

	ACTA DE REUNION Nº.006	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 1 de 5

Nombre del Evento:		Comité virtual de seguimiento técnico, contrato de obra pública N° 084 de 2023	
Tema/Proyecto/Asunto: Comité de seguimiento técnico, contrato de obra pública N°084 de 2023		Fecha: 20/01/2025	
		Lugar: virtual	
		Hora de Inicio: 9:00 a.m.	
		Hora de Final: 11:00 a.m.	
Agenda:			
PARTICIPANTES			
NOMBRE	CARGO	ENTIDAD	
Jefferson Bracho	Supervisor de Obra (E)	Corpoguajira	
Angelica Patricia Mendoza	Supervisor de interventoría	Corpoguajira	
María De Luque Parody	Residente	Asopagua	
Juan Carlos Amaya	Director interventoría	Prida S.A.S	
SEGUIMIENTO COMPROMISOS REUNION ANTERIOR			
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	% CUMPLIMIENTO	OBSERVACIONES
DESARROLLO			
<p>El día lunes de 20 de enero de 2025, se procede a celebrar el Comité virtual de seguimiento técnico al contrato de obra pública N° 084 de 2023, convocado por parte de la interventoría vía correo el día 16 de enero de 2025; donde se contó con la asistencia de los participantes anteriormente mencionado.</p> <p>Los supervisores manifiestan preocupación por el poco avance del contrato teniendo en cuenta que han pasado tres semanas de reinicio de actividades correspondiente a la prórroga del cual no se ha evidenciado actuación por parte del contratista. Y lo que aun genera más preocupación es el estado de la interventoría que lleva 3 semanas sin poder verificar por lo menos el material comprado para comprobar que este cumple con las especificaciones técnicas.</p> <p>En vista del que el contratista se encuentra entregando material, la interventoría desconoce cuáles son los sitios exactos donde fueron descargados, por ende, asumir unos puntos cuando en realidad están en otra zona, dificultaría el desplazamiento del equipo técnico. Es por ello, que la interventoría requiere con urgencia la entrega del cronograma de actividades y que de verdad de parte de Asopagua tenga compromiso y trabajo en conjunto con la interventoría y supervisión para sacar adelante el contrato y evitar los retrasos teniendo en cuenta la limitación de tiempo para la ejecución.</p> <p>La supervisión insta al contratista de obra a la entrega oportuna de información, porque se desconoce las intervenciones por parte de Asopagua, ahora bien se le recuerda que son 6</p>			



ACTA DE REUNION Nº.006

Código: R PCP04-2

Versión: 5

Fecha: 05/11/2015

Página 2 de 5

meses de vigencia del contrato y estamos finalizando en 5to mes y aun no se ha visto ni una sola estufa construida.

El ingeniero Juan Carlos manifiesta que ha solicitado en varias oportunidades en plazo oportunos una programación de obra como se pactado en el comité 1 y hasta la fecha no se ha entregado ni la programación ni el avance de obra, por lo que genera preocupación. Por su parte el contratista de obra debe estructurar un plan de trabajo que justifique porque una obra que tenía que entregar en teoría en 4 meses, ahora con la adición la hará en 2 meses. Así mismo queremos saber cómo lo piensa hacer que recursos va emplear que rendimientos tiene presupuestados, al igual se necesita esos rendimientos para hacer seguimiento.

Acto seguido, el ingeniero Juan Carlos informa que le envió un oficio solicitando unas correcciones al informe y hasta la fecha no se han subsanado. Lo que genera incertidumbre saber qué pasa con Asopagua porque no se pronuncia frente a las solicitudes de la interventoría y de la supervisión.

María Deluque representante de Asopagua manifiesta que hasta la fecha se han entregado 40 estufas, el proyecto esta dividido en dos etapas el sector de troncal y sector que va de arroyo arenas hasta el sur del municipio.

Sin embargo el ingeniero Juan Carlos interviene diciendo que si han entregado 40 estufas porque no han remitido a la interventoría una relación de esas estufas que han entregado y una programación de las estufas que van a entregar dado que están avanzando como les parece y a la interventoría necesita hacer ese seguimiento para verificar.

La ingeniera Deluque manifiesta que el día de hoy tuvieron una reunión interna y quedaron que iban a entregar a partir de mañana una relación de los beneficiarios que se le han entregado las estufas y a los próximos entregar para que la interventoría sepa la ubicación y a la georreferenciación de cada punto donde las cuadrillas estarán realizando los trabajos. En cuanto a las entrega, se ha presentado que vamos a llevar la estufa y los beneficiarios no se encuentran y toca trasladarse inmediatamente a otro para no perder tiempo por ejemplo en el sector de la troncal muchas veces las cocinas están más cerca y es más fácil hacer Las entregas, mientras que en el sector de arroyo arena las comunidades están muy dispersas y es más difícil hacer las entregas más efectivas. Además, la ingeniera resalta que se tiene contemplado entregar entre 5 a 10 estufas por días, con una total de 7 cuadrillas trabajando.

El ingeniero Juan Carlos hace énfasis en la entrega de la programación semanal, aunque esta no se cumpla a cabalidad, dado que en el informe de avance les permite justificar la cantidad real de estufa entregada y las novedades presentadas en campo en caso de no entregar lo proyectado en dicha programación. Es importante informar cómo están avanzando.

Asopagua manifiesta que tienen contemplado aumentar las cuadrillas simultaneas es decir alrededor de 5 a 7 cuadrillas diarias que so corresponde a realizar las entregas de 5 a 10 estufas por día dependiendo las distancias de los predios.



ACTA DE REUNION Nº.006

Código: R PCP04-2

Versión: 5

Fecha: 05/11/2015

Página 3 de 5

La interventoría solicita un plan de contingencia que diga los rendimientos que tengan proyectados, para identificar las medidas que toma ASOPAGUA y como impactan dichos rendimientos.

El contratista atiende a la petición y manifiesta que realizaran un frente de trabajo para trabajar en el plan de contingencia. La intención del contratista es terminar el contrato en el tiempo apremiante y poder cumplir con todos los requerimientos que solicitan tanto la interventoría como la supervisión.

Finalmente, la doctora Angelica informa a los presente que queda fijada todos los viernes la ASOCION ASOPAGUA deben pasar la programación semanal y los lunes deben pasar el informe de avance para verificar los trabajos realizados en dicha programación.

Así mismo se le reitera al contratista que solo se cuenta con dos meses de prorrogas y no existe más adición de tiempo.

Por su parte el contratista informa que basado a los rendimientos proyectados sin contratiempo la meta la estarían entregando para el 20 de febrero, quedarían 11 días para la legalización del contrato, lo que si le genera preocupación es que en el sector Juan y Medio hay situación con respecto al orden público por lo que se tiene la precaución de antes de intervenir la zona se llaman a los beneficiarios para ingresar a la zona con ellos para evitar conflicto, respetando las condiciones que allí se estén implementando.

No obstante la doctora Angelica exhorta al contratista, recordándole que cuando la asociación paso el cronograma, las dos primeras semanas era para hacer socialización y hacer reconocimiento de los predios, no encontraron dificultades lo que genera preocupación que faltando un mes el contratista informe a última hora que existan beneficiarios que no cumplen por conflictos que ya se habían mencionado en informes anteriores por parte del contratista de obra sobre el orden público, teniendo en cuenta que hasta la fecha ya se debe tener clara esta información.

Por su parte, el contratista informa que, una vez finalizada las construcciones en la zona de la troncal, se procede a dar inicio a la segunda etapa en acompañamiento de los beneficiarios con la intención de cumplir con la construcción de las estufas, si en casos dado se llegase a presentar una eventualidad que impida el cumplimiento de esta actividad en esta zona, será comunicado a la corporación con tiempo.

Sin embargo, el ingeniero Juan Carlos manifiesta que al contratista se le emitió una solicitud sobre el diagnóstico de los beneficiarios, dado que en teoría cuando se firmó el acta de suspensión el contratista afirmó tener la verificación de los usuarios lista y que todas cumplían reafirmado en un oficio remitido a la interventoría.


El contratista se compromete entregar en el transcurso de la semana las observaciones de los beneficiarios de los cumplen o no para la construcción de las estufas. Sin embargo, señala que en el sector la troncal son alrededor de 62 estufas las cuales se le presentara a la interventoría para que hagan la verificación, por lo que deberán aumentar esfuerzos en la segunda etapa del proyecto. Se pretenden trabajar de lunes a domingo con un rendimiento de 5 a 10 estufas diarias.

	ACTA DE REUNION Nº.006	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 4 de 5

COMPROMISO		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Entregar informe ajustado	Asopagua	22 de enero de 2025
Programación semanal		20 de enero de 2025
Plan de contingencia		22 de enero de 2025

Se cierra el acta con 2 folios.

Evidencia del comité virtual

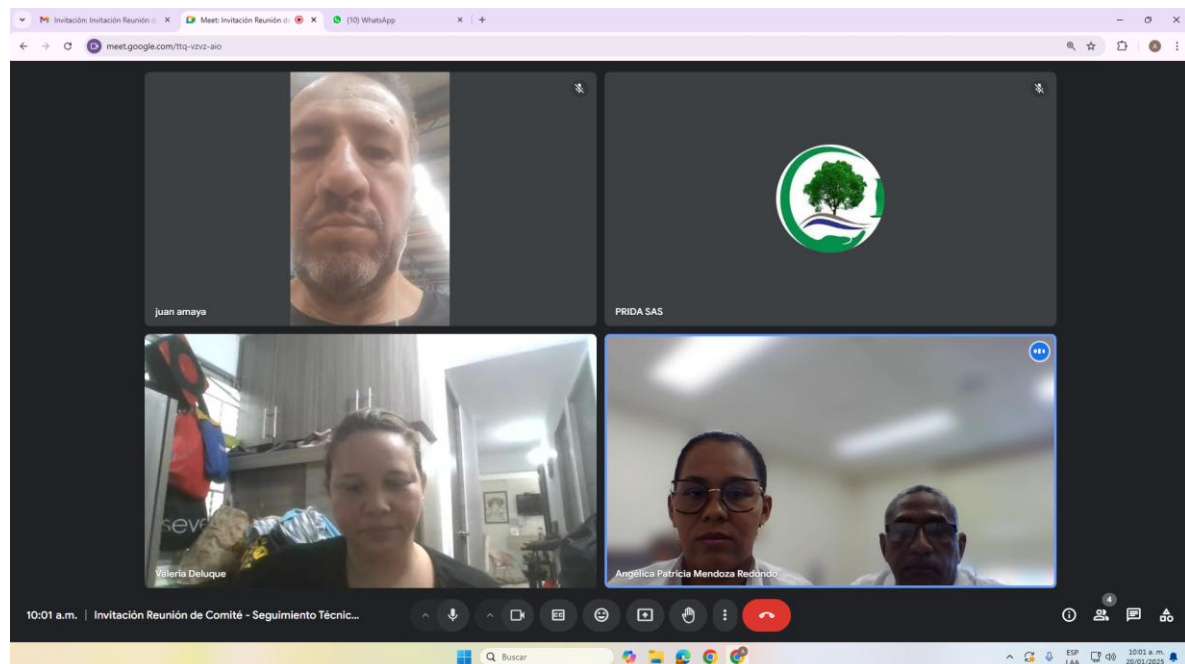

	<h1>ACTA DE REUNION Nº.006</h1>	Código: R PCP04-2
		Versión: 5
		Fecha: 05/11/2015
		Página 5 de 5

