



**CONTRATO N° MC-033-2024 OBJETO: "CONSTRUCCIÓN
DE CERRAMIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL
MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE"**

**INFORME FINAL DE
SUPERVISION**

**PERIODO COMPRENDIDO
ENTRE NOVIEMBRE 26 Y
DICIEMBRE 13 DE 2024
(AVANCES)**



TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION

2. GENERALIDADES

2.1. Datos generales del contrato de obra.

2. PÓLIZAS

2.1. Póliza de contrato de obra

3. LOCALIZACIÓN

4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE

5. ETAPA DE OBRA

5.1. Trazado y replanteo

5.2. Excavación en material común para postes de madera prof. 0,50 m

5.3. Cerramiento en estructura de madera y alambres de púas cal. 14 (6 hilos)

6. MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

7. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SG-SST

8. CONCLUSIÓN

9. ANEXOS

9.1. Copia De Bitácora



1. INTRODUCCION:

La Gobernación de Sucre, entre sus funciones y deberes se encuentra garantizar el accionar encaminado a promover la seguridad y la convivencia en el territorio, apoyando intervenciones que en materia de seguridad contribuyan al desarrollo en el marco del beneficio público.

En este sentido, la Gobernación de Sucre con sus sedes busca disponer de todos los recursos técnicos, administrativos, financieros, legales y logísticos en pro del desarrollo de estas estrategias de intervención.

Por lo anterior, el inexistente cerramiento para la protección del espacio físico de intervención predio San Cayetano, aunado a la limitada presencia de organismos de seguridad para la prevención de situaciones adversas, el incremento de los índices de inseguridad y el consecuente deterioro del tejido social y la confianza entre los habitantes de la zona circundante, ha motivado la pluralidad e incrementado las expectativas para velar por la protección integral de la sociedad y garantizar los derechos humanos de todos los involucrados directa e indirectamente en esta situación latente.

De acuerdo con esto, a través de la celebración del contrato de obra de índole público No. **MC – 033 – 2024** entre La Gobernación de Sucre, y la empresa **ING CONSTRUCCIONES SAS**, se llevará a cabo la **CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE**, por lo cual se pone en marcha la participación departamental para brindar un seguimiento, acompañamiento y apoyo técnico en la ejecución del contrato de obra hasta su cabalidad.

En la presente supervisión de obra, se controla y verifica que la obra en ejecución se lleve a cabo de acuerdo con los planos, especificaciones técnicas y normativas aplicables, promoviendo la calidad, seguridad y cumplimiento de los plazos establecidos.

Este informe final de supervisión tiene como objetivo proporcionar una visión integral de la ejecución de la obra, iniciando a partir del 26 de noviembre del 2024 hasta el 13 de diciembre del mismo año, de los avances de la **CONSTRUCCIÓN DE CERRA-**



**MIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO,
DEPARTAMENTO DE SUCRE.**



2. GENERALIDADES:

2.1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA

CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA	ING CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT 900.432.306-7
REPRESENTANTE LEGAL	YESID DE JESUS CASTILLO BARRIOS C.C. 1.140.897.456
CONTRATO DE OBRA:	MC – 033 – 2024
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
SUPERVISION:	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA
VALOR EJECUTADO FINAL DEL CONTRATO DE OBRA:	SESENTA Y TRES MILLONES, QUINIENTOS VEINTICINCO MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$63.525.650,50)
PLAZO DE EJECUCION	UN (1) MES
FECHA DE INICIO	26 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA	13 DE DICIEMBRE DE 2024
VALOR PRESENTE ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA:	SESENTA Y TRES MILLONES, QUINIENTOS VEINTICINCO MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS Y CINCUENTA CENTAVOS M/CTE (\$63.525.650,50)



2. PÓLIZAS:

2.1. PÓLIZA DE CONTRATO DE OBRA


GARANTÍA	NOMBRE ASEGURADORA	No PÓLIZA	INICIO	VENCIM.	Vr. ASEGURADO	VIGENC.
Cumplimiento estatal	Seguros del estado	75-40- 101053385	26-11- 2024	26-12- 2027	\$ 15.881.412,63	SI
Responsabilidad civil extracontractual derivad de cumplimiento	Seguros del estado	75-40- 101053385	12-11- 2024	26-12- 2024	\$ 260.000.000,00	SI

Tabla.1. Pólizas vigentes del contrato.

3. LOCALIZACIÓN

Para contextualizar de una mejor manera la ubicación del proyecto a desarrollar CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE; se realizará una descripción de la ubicación desde lo macro a lo micro.

La obra a realizar se localiza en el municipio de Sincelejo en el lote ubicado con dirección San Cayetano en zona urbana, identificado con matrícula inmobiliaria # 340 – 8918 y cedula catastral # 01 – 02 – 1407 – 0001 – 000.

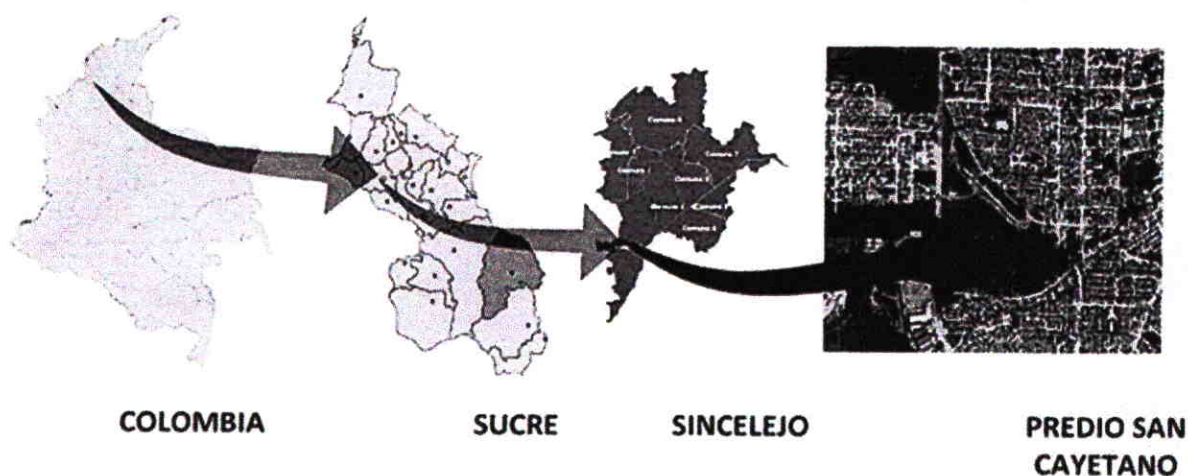

SITIO ESCOGIDO PARA LA INTERVENCIÓN



4. ACTIVIDADES POR EJECUTAR Y ALCANCE

El alcance del proyecto se encuentra definido por las condiciones establecidas en el contrato, el cual contempla la ejecución de las siguientes actividades:

5. ETAPA DE OBRA

**PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL PREDIO
SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO,
DEPARTAMENTO DE SUCRE**

CONTRATISTA: ING CONSTRUCCIONES S.A.S NIT: 900.432.306-7

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO,
DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CONTRATANTE:

DEPARTAMENTO DE
SUCRE

VR CONTRATO:

\$ 63.525.650,50

CONTRATO DE OBRA No MC - 033 - 2024

OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE SUCRE
CONTRATISTA	ING CONSTRUCCIONES SAS
NIT	900.432.306-7
REPRESENTANTE LEGAL	REPRESENTANTE LEGAL YESID DE JESUS CASTILLO BARRIOS
CEDULA DE CIUDADANIA	1.140.897.456
VALOR DEL CONTRATO	SESENTA Y TRES MILLONES, QUINIENTOS VEINTICINCO MIL, SEISCIENTOS CINCUENTA PESOS CON CINCUENTACENTAVOS M/CTE (\$63.525.650,50)
PLAZO DE EJECUCION	UN (1) MES
ACTA DE INICIO	26/11/2024
FECHA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO	18/12/2024

EN SINCELEJO - SUCRE, A LOS TRECE (13) DÍAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2024 SE REUNIERON EL ING YESID DE JESUS CASTILLO BARRIOS, EN CALIDAD DE REPRESENTANTE LEGAL DE ING CONSTRUCCIONES S.A.S, COMO
CONTRATISTA, EL ING JORGE ALBERTO ROMERO ROMERO SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA EN CALIDAD DE SUPERVISOR, PARA DEJAR CONSTANCIA POR MEDIO DE LA PRESENTE ACTA DEL RECIBO FINAL DE LAS SIGUIENTES
ACTIVIDADES SEGÚN LAS CONDICIONES QUE SE DETALLAN A CONTINUACIÓN:

PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

PROPUESTA ECONOMICA						PRESENTA ACTA		ACUMULADO FINAL		
ITEM	ACTIVIDAD/DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	CANTIDAD	VR AVANCE FINAL	% EJECUTAD
1	TRAZADO Y REPLANTEO	MI	1381,00	\$ 2.100,00	\$ 2.900.100,00	1381,00	\$ 2.900.100,00	1381,00	\$ 2.900.100,00	100%
					SUBTOTAL		\$ 2.900.100,00		\$ 2.900.100,00	
2	EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA POSTES DE MADERA PROF. 0,50 M	MI	345,50	\$ 5.086,00	\$ 1.757.213,00	345,50	\$ 1.757.213,00	345,50	\$ 1.757.213,00	100%
					SUBTOTAL		\$ 1.757.213,00		\$ 1.757.213,00	
	CERRAMIENTO EN ESTRUCTURA DE MADERA Y ALAMBRES DE PÚAS CAL. 14 (6 HILOS)	MI	1381,00	\$ 32.012,00	\$ 44.208.572,00	1.381,00	\$ 44.208.572,00	1381,00	\$ 44.208.572,00	100%
					SUBTOTAL		\$ 44.208.572,00		\$ 44.208.572,00	
					SUBTOTAL		\$ 48.865.885,00		\$ 48.865.885,00	100%
					SUBTOTAL COSTO DIRECTOS		\$ 48.865.885,00		\$ 48.865.885,00	100%
				A.L.U. 30% C.D.	30,0%		\$ 14.659.765,50		\$ 14.659.765,50	100%
				TOTAL COSTOS DIRECTOS + A.L.U.			\$ 63.525.650,50		\$ 63.525.650,50	100%
					TOTAL COSTO OBRA CIVIL		\$ 63.525.650,50		\$ 63.525.650,50	100%

Firma

Nombre del proponente: ING CONSTRUCCIONES S.A.S

Nombre del representante legal: YESID DE JESUS CASTILLO BARRIOS

Firma

JORGE ROMERO ROMERO

Supervisor De La Secretaría De Infraestructura

Firma

ISMAEL SIERRA HIRARTE


Apoyo a Supervision

Nº	DESCRIPCIÓN	FECHA	VALOR A FACTURAR	VALOR NETO A PAGAR	% ACUMULADO
FACT	ACTA FINAL DE OBRA	13/12/2024	\$ 63.525.650,50	\$ 63.525.650,50	100%



A continuación, se presenta la descripción de las actividades desarrolladas en la ejecución del proyecto, **CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE:**

5.1. TRAZADO Y REPLANTEO

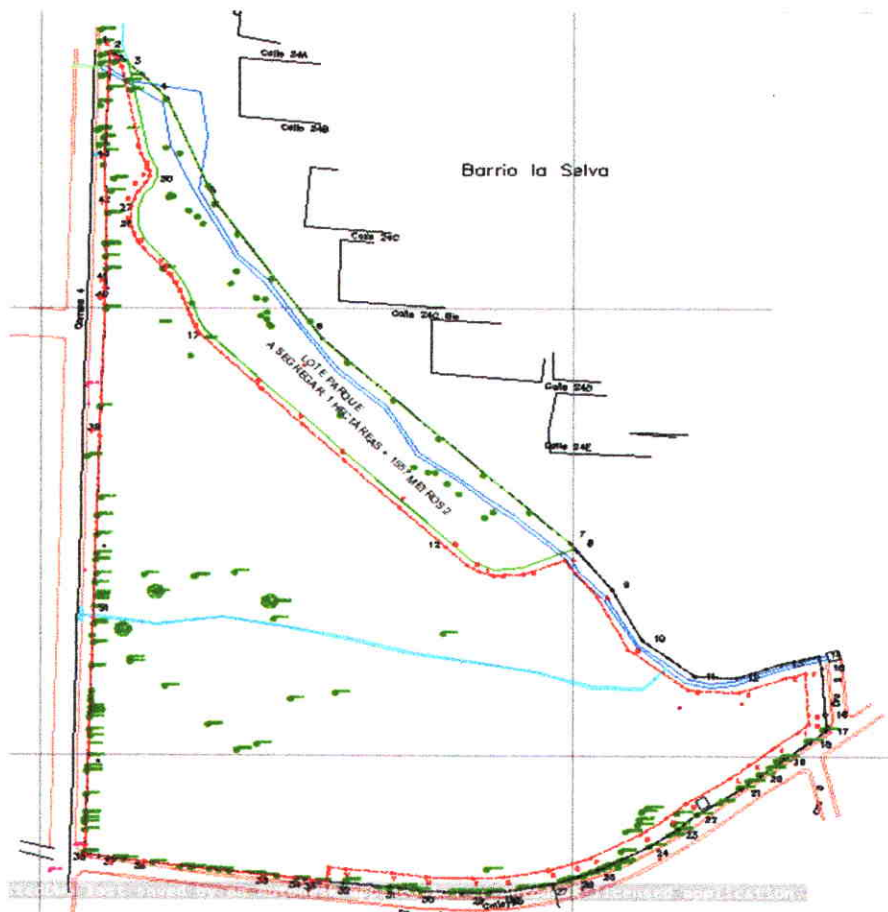

Correspondió a los procesos iniciales de obra para definir y medir las dimensiones del cercado en el terreno trasladando los ejes y niveles del plano al terreno, trazando la forma del perímetro de la obra y señalando los ejes y contornos donde se situaran los postes en madera. Así como el procedimiento de verificación de la ubicación y medidas de los elementos que se detallan en los planos.


5.2. EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN PARA POSTES EN MADERA PROF. 0,50 M



Consistió en la extracción de materiales de suelo, como limos, arcillas arenosas, gravas, o una combinación de estos, dentro de los límites del contrato de obra y condiciones ordinarias según especificaciones geotécnicas, es decir, a la profundidad definida de 0.50 m y tipo de suelo corriente.

5.3. CERRAMIENTO EN ESTRUCTURA DE MADERA Y ALAMBRES DE PÚAS CAL. 14 (6 HILOS)

**Tramo: Entrada Parque 20 de Enero (CL 24 A – La Selva) – Puente arroyo CRA
9 (Lavadero informal de vehículos)**

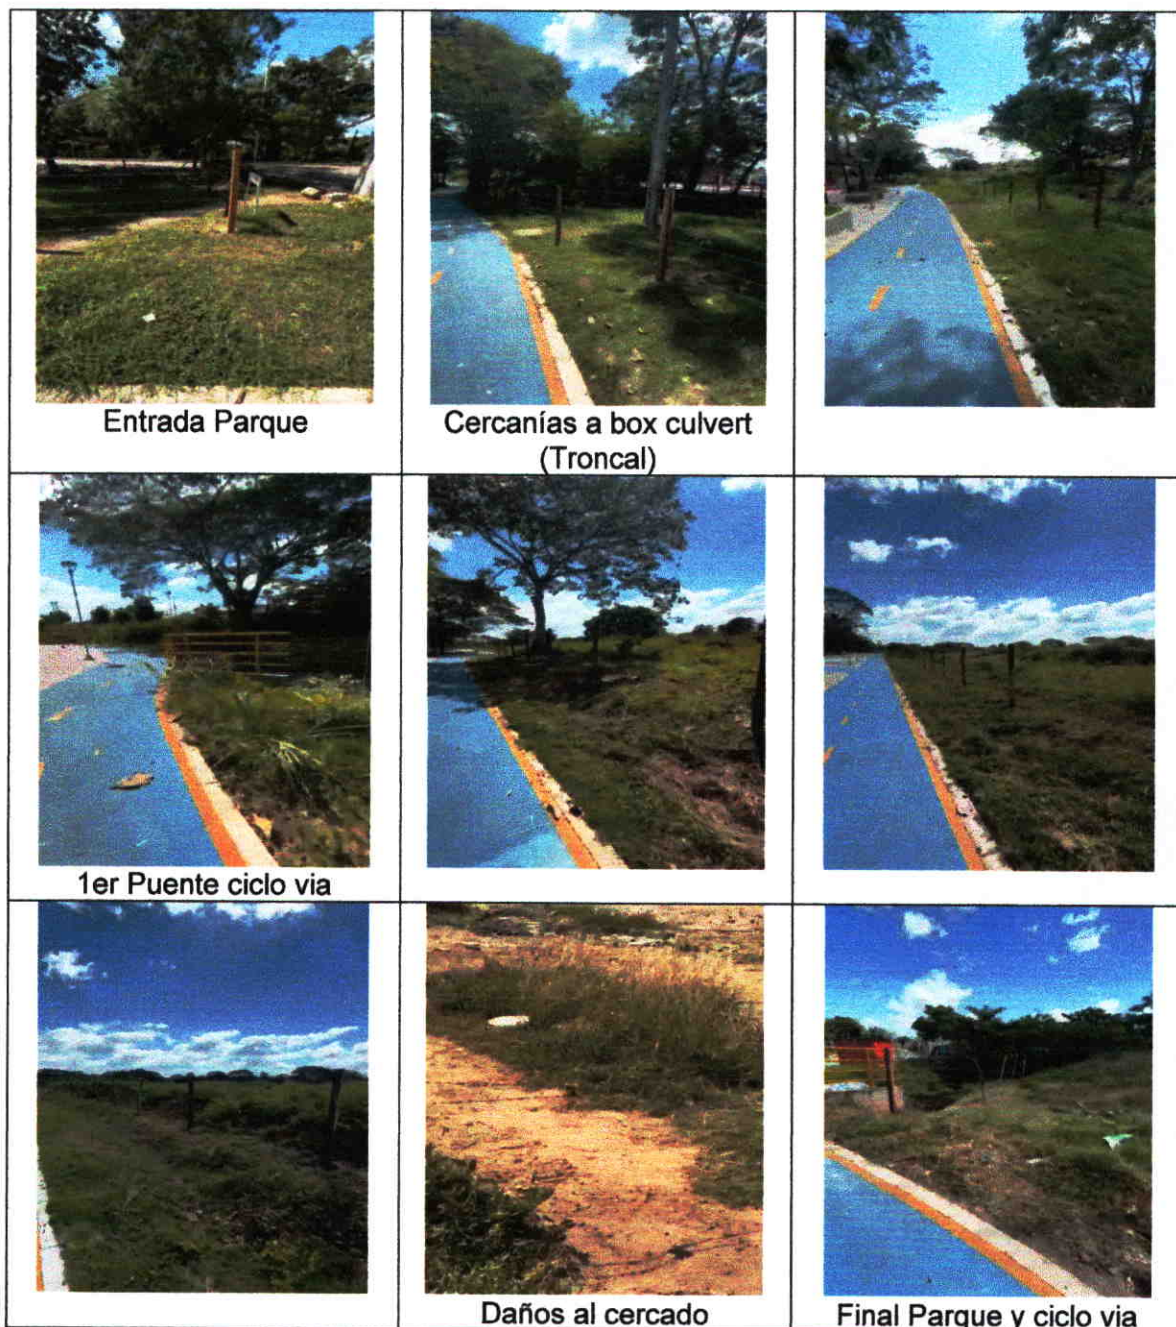



2do Puente



Rivera arroyo
(Inicio cercado hacia CRA
9)



Daños al cercado



Rivera arroyo CRA 7



Rivera arroyo CRA 7



Rivera arroyo CRA 8



Rivera arroyo CRA 8



Cercanías a vivienda
irregular CRA 9




Tramo: Entrada Parque 20 de Enero (CL 24 A – La Selva) – Intersección RUTA 25-CL 25 (Troncal)



Puente arroyo (Entrada Parque)



Frente a CL 24 E Ciudad Satélite

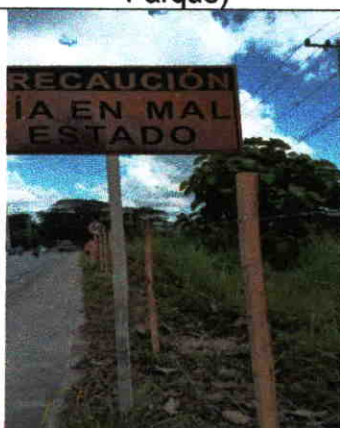

Frente a taller Atlantis (Troncal)



Diagonal taller Atlantis (Troncal) – Hurto de postes cercado



Rehabilitación cercado



Inicio cercado desde intersección CL 25-RUTA 25 (Troncal)



**Tramo: Intersección RUTA 25-CL 25 (Troncal) - Vivienda
irregular y lavadero de vehículos informal (CL 25)**



Inicio cercado desde
intersección CL 25-RUTA
25 (Troncal)



Zona maderera



Accesos cercado para
almacenamiento maderas



Final cercado vivienda
irregular y lavadero de
vehículos informal (CL 25)





**Tramo: Vivienda irregular y lavadero de vehículos informal (CL 25) –
Intersección cerco (Margen Arroyo)**



Inicio cercado vivienda irregular



Patio vivienda
irregular



Interseccion cercado (Margen arroyo)

Concerniente a uno de los tipos de cerramiento más económicos y de rápida instalación. Compuesto de hiladas de alambres horizontales de púas (6 para este caso), en calibre 14, fijados a postes de madera ubicados cada (3) metros en promedio, mediante grapas tipo U galvanizadas.

Se resalta el hecho particular, de tensado de los alambres para estabilidad y firmeza del cercado, así como la disposición de postes de madera diagonales en determinados puntos para este fin.




6. MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO DEL CONTRATO: "CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CAPITULO		SUB-CAPITULO	
ITEM:	DESCRIPCION:	UNIDAD:	MI

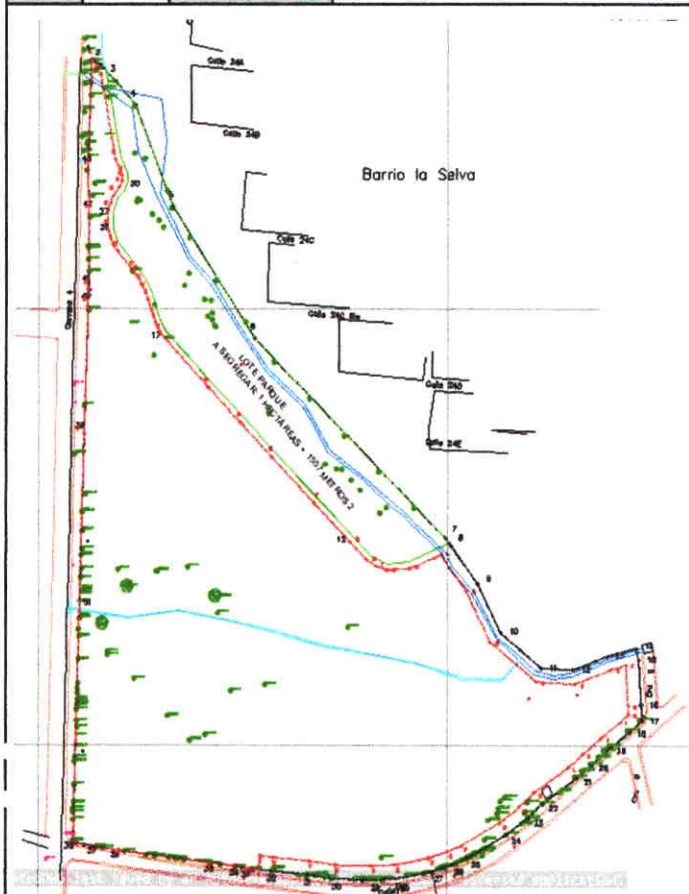

Dimensiones					
EST	PV	LONGITUD (M)	AREA (M2)	CANT. UNID.	SUBTOTAL UNID.
A	B	32,658			32,66
B	C	36,382			36,38
C	D	23,96			23,96
D	E	23,363			23,36
E	F	9,428			9,43
F	G	23,044			23,04
G	H	4,996			5,00
H	I	6,393			6,39
I	J	14,854			14,85
J	K	14,854			14,85
K	L	11,391			11,39
L	M	25,566			25,57
M	N	12,214			12,21
N	O	15,528			15,53
O	P	26,167			26,17
P	Q	9,989			9,99
Q	R	11,555			11,56
R	S	21,207			21,21
S	T	14,813			14,81
T	U	21,922			21,92
U	V	16,283			16,28
V	W	21,826			21,83
W	X	7,75			7,75
X	Y	8			8,00
Y	Z	7,877			7,88
Z	A	6,828			6,83
A	B	15,218			15,22
B	C	56,708			56,71
C	D	14,114			14,11
D	E	14,275			14,28
E	F	234,342			234,34
F	G	73,456			73,46
G	H	9,568			9,57
H	I	42,967			42,97
I	J	25,863			25,86
J	K	63,211			63,21
K	L	9,483			9,48
L	M	50,164			50,16
M	N	10,158			10,16
N	O	3,06			3,06
O	P	4,284			4,28
P	Q	6,877			6,88
Q	R	9,389			9,39
R	S	11,112			11,11
S	T	9,006			9,01
T	U	4,877			4,88
U	V	14,80			14,80
V	W	3,78			3,78
W	X	5,59			5,59
X	Y	5,17			5,17
Y	Z	4,12			4,12
Z	A	14,07			14,07
A	B	7,06			7,06
B	C	42,70			42,70
C	D	27,89			27,89
D	E	27,84			27,84
E	F	37,03			37,03
F	G	30,89			30,89
G	H	14,96			14,96
H	I	6,27			6,27
I	J	7,53			7,53
J	K	14,17			14,17
K	L	20,38			20,38
L	A	0,85			0,85
TOTAL					1.381,90

ARROYO EXISTENTE
ARROYO EXISTENTE AL LADO DEL PARQUE LINEAL
ZONA PERTENECIENTE A PARQUE LINEAL
CERRAMIENTO REALIZADO

ING. YERMO DE JESUS CASTILLO BARRIOS
MP. 021037-0673718 ATL
CC. 1.140.897.406

ING. JOSE MUNIVIA
RESPONSABLE DE OBRA

OBSERVACIONES:

"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

[illegible]

"CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE"

CAPITULO			SUB-CAPITULO		
ITEM:	3	DESCRIPCION:	UNIDAD:	MI	
CERRAMIENTO EN ESTRUCTURA DE MADERA Y ALAMBRES DE PÚAS CAL 14 (6 HILOS)					
     			Dimensiones		
			EST	PV	LONGITUD (M)
A	B	32,658			32,66
B	C	36,382			36,38
C	D	23,96			23,96
D	E	23,363			23,36
E	F	9,428			9,43
F	G	23,044			23,04
G	H	4,996			5,00
H	I	6,393			6,39
I	J	14,854			14,85
J	K	14,854			14,85
K	L	11,391			11,39
L	M	25,566			25,57
M	N	12,214			12,21
N	O	15,528			15,53
O	P	26,167			26,17
P	Q	9,989			9,99
Q	R	11,555			11,56
R	S	21,207			21,21
S	T	14,813			14,81
T	U	21,922			21,92
U	V	16,263			16,26
V	W	21,826			21,83
W	X	7,75			7,75
X	Y	8			8,00
Y	Z	7,877			7,88
Z	A	6,828			6,83
A	B	15,218			15,22
B	C	56,708			56,71
C	D	14,114			14,11
D	E	14,275			14,28
E	F	234,342			234,34
F	G	73,456			73,46
G	H	9,589			9,57
H	I	42,967			42,97
I	J	25,863			25,86
J	K	63,211			63,21
K	L	9,483			9,48
L	M	50,164			50,16
M	N	10,158			10,16
N	O	3,05			3,05
O	P	4,264			4,26
P	Q	4,877			4,88
Q	R	9,399			9,39
R	S	11,112			11,11
S	T	9,006			9,01
T	U	4,877			4,88
U	V	14,80			14,80
V	W	3,78			3,78
W	X	5,59			5,59
X	Y	5,17			5,17
Y	Z	4,12			4,12
Z	A	14,07			14,07
A	B	7,06			7,06
B	C	42,70			42,70
C	D	27,89			27,89
D	E	27,84			27,84
E	F	37,03			37,03
F	G	30,89			30,89
G	H	14,96			14,96
H	I	6,27			6,27
I	J	7,53			7,53
J	K	14,17			14,17
K	L	20,36			20,36
L	A	0,85			0,85
				TOTAL	1.361,00



ING. YEBID DE JESUS CASTILLO BARRIOS
MP. 021057-0673718 ATL
CC: 1.146.897.456



ING. JOSE MUÑIVE
RESIDENTE DE OBRA

OBSERVACIONES: EL CERRAMIENTO SE LLEVO A CABO CON LA INSTALACION DE 601 LISTONES DE MADERA



7. INFORMACIÓN AMBIENTAL Y SG-SST

En cumplimiento de los requerimientos contractuales y tomando como fundamento las buenas prácticas de ingeniería, la demanda de recursos naturales, el cumplimiento de la normatividad vigente y basados en los programas propuestos en el plan de gestión ambiental propuesto en el estudio de impacto ambiental para el proyecto en ejecución, se hace este seguimiento mensual teniendo como eje fundamental minimizar y/o mitigar los impactos ambientales negativos que se generan con la construcción de la obra que se adelanta, así como la protección de la salud y el bienestar de todos los trabajadores y la satisfacción de los grupos de interés.

Es por eso que se relaciona la evolución y progreso respectivo de cada una de las actividades contempladas dentro de la obra, en aspectos como: Gestión ambiental y Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG – SST).

De acuerdo con lo anterior, el SISO de la obra posee un papel fundamental, dado que este a través de su gestión y trabajo implementa las medidas necesarias en aras de que prevalezca la salud e integridad de cada una de las personas de la obra, como también vincular al personal de trabajo en cada una de las prestaciones sociales, tales como salud, pensión y riesgos laborales.

La empresa **ING CONSTRUCCIONES S.A.S.** en el cumplimiento al SG – SST y en el marco legal establecido, ha suministrado la dotación de seguridad al personal de trabajo, como cascos, guantes, gafas y otros elementos que promuevan la seguridad del trabajador a la hora de poner en práctica las diferentes actividades de obra. Otra de las actividades puestas en prácticas es la señalización dentro de obra, trazando rutas de acceso y de evacuación.

Por otro lado, la implementación de las medidas dispuestas en el estudio de impacto ambiental, han ayudado a mitigar los impactos ambientales.



8. CONCLUSION

En el anterior informe final de supervisión se presentaron las diferentes actividades (con sus respectivos registros fotográficos) dentro de la **CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE**, durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre del 2024 y el 13 de diciembre del mismo año, del contrato de obra No **MC – 033 – 2024** y el seguimiento y acompañamiento realizado por la supervisión. Durante la obra, se enfatizó en el estudio y realización a cabalidad de los diferentes planos y diseños del proyecto, con la intención de tener una línea clara de ejecución. La supervisión en aras de cumplir con cada una de sus responsabilidades, a lo largo del proceso ha suministrado aportes técnicos y normativos que permitan que la obra en ejecución cumpla con cada una de las especificaciones dispuestas en los planos, marco legal y contractual, garantizando así estándares de calidad y funcionalidad de la obra.

Durante la obra, las actividades se llevaron a cabo con completa normalidad, salvo algunos hechos como cortes malintencionados al cercado, hurto de postes de madera ya instalados y la protesta de algunos habitantes por la limitación al libre tráfico y movilidad por predios en situación irregular y espacios comerciales informales destinados al lavado de vehículos. No obstante, el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE** a la fecha de entrega del acta final (13 de diciembre de 2024) fue ejecutado al 100%, sin la presencia de novedades adversas u imprevistos.



8. CONCLUSION

En el anterior informe final de supervisión se presentaron las diferentes actividades (con sus respectivos registros fotográficos) dentro de la **CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE**, durante el periodo comprendido entre el 26 de noviembre del 2024 y el 13 de diciembre del mismo año, del contrato de obra No **MC – 033 – 2024** y el seguimiento y acompañamiento realizado por la supervisión.

Durante la obra, se enfatizó en el estudio y realización a cabalidad de los diferentes planos y diseños del proyecto, con la intención de tener una línea clara de ejecución.

La supervisión en aras de cumplir con cada una de sus responsabilidades, a lo largo del proceso ha suministrado aportes técnicos y normativos que permitan que la obra en ejecución cumpla con cada una de las especificaciones dispuestas en los planos, marco legal y contractual, garantizando así estándares de calidad y funcionalidad de la obra. Durante la obra, las actividades se llevaron a cabo con completa normalidad, salvo algunos hechos como cortes malintencionados al cercado, hurto de postes de madera ya instalados y la protesta de algunos habitantes por la limitación al libre tráfico y movilidad por predios en situación irregular y espacios comerciales informales destinados al lavado de vehículos. No obstante, el proyecto **CONSTRUCCIÓN DE CERRAMIENTO DEL PREDIO SAN CAYETANO EN EL MUNICIPIO DE SINCELEJO, DEPARTAMENTO DE SUCRE** a la fecha de entrega del acta final (13 de diciembre de 2024) fue ejecutado al 100%, sin la presencia de novedades adversas u imprevistos.

Para constancia, se firma por los delegados de La Gobernación de Sucre:


JORGE ROMERO ROMERO
Supervisor
Secretaria De Infraestructura


ISMAEL SIERRA IRIARTE
Apoyo A la Supervisión
Secretaria De Infraestructura
