

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO	Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN	Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Página 1 de 17

Villavicencio, 15/05/2025

Doctor(a):
ALBA AURORA COLINA
 Jefe de Oficina de Contratación
 Alcaldía Municipal de Villavicencio
 Ciudad.

Ref.: CONTRATO N°.2928 DE 2024, N°. DEL PROCESO EN SECOP SAMC-013-2024 EL CUAL TIENE COMO OBJETO “REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO”
PERIODO No. 04 del 1 de abril de 2025 al 30 de abril de 2025.

OBJETIVO DEL INFORME: Llevar a cabo las tareas de vigilancia de la ejecución contractual e informar al municipio de Villavicencio acerca del desarrollo del mismo verificando el cumplimiento de las obligaciones contractuales a lo largo de su ejecución en desarrollo de las obligaciones legales contenidas en los artículos 83, 84 y siguientes de la Ley 1474 de 2011 y demás normativa aplicable.

1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO

No. Y FECHA DEL CONTRATO (incluir el número del proceso en SECOP)	CONTRATO N°.2928 DE 2024, N°. DEL PROCESO EN SECOP SAMC-013-2024		
PUBLICADO EN (Marque con X)	SECOP I _____ Ó SECOP II <u> X </u>		
CLASE DE CONTRATO:	OBRA		
NOMBRE DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO ALSIPA		
No. DE IDENTIFICACIÓN	901.892.095-4		
OBJETO:	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		
NOMBRE DEL SUPERVISOR CON NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: (De todos los que haya tenido, empezando por el vigente)	DIEGO ORLANDO BARBOSA MONTEALGRE C.C 1.121.838.448		
FECHA DESIGNACIÓN SUPERVISIÓN: (De todos los que haya tenido, en orden empezando por el vigente)	12 DE DICIEMBRE DE 2024		
CONDICIONES INICIALES			
VALOR DEL CONTRATO (letras y número):	NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MTCE (\$965.030.477,00)		
PLAZO DE EJECUCIÓN:	El plazo de ejecución será hasta el 30 DE DICIEMBRE DE 2024 contados a partir de la suscripción del acta de inicio		
FECHA DE INICIO:	11/12/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN:	30/12/2024		
MODIFICACIONES:			
CESIÓN:	N.A	FECHA:	N.A
VALOR DE ADICIÓN:	N. A.	FECHA:	N.A

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO		Código: GCT-F-27
	PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN		Versión: V1
			Fecha: 29/04/2025
	FORMATO INFORME DE SUPERVISOR		Página 2 de 17

NUEVO VALOR DEL CONTRATO: (INICIAL + ADICIÓN)	N.A		
PRORROGAS	001	FECHA:	28/01/2025
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	TRES (03) MESES Y CINCO (05) DIAS		
PRORROGAS	002	FECHA:	10/04/2025
TOTAL PLAZO DE EJECUCIÓN (INICIAL + PRÓRROGAS)	CUATRO (04) MESES Y VEINTE (20) DIAS		
SUSPENSIONES	FECHA:24/012/2024		
REINICIOS:	1	FECHA:	24/01/2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO:	30/05/2025		

2. **DESARROLLO DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO:** Teniendo en cuenta que mediante acto administrativo del 12/12/2024 y en plataforma SECOP II, se me designó como SUPERVISOR del contrato de la referencia, me permito presentar el informe del desarrollo del objeto contractual correspondiente al PERIODO el 01/04/2025 al 30/04/2025 de conformidad con lo dispuesto en el Manual de Interventoría y Supervisión adoptado mediante Decreto No. 1000-21/293, vigente desde el 19 de julio de 2016

Durante el mes de abril se realizo el acta de mayores y menores cantidades de las actividades que se venían desarrollando desde el mes de enero y desde la misma se tenía proyectada, las actividades a continuación corresponden a las nuevas actividades modificadas.

Las siguientes son las obligaciones ejecutadas por el contratista en el presente periodo, que corresponden a un porcentaje de avance acumulado ejecutado total del 59.22%:

ACTIVIDAD No. 1.1

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS

Anexos y Evidencias:



ACTIVIDAD No. 2.1

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE

Anexos y Evidencias:



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN


FORMATO INFORME DE SUPERVISOR

Código: GCT-F-27

Versión: V1

Fecha: 29/04/2025

Página 3 de 17

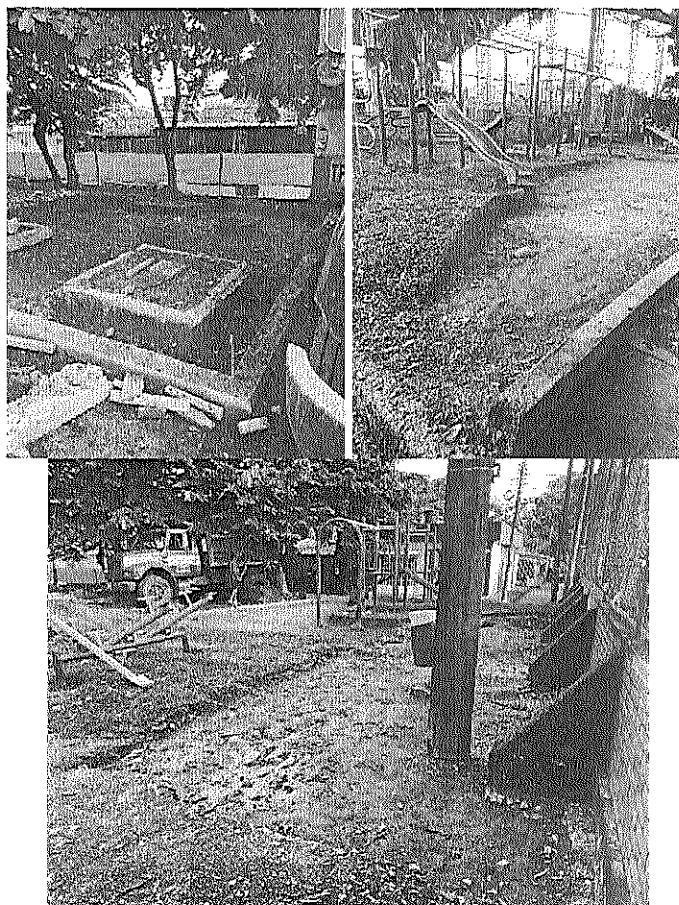


ACTIVIDAD No. 3.1

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN RELLENO CON MATERIAL MIXTO DERÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO

Descripción del avance En este periodo se alcanzó un avance acumulado del 45 % en la instalación de relleno en el parque El Retiro, mientras que en el parque Virrey se continuó trabajando en paralelo, logrando completar el 100 % de los rellenos a mediados de la segunda semana de abril.

El material fue compactado manualmente utilizando un vibrocompactador, para así dar continuidad a las actividades subsecuentes como la instalación del refuerzo de malla electrosoldada y la fundición de concretos estampados.

Anexos y Evidencias:



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN


FORMATO INFORME DE SUPERVISOR

Código: GCT-F-27

Versión: V1

Fecha: 29/04/2025

Página 4 de 17

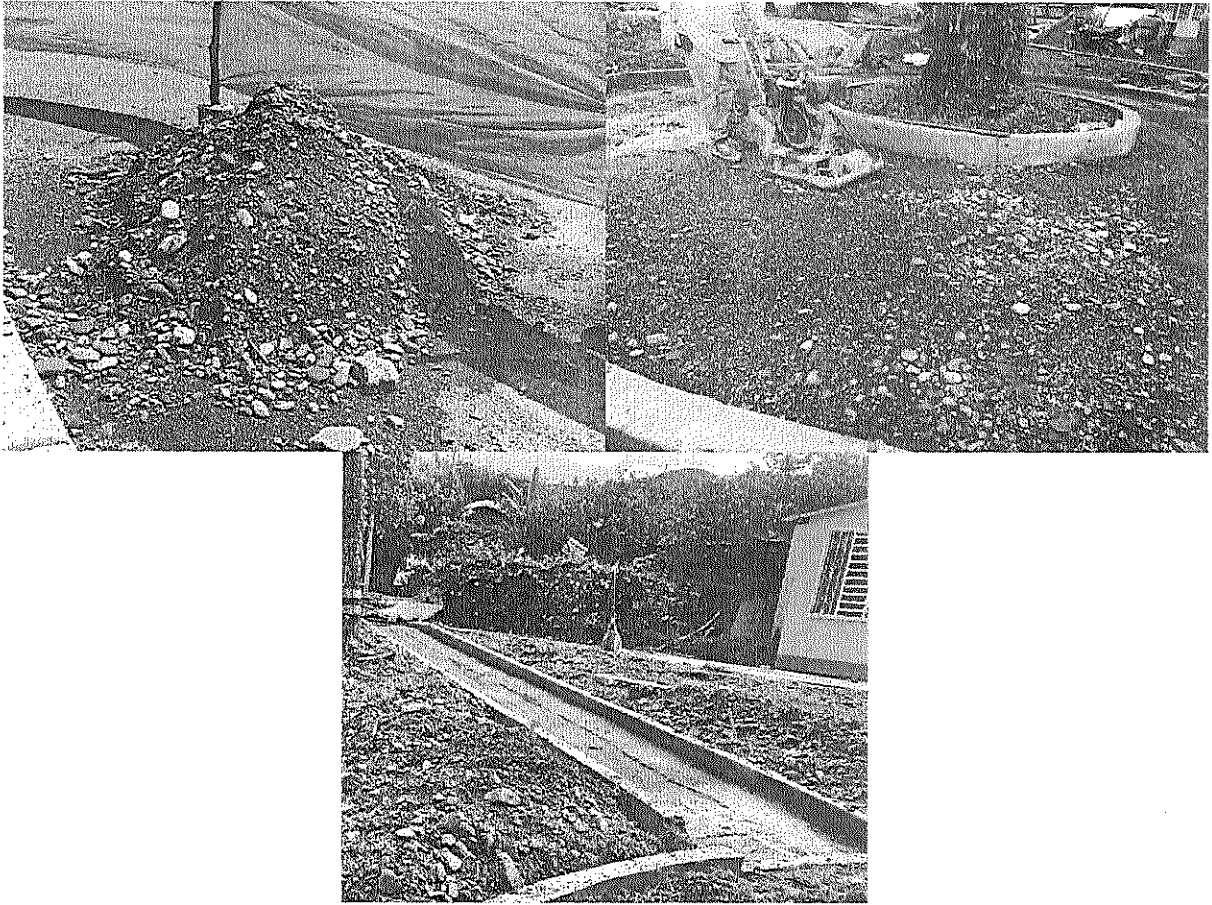

ACTIVIDAD No. 4.1

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO

Descripción del avance: avance respecto a la cantidad modificada. Quedó pendiente la instalación de piezas especiales en los puntos de acceso utilizados para el ingreso de material mediante volquetas, las cuales se instalarán una vez se haya ingresado la totalidad del material requerido para la parte interna del parque.

Anexos y Evidencias:



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN


FORMATO INFORME DE SUPERVISOR

Código: GCT-F-27

Versión: V1

Fecha: 29/04/2025

Página 5 de 17

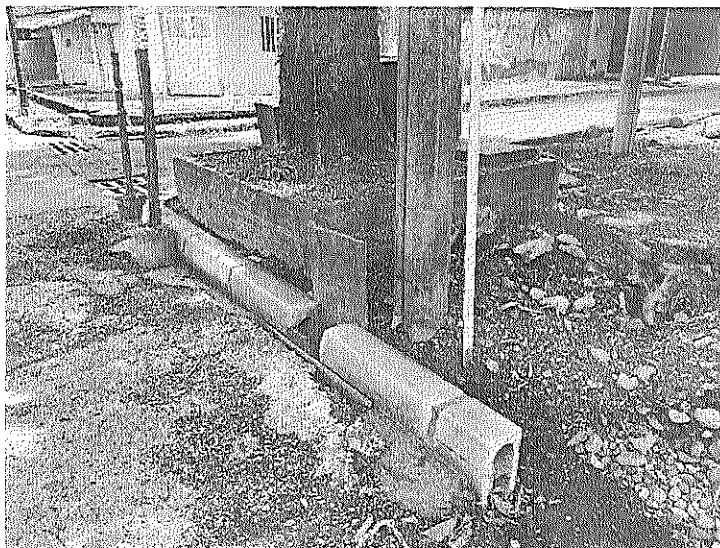


ACTIVIDAD No. 4.2

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN MALLA ELECTROSOLDADA $f_y = 5000 \text{ kg/cm}^2, 500 \text{ Mpa}$

Descripción del avance: En este periodo, al final del mes, se inició la distribución del acero de refuerzo a lo largo del sendero perimetral del parque El Retiro, utilizando el material previamente acopiado en el sitio. Esta labor se llevó a cabo sobre el terreno ya preparado en días anteriores, que contaba con la instalación y compactación previa de material de recebo como relleno.

Anexos y Evidencias:

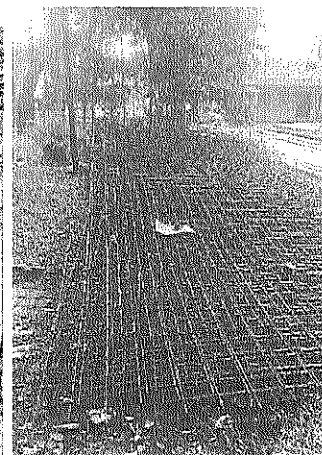

ACTIVIDAD No.6.4

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST

Descripción del avance: En el presente periodo se realizaron ajustes finales en los acabados, corrigiendo imperfecciones en las piezas bolladas y aplicando material anticorrosivo adicional donde fue necesario. Estas acciones permitieron dar inicio a la aplicación de una última capa de material base para la preparación del pintado. Como resultado, se avanzó con la pintura de dos unidades, continuando con este proceso, el cual tiene programada su finalización a inicios del mes de mayo.

Anexos y Evidencias



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN


FORMATO INFORME DE SUPERVISOR

Código: GCT-F-27

Versión: V1

Fecha: 29/04/2025

Página 6 de 17

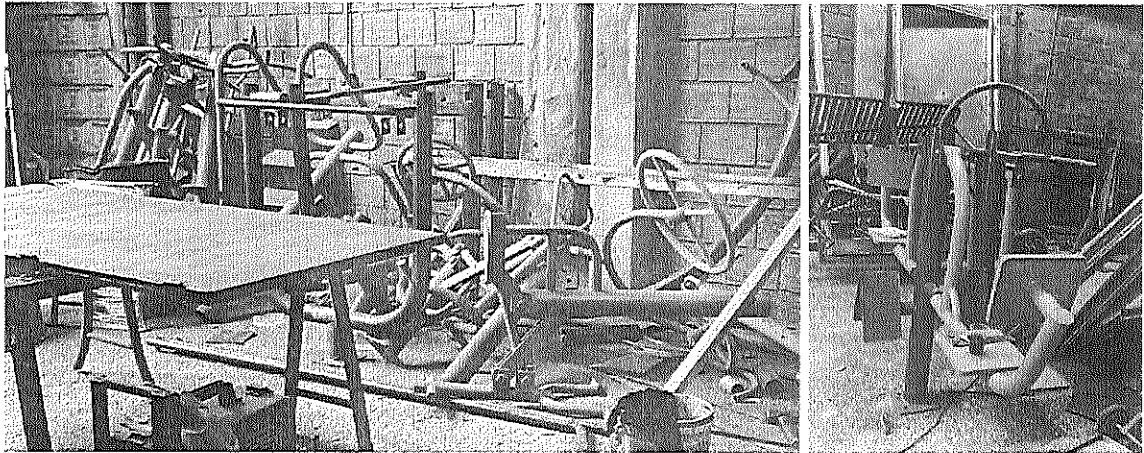

ACTIVIDAD No.NP.01

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)

Anexos y Evidencias





MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE SUPERVISOR

Código: GCT-F-27

Versión: V1


Fecha: 29/04/2025

Página 7 de 17

ACTIVIDAD No.NP.02

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.

Anexos y Evidencias

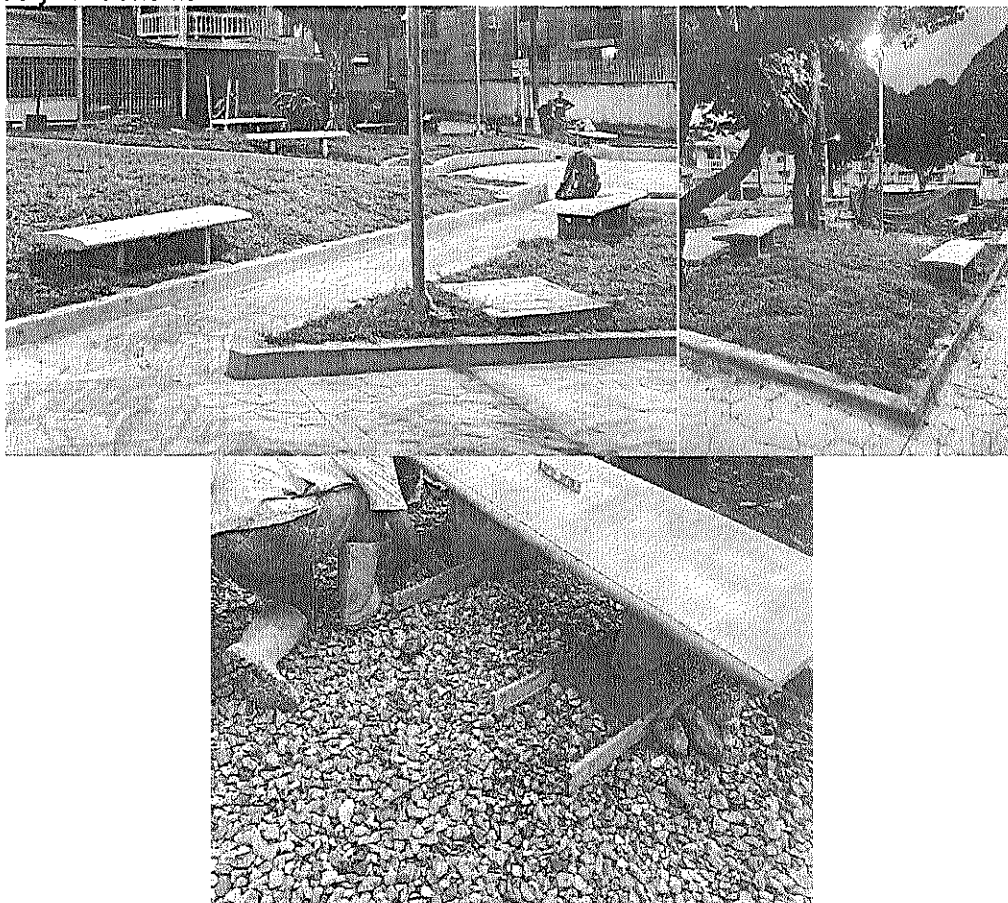

ACTIVIDAD No.NP.03

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DESMONTE DE BANCA incl retiro

Descripción de actividad Esta actividad antecedió la instalación del nuevo mobiliario, iniciando con el desmonte de las bancas existentes mediante la demolición de sus anclajes. Las piezas fueron trasladadas al área de almacenamiento para su disposición final. La mayoría de las bancas presentaban daños severos por deterioro, incluyendo roturas, fisuras, ausencia de espaldares y grietas en el acero de refuerzo.

Anexos y Evidencias



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE SUPERVISOR

Código: GCT-F-27

Versión: V1

Fecha: 29/04/2025

Página 8 de 17




ACTIVIDAD No.NP.04

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)

Descripción de actividad. En revisión inicial y recorrido de los parques se encuentran que parque azotea cuenta con canecas las cuales presentan deterioro en su base y para efectos de que este parque se entregue 100% rehabilitado se incluye en la modificación este ítem, el cual se ejecuta en el mes de abril, para esto se realiza la respectiva demolición de la base extracción y traslado a sitio de cargue, realizando los 2 desmontes correspondientes a las unidades analizadas en parque azotea, de esta manera se da por finalizada esta actividad de obra.

Anexos y Evidencias

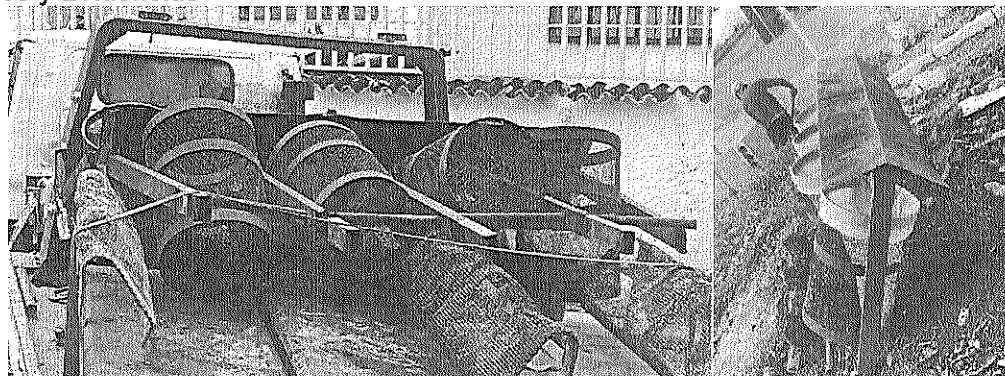



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN
FORMATO INFORME DE SUPERVISOR

Código: GCT-F-27

Versión: V1


Fecha: 29/04/2025

Página 9 de 17

ACTIVIDAD No.NP.06

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)


Anexos y Evidencias

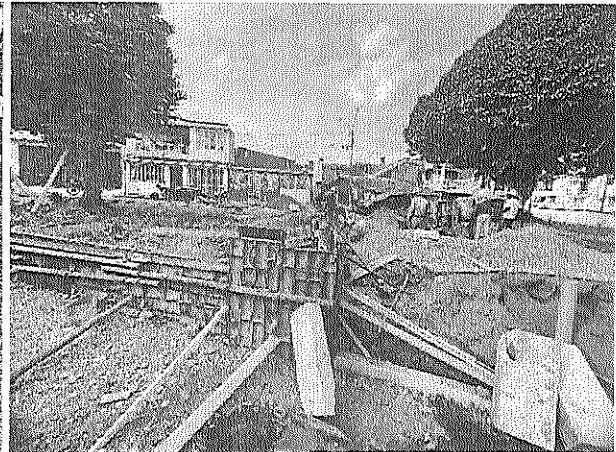

ACTIVIDAD No.NP.07

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)

Anexos y Evidencias



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN


FORMATO INFORME DE SUPERVISOR

Código: GCT-F-27

Versión: V1

Fecha: 29/04/2025

Página 10 de 17

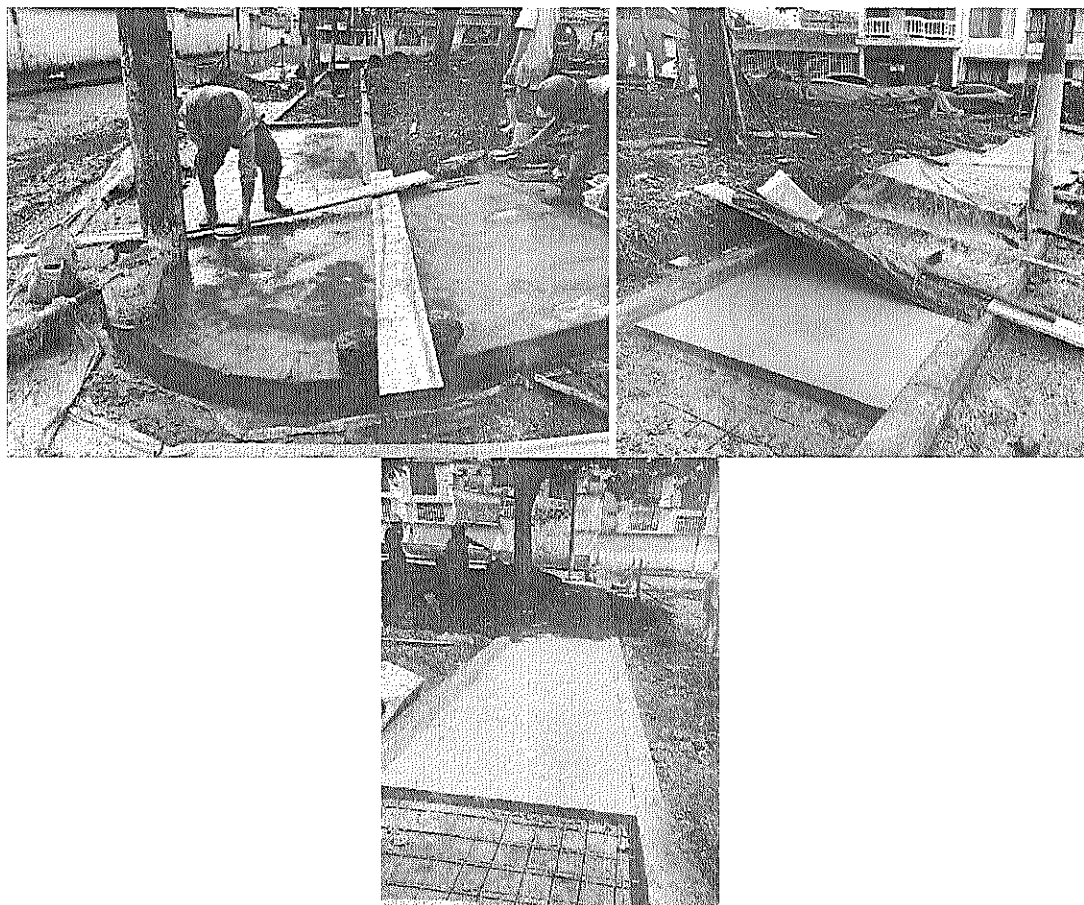

ACTIVIDAD No.NP.08

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTE INC REF)

Anexos y Evidencias





MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE SUPERVISOR

Código: GCT-F-27

Versión: V1

Fecha: 29/04/2025


Página 11 de 17



ACTIVIDAD No.NP.09

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")


Anexos y Evidencias

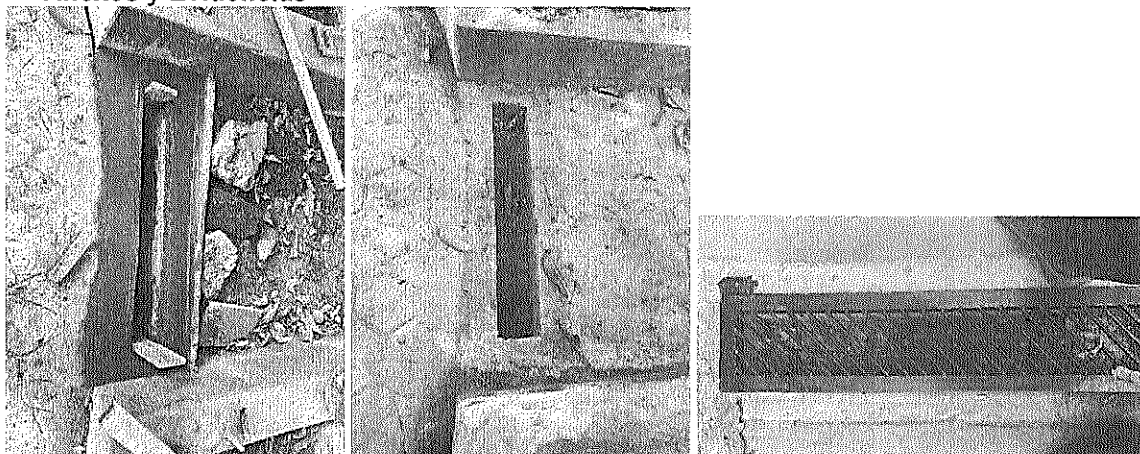

ACTIVIDAD No.NP.10

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC

Anexos y Evidencias



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN


FORMATO INFORME DE SUPERVISOR

Código: GCT-F-27

Versión: V1

Fecha: 29/04/2025


Página 12 de 17

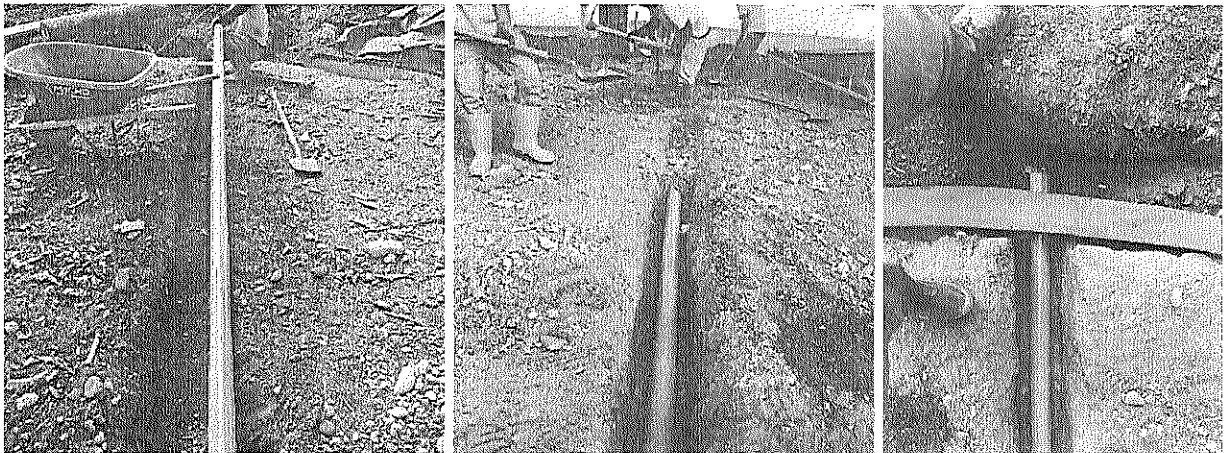

ACTIVIDAD No.NP.11

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN RELLENO EN GRAVA 1 1/2" < D < 2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)

Anexos y Evidencias

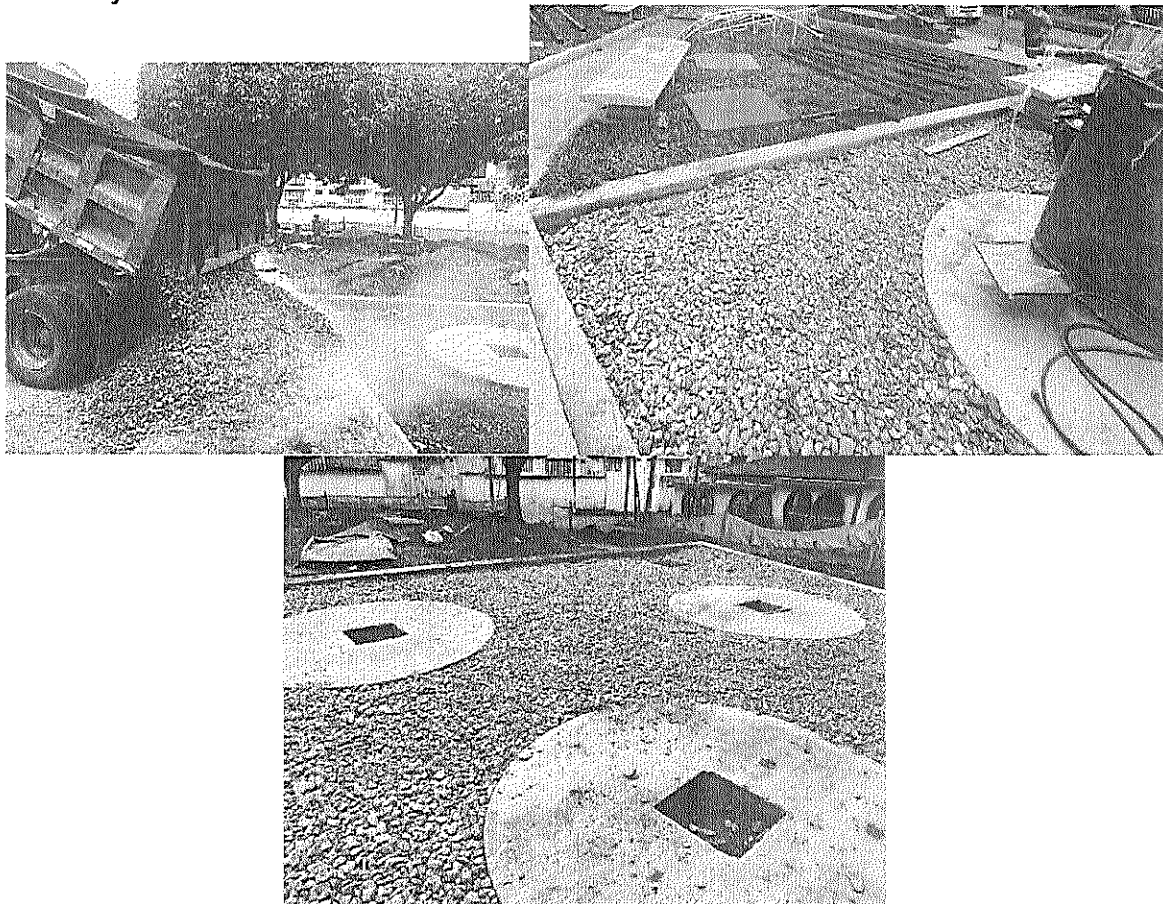

ACTIVIDAD No.NP.14

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN BASE CIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE SUPERVISOR

Código: GCT-F-27


Versión: V1

Fecha: 29/04/2025

Página 13 de 17

DIRECCIONES


Anexos y Evidencias

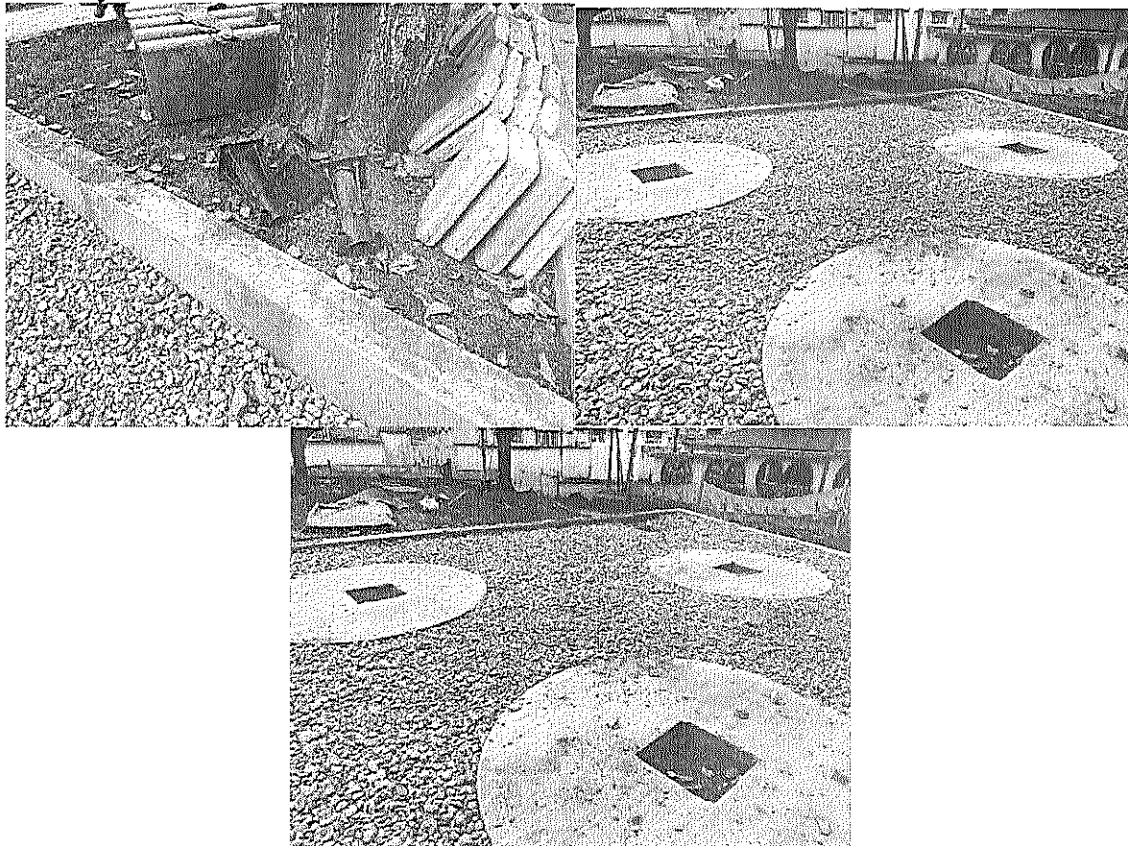

ACTIVIDAD No.NP.15

ESTABLECER LA OBLIGACIÓN SARDINEL 3000PSI $B=0.2$, $b=0.15$, $H=0.40$ INC. EXC/RET

Anexos y Evidencias

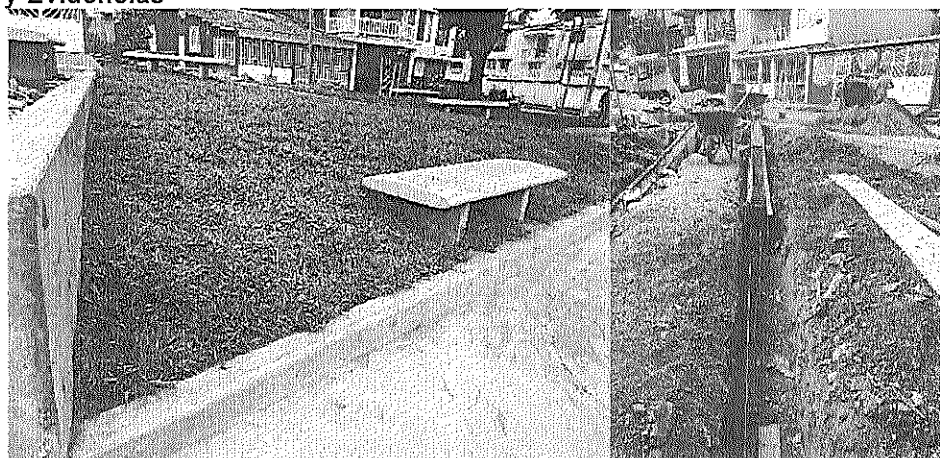



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN

FORMATO INFORME DE SUPERVISOR

Código: GCT-F-27


Versión: V1

Fecha: 29/04/2025

Página 14 de 17



ACTIVIDAD No.NP.17
ESTABLECER LA OBLIGACIÓN SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121
Anexos y Evidencias

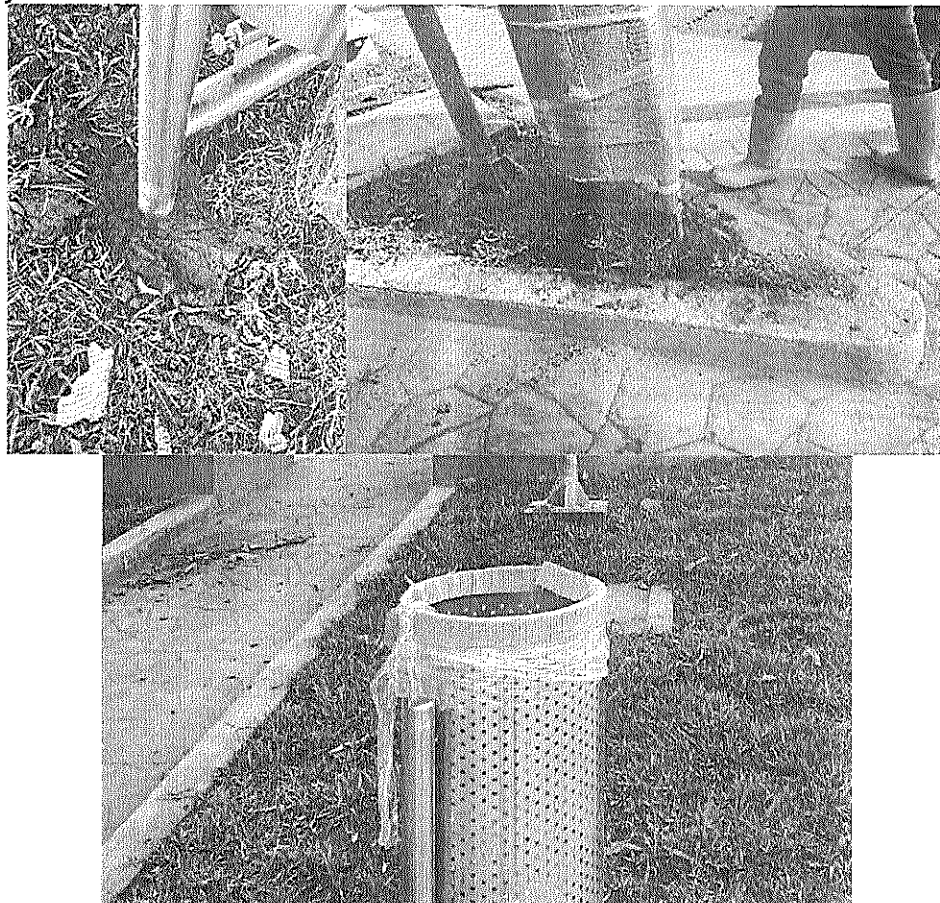

ACTIVIDAD No.NP.18
ESTABLECER LA OBLIGACIÓN PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA
Anexos y Evidencias



MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN


FORMATO INFORME DE SUPERVISOR

Código: GCT-F-27

Versión: V1

Fecha: 29/04/2025

Página 15 de 17

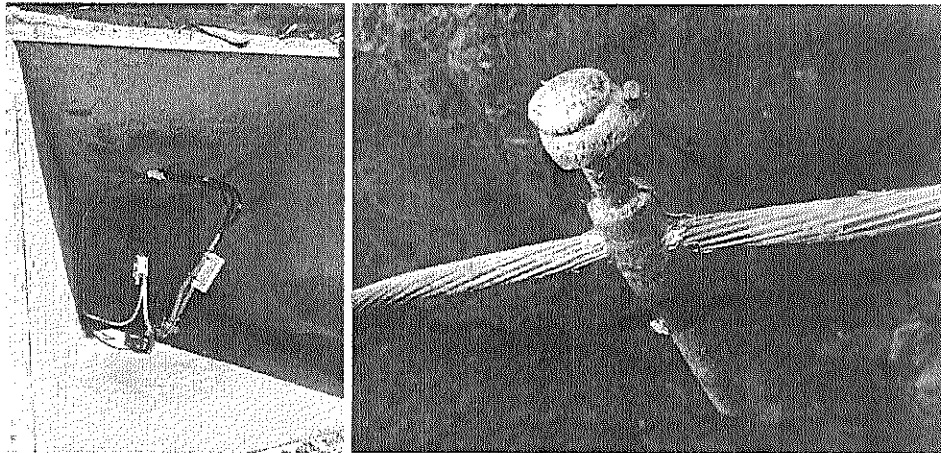

3. EVALUACION Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA

RANGO DE CALIFICACIÓN	
EXCELENTE	El contratista superó las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
BUENA	El contratista cumplió las especificaciones técnicas establecidas de los productos o servicios.
REGULAR	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades que no son graves, ni se considera que incumplió el mismo.
NO CUMPLE	El contratista en el desarrollo del contrato presentó inconformidades graves y se considera que incumplió el mismo.
EVALUACIÓN Y REEVALUACIÓN DEL CONTRATISTA	
CUMPLIMIENTO (Oportunidad en la entrega de los productos o servicios; Atención a compromisos adquiridos)	BUENA
CALIDAD (Grado en el que el producto o servicio cumple las necesidades y expectativas contractuales)	BUENA
COMUNICACIÓN (Comunicación asertiva durante la ejecución del contrato)	BUENA
EVALUACIÓN GENERAL (Percepción general sobre el producto y/o servicio suministrado)	BUENA

4. CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RELATIVAS A LA SEGURIDAD SOCIAL

INTEGRAL: Certifico que teniendo en cuenta la normatividad vigente sobre dicho aspecto, verifiqué el cumplimiento del pago de aportes a la seguridad social integral (salud, pensión y ARL) correspondiente al respectivo periodo así: Si el contratista es pensionado indicar el número de resolución correspondiente y anexar copia del documento.

Mes de Cotizado	Marzo
Fecha de Pago	14/05/2024
IBC (Ingreso Base de Cotización)	\$6.310.850
Número de Planilla	9486013831
Valor pagado en SALUD	\$789.700

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Código: GCT-F-27
		Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
		Página 16 de 17

Valor pagado en PENSIÓN	\$1.010.000
Valor pagado en ARL	\$440.300

5. CUMPLIMIENTO DE LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN MANEJADA POR EL CONTRATISTA: Certifico que el contratista hizo entrega en medio magnético y físico de los archivos y documentos y demás información manejada resultante durante el presente periodo de ejecución

6. CUMPLIMIENTO DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN:

Certifico que el contratista dio cumplimiento a los requisitos y lineamientos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de la siguiente manera:

Sistema de Gestión aplicable	Requisito	Cumplió / No Cumplió
Calidad	Usó la documentación vigente establecida aplicable el desarrollo de las obligaciones contractuales.	Cumplió
Seguridad y Salud en el Trabajo	Participó de las actividades programadas en SST.	Cumplió
	Realizó las obligaciones contractuales utilizando los elementos de protección personal o protocolos de bioseguridad.	Cumplió
	En el desarrollo de sus actividades no incurrió en actividades de riesgo sin el cumplimiento de las medidas y protocolos necesarios.	Cumplió
Documental	La documentación que generó el contratista está acorde a los lineamientos normativos en materia archivística y política de gestión documental de la entidad.	Cumplió
Seguridad y Privacidad de la Información	Se manejó reserva de la información utilizada para el desarrollo de sus obligaciones.	Cumplió
	Se garantizó la integridad y disponibilidad de la información generada de la gestión contractual.	Cumplió
Medio Ambiente	El desarrollo de las obligaciones contractuales está acorde a los lineamientos normativos vigentes.	Cumplió

NOTA: Se puede modificar esta información acorde a los requerimientos de cada contrato sin necesidad de actualización del formato, también puede ampliar el detalle de la evaluación.

7. BALANCE FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO A LA FECHA. El siguiente es el balance financiero de ejecución del contrato:


CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
----------	-------	--------------	-------	---

	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO PROCESO GESTIÓN A LA CONTRATACIÓN FORMATO INFORME DE SUPERVISOR	Código: GCT-F-27
		Versión: V1
		Fecha: 29/04/2025
		Página 17 de 17

ANTICIPO	0			
VALOR EJECUTAD	\$521.020.579 COP		11/12/204 AL 30/04/2025	59.22%
SALDO DEL CONTRATO PENDIENTE POR EJECUTAR	\$444.002.579 COP		01/05/2025 AL 30/05/2025	40.78%
VALOR TOTAL DEL CONTRATO ACTUALIZADO	\$965.022.715 COP		11/12/2024 AL 30/05/2025	99.0002%
SALDO	\$7.772		N/A	0.0008%

8. CERTIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO:

Con base en todo lo expuesto, el suscrito SUPERVISOR certifica que durante el **PERIODO No. 04** comprendido entre el **1 de marzo de 2025 al 30 de marzo de 2025**, el contratista cumplió a satisfacción las actividades objeto del contrato y todas las demás obligaciones pactadas, entre ellas las relativas al pago del sistema de seguridad social. El presente informe se encuentra cargado en la plataforma SECOP II.



NOMBRE DEL SUPERVISOR: DIEGO ORLANDO BÁRBOSA MONTEALEGRE
CARGO DEL SUPERVISOR: Director de obras civiles
SECRETARÍA U OFICINA: Secretaría de Infraestructura
TELÉFONO DEL SUPERVISOR: 320-861-3106



Villavicencio, 12 de Mayo de 2025

OFI-032-2928-03/12/2024

Señores:

INFRAESTRUCTURA
CORRESPONDENCIA RECIBIDA

Alcaldía de Villavicencio – Secretaria de infraestructura
Arq. Diego Orlando Barbosa Montealegre
Director de Obas Civiles – supervisor

Fecha: 15 MAY 2025 Hora: 2:57
Radicado No. 1848
No. Folios: 1 carpeta
Recibido por:

REFERENCIA: CONTRATO N° 2928 del 03 de Diciembre de 2024 , objeto " REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO".

ASUNTO: ENTREGA DE INFORME TECNICO MENSUAL DE OBRA N°004 MES ABRIL 2025


Cordial Saludo;

De manera atenta nos permitimos presentar el informe mensual de obra N°4 del contrato de la referencia, dando a conocer los avances de obras respectivos a las actividades que se están ejecutando y que fueron realizados en el mes de abril.


Para lo anterior se presenta el informe mensual de obra N°4 (Incluye registro fotográfico)

Sin otro particular, y para su conocimiento

JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L CONSORCIO ALSIPA




INFORME TECNICO MENSUAL DE OBRA N°004 MES ABRIL 2025

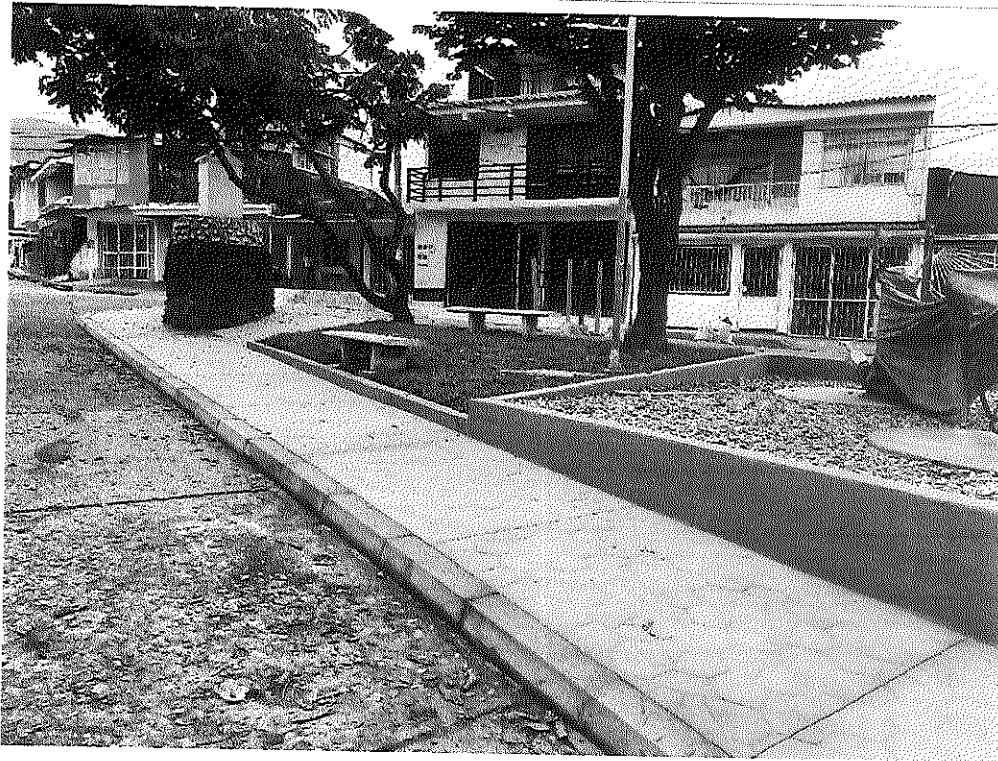

CONSORCIO ALSIPA

CR 24 A 8 125 CONJ CERRADO LA CABAÑA CA 1 IN 9. VILLAVICECNIO-META
SHARKYING10@GMAIL.COM-3222169909



INTRODUCCIÓN

El siguiente documento, presenta el informe Técnico mensual de obra N°4 que CONSORCIO ALSIPA eleva a la supervisión del contrato de obra No 2928 del 03 de Diciembre de 2024 que tiene por objeto "REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO" con el fin de que conozcan el avance y la forma en la que se ha llevado la ejecución de las actividades desde que CONSORCIO ALSIPA dio inicio con la ejecución física de las obras del contrato, haciendo énfasis en las actividades ejecutadas en el mes número 4 del presente año 2025.

Con el presente Informe presentamos las actividades ejecutadas, en el periodo comprendido del mes de Abril de los corrientes (01 de abril al 30 de abril); Dentro del presente informe se hace una explicación de las actividades realizadas con su respectiva descripción y registro fotográfico. De igual manera durante este periodo de ejecución y como en los anteriores CONSORCIO ALSIPA ha contado con todos los elementos como maquinaria, equipos y materiales de excelente calidad para la realización de cada actividad ejecutada, igualmente el proceso de construcción se ha realizado por personal capacitado y en constante supervisión por parte del personal profesional.

Para este periodo se intensifican las lluvias que se presentan casi a diario, afectando sumamente los rendimientos de obra, toda vez que las actividades se realizan en campo abierto a la intemperie, razón por la cual a inicios de mes se solicita la prórroga n° 002, para ampliar el tiempo de ejecución, recuperando los días perdidos por las condiciones de lluvia, que impidieron el correcto desempeño de las actividades.



OBJETIVO

Dar a conocer, a la entidad contratante y a la supervisión, las actividades que se han realizado en el mes de abril, sus avances alcanzados en este periodo y rendimientos de obra teniendo en cuenta que durante la ejecución de estas se presentaron interrupciones las cuales retrasaron la programación establecida.

UBICACIÓN GEOGRÁFICA

La ubicación de las actividades de obra es en el departamento del meta, municipio de Villavicencio, Y el desarrollo de la obra se lleva a cabo en el casco urbano del municipio de Villavicencio – Meta, en el parque VIRREY, AZOTEA, MACARENA Y RETIRO

PARQUE BARRIO EL VIRREY ENTRE CR 52 CON CLL 44

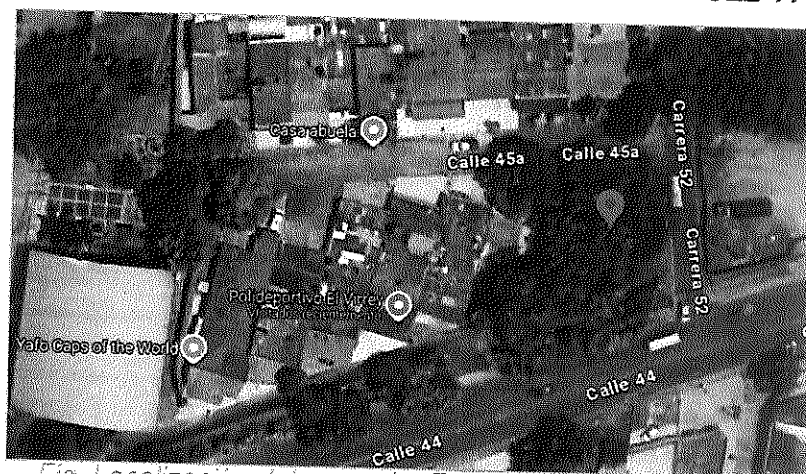


Fig. Localización del proyecto. Fuente: Google Maps 2024

PARQUE BARRIO AZOTEA ENTRE CR 49, CLL 34 Y DG 34

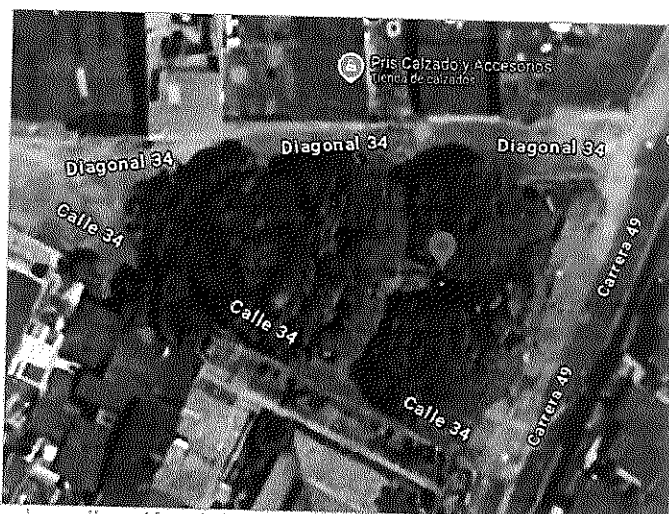


Fig. Localización del proyecto. Fuente: Google Maps 2024

CR 24 A 8 125 CONJ CERRADO LA CABAÑA CA 1 IN 9. VILLAVICECNO-META
SHARKYING10@GMAIL.COM-3222169909



PARQUE BARRIO MACARENA ENTRE CRS 20a y 20c, CLLS 20d Y 21

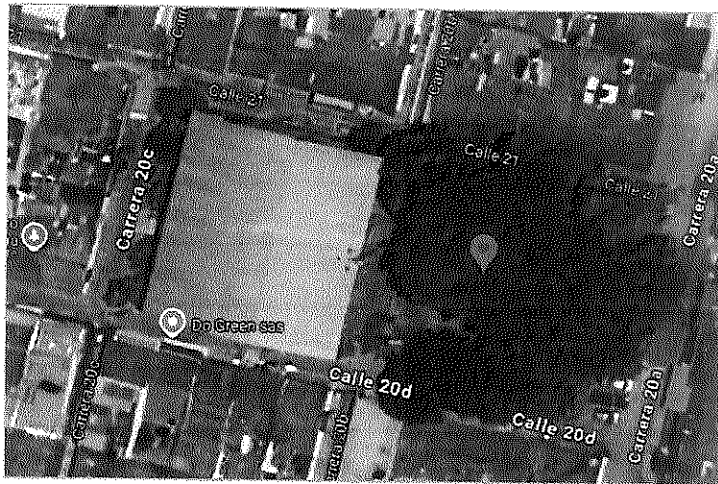


Fig. Localización del proyecto. Fuente: Google Maps 2024

PARQUE BARRIO RETIRO ENTRE CRS 24 y 24a, CLLS 24 Y 24a

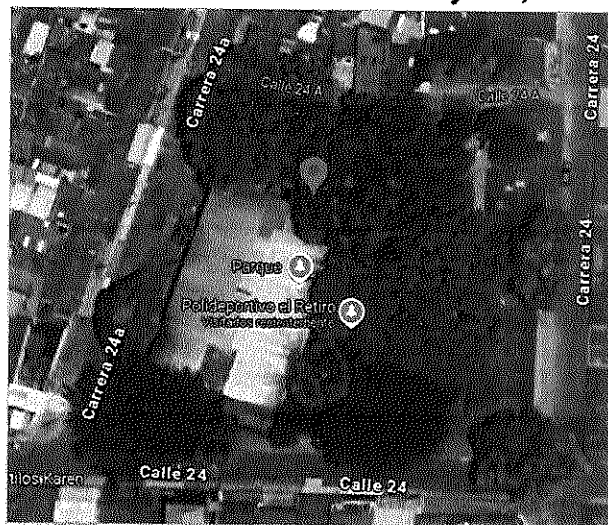


Fig. Localización del proyecto. Fuente: Google Maps 2024

**ALCANCE DEL PROYECTO**

El alcance principal de este proyecto es llegar y dar cumplimiento al objeto del contrato, mediante "REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO"


INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA

N° DE CONTRATO	2928 DEL 03 DE DICIEMBRE DE 2024
TIPO DE CONTRATO	CONTRATO DE OBRA
OBJETO	REHABILITACIÓN DE PARQUES EN DIFERENTES BARRIOS EN EL MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE VILLAVICENCIO
CONTRATRISTA	CONSORCIO ALSIPA
PLAZO INICIAL	EL PLAZO DE EJECUCIÓN SERÁ HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
VALOR INICIAL	NOVECIENTOS SESENTA Y CINCO MILLONES TREINTA MIL CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS M/CTE. (\$ 965.030.477).
FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO	03 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INCIO	11 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE TERMINACION INICIAL	30 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSION N° 001	24 DE DICIEMBRE DE 2024
DURACION SUSPENSION N° 001	UN (01) MES
FECHA DE REINICIO N° 001	24 DE ENERO DE 2025
FECHA DE PRORROGA N° 001	28 DE ENERO DE 2025
DURACION PRORROGA N° 001	DOS (02) MESES Y QUINCE (15) DIAS
FECHA DE PRORROGA N° 002	10 DE ABRIL DE 2025
DURACION PRORROGA N° 002	CUARENTA Y CINCO (45) DIAS
FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA	30 DE MAYO DE 2025

**ACTIVIDADES INICIALES DE LA OBRA**

Dentro de las actividades según las condiciones contractuales de obra se tienen:

CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					
N°	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL
1					
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	2,550.00	3,648.90	9,304,696.95
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	40.00	306,546.56	12,261,862.60
1.3	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	1.00	322,680.15	322,680.15
2					
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	410.00	72,258.02	29,625,786.26
3					
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX.3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	213.40	54,303.05	11,588,271.60
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	60.00	163,865.65	9,831,938.93
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	800.00	18,967.94	15,174,351.15
4					
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	890.00	80,637.40	71,767,290.08
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2, 500 Mpa	KG	3,070.00	8,441.98	25,916,893.13



4.3	PLACA CONTRAPISO e=10 cm (20.7 Mpa, 3000 psi) concreto estampado - color	M2	2,005.00	126,035.11	252,700,404.58
5					
5.1	LUMINARIA: MECANO V TEMPERATURA DE COLOR: 4000 K POTENCIA: 33W CON BASE PARA FOTOCELDA IRC 70 ÓPTICA: R07	UND	32.00	1,924,034.92	61,569,117.29
5.2	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	30.00	1,226,042.61	36,781,278.29
5.3	ESTRUCTURA LA321	UND	4.00	618,429.34	2,473,717.37
5.4	ESTRUCTURA CS400	UND	4.00	740,300.03	2,961,200.10
5.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL	ML	459.05	42,392.00	19,460,174.78
5.6	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN	ML	705.78	34,394.00	24,274,597.32
5.7	CANALIZACION PVC 2X1" PARA AP	ML	653.00	34,123.70	22,282,775.32
5.8	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	47.00	413,401.92	19,429,890.41
5.9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	41.00	520,301.06	21,332,343.50
6					
6.1	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	4,716,925.95	4,716,925.95
6.2	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	4,095,050.38	4,095,050.38
6.3	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	3,281,948.09	3,281,948.09
6.4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN	11.00	656,186.26	7,218,048.85
6.5	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	8.00	487,452.67	3,899,621.37
6.6	SUM E INST. COLUM SW. THREE, INCL. LOCALIZ Y EXC.	UN	1.00	2,659,673.28	2,659,673.28



6.7	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	25.00	53,161.07	1,329,026.72
COSTO DIRECTO OBRAS INICIALES (A)					676,259,564.45
ADMINISTRACION				35.00%	236,690,847.55
IMPREVISTOS				1.00%	6,762,595.64
UTILIDAD				4.00%	27,050,382.58
TOTAL AIU (B)				40.00%	270,503,825.78
COMPONENTE AMBIENTAL (C)				0.50%	3,400,390.60
COMPONENTE SOCIAL (D)				0.50%	3,400,390.60
COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (E)				0.50%	3,400,390.60
COMPONENTE CERTIFICACIÓN ELECTRICA (F)				0.40%	2,719,937.43
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA (CON LA CUAL SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO CON LAS FÓRMULAS DEL NUMERAL 4.1.4 DEL DOCUMENTO BASE O PLIEGO TIPO): $(G = A + B + C + D + E + F)$					\$ 959,684,499.46
PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS O ADICIONALES (INCLUYE SU PROPIO COSTO DIRECTO Y SU AIU DE OBRAS PROPUESTO, UNICAMENTE) (H)					\$ 5,345,977.54
COSTO DEL CONTRATO A EJECUTAR PROPUESTO: $(I = G + H)$					\$ 965,030,477.00

Para la ejecución de las actividades de obra CONSORCIO ALSIPA, ha tenido bajo cobertura de afiliación a seguridad y riesgos al personal con el que cuenta a disposición para la realización de las diferentes actividades.

En el presente periodo se aprueban las condiciones solicitadas ya actualizadas de las cantidades e inclusión de ítems solicitados en la modificación de obra N°001, condiciones que fueron presentadas luego de las revisiones en campo ajuste de diseños, tomas de medidas reales con levantamientos topográficos y demás desde el inicio de obra, y mediante el acompañamiento de la supervisión entrega y revisión de pre-actas en las cuales se establecen los alcances finales y distribución de recursos para cada parque se logra dejar este acto administrativo como soporte para las actividades próximas a realizar las cuales se incluyeron en este mediante ítems no previstos para complemento de otros y cumplir con el objeto del contrato, para ello se deja firmada acta de modificación el día 9 de abril.



Para ello se presenta a continuación el cuadro con las condiciones actualizadas del contrato

CONDICIONES MODIFICACION DE OBRA N°001					
N°	DESCRIPCION	UND	CANT	V.UNITARIO	V.TOTAL
1	PRELIMINARES				
1.1	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO OBRA ARQUITECTÓNICA INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA, CARTERA Y PLANOS	M2	4653.53	4653.53 \$	16,980,269.17
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	218.62	218.62 \$	67,017,210.02
1.3	DEMOLICION MECÁNICA ANDENES, PLACAS, SARDINELES EN CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	0.00	0.00 \$	-
2	EXCAVACION				
2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	294.23	294.23 \$	21,260,164.47
3	BASES Y RELLENOS				
3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTODERÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	279.07	279.07 \$	15,154,348.67
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	90.38	90.38 \$	14,810,177.34



3.3	SUMINISTRO E INSTALACION GRAMA TRENZA	M2	1221.16	1221.16	\$	23,162,888.31
4	ANDENES, SARDINELES, BORDILLOS, ADOQUINES					
4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A- 8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	ML	366.37	366.37	\$	29,543,125.92
4.2	MALLA ELECTROSOLDADA fy= 5000 kg/cm2,500 Mpa	KG	3012.79	3012.79	\$	25,433,927.18
4.3	PLACA CONTRAPISO e=10 cm (20.7 Mpa, 3000 psi) concreto estampado - color	M2	0.00	126,035.11	\$	-
5	INSTALACIONES ELECTRICAS					
5.1	LUMINARIA: MECANO V TEMPERTATURA DE COLOR: 4000 K POTENCIA: 33W CON BASE PARA FOTOCELDA IRC 70 ÓPTICA: R07	UND	0.00	1,924,034.92	\$	-
5.2	MÁSTIL METÁLICO GALVANIZADO DE 6M. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0.00	1,226,042.61	\$	-
5.3	ESTRUCTURA LA321	UND	2.00	618,429.34	\$	1,236,858.69
5.4	ESTRUCTURA CS400	UND	2.00	740,300.03	\$	1,480,600.05
5.5	ACOMETIDA PARCIAL 2 No6+1No.6 AL	ML	139.11	42,392.00	\$	5,897,151.12
5.6	ACOMETIDA PARCIAL 2 No8+1No.8 CU THHN	ML	139.11	34,394.00	\$	4,784,549.34
5.7	CANALIZACION PVC 2X1" PARA AP	ML	0.00	34,123.70	\$	-
5.8	PUESTA A TIERRA TERMINAL DE BAJA TENSION SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0.00	413,401.92	\$	-



5.9	CAJA DE INSPECCIÓN TIPO CS 274 - AP 274, INCLUYE TAPA EN MARCO METALICO	UND	14.00	\$ 520,301.06	\$ 7,284,214.85
6	MOBILIARIO URBANO				
6.1	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO ELIPTICA (ESQUÍ DE FONDO). SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	\$ 4,716,925.95	\$ 4,716,925.95
6.2	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO SURF. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	\$ 4,095,050.38	\$ 4,095,050.38
6.3	MAQUINA BIOSALUDABLE TIPO BARRAS PARALELAS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1.00	\$ 3,281,948.09	\$ 3,281,948.09
6.4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN	13.00	\$ 656,186.26	\$ 8,530,421.37
6.5	CANECA EN MALLA METÁLICA TIPO M120 SUMINISTRO E INSTALACIÓN. INCLUYE BASE EN CONCRETO 1500 PSI MEZCLA EN OBRA	UN	0.00	\$ 487,452.67	\$ -
6.6	SUM E INST. COLUM SW. THREE, INCL. LOCALIZ Y EXC.	UN	0.00	\$ 2,659,673.28	\$ -
6.7	PISO DUROPISO BLANCO 33,8X33,8 T. COMERCIAL	M2	0.00	\$ 53,161.07	\$ -
NP	ITEMS NO PREVISTOS MODIFICATORIA 01				
NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)	UN	30.00	\$ 100,790.00	\$ 3,023,700.00
NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN	50.00	\$ 571,790.75	\$ 28,589,537.50



NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UN	41.00	\$ 42,189.00	\$ 1,729,749.00
NP 4	DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)	UN	2.00	\$ 41,751.00	\$ 83,502.00
NP 5	LIMPIEZA PISOS SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	287.36	\$ 5,276.00	\$ 1,516,111.36
NP 6	MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO 0.60>H>0.45 A=0.20 EN CONCRETO REF 3000 PSI	ML	73.00	\$ 348,664.00	\$ 25,452,472.00
NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2	1445.87	\$ 137,629.00	\$ 198,993,642.23
NP 8	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2	156.49	\$ 187,558.00	\$ 29,350,951.42
NP 9	CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")	UN	3.00	\$ 369,023.00	\$ 1,107,069.00
NP 10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML	15.47	\$ 32,021.00	\$ 495,364.87



NP 11	RELLENO EN GRAVA 1 1/2" < D < 2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)	M2	354.14	\$ 43,783.00	\$ 15,505,311.62
NP 12	LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 36-60 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)	UN	12.00	\$ 1,452,795.00	\$ 17,433,540.00
NP 13	POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA	UN	12.00	\$ 1,072,121.00	\$ 12,865,452.00
NP 14	BASE CIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECCIONES	UN	16.00	\$ 853,460.00	\$ 13,655,360.00
NP 15	SARDINEL 3000PSI B=0.2, b=0.15, H=0.40 INC. EXC/RET	ML	1128.52	\$ 50,757.00	\$ 57,280,289.64
NP 16	PLACA CONTRAPISO e = 12 cm (24.13Mpa, 3500psi)	M2	7.45	\$ 95,185.00	\$ 709,128.25
NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121	UN	3.00	\$ 1,947,961.00	\$ 5,843,883.00
NP 18	PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA	UN	6.00	\$ 380,570.00	\$ 2,283,420.00
NP 19	DESMONTE Y MONTAJE DE JUEGO DE NIÑOS EXISTENTE (INC. ADECUACION TUB MET, DADOS EN COCNRETO PARA CIMENTACION, SOLDADURAS, ANTICORROSIVO Y PINTURAS)	UN	3.00	\$ 3,809,022.00	\$ 11,427,066.00
COSTO DIRECTO OBRAS (A)					682,015,380.81
ADMINISTRACION				35.00%	238,705,383.28
IMPREVISTOS				1.00%	6,820,153.81
UTILIDAD				4.00%	27,280,615.23
TOTAL AIU (B)				40.00%	272,806,152.32
COMPONENTE AMBIENTAL (C)					3,400,390.60



COMPONENTE SOCIAL (D)		3,400,390.60
COMPONENTE PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (E)		3,400,390.60
COMPONENTE CERTIFICACIÓN ELECTRICA (F)		-
VALOR PROPUESTA ECONÓMICA (CON LA CUAL SE EVALUARÁN LAS PROPUESTAS DE ACUERDO CON LAS FÓRMULAS DEL NUMERAL 4.1.4 DEL DOCUMENTO BASE O PLIEGO TIPO): (G = A + B + C + D + E + F)		\$ 965,022,704.93
PROVISION OBRAS COMPLEMENTARIAS O ADICIONALES (INCLUYE SU PROPIO COSTO DIRECTO Y SU AIU DE OBRAS PROPUESTO, ÚNICAMENTE) (H)		-
COSTO DEL CONTRATO A EJECUTAR PROPUESTO: (I = G + H)		\$ 965,022,705.00

AVANCES

Durante el mes N°004 el cuarto en el periodo comprendido del día 01 de abril al 30 de abril de 2025, CONSORCIO ALSIPA continúa trabajando en 3 distintos frentes de trabajo, en 3 parques Azotea, Virrey, Retiro y Macarena dando continuidad a las actividades mencionadas en el informe del mes de marzo finalizando parte de estas e iniciando con la ejecución de los ítems nuevos no previstos propuestos y aprobados en la modificación N°01 de obra, con estos ítems nuevos no previstos se logra culminar el parque azotea, al igual que se avanza y se alcanza un 95% de ejecución en parque virrey quedando pendiente por ejecutar las actividades la instalación de parte eléctrica grama y mobiliario, el cual se programa para el mes siguiente, por ello se presenta la relación del avance de las actividades ejecutadas y realizadas en este mes N°004.

**ACTIVIDADES REALIZADAS Y EJECUTADAS**

2.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3
-----	---	----

En el presente periodo se llega a un 80% de avance de esta actividad sobre las condiciones de modificación N°1, representando en un 65% de las excavaciones de parque retiro quedando pendiente el restante y la excavación en parque macarena, esto debido a que en el transcurso del mes se presentaron constantemente fuertes aguaceros los cuales saturan el terreno, y se dificulta la continuidad normal de esta actividad.





3.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DERÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 3" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3
-----	---	----

Para este periodo se alcanza un acumulado de 45% en la instalación de relleno en el parque el retiro, y se continúa trabajando en paralelo en parque virrey llegando al 100% de los rellenos en este parque a mediados de la segunda semana de abril, se compactan manualmente con vibro compactador, para continuar con los ítems subsecuentes a este como lo son el refuerzo de malla electrosoldada y fundición de concretos estampados.





4.1	BORDILLO DE PIEZAS PREFABRICADAS DE CONCRETO TIPO A-8080X35X20CM. NO INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO	M3
-----	--	----




En este periodo dando continuidad a la instalación de estas piezas prefabricadas, se logra alcanzar un 98% de la cantidad modificada, quedando pendiente la instalación de piezas especiales en puntos por los cuales se accede material por medio de volquetas, cuya instalación se hará una vez se ingrese todo el material requerido de la parte interna de, parque.






4.2	MALLA ELECTROSOLDADA $f_y = 5000 \text{ kg/cm}^2, 500 \text{ Mpa}$	M3
-----	--	----



En este periodo a din de mes, del acopio de material ubicado en parque el Retiro, se empieza a realizar distribución de este refuerzo por el sendero perimetral, mismo que en días previos se tiene ya preparado mediante la instalación y compactación de material de recebo como relleno.

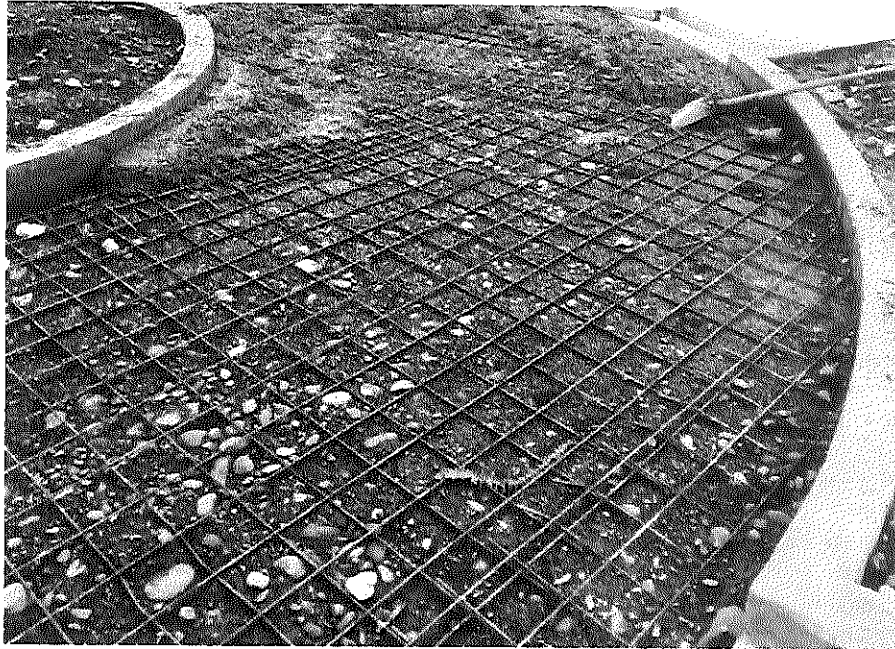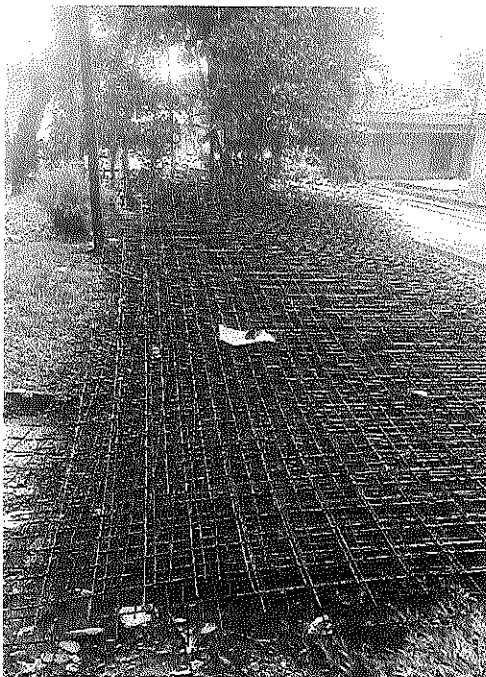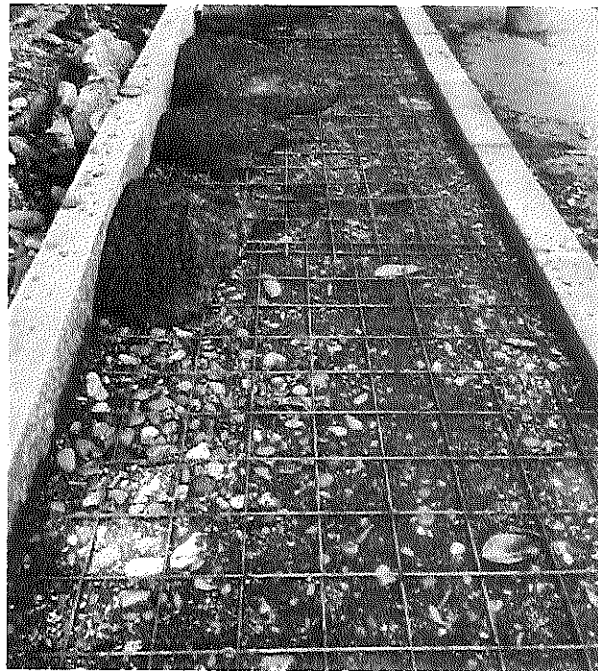



6.4	MANTE Y REPA JUEGO BIOSALUDABLES EXIST	UN
-----	--	----



En el presente periodo se afinan detalles en los acabados de anticorrosivo piezas bolladas y demás las cuales se subsanan para poder dar inicio a una última capa de material base, para la preparación de aplicado de pintura, de esta manera se avanzan con 2 unidades pintadas y se continua en este proceso el cual tiene programado finalizar a inicios del mes de mayo.

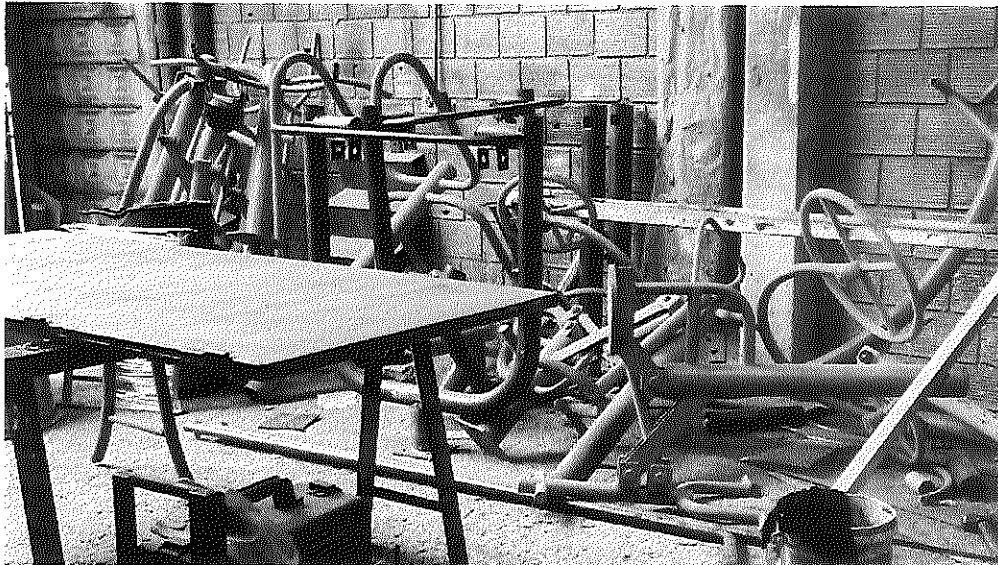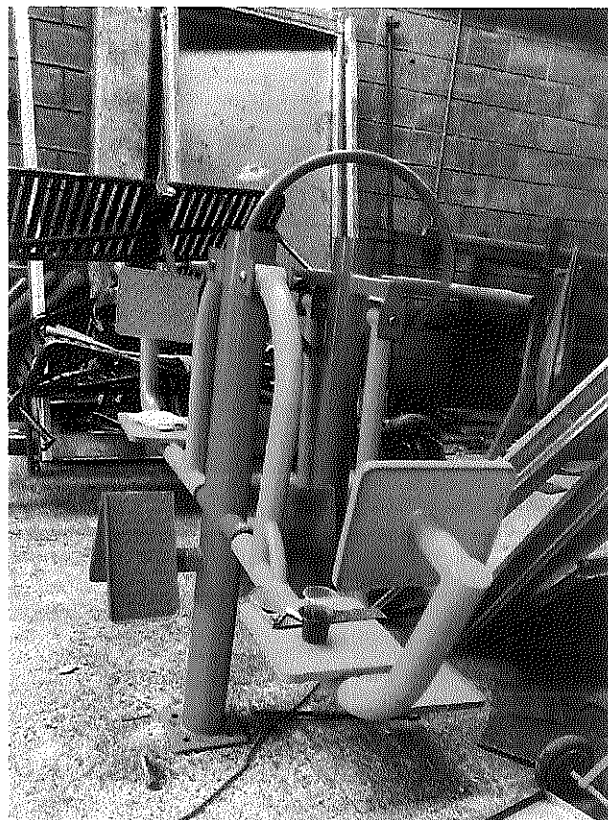




NP 1	DESMONTE DE MASTILES EXISTENTES (INC. DEMOLICION BASE Y CARGUE DE MATERIALES, Y SUSP RED CABLEADO EXIS)	UN
------	---	----

Esta actividad se incluye dentro de los NP de modificatoria N°001, toda vez que se hace necesario para la entrega de los espacios rehabilitados que se realicen los respectivos desmontes de mástiles los cuales se encuentran en desuso por mal estado de la iluminación, y de la remodelación lumínica que sufren los parques azotea y virrey, esta consiste de la suspensión de la red eléctrica, demolición de bases o pedestales existentes que sostienen los mástiles y el desmonte y traslado a sitio de cargue, en el mes de abril se logra realizar los desmontes de las unidades encontradas en los parques azotea y virrey, estos siguen el procedimiento antes mencionado, y se realiza cargue y se entrega a la supervisión la cual los destina para aprovechamiento, rehabilitación de estos alargando su vida útil en otros espacios que necesitan de estos.

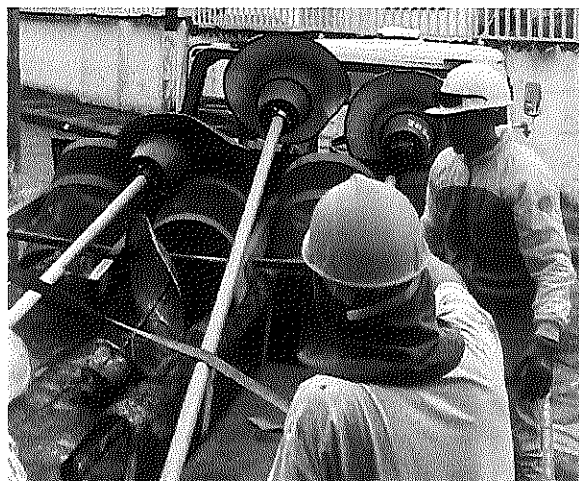



NP 2	BANCA EN CONCRETO SIN ESPALDAR TIPO M31. SUMINISTRO E INSTALACIÓN.	UN
------	--	----

Esta actividad se realiza previo la aprobación de modificación de obra, en la cual se incluyen bancas para mobiliario urbano, para ello se logra realizar en el presente mes la instalación de 34 unidades de bancas en concreto de referencia M-31 banca sin espaldar, las cuales se ubican en campo distribuidas de manera estratégica en puntos de afluencia y demás concurridos, cada banca se arma en campo mediante anclajes de bases con su placa superior con pernos internos, y posterior a ello se sitúan sobre una base de concreto, el cual se instala en cada una de las 2 bases, en este transcurso de fundida de los anclajes se realiza nivelación de las bancas con nivel de mano, garantizando la correcta verticalidad del elemento, y de igual forma se realizan los ajustes necesarios en alineaciones de la ubicación.






NP 3	DESMONTE DE BANCA incl retiro	UN
------	-------------------------------	----

Esta actividad es precedente de la actividad anterior, toda vez que para la instalación del mobiliario nuevo, se realiza primero el desmonte de las bancas existentes, esta actividad se realiza demoliendo los anclajes de las sillas, para facilitar su desmonte, una vez son demolidos los anclajes se realiza traslado hasta sitio de almacenamiento para su respectivo cargue para disposición final.


En el desmonte de la mayoría de las bancas existentes estas sufren averías por las condiciones en que se encuentran (rotas, placas fisuradas, sin espaldares, grietas que comprometen el acero de refuerzo) y demás características propias del deterioro.

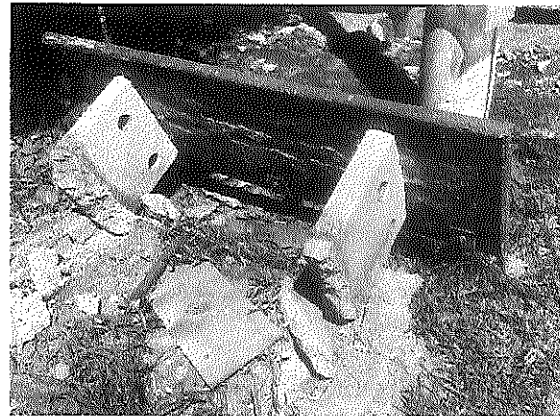



NP 4	DESMONTE DE CANECAS EXISTENTES (INC. DEMOLICION DE BASE EXISTENTE Y CARGUE DE MATERIALES)	UN
------	---	----

En revisión inicial y recorrido de los parques se encuentran que parque azotea cuenta con canecas las cuales presentan deterioro en su base y para efectos de que este parque se entregue 100% rehabilitado se incluye en la modificación este ítem, el cual se ejecuta en el mes de abril, para esto se realiza la respectiva demolición de la base extracción y traslado a sitio de cargue, realizando los 2 desmontes correspondientes a las unidades analizadas en parque azotea, de esta manera se da por finalizada esta actividad de obra.

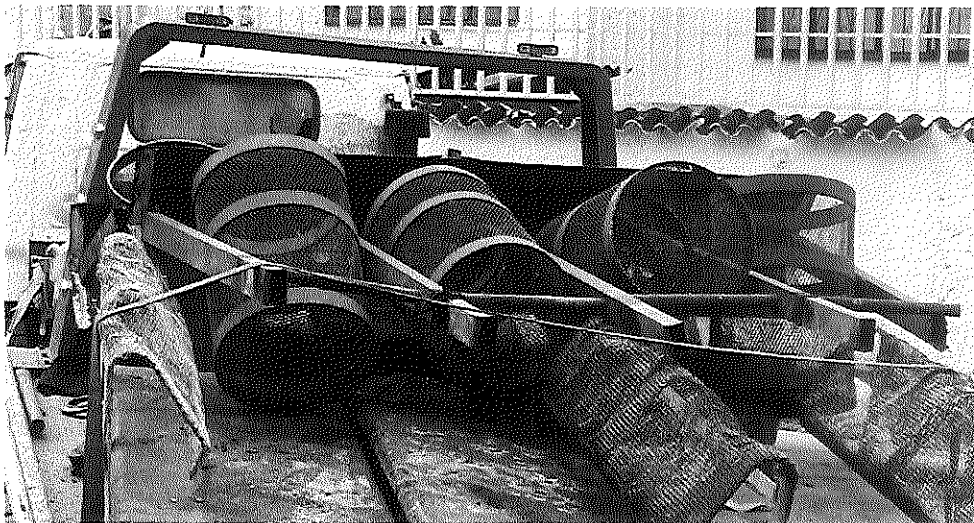





NP 6	MURO CONFINAMIENTO ACABADO LISO $0.60 > H > 0.45$ $A=0.20$ EN CONCRETO REF 3000 PSI	ML
------	---	----

En este mes días después de la aprobación de la modificatoria de obra, se construye el muro de confinamiento del área de biosaludables de parque azotea, toda vez que una vez ejecutada las demás actividades como excavaciones de nuevos senderos, instalación de rellenos y otros, se observa que por la topografía del parque se hace necesaria la construcción de este muro de confinamiento, el cual permite confinar el material de terreno natural, relleno recebo, y gravilla contenido dentro de la zona de biosaludables, toda vez que esta necesita de una superficie uniforme sobre la cual se puedan construir las bases para los biosaludables.

Para ello se construye, este muro perimetral a la zona de juegos, comprendiendo la excavación y ajuste de trazos, instalación de moldes metálicos con los cuales se formaletea las paredes del muro, y son alineadas respectivamente y revisados los plomos para garantizar el terminado deseado, una vez formaleteado o encofrada la zona de muro se coloca el respectivo acero de refuerzo amarrado y se inicia con la fundida de este elemento.

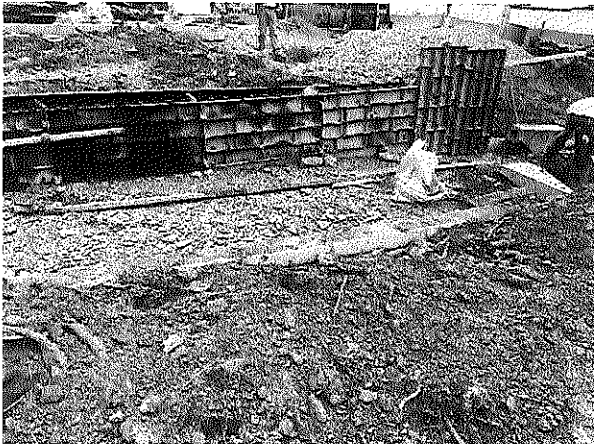



NP 7	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR OCRE ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2
------	--	----


Una vez preparado la base de los senderos con relleno de material mixto de río compactado manualmente, se verifican cotas de los terminados y demás para proceder con la fundida de la circular en concreto estampado color ocre, se inicia la ejecución de este ítem en 3 parques de manera simultánea, iniciando por parque azotea, virrey y parque retiro se realizan en paralelo.


Esta actividad comprende la fundida de placa la cual se le instala refuerzo correspondiente al ítem 4.2, una vez culminada la placa se llana con una llana metálica dejando la superficie lisa o uniforme, en este punto se deja fraguar durante unos minutos y se procede a llanar nuevamente y aplicar seguidamente la primera capa de color endurecedor color ocre, el cual se esparce con un colador de mano evitando que grumos o impurezas afecten el terminado final, se deja fraguar nuevamente para que se impregne el color endurecedor a la capa superficial de la placa, pasado unos minutos se vuelve a aplicar una segunda capa siguiendo las mismas indicaciones, y esto se realiza 4 veces, una vez realizada la última instalación del color endurecedor se deja pasar unos minutos y se procede a aplicar una capa densa de desmoldante el cual se aplica con colador sobre toda la superficie de concreto.

Pasados segundos se toma el molde con la textura a estampar se aplica una capa leve en este de desmoldante y se coloca sobre la superficie del concreto con desmoldante, una vez ubicada en la posición deseada se golpea firmemente con un pisón sobre la superficie del molde y se toma el siguiente molde realizando el mismo procedimiento de preparación de este y se ubica junto al molde anterior dando continuidad al patrón establecido en el molde, se continua de esta manera sobre los m2 fundidos para que el concreto quede en toda su superficie estampada.

Posterior a esto se cubre con plástico inmediatamente evitando el contacto con el agua, 8 días después del estampado se lava la superficie con hidro lavadora, eliminando las impurezas en el color como lo son el tono del desmoldante y posibles filtraciones de polvo o suciedad, una vez limpia la superficie y visualizando el color ideal, se deja secar la placa estampada y se procede con la instalación del sello sobre la superficie el cual permite realzar la tonalidad y le agrega un terminado brillante a la superficie.

En este periodo se logra ejecutar el 100% de los estampados color ocre parque azotea y virrey y se alcanza un 50% en los estampados color ocre del parque Retiro.

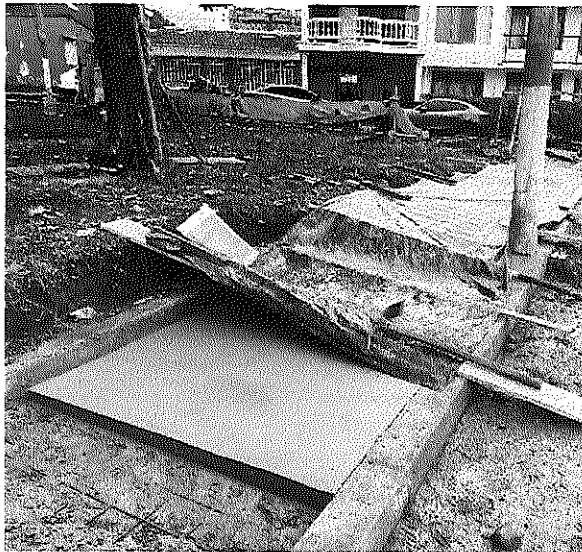




NP 8	CIRCULARES E=10 CM (3000 PSI) CONCRETO REF (INC. ESTAMPADO TIPO LADRILLOS O SIMILAR, INCLUYE COLOR AZUL ENDURECEDOR, DESMOLDANTE, SELLADOR Y RETARDANTENO INC REF)	M2
------	--	----

Este ítem comprende y hace referencia al mismo concreto estampado de la actividad anterior, solamente que para esta actividad se utiliza el color endurecedor azul a cambio del ocre, para ello se sigue exactamente el mismo procedimiento en su instalación, solamente que para este color en específico se aplica una capa de mas según lo sugerido por la empresa proveedora para alcanzar la tonalidad del color azul.

Se aplica el desmoldante sobre la superficie de la palca y molde y se procede a estampar con ayuda del pisón las superficies, en este periodo del mes de abril se logra culminar los estampados en color azul del parque azotea correspondiente a la zona central, y en parque virrey se culminan los estampados azules de la rotonda, quedando únicamente pendiente el lavado y sellado el cual esta programado realizarse en la 1 semana de mayo.

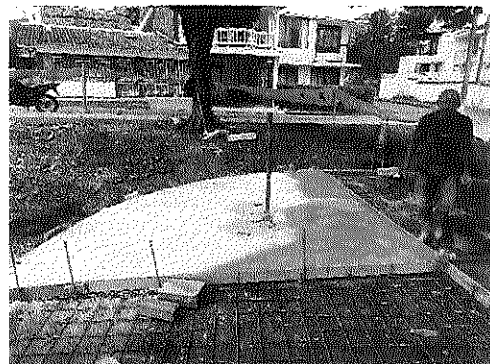





NP 9	CAJA EN CONCRETO REF CON REJILLA .60*.30 P=.30 (MARCO < 11/2" 3/16")	UN
------	--	----

Una vez realizado el muro de confinamiento se procede a realizar el relleno de la zona de juegos y se construye Caja recolectora de agua con rejilla, la cual cumple la función de recoger el agua lluvia que se acumule dentro del área de biosaludables del parque azotea toda vez que el muro de confinamiento retiene el agua e impide que este lave el material de relleno y se sala de allí.

De igual manera en la parte central del parque se instalan rejillas en los senderos cuyo nivel por la topografía del parque conducen el agua hacia la parte interna, evitando que estas ingresen y queden acumuladas en la parte central del parque, esta actividad se realiza fundiendo la caja en concreto e instalando posteriormente rejilla en Angulo la cual se ancla mediante bisagras facilitando el acceso al interior para limpieza de estas.



Así mismo en parque Virrey se realiza la construcción de 2 cajas las cuales se culminan finalizando mes de abril y queda pendiente el anclaje de la rejilla.

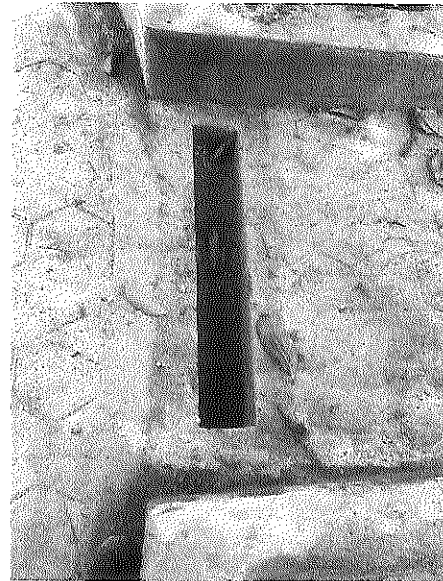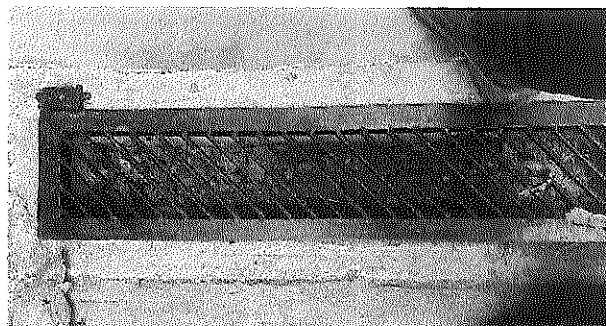



NP 10	BAJANTE AGUAS LLUVIAS 4" PVC	ML
-------	------------------------------	----

Esta actividad es complementaria del ítem anterior caja en concreto y rejillas, y tiene por objeto recoger las aguas que ingresen a la caja y conducir las internamente bajo tierra a la parte externa del parque donde por acción de la escorrentía se conducen al sumidero mas cercano, en este periodo se realiza instalación de estos elementos en parque azotea y virrey

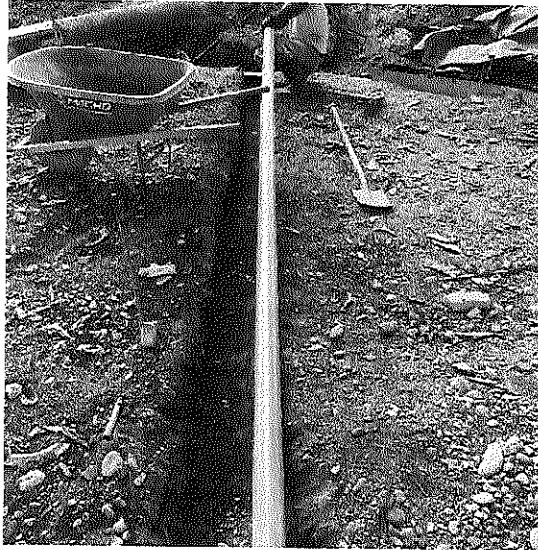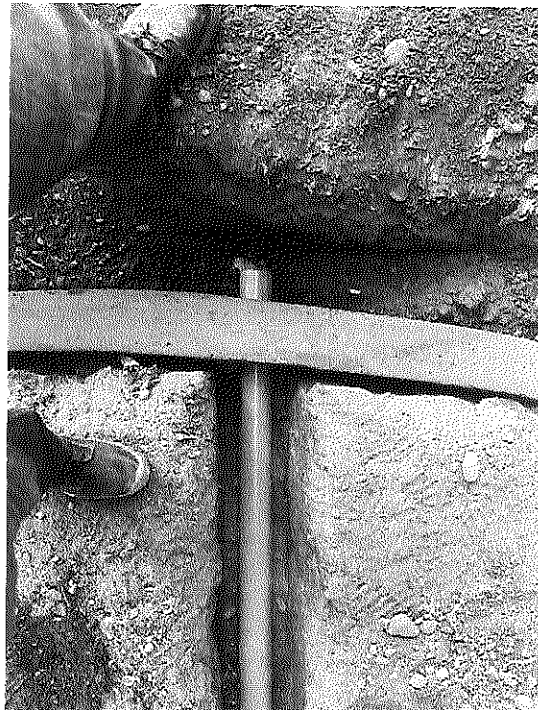



NP 11	RELLENO EN GRAVA 1 1/2"<D<2" EP 15 CM (INC ALISTAMIENTO DE TERRENO HACIA DRENAJE)	M2
-------	---	----

Este ítem presenta avance del 100% de la gravilla instalada en el área de parque biosaludable de Azotea, actividad que comprende inicialmente un replanteo del terreno garantizando el espesor correcto a aplicar y rectificando que el terreno base cuente con un alistamiento hacia el drenaje, el cual se realiza mediante instalación de capas de relleno y compactación de este material.




Una vez teniendo el alistamiento del terreno se aplica la grava manualmente, esparciéndola en capas sobre toda el área de juegos alrededor de las placas circulares bases de los biosaludables.





NP 12	LUMINARIA PARA PARQUE ENTRE 36-60 (W) 100000 H (SUMINISTRO E INSTALACION INC FOTOCELDA Y BRAZO)	UN
-------	--	----



En este periodo son instaladas las luminarias del parque Azotea, esta son instaladas por personal con experiencia en manejo de estas y capacitado para esta labor, el cual comprende la instalación de fotocelda sobre luminaria, conexión de luminaria a acometida interna en brazo y poste, e instalación de luminaria en el brazo metálico, en este periodo se logra realizar la conexión con éxito de esta y se pone en marcha la iluminación del parque azotea.

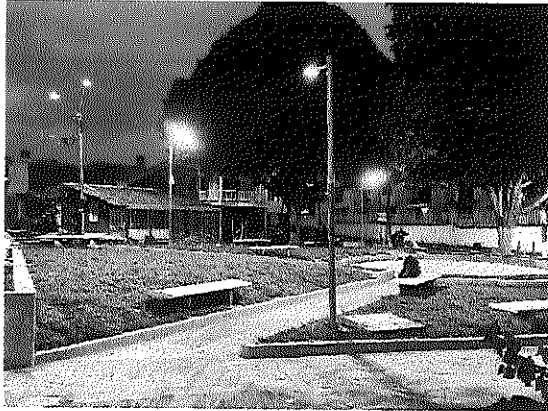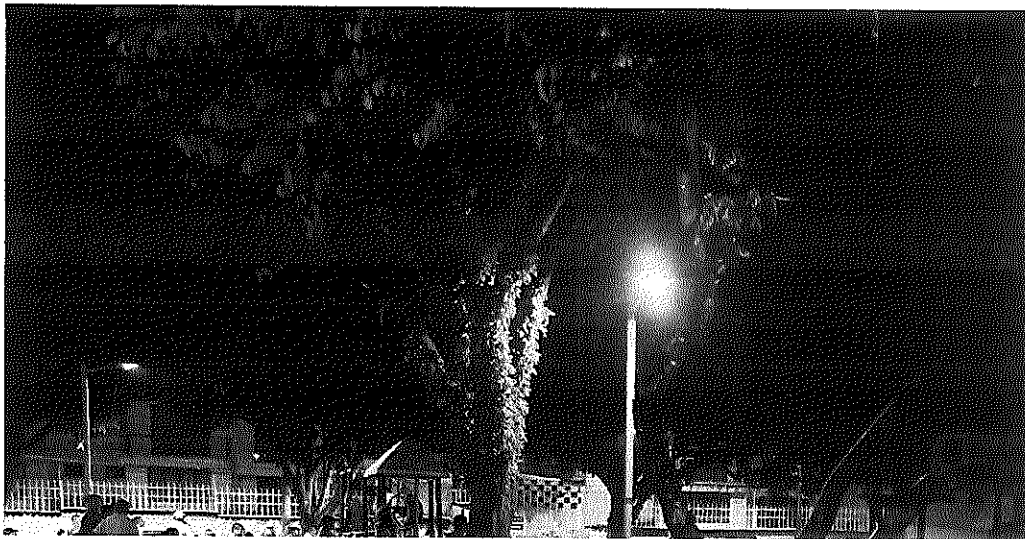



NP 13	POSTE 4 M METALCIO DIAM 3" CON CANSITILLAS Y ACABADO EN PINURA	UN
-------	--	----



Actividad realizada simultáneamente con la instalación de las luminarias, toda vez que estas se colocan sobre el brazo y el brazo es izado junto con el poste metálico sobre su pedestal, el cual se compone de una parrilla de anclaje embebida en un dado de concreto sobre la cual sobre salen los 4 pernos en los que se introduce la base del poste y se aseguran con tuercas de seguridad, estos postes se entregan e instalan con acabado en pintura gris, color institucional y que hace juego con la gama de colores similares presente dentro del parque, llegando a realizar en este mes la instalación de 5 postes los cuales corresponden al parque azotea en su totalidad.

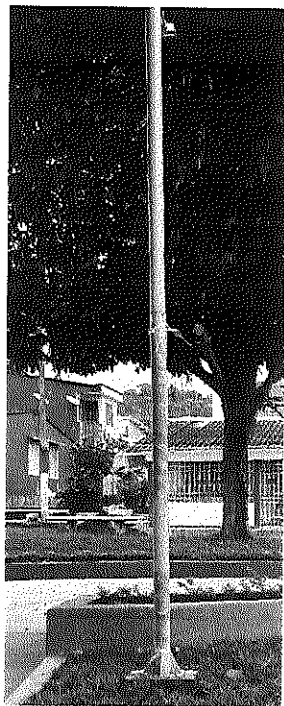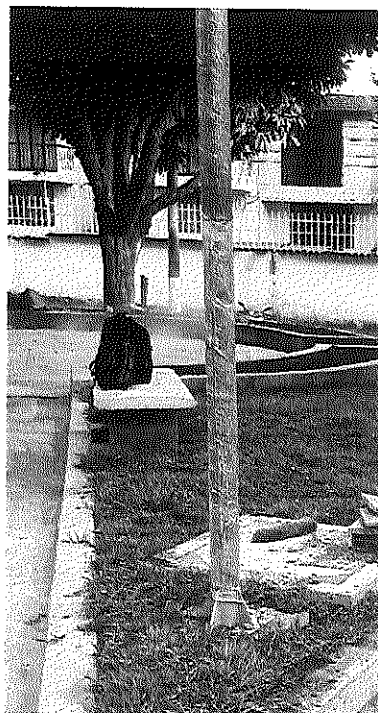



NP 14	BASE CIRCULAR PARA JUEGOS D:2.00 INC REFUERZO DOS DIRECCIONES	UN
-------	---	----

Se realizan 3 bases circulares correspondientes a todas las unidades necesarias para el parque Azotea, con esta actividad se da por culminada y terminada la zona de biosaludables, estas bases se componen de concreto con acero de refuerzo y en su superficie cuenta con acabado escobrado y gualiado en su perímetro, el cual garantiza que no se presenten filos en sus esquinas sino que estos queden de manera segura y no representen riesgos para los usuarios.

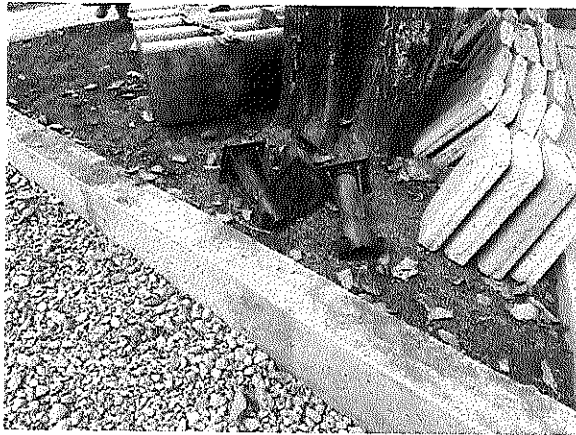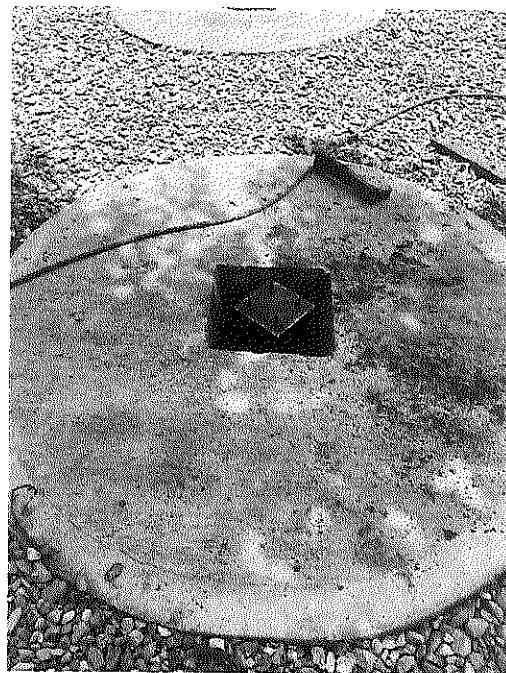




NP 15	SARDINEL 3000PSI $B=0.2, b=0.15, H=0.40$ INC. EXC/RET	ML
-------	---	----

Para el confinamiento de los senderos placas estampados y zonas verdes, se construyen los sardineles fundidos en obra, obteniendo un avance de casi el 85% del total incluido dentro de la modificatoria N°001, y comprende la realización de todos los sardineles internos y perimetrales en el parque Azotea, parque virrey, un 80% en parque retiro y un 90% en parque macarena.

Esta actividad se realiza excavando e instalando formaleta metálica de sardinel la cual se ancla al piso con varillas, se pasan hilos del trazo del sardinel, se instala acero de refuerzo en su interior y se inicia con el vaciado de concreto en su interior, y se vibra con vibrador eléctrico garantizando la uniformidad de los acabados,

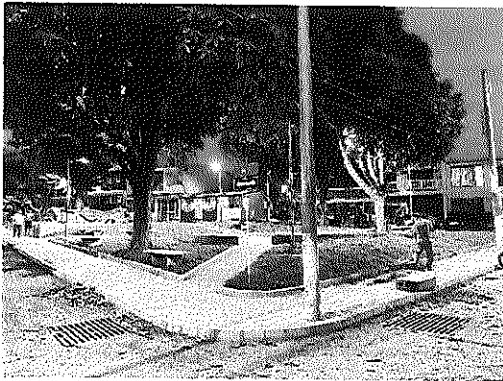



NP 17	SUMINISTRO E INSTALACION CANECA M-121	UN
-------	---------------------------------------	----



Para culminar y dar por terminado en un 100% las actividades en el parque de la azotea, en el presente periodo se instalan 2 canecas en remplazo de las 2 unidades desmontadas, estas canecas son en un 1000% cuerpo en acero inoxidable lo que alarga hasta en 5 veces su lapso de vida útil en comparativo con una de malla convencional, para su instalación se realiza excavación profunda luego se insertan las 2 bases de la caneca en la excavación y se vierte concreto, de esta manera se dejan estas 2 unidades fijadas y funcionales.





NP 18	PUESTA A TIERRA MASTIL LUMINARIA	UN
-------	----------------------------------	----

Esta actividad fue ejecutada junto con el capítulo de instalaciones eléctricas y comprende la instalación de puestas a tierra para el circuito eléctrico, en el mes numero 4 se realiza esta actividad en el parque Azotea, mediante el cual se instalan 3 puestas a tierra de mástil de luminaria, distribuidas de la siguiente manera, caja principal inicio del circuito y punto medio ya que de esta se derivan los 2 circuitos del parque, y las 2 cajas de finalización, se instala varilla de cobre, y se realiza la conexión a la acometida subterránea por medio de los conectores de varilla.

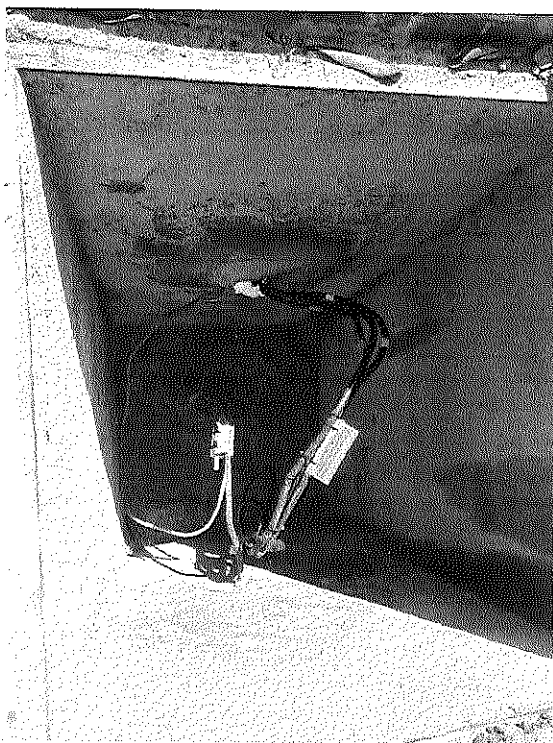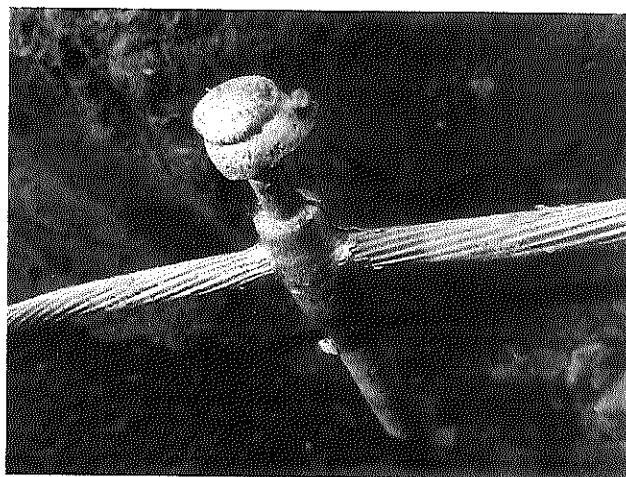



Las actividades anteriormente mencionadas corresponden a las actividades de obra que hacen parte de las cantidades actualizadas según acta de modificación de obra de fecha del 09 de abril del presente año, las cuales tuvieron ejecución en este respectivo periodo, así mismo en conjunto con el trabajo de campo se continúa con los trabajos administrativos con el personal profesional de obra, trabajos que se basan principalmente en llevar control de las actividades que se ejecutan, presentando informes mensuales de las actividades de obra y la forma en la que se ejecutaron mes a mes.

CONCLUSIONES

CONSORCIO ALSIPA cumple con la ejecución de las obras objeto contractual y las condiciones de modificatoria N°001.

En el presente periodo se obtiene firma y aprobación por parte de la entidad contratante de la modificación N°001 de obra, modificación la cual permite ampliar el alcance del contrato en los 4 parques mediante la rehabilitación completa de algunos de sus componentes.


Se cumplen con las normas técnicas y se seguridad en la ejecución de todas las actividades, de igual manera todos los suministros o materiales utilizados en estas actividades cumplen con las normas establecidas y de calidad de los materiales, la obra ha contado con el constante acompañamiento del personal siso el cual realiza sus debidas charlas control sobre el buen uso de elementos de protección personal, verificación de cerramientos de obra entre otros que conllevan al correcto desempeño de la obra y prevención de accidentes.

La obra cuenta con el personal profesional necesario y personal calificado para la ejecución de las actividades del contrato, para el presente periodo mes N°004 se cuenta con 3 frentes de trabajo distribuidos en parque Azotea, Virrey y parque Retiro.

Como se informó en el contenido del presente informe, se continúan presentando interrupciones al ritmo de trabajo producto de la condición climática que se está presentando en los últimos meses, por fuertes lluvias repentinas que interfieren con las actividades que se están ejecutando, lo cual detiene y pospone la continuidad de estas hasta no mejorar la condición climática.

Sin otro particular

Cordialmente;


JOHN DANI NAGLES PACHON
R/L CONSORCIO ALSIPA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Cludad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA a ICBF
NIT 901892095	4	CONSORCIO ALSIPA	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES		Principal	CR 24 A B 125 COND RES LA CABAÑA	VILLAVICENCIO-META	6000000	No
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-04	2025-05	1480937636	9486013831	E	2025/05/23	2025/05/14	BANCO DAVIVIENDA	0	\$2,809,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)									
COLFONDOS		231001	800,227,940	6	14	\$1,010,000	\$0	\$0	\$1,010,000
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	3	\$7,600	\$0	\$0	\$7,600
PORVENIR		230301	800,224,808	8	9	\$243,000	\$0	\$0	\$243,000
PROTECCION		230201	800,229,739	0	9	\$531,600	\$0	\$0	\$531,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					14	\$440,300	\$0	\$0	\$440,300
COFREM		CCF34	892,000,146	3	14	\$440,300	\$0	\$0	\$440,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					14	\$252,700	\$0	\$0	\$252,700
CAJACOPI		CCFC55	901,543,211	6	14	\$789,700	\$0	\$0	\$789,700
FAMISANAR		EPS017	830,003,564	7	3	\$18,000	\$0	\$0	\$18,000
NUOVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	3	\$350,100	\$0	\$0	\$350,100
SALUD TOTAL		EPS002	800,130,907	4	3	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000
SANITAS		EPS005	800,251,440	6	2	\$41,600	\$0	\$0	\$41,600
ICBF (ADMINISTRADORAS: 1)					3	\$190,000	\$0	\$0	\$190,000
INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR		PAICBF	899,999,239	2	14	\$190,400	\$0	\$0	\$190,400
SENA (ADMINISTRADORAS: 1)					14	\$190,400	\$0	\$0	\$190,400
SENA		PASENA	899,999,034	1	14	\$126,800	\$0	\$0	\$126,800
TOTAL					14	\$2,809,900	\$0	\$0	\$2,809,900



Pagos aportes en línea

Módulo de pagos electrónicos

Pago electrónico

El pago electrónico de su autoliquidación se ha realizado exitosamente

Resumen del pago electrónico



Dirección IP:	191.156.158.26
Estado de la transacción:	APROBADA
Clave planilla:	9486013831
Valor:	2.609.900
Período de pago:	2025-04
Nº Transacción (CUS):	148037636
Fecha:	2025/05/14
Banco:	BANCO DAVIVIENDA
Descripción:	Pago de la planilla de aportes con clave: 9486013831
Aportes en línea:	89960147382

Aceptar

Imprimir

Recuerda los canales de atención que tiene Aportes en Línea para brindarte soporte

- Si usted es un cliente empresarial comuníquese con nuestras líneas de servicio telefónico en Bogotá 604 604 3010, Cali 602 485 2050, Barranquilla 605 335 8090, Cartagena 605 693 4080 y en el resto de país 01 6000 510245
- Si usted es independiente o empleador comuníquese con nuestros líneas de servicio telefónico en Bogotá 604 742 3926, Medellín 604 1000, Cali 602 435 3939, Barranquilla 605 385 2050, Cartagena 605 693 1515, Bucaramanga 607 697 0909, Bogotá 605 277 1160. Atención 01 8000 524445
- Nuestro horario de atención con asesores telefónicos es de lunes a viernes de 7:00 a.m. a 6:00 p.m. y los sábados de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Rezon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 17368081		CONTRERAS GARZON FRANCISCO JAVIER	INDEPENDIENTE		PRINCIPAL	MT 16 CASA 104 PRADOS MANICORE	VILLAVICENCIO-META	6675432	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Dias Mora	Valor			
Pensión	Salud	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor			
2025-04	1471732413	9485414869	2025/05/20	2025/05/12	BANCO DAVIVIENDA	0			
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO									
CODIGO NIT DV AFILIADOS VALOR LIQUIDADO INTERESES MORA SALDOS E INCAPACIDADES VALOR A PAGAR									
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)									
PROTECCION									
230201 800,229,739 0 1 \$320,000 \$0 \$320,000									
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)									
POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS									
14-23 860,011,153 6 1 \$48,800 \$0 \$48,800									
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)									
SANTAS									
EPS005 800,251,440 6 1 \$250,000 \$0 \$250,000									
TOTAL									
1 \$618,800 \$0 \$618,800									

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	79895578	EDISSON MARTIN ARCOS NALDONADO	CL. 2 31 8 20 AP 419	5516407	martin.arcosnaldonado@gmail.com	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I - Independiente			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD					TOTAL A PAGAR	
2025-04	2025-04	1	14/05/2025	85923341	\$405.800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD									
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	
EP3008	Compensar EPS	880056642-7	178.000	0	0	0	0	0	1

TOTALES PENSIÓN

Código APP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsidencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	800224808-8	227.800	0	0	0	0	0	0	0	178.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros		Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Ratificado	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor	Aportes Sistemas	Aportes Salud									

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
------------	--------	-----	--------------	-----------	-------------------	---------------	---------------

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de ICE, LBA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	178.000	178.000
Pensión	1	227.800	227.800
Riesgos Laborales	0	0	0
CCF	0	0	0
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	2	405.800	405.800

DATOS DEL APORTANTE							EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	
CC	79890578	EDISSON MARTÍN ARCOS MALDONADO		CL. 2 31 B 20 AP 419	5516407	marlin.arcosmaldonado@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPL/EAOS	UPFC
					1	0
PERÍODO SALUD 2025-04	PERÍODO PENSIONES 2025-04	I	14/05/2025	85923341	TOTAL A PAGAR \$405.800	

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1121920784		LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Az h6 cs 10a etapa III	VILLAVICENCIO-META	6708248	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago				
2025-04	2025-04	1478331531	Planilla	2025/05/21	2025/05/13	Banco DANVIVENDA			
					Limite	2025/05/21			
					Pago	0			
					Valor	\$421,900			

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES									
EMPLEADO									
No.	Identificación	Nombre	Ingresos	Seguros	Planilla	Clave	Tipo	Fecha	Pago
NOVEDADES									
PENSION									
SALUD									
CCF									
RIESGOS									
PARAFISCALES									
TOTAL APORTES									

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1121920784		LEON PRIETO DIANA ALEJANDRA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Az h6 cs 10a etapa III	VILLAVICENCIO-META	6708248	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Salud	Clave	Tipo	Fecha	Pago				
2025-04	2025-04	1478331531	Planilla	2025/05/21	2025/05/13	Banco DANVIVENDA			
					Limite	2025/05/21			
					Pago	0			
					Valor	\$421,900			

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$8,600	\$0	\$0	\$8,600	
COFREMA	CCF34	892,000,146	3	1	\$8,600	\$0	\$0	\$8,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$421,900	\$0	\$0	\$421,900	
