

Página 2858-FR-0064		GUÍA PARA LA SUPERVISIÓN A CONTRATOS DE INTERVENCIÓN A OBRAS Y MANTENIMIENTO A INSTALACIONES DE LA POLICÍA NACIONAL		POLICÍA NACIONAL	
Fecha: 14/12/2023					
Versión: 0					

BALANCE DE OBRA No.2		CONTRATO No. PN DIRAF No.08-6-10235-23	
1. Contratista de Obra: CONSTRUCCIM CONSTRUCCIONES SAS			
2. Contratista de Interventoría: GORILLO & ASOCIADOS S.A.S			
BALANCE No. 02 del 30/Mayo/ 2024			

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO		Noviembre 10 de 2023	
FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO		Noviembre 9 de 2024	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO		\$ 6.252.148.533,55	
ADICIÓN No. 1			
FECHA ADICIÓN No. 1			
ADICIÓN No. 2			
FECHA ADICIÓN No. 2			
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO		\$ 6.252.148.533,55	

DESCRIPCION		CANTIDADES BALANCE No.1 MARZO 18/2024		CONDICIONES ACTUALIZADAS		BALANCE No. 02 MAYO 30/2024				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	MAYORES VALOR	MENORES VALOR		
1	PRELIMINARES			\$ 46.877.187,70		\$ 53.732.237,32		\$ 7.855.049,62	\$ -		
1.1	DEMOLICIONES Y RETIROS										
1.1.2	DEMOLICION DE MURO EN MAMPOSTERIA - DIMENSION VARIABLE	M2		\$ 96.280,64	5,12	\$ 491.756,87		\$ -	\$ -		
1.1.12	DEMOLICION DE SARDINEL EN CONCRETO	ML		\$ 53.245,37	13,00	\$ 692.189,77		\$ -	\$ -		
1.2	DESMONTE DE POZO SEPTICO	UND		\$ 81.018,43	1,00	\$ 81.018,43		\$ -	\$ -		
1.3.1	INSTALACION PROVISIONAL DE AGUA Y SANITARIA	ML		\$ 56.844,57	15,00	\$ 852.668,58		\$ -	\$ -		
1.3.2	INSTALACION PROVISIONAL DE ENERGIA	ML		\$ 100.699,83	15,00	\$ 1.510.497,48		\$ -	\$ -		
1.4.1	VALIA INFORMACION LICENCIA	UND		\$ 464.385,69	1,00	\$ 464.385,69		\$ -	\$ -		
1.4.3	LOCALIZACION, TRAZADO Y REPLANTEO	M2		\$ 7.044,13	637,56	\$ 4.480.988,74		\$ -	\$ -		
1.4.4	LIMPIEZA/DESCAPOTE Y RETIRO - E=0-20 mm	M2		\$ 12.576,16	787,05	\$ 9.898.069,62		\$ -	\$ -		
1.6.1	CAMPAMENTO DE OBRA MAMPOSTERIA	M2		\$ 485.885,36	27,00	\$ 13.113.504,82		\$ -	\$ -		
1.6.5	BATERIA DE BAÑOS	M2		\$ 515.879,92	4,00	\$ 2.063.519,69		\$ -	\$ -		
1.7.1	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA	ML		\$ 35.511,16	442,40	\$ 1.570.139,24		\$ 7.855.049,62	\$ -		
1.8.2	EXCAVACION MANUAL - INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION BOTADERO AUTORIZADO	M3		\$ 54.994,34	59,10	\$ 3.250.165,55		\$ -	\$ -		
1.11.1	TALA DE ARBOL PORTE MENOR - PLATANO	UND		\$ 119.590,76	6,00	\$ 7.175.520,58		\$ -	\$ -		
1.11.2	TALA DE ARBOL PORTE MEDIO - GUAMO	UND		\$ 147.764,78	1,00	\$ 147.764,78		\$ -	\$ -		
1.11.3	TALA DE ARBOL PORTE MAYOR (2 AGUACATES - 1 GUAMO)	UND		\$ 167.449,47	1,00	\$ 167.449,47		\$ -	\$ -		
2	CIMENTACION			\$ 414.232.280,73		\$ 424.938.854,47		\$ 10.706.603,74	\$ -		
2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN - PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION	M3		\$ 48.973,24	1023,75	\$ 50.106.352,69		\$ 428.515,83	\$ -		
2.3.11	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		\$ 706.045,87	166,21	\$ 117.351.850,14		\$ 8.825.570,82	\$ -		
2.3.51	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3		\$ 757.743,89	62,81	\$ 47.593.893,53		\$ 672.040,88	\$ -		
2.5.11	MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 3000 PSI	M3		\$ 809.887,81	22,46	\$ 18.185.588,21		\$ -	\$ -		
2.6.11	LOSA INFERIOR DE TANQUE E=25CM	M2		\$ 175.911,84	41,87	\$ 7.361.241,80		\$ -	\$ -		
2.6.12	PLACA DE CONTRAPISO E=10CM	M2		\$ 107.444,77	186,32	\$ 20.093.557,85		\$ -	\$ -		
2.9.1	ACERO 60.000 PSI#4/20 MPA	KG		\$ 6.002,83	27.889,91	\$ 163.216.380,28		\$ -	\$ -		
3	DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS			\$ 24.449.494,44		\$ 39.421.937,60		\$ 15.072.012,76	\$ -		
3.1.1	EXCAVACION MANUAL PARA INSTALACIONES DE DESAGÜES - NO INCLUYE RETIRO Y DISPOSICION	M3		\$ 25.165,53	75,98	\$ 1.912.076,75		\$ -	\$ -		
3.2.1	RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO	M3		\$ 77.994,83	62,72	\$ 4.891.835,45		\$ -	\$ -		
3.2.2	RELLENO EN MATERIAL GRANULAR (ARENA)	M3		\$ 105.456,85	7,60	\$ 801.472,05		\$ -	\$ -		
3.2.8	RELLENO EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACION	M3		\$ 159.683	199,83	\$ 2.537.463,48		\$ -	\$ -		
3.3.1	RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION	M3		\$ 42.400,87	393,36	\$ 16.710.195,20		\$ 14.128.220,28	\$ -		
3.4.7	SUMINISTRO E INSTALACION CAJILLA VAMPOSTERIA MEDIDOR TOTALIZ. 3/4" - SEGUN NORMA	UND		\$ 1.055.594,95	1,00	\$ 1.055.594,95		\$ -	\$ -		
3.4.10	SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCION AGUAS RESIDUALES (Ø 80XØ 80X1M)	UND		\$ 314.597,50	11,00	\$ 3.460.572,51		\$ 943.792,50	\$ -		
3.4.11	SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCION AGUAS RESIDUALES (Ø 60XØ 60X1M)	UND		\$ 275.537,32	2,00	\$ 551.074,64		\$ -	\$ -		
3.4.13	SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCION AGUAS LLUVIAS (Ø 80XØ 80X1M)	UND		\$ 314.597,50	1,00	\$ 314.597,50		\$ -	\$ -		
3.4.14	SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCION AGUAS LLUVIAS (Ø 60XØ 60X1M)	UND		\$ 275.537,32	2,00	\$ 551.074,64		\$ -	\$ -		
3.8.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TRAMPA DE GRASAS	UND		\$ 263.123,43	1,00	\$ 263.123,43		\$ -	\$ -		

CANTIDADES BALANCE No.1 MARZO 142024	UNIDAD	DESCRIPCION	CONDICIONES ACTUALIZADAS			BALANCE No. 02 MAYO 30/2024				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	MAYORES		MENORES	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
3.6.2	UND	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE VÁLVULA CHARNELA 4"	1,00	\$ 602.733,77	\$ 602.733,77	1,00	\$ 602.733,77	-	\$ -	-	\$ -
3.10.1	UND	CONEXIÓN A RED PÚBLICA DE ALCANTRILLADO SANITARIO	1,00	\$ 490.911,35	\$ 490.911,35	1,00	\$ 490.911,35	-	\$ -	-	\$ -
3.10.3	UND	CONEXIÓN A RED ACOMETIDA	1,00	\$ 305.954,14	\$ 305.954,14	1,00	\$ 305.954,14	-	\$ -	-	\$ -
3.11.1	M3	GRANILLA DIAM 3/4" A 1"	5,45	\$ 116.790,35	\$ 636.540,09	5,45	\$ 636.540,09	-	\$ -	-	\$ -
3.11.4	ML	TUBERÍA DE DRENAJE DE 4"	74,23	\$ 32.465,57	\$ 2.409.919,10	74,23	\$ 2.409.919,10	-	\$ -	-	\$ -
3.11.5	ACCESORIOS	TUBERÍA DE DRENAJE 4"	40,00	\$ 19.178,16	\$ 767.126,51	40,00	\$ 767.126,51	-	\$ -	-	\$ -
3.11.8	M2	GEOTEXTIL TEJIDO 2100	74,23	\$ 18.969,31	\$ 1.259.832,04	74,23	\$ 1.259.832,04	-	\$ -	-	\$ -
4		ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METÁLICAS Y MADERA		\$ 1.568.199.947,35		\$ 1.660.337.850,85	\$ 71.127.703,20	-	\$ -	-	\$ -
4.2.1.3	M3	PANTALLAS EN CONCRETO DE 4000 PSI	135,46	\$ 759.773,51	\$ 102.783.459,25	135,46	\$ 102.783.459,25	-	\$ -	-	\$ -
4.2.2.1	M2	MURO NO ESTRUCTURAL A LA VISTA EN CONCRETO DE 4000 PSI E=20CM	491,08	\$ 157.083,32	\$ 77.139.827,48	659,71	\$ 103.659.956,23	168,64	\$ 26.490.168,76	-	\$ -
4.2.2.2	M2	MURO NO ESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 4000 PSI E=20CM	38,27	\$ 154.724,62	\$ 5.921.311,29	79,57	\$ 12.156.713,96	40,30	\$ 6.235.402,27	-	\$ -
4.2.2.3	M2	MURO NO ESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 4000 PSI E=15CM	49,66	\$ 114.692,56	\$ 5.695.832,49	139,83	\$ 16.037.460,54	90,17	\$ 10.341.828,06	-	\$ -
4.2.2.4	M2	MURO NO ESTRUCTURAL A LA VISTA EN CONCRETO DE 4000 PSI E=10CM	4,49	\$ 78.541,69	\$ 352.652,07	4,49	\$ 352.652,07	-	\$ -	-	\$ -
4.2.2.5	M2	MURO NO ESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 4000 PSI E=10CM	2,34	\$ 73.175,54	\$ 171.330,77	2,34	\$ 171.330,77	-	\$ -	-	\$ -
4.2.3.1	M3	COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO DE 4000 PSI	16,46	\$ 970.028,14	\$ 14.320.663,20	21,82	\$ 18.984.014,04	5,36	\$ 4.663.350,84	-	\$ -
4.5.1	M2	LOSA ALIGERADA SIN TORTA INFERIOR EN CONCRETO DE 4000 PSI H=0,70 m compuesta por una Losa superior a=0,12 m + viga descolgada h= 0,58 m	701,22	\$ 244.790,17	\$ 171.651.763,90	701,22	\$ 171.651.763,90	-	\$ -	-	\$ -
4.5.2	M2	LOSA ALIGERADA SIN TORTA INFERIOR EN CONCRETO DE 4000 PSI H=0,45 m compuesta por una Losa superior a=0,12 m + viga descolgada h= 0,33 m	495,12	\$ 223.411,59	\$ 110.615.544,12	495,12	\$ 110.615.544,12	-	\$ -	-	\$ -
4.5.3	M2	LOSA ALIGERADA SIN TORTA INFERIOR EN CONCRETO DE 4000 PSI CON LAMINA COLABORANTE H=0,45 m CUBIERTA MÓDULO ADMINISTRATIVO	464,25	\$ 251.465,44	\$ 116.742.830,33	464,25	\$ 116.742.830,33	-	\$ -	-	\$ -
4.5.4	M2	LOSA ALIGERADA SIN TORTA INFERIOR EN CONCRETO DE 4000 PSI CON LAMINA COLABORANTE H=0,70 m CUBIERTA MÓDULO ALOJAMIENTO	490,02	\$ 272.844,03	\$ 133.699.029,40	490,02	\$ 133.699.029,40	-	\$ -	-	\$ -
4.5.5	M2	LOSA ALFAJIA MURO PACHADA VOL. ADMIN. E= 0,10 M	11,66	\$ 179.338,66	\$ 2.091.088,73	11,66	\$ 2.091.088,73	-	\$ -	-	\$ -
4.6.1	M3	ESCALERA EN CONCRETO - VOLUMEN ADMINISTRATIVO	3,87	\$ 851.227,55	\$ 3.294.250,63	4,47	\$ 3.804.987,16	0,60	\$ 510.736,53	-	\$ -
4.8.2	M3	ESCALERA EN CONCRETO - VOLUMEN AJUAIENTOS	10,19	\$ 851.227,55	\$ 8.674.008,75	10,19	\$ 8.674.008,75	-	\$ -	-	\$ -
4.9.1	M3	TANQUE EN CONCRETO DE 4000 PSI - INCLUYE AGUA POTABLE Y RED DE INCENDIOS	27,52	\$ 865.368,21	\$ 23.539.733,23	27,52	\$ 23.539.733,23	-	\$ -	-	\$ -
4.9.6	M3	POZO EYECTOR EN CONCRETO DE 4000 PSI	0,00	\$ 865.368,21	\$ -	0,00	\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -
4.10.1	KG	ACERO 60 000 PSI#420 MPA	121770,61	\$ 6.002,63	\$ 730.958.149,06	121770,61	\$ 730.958.149,06	-	\$ -	-	\$ -
4.10.2	KG	MALLA ELECTROSOLDADA	9212,37	\$ 7.142,84	\$ 65.800.597,13	12416,54	\$ 88.666.814,18	3.204,17	\$ 22.866.217,04	-	\$ -
4.27.1	UND	GARITAS EN CONCRETO DE 4000 PSI SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL_4.41 M2	1,00	\$ 7.753.546,81	\$ 7.753.546,81	1,00	\$ 7.753.546,81	-	\$ -	-	\$ -
4.27.2	UND	GARITAS EN CONCRETO DE 4000 PSI SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO Y ESTRUCTURAL_4.66 M2	1,00	\$ 7.984.628,91	\$ 7.984.628,91	1,00	\$ 7.984.628,91	-	\$ -	-	\$ -
5		MAMPOSTERIA, DIVISIONES, ENCHAPES Y REMATES		\$ 58.940.722,82		\$ 58.940.722,82		-	\$ -	-	\$ -
5.8.1	M2	MURO BLOQUE ARCILLA - BLOQUE No 4 - DIMENSIONES 0.10x0.20x0.30 mts	1078,00	\$ 41.553,19	\$ 44.794.343,56	1078,00	\$ 44.794.343,56	-	\$ -	-	\$ -
5.8.2	ML	MURO BLOQUE ARCILLA No 4 - DIMENSIONES 0.10x0.20x0.30 mts	201,18	\$ 22.967,63	\$ 4.620.628,00	201,18	\$ 4.620.628,00	-	\$ -	-	\$ -
5.10.5	UND	MÓDULO DE ASTA DE BANDERAS SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO	1,00	\$ 484.835,54	\$ 484.835,54	1,00	\$ 484.835,54	-	\$ -	-	\$ -
5.14.8	M2	RECUBRIMIENTO CON PANEL DE YESO O FIBROCEMENTO	186,00	\$ 43.768,36	\$ 8.140.915,51	186,00	\$ 8.140.915,51	-	\$ -	-	\$ -
6		PANETES		\$ 44.531.948,41		\$ 44.531.948,41		-	\$ -	-	\$ -
6.1.1	M2	PANETE INTERIOR 1:4 LIBO MUROS X M2. E= 0,015 mts	1680,00	\$ 22.148,52	\$ 37.209.508,36	1680,00	\$ 37.209.508,36	-	\$ -	-	\$ -
6.1.2	ML	PANETE INTERIOR 1:4 LIBO MUROS X ML. E= 0,015 mts	297,72	\$ 16.003,39	\$ 4.764.628,40	297,72	\$ 4.764.628,40	-	\$ -	-	\$ -
6.1.3	M2	PANETE INTERIOR 1:4 IMPERMEABILIZADO MUROS X M2. E= 0,015 mts	44,00	\$ 26.775,62	\$ 1.178.127,10	44,00	\$ 1.178.127,10	-	\$ -	-	\$ -
6.1.4	ML	PANETE INTERIOR 1:4 IMPERMEABILIZADO MUROS X ML. E= 0,015 mts	15,78	\$ 19.261,34	\$ 303.943,89	15,78	\$ 303.943,89	-	\$ -	-	\$ -
6.3.1	M2	PANETE LISO 1:4 BALD ESCALERAS X M2	4,00	\$ 24.412,05	\$ 97.651,40	4,00	\$ 97.651,40	-	\$ -	-	\$ -
6.4.1	M2	PANETE IMPERMEABILIZADO 1:4 PARA MUROS TANQUE X M2	46,00	\$ 21.264,99	\$ 978.189,46	46,00	\$ 978.189,46	-	\$ -	-	\$ -
7		PREFABRICADOS		\$ 9.810.207,40		\$ 9.810.207,40		-	\$ -	-	\$ -
7.6.1	ML	CORTASOL EN CONCRETO - E=15cm (Ver Detalle Arquitectonico)	0,00	\$ 331.380,79	\$ -	0,00	\$ 0,00	-	\$ -	-	\$ -
7.6.2	ML	CORTASOL EN CONCRETO - E=10cm (Ver Detalle Arquitectonico)	51,80	\$ 126.250,83	\$ 6.514.532,54	51,80	\$ 6.514.532,54	-	\$ -	-	\$ -
7.11.1.1	ML	BANCAS EN CONCRETO DE 3.000 PSI SEGUN DETALLE - CELDAS DE RETENCION	6,00	\$ 488.213,96	\$ 2.929.283,78	6,00	\$ 2.929.283,78	-	\$ -	-	\$ -
7.11.1.31	ML	SOPORTE LAVADERO - LAMINA SUPERBOARD	12,00	\$ 30.532,59	\$ 366.381,08	12,00	\$ 366.381,08	-	\$ -	-	\$ -
8		INSTALACION HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS		\$ 280.848.842,78		\$ 285.156.884,25	\$ 4.48.021,46	-	\$ -	-	\$ -
8.1.7	UND	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P. DIAM= 3/4"	57,74	\$ 13.251,27	\$ 765.128,12	57,74	\$ 765.128,12	-	\$ -	-	\$ -
8.1.15	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P. DIAM= 3/4"	30,00	\$ 7.573,51	\$ 227.205,39	30,00	\$ 227.205,39	-	\$ -	-	\$ -
8.1.23	UND	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR TOTALIZADOR DIAM= 3/4"	1,00	\$ 431.272,32	\$ 431.272,32	1,00	\$ 431.272,32	-	\$ -	-	\$ -
8.1.31	UND	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO BOLA DIAM= 3/4"	6,00	\$ 34.063,87	\$ 204.503,22	6,00	\$ 204.503,22	-	\$ -	-	\$ -

	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDADES BALANCE No.1 MARZO 197024			CONDICIONES ACTUALIZADAS			BALANCE No. 02 MAYO 201824			JUSTIFICACION MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	MAYORES	MENORES	
8.1.39	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION FLOTADOR MECANICO DIAM= 3/4"	2,00	\$ 92.254,58	\$ 185.989,16			2,00	\$ 165.989,16		\$ -	-	\$ -	
8.1.75	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO DIAM= 3/4"	1,00	\$ 591.146,87	\$ 591.146,87			1,00	\$ 591.146,87		\$ -	-	\$ -	
8.1.83	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. DIAM= 3/4"	2,00	\$ 49.015,52	\$ 98.031,04			2,00	\$ 98.031,04		\$ -	-	\$ -	
8.1.99	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3/4"	49,00	\$ 31.295,96	\$ 1.533.011,96			49,00	\$ 1.533.011,96		\$ -	-	\$ -	
8.1.101	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION PASE 1"	1,00	\$ 126.407,42	\$ 126.407,42			1,00	\$ 126.407,42		\$ -	-	\$ -	
8.2.3	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO INOX. TIPO 304/304L ASTM A312 DIAM= 3"	2,57	\$ 164.787,97	\$ 423.505,09			2,57	\$ 423.505,09		\$ -	-	\$ -	
8.2.4	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO INOX. TIPO 304/304L ASTM A312 DIAM= 2 1/2"	5,33	\$ 59.553,07	\$ 317.579,84			5,33	\$ 317.579,84		\$ -	-	\$ -	
8.2.6	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO INOX. TIPO 304/304L ASTM A312 DIAM= 1 1/2"	16,86	\$ 48.747,69	\$ 838.746,04			16,86	\$ 838.746,04		\$ -	-	\$ -	
8.2.11	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO INOX DIAM= 3"	3,00	\$ 80.187,57	\$ 240.562,71			3,00	\$ 240.562,71		\$ -	-	\$ -	
8.2.12	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO INOX DIAM= 2 1/2"	9,00	\$ 36.663,38	\$ 329.970,45			9,00	\$ 329.970,45		\$ -	-	\$ -	
8.2.14	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS ACERO INOX DIAM= 1 1/2"	17,00	\$ 19.020,22	\$ 323.341,81			17,00	\$ 323.341,81		\$ -	-	\$ -	
8.2.20	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO DIAM= 2 1/2"	3,00	\$ 441.847,80	\$ 1.325.543,41			3,00	\$ 1.325.543,41		\$ -	-	\$ -	
8.2.22	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE HIDRO DIAM= 1 1/2"	1,00	\$ 186.262,96	\$ 186.262,96			1,00	\$ 186.262,96		\$ -	-	\$ -	
8.2.27	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE PIE Y CANASTILLA EN HIERRO FUNDIDO ROSCA NPT O SIMILAR 3"	2,00	\$ 352.915,79	\$ 705.831,58			2,00	\$ 705.831,58		\$ -	-	\$ -	
8.2.35	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA. DIAM= 3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	4,00	\$ 531.658,76	\$ 2.126.635,03			4,00	\$ 2.126.635,03		\$ -	-	\$ -	
8.2.36	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA. DIAM= 2 1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	4,00	\$ 559.956,61	\$ 2.239.866,46			4,00	\$ 2.239.866,46		\$ -	-	\$ -	
8.2.38	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO CORTINA. DIAM= 1 1/2" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT	4,00	\$ 188.022,42	\$ 752.089,50			4,00	\$ 752.089,50		\$ -	-	\$ -	
8.2.43	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION UNION FLEXIBLE BORRACHA DIAM= 3"	2,00	\$ 217.408,19	\$ 434.816,39			2,00	\$ 434.816,39		\$ -	-	\$ -	
8.2.44	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION UNION FLEXIBLE BORRACHA DIAM= 2 1/2"	2,00	\$ 618.897,98	\$ 1.237.775,96			2,00	\$ 1.237.775,96		\$ -	-	\$ -	
8.2.49	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION COPA CONCENTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE UNION SOLDADA. TIPO 1	2,00	\$ 29.686,30	\$ 59.372,60			2,00	\$ 59.372,60		\$ -	-	\$ -	
8.2.59	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION COPA EXCENTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE UNION SOLDADA	2,00	\$ 79.259,28	\$ 158.518,56			2,00	\$ 158.518,56		\$ -	-	\$ -	
8.2.61	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION COPA EXCENTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE UNION SOLDADA ASMT-A351 - TIPO 1	2,00	\$ 45.341,11	\$ 90.682,22			2,00	\$ 90.682,22		\$ -	-	\$ -	
8.2.65	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. DIAM= 4"	2,00	\$ 119.556,48	\$ 239.112,95			2,00	\$ 239.112,95		\$ -	-	\$ -	
8.2.67	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. DIAM= 3"	2,00	\$ 94.826,52	\$ 189.653,04			2,00	\$ 189.653,04		\$ -	-	\$ -	
8.2.70	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. DIAM= 1 1/2"	1,00	\$ 129.244,09	\$ 129.244,09			1,00	\$ 129.244,09		\$ -	-	\$ -	
8.2.83	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3"	3,00	\$ 18.720,15	\$ 56.250,46			3,00	\$ 56.250,46		\$ -	-	\$ -	
8.2.84	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 2 1/2"	5,00	\$ 17.813,41	\$ 89.067,03			5,00	\$ 89.067,03		\$ -	-	\$ -	
8.2.95	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 1 1/2"	15,00	\$ 16.839,20	\$ 252.588,00			15,00	\$ 252.588,00		\$ -	-	\$ -	
8.2.97	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION PASE 3"	1,00	\$ 41.714,18	\$ 41.714,18			1,00	\$ 41.714,18		\$ -	-	\$ -	
8.2.98	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION FITRO YEE DIAM= 2 1/2"	1,00	\$ 645.709,59	\$ 645.709,59			1,00	\$ 645.709,59		\$ -	-	\$ -	
8.4.6	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DIAM= 3"	6,31	\$ 55.540,78	\$ 350.462,38			6,31	\$ 350.462,38		\$ -	-	\$ -	
8.4.7	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA ACERO NEGRO SCH 40 DIAM= 2"	1,49	\$ 37.553,54	\$ 55.954,78			1,49	\$ 55.954,78		\$ -	-	\$ -	
8.4.14	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS RANURADOS. DIAM= 3"	6,00	\$ 69.663,65	\$ 418.381,91			6,00	\$ 418.381,91		\$ -	-	\$ -	
8.4.15	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS RANURADOS. DIAM= 2"	2,00	\$ 42.732,75	\$ 85.585,49			2,00	\$ 85.585,49		\$ -	-	\$ -	
8.4.22	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION ACOPLE RIGIDO EN HIERRO DUCTIL DE UNION RANURADA DIAM= 3"	19,00	\$ 28.437,90	\$ 540.320,12			18,00	\$ 540.320,12		\$ -	-	\$ -	
8.4.23	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION ACOPLE RIGIDO EN HIERRO DUCTIL DE UNION RANURADA DIAM= 2"	11,00	\$ 19.225,33	\$ 211.478,67			11,00	\$ 211.478,67		\$ -	-	\$ -	
8.4.36	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA SENSOR DE FLUJO 3"	1,00	\$ 219.945,42	\$ 219.945,42			1,00	\$ 219.945,42		\$ -	-	\$ -	
8.4.45	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE LISTADO DIAM= 3"	1,00	\$ 354.977,40	\$ 354.977,40			1,00	\$ 354.977,40		\$ -	-	\$ -	
8.4.46	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE LISTADO DIAM= 2 1/2"	1,00	\$ 316.932,88	\$ 316.932,88			1,00	\$ 316.932,88		\$ -	-	\$ -	
8.4.47	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO VASTAGO ASCENDENTE LISTADO DIAM= 2"	1,00	\$ 308.997,89	\$ 308.997,89			1,00	\$ 308.997,89		\$ -	-	\$ -	
8.4.52	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARPOSA CON SUPERVISOR DIAM= 3"	2,00	\$ 307.188,80	\$ 614.377,60			2,00	\$ 614.377,60		\$ -	-	\$ -	
8.4.53	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARPOSA CON SUPERVISOR DIAM= 2 1/2"	2,00	\$ 285.265,21	\$ 570.530,42			2,00	\$ 570.530,42		\$ -	-	\$ -	
8.4.54	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA MARPOSA CON SUPERVISOR DIAM= 2"	1,00	\$ 417.408,52	\$ 417.408,52			1,00	\$ 417.408,52		\$ -	-	\$ -	
8.4.65	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE RANURADO DIAM= 3"	1,00	\$ 235.908,72	\$ 235.908,72			1,00	\$ 235.908,72		\$ -	-	\$ -	
8.4.67	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE RANURADO DIAM= 2 1/2"	1,00	\$ 217.792,69	\$ 217.792,69			1,00	\$ 217.792,69		\$ -	-	\$ -	
8.4.68	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE RANURADO DIAM= 2"	1,00	\$ 207.570,04	\$ 207.570,04			1,00	\$ 207.570,04		\$ -	-	\$ -	
8.4.69	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION MANOMETRO DE GLUCERINA 0-300 PSI	4,00	\$ 284.982,27	\$ 1.139.929,08			4,00	\$ 1.139.929,08		\$ -	-	\$ -	
8.4.70	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA COBRE TIPO L 1 1/2"	10,86	\$ 61.227,06	\$ 664.925,85			10,86	\$ 664.925,85		\$ -	-	\$ -	
8.4.71	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIO COBRE 1/2"	51,00	\$ 7.104,63	\$ 362.338,12			51,00	\$ 362.338,12		\$ -	-	\$ -	
8.4.72	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE 1/2"	4,00	\$ 53.200,36	\$ 212.921,42			4,00	\$ 212.921,42		\$ -	-	\$ -	
8.4.73	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION UNIVERSAL 1/2" COBRE	4,00	\$ 17.862,53	\$ 71.462,14			4,00	\$ 71.462,14		\$ -	-	\$ -	
8.4.74	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA DE COMPUESTA 1/2"	6,00	\$ 492.971,90	\$ 2.957.631,00			6,00	\$ 2.957.631,00		\$ -	-	\$ -	
8.4.80	UNO	PLACA ANTIVORTICE 2 1/2" DE UNION SOLDADA- NFPA 20	1,00	\$ 969.975,27	\$ 969.975,27			1,00	\$ 969.975,27		\$ -	-	\$ -	
8.4.86	UNO	SUMINISTRO E INSTALACION NIPLE PASAMUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. DIAM= 4"	2,00	\$ 409.402,19	\$ 818.804,38			2,00	\$ 818.804,38		\$ -	-	\$ -	

	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDADES BALANCE No.1 MARZO 16/2024			CONDICIONES ACTUALIZADAS			BALANCE No.02 MAYO 30/2024			JUSTIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			VR. UNITARIO			VR. TOTAL			VR. TOTAL			MAYORES		
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	VALOR
8.10.53	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS DIAM= 4"	25.00	\$ 19,771.91	\$ 494,297.72			25.00	\$ 494,297.72				\$ -	\$ -
8.10.54	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS DIAM= 3"	6.00	\$ 19,227.00	\$ 115,361.98			6.00	\$ 115,361.98				\$ -	\$ -
8.11.04	UND	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE=11 DIAM= 3/4"	18.77	\$ 10,560.39	\$ 198,218.54			18.77	\$ 198,218.54				\$ -	\$ -
8.11.12	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DIAM= 3/4"	15.00	\$ 5,422.04	\$ 81,330.59			15.00	\$ 81,330.59				\$ -	\$ -
8.11.18	UND	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3/4"	16.00	\$ 18,302.94	\$ 292,847.11			16.00	\$ 292,847.11				\$ -	\$ -
8.12.11	UND	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F LAVAMANOS 1/2"	22.00	\$ 45,695.66	\$ 1,003,324.45			22.00	\$ 1,003,324.45				\$ -	\$ -
8.12.12	UND	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F DUCHA 1/2"	10.00	\$ 49,398.11	\$ 493,981.09			10.00	\$ 493,981.09				\$ -	\$ -
8.12.22	UND	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F LAVAPLATOS 1/2"	3.00	\$ 45,605.66	\$ 136,816.97			3.00	\$ 136,816.97				\$ -	\$ -
8.12.25	UND	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F ORINAL 3/4"	6.00	\$ 48,672.45	\$ 292,034.72			6.00	\$ 292,034.72				\$ -	\$ -
8.12.26	UND	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F SANITARIO DE TANQUE 1/2"	2.00	\$ 45,605.66	\$ 91,211.31			2.00	\$ 91,211.31				\$ -	\$ -
8.12.28	UND	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F SANITARIO DE FLUXOMETRO 1.1/4"	17.00	\$ 65,382.34	\$ 1,111,499.75			17.00	\$ 1,111,499.75				\$ -	\$ -
8.12.29	UND	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F LLAVE MANGUERA 1/2"	6.00	\$ 45,605.66	\$ 273,633.94			6.00	\$ 273,633.94				\$ -	\$ -
8.12.10	UND	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F POCETA DE ASEO 1/2"	3.00	\$ 45,605.66	\$ 136,816.97			3.00	\$ 136,816.97				\$ -	\$ -
8.12.13	UND	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F LAVADORA 1/2"	3.00	\$ 45,605.66	\$ 136,816.97			3.00	\$ 136,816.97				\$ -	\$ -
8.12.14	UND	INSTALACION DE PUNTO HIDRAULICO A F LAVADERO 1/2"	5.00	\$ 45,605.66	\$ 228,028.28			5.00	\$ 228,028.28				\$ -	\$ -
8.15.11	UND	INSTALACION DE SALIDA SANITARIO FLUXOMETRO 1"	17.00	\$ 68,446.25	\$ 1,163,586.21			17.00	\$ 1,163,586.21				\$ -	\$ -
8.15.2	UND	INSTALACION DE SALIDA SANITARIO TANQUE 1"	2.00	\$ 68,446.25	\$ 136,892.49			2.00	\$ 136,892.49				\$ -	\$ -
8.15.2	UND	INSTALACION DE SALIDA SANITARIO TANQUE 1"	22.00	\$ 57,427.81	\$ 1,263,407.35			22.00	\$ 1,263,407.35				\$ -	\$ -
8.15.5	UND	INSTALACION DE SALIDA LAVAPLATOS 2"	3.00	\$ 57,427.81	\$ 172,282.52			3.00	\$ 172,282.52				\$ -	\$ -
8.15.8	UND	INSTALACION DE SALIDA ORINAL 2"	6.00	\$ 61,045.53	\$ 366,279.17			6.00	\$ 366,279.17				\$ -	\$ -
8.15.9	UND	INSTALACION DE SALIDA SIFON 3"	25.00	\$ 56,237.25	\$ 1,405,931.18			25.00	\$ 1,405,931.18				\$ -	\$ -
8.15.11	UND	INSTALACION DE SALIDA DUCHA 3"	10.00	\$ 56,237.25	\$ 562,372.47			10.00	\$ 562,372.47				\$ -	\$ -
8.15.12	UND	INSTALACION DE SALIDA POCETA ASEO 3"	3.00	\$ 56,237.25	\$ 168,711.74			3.00	\$ 168,711.74				\$ -	\$ -
8.15.13	UND	INSTALACION DE SALIDA LAVADORA 2"	3.00	\$ 65,482.29	\$ 196,446.87			3.00	\$ 196,446.87				\$ -	\$ -
8.15.14	UND	INSTALACION DE SALIDA LAVADERO 2"	5.00	\$ 58,633.92	\$ 293,169.59			5.00	\$ 293,169.59				\$ -	\$ -
8.15.2	UND	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-P RDE=21 DIAM=3"	89.46	\$ 15,922.12	\$ 1,424,392.69			89.46	\$ 1,424,392.69				\$ -	\$ -
8.16.5	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-P DIAM=3"	26.00	\$ 42,765.29	\$ 1,111,897.49			26.00	\$ 1,111,897.49				\$ -	\$ -
8.16.8	UND	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA COMPUERTA DIAM= 3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT.	2.00	\$ 684,257.45	\$ 1,368,514.90			2.00	\$ 1,368,514.90				\$ -	\$ -
8.16.11	UND	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE CORTINA SELLO NITRILLO DIAM= 3" CUERPO EN BRONCE ROSCA NPT.	2.00	\$ 715,100.30	\$ 1,430,200.61			2.00	\$ 1,430,200.61				\$ -	\$ -
8.16.14	UND	SUMINISTRO E INSTALACION UNIVRSAL DIAM=3" PVC ROSCA NPT.	2.00	\$ 132,515.03	\$ 265,030.07			2.00	\$ 265,030.07				\$ -	\$ -
8.16.17	UND	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA 3"	2.00	\$ 15,603.39	\$ 30,320.78			2.00	\$ 30,320.78				\$ -	\$ -
8.16.20	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS DIAM= 3"	4.00	\$ 19,227.00	\$ 76,907.98			4.00	\$ 76,907.98				\$ -	\$ -
8.18.5	UND	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CS90 DIAM= 4"	100.77	\$ 103,230.08	\$ 10,402,495.55			100.77	\$ 10,402,495.55				\$ -	\$ -
8.18.16	UND	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AGERO NEGRO SCH40 DIAM= 4"	51.34	\$ 67,075.58	\$ 3,443,885.46			51.34	\$ 3,443,885.46				\$ -	\$ -
8.18.18	UND	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AGERO NEGRO SCH40 DIAM= 2 1/2"	7.55	\$ 47,192.79	\$ 356,305.54			7.55	\$ 356,305.54				\$ -	\$ -
8.18.19	UND	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AGERO NEGRO SCH40 DIAM= 2"	15.57	\$ 38,376.52	\$ 597,522.47			15.57	\$ 597,522.47				\$ -	\$ -
8.18.20	UND	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AGERO NEGRO SCH40 DIAM= 1 1/2"	403.09	\$ 400,965.30	\$ 12,458,022.45			403.09	\$ 12,458,022.45				\$ -	\$ -
8.18.30	UND	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AGERO NEGRO SCH40 DIAM= 1 1/4"	68.58	\$ 118,342.44	\$ 8,115,924.44			68.58	\$ 8,115,924.44				\$ -	\$ -
8.18.31	UND	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA AGERO NEGRO SCH40 DIAM= 1"	138.41	\$ 24,551.02	\$ 3,398,106.34			138.41	\$ 3,398,106.34				\$ -	\$ -
8.18.36	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC CS90 DIAM= 4"	39.00	\$ 448,722.82	\$ 17,422,190.03			39.00	\$ 17,422,190.03				\$ -	\$ -
8.18.47	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS AGERO RANURADOS DIAM= 4"	29.00	\$ 72,795.69	\$ 2,111,075.15			29.00	\$ 2,111,075.15				\$ -	\$ -
8.18.49	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS AGERO RANURADOS DIAM= 2 1/2"	8.00	\$ 35,246.49	\$ 289,971.54			8.00	\$ 289,971.54				\$ -	\$ -
8.18.50	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS AGERO RANURADOS DIAM= 2"	57.00	\$ 44,823.38	\$ 2,543,532.82			57.00	\$ 2,543,532.82				\$ -	\$ -
8.18.51	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS AGERO RANURADOS DIAM= 1 1/2"	287.00	\$ 27,086.30	\$ 7,725,246.24			287.00	\$ 7,725,246.24				\$ -	\$ -
8.18.52	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS AGERO ROSCADO DIAM= 1 1/4"	50.00	\$ 25,320.02	\$ 1,266,000.84			50.00	\$ 1,266,000.84				\$ -	\$ -
8.18.53	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS AGERO ROSCADO DIAM= 1"	246.00	\$ 24,235.37	\$ 5,961,501.44			246.00	\$ 5,961,501.44				\$ -	\$ -
8.18.59	UND	SUMINISTRO E INSTALACION RESTRICTORES BELL RESTRANER SERIES 300 CHO DIAM= 4"	88.00	\$ 283,954.76	\$ 24,989,019.16			88.00	\$ 24,989,019.16				\$ -	\$ -
8.18.63	UND	SUMINISTRO E INSTALACION RESTRICTORES TUF GRIP HEXAGONAL HO DIAM= 4"	27.00	\$ 326,108.10	\$ 8,804,918.69			27.00	\$ 8,804,918.69				\$ -	\$ -
8.18.68	UND	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA SENSORA DE FLUJO DIAM= 2"	1.00	\$ 332,417.46	\$ 332,417.46			1.00	\$ 332,417.46				\$ -	\$ -
8.18.69	UND	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA SENSORA DE FLUJO DIAM= 1 1/2"	4.00	\$ 196,726.73	\$ 786,946.91			4.00	\$ 786,946.91				\$ -	\$ -
8.18.74	UND	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE DIAM= 2"	1.00	\$ 193,040.07	\$ 193,040.07			1.00	\$ 193,040.07				\$ -	\$ -
8.18.75	UND	SUMINISTRO E INSTALACION CHEQUE DIAM= 1 1/2"	4.00	\$ 129,945.50	\$ 519,782.02			4.00	\$ 519,782.02				\$ -	\$ -
8.18.80	UND	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO MARIPOSA CON SUPERVISOR DIAM= 2"	1.00	\$ 402,878.55	\$ 402,878.55			1.00	\$ 402,878.55				\$ -	\$ -
8.18.81	UND	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA TIPO MARIPOSA CON SUPERVISOR DIAM= 1 1/2"	4.00	\$ 502,513.47	\$ 810,053.87			4.00	\$ 810,053.87				\$ -	\$ -
8.18.86	UND	SUMINISTRO E INSTALACION COUPLING 4"	117.00	\$ 19,789.65	\$ 2,312,932.36			117.00	\$ 2,312,932.36				\$ -	\$ -
8.18.88	UND	SUMINISTRO E INSTALACION COUPLING 2 1/2"	43.00	\$ 24,724.73	\$ 1,063,163.18			43.00	\$ 1,063,163.18				\$ -	\$ -
8.18.90	UND	SUMINISTRO E INSTALACION COUPLING 1 1/2"	854.00	\$ 17,797.02	\$ 11,639,250.22			854.00	\$ 11,639,250.22				\$ -	\$ -
8.18.94	UND	SUMINISTRO E INSTALACION STRAIP 1/2"	54.00	\$ 22,305.04	\$ 1,204,472.05			54.00	\$ 1,204,472.05				\$ -	\$ -
8.18.96	UND	SUMINISTRO E INSTALACION VALVULA EXPLUSORA DE AIRE 1"	3.00	\$ 288,512.82	\$ 865,538.46			3.00	\$ 865,538.46				\$ -	\$ -
8.18.99	UND	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE CORTE 1"	9.00	\$ 177,641.74	\$ 1,598,802.68			9.00	\$ 1,598,802.68				\$ -	\$ -
8.18.103	UND	SUMINISTRO E INSTALACION TOMA PARA BOMBERS DIAM= 2 1/2"	5.00	\$ 532,577.06	\$ 2,662,885.32			5.00	\$ 2,662,885.32				\$ -	\$ -
8.18.104	UND	SUMINISTRO E INSTALACION MANOMETRO DE GLICERINA 0-300 PSI	5.00	\$ 71,067.30	\$ 355,286.51			5.00	\$ 355,286.51				\$ -	\$ -
8.18.105	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ROCAMOR AUTOMATICO PENDIENT (K=5.0) SUM Y MONT	114.00	\$ 44,244.92	\$ 5,043,921.43			114.00	\$ 5,043,921.43				\$ -	\$ -

	UNIDAD	DESCRIPCION	CANTIDADES BALANCE No.1 MARZO 16/2024			CONDICIONES ACTUALIZADAS			BALANCE No. 02 MAYO 30/2024			JUSTIFICACION MAYORES Y MENORES CANTIDADES		
			CANTIDAD	VR. UNIFARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	MAYORES VALOR	CANTIDAD	MENORES VALOR			
8.18.105	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ROCIADOR AUTOMATICO UP-RIGHT (K=5.6) SUM Y MONT	2,00	\$ 39.864,19	\$ 79.728,38			2,00						
8.18.107	UND	SUMINISTRO E INSTALACION PUNTO HIDRAULICO ROCIADOR	116,00	\$ 34.919,87	\$ 4.050.682,12			116,00						
8.18.108	ML	SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA PARA TUBERIA	684,54	\$ 6.892,51	\$ 4.718.193,01			684,54						
8.18.109	UND	SUMINISTRO E INSTALACION EXTINTOR MULTIPROPOSITO ABC 10 LB	3,00	\$ 85.796,79	\$ 257.390,38			3,00						
8.18.110	UND	SUMINISTRO E INSTALACION EXTINTOR A BASE DE CO2 10 LB	6,00	\$ 286.762,45	\$ 1.720.574,72			6,00						
8.18.112	UND	CAJAS DE BATERIA CON ROCIADORES DE REPUESTO (CONTIENE 6 ROCIADORES DE RESPUESTA RAPIDA K=6 TEMP. 132°F 6 TIPO PENDIENT)	1,00	\$ 672.764,18	\$ 672.764,18			1,00						
8.18.117	UND	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA ULFUM 4"	12,00	\$ 19.547,66	\$ 234.571,90			12,00						
8.18.119	UND	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA ULFUM 2 1/2"	2,00	\$ 15.947,48	\$ 31.894,96			2,00						
8.18.120	UND	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA ULFUM 2"	4,00	\$ 15.100,50	\$ 60.401,99			4,00						
8.18.121	UND	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA ULFUM 1 1/2"	89,00	\$ 13.975,20	\$ 1.243.614,79			89,00						
8.18.122	UND	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA ULFUM 1 1/4"	16,00	\$ 212.872,62	\$ 3.405.962,32			16,00						
8.18.123	UND	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA ULFUM 1"	31,00	\$ 12.659,45	\$ 392.443,09			31,00						
8.18.124	UND	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE TIPO PERA ULFUM 1"	6,00	\$ 897.209,34	\$ 5.383.255,64			6,00						
8.18.125	UND	SUMINISTRO E INSTALACION SOPORTE SISMO RESISTENTE 4 VAS	8,00	\$ 149.535,89	\$ 1.196.488,72			8,00						
8.18.131	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS ULFUM DIAM= 4"	4,00	\$ 18.811,23	\$ 75.244,92			4,00						
8.18.137	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ABRAZADERAS ULFUM DIAM= 1"	1,00	\$ 5.663,28	\$ 5.663,28			1,00						
8.18.139	UND	SUMINISTRO E INSTALACION PASA 5"	1,00	\$ 384.704,17	\$ 384.704,17			1,00						
8.18.148	UND	SUMINISTRO E INSTALACION SIEMESA 4" X 2 1/2" CON CHEQUE INTEGRADO	1,00	\$ 76.589,00	\$ 76.589,00			1,00						
8.18.149	UND	SUMINISTRO SELLO CORTAFUENO DE 2 1/2"	6,00	\$ 945.065,11	\$ 5.670.390,66			6,00						
8.18.149	UND	SUMINISTRO E INSTALACION GABINETE CLASE II	1,00	\$ 3.360.340,46	\$ 3.360.340,46			1,00						
8.20.4	UND	SUMINISTRO E INSTALACION TRANSICION PVC CS90 A ACERO	6,00	\$ 699.265,37	\$ 4.193.791,33			6,00						
8.20.5	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A G SCH 40 DIAM= 1"	32,95	\$ 27.742,62	\$ 914.119,33			32,95						
8.20.6	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A G SCH 40 DIAM= 3/4"	33,24	\$ 20.324,75	\$ 675.594,80			33,24						
8.20.16	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A G SCH 40 DIAM= 1/2"	15,36	\$ 16.479,25	\$ 253.121,27			15,36						
8.20.17	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA A G SCH 40 DIAM= 1"	20,00	\$ 6.161,39	\$ 123.227,63			20,00						
8.20.18	ML	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS A G SCH 40 DIAM= 3/4"	18,00	\$ 5.053,15	\$ 90.959,78			18,00						
8.20.19	ML	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS A G SCH 40 DIAM= 1/2"	41,00	\$ 4.184,28	\$ 171.555,69			41,00						
8.20.35	UND	SUMINISTRO E INSTALACION REGISTRO DE BOLA DIAM= 1/2"	1,00	\$ 59.193,76	\$ 59.193,76			1,00						
8.20.45	UND	SUMINISTRO E INSTALACION MEDIDOR	1,00	\$ 1.090.659,61	\$ 1.090.659,61			1,00						
8.20.46	UND	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PE 80 AMARILLA DIAM= 1"	26,33	\$ 24.573,85	\$ 647.024,13			26,33						
8.20.47	UND	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PE 80 AMARILLA DIAM= 3/4"	4,75	\$ 17.642,00	\$ 83.799,52			4,75						
8.20.48	ML	SUMINISTRO E INSTALACION ELEVADOR DIAM= 3/4"	3,00	\$ 37.106,92	\$ 111.320,75			3,00						
8.20.49	ML	SUMINISTRO E INSTALACION ELEVADOR DIAM= 3/4"	2,00	\$ 25.183,70	\$ 50.367,41			2,00						
8.20.50	GL	SUMINISTRO E INSTALACION REGULADOR UNICA ETAPA	1,00	\$ 70.893,23	\$ 70.893,23			1,00						
8.21.3	UND	INSTALACION DE PUNTO ESTUFA - TIPO 1	1,00	\$ 18.690,27	\$ 18.690,27			1,00						
8.21.4	UND	INSTALACION DE PUNTO ESTUFA - TIPO 2	1,00	\$ 18.690,27	\$ 18.690,27			1,00						
8.21.6	UND	INSTALACION DE PUNTO HORNO - TIPO 1	2,00	\$ 15.442,48	\$ 30.884,96			2,00						
8.22.6	UND	LAVADO Y DESINFECCION DE TANQUE	2,00	\$ 281.767,80	\$ 563.535,60			2,00						
8.22.7	UND	DESINFECCION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE	1,00	\$ 510.234,21	\$ 510.234,21			1,00						
9		INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CCTV		\$ 288.481.880,46	\$ 288.481.880,46									
9.1.3	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P Diam= 3"	35,00	\$ 11.529,44	\$ 403.530,27			35,00						
9.1.4	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P Diam= 2"	11,00	\$ 10.587,34	\$ 116.460,79			11,00						
9.1.5	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P Diam= 1 1/2"	20,00	\$ 12.139,66	\$ 242.793,16			20,00						
9.1.6	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P Diam= 1"	125,00	\$ 8.927,98	\$ 1.115.996,94			125,00						
9.1.7	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P Diam= 3/4"	795,00	\$ 14.034,43	\$ 11.157.388,77			795,00						
9.1.11	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P Diam= 3"	3,00	\$ 5.871,67	\$ 17.615,00			3,00						
9.1.12	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P Diam= 2"	1,00	\$ 5.454,79	\$ 5.454,79			1,00						
9.1.13	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P Diam= 1 1/2"	2,00	\$ 6.090,70	\$ 12.181,40			2,00						
9.1.14	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P Diam= 1"	2,00	\$ 5.037,91	\$ 10.075,83			2,00						
9.1.15	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P Diam= 3/4"	2,00	\$ 5.002,58	\$ 10.005,17			2,00						
9.1.16	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P Diam= 1/2"	265,00	\$ 4.889,53	\$ 1.296.725,28			265,00						
9.2.3	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DIAM= 3" - PARA ACOMETIDAS - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	35,00	\$ 40.209,97	\$ 1.407.348,89			35,00						
9.2.4	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DIAM= 2"	11,00	\$ 24.638,66	\$ 271.025,31			11,00						
9.2.5	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DIAM= 1 1/2"	20,00	\$ 21.450,53	\$ 429.010,67			20,00						
9.2.6	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA EMT DIAM= 1"	125,00	\$ 18.996,99	\$ 2.374.624,33			125,00						
9.3.3	ML	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA IMC P Diam= 3"	40,00	\$ 40.209,97	\$ 1.608.398,73			40,00						
9.3.11	UND	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS IMC P Diam= 3"	3,00	\$ 55.506,14	\$ 166.518,41			3,00						
9.5.3	UND	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA EN MAMPUESTERIA SENCILLA INSPECCION 1.00 X 1.00 - REF CS	1,00	\$ 809.904,05	\$ 809.904,05			1,00						

DESCRIPCION		UNIDAD	CANTIDADES BALANCE No.1 MARZO 16/2024			CONDICIONES ACTUALIZADAS			BALANCE No. 02 MAYO 30/2024			JUSTIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	MAYORES		MENORES			
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
9.5.6	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA EN MAMPUESTA 300X300 CM. - PARA INSPECCION	UND	1,00	\$ 311.481,09	\$ 311.481,09	1,00					\$		\$
9.5.14	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA RAMELT 4X4	UND	268,00	\$ 18.316,79	\$ 4.908.889,64				268,00		\$		\$
9.5.15	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA RAMELT 4X2	UND	96,00	\$ 16.375,96	\$ 1.604.834,03				96,00		\$		\$
9.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO FPLR NO 14	ML	665,00	\$ 5.199,16	\$ 3.750.483,78				665,00		\$		\$
9.6.3	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO FPLR NO 12 - PARA SISTEMA DE DETECCION DE INCENDIOS	ML	2385,00	\$ 5.339,50	\$ 12.734.701,11				2385,00		\$		\$
9.6.8	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO 8 - PARA ALIMENTADOR	ML	130,00	\$ 8.477,32	\$ 1.102.061,27				130,00		\$		\$
9.6.9	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO 6 - PARA ALIMENTADOR	ML	230,00	\$ 9.965,39	\$ 2.292.039,96				230,00		\$		\$
9.6.10	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO 4 - PARA ALIMENTADOR	ML	130,00	\$ 14.133,08	\$ 1.837.300,94				130,00		\$		\$
9.6.11	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO 2 - PARA ALIMENTADOR	ML	60,00	\$ 21.179,27	\$ 1.270.756,06				60,00		\$		\$
9.6.12	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO 10 - PARA ALIMENTADOR	ML	30,00	\$ 31.174,02	\$ 935.220,69				30,00		\$		\$
9.6.13	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO 20 - PARA ALIMENTADOR	ML	160,00	\$ 34.660,84	\$ 5.545.734,34				160,00		\$		\$
9.6.14	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO 30 - PARA ALIMENTADOR	ML	240,00	\$ 40.407,61	\$ 9.697.827,51				240,00		\$		\$
9.6.16	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU AISLADO LSZH NO 250	ML	10,00	\$ 58.997,90	\$ 589.979,02				10,00		\$		\$
9.6.33	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CU DESNUDO NO 200 - CABLE DE PUESTA A TIERRA	ML	75,00	\$ 36.039,73	\$ 2.702.979,64				75,00		\$		\$
9.6.43	SUMINISTRO E INSTALACION ALAMBREON 8 MM - PARA SIPRA	ML	65,00	\$ 10.604,19	\$ 689.272,32				65,00		\$		\$
9.6.48	SUMINISTRO E INSTALACION FIBRA OPTICA OM4	ML	50,00	\$ 13.962,54	\$ 698.126,85				50,00		\$		\$
9.6.51	SUMINISTRO E INSTALACION CABLE CATEGORIA 6A FFTP DE 500 MHZ	ML	1050,00	\$ 6.003,34	\$ 6.303.511,37				1050,00		\$		\$
9.6.56	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 8	UND	22,00	\$ 4.885,32	\$ 107.477,05				22,00		\$		\$
9.6.57	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 6	UND	18,00	\$ 6.314,52	\$ 113.661,36				18,00		\$		\$
9.6.58	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 4	UND	4,00	\$ 6.070,43	\$ 24.281,73				4,00		\$		\$
9.6.59	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 2	UND	12,00	\$ 7.157,06	\$ 85.884,60				12,00		\$		\$
9.6.60	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 10	UND	8,00	\$ 8.281,14	\$ 66.249,11				8,00		\$		\$
9.6.61	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 20	UND	12,00	\$ 8.368,93	\$ 100.427,16				12,00		\$		\$
9.6.62	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 30	UND	24,00	\$ 8.675,11	\$ 208.202,63				24,00		\$		\$
9.6.64	SUMINISTRO E INSTALACION TERMINAL TIPO PALA NO 250	UND	2,00	\$ 19.933,12	\$ 39.866,25				2,00		\$		\$
9.6.76	SUMINISTRO E INSTALACION VARILLA COOPER WELL 2.4 MTS	UND	8,00	\$ 171.860,54	\$ 1.374.884,36				8,00		\$		\$
9.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICOTRIFASICO 12 CTOS CON ESPACIO DE TOTALIZADOR - INCLUYE CHAPA Y PUERTA	UND	4,00	\$ 592.145,30	\$ 2.368.581,19				4,00		\$		\$
9.7.11	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICOTRIFASICO TGA DE 2000MM X 80 MM DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS. INCLUYE DPS	UND	1,00	\$ 18.739.778,44	\$ 18.739.778,44				1,00		\$		\$
9.7.12	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICOTRIFASICO TGN DE 2000MM X 80 MM DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS	UND	1,00	\$ 14.200.386,54	\$ 14.200.386,54				1,00		\$		\$
9.7.14	SUMINISTRO E INSTALACION TABLERO ELECTRICOTRIFASICO TGE DE 2000MM X 80 MM DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR Y CUADRO DE CARGAS.	UND	1,00	\$ 16.469.433,73	\$ 16.469.433,73				1,00		\$		\$
9.8.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X30A	UND	48,00	\$ 32.433,77	\$ 1.556.821,14				48,00		\$		\$
9.8.16	SUMINISTRO E INSTALACION INTERRUPTOR 3X20A - CON ICC 10KA	UND	7,00	\$ 32.433,77	\$ 227.038,42				7,00		\$		\$
9.8.28	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR 3X90A	UND	2,00	\$ 51.351,30	\$ 102.702,61				2,00		\$		\$
9.8.30	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR 3X70A	UND	4,00	\$ 240.343,83	\$ 961.375,30				4,00		\$		\$
9.8.33	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR 3X150A	UND	2,00	\$ 483.654,46	\$ 967.308,91				2,00		\$		\$
9.8.34	SUMINISTRO E INSTALACION TOTALIZADOR 3X175A - CON ICC 15KA	UND	1,00	\$ 483.654,46	\$ 483.654,46				1,00		\$		\$
9.9.1	SUMINISTRO E INSTALACION PARA SALIDA EN TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA DE INCRUSTAR - TIPO NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA (COLOR BLANCO)	UND	58,00	\$ 19.440,58	\$ 1.127.553,83				58,00		\$		\$
9.9.2	SUMINISTRO E INSTALACION PARA SALIDA EN TOMA CORRIENTE DOBLE D INCRUSTAR MONOFASICA - TIPO NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA TIPO GFCL (COLOR BLANCO)	UND	6,00	\$ 70.890,66	\$ 425.343,97				6,00		\$		\$
9.9.3	SUMINISTRO E INSTALACION PARA SALIDA EN TOMA CORRIENTE DOBLE D INCRUSTAR HOSPITALARIO - TIPO NEMA 5-15R CON POLO A TIERRA TIPO REGULADA (COLOR NARANJA TIPO HOSPITALARIO)	UND	35,00	\$ 26.240,35	\$ 918.727,11				35,00		\$		\$
9.9.5	SUMINISTRO E INSTALACION PARA SALIDA DE TOMA TRIFASICA TOMA DE EMPOTRAR 3F+T 32A US0 INDUSTRIAL	UND	1,00	\$ 57.562,18	\$ 57.562,18				1,00		\$		\$
9.9.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA SENSOR DE MOVIMIENTO DE DOBLE TECNOLOGIA CON ALANCE DE 16 METROS DE RADIO - INCLUYE SENSOR	UND	18,00	\$ 110.382,98	\$ 1.986.886,53				18,00		\$		\$
9.9.11	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR DOBLE DE INCRUSTAR CON POLO A TIERRA COLOR BLANCO Y TESTIGO LED	UND	15,00	\$ 29.034,94	\$ 435.524,14				15,00		\$		\$
9.9.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SALIDA PARA INTERRUPTOR SECILLO DE INCRUSTAR CON POLO A TIERRA COLOR BLANCO Y TESTIGO LED	UND	25,00	\$ 27.011,59	\$ 675.289,71				25,00		\$		\$
9.10.1	SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 1	UND	65,00	\$ 22.762,49	\$ 1.479.561,88				65,00		\$		\$
9.10.2	SALIDA PARA LUMINARIA INTERIOR TIPO 2	UND	45,00	\$ 24.381,04	\$ 1.097.146,60				45,00		\$		\$
9.10.12	SALIDA PARA LUMINARIA EXTERIOR TIPO 1	UND	18,00	\$ 21.953,22	\$ 395.158,01				18,00		\$		\$
9.11.6	SUMINISTRO E INSTALACION JACK CAT. 6A INCLUYE PONCHAHO	UND	80,00	\$ 34.804,45	\$ 2.784.356,21				80,00		\$		\$
9.11.9	SUMINISTRO E INSTALACION FACE PLATE SECILLO CATEGORIA 6A PARA JACK APANTALLADO	UND	40,00	\$ 20.939,02	\$ 837.580,74				40,00		\$		\$
9.11.15	SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH CORE DE 2 MTS - CATEGORIA 6A LSZH	UND	70,00	\$ 37.625,86	\$ 2.633.809,35				70,00		\$		\$
9.11.16	SUMINISTRO E INSTALACION SWITCH 12 PUERTOS DE 10 GB DE FIBRA OPTICA	UND	1,00	\$ 8.503.750,44	\$ 8.503.750,44				1,00		\$		\$

7.

ID	DESCRIPCION	CANTIDADES BALANCE No.1 MARZO 14/2024			CONDICIONES ACTUALIZADAS			BALANCE No. 02 MAYO 10/2024			JUSTIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
		UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	MENORES VALOR
22	VIDRIOS, ESPEJOS Y DIVISIONES				\$ 64,556,403.27		\$ 64,556,403.27		\$ 64,556,403.27		\$ -	\$ -
22.1	ESPEJO CANTO PULIDO - 1.20 X 0.70 m	UND	20.00	\$ 81,220.86	\$ 1,744,417.30	20.00	\$ 1,744,417.30	20.00	\$ 1,744,417.30		\$ -	\$ -
22.1.1	ESPEJO CANTO PULIDO - PMR - INCLINACION 10° 0.70 X 0.90 m	UND	2.00	\$ 70,667.85	\$ 141,335.70	2.00	\$ 141,335.70	2.00	\$ 141,335.70		\$ -	\$ -
22.1.2	DIVISION EN VIDRIO + PUERTA - OPV-01 - 3.95 X 3.0m	UND	1.00	\$ 5,328,181.10	\$ 5,328,181.10	1.00	\$ 5,328,181.10	1.00	\$ 5,328,181.10		\$ -	\$ -
22.1.3	DIVISION EN VIDRIO + PUERTA - OPV-01 - 3.81 X 3.0m	UND	1.00	\$ 5,139,334.18	\$ 5,139,334.18	1.00	\$ 5,139,334.18	1.00	\$ 5,139,334.18		\$ -	\$ -
22.1.4	DIVISION DUCHA - Corredor en vidrio y aluminio	UND	1.00	\$ 1,792,547.00	\$ 1,792,547.00	1.00	\$ 1,792,547.00	1.00	\$ 1,792,547.00		\$ -	\$ -
22.1.5	DIVISION DUCHA - TIPO 1 - EN ACERO INOXIDABLE 0+1.95 X 0.90 m	UND	6.00	\$ 1,330,214.62	\$ 7,981,287.72	6.00	\$ 7,981,287.72	6.00	\$ 7,981,287.72		\$ -	\$ -
22.1.6	DIVISION DUCHA - TIPO 2 - EN ACERO INOXIDABLE 0+1.95 X 1.07 m	UND	2.00	\$ 1,591,477.38	\$ 3,182,954.76	2.00	\$ 3,182,954.76	2.00	\$ 3,182,954.76		\$ -	\$ -
22.1.7	DIVISION DUCHA - TIPO 3 - EN ACERO INOXIDABLE 0+1.95 X 1.03 m	UND	2.00	\$ 1,592,356.73	\$ 3,044,713.46	2.00	\$ 3,044,713.46	2.00	\$ 3,044,713.46		\$ -	\$ -
22.1.8	DIVISION LATERAL EN ACERO INOXIDABLE - SOCODA SLIM-H=1.55m	UND	48.80	\$ 780,376.73	\$ 38,521,631.05	48.80	\$ 38,521,631.05	48.80	\$ 38,521,631.05		\$ -	\$ -
23	CERRADURAS, HERRAJES Y ACCESORIOS				\$ 19,354,317.41		\$ 19,354,317.41		\$ 19,354,317.41		\$ -	\$ -
23.1	CERRADURAS DE SOBREPONER TIPO TAMBOR	UND	1.00	\$ 132,175.42	\$ 132,175.42	1.00	\$ 132,175.42	1.00	\$ 132,175.42		\$ -	\$ -
23.1.1	CERRADURAS DE EMBUTIR - AJUJALUAR SG 3 BULLONES ANITLADRO	UND	1.00	\$ 163,884.36	\$ 163,884.36	1.00	\$ 163,884.36	1.00	\$ 163,884.36		\$ -	\$ -
23.1.2	MANILA INSTITUCIONAL TIPO DAME - GRADO 2	UND	46.00	\$ 226,991.78	\$ 10,441,621.98	46.00	\$ 10,441,621.98	46.00	\$ 10,441,621.98		\$ -	\$ -
23.1.3	MANILA INSTITUCIONAL TIPO ORION - PARA BARRA ANITPANICO	UND	8.00	\$ 209,791.08	\$ 1,678,328.61	8.00	\$ 1,678,328.61	8.00	\$ 1,678,328.61		\$ -	\$ -
23.1.4	CIERRAPUERTAS DE BRAZO AJUSTABLES	UND	1.00	\$ 144,774.85	\$ 144,774.85	1.00	\$ 144,774.85	1.00	\$ 144,774.85		\$ -	\$ -
23.1.5	BARRAS ANITPANICO TAMPA + MANILA VERSALES	UND	2.00	\$ 754,331.63	\$ 1,508,663.65	2.00	\$ 1,508,663.65	2.00	\$ 1,508,663.65		\$ -	\$ -
23.1.6	BARRAS ANITPANICO TIPO ORLANDO 2 PUNTOS-ACCION MECANICA	UND	8.00	\$ 608,498.96	\$ 4,867,991.71	8.00	\$ 4,867,991.71	8.00	\$ 4,867,991.71		\$ -	\$ -
23.1.7	JALADERA EN ACERO INOXIDABLE - L=0.5M	UND	2.00	\$ 158,438.42	\$ 316,876.84	2.00	\$ 316,876.84	2.00	\$ 316,876.84		\$ -	\$ -
24	PINTURA				\$ 131,528,887.61		\$ 131,528,887.61		\$ 131,528,887.61		\$ -	\$ -
24.1	ESTUCO Y VINILO BLANCO SOBRE PAÑETE (3 MANOS) X M2	M2	1680.00	\$ 22,570.12	\$ 37,917,804.76	1680.00	\$ 37,917,804.76	1680.00	\$ 37,917,804.76		\$ -	\$ -
24.1.1	ESTUCO Y VINILO BLANCO SOBRE PAÑETE (3 MANOS) X M2	M2	297.55	\$ 15,799.08	\$ 4,701,016.97	297.55	\$ 4,701,016.97	297.55	\$ 4,701,016.97		\$ -	\$ -
24.1.2	VINILO BLANCO SOBRE CIELO RASO (2 MANOS) X M2	M2	840.00	\$ 13,237.25	\$ 11,119,290.03	840.00	\$ 11,119,290.03	840.00	\$ 11,119,290.03		\$ -	\$ -
24.1.3	VINILO BLANCO SOBRE CIELO RASO (2 MANOS) X M2	M2	32.81	\$ 9,268.08	\$ 304,019.95	32.81	\$ 304,019.95	32.81	\$ 304,019.95		\$ -	\$ -
24.1.4	VINILO BLANCO SOBRE MURO + PVA (2 MANOS) X M2	M2	73.00	\$ 60,773.34	\$ 4,436,453.65	73.00	\$ 4,436,453.65	73.00	\$ 4,436,453.65		\$ -	\$ -
24.1.5	PINTURA PLASTICA COLOR BLANCO PARA BAÑOS (2 MANOS) X M2	M2	240.00	\$ 28,160.59	\$ 6,758,542.24	240.00	\$ 6,758,542.24	240.00	\$ 6,758,542.24		\$ -	\$ -
24.1.6	PINTURA PLASTICA COLOR BLANCO PARA BAÑOS (2 MANOS) X M2	M2	15.78	\$ 18,312.41	\$ 288,969.86	15.78	\$ 288,969.86	15.78	\$ 288,969.86		\$ -	\$ -
24.1.7	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO DE PROTECCION SOBRE MUROS X M2 - KORAZA	M2	1269.3989717	\$ 52,130.53	\$ 66,174,438.08	1269.3989717	\$ 66,174,438.08	1269.3989717	\$ 66,174,438.08		\$ -	\$ -
24.1.8	PINTURA ACRILICA COLOR BLANCO DE PROTECCION SOBRE MUROS X M2	M2	8.45	\$ 36,491.37	\$ 308,352.06	8.45	\$ 308,352.06	8.45	\$ 308,352.06		\$ -	\$ -
25	EQUIPOS				\$ 119,870,872.62		\$ 119,870,872.62		\$ 119,870,872.62		\$ 10,728,275.98	\$ -
25.1	EQUIPO PRESION DE 2 BOMBAS DE 7.5HP E HIDROACUMULADOR DE 200 LT	UND	0.00	\$ 29,260,248.62	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -	\$ -
25.1.1	EQUIPO RED CONTRA INCENDIO 100 GPM - 10HP - JOCKEY 1.5HP 240PM	UND	1.00	\$ 60,822,493.36	\$ 60,822,493.36	1.00	\$ 60,822,493.36	1.00	\$ 60,822,493.36		\$ -	\$ -
25.1.2	EQUIPO ELEVADOR DE 1.0HP	UND	1.00	\$ 8,744,410.20	\$ 8,744,410.20	1.00	\$ 8,744,410.20	1.00	\$ 8,744,410.20		\$ -	\$ -
25.1.3	PLANTA ELECTRICA DE 45 KVA + TRANSFERENCIA	UND	1.00	\$ 8,094,979.93	\$ 8,094,979.93	1.00	\$ 8,094,979.93	1.00	\$ 8,094,979.93		\$ -	\$ -
25.1.4	INSTALACION DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA TIPO SECO CLASE H, TRF-BB-04, INCLUYE CAJA METALICA DE PROTECCION Y ACCESORIOS	UND	1.00	\$ 6,947,429.06	\$ 6,947,429.06	1.00	\$ 6,947,429.06	1.00	\$ 6,947,429.06		\$ -	\$ -
25.1.5	SUMINISTRO DE TRANSFORMADOR DE 45 KVA TIPO SECO CLASE H, TRF-BB-04, INCLUYE CAJA METALICA DE PROTECCION Y ACCESORIOS	UND	1.00	\$ 32,630,284.01	\$ 32,630,284.01	1.00	\$ 32,630,284.01	1.00	\$ 32,630,284.01		\$ -	\$ -
25.1.6	UPS DE 10KVA CON MODULOS EXPANDIBLES DE 10KVA, AUTOREDUNTANTE, AUTONOMIA DE 5 MINUTOS A PLENA CARGA - PARA INSTALACION EN EL DATACENTER	UND	1.00	\$ 2,631,296.06	\$ 2,631,296.06	1.00	\$ 2,631,296.06	1.00	\$ 2,631,296.06		\$ -	\$ -
25.1.7	ASCENSOR HIDRAULICO PARA PASAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA 300 KG 2 PARADAS SECCION 1.20 MT (ANCHO) X 1.30 MT (FONDO) X 2.1 MT (ALTO)	UND	0.00	\$ 77,427,745.11	\$ -	0.00	\$ -	0.00	\$ -		\$ -	\$ -
29	OBRAS EXTERIORES				\$ 182,708,282.41		\$ 182,708,282.41		\$ 182,708,282.41		\$ -	\$ -
29.1	PLACA CONTRAPISO CONCRETO E+15 CM - ACABADO CONCRETO ESCOBADO	M2	185.00	\$ 134,763.36	\$ 24,931,221.22	185.00	\$ 24,931,221.22	185.00	\$ 24,931,221.22		\$ -	\$ -
29.1.1	PLACA CONTRAPISO CONCRETO - ACABADO CONCRETO ESCOBADO - SENDERO A GARTITAS - E+12 CM	M2	65.08	\$ 116,928.24	\$ 7,609,689.66	65.08	\$ 7,609,689.66	65.08	\$ 7,609,689.66		\$ -	\$ -
29.1.2	GRADERIA EN CONCRETO - PATIO INTERIOR - ACABADO ESCOBADO	M2	7.00	\$ 828,979.50	\$ 5,802,859.51	7.00	\$ 5,802,859.51	7.00	\$ 5,802,859.51		\$ -	\$ -
29.1.3	PISO EN ADOQUIN DE ARCILLA - SANTA FE ESPAÑOL TERRACOTA	M2	55.00	\$ 30,533.65	\$ 1,709,884.39	55.00	\$ 1,709,884.39	55.00	\$ 1,709,884.39		\$ -	\$ -
29.1.4	ESCALERA EN CONCRETO - PATIO INTERIOR - ACABADO ESCOBADO	M2	28.92	\$ 144,979.26	\$ 4,189,908.29	28.92	\$ 4,189,908.29	28.92	\$ 4,189,908.29		\$ -	\$ -
29.1.5	ESCALERA EN CONCRETO - ZONA EXTERIOR SOTANO - ACABADO ESCOBADO	M2	28.92	\$ 127,755.04	\$ 3,694,037.35	28.92	\$ 3,694,037.35	28.92	\$ 3,694,037.35		\$ -	\$ -
29.1.6	CINTA DE CONFINAMIENTO 10cm	M2	92.20	\$ 41,334.44	\$ 3,811,035.01	92.20	\$ 3,811,035.01	92.20	\$ 3,811,035.01		\$ -	\$ -
29.1.7	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A-105	UND	4.00	\$ 98,361.22	\$ 393,444.88	4.00	\$ 393,444.88	4.00	\$ 393,444.88		\$ -	\$ -
29.1.8	BORDILLO PREFABRICADO EN CONCRETO A-100	UND	4.00	\$ 79,539.79	\$ 318,159.16	4.00	\$ 318,159.16	4.00	\$ 318,159.16		\$ -	\$ -
29.1.9	GARDINEL PREFABRICADO A-45 80 X 20	M2	11.15	\$ 66,248.76	\$ 738,673.89	11.15	\$ 738,673.89	11.15	\$ 738,673.89		\$ -	\$ -
29.1.10	BANCAS EN CONCRETO Y MAMPONERIA - SEGUN DETALLE ARQUITECTONICO	M2	29.91	\$ 287,457.97	\$ 8,609,687.87	29.91	\$ 8,609,687.87	29.91	\$ 8,609,687.87		\$ -	\$ -
29.1.11	JARDINERAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO - INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS DE NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION Y FUNCIONAMIENTO.	M2	17.00	\$ 44,648.00	\$ 759,016.00	17.00	\$ 759,016.00	17.00	\$ 759,016.00		\$ -	\$ -
29.1.12	JARDIN ORNAMENTAL SEGUN DETALLE DE PAISAJISMO A-009	M2	108.97	\$ 826,467.91	\$ 90,060,208.41	108.97	\$ 90,060,208.41	108.97	\$ 90,060,208.41		\$ -	\$ -
29.1.13	MURO DE CERRAMIENTO A LA VISTA EN CONCRETO E=30CM H= 2.5 MTS - INCLUYE ZAPATAS Y VIGAS DE CIMENTACION	M2	1182.00	\$ 9,518.42	\$ 11,250,768.80	1182.00	\$ 11,250,768.80	1182.00	\$ 11,250,768.80		\$ -	\$ -
30	ASEO				\$ 18,430,561.36		\$ 18,430,561.36		\$ 18,430,561.36		\$ -	\$ -
30.1	ASEO FINO DE OBRA	M2	1182.00	\$ 9,518.42	\$ 11,250,768.80	1182.00	\$ 11,250,768.80	1182.00	\$ 11,250,768.80		\$ -	\$ -
30.2	LIMPIEZA DE VIDRIOS	M2	125.00	\$ 15,261.04	\$ 1,907,638.00	125.00	\$ 1,907,638.00	125.00	\$ 1,907,638.00		\$ -	\$ -
30.3					\$ 2,032,629.39		\$ 2,032,629.39		\$ 2,032,629.39		\$ -	\$ -

Se reñra por estar incluido en la Dotación

Se reñra por estar incluido en la Dotación

—

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES BALANCE No.1 MARZO 14/2024			CONDICIONES ACTUALIZADAS			BALANCE No. 02 MAYO 30/2024				JUSTIFICACIÓN MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL		MAYORES		MENORES		VALOR	
								CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
UPSDE 10KVA CON MODULOS EXPANDIBLES DE 10 KVA, AUTOREDUCTANTE, AUTONOMIA DE 5 MINUTOS A PLENA CARGA. - PARA INSTALACION EN EL DATA CENTER	UND	1,00	\$ 34.215.493,34	\$ 34.215.493,34	1,00	\$ 34.215.493,34			\$ -		\$ -		
ASCENSOR HIDRAULICO PARA PASAJEROS CON MOVILIDAD REDUCIDA 300 KG 2 PARADAS SECCION 1.20 MT (PISO) X 1.30 MT (FONDO) X 2.1 MT (ALTO)	UND	0,00	\$ 114.173.234,14	\$ -		\$ -			\$ -		\$ -		
SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT INVERTER INDEPENDIENTES MSP 12.000 BTUH (incluye: Unidad interior y exterior)	UND	2,00	\$ 5.286.893,16	\$ 10.573.786,31	2,00	\$ 10.573.786,31			\$ -		\$ -		
SUMINISTRO E INSTALACION DE MINISPLIT INVERTER INDEPENDIENTES CSI 36.000 BTUH (incluye: Unidad interior y exterior)	UND	1,00	\$ 13.518.120,81	\$ 13.518.120,81	1,00	\$ 13.518.120,81			\$ -		\$ -		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO EN LINEA DE 700 CFM. VS-01. INCLUYE FILTRO HEAVY B	UND	1,00	\$ 8.935.101,79	\$ 8.935.101,79	1,00	\$ 8.935.101,79			\$ -		\$ -		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR CENTRIFUGO EN LINEA DE 1.700 CFM. VE-01	UND	1,00	\$ 9.163.091,72	\$ 9.163.091,72	1,00	\$ 9.163.091,72			\$ -		\$ -		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA SILENT DE 300 CFM. VE-02/05	UND	2,00	\$ 3.100.178,40	\$ 6.200.356,80	2,00	\$ 6.200.356,80			\$ -		\$ -		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA SILENT DE 400 CFM. VE-04/06	UND	2,00	\$ 3.210.216,76	\$ 6.420.433,52	2,00	\$ 6.420.433,52			\$ -		\$ -		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR HELICOCENTRIFUGO EN LINEA SILENT DE 500 CFM. VE-03	UND	1,00	\$ 3.210.216,76	\$ 3.210.216,76	1,00	\$ 3.210.216,76			\$ -		\$ -		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR AXIAL DE 400 CFM. VAX-04	UND	1,00	\$ 1.902.165,99	\$ 1.902.165,99	1,00	\$ 1.902.165,99			\$ -		\$ -		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR INDIVIDUAL CENTRIFUGO DE 100 CFM. VAX-01	UND	3,00	\$ 1.375.881,22	\$ 4.127.643,66	3,00	\$ 4.127.643,66			\$ -		\$ -		
SUMINISTRO E INSTALACION DE VENTILADOR INDIVIDUAL CENTRIFUGO DE 200 CFM. VAX-02	UND	1,00	\$ 2.303.070,12	\$ 2.303.070,12	1,00	\$ 2.303.070,12			\$ -		\$ -		
SUB TOTAL OSEQUIOS Y DOTACION IVA 1%				\$ 233.958.165,52		\$ 233.958.165,52			\$ -		\$ -		
TOTAL DE EQUIPOS Y DOTACION				\$ 44.452.091,45		\$ 44.452.091,45			\$ -		\$ -		
COSTO TOTAL CONTRATO				\$ 6.262.146.633,55		\$ 6.262.146.633,55			\$ 144.412.744,87		\$ 144.412.744,87		

CARLOS ALBERTO MAHECHA - CONSTRUCCIONES SAS


Ing. LEONEL RAUL POVEDA Jr. - Director Obra Construcciones SAS

OSCAR GREGORIO GORDILLO - GORDILLO & ASOCIADOS SAS

Ing. LUCRECIA LOPEZ - DIRECTORA INTERVENTORIA Gordillo & Asociados SAS

V.O. Bo. Tito MARIO ANDRES GRIJALES ROJAS - Supervisor Interventoria


Ing. GRACIA PATRICIA SALAZAR SANCHEZ - DIRECTORA DE LOGISTICA Y FINANCIERA

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS						
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE				
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23				
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S				
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S				
CAPITULO		2. CIMENTACION				
N°	ITEM	DESCRIPCION		UND		
	1.7.1	CERRAMIENTO EN POLISOMBRA		ML		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3				
 		FECHA ACTA		DIA	MES	AÑO
				24	6	2024
		UBICACIÓN		OBRA		
		ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	SUMA
		CIERRE DE OBRA	221,2			221,2
OBSERVACIONES: En el hostigamiento realizado el 4 de abril de 2024 dentro de las consecuencias tenemos la destruccion del cerramiento original pagado en el acta 01. por seguridad de la obra para restringir el ingreso de personal no autorizado, fue necesario la construccion nuevamente del cerramiento.		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE		221,20		
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		221,20,		
		 CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS				




LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ

 DIRECTOR DE OBRA



GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S


 DIRECTOR DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS										
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE								
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23								
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S								
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S								
CAPITULO		2 CIMENTACION								
N°	ITEM	DESCRIPCION		UND						
	2.1.6	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN - PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION		M3						
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3								
 		FECHA ACTA		<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>24</td> <td>6</td> <td>2024</td> </tr> </table>	DIA	MES	AÑO	24	6	2024
		DIA	MES	AÑO						
		24	6	2024						
		UBICACIÓN		OBRA						
		ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	SUMA				
		GARITA 2	2,5	2,5	1,3	8,125				
		APIQUE GARITA	0,5	0,50	2,50	0,625				
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE			8,75					
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			8,75					
		 CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS								


 LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRA


 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS						
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE				
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23				
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S				
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S				
CAPITULO		2 CIMENTACION				
N°	ITEM	DESCRIPCION		UND		
	2.3.11	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI		M3		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3				
		FECHA ACTA		DIA	MES	AÑO
				24	6	2024
		UBICACIÓN		OBRA		
		ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	SUMA
		ZAPATA 1	2,90	2,90	0,043	1,085
		ZAPATA 2	1,40	1,40	0,043	0,084
		ZAPATA 3	2,00	3,00	0,043	0,258
		ZAPATA 4	1,80	3,50	0,043	1,084
		ZAPATA 5	1,40	2,90	0,043	0,349
		ZAPATA 6	1,10	1,40	0,043	0,132
		ZAPATA 7	2,20	3,70	0,043	0,350
		ZAPATA 8	2,30	3,80	0,043	0,376
		ZAPATA 9	11,86	4,00	0,043	2,040
		ZAPATA 10	11,86	3,50	0,043	1,785
		ZAPATA 11	11,66	3,30	0,043	1,655
ZAPATA 12	11,58	2,90	0,043	1,444		
ZAPATA 13	11,53	3,20	0,043	1,587		
GARITA	2,50	2,50	0,043	0,269		
OBSERVACIONES: La cantidad cobrada corresponde a los solados de elementos		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE			12,50	
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			12,50	
		 CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS				


LEONEL RAÚL POVEDA HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE OBRA


GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS					
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23			
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S			
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			
CAPITULO		2. CIMENTACION			
N°	ITEM	DESCRIPCION		UND	
	2.3.51	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI		M3	
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3			
		FECHA ACTA			
		DIA		24	
		MES		6	
		AÑO		2024	
		UBICACIÓN			
		OBRA			
		ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO
		VC-1000	1,75	0,25	0,04
		VC-1001	2,30	0,25	0,04
		VC-1002	2,30	0,25	0,04
VC-1003	1,75	0,25	0,04		
VC-1004	2,80	0,25	0,04		
VC-1005	2,80	0,25	0,04		
VC-1006	5,90	0,5	0,04		
VC-1007	3,83	0,5	0,04		
VC-1008	5,25	0,5	0,04		
VC-1009	8,46	0,5	0,04		
VC-2000	10,6	0,5	0,04		
VC-2001	10,60	0,5	0,04		
OBSERVACIONES: La cantidad cobrada corresponde a los solados de elementos		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE		1,03	
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1,03	
					
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS			

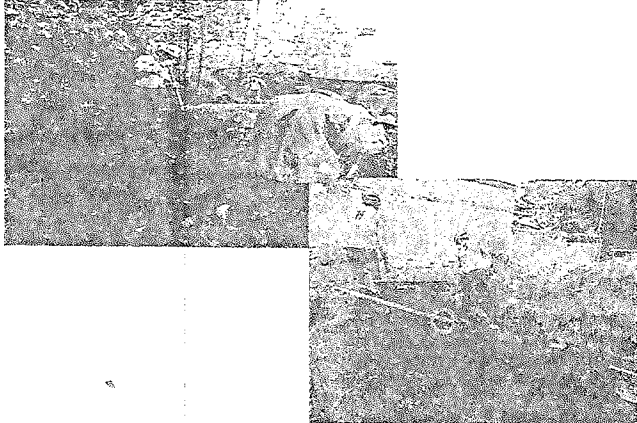

 LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRA


 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS						
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE				
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23				
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S				
CAPITULO		2. CIMENTACION				
Nº	ITEM	DESCRIPCION		UND		
	2.5.11	MUROS DE CONTENCIÓN EN CONCRETO FUNDIDO DE 3000 PSI		M3		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N.º 3				
		FECHA ACTA		DIA	MES	AÑO
				24	6	2024
		UBICACIÓN		OBRA		
		ELEMENTO	LONGITUD	ANCHO	ALTO	SUMA
		MC-1	12,58	0,8	0,04	0,40256
		MC-3	10,93	0,8	0,04	0,34376
		MC-2	2,5	0,8	0,04	0,08
OBSERVACIONES: La cantidad cobrada corresponde a los solados de elementos		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE			0,83	
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			0,83	
		 CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS				

LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS								
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE						
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23						
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S						
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S						
CAPITULO		3. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS						
Nº	ITEM	DESCRIPCION				UND		
3	3.3.1	RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION				M3		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA Nº.3						
		FECHA ACTA			DIA	MES	AÑO	
					24	6	2024	
		UBICACIÓN		OBRA				
		ELEMENTO	LOCALIZACION	CANTIDAD	LARGO	ALTO	ANCHO	SUMA
		EXCAVACION CIMENTACION ITEM 2.1.6		1023,75				1023,75
		EXCAVACION PARA DESAGUES ITEM 3.1.1		49,42				49,42
		RELLENOS EXCAVACIONES ITEMS 3.2.6		-199,83				-199,83
		CANTIDAD TOTAL						873,34
		PORCENTAJE RESTANTE		52%				454,14
		CANTIDAD ACTA 1						-60,78
OBSERVACIONES: Para optimizar los recursos del proyecto y de acuerdo a lo realizado en obra, el retiro de material de excavacion es de 873,34 solo se paga el 52% ya que no se utilizo maquinaria y se relleno el lote vecino el cual autorizo su disposicion, por lo cual la cantidad es de 332,58		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE					393,36	
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA					332,58	
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS						

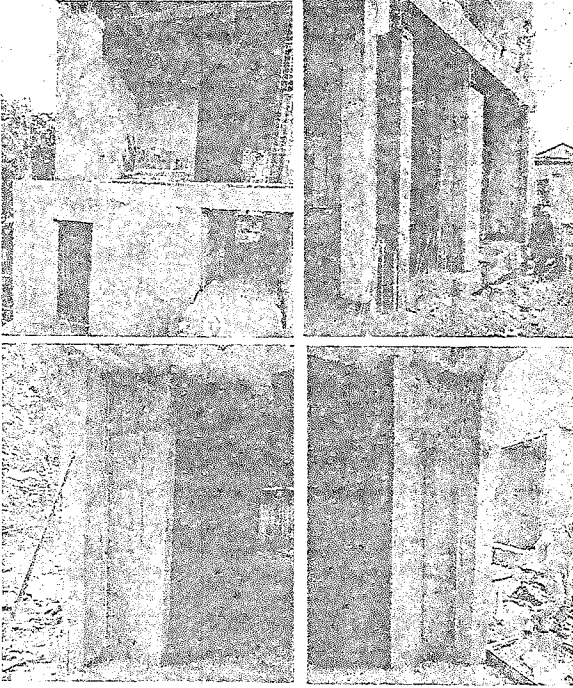

 LEONEL RAÚL OVIEDO HERNÁNDEZ
 DIRECTOR DE OBRA


 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBURO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE																																																																																																																																													
CONTRATO No: 4.2.21		PN DIRAF No.06-6-10295-23																																																																																																																																													
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S																																																																																																																																													
INTERVENIOR:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S																																																																																																																																													
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA																																																																																																																																													
ITEM		DESCRIPCION																																																																																																																																													
Nº	4	MURO NO ESTRUCTURAL A LA VISTA EN CONCRETO DE 4000 PSI E=20CM																																																																																																																																													
FOTOGRAFIA - PLANOS																																																																																																																																															
		<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA ACTA</th> <th colspan="2">ACTA N° 3</th> </tr> <tr> <th colspan="2">UBICACIÓN</th> <th colspan="2">OBRA</th> </tr> <tr> <th>ELEMENTO</th> <th>LOCALIZACIÓN</th> <th>LARGO</th> <th>CANTIDAD</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>MUROS B-1 N-2.5</td> <td>EJE A ENTRE 1 Y 2</td> <td>2.85</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE A ENTRE 2 Y 3</td> <td>3.72</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE A ENTRE 3 Y 4</td> <td>3.67</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE A ENTRE 4 Y 5</td> <td>1.47</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>MUROS B-1 N-0.05</td> <td>EJE C ENTRE 1 Y 2</td> <td>2.85</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE C ENTRE 2 Y 3</td> <td>3.72</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE C ENTRE 3 Y 4</td> <td>3.67</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE C ENTRE 4 Y 5</td> <td>1.47</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>MUROS B-1 N-4.00</td> <td>EJE A ENTRE 1 Y 2</td> <td>2.85</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE A ENTRE 2 Y 3</td> <td>3.72</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE A ENTRE 3 Y 4</td> <td>3.67</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE A ENTRE 4 Y 5</td> <td>1.47</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>MUROS B-2 N-6.25</td> <td>EJE A ENTRE 7 Y 8</td> <td>4.2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE A ENTRE 8 Y 9</td> <td>4.05</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE A ENTRE 9 Y 10</td> <td>3.7</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE C ENTRE 7 Y 8</td> <td>4.35</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE C ENTRE 8 Y 9</td> <td>6.35</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE C ENTRE 9 Y 10</td> <td>3.55</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MUROS B-2 N-2.85</td> <td>EJE A ENTRE 7 Y 8</td> <td>4.2</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE A ENTRE 8 Y 9</td> <td>4.05</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE A ENTRE 9 Y 10</td> <td>3.7</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE C ENTRE 7 Y 8</td> <td>4.35</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE C ENTRE 8 Y 9</td> <td>6.35</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE C ENTRE 9 Y 10</td> <td>3.55</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MUROS B-2 N+2.20</td> <td>EJE A ENTRE 8 Y 9</td> <td>4.85</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td></td> <td>EJE A ENTRE 9 Y 10</td> <td>3.7</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD ACTA 1</td> <td></td> <td></td> <td>-135</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD ACTA 2</td> <td></td> <td></td> <td>-296,6</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">CANTIDAD TOTAL EJECUTADA</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">442,68</td> </tr> <tr> <td colspan="2"></td> <td colspan="2">11,08</td> </tr> </tbody> </table>		FECHA ACTA		ACTA N° 3		UBICACIÓN		OBRA		ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	LARGO	CANTIDAD	MUROS B-1 N-2.5	EJE A ENTRE 1 Y 2	2.85	2		EJE A ENTRE 2 Y 3	3.72	2		EJE A ENTRE 3 Y 4	3.67	2		EJE A ENTRE 4 Y 5	1.47	2	MUROS B-1 N-0.05	EJE C ENTRE 1 Y 2	2.85	2		EJE C ENTRE 2 Y 3	3.72	2		EJE C ENTRE 3 Y 4	3.67	2		EJE C ENTRE 4 Y 5	1.47	2	MUROS B-1 N-4.00	EJE A ENTRE 1 Y 2	2.85	2		EJE A ENTRE 2 Y 3	3.72	2		EJE A ENTRE 3 Y 4	3.67	2		EJE A ENTRE 4 Y 5	1.47	2	MUROS B-2 N-6.25	EJE A ENTRE 7 Y 8	4.2	1		EJE A ENTRE 8 Y 9	4.05	1		EJE A ENTRE 9 Y 10	3.7	1		EJE C ENTRE 7 Y 8	4.35	1		EJE C ENTRE 8 Y 9	6.35	1		EJE C ENTRE 9 Y 10	3.55	1	MUROS B-2 N-2.85	EJE A ENTRE 7 Y 8	4.2	1		EJE A ENTRE 8 Y 9	4.05	1		EJE A ENTRE 9 Y 10	3.7	1		EJE C ENTRE 7 Y 8	4.35	1		EJE C ENTRE 8 Y 9	6.35	1		EJE C ENTRE 9 Y 10	3.55	1	MUROS B-2 N+2.20	EJE A ENTRE 8 Y 9	4.85	1		EJE A ENTRE 9 Y 10	3.7	1	CANTIDAD ACTA 1			-135	CANTIDAD ACTA 2			-296,6			CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA				442,68				11,08	
FECHA ACTA		ACTA N° 3																																																																																																																																													
UBICACIÓN		OBRA																																																																																																																																													
ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	LARGO	CANTIDAD																																																																																																																																												
MUROS B-1 N-2.5	EJE A ENTRE 1 Y 2	2.85	2																																																																																																																																												
	EJE A ENTRE 2 Y 3	3.72	2																																																																																																																																												
	EJE A ENTRE 3 Y 4	3.67	2																																																																																																																																												
	EJE A ENTRE 4 Y 5	1.47	2																																																																																																																																												
MUROS B-1 N-0.05	EJE C ENTRE 1 Y 2	2.85	2																																																																																																																																												
	EJE C ENTRE 2 Y 3	3.72	2																																																																																																																																												
	EJE C ENTRE 3 Y 4	3.67	2																																																																																																																																												
	EJE C ENTRE 4 Y 5	1.47	2																																																																																																																																												
MUROS B-1 N-4.00	EJE A ENTRE 1 Y 2	2.85	2																																																																																																																																												
	EJE A ENTRE 2 Y 3	3.72	2																																																																																																																																												
	EJE A ENTRE 3 Y 4	3.67	2																																																																																																																																												
	EJE A ENTRE 4 Y 5	1.47	2																																																																																																																																												
MUROS B-2 N-6.25	EJE A ENTRE 7 Y 8	4.2	1																																																																																																																																												
	EJE A ENTRE 8 Y 9	4.05	1																																																																																																																																												
	EJE A ENTRE 9 Y 10	3.7	1																																																																																																																																												
	EJE C ENTRE 7 Y 8	4.35	1																																																																																																																																												
	EJE C ENTRE 8 Y 9	6.35	1																																																																																																																																												
	EJE C ENTRE 9 Y 10	3.55	1																																																																																																																																												
MUROS B-2 N-2.85	EJE A ENTRE 7 Y 8	4.2	1																																																																																																																																												
	EJE A ENTRE 8 Y 9	4.05	1																																																																																																																																												
	EJE A ENTRE 9 Y 10	3.7	1																																																																																																																																												
	EJE C ENTRE 7 Y 8	4.35	1																																																																																																																																												
	EJE C ENTRE 8 Y 9	6.35	1																																																																																																																																												
	EJE C ENTRE 9 Y 10	3.55	1																																																																																																																																												
MUROS B-2 N+2.20	EJE A ENTRE 8 Y 9	4.85	1																																																																																																																																												
	EJE A ENTRE 9 Y 10	3.7	1																																																																																																																																												
CANTIDAD ACTA 1			-135																																																																																																																																												
CANTIDAD ACTA 2			-296,6																																																																																																																																												
		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE																																																																																																																																													
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA																																																																																																																																													
		442,68																																																																																																																																													
		11,08																																																																																																																																													
OBSERVACIONES:																																																																																																																																															
CARLOS ALBERTO MAJECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS																																																																																																																																															


LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA

[Signature]
GÓRDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS							
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE					
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23					
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S					
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S					
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA					
Nº	ITEM	DESCRIPCION			UND		
4	4.2.22	MURO NO ESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 4000 PSI E=20CM			M2		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3					
		FECHA ACTA		DIA	MES	AÑO	
				24	6	2024	
		UBICACIÓN					
		ELEMENTO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	SUMA
		MUROS B-1 N+005	EJE 5 ENTRE A Y B	5,48	0,2	3,60	19,73
			EJE 6 ENTRE B Y C	5,35	0,2	3,60	19,26
			PUERTA	-0,9	0,2	3,00	-2,70
			EJE 4 Y B	0,4	0,2	3,60	1,44
			EJE 1 EN B	1,4	0,2	3,10	4,34
			EJE 1 EN C	0,6	0,2	3,10	1,86
	EJE 1 EN B	0,4	0,2	3,10	1,24		
	EJE 1 ENTRE A Y B	0,85	0,2	3,10	2,95		
	EJE 1 EN A	0,405	0,2	3,10	1,26		
MUROS B-1 N+400		EJE 4 EN C	1,32	0,2	5,07	6,69	
	EJE 4 EN A	1,32	0,2	5,07	6,69		
	EJE 4 EN B	2,41	0,2	5,07	12,22		
MUROS B-2 N-6,25		EJE 10 EN C	0,7	0,2	3,00	2,10	
	EJE 10 EN A	0,5	0,2	3,00	1,50		
CANTIDAD ACTA 1:						-30,00	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE				78,57	
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA				48,57	
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS					
		 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA					
 LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA							

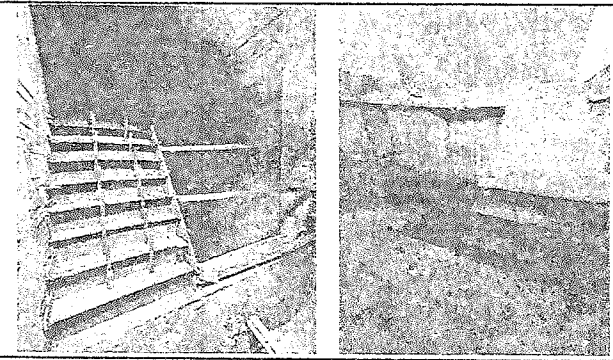
		MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS								
CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE										
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23								
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S								
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S								
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA								
Nº	ITEM	DESCRIPCION							UND	
4	4.2.23	MURO NO ESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 4000 PSI E=15CM							M2	
FOTOGRAFIA - PLANOS				ACTA Nº.3						
 				FECHA ACTA		DIA	MES	AÑO		
						24	6	2024		
 				UBICACIÓN						
				ELEMENTO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	SUMA	
 				MUROS B1- PISO 1	EJE B ENTRE 4 Y 5	2,2	0,15	3,6	7,92	
					CIERRE CELDA HOMBRES	1,91	0,15	3,6	6,876	
					EJE 2 ENTRE B Y C (ASEO)	1,62	0,15	3,6	5,832	
					EJE B ENTRE 2 Y 3	7,4	0,15	3,6	26,64	
					EJE B ENTRE 2 Y 3 (PUERTA1)	0,75	0,15	3,07	-2,3025	
					EJE B ENTRE 2 Y 3 (PUERTA2)	1,02	0,15	3,07	-3,1314	
					EJE 3 ENTRE B Y C	1,45	0,15	3,6	5,22	
					DIVISION CELDAS HOMBRE Y MUJER	3,11	0,15	3,6	11,196	
					DIENTES CELDAS	3,64	0,15	1,01	3,6764	
					EJE 3 ENTRE 3 Y 4	3,25	0,15	3,6	11,7	
					EJE 1 Y 2 ENTRE B Y C	3,9	0,15	3,6	14,04	
					MUROS B1- PISO 2	EJES 1 Y 2 ENTRE B Y C	4,33	0,15	4,1	17,753
 				MUROS B-2 N-6,25	EJE 8 Y 9 ENTRE B Y C	5,3	0,15	3,1	16,43	
					EJE 9 Y 10 ENTRE B Y C	5,8	0,15	3,1	17,98	
CANTIDAD ACTA 1								-30		
OBSERVACIONES:				CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE				139,83		
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA				109,83		
				CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS						


GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS								
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE						
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23						
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S						
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S						
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA						
N°	ITEM	DESCRIPCION			UND			
	4.2.31	COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO DE 4000 PSI			M3			
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3						
		FECHA ACTA		DIA	MES	AÑO		
				24	6	2024		
		UBICACIÓN		BLOQUE 1				
		ELEMENTO	LOCALIZACION	LADO	LADO	ALTO	SURTA	
		COLUMNA	C1	0,4	0,4	3,86	1,4176	
			C2	0,4	0,4	11	1,7690	
			C3	0,4	0,4	12,22	1,9552	
			C4	0,3	0,4	6,9	0,9230	
			C4	0,3	0,4	6,9	0,9230	
			C4	0,3	0,4	6,9	0,9230	
			C5	0,5	0,5	10,95	2,7375	
			C5	0,5	0,5	10,95	2,7375	
		COLUMNETAS MUROS MAMPOSTERIA BLOQUE						
		MODULO 1						
		PISO 1	21,00	0,12	0,25	3,07	1,9341	
		PISO 1'	3,00	0,12	0,25	3,07	0,9233	
		PISO 1''	1,00	0,12	0,25	0,77	0,0231	
		PISO 1'''	3,00	0,12	0,25	1,81	0,1629	
		PISO 2	11,00	0,12	0,25	3,07	1,0131	
		PISO 2'	3,00	0,12	0,25	4,15	0,3735	
			PISO 2''	3,00	0,12	0,25	4,45	0,4605
		MODULO 2						
		SOTANO	10,00	0,12	0,25	2,57	0,7710	
		SOTANO'	3,00	0,12	0,25	1,53	0,1377	
		ADICION	5,00	0,12	0,25	2,63	0,4252	
		VIGA CINTA DE MUROS MAMPOSTERIA BLOQUE						
		PISO 1						
		GUARDIA RADIOS	0,12	0,25	11,92	0,3676		
		TABLEROS ELECTRICOS	0,12	0,25	3,53	0,1077		
		PLANTA ELECTRICA	0,12	0,25	9,80	0,2040		
			ZONA SEGURIDAD	0,12	0,25	1,00	0,0300	
			CELLOS	0,12	0,25	6,06	0,1818	
			CIRCULACION	0,12	0,25	12,60	0,3600	
			ATE. CIUDADANO	0,12	0,25	4,64	0,1392	
			SASURAS	0,12	0,25	3,73	0,1119	
		PISO 2						
			ARCHIVOS	0,12	0,25	5,70	0,1710	
			GCTV Y TELECOMUNICACIONES	0,12	0,25	11,55	0,3465	
			BAÑOS	0,12	0,25	2,16	0,0648	
			CIRCULACION	0,12	0,25	5,50	0,1650	
			SALA MULTIPLE	0,12	0,25	11,02	0,3305	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD ACTA 1				-10,00		
		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE				21,82		
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA				11,82		
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO						
		REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS						

LEONEL RAÚL ROVEDA HERNÁNDEZ
DIRECTOR DE OBRA

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS								
	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE							
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23						
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S						
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S						
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METAUCAS Y MADERA						
N°	ITEM	DESCRIPCION				UND		
	4.6.1	ESCALERA EN CONCRETO - VOLUMEN ADMINISTRATIVO				M3		
FOTOGRAFIA - PLANOS			ACTA N°.3					
			FECHA ACTA		DIA	MES	AÑO	
					24	6	2024	
			UBICACIÓN		BLOQUE 1			
			ELEMENTO	CANTIDAD	LADO	LADO	ALTO	SEÑA
			ESCALERA PISO 1 A PISO 2					
			PLACA PISO 1		1,6	3,95	0,2	1,26
			ESCALONES P1	11	1,6	0,3	0,17	0,45
			PLACA DESCA		1,63	4	0,2	1,30
			PLACA PISO 2		1,4	3,8	0,2	1,06
			ESCALONES P2	11	1,4	0,3	0,17	0,39
OBSERVACIONES:			CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE				4,47	
			CANTIDAD TOTAL EJECUTADA				4,47	
			<u>CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO</u>					
			REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS					

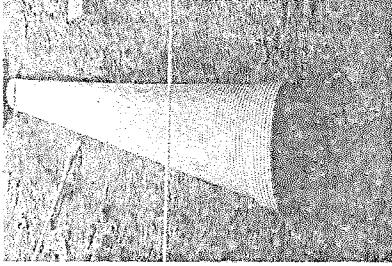

 LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRA


 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

		MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS						
CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE								
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23						
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S						
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S						
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA						
Nº	ITEM	DESCRIPCION			UNID			
	4.10.2	MALLA ELECTROSOLDADA			KG			
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N°3						
		FECHA ACTA		DIA	MES	AÑO		
				24	6	2024		
		UBICACIÓN						
		ELEMENTO	ÁREA	ÁREA MALLA	PESO	CAN/MALLA	SUMA	
		PLACAS						
		ENTRE PISO N=2.55 M2	228,34	14,10	49,60	2	1.606,46	
		CONTRA PISO N=6,25 M2		169,75	14,10	23,30	1	352,74
		CONTRA PISO N=6,25 M2		9,40	14,10	23,30	1	19,70
		TAPA CAJA ELECTRICA		-0,81	14,10	23,30	1	-1,68
		MURO NO ESTRUCTURAL 20 CM						
		CELDAS HOM Y MUJ M1 P1		21,17	14,10	49,60	2	148,94
		BASURAS M1 P1		19,26	14,10	49,60	2	135,50
		BASURAS M1 P1 (PUERTA)		-2,70	14,10	49,60	2	-19,00
		FACHADA FRO. M1 P1 EJE 1B-C		4,34	14,10	49,60	2	30,53
		FACHADA FRO. M1 P1 EJE 1C		1,85	14,10	49,60	2	13,09
		FACHADA POS. M1 P2 EJE 4C		6,69	14,10	49,60	2	47,07
		M.N.E A LA VISTA B1 Y B2		11,03	14,10	49,60	2	77,93
		FACHADA FRO. M1 P1 EJE 1B		1,24	14,10	49,60	2	8,72
		FACHADA POS. M1 P2 EJE 4A		6,69	14,10	49,60	2	47,07
		FACHADA FRO. M1 P1 EJE 1A-B		2,95	14,10	49,60	2	26,72
		FACHADA POS. M2 SOTANO		2,10	14,10	49,60	2	14,77
		FACHADA POS. M2 SOTANO		1,50	14,10	49,60	2	10,55
		FACHADA FRO. M1 P1 EJE 1A		1,25	14,10	49,60	2	8,83
		FACHADA POS. M1 P2 EJE 4G		12,22	14,10	49,60	2	85,96
		MURO NO ESTRUCTURAL 15 CM						
		OFICINA DENUNCIA M1 P1		14,04	14,10	49,60	1	49,39
		ESCALERA M1 P1		37,69	14,10	49,60	1	132,58
		ESCALERA M1 P1 (PUERTA)		-5,43	14,10	49,60	1	-19,10
		CELDAS HOM Y MUJ M1 P1		25,99	14,10	49,60	2	182,85
				3,69	14,10	49,60	2	25,89
		FOSO A SENSOR		11,70	14,10	49,60	1	41,16
		ESCALERAS M1 P2		17,75	14,10	49,60	1	62,44
		ESCALERAS M2 SOTANO		16,43	14,10	49,60	1	57,80
		PASILLO M2 SOTANO N=6,25		17,98	14,10	49,60	1	63,25


GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

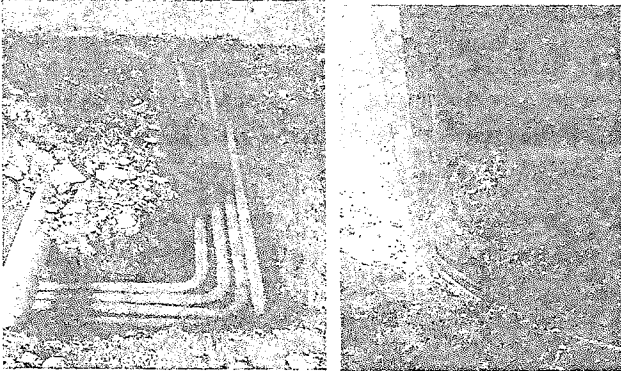
MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS										
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE								
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23								
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S								
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S								
CAPITULO		8. INSTALACION HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS								
ITEM		DESCRIPCION								
N°	8	8.10.16	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 110MM						UND	ML
FOTOGRAFIA - PLANOS										
			FECHA ACTA		DIA	MES	AÑO			
					31	5	2024			
			UBICACIÓN				OBRA			
			ELEMENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	SUMA			
			PVC - 110MM	-27,00			-27,00			
			INSTALACION SANITARIA		90,00		90,00			
OBSERVACIONES:			CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE				63,00			
			CANTIDAD TOTAL EJECUTADA				63,00			
			CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO							
REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS										



LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA

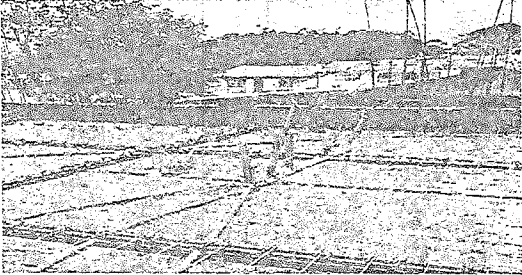

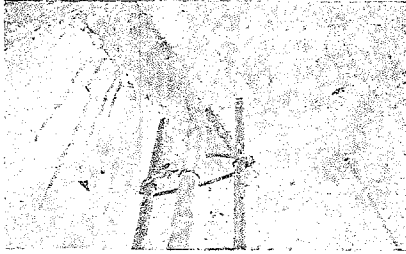



GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS					
	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE				
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23			
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S			
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			
CAPITULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ,DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CCTV			
N°	ITEM	DESCRIPCION	UND		
9	9.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P DIAM= 1" - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N°.3			
		FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
			24	6	2024
		UBICACIÓN	OBRA		
		ELEMENTO	DIAMETRO	CANTIDAD	SUMA
		ACOM PRINCIPAL NORMAL N+0,05	1	8,00	8,00
		ACOM PRINCIPAL REGULADA N-000	1	2,00	2,00
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE		10,00	
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		10,00	
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS			


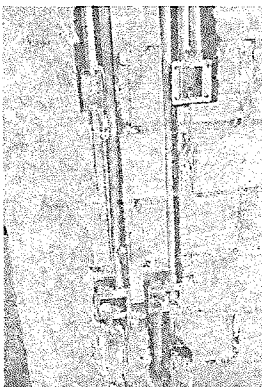

 LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRA



 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS						
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE				
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23				
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S				
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S				
CAPITULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CCTV				
N°	ITEM	DESCRIPCION		UND		
9	9.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P DIAM= 3/4" - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION		UND		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3				
     		FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO	
			24	6	2024	
		UBICACIÓN	OBRA			
		ELEMENTO	DIAMETRO	CANTIDAD	SUMA	
		MODULO 1				
		PLACA ENTRE PISO 1 N+0,05	CURVAS	3/4	9,00	9,00
		CUARTO ASEO	CURVAS	3/4	1,00	1,00
		CHUT BASURAS	CURVAS	3/4	1,00	1,00
		PLACA ENTRE PISO 2 N+4,00	CURVAS	3/4	28,00	28,00
		DISPONIBLE	UNION	3/4	3,00	3,00
		GUARDIA	UNION	3/4	10,00	10,00
		ZONA SEGURIDAD	UNION	3/4	2,00	2,00
		CUATO DE ASEO	UNION	3/4	1,00	1,00
		CHUT BASURAS	UNION	3/4	2,00	2,00
		PLANTA ELECTRICA	UNION	3/4	1,00	1,00
		ATE. CIUDADANO	UNION	3/4	3,00	3,00
		ESCALERA SIRENA	UNION	3/4	2,00	2,00
			UNION	3/4	1,00	1,00
		OFICINA DENUNCIAS	UNION	3/4	1,00	1,00
		SALA MULTIPLE	UNION	3/4	6,00	6,00
			UNION	3/4	3,00	3,00
			UNION	3/4	4,00	4,00
		OFL. COMANDANTE	UNION	3/4	3,00	3,00
		CCTV Y TELECOMUNICACION	UNION	3/4	5,00	5,00
		ARCHIVOS	UNION	3/4	7,00	7,00
			UNION	3/4	3,00	3,00
		ATENCION CIUDADANO	UNION	3/4	1,00	1,00
		VIGILANCIA Y ADOLESCENCIA	UNION	3/4	1,00	1,00
		DENUNCIAS	UNION	3/4	1,00	1,00
		MODULO 2				
PLACA CONTRA PISO 1 N-6,25	CURVAS	3/4	3,00	3,00		
PLACA ENTRE PISO 1 N-2,50	CURVAS	3/4	16,00	16,00		
ESCALERAS PISO 1	CURVAS	3/4	5,00	5,00		
PLACA ENTRE PISO 2 N+2,20	CURVAS	3/4	22,00	22,00		
PLACA CONTRA PISO SOTANO	CURVAS	3/4	49,00	49,00		
ESCALERA ALARMA SOTANO	CURVAS	3/4	2,00	2,00		
COCINA	UNION	3/4	4,00	4,00		
	UNION	3/4	2,00	2,00		
DESPENSA	UNION	3/4	4,00	4,00		
DESPENSA	CURVAS	3/4	1,00	1,00		
PASILLO	UNION	3/4	5,00	5,00		
	UNION	3/4	3,00	3,00		
	UNION	3/4	2,00	2,00		
ESCALERAS SOTANO	UNION	3/4	4,00	4,00		
	UNION	3/4	2,00	2,00		
ESCALERAS PISO 1	UNION	3/4	3,00	3,00		
	UNION	3/4	6,00	6,00		
	UNION	3/4	4,00	4,00		
ALOJAMIENTO H	UNION	3/4	6,00	6,00		
	UNION	3/4	1,00	1,00		
ESCALERAS PISO 2	UNION	3/4	4,00	4,00		
	UNION	3/4	1,00	1,00		
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE		248,00		
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		248,00		
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO R.P. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS				


LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA


GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS					
	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE				
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23			
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S			
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			
CAPITULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ,DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CCTV			
N°	ITEM	DESCRIPCION	UND		
9	9.5.14	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA RAWELT 4X4	UND		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N°.1			
    		FECHA ACTA	DÍA	MES	AÑO
			31	5	2024
		UBICACIÓN	OBRA		
		ELEMENTO		CANTIDAD	SUMA
		MODULO 1			
		DISPONIBLE		3,00	3,00
		GUARDIA		4,00	4,00
		ZONA SEGURIDAD		1,00	1,00
		CHUT BASURAS		1,00	1,00
		ATE. CIUDADANO		3,00	3,00
		ESCALERA SIRENA		1,00	1,00
				1,00	1,00
		OFICINA DENUNCIAS		1,00	1,00
		SALA MULTIPLE		6,00	6,00
				1,00	1,00
				2,00	2,00
		OFI. COMANDANTE		3,00	3,00
		CCTV Y TELECOMINICACION		3,00	3,00
		ARCHIVOS		3,00	3,00
				3,00	3,00
		VIGILANCIA Y ADOLESCENCIA		1,00	1,00
		MODULO 2			
		COCINA		2,00	2,00
		2,00	2,00		
DESPENSA		3,00	3,00		
PASILLO		5,00	5,00		
		1,00	1,00		
		1,00	1,00		
ESCALERAS SOTANO		2,00	2,00		
		2,00	2,00		
ESCALERAS PISO 1		3,00	3,00		
		2,00	2,00		
		1,00	1,00		
ALOJAMIENTO H		3,00	3,00		
		1,00	1,00		
ESCALERAS PISO 2		1,00	1,00		
		1,00	1,00		
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE		67,00	
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		67,00	
		 CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO			
		REP. LEGAL. CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS			


LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRA



GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS						
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE				
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23				
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S				
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S				
CAPITULO		ACTIVIDADES NO PREVISTAS				
N°	ITEM	DESCRIPCION		UND		
	14.2.1	IMPERMEABILIZACION ACRILICA - CERESIT		M2		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N°.3				
 		FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO	
			24	6	2024	
		UBICACIÓN	OBRA			
		ELEMENTO	LARGO	ANCHO	SUMA	
		ZAPATA 1	2,90	2,90	8,41	
		ZAPATA 2	1,40	1,40	1,96	
		ZAPATA 3	2,00	3,00	6,00	
		ZAPATA 4	1,80	3,50	6,30	
		ZAPATA 5	1,40	2,90	4,06	
		ZAPATA 6	1,10	1,40	1,54	
		ZAPATA 7	2,20	3,70	8,14	
		ZAPATA 8	2,30	3,80	8,74	
		ZAPATA 9	6,30	4,00	25,20	
		ZAPATA 10	7,00	3,50	24,50	
		ZAPATA 11	6,40	3,30	21,12	
		ZAPATA 12	7,00	2,90	20,30	
		ZAPATA 13	6,10	3,20	19,52	
		VC-1000	1,75	0,25	0,44	
		VC-1001	2,30	0,25	0,58	
		VC-1002	2,30	0,25	0,58	
		VC-1003	1,75	0,25	0,44	
		VC-1004	2,90	0,25	0,70	
		VC-1005	2,80	0,25	0,70	
		VC-1006	6,10	0,5	3,05	
		VC-1007	4,00	0,5	2,00	
		VC-1008	5,3	0,5	2,65	
		VC-1009	8,5	0,5	4,25	
		V-2002	6,80	0,7	4,76	
		V-2003	6,30	0,7	4,41	
		V-2006	6,13	0,7	4,29	
		AREAS PERIMETRALES	6,00	10,48	62,95	
OBSERVACIONES: se ejecutó impermeabilización con CERESIT, aditivo cementoso con la finalidad de proteger el concreto de cimentación de la humedad por capilaridad, evitando afectaciones por la misma.		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE		202,33		
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		202,33		
		 CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS				


LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRA


GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS					
	CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE				
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23			
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S			
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			
CAPITULO		ASEO			
Nº	ITEM	DESCRIPCION	UND		
30	30.2.5	LIMPIEZA DE ZONAS EXTERIORES	M2		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3			
		FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
		24	6	2024	
		UBICACIÓN	OBRA		
		ELEMENTO	LARGO	ANCHO	SUMA
		FRENTE DE OBRA	32	7	224
OBSERVACIONES: Por condiciones de seguridad (Nivel de seguridad 4), la calle esta cerrada y controlada por la policia nacional. Por lo tanto el frente de obra correspondia a una longitud de 32m. No existia dentro del lote espacio donde se pudiese trabajar las mezclas de concreto y disposicion de materiales. Por lo tanto ese espacio se utilizo como parte de la obra.		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE		224,00	
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		224,00	
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS			


 LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRA


 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

