

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 1 de 71

CONTENIDO DEL INFORME

1.	CONDICIONES DEL CONTRATO	1
2.	OBJETO DEL CONTRATO	1
3.	ACTIVIDADES EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS. ¡Error! Marcador no definido.	
4.	OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS. 47	
5.	OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.	5
6.	PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.	8

1. CONDICIONES DEL CONTRATO

Número de Contrato:	23000931 H4 DE 2023
Nombre del Contratista:	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
Periodo informe:	Del 22 de diciembre de 2023 al 31 de enero de 2024
Nombre de Supervisor:	ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
Nombre del Interventor:	N/A
Área perteneciente:	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil Regional Antioquia

2. OBJETO DEL CONTRATO

“REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO.”

3. EJECUTADAS, OBLIGACIONES CUMPLIDAS, PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 2 de 71

3.1 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL AEROPUERTO ALI PIEDRAHITA EN EL MUNICIPIO DE URRAO

1. ACTIVIDADES TECNICAS.

DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (E=10 CM) INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE MATERIAL SOBRANTE

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	DESCAPOTE A MAQUINA EN MATERIAL COMUN (e=10 cm) incluye carga y retiro de mayerial sobrante				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
(Escriba el nombre de la Sociedad por el IDU)					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
DESCAPOTE VIA	50,00	5,00	0,00	1,00	250,00
DESCAPOTE HELIPUERTO	8,00	8,00	3,14	1,00	201,06
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					451,06
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					451,06
TOTAL POR EJECUTAR					0,00



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 3 de 71

EXCAVACION DE 0 A 2 METROS EN MATERIAL HETEROGENEO BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MEDIDO EN SITIO, INCLUYE ENTIBADO TEMPORAL, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MAYERIAL

ITEM N°	3	UNIDAD	M3	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	EXCAVACION DE 0 A 2 METROS EN MATERIAL HETEROGENEO BAJO CUALQUIER GRADO DE HUMEDAD MEDIDO EN SITIO, INCLUYE ENTIBADO TEMPORAL, CARGUE, TRANSPORTE Y BOTADA DE MAYERIAL				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENIENTE	N/A				
INTERVENIENTE (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
<small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
EXCAVACION PARA VIA	60,00	5,00	0,50	1,00	151,38
EXCAVACION HELIPUERTO	81,00	3,14	0,50	1,00	127,62
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					279,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					279,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					279,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 4 de 71

CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE (ESPECIFICACIONES INVIAS ARTICULO 310), INCLUYE ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA

ÍTEM N°	4	UNIDAD	M2	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	Conformación de la calzada existente (especificaciones invias articulo 310), incluye ESTABILIZADA CON EMULSION ASFALTICA					
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS <small>(Escriba el nombre y razón social del contratista)</small>					
INTERVENTOR	N/A <small>(Escriba el nombre y razón social del Interventor,</small>					
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO <small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) de la obra (s) por el IDI</small>					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL	
CALZADA ASFALTICA	45,00	5,00	0,00	1,00	225,00	
HELIPUERTO	7,50	7,50	3,14		176,72	
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						401,72
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						0,00
TOTAL POR EJECUTAR						0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 5 de 71

SUMINISTRO, TRANSPORTE Y COLOCACION DE SUBBASE CON AFIRMADO DE LA ZONA DE TAMAÑO MAXIMO DE 1 " 1/2 COMPACTADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DEL PROCYOT MODIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO CON UN ESPESOR MINIMO DE 0,15 METROS Y SU MEDIDA SERA EN SITIO YA COMPACTADA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SUMINISTRO , TRANSPORTE Y COLOCACION DE SUBBASE CON AFIRMADO DE LA ZONA DE TAMAÑO MAXIMO DE 1 " 1/2 COMPACTADA CON MEDIOS MECANICOS HASTA UNA DENSIDAD DEL 95% DEL PROCYOT MODIFICADO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CONSTRUCCION Y FUNCIONAMIENTO CON UN ESPESOR MINIMO DE 0,15 METROS Y SU MEDIDA SERA EN SITIO YA COMPACTADA				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)					

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CALZADA VIA	45,00	5,00	0,59	1,00	132,75
	7,50	7,50	0,58	3,14	102,76
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					235,51

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; width: 100px; float: right;"> Total Diligencie e resultado d multiplicac columnas a unidades d m2, o ml, e la columna </div>



FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

xxx.092

Página: 6 de 71

[illegible]



FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

xxx.092

Página: 7 de 71

[illegible]

A photograph showing three orange life jackets with reflective silver stripes and buckles, lying on a light-colored tiled floor. The jackets are arranged in a triangular pattern. A person's leg in camouflage pants is visible in the top left corner.



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 8 de 71

CONSTRUCCION DE SEÑALIZACION MANGAVELETA EN CONCRETO 1:2:3 FORMA (ANILLO CIRCULAR) DONDE SU RADIO MAYOR ES DE 7,5 METROS Y SU RADIO MENOR ES DE 6,3 M ESPESOR E= 0,07 CM ANCHO 1,50 DE JUNTAS DE MADERA CADA 1,50 METROS INCLUYE PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR BLANCO PARA DEMARCACION DE MANGAVELETA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CONSTRUCCION DE SEÑALIZACION MANGAVELETA EN CONCRETO 1:2:3 FORMA (ANILLO CIRCULAR) DONDE SU RADIO MAYOR ES DE 7,5 METROS Y SU RADIO MENOR ES DE 6,3 M ESPESOR E= 0,07 CM ANCHO 1,50 DE JUNTAS DE MADERA CADA 1,50 METROS INCLUYE PINTURA A BASE DE ACEITE COLOR BLANCO PARA DEMARCACION DE MANGAVELETA				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>				
INTERVENTOR	N/A <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO <small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (a) por el IDU)</small>				

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
MANGAVELETA 1	49,50	1,50	0,07	1,00	5,20
MANGAVELETA 2	49,50	1,50	0,07	1,00	5,20
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					10,40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					10,40

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 9 de 71

CONSTRUCCION DE BASE PARA MANGAVELETA EN CONCRETO 1:2:3 (CILINDRO CIRCULAR RECTO) DONDE SU RADIO ES 0,6 M H= 1 M INCLUYE PINTURA A BASE DE ACEITE BLANCA PARA DEMARCACION DE MANGAVELETA

ÍTEM N°	9	UNIDAD	M3	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	CONSTRUCCION DE BASE PARA MANGAVELETA EN CONCRETO 1:2:3 (CILINDRO CIRCULAR RECTO) DONDE SU RADIO ES 0,6 M H= 1 M INCLUYE PINTURA A BASE DE ACEITE BLANCA PARA DEMARCACION DE MANGAVELETA				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
<small>(Escriba el nombre del Supervisor (s) delegado (s) por el IDU)</small>					

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CILINDRO MANGAVELETA LADO AIRE	0,40	0,40	3,14	1,00	0,50
CILINDRO MANGAVELETA LADO TIERRA	0,40	0,40	3,14	1,00	0,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00

Página 1



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 10 de 71

SUMINISTRO DE POSTE Y MALLA ESLABONADA CON RECUBRIMIENTO EN PVC CALIBRE 8" INCLUYENDO EL RECUBRIMIENTO CON EL FIN DE SELLAR ESPECIOS ENTRE POSTES Y COLUMNAS EN CONCRETO DEL CERRAMIENTO ANTIGUO

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SUMINISTRO DE POSTE Y MALLA ESLABONADA CON RECUBRIMIENTO EN PVC CALIBRE 8" INCLUYENDO EL RECUBRIMIENTO CON EL FIN DE SELLAR ESPECIOS ENTRE POSTES Y COLUMNAS EN CONCRETO DEL CERRAMIENTO ANTIGUO				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS <small>(Escriba el nombre y razón social del contratista)</small>				
INTERVENTOR	N/A <small>(Escriba el nombre y razón social del Interventor)</small>				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO <small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (a) por el IDU)</small>				

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
MALLA ESLABONADA	2,00	2,00	0,00	0,00	4,00
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					4,00

Página 1



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 11 de 71

SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 1"1/2 CON ESPACIOS ENTRE TUBOS DE 5 CM CON ESPACIOS VERTICALES Y HORIZONTALES EN ESPACIO DEBAJO DE MUROS DE CERRAMIENTO, INCLUYE CONCRETO CICLOPEO EN LA BASE DE LA TUBERIA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA GALVANIZADA DE 1"1/2 CON ESPACIOS ENTRE TUBOS DE 5 CM CON ESPACIOS VERTICALES Y HORIZONTALES EN ESPACIO DEBAJO DE MUROS DE CERRAMIENTO, INCLUYE CONCRETO CICLOPEO EN LA BASE DE LA TUBERIA				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>				
INTERVENTOR	N/A <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO <small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) designado (a) por el IDU)</small>				

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
TUBERIA GALVANIZADA	3,60		0,95	1,00	3,40
					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					3,40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00

Alto
 Diligencie en
 números el alto,
 cuando la unidad de
 medida sea en m3.

Página 1


REGISTRO FOTOGRÁFICO



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 13 de 71

LAMPARA HERMETICA 2X32 W

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	LAMPARA HERTMRTICA 2X32 W				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
<small>(Escriba el nombre a razón racial del contratista)</small>					
<small>(Escriba el nombre a razón racial del interventor)</small>					
<small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado(a) por el IDU)</small>					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
LAMPARA HERTMRTICA 2X32 W				11,00	11,00
					0,00
Página 1					
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					11,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					11,00

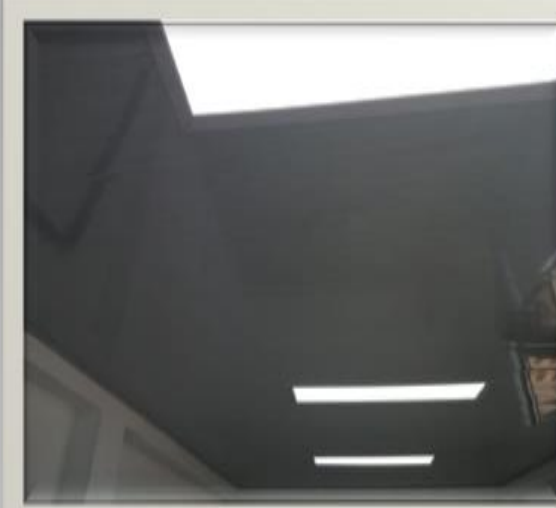REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 14 de 71

SENSORES DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360° ALCANZE 6 METROS

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SENSORES DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360° ALCANZE 6 METROS				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
	<small>(Escriba el nombre a razón racial del contratista)</small>				
	<small>(Escriba el nombre a razón racial del interventor)</small>				
	<small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado(a) por el IDU)</small>				
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SENSORES DE MOVIMIENTO PARA TECHO 360° ALCANZE 6 METROS				2,00	2,00
					0,00
Página 1					
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					2,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 15 de 71

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCE EN CINTA TOIL DE 20CM

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCE EN CINTA TOIL DE 20CM				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
<small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLANCE EN CINTA TOIL DE 20CM	3,00	1,17			3,50
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					3,50
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 16 de 71

**DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN LA PARED REF. 8345
COMPACTO TIPO FAMILIA O SU EQUIVALENTE**

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN LA PARED REF. 8345 COMPACTO TIPO FAMILIA O SU EQUIVALENTE

CONTRATISTA

MATMAR CONSTRUCCIONES SAS

(Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR

	N/A
--	-----

(Escriba el nombre a razón racial del Interventor)

UPERVISOR (A)

ALVARO HERNAN RESTREPO

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delgado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
DISPENSADOR DE PAPEL HIGIENICO DE SOBREPONER EN LA PARED REF. 8345 COMPACTO IPO FAMILIA O SU EQUIVALENTE				6,00	6,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					6,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					6,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 17 de 71

DISPENSADOR DE JABON TIPO FAMILIA O SU EQUIVALENTE

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	DISPENSADOR DE JABON TIPO FAMILIA O SU EQUIVALENTE				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
DISPENSADOR DE JABON TIPO FAMILIA O SU EQUIVALENTE				6,00	6,00
Página 1					

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	6,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	6,00
TOTAL POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 18 de 71

DISPENSADOR DE TOALLAS DESECHABLES TIPO FAMILIA O SU EQUIVALENTE

TEM N°	67	UNIDAD	UND	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	DISPENSADOR DE DE TOALLAS DESECHABLES TIPO FAMILIA O SU EQUIVALENTE			
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>			
INTERVENTOR	N/A <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>			
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO <small>(Escriba el nombre del Supervisor (s) delegado (s) por el IDU)</small>			

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
DISPENSADOR DE DE TOALLAS DESECHABLES TIPO FAMILIA O SU EQUIVALENTE				6,00	6,00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	6,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	6,00
TOTAL POR EJECUTAR	0,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 19 de 71

EXTRACTOR DE OLORES AXIAL DE 15"

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	EXTRACTOR DE OLORES AXIAL DE 15"				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
EXTRACTOR DE OLORES AXIAL DE 15"				6,00	6,00

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	6,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	6,00
TOTAL POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 20 de 71

LAVAMANOS DE SOBREPONER CORONA VALENCIA REF 01331100 O SU EQUIVALENTE INC GRIFERIA REF 591125551 VENTO O SU EQUIVALENTE

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	LAVAMANOS DE SOBREPONER CORONA VALENCIA REF 01331100 O SU EQUIVALENTE INC GRIFERIA REF 591125551 VENTO O SU EQUIVALENTE		
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS <small>(Escriba el nombre a razón racial del contratista)</small>		
INTERVENTOR	N/A <small>(Escriba el nombre a razón racial del Interventor)</small>		
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO <small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>		

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
LAVAMANOS DE SOBREPONER CORONA VALENCIA REF 01331100 O SU EQUIVALENTE INC GRIFERIA REF 591125551 VENTO O SU EQUIVALENTE				1,00	1,00

Página 1

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1,00
TOTAL POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 21 de 71

SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
(Escriba el nombre del Supervisor (a) de la obra (a) por el IDU)					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE SANITARIO PARA PERSONAS DE MOVILIDAD REDUCIDA INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS				4,00	4,00
<div style="position: absolute; top: 50%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); font-size: 100px; opacity: 0.3;"> Página 1 </div>					
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					4,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					4,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 22 de 71

SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA PARA BAÑO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y GRIFERIA PARA SU INSTALACION

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA PARA BAÑO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y GRIFERIA PARA SU INSTALACION				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
	<small>(Escriba el nombre a razón racial del contratista)</small>				
	<small>(Escriba el nombre a razón racial del interventor)</small>				
	<small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegada (a) por el IDU)</small>				
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCHA PARA BAÑO INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS Y GRIFERIA PARA SU INSTALACION				1,00	1,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 23 de 71

LLAVE DE CONTROL DE AGUA CON CAJA PLASTICA 0,20X0,20CM

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	LLAVE DE CONTROL DE AGUA CON CAJA PLASTICA 0,20X0,20CM				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS <small>(Escriba el nombre y razón social del contratista)</small>				
INTERVENTOR	N/A <small>(Escriba el nombre y razón social del Interventor)</small>				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO <small>(Escriba el nombre del Supervisor (s) delegado (s) por el IDU)</small>				

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
LLAVE DE CONTROL DE AGUA CON CAJA PLASTICA 0,20X0,20CM				5,00	5,00
Página 1					
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					5,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					5,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 24 de 71

INCRUSCIONES PARA BAÑO (JABONERO, TOALLERA Y GANCHO)

ÍTEM N°	77	UNIDAD	UND	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	INCRUSCIONES PARA BAÑO (JABONERO, TOALLERA Y GANCHO)			
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS			
INTERVENTOR	N/A			
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO			
<small>(Escriba el nombre de Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>				

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
INCRUSCIONES PARA BAÑO (JABONERO, TOALLERA Y GANCHO)				1,00	1,00
Página 1					
OTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
OTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
OTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,00
OTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 25 de 71

POCETA PARA LAVATRAPEROS

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	POCETA PARA LAVATRAPEROS				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
<small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
POCETA PARA LAVATRAPEROS				1,00	1,00
<div style="font-size: 48px; opacity: 0.5; transform: rotate(-15deg); pointer-events: none;">Página 1</div>					
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					1,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 26 de 71

VENTANA EN ALUMINIO COMBINADA, CORREDIZA, FIJA Y PERSIANA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VENTANA EN ALUMINIO COMBINADA,CORREDIZA, FIJA Y PERSIANA				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
(Escriba el nombre y razón social del contratista)					
(Escriba el nombre y razón social del Interventor)					
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)					

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
VENTANA BODEGA	2,03		1,00	3,00	6,08
VENTANA SALA DE DESEMBARGUE	1,47		1,03	2,00	3,03
VENTANA GARITA	0,90		0,85	3,00	2,30
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					11,40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					11,40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					11,40
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 27 de 71

SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO PARA OFICINA O CERRAMIENTO EN VIDRIO PARA NUEVA SALA DE OBORDAJE Y EQUIPAJES, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU ADECUADA INSTALACION

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO PARA OFICINA O CERRAMIENTO EN VIDRIO PARA NUEVA SALA DE OBORDAJE Y EQUIPAJES, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU ADECUADA INSTALACION				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>				
INTERVENTOR	N/A <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO <small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) designado (a) por el IDU)</small>				
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE DIVISIONES EN VIDRIO PARA OFICINA O CERRAMIENTO EN VIDRIO PARA NUEVA SALA DE OBORDAJE Y EQUIPAJES, INCLUYE ACCESORIOS Y ELEMENTOS PARA SU ADECUADA INSTALACION	5,60		2,46	1,00	13,75
Página 1					
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					13,75
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					13,75
TOTAL POR EJECUTAR					0,00


REGISTRO FOTOGRÁFICO



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 28 de 71

RUANA REMATE LATERAL CUBIERTA EN LAMINA METALICA PINTADA AL COLOR DE TEJA

CRIPCIÓN DEL ÍTEM	RUANA REMATE LATERAL CUBIERTA EN LAMINA METALICA PINTADA AL COLOR DE TEJA				
TRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
RVENTOR	N/A				
ERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
<small>(Escriba el nombre del Supervisor (s) de lo queda (s) por el IDU)</small>					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
NA REMATE LATERAL CUBIERTA EN LAMINA METALICA PINTADA AL COLOR DE TEJA				4,00	4,00
Página 1					

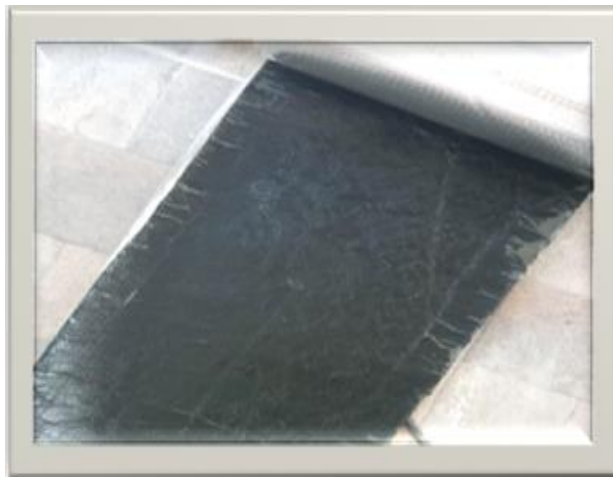

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 29 de 71

PINTURA ACRILICA DE TRAFICO PESADO Y MICROESFERAS REFLECTIVAS EN COLOR A DEFINIR, INCLUYE IMPREIGNANTE

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	PINTURA ACRILICA DE TRAFICO PESADO Y MICROESFERAS REFLECTIVAS EN COLOR A DEFINIR, INCLUYE IMPREIGNANTE				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS <small>(Escriba el nombre y razón social del contratista)</small>				
INTERVENTOR	N/A <small>(Escriba el nombre y razón social del interventor)</small>				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO <small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>				

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PINTURA TOPELLANTAS	1,00		0,15	45,00	6,75
PINTURA PLATAFORMA	90,00	0,15		1,00	13,50
PINTURA POMPELLANO	10,45	4,45		2,00	93,01
DELIMITACION ESTACIONAMIENTOS	8,47	0,15		10,00	12,71
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					125,96
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					125,96
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1


REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 30 de 71

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO

ÍTEM N°	NP9	UNIDAD	ML	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN ALUMINIO				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
<small>(Escriba el nombre a razón racial del contratista)</small>					
<small>(Escriba el nombre a razón racial del Interventor)</small>					
<small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PUERTAS DE BODEGAS		1,05	2,00	2,00	6,10
PUERTAS BAÑOS NUEVOS		1,05	2,00	2,00	6,10
PUERTA BODEGA BAÑO BODEGA		1,00	1,90	1,00	1,90
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					14,10
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					14,10
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

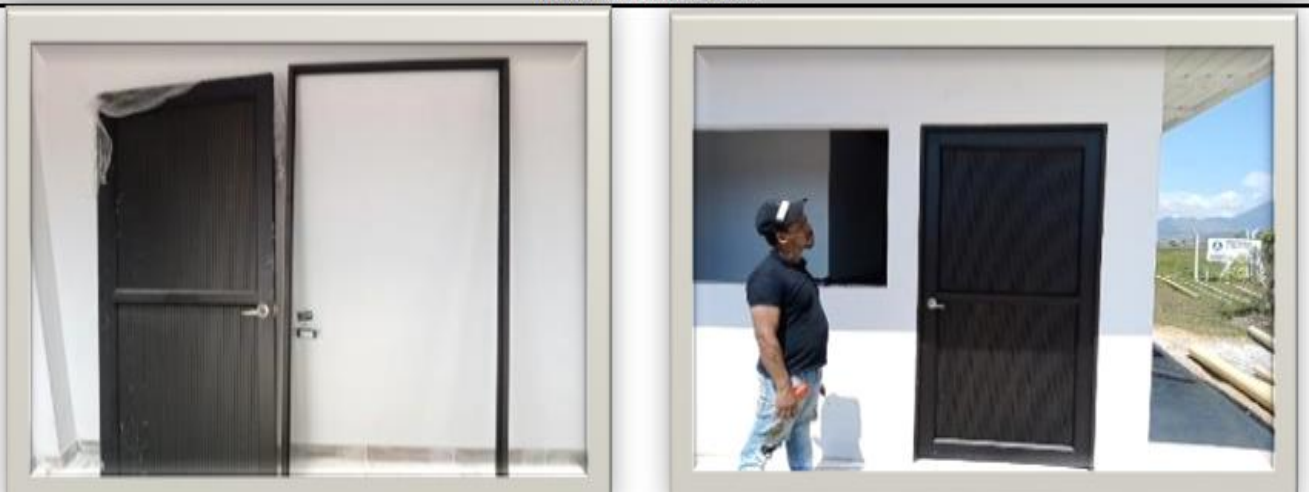



FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

xxx.092

Página: 31 de 71

M N°	NP11	UNIDAD	M2	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		ESPEJOS 3MM				
CONTRATISTA		MATMAR CONSTRUCCIONES SAS <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>				
INTERVENIENTOR		N/A <small>(Escriba el nombre o razón social del interviniente)</small>				
SUPERVISOR (A)		ALVARO HERNAN RESTREPO <small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) designado (a) por el IDU)</small>				
UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ESPEJOS BAÑOS ADMINISTRATIVOS			0,80	0,50	2,00	0,80
ESPEJOS BAÑOS ZONA DE DESEMBARQUE EVA			0,80	0,50	2,00	0,80
ESPEJOS BAÑO BODEGA			0,80	0,50	1,00	0,40
ESPEJO BAÑO SANIDAD			0,80	0,50	1,00	0,40
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						2,40
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						2,40
TOTAL POR EJECUTAR						0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 32 de 71

SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC 9 MM, INCLUYE PERFILERIA Y ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE CIELO RASO EN PVC 9 MM, INCLUYE PERFILERIA Y ACCESORIOS PARA SU ADECUADA INSTALACION				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS <small>(Escriba el nombre o razón social del contratista)</small>				
INTERVENTOR	N/A <small>(Escriba el nombre o razón social del Interventor)</small>				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO <small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>				

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CIELO RASO BODEGA	7,81	4,52		1,00	35,30
CIELO RASOPIEZA BODEGA	4,80	4,52		1,00	21,70
CIELO RASO NUEVA ZONA DE DESEMBARGUE	5,00	5,00		1,00	25,00
CIELO RASO GARITA NUEVA	2,00	2,00		1,00	4,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					86,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					86,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

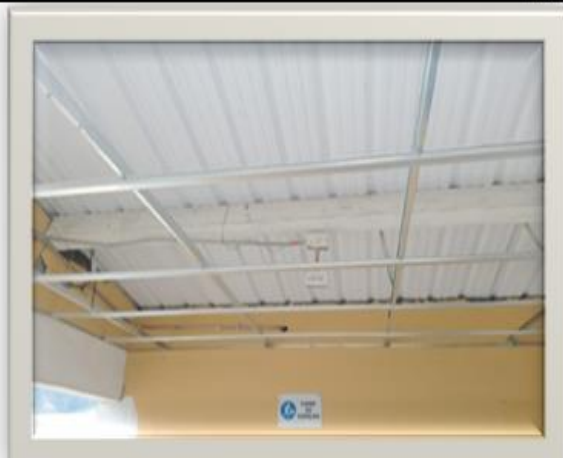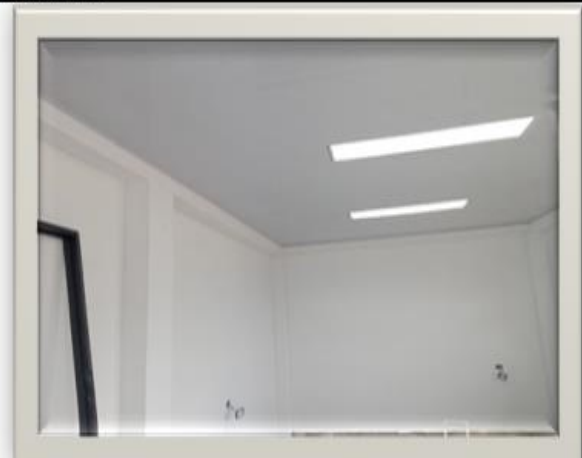


 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 33 de 71

CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18

<small>(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrito)</small>						
RECIBO PARCIAL No	FINAL	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE		28/12/2023	HASTA	31/01/2024
TEM N°	NP16	UNIDAD	ML	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CALIBRE 18				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS					
INTERVENTOR	N/A					
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO					
<small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>						
UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CANAL EN BODEGA NUEVA		16,75			1,00	16,75
CANAL EN ZONA DE DESEMBARGUE		6,25			1,00	6,25
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA						23,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES						0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						23,00
TOTAL POR EJECUTAR						0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO

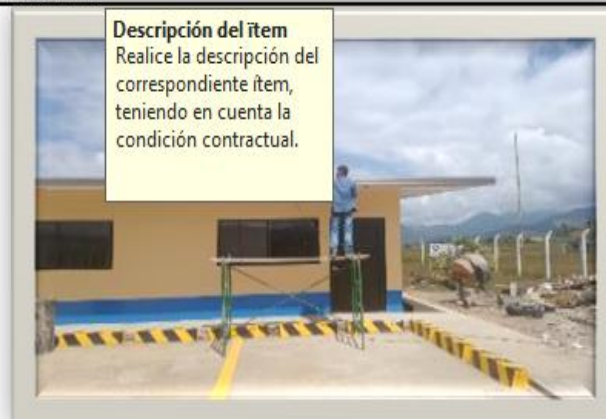

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 34 de 71

LAMPARA REDONDA 24 W

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	LAMPARA REDONDA 24 W				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
<small>(Escriba el nombre a razón racial del contratista)</small>					
<small>(Escriba el nombre a razón racial del Interventor)</small>					
<small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
LAMPARA REDONDA 24 W				2,00	2,00
Página 1					
TOTAL E EJECUTADO PRESENTE ACTA					2,00
TOTAL E EJECUTADO PRESENTE ACTA					2,00
TOTAL E EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL E EJECUTADO ACUMULADO					2,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 35 de 71

TIERRA NEGRA ABONADA

EM N°	19	UNIDAD	M3	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	TIERRA NEGRA ABONADA				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
<small>(Escriba el nombre de la entidad contratante)</small>					
<small>(Escriba el nombre y razón social del contratista)</small>					
<small>(Escriba el nombre y razón social del interventor)</small>					
<small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) de la obra (a) por el IDU)</small>					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
ERRANDEN	50,00	0,30	0,20	1,00	3,00
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					3,00
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					3,00
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

Página 1

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 36 de 71

SUMINISTRO E INSTALACION DE FLORES IXORA ROJA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE FLORES IXIRA ROJA				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS <small>(Escriba el nombre a razón social del contratista)</small>				
INTERVENTOR	N/A <small>(Escriba el nombre a razón social del Interventor)</small>				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO <small>(Escriba el nombre del Supervisor (s) delegada (s) por el IDU)</small>				

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE FLORES IXIRA ROJA				170,00	170,00

Página 1



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 37 de 71

GUARDA ESCOBA EN CERAMICA H=10 CM

CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS					(Escriba el nombre o razón social del contratista)
INTERVENTOR	N/A					(Escriba el nombre o razón social del interventor)
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO					(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
GUARDA ESCOBA BODEGA NUEVA				23,00	23,00
GUARDA ESCOBA ZONA DE EMBARGUE				21,50	21,50
GUARDA ESCOBA ANDEN Y PIEZA DE DESEMBARQUE				60,70	60,70
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					105,20
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					105,20
TOTAL POR EJECUTAR					0,00



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 38 de 71

SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO CON VIDRIO DE 8 MM

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO CON VIDRIO DE 8 MM				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
<small>(Escriba el nombre y razón social del contratista)</small>					
<small>(Escriba el nombre y razón social del Interventor)</small>					
<small>(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)</small>					
UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA CORREDIZA EN ALUMINIO CON VIDRIO DE 8 MM		1,60	2,50	1,00	4,00
		1,40	1,99	3,00	8,37
<div style="position: relative; width: 100%;"> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: linear-gradient(to right, transparent 49%, #ccc 49% 49%, #ccc 51% 51%, transparent 51%); background-size: 100% 100%;"></div> <div style="position: absolute; top: 0; left: 0; width: 100%; height: 100%; background: linear-gradient(to right, transparent 49%, #ccc 49% 49%, #ccc 51% 51%, transparent 51%); background-size: 100% 100%;"></div> </div>					
<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="flex: 1;"> <p>OTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA</p> <p>OTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES</p> <p>OTAL EJECUTADO ACUMULADO</p> <p>OTAL POR EJECUTAR</p> </div> <div style="flex: 1; text-align: right;"> <p>12,37</p> <p>0,00</p> <p>12,37</p> <p>0,00</p> </div> </div>					



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 39 de 71

SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO PEATONAL CON TUBO GALBANIZADO 2" MALLA ESLABONADA 2.0X0.9 INCLUYE PINTURA, SOLDADURA, HERRAJES, ANTICORROSIVO, BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO

M N°	NP22	UNIDAD	M2	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		SUMINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO PEATONAL CON TUBO GALBANIZADO 2" MALLA ESLABONADA 2.0X0.9 INCLUYE PINTURA, SOLDADURA, HERRAJES, ANTICORROSIVO, BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO		
CONTRATISTA		MATMAR CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENIENTOR		N/A		
SUPERVISOR (A)		ALVARO HERNAN RESTREPO		

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
MINISTRO E INSTALACION DE PORTON DE ACCESO PEATONAL CON TUBO GALBANIZADO 2" MALLA ESLABONADA 2.0X0.9 INCLUYE PINTURA, SOLDADURA, HERRAJES, ANTICORROSIVO, BISAGRAS Y TODO LO NECESARIO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO				2,00	2,00

EL EJECUTADO PRESENTE ACTA	2,00
EL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
EL EJECUTADO ACUMULADO	2,00
EL POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 40 de 71

DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA

N°	NP23	UNIDAD	M2	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA			
TRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENIENTE	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)					
UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD
DESMONTE DE CERRAMIENTO EN MALLA			1,50	1,70	1,00
			1,38	1,70	3,00
					7,02



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 41 de 71

CAJA DE INSPECCION DE 1,30X1,30

ECIBO PARCIAL No		FINAL	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE	28/12/2023	HASTA	31/01/2024
EM N°	NP24	UNIDAD	M3	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA		
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		CAJA DE INSPECCION DE 1,30X1,30				
CONTRATISTA		MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR		N/A				
SUPERVISOR (A)		ALVARO HERNAN RESTREPO				
UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
CAJA DE INSPECCION DE 1,30X1,30		1,30	1,30		1,00	1,30

TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	1,30
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1,30
TOTAL POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 42 de 71

PINTURA TIPO KORAZA

ÍTEM N°	NP25	UNIDAD	M2	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM		PINTURA TIPO KORAZA		
CONTRATISTA		MATMAR CONSTRUCCIONES SAS		
INTERVENTOR		N/A		
SUPERVISOR (A)		ALVARO HERNAN RESTREPO		
<small>(Escriba el nombre a razón del IDU)</small>				

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
PINTURA TIPO KORAZA BODEGA	34,30		2,75	2,00	188,64
PINTURA FACHADA	37,30		2,35	2,00	175,31
PINTURA PISTA	12,40		0,75	2,00	18,60
PINTURA GARITA NUEVA	6,20		1,30	2,00	16,12
TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					398,66
TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					398,66
TOTAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 43 de 71

PINTURA TIPO ESMALTE AZUL

TEM N°	NP25	UNIDAD	M2	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
--------	------	--------	----	------------------------

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	PINTURA ESMALTE AZUL			
----------------------	----------------------	--	--	--

CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS
-------------	---------------------------

INTERVENTOR	N/A
-------------	-----

SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO
----------------	------------------------

(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

UBICACIÓN	LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD	TOTAL
30CALO BODEGA	33,19		0,50	2,00	33,19
30CALO FACHADA	38,20		0,50	1,00	19,10
30CALO PISTA	13,72		0,50	2,00	13,72
30CALO GARITA NUEVA	6,20		0,50	1,00	3,10

OTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA	69,11
OTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES	0,00
OTAL EJECUTADO ACUMULADO	69,11
OTAL POR EJECUTAR	0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 44 de 71

SUMINISTRO DE SILLAS TANDEM

(Indique el objeto del contrato de ejecución suscrita)					
RECIBO PARCIAL No	FINAL	CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE		28/12/2023	HASTA 31/01/2024
ÍTEM N°	NP25	UNIDAD	UND	ESPECIFICACIÓN TÉCNICA	
DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	SUMINISTRO DE SILLAS TANDEM				
CONTRATISTA	MATMAR CONSTRUCCIONES SAS				
INTERVENTOR	N/A				
SUPERVISOR (A)	ALVARO HERNAN RESTREPO				
(Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)					
UBICACIÓN		LARGO	ANCHO	ALTO	CANTIDAD
SUMINISTRO DE SILLAS TANDEM					8,00
TAL EJECUTADO PRESENTE ACTA					8,00
TAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES					0,00
TAL EJECUTADO ACUMULADO					8,00
TAL POR EJECUTAR					0,00

REGISTRO FOTOGRÁFICO





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 45 de 71

ACTIVIDADES EJECUTADAS EN ACTA FINAL

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANT.	VALOR UNITARIO	CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO 1 SIN AUMENTO DE VALOR		CONDICIONES ACTUALIZADAS SEGUN MODIFICATORIO No 2 Y ANEXOS EN AUMENTO DE VALOR		CANTIDADES EJECUTADAS ACUMULADAS PARCIALES 1, 2 Y 3		CANTIDADES SEGUN MODIFICATORIO 3		CANTIDADES ACTUALES		CANTIDADES PRESENTE ACTA FINAL		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			
					CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR ACUMULADO	(N-3)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR PARCIAL	CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	% ACUMULADO		
LADO AIRE																				
1	Lubricación regular	m2	2000.00	\$ 2.612.000	848.00	\$ 2.214.976.00	848.00	\$ 2.214.976.00	848.00	\$ 2.214.976.00			848.00	\$ 2.214.976.00	0.00	\$ -	848.00	\$ 2.214.976.00	100.00%	
2	Reemplazo e instalación de material concreto (4x12x24) incluído trabajo e mano de obra	m2	601.00	\$ 6.865.000	601.00	\$ 5.649.823.00	789.00	\$ 6.836.689.00	0.00	\$ -	(1)	237.00	\$ 2.808.265.00	451.00	\$ 3.968.426.00	451.00	\$ 3.968.426.00	100.00%		
3	Demolición de 7 a 2 m en material heterogeneous bajo cualquier grado de humedad, medido en volúmenes, incluye empuje, transporte y traslado de material	m3	130.00	\$ 63.513.000	130.00	\$ 7.986.690.00	279.00	\$ 17.182.127.00	0.00	\$ 0.00			-	279.00	\$ 17.182.127.00	279.00	\$ 17.182.127.00	100.00%		
4	Construcción de cubiertas inclinadas impermeabilizadas hasta altura 20'3", incluye 100mm de concreto armado, 100mm de aislamiento térmico y 100mm de impermeabilizante	m2	123.00	\$ 12.946.000	75.00	\$ 8.039.029.00	96.00	\$ 9.883.376.00	402.72	\$ 4.839.289.00	(2)	954.28	\$ 9.345.127.00	451.72	\$ 4.839.289.00	0.00	\$ -	402.72	\$ 4.839.289.00	100.00%
5	Suministro, transporte y colocación de SUS BARRONAS IMPERMEO DE LADINA, de 100mm nominal, 1.50' con espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones, medido en metros lineales, incluye empuje, transporte y traslado de material, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	97.00	\$ 137.400.00	75.00	\$ 13.338.009.00	279.51	\$ 32.360.487.00	0.00	\$ 0.00			279.51	\$ 32.360.487.00	279.51	\$ 32.360.487.00	279.51	\$ 32.360.487.00	100.00%	
6	Replazo de 120 cm de tubería metálica galvanizada de 1" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	2.00	\$ 2.777.040.00	2.00	\$ 5.554.086.00	2.00	\$ 5.554.086.00	0.00	\$ 0.00			2.00	\$ 5.554.086.00	2.00	\$ 5.554.086.00	2.00	\$ 5.554.086.00	100.00%	
7	Reemplazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	8.00	\$ 365.700.00	8.00	\$ 3.085.608.00	8.00	\$ 3.085.608.00	0.00	\$ 0.00			8.00	\$ 3.085.608.00	8.00	\$ 3.085.608.00	8.00	\$ 3.085.608.00	100.00%	
8	Construcción de refuerzos de mamparas en concreto 125, forma (piedra, concreto) hasta su nivel superior en 7.5 m y su nivel inferior en 6.25 m, espesor de 100 cm, ancho 1.5 m, juntas de media pulgada 1/2", incluye pintura a base de agua color blanco para decoración de mamparas.	m2	10.40	\$ 735.404.00	10.40	\$ 7.648.202.00	10.40	\$ 7.648.202.00	0.00	\$ 0.00			10.40	\$ 7.648.202.00	10.40	\$ 7.648.202.00	10.40	\$ 7.648.202.00	100.00%	
9	Replazo de 120 cm de tubería metálica galvanizada, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	1.00	\$ 737.883.00	1.00	\$ 737.883.00	1.00	\$ 737.883.00	0.00	\$ 0.00			1.00	\$ 737.883.00	1.00	\$ 737.883.00	1.00	\$ 737.883.00	100.00%	
10	Reemplazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	4.00	\$ 102.452.00	4.00	\$ 409.808.00	4.00	\$ 409.808.00	0.00	\$ 0.00			4.00	\$ 409.808.00	4.00	\$ 409.808.00	4.00	\$ 409.808.00	100.00%	
11	Reemplazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	3.40	\$ 238.883.00	3.40	\$ 812.195.00	3.40	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			3.40	\$ 812.195.00	3.40	\$ 812.195.00	3.40	\$ 812.195.00	100.00%	
12	Reemplazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	9.00	\$ 365.522.00	9.00	\$ 3.085.608.00	19.84	\$ 7.178.802.00	10.75	\$ 12.939.362.00	(1)	8.84	\$ 3.248.461.00	10.75	\$ 12.939.362.00	0.00	\$ -	10.75	\$ 12.939.362.00	100.00%
LADO TIERRA																				
13	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	4.63	\$ 37.060.000	4.63	\$ 171.588.00	4.63	\$ 171.588.00	0.00	\$ 0.00			4.63	\$ 171.588.00	4.63	\$ 171.588.00	4.63	\$ 171.588.00	100.00%	
14	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	2.00	\$ 52.085.000	2.00	\$ 208.340.00	4.00	\$ 208.340.00	0.00	\$ 0.00			4.00	\$ 208.340.00	4.00	\$ 208.340.00	4.00	\$ 208.340.00	100.00%	
15	Demolición de muro cualquier espesor	m2	24.20	\$ 42.871.000	18.70	\$ 713.946.00	18.70	\$ 713.946.00	0.00	\$ 0.00			18.70	\$ 713.946.00	18.70	\$ 713.946.00	18.70	\$ 713.946.00	100.00%	
16	Demolición de muros cualquier espesor (Incluye Paredes)	m	3.00	\$ 49.085.000	2.00	\$ 98.170.00	2.00	\$ 98.170.00	0.00	\$ 0.00			2.00	\$ 98.170.00	2.00	\$ 98.170.00	2.00	\$ 98.170.00	100.00%	
17	Demolición de muros cualquier espesor (Incluye Paredes)	m	2.00	\$ 49.113.000	2.00	\$ 98.226.00	2.00	\$ 98.226.00	0.00	\$ 0.00			2.00	\$ 98.226.00	2.00	\$ 98.226.00	2.00	\$ 98.226.00	100.00%	
18	Demolición de muros cualquier espesor (Incluye Paredes)	m	20.20	\$ 13.871.000	4.00	\$ 202.023.00	4.00	\$ 202.023.00	0.00	\$ 0.00			4.00	\$ 202.023.00	4.00	\$ 202.023.00	4.00	\$ 202.023.00	100.00%	
19	Demolición de muros cualquier espesor (Incluye Paredes)	m	13.00	\$ 53.371.000	3.84	\$ 204.945.00	3.84	\$ 204.945.00	0.00	\$ 0.00			3.84	\$ 204.945.00	3.84	\$ 204.945.00	3.84	\$ 204.945.00	100.00%	
20	Demolición de muros cualquier espesor (Incluye Paredes)	m	10.00	\$ 50.142.000	12.00	\$ 661.704.00	12.00	\$ 661.704.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 661.704.00	12.00	\$ 661.704.00	12.00	\$ 661.704.00	100.00%	
21	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
22	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
23	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
24	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
25	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
26	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
27	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
28	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
29	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
30	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
31	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
32	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
33	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
34	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
35	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
36	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
37	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
38	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
39	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
40	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
41	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2" nominal, con mangueo tipo 100mm de espesor, con un espesor mínimo de 0.25 m y no menor a 0.50 m en sus conexiones.	m	14.00	\$ 1.809.000	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	0.00	\$ 0.00			12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	12.00	\$ 812.195.00	100.00%	
42	Replazo de tuberías metálicas galvanizadas, de 1/2" a 1 1/2"																			

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 46 de 71

91	Requerimiento y envío sobre mano de obra y arrendamiento de maquinaria y herramienta menor	M2	440,52	\$ 30.322.000	440,52	\$ 13.352.161,00	440,52	\$ 13.352.161,00	440,52	\$ 13.352.161,00	0,00	\$ -	440,52	\$ 13.352.161,00	0,00	\$ -	440,52	\$ 13.352.161,00	100,00%	
92	Instalar para mano de obra	M2	500,00	\$ 23.500,00	500,00	\$ 7.052.400,00	500,00	\$ 7.052.400,00	500,00	\$ 7.052.400,00	0,00	\$ -	500,00	\$ 7.052.400,00	0,00	\$ -	500,00	\$ 7.052.400,00	100,00%	
93	Protección de tráfico pesado y recorridos de vehículos en color a tráfico, incluye	M2	125,96	\$ 70.023,00	125,96	\$ 8.820.097,00	125,96	\$ 8.820.097,00	125,96	\$ 8.820.097,00	(*)	\$ -	125,96	\$ 8.820.097,00	0,00	\$ -	125,96	\$ 8.820.097,00	100,00%	
94	Suministro y colocación de Piso estructurado para exterior multiuso casas	M2	307,00	\$ 106.493,00	307,00	\$ 24.067.418,00	307,00	\$ 24.067.418,00	307,00	\$ 24.067.418,00	0,00	\$ -	307,00	\$ 24.067.418,00	0,00	\$ -	307,00	\$ 24.067.418,00	100,00%	
95	Suministro e instalación de barra fpa y barra atabiliz para todo de discapacidad	un	4,00	\$ 929.685,00	4,00	\$ 3.718.740,00	4,00	\$ 3.718.740,00	4,00	\$ 3.718.740,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 3.718.740,00	0,00	\$ -	4,00	\$ 3.718.740,00	100,00%	
96	Instalación y registro	M2	\$ 2.612,00	115,00	\$ 300.380,00	115,00	\$ 300.380,00	115,00	\$ 300.380,00	(*)	\$ -	0,00	\$ 522,00	115,00	\$ 300.902,00	0,00	\$ -	115,00	\$ 300.902,00	100,00%
992	Desmontaje capa vegetal y nivelación masal incluye retiro	M2	\$ 18.196,00	115,00	\$ 2.092.540,00	115,00	\$ 2.092.540,00	115,00	\$ 2.092.540,00	(*)	\$ -	0,00	\$ 3.639,00	113,00	\$ 2.096.179,00	0,00	\$ -	113,00	\$ 2.096.179,00	100,00%
993	Perfil metálico canalado 100x40 o 14, incluye anticoncreto y pintura	M	\$ 133.000,00	78,00	\$ 8.580.000,00	78,00	\$ 8.580.000,00	78,00	\$ 8.580.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 3.580.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 3.580.000,00	100,00%		
994	Perfil metálico canalado 100x40 o 18, incluye anticoncreto y pintura	M	\$ 85.000,00	204,00	\$ 17.340.000,00	204,00	\$ 17.340.000,00	204,00	\$ 17.340.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 204,00	\$ 17.340.000,00	0,00	\$ -	204,00	\$ 17.340.000,00	100,00%	
995	Desmontaje del enchape de piso y grando, incluye trabajo y carga masal	M	\$ 51.000,00	303,22	\$ 15.464.220,00	303,22	\$ 15.464.220,00	303,22	\$ 15.464.220,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 303,22	\$ 15.464.220,00	0,00	\$ -	303,22	\$ 15.464.220,00	100,00%	
996	Concreto para columnas	M2	\$ 188.400,00	0,84	\$ 188.688,00	0,84	\$ 188.688,00	0,84	\$ 188.688,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 0,84	\$ 188.688,00	0,00	\$ -	0,84	\$ 188.688,00	100,00%	
997	Teja arquitectónica termocautica 2mm, impermeabil color azul, incluye canalillo	M2	\$ 138.000,00	176,00	\$ 24.288.000,00	415,00	\$ 57.270.000,00	415,00	\$ 57.270.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 415,00	\$ 57.270.000,00	0,00	\$ -	415,00	\$ 57.270.000,00	100,00%	
998	Suministro e instalación de tubería de 6"	M2	\$ 98.000,00	78,00	\$ 7.644.000,00	78,00	\$ 7.644.000,00	78,00	\$ 7.644.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 78,00	\$ 7.644.000,00	0,00	\$ -	78,00	\$ 7.644.000,00	100,00%	
999	Suministro e instalación de puertas en aluminio	M2	\$ 700.000,00	19,80	\$ 13.720.000,00	19,80	\$ 13.720.000,00	0,00	\$ -	(*)	\$ -	5,00	\$ 3.810.000,00	14,30	\$ 9.870.000,00	14,30	\$ 9.870.000,00	100,00%		
9910	Instalación de tubería termoplastica 2mm, impermeabil color azul, incluye canalillo	M2	\$ 135.000,00	14,88	\$ 2.008.800,00	14,88	\$ 2.008.800,00	14,88	\$ 2.008.800,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 14,88	\$ 2.008.800,00	0,00	\$ -	14,88	\$ 2.008.800,00	100,00%	
9911	Empaques 3 mm	M2	\$ 185.000,00	6,00	\$ 1.110.000,00	6,00	\$ 1.110.000,00	0,00	\$ -	(*)	\$ -	3,60	\$ 666.000,00	2,40	\$ 444.000,00	2,40	\$ 444.000,00	100,00%		
9912	Enchape para baños piso pastel en ceramica formato 60x60cm para plato y mano de obra ceramica o similar	M	\$ 108.000,00	120,00	\$ 12.720.000,00	120,00	\$ 12.720.000,00	120,00	\$ 12.720.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 120,00	\$ 12.720.000,00	0,00	\$ -	120,00	\$ 12.720.000,00	100,00%	
9913	Suministro e instalación de division en vidrio de 8mm, con estructura en aluminio	M2	\$ 870.000,00	22,10	\$ 21.437.000,00	22,10	\$ 21.437.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 22,10	\$ 21.437.000,00	0,00	\$ -	22,10	\$ 21.437.000,00	100,00%	
9914	Suministro e instalación de cielo raso en pvc, incluye perfilado y los accesorios para su correcta instalación	M2	\$ 105.000,00	88,00	\$ 9.030.000,00	88,00	\$ 9.030.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	88,00	\$ 9.030.000,00	88,00	\$ 9.030.000,00	88,00	\$ 9.030.000,00	100,00%		
99	ITEM NO PREVISTOS												0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ -		
9915	Concreto para bordillo de 0,30x0,10	M	\$ 106.494,00			74,10	\$ 7.891.205,00	74,10	\$ 7.891.205,00	0,00	\$ -	0,00	\$ 74,10	\$ 7.891.205,00	0,00	\$ -	74,10	\$ 7.891.205,00	100,00%	
9916	Cable en tubería galvanizada C1 18	M	\$ 95.823,00			20,00	\$ 1.916.500,00	0,00	\$ -	(*)	\$ -	4,00	\$ 383.300,00	24,00	\$ 2.299.800,00	24,00	\$ 2.299.800,00	100,00%		
9917	Lampara led instalada 2kw	L	\$ 60.000,00			2,00	\$ 120.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 2,00	\$ 120.000,00	2,00	\$ 120.000,00	2,00	\$ 120.000,00	100,00%	
9918	Tierra negra abonada para jardín	M3	\$ 169.941,00			1,00	\$ 169.941,00	0,00	\$ -	(*)	\$ -	2,00	\$ 339.882,00	3,00	\$ 509.823,00	3,00	\$ 509.823,00	100,00%		
9919	Suministro e instalación de fono para riego	L	\$ 27.000,00			150,00	\$ 4.050.000,00	0,00	\$ -	(*)	\$ -	20,00	\$ 540.000,00	170,00	\$ 4.590.000,00	170,00	\$ 4.590.000,00	100,00%		
9920	Guata escoba en ceramica 14,30cm	M	\$ 28.000,00			44,50	\$ 1.345.000,00	44,50	\$ 1.345.000,00	(*)	\$ -	60,70	\$ 1.899.600,00	105,20	\$ 3.245.600,00	105,20	\$ 3.245.600,00	100,00%		
9921	Suministro e instalación de puerta en aluminio con vidrio de 8 mm	M2	\$ 1.045.000,00			9,57	\$ 10.008.000,00	0,00	\$ -	(*)	\$ -	2,80	\$ 2.926.000,00	12,37	\$ 12.926.000,00	12,37	\$ 12.926.000,00	100,00%		
9922	Suministro e instalación de accesorio para en tubería galvanizada 2" malla	L	\$ 1.980.000,00			2,00	\$ 3.960.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 2,00	\$ 3.960.000,00	2,00	\$ 3.960.000,00	2,00	\$ 3.960.000,00	100,00%	
9923	Desmonte de pavimento en malla	M2	\$ 33.000,00			2,40	\$ 80.400,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	2,40	\$ 80.400,00	2,40	\$ 80.400,00	2,40	\$ 80.400,00	100,00%		
9924	Caja de inspeccion de 1,20x0,30	M2	\$ 720.000,00			1,00	\$ 720.000,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	1,00	\$ 720.000,00	1,00	\$ 720.000,00	1,00	\$ 720.000,00	100,00%		
9925	PERFORACIÓN TPO KOPORAZA	M2	\$ 16.828,75					0,00	\$ -	(*)	\$ -	398,68	\$ 6.708.152,00	398,68	\$ 6.708.152,00	398,68	\$ 6.708.152,00	100,00%		
9926	PERFORACIÓN TPO ESMAL NE AZUL MAR	M2	\$ 27.985,43					0,00	\$ -	(*)	\$ -	69,11	\$ 1.934.002,00	69,11	\$ 1.934.002,00	69,11	\$ 1.934.002,00	100,00%		
SUB TOTAL																				
IVA 10% SUMINISTROS																				
TOTAL OBRA																				
SUMINISTROS																				
9927	Suministro de silla tandem modular de cuatro puestos	Unid	\$ 1.180.000,00			8,00	\$ 9.480.000,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	8,00	\$ 9.480.000,00	8,00	\$ 9.480.000,00	8,00	\$ 9.480.000,00	100,00%		
SUB TOTAL SUMINISTROS																				
IVA 10% SUMINISTROS																				
TOTAL SUMINISTROS																				
TOTAL PROYECTO (OBRA + SUMINISTROS)																				

B. ACTIVIDADES AMBIENTALES Y DE SALUD OCUPACIONAL.

1. AFILIACION DEL PERSONAL.

Se verificó que todo el personal que labora en la obra esté afiliado al sistema de seguridad social.

2. INDUCCION AEROCIVIL.

Se realizó la inducción de la Aero civil a todo el personal que labora en la obra.

3. DOTACION DEL PERSONAL.

Se entregó la dotación requerida para los trabajos a ejecutar, así como los elementos de protección personal para minimizar los riesgos por accidentes de trabajo. Se cumplió con los requerimientos de trabajo seguro en alturas, contando con los respectivos permisos para el personal que realiza dichas actividades. Además se cumple con protocolos de bioseguridad establecidos.

4. SEÑALIZACION DE OBRA.

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 47 de 71

Se realizó la señalización de la obra, con cinta, para lograr un espacio adecuado y seguro de trabajo, en los espacios que presentan riesgo para el personal.

5. CAPACITACIONES AL PERSONAL.

Se realiza diferentes charlas al personal en temas relacionados con:

- Manejo de residuos sólidos.
- Utilización de elementos de protección personal.
- Manejo de herramientas de trabajo.
- Trabajo seguro en obra.

6. REVISION DE EQUIPO Y HERRAMIENTA.

Se verifico que tanto el equipo, vehículos y herramienta cumpliera con los requisitos técnicos y de seguridad. En cuanto a vehículos que se cuente con los documentos como SOAT, revisión técnico mecánicas vigentes, y en cuanto a herramienta que estén adecuadas para laborar, realizándole el debido mantenimiento.

C. SEGUIMIENTO PROGRAMACION.

Se lleva control adecuado del programa de obra presentado, no obstante, las lluvias que se han presentado durante varios días de labores, así como la falta de materiales en la zona y trasladarlos vía terrestre hacia el Aeropuerto, lo que ha dificultado el acceso de personal y materiales al sitio de obra.

2.1 PRODUCTOS ENTREGADOS Y/O BIENES ENTREGADOS:

De acuerdo con el objeto del contrato en ejecución durante el periodo se realizó actividades contempladas en el contrato tales como Cubiertas, estucos, pinturas, enchapes concretos y andenes.

OBSERVACIONES A LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS, A LAS OBLIGACIONES CUMPLIDAS, Y A LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

No se presenta ninguna observación.

3. OBSERVACIONES ADICIONALES, SI A ELLO HUBIERE LUGAR.

N/A

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 48 de 71

3.1 ANÁLISIS MATERIALIZACIÓN Y MITIGACIÓN DEL RIESGO:

1	¿Durante la ejecución se materializó algún riesgo?	NO
2	Tipo de riesgo	NO APLICA
3	¿Cómo se materializó el riesgo?	NO APLICA
4	¿Cómo se mitigó el riesgo?	NO APLICA
5	¿Fue oportuna la mitigación?	NO APLICA
OBSERVACIONES: No se materializo ningún riesgo		

3.2 VERIFICACIÓN de obligaciones frente al SGSST

3.2.1 EXAMEN OCUPACIONAL

¿CUENTA CON EL EXAMEN PREOCUPACIONAL VIGENTE?	
SI	NO
N/A	
¿FUE ENTREGADA LA COPIA DEL EXAMEN A LA SUBDIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS SRH-GSST?	
SI	NO
N/A	

En caso de ser afirmativas las anteriores respuestas, por favor diligencie la siguiente información:

FECHA DE REALIZACION DEL EXAMEN	FECHA DE VENCIMIENTO DEL EXAMEN
N/A	

3.2.2. CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

¿ASISTIO A LA CAPACITACION EN EL SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO?
--

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 49 de 71

SI	NO
X	
FECHA DE REALIZACION DE LA CAPACITACION	
18 de noviembre de 2023	

3.3 PUBLICACION DEL INFORME EN LA PLATAFORMA SECOP II

NÚMERO DE INFORME	PUBLICACIÓN EN SECOP II	
	SI	NO
1		x
2		x
3		x
4 y f		x

NOTA: este cuadro deberá ser diligenciado a partir del momento en que la Dirección administrativa informe.

4. PORCENTAJES DE AVANCE PRESUPUESTAL Y EN EJECUCIÓN DEL CONTRATO.

4.1 AVANCE PRESUPUESTAL EN RAZÓN DE LOS PAGOS REALIZADOS:

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 50 de 71

ORDEN	OBJETO	VALOR TOTAL	PERIODO	SALDO	PAGADO	VALOR PENDIENTE PERIODO
23000931 H4 DE 2023	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO	CUATROCIENTOS DIECISEIS MILLONES CIENTO VEINTIUN MIL QUINIENTOS VEINTIDOS PESOS M/CTE (\$416.121.522.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Del 12 de septiembre de 2023 al 25 de noviembre de 2023	\$416.121.522	\$ 100.796.469	\$ 315.325.053
23000931 H4 DE 2023	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO	CIENTO VEINTE MILLONES CIENTO VEINTI SIETE MIL CUATROCIENTOS OVENTA Y CINCO PESOS M/CTE (\$120.127.495) INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD. QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS M/CTE (\$536.249.017.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Del 26 de noviembre de 2023 al 11 de diciembre de 2023	\$435.452.548	\$ 181.886.020	\$253.586.528
23000931 H4 DE 2023	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO	QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS M/CTE (\$536.249.017.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Del 12 de DICIEMBRE de 2023 al 27 de diciembre de 2023	\$253.586.528	\$ 71.518.676	\$ 182.047.852

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 51 de 71

23000931 H4 DE 2023	REALIZAR MANTENIMIENTO DEL LADO AIRE Y LADO TIERRA EN LA INFRAESTRUCTURA AEROPORTARIA EN EL AEROPUERTO DE URRAO	QUINIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MIL DIECISIETE PESOS M/CTE (\$536.249.017.00), INCLUIDO IVA SOBRE UTILIDAD	Del 28 de DICIEMBRE de 2023 al 31 de enero de 2024	182.067.851,00	\$ 182.067.851,00	\$ 0,00
---------------------	---	---	--	----------------	-------------------	---------


El porcentaje ejecutado del contrato en mención es de 100 % hasta el 31 de enero de 2024.

5.2 AVANCE EN EL PORCENTAJE DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO RESPECTO DE LOS PRODUCTOS Y/O BIENES ENTREGADOS.

Al corte mensual del 31 de enero de 2024 se entrega el informe mensual correspondiente.

En mi calidad de supervisor del contrato me permito avalar el contenido del informe y el avance en la ejecución del mismo de acuerdo a lo descrito.

El contrato no presenta a la fecha dificultades en su ejecución, ni situaciones exógenas que afecten el normal desarrollo del mismo.



ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN
SUPERVISOR

 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 52 de 71





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 53 de 71





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 54 de 71





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 55 de 71





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:


xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 56 de 71

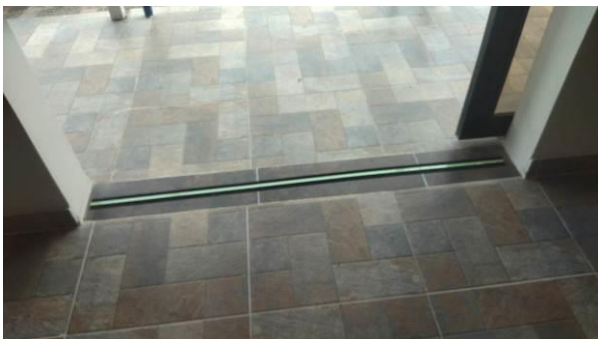

 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 57 de 71





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 58 de 71





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:


xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 59 de 71

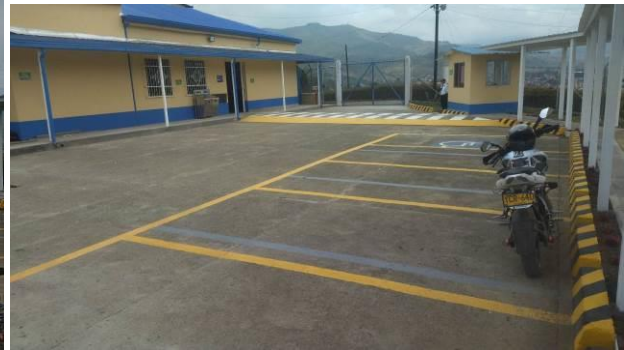



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 60 de 71





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046


Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 61 de 71



 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 62 de 71

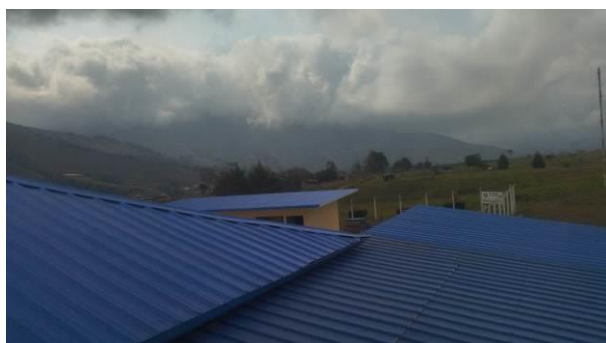



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 63 de 71





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 64 de 71





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 65 de 71



 <p>AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL</p>	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 66 de 71





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 67 de 71





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 68 de 71





AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:



xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 69 de 71

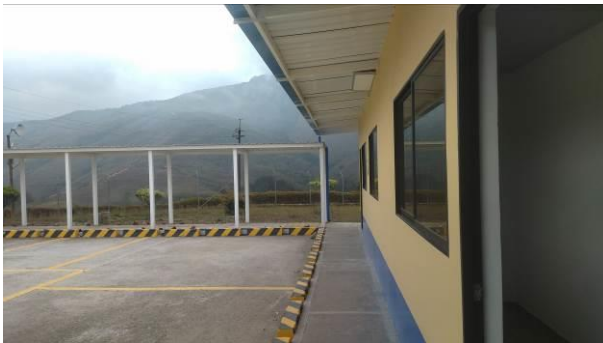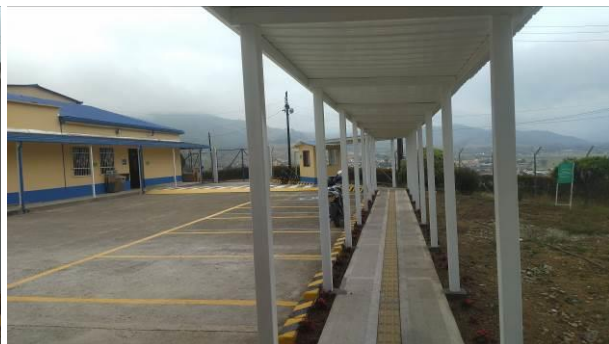



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

FORMATO

FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Principio de procedencia:

xxxx.092

Clave: GCON-1.0-12-046

Versión: 02

Fecha: 04/oct/2019

Página: 70 de 71



 AERONÁUTICA CIVIL UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL	FORMATO			
	FORMATO 62 INFORME DE SUPERVISIÓN Y EJECUCIÓN CONTRACTUAL			
Principio de procedencia: xxxx.092	Clave: GCON-1.0-12-046	Versión: 02	Fecha: 04/oct/2019	Página: 71 de 71

