

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INFORME DE MES No. 4	
--	---------------------------------	---

INFORME DE AVANCES No. 4

Contrato No. 217 de 2024

ALCANCE: Implementación de una solución tecnológica integral para audio, video e iluminación en las sedes de la rama judicial.

ABRIL DE 2025

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	3
2. OBJETIVO	3
3. ADQUISICIONES	3
4. AVANCE IMPLEMENTACIÓN POR SALA	3
4.1. Centro de Memoria del Holocausto	4
4.2. Cartelería Digital.....	4
4.3. Sala Plena Corte Suprema de Justicia	4
4.3.1. Informes de ejecución semanal para Sala Corte Suprema de Justicia.....	5
4.4. Sala Plena Comisión Nacional de Disciplina Judicial	25
4.4.1. Informes de ejecución semanal Sala Plena Comisión Nacional de Disciplina Judicial. .	26
4.5. Sala Plena Consejo Superior de la Judicatura	35
4.5.1. Informes de ejecución semanal Sala Plena Consejo Superior de la Judicatura.	36
4.6. Salas de Reunión Piso 9	46
4.6.1. Informes de ejecución semanal Salas del Piso Nueve	47
5. CRONOGRAMA.....	60
5.1. Análisis General del Cronograma (hasta el 05 de mayo de 2025).....	61
5.1.1. Fase de Ejecución	61
6. Conclusiones y Recomendaciones	62

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INFORME DE MES No. 4	
--	--	---

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe detalla el avance en la ejecución del Contrato No. 217 de 2024 cuyo objeto es la **implementación de una solución tecnológica integral para audio, video e iluminación** en las sedes de la rama judicial.

Este documento incluye detalle de las actividades realizadas y los resultados obtenidos en la ejecución del proyecto, en los espacios a los cuales la Entidad ha autorizado el ingreso para inicio de ejecución.

2. OBJETIVO

El objetivo de este informe es:

Registrar y documentar los avances hasta la fecha del presente informe en la ejecución del proyecto de **implementación de una solución tecnológica integral para audio, video e iluminación** en las sedes de la rama judicial.

3. ADQUISICIONES

En el mes de se realizó entrega y cargue en la carpeta del proyecto del cuadro de control de importaciones

[Cuadro control importaciones CSJ.xlsx](#)

4. AVANCE IMPLEMENTACIÓN POR SALA

El presente capítulo detalla el avance en la implementación del proyecto en las diferentes sedes de la Rama Judicial.

A continuación, se presenta la descripción de los planes de trabajo desarrollados por cada una de las semanas, posterior a la entrega de los espacios acorde al cronograma entregado al cliente final, resultado de la ampliación de los plazos en la ejecución del contrato, y la determinación en la disponibilidad de intervención de las salas.

Se presenta la evidencia fotográfica de las actividades realizadas en los espacios con la finalidad de establecer los estados de avance para cada uno de los espacios intervenidos durante el mes de abril, periodo del presente informe.



4.1. Centro de Memoria del Holocausto

Durante el mes de abril de 2025, las intervenciones en el Centro de Memoria del Holocausto estuvieron en pausa debido principalmente a que el espacio estuvo asignado por parte del cliente final a los contratistas de obra civil encargados de las respectivas adecuaciones.

Según el cronograma presentado (modificado por ampliación en plazos con cliente final y Yeapdata), se espera recibir el espacio para el reinicio en la ejecución de las tareas programadas el 05-05-2025.

4.2. Cartelería Digital

Las actividades de Cartelería Digital el avance registrado y detallado en el informe del mes de marzo. Posterior a la modificación del cronograma entre la Entidad y Yeapdata, como parte de la ampliación en tiempo del contrato, las actividades de cartelería digital previstas en el mismo se avanza en la instalación y configuración del servidor de cartelería digital, la fabricación del soporte para la pantalla de 163" ubicada en la Dirección Ejecutiva de Administración Judicial.

4.3. Sala Plena Corte Suprema de Justicia

Este progreso refleja la ejecución de las actividades programadas según el cronograma, como se detalla a continuación:

- **Adecuaciones (50% completado):** La mayoría de las tareas en esta área están completamente ejecutadas, incluyendo las adecuaciones locativas, el desmonte de equipos e infraestructura, y la instalación de cableado eléctrico y de datos (100% de avance). Sin embargo, las adecuaciones de mobiliario presentan un avance limitado, con actividades como la perforación de mesas y la adecuación de faldones aún pendientes, lo que ha generado una demora en la instalación y configuración de equipos.
- **Instalaciones (18% completado):** Se ha logrado un avance parcial en la instalación de racks y equipos de audio y video (50%). Sin embargo, las instalaciones de equipos de conferencia, iluminación y automatización están pendientes (0%). Debido a la no culminación en las adecuaciones de mobiliario no se ha iniciado completamente las instalaciones generando así un impacto también en la fase de configuración, pruebas y ajustes de los equipos, lo que retrasa el progreso general de avance en esta sala.

En el numeral subsecuente se presentan las evidencias consolidadas de los avances alcanzados en la Sala Corte Suprema de Justicia durante el mes de abril.

4.3.1. Informes de ejecución semanal para Sala Corte Suprema de Justicia.

Semana 11 de abril al 21 de abril

A continuación, se presenta el avance de la semana comprendida entre el 11 de abril al 21 de abril de 2025, se trabajó acorde al plan de trabajo presentado para cada una de las salas como se presente e los numerales subsecuentes.

Actividad del Plan de Trabajo	Actividades Ejecutadas
0. Terminar empapelado de sala	Se realizó el empapelado, cubierta y protección del piso y puerta de la sala.
1. Identificación de circuitos eléctricos de cada toma (regulado y no regulado)	Identificación y validación de puntos de red y circuitos eléctricos.
2. Desmonte de cornisas donde aplique	Se realizó proceso de verificación si procede o no en la sala.
3. Desmonte de canaletas para seguimiento de rutas	Se realizó desmonte de tapas de canaletas.
4. Seguimiento y marquillado de cableado de datos existente	Validación de puntos de red desde el rack hasta la mesa. Se identificaron 6 puntos. Validación de puntos en cornisa.
5. Prueba de puntos de datos que se pueden utilizar	Se realizó prueba de puntos de red.
6. Identificación de puntos a retirar	Retiro de cableado UTP para optimización de tuberías.
7. Entrega de plano para intervención de mobiliario	Se entregaron los planos para la definición por parte de la Entidad.
— Otras actividades adicionales	Instalación de puntos de red y control por fuera de canaleta con protección. Desmontaje de parlantes para inventario. Planificación y análisis de próximas actividades para presentar plan de trabajo. Solicitud de anclaje de circuitos.




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



Registro fotográfico

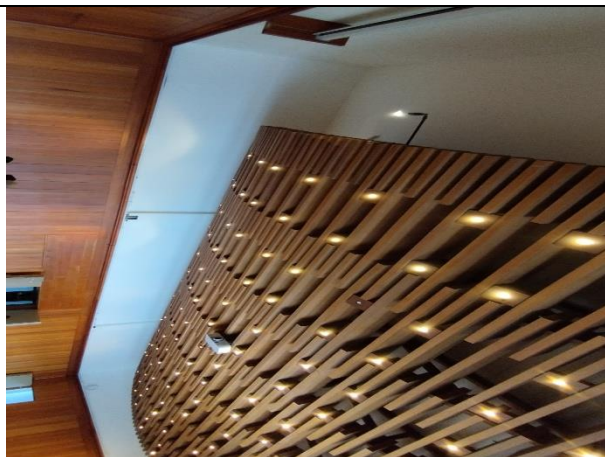

1. desmonte de parlantes CS



2. desmonte de parlantes CS_1



3. desmonte de parlantes CS_2



4. desmonte de parlantes CS_3



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



5. desmonte tapas canaletas CS



6. Protección mobiliario



7. Protección piso



8. Protección Puerta



9. Protección



10. Verificación de rutas e infraestructura



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



11. Verificación canaletas



12. Desmonte de tapas canaletas




13. IMG-20250415-WA0067



14. IMG-20250415-WA0068



15. IMG-20250415-WA0069

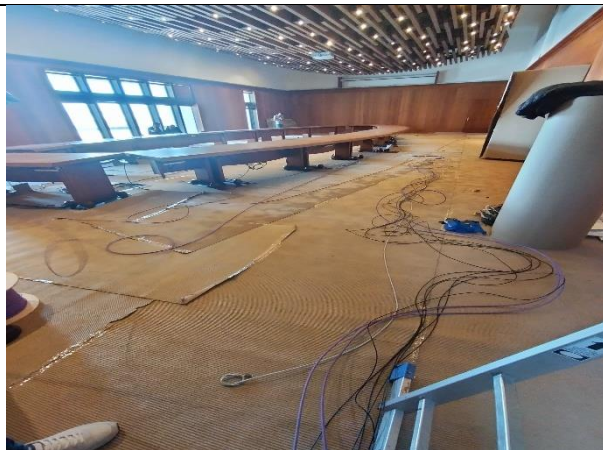

16. IMG-20250416-WA0016



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


INFORME DE MES No. 4



17. Verificación cableado



18. cableado

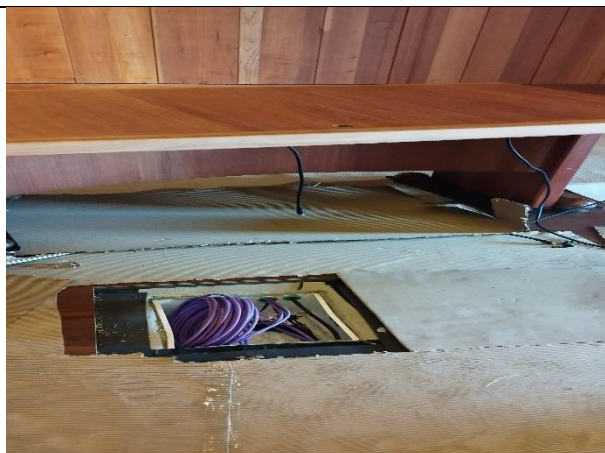

19. Verificación cableado



20. Verificación cableado



21. Verificación cableado



22. Verificación cableado



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



23. Protección piso CS




24. retiró de cableado



25. Validación datos CS



26. verificación puntos de red CS

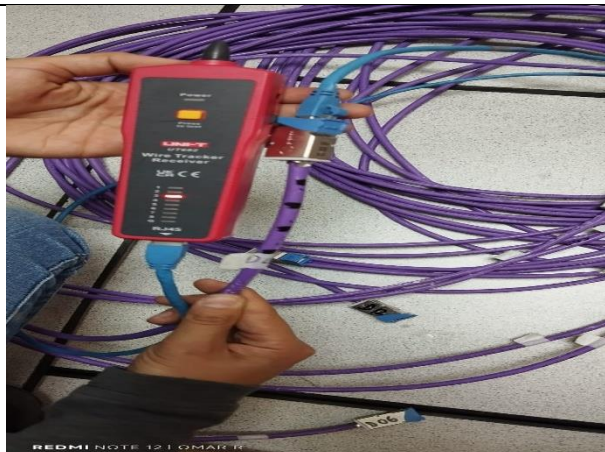

27. verificación puntos de red CS1



28. verificación puntos de red CS2



29. verificación puntos de red mesas



30. verificación puntos de red mesas_1

Semana entre el 22 y 28 de abril

A continuación, se presenta el avance de la semana comprendida entre el 22 y 28 de abril de 2025, se trabajó acorde al plan de trabajo presentado para cada una de las salas como se presenta en los numerales subsecuentes.


Actividades	Observaciones
Aprobación ubicación equipos (Pantallas retractiles) en mobiliario según plano.	Se entregaron las propuestas para buscar aprobación por parte de la entidad.
Generación, definición y aprobación de ubicaciones en planos para todos los equipos dentro de la sala.	Se entregaron las propuestas de ubicación de equipos para aprobación.
Generación, definición y aprobación de ubicaciones en planos para tablero de control de iluminación	Se entregaron las propuestas de ubicación de equipos para aprobación.
Definición de ubicación de tablero de control de iluminación y socialización para punto de control de iluminación (conforme a diseño HighLights)	Se realizo la definición en sitio con apoyo de la supervisión
Estudio y aprobación de redistribución y/o instalación de circuitos nuevos eléctricos para los equipos de la sala.	Se realizó el estudio para definir la capacidad de carga requerida y programación de la tarea para la próxima semana según las aprobaciones por parte de la entidad.
Propuesta cotización de acometida eléctrica dentro de estructura para la pantalla LED	Se presentó el diseño posterior a la visita realizada para ajustar detalles según validación en sitio
Ingreso de Equipos de alturas, Andamio, Arneses, Materiales	Se realizo ingreso, y armado de andamio para labores de trabajo en alturas




Actividades	Observaciones
Armado de Andamio en sala. Generación de permiso de trabajo en alturas	Se realizó ingreso, y armado de andamio para labores de trabajo en alturas
Desmontaje de Videoprojector y Telón de la sala	Se realizó el desmontaje de Videoprojector y Telón de la sala
Cableado de puntos (Cámaras, puntos eléctricos pantalla LED)	Se realizó el cableado de cámaras y parlantes (queda pendiente las acometidas adicionales para la pantalla de 5x3 posterior a la aceptación de la OC)
Tendido de circuitos eléctricos para la pantalla Led.	Se realizó la cotización y visita de campo para análisis.
Distribución de tubería para parlantes / cableado - punto para control de iluminación desde el rack. De la sala	Se realizó el cableado de cámaras y parlantes (queda pendiente las acometidas adicionales para la pantalla de 5x3 posterior a la aceptación de la OC)

Registro fotográfico

1. cableado de datos desde rack hasta pantalla	2. cableado para cámaras

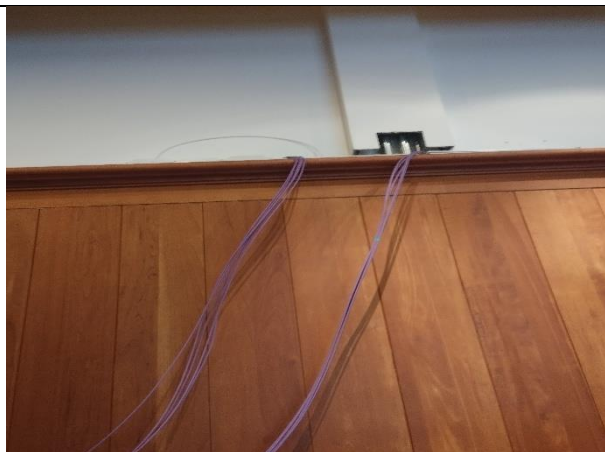

3. 5 infraestructura de datos

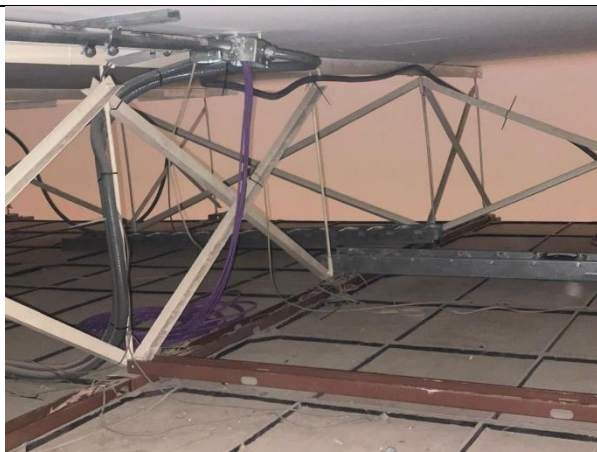

4. cableado e infraestructura para audio en techo (2)



5. cableado e infraestructura para audio en techo (3)



6. cableado e infraestructura para audio en techo (4)



7. cableado e infraestructura para audio en techo (5)



8. cableado e infraestructura para audio en techo (6)



9. cableado e infraestructura para audio en techo (7)



10. cableado e infraestructura para audio en techo



11. cableado para cámara (ubicación Cámara)



12. Cableados de iluminación



13. cableado en techo (2)



14. cableado en techo (3)




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



15. cableado en techo (4)

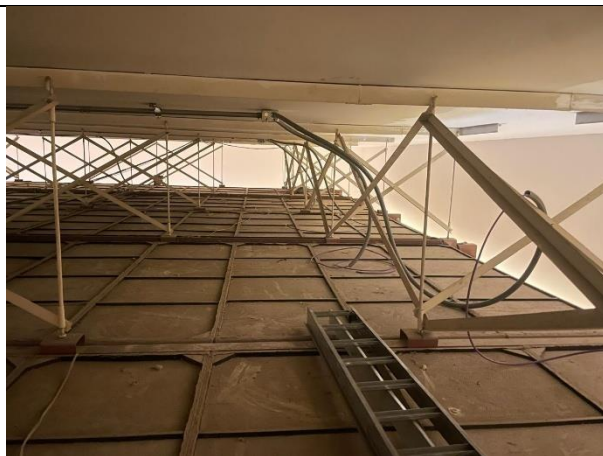


16. cableado en techo (5)




17. cableado en techo



18. desmonte de cables de micrófonos anteriores

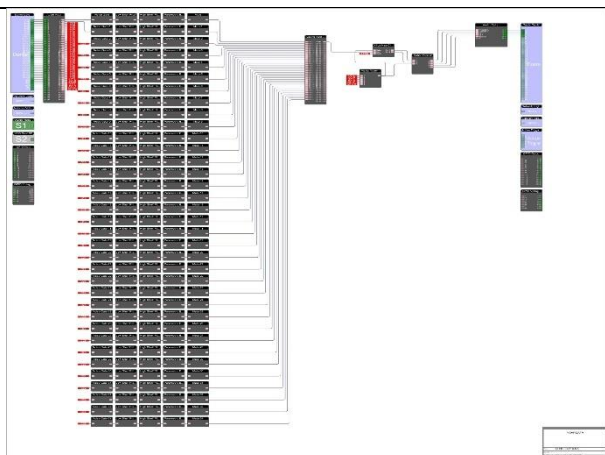

19. Diseño de audio Corte Suprema (2)

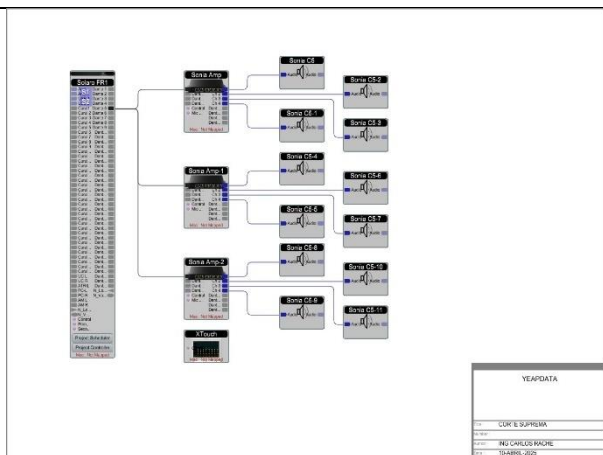


20. Diseño de audio Corte Suprema



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4

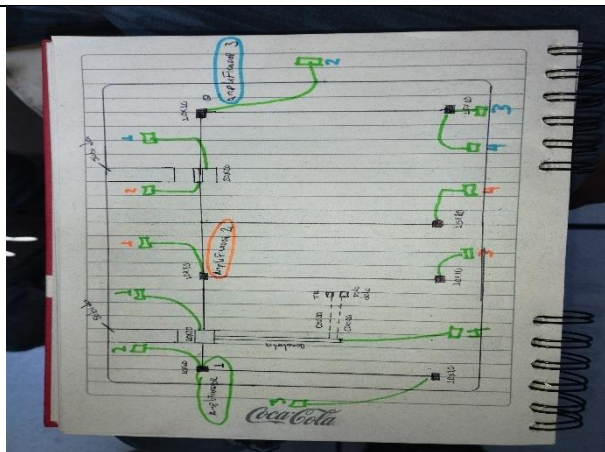


21. distribución infraestructura en techo corte suprema



22. identificación de parlantes para desinstalar 1



23. infraestructura de datos para rack

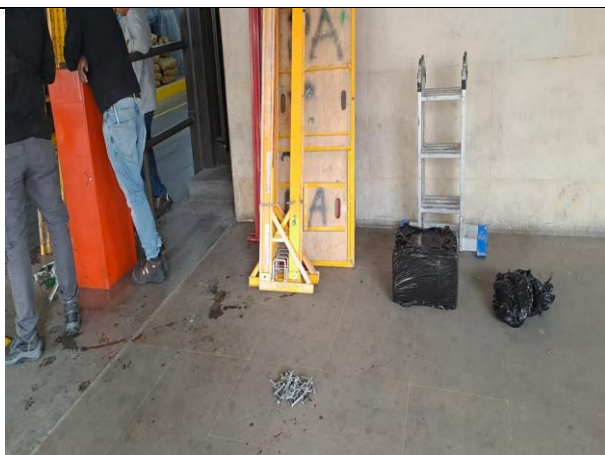

24. Ingreso andamio (2)



25. Ingreso andamio



26. ingreso equipo de seguridad



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



27. instalación cableado audio 1



28. prueba y marquillado de puntos (2)



29. prueba y marquillado de puntos (3)



30. prueba y marquillado de puntos (4)



31. prueba y marquillado de puntos (5)




32. prueba y marquillado de puntos (6)



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4

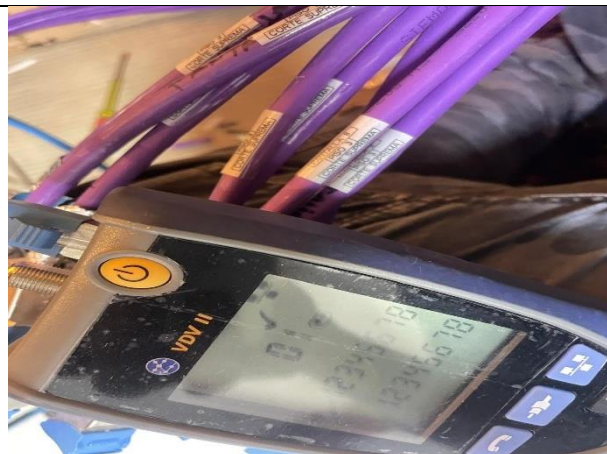

33. prueba y marquillado de puntos (7)




34. prueba y marquillado de puntos (8)



35. prueba y marquillado de puntos



36. punto de Cámara

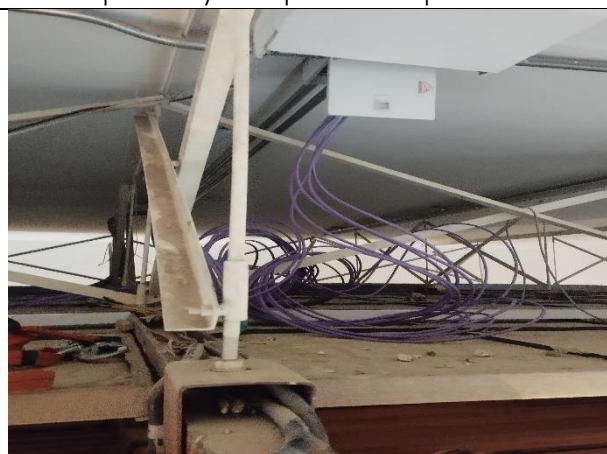

37. Punto de datos listo en el techo para distribución parlantes



38. puntos de datos para amplificadores



39. visita para verificación soportes de pantallas 5x3	

Semana entre el 29 de abril y el 5 de mayo

A continuación, se presenta el avance de la semana comprendida entre el 29 de abril al 05 de mayo del 2025, se trabajó acorde al plan de trabajo presentado para cada una de las salas como se presenta en los numerales subsecuentes.

Nombre de la tarea	Observaciones
CORTE SUPREMA	
Instalación cableado eléctrico	
Identificación de rutas de los circuitos eléctricos para la pantalla de 5x3	Se llevo a cabo la tarea identificando y cableando la nueva ruta que llevaría los tres circuitos para la pantalla de 5x3, se requirió des energizar el tablero sobre el cual se conectarían la nueva acometida.
Instalación de circuitos eléctricos nuevos	
Adecuaciones mobiliario	
Aprobación de intervención de mesas	Se entregó aprobación por parte de la Entidad, se realizó la respectiva plantilla y marcación
Generación de plantilla	
Marcación de mesa	
Retiro canaleta mesa	
Retiro de faldones.	
Aprobación de inicio de intervención	
Adecuaciones mesas (perforación y acondicionamiento)	
Adecuación de refuerzo de pantalla	




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



Nombre de la tarea	Observaciones
Adecuaciones placa de identificación	
INSTALACIONES	
Fase de Instalaciones	
Instalaciones Rack	Se completó la instalación del rack
Instalaciones equipos de audio	Se completo la instalación de equipos de audio en rack, pendiente amplificador y parlantes ubicados en techo
Instalaciones equipos de video	Se completó la instalación de equipos de video en rack, así como la instalación del soporte de la pantalla de 5x3
Instalación equipos conferencia y debate	Se completó la instalación de equipos de conferencia y debate ubicados en rack. Debido a la demora en la adecuación de mobiliario no se puede realizar la instalación de las pantallas retráctiles.

Registro fotográfico

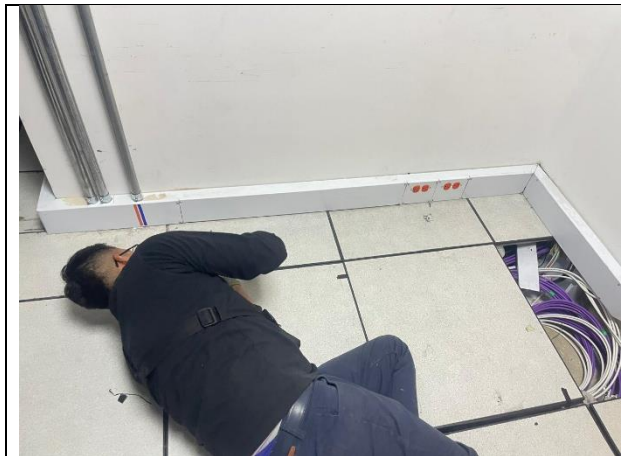

1. cableado de acometida para pantalla 5X3




2. Conexión a tablero eléctrico 4 piso (2)



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4

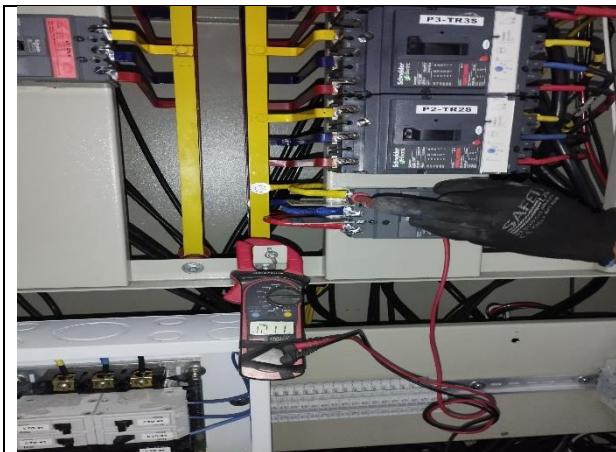


3. Conexión a tablero eléctrico 4 piso (3)



4. Conexión a tablero eléctrico 4 piso (4)



5. Conexión a tablero eléctrico 4 piso (5)

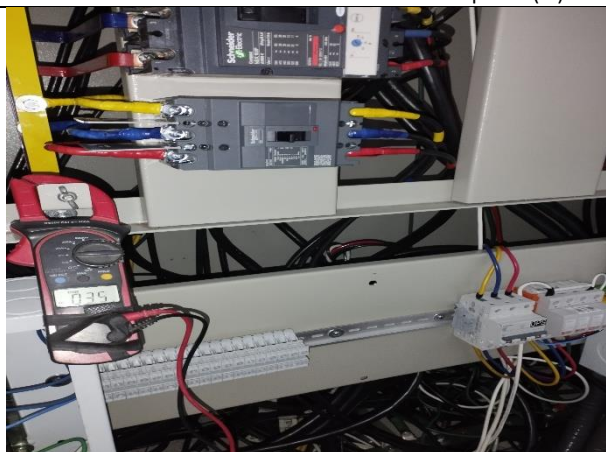

6. Conexión a tablero eléctrico 4 piso (6)



7. Conexión a tablero eléctrico 4 piso



8. desmonte de troqueles




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



9. Inicio organización rack

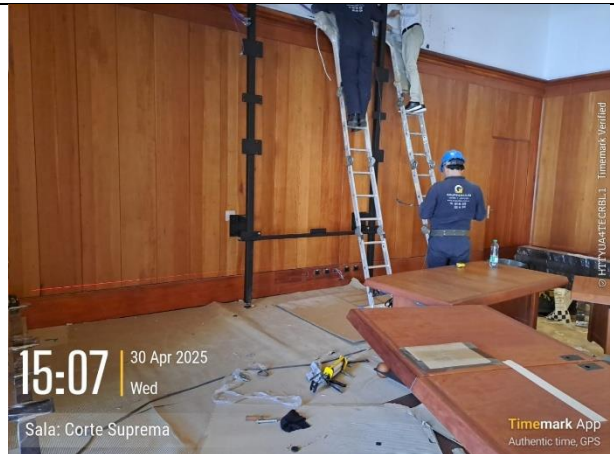


10. instalación soporte de pantalla 5x3 (2)



11. instalación soporte de pantalla 5x3 (3)



12. instalación soporte de pantalla 5x3

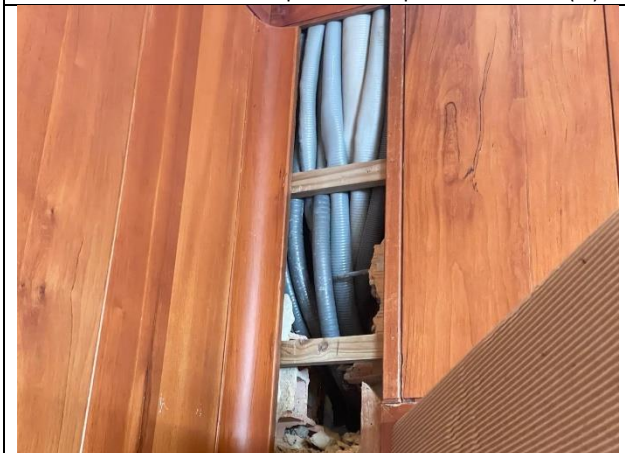

13. Instalación acometida eléctrica
pantalla 5x3 (2)



14. Instalación acometida eléctrica pantalla
5x3 (3)




15. Instalación acometida eléctrica
pantalla 5x3 (4)



16. Instalación acometida eléctrica pantalla
5x3 (5)



17. Instalación acometida eléctrica
pantalla 5x3 (6)

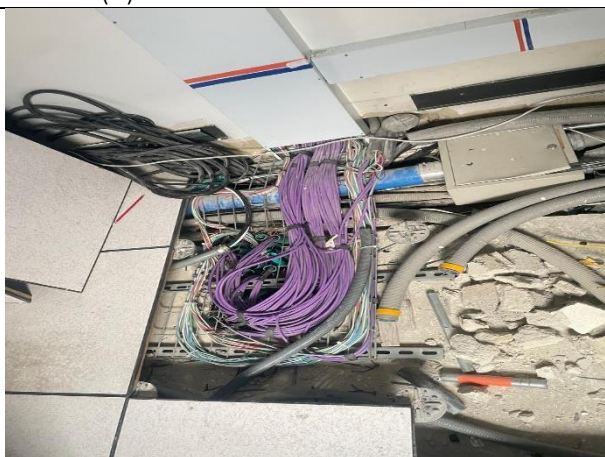

18. Instalación acometida eléctrica pantalla
5x3 (7)



19. instalación acometida eléctrica
pantalla 5x3



20. Instalación de tablero eléctrico en
cabina (2)



21. Instalación de tablero eléctrico en cabina (3)



22. Instalación de tablero eléctrico en cabina (4)




23. Instalación de tablero eléctrico en cabina



24. Instalación Rack



25. Instalación tablero eléctrico

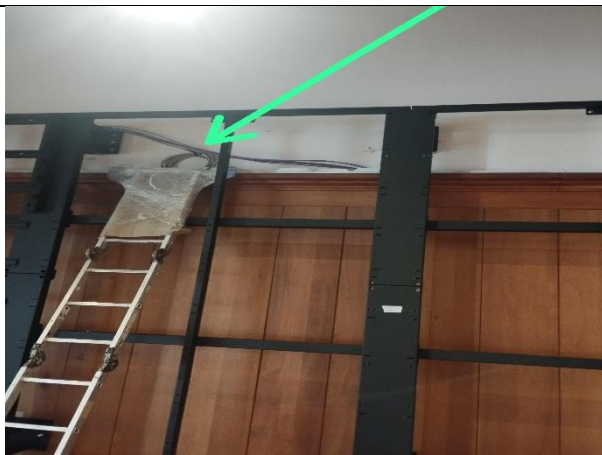


26. Tendido de circuitos eléctricos nuevos



27. Tendido de circuitos eléctricos nuevos2



28. Tendido de circuitos eléctricos nuevos3

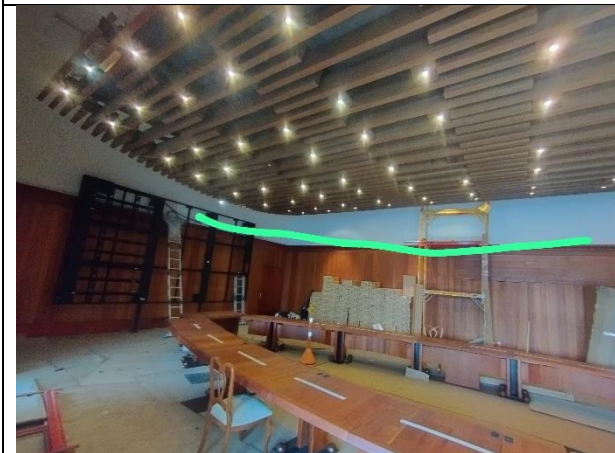

29. Tendido de circuitos eléctricos nuevos4

4.4. Sala Plena Comisión Nacional de Disciplina Judicial

Este progreso refleja la ejecución de las actividades programadas según el cronograma, como se detalla a continuación:

- **Adecuaciones (100% completado):** Todas las actividades en esta área han sido completadas, incluyendo las adecuaciones locativas e infraestructura, el desmonte de equipos e infraestructura existente, el empapelado de la sala para protección de pisos y muebles, y la instalación de cableado eléctrico y de datos. También se ha completado la redistribución e instalación de circuitos eléctricos, el desmontaje de canaletas y cornisa, y la instalación de cableado de automatización, entre otras tareas.
- **Instalaciones (32% completado):** En esta fase, se han logrado avances importantes, como la instalación de racks (100%) y equipos de audio (80%), así como la instalación de equipos de



video (60%) y de conferencia y debate (80%). Sin embargo, las instalaciones de equipos de iluminación y automatización aún están pendientes (0%), lo que limita el progreso general en esta área.

- **Fase de Configuración (9% completado):** La configuración de los equipos de audio y video ha avanzado un 20%, se avanza según cronograma indicado que los próximos pasos relacionan la configuración de equipos de conferencia y debate, iluminación y automatización.

En el numeral subsecuente se presentan las evidencias consolidadas de los avances alcanzados en la Sala Plena Comisión Nacional de Disciplina Judicial durante el mes de abril.

4.4.1. Informes de ejecución semanal Sala Plena Comisión Nacional de Disciplina Judicial.


Semana 11 de abril al 21 de abril

A continuación, se presenta el avance de la semana comprendida entre el 11 de abril al 21 de abril de 2025, se trabajó acorde al plan de trabajo presentado para cada una de las salas como se presente e los numerales subsecuentes.

Actividad del Plan de Trabajo	Actividades Ejecutadas
0. Terminar empapelado de sala	Se realizo el empapelado, cubierta y protección del piso y muebles.
1. Identificación de circuitos eléctricos de cada toma (regulado y no regulado)	Identificación de puntos regulados y no regulados. Identificación de circuitos en mesa, muro y tablero.
2. Desmonte de cornisas donde aplique	Se realizo el desmonte para verificación de ducterías y puntos ubicados en la misma
3. Desmonte de canaletas para seguimiento de rutas	Se realizó el desmontaje y verificación de las rutas de cableado.
4. Seguimiento y marquillado de cableado de datos existente	Verificación y propuesta de reorganización de circuitos.
5. Prueba de puntos de datos que se pueden utilizar	Se realizó validación y pruebas de la infraestructura de datos existente.
6. Identificación de puntos a retirar o desescalar	Se realizó la identificación de los puntos a retirar y se presenta propuesta.
7. Entrega de plano para intervención de mobiliario	Se realiza el plano de intervención del mobiliario para aprobación.
— Otras actividades adicionales	Propuesta de ubicación del rack (con renders). Planificación y análisis de próximas actividades para presentar plan de trabajo. Solicitud de anclaje de circuitos.



Registro fotográfico

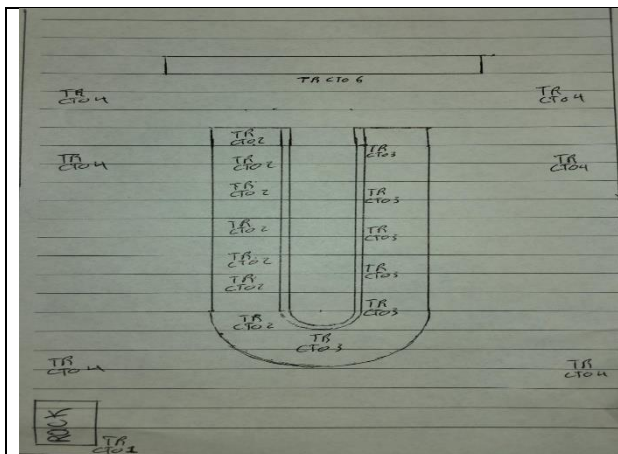


1. identificación puntos eléctricos en mesa

2. Verificación puntos eléctricos



3. Verificación puntos eléctricos

4 Verificación puntos eléctricos

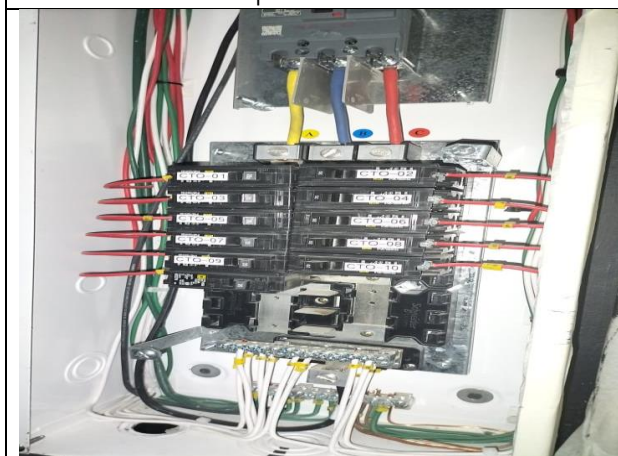


5. Verificación puntos eléctricos

6. Verificación puntos eléctricos



7. Verificación puntos eléctricos

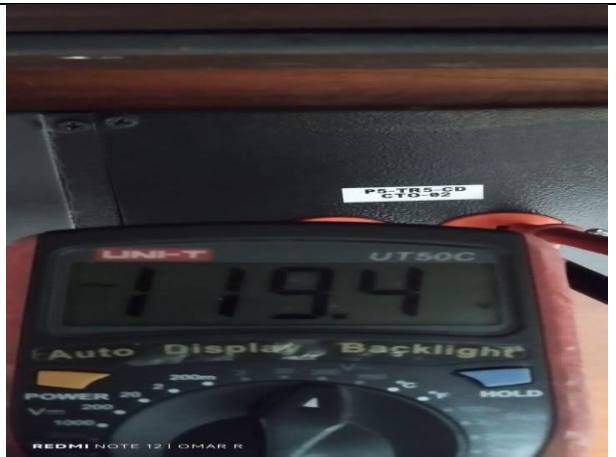

8. Verificación puntos eléctricos

Semana entre el 22 y 28 de abril

A continuación, se presenta el avance de la semana comprendida entre el 22 y 28 de abril de 2025, se trabajó acorde al plan de trabajo presentado para cada una de las salas como se presenta en los numerales subsecuentes.

Actividades	Observaciones
Aprobación ubicación equipos (Pantallas retractiles) en mobiliario según plano.	Se recibió aprobación por parte del equipo de la entidad, se realizaron los cortes según el plano por el equipo de carpintería.
Definición y/o aprobación de solicitud de infraestructura para paso de cableado entre canaletas a nivel de suelo a cenefa	Se realizó la redistribución de infraestructura requerida a nivel de piso y cenefa.
Generación, definición y aprobación de ubicaciones en planos para parlantería y cámaras.	Se recibió aprobación y se instalaron las cámaras
Generación, definición y aprobación de ubicaciones de rack de la sala.	Se recibió aprobación, se hizo requerimiento de racks en sitio para su instalación.
Estudio y aprobación de redistribución y/o instalación de circuitos nuevos eléctricos para los equipos de la sala.	No fue requerida una redistribución para los equipos de la sala
Redistribución de circuitos eléctricos y cableado eléctrico.	No fue requerida una redistribución para los equipos de la sala
Cableado de puntos de datos y control de la sala. (cámaras, parlantes, pantalla LED)	Se realizó la redistribución de infraestructura requerida a nivel de piso y cenefa.

Registro fotográfico



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


INFORME DE MES No. 4




1. dimensionamiento para apertura troqueles cámaras



2. instalación de cámaras

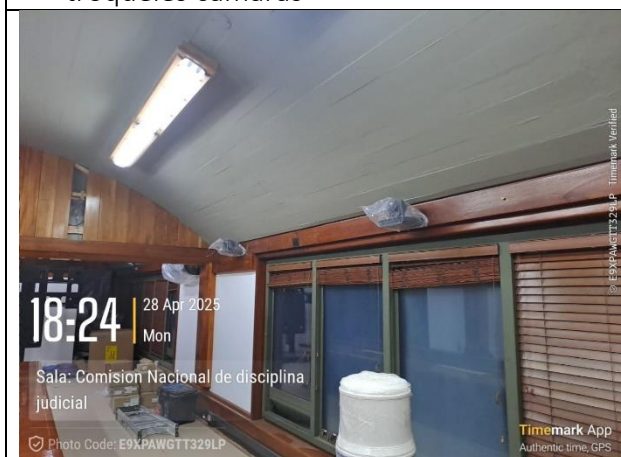


3. instalación de cámaras

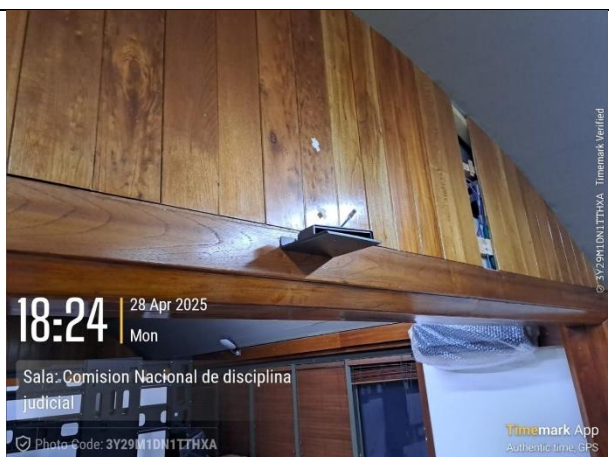

4. Instalación de cámaras



5. Perforaciones para Cámara

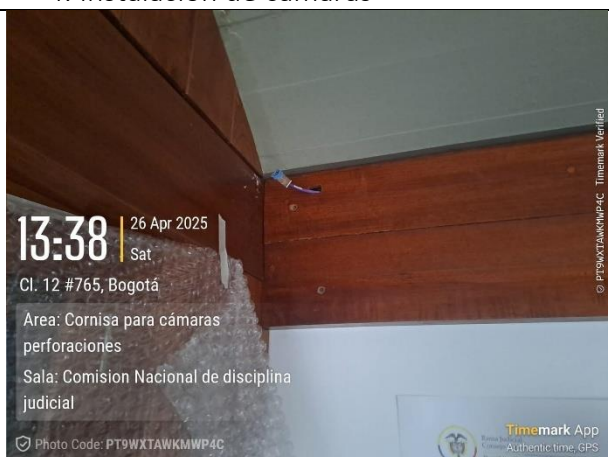

6. Perforaciones en cornisa para Cámara



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



7. Perforaciones para Cámara




8. Perforaciones para Cámara



9. Perforaciones para Cámara



10. plantilla ubicación cámaras

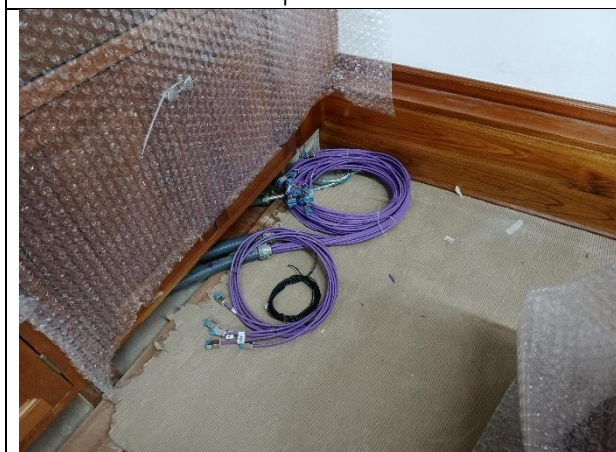

11. ponchado de cables



12. Ponchado de cables



13. validación y ubicación de cámaras-



14. validación y ubicación de cámaras



15. validación y ubicación de cámaras



16. validación y ubicación de cámaras

Semana entre el 29 de abril y el 5 de mayo

A continuación, se presenta el avance de la semana comprendida entre el 29 de abril al 05 de mayo del 2025, se trabajó acorde al plan de trabajo presentado para cada una de las salas como se presenta en los numerales subsecuentes.

Nombre de la tarea	Observaciones
COMISIÓN NACIONAL DE DISCIPLINA JUDICIAL	
Adecuaciones mobiliario	
Aprobación de intervención de mesas	Se completo la adecuación de mobiliario programada, perforaciones y acondicionamiento
Generación de plantilla	
Marcación de mesa	
Retiro canaleta mesa	



INFORME DE MES No. 4

Nombre de la tarea	Observaciones
Retiro de faldones.	
Aprobación de inicio de intervención	
Adecuaciones mesas (perforación y acondicionamiento)	
Adecuaciones placa de identificación	
INSTALACIONES	
Fase de Instalaciones	
Instalaciones Rack	Se realizó la instalación del rack
Instalaciones equipos de audio	Se realizó la instalación de los equipos del sistema de audio, pendiente las cajas en madera donde se instalaran los parlantes
Instalaciones equipos de video	Se realizó la instalación de los equipos del sistema de video, quedando pendiente la instalación del soporte y pantalla
Instalación equipos automatización	Pendiente equipos, se reprograma según llegada de los mismos.
Instalación equipos conferencia y debate	Se realizó la instalación de los equipos de conferencia y debate
Fase de Configuración	
Configurar equipos de audio	Se inició la fase de configuración de los equipos según plan de trabajo, se dará continuidad según plan de trabajo.
Configurar equipos de video	
Configurar equipos automatización	

Registro fotográfico

1. adecuación de puntos en canaletas	2. Cableado de puntos en mesa



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



3. cableado para pantallas y nameplate (2)



4. cableado para pantallas y nameplate (3)



5. cableado para pantallas y nameplate (4)



6. cableado para pantallas y nameplate (5)



7. cableado para pantallas y nameplate (6)



8. cableado para pantallas y nameplate



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


INFORME DE MES No. 4



9. cierre de canaletas (2)



10. cierre de canaletas

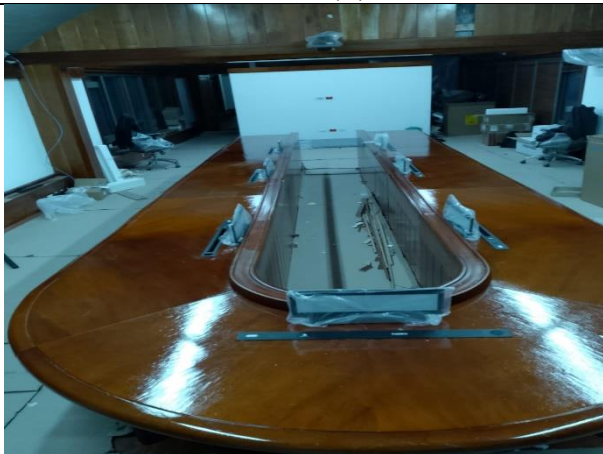

11. instalación de pantallas retractiles y nameplate



12. instalación de pantallas retractiles y nameplate2



13. instalación de pantallas retractiles1



14. instalación de pantallas retractiles2



15. instalación de rack y equipos en rack



16. instalación de rack y equipos en rack2



17. instalación de rack y equipos en rack3



18. termino actividad de puntos, control, eléctricos y comunicación

4.5. Sala Plena Consejo Superior de la Judicatura

Este progreso refleja la ejecución de las actividades programadas según el cronograma, como se detalla a continuación:

- **Adecuaciones (81% completado):** La mayoría de las tareas en esta área han sido completadas, incluyendo las adecuaciones locativas, el desmonte de equipos e infraestructura, el empapelado de la sala, la instalación de cableado eléctrico y de datos, y la redistribución e instalación de nuevos circuitos eléctricos. También se ha completado el desmonte de canaletas y cornisa, y la instalación de cableado para automatización. Sin embargo, en las adecuaciones de mobiliario, aunque se han logrado avances importantes (67%), aun se encuentra en proceso debido a que el mueble completo debió ser modificado en altura, en razón a que las pantallas retráctiles demandaban mas altura en el mismo, siendo necesario realizar una modificación estructural que le diera mas altura a los muebles, siendo esta ultima la que se encuentra pendiente de culminar.
- **Instalaciones (21% completado):** Se han completado las instalaciones de racks (100%) y se han

avanzado en la instalación de equipos de audio (80%) y video (80%). No obstante, las instalaciones de equipos de conferencia y debate están solo al 20%, y las instalaciones de equipos de iluminación, automatización y aire acondicionado aún no han comenzado (0%).

- **Fase de Configuración (9% completado):** El avance en la configuración de los equipos de audio y video ha sido del 20%, se avanza según cronograma indicado que los próximos pasos relacionan la configuración de equipos de conferencia, debate, iluminación y automatización.

4.5.1. Informes de ejecución semanal Sala Plena Consejo Superior de la Judicatura.

Semana 11 de abril al 21 de abril

A continuación, se presenta el avance de la semana comprendida entre el 11 de abril al 21 de abril de 2025, se trabajó acorde al plan de trabajo presentado para cada una de las salas como se presente e los numerales subsecuentes.

Actividad del Plan de Trabajo	Actividades Ejecutadas
0. Terminar empapelado de sala	Se realizó el empapelado, cubierta y protección del piso y muebles.
1. Identificación de circuitos eléctricos de cada toma (regulado y no regulado)	Identificación de puntos eléctricos en mesa y muros.
2. Desmonte de cornisas donde aplique	No requerido para actividades de la semana
3. Desmonte de canaletas para seguimiento de rutas	Se realizó el desmontaje y verificación de las rutas de cableado.
4. Seguimiento y marquillado de cableado de datos existente	Redistribución y nueva marquilla con registro fotográfico.
5. Prueba de puntos de datos que se pueden utilizar	Se realizó validación y pruebas de la infraestructura de datos existente.
6. Identificación de puntos a retirar o desescalar	Redistribución y actualización de cableado eléctrico y marquillado.
7. Entrega de plano para intervención de mobiliario	Se realiza el plano de intervención del mobiliario para aprobación.
— Otras actividades adicionales	Cableado de control y parlantes. Cableado para cámaras (SDI). Instalación de tomas eléctricas. Solicitud de anclaje de circuitos.




Registro fotográfico



1. Identificación de puntos de red en muros



2 Identificación de puntos de red

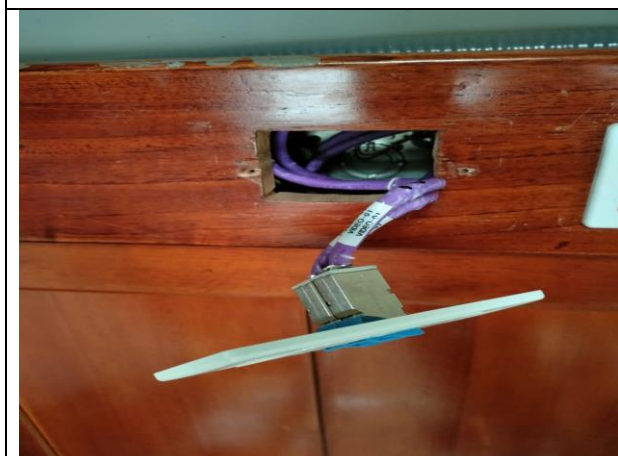

3. Identificación de puntos de red



4. Cableado



5. Identificación puntos eléctricos



Semana entre el 22 y 28 de abril

A continuación, se presenta el avance de la semana comprendida entre el 22 y 28 de abril de 2025, se trabajó acorde al plan de trabajo presentado para cada una de las salas como se presenta en los numerales subsecuentes.

Actividades	Observaciones
Aprobación ubicación equipos (Pantallas retractiles) en mobiliario según plano.	Pendiente recibir la aprobación de intervención, se realizó estudio detallado sobre la ubicación física del equipo, encontrando que se debe subir la mesa aproximadamente 3cm, lo que implica una nueva tarea en el acondicionamiento de las mesas.
Definición y aprobación de ubicaciones en planos para parlantería y cámaras (AirMedia).	Se realizó propuesta, se recibieron aprobaciones, se realizó instalación de cámaras
Estudio y aprobación de redistribución de circuitos eléctricos dentro de la sala	Se realizó redistribución para los equipos de la sala
Redistribución de circuitos eléctricos y cableado eléctrico .	Se realizó redistribución para los equipos de la sala
Cableado de puntos de datos y control de la sala. (cámaras, parlantes, pantalla LED)	Se realizo la infraestructura de datos requerida
Desmontaje de Canaletas de mesa de ser requerido por equipo MOBILIARIO	Se realizo el desmontaje de las canaletas de mesa, pendiente intervención de las mesas en altura de 3cm para posterior corte y montaje de la canaleta

Registro fotográfico

1. adecuación de infraestructura-	2. adecuación de infraestructura



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4




3. adecuación de infraestructura




4. cableado e infraestructura (2)



5. cableado e infraestructura

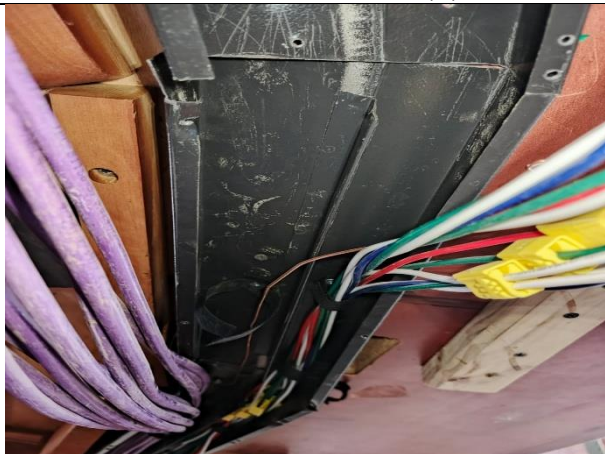

6. desmonte de canaleta

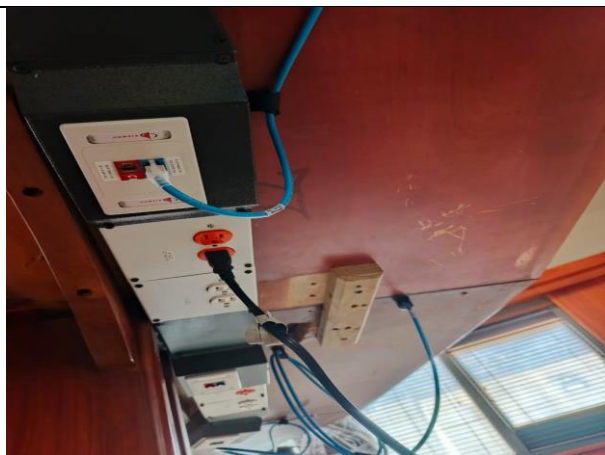

7. desmonte de canaletas



8. disposición de equipos en sala



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



9. instalación de cámaras




10. instalación de cámaras-



11. instalación de cámaras



12. marcación de huecos para pantallas

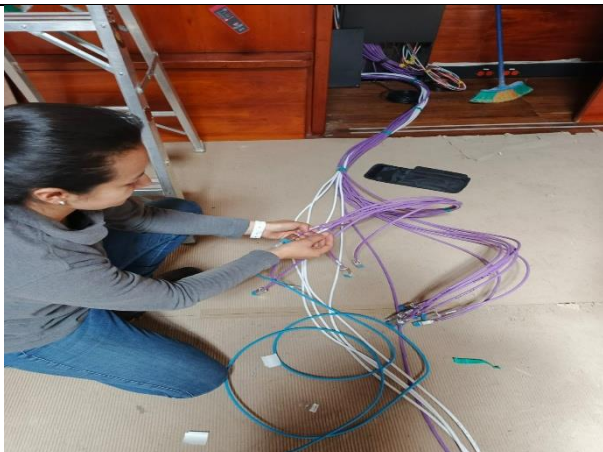

13. marquillado de cableado de datos



14. remoción de faldones



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



15. verificación de puntos (2)



16. verificación de puntos (3)



17. verificación de puntos (4)



18. verificación de puntos (5)



19. verificación de puntos (6)



20. verificación de puntos

Semana entre el 29 de abril y el 5 de mayo

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INFORME DE MES No. 4	
--	---	---

A continuación, se presenta el avance de la semana comprendida entre el 29 de abril al 05 de mayo del 2025, se trabajó acorde al plan de trabajo presentado para cada una de las salas como se presenta en los numerales subsecuentes.

Nombre de la tarea	Observaciones
CORTE SUPREMA	
Adecuaciones mobiliario	
Aprobación de intervención de mesas	Se completo parcialmente la tarea de acondicionamiento de mobiliario, quedando pendiente los soportes sobre los cuales reposará la mesa posterior a la subida de 3cm requerida para la instalación de los equipos de conferencia y debate.
Generación de plantilla	
Marcación de mesa	
Retiro canaleta mesa	
Retiro de faldones.	
Aprobación de inicio de intervención	
Adecuaciones mesas (perforación y acondicionamiento)	
Adecuación de refuerzo de pantalla	
Adecuaciones placa de identificación	
INSTALACIONES	
Fase de Instalaciones	
Instalaciones Rack	Se realizó la instalación del rack
Instalaciones equipos de audio	Se realizó la instalación de los equipos del sistema de audio, pendiente las cajas en madera donde se instalarán los parlantes
Instalaciones equipos de video	Se realizó la instalación de los equipos del sistema de video, quedando pendiente la instalación del soporte y pantalla
Instalación equipos automatización	Pendiente equipos, se reprograma según llegada de estos.



Registro fotográfico



1. cableado



2. Conectividad de parlantes1



3. Conectividad de parlantes2




4. Conectividad de parlantes3



5. Conectividad de parlantes4



6. conectividad eléctrica y datos rack

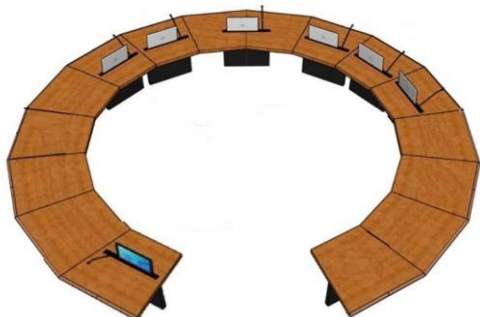


7. definición y aprobación de ubicación equipos




8. Instalación de canaleta (2)




9. Instalación de canaleta (3)

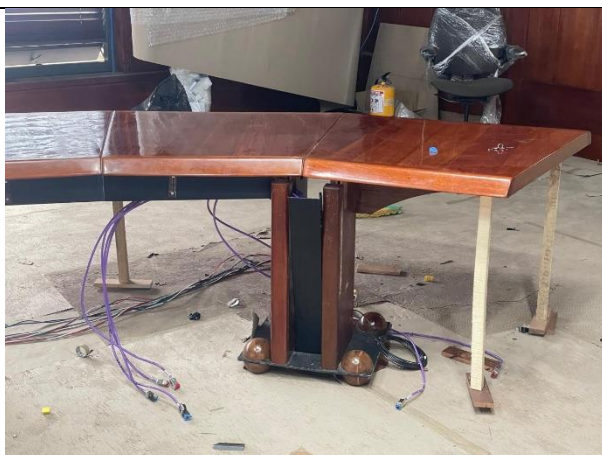

10. Instalación de canaleta (4)

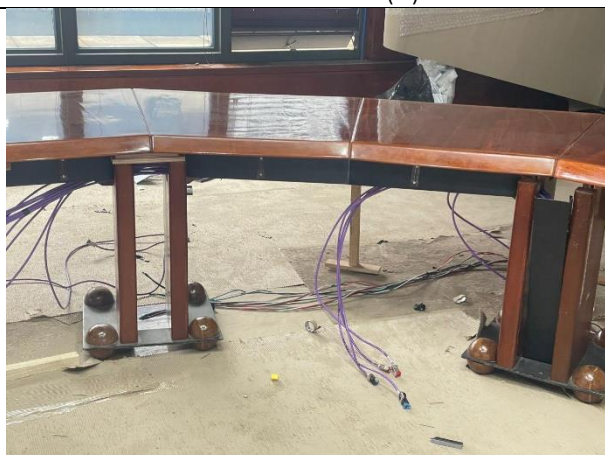

11. Instalación de canaleta (5)

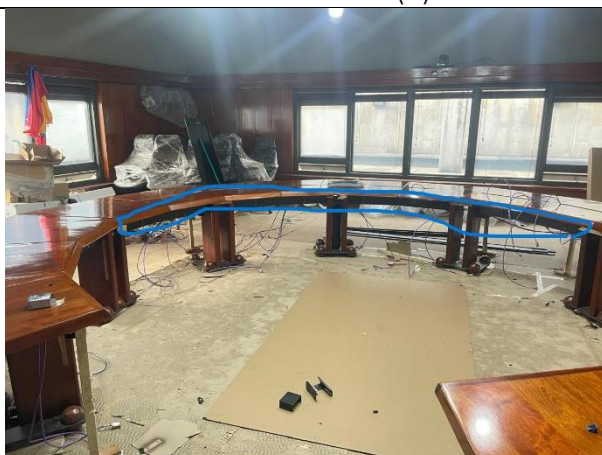

12. Instalación de canaleta (6)




13. Instalación de canaleta (7)



14. Instalación de canaleta



15. Instalación de rack y equipos en rack

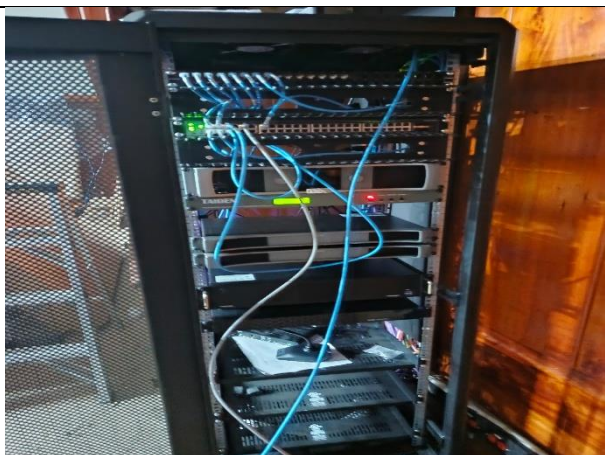


16. Instalación de rack y equipos en rack2



17. instalación equipos en rack1




18. instalación equipos en rack2

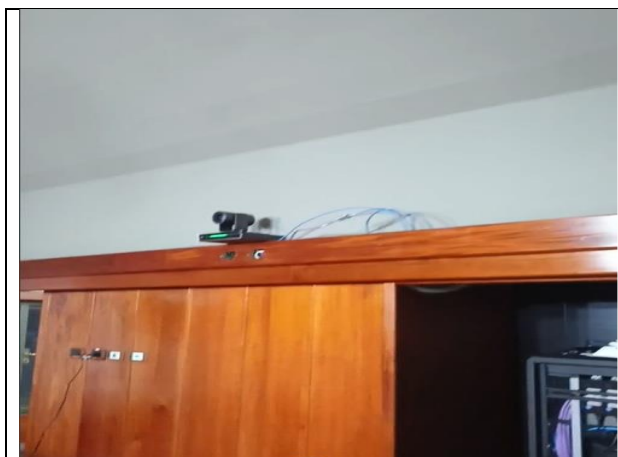

19. instalación y conexión cámaras 1



20. instalación y conexión cámaras 2

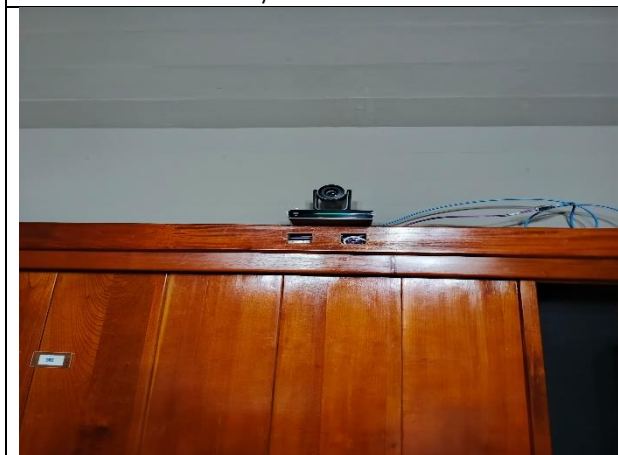

21. Instalación y conexión de cámaras



22. perforación de mesas para equipos

4.6. Salas de Reunión Piso 9

Este progreso refleja la ejecución de las actividades programadas según el cronograma, como se detalla a continuación:

- **Adecuaciones Sala 3 (100% completado):** Todas las actividades en esta área han sido completadas, incluyendo las adecuaciones locativas, el desmonte de equipos e infraestructura, el empapelado de la sala, la instalación de cableado eléctrico y de datos, y la redistribución e instalación de circuitos eléctricos nuevos. También se ha completado el desmonte de canaletas y cornisa, la instalación de cableado de automatización y la identificación de rutas y puntos existentes.
- **Instalaciones Sala 3 (25% completado):** En esta fase, se ha completado la instalación de los equipos de audio (100%), las instalaciones de equipos de video están al 40%.
- **Configuración (18% completado):** El avance en la configuración de los equipos de audio es del 60%, se continua acorde a cronograma con las actividades de configuración y pruebas.

4.6.1. Informes de ejecución semanal Salas del Piso Nueve

Semana 11 de abril al 21 de abril

A continuación, se presenta el avance de la semana comprendida entre el 11 de abril al 21 de abril de 2025, se trabajó acorde al plan de trabajo presentado para cada una de las salas como se presente e los numerales subsecuentes.

Actividad del Plan de Trabajo	Actividades Ejecutadas
0. Terminar empapelado de sala	Se realizó el empapelado, cubierta y protección del piso y muebles.
1. Identificación de circuitos eléctricos de cada toma (regulado y no regulado)	Identificación de circuitos eléctricos existentes.
2. Desmonte de cornisas donde aplique	No Aplica
3. Desmonte de canaletas para seguimiento de rutas	Se realizó el desmontaje y verificación de las rutas de cableado.
4. Seguimiento y marquillado de cableado de datos existente	Validación de rutas de infraestructura para puntos de red y eléctricos.
5. Prueba de puntos de datos que se pueden utilizar	Se hace validación de puntos existentes.
6. Identificación de puntos a retirar o desescalar	Validación de rutas para cableado nuevo desde el tablero hasta sala 3 o C.
7. Entrega de plano para intervención de mobiliario	N/A
— Otras actividades adicionales	Desmontaje de vidrio de proyección. Organización y registro de elementos desmontados del rack. Plan de trabajo para desmontaje acústico e instalación de equipos. Solicitud de anclaje de circuitos

Registro fotográfico



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



1. desmonte vidrio de proyección



2. desmonte vidrio de proyección_1



3. Identificación de puntos




4. Validación puntos eléctricos



5. Validación puntos eléctricos



6. Validación puntos eléctricos

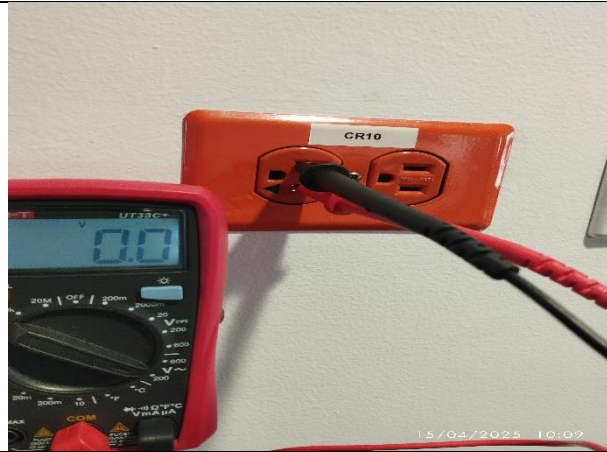

7. Validación puntos eléctricos



8. Validación puntos eléctricos



9. Validación puntos eléctricos

Semana entre el 22 y 28 de abril

A continuación, se presenta el avance de la semana comprendida entre el 22 y 28 de abril de 2025, se trabajó acorde al plan de trabajo presentado para cada una de las salas como se presenta en los numerales subsecuentes.

Actividades	Observaciones
Definición y aprobación de ubicaciones en planos para parlantería, micrófono y cámaras.	Se presento la propuesta y se realizó avance en la intervención en sala sobre la ubicación de estos.
Definición de estructura infraestructura existente y nueva.	Se entrego la cotización, y se inició la intervención el tendido de la nueva infraestructura eléctrica



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



Autorización, socialización y levantamiento de requerimiento, solicitud de aperturas de cajas de paso para nuevo tendido y acometidas eléctricas para la pantalla de 163"	Se entrego la cotización, y se inició la intervención el tendido de la nueva infraestructura eléctrica
Autorización Intervención y desmontaje de estructura acústica, para tendido de tubería e instalación de parlantes, micrófonos y cámaras.	No fue requerido en la ejecución de las actividades para esta semana.
Realizar el desmonte de la estructura acústica	No fue requerido en la ejecución de las actividades para esta semana.
El paso de tubería y cableado para micrófonos, cámaras y parlantes.	Se realizo la instalación de la infraestructura de datos requerida para la sala.
Después de aprobado el requerimiento eléctrico se procederá a realizar esta actividad de tendido para los circuitos de la pantalla	La actividad se encuentra en ejecución posterior a la autorización del adicional y OC.

Registro fotográfico

	
1. adecuaciones e infraestructura para micrófono	2. adecuaciones para parlantes (2)




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



3. adecuaciones para parlantes

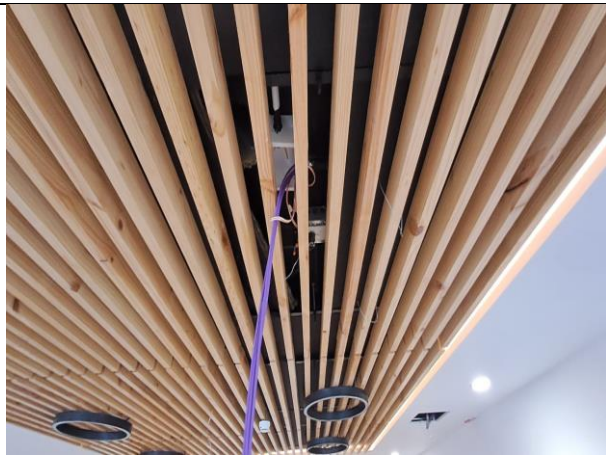

4. cableado micrófonos y parlantes



5. cableado piso 9 sala 3
micrófonos y parlantes



6. instalación de Infraestructura de datos
(10)



7. instalación de Infraestructura de datos
(11)



8. instalación de Infraestructura de datos
(12)



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



9. instalación de Infraestructura de datos
(13)



10. instalación de Infraestructura de datos
(2)



11. instalación de Infraestructura de datos
(3)



12. instalación de Infraestructura de datos
(4)



13. instalación de Infraestructura de datos
(5)



14. instalación de Infraestructura de datos
(6)



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



15. instalación de Infraestructura de datos
(7)



16. instalación de Infraestructura de datos
(8)




17. instalación de Infraestructura de datos
(9)



18. instalación de Infraestructura de datos



19. instalación de Infraestructura eléctrica
(2)

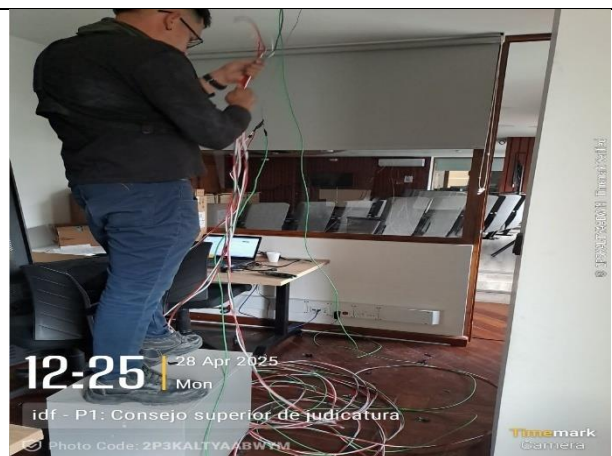


20. instalación de Infraestructura eléctrica



21. Instalación de Infraestructura



22. Marquillado y ponchado en rack

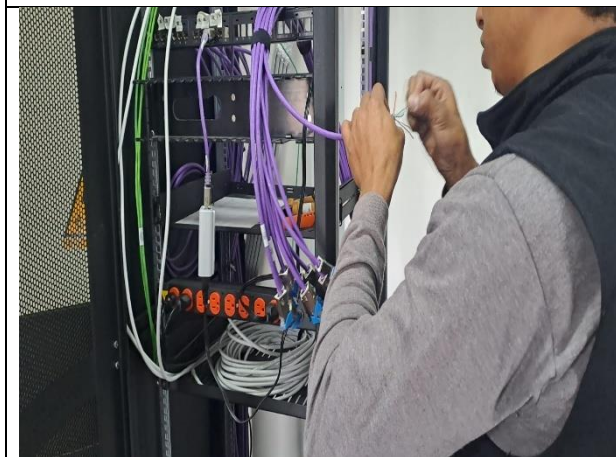

23. Ponchado

Semana entre el 29 de abril y el 5 de mayo

A continuación, se presenta el avance de la semana comprendida entre el 29 de abril al 05 de mayo del 2025, se trabajó acorde al plan de trabajo presentado para cada una de las salas como se presenta en los numerales subsecuentes.

Nombre de la tarea	Observaciones
SALAS PISO NUEVE	
Instalación cableado eléctrico	
Identificación de rutas de circuitos eléctricos pantalla de 163"	Se culmino la tarea de instalación de los circuitos eléctricos nuevos requeridos para la pantalla de 163"
Instalación de circuitos eléctricos nuevos	
INSTALACIONES SALA 3	
Instalaciones	




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



Instalaciones equipos de audio	Se realizó la instalación de los equipos de sistema de audio en rack y en sala
Instalaciones equipos de video (cámaras)	Se realizó la instalación de los equipos de sistema de video en rack y en sala (cámaras).
Instalación equipos automatización	Pendiente equipos


Registro fotográfico

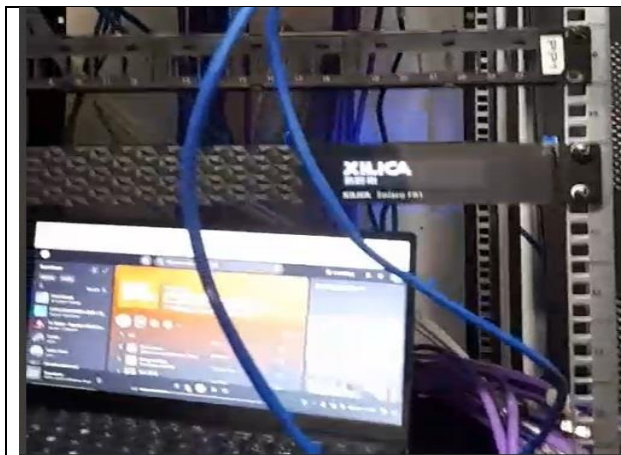

1. Inicio configuración de audio



2. instalación acometida eléctrica para pantalla 163 (2)

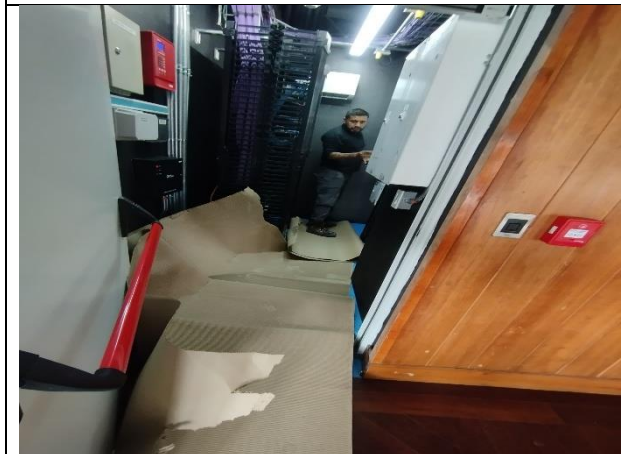


3. instalación acometida eléctrica para pantalla 163 (3)



4. instalación acometida eléctrica para pantalla 163 (4)




5. instalación acometida eléctrica para pantalla 163 (5)

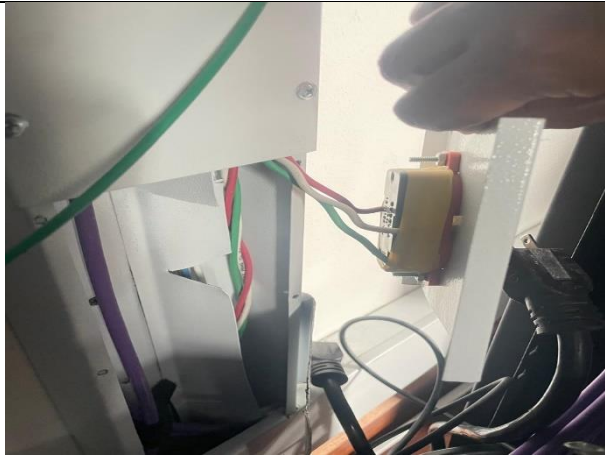

6. instalación acometida eléctrica para pantalla 163 (6)



7. instalación acometida eléctrica para pantalla 163 (7)

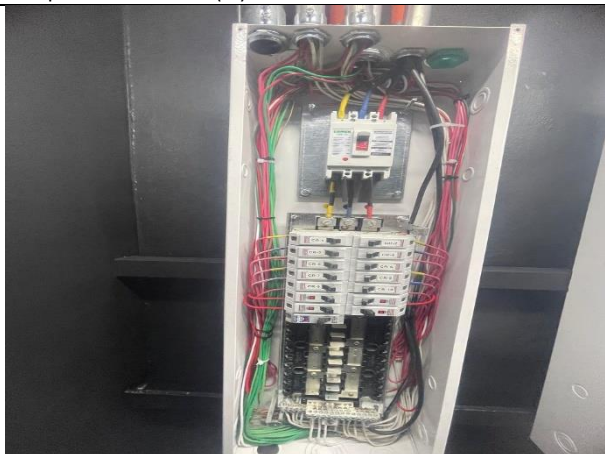

8. instalación acometida eléctrica para pantalla 163 (8)



9. instalación acometida eléctrica para pantalla 163 (9)



10. instalación acometida eléctrica para pantalla 163




Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4




11. instalación de parlantes en sala

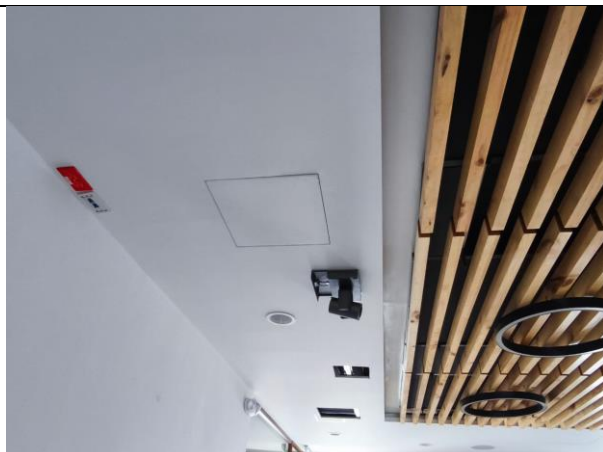

12. Instalación de cámaras (2)



13. Instalación de cámaras (3)

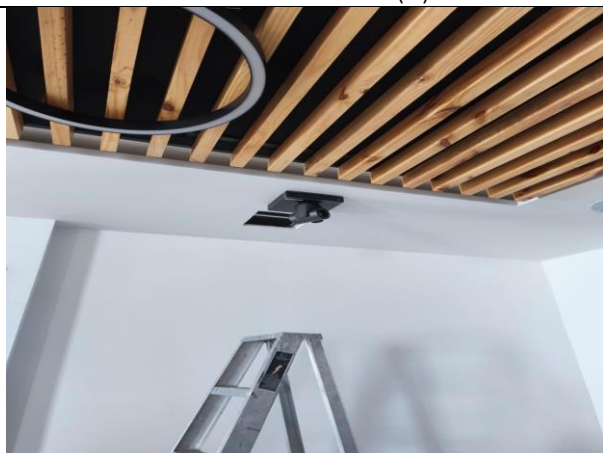

14. Instalación de cámaras (4)



15. Instalación de cámaras (5)



16. Instalación de cámaras (6)



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia


INFORME DE MES No. 4



17. Instalación de cámaras (7)



18. Instalación de cámaras (8)

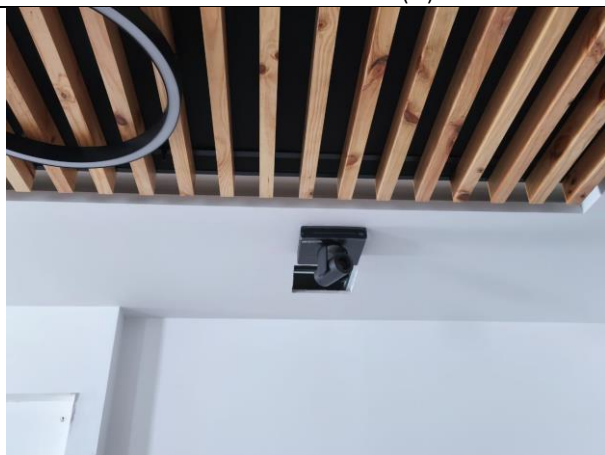

19. Instalación de cámaras



20. Instalación de equipos en rack3



21. Instalación de parlantes (2)



22. Instalación de parlantes (3)



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



23. Instalación de parlantes (4)



24. Instalación de parlantes (5)




25. Instalación de parlantes (6)



26. Instalación de parlantes (7)



27. Instalación de parlantes

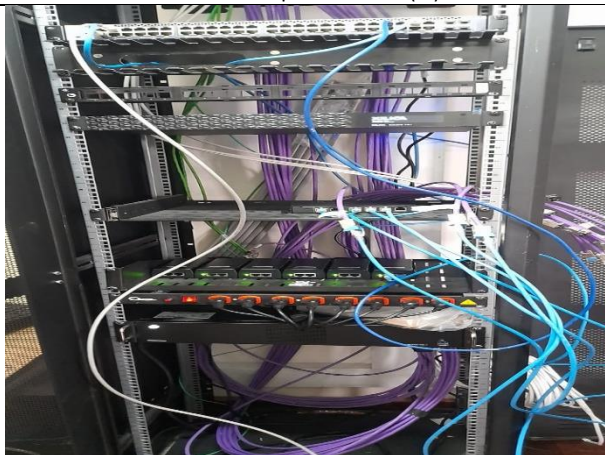

28. Instalación equipos en rack (2)



Rama Judicial
Consejo Superior de la Judicatura
República de Colombia

INFORME DE MES No. 4



29. instalación equipos en rack



30. instalación equipos en rack2



31. Instalación equipos en rack3



32. Instalación parlantes




33. Marquillado

5. CRONOGRAMA



5.1. Análisis General del Cronograma (hasta el 05 de mayo de 2025)

El análisis del cronograma hasta la fecha del informe (05 de mayo de 2025) muestra que el proyecto ha avanzado de manera considerable en las fases iniciales, como el inicio, la planeación y la importación de equipos. Sin embargo, debido a la disponibilidad de las salas, retrasos en llegada en equipos de pantallas retráctil, se presentó a la entidad la solicitud de prórroga que fue aprobada el 30 de abril de 2025, con prórroga hasta el 31 de julio de 2025

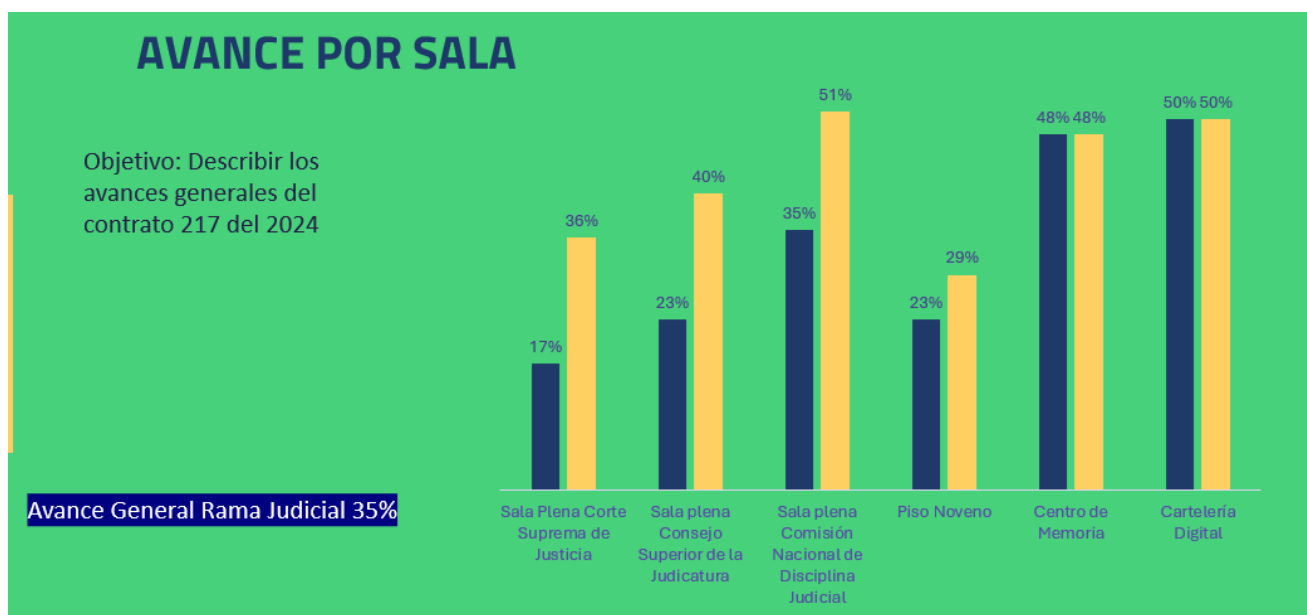

5.1.1. Fase de Ejecución

La fase de ejecución, que comenzó el 14 febrero con Centro de Memoria y el 14 marzo con Cartelería digital, el 11 y 14 de abril de 2025 fecha en la que se recibieron las salas Corte Suprema, Comisión de Disciplina Judicial, Consejo Superior de la Judicatura y Sala 3 Piso 9.

Las actividades críticas como la adecuación del mobiliario han requerido mayor tiempo al inicialmente planeado, debido a la necesidad de modificación en altura de los muebles de las salas de Corte Suprema de Justicia y Consejo Superior de la Judicatura, impactando directamente las actividades de la línea crítica como son la instalación de las pantallas retráctiles y configuraciones, a continuación, se hace un resumen por cada una de las salas actualmente intervenidas:

 Rama Judicial Consejo Superior de la Judicatura República de Colombia	INFORME DE MES No. 4	
--	---	---

6. Conclusiones y Recomendaciones

Retrasos en la Fase de Ejecución: El análisis muestra que el proyecto ha avanzado considerablemente en las fases iniciales, como el inicio, la planeación y la importación de equipos. Sin embargo, presenta retrasos significativos en la fase de ejecución, especialmente debido a las demoras en las aprobaciones por parte del cliente final y los retrasos en las adecuaciones de mobiliario.

Las adecuaciones de mobiliario son prerequisites para la instalación de equipos, han impactado directamente la ejecución de actividades críticas, como la instalación de pantallas retractiles y la configuración de los sistemas en salas clave como la Corte Suprema y el Consejo Superior de la Judicatura.

Recomendaciones

1. **Aceleración de las Aprobaciones:** Es crucial que el cliente final autorice y apruebe las modificaciones necesarias de forma inmediata para evitar más retrasos en las adecuaciones de mobiliario. Este es un paso crítico para permitir que las actividades de instalación de equipos comiencen y se finalicen dentro de los plazos establecidos.

En conclusión, para que el proyecto se complete con éxito dentro de los plazos revisados, es fundamental que las partes involucradas, especialmente el cliente final, tomen medidas urgentes para acelerar las aprobaciones y Yeapdata debe buscar estrategias como más recursos para las adecuaciones de mobiliario (Corte Constitucional y Consejo de Estado).
