

[illegible]

802

 <p>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</p> <p>GOBIERNO DE BOGOTÁ D.C.</p>	INFORME SSTMA , ETAPA DE OBRA N° 5		 <p>INTERSA S.A. INGENIERIA</p> <p>30 Años</p>
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018		
COP No. FDLPA – 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.		

➤ ANEXO 13 . SOPORTE PAGO DE NOMINA



INTERSA S.A. - INGENIERIA RELACION PAGO NOMINA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: FRANCISCO PENAGOS P.
IDENTIFICACION: 19.233.930
CARGO: Conductor
PERIODO DE PAGO: 01 al 30 de Abril de 2019

SALARIO BASICO: \$ 1.000.000
DIAS PAGADOS: 24
NOMINA DE: PUENTE ARANDA

DEVENGADO POR	
1. SALARIO	\$ 800.000
2. AUXILIO TRANSPORTE	\$ 77.626
3. RETROACTIVO	\$ 0
4. HORAS EXTRAS	\$ 0
5. INT. CESANTIAS 2018	\$ 0
TOTAL	\$ 877.626

DEDUCCIONES POR	
1. APORTES SALUD (4%)	\$ 32.000
2. APORTES PENSION (4%)	\$ 0
3. FONDO SOLIDARIDAD (1%)	\$ 0
4. RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0
5. ADELANTOS Y/O PRESTAMOS	\$ 0
6. POLIZA	\$ 0
7. PRESTAMO COMPENSAR	\$ 0
TOTAL	\$ 32.000

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO EN
TODAS SUS PARTES ESTE PAGO.

Francisco Penagos P.
FIRMA Y C.C:
19233930

NETO PAGADO ➡ \$ 845.626

INVELER LTDA. RELACION PAGO NOMINA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: JAIRO ANDRES LEON
IDENTIFICACION: 1.018.475.748
CARGO: Inspector
PERIODO DE PAGO: 01 al 30 de Abril de 2019

SALARIO BASICO: \$ 1.900.000
DIAS PAGADOS: 30
NOMINA DE: PUENTE ARANDA

DEVENGADO POR	
1. SALARIO	\$ 1.900.000
2. AUXILIO TRANSPORTE	\$ 0
3. RETROACTIVO	\$ 0
4. HORAS EXTRAS	\$ 0
5. INT. CESANTIAS 2018	\$ 0
TOTAL	\$ 1.900.000

DEDUCCIONES POR	
1. APORTES SALUD (4%)	\$ 76.000
2. APORTES PENSION (4%)	\$ 76.000
3. FONDO SOLIDARIDAD (1%)	\$ 0
4. RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0
5. ADELANTOS Y/O PRESTAMOS	\$ 0
6. POLIZA	\$ 0
7. PRESTAMO COMPENSAR	\$ 0
TOTAL	\$ 152.000

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO EN
TODAS SUS PARTES ESTE PAGO.

Jairo Andres Leon
FIRMA Y C.C:
1018475748

NETO PAGADO ➡ \$ 1.748.000



INTERSA S.A. - INGENIERIA

RELACION PAGO NOMINA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: ANGELICA MARIA RIVERA
 IDENTIFICACION: 63.438.199
 CARGO: Inspector de Obra
 PERIODO DE PAGO: 01 al 30 de Abril de 2019

SALARIO BASICO: \$ 1.900.000
 DIAS PAGADOS: 30
 NOMINA DE: PUENTE ARANDA

DEVENGADO POR	
1. SALARIO	\$ 1.900.000
2. AUXILIO TRANSPORTE	\$ 0
3. RETROACTIVO	\$ 0
4. HORAS EXTRAS	\$ 0
5. INT. CESANTIAS 2018	\$ 0
TOTAL	\$ 1.900.000

DEDUCCIONES POR	
1. APORTES SALUD (4%)	\$ 76.000
2. APORTES PENSION (4%)	\$ 76.000
3. FONDO SOLIDARIDAD (1%)	\$ 0
4. RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0
5. ADELANTOS Y/O PRESTAMOS	\$ 0
6. POLIZA	\$ 0
7. PRESTAMO COMPENSAR	\$ 0
TOTAL	\$ 152.000

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO EN
 TODAS SUS PARTES ESTE PAGO.

Angela Rivera

FIRMA Y C.C: 63438199

NETO PAGADO → \$ 1.748.000



INTERSA S.A. - INGENIERIA

RELACION PAGO NOMINA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: ISMAEL ALBERTO RESTREPO
 IDENTIFICACION: 79.989.938
 CARGO: Topografo Inspector
 PERIODO DE PAGO: 01 al 30 de Abril de 2019

SALARIO BASICO: \$ 2.200.000
 DIAS PAGADOS: 30
 NOMINA DE: PUENTE ARANDA

DEVENGADO POR	
1. SALARIO	\$ 2.200.000
2. AUXILIO TRANSPORTE	\$ 0
3. RETROACTIVO	\$ 0
4. HORAS EXTRAS	\$ 0
5. INT. CESANTIAS 2018	\$ 0
TOTAL	\$ 2.200.000

DEDUCCIONES POR	
1. APORTES SALUD (4%)	\$ 88.000
2. APORTES PENSION (4%)	\$ 88.000
3. FONDO SOLIDARIDAD (1%)	\$ 0
4. RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0
5. ADELANTOS Y/O PRESTAMOS	\$ 0
6. POLIZA	\$ 0
7. PRESTAMO COMPENSAR	\$ 0
TOTAL	\$ 176.000

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO EN
 TODAS SUS PARTES ESTE PAGO.

Ismael Restrepo

FIRMA Y C.C: 79989938

NETO PAGADO → \$ 2.024.000



INTERSA S.A. - INGENIERIA

RELACION PAGO NOMINA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Andres Giovanni Franco
 IDENTIFICACION: 80.033.516
 CARGO: Residente
 PERIODO DE PAGO: 01 al 30 de Abril de 2019

SALARIO BASICO: \$ 3.000.000
 DIAS PAGADOS: 30
 NOMINA DE: PUENTE ARANDA

DEVENGADO POR	
1. SALARIO	\$ 3.000.000
2. AUXILIO TRANSPORTE	\$ 0
3. RETROACTIVO	\$ 0
4. HORAS EXTRAS	\$ 0
5. INT. CESANTIAS 2018	\$ 0
TOTAL	\$ 3.000.000

DEDUCCIONES POR	
1. APORTES SALUD (4%)	\$ 120.000
2. APORTES PENSION (4%)	\$ 120.000
3. FONDO SOLIDARIDAD (1%)	\$ 0
4. RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0
5. ADELANTOS Y/O PRESTAMOS	\$ 0
6. POLIZA	\$ 0
TOTAL	\$ 240.000

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO EN
 TODAS SUS PARTES ESTE PAGO.

FIRMA Y C.C:

80.033.516

NETO PAGADO → \$ 2.760.000



INTERSA S.A. - INGENIERIA

RELACION PAGO NOMINA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Raul Andres Aparicio
 IDENTIFICACION: 79.138.743
 CARGO: Residente
 PERIODO DE PAGO: 01 al 30 de Abril de 2019

SALARIO BASICO: \$ 3.500.000
 DIAS PAGADOS: 30
 NOMINA DE: PUENTE ARANDA

DEVENGADO POR	
1. SALARIO	\$ 3.500.000
2. AUXILIO TRANSPORTE	\$ 0
3. RETROACTIVO	\$ 0
4. HORAS EXTRAS	\$ 0
5. INT. CESANTIAS 2018	\$ 0
TOTAL	\$ 3.500.000

DEDUCCIONES POR	
1. APORTES SALUD (4%)	\$ 140.000
2. APORTES PENSION (4%)	\$ 140.000
3. FONDO SOLIDARIDAD (1%)	\$ 35.000
4. RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0
5. ADELANTOS Y/O PRESTAMOS	\$ 0
6. POLIZA	\$ 0
TOTAL	\$ 315.000

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO EN
 TODAS SUS PARTES ESTE PAGO.

FIRMA Y C.C:

79.138.743

NETO PAGADO → \$ 3.185.000



INTERSA S.A. - INGENIERIA RELACION PAGO NOMINA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Carlos Arturo Alfonso
IDENTIFICACION: 79.472.441
CARGO: Profesional Ambiental y SST
PERIODO DE PAGO: 01 al 30 de Abril de 2019

SALARIO BASICO: \$ 3.000.000
DIAS PAGADOS: 30
NOMINA DE: PUENTE ARANDA

DEVENGADO POR	
1. SALARIO	\$ 3.000.000
2. AUXILIO TRANSPORTE	\$ 0
3. RETROACTIVO	\$ 0
4. HORAS EXTRAS	\$ 0
5. INT. CESANTIAS 2018	\$ 0
TOTAL	\$ 3.000.000

DEDUCCIONES POR	
1. APORTES SALUD (4%)	\$ 120.000
2. APORTES PENSION (4%)	\$ 120.000
3. FONDO SOLIDARIDAD (1%)	\$ 0
4. RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0
5. ADELANTOS Y/O PRESTAMOS	\$ 0
6. POLIZA	\$ 0
TOTAL	\$ 240.000

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO EN
TODAS SUS PARTES ESTE PAGO.

Carlos A. Alfonso
FIRMA Y C.C.: 79472441

NETO PAGADO → \$ 2.760.000



INTERSA S.A. - INGENIERIA RELACION PAGO NOMINA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Ingrid Alejandra Chaparro
IDENTIFICACION: 1.070.603.028
CARGO: Profesional Social
PERIODO DE PAGO: 01 al 30 de Abril de 2019

SALARIO BASICO: \$ 3.000.000
DIAS PAGADOS: 22
NOMINA DE: PUENTE ARANDA

DEVENGADO POR	
1. SALARIO	\$ 2.200.000
2. AUXILIO TRANSPORTE	\$ 0
3. RETROACTIVO	\$ 0
4. HORAS EXTRAS	\$ 0
5. INT. CESANTIAS 2018	\$ 0
TOTAL	\$ 2.200.000

DEDUCCIONES POR	
1. APORTES SALUD (4%)	\$ 88.000
2. APORTES PENSION (4%)	\$ 88.000
3. FONDO SOLIDARIDAD (1%)	\$ 0
4. RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0
5. ADELANTOS Y/O PRESTAMOS	\$ 0
6. POLIZA	\$ 0
TOTAL	\$ 176.000

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO EN
TODAS SUS PARTES ESTE PAGO.

FIRMA Y C.C.:

NETO PAGADO → \$ 2.024.000



INTERSA S.A. - INGENIERIA

RELACION PAGO NOMINA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: **Diego Andres Caviedes**
 IDENTIFICACION: **1.032.394.259**
 CARGO: **Topografo**
 PERIODO DE PAGO: **01 al 30 de Abril de 2019**

SALARIO BASICO: **\$ 1.850.000**
 DIAS PAGADOS: **22**
 NOMINA DE: **PUENTE ARANDA**

DEVENGADO POR	
1. SALARIO	\$ 1.356.667
2. AUXILIO TRANSPORTE	\$ 0
3. RETROACTIVO	\$ 0
4. HORAS EXTRAS	\$ 0
5. INT. CESANTIAS 2018	\$ 0
TOTAL	\$ 1.356.667

DEDUCCIONES POR	
1. APORTES SALUD (4%)	\$ 54.267
2. APORTES PENSION (4%)	\$ 54.267
3. FONDO SOLIDARIDAD (1%)	\$ 0
4. RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0
5. ADELANTOS Y/O PRESTAMOS	\$ 0
6. POLIZA	\$ 0
TOTAL	\$ 108.533

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO EN
TODAS SUS PARTES ESTE PAGO.

FIRMA Y C.C:

NETO PAGADO →

\$ 1.248.133



INTERSA S.A. - INGENIERIA

RELACION PAGO NOMINA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: **Monica Andrea Fajardo**
 IDENTIFICACION: **1.077.847.723**
 CARGO: **Profesional Ambiental**
 PERIODO DE PAGO: **01 al 30 de Abril de 2019**

SALARIO BASICO: **\$ 3.000.000**
 DIAS PAGADOS: **27**
 NOMINA DE: **PUENTE ARANDA**

DEVENGADO POR	
1. SALARIO	\$ 2.700.000
2. AUXILIO TRANSPORTE	\$ 0
3. RETROACTIVO	\$ 0
4. HORAS EXTRAS	\$ 0
5. INT. CESANTIAS 2018	\$ 0
TOTAL	\$ 2.700.000

DEDUCCIONES POR	
1. APORTES SALUD (4%)	\$ 108.000
2. APORTES PENSION (4%)	\$ 108.000
3. FONDO SOLIDARIDAD (1%)	\$ 0
4. RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0
5. ADELANTOS Y/O PRESTAMOS	\$ 0
6. POLIZA	\$ 0
TOTAL	\$ 216.000

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO EN
TODAS SUS PARTES ESTE PAGO.

Monica Fajardo

FIRMA Y C.C:

NETO PAGADO →

\$ 2.484.000


INVELER LTDA. **RELACION PAGO NOMINA**

NOMBRE DEL TRABAJADOR: **Natalia Cogollo Causil**
 IDENTIFICACION: **1.033.375.635**
 CARGO: **Servicios Generales**
 PERIODO DE PAGO: **01 al 30 de Abril de 2019**

SALARIO BASICO: **\$ 828.116**
 DIAS PAGADOS: **30**
 NOMINA DE: **PUENTE ARANDA**

DEVENGADO POR	
1. SALARIO	\$ 828.116
2. AUXILIO TRANSPORTE	\$ 97.032
3. RETROACTIVO	\$ 0
4. HORAS EXTRAS	\$ 0
5. INT. CESANTIAS 2018	\$ 0
TOTAL	\$ 925.148

DEDUCCIONES POR	
1. APORTES SALUD (4%)	\$ 33.125
2. APORTES PENSION (4%)	\$ 33.125
3. FONDO SOLIDARIDAD (1%)	\$ 0
4. RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0
5. ADELANTOS Y/O PRESTAMOS	\$ 0
6. POLIZA	\$ 0
	\$ 0
TOTAL	\$ 66.249

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO EN
 TODAS SUS PARTES ESTE PAGO.

 FIRMA Y C.C:

NETO PAGADO ➡ **\$ 858.899**



INTERSA S.A. - INGENIERIA RELACION PAGO NOMINA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Paola Yised Rueda Sanchez
IDENTIFICACION: 1.032.397.006
CARGO: Profesional Social
PERIODO DE PAGO: 01 al 30 de Abril de 2019

SALARIO BASICO: \$ 3.000.000
DIAS PAGADOS: 30
NOMINA DE: PUENTE ARANDA

DEVENGADO POR	
1. SALARIO	\$ 3.000.000
2. AUXILIO TRANSPORTE	\$ 0
3. RETROACTIVO	\$ 0
4. HORAS EXTRAS	\$ 0
5. INT. CESANTIAS 2018	\$ 0
TOTAL	\$ 3.000.000

DEDUCCIONES POR	
1. APORTES SALUD (4%)	\$ 120.000
2. APORTES PENSION (4%)	\$ 120.000
3. FONDO SOLIDARIDAD (1%)	\$ 0
4. RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0
5. ADELANTOS Y/O PRESTAMOS	\$ 0
6. POLIZA	\$ 0
TOTAL	\$ 240.000

RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO EN
TODAS SUS PARTES ESTE PAGO.

Paola Yised Rueda
FIRMA Y C.C:
1032397006 Btu.

NETO PAGADO → \$ 2.760.000



INTERSA S.A. - INGENIERIA RELACION PAGO NOMINA

NOMBRE DEL TRABAJADOR: Nelson Borja Romero
IDENTIFICACION: 9.659.283
CARGO: Inspector
PERIODO DE PAGO: 01 al 30 de Abril de 2019

SALARIO BASICO: \$ 2.200.000
DIAS PAGADOS: 30
NOMINA DE: PUENTE ARANDA

DEVENGADO POR	
1. SALARIO	\$ 2.200.000
2. AUXILIO TRANSPORTE	\$ 0
3. RETROACTIVO	\$ 0
4. HORAS EXTRAS	\$ 0
5. INT. CESANTIAS 2018	\$ 0
TOTAL	\$ 2.200.000

DEDUCCIONES POR	
1. APORTES SALUD (4%)	\$ 88.000
2. APORTES PENSION (4%)	\$ 88.000
3. FONDO SOLIDARIDAD (1%)	\$ 0
4. RETENCION EN LA FUENTE	\$ 0
5. ADELANTOS Y/O PRESTAMOS	\$ 0
6. POLIZA	\$ 0
TOTAL	\$ 176.000



RECIBI A SATISFACCION Y ACEPTO EN
TODAS SUS PARTES ESTE PAGO.

NB
FIRMA Y C.C: 9659283

NETO PAGADO → \$ 2.024.000

 <p>BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS</p>	INFORME SSTMA , ETAPA DE OBRA N° 5	 <p>30 años INTERSA S.A. INGENIERIA</p>
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	
COP No. FDLPA – 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	

➤ ANEXO 14 RESISTRO FOTOGRAFICO

REGISTRO FOTOGRAFICO GESTION AMBIENTAL Y SST			
INTERVENTORIA	INTERSA S.A	MES	ABRIL
COMITES, CAPACITACIONES E INSPECCIONES			
EXTINTORES, BOTIQUIN, SEÑALES INFORMATIVAS			
	CN 16003273	CN 16001793	
CERRAMIENTOS			
	CN 16001793	CN 16002026	
SUMIDEROS			
	CN 16002026	CN 16004097	
CENTROS DE ACOPIO			
	CN 16001040	CN 16003550	
PROTECCION DE ARBOLES			
	CN 16001049	CN 16004097	

 ALCALDÍA NACIONAL DE BOGOTÁ GOBIERNO MUNICIPAL DE BOGOTÁ	INFORME SSTMA , ETAPA DE OBRA N° 5	 30 años INTERSA S.A. INGENIERIA
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	
COP No. FDLPA – 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	

➤ **ANEXO 15. LISTAS DE CHEQUEO**

LISTA DE CHEQUEO No.

INTERVENTORIA		Interna S.A		CONTRATO FOLPA No.		141 de 2018							
CONTRATISTA		Luis Gabriel Nieto Garcia		CONTRATO FOLPA No.		156 de 2018							
SEMANA 1 - DEL 29 AL 04 DE ABRIL DE 2019													
COMPONENTE A - CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES													
PUNTAJE 7%													
Item	Componente SG-SSTMA	INDICE DE PONDERACION	Aplica	No aplica	INDICE REDISTRIBUIDO	V	S	L	M	MI	J	CALIFICACION	Observaciones
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas S&SOMA exigidas	1,00	X	1,00	0,00	1,00	100	100	100	100	100	100	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito S&SOMA hechas por la Interventoría o el FOLPA en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,00	X	2,00	0,00	2,00	100	100	100	100	100	100	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza S&SOMA está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones	2,00	X	2,00	0,00	2,00	100	100	100	100	100	100	
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de obra	1,00	X	1,00	0,00	1,00	100	100	100	100	100	100	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	1,00	X	1,00	0,00	1,00	100	100	100	0	100	80	ACOPIO DE FRESADO NO CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN PLEGOS frente 1040
		7,00	5	7,00	0	7,00							
TOTAL COMPONENTE A													96,00
COMPONENTE B- MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS													
PUNTAJE 40%													
Item	Componente SG-SSTMA	INDICE DE PONDERACION	Aplica	No aplica	INDICE REDISTRIBUIDO							CALIFICACION	Observaciones
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua	6,00	X	6,00	0,00	6,00	100	100	100	100	100	100	
7	Los acopios de materiales y escombros se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones	6,00	X	6,00	0,00	6,00	100	100	100	0	100	83	ACOPIO DE FRESADO NO CUMPLE CON LO ESTIPULADO EN PLEGOS frente 1040
8	Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante la ESP correspondiente.	5,00	X	5,00	0,00	5,00	100	100	100	100	100	100	
9	El campamento de obra se encuentra debidamente enmarcado, señalizado, ordenado y aseado, cumpliendo con el plan de manejo integral de residuos sólidos aprobados.	5,00	X	5,00	0,00	5,00	100	100	100	100	100	100	
10	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o aquella que la sustituya o modifique.	5,00	X	5,00	0,00	5,00	100	100	100	100	100	100	
11	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las vías. ¿Se implementa un sistema de verificación de este ítem?	6,00	X	6,00	0,00	6,00	100	100	100	100	100	100	
12	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el plan de manejo integral de residuos	6,00	X	6,00	0,00	6,00	100	100	100	100	100	100	
13	Se implementa efectivamente algún plan o programa para controlar las emisiones de material particulado en la obra	6,00	X	6,00	0,00	6,00	100	100	100	100	100	100	
		45,00	8	45,00	0	45,00							
TOTAL COMPONENTE B													97,92

LISTA DE CHEQUEO No.

INTERVENIENTE	Intrinsa S.A.	CONTRATO FOLPA No.	141 de 2018
CONTRATISTA	Luis Gabriel Nieto García	CONTRATO FOLPA No.	156 de 2018

SEMANA 1 - DEL 29 AL 04 DE ABRIL DE 2019

COMPONENTE C - MANEJO DE LA VEGETACIÓN Y DEL PAISAJE

PUNTAJE 3%

Item	Componente SG-SSTMA	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	Aplica	No aplica	ÍNDICE REDISTRIBUIDO	Calificación	Observaciones
14	Si existen zonas verdes en el área de intervención de la obra, estas se encuentran libres de materiales de construcción y residuos. Si los impredecibles se cubren con rellenos de condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación	3.00	X	0.00	3.00	0	83
		3.00	1	0.00	3.00		

TOTAL COMPONENTE C

83.33

COMPONENTE D. GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

PUNTAJE 30%

Item	Componente SG-SSTMA	ÍNDICE DE PONDERACIÓN	Aplica	No aplica	ÍNDICE REDISTRIBUIDO	V	S	L	M	MI	J	Calificación	Observaciones
15	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones	2.00	X	0.00	2.47	100	100	100	100	100	100	100	
16	Se realiza la protección a pozos en construcción de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y de manera que se minimice el riesgo de accidentes	1.00	X	0.00	1.23	100	100	100	100	100	100	100	
17	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección personal señalados en la matriz de EPPs aprobado por la interventoría	2.00	X	0.00	2.47	100	100	100	100	100	100	100	
18	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los pliegos de condiciones	1.00	X	0.00	1.23	100	100	100	100	100	100	100	
19	Se tiene implementada toda la señalización SISO de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones	2.00	X	0.00	2.47	100	100	100	100	100	100	100	
20	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2.00	X	2.00	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
21	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios	1.00	X	0.00	1.23	100	100	100	100	100	100	100	
22	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria y equipo.	1.00	X	0.00	1.23	100	100	100	100	100	100	100	
23	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley ARP, EPS y AFP y el contratista se encuentra al día en los pagos.	4.00	X	0.00	4.93	100	100	100	100	100	100	100	
24	Se socializa a todo el personal de la obra la Política de Salud Ocupacional y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial firmada por el representante legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes REO.	2.00	X	0.00	2.47	100	100	100	100	100	100	100	
25	Los miembros del COPASO o VIGIA se reúnen mensualmente, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión	1.00	X	1.00	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

LISTA DE CHEQUEO No.

INTERVENTORIA		Intersa S.A.		CONTRATO FOLPA No.		141 de 2018	
CONTRATISTA		Luis Gabriel Nieto García		CONTRATO FOLPA No.		155 de 2018	
SEMANA 1 - DEL 29 AL 04 DE ABRIL DE 2019							
26	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2,00	X	2,00	0,00	2,47	100
27	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el MAO	1,00	X	1,00	0,00	1,23	100
28	Todos los trabajadores cuentan con vestimenta para el manejo de ropa, implementos personales y EPPs.	1,00	X	1,00	0,00	1,23	100
29	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad y es socializado con el personal involucrado en su manejo.	1,00	X	1,00	0,00	1,23	100
30	Se realiza el mantenimiento especificado por el fabricante a toda la maquinaria y equipo utilizado en obra	2,00	X	2,00	0,00	2,47	100
31	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y existen los soportes.	2,00	X	2,00	2,00	0,00	NA
32	Se realizan simulacros de emergencia	2,00	X	2,00	2,00	0,00	NA
		30,00	18	30,00	4	7,00	28,27
TOTAL COMPONENTE D		100,00					
COMPONENTE E - PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN							
PUNTAJE 15%							
Item	Componente SC-SSTMA	INDICE DE PONDERACION	Aplica	No aplica	INDICE REDISTRIBUIDO	V	CAURICACION
33	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el diagrama prearmatral de los frentes, en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	15,00	X	15,00	0,00	15,00	100
		15,00	1	15,00	0	15,00	100
TOTAL COMPONENTE E		100,00					
		98,23					

FIRMAS

RESIDENTE SSTMA INTERVENTORIA

RESIDENTE SSTMA INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

RESIDENTES SST CONTRATISTA

RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA

LISTA DE CHEQUEO No.

INTERVENTORIA	Inlarsa S.A	CONTRATO FDLPA No.	141 de 2018
CONTRATISTA	Luis Gabriel Nieto García	CONTRATO FDLPA No.	155 de 2018

SEMANA 3 - DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2019

COMPONENTE A - CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES

Item	Componente SC-SSTMA	INDICE DE PONDERACION	Aplica		No aplica	INDICE REDISTRIBUIDO	V	S	L	M	MI	J	CALIFICACIÓN	Observaciones
			X	1,00	0,00									
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas S&SOMA exigidas	1,00	X	1,00	0,00	1,00	100	100	100	100	100	100	100	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito S&SOMA hechas por la Interventoría o el FDLPA en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,00	X	2,00	0,00	2,00	100	100	100	100	100	100	100	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza S&SOMA está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones	2,00	X	2,00	0,00	2,00	100	100	100	100	100	100	100	
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de obra	1,00	X	1,00	0,00	1,00	100	100	100	100	100	100	100	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	1,00	X	1,00	0,00	1,00	100	100	100	100	100	100	100	
		7,00	5	7,00	0	7,00								
TOTAL COMPONENTE A														100,00

COMPONENTE B- MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

PUNTAJE 45%															
Item	Componente SC-SSTMA	INDICE DE PONDERACION	Aplica		No aplica		INDICE REDISTRIBUIDO							Observaciones	
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua	6,00	X	6,00		0,00	6,00	100	100	100	100	100	100		
7	Los acopios de materiales y escombros se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones	6,00	X	6,00		0,00	6,00	100	100	100	100	100	100		
8	Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante la ESP correspondiente.	5,00	X	5,00		0,00	5,00	100	100	100	100	100	100		
9	El componente de obra se encuentra debidamente enmarcado, señalizado, ordenado y aseado, cumpliendo con el plan de manejo integral de residuos sólidos aprobados.	5,00	X	5,00		0,00	5,00	100	100	100	100	100	100		
10	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o aquella que la sustituya o modifique.	5,00	X	5,00		0,00	5,00	100	100	100	100	100	100		
11	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las vías. ¿Se implementa un sistema de verificación de este ítem?	6,00	X	6,00		0,00	6,00	100	100	100	100	100	100		
12	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el plan de manejo integral de residuos	6,00	X	6,00		0,00	6,00	100	100	100	100	100	100		
13	Se implementa efectivamente algún plan o programa para controlar las emisiones de material particulado en la obra	6,00	X	6,00		0,00	6,00	100	100	100	100	100	100		
		45,00	8	45,00	0	0,00	45,00								
TOTAL COMPONENTE B														100,00	

LISTA DE CHEQUEO No.

INTERVENTORIA		Interna S.A		CONTRATO FOLPA No.		141 de 2018							
CONTRATISTA		Luis Gabriel Nieto Garcia		CONTRATO FOLPA No.		158 de 2018							
SEMANA 3 - DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2019													
COMPONENTE C - MANEJO DE LA VEGETACION Y DEL PAISAJE													
PUNTAJE 3%													
Item	Componente SG-SSTMA	INDICE DE PONDERACION	Aplica	No aplica	INDICE REDISTRIBUIDO		CALIFICACIÓN	Observaciones					
14	Si existen zonas verdes en el área de intervención de la obra, estas se encuentran libres de materiales de construcción y residuos. Si los imprescindible su utilización con restricciones a condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación	3,00	X	3,00	0,00	3,00	100	100	100				
		3,00	1	3,00	0	3,00							
TOTAL COMPONENTE C						100,00							
COMPONENTE D. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO													
PUNTAJE 30%													
Item	Componente SG-SSTMA	INDICE DE PONDERACION	Aplica	No aplica	INDICE REDISTRIBUIDO	V	S	L	M	MI	J	CALIFICACIÓN	Observaciones
15	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones	2,00	X	2,00	0,00	2,47	0	0	100	100	100	67	fuente asunción y traslado
16	Se realiza la protección a pozos en construcción de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y de manera que se minimice el riesgo de accidentes	1,00	X	1,00	0,00	1,23	100	100	100	100	100	100	
17	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección personal señalados en la matriz de EPPs aprobada por la Interventoría	2,00	X	2,00	0,00	2,47	100	100	100	100	100	100	
18	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los pliegos de condiciones	1,00	X	1,00	0,00	1,23	0	0	100	100	100	67	fuente asunción y traslado
19	Se tiene implementada toda la señalización SISO de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones	2,00	X	2,00	0,00	2,47	100	100	100	100	100	100	
20	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2,00	X	2,00	X	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	
21	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios	1,00	X	1,00	0,00	1,23	100	100	100	100	100	100	
22	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria y equipo.	1,00	X	1,00	0,00	1,23	100	100	100	100	100	100	
23	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley ARP, EPS y AFP y el contratista se encuentra al día en los pagos.	4,00	X	4,00	0,00	4,93	100	100	100	100	100	100	
24	Se socializa a todo el personal de la obra la Política de Salud Ocupacional y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial firmando por el representante legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los reportes REQ.	2,00	X	2,00	0,00	2,47	100	100	100	100	100	100	
25	Los miembros del COPASO o VIGIA se reúnen mensualmente, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunión	1,00	X	1,00	X	0,00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	

LISTA DE CHEQUEO No.

INTERVENTORIA		Intrinsa S.A.		SEMANA 3 - DEL 12 AL 18 DE ABRIL DE 2019																CONTRATO FOLPA No.		141 de 2018	
CONTRATISTA		Luis Gabriel Nieto García																		CONTRATO FOLPA No.		152 de 2018	
26	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2.00	X	2.00	0.00	2.47	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
27	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el MAO	1.00	X	1.00	0.00	1.23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
28	Todos los trabajadores cuentan con vestimenta para el manejo de ropa, Implementos personales y EPPs.	1.00	X	1.00	0.00	1.23	0	0	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	87				
29	Todos las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad y es socializado con el personal involucrado en su manejo.	1.00	X	1.00	0.00	1.23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
30	Se realiza el mantenimiento especificado por el fabricante a toda la maquinaria y equipo utilizado en obra	2.00	X	2.00	0.00	2.47	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100				
31	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento periódico, se ejecuta y existen los soportes.	2.00	X	2.00	2.00	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
32	Se realizan simulacros de emergencia	2.00	X	2.00	2.00	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA				
TOTAL COMPONENTE D		30.00	18	30.00	4	7.00	28.37																
TOTAL COMPONENTE E - PROGRAMA DE SEÑALIZACIÓN																				92.86			
PUNTAJE 15%																							
Item	Componente SG-SSTMA	INDICE DE PONDERACION	Aplica	No aplica	INDICE REDISTRIBUIDO	V	S	L	M	MI	J	CAIFICACIÓN	Observaciones										
33	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el currículum primario de los frentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	15.00	X	15.00	0.00	15.00	100	100	100	100	100	100	100										
TOTAL COMPONENTE E		15.00	1	15.00	0	15.00								100.00									
TOTAL COMPONENTE E																				97.86			
RESIDENTE SSTMA INTERVENTORIA														FRUAS									
RESIDENTE SSTMA INTERVENTORIA																							
DIRECTOR DE INTERVENTORIA																							
RESIDENTES SST CONTRATISTA																							
RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA																							

LISTA DE CHEQUEO No.

INTERVENTORIA		Inversa S.A		CONTRATO FOLPA No.		141 de 2018							
CONTRATISTA		Luis Gabriel Nieto Garcia		CONTRATO FOLPA No.		156 de 2018							
SEMANA 4 - DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2019													
COMPONENTE A - CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES													
PUNTAJE 7%													
Item	Componente SG-SSTMA	INDICE DE PONDERACION	Aplica	No aplica	INDICE REDISTRIBUIDO	V	S	L	M	MI	J	CAIFICACIÓN	Observaciones
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas S&SOMA	1,00	X	1,00	0,00	1,00	100	100	100	100	100	100	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito S&SOMA hechas por la Interventoría o el FOLPA en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,00	X	2,00	0,00	2,00	100	100	100	100	100	100	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza S&SOMA está conformada y dotada de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones	2,00	X	2,00	0,00	2,00	100	100	100	100	100	100	
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los soportes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de obra	1,00	X	1,00	0,00	1,00	100	100	100	100	100	100	
5	Se cumple con todos los procedimientos establecidos en el MAO aprobado	1,00	X	1,00	0,00	1,00	100	100	100	100	100	100	
		7,00	5	7,00	0	0,00	7,00						
TOTAL COMPONENTE A													100,00
COMPONENTE B- MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS													
PUNTAJE 45%													
Item	Componente SG-SSTMA	INDICE DE PONDERACION	Aplica	No aplica	INDICE REDISTRIBUIDO							CAIFICACIÓN	Observaciones
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua	6,00	X	6,00	6,00	100	100	100	100	100	100	100	
7	Los acopios de materiales y escombros se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones	6,00	X	6,00	6,00	100	100	100	100	100	100	100	
8	Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante la ESP correspondiente.	5,00	X	5,00	5,00	100	100	100	100	100	100	100	
9	El camuflaje de obra se encuentra debidamente enmascarado, señalizado, ordenado y aseado, cumpliendo con el plan de manejo integral de residuos sólidos aprobados.	5,00	X	5,00	5,00	100	100	100	100	100	100	100	
10	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o aquella que la sustituya o modifique.	5,00	X	5,00	5,00	100	100	100	100	100	100	100	
11	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las vías. ¿Se implementa un sistema de verificación de este ítem?	6,00	X	6,00	6,00	100	100	100	100	100	100	100	
12	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el plan de manejo integral de residuos	6,00	X	6,00	6,00	100	100	100	100	100	100	100	
13	Se implementa efectivamente algún plan o programa para controlar las emisiones de material particulado en la obra	8,00	X	8,00	8,00	100	100	100	100	100	100	100	
		45,00	8	45,00	0	0,00	45,00						
TOTAL COMPONENTE B													100,00

LISTA DE CHEQUEO No.

LISTA DE CHEQUEO No.												
INTERVENTORIA		Intrinsa S.A		CONTRATO FOLPA No.				141 de 2018				
CONTRATISTA		Luis Gabriel Nieto Garcia		CONTRATO FOLPA No.				156 de 2018				
SEMANA 4 - DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2019												
COMPONENTE C - MANEJO DE LA VEGETACION Y DEL PAISAJE												
PUNTAJE %												
Item	Componente SG-SSTMA	INDICE DE PONDERACION	Aplica	No aplica	INDICE REDISTRIBUIDO						CALIFICACIÓN	Observaciones
14	Si existen zonas verdes en el área de intervención de la obra, estas se encuentran libres de materiales de construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización son reutilizados a condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectación	3.00	X	3.00	0.00	3.00	100	100	100	100	100	100
		3.00	1	3.00	0	3.00						
TOTAL COMPONENTE C												
100.00												
COMPONENTE D. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO												
PUNTAJE 30%												
Item	Componente SG-SSTMA	INDICE DE PONDERACION	Aplica	No aplica	INDICE REDISTRIBUIDO	V	S	L	M	MI	J	Observaciones
15	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones	2.00	X	2.00	0.00	2.47	100	100	100	100	100	100
16	Se realiza la protección a pozos en construcción de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y de manera que se minimice el riesgo de accidentes	1.00	X	1.00	0.00	1.23	100	100	100	100	100	100
17	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección personal señalados en la matriz de EPPs aprobado por la Interventoría	2.00	X	2.00	0.00	2.47	100	100	100	100	100	100
18	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los pliegos de condiciones	1.00	X	1.00	0.00	1.23	100	100	100	100	100	100
19	Se tiene implementada toda la señalización SISO de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones	2.00	X	2.00	0.00	2.47	100	100	100	100	100	100
20	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2.00	X	2.00	X	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	
21	El campamento y almacenes se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios	1.00	X	1.00	0.00	1.23	100	100	100	100	100	100
22	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria y equipo.	1.00	X	1.00	0.00	1.23	100	100	100	100	100	100
23	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley ARP, EPS y AFP y el contratista se encuentra al día en los pagos.	4.00	X	4.00	0.00	4.93	100	100	100	100	100	100
24	Se socializa a todo el personal de la obra la Política de Salud Ocupacional y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial firmado por el representante legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los reportes REQ.	2.00	X	2.00	0.00	2.47	100	100	100	100	100	100
25	Los miembros del COPASO o VIGIA se reúnen mensualmente, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan los actas de reunión	1.00	X	1.00	X	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA

LISTA DE CHEQUEO No.

INTERVENTORIA		CONTRATISTA		Intarsa S.A.		Luis Gabriel Nieto Garcia		SEMANA 4 - DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2019												CONTRATO FOLPA No.		141 de 2019		155 de 2018	
CONTRATISTA		Luis Gabriel Nieto Garcia		Intarsa S.A.		Luis Gabriel Nieto Garcia		SEMANA 4 - DEL 19 AL 25 DE MARZO DE 2019												CONTRATO FOLPA No.		141 de 2019		155 de 2018	
26	Todos los trabajadores cuentan con inducción, capacitación y entrenamiento; además son notificados de los riesgos de acuerdo al cargo a ocupar y se cuenta con los soportes de ejecución de la actividad.	2.00	X	2.00	0.00	2.47	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
27	Se realizan las actividades de Promoción y Prevención a todos los trabajadores según lo establecido en el MAO	1.00	X	1.00	0.00	1.23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
28	Todos los trabajadores cuentan con vestimenta para el manejo de ropa, implementos personales y EPPs.	1.00	X	1.00	0.00	1.23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
29	Todas las sustancias químicas están inventariadas y cuentan con hoja de seguridad y es socializada con el personal involucrado en su manejo.	1.00	X	1.00	0.00	1.23	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
30	Se realiza el mantenimiento especificado por el fabricante a toda la maquinaria y equipo utilizado en obra	2.00	X	2.00	0.00	2.47	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100						
31	Se han conformado las Brigadas de Emergencia, están activas, especializadas e identificadas, tienen un plan de capacitación y entrenamiento periódico, se ejerce y existen los soportes.	2.00	X	2.00	2.00	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA						
32	Se realizan simulacros de emergencia	2.00	X	2.00	2.00	0.00	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA	NA						
TOTAL COMPONENTE D		30.00	18	30.00	4	7.00	28.37													100.00					
COMPONENTE E - PROGRAMA DE SEÑALIZACION																									
PUNTAJE 15%																									
Item	Componente SG-SSTMA	INDICE DE PONDERACION	Aplica	No aplica	INDICE REDISTRIBUIDO	V	S	L	M	MI	J	Calificación	Observaciones												
33	Se mantiene instalado y en buenas condiciones el cerramiento perimetral de las fuentes en intervención de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones.	15.00	X	15.00	0.00	15.00	100	100	100	100	100	100	100												
TOTAL COMPONENTE E		15.00	1	15.00	0	15.00													100.00						
RESIDENTE SSTMA INTERVENTORIA																									
RESIDENTE SSTMA INTERVENTORIA																									
DIRECTOR DE INTERVENTORIA																									
RESIDENTES SST CONTRATISTA																									
RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA																									

LISTA DE CHEQUEO No.

INTERVENTORIA	Interesa S.A	CONTRATO FDLPA No.	141 de 2018
CONTRATISTA	Luis Gabriel Nieto García	CONTRATO FDLPA No.	155 de 2018

SEMANA 2 - DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2019

COMPONENTE A - CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES

Item	Componente SC-SSTMA	INDICE DE PONDERACION	PUNTAJE 7%		INDICE REDISTRIBUIDO	V	S	L	M	MI	J	CALIFICACION	Observaciones
			Aplica	No aplica									
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las carpetas SASOMA en el sitio	1,00	X	0,00	1,00	100	100	100	100	100	100	100	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el sitio SASOMA hechas por la Interventoría o el FDLPA en el desarrollo de las actividades del proyecto	2,00	X	0,00	2,00	100	100	100	100	100	100	100	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza SASOMA está conformada y deacda de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones y cumple sus funciones	2,00	X	0,00	2,00	100	100	100	0	0	100	67	frente de asunción y brasil no se encontro personal de BOAL
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los comités, todos los informes de proveedores de materiales y sitio de disposición final de residuos producto de las actividades de obra	1,00	X	0,00	1,00	100	100	100	100	100	100	100	
5	Se cumple con todos los procedimientos ofertados en el MAO aprobado	1,00	X	0,00	1,00	100	100	100	0	0	0	50	lo aportado por el MAO se tiene que dar cumplimiento en todos los componentes
		7,00	5	0	0,00	7,00							
TOTAL COMPONENTE A												83,33	

COMPONENTE B - MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS

Item	Componente SC-SSTMA	INDICE DE PONDERACION	PUNTAJE 45%		INDICE REDISTRIBUIDO	V	S	L	M	MI	J	CALIFICACION	Observaciones
			Aplica	No aplica									
6	Se implementan las medidas de manejo necesarias para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de alcantarillado o cuerpos de agua	6,00	X	0,00	6,00	100	100	100	100	100	100	100	
7	Los acopios de materiales y escombros se adecuan y mantienen de acuerdo a lo especificado en el pliego de condiciones	6,00	X	0,00	6,00	100	100	100	0	0	100	67	ACOPIO FRENTE ASUNCION Y BRASILIA
8	Las conexiones a servicios públicos se encuentran debidamente legalizadas ante la ESP correspondiente.	5,00	X	0,00	5,00	100	100	100	100	100	100	100	
9	El campamento de obra se encuentra debidamente enmarcado, señalizado, ordenado y aseoado, cumpliendo con el plan de manejo integral de residuos sólidos aprobados.	5,00	X	0,00	5,00	100	100	100	0	0	0	50	NO CUENTA CON CAMPAMENTO ASUNCION Y BRASILIA
10	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la resolución 541 de 1994 del Ministerio del Medio Ambiente, o aquella que la sustituya o modifique.	5,00	X	0,00	5,00	100	100	100	100	100	100	100	
11	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las vías. ¿Se implementa un sistema de verificación de este ítem?	6,00	X	0,00	6,00	100	100	100	100	100	100	100	
12	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el plan de manejo integral de residuos	6,00	X	0,00	6,00	100	100	100	100	100	100	100	
13	Se implementa efectivamente algún plan o programa para controlar las emisiones de material particulado en la obra	6,00	X	0,00	6,00	100	100	100	100	100	100	100	
		45,00	8	0	0,00	45,00							
TOTAL COMPONENTE B												89,58	

LISTA DE CHEQUEO No.

INTERVENTORIA		Inbresa S.A		CONTRATO FOLPA No.		141 de 2018	
CONTRATISTA		Luis Gabriel Nieto García		CONTRATO FOLPA No.		135 de 2018	
SEMANA 2 - DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2019							
COMPONENTE C - MANEJO DE LA VEGETACION Y DEL PAISAJE							
PUNTAJE 2%							
Item	Componente SG-SSTMA	INDICE DE PONDERACION	Aplica	No aplica	INDICE REDISTRIBUIDO	CALIFICACION	
14	Si existen zonas verdes en el area de intervencion de la obra, estas se encuentran libres de materiales de construccion y residuos. Si se imprescindible su utilizacion son reutilizados a condiciones iguales o mejores a las presentes antes de la afectacion	3.00	X	3.00	0.00	100	100
		3.00	1	3.00	0	100	100
TOTAL COMPONENTE C							
COMPONENTE D. GESTION EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO							
PUNTAJE 30%							
Item	Componente SG-SSTMA	INDICE DE PONDERACION	Aplica	No aplica	INDICE REDISTRIBUIDO	V	Observaciones
15	Las unidades sanitarias se encuentran de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones	2.00	X	2.00	0.00	100	67
16	Se realiza la protección a pozos en construcción de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones y de manera que se minimice el riesgo de accidentes	1.00	X	1.00	0.00	100	100
17	Todos los trabajadores tienen y utilizan adecuadamente la dotación y elementos de protección personal señalizados en la matriz de EPPs aprobado por la Interventoria	2.00	X	2.00	0.00	100	100
18	Todos los frentes de obra cuentan con el kit de emergencias especificado en los pliegos de condiciones	1.00	X	1.00	0.00	100	100
19	Se tiene implementada toda la señalización SISO de acuerdo a lo especificado en los pliegos de condiciones	2.00	X	2.00	0.00	100	50
20	Se implementan los planes de emergencia en todos los frentes de obra	2.00	X	2.00	0.00	100	50
21	El campamento y almacenos se encuentran debidamente dotados de equipos de primeros auxilios y equipos para el control de contagios	1.00	X	1.00	0.00	100	100
22	Se cumplen con todos los requerimientos establecidos en los pliegos de condiciones relacionados con maquinaria y equipo.	1.00	X	1.00	0.00	100	100
23	Todo el personal que labora en el proyecto está afiliado de acuerdo a la ley ARP, EPS y AFP y el contratista se encuentra al día en los pagos.	4.00	X	4.00	0.00	100	100
24	Se socializa a todo el personal de la obra la Política de Salud Ocupacional y el Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial firmado por el representante legal, se encuentra en un lugar visible de las instalaciones temporales y se cuenta con los soportes REG.	2.00	X	2.00	0.00	100	50
25	Los miembros del COPASO o VIGIA se reúnen mensualmente, se cuenta con el cronograma de reuniones, plan de trabajo general de acuerdo a sus funciones y se entregan las actas de reunion	1.00	X	1.00	1.00	NA	NA

INTERVENTORIA		LISTA DE CHEQUEO No.										CONTRATO FOLPA No.		141 de 2018		156 de 2018	
CONTRATISTA		SEMANA 2 - DEL 05 AL 11 DE ABRIL DE 2019										CONTRATO FOLPA No.					

INTERVENTORIA		INTERSEA S.A		CONTRATO FOLPA No.		141 DE 2018
CONTRATISTA		LUIS GABRIEL NIETO GARCIA		CONTRATO FOLPA No.		156 DE 2018
INFORME MENSUAL No. 5 DEL 1 AL 30 DE ABRIL 2019						
COMPONENTE A - CUMPLIMIENTO A OBLIGACIONES AMBIENTALES Y SST CONTRACTUALES						
PUNTAJE 7%						
Item	Componente SC-SSTMA	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Observaciones
1	El contratista mantiene actualizado el contenido de las cartillas SASOMA exigidas	100	100	100	100	
2	Se cumple con el plan de acciones correctivas y/o preventivas a las observaciones en el ámbito SASOMA hechas por la Interventoría o el IDU en el desarrollo de las actividades del proyecto	100	100	100	100	
3	La brigada de orden, aseo y limpieza SASOMA está conformada y dotada de acuerdo a la especificación en el plan de condiciones y cumple sus funciones.	100	67	100	100	64.4%
4	Se entrega de manera oportuna de acuerdo a lo definido en los contratos, todos los reportes de providencias administrativas y auto de disposición final de residuos producidos por las actividades de obra.	100	100	100	100	
5	Se cumple con todos los procedimientos otorgados en el PIPMA aprobado	80	100	100	100	
		96.00	83.33	100.00	100.00	94.83
COMPONENTE B- MANEJO AMBIENTAL EN LA EJECUCION DE ACTIVIDADES CONSTRUCTIVAS						
PUNTAJE 45%						
Item	Componente SC-SSTMA	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Observaciones
7	Se implementan las medidas de manejo ambiental para impedir el aporte de sólidos o sustancias contaminantes al sistema de drenamiento o cuerpos de agua	100	80	100	100	
8	Los acopios de materiales y escombros se adecúan y mantienen de acuerdo a lo especificado en el plan de condiciones	83	87	100	100	
9	Los camiones a servicios públicos se encuentran debidamente señalizados ante la ESSP correspondiente.	100	100	100	100	
10	El camión de obra se encuentra debidamente amarrado, señalizado, ordenado y aseado, cumpliendo con el plan de manejo integral de residuos sólidos aprobados.	100	50	100	100	
11	Todos los vehículos de transporte de residuos cumplen con la resolución 541 de 1984 del Ministerio del Medio Ambiente, o igual que la señaliza o homologa.	100	100	100	100	
12	Todos los vehículos y maquinaria que salen del frente de obra se encuentran libres de residuos de materiales o escombros que puedan desprenderse en las vías. ¿Se implementa un sistema de verificación de este ítem?	100	100	100	100	
13	Todos los frentes de obra se encuentran ordenados y limpios y cumplen con lo establecido en el plan de manejo integral de residuos.	100	100	100	100	
14	Se implementa estrictamente algún plan o programa para controlar las emisiones de material producido en la obra	100	100	100	100	
		97.22	89.58	100.00	100.00	96.88
COMPONENTE C- MANEJO DE LA VEGETACION Y DEL PAISAJE						
PUNTAJE 3%						
Item	Componente SC-SSTMA	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Observaciones
6	Si existen zonas verdes en el área de intervención de la obra, estas se encuentran libres de materiales de construcción y residuos. Si es imprescindible su utilización son reemplazados a condiciones iguales o mejores a las propuestas antes de la afectación	83	100	100	100	2.17%
		83.00	100.00	100.00	100.00	95.75

INTERVENCIÓN	INTERVENSA S.A.	INTERVENIO FOLIO No.	141 DE 2018
CONTRATISTA	LUIS GABRIEL NETO GARCIA	CONTRATO FOLIO No.	150 DE 2018
INFORME MENSUAL No. 5 DEL 1 AL 30 DE Abril 2019			
RESIDENTE SISTEMA INTERVENCIÓN	A. Alfonso		
RESIDENTE SISTEMA INTERVENCIÓN	M. Martinez		
DIRECCIÓN DE INTERVENCIÓN	M. Martinez		
RESIDENTE SST CONTRATISTA	M. Martinez		
RESIDENTE AMBIENTAL CONTRATISTA	M. Martinez		

	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	Página 1 de 57
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	

INFORME N° 5 ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA GESTIÓN SOCIAL

PERÍODO: 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2019
GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORÍA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA- 141-2018
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA N° 156-2018

REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL,
FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA
PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL
QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA
VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.

INTERSA S.A
NIT: 860.450.644-3

BOGOTÁ D.C,
ABRIL 2019

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. CONSEJO LOCAL DE PUENTE ARANDA</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	 INTERSA S.A. <small>INGENIERIA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 2 de 57

TRAZABILIDAD DEL DOCUMENTO

FECHA	VERSION	DETALLE
ABRIL DE 2019	00	ORIGINAL

CONTROL DEL DOCUMENTO

Elaboró	
Nombre:	Paola Rueda
Cargo:	Residente social
Firma:	<i>Paola Rueda</i>

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>GOBIERNO MUNICIPAL DE BOGOTÁ</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	 INTERSA S.A. <small>INGENIERÍA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 3 de 57

TABLA DE CONTENIDO

INTRODUCCION	5
1. OBJETIVOS.....	7
1.1 Objetivo General.....	7
1.2 Objetivos Específicos	7
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	8
2.1 Ubicación	8
3. RECURSOS HUMANOS DE LA INTERVENTORIA.....	11
4. PROGRAMA DE INFORMACION A LA COMUNIDAD	13
4.1 Reunión de inicio de obra:.....	13
4.2 Reunión de avance:	13
4.3 Reunión extraordinaria:.....	14
5. PROGRAMA DE DIVULGACION DEL PROYECTO.....	14
5.1 Puntos satélites:.....	14
5.2 Volante de invitación a convocatorias, reuniones y comités:.....	16
6. PROGRAMA DE ATENCION AL CIUDADANO	20
6.1 Clasificación de los requerimientos ciudadanos:.....	20
6.2 Medios de atención:	21
6.3 Equipamiento de atención:	24
7. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD	24
8. PROGRAMA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO A EMPLEADOS A LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA.	28
9. PROGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO.....	29

 SOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>GOBIERNO</small> <small>Regional de la Fuerza Armada</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	 INTERSA S.A. <small>INGENIERÍA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 4 de 57

10. PROGRAMA DE MANEJO DE IMPACTOS EN EL SECTOR COMERCIAL	30
11. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA .30	
11.1 Levantamiento de actas de vecindad:	31
11.2 Levantamiento actas de rampas de accesos vehiculares	32
11.3 Acta de compromisos.....	32
11.4 Registro filmico y fotografías de las vías.....	32
12 REPORTE	33
12.1 Informes semanales:	33
12.2 Informes mensuales:	34
12.3 Informe final gestión social:	34
12.4 Evaluación de gestión social del contrato.....	35
13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.....	37
14. ANEXOS	39

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>GOBIERNO AJUNTAMIENTO DE PUENTE ARANDA</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	 INTERSA S.A. <small>INGENIERÍA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 5 de 57

INTRODUCCION

El siguiente informe social describe cada una de las estrategias que se manejaron durante el quinto periodo de ejecución de obra, correspondiente al mes de abril (01-30 de abril), en el cual se continúan actividades constructivas en los CIV's: 16002026 (Milenta), 160010140 (San Rafael), 16003550 (Santa Rita) y 16004097 (Autopista sur Muzú), además se iniciaron actividades en los CIV's: 16003273 (La Asunción), 16001283 (Brasilia.) y 16001793 (El Sol)

El informe se hace con el fin de darle cumplimiento al del Plan de Gestión Social, del Contrato de Obra No. 156-de 2018, cuyo objeto es: "CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C." y del contrato de interventoría N°141-2018, cuyo objeto es: "REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA."

Se expone el seguimiento y acompañamiento por parte de interventoría de las actividades sociales ejecutadas por el contratista Luis Gabriel Nieto García en los CIV's anteriormente mencionados. Así mismo las actividades sociales previas a la ejecución de actividades de obra para los segmentos de mantenimiento periódico de los CIV's:

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>GOBIERNO DE BOGOTÁ</small> <small>Equipo asistencial de Puente Aranda</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	 INTERSA S.A. <small>INGENIERÍA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	

16002882 (Santa Matilde), 16002882 (Carabelas) y 16003114 (Santa Isabel) , además del segmento de rehabilitación el CIV 16004735 (Villa Inés).

Se incluyen los instrumentos de seguimiento y control para todas estas actividades en los diferentes segmentos de intervención, para así garantizar el cumplimiento de la Gestión Social.

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	 INTERSA S.A. <small>INGENIERÍA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 7 de 57

1. OBJETIVOS

1.1 Objetivo General

Realizar gestiones desde el componente social, para verificar las actividades que se desarrollan dentro del mismo, en el marco del desarrollo del Contrato de Obra N°. 156 – 2018 y contrato de interventoría N° 141-2018, que permitan potenciar los efectos positivos, reducir el impacto de la intervención e integrar diversos actores sociales, de igual forma controlar y supervisar cada una de las actividades sociales que se realizarán dentro del contrato de obra.

1.2 Objetivos Específicos

- Conocer y participar en cada una de las actividades sociales que son convocadas por el contratista.
- Realizar informes semanales y mensuales del componente social.
- Realizar cronograma de actividades sociales que se ejecutaran dentro del mes
- Realizar recorridos por frente de obra
- Atender el punto de atención al ciudadano- PAC
- Realizar seguimiento al primer comité de veeduría ciudadana
- Realizar visita por frente de obra, verificación que la profesional social se encuentre brindando la información adecuada a la comunidad
- Acompañar la ejecución de las actividades técnicas durante el desarrollo de la obra.
- Verificar que se brinde cumplimiento con las actividades entregadas dentro del Plan de Gestión Social (PGS).
- Evaluar las actividades sociales por medio de la lista de chequeo social
- Dar seguimiento a cada una de las reuniones sociales que son realizadas por el contratista.

	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 8 de 57

-Realizar lista de chequeo social, frente a las actividades que son realizadas por el contratista.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1 Ubicación

El proyecto se encuentra localizado en las diferentes UPZ de la localidad 16 de Puente Aranda.

A continuación se relacionan cada uno de los CIVs y en que UPZ se localizan.

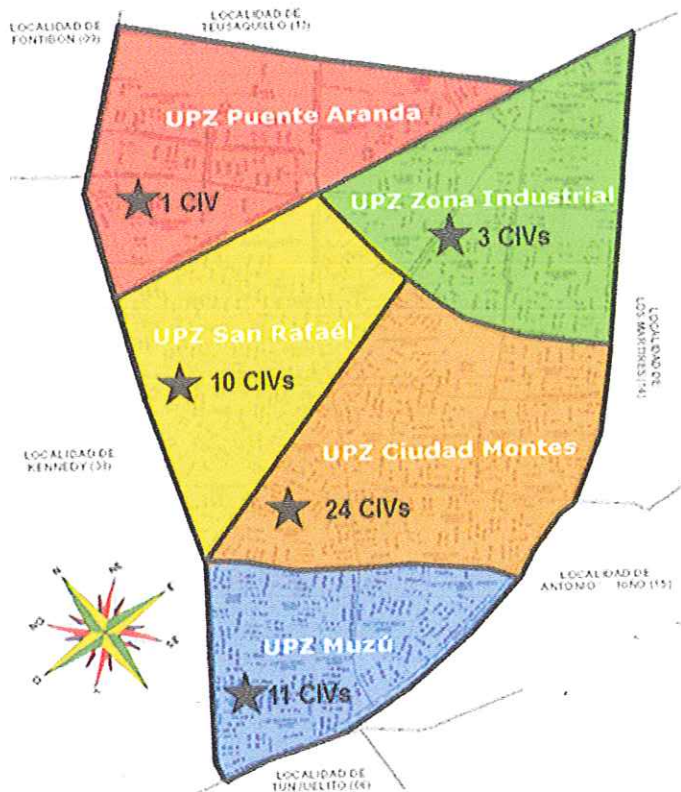


Ilustración 1 Localidad de Puente Aranda

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>GOBIERNO Municipal de Bogotá</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	 INTERSA S.A. <small>INGENIERIA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	

Página 9 de 57

Tabla 1CIV por UPZ de la localidad de Puente Aranda

CIV POR UPZ DE LA LOCALIDAD PUENTE ARANDA						
CIV	N°	PUENTE ARANDA	SAN RAFAEL	CIUDAD MONTES	MUZU	ZONA INDUSTRIAL
	1	16000217	16001100	16001664	16003550	16000471
	2		16001256	16001793	16003612	16000527
	3		16001590	16001903	16003758	16004450
	4		16000711	16001911	16002784	
	5		16000431	16002109	16004349	
	6		16000683	16002174	16003114	
	7		16000693	16002425	16004097	
	8		16001283	16002478	16002961	
	9		16001040	16002945	16002909	
	10		16000629	16002769	16003173	
	11			16002905	16002026	
	12			16002879		
	13			16003273		
	14			16002533		
	15			16003026		
	16			16002914		
	17			16002844		
	18			16002870		
	19			16002882		
	20			16004735		
	21			16002829		
	22			16002518		
	23			16002586		
	24			16003550		

El Proyecto, se desarrollará dentro del área determinada por los Pliegos de condiciones, en la localidad de Puente Aranda y en los CIV definidos por el FDLPA, para la licitación pública No. ALPA-LP-006-2087.

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>GOBIERNO Abierto y Local de Puente Aranda</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	 INTERSA S.A. <small>INGENIERÍA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 10 de 57

El Fondo de Desarrollo Local de puente Aranda adjudicó al contratista LUIS GABRIEL NIETO GARCIA, 44 CIV (códigos de identificación vial): en la Tabla N° 2, en color amarillo, se encuentran los CIV's que se encuentran en intervención de rehabilitación, y en color azul los CIV's que se les realizó mantenimiento periódico; para este periodo:

Tabla 2 CIV DE VIAS

CIV	N°	VIA	INICIO	FIN
16000217	1	CL 9A	KR 67	KR 67ª
16001100	2	KR 58	CL 2A BIS	CL 2C
16001590	3	CL 14 SUR	KR 56	KR 63
16001664	4	KR 39D	CL 5A	CL 5B
16001793	5	CL 2F	KR 41B	KR 42
16001903	6	KR 39B	CL 3	CL 3ª
16001911	7	CL 2B	KR 41A	KR 42
16002109	8	KR 52C	CL 19 SUR	CL 18A SUR
16002174	9	CL 17 SUR	KR 52A	KR 52B
16002425	10	CL 22 SUR	KR 52A	KR 52B
16002478	11	CL 1 H	KR 38 A	KR 38
16003550	12	KR 50A	CL 33 sur	CL 32 sur
16003612	13	KR 50A	CL 34 sur	CL 33 sur
16000471	14	KR 42A	CL 17A	AV CL 20
16000527	15	KR 42A	CL 17	CL 17ª
16001256	16	KR 54	CL 2B	CL 3
16000711	17	CL 4B	KR 57A	KR 60
16003758	18	KR 52B	CL 40 B Sur	CL 41
16002945	19	CL 1 G	KR 33	KR 33 A
16002769	20	CL 2	KR 34	KR 35
16002784	21	KR 52 C	CL 33 Sur	CL 34 Sur
16002905	22	CL 2	KR 32	KR 32 A
16002879	23	CL 2	KR 32 A	KR 32 B
16002846	24	CL 2	KR 32 B	KR 32 C
16004349	25	CL 43 Sur	KR 51 D BIS	KR 51 D
16003114	26	CL 2	KR 30 A	KR 31
16000431	27	KR 56	CL 5 B BIS	CL 5C

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>GOBIERNO</small> <small>Municipio de Puente Aranda</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	 INTERSA S.A. <small>INGENIERÍA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 11 de 57

16000683	28	KR 56	CL 4 D	CL 4 G
16004097	29	KR 50a	CL 39 Sur	CL 38b Sur
16003273	30	KR 31b	CL 1D Bis	CL 1F
16002533	31	CL 1C	KR 39	KR 40
16000693	32	DG 5 D Bis	TV 47	TV 48
16004450	33	KR 32	CL 6 A	CL 7
16001283	34	KR 44	CL 4B	CL 4 F
16003026	35	CL 1 D BIS	KR 33	CALLEJON
16002914	36	CL 1 B	KR 37	KR 37A
16002844	37	CL 1H BIS	KR 33	CALLEJON
16002870	38	CL 1 B	KR 37A	KR 37 B
16002882	39	CL 1	KR 38 A BIS	KR 38 BIS
16004735	40	KR 38 A	CL 1 D	CALLEJON
16001040	41	KR 53C	CL 4C	CL 4F
16002829	42	CL 1H BIS	KR 35	KR 35 BIS
16000629	43	CL 4D	KR 57	KR 57A
16002961	44	CL 32 Sur	KR 51G	KR 52A
16002518	45	KR 40	CL 1B	CL 1C
16002586	46	KR 40	CL 1B	CL 1
16002909	47	CL 31 SUR	KR 51G	KR 52
16003173	48	CL 38A SUR	KR 52C	AK 68
16002026	49	CL 20 SUR	TV 53 A	
TOTAL CIV'S INTERVENIDOS REHABILITACIÓN EN EL PERIODO				6
TOTAL CIV'S INTERVENIDOS MANTENIMIENTO PERIODICO EN EL PERIODO				2

3. RECURSOS HUMANOS DE LA INTERVENTORIA

Para dar alcance al objeto del contrato y de acuerdo con las condiciones contractuales, se ha destinado la contratación del personal que abarque diferentes áreas de gestión

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>GOBIERNO LOCAL DE PUENTE ARANDA</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	 INTERSA S.A. <small>INGENIERIA</small>
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 12 de 57

garantizando el seguimiento y acompañamiento a las labores del contrato de obra, el personal de interventoría se relaciona en la Tabla No 3.

Tabla 3 Personal de Interventoría

CARGO	NOMBRE	TELÉFONO
Director	Andrés Useche	3103098232
Residente	Raúl Aparicio	3006036322
Residente	Andrés Franco	3003095337
Ambiental y SST	Carlos Alfonso	3133003882
Ambiental	Mónica Andrea Fajardo	3106192038
Social	Paola Rueda	3002375414
Especialista Hidráulico	Eugenia Villegas	3002389225
Especialista Tránsito y Transporte	Miguel Nieto	3176581748
Especialista Geotecnia y Pavimentos	Neimar Castaño	3132831655
Inspector 1	Nelson Borja	3042103245
Inspector 2	Andrés León	3138215468
Inspector 3	Pedro Castaño	3142376040
Topógrafo	Ismael Restrepo	3112123780

En este periodo se presentó la renuncia de la residente Social de interventoría, la TS. Alejandra Chaparro y del topógrafo. Diego Caviades, por tal motivo no se encuentran relacionados en la tabla #3. La Interventoría, se encuentra en el proceso de vinculación de este nuevo personal.

	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 13 de 57

4. PROGRAMA DE INFORMACION A LA COMUNIDAD

El objetivo de este programa es velar por un espacio de participación, en donde se establezcan canales de comunicación con la comunidad. Esta actividad se llevara a cabo por UPZ.

Es por esta razón que durante la ejecución del proyecto, se debe realizar como mínimo las siguientes reuniones:

- Reunión de inicio de obra
- Reunión de avance
- Reunión extraordinaria
- Reunión de finalización

4.1 Reunión de inicio de obra:

El 08 de abril el contratista realizó la socialización de las actividades que se ejecutarán en el segmento, en cada uno de los componentes, con el presidente de la JAC de La Asunción, el administrador del edificio y la encargada de la Iglesia evangélica del CIV 16003273, para dar cumplimiento al compromiso establecido en el comité integral.

4.2 Reunión de avance:

El día 22 de abril, se llevó reunión de avance del CIV 16003550 (Santa Rita). La reunión se llevó a cabo a las 5:00 pm en el salón comunal de Santa Rita, ubicado en Cll 37 A Sur No.39-35; contó con la asistencia de los residentes técnicos, sociales, ambientales y SST del contratista y de la interventoría, así mismo contó con la participación de 9 miembros de la comunidad.

Se socializó con los asistentes las actividades que se han ejecutado en cada uno de los componentes (técnico, social, ambiental y SST), así mismo se dio respuestas a las inquietudes dadas por la comunidad.

Ver Anexo 1 (Actas de reuniones de inicio). Ver Anexo 2 (Seguimientos reuniones de inicio). Ver Anexo 3 (Registro fotográfico).

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>GOBIERNO LOCAL DE PUENTE ARANDA</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	 INTERSA S.A. <small>INGENIERIA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 14 de 57

4.3 Reunión extraordinaria:

Durante este periodo el contratista no llevo a cabo reuniones extraordinarias.

4.4 Reunión de finalización:

Durante este período no aplica esta reunión, ya que se realiza al finalizar el proyecto y entrega a la comunidad; a la fecha no se ha finalizado ningún segmento.

5. PROGRAMA DE DIVULGACION DEL PROYECTO

5.1 Puntos satélites:

Los puntos satélites de Información son equipamientos urbanos o puntos de encuentro ciudadano ubicados en las diferentes localidades de la ciudad. Los puntos satélites tienen como función difundir, por medio de piezas de divulgación, la información del proyecto a la comunidad de la localidad beneficiada (Puente Aranda) por la construcción de la obra. Los puntos se ubican en entidades o centros a los cuales acude una amplia población de las localidades, como lo son: centros de salud, alcaldías locales, centros culturales, centros comerciales, entre otros.

En este periodo se realizó la instalación de dos puntos satélites, ya que se abrieron otros tres segmentos de intervención, en los CIV's

A continuación, en la Tabla N° 5, se relacionan los Puntos satélites que se instalaron en este periodo, los cuales se encuentran en color azul y en color verde los puntos satélites que ya se encontraban instalados; así mismo se relacionan los volantes informativos que se encuentran expuestos, en cada uno de los puntos satélites:

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>GOBIERNO ALIADO LOCAL DE PUENTE ARANDA</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	 INTERSA S.A. <small>INGENIERIA</small>
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 15 de 57

TABLA 4 PUNTOS SATÉLITES

PUNTOS SATÉLITES		
CIV	UBICACIÓN DEL PSI	PIEZAS QUE SE INSTALARON
16003273 (La Asunción)	Crr 31 b #1D-17	Volante #41 de inicio de obra Volante #58 de PMT
16001283 (Brasilia)	Crr 44 n°4 B-30	Volante #46 de inicio de obra Volante #59 de PMT
16001193 (El Sol)	Cll 2 f #41b-42	Volante #51 de inicio de obra Volante #77 de PMT
16002026 (Milenta)	Cll 20 Sur N. 53ª-38	Volante #6 de inicio de obra Volante #57 de PMT andenes Volante #76 de comité de participación ciudadana N°4.
16003550 (Santa Rita)	Crr 50ª N. 32-42	Volante #22 de inicio de obra Volante #28 de PMT Volante #64 reunión de avance
16004097 (Autopista Sur Muzú)	Crr 50ª N. 38 B 06 sur	Volante #17 de inicio de obra Volante #27 de PMT Volante #65 de comité de participación ciudadana N°1.
16001040. (San Rafael)	Crr 53 B Bis 14C-09	Volante #11 de inicio de obra Volante #16 de PMT Volante #66 de comité de participación ciudadana N°1.
TOTAL PUNTOS SATELITES INSTALADOS EN EL PERIODO		3
TOTAL PUNTOS SATELITES		7

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>GOBIERNO ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	 INTERSA S.A. <small>INGENIERÍA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 16 de 57

La interventoría realizó el seguimiento respectivo a la instalación de los puntos satélites y de las vallas móviles de los CIV's: 16003273 (La Asunción) ,16001283 (Brasilia) y 16001793 (El Sol).

Ver Anexo 4 (Seguimientos Puntos Satélites). Ver Anexo 3 (Registro fotográfico)

5.2 Volante de invitación a convocatorias, reuniones y comités:

5.2.1 Volantes de inicio de obra:

Son piezas de divulgación que describen aspectos específicos del comienzo del proyecto se distribuyen a la comunidad del área de influencia directa y se dejan en los puntos satélites de información, predios, puntos de atención a la comunidad, actores institucionales y sociales identificados y asistentes a las reuniones informativas de inicio.

- En este periodo se generaron 21 piezas de divulgación tanto informativas como de convocatoria.
- En el periodo se hizo la distribución de 194 volantes los cuales se entregaron predio a predio en el área de influencia directa de los segmentos viales en intervención y cuyas generalidades se describen en el siguiente cuadro:
- La interventoría realizó la revisión y aprobación de cada una de las piezas divulgativas, teniendo el aval de la oficina de prensa del FDLPA.

VER ANEXO 3 (Registro fotográfico) y **VER ANEXO 5** (Listado de entrega de volantes de información).

5.2.2 Afiches de información:

Para este período no se generaron afiches de información.

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>GOBIERNO</small> <small>Apoyando a la Localidad de Puente Aranda</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	 INTERSA S.A. <small>INGENIERIA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 17 de 57

5.2.4 Plegables del plan de manejo de tráfico – PMT:

Para este período el contratista generó plegables de plan de manejo de tráfico, en los nuevos tramos en los que en este periodo se iniciaron actividades constructivas, que corresponde a los CIV's: 16003273 (La Asunción), 16001283 (Brasilia) y 16001793 (El Sol), además se implementó el PMT de andenes del CIV 16002026 (Milenta).

A continuación, en la Tabla N° 6, se relacionan los volantes de PMT generados, para este periodo:

TABLA 5 VOLANTES DE PMT

VOLANTES DE PMT				
N°	FECHA DE ENTREGA	# CONSECUTIVO DE VOLANTE	TIPO DE PIEZA DE COMUNICACIÓN	CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS
1	12/04/2019	57	Volante de PMT del CIV 16002026 (Milenta)	30
2	09/04/2019	58	Volante de PMT del CIV 16003273 (La Asunción)	23
3	09/04/2019	59	Volante de PMT del CIV 16001283 (Brasilia)	26
4	26/04/2019	77	Volante de PMT del CIV 16001793 (El Sol)	10

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>GOBIERNO ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	 INTERSA S.A. <small>INGENIERIA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 18 de 57

A continuación, en la Tabla N° 7 se relacionan las generalidades de todos los volantes generados y entregados durante el periodo:

TABLA 6 PIEZAS DE DIVULGACIÓN

PIEZAS DIVULGATIVAS				
No	FECHA DE ENTREGA	# CONSECUTIVO	TIPO DE PIEZA DE COMUNICACIÓN	CANTIDAD DE PIEZAS ENTREGADAS
1	12/04/2019	57	Volante Informativo sobre PMT de andenes barrio Milenta	30
2	09/04/2019	58	Volante Informativo PMT barrio La Asunción	23
3	09/04/2019	59	Volante Informativo PMT barrio Brasilia.	26
4	15/04/2019	60	Volante Inicio de obra barrio Santa Matilde.	9
5	15/04/2019	61	Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita barrio Santa Matilde	9
6	N/A	62	Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita barrio Santa Matilde	3
7	N/A	63	Levantamiento de acta de vecindad - Tercera visita barrio Santa Matilde	1
8	16/04/2019	64	Reunión de avance barrio Santa Rita	10
9	16/04/2019	65	Comité de participación ciudadana No.1 barrio Autopista Sur-Muzú	3

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>GOBIERNO ALCALDÍA DE BOGOTÁ</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	 INTERSA S.A. <small>INGENIERIA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 19 de 57

10	16/04/2019	66	Comité de participación ciudadana No.1 San Rafael	6
11	25/04/2019	67	Reunión de Inicio Barrio Villa Inés	Este volante se generó en el periodo, pero no se divulgo.
12	25/04/2019	68	Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita barrio Villa Inés	18
13	N/A	69	Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita barrio Villa Inés	5
14	N/A	70	Levantamiento de acta de vecindad - Tercera visita barrio Villa Inés	2
15	25/04/2019	71	Inicio de obra barrio Villa Inés	18
16	25/04/2019	72	Inicio de obra barrio Santa Isabel	7
17	25/04/2019	73	Levantamiento de acta de vecindad - Primera visita barrio Santa Isabel	7
18	N/A	74	Levantamiento de acta de vecindad - Segunda visita barrio Santa Isabel	0
19	N/A	75	Levantamiento de acta de vecindad - Tercera visita barrio Santa Isabel	0
20	26/04/2019	76	Comité de participación ciudadana No.4 barrio Milenta	7
21	26/04/2019	77	Volante Informativo PMT barrio El Sol	10

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>GOBIERNO ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>Agua a la Localidad de Puente Aranda</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	 INTERSA S.A. <small>INGENIERÍA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 20 de 57

6. PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

El Punto de atención al ciudadano (PAC) del contratista, está ubicado en la Localidad de Puente Aranda en Carrera 53g N. 1-04. Como medios de atención se cuenta con la línea telefónica 9272941, celular 3208673701 y el correo electrónico gestionsocial156@gmail.com, y la atención del Punto PAC será de lunes a viernes en horario de 8:00 a.m. a 12:00 m.

El Punto de Atención al Ciudadano (PAC) de Interventoría se encuentra ubicado en la Localidad de Puente Aranda [en la carrera 32b N.01-72](#). Como medios de atención se cuenta con la línea telefónica 7517211 y número de celular: 3002034603 y el correo electrónico social.pa@intersaingeneria.com, la atención al ciudadano serán los días martes en el horario de 8:00 a.m. a 4:00 pm.

6.1 Clasificación de los requerimientos ciudadanos:

El contratista deberá realizar todas las actividades o acciones necesarias que garanticen la satisfacción en la atención a los requerimientos de la comunidad, los cuales se clasifican de la siguiente forma:

- ✓ **Petición:** Es la solicitud verbal o escrita presentada por un ciudadano con el fin de requerir la intervención de la entidad en un asunto de su competencia.
- ✓ **Queja:** Es la expresión de los ciudadanos que permite manifestar la inconformidad o disgusto que se tiene contra una persona u organización relacionada con el proyecto, por actos vinculados con el cumplimiento de sumisión y objetivos.
- ✓ **Reclamo:** Es el derecho que tiene todo ciudadano de exigir o demandar solución referente a la prestación de indebida de un servicio o a la inatención oportuna de una solución derivada de la ejecución de una obra.

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	 INTERSA S.A. INGENIERIA
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	

Página 21 de 57

- ✓ **Solicitud de información:** Toda persona tiene derecho a consultar los documentos o solicitar información relacionada con la ejecución de un proyecto.
- ✓ **Denuncia:** Es el mecanismo mediante el cual cualquier ciudadano da aviso o notifica, en forma escrita o verbal, hechos o conductas con las que se pueda estar configurando un posible manejo irregular o eventual detrimento de los bienes o fondos del Distrito.
- ✓ **Sugerencias:** Es la proposición, idea o indicación que se ofrece o presenta con el propósito de incidir en el mejoramiento de un proceso cuyo objeto se encuentre relacionado con la prestación del servicio o el cumplimiento de una función pública.

6.2 Medios de atención:

El contratista cuenta con los siguientes medios de atención:

- Línea de atención al ciudadano: 9272941
- Celular: 3208674964
- Correo electrónico: gestionsocial156@gmail.com.
- Redes sociales: En caso de ser necesario, previa evaluación y autorización de la Oficina de prensa de la FDLPA.

La interventoría cuenta con los siguientes medios de atención:

- Línea de atención al ciudadano 7517211.
- Para este periodo se realizó actualización de la línea del Celular: 3223653975
- Correo electrónico: social.pa@intersaingenieria.com.
- Redes sociales: En caso de ser necesario, previa evaluación y autorización de la Oficina de prensa de la FDLPA.

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>GOBIERNO</small> <small>ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	 INTERSA S.A. <small>INGENIERIA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 22 de 57

A continuación se relacionan las manifestaciones atendidas por el contratista durante este periodo:

MANIFESTACIONES CIUDADANAS

En este periodo el contratista recepciona tres manifestaciones ciudadanas en los CIV's: 16004097 (Autopista sur Muzú), 16002026 (Milenta); cuyas generalidades se relacionan a continuación:

- El 25 de abril de 2019, el contratista recepciona una manifestación del señor Oscar Gómez, del tramo de Autopista sur Muzú correspondiente al CIV 16004097 (Autopista Sur- Muzú). El ciudadano solicita copia de la actualización del acta de vecindad que se realizó en el predio y copia del acta de compromiso del sector del jardín que se va a intervenir, por la domiciliaria.
- El 29 de Abril de 2019 el contratista, abre manifestación ciudadana del señor Álvaro Sánchez, del tramo de Milenta correspondiente al CIV 16002026, quien solicita se realice el arreglo del cable de energía del predio ubicado en la calle 20 sur N. 53 A-50. que sufrió afectación por una de las máquinas de la obra.
- El 29 de Abril, el contratista recibe correo electrónico del señor Manuel Piñeros del tramo Autopista sur Muzú correspondiente al CIV 16004097 ubicado en la carrera 50ª N. 38B -48 sur, quien solicita se le dejen los bolardos ubicados en el andén del predio.

A la fecha se cuenta con 5 manifestaciones ciudadanas en lo transcurrido del contrato, de las que una se encuentra abierta y cuatro cerradas.

A continuación se relaciona, en la Tabla N° 8, las manifestaciones ciudadanas, hasta la fecha:

	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 23 de 57

Tabla 7 Manifestaciones Ciudadanas

FECHA DE LA MANIFESTACION CIUDADANA	NOMBRE DEL PETICIONARIO (A)	CIV	ESTADO DE LA MANIFESTACION CIUDADANA
27 de febrero	Efraín Antonio Montoya	16002026 (Milenta)	CERRADA
28 de febrero	Alejandro Roberts	16002026 (Milenta)	CERRADA
25 de abril	Óscar Gómez	16004097 (Autopista Sur Muzú)	CERRADA
29 de abril	Álvaro Sánchez	16002026 (Milenta)	ABIERTA
29 de abril	Manuel Piñeros	16004097 (Autopista Sur Muzú)	CERRADA
TOTAL MANIFESTACIONES CIUDANAS EN EL PERIODO			3
TOTAL MANIFESTACIONES CIUDANAS			5

Ver Anexo 15 (Manifestaciones ciudadanas.)

PUNTO DE ATENCIÓN MÓVIL

- En este periodo se han realizado todos los días recorridos sociales, para verificar que se encuentren las vallas móviles informativas y los Puntos satélites, así mismo recibir las posibles atenciones ciudadanas, en los CIV's que se encuentran en intervenciones constructivas: 16002026 (Mienta), 16001040 (San Rafael), 16003550 (Santa Rita), 16004097 (Autopista Sur-Muzú), 16003273 (La Asunción), 16001283 (Brasilia) y 16001793 (El Sol).
- Todos los días se realiza recorrido con la residente social del contrato. Ver Anexo 3 (Registro fotográfico).

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>GOBIERNO LOCAL DE PUENTE ARANDA</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	 INTERSA S.A. INGENIERIA
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 24 de 57

6.3 Equipamiento de atención:

Los puntos de atención al ciudadano (PAC), tanto del contratista como de interventoría contarán con el siguiente equipamiento

- Aviso del Punto de atención al ciudadano (PAC) ubicado en lugar visible. El diseño debe cumplir con los requerimientos establecidos en el manual de imagen del FDLPA.
- Escritorio
- Cinco sillas para acomodar a los peticionarios
- Un Teléfono, silla telefónica y acceso a Internet
- Planos actualizados del proyecto a escala 1:500, medio pliego, a color, con detalles arquitectónicos y geométricos.
- Un computador con unidad de DVD y pantalla LCD de 17".
- Una Impresora
- Un Baño
- Un Archivador (mínimo de 2 gavetas)

7. PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

En este periodo se llevaron a cabo tres comités de participación ciudadana, a continuación se describen las generalidades de las mismas:

- El día 25 de abril a las 8:00 am se realizó el comité de participación ciudadana #1 del CIV 16004097 (Autopista Sur- Muzú), donde se contó con la asistencia de un veedor, las residentes sociales del contratista e interventoría, el residente técnico de la interventoría. Se le socializó al asistentes las actividades que se han ejecutado en

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>GOBIERNO</small> <small>ABORDA LOCAL DE PUENTE ARANDA</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	 INTERSA S.A. <small>INGENIERIA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 25 de 57

cada uno de los componentes (técnico, social, ambiental y SST), además se dió respuestas a las inquietudes del veedor.

- El día 25 de abril a las 10:00 am se realizó el comité de participación ciudadana #1 del CIV 16001040 (San Rafael), donde se contó con la asistencia de 10 personas incluyendo veedores y comunidad; las residentes sociales del contratista e interventoría, los residentes técnicos del contratista y de la interventoría. Se les socializó a los asistentes las actividades que se han ejecutado en cada uno de los componentes (técnico, social, ambiental y SST), además se dio respuestas a las inquietudes de los veedores. Se les informo que es necesario realizar una reunión extraordinaria con la comunidad, con el fin informarles que por cuestión de colmatación de la tubería sanitaria, no es posible realizar la renovación del espacio público, ni tampoco la construcción de las redes domiciliarias.
- El día 29 de abril a las 9:00 am se realizó el comité de participación ciudadana #4 del CIV 16002026 (Milenta), donde contó con la asistencia de 12 personas incluyendo veedores y comunidad, las residentes sociales del contratista e interventoría, los residentes técnicos del contratista y de la interventoría. Se les socializó a los asistentes las actividades que se han ejecutado en cada uno de los componentes (técnico, social, ambiental y SST), además se dio respuestas a las inquietudes de los veedores. Se les informo que a finalizar el mes de mayo se realizará la entrega de la obra.

Ver. Anexo 3 (registro fotográfico). **Ver Anexo N.6** Actas de comités de participación ciudadana. **Ver Anexo N.7** Seguimiento comités de participación ciudadana.

	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 26 de 57

Las generalidades de las reuniones se relacionan en la Tabla N°8:

Tabla 8 Generalidades Comité de participación ciudadana

N°	FECHA DE REALIZACIÓN	ACTIVIDAD	LUGAR	TOTAL INSCRITOS	TOTAL, CONVOCADOS	TOTAL, ASISTENTES
1	29/03/2019	Comité de participación ciudadana No 4 barrio Milenta	Salón comunal barrio Milenta Carrera 56 No.14-48	7	7	12
2	25/04/2019	Comité de participación ciudadana No 1 barrio Autopista Sur-Muzú	Salón comunal barrio Autopista Sur- Muzú Calle 38 Sur No. 50A - 70	3	3	4
3	25/04/2019	Comité de participación ciudadana No 1 barrio San Rafael	Salón Comunal Barrio San Rafael Carrera 53 B Bis No.4C-09	8	8	10

En las reuniones de inicio de los CIV's: 16001040 (San Rafael), 16003550 (Santa Rita), 16004097 (Autopista Sur- Muzú), 16001793 (El Sol), 16001283 (Brasilia), 16003273 (La Asunción), se realizó la convocatoria para inscribirse al comité de participación ciudadana.

A continuación, en la Tabla N°9, se relacionan las personas que se inscribieron al mismo, en cada uno de los CIV's.

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>GOBIERNO ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C. Administración de Puente Aranda</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	 INTERSA S.A. <small>INGENIERIA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 27 de 57

TABLA 9 Miembros del comité de participación

MIEMBROS DEL COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA			
N.	TRAMO	BARRIO	NOMBRES Y APELLIDOS
1	16002026	MILENTA	Betzabe García de Barrios
			Ana López
			Norma Rodríguez
			Emperatriz Álvarez
			Ghieslaine M . Coke Torres
			José Rodríguez
			Campo Elías Ocampo
2	16003550	SANTA RITA	Dixon Carrascal
			José Cortes
			Luis Jiménez
			Fernando Ilanos
			Rosando Cruz
3	16001040	SAN RAFAEL	María Nancy Costada
			Stela Rojas Forero
			Javier Suaza Saavedra
			Carlos Rodríguez
			Lucino Neira Pérez
			Carlos Suarez
4	16004097	AUTOPISTA SUR MUZÚ	Manuel Russi
			Ruby Torres
			Alonso Reyes
3	16001040	LA ASUNCION	German Camacho
			Yenni Alexandra Cabezas
			Luis Barrera
4	16001283	BRASILIA	Teófilo Espitia
			María Antonia Tolleros

	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5 CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 28 de 57

			Fabio Humberto Ortiz Rubén Casallas Carlos Rodríguez Marcia González Gloria Cruz Gómez Ligia Albarracín Nelson Núñez Miguel Hernández Marco Antonio
7	16001793	EL SOL	Sandra Milena Reina Héctor Rodríguez Gómez Arcesio Navarrete

7.2 Talleres de sostenibilidad

En este período no se desarrollaron talleres de sostenibilidad.

8. PROGRAMA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO A EMPLEADOS A LA MANO DE OBRA NO CALIFICADA.

El 29 de abril, a las 7:00 am, el contratista realizó capacitación al personal de obra, donde se contó con la asistencia de 96 personas, esta capacitación se realizó en el Punto PAC del contratista; el tema social que se socializó la residente social del contratista, con los participantes fue “comunicación asertiva”.

Las generalidades de la capacitación se relacionan en la Tabla N°10:

	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 29 de 57

Tabla 10 PROGRAMA DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO A EMPLEADOS DE LA OBRA

N°	FECHA REALIZACIÓN	TEMA	LUGAR	TOTAL ASISTENTES	TOTAL EMLEADOS EN EL PERIODO
1	29/04/2019	Comunicación asertiva	Punto PAC del contratista	96	95

La interventoría realizó acompañamiento y seguimiento a esta actividad. **Ver Anexo 3** (Registro fotográfico.) **Anexo 8** (Seguimiento al programa de socialización a empleados de la obra). **Anexo 9** (Listados de asistencia al programa de socialización con empleados).

9. PROGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Para este periodo el contratista cuenta en el proyecto con un total de 95 trabajadores, de los cuales 50 trabajadores son de mano de obra calificada y 45 trabajadores son de mano de obra no calificada; 13 de estos trabajadores (MONC) son de la localidad de Puente Aranda correspondiente al 28%; en este periodo el contratista **NO** logro cumplir con el porcentaje solicitado en los pliegos de condiciones.

Ver Anexo 10 (Listado del personal de obra).

A continuación en la tabla N°11, se relaciona el personal MONCL vinculado al proyecto, en este periodo

	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 30 de 57

Tabla 11 Porcentaje generación de empleo

No	PERIODO	TOTAL TRABAJADORES	MANO DE OBRA CALIFICADA	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	MONCL	% REQUERIDO	MONCL %
1	Del 1 de abril al 30 de abril de 2019	95	50	45	13	50%	28%

10. PROGRAMA DE MANEJO DE IMPACTOS EN EL SECTOR COMERCIAL

En este periodo no se realizaron actividades en este programa.

11. PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA

Para este programa se realizan diferentes actividades orientadas a brindar acompañamiento social al área técnica, las cuales se describen a continuación:

	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 31 de 57

11.1 Levantamiento de actas de vecindad:

En este periodo se realizó el levantamiento de Actas de vecindad internas del CIV: 16001283 (Brasilia) y 16004735 (Villa Inés); para los tramo de mantenimiento periódico se realizaron los levantamiento de actas de fachada de los CIV's: 16002882 (Carabelas) y 16003114 (Santa Isabel).

A continuación, en la tabla N°12 se relaciona las actas de vecindad y de fachada levantadas durante el periodo:

TABLA 12 ACTAS DE VECINDAD Y FACHADA

LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD (REHABILITACIÓN)			
CIV	BARRIO	FECHA	# DE ACTAS REALIZADAS
16001283	Brasilia	03 al 15 de abril	20
16004735	Villa Inés	29 al 30 de abril	11
LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE FACHADA (MANTENIMIENTOS PERIODICOS)			
16002882	Carabelas	22 al 23 de abril	7
16003114	Santa Isabel	29 de abril	6

Durante el desarrollo de estas actividades, la interventoría realizó el acompañamiento y seguimiento. Ver **Anexo 3** (Registro fotográfico). Ver **anexo 11** (Seguimiento levantamiento de actas de vecindad y actas de fachada)

El contratista radicó en la Interventoría las actas de vecindad de los CIV's de rehabilitación: 16004097 (Autopista Sur- Muzú), 16001040 (San Rafael), 16003550

	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	
	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 32 de 57

(Santa Rita), 16001793 (El Sol) y 16003273 (Brasilia) y de los CIV's periódicos: 16000683 (San Gabriel), 16002174 (Torremolinos) y 16001911 (El Jazmín).

La interventoría dio aprobación a este levantamiento a través de los oficios ALBO-PUAR141-172 y ALBO-PUAR141-178, realizando radicación los días 12 y 16 de abril en la Alcaldía Local de Puente Aranda con N° 2019-661-004880-2 y N° 2019-661-004981-2 respectivamente, así mismo fue radicado en el campamento del contratista también los días 12 y 16 de abril con radicados N° LGNG8412042019 y LGNG7016042019

11.2 Levantamiento actas de rampas de accesos vehiculares

En este periodo, para los segmentos que son de rehabilitación, es decir los CIV's : 16001283 (Brasilia) y 16004735 (Villa Inés): se llevó a cabo levantamiento de actas de rampas de acceso vehicular, al mismo tiempo que con el levantamiento de actas de vecindad.

Como se mencionó anteriormente la Interventoría, realizó el acompañamiento y seguimiento a esta actividad.

11.3 Acta de compromisos

El 29 de Abril se realizó un acta de compromiso con el señor Oscar Albey Gómez Vanegas por intervención en zona verde en el predio Calle 38B sur # 50ª-09, correspondiente al CIV 16004097 (Autopista Sur- Muzú)

11.4 Registro fílmico y fotografías de las vías

En este periodo se realizó esta actividad de registro fílmico y fotográfico de las vías a intervenir y del PMT que se implementó, en el CIV de rehabilitación: 16001283 (Brasilia)

	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 33 de 57

y de los CIV's de mantenimiento periódico: 16002882 (Carabelas) y 16003114 (Santa Isabel).

Por medio del oficio ALBO-PUAR141-174 esta interventoría dio aprobación al registro filmico y fotográfico de vías y PMT de los CIV's de rehabilitación: 16004097 (Autopista Sur- Muzú), 16001040 (San Rafael), 16003550 (Santa Rita), 16001793 (El Sol) y 16003273 (Brasilia) y de los CIV's periódicos: 16000683 (San Gabriel), 16002174 (Torremolinos) y 16001911 (El Jazmín). Realizando radicación el día 24 de abril en la Alcaldía Local de Puente Aranda con N° 2019-661-005234-2, y en el campamento del contratista y en esta misma fecha, con radicado N° LGNG 7824042019. **Ver Anexo 12** (Oficio de aprobación registros filmico y fotográficos de vías y PMT).

12 REPORTES

12. 1 Informes semanales:

Los informes realizados durante este período, se relacionan a continuación en la Tabla N°13:

Tabla 13 Informes semanales

NÚMERO DE INFORME	PERÍODO	FECHA DE ENVIO
Semanal No. 26	01 de abril al 06 de abril de 2019.	02 de abril 2019
Semanal No.27	08 de abril al 11 de abril de 2019.	09 de abril 2019
Semanal No.28	15 de abril al 20 de abril de 2019.	16 de abril 2019

	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 34 de 57

Semana No. 29	22 de abril al 27 de abril de 2019.	23 de abril 2019
Semana No. 30	29 de abril al 04 de mayo de 2019	07 de mayo 2019

12.2 Informes mensuales:

Por medio del oficio ALBO-PUAR141-179 esta interventoría dio aprobación al informe mensual de ejecución de obra #4 del contratista, correspondiente al mes de marzo; realizando radicación el día 16 de abril en la Alcaldía Local de Puente Aranda con N° 2019-661-004949-2, y en el campamento del contratista también el día 16 de abril con radicado N° LGNG7816042019. **Ver Anexo 13** (Oficio de aprobación informe mensual #4 de ejecución de obra Contratista).

En este periodo se realizaron 3 comités sociales, llevados a cabo uno por semana, además se llevó a cabo un comité integral. **Ver anexo 3** (Registro fotográfico) **Ver Anexo 16** (Actas de Comités sociales)

- Comité social #21 , realizado el 05 de abril de 2019
- Comité social # 22, realizado el 12 de abril de 2019
- Comité social # 23, realizado el 24 de abril de 2019
- Comité integral #8, realizado el 24 de abril de 2019

12.3 Informe final gestión social:

El Contratista deberá entregar a la FDLPA previa revisión y aprobación de la Interventoría un informe consolidado de la gestión social realizada durante todo el proceso constructivo, en un plazo máximo de quince (15) días después de realizada la reunión de finalización del contrato.

	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 35 de 57

12.4 Evaluación de gestión social del contrato.

Para evaluar la gestión social del contrato se propone medir las actividades en los diferentes programas con los siguientes indicadores:

TABLA 14 INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE INFORMACIÓN

INDICADOR	FORMULA
Productividad	NUMERO DE REUNIONES REALIZADAS/NUMERO DE REUNIONES PROGRAMADAS $0/0 \times 100 = \text{N/A}$
Participación (asistencia)	NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE INICIO/ NUMERO DE PERSONAS CONVOCADAS A REUNION DE INICIO $/X 100 = \text{N/A} \%$
Participación (asistencia)	NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION EXTRAORDINARIA / NUMERO DE PERSONAS CONVOCADAS A REUNION EXTRAORDINARIA $X 100 = \text{No aplica}$
Productividad	NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION DE AVANCE / NÚMERO DE PERSONAS CONVOCADAS A REUNION DE AVANCE $5 \times 100 / 10 = 50\%$
Productividad	NUMERO DE PERSONAS QUE ASISTIERON A REUNION FINAL / NUMERO DE PERSONAS CONVOCADAS A REUNION FINAL $X 100 = \text{No aplica}$

TABLA 15 INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

INDICADOR	FORMULA
Productividad	NÚMERO DE HORAS DE ATENCIÓN EN EL PUNTO PAC, EN EL PERIODO /NÚMERO DE HORAS DE ATENCIÓN EN EL PUNTO PAC REQUERIDAS EN EL PERIODO $20 \times 100 / 20 = 100\%$
	TOTAL DE PUNTO PAC FUNCIONANDO EN EL PERIODO /TOTAL DE PUNTO PAC REQUERIDO EN EL PERIODO $X 100 \% = \text{No aplica}$
	TOTAL MANIFESTACIONES CERRADAS EN EL PERIODO /TOTAL MANIFESTACIONES INTERPUESTAS EN EL PERIODO $3 \times 100 / 2 = 66\%$

TABLA 16 INDICADORES DE CUMPLIMIENTO PROGRAMA DE SOSTENIBILIDAD

INDICADOR	FORMULA
Productividad	TALLERES DE SOSTENIBILIDAD EJECUTADOS EN EL PERIODO/ TALLERES DE SOSTENIBILIDAD PROGRAMADOS EN EL PERIODO $X 100 \% = \text{No aplica}$

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small> <small>CONSEJO</small> <small>Asesoría a la Localidad de Puente Aranda</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	 INTERSA S.A. <small>INGENIERÍA</small>
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018	
Contrato de obra 156 de 2018	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 36 de 57

Productividad	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS TALLERES/NÚMERO DE CONVOCADOS A LOS TALLERES X 100 % = No aplica
Productividad	COMITÉ PAC EJECUTADOS EN EL PERIODO/ COMITÉ PAC PORGRAMADOS EN EL PERIODO $3X 100 /3 = 100 \%$
Productividad	NÚMERO DE ASISTENTES A LOS COMITES PAC/NÚMERO DE CONVOCADOS A LOS COMITES PAC $12/X 100 /18= 66 \%$

Tabla 17 INDICADORES DE GESTIÓN PROGRAMA DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO A EMPLEADOS DE LA OBRA

INDICADOR	FORMULA
Productividad	NÚMERO DE CAPACITACIONES REALIZADAS EN EL PERIODO /NÚMERO DE CAPACITACIONES REQUERIDAS EN EL PERIODO $1 X 100 /1 = 100\%$
Productividad	NÚMERO DE PERSONAL CAPACITADO EN EL PERIODO/ NÚMERO DE PERSONAL VINCULADO AL PROYECTO EN EL MES $95X 100 /95=100\%$

Tabla 18 INDICADORES DE GESTIÓN PORGRAMA DE APOYO PARA LA GENERACIÓN DE EMPLEO

Indicador	Formula
Productividad	MANO DE OBRA NO CALIFICADA DE LA LOCALIDAD EN EL PERIODO /MANO DE OBRA NO CALIFICADA EN EL PERIODO $45/13 x 100=28 \%$

Tabla 19 INDICADORES DE GESTIÓN PORGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO SOCIAL A ACTIVIDADES TÉCNICAS DE OBRA

INDICADOR	FORMULA
Productividad	ACTAS DE VECINDAD LEVANTADAS EN EL PERIODO/ NÚMERO DE PREDIOS EN INVENTARIO PREDIAL $29= 29$
Productividad	NÚMERO DE ACTAS DE COMPROMISO REALIZADA/NÚMERO DE ACTAS DE COMPROMISO PROGRAMADAS $1X 100 /1 = 100 \%$
Productividad	NÚMERO DE REGISTROS FÍLMICOS REALIZADOS EN RUTAS DE DESVÍO /NÚMERO DE VÍAS UTILIZADAS COMO DESVÍOS $X 100 \% = \text{No aplica}$

	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 37 de 57

13. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- ✓ Durante el periodo de abril se continúa las intervenciones en los CIV's: 16002026 (Milenta), 16003550 (Santa Rita), 16004097 (Autopista sur Muzú) y 16001040 (San Rafael). Se iniciaron actividades en los CIV's: 16003273 (La Asunción), 16001283 (Brasilia) y 16001793 (El Sol). En los segmentos de Milenta, San Rafael y Autopista Sur Muzú se llevaron a cabo los comités de participación ciudadana; en el segmento de Santa Rita se realizó la reunión de avance.
- ✓ Las actividades que se llevan a cabo en el desarrollo del objetivo del contrato integran estrategias enfocadas a minimizar el impacto negativo que generen estas en la comunidad que pertenece al área de influencia directa, como parte de este proceso se ha priorizado la atención a los programas de información y divulgación, utilizando diversos elementos de comunicación, como: socializaciones predio a predio, puntos satélites y volantes que proporcionan información pertinente y se brinda información de manera clara y oportuna a la comunidad.
- ✓ Se dio cumplimiento a lo establecido en apéndice de gestión social y demás documentos contractuales correspondientes al contrato, ya que mediante la verificación de la interventoría, se evidencio que el contratista, ejecutó los programas correspondientes para este periodo de marzo.
- ✓ Para este periodo el contratista no logró cumplir con el porcentaje requerido para la mano de obra no calificada, ya que solo alcanzó un 28%, y se solicita un 50%: es por este motivo que esta interventoría recomienda seguir haciendo todo el proceso con la Alcaldía Local de Puente Aranda, así mismo hacer la convocatoria en las reuniones de inicio, para así lograr cumplir con este porcentaje, para el siguiente periodo. La lista de chequeo se vio afectada por este porcentaje.

	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 38 de 57

- ✓ La atención al ciudadano, la permanente comunicación con la comunidad, con las diferentes áreas involucradas en el desarrollo del proyecto, tanto del contratista como de la Interventoría, han permitido realizar un trabajo conjunto, en pro de minimizar los impactos negativos generados por el desarrollo de la obra.
- ✓ Por parte de la Interventoría, se realizó acompañamiento y supervisión a las actividades realizadas por el contratista, con el fin de dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por el FDPA.
- ✓ Se involucró a la comunidad en los procesos de participación ciudadana, con el propósito de asegurar un adecuado seguimiento en el desarrollo de las actividades del proyecto.

 <p>BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS</p> <p>GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ D.C.</p>	<p>INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5</p>	 <p>INTERSA S.A. INGENIERIA</p>
<p>Contrato de obra 156 de 2018</p>	<p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018</p> <p>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.</p>	<p>Página 39 de 57</p>

14. ANEXOS

 <p>BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS</p> <p><small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small></p> <p><small>CONSEJO ALCALDÍA LOCAL DE PUENTE ARANDA</small></p>	<p>INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5</p>	 <p>INTERSA S.A. INGENIERIA</p>
<p>Contrato de obra 156 de 2018</p>	<p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018</p> <p>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.</p>	<p>Página 40 de 57</p>

1. ACTA DE REUNIÓN DE AVANCE CIV 16003550 (SANTA RITA)



ALCALDIA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Alc. Gabriel Nieto Boyacá
FECHA: 1.05.21 de 2017
LUGAR: Salón Comunal Barrio Santa Rita
OBJETO DE LA REUNIÓN: Revisión de Avance Barrio Santa Rita
HORA DE INICIO: 5:00 am
HORA DE FINALIZACIÓN: 6:00 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN					ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
		ASISTENTE	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TECNICO/NO	ADJUNTO				
Andrés Molavech Rivero							Comunidad	andreo1945@hotmail.com	314 379 8265	
Fernando Vargas							Comunidad		312 385 913	
Esperanza Torres							Comunidad		312 373 5126	
la Angulo Herrera							Comunidad		316 333 5501	
Andrés Efraim Jiménez							Comunidad		312 355 4570	
Diana Lorena Astill, Molave							Comunidad		312 351 2311	
Maria Helena Pardo							Comunidad		312 348 8552	
Aida Cruz							Comunidad		312 348 8552	
Quirós E. Rodríguez							Comunidad		312 348 8552	



ALCALDÍA MUNICIPAL
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

DEPENDENCIA Y/O ALCALDÍA RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Juan Gabriel Vela Gaitán
FECHA: Juho 22 de Abril de 2019.
LUGAR: Salón Comunal Barrio Santa Rita
OBJETO DE LA REUNIÓN: Reunión de Apoyo Barrio Santa Rita
HORA DE INICIO: 5:00 pm
HORA DE FINALIZACIÓN: 6:00 pm

ASISTENTES:

NOMBRE	CARGO	TIPO DE VINCULACIÓN					ENTIDAD o DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO	FIRMA
		ASISOR	DIRECTIVO	PROFESIONAL	TECNICO/NO LOGO	ADMINISTRATIVO	CARRERA	PROVISIONAL	LIBRE NOMIA	CONTRATISTA
Andrés Franco Golis			X				INTERVENTORIA	carro.papier@sanjose.gob.cr	3003095337	
Monica Ayala			X				Interventoria	ambien@pape@sanjose.gob.cr	300197013	
Ana Nicely Casas			X				LG416	ingnice@h@mat@sanjose.gob.cr	3008800	
Paulo Váron Rojas							JDC 570. RITA	pvaronro@sanjose.gob.cr	312362	
Carla Vela						X	LG416	carla.mech@sanjose.gob.cr	310120589	



EVIDENCIA DE REUNIÓN

DESARROLLO Y CONCLUSIONES DE LA REUNIÓN:

REUNION DE AVANCE BARRIO SANTA RITA

El día 22 de abril de 2019 se realiza la reunión de avance del Contrato 156 de 2018 para el CIV: 16003550, con dirección: Carrera 50ª entre Calle 33 Sur y Calle 32 Sur, el cual corresponde al barrio Santa Rita, en el salón comunal ubicado en la Calle 37 A Sur # 39-35 a las 5:00 pm.

La residente social del contrato; la Trabajadora Social Yesica Agudelo González, les da la bienvenida a los asistentes de la comunidad a la reunión; haciendo referencia que para que la reunión se realice satisfactoriamente primero se expondrá la información expuesta en la presentación y al finalizar se les dará el espacio para las dudas e inquietudes de la comunidad, una vez aclarado este aspecto, da a conocer la agenda de la reunión

1. Bienvenida y presentación de asistentes
2. Presentación de los encargados del proyecto
3. Relación del proyecto con el POT
4. Explicación técnica del proyecto
5. Información punto de atención al ciudadano
6. Presentación área SISOMA y Social
7. Intervención de la comunidad
8. Cierre de la reunión
9. Refrigerio

La residente social del contratista, Yesica Agudelo González, da la bienvenida a los asistentes, a la reunión de avance del tramo 16003550 barrio Santa Rita, agradeciendo la participación, compromiso, y sentido de pertenencia frente al proyecto a intervenir. A continuación, realiza la presentación de los asistentes a la reunión; "Por parte del área técnica se encuentra la Ingeniera Ana Nicelly Casas, por parte del área SST y el área Ambiental el ingeniero Diego Sarmiento, y por último por parte del área social del contratista quien les habla Yesica Agudelo González; Por parte de la interventoría se encuentra del área técnica el arquitecto Andrés Franco Galvis y por parte del área Ambiental se encuentra la Ingeniera Mónica Fajardo.

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Una vez se le informa a la comunidad la agenda del día, se les da a conocer las generalidades del proyecto; informando que el contrato es de tipo obra pública, cuyo objeto es "CONTRATO 156 DE 2018: Contratar a precios unitarios fijos, sin fórmula de ajuste y a monto agotable los diagnósticos e intervención del mantenimiento, rehabilitación, reconstrucción y acciones de movilidad para la malla vial y el espacio público de la localidad de Puente Aranda en la ciudad de Bogotá D.C.", adicionalmente se les informa que el tiempo de duración del contrato es de 3 meses.

Como segundo punto de la agenda del día la residente social del contrato da a conocer a los encargados del proyecto, los cuales son: del FDLPA: la alcaldesa local Cornelia Nisperuza Flórez y el supervisor técnico es: Fabián Cruz. Por parte de la Interventoría esta: INTERSA S.A. por parte del contratista LUIS GABRIEL NIETO GARCÍA.

Desde la parte técnica, se le da la palabra a la Ingeniera Ana Nicelly Casas, quien explica las actividades a realizar en el área técnica del proyecto.

Relacionadas a continuación:

- ✓ Fresado de la capa de rodadura del pavimento existente CIV 16003550
- ✓ Renovación redes de alcantarillado sanitario
- ✓ Instalación de tubería y relleno - renovación red de alcantarillado
- ✓ Mejoramiento de subrasante con rajón
- ✓ Extensión y compactación de sub- base granular
- ✓ Construcción de pozo de inspección - red alcantarillado
- ✓ Construcción de sumideros e instalación de tubería ultrarreforzada

Siguiendo con la agenda, la residente social del contrato informa acerca del punto de atención al ciudadano, se brinda el horario de atención, el cual es de lunes a viernes de 8:00 a.m. a 12 am, de igual modo la dirección donde queda ubicado es la Carrera 53g No 1 – 04, barrio Camelia, las líneas de atención al usuario con las que cuenta son: 9272941-3208674964 y el correo electrónico : gestionsocial156@gmail.com.

Se da la palabra al Ingeniero de la parte Ambiental y SST Diego Sarmiento quien habla sobre los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, refiriendo temas como: señalización, frente de obra, dotación para el personal y capacitación al personal, protección de Individuos

arbóreos, retiro de material de excavación, acopio de materiales, puntos ecológicos, protección de sumideros e implementación del PMT.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

La comunidad hace sus intervenciones las cuales se transcriben textualmente.

Pide la palabra un miembro de la comunidad: "En este momento me parece a mí que el problema es el invierno, entonces la pregunta que yo tengo es: ¿ya está listo el piso o tienen que volver a levantarlo o va a quedar, así como esta?".

La Ingeniera técnica del área del contratista Ana Nicelly responde: "No, ya se hizo la nueva capa que tiene en este momento, es una mezcla de asfalto con base granular, asfalto reciclado molido, y emulsiones, esa mezcla hace las veces de asfalto frío, entonces encima, vendrá la capa caliente".

Pide la palabra un representante de la comunidad: "Y una vez echada esa capa, ¿En cuanto tiempo pueden pasar los carros?".

La Ingeniera técnica del área del contratista Ana Nicelly responde: "Cuando se ponga el asfalto y este madure, damos paso al tráfico, pero tenemos que dejar que se madure porque si no, la vía se huella".

Responde el representante de la comunidad: "Gracias".

Pide la palabra el señor Fernando Llanos miembro de la comunidad: "Buenas tardes, yo quisiera saber ¿En que consiste el PMT?".

La Ingeniera técnica del área del contratista Ana Nicelly responde: "Es el plan de manejo de tráfico".



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

Interviene el señor Fernando Llanos miembro de la comunidad: "¿Cuáles son las acciones puntuales que están haciendo en la obra?".

La Ingeniera técnica del área del contratista Ana Nicelly responde: "Son los BOAL, los BOAL son los muchachos que están pendientes que no se vaya a ocasionar ningún tipo de accidente, son ellos básicamente los que están pendientes todo el tiempo, están ahí para que den vía y redireccionen a las personas que están en la vía".

Responde el señor Fernando Llanos miembro de la comunidad: " Hay una duda que nos quedó , nosotros el día seis de marzo hablamos y preguntamos cómo íbamos a hacer para los fines de semana porque no había salida , porque la 50ª es una ciclovia y para salir realmente no hay una salida , eso se habló hasta la saciedad , yo llame varias veces al punto de atención me comunicaron con varias personas , hable con varios expertos en el tema y ellos me dijeron que lo estaba oficiando y ya; digamos que yo por puro agotamiento doy por sentado que ese plan no lo van oficiar , eso es una parte , la otra parte es el manejo ambiental a las personas que estuvieron acá yo les pregunte como iba hacer el manejo de los residuos , hablo puntualmente de mi predio , pero yo tengo muchos problemas porque la gente saca a los perros y hacen sus necesidades al frente de mi casa , ustedes se han figado y saben que el olor es bastante incómodo no sé si de pronto se pueda hacer algo para que la gente sacara a los perros pero que no dejaran sus heces al frente de mi casa y los manejen adecuadamente. Frente al manejo ambiental tampoco se dijo nada , son más que todo esas cositas porque la obra ha avanzado porque es un tramo pequeño , el concepto técnico fue el apropiado ,pero yo veo que en la gente hay deficiencias en ese tema , lo otro es específicamente para mi predio se había dicho que no se iba a intervenir , está en este momento el setenta por ciento del mi predio tapado, yo veo que la obra sí a avanzando , pero sí hago un llamado de atención muy cordial de parte mía como miembro de la comunidad porque no ha pasado nada con todo lo que hablamos y veo que tampoco han hecho nada , varias veces me comuniqué con ustedes y les pregunte como íbamos hacer para los fines de semana , en este punto ya no solo se ven afectadas las personas del frente de obra si no también las dos manzanas que están aledañas , la gente tiene que salir , yo personalmente tengo que salir y tenemos que esperar a que uno de los muchachos de la ciclovia nos ayude , pero es más por acción de ellos y no de ustedes los que están haciendo la obra , no hay señalización adecuada . Cuando hay tráfico por la Calle 33, algunos tienden a desviar hacia la Carrera 50ª para saltarse el semáforo de la 33 con 50, pero la mayoría de las veces se tienen que devolver, eso es lo que está generando en cierto momento el tráfico, porque desafortunadamente no hacen presencia los paleteros".

EVIDENCIA DE REUNIÓN

La residente social del Contratista Yesica Agudelo González responde: "Después de la reunión del 6 de Marzo nosotros, fuimos al predio con la interventoría y le hicimos el respectivo acompañamiento, se le hizo seguimiento, se levantó un acta, esa misma acta se envió a interventoría, nosotros teníamos la información que ustedes también tenían que al PMT le faltaba una salida por la 50; Internamente ¿Qué pasó? secretaria de movilidad dijo que durante el proceso que estuviera funcionando la ciclo ruta las mismas personas que hacían el manejo de la ciclo vía ellos iban a dar la salida y si se presentaba algún problema con la comunidad se llamaba a secretaria de movilidad para que fuera e interviniera, teniendo en cuenta que en los recorridos que se han realizado no se presentó ningún tipo de inconveniente con que la comunidad pueda sacar su vehículo, secretaria de movilidad cumplió entre comillas porque dio la instrucción a los muchachos que están los días domingos para que permitieran la salida porque eso entre comillas no se puede hacer y darles salida todo el tiempo hasta donde yo sé, nosotros sí le hicimos seguimiento y los muchachos han permitido la salida eso fue un proceso que se realizó de manera interna debido a la gestión que se hizo con usted, debido a la atención que se hizo fue que resulto así, respecto a su solicitud esa fue la gestión que hubo y esa fue la respuesta, igual como les decía creo que ninguno se ha quedado encerrado porque siempre secretaria de movilidad nos ha ayudado mucho y nos ha colaborado mucho en la salida de los vehículos".

Interviene el señor Fernando Llanos representante de la comunidad: "No es que no se pueda, lo que pasa es que hace unos 15 días tuve una dificultad y me dijeron que no podía salir, luego un auxiliar de la policía y me dijo que no podía transitar por ahí, yo le dije: "Discúlpeme señor pero debo salir es urgente", digamos que eso es lo único que se ha hecho, esa es como la salida natural que tenemos yo no lo veo muy lógico, es decir lo que la gente está haciendo es eso, pero ustedes nunca informaron; esto fue lo que paso y manejo así, si tienen problemas ustedes hablen con el de la ciclo vía pero eso es lo estamos haciendo nosotros pero de forma natural sin la ayuda de ustedes".

La residente social del Contratista Yesica Agudelo González responde: "Nosotros fuimos hasta allá y se le dio la atención y se le dijo que se le iba a dar seguimiento, de pronto si fue la falta de comunicación porque esa fue la atención que se hizo, como usted dice el 6 de marzo fue el día que usted puso la queja, fuimos hasta allá y se hizo la atención con la interventoría, se hizo recepción y se le dio el respectivo seguimiento, secretaria de movilidad nos colaboró al respecto, eso en cuanto a secretaria de movilidad; en cuanto a las basuras me parece extraño porque dijimos que sí se llegaba a presentar y la verdad no me ha llegado ninguna



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

queja , no sé si es falta de comunicación en cuanto a la colmatación de las basuras en las esquinas; En cuanto a los excrementos, eso ya es un tema cultural, quedamos en que hacíamos una caja grande , pero no vamos hacer una caja grande para los excrementos de los perros, dijimos si se llega a presentar un problema fuerte en cuanto al manejo de las basuras podemos manejarlo con unos tablonos o hacemos una caja grande que se maneja en algunos tramos , obviamente eso afectaría visualmente porque comenzaría todo el mundo a dejar sus basuras en ese lugar , la comunidad se ha portado muy juiciosa respecto al manejo de los residuos sólidos , los han sacado en el horario establecido; Lo del manejo de las heces de los perros no tenía conocimiento igual es muy difícil identificar que personas están sacando a los perros y eso es más complicado”.

Manifiesta el señor Fernando Llanos representante de la comunidad: “Desafortunadamente el sacrificado es mi predio y no son las demás”.

La residente social del Contratista Yesica Agudelo González interviene: “Realmente no entiendo porque las heces de los perros las están dejando al frente de su casa”.

Responde el señor Fernando Llanos miembro de la comunidad: “Porque donde ustedes pusieron los ladrillos eso era una zona verde y ahí la gente deposita las basuras y las heces de los perros”.

La residente social del Contratista Yesica Agudelo González manifiesta: “Tendríamos que coordinar con la empresa de aseo o la empresa recolectora y decirle al muchacho paletero que se encuentre ese día que por favor nos ayude a retirar esos residuos, nos tocaría manejarlo así”.

Responde el señor Fernando Llanos representante de la comunidad: “La recolección se hace en las noches, así que el paletero no va a estar”.

La residente social del Contratista Yesica Agudelo González responde: “Cuando este el personal de verde a ellos les podríamos decir que recojan las heces, podríamos decirles para que lo tengan en cuenta para que estén pendiente de ese tema, igualmente vamos a estar muy pendientes del tema”.

Interviene por parte del área técnica de la Interventoría el arquitecto Andrés Franco Galvis: “Que pena yo los interrumpo , el día 6 de marzo se había hablado en la última reunión,



ALCALDÍA MAYOR
DE BOGOTÁ D.C.
SECRETARÍA DE GOBIERNO

EVIDENCIA DE REUNIÓN

dijimos que íbamos a tratar de no intervenir el espacio público de él , por tal motivo no se está tocando , lamentablemente frente a la casa del predio de él hay un pozo al que tenemos que conectar la red de aguas lluvias y ahí no hay nada que hacer , hay que hacer una excavación , hay que hacer el retiro del material pero frente al predio de él no se está interviniendo el espacio público”.

Interviene el señor Fernando Llanos miembro de la comunidad: “¿Cuál es la dificultad que tengo yo? ,cuando terminen la caja los residuos los van a poner más allá , usted mismo me dijo el 6 de marzo que no iban a intervenir pero yo entiendo que si van a intervenir las cajas tendrán que tapar algo de mi frente eso es más que obvio , pero los desechos los están poniendo más hacia allá , hay una situación particular que tengo y no la voy a revelar en público , ya ustedes saben cuál es y la conocen , únicamente tengo para hacer esa anotación para que de pronto los residuos no los sigan poniendo al frente a mi casa”.

La residente social del Contratista Yesica Agudelo González responde: “El área ambiental va a tener en cuenta el tema del manejo los residuos”.

Interviene por parte del área técnica de la interventoría el arquitecto Andrés Franco Galvis: “Qué pena interrumpo, pero igual vamos a trabajar en el cruce, se va a trabajar como acción de movilidad, es decir ahí se va a levantar asfalto, en el cruce de la intersección de las dos calles, carrera con calle y si va a haber material de excavación”.

La residente social del Contratista Yesica Agudelo González interviene: “¿En algún momento va a quedar el predio sin el ingreso vehicular?”.

La ingeniera del área técnica del contratista Ana Nicelly Casas responde: “No, porque lo único que se va a hacer es levantar el asfalto para cambiarlo porque está en malas condiciones, pero no va a tener ningún fallo estructural, solamente se va a cambiar”.

La residente social del Contratista Yesica Agudelo González responde: “ Desde el principio se había manifestado la importancia de tener siempre el acceso vehicular por la situación específica en ese predio , la recomendación que tienen un caso específico es garantizarle a él la entrada y salida del vehículo, adicionalmente porque obviamente no tiene la intervención directa como la tienen los otros predios a los que no se les puede permitir el ingreso y creo que todos han comprendido esa situación”.

EVIDENCIA DE REUNIÓN

La residente social del Contratista Yesica Agudelo González manifiesta: "¿Quién más tiene dudas?".

Pide la palabra un representante de la comunidad: " En mi opinión tenemos que ser consientes de la intervención, porque por parte los vecinos en este momento no hemos podido sacar los vehículos , por ejemplo en el caso del señor Llanos , él siempre ha tenido el paso para su vehículo , en el caso de las basuras , eso no va a durar toda la vida , es mientras esta la obra , además , el carro de la basura ha sido muy puntual , el que recoge las basuras es muy puntual además que el carro da la vuelta y las recoge ¿Qué más podemos nosotros pedirles a ellos? , el trabajo está quedando bien hecho , pero tenemos que tener conciencia y ser calmados , también colaborarles en ese sentido , eso no es para toda la vida eso era todo , no es más , muchas gracias".

La residente social del Contratista Yesica Agudelo González manifiesta: " Gracias; también hemos tenido mucha colaboración por parte de la comunidad , en los pequeños temas propios de la dinámica de la obra que se presentan día a día , ustedes han sido muy colaboradores y muy comprensivos , falta hacer ciertas cosas puntuales como limpiar una fachada que se ensucio , cosas muy puntuales ; pero muchas gracias por la colaboración de ustedes porque eso hace que la obra funcione correctamente y la paciencia de ustedes ; este es el tramo en el que más nos ha rendido yo tengo mucha fe de que aquí vamos a salir rápido, de pronto si el aspecto de las lluvias nos atrase un poco , pero si nos ha rendido bastante".

Pide la palabra un miembro de la comunidad: "¿En cuánto tiempo van a abrir la obra?".

La Ingeniera del área técnica del contratista Ana Nicelly Casas responde: "Una cosa es habilitar la vía que es la que estamos arreglando, también vamos a hacer los andenes, las domiciliarias, conectar las redes a cada una de las casas, las redes sanitarias; En ese tema si nos vamos a demorar un poco, pero en la vía ya no, pensamos también agilizar ese tema para poner el asfalto".

La residente social del Contratista Yesica Agudelo González manifiesta: " Ya tenemos ese tema adelantado con el plan de manejo de tráfico en cuanto al tema de los andenes ya se hizo también el proceso de divulgación a la comunidad , creo que a todos se les digo que se iba hacer el proceso del PMT de andenes , ya tiene la información , en cuanto a la interventoría ellos también están en el proceso , nuestros especialistas también están



EVIDENCIA DE REUNIÓN

tramitando el PMT de los andenes , para ir al ritmo de la parte técnica y hacer el proceso lo más ágil posible y para que nos rinda ”.

La residente social del Contratista Yesica Agudelo González interviene: “¿Alguna otra duda o pregunta?”.

Pide la palabra una representante de la comunidad: “Lo que pasa es que frente a la casa de nosotros tenemos una canasta de basuras”.

La residente social del Contratista Yesica Agudelo González interviene: “¿Cuál es la dirección?”.

Responde la representante de la comunidad: “Carrera 50ª No. 32- 20 Sur; Es la única casa que tiene esa canasta, esa canasta la usan para poner las basuras, pero nosotros la queremos quitar, entonces no sé si ustedes la puedan quitar de una vez”.

La ingeniera del área técnica del contratista Ana Nicelly Casas responde: “Cuando estemos en el tema de los andenes, miraremos que podemos hacer”.

Responde la representante de la comunidad: “Es que la queremos quitar porque los olores son terribles”.

La residente social del Contratista Yesica Agudelo González responde: “En cuanto a la mobiliaria vamos a hacer la consulta porque tengo entendido que todo debe quedar tal cual como lo encontramos”.

Pide la palabra por parte del área técnica de la interventoría el arquitecto Andrés Franco Galvis: “Yo veo que llegando hacia la calle principal hay una matera hacia el costado occidental que nos da luz, la verdad yo no le veo funcionalidad ¿Eso está funcionando o la idea es seguir plantado matas, o lo dejamos así? o ¿Cuál es la función?”.

Responde un representante de la comunidad: “Precisamente ahí se plantaban materas, lo que pasa es que yo lo estuve cuidado y sembré matillas, pero me demoraba más en arreglar el lugar que en volverlo a dañar, por ese motivo no volví arreglarlo y yo dije: “si lo vuelvo arreglar lo van a dañar”.

La Ingeniera del área técnica del contratista Ana Nicelly Casas responde: “Entonces ¿si se puede retirar?”.



EVIDENCIA DE REUNIÓN

Responde el representante de la comunidad: "Si es mejor retirarla toca para que el sector se vea más bonito".

Interviene por parte del área técnica de la interventoría el arquitecto Andrés Franco Galvis: "Es decir, nosotros tenemos que dejar el espacio público tal como lo encontramos, es decir si usted quiere esa materia sin matas tendríamos que hacer un acta y dejarlo por escrito, de lo contrario nosotros tenemos que dejar el lugar tal cual como estaba".

Responde el representante de la comunidad: "¿Eso se puede hacer ya?".

La ingeniera del área técnica del contratista Ana Nicelly Casas responde: "Una vez termine la vía".

La residente social del Contratista Yesica Agudelo González interviene: "Ambientalmente sí se tienen que respetar las zonas verdes".

Pide la palabra un miembro de la comunidad: "Hay una cosa que no me quedo clara, la ingeniera decía que una cosa es que tan pronto se termine y coloquen la capa asfáltica abren la vía, la pregunta es ¿van a abrir la vía sin hacer los andenes? o ¿se abre cuando esté totalmente la obra terminada?, esa parte no me quedo clara, no sé si a los demás sí".

Interviene por parte del área técnica de la interventoría el arquitecto Andrés Franco Galvis: "Te voy a explicar eso, resulta que movilidad, es quién nos aprueba a nosotros los PMTs, hay un PMT para la vía y hay un PMT para los andenes; Movilidad a nosotros no nos da la aprobación de dos PMT al mismo tiempo, tenemos que habilitar la vía para que el PMT de los andenes se pueda implementar y podamos intervenir el PMT de los andenes; cuando ya abramos la vía el andén que vamos a intervenir, van a tener un sendero peatonal sobre la calle con colombinas y maletines, para que la gente pueda transitar por ahí y puedan intervenir el espacio público".

Toma la palabra la residente social del Contratista Yesica Agudelo González: "Gracias arquitecto"; ¿Alguna otra inquietud, alguna duda al respecto? Nosotros tenemos el comité de participación cuidada en los que se realizan reuniones una vez al mes; esta vez no lo realizamos porque quedaba muy cerca a la reunión del día de hoy nuestra reunión de avance, la reunión de avance se debe hacer cuando llevamos el 50% de obra ejecutada y vamos en el 60%, entonces nos hubieran quedado muy seguidas las reuniones y no tendría sentido,



EVIDENCIA DE REUNIÓN

por ese motivo hicimos la reunión de avance para informarles a toda la comunidad y entre todos nos escucharnos, fue por esa razón; Si dentro de un mes no hemos terminado obra hacemos nuestra reunión con el comité de participación ciudadana para que ustedes tengan la información y sepan porque no se realizó la reunión este mes”.

Siendo las 6:00pm la residente social del contratista Yesica Agudelo González, toma la palabra e indica: “Les quiero dar las gracias por su asistencia y por su tiempo; Muchísimas gracias por estar acá, nos dan a entender que la obra nos interesa y les importa. Como siempre vamos a estar muy atentos a lo que ustedes puedan necesitar, damos por terminada la reunión muchísimas gracias”.

COMPROMISOS DE LA REUNIÓN

No.	ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA DE ENTREGA

Nota: Agregar número de fila que sea necesario para registrar los acuerdos y los compromisos de la reunión.

GDI-GPD-F027

Versión 2

Vigencia: 09 de mayo de 2018

12 de 13

 BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS <small>GOBIERNO Municipal de Bogotá</small>	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	 INTERSA S.A. <small>INGENIERÍA</small>
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 41 de 57

2. SEGUIMIENTO REUNIÓN DE AVANCE CIV 16003550 (SANTA RITA)



INTERSA S.A.

CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".

Alcaldía de Bogotá

FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES

FECHA: 22/04/2019		TEMA: REUNIÓN DE AVANCE DEL CIV 16003550 (SANTA RITA)	LUGAR: Salón comunal Santa Rita Calle 37 A Sur # 39-35	BARRIO: SANTA RITA	UPZ: MUZÚ	Localidad: Puente Aranda
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	Monica Pajardo	ESTAD	Intendencia	3106142025	umbenul.p.e.inten	[Firma]
2	Andres Franco	R.Técnico	INTERVENCIÓN	3008095337	tecnico.presidencia	[Firma]
3	Nicely Casas	R.Técnico	LCV 6	300 8800 280	ingnie@hotmilion	[Firma]
4	Yosica Aguado	Res. Socio	LCV 6	3213905517	gestionocial@gmail	[Firma]
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						



INTERSA S.A.

CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".

Acción de 69906

FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES

FECHA: 22/04/2019	TEMA: REUNIÓN DE AVANCE DEL CIV 16003550 (SANTA RITA)	LUGAR: Salón comunal Santa Rita Calle 37 A Sur # 39-35	BARRIO: SANTA RITA	UPZ: MUZÚ	Localidad: Puente Aranda
----------------------	--	---	--------------------	-----------	--------------------------

OBSERVACIONES

Siendo las 5:20 pm del día 22 de abril, se llevó a cabo la reunión de avance del CIV 16003550 en el salón comunal de Santa Rita.

- Se socializó con la comunidad las actividades que se han ejecutado hasta la fecha, en cada una de las áreas (técnica, social, ambiental y SST). Además se les socializo las actividades que faltan por ejecutar en el segmento.
- Se solicita al contratista, contar con la participación de la residente contractual SST.
- Se aclararon dudas que tenía la comunidad, especialmente en el tema del PMT.
- Se les indicó, que este mes no se llevará a cabo reunión de comité de participación ciudadana, sino que se llevará a cabo el siguiente mes.
- Se pudo evidenciar que el contratista, atención la solicitud del video beam, ya que se logró una excelente proyección.



 <p>BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS</p> <p><small>ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.</small></p> <p><small>COOPERADORA</small></p> <p><small>Asociación Local de Puente Aranda</small></p>	<p>INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5</p> <p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018</p>	 <p>INTERSA S.A.</p> <p>INGENIERIA</p>
<p>Contrato de obra 156 de 2018</p>	<p>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.</p>	<p>Página 42 de 57</p>

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL MES DE ABRIL**COMITÉS INTEGRALES****COMITÉS SOCIALES**

RECORRIDOS SOCIALES



**RECORRIDO SOCIAL CIV 16004097
(AUTOPISTA SUR MUZÚ) 02-05/04/19**



**RECORRIDO SOCIAL CIV 16002026
(MILENTA) 02-05/04/19**



**RECORRIDO SOCIAL CIV 16001040 (SAN
RAFAEL) 02-05/04/19**



**RECORRIDO SOCIAL CIV 16003550
(SANTA RITA) 02-05/04/19**

VERIFICACION DE INSTALACION DE PUNTOS SATELITES



**VERIFICACIÓN PUNTO SATELITE CIV
16004097 (AUTOPISTA SUR MUZÚ)
02/04/19**



**VERIFICACIÓN
PUNTO SATELITE
DEL CIV 16003273(LA
ASUNCIÓN) 12/04/19**



**VERIFICACIÓN PUNTO
SATELITE DEL CIV
16001283 (BRASILIA)
12/04/19**



**VERIFICACION INSTALACIÓN PUNTO
SATELITE CIV 16001793 (El Sol)
29/04/19**

VERIFICACION DE INSTALACION DE VALLAS INFORMATIVAS



**INSTALACIÓN VALLA MOVIL
INFORMATIVA CIV 16001040 (SAN
RAFAEL) 02/04/19**



**VERIFICACIÓN INSTALACIÓN VALLA
MOVIL DEL CIV 16001283 (BRASILIA)
12/04/19**



**VERIFICACIÓN INSTALACIÓN
VALLA MOVIL DEL CIV
16003273 (LA ASUNCIÓN)
12/04/19**



**VERIFICACION INSTALACIÓN VALLA
MOVIL CIV 16001793 (El Sol)
29/04/19**

CAPACITACIÓN CON PERSONAL DE OBRA

**CAPACITACIÓN CON EL PERSONAL
DE OBRA DEL CONTRATISTA MES DE
ABRIL 29/04/19**

COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

**COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
#1 CIV 16004097 (Autopista Sur Muzú)
25/04/19**



**COMITÉ DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA
#1 CIV 16001040 (San Rafael) 25/04/19**



**COMITÉ DE PARTICIPACIÓN
CIUDADANA #4 CIV 16002026
(Milenta) 29/04/19**

LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE VECINDAD Y DE FACHADA



ACOMPANAMIENTO ACTAS DE
VECINDAD CIV 16001283 (BRASILIA)
03-06/04/19



ACOMPANAMIENTO ACTAS DE VECINDAD
CIV 16001283 (BRASILIA) 03-06/04/19



ACOMPANAMIENTO LEVANTAMIENTO
ACTAS DE VECINDAD DEL CIV
16001283 (BRASILIA) 08/04/19



ACOMPANAMIENTO LEVANTAMIENTO
DE ACTAS DE FACHADA DEL CIV
16002882 (Santa Matilde) 22/04/19



LEVANTAMIENTO DE ACTAS DE
FACHADA CIV 16003114 (Santa Isabel)
29/04/19

REUNIONES DE AVANCE



REUNION DE AVANCE CIV 16003550 (Santa Rita) 22/04/19



REUNION DE AVANCE CIV 16003550 (Santa Rita) 22/04/19

ATENCIONES A LA CIUDADANIA



ATENCION CIUDADANA DEL PREDIO
CII 38 B Sur #50ª-09 CIV
16004097(AUTOPISTA SUR MUZÚ)
13/04/19



ATENCIÓN CIUDADANA CII 20 Sur
53ª-50 CIV 16002026 (Milenta)
29/04/19

	INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5	 INTERSA S.A. INGENIERIA
Contrato de obra 156 de 2018	CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018 REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.	Página 43 de 57


4. SEGUIMIENTOS PUNTOS SATELITES Y VALLAS MOVILES INFORMATIVAS

 INTERSA S.A.		CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-IP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".						
FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES								
FECHA: 02/04/2019	TEMA: PUNTO SATELITE DEL CIV 16004097	LUGAR: 16004097 Cr 50 a #38b-06 sur	BARRIO: AUTOPISTA SUR	UPZ: MUZÚ	LOCALIDAD: Puente Aranda			
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	TÉLEFONO	CORREO	FIRMA		
1	Alejandra Guapari R. social		Interventoria	310577464	social@guapari.com	Alejandra Guapari		
2								
3								
4								
5								

OBSERVACIONES

Siendo las 11:00 am del día 02 de abril, se realizó verificación nuevamente del Punto satélite de autopista Sur Muzú, ya que se realizó un cambio y ahora se encuentra ubicado en la Cr 50 a #38b-06 sur.

- El punto satélite cuenta con todos los logos solicitados y las especificaciones indicadas.
- El cambio se realizó ya que en anterior lugar de ubicación, el punto satélite se encontraba a la intemperie, lo cual ocasionaba el deterior más rápido del mismo.





 INTERSA S.A.		CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".							
FECHA: 02/04/2019		FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES							
TEMA: VERIFICACION INSTALACION DE VALLA MOVIL INFORMATIVA DEL CIV 16001040		LUGAR: CIV'S 16001040		BARRIO: SAN RAFAEL		UPZ: SAN RAFAEL		Localidad: Puente Aranda	
N°		NOMBRE		CARGO		DEPENDENCIA		TELÉFONO	
1		DACIA RUEDA		RESIDENTE SOCIAL		INTERCOMUNICACION		322 3653975	
2								correo: @intercomunicacion.com	
3									
4									
5									

OBSERVACIONES

Se realizó verificación de la instalación de las valla informativa del CIV 16001040 (San Rafael)), identificando que la misma se encuentra instalada en la Cll 4 F, con el objetivo de dar a conocer la imagen corporativa de la intervención.

- Se le solicita al contratista que estas vallas siempre deben estar visibles para la comunidad.

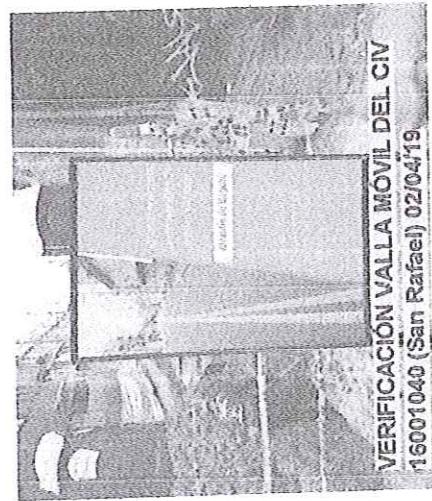


 INTERSA S.A.		CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".				Alcaldía de Bogotá	
FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES							
FECHA: 12/04/2019	TEMA: PUNTO SATELITE Y VALLA MOVIL DEL CIV 16001283	LUGAR: CRR 44 n°4 B-30	BARRIO: BRASILIA	UPZ: SAN RAFAEL	Localidad: Puente Aranda		
N°	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO	FIRMA	
1	PAOLA RUEDA	RESIDENTE SOCIAL	INTERVENTORIA	322 3653975	social.p@interventoriavial.com		
2							
3							
4							
5							

OBSERVACIONES

Siendo las 10:30 am del día 12 de abril, se realizó verificación del Punto satélite ubicado en la CRR 44 n°4 B-30.

- El punto satélite cuenta con todos los logos solicitados y las especificaciones indicadas.
- Se le solicita al contratista tener todos los volantes en el punto satélite (inicio de obra, reunión de inicio e implementación del PMT), hasta el final del mes.

La valla móvil también se encuentra instalada en el segmento de intervención.

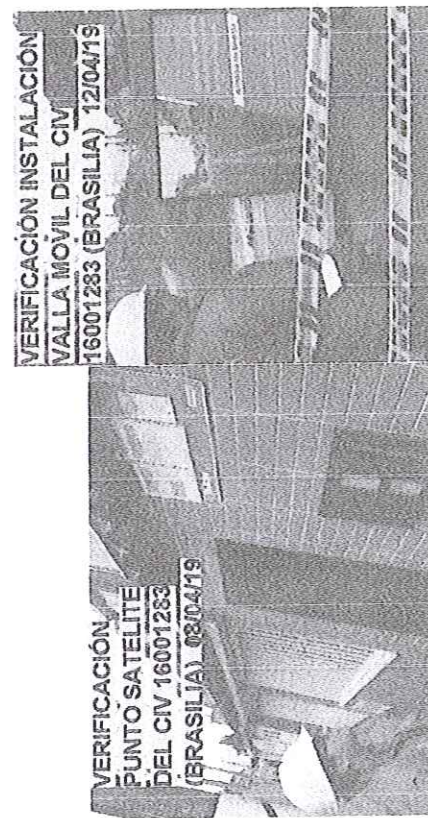

 INTERSA S.A.		CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".				Alcaldía de Bogotá	
FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES							
FECHA: 12/04/2019	TEMA: PUNTO SATELITE DEL CIV 16003273	LUGAR: CR 31 b #1D-17	BARRIO: LA ASUNCIÓN	UPZ: CIUDAD MONTES	Localidad: Puente Aranda		
Nº	NOMBRE	CARGO	DEPENDENCIA	TELÉFONO	CORREO	FIRMA	
1	Alejandra Chaparro	Res Social	Interventoria	322 355 3975	social.pape@interventoria.com	Alejandra Chaparro	
2							
3							
4							
5							

OBSERVACIONES

Siendo las 10:30 am del día 12 de abril, se realizó verificación del Punto satélite ubicado en la CR 31 b #1D-17

- El punto satélite cuenta con todos los logos solicitados y las especificaciones indicadas.
- Se le solicita al contratista tener todos los volantes en el punto satélite (inicio de obra, reunión de inicio e implementación del PMT), hasta el final del mes.

La valla móvil también se encuentra instalada en el segmento de intervención.



 INTERSA S.A.		CONTRATO No. 141 de 2018 "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA PARA EL CONTRATO DE OBRA PUBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006 -2018 O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENTORIA DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA".					Alcaldía de Bogotá		
FECHA: 29/04/2019		FORMATO DE VERIFICACIÓN: REUNIONES, TALLERES, COMITÉS, COMERCIANTES, ACTIVIDADES SOCIALES							
TEMA: PUNTO SATELITE Y VALLA MOVIL DEL CIV 16001793		LUGAR: CII 2 f #41b-42		BARRIO: EL SOL		UPZ: CIUDAD MONTES		Localidad: Puente Aranda	
N°		NOMBRE		CARGO		DEPENDENCIA		TELÉFONO	
1		PAOLA RODEVA		RESIDENTE SOCIAL		INTERVENTORIA		322.365.3975	
2								correo: pa@interventoria.com	
3									
4									
5								FIRMA	
									
OBSERVACIONES									
Siendo las 11:30 am del día 29 de abril, se realizó verificación del Punto satélite ubicado en la CII 2 f #41b-42.									
<ul style="list-style-type: none"> - El punto satélite y las vallas móviles fueron instaladas el día 27 de abril. - El punto satélite cuenta con todos los logos solicitados y las especificaciones indicadas. Si mismo están publicados los volantes informativos correspondientes. - Las vallas móviles también se encuentran instalada en el segmento de intervención. 									
									

 <p>BOGOTÁ MEJOR PARA TODOS GOBIERNO LOCAL DE BOGOTÁ D.C. Alcaldía Mayor de Bogotá D.C.</p>	<p>INFORME SOCIAL , ETAPA DE EJECUCIÓN DE OBRA N° 5</p>	 <p>INTERSA S.A. INGENIERIA</p>
<p>Contrato de obra 156 de 2018</p>	<p>CONTRATO DE INTERVENTORÍA FDLPA - 141 DE 2018</p> <p>REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, FINANCIERA, SOCIAL, AMBIENTAL Y SISO PARA EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO LICITATORIO ALPA-LP-006-2018, O EL QUE HAGA SUS VECES, CUYO OBJETO ES LA INTERVENCIÓN DE LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA.</p>	<p>Página 44 de 57</p>

5. LISTADO DE ENTREGA DE VOLANTES INFORMATIVOS

Volante: 57

Fecha: 12 de abril de 2019

Localidad: Puente Aranda


Contrato: 156 de 2018

CONTRATAR A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE AJUSTE Y A MONTO AGOTABLE LOS DIAGNOSTICOS E INTERVENCIÓN DEL MANTENIMIENTO, REHABILITACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y ACCIONES DE MOVILIDAD PARA LA MALLA VIAL Y EL ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE PUENTE ARANDA EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C.


**INICIA
LA REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO
CALLE 20 SUR ENTRE TRANSVERSAL 53 A Y CARRERA 58
CIV: 16002026**

CIERRE ALTERNO DE ANDENES CALLE 20 SUR ENTRE TRANSVERSAL 53 A Y CARRERA 58

POR REHABILITACIÓN DE ESPACIO PÚBLICO.

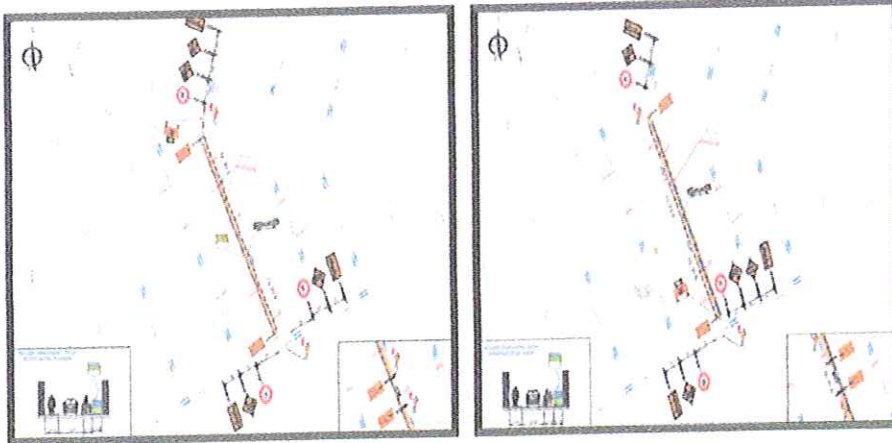

LA SDM AUTORIZA PMT PARA CIERRE TOTAL DE ANDEN EN AMBOS COSTADOS NO SIMULTANEOS Y CIERRE DEL CARRIL ADYACENTE AL CIERRE DE OBRA PARA TRASLADO DEL PEATÓN Y ACTIVIDADES DE CARGUE Y DESCARGUE SIN AFECTACION DEL SENDERO PEATONAL PARA ACTIVIDADES DE REHABILITACIÓN



- Atienda la señalización informativa y reglamentaria ubicada en obra.
- Acate las recomendaciones del personal de la obra.
- Circule por los senderos peatonales demarcados.
- Evite ingresar a la zona de trabajo o romper la malla o las cintas de demarcación dispuestas para su protección.
- Cualquier irregularidad, comuníquela a nuestro punto de atención

SE GARANTIZA EL ADECUADO MANEJO DE LOS PEATONES Y VEHÍCULOS CON EL APOYO DE LOS AUXILIARES DE TRANSITO

Más información sobre el proyecto en:
Contratista: LUIS GABRIEL NIETO GARCIA
COP: 156 - 2018
Residente social: Yesica Agudelo González
Teléfonos: 9272941-3208674964
Dirección: CARRERA 53 G N 1- 04/ Barrio
Camelia
Correo
electrónico: gestion-social156@gmail.com
Interventoría: INTERSA S.A

	FORMATO CONTROL ENTREGA DE PIEZAS DE DIVULGACIÓN		MEJOR ALTERNATIVA
	PROCESO		VERSION 3
GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA			

NO DE PIEZA: SE divulga Pieza Informativa No. 57, Rehabilitación del espacio Público Andarés
FECHA: 13 de Abril de 2019
TRABJO: 16002016

	NOMBRES Y APELLIDOS	DIRECCIÓN	TÉLEFONO	BARRIO	FIRMA	OBSERVACIÓN
1	Betsabe García de Bayos	Calle 20 Sur N-53A 38	3173539850	Milento	<i>[Signature]</i>	
2	Guieslaine M. Cole	Calle 20 Sur N-53A 38	3164995924	Milento	<i>[Signature]</i>	
3	Hier Mercedes	Calle 20 Sur N-53A 38	3533334	Milento	<i>[Signature]</i>	
4	Rosa Puerta	Calle 20 Sur N-53A 38		Milento	<i>[Signature]</i>	
5	Rosa Puerta	Calle 20 Sur N-53A 38		Milento	<i>[Signature]</i>	
6	Nahir González	Calle 20 Sur N-53A 42	3132513725	Milento	<i>[Signature]</i>	
7	Rosa Puerta	Calle 20 Sur N-53A 46		Milento	<i>[Signature]</i>	
8	Rosa Puerta	Calle 20 Sur N-53A 50		Milento	<i>[Signature]</i>	
9	Rosa Puerta	Calle 20 Sur N-53A 54		Milento	<i>[Signature]</i>	
10	Rosa Puerta	Calle 20 Sur N-53A 62		Milento	<i>[Signature]</i>	
11	Rosa Puerta	Calle 20 Sur N-53A 66		Milento	<i>[Signature]</i>	
12	Edilma Hernández	Calle 20 Sur N-53A 70	3592449	Milento	<i>[Signature]</i>	
13	Rosa Puerta	Calle 19 Sur N-98 Sur		Milento	<i>[Signature]</i>	
14	Rosa Puerta	Calle 20 Sur N-53A 75		Milento	<i>[Signature]</i>	
15	Olivia Beltrán	Calle 20 Sur N-53A 77	5037751	Milento	<i>[Signature]</i>	
16	María Cuchina Valtito	Calle 20 Sur N-53A 67	3037424712	Milento	<i>[Signature]</i>	
17	Orlando Fariña	Calle 20 Sur N-53A 65	316536735	Milento	<i>[Signature]</i>	
18	Julia Viquez	Calle 20 Sur N-53A 59	7587320	Milento	<i>[Signature]</i>	
19	Florencia Alvará	Calle 20 Sur N-53A 87	302407349	Milento	<i>[Signature]</i>	
20	Angela Suárez	Calle 20 Sur N-53A 47	3172216483	Milento	<i>[Signature]</i>	

TOTAL DE PIEZAS ENTREGADAS:

ELABORÓ - CONTRATISTA	REVISÓ - INTERVENTORIA
Yessica Andarés	PAOLA RUELO
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
