

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	1 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

GOBERNACION DEL TOLIMA

INFORME DE GESTIÓN N° 07

CONTRATO 1698 - 2024

PERIODO: 11/12/2024 AL 20/12/2024 y 07/01/2025 AL 25/01/2025

CONTROL DE CAMBIOS					
DESCRIPCIÓN	VERSIÓN	FECHA	ELABORÓ	REVISÓ	APROBÓ
Informe Mensual N° 07	00	25 de enero del 2025	 José Luis tique cruz Residente de Interventoría	 Coordinador de Interventoría	 director de Interventoría


INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	2 de 54    @ gobertolima www.tolima.gov.co

INFORME MENSUAL No. 07

Del 11/12/2024 AL 20/12/2024 y 07/01/2025 AL 25/01/2025

CONTRATO No 1698-2024

CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

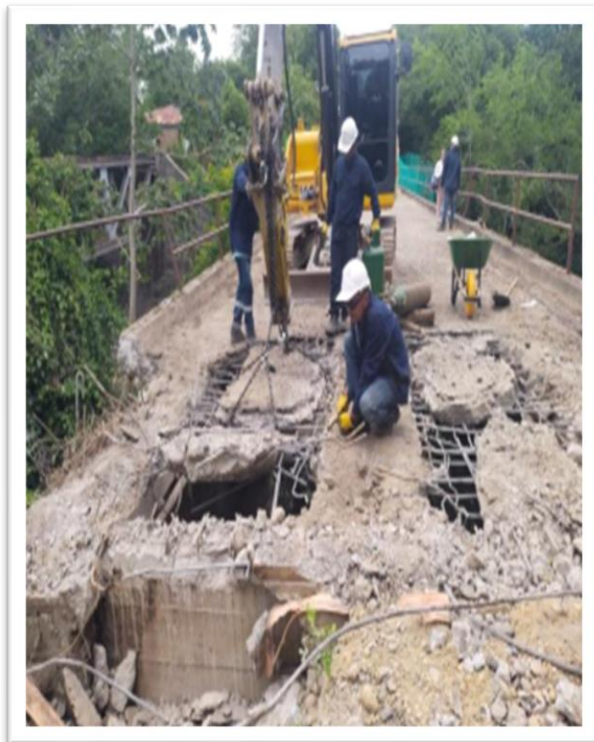

GOBERNACION DEL TOLIMA
BOGOTÁ D.C
ENERO 2025

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	3 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

TABLA DE CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.	7
2.	GENERALIDADES DEL PROYECTO.	7
2.1	DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.	7
2.1.1	Alcance General.	8
2.1.2	Objeto del Contrato de Obra e Interventoría.	10
2.2	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.	10
2.3	INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA.	12
2.3.1	Información General Contrato de obra.	12
2.3.2	Información General Contrato de Interventoría.	13
2.3.3	Personal involucrado en el proyecto.	14
3.	INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA.	15
3.1	CONTROL LEGAL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORÍA.	15
3.1.684	Bogotá D.C.	16
3.2	ESTADO DE POLIZAS.	17
3.3	INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA.	18
3.3.1	Balance financiero contrato de obra.	18
3.3.2	Balance financiero contrato de interventoría.	18
3.3.3	Anticipo contrato de obra e interventoría.	19
3.3.4	Actas parciales Contrato de Obra.	19
3.3.5	Actas parciales Contrato de Interventoría.	20
3.3.6	Metas físicas, actividades por ejecutar y alcance.	20
4.	INFORMACION TECNICA.	23
4.1	SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA.	23
4.2	INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS.	25
4.3	CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO.	25
4.4	DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS EN EL PERIODO.	26
4.5	ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA.	39
4.6	DESCRIPCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO.	40
4.7	CONTROL E INSPECCIÓN Y ENSAYOS.	40
4.8	CALIFICACION DE PERSONAL, MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPOS.	40
4.8.1	Personal.	40
4.8.2	Materiales.	41
4.8.3	Maquinaria Y Equipos.	41
4.9	CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.	41
4.10	GESTIONES ADELANTADAS ANTE ENTIDADES PUBLICAS POR EL CONTRATISTA E INTERVENTORIA.	42
4.11	PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS.	42
4.12	BITÁCORA DE OBRA.	43
4.13	ACTAS DE COMITÉ DE OBRA.	43
4.14	CONTROL ADMINISTRATIVO.	43

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	4 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

4.14.1	Personal del Contratista	43
4.14.2	Personal de la Interventoría	43
4.14.3	Control e inspección y ensayos.....	43
4.14.4	Control de equipos utilizados en obra.....	43
4.14.5	Control del estado del tiempo	43
	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	44

ANEXOS

ANEXO No. 01 Acta Comité de Obra.
ANEXO No. 02 Control de personal del Contratista.
ANEXO No. 03 Control de personal de la Interventoría.
ANEXO No. 04 Control e inspección y ensayos.
ANEXO No. 05 Control de equipos utilizados en obra.
ANEXO No. 06 Control del estado del tiempo.
ANEXO No. 07 Correspondencia enviada.
ANEXO No. 08 Registro Fotográfico.
ANEXO No. 09 Bitácora de Obra.

LISTADO DE TABLAS

Tabla 01	Datos generales del Contrato de Obra No. 1665 de 2024	12
Tabla 02	Datos generales del contrato de Interventoría No. 1698 de 2024	13
Tabla 03	Personal de Gobernación del Tolima.....	14
Tabla 04	Personal de ALDEIC S.A.S. BIC	14
Tabla 05	Personal de CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO	14
Tabla 06	Control Legal Contrato de Obra	15
Tabla 07	Control Legal del Contrato de Interventoría.....	16
Tabla 08	Pólizas del Contrato de Obra	17
Tabla 09	Pólizas del Contrato de Interventoría	17
Tabla 10.	Control de materiales granulares empleados en obra. ¡Error! Marcador no definido.	
Tabla 11.	Control de bolsas de cemento empleados en obra ¡Error! Marcador no definido.	
Tabla 12.	Control de suministro de agua industrial en la obra. .. ¡Error! Marcador no definido.	
Tabla 13.	Control de RCD – MATERIAL DE EXCAVACIÓN - dispuestos en zona de nivelación Hacienda Guadalupe..... ¡Error! Marcador no definido.	
Tabla 14.	Control de RCD – MATERIAL DE DEMOLICIÓN - dispuestos en zona de nivelación Hacienda Guadalupe..... ¡Error! Marcador no definido.	
Tabla 15.	Control de RCD - MATERIAL DE EXCAVACIÓN - dispuestos en zona de nivelación Predio Villa Blanca..... ¡Error! Marcador no definido.	
Tabla 16.	Control de RCD - MATERIAL DE DEMOLICIÓN - dispuestos en zona de nivelación Predio Villa Blanca..... ¡Error! Marcador no definido.	

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	5 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

Tabla 17. Vehículos utilizados mes 7..... ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 18. Equipo y/o Maquinaria utilizada ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 19. Relación de maquinaria y/o vehículos utilizados en obra en mes No 7 ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 20. Relación uso de unidades sanitarias contratista..... ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 21. Capacitaciones SST contratista reportadas para informe No. 7 ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 13. Capacitaciones ambientales contratista reportadas para informe No. 7 ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 23. Reporte accidentes, incidentes y ausentismo contratista ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 24. Reporte accidentes, incidentes y ausentismo Interventoría ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 25. Comparación personal en obra según contratista e interventoría ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 26. Documentación de afiliaciones personal contratista .. ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 27. Seguridad social personal interventoría ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 28. Trazabilidad requerimientos de presentación documento PAGA ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 29. Seguridad social contratista mes de octubre 2024..... ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 30. Identificación de permisos ambientales del proyecto. ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 31. Charlas área social..... ¡Error! Marcador no definido.

Tabla 32. Consolidado PQRS del periodo mes 7 ¡Error! Marcador no definido.

LISTADO DE FIGURAS

Figura No. 1. Descripción de la estructura del Puente sobre el Río Venadillo en el corredor vial Palobayo – Ambalema.....10

Figura No. 2. Localización Puente sobre el Río Venadillo en el corredor vial Palobayo – Ambalema.....11

Figura No. 3. estado inicial ejecución vs estado actual.....12

Figura No. 5. Placas de acceso a puente y terminación mediante aplicación asfalto MDC.....30

Figura No. 6. Ejecución andenes sobre puente vs terminados actuales a terminación contractual.....31

Figura No. 7. Ejecución rellenos y concretos sobre taludes puente.....32

Figura No. 8. Ejecución soporte metálico placa de concreto puentes estado final ejecución contractual.....33

Figura No. 9. acero placa sobre estructura metálica.....34

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	6 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

Figura No. 10. ejecución de drenes en acceso y salida puente.....	35
Figura No. 11. imprimación sobre loza de puente.....	36
Figura No.12. aplicación MDC.....	36
Figura No. 13. Prueba de carga interventoría y contratista.....	37
Figura No. 14. Imprimacion acceso y salida puente.....	37
Figura No. 15. Aplicación de MDC.....	38
Figura No. 16. Concretos para revestimientos de taludes en puente.....	38
Figura No. 17. Aceros de refuerzo en cunetas longitudinales acceso y salida puente.....	39
Figura No. 18. demarcación pintura en frio acceso y salida puente.....	39
Figura No. 19. Señalización vertical de vía.....	39

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	7 de 54    @ gobertolima www.tolima.gov.co

1. INTRODUCCIÓN.

El presente documento es elaborado por el personal profesional en obra y de especialistas de la empresa ALDEIC S.A.S. BIC, contiene información de la etapa de construcción, el desarrollo de actividades técnicas, administrativas, financieras y ambientales, en el trabajo que realizó el contratista CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO para el CONTRATO DE OBRA N° 1665 DE 2024, cuyo objeto es **“CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”**.

Asimismo, describe la gestión realizada y el estado de ejecución del CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°1698 de 2024, cuyo objeto es **CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**.

El presente documento contiene una descripción general de las actividades realizadas, durante el período comprendido entre el 11/12/2024 AL 20/12/2024 y 07/01/2025 AL 25/01/2025 por parte de esta Interventoría.

2. GENERALIDADES DEL PROYECTO.

2.1 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

Actualmente el Departamento del Tolima cuenta con una longitud total de 2192,76 kilómetros de vías a su cargo, divididos en 745,76 km de vías de segundo orden y 1447 km en vías de tercer orden. Ahora bien, además de la infraestructura vial que se encuentra a cargo del departamento, también es uno de los objetivos del gobierno departamental ejecutar proyectos para intervenir la infraestructura de puentes presentes a lo largo de dichos corredores.

El puente existente en la vía Palobayo – Ambalema, está ubicado en las coordenadas: 4.724581° y -74.84792°, dentro del Departamento del Tolima, cuya estructura cruza en sentido NE-SO el río Venadillo, el cual; por efectos del desgaste que sufren estas estructuras por la exposición a condiciones ambientales extremas, se encuentra en estado crítico. Según la inspección realizada por parte de la **CONSULTORÍA TÉCNICA ADMINISTRATIVA FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA LA REALIZACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO - AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA**, se determinó como patología principal durante la inspección lo siguiente: Falla en la capacidad portante del suelo que soportaba uno de los estribos; dicho estribo no contaba con cimentación profunda, lo que lo volvió más susceptible a la socavación por efectos del flujo de agua generando el fallo de la superestructura.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	8 de 54    @ gobertolima www.tolima.gov.co

La situación que se presenta con el puente sobre el Río Venadillo ha generado un impacto negativo en la comunidad y en la productividad de la región. En consecuencia, genera bajo desarrollo socioeconómico, aumento de los tiempos de viaje y costos de transporte de carga y pasajeros. Además, afecta el acceso a servicios médicos, la asistencia educativa y aumenta los costos de operación vehicular, lo que crea condiciones desfavorables y presuntamente alto riesgo de accidentalidad.

Los efectos positivos de la inversión en infraestructura de transporte, se ven reflejados a nivel macroeconómico, regional y en términos de competitividad; con ello se iniciaría a cerrar la brecha de infraestructura y atender los requerimientos que le impondrá el crecimiento de la demanda productiva y de servicios de transporte en las carreteras; la política de infraestructura de transporte que se adelantara, estará enmarcada en procesos integrales de planificación con un nivel alto de los estudios técnicos para la toma de decisiones; en la definición de lineamientos estratégicos para el sector en materia de adaptación y mitigación del riesgo frente a desastres naturales; en el desarrollo de programas que respondan y complementen las apuestas productivas y sectoriales; en la adopción de nuevos y mejores mecanismos de financiación y en la integración y desarrollo regional.

Los estudios y diseños definitivos, nos presentan las especificaciones de intervención del puente vehicular sobre el Río Venadillo ubicado en el corredor vial Palobayo - Ambalema, donde se describen: Estudios de tránsito, de capacidad y niveles de servicio, levantamiento topográfico, batimétrico, diseño geométrico, estudio de suelos, geológicos y diseño de estructuras de cimentación, así como estabilización de terraplenes, estudio hidrológico, hidráulico y de socavación, diseño estructural de puentes y obras complementarias (accesos y otros), gestión predial, gestión ambiental y social, estudio de análisis del riesgo y sostenibilidad entre otros para su ejecución en la etapa de construcción.

2.1.1 Alcance General.

El puente existente en la vía Palobayo – Ambalema, ubicado en las coordenadas: 4.724581° y - 74.84792°, en el Departamento del Tolima, cuya estructura cruza en sentido NE-SO el río Venadillo el cual, por efectos del desgaste de estructuras por la exposición a condiciones ambientales extremas, se encuentra en estado crítico.

Con la ejecución del proyecto se pretende realizar la demolición del puente existente y la construcción de uno nuevo en estructura metálica y placa de concreto, dentro de las actividades a desarrollar se encuentra la demolición de la estructura existente puesto que este puente colapso en uno de sus estribos y la construcción de un nuevo puente con una cimentación profunda con estructura de apoyo en concreto, el puente se realizará con estructura metálica que soportará una placa de concreto. Teniendo en cuenta el amplio alcance del proyecto, la gestión de recursos, el entorno donde se desarrolla, la integralidad del mismo, el manejo y disposición del recurso humano, maquinaria y equipo, los diferentes actores que intervienen y los riesgos inherentes hacen que el proyecto presente una complejidad alta. Las actividades a ejecutar y el alcance del proyecto, se enfoca en realizar la construcción de un puente de 45 metros de longitud con dos

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	9 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

aproxches a ambos lados de 8 metros. Se precisa como requerimiento la construcción, de estructuras nuevas para el soporte del puente, así como también el mejoramiento de la vía de acceso al puente, beneficiando al Municipio de Ambalema, al municipio de Venadillo, y demás municipios, corregimientos y veredas que se encuentran en el área de influencia del proyecto.

- ✓ Tipología = Mixta (superestructura en acero, con apoyos y cimentación en concreto reforzado).
- ✓ Luz = luz central de 45 metros, más dos luces con lozas de aproximación de 8 metros cada una.
- ✓ Ancho = 5,90 metros.
- ✓ Capacidad = hasta vehículos de 52 Toneladas.

Estructura en Concreto	Mixta con Superestructura en Acero
Bajo rendimiento constructivo: conduce mayor tiempo de emisión de polvo y ruido en sitio de la obra	Alto rendimiento Constructivo, mínimo emisión de polvo y ruido en ejecución de obra.
Se genera mayores desechos de construcción	Se genera bajos desechos de construcción
Mayor complejidad en el proceso constructivo	Proceso constructivo más cómodo
Requiere formaleta y andamiaje	Formaleta solo para tablero
Mayores tiempos de Cierre Permanentes	Bajos tiempos de cierres permanentes y ejecución
Mayor Peso, lo que se traduce en mayores dimensiones de cimentación	Pesos moderados, Menores obras de cimentación.
Se requieren muchos controles, para garantizar el diseño	Controles hechos en entornos controlados en taller
Mayor imprevistos y desperdicios	Mayor control en las cantidades y menor cantidad de desperdicios.

Figura No. 1. Descripción de la estructura del Puente sobre el Río Venadillo en el corredor vial Palobayo – Ambalema

Fuente: Estudios y diseños para la construcción del puente vehicular sobre el rio Venadillo ubicado en el corredor vial Palobayo - Ambalema en el departamento del Tolima.

Que, según el Decreto Nro. 0117 del 28 de enero de 2022, por el cual se clasifican unas carreteras y se dictan otras disposiciones, y de acuerdo con los dispuesto en las Resoluciones 1860 de 2013 y 1067 de 2015 del Ministerio de Transporte, la Caracterización del tramo vial del Proyecto de inversión denominado “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” se encuentra categorizada como vía de tercer orden a cargo y competencia del Departamento del Tolima.

ID	CODIGO	NOMBRE DE LA VIA	CLASIFICACION	LONGITUD (KM)
3	43TL13	PALOBAYO - AMBALEMA	VÍA DE TERCER ORDEN	23.80

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	10 de 54  @gobertolima www.tolima.gov.co

2.1.2 Objeto del Contrato de Obra e Interventoría.

El contrato de obra No. 1665 de 2024, cuyo contratista de la obra es el **CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO**, tiene como objeto: “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.

Por otra parte, para la interventoría del contrato de obra anteriormente descrito, se suscribió el contrato de interventoría No. 1698 de 2024 con la empresa **ALDEIC S.A.S. BIC**, cuyo objeto es: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

2.2 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.

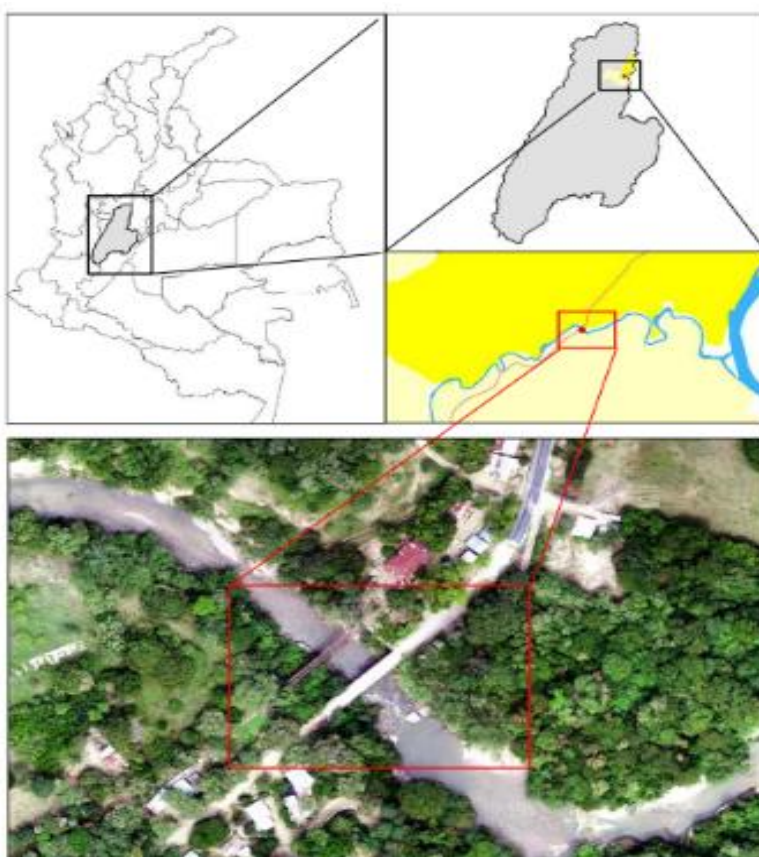


Figura No. 2. Localización Puente sobre el Río Venadillo en el corredor vial Palobayo – Ambalema
Fuente: Estudios y diseños para la construcción del puente vehicular sobre el río Venadillo ubicado en el corredor vial Palobayo - Ambalema en el departamento del Tolima

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	11 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

El proyecto contempla la construcción de un puente sobre el Río Venadillo en los municipios de Venadillo y Ambalema en el departamento del Tolima, nuevos tramos viales de accesos al puente, obras de drenajes y construcción de estructura de pavimentos.

En el presente informe se describe el proceso y se exhiben los resultados del proceso constructivo en el periodo comprendido entre el 11 de noviembre al 10 de diciembre de 2024, de cada una de las actividades a ejecutar a lo largo de la materialización del proyecto, localizado entre el municipio de Venadillo y Ambalema (Departamento del Tolima).

REGISTRO FOTOGRAFICO CONDICIONES ORIGINALES vs CONDICIONES FINALES.



Figura No. 3. estado inicial ejecución vs estado actual.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	12 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

2.3 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA.

2.3.1 Información General Contrato de obra.

En la siguiente tabla se relacionan los datos generales del contrato de obra No. 1665 de 2024:

Tabla 01 Datos generales del Contrato de Obra No. 1665 de 2024.

CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		CONSORCIO PUENTE AMBALEMA – PALOBAYO		
	NIT O CC:		901.826.039-0		
	DIRECCIÓN:		CL 2 2 – 70 of. 405 Ed. El Molino	TEL:	6424928
	CIUDAD:		Ibagué – Tolima		
	REPR. LEGAL:		LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ		
	C. C. No.:		14.225.605		
SUPERVISOR GOBERNACIÓN:	NEIL HAROL LEAL				
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA				
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 6.616.451.791,35				
	Valor en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.				
VALOR ADICIONAL	Nº 1	\$ 0,00			
VALOR FINAL DEL CONTRATO:	\$ 6.616.451.791,35				
	Valor en Letras: SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE.				
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO (5) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION.				
PRORROGA	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024				
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	SIETE (7) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION				
FECHA DE INICIO:	11 DE JUNIO DE 2024				
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	Nº 1	SUSPENSIÓN	Diciembre 20 del 2024.		
		REINICIACIÓN	Enero 7 del 2025.		
FECHA DE TERMINACIÓN:	25 DE ENERO DE 2025				

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	13 de 54    @ gobertolima www.tolima.gov.co

2.3.2 Información General Contrato de Interventoría.

En la siguiente tabla se relacionan los datos generales del contrato de Interventoría No. 1698 de 2024:

Tabla 02 Datos generales del contrato de Interventoría No. 1698 de 2024.

INTERVENTORÍA:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:		ALDEIC S.A.S. BIC	
	NIT O CC:		901.099.626-4	
	DIRECCIÓN:		Carrera 18 No. 116-24	TEL: 601-2145198
	CIUDAD:		Bogotá D.C.	
	REPR. LEGAL:		CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS	
	C. C. No.:		39.691.684 de Bogotá D.C.	
SUPERVISOR GOBERNACIÓN:	NEIL HAROL LEAL			
OBJETO:	"CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA."			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$525.586.987,00 IVA INCLUIDO			
	Valor en Letras: QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE.			
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION			
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE JUNIO DE 2024			
FECHA DE SUSPENSIÓN Y REINICIACIÓN:	Nº 1	SUSPENSIÓN	Diciembre 20 del 2024.	
		REINICIACIÓN	Enero 7 del 2025.	
FECHA ACTA ADICIONAL 001	N.A.			
PRORROGA	DOS (2) MESES CONTADOS A PARTIR DEL 07 DE NOVIEMBRE DE 2024			
VALOR ADICIÓN	\$ 127.009.099,00			
	N.A.			
VALOR TOTAL INCLUYENDO ADICIONES	\$ 652.596.086,00 IVA INCLUIDO			
	Valor en Letras: SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE.			
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO			
PLAZO FINAL DEL CONTRATO PRORROGA	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO			
FECHA DE TERMINACIÓN	25 DE ENERO DE 2025			

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	14 de 54    @ gobertolima www.tolima.gov.co

2.3.3 Personal involucrado en el proyecto.

Durante el presente período, cada uno de los participantes del proyecto ha dispuesto el personal que se relaciona a continuación:

2.3.3.1 Personal autorizado por Ente contratante.

Tabla 03 Personal de Gobernación del Tolima

(Supervisión de los Contratos de Obra e Interventoría)

CARGO	NOMBRE
DIRECTOR DE INFRAESTRUCTURA – SUPERVISOR CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA, GOBERNACIÓN DEL TOLIMA	NEIL HAROL LEAL

2.3.3.2 Personal de Interventoría.

Tabla 04 Personal de ALDEIC S.A.S. BIC.

CARGO	NOMBRE
Director de Interventoría	Diana Esperanza Riveros
Residente de Interventoría	José Luis tique cruz
Especialista en Geotecnia	Hildebrando Ciendua
Especialista en Pavimentos	Teófilo Carlos Yidi
Especialista en Estructuras	Diego Ernesto Dueñas Puentes
Especialista en Hidráulica	Andrés Galarza Guzmán
Especialista Ambiental	Claudia Alicia Alfaro de Los Ríos
Especialista en Vías	Néstor Espinosa Niño
Ingeniero de Apoyo	Jhoan Sebastián Téllez Torres
Profesional HSEQ	Paula Dayana Castiblanco
Topógrafo	Marco Aurelio Murcia
Dibujante	Sergio Guarín Caldas
Laboratorista	Edgar Gómez
Secretaria	Nidia Gómez
Cadenero	Olga Rodríguez
Cadenero	Jhon Franco
Conductor	Wilson Yovanny Arias Martínez

2.3.3.3 Personal Profesional del Contratista.

Tabla 05 Personal de CONSORCIO PUENTE AMBALEMA – PALOBAYO.

CARGO	NOMBRE
Representante legal	Ing. Ricardo Ortigoza González
Director de Obra	Ing. Luis Fernando Urrego
Ingeniero Residente de Obra	Ing. Jaime Alexander Ortigoza
Residente Auxiliar	Ing. Diego Alejandro Reyes
Especialista Geotecnia	Juan Daniel Moya Robayo

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	15 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

CARGO	NOMBRE
Especialista en Pavimentos	Diego Andrés Díaz Díaz
Especialista en Estructuras	Hugo Alberto Calvo
Profesional HSEQ	Franklin Ricardo Piragua
Coordinadora SST	Gloria Astrid López
Auxiliar SST	Mónica Marcela Cifuentes Méndez
Ingeniero Ambiental	Jorge Alberto Ramos
Ingeniera Auxiliar Ambiental	Ángela Johana Vanegas
Topógrafo	Luis Enrique Garay Moreno
Auxiliar de Topografía	Oliverio Rivas Rayo

3. INFORMACION LEGAL Y FINANCIERA.

3.1 control legal contrato de obra e interventoría.

Tabla 06 Control Legal Contrato de Obra.

CONTRATO DE OBRA No:	1665	FECHA:	30 ABRIL 2024
NUMERO DEL PROCESO:	LPO-003-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL TOLIMA		
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA		
VALOR INICIAL:	SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 6.616.451.791,35) incluidos impuestos y demás deducciones de Ley.		
VALOR ADICION:	NO APLICA		
VALOR FINAL:	SEIS MIL SEISCIENTOS DIECISÉIS MILLONES CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA Y UN PESOS CON TREINTA Y CINCO CENTAVOS M/CTE (\$ 6.616.451.791,35) Incluidos impuestos y demás deducciones de Ley.		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato es de cinco (05) meses contados a partir del Acta de Iniciación.		
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE JUNIO DE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Diciembre 20 del 2024		
FECHA DE REINICIACIÓN:	Enero 7 del 2025		
FECHA ACTA ADICIONAL – PRORROGA:	Noviembre 5 del 2024		
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	El plazo de ejecución del contrato es de siete (07) meses contados a partir del Acta de Iniciación.		
FECHA DE TERMINACIÓN	Enero 25 del 2025.		
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	CONSORCIO PUENTE AMBALEMA – PALOBAYO	
	NIT O CC:	901.826.039-0	

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	16 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

	DIRECCIÓN:	CL 2 2 – 70 of. 405 Ed. El Molino	TEL:	6082639103
	CIUDAD:	Ibagué – Tolima		
	REPR. LEGAL:	LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ		
	C. C. No.:	14.225.605		

Tabla 07 Control Legal del Contrato de Interventoría.

CONTRATO DE INTERVENTORIA No:	1698	FECHA:	07 MAYO 2024
NUMERO DEL PROCESO:	CMA-007-2024		
ENTIDAD CONTRATANTE:	GOBERNACION DEL TOLIMA		
OBJETO:	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.		
VALOR INICIAL:	QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$525.586.987,00) IVA INCLUIDO.		
VALOR ADICION:	CIENTO VEINTISIETE MILLONES NUEVEMIL NOVENTA Y NUEVE PESOS M/CTE (127.009.099,00) IVA INCLUIDO		
VALOR FINAL:	SEISCIENTOS CINQUENTA Y DOS MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL OCHENTA Y SEIS PESOS M/CTE (\$652.596.086,00) IVA INCLUIDO.		
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE CINCO (05) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.		
FECHA ACTA DE INICIO:	11 DE JUNIO DE 2024		
FECHA DE SUSPENSIÓN:	Diciembre 20 del 2024		
FECHA ACTA REINICIO:	Enero 7 del 2025		
FECHA ACTA ADICIONAL – PRORROGA:	Noviembre 5 del 2024		
PLAZO FINAL DEL CONTRATO:	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO ES DE SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN.		
FECHA DE TERMINACIÓN	enero 25 del 2025		
CONTRATISTA:	NOMBRE O RAZÓN SOCIAL:	ALDEIC S.A.S. BIC	
	NIT O CC:	901.099.626-4	
	DIRECCIÓN:	Carrera 18 No. 116-24	TEL: 601-2145198
	CIUDAD:	Bogotá D.C.	
	REPR. LEGAL:	CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS	
	C. C. No.:	3.1.684 Bogotá D.C.	

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	17 de 54    @ gobertolima www.tolima.gov.co

3.2 ESTADO DE POLIZAS.

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de obra vigentes según acta de inicio del contrato de obra.

Tabla 08 Pólizas del Contrato de Obra.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Póliza No.	I-100032865 – No. de Anexo 6		
Fecha de expedición	30/05/2025		
Actualización de pólizas con respecto a la Fecha de inicio del Contrato de obra			
COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
Cumplimiento del Contrato	07/01/2025	25/07/2029	\$ 661.645.179,20
Prestaciones sociales	07/07/2028	25/01/2028	\$ 330.822.589,60
Estabilidad de la Obra	25/01/2025	2501/2030	\$ 1.323.290.358,40
Póliza No.	I-100007841 - No. de Anexo 3		
Fecha de expedición	14-06-2024		
Responsabilidad civil extracontractual	11/06/2024	11/01/2025	\$ 650.000.000,00

A continuación, se relacionan las pólizas del contrato de interventoría vigentes según acta de inicio del contrato de interventoría.

Tabla 09 Pólizas del Contrato de Interventoría.

COMPAÑÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Póliza No.	21-44-101441008 – Anexo No. 6		
Fecha de expedición	27 de enero del 2025.		
Actualización de pólizas con respecto a la Fecha de inicio			
COBERTURAS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	INICIAL	FINAL	
Cumplimiento del Contrato	11/06/2024	25/07/2025	\$ 65.259.608.60
Calidad de Servicio	11/06/2024	25/01/2030	\$ 195.778.825.80
Pago de salario, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	11/06/2024	25/01/2028	\$ 32.629.804.30

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	18 de 54    @ gobertolima www.tolima.gov.co

3.3 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA E INTERVENTORIA.

3.3.1 Balance financiero contrato de obra.

BALANCE DEL CONTRATO DE OBRA 1665 DE 2024			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 6.616.451.791,35		
VALOR ADICIONAL:	\$ 0,0		
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1		\$ 3.871.706.984,86	
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2		\$ 2.189.615.371,16	
VALOR A PAGAR ACTA DE RECIBO No 3		\$ 555.129.435,33	
SUMAS IGUALES	\$ 6.616.451.791,35	\$ 6.616.451.791,35	

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALORES
1. Valor Inicial Contrato	\$ 6.616.451.791,35
2. Valor Adicional	\$ 0,00
3. Valor total del Contrato (1+2)	\$ 6.616.451.791,35
4. Valor Girado por Anticipo	\$ 0,0
5. Valor que resta por Pagar (3-4)	\$ 0,0
6. Valor Presente Acta parcial	\$ 555.129.435,33
7. Amortización en esta acta	\$ 0,0
8. Otras retenciones (Acumuladas)	\$ 0,0
9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-8)	\$ 555.129.435,33
10. Pagos Actas Anteriores	\$ 6.061.322.356,02
11. Valor pagado a la Fecha	\$ 6.061.322.356,02
12. valor a pagar presente acta No 3	\$ 555.129.435,33
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha con corte de la preacta parcial de obra	100.0%

3.3.2 Balance financiero contrato de interventoría.

BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA 1698 DE 2024			
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 525.586.987,00		
VALOR ADICIONAL:	\$ 127.009.099,00		
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.1		\$ 307.573.505,00	
VALOR ACTA DE RECIBO PARCIAL No.2		\$ 290.269.769,00	
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA No 3		\$ 54.752.812,00	
SUMAS IGUALES	\$ 652.596.086,00	\$ 652.596.086,00	

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	19 de 54    @ gobertolima www.tolima.gov.co

BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO	VALORES
1. Valor Inicial Contrato	\$ 525.586.987,00
2. Valor Adicional	\$ 127.009.099,00
3. Valor total del Contrato (1+2)	\$ 652.596.086,00
4. Valor Girado por Anticipo	
5. Valor que resta por Pagar (3-4)	\$ 652.596.086,00
6. Valor Presente Acta parcial	\$ 54.752.812,00
7. Amortización en esta acta	
8. Otras retenciones (Acumuladas)	
9. Valor a Pagar de la Presente Acta (6-8)	\$ 54.752.812,00
10. Pagos Actas Anteriores	\$ 597.843.274,00
11. Valor pagado a la Fecha	\$ 597.843.274,00
12. Saldo por pagar presente acta No 3	\$ 54.752.812,00
13. Porcentaje de ejecución del contrato a la fecha con corte de la preacta parcial de obra	100%

3.3.3 Anticipo contrato de obra e interventoría.

Según lo pactado en la cláusula 5 del contrato de obra No. 1665 de 2024; la entidad contratante no entregara anticipo al contratista de obra.

De igual manera, según lo estipulado en la cláusula 6 del contrato de interventoría No. 1698 de 2024; la entidad no entregara al contratista de interventoría anticipo y/o pago anticipado.

3.3.4 Actas parciales Contrato de Obra.

Durante el periodo reportado en el presente informe; el contratista de obra Consorcio PUENTE AMBALEMA – PALOBAYO ha presentado el acta parcial de obra No.1, No 2 y el acta parcial de obra No 3 , la cual se encuentra en proceso de radicación en la entidad (Gobernación del Tolima) pendiente para el desembolso de los recursos.

Del trámite de acta parcial de obra No.3, se resumen los valores ejecutados y tramitados a continuación:

Acta Parcial de Obra No. 01	\$ 3.871.706.984,86
Acta Parcial de Obra No. 02	\$ 2.189.615.371,16
Acta Parcial de Obra No. 03 pendiente por pago	\$ 555.129.435,33
TOTAL, EJECUTADO A LA FECHA	\$ 6.616.451.791,35

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	20 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS		ACTAS ANTERIORES		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
Nº	ITEM DE PAGO	UNO	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				\$ 6,591,294,625.64		6,591,294,625.64		\$ 3,871,706,984.86		\$ 2,189,615,371.16		\$ 6,061,322,356.02
	PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE PAGA)				\$ 43,260,000.00		43,260,000.00						
	PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO				\$ 16,897,865.71		16,897,865.71						
	CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES DAGA-1-3-03				\$ 20,000,000.00		20,000,000.00						
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				\$ 85,157,865.71		85,157,865.71						
	GRAN TOTAL				\$ 6,616,451,791.35		\$ 6,616,451,791.35		\$ 3,871,706,984.86	TOTAL	\$ 2,189,615,371.16	TOTAL	\$ 6,061,322,356.02
	PORCENTAJE DE AVANCE								58.52% % PARCIAL		33.09%	% ACUMULADO	91.61%

Resumen tramite acta parcial de obra No 1 y 2.

3.3.5 Actas parciales Contrato de Interventoría.

La Interventoría ALDEIC S.A.S BIC, a fecha de corte del presente informe ha realizado entrega de acta parcial de costos de interventoría No. 2. Del acta parcial de costos de interventoría No. 2, se resumen los valores ejecutados y tramitados a continuación:

BALANCE DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA N° 1698 DE 2024			
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$	548,400,072	
IVA (19%)	\$	104,196,014	
VALOR TOTAL	\$	652,596,086	
ACTA PARCIAL N°01 (agosto/30/2024) - 58,52%		\$ 258,465,130	
IVA (19%)		\$ 49,108,375	
VALOR ACTA PARCIAL N° 01		\$ 307,573,505	
ACTA PARCIAL N°02 (noviembre/22/2024) - 33,09%		\$ 243,924,176.00	
IVA (19%)		\$ 46,345,593	
VALOR ACTA PARCIAL N° 02		\$ 290,269,769	
VALOR ACUMULADO		\$ 597,843,274	91.61%
VALOR POR EJECUTAR		\$ 54,752,812	8.39%
VALOR TOTAL		\$ 652,596,086	100%

Resumen tramite Acta parcial de interventoría No 1 y 2.

3.3.6 Metas físicas, actividades por ejecutar y alcance.

El proyecto contemplo la construcción de un puente sobre el Río Venadillo en los municipios de Venadillo y Ambalema en el departamento del Tolima, accesos al puente, obras de drenajes y construcción de estructura de pavimentos.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	21 de 54    @ gobertolima www.tolima.gov.co

Las actividades ejecutadas comprendieron dos pilares fundamentales, el primero es la construcción de los tramos viales que conectarán la súper estructura a la vía existente, la cual comunica el municipio de Venadillo con el municipio de Ambalema en el departamento del Tolima, para ello se contemplan excavaciones y movimientos de tierra para el cajeo de la vía, a su vez, se requirió realizar la nivelación, compactación y mejoramiento de la subrasante empleando para ello material seleccionado según especificaciones técnicas, de manera seguida se realizará el suministro y colocación de base y subbase en concordancia con lo establecido en diseño de pavimentos, adicionalmente, se realizó la aplicación de emulsión asfáltica y aplicación de mezcla densa en caliente para la construcción de la carpeta asfáltica, además se construyó las obras hidráulicas necesarias para la conducción de aguas producto de precipitaciones de la región.

Por otro lado, se realizaron las labores de excavaciones para la construcción de los cimientos del puente vehicular en concreto reforzado, también se contempló movimientos de materiales de excavación y de relleno en para el aproche del puente, del mismo modo, se contempló la construcción de estructuras en concreto reforzado de resistencias varias, la instalación de estructuras metálicas, drenajes sobre el viaducto y la construcción de una carpeta asfáltica para el paso vehicular, para finalizar con el proceso constructivo del proyecto se instaló las señales de tránsito verticales y horizontales según estudios y diseños.

Con la ejecución de este proyecto se beneficiarán cerca de 19.427 habitantes de los municipios de Venadillo y Ambalema, se minimizo el riesgo de accidentes, una mejor conectividad local, incremento en el turismo, mejora en las condiciones comerciales, es decir municipios más atractivos, con mejor calidad de infraestructura, aumento la productividad, se disminuyó los tiempos de viaje en el servicio público y se redujo los costos de operación que implica beneficio para los empresarios del sector transporte y también para la comunidad en general.

El presente proyecto se justifica debido a que, una vez ejecutada la construcción del puente vehicular, esta actuación contribuye a:

- ✓ El mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes de los municipios de Venadillo y Ambalema.
- ✓ Fortalecer instrumentos que garanticen el manejo y control eficiente del tránsito en los municipios.
- ✓ Potenciar el desarrollo regional a través de una infraestructura de transporte que facilite la movilidad.
- ✓ Generar la comunicación intermunicipal de Ambalema y Venadillo para el transporte, ingreso y egreso de materias primas que generan crecimiento en la economía del departamento.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	22 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

Ítems de pago del contrato de obra:

ÍTEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD
EXPLANACIONES				
1	201.2	Demolición de Estructuras	M3	705,00
2	210.2.1	Excavación en roca de la explanación y canales	m3	202,12
3	210.2.2	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	808,48
PUENTE				
4	600.1.1	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes)	m3	1050,00
5	600.2.4	Excavaciones varias en material común bajo agua	m3	77,61
6	610.2	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	3002,73
7	621.1P	Caissons concreto anillo en concreto clase D y núcleo en concreto clase C, incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	m3	295,07
8	630.3.4P	Concreto clase 35 MPA para tablero	m3	63,25
9	630.3	Concreto Resistencia 28MPa (C)	m3	141,89
10	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	37,93
11	630.5	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	9,00
12	650.2P	Suministro y Fabricación de Estructura Metálica en ASTM A709/ ASTM A588 Grado 50 para vigas y arriostramientos. (incluye transporte)	Kg	64802,67
13	650.2.1P	Suministro y fabricación de láminas de los apoyo de los neoprenos, anclajes de apoyo y baranda, Incluido fabricación, transporte, montaje y pintura donde se requiera.	Kg	963,96
14	650.4	Montaje y Pintura de Estructura Metálica.	Kg	64802,67
15	632P	Barandas metálicas acero A36 y A500-C. Incluido fabricación.	ML	125,70
16	642.2	Juntas de dilatación según diseño.	ML	24,00
17	640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	48596,29
18	673.2	Material Granular Drenante	m3	19,20
19	4P	Drenes PVC para el tablero 4"	u	24,00
20	642.1P	Suministro e instalación de aparatos de apoyos y topes sísmicos en Neopreno dureza 70(60 cm x60 cm x 5 cm reforzado con 2 platinas)	u	6,00
21	642.1.1P	Suministro e instalación de aparatos de apoyos y topes sísmicos en Neopreno dureza 70(20 cm x2 0 cm x 5 cm reforzado con 2 platinas)	u	20,00
22	5P	Bolsacretos de 1.0 m3 c/u.	u	200,00
23	420.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	m2	378,00
24	450.1P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	18,90
25	6P	Prueba de carga	u	1,00
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				
26	310.1	Conformación de la calzada existente	m2	1.024,80
27	330.1	Base granular clase A	m3	215,14
28	673.1.1	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	1.024,80
29	320.1	Subbase granular clase A	m3	215,14
PAVIMENTOS ASFALTICOS				
30	420.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	m2	1.024,80
31	450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	139,85
DRENAJES				
32	600.2.3P	Excavaciones varias en material común en seco a mano	m3	117,30
33	630.4	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	110,00
34	640.1	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	3.551,12

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	23 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

ÍTEM	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UN	CANTIDAD
35	671.3P	Cuneta de Concreto clase D Vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo,	m3	26,88
36	673.2	Material Granular Drenante	m3	168,00
37	663,1P	Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4"	m	336,00
38	673.1.1	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	1.008,00
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD				
39	700.1	Líneas de Demarcación con pintura en frio	m	693,00
40	701.1	Tacha Reflectiva	u	173,00
41	710.1	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	u	4,00

4. INFORMACION TECNICA

4.1 SEGUIMIENTO CRONOGRAMA DE OBRA


Según el cronograma de obra presentado por el contratista de obra, una vez se realiza la reprogramación de obra con el adicional de tiempo para completar las labores a un plazo de siete (07) meses el cual es aprobado por la interventoría del contrato; en el presente periodo de reporte el avance se ilustra a continuación:

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC		Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.		<div>24 de 54</div> <div>    </div> <div> @ gobertolima www.tolima.gov.co </div>

DESCRIPCION	UN	CANTIDAD	VR UNITARIO	VR.TOTAL	PROGRAMADO 11/10/24 AL 10/12/24	EJECUTADO ACUM 11/10/24 AL 10/11/24	PROGRAMADO 11/11/24 AL 10/12/24	EJECUTADO ACUM 11/11/24 AL 10/12/24
EXPLANACIONES								
Demolición de Estructuras	M3	705.00	\$ 261,602.00	\$ 184,429,410.00	\$ 23,544,180.00 0.36%	\$ 184,429,410.00 2.79%		\$ 184,429,410.00 2.79%
Excavación en roca de la explanación y canales	m3	202.12	\$ 148,144.00	\$ 29,942,865.28		\$ 29,942,865.28 0.45%		\$ 29,942,865.28 0.45%
Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3	808.48	\$ 48,706.00	\$ 39,377,826.88		\$ 39,377,826.88 0.60%		\$ 39,377,826.88 0.60%
SUBTOTAL EXPLANACIONES				\$ 253,750,102.16				
PUENTE								
Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes)	m3	1050.00	\$ 72,128.00	\$ 75,734,400.00		\$ 75,734,400.00 1.14%		\$ 75,734,400.00 1.14%
Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3	77.61	\$ 79,492.00	\$ 6,169,374.12		\$ 6,169,374.12 0.09%		\$ 6,169,374.12 0.09%
Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3	3002.73	\$ 137,279.00	\$ 412,211,771.67		\$ 412,211,771.67 6.23%	\$ 412,211,771.67 6.23%	\$ 412,211,771.67 6.23%
Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	m3	295.07	\$ 5,194,792.00	\$ 1,532,852,106.55		\$ 1,532,852,106.55 23.17%		\$ 1,532,852,106.55 23.17%
Concreto clase 35 MPA para tablero	m3	63.25	\$ 1,843,684.00	\$ 116,613,013.00			\$ 116,613,013.00 1.76%	\$ 116,613,013.00 1.76%
Concreto Resistencia 28MPa (C)	m3	141.89	\$ 1,529,279.00	\$ 216,989,397.31	\$ 41,405,228.93 0.63%			\$ 216,989,397.31 3.28%
Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	37.93	\$ 1,320,580.00	\$ 50,089,599.40				\$ 50,089,599.40 0.76%
Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3	9.00	\$ 842,321.00	\$ 7,580,889.00				\$ 7,580,889.00 0.11%
Suministro y Fabricación de Estructura Metálica en ASTM A709/ ASTM A588 Grado 50 para vigas y arriostramientos . (incluye transporte)	Kg	64802.67	\$ 26,732.00	\$ 1,732,304,974.44		\$ 1,732,304,974.44 26.18%		\$ 1,732,304,974.44 26.18%
Suministro y fabricacion de láminas de los apoyo de los neoprenos, anclajes de apoyo y baranda, incluido fabricación, transporte, montaje y pintura donde se requiera.	Kg	963.96	\$ 31,437.00	\$ 30,304,010.52				\$ 30,304,010.52 0.46%
Montaje y Pintura de Estructura Metálica.	Kg	64802.67	\$ 5,671.00	\$ 367,495,941.57		\$ 183,747,970.79 2.78%		\$ 367,495,941.57 5.56%
Barandas metálicas acero A36 y A500-C. Incluido fabricación.	ML	125.70	\$ 722,716.00	\$ 90,845,401.20				\$ 90,845,401.20 1.37%
Juntas de dilatación según diseño.	ML	24.00	\$ 456,196.00	\$ 10,948,704.00			\$ 10,948,704.00 0.17%	\$ 10,948,704.00 0.17%
Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	48596.29	\$ 12,285.00	\$ 597,005,422.65	\$ 149,251,355.68 2.26%	\$ 381,270,626.10 5.76%		\$ 597,005,422.65 9.02%
Material Granular Drenante	m3	19.20	\$ 197,303.00	\$ 3,788,217.60				\$ 3,788,217.60 0.05%
Drenes PVC para el tablero 4"	u	24.00	\$ 16,516.00	\$ 396,384.00			\$ 396,384.00 0.03%	\$ 396,384.00 0.03%
Suministro e instalacion de aparatos de apoyos y topes sísmicos en Neopreno dureza 70(60 cm x60 cm x 5 cm reforzado con 2 platinas)	u	6.00	\$ 1,592,408.00	\$ 9,554,448.00				\$ 9,554,448.00 0.14%
Suministro e instalacion de aparatos de apoyos y topes sísmicos en Neopreno dureza 70(20 cm x2 0 cm x 5 cm reforzado con 2 platinas)	u	20.00	\$ 1,194,726.00	\$ 23,894,520.00				\$ 23,894,520.00 0.36%
Bolsacretos de 1.0 m3 c/u.	u	200.00	\$ 1,084,134.00	\$ 216,826,800.00		\$ 175,629,708.00 2.65%	\$ 108,413,400.00 1.64%	\$ 216,826,800.00 3.28%
Riego de imprimación con emulsion asfaltica CRL-0	m2	378.00	\$ 4,763.00	\$ 1,800,414.00				\$ 1,800,414.00 0.02%
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	18.90	\$ 1,520,546.00	\$ 28,738,319.40				\$ 28,738,319.40 0.44%
Prueba de carga	u	1.00	\$ 121,615,000.00	\$ 121,615,000.00				\$ 121,615,000.00 18.88%
SUBTOTAL PUENTE				\$ 5,653,759,108.43				
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS								
Conformación de la calzada existente	m2	1,024.80	\$ 2,259.61	\$ 2,315,644.95	\$ 2,315,644.95 0.03%			\$ 2,315,644.95 0.03%
Base granular clase A	m3	215.14	\$ 220,669.20	\$ 47,474,771.98	\$ 47,474,771.98 0.72%			\$ 47,474,771.98 0.72%
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	1,024.80	\$ 13,813.03	\$ 14,155,594.89	\$ 14,155,594.89 0.21%			\$ 14,155,594.89 0.21%
Subbase granular clase A	m3	215.14	\$ 186,371.34	\$ 40,095,929.88	\$ 40,095,929.88 0.61%			\$ 40,095,929.88 0.61%
SUBTOTAL BASES				\$ 104,041,941.69				
PAVIMENTOS ASFALTICOS								
Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	m2	1,024.80	\$ 4,763.66	\$ 4,881,798.31				\$ 4,881,798.31 0.07%
Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	139.85	\$ 1,457,974.13	\$ 203,897,682.16				\$ 203,897,682.16 3.12%
SUBTOTAL PAVIMENTOS				\$ 208,779,480.47				
DRENAJES								
Excavaciones varias en material común en seco a mano	m3	117.30	\$ 103,795.97	\$ 12,175,267.30			\$ 12,175,267.30 0.18%	\$ 12,175,267.30 0.18%
Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	110.00	\$ 1,320,580.80	\$ 145,263,888.06				\$ 145,263,888.06 2.24%
Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	3,551.12	\$ 12,285.55	\$ 43,627,452.73				\$ 43,627,452.73 0.67%
Cuneta de Concreto clase D Vacuada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo.	m3	26.88	\$ 1,444,276.63	\$ 38,822,155.90				\$ 38,822,155.90 0.59%
Material Granular Drenante	m3	168.00	\$ 197,303.31	\$ 33,146,956.32			\$ 33,146,956.32 0.50%	\$ 33,146,956.32 0.50%
Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4"	m	336.00	\$ 44,753.17	\$ 15,037,064.90			\$ 15,037,064.90 0.23%	\$ 15,037,064.90 0.23%
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	1,008.00	\$ 13,813.03	\$ 13,923,535.95			\$ 13,923,535.95 0.21%	\$ 13,923,535.95 0.21%
SUBTOTAL DRENAJES				\$ 301,996,321.15				
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD								
Líneas de Demarcación con pintura en frio	m	693.00	\$ 3,929.38	\$ 2,723,060.79				\$ 2,723,060.79 0.41%
Tacha Reflectiva	u	173.00	\$ 19,471.78	\$ 3,368,617.53				\$ 3,368,617.53 0.51%
Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	u	4.00	\$ 719,064.59	\$ 2,876,258.36				\$ 2,876,258.36 0.43%
SUBTOTAL SEÑALIZACION				\$ 8,967,936.69				
SUBTOTAL OBRAS				\$ 6,531,294,890.59	\$ 276,837,477.40	\$ 4,795,076,262.75	\$ 722,866,097.25	\$ 6,061,347,452.07
VALOR TOTAL OBRAS				\$ 6,531,294,890.59	\$ 276,837,477.40			
PAGA		NO MODIFICAR		\$ 48,260,000.00	\$ 6,894,285.71 0.10%	\$ 41,365,714.29 0.63%	\$ 6,894,285.71 0.10%	\$ 48,260,000.00 0.74%
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO (PMT)		NO MODIFICAR		\$ 16,897,165.71	\$ 2,413,880.82 0.04%	\$ 14,483,284.90 0.22%	\$ 2,413,880.82 0.04%	\$ 16,897,165.71 0.25%
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES DAGA -1-3-03		NO MODIFICAR		\$ 20,000,000.00	\$ 2,857,142.86 0.04%	\$ 17,142,857.14 0.26%	\$ 2,857,142.86 0.04%	\$ 20,000,000.00 0.30%
VALOR TOTAL OBRA				\$ 6,616,452,056.30	\$ 289,002,786.79		\$ 735,031,406.64	
PORCENTAJE TOTAL				76.66%	4.37%	73.58%	11.11%	91.61%

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	25 de 54    @ gobertolima www.tolima.gov.co

4.2 INFORME DE AVANCE DE ACTIVIDADES PROGRAMADAS Y EJECUTADAS

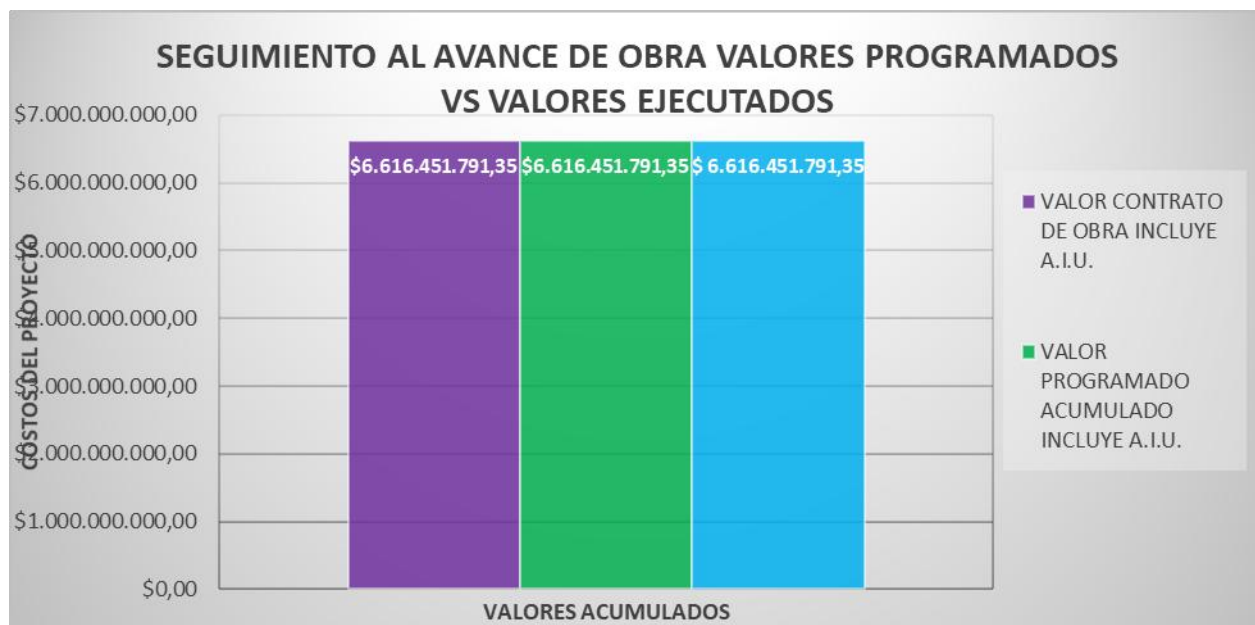

VALOR CONTRATO DE OBRA INCLUYE A.I.U.	\$ 6.616.451.791,35	100%
VALOR TOTAL PROGRAMADO INCLUYE A.I.U.	\$ 6.616.451.791,35	100%
VALOR TOTAL EJECUTADO INCLUYE A.I.U.	\$ 6.616.451.791,35	100%

Con corte al 25 de enero del 2025, de acuerdo a la reprogramación de obra entregada por el contratista de obra, y al seguimiento de ejecución de las actividades de obra por parte de la interventoría; se informa que se tiene un porcentaje programado acumulado de **100.00%** y el contratista de obra **CONSORCIO PUENTE AMBALEMA – PALOBAYO** ha ejecutado el **100.00%** del valor total del contrato de obra, lo que representa un avance parcial del **100.0%**, respecto a la ejecución de actividades que integran la programación de obra suministrado por el contratista.

El avance presentado dentro de las actividades de obra según el cronograma de obra aprobado por la interventoría, obedece a que se han realizado actividades de montaje y pintura de la estructura metálica, vaciados de concretos de 14Mpa, 21Mpa, 28Mpa y 35Mpa, amarre de acero de refuerzo de fy 4200Mpa, suministro e instalación de neoprenos, suministro e instalación de geotextil no tejido, material drenante, Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4", conformación de calzada, suministro e instalación de material de subbase y base granular.

4.3 CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO

En el Anexo No. 07, se relaciona el estado del tiempo presentado durante las actividades ejecutadas durante el periodo reportado en el presente informe.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	26 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

4.4 DESCRIPCIÓN RESUMIDA DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS Y ACUMULADAS EN EL PERIODO

En el presente mes de reporte, la Interventora desarrolló labores de supervisión, revisión y control, de acuerdo a las funciones de seguimiento a las actividades de obra ejecutadas por el Contratista en el sitio de obras (ver preacta de obra); las cuales se relacionan a continuación:

CONDICIONES ORIGINALES						
				PRESENTE ACTA No 3		ACUMULADO FINAL
Nº	ITEM DE PAGO	UND	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EXPLANACIONES						
1,1	Demolición de Estructuras	m3			705,00	\$ 184.429.410,00
1,2	Excavación en roca de la explanación y canales	m3			202,12	\$ 29.942.865,28
1,3	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3			808,48	\$ 39.377.826,88
SUBTOTAL						\$ 253.750.102,16
PUENTE						
2,1	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes)	m3			1.050,00	\$ 75.734.400,00
2,2	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3			77,61	\$ 6.169.374,12
2,3	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3			3.002,73	\$ 412.211.506,72
2,4	Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	m3			295,07	\$ 1.532.852.106,55
2,5	Concreto clase 35 MPA para tablero	m3			63,25	\$ 116.613.013,00
2,6	Concreto Resistencia 28MPa (C)	m3			141,89	\$ 216.989.397,31
2,7	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3			37,93	\$ 50.089.599,40
2,8	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3			9,00	\$ 7.580.889,00
2,9	Suministro y Fabricación de Estructura Metálica en ASTM A709/ ASTM A588 Grado 50 para vigas y arriostramientos . (incluye transporte)	Kg			64.802,67	\$ 1.732.304.974,44
2,10	Suministro y fabricacion de láminas de los apoyo de los neoprenos, anclajes de apoyo y baranda, Incluido fabricación, transporte, montaje y pintura donde se requiera.	Kg			963,96	\$ 30.304.010,52
2,11	Montaje y Pintura de Estructura Metálica.	Kg			64.802,67	\$ 367.495.941,57
2,12	Barandas metálicas acero A36 y A500-C. Incluido fabricación.	ML			125,70	\$ 90.845.401,20
2,13	Juntas de dilatación según diseño.	ML	12,00	\$ 5.474.352,00	24,00	\$ 10.948.704,00
2,14	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg			48.596,29	\$ 597.005.422,65


INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	27 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

2,1 5	Material Granular Drenante	m3	19,20	\$ 3.788.217,60	19,20	\$ 3.788.217,60
2,1 6	Drenes PVC para el tablero 4"	u	24,00	\$ 396.384,00	24,00	\$ 396.384,00
2,1 7	Suministro e instalacion de aparatos de apoyos y topes sismicos en Neopreno dureza 70(60 cm x60 cm x 5 cm reforzado con 2 platinas)	u			6,00	\$ 9.554.448,00
2,1 8	Suministro e instalacion de aparatos de apoyos y topes sismicos en Neopreno dureza 70(20 cm x2 0 cm x 5 cm reforzado con 2 platinas)	u			20,00	\$ 23.894.520,00
2,1 9	Bolsacretos de 1.0 m3 c/u.	u			200,00	\$ 216.826.800,00
2,2 0	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-0	m2	378,00	\$ 1.800.414,00	378,00	\$ 1.800.414,00
2,2 1	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	18,90	\$ 28.738.319,40	18,90	\$ 28.738.319,40
2,2 2	Prueba de carga	u	1,00	\$ 121.615.000,00	1,00	\$ 121.615.000,00
SUBTOTAL				\$ 161.812.687,00		\$ 5.653.758.843,48
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
3,1	Conformación de la calzada existente	m2			1.024,80	\$ 2.315.644,95
3,2	Base granular clase A	m3			215,14	\$ 47.474.771,98
3,3	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2			1.024,80	\$ 14.155.594,89
3,4	Subbase granular clase A	m3			215,14	\$ 40.095.929,88
SUBTOTAL						\$ 104.041.941,69
PAVIMENTOS ASFALTICOS						
4,1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	m2	1.024,80	\$ 4.881.798,31	1.024,80	\$ 4.881.798,31
4,2	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	139,85	\$ 203.897.682,16	139,85	\$ 203.897.682,16
SUBTOTAL				\$ 208.779.480,47		\$ 208.779.480,47
DRENAJES						
5,1	Excavaciones varias en material común en seco a mano	m3	47,30	\$ 4.909.549,39	117,30	\$ 12.175.267,30
5,2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	40,00	\$ 52.823.232,02	110,00	\$ 145.263.888,06
5,3	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	651,12	\$ 7.999.365,56	3.551,12	\$ 43.627.452,73
5,4	Cuneta de Concreto clase D Vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo,	m3	8,88	\$ 12.825.176,50	26,88	\$ 38.822.155,90
5,5	Material Granular Drenante	m3	32,00	\$ 6.313.705,96	168,00	\$ 33.146.956,32
5,6	Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4"	m	64,00	\$ 2.864.202,84	336,00	\$ 15.037.064,90
5,7	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	192,00	\$ 2.652.102,09	1.008,00	\$ 13.923.535,95
SUBTOTAL				\$ 90.387.334,36		\$ 301.996.321,15
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						
6,1	Líneas de Demarcación con pintura en frio	m	693,00	\$ 2.723.060,79	693,00	\$ 2.723.060,79
6,2	Tacha Reflectiva	u	173,00	\$ 3.368.617,53	173,00	\$ 3.368.617,53


INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	28 de 54    @ gobertolima www.tolima.gov.co

6,3	Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	u	4,00	\$ 2.876.258,36	4,00	\$ 2.876.258,36
SUBTOTAL				\$ 8.967.936,69		\$ 8.967.936,69
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)				\$ 469.947.438,52		\$ 6.531.294.625,64
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE PAGA)				\$ 48.260.000,00		\$ 48.260.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				\$ 16.897.165,71		\$ 16.897.165,71
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES DAGA - 1.3-03				\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				\$ 85.157.165,71		\$ 85.157.165,71
GRAN TOTAL			TOTAL	\$ 555.104.604,23	TOTAL	\$ 6.616.451.791,35
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO MES 7 Y ACUMULADO			% PARCIAL	8,39%	% ACUMULADO	100,00%

- Concreto Resistencia 28MPa (C):** En el presente periodo se culminó con la construcción de la viga de amarre de las pilas de estribo, vigas de aproche, losas de aproche y losas de acceso en los costados de Ambalema y Palobayo.

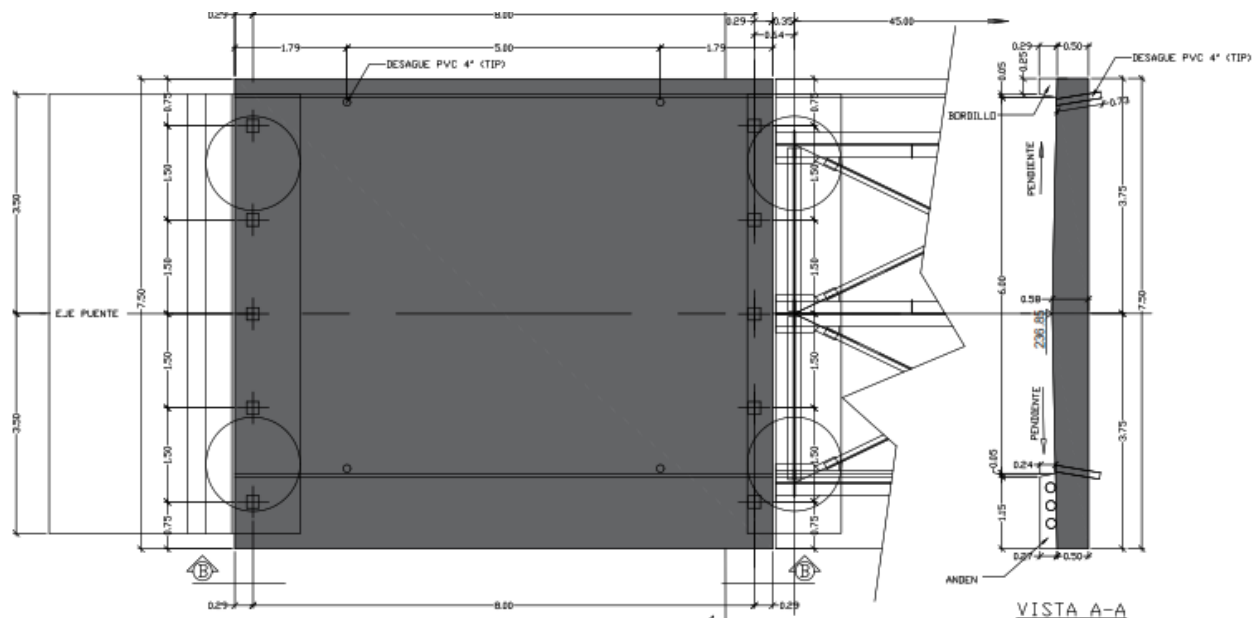

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	29 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

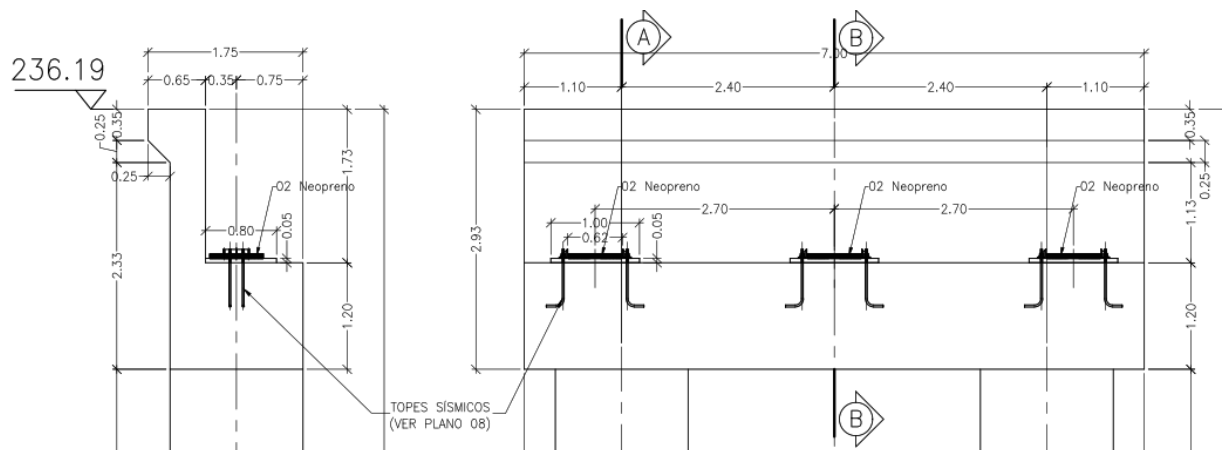

- **Concreto Resistencia 35MPa (C):** Se realizó el vaciado de concreto para la loza del puente según las especificaciones observadas en la planimetría.



Figura No. 5. Placas de acceso a puente y terminación mediante aplicación asfalto MDC.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	30 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

- **Concreto Resistencia 21MPa (C).:** En el presente periodo se realiza la construcción de andenes y bordillos a lo largo del puente metálico y las losas de aproke.

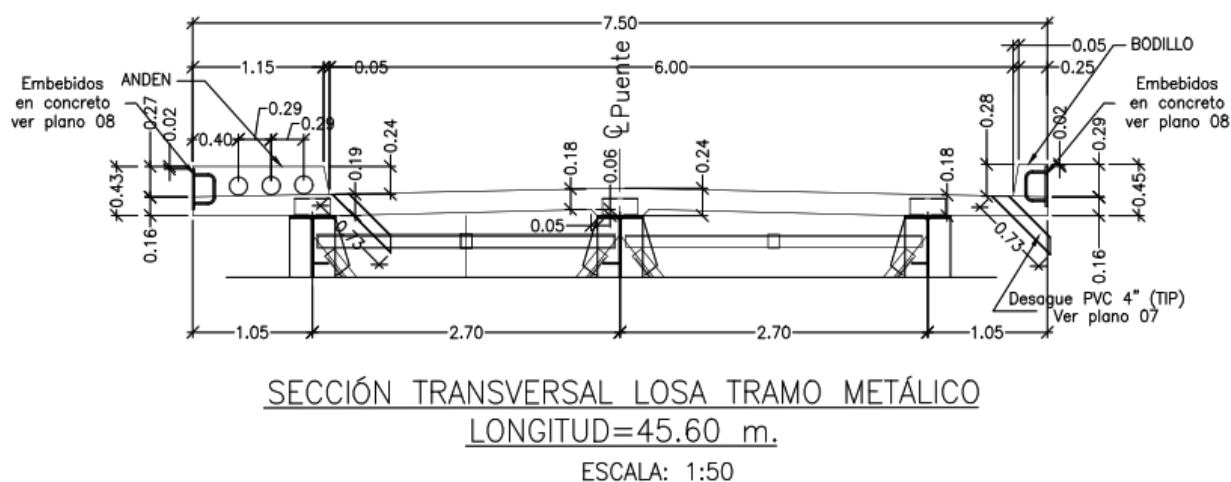


Figura No. 6. Ejecución andenes sobre puente vs terminados actuales a terminación contractual.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	31 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

- **Rellenos Para Estructuras con Recebo.:** En el periodo de este informe se culminó el relleno con material de recebo en ambos costados, para dar inicio a las actividades de instalación de material granular.

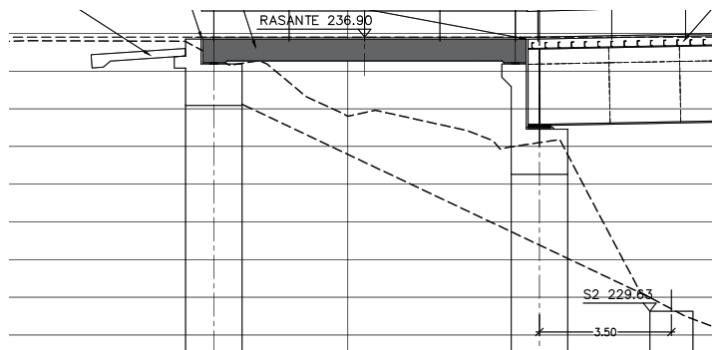


Figura No. 7. Ejecución rellenos y concretos sobre taludes puente.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	32 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

- Montaje y Pintura de Estructura Metálica.:** En el periodo en mención se ejecutaron actividades de montaje de riostras, rigidizadores, topes sísmicos y separadores para la loza de concreto que va sobre la estructura metálica.


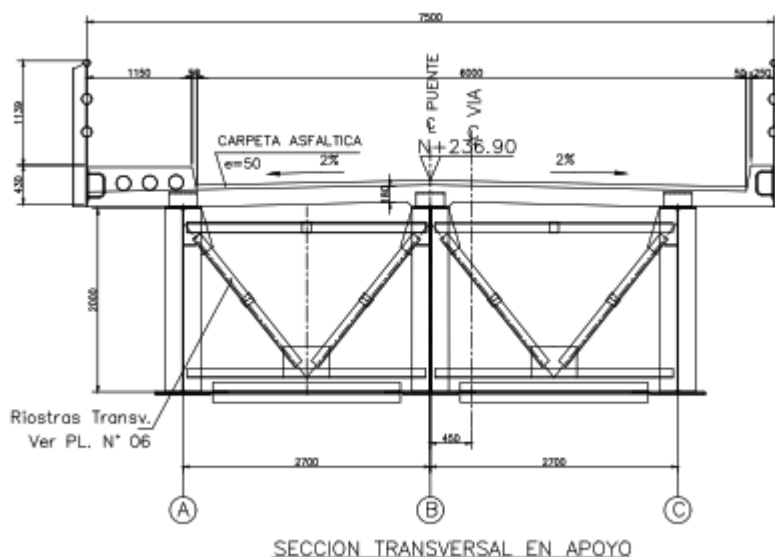


Figura No. 8. Ejecución soporte metálico placa de concreto puentes estado final ejecución contractual.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	33 de 54    @ gobertolima www.tolima.gov.co

- **Acero de Refuerzo F_y 4200 MPa.:** esta actividad se realizó en el presente periodo con el suministro, e instalación de acero de refuerzo en la construcción de aproches en ambos costados del puente y a lo largo de la estructura metálica para la loza del puente.

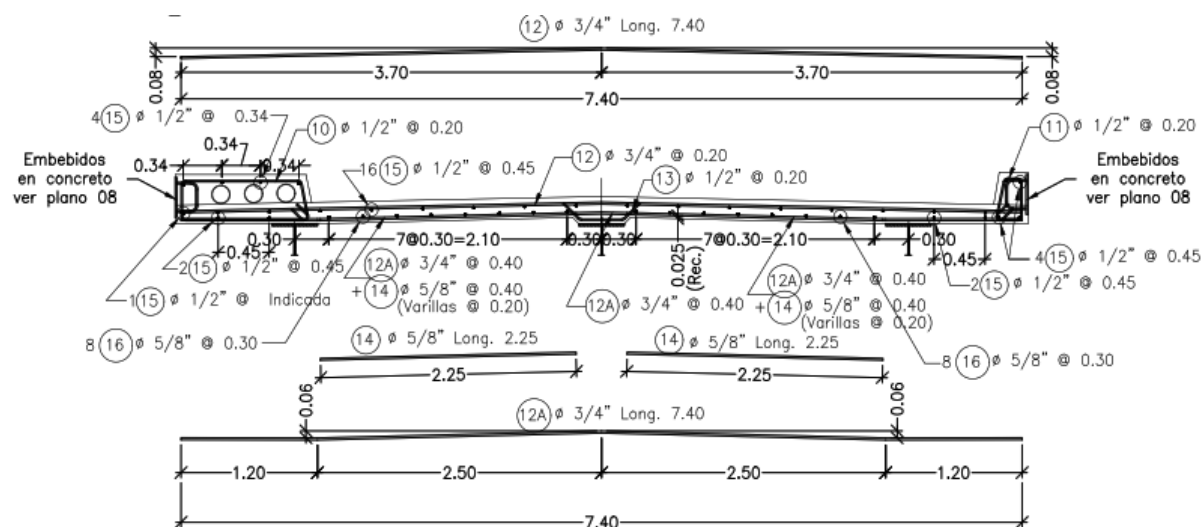

REFUERZO TRANSVERSAL TÍPICO LOSA (LOS)

ESCALA: 1:50



Figura No. 9. acero placa sobre estructura metálica.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	34 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

- Construcción de filtro longitudinal - Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido, Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4" y Material Granular Drenante:** En el presente periodo se realiza excavación mecánica, instalación de geotextil, tubería perforada y suministro e instalación de material granular drenante para filtro longitudinal, en ambos costados de la vía, así como en el tramo de Ambalema y de Palobayo.

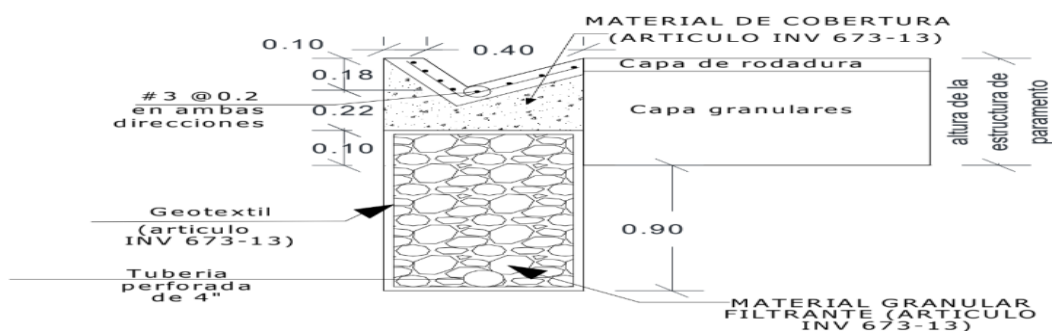
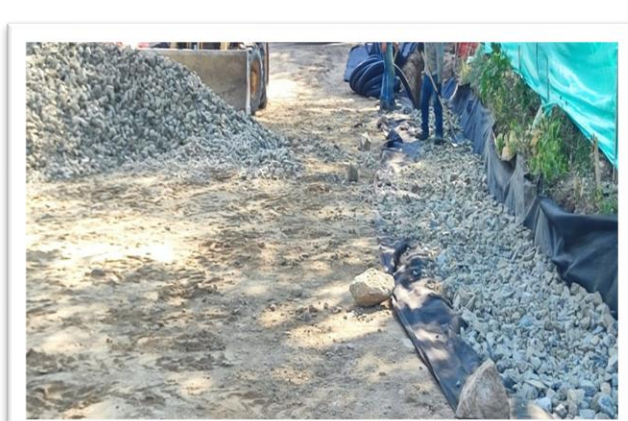


Figura No. 10. ejecución de drenes en acceso y salida puente.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	35 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

- ***Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0***



Figura No. 11. imprimación sobre loza de puente.

- ***Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25.***



Figura No.12. aplicación MDC.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	36 de 54    @ gobertolima www.tolima.gov.co

- ***Prueba de carga.***



Figura No. 13. Prueba de carga interventoría y contratista.

- ***Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0.***



Figura No. 14. Imprimacion acceso y salida puente.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	37 de 54    @ gobertolima www.tolima.gov.co

- **Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19.**



Figura No. 15. Aplicación de MDC.

- **Concreto Resistencia 21MPa (D).**



Figura No. 16. Concretos para revestimientos de taludes en puente.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	38 de 54    @ gobertolima www.tolima.gov.co

- ***Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.***



Figura No. 17. Aceros de refuerzo en cunetas longitudinales acceso y salida puente.

- ***Líneas de Demarcación con pintura en frio.***



Figura No. 18. demarcación pintura en frio acceso y salida puente.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	39 de 54    @ gobertolima www.tolima.gov.co

- **Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm**



Figura No. 19. Señalización vertical de vía.

- **Obras varias:** desmonte de obras provisionales, limpieza de zona de afectación obras, actividades del PMT, PAGA y demás

4.5 ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA

De manera general, la Interventoría en cumplimiento de sus obligaciones contractuales desarrolla las siguientes labores:

- Consignación y registro de la información de la ejecución de la obra en los diferentes formatos destinados para tal fin.
- Vigilancia y velación por la buena y óptima calidad de los materiales utilizados en la construcción de la obra contratada.
- Diligenciamiento en conjunto con el contratista la bitácora de obra y presentación de registros fotográficos que evidencie las actividades de obra.
- Desarrollo de reuniones y/o comités de obra para analizar y revisar temas en todos los componentes involucrados en la etapa de construcción.
- Seguimiento al cronograma de la etapa de construcción y Flujo Financiero del proyecto.
- Seguimiento a las diferentes actividades contractuales para los diferentes frentes de obra.
- Elaboración informe mensual de Interventoría.
- El personal de especialistas de la interventoría ha realizado acompañamiento en la etapa de obra; conceptualizando diversos documentos técnicos que conforman el proyecto y proyectando solicitudes al contratista para el complemento de información técnica requerida en desarrollo de las actividades de obra.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	40 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

4.6 DESCRIPCION Y REGISTRO FOTOGRAFICO

En el Anexo No. 08 se relaciona el registro fotográfico Técnico y SST, reporte el cual contiene las actividades realizadas durante el periodo reportado.

4.7 CONTROL E INSPECCIÓN Y ENSAYOS

En el presente periodo la interventoría del contrato de obra, ha realizado ensayos de resistencia a la compresión en los concretos clase C empleados en la construcción de las vigas de amarre de las pilas tanto para el estribo como para las vigas de soporte de aproche. Los resultados de laboratorio se presentan en el anexo No. 4. A medida de que avancen las labores de construcción y se presenten actividades de obra que requieran ensayos de laboratorio serán realizadas bajo las normas y especificaciones del INVIAS 2013, Normas Técnicas Colombianas (NTC) y Código Colombiano de Puentes – CCP-14, considerando lo establecido en el Artículo Primero de la Resolución 108 del 26 de enero de 2015, por la cual se actualiza el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y se adopta como “Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14; se determinó por parte de la Interventoría y el Contratista, para el recibo de las obras, realizar los trabajos de control de calidad haciendo las pruebas y ensayos de manera conjunta en los mismos sitios.

En el Anexo No. 04 se relaciona el resumen y resultados de los ensayos de laboratorio con el que ha contado la Interventoría durante el periodo comprendido.

CALIFICACIÓN Y CALIDAD DE LOS PROCEDIMIENTOS Y MATERIALES DE TRABAJO.

Los estándares de Calidad se supervisan bajo los parámetros descritos en las Normas y Especificaciones del INVIAS, Norma NSR-10, CCP14, guía de manejo de tránsito, guía para la presentación de resultados de ensayos de materiales empleados en obra, así como de las normas que modifiquen, complementen, sustituyan o adicionen la normatividad técnica y todos los estudios y diseños particulares de este proyecto.

4.8 CALIFICACION DE PERSONAL, MATERIALES Y MAQUINARIA Y EQUIPOS:

4.8.1 Personal

Los profesionales vinculados en obra por el contratista CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO; fueron presentados y posteriormente aprobados por la interventoría mediante comunicados C–285-0014-0016-24 del 28-jun-2024 y C–285-0017-0019-24 del 4-jul-2024.

De acuerdo a lo anterior informamos que el personal ofrecido por el contratista CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO, para el cumplimiento de las Actividades objeto del contrato de obra es el Idóneo, optimo y con los conocimientos técnicos para la labor que desarrollan. Según lo anterior se cumple con lo establecido en el contrato y/o los documentos anexos o asociados del contrato de obra.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	41 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

4.8.2 Materiales

Es responsabilidad del constructor CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO informar sobre la disponibilidad de las fuentes de los materiales necesarios para la ejecución de la obra y/o adquirirlos de proveedores debidamente legalizados; mantener en el sitio de obra la cantidad de material suficiente para evitar atrasos con el cronograma de obra.

El contratista ha ejecutado actividades de demolición y excavación, en cuanto al empleo de materiales de arrastre empleado en concretos, el contratista allegó información sobre la empresa proveedora de materiales granulares que corresponde a Triturados y Vías La Caima S.A.S para la actividad de concretos de anillos de caisson y concretos para vigas de amarre ménsulas y demás elementos de la superestructura.

4.8.3 Maquinaria Y Equipos

Los equipos que vienen siendo utilizados por el contratista CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO son relacionados en el Anexo No. 5 Control del Equipo de Obra del Contratista. Estos equipos son los requeridos en la ejecución de las obras correspondientes y serán sometidos periódicamente a revisiones y mantenimiento por parte de supervisores y personal técnico del CONTRATISTA DE OBRA, y el área de Salud y Seguridad en el Trabajo.

4.9 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TECNICAS.

El objeto del contrato sometido a seguimiento y control por parte de esta Interventoría, se viene cumpliendo de acuerdo a lo estipulado en el Contrato de Obra No. 1665 DE 2024 en los respectivos pliegos de condiciones, las especificaciones técnicas referenciadas en la propuesta del contratista y el cronograma de ejecución de obra. Se verifica el cumplimiento de los parámetros contenidos en las Normas y Especificaciones del INVIAS, Normas Técnicas Colombianas (NTC) y el Código Colombiano de Puentes – CCP-14, considerando lo establecido en el Artículo Primero de la Resolución 108 del 26 de enero de 2015, por la cual se actualiza el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes y se adopta como “Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP-14.

Por otra parte, en comunicado CA–285-0035-0077-24 del 04-sep-2024 se realiza por parte de la interventoría *“Solicitud técnica – Concepto del Proceso de colocación del concreto del núcleo, fuste o cuerpo de caisson.”*, lo anterior, debido a la carencia de la especificación técnica 621.1P de la actividad contractual *“Caissons concreto anillo en concreto clase D y núcleo en concreto clase C incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)”*; en atención a la solicitud realizada por la interventoría el contratista emite concepto el día 10-sep-2024 *“Concepto Geotécnico Para Colocación De Concreto.”*, avalado por el especialista en geotecnia para los caisson del costado Ambalema, quedando pendiente el concepto estructural del proceso de colocación del concreto del fuste, núcleo o cuerpo del caisson que a la fecha de este informe aún no se ha presentado formalmente a esta interventoría acertando que es un compromiso reiterado en el comité de obra del día 10 de octubre de 2024.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	42 de 54    @ gobertolima www.tolima.gov.co

4.10 GESTIONES ADELANTADAS ANTE ENTIDADES PUBLICAS POR EL CONTRATISTA E INTERVENTORIA.

El pasado 26-jun-2024 el contratista de obra CONSORCIO PUENTE AMBALEMA – PALOBAYO, envió comunicado a la interventoría informando sobre *“Paso De Los Habitantes Del Sector Por La Zona De Construcción Del Puente”*; atendiendo la solicitud del contratista, la interventoría realizado el traslado de su comunicado e informo a las diversas entidades públicas: Alcaldía Municipal de Ambalema (SECRETARIA GENERAL Y DE GOBIERNO - Gestión en Ambiente y Gestión del Riesgo "CMGRD"), Alcaldía Municipal de Venadillo (SECRETARIA DE DESARROLLO AGROPECUARIO MEDIO AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO) y a la SECRETARIA DEL AMBIENTE Y GESTIÓN DEL RIESGO - Dirección De Gestión y Riesgo De Desastres de la Gobernación del Tolima; dado a que la comunidad de la zona de influencia del proyecto NO ha respetado los cierres realizados por la construcción del puente, haciendo caso omiso a la señalización y pasando por la zona cruzando el rio en vehículos (carros y motos), caminando por el rio o por la estructura metálica (puente férreo) que se encuentra en el lateral derecho del puente objeto de intervención en sentido Palobayo – Ambalema y recientemente en una balsa improvisada construida por integrantes de la misma comunidad tal como lo informa el contratista de obra en su oficio del 26-jun-2024 dirigido a la interventoría.

Según lo anterior, se solicitó a las entidades y/o autoridades correspondientes se tomen las medidas pertinentes para reducir riesgos y evitar consecuencias lamentables físicas o materiales originados por el paso imprudente de la comunidad por el sector donde se ejecutan las obras del contrato.

4.11 PLAN DE MANEJO DE TRANSITO, SEÑALIZACIÓN Y DESVIOS

En oficio CA-285-0006-0006-24 del 14-jun-2024 fue solicitado al Contratista de obra CONSORCIO PUENTE AMBALEMA – PALOBAYO, según lo descrito en el pliego de condiciones del contrato de obra *“CAPITULO VIII MINUTA Y CONDICIONES DEL CONTRATO Numeral 8.1. INFORMACION PARA EL CONTROL DE LA OBRA”*; para revisión y aprobación el Plan de Manejo del Tránsito. El contratista en atención al oficio en mención radico el 26-jul-2024 mediante correo electrónico denominado *“entrega de pmt para revisión y aprobación”*. El documento PMT presentado por el contratista se le generaron observaciones por parte de interventoría relacionadas en el comunicado C-285-0027-0044-24 del 02-ago-2024; por lo anterior, se informa que a fecha de corte del presente informe el contratista de sigue sin presentar el documento de atención a las observaciones soportado y hablado en el comité de obra y especialistas del día 08 de octubre de 2024.

Por otra parte, en obra se evidencia la instalación de señales de obra preventivas, instalación de pasacalles con información acertada del cierre del tramo vial, colocación de barreras plásticas (maletines), polisombra de color verde, delineadores tubulares con cinta de peligro, al igual que la instalación de la valla informativa del proyecto.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	43 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

4.12 BITÁCORA DE OBRA

En el Anexo No. 09 se relaciona bitácora de obra.

4.13 ACTAS DE COMITÉ DE OBRA

En el presente periodo se realiza comité de obra en la zona donde se ejecutan las labores de obra; con el ánimo de revisar los avances de la obra y abordar diversos temas relacionados con la ejecución de las obras contratadas para la construcción del puente sobre el Rio Venadillo; contando con la asistencia del personal profesional, como de especialistas en el campo por parte de la Interventoría y el personal profesional delegado por parte del contratista de obra.

4.14 CONTROL ADMINISTRATIVO

4.14.1 Personal del Contratista

En el Anexo No. 02, se relaciona el personal con el que el Contratista de obra contó durante el periodo comprendido.

4.14.2 Personal de la Interventoría

En el Anexo No. 03, se relaciona el personal con el que ha contado la Interventoría durante el periodo comprendido.

4.14.3 Control e inspección y ensayos

En el Anexo No. 04 se relaciona el resumen y resultados de los ensayos de laboratorio con el que ha contado la Interventoría durante el periodo comprendido.

4.14.4 Control de equipos utilizados en obra

En el Anexo No. 05, se relaciona el seguimiento a los equipos dispuestos en el frente de obra por el Contratista durante el periodo comprendido.

4.14.5 Control del estado del tiempo

En el Anexo No. 06, se relaciona el estado del tiempo presentado durante las actividades ejecutadas durante el periodo reportado en el presente informe.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	44 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- mediante el presente informe mensual de No 07, en donde se plasma las actividades de obra ejecutadas durante toda la ejecución de obra se evidencia la ejecución del 100% de ejecución llegando a entera ejecución contractual, por lo cual se procederá a la realización de las actas de finalización, recibo a satisfacción y de liquidación de los contratos tanto de obra como de interventoría.
- Se deberá adelantar la entrega de los paz y salvo de proveedores, como así las actas vecindad de cierre y demás cierres de permisos ambientales que fue objeto durante la ejecución contractual.
- Previo recibo a la comunidad se deberá hacer entrega de las obras a la gobernación del Tolima, mediante la suscripción de acta de entrega y recibo final para así iniciar la actualización de las pólizas que surgieron de los contratos celebrados del presente objeto contractual.
- Se deberá adelantar los cierres ambientales ante las corporaciones ambientales correspondientes.
- se tendrá en cuenta las correspondientes recomendaciones del contratista para el mantenimiento y conservación de las obras entregadas a la gobernación del Tolima y comunidad.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	45 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y SG-SST

CONTRATO 1698 - 2024

PERIODO: 11/12/2024 AL 20/12/2024 y 07/01/2025 AL 25/01/2025

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	1 de 40    @ gobertolima www.tolima.gov.co

Tabla de contenido

COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y SG-SST	4
1. INFORMACION AMBIENTAL Y SG-SST	4
1.1 Informe mensual ambiental y SST de interventoría a la etapa de la obra (incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.	4
1.2 Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.	4
1.3 Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición RCD	8
1.4 Manejo de vegetación	11
1.5 Listado de vehículos utilizados en obra	11
1.6 Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.	12
1.7 de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista donde se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el contratista de obra y aprobado por la interventoría.....	12
1.8 Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.	13
1.9 Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, con sus respectivos soportes. 14	
1.10 Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del contratista de obra como del interventor.	23
1.11 Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra del sistema general de seguridad social integral.....	25
1.12 Certificación de Revisor Fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra (de acuerdo con l naturales de la misma) y Subcontratistas, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número e trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.	25

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	2 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

1.13	Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría al sistema general de seguridad social integral.....	25
1.14	Certificación de Revisor Fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratistas, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.....	26
1.15	Calificación del componente de gestión ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores ambientales.	26
1.16	Certificación expedida por la interventoría donde exprese que se han revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSST remitidos por el contratista de obra para el respectivo informe.	27
1.17	Permisos y/o autorizaciones ambientales.....	27
2.	INFORMACION SOCIAL	31
2.1	Descripción de las actividades del plan de acción de la interventoría y verificación del plan de gestión social del contratista. Debe incluir copia de los anexos referentes a la gestión del contratista requerido en el contrato.	31
2.2	Observaciones y recomendaciones formuladas por la interventoría. Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al plan de gestión social del contratista aprobado por la interventoría. Además, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del contratista.	33
2.3	Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del contratista y de la interventoría.....	33
2.4	Calificación del componente de gestión social.....	38
3.	Registro fotográfico (AMBIENTAL, SOCIAL Y SST).....	38
4.	Conclusiones y recomendaciones	39

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	3 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

Tabla 1. Consolidado de control de materiales granulares empleados en obra	5
Tabla 2. Control de bolsas de cemento empleados en obra.....	6
Tabla 3. Control de suministro de agua industrial en la obra.....	7
Tabla 4. Control de RCD – MATERIAL DE EXCAVACIÓN - dispuestos en zona de nivelación Hacienda Guadalupe	9
Tabla 5. Control de RCD – MATERIAL DE DEMOLICIÓN - dispuestos en zona de nivelación Hacienda Guadalupe	9
Tabla 6. Control de RCD - MATERIAL DE EXCAVACIÓN - dispuestos en zona de nivelación Predio Villa Blanca	10
Tabla 7. Control de RCD - MATERIAL DE DEMOLICIÓN - dispuestos en zona de nivelación Predio Villa Blanca	10
Tabla 8. Maquinaria, Vehículos y Volquetas que apoyaron las actividades del Contrato.....	11
Tabla 9. Equipo y/o Maquinaria utilizada	13
Tabla 10. Relación uso de unidades sanitarias alquiladas por el contratista	14
Tabla 11. Listado de capacitaciones y charlas realizadas por contratista	14
Tabla 12. Capacitaciones realizadas por interventoría	22
Tabla 13. Reporte accidentes, incidentes y ausentismo contratista.....	23
Tabla 14. Reporte accidentes, incidentes y ausentismo Interventoría	24
Tabla 15. Trazabilidad requerimientos de presentación documento PAGA	26
Tabla 16. Síntesis de requerimientos legales componente ambiental para el proyecto	27
Tabla 17. Trazabilidad permiso de ocupación de cauce sobre Río Venadillo	28
Tabla 18. Síntesis de certificaciones y paz y salvo obtenidos al finalizar el contrato de obra.....	33
Tabla 19. Charlas componente social realizadas por el contratista.....	34
Tabla 20. Consolidado PQRS registradas en el proyecto	38

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	4 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

COMPONENTE AMBIENTAL, SOCIAL Y SG-SST

La interventoría como ente garante de cumplimiento a la ejecución del “PROYECTO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA” entre límites de los municipios de Venadillo y Ambalema (Tolima), supervisó y verificó en el área de Seguridad y Salud en el Trabajo los lineamientos y procedimientos aplicados en la ejecución de actividades en obra, como lo dicta el Decreto 1072 de 2015 y la Resolución 0312 de 2019, en donde se debe dar cumplimiento a directrices y estándares correspondientes al Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST), con el objetivo de velar por la integridad mental y física de los trabajadores, a través de actividades de promoción de la salud y prevención de riesgos laborales.

Igualmente hizo seguimiento al desarrollo del componente ambiental y de la gestión social a lo largo del desarrollo del proyecto vial, conforme con los lineamientos dados por INVIAS, particularmente en la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura -Modo Carretero, INVIAS 2022.

De acuerdo con las obligaciones descritas en el Anexo 1- ANEXO TECNICO INTERVENTORIA del presente contrato, a continuación, se evidencia el cumplimiento y desarrollo de las actuaciones realizadas por el contratista constructor en el desarrollo del contrato de obra No. 1665 de 2024:

1. INFORMACION AMBIENTAL Y SG-SST

1.1 Informe mensual ambiental y SST de interventoría a la etapa de la obra (incluyendo el componente de maquinaria/equipo y vehículos), con sus respectivos soportes y análisis de los indicadores propuestos para cada uno de los programas desarrollados en el PIPMA.

El presente informe corresponde a las labores realizadas desde el área HSEQ durante la ejecución del contrato de obra 1665 de 2024, en la construcción del puente vehicular sobre el Rio Venadillo, este informe contiene el seguimiento y control de las principales tareas adelantadas referentes a las actividades ejecutadas durante el desarrollo de la obra comprendido entre el periodo del 10/06/2024 al 25/01/2025.

1.2 Control de materiales y copia de los correspondientes certificados de adquisición de todos los materiales empleados en el mes dentro de la obra.

- MATERIALES PÉTREOS:

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	5 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

El contratista allego información legal sobre la empresa proveedora de materiales granulares que correspondió a Triturados y Vías La Caima S.A.S con Nit 900.237.153-1, proveedor que cuenta con permiso minero y licencia ambiental vigente. El contrato de concesión minera No. 0518-73 tienen una duración de 30 años y la licencia ambiental fue cedida y con una vigencia similar al permiso minero. El sitio de explotación se ubica en el predio La Villas, Inspección de Caldas en el municipio de Alvarado. El RUCOM-2023110926168 emitido el 9/07/2024 indica certifica que Triturados y Vías La Caima S.A.S acredita la calidad de comercializador inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales con una vigencia hasta el 31/07/2025. Se adjuntan al presente informe los documentos legales minero y ambiental, el certificado final de materiales granulares y el paz y salvo del proveedor emitido el 21/04/2025.

A continuación, se cuantifican los materiales granulares empelados por el contratista constructor en la ejecución de la obra:

Tabla 1. Consolidado de control de materiales granulares empleados en obra

Mes	Periodo	Tipo de material	Volumen (m³)	Volumen acumulado (m³)	Certificados de soporte
1	11/06/2024 a 10/07/2024	Arena	68	68	Certificado emitido por TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA SAS con fecha del 28/09/2024
		Triturado	78	78	
2	11/07/2024 a 10/08/2024	Arena	68	136	
		Triturado	78	156	
3	11/08/2024 a 10/09/2024	Arena	68	204	
		Triturado	78	234	
4	11/09/2024 a 10/10/2024	Arena	35	239	Certificado emitido por TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA SAS con fecha del 11/10/2024
		Triturado	55	294	
5	11/10/2024 a 10/11/2024	Arena	35	239	Certificado emitido por TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA SAS con fecha del 08/11/2024
		Triturado	30	294	
6	11/11/2024 a 10/12/2024	Arena	80	354	Certificado emitido por TRITURADOS Y VIAS LA CAIMA SAS con fecha del 09/12/2024
		Triturado	78	397	
7	11/12/2024 a 20/12/2024 y 07/01/2025 a 25/01/2015	Arena	281	650	Certificado final emitido por Triturados la Caima S.A.S de fecha 21/04/2025
		Triturado	203	600	
TOTAL ARENA (m3)				650	

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	6 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

TOTAL TRITURADO (m3)	600	
-----------------------------	------------	--

Fuente. Elaboración propia

- **MANEJO DE CONCRETO**

El contratista informó que los pedidos de cemento se realizaron a la empresa ARGOS de Colombia, y los bultos se apilaron sobre estibas de madera, cubriéndolas con plástico negro de polipropileno aislándolo del agua y de la humedad del suelo con el objetivo de mantener las condiciones físico-químicas en óptimas condiciones.

El contratista informó que las bolsas de cemento utilizadas fueron organizadas y apiladas en sitios de acopio temporal cerca al campamento principal y posteriormente se trasladaron a la ciudad de Ibagué siendo entregadas a la empresa de servicios públicos Interaseo S.A.S E.S.P. quien hizo la respectiva disposición final en el Relleno sanitario La Miel del municipio antes mencionado. Esta entrega se hizo en dos fechas el 20 de noviembre de 2024 y el 16 de marzo de 2025 con un volumen de 12 m3 en cada entrega. Se obtuvieron los certificados por parte del Director Comercial de la empresa Interaseo S:A:S E.S.P de fecha 11/02/2025, los cuales se adjuntan al presente informe.

A continuación, se relacionan las cantidades de bolsas de cemento residuales en el desarrollo de la obra:

Tabla 2. Control de bolsas de cemento empleados en obra

Mes	Periodo	Bolsas (und)	Bolsas acumuladas (und)
1	11/06/2024 a 10/07/2024	850	850
2	11/07/2024 a 10/08/2024	850	1700
3	11/08/2024 a 10/09/2024	850	2550
4	11/09/2024 a 10/10/2024	850	3400
5	11/10/2024 a 10/11/2024	300	3700
6	11/10/2024 a 10/11/2024	1000	4700
7	11/12/2024 a 20/12/2024 y 07/01/2025 a 25/01/2015	450	5150
TOTAL			5.150

Fuente. Elaboración propia

- **MANEJO DE PREFABRICADOS**

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	7 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

El suministro de tubería, madera, formaletas, acero entre otros, materiales o elementos que fueron requeridos para la ejecución de la estructura del puente, se suministraron por proveedores debidamente legalizados de acuerdo con normatividad vigente, como también con el cumplimiento en los estándares de calidad de dichos materiales; se recibe por parte del contratista un compromiso de proveedor por parte de la empresa G&J – Empresas de acero Ferretería S.A. y su documentación legal correspondiente, además se recibe por parte del contratista los certificados de calidad de acero y alambre anexos al presente informe; igualmente se adjunta paz y salvo de G&J Ferreterías S.A emitido al Consorcio Puente Ambalema – Palobayo el 09 de mayo de 2025.

De la madera se recibe certificación emitida por Cortolima a favor de MADERAS PROFORCA con NIT 901.447.028-3 que cuenta con libro de operaciones forestales dentro del expediente D018 emitida el día 09/03/2023 y certificación emitida por esta corporación en la adopción del “Esquema de reconocimiento a la procedencia legal para las empresas forestales de transformación y comercialización de productos forestales ERPLEF” según Resolución 7859 del 11/12/2023; adicional se recibe salvoconducto único nacional para la movilización de especímenes de la diversidad biológica No. 138210536368 de fecha 22/10/2024 y No. 138210536454 del 18/12/2024, los cuales se anexan al presente informe.

La gerente de Proforca emite paz y salvo al Consorcio Puente Ambalema – Palobayo el 15 de abril de 2025.

El manejo de materiales se realizó de la siguiente manera en obra:

- Acero, se ubicó sobre estructuras de madera para evitar el contacto directo con el suelo y la humedad del mismo, como también la afectación o contaminación del suelo.
- Madera, en la parte frontal del campamento principal sobre una estructura metálica para aislarla del suelo y humedad.

- **MANEJO Y SUMINISTRO DE AGUA EN BLOQUE**

A continuación, se presenta trazabilidad de cantidades consumidas por el contratista de obra con relación al agua industrial utilizada en obra, con respecto al soporte y las cantidades reportadas por el contratista, el cual adjuntó certificación y recibos de cantidades compradas a IBAL S.A ESP, se anexan al presente informe. A continuación, se lista lo que el contratista ha informado en sus respectivos informes mensuales:

Tabla 3. Control de suministro de agua industrial en la obra.

Mes	Periodo	Volumen (m³)	Volumen acumulado (m³)	Certificados de soporte
1	11/06/2024 a 10/07/2024	5,5	5,5	

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	8 de 40    @ gobertolima www.tolima.gov.co

2	11/07/204 a 10/08/2024	4,8	10,3	Certificación expedida por IBAL con fecha 12/12/2024
3	11/08/204 a 10/09/2024	6,7	17	
4	11/09/204 a 10/10/2024	4,5	21.5	
5	11/10/204 a 10/11/2024	15	36.5	
6	11/11/204 a 10/12/2024	55	91.5	
7	11/12/2024 a 20/12/2024 y 07/01/2025 a 25/01/2015	160	251.5	
TOTAL			251.5	

Fuente. Datos suministrados por contratista de obra

Es de anotar que los pagos realizados fueron hechos por la empresa Ricardo Ortigoza consorciado del Consorcio Puente Ambalema Palobayo.

- **SUMINISTRO DE MEZCLA ASFALTICA**

El contratista para la pavimentación del puente vehicular utilizó al proveedor de mezcla asfáltica Asfaltos y Agregados del Tolima S.A.S, con Nit 900542039-7, quien cuenta con RUCOM-2024080128154 expedido el 30/08/2024, en el cual la Agencia Nacional de Minería certifica que Asfaltos y Agregados del Tolima S.A.S acredita la calidad de comercializador autorizado inscrito en el Registro Único de Comercializadores de Minerales, vigente hasta el 31/07/2025.

Se obtuvo el certificado de las cantidades de MDC-25 y MDC-19 suministradas en el mes de enero de 2025 emitido por Asfaltos y Agregados del Tolima S.A.S (Agretol), totalizando 158.75 m3 de mezcla asfáltica.

El 13 de mayo de 2025 este proveedor emite paz y salvo al Consorcio Puente Ambalema Palobayo. Ver documentos adjuntos.

1.3 Control del aprovechamiento de los Residuos de Construcción y Demolición RCD

El contratista informó que la disposición de RCD se ha realizó en dos predios para nivelación topográfica, Hacienda Guadalupe de Propiedad del Señor Francisco Javier Ocampo y Predio Villa Blanca de Propiedad de la señora Blanca Lucy Sánchez, el contratista presentó actas de acuerdo de ambos predios, para la utilización de los mismos como zona de depósito de material, y los respectivos paz y salvos.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	9 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

Con respecto al predio Villa Blanca el contratista allego el Acta de Autorización, promesa compra venta, certificado de Uso de suelo emitido por la alcaldía municipal de Ambalema, Levantamiento Topográfico Inicial y Final, Acta de entrega y paz y salvo de recibo a satisfacción del propietario con fecha 30/10/2024.

Del predio Hacienda Guadalupe de Propiedad del Señor Francisco Javier Ocampo, se adjunta Acta de Autorización, Certificado de libertad y tradición, certificado de Uso de suelo emitido por la alcaldía municipal de Ambalema, levantamiento topográfico inicial y final, Acta de entrega y paz y salvo de recibo a satisfacción del propietario suscrita el 17/02/2025.

El contratista reporta las siguientes cantidades de RCD durante la ejecución de la obra:

Tabla 4. Control de RCD – MATERIAL DE EXCAVACIÓN - dispuestos en zona de nivelación Hacienda Guadalupe

Mes	Periodo	Volumen (m³)	Volumen acumulado (m3)	Certificados de soporte
1	11/06/2024 a 10/07/2024	398,76	398,76	Certificado mes de Junio 2024
2	11/07/2024 a 10/08/2024	398,76	797,52	Certificado mes de Julio
3	11/08/2024 a 10/09/2024	398,76	1196,28	Certificado mes de Agosto 2024
4	11/09/2024 a 10/10/2024	245	1441,28	Certificado mes de Septiembre 2024
5	11/10/2024 a 10/11/2024	0	0	N/A
6	11/11/2024 a 10/12/2024	0	0	N/A
7	11/12/2024 a 20/12/2024 y 07/01/2025 a 25/01/2015	0	0	N/A
TOTAL			1441,28	

Fuente. Elaboración propia

Tabla 5. Control de RCD – MATERIAL DE DEMOLICIÓN - dispuestos en zona de nivelación Hacienda Guadalupe

Mes	Periodo	Volumen (m³)	Volumen acumulado (m3)	Certificados de soporte
1	11/06/2024 a 10/07/2024	205	205	Certificado mes de Junio 2024
2	11/07/2024 a 10/08/2024	205	410	Certificado mes de Julio 2024
3	11/08/2024 a 10/09/2024	205	615	Certificado mes de Agosto 2024

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	10 de 40    @ gobertolima www.tolima.gov.co

Mes	Periodo	Volumen (m³)	Volumen acumulado (m3)	Certificados de soporte
4	11/09/2024 a 10/10/2024	0	0	Certificado mes de Septiembre 2024
5	11/10/2024 a 10/11/2024	0	0	N/A
6	11/11/2024 a 10/12/2024	0	0	N/A
7	11/12/2024 a 20/12/2024 y 07/01/2025 a 25/01/2015	0	0	N/A
TOTAL			615	

Fuente. Elaboración propia

Tabla 6. Control de RCD - MATERIAL DE EXCAVACIÓN - dispuestos en zona de nivelación Predio Villa Blanca

Mes	Periodo	Volumen (m³)	Volumen acumulado (m3)	Certificados de soporte
1	11/06/2024 a 10/07/2024	512,7	512,7	Certificado mes de Junio 2024
2	11/07/2024 a 10/08/2024	-	-	N/A
3	11/08/2024 a 10/09/2024	-	-	N/A
4	11/09/2024 a 10/10/2024	-	-	N/A
5	11/10/2024 a 10/11/2024	-	-	N/A
6	11/11/2024 a 10/12/2024	-	-	N/A
7	11/12/2024 a 20/12/2024 y 07/01/2025 a 25/01/2015	-	-	N/A
TOTAL			512,7	

Fuente. Elaboración propia

Tabla 7. Control de RCD - MATERIAL DE DEMOLICIÓN - dispuestos en zona de nivelación Predio Villa Blanca

Mes	Periodo	Volumen (m³)	Volumen acumulado (m3)	Certificados de soporte
1	11/06/2024 a 10/07/2024	0	0	N/A
2	11/07/2024 a 10/08/2024	-	-	N/A
3	11/08/2024 a 10/09/2024	-	-	N/A
4	11/09/2024 a 10/10/2024	-	-	N/A
5	11/10/2024 a 10/11/2024	-	-	N/A
6	11/11/2024 a 10/12/2024	-	-	N/A

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	11 de 40    @ gobertolima www.tolima.gov.co

7	11/12/2024 a 20/12/2024 y 07/01/2025 a 25/01/2015	-	-	N/A
TOTAL			0	

Fuente. Elaboración propia

1.4 Manejo de vegetación

En el área de intervención para la restitución del puente vehicular sobre el Río Venadillo, no se encontró vegetación arbórea que fuera objeto de aprovechamiento forestal, por lo cual este numeral no aplicó para el proyecto. Tema que fue igualmente observado por funcionario de CORTOLIMA en la visita técnica realizada el día 03/07/2024 dentro del expediente No 3479 del trámite del permiso de ocupación de cauce, acta que fue anexada en informes previos.

No obstante, el contratista solicitó a través de la Ventanilla virtual de Cortolima la verificación de un individuo arbóreo a través del radicado No. 23435 del 11/12/2024, por cuanto generó riesgo de caída, y se trató de un individuo seco, el cual fue talado, por orden de CORTOLIMA, no se presentó ningún tipo de novedad en referencia a esta actividad y tampoco fue necesaria la tala o corte de más especies arbóreas durante el desarrollo de la obra.

El componente arbóreo no se vio afectado por el proceso constructivo del puente vehicular.

1.5 Listado de vehículos utilizados en obra

Durante el desarrollo de la obra, el contratista de obra utilizó los siguientes vehículos:

Tabla 8. Maquinaria, Vehículos y Volquetas que apoyaron las actividades del Contrato.

Equipo	Marca	Referencia/placa
Carrotanque Agua	International	WV172
Volqueta Doble troque	Freightliner	SOP507
Volqueta Doble troque	Kenworth	USE683
Volqueta Sencilla Chevrolet	Kodiak	TBL046
Camioneta de Estacas	Chevrolet Dimax	ICL610
Excavadora Sobre Oruga	Shantui	SE75
Excavadora Sobre Oruga	Hyundai	H940C
Excavadora Sobre Oruga	Hyundai	15OLC
Binitin	Wacker Neuson	RD16
Carro Hormigonero	Dieci	MX2Dieci

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	12 de 40    @ gobertolima www.tolima.gov.co

Carro Hormigonero	Dieci	L3500
Compresor	Atlas Copco	XAS88KD
Apisonador	Honda	GX120
Pavimentadora	Dynapac	F161 6W
Compactador Asfalto	Dynapac	CC224HF
Compactador sellador	Dynapac	CP142

Fuente. Elaboración propia

De los vehículos anteriormente mencionados y utilizados se recibió la documentación correspondiente a tarjetas de propiedad y verificación en la plataforma RUNT sobre estado de revisión tecno mecánica y de gases y seguro obligatorio, de los cuales se adjunta documentación dentro de los anexos SST del presente informe.

Para el abastecimiento de combustible el contratista utilizó una Camioneta de Estacas, Chevrolet Dimax de placa ICL610, en la cual se transportaron tres canecas metálicas de 55 galones, el abastecimiento de combustible se dio mediante un sistema de tanqueo con bomba eléctrica para llevar un mayor control y evitar los derrames de combustible. Este vehículo contó con la documentación legal vigente y con el equipo de emergencia para el control de incendios.

1.6 Relación del número de licencia ambiental y/o permiso ambiental y/o PIN ambiental.

Para la ejecución del contrato de obra No. 1665 del 2024, no fue necesario la obtención de licencia ambiental para la construcción del puente vehicular sobre el Río Venadillo, en la medida en que el puente colapsó en el año 2023 por falla geológica que incomunicó a los habitantes del municipio de Ambalema y Palobayo y lo que se ejecutó fue la reposición del puente vehicular.

Se aclara que el proyecto no fue objeto de la obtención de PIN ambiental dado que este código se obtiene ante la Secretaría Distrital de Bogotá, para proyectos ubicados bajo su jurisdicción, lo que no corresponde al contrato de obra No. 1665 de 2024, que se localiza en el departamento del Tolima.

1.7 de los equipos y/o maquinaria utilizada por el contratista donde se verifique el cumplimiento de las actividades descritas en el plan de mantenimiento presentado por el contratista de obra y aprobado por la interventoría.

La Interventoría ha evidenciado en campo la siguiente maquinaria utilizada por el contratista durante el desarrollo del contrato, se relaciona a continuación:

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	13 de 40    @ gobertolima www.tolima.gov.co

Tabla 9. Equipo y/o Maquinaria utilizada

Equipo	Marca	Referencia/placa
Excavadora sobre Oruga	Hyundai	H940C
Autohormiguera	Dieci	L3500
Autohormiguera	Dieci	L3500
Compresores	COPCO	XAS88
Planta eléctrica	Baifa	6560
Pulidora	Makita	
Martillo neumático	Honda	GX-100
Grúa telescópica		
Motosierra		MS310
Vibro compactador pequeño	Wacker Neuson	RD16
Excavadora Sobre Oruga	Shantui	SE75
Excavadora Sobre Oruga	Hyundai	150C

Fuente. Elaboración propia

La documentación correspondiente a las tres excavadoras sobre oruga listadas en la tabla anterior se adjunta dentro de los anexos SST del presente informe. Interventoría verificó en campo, documentación y el buen estado y uso de equipos y maquinaria a través de inspecciones periódicas.

1.8 Copia de la certificación de mantenimiento periódica de los baños móviles, anexando copia del permiso de vertimientos vigente expedido por la autoridad ambiental competente.

Se establece que el contratista de obra no alquiló unidades sanitarias portátiles con una empresa especializada. En la medida en que el frente de obra se ubicó en el extremo Palobayo, el contratista alquiló un predio privado para campamento que pertenece a la Señora Jessica María Moreno Naranjo, dentro del cual se instalaron varias dependencias como oficina, almacén y zona de acopio y con se hizo un Acuerdo para la utilización del baño existente.

No hubo necesidad de tramitar permiso de vertimiento ante la autoridad ambiental competente.

Como se mencionó, el contratista firmó acta de acuerdo con la señora Jessica María Moreno Naranjo para el préstamo de la unidad sanitaria, como también se hizo uso de los baños existentes ubicados en los campamentos donde residían los colaboradores del proyecto. Unidades sanitarias que están conectadas de manera directa a pozos sépticos los cuales se pudieron verificar, a continuación, se especifica el uso de cada uno:

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	14 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

Tabla 10. Relación uso de unidades sanitarias alquiladas por el contratista

PROPIETARIO	UBICACIÓN	USO	OBSERVACIÓN
Jessica María Moreno Naranjo	Restaurante / Vereda Vile Alto	Mixto	Se presenta acta de acuerdo y paz y salvo emitido el 21/02/2025
Blanca Lucy Sánchez	Campamento Auxiliar SST/ Vereda Vile Alto	Mujer	Se presenta acta de acuerdo y paz y salvo emitido el 25/02/2025
Ángela Sánchez	Campamento Personal obra / Vereda Vile Alto	Hombre	Se presenta acta de acuerdo y paz y salvo emitido el 25/02/2025

Fuente: Informes mensuales presentados por el contratista

En cuanto predio ocupado de manera temporal como campamento se tienen los siguientes registros:

- El 13 de junio de 2024 se suscribió el acta de acuerdo con José Elías Encarnación para ocupar en arriendo un área para campamento y al finalizar el proyecto se obtuvo el paz y salvo correspondiente el 21/02/2025.
- Se obtuvo paz y salvo de fecha 25/02/2025 con la Sra. Angela Sánchez por el pago de alquiler de vivienda empleada para el personal operativo del contrato
- Se obtuvo paz y salvo suscrito el 25/02/2025 con la Sra. Blanca Lucy Sánchez por concepto de pago de alquiler de vivienda para el alojamiento del personal de obra.

1.9 Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de seguridad y salud en el trabajo, con sus respectivos soportes.

Contratista constructor

A lo largo del desarrollo del proyecto, el contratista realizó inducciones, capacitaciones de seguridad y salud en el trabajo y concientización en temas ambientales dirigidos al personal de obra. A continuación, se relacionan las capacitaciones y charlas dirigidas al personal en obra:

Tabla 11. Listado de capacitaciones y charlas realizadas por contratista

TEMA	FECHA
Orden y aseo – resolución de conflictos	20 junio 2024
Manejo de flora y fauna – pensamiento de líder	21 junio 2024
Protección de recurso hídrico – manejo de escombros	22 junio 2024
Manejo de escombros - trabajo en equipo	24 junio 2024
Manejo de sustancias química – la unión hace la fuerza	25 junio 2024
Conciencia ambiental – riesgo publico	26 junio 2024

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	15 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

TEMA	FECHA
Adecuada Señalización – puntualidad en el trabajo	26 junio 2024
Adecuada disposición de las bolsas de cemento	03 julio de 2024
Energías renovables	05 julio de 2024
Protección de la Flora	08 julio de 2024
Adecuada señalización en Obra	10 julio de 2024
Manejo de sustancias químicas	16 julio de 2024
Manejo de escombros	18 julio de 2024
Emergencia ambiental, aumento del caudal del rio	22 julio de 2024
Sustancias peligrosas	23 julio de 2024
Protección del recurso hídrico	25 julio de 2024
Manejo de señalización	24 julio de 2024
Protección de fauna	26 julio de 2024
Protección del medio ambiente	27 julio de 2024
Como podemos mitigar la contaminación	29 julio de 2024
Uso del suelo	30 julio de 2024
Manejo de residuos solidos	31 julio de 2024
Importancia de higiene y cuidado auditivo	1 agosto 2024
Orden y aseo en el lugar de trabajo	1 agosto 2024
La importancia del orden y el aseo	2 agosto 2024
La importancia del orden y el aseo	2 agosto 2024
Protección de individuos arbóreos	3 agosto 2024
Manejo seguro de herramientas de impacto	5 agosto 2024
Como evitar la contaminación del aire	5 agosto 2024
Seguridad con la maquinaria	6 agosto 2024
Conciencia ambiental	6 agosto 2024
Manipulación adecuada de cargas	8 agosto 2024
Plan de manejo ambiental	8 agosto 2024
Conservación auditiva	9 agosto 2024
Adecuado almacenamiento de materiales de construcción	9 agosto 2024
Pausas activas	10 agosto 2024
Manejo de materiales de construcción	10 agosto 2024
Señales de prevención de accidentes e incidentes laborales	12 agosto 2024
Manejo de sustancias químicas	12 agosto 2024
Resbalos, tropiezos, caídas	13 agosto 2024
Contaminación atmosférica	13 agosto 2024
Herramientas manuales	14 agosto 2024
Manejo zonas verdes y paisajismos	14 agosto 2024
Trabajo en equipo	15 agosto 2024
Manejo residuos solidos	15 agosto 2024
Peligros (reconocimiento y reporte)	16 agosto 2024
Manejo de flora y fauna	16 agosto 2024
Riesgo de levantamiento - caída	20 agosto 2024
Uso adecuado de los baños	20 agosto 2024
Primeros auxilios	21 agosto 2024
Estilos de vida y de trabajo saludables	22 agosto 2024
Retiro de sobrantes una vez finalizada la obra asignada	22 agosto 2024

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	16 de 40    @ gobertolima www.tolima.gov.co

TEMA	FECHA
Riesgo cardiovascular y dislipidemia	23 agosto 2024
Reducir, reutilizar, reciclar	23 agosto 2024
Que es riesgo locativo	24 agosto 2024
Como podemos mitigar la contaminación	24 agosto 2024
Manejo del estrés	26 agosto 2024
Prevención de accidentes ambientales	26 agosto 2024
Riesgos eléctricos	27 agosto 2024
Contaminación ambiental y conservación de los recursos	27 agosto 2024
No uso del celular en horario laboral	28 agosto 2024
Energías renovables	28 agosto 2024
Consecuencias por consumo de alcohol y tabaco	29 agosto 2024
Tanqueo seguro de maquinaria en obra	29 agosto 2024
Restauración de áreas alteradas	30 agosto 2024
Prevención accidentes laborales	02 septiembre 2024
Uso, funciones y limitaciones de los EPP	03 septiembre 2024
Trabajo en alturas	03 septiembre 2024
Calistenia – pausas activas	04 septiembre 2024
Procedimiento seguro – excavaciones profundas	05 septiembre 2024
Mantenimiento preventivo de maquinaria	06 septiembre 2024
Inspecciones preventivas	07 septiembre 2024
Seguridad y uso de EPP	08 septiembre 2024
Levantamiento seguro de cargas	09 septiembre 2024
Protección de manos	10 septiembre 2024
Protección auditiva	11 septiembre 2024
Prevención de accidentes ambientales	11 septiembre 2024
Protección visual	12 septiembre 2024
Restauración de áreas alteradas	12 septiembre 2024
Primeros auxilios	13 septiembre 2024
Uso de suelo	13 septiembre 2024
Como reportar un accidente laboral	16 septiembre 2024
Como podemos mitigar la contaminación	16 septiembre 2024
Investigación de accidentes	17 septiembre 2024
Retiro sobrantes una vez finalizada la obra	17 septiembre 2024
Manejo de extintores	18 septiembre 2024
Protección de la flora	18 septiembre 2024
Prevención de caídas	19 septiembre 2024
Protección fauna	19 septiembre 2024
Peligros en excavación	20 septiembre 2024
Campañas ambientales	20 septiembre 2024
Protección de los pies	21 septiembre 2024
Salud ocupacional, higiene postural y enfermedades laborales	21 septiembre 2024
Respeto por el medio ambiente	21 septiembre 2024
Procedimientos de respuestas a emergencias ambientales	23 septiembre 2024
Manejo de herramientas manuales	23 septiembre 2024
Agotamiento por calor	24 septiembre 2024
Manejo de materiales de construcción	24 septiembre 2024

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	17 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

TEMA	FECHA
Protección de la piel	25 septiembre 2024
Uso adecuado de los baños	25 septiembre 2024
Orden y aseo en el trabajo	26 septiembre 2024
Contaminación atmosférica	26 septiembre 2024
Situaciones inseguras en el trabajo	27 septiembre 2024
Manejo de sustancias químicas	27 septiembre 2024
Estrés laboral	30 septiembre 2024
Protección de individuos arbóreos	30 septiembre 2024
Clasificación de residuos	1 octubre 2024
Equipos de rescate	1 octubre 2024
Cuáles son los programas del plan de manejo	1 octubre 2024
Aceites usados	2 octubre 2024
Que es un entibado discontinuo	2 octubre 2024
Destino de residuos solidos	4 octubre 2024
Disposición final de residuos solidos	4 octubre 2024
Que son las pruebas de alcohol espiradas en el aire	5 octubre 2024
Incidente ambiental	6 octubre 2024
Manejo de derrames	5 octubre 2024
Plan de manejo ambiental	7 octubre 2024
Requisitos para el ingreso de personal nuevo a la obra o personal trasladado	7 octubre 2024
Comunicaciones relaciones interpersonales y trabajo en equipo	7 octubre 2024
Comunicaciones relaciones interpersonales y trabajo en equipo	7 octubre 2024
Ambiente libre de tabaco	8 octubre 2024
Tanqueo seguro de maquinaria y equipo de obra	9 octubre 2024
Como podemos mitigar la contaminación	9 octubre 2024
Uso obligatorio EPP – casco	9 octubre 2024
Contaminación atmosférica	10 octubre 2024
Rotulación de envases que contienen productos químicos	10 octubre 2024
Actos inseguros	10 octubre 2024
Cáncer de seno y próstata	11 octubre 2024
Uso obligatorio EPP - guantes	11 octubre 2024
Prevención de accidentes ambientales	11 octubre 2024
Condiciones inseguras	12 octubre 2024
Riesgo publico	15 octubre 2024
Manejo de escombros	15 octubre 2024
Uso obligatorio EPP - monogafas	15 octubre 2024
Manejo de bolsas de cemento	16 octubre 2024
Calistenia – yo tengo un tic	16 octubre 2024
Acciones preventivas	16 octubre 2024
Incidentes ambientales	17 octubre 2024
Alcoholismo	17 octubre 2024
Uso obligatorio EPP - tapabocas	17 octubre 2024
Acciones correctivas	18 octubre 2024

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	18 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

TEMA	FECHA
Manejo defensivo motocicletas	18 octubre 2024
El recurso del suelo	18 octubre 2024
Política integral HSEQ	19 octubre 2024
Procedimientos para tramitar permiso de aprovechamiento forestal y tala de arboles	19 octubre 2024
Relleno de seguridad	19 octubre 2024
Que hacer en caso de derrame de sustancias químicas en obra	20 octubre 2024
Residuos líquidos peligrosos	20 octubre 2024
Uso obligatorio EPP - Careta	21 octubre 2024
Riesgo químico	21 octubre 2024
Transporte de heridos	22 octubre 2024
Reciclaje	21 octubre 2024
Protección ambiental	22 octubre 2024
Inducción SST - ambiental	22 octubre 2024
Reglamento de higiene y seguridad industrial	23 octubre 2024
Medio ambiente	23 octubre 2024
Manejo extintores	23 octubre 2024
Buenas prácticas para ahorro de agua y energía	24 octubre 2024
El recurso del agua	24 octubre 2024
Actividades de alto riesgo	24 octubre 2024
Como actuar ante una emergencia en obra	25 octubre 2024
Residuos orgánicos reciclables	25 octubre 2024
Kit de emergencias	25 octubre 2024
Inspección de herramientas manuales	26 octubre 2024
Protección de la flora	26 octubre 2024
Riesgo locativo	28 octubre 2024
Protección de la fauna	28 octubre 2024
Primeros auxilios	28 octubre 2024
Riesgo publico	29 octubre 2024
Conciencia de la importancia del medio ambiente	29 octubre 2024
Manejo de aceites usados	29 octubre 2024
Calistenia – que son pausas activas	30 octubre 2024
Inspección de herramientas eléctricas	30 octubre 2024
Destino de residuos sólidos	30 octubre 2024
Prevención de actos inseguros	31 octubre 2024
Nombramiento vipia SST	31 octubre 2024
Porque usar un código de colores	31 octubre 2024
Residuos metálicos	1 noviembre 2024
Señalización de seguridad	1 noviembre 2024
Cuidado de la piel	1 noviembre 2024
Manejo e importancia en el uso de EPP	2 noviembre 2024
Todos debemos preocuparnos por la prevención de accidentes	3 noviembre 2024
Transporte seguro de lesionados en camillas	5 noviembre 2024
Manejo de extintores	6 noviembre 2024

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	19 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

TEMA	FECHA
Rutas de evacuación y puntos de encuentro	7 noviembre 2024
Primeros auxilios – heridas abiertas y cerradas	8 noviembre 2024
Socialización procedimiento reporte e investigación – accidente de trabajo	12 noviembre 2024
El efecto invernadero y calentamiento global	12 noviembre 2024
Adelgazamiento de la capa de ozono	13 noviembre 2024
Manejo de bolsas y sobrantes de cemento en obra	13 noviembre 2024
Registros ambientales	14 noviembre 2024
Socialización plan de acción en accidente de trabajo	14 noviembre 2024
Pilas y Baterías	15 noviembre 2024
Riesgo publico	15 noviembre 2024
Aceites usados	16 noviembre 2024
Riesgo biológico	16 noviembre 2024
Residuos líquidos y peligrosos	17 noviembre 2024
Uso eficiente del agua	17 noviembre 2024
Destino de residuos solidos	18 noviembre 2024
Plantas de reciclaje	19 noviembre 2024
Manejo de residuos sólidos y puntos ecológicos en obra	18 noviembre 2024
Cargue y transporte de bordillos de manera segura	19 noviembre 2024
Residuos metálicos	20 noviembre 2024
Señalización temporal de obra	20 noviembre 2024
Uso racional de energía	21 noviembre 2024
Protección de las fuentes hídricas	21 noviembre 2024
Sistemas de gestión ambiental	22 noviembre 2024
Como identificar los residuos peligrosos	22 noviembre 2024
Como podemos contribuir a mejorar nuestro medio ambiente	25 noviembre 2024
Manejo seguro de herramientas	25 noviembre 2024
Síntomas y prevención frente a la fiebre amarilla	26 noviembre 2024
Los principales contaminantes del agua	26 noviembre 2024
Contaminación atmosférica	27 noviembre 2024
Protección de individuos arbóreos	27 noviembre 2024
Reciclado de papel	28 noviembre 2024
Trabajo seguro en alturas	28 noviembre 2024
Sistemas y ecosistemas	29 noviembre 2024
Que es peligro y que es riesgo	29 noviembre 2024
Riesgo de actividades laborales en lluvia	30 noviembre 2024
Contaminación del suelo	30 noviembre 2024
Como Identificar los Desechos Peligrosos	2 diciembre 2024
Como podemos contribuir a mejorar el medio ambiente	3 diciembre 2024
Contaminación del agua	4 diciembre 2024
Reciclaje	5 diciembre 2024
Tipos de ruido	6 diciembre 2024
Contaminación del suelo	7 diciembre 2024
Contaminación del agua	9 diciembre 2024
Orden y aseo en el lugar de trabajo	10 diciembre 2024
Gasolina lo Malo – lo Bueno y lo Feo	11 diciembre de 2024

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	20 de 40    @ gobertolima www.tolima.gov.co

TEMA	FECHA
Manejo de Sustancias Químicas	12 diciembre de 2024
Prevención de Incendios	13 diciembre de 2024
Riesgo de la Electricidad Estática	14 diciembre de 2024
Cuidemos el Medio Ambiente	16 diciembre de 2024
Contaminantes Ambientales	17 diciembre de 2024
Sistema de Gestión Ambiental	18 diciembre de 2024
Apilamiento de Material	19 diciembre de 2024
El Almacenamiento Adecuado Evite Accidente	20 diciembre de 2024
Cambios Climáticos	7 enero 2025
Desechos y Reciclajes	8 enero 2025
Incendios y su Salud	9 enero 2025
Orden y Aseo	10 enero 2025
Manejo de Derrames	11 enero 2025
Aspectos e Impactos Ambientales	12 enero 2025
Materiales Peligrosos	13 enero 2025
Contaminación del Aire	14 enero 2025
Incidente Ambiental	15 enero 2025
Relleno Sanitario	16 enero 2025
Incidente Ambiental	17 enero 2025
Registros Ambientales	20 enero 2025
Materiales Peligrosos	21 enero 2025
Baterías Usadas	22 enero 2025
Relleno de Seguridad	23 enero 2025
Residuos Solidos	24 enero 2025
Destino de Residuos Solidos	25 enero 2025

Fuente: Elaboración propia

Los registros de asistencia a las capacitaciones e inducciones reportadas por el contratista se entregaron en cada informe mensual, no obstante, hacen parte de los soportes en la carpeta de ANEXOS SST-CONTRATISTA.

Otras actividades relacionada con seguridad y salud en el trabajo igualmente fueron reportadas en todos los informes mensuales presentados a la Gobernación y se sintetizan de manera mensual en el ANEXS SST-CONTRATISTA, lo que se resume a continuación:

INFORME MENSUAL No. 1: 11/junio/2024 al 10/julio/2024:

El contratista en el informe del periodo presente reportó la entrega de dotación al personal de obra, acta de conformación del COPASST, diligenciamiento de los formatos, realización de exámenes médicos ocupacional de informes, inducciones, cerramientos de áreas de intervención, colocación de señalización, etc.

INFORME MENSUAL No. 2: 11/julio/2024 al 10/agosto/2024:

- Entrega de elementos de protección personal - EPP
- Cursos de trabajo en alturas con los cuales se obtuvieron certificaciones
- Capacitación de trabajo en alturas

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	21 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

- Colocación e inspección de señalización en obra
- Inspección elementos de emergencia
- Hoja de vida equipos para trabajo en alturas y espacios confinados

INFORME MENSUAL No. 3: 11/agosto/2024 al 10/septiembre/2024:

- Entrega de elementos de protección personal - EPP
- Inspección de señalización
- Inspección elementos de emergencia
- Hoja de vida equipos para trabajo en alturas y espacios confinados

INFORME MENSUAL No. 4: 11/septiembre/2024 al 10/octubre/2024:

- Entrega de elementos de protección personal – EPP: 11 folio de formato Control Suministro Elementos de Protección
- Acta COPASST: reunión celebrada el 26 de septiembre de 2024
- Permisos de ATS, permisos para trabajos en alturas, hoja de vida equipos para trabajo en alturas y espacios confinados y permisos para trabajos en espacios confinados y trabajos en alturas (Análisis de Trabajo Seguro – ATS).
- Inspección elementos de emergencia e inspección de maquinaria y vehículos

INFORME MENSUAL No. 5: 11/octubre/2024 al 10/noviembre/2024:

- Entrega de elementos de protección personal – EPP:
- Acta COPASST: reunión celebrada el 28 de octubre de 2024
- Permisos de ATS, permisos para trabajos en alturas, hoja de vida equipos para trabajo en alturas y espacios confinados y permisos para trabajos en espacios confinados y trabajos en alturas
- Inspección elementos de emergencia e inspección de maquinaria y vehículos
- Afiliaciones nuevo trabajador – vigilante
- EMO vigilante
- Inducción vigilante
- Oficios para permisos de trabajo los fines de semana
- Carpeta con la documentación del subcontratista ICMO SAS, encargado del montaje de la estructura metálica del puente donde se adjunta:
 1. Afiliaciones de trabajadores
 2. Certificados de calidad de EPP utilizados en alturas
 3. Cursos de alturas
 4. EMO trabajadores
 5. Inducción, reinducción y capacitaciones
 6. Planillas pre operacionales
 7. Programa de prevención contra caídas
 8. Registro y entrega de EPP
 9. Soportes de inducción SST
 10. Política integral HSEQ

INFORME MENSUAL No. 6: 11/noviembre/2024 al 10/diciembre /2024:

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	22 de 40    @ gobertolima www.tolima.gov.co

- Entrega de elementos de protección personal – EPP
- Permisos de ATS, permisos para trabajos en alturas, hoja de vida equipos para trabajo en alturas y espacios confinados y permisos para trabajos en espacios confinados y trabajos en alturas.
- Inspección elementos de emergencia e inspección de maquinaria y vehículos
- Carpeta con la documentación del subcontratista ICMO SAS, encargado del montaje de la estructura metálica del puente donde se adjunta:
 1. Afiliaciones de trabajadores
 2. Certificados de calidad de EPP utilizados en alturas
 3. Cursos de alturas
 4. EMO trabajadores
 5. Inducción, reinducción y capacitaciones
 6. Planillas pre operacionales
 7. Programa de prevención contra caídas
 8. Registro y entrega de EPP
 9. Soportes de inducción SST
 10. Política integral HSEQ

INFORME MENSUAL No. 7: 11/diciembre/2024 al 20/diciembre /2024 y 07/enero/2025 al 25/enero/2025:

- Entrega de elementos de protección personal – EPP
- Permisos de ATS, permisos para trabajos en alturas, hoja de vida equipos para trabajo en alturas y espacios confinados y permisos para trabajos en espacios confinados y trabajos en alturas.
- Inspección elementos de emergencia e inspección de maquinaria y vehículos
- Verificación de señalización en obra

Interventoría

La interventoría realizó a su vez actividades propias en seguridad y salud en trabajo, entre las que se destacaron las inspecciones locativas en la oficina del proyecto ubicada en el municipio de Ambalema, (Tolima), inspecciones a botiquines de primeros auxilios y al botiquín del vehículo que funciona como medio de transporte para el personal en campo, inspecciones preoperativas del vehículo, formatos diligenciados que se adjuntan dentro de los anexos SST-INTERVENTORIA del presente informe.

Las capacitaciones propias realizadas por la interventoría se presentan a continuación y los registros se encuentran dentro de los anexos SST del presente informe:

Tabla 12. Capacitaciones realizadas por interventoría

Tema	Fecha	No participantes
Inducción al personal de campo	25 julio 2024	3

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	23 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

Energías renovables y productividad laboral	3 septiembre 2024	4
Energías renovables y productividad laboral al personal de campo	3 octubre 2024	4
Uso adecuado de recursos naturales y liderazgo	5 noviembre 2024	3
Protección de flora y fauna y manejo del estrés	5 diciembre 2024	2
contaminación del recurso hídrico y liderazgo	8 enero 2025	2

Fuente: Elaboración propia

También se realizaron pausas activas cognitivas, visuales y movilidad y estiramiento durante los meses de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2024 y enero de 2025, de las cuales se encuentran los registros adjuntos en la carpeta de anexos SST del presente informe.

En la obra se realizaron inspecciones locativas, inspecciones al uso correctos de los EPP al personal de campo de Interventoría, diligenciamiento de listas de chequeo de la señalización en campo, participación en el Copasst mensual, asistencia y participación a capacitaciones virtuales, etc.

1.10 Informe de accidentes e incidentes de trabajo en el periodo tanto del contratista de obra como del interventor.

Contratista

A continuación, se presenta la relación de ausentismos, incapacidades accidentes y/o incidentes del contratista:

Tabla 13. Reporte accidentes, incidentes y ausentismo contratista

FECHA	ACCIDENTE		INCIDENTE		Total
	SI	NO	SI	NO	
Del 11 junio 2024 – 10 julio 2024		x		x	0
Del 11 julio 2024 – 10 agosto 2024		x		x	0
Del 11 de agosto 2024 – 10 septiembre 2024		x		x	0
Del 11 de septiembre 2024 – 10 octubre 2024		x		x	0
Del 11 de octubre 2024 – 10 noviembre 2024		x		x	0
Del 11 de noviembre 2024 – 10 diciembre 2024		x		x	0
Del 11 de diciembre 2024 – 20 diciembre 2024 y 07 de enero 2025 al 25 enero 2025		x		x	0

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	24 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

INCAPACIDADES POR ACCIDENTES	INICIA	TERMINA	N° de días
No se presentaron incapacidades	-	-	0
INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL	INICIA	TERMINA	N° de días
No se presentaron incapacidades	-	-	0

Fuente: Elaboración propia

Mensualmente el contratista adjuntó documento de certificación de su ARL (SURA S.A) de no reporte de accidentes de trabajo durante los periodos correspondientes a cada informe mensual de obra presentado, adicional a esto y respaldando las buenas prácticas en la ejecución de la obra el contratista presentó certificaciones de trabajos en alturas y en espacios confinados y exámenes medico ocupacionales (EMO), cuyos registros se entregaron en los respectivos informes mensuales allegados a la Gobernación. Ver ANEXOS SST-CONTRATISTA.

Interventoría

Para Interventoría se presenta la relación de ausentismos, incapacidades accidentes y/o incidentes así:

Tabla 14. Reporte accidentes, incidentes y ausentismo Interventoría

FECHA	ACCIDENTE		INCIDENTE		Total
	SI	NO	SI	NO	
Del 11 junio 2024 – 10 julio 2024		x		x	0
Del 11 julio 2024 – 10 agosto 2024		x		x	0
Del 11 de agosto 2024 – 10 septiembre 2024		x		x	0
Del 11 de septiembre 2024 – 10 octubre 2024		x		x	0
Del 11 de octubre 2024 – 10 noviembre 2024		x		x	0
Del 11 de noviembre 2024 – 10 diciembre 2024		x		x	0
Del 11 de diciembre 2024 – 20 diciembre 2024 y 07 de enero 2025 al 25 enero 2025		x		x	0
INCAPACIDADES POR ACCIDENTES	INICIA		TERMINA		N° de días

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	25 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

No se presentaron incapacidades	-	-	0
INCAPACIDADES POR ENFERMEDAD GENERAL	INICIA	TERMINA	N° de días
No se presentaron incapacidades	-	-	0

Fuente: Elaboración propia

1.11 Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra del sistema general de seguridad social integral.

Con base en las labores de Interventoría, se llevó un control diario del personal del contrato de obra, cuyos soportes fueron entregados en los respectivos informes mensuales y se consolidan en ANEXO SST-CONTRATISTA.

1.12 Certificación de Revisor Fiscal/contador público y representante legal del Contratista de obra (de acuerdo con l naturales de la misma) y Subcontratistas, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número e trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.

Este documento será adjunto con el acta parcial No.1 en cumplimiento a lo descrito en el pliego de condiciones del contratista, en el numeral 3.4.5. ACREDITACIÓN DEL PAGO AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO. *El contratista debe acreditar, **para realizar cada pago del contrato**, que se encuentra al día en los aportes parafiscales relativos al sistema de seguridad social integral, así como los propios del SENA, ICBF y cajas de compensación familiar cuando corresponda.*

1.13 Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría al sistema general de seguridad social integral.

Al presente informe se anexan las planillas pagas de los profesionales y especialistas que forman parte de la interventoría durante el desarrollo de la obra en los anexos SST-INTERVENTORIA.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	26 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

1.14 Certificación de Revisor Fiscal/contador público y representante legal del Interventor (de acuerdo con la naturaleza de la misma) y Subcontratistas, donde se exprese paz y salvo por concepto de pagos al Sistema General de Seguridad Social Integral y salarios que contenga como mínimo el número de trabajadores que laboran en el Contrato de Obra y el periodo laborado.

1.15 Calificación del componente de gestión ambiental y SST y fichas de seguimiento de labores ambientales.

Inicialmente se establece que dentro del Contrato de consultoría No. 4666 del 2022 el Consorcio Venadillo 182 encargado de los estudios y diseños del puente vehicular formuló el documento PAGA versión 0 de febrero de 2023, el cual fue revisado por esta Interventoría encontrando que no cumplía con el contenido exigido en la Guía Ambiental de INVIAS del año 2022.

Adicionalmente se evidenció que no era específico para las condiciones contractuales del contrato de obra, ni para el entorno socio ambiental del sitio donde se desarrolla el proyecto, a manera de ejemplo, no fue determinado el nivel de complejidad del proyecto, por lo cual los componentes de la línea base ni las fichas propuestas en el manejo ambiental y social no estaban determinada de manera integral. En tal sentido, la Interventoría solicitó al contratista constructor ajustar y complementar el documento PAGA, con el fin de definir las fichas de seguimiento de las labores ambientales y poder brindar una calificación por parte de Interventoría.

A continuación, se detallan los requerimientos formulados al contratista constructor sobre la entrega del documento PAGA:

Tabla 15. Trazabilidad requerimientos de presentación documento PAGA

Comunicado	Asunto
CA-285-0024-0031-24 de fecha 31/07/2024	Solicitud perentoria presentación documento PAGA para contrato de obra No.1665 de 2024 y mesa de trabajo 05/08/2024
CA-285-0025-0032-24 de fecha 31/07/2024	Alcance comunicados C-285-0020-0023-24 del 18/7/2024 y C-285-0023-0028-24 del 24/07/2024. Observaciones al Informe Mensual No.1 – Componente Ambiental y de Gestión Social
CA-285-0031-0064-24 del 21/08/2024	Observaciones PLAN DE ADAPTACIÓN Y GESTIÓN AMBIENTAL para contrato de obra No. 1665 2024.
CA-285-0044-0123-24 de 02/10/2024	Reiteración a cumplimiento de requerimientos HSEQ en informes mensuales y presentación documento PAGA ajustado al contrato de obra No. 1665 de 2024
CA-285-0059-0244-24 de 06/11/2024	Observaciones documento PAGA versión 0.1 de fecha 23/10/2024
CA-285-0073-0300-24 de 03/12/2024	Apremio para ajustar documento PAGA versión 0.2 de fecha 22/11/2024
C-285-0090-0036-25 de 28/01/2025	Aprobación documento PAGA versión 0.3 de fecha 14/01/2025

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	27 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

Fuente: Elaboración propia

El día 23/10/2024 el contratista allegó una versión 0.2 del documento PAGA a la interventoría, el cual fue revisado, pero aún no cuenta con aprobación de la misma, las observaciones se emitieron mediante comunicado CA-285-0073-0300-24 del 03/12/2024.

Posterior a esto, se recibe ante la interventoría el día 14/01/2024 el PAGA versión 0.3, el cual fue aprobado mediante comunicado C-285-0090-0036-25 de fecha 28/01/2025.

Dicho lo anterior la interventoría califica la gestión ambiental por parte del contratista como aceptable, considerando que, en el desarrollo del proyecto, se hizo control, prevención y mitigación de los impactos ambientales generados por el reemplazo del puente vehicular sobre el Río Venadillo. Anotando adicionalmente que se cumplió a cabalidad con la medida compensatoria impuesta por Cortolima dentro del permiso de ocupación de cauce otorgado para el proyecto.

1.16 Certificación expedida por la interventoría donde exprese que se han revisado los documentos soporte de pagos salariales y del SGSST remitidos por el contratista de obra para el respectivo informe.

La interventoría indica que mes a mes realizó una revisión detallada de los soportes indicados, encontrando inconsistencias las cuales fueron informadas al contratista para su ajuste; posteriormente se tenían reuniones conjuntas si eran necesarias para la revisión final de la documentación. En obra la interventoría llevó un control diario diligenciando un formato específico para este fin (ver Anexo 2. PERSONAL DEL CONTRATISTA).

1.17 Permisos y/o autorizaciones ambientales

Se presenta el siguiente resumen:

Tabla 16. Síntesis de requerimientos legales componente ambiental para el proyecto

Permiso y/o autorización	Descripción y/o justificación
Concesión de agua industrial	Se contó con la venta de agua en bloque por parte de IBAL S.A.S. E.S.P
Vertimientos	A lo largo del proyecto se contó con el préstamo de baños de viviendas cercanas, sistemas conectados a un sistema séptico. Para ello se firmó actas de acuerdo con los propietarios, una vez finalizado el proceso constructivo se realizó entrega de cada una de estas y se firmó acta de entrega y paz y salvo a satisfacción de los propietarios.
Ocupación de Cauce	El contratista solicitó este permiso mediante radicado en plataforma No. 3479 del 18/03/2024, Cortolima emitió el Auto 2150 de 10/05/2024 por medio del cual da inicio al trámite ambiental. El 03/07/2024 se realizó la visita de evaluación y posteriormente en la

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	28 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

Permiso y/o autorización	Descripción y/o justificación
	Resolución No.6847 del 20/11/2024 se otorgó el permiso de ocupación de cauce al Departamento del Tolima, quien en Resolución 364 del 17/02/2025 cedió los derechos y obligaciones a favor del Consorcio Puente Ambalema-Palobayo. Posteriormente, al no estar de acuerdo con la medida de compensación impuesta inicialmente, Cortolima a través de la Resolución No. 1029 del 08/04/2025 modifica parcialmente la Resolución No.6847 del 20 de noviembre de 2024, dando viabilidad a la solicitud de cambio de la medida compensatoria. La medida compensatoria fue realizada y se radicó en Cortolima el INFORME DE CONSTRUCCIÓN DE ESTUFAS ECOEFICIENTES Y SIEMBRA DE HUERTO LEÑERO bajo radicado 1722 del 25/04/2025 solicitando visita técnica por parte de la autoridad ambiental, la cual fue realizada el 19/05/2025 según acta de visita levantada. Toda la información citada se adjunta en los anexos del presente informe.
Fuentes de materiales	Se empleo un proveedor que cuenta con los permisos minero y ambientales, al igual que RUCOM vigente y correspondió a Triturados y Vías La Caima S.A.S.
Manejo y disposición de RCD	Se contó con permisos para la disposición de RCD y nivelaciones topográficas, para lo cual el contratista informo la disposición en dos predios ubicados en el AID del proyecto y de los cuales el contratista presentó actas de acuerdo de ambos predios, para la utilización de los mismos como zona de depósito/nivelación de material, tema sobre el cual ya se detalló la información en numeral anterior
Manejo y Disposición de Residuos Sólidos Convencionales	Se realizo acopio de residuos en área lateral izquierdo del campamento, donde se protegieron del agua. Se realizaron dos entregas de estos residuos a la empresa de servicios públicos para su disposición final, en el relleno sanitario la Miel, particularmente Interaseo S.A E.S.P.
Aprovechamiento Forestal	No se requirió, el componente arbóreo no se vio afectado por el proceso constructivo

Fuente: Elaboración propia

A continuación, se detalla la información y trazabilidad relacionada con el permiso de ocupación de cauce obtenido ante Cortolima:

Tabla 17. Trazabilidad permiso de ocupación de cauce sobre Río Venadillo

Acto Administrativo/Documento	Contenido/actividad realizada
Radicado Cortolima No. 3479 del 18/03/202	El Contratista solicitó ante Cortolima el permiso de ocupación de cauce

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	29 de 40    @goberntolima www.tolima.gov.co

Acto Administrativo/Documento	Contenido/actividad realizada
Auto No. 2150 de 10/05/2024	Cortolima da inicio al trámite ambiental
Acta de visita técnica del 03/07/2024	Funcionario de Cortolima realiza visita de evaluación al sitio del proyecto y levanta el acta respectiva. Al visita tuvo el acompañamiento de funcionario de la Gobernación y el contratista constructor.
Resolución 6847 del 20/12/2024	Cortolima concede al Departamento del Tolima el permiso de ocupación de cauce sobre el Río Venadillo para la construcción de un puente vehicular en el corredor vial Palobayo – Ambalema, en jurisdicción del municipio de Ambalema-Tolima. Impuso en el artículo 3 la siembra y mantenimiento por tres años de 200 árboles de especies nativas, lo que se consideró inconveniente para todas las partes interesadas; particularmente porque estos tres años exceden los plazos contractuales tanto del contrato de obra como de interventoría.
Resolución 364 del 17/02/2025	Cortolima autoriza la cesión total de derechos y obligaciones dentro del expediente OCA-1-3479-20240510 Ocupación de cauce sobre el río Venadillo para la construcción del puente vehicular en el corredor vial Palobayo – Ambalema a favor del Consorcio Puente Ambalema – Palobayo.
Resolución 1029 del 08/04/2025	Cortolima modificar el artículo tercero y cuarto de la Resolución CORTOLIMA No. 6847 del 20 de noviembre de 2024, estableciendo la modificación de compensación ambiental alternativa presentada mediante el radicado No.0085 del 23 de enero de 2025, por parte del CONSORCIO PUENTE AMBALEMA-PALOBAYO, identificado con NIT No.901.826.039-0, consistente en la entrega de tres (3) estufas ecoeficientes a los beneficiarios establecidos en la propuesta y la entrega, establecimiento y siembra de material vegetal - 100 individuos arbóreos con la finalidad de establecer huertos leñeros, en un área que dispondrán los beneficiarios de las estufas mencionadas.
Radicado Cortolima 1722 del 28/04/2025	El contratista constructor hace entrega a Cortolima del “Informe de construcción de estufas ecoeficientes y siembra de huerto leñero”, documento en el cual se describen las actividades realizadas y los datos de las tres personas beneficiadas en la vereda Vile Alto. Documento de 13 páginas. Al final del comunicado el contratista solicita visita a la autoridad ambiental para hace entrega de las obligaciones cumplidas.
Acta de visita Cortolima del 19/05/2025	Cortolima evidenció la correcta construcción de las estufas ecoeficientes y el establecimiento de los huertos leñeros, individuos arbóreos en buenas condiciones fitosanitarias y de desarrollo. El cierre del expediente se encuentra en trámite por parte de la entidad ambiental

Fuente: Elaboración propia

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	30 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

Bajo radicado No. 3479 del 18/03/2024 el contratista solicitó ante Cortolima el permiso de ocupación de cauce sobre el río Venadillo. Una vez realizada la visita de evaluación por parte de funcionario de la Entidad, Cortolima emitió la Resolución 6847 del 20 de noviembre de 2024; *“Por medio de la cual se emite decisión de fondo sobre un permiso de ocupación de cauce y se dictan otras disposiciones”*, acto administrativo en el cual se otorga al Departamento del Tolima el permiso de ocupación de cauce sobre el río Venadillo para la construcción de un puente vehicular en el corredor vial Palobayo-Ambalema, en jurisdicción del municipio de Ambalema-Tolima.

Em comunicado CA-285-0070-0294-24 de fecha 03/12/2024 con Asunto: *“Consideraciones Resolución No. 6847 del 20 de noviembre de 2024. Permiso de Ocupación de Cauce sobre el río Venadillo”*, la interventoría presentó objeciones a las medidas compensatorias impuestas en los artículos 3 y 4 del acto administrativo, las cuales corresponden a la siembra y mantenimiento por tres (3) años de 200 individuos arbóreos de especies nativas dentro de la Subzona hidrográfica del Río Venadillo y la construcción de cerramiento o aislamiento del área con postes en madera aserrada y alambre de púas para proteger los árboles sembrados. La interventoría consideró que el cambio de medida compensatoria era procedente, principalmente por la culminación tanto del contrato de obra como el de interventoría en fechas próximas, por lo que no se cubrirían los tres años de mantenimiento del arbolado sembrado en cumplimiento de la medida compensatoria impuesta. Esto implicaría que ambos contratos sólo podrían ser liquidados en tres años, una vez se obtuviera el certificado de cierre del expediente OCA-1-3479-20240510.

Después de reunión conjunta con la Gobernación, Contratista e Interventoría se comparte la apreciación anterior, y se solicitó a la Autoridad Ambiental el cambio de medida compensatoria a través de radicado electrónico No. 00857 de 23/01/2025 ante Cortolima.

En la Resolución 364 de 17/02/2025, Cortolima aceptó la cesión de obligaciones y derechos del permiso de ocupación de cauce a favor del Consorcio Puente Ambalema-Palobayo.

Finalmente, mediante Resolución No. 1029 del 08/04/2025 *“Por medio de la cual se modifica parcialmente la Resolución CORTOLIMA No.6847 del 20 de noviembre de 2024 y se establecen otras disposiciones”*, Cortolima modificó los artículos tercero y cuarto de la Resolución CORTOLIMA No. 6847 del 20 de noviembre de 2024, estableciendo la compensación ambiental alternativa presentada mediante el radicado No.0085 del 23 de enero de 2025, por parte del CONSORCIO PUENTE AMBALEMA- PALOBAYO, consistente en la entrega de tres (3) estufas ecoeficientes a los beneficiarios establecidos en la propuesta y la entrega, establecimiento y siembra de material vegetal - 100 individuos arbóreos con la finalidad de establecer huertos leñeros, en un área que dispondrán los beneficiarios de las estufas.

El contratista en consecuencia llevó a cabo la construcción de las tres estufas y la siembra correspondiente de 300 árboles los cuales pertenecen al bosque dendroenergético: 90 igua (*pseudosamanea guachapele*), 70 guásimos (*Guazuma ulmifolia*), 70 matarraton (*Gliricidia sepium*), 70 vainillo (*Inga eriocarpa*).

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	31 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

En radicado Cortolima 1722 del 28/04/2025, el contratista entregó a Cortolima el “Informe de construcción de estufas ecoeficientes y siembra de huerto leñero”, documento en el cual se describen las actividades realizadas y los datos de las tres personas beneficiadas en la vereda Vile Alto. Al final del comunicado remitatorio el contratista solicitó visita a la autoridad ambiental para hacer entrega de las actividades cumplidas.

Cortolima realizó visita el 19/05/2025, en cuya acta evidenció la correcta construcción de las estufas ecoeficientes y el establecimiento de los huertos leñeros, individuos arbóreos en buenas condiciones fitosanitarias y de desarrollo. El cierre del expediente se encuentra en trámite por parte de la entidad ambiental al cierre de este Informe.

2. INFORMACION SOCIAL

2.1 Descripción de las actividades del plan de acción de la interventoría y verificación del plan de gestión social del contratista. Debe incluir copia de los anexos referentes a la gestión del contratista requerido en el contrato.

Contratista

Mensualmente el contratista dentro del su INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL - SOCIAL Y SG-SST desarrolló el componente SOCIAL, en el cual se informó sobre las actividades ejecutadas anexando los respectivos soportes dentro de la carpeta de anexos componente social, que igualmente se adjuntan al presente informe.

Se sintetizan a continuación las actividades realizadas a mes a mes dentro de la ejecución del contrato de obra:

ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL Informe No.1 – 11/06/2024 al 10/07/2024:

- Se elaboraron los volantes de divulgación a la comunidad.
- El contratista reportó la contratación de 4 personas para mano de obra no calificada local, lo cual corresponde a un 57% en la contratación del personal del AID.
- Se mencionó la elaboración de 4 actas de vecindad de inicio del sector objeto de intervención.

ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL Informe No.2 – 11/07/2024 al 10/08/2024:

- Se elaboraron los volantes de divulgación a la comunidad.
- El contratista reportó la contratación de 47 personas para mano de obra no calificada, de los cuales 45 son directos y 2 indirectos, de los cuales el 40% (19 personas) correspondieron a mano de obra calificada y el 60% (28 personas)

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	32 de 40    @ gobertolima www.tolima.gov.co

correspondieron a mano de obra no calificada, de los cuales 23 son locales y 5 externos.

- Se adjuntó acta de conformación del comité de participación comunitaria.

ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL Informe No.3 – 11/08/2024 al 10/09/2024:

- El contratista reportó la contratación de 46 personas para mano de obra no calificada, de los cuales el 35% (16 personas) correspondieron a mano de obra calificada y el 65% (30 personas) correspondieron a mano de obra no calificada, de los cuales 25 son locales y 5 externos.
- Se adjuntó acta de conformación del comité de participación comunitaria.

ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL Informe No.4 – 11/09/2024 al 10/10/2024:

- El contratista reportó la contratación de 48 personas, de los cuales el 40% (19 personas) correspondieron a mano de obra calificada y el 60% (29 personas) correspondieron a mano de obra no calificada, de los cuales 6 son locales y 23 externos.

ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL Informe No.5 – 11/10/2024 al 10/11/2024:

- El contratista reportó la contratación de 44 personas, de los cuales el 40% (19 personas) correspondieron a mano de obra calificada y el 60% (25 personas) correspondieron a mano de obra no calificada, de los cuales 17 son locales y 8 externos.

ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL Informe No.6 – 11/11/2024 al 10/12/2024:

- El contratista reportó la contratación de 64 personas, de los cuales el 53% (34 personas) corresponde a mano de obra calificada y el 47% (30 personas) corresponde a mano de obra no calificada, de los cuales 16 son locales y 14 externos.

ACTIVIDADES COMPONENTE SOCIAL Informe No.7 – 11/12/2024 al 20/12/2024 y 07/01/2025 al 25/01/2025:

- El Contratista empleó un total de 83 colaboradores, de los cuales el 49% (41 personas) correspondieron a mano de obra calificada y el 51% (42 personas) correspondieron a mano de obra no calificada.

Como actividades de cierre del proyecto es importante señalar certificados obtenidos a la finalización del contrato de obra:

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	33 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

Tabla 18. Síntesis de certificaciones y paz y salvo obtenidos al finalizar el contrato de obra

Certificación Personería Municipal de Ambalema-Tolima emitida el 31/03/2025	No se presentaron quejas, reclamos e inquietudes por parte de la comunidad registradas en el Personería.
Certificado de Secretaria de Planeación e Infraestructura y TICs del municipio de Ambalema- Tolima emitido el 04/04/2025	No se encontraron pendientes: quejas, reclamos e inquietudes por parte de la comunicad que hubieren sido radicadas
Paz y salvo de la comunidad firmado por 92 personas	Se indica que el contratista está a paz y salvo por todo concepto (alimentación, arriendos, pago de salarios de los trabajadores).
Paz y Salvo Comité de Participación Comunitaria	Suscrito con Yessica Maria Moreno y María Alexis Moreno
Otros paz y salvos y Actas de entrega	Relacionados con inmuebles alquilados para campamento y vivienda de trabajadores. Al igual que baterías sanitarias existentes en estos predios.

Fuente: Elaboración propia

Interventoría

Por parte de la interventoría, durante la ejecución de la obra se realizaron el acompañamiento e inspecciones al contratista que garantizaran el cumplimiento del programa de gestión social, se participó en reuniones al igual que el acompañamiento a reuniones y en general a procesos de atención a la comunidad. No se presentaron ningún tipo de novedades con la comunidad, la cual estuvo siempre en buena disposición y con toda la colaboración para el buen desarrollo de la obra. Ver ANEXOS COMPONENTE SOCIAL-INTERVENTORIA.

2.2 Observaciones y recomendaciones formuladas por la interventoría. Descripción de los atrasos o adelantos o eventualidades que se estén presentando conforme al plan de gestión social del contratista aprobado por la interventoría. Además, se deben relacionar las acciones correctivas propuestas, así como la respuesta por parte del contratista.

El documento PAGA fue aprobado por la interventoría mediante comunicado C-285-0090-0036-25 de fecha 28/01/2025, dentro del cual se formuló el Plan gestión social, que si bien se aprobó en el año 2025, desde el inicio de la obra se cumplieron con las actividades en la materia, generando soportes como actas, documentos, registros que hacen parte de los ANEXOS COMPONENTE SOCIAL-CONTRATISTA, adjuntos al presente informe.

2.3 Relación de recursos físicos empleados para el desarrollo del componente social del contratista y de la interventoría.

Contratista

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	34 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

El contratista contó con el punto SAU ubicado en el área de influencia directa del proyecto en el predio de la Sra Jessica Moreno vereda Vile Alto, para la atención a la comunidad en general. El contratista estuvo presto en campo a recibir todas las peticiones quejas y/o reclamos que se presentaran, su horario de atención fuera los días martes, miércoles y jueves de 10:00 am a 4:00 pm. También contó con líneas telefónicas de atención al usuario (3124886337 - 3124458304), con la disposición de 7:00 am a 4:00 pm de lunes a viernes, donde la comunidad en general y la de los sectores más distantes del Proyecto, podían encontrar respuestas claras y oportunas para cada una de sus inquietudes.

Adicional a esto, se realizó la instalación del buzón de sugerencias, el cual se ubicó en la vereda EL ALTO, mismo punto del Sistema de Atención a la Comunidad, del cual se reporta no haber recibido ningún tipo de PQRs durante el desarrollo del proyecto.

El contratista presentó evidencias de las instalaciones con el equipamiento adecuado para atender a la comunidad, junto con los formatos dispuestos para la atención al usuario.

El contratista relaciona las charlas dadas al personal de obra en cuanto a inducción y las demás con el objetivo de concientizar y sensibilizar al personal de obra en diversos temas de interés para el proyecto, de las cuales se anexa listas de asistencia en carpeta de anexos componente social.

Tabla 19. Charlas componente social realizadas por el contratista

Tema	Fecha
Respeto Por la Comunidad	28/06/2024
Riesgo Público	28/06/2024
Puntualidad en el Trabajo	28/06/2024
La Unión hace la fuerza	28/06/2024
Trabajo En Equipo	28/06/2024
Manejo de Estrés	28/06/2024
Pensamiento de Líder Resolución de conflictos	28/06/2024
Manejo de equipo	23/07/2024
Liderazgo	24/07/2024
Sentido de pertenencia	25/07/2024
Adecuado vocabulario	26/07/2024
Mirar antes de actuar	27/07/2024
Pensar antes de hablar	29/07/2024
Puntualidad	30/07/2024
Pensamiento de líder	31/07/2024
Puntualidad en el trabajo	1 agosto 2024
La unión hace la fuerza	2 agosto 2024
Pensar siempre antes de hablar	3 agosto 2024
Mirar siempre antes de actuar	5 agosto 2024

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	35 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

Tema	Fecha
Relaciones interpersonales	6 agosto 2024
Manejo de estrés	8 agosto 2024
Trabajo en equipo	9 agosto 2024
Respeto por los demás	10 agosto 2024
Sentido de pertenencia	12 agosto 2024
Pensamiento líder	13 agosto 2024
Respeto por la comunidad	14 agosto 2024
Adecuado vocabulario	15 agosto 2024
Liderazgo	16 agosto 2024
Liderazgo positivo	20 agosto 2024
Liderazgo negativo	21 agosto 2024
Manejo de temperamento	22 agosto 2024
Compañerismo	23 agosto 2024
Resolución de conflictos	24 agosto 2024
Respeto por uno mismo	26 agosto 2024
Productividad laboral	28 agosto 2024
Comunicación asertiva	29 agosto 2024
Liderazgo	02 septiembre 2024
La unión hace la fuerza	03 septiembre 2024
Trabajo en equipo	04 septiembre 2024
Liderazgo positivo	05 septiembre 2024
Compañerismo	06 septiembre 2024
Adecuada señalización	07 septiembre 2024
Sentido de pertenencia	09 septiembre 2024
Manejo de la señalización y del flujo vehicular	10 septiembre 2024
Unión hace la fuerza	11 septiembre 2024
Adecuado vocabulario	12 septiembre 2024
Resolución de conflictos	13 septiembre 2024
Manejo del estrés	16 septiembre 2024
Puntualidad	17 septiembre 2024
Productividad laboral	18 septiembre 2024
Manejo de temperamento	19 septiembre 2024
Pensamiento de líder	20 septiembre 2024
Respeto por los demás	21 septiembre 2024
Relaciones interpersonales	23 septiembre 2024
Respeto por uno mismo	24 septiembre 2024
Comunicación asertiva	25 septiembre 2024
Sentido de pertenencia	26 septiembre 2024
Respeto por la comunidad	27 septiembre 2024
Pensar antes de hablar	30 septiembre 2024

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	36 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

Tema	Fecha
Los celos son un veneno mortal	01 octubre 2024
Cadena de hábitos	02 octubre 2024
Hoy no es lo mismo que ayer	04 octubre 2024
Sentido común	05 octubre 2024
La Salud	06 octubre 2024
Relaciones interpersonales	07 octubre 2024
Respeto por la comunidad	08 octubre 2024
Respeto por mis compañeros	09 octubre 2024
Manejo del temperamento	10 octubre 2024
Resolución de conflictos	11 octubre 2024
Trabajo en equipo	15 octubre 2024
Puntualidad	16 octubre 2024
El secreto para trabajar mejor y feliz	17 octubre 2024
Como alcanzar el equilibrio entre la vida y el trabajo	18 octubre 2024
Porque no se trabaja en el trabajo	19 octubre 2024
Trabajo en equipo	20 octubre 2024
Resolución de conflictos	21 octubre 2024
Que nos hace sentir bien sobre nuestro trabajo – motivación	22 octubre 2024
Manejo del estrés	23 octubre 2024
Las pequeñeces de la vida	24 octubre 2024
Nadie trata de echarle la culpa al otro	25 octubre 2024
Liderazgo negativo	26 octubre 2024
Liderazgo positivo	28 octubre 2024
La cooperación	29 octubre 2024
Todo es cuestión de actitud	30 octubre 2024
Tolerancia	31 octubre 2024
Hábitos de vida saludable	1 noviembre 2024
Orden y aseo	2 noviembre 2024
Sentido común	3 noviembre 2024
Que pasa si estas sentado todo el día	12 noviembre 2024
Los riesgos de realizar bromas en el área de trabajo	13 noviembre 2024
Importancia del uniforme en el trabajo	14 noviembre 2024
Violencia en el lugar de trabajo	15 noviembre 2024
Hábitos saludables en el trabajo	16 noviembre 2024
Igualdad y diversidad	17 noviembre 2024
Estrés laboral	18 noviembre 2024
Relaciones laborales	19 noviembre 2024

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	37 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

Tema	Fecha
No discriminación	20 noviembre 2024
Conductas responsables	21 noviembre 2024
Igualdad de género y diversidad	22 noviembre 2024
Dialogo	25 noviembre 2024
Normas del trabajo	26 noviembre 2024
Lenguaje claro y directo	27 noviembre 2024
Manejo del estrés laboral	28 noviembre 2024
Higiene postural	29 noviembre 2024
Sentido común	30 noviembre 2024
La unión hace la fuerza	2 diciembre 2024
Cadena de hábitos	3 diciembre 2024
Compañerismo	4 diciembre 2024
Calistenia	5 diciembre 2024
Los celos son un arma mortal	6 diciembre 2024
Comunicación asertiva	7 diciembre 2024
Estrés laboral	9 diciembre 2024
No a los malos tratos	10 diciembre 2024
El Respeto Hacia los Compañeros	11 diciembre 2024
Salud Mental Física y Emocional	12 diciembre 2024
Promoción de Estilos de Vida Saludable	13 diciembre 2024
Autoestima	14 diciembre 2024
Respeto por la Comunidad	16 diciembre 2024
Pausas Activas	17 diciembre 2024
Yo me Cuido y Cuido mi Compañero	18 diciembre 2024
Orgullo Fuente Inagotable de Satisfacción	19 diciembre 2024
Trabajo en Equipo – Cadena de Hábitos	20 diciembre 2024
Unión Hace la Fuerza	03 enero 2025
Aguafiestas	04 enero 2025
Acoso Laboral	07 enero 2025
Manejo de Estres	08 enero 2025
Salud Mental	09 enero 2025
Respeto Hacia los Compañeros de Trabajo	10 enero 2025
Las Pequeñeces de la Vida	11 enero 2025
Orgullo Fuente Inagotable de Satisfacción	12 enero 2025
Perjuicio de las Diversiones Ruidosas	13 enero 2025
Nadie Trata de Echarle la Culpa a Nadi	14 enero 2025
Trabajo en Equipo	15 enero 2025
Que Nos Hace Sentir Bien de Nuestro Trabajo	16 enero 2025
Resolución de Conflictos	17 enero 2025
Sentimiento de Aburrimiento	20 enero 2025

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	38 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

Tema	Fecha
Uno para Todos y Todos Para Uno	21 enero 2025
Sentido de Pertenencia y Satisfacción	22 enero 2025
La Historia del Burro	23 enero 2025
La Elección de los Gansos: Trabajo en Equipo	24 enero 2025
Ponte las Pilas	25 enero 2025

Fuente: Elaboración propia

Interventoría

Por parte de la interventoría, se relaciona a continuación el consolidado de PQRS recibidas por parte de la comunidad o entes externos.

Tabla 20. Consolidado PQRS registradas en el proyecto

PQRS	Acumuladas	Presente periodo	Observaciones
Recibida	0	0	N/A
Cerrada	0	0	N/A
Abierta	0	0	N/A
En tramite	0	0	N/A

Fuente: Elaboración propia

Como se observa en la tabla anterior, durante la ejecución del puente vehicular sobre el río Venadillo en cumplimiento del programa de atención a la comunidad no se recepcionaron manifestaciones ciudadanas. Es importante recalcar que así también lo certificó la Personería municipal y la Secretaria de Planeación e Infraestructura y TICs del municipio de Ambalema- Tolima.

2.4 Calificación del componente de gestión social.

Se presento una versión 4 del documento PAGA el día 14/01/2024, el cual se aprobó por parte de la interventoría, el cual contiene las actividades y programas del componente social. La Interventoría califica como aceptable la gestión social realizada por el Consorcio Puente Ambalema-Palobayo por cuanto dio cumplimiento a las disposiciones en gestión social y obtuvo los soportes y registros necesarios.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO (AMBIENTAL, SOCIAL Y SST)

En el Anexo se relaciona el registro fotográfico Técnico y SST, las cuales contienen las actividades realizadas durante el desarrollo de la obra.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	39 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

4. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Inicialmente se establece que el proyecto ejecutado se encuentra en la lista de actividades de mejoramiento de infraestructura de transporte que no requiere la obtención de licencia ambiental, tal y como lo establece el Decreto 1076 de 2015 en el capítulo 5. Sección 1. ACTIVIDADES DE MEJORAMIENTO EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE así:

Artículo 2.2.2.5.1.1. Modo Terrestre- Férreo

(...)

5. La adecuación, ampliación, reforzamiento, reemplazo de puentes, estructuras deprimidas y/o pontones en vías férreas". Subrayado fuera de texto.

El mismo decreto en el artículo 2.2.2.5.4.3 Programa de Adaptación de la Guía Ambiental, indica que para la ejecución de actividades de mejoramiento listadas en el decreto se deberá aplicar las Guías Ambientales para cada subsector y elaborar el documento PAGA; como en efecto se cumplió por parte del Consorcio Puente Ambalema-Palobayo.

Es de recordar que el puente que existía construido alrededor hace 35 años, colapsó en el año 2022 por una falla geológica que generó un movimiento de la masa de suelo que debilitó la base de la estructura y provocó su desplazamiento vertical de aproximadamente dos metros.

En tal sentido, el contratista constructor desarrolló el documento PAGA el cual fue sometido a revisión y aprobación de Interventoría. En el proyecto se dio cumplimiento a las directrices correspondientes a proyectos no licenciados, establecidos claramente en la Guía de manejo ambiental de proyectos de infraestructura -Modo Carretero, INVIAS 2022.

El contratista tramitó y obtuvo el permiso de ocupación de cauces sobre el Río Venadillo. Dio cumplimiento a todas las obligaciones impuestas en el acto administrativo emitido por Cortolima como autoridad ambiental competente, incluyendo la ejecución en debida forma de la medida de compensación.

El desarrollo del componente de seguridad y salud en el trabajo (SST) durante el desarrollo de la obra se realizó de manera satisfactoria, cumpliendo con la normatividad vigente y garantizando condiciones seguras de trabajo para trabajadores y colaboradores, obteniendo un reporte de accidentalidad de ceros (0).

En el componente social se dio cumplimiento al Plan de Gestión social conformado por subprogramas así:

- Seguimiento y control a la mano de obra contratada con enfoque de género, derechos y diferencial
- Infraestructura de predios y servicios públicos
- Atención a la Comunidad.

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	40 de 40    @gobertolima www.tolima.gov.co

- Información y divulgación.
- Comité de Participación comunitario
- Cultura Vial y Participación Comunitaria
- Inclusión social con perspectiva de género y de transversalización

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	46 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

ANEXO No. 01
ACTAS COMITÉ DE OBRA
NO SE REGISTRARON

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	47 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

ANEXO No. 02

CONTROL DE PERSONAL DEL CONTRATISTA

Firma _____
Nombre: Jose Luis tique cruz
Residente de Interventoría

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79893182		RAMOS SALAZAR JORGE ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 No. 3 76 Oficina 507	IBAGUE-TOLIMA	2694886	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2024-12	2024-12	1258571360	9481570222	I	2025/01/22	2025/02/11	BANCO DE OCCIDENTE	\$2,813,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																			
EMPLEADO					PENSION					SALUD					CCF				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días
1	CC 79893182	RAMOS JORGE	230201	30	\$9,250,703	\$1,572,800	EPS005	30	\$9,250,703	\$1,156,400		0	\$0	\$0	14-23	30	\$9,250,703	\$48,300	0
Total Afiliados(1)					\$9,250,703	\$1,572,800			\$9,250,703	\$1,156,400			\$0	\$0			\$9,250,703	\$48,300	\$0

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,572,800	\$20,400	\$0	\$1,593,200	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$1,572,800	\$20,400	\$0	\$1,593,200	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$48,300	\$700	\$0	\$49,000	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$48,300	\$700	\$0	\$49,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,156,400	\$15,000	\$0	\$1,171,400	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$1,156,400	\$15,000	\$0	\$1,171,400	
TOTAL				1	\$2,777,500	\$36,100	\$0	\$2,813,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800078011	9	ICMO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 129 17F 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4180056	Si

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irt	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes
SUCURSAL: BOGOTA (18 Afiliados)																																						
Centro de Trabajo: 1 OPERATIVOS (18 Afiliados)																																						
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (18 Afiliados)																																						
1	CC 74325881	ALFONSO JUAN								X									230301	22	\$1,890,435	\$302,500	EPS017	22	\$1,890,435	\$75,700	CCF24	22	\$1,890,435	\$75,700	22	\$1,890,435	\$131,600	22	\$0	\$0	\$585,500	
2	CC 74325881	ALFONSO JUAN												X					230301	8	\$640,000	\$102,400	EPS017	8	\$640,000	\$25,600	CCF24	8	\$640,000	\$25,600	8	\$640,000	\$0	8	\$0	\$0	\$153,600	
3	CC 1056800289	ALFONSO OSCAR								X									230301	22	\$2,330,087	\$372,900	EPS005	22	\$2,330,087	\$93,300	CCF24	22	\$2,330,087	\$93,300	22	\$2,330,087	\$162,200	22	\$0	\$0	\$721,700	
4	CC 1056800289	ALFONSO OSCAR											X						230301	8	\$672,000	\$107,600	EPS005	8	\$672,000	\$26,900	CCF24	8	\$672,000	\$26,900	8	\$672,000	\$0	8	\$0	\$0	\$161,400	
5	CC 79977987	ARIZA JOHN								X									230301	22	\$2,562,319	\$410,000	EPS017	22	\$2,562,319	\$102,500	CCF24	22	\$2,562,319	\$102,500	22	\$2,562,319	\$178,400	22	\$0	\$0	\$793,400	
6	CC 79977987	ARIZA JOHN												X					230301	8	\$693,334	\$111,000	EPS017	8	\$693,334	\$27,800	CCF24	8	\$693,334	\$27,800	8	\$693,334	\$0	8	\$0	\$0	\$166,600	
7	CC 1002300113	CHAPETA JHON								X									230301	22	\$1,410,145	\$225,700	EPS037	22	\$1,410,145	\$56,500	CCF24	22	\$1,410,145	\$56,500	22	\$1,410,145	\$98,200	22	\$0	\$0	\$436,900	
8	CC 1002300113	CHAPETA JHON												X					230301	8	\$373,334	\$59,800	EPS037	8	\$373,334	\$15,000	CCF24	8	\$373,334	\$15,000	8	\$373,334	\$0	8	\$0	\$0	\$89,800	
9	CC 83252604	CHAVARRO ALDEMAR								X									230301	22	\$2,255,652	\$361,000	EPS037	22	\$2,255,652	\$90,300	CCF24	22	\$2,255,652	\$90,300	22	\$2,255,652	\$157,000	22	\$0	\$0	\$698,600	
10	CC 83252604	CHAVARRO ALDEMAR												X					230301	8	\$640,000	\$102,400	EPS037	8	\$640,000	\$25,600	CCF24	8	\$640,000	\$25,600	8	\$640,000	\$0	8	\$0	\$0	\$153,600	
11	CC 17676269	CHAVES ANGELO									X								230301	20	\$1,300,627	\$208,200	EPS002	20	\$1,300,627	\$52,100	CCF24	20	\$1,300,627	\$52,100	20	\$1,300,627	\$90,600	20	\$0	\$0	\$403,000	
12	CC 17676269	CHAVES ANGELO												X					230301	10	\$489,799	\$78,400	EPS002	10	\$489,799	\$19,600	CCF24	10	\$489,799	\$19,600	10	\$489,799	\$0	10	\$0	\$0	\$117,600	
13	CC 75059524	CORTEZ ELIAS								X									25-14	22	\$2,135,042	\$341,700	EPS037	22	\$2,135,042	\$85,500	CCF24	22	\$2,135,042	\$85,500	22	\$2,135,042	\$148,600	22	\$0	\$0	\$661,300	
14	CC 75059524	CORTEZ ELIAS												X					25-14	8	\$652,571	\$104,500	EPS037	8	\$652,571	\$26,200	CCF24	8	\$652,571	\$26,200	8	\$652,571	\$0	8	\$0	\$0	\$156,900	
15	CC 65708823	DONOSO JISSELL									X								230301	20	\$2,069,276	\$331,100	EPS002	20	\$2,069,276	\$82,800	CCF24	20	\$2,069,276	\$82,800	20	\$2,069,276	\$144,100	20	\$0	\$0	\$640,800	
16	CC 65708823	DONOSO JISSELL												X					230301	10	\$733,334	\$117,400	EPS002	10	\$733,334	\$29,400	CCF24	10	\$733,334	\$29,400	10	\$733,334	\$0	10	\$0	\$0	\$176,200	
17	CC 1085181250	LOPEZ JOSE								X									231001	22	\$1,209,094	\$193,500	EPS002	22	\$1,209,094	\$48,400	CCF24	22	\$1,209,094	\$48,400	22	\$1,209,094	\$84,200	22	\$0	\$0	\$374,500	
18	CC 1085181250	LOPEZ JOSE												X					231001	8	\$346,667	\$55,500	EPS002	8	\$346,667	\$13,900	CCF24	8	\$346,667	\$13,900	8	\$346,667	\$0	8	\$0	\$0	\$83,300	
19	CC 9498961	LOPEZ JOSE								X									230301	22	\$1,837,718	\$294,100	EPS005	22	\$1,837,718	\$73,600	CCF24	22	\$1,837,718	\$73,600	22	\$1,837,718	\$128,000	22	\$0	\$0	\$569,300	
20	CC 9498961	LOPEZ JOSE												X					230301	8	\$440,000	\$70,400	EPS005	8	\$440,000	\$17,600	CCF24	8	\$440,000	\$17,600	8	\$440,000	\$0	8	\$0	\$0	\$105,600	
21	CC 82332098	MEJIA LAZARO								X									230301	30	\$3,150,435	\$504,100	EPS002	30	\$3,150,435	\$126,100	CCF24	30	\$3,150,435	\$126,100	30	\$3,150,435	\$219,300	30	\$0	\$0	\$975,600	
22	CC 5836434	MENDOZA JOSE								X									0		\$0	\$0	EPS037	30	\$1,900,000	\$76,000	CCF24	30	\$1,900,000	\$76,000	30	\$1,900,000	\$132,300	30	\$0	\$0	\$284,300	
23	CC 1057095245	MOLINA YEISON								X									230301	18	\$1,539,130	\$246,300	EPS037	18	\$1,539,130	\$61,600	CCF24	18	\$1,539,130	\$61,600	18	\$1,539,130	\$107,200	18	\$0	\$0	\$476,700	
24	CC 1057095245	MOLINA YEISON												X					230301	12	\$800,000	\$128,000	EPS037	12	\$800,000	\$32,000	CCF24	12	\$800,000	\$32,000	12	\$800,000	\$0	12	\$0	\$0	\$192,000	
25	CC 79124248	ROMAN GILBERTO								X									25-14	30	\$3,680,825	\$589,000	EPS037	30	\$3,680,825	\$147,300	CCF24	30	\$3,680,825	\$147,300	30	\$3,680,825	\$256,200	30	\$0	\$0	\$1,139,800	
26	CC 1120562392	SALGADO JAIDER								X									230301	20	\$1,143,623	\$183,000	EPS041	20	\$1,143,623	\$45,800	CCF24	20	\$1,143,623	\$45,800	20	\$1,143,623	\$79,600	20	\$0	\$0	\$354,200	
27	CC 1120562392	SALGADO JAIDER												X					230301	10	\$433,334	\$69,400	EPS041	10	\$433,334	\$17,400	CCF24	10	\$433,334	\$17,400	10	\$433,334	\$0	10	\$0	\$0	\$104,200	
28	CC 1193570170	SANABRIA MIGUEL								X									230201	30	\$1,663,152	\$266,200	EPS041	30	\$1,663,152	\$66,600	CCF24	30	\$1,663,152	\$66,600	30	\$1,663,152	\$115,800	30	\$0	\$0	\$515,200	
29	CC 79666893	VEGA ALVARO								X									25-14	20	\$1,930,435	\$308,900	EPS037	20	\$1,930,435	\$77,300	CCF24	20	\$1,930,435	\$77,300	20	\$1,930,435	\$134,400	20	\$0	\$0	\$599,900	
30	CC 79666893	VEGA ALVARO												X					25-14	10	\$750,000	\$120,000	EPS037	10	\$750,000	\$30,000	CCF24	10	\$750,000	\$30,000	10	\$750,000	\$0	10	\$0	\$0	\$180,000	
31	CC 4149044	VEGA EDGAR								X									230301	18	\$1,946,087	\$311,400	EPS005	18	\$1,946,087	\$77,900	CCF24	18	\$1,946,087	\$77,900	18	\$1,946,087	\$135,500	18	\$0	\$0	\$602,700	
32	CC 4149044	VEGA EDGAR									X								230301	4	\$320,000	\$51,200	EPS005	4	\$320,000	\$0	CCF24	4	\$320,000	\$0	4	\$320,000	\$0	4	\$0	\$0	\$51,200	
33	CC 4149044	VEGA EDGAR												X					230301	8	\$640,000	\$102,400	EPS005	8	\$640,000	\$25,600	CCF24	8	\$640,000	\$25,600	8	\$640,000	\$0	8	\$0	\$0	\$153,600	
Total Afiliados(18)																						\$42,678,455	\$6,830,000			\$44,578,455	\$1,771,900			\$44,578,455	\$2,503,200		\$0	\$0	\$12,877,000			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800078011	9	ICMO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 129 17F 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4180056	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-12	2025-01	1178684322	9480016938	E	2025/01/07	2025/01/07	BANCO DAVIVIENDA	0	\$55,401,600

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)					17
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$249,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$1,464,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	12	\$4,850,700
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$266,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					18
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	18	\$2,503,200
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					18
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	18	\$1,771,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 5)					18
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$231,600
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$723,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$129,800
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	4	\$372,300
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	3	\$314,900
TOTAL					18
					\$12,877,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:			28554915	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:			28554915
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				ANGELA MARIA	APELLIDOS:	VANEGAS NOMBRES:			ANGELA JOHANA
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:			TOLIMA	CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:			TOLIMA
DIRECCIÓN:	BARRIO JORDAN TELÉFONO:			3124886	TIPO COTIZANTE:	INDEPEND SUBTIPO COTIZANTE:			
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE		COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:			NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de saneamiento ambiental y otros serv		TIPO DE SALARIO:				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO	COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				NO

PLANILLA No: 2331037417										TIPO DE PLANILLA:										PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: noviembre - 2024										PERIODO COTIZACIÓN SALUD: noviembre - 2024										FECHA DE PAGO: 04/12/2024										FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:										ÚNICO																													
NOVEDADES															PENSIÓN															SEGURIDAD SOCIAL															SALUD															ARP															PARAFISCALES														
															SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																											
SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																																																																						
\$ 1.300.000																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500			\$ 0		\$ 0	30	\$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																											

TOTAL PAGADO:	\$ 396.500
----------------------	-------------------



Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 5989456

DESDE DICIEMBRE 2024 HASTA ENERO 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		14225605	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		5989456
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ	APELLLIDOS:	SUAREZ PRADA NOMBRES:		JOSE DANIEL
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA	CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2-70 OFICNA 405 TELÉFONO:		2639103	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de otras obras de ingeniería civil.	TIPO DE SALARIO:	FIJO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			
SI				SI			

PLANILLA No:		7950798755		TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:		noviembre - 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		diciembre - 2024		FECHA DE PAGO:		02/12/2024		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:						SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										01 - ADMINISTRATIVO																																																					
		NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																																																													
																PENSIÓN														SALUD										ARP										CCF										SENA		ICBF		ESAP		MINEDU																									
SALARIO BASICO		ING		RET		TDE		TAE		TDP		TAP		COR		VSP		VST		SLN		COM		IGE		LMA		VAC		AVP		VCT		IRP		ADMIN		DIAS COT		IBC		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL		TOTAL APORTE		ADMIN		DIAS COT		IBC		COTIZACIÓN		VALOR ADRES		TOTAL APORTE		ADMIN		DIAS COT		IBC		CENTRO DE TRABAJO		TOTAL APORTE		DIAS COT		IBC		ADMIN		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE	
																																												SUBSISTENCI		SOLIDARIDAD																																													
\$ 1.938.000																																				231001-COLFONDO S		30		\$ 1.938.000		\$ 310.100		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		Normal		\$ 310.100		EPS002-SALUD TOTAL		30		\$ 1.938.000		\$ 77.600		\$ 0		\$ 77.600		14-11 - ARL SURA		30		\$ 1.938.000		\$ 134.900		30		\$ 1.938.000		CCF48-CONFATOLIMA		\$ 77.600		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	

TOTAL PAGADO:	\$ 600.200
---------------	------------



Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 2736167
DESDE DICIEMBRE 2024 HASTA ENERO 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		14225605	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		2736167
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ	APELLLIDOS:	LAMAZA VEGA NOMBRES:		SIXTO MANUEL
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA	CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2-70 OFICNA 405 TELÉFONO:		2639103	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de otras obras de ingeniería civil.	TIPO DE SALARIO:	FIJO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			
SI				SI			

PLANILLA No:	7950798755										TIPO DE PLANILLA:		E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:				noviembre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				diciembre - 2024	FECHA DE PAGO:		02/12/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:										SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										01 - ADMINISTRATIVO																							
SALARIO BÁSICO	NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																																								
																		PENSIÓN														ARP																																								
																		SALUD														CCF																																								
																		SALUD														ARP																																								
																	ADMIN		DIAS COT		IBC		COTIZACIÓN		VALOR ADRES		TOTAL APORTE		ADMIN		DIAS COT		IBC		CENTRO DE TRABAJO		TOTAL APORTE		DIAS COT		IBC		ADMIN		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		ICBF		ESAP		MINEDU																			
																	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL		TOTAL APORTE		ADMIN		DIAS COT		IBC		COTIZACIÓN		VALOR ADRES		TOTAL APORTE		ADMIN		DIAS COT		IBC		CENTRO DE TRABAJO		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE																			
																	SUBSISTENCI		SOLIDARIDAD		EMPLEADOR		EMPLEADO		Normal		\$ 374.100		EPS002-SALUD TOTAL		30		\$ 2.338.000		\$ 93.600		\$ 0		\$ 93.600		14-11 - ARL SURA		30		\$ 2.338.000		\$ 162.800		30		\$ 2.338.000		CCF48-CONFATOLIMA		\$ 93.600		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0									
\$ 2.338.000																	25-14 COLPENSI NES		30		\$ 2.338.000		\$ 374.100		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		Normal		\$ 374.100		EPS002-SALUD TOTAL		30		\$ 2.338.000		\$ 93.600		\$ 0		\$ 93.600		14-11 - ARL SURA		30		\$ 2.338.000		\$ 162.800		30		\$ 2.338.000		CCF48-CONFATOLIMA		\$ 93.600		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	

TOTAL PAGADO:	\$ 724.100
---------------	------------



Entregado por:

Recibido por:



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 93402894
DESDE DICIEMBRE 2024 HASTA ENERO 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		14225605	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		93402894
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ	APELLLIDOS:	ORTIGOZA LEAL NOMBRES:		GUILLERMO ALEXANDER
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA	CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2-70 OFICNA 405 TELÉFONO:		2639103	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de otras obras de ingeniería civil.	TIPO DE SALARIO:	FIJO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

PLANILLA No:		7950798755		TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:		noviembre - 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		diciembre - 2024		FECHA DE PAGO:		02/12/2024		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:						SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										01 - ADMINISTRATIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
SALARIO BÁSICO		NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
																PENSIÓN						SALUD								ARP						CCF						SENA		ICBF		ESAP		MINEDU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
																ADMIN		DÍAS COT		IBC		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL		TOTAL APOORTE		ADMIN		DÍAS COT		IBC		COTIZACIÓN		VALOR ADRES		TOTAL APOORTE		ADMIN		DÍAS COT		IBC		CENTRO DE TRABAJO		TOTAL APOORTE		DÍAS COT		IBC		ADMIN		TOTAL APOORTE		TOTAL APOORTE		TOTAL APOORTE		TOTAL APOORTE		TOTAL APOORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

TOTAL PAGADO:	\$ 724.100
---------------	------------



Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA No:	7950798755										TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	noviembre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	diciembre - 2024	FECHA DE PAGO:	02/12/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	01 - ADMINISTRATIVO																													
	NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																								
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	SALUD	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP				DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	CCF				DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	ICBF	ESAP	MINEDU
																						FSP												EMPLOYADOR	EMPLOYADO	CCF																	
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD													TOTAL APORTE	TOTAL APORTE					TOTAL APORTE	TOTAL APORTE										
\$ 2.600.000																		230301-PORVENIR	30	\$ 2.600.000	\$ 416.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0Normal	\$ 416.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 2.600.000	\$ 104.000	\$ 0	\$ 104.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.600.000	1	\$ 181.000	30	\$ 2.600.000	CCCF48-CONFATOLIMA	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0								

Recibido por:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901495253	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	93375223
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA SAS	APELLIDOS:	RICO SANABRIA	NOMBRES:	HENRY
CIUDAD/MUNICIPIO:		IBAGUE DEPARTAMENTO:	TOLIMA	CIUDAD/MUNICIPIO:			TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2/70 OFICIA 405 EDIFICIO EL	TELÉFONO:	2639103	TIPO COTIZANTE:	DEPEND	SUBTIPO COTIZANTE:	
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO	EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:	NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.	TIPO DE SALARIO:	FIJO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI			
				COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			
				SI			

PLANILLA No:		7949904576		TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:		noviembre - 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		diciembre - 2024		FECHA DE PAGO:		02/12/2024		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:										SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										002 - OPERATIVO							
		NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																			
SALARIO BÁSICO		ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP				DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU
																							SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO									TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	ADMIN					TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE				
\$ 1.638.000																				25-14 COLPENSI NES	30	\$ 1.638.000	\$ 262.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 262.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.638.000	\$ 65.600	\$ 0	\$ 65.600	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.638.000		\$ 114.100	30	\$ 1.638.000	CCF48-CONFATOLIMA	\$ 65.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL PAGADO:	\$ 507.400
----------------------	-------------------



Entregado por:

Recibido por:



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1152686000
DESDE DICIEMBRE 2024 HASTA ENERO 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE					DATOS DEL COTIZANTE														
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901495253		TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1152686000											
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA SAS				APELLLIDOS:	REYES AFANADOR NOMBRES:		DIEGO ALEJANDRO											
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA		CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA											
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2/70 OFICINA 405 EDIFICIO EL		TELÉFONO: 2639103		TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:													
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES		COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO											
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.		TIPO DE SALARIO:	FIJO													
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					SI					COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					SI				

PLANILLA No:	7949904576										TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	noviembre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	diciembre - 2024	FECHA DE PAGO:	02/12/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL					SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										002 - OPERATIVO												
	NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																		
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						FSP																									
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																						
\$ 2.000.000																		25-14 COLPENSI NES	30	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 320.000	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.000.000		\$ 139.200	30	\$ 2.000.000	CCF48- CONFATOLIMA	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

TOTAL PAGADO:	\$ 619.200
---------------	------------



Entregado por: _____

Recibido por: _____



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1110539630
DESDE DICIEMBRE 2024 HASTA ENERO 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE															DATOS DEL COTIZANTE														
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					901495253					TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					1110539630				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA SAS					APELLLIDOS:					ORTIGOZA GIRALDO NOMBRES:					JAIME ALEXANDER					TOLIMA				
CIUDAD/MUNICIPIO:					TOLIMA					CIUDAD/MUNICIPIO:					IBAGUE DEPARTAMENTO:					TOLIMA									
DIRECCIÓN:					CALLE 12 N. 2/70 OFICICA 405 EDIFICIO EL TELÉFONO:					2639103					DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:					NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:					NO				
TIPO APORTANTE:					01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:					B-MENOS DE 200 COTIZANTES					TIPO DE SALARIO:					FIJO									
TIPO EMPRESA:					PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:					Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.					COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):					SI									
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):																													

PLANILLA No:	7949904576										TIPO DE PLANILLA:	E										PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	noviembre - 2024										PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	diciembre - 2024										FECHA DE PAGO:	02/12/2024										FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL										SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	002 - OPERATIVO									
	NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL															PARAFISCALES																																													
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																															
																						FSP																								EMPLOYADOR	EMPLOYADO																													
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD																																																					
\$ 3.500.000																		25-14 COLPENSI NES	30	\$ 3.500.000	\$ 560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 560.000	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 140.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 3.500.000	1	\$ 243.600	30	\$ 3.500.000	CCF48- CONFATOLIMA	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																														

TOTAL PAGADO:	\$ 1.083.600
---------------	--------------



Entregado por: _____

Recibido por: _____

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901826039	NÚMERO PLANILLA:		7955184348	TIPO DE PLANILLA:		E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CONSORCIO PUENTE AMBALEMA PALOBAYO	PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre AÑO 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	enero AÑO 2025
CIUDAD/MUNICIPIO:		DEPARTAMENTO:	TOLIMA	DÍAS DE MORA:		0			
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2/70 OFICINA 405	TELÉFONO:	2639103	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/01/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN:		1180357696
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES						
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.						
FORMA DE PRESENTACIÓN:	UNICO								
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI						

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230201	230201- PROTECCION	1	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 104.000	\$ 0	\$ 104.000
230301	230301-PORVENIR	4	\$ 728.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 728.000	\$ 0	\$ 728.000
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000	\$ 0	\$ 480.000
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 230.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.100	\$ 0	\$ 230.100
SUBTOTALES:										\$ 1.542.100	\$ 0	\$ 1.542.100

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS041	NUEVA EPS CM	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 52.000		\$ 0		\$ 52.000		\$ 0	\$ 52.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 224.000		\$ 0		\$ 224.000		\$ 0	\$ 224.000
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 161.600		\$ 0		\$ 161.600		\$ 0	\$ 161.600
SUBTOTALES:													\$ 437.600	\$ 0	\$ 0	\$ 437.600

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	8		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 761.500	\$ 761.500	\$ 0	\$ 0	\$ 761.500
SUBTOTALES:									\$ 761.500	\$ 0	\$ 0	\$ 761.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	8	\$ 437.600	\$ 0	\$ 437.600
SUBTOTALES:			\$ 437.600	\$ 0	\$ 437.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																							
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																						
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				SALUD				ARP				IBCF	ESAP	MINEDU															
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT				IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 1006127022	VARGAS CESPEDES VICTOR ALFONSO	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI		15																	230301-PORVENIR	15	\$ 650.000	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 104.000	EPS002-SALUD TOTAL	15	\$ 650.000	\$ 26.000	\$ 0	\$ 26.000	14-11 - ARL SURA	15	\$ 650.000		\$ 45.300	15	\$ 650.000	CCF48-CONFATO LIMA	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1106713033	AMAYA LOZANO YEIMI	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																			230301-PORVENIR	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000		\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	CCF48-CONFATO LIMA	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 14136568	BRINEZ DIAZ ROBINSON	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																			230301-PORVENIR	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000		\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	CCF48-CONFATO LIMA	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 5836918	NARANJO LUIS CARLOS	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	\$ 1.300.000	FIJO		SI		30																			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000		\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	CCF48-CONFATO LIMA	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
5	CC 6009657	TORRES GOMEZ JOSE	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI		15																	230201-PROTECCION	15	\$ 650.000	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 104.000	EPS002-SALUD TOTAL	15	\$ 650.000	\$ 26.000	\$ 0	\$ 26.000	14-11 - ARL SURA	15	\$ 650.000		\$ 45.300	15	\$ 650.000	CCF48-CONFATO LIMA	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	CC 65800518	CIFUENTES MENDEZ MONICA MARCELA	DEPEND		\$ 1.438.000	FIJO		SI																			231001-COLFONDOS	30	\$ 1.438.000	\$ 230.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 230.100	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.438.000	\$ 57.600	\$ 0	\$ 57.600	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.438.000		\$ 100.100	30	\$ 1.438.000	CCF48-CONFATO LIMA	\$ 57.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7	CC 93412391	RIVAS RAYO OLIVERIO	DEPEND		\$ 3.000.000	FIJO		SI																			25-14 COLPENSIONES	30	\$ 3.000.000	\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 480.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 3.000.000		\$ 208.800	30	\$ 3.000.000	CCF48-CONFATO LIMA	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	CC 93456922	DURAN MONTAÑA JOSE GREGORIO	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																			230301-PORVENIR	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000		\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	CCF48-CONFATO LIMA	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 3.178.800
--------------	---------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:		NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901826039
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		CONSORCIO PUENTE AMBALEMA PALOBAYO	
CIUDAD/MUNICIPIO:		IBAGUE DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2/70 OFICINA 405	TELÉFONO:	2639103
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de carreteras y vías
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA					
NÚMERO PLANILLA:		7955184348		TIPO DE PLANILLA:	
PERIODO COTIZACIÓN		MES: diciembre		E-EMPLEADOS	
OTROS SUBSISTEMAS:		AÑO: 2024		PERIODO COTIZACIÓN	
		SALUD:		MES: enero	
DÍAS DE MORA:		0		AÑO: 2025	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/01/08		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	
				1180357696	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	1	\$ 104.000
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 480.000
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 230.100
800224808	230301	230301-PORVENIR	4	\$ 728.000
SUBTOTAL:			7	\$ 1.542.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 52.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	\$ 224.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	\$ 161.600
SUBTOTAL:			8	\$ 437.600
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800211025	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	8	\$ 437.600
SUBTOTAL:			8	\$ 437.600
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	8	\$ 761.500
SUBTOTAL:			8	\$ 761.500

VALOR SIN MORA:	\$ 3.178.800
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 3.178.800

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 14226887
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	JULIO ERNESTO ARANAGA LONDONO	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:	TOLIMA
DIRECCIÓN:	BARRIO DEPARTAMENTAL	TELÉFONO: 2637743
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Otras actividades especializadas
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA: 12341 - PUENTE AMBALEMA
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7955509093	TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN	MES: diciembre	PERIODO COTIZACIÓN MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2024	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/08	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1180399729

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSÍ?N				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800229739	230201	230201- PROTECCION	3	\$ 485.400
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 208.000
800224808	230301	230301-PORVENIR	10	\$ 2.010.700
SUBTOTAL:			14	\$ 2.704.100
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2	\$ 104.000
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	4	\$ 208.000
800130907	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4	\$ 208.000
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	5	\$ 208.100
SUBTOTAL:			15	\$ 728.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800211025	CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	15	\$ 728.100
SUBTOTAL:			15	\$ 728.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
890903790	14-11	14-11 - ARL SURA	15	\$ 1.267.200
SUBTOTAL:			15	\$ 1.267.200

VALOR SIN MORA:	\$ 5.427.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 5.427.500

PÁGINA 1 DE 2

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE															DATOS GENERALES DE LA PLANILLA														
TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA					NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					14226887					NÚMERO PLANILLA:					7955509093				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:										JULIO ERNESTO ARANAGA LONDONO					TOLIMA					PERIODO COTIZACIÓN OTROS					MES				
CIUDAD/MUNICIPIO:					IBAGUE					DEPARTAMENTO:					diciembre					AÑO					2024				
DIRECCIÓN:					BARRIO DEPARTAMENTAL					TELÉFONO:					2637743					DÍAS DE MORA:					0				
TIPO APORTANTE:					01-EMPLEADOR					CLASE APORTANTE:					B-MENOS DE 200 COTIZANTES					FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):					2025/01/08				
TIPO EMPRESA:					PRIVADA					ACTIVIDAD ECONOMICA:					Otras actividades especializadas para la construc					NÚMERO AUTORIZACIÓN:					1180399729				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					SUCURSAL					SUCURSAL / DEPENDENCIA:					12341 - PUENTE AMBALEMA PALOBAYO														
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										SI																			

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES																					
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES												
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					
14	CC 80440122	RUEDA PEREIRA LUIS HENRY	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		230301- PORVENIR	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$	\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	SCCF48- CONFATO LIMA	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
15	CC 83234477	AVILA LADY	DEPEND		\$ 1.300.000	FIJO		SI																		230201- PROTECCI ON	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.300.000	\$	\$ 90.500	30	\$ 1.300.000	SCCF48- CONFATO LIMA	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL \$ 5.427.500



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 79893182		RAMOS SALAZAR JORGE ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 10 No. 3 76 Oficina 507	IBAGUE-TOLIMA	2694886	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Período		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2025-01	2025-01	1258583032	9481555686	I	2025/02/20	2025/02/11	BANCO DE OCCIDENTE	\$580,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
1	CC	79893182	RAMOS JORGE	230201	30	\$2,000,000	\$320,000	EPS005	30	\$2,000,000	\$250,000		0	\$0	\$0	14-23	30	\$2,000,000	\$10,500	0	\$0	\$0	
Total Afiliados(1)						\$2,000,000	\$320,000			\$2,000,000	\$250,000			\$0	\$0			\$2,000,000	\$10,500		\$0	\$0	

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$320,000	\$0	\$0	\$320,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$10,500	\$0	\$0	\$10,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$250,000	\$0	\$0	\$250,000
TOTAL				1	\$580,500	\$0	\$0	\$580,500

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 800078011	9	ICMO S.A.S.	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 129 17F 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4180056	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1244784761	9481364619	E	2025/02/05	2025/02/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$58,933,900

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irti	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Total Aportes	
SUCURSAL: BOGOTA (13 Afiliados)																						\$24,553,477	\$3,929,700			\$29,971,477	\$978,800			\$29,654,495	\$974,800			\$29,971,477	\$1,240,600		\$0	\$0	\$7,123,900
Centro de Trabajo: 1 OPERATIVOS (13 Afiliados)																						\$24,553,477	\$3,929,700			\$29,971,477	\$978,800			\$29,654,495	\$974,800			\$29,971,477	\$1,240,600		\$0	\$0	\$7,123,900
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (13 Afiliados)																						\$24,553,477	\$3,929,700			\$29,971,477	\$978,800			\$29,654,495	\$974,800			\$29,971,477	\$1,240,600		\$0	\$0	\$7,123,900
1	CC	83252604	CHAVARRO ALDEMAR											X					230301	6	\$480,000	\$76,800	EP5037	6	\$480,000	\$19,200	CCF24	6	\$480,000	\$19,200		6	\$480,000	\$0	6	\$0	\$0	\$115,200	
2	CC	83252604	CHAVARRO ALDEMAR								X								230301	12	\$960,000	\$153,600	EP5037	12	\$960,000	\$0	CCF24	12	\$960,000	\$0		12	\$960,000	\$0	12	\$0	\$0	\$153,600	
3	CC	83252604	CHAVARRO ALDEMAR							X									230301	12	\$1,575,653	\$252,200	EP5037	12	\$1,575,653	\$63,100	CCF24	12	\$1,575,653	\$63,100		12	\$1,575,653	\$109,700	12	\$0	\$0	\$488,100	
4	CC	75059524	CORTEZ ELIAS											X					25-14	6	\$489,428	\$78,400	EP5037	6	\$489,428	\$19,600	CCF24	6	\$489,428	\$19,600		6	\$489,428	\$0	6	\$0	\$0	\$117,600	
5	CC	75059524	CORTEZ ELIAS							X									25-14	24	\$2,183,806	\$349,500	EP5037	24	\$2,183,806	\$87,400	CCF24	24	\$2,183,806	\$87,400		24	\$2,183,806	\$152,000	24	\$0	\$0	\$676,300	
6	CC	65708823	DONOSO JISSELL											X					230301	13	\$953,334	\$152,600	EP5002	13	\$953,334	\$38,200	CCF24	13	\$953,334	\$38,200		13	\$953,334	\$0	13	\$0	\$0	\$229,000	
7	CC	65708823	DONOSO JISSELL							X									230301	16	\$1,594,203	\$255,100	EP5002	16	\$1,594,203	\$63,800	CCF24	16	\$1,594,203	\$63,800		16	\$1,594,203	\$111,000	16	\$0	\$0	\$493,700	
8	CC	65708823	DONOSO JISSELL											X					230301	1	\$73,334	\$11,800	EP5002	1	\$73,334	\$3,000	CCF24	1	\$73,334	\$3,000		1	\$73,334	\$0	1	\$0	\$0	\$17,800	
9	CC	1121961475	GARCIA EDWAR											X					230301	6	\$284,700	\$45,600	EP5037	6	\$284,700	\$11,400	CCF24	6	\$260,000	\$10,400		6	\$284,700	\$0	6	\$0	\$0	\$67,400	
10	CC	1121961475	GARCIA EDWAR								X								230301	20	\$949,000	\$151,900	EP5037	20	\$949,000	\$0	CCF24	20	\$866,667	\$0		20	\$949,000	\$0	20	\$0	\$0	\$151,900	
11	CC	1121961475	GARCIA EDWAR					X		X									230301	4	\$432,208	\$69,200	EP5037	4	\$432,208	\$17,300	CCF24	4	\$432,208	\$17,300		4	\$432,208	\$30,100	4	\$0	\$0	\$133,900	
12	CC	15914141	HENAO RIGOBERTO																	0	\$0	\$0	EP5037	19	\$2,215,400	\$88,700	CCF24	19	\$2,215,400	\$88,700		19	\$2,215,400	\$154,200	19	\$0	\$0	\$331,600	
13	CC	15914141	HENAO RIGOBERTO											X						0	\$0	\$0	EP5037	11	\$1,282,600	\$51,400	CCF24	11	\$1,282,600	\$51,400		11	\$1,282,600	\$0	11	\$0	\$0	\$102,800	
14	CC	1085181250	LOPEZ JOSE											X					231001	6	\$284,700	\$45,600	EP5002	6	\$284,700	\$11,400	CCF24	6	\$260,000	\$10,400		6	\$284,700	\$0	6	\$0	\$0	\$67,400	
15	CC	1085181250	LOPEZ JOSE								X								231001	6	\$284,700	\$45,600	EP5002	6	\$284,700	\$0	CCF24	6	\$260,000	\$0		6	\$284,700	\$0	6	\$0	\$0	\$45,600	
16	CC	1085181250	LOPEZ JOSE					X		X									231001	18	\$1,205,333	\$192,900	EP5002	18	\$1,205,333	\$48,300	CCF24	18	\$1,205,333	\$48,300		18	\$1,205,333	\$83,900	18	\$0	\$0	\$373,400	
17	CC	5836434	MENDOZA JOSE							X										0	\$0	\$0	EP5037	30	\$1,920,000	\$76,800	CCF24	30	\$1,920,000	\$76,800		30	\$1,920,000	\$133,700	30	\$0	\$0	\$287,300	
18	CC	1057095245	MOLINA YEISON											X					230301	12	\$800,000	\$128,000	EP5037	12	\$800,000	\$32,000	CCF24	12	\$800,000	\$32,000		12	\$800,000	\$0	12	\$0	\$0	\$192,000	
19	CC	1057095245	MOLINA YEISON							X									230301	18	\$1,539,130	\$246,300	EP5037	18	\$1,539,130	\$61,600	CCF24	18	\$1,539,130	\$61,600		18	\$1,539,130	\$107,200	18	\$0	\$0	\$476,700	
20	CC	1071304346	PIÑEROS YEFERSON											X					230301	6	\$284,700	\$45,600	EP5041	6	\$284,700	\$11,400	CCF24	6	\$260,000	\$10,400		6	\$284,700	\$0	6	\$0	\$0	\$67,400	
21	CC	1071304346	PIÑEROS YEFERSON								X								230301	20	\$949,000	\$151,900	EP5041	20	\$949,000	\$0	CCF24	20	\$866,667	\$0		20	\$949,000	\$0	20	\$0	\$0	\$151,900	
22	CC	1071304346	PIÑEROS YEFERSON					X		X									230301	4	\$298,110	\$47,700	EP5041	4	\$298,110	\$12,000	CCF24	4	\$298,110	\$12,000		4	\$298,110	\$20,800	4	\$0	\$0	\$92,500	
23	CC	1120562392	SALGADO JAIDER											X					230301	6	\$284,700	\$45,600	EP5041	6	\$284,700	\$11,400	CCF24	6	\$260,000	\$10,400		6	\$284,700	\$0	6	\$0	\$0	\$67,400	
24	CC	1120562392	SALGADO JAIDER								X								230301	7	\$332,150	\$53,200	EP5041	7	\$332,150	\$0	CCF24	7	\$303,334	\$0		7	\$332,150	\$0	7	\$0	\$0	\$53,200	
25	CC	1120562392	SALGADO JAIDER					X		X									230301	17	\$1,171,808	\$187,500	EP5041	17	\$1,171,808	\$46,900	CCF24	17	\$1,171,808	\$46,900		17	\$1,171,808	\$81,600	17	\$0	\$0	\$362,900	
26	CC	1082158500	SUAREZ EDER								X								230301	30	\$1,600,000	\$256,000	EP5037	30	\$1,600,000	\$0	CCF24	30	\$1,600,000	\$0		30	\$1,600,000	\$0	30	\$0	\$0	\$256,000	
27	CC	79666893	VEGA ALVARO											X					25-14	6	\$450,000	\$72,000	EP5037	6	\$450,000	\$18,000	CCF24	6	\$450,000	\$18,000		6	\$450,000	\$0	6	\$0	\$0	\$108,000	
28	CC	79666893	VEGA ALVARO								X								25-14	6	\$450,000	\$72,000	EP5037	6	\$450,000	\$0	CCF24	6	\$450,000	\$0		6	\$450,000	\$0	6	\$0	\$0	\$72,000	
29	CC	79666893	VEGA ALVARO							X									25-14	18	\$1,643,479	\$263,000	EP5037	18	\$1,643,479	\$65,800	CCF24	18	\$1,643,479	\$65,800		18	\$1,643,479	\$114,400	18	\$0	\$0	\$509,000	
30	CC	4149044	VEGA EDGAR											X					230301	12	\$960,000	\$153,600	EP5005	12	\$960,000	\$38,400	CCF24	12	\$960,000	\$38,400		12	\$960,000	\$0	12	\$0	\$0	\$230,400	
31	CC	4149044	VEGA EDGAR							X									230301	18	\$2,040,001	\$326,500	EP5005	18	\$2,040,001	\$81,700	CCF24	18	\$2,040,001	\$81,700		18	\$2,040,001	\$142,000	18	\$0	\$0	\$631,900	
Total Afiliados(13)																						\$24,553,477	\$3,929,700			\$29,971,477	\$978,800			\$29,654,495	\$974,800			\$29,971,477	\$1,240,600		\$0	\$0	\$7,123,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 800078011	9	ICMO S.A.S.	8 - MENOS DE 200 COTIZANTES	BOGOTA	CR 129 17F 64	BOGOTA-BOGOTA D.E.	4180056	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-01	2025-02	1244784761	9481364619	E	2025/02/05	2025/02/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$58,933,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				11	\$3,929,700
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$284,100
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$834,900
PORVENIR	230301	800,224,808	8	8	\$2,810,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$1,240,600
COLPATRIA ARP	14-4	860,002,183	9	12	\$1,240,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				12	\$974,800
COMPENSAR	CCF24	860,066,942	7	12	\$974,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				12	\$978,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	7	\$612,300
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	2	\$81,700
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	2	\$164,700
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$120,100
TOTAL				13	\$7,123,900

Certificado de Aportes

Se certifica que JULIO ERNESTO ARANAGA LONDOÑO identificado(a) con CC 14226887 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES NI 900336004																
Clave Planilla	Clave Pago	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades							
									ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	su
9479275205	1162040443	2024-12-30	EPS	EPS037	NUEVA E.P.S.	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-01	30								

Este certificado se expide el día 2025-02-06 a las 19:02.

PAGADO

PLANILLA No: 2331086469										TIPO DE PLANILLA: I										PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: diciembre - 2024										PERIODO COTIZACIÓN SALUD: diciembre - 2024										FECHA DE PAGO: 08/01/2025										FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:										ÚNICO									
NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES																																	
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																							
																						FSP																																															
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																												
\$ 1.300.000																		230201-PROTECCION	30	\$ 1.300.000	\$ 208.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 208.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 1.300.000	\$ 162.500	\$ 0	\$ 162.500		\$ 0		\$ 0	30	\$ 1.300.000	CCF48-CONFATOLIMA	\$ 26.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																								

Recibido por:



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 2736167
DESDE ENERO 2025 HASTA FEBRERO 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE				
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		14225605	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		2736167	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ	APELLLIDOS:	LAMAZA VEGA NOMBRES:		SIXTO MANUEL	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA	CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA	
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2-70 OFICNA 405 TELÉFONO:		2639103	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:			
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de otras obras de ingeniería civil.	TIPO DE SALARIO:	FIJO			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI				
				COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI

PLANILLA No:		7955189951		TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:		diciembre - 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		enero - 2025		FECHA DE PAGO:		08/01/2025		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										01 - ADMINISTRATIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
SALARIO BÁSICO		NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																PENSIÓN						SALUD						ARP						CCF						SENA		ICBF		ESAP		MINEDU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
																ADMIN		DÍAS COT		IBC		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL		TOTAL APORTE		ADMIN		DÍAS COT		IBC		COTIZACIÓN		VALOR ADRES		TOTAL APORTE		ADMIN		DÍAS COT		IBC		CENTRO DE TRABAJO		TOTAL APORTE		DÍAS COT		IBC		ADMIN		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																SUBSISTENCI		SOLIDARIDAD		EMPLEADOR		EMPLEADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											

TOTAL PAGADO:	\$ 724.100
---------------	------------



Entregado por:

Recibido por:

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 93402894

DESDE ENERO 2025 HASTA FEBRERO 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		14225605	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		93402894
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ	APELLLIDOS:	ORTIGOZA LEAL NOMBRES:		GUILLERMO ALEXANDER
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA	CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2-70 OFICNA 405 TELÉFONO:		2639103	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de otras obras de ingeniería civil.	TIPO DE SALARIO:	FIJO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

PLANILLA No:		7955189951		TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:		diciembre - 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		enero - 2025		FECHA DE PAGO:		08/01/2025		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:				SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										01 - ADMINISTRATIVO											
SALARIO BÁSICO		NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																	
																PENSIÓN						SALUD				ARP				CCF						SENA		ICBF		ESAP		MINEDU					
		ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																
SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																												
\$ 2.338.000		ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 374.100	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 2.338.000	\$ 93.600	\$ 0	\$ 93.600	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.338.000		\$ 162.800	30	\$ 2.338.000	CCF48-CONFATOLIMA	\$ 93.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL PAGADO:	\$ 724.100
---------------	------------



Entregado por:

Recibido por:



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 65753684
DESDE ENERO 2025 HASTA FEBRERO 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		14225605	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		65753684
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			LUIS RICARDO ORTIGOZA GONZALEZ	APELLLIDOS:	LOPEZ SANCHEZ NOMBRES:		GLORIA ASTRID
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA	CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 NO. 2-70 OFICNA 405 TELÉFONO:		2639103	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de otras obras de ingeniería civil.	TIPO DE SALARIO:	FIJO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			

PLANILLA No:		7955189951		TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:		diciembre - 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		enero - 2025		FECHA DE PAGO:		08/01/2025		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:						SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:						01 - ADMINISTRATIVO																														
		NOVEDADES												SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																																						
SALARIO BÁSICO		ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	SALUD	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP				DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	CCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU													
																							FSP		EMPLOYER											EMPLOYEE		TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	ADMIN					DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																							SUBSISTEN	SOLIDARIDAD	EMPLOYER	EMPLOYEE										TOTAL APORTE	ADMIN																											
\$ 2.600.000																				230301- PORVENIR	30	\$ 2.600.000	\$ 416.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 416.000	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 2.600.000	\$ 104.000	\$ 0	\$ 104.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.600.000	1	\$ 181.000	30	\$ 2.600.000	CCF48- CONFATOLIMA	\$ 104.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																

TOTAL PAGADO:	\$ 805.000
---------------	------------



Entregado por:

Recibido por:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE				
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901495253	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		1110539630	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			ORTIGOZA GIRALDO INGENIERIA SAS	APELLIDOS:	ORTIGOZA GIRALDO NOMBRES:		JAIME ALEXANDER	
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA	CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA	
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2/70 OFICIA 405 EDIFICIO EL		TELÉFONO: 2639103	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:			
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO	
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.	TIPO DE SALARIO:	FIJO			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI				
				COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI

PLANILLA No:	7955167834													TIPO DE PLANILLA:		E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:				diciembre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				enero - 2025	FECHA DE PAGO:		08/01/2025	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:						SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										002 - OPERATIVO	
SALARIO BASICO	NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES																
															PENSIÓN								SALUD						ARP				CCF						SENA		ICBF		ESAP		MINEDU				
															ADMIN		DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE						
																				SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																										
\$ 3.500.000															25-14 COLPENSIONES	30	\$ 3.500.000	\$ 560.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 560.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 3.500.000	\$ 140.000	\$ 0	\$ 140.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 3.500.000	1	\$ 243.600	30	\$ 3.500.000	CCF48-CONFATOLIMA	\$ 140.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0						

TOTAL PAGADO:	\$ 1.083.600
----------------------	---------------------



Entregado por:

Recibido por:

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS DEL COTIZANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901495253	TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		93375223
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:				APELLIDOS:	RICO SANABRIA NOMBRES:		HENRY
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA	CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE DEPARTAMENTO:		TOLIMA
DIRECCIÓN:	CALLE 12 N. 2/70 OFICINA 405 EDIFICIO EL TELÉFONO:		2639103	TIPO COTIZANTE:	DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:		
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:	NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:		NO
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de carreteras y vías de ferrocarril.	TIPO DE SALARIO:	FIJO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI	COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			SI


PLANILLA No:	7955167834															TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	diciembre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	enero - 2025	FECHA DE PAGO:	08/01/2025	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										002 - OPERATIVO													
	NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																			
SALARIO BASICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP				DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	ICBF	ESAP	MINEDU
																						FSP		EMPLOYER										EMPLOYEE															
																						SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLOYER	EMPLOYEE																								
\$ 1.638.000		15																25-14 COLPENSIO NES	15	\$ 819.000	\$ 131.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 131.100	EPS002-SALUD TOTAL	15	\$ 819.000	\$ 32.800	\$ 0	\$ 32.800	14-11 - ARL SURA	15	\$ 819.000		\$ 57.100	15	\$ 819.000	CCF48-CONFATOLIMA	\$ 32.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			

TOTAL PAGADO:	\$ 253.800
----------------------	-------------------



Entregado por:

Recibido por:



PLANILLA No:	7958626661										TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	enero - 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	febrero - 2025	FECHA DE PAGO:	04/02/2025	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL					SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										002 - OPERATIVO											
	NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL													PARAFISCALES															
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																					
\$ 2.000.000																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 2.000.000	\$ 320.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 320.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0	\$ 80.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 2.000.000		\$ 139.200	30	\$ 2.000.000	CCF48-CONFATOLIMA	\$ 80.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

PLANILLA No:		7955167834		TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:		diciembre - 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		eptep - 2025		FECHA DE PAGO:		08/01/2025		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										002 - OPERATIVO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
SALARIO BÁSICO	NOVEDADES															SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
																PENSIÓN						SALUD				ARP				CCF						SENA		ICBF		ESAP		MINEDU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
																ADMIN		DÍAS COT		IBC		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL		TOTAL APORTE		ADMIN		DÍAS COT		IBC		COTIZACIÓN		VALOR ADRES		TOTAL APORTE		ADMIN		DÍAS COT		IBC		CENTRO DE TRABAJO		TOTAL APORTE		DÍAS COT		IBC		ADMIN		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														
	SUBSISTENCI	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															

COTIZACIÓN SALUD:			enero -2025	FECHA DE PAGO:	08/01/2025	FORMA DE PRESENTACIÓN		
SEGURIDAD SOCIAL								
				SALUD				
APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT.	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES
ARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO						
\$ 0	\$ 0	\$ 0 Normal	\$ 320.000	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 2.000.000	\$ 80.000	\$ 0



Planilla Pagada

Recibido por:



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										NÚMERO PLANILLA: 7958628417 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS PERIODO COTIZACIÓN OTROS: MES enero AÑO 2025 PERIODO COTIZACIÓN SALUD: MES febrero AÑO 2025 DÍAS DE MORA: 0 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1243209540 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/02/04									
NIT: 901826039 DEPARTAMENTO: CONSORCIO PUENTE AMBALEMA PALOBAYO TELÉFONO: 2639103 CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de carreteras y vías de ferrocarril. APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI																			

TOTAL APORTES A PENSIÓN																	
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO			
25-14	25-14 COLPENSIONES			1	\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 480.000	\$ 0	\$ 480.000			
230301	230301-PORVENIR			4	\$ 266.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 266.100	\$ 0	\$ 266.100			
231001	231001-COLFONDOS			1	\$ 230.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 230.100	\$ 0	\$ 230.100			
SUBTOTALES:												\$ 976.200	\$ 0	\$ 976.200			

TOTAL APORTES A SALUD																		
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 182.800	\$ 0	\$ 0	\$ 182.800	\$ 0	\$ 0	\$ 182.800			
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 74.700	\$ 0	\$ 0	\$ 74.700	\$ 0	\$ 0	\$ 74.700			
EPS041	NUEVA EPS CM	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 20.900	\$ 0	\$ 0	\$ 20.900	\$ 0	\$ 0	\$ 20.900			
SUBTOTALES:												\$ 278.400	\$ 0	\$ 0	\$ 278.400			

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES																
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES					
CÓDIGO	NOMBRE				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO		
14-11	14-11 - ARL SURA			7	\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 484.300	\$ 484.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 484.300		
SUBTOTALES:										\$ 484.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 484.300		

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES						
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO				
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	7	\$ 278.400	\$ 0	\$ 278.400				
SUBTOTALES:			\$ 278.400	\$ 0	\$ 278.400				

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																												
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																								
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP				DÍAS COT	IBC	CCF						SENA	ICBF	ESAP	MINEDU			
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO			TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE					TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
																														SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																											
1	CC 1106713033	AMAYA LOZANO YEIMI	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI	11																230301-PORVENIR	11	\$ 521.950	\$ 83.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 83.600	NUEVA EPS CM	11	\$ 521.950	\$ 20.900	\$ 0	\$ 20.900	14-11 - ARL SURA	11	\$ 521.950	\$ 36.400	11	\$ 521.950	CCCF48-CONFATO LIMA	\$ 20.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
2	CC 1110469827	LOZANO ARANZALES MAICOL DAMIAN	DEPEND		\$ 1.425.300	FIJO			SI	27																230301-PORVENIR	4	\$ 190.040	\$ 30.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 30.500	EPS002-SALUD TOTAL	4	\$ 190.040	\$ 7.700	\$ 0	\$ 7.700	14-11 - ARL SURA	4	\$ 190.040	\$ 13.300	4	\$ 190.040	CCCF48-CONFATO LIMA	\$ 7.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
3	CC 14136568	BRINEZ DIAZ DAMIAN ROBINSON	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI	11																230301-PORVENIR	11	\$ 521.950	\$ 83.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 83.600	EPS002-SALUD TOTAL	11	\$ 521.950	\$ 20.900	\$ 0	\$ 20.900	14-11 - ARL SURA	11	\$ 521.950	\$ 36.400	11	\$ 521.950	CCCF48-CONFATO LIMA	\$ 20.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
4	CC 65800518	CIFUENTES MENDEZ MONICA MARCELA	DEPEND		\$ 1.438.000	FIJO			SI	30																231001-COLFONDOS	30	\$ 1.438.000	\$ 230.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 230.100	EPS037-NUEVA EPS	30	\$ 1.438.000	\$ 57.600	\$ 0	\$ 57.600	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.438.000	\$ 100.100	30	\$ 1.438.000	CCCF48-CONFATO LIMA	\$ 57.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
5	CC 91067297	MEDINA CACERES JOSE	DEPEND	REQ CUMPLENS	\$ 1.423.500	FIJO			SI	13																			\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 0	EPS002-SALUD TOTAL	18	\$ 854.100	\$ 34.200	\$ 0	\$ 34.200	14-11 - ARL SURA	18	\$ 854.100	\$ 59.500	18	\$ 854.100	CCCF48-CONFATO LIMA	\$ 34.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0						
6	CC 93412391	RIVAS RAYO OLIVERIO	DEPEND		\$ 3.000.000	FIJO			SI																	25-14 COLPENSIONES	30	\$ 3.000.000	\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 480.000	EPS002-SALUD TOTAL	30	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 120.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 3.000.000	\$ 208.800	30	\$ 3.000.000	CCCF48-CONFATO LIMA	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							
7	CC 93456922	DURAN MONTAÑA JOSE GREGORIO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO			SI	09																230301-PORVENIR	9	\$ 427.050	\$ 68.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 68.400	EPS037-NUEVA EPS	9	\$ 427.050	\$ 17.100	\$ 0	\$ 17.100	14-11 - ARL SURA	9	\$ 427.050	\$ 29.800	9	\$ 427.050	CCCF48-CONFATO LIMA	\$ 17.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0							

TOTAL	\$ 2.017.300
-------	--------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14226887	NÚMERO PLANILLA:	7958648817	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		JULIO ERNESTO ARANAGA LONDONO		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA	DÍAS DE MORA:	0	MES	febrero AÑO
DIRECCIÓN:	BARRIO DEPARTAMENTAL	TELÉFONO:	2637743	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/04	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1243251434
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	12341 - PUENTE AMBALEMA PALOBAYO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):				SI			

TOTAL APORTES A PENSION													
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800	
230201	230201- PROTECCION	2	\$ 357.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 357.100	\$ 0	\$ 357.100	
230301	230301-PORVENIR	9	\$ 2.050.200	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 2.050.200	\$ 0	\$ 2.050.200	
SUBTOTALES:										\$ 2.635.100	\$ 0	\$ 2.635.100	

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS037	EPS037-NUEVA EPS	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 114.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000
ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 114.000		\$ 0	\$ 0	\$ 114.000	\$ 0	\$ 0	\$ 114.000
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	5		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 260.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 260.400	\$ 0	\$ 0	\$ 260.400
EPS041	NUEVA EPS CM	4		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 228.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 228.000	\$ 0	\$ 0	\$ 228.000
SUBTOTALES:													\$ 716.400	\$ 0	\$ 0	\$ 716.400

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-11	14-11 - ARL SURA	13		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 1.245.500	\$ 1.245.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.245.500
SUBTOTALES:									\$ 1.245.500	\$ 0	\$ 0	\$ 1.245.500

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR					
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE		APORTES	MORA	VALOR PAGADO
CCF48	CCF48-CONFATOLIMA	13	\$ 716.400	\$ 0	\$ 716.400
SUBTOTALES:			\$ 716.400	\$ 0	\$ 716.400

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE														NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN				APORTES VOLUNTARIOS				INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	SALUD				ARP				DÍAS COT	IBC	CCF					IBCF	ESAP	MINEDU	
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		EMPLEADOR				EMPLEADO	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN			DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT				IBC
1	CC 1005828283	MORENO NARANJO CRISTOFER DUJAN	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301- PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC62- ASMET SALUD	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF48- CONFATO LIMA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
2	CC 1005848423	HOYOS DIAZ JOSE JAIR	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		231001- COLFOND OS	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF48- CONFATO LIMA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
3	CC 1005848634	ARBELAEZ NIETO HAROLD	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301- PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF48- CONFATO LIMA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
4	CC 1005848808	BARRIOS MARTINEZ JOSE ALEXANDER	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301- PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	ESSC62- ASMET SALUD	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF48- CONFATO LIMA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
5	CC 1005848884	MORENO MENDOZA WILSON ESTEBAN	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301- PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF48- CONFATO LIMA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
6	CC 1006094932	RINCON PATINO JAIDER	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO																				230301- PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF48- CONFATO LIMA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
7	CC 1007667166	NARANJO MORENO JOSE ARMANDO	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301- PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF48- CONFATO LIMA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
8	CC 1106482704	MORENO GUALTEROS JUAN ESTEBAN	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301- PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS037- NUEVA EPS	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF48- CONFATO LIMA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
9	CC 1110527312	CULMA PATINO NELSON FABIAN	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301- PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	NUEVA EPS CM	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF48- CONFATO LIMA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
10	CC 14223742	MUNOZ PAEZ ROMEL	DEPEND	INDEMN SUST/DEV SALDOS	\$ 1.423.500	FIJO		SI																				\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF48- CONFATO LIMA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
11	CC 14297633	PEREZ EUSTAMANT E OSCAR ORLANDO	DEPEND		\$ 1.425.300	FIJO		SI	14																	230201- PROTECCI ON	17	\$ 807.670	\$ 129.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 129.300	EPS002- SALUD TOTAL	17	\$ 807.670	\$ 32.400	\$ 0	\$ 32.400	14-11 - ARL SURA	17	\$ 807.670	\$ 32.400	\$ 56.300	17	\$ 807.670	CCCF48- CONFATO LIMA	\$ 32.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
12	CC 80440122	RUEDA PEREIRA LUIS HENRY	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230301- PORVENIR	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF48- CONFATO LIMA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
13	CC 83234477	AVILA LADY	DEPEND		\$ 1.423.500	FIJO		SI																		230201- PROTECCI ON	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-11 - ARL SURA	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	30	\$ 1.423.500	SCCF48- CONFATO LIMA	\$ 57.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	14226887	NÚMERO PLANILLA:	7958648817	TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:		JULIO ERNESTO ARANAGA LONDONO		PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	enero AÑO	2025
CIUDAD/MUNICIPIO:	IBAGUE	DEPARTAMENTO:	TOLIMA	DÍAS DE MORA:		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES febrero AÑO
DIRECCIÓN:	BARRIO DEPARTAMENTAL	TELÉFONO:	2637743	FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR	CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES			NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1243251434
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Otras actividades especializadas para la construc				
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA:	12341 - PUENTE AMBALEMA PALOBAYO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):							
			SI				

TOTAL	\$ 5.313.400
-------	--------------



INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	48 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

ANEXO No. 03

CONTROL DE PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

	 <div>GOBERNACION DEL TOLIMA MANUAL DE INTERVENTORIA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 7</div>  <div>@gobertolima www.tolima.gov.co</div>	INFORME N° 7	PERIODO 11/12/2024 AL 20/12/2024 y 07/01/2025 AL 25/01/2025																																															
		PAGINA 1	DE 1																																															
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1698		ALDEIC SAS BIC																																																
		OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"																																																
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATISTA DE INTERVENTORIA																																																		
	dic-24															ene-25																																		
Día	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
PERSONAL																																																		
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA Claudia Alicia Alfaro de Los Rios																																																		
DIRECTOR DE INTERVENTORIA Diana Esperanza Riveros	1	1	1	1		1	1	1	1	1																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	1
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Jerson Said Lazaro Suarez	1	1	1	1		1	1	1	1	1																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1										
RESIDENTE DE INTERVENTORIA Jose luis tique cruz																																									1	1	1	1	1	1	1	1	1	
ESPECIALISTA EN GEOTECNIA Hildebrando Ciendua	1	1	1	1		1	1	1	1	1																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
ESPECIALISTA EN PAVIMENTOS Teofilo Carlos Yidi	1	1	1	1		1	1	1	1	1																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS Diego Ernesto Dueñas Puentes	1	1	1	1		1	1	1	1	1																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
ESPECIALISTA EN HIDRAULICA Andres Galarza Guzman	1	1	1	1		1	1	1	1	1																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
ESPECIALISTA AMBIENTAL Claudia Alicia Alfaro de Los Rios	1	1	1	1		1	1	1	1	1																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
ESPECIALISTA EN VIAS Nestor Espinosa Niño	1	1	1	1		1	1	1	1	1																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
INGENIERO DE APOYO Jhoan Sebastian Tellez Torres	1	1	1	1		1	1	1	1	1																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
SUPERVISOR DE INTERVENTORIA	1	1	1	1		1	1	1	1	1																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
PROFESIONAL HSEQ Paula Dayana Castiblanco	1	1	1	1		1	1	1	1	1																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
LABORATORISTA Edgar Gomez	1	1	1	1		1	1	1	1	1																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
TOPOGRAFO Marco Aurelio Murcia	1	1	1	1		1	1	1	1	1																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
DIBUJANTE Segio Guarín	1	1	1	1		1	1	1	1	1																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
SECRETARIA Nidia Gomez	1	1	1	1		1	1	1	1	1																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
CADENERO Olga Rodriguez	1	1	1	1		1	1	1	1	1																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
CADENERO Jhon Franco	1	1	1	1		1	1	1	1	1																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
CONDUCTOR Wilson Yovanny Arias Martinez	1	1	1	1		1	1	1	1	1																			1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1		1	1	1	1	1	1	1	1	
Total	18	18	18	18	0	18	18	18	18	18	0	0	0	0	0	0	0	0	0										18	18	18	18	18		18	18	18	18					18	18	18	18	18	18		
Firma Nombre: Paula Dayana Castiblanco Profesional HSEQ		Firma Nombre: Jose luis tique cruz Residente de Interventoría																																																

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: CIUDAD/MUNICIPIO: DIRECCIÓN: TIPO APORTANTE: TIPO EMPRESA: FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):										NÚMERO PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN OTROS DÍAS DE MORA: FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):									
NIT 860041968										7951509331									
COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA BOGOTA - DISTRITO CAPITAL 2136402 B-MENOS DE 200 COTIZANTES Actividades de arquitectura e ingeniería y otras CIA-285 - PUENTE VENADILLO SI										MES diciembre AÑO 2024 0 2025/01/08									
BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: CARRERA 18 N° 116-24 01-EMPLEADOR PRIVADA SUCURSAL										TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: NÚMERO AUTORIZACIÓN:									
										E-EMPLEADOS 2025 1181555017									

TOTAL APORTES A PENSIÓN														
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 224.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 224.000	\$ 0	\$ 224.000		
230301	230301-PORVENIR	3	\$ 1.760.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.760.000	\$ 0	\$ 1.760.000		
SUBTOTALES:										\$ 1.984.000	\$ 0	\$ 1.984.000		

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 56.000	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	3		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 440.000	\$ 0	\$ 0	\$ 440.000	
SUBTOTALES:													\$ 496.000	\$ 0	\$ 0	\$ 496.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES														
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE				NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.			4		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 863.100	\$ 863.100	\$ 0	\$ 0	\$ 863.100
SUBTOTALES:											\$ 863.100	\$ 0	\$ 0	\$ 863.100

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR														
ADMINISTRADORA										No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE										APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA									4	\$ 496.000	\$ 0	\$ 496.000	
SUBTOTALES:											\$ 496.000	\$ 0	\$ 496.000	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP				DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APO

TOTAL	\$ 3.839.100
-------	--------------

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79795367	TEOFILO CARLOS YIDI VILLARREAL		AV CALLE 80 # 75-26 OFI 201	3193962597	eyhingenieria_admon@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						NO

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					1	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-01	2025-01	I	07/02/2025	83865668	\$770.200	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	325.000	0		0		0	0	0	0	325.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	13.600				13.600	0	0	13.600			136	13.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	15.600	0	0	15.600	1

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	325.000	325.000
Pensión	1	416.000	416.000
Riesgos Laborales	1	13.600	13.600
CCF	1	15.600	15.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	770.200	770.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79795367	TEOFILO CARLOS YIDI VILLARREAL		AV CALLE 80 # 75-26 OFI 201	3193962597	eyhingenieria_admon@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-01	2025-01	I	07/02/2025	83865668	10
					TOTAL A PAGAR
					\$770.200

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES										PENSIÓN								SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES										
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Clase exterior	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SIL	IDE	MA	MA	MA	AVP	VCT	IRL	CONEXIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79795367	YIDI VILLARREAL TEOFILO CARLOS	59	0		N																			25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	325.000	14-11	2.600.000	1	13.600	CCF24	2.600.000	15.600	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 51936744
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ
CIUDAD/MUNICIPIO: BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN: CALLE 65A # 17 - 56 TELÉFONO: 7731989
TIPO APORTANTE: 02-INDEPENDIENTE CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN: ÚNICO
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7951267338 TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre PERIODO COTIZACIÓN MES: diciembre
OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2024 SALUD: AÑO: 2024
DÍAS DE MORA: 0
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/01/07 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1178273484

NOVEDADES

ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

LIQUIDACIÓN GENERAL

			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 320.000
SUBTOTAL:			1	\$ 320.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 250.000
SUBTOTAL:			1	\$ 250.000

VALOR SIN MORA:	\$ 570.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 570.000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 51936744
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ	
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTA DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO: BOGOTA - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CALLE 65A # 17 - 56	TELÉFONO: 7731989
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE: I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA: Actividades reguladoras y
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO	
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7955956758	TIPO DE PLANILLA: I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN	MES: enero	PERIODO COTIZACIÓN MES: enero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/01/31	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1232712193

NOVEDADES																	
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 320.000
SUBTOTAL:			1	\$ 320.000
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860066942	EPS008	EPS008-COMPENSAR	1	\$ 250.000
SUBTOTAL:			1	\$ 250.000

VALOR SIN MORA:	\$ 570.000
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 570.000

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7162583	0	DIEGO DUEÑAS PUENTES	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CL 165 B 13 C 55 APT 1417		3114740190		DEDUENASP@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	31488358	I	2024-12-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.451.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31488358	2025-01-22	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES														DÍAS				PENSIÓN						SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica			
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.						Cot.	Cot.	Cot.
1	CC 7162583	DUEÑAS PUENTES DIEGO ERNESTO	5.000.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	5.000.000	800.000	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	5.000.000	625.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	5.000.000	26.100	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	1.451.100	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7162583	0	DIEGO DUEÑAS PUENTES	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CL 165 B 13 C 55 APT 1417		3114740190		DEDUENASP@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-12	2024-12	31488358	I	2024-12-18	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.451.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	31488358	2025-01-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	800.000	0	0	0	800.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	800.000	0	0	0	800.000
EPS(Administradoras: 1)				1	625.000	0	0	0	625.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	625.000	0	0	0	625.000
ARP(Administradoras: 1)				1	26.100	0	0	0	26.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	26.100	0	0	0	26.100
Gran Total					1.451.100	0	0	0	1.451.100

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7162583	0	DIEGO DUEÑAS PUENTES	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CL 165 B 13 C 55 APT 1417		3114740190		DEDUENASP@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	32087808	I	2025-02-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.451.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32087808	2025-02-20	Pagada							

EMPLEADO					NOVEDADES																	DÍAS			PENSIÓN					SALUD			CCF			RIESGOS		TARIFA	PARAF	SENA	ICBF	ESAP	MIN	Tipo Cot.	Sub. Tipo Cot.	Total	Exento de Parafiscales	Actividad Económica		
N.	ID	EMPLEADO	SALARIO	MODALIDAD DE SALARIO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VTE	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRL	EPST	AFPT	AFP	EPS	CCF	ARL	NOMBRE	IBC	Cot	FNSOL	FNSUB	NOMBRE	IBC	Cot	NOMBRE	IBC	Cot	IBC	Cot.	ARL	IBC	Cot.	Cot.						Cot.	Cot.
1	CC 7162583	DUEÑAS PUENTES DIEGO ERNESTO	5.000.000																	0			30	30	0	30	COLPENSION ES-25-14	5.000.000	800.000	0	0	COMPENSAR EPS-EPS008	5.000.000	625.000	SIN CCF-SINCCF	0	0	5.000.000	26.100	0,00522	0	0	0	0	0	59	0	1.451.100	N	1941201

RESUMEN PLANILLA PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA
CC 7162583	0	DIEGO DUEÑAS PUENTES	I	0	POSITIVA - 14-23	ÚNICA	7112	Natural
MUN-DEP	DIRECCIÓN		TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
11-1	CL 165 B 13 C 55 APT 1417		3114740190		DEDUENASP@GMAIL.COM		N	



DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-01	2025-01	32087808	I	2025-02-10	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.451.100	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
1	32087808	2025-02-20	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
5.000.000	5.000.000	5.000.000	0	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				1	800.000	0	0	0	800.000
COLPENSIONES	25-14	900336004	7	1	800.000	0	0	0	800.000
EPS(Administradoras: 1)				1	625.000	0	0	0	625.000
COMPENSAR-EPS	EPS008	860066942	7	1	625.000	0	0	0	625.000
ARP(Administradoras: 1)				1	26.100	0	0	0	26.100
POSITIVA	14-23	860011153	6	1	26.100	0	0	0	26.100
Gran Total					1.451.100	0	0	0	1.451.100

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79795367	TEOFILO CARLOS YIDI VILLARREAL		AV CALLE 80 # 75-26 OFI 201	3193962597	eyhingenieria_admon@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				1 0
2024-12	2024-12	I	14/01/2025	83091089	TOTAL A PAGAR \$770.200

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	325.000	0		0		0	0	0	0	325.000	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-14	Colpensiones	900336004-7	416.000	0	0	0	0	0	0		416.000	1

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-11	ARL SURA	890903790-5	13.600				13.600	0	0	13.600			136	13.600	1

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre				NIT	Valor Aporte	Días Mora
CCF24	Compensar Caja				860066942-7	15.600	0
						0	0
						15.600	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	1	325.000	325.000
Pensión	1	416.000	416.000
Riesgos Laborales	1	13.600	13.600
CCF	1	15.600	15.600
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	4	770.200	770.200

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
CC	79795367	TEOFILO CARLOS YIDI VILLARREAL		AV CALLE 80 # 75-26 OFI 201	3193962597	eyhingenieria_admon@hotmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	I – Independiente			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
						NO

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS
					UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10
TOTAL A PAGAR					
2024-12	2024-12	I	14/01/2025	83091089	\$770.200

DETALLE POR COTIZANTE																																															
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES							PENSIÓN							SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES														
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Sueldo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VSP	VST	SILN	IDE	MA	MA	MA	MA	MA	MA	MA	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	79795367	YIDI VILLARREAL TEOFILO CARLOS	59	0		N																			25-14	2.600.000	416.000	0	0	0	0	EPS005	2.600.000	325.000	14-11	2.600.000	1	13.600	CCF24	2.600.000	15.600	0	0	0	0	0

PAGADA

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	39691684
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 18 N° 116-24	TELÉFONO:	2145198
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA							
NÚMERO PLANILLA:	7951415302			TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES		
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS	MES	diciembre	AÑO 2024	PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:	MES	diciembre	AÑO 2024
DÍAS DE MORA:			0				
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2025/01/09	NÚMERO AUTORIZACIÓN:			1182072825

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 906.300	\$ 0	\$ 0	\$ 28.400	\$ 28.400	\$ 0	\$ 0	\$ 963.100	\$ 0	\$ 963.100
SUBTOTALES:										\$ 963.100	\$ 0	\$ 963.100

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSA SALUD S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 708.100		\$ 0		\$ 0	\$ 708.100	\$ 0	\$ 708.100
SUBTOTALES:									\$ 708.100				\$ 708.100	\$ 0	\$ 0	\$ 708.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 29.600	\$ 29.600	\$ 0	\$ 0	\$ 29.600
SUBTOTALES:									\$ 29.600	\$ 0	\$ 0	\$ 29.600

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE			ADMIN	DÍAS COT					IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE
1	CC 39691684	ALFARO DE LOS RIOS CLAUDIA ALICIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 5.664.191			NO																			25-14 COLPENSI ONES	30	\$ 5.664.191	\$ 906.300	\$ 28.400	\$ 28.400	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 963.100	EPS001- ALIANSA UD S.A.	30	\$ 5.664.191	\$ 708.100	\$ 0	\$ 708.100	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 5.664.191	\$ 39691684	\$ 29.600	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 1.700.800
--------------	---------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
TIPO IDENTIFICACIÓN:	CÉDULA DE CIUDADANÍA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	39691684
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			CLAUDIA ALICIA ALFARO DE LOS RIOS
CIUDAD/MUNICIPIO:	BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL	DEPARTAMENTO:	BOGOTÁ - DISTRITO CAPITAL
DIRECCIÓN:	CRA 18 N° 116-24	TELÉFONO:	2145198
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
NÚMERO PLANILLA:		7959529714		TIPO DE PLANILLA:				I-INDEPENDIENTES	
PERÍODO COTIZACIÓN OTROS		MES		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD:		MES		2025	
DÍAS DE MORA:		enero AÑO		2025		enero AÑO		2025	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):		2025/02/07		NÚMERO AUTORIZACIÓN:				1249476136	

TOTAL APORTES A PENSIÓN												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
25-14	25-14 COLPENSIONES	1	\$ 912.600	\$ 0	\$ 0	\$ 28.600	\$ 28.600	\$ 0	\$ 0	\$ 969.800	\$ 0	\$ 969.800
SUBTOTALES:										\$ 969.800	\$ 0	\$ 969.800

TOTAL APORTES A SALUD																
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
EPS001	EPS001-ALIANSA SALUD S.A.	1		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 713.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 713.000	\$ 0	\$ 0	\$ 713.000
SUBTOTALES:									\$ 713.000				\$ 713.000	\$ 0	\$ 0	\$ 713.000

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	1		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 29.800	\$ 29.800	\$ 0	\$ 0	\$ 29.800
SUBTOTALES:									\$ 29.800	\$ 0	\$ 0	\$ 29.800

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																						
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL																	PARAFISCALES																	
Nº	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU					
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP	APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN			DÍAS COT	IBC					CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
1	CC 39691684	ALFARO DE LOS RIOS CLAUDIA ALICIA	INDEPENDIENTE CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS		\$ 5.703.216			NO								01-30											25-14 COLPENSIONES	30	\$ 5.703.216	\$ 912.600	\$ 28.600	\$ 28.600	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 969.800	EPS001-ALIANSA UD S.A.	30	\$ 5.703.216	\$ 713.000	\$ 0	\$ 713.000	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 5.703.216	\$ 39691684	\$ 29.800	\$ 0		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

TOTAL	\$ 1.712.600
--------------	---------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES

SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS GENERALES DE LA PLANILLA									
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:				NÚMERO PLANILLA:					TIPO DE PLANILLA:				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:						860041968				7956284656					E-EMPLEADOS				
CIUDAD/MUNICIPIO:					BOGOTA DISTRITO CAPITAL	COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA				MES					2025				
DIRECCIÓN:					CARRERA 18 N° 116-24	BOGOTA - DISTRITO CAPITAL				enero AÑO					PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				
TIPO APORTANTE:					01-EMPLEADOR	2136402				0					febrero AÑO				
TIPO EMPRESA:					PRIVADA	B-MENOS DE 200 COTIZANTES				2025/02/11					NÚMERO AUTORIZACIÓN:				
FORMA DE PRESENTACIÓN:					SUCURSAL	Actividades de arquitectura e ingeniería y otras									1259135445				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):						CIA-285 - PUENTE VENADILLO				SI									

TOTAL APORTES A PENSIÓN																
ADMINISTRADORA				No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE					EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO		
230301	230301-PORVENIR			2	\$ 1.120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 1.120.000	\$ 0	\$ 1.120.000		
231001	231001-COLFONDOS			1	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800	\$ 0	\$ 227.800		
230201	230201- PROTECCION			1	\$ 264.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 264.000	\$ 0	\$ 264.000		
SUBTOTALES:												\$ 1.611.800	\$ 0	\$ 1.611.800		

TOTAL APORTES A SALUD																	
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
EPS002	EPS002-SALUD TOTAL	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 123.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 123.000	\$ 0	\$ 0	\$ 123.000	
EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	2		\$ 0		\$ 0		\$ 0	\$ 280.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 280.000	\$ 0	\$ 0	\$ 280.000	
SUBTOTALES:													\$ 403.000	\$ 0	\$ 0	\$ 403.000	

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES												
ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
14-4	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	4		\$ 0	\$ 0		\$ 0	\$ 701.200	\$ 701.200	\$ 0	\$ 0	\$ 701.200
SUBTOTALES:								\$ 701.200	\$ 0	\$ 0	\$ 701.200	

TOTAL APORTES A CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
ADMINISTRADORA					No. COTIZANTES	TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE					APORTES	MORA	VALOR PAGADO	
CCF50	CCF50-COMFENALCO TOLIMA				4	\$ 402.000	\$ 0	\$ 402.000	
SUBTOTALES:						\$ 402.000	\$ 0	\$ 402.000	

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES																																																								
DATOS DEL COTIZANTE										NOVEDADES										SEGURIDAD SOCIAL											PARAFISCALES																									
Nº	IDENTIFICA CIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN						SALUD						ARP				DÍAS COT	IBC	CCF					DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE	TOTAL APOORTE
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APOORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APOORTE			ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APOORTE								
1	CC 1049631922	LAZARO SUAREZ JERSON SAID	DEPEND		\$ 4.500.000	FIJO		SI		20																230301- PORVENIR	20	\$ 3.000.000	\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 480.000	EPS005- SANITAS S.A.	20	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 120.000	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	20	\$ 3.000.000		208.800	\$ 3.000.000	CCCF50- COMFENA LCO TOLIMA	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0		
2	CC 1069757599	CASTIBLANCO MOLINA PAULA DAYANA	DEPEND		\$ 4.000.000	FIJO		SI																	230301- PORVENIR	30	\$ 4.000.000	\$ 640.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 640.000	EPS005- SANITAS S.A.	30	\$ 4.000.000	\$ 160.000	\$ 0	\$ 160.000	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 4.000.000		278.400	\$ 4.000.000	CCCF50- COMFENA LCO TOLIMA	\$ 160.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
3	CC 5826192	ARIAS MARTINEZ WILSON YOVANNI	DEPEND		\$ 1.400.000	FIJO		SI																	231001- COLFOND OS	30	\$ 1.423.500	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 227.800	EPS002- SALUD TOTAL	30	\$ 1.423.500	\$ 57.000	\$ 0	\$ 57.000	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	30	\$ 1.423.500		\$ 99.100	\$ 1.400.000	CCCF50- COMFENA LCO TOLIMA	\$ 56.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			
4	CC 93410292	TIQUE CRUZ JOSE LUIS	DEPEND		\$ 4.500.000	FIJO		SI	20																230201- PROTECCI ON	11	\$ 1.650.000	\$ 264.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 264.000	EPS002- SALUD TOTAL	11	\$ 1.650.000	\$ 66.000	\$ 0	\$ 66.000	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRI A S.A.	11	\$ 1.650.000		114.900	\$ 1.650.000	CCCF50- COMFENA LCO TOLIMA	\$ 66.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0			

TOTAL

\$ 3.118.000

Se certifica que MARCO AURELIO MURCIA FIGUEROA identificado(a) con CC 1083912902 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-12	2025-01	1206793394	9480439186	E	2025-01-20																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$2,927,160						\$468,400										
ARL		COLPATRIA ARP		30	6.96%	\$2,927,160						\$203,800										
CCF		COMFACA		30	4%	\$2,927,160						\$117,100										
EPS		SANITAS		30	4%	\$2,927,160						\$117,100										

Este certificado se expide el día 2025-03-04 a las 09:45.

Se certifica que MARCO AURELIO MURCIA FIGUEROA identificado(a) con CC 1083912902 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	
2025-01	2025-02	1248443734	9481436153	E	2025-02-06																		
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización											
AFP		PORVENIR		30	16%	\$2,927,160						\$468,400											
ARL		COLPATRIA ARP		30	6.96%	\$2,927,160						\$203,800											
CCF		COMFACA		30	4%	\$2,927,160						\$117,100											
EPS		SANITAS		30	4%	\$2,927,160						\$117,100											

Este certificado se expide el día 2025-03-04 a las 09:44.

PLANILLA No:	7959218921													TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:				enero - 2025				PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				febrero - 2025				FECHA DE PAGO:		11/02/2025		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:						SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:						004 - ADMINISTRACION 3			
	NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																							
SALARIO BASICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU											
																						FSP												ARP				CCF																	
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO									IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE														
\$ 3.000.000																		230201-PROTECCION	30	\$ 3.000.000	\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 480.000	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 120.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 3.000.000		\$ 208.800	30	\$ 3.000.000	CCF21-CAFAM	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0									

PLANILLA No:	7954828330													TIPO DE PLANILLA:		E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:				diciembre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				enero - 2025	FECHA DE PAGO:		02/01/2025	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:								SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:								004 - ADMINISTRACION 3			
	NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES																
SALARIO BASICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP				ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD										EMPLEADOR	EMPLEADO	CCF																
\$ 3.000.000																		230201-PROTECCION	30	\$ 3.000.000	\$ 480.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 480.000	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 3.000.000	\$ 120.000	\$ 0	\$ 120.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 3.000.000		\$ 208.800	30	\$ 3.000.000	CCF21-CAFAM	\$ 120.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0					

PLANILLA No:		7951306783										TIPO DE PLANILLA:		E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:										noviembre - 2024										PERIODO COTIZACIÓN SALUD:										diciembre - 2024										FECHA DE PAGO:										02/12/2024										FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:										SUCURSAL										SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										004 - ADMINISTRACION 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
SALARIO BÁSICO		NOVEDADES																SEGURIDAD SOCIAL																PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
																		PENSIÓN																SALUD										ARP										CCF										SENA										ICBF										ESAP										MINEDU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	

Recibido por:


PLANILLA No:	7959226452										TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	enero - 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	febrero - 2025	FECHA DE PAGO:	06/02/2025	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	001 - BOGOTA																							
	NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL												PARAFISCALES																				
														PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU													
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	
																		230301-PORVENIR	23	\$ 1.916.667	\$ 306.700	SUBSISTENCIA A	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO	Normal	\$ 306.700	EPS017-FAMISANAR	23	\$ 1.916.667	\$ 76.700	\$ 0	\$ 76.700	014-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	23	\$ 1.916.667		\$ 10.100	23	\$ 1.916.667	CCF21-CAFAM	\$ 76.700	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 2.500.000														01-07				230301-PORVENIR	7	\$ 583.334	\$ 93.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 93.400	EPS017-FAMISANAR	7	\$ 583.334	\$ 23.400	\$ 0	\$ 23.400	014-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	7	\$ 583.334		\$ 0	7	\$ 583.334	CCF21-CAFAM	\$ 23.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

PLANILLA No:		7954813724		TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:		diciembre - 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		enero - 2025		FECHA DE PAGO:		02/01/2025		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:		001 - BOGOTÁ																																																															
NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																																																													
														PENSIÓN				SALUD				ARP						CCF				SENA		ICBF		ESAP		MINEDU																																																			
														FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL		TOTAL APORTE		ADMIN		DÍAS COT		IBC		COTIZACIÓN		VALOR ADRES		TOTAL APORTE		ADMIN		DÍAS COT		IBC		CENTRO DE TRABAJO		TOTAL APORTE		DÍAS COT		IBC		ADMIN		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE																																	
SUBSISTENCIA		SOLIDARIDAD		EMPLEADOR		EMPLEADO																																																																																			
SALARIO BÁSICO		ING		RET		TDE		TAE		TDP		TAP		COR		VSP		VST		SLN		COM		IGE		LMA		VAC		AVP		VCT		IRP		ADMIN		DÍAS COT		IBC		COTIZACIÓN		SUBSISTENCIA		SOLIDARIDAD		EMPLEADOR		EMPLEADO		Normal		\$ 106.700		EPS017- FAMISANAR		8		\$ 666.667		\$ 26.700		\$ 0		\$ 26.700		14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		8		\$ 666.667		\$ 0		\$ 0		CCF21-CAFAM		\$ 26.700		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	
\$ 2.500.000																										23-30								230301- PORVENIR		8		\$ 666.667		\$ 106.700		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		Normal		\$ 106.700		EPS017- FAMISANAR		8		\$ 666.667		\$ 26.700		\$ 0		\$ 26.700		14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		8		\$ 666.667		\$ 0		\$ 0		CCF21-CAFAM		\$ 26.700		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0			
\$ 2.500.000																																		230301- PORVENIR		22		\$ 1.833.334		\$ 293.400		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0		Normal		\$ 293.400		EPS017- FAMISANAR		22		\$ 1.833.334		\$ 73.400		\$ 0		\$ 73.400		14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		22		\$ 1.833.334		\$ 9.600		\$ 0		\$ 0		CCF21-CAFAM		\$ 73.400		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0	

PLANILLA No:	7951309022	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	noviembre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	diciembre - 2024	FECHA DE PAGO:	02/12/2024	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	001 - BOGOTÁ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
SALARIO BASICO	NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	
																		PENSIÓN					SALUD					ARP					CCF					SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
																		FSP		APORTES VOLUNTARIOS			INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		
	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
\$ 2.500.000	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								

Entregado por:

Recibido por:




PLANILLA No:	7959218921													TIPO DE PLANILLA:		E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:				enero - 2025				PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				febrero - 2025		FECHA DE PAGO:		11/02/2025		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:						SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:						004 - ADMINISTRACION 3			
	NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																				
SALARIO BASICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP				CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU								
																						FSP												ARP				CCF														
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD A	EMPLEADOR	EMPLEADO									IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE													
\$ 1.700.000																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.700.000	\$ 272.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 272.000	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.700.000	\$ 68.000	\$ 0	\$ 68.000	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 1.700.000		\$ 118.400	30	\$ 1.700.000	CCF21-CAFAM	\$ 68.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0						

PLANILLA No:	7954828330													TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:				diciembre - 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:				enero - 2025		FECHA DE PAGO:		02/01/2025		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:										SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										004 - ADMINISTRACION 3			
	NOVEDADES																	SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																											
SALARIO BASICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP				ADMIN	DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	CCF			SENA	ICBF	ESAP	MINEDU										
																						FSP		EMPLEADOR										EMPLEADO	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT						IBC	TOTAL APORTE	ADMIN					DIAS COT	IBC	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE					
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD																																				
\$ 1.700.000																		25-14 COLPENSIONES	30	\$ 1.700.000	\$ 272.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 272.000	EPS017-FAMISANAR	30	\$ 1.700.000	\$ 68.000	\$ 0	\$ 68.000	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 1.700.000		\$ 118.400	30	\$ 1.700.000	CCF21-CAFAM	\$ 68.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0													

PLANILLA No:		7951306783		TIPO DE PLANILLA:		E		PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:		noviembre - 2024		PERIODO COTIZACIÓN SALUD:		diciembre - 2024		FECHA DE PAGO:		02/12/2024		FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:		004 - ADMINISTRACION 3																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
SALARIO BÁSICO	NOVEDADES													SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																									
														PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
														FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																													
\$ 1.700.000																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																	</

Recibido por:



PLANILLA NO:	7959218921										TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	enero - 2025	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	febrero - 2025	FECHA DE PAGO:	11/02/2025	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:		SUCURSAL		SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:		004 - ADMINISTRACION 3																						
	NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																		
SALARIO BASICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	CCF		SENA	ICBF	ESAP	MINEDU	
																						FSP																			APORTES VOLUNTARIOS						
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD																		EMPLEADOR	EMPLEADO					
\$ 2.100.000														01-12					230301-PORVENIR	12	\$ 840.000	\$ 134.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 134.400	EPS008-COMPENSAR	12	\$ 840.000	\$ 33.600	\$ 0	\$ 33.600	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	12	\$ 840.000		\$ 0	12	\$ 840.000	CCF21-CAFAM	\$ 33.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
\$ 2.100.000																			230301-PORVENIR	18	\$ 1.260.000	\$ 201.600	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 201.600	EPS008-COMPENSAR	18	\$ 1.260.000	\$ 50.400	\$ 0	\$ 50.400	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	18	\$ 1.260.000		\$ 6.600	18	\$ 1.260.000	CCF21-CAFAM	\$ 50.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

PLANILLA N°:	7954828330	TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	diciembre - 2024	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	enero - 2025	FECHA DE PAGO:	02/01/2025	FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:	004 - ADMINISTRACION 3																														
SALARIO BASICO	NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL										PARAFISCALES																		
															PENSIÓN				SALUD				ARP				CCF				SENA	ICBF	ESAP	MINEDU									
															ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE
	SUBSISTENCIA		SOLIDARIDAD		EMPLOYADOR	EMPLOYADO																																					
\$ 2.100.000															230301-PORVENIR	30	\$ 2.100.000	\$ 336.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 336.000	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 2.100.000	\$ 84.000	\$ 0	\$ 84.000	14-4-SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 2.100.000		\$ 11.000	30	\$ 2.100.000	CCF21-CAFAM	\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0

PLANILLA No: 7951306783										TIPO DE PLANILLA:	E	PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS: noviembre - 2024										PERIODO COTIZACIÓN SALUD: diciembre - 2024										FECHA DE PAGO: 02/12/2024										FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:										SUCURSAL										SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:										004 - ADMINISTRACION 3									
	NOVEDADES														SEGURIDAD SOCIAL														PARAFISCALES																																																				
SALARIO BASICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DIAS COT	IBC	COTIZACION	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ARP				DIAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DIAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLEADOR	EMPLEADO									ADMIN	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE													TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																													
\$ 2.100.000																			230301-PORVENIR	30	\$ 2.100.000	\$ 336.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	Normal	\$ 336.000	EPS008-COMPENSAR	30	\$ 2.100.000	\$ 84.000	\$ 0	\$ 84.000	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 2.100.000		\$ 11.000	30	\$ 2.100.000	CCF21-CAFAM	\$ 84.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																		

Recibido por:



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 35507550
DESDE DICIEMBRE 2024 HASTA MARZO 2025

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										DATOS DEL COTIZANTE																			
TIPO IDENTIFICACIÓN:					NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					860041968					TIPO IDENTIFICACIÓN:					CÉDULA DE CIUDADANÍA NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:					35507550				
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:					BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:					COMPANIA DE PROYECTOS TECNICOS CPT SA					APELLIDOS:					RODRIGUEZ CANGREJO NOMBRES:					OLGA				
CIUDAD/MUNICIPIO:					CARRERA 18 N° 116-24 TELÉFONO:					BOGOTA - DISTRITO CAPITAL					CIUDAD/MUNICIPIO:					BOGOTA DISTRITO CAPITAL DEPARTAMENTO:					BOGOTA - DISTRITO CAPITAL				
DIRECCIÓN:					01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:					B-MENOS DE 200 COTIZANTES					TIPO COTIZANTE:					DEPEND SUBTIPO COTIZANTE:					NO OBLIG COT PENS EDAD				
TIPO APORTANTE:					PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:					Actividades de arquitectura e ingeniería y otras					COLOMBIANO RESIDENTE EN EL EXTERIOR:					NO EXTRANJERO NO OBLIGADO A COTIZAR PENSIÓN:					NO				
TIPO EMPRESA:					SI					SI					TIPO DE SALARIO:					FIJO					NO				
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):															COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):														

PLANILLA No:	7959218921														TIPO DE PLANILLA:	E														PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	enero - 2025														PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	febrero - 2025														FECHA DE PAGO:	11/02/2025														FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:															SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:														004 - ADMINISTRACION 3													
	NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																						PARAFISCALES																																																																													
SALARIO BÁSICO	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	PENSIÓN		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	ICBF	ESAP	MINEDU																																																																										
																						FSP																							APORTES VOLUNTARIOS																																																																									
																						SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD																						EMPLEADOR	EMPLEADO																																																																								
\$ 1.423.500														20-31							\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	OCIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	11	\$ 521.950	\$ 20.900	\$ 0	\$ 20.900	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	11	\$ 521.950		\$ 0	11	\$ 521.950	CCF21-CAFAM	\$ 20.900	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																									
\$ 1.423.500																					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	OCIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	19	\$ 901.550	\$ 36.100	\$ 0	\$ 36.100	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	19	\$ 901.550		\$ 4.800	19	\$ 901.550	CCF21-CAFAM	\$ 36.100	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																									

TOTAL PAGADO: \$ 118.800

PLANILLA No:	7954828330														TIPO DE PLANILLA:	E														PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	diciembre - 2024														PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	enero - 2025														FECHA DE PAGO:	02/01/2025														FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:															SUCURSAL	SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:														004 - ADMINISTRACION 3													
SALARIO BÁSICO	NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES																																																																																	
																			PENSIÓN										SALUD								ARP						CCF						SENA	ICBF	ESAP	MINEDU																																																																		
																			ADMIN		DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	VALOR ADRES	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	ADMIN	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE	TOTAL APORTE																																																																						
	SUBSISTENCIA	SOLIDARIDAD	EMPLOYADOR	EMPLOYADO																																																																																																																		
\$ 1.300.000																					\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	OCIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD	30	\$ 1.300.000	\$ 52.000	\$ 0	\$ 52.000	14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.	30	\$ 1.300.000		\$ 6.800	30	\$ 1.300.000	CCF21-CAFAM	\$ 52.000	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0																																																																									

TOTAL PAGADO: \$ 110.800

PLANILLA No:	7951306783														TIPO DE PLANILLA:	E														PERIODO COTIZACION OTROS SUBSISTEMAS:	noviembre - 2024														PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	diciembre - 2024														FECHA DE PAGO:	02/12/2024														FORMA DE PRESENTACIÓN APORTANTE:	SUCURSAL														SUCURSAL / DEPENDENCIA APORTANTE:														004 - ADMINISTRACION 3													
SALARIO BÁSICO	NOVEDADES																		SEGURIDAD SOCIAL																		PARAFISCALES																																																																																
																			PENSIÓN										SALUD								ARP						CCF						SENA		ICBF		ESAP		MINEDU																																																														
																			ADMIN		DÍAS COT		IBC		COTIZACIÓN		FSP		APORTES VOLUNTARIOS		INDICADOR TARIFA ESPECIAL		TOTAL APORTE		ADMIN		DÍAS COT		IBC		COTIZACIÓN		VALOR ADRES		TOTAL APORTE		ADMIN		DÍAS COT		IBC		CENTRO DE TRABAJO		TOTAL APORTE		DÍAS COT		IBC		ADMIN		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE		TOTAL APORTE																																												
	SUBSISTENCIA		SOLIDARIDAD		EMPLEADOR		EMPLEADO																																																																																																														
\$ 1.300.000																							\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0				\$ 0		OCIA SURAMERICANA DE SERVICIOS DE SALUD		30		\$ 1.300.000		\$ 52.000		\$ 0		\$ 52.000		14-4- SEGUROS DE VIDA COLPATRIA S.A.		30		\$ 1.300.000				\$ 6.800		30		\$ 1.300.000		CCF21-CAFAM		\$ 52.000		\$ 0		\$ 0		\$ 0		\$ 0																																														

TOTAL PAGADO: \$ 110.800

Entregado por:

Recibido por:

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	49 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

ANEXO No. 04

CONTROL E INSPECCIÓN Y ENSAYOS


		GOBERNACION DEL TOLIMA. MANUAL DE INTERVENTORIA INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA. N° 6			   @gobertolima www.tolima.gov.co	INFORME N°	7		
					PERIODO	11/12/2024 AL 20/12/2024 y 07/01/2025 AL 25/01/2025			
					PAGINA	1	DE		1
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1698					CONTRATISTA:	<u>ALDEIC SAS BIC</u>			
OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"									
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO									
No. ORDEN	ESPECIFICACIÓN								
	DESCRIPCIÓN / ENSAYO	NORMA	PROCEDENCIA	No. MUESTRAS	RANGO CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE OBTENIDO%	OBSERVACIÓN /ACCIONES		
2025-01-31 CO3250 OS-28409	COMPRESION	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO, NTC 673-2010 y MÉTODOS DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA EVALUACIÓN EN LABORATORIO Y EN OBRA, DE MORTEROS PARA UNIDADES DE MAMPOSTERÍA SIMPLE Y REFORZADA NTC 3546-2003	PLACA PUENTE	1	70	86,2	ENSAYO A 14 DIAS		
2025-01-31 CO3250 OS-28409	COMPRESION		PLACA PUENTE	1	70	89,4	ENSAYO A 14 DIAS		
2025-01-31 CO3250 OS-28409	COMPRESION		PLACA PUENTE	1	100	101,5	ENSAYO A 28 DIAS		
2025-01-31 CO3250 OS-28409	COMPRESION		PLACA PUENTE	1	100	104,1	ENSAYO A 28 DIAS		
3/02/2025	ENSAYO DE CONO DE ARENA DENSIDADES	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA INV E – 161 – 13	K0+300	1	98	101,9	SE REALIZO NUEVAMENTE COMPACTACION		
			K0+333	1	98	103,9			
			K0+373	1	98	95,8			
			K0+448	1	98	96,5			
			K0+472	1	98	97			
			K0+495	1	98	103			
21/12/2024	COMPACTACION (GOLPES/ CARA)	CRITERIOS DE DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE GRADACION CONTINUA POR EL MÉTODO MARSHALL CATEGORIA DE TRANSITO NT2 NORMA INV. ART 450: 2022 (TABLA 450.9)			75	75			
	ESTABILIDAD MINIMA				NORMA MAYOR 7500	10403			
	FLUJO (MM)				NORMA 2,0 -4,0	2,84			
	RELACION ESTABILIDAD FLUJO				3,0-5,0	3,99			
						<div>FIRMA:  Nombre: Jose Luis Tique Cruz Residente de Interventoría</div>			

	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S		CÓDIGO: OPS-R-077																																																			
			EMISIÓN: 2024-04-11																																																			
			VERSIÓN: 3																																																			
			CONSECUTIVO: EDY-GRA N°2438																																																			
INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO																																																						
INFORMACION DEL CLIENTE																																																						
NOMBRE O RAZON SOCIAL	ALDEIC SAS BIC	No. IDENTIFICACION O NIT	901.529.306																																																			
DIRECCION	CR 18 116 24	NUMERO DE CONTACTO	6012145198																																																			
NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO VENADILLO, UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.																																																					
INFORMACION DEL LABORATORIO																																																						
NOMBRE DEL LABORATORIO	ESTUDIOS DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S	TELEFONO	3175262303																																																			
DIRECCION	DIAGONAL 8 No. 32-36 BARRIO BLANCO	CIUDAD	GIRARDOT - CUNDINAMARCA																																																			
EMAIL	edyconst@hotmail.com																																																					
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA																																																						
TIPO DE MATERIAL	MEZCLA ASFALTICA MDC-19																																																					
MUESTRA ENTREGADA AL LABORATORIO POR	EL CLIENTE ☒		EDYCONST ☐																																																			
PROCEDENCIA	AGRETOL S.A.S																																																					
LOCALIZACION	AMBALEMA - TOLIMA																																																					
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	2024-12-21	FECHA DE EMISION DEL INFORME	2025-02-24																																																			
OBSERVACIONES DE LA MUESTRA:																																																						
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS																																																						
<table><tr><th colspan="4">CRITERIOS DE DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE GRADACION CONTINUA POR EL MÉTODO MARSHALL CATEGORIA DE TRANSITO NT2 NORMA INV. ART 450: 2022 (TABLA 450.9)</th></tr><tr><th>ENSAYO</th><th>NORMA DE ENSAYO INVIAS</th><th>REQUISITO</th><th>RESULTADOS</th></tr><tr><td>Granulometria</td><td>E - 782: 2013</td><td>Tabla 450.5</td><td></td></tr><tr><td>Compactación (golpes/cara)</td><td rowspan="5">E-748: 2013 (E-800) (Nota 1)</td><td>75</td><td>75</td></tr><tr><td rowspan="2">Estabilidad minima (N)</td><td>NORMA >7500</td><td rowspan="2">10403</td></tr><tr><td>F.T (12857 - 17857)</td></tr><tr><td rowspan="2">Flujo (mm)</td><td>NORMA 2.0 - 4.0</td><td rowspan="2">2,84</td></tr><tr><td>F.T (2.72 - 4.0)</td></tr><tr><td>Relacion estabilidad - flujo (kN/mm)</td><td></td><td>3,0 - 5,0</td><td>3,99</td></tr><tr><td>% Vacios con aire (%)</td><td>E - 736 - 799</td><td>3 - 5</td><td>6,48</td></tr><tr><td>% Vacios en los agregados minerales minimo (%)</td><td rowspan="3">E - 799</td><td>>= 15</td><td>15,57</td></tr><tr><td>% de vacios llenos de asfalto (%)</td><td>65 - 78</td><td>58,36</td></tr><tr><td>Relacion llenante/ Ligante efectivo, en peso</td><td>0.8 - 1.2</td><td>0,82</td></tr><tr><td>Gravedad especifica maxima</td><td>E - 735</td><td>-</td><td>2,479</td></tr><tr><td>Contenido optimo de asfalto</td><td>E - 732</td><td>5.2 - 5.8</td><td>4,9</td></tr></table>					CRITERIOS DE DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE GRADACION CONTINUA POR EL MÉTODO MARSHALL CATEGORIA DE TRANSITO NT2 NORMA INV. ART 450: 2022 (TABLA 450.9)				ENSAYO	NORMA DE ENSAYO INVIAS	REQUISITO	RESULTADOS	Granulometria	E - 782: 2013	Tabla 450.5		Compactación (golpes/cara)	E-748: 2013 (E-800) (Nota 1)	75	75	Estabilidad minima (N)	NORMA >7500	10403	F.T (12857 - 17857)	Flujo (mm)	NORMA 2.0 - 4.0	2,84	F.T (2.72 - 4.0)	Relacion estabilidad - flujo (kN/mm)		3,0 - 5,0	3,99	% Vacios con aire (%)	E - 736 - 799	3 - 5	6,48	% Vacios en los agregados minerales minimo (%)	E - 799	>= 15	15,57	% de vacios llenos de asfalto (%)	65 - 78	58,36	Relacion llenante/ Ligante efectivo, en peso	0.8 - 1.2	0,82	Gravedad especifica maxima	E - 735	-	2,479	Contenido optimo de asfalto	E - 732	5.2 - 5.8	4,9
CRITERIOS DE DISEÑO DE LA MEZCLA ASFÁLTICA EN CALIENTE DE GRADACION CONTINUA POR EL MÉTODO MARSHALL CATEGORIA DE TRANSITO NT2 NORMA INV. ART 450: 2022 (TABLA 450.9)																																																						
ENSAYO	NORMA DE ENSAYO INVIAS	REQUISITO	RESULTADOS																																																			
Granulometria	E - 782: 2013	Tabla 450.5																																																				
Compactación (golpes/cara)	E-748: 2013 (E-800) (Nota 1)	75	75																																																			
Estabilidad minima (N)		NORMA >7500	10403																																																			
		F.T (12857 - 17857)																																																				
Flujo (mm)		NORMA 2.0 - 4.0	2,84																																																			
		F.T (2.72 - 4.0)																																																				
Relacion estabilidad - flujo (kN/mm)		3,0 - 5,0	3,99																																																			
% Vacios con aire (%)	E - 736 - 799	3 - 5	6,48																																																			
% Vacios en los agregados minerales minimo (%)	E - 799	>= 15	15,57																																																			
% de vacios llenos de asfalto (%)		65 - 78	58,36																																																			
Relacion llenante/ Ligante efectivo, en peso		0.8 - 1.2	0,82																																																			
Gravedad especifica maxima	E - 735	-	2,479																																																			
Contenido optimo de asfalto	E - 732	5.2 - 5.8	4,9																																																			

Diagonal 8 No. 32-36 Barrio Blanco/Girardot-Cundinamarca.

Tel: 8887452-Cel: 3175262303

edyconst@hotmail.com

OBSERVACIONES
Los resultados presentados en este informe, solo son aplicables a los ítems sometidos a ensayo.
El presente informe no podrá reproducirse parcialmente sin la aprobación del laboratorio de EDYCONST S.A.S. Excepto cuando se reproduce en su totalidad.
Los datos de la muestra que figuran en este informe han sido proporcionados por el cliente.
El laboratorio no realiza opiniones, interpretaciones ni declaraciones de conformidad, sobre los ensayos ofertados. Se limitará solamente a expresar resultados en un informe de ensayo.
EDYCONST S.A.S, conservará muestras testigo de ensayos o contramuestras que lo permitan, por un periodo máximo de 15 días calendario, luego de la emisión del informe de resultados. si el cliente requiere la devolución de la muestra restante del análisis (en el caso de quedar disponible) los gastos de devolución, manipulación, embalaje, y transporte correrán a cargo del cliente.
Las solicitudes de modificación o corrección al informe de resultados de ensayos de laboratorio solo podrán ser solicitadas sobre información suministrada por el cliente y no sobre los resultados emitidos, estas deberán ser solicitadas por medio de un correo corporativo oficial.
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD
La siguiente información relacionada en todos los formatos anexos a este informe: nombre o razón social, nombre del proyecto, No. de identificación o NIT, localización, tipo de material y procedencia son suministradas por el cliente con fines informativos. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada o confirmada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados.
El laboratorio de EDYCONST S.A.S no es responsable del origen de donde haya sido tomada o extraída la muestra.
<div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  <p>ING. CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA DIRECTOR TECNICO APROBÓ</p> </div> <div style="text-align: center;">  <p>BRAYAN STIVEN VARGAS MANCILLA COORDINADOR DE LABORATORIO REVISÓ</p> </div> </div>
Nota. Por políticas del laboratorio, se garantiza total confidencialidad y reserva sobre los resultados obtenidos, además, los derechos de autor son propiedad total de la parte contratante.

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S

CONTRATISTA:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO VENADILLO, UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA
LOCALIZACIÓN:	AMBALEMA - TOLIMA
TIPO DE MUESTRA:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19
No. DE BRIQUETAS:	004

MUESTRA No.	1	FECHA DE RECEPCION:	2024-12-21
TEMPERATURA:	150 °C	FECHA DE ENSAYO:	2025-02-22
HORA:	11:30 AM		
PLANTA:	AGRETEL S.A.S		
VIAJE No.	VEHICULO PLACA "SOP507"		

EXTRACCIÓN CUANTITATIVA DEL ASFALTO EN MEZCLAS PARA PAVIMENTOS INV E - 732- 2013	
DATOS INICIALES	
<i>P1. Peso neto de la muestra g</i>	1.505,2 gr
<i>P2. Peso seco de la muestra después de la extracción g.</i>	1.430,1 gr
<i>P3. Peso de la muestra después de la extracción g. mas residuo</i>	1,6 gr
RESULTADOS	
<i>A. Peso del asfalto extraído g.</i>	73,5 gr
<i>% . De asfalto de la mezcla</i>	4,9%

PROPIEDADES FÍSICAS		DATOS DE DISEÑO	OBTENIDOS
Asfalto	%	5,50%	4,9
Estabilidad N.		14286	11339
Flujo	m.m.	3,40	2,84
Vacios	%	4,0%	6,5
ESPECIFICACIONES NORMA			CUMPLE SI/NO
Asfalto	%	(+/-0,3%), (5,2%-5,8%)	NO
Estabilidad N.		>7500	SI
Flujo	m.m.	2.0 A 4.0 mm.	SI
Vacios	%	3.0 % - 5.0 %	NO


ANÁLISIS GRANULOMÉTRICO DE LOS AGREGADOS EXTRAÍDOS DE MEZCLAS ASFÁLTICAS
INVE - 782: 2013

TAMIZ	PESO RETENIDO g.	% RETENIDO	% RET. ACUMULADO	% PASA	FORMULA DE TRABAJO			ESPECIFICACIÓN GRANULOMÉTRICA		CUMPLE ESPEC.?	CUMPLE F TRAB.?
					- %	CENTRAL	+ %	MDC - 19 NORMA INV. 2022	(S/N/NA)	(S/N/NA)	
3/4" (19,05 mm.)	74,5	5,2	5,2	94,8	100,0	100,0	100,0	100	100	NO	NO
1/2" (12,70 mm.)	250,9	17,5	22,8	77,2	79,5	83,5	87,5	80	95	NO	NO
3/8" (9,50 mm.)	110,8	7,7	30,5	69,5	70,0	74,0	78,0	70	88	NO	NO
No. 4 (4,75 mm.)	203,1	14,2	44,7	55,3	53,9	57,9	61,9	49	65	SI	SI
No. 10 (2,00 mm.)	211,9	14,8	59,5	40,5	40,0	43,0	46,0	29	45	SI	SI
No. 40 (0,42 μ)	343,2	24,0	83,5	16,5	15,1	18,1	21,1	14	25	SI	SI
No. 80 (0,177 μ)	121,6	8,5	92,0	8,0	6,4	9,4	12,4	8	17	NO	SI
No. 200 (0,074 μ)	69,8	4,9	96,9	3,1	3,6	5,6	7,6	4	8	NO	NO
Pasa No. 200	118,8	8,3	105,2								

PORCENTAJE DE LOS AGREGADOS	
GRAVAS (%):	0.2
ARENAS (%):	1.0
FINOS (%):	6.0

D10:	0,2
D60:	5,50
D30:	1,20

CU:	27,5
CC:	1,31

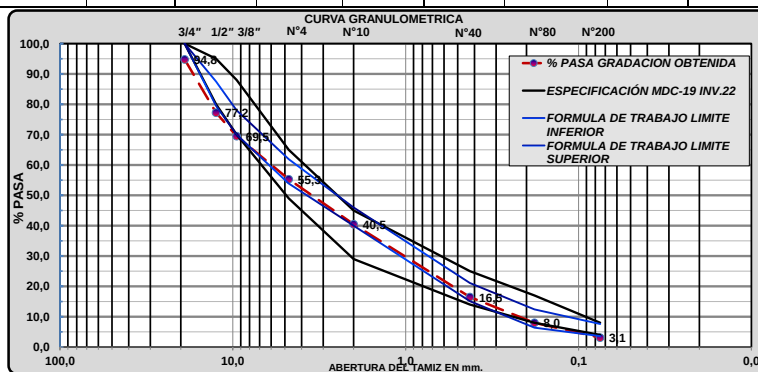

RELACION ESTABILIDAD-FLUJO:


RELACION LLENANTE-LIGANTE:

OBSERVACIONES:

Los resultados presentados en este informe, solo son aplicables a los ítems sometidos a ensayo.

ING. CARLOS ANDRES NIETO L.
DIRECTOR TÉCNICO

BRAYAN STIVEN VARGAS MANCILLA
COORDINADOR DE LABORATORIO

	MEZCLAS ASFÁLTICAS EN CALIENTE DE GRADACIÓN CONTINUA (CONCRETO ASFÁLTICO) ARTÍCULO 450: 2022 (INV E – 799: 2013), (INV E – 733: 2013), (INV E – 736: 2013), (INV E – 748: 2013)												CÓDIGO: OPS-R-026			
													EMISIÓN: 01/02/2017			
													VERSIÓN: 1			
													CONSECUTIVO: EDY-GRA N°2438			
ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S																
<div>CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO VENADILLO, UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.</div> <div><div>PROYECTO:</div><div>CONTRATISTA:</div><div>LOCALIZACIÓN:</div><div>TIPO DE MUESTRA:</div><div>N° DE BRIQUETAS:</div></div> <div><div>MUESTRA No.</div><div>TEMPERATURA:</div><div>HORA:</div><div>VIAJE No.</div></div> <div><div>FECHA DE RECEPCION:</div><div>FECHA D ENSAYO:</div><div>PROCEDENCIA:</div></div>																
P. Esp. Agr: Gag =		2,612		Peso Especifico Asfalto: Gas		1,0217		Temperatura de Compactación :		140 °C		Golpes por Cara:		75		
Briqueta Tramo N°	Contenido de Asfalto	PESO MUESTRA			PESO ESPECIFICO			Asf. Absorbido	VOLUMEN TOTAL			% Vacios		ESTABILIDAD		FLUJO
		Seca en Aire	S.S.S. En el Aire	En Agua	Bulk	Máximo Medido	Máximo Teorico		Agregados	Vacios con Aire	Asfalto Efectivo	Agregados Minerales	Llenos de Asfalto	Medida	Corregida	
	%	grs.	grs.	grs.	grs./cm³	grs./cm³	grs./cm³	%	%	%	%	%	%	kN	kN	mm
1	4,9	1141,1	1143,2	652,6	2,326									11,89	12,96	2,74
2		1142,2	1145,7	653,4	2,320									9,61	10,47	3,06
3		1144,5	1146,6	651,5	2,312									9,20	10,03	2,68
4		1144,1	1145,9	652,1	2,317									10,91	11,89	2,89
PROMEDIO					2,319	2,427	2,479	0,91	84,4	6,5	9,1	15,6	58,4	10,40	11,34	2,84
<div>ASFALTO EFECTIVO: 3,78</div> <div>ASFALTO ABSORBIDO: 0,91</div> <div>OBSERVACIONES:</div> <div>Los resultados presentados en este informe, solo son aplicables a los ítems sometidos a ensayo.</div> <div><div> ING. CARLOS ANDRES NIETO L. DIRECTOR TÉCNICO</div><div> BRAYAN STIVEN VARGAS MANCILLA COORDINADOR DE LABORATORIO</div></div>																



**GRAVEDAD ESPECÍFICA MÁXIMA DE MEZCLAS
ASFÁLTICAS PARA PAVIMENTOS
INV E – 735: 2013**

CÓDIGO: OPS-R-035

EMISIÓN: 01/02/2017

VERSIÓN: 1

**CONSECUTIVO: EDY-GRA
N°2438**

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S

OBRA O PROYECTO:	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO VENADILLO, UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.
CONTRATISTA:	ALDEIC SAS BIC
LOCALIZACIÓN:	AMBALEMA - TOLIMA
MATERIAL:	MEZCLA ASFALTICA MDC-19
FECHA DE TOMA:	2024-12-21
FECHA DE ENTREGA:	2025-02-24

ENSAYO N°	1
a- Temperatura °C	25
b- Contenido de Asfalto	4,9%
c- Peso muestra seca en el aire (gr)	1500
d- Peso picnómetro lleno de agua (gr)	9724,0
e- Peso fresca lleno de agua + muestra (gr)	10619
f- Peso Específico máximo medido (c/(c+d-e))	2,479

OBSERVACIONES:

Los resultados presentados en este informe, solo son aplicables a los ítems sometidos a ensayo.

ING. CARLOS ANDRES NIETO L.
DIRECTOR TÉCNICO

BRAYAN STIVEN VARGAS MANCILLA
COORDINADOR DE LABORATORIO

	Informe de Ensayo: ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO, NTC 673-2010 y MÉTODOS DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA EVALUACIÓN EN LABORATORIO Y EN OBRA, DE MORTEROS PARA UNIDADES DE MAMPOSTERÍA SIMPLE Y REFORZADA NTC 3546-2003				Código: LA-FOR-021	
					Versión: 011	
					Fecha de Emisión: 2023-09-19	

Obra:	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA						
Dirigido a:	ALDEIC SAS BIC	Atención:		ING. JOSE LUIS TIQUE CRUZ			
Teléfono contacto:	6012145198	Dirección Contacto:		CR 18 116 24BOGOTA D.C			
Descripción:	CONTROL DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILINDRICOS						
Fecha Informe:	2025-01-31	Código Obra:	CO-3250	Periodo Informe:	1 - 2025	Informe N°	1

Los resultados presentados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El Laboratorio no es responsable del proceso de muestreo, referenciación y embalaje de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del Laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma física y sello o firma digital.

Atentamente me permito informarle sobre los resultados obtenidos en los siguientes cilindros de concreto:

Tipos de falla de los Cilindros de Concreto:



Identificación	Consecutivo de muestra	Fecha de recepción de muestras	Fecha recepción remisión de	Orden de Servicio N°	Abscisa y Clase Obra	Fecha de Muestreo:	Fecha de Ensayo:	Lectura Prensa Carga máxima (Kn)	Diámetro muestra (mm)	Longitud muestra (mm)	Relación Largo / Diámetro	Sección Transversal mm²	Peso (kg)	Densidad (Ton/m³)	Resistencia Mpa	Resistencia en PSI	(%)	Edad en días	Resistencia esperada a los 28 días en PSI	Tipo de falla	Asentamiento	Prensa a compresión	Inciditumbre expandida
1 - 1	82897	2025-01-30	2025-01-30	OS-28409	Placa puente	2025-01-17	2025-01-31	245,1	102,5	203,7	2,0	8252	---	---	30,3	4309	86,2%	14	5000	2	----	E144	---
1 - 2	82898	2025-01-30	2025-01-30	OS-28409	Placa puente	2025-01-17	2025-01-31	252,0	102,0	203,0	2,0	8171	---	---	31,4	4472	89,4%	14	5000	5	----	E144	---
1 - 3	82899	2025-01-30	2025-01-30	OS-28409	Placa puente	2025-01-17	2025-02-14	----	---	---	---	---	---	---	Pendiente	---	----	28	5000	---	----	---	---
1 - 4	82900	2025-01-30	2025-01-30	OS-28409	Placa puente	2025-01-17	2025-02-14	----	---	---	---	---	---	---	Pendiente	---	----	28	5000	---	----	---	---

Observaciones:			Aprobó:

Fin Informe

	Informe de Ensayo: ENSAYO DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILÍNDRICOS DE CONCRETO, NTC 673-2010 y MÉTODOS DE ENSAYO PARA DETERMINAR LA EVALUACIÓN EN LABORATORIO Y EN OBRA, DE MORTEROS PARA UNIDADES DE MAMPOSTERÍA SIMPLE Y REFORZADA NTC 3546-2003		Código: LA-FOR-021
			Versión: 011
			Fecha de Emisión: 2023-09-19

Obra:	CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA						
Dirigido a:	ALDEIC SAS BIC		Atención:		ING. JOSE LUIS TIQUE CRUZ		
Teléfono contacto:	6012145198		Dirección Contacto:		CR 18 116 24BOGOTA D.C		
Descripción:	CONTROL DE RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE ESPECIMENES CILINDRICOS						
Fecha Informe:	2025-02-14	Código Obra:	CO-3250	Periodo Informe:	1 - 2025	Informe N°	2

Los resultados presentados pertenecen únicamente a las muestras ensayadas. El Laboratorio no es responsable del proceso de muestreo, referenciación y embalaje de muestras. Este informe no puede ser reproducido en su totalidad ni parcialmente, sin la autorización escrita del Laboratorio que lo emite. Este informe no es válido sin la firma física y sello o firma digital.

Atentamente me permito informarle sobre los resultados obtenidos en los siguientes cilindros de concreto:

Tipos de falla de los Cilindros de Concreto:




Identificación	Consecutivo de muestra	Fecha de recepción de muestras	Fecha recepción remisión de	Orden de Servicio N°	Abscisa y Clase Obra	Fecha de Muestreo:	Fecha de Ensayo:	Lectura Prensa Carga máxima (Kc)	Diámetro muestra (mm)	Longitud muestra (mm)	Relación Largo / Diámetro	Sección Transversal mm²	Peso (Kg)	Densidad (Ton/m³)	Resistencia Mpa	Resistencia en PSI	(%)	Edad en días	Resistencia esperada a los 28 días en PSI	Tipo de falla	Asentamiento	Prensa a compresión	Incertidumbre expandida
1 - 1	82897	2025-01-30	2025-01-30	OS-28409	Placa puente	2025-01-17	2025-01-31	245,1	102,5	203,7	2,0	8252	---	---	30,3	4309	86,2%	14	5000	2	----	E144	---
1 - 2	82898	2025-01-30	2025-01-30	OS-28409	Placa puente	2025-01-17	2025-01-31	252,0	102,0	203,0	2,0	8171	---	---	31,4	4472	89,4%	14	5000	5	----	E144	---
1 - 3	82899	2025-01-30	2025-01-30	OS-28409	Placa puente	2025-01-17	2025-02-14	291,5	103,0	203,7	2,0	8332	---	---	35,7	5075	101,5%	28	5000	3	----	E144	---
1 - 4	82900	2025-01-30	2025-01-30	OS-28409	Placa puente	2025-01-17	2025-02-14	301,9	103,5	204,0	2,0	8413	---	---	36,6	5205	104,1%	28	5000	2	----	E144	---

Observaciones:		Aprobó:

Fin Informe

	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S		CÓDIGO: OPS-R-077	
			EMISIÓN: 2024-04-11	
			VERSIÓN: 3	
			CONSECUTIVO: EDY N° 150	
INFORME DE RESULTADOS DE ENSAYOS DE LABORATORIO				
INFORMACION DEL CLIENTE				
NOMBRE O RAZON SOCIAL	ALDEIC SAS BIC	No. IDENTIFICACION O NIT	901.529.306	
DIRECCION	CARRERA 18 N° 116-24 BOGOTA D.C.	NUMERO DE CONTACTO	6012145198	
NOMBRE DEL PROYECTO	CONTRATAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO VENADILLO, UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.			
INFORMACION DEL LABORATORIO				
NOMBRE DEL LABORATORIO	ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S	TELEFONO	3175262303	
DIRECCION	DIAGONAL 8 N° 32 - 36 BARRIO BLANCO	CIUDAD	GIRARDOT	
EMAIL	edyconst@hotmail.com			
IDENTIFICACION DE LA MUESTRA				
TIPOS DE MATERIAL	BASE GRANULAR			
MUESTRA ENTREGADA AL LABORATORIO POR	EL CLIENTE ☐		EDYCONST ☒	
PROCEDENCIA	CANTERA CAIMA			
LOCALIZACION	AMBALEMA - TOLIMA			
FECHA DE RECEPCION DE LA MUESTRA	2025-02-03	FECHA DE EMISION DEL INFORME	2025-02-04	
OBSERVACIONES DE LA MUESTRA				
RESULTADOS DE LOS ENSAYOS				

OBSERVACIONES	
Los resultados presentados en este informe, solo son aplicables a los ítems sometidos a ensayo.	
El presente informe no podra reproducirse parcialmente sin la aprobacion del laboratorio de EDYCONST S.A.S. Excepto cuando se reproduce en su totalidad.	
Los datos de la muestra que figuran en este informe han sido proporcionados por el cliente.	
El laboratorio no realiza opiniones, interpretaciones ni declaraciones de conformidad, sobre los ensayos ofertados. Se limitará solamente a expresar resultados en un informe de ensayo.	
EDYCONST S.A.S, conservará muestras testigo de ensayos o contramuestras que lo permitan, por un periodo máximo de 15 días calendario, luego de la emisión del informe de resultados. si el cliente requiere la devolución de la muestra restante del análisis (en el caso de quedar disponible) los gastos de devolución, manipulación, embalaje, y transporte correrán a cargo del cliente.	
Las solicitudes de modificación o corrección al informe de resultados de ensayos de laboratorio solo podrán ser solicitadas sobre información suministrada por el cliente y no sobre los resultados emitidos, estas deberán ser solicitadas por medio de un correo corporativo oficial.	
DESCARGO DE RESPONSABILIDAD	
La siguiente información relacionada en todos los formatos anexos a este informe: nombre o razon social, nombre del proyecto, No. de identificación o NIT, localización, tipo de material y procedencia son suministradas por el cliente con fines informativos. El laboratorio no se hace responsable por la información suministrada o confirmada por el cliente que pueda afectar la validez de los resultados.	
El laboratorio de EDYCONST S.A.S no es responsable del origen de donde haya sido tomada o extraída la muestra.	
 <hr/> ING. CARLOS ANDRES NIETO LAGUNA DIRECTOR TECNICO APROBÓ	 <hr/> DAVID STEVEN TAFUR RODRIGUEZ COORDINADOR DE CAMPO REVISÓ
Nota. Por políticas del laboratorio, se garantiza total confidencialidad y reserva sobre los resultados obtenidos, además, los derechos de autor son propiedad total de la parte contratante.	



DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR EL MÉTODO DEL CONO Y ARENA
INV
E – 161 – 13

CÓDIGO: OPS-R-014
EMISIÓN: 2024-11-20
VERSIÓN: 4
CONSECUTIVO: EDY N° 150

ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIONES CARLOS NIETO S.A.S


MATERIAL: BASE GRANULAR
CONTRATISTA: ALDEIC SAS BIC
PROYECTO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y JURÍDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RÍO VENADILLO, UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA, EN EL DEPARTAMENTO DE TOLIMA.
LOCALIZACION: VIA PALOBAYO - AMBALEMA

PROCEDENCIA: CANTERA CAIMA
MUNICIPIO: AMBALEMA - TOLIMA
VÍA EXIST: ☐
VÍA NUEVA: ☒

FECHA DE TOMA: 2025-02-03
FECHA DE EMISION: 2025-02-04

DENSIDAD N°	UNIDAD	1	2	3	4	5	6
Ubicación		TRAMO PALOBAYO			TRAMO AMBALEMA		
Abscisa		K0+300 DERECHA	K0+333 CENTRO	K0+373 IZQUIERDA	K0+448 DERECHA	K0+472 CENTRO	K0+495 IZQUIERDA
Aparato de cono utilizado	N°	3	4	4	3	4	3
Profundidad del hueco	m	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10	0,10
Masa frasco y arena inicial	g	6.580	6.572	6.542	6.502	6.480	6.552
Masa frasco y arena restante	g	2.760	2.754	2.642	2.238	2.674	2.742
Masa de arena usada	g	3.820	3.818	3.900	4.264	3.806	3.810
Constante del Cono	g	1.604	1.636	1.636	1.604	1.636	1.604
Masa arena en el hueco	g	2.216	2.182	2.264	2.660	2.170	2.206
Densidad de la arena	g/cm3	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43	1,43
Volumen del hueco de ensayo	cm3	1.550	1.526	1.583	1.860	1.517	1.543
masa del material extraído humedo	g	3.716	3.694	3.550	4.190	3.428	3.680
Contenido de humedad in-situ (INV-E-150: 2013)	%	5,6	4,6	5,0	4,8	4,5	4,0
masa del material extraído seco	g	3.519	3.532	3.381	3.998	3.280	3.538
Densidad humedad in-situ	g/cm3	2,398	2,421	2,242	2,253	2,259	2,385
Densidad seca in-situ	g/cm3	2,271	2,314	2,135	2,149	2,162	2,294
Peso unitario seco in-situ	kN/m3	22,3	22,7	20,9	21,1	21,2	22,5
	kg/m3	2.271	2.314	2.135	2.149	2.162	2.294
Masa sobretamaños retenido en el tamiz 3/4"	g	262,0	444,0	320,0	780,0	240,0	520,0
% de material retenido en el tamiz 3/4"	%	7,1%	12,0%	9,0%	18,6%	7,0%	14,1%
Peso unitario seco maximo (INV-E-142: 2013)	kN/m3	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85	21,85
	kg/m3	2.228	2.228	2.228	2.228	2.228	2.228
Peso unitario seco maximo corregido (INV-E-143: 2013)	kN/m3						
	kg/m3						
Contenido de humedad optimo	%	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0	7,0
% De compactación en el terreno	%	101,9%	103,9%	95,8%	96,5%	97,0%	103,0%
% De compactación en el terreno corregido	%						
Criterio de aceptacion de compactacion según la norma.	%	98%	98%	98%	98%	98%	98%

OBSERVACIONES:
 Proctor modificado y humedad optima suministrado por el contratista.


ING.CARLOS ANDRES NIETO L.
 DIRECTOR TÉCNICO


CO17/7710


DAVID STEVEN TAFUR RODRIGUEZ
 COORDINADOR DE CAMPO

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	50 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

ANEXO No. 05

CONTROL EQUIPOS UTILIZADOS EN OBRA

<div><p>ALDEIC S.A.S BIC</p></div>	<div><p>GOBERNACION DEL TOLIMA</p></div>	<div><div></div><p>@gobertolima www.tolima.gov.co</p><p>GOBERNACION DEL TOLIMA</p><p>MANUAL DE INTERVENTORIA</p><p>INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA No 7</p></div>	INFORME N°	7																																															
			PERIODO	11/12/2024 AL 20/12/2024 y 07/01/2025 AL 25/01/2025																																															
			PAGINA	1	DE	1																																													
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1698	CONTRATISTA OBRA:	CONSORCIO PUENTE AMBALEMA - PALOBAYO	OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"																																																
	CONTRATISTA INTERVENTORIA:	ALDEIC SAS BIC																																																	
CONTROL DIARIO DEL EQUIPO DEL CONTRATISTA DE OBRA																																																			
MÁQUINA \ DÍA	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26				
Excavadora sobre Oruga Hyundai 150C	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A																		A	I	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Planta electrica	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A																		A	I	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Compresor Neumatico	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I																		I	I	I	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Carmix DIECI (carro hormiguero) L3500	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I																		A	A	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	1	0	0		
Carmix DIECI (carro hormiguero) L3500	I	A	A	A	A	A	A	A	A	I																		I	I	I	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	0	1	0	0	0	0		
Camioneta de estacas DIMAX ICL610	I	I	I	I	I	A	I	I	A	I																		I	I	I	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	
Carro tanque de agua International WFFV172	I	I	I	I	I	A	I	I	A	I																		I	I	I	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	
Martillo Neumatico	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I																		I	I	I	1	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Pulidora 6A-9020	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A																		A	A	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Oxicorte	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I																		A	A	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	
Volqueta dobletroque TGU480	I	A	A	A	A	I	I	A	A	A																		I	I	A	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	0	0	1	1	1	1	1	
Volqueta dobletroque SOP507	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I																		I	I	I	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0		
Volqueta dobletroque USE683	I	I	A	I	I	I	A	I	I	I																		I	I	I	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	0	0		
Volqueta dobletroque USE257	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I																		I	I	A	1	1	1	1	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	1	1		
Grua Telescopica	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A																		A	A	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Vibro compactador doble rodillo 2 Ton	I	A	A	A	A	A	I	A	A	A																		A	I	A	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Vibro compactador de concreto	I	I	I	I	I	A	I	I	A	I																		I	I	A	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0		
Equipo Oxicorte	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A																		A	A	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Equipo Soldadura	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A																		A	A	A	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1		
Total	2	13	14	13	13	12	9	10	13	8																		9	6	12	13	14	13	13	12	9	10	13	8	13	14	9	3	12	11	9					
CONVENCIONES	La inactividad de la maquinaria reportada en este formato se debe a que no se requería la maquinaria todo el mes o se usaba cuando se requería para las actividades inherentes de la obra		<div></div> <div>Firma</div> <div>Nombre: Jose Luis Tique Cruz</div> <div>Residente de Interventoría</div>																																																
ACTIVO = A																																																			
REPARACION = R																																																			
INACTIVO = I																																																			

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	51 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

ANEXO No. 06

CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO



GOBERNACION DEL TOLIMA
MANUAL DE INTERVENTORIA
INFORME MENSUAL No 7

INFORME N°

7

PERIODO

11/12/2024 AL 20/12/2024 y 07/01/2025 AL 25/01/2025

PAGINA

1

DE

•

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 1698

CONTRATISTA:

ALDEIC SAS BIC

OBJETO: CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

[illegible]

Nota: Se hace referencia a los días que tuvieron tiempo seco y lluvia, hay presencia de nubosidad algunos días pero no se presentan lluvias en la obra

Firma

Nombre: Jose Luis Tigue Cruz

Residente de Interventoría

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	52 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

ANEXO No. 07

CORRESPONDENCIA ENVIADA



Bogotá, D.C., diciembre 17 de 2024

CA-285-0077-0340-24

Señores:

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Atn: Ing. HAROL LEAL

Supervisor Contrato de Interventoría

Director de Infraestructura

Ibagué - Tolima

REF: Contrato de Interventoría N° 1698 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ASUNTO: Entrega informe mensual No.1, No.2; No.3 y No,4 en físico.

Respetados Señores:

Atendiendo a lo requerido por la Gobernación del Tolima, remitimos a ustedes los informes mensuales en físico de la referencia de la referencia.

Quedamos a la espera de su revisión y comentarios

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ

Directora Interventoría

Elaboró: S. Guarín - Ing., Apoyo

Revisó: D. Riveros – Directora de Interventoría

Aprobó: C. Alfaro – R.L.

Copia. Archivo de Interventoría



Bogotá, D.C., 17 diciembre de 2024

C-285-0078-0341-24

Señores:

CONSORCIO PUENTE AMBALEMA-PALOMAYO

Atn: Ing. Luis Ricardo Ortigoza González

Contratista de obra

Ibagué – Tolima

REF: Contrato de Obra N° 1665 “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

ASUNTO: Requerimientos área HSEQ - señalización

Respetados señores (as),

Según las obligaciones descritas y adquiridas por la parte contratista con la firma del contrato de obra de la referencia en especial lo enunciado en la *CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA – Numerales 32, 6, 9, 12, 15, 16, 22, 36, 37, y 38.*

Se solicita al contratista de la obra que, en atención a la suspensión del contrato, remita a la interventoría, a más tardar el día 20 de diciembre de 2024, evidencia fotográfica con marca de agua que indique claramente la fecha y hora del cierre de la obra. Dicha evidencia deberá incluir la señalización instalada en los accesos para impedir el tránsito de personas no autorizadas, minimizando cualquier tipo de riesgo. Además, deberá documentarse la instalación de avisos que indiquen claramente **“PROHIBIDO EL PASO A PERSONAL NO AUTORIZADO”** en los puntos correspondientes.

Se solicita igualmente dejar evidencia de la señalización que indique claramente la *NO EXISTENCIA DE PASO VEHICULAR DE NINGÚN TIPO*, con el fin de evitar responsabilidades en caso de accidentes dentro del AID. Esto, considerando que la vía está cerrada y se encuentra prohibido el tránsito de cualquier vehículo motorizado. Cabe mencionar que, actualmente, la comunidad utiliza un paso alterno bajo su propia responsabilidad. En caso de ser necesario, se deberá realizar el requerimiento correspondiente a las autoridades locales competentes. Es importante recordar que es responsabilidad del contratista de obra instalar la señalización adecuada que informe el cierre de la vía de manera inequívoca.

Teniendo en cuenta lo mencionado y los compromisos adquiridos en comité de obra del día 08/10/2024, y lo solicitado mediante comunicado C-285-0027-004-24 de fecha 02/08/2024, se reitera al contratista la importancia y premura en la presentación y radicación del PMT ante la interventoría y a su vez ante la entidad de tránsito correspondiente.

En atención a lo anterior, quedamos atentos a la respuesta al presente comunicado, junto con la presentación de los documentos requeridos y la implementación de los elementos de seguridad descritos en este oficio. Esto, en cumplimiento de las normas de salud ocupacional y seguridad



industrial aplicables, con el objetivo de garantizar la seguridad de los trabajadores y de la comunidad dentro del AID del proyecto.

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ

Directora Interventoría

Elaboró: P. Castiblanco – Profesional HSEQ

Revisó: D. Riveros – Directora de Interventoría

Aprobó: D. Riveros – Directora de Interventoría

Copia. Archivo de Interventoría



Bogotá, D.C., 17 diciembre de 2024

C-285-0079-0342-24

Señores:

CONSORCIO PUENTE AMBALEMA-PALOMAYO

Atn: Ing. Luis Ricardo Ortigoza González

Contratista de obra

Ibagué – Tolima

REF: Contrato de Obra N° 1665 “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

ASUNTO: Comité de fecha 19/12/2024

Respetados señores (as),

Por medio del presente documento, dejamos constancia de los acuerdos alcanzados durante la reunión del Comité Ambiental, llevada a cabo el día 19 de diciembre de 2024 en las instalaciones de la Gobernación del Tolima. En dicha reunión se contó con la asistencia de:

- Ing. Cesar Sandoval – director contratista de obra
- Ing. Angela Vanegas – Au. Ambiental en campo contratista de obra
- Ing. Mateo Castro – Personal de apoyo ambiental contratista de obra
- Ing. Harold Leal – Supervisor del Contrato Gobernación del Tolima
- Ing. Daniel Villamil - Profesional ambiental secretaria de infraestructura Gobernación del Tolima
- Ing. Claudia Alfaro – Representante legal y Especialista ambiental Interventoría
- Ing. Paula Castiblanco – Profesional HSEQ interventoría

Durante el desarrollo de la reunión se trataron lo siguientes temas:

1. Permiso de ocupación de cauce: Se acuerda que el contratista presentará ante CORTOLIMA un documento solicitando la cesión de derechos, de manera que la resolución transfiera las responsabilidades directamente al contratista de obra y no a la Gobernación del Tolima. Asimismo, se gestionará la solicitud para el cambio de la medida compensatoria otorgada. Como parte de este compromiso, el contratista de obra se compromete a remitir copia del radicado a la interventoría para su respectiva revisión.
2. Se solicita al contratista de obra radicar un documento ante la Oficina de Gestión del Riesgo del Tolima, solicitando autorización para la tala por emergencia de un individuo arbóreo que se encuentra muerto en pie dentro del área de la obra. Esta medida es necesaria debido al riesgo de que, por la vibración de la maquinaria, el árbol pueda caer y ocasionar un accidente.
3. El contratista se compromete a realizar el mejoramiento de la unidad sanitaria utilizada dentro de la obra, remplazando el alquiler de baños portátiles por esta medida.



4. La interventoría da viabilidad a la suspensión del contrato de obra del 20/12/2024 al 07/01/2025.
5. La Gobernación del Tolima solicita a la interventoría subir los informes al SECOP y radicar los mismos en físico en correspondencia para el correspondiente archivo.
6. El contratista de obra se compromete a realizar una labor de divulgación para prevenir el paso no autorizado por la obra durante las festividades de fin de año, y evitar cualquier incidente o accidente que puede llegar a presentarse.
7. El contratista de obra se compromete a realizar la reunión final el día 22/01/2025 con la comunidad y entidades gubernamentales del AID del proyecto.

Cordialmente,
ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ

Directora Interventoría

Elaboró: P. Castiblanco – Profesional HSEQ

Revisó: D. Riveros – Directora de Interventoría

Aprobó: D. Riveros – Directora de Interventoría

Copia. Archivo de Interventoría



Bogotá, D.C., enero 08 de 2025

C-285-0018-0020-24

Señores:

CONSORCIO PUENTE AMBALEMA-PALOMAYO

Atn: Ing. Luis Ricardo Ortigoza González

Contratista de obra

Ibagué – Tolima

REF: Contrato de Obra N° 1665 “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

ASUNTO: Solicitud de informe No. 6 y corrección de informes ambientales y PAGA.

Respetados señores (as),

Según las obligaciones descritas y adquiridas por la parte contratista con la firma del Contrato de Obra No.1665 de 2024 en especial lo enunciado en la *CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA – Numerales 25, 28 y 29, se solicita:*

- La presentación del informe No.6, teniendo en cuenta que el período del mismo es del 11 de noviembre al 10 de diciembre del 2024 y a la fecha no ha sido remitido a la interventoría para su correspondiente revisión.
- La subsanación de los informes ambientales No 1, 2, 3, 4 y 5; y la presentación de las observaciones del PAGA V 0.2, compromiso adquirido por el contratista en mesa de trabajo del día 05/12/2024; las cuales quedaron de presentarse el 20/12/2024 y 13/12/2024 respectivamente, y a la fecha la interventoría no ha recibido dichos documentos.

De acuerdo con lo anterior, quedamos atentos a la presentación de los documentos relacionados a la mayor brevedad posible.

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ

Directora Interventoría

Elaboró: P. Castiblanco – Profesional HSEQ

Revisó: D. Riveros – Directora de Interventoría

Aprobó: D. Riveros – Directora de Interventoría

Copia. Archivo de Interventoría



Bogotá, D.C., enero 09 de 2025

CA-285-0081-0011-25

Señores:

CONSORCIO PUENTE AMBALEMA – PALOBAYO

Atn: Ing. Luis Ricardo Ortigoza González

Contratista de Obra

Ibagué - Tolima

REF: Contrato de Interventoría N° 1698 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.

ASUNTO: Solicitud comité de obra para el día 16 de enero de 2025.

Respetados Señores:

Atendiendo a las responsabilidades adquiridas en la firma de los contratos con la Gobernación del Tolima; esta interventoría solicita realizar comité de obra el día mencionado en el asunto en la zona del proyecto a las 10:00 AM, para analizar el avance de las actividades, tratar los diferentes temas técnicos pertinentes al proyecto y la proyección respectiva del cierre al contrato de obra e interventoría una vez que, se han reanudado actividades en campo.

No siendo otra la intención de esta misiva, quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ

Directora Interventoría

Elaboró: Área de apoyo, Residente

Revisó: D. Riveros – Directora de Interventoría

Aprobó: D. Riveros – Directora de Interventoría

Copia. Archivo de Interventoría



Bogotá, D.C., enero 10 de 2025

CA-285-0082-0013-25

Señores:

CONSORCIO PUENTE AMBALEMA – PALOBAYO

Atn: Ing. Luis Ricardo Ortigoza González

Contratista de Obra

Ibagué - Tolima

REF: Contrato de Obra N° 1665 “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.

ASUNTO: Solicitud Plan de Contingencia y entrega información pendiente solicitada con antelación.

Respetados Señores,

De acuerdo a las funciones contractuales de esta interventoría como son, la de control y seguimiento a las actividades constructivas, se observa con preocupación un retraso significativo, respecto a la culminación de actividades predecesoras en la ruta crítica para la finalización del contrato; ya que, se acerca la fecha de terminación del contrato objeto de vigilancia; por este motivo, solicitamos a ustedes un plan de contingencia, junto con el de manera oportuna para la ejecución de actividades faltantes como son la instalación de materiales granulares, mezcla asfáltica densa en caliente y concretos para obras hidráulicas entre otras, en el cual se garantice la finalización de las obras dentro del plazo contractual es decir el 25 de enero de 2025.

De igual forma, se solicita la entrega de los documentos faltantes solicitados en los distintos comités de obra realizados y oficios allegados a ustedes como son, la entrega del Plan de Manejo de Tránsito actualizado a las condiciones del proyecto, el informe ejecutivo de la construcción de las pilas en dos secciones por parte del especialista estructural, el diseño de mezcla asfáltica tipo MDC-19 y MDC-25; así como el proveedor de la misma, información que ha sido solicitada en reiteradas ocasiones.

No siendo otra la finalidad de este documento quedamos atentos a su pronta respuesta.

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ

Directora Interventoría

Elaboró: Dirección, Residente

Revisó: D. Riveros – Directora de Interventoría

Aprobó: D. Riveros – Directora de Interventoría

Copia. Archivo de Interventoría

Cra. 11C No. 117-36, Bogotá D.C., Colombia
Correo electrónico: interventoriapuentevenadillo@gmail.com
Tel. 601 3028883 – 320 377 8225



Bogotá, D.C., enero 13 de 2025

C-285-0083-0015-25

Señores:

CONSORCIO PUENTE AMBALEMA-PALOMAYO

Atn: Ing. Luis Ricardo Ortigoza González

Contratista de obra

Ibagué – Tolima

REF: Contrato de Obra N° 1665 “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”

ASUNTO: Apremio para entrega de PAGA ajustado, Informes de gestión ambiental - social y SG-SST Nos. 6 y 7 y subsanaciones de Informes de gestión ambiental - social y SG-SST No. 1, 2, 3, 4 y 5

Respetados señores (as),

Según las obligaciones descritas y adquiridas por la parte contratista con la firma del contrato de obra No.1665 de 2024 en especial lo enunciado en la *CLAUSULA 8. OBLIGACIONES GENERALES Y ESPECIFICAS DEL CONTRATISTA – Numerales 25, 28 y 29.*

La Interventoría apremia al Consorcio Puente Ambalema – Palomayo para que se subsane y se entregue los siguientes productos, que a la fecha no cuentan con la aprobación por parte de la Interventoría:

A. PLAN DE IMPLEMENTACION DE LA GUIA AMBIENTAL -PAGA V 0.2

Según observaciones dadas por la interventoría en comunicado CA-285-0073-0300-24 de fecha 03/diciembre/2024.

B. INFORMES DE GESTIÓN AMBIENTAL - SOCIAL Y SG-SST Nos. 6 y 7

Se reitera la solicitud de la presentación de los informes de los componentes ambiental, social y SST, teniendo en cuenta que el Informe No. 6 cubre el periodo del 11 de noviembre al 10 de diciembre del 2024 y el Informe mensual No. 7 cobija del 11 de diciembre del 2024 al 10 de enero 2025. Respectivamente.

C. SUBSANACIONES DE INFORMES DE GESTIÓN AMBIENTAL - SOCIAL Y SG-SST No. 1, 2, 3, 4 y 5

Se reitera la subsanación y corrección de los informes ambientales como se detalla a continuación:

INFORME DE GESTIÓN AMBIENTAL - SOCIAL Y SG-SST (mes)	Consecutivo oficio Interventoría	Fecha comunicado
1 y 3	CA-285-0063-0259-24	22 de noviembre de 2024
2	CA-285-0071-0298-24	3 de diciembre de 2024
4	CA-285-0072-0299-24	3 de diciembre de 2024
5	CA-285-0069-0289-24	29 de noviembre de 2025



Es preciso recordar que el día 05 de diciembre de 2024 se realizó una mesa de trabajo con los profesionales ambientales de apoyo en campo del contratista constructor, reunión en la cual se revisaron los requerimientos establecidos en los comunicados previamente mencionados, y mediante acta de reunión, se adquirieron los siguientes compromisos por parte del contratista:

1. Presentación de correcciones documento PAGA para el día 13/12/2024
2. Subsanación de las observaciones de los informes ambientales No. 1, 2, 3, 4, y 5 para el día 20/12/2024

Sin embargo, a la fecha y teniendo en cuenta que el plazo contractual para culminar el contrato de obra 1665/2024, es el día 25/enero/2025; la interventoría no ha recibido ninguno de los documentos ajustados o subsanados mencionados en este comunicado; por lo cual se solicita apremia al CONSORCIO PUENTE AMBALEMA-PALOMAYO para que presente la totalidad de la documentación referida anteriormente en un plazo no mayor a **cinco (5) días** a partir de la fecha de recibo del presente oficio, teniendo en cuenta que es fundamental encontrarse con el 100% de los documentos e informes avalados por la interventoría para la liquidación del contrato.

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ

Directora Interventoría

Elaboró: P. Castiblanco – Profesional HSEQ

Revisó: C. Alfaro-Especialista ambiental Interventoría

Aprobó: D. Riveros – Directora de Interventoría

Copia. Archivo de Interventoría



Bogotá, D.C., enero 23 de 2025

CA-285-0084-0028-25

Señores:

CONSORCIO PUENTE AMBALEMA – PALOBAYO

Atn: Ing. Luis Ricardo Ortigoza González

Contratista de Obra

Ibagué - Tolima

REF: Contrato de Obra N° 1665 “CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA”.

ASUNTO: Requerimiento finalización de actividades en ítem montaje y pintura.

Respetados Señores,

De acuerdo a las funciones contractuales de esta interventoría como son, la de control y seguimiento a las actividades constructivas, una vez realizado el comité de obra el día 16 de enero de 2025 y según lo manifestado por el director de la firma Contratista en el sentido de que no se le va a aplicar pintura a la estructura metálica, esta Interventoría considera que dicha actividad requiere su ejecución ya que está prevista Contractualmente.

Lo anterior, se refiere a que dentro del Análisis de Precios Unitarios se encuentran los materiales de pintura anticorrosiva, Pintura acrílica, esmalte o similar y disolvente para pintura (TINNER) que obedece a un valor de \$145.52 por kg de estructura.

En relación con la cantidad de estructura, se registra un total de 64,802.67 kg, lo que representa un costo total en materiales de \$9,430,084.54. Esta inversión es necesaria para completar el 100% de ejecución de obra y suscribir el Acta de recibo final.

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ

Directora Interventoría

Elaboró: Dirección, Residente

Revisó: D. Riveros – Directora de Interventoría

Aprobó: D. Riveros – Directora de Interventoría

Copia. Archivo de Interventoría



Bogotá, D.C., enero 24 de 2025

CA-285-0086-0030-25

Señores:

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Atn: Ing. HAROL LEAL

Supervisor Contrato de Interventoría

Director de Infraestructura

Ibagué - Tolima

REF: Contrato de Interventoría N° 1698 CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ASUNTO: Solicitud cambio de personal – Ingeniero Residente

Respetados Señores:

Por medio de la presente se envía para su revisión y aprobación la hoja de vida con sus respectivos soportes del ingeniero JOSE LUIS TIQUE CRUZ en reemplazo del ingeniero JERSON SAID LAZARO SUAREZ para el cargo de ingeniero residente de interventoría.

Quedamos a la espera de su revisión y comentarios

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ

Directora Interventoría

Elaboró: S. Guarín - Ing., Apoyo

Revisó: D. Riveros – Coordinadora de Interventoría

Aprobó: C. Alfaro – R.L.

Copia. Archivo de Interventoría



Bogotá, D.C., enero 24 de 2025

CA-285-0088-0032-25

Señores:

GOBERNACIÓN DEL TOLIMA

Atn: Ing. HAROL LEAL

Supervisor Contrato de Interventoría

Director de Infraestructura

Ibagué - Tolima

REF: **Contrato de Interventoría N° 1698** CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA

ASUNTO: Entrega actas de terminación contratos 1698 de 2024 - interventoría y 1665 de 2024 - obra

Respetados Señores:

La interventoría en el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, por medio de la presente envía para su revisión y respectiva firma las actas de terminación de los contratos 1665 del 2024 – obra y 1698 de 2024 – interventoría

Quedamos a la espera de su revisión y comentarios

Cordialmente,

ALDEIC S.A.S. BIC

DIANA ESPERANZA RIVEROS ORTIZ

Directora Interventoría

Elaboró: S. Guarín - Ing., Apoyo

Revisó: D. Riveros – Coordinadora de Interventoría

Aprobó: C. Alfaro – R.L.

Copia. Archivo de Interventoría

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	53 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

ANEXO No. 08

REGISTRO FOTOGRÁFICO

 <p>ALDEIC S.A.S BIC</p>	 <p>GOBERNACION DEL TOLIMA</p>	<p>GOBERNACION DEL TOLIMA</p> <p>MANUAL DE INTERVENTORIA</p> <p>INFORME MENSUAL No 7</p>	 <p>@gobertolima www.tolima.gov.co</p>	<table border="1"> <tr> <td>INFORME No.</td> <td colspan="3">7</td> </tr> <tr> <td>PERIODO</td> <td colspan="3">11/12/24 - 20/12/24 y 07/01/2025 - 25/01/2025</td> </tr> <tr> <td>PÁGINA</td> <td>1</td> <td>DE</td> <td>1</td> </tr> </table>	INFORME No.	7			PERIODO	11/12/24 - 20/12/24 y 07/01/2025 - 25/01/2025			PÁGINA	1	DE	1
INFORME No.	7															
PERIODO	11/12/24 - 20/12/24 y 07/01/2025 - 25/01/2025															
PÁGINA	1	DE	1													
<p>REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TECNICO</p>																
																
<p>6.3 Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm</p>		<p>6.2 Tacha Reflectiva</p>														
																
<p>6.1 Líneas de Demarcación con pintura en frio</p>		<p>5.5 Material Granular Drenante 5.6 Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4" 5.7 Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido</p>														
																
<p>5.4 Cuneta de Concreto clase D Vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo,</p>		<p>5.3 Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.</p>														



GOBERNACION DEL TOLIMA
MANUAL DE INTERVENTORIA
INFORME MENSUAL No 7



INFORME No.	7		
PERIODO	11/12/24 - 20/12/24 y 07/01/2025 - 25/01/2025		
PÁGINA	1	DE	1

REGISTRO FOTOGRÁFICO COMPONENTE TECNICO



5.2 Concreto Resistencia 21MPa (D)



4.2 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19



4.1 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0



2.22 Prueba de carga



2.21 Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25 2.20 Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0



2.17 Drenos PVC para el tablero 4"

INFORME MENSUAL N° 07	ALDEIC S.A.S. BIC	Código: C-199-11-02-01 Versión: 00 Fecha: 12 de Junio 2021
	CONTRATAR LA INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA AL CONTRATO QUE TIENE COMO OBJETO CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL RIO VENADILLO UBICADO EN EL CORREDOR VIAL PALOBAYO AMBALEMA EN EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA.	54 de 54    @gobertolima www.tolima.gov.co

ANEXO No. 09
BITÁCORA DE OBRA

21/12/24 ESTADO DEL TIEMPO: Seco - Soleado.

DOMINGO PERSONAL EN OBRA: Ing Residente 1 Topógrafo 1 Codenaro 1 Almacenista 1
Aux SST 1 Copataz 2 Soldador 4 Montador 1 Ayudante 4
Mecánico Operador maquinaria 1

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Grúa Telescópica 1 Equipo Oricorte 1 Equipo Soldadura 4
Equipos y herramientas menor.

Estructura Metálica: Continúan los trabajos de soldadura en cinta central de vigas principales TR1, TR2 y TR3.

Estructura de concreto: Sin novedades

Relevos: Sin novedades.

Diego Reyes
P.A OBRA

Jerson Lizaro

Residente Interventoria

22/12/24 ESTADO DEL TIEMPO: Seco - Soleado

VIERNES PERSONAL EN OBRA: Ing. Residente 1 Topógrafo 1 Codenaro 1 Almacenista 2
Aux SST 2 Copataz 1 Soldador 3 Montador 1
Ayudante 3 Maestro General 1 Oficial 2 Cheros 11
Mecánico 1 Operador Maquinaria 4

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora Chigada 1 Vibrocompactador 1 Volqueta 2
Autohormigonera 1 Grúa Telescópica 1 Equipo Oricorte 2
Equipo Soldadura 4 herramientas menor.

ESTRUCTURA METÁLICA: Continúan labores de soldadura en TR1, TR2 y TR3; empieza la instalación de noshas de rigidez.

ESTRUCTURA DE CONCRETO: Inicia instalación de formideta para placas de apoché.

RELEVOS: Continúan relevos de estructura en acceso y pilar en costado de Paldoyo.

SOCIAL, SST, AMBIENTAL: Sin novedades.

Diego Reyes
P.A OBRA

Jerson Lizaro

Residente Interventoria

23/12/24 ESTADO DEL TIEMPO: Seco - Soleado

VIERNES PERSONAL EN OBRA: Ing Residente 1 Topógrafo 1 Codenaro 1 Almacenista 2
Maestro General 1 Oficial 2 Aux SST 2 Cheros 11
Copataz 1 Soldador 3 Montador 1 Ayudante 3
Mecánico 1 Operador Maquinaria 4

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora Chigada 1 Vibrocompactador 1 Volqueta 2

Autohormigonera 1 Grúa Telescópica 1 Oricate 2
Equipo Soldadura 3 Herramienta menor

Estructura de concreto: Continúa la instalación de formaleta sobre costado Palobayo para placa apbroche.

Estructura Metálica: Continúa soldadura en viga principal y en rigidizadores "RIOSTRAS".

Reellenos: Continúa reellenos de estructura con recibo en costado palobayo al costado izquierdo según diseño.

Ambiental, Social, SST: Sin novedades.

Diego Pérez
P.A OBRA

Jerson Lázaro
Residente Interventoría

04/12/24 ESTADO DEL TIEMPO: Seco-Soleado.

PERSONAL EN OBRA: Ing. Residente 1 Topógrafo 1 Cadenero 1 Almacenista 1
Maestro General 1 Oficial 1 Aux SST 2 Obreros 11
Capataz 1 Soldador 3 Montador 1 Ayudante 3
Mecánicos 1 Operador maquinaria 4.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora Cargada 1 Vibracompactor 1 Volquete
Autohormigonera 1 Grúa Telescópica 1 Herramienta menor

Estructura de concreto: Continúa instalación de formaleta en apbroche en el costado de Palobayo.

Estructura Metálica: Continúa trabajos de soldadura de riostras de rigidez en las vigas principales.

Reellenos: Se continúa el relleno de estructura en el costado de Palobayo en acceso a viga acceso y costado izquierdo de Pilas.

SST, Social, Ambiental: Sin novedades.

Diego Pérez
P.A OBRA

Jerson Lázaro
Residente Interventoría

05/12/24 ESTADO DEL TIEMPO: Lluvias leves en la mañana de 7:00 a 7:40 am. Soleado.

PERSONAL EN OBRA: Ing. Residente 1 Topógrafo 1 Cadenero 1 Almacenista 2
Maestro General 1 Oficial 2 Aux SST 2 Obreros 11
Capataz 1 Soldador 3 Montador 1 Ayudante 3
Mecánicos 1 Operador maquinaria 4

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora Cargada 1 Vibracompactor 1 Volquete
Autohormigonera 1 Grúa Telescópica 1 Herramienta menor

Estructura de concreto: Continúa la instalación de formateo de opoches costado Paldaño e instalación de ejes y juntas de dilatación.

Estructura Metálica: Continúa labores de juntas de riostras y rigidizadores

Rellenos: Continúa rellenos en costado Paldaño acceso y costado SST, Ambiental, Social: Mesa de trabajo área ambiental y social.

DCECO REYES
R.A OBRA

JESUS LIZALES
Residente Interventoria

06/12/24 ESTADO DEL TIEMPO: Seco-Soleado

PERSONAL EN OBRA: Ing Residente 1 Topógrafo 1 Codeneno 1 Almacenista 2
Maestro General 1 Oficial 2 Aux SST 2 Obreros 11
Capataz 1 Soldador 3 Montador 1 Ayudante 3
Mecánico 1 Operador Maquinaria 4

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora Cargada 1 Vibrocompactadora 1 Volquete 1
Autohormigonera 1 Grúa Telescópica 1 Herramienta menor

Estructura de concreto: Continúa instalación de ejes y juntas de dilatación

Estructura Metálica: Se realizan trabajos de soldadura en riostras y rigidizadores en vigas principales.

Rellenos: Continúan rellenos en costado Paldaño y se marca cajas en costado Ambiental.

Ambiental, SST, Social: Sin novedades

DCECO REYES
R.A OBRA

JESUS LIZALES
Residente Interventoria

09/12/24 ESTADO DEL TIEMPO: Seco-Soleado

SABADO PERSONAL EN OBRA: Ing. Residente 1 Almacenista 1 Aux SST 1 Capataz 1
Soldador 3 Montador 1 Ayudante 2 Mecánico 1
Operador Maquinaria 1

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Grúa Telescópica 1 Herramienta menor

Estructura de concreto: No se programan actividades constructivas.

Rellenos: No se programan actividades

Estructura Metálica: Se continúan las labores de soldadura en vigas principales en riostras y rigidizadores.

DCECO REYES
R.A OBRA

JESUS LIZALES
Residente Interventoria

08/12/24
DOMINGO

ESTADO DEL TIEMPO: Seco-Soleado

Personal en obra: Ing Residente 1 Almacenista 1 Aux SST 1 Almacenista 1
Capataz 1 Soldador 3 Montador 1 Ayudante 2
Mecánico 1 Operador Maquinaria 1.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Grúa Telescopica Herramienta menor

Estructura de concreto: No se programan actividades

Relleños: No se programan actividades

Estructura Metálica: Continúa soldadura de nudos de rigidez.

SST, Social, Ambiental: Sin novedades.

Diego Pérez
R.A OBRA

Jesús Azaró
Residente Interventoría

09/12/24
LUNES

ESTADO DEL TIEMPO: Seco-Soleado

Personal de obra: Ing Residente 1 Topógrafo 1 Cadenero 1 Almacenista 2
Maestro General 1 Oficial 2 Aux SST 2 Obreros 11
Capataz 1 Soldador 3 Ayudantes 2 Montador 1
Mecánico 1 Operador Maquinaria 5.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora Oruga 1 Retrocargador en llanta 1
Autobombina 1 Vibrocompactador 1 Grúa Telescopica
Volqueta 1 Herramienta menor.

Estructura Metálica: Continúa la soldadura en nudos y rigide-
zadores en las vigas principales.

Estructura de concreto: Se finaliza la instalación de formateo y se in-
ician labores de marcación de ejes para instalación de acero.

Rellenos: Continúa el relleno en áreas costado del bazo mediante
y compactación.

Diego Pérez
R.A OBRA

Jesús Azaró
Residente Interventoría

10/12/24
MARTES

Estado del tiempo: Seco-Soleado

Personal en obra: Ing Residente 1 Almacenista 2 Topógrafo 1 Cadenero 1
Maestro General 1 Oficial 2 Aux SST 2 Obreros 10
Capataz 1 Soldador 3 Ayudante 2 Montador 1
Mecánico 1 Operador Maquinaria 5

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora Oruga 1 Retrocargador de llanta 1
Autobombina 1 Vibrocompactador 1 Grúa Telescopica 1

Volquetas 2 Herramienta menor

Estructura de concreto: Se inicia instalación de icopores para dilataciones y moldes para neoprenos.

Estructura Metálica: Continúan trabajos de soldadura en rigidizadores y separadores en vigas principales.

Relevos: Se continúa relevo en costado Palobayo con acceso a Puente

Filtros: Se realiza localización topográfica

SST, Ambiental, Social: Se realizó vacunación contra fiebre amarela al personal del contratista y de la interventoría.

Diego Reyes
E.A OBRA

Jessy Azaro
Residente Interventoría

11/12/24 ESTADO DEL TIEMPO: Seco - Soleado

PERSONAL EN OBRA: Ing. Residente 1 Topógrafo 1 Cadenero 1 Almacenerista 2
Maestro General 1 Oficial 2 Aux SST 2 Obreros 10
Capataz 1 Soldador 3 Ayudante 2 Montador 1
Mecánico 1 Operador Maquinaria 5

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Excavadora Orugada 1 Retracargador de Lenta 1
Autobomboneadora 1 Vibracompactor 1 Grúa Telescópica 1
Volquetas 2 Herramienta menor.

Estructura de concreto: Se realiza instalación de icopor y neoprenos en la placa de apoyos en costado Palobayo.

Estructura Metálica: Continúa la soldadura en rigidizadores inferiores entre vigas principales y separadores.

Relevos: Se realiza nivelación y retiro de material en costado de Ambolama para llegar a cota de subrasante.

Filtros: Inician excavaciones en costado Palobayo en canal izquierda.

SST, Ambiental, Social: Sin novedades

Diego Reyes
E.A OBRA

Jessy Azaro
Residente Interventoría

12/12/24 ESTADO DEL TIEMPO: Seco - Soleado

PERSONAL EN OBRA: Ing. Residente 1 Topógrafo 1 Cadenero 1 Almacenerista 2
Maestro General 1 Oficial 2 Aux SST 2 Obreros 10 Capataz 1
Soldador 3 Ayudante 2 Montador 2 Mecánico 1
Operador de Maquinaria 5

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Excavadora cargada 1 Retrocargador en llanta 1
Autobombas 1 Vibracompactor 2
Grúa Telescópica 1 Volqueta 2 Herramientas menores.

Estructura de concreto: Inicia el amarrado de acero de refuerzo para la placa de apriete en el costado de Palobayo.

Estructura metálica: Continúa el amarrado e instalación de separadores y vigas, rigidizadores y soldadura de juntas de dilatación en costado de Ambalema.

Filtros: Continúa la construcción de filtros con excavación, instalación de manguera perforada, piedra filtro e instalación de geotextil.

Rellenos: Se retira el material de excavación de los filtros en costado Palobayo.

SST, Ambalema, Social: Sin novedades.

Diego Beltrán
LA OBRA

José Lizares
Residente Interintendencia

13/12/24

ESTADO DEL TIEMPO: Seco-Soleado

VIERNES

PERSONAL EN OBRA: Ing. Residente 1 Topógrafo 1 Codeneno 1 Almacén
Maestro General 1 Oficial 2 Aux SST 2 Obreros 10 Carpinteros 1
Soldador 3 Ayudante 2 Montador 2 Mecánicos 1
Operador de Maquinaria 6

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Excavadora Cargada 1 Retrocargador en llanta 1 Volqueta 2
Vibracompactador 2 Autobombas 1 Grúa Telescópica 1
Herramientas menores.

Estructura de concreto: Continúa el amarrado de acero de refuerzo para placa de apriete en costado Palobayo.

Estructura Metálica: Continúan labores de soldadura de separadores sobre vigas y rigidizadores en la parte inferior de las vigas.

Filtros: Continúa trabajos de excavación, instalación de geotextil, manguera perforada, piedra filtro y material de cobertura en costado derecho en Palobayo.

Rellenos: Sin novedades.

SST, Social, Ambiental: Sin novedades.

Diego Beltrán
LA OBRA

José Lizares
Residente Interintendencia

14/12/24 ESTADO DEL CLIMA: Seco - Soleado.

PERSONAL EN OBRA: Ing. Residente 1 Topógrafo 1 Cadenero 1
Almacenista 2 Maestro General 1 Oficial 2
Aux SST 2 Obreros 10 Capataz 1 Soldador 3
Ayudante 2 Montador 1 Mecánico 1 Operador 6

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Excavadora Orugada 1 Retrocargador 1
Vibrocompactador 2 Autobornigonera 1
Gúa Telescopica 1 Herramienta menor

Estructura de concreto: Se realiza vaciado de concreto sobre
viga de apoyo de 4000 PSI, se realiza toma de muestras de
concreto, costado Peldazo

Estructura Metálica: Se finaliza la soldadura de los separadores
sobre las vigas del puente, se realiza chequeo con topografía

Filtros: Sin novedades

Reellenos: Se realizan ensayos de densidades en campo para libera-
ción de capa de subrasante.

SST, Social, Ambiental: Sin novedades.

DEFO PERE
P.A OBRA

PERSONAL EN OBRA
Residente Interentoria

15/12/24 Estado del clima: Seco - Soleado

DOMINGO No se programan actividades en obra.

16/12/24 Estado del clima: Seco - Soleado

LUNES PERSONAL EN OBRA: Ing Residente 1 Topógrafo 1 Cadenero 1 Oficial 2
Almacenista 2 Maestro General 1 Aux SST 2 Obreros 10
Capataz 1 Soldador 3 Ayudante 2 Montador 1
Operador Maquinaria 6

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Excavadora Orugada 1 Retrocargador Planta 1
Vibrocompactador 2 Autobornigonera 1 Gúa Telesco-
pica 1 Herramientas menor.

Estructura de concreto: Inicia la instalación de formaleta sobre estructura
metálica.

Estructura Metálica: Se realiza retiro de apoyos metálicos en

vigiladores interiores del puente metálico.

T. Hos. Sin novedades.

Relevo: Sin novedades.

Subbases y bases: Inicia la instalación de subbase granular costado Palobayo.

SST, Ambiental, Social: Visita profesional de Cortolima para el desarrollo albañeo en pie costado Palobayo.

DICCO REYES

R.A OBRA

JESÚS LÓPEZ

Residente Interventor.

17/12/2024 ESTADO DEL CLIMA: Seco - Soleado

PERSONAL EN OBRA: Ing. Residente 1 Topógrafo 1 Cadenero 1 Almacenista
Maestro General 1 Oficial 2 Aux SST 2 Obreros 10
Cepataz 1 Soldador 2 Ayudante 2 Montador 1
Operador Maquinaria 6

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora Orugada 1 Retrocargador 11111
Vibrocompactador 2 Autohormigonera 1 Grúa 1

Estructura concreto: Vaciado de solado placa de acero, armado de
acero de refuerzo y vaciado placa de acero costado Palobayo.

Estructura Metálica: Retiro de falso apoyo del puente, haciendo uso
de oxicate y retroexcavadora orugada.

Filtros: Se realiza excavación, instalación de geotextil, tubería perforada y
material granular drenante en costado izquierdo en Ambalema.
SST, Social, Ambiental: Sin novedades.

DICCO REYES

R.A OBRA

JESÚS LÓPEZ

Residente Interventor.

18/12/2024 ESTADO DEL CLIMA: Seco - Soleado.

PERSONAL EN OBRA: Ing. Residente 1 Topógrafo 1 Cadenero 1 Oficial
Almacenista 2 Maestro General 1 Aux SST 2,
Obreros 10, Cepataz 1 Soldador 2 Ayudante 2
Montador 1 Operador Maquinaria 5.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora Orugada 1 Retrocargador 11111
Vibrocompactador 2 Autohormigonera 1
Herramienta menor

Estructura de concreto: Se realiza vaciado de andén y bordillo en pl

07/01/2025 Estado del clima: Seco-Soleado

MARTES

PERSONAL EN OBRA: Ing. Residente 1 Topógrafo 1 Codenao 1 Almacenista 1
Maestro General 1 Oficial 2 Aux SST 1 Obreros 9
Operador Maquinaria 3 Conductor de bitruque 2.

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora 1 Autohormigonera 2 Volquete 1
Camioneta de agua 1 Herramienta menor.

Estructura de concreto: Se realiza revision de aceros de refuerzo en placa de opaco y se realiza vaciado de concreto de acceso en placa, se toman medidas de concreto. Continúa el formateado en estructura de puente.

SST, Social, Ambiental: Sin novedades.

Diego Reyes
R.A OBRA

Jesús Arias
Residente Interventoria

08/01/2025 Estado del clima: Seco-Soleado

MIERCOLES

PERSONAL EN OBRA: Ing. Residente 1 Topógrafo 1 Codenao 1 Almacenista 1
Maestro General 1 Oficial 2 Aux SST 1 Obreros 9
Operador Maquinaria 3 Conductor 1

MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora 1 Autohormigonera 1 Volquete 1 Herram. men.

Estructura de concreto: Se realiza excavación manual para vaciado de solado de limpieza para placa de acceso, vaciado de solado de limpieza y costado de Ambalema, continúa la instalación de formateo en voladizo del puente.

SST, Social, Ambiental: Sin novedades.

Riesgos y Subriesgos: Sin novedades.

Diego Reyes
R.A OBRA

Jesús Arias
Residente Interventoria

10/01/2025 Estado del clima: Seco-Soleado.

VIERNES

Personal en obra: Ing. Residente 1 Topógrafo 1 Codenao 1 Almacenista 1
Maestro General 1 Oficial 2 Aux SST 1 Obreros 9
Operador Maquinaria 3

Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora 1 Autohormigonera 2 Herramienta menor

Estructura de concreto: Instalación de formateo en puente y placa de acceso instalación acero placa acceso costado Ambalema.

Jesús Arias

10/01/25 ESTADO DEL CLIMA: Seco-Soleado.

VIERNES Personal en obra: Ing. Residente 1 Topógrafo 1 Codenro 1 Almacenero 1 Oficial 2
Maestro General 1 Aux SST 1 Obrero 9 Operador Maquinaria 3

Maquinaria y equipos: Retroexcavadora 1 Autohormigonera 2 Herramienta menor.

Estructura de concreto: Se realiza vaciado de concreto en placa de acceso en costado Ambalena, continua la instalación de firmaleta en voladizo del puente.

DIEGO PEREZ
D.A OBRA

JERSON LIZARDI
RESIDENTE INTERVENTORIA

11/01/2025 ESTADO DEL CLIMA: Seco-Soleado

SÁBADO Personal en obra: Ing Residente 1 Topógrafo 1 Oficial 2 Maestro General 1
Aux SST 1 Obrero 9 Operadores Maquinaria 3

MAQUINARIA Y EQUIPOS: RETROEXCAVADORA 1 AUTOHORMIGONERA 2 HERRAMIENTA MENOR

Estructura de concreto: finaliza la instalación de firmaleta en voladizo inicia la instalación de acero de refuerzo en puente metálico.

DIEGO PEREZ
D.A OBRA

JERSON LIZARDI
RESIDENTE INTERVENTORIA

21/01/2025 NO SE PROGRAMAN ACTIVIDADES

DOMINGO

13/01/2025 ESTADO DEL CLIMA: Seco-Soleado.

LUNES Personal en obra: Ing Residente 1 Topógrafo 1 Oficial 2 Maestro General 1
Aux SST 1 Obrero 9 Operadores maquinaria 3.

MAQUINARIAS Y EQUIPOS: Retroexcavadora 1 Autohormigoneras 2 Herramienta menor

Estructura de concreto: Continúa el amarrado de acero de refuerzo en estructura placa puente.

SST, Ambiental, Social: Sin novedades.

DIEGO PEREZ
D.A OBRA

JERSON LIZARDI
RESIDENTE INTERVENTORIA

14/01/2025 Estado del clima: Seco-Soleado
 MIERCOLES Personal en obra: Ing Residente 1 Topógrafo 1 Oficial 2 Maestro San-
 Aux SST 1 Obreros 9 Operador Maquinaria 3
 Maquinaria y Equipos: Retroexcavadora 1 Autohormigonera 2 Herramientas
 Estructura de concreto: Continúa el amarrado de acero de refuerzo
 en estructura de puente y amarrado acero de refuerzo en bordillos y
 andenes
 SST, Social, Ambiental: Sin novedades.

[Signature]
 R. AOBDA

[Signature]
 Residente Internacional

15/01/2025 Estado del clima: Seco-Soleado
 MIERCOLES Personal en obra: Ing Residente 1 Topógrafo 1 Oficial 2 Maestro Gen-
 Aux SST 2, Obreros 9, Operador Maquinaria 3
 Capataz 1, Soldador 2, Ayudante 2, Montador 1
 MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora 1 Autohormigonera 2 Equipo
 Soldadura 2, Herramientas menores
 Estructura de concreto: Continúa amarrado de acero de refuerzo de puente
 andén y bordillo; inician trabajos de soldadura de mesas para
 baranda metálica.

[Signature]
 R. AOBDA

[Signature]
 Residente Internacional

16/01/2025 Estado del clima: Seco-Soleado
 Personal en obra: Ing. Director obra 1, Ing. Director Internacional,
 Ing. Residente 1 Topógrafo 1 Oficial 2, Aux SST 2
 Maestro General 1, Obreros 9, Capataz 1 Soldador
 Ayudante 2, Montador 1, Operador Maquinaria 3
 MAQUINARIA Y EQUIPOS: Retroexcavadora 1, Autohormigonera 2, Eq. Soldadura
 Herramientas menores.

Estructura de concreto: Finaliza amarrado de acero de refuerzo de placa
 puente, bordillo y andén; continúan soldadura de mesas de baranda
 metálica.

Se realizó comité de obra para verificar compromisos adquiridos
 y proyectar la terminación del proyecto entre el plazo
 contractual del contrato.

SST, Social, Ambiental. Revisión compensación ambiental y procesos de los mismos.

NECO BEYB
D.A OBLA

Jesús Lizaraz
Presidente Interventoría

17-01-2025 estado del clima: Soleado.

Viernes Personal de obra: ING director de obra

(1) topógrafo, (1) Maestros Generales, (2) oficiales.

(1) Aux SST, (9) obreros.

Personal de estructura. Metalica.

Maquinaria. retro excavadora, (2) autohormigonera.

(2) Pa. de Soldadura. herramienta menor.

Actividades.

Colocación de aceros Placa Puerta Para.
Realización de fundación en concreto según
Diseño, lleno de Tabud lado estribos Puente.

18-01-2025 clima. Soleado.

Sábado. Personal de obra. ING res de obra.

(1) topógrafo (1) Maestro General (1) oficial.

(2) Aux S.S.T, (9) obreros

Personal estructura. Metalica.

Maquinaria. retro excavadora (2) autohormigonera

Actividades.

Se adelantaron actividades de terminación de obra
Teniendo en cuenta los compromisos acta de
comite. según Avance de Obra Ejecución
Pendiente por Ejecutar según preactos de obra
Por lo cual la interventoría y contratista de
Obra. Informan un avance del 95.45% de
Avance lo cual el contratista viene adelantando
Ejecución presupuesta como se
evidencia en Actos finas de obra.

CONDICIONES ORIGINALES			PRESENTE ACTA No 3		ACUMULADO FINAL	
Nº	ITEM DE PAGO	UND	CANT	VALOR	CANT	VALOR
EXPLANACIONES						
1.1	Demolición de Estructuras	m3			705,00	\$ 184 429 410,00
1.2	Excavación en roca de la explanación y canales	m3			202,12	\$ 29 942 865,28
1.3	Excavaciones en material común de la Explanación y Canales	m3			808,48	\$ 39 377 826,88
SUBTOTAL						\$ 253.750.102,16
PUENTE						
2.1	Excavaciones varias sin clasificar (incluye retiro de sobrantes)	m3			1.050,00	\$ 75.734.400,00
2.2	Excavaciones varias en material comun bajo agua	m3			77,61	\$ 6.169.374,12
2.3	Rellenos Para Estructuras con Recebo.	m3			3.002,73	\$ 412.211.506,72
2.4	Caissons concreto anillo en concreto clase D y nucleo en concreto clase C , incluye excavaciones, formaleta, no incluye acero de refuerzo)	m3			295,07	\$ 1.532.852.106,55
2.5	Concreto clase 35 MPA para tablero	m3			63,25	\$ 116.613.013,00
2.6	Concreto Resistencia 28MPa (C)	m3			141,89	\$ 216.989.397,31
2.7	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3			37,93	\$ 50.089.599,40
2.8	Concreto Resistencia 14MPa (F)	m3			9,00	\$ 7.580.889,00
2.9	Suministro y Fabricación de Estructura Metálica en ASTM A709/ ASTM A588 Grado 50 para vigas y arriostramientos . (incluye transporte)	Kg			64.802,67	\$ 1.732.304.974,44
2.10	Suministro y fabricacion de láminas de los apoyo de los neoprenos, anclajes de apoyo y baranda, Incluido fabricación, transporte, montaje y pintura donde se requiera.	Kg			963,96	\$ 30.304.010,52
2.11	Montaje y Pintura de Estructura Metálica.	Kg			64.802,67	\$ 367.495.941,57
2.12	Barandas metálicas acero A36 y A500-C. Incluido fabricación.	ML			125,70	\$ 90.845.401,20
2.13	Juntas de dilatación según diseño.	ML	12,00	\$ 5.474.352,00	24,00	\$ 10.948.704,00
2.14	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg			48.596,29	\$ 597.005.422,65
2.15	Material Granular Drenante	m3	19,20	\$ 3.788.217,60	19,20	\$ 3.788.217,60
2.16	Drenes PVC para el tablero 4"	u	24,00	\$ 396.384,00	24,00	\$ 396.384,00
2.17	Suministro e instalacion de aparatos de apoyos y topes sismicos en Neopreno dureza 70(60 cm x60 cm x 5 cm reforzado con 2 platinas)	u			6,00	\$ 9.554.448,00
2.18	Suministro e instalacion de aparatos de apoyos y topes sismicos en Neopreno dureza 70(20 cm x20 cm x 5 cm reforzado con 2 platinas)	u				
2.19	Bolsacretos de 1.0 m3 c/u.	u			20,00	\$ 23.894.520,00
2.20	Riego de imprimacion con emulsion asfaltica CRL-	m2	378,00	\$ 1.800.414,00	378,00	\$ 1.800.414,00

2.2.1	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-25	m3	18,90	\$ 28.738.319,40	18,90	\$ 28.738.319,40
2.2.2	Prueba de carga	u	1,00	\$ 121.615.000,00	1,00	\$ 121.615.000,00
SUBTOTAL				\$ 161.812.687,00		\$ 5.653.758.843,48
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS						
3.1	Conformación de la calzada existente	m2			1.024,80	\$ 2.315.644,95
3.2	Base granular clase A	m3			215,14	\$ 47.474.771,98
3.3	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2			1.024,80	\$ 14.155.594,89
3.4	Subbase granular clase A	m3			215,14	\$ 40.095.929,88
SUBTOTAL						\$ 104.041.941,69
PAVIMENTOS ASFALTICOS						
4.1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-0	m2	1.024,80	\$ 4.881.798,31	1.024,80	\$ 4.881.798,31
4.2	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	139,85	\$ 203.897.682,16	139,85	\$ 203.897.682,16
SUBTOTAL				\$ 208.779.480,47		\$ 208.779.480,47
DRENAJES						
5.1	Excavaciones varias en material común en seco a mano	m3	47,30	\$ 4.909.549,39	117,30	\$ 12.175.267,30
5.2	Concreto Resistencia 21MPa (D)	m3	40,00	\$ 52.823.232,02	110,00	\$ 145.263.888,06
5.3	Acero de Refuerzo Fy 4200 MPa.	Kg	651,12	\$ 7.999.365,56	3.551,12	\$ 43.627.452,73
5.4	Cuneta de Concreto clase D Vaciada In Situ; incluye la conformación de la superficie de apoyo,	m3	8,88	\$ 12.825.176,50	26,88	\$ 38.822.155,90
5.5	Material Granular Drenante	m3	32,00	\$ 6.313.705,96	168,00	\$ 33.146.956,32
5.6	Tubería de Plástico Drenaje de Diámetro 4"	m	64,00	\$ 2.864.202,84	336,00	\$ 15.037.064,90
5.7	Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	192,00	\$ 2.652.102,09	1.008,00	\$ 13.923.535,95
SUBTOTAL				\$ 90.387.334,36		\$ 301.996.321,15
SEÑALIZACION Y SEGURIDAD						
6.1	Líneas de Demarcación con pintura en frío	m	693,00	\$ 2.723.060,79	693,00	\$ 2.723.060,79
6.2	Tacha Reflectiva	u	173,00	\$ 3.368.617,53	173,00	\$ 3.368.617,53
6.3	Señal Vertical de Tránsito tipo 1 con lámina retrorreflectiva tipo III (75 x 75) cm	u	4,00	\$ 2.876.258,36	4,00	\$ 2.876.258,36
SUBTOTAL				\$ 8.967.936,69		\$ 8.967.936,69
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE AIU)						
				\$ 469.947.438,52		\$ 6.531.294.625,64
PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (INCLUYE PAGA)				\$ 48.260.000,00		\$ 48.260.000,00
PLAN DE MANEJO DE TRANSITO				\$ 16.897.165,71		\$ 16.897.165,71
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUERIMIENTOS LEGALES DGA -1.3-03				\$ 20.000.000,00		\$ 20.000.000,00
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				\$ 85.157.165,71		\$ 85.157.165,71
GRAN TOTAL			TOTAL	\$ 555.104.604,23	TOTAL	\$ 6.616.451.791,35
PORCENTAJE DE AVANCE EJECUTADO MES 7 Y ACUMULADO			% PARCIAL	8,39%	% ACUMULADO	100,00%

durante la presente semana se cuantifican las cantidades de obra ejecutadas presente mes y teniendo en cuenta la terminación del presente contrato con fecha del 25 - enero del 2025.

lo cual cubra las cantidades ejecutadas y acumuladas del presente contrato. Se procederá a realizar la liquidación y legalización de actos señalados, de liquidación y entrega de paz y salvo respectivos según condiciones contractuales de los contratos de obra e interventoría.

Se cierra obra de obra,

a los 25-01-2025

 H. Sando
Intor
