



1. INTRODUCCION:

El Instituto Nacional de Vías, realizo mediante concurso de méritos abierto CMA-DO-SRT-049-2021 convocatoria para la interventoría cuyo objeto es “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS Terciarias del Programa “COLOMBIA RURAL” EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2” Asignándolo mediante el contrato No 1643-2021 a **Ara ingeniería SAS**.

El INVÍAS suscribió convenios interadministrativos con municipios en el Departamento de Cauca cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVOS DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”, producto de ello los municipios adelantarán los procesos contractuales bajo la modalidad de licitación pública tendiente a contratar las obras consistentes en el MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE SANTANDER DE QUILICHAO, CALOTO, CORINTO, GUACHENE, MIRANDA, SUARE, EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”, para lo cual se requiere realizar las labores de control y seguimiento.

En el siguiente cuadro se relacionan las vías a intervenir que serán objeto de vigilancia, control y verificación por parte de la Interventoría, en el marco de ejecución de seis (6) Convenios Interadministrativos que se suscribieron en el departamento de Cauca, como parte del programa Colombia Rural:

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREDOR A INTERVENIR
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	PANAMERICANA-QUINAMAYO-CAPILLA DE DOMINGUILLO-CRUCERO EL ASOMADERO-CRUCERO LAS MONJAS-CRUCERO HACIENDA VILACHI-CRUCERO CANOAS-CALIFORNIA- 3 QUEBRADAS -GUAITALA
	CALOTO	MARAÑON - ALBA -MORALES-PALOMERA
	CORINTO	CABECERRA CORINTO, VEREDA BOQUERON, CORREGIMIENTO LOS ANDES
	GUACHENÉ	GOLONDRINAS - EL JIGUAL -SANTA CLARA - EL 55 - LOMA GRANDE - SAUCE - CHURO TABLON
	MIRANDA	MIRANDA – LA MUNDA- TIERRADURA-PADILLA
	SUÁREZ	PLAYA RICA – ALEJANDRIA – LA CHORRER – EL RECREO – EL DIVISO – CARMELITA – LIM.

	CONTRATO No.1643-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2	 ARA INGENIERÍA S.A.S
--	---	---

		MORALES
--	--	---------

2. DESCRIPCION DEL PROYECTO:

2.1 LOCALIZACION:



El programa prioriza corredores viales que incrementan la productividad del campo en las regiones mediante actividades de mantenimiento y mejoramiento, las cuales se desarrollarán bajo diferentes esquemas de financiación y ejecución.

De esta manera, con la suscripción de los convenios con los municipios de Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Guachené, Miranda y Suárez en el Departamento de Cauca, el proyecto busca realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad del proyecto.

DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	CORREDOR	LONGITUD KM
CAUCA	SANTANDER DE QUILICHAO	PANAMERICANA-QUINAMAYO-CAPILLA DE DOMINGUILLO-CRUCERO EL ASOMADERO-CRUCERO LAS MONJAS-CRUCERO HACIENDA VILACHI-CRUCERO CANOAS-CALIFORNIA- 3 QUEBRADAS -GUAITALA	22.4
	CALOTO	MARAÑON - ALBA -MORALES-PALOMERA	13.7
	CORINTO	CABECERRA CORINTO, VEREDA BOQUERON, CORREGIMIENTO LOS ANDES	15
	GUACHENÉ	GOLONDRINAS - EL JIGUAL -SANTA CLARA - EL 55 - LOMA GRANDE - SAUCE - CHURO TABLON	4
	MIRANDA	MIRANDA – LA MUNDA – TIERRADURA-PADILLA	11.61
	SUÁREZ	PLAYA RICA – ALEJANDRIA – LA CHORRERA – EL SECRETO – EL DIVISO – CARMELITA – LIM. MORALES	18.61

El alcance de la interventoría consiste en desarrollar las actividades de seguimiento y control integral de los contratos de obra.

2.2 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LAS VIAS:

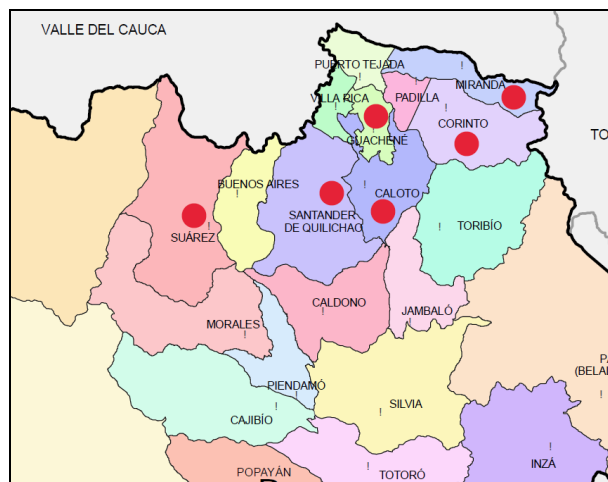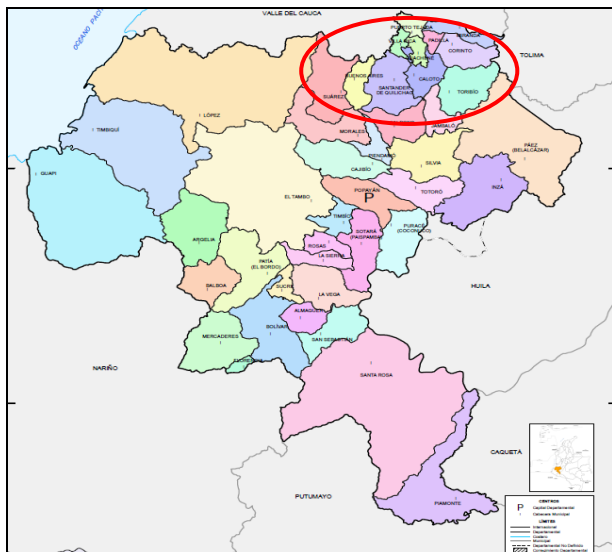

Para el presente periodo no se ha dado inicio a las actividades de obra, no se ha realizado visita inicial a los sitios donde se ejecutarán las actividades ya que los municipios están en proceso de adjudicación de contratos

2.3. CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO:

Las especificaciones técnicas de las actividades de obra de cada proyecto y/o contrato de obra, se desarrollarán teniendo en cuenta los Requerimientos Técnicos establecidos por las Entidades públicas designadas para la ejecución.

La interventoría realiza seguimiento a las principales actividades y/u obras a ejecutar por parte de los contratistas de obra, cuyo principal objetivo es atender las necesidades de mejoramiento y/o rehabilitación, dentro del alcance de los recursos presupuestales, incluyendo obras de contención, arte, drenaje y seguridad vial, según corresponda.

Actividades de mejoramiento:

- Construcción de placa huella
- Construcción de obras de drenaje (alcantarillas y bateas)
- Construcción de Filtros

Actividades de mantenimiento periódico

- Conformación de calzada existente
- Suministro e instalación de afirmado

 INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CONTRATO No.1643-2021 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2	 ARA INGENIERÍA S.A.S
---	---	---

3. INFORMACION DE LOS CONTRATOS DE OBRA:

3.1 INFORMACION GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA:

MUNICIPIO	SANTANDER DE QUILICHAO
Contratista	JULIAN LIZANDRO GONZÁLEZ CASAS
Contrato No.	617 DE 2021
Objeto:	Realizar el mantenimiento y mejoramiento de vías rurales en el municipio de Santander de Quilichao, departamento del Cauca en el marco del proyecto Colombia Rural.
Valor del Contrato	\$ 985.828.235
Valor del Anticipo	50 % de 1.904.156.303.00
Plazo Actual	Hasta el 31 de diciembre de 2021
Fecha de Iniciación	28/12/2021
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2021
Fecha de Terminación Final	31/12/2021
Supervisor	Ing. Paula Andrea Arce

MUNICIPIO	CALOTO
Contratista	CONSORCIO HUELLAS 2021
Contrato No.	200 DE 2021
Objeto:	Realizar el mantenimiento y mejoramiento de la vía rural "Marañón-Alba-Morales-Palomera" del municipio de Caloto-Departamento del Cauca
Valor del Contrato	\$ 998.060.257
Plazo Actual	Hasta el 31 de diciembre de 2021
Fecha de Iniciación	29/12/2021
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2021
Fecha de Terminación Final	31/12/2021
Supervisor	Ing. Mario Andrés Mosquera

MUNICIPIO	CORINTO
Contratista	CONSORCIO CORINTO PC
Contrato No.	En proceso de legalización
Objeto:	Mejoramiento y Mantenimiento de vías rurales en el marco del programa Colombia rural
Valor del Contrato	\$ 981.477.032
Plazo Actual	
Fecha de Iniciación	
Fecha de Terminación Inicial	
Fecha de Terminación Final	
Supervisor	Ing. Julián Fernando Ortega

	CONTRATO No.1643-2021 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2	 ARA INGENIERÍA S.A.S
--	---	---

MUNICIPIO	GUACHENÉ
Observación	Mediante resolución 510 de 2021 del 22/11/2021 el municipio revoca la apertura de la licitación pública No.LP-007-2021

MUNICIPIO	MIRANDA
Contratista	DRC INGENEIRÍA SAS
Contrato No.	1010-12-004-522- 2021
Objeto:	Realizar el mantenimiento y mejoramiento de la vía Miranda-La Munda-Tierradura-Padilla del municipio de Miranda Cauca
Valor del Contrato	\$ 867.038.664
Plazo Inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2021
Plazo Actualizado	6 meses según Otro si No.1
Fecha de Iniciación	
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2021
Fecha de Terminación Final	30/06/2022
Supervisor	Ing. Claudia Patricia Oyola

MUNICIPIO	SUÁREZ
Contratista	CONSORCIO VÍAS RURALES 2022
Contrato No.	F1-F14-214-23-12-2021
Objeto:	Mejoramiento y mejoramiento de vías rurales del programa "Colombia Rural", en el municipio de Suárez Cauca
Valor del Contrato	\$ 1.000.000.000
Plazo Actual	Hasta el 31 de diciembre de 2021
Fecha de Iniciación	
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2021
Fecha de Terminación Final	31/12/2021
Supervisor	Ing. Sandra Samara Sarria Erazo

3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS DURANTE EL MES

Para el presente periodo no se ha dado inicio a las actividades de obra.

3.3 SEGUIMIENTO A ÍTEMS NO PREVISTOS:

Para el periodo no se tienen actividades no previstas de obra.

	CONTRATO No.1643-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2	 ARA INGENIERÍA S.A.S
--	---	---

3.4 INFORMES DE AVANCE:

Para el periodo no se ha dado inicio a las actividades de obra.

3.4.1 AVANCE DE OBRAS PROGRAMADAS EJECUTADAS Y ACUMULADAS DEL CONTRATO.

Para el periodo no se ha dado inicio a las actividades de obra.

4. REPORTES DE EJECUCIÓN MENSUAL DE CONTRATOS DE OBRA:

4.1. Resumen mensual estado general del proyecto formato MINFRA-MN-IN-15-FR-3:

N.A. para el periodo

4.2 Control diario de maquinaria y equipo del proyecto, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-4

N.A. para el periodo

4.3 Control diario del personal del contratista de obra, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-6.

N.A. para el periodo

4.4 Información financiera del contrato de obra, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-8

N.A. para el periodo

4.5 Estado general del tiempo, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-10

N.A. para el periodo

4.6 Ensayos de laboratorio, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-11

N.A. para el periodo

4.7 Revisión y verificación de pago de aportes legales parafiscales y de seguridad social, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-12.

N.A. para el periodo

4.8 Avance físico y financiero, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-14

N.A. para el periodo

4.9 Seguimiento garantías y seguros contrato de obra, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-15.

N.A. para el periodo

4.10 Seguimiento a la inversión del anticipo, formatos MINFRA-MN-IN-2-FR-1 y MINFRA-MN-IN-2-FR-2

N.A. para el periodo

4.11 Seguimiento al programa de obra, formato Project

N.A. para el periodo

	CONTRATO No.1643-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2	 ARA INGENIERÍA S.A.S
--	---	---

4.12 Seguimiento programa de inversiones, formatos MINFRA-MN-IN-6-FR-1 y MINFRA-MN-IN-6-FR-2.

N.A. para el periodo

4.13 Copia de las actas de comité y reunión, formatos MINFRA-MN-IN-14-FR-1 y MINFRA-MN-IN-14-FR-2

N.A. para el periodo

4.14 Informes semanales de interventoría, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-2

Se anexan informes semanales 1 y 2

5 INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

Interventor.	ARA INGENIERÍA SAS
Contrato No.	1643 DE 2021
Objeto:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2
Valor del Contrato	\$ 645.953.947.0.
Plazo inicial	Hasta el 31 de diciembre de 2021
Plazo Actual	6 meses (hasta el 30 de junio de 2022)
Fecha de Iniciación	14/12/2021
Fecha de Terminación Inicial	31/12/2021
Fecha de Terminación Final	30/06/2022
Gestor del Proyecto	Ing. Juan Camilo Cáceres
Supervisor	Ing. Jorge Alonso Ortega

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR PARTE DEL INTERVENTOR

Para el periodo del presente informe la interventoría realizó labores administrativas, teniendo en cuenta que los municipios se encontraban en procesos de evaluación y adjudicación de contratos de obra.

	CONTRATO No.1643-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2	 ARA INGENIERÍA S.A.S
--	---	---

Se remitieron documentos a INVIAS para solicitud de anticipo del contrato de interventoría.

Se remitió a INVIAS solicitud de prórroga del contrato de interventoría.

Se realizó reunión por medios virtuales con participación de funcionarios de la alcaldía de Santander de Quilichao, contratista e interventoría, con el fin de determinar el avance en los procesos contractuales de interventoría, en esta reunión la interventoría manifestó que no contaba con documento de inicio del contrato de interventoría. La alcaldesa del municipio indicó que ya contaban con el contrato suscrito e incluirían el contrato dentro de las vigencias futuras, teniendo en cuenta que a la fecha (14 de diciembre de 2021) no se contaba con acta de inicio para el contrato de obra.

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS:

N.A. para el presente informe

6. **REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA**

6.1 Control diario de vehículos y equipo de la interventoría, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-5

N.A. para el presente periodo

6.2 Control diario de personal de interventoría, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-7

N.A. para el presente periodo

6.3 Información financiera contrato de interventoría, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-9

N.A. para el periodo

6.4 Revisión y verificación de pago de aportes legales y seguridad social, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-13.

Se remite certificación de pago de aportes parafiscales

6.5 Seguimiento a las garantías contractuales, formato MINFRA-MN-IN-15-FR-16

Se anexa formato

6.6 Seguimiento a la inversión del anticipo, formatos MINFRA-MN-IN-3-FR-1 y MINFRA-MN-IN-3-FR-2

N.A. para el presente periodo

	CONTRATO No.1643-2021 INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2	 ARA INGENIERÍA S.A.S
--	---	---

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Para el periodo correspondiente a este informe los municipios se encuentran en procesos de adjudicación y formalización de contratos de obra.

La interventoría no cuenta aún con documentación referente a los contratos de obra, se estarán realizando los trámites pertinentes para obtener dicha documentación.

El municipio de Guachené mediante resolución 510 de 2021 del 22/11/2021 revocó la apertura de la licitación pública No.LP-007-2021, la interventoría realizará las indagaciones pertinentes respecto a la situación futura del proceso.

8. ANEXOS

8.1 Relación de correspondencia

N.A. para el presente periodo

8.2 Registro Fotográfico

N.A. para el presente periodo

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y
PARAFISCALES**

YO, **KERLY GIOVANNA CUELLAR OBREGÓN**, en calidad de Representante Legal de **ARA
INGENIERIA S.A.S.** identificado con NIT. 830.068.724-8


CERTIFICO QUE:

ARA INGENIERIA S.A.S realizó el pago de aportes de Salud, pensiones, riesgos profesionales y aportes a Cajas de Compensación Familiar (Artículo 25 Ley 1607 de 2012) correspondientes al **Contrato de interventoría No. 1643 de 2021** para el Periodo del 01 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 legalmente exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Que, el pago fue verificado mediante Planilla Integrada No. 55872349.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Bogotá el 04 de enero de 2022.

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke, positioned above a solid horizontal line.

Kerly Giovanna Cuellar Obregón

CC. 52.904.861 de Bogotá D.C.

Representante Legal

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	aracontabilidad@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10 0
2022-01	2021-12	E		55872349	TOTAL A PAGAR
					\$5.660.000

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	280.000	0		0		0	0	0	0	280.000	2
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	66.700	0		0		0	0	0	0	66.700	2
EPS016	Cooimea EPS	805000427-1	140.000	0		0		0	0	0	0	140.000	1
EPS018	Serv. Occ. Salud - EPS	805001157-2	72.000	0		0		0	0	0	0	72.000	1
EPS044	MEDIMAS EPS SAS	901097473-5	172.000	0		0		0	0	0	0	172.000	2
EPSC34	Recaudo SGP Capital Salud	900298372-9	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1
ESSC24	EPS-S Coosalud	900226715-3	36.400	0		0		0	0	0	0	36.400	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230201	Proteccion (ING + Proteccion)	800229739-0	1.280.000	0	0	22.500	22.500	0	0		1.325.000	2
230301	Porvenir	800224808-8	826.600	0	0	0	0	0	0		826.600	3
231001	Colfondos	800227940-6	145.400	0	0	0	0	0	0		145.400	1
25-14	Colpensiones	900336004-7	961.400	0	0	0	0	0	0		961.400	4

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-4	Vida Colpatria S.A.	860002183-9	794.600				794.600	0	0	794.600			7.946	794.600	10

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF22	Colsubsidio	860007336-1	803.500	0	0	803.500	10

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	aracontabilidad@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10 0
TOTAL A PAGAR					
2022-01	2021-12	E		55872349	\$5.660.000

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	803.500	803.500
Pensión	4	3.258.400	3.258.400
Riesgos Laborales	1	794.600	794.600
CCF	1	803.500	803.500
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	5.660.000	5.660.000

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	830068724-8	ARA INGENIERIA SAS		CALLE 95 15 33	2896745	aracontabilidad@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B – menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2022-01	2021-12	E		55872349	\$5.660.000	

DETALLE POR COTIZANTE

INFORMACIÓN COTIZANTE						INFORMACIÓN NOVEDADES													PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES												
No.	Tipo	No. de Identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subleigo	Entrenador	Columna anterior Exonerado	ING	RET	TVE	TAE	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	IVA	VAC	AVP	UVT	RL	CORRECCION	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN		
1	CC	1000954208	RAMIREZ PALACIOS JUAN ANDRES	1	0		S																	25-14	908.526	145.400	0	0	0	0	EPSC34	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0	
2	CC	10103369	ORREGO LOPEZ JAVIER	1	0		S																	25-14	1.800.000	288.000	0	0	0	0	EPS018	1.800.000	72.000	14-4	1.800.000	5	125.300	CCF22	1.800.000	72.000	0	0	0	0	0	0
3	CC	35899441	RENERIA RENTERIA ANA LORENZA	1	0		S																	230301	908.526	145.400	0	0	0	0	ESSC24	908.526	36.400	14-4	908.526	5	63.300	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0	0
4	CC	98394692	DELGADO CAICEDO PABLO HERNANDO	1	0		S																	230201	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS016	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	5	243.600	CCF22	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	0
5	CC	9976903	MORALES CARDENAS CRISTIAN PEDRO	1	0		S																	230201	4.500.000	720.000	0	0	22.500	22.500	EPS005	4.500.000	180.000	14-4	4.500.000	5	313.200	CCF22	4.500.000	180.000	0	0	0	0	0	0
6	CC	52356779	NIVIA CHAPARRO CLAUDIA MARCELA	1	0		S																	25-14	2.500.000	400.000	0	0	0	0	EPS005	2.500.000	100.000	14-4	2.500.000	1	13.100	CCF22	2.500.000	100.000	0	0	0	0	0	0
7	CC	52904159	ALONSO FARFAN ADRIANA DEL PILAR	1	0		S	X																230301	757.105	121.200	0	0	0	0	EPS008	757.105	30.300	14-4	757.105	1	4.000	CCF22	757.105	30.300	0	0	0	0	0	0
8	CC	52904861	CUELLAR OBREGON KERLY GIOVANNA	1	0		S																	230301	3.500.000	560.000	0	0	0	0	EPS044	3.500.000	140.000	14-4	3.500.000	1	18.300	CCF22	3.500.000	140.000	0	0	0	0	0	0
9	CC	77182813	TAMAYO MESTRE JOSE GREGORIO	1	0		S																	231001	908.526	145.400	0	0	0	0	EPS008	908.526	36.400	14-4	908.526	1	4.800	CCF22	908.526	36.400	0	0	0	0	0	0
10	CC	79442593	ROJAS PRIETO JOSE ALBERTO	1	0		S	X																25-14	800.000	128.000	0	0	0	0	EPS044	800.000	32.000	14-4	800.000	1	4.200	CCF22	800.000	32.000	0	0	0	0	0	0

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	31	12	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CAUCA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1643-2021 **INTERVENTOR:** ARA INGENIERÍA SAS

OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS TERCARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CAUCA GRUPO 2

FECHA DE INICIO: 14/12/2021

PLAZO INICIAL: 31/12/2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/06/2022
(Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: \$ 645.953.947,00

VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947,00
(Incluye adiciones)

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: JORGE ALONSO ORTEGA

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	\$ 64.595.394,70	12	10	2021	2/07/2022		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42,02%	\$ 271.409.222,00	12	10	2021	2/07/2022		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 129.190.789,40	12	10	2021	1	1	2025
Calidad del servicio	30,00%	\$ 193.786.184,10	12	10	2021	12	10	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101175872

Certificado de modificación o anexo No.: 2
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-16		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA	31	12	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES Y PRÓRROGAS

A continuación indicar los amparos y vigencias del último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10,00%	\$ 64.595.394,70	12	10	2021	30/12/2022		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	42,02%	\$ 271.409.222,00	12	10	2021	30/12/2022		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20,00%	\$ 129.190.789,40	12	10	2021	30	6	2025
Calidad del servicio	30,00%	\$ 193.786.184,10	12	10	2021	12	10	2026

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101175872


Certificado de modificación o anexo No.: 5
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Documento y fecha de aprobación de la última garantía o certificado de modificación o anexos: Memorando SPSC 93395 del 10/12/2021

OBSERVACIONES SOBRE CUMPLIMIENTO:

Firma




Nombre: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO
Director de Interventoría
Matricula No.: 2520245905 CND

Firma



Nombre: JORGE ALONSO ORTEGA ROJAS
Supervisor Contrato de Interventoría
Matricula No.: 1920216412

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

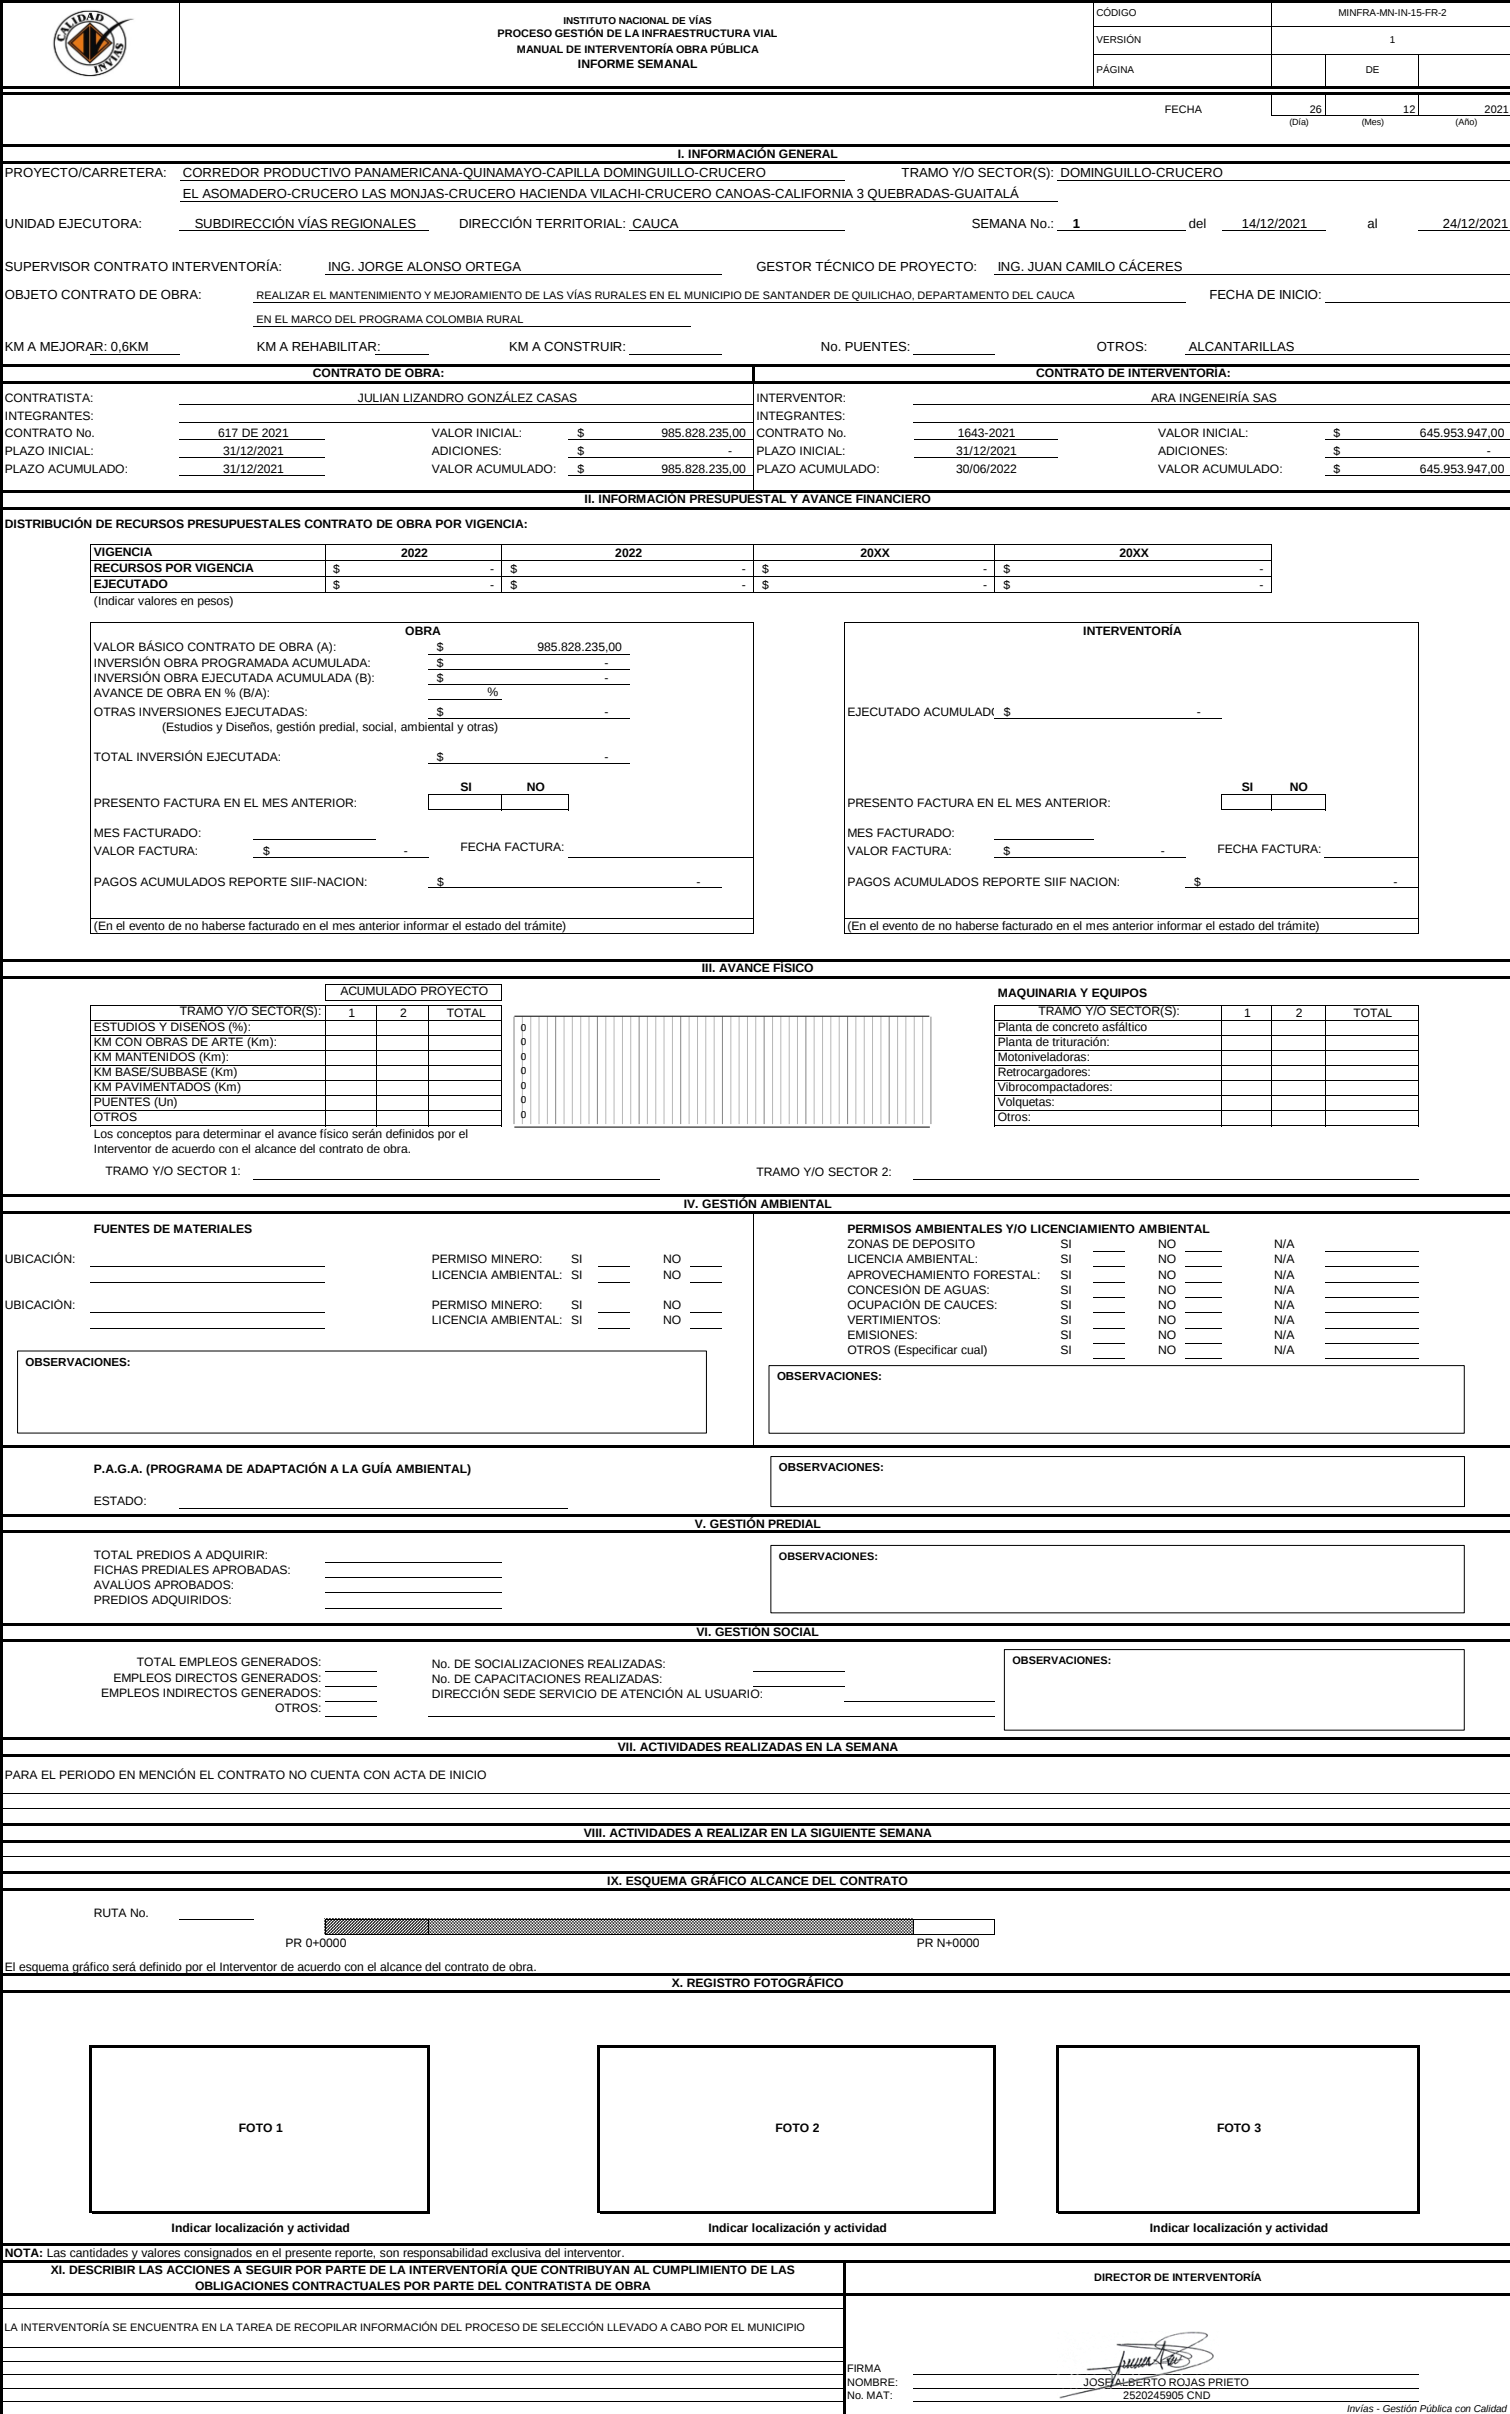

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MNFRM-MV-IN-15-FR-2
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	DE _____

FECHA		26	12	2021
(Día)		(Mes)	(Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO/CARRETERA: VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA, DEL MUNICIPIO DE CALOTO			TRAMO Y/O SECTOR(S): MARAÑÓN ALBA-MORALES-PALOMERA	
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CAUCA	SEMANA No.: 1 del 14/12/2021 al 24/12/2021
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENIA:		ING. JORGE ALONSO ORTEGA		
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:		ING. JUAN CAMILO CÁCERES		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA DEL MUNICIPIO DE CALOTO				
KM A MEJORAR: 0.8 KM	KM A REHABILITAR:	KM A CONSTRUIR:	No. PUENTES:	OTROS:

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENIA:	
CONTRATISTA: INTEGRANTES: CONTRATO No. PLAZO ACUMULADO:	CONSORCIO HUELLAS 2021 OSWALDO TAMAYO 70% - INVERSIONES CLH SAS 30% 200 DE 2021 31/12/2021 VALOR INICIAL: \$ 998.060.257,00 ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ 998.060.257,00	INTERVENTOR: INTEGRANTES: CONTRATO No. PLAZO ACUMULADO:	ARA INGENIERÍA SAS 1643-2021 31/12/2021 VALOR INICIAL: \$ 645.953.947,00 ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947,00

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
(Indicar valores en pesos)				
OBRA				
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 998.060.257,00			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ -			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ -			
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	% -			
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ -			
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ -			
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO	X	
MES FACTURADO:				
VALOR FACTURA:	\$ -	FECHA FACTURA:		
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:	\$ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				
INTERVENIA				
EJECUTADO ACUMULADO(\$				
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:	SI	NO	X	
MES FACTURADO:				
VALOR FACTURA:	\$ -	FECHA FACTURA:		
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:	\$ -			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)				

III. AVANCE FÍSICO				
ACUMULADO PROYECTO				
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			0	
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			0	
KM MANTENIMIENTOS (Km):			0	
KM BASE/SUBBASE (Km):			0	
KM PAVIMENTADOS (Km):			0	
PUENTES (Un):			0	
OTROS:			0	
Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el				
TRAMO Y/O SECTOR 1:	TRAMO Y/O SECTOR 2:			

MAQUINARIA Y EQUIPOS				
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	
Planta de concreto asfáltico			0	
Planta de trituración:			0	
Motorveladores:			0	
Retrocargadores:			0	
Vibrocompactadores:			0	
Volquetas:			0	
Otros:			0	

IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL			
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	N/A
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
UBICACIÓN:	PERMISO MINERO:	SI	NO	N/A
	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A
OBSERVACIONES:	OBSERVACIONES:			
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)	OBSERVACIONES:			
ESTADO:				

V. GESTIÓN PREDIAL				
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR:	OBSERVACIONES:			
FICHAS PEDIALES APROBADAS:				
AVALÚOS APROBADOS:				
PREDIOS ADQUIRIDOS:				

VI. GESTIÓN SOCIAL				
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	No. de SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	OBSERVACIONES:		
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	No. de CAPACITACIONES REALIZADAS:			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:			
OTROS:				

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA				
PARA EL PERIODO EN MENCIÓN EL CONTRATO NO CUENTA CON ACTA DE INICIO				

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
---	--	--	--	--

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO				
RUTA No.	PR 0+0000 PR N+0000			
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.				

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO				
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3		
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad		

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.				
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA				
DIRECTOR DE INTERVENIA				
LA INTERVENIA SE ENCUENTRA EN LA TAREA DE RECOPIRAR INFORMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN LLEVADO A CABO POR EL MUNICIPIO				
FIRMA				
NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO				
No. MAT: 2620245905 CND				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	DE _____		

	FECHA	26	12	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VÍA CORINTO - CORREGIMIENTO DE LOS ANDES TRAMO Y/O SECTOR(S): VEREDA BOQUERON

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 1 del 14/12/2021 al 24/12/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" FECHA DE INICIO: _____

KM A MEJORAR: 0,8 KM KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: ALCANTARILLAS

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO CORINTO PC</u>				INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERÍA SAS</u>			
INTEGRANTES: <u>PROQUING SAS 70% - CITY CYR SAS 30%</u>				INTEGRANTES: _____			
CONTRATO No. <u>304 DE 2021</u>		VALOR INICIAL: <u>\$ 981.477.032,00</u>		CONTRATO No. <u>1643-2021</u>		VALOR INICIAL: <u>\$ 645.953.947,00</u>	
PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>		ADICIONES: <u>\$ -</u>		PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>		ADICIONES: <u>\$ -</u>	
PLAZO ACUMULADO: <u>31/12/2021</u>		VALOR ACUMULADO: <u>\$ 981.477.032,00</u>		PLAZO ACUMULADO: <u>30/06/2022</u>		VALOR ACUMULADO: <u>\$ 645.953.947,00</u>	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 981.477.032,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0 %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: \$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO				MAQUINARIA Y EQUIPOS			
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)			0	Planta de concreto asfáltico			0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)			0	Planta de trituración:		0	0
KM MANTENIDOS (Km)			0	Motoniveladoras:		0	0
KM BASE/SUBBASE (Km)			0	Retrocargadores:		0	0
KM PAVIMENTADOS (Km)			0	Vibrocompactadores:		0	0
PUENTES (Un)			0	Volquetes:		0	0
OTROS:			0	Otros:			0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES:

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO SI _____ NO _____ N/A _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____

CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____

OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____

VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____

EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____

OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____

OBSERVACIONES:

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES:

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0

AVALUOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OTROS: _____

OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

PARA EL PERÍODO EN MENCIÓN EL CONTRATO NO CUENTA CON ACTA DE INICIO

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____

PR 0+0000 PR N+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRAFICO

FOTO 1

Indicar localización y actividad

FOTO 2

Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORÍA SE ENCUENTRA EN LA TAREA DE RECOPIAR INFORMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN LLEVADO A CABO POR EL MUNICIPIO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA:

NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

No. NAT: 2520245905 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
			VERSION	1		
			PÁGINA		DE	

FECHA					
		26	12	2021	
		(Día)	(Mes)	(Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO/CARRETERA: <u>VIA MIRANDA- LA MUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</u>			TRAMO Y/O SECTOR(S): <u>MIRANDA LA MUNDA TIERRADURA-PADILLA</u>		
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>		DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u>		SEMANA No.: <u>1</u> del <u>14/12/2021</u> al <u>24/12/2021</u>	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u>			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. JUAN CAMILO CÁCERES</u>		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRANDA-LAMUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA</u>			FECHA DE INICIO: _____		
KM A MEJORAR: <u>0.6 KM</u>		KM A REHABILITAR: _____		KM A CONSTRUIR: _____	
		No. PUENTES: _____		OTROS: <u>FILTROS</u>	

CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		
CONTRATISTA: <u>DRC INGENIERÍA SAS</u>			INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERÍA SAS</u>		
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:		
CONTRATO No. <u>522 DE 2021</u>	VALOR INICIAL: \$ <u>867.038.664,00</u>		CONTRATO No. <u>1643-2021</u>	VALOR INICIAL: \$ <u>645.953.947,00</u>	
PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>	ADICIONES: \$ _____		PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>	ADICIONES: \$ _____	
PLAZO ACUMULADO: <u>31/12/2021</u>	VALOR ACUMULADO: \$ <u>867.038.664,00</u>		PLAZO ACUMULADO: <u>30/06/2022</u>	VALOR ACUMULADO: \$ <u>645.953.947,00</u>	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																	
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																	
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX																																																																													
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____																																																																												
EJECUTADO	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____																																																																												
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">OBRA</td> </tr> <tr> <td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td> <td>\$ <u>867.038.664,00</u></td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td> <td>\$ _____</td> </tr> <tr> <td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td> <td>\$ _____</td> </tr> <tr> <td>AVANCE DE OBRA EN % (B/A):</td> <td style="text-align: center;">%</td> </tr> <tr> <td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td> <td>\$ _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="font-size: x-small;">(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td> </tr> <tr> <td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td> <td>\$ _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MES FACTURADO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR FACTURA: \$ _____</td> <td>FECHA FACTURA: _____</td> </tr> <tr> <td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:</td> <td>\$ _____</td> </tr> </table> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	OBRA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ <u>867.038.664,00</u>	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ _____	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ _____	AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	%	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ _____	(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)		TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ _____	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>		SI	NO	X	X	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		MES FACTURADO:		VALOR FACTURA: \$ _____	FECHA FACTURA: _____	PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:	\$ _____	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;">INTERVENTORÍA</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO ACUMULADO:</td> <td>\$ _____</td> </tr> <tr> <td colspan="2" style="text-align: center;"> <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table> </td> </tr> <tr> <td>PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>MES FACTURADO:</td> <td></td> </tr> <tr> <td>VALOR FACTURA: \$ _____</td> <td>FECHA FACTURA: _____</td> </tr> <tr> <td>PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:</td> <td>\$ _____</td> </tr> </table> (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	INTERVENTORÍA		EJECUTADO ACUMULADO:	\$ _____	<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>		SI	NO	X	X	PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:		MES FACTURADO:		VALOR FACTURA: \$ _____	FECHA FACTURA: _____	PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:	\$ _____																																
OBRA																																																																																	
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ <u>867.038.664,00</u>																																																																																
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ _____																																																																																
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ _____																																																																																
AVANCE DE OBRA EN % (B/A):	%																																																																																
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ _____																																																																																
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																																																																																	
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ _____																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>		SI	NO	X	X																																																																												
SI	NO																																																																																
X	X																																																																																
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:																																																																																	
MES FACTURADO:																																																																																	
VALOR FACTURA: \$ _____	FECHA FACTURA: _____																																																																																
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION:	\$ _____																																																																																
INTERVENTORÍA																																																																																	
EJECUTADO ACUMULADO:	\$ _____																																																																																
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 50%; text-align: center;">SI</td> <td style="width: 50%; text-align: center;">NO</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">X</td> <td style="text-align: center;">X</td> </tr> </table>		SI	NO	X	X																																																																												
SI	NO																																																																																
X	X																																																																																
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:																																																																																	
MES FACTURADO:																																																																																	
VALOR FACTURA: \$ _____	FECHA FACTURA: _____																																																																																
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION:	\$ _____																																																																																
III. AVANCE FÍSICO																																																																																	
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">ACUMULADO PROYECTO</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>TRAMO Y/O SECTOR(S):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (Km):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KM BASE/SUBBASE (Km):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (Km):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>PUENTES (Ln):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el TRAMO Y/O SECTOR 1: _____	ACUMULADO PROYECTO					1	2	TOTAL	TRAMO Y/O SECTOR(S):				ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):				KM CON OBRAS DE ARTE (Km):				KM MANTENIDOS (Km):				KM BASE/SUBBASE (Km):				KM PAVIMENTADOS (Km):				PUENTES (Ln):				OTROS:				<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td colspan="4" style="text-align: center;">MAQUINARIA Y EQUIPOS</td> </tr> <tr> <td style="width: 30%;"></td> <td style="width: 10%; text-align: center;">1</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">2</td> <td style="width: 10%; text-align: center;">TOTAL</td> </tr> <tr> <td>TRAMO Y/O SECTOR(S):</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Planta de concreto asfáltico</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Planta de trituración:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Motovelocidades:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Retrocargadores:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Vibracompactadores:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Volquetes:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td>Otros:</td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> TRAMO Y/O SECTOR 2: _____	MAQUINARIA Y EQUIPOS					1	2	TOTAL	TRAMO Y/O SECTOR(S):				Planta de concreto asfáltico				Planta de trituración:				Motovelocidades:				Retrocargadores:				Vibracompactadores:				Volquetes:				Otros:			
ACUMULADO PROYECTO																																																																																	
	1	2	TOTAL																																																																														
TRAMO Y/O SECTOR(S):																																																																																	
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):																																																																																	
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):																																																																																	
KM MANTENIDOS (Km):																																																																																	
KM BASE/SUBBASE (Km):																																																																																	
KM PAVIMENTADOS (Km):																																																																																	
PUENTES (Ln):																																																																																	
OTROS:																																																																																	
MAQUINARIA Y EQUIPOS																																																																																	
	1	2	TOTAL																																																																														
TRAMO Y/O SECTOR(S):																																																																																	
Planta de concreto asfáltico																																																																																	
Planta de trituración:																																																																																	
Motovelocidades:																																																																																	
Retrocargadores:																																																																																	
Vibracompactadores:																																																																																	
Volquetes:																																																																																	
Otros:																																																																																	
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																	
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ OBSERVACIONES:	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPOSITO SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____ OBSERVACIONES:																																																																																
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: _____	OBSERVACIONES:																																																																																
V. GESTIÓN PREDIAL																																																																																	
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES:																																																																																
VI. GESTIÓN SOCIAL																																																																																	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ OBSERVACIONES:																																																																																
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																																																																	
PARA EL PERÍODO EN MENCIÓN EL CONTRATO NO CUENTA CON ACTA DE INICIO																																																																																	
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																																																																	
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																																																																	
RUTA No. _____ PR 0+0000 PR N+0000 El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																																																																	
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																	
FOTO 1 Indicar localización y actividad	FOTO 2 Indicar localización y actividad	FOTO 3 Indicar localización y actividad																																																																															
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA																																																																															
LA INTERVENTORÍA SE ENCUENTRA EN LA TAREA DE RECOPIRAR INFORMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN LLEVADO A CABO POR EL MUNICIPIO		FIRMA: _____ NOMBRE: <u>JOSE ALBERTO PRIETO</u> No. MAT: <u>2500249986 CND</u>																																																																															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CODIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-2
		VERSIÓN 1
		PÁGINA DE

	FECHA	26	12	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: CORREDOR PRODUCTIVO PLAYA RICA-ALEJANDRIA-LA CHORRERA-EL SECRTEO-EL DIVISO-CARMELITA-LIM.MORALES TRAMO Y/O SECTOR(S): VEREDA PLAYA RICA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 1 del 14/12/2021 al 24/12/2021

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SUÁREZ CAUCA FECHA DE INICIO: _____

KM A MEJORAR: 0,7 KM KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: ALCANTARILLAS

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO VÍAS RURALES 2022</u>				INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERÍA SAS</u>			
INTEGRANTES: <u>3 DISEÑO E INGENIERIA INDUSTRIAL EU 10% - SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES INTEGRADOS S</u>				INTEGRANTES: _____			
CONTRATO No. <u>214 DE 2021</u>		VALOR INICIAL: <u>\$ 1.000.000.000,00</u>		CONTRATO No. <u>1643-2021</u>		VALOR INICIAL: <u>\$ 645.953.947,00</u>	
PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>		ADICIONES: <u>\$ -</u>		PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>		ADICIONES: <u>\$ -</u>	
PLAZO ACUMULADO: <u>31/12/2021</u>		VALOR ACUMULADO: <u>\$ 1.000.000.000,00</u>		PLAZO ACUMULADO: <u>30/06/2022</u>		VALOR ACUMULADO: <u>\$ 645.953.947,00</u>	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.000.000.000,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

PRESENTE FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: \$ -

PRESENTE FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO			
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			0
KM MANTENIDOS (Km):			0
KM BASE/SUBBASE (Km):			0
KM PAVIMENTADOS (Km):			0
PUENTES (Un):			0
OTROS:			0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			0
Planta de trituración:		0	0
Motoniveladoras:		0	0
Retrocargadores:		0	0
Vibracompactadores:		0	0
Volquetes:		0	0
Otros:			0

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: _____

UBICACIÓN: _____

OBSERVACIONES: _____

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO: SI _____ NO _____ N/A _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____

CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____

OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____

VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____

EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____

OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____

OBSERVACIONES: _____

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES: _____

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0

AVALUOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: _____

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OTROS: _____

OBSERVACIONES: _____

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

PARA EL PERÍODO EN MENCIÓN EL CONTRATO NO CUENTA CON ACTA DE INICIO

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

ruta No. _____

PR 0+0000 PR N+0000

El esquema gráfico será definido por el interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1

Indicar localización y actividad

FOTO 2

Indicar localización y actividad

FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA EN LA TAREA DE RECOPIRAR INFORMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN LLEVADO A CABO POR EL MUNICIPIO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


FIRMA: _____

NOMBRE: JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO

No. MAT: 2520245905 CND

Inviás - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2																																					
			VERSION	1																																					
			PÁGINA	DE																																					
			FECHA																																						
			(Día) 26 (Mes) 12 (Año) 2021																																						
I. INFORMACIÓN GENERAL																																									
PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO DE GUACHENÉ			TRAMO Y/O SECTOR(S):																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA			SEMANA No.: 1 del 14/12/2021 al 24/12/2021																																						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES																																						
OBJETO CONTRATO DE OBRA:			FECHA DE INICIO:																																						
KM A MEJORAR:		KM A REHABILITAR:	KM A CONSTRUIR:	No. PUENTES:	OTROS:																																				
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																						
CONTRATISTA:			INTERVENTOR: ARA INGENIERÍA SAS																																						
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:																																						
CONTRATO No. VALOR INICIAL:			CONTRATO No. VALOR INICIAL:																																						
PLAZO INICIAL: ADICIONES: \$			PLAZO INICIAL: ADICIONES: \$																																						
PLAZO ACUMULADO: VALOR ACUMULADO: \$			PLAZO ACUMULADO: VALOR ACUMULADO: \$																																						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>20XX</th> <th>20XX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table> (Indicar valores en pesos)						VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																					
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX																																					
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																					
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																					
OBRA			INTERVENTORIA																																						
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ - INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - AVANCE DE OBRA EN % (B/A): % OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -			EJECUTADO ACUMULADO: \$ - PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO MES FACTURADO: SI NO VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -																																						
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO MES FACTURADO: SI NO VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -			PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: SI NO MES FACTURADO: SI NO VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -																																						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																						
III. AVANCE FÍSICO																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACUMULADO PROYECTO</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S):</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km)</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>KM MANTENIDOS (Km)</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>KM BASES/SIIRAS (Km)</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>KM PAVIMENTADOS (Km)</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>PUENTES (Un)</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table> Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:						ACUMULADO PROYECTO				TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)			0	KM CON OBRAS DE ARTE (Km)			0	KM MANTENIDOS (Km)			0	KM BASES/SIIRAS (Km)			0	KM PAVIMENTADOS (Km)			0	PUENTES (Un)			0	OTROS			0
ACUMULADO PROYECTO																																									
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL																																						
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)			0																																						
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)			0																																						
KM MANTENIDOS (Km)			0																																						
KM BASES/SIIRAS (Km)			0																																						
KM PAVIMENTADOS (Km)			0																																						
PUENTES (Un)			0																																						
OTROS			0																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">MAQUINARIA Y EQUIPOS</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S):</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Planta de concreto asfáltico</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Planta de trituración</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Motorveladores</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Petrocargadores</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Vibrocompactadores</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Volquetas</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>						MAQUINARIA Y EQUIPOS				TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	Planta de concreto asfáltico			0	Planta de trituración			0	Motorveladores			0	Petrocargadores			0	Vibrocompactadores			0	Volquetas			0	Otros			0
MAQUINARIA Y EQUIPOS																																									
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL																																						
Planta de concreto asfáltico			0																																						
Planta de trituración			0																																						
Motorveladores			0																																						
Petrocargadores			0																																						
Vibrocompactadores			0																																						
Volquetas			0																																						
Otros			0																																						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																									
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO OBSERVACIONES:			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIENTES: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A OBSERVACIONES:																																						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO:			OBSERVACIONES:																																						
V. GESTIÓN PREDIAL																																									
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0 AVALUOS APROBADOS: 0 PREDIOS ADQUIRIDOS: 0			OBSERVACIONES:																																						
VI. GESTIÓN SOCIAL																																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: OTROS:			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: OBSERVACIONES:																																						
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																									
POR MEDIO DE RESOLUCIÓN No.510 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 EL MUNICIPIO DE GUACHENÉ REVOCA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-007-2021, TENIENDO EN CUENTA QUE LA MATRIZ DE EXPERIENCIA EXIGIDA EN EL PROCESO NO CORRESPONDÍA AL PRESUPUESTO OFICIAL																																									
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																									
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																									
RUTA No. PR 0+0000 El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra. PR N-0000																																									
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																									
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3																																					
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad																																					
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.																																									
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA			DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																						
LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA EN LA TAREA DE RECOPIRAR INFORMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN LLEVADO A CABO POR EL MUNICIPIO			FIRMA: NOMBRE: No. MAT:																																						
			 JOSA ALBERTO ROJAS PRIETO 2520245905 CND																																						
Instit - Gestión Pública con Calidad																																									

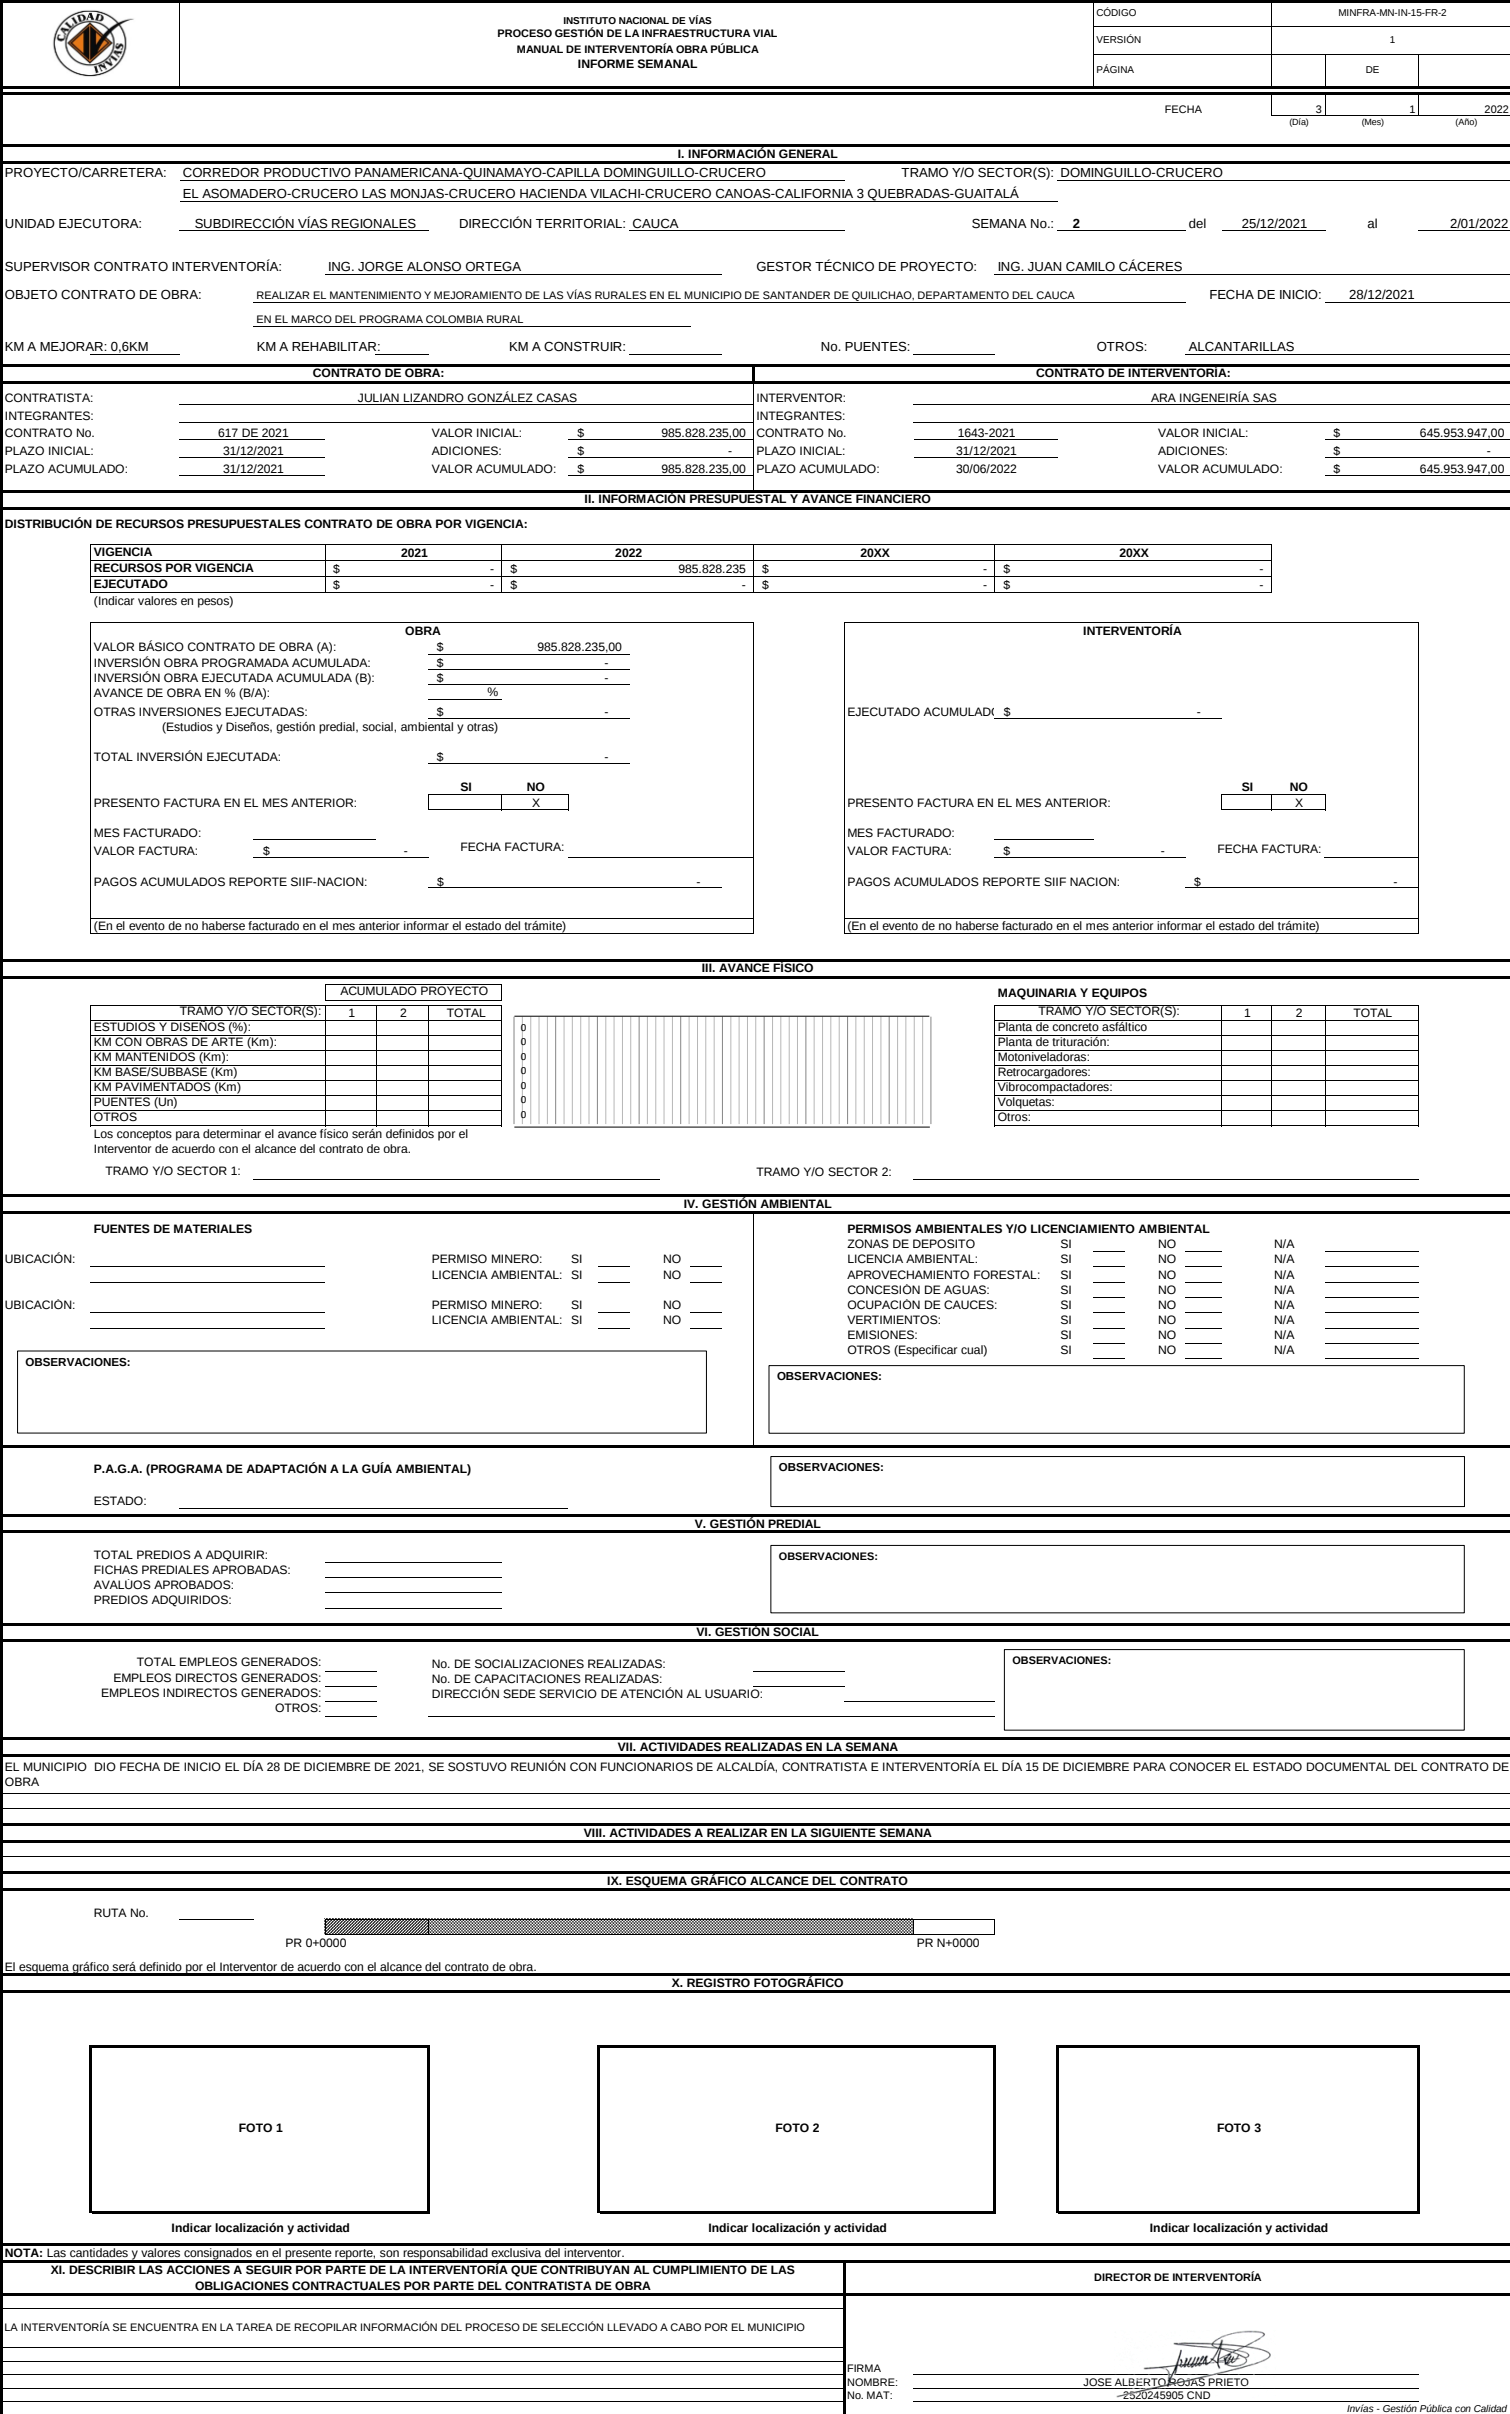

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO	MINFRA-MV-R-15-FR-2		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA		DE	

FECHA		3	1	2022
		(Día)	(Mes)	(Año)

I. INFORMACIÓN GENERAL				
PROYECTO/CARRETERA: <u>VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA, DEL MUNICIPIO DE CALOTO</u>		TRAMO Y/O SECTOR(S): <u>MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA</u>		
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CAUCA</u>	SEMANA No.: <u>2</u> del <u>25/12/2021</u> al <u>2/01/2022</u>		
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: <u>ING. JORGE ALONSO ORTEGA</u>		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: <u>ING. JUAN CAMILO CÁCERES</u>		
OBJETO CONTRATO DE OBRA: <u>REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA RURAL MARAÑÓN-ALBA-MORALES-PALOMERA DEL MUNICIPIO DE CALOTO</u>		FECHA DE INICIO: <u>29/12/2021</u>		
KM A MEJORAR: <u>0.8 KM</u>	KM A REHABILITAR: _____	KM A CONSTRUIR: _____	No. PUENTES: _____	OTROS: _____

CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO HUELLAS 2021</u>	INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERÍA SAS</u>		
INTEGRANTES: <u>OSWALDO TAMAYO 70% - INVERSIONES CLH SAS 30%</u>	INTEGRANTES: _____		
CONTRATO No. <u>200 DE 2021</u>	CONTRATO No. <u>1643-2021</u>	VALOR INICIAL: \$ _____	VALOR INICIAL: \$ <u>645.953.947,00</u>
PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>	PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>	ADICIONES: \$ _____	ADICIONES: \$ _____
PLAZO ACUMULADO: <u>31/12/2021</u>	PLAZO ACUMULADO: <u>30/06/2022</u>	VALOR ACUMULADO: \$ _____	VALOR ACUMULADO: \$ <u>645.953.947,00</u>

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:									
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX					
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ _____	\$ <u>998.060.257</u>	\$ _____	\$ _____					
EJECUTADO	\$ _____	\$ _____	\$ _____	\$ _____					
OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ <u>998.060.257,00</u> INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ _____ INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ _____ AVANCE DE OBRA EN % (B/A): _____ % OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ _____ (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ _____ PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ _____ (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	SI	NO		X	INTERVENTORÍA EJECUTADO ACUMULADO: \$ _____ PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table style="display: inline-table; border: 1px solid black;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ _____ FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACIÓN: \$ _____ (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	SI	NO		X
SI	NO								
	X								
SI	NO								
	X								

III. AVANCE FÍSICO																																																																	
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM MANTENIDOS (Km)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM BASE/SUBBASE (Km)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>KM PAVIMENTADOS (Km)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>PUENTES (Un)</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>OTROS:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table> Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____	TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)			0	KM CON OBRAS DE ARTE (Km)			0	KM MANTENIDOS (Km)			0	KM BASE/SUBBASE (Km)			0	KM PAVIMENTADOS (Km)			0	PUENTES (Un)			0	OTROS:			0	MAQUINARIA Y EQUIPOS <table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th style="text-align: left;">TRAMO Y/O SECTOR(S)</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> <tr> <td>Planta de concreto asfáltico</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Planta de trituración</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Motorveladoras</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Retrocargadores</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Vibrocompactadores</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Volquetes</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>Otros:</td> <td></td> <td></td> <td>0</td> </tr> </table>	TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	Planta de concreto asfáltico			0	Planta de trituración			0	Motorveladoras			0	Retrocargadores			0	Vibrocompactadores			0	Volquetes			0	Otros:			0
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL																																																														
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)			0																																																														
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)			0																																																														
KM MANTENIDOS (Km)			0																																																														
KM BASE/SUBBASE (Km)			0																																																														
KM PAVIMENTADOS (Km)			0																																																														
PUENTES (Un)			0																																																														
OTROS:			0																																																														
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL																																																														
Planta de concreto asfáltico			0																																																														
Planta de trituración			0																																																														
Motorveladoras			0																																																														
Retrocargadores			0																																																														
Vibrocompactadores			0																																																														
Volquetes			0																																																														
Otros:			0																																																														

IV. GESTIÓN AMBIENTAL				
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ OBSERVACIONES:	PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI _____ NO _____ N/A _____ LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____ CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____ OCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____ VERTIMIENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____ EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____ OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____ N/A _____ OBSERVACIONES:			

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: _____	OBSERVACIONES:
---	--

V. GESTIÓN PREDIAL	
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____ FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____ AVALUOS APROBADOS: _____ PREDIOS ADQUIRIDOS: _____	OBSERVACIONES:

VI. GESTIÓN SOCIAL	
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ OTROS: _____	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____ OBSERVACIONES:

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA	
LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL FORMALIZÓ ACTA DE INICIO EL DÍA 29 DE DICIEMBRE Y OTRO SI MODIFICATORIO EL DÍA 30 DE DICIEMBRE PARA PRÓRROGA DEL CONTRATO HASTA EL 30/12/2022, LA INTERVENTORÍA SE ENCUENTRA EN PROCESO DE INDAGACIÓN EN PÁGINA DE SECOP PARA VERIFICAR EL AVANCE DEL PROCESO CONTRACTUAL Y DOCUMENTAL DEL CONTRATO.	

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA	

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO	
RUTA No. _____ PR 0+0000 PR N+0000 El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.	

X. REGISTRO FOTOGRAFICO		
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.	
XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA LA INTERVENTORÍA SE ENCUENTRA EN LA TAREA DE RECOPIAR INFORMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN LLEVADO A CABO POR EL MUNICIPIO 	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA FIRMA: NOMBRE: <u>JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO</u> No. MAT: <u>2520245905 CND</u> Inviap - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	DE		

	FECHA	31	11	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: VÍA CORINTO - CORREGIMIENTO DE LOS ANDES TRAMO Y/O SECTOR(S): VEREDA BOQUERON

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 2 del 25/12/2021 al 2/01/2022

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MARCO DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" FECHA DE INICIO: _____

KM A MEJORAR: 0,8 KM KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: ALCANTARILLAS

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORÍA:			
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO CORINTO PC</u>				INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERÍA SAS</u>			
INTEGRANTES: <u>PROQUING SAS 70% - CITY CYR SAS 30%</u>				INTEGRANTES: _____			
CONTRATO No. <u>304 DE 2021</u>		VALOR INICIAL: <u>\$ 981.477.032,00</u>		CONTRATO No. <u>1643-2021</u>		VALOR INICIAL: <u>\$ 645.953.947,00</u>	
PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>		ADICIONES: <u>\$ -</u>		PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>		ADICIONES: <u>\$ -</u>	
PLAZO ACUMULADO: <u>31/12/2021</u>		VALOR ACUMULADO: <u>\$ 981.477.032,00</u>		PLAZO ACUMULADO: <u>30/06/2022</u>		VALOR ACUMULADO: <u>\$ 645.953.947,00</u>	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 981.477.032	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 981.477.032,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0 %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORÍA

EJECUTADO ACUMULADO: \$ -

PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO: _____ FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO				MAQUINARIA Y EQUIPOS			
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL	TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%)			0	Planta de concreto asfáltico			0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km)			0	Planta de trituración:		0	0
KM MANTENIDOS (Km)			0	Motonevadoras:		0	0
KM BASE/SUBBASE (Km)			0	Retrocargadores:		0	0
KM PAVIMENTADOS (Km)			0	Vibrocompactadores:		0	0
PUENTES (Un)			0	Volquetes:		0	0
OTROS:			0	Otros:			0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

UBICACIÓN: _____ PERMISO MINERO: SI _____ NO _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: _____

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPÓSITO SI _____ NO _____ N/A _____

LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____ N/A _____

APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____ N/A _____

CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____ N/A _____

OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____ N/A _____

VERTIMENTOS: SI _____ NO _____ N/A _____

EMISIONES: SI _____ NO _____ N/A _____

OTROS (Especificar cual) SI _____ NO _____ N/A _____

OBSERVACIONES: _____

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES: _____

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0

AVALUOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: _____

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____ No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____ No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____ DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OTROS: _____

OBSERVACIONES: _____

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

EL MUNICIPIO FORMALIZÓ ACTA DE INICIO CON EL CONTRATISTA EL DÍA 31 DE DICIEMBRE, ASÍ MISMO SUSCRIBIERON OTRO SI MODIFICATORIO PARA PRÓRROGA DEL CONTRATO HASTA EL DÍA 31/12/2022

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

RUTA No. _____

PR 0+0000 _____ PR N+0000

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRAFICO



FOTO 1

Indicar localización y actividad



FOTO 2

Indicar localización y actividad



FOTO 3

Indicar localización y actividad

NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORÍA SE ENCUENTRA EN LA TAREA DE RECOPIAR INFORMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN LLEVADO A CABO POR EL MUNICIPIO

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA: _____

NOMBRE: JOSÉ ALBERTO ROJAS PRIETO

No. NAT: 2520245905 CND

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2																																					
			VERSIÓN	1																																					
			PÁGINA																																						
			FECHA																																						
			(Día) 3 (Mes) 1 (Año) 2022																																						
I. INFORMACIÓN GENERAL																																									
PROYECTO/CARRETERA: VÍA MIRANDA- LA MUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA			TRAMO Y/O SECTOR(S): MIRANDA LA MUNDA TIERRADURA-PADILLA																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA			SEMANA No.: 2 del 25/12/2021 al 2/01/2022																																						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES																																						
OBJETO CONTRATO DE OBRA: REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA MIRANDA-LAMUNDA, TIERRADURA-PADILLA DEL MUNICIPIO DE MIRANDA CAUCA			FECHA DE INICIO:																																						
KM A MEJORAR: 0.6 KM			OTROS: FILTROS																																						
CONTRATO DE OBRA: CONTRATISTA: DRC INGENIERÍA SAS INTEGRANTES: CONTRATO No. 522 DE 2021 VALOR INICIAL: \$ 867.038.664,00 PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ 867.038.664,00 PLAZO ACUMULADO: 31/12/2021 VALOR ACUMULADO: \$ 867.038.664,00			CONTRATO DE INTERVENTORÍA: INTERVENTOR: ARA INGENIERÍA SAS INTEGRANTES: CONTRATO No. 1643-2021 VALOR INICIAL: \$ 645.953.947,00 PLAZO INICIAL: 31/12/2021 ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947,00 PLAZO ACUMULADO: 30/06/2022 VALOR ACUMULADO: \$ 645.953.947,00																																						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>20XX</th> <th>20XX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ -</td> <td>\$ 867.038.664</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table> (Indicar valores en pesos) OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 867.038.664,00 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - AVANCE DE OBRA EN % (B/A): % OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ - PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ - (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) INTERVENTORÍA EJECUTADO ACUMULADO: \$ - PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"><tr><td>SI</td><td>NO</td></tr><tr><td></td><td>X</td></tr></table> MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____ PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ - (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)						VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 867.038.664	\$ -	\$ -	EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	SI	NO		X	SI	NO		X													
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX																																					
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 867.038.664	\$ -	\$ -																																					
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																					
SI	NO																																								
	X																																								
SI	NO																																								
	X																																								
III. AVANCE FÍSICO																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACUMULADO PROYECTO</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S):</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km):</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>KM MANTENIDOS (Km):</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>KM BASE/SUBBASE (Km):</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>KM PAVIMENTADOS (Km):</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>PUENTES (Un):</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table> Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____						ACUMULADO PROYECTO				TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			0	KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			0	KM MANTENIDOS (Km):			0	KM BASE/SUBBASE (Km):			0	KM PAVIMENTADOS (Km):			0	PUENTES (Un):			0	OTROS			0
ACUMULADO PROYECTO																																									
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL																																						
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			0																																						
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			0																																						
KM MANTENIDOS (Km):			0																																						
KM BASE/SUBBASE (Km):			0																																						
KM PAVIMENTADOS (Km):			0																																						
PUENTES (Un):			0																																						
OTROS			0																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">MAQUINARIA Y EQUIPOS</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S):</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Planta de concreto asfáltico</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Planta de trituración:</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Motoveladoras:</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Retrocargadores:</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Vibrocompactadores:</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Volquetas:</td><td></td><td>0</td><td>0</td></tr> <tr><td>Otros:</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>						MAQUINARIA Y EQUIPOS				TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	Planta de concreto asfáltico			0	Planta de trituración:		0	0	Motoveladoras:		0	0	Retrocargadores:		0	0	Vibrocompactadores:		0	0	Volquetas:		0	0	Otros:			0
MAQUINARIA Y EQUIPOS																																									
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL																																						
Planta de concreto asfáltico			0																																						
Planta de trituración:		0	0																																						
Motoveladoras:		0	0																																						
Retrocargadores:		0	0																																						
Vibrocompactadores:		0	0																																						
Volquetas:		0	0																																						
Otros:			0																																						
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2">FUENTES DE MATERIALES</th> <th colspan="2">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>UBICACIÓN: _____</td> <td>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</td> <td>ZONAS DE DEPOSITO: SI _____ NO _____</td> <td>N/A _____</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN: _____</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</td> <td>N/A _____</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN: _____</td> <td>PERMISO MINERO: SI _____ NO _____</td> <td>APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____</td> <td>N/A _____</td> </tr> <tr> <td>UBICACIÓN: _____</td> <td>LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____</td> <td>CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____</td> <td>N/A _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____</td> <td>N/A _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>VERTIENTES: SI _____ NO _____</td> <td>N/A _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>EMISIONES: SI _____ NO _____</td> <td>N/A _____</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td>OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____</td> <td>N/A _____</td> </tr> </tbody> </table> OBSERVACIONES: _____						FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL		UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO: SI _____ NO _____	N/A _____	UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	N/A _____	UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____	N/A _____	UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____	N/A _____			OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____	N/A _____			VERTIENTES: SI _____ NO _____	N/A _____			EMISIONES: SI _____ NO _____	N/A _____			OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____	N/A _____
FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																							
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	ZONAS DE DEPOSITO: SI _____ NO _____	N/A _____																																						
UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	N/A _____																																						
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI _____ NO _____	N/A _____																																						
UBICACIÓN: _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	CONCESIÓN DE AGUAS: SI _____ NO _____	N/A _____																																						
		OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI _____ NO _____	N/A _____																																						
		VERTIENTES: SI _____ NO _____	N/A _____																																						
		EMISIONES: SI _____ NO _____	N/A _____																																						
		OTROS (Especificar cual): SI _____ NO _____	N/A _____																																						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO: _____ OBSERVACIONES: _____																																									
V. GESTIÓN PREDIAL																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____</td> <td>OBSERVACIONES: _____</td> </tr> <tr> <td>FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____</td> <td></td> </tr> <tr> <td>AVALÚOS APROBADOS: 0</td> <td></td> </tr> <tr> <td>PREDIOS ADQUIRIDOS: 0</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____	OBSERVACIONES: _____	FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____		AVALÚOS APROBADOS: 0		PREDIOS ADQUIRIDOS: 0																													
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____	OBSERVACIONES: _____																																								
FICHAS PREDIALES APROBADAS: _____																																									
AVALÚOS APROBADOS: 0																																									
PREDIOS ADQUIRIDOS: 0																																									
VI. GESTIÓN SOCIAL																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____</td> <td>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____</td> <td rowspan="4" style="vertical-align: top;">OBSERVACIONES: _____</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____</td> <td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____</td> </tr> <tr> <td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____</td> <td>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____</td> </tr> <tr> <td>OTROS: _____</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____	OBSERVACIONES: _____	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____	OTROS: _____																												
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____	OBSERVACIONES: _____																																							
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____																																								
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____																																								
OTROS: _____																																									
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																									
PARA EL PERIODO EN MENCIÓN EL CONTRATO NO CUENTA CON ACTA DE INICIO, EL MUNICIPIO SUSCRIBIÓ OTRO SI MODIFICATORIO PARA PRORROGAR EL PLAZO DEL CNTRATO POR 6 MESES A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO																																									
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																									
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																									
ruta No. _____ PR 0+0000 _____ PR N+0000 _____ El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																									
X. REGISTRO FOTOGRÁFICO																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 33%; text-align: center;">FOTO 1</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">FOTO 2</td> <td style="width: 33%; text-align: center;">FOTO 3</td> </tr> <tr> <td style="text-align: center;">Indicar localización y actividad</td> <td style="text-align: center;">Indicar localización y actividad</td> <td style="text-align: center;">Indicar localización y actividad</td> </tr> </tbody> </table>						FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad																														
FOTO 1	FOTO 2	FOTO 3																																							
Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad	Indicar localización y actividad																																							
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor. XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA LA INTERVENTORÍA SE ENCUENTRA EN LA TAREA DE RECOPIRAR INFORMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN LLEVADO A CABO POR EL MUNICIPIO																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tbody> <tr> <td style="width: 60%;">FIRMA: _____</td> <td style="width: 40%;">NOMBRE: _____</td> </tr> <tr> <td>NO. MAT: _____</td> <td>NO. MAT: _____</td> </tr> </tbody> </table> DIRECTOR DE INTERVENTORÍA JOSE ALBERTO ROJAS PRIETO 2520245905 CND Inviap - Gestión Pública con Calidad						FIRMA: _____	NOMBRE: _____	NO. MAT: _____	NO. MAT: _____																																
FIRMA: _____	NOMBRE: _____																																								
NO. MAT: _____	NO. MAT: _____																																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CODIGO MINFRA-MN-IN-15-FR-2
			VERSIÓN 1
			PÁGINA DE

	FECHA	3	1	2022
	(Día)	(Mes)	(Año)	

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO/CARRETERA: CORREDOR PRODUCTIVO PLAYA RICA-ALEJANDRIA-LA CHORRERA-EL SECRTEO-EL DIVISO-CARMELITA-LIM.MORALES TRAMO Y/O SECTOR(S): VEREDA PLAYA RICA

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA SEMANA No.: 2 del 25/12/2021 al 2/01/2022

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES

OBJETO CONTRATO DE OBRA: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL EN EL MUNICIPIO DE SUÁREZ CAUCA FECHA DE INICIO: _____

KM A MEJORAR: 0,7 KM KM A REHABILITAR: _____ KM A CONSTRUIR: _____ No. PUENTES: _____ OTROS: ALCANTARILLAS

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO VÍAS RURALES 2022</u>				INTERVENTOR: <u>ARA INGENIERÍA SAS</u>			
INTEGRANTES: <u>2 DISEÑO E INGENIERIA INDUSTRIAL EU 10% - SERVICIOS AMBIENTALES Y SOCIALES INTEGRADOS S</u>				INTEGRANTES: _____			
CONTRATO No. <u>214 DE 2021</u>		VALOR INICIAL: <u>\$ 1.000.000.000,00</u>		CONTRATO No. <u>1643-2021</u>		VALOR INICIAL: <u>\$ 645.953.947,00</u>	
PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>		ADICIONES: <u>\$ -</u>		PLAZO INICIAL: <u>31/12/2021</u>		ADICIONES: <u>\$ -</u>	
PLAZO ACUMULADO: <u>31/12/2021</u>		VALOR ACUMULADO: <u>\$ 1.000.000.000,00</u>		PLAZO ACUMULADO: <u>30/06/2022</u>		VALOR ACUMULADO: <u>\$ 645.953.947,00</u>	

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ 1.000.000.000	\$ -	\$ -
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

(Indicar valores en pesos)

OBRA

VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 1.000.000.000,00

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ -

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ -

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): %

OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ -

(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)

TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -

PRESENTE FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

INTERVENTORIA

EJECUTADO ACUMULADO: \$ -

PRESENTE FACTURA EN EL MES ANTERIOR:

SI	NO
	X

MES FACTURADO: _____ VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA: _____

PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ -

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

III. AVANCE FÍSICO

ACUMULADO PROYECTO			
TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			0
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			0
KM MANTENIDOS (Km):			0
KM BASE/SUBBASE (Km):			0
KM PAVIMENTADOS (Km):			0
PUENTES (Un):			0
OTROS:			0

Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el

TRAMO Y/O SECTOR 1: _____ TRAMO Y/O SECTOR 2: _____

MAQUINARIA Y EQUIPOS

TRAMO Y/O SECTOR(S)	1	2	TOTAL
Planta de concreto asfáltico			0
Planta de trituración:		0	0
Motoniveladoras:		0	0
Retrocargadores:		0	0
Vibrocompactadores:		0	0
Volquetes:		0	0
Otros:			0

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL	
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____
UBICACIÓN: _____	PERMISO MINERO: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____	LICENCIA AMBIENTAL: SI _____ NO _____

OBSERVACIONES: _____

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: _____

OBSERVACIONES: _____

V. GESTIÓN PREDIAL

TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: _____

FICHAS PREDIALES APROBADAS: 0

AVALUOS APROBADOS: 0

PREDIOS ADQUIRIDOS: 0

OBSERVACIONES: _____

VI. GESTIÓN SOCIAL

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: _____

EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: _____

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: _____

OTROS: _____

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: _____

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: _____

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: _____

OBSERVACIONES: _____

VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

PARA EL PERÍODO EN MENCIÓN EL CONTRATO NO CUENTA CON ACTA DE INICIO, EL MUNICIPIO SUSCRIBIÓ ADICIÓN No.1 AL CONTRATO DE OBRA EL DÍA 28 DE DICIEMBRE PARA ADICIÓN DEL PLAZO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2022

VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO

ruta No. _____

PR 0+0000 _____ PR N+0000 _____

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.

X. REGISTRO FOTOGRÁFICO

FOTO 1 Indicar localización y actividad	FOTO 2 Indicar localización y actividad	FOTO 3 Indicar localización y actividad
---	---	---

XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

LA INTERVENTORIA SE ENCUENTRA EN LA TAREA DE RECOPIRAR INFORMACIÓN DEL PROCESO DE SELECCIÓN LLEVADO A CABO POR EL MUNICIPIO

FIRMA: _____

NOMBRE: JUAN ALBERTO ROJAS PRIETO

No. MAT: 2520245905 CND

Institución - Gestión Pública con Calidad

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-15-FR-2																																					
			VERSION	1																																					
			PÁGINA																																						
			FECHA																																						
			(Día) 3 (Mes) 1 (Año) 2022																																						
I. INFORMACIÓN GENERAL																																									
PROYECTO/CARRETERA: MUNICIPIO DE GUACHENÉ			TRAMO Y/O SECTOR(S):																																						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAUCA			SEMANA No.: 2 del 25/12/2021 al 2/01/2022																																						
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: ING. JORGE ALONSO ORTEGA			GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: ING. JUAN CAMILO CÁCERES																																						
OBJETO CONTRATO DE OBRA:			FECHA DE INICIO:																																						
KM A MEJORAR:		KM A REHABILITAR:	KM A CONSTRUIR:	No. PUENTES:	OTROS:																																				
CONTRATO DE OBRA:			CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																						
CONTRATISTA:			INTERVENTOR: ARA INGENIERIA SAS																																						
INTEGRANTES:			INTEGRANTES:																																						
CONTRATO No. VALOR INICIAL:			CONTRATO No. VALOR INICIAL:																																						
PLAZO INICIAL: ADICIONES: \$			PLAZO INICIAL: ADICIONES: \$																																						
PLAZO ACUMULADO: VALOR ACUMULADO: \$			PLAZO ACUMULADO: VALOR ACUMULADO: \$																																						
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																									
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th>VIGENCIA</th> <th>2021</th> <th>2022</th> <th>20XX</th> <th>20XX</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>RECURSOS POR VIGENCIA</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> <tr> <td>EJECUTADO</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> <td>\$ -</td> </tr> </tbody> </table> (Indicar valores en pesos)						VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																					
VIGENCIA	2021	2022	20XX	20XX																																					
RECURSOS POR VIGENCIA	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																					
EJECUTADO	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -																																					
OBRA			INTERVENTORIA																																						
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ - INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ - INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ - AVANCE DE OBRA EN % (B/A): % OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ - (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ -			EJECUTADO ACUMULADO: \$ - PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>SI</td><td>NO</td></tr> <tr><td></td><td>X</td></tr> </table>			SI	NO		X																																
SI	NO																																								
	X																																								
PRESENTO FACTURA EN EL MES ANTERIOR: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>SI</td><td>NO</td></tr> <tr><td></td><td>X</td></tr> </table>			SI	NO		X	MES FACTURADO: <table border="1" style="display: inline-table; vertical-align: middle;"> <tr><td>SI</td><td>NO</td></tr> <tr><td></td><td>X</td></tr> </table>			SI	NO		X																												
SI	NO																																								
	X																																								
SI	NO																																								
	X																																								
MES FACTURADO: VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA:			MES FACTURADO: VALOR FACTURA: \$ - FECHA FACTURA:																																						
PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF-NACION: \$ -			PAGOS ACUMULADOS REPORTE SIIF NACION: \$ -																																						
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																						
III. AVANCE FÍSICO																																									
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACUMULADO PROYECTO</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S):</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>KM CON OBRAS DE ARTE (Km):</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>KM MANTENIDOS (Km):</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>KM BASES/PIBRAS (Km):</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>KM PAVIMENTADOS (Km):</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>PUENTES (Un):</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>OTROS</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table> Los conceptos para determinar el avance físico serán definidos por el						ACUMULADO PROYECTO				TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			0	KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			0	KM MANTENIDOS (Km):			0	KM BASES/PIBRAS (Km):			0	KM PAVIMENTADOS (Km):			0	PUENTES (Un):			0	OTROS			0
ACUMULADO PROYECTO																																									
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL																																						
ESTUDIOS Y DISEÑOS (%):			0																																						
KM CON OBRAS DE ARTE (Km):			0																																						
KM MANTENIDOS (Km):			0																																						
KM BASES/PIBRAS (Km):			0																																						
KM PAVIMENTADOS (Km):			0																																						
PUENTES (Un):			0																																						
OTROS			0																																						
<table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="4">MAQUINARIA Y EQUIPOS</th> </tr> <tr> <th>TRAMO Y/O SECTOR(S):</th> <th>1</th> <th>2</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>Planta de concreto asfáltico</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Planta de trituración:</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Motorveladores:</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Petrocargadores:</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Vibrocompactadores:</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Volquetas:</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> <tr><td>Otros:</td><td></td><td></td><td>0</td></tr> </tbody> </table>						MAQUINARIA Y EQUIPOS				TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL	Planta de concreto asfáltico			0	Planta de trituración:			0	Motorveladores:			0	Petrocargadores:			0	Vibrocompactadores:			0	Volquetas:			0	Otros:			0
MAQUINARIA Y EQUIPOS																																									
TRAMO Y/O SECTOR(S):	1	2	TOTAL																																						
Planta de concreto asfáltico			0																																						
Planta de trituración:			0																																						
Motorveladores:			0																																						
Petrocargadores:			0																																						
Vibrocompactadores:			0																																						
Volquetas:			0																																						
Otros:			0																																						
TRAMO Y/O SECTOR 1: TRAMO Y/O SECTOR 2:																																									
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																									
FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO UBICACIÓN: PERMISO MINERO: SI NO LICENCIA AMBIENTAL: SI NO OBSERVACIONES:			PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A OCUPACIÓN DE CAUCES: SI NO N/A VERTIENTES: SI NO N/A EMISIONES: SI NO N/A OTROS (Especificar cual) SI NO N/A OBSERVACIONES:																																						
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL) ESTADO:			OBSERVACIONES:																																						
V. GESTIÓN PREDIAL																																									
TOTAL PREDIOS A ADQUIRIR: FICHAS PREDIALES APROBADAS: AVALUOS APROBADOS: PREDIOS ADQUIRIDOS:			OBSERVACIONES:																																						
VI. GESTIÓN SOCIAL																																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: OTROS:			No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:																																						
			OBSERVACIONES:																																						
VII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA																																									
POR MEDIO DE RESOLUCIÓN No.510 DEL 22 DE NOVIEMBRE DE 2021 EL MUNICIPIO DE GUACHENÉ REVOCA EL ACTO DE APERTURA DEL PROCESO DE LICITACIÓN LP-007-2021, TENIENDO EN CUENTA QUE LA MATRIZ DE EXPERIENCIA EXIGIDA EN EL PROCESO NO CORRESPONDÍA AL PRESUPUESTO OFICIAL																																									
VIII. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																																									
IX. ESQUEMA GRÁFICO ALCANCE DEL CONTRATO																																									
RUTA No. PR 0+0000 PR N-0000 El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con el alcance del contrato de obra.																																									
X. REGISTRO FOTOGRAFICO																																									
FOTO 1		FOTO 2		FOTO 3																																					
Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad		Indicar localización y actividad																																					
NOTA: Las cantidades y valores consignados en el presente reporte, son responsabilidad exclusiva del interventor.			XI. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA																																						
A LA FECHA LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL NO HA INICIADO UN NUEVO PROCESO DE SELECCIÓN PARA LA EJECUCIÓN DEL CONVENIO 2124-2020			DIRECTOR DE INTERVENTORIA FIRMA: NOMBRE: JOSÉ ROBERTO ROJAS PRIETO No. MAT: 2520245905 CND																																						
