



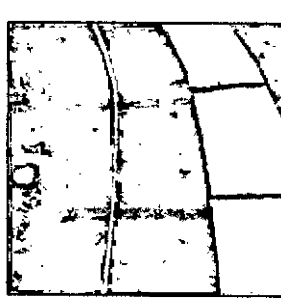
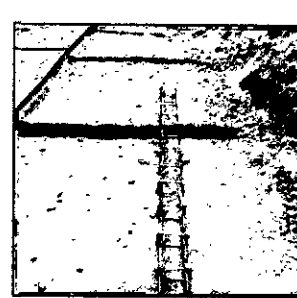



POPAYAN	DIRECCION DE INFRAESTRUCTURA	USOP 7158-1 Unidad 10 W30001																																																													
INFORMACION GENERAL EMPRESA No: 64 18/1/2024 01 24/1/2024 APOYO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO LUIS FELIPE TORRES MELLADO		FECHA: Domingo, 24 de noviembre de 2024 PAGINA 2 de 4																																																													
OBJETO: AMAR ESPERUNDO ENTRE EL MUNICIPIO DE POPAYAN Y LA JUNTA DE ACCION COMUNITARIA DE LA VEREDA LA CALERA PARA LA CONSTRUCCION DE LA PLACA HUELLA EN EL MARCO DEL PROYECTO DENOMINADO: "CONTRIBUCION AL PROGRAMA DE INFRAESTRUCTURA PARA EL MEJORAMIENTO INTEGRAL DE BIENES INMUEBLES Y ESPACIO PUBLICO EN BARRIOS, COLENIAS Y CORRENTONES EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN", DE CONFORMIDAD CON LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DETERMINADAS POR LA ENTIDAD. FECHA DE INICIO: 18 de noviembre de 2024																																																															
CONTRATISTA: REPRESENTANTE: JUNTA DE ACCION COMUNITARIA DE LA CALERA		SUPERVISOR: ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE POPAYAN MUNICIPIO DE POPAYAN BTL 89 Avenida LUIS FELIPE TORRES MELLADO																																																													
CONVENIO No: 7924 (EJECUCION) del 2024 PLAZO INICIAL: 31 de diciembre de 2024 ADICION PLAZO: FECHA INICIO: 28 de noviembre de 2024 FECHA SUSPENSO 1: FECHA RESUMIDO 1: FECHA SUSPENSO 2: FECHA RESUMIDO 2: FECHA TERMINACION: 31 de noviembre de 2024	VALOR APOYAR MUNICIPIO: 1 \$ 86.844.172 VALOR APOYAR DE LA COMUNIDAD: 1 \$ 3.125.628 VA ACUMULADO: 1 \$ 73.718.544 FECHA SUSPENSO 2: FECHA RESUMIDO 2: FECHA SUSPENSO 4: FECHA RESUMIDO 4: PLAZO ACUMULADO: % PLAZO TRANSCURRIDO:																																																														
B. AVANCE FINANCIERO OBRA: INVERSION ACUMULADA ANTERIOR: \$ 34.812.987,88 INVERSION FINANCIERA DE LA SEMANA: \$ 19.296.828,28 INVERSION TOTAL ACUMULADA: \$ 54.109.816,16																																																															
B. AVANCE FISICO <table border="1" style="width:100%; border-collapse: collapse; font-size: 0.7em;"> <thead> <tr> <th colspan="4">ACUMULADO PROYECTO</th> <th colspan="2">MAGNANERIA Y EQUIPOS</th> </tr> <tr> <th>ZONA COMUNITARIA DE LA YUNGA CERRAMIENTO Y PLACA HUELLA</th> <th>PLACA HUELLA</th> <th>TOTAL</th> <th>% AVANCE</th> <th>TRAMO</th> <th>TOTAL</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>VOL. EXCAVACIONES (m3)</td> <td>29,80</td> <td>29,80</td> <td>100,0%</td> <td>Instalacion de obra</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>ACERO DE REFUERZO (kg)</td> <td>874,36</td> <td>874,36</td> <td>100,0%</td> <td>Instalacion de cobo</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CONCRETO ARMADO (m3)</td> <td>10,04</td> <td>10,04</td> <td>100,0%</td> <td>Revoque interior</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CONCRETO CICLOPEO (m3)</td> <td>2,00</td> <td>2,00</td> <td>100,0%</td> <td>Instalacion</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>MATERIAL DE SUBBASE (m3)</td> <td>12,80</td> <td>12,80</td> <td>100,0%</td> <td>Subsuelo</td> <td>3</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Pulsos</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Revoque de cobo</td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>Instalacion de cerchas</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>				ACUMULADO PROYECTO				MAGNANERIA Y EQUIPOS		ZONA COMUNITARIA DE LA YUNGA CERRAMIENTO Y PLACA HUELLA	PLACA HUELLA	TOTAL	% AVANCE	TRAMO	TOTAL	VOL. EXCAVACIONES (m3)	29,80	29,80	100,0%	Instalacion de obra	1	ACERO DE REFUERZO (kg)	874,36	874,36	100,0%	Instalacion de cobo	1	CONCRETO ARMADO (m3)	10,04	10,04	100,0%	Revoque interior	1	CONCRETO CICLOPEO (m3)	2,00	2,00	100,0%	Instalacion	1	MATERIAL DE SUBBASE (m3)	12,80	12,80	100,0%	Subsuelo	3					Pulsos						Revoque de cobo						Instalacion de cerchas	
ACUMULADO PROYECTO				MAGNANERIA Y EQUIPOS																																																											
ZONA COMUNITARIA DE LA YUNGA CERRAMIENTO Y PLACA HUELLA	PLACA HUELLA	TOTAL	% AVANCE	TRAMO	TOTAL																																																										
VOL. EXCAVACIONES (m3)	29,80	29,80	100,0%	Instalacion de obra	1																																																										
ACERO DE REFUERZO (kg)	874,36	874,36	100,0%	Instalacion de cobo	1																																																										
CONCRETO ARMADO (m3)	10,04	10,04	100,0%	Revoque interior	1																																																										
CONCRETO CICLOPEO (m3)	2,00	2,00	100,0%	Instalacion	1																																																										
MATERIAL DE SUBBASE (m3)	12,80	12,80	100,0%	Subsuelo	3																																																										
				Pulsos																																																											
				Revoque de cobo																																																											
				Instalacion de cerchas																																																											
D. GESTION AMBIENTAL FUENTES DE MATERIALES UBICACION: TRITURADO 3/4" - CONEXPE S.A. PERMISO NUMERO 01 X NO ARENA - ARENA DEL PUERTO LICENCIA AMBIENTAL 01 X NO SUBBASE - CONEXPE S.A. LICENCIA AMBIENTAL 01 X NO																																																															
V. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA En la presente semana, se realizo toda la formalidad referente a la obra, posteriormente se realizo la fundicion del concreto ciclopeo y se realizaron las actividades correspondientes al faja, amarrado e instalacion de todo el acero referente a la obra. Asi mismo se realizaron las excavaciones para las vigas riostras.																																																															
VI. REGISTRO FOTOGRAFICO <div style="display: flex; flex-wrap: wrap;"> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>FIGURA 1. Formateo para Ciclopeo</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>FIGURA 2. Acero para viga riostra</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>FIGURA 3. Ciclopeo construido</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  <p>FIGURA 4. Instalacion de Acero para Riostras y Placas</p> </div> <div style="width: 50%; text-align: center;">  </div> </div>																																																															
RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO Y OBSERVACIONES OBSERVACIONES: El contrato se desarrollo en cambio ni falta, satisfaciendo la necesidad de transferir la obra a la comunidad sin provocar el minimo riesgo de cambio. Se atende de manera acata las solicitudes de la comunidad, para garantizar el correcto cumplimiento del componente social dentro de la ejecucion del convenio social.		APOYO TECNICO  NUMERO: LUIS FELIPE TORRES MELLADO No. IDENT: 34607-251907 CAU																																																													

