



Remisiones Manuales
Fiscal

FECHA: Diciembre 03 de 2019

ORIGEN: _____

CLIENTE: cliente OTE

NIT: _____

DIRECCIÓN: _____

PLACA: OTI 610 CONDUCTOR: \$17.000

Nº PEDIDO: _____

OBRA: _____

PRODUCTO: Demolición Sencilla

CÓDIGO OBRA: _____

CANTIDAD: _____

HORA SALIDA: _____

HORA ENTREGA: _____

Nº 5270
DESPACHADO

TELÉFONO: _____



RCD

OBSERVACIONES

Actualización Sistema

DESPACHADOR: Jessica B c.c. 53108247

CONDUCTOR: Carlos Andres Botencia c.c. 79741958

CLIENTE: [Signature] c.c. 79741958

El transportista aceptó el producto en la cantidad descrita en el presente documento

Calle 99 # 9A - 54 Piso 8 - Edificio 100 Street - Tel.: (091) 630 9000 - Bogotá D.C.



Carlos Gutiérrez

Contratista
Cel: 311 444 24 35



0347

Fecha: 3-12-2019

Tipo de Maquinaria: Retiro de 3 Viajes


Sitio de Trabajo: De Escombro.

Empresa: BATALLON- Artilleria - SUR.

Tiempo de Horas Trabajadas

OAI 286


OPERARIO
79741958


CONTRATISTA
1007411253



Remisiones Manuales
Fiscal

FECHA: 03/12/2019

ORIGEN:

CLIENTE: OTC

NIT:

DIRECCIÓN:

PLACA: OAI286

CONDUCTOR:

\$17.000

Nº PEDIDO:

OBRA:

PRODUCTO:

CANTIDAD:

HORA DE SALIDA:

HORA DE ENTRADA:

TN

M³

7

OBSERVACIONES

Actualización de sistema

DESPACHADOR

John Garcia

C.C.

1023922

CONDUCTOR

Carlos Gutierrez

C.C.


11253207

CLIENTE:

C.C.

El transportista aceptó el producto en la cantidad descrita en el presente documento

Calle 99 # 9A - 54 Piso 8 - Edificio 100 street - Tel.: (091) 630 9000 - Bogotá D.C.



Remisiones Manuales
Fiscal

FECHA: 03/12/2019

ORIGEN:

CLIENTE: OTC

NIT:

DIRECCIÓN:

PLACA: OAI286

CONDUCTOR:

\$17.000

Nº PEDIDO:

OBRA:

PRODUCTO:

CANTIDAD:

HORA SALIDA:

HORA ENTREGA:

TELÉFONO:

DESPACHADO

03010-2019

TN

M³

17

CÓDIGO OBRA:

CEMEX RCD

OBSERVACIONES

Actualización de sistema

DESPACHADOR:

John Garcia

C.C.

1023922

CONDUCTOR:

C.C.

CLIENTE:

C.C.

71741-958

El transportista aceptó el producto en la cantidad descrita en el presente documento

Calle 99 # 9A - 54 Piso 8 - Edificio 100 Street - Tel.: (091) 630 9000 - Bogotá D.C.



Remisiones Manuales
Fiscal

FECHA: Diciembre 03 de 2019

ORIGEN: Client

CLIENTE: OTE

NIT:

DIRECCIÓN:

PLACA: OAE286 CONDUCTOR: \$17.000

Nº PEDIDO:

OBRA:

PRODUCTO: Demolición Señala

CANTIDAD:

HORA SALIDA: HORA ENTREGA:



OBSERVACIONES

Actualización Sistema

DESPACHADOR: Jairo B C.C. 53108247

CONDUCTOR: Carlos Gutierrez C.C. 11753707

CLIENTE: C.C. 11222207

El transportista aceptó el producto en la cantidad descrita en el presente documento

Calle 99 # 9A - 54 Piso 8 - Edificio 100 Street - Tel.: (091) 630 9000 - Bogotá D.C.

REMISION / CARTA PORTE



CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 6039000

FECHA 25.10.2019 FOLIO 167703121



EXPEDIDA EN:

CO-ESCOMBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP: 11001000 Bogota CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA A:

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur
BOGOTÁ, D.C. 11
8600025231

OTC ESCOMBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur

CP: BOG BOGOTÁ, D.C., 11, CO

COMPañIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

CONDUCTOR:
VEHICULO :
VIAJE :
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD:

PEDIDO 167703120 ZTA 000010 **PRODUCTO** SERV. DISPOSICIÓN CONCRETOSENCILLO
OC: OAI286 00 17000 Contrato:

CANTIDAD
1.000 EA



NOTAS

ACUSE DE RECIBO

Descripcion	Cantidad	Recibidos	Devueltos
Sacos Rotos			
Sacos Humedos			
Sacos Faltantes			
Fecha por Distancia			
Fecha y Hora llegada			
Fecha y Hora salida			
N° Manifiesto			

NOMBRE

FIRMA

Fecha: 25 10 2019

Hora: 16 18 06

E0JESSICAABN JESSICA ANDREA BENAVIDES

CLIENTE

1 / 1

www.cemexcolombia.com



ORIGINAL

REMISION / CARTA PORTE



CEMEX COLOMBIA, S.A.
Calle 99 No. 9A 54 Piso 8
CO 6039000

FECHA 31.10.2019 FOLIO 167968165



EXPEDIDA EN:

CO-ESCOBRERA-TUNJUELO
Avenida al Llano Sur 72-04
CP. 11001000 Bogota CO

ESTE COMPROBANTE ES EXPEDIDO PARA EL TRANSPORTE

DE MERCANCIA QUE SERÁ FACTURADA A:

OTC ESCOBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur
BOGOTÁ, D.C. 11
8600025231

OTC ESCOBRERA TUNJUELO ZUN675012
Avenida al Llano No. 72-04 Sur

CP. BOG BOGOTÁ, D.C., 11, CO

COMPAÑIA DE TRANSPORTE QUE ENTREGA:

CONDUCTOR:
VEHICULO :
VIAJE :
RANGO DE SELLOS: DE A
RECIBIO DE
CONFORMIDAD:

PEDIDO
167968164 ZTA 000010

OC. OAI286 17000

PRODUCTO
SERV.DISPOSDIURNOCONCRETOSENCILLO

Contrato:

CANTIDAD
1.000 EA

31 OCT 2019



RCD

NOTAS

ACUSE DE RECIBO

Descripcion	Cantidad	Recibidos	Devueltos
Sacos Rotos			
Sacos Humedos			
Sacos Faltantes			
Fecha por Distancia			
Fecha y Hora llegada			
Fecha y Hora salida			
N° Manifiesto			


NOMBRE

FIRMA

Fecha: 31.10.2019

CLIENTE




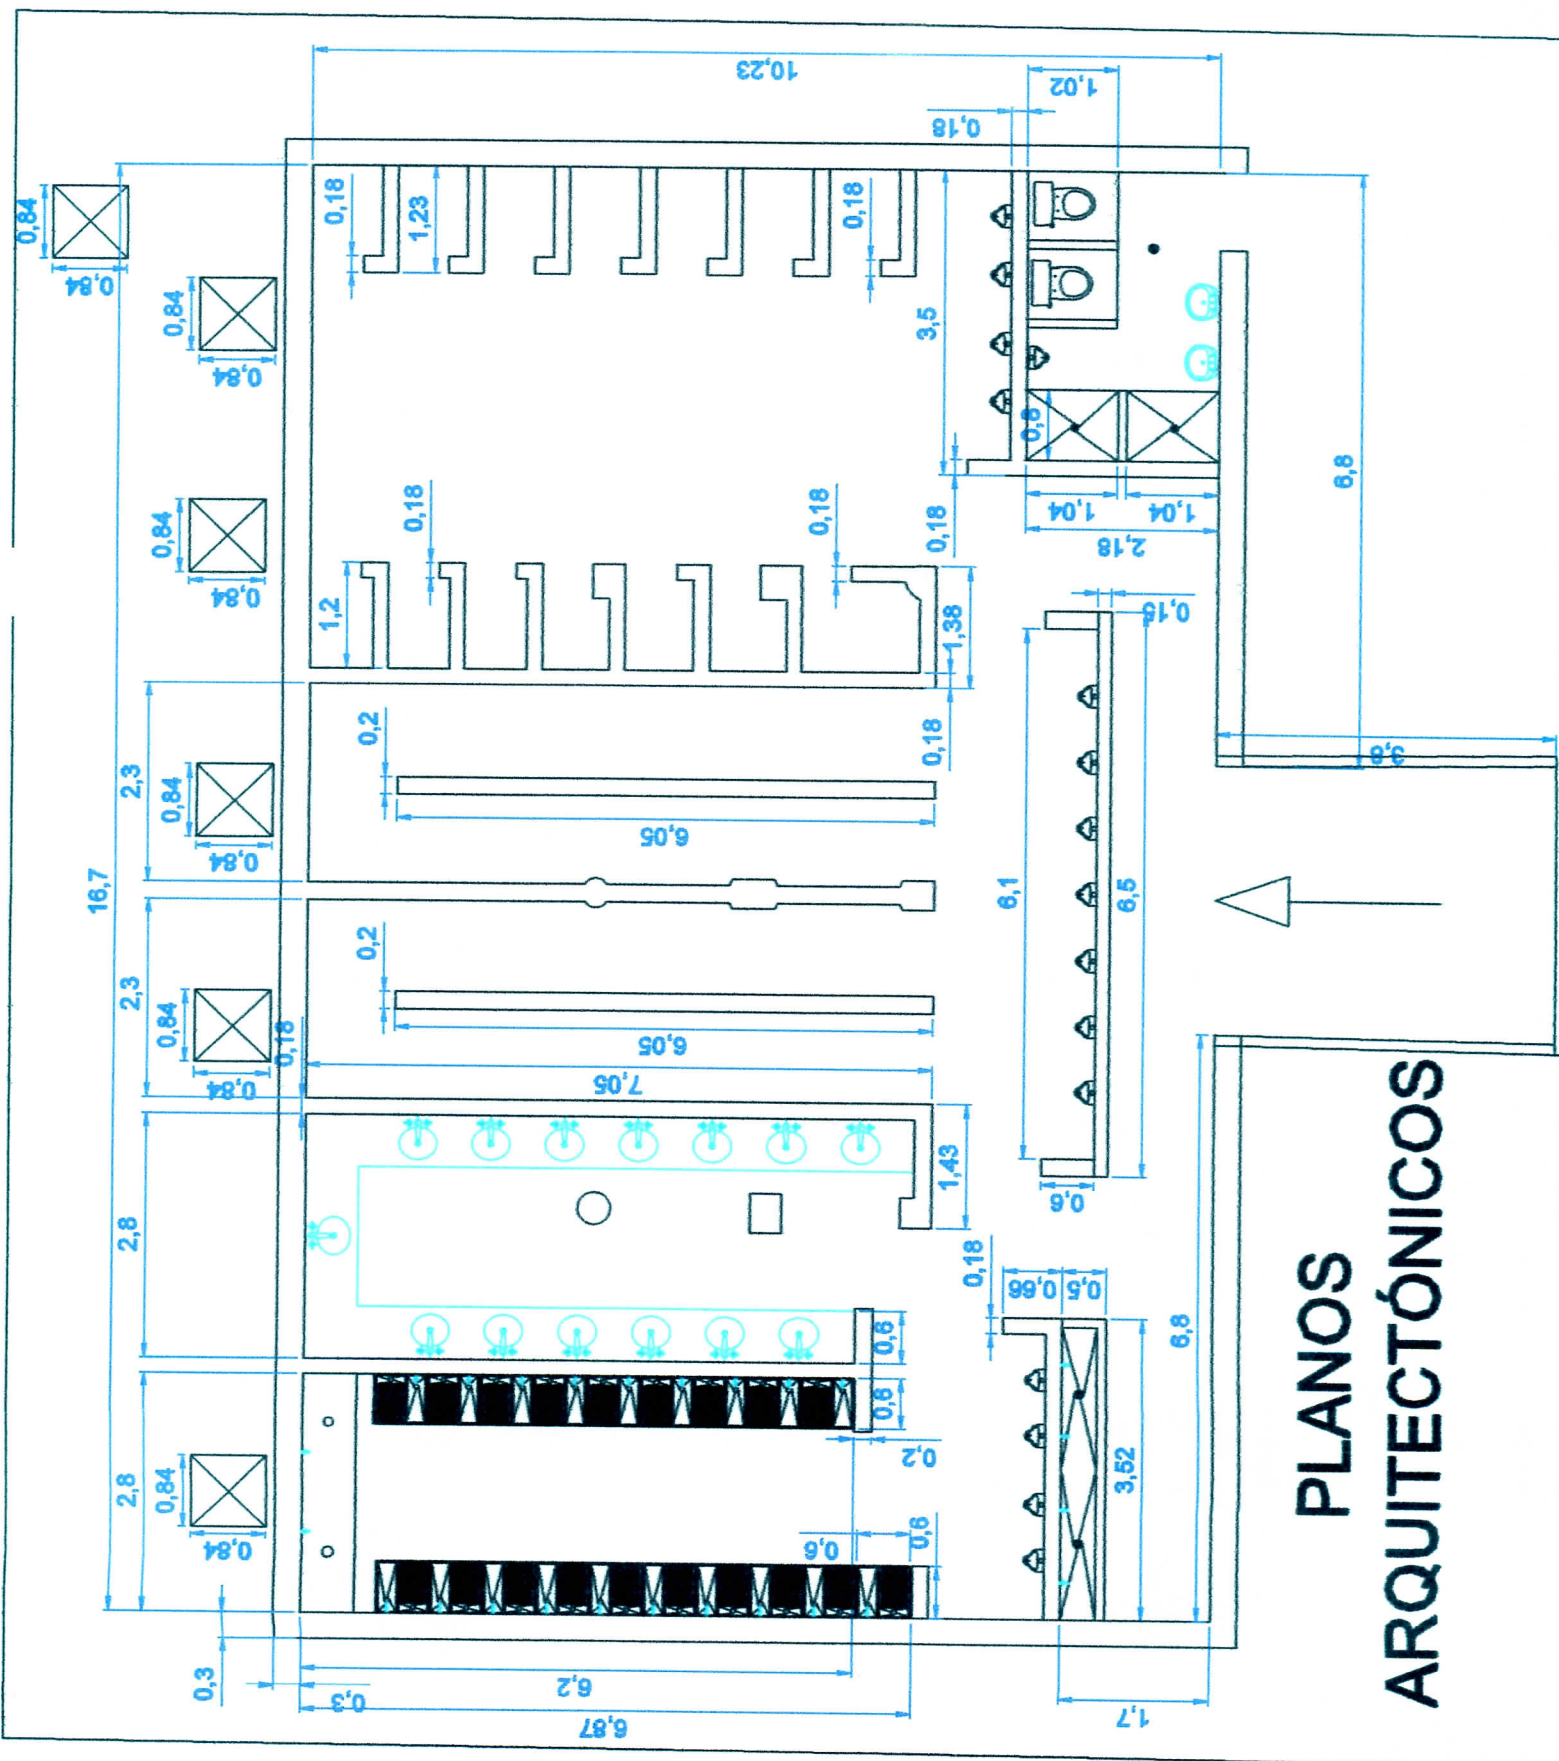

PLANOS ARQUITECTÓNICOS

DISTRIBUCIÓN DE RED HIDRÁULICA


	RED PVC PRESION 1" 1/2"
	RED PVC PRESION 1/2"
	REGISTRO RED WHITE

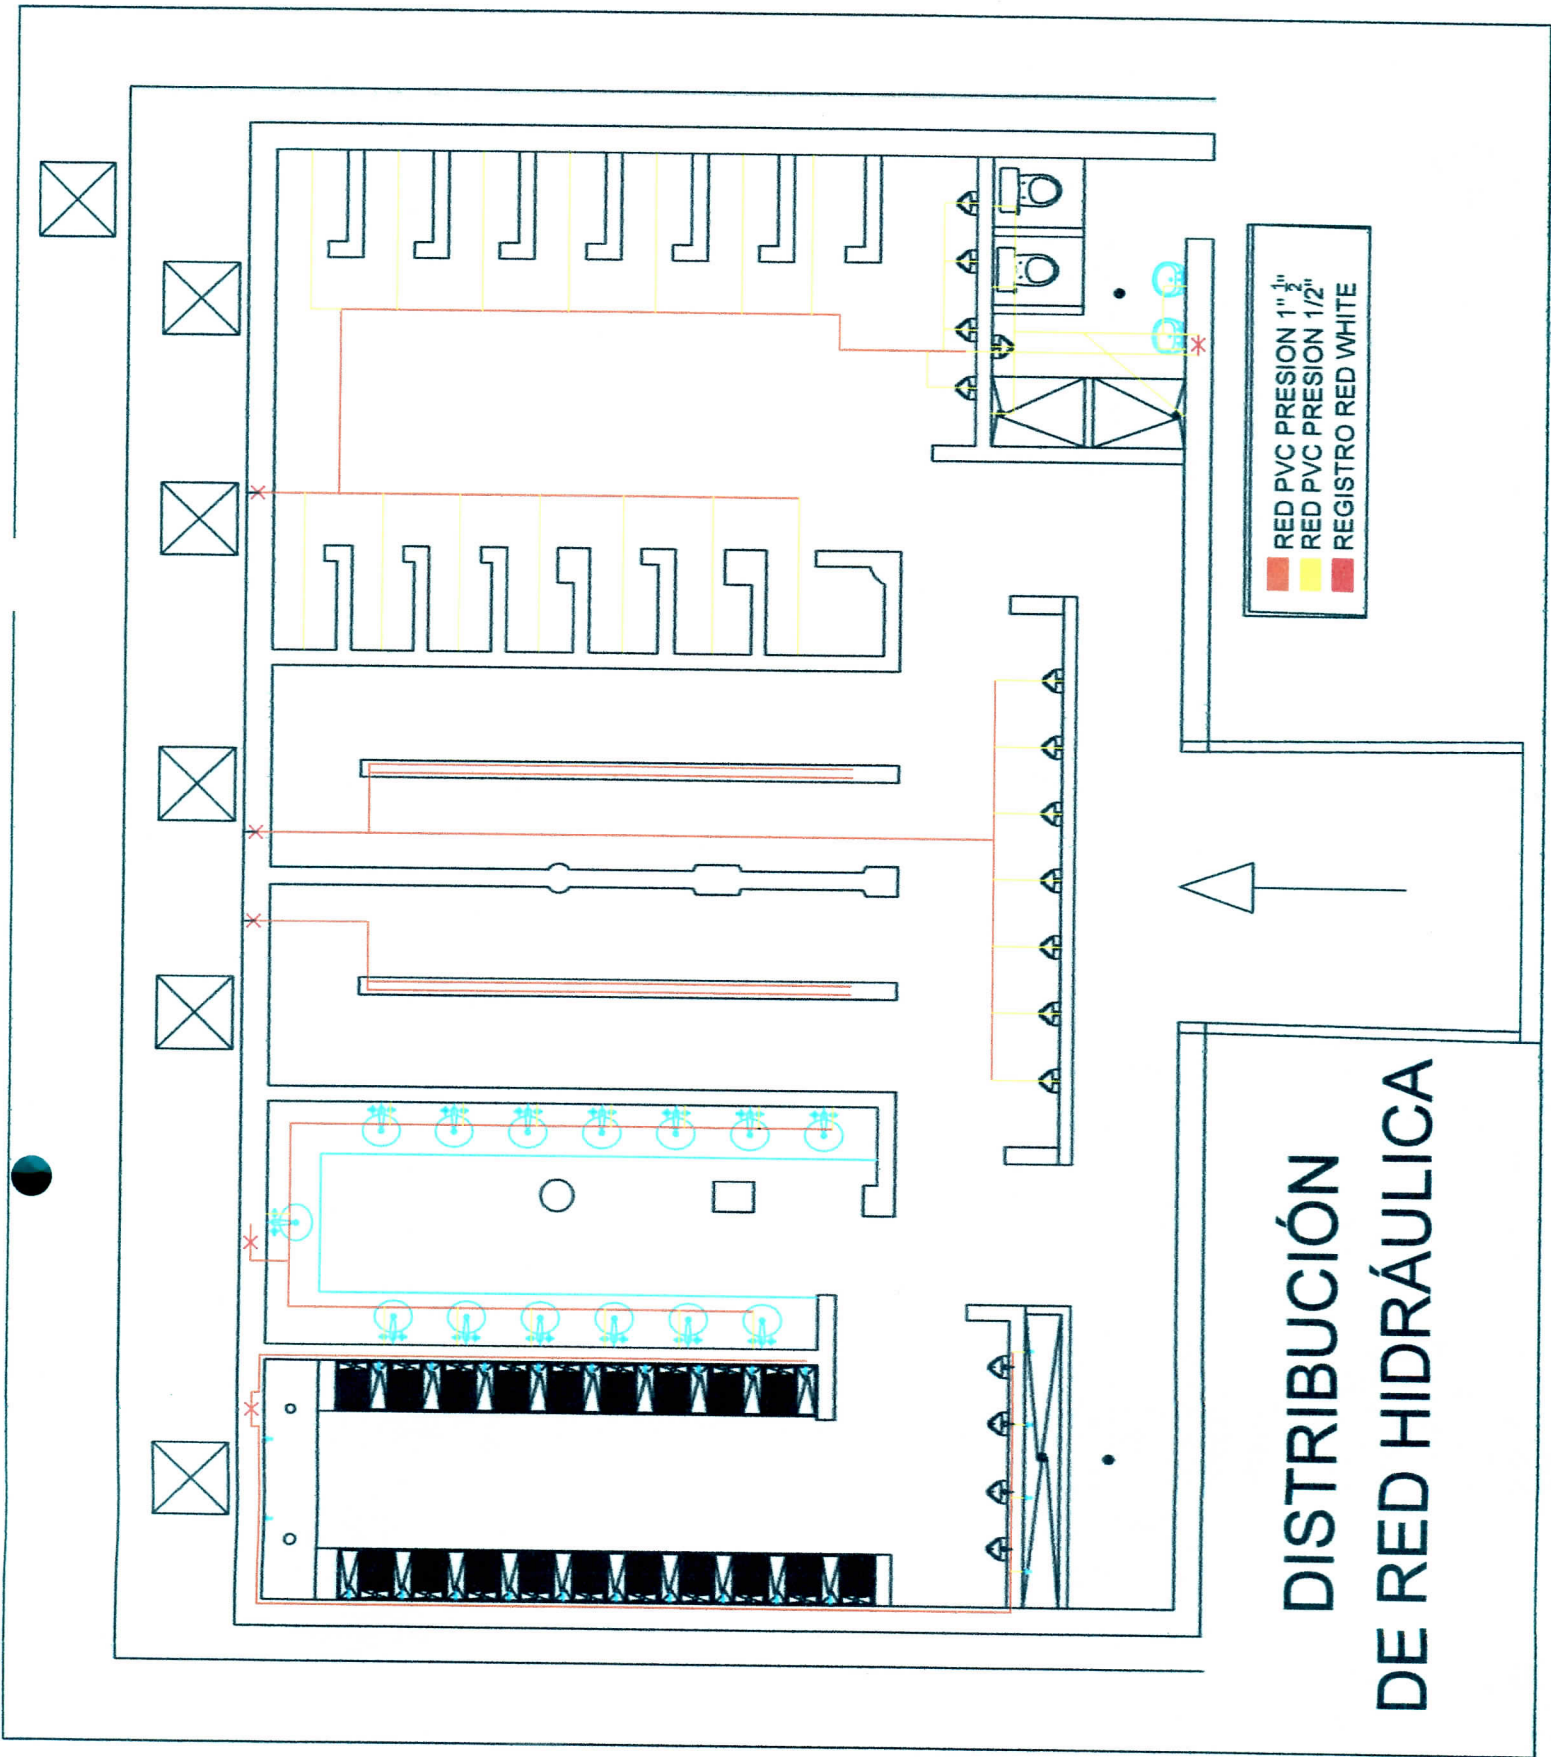


DISTRIBUCIÓN DE RED SANITARIA

- RED PVC SANITARIA DE 2"
- RED PVC SANITARIA DE 3"
- RED PVC SANITARIA DE 4"
- RED PVC SANITARIA DE 6"
- RED PVC SANITARIA DE 8"

Red sanitaria principal de 6" tubería en gris

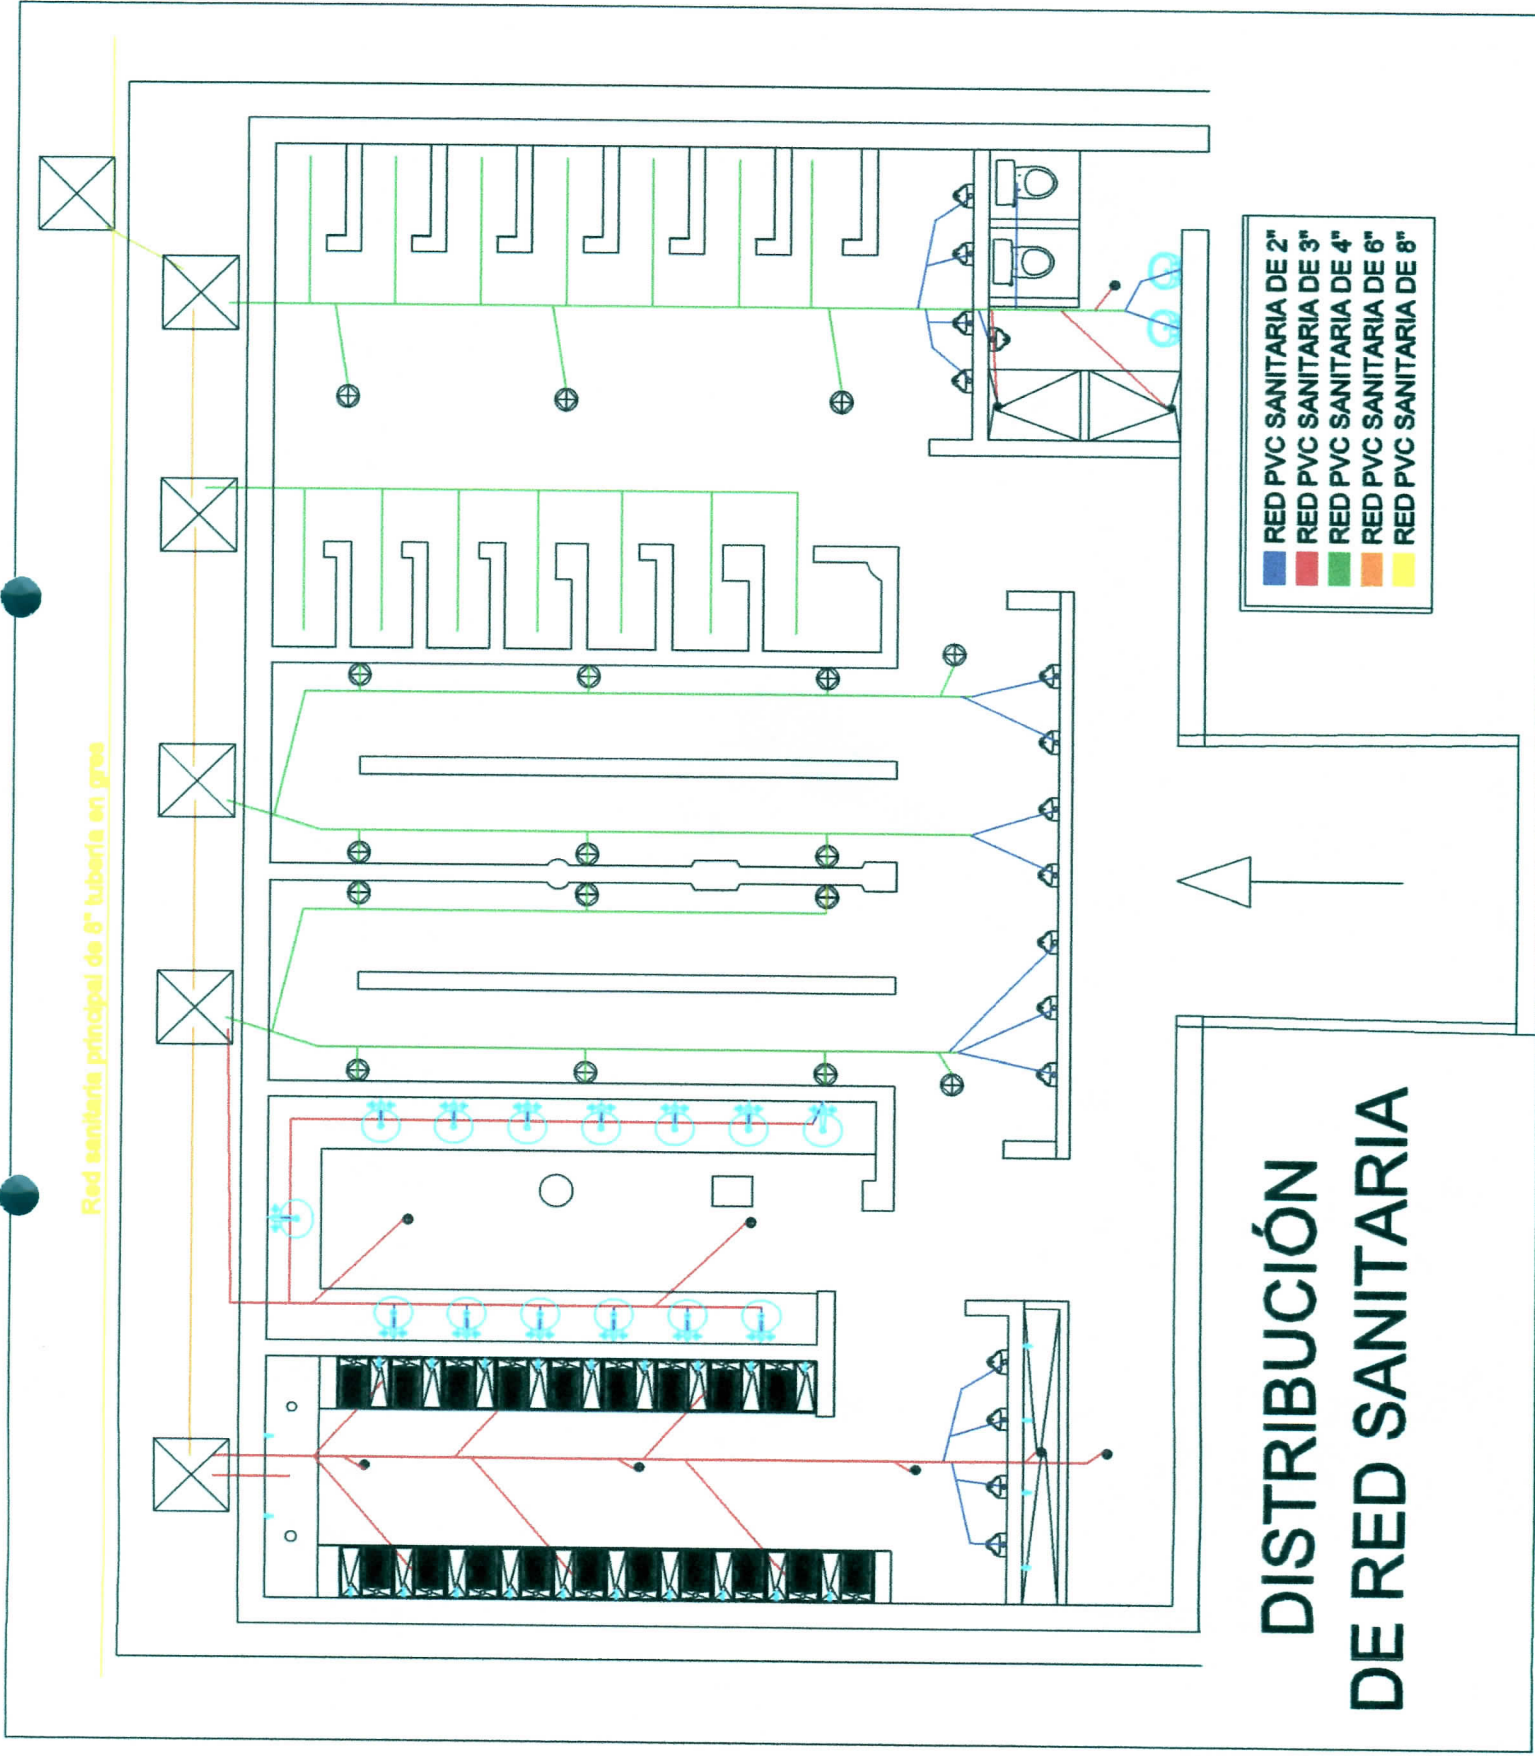

- RED PVC SANITARIA DE 2"
- RED PVC SANITARIA DE 3"
- RED PVC SANITARIA DE 4"

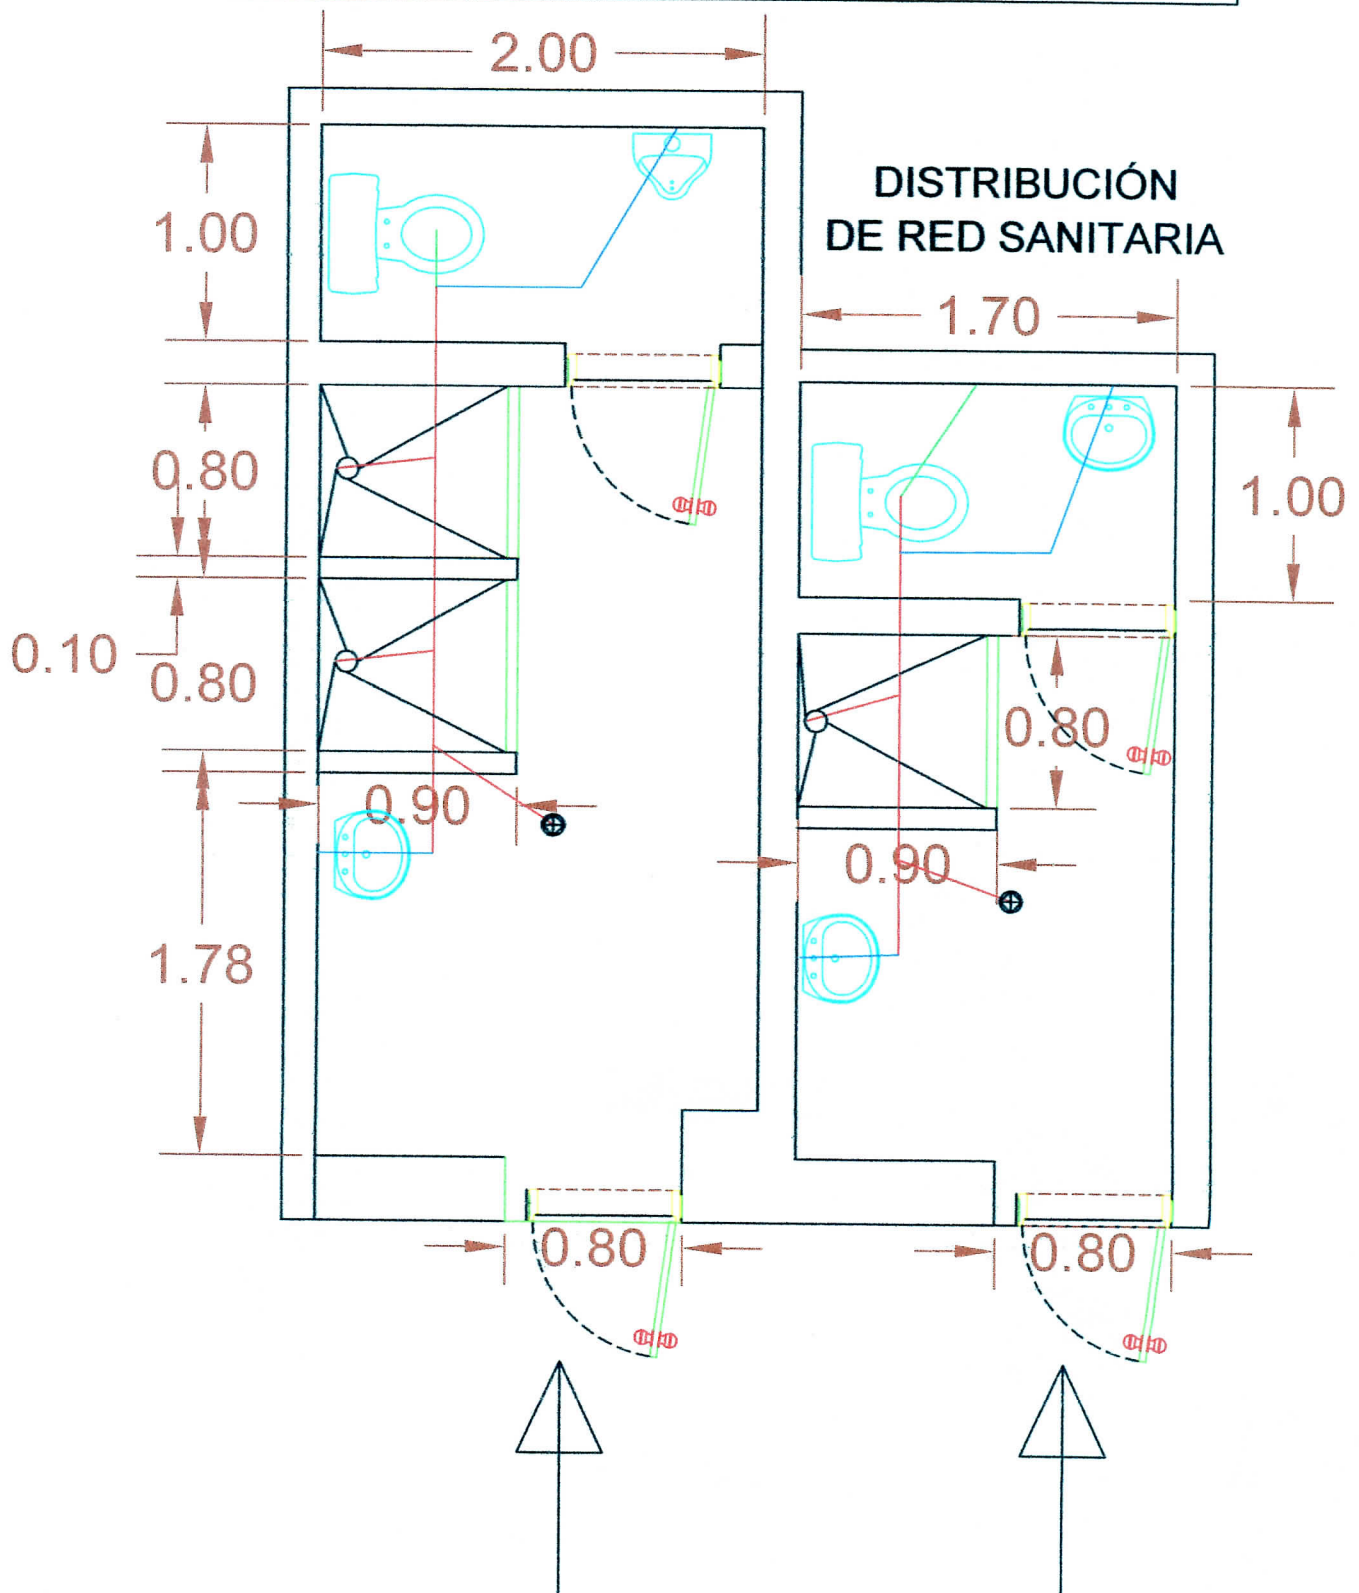





RED PVC PRESION 1/2"



REGISTRO RED WHITE

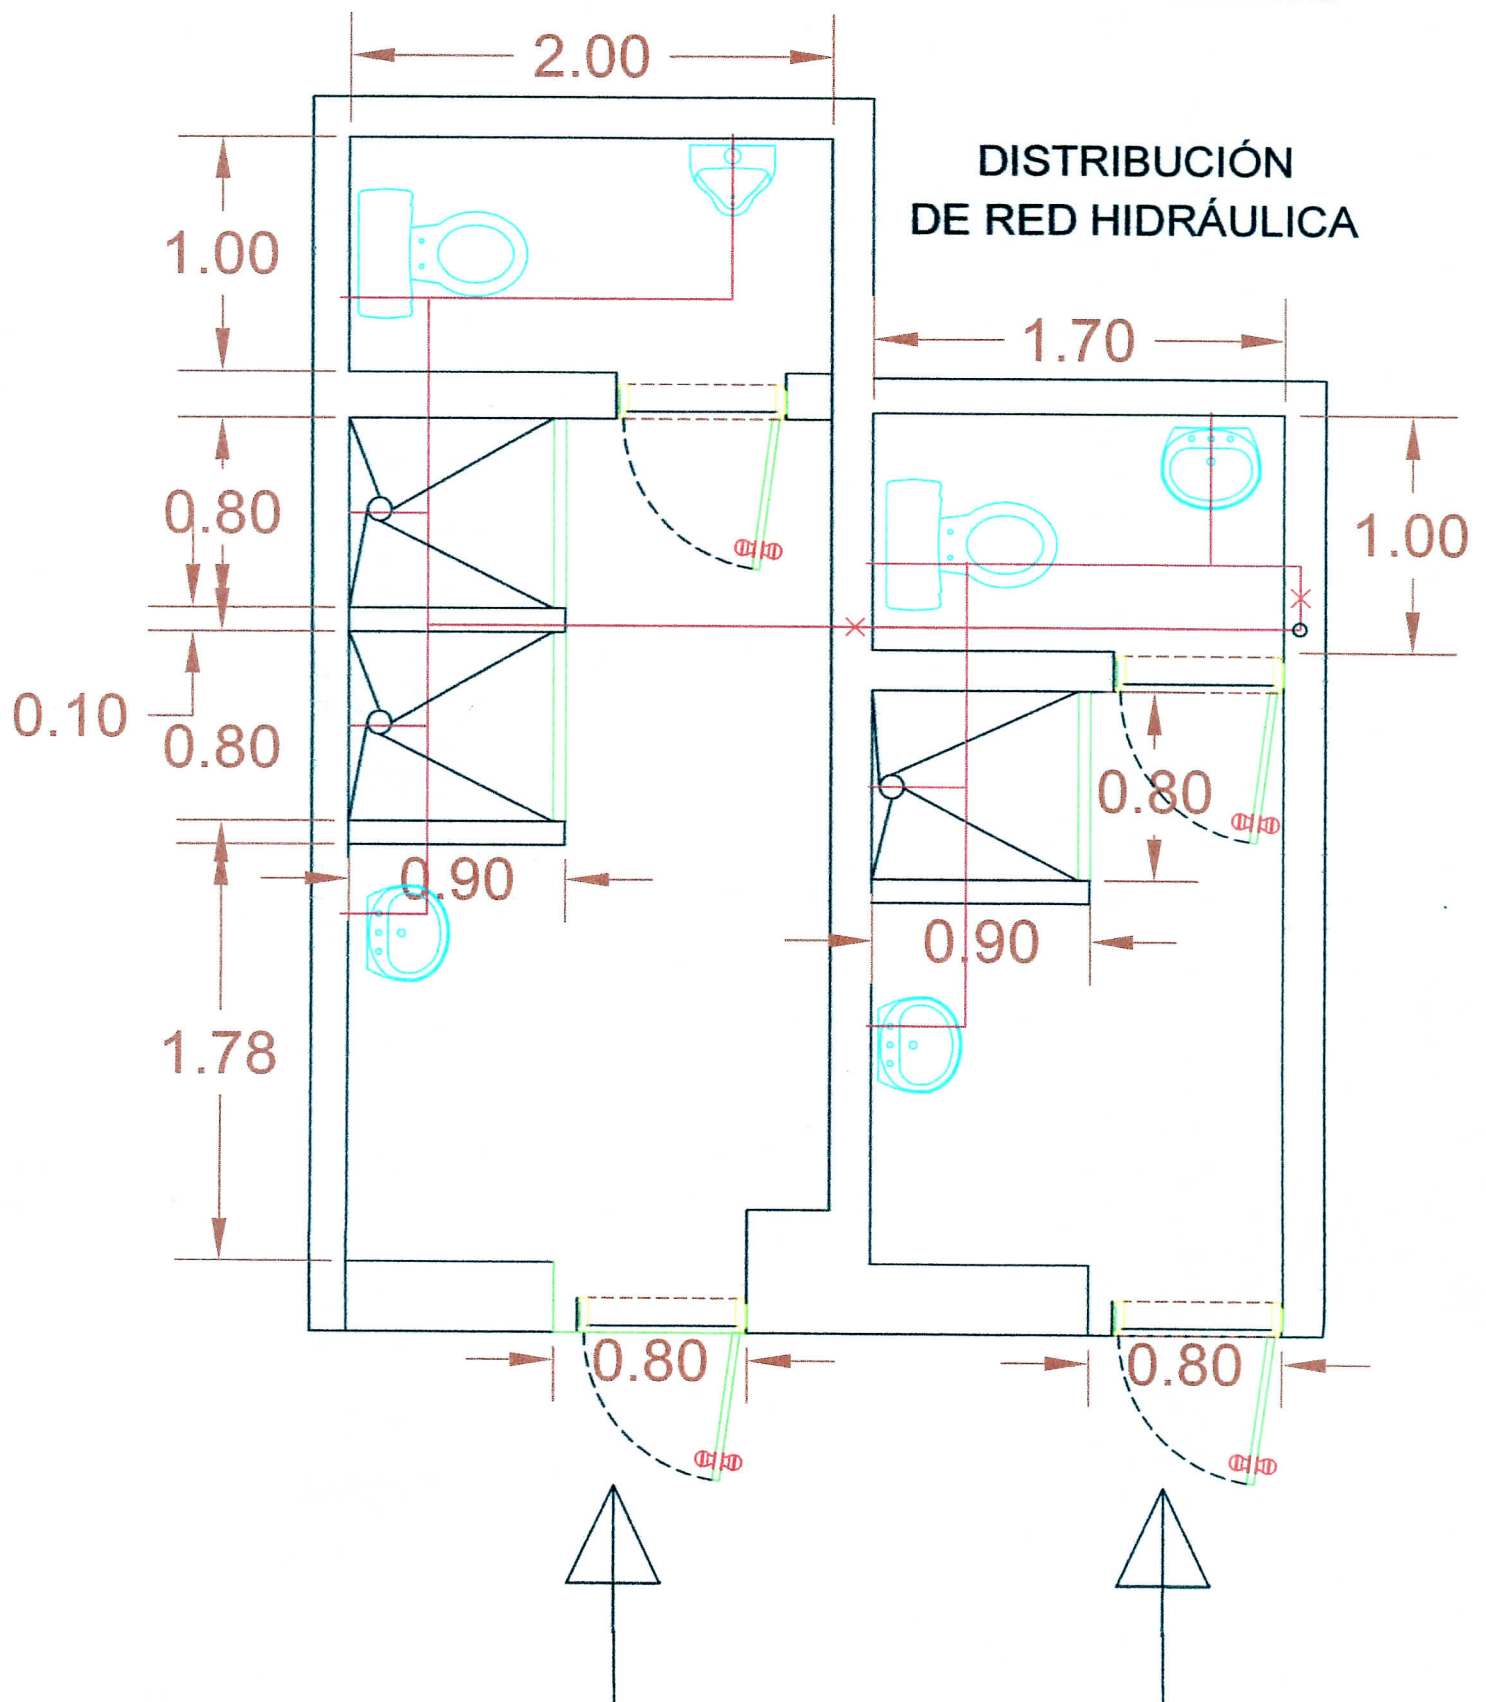

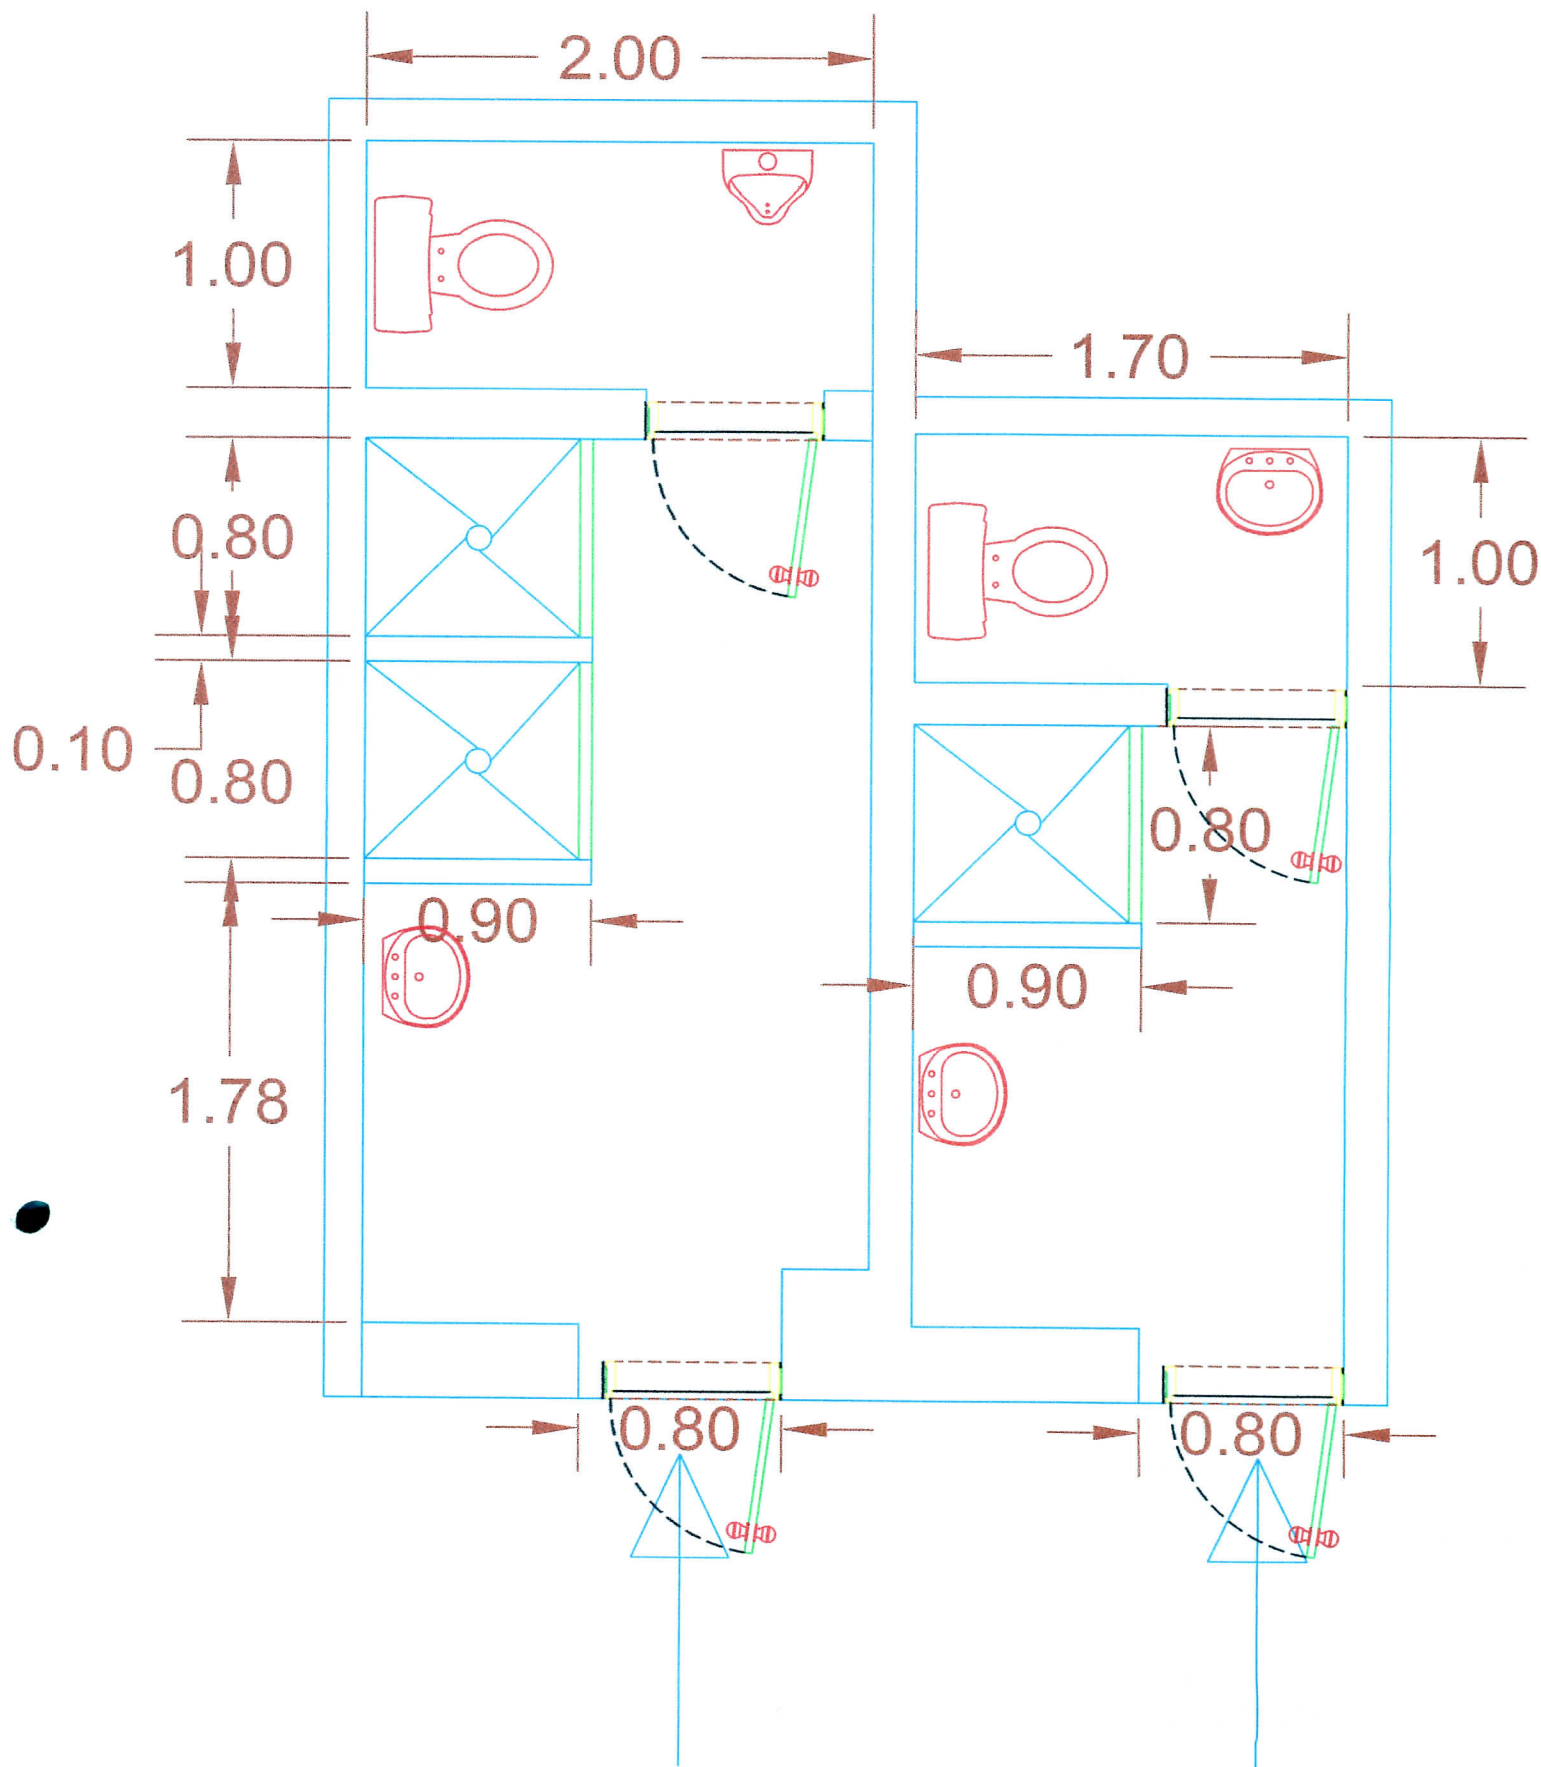

BITÁCORA DE


INTERVENTORÍA

Contrato 179 de 2019
DE OPA.

Oct-10-19. Se inician actividades de intervención de baños de Cantón Sur, el contratista de obra inicia con proceso de delimitación y cierre de área de intervención y demolición de enchape.

La interventoría solicita al contratista documentación e información contractual mediante comunicación SDC-CENAC-CTO-179-2019-001.

Se inician por parte del contratista y la interventoría, proceso de toma de medidas para elaboración de balance de cantidades de obra.



Interventoría


Oct-11-19 El ingreso del personal del contrato de Interventoría y de obra no fue permitido, debido a que por gestiones internas del contratante no fue permitido. Tanto el Contratista como la interventoría manifestó a la entidad Contratante sus inquietudes y solicitó se realizaran las gestiones necesarias para continuar con el desarrollo de las actividades contractuales.




Interventoría.

Oct-21-19 Se reactivan actividades y ejecución contractual en el cantón sur; se continúan con las actividades correspondientes a enchape de muros. La interventoría y el contratista continúan con el proceso de toma de medidas para elaboración de balance de cantidades de obra.

La interventoría solicita nuevamente al contratista de manera verbal la presentación de documentos contractuales para revisión y envío al contratante, estos correspondientes a H.V, APU's, Pólizas, Pagos S.S.





Interventoría



Interventoría

Oct-22-19 Se realiza balance preliminar de cantidades de obra por parte del contratista y la interventoría. La interventoría nuevamente solicita al contratista la presentación de documentación contractual, adicional a la presentación del programa de obra y la propuesta de modificación solicitada por la teniente chacón, para revisión e inicio de actividades de obra en el batallón de Puente aranda. En el cantón sur se continúan con las actividades de demolición de enchape.

 + 
Ing. Civil Olmedo Orozco B.
1007411253



 Interventoría

24-Oct-19. La interventoría solicita al contratista entrega de información y documentación que se entrega a lista continuación =

- APU's cerrados.
- Copia de pólizas.
- Propuesta de modificación Puente Aranda.

Se aprueba por parte de la interventoría pariete de 400 mts², debido al estado del muro para enchape no obstante, no se aprueba ejecución de la actividad hasta tanto el contratista presente APU y sea revisado y aprobado por la interventoría.

Se continúan actividades de demolición de enchape.

 + 
Ing. Civil Olmedo Orozco B.
1007411253

 Interventoría

28-Oct-2019 El día lunes, se realizó comité de avance con el Contratista de Obra, la Interventoría y el Contratante, en donde se manifestaron por parte del Contratista y la Interventoría dudas respecto a los diseños, especificaciones técnicas del contrato; al respecto el Contratante manifestó que haría la solicitud al Comando de Ingenieros; por otra parte, por solicitud del Coronel Díaz se aprueba por parte del

Contratante, cambio de Cobr de enchape de muros y pisos; cambio de estilo del lavadero corrido a Pocetas individuales.


El contratista adquiere compromiso de entrega de cronograma de obra actualizado el día miércoles 30 de octubre de 2019.


Se evidencia en la zona de las nodoras hundimiento de material bajo el piso.

Se propone la ejecución de baños adicionales para Comandantes, por lo tanto se adquirió el compromiso por parte del Contratista de la presentación de la propuesta de estas actividades y poder tramitar autorización por parte del Contratante. Se está a la espera de la presentación por parte del Contratista de la propuesta.

Se reitera la solicitud al Contratista de la presentación de la propuesta de modificación de la intervención en el batallón de Frente Aranda, ya que se ha hecho la ^{solicitud} intervención en varias oportunidades. Aún se encuentra pendiente la presentación de la propuesta para poder iniciar intervención en el batallón de Frente Aranda.

Se reitera la solicitud por parte de la interventoría de los análisis de precios unitarios, lo cual se había solicitado en reiteradas ocasiones, a la fecha el contratista ha hecho caso omiso a las solicitudes y aún se encuentra pendiente la presentación por parte del contratista para revisión y aprobación por parte de la interventoría.



Ing. Resident 1097411253
Olimpo Orozco

 Interventoría.

0 Oct-29-19 Se inician actividades de demolición de caja de inspección y señalización externa.

Se solicita de nuevo la presentación de análisis de precios unitarios, el cronograma de obra y los propuestas de modificación para intervención de las baterías.


• Regata para tubería de 4" → Demolicion de Piso.



Ing. Civil. Olmedo Orozco



Interventor

31-oct-2019 Se cae muro divisor de Unidades Sanitarias al momento proceso de regateo para la instalación de tubería sanit y se ve la necesidad de demoler el muro.

Se presenta fracturamiento de muro divisorio de la zona de lavandería, por lo cual se genera necesidad de demoler el.



Olmedo Orozco Ing. Civil.



Interventor

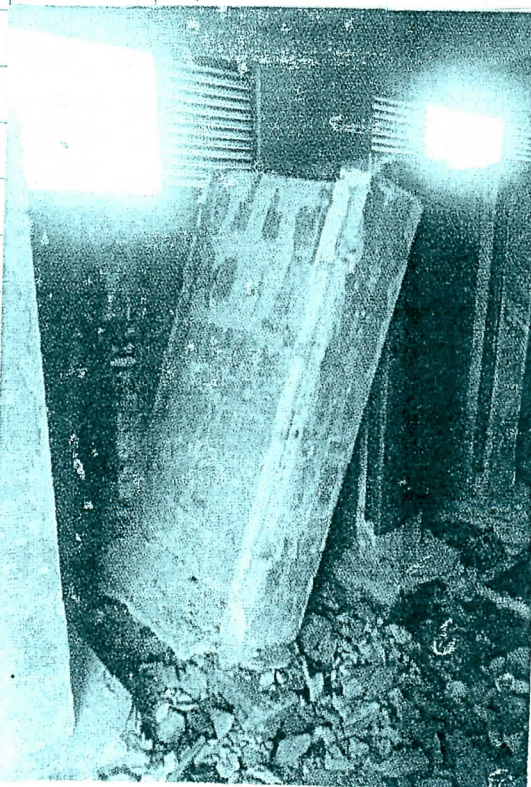

En 11-11-2019 Se hace demolición de muro de los orinales del lado ^{Derecho} ~~izquierdo~~; esto obedece a la ampliación para hacer los baños de los "cuadros" (comandante de peloton). La interventoría aclara que esta demolición no ~~ha~~ ha sido aprobada ni tenida en cuenta en el avance semanal, debido a que no está contemplado contractualmente ni se ha recibido por parte del contratista propuesta de modificación para trámite ante el Contratante.

Se encuentra una Quinta caja. Anexo (para demolición) la cual recibía agua correspondiente a los lavaderos del baño del alojamiento.

 Interventoría

 Interventoría

05-11-2019 Se encuentra una sexta caja, para demolición, la cual recibía agua correspondiente a los bañamanos del baño del alojamiento. Se inician actividades de instalación de tubería correspondientes: Duchas, unidades sanitarias. Se continúan con actividades de repatas. Se laboraron los días domingo 03/nov y lunes festivo 04/nov en los que se continúan las actividades de repatas. Se hace lleno con relleno B-200 compactado en la zona de unidades sanitarias, en la cual se había encontrado asentamiento de material. Se hace cama de arena para tubería en la zona de las unidades sanitarias. Se hace comité de avance de obra semanal con Contratista, Interventoría y Contratante, mediante el cual se definen cambios solicitados por el Contratante y ítems no previstos. Los compromisos y acuerdos se evidencian en el acta adjunta a esta nota de bitácora.

ACTA DE REUNIÓN

SDC-SGC-RCA-01

VERSIÓN: 0

FECHA DE EMISIÓN: 10/10/2019

ACTA DE REUNIÓN No. 03

FECHA DE REUNIÓN: 05-Nov-2019
LUGAR: Batallón Puente Aranda
HORA: 02:00 P.M.
CARÁCTER: ☐ TÉCNICA ☐ ADMINISTRATIVA ☒ COMITÉ

ASISTENTES:

SR. Leonardo Díaz Mohr
SR. WILLIAM TAPIA CASACCA
CT. Camillo Calderon Alexander
Sr. Gescaprien Garro Fgs
Omaro Anteo Buitrago
TE. Carolina Chacón
GUSTAVO BARRIO LEAL QUIRÓTES

Jemi K. Tereros
Nelson F. Sainz

1. OBJETIVO:

Comité de avance de obra Semanal


2. OBSERVACIONES DEL ACTA ANTERIOR:


3. VERIFICACIÓN CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS:

[Signature]
10-11-2019

[Signature]
Interventor

26/11/19 Se inician actividades de raspado y lijado de techo
Se inician actividades de demolición de andén posterior donde se encuentran los cajas de inspección y actividades de excavación de la misma zona para instalación de tubería de 6"


1007411253



Interventoría


12/11/19 Se laboró el día domingo y lunes festivo 10 y 11 de noviembre-2019 respectivamente, los cuales se inició con la construcción de los cajas de inspección e inicio de actividad de pañete.

Se hizo construcción de muros divisorios correspondientes al bano de camarógrafos de pelotón.


Se hace comité de avance semanal con contratista, contratante e interventoría, en donde se adquieren compromisos de presentación de cronograma y APU's.


Se solicita actualización de pólizas al Contratista de Obra.


1007411253



Interventoría

18/11/19 Se laboró el día domingo 17 de noviembre de 2019 en el cual se adelantaron actividades de pañete de muros. Se hace suministro de material de enlape y lacrados.


1007411253



Interventoría

19/11/19 Se realiza comité de avance semanal en el cual se presenta avance, se continúan actividades de pañete y alisado de pisos. Se firma acta de aprobación de ítems nuevos.


1007411253



Interventoría


20/11/19 Se inician actividades de instalación de enchape de muros y se realizan actividades hasta las 12:00

 1007411253


 Interventoría.


21/11/19 El día jueves no se puede laborar, debido a que no estaba permitido el ingreso debido a acortamiento por paro nacional

 1007411253


 Interventoría


22/11/19 Se reactivan actividades, en donde se continúan las actividades correspondientes a instalación de enchape, alistado de pisos, instalación de tubería al baño nuevo, fundida de placa en concreto y y estaca de placa interior. Se laboró hasta las 5:00 p.m.

 1007411253


 Interventoría


23/11/19. Se evidencia poco personal de trabajo, debido a no les fue posible movilizarse por falta de transporte. Se continúa con instalación de enchape de muros. Se laboró hasta las 11:00 p.m.

 1007411253


 Interventoría


25/11/19 Se laboró el día domingo 24 de noviembre de 2019 hasta las 7:00 p.m., en el cual se continúan actividades de instalación de enchape e instalación de tubería en baño nuevo

 1007411253

 Interventoría


26/11/19 Se realiza llenado de pisos en concreto en baño nuevo de azulejos y se hace instalación de cerámica






Interventoría.


01/12/19 Del día 27 de noviembre al 30 de noviembre, se realizarán actividades de enchape e instalación de cerámica. Se trabaja el domingo 01/12/19, en actividades de enchape.





Interventoría


04/12/19 Se inicia con el proceso de instalación de puertas y se continúa con proceso de enchape.






Interventoría.


09/12/19 Durante los días 05/12/19, 06/12/19, 07/12/19, se continúan con actividades de enchape, estuco de placa, lijado y pintura.





Interventoría.


10/12/19 Se continúa con el proceso de enchape, estuco, lijado y pintado de placa, se inicia con proceso de instalación de aparatos sanitarios, se inicia con fundida de concreto de andén y fundida de tapas de cajas de inspección.





Interventoría.

11/12/19 Se continúa con fundida de concreto y tapas de cajas de inspección, se realiza terminado de boquilla general.






Interventoría.

20 12/12/19

Se inicia con proceso de impermeabilización cubierta y mantenimiento de tanques existente suministro de tanques de almacenamiento nuevos




Interventoría

21/

13/12/19

Se realiza instalación de tubería de bajantes aguas lluvias, y se realizan detalles de te general para entrega.



Interventoría


22

23


24

INTERVENCIÓN PUENTE ARANDA

4/11/2019 Se hace recorrido y levantamiento de las zonas a intervenir, en los que participan el Coronel Tapias y la Teniente Chacón por parte del contratante, y los residentes tanto de obra como de Interventoría. En dicho recorrido se solicitan cambios por el Contratante respecto a la distribución de espacios en el baño de la brigada, generando así cambios en (el plano) la propuesta presentada por el contratista el día 05 de noviembre de 2019. Se adjunta plano aprobado finalmente por el Contratante. Se solicitan APU's y Cronograma de obra al Contratista de obra.





Tapias S. S.




Interventoría

15/11/2019 Se inician actividades de demolición de enchape y desmonte de unidades sanitarias.


Interventoría -

18/11/2019 Se continúan actividades de demolición de enchape en bano de brigada logística.





Interventoría

19/11/2019 Se continúan actividades de demolición de enchape en bano de brigada logística, Se realiza comité de avance semanal, en el que se solicitan nuevamente al contratista, presentación de análisis de precios unitarios, programa de obra, actualización de pólizas.



Contratista



Interventoría

26/11/19 No se labora el día jueves 29 de noviembre de 2019 por acuartelamiento por feriado nacional, el día viernes 22 de noviembre de 2019, el contratista no dispone personal para ejecución de actividades, argumentando que el mismo no tuvo movilización por falta de transportes, el día sábado 23 de noviembre de 2019 y el día lunes 25 de noviembre de 2019, el Contratista de obra no dispone personal para ejecución de actividades. Se reactivan actividades el día 26 de noviembre de 2019.




Contratista




Interventoría

21/11/19 Se continúan actividades de demolición de enchape en baños de brigada bogotana.



Interventoría.



02/12/19 Se hace levantamiento de muros divisorios de acuerdo a lo establecido en los planos aprobados.




Interventoría.

09/12/19 Los días 05 de diciembre, 06 de diciembre de 2019, el contratista no dispone personal para ejecución de actividades.

Se inicia con proceso de pañete de muros. El día 07 de diciembre se hace sellamiento de tubo galvanizado que presentaba fuga.




Interventoría.

10/12/19 Se inicia con proceso de enchape, se realiza instalación de duchas.




Interventoría.

12/12/19 Se continúa con proceso de enchape, mantenimiento de codo rojo, mantenimiento de puertas, instalación de pisos.



Interventoría.

13/12/19 Cambio de lámparas, instalación de divisiones de duchas, mobiliario, aparatos sanitarios, espejos, cierre de detalles



Interventoría.

BOGOTA 10 diciembre de 2019

SEÑORES INTERVENTORIA

Ciudad

Asunto: CONTRATO 179 DE 2019. MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE LA BATERÍA DE BAÑOS DE LA COMPAÑÍA DE INSTRUCCIÓN Y DEL ESTADO MAYOR, DE LA BRIGADA DE APOYO LOGÍSTICO No. 1. DISEÑO DE MEZCLA EN OBRA 3000 PSI


Diseño de mezcla en concreto de 3000 psi, las dosificaciones son en metros cúbicos para un concreto 1-2-3 con una relación agua cemento 0,48.

TIPO DE CONCRETO	RESISTENCIA PSI O (LB/PULG2)	CEMENTO (KG)	ARENA (M3)	GRAVA (M3)	AGUA (LT)
1 -2 -3	3000	350	0,56	0,84	170

Para preparar el concreto en obra dosificando los materiales por medio de una carretilla tipo bugí

TIPO DE CONCRETO	RESISTENCIA PSI O (LB/PULG2)	CEMENTO (KG)	ARENA (bugí)	GRAVA (bugí)	AGUA (CANECA 20 LT)
1 -2 -3	3000	50	1	1	1

Atentamente



OLMEDO OROZCO BUITRAGO
INGENIERO CIVIL
CC. 1.007.411.253 de Ibagué

**CERTIFICACION DE PAGOS SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL
PARAFISCALES**

CERTIFICA

Yo, **MARIA FERNANDA CULMA TAMARA**, identificada con cedula de ciudadanía N° **1.023.906.315** de Bogotá, en mi condición de Representante Legal de **INGENIERIA Y CONSULTORIA SDC S.A.S.** identificada con N° **901.135.736-0** debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de certifico el pago de aportes realizados por la compañía durante los últimos (6) mese calendarios legalmente exigibles a la fecha de presentación de nuestra propuesta, para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y servicio Nacional de Aprendizaje (SENA).

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002

La presente certificación se expide, a los 10 días del mes de Diciembre 2019, en la ciudad de Bogotá D.C.

Atentamente,



MARIA FERNANDA CULMA TAMARA
C.C. N°: 1.023.906.315 De Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL
INGENIERIA YCONSULTORIA SDC S.A.S

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 901135736	0	INGENIERIA Y CONSULTORIA SDC S.A.S	C - MIPYMES	PRINCIPAL	calle 134 N 151a - 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5368391	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	529948899	9400492267	E	2019/12/10	2019/12/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$972,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$1,080,000	\$172,800			\$1,080,000	\$43,200			\$1,080,000	\$32,400			\$1,080,000	\$75,200			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (1 Afiliados)					\$1,080,000	\$172,800			\$1,080,000	\$43,200			\$1,080,000	\$32,400			\$1,080,000	\$75,200			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (1 Afiliados)					\$1,080,000	\$172,800			\$1,080,000	\$43,200			\$1,080,000	\$32,400			\$1,080,000	\$75,200			\$0	\$0	
1	CC	1030594174	TERREROS JEM	230301	30	\$1,080,000	\$172,800	EPS017	30	\$1,080,000	\$43,200	CCF21	30	\$1,080,000	\$32,400	14-11	30	\$1,080,000	\$75,200	30		\$0	\$0
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte		
Sucursal: PRINCIPAL R1 (3 Afiliados)					\$2,756,232	\$441,000			\$2,756,232	\$110,400			\$2,756,232	\$82,800			\$2,756,232	\$14,600			\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL R1 (3 Afiliados)					\$2,756,232	\$441,000			\$2,756,232	\$110,400			\$2,756,232	\$82,800			\$2,756,232	\$14,600			\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (3 Afiliados)					\$2,756,232	\$441,000			\$2,756,232	\$110,400			\$2,756,232	\$82,800			\$2,756,232	\$14,600			\$0	\$0	
2	CC	1019030585	DAZ YEFERSON	230201	30	\$1,100,000	\$176,800	EPS017	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF21	30	\$1,100,000	\$33,000	14-11	30	\$1,100,000	\$5,800	30		\$0	\$0
3	CC	51938451	HERNANDEZ CLAUDIA	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS037	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$24,900	14-11	30	\$828,116	\$4,400	30		\$0	\$0
4	CC	1110561805	JIMENEZ BRAYAN	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPS034	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$24,900	14-11	30	\$828,116	\$4,400	30		\$0	\$0
Total Afiliados(4)					\$3,836,232	\$613,800			\$3,836,232	\$153,600			\$3,836,232	\$115,200			\$3,836,232	\$89,800			\$0	\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901135736	0	INGENIERIA Y CONSULTORIA SDC S.A.S		C - MIPYMES	PRINCIPAL	calle 134 N 151a - 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5368391	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-11	2019-12	529948899	9400492267	E	2019/12/10	2019/12/04	BANCO DAVIVIENDA	0	\$972,400
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				4	\$613,800	\$0	\$0	\$613,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$437,800	\$0	\$0	\$437,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$176,000	\$0	\$0	\$176,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$89,800	\$0	\$0	\$89,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	\$89,800	\$0	\$0	\$89,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	\$115,200	\$0	\$0	\$115,200	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	4	\$115,200	\$0	\$0	\$115,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				4	\$153,600	\$0	\$0	\$153,600	
FAMISANAR	EPS017	830,003,564	7	2	\$87,200	\$0	\$0	\$87,200	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
PIJASALUD	EPSIC6	809,008,362	2	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
TOTAL				4	\$972,400	\$0	\$0	\$972,400	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901135736	0	INGENIERIA Y CONSULTORIA SDC S.A.S	C - MIPYMES	PRINCIPAL	calle 134 N 151a - 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5368391	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	504885010	8497817370	E	2019/10/09	2019/10/08	BANCO DAVIVIENDA	0	\$434,500

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sistema afil: PRINCIPAL R1 (2 Afiliados)				\$1,928,116	\$308,500			\$1,928,116	\$77,200			\$1,928,116	\$38,600			\$1,928,116	\$10,200			\$0		\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL R1 (2 Afiliados)				\$1,928,116	\$308,500			\$1,928,116	\$77,200			\$1,928,116	\$38,600			\$1,928,116	\$10,200			\$0		\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)				\$1,928,116	\$308,500			\$1,928,116	\$77,200			\$1,928,116	\$38,600			\$1,928,116	\$10,200			\$0		\$0	

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social		Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901135736	0	INGENIERIA Y CONSULTORIA SDC S.A.S		C - MIPYMES	PRINCIPAL	calle 134 N 151a - 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5368391	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-09	2019-10	504886510	8497817370	E	2019/10/09	2019/10/08	BANCO DAVIVIENDA	0	\$434,500
RESUMEN DE PAGO									
RUBRO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$308,500	\$0	\$0	\$308,500	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$132,500	\$0	\$0	\$132,500	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$176,000	\$0	\$0	\$176,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	2	\$10,200	\$0	\$0	\$10,200	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$38,600	\$0	\$0	\$38,600	
CAFAM	CCF21	860,013,570	3	2	\$38,600	\$0	\$0	\$38,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$77,200	\$0	\$0	\$77,200	
FAMISANAR	EP5017	830,003,564	7	1	\$44,000	\$0	\$0	\$44,000	
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$33,200	\$0	\$0	\$33,200	
TOTAL				2	\$434,500	\$0	\$0	\$434,500	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NT 901135736	0	INGENIERIA Y CONSULTORIA SDC S.A.S	C - MIPYMES		PRINCIPAL	calle 134 N 151a - 39	BOGOTA-BOGOTA D.E.	5368391	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2019-10	2019-11	516416405	8498781293	E	2019/11/13	2019/11/05	BANCO DAVIVIENDA	0	\$792,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																							
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (2 Afiliados)						\$1,233,662	\$197,500			\$1,233,662	\$49,400			\$1,233,662	\$24,800			\$1,233,662	\$86,000		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: RIESGO 5 (2 Afiliados)						\$1,233,662	\$197,500			\$1,233,662	\$49,400			\$1,233,662	\$24,800			\$1,233,662	\$86,000		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						\$1,233,662	\$197,500			\$1,233,662	\$49,400			\$1,233,662	\$24,800			\$1,233,662	\$86,000		\$0	\$0	
1	CC	1110561805	JIMENEZ BRAYAN	230301	16	\$441,662	\$70,700	EPSICA	16	\$441,662	\$17,700	CCF21	16	\$441,662	\$8,700	14-11	16	\$441,662	\$10,800	16	\$0	\$0	
2	CC	1030994174	TERREROS JEIM	230301	22	\$792,000	\$126,800	EPSO17	22	\$792,000	\$31,700	CCF21	22	\$792,000	\$15,700	14-11	22	\$792,000	\$50,200	22	\$0	\$0	
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombres		Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL RI (2 Afiliados)						\$1,928,116	\$308,500			\$1,928,116	\$77,200			\$1,928,116	\$38,600			\$1,928,116	\$10,200		\$0	\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL RI (2 Afiliados)						\$1,928,116	\$308,500			\$1,928,116	\$77,200			\$1,928,116	\$38,600			\$1,928,116	\$10,200		\$0	\$0	
Ciudad: BOGOTA Depto: BOGOTA D.E. (2 Afiliados)						\$1,928,116	\$308,500			\$1,928,116	\$77,200			\$1,928,116	\$38,600			\$1,928,116	\$10,200		\$0	\$0	
3	CC	1019030985	DAZ YEFERSON	230201	30	\$1,100,000	\$176,000	EPSO17	30	\$1,100,000	\$44,000	CCF21	30	\$1,100,000	\$22,000	14-11	30	\$1,100,000	\$5,800	30	\$0	\$0	
4	CC	51938451	HERNANDEZ CLAUDIA	230301	30	\$828,116	\$132,500	EPSO17	30	\$828,116	\$33,200	CCF21	30	\$828,116	\$16,600	14-11	30	\$828,116	\$4,400	30	\$0	\$0	
Total		Afiliados(4)				\$3,161,778	\$506,000			\$3,161,778	\$126,600			\$3,161,778	\$63,400			\$3,161,778	\$96,200		\$0	\$0	

FUERZAS MILITARES DE COLOMBIA
EJERCITO NACIONAL



BRIGADA LOGÍSTICA No. 1

Bogotá, D.C.,

No. 6990015MD-CGFM-COEJC-SECEJ-JEMGF-COLOG-BRLOG1

Señor Teniente Coronel
HERNANDO DE FILIPPIS RODRIGUEZ
Director de la central administrativa y contable de puente Aranda
Carrera 50 N° 18 – 92
Bogotá D.C

ASUNTO: Informe de Interventoría Contrato de obra No. 179 del 02 de octubre de 2019

Dando cumplimiento a lo establecido en la Cláusula “22” “Interventoría” del contrato de obra No. 179 **“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE LA BATERÍA DE BAÑOS DE LA COMPAÑÍA DE INSTRUCCIÓN Y DEL ESTADO MAYOR, DE LA BRIGADA DE APOYO LOGÍSTICO No. 1 Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS PLANTAS DE VEHÍCULOS TÁCTICOS, ARMAMENTO, CONFORMADO, METALMECÁNICA Y GALVANOTECNIA DE EL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO No. 1”**, con toda atención me permito informar al Señor Teniente Coronel Director de central administrativa y contable de puente Aranda del Ejército la situación actual del contrato:

I. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO N°	179 del 02 de octubre de 2019
CDP N°	13419 del 27 de junio de 2019
CRP N°	53419 del 02 de octubre de 2019
FECHA DE EMISIÓN	02 de octubre de 2019
OBJETO DEL CONTRATO	“MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN DE INSTALACIONES DE LA BATERÍA DE BAÑOS DE LA COMPAÑÍA DE INSTRUCCIÓN Y DEL ESTADO MAYOR, DE LA BRIGADA DE APOYO LOGÍSTICO No. 1 Y MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES DE LAS PLANTAS DE VEHÍCULOS TÁCTICOS, ARMAMENTO, CONFORMADO, METALMECÁNICA Y GALVANOTECNIA DE EL BATALLÓN DE MANTENIMIENTO No. 1”.
FORMA Y CONDICIONES	El MDN - Ejército Nacional se compromete a cancelar el valor del contrato



Por mi patria, mi lealtad es el honor
No. del Comunicador - No. de fax institucional
Dirección: carrera 50 N° 18-92 puente Aranda Tel:4261458 ext.38808
E-mail cenacbogota@ejercito.mil.co



CONTINUACION INFORME DE INTERVENTORÍA CONTRATO 179 CENAC PUENTE ARANDA

DE PAGO	<p>resultante a GUSTAVO ADOLFO LEAL QUIÑONES, NIT No. 93.132.059 – 9, representada legalmente por el señor GUSTAVO ADOLFO LEAL QUIÑONES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.132.059.</p> <p>EL MDN-EJERCITO NACIONAL- CENAC PA cancelará mediante UN SOLO PAGO, al recibo a satisfacción de los elementos por el Supervisor del Contrato, dentro de los sesenta (60) días calendario siguientes a la recepción a satisfacción de los elementos y previa asignación del cupo PAC por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, previo cumplimiento de los siguientes requisitos:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Acta de recibo a satisfacción de los elementos recibidos por parte Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable - CENAC Puente Aranda, debidamente suscrita por el Supervisor del contrato, un representante del Contratista. 2. Entrada al Almacén. 3. Informe de supervisión. 4. Situación de recursos por parte del Ministerio de Hacienda y Crédito Público Dirección del Tesoro Nacional (Asignación cupo PAC). 5. Presentación de factura en Original. 6. Que se ejecuten los demás trámites administrativos correspondientes. 7. Verificación por parte del Ministerio de Defensa Nacional – Ejército Nacional – Central Administrativa y Contable -CENAC Puente Aranda, del cumplimiento del contratista del pago de aportes parafiscales y los propios del SENA, ICBF y Caja de compensación familiar en los casos que aplique, de acuerdo a lo contenido en la Ley 1607 de 2012 reglamentada por Decreto 1828 de fecha 27 de Agosto de 2013. <p>Nota 1: En el evento de prórroga en la entrega del objeto del contrato, por causa imputable al contratista, el pago se postergará en el mismo lapso de la prórroga.</p> <p>Nota 2: El Ejército Nacional – CENTRAL ADMINISTRATIVA Y CONTABLE - PUENTE ARANDA no se responsabilizan por los retardos que puedan generarse por el corresponsal bancario al momento del pago.</p>
CONTRATISTA	<p>GUSTAVO ADOLFO LEAL QUIÑONES NIT No. 93.132.059 – 9, representada legalmente por el señor GUSTAVO ADOLFO LEAL QUIÑONES, identificado con la cédula de ciudadanía No. 93.132.059.</p>
INTERVENTOR	INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SDC S.A.S
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$227.257.675,38)
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del presente contrato será hasta el 13 de diciembre de 2019, plazo contado a partir del cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución del contrato.



Por mi patria, mi lealtad es el honor
 No. del Conmutador - No. de fax institucional
 Dirección calle 106 N° 8 –BAPOM 15
 E-mail cristian.martinez@buzonejercito.mil.co



CONTINUACION INFORME DE INTERVENTORÍA CONTRATO 179 CENAC PUENTE ARANDA

VALOR FINAL DEL CONTRATO.	DOSCIENTOS VEINTISIETE MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SETENTA Y CINCO PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS M/CTE (\$227.257.675,38)
---------------------------	---

II. APROBACION POLIZA

Las obligaciones contractuales se respaldaron con la Póliza de Seguros de cumplimiento a favor de Entidades Estatales No. GU051231, con los amparos de Cumplimiento del contrato, calidad del servicio, Salarios y prestaciones sociales y Estabilidad de la obra y la póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual No. 17 RE004836, expedida por la compañía **SEGUROS CONFIANZA**, aprobada por el Director del CENAC-PA mediante acta No.193- del 06 de septiembre de 2019, y los mismos amparos de acuerdo a lo establecido en el modificadorio No. 1 del contrato de obra, los cuales se muestran en la Tabla 1:

Tabla 1 Pólizas y garantías del contrato de obra

COBERTURAS DE LA POLIZA						
COBERTURA	CONDICIONES INICIALES			MODIFICATORIO No. 1		
	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO	FECHA INICIAL	FECHA DE VENCIMIENTO	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	02/10/2019	02/08/2020	\$ 34,088,651	02/10/2019	13/08/2020	\$ 34,088,651
CALIDAD DEL SERVICIO	02/10/2019	02/04/2021	\$ 45,451,535	02/10/2019	13/04/2021	\$ 45,451,535
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	02/10/2019	02/04/2023	\$ 11,362,884	02/10/2019	13/04/2023	\$ 11,362,884
ESTABILIDAD DE LA OBRA	02/10/2019	02/12/2024	\$ 45,451,535	02/10/2019	02/12/2024	\$ 45,451,535
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	20/10/2019	02/04/2020	\$165.623.200	02/10/2019	13/04/2020	\$165.623.200

III. MODIFICATORIOS Y/O ADICIONALES

A la fecha se presentó el modificadorio No. 1 al contrato de Obra, el cual se modifica la cláusula séptima – plazo de ejecución, hasta el día 13 de diciembre de 2019 y el modificadorio No. 2, en el que se actualizan las cantidades de obra de acuerdo a las actas de mayores y menores cantidades de obra.

IV. MATERIAL RECIBIDO

Se certifica que con el Acta No. _____ de fecha _____ de 2019 se recibió a satisfacción los bienes establecidos correspondientes al objeto contractual descrito en la CLAUSULA PRIMERA del contrato No. 179 - CENACPA-2019. Con la Entrada No. 500225650-2019, movimiento ML81N Y 5002256651, movimiento ML81N (Almacén de intendencia), de acuerdo con la Factura de Venta No. FACTURA DE VENTA No. 215 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2019 y FACTURA DE VENTA No. 216 DE FECHA 11 DE DICIEMBRE DE 2019, ejecución de los ítems evidenciados en el balance final de obra y acta de mayores y menores (Anexo 1), adicionalmente, estos documentos fueron radicados ante la entidad contratante mediante comunicación SDC-CENAC-CTO-179-2019-022.

V. PAGOS EFECTUADOS

A la fecha no se han efectuado pagos:



Por mi patria, mi lealtad es el honor
No. del Conmutador - No. de fax institucional
Dirección calle 106 N° 8 –BAPOM 15
E-mail cristian.martinez@buzonejercito.mil.co



CONTINUACION INFORME DE INTERVENTORÍA CONTRATO 179 CENAC PUENTE ARANDA

Tabla 2 Balance del contrato

Valor Total Contrato:	\$227.257.675,38	
Valor a pagar		\$227.257.675,38
Sumas iguales	\$227.257.675,38	\$227.257.675,38

VI. NIVEL DE EJECUCION Y AVANCE DEL CONTRATO

Tabla 3 Nivel de ejecución física y avance del contrato

% de Ejecución Financiera Cancelado	% Ejecución Física y Entrega de Elementos
0 %	100%

Nota: En el Anexo 2, se presenta el registro fotográfico correspondiente a la ejecución de actividades del contrato de obra (Informe técnico entregado por el Contratista de obra), en el Anexo 3, se presentan los certificados de recolección de escombros durante la ejecución del contrato de obra, en el Anexo 4, se presentan los planos As-built presentados por el Contratista de Obra, en el Anexo 5 se presenta la bitácora de obra diligenciada durante la ejecución del contrato y en el Anexo 6, se presenta el diseño de mezcla de concreto presentado por el Contratista de obra en el cual garantiza la resistencia del concreto fundido en obra, Anexo 7, actas de reunión de comités de avance de obra.

VII. CUMPLIMIENTO PARAFISCALES

Se deja constancia del cumplimiento por parte del contratista de acuerdo a lo establecido en el Ley 1607 de 2012 reglamentada por el Decreto 1828 del 27 de agosto de 2013, debidamente suscrita por el representante legal o por el revisor fiscal si a ello hubiere lugar, en cuanto al cumplimiento de las obligaciones frente al sistema de seguridad social integral, parafiscales (Cajas de Compensación Familiar, Sena e Instituto Colombiano de Bienestar Familiar), tal como se evidencia en el Anexo 8.

VIII. OTRAS ACTIVIDADES

Una vez cumplidos todos los trámites administrativos a que haya lugar se dará cumplimiento a la liquidación del contrato, para dar cumplimiento a lo normado en los artículo 60 de la Ley 80 de 1993, modificado por el artículo 217 del decreto 019 de 2012; en lo no derogado y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007, si es procedente la liquidación.

Atentamente,


INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SDC S.A.S
Interventoría del contrato de obra 179 de 2918 CENAC PUENTE ARANDA 2019
