

		FORMATO		VERSIÓN: 0	
				CÓDIGO: A-AD-GC-F-034	
ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN				FECHA: 24/Jul/2019	
FECHA PRESENTE ACTA		8 DE JULIO DE 2025			
CONTRATO ☒ CONVENIO		No. 2105		DE FECHA: 30 ABRIL DE 2025	
OBJETO		ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ			
CONTRATISTA		HUGO ARMANDO MONTANA SANABRIA		NIT: 1.055.228.532-8	
INTERVENTOR SUPERVISOR		LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA		C.C: 1.055.228.532	
				C.C: 33.365.608	
VALOR DEL CONTRATO / CONVENIO:		VALOR INICIAL: \$ 95.463.900,00			
		APORTE DEPARTAMENTO: \$ 0,00			
		APORTE DE CONTRAPARTE: \$ 0,00			
ADICIONAL N°		VALOR \$ 0,00			
ADICIONAL N°		VALOR \$ 0,00			
VALOR TOTAL CON ADICIONES		\$ 95.463.900,00			
PLAZO INICIAL		DESDE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO HASTA EL SEIS (6) DE JUNIO DEL DOS MIL VEINTICINCO (2025)			
PRORROGA N°		N/A			
PRORROGA N°		N/A			
PLAZO TOTAL		TREINTA (30) DÍAS			
FECHA DE INICIACIÓN		7 DE MAYO DE 2025			
ACTA DE SUSPENSIÓN N°		N/A			
ACTA DE REINICIACIÓN N°		N/A			
ACTA DE SUSPENSIÓN N°		N/A			
ACTA DE REINICIACIÓN N°		N/A			
FECHA DE TERMINACIÓN		6 DE JUNIO 2025			
FECHA DE TERMINACIÓN REAL		6 DE JUNIO 2025			
PERIODO AUTORIZADO A PAGAR		DEL 7 DE MAYO DE 2025 AL 6 DE JUNIO DE 2025			
RBPP N°		202500000016912			
N°s Y AÑO DE REGISTRO/S PRESUPUESTALES QUE RESPALDAN EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA: RPC No: 4086 AÑO: 2025, RPC No:					
En las oficinas de INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA se reunieron los señores, LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA Interventor / Supervisor, y el señor HUGO ARMANDO MONTANA SANABRIA como representante legal o contratista, con el fin de suscribir la presente acta.					
En visita al lugar de los trabajos se constató, que lo ejecutado está de acuerdo con las especificaciones, características y condiciones estipuladas en el contrato o convenio y registradas en los informes, por tanto el suscrito supervisor recibe satisfactoriamente y autoriza el pago como lo registra la presente acta; igualmente certifica que el CONTRATISTA cumplió con sus aportes al régimen de Seguridad Social en Salud, Pensión, Riesgos profesionales y Parafiscales (Cuando Aplique) de acuerdo a la(s) planilla (s) N° 9487282406, 9488088825, 9486214507, 9486196939, 9488149154, 9488331724 de los meses MAYO Y JUNIO de conformidad con la normatividad vigente.					
CONTROL ANTICIPOS					
Valor Anticipo		\$ 0,00			
Sumatoria Amortizaciones		\$ 0,00			
Saldo por Amortizar		\$ 0,00			
*Nota al anticipo: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el anticipo por cada fuente de financiación, según hoja anexa de fuentes de financiación (aclarar dentro de las observaciones), diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.					
BALANCE DE PAGO					
CONCEPTO		DEBE		HABER	
Valor del contrato o Convenio		\$ 95.463.900,00			
Amortización Anticipo					
Valor a pagar de la presente acta				\$ 95.463.025,00	
Valor Total actas pagadas					
Saldo sin ejecutar (Liberar por el Departamento)				\$ 875,00	
Valor a Reintegrar al Departamento (Cuando aplique)					
Sumas Iguales		\$ 95.463.900,00		\$ 95.463.900,00	
*Nota al balance: En los casos en los que existan diferentes fuentes de financiación debe discriminarse el balance por cada fuente según hoja anexa (fuentes de financiación- Balance) , diligenciar y copiar cuadro el cual debe reflejarse en el espacio asignado en observaciones o aclaraciones de la presente acta.					
CUENTA BANCARIA EN LA QUE SE CONSIGNA EL PAGO DE LA PRESENTE ACTA:					
No. CUENTA: 35851216551		BANCO: BANCOLOMBIA		AHORROS: X	
				CORRIENTE:	
*Las cantidades y valores consignados en la presente acta son responsabilidad exclusiva del contratista e interventor y/o supervisor. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con que el Interventor y/o Supervisor y el contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas a los informes por parte del Interventor y/o Supervisor.					
OBSERVACIONES O ACLARACIONES:					
No siendo otro el objeto de la presente reunión se firma el acta por los que en ella intervinieron.					
Firma:		Firma:			
Nombre: LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA		Nombre: HUGO ARMANDO MONTANA SANABRIA			
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR		CONTRATISTA			
* Si se requieren se pueden adicionar mas firmas.					
ANEXO: PLANILLA DE PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL DEL MES CORRESPONDIENTE					
ANEXO: LIQUIDACIÓN PARAFISCALES (CUANDO APLIQUE)					
ANEXO: FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO APLIQUE)					
ANEXO: INFORME COMPLETO DE ACTIVIDADES FIRMADO POR EL CONTRATISTA Y EL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR.					
Original: Archivo Carpeta Secretaría de Contratación					
Copias: Orden de Pago Tesorería, Contratista, Supervisor y/o Interventor					

GOBERNACION DE BOYACA

NIT. 891800498-1

REGISTRO PRESUPUESTAL DE COMPROMISOS

Registro No. **4086**

Vigencia: 2.025

Fecha de Compromiso: 30 de abril de 2025

Beneficiario DEPARTAMENTO DE BOYACA

Nit: 891800498 - 1

No. C.D.P. : 2299

Fecha de Expedición del C.D.P.: 11 de marzo de 2025

Con Formalidades Plenas

Tipo de Compromiso CONTRATO

CONTRATO: 2105/25 Fecha: 30/04/2025 Vence: 31/12/2025

Objeto: REG BPPID: 2025 000000 16912. ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Identificación Presupuestal	Concepto	Valor
Gastos-Gastos De Inversión 0306 - 2.3.22.1.700.3.29 - 1006	Adecuación y/o mejoramiento de la infraestructura de la institución educativa rafael bayona niño sede principal y sede toibita del municipio de paipa, departamento de Boyacá Clasificadores 2201052-54129-0-0-0-220402	95.463.900,00 95.463.900,00

Programación de Pagos	
Mes	Valor
Abril	\$95.463.900,00
Valor Total Prog.	\$95.463.900,00

Total Compromisos

\$95.463.900,00

OSCAR ALEXANDER MELO PEDRAZA

Subdirector Técnico - Presupuesto

REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACIÓN PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

NÚMERO **1.055.228.532**

MONTAÑA SANABRIA

APELLIDOS

HUGO ARMANDO

NOMBRES

FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO **01-ABR-1995**

PESCA
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.66

ESTATURA

O+

G.S. RH

M

SEXO

30-ABR-2013 PESCA

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICIÓN

REGISTRADOR NACIONAL
ALEXANDER VEGA ROCHA

ÍNDICE DERECHO



A-0720200-01354942-M-1055228532-20230513 0107231395G 1 54453813

NACIONAL DEL ESTADO CIVIL

141161728384



Impuestos y Aduanas de Sogamoso

37. Sign

45. Teléfono 2

52. Número establecimientos

Device Type	Percentage of Respondents
Smartphone	100%
Tablet	95%
Laptop	85%
Desktop Computer	75%

[illegible]

49 - No responsable de IVA

54. Código

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

60. No. de Folios: 0

Firma del solicitante:

Firma autorizada:

985. Cargo CONTRIBUYENTE


 CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA	CERTIFICACION	F_P_01
		Versión: 1.0
		Página 1 de 2

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA, identificado con cedula de ciudadanía No. 1055228532 de Pesca, en mi condición de contratista y OSCAR ROBINSON ALVARADO QUIJANO con cedula de ciudadanía 79653974 de Bogotá D.C, en calidad de contador publico portante de la matricula profesional 112384-T, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados durante el periodo comprendido entre el 01 de mayo de 2025 al 30 de junio de 2025. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia se firma en Sogamoso a los ocho (08) días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,


HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA
Persona Natural


OSCAR ROBINSON ALVARADO QUIJANO
T.P No 112384-T
Contador Publico



F P 01

Versión: 1.0

Página 2 de 2



Certificado No.



LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUEN INTERESE

Que el contador público OSCAR ROBINSON ALVARADO QUIJANO identificado con CEDULA DE CIUDADANIA No 79651974 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 112384-T Si tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTÁ a los 6 días del mes de Marzo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2010 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado.

Servimos Con Calidad y Excelencia
Email: ing.hugomontana@gmail.com
Tel: 3213270108

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

5010091649F5950A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **OSCAR ROBINSON ALVARADO QUIJANO** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 79653974 de BOGOTA, D.C. (BOGOTA D.C) Y Tarjeta Profesional No 112384-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 17 días del mes de Julio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

DATOS GENERALES DEL APORTANTE																																
Identificación		dv	Razon Social			Clase Aportante			Sucursal Principal		Direccion		Ciudad-Departamento		Teléfono	Exonerado SENA e ICBF																
CC 1055228532			MONTAÑA SANABRIA HUGO ARMANDO			INDEPENDIENTE			PRINCIPAL		CARRERA 4 N 2 150		PESCA-BOYACA		7784271	Si																
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION																																
Periodo		Clave			Tipo		Fecha			Pago																						
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago		Banco			Días Mora		Valor																		
2025-05	2025-05	1540099998		9487282406	I	2025/06/10	2025/06/09		BANCO DAVIVIENDA			0		5533,400																		
LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																
EMPLEADO				NOVEDADES								PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES												
No.	Identificación	Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sin	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF		
1	CC	1055228532	MONTAÑA SANABRIA HUGO ARMANDO																		230301	30	EP5037	30	CCF10	30	14-23	30	30	No		
Total		Afiliados(1)																														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 105528532		MONTAÑA SANABRIA HUGO ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 4 N 2 150	PESCA-BOYACA	7784271	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-05	1540099998	9487282406	I	2025/06/10	2025/06/09	BANCO DAVIVIENDA	0	\$533,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$99,100	\$0	\$0	\$99,100
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$28,500	\$0	\$0	\$28,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$533,400	\$0	\$0	\$533,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1055228532		MONTAÑA SANABRIA HUGO ARMANDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HUGO ARMANDO MONTANA SANABRIA	K 4 2 150	PESCA-BOYACA	3213270108	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1600613731	9488088825	E	2025/06/10	2025/07/03	BANCOLOMBIA		\$358,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES		
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tdc	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Código	Días	Días	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	1055228038	MONTAÑA SANABRIA YONATHAN ALEXANDER	X																	230301	24	EP5041	24	CCF10	24	14-23	24	24	Si
Total Afiliados(1)																														

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1055228532		MONTAÑA SANABRIA HUGO ARMANDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HUGO ARMANDO MONTANA SANABRIA	K 4 2 150	PESCA-BOYACA	3213270108	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-06	1600613731	9488088825	E	2025/06/10	2025/07/03	BANCOLOMBIA		\$358,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR		
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$182,300	\$0	\$185,000		
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$182,300	\$0	\$185,000		
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$79,300	\$0	\$80,500		
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$79,300	\$0	\$80,500		
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$45,600	\$0	\$46,300		
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	1	\$45,600	\$0	\$46,300		
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$45,600	\$0	\$46,300		
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$45,600	\$0	\$46,300		
TOTAL				1	\$352,800	\$0	\$358,100		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9636488		BOYACA SANABRIA WILLIAM FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 3 3 2 -18	PESCA-BOYACA	3125161214	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-05	1495503258	9486214507	I	2025/06/24	2025/05/21	BANCO CAJA SOCIAL	\$101,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES														PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	CC	9636488	BOYACA SANABRIA WILLIAM FERNANDO																	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 9636488		BOYACA SANABRIA WILLIAM FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 3 3 2 -18	PESCA-BOYACA	3125161214	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-05	2025-05	1495503258	9486214507	I	2025/06/24	2025/05/21	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$101,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$45,600	\$0	\$0	\$45,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$45,600	\$0	\$0	\$45,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,900	\$0	\$0	\$19,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$19,900	\$0	\$0	\$19,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,600	\$0	\$0	\$35,600
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$35,600	\$0	\$0	\$35,600
TOTAL				1	\$101,100	\$0	\$0	\$101,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1074714566		ROJAS ARIZA YAIR DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 # 6 - 21	PESCA-BOYACA	3105401026	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-05	2025-05	1495503262	9486196939	I	2025/06/17	2025/05/21	BANCO CAJA SOCIAL	\$101,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
1	CC	1074714566	ROJAS ARIZA YAIR DAVID																	X	X																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1074714566		ROJAS ARIZA YAIR DAVID	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Calle 3 # 6 - 21	PESCA-BOYACA	3105401026	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-05	2025-05	1495503262	9486196939	I	2025/06/17	2025/05/21	BANCO CAJA SOCIAL	0	\$101,100

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$45,600	\$0	\$0	\$45,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$45,600	\$0	\$0	\$45,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$19,900	\$0	\$0	\$19,900
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$19,900	\$0	\$0	\$19,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$35,600	\$0	\$0	\$35,600
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$35,600	\$0	\$0	\$35,600
TOTAL				1	\$101,100	\$0	\$0	\$101,100

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1055228532		MONTAÑA SANABRIA HUGO ARMANDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HUGO ARMANDO MONTANA SANABRIA	K 4 2 150	PESCA-BOYACA	3213270108	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1600626651	9488149154	E	2025/07/08	2025/07/03	BANCOLOMBIA	0	\$176,600

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																															
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION		SALUD		CCF		RIESGOS		PARAFISCALES			
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	ima	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Codigo	Dias	Dias	Exonerado SENA e ICBF
1	CC	9636488	BOYACA SANABRIA WILLIAM FERNANDO		X	X																230301	6	EP5037	6	CCF10	6	14-23	6	6	SI
2	CC	1055228038	MONTAÑA SANABRIA YONATHAN ALEXANDER			X																230301	6	EP5041	6	CCF10	6	14-23	6	6	SI
Total Afiliados(2)																															

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1055228532		MONTAÑA SANABRIA HUGO ARMANDO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	HUGO ARMANDO MONTANA SANABRIA	K 4 2 150	PESCA-BOYACA	3213270108	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07	1600626651	9488149154	E	2025/07/08	2025/07/03	BANCOLOMBIA	0	\$176,600

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$91,200	\$0	\$0	\$91,200
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	\$91,200	\$0	\$0	\$91,200
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$39,800	\$0	\$0	\$39,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	2	\$39,800	\$0	\$0	\$39,800
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				2	\$22,800	\$0	\$0	\$22,800
COMFABOY	CCF10	891,800,213	8	2	\$22,800	\$0	\$0	\$22,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				2	\$22,800	\$0	\$0	\$22,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$11,400	\$0	\$0	\$11,400
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$11,400	\$0	\$0	\$11,400
TOTAL				2	\$176,600	\$0	\$0	\$176,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1055228532		MONTAÑA SANABRIA HUGO ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 4 N 2 150	PESCA-BOYACA	7784271	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1608293730	9488331724	I	2025/07/08	2025/07/07	BANCOLOMBIA		\$504,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	lrl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	1055228532	MONTAÑA HUGO		R															230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$178,000	0		\$0		\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$99,100	0		\$0		\$0	No	\$504,900
Total Afiliados(1)																							\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0		\$0		\$1,423,500	\$99,100			\$0		\$0		\$504,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 105528532		MONTAÑA SANABRIA HUGO ARMANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CARRERA 4 N 2 150	PESCA-BOYACA	7784271	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-06	1608293730	9488331724	I	2025/07/08	2025/07/07	BANCOLOMBIA		\$504,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$227,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$99,100	\$0	\$99,100
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$99,100	\$0	\$99,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$178,000
NUEVA E.P.S.	EP5037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$178,000
TOTAL				1	\$504,900	\$0	\$504,900


EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO DE LA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY
NIT 891800213 - 8
C E R T I F I C A

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral, por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aquí se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efectuó la empresa aportante a través de Planilla PILA.
2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.
3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.
4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que debería cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.
5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa MONTANA SANABRIA HUGO ARMANDO con nit 1055228532 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

Fecha	Planilla	# Trab	Val Tot	Consig	Mes Pago	Valor 4% Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp. papliceap
03/07/2025	849488088825	1	45,600	202505		45,600	\$1,138,800	\$1,138,800
03/07/2025	849488149154	2	22,800	202506		22,800	\$569,400	\$569,400
TOTALES:			\$68,400			\$68,400	\$1,708,200	\$1,708,200

FECHA DE EXPEDICION: 04/07/2025

Cordialmente;



LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapo15
DPTO. APORTES Y SUBSIDIO

F - 12 - 276 | Versión 2 | 13/09/2018
Certificación de aportes 2025 Afil.:003634 NIT: 1055228532





Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social HUGO ARMANDO MONTANA SANABRIA identificado con el NIT 1055228532, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

Nº Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
2105-2025	ADEC Y MEJ INFRA IE RAFAEL BAY	PAIPA	238,700	2025-06	16-JUN-2025	133653751
		Total	238,700			

Expedido por el SENA, a los dieciseis (16) días del mes de Junio de 2025

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.

La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-06-16

Generado por : CLAUDIA CONSTANZA NUÑEZ ARAQUE

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresarios.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:

el código de verificación: 1839326310 y el Número de Certificado: 396661

						FORMATO				VERSIÓN: 0			
										CÓDIGO: A-AD-GC-F-028			
SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS										FECHA: 24/Jul/2019			
FECHA: 06 DE JUNIO DE 2025										1 HOJA DE 2			
CONTRATO: 2105-2025						FECHA DE INICIACIÓN REAL 07/05/2025				ACTA PARCIAL: N/A			
OBJETO: ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ						FECHA TERMINACIÓN S/ CONTRATO: 06/06/2025				ACTA FINAL: 06/06/2025			
CONTRATISTA: HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA						FECHA DE TERMINACIÓN REAL: 06/06/2025				ACTA No. _____			
SUPERVISOR (A): ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA										FECHA: _____			
V. INICIAL \$ 95.463.900,00										MES: _____			
V. ADICIONAL \$ 0,00													
VALOR TOTAL \$ 95.463.900,00													
CONDICIONES ORIGINALES						% OBRA EJECT.				% TIEMPO			
						OBRA EJECUTADA							
						MODIFICACIONES (insertar columnas según número de modificaciones)		PRESENTE ACTA		ACUM. ACTA ANTERIOR		ACUMULADO	
						Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor	Cantidad	Valor
No.	Descripción	Un	Cant.	Valor. Unit.	Valor. Total								
1	REALIZAR CUBIERTA EN LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE TOIBITA				28.396.120,00		-672.900,00		27.723.220,00				27.723.220,00
1.01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	kg	1.140,98	14.000,00	15.973.720,00	+	-185,18	-2.592.520,00	955,80	13.381.200,00		955,80	13.381.200,00
1.02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	m2	145,46	50.000,00	7.273.000,00	+	0,00	0,00	145,46	7.273.000,00		145,46	7.273.000,00
1.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ml	14,00	60.000,00	840.000,00	+	0,00	0,00	14,00	840.000,00		14,00	840.000,00
1.04	LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)	m2	95,46	30.000,00	2.863.800,00	+	8,55	256.500,00	104,01	3.120.300,00		104,01	3.120.300,00
1.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	und	8,00	20.000,00	160.000,00	+	1,00	20.000,00	9,00	180.000,00		9,00	180.000,00
1.06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE AWG 12 Y DUCTO PVC 1/2" (INCLUYE APARATO)	und	8,00	110.000,00	880.000,00	+	1,00	110.000,00	9,00	990.000,00		9,00	990.000,00
1.07	ESTUCO Y VINOLO TRES MANOS EN MUROS	m2	33,80	12.000,00	405.600,00		127,76	1.533.120,00	161,56	1.938.720,00		161,56	1.938.720,00
2	REALIZAR PLACA PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL				47.975.000,00		672.200,00		48.647.200,00				48.647.200,00
2.01	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	m3	83,61	100.000,00	8.361.000,00		0,00	0,00	83,61	8.361.000,00		83,61	8.361.000,00
2.02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	kg	1.029,00	6.000,00	6.174.000,00		14,70	88.200,00	1.043,70	6.262.200,00		1.043,70	6.262.200,00
2.03	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m3	41,80	800.000,00	33.440.000,00		0,73	584.000,00	42,53	34.024.000,00		42,53	34.024.000,00



FORMATO

VERSIÓN: 0

CÓDIGO: A-AD-GC-F-028

SABANA - CUADRO DE CANTIDADES CONTRATADAS Y EJECUTADAS

FECHA: 24/Jul/2019

COSTOS DIRECTOS	76.371.120,00	76.370.420,00	76.370.420,00
A.I.U. 25%	19.092.780,00	19.092.605,00	19.092.605,00
COSTO TOTAL	95.463.900,00	95.463.025,00	95.463.025,00
VALOR OBRAS EJECUTADAS		95.463.025,00	
AMORTIZACIÓN ANTICIPO __%		0,00	
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA		95.463.025,00	

SON: NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTICINCO PESOS


ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
SUPERVISOR (A)
HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA
CONTRATISTA



Si este formato se adjunta en un acta de recibo parcial o de recibo final a satisfacción que corresponde a un contrato de obra en infraestructura vial, se debe adjuntar también el acta de Recursos Físicos

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


Objeto: ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Capítulo: REALIZAR CUBIERTA EN LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE TOIBITA

Item	Descripción	Unidad	Acta	Fecha
1,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	Kilogramo		

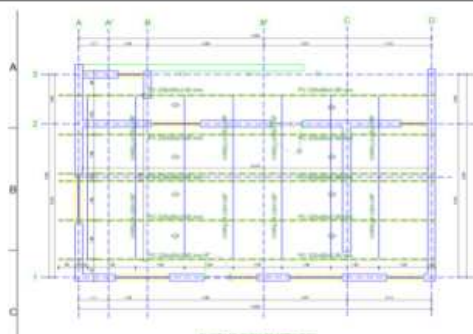IMAGEN O REGISTRO FOTOGRAFICO	Localización	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Peso (kg/m)	Calibre (mm)	Longitud (m)		
 	Cubierta Correa - Perfil en C 220x80x2.00 mm	6,37	2,00	14,00	6,00	535,08
	Cubierta Correa - Perfil 90X90X2.00 mm	5,59	2,00	14,00	1,00	78,26
	Cubierta Nivelantes - Perfil 90X90X2.00 mm	5,59	2,00	0,40	4,00	8,94
	Cubierta Cercha Ext - Perfil 90X90X2.00 mm	5,59	2,00	17,78	2,00	198,78
	Cubierta Cercha Int - Perfil 70X70X1.50 mm	4,34	2,00	6,35	4,00	110,24
	Cubierta Esq sin correa- Perfil 70X70X1.50 mm	4,34	2,00	1,00	1,00	4,34
	Cubierta - Varilla Lisa 3/8"	0,56	3/8.	9,00	4,00	20,16


Contratista	Supervisor				
 HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA Contratista	 ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA Asesora de Despacho para Infraestructura-Secretaría de Educacion de Boyaca Supervisor				
Total Item Acumulado					955,80




Objeto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
----------------	---

The architectural drawings include:

- Floor Plan:** A square plan with a red grid. Dimensions are 10m by 10m. The text "KONSTRUKCIJSKI PLAN" is at the bottom.
- Section:** A cross-section of the house showing the roof, walls, and floor. Dimensions are indicated on the left.
- Facade:** A detailed elevation of the house facade, showing a gabled roof, a central door, and a window. Dimensions are indicated on the left.




Objeto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
----------------	---

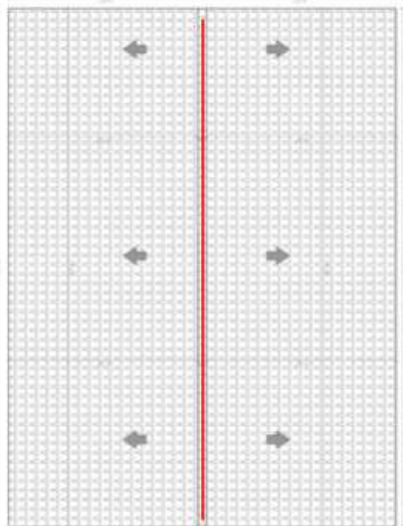Capítulo	REALIZAR CUBIERTA EN LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE TOIBITA		Unidad	Acta	Fecha			
Item	Descripción							
1,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO		Metro lineal					
IMAGEN O REGISTRO FOTOGRAFICO			Localización	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
				Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
			Cubierta Comedor Toibita - Caballete			14,00		14,00
Contratista			Supervisor					
 HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA Contratista			 ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA Asesora de Despacho para Infraestructura-Secretaría de Educación de Boyaca Supervisor					
			Total Item Acumulado				14,00	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA


Objeto: ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

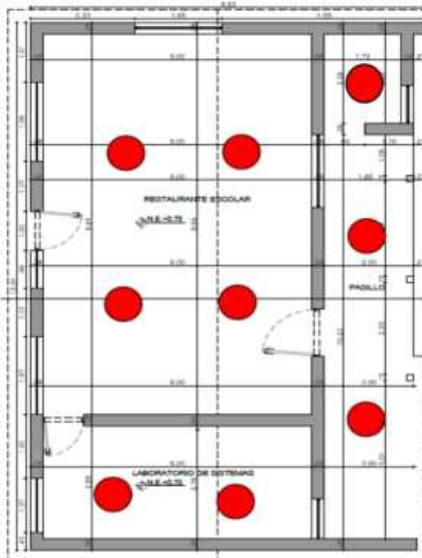
Capítulo	REALIZAR CUBIERTA EN LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE TOIBITA	Unidad	Acta	Fecha			
Item	Descripción	Unidad	Acta	Fecha			
1,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	Unidad					
IMAGEN O REGISTRO FOTOGRAFICO		Localización	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
			Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
		Comedor - Toibita				4,00	4,00
		Sala de Computo- Toibita				2,00	2,00
		Pasillo - Toibita				2,00	2,00
		Bodega - Toibita				1,00	1,00
Contratista		Supervisor		Total Item Acumulado			
 HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA Contratista		 ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA Asesora de Despacho para Infraestructura-Secretaría de Educación de Boyaca Supervisor		9,00			

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Objeto: ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Capítulo	Realizar	Descripción	Unidad	Acta	Fecha
Item					
1,06		SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE AWG 12 Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	Unidad		

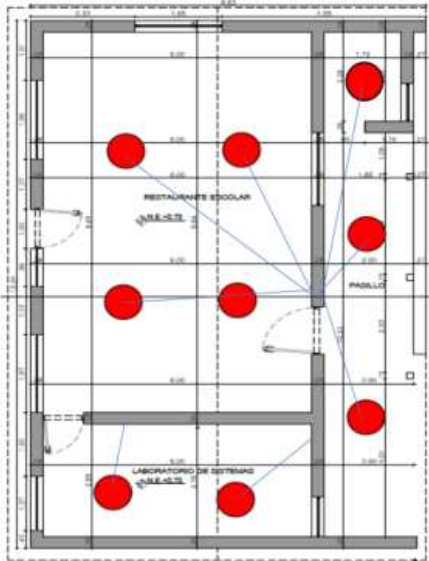IMAGEN O REGISTRO FOTOGRAFICO	Localización	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
	Comedor - Toibita				4,00	4,00
	Sala de Computo- Toibita				2,00	2,00
	Pasillo - Toibita				2,00	2,00
	Bodega - Toibita				1,00	1,00
Contratista	Supervisor					
 HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA Contratista	 ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA Asesora de Despacho para Infraestructura-Secretaria de Educacion de Boyaca Supervisor					
Total Item Acumulado						9,00



MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Objeto:	ADECUACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
---------	--


Capítulo	REALIZAR CUBIERTA EN LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE TOIBITA							
Item	Descripción		Unidad	Acta	Fecha			
1.07	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS		Metro Cuadrado					
IMAGEN O REGISTRO FOTOGRAFICO			Localización	Dimensiones promedio		Nº Elementos	Medida Total	
				Alto (m)	Espesor / Altura (m)			Longitud (m)
			Comedor - Toibita					
			General Comedor - Toibita	2,65		31,28		82,89
			Descuento Puerta principal	2,40		1,20	-1,00	-2,88
			Descuento puerta a sala de computo	2,00		0,90	-1,00	-1,80
			Descuento puerta auxiliar	2,10		0,95	-1,00	-2,00
			Descuento ventana 01 Muro Norte	1,20		1,80	-1,00	-2,16
			Descuento ventana 02 Muro Occidente	1,25		1,95	-1,00	-2,44
			Descuento ventana 03 Muro Sur	1,30		1,90	-1,00	-2,47
			Descuento ventana 04 Muro Sur Puerta	1,25		1,00	-1,00	-1,25
			Descuento ventana 05 Muro Sur	1,20		1,90	-1,00	-2,28
			Descuento dibujos artisticos	1,10		0,70	-8,00	-6,16
			Pestañas o base de marco puertas y ventanas	0,10		52,00		5,20
			Sala de Computo- Toibita					
			General Sala de Computo- Toibita	2,65		18,00		47,70
			Descuento ventana 01 Muro sur	0,35		1,35	-1,00	-0,47
			Descuento ventana 02 Muro norte	0,80		1,00	-1,00	-0,80
			Descuento puerta a comedor	2,00		0,90	-1,00	-1,80
			Pasillo - Toibita					
			Muro 01 exterior cocina	2,20		4,45		9,79
			Descuento venta	1,00		1,45	-1,00	-1,45
			Muro 02 Altar Virgen	2,75		2,10		5,78
			Descuento base de Altar	1,40		0,35	-1,00	-0,49
			Muro 03 exterior sala de computo y comedor	2,75		10,30		28,33
			Descuento ventana sala de computo	0,80		1,00	-1,00	-0,80
			Descuento dibujo artistico 01	1,55		3,25	-1,00	-5,04
			Descuento puerta principal comedor	2,40		1,20	-1,00	-2,88
			Descuento Descuento dibujo artistico 02	1,55		2,35	-1,00	-3,64
			Descuento ventana comedor	1,20		1,80	-1,00	-2,16
			Cuarto de Bodega o habitacion adicional					
			Bodega parte interior	2,75		8,40		23,10
			Descuento ventana	1,00		1,00	-1,00	-1,00
			Descuento puerta	2,00		1,00	-1,00	-2,00
			Zocalo exterior Bodega Muro 01	0,77		1,10		0,85
Zocalo exterior Bodega Muro 02	1,30		3,00		3,90			
Contratista			Supervisor					
HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA			ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA					
Contratista			Asesora de Despacho para Infraestructura-Secretaría de Educación de Boyaca					
			Supervisor					
			</					

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Objeto: ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Capítulo: REALIZAR PLACA PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL


Item	Descripción	Unidad	Acta	Fecha
2,01	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	Metro Cúbico		

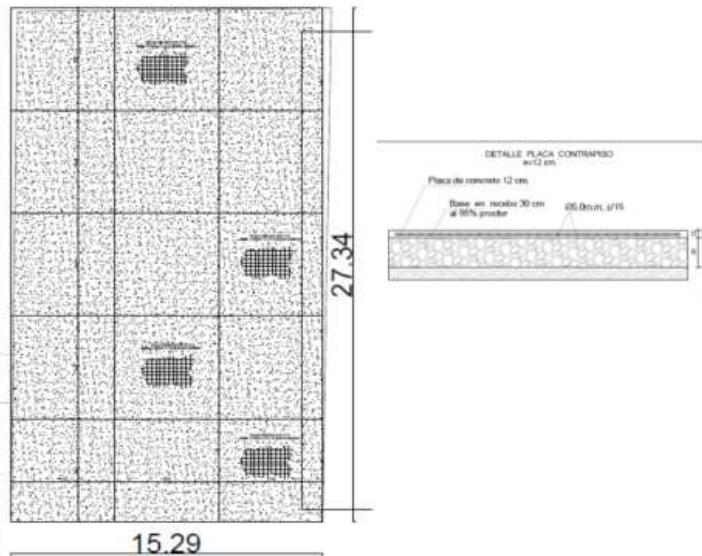
IMAGEN O REGISTRO FOTOGRAFICO	Localización	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Espesor / Altura (m)	Longitud (m)		
 15.29 27.34 DETALLE PLACA CONTRAFUERO 12 cm Placa de concreto 12 cm Base en relleno 30 cm al 95% proctor 27.34m x 15.29m	Base Placa campo deportivo	15,29	0,20	27,34		83,61
Contratista	Supervisor					
 HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA Contratista	 ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA Asesora de Despacho para Infraestructura-Secretaría de Educación de Boyacá Supervisor					
Total Item Acumulado					83,61	

MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

Objeto: ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Capítulo	Descripción	Unidad	Acta	Fecha
Item				
2,02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kilogramo		

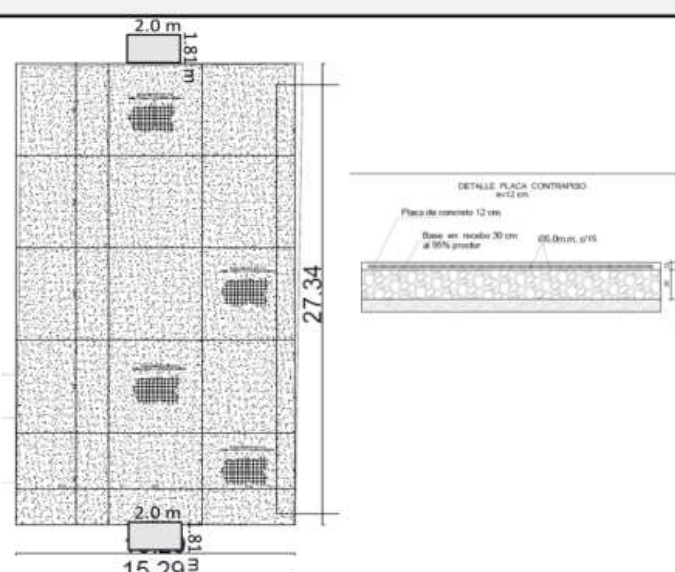IMAGEN O REGISTRO FOTOGRAFICO	Localización	Dimensiones promedio			Nº Elementos	Medida Total
		Ancho (m)	Peso (kg)	Longitud (m)		
	Malla para Placa de campo deportivo		29,40		35,00	1029,00
	Malla adicional placas para arcos		29,40		0,50	14,70
Contratista	Supervisor					
 HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA Contratista	 ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA Asesora de Despacho para Infraestructura-Secretaría de Educación de Boyacá Supervisor					
Total Item Acumulado						1.043,70



Objeto:	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
----------------	---

[illegible]

	INFORME DE EJECUCION	F_P_01
		Versión: 1.0
		Página 1 de 49

INFORME GENERAL DE EJECUCION

CONTRATO DE OBRA No. 2105-2025

**ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN
EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL
MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ**

**GOBERNACION DE BOYACA
MUNICIPIO DE PAIPA
2025**

Servimos Con Calidad y Excelencia
Email: ing.hugomontana@gmail.com
Tel: 3213270108

 CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA	INFORME DE EJECUCION	F_P_01
		Versión: 1.0
		Página 2 de 49


INFORME GENERAL DE EJECUCION

1. DATOS DEL CONTRATO:

FECHA DEL CONTRATO	30 de abril de 2025
TIPO DE CONTRATO	Contrato de Obra Publica
PROCESO No.	017/2025
CONTRATO No.	2105-2025
OBJETO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
CONTRATANTE	DEPARTAMENTO DE BOYACA
CONTRATISTA	HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA C.C. 1.055.228.532 EXPEDIDA EN PESCA
VALOR CONTRATO	NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS PESOS M/CTE (\$95.463.900,00); INCLUYE IVA, Y LOS DEMÁS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS.
FORMA DE PAGO	El DEPARTAMENTO pagará al CONTRATISTA el valor de la siguiente manera: EL pago total de la presente contratación será mediante un único pago correspondiente al 100% del valor total del contrato, una vez se suscriba el acta de recibido a satisfacción expedida por el supervisor del contrato y demás formatos establecidos por el Sistema Integrado de Gestión de Calidad; entre ellos acta de terminación y acta de liquidación, si con la cuenta no se acompañan los documentos requeridos para el pago, será responsabilidad del CONTRATISTA y no tendrá por ello derecho al pago de intereses. PARAGRAFO 1: La entrega de la documentación solicitada debe realizarse con todos los soportes documentales requeridos por la Tesorería del Departamento en la Central de Cuentas de la Gobernación de Boyacá, con el fin de realizar los trámites administrativos para el giro de los recursos estipulados. El Departamento no se responsabilizará por la demora en los pagos a la Sociedad, cuando ella fuere provocada por encontrarse incompleta la documentación que sirva de soporte para el trámite de las cuentas de cobro. PARAGRAFO 2: Los trámites correspondientes al pago deben ser gestionados por la Sociedad y radicados ante la Secretaría de Contratación de la Gobernación, dando cumplimiento al Artículo 19 de la Ley 1150 de julio 16 de 2007. DEL DERECHO DE TURNO. PARÁGRAFO 3: Los informes, certificaciones y demás soportes de ejecución deberán adjuntarse a la carpeta del convenio que reposa en la Secretaría de Contratación. PARAGRAFO 4: Los pagos estarán sujetos a la disponibilidad del PAC.
PLAZO DE EJECUCION	El plazo de ejecución del contrato será de TREINTA (30) DIAS CALENDARIO, contados a partir del Acta de Inicio y/o hasta agotar el presupuesto.
FECHA ACTA DE INICIO	07 de mayo de 2025
FECHA DE TERMINACIÓN	06 de junio de 2025
SUPERVISOR (A)	ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

	INFORME DE EJECUCION	F_P_01
		Versión: 1.0
		Página 3 de 49

2. LOCALIZACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

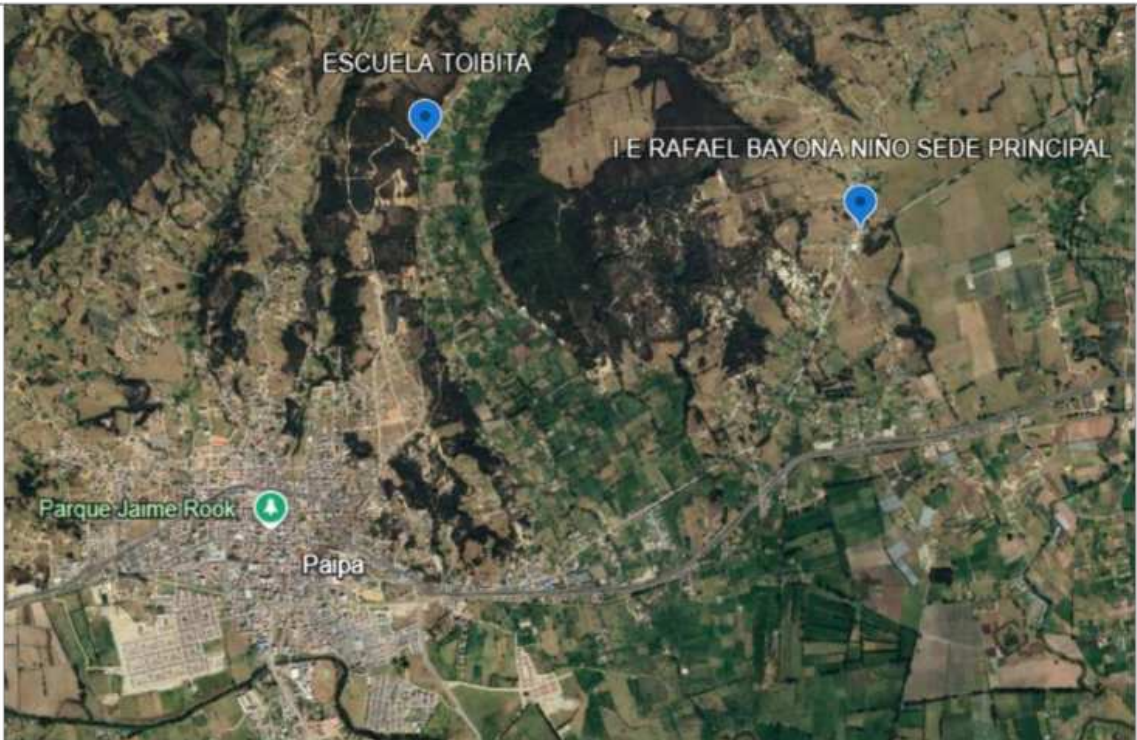Colombia – Boyacá – Municipio de Paipa	
	
Imagen Sitio del Proyecto - Google Earth	
	
I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL 5°47'43"N 73°05'23"W ESCUELA TOIBITA 5°47'57"N 73°06'37"W	

	INFORME DE EJECUCION	F_P_01
		Versión: 1.0
		Página 4 de 49

3. ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A DIFERENTES ASPECTOS:

3.1. ASPECTOS TECNICOS:

Durante la ejecución de la obra se implementaron los siguientes aspectos técnicos:

El personal empleado en la obra fue el adecuado e idóneo para la ejecución de las actividades previstas en el contrato.

Se cumplió con las obligaciones laborales, contractuales y legales adquiridas.

Para el desarrollo de la obra se ha utilizado el recurso técnico y administrativo idóneo requerido para la correcta ejecución del contrato.

Durante toda la ejecución del contrato se realizó el control de la programación física y financiera, velando por que el proyecto se desarrollara según lo programado y presupuestado, enfocado en el cumplimiento de especificaciones técnicas del mismo.

Se llevó a cabo el control en la ejecución de las actividades de obra, con el fin de cumplir las condiciones técnicas contratadas.

3.2. REGISTRO FOTOGRÁFICO PREVIO A LA INTERVENCIÓN

I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE TOIBITA





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 5 de 49



14/05/2025 10:09:58 a. m.
Via Sin Nombre
Paipa
Boyacá

I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL



15/05/2025 9:26:45 a. m.
Via Bonza
Paipa
Boyacá



15/05/2025 8:24:14 a. m.
Via Bonza
Paipa
Boyacá



14/05/2025 3:52:21 p. m.
Via Bonza
Paipa
Boyacá



14/05/2025 3:50:31 p. m.
Via Bonza
Paipa
Boyacá

 CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA	INFORME DE EJECUCION	F_P_01
		Versión: 1.0
		Página 6 de 49

3.3. CANTIDADES CONTRACTUALES Y ACTIVIDADES EJECUTADAS:

A continuación, se presenta un cuadro resumen de las actividades y cantidades realizadas durante la ejecución del contrato.

No.	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
1	REALIZAR CUBIERTA EN LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE TOIBITA			
1,01	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	kg	1.140,98	955,80
1,02	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	m2	145,46	145,46
1,03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ml	14,00	14,00
1,04	LAMINA PANEL (PVC-FOIL ALUM)	m2	95,46	104,01
1,05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W	und	8,00	9,00
1,06	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE AWG 12 Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)	und	8,00	9,00
1,07	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS	m2	33,80	161,56
2	REALIZAR PLACA PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL			
2,01	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)	m3	83,61	83,61
2,02	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	kg	1.029,00	1.043,70
2,03	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS	m3	41,80	42,53

A la fecha se realizó la ejecución de las actividades descritas anteriormente, logrando así un avance del 100 % de ejecución. Las actividades desarrolladas fueron las siguientes:

REALIZAR CUBIERTA EN LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE TOIBITA

ITEM 1.1 SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO

Este ítem se refiere al suministro e instalación perfilera metálica para estructura de cubierta. dimensiones y calibres según diseño (cubierta) que servirá de apoyo a la cubierta, construida según los diseños y planos, la instalación de la cubierta y de los demás elementos de remate y cierre contemplados en dichos diseños y definidos por el supervisor.



CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 7 de 49

Dentro de la ejecución de este ITEM se realizó el suministro e instalación de la perfilería metálica como estructura de la nueva cubierta de la I.E Rafael Bayona Niño sede Toibita.

REGISTRO FOTOGRAFICO






CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 8 de 49

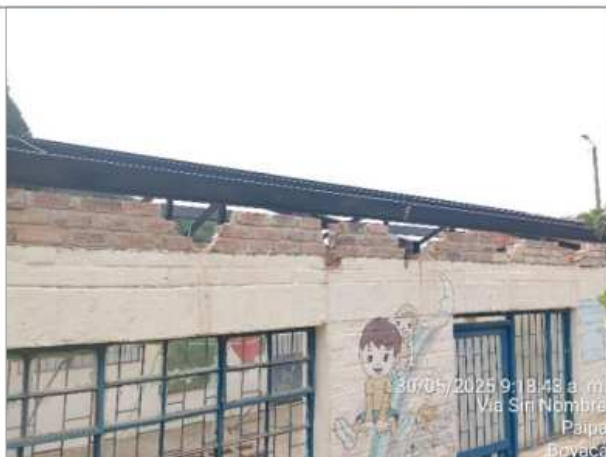



CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 9 de 49



 CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA	INFORME DE EJECUCION	F_P_01
		Versión: 1.0
		Página 10 de 49



ITEM 1.2 SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6

Este Ítem se refiere al suministro e instalación de cubierta en teja fibrocemento número 6, según detalles incluidos en los diseños y los planos del Proyecto.

Dentro de la ejecución de este ITEM se realizó el suministro e instalación de teja fibrocemento numero 6 para la cubierta de la I.E Rafael Bayona Niño sede Toibita.

REGISTRO FOTOGRAFICO






CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 11 de 49

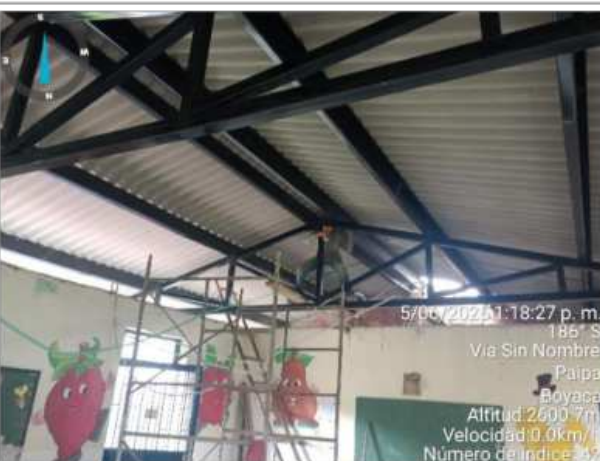

	INFORME DE EJECUCION	F_P_01
		Versión: 1.0
		Página 12 de 49



ITEM 1.3. SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO

Este Ítem se refiere al suministro e instalación caballete ondulado fibrocemento, según detalles incluidos en los diseños y los planos del Proyecto.

 CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA	INFORME DE EJECUCION	F_P_01
		Versión: 1.0
		Página 13 de 49

Dentro de la ejecución de este ITEM se realizó el suministro e instalación de caballete ondulado fibrocemento para la cubierta de la I.E Rafael Bayona Niño sede Toibita.

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM 1.4. LAMINA PANEL (PVC-FOIL ALUM)

Este Ítem se refiere al suministro e instalación de lámina panel (PVC-FOIL ALUM) según detalles incluidos en los diseños y los planos del Proyecto.

Dentro de la ejecución de este ITEM se realizó el suministro e instalación de techo en PVC incluida la estructura y demás accesorios señalados en el A.P.U, en el techo de las siguientes zonas de la I.E Rafael Bayona Niño sede Toibita.

- Techo PVC Comedor – Toibita
- Techo PVC Sala de Computo- Toibita
- Techo PVC Pasillo – Toibita
- Techo PVC Bodega – Toibita
- Techo PVC Tapa Cubierta – Toibita



CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 14 de 49

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 15 de 49



ITEM 1.5 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W

Este ítem se refiere al suministro e instalación de panel led de incrustar de 12W, en el techo de PVC, de acuerdo a las normas técnicas e indicaciones del supervisor.

	INFORME DE EJECUCION	F_P_01
		Versión: 1.0
		Página 16 de 49

Dentro de la ejecución de este ITEM se suministraron e instalaron panel led en los siguientes espacios de la I.E Rafael Bayona Niño sede Toibita.

- Comedor – Toibita - 4
- Sala de Computo- Toibita - 2
- Pasillo – Toibita - 2
- Bodega – Toibita - 1

REGISTRO FOTOGRAFICO



ITEM 1.6. SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE AWG 12 Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)

Este ítem se refiere al suministro e instalación de salida completa para interruptor doble en calibre AWG 12 y ducto PVC 1/2 " (incluye aparato), de acuerdo a las normas técnicas e indicaciones del supervisor.



CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01


Versión: 1.0

Página 17 de 49

Dentro de la ejecución de este ITEM se suministró e instalo la salida completa eléctrica de la I.E Rafael Bayona Niño sede Toibita.

- Comedor – Toibita - 4
- Sala de Computo- Toibita - 2
- Pasillo – Toibita - 2
- Bodega – Toibita - 1

REGISTRO FOTOGRAFICO

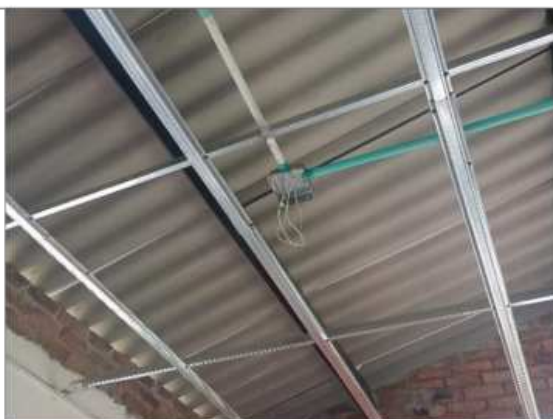



CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 18 de 49



 CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA	INFORME DE EJECUCION	F_P_01
		Versión: 1.0
		Página 19 de 49



ITEM 1.7. ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS

Esta actividad se refiere al suministro y aplicación de estuco plástico liso sobre muros internos, para sellar todas las juntas o grietas e imperfecciones; finalmente se pule la superficie con una lija dejando la superficie lista para las tres capas de pintura.

Dentro de la ejecución de este ITEM se estuco y se pintó con vinilo tres manos las siguientes zonas de la I.E Rafael Bayona Niño sede Toibita.

- Comedor – Toibita
- Sala de Computo- Toibita
- Pasillo – Toibita
- Bodega – Toibita
- Otros muros aledaños

REGISTRO FOTOGRAFICO



CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 20 de 49





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 21 de 49





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 22 de 49





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 23 de 49






CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 24 de 49

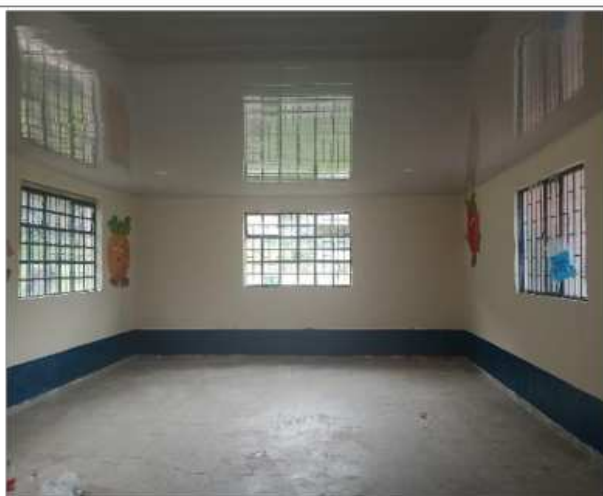

 CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA	INFORME DE EJECUCION	F_P_01
		Versión: 1.0
		Página 25 de 49

REALIZAR PLACA PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL

ITEM 2.1 SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) ()**

Este ítem se refiere al suministro, extendida y compactación de material seleccionado para base granular (incluye acarreo libre de 5km) (**) de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones y sitios dados por el supervisor.

Dentro de la ejecución de este ITEM se realizó el suministro, extendida y compactación de material seleccionado para base granular (incluye acarreo libre de 5km), para la cancha de la sede principal de la I.E Rafael Bayona Niño.

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 26 de 49





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 27 de 49





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 28 de 49





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 29 de 49





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 30 de 49



ITEM 2.2. MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)

Este ítem se refiere al suministro, fijación e instalación de malla electrosoldada 0.15 X 0.15 M D= 5MM de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones y sitios dados por el supervisor.

Dentro de la ejecución de este ITEM se realizó el suministro, fijación e instalación de malla electrosoldada 0.15 X 0.15 M D= 5MM, para la cancha de la sede principal de la I.E Rafael Bayona Niño.

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 31 de 49





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 32 de 49






CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 33 de 49

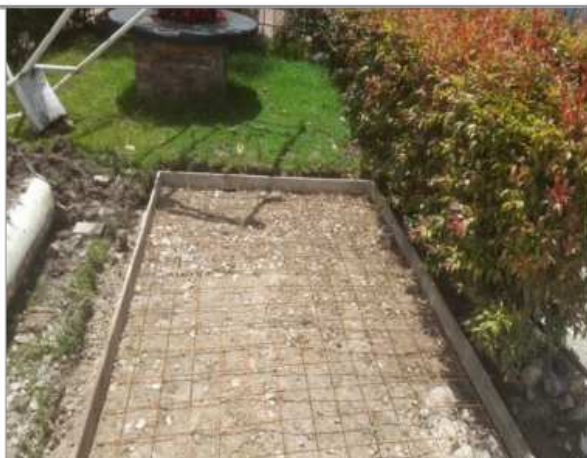

ITEM 2.3. CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS

Este ítem se refiere a suministro o elaboración de concreto simple de 21 MPA - (3000 PSI) impermeabilizado para placas pisos, de acuerdo a las especificaciones técnicas del proyecto, indicaciones y sitios dados por el supervisor.

Dentro de la ejecución de este ITEM se realizó la elaboración e instalación de concreto simple de 21 MPA - (3000 PSI) impermeabilizado para placas pisos, para la cancha de la sede principal de la I.E Rafael Bayona Niño, dando cumplimiento a todas las normas y especificaciones técnicas de calidad vigentes.

REGISTRO FOTOGRAFICO





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 34 de 49






CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 35 de 49

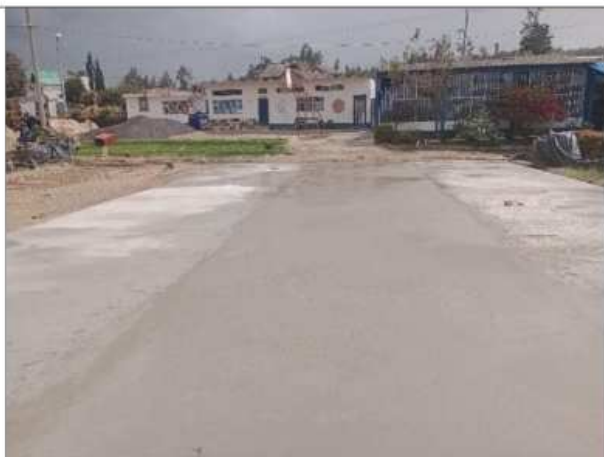



CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 36 de 49





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 37 de 49





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 38 de 49





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 39 de 49





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 40 de 49





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 41 de 49





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 42 de 49





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 43 de 49





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 44 de 49





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 45 de 49





CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 46 de 49



❖ Memorias y sabanas de cantidades.

Se anexan las memorias de cantidades correspondiente a cada una de las actividades de obra ejecutadas.

❖ Relación de personal empleado en la ejecución de la obra.

NOMBRE	CARGO
Hugo Armando Montaña Sanabria	Contratista y residente de obra
Yonathan Alexander Montaña Sanabria	Auxiliar de Obra
William Fernando Boyacá Sanabria	Auxiliar de Obra
Yair David Rojas Ariza	Maestro general

 CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA	INFORME DE EJECUCION	F_P_01
		Versión: 1.0
		Página 47 de 49

- ❖ Informe del estado de compra, logística y transporte de materiales (órdenes de compra, cronograma de entregas, certificaciones de calidad del material antes de su respectiva instalación).

Se realizó la entrega formal de las fichas y certificaciones técnicas de los materiales adquiridos, antes de su instalación, los cuales fueron aprobados por la supervisión del contrato.

Se anexan copia de los resultados de los ensayos de campo y de laboratorio efectuados para garantizar la calidad en la ejecución de algunos ítems del contrato.

- ❖ Análisis físico y financiero.

AVANCE FISICO		
PERIODO	Programado	Ejecutado
DESDE 07/MAY/2025 A 22 /MAY/2025	50%	39.09%
DESDE 23/MAY/2025 A 06 /JUN/2025	50%	60.91%

AVANCE FINANCIERO					
Fecha	Concepto	Valor Contrato	Acta de Pago parcial	Amortización	Desembolsos
N/A	N/A	\$ 95.463.900,00	N/A	N/A	\$ 0.00

TIEMPO EN MESES	Mes 1	Mes 2	Mes 3	Mes 4	Mes 5	Mes 6
PLAZO INICIAL DE EJECUCION	100%					
PLAZO FINAL EMPLEADO	100%					

A la fecha se ejecutó el 100% de las actividades del contrato

Para la ejecución total de las actividades se empleó el total del plazo programado para la ejecución del contrato.

COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Dentro del componente de seguridad y salud en el trabajo se desarrollaron las siguientes actividades:

- ✓ Radicación del certificado de afiliación ARL de todo el personal.
- ✓ Identificación de peligros y riesgos para el proyecto.
- ✓ Afiliación vigente del personal que participa en el proyecto a la seguridad social
- ✓ Identificación de las necesidades de EPP y dotación específicas para el proyecto.
- ✓ Registro de entrega de EPP y dotación – Residente de obra.

Se anexan las planillas de pago PILA de los trabajadores relacionados anteriormente.

Mes	No Planilla	Días	Aportes Salud	Aportes Pensión	Aportes ARL	Aportes CCF
05-2025	9487282406	30	\$ 178.000,00	\$ 227.800,00	\$ 99.100,00	\$ 28.500,00
05-2025	9488088825	24	\$ 45.600,00	\$ 182.300,00	\$ 79.300,00	\$ 45.600,00
05-2025	9486214507	6	\$ 35.600,00	\$ 45.600,00	\$ 19.900,00	\$ 0,00
05-2024	9486196939	6	\$ 35.600,00	\$ 45.600,00	\$ 19.900,00	\$ 0,00
06-2024	9488149154	6	\$ 22.800,00	\$ 91.200,00	\$ 39.800,00	\$ 22.800,00
06-2024	9488331724	30	\$ 178.000,00	\$ 227.800,00	\$ 99.100,00	\$ 0,00



CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA
DE PROYECTOS DE INGENIERÍA

INFORME DE EJECUCION

F_P_01

Versión: 1.0

Página 48 de 49

ASPECTOS FINANCIEROS:

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	\$ 95.463.900,00
2	VALOR ADICIONADO	\$ 0.00
3	VALOR TOTAL (1+2)	\$ 95.463.900,00
4	VALOR PRESENTE ACTA	\$ 95.463.025,00
5	VALOR TOTAL PAGOS EFECTUADOS	\$ 0.00
6	VALOR EJECUTADO (4+5)	\$ 95.463.025,00
7	SALDO A LIBERAR (3-6)	\$ 875.00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Se realizó el control. Seguimiento y evaluación de las condiciones y procesos relacionados con la ejecución del contrato de obra pública cuyo objeto es "ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ. Así mismo Se Verificó que los trabajadores que laboran en la ejecución del contrato, se encontraran afiliados al sistema de seguridad social y tuvieran las condiciones y los elementos adecuados para la realización de las diferentes actividades. Se dio cumplimiento a las obligaciones establecidas en el contrato, igualmente se realizó el seguimiento a la ejecución del contrato verificando principalmente la calidad de los materiales y mano de obra usados en el desarrollo del contrato.

❖ Garantías del Contrato:

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	
COMPANÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	51-44-101029799
ANEXO	ANEXO ACTA DE RECIBO FINAL

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Cumplimiento del Contrato	07/05/2025	07/12/2025	\$ 19.092.780,00
Pago de Salarios, pago de prestaciones sociales legales e indemnizaciones	07/05/2025	07/06/2025	\$ 4.773.195,00
Calidad del servicio	07/05/2025	07/11/2025	\$ 19.092.780,00
Estabilidad y calidad de la obra	08/07/2025	08/07/2030	\$ 19.092.780,00

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO	
COMPANÍA DE SEGUROS	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
POLIZA DE CUMPLIMIENTO No.	51-40-101010058
ANEXO	ANEXO ACTA DE INICIO

 CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA	INFORME DE EJECUCION	F_P_01
		Versión: 1.0
		Página 49 de 49

AMPAROS	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	DESDE	HASTA	
Predios Labores y Operaciones	07/05/2025	07/06/2025	\$ 284.700.000,00

- ❖ Relación de actos administrativos en orden cronológico, prorrogas, adiciones, suspensiones.

No se realizaron prorrogas, adiciones, o suspensiones al contrato.

- ❖ Actas contractuales

Acta	Descripción	Fecha
1	Acta de Inicio	07/05/2025
2	Informe de Avance 01 GC-P06-F01 -01	22/05/2025
3	Informe de Avance 02 GC-P06-F01-02	06/06/2025
4	Informe de Avance 03 GC-P06-F01-03	08/07/2025
5	Acta de modificación de cantidades	06/06/2025
6	Sabana de Cantidades GC-P06-F14	06/06/2025
7	Acta de terminación	06/06/2025
8	Acta de recibo final a satisfacción	08/07/2025

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

DOCUMENTOS ANEXOS:

- Memorias y sabanas de cantidades
- Seguridad Social
- Fichas técnicas material
- Ensayos de Laboratorio


HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA
CONTRATISTA

NOMBRE DEL CLIENTE :	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO- MUNICIPIO DE PAIPA.
CONTACTO CLIENTE:	HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA
CÓDIGO DE PROYECTO N°:	FDD035
CÓDIGO REPORTE:	RPD032
FECHA DE INGRESO	6 de junio de 2025
FECHA DE REPORTE:	9 de junio de 2025
LUGAR DE ENSAYO	LABORATORIO - FIELD DATA GEOLOGICAL ENGINEERING RESEARCH S.A.S

Señor:

HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA

Por medio del presente, nos permitimos informar los resultados de laboratorio correspondientes a los ensayos de Proctor modificado y densidades de campo realizados el día 6 de junio de 2025, sobre los materiales instalados en la Institución Educativa Rafael Bayona Niño, ubicada en el municipio de Paipa, Boyacá.

Los ensayos fueron efectuados de conformidad con los procedimientos establecidos en las normas técnicas correspondientes (INV-E 142-13) para Proctor Modificado e (INV-E 161-13) para densidades de campo), con el fin de verificar el cumplimiento de los requisitos de compactación establecidos para el proyecto.

Ensayo Proctor Modificado

Densidad máxima seca: 1,8 g/cm³

Contenido óptimo de humedad: 11,5 %


Ensayos de Densidad de Campo (N° de caPas: 1)


Porcentajes de compactación respecto al Proctor: del 98% al 102 % .

Se adjuntan resultados de laboratorio.

DECLARACIÓN: LOS RESULTADOS PRESENTADOS EN ESTE INFORME CORRESPONDEN EXCLUSIVAMENTE A LAS MUESTRAS IDENTIFICADAS DE MANERA INEQUÍVOCA CON LOS CÓDIGOS INTERNOS, ESTOS CÓDIGOS PERMITEN RASTREAR CADA MUESTRA A LO LARGO DE TODO EL PROCESO ANALÍTICO, GARANTIZANDO LA EXACTITUD Y LA CONFIABILIDAD DE LOS RESULTADOS. LOS ANÁLISIS SE REALIZARON BAJO LAS CONDICIONES ESPECÍFICAS DETALLADAS EN ESTE INFORME, Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS SON VÁLIDOS ÚNICAMENTE PARA LAS MUESTRAS ANALIZADAS Y LAS CONDICIONES DE ENSAYO DESCRITAS.

Cordialmente,


 46337518
 Ana Cecilia Santos Perez
 Ingeniero geólogo/ Especialista en Geotécnia



 Nestor Mauricio Gutierrez Duarte
 Ingeniero geólogo/PhD. Geología.

		FIELD DATA					CODIGO		
		ENSAYO DE DENSIDAD EN CAMPO INV E-161					VERSION		
							PAGINA		
FECHA	DD	MM	AA	PROYECTO	ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO- MUNICIPIO DE PAIPA.			CONSECUTIVO	N/A
	6/06/2025			SOLICITO	HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA				
DESCRIPCION MATERIAL		SUBBASE GRANULAR (SBG-38)							
PROCTOR N°		1			PROCEDENCIA-MATERIAL		ACOPIO EN OBRA		
LOCALIZACION		INSTITUCION EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO- MUNICIPIO DE PAIPA			LABORATORISTA		IDALURO MUÑOZ		
COMPACTACION ESPECIFICA (%)		95%			HUMEDAD OPTIMA (%)		11,5		
ENSAYO N°					DENSIDAD SECA MAX(gr/cm3)		1,80		
FECHA	DD-MM-AA	6/06/2025	6/06/2025	6/06/2025	6/06/2025	6/06/2025	6/06/2025	6/06/2025	6/06/2025
CAPA		SUBBASE GRANULAR (SBG-38)	SUBBASE GRANULAR (SBG-38)	SUBBASE GRANULAR (SBG-38)	SUBBASE GRANULAR (SBG-38)	SUBBASE GRANULAR (SBG-38)	SUBBASE GRANULAR (SBG-38)	SUBBASE GRANULAR (SBG-38)	SUBBASE GRANULAR (SBG-38)
ABSCISA		N/A	N/A	N/A					23
DETERMINACION		SUR			CENTRO			OCCIDENTE	
ITEM	UNIDAD	1	2	3	4	5	6	7	8
(1) Peso frasco + arena antes	gr	7137	7089	7022					
(2) Peso frasco + arena despues	gr	3427	3928	3848					
(3) Arena usada = (1) - (2)	gr	3710	3161	3176					
(4) Peso arena en embudo (CONSTANTE DEL CONO)	gr	1610	1610	1610					1610
(5) Arena en hueco = (3) - (4)	gr	2100	1551	1566					
(6) Densidad de la arena	gr/cm3	1,41	1,41	1,41					1,41
(7) Volumen del hueco (5) / 6	cm3	1489,4	1100,0	1110,6					
(8) Densidad suelo húmedo	gr	2940	2114	2095					
(9) Densidad suelo húmedo (7) / (6)	gr/cm3	1,974	1,922	1,886					
(10) Tara N°	-	N/A	N/A	N/A					
(11) Peso tara + muestra húmeda	gr	N/A	N/A	N/A					
(12) Peso tara + muestra seca	gr	N/A	N/A	N/A					
(13) Peso tara	gr	N/A	N/A	N/A					
(14) Peso agua (10) - (11)	gr	N/A	N/A	N/A					
(15) Peso muestra seca (11) - (12)	gr	N/A	N/A	N/A					
(16) Contenido de humedad ((13)-(14))/((14)-100) (HUMEDAD EN CAMPO)	%	4,20	3,80	2,50					
(17) Densidad suelo seco (8) / (1+((15)/100))	gr/cm3	1,89	1,85	1,84					
(18) % de la densidad máxima (PROCTOR)	%	1,80	1,80	1,80					
(19) Peso húmedo de material > 3/4 (RETENIDO EN 3/4")	gr	369	397	335					
(20) peso seco sobretamafos (19)/1,01	gr	361,8	389,2	328,4					
(21) peso material fino húmedo (7)-(18)	gr	2571	1717	1760					
(22) Peso seco de partículas finas, gr. (20)/(1+((15)/99))	gr	2467,4	1654,1	1717,1					
(23) Peso total de la muestra seca (21)+(19)	gr	2829,1	2043,4	2045,5					
(24) Densidad del suelo (22)/(6)	gr/cm3	1,90	1,86	1,84					
(25) Porcentaje sobretamafos 100"/(19)/(22)	%	12,6	19,0	16,1					
(26) Porcentaje de partículas finas 100-(24)	%	87,2	81,0	83,9					
(27) densidad bulk sobretamafos	gr/cm3	2,6	2,6	2,6	2,29	2,29	2,29	2,29	2,29
(28) densidad corregida 100"/(26)*((17)/(24))+((25)/(26))	gr/cm3	1,874	1,912	1,894					
(29) Volumen del material > 3/4 (18)/(26)	cm3	141,9	152,7	126,8	162,7	161,6	161,6	161,6	161,6
(30) Porcentaje de compactacion (23)/(27)	%	102,0	98,0	98,0	99,0	99,0	99,0	99,0	99,0
OBSERVACIONES									
ELABORADO POR:  Idaluro Muñoz Laboratorio APROBADO POR:  Ana Cecilia Santos P. Jefe de proyectos									
Calle 2a No 27 - 68 -Barrio San Andresito - Sogamoso e-mail: cecilia.santos@fielddata.world									

	FIELD DATA S.A.S				CODIGO	22.F15-1	
	ENSAYO PROCTOR				VERSION	1	
	INV E-141 -13 Y INV E-142 -13				FECHA	2018	
				PAGINA	1 DE 1		

PROYECTO	ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA ESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO- MUNICIPIO DE PAIPA.				Profundidad	NA	
Muestra N°	DI034	Solicita	HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA			Martillo (lb.)	10
Fecha	6/06/2025	Material	SUBBASE GRANULAR (SBG-38)			N° capas	5
Laboratorista	IDAURO MUÑOZ	Procedencia material	ACOPIO EN OBRA			Golpes/capa	56
Ingeniera de proyectos	ANA CECILIA SANTOS					Caída (pulg.)	18

ENSAYO DE PROCTOR	Unidad	1	2	3	4	5					
Masa de la muestra húmeda y molde	g	6604	6792	6971	6975						
Masa del molde	g	2718	2718	2718	2718						
Masa de la muestra húmeda	g	3886	4074	4253	4257						
Masa de la muestra seca	g	3649	3746	3810	3670						
Volumen del molde	cm ³	2109	2109	2109	2109						
Densidad de la muestra seca	g/cm ³	1,730	1,776	1,806	1,740						
Tara N°		28	80	201	100	105	78	81	1		
Masa muestra húmeda + tara	g	431,6	399,1	363,7	349,8	405,8	444	447,31	409,3		
Masa muestra seca + tara	g	407,7	378,3	338,3	325,9	369,0	402,8	393,5	359,7		
Masa agua	g	23,9	20,8	25,4	23,9	36,7	41,2	53,8	50		
Masa tara	g	47,8	51,5	49,3	50,2	51,2	50,7	56,6	48,8		
Masa muestra seca	g	359,9	326,8	289,0	275,7	317,8	352,1	336,9	310,9		
Humedad de moldeo	%	6,6	6,4	8,8	8,7	11,6	11,7	16,0	16,0		
Humedad Promedio	%	6,5		8,7		11,6		16,0			

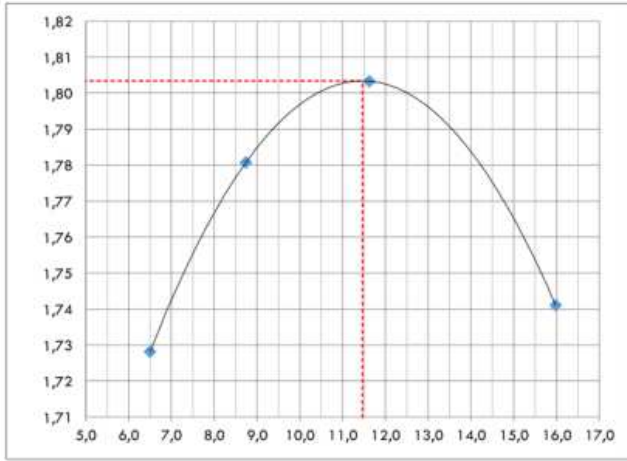

Humedad de Moldeo %

CLASIFICACIÓN		
L.L.	%	
L.P.	%	
I.P.		
Pasa N° 200	%	
A.A.S.H.T.O.		
U.S.C.		
Densidad máxima	g/cm ³	1,80
Humedad óptima	%	11,5

OBSERVACIONES

Aprobó


 Ing. Ana Cecilia Santos Perez
 Jefe de proyectos

Calle 2a N. 27-68 - sogamoso - Boyaca - Celular: 3158468211 e-mail: cecilia.santos@fielddata.world

Ficha técnica Base Granular

Cantera: Agregados Garzón Sánchez.


Municipio: Paipa Vereda: El Túnel Departamento: Boyacá

Muestra: 001-Base Granular.



Granulometría.

Se considerarán los límites inferiores y superiores de la gradación fina y gruesa teniendo en cuenta las curvas **BG-40**, **BG-27**, **BG-38** Y **BG-25** de la Norma **invias** para determinar la línea granulométrica de la base granular, utilizando la siguiente curva.

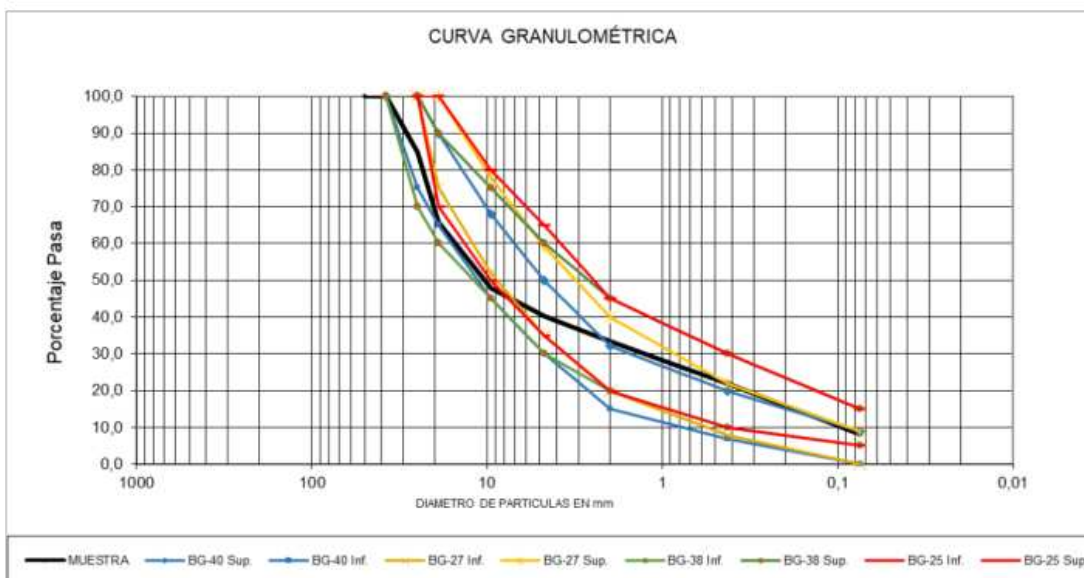

Plasticidad.

El análisis realizado mediante los límites de Atterberg indica que el material en cuestión no es líquido ni plástico, lo que lo convierte en un material óptimo para su uso como Base Granular.

Desgaste.

Teniendo en cuenta las normas **INVÍAS NT2** y **NT3**, que regulan el uso de materiales para vías, se establece un límite máximo de desgaste del 50% en el ensayo de desgaste realizado con la máquina de Los Ángeles. En este contexto, nuestro material de base ha presentado un desgaste del **32.5%**, lo cual se encuentra dentro de los rangos permitidos por dichas normas.

Nota:

Los soportes de los ensayos antes mencionadas se encuentran anexos a al presente documento.

Nuestros Equipos son
Certificados y Calibrados por:

Concrelab
MEDICIÓN CONFIABLE

Cels. 3134503624

www.ingeogis.com

E-mail: ingeogis@gmail.com

CALLE 5 No 22 A 05 - PISO 1 BARRIO VILLA DEL SOL

SOGAMOSO – BOYACÁ – COLOMBIA



 CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORÍA DE PROYECTOS DE INGENIERÍA		BITÁCORA DE OBRA		F_P_01
				VERSION: 1.0
				PAGINA 1 DE 1
PERIODO REPORTADO				
No. DE FOLIO				
DATOS DEL CONTRATO				
CONTRATO DE OBRA No.		2105-2025		
OBJETO		ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN		30 DE ABRIL DE 2025		
CONTRATANTE		GOBERNACIÓN DE BOYACA		
CONTRATISTA		HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA C.C 1055228532		
SUPERVISOR (A)		ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA		
VALOR CONTRATO		\$ 93.463.900		
PLAZO DE EJECUCION		UN (01) MESES		
FECHA ACTA DE INICIO		SIETE (07) DE MAYO DE 2025		
ACTIVIDADES A DESARROLLAR				
1	REALIZAR CUBIERTA EN LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE TOIBITA			
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFLERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISEÑO			
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6			
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO			
1.4	LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)			
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W			
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE AWG 12 Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)			
1.7	ESTUCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS			
	REALIZAR PLACA PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL			
2.1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)			
2.2	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)			
2.3	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS			
ANOTACIONES				
No.	TIPO DE NOTA	FECHA	NOTAS Y CROQUIS	
1	Sede: Toibita y sede principal. Clima: Soleado Actividades: Entrega de obra por parte de la supervisora. Personal: Contratista	7 MAYO DEL 2025	Municipio de Paipa I.E Rafael Bayona Niño.	

ANOTACIONES			
No.	TIPO DE NOTA	FECHA	NOTAS Y CROQUIS
2	Sede: Toibita y sede principal. Clima: Soleado. Actividades: Trabajos preliminares Alcaldía Municipal. Sin personal.	8 MAYO DEL 2025	SEDE PRINCIPAL SEDE TOIBITA
3	Sede: Toibita y sede principal. Clima: Soleado Actividades: Trabajos preliminares Alcaldía Municipal. Sin personal.	09 MAYO DEL 2025	SEDE PRINCIPAL SEDE TOIBITA
4	Sede: Toibita Clima: Lluvioso Actividad: Retiro de escombros cubierta. Personal: Residente de Obra y auxiliar.	12 MAYO DEL 2025	SEDE TOIBITA

ANOTACIONES			
Nº.	TIPO DE NOTA	FECHA	NOTAS Y CROQUIS
5	Sede: Toibita Clima: Fuertes lluvias. Actividad: Retiro de escombros cubierta. Personal: Residente y auxiliar de obra.	13 MAYO DEL 2025	SEDE TOIBITA
6	Sede: Toibita y Sede principal. Clima: Fuertes lluvias. Actividad: Suspensión de actividad del día, por condiciones climáticas.	14 MAYO DEL 2025	NO APLICA
7	Sede: Toibita y Sede principal. Clima: Nublado Actividad: Suministro e instalación de estructura metálica cubierta. Perfilamiento y retiro de escombros cancha. Personal: Residente y cuadrilla.	15 MAYO DEL 2025	SEDE TOIBITA Y SEDE PRINCIPAL.

ANOTACIONES			
No.	TIPO DE NOTA	FECHA	NOTAS Y CROQUIS
8	Sede: Toibita y sede principal. Clima: Nublado Actividad: Suministro e instalación de estructura metálica cubierta. Compactación subyacente cancha.	16 MAYO DEL 2025	SEDE TOIBITA Y SEDE PRINCIPAL PERSONAL: Residente y cuadrilla.
9	Sede: Toibita Clima: Lluvioso Actividad: Suministro e instalación de estructura metálica cubierta. Personal: Residente y cuadrilla.	17 MAYO DEL 2025	SEDE TOIBITA
10	Sede: Toibita Clima: Lluvioso Actividad: Suministro e instalación de estructura metálica cubierta. Personal: Residente y cuadrilla	19 MAYO DEL 2025	SEDE TOIBITA

ANOTACIONES			
No.	TIPO DE NOTA	FECHA	NOTAS Y CROQUIS
11	Sede: Toibita y Sede principal. Clima: Nublado Actividad: Suministro e instalación de estructura metálica cubierta. Suministro extendida y compactación base granular. Personal: Residente y cuadrilla.	20 DE MAYO DEL 2025	SEDE TOIBITA Y SEDE PRINCIPAL.
12	Sede: Toibita y Sede principal. Clima: Soleado Actividad: Suministro e instalación de cubierta en teja y caballete. Suministro, extendida y compactación base granular. Personal: Residente y cuadrilla.	24 DE MAYO DEL 2025	SEDE TOIBITA Y SEDE PRINCIPAL

ANOTACIONES			
No.	TIPO DE NOTA	FECHA	NOTAS Y CROQUIS
13	Sede: Toibita y sede principal. Clima: Soleado Actividad: Suministro e instalación de cubierta en teja y caballete. Suministro, extendida y compactación base granular. Personal: Residente y cuadrilla.	22 DE MAYO DEL 2025	SEDE TOIBITA Y SEDE PRINCIPAL
14	Sede: Toibita y sede principal. Clima: Soleado. Actividad: Suministro, extendida y compactación base granular. Personal: Residente y cuadrilla	23 DE MAYO DEL 2025	SEDE TOIBITA Y SEDE PRINCIPAL.

 CONSTRUCCIÓN Y CONSULTORIA EN PROYECTOS DE INGENIERÍA	BITACORA DE OBRA		E_P_01
			VERSION: 1.0
			PAGINA 1 DE
PERIODO REPORTADO			
No. DE FOLIO			
DATOS DEL CONTRATO			
CONTRATO DE OBRA No.	2105-2025		
OBJETO	ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACA		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 DE ABRIL DE 2025		
CONTRATANTE	GOBERNACION DE BOYACA		
CONTRATISTA	HUGO ARMANDO MONTANA SANABRIA C.C 1055228532		
SUPERVISOR (A)	ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA		
VALOR CONTRATO	\$ 93.463.900		
PLAZO DE EJECUCION	UN (01) MESES		
FECHA ACTA DE INICIO	SIETE (07) DE MAYO DE 2025		
ACTIVIDADES A DESARROLLAR			
1	REALIZAR CUBIERTA EN LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE TOIBITA		
1.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFLERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISEÑO		
1.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6		
1.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO		
1.4	LAMINA PANEL(PVC-FOIL ALUM)		
1.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PANEL LED REDONDO DE INCRUSTAR DE 12 W		
1.6	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA COMPLETA PARA INTERRUPTOR DOBLE EN CALIBRE AWG 12 Y DUCTO PVC 1/2 " (INCLUYE APARATO)		
1.7	ESTUCCO Y VINILO TRES MANOS EN MUROS		
	REALIZAR PLACA PARA EL CAMPO DEPORTIVO DE LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL		
2.1	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL SELECCIONADO PARA BASE GRANULAR (INCLUYE ACARREO LIBRE DE 5KM) (**)		
2.2	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 5MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)		
2.3	CONCRETO SIMPLE DE 21 MPa - (3000 PSI) IMPERMEABILIZADO PARA PLACAS PISOS		
ANOTACIONES			
No.	TIPO DE NOTA	FECHA	NOTAS Y CROQUIS
15	Sede: Toibita y sede principal Clima: Soleado Actividad: Suministro e instalación de techo PVC. Personal: Residente y cuadrilla.	23 DE MAYO DE 2025	SEDE TOIBITA Y SEDE PRINCIPAL.

ANOTACIONES			
No.	TIPO DE NOTA	FECHA	NOTAS Y CROQUIS
16	Sede: Toibita y sede principal. Clima: Nublado Actividad: Nivelación manual cancha. Suministro e instalación de techo PVC, puntos eléctricos.	24 DE MAYO DEL 2025	SEDE TOIBITA Y SEDE PRINCIPAL PERSONAL: Residente y cuadrilla.
17	Sede: Toibita y sede principal. Clima: Nublado Actividad: Nivelación manual cancha. Suministro e instalación de techo PVC, puntos eléctricos. Personal: Residente y cuadrilla.	26 DE MAYO DEL 2025	SEDE TOIBITA Y SEDE PRINCIPAL.
18	Sede: Toibita y sede principal. Clima: Lluvioso. Actividad: Nivelación manual cancha. Suministro e instalación de techo PVC, puntos eléctricos. Personal: Residente y cuadrilla.	27 DE MAYO DEL 2025	SEDE TOIBITA Y SEDE PRINCIPAL.

ANOTACIONES			
No.	TIPO DE NOTA	FECHA	NOTAS Y CROQUIS
19	Sede: Toibita y sede principal. Clima: Soleado Actividad: Toma de densidades. Instalación de bamparas y estuco y vinilo. Personal: Residente y cuadrilla.	28 DE MAYO DEL 2025	SEDE TOIBITA y SEDE PRINCIPAL
20	Sede: Toibita y sede principal. Clima: Nublado Actividad: Instalación de malla y formaleta. Estuco y vinilo. Personal: Residente y cuadrilla.	29 DE MAYO DEL 2025	SEDE TOIBITA y SEDE PRINCIPAL.
21	Sede: Toibita y sede principal. Clima: Nublado. Actividad: Instalación de malla y formaleta. Estuco y vinilo. Personal: Residente y cuadrilla.	30 DE MAYO DEL 2025	SEDE TOIBITA y SEDE PRINCIPAL

ANOTACIONES			
No.	TIPO DE NOTA	FECHA	NOTAS Y CROQUIS
22	Sede: Toibita y sede principal. Clima: Nublado. Actividad: Estuco y vinilo. Suministro de materiales para concreto. Personal: Residente y cuadrilla.	31 DE MAYO DE 2025	SEDE TOIBITA Y SEDE PRINCIPAL
23	Sede: Sede principal. Clima: Soleado. Actividad: Elaboración de concreto. Toma de cilindros. Personal: Residente y cuadrilla.	03 DE JUNIO DE 2025	SEDE PRINCIPAL
24	Sede: Sede principal. Clima: Soleado. Actividad: Elaboración de concreto. Toma de cilindros. Personal: Residente y cuadrilla.	04 DE JUNIO DEL 2025	SEDE PRINCIPAL

ANOTACIONES			
No.	TIPO DE NOTA	FECHA	NOTAS Y CROQUIS
25	Sede: Sede prin- cipal Clima: Soleado Actividad: Elabo- ración de concre- to. Toma de cilin- dros. Personal: Residen- te y cuadrilla.	05 DE JUNIO DEL 2025	SEDE PRINCIPAL
26	Sede: Sede prin- cipal. Clima: Soleado Actividad: Elabo- ración de concreto Toma de cilindros Estuco y vinilo. Personal: Residen- te y cuadrilla.	06 DE JUNIO DEL 2025	SEDE PRINCIPAL

	CUENTA DE COBRO	F_P_01
		Versión: 1.0
		Página 1 de 1

PAIPA, BOYACA
JULIO DE 2025

CUENTA DE COBRO

DEPARTAMENTO DE BOYACA

NIT 891.800.498-1

DEBE A:

HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA

C.C 1.055.228.532
DE PESCA (BOYACÁ)

LA SUMA DE:

\$ 95.463.025,00


(NOVENTA Y CINCO MILLONES CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES MIL VEINTICINCO PESOS MCTE)

POR CONCEPTO DE:

ACTA DE RECIBO FINAL Y/O LIQUIDACION DEL CONTRATO DE OBRA No. 2105-2025 CUYO OBJETO ES ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.

NOTA: AUTORIZO A LA SECRETARIA DE HACIENDA O RESPONSABLE DE PAGOS, PARA QUE REALICE LA TRANSFERENCIA A LA CUENTA DE AHORROS No. **35851216551** DE BANCOLOMBIA.

Cordialmente,.



HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA

C.C 1.055.228.532 DE PESCA (BOYACÁ)

TEL: 3213270108

EMAIL: ing.hugomontana@gmail.com

	FORMATO	VERSIÓN: 0
		CÓDIGO: A-AD-GC-F-020
INFORME DE AVANCE DEL CONTRATISTA		FECHA: 24/Jul/2019

PERIODO REPORTE DEL 07-06-2025 AL 08-07-2025

CONTRATO No. 2105-2025

REGISTRO BPyP No.: 20250000016912

FECHA INICIACIÓN 07 DE MAYO DE 2025

FECHA TERMINACIÓN 06 DE JUNIO DE 2025

CONTRATISTA: HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA


INTERVENTOR: ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

OBJETO DEL CONTRATO: ADECUACIÓN Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOIBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL INTERVENTOR			
ITEM	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES			OBSERVACIONES
			T	P	N	
	Elaborar los informes y memorias de calculo finales, de acuerdo a las dimensiones reales registradas y revisadas. Incluye registro fotografico y demas evidencias solicitadas por la entidad contratante.	100%	X			Actividad ejecutada de acuerdo a los parámetros establecidos.
	Realizar el pago de los Aportes al Sistema Integral de Seguridad Social, y aportes parafiscales a las Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar "ICBF" y Servicio Nacional de Aprendizaje "SENA", Artículo 23 Ley 1150 de 2007, y demás impuestos de Ley según corresponda.	100%	X			Actividad ejecutada de acuerdo a los parámetros establecidos.
	Actualizar las pólizas o garantías del contrato	100%	X			Actividad ejecutada de acuerdo a los parámetros establecidos.
	Presentar informe final junto con todos los formatos, soportes y anexos necesarios para tramitar el pago correspondiente.	100%	X			Actividad ejecutada de acuerdo a los parámetros establecidos.

Firma: 

Nombre: ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA
INTERVENTOR Y/O SUPERVISOR

Firma: 

Nombre: HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA
CONTRATISTA

T: Cumple totalmente las actividades pactadas.

P: Cumple parcialmente las actividades pactadas.

N: No cumplió las actividades pactadas.

	FORMATO	VERSIÓN: 1 CÓDIGO: A-AD-GC-F-029
	INFORME DE INTERVENTORÍA Y/O SUPERVISIÓN	FECHA: 26/Feb/2021

MARQUE CON UNA "X" EL TIPO DE INFORME:

CONTRATO: _____	CONVENIO: _____
INTERVENTORÍA: _____	SUPERVISIÓN: <u> X </u>
PARCIAL: _____	FINAL: _____

INFORME No:	3	FECHA:	24	de	JULIO	de	2025
PERIODO:	DEL 7	de	JUNIO	de	2025	AL	8 de JULIO de 2025
Nº. CONTRATO O CONVENIO	2105	DE	2025	FECHA:	30 de	ABRIL	de 2025
VALOR DEL CONTRATO O CONVENIO	\$ 95.463.900,00		RPC		4086		
REGISTRO BP y P No.	202500000016912						
CONTRATISTA O ENTIDAD PARTE DEL CONVENIO	HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA NIT. 1.055.228.532-8 C.C. 1.055.228.532 DE PESCA, BOYACÁ						

OBJETO: ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE PRINCIPAL Y SEDE TOBITA DEL MUNICIPIO DE PAIPA, DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

INFORMACIÓN DEL CONTRATO O CONVENIO			
NOMBRE DEL SUPERVISOR O INTERVENTOR	ING. LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA		
Teléfono:	3002374117	Dirección:	Calle 18 No. 10-29
FECHAS DE INICIO Y TERMINACIÓN		CONTRATO/CONVENIO	
		dd	mm aaaa
FECHA DE INICIACIÓN		7	5 2025
PLAZO INICIAL	UN (01) MESES		
PLAZO CON ADICIONES	N/A		
FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO O CONVENIO INICIAL		6	6 2025
FECHA DE TERMINACIÓN REAL (Según prórrogas y suspensiones)			

INFORME ADMINISTRATIVO

RELACIÓN DE ACTAS GENERADAS (Inicio, Parcial, Suspensión, reinicio, etc.)
--

CONTRATO O CONVENIO		
DESCRIPCIÓN	FECHA (dd/mm/aaaa)	OBSERVACIÓN

ADICIONALES EN VALOR Y/O PLAZO


CONTRATO O CONVENIO			
NUMERO DE ADICIONAL	FECHA ADICIONAL (dd/mm/aaaa)	VALOR	PLAZO
N/A		N/A	N/A
VALOR ADICIONALES Y PLAZO TOTAL			

MODIFICATORIOS DEL CONTRATO O CONVENIO

No.	CLAUSULA MODIFICADA	FECHA MODIFICATORIO (dd/mm/aaaa)	DESCRIPCIÓN MODIFICACIÓN
N/A	N/A		N/A

SEGUIMIENTO A OBLIGACIONES LEGALES Y ESTABLECIDAS EN EL CONTRATO O CONVENIO
--

ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACIÓN EJECUCIÓN			OBSERVACIONES Y SOPORTES (Cuando aplique)
		T	P	N	
1. REALIZAR CUBIERTA EN LA I.E. RAFAEL BAYONA NIÑO SEDE TOBITA					
ELABORAR LOS INFORMES Y MEMORIAS DE CALCULO FINALES, DE ACUERDO A LAS DIMENSIONES REALES REGISTRADAS Y REVISADAS. INLUYE REGISTRO FOTOGRAFICO Y DEMAS EVIDENCIAS SOLICITADAS POR LA ENTIDAD CONTRATANTE.	100%	X			ACTIVIDAD EJECUTADA DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS.
REALIZAR EL PAGO DE LOS APORTES AL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL, Y APORTES PARAFISCALES A LAS CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR , INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR “ICBF” Y SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE “SENA” , ARTÍCULO 23 LEY 1150 DE 2007, Y DEMÁS IMPUESTOS DE LEY SEGÚN CORRESPONDA.	100%	X			ACTIVIDAD EJECUTADA DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS.
ACTUALIZAR LAS PÓLIZAS O GARANTÍAS DEL CONTRATO	100%	X			ACTIVIDAD EJECUTADA DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS.
PRESENTAR INFORME FINAL JUNTO CON TODOS LOS FORMATOS, SOPORTES Y ANEXOS NECESARIOS PARA TRAMITAR EL PAGO CORRESPONDIENTE.	100%	X			ACTIVIDAD EJECUTADA DE ACUERDO A LOS PARÁMETROS ESTABLECIDOS.

INFORME TÉCNICO					
AVANCE DE EJECUCIÓN					
CONTRATO O CONVENIO					
% DE AVANCE CONTRATO/CONVENIO	100,0%	% TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO	100,0%	% PAGOS AUTORIZADOS	0,0%
■ % DE AVANCE C ONTRATO/CONVENIO ▨ % TIEMPO TRANSCURRIDO CONTRATO/CONVENIO ▩ % PAGOS A UTOR IZADOS					

DESCRIPCION DETALLADA DE LA EJECUCION, AVANCE Y ESTADO DEL CONTRATO Y/O CONVENIO CON ESPECIFICACION EN CUANTO A LAS PARTICULARIDADES Y OBSERVACIONES PRESENTADAS EN EL DESARROLLO CONTRACTUAL

EJECUCION. AVANCE Y ESTADO

Con fecha del 8 de julio de 2025 se realizo acta final de recibo a satisfacción, y cuenta con pagos al dia por concepto de parafiscales.

SEGUIMIENTO FINANCIERO					
CONTRATO O CONVENIO					
CUENTA No.	35851216551	FIDUCIA No.:	N/A	BANCO:	BANCOLOMBIA S.A
ENTIDAD BANCARIA O FIDUCIARIA:		BANCOLOMBIA S.A.			
NOMBRE DE CUENTA O FIDUCIA:		HUGO ARMANDO MONTAÑA SANABRIA			
DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE	FECHA (dd/mm/aaaa)	VALOR	
N/A				N/A	
TOTAL				N/A	

INFORME JURÍDICO	
OBSERVACIONES:	



LOURDES MARCELA BLANCO PEDROZA

NOTA: En los campos del formato, en los cuales no aplique el diligenciamiento debido al objeto del contrato o convenio colocar: "No aplica o N.A."
