



ÁLAMO CONSTRUCTORES S.A.S
Nit.:901155830-0

Contrato de obra No. 130.19.06-208 DE 2025

INFORME FINAL DE OBRA

**"EJECUTAR LA REPOSICION DEL TRAMO DE RED DE ALCANTARILLADO
SECTOR MIRAVALLE EN EL CORREGIMIENTO DE VALLEJUELO DEL
MUNICIPIO DE ZARZAL-VALLE."**

Contratante:

**MUNICIPIO DE ZARZAL
VALLE DEL CAUCA**

Contratista:

ÁLAMO CONSTRUCTORES SAS

Celular: 3165281337

E-mail: alamoconstructoressas@gmail.com

JULIO DE 2025

Tabla de contenido

1.	INTRODUCCIÓN	3
2.	CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO	3
2.1	Características administrativas	4
2.2	Aspectos Logísticos	4
2.3	Revisión de Cantidades	5
1.	INFORME CONTRATO DE OBRA.....	5
3.1	Descripción del proyecto.....	5
3.2	Inventario y estado inicial de las áreas intervenidas	7
3.3	Seguimiento a maquinaria y equipo de obra.	8
3.4	Informe financiero y presupuestal del contrato de obra.....	8
3.5	Control de aportes legales y seguridad social del contrato	9
3.6	Seguimiento a programas sociales.	9
3.7	Seguimiento a programas de seguridad y salud en el trabajo	9
3.	REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	10
4.	MEMORIA DE CANTIDADES Y ACTA FINAL;Error! Marcador no definido.	
5.	BITÁCORA DE OBRA	18

Celular: 3165281337

E-mail: alamoconstructoressas@gmail.com

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe tiene como finalidad presentar un balance técnico, contractual y administrativo del Contrato de Obra Pública 130.19.06-208 DE 2025, celebrado entre el Municipio de Zarzal y la empresa ALAMOS CONSTRUCTORES S.A.S., cuyo objeto fue ejecutar la reposición del tramo de red de alcantarillado sector Miravalle en el corregimiento de Vallejuelo.

Las actividades fueron ejecutadas conforme a lo estipulado en los estudios previos, pliegos de condiciones, cronograma y especificaciones técnicas del contrato. La intervención permitió recuperar el normal funcionamiento de la red de alcantarillado de este sector la cual se encontraba totalmente colmatada, ocasionando que las aguas residuales se represaran en las viviendas de este sector, con esta reposición de alcantarillado recupera el normal funcionamiento de esta red, mejorando las condiciones de salubridad y habitabilidad de la comunidad este sector del corregimiento.

Este informe detalla el alcance de los trabajos realizados, cantidades ejecutadas, condiciones técnicas de intervención, aspectos logísticos, condiciones ambientales, seguimiento de obra y resultados obtenidos.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL CONTRATO

OBJETO: "EJECUTAR LA REPOSICION DEL TRAMO DE RED DE ALCANTARILLADO SECTOR MIRAVALLE EN EL CORREGIMIENTO DE VALLEJUELO DEL MUNICIPIO DE ZARZAL-VALLE"

Plazo de ejecución: 90 días calendario.

Valor total del contrato: \$ 139.800.564

Forma de ejecución: Precios unitarios fijos sin fórmula de reajuste

Forma de pago:

- 20% como anticipo con plan de inversión aprobado
- 80% en actas parciales o final

Celular: 3165281337

E-mail: alamoconstructoressas@gmail.com

2.1 Características administrativas

NÚMERO DEL CONTRATO: 130.19.06-208 DE 2025
OBJETO: "EJECUTAR LA REPOSICION DEL TRAMO DE RED DE ALCANTARILLADO SECTOR MIRAVALLE EN EL CORREGIMIENTO DE VALLEJUELO DEL MUNICIPIO DE ZARZAL-VALLE."
CONTRATISTA: ÁLAMO CONSTRUCTORES SAS
FECHA DE CONTRATO: 16/05/2025
PLAZO DE EJECUCIÓN: 90 DIAS
VALOR INICIAL: \$ 139.800.564

2.2 Aspectos Logísticos

Para el adecuado desarrollo del contrato de obra, se contó con el apoyo de la empresa Acuasalud, en la ubicación de otras redes (acueducto y gas), existentes en el sector y las cuales en varios puntos se intersectaron con la red de alcantarillado, lo que nos permitió implementar una estrategia logística ajustada al contexto rural y a la naturaleza de las actividades. Esta planificación permitió garantizar el cumplimiento del cronograma y la seguridad en el frente de obra.

a. Programación y coordinación de actividades:

- Las actividades se ejecutaron según cronograma establecido, iniciando con la localización y replanteo, y continuando con la excavación, instalada de la tubería, relleno y obras complementarias.
- Se priorizó la intervención por tramos, para mantener control sobre el perímetro durante la ejecución.

b. Gestión de materiales y herramientas:

- Los materiales fueron adquiridos previamente y transportados al sitio de forma ordenada para evitar obstrucciones en la vía pública o afectación a vecinos.
- Se contó con herramientas manuales y equipos menores (bugís, palas, palin, barra, cincel, porra, picas, cortadora, etc.) suficientes para la ejecución eficiente de cada fase.

Celular: 3165281337

E-mail: alamoconstructoressas@gmail.com

c. Manejo de residuos y limpieza del área:

- Se realizó recolección progresiva de escombros y materiales sobrantes, con cargue en volquetas y disposición en sitio autorizado.
- Al finalizar la obra, se efectuó limpieza general de las áreas intervenidas.

d. Seguridad en obra:

- Se implementaron medidas de seguridad con cerramiento temporal, señalización de advertencia y uso obligatorio de elementos de protección personal (EPP).
- El personal se encontraba afiliado al sistema de seguridad social, cumpliendo lo requerido por la normativa vigente.

e. Coordinación comunitaria:

- Durante la ejecución, se mantuvo comunicación con vecinos del sector para minimizar molestias, en especial relacionadas con ruido, ingreso de materiales y tránsito peatonal.
-

Estas acciones logísticas contribuyeron al cumplimiento del contrato sin afectaciones mayores al entorno ni interrupciones significativas en la programación de obra.

2.3 Revisión de Cantidades

En conjunto con el Supervisor, se realizó la revisión de la obra y sus respectivas cantidades. Las cantidades con su debido soporte.

1. INFORME CONTRATO DE OBRA.

3.1 Descripción del proyecto.

El proyecto consistió en ejecutar la reposición del tramo de red de alcantarillado sector Miravalle en el corregimiento de Vallejuelo municipio de Zarzal. Esta intervención tuvo como objetivo principal recuperar las condiciones de funcionabilidad optima de la red de alcantarillado de este sector del corregimiento garantizando salubridad en la comunidad transeúntes de este sector.

Las actividades ejecutadas incluyeron localización y replanteo, excavación a máquina, excavación a mano, relleno, instalación de tubería, empalme a cámara, construcción de cámara de inspección, construcción de caja de inspección, retiro de material sobrante de obra.

La reposición de alcantarillado fue ejecutada en un 98.72% de acuerdo con las especificaciones técnicas del contrato, cumpliendo con los requisitos funcionales, estéticos y de durabilidad exigidos por el municipio. La obra se desarrolló en buenas

Celular: 3165281337

E-mail: alamoconstructoressas@gmail.com

condiciones, requiriendo un manejo logístico cuidadoso y una adecuada coordinación con la comunidad.

Objetivo General

Ejecutar la reposición del tramo de red de alcantarillado sector Miravalle en el corregimiento de Vallejuelo municipio de Zarzal. Esta intervención tuvo como objetivo principal recuperar las condiciones de funcionabilidad óptima de la red de alcantarillado de este sector del corregimiento garantizando salubridad en la comunidad y transeúntes de este sector.

Alcance del Proyecto

El alcance del proyecto comprendió la ejecución de todas las actividades necesarias para la rehabilitación integral del alcantarillado de sector Miravalle del corregimiento de Vallejuelo, garantizando funcionabilidad del tramo intervenido y la salubridad del sector y la comunidad en general.

Las principales actividades incluidas dentro del alcance fueron:

- Localización y replanteo de la obra.
- Cierre con cinta preventiva de la zona a intervenir.
- Excavación a máquina y a mano.
- Rotura de cámara existente.
- Empalme de tubería a cámara existente.
- Instalación de lecho o colchón de grava-arena.
- Instalación de tubería.
- Relleno con material de sitio compactado.
- Construcción de cámaras y cajas de inspección.
- Retiro de material sobrante.

Estas actividades se ejecutaron dentro del tramo replanteado, conforme a los planos, especificaciones técnicas y cantidades establecidas en el contrato de obra.

Celular: 3165281337

E-mail: alamoconstructoressas@gmail.com

Justificación

El corregimiento de Vallejuelo, por su topografía tan montañosa, tiene varias arterias en su red de alcantarillado que convergen a una red madre o red matriz. El alcantarillado del sector Miravalles del corregimiento de Vallejuelo, es una de esas arterias, que recogen las aguas residuales del colegio "Luis Gabriel Umaña", el sector de Santa Elena y el mismo sector. Un error en un tramo de tubería instalada hace años, ocasiono el mal funcionamiento o mejor la obstrucción o colapso de la red restante del sector de Miravalles, con lo que se afectó además el colegio "Luis Gabriel Umaña" y el sector de Santa Elena, lo que ocasiono rotura de la tubería que descargaban a una finca del sector, generando malos olores y contaminación ambiental.

En este contexto, la intervención fue necesaria para reestablecer la funcionabilidad de la red y devolver a la comunidad del sector y la comunidad en general, el restablecimiento de un medio ambiente sano, gozar de paz y tranquilidad en épocas de lluvias. Por otra parte, comenzar a sustituir tramos de alcantarillado que van cumpliendo su vida útil. Además, esta vía es paso obligado del 90% de los habitantes del corregimiento de Vallejuelo pues es una de sus vías principales.

3.2 Inventario y estado inicial de las áreas intervenidas

Previo al inicio de la ejecución del contrato, se realizó un diagnóstico general de las condiciones físicas de la vía donde se va a cambiar la red de alcantarillado, evidenciando las siguientes situaciones:

Elemento	Estado Inicial
Vía embalstrada	Estado de la rasante en regular estado.
Vía asfaltada	Este tramo de vía a intervenir se encuentra en mal estado.
Cámara de inspección	Cámara inicial en concreto.(buen estado).
Red de tubería	Tubería en concreto, más de 32 años de uso, presenta dos roturas o fugas visibles a lo largo del tramo a cambiar.
Cajas de Inspección	Las viviendas, no tienen cajas domiciliarias a la vista.

Celular: 3165281337

E-mail: alamoconstructoressas@gmail.com

3.3 Seguimiento a maquinaria y equipo de obra.

Equipo / Herramienta	Cantidad en obra	Frecuencia de uso	Actividad asociada	Observaciones
Comisión de topografía	1	Diaria	Instalación de tubería	Garantizar corrección de fallas
Retroexcavadora	1	Diaria	excavaciones	
Carretillas (tipo bugí)	2	Diaria	Instalación del lecho de grava	
Volqueta	1	Puntual	Retiro de material sobrante	
Trompo	1	Puntal	Mezclar de concreto	Garantizar dosificación
Formaleta cámara de inspección	1	puntual	Construcción de cámara	
Herramientas manuales (palas, picas, barras, cincel, niveles, porra)	Múltiples	Permanente	Excavaciones, fundida, mampostería, replanteo	Base del trabajo en terreno

3.4 Informe financiero y presupuestal del contrato de obra

EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
VR. CONTRATO	139.800.564	
VR. ANTICIPO		
VALOR EJECUTADO		138.007.596
VALOR POR EJECUTAR		1.792.968
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO		
VALOR PENDIENTE POR PAGAR		
SUMAS IGUALES	139.800.564	139.800.564

Celular: 3165281337

E-mail: alamoconstructoressas@gmail.com

3.5 Control de aportes legales y seguridad social del contrato

Para el contrato de obra se anexa el soporte de los aportes y pago de planilla de seguridad social.

3.6 Seguimiento a programas sociales.


Durante la gestión social se realizan varias actividades, las cuales se describen a continuación:

Empleos formales generados en la ejecución de la obra: durante la ejecución de la obra se generó empleo para lo cual fue necesario contratar mano de obra no calificada, así mismo durante la ejecución de este tipo de obras se necesita personal con cierta capacidad de entendimiento por lo que también se contrató personal con estas características.

3.7 Seguimiento a programas de seguridad y salud en el trabajo

Durante la ejecución de la obra se garantizó que cada una de las personas que laboran en la obra contaran con las medidas de seguridad y salud en el trabajo, asegurándose que tuvieran al día la afiliación al sistema de seguridad social, ARL y que contaran con los elementos de protección personal como: casco, guantes, botas, chalecos, etc.

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

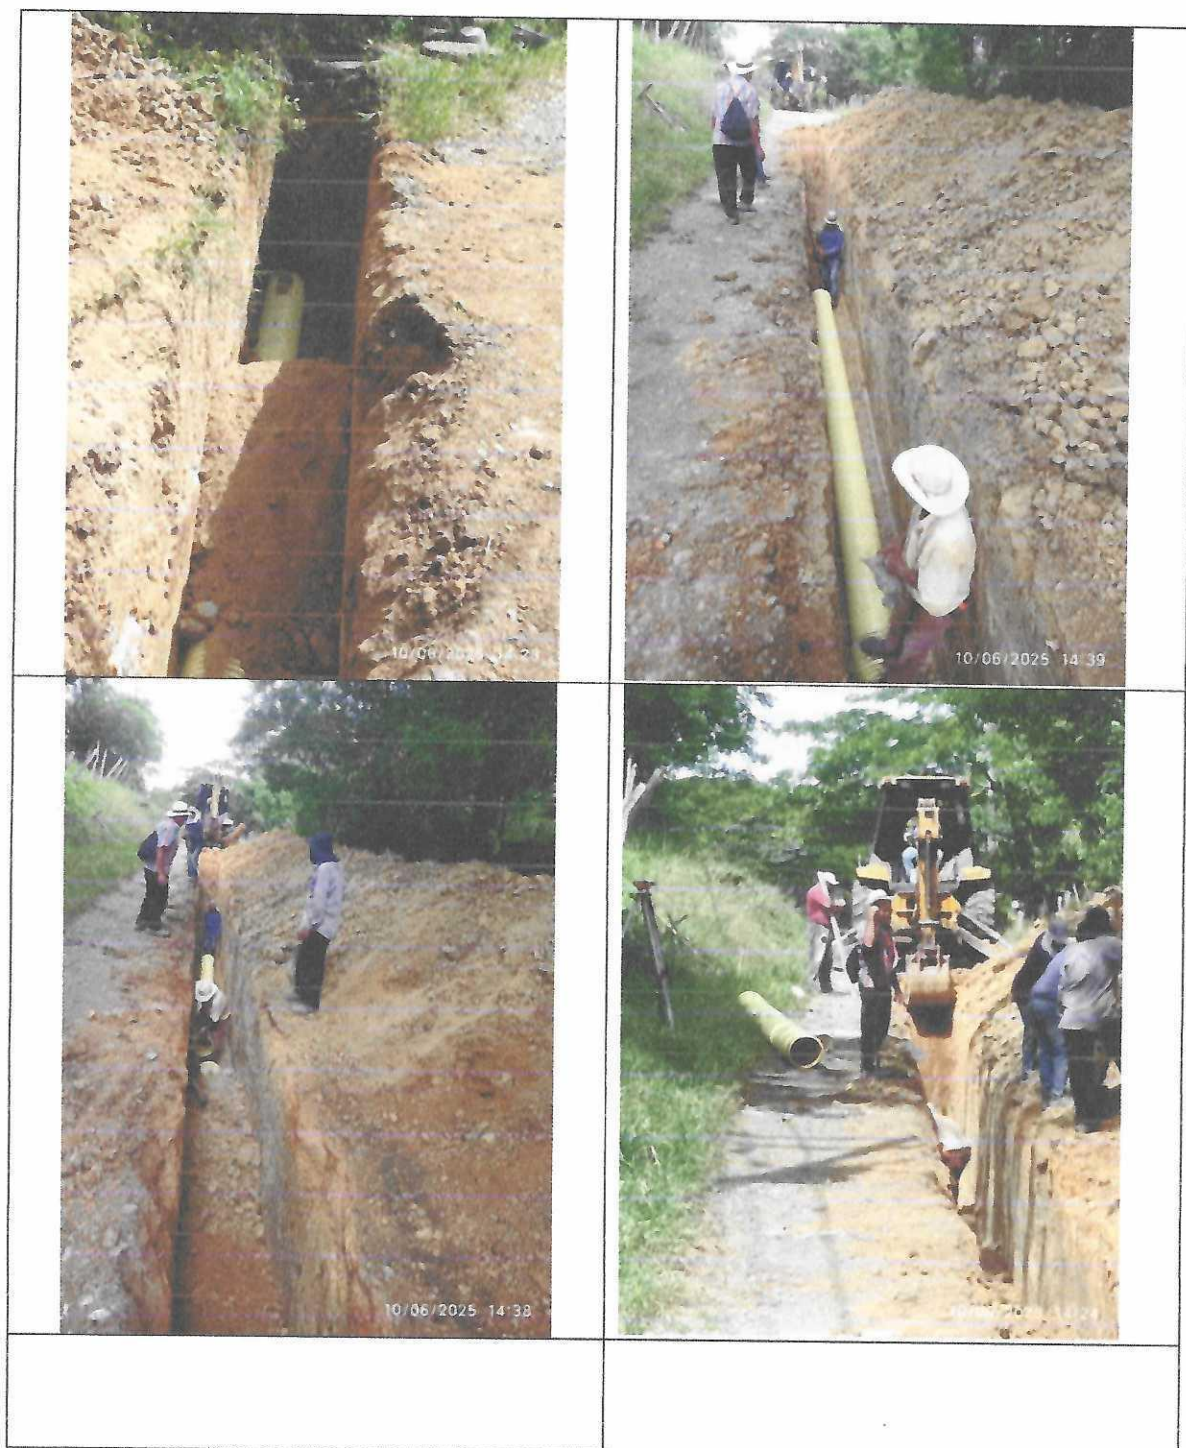

Celular: 3165281337

E-mail: alamoconstructoressas@gmail.com









Celular: 3165281337

E-mail: alamoconstructoressas@gmail.com



4. ACTA DE CAMBIO

ACTA DE CAMBIO DE OBRA PUBLICA												
CONTRATO 130.19.06-200 DE 2025			FECHA CONTRATO 16/05/2025		FECHA ACTA DE CAMBIO 30/7/2025							
OBJETO EJECUTAR LA REPOSICION DEL TRAMO DE RED DE			FECHA INICIO 26/05/2025		POSIBLE FECHA ENTREGA 23/08/2025							
SUPERVISOR JOHAN ESTEBAN LOPEZ JARAMILLO			VALOR CONTRATO \$ 139.900.564,00		EXCEDENTE A FAVOR DEL MUNICIPIO \$ 1.792.968,0							
CONTRATISTA ALAMO CONSTRUCTORES S.A.S												
OBRA CONTRATADA						OBRA EJECUTADA						
ITEM	DESCRIPCION	UNID	V. UNIT	CANT	VLR PARC.	ITEMS	DESCRIPCION	UNID	VLR UNIT	CANT	VLR PARC.	
	ALCANTARILLADO						ALCANTARILLADO					
	LOCALIZACION REPLANTEO						LOCALIZACION REPLANTEO					
010105	ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	280,00	2.258	632.240	010105	ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	259,00	2.258	584.822	
010205	EXCAVACION MAQUINA ALCANT Y ACUEDUCTO	M3	743,40	6.615	4.917.591	010205	EXCAVACION MAQUINA ALCANT Y ACUEDUCTO	M3	687,65	6.615	4.548.005	
010110	RETIRO TUBERIA EXISTENTE D" A 12"	ML	280,00	10.544	2.952.320	010110	RETIRO TUBERIA EXISTENTE D" A 12"	ML	259,00	10.544	2.730.866	
010105	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	280,00	14.763	4.130.640	010105	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	259,00	14.763	3.823.617	
110301	TUBER INCLUYE ACARRE	M3	31,80	91.503	3.459.813	110301	TUBER INCLUYE ACARRE	M3	31,97	91.503	3.199.280	
020105	TUB PVC NOVAFORT 12"	ML	210,00	174.799	36.707.730	020105	TUB PVC NOVAFORT 12"	ML	210,00	174.799	36.707.730	
080110	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	635,10	34.114	23.311.501	020105	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	49,00	94.373	1.624.271	
020417	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.51-3.00 MTS	UND	2,00	2.618.193	5.236.386	080110	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	635,20	34.114	21.609.681	
SUBTOTAL CAP. ALCANTARILLADO					21.410.281	SUBTOTAL CAP. ALCANTARILLADO					82.371.329	
DOMICILIARIA						DOMICILIARIA						
100601	EXCAVACION TIERRA AMANO	M3	91,84	28.969	2.680.513	100601	EXCAVACION TIERRA AMANO	M3	68,88	28.969	1.996.395	
020705	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	64,00	70.889	4.536.896	020705	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	48,00	70.889	3.432.672	
110600	SILLA YEE NOVAF 6"X12"	UND	8,00	265.750	2.126.000	110107	CAJA INSPECCION 60x 60 CM	UND	1,00	532.995	532.995	
080110	COMPACTADO 90% PM	M3	90,67	34.114	3.093.116	110600	SILLA YEE NOVAF 6"X12"	UND	8,00	265.750	2.126.000	
110105	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	8,00	450.253	3.602.024	080110	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	68,15	34.114	2.324.899	
100603	RETIRO SOBRESANTES MAQUINA <=10MM	M3	59,42	28.955	1.720.508	110105	CAJA INSPECCION 60x 60 CM [CONCRETO]	UND	8,00	450.253	3.602.024	
SUBTOTAL CAP. DOMICILIARIAS					17.739.055	100603	RETIRO SOBRESANTES MAQUINA <=10MM	M3	52,58	28.955	1.522.454	
COSTOS INDIRECTOS						SUBTOTAL CAP. DOMICILIARIAS						15.506.399
						COSTOS INDIRECTOS						
												97.877.728
						ADMINISTRACION 30,0%						29.365.318
						UTILIDAD 5,0%						4.899.886
						TOTAL A.U 35,00%						34.267.205
						INCREMENTO POR DISTANCIA 8,0%						5.872.665

5. MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA

MEMORIAS DE CALCULO											
OBJETO:	REPOSICION ALCANTARILLADO CORREGIMIENTO DE VALLEJUELO, SECTOR MIRAVALLES, MUNICIPIO DE ZARZAL										
FECHA:	Julio de 2025										
CÓDIGO	DESCRIPCION	UN.	LONGITUD	ANCHO	ALTURA	PROFUND	CANTIDAD	MULTIP	DIVIDIDO	S/TOTAL	TOTAL
010106	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTA	ML	259,00							259,00	259,00
010205	EXCAVACION MAQUINA ALCANT.Y ACUEDUCTO	M3	259,00	0,90		2,95				687,65	687,65
010110	RETIRO TUBERIA EXISTENTE 0" A 12"	ML	259,00							259,00	259,00
010108	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	259,00							259,00	259,00
110901	COLCHON ARENA-GRAVA TUBER INCLUYE ACARRE	M3	259,00	0,90	0,15					34,97	34,97
020708	TUB PVC NOVAFORT 12"	ML	210,00							210,00	210,00
020706	TUB PVC NOVAFORT 8"	ML	49,00							49,00	49,00
080110	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3	210,00	0,15	0,15	3,14				15,34	635,80
			259,00	0,90	0,15					34,97	
			49,00	0,10	0,10	3,14				1,54	
020417	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2.51-3.00 MTS	UND					1,00			1,00	1,00
020403	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0.00-1.50 MTS	UND					1,00			1,00	1,00
	DOMICILIARIA									0,00	0,00
100601	EXCAVACION TIERRA A MANO	M3	6,00	0,70		2,05	8,00			68,88	68,88
020705	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	6,00				8,00			48,00	48,00
110107	CAJA INSPECCION 80x80 CM [CONCRETO]	UND					1,00			1,00	1,00
110650	SILLA YEE NOVAF 6"x12"	UND					8,00			8,00	8,00
080110	RELLENO MATERIAL SITIO COMPACTADO 90% PM	M3					68,88	0,02	40,00	68,15	68,15
110105	CAJA INSPECCION 60x60 CM [CONCRETO]	UND					8,00			8,00	8,00
100608	RETIRO SOBRANTES MAQUINA <=10KM.	M3			0,73	51,85				52,58	52,58

Celular: 3165281337

E-mail: alamoconstructoressas@gmail.com

6. ACTA FINAL

ACTA FINAL OBRA				
CONTRATO	1301906205 DE 2025	FECHA CONTRATO	16052025	
OBJETO	ELABORAR LA REPOSICIÓN DEL TRAMO DE RED DE ALCANTARILLADO SECTOR MIRAVALLE EN EL CORRECTORIO DE VALLEUELO DEL MUNICIPIO DE ZARZAL	EXCEDENTE A FAVOR DEL MUNICIPIO	\$1.792.920	
SUPERVISOR	JOHAN ESTEBAN LOPEZ JARAMILLO	VALOR CONTRATO	\$139.200.564,00	
CONTRATISTA	ALAMO CONSTRUCTORES S.A.S	POSIBLE FECHA DE ENTREGA	23092025	
FECHA INICIO ITENS	26052025	FECHA ACTA DE CAMBIO	30072025	
DESCRIPCION	ALCANTARILLADO	UNID.	VL.R. UNIT	CANT.
010105	LOCALIZACION-REPLANTEO ACUEDUCTO-ALCANTARILLADO	ML	259,00	2.258
010205	EXCAVACION MAQUINA ALCANTARILLADO Y ACUEDUCTO	M3	657,85	6.615
010110	RETRO TUBERIA EXISTENTE Ø 12"	ML	259,00	10.544
010105	MANEJO DE AGUAS RESIDUALES	ML	259,00	14.763
110301	COLCHON ARENA-GRASA TUBERIA INCLUYE ACARRE	M3	34,57	91.403
030105	TUB PVC NOVAFORT 12"	ML	210,00	174.758
030105	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	49,00	94.373
030110	RELLENO MATERIAL SITO COMPACTADO 50% RM	M3	635,20	34.114
030417	CAMARA INSPECCION TIPO B H=2,5+3,00 MTS	UND	1,00	2.612,80
030403	CAMARA INSPECCION TIPO B H=0,00-1,50 MTS	UND	1,00	1243,383
SUBTOTAL CAP. ALCANTARILLADO				3237.1328
DOMICILIARIA	EXCAVACION TIERRA MANO	M3	65,22	23.589
030105	TUB PVC NOVAFORT 6"	ML	45,00	70.239
110107	CAJA INSPECCION 60x60 CM [CONCRETO]	UND	1,00	532.566
110350	SILLA YEE NOVAF 6"x12"	UND	3,00	255.750
030110	RELLENO MATERIAL SITO COMPACTADO 50% RM	M3	63,15	34.114
110105	CAJA INSPECCION 60x60 CM [CONCRETO]	UND	3,00	460.230
030105	RETRO SOB RANTEE MAQUINA <= 10 HRS.	M3	52,55	23.565
SUBTOTAL CAP. DOMICILIARIAS				16608,280
COSTOS INDIRECTOS				
ADMINISTRACION 30,0%				87.877,725
UTILIDAD 50%				29.353,16
TOTAL A.U. 35,0%				4.253,835
INCREMENTO POR DISTANCIA 50%				34.257,205
				537.2994
				122.007,601
ALAMO CONSTRUCTORES S.A.S		JOHAN ESTEBAN LOPEZ JARAMILLO		
R.L.		SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y MTO VIAL		

Celular: 3165281337

E-mail: alamoconstructoressas@gmail.com

7. BITÁCORA DE OBRA

Fecha	Actividad Ejecutada	Ubicación	Clima	Personal	Observaciones
05/06/2025	Localización y replanteo	Todos los tramos a cambiar	Soleado	1 maestro de obra, 3 ayudantes y topógrafo	sin novedad
06/06/2025	Se inicia la excavación e instalación de tubería	Cámara 1 a cámara 2	soleado	Topógrafo, 1 maestro, 4 ayudantes y operador de retroexcavadora	Se aisló la zona de trabajo, con cinta de seguridad
07,09,10/06/2025	No se trabajó por lluvia		lluvioso		se creció la quebrada y no hubo paso
11/06/2025	Se continua con la excavación e instalación de tubería	Cámara 2 a cámara 3	Soleado	Topógrafo, 1 maestro, 3 ayudantes y operador de retroexcavadora	Sin novedad
12/06/2025	Se continua con la excavación e instalación de tubería	Cámara 2 a cámara 3	soleado	Topógrafo, 1 maestro, 3 ayudantes y operador de retroexcavadora	No se presentó ninguna novedad
13/06/2025	Se continua con la excavación e instalación de tubería	Cámara 3 a cámara 4	Soleado	Topógrafo, 1 maestro, 3 ayudantes y operador de retroexcavadora	No se continua el trabajo para no dejar el corregimiento incomunicado el fin de semana
14,15/06/2025	No se laboro este fin de semana				
16/06/2025	Se continua con la excavación e instalación de tubería	Cámara 4 a cámara 5	Soleado	Topógrafo, 1 maestro, 3 ayudantes y operador de retroexcavadora	No hubo novedad
17/06/2025	Se continua con la excavación e instalación de tubería	Cámara 4 a cámara 5	soleado	Topógrafo, 1 maestro, 3 ayudantes y operador de retroexcavadora	No hubo novedad
18/06/2025	Se continua con la excavación, se llega con la tubería a la cámara 5	Cámara 4 a cámara 5	Soleado	Topógrafo, 1 maestro, 3 ayudantes y operador de retroexcavadora	No hubo novedad
19/06/2025	Se inicia la excavación a mano de las domiciliarias	Entre cámaras 4 y cámara 5	soleado	1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes	Se trabaja paralelamente el armado de las parrillas para las tapas de cajas y cámaras
20/06/2025	Se continua con la excavación de las domiciliarias	Entre cámaras 4 y cámara 5	Soleado	1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes	Se echan los solados de limpieza para las primeras cajas

Celular: 3165281337

E-mail: alamoconstructoressas@gmail.com

21/06/2025	Se instalan la tubería de tres domiciliarias	Entre cámaras 4 y cámara 5	Soleado	1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes	Se rellenan con material de sitio
24/06/2025	Se inicia con la fundición de las cajas domiciliarias	Entre la cámara 4 y 5	Soleado	1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes	Sin novedad
25/06/2025	Se continua con la fundición de las cajas domiciliarias	Entre la cámara 4 y 5	Soleado	1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes	Sin novedad
26/06/2025	Se inicia la excavación para las cámaras	Cámaras 2 y 4	Soleado	1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes	Sin novedad
27/06/2025	Se continua la excavación para las cámaras	Cámaras 2 y 4	Soleado	1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes	Sin novedad
01/07/2025	Se continua la excavación para las cámaras	Cámaras 2 y 4	Soleado	1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes	Sin novedad
02/07/2025	Se inicia la fundición de cámaras y cajas	Cámaras 2 y 4	Soleado	1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes	Sin novedad
03/07/2025	Se inicia la fundición de cámaras y cajas	Cámaras 2	Soleado	1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes	Sin novedad
04/07/2025	Se continua con la fundición de cajas y cámara	Cámaras 4	Soleado	1 maestro, 1 oficial, 3 ayudantes	Sin novedad
07-16/07/2025	Estos días no se trabajó por falta de tubería				
17/07/2025	Se empieza la excavación entre cámaras 5 a 6 y la instalación de la tubería	Cámaras 5 y 6	Soleado	1 maestro, 2 ayudantes	Se daño la manguera de gas domiciliario.
18/07/2025	Se continua la excavación entre cámaras 5 a 6 y la instalación de la tubería	Cámaras 5 y 6	Soleado	1 maestro, 2 ayudantes	Se tapa la tubería
21/07/2025	Inicia la excavación a mano para las domiciliarias	Entre cámara 5 y cámara 6	Soleado	1 maestro, 2 ayudantes	Sin novedad
22/07/2025	continua la excavación a mano para las domiciliarias	Entre cámara 5 y cámara 6	Soleado	1 maestro, 2 ayudantes	Sin novedad
23/07/2025	Se instala tubería de domiciliarias	Entre cámara 5 y cámara 6	Soleado	1 maestro, 2 ayudantes	Sin novedad
24/07/2025	Se funden cajas domiciliarias	Entre cámara 5 y cámara 6	Soleado	1 maestro, 2 ayudantes	Sin novedad
25/07/2025	Termina la fundición de cajas domiciliarias	Entre cámara 5 y cámara 6	Soleado	1 maestro, 2 ayudantes	Sin novedad

Celular: 3165281337

E-mail: alamoconstructoressas@gmail.com



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TULUA			SUCURSAL AGENCIA TULUA			COD.SUC 52		NO.PÓLIZA 52-44-101017073		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 09 05 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 09 05 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 09 08 2028		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ALAMO CONSTRUCTORES S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.155.830-0			
DIRECCIÓN: DG 3 NRO. 6 - 80						CIUDAD: ZARZAL, VALLE			TELÉFONO: 3165281337		

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZARZAL								IDENTIFICACIÓN NIT: 891.900.624-0			
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 10 - 36						CIUDAD: ZARZAL, VALLE			TELÉFONO 2219000		
ADICIONAL:											

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES A CARGO DEL CONTRATISTA, ORIGINADOS MEDIANTE EL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 130.19.06-208 DE 2025 CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LA REPOSICION DEL TRAMO DE RED DE ALCANTARILLADO SECTOR MIRAVALLE EN EL CORREGIMIENTO DE VALLEJUELO DEL MUNICIPIO DE ZARZAL - VALLE DEL CAUCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES			
AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	09/05/2025	09/12/2025	\$20,970,084.60
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSION DEL ANTICIPO	09/05/2025	09/12/2025	\$27,960,112.80
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	09/05/2025	09/08/2028	\$13,980,056.40
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	09/08/2025	09/08/2026	\$20,970,084.60

ACLARACIONES

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****285,480.00	\$ *****8,000.00	\$ *****55,761.00	\$ *****349,241.00	\$ *****83,880,338.40	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
ANA MILENA PEÑA MORENO	81789	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN



52-44-101017073

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF081789A

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TULUA			SUCURSAL AGENCIA TULUA			COD.SUC 52	NO.POLIZA 52-44-101017073	ANEXO 0
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO		A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO	
09 05 2025	09 05 2025		00:00	09 08 2028		23:59	EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ALAMO CONSTRUCTORES S.A.S.	IDENTIFICACIÓN NIT: 901.155.830-0
DIRECCIÓN: DG 3 NRO. 6 - 80	CIUDAD: ZARZAL, VALLE
	TELÉFONO: 3165281337

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZARZAL	IDENTIFICACIÓN NIT: 891.900.624-0
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 10 - 36	CIUDAD: ZARZAL, VALLE
	TELÉFONO 2219000

ADICIONAL:

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:

Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PAGINA WEB



CORRESPONSALES BANCARIOS



PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****285,480.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****55,761.00	TOTAL A PAGAR \$ *****349,241.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****83,880,338.40	PLAN DE PAGO CONTADO
--	---------------------------------------	--------------------------	-------------------------------------	--	-------------------------

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCIÓN COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑÍA	% PART	VALOR ASEGURADO
ANA MILENA PEÑA MORENO	81789	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE POLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO. 26-63 - TELEFONO: 2247827 - TULUA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
-------	------------	-------

EFFECTIVO	
CHEQUE	
TOTAL \$	



(415) 7709998221167 (8020) 11015700979807 (3900) 000000349241 (96) 20260509

REFERENCIA
PAGO:
1101570097980-7

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

NOMBRE O RAZON SOCIAL				ALAMO CONSTRUCTORES S.A.S.				IDENTIFICACIÓN NIT: 901.155.830-0	
DIRECCIÓN: DG 3 NRO. 6 - 80				CIUDAD: ZARZAL, VALLE				TELÉFONO: 3165281337	

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

SE GARANTIZA EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA NO. MZ-SA005 DE 2025, CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LA REPOSICIÓN DEL TRAMO DE RED DE ALCANTARILLADO SECTOR MIRAVALLE EN EL CORREGIMIENTO DE VALLEJUELO DEL MUNICIPIO DE ZARZALVALLE DEL CAUCA

LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA COBRARÁ LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DEL OFRECIMIENTO, EN LOS SIGUIENTES EVENTOS, DE ACUERDO CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 2.2.1.1.2.3.1.6 DEL DECRETO NO. 1082 DE 2015:

1. LA NO AMPLIACIÓN DE LA VIGENCIA DE LA GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA OFERTA CUANDO EL PLAZO PARA LA ADJUDICACIÓN O PARA SUSCRIBIR EL CONTRATO ES PRORROGADO, SIEMPRE QUE TAL PRORROGA SEA INFERIOR A TRES (3) MESES.
2. EL RETIRO DE LA OFERTA DESPUÉS DE VENCIDO EL PLAZO FIJADO PARA LA PRESENTACIÓN DE LAS OFERTAS.
3. LA NO SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO SIN JUSTA CAUSA POR PARTE DEL ADJUDICATARIO.
4. LA FALTA DE OTORGAMIENTO POR PARTE DEL PROPONENTE SELECCIONADO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO.

ACLARACIONES

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARÁN SU COLABORACIÓN

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN



52-44-101017021

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Oieda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60. PISO 5 TELEFONO: 601-2186977 601-6019330

DL E081789A

4



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TULUA			SUCURSAL AGENCIA TULUA			COD.SUC 52		NO.PÓLIZA 52-44-101017021		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 01 05 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 05 05 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 05 07 2025		A LAS HORAS 23:59	
										TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
NOMBRE O RAZON SOCIAL ALAMO CONSTRUCTORES S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.155.830-0	
DIRECCIÓN: DG 3 NRO. 6 - 80						CIUDAD: ZARZAL, VALLE		TELÉFONO: 3165281337	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO									
ASEGURADO / BENEFICIARIO: MUNICIPIO DE ZARZAL								IDENTIFICACIÓN NIT: 891.900.624-0	
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 10 - 36						CIUDAD: ZARZAL, VALLE		TELÉFONO: 2219000	

ADICIONAL:									
------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

OBJETO DE LA POLIZA
LA PRESENTE GARANTIA AMPARARA EN GENERAL EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES ASUMIDAS POR EL TOMADOR (AFIANZADO) CON OCASION DE LA PRESENTACION DE UNA PROPUESTA CONFORME AL PROCESO SELECCION ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. MZ-SA005 DE 2025, ADELANTADO POR EL MUNICIPIO DE ZARZAL VALLE DEL CAUCA.

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO. 26-63 - TELEFONO: 2247827 - TULUA

52-44-101017021

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF081789A

2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TULUA						SUCURSAL AGENCIA TULUA						COD.SUC 52		NO.PÓLIZA 52-44-101017021		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA			A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO						
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO		DÍA	MES	AÑO								
01	05	2025	05	05	2025	00:00	05	07	2025	23:59	EMISION ORIGINAL						

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
NOMBRE O RAZON SOCIAL ALAMO CONSTRUCTORES S.A.S.								IDENTIFICACIÓN NIT: 901.155.830-0	
DIRECCIÓN: DG 3 NRO. 6 - 80						CIUDAD: ZARZAL, VALLE		TELÉFONO: 3165281337	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO			
ASEGURADO / BENEFICIARIO:		MUNICIPIO DE ZARZAL	
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 10 - 36		IDENTIFICACIÓN NIT: 891.900.624-0	
ADICIONAL:		CIUDAD: ZARZAL, VALLE	TELÉFONO 2219000

Recuerda que puedes actualizar tus datos de contacto conforme a la Ley 2300, a través de nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO

PÁGINA WEB    **VISA**

CORRESPONSALES BANCARIOS

   **MOVIERED**

  **SURTIMAX** 

PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias

Bancolombia Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189

Banco de Bogotá Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA \$ *****20,970.00	GASTOS EXPEDICIÓN \$ *****8,000.00	IVA \$ *****5,504.00	TOTAL A PAGAR \$ *****34,474.00	VALOR ASEGURADO TOTAL \$ *****13,980,088.80	PLAN DE PAGO CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
ANA MILENA PEÑA MORENO	81789	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO. 26-63 - TELEFONO: 2247827 - TULUA

FORMA DE PAGO		
BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



REFERENCIA
PAGO:
1101570097753-1

(415) 770998021167 (8020) 11015700977531 (3900) 000000034474 (96) 20260505

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TULUA			SUCURSAL AGENCIA TULUA			COD.SUC 52		NO.PÓLIZA 52-40-101009707		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 09 05 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 09 05 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 09 08 2025		A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL											

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL ALAMO CONSTRUCTORES S.A.S.		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.155.830-0	
DIRECCIÓN: DG 3 NRO. 6 - 80		CIUDAD: ZARZAL, VALLE	
		TELÉFONO: 3165281337	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE ZARZAL		IDENTIFICACIÓN NIT: 891.900.624-0	
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 10 - 36		CIUDAD: ZARZAL, VALLE	
		TELÉFONO: 2219000	
BENEFICIARIO: 891900624 - MUNICIPIO DE ZARZAL			

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECCIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN 15-05-2020 - 1329-P-06-00000-E-RCE-002A-D001 / 31-03-22-1329-P-06-00000-E-RCE-001P-D001, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:
SE GARANTIZA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 130.19.06-208 DE 2025 CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LA REPOSICION DEL TRAMO DE RED DE ALCANTARILLADO SECTOR MIRAVALLE EN EL CORREGIMIENTO DE VALLEJURIO DEL MUNICIPIO DE ZARZAL - VALLE DEL CAUCA.

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION DE OBRAS CIVILES

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
PREDIOS LABORES Y OPERACIONES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2025	09/08/2025	\$284,700,000.00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2025	09/08/2025	\$284,700,000.00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2025	09/08/2025	\$284,700,000.00

ACLARACIONES

BENEFICIARIOS ADICIONALES:
- TERCEROS AFECTADOS

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ *****215,280.00	\$ *****3,000.00	\$ *****41,473.00	\$ *****259,753.00	\$ *****284,700,000.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	N. DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
ANA MILENA PEÑA MORENO	81789	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO.
QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.
NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN
PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO. 26-63 - TELEFONO: 2247827 - TULUA



52-40-101009707

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

USTED PUEDE CONSULTAR ESTA PÓLIZA EN WWW.SEGUROSDELESTADO.COM

OFICINA PRINCIPAL: AUTOPISTA NORTE # 103 - 60, PISO 5 TELEFONO: 601-2186977, 601-6019330

DLF081789A

1

VIGILADO
SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO
RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TULUA			SUCURSAL AGENCIA TULUA			COD.SUC 52		NO.PÓLIZA 52-40-101009707		ANEXO 0		
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 09 05 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 09 05 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 09 08 2025			A LAS HORAS 23:59	
TIPO MOVIMIENTO EMISION ORIGINAL												

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO											
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL ALAMO CONSTRUCTORES S.A.S.										IDENTIFICACIÓN NIT: 901.155.830-0	
DIRECCIÓN: DG 3 NRO. 6 - 80						CIUDAD: ZARZAL, VALLE				TELÉFONO: 3165281337	

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO											
ASEGURADO: MUNICIPIO DE ZARZAL										IDENTIFICACIÓN NIT: 891.900.624-0	
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 10 - 36						CIUDAD: ZARZAL, VALLE				TELÉFONO: 2219000	
BENEFICIARIO: 891900624 - MUNICIPIO DE ZARZAL											

AMPAROS	DEDUCIBLE	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG ACTUAL
RESPONSABILIDAD CIVIL PATRONAL	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2025	09/08/2025	\$284,700,000.00
DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2025	09/08/2025	\$284,700,000.00
PERJUICIOS EXTRAPATRIMONIALES	10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMMLV	09/05/2025	09/08/2025	\$284,700,000.00

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO. 26-63 - TELEFONO: 2247827 - TULUA

52-40-101009707

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLF081789A



SEGUROS
DEL
ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE
CUMPLIMIENTO

RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN TULUA			SUCURSAL AGENCIA TULUA			COD.SUC 52		NO.PÓLIZA 52-40-101009707		ANEXO 0	
FECHA EXPEDICIÓN DÍA MES AÑO 09 05 2025			VIGENCIA DESDE DÍA MES AÑO 09 05 2025			A LAS HORAS 00:00		VIGENCIA HASTA DÍA MES AÑO 09 08 2025		A LAS HORAS 23:59	
EMISION ORIGINAL										TIPO MOVIMIENTO	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
NOMBRE O RAZON SOCIAL ALAMO CONSTRUCTORES S.A.S.									
IDENTIFICACIÓN NIT: 901.155.830-0									
DIRECCIÓN: DG 3 NRO. 6 - 80									
CIUDAD: ZARZAL, VALLE									
TELÉFONO: 3165281337									

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO									
ASEGURADO: MUNICIPIO DE ZARZAL									
IDENTIFICACIÓN NIT: 891.900.624-0									
DIRECCIÓN: CR 9 NRO. 10 - 36									
CIUDAD: ZARZAL, VALLE									
TELÉFONO 2219000									
BENEFICIARIO:									

Recuerda que puedes actualizar
tus datos de contacto conforme
a la Ley 2300, a través de
nuestras páginas:

www.segurosdelestado.com
o www.segurosdevidadelestado.com

Ve a la opción PQR y selecciona
el tipo de solicitud:
Acceso a la información

CONOCE LOS MEDIOS DE PAGO



PAGOS CON CONVENIO *No aplica para transferencias



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 47189



Seguros del Estado
Cuenta Convenio 008465445

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
\$ ****215,280.00	\$ *****3,000.00	\$ *****41,473.00	\$ *****259,753.00	\$ *****284,700,000.00	CONTADO
INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART	NOMBRE COMPAÑIA	% PART	VALOR ASEGURADO
ANA MILRENA PEÑA MORENO	81789	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A. SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO. 26-63 - TELEFONO: 2247827 - TULUA

FORMA DE PAGO

BANCO	CHEQUE No.	VALOR
EFFECTIVO		
CHEQUE		
TOTAL \$		



(415) 7709998023167 (8020) 11015700979839 (3900) 000000259753 (96) 20260509

REFERENCIA
PAGO:
1101570097983-9

COPIA PARA PAGO EN BANCOS NO NEGOCIABLE

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



NIT. 860.009 578.6

POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL DERIVADA DE CUMPLIMIENTO RCE CONTRATOS

CIUDAD DE EXPEDICIÓN			SUCURSAL			COD.SUC		NO.PÓLIZA		ANEXO	
TULUA			AGENCIA TULUA			52		52-40-101009707		0	
FECHA EXPEDICIÓN			VIGENCIA DESDE			A LAS		VIGENCIA HASTA		A LAS	
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO	HORAS	DÍA	MES	AÑO	HORAS	
09	05	2025	09	05	2025	00:00	09	08	2025	23:59	
										TIPO MOVIMIENTO	
										EMISION ORIGINAL	

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO									
---------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL		ALAMO CONSTRUCTORES S.A.S.		IDENTIFICACIÓN NIT: 901.155.830-0	
DIRECCIÓN: DG 3 NRO. 6 - 80			CIUDAD: ZARZAL, VALLE		TELÉFONO: 3165281337

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO	
---	--

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO			
ASEGURADO:	MUNICIPIO DE ZARZAL	IDENTIFICACIÓN	NIT: 891.900.624-0
DIRECCIÓN:	CR 9 NRO. 10 - 36	CIUDAD:	ZARZAL, VALLE
BENEFICIARIO: 891900624 - MUNICIPIO DE ZARZAL		TELÉFONO:	2219000

TEXTO ACLARATORIO

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA, PRODUCIRA LA TERMINACION AUTOMATICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A SEGUROS DEL ESTADO S.A. PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASION DE LA EXPEDICION DEL CONTRATO. QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACION

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 28 NO. 26-63 - TELEFONO: 2247827 - TULUA

52-40-101009707

FIRMA AUTORIZADA: Jose Luis Ojeda - Vicepresidente de Fianzas

FIRMA TOMADOR

DLE081789A

2

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA

0800 678 1121



ALAMO CONSTRUCTORES SAS
NIT: 901155830-0
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CL 27 26 60, Tuluá, Valle Del Cauca, Colombia
Tel. 3165281337
Email. msr1115@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764088312482 válida desde 2025-02-04 hasta 2026-02-04 rango desde ACFE-89 hasta ACFE-600.

Razón Social:

MUNICIPIO DE ZARZAL

NIT :

891900624-0

Dirección:

CRA 9 No. 10-36, Zarzal, Valle Del Cauca, Colombia

Teléfono:

6022219000

Email:

juridica@zarzal-valle.gov.co

Método de pago:

Contado

Medio de Pago:

Instrumento no definido

Total de Lineas:

4

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :

ACFE - 105

MONEDA:

COP Colombia, Pesos

HORA EMISIÓN:

16:28:06-05:00

FECHA FIRMADO:

25/07/2025 16:28:09

FECHA DE EMISIÓN

FECHA DE VENCIMIENTO

DIA

MES

AÑO

25

07

2025

DIA

MES

AÑO

--

--

--

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	MZ-0C025	EJECUTAR LA REPOSICION DEL TRAMO DE RED DE ALCANTARILLADO SECTOR MIRAVALLE Corregimiento de Vallejuelo del municipio de Zarzal Valle Del Cauca Contrato de obra publica	WSD	1,00	\$97.877.728,00				0,00	\$97.877.728,00
2	AIU1	ADMINISTRACION CONTRATO DE SERVICIOS AIU POR CONCEPTO DE ADMINISTRACION 30%	EA	1,00	\$29.363.318,00				0,00	\$29.363.318,00
3	AIU3	UTILIDAD CONTRATO DE SERVICIOS AIU POR CONCEPTO DE UTILIDAD 5%	EA	1,00	\$4.893.886,00				0,00	\$4.893.886,00
4	4	INCREMENTO POR DISTANCIA 6%	WSD	1,00	\$5.872.664,00				0,00	\$5.872.664,00

Notas:	Subtotal:	\$138.007.596,00
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
	Total:	\$138.007.596,00


SON: (ciento treinta y ocho millones siete mil quinientos noventa y seis pesos)

CUFE: 0fd6e4c3908cd4973dbcc7f7152a1f553c47631fd533e235366a8ef3eff451001dfec134b34c26ba6ad2a7728e52f27d

Firma Digital: Ou+P1Ov0YqkN17mEYCrRZ9j7IZ2pePQIwCEI9zEwDxV/QdD4cyD8soU7HLP6P
etXwr/DTL66NzY9Rb5Mc2MAhW/x8MQ5MkZ9N47IXbcFFCNyW
YlwXIsL4JAmXtY Jel,uDT,ti0Vkp9c6U3bHtInlq16sUsCFOcCnwUOmK4+04LVNZ6aoDqasXjdILxRx 0a6bCvyVFOSNlj7U1kzQitCkLAGpNWmHe
Av5HCUOn/dmXsPos6Rk56VqbxSxIW CBseoyabW2IsK3y4wR3RH2k59NwVlUitpjbK7IEcmH2BDJ9I7It8nmAkzPkr iTu4K2IWqEwWeHcytHI
7u/==


Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES



Certificado No:

B C D 3 0 A 0 3 A E C C 5 2 8 0

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **ALEJANDRA MARIA JARAMILLO GUTIERREZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 66873970 de ROLDANILLO (VALLE DEL CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 148232-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de Inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 30 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA BARRIOS PULIDO
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO
ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO
REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web
www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

ALAMOS CONSTRUCTORES S.A.S

NIT. 901.155.830 -0

**CERTIFICACIÓN DE PAGO DE APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD
SOCIAL Y PARAFISCALES**

Yo, **ALEJANDRA Ma. JARAMILLO GUTIERREZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 66.873.970 de Roldanillo (V), y con Tarjeta Profesional No. 148232-T de la Junta Central de Contadores, en mi condición de Contadora publica de **ALAMOS CONSTRUCTORES S.A.S** identificada con NIT. **901.155.830 -0**, luego de examinar los estados financieros de la empresa de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, certifico que durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles, la empresa ha realizado el pago de los aportes al sistema de seguridad social y parafiscales exigidos por la ley y se encuentra al día y a paz y salvo por todo concepto relacionado con dichos aportes.

Lo anterior en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007.

Dada en Roldanillo Valle a el día veintiséis (26) del mes de junio de 2025.



ALEJANDRA Ma. JARAMILLO G.
Contador
TP:148232-T
Cc. 66.873.970 de Rold. (V)

República de Colombia
Ministerio de Comercio Industria y Turismo

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PUBLICO

148232-T

ALEJANDRA MARIA
JARAMILLO GUTIERREZ
C.C. 66873970
RESOLUCION INSCRIPCION 112
UNIVERSIDAD DEL VALLE



PRESIDENTE

LEONARDO SANCHEZ GARRIDO


5034

FECHA 08/04/2010

FIRMA DEL TITULAR

72939

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PUBLICO de acuerdo con lo establecido en
la Ley 43 de 1990.
Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta devolverla
al Ministerio de Comercio Industria y Turismo - Junta Central
de Contadores.



REPÚBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CÉDULA DE CIUDADANÍA

66.873.970

IDENTIFICACION


JARAMILLO GUTIERREZ

APPELLIDO

ALEJANDRA MARIA

PRIMER NOMBRE

Alejandro Jaramillo



IMPORTE DERECHO

FECHA DE NACIMIENTO 03-NOV-1981

CALI
(VALLE)

LUGAR DE NACIMIENTO

1.68

ESTATURA

A+

G.S. RH

F


SEXO

10-MAY-2000 ROLDANILLO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Alejandro Jaramillo

REGISTRADORA NACIONAL
ALEXANDRA VILLALBA LOPEZ



A-3108100-08122101 F-0000873070-00041125

02347 04330A 02 160562856
