

EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

Semana 5

OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA \$ 1.188.748.997

Plazo Inicial 2 Meses

Suspensión 1 -

Fecha Corte 5-may-25


Fecha Inicio 9-abr-25

Reinicio 1 -

Fecha Fin 7-jun-25

	ACUM. ANTERIOR		PRESENTE SEMANA		ACUM. TOTAL	
	\$	%	\$	%	\$	%
PROGRAMADO	\$ 667.548.293	56,16%	\$ 250.712.187	21,09%	\$ 918.260.479	77,25%
AVANCE REAL	\$ 787.891.803	66,28%	\$ 46.105.618	3,88%	\$ 833.997.421	70,16%
VARIACION	\$ 120.343.510	10,12%	-\$ 204.606.569	-17,21%	-\$ 84.263.058	-7,09%

PROG. PROXIMA SEMANA	\$ 131.089.215
----------------------	----------------

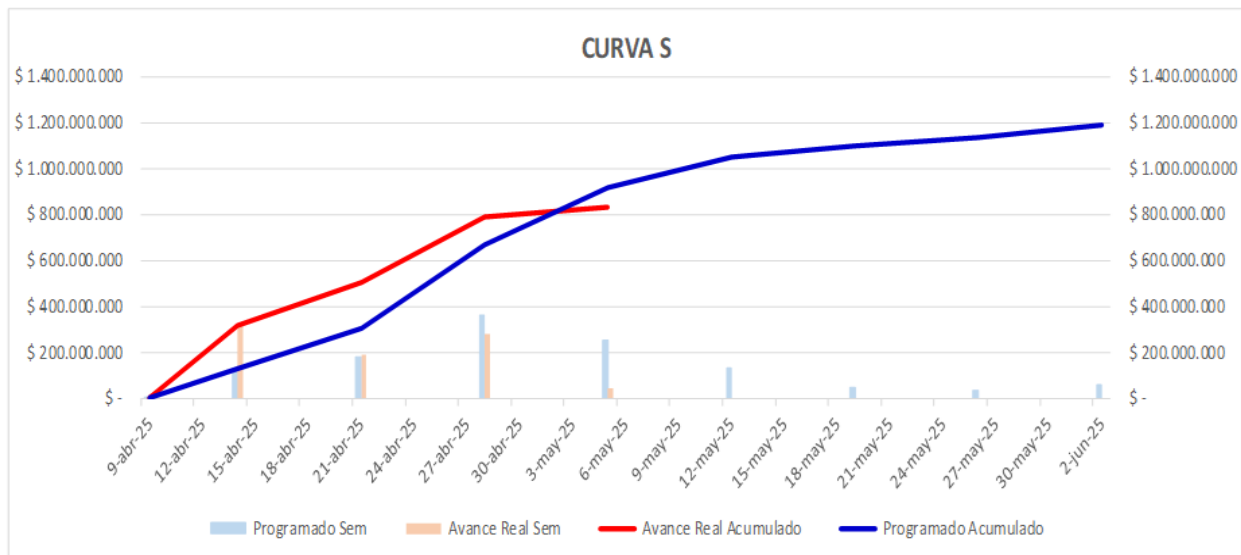

BALANCE SEGÚN AVANCE REAL			
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 1.188.748.997		Incidencia (%)
VALOR AVANCE CONTRACTUAL		\$ 918.260.479	77,25%
VALOR AVANCE		\$ 833.997.421	70,16%
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 833.997.421	70,16%
SALDO POR EJECUTAR		\$ 354.751.576	29,84%
SUMAS IGUALES	\$ 1.188.748.997	\$ 1.188.748.997	100,00%

EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

Semana 6


OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

VALOR CONTRATO ANTES
DE IVA \$ 1.188.748.997
Fecha Corte 12-may-25

Plazo Inicial 2 Meses Suspensión 1 -
Fecha Inicio 9-abr-25 Reinicio 1 -
Fecha Fin 7-jun-25

	ACUM. ANTERIOR		PRESENTE SEMANA		ACUM. TOTAL	
	\$	%	\$	%	\$	%
PROGRAMADO	\$ 918.260.479	77,25%	\$ 131.089.215	11,03%	\$ 1.049.349.695	88,27%
AVANCE REAL	\$ 833.997.421	70,16%	\$ 35.807.824	3,01%	\$ 869.805.245	73,17%
VARIACION	-\$ 84.263.058	-7,09%	-\$ 95.281.391	-8,02%	-\$ 179.544.450	-15,10%

PROG. PROXIMA SEMANA	\$ 49.745.750
----------------------	---------------

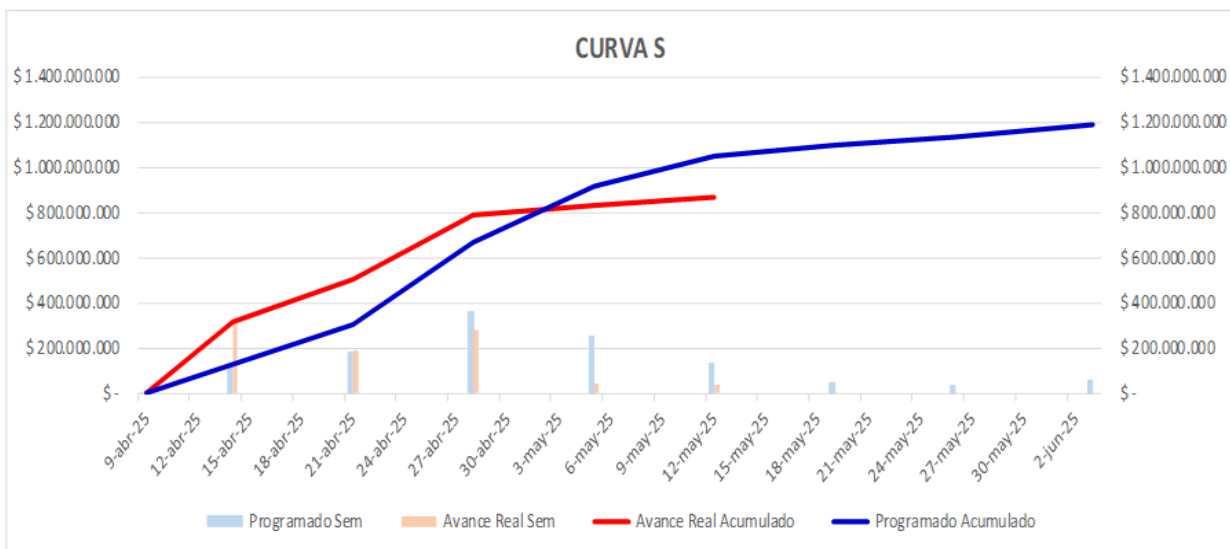

BALANCE SEGÚN AVANCE REAL			
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 1.188.748.997		Incidencia (%)
VALOR AVANCE CONTRACTUAL		\$ 1.049.349.695	88,27%
VALOR AVANCE		\$ 869.805.245	73,17%
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 869.805.245	73,17%
SALDO POR EJECUTAR		\$ 318.943.752	26,83%
SUMAS IGUALES	\$ 1.188.748.997	\$ 1.188.748.997	100,00%

EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

Semana 7

OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA \$ 1.188.748.997

Plazo Inicial 2 Meses

Suspensión 1 -

Fecha Corte 19-may-25


Fecha Inicio 9-abr-25

Reinicio 1 -

Fecha Fin 7-jun-25

	ACUM. ANTERIOR		PRESENTE SEMANA		ACUM. TOTAL	
	\$	%	\$	%	\$	%
PROGRAMADO	\$ 1.049.349.695	88,27%	\$ 49.745.750	4,18%	\$ 1.099.095.445	92,46%
AVANCE REAL	\$ 869.805.245	73,17%	\$ 201.089.215	16,92%	\$ 1.070.894.460	90,09%
VARIACION	-\$ 179.544.450	-15,10%	\$ 151.343.465	12,73%	-\$ 28.200.985	-2,37%

PROG. PROXIMA SEMANA	\$ 250.712.187
----------------------	----------------

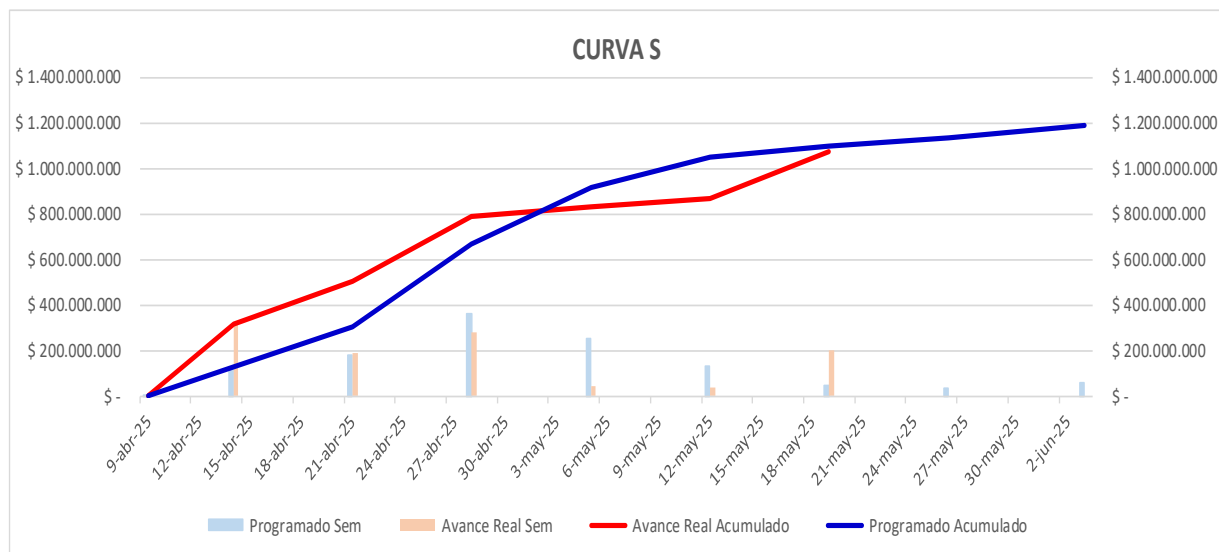

BALANCE SEGÚN AVANCE REAL			
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 1.188.748.997		Incidencia (%)
VALOR AVANCE CONTRACTUAL		\$ 1.099.095.445	92,46%
VALOR AVANCE		\$ 1.070.894.460	90,09%
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 1.070.894.460	90,09%
SALDO POR EJECUTAR		\$ 117.854.537	9,91%
SUMAS IGUALES	\$ 1.188.748.997	\$ 1.188.748.997	100,00%

EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

Semana 8

OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA \$ 1.188.748.997

Plazo Inicial 2 Meses

Suspensión 1 -

Fecha Corte 1-jun-25


Fecha Inicio 9-abr-25

Reinicio 1 -

Fecha Fin 7-jun-25

	ACUM. ANTERIOR		PRESENTE SEMANA		ACUM. TOTAL	
	\$	%	\$	%	\$	%
PROGRAMADO	\$ 1.099.095.445	92,46%	\$ 33.039.381	2,78%	\$ 1.132.134.826	95,24%
AVANCE REAL	\$ 1.070.894.460	90,09%	\$ 53.459.866	4,50%	\$ 1.124.354.326	94,58%
VARIACION	-\$ 28.200.985	-2,37%	\$ 20.420.485	1,72%	-\$ 7.780.500	-0,65%

PROG. PROXIMA SEMANA	\$ 56.614.171
----------------------	---------------

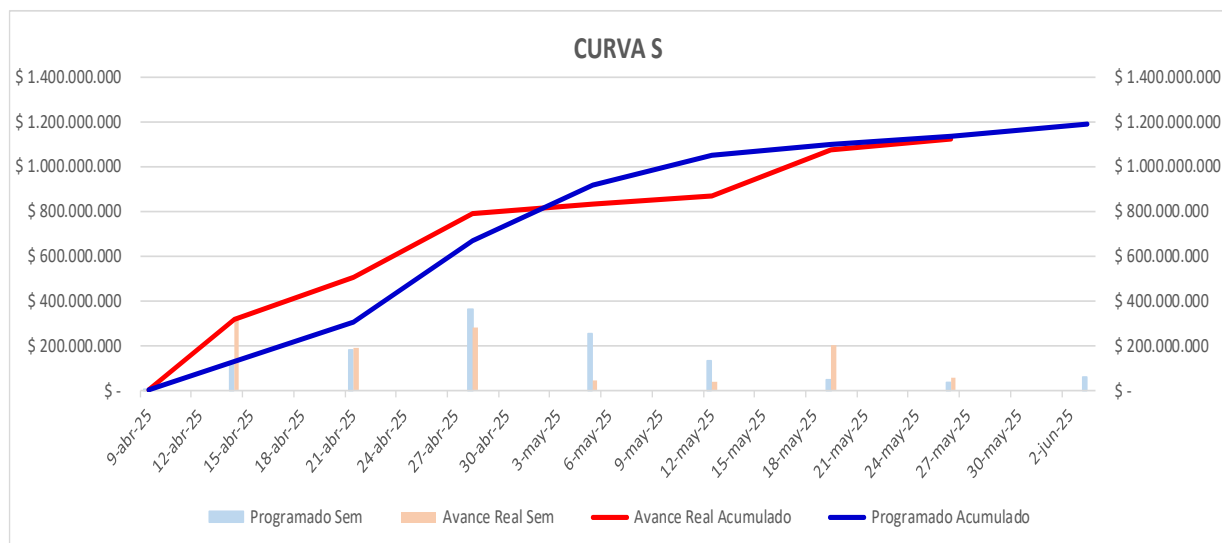

BALANCE SEGÚN AVANCE REAL			
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 1.188.748.997		Incidencia (%)
VALOR AVANCE CONTRACTUAL		\$ 1.132.134.826	95,24%
VALOR AVANCE		\$ 1.124.354.326	94,58%
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 1.124.354.326	94,58%
SALDO POR EJECUTAR		\$ 64.394.671	5,42%
SUMAS IGUALES	\$ 1.188.748.997	\$ 1.188.748.997	100,00%

EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO


Semana 9

OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA	\$ 1.606.694.300	Plazo Inicial	2 Meses	Suspensión 1	6-jun-25
Fecha Corte	2-jun-25	Fecha Inicio	9-abr-25	Reinicio 1	19-jun-25
		Fecha Fin	20-jul-25	Adicion 1	1 mes

	ACUM. ANTERIOR		PRESENTE SEMANA		ACUM. TOTAL	
	\$	%	\$	%	\$	%
PROGRAMADO	\$ 1.038.715.234	64,65%	\$ 104.364.894	6,50%	\$ 1.143.080.128	71,14%
AVANCE REAL	\$ 1.014.354.326	63,13%	\$ 84.213.724	5,24%	\$ 1.098.568.050	68,37%
VARIACION	-\$ 24.360.908	-1,52%	-\$ 20.151.170	-1,25%	-\$ 44.512.078	-2,77%

PROG. PROXIMA SEMANA	\$ -
----------------------	------

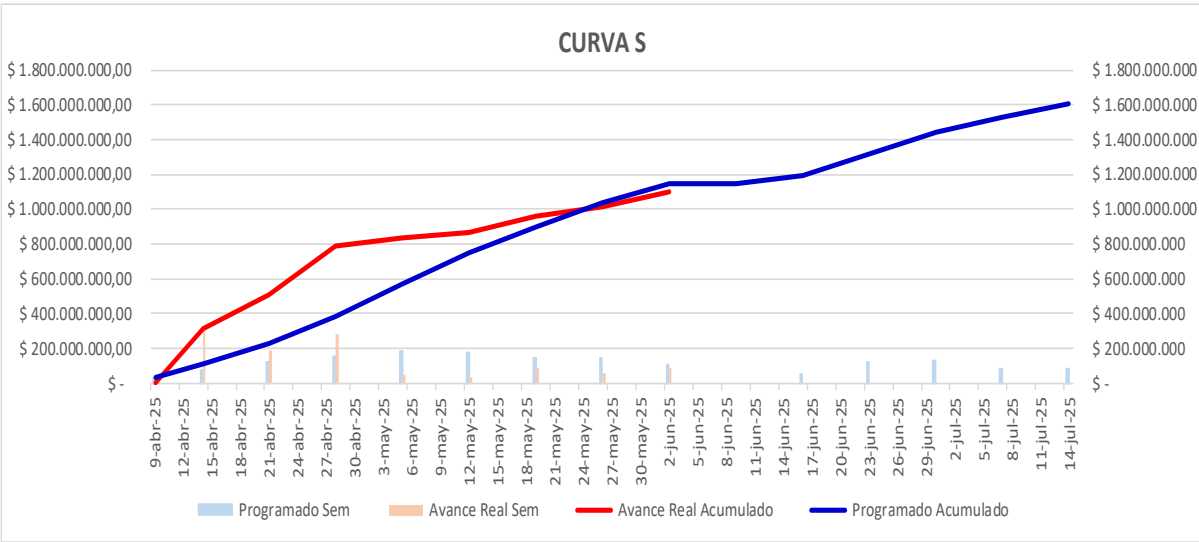

BALANCE SEGÚN AVANCE REAL			
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 1.606.694.300		Incidencia (%)
VALOR AVANCE CONTRACTUAL		\$ 1.143.080.128	71,14%
VALOR AVANCE		\$ 1.098.568.050	68,37%
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 1.098.568.050	68,37%
SALDO POR EJECUTAR		\$ 508.126.250	31,63%
SUMAS IGUALES	\$ 1.606.694.300	\$ 1.606.694.300	100,00%

EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

Semana 10


OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

VALOR CONTRATO ANTES
DE IVA \$ 1.606.694.300
Fecha Corte **9-jun-25**

Plazo Inicial 2 Meses Suspensión 1 6-jun-25
Fecha Inicio 9-abr-25 Reinicio 1 19-jun-25
Fecha Fin **20-jul-25** Adición 1 1 mes

	ACUM. ANTERIOR		PRESENTE SEMANA		ACUM. TOTAL	
	\$	%	\$	%	\$	%
PROGRAMADO	\$ 1.143.080.128	71,14%	\$ -	0,00%	\$ 1.143.080.128	71,14%
AVANCE REAL	\$ 1.098.568.050	68,37%	\$ -	0,00%	\$ 1.098.568.050	68,37%
VARIACION	-\$ 44.512.078	-2,77%	\$ -	0,00%	-\$ 44.512.078	-2,77%

PROG. PROXIMA SEMANA \$ 51.513.993

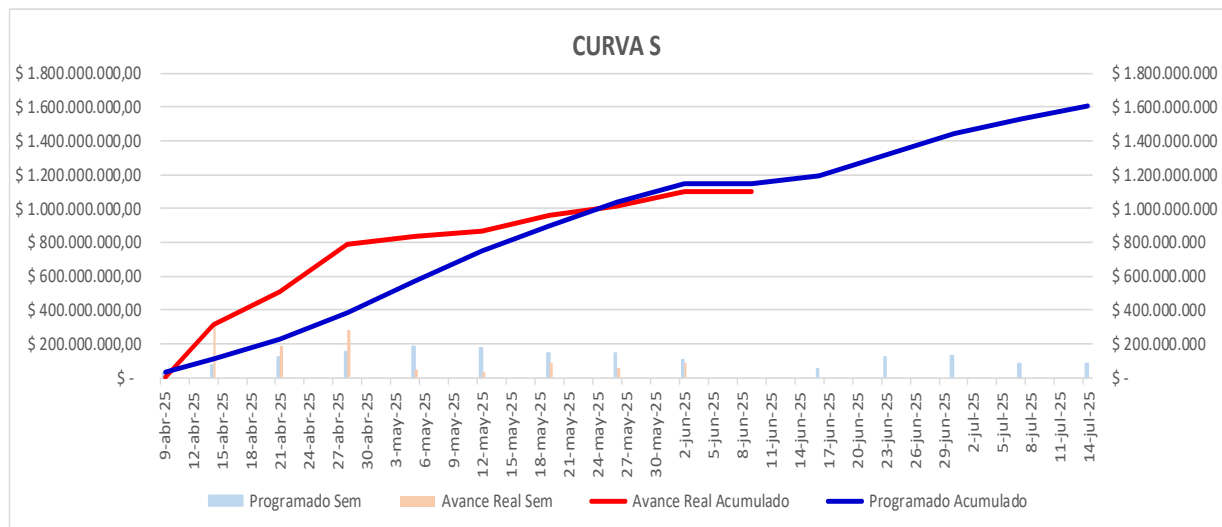

BALANCE SEGÚN AVANCE REAL			
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 1.606.694.300		Incidencia (%)
VALOR AVANCE CONTRACTUAL		\$ 1.143.080.128	71,14%
VALOR AVANCE		\$ 1.098.568.050	68,37%
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 1.098.568.050	68,37%
SALDO POR EJECUTAR		\$ 508.126.250	31,63%
SUMAS IGUALES	\$ 1.606.694.300	\$ 1.606.694.300	100,00%

EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO


Semana 11

OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

VALOR CONTRATO ANTES DE IVA	\$ 1.606.694.300	Plazo Inicial	2 Meses	Suspensión 1	6-jun-25
Fecha Corte	16-jun-25	Fecha Inicio	9-abr-25	Reinicio 1	19-jun-25
		Fecha Fin	20-jul-25	Adicion 1	1 mes

	ACUM. ANTERIOR		PRESENTE SEMANA		ACUM. TOTAL	
	\$	%	\$	%	\$	%
PROGRAMADO	\$ 1.143.080.128	71,14%	\$ 51.513.993	3,21%	\$ 1.194.594.120	74,35%
AVANCE REAL	\$ 1.098.568.050	68,37%	\$ 45.486.789	2,83%	\$ 1.144.054.839	71,21%
VARIACION	-\$ 44.512.078	-2,77%	-\$ 6.027.204	-0,38%	-\$ 50.539.281	-3,15%

PROG. PROXIMA SEMANA	\$ 122.581.435
----------------------	----------------

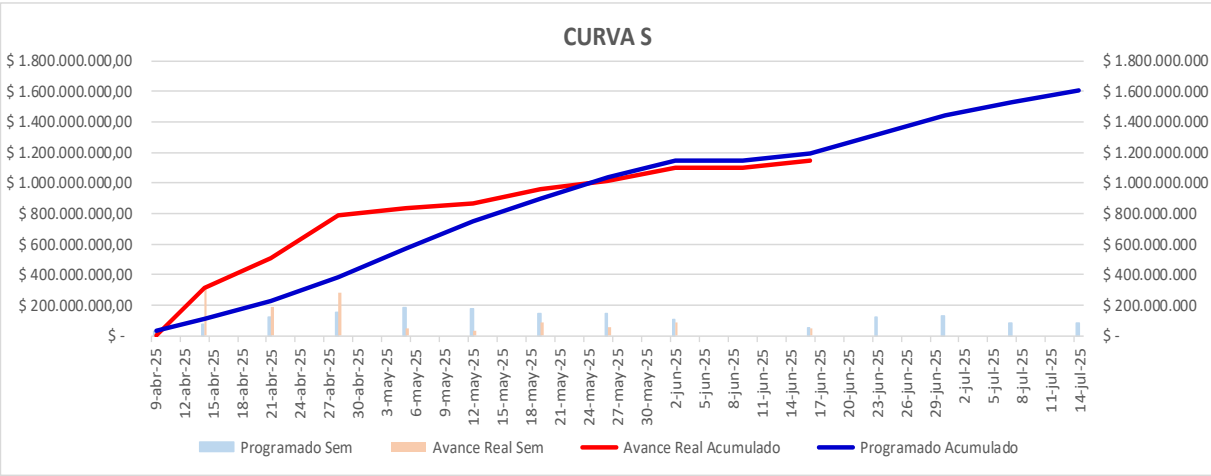

BALANCE SEGÚN AVANCE REAL			
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 1.606.694.300		Incidencia (%)
VALOR AVANCE CONTRACTUAL		\$ 1.194.594.120	74,35%
VALOR AVANCE		\$ 1.144.054.839	71,21%
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 1.144.054.839	71,21%
SALDO POR EJECUTAR		\$ 462.639.461	28,79%
SUMAS IGUALES	\$ 1.606.694.300	\$ 1.606.694.300	100,00%

EJECUCION FINANCIERA DEL CONTRATO

Semana 11


OBJETO: REALIZAR EL MEJORAMIENTO Y ADECUACIÓN DEL SISTEMA DE AGUAS LLUVIAS CUBIERTAS, DRENAJES, TRATAMIENTOS SUPERFICIALES Y ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS DE LAS PLAZAS DE MERCADO LA 14, LA 21, LA 28 Y EL JARDÍN DE LA CIUDAD DE IBAGUÉ.

VALOR CONTRATO ANTES
DE IVA \$ 1.606.694.300
Fecha Corte 29-jun-25

Plazo Inicial 2 Meses Suspensión 1 6-jun-25
Fecha Inicio 9-abr-25 Reinicio 1 19-jun-25
Fecha Fin 20-jul-25 Adición 1 1 mes

	ACUM. ANTERIOR		PRESENTE SEMANA		ACUM. TOTAL	
	\$	%	\$	%	\$	%
PROGRAMADO	\$ 1.194.594.120	74,35%	\$ 122.581.435	7,63%	\$ 1.317.175.555	81,98%
AVANCE REAL	\$ 1.144.054.839	71,21%	\$ 85.452.128	5,32%	\$ 1.229.506.967	76,52%
VARIACION	-\$ 50.539.281	-3,15%	-\$ 37.129.307	-2,31%	-\$ 87.668.588	-5,46%

PROG. PROXIMA SEMANA \$ 126.954.659

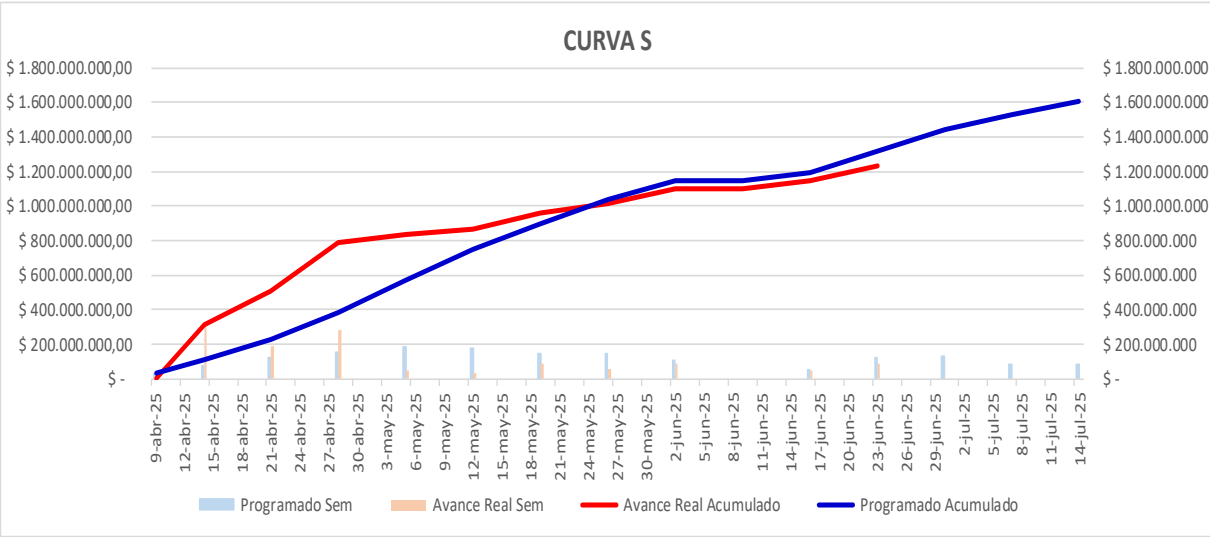

BALANCE SEGÚN AVANCE REAL			
VALOR CONTRATO INICIAL	\$ 1.606.694.300		Incidencia (%)
VALOR AVANCE CONTRACTUAL		\$ 1.317.175.555	81,98%
VALOR AVANCE		\$ 1.229.506.967	76,52%
VALOR TOTAL EJECUTADO		\$ 1.229.506.967	76,52%
SALDO POR EJECUTAR		\$ 377.187.333	23,48%
SUMAS IGUALES	\$ 1.606.694.300	\$ 1.606.694.300	100,00%
