



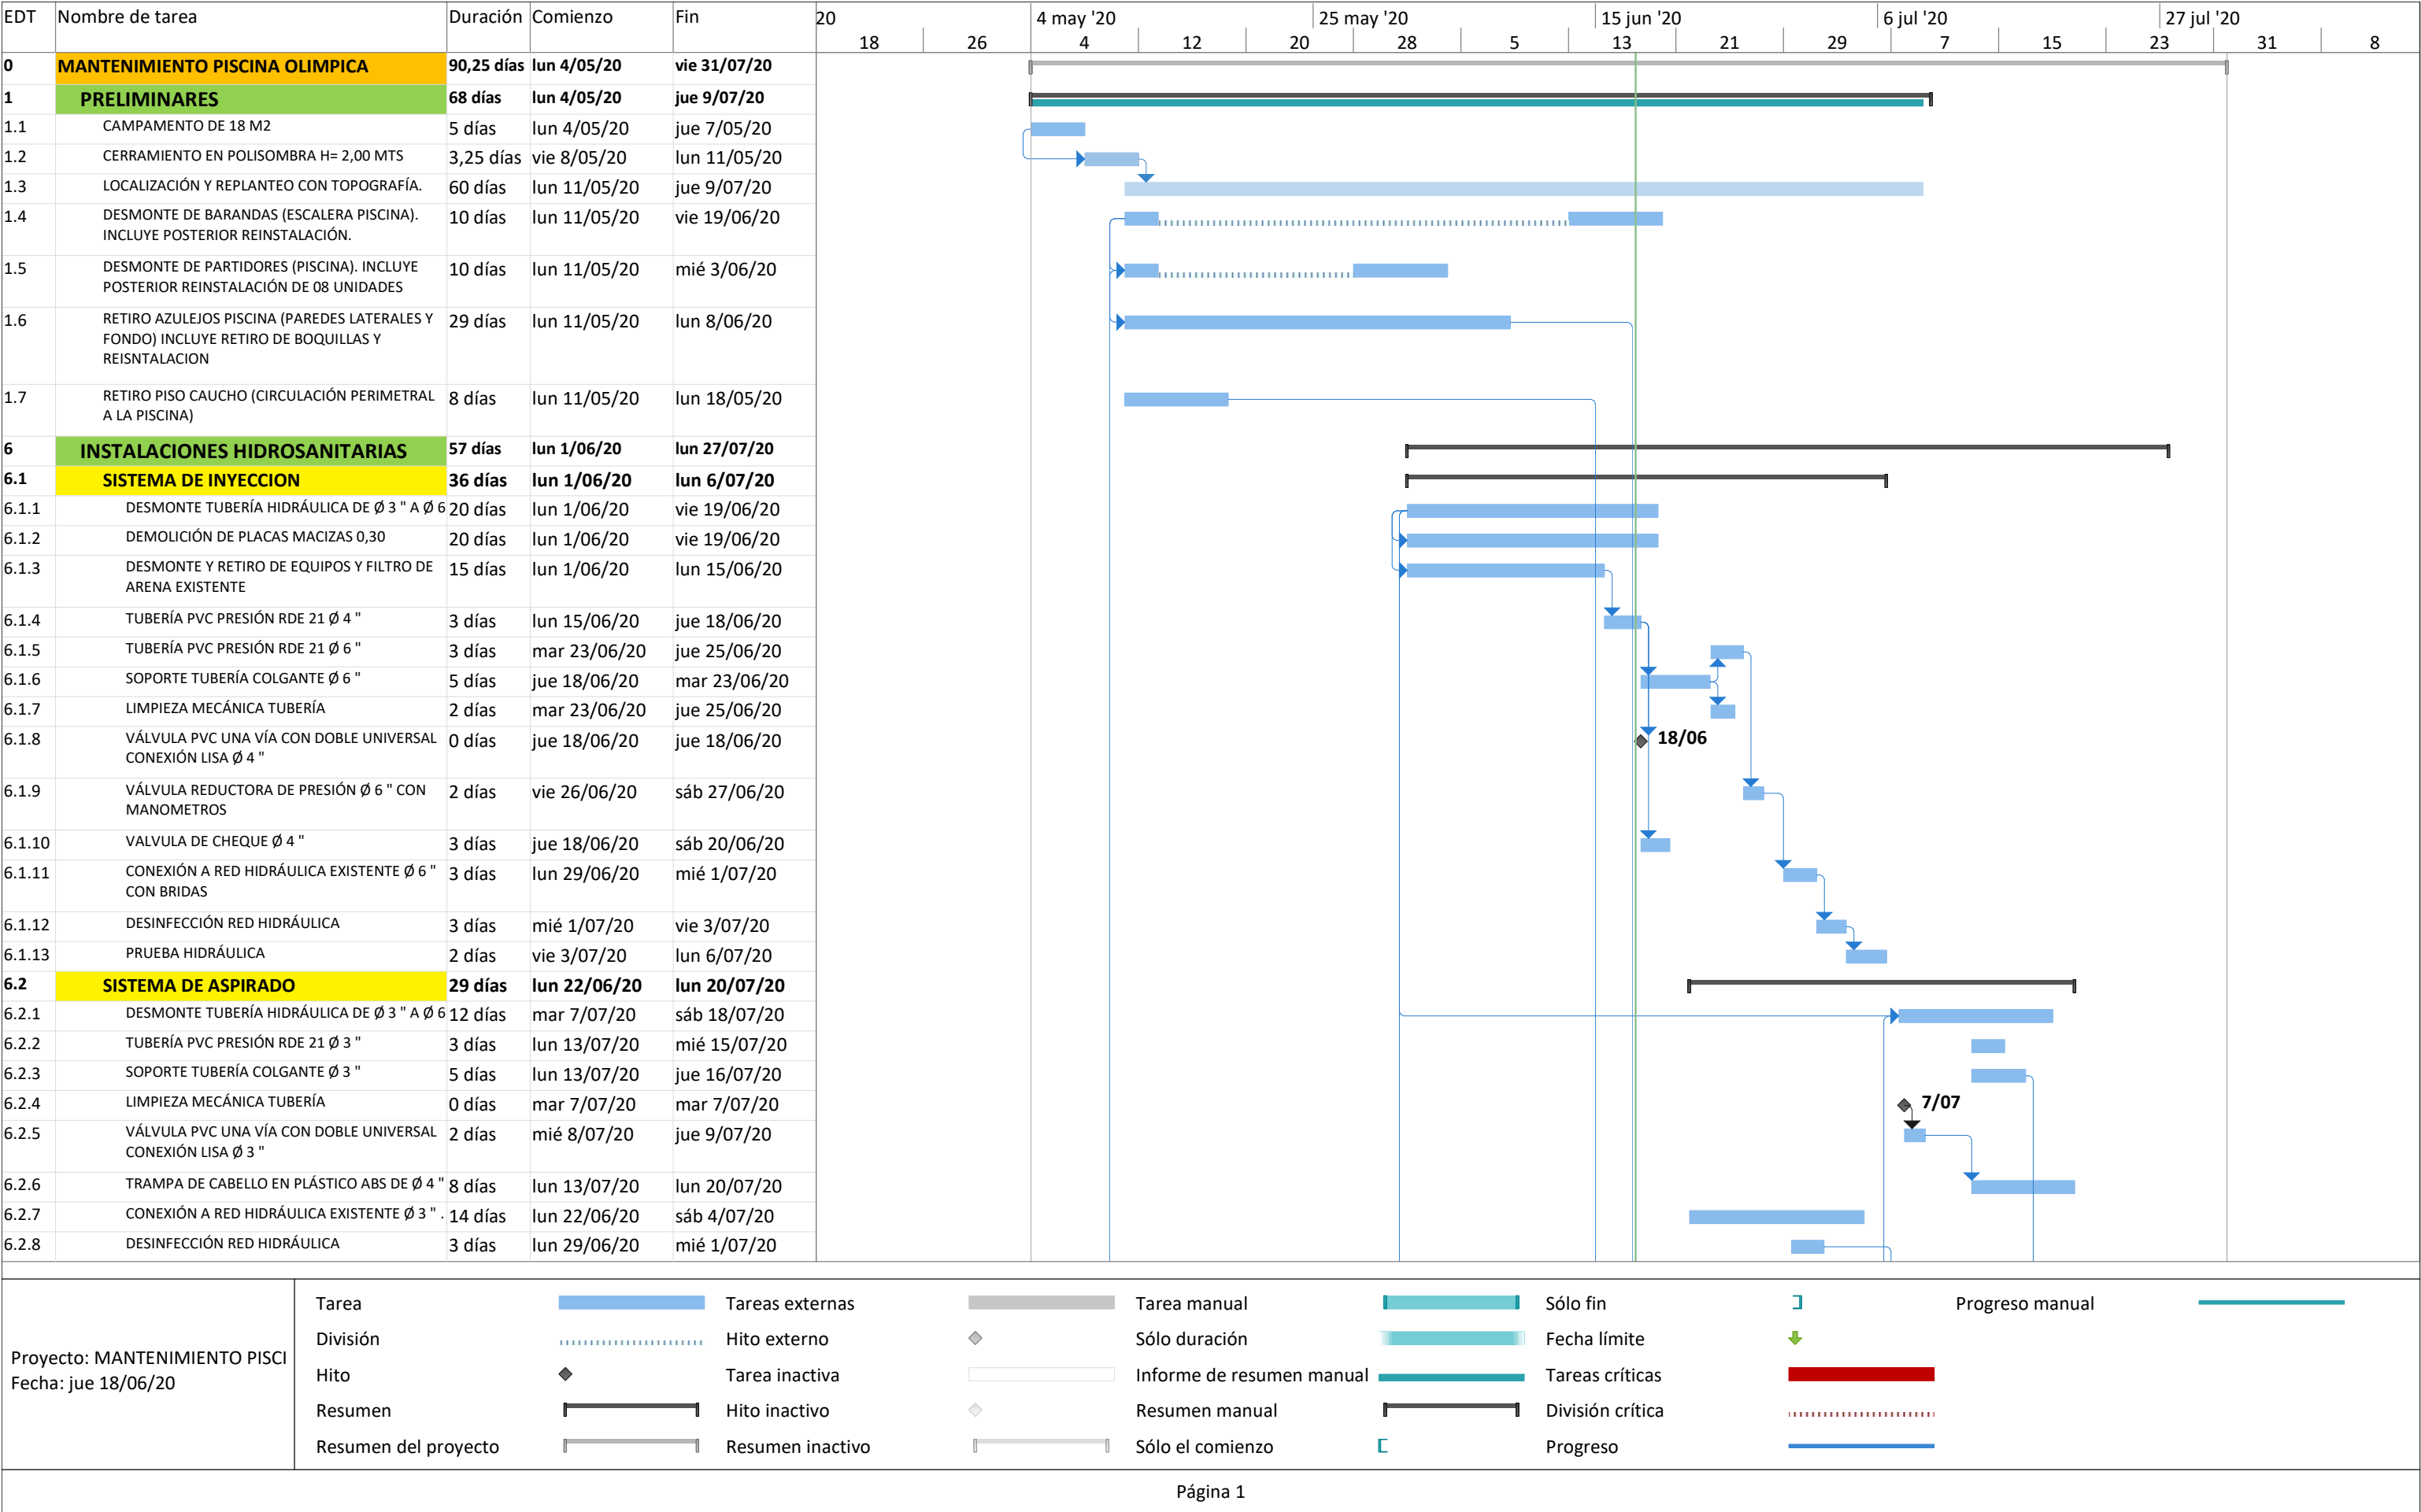

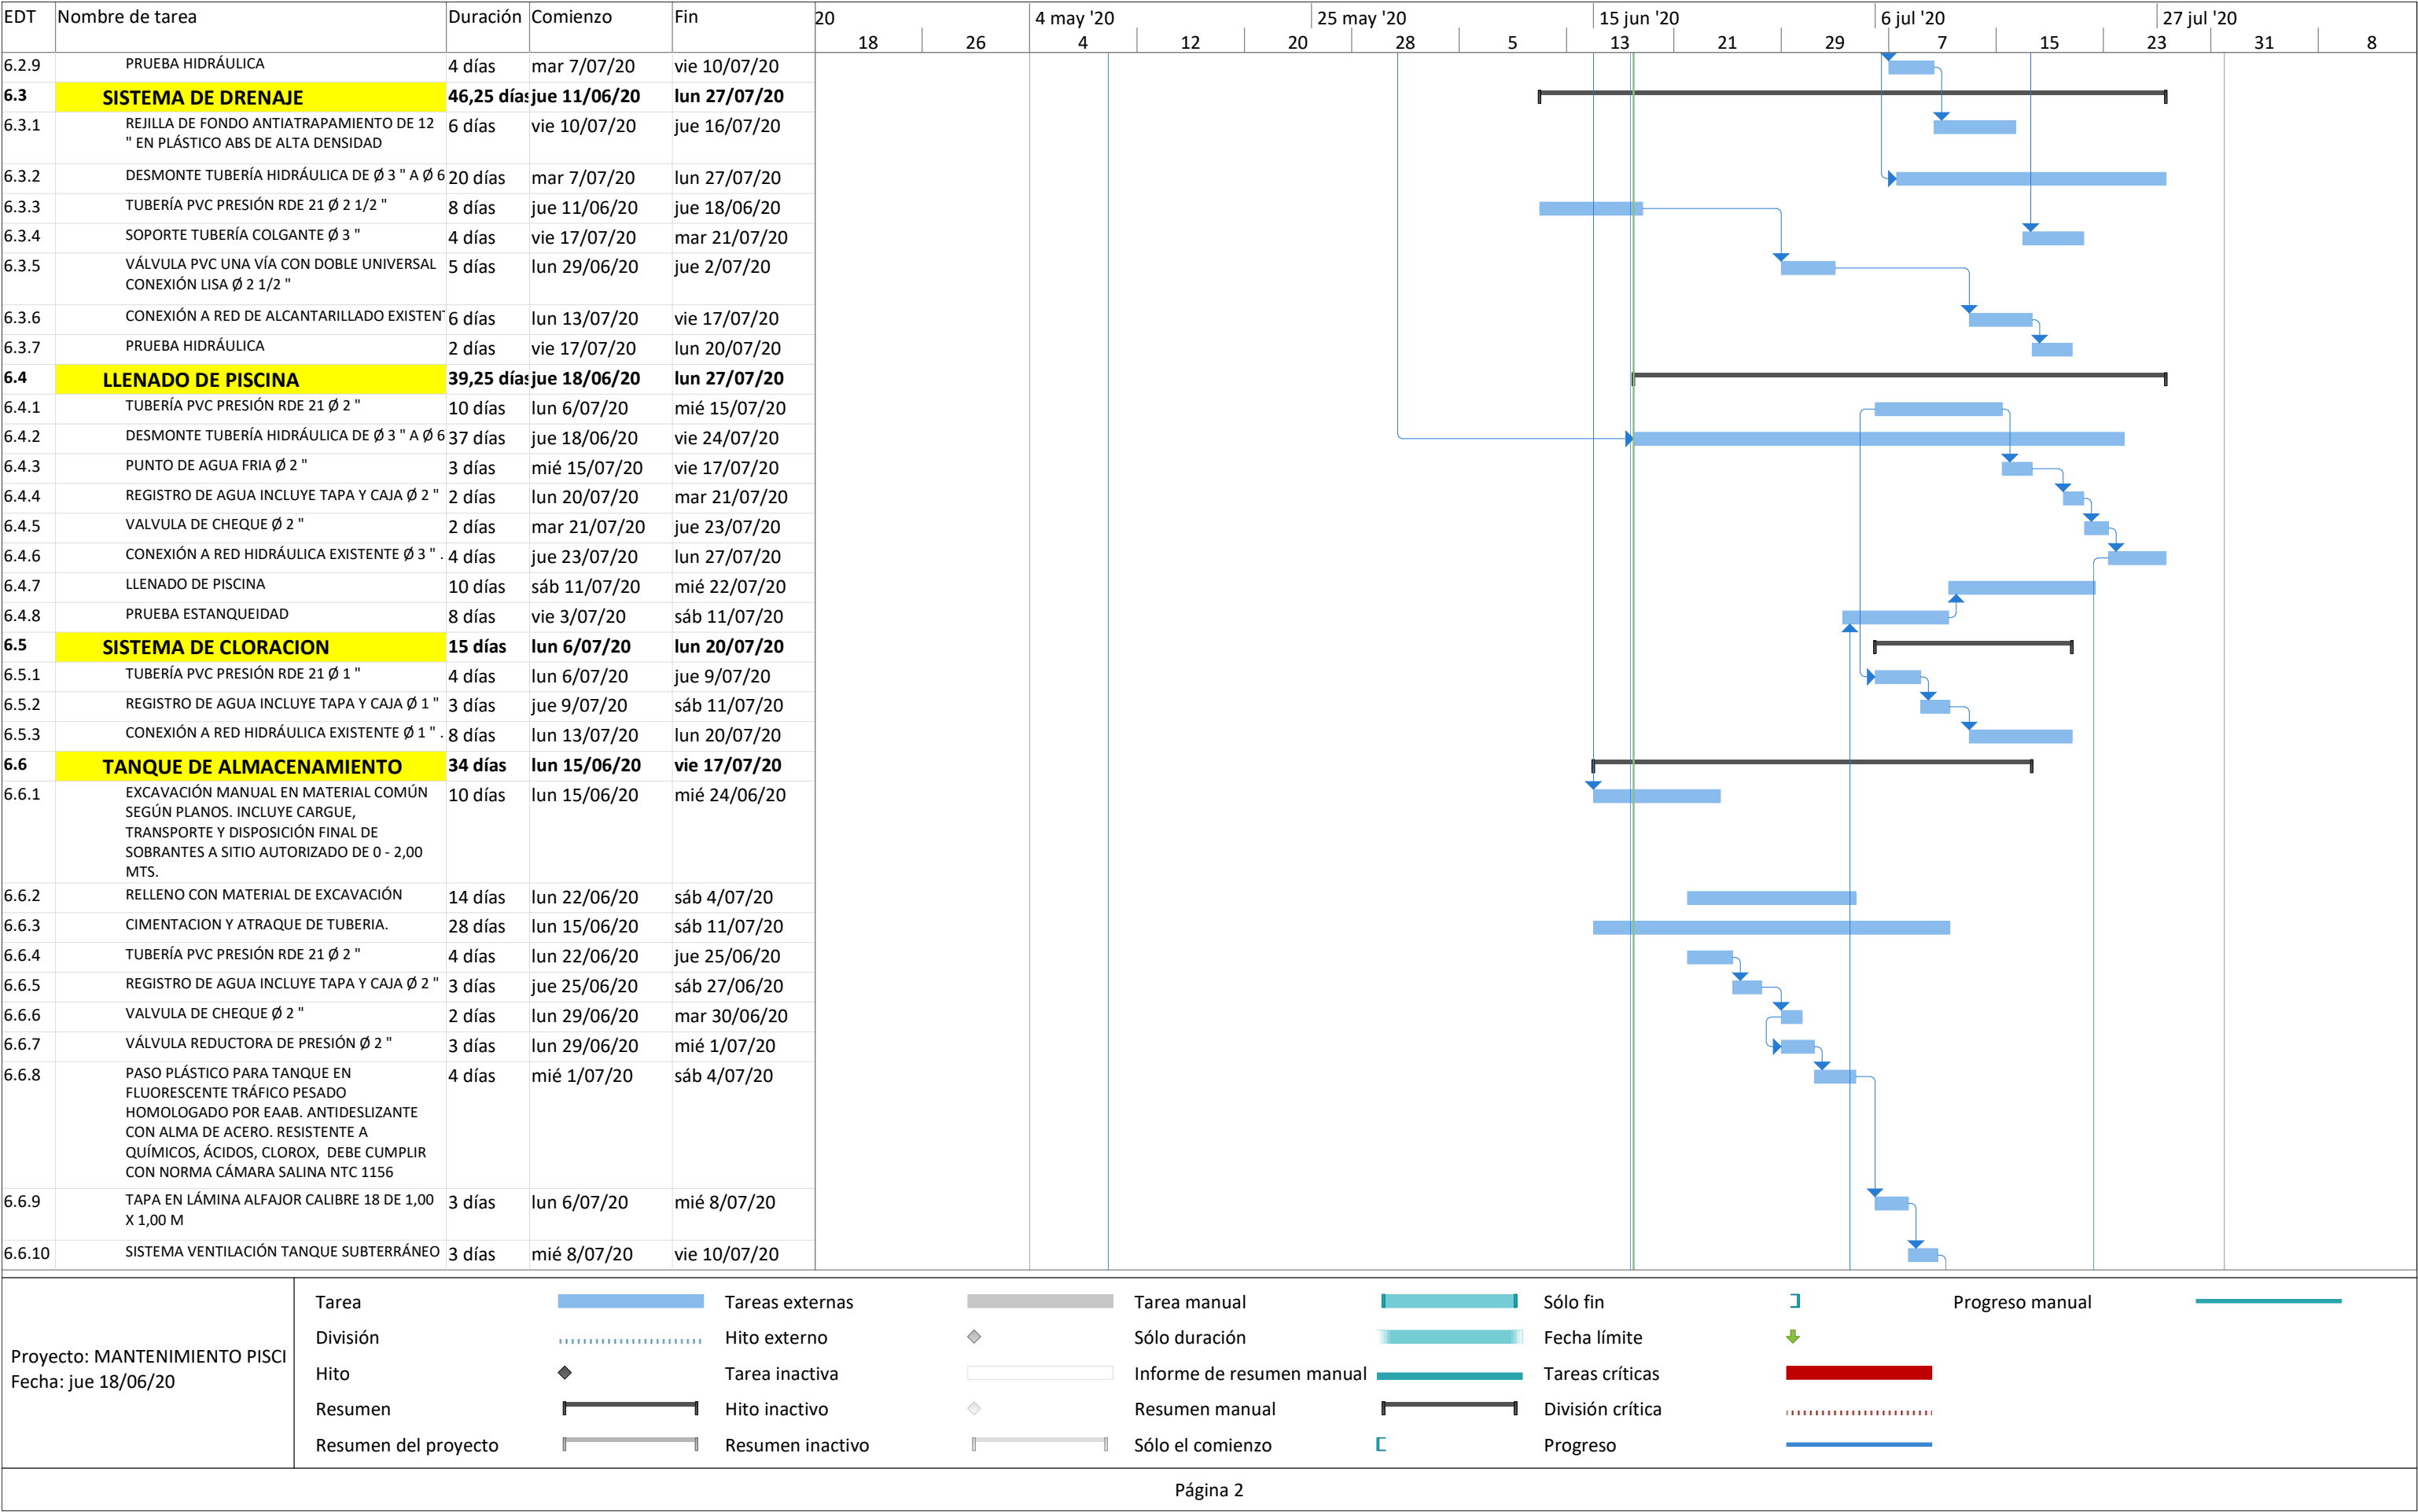

EDT	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	20	18	26	4 may '20	12	20	25 may '20	28	5	13	21	29	6 jul '20	7	15	23	27 jul '20	31	8
6.6.11	CONEXIÓN A RED HIDRÁULICA EXISTENTE Ø 3 "	4 días	vie 10/07/20	mié 15/07/20																			
6.6.12	PRUEBA HIDRÁULICA	3 días	mié 15/07/20	vie 17/07/20																			
7	INSTALACIONES ELECTRICAS	77,75 días	lun 11/05/20	lun 27/07/20																			
7.1	INFRAESTRUCTURA ELECTRICA,COMUNICACIONES Y OBRAS	7 días	lun 11/05/20	sáb 16/05/20																			
7.1.1	RETIRO DE ILUMINACIÓN SUBACUÁTICA DE LA PISCINA DE CADETES, INCLUYE RETIRO DE LUMINARIAS, RETIRO DE ALAMBRADO, RETIRO DE DUCTERIA, RETIRO DE TRANSFORMADORES DE BAJA TENSIÓN 110 V A 12 V Y TODOS LOS ELEMENTOS QUE COMPONEN DICHO SISTEMA, LOS ELEMENTOS RETIR	7 días	lun 11/05/20	sáb 16/05/20																			
7.2	BANCO DE DUCTERIAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y	39 días	jue 18/06/20	lun 27/07/20																			
7.2.1	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO SCH 40 DE 1XØ1 1/2 " ., INCLUYE CAJAS DE PASO CON TAPA, TERMINALES, UNIONES, SOPORTES Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO, ESTA SERA LA DUCTERIA D	22 días	jue 18/06/20	jue 9/07/20																			
7.2.2	CAJA PLÁSTICA INDUSTRIAL PLEXO WEATHERPROOF BOXES DE LEGRAND, DE DIMENSIONES 220 X 170 X 140 MM, LIBRE DE HALÓGENOS IP 55, IK 07.	2 días	jue 9/07/20	sáb 11/07/20																			
7.2.3	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE BANCO DE DUCTOS SUBTERRÁNEO PVC - TDP DE 1XØ1 " . INCLUYE TERMINALES Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	26 días	jue 18/06/20	mar 14/07/20																			
7.2.4	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE ACOMETIDA EN CABLE 3 X(NO. 8 CUXAWG FASES) + 1 X NO.8 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUXDESNXAWG TIERRA, EN CABLEADO THWN, INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	15 días	jue 9/07/20	vie 24/07/20																			
7.2.5	SUMINISTRO INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO DE PROTECCIÓN TERMOMAGNÉTICA TRIFÁSICA ENTRE 15 Y 65 A, 10KA, 230V, DE ACUERDO A DIAGRAMA UNIFILAR O CUADRO DE CARGAS	17 días	jue 9/07/20	lun 27/07/20																			
7.2.6	EXCAVACIÓN, RELLENO Y COMPACTACIÓN EN ZONA VERDE, NORMA CODENSA CS207 MEDIDAS DE ACUERDO A ESPECIFICACIONES TÉCNICAS), INCLUYE RELLENO CON EL MISMO MATERIAL DE LA EXCAVACIÓN Y RECUPERACIÓN DE LA ZONA VERDE.	15 días	jue 9/07/20	vie 24/07/20																			
12	ACABADOS E IMPERMEABILIZACIONES	36,5 días	jue 25/06/20	vie 31/07/20																			

Proyecto: MANTENIMIENTO PISCI

Fecha: jue 18/06/20

Tarea

División

Hito

Resumen

Resumen del proyecto

Tareas externas

Hito externo

Tarea inactiva

Hito inactivo

Resumen inactivo

Tarea manual

Sólo duración

Informe de resumen manual

Resumen manual

Sólo el comienzo

Sólo fin

Fecha límite

Tareas críticas

División crítica

Progreso

Progreso manual

Página 3

