

AT40

1

Código: 2BS-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
--	---	---

Radicado GEPOL Nro.	GS-2024-	-DILOF	E-025061
---------------------	----------	--------	----------

Intendente Jefe	
Adriana Martínez Caro	
Jefe Grupo Central de Cuentas (E)	

TURNO No.	029 INV
No. SISCO: 481498	No. REGISTRO QUIPU: N/A
No. CONTRATO: 06-6-10295-23	FECHA DE RECIBIDO: 29-jul-25
VALOR PAGO: \$ 390.116.718,20 ✓	NUMERO DE RADICADO SIIF: 275325
VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR: \$ ✓	CONTRATISTA: CONSTRUCCAM CONSTRUCCIONES S.A.S
No. FACTURA (S) O CUENTA DE COBRO: S 43 VIGENCIAS EXPIRADAS	NIT DEL CONTRATISTA: 900.322.299-1

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO X _____
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO X _____
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO X _____

CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 166125
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☐ X
6. FACTURA ORIGINAL: ☐ X
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 29/07/2025 ☐ X
8. NÚMERO DE PEDIDO SAP DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300191788
- 8.1 NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA
9. APROBACIÓN DE GARANTÍA, CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☐ X
10. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES. PUBLICADOS EN SECOP ☐ X
11. COPIA FIEL DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. ☐ N/A
12. ENDOSO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS. PUBLICADO EN SECOP ☐ N/A
13. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. ☐ N/A
14. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). ☐ N/A

PARÁGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009,

OBSERVACIONES:

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI X NO _____

FIRMA _____

CPS04 MAYER Y PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS

ANALISTA POSTCONTRACTUAL - DILOF

OP-269631725

31-07-2025

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____	
FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____	

Benito
 Recibido
 31-07-2025
 10:30



Obligación Presupuestal

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad
Ejecutora Solicitante:

Módulo: 0
16-0 000
2025-07-29-2:24 p. m.

CRISTIAN DAVID BERRIO BELLO
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DE OBLIGACION

Numero:	687425	Fecha Registro:	2025-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generada	requiere	No
Valor Inicial:	390.116.718,20	Valor Total Operaciones:	0,00	Valor Actual:	390.116.718,20
Valor Inicial Moneda Original:	0,00	Valor Total Operaciones Moneda Original:	0,00	Valor Actual Moneda Original:	0,00
Valor Deducciones:	31.370.196,00	Valor Neto:	0,00	Valor IVA:	358.746.532,20
Valor Deducciones Moneda:	0,00	Valor Neto Moneda:	0,00	Valor IVA:	358.746.532,20
Identificación:	900322299	Razon Social:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
Numero:	15354515293	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.	Cuenta Bancaria	
Cuenta X PAGAR					
Numero:	275925	Tipo:	Compra de activos Muebles, Declarantes	Identificación:	
Numero:	SE 43 DEL 22-10-2024	Tipo:	FACTURA	Fecha:	2024-10-22

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	ATRIBUTO CONTABLE	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X ORDENAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1507-0100-17-207050-15070207-ADQUISICION DE Bienes, Servicios, Obras, Contratos de Obra	Nación	10	CSF	ADQUISICION DE BIENES, SERVICIOS, OBRAS, CONTRATOS DE OBRA		390.116.718,20	0,00	390.116.718,20	390.116.718,20

Objeto: TURNO 028 INV; CTO 06.6-10295-23; FACTURA SE 43 DEL 22-10-2024(VIGENCIAS EXPIRADAS DE ACUERDO CON LA RESOLUCION 0349 DEL 28/JUL/2025)

PLAN DE PAGOS									
DEPENDENCIA DE AFECTACION DE PAC		POSICION DEL CATALOGO DE PAC		FECHA DE PAGO		ESTADO		VALOR A PAGAR	
000 PONAL GESTION GENERAL		3-8 CMC - INVERSION ORDINARIA NACION CSF		2025-07-31		Generada		390.116.718,20	
POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTAL									
POSICION DEL CATALOGO DE PAGO	IDENTIFICACION	NOMBRE BENEFICIARIO	BASE GRAVABLE	TARIFA	VALOR DEDUCCION	SALDO DISPONIBLE PARA ORDENAR			
2-01-04-01-14 RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	387.818.890,00	2,000 %	7.756.378,00	7.756.378,00			
2-01-04-02-01-03 RETE IVA - SERVICIOS GRAVADOS - RÉGIMEN COMÚN - SERVICIOS	NIT 800197268	U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES	2.297.827,00	15,000 %	344.674,00	344.674,00			
2-10-01 CONTRIBUCION CONTRATO OBRA PÚBLICA	NIT 830114475	MINISTERIO DEL INTERIOR	387.818.890,00	5,000 %	19.390.945,00	19.390.945,00			
2-03-30-01 PRO-UNIVERSIDAD NACIONAL Y DEMAS UNIVERSIDADES ESTATALES DE COLOMBIA	NIT 6989999001	MINISTERIO DE EDUCACION NACIONAL	387.818.890,00	1,000 %	3.878.189,00	3.878.189,00			


ELABORO: PP. CRISTIAN DAVID BERRIO BELLO
AUXILIAR DE CUENTAS

REVISÓ: U. ADRIANA MARTINEZ CARO
JEFE GRUPO CENTRAL DE CUENTAS (E)

Brigadier General HERBERT LUGUIN BENAVIDEZ VALDERRAMA
DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO (E)

REVISÓ: TC. JENNY PATRICIA MORALES PUEENTES
JEFE AREA FINANCIERA

REVISÓ: CFS.02 GERMAN TORRES TORRES
REVISION TRIBUTARIA



Orden de pago Presupuestal de gastos Comprobante

Issuance Enciente

Milagracia

LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ

Orden de pago Prorupuestal de gastos Comprobante

Milegancia
 16-01-01-000
 2025-08-02 3:05 p.m.

Usuario: Encartere,
 Unidad: Subunidad,
 Ejecutor: Solicitante,
 Fecha y Hora Sistema

LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ
 PONAL GESTION GENERAL

ORDEN DE PAGO PRESUPUESTAL

Número:	205531725	Fecha Registro:	2025-07-29	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Ejercicio:	Pagado	Nro Obligación:	687425
Fecha Máxima Pago:	2025-07-31	Código de Retención:	0450703960205651725	Comprobante Contable de la Generación:	
Valor Bruto:	390.116.718,00	Valor Deducciones:		Tipos de Moneda:	COP-Pesos
				Tasa de Cambio:	0,00
				Valor Neto:	390.116.718,00
				Saldo a Pagar:	0,00

VALORES PAGADOS				
TERM Pago	Valor Bruto	Valor Descuotes	Valor Neto	Valor HRC
TERM Pago	396,116,718.20	Valor Descuotes	31,370,193.00	365,746,525.20
				Menuda Baza Compra

REINTEGROS

Números		No Recaudar	
Bruto Reintegrado Pesos:	0.00 Reintegrado Deducciones Pesos:	0.00 Reintegrado Neto Pesos:	0.00
Bruto Reintegrado Moneda:	0.00 Reintegrado Deducciones Moneda:	0.00 Reintegrado Neto Moneda:	0.00

TERCERO DE LA ORDEN DE PAGO.

Identificación:	90032299	Razón Social:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	Medio de Pago:	Abono en cuenta
-----------------	----------	---------------	----------------------------------	----------------	-----------------

CUENTA BANCARIA

Número:		Banco:		BANCOLOMBIA S.A.		Tipo:		Año:		Estado:		Activa									
13-01-01-01 - DIRECCION TESORO NACION DCEPN												DOCUMENTO SOPORTE									
												Número:		Tipo:		CONTRATO DE		Fecha:		2005-07-29	
																TURNO G2 INVERSON		CUBA			

Tipo Beneficiario Pago

01 - Beneficiario final

ITEM PARA AFECTACION DE GASTOS

DEPENDENCIA / POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	REC	SIG	VALOR		VALOR PAGADO		VALOR REINGRESADO		USO DE PROYECTOS ESPECIALES		VALOR MONEDA
				PESOS	MONEDA	PESOS	PESOS	MONEDA	MONEDA	TASA DE CAMBIO		
0007 FONAL GESTION GENERAL / C-1501-0100-17-2016CC-1801020-02 ADQUIS. DE BVS - ESTACIONES DE POLICIA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	NACION	10	CSIF	350.116.718,20	0,00	350.116.718,20					0,00	0,00


DEDUCCIONES

POSICIONES DEL CATALOGO PARA PAGO NO PRESUPUESTALES	RENTIFUENTE, CONTRATO DE OBRAS	FECHA	TARIFA	VALOR	VALOR AJUSTADO PAGO	VALOR REINTEGRADO
2-01-04-01-14	RENTIFUENTE, CONTRATO DE OBRAS	06/01/2008	2,000 %	7.755.378,00	7.755.378,00	
2-01-04-02-01-02	RENTIFUENTE, CONTRATO DE OBRAS	06/01/2008	15,000 %	344.674,00	344.674,00	
2-04-01	RENTIFUENTE, CONTRATO DE OBRAS	03/01/2008	5,000 %	19.360.945,00	19.360.945,00	
2-04-00-01	RENTIFUENTE, CONTRATO DE OBRAS	03/01/2008	1,000 %	3.678.189,00	3.678.189,00	

LINEAS DE PAGO VINCULADA

DEPENDENCIA PARA AFECTACION DE PAC	POSICION DEL CATALOGO DE PAC	FECHA	VALOR	ANEXO LINEAS	ESTADO
000 - PUNAL GESTION GENERAL	3.8 - CING - INMERSION ORDENARIA NACION CSF	2025-07-31	390,116,710.20	20 Bienes, Servicios, Inmuebles y	Pagado

FIRMA SI RESPONSABILE SI



POLICIA NACIONAL DE COLOMBIA

Clase doc...CE Comprobante Egreso		Sociedad		: DILOF DIR.LOGÍST.Y FCIERA		Ejercicio :2025	
N° documento :1500099998		NIT		: 800141397-5		Período :07	
Fe. documento :31.07.2025		Fe.contab.		: 31.07.2025		Moneda doc.:COP	
Referencia :INVERSION							
Texto cab. Doc. :OB 6874250P 269631725							
ACREEDOR NIT :9003222299		NOMBRE : CONSTRUCAM LTDA					
DOCUMENTO FINANCIERO							
Pos Clv	Cuenta	Texto breve cuenta	Nit	Centro de Coste	Debe	Haber	
001 50	4705100000	Inversion		70000007301		358.746.532,20	
002 27	2401010010	CONSTRUCAM LTDA	9003222299		358.746.532,20		
TOTALES:					358.746.532,20	358.746.532,20	
RETENCIONES							
Tip Ind.	Cuenta	Concepto	Porc.	Base	Valor Retención		
TOTAL IMP:							
CONCEPTO: TUR 29 INV CTO 06-6-10295-23							
Elaboró:		TE. LEIDY CAROLINA GARCIA DIAZ		Revisó:			
Ordenador del gasto:							

Página: 1 de 7	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		
CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA		

Ciudad y fecha:	Bogotá, 29 de julio de 2025						
Unidad Contratante:	DIRECCIÓN LOGISTICA Y FINANCIERA						
Contrato No.	PN DIRAF 06-6-10295-23						
Fecha suscripción contrato:	24/10/2023						
Objeto del contrato:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".						
Lugar de ejecución de la obra:	REGIÓN	DPTO.	OBJETO	DIRECCIÓN DE PREDIO	MATRÍCULA INMOBILIARIA	ESCRITURA PÚBLICA	AREA LOTE
	4	CAUCA	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"	CALLE 6 Nro. 2-38/42	120 - 44863	6243 del 20/12/2016	1.282 metros cuadrados
Constancia de recibo No.	003 (vigencias expiradas)						
Contratista:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.						
NIT del contratista:	900.322.299-1						
Fecha del acta de inicio:	10/11/2023						
Plazo de ejecución:	Conforme a la comunicación oficial No GS-2023-001378-DIFRA del 09 de octubre del 2023, el plazo de ejecución para el presente contrato será de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (365) DIAS CALENDARIO, para los cuales se adelantarán obras durante las vigencias 2023 y 2024, contados a partir de la aprobación de la garantía única fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con el contratista de interventoría. Nota 1: la programación del contrato será realizada y presentada por el contratista de obra y deberá contar con la aprobación de la interventoría y supervisor de la interventoría. En dicha programación no se modificará la proyección de las vigencias futuras, debiendo conservar la asignación por anualidad de la vigencia futura aprobada y el plazo total previsto de ejecución.						
Nombre del Interventor del contrato:	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO Representante Legal de la firma GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.						
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO Representante Legal de la firma GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.						
Valor del contrato:	PRINCIPAL \$ 6.252.146.633,55 Incluido AIU e IVA MODIFICATORIO Nro. 1 del 27/11/2024: reducir el valor de las vigencias 2023 y 2024 por la suma de \$4.145'423.319,90 incluido AIU e IVA						
Adición No.	N/A						
Fecha de Suspensión del contrato:	Acta de Suspensión Nro. 1 del 20/06/2024						

T= 0291nu . RP 166125 810 CO . 481498 011 F 275325 / 20072025 10/15hrs

Página: 2 de 7	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		
CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA		

Fecha de Reiniciación:	Acta de Reinicio Nro. 1 del 19/07/2024				
Valor total del contrato:	\$ 2.106'723.313,65 Incluido AIU e IVA				
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial SI ☒ X Entrega Total: Si ☐				
Periodo de entrega certificado:	<table border="1"> <tr> <td>Período certificado</td> <td>Acta de corte *</td> </tr> <tr> <td>Al 30/07/2024</td> <td>Nro. 003</td> </tr> </table>	Período certificado	Acta de corte *	Al 30/07/2024	Nro. 003
Período certificado	Acta de corte *				
Al 30/07/2024	Nro. 003				
Forma de Pago:	PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la Interventoría y Contratista hayan suscrito el acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la Interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) del mes a facturar. Quando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación. Previo a la presentación de las actas parciales y a la ejecución, deberá estar aprobado por la Dirección Logística y Financiera, el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la interventoría, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado. Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así: • Acta de recibo parcial. (suscrita entre el contratista de obra e interventoría) • Factura de venta • Balance de cantidades ejecutadas. • Certificación de pagos parafiscales y seguridad social. • Certificación pagos FIC • Memoria de cantidades ejecutadas. Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera. Nota: Para el caso puntual de elementos de dotación y/o equipos, se deberá discriminar cada ítem dentro de la factura de venta. Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecidos o recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información, mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, que se hayan cumplido con el trámite				

Página: 3 de 7	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		
CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA		

	documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC). Los pagos se harán a la siguiente cuenta: NOMBRE BENEFICIARIO: CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 900.322.299-1 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A. TIPO CUENTA: Ahorros NÚMERO DE CUENTA: 15354515293														
Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial - 2023	RPC 166125 ✓ <table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DILOF</td> <td>10 INVERSIÓN</td> <td>"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".</td> <td>\$390'116.718,20 ✓</td> <td>\$390'116.718,20 ✓</td> <td>0</td> <td>\$390'116.718,20 ✓</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar	Valor a pagar	DILOF	10 INVERSIÓN	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".	\$390'116.718,20 ✓	\$390'116.718,20 ✓	0	\$390'116.718,20 ✓
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar	Valor a pagar									
DILOF	10 INVERSIÓN	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".	\$390'116.718,20 ✓	\$390'116.718,20 ✓	0	\$390'116.718,20 ✓									
Observaciones:	El presente valor corresponde al pago de las vigencias expiradas, autorizado por el señor Subdirector General de la Policía Nacional mediante comunicación oficial GS-2025-010272-SUDIR del 23 de julio de 2025, de igual manera mediante resolución 0349 del 28 de julio de 2025, firmada por el ordenador del gasto.														

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: \$ 2.106'723.313,65 ✓ Vigencia Expirada: \$ 390'116.718,20 ✓
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta Parcial de Obra Nro.003 ✓
Memorias de cálculo.	Memorias de fecha 30/07/2024, acta Nro. 003 ✓
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO <u>X</u> SI <u> </u> siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO <u>X</u> SI <u> </u> (Autorizados mediante modificatorio y adicional No. <u> </u> de fecha: <u> </u>).
Documentos requeridos para el trámite de pago:	Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así: Acta de recibo parcial. (suscrita entre el contratista de obra e interventoría)

Página: 4 de 7	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

	Factura de venta Balance de cantidades ejecutadas. Certificación de pagos parafiscales y seguridad social. Certificación pagos FIC Memoria de cantidades ejecutadas. Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera. Nota: Para el caso puntual de elementos de dotación y/o equipos, se deberá discriminar cada ítem dentro de la factura de venta. Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecidos o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, que se hayan cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	N/A
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> <u>X</u>	N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
pago del acta parcial de obra No. 003	\$390'116.718,20	El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

NOTA: La información que se consigne dependerá del estado particular de cada contrato.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
S 43	22/10/2024	\$390'116.718,20	0	\$390'116.718,20
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$390'116.718,20	0	\$390'116.718,20

***** Nota:** Con fecha 05 de noviembre de 2024 se radicó trámite de facturación ante el área de contratación DILOF por valor de \$390'116.718,20, dando lugar a la asignación del turno 358 reserva, de los cuales \$390'116.718,20 correspondían al recurso de vigencia 2023, con trámite ante el responsable de Central de Cuentas; no obstante, no fue posible continuar con el trámite de obligación presupuestal y generación de orden de pago de los recursos correspondiente a la vigencia 2023, teniendo en cuenta que Min hacienda no autorizó el cupo PAC 1-2 Gastos de Inversión constituyéndose en pasivos exigibles por vigencia expirada como "causa de un tercero" por valor de \$390'116.718,20.

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

En la ciudad de Bogotá D.C. a los veintinueve (29) días del mes de julio de 2025, se reunieron el señor OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO Representante Legal Suplente de la firma GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S., en calidad de Contratista de Interventoría y señor CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO Representante Legal de la firma CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S., en calidad de

Página: 5 de 7	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		

Contratista de Obra, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales descritas en el contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10295-23, revisar los avances de obra relacionados en el acta parcial No. 003 y el cumplimiento de las especificaciones técnicas establecidas, con el fin de proceder a radicar ante el supervisor de interventoría designado por la Entidad - Policía Nacional, los documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera para el pago parcial correspondiente.

Lo anterior, en cumplimiento de los términos, características y condiciones establecidas en el Contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10295-23, CLAUSULA CUARTA – FORMA DE PAGO – Según se evidencia en el acta de corte de obra (ACTA PARCIAL No. 003), en el cual de acuerdo con lo certificado por parte de la firma contratista de interventoría, se recibieron las actividades de obra realizadas a entera satisfacción, cumpliendo con todas las especificaciones técnicas estipuladas en referido contrato.

Es de anotar que la firma contratista de interventoría, ha ejercido el control necesario para verificar el cumplimiento de las obligaciones descritas para el contratista de obra y aplicará para sí, las que competen a su contrato de acuerdo a la indicación de la supervisión.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor del contrato de interventoría, informo que la firma contratista de interventoría manifiesta a través de su firma, que verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista de obra y certifica que los avances de obra relacionados en las actas de corte, corresponden a lo pactado en el contrato y se cumple con las especificaciones técnicas establecidas, lo cual además se evidencia en el acta objeto de entrega.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en su condición de contratista de interventoría, la firma GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S., acredita el cumplimiento parcial de las obligaciones del contratista de obra CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S., y certifica que los avances de obra relacionados en el acta parcial de obra No. 003, corresponden a lo pactado en el contrato y cumplen con las especificaciones técnicas establecidas, de acuerdo al seguimiento y verificación de las actividades realizadas in situ por parte del equipo de profesionales destinados para esta labor.

NOTA 1: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el Supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión y/o coordinación correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

De igual forma se cita lo establecido en la **Ley 1474 de 2011, artículo 83** *“La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría.*

Por regla general, no serán concurrentes en relación con un mismo contrato, las funciones de supervisión e interventoría.”

NOTA 2: la presente verificación corresponde al estado del arte de los documentos remitidos por la interventoría, conforme al alcance técnico administrativo, financiero, legal y ambiental previsto en el contrato.

Página: 6 de 7	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		

El pago por valor de \$390'116.718,20 estará a cargo del registro presupuestal No. 166125, correspondiente a la ejecución de recurso presupuestal de la vigencia 2025.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-010272-SUDIR del 23 de julio de 2025, el señor Brigadier general ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS Subdirector General de la Policía Nacional, remite al señor Coronel HERNANDO ANTONIO VALLEJO VALENCIA Jefe de la Oficina de Planeación, certificación tramite PPEVE contrato de obra PN-DIRAF Nro. 06-6-10295-23.

Mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-005223-OFPLA del 23 de julio de 2025, el señor Coronel HERNANDO ANTONIO VALLEJO VALENCIA Jefe de la Oficina de Planeación, envía al señor Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA Director Logístico y Financiero (E) la certificación de cumplimiento de los requisitos para pago PPEVE, contrato de obra PN-DIRAF Nro. 06-6-10295-23.

Mediante resolución No. 0349 del 28 de julio de 2025, el señor Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA Director Logístico y Financiero – Ordenador del gasto resolvió lo siguiente:

PROYECTO :										FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL									
CODIGO SPIN :										2018011000669									
CODIGO PRESUPUESTAL					RECURSO		SITUACION DE FONDOS		ITEMS					CANT	VALOR UNITARIO \$				
PRG	SUB	PROY	ORD	SUBORD	ITEM			CSF	SSF	CONSECUTIVO	DESCRIPCIÓN								
											ESTACIONES DE POLICIA								
1501	0100	17	20105C	1501020							ESTACIONES DE POLICIA CONSTRUIDOS Y DOTADOS								
1501	0100	17	20105C	1501020	02	10	X				Pago pasivos exigibles vigencias expiradas - Construcción e Interventoría Estación de Policía Cajibío Cauca								
											Pago pasivos exigibles vigencias expiradas (contrato 06-6-10295-23) - Construcción Estación de Policía Cajibío Cauca				1	390.116.718,20			

CONCEPTO	CONTRATISTA	NIT	VALOR
Pago pasivos exigibles - vigencias expiradas (contrato de consultoría PN DIRAF Nro. 06-6-10295-23)	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	900.322.299-1	\$390'116.718,20

EL VALOR A PAGAR CORRESPONDE A: TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$390'116.718,20).

ARTÍCULO 2. Ordenar al Área Financiera de la Dirección Logística y Financiera – Grupo de Presupuesto General, se expida el Registro Presupuestal, con el objeto de continuar el trámite del pago correspondiente.

ARTÍCULO 3. Ordenar al Área Financiera la remisión de la copia del presente acto administrativo a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Decreto 1621 del 30/12/2024.

Página: 7 de 7	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

Es de anotar que debido a las capacidades técnicas de la Dirección de Infraestructura, a las responsabilidades de cada funcionario y a la imposibilidad de estar presente en el lugar de la obra, en todo momento del desarrollo del proyecto, no es posible la verificación de las cantidades de obra por parte de los supervisores de interventoría designados por la ordenación del gasto, así como realizar el seguimiento día a día de la ejecución y cumplimiento de compromisos contractuales, es por ello que se contrata una firma especializada para realizar la interventoría del proyecto; dicha ejecución fue supervisada por funcionarios idóneos de la interventoría y adelantada por un contratista que se presume cumple con las condiciones mínimas del proceso, por tal razón, se indica que el contenido del trámite de este periodo son responsabilidad de los profesionales encargados; asumiéndose que estos han sido desarrollados de acuerdo con su conocimiento, experiencia y perfil profesional.

En Constancia, firman:




OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
Representante Legal de la firma
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.



CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO
Representante Legal de la firma
CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

12
RW



VICTOR ALFONSO LOPEZ C.
REVISOR FISCAL

EL SUSCRITO


REVISOR FISCAL:

Declara bajo gravedad de juramento que la empresa **CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S** Identificada con NIT.900.322.299 - 1, se encuentra a paz y salvo por pagos de parafiscales realizando aportes de CCF, ARL, PENSION Y SALUD durante los últimos seis meses para dar cumplimiento a lo previsto en el Certificado de aportes parafiscales de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988 y/o Certificación del pago de Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) en virtud de lo establecido en la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, reglamentada por el Decreto 2763 de 2012, atendiendo que aplica para las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes.

Certificamos que la empresa en mención se encuentra acogida a la exoneración de pago aportes parafiscales ICBF y SENA, según artículo 114 – 1 del estatuto tributario.

Dado en Ibagué a los 29 días del mes de julio del año 2025 a solicitud del Interesado.

VICTOR A. LOPEZ
VICTOR ALFONSO LOPEZ CALDERON
TP: 251339 – T
Revisor Fiscal


CARLOS ALBERTO MAHECHA M.
C.C.No. 14'238.687 de Ibagué
Rep. Legal

VICTOR ALFONSO LOPEZ C.
REVISOR FISCAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

B F F B 2 E 0 3 C 4 7 5 8 A 2 B


LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público VICTOR ALFONSO LOPEZ CALDERON identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 1111192277 de MARIQUITA (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 251339-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

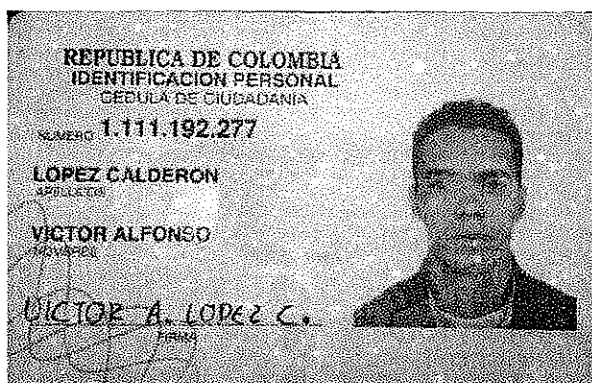

Dado en BOGOTÁ a los 29 días del mes de Mayo de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


SANDRA MILENA PARRA OCHOA
DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

VICTOR ALFONSO LOPEZ C.
REVISOR FISCAL



ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ÁRL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 800332399	1	CONSTRUCIMASAS	B	segunda	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4112	Jurídica	
MUNDEP		DIRECCIÓN	2680602				EMAIL		CONSTRUCIMAS@YAHOO.ES
72-1		OF E2 9 19 PASO COMERCIAL ANACENTRO							S

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	TODOS LOS CENTROS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDADO
2025-6-08	2025-07	33957283	E	2025-07-03	TODOS		TODOS	816.700	0	BANCO GUABIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	33957283	2025-07-22	Pagada							

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	P. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 900322329	t	CONSTRUCAMBUS	B	segovia	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4112	Unidista	
MUNIDEP		DIRECCION		TELEFONO			EMAIL	EVENTO DE PARAFISICALES	
73-1		OF E2 B19 PASO COMERCIAL ARKACENTRO		2690602			CONSTRUCAMBUS@YAHOO.ES	S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	TODOS LOS CENTROS	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2025-06	2025-07	33957303	E	2025-07-03			TODOS	816.703	0	BANCOLOMBIA
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
4	33847293	2025-07-22	Pagada							

TOTALES IBC				
IBC PENSIÓN	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
2.941.900	2.941.900	2.941.900	2.941.900	2.941.900

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFPI(Administradoras: 3)	PORVENIR	800224908	8	1	7.600	0	0	0	7.600,00
	PROTECCION	900229739	0	1	227.900	0	0	0	227.900,00
	COLPENSIONES	900336004	7	2	235.400	0	0	0	235.400,00
EPS(Administradoras: 2)	SANITAS	EP-S005	6	3	117.900	0	0	0	117.900,00
	NUEVA E.P.S.A.	EP-S037	2	1	60.900	0	0	0	60.900,00
					57.000	0	0	0	57.000,00

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				4	110.300	0	0	0	110.300
POSITIVA	14-23	860011153	6	4	110.300	0	0	0	110.300
CCF(Administradoras: 1)				4	117.800	0	0	0	117.800
COMPENALCO-TOLIMA	CCF60	888700148	4	4	117.800	0	0	0	117.800
Gran Total					816.700	0	0	0	816.700



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
SUBDIRECCION GENERAL POLICIA NACIONAL
GRUPO ASESORIA

SUDIR-GRASE - 20.1

Bogotá D.C., 21 de julio de 2025

Señor brigadier general
ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS
Subdirector general de la Policía Nacional (E)
Carrera 59 No 26-21
Ciudad.

Asunto: certificación trámite PPEVE contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10295-23.

De manera atenta y respetuosa mi general, me permito remitir para su respectiva suscripción, la certificación de viabilidad trámite Pago Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas – PPEVE del contrato de obra PN-DIRAF No. 06-3-10295-23, cuyo objeto es *"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE"*, por un valor de TRECIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$390.116.718.20).

Lo anterior, considerando que los documentos aportados mediante comunicado oficial No GS-2025-005085-OFPLA del 17/07/2025, cumplen los requisitos legales del Decreto No 1621 del 2024, *"Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025 se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos"*, y los lineamientos del oficio No S-2018-006946-OFPLA del 28/11/2018.

Atentamente,



Firmado digitalmente por:
Nombre: Paola Cardenas Bermudez
Grado: Mayor
Cargo: Jefe Grupo Asesoría (Sudir)
Cédula: 26422046
Título: Especialista En Servicio De Policía
Dependencia: Grupo Asesoría
Unidad: Subdirección General Policía Nacional
Correo: paola.cardenas2046@correo.policia.gov.co
22/07/2025 3:02:20 p. m.

Anexo: si

Carrera 59 No. 26-21 CAN
Teléfono: 9280-9592
sudir.grase@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
SUBDIRECCIÓN GENERAL
GRUPO ASESORÍA

No. GS-2025- - 0 10 27 2 - SUDIR-GRASE 14.13

Bogotá, D.C.

23 JUL 2025

Señor coronel
HERNANDO ANTONIO VALLEJO VALENCIA
Jefe Oficina de Planeación
Carrera 59 No 26-21
Ciudad.

Asunto: certificación trámite PPEVE contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10295-23.

De manera atenta y respetuosa me permito remitir al señor coronel, certificación de viabilidad trámite Pago Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas – PPEVE del contrato de obra PN-DIRAF No. 06-6-10295-23, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE", por un valor de TRECIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS (\$390.116.718.20).

Lo anterior dando alcance a las comunicaciones oficiales No GS-2025-003638 -OFPLA del 16/05/2025, GS-2025-005055-SUDIR del 10/07/2025, GS-2025-005085-OFPLA del 17/07/2025 y GS-2025-010220-SUDIR del 21/07/2025. Finalmente se reitera que "Copia del acto administrativo que ordena su pago deberá ser remitido a la Contraloría General de la República", de conformidad a lo establecido en el párrafo cuarto del artículo 54 del Decreto No 1621 del 2024, "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025 se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos".

Atentamente,

Brigadier general **ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS**
Subdirector general de la Policía Nacional (E)
Administrador Policial T.B. 3336

Anexos: 01 carpeta en físico


Elaboró: **SI. SANDRA MILENA VILLA VELA**
SUDIR - GRASE

Revisó: **MY. PAOLA CÁRDENAS BERMÚDEZ**
SUDIR - GRASE

Fecha de elaboración: 21/07/2025
Ubicación: SUDIR\GRASE\PPEVE

Carrera 59 No. 26-21 CAN Bogotá
Teléfonos: 5159000 ext. 9046
sudir.grase@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA VISIBLE



Compromiso Presupuestal de Gasto --
Comprobante.

Usuario Solicitante: NILTON JAVIER RINCON AMAYA
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante: PONAL GESTION GENERAL
Fecha y Hora Sistema: 29/07/2025 12:00:00 a. m.


REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO									
Con base en el CDP No: 35825 de fecha 2025-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle									
Número:	155125	Fecha Registro:	2025-07-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL				
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:		0,00
Valor Inicial:	390.116.718,20	Valor Total Operaciones:			Valor Actual:	390.116.718,20	Saldo x Obligar:		390.116.718,20
TERCERO ORIGINAL									
Identificación: NIT	900322299	Razón Social:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.						
CUENTA BANCARIA									
Número:	15354515293	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.						
Identificación:	80512723	Nombre:	HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA						
Identificación:		Fecha de Registro:		Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:		Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO
DOCUMENTO SOPORTE									
					0349	Número:		Tipo:	RESOLUCION
								Fecha:	2025-07-28

ITEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICIA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		390.116.718,20	0,00		
						390.116.718,20	0,00	390.116.718,20	390.116.718,20
					Total:				390.116.718,20

Objeto: GS-2025-005503-DIFRA POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS CTO 06-6-10295-23 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAC	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-8 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-08-07	390.116.718,20	390.116.718,20 NINGUNO

Mayor JENNER SANTIAGO ARAGÓN
Jefe Grupo Presupuesto General



Certificado de Disponibilidad Presupuestal – Comprobante.

Usuario Solicitante: MHeñorezj EDWIN FLOREZ JIMENEZ
Unidad ó Subunidad: 16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema: 8/04/2025 12:00:00 p. m.

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

El suscrito Jefe de Presupuesto CERTIFICA que existe apropiación presupuestal disponible y libre de afectación en los siguientes "ítems de afectación de gastos"

Número:	35825	Fecha Registro:	2025-04-08	Unidad / Subunidad ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo:	Gasto
Valor Inicial:	390.116.718,20	Valor Total Operaciones:		Saldo x Comprometer:	390.116.718,20
				Uso Caja Menor	Ninguno
					Vr. Bloqueado
					0,00

SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número:	38025	Fecha Registro:	2025-04-08	Número:		Modalidad de contratación:		Tipo de contrato:	
---------	-------	-----------------	------------	---------	--	----------------------------	--	-------------------	--

AUTORIZACION DE ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS

ITEM PARA AFECTACION DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICION CATALOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACION	VALOR INICIAL	VALOR OPERACION	VALOR ACTUAL	SALDO X COMPROMETER	VALOR BLOQUEADO
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BVS - ESTACIONES DE POLICIA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATEGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF						
						390.116.718,20	0,00	390.116.718,20	390.116.718,20	0,00

Objeto:	GS-2025-002363-DIFRA CPA 101 INV PAGO PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS CTO 06-6-10295-23 CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DEL MUNICIPIO DE CAJIBO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
---------	---

INTENDENTE NILTON JAVIER RINCON AMAYA
JEFE GRUPO PRESUPUESTO GENERAL (E)



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
OFICINA DE PLANEACION
GRUPO GESTIÓN PRESUPUESTAL

ADREC-GUSPE - 20.1

Bogotá D.C., 23 de julio de 2025

Señor brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero (E)
Carrera 59 26-21 CAN
Bogotá D.C

Asunto: envío certificación cumplimiento requisitos para pago PPEVE, contrato de obra PN DIRAF Nro.06-6-10295-23

Respetuosamente me permito remitir a mi general, certificación de "CUMPLIMIENTO REQUISITOS PAGO PASIVOS EXIGIBLES VIGENCIAS EXPIRADAS", firmada por el señor Subdirector General de la Policía Nacional mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-010220-SUDIR, con cargo al contrato de obra PN DIRAF Nro. 06-6-10295-23 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE", respaldado presupuestalmente con CDP Nro. 35825 de 08/04/2025, expedido por la Dirección Logística y Financiera de la Policía Nacional, por valor de TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS, CON VEINTE CENTAVOS, MCTE (\$390.116.718,20).

Es de anotar mi general, que posterior al envío de esta certificación se debe expedir acto administrativo "resolución firmada por medio de la cual se reconoce y autoriza el pago de las obligaciones causadas por "Pago Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas" con su debida justificación", en cumplimiento a lo estipulado en el artículo 54 del Decreto Nro.1621 del 2024 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025 se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos" y a lo indicado en el numeral 2 del literal B de la Circular Externa Nro. C20250507000150 del 07 de mayo de 2025, suscrita por la Directora de Finanzas del Ministerio de Defensa Nacional.

Asimismo, una vez cumplido el lineamiento de "Pago Pasivos Exigibles Vigencias Expiradas (PPEVE)", se deberá cumplir a cabalidad con el procedimiento efectuando los registros en el Sistema Integrado de Información Financiera -SIIF Nación II, del pago de los TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS, CON VEINTE CENTAVOS, MCTE (\$390.116.718,20), en articulación con la Dirección de Infraestructura.

Finalmente, de manera respetuosa se hace la recomendación a mi general, tenga a bien disponer adelantar el trámite de la liquidación del contrato referido, de acuerdo a los parámetros establecidos en el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Atentamente,



Anexo: si

Firmado digitalmente por:
Nombre: Hernando Antonio Vallejo Valencia
Grado: Coronel
Cargo: Jefe Oficina De Planeacion
Cédula: 75147364
Título: Administrador Policial T.P 147
Dependencia: Oficina De Planeacion
Unidad: Oficina De Planeacion
Correo: hernando.vallejo1432@correo.policia.gov.co
24/07/2025 9:39:51 a. m.

Carrera 59 26 - 21 CAN
Teléfono: 5159000
ofpla.jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA

RESOLUCIÓN NÚMERO **0349** DEL **28 JUL 2025**

"Por la cual se reconoce y ordena el pago de Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas del contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10295-23".

EL DIRECTOR LOGÍSTICO Y FINANCIERO DE LA POLICÍA NACIONAL (E)

En uso de las facultades legales que le confiere la Resolución Nro. 00011 del 02/01/2025 *"Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional de Colombia, suscribir comodatos de bienes inmuebles, convenios y/o contratos interadministrativos, y se dictan otras disposiciones"*, la Resolución Nro. 0269 del 25/01/2023 *"Por la cual se define la estructura orgánica de la Dirección Logística y Financiera, se determinan las funciones de sus dependencias internas y se dictan otras disposiciones"*, la Orden Administrativa de Personal Nro. 25-182 del 01 de julio de 2025, y

CONSIDERANDO:

Que la Constitución Política de Colombia en su artículo 352 refiere *"Además de lo señalado en esta Constitución, la Ley Orgánica del Presupuesto regulará lo correspondiente a la programación, aprobación, modificación, ejecución de los presupuestos de la Nación, de las entidades territoriales y de los entes descentralizados de cualquier nivel administrativo, y su coordinación con el Plan Nacional de Desarrollo, así como también la capacidad de los organismos y entidades estatales para contratar"*, así mismo el artículo 356 indica que *"Salvo lo dispuesto por la Constitución, la ley orgánica, a iniciativa del Gobierno, fijará las competencias a cargo de la Nación, de los Departamentos, Distritos, municipios y entidades territoriales indígenas. Para efectos de atender los servicios a cargo de estos y proveer los recursos para financiar adecuadamente su prestación, se crea el Sistema General de Participaciones del que serán beneficiarios los Departamentos, Distritos, municipios y las entidades territoriales indígenas"*.

Que la Ley 80 de 1993, *"Por la cual se expide el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública"*, dispone las reglas y principios que rigen los contratos de las entidades estatales.

Que la Ley 819 de 2003, *"Por la cual se dictan normas orgánicas en materia de presupuesto, responsabilidad y transparencia fiscal y se dictan otras disposiciones"*, determina las características y contenido del marco fiscal de cada vigencia, las normas que definen la disciplina fiscal y endeudamiento territorial.

Que la Ley 1150 de 2007, *"Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con Recursos Públicos"*, fortalece las medidas del estatuto de la contratación pública a través de las modalidades y medios de control en la selección de oferentes y el manejo de recursos públicos.

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN "Por la cual se reconoce y ordena el pago de Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas del contrato de obra PN DIRAF Nro. 06-6-10295-23".

Que la Ley 1712 de 2014, "Por medio de la cual se crea la Ley de Transparencia y del Derecho de Acceso a la Información Pública Nacional y se dictan otras disposiciones" tiene por objeto regular el derecho de acceso a la información pública, los procedimientos para el ejercicio y garantía del derecho y las excepciones a la publicidad de información, así mismo en su artículo 10 recalca la publicidad en el marco del régimen de la contratación estatal.

Que la Ley 2294 de 2023, "Por el cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026 "Colombia Potencia Mundial de la Vida", fija como objetivos, sentar las bases para que el país se convierta en un líder de la protección de la vida a partir de la construcción de un nuevo contrato social que propicie la superación de injusticias y exclusiones históricas, la no repetición del conflicto, el cambio de nuestro relacionamiento con el ambiente y una transformación productiva sustentada en el conocimiento y en armonía con la naturaleza.

Que el Decreto 111 de 1996, "Por el cual se compila la Ley 38 del 21 de abril de 1989, Ley 179 del 30 de diciembre de 1994 y Ley 225 del 20 de diciembre de 1995 que conforman el Estatuto Orgánico del Presupuesto", dispone en el artículo 110 que: "Los órganos que son una sección en el Presupuesto General de la Nación, tendrán la capacidad de contratar y comprometer a nombre de la persona jurídica de la cual hagan parte, y ordenar el gasto en desarrollo de las apropiaciones incorporadas en la respectiva sección, lo que constituye la autonomía presupuestal a que se refieren la Constitución Política y la ley. Estas facultades estarán en cabeza del jefe de cada órgano quien podrá delegarlas en funcionarios del nivel directivo o quien haga sus veces, y serán ejercidas teniendo en cuenta las normas consagradas en el estatuto general de contratación de la administración pública y en las disposiciones legales vigentes".

Que el Decreto 1068 de 2015, "Por medio del cual se expide el Decreto Único Reglamentario del Sector Hacienda y Crédito Público", compila la normatividad del Sector Hacienda y Crédito Público de Colombia, racionalizando y simplificando las normas para mejorar la eficiencia económica y social y afianzar la seguridad jurídica.

Que el Decreto 4730 de 2005, "Por el cual se reglamentan normas orgánicas de presupuesto", en su artículo 29, determina como objetivos del Sistema Presupuestal: El equilibrio entre los ingresos y los gastos públicos que permita la sostenibilidad de las finanzas públicas en el mediano plazo; la asignación de los recursos de acuerdo con las disponibilidades de ingresos y las prioridades de gasto y la utilización eficiente de los recursos en un contexto de transparencia.

Que el Decreto 1082 de 2015, "Por medio del cual se expide el decreto único reglamentario del sector Administrativo de Planeación Nacional", define como sus objetivos fundamentales "la coordinación y diseño de políticas públicas y del presupuesto de los recursos de inversión, la articulación entre la planeación de las entidades del Gobierno Nacional y los demás niveles del gobierno; la preparación, el seguimiento de la ejecución y la evaluación de resultados de las políticas, planes, programas y proyectos del sector público, así como realizar en forma permanente el seguimiento de la economía nacional e internacional, proponer los estudios, planes, programas y proyectos para avanzar en el desarrollo económico, social, institucional y ambiental, y promover la convergencia regional del país, participar en la planeación y el adecuado desempeño en la ejecución de los proyectos de inversión, en la administración del Sistema de Seguimiento, Evaluación y Control del SGR y el Banco de Proyectos de Inversión y apoyar al Presidente de la República en el ejercicio de su función de máximo orientador de la planeación nacional de corto, mediano y largo plazo".

Que mediante Decreto 113 del 25/01/2022, "Por el cual se modifica la estructura del Ministerio de Defensa Nacional" establece en el artículo Nro. 19 las funciones de la Dirección Lógica y

Que el Decreto 1621 de 2024 "Por el cual se liquida el Presupuesto General de la Nación para la vigencia fiscal de 2025, se detallan las apropiaciones y se clasifican y definen los gastos", indica en su artículo 54 que: "Sin perjuicio de la responsabilidad fiscal y disciplinaria a que haya lugar, cuando en vigencias anteriores no se haya realizado el pago de obligaciones adquiridas con las formalidades previstas en el Estatuto Orgánico del Presupuesto y demás normas que regulan la materia, y sobre los mismos no se haya constituido la reserva presupuestal o la cuenta por pagar correspondiente, se podrá hacer el pago bajo el concepto de "Pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas".

Que la Resolución Nro. 03049 de 2014, "Por la cual se adopta el manual de contratación de la Policía Nacional", constituye un instrumento de orientación y apoyo a la gestión contractual que adelantan los distintos delegatarios de contratación en la Policía Nacional.

Que la Resolución Nro. 00090 de 2018, "Por la cual se actualiza, modifica y complementa el manual de contratación de la Policía Nacional, adoptado mediante Resolución 03049 de 2014" busca materializar una herramienta que ofrezca a los participantes de la actividad contractual de la institución, mecanismos y criterios claros y precisos con relación a los procedimientos y requisitos que deben observarse para la selección de los contratistas, acorde con la normativa vigente.

Que la Resolución Nro. 05252 de 2018, "Por la cual se adiciona la Resolución No. 04612 de PPEVE2018" refiere los lineamientos para la administración y gestión de recursos logísticos y financieros de la institución. El objetivo es asegurar el buen uso y la eficiencia de los recursos, contribuyendo al cumplimiento de la misión policial.

Que la Resolución Nro. 04612 de 2018, "Por la cual se efectúa una delegación al Subdirector General de la Policía Nacional", tiene como finalidad optimizar la gestión institucional mediante la asignación de funciones administrativas estratégicas, permitiendo al Subdirector General asumir responsabilidades previamente atribuidas al Director General, con el fin de agilizar los procedimientos internos y fortalecer la eficiencia en la administración de los recursos logísticos, financieros y operativos de la institución.

Que la Resolución Nro. 01118 de 2020, "Por la cual se expide el Manual de Lineamientos Contables para la Policía Nacional de Colombia", establece los principios, normas y procedimientos contables aplicables a la Policía Nacional para asegurar la transparencia y eficiencia en la gestión de sus recursos.

Que la Resolución Nro. 00011 de 2025, "Por la cual se delega en algunos funcionarios, la competencia para contratar, comprometer y ordenar el gasto, en desarrollo de las apropiaciones incorporadas al presupuesto de la Policía Nacional de Colombia, suscribir comodato de bienes inmuebles, convenios y/o contratos interadministrativos, y se dictan otras disposiciones", contempla en sus disposiciones delegar la ordenación del gasto en directores, comandantes de policías metropolitana y de departamentos, entre otros, para llevar a cabo las modalidades de selección de la contratación pública.

Que la Resolución 00364 de 2025, "Por la cual se adiciona y modifica parcialmente la Resolución 00011 del 02/01/2025" realiza ajustes respecto al alcance y condiciones de la delegación, ordenación del gasto de las modalidades de selección, delegación para la celebración de contratos de comodato de bienes muebles e inmuebles, entre otros aspectos.

Que la Resolución Nro. 00168 de 2025, "Por la cual se asignan y modifican unas partidas con

CONTINUACIÓN DE LA RESOLUCIÓN "Por la cual se reconoce y ordena el pago de Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas del contrato de obra PN DIRAF Nro. 06-6-10295-23".

Que la circular externa Nro. RS20250507091479 del 07 de mayo de 2025 emitida por el Ministerio de Defensa, define los parámetros a tener en cuenta en el procedimiento de pago "Pasivos exigibles – Vigencias Expiradas".

Que el día 24 de octubre del 2023, se firmó el contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10295-23 cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE". Que no fue posible continuar con el trámite de obligación presupuestal y generación de orden de pago de las cuentas de cobro correspondientes al turno de reserva 358 del 05 de noviembre 2024 de obra por valor de **TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$390.116.718,20)**, teniendo en cuenta que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público no autorizó el cupo PAC 1-2 Gastos Generales y 3-8 Inversión, siendo esta una causal ajena y externa al normal desarrollo del procedimiento de cadena presupuestal en la institución, lo cual se enmarca en la norma como "Causa de un Tercero" para la constitución de pasivos exigibles por vigencia expirada.

Que mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-002410-DILOF del 24 de enero de 2025, el Área Financiera de la Dirección Logística y Financiera, informó al señor Director de Infraestructura coronel EDGAR FERNANDO LÓPEZ GONZÁLEZ lo siguiente:

"respetuosamente permito informar a mi coronel que, para la fecha 01/11/2024 el Ministerio de Hacienda y Crédito Público realizó la reducción del PAC asignado para la reserva presupuestal de la vigencia 2023, por lo anterior, esta Jefatura lideró las actuaciones de solicitud de PAC por las posiciones de catalogo 1-2 GASTOS GENERALES y 3-8 INVERSIÓN ante el Ministerio como se indica a continuación y en la línea de tiempo del formato anexo a la presente comunicación, así...:

Es preciso indicar a mi coronel que, realizadas las gestiones en mención, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no autorizó el PAC de reserva presupuestal 2023, a esta unidad ejecutora POLICIA NACIONAL – GESTIÓN GENERAL."

Que ante la ausencia de PAC para el pago de las obligaciones se dio cumplimiento a la Circular Externa 040 denominada "ASPECTOS A CONSIDERAR PARA EL CIERRE DE LA VIGENCIA 2024 Y APERTURA DEL AÑO 2025 EN EL SISTEMA INTEGRADO DE INFORMACIÓN FINANCIERA – SIIF NACIÓN, numeral 12. "ASPECTOS RELACIONADOS CON EL MÓDULO DE CONTABILIDAD", literal b):

"Ajustes contables manuales por efecto de la ausencia de PAC: En el evento que se reciban bienes y/o servicios y la entidad no cuente con PAC para registrar la obligación, el área contable deberá hacer los respectivos ajustes manuales correspondientes para reflejar en la contabilidad del SIIF Nación el hecho económico.

En el año 2025, al momento de obligar la reserva presupuestal inducida por la ley por la ausencia de PAC, se deberá seleccionar el atributo contable diferente al 5- Ninguno que corresponda en la parametrización de la tabla TCON09, con el fin de que no se realice registro contable dado que, el hecho económico debió ser registrado en diciembre del año 2024".

Que se hace necesario efectuar el reconocimiento y pago mediante el mecanismo "Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas PPEVE", el cual se requiere para atender el compromiso con recursos del Presupuesto General de la Nación, asignados a la Policía Nacional dentro del proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA

Nro. Contrato	Razón social	Balance financiero	
PN DIRAF 06-6-10295-23	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	Presupuesto vigencia 2023	\$ 2.430'209.396,46
		Presupuesto vigencia 2024	\$ 3.821'937.237,09
		Sub total valor inicial del contrato (A)	\$ 6.252'146.633,55
		Modificadorio 1: reducción presupuesto vigencia 2023	\$ 323'486.062,81
		Modificadorio 1: reducción presupuesto vigencia 2024	\$ 3.821'937.237,09
		Sub total reducción Modificadorio 1 (B)	\$ 4.145'423.319,90
		Valor final contrato (A - B)	\$ 2.106'723.313,65
		Pago Recibo a Satisfacción Nro. 1 Presupuesto vigencia 2023	\$1.115'008.548,44
		Pago Recibo a Satisfacción Nro. 2 Presupuesto reserva constituida 2024	\$601'598.047,01
		Valor girado al contratista (C) - recursos pagados con cargo a reservas presupuestales durante la vigencia 2024.	\$1.716'606.595,45
		Obligación PPEVE (A - B - C)	\$ 390.116.718,20

Que el valor del pago de Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas - PPEVE por **TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$390.116.718,20)**, se sustenta en el acta parcial de obra Nro. 03, por medio de la cual se recibieron las obras realizadas a entera satisfacción cumpliendo con todas las especificaciones técnicas a lo estipulado en el contrato.

Que mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-010272-SUDIR del 23 de julio de 2025, el señor Brigadier general ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS Subdirector General de la Policía Nacional (E), remite al señor Coronel HERNANDO ANTONIO VALLEJO VALENCIA Jefe de la Oficina de Planeación, certificación trámite PPEVE del contrato de obra PN-DIRAF Nro. 06-6-10295-23.

Que mediante comunicación oficial Nro. GS-2025-005223-OFPLA del 23 de julio de 2025, el señor Coronel HERNANDO ANTONIO VALLEJO VALENCIA Jefe de la Oficina de Planeación, envía al señor Brigadier general HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA Director Logístico y Financiero (E) la certificación de cumplimiento de los requisitos para pago PPEVE, contrato de obra PN-DIRAF Nro. 06-6-10295-23.

Que el Director Logístico y Financiero de la Policía Nacional (E), compromete los recursos para atender el pago al contratista CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S. por valor de **TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$390.116.718,20)**, el gasto se ejecutará con cargo al presupuesto de la Dirección Logística y Financiera rubro presupuestal "FORTEALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL" dentro del código presupuestal 1501- 0100 - 17 - 20105C - 1501020 - ESTACIONES DE POLICÍA de la vigencia fiscal 2025, recurso 10, aportes de la nación amparado en el Certificado de Disponibilidad Presupuestal SIIF Nación Nro. 35825 del 08 de abril de 2025, así mismo la factura debe ser cancelada a la firma CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S. el NIT Nro. 900.322.299-1 cuenta de ahorros Nro. 15354515293 del BANCOLOMBIA S.A.

En mérito de lo expuesto,

RESUELVE:

ARTÍCULO 1. Comprometer, y pagar una partida con cargo al presupuesto de inversión de adquisiciones de bienes y servicios, vigencia fiscal 2025 en la cuenta, unidad y valores que a

CONCEPTO	CONTRATISTA	NIT	VALOR
Pago Pasivos Exigibles - Vigencias Expiradas (contrato de obra PN DIRAF No. 06-6-10295-23)	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.	900.322.299-1	\$390.116.718,20

EL VALOR A PAGAR CORRESPONDE A: TRESCIENTOS NOVENTA MILLONES CIENTO DIECISÉIS MIL SETECIENTOS DIECIOCHO PESOS CON VEINTE CENTAVOS M/CTE (\$390.116.718,20).

ARTÍCULO 2. Ordenar al Área Financiera de la Dirección Logística y Financiera – Grupo de Presupuesto General, se expida el Registro Presupuestal, con el objeto de continuar el trámite del pago correspondiente.

ARTÍCULO 3. Ordenar al Área Financiera la remisión de la copia del presente acto administrativo a la Contraloría General de la República, de conformidad con lo establecido en el artículo 54 del Decreto 1621 del 30 de diciembre de 2024.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:

Dada en Bogotá, D.C. a los

Brigadier general **HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA**
Director Logístico y Financiero (E)

Elaboró: CPS. Cesar Fernando Romero Alejo
DIFRA-JEFAT

Revisó: TE. Mario Andrés Grisales Rojas
DIFRA-GRUED

Revisó: MY. Jennifer Fuentes Aragón
DIFLOF-GUEG

Revisó: MY. José Ricardo Rodríguez Andrade
DIFLOF-ASUR

Revisó: TC. Fernando Aragon Pinto
DIFRA-GRUED

Revisó: TC. Hernando López Bonilla
DIFRA-JEFAT (E)

Revisó: TC. Jenny Patricia Morales Fuentes
DIFLOF-ARFIN

Revisó: CR. Edwin Orlando Correa Correa
DIFLOF-SULOF

Fecha de elaboración: 25/07/2025

Ubicación: \\srvfilesponal1\ARIN\Publica_ARIN\FIDOCUMENTOS TRÁMITE VIGENCIAS EXPIRADAS DIFRA\CAJIBIO\OBRA



MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL
POLICÍA NACIONAL
DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA
ÁREA DE GESTIÓN DE PROYECTOS

GS- 2025-005503 / DIFRA - GUTEP - 29.10

Bogotá D.C. **29 JUL 2025**

Señor brigadier general
HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA
Director Logístico y Financiero (E)
Carrera 59 26 - 21 CAN
Bogotá D.C.

Asunto: solicitud trámite expedición RP para pago pasivos exigibles - PN DIRAF Nro. 06-6-10295-23

Teniendo en cuenta lo establecido en la Resolución Nro. 0349 del 28/07/2025, "Por la cual se reconoce y ordena el pago de Pasivos Exigibles – Vigencias Expiradas del contrato de obra PN DIRAF Nro. 06-6-10295-23" y la certificación de viabilidad suscrita por el señor Brigadier General **ARNULFO ROSEMBERG NOVOA PIÑEROS** Subdirector General mediante comunicado oficial GS-2025-010272-SUDIR, respetuosamente me permito solicitar a mi general, tenga a bien ordenar a quien corresponda, expedir el Registro Presupuestal (RP) así:

Número de contrato: 06-6-10295-23

Objeto: "CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE"

Dependencia de afectación del gasto: 000 – PONAL GESTIÓN GENERAL


Recurso: 10

Rubro: C 1501- 0100 – 17 - 20105C – 1501020

Valor de la vigencia expirada: \$ 390.116.718,20

Por lo anterior, se adjunta el certificado de disponibilidad presupuestal Nro. 35825 de fecha 08/04/2025, con objeto "Pago pasivos exigibles - vigencias expiradas cto 06-6-10295-23- objeto CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE, A Precios Unitarios Fijos Sin Fórmula De Reajuste", por valor de **\$390.116.718,20** y la resolución 0349 del 28 de julio de 2025.

Atentamente,


Teniente coronel **HERNANDO LÓPEZ BONILLA**
Director de Infraestructura (E)
Especialista en Servicio de Policía

Anexo: SI



Elaboró: IJ. Edwin Ferny Bohórquez Arenas
DIFRA-GUTEP

Fecha de elaboración: 28/07/2025
Ubicación: Z:\GUSEP\DIRAF\2025\PLANE21. VIGENCIAS EXPIRADAS

Carrera 59 No. 26-21 CAN, Bogotá
Teléfonos: 3159000 IP. 9013
diraf.arinf-jefat@policia.gov.co
www.policia.gov.co

INFORMACIÓN PÚBLICA

24



Compromiso Presupuestal de Gasto - Comprobante.

Usuario Solicitante:
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:
Fecha y Hora Sistema:

MHnjncon
16-01-01-000
29/07/2025 12:00:00 a. m.

NILTON JAVIER RINCON AMAYA
PONAL GESTION GENERAL

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 35825 de fecha 2025-04-08. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	166125	Fecha Registro:	2025-07-29	Unidad / Subunidad Ejecutora:	16-01-01-000 PONAL GESTION GENERAL			
Vigencia Presupuestal	Actual	Estado:	Generado	Tipo de Moneda:		COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Inicial:	390.116.718,20	Valor Total Operaciones:		0,00	Valor Actual:	390.116.718,20	Saldo x Obligar:	390.116.718,20
TERCERO ORIGINAL								
Identificación: NIT	900322299	Razón Social:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.					
CUENTA BANCARIA								
Número:	15354515293	Banco:	BANCOLOMBIA S.A.					
ORDENADOR DEL GASTO								
Identificación:	80512723	Nombre:	HERBERT LUGUIY BENAVIDEZ VALDERRAMA		Cargo:	DIRECTOR LOGISTICO Y FINANCIERO		
DOCUMENTO SOPORTE								
CAJA MENOR								
Identificación:	Fecha de Registro:	Genera Viáticos:	No	Num. Solicitud de Comisión:	Número:	0049	Tipo:	RESOLUCION
								2025-07-28

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO									
DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	C-1501-0100-17-20105C-1501020-02 ADQUIS. DE BYS - ESTACIONES DE POLICIA CONSTRUIDAS Y DOTADAS - FORTALECIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA OPERACIONAL ORIENTADA A CONSOLIDAR LA CONVIVENCIA Y SEGURIDAD CIUDADANA A NIVEL NACIONAL	Nación	10	CSF		390.116.718,20	0,00		
						390.116.718,20	0,00	390.116.718,20	390.116.718,20
					Total:				390.116.718,20

Objeto: GS-2025-006503-DIFRA POR LA CUAL SE RECONOCE Y ORDENA EL PAGO PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPRADAS CTO 06-6-10295-23 CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DE CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE

PLAN DE PAGOS				
DEPENDENCIA DE AFECTACIÓN DE PAG	POSICIÓN DEL CATÁLOGO DE PAC	FECHA	VALOR A PAGAR	SALDO POR OBLIGAR
000 PONAL GESTION GENERAL	3-3 CNC - INVERSION ORDINARIA NACIÓN CSF	2025-06-07	390.116.718,20	390.116.718,20 NINGUNO

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)

25

Código: 28S-FR-0021 Fecha: 12-03-2021 Versión: 5	ELABORACIÓN, EJECUCIÓN Y LIQUIDACIÓN DE CONTRATOS PLANILLA ASIGNACIÓN TURNO-TRÁMITE DE CUENTAS	 POLICÍA NACIONAL
--	---	---

Radicado GEPOL Nro.	GS-2024-	-DILOF	--034183
---------------------	----------	--------	----------

Teniente Winny Bustamante Córdoba Jefe Grupo Central de Cuentas	<table style="width:100%;"> <tr> <th style="width:50%;">TURNO No.</th> <th style="width:50%;">358 RESERVA</th> </tr> <tr> <td>No. REGISTRO QUIPU :</td> <td>No aplica</td> </tr> <tr> <td>FECHA DE RECIBIDO :</td> <td>5-Nov-24</td> </tr> <tr> <td>NUMERO DE RADICADO SIIF:</td> <td>491524</td> </tr> <tr> <td>CONTRATISTA:</td> <td>CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S</td> </tr> <tr> <td>NIT DEL CONTRATISTA:</td> <td>900.322.299-1</td> </tr> </table>	TURNO No.	358 RESERVA	No. REGISTRO QUIPU :	No aplica	FECHA DE RECIBIDO :	5-Nov-24	NUMERO DE RADICADO SIIF:	491524	CONTRATISTA:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S	NIT DEL CONTRATISTA:	900.322.299-1
TURNO No.	358 RESERVA												
No. REGISTRO QUIPU :	No aplica												
FECHA DE RECIBIDO :	5-Nov-24												
NUMERO DE RADICADO SIIF:	491524												
CONTRATISTA:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S												
NIT DEL CONTRATISTA:	900.322.299-1												

No. SISCO: 491498 No. CONTRATO: 06-6-10295-23 VALOR PAGO: \$ 390,116,718.20 VALOR QUE SE AMORTIZARÁ CON EL PAGO A TRAMITAR : No. FACTURA (\$) O CUENTA DE COBRO: \$ 43	
---	--

DOCUMENTOS PARA EL TRÁMITE DE CUENTAS

1. EL CONTRATISTA REALIZÓ EL ENDOSO DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO SI _____ NO ☒
2. EL CONTRATISTA SOLICITÓ LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO SI _____ NO ☒
3. LA CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS DEL CONTRATO ESTÁ AUTORIZADA POR EL ORDENADOR DEL GASTO SI _____ NO ☒


CESIÓN A: _____ CUENTA BANCARIA: _____

4. NÚMERO DEL REGISTRO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO QUE SOPORTA EL TRÁMITE DE PAGO (REGISTRADO EN SECOP) 45492308 ☒
5. CONSTANCIA DE RECIBIDO EXPEDIDA POR EL SUPERVISOR/COORDINADOR/INTERVENTOR DEL CONTRATO A SATISFACCIÓN (ORIGINAL) ☒
6. FOLIOVA EXISTENTE ☒
7. CERTIFICACIÓN DE APORTES PARAFISCALES VIGENTE, DE FECHA: 15/10/2024 ☒
8. NÚMERO DEL REGISTRO DEL SERVICIO Y/O BIEN: 4300191788 ☒
9. NÚMERO DE ENTRADA QUIPU DEL BIEN: NO APLICA ☒
10. MODIFICACIÓN DEL CONTRATO, ADICIÓN O PRÓRROGA -PUBLICADA EN SECOP ☒
11. CONTRATO, ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES, PUBLICADOS EN SECOP ☒
12. COPIA DEL ORIGINAL DEL PAGO DE INDUSTRIA Y CONSTRUCCIÓN FIC, CONTRATOS DE OBRA. N/A
13. VÍDEO DE FACTURAS Y/O CESIÓN DE DERECHOS ECONÓMICOS, PUBLICADO EN SECOP. N/A
14. CERTIFICACIÓN BANCARIA DEL CESIONARIO DEL ENDOSO Y/O CESIÓN DE DERECHOS, PUBLICADA EN SECOP. N/A
15. DOCUMENTOS QUE ACREDITAN EL CUMPLIMIENTO DE PAGO APORTES SALUD Y PENSIÓN, REMUNERACIÓN SERVICIOS (ORIGINAL). N/A

PARAGRAFO 1 ARTICULO 4 DEL DECRETO 2271 DEL 18 DE JUNIO DE 2009.

OBSERVACIONES :

LA CUENTA BANCARIA DEL BENEFICIARIO DEL PAGO SE ENCUENTRA ACTIVA EN SIIF SI ☒ NO _____

FIRMA: 

C.P.04 MAYERLY PAOLA HERNÁNDEZ RIVAS
 ANALISTA CONTRACTUAL - DILOF

ESTE CAMPO APLICA SOLO PARA LOS CASOS EN QUE SE REALIZA LA DEVOLUCIÓN DE LA FACTURACIÓN O CUENTA DE COBRO

POSTFIRMA (GRADO, APELLIDOS Y NOMBRES) DEL FUNCIONARIO QUE REALIZA LA DEVOLUCIÓN: _____	FIRMA _____	REQUIERE LA ANULACIÓN DEL TURNO. SI _____ NO _____
---	-------------	---

MOTIVO DEVOLUCIÓN: _____

FECHA DE DEVOLUCIÓN: _____ Nro. RADICADO COMUNICACIÓN OFICIAL DEVOLUCIÓN: _____

Rte fle 2.5%
 Rte no 15%
 Ch dora 5%
 Estampillo 1%

sep. 51/2579

15. Adm. 05/11/2024 18:50h

Página: 1 de 6	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		

Ciudad y fecha:	Bogotá, 05 NOV 2024														
Unidad Contratante:	DIRECCIÓN LOGÍSTICA Y FINANCIERA ✓														
Contrato No.	PN DIRAF 06-6-10295-23 ✓														
Fecha suscripción contrato:	24/10/2023 ✓														
Objeto del contrato:	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE". ✓														
Lugar de ejecución de la obra:	<table border="1"> <thead> <tr> <th>REGIÓN</th> <th>DPTO.</th> <th>OBJETO</th> <th>DIRECCIÓN DE PREDIO</th> <th>MATRICULA INMOBILIARIA</th> <th>ESCRITURA PÚBLICA</th> <th>ÁREA LOTE</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4</td> <td>CAUCA</td> <td>CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.</td> <td>CALLE 6 Nro. 2-38/42</td> <td>120 - 44863</td> <td>6243 del 20/12/2016</td> <td>1.282 metros cuadrados</td> </tr> </tbody> </table>	REGIÓN	DPTO.	OBJETO	DIRECCIÓN DE PREDIO	MATRICULA INMOBILIARIA	ESCRITURA PÚBLICA	ÁREA LOTE	4	CAUCA	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	CALLE 6 Nro. 2-38/42	120 - 44863	6243 del 20/12/2016	1.282 metros cuadrados
REGIÓN	DPTO.	OBJETO	DIRECCIÓN DE PREDIO	MATRICULA INMOBILIARIA	ESCRITURA PÚBLICA	ÁREA LOTE									
4	CAUCA	CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE.	CALLE 6 Nro. 2-38/42	120 - 44863	6243 del 20/12/2016	1.282 metros cuadrados									
Constancia de recibo No.	003 ✓														
Contratista:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S. ✓														
NIT del contratista:	900.322.299-1 ✓														
Fecha del acta de inicio:	10/11/2023 ✓														
Plazo de ejecución:	Conforme a la comunicación oficial No GS-2023-001378-DIFRA del 09 de octubre del 2023, el plazo de ejecución para el presente contrato será de TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO (365) DIAS CALENDARIO, para los cuales se adelantarán obras durante las vigencias 2023 y 2024, contados a partir de la aprobación de la garantía única fecha en la cual se suscribirá el acta de inicio con el contratista de interventoría. ✓ Nota 1: la programación del contrato será realizada y presentada por el contratista de obra y deberá contar con la aprobación de la interventoría y supervisor de la interventoría. En dicha programación no se modificará la proyección de las vigencias futuras, debiendo conservar la asignación por anualidad de la vigencia futura aprobada y el plazo total previsto de ejecución.														
Nombre del Interventor del contrato:	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO Representante Legal de la firma GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S. ✓														
Nombre del supervisor del contrato y cargo que desempeña:	OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO Representante Legal de la firma GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S. ✓														
Valor del contrato:	\$ 6.252.146.633,55 Incluido AIU e IVA ✓														
Adición No.	N/A ✓														
Fecha de Suspensión del contrato:	Acta de Suspensión Nro. 1 del 20/06/2024 ✓														
Fecha de Reiniciación:	Acta de Reinicio Nro. 1 del 19/07/2024 ✓														

T= 358 Reconocimiento RF 454923 2800481498 211F 491524 05/11/2024 17:26hr

Página: 2 de 6	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021		
Versión: 0		
CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA		

Valor total del contrato:	\$ 6.252.146.633,55 Incluido AIU e IVA ✓				
Indicar si corresponde a la entrega parcial o total del contrato:	Entrega parcial Si ☒ X _____ Entrega Total: Si _____				
Periodo de entrega certificado:	<table border="1"> <tr> <td>Periodo certificado</td> <td>Acta de corte *</td> </tr> <tr> <td>Al 30/07/2024 ✓</td> <td>✓ Nro. 003</td> </tr> </table>	Periodo certificado	Acta de corte *	Al 30/07/2024 ✓	✓ Nro. 003
Periodo certificado	Acta de corte *				
Al 30/07/2024 ✓	✓ Nro. 003				
Forma de Pago:	PAGOS PARCIALES: Se realizarán pagos parciales de acuerdo al avance porcentual de ejecución de la obra; las actas deben corresponder al valor ejecutado en el respectivo periodo, las cuales se tramitarán una vez la Interventoría y Contratista hayan suscrito la acta parcial correspondiente con sus respectivas memorias de cantidades y que la Interventoría haya certificado la ejecución y el recibo a satisfacción de las obras contenidas en el corte, el cual deberá presentarse a más tardar el día veinte (20) del mes a facturar. Cuando los elementos sean de origen extranjero se deberá aportar la declaración de importación. Previo a la presentación de las actas parciales y a la ejecución, deberá estar aprobado por la Dirección Logística y Financiera, el balance de mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos si los hay, consolidado por el contratista de obra con los soportes documentales (fotográficos de ser necesario), proyectado y avalado por la interventoría, igual condición para el acta final, si hay modificaciones al balance aprobado. Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así: • Acta de recibo parcial. (suscrita entre el contratista de obra e interventoría) • Factura de venta • Balance de cantidades ejecutadas. • Certificación de pagos parafiscales y seguridad social. • Certificación pagos FIC • Memoria de cantidades ejecutadas. Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera. Nota: Para el caso puntual de elementos de dotación y/o equipos, se deberá discriminar cada ítem dentro de la factura de venta. Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecidos o recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información, mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, que se hayan cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).				

Página: 3 de 6	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

Valor que se está certificando con la presente constancia de recibo a satisfacción de la vigencia y acta de corte parcial - 2023	Los pagos se harán a la siguiente cuenta: NOMBRE BENEFICIARIO: CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S. NIT: 900.322.299-1 ENTIDAD FINANCIERA: BANCOLOMBIA S.A. ✓ TIPO CUENTA: Ahorros NÚMERO DE CUENTA: 15354515293													
	<table border="1"> <thead> <tr> <th>Unidad</th> <th>Recurso</th> <th>Descripción del bien o servicios recibidos</th> <th>Valor recibido</th> <th>Valor facturado</th> <th>Valor a amortizar</th> <th>Valor a pagar</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>DIOF</td> <td>11</td> <td>"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".</td> <td>\$390'116.718,20 ✓</td> <td>\$390'116.718,20 ✓</td> <td>0</td> <td>\$390'116.718,20 ✓</td> </tr> </tbody> </table>	Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar	Valor a pagar	DIOF	11	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".	\$390'116.718,20 ✓	\$390'116.718,20 ✓	0
Unidad	Recurso	Descripción del bien o servicios recibidos	Valor recibido	Valor facturado	Valor a amortizar	Valor a pagar								
DIOF	11	"CONSTRUCCIÓN Y DOTACIÓN DE LA ESTACIÓN DE POLICÍA DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE REAJUSTE".	\$390'116.718,20 ✓	\$390'116.718,20 ✓	0	\$390'116.718,20 ✓								
Observaciones:														

Avance acumulado anterior, para el presente corte y acumulado.	Acumulado anterior: \$ 1'716'606.595,45 ✓ Avance parcial recibido: \$ 390'116.718,20 ✓ Total, Acumulado \$ 2.106.723.313,65 ✓
Acta de avance parcial o acta final de obra.	Acta Nro.003 ✓
Memorias de cálculo.	Memorias de fecha 30/07/2024, acta Nro. 003
En el corte se presentaron mayores y/o menores cantidades de obra:	NO <u>X</u> SI <u> </u> siendo aprobado el balance de mayores y menores por parte del ordenador del gasto de fecha:
En el presente corte se presentaron ítems no previstos:	NO <u>X</u> SI <u> </u> (Autorizados mediante modificadorio y adicional No. <u> </u> de fecha: <u> </u>).
Documentos requeridos para el trámite de pago:	Para cada una de las actas parciales, el pago se realizará dentro de los sesenta (60) días hábiles, una vez aprobada la siguiente documentación presentada, de acuerdo al derecho a turno y la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC), así: Acta de recibo parcial. (suscrita entre el contratista de obra e interventoría) Factura de venta Balance de cantidades ejecutadas. Certificación de pagos parafiscales y seguridad social. Certificación pagos FIC Memoria de cantidades ejecutadas. Y los demás documentos requeridos por la Dirección Logística y Financiera.

Página: 4 de 6	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

	Nota: Para el caso puntual de elementos de dotación y/o equipos, se deberá discriminar cada ítem dentro de la factura de venta. Si los documentos en referencia no se reciben dentro del plazo establecidos o si recibidos son devueltos por inconsistencias tales como la falta de información o mal diligenciamiento de los mismos, se reprogramará el valor a cancelar una vez se hubieren subsanado las observaciones, que se hayan cumplido con el trámite documental dentro del plazo indicado y de acuerdo al derecho a turno y a la disponibilidad del Plan Anual de Caja (PAC).
Documento de entrada de bienes en SAP, cuando el contrato los incluya y hayan sido recepcionados:	✓ N/A
Incumplimiento del plazo de ejecución SI <u>NO</u> X	✓ N/A

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO		
DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
pago del acta parcial de obra No. 003	\$390'116.718,20 ✓	El valor cancelado se encuentra soportado en los documentos que se anexan y está de acuerdo a lo estipulado en la forma de pago establecida en el contrato.

NOTA: La información que se consigne dependerá del estado particular de cada contrato.

No. Factura	Fecha factura	Valor factura	Nota crédito o débito	Valor neto
S 43 ✓	22/10/2024 ✓	\$390'116.718,20	0	\$390'116.718,20
Valor total bienes y/o servicios recibidos		\$390'116.718,20	0	\$390'116.718,20

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO:

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor del contrato de obra, informo que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los avances de obra relacionados en las actas de corte o final, corresponden a lo pactado en el contrato y se cumple con las especificaciones técnicas establecidas, lo cual además se evidencia en el acta objeto de entrega.

- Mediante oficio Nro. GS-2024-003402-DIFRA del 31/05/2024 el supervisor encargado remite la solicitud de suspensión inicial por un término de 45 días.
- Posteriormente el 12/06/2024 nuevamente la estación fue hostigada, razón por la cual mediante oficio Nro. GS-2024-003785-DIFRA del 13/06/2024 se solicitó la suspensión de la obra por 45 días, durante este ataque se reportó que hubo uso de drones cargados con explosivos para atentar contra el ejército, igualmente fueron hostigadas la subestación de policía el carmelito en Cajibío y la estación de policía Suarez, la cual queda a 1 hora del casco urbano de Cajibío.
- En reunión sostenida el 18/06/2024 el contratista de obra solicitó la suspensión de la obra, la cual interventoría conceptuó por 30 días.
- Mediante oficio Nro. GS-2024-003904-DIFRA del 18/06/2024 se remitió la solicitud de suspensión de obra por 30 días.
- El contrato se suspendió por 30 días desde el 20/06/2024 hasta el 19/07/2024 ✓
- El 24/06/2024, nuevamente el municipio y la Estación de Policía Cajibío recibió ataques por parte de grupos armados.

101
78
AW

Página: 5 de 6	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		

- El contrato reinició el 19/07/2024, el contratista envió una comisión al municipio, pero fue imposible retomar las actividades por orden público.
- Mediante oficio Nro. GE-2024-057573-DIPON la interventoría allega solicitud de terminación y liquidación del contrato Nro. PN DIRAF 06-6-10295-23.
- El 26/09/2024 se logró realizar comisión de servicio al sitio para verificar el alcance del contratista de obra.
- Se han adelantado mesas con obra e interventoría la finalidad de establecer el avance de la obra de acuerdo a las condiciones ejecutadas.
- Mediante oficio Nro. GS-2024-007475-DIFRA se remitió a la ordenación del gasto la solicitud de reducción de recursos de los contratistas de obra e interventoría, en el marco de la terminación anticipada por mutuo acuerdo.
- Las condiciones no han podido ser superadas, razón por la cual ha sido necesario adelantar el proceso de terminación anticipada por mutuo acuerdo.

NOTA: para la radicación de la constancia de recibo a satisfacción, el Supervisor deberá acompañarla, con el informe de supervisión y/o coordinación correspondiente al periodo o la entrega certificada, junto con la publicación de la factura por parte del contratista en el SECOP II – Plan de pagos.

Se aclara, para establecer los valores en el acta, los mismos se redondean a dos (02) decimales con el fin de simplificar a centavos el valor y minimizar las novedades en términos contables.

De acuerdo a la parametrización de la empresa de facturación del contratista, dentro del desagregado del valor de la utilidad se encuentra incluido el IVA, lo cual se esclarece en el ANEXO A LA FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA No. S 43 en el cual se muestran los valores desagregados de forma individual.

Igualmente se aclara que el contratista se acoge a la Resolución Nro. 1449 del 24/07/2012 publicada en el Diario Oficial No. 48.503 de 26 de julio de 2012 *"Por la cual se regula el funcionamiento del Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción del SENA FIC"*, por el SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE (SENA) en la cual en su ARTÍCULO 7. FORMAS DE LIQUIDACIÓN, establece *"Liquidación presuntiva: Hay lugar a esta liquidación cuando el empleador obligado no pueda demostrar el número mensual de trabajadores que laboren en cada una de las obras bajo su responsabilidad, caso en el cual podrá aplicarse la liquidación presuntiva FIC a todo costo, así: Se presume que la industria de la construcción destina para la realización de los trabajos que ejecuta, un veinticinco por ciento (25%) de sus costos al pago de jornales y subcontratos de prestación de servicios; en consecuencia las personas jurídicas y naturales dedicadas a la industria de la construcción, deberán pagar a título de contribución con destino al FIC, el punto veinticinco por ciento (0.25%) del valor de las obras que ejecuten directamente o por medio de subcontratistas"*, razón por la cual el contratista al no poder determinar el número de trabajadores empleados por parte de sus subcontratistas, y no poder certificar igualmente el cumplimiento de la obligación del pago del FIC por parte de los mismos, realiza un único pago concerniente al 0,25% del valor total del contrato con la finalidad de evitar incumplimientos tributarios en la obra.

Es preciso aclarar que en atención al Registro de Identificación Tributaria (RIT), y teniendo en cuenta que la obra se realiza en el municipio de Cajibío, en el cual la Alcaldía Municipal no presenta este mecanismo de identificación, ubicación y clasificación de los contribuyentes del impuesto de industria y comercio, el contratista anexa el Registro Único Tributario, en el cual se encuentran las actividades económicas en las cuales se encuentra registrado, igualmente, en concordancia, de acuerdo al Acuerdo Nro. 017 del 10/12/2015 *"POR MEDIO DEL CUAL SE DICTAN DISPOSICIONES EN MATERIA DE IMPUESTOS DEL MUNICIPIO DE CAJIBÍO, SE ARMONIZAN LOS PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS CON EL ESTATUTO TRIBUTARIO NACIONAL, SE ACTUALIZA EL CÓDIGO DE RENTAS MUNICIPAL Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES DE CARÁCTER TRIBUTARIO"*, en su *"ARTICULO 66. ACTIVIDADES ECONOMICAS Y REGIMEN TARIFARIO Establece en "3. ACTIVIDADES DE SERVICIOS. Construcción de edificaciones para uso no residencial"* se Establece la Tarifa de 10 X 1000 sobre los valores facturados sobre el contrato que nos ocupa.

Página: 6 de 6	ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS LOGÍSTICOS Y FINANCIEROS	 POLICÍA NACIONAL
Código: 1LF-FR-0128		
Fecha: 14-05-2021	CONSTANCIA DE RECIBO A SATISFACCIÓN CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA	
Versión: 0		


Este pago de \$390'116.718,20, es a cargo del registro presupuestal No. 454923, correspondiente a la ejecución de recurso presupuestal de la vigencia 2023.

Por medio de la presente constancia de recibo a satisfacción y en mi condición de supervisor acredito el cumplimiento de las obligaciones del contratista y certifico que los servicios relacionados cumplen con las especificaciones técnicas contratadas.

Se deja constancia que las presentes facturas se tramitan a la fecha, teniendo en cuenta los continuos problemas de orden público que causaron la suspensión temporal del contrato por temas de orden público, y la solicitud del contratista de terminación anticipada por mutuo acuerdo.

Valor a pagar con cargo al Registro Presupuestal No. **454923** del 24/10/2023.

En Constancia, firman:


OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO

Representante Legal de la firma
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S.


CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO

Representante Legal de la firma
CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

Espacio para
Logo Corporativo

CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES
NIT 900.322.299-1
cc arkacentro l e2 b 19
Tel: (3158689804) undefined - Ext.
undefined
Ibagué - Colombia
construcamfacturacion@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. 5 43 ✓

Señores POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
NIT 800.141.397-5 **Teléfono** (601) 5189559 - Ext. 000
Dirección Carrera 59 No. 26-21 **Ciudad** Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 22/10/2024, 11:11
Expedición 22/10/2024, 11:11
Vencimiento 22/10/2024

Ítem	Descripción	Cantidad	Valor Impto.Cargo	Vr. Bruto
1	COSTO DIRECTO	1.00	0.00	302,345,747.65 ✓
2	ADMINISTRACION 21.27% ✓	1.00	0.00	64,308,940.53 ✓
3	IMPREVISTOS 3% ✓	1.00	0.00	9,070,372.43 ✓
4	UTILIDAD 4% ✓	1.00	2,297,827.68	12,093,829.91 ✓

Total ítems: 4

Valor en Letras:

Trescientos noventa millones ciento dieciséis mil setecientos dieciocho pesos m/cte con veinte cent.

Forma de pago:

Contado

Medio de pago:

Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia \$ 390,116,718.20

Total Bruto	387,818,890.52 ✓
IVA 19%	2,297,827.68 ✓
IVA 0%	0.00 ✓
Total a Pagar	390,116,718.20 ✓

Observaciones:

#\$16-01-01-000;06-6-10295-23;mario.grisales@correo.policia.gov.co#\$
CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL
DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. Número Autorización Electrónica 18764080505367 aprobado en

20240928 prefijo 5 desde el número 1 al 300 Vigencia: 12 Meses

Responsable de IVA - Actividad Económica 4112 Construcción de edificios no residenciales Tarifa

CUFE: df90e67baf1859337482814d1906ef4033987f7c00572c65da8df9c7713dcc517b63a18c10a4c003299ea9d793953440



**ANEXO A LA FACTURA No. S-43 CONSTRUCAM
CONSTRUCCIONES S.A.S**

Factura electrónica de venta No. : S-43 ✓
No. De Resolución de facturación : Numero de Autorización **18764080505367** aprobado
el 2024-09-28, prefijo S numeración desde el 1 hasta el
300 vigencia: 24 meses.

Fecha de Emisión : Septiembre 28 de 2024

Fecha de vencimiento : septiembre 28 de 2026

DATOS DEL EMISOR.

Razón Social : Construcam Construcciones S.A.S

NIT : 900.322.299-1

DATOS DEL ADQUIRIENTE

Razón Social : Policía Nacional - Dirección Logística y
Financiera ✓

NIT : 800.141.397-5 ✓

Costo Directo : \$ 302,345,747.65

Administración (21.27%) : \$ 64,308,940.53

Imprevistos (3%) : \$ 9,070,372.43

Utilidad (4%) : \$ 12,093,829.91


Total Bruto : \$ 387,818,890.52

I.V.A. (19%) : \$ 2,297,827.68

Total a Pagar : \$ 390,116,718.20 ✓

CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO Representante
legal Construcam Construcciones SAS

Paseo Comercial Arkacentro Oficina E2B 30 Barrio Sector Arkacentro – Ibagué Colombia

DIAN		Autorización Numeración de Facturación		1876	
Espacio reservado para la DIAN 			4. Número de formulario 18764080505367  (415)7707212489984(8020) 001876408050536 7		
5. Número de Identificación Tributaria - NIT 9 0 0 3 2 2 2 9 9		6. DV 1 ✓	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre
10. Otros nombres					
11. Razón social CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.					
12. Dirección seccional Impuestos y Aduanas de Ibagué					Cód. 9
24. Dirección PASEO COMERCIAL ARKACENTRO OF E 2 B 30 BRR SECTOR ARKACENTRO					
25. País Colombia		26. Departamento Tolima		27. Municipio Ibagué	
La U.A.E. Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, conforme a la facultad discrecional establecida en el artículo 684 - 2 del Estatuto Tributario y en virtud de lo estipulado en la Resolución 000165 del 01/11/2023, por la cual se dictan otras disposiciones en materia de sistemas de facturación; previo estudio y evaluación de la solicitud realizada por el contribuyente, representante legal o apoderado debidamente acreditado; determina autorizar los rangos de numeración de facturación y/o documento equivalente. En los casos en que se agote dicha numeración antes de culminar su vigencia, el interesado tendrá derecho a solicitar una nueva autorización, de acuerdo con el trámite establecido. Las vigencias de los rangos de numeración de facturación se contarán a partir de la formalización de éste documento oficial. Si el obligado a facturar, no hubiere agotado la numeración de facturación transcurrido el término de la vigencia autorizada, con 15 días de antelación podrá solicitar la habilitación de la numeración sobrante. Cuando se trate de una solicitud de inhabilitación de la numeración de facturación y/o documento equivalente, la vigencia es permanente, por lo tanto, no procede la habilitación de dichos rangos. El formato oficial 1876 Autorización numeración de facturación es único e intransferible, solo surte efecto durante la vigencia para el titular del mismo, por ende, su custodia y divulgación es exclusiva responsabilidad del facturador. El uso no autorizado del formato o su adulteración puede tener consecuencias de tipo penal.					
Nota: La no adopción o violación de los sistemas técnicos de control, dará lugar a la sanción establecida en el artículo 684-2 del E.T.			Firma del funcionario autorizado		
Firma del solicitante			Firma del funcionario autorizado		
			984. Apellidos y nombres		
			985. Cargo		
			989. Dependencia		
1001. Apellidos y nombres MAHECHA MORENO CARLOS ALBERTO			990. Lugar administrativo SUBDIRECCION DE FACTURA ELECTRONICA Y SOLUCI		
1002. Tipo documento Cédula de Ciudadanía			991. Organización U.A.E. DIRECCION DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACION		
1003. No. Identificación 14238687			992. Área		
1004. DV 3			993. Establecimiento		
1005. Cod. Representación Representante Legal Principal					
1006. Organización CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.					
			997. Fecha formalización 2024-09-28 09:40:53		

100
37

DIAN		Autorización Numeración de Facturación		1876				
Espacio reservado para la DIAN				Página 2 de 2 Hoja No. 2				
				4. Número de formulario 18764080505367				
 (415)7707212489984(8020) 0018764080505367								
5. Número de Identificación Tributaria - NIT		6. DV	7. Primer apellido	8. Segundo apellido	9. Primer nombre	10. Otros nombres		
9 0 0 3 2 2 2 9 9		1						
11. Razón social CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.								
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar								
1	29. Establecimiento CONSTRUCAM CC ARKACENTRO OF E2 B19 SECTOR ARKACENTRO							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
	FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA	4	S			300 24	AUTORIZACIÓN	1
2	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
3	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
4	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
5	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
6	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
7	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
8	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
9	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
10	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.
11	29. Establecimiento							
	30. Modalidad	Cód.	31. Prefijo	32. Desde el número	33. Hasta el número	38. Vigencia	34. Tipo solicitud	Cód.

Certificado Bancario

Martes, 1 de octubre de 2024

A QUIEN PUEDA INTERESAR

BANCOLOMBIA S.A. se permite informar que CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS identificado(a) con NIT 900322299-1, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura	Estado
CUENTA DE AHORROS	15354515293 ✓	2009/11/13	ACTIVA ✓

* **Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

* Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia los siguientes números: Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05 - Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales Telefónicas en el exterior: España (34) 900 995 717 - Estados Unidos (1) 1 866 379 97 14.


Juan Camilo Moreno Gómez
Gerente Estrategia Canal Telefónico

COMPROBANTE

34

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
89999990341	BANCOLOMBIA	100932776	323984781	07/12/2023

Razón Social: **SENA**

Usuario Pagador: **900322299**

Descripción del Pago: **Pago Ordinario - FIC**

Dirección IP: **161.18.239.198**

Su transacción fue **Total Pagado \$ 15,630,367.00**
APROBADA por la

Descripción	Cantidad	Valor Pagado	Valor Servicio
Pago Ordinario - FIC	1	\$ 15,630,367.00	COP\$ 15,630,367.00

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
8999990341	BANCOLOMBIA	100932776	323984781	07/12/2023

Número de Identificación

900322299

Primer Apellido (si es Persona natural)**Dígito de Verificación (Si es persona**

1

Departamento

TOLIMA

Dirección de Domicilio

ARKACENTRO OF E2 B19

Localización

Nacional

Correo electrónico

construcam@yahoo.es

Regional

Cauca

Número Licencia de Obra**Nombre Obra**

CONSTRUCCION DOTACION CAJIBIO

Fecha Terminación Obra

09/11/2024

Tipo FIC

Costo Total de Obra (Sin Aportes)

Mes Periodo a Pagar

12

Costo Total Mano de Obra

6252146633.55

Valor Intereses Moratorios

0.00

Aporte SENA

0.00

Primer Nombre ó Razón Social

CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.

Tipo de documento

01

Naturaleza Juridica

01

Ciudad Capital

IBAGUE (TOLIMA)

Ciudad de Domicilio

IBAGUE

Teléfono de Contacto

+57,2741144

Código SIIF

3-2-07-1-02-1-04-43

Regional Centros SIIF

36-02-00-019-000000

Número Contrato de Obra

06-6-10295-23

Fecha Inicio Obra

10/11/2023

Ciudad de Ejecución de la Obra

900322299

Año Periodo a Pagar

2023

Costo Total de Obra a Todo Costo

6252146633.55

Número de Trabajadores en el Periodo


23

Aporte FIC

15630367.00

Valor del Pago

15630367.00



VICTOR ALFONSO LOPEZ C.
REVISOR FISCAL

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

A0042914209801ER

LA REPUBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público VICTOR ALFONSO LOPEZ CALDERON identificado con CÉDULA DE CIUDADANIA No 1111192277 de MARIQUITA (TOLIMA) y Tarjeta Profesional No 251332-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde la fecha de inscripción.


NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Agosto de 2004 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.


DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 427 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2010 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado



VICTOR ALFONSO LOPEZ C.
REVISOR FISCAL

EL SUSCRITO


REVISOR FISCAL:

Declara bajo gravedad de juramento que la empresa **CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S** identificada con NIT.900.322.299 - 1, se encuentra a paz y salvo a la fecha por pagos de parafiscales del personal correspondientes a aportes a CCF, ARL, PENSION Y SALUD durante los últimos seis meses a la fecha para dar cumplimiento a lo previsto en el Certificado de aportes parafiscales de que tratan los artículos 202 y 204 de la Ley 100 de 1993, el artículo 7° de la Ley 21 de 1982, los artículos 2° y 3° de la Ley 27 de 1974 y el artículo 1° de la Ley 89 de 1988 y/o Certificación del pago de Impuesto sobre la Renta para la Equidad (CREE) en virtud de lo establecido en la Ley 1607 de diciembre 26 de 2012, reglamentada por el Decreto 2763 de 2012, atendiendo que aplica para las sociedades y personas jurídicas y asimiladas contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta y complementarios o sociedades y entidades extranjeras contribuyentes declarantes del impuesto sobre la renta por sus ingresos de fuente nacional obtenidos mediante sucursales y establecimientos permanentes.

Certificamos que la empresa en mención se encuentra acogida a la exoneración de pago aportes parafiscales ICBF y SENA, según artículo 114 – 1 del estatuto tributario.

Dado en Ibagué a los 15 días del mes de octubre del año 2024 a solicitud del Interesado. ✓

VICTOR A. LOPEZ
VICTOR ALFONSO LOPEZ CALDERON
TP: 251339 – T
Revisor Fiscal


CARLOS ALBERTO MAHECHA M.
C.C.No. 14'238.687 de Ibagué
Rep. Legal

ASOPAGOS

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERIODO PENSION:	PERIODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-09	2024-10	31224699	E	2024-10-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5.135.909	0	BANCOLOMBIA
N° AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LIMITE PAGO	ESTADO PLANILLA							
23	31234699	2024-10-23	Pagada							

[illegible]

440

RESUMEN PLANILLA PAGADA




DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT ECO	TIPO DE EMPRESA	
Nº 900322299	1	CONSTRUCAM SAS	B	003	POSITIVA - 14-23	SUCURSAL	4112	Judicial	
MUN-DEP		DIRECCIÓN	EMAIL						
73-1		PASEO COMERCIAL ANACENTRO OF 22 B19	CONSTRUCAM@AHOOLES						
			2680302						
			8						

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN									
PERÍODO PENSION	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	GENTRITO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERES X MORA
2024-09	2024-10	31224499	E	2024-10-07	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	5,135,000	0
Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA						
23	31224493	2024-10-23	Pagada						

TOTALES IBC			
IBC PENSION	15,946,674	IBC SALUD	17,246,674
		IBC RESGOS	17,246,674
		IBC CAJAS	17,246,674
		IBC PARAF	0

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 3)				22	2,552,200	0	0	0	2,552,200
COLFONDOS	231001	800227940	6	1	208,000	0	0	0	208,000
PROTECCION	230201	800228733	0	5	679,700	0	0	0	679,700
PORVENIR	230301	800224808	8	16	1,664,500	0	0	0	1,664,500
EPS(Administradoras: 7)				23	890,800	0	0	0	890,800
NUEVA E.P.S. S.A.	EPS037	900158264	2	1	7,000	0	0	0	7,000
SALUD TOTAL	EPS002	800130907	4	5	126,700	0	0	0	126,700
NUEVA E.P.S. S.A. MOV	EPS041	900158264	2	3	119,700	0	0	0	119,700
FAMISANAR	EPS017	830003564	7	7	178,800	0	0	0	178,800
COMPENSAR-EPS	EPS008	800068942	7	2	60,700	0	0	0	60,700
EPS-S COOSALUD	ESSC24	900225745	3	2	52,500	0	0	0	52,500
SANITAS	EPS005	800251440	6	3	135,200	0	0	0	135,200
ARF(Administradoras: 1)				23	1,201,600	0	0	0	1,201,600
POSITIVA	14-23	990011153	6	23	1,201,600	0	0	0	1,201,600
CCF(Administradoras: 1)				23	890,800	0	0	0	890,800
COMFATOLIMA	CGF48	800211025	1	23	890,800	0	0	0	890,800
Gran Total					5,135,000	0	0	0	5,135,000

DIAN		Formulario del Registro Único Tributario		001	
2. Concepto ☐ 0 ☒ 2 Actualización				4. Número de formulario 14944937052	
				 (415)7707212489984(8020) 000001494493705 2	
5. Número de Identificación Tributaria (NIT)		6. DV	12. Dirección seccional		14. Buzón electrónico
9 0 0 3 2 2 2 9 9		1	Impuestos y Aduanas de Ibagué		9
IDENTIFICACIÓN					
24. Tipo de contribuyente		25. Tipo de documento		26. Número de identificación	
Persona jurídica		1			
Lugar de expedición		28. País		29. Departamento	
				30. Ciudad/Municipio	
31. Primer apellido		32. Segundo apellido		33. Primer nombre	
				34. Otros nombres	
35. Razón social CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S.					
36. Nombre comercial CONSTRUCAM					
37. Sigla					
UBICACIÓN					
38. País		39. Departamento		40. Ciudad/Municipio	
COLOMBIA		1 6 9 Tolima		7 3 Ibagué 0 0 1	
41. Dirección principal PASEO COMERCIAL ARKACENTRO OF E 2 B 30 BRR SECTOR ARKACENTRO					
42. Correo electrónico construcamfacturacion@gmail.com					
43. Código postal		44. Teléfono 1		45. Teléfono 2	
		6 0 8 2 6 9 0 6 0 2		3 1 5 8 6 8 9 8 0 4	
CLASIFICACIÓN					
Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 0 9, 1 0 3 1	4 3 3 0	2 0 0 9, 1 0 3 1	4 1 1 1 4 6 6 9	1
Responsabilidades, Calidades y Atributos					
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 53. Código 5 7 9 1 0 1 4 4 2 4 8 5 2 5 5 05- Impto. renta y compl. régimen ordinario 52- Facturador electrónico 07- Retención en la fuente a título de rent 55- Informante de Beneficiarios Finales 09- Retención en la fuente en el impuesto 10- Obligado aduanero 14- Informante de exogena 42- Obligado a llevar contabilidad 48- Impuesto sobre las ventas - IVA					
Usuarios aduaneros				Exportadores	
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 54. Código 2 3 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20				55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC	
IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación.					
Para uso exclusivo de la DIAN					
59. Anexos SI ☐ NO ☒		60. No. de Folios: 0		61. Fecha 2023 - 09 - 07 / 09 : 06 : 05	
La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012. Firma del solicitante:			Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice. Firma autorizada: 984. Nombre MAHECHA MORENO CARLOS ALBERTO 985. Cargo Representante legal Certificado		



POLICIA NACIONAL

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 03

Contrato No.	PN DIRAF No.05-6-10295-23
Objeto:	"CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REALISTE"
Contratante:	POLICIA NACIONAL - DIRECCION LOGISTICA Y FINANCIERA
Contratista:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S
Representante Legal:	CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO
Interventor:	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
Representante Legal:	Ing. OSCAR GREGORIO GORDILLO GUERRERO
Valor Contrato:	\$ 6.252.146.633,55
Acta Parcial No.1:	\$ 1.115.008.548,44
Acta Parcial No.2:	\$ 601.598.047,01
Acta Parcial No.3:	\$ 390.116.718,20



RIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS			ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
RIA - DIMENSION VARIABLE	M2	5,12	\$ 86.280,64	\$ 441.756,87	5,12	\$ 441.756,87		5,12	\$ 441.756,87			5,12	\$ 441.756,87
ITO	ML	13,00	\$ 63.245,37	\$ 822.189,77	13,00	\$ 822.189,77		13,00	\$ 822.189,77			13,00	\$ 822.189,77
	UND	1,00	\$ 81.618,43	\$ 81.618,43	1,00	\$ 81.618,43		1,00	\$ 81.618,43			1,00	\$ 81.618,43
'SANITARIA	ML	15,00	\$ 56.844,57	\$ 852.668,58	15,00	\$ 852.668,58		15,00	\$ 852.668,58			15,00	\$ 852.668,58
IA	ML	15,00	\$ 100.699,83	\$ 1.510.497,48	15,00	\$ 1.510.497,48		15,00	\$ 1.510.497,48			15,00	\$ 1.510.497,48
O	UND	1,00	\$ 464.385,69	\$ 464.385,69	1,00	\$ 464.385,69		1,00	\$ 464.385,69			1,00	\$ 464.385,69
20 mls	M2	637,55	\$ 7.044,13	\$ 4.490.986,74	637,55	\$ 4.490.986,74		637,55	\$ 4.490.986,74			637,55	\$ 4.490.986,74
Λ	M2	1349,53	\$ 12.576,16	\$ 16.971.910,17	787,05	\$ 9.898.069,62		787,05	\$ 9.898.069,62			787,05	\$ 9.898.069,62
	M2	27,00	\$ 465.685,36	\$ 13.113.504,82	27,00	\$ 13.113.504,82		27,00	\$ 13.113.504,82			27,00	\$ 13.113.504,82
	M2	4,00	\$ 515.879,92	\$ 2.063.519,68	4,00	\$ 2.063.519,68		4,00	\$ 2.063.519,68			4,00	\$ 2.063.519,68
	ML	221,20	\$ 35.511,16	\$ 7.855.089,62	442,40	\$ 15.710.139,24		221,20	\$ 7.855.089,62			442,40	\$ 15.710.139,24
IO Y DISPOSICION BOTADERO AUTORIZADO	M3	59,10	\$ 54.984,34	\$ 3.250.165,55	59,10	\$ 3.250.165,55		59,10	\$ 3.250.165,55			59,10	\$ 3.250.165,55
ANO	UND	6,00	\$ 119.586,76	\$ 717.520,58	6,00	\$ 717.520,58		6,00	\$ 717.520,58			6,00	\$ 717.520,58
O	UND	1,00	\$ 147.764,78	\$ 147.764,78	1,00	\$ 147.764,78		1,00	\$ 147.764,78			1,00	\$ 147.764,78
ACATES - 1 GUAMOJ	UND	3,00	\$ 167.449,47	\$ 502.348,42	1,00	\$ 167.449,47		1,00	\$ 167.449,47			1,00	\$ 167.449,47
				\$ 309.330.983,85		\$ 424.338.864,47			\$ 378.102.664,12				\$ 399.268.037,78
DMÚN - PARA ELEMENTOS DE CIMENTACION	M3	210,77	\$ 48.973,24	\$ 10.322.089,43	1023,75	\$ 50.136.352,69		1023,75	\$ 48.707.836,85			1023,75	\$ 50.136.352,69
	M3	151,50	\$ 706.045,67	\$ 106.965.918,39	166,21	\$ 117.351.850,14		153,71	\$ 108.526.279,31			166,21	\$ 117.351.850,14
O DE 3000 PSI	M3	28,69	\$ 757.743,89	\$ 21.739.672,11	62,81	\$ 47.593.893,53		61,78	\$ 46.813.417,33			62,81	\$ 47.593.893,53
O FUNDIDO DE 3000 PSI	M3	13,79	\$ 809.687,81	\$ 11.165.594,90	22,46	\$ 18.165.598,21		21,63	\$ 17.513.547,33			22,46	\$ 18.165.598,21
	M2	41,87	\$ 175.811,84	\$ 7.361.241,80	41,87	\$ 7.361.241,80							
	M2	190,32	\$ 107.444,77	\$ 21.093.557,85	190,32	\$ 21.093.557,85							
	KG	21770,72	\$ 6.002,83	\$ 130.685.909,37	27198,91	\$ 163.216.380,26		25.911,38	\$ 155.541.583,29			24.459,81	\$ 146.828.056,80
IRÁNEAS				\$ 16.697.589,75		\$ 39.521.507,60			\$ 21.599.035,54				\$ 38.519.909,46

UNION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 2		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SIS DE DESAGUES - NO INCLUYE RETIRO Y	M3	75,98	\$ 25.165,53	\$ 1.912.076,75	75,98	\$ 1.912.076,75	75,98	\$ 1.912.076,75		\$ -	75,98	\$ 1.912.076,75
	M3	15,20	\$ 77.994,83	\$ 1.185.521,35	62,72	\$ 4.891.835,45	62,72	\$ 4.891.835,45		\$ -	62,72	\$ 4.891.835,45
A EXCAVACION	M3	7,60	\$ 105.456,85	\$ 801.472,05	7,60	\$ 801.472,05	7,60	\$ 801.472,05		\$ -	7,60	\$ 801.472,05
	M3	60,78	\$ 12.698,11	\$ 771.791,17	199,83	\$ 2.537.463,48	199,83	\$ 2.537.463,48		\$ -	199,83	\$ 2.537.463,48
OSTERIA MEDIDOR TOTALIZ. 3/4" - SEGÚN	M3	60,78	\$ 42.480,67	\$ 2.581.974,95	393,36	\$ 16.710.195,20	393,36	\$ 16.710.195,20		\$ -	393,36	\$ 16.710.195,20
	UND	1,00	\$ 1.055.594,95	\$ 1.055.594,95	1,00	\$ 1.055.594,95		\$ -		\$ -		\$ -
ECCION AGUAS RESIDUALES (0.80X0.80M)	UND	2,00	\$ 314.597,50	\$ 629.195,00	11,00	\$ 3.460.572,51	8,00	\$ 2.516.780,00	3,00	\$ 943.792,50	11,00	\$ 3.460.572,51
	UND	1,00	\$ 275.537,32	\$ 275.537,32	2,00	\$ 551.074,64	2,00	\$ 551.074,64		\$ -	2,00	\$ 551.074,64
ECCION AGUAS LLUVIAS (0.80X0.80M)	UND	1,00	\$ 314.597,50	\$ 314.597,50	1,00	\$ 314.597,50	1,00	\$ 314.597,50		\$ -	1,00	\$ 314.597,50
	UND	2,00	\$ 275.537,32	\$ 551.074,64	2,00	\$ 551.074,64	2,00	\$ 551.074,64		\$ -	2,00	\$ 551.074,64
E GRASAS	UND	1,00	\$ 263.123,43	\$ 263.123,43	1,00	\$ 263.123,43		\$ -		\$ -		\$ -
	UND	1,00	\$ 602.733,77	\$ 602.733,77	1,00	\$ 602.733,77		\$ -		\$ -		\$ -
HARNELA 4"	UND	1,00	\$ 490.911,35	\$ 490.911,35	1,00	\$ 490.911,35	1,00	\$ 490.911,35		\$ -	1,00	\$ 490.911,35
	M3	4,45	\$ 118.796,35	\$ 519.743,74	5,45	\$ 636.540,09	5,45	\$ 636.540,09		\$ -	5,45	\$ 636.540,09
Y MADERA	ML	74,23	\$ 32.465,57	\$ 2.409.919,10	74,23	\$ 2.409.919,10	66,30	\$ 2.152.487,15	8,00	\$ 153.425,30	20,00	\$ 383.563,25
	UND	40,00	\$ 19.178,16	\$ 767.126,51	40,00	\$ 767.126,51	12,00	\$ 230.137,95		\$ -	66,30	\$ 1.125.085,39
MADERA	M2	74,23	\$ 16.969,31	\$ 1.259.632,04	74,23	\$ 1.259.632,04	66,30	\$ 1.125.085,39		\$ -	66,30	\$ 1.125.085,39
				\$ 1.537.254.317,63		\$ 1.680.327.650,85		\$ 880.052.122,58		\$ 214.261.950,46		\$ 1.094.314.073,04
MADERA	M3	135,46	\$ 758.773,51	\$ 102.763.459,25	135,46	\$ 102.763.459,25	125,00	\$ 94.846.898,37	28,82	\$ 21.867.852,47	96,18	\$ 72.978.835,90
	M2	176,13	\$ 157.083,32	\$ 27.667.084,48	659,71	\$ 103.829.986,23	431,60	\$ 67.797.159,27	11,08	\$ 1.740.483,14	442,68	\$ 69.537.642,42
MADERA	M2	38,27	\$ 154.724,82	\$ 5.921.311,29	78,57	\$ 12.156.713,56	30,00	\$ 4.641.738,68	48,57	\$ 7.514.974,90	78,57	\$ 12.156.713,56
	M2	49,86	\$ 114.692,56	\$ 5.695.632,48	139,83	\$ 16.037.480,54	30,00	\$ 3.440.778,77	108,83	\$ 12.596.693,77	139,83	\$ 16.037.480,54
MADERA	M2	4,49	\$ 78.541,66	\$ 352.652,07	4,49	\$ 352.652,07	2,00	\$ 157.083,33		\$ -	2,00	\$ 157.083,33
	M2	2,34	\$ 73.175,54	\$ 171.230,77	2,34	\$ 171.230,77	1,00	\$ 73.175,54		\$ -	1,00	\$ 73.175,54
MADERA	M3	19,48	\$ 870.028,14	\$ 14.320.663,20	21,82	\$ 18.984.014,04	10,00	\$ 8.700.281,41	11,82	\$ 10.283.732,63	21,82	\$ 18.984.014,04
	M2	701,22	\$ 244.790,17	\$ 171.651.763,90	701,22	\$ 171.651.763,90	254,71	\$ 62.350.504,53	228,34	\$ 55.995.387,71	483,05	\$ 118.245.892,24
MADERA	M2	495,12	\$ 223.411,59	\$ 110.615.544,12	495,12	\$ 110.615.544,12	483,59	\$ 108.039.608,54		\$ -	483,59	\$ 108.039.608,54
	M2	464,25	\$ 251.465,44	\$ 116.742.830,33	464,25	\$ 116.742.830,33	279,04	\$ 70.188.916,27		\$ -	279,04	\$ 70.188.916,27
MADERA	M2	490,02	\$ 272.844,03	\$ 133.699.029,40	490,02	\$ 133.699.029,40		\$ -		\$ -		\$ -
	M2	11,66	\$ 179.338,66	\$ 2.091.088,73	11,66	\$ 2.091.088,73		\$ -		\$ -		\$ -
MADERA	M3	3,87	\$ 851.227,55	\$ 3.294.250,83	4,47	\$ 3.804.987,16		\$ -	4,47	\$ 3.804.987,16	4,47	\$ 3.804.987,16
	M3	10,19	\$ 851.227,55	\$ 8.674.008,75	10,19	\$ 8.674.008,75		\$ -		\$ -		\$ -
MADERA	M3	27,62	\$ 855.398,21	\$ 23.539.733,23	27,62	\$ 23.539.733,23		\$ -		\$ -		\$ -
	M3	1,80	\$ 855.398,21	\$ 1.539.692,78	0,00	\$ 0,00		\$ -		\$ -		\$ -
MADERA	KG	121770,61	\$ 6.002,83	\$ 730.968.149,06	121770,61	\$ 730.968.149,06	64.350,00	\$ 388.282.046,15	20.225,02	\$ 121.407.336,58	84.575,02	\$ 507.688.382,73
	KG	6414,83	\$ 7.142,64	\$ 45.818.769,79	12416,54	\$ 88.886.814,18	9.212,37	\$ 65.800.597,13	3.204,17	\$ 22.896.217,04	12.416,54	\$ 88.886.814,18
MADERA	UND	1,00	\$ 7.753.546,61	\$ 7.753.546,61	1,00	\$ 7.753.546,61	1,00	\$ 7.753.546,61		\$ -	1,00	\$ 7.753.546,61
	UND	3,00	\$ 7.984.628,91	\$ 23.953.886,74	1,00	\$ 7.984.628,91		\$ -		\$ -		\$ -

CION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 2			ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
REIMATES				\$ 58.040.722,62		\$ 58.040.722,62			\$ -		\$ 9.880.103,03		\$ 9.880.103,03
DIMENSIONES 0.10x0.20x0.30 mts	M2	1078,00	\$ 41.553,19	\$ 44.794.343,56	1078,00	\$ 44.794.343,56			\$ -	237,77	\$ 9.880.103,03	237,77	\$ 9.880.103,03
ES 0.10x0.20x0.30 mts	ML	201,18	\$ 22.967,63	\$ 4.620.628,00	201,18	\$ 4.620.628,00			\$ -		\$ -		\$ -
DETALLE ARQUITECTONICO	UND	1,00	\$ 484.835,54	\$ 484.835,54	1,00	\$ 484.835,54			\$ -		\$ -		\$ -
IBROCEMENTO	M2	186,00	\$ 43.788,36	\$ 8.140.915,51	186,00	\$ 8.140.915,51			\$ -		\$ -		\$ -
				\$ 44.531.948,61		\$ 44.531.948,61			\$ -		\$ -		\$ -
- E= 0,015 mts	M2	1680,00	\$ 22.148,52	\$ 37.209.508,36	1680,00	\$ 37.209.508,36			\$ -		\$ -		\$ -
- E= 0,015 mts	ML	297,72	\$ 16.003,39	\$ 4.764.528,40	297,72	\$ 4.764.528,40			\$ -		\$ -		\$ -
MUROS X M2 - E= 0,015 mts	M2	44,00	\$ 26.775,62	\$ 1.178.127,10	44,00	\$ 1.178.127,10			\$ -		\$ -		\$ -
MUROS X ML - E= 0,015 mts	ML	45,78	\$ 19.261,34	\$ 303.943,89	15,78	\$ 303.943,89			\$ -		\$ -		\$ -
	M2	4,00	\$ 24.412,85	\$ 97.651,40	4,00	\$ 97.651,40			\$ -		\$ -		\$ -
ROS TANQUE X M2	M2	46,00	\$ 21.264,99	\$ 978.189,46	46,00	\$ 978.189,46			\$ -		\$ -		\$ -
				\$ 33.006.862,79		\$ 9.810.207,40			\$ -		\$ -		\$ -
Detalle Arquitectonico)	ML	70,00	\$ 331.380,79	\$ 23.196.655,39	0,00	\$ 0,00			\$ -		\$ -		\$ -
Detalle Arquitectonico)	ML	51,60	\$ 126.250,63	\$ 6.514.532,54	51,60	\$ 6.514.532,54			\$ -		\$ -		\$ -
JN DETALLE - CELDAS DE RETENCION	ML	6,00	\$ 488.213,96	\$ 2.929.283,78	6,00	\$ 2.929.283,78			\$ -		\$ -		\$ -
ARO	ML	12,00	\$ 30.532,59	\$ 366.391,08	12,00	\$ 366.391,08			\$ -		\$ -		\$ -
Y DE GAS				\$ 280.100.925,07		\$ 285.156.884,25			\$ 4.762.403,43		\$ 6.310.668,19		\$ 11.073.061,62
C P DIAM= 3/4"	UND	57,74	\$ 13.251,27	\$ 765.128,12	57,74	\$ 765.128,12			\$ -		\$ -		\$ -
S PVC P DIAM= 3/4"	UND	30,00	\$ 7.573,51	\$ 227.205,39	30,00	\$ 227.205,39			\$ -		\$ -		\$ -
XTALIZADOR DIAM= 3/4"	UND	1,00	\$ 431.272,32	\$ 431.272,32	1,00	\$ 431.272,32			\$ -		\$ -		\$ -
OLA DIAM= 3/4"	UND	6,00	\$ 34.083,87	\$ 204.503,22	6,00	\$ 204.503,22			\$ -		\$ -		\$ -
MECANICO DIAM= 3/4"	UND	2,00	\$ 82.994,59	\$ 165.989,18	2,00	\$ 165.989,18			\$ -		\$ -		\$ -
RO DIAM= 3/4"	UND	1,00	\$ 69.146,87	\$ 69.146,87	1,00	\$ 69.146,87			\$ -		\$ -		\$ -
MUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. DIAM=	UND	2,00	\$ 49.015,52	\$ 98.031,04	2,00	\$ 98.031,04			\$ -		\$ -		\$ -
PO PERA 3/4"	UND	49,00	\$ 31.285,96	\$ 1.533.011,96	49,00	\$ 1.533.011,96			\$ -		\$ -		\$ -
	UND	1,00	\$ 126.407,42	\$ 126.407,42	1,00	\$ 126.407,42			\$ -		\$ -		\$ -
ERO INOX. TIPO 304/304L ASTM A312 DIAM= 3"	ML	2,57	\$ 164.787,97	\$ 423.505,09	2,57	\$ 423.505,09			\$ -		\$ -		\$ -
ERO INOX. TIPO 304/304L ASTM A312 DIAM=	ML	5,33	\$ 50.953,07	\$ 271.579,84	5,33	\$ 271.579,84			\$ -		\$ -		\$ -
ERO INOX. TIPO 304/304L ASTM A312 DIAM=	ML	16,86	\$ 48.747,69	\$ 838.746,04	16,86	\$ 838.746,04			\$ -		\$ -		\$ -
S ACERO INOX DIAM= 3"	UND	3,00	\$ 80.187,57	\$ 240.562,71	3,00	\$ 240.562,71			\$ -		\$ -		\$ -
S ACERO INOX DIAM= 2.1/2"	UND	9,00	\$ 36.663,36	\$ 329.970,45	9,00	\$ 329.970,45			\$ -		\$ -		\$ -
S ACERO INOX. DIAM= 1.1/2"	UND	17,00	\$ 19.030,22	\$ 323.513,81	17,00	\$ 323.513,81			\$ -		\$ -		\$ -
RO DIAM= 2.1/2"	UND	3,00	\$ 411.847,80	\$ 1.325.543,41	3,00	\$ 1.325.543,41			\$ -		\$ -		\$ -
RO DIAM= 1.1/2"	UND	1,00	\$ 186.262,96	\$ 186.262,96	1,00	\$ 186.262,96			\$ -		\$ -		\$ -
PIE Y CANASTILLA EN HIERRO FUNDIDO ROSCA	UND	2,00	\$ 352.915,79	\$ 705.831,58	2,00	\$ 705.831,58			\$ -		\$ -		\$ -

CICLO	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 2		ACUMULADO ANTERIOR			EJECUTADO PRESENTE ACTA			ACUMULADO TOTAL	
		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
ORTINA DIAM= 3" CUERPO EN BRONCE ROSCA	UND	4,00	\$ 531.688,78	\$ 2.128.635,03	4,00	\$ 2.128.635,03	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ORTINA DIAM= 2 1/2" CUERPO EN BRONCE	UND	4,00	\$ 569.988,61	\$ 2.279.988,46	4,00	\$ 2.279.988,46	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ORTINA DIAM= 1 1/2" CUERPO EN BRONCE	UND	4,00	\$ 188.022,12	\$ 752.088,50	4,00	\$ 752.088,50	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
BLE BORRACHA DIAM= 3"	UND	2,00	\$ 217.408,18	\$ 434.816,39	2,00	\$ 434.816,39	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
BLE BORRACHA DIAM= 2 1/2"	UND	2,00	\$ 618.887,98	\$ 1.237.775,98	2,00	\$ 1.237.775,98	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ENTRICA EN ACERO INOXIDABLE DE UNIÓN	UND	2,00	\$ 29.696,30	\$ 59.372,60	2,00	\$ 59.372,60	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1/2"	UND	2,00	\$ 79.259,28	\$ 158.518,56	2,00	\$ 158.518,56	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
4TRICA EN ACERO INOXIDABLE DE UNIÓN	UND	2,00	\$ 45.341,11	\$ 90.682,22	2,00	\$ 90.682,22	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
UIROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. DIAM=	UND	2,00	\$ 119.558,48	\$ 239.112,95	2,00	\$ 239.112,95	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
UIROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. DIAM=	UND	2,00	\$ 94.828,52	\$ 189.653,04	2,00	\$ 189.653,04	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
UIROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. DIAM=	UND	1,00	\$ 129.244,09	\$ 129.244,09	1,00	\$ 129.244,09	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
PO PERA 3"	UND	3,00	\$ 18.750,15	\$ 56.250,45	3,00	\$ 56.250,45	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
PO PERA 2 1/2"	UND	5,00	\$ 17.813,41	\$ 89.067,03	5,00	\$ 89.067,03	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
PO PERA 1 1/2"	UND	15,00	\$ 18.899,20	\$ 283.488,00	15,00	\$ 283.488,00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
DIAM= 2 1/2"	UND	1,00	\$ 41.714,18	\$ 41.714,18	1,00	\$ 41.714,18	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ERO NEGRO SCH 40 DIAM= 3"	ML	6,31	\$ 55.540,79	\$ 350.462,38	6,31	\$ 350.462,38	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ERO NEGRO SCH 40 DIAM= 2"	ML	1,49	\$ 37.553,54	\$ 55.954,78	1,49	\$ 55.954,78	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
S RANURADOS DIAM= 3"	UND	6,00	\$ 69.083,65	\$ 414.381,91	6,00	\$ 414.381,91	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
S RANURADOS DIAM= 2"	UND	2,00	\$ 42.792,75	\$ 85.585,49	2,00	\$ 85.585,49	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
IDO EN HIERRO DUCTIL DE UNIÓN RANURADA	UND	19,00	\$ 28.437,80	\$ 540.320,12	19,00	\$ 540.320,12	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
DO EN HIERRO DUCTIL DE UNIÓN RANURADA	UND	11,00	\$ 19.225,33	\$ 211.478,67	11,00	\$ 211.478,67	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
VSOR DE FLUJO 3"	UND	1,00	\$ 219.945,42	\$ 219.945,42	1,00	\$ 219.945,42	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ASTAGO ASCENDENTE LISTADO DIAM= 3"	UND	1,00	\$ 354.977,40	\$ 354.977,40	1,00	\$ 354.977,40	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ASTAGO ASCENDENTE LISTADO DIAM= 2 1/2"	UND	1,00	\$ 316.932,88	\$ 316.932,88	1,00	\$ 316.932,88	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ASTAGO ASCENDENTE LISTADO DIAM= 2"	UND	1,00	\$ 308.997,89	\$ 308.997,89	1,00	\$ 308.997,89	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
RIPOSA CON SUPERVISOR DIAM= 3"	UND	2,00	\$ 307.188,80	\$ 614.377,60	2,00	\$ 614.377,60	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
RIPOSA CON SUPERVISOR DIAM= 2 1/2"	UND	2,00	\$ 285.295,21	\$ 570.590,42	2,00	\$ 570.590,42	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
RIPOSA CON SUPERVISOR DIAM= 2"	UND	1,00	\$ 417.408,52	\$ 417.408,52	1,00	\$ 417.408,52	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
MURADO DIAM= 3"	UND	1,00	\$ 235.908,72	\$ 235.908,72	1,00	\$ 235.908,72	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
MURADO DIAM= 2 1/2"	UND	1,00	\$ 217.792,89	\$ 217.792,89	1,00	\$ 217.792,89	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
MURADO DIAM= 2"	UND	1,00	\$ 207.570,04	\$ 207.570,04	1,00	\$ 207.570,04	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3 DE GLICERINA 0-300 PSI	UND	4,00	\$ 71.245,57	\$ 284.982,27	4,00	\$ 284.982,27	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3PE TIPO L 1/2"	UND	10,86	\$ 61.227,06	\$ 664.925,85	10,86	\$ 664.925,85	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

CION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 2			ACUMULADO ANTERIOR			EJECUTADO PRESENTE ACTA			ACUMULADO TOTAL		
		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	
COBRE 1/2"	UND	51,00	\$ 7.104,63	\$ 362.336,12	51,00	\$ 362.336,12		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
COBRE 1/2"	UND	4,00	\$ 53.230,36	\$ 212.921,42	4,00	\$ 212.921,42		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
COBRE 1/2"	UND	4,00	\$ 17.995,53	\$ 71.892,14	4,00	\$ 71.892,14		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
COMPUERTA 1/2"	UND	6,00	\$ 82.161,38	\$ 492.971,90	6,00	\$ 492.971,90		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
DADA- NFPA 20	UND	1,00	\$ 969.975,27	\$ 969.975,27	1,00	\$ 969.975,27		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
VIUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. DIAM=	UND	2,00	\$ 409.402,19	\$ 818.804,38	2,00	\$ 818.804,38		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
VIUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. DIAM=	UND	1,00	\$ 103.340,64	\$ 103.340,64	1,00	\$ 103.340,64		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
VIUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. DIAM=	UND	1,00	\$ 73.105,86	\$ 73.105,86	1,00	\$ 73.105,86		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
VIUROS ACERO INOXIDABLE CON RUANA. DIAM=	UND	1,00	\$ 71.223,82	\$ 71.223,82	1,00	\$ 71.223,82		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ERO NEGRO SCH 40 DIAM= 2 1/2"	ML	4,10	\$ 101.001,84	\$ 414.107,55	4,10	\$ 414.107,55		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
S RANURADOS DIAM= 2 1/2"	UND	4,00	\$ 11.407,86	\$ 45.631,51	4,00	\$ 45.631,51		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
C-P ROE=21 DIAM= 2 1/2"	ML	13,61	\$ 39.312,54	\$ 535.043,67	13,61	\$ 535.043,67		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
C-P ROE=21 DIAM= 2"	ML	2,67	\$ 26.602,58	\$ 71.028,89	2,67	\$ 71.028,89		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
C-P ROE=21 DIAM= 1 1/2"	ML	40,85	\$ 19.987,61	\$ 816.502,02	40,85	\$ 816.502,02		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
C-P ROE=21 DIAM= 1 1/4"	ML	178,08	\$ 18.223,03	\$ 2.888.997,17	178,08	\$ 2.888.997,17		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
C-P ROE=21 DIAM= 1"	ML	4,37	\$ 11.203,39	\$ 48.988,81	4,37	\$ 48.988,81		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
C-P ROE=11 DIAM= 3/4"	ML	36,68	\$ 10.590,39	\$ 387.355,15	36,68	\$ 387.355,15		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
C-P ROE=9 DIAM= 1/2"	ML	132,64	\$ 8.550,57	\$ 1.134.147,25	132,64	\$ 1.134.147,25		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
S PVC-P DIAM= 2 1/2"	UND	10,00	\$ 32.601,05	\$ 326.010,55	10,00	\$ 326.010,55		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
S PVC-P DIAM= 2"	UND	3,00	\$ 16.546,19	\$ 49.638,57	3,00	\$ 49.638,57		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
S PVC-P DIAM= 1 1/2"	UND	22,00	\$ 12.197,27	\$ 268.339,90	22,00	\$ 268.339,90		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
S PVC-P DIAM= 1 1/4"	UND	156,00	\$ 10.446,70	\$ 1.629.684,63	156,00	\$ 1.629.684,63		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
S PVC-P DIAM= 1"	UND	4,00	\$ 6.769,05	\$ 27.072,18	4,00	\$ 27.072,18		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
S PVC-P DIAM= 3/4"	UND	38,00	\$ 5.590,22	\$ 212.428,54	38,00	\$ 212.428,54		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
S PVC-P DIAM= 1/2"	UND	96,00	\$ 4.813,94	\$ 476.579,76	96,00	\$ 476.579,76		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
OLA DIAM= 1 1/4"	UND	12,00	\$ 142.874,95	\$ 1.714.488,24	12,00	\$ 1.714.488,24		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
OLA DIAM= 1"	UND	2,00	\$ 109.953,46	\$ 219.926,92	2,00	\$ 219.926,92		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
OLA DIAM= 1/2"	UND	3,00	\$ 69.151,33	\$ 207.453,98	3,00	\$ 207.453,98		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PULSORA DE AIRE 1"	UND	2,00	\$ 300.339,60	\$ 600.679,20	2,00	\$ 600.679,20		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PO PERA 2 1/2"	UND	4,00	\$ 19.882,43	\$ 79.529,74	4,00	\$ 79.529,74		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PO PERA 2"	UND	2,00	\$ 19.620,15	\$ 39.240,30	2,00	\$ 39.240,30		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PO PERA 1 1/2"	UND	4,00	\$ 18.571,87	\$ 74.287,47	4,00	\$ 74.287,47		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PO PERA 1 1/4"	UND	149,00	\$ 19.122,13	\$ 2.849.196,90	149,00	\$ 2.849.196,90		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PO PERA 1"	UND	1,00	\$ 18.167,20	\$ 18.167,20	1,00	\$ 18.167,20		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PO PERA 3/4"	UND	31,00	\$ 18.639,31	\$ 577.818,46	31,00	\$ 577.818,46		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PO PERA 1/2"	UND	111,00	\$ 17.524,45	\$ 1.945.214,00	111,00	\$ 1.945.214,00		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
AS DIAM= 2 1/2"	UND	4,00	\$ 15.183,74	\$ 60.734,95	4,00	\$ 60.734,95		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
AS DIAM= 2"	UND	1,00	\$ 15.183,74	\$ 15.183,74	1,00	\$ 15.183,74		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
AS DIAM= 1 1/2"	UND	13,00	\$ 13.747,92	\$ 178.722,95	13,00	\$ 178.722,95		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	

CON	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 2			ACUMULADO ANTERIOR			EJECUTADO PRESENTE ACTA			ACUMULADO TOTAL		
		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	
1S DIAM= 1"	UND	2,00	\$ 14.069,09	\$ 28.138,18	2,00	\$ 28.138,18		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ALCANTARILLADO 160MM	ML	1,85	\$ 48.750,02	\$ 90.187,53	13,50	\$ 668.125,25		-	\$ -		5,10	\$ 248.625,09		5,10	\$ 248.625,09	
ALCANTARILLADO 110MM	ML	13,50	\$ 31.301,91	\$ 422.575,77	55,50	\$ 1.737.255,95		-	\$ -		55,50	\$ 1.737.255,95		55,50	\$ 1.737.255,95	
PVC ALCANTARILLADO 110MM	UND	3,00	\$ 45.471,48	\$ 136.414,45	3,00	\$ 136.414,45		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PVC ALCANTARILLADO 110MM	UND	26,97	\$ 68.527,22	\$ 1.794.239,07	26,97	\$ 1.794.239,07		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
-S DIAM= 4"	ML	289,23	\$ 33.499,23	\$ 9.688.982,74	289,23	\$ 9.688.982,74		18,02	\$ 603.656,15		-	\$ -		18,02	\$ 603.656,15	
-S DIAM= 3"	ML	59,54	\$ 29.304,75	\$ 1.744.804,83	59,54	\$ 1.744.804,83		5,05	\$ 147.988,99		-	\$ -		5,05	\$ 147.988,99	
-S DIAM= 2"	ML	32,29	\$ 20.369,79	\$ 658.386,31	32,29	\$ 658.386,31		7,00	\$ 147.728,53		3,55	\$ 72.383,75		10,55	\$ 215.112,28	
-L DIAM= 4"	ML	33,15	\$ 30.157,32	\$ 999.715,18	33,15	\$ 999.715,18		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
-L DIAM= 2"	ML	110,92	\$ 16.099,14	\$ 1.785.716,48	110,92	\$ 1.785.716,48		4,40	\$ 70.836,21		-	\$ -		4,40	\$ 70.836,21	
PVC-S DIAM= 8"	UND	5,00	\$ 97.996,31	\$ 489.981,53	5,00	\$ 489.981,53		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PVC-S DIAM= 4"	UND	228,00	\$ 20.822,17	\$ 4.747.455,74	228,00	\$ 4.747.455,74		43,00	\$ 895.353,49		10,00	\$ 208.221,74		53,00	\$ 1.103.575,24	
PVC-S DIAM= 3"	UND	174,00	\$ 14.326,47	\$ 2.492.806,34	174,00	\$ 2.492.806,34		8,00	\$ 114.611,79		23,00	\$ 329.508,88		31,00	\$ 444.120,67	
PVC-S DIAM= 2"	UND	235,00	\$ 5.683,35	\$ 1.335.587,73	235,00	\$ 1.335.587,73		14,00	\$ 79.566,93		15,00	\$ 95.250,28		29,00	\$ 184.817,21	
INVENT DIAM= 2"	UND	4,00	\$ 97.100,31	\$ 388.401,25	4,00	\$ 388.401,25		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PO PERA 6"	UND	23,00	\$ 24.026,31	\$ 552.605,22	23,00	\$ 552.605,22		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PO PERA 4"	UND	228,00	\$ 24.347,48	\$ 5.502.530,98	228,00	\$ 5.502.530,98		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PO PERA 3"	UND	50,00	\$ 20.819,17	\$ 1.040.958,54	50,00	\$ 1.040.958,54		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PO PERA 2"	UND	78,00	\$ 19.820,15	\$ 1.530.371,74	78,00	\$ 1.530.371,74		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
AS DIAM= 4"	UND	12,00	\$ 19.771,91	\$ 237.262,91	12,00	\$ 237.262,91		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
AS DIAM= 2"	UND	17,00	\$ 15.183,74	\$ 258.123,55	17,00	\$ 258.123,55		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PVC ALCANTARILLADO 110MM	ML	27,70	\$ 48.750,02	\$ 1.350.375,51	90,00	\$ 4.387.501,66		27,00	\$ 1.316.250,50		63,00	\$ 3.071.251,16		90,00	\$ 4.387.501,66	
PVC ALCANTARILLADO 110MM	UND	7,00	\$ 45.405,05	\$ 317.835,32	10,00	\$ 454.050,46		-	\$ -		10,00	\$ 454.050,46		10,00	\$ 454.050,46	
C-S DIAM= 4"	ML	181,12	\$ 33.499,23	\$ 6.037.395,19	181,12	\$ 6.037.395,19		39,40	\$ 1.319.869,72		-	\$ -		39,40	\$ 1.319.869,72	
C-S DIAM= 3"	ML	132,13	\$ 29.304,75	\$ 3.872.036,65	132,13	\$ 3.872.036,65		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
S PVC-S DIAM= 4"	UND	59,00	\$ 20.822,17	\$ 1.228.508,28	59,00	\$ 1.228.508,28		-	\$ -		5,00	\$ 104.110,87		5,00	\$ 104.110,87	
S PVC-S DIAM= 3"	UND	57,00	\$ 14.326,47	\$ 816.608,97	57,00	\$ 816.608,97		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PO PERA 4"	UND	9,00	\$ 23.847,04	\$ 214.623,34	9,00	\$ 214.623,34		3,00	\$ 71.541,11		-	\$ -		3,00	\$ 71.541,11	
PO PERA 3"	UND	73,00	\$ 17.343,27	\$ 1.265.056,68	73,00	\$ 1.265.056,68		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PO PERA 2"	UND	97,00	\$ 15.160,39	\$ 1.470.557,92	97,00	\$ 1.470.557,92		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
AS DIAM= 4"	UND	25,00	\$ 19.771,91	\$ 494.297,72	25,00	\$ 494.297,72		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
AS DIAM= 3"	UND	6,00	\$ 19.227,00	\$ 115.361,98	6,00	\$ 115.361,98		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
C-P RDE=11 DIAM= 3/4"	ML	18,77	\$ 10.560,39	\$ 198.218,54	18,77	\$ 198.218,54		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
S PVC-P DIAM= 3/4"	UND	15,00	\$ 5.422,04	\$ 81.330,59	15,00	\$ 81.330,59		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PO PERA 3/4"	UND	16,00	\$ 18.302,94	\$ 292.847,11	16,00	\$ 292.847,11		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
LAVAMANOS 1/2"	UND	22,00	\$ 45.805,66	\$ 1.003.324,45	22,00	\$ 1.003.324,45		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
DUCHA 1/2"	UND	10,00	\$ 49.398,11	\$ 493.981,09	10,00	\$ 493.981,09		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
LAVAPLATOS 1/2"	UND	3,00	\$ 45.605,66	\$ 136.816,97	3,00	\$ 136.816,97		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ORINAL 3/4"	UND	6,00	\$ 48.672,45	\$ 292.034,72	6,00	\$ 292.034,72		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
SANITARIO DE TANQUE 1/2"	UND	2,00	\$ 45.905,66	\$ 91.211,31	2,00	\$ 91.211,31		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
SANITARIO DE FLUXÓMETRO 1 1/4"	UND	17,00	\$ 65.382,34	\$ 1.111.499,75	17,00	\$ 1.111.499,75		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
LLAVE MANGUERA 1/2"	UND	6,00	\$ 45.605,66	\$ 273.633,94	6,00	\$ 273.633,94		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
POCETA DE ASEO 1/2"	UND	3,00	\$ 45.905,66	\$ 138.616,97	3,00	\$ 138.616,97		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	

CION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 2			ACUMULADO ANTERIOR			EJECUTADO PRESENTE ACTA			ACUMULADO TOTAL		
		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	
LAVADORA 1/2"	UND	3,00	45.805,68 \$	\$ 136.816,97	3,00	\$ 136.816,97		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
LAVADERO 1/2"	UND	5,00	45.805,68 \$	\$ 228.028,28	5,00	\$ 228.028,28		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
COMETRO 4"	UND	17,00	88.446,25 \$	\$ 1.503.586,21	17,00	\$ 1.503.586,21		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
JUE 4"	UND	2,00	88.446,25 \$	\$ 176.892,49	2,00	\$ 176.892,49		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
	UND	22,00	57.427,61 \$	\$ 1.263.407,35	22,00	\$ 1.263.407,35		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
	UND	3,00	57.427,61 \$	\$ 172.282,82	3,00	\$ 172.282,82		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
	UND	6,00	81.046,53 \$	\$ 486.279,17	6,00	\$ 486.279,17		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
	UND	25,00	56.237,25 \$	\$ 1.405.931,18	25,00	\$ 1.405.931,18		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
	UND	10,00	56.237,25 \$	\$ 562.372,47	10,00	\$ 562.372,47		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
	UND	3,00	56.237,25 \$	\$ 168.711,74	3,00	\$ 168.711,74		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
	UND	3,00	65.482,29 \$	\$ 196.446,87	3,00	\$ 196.446,87		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
	UND	5,00	58.633,92 \$	\$ 293.169,59	5,00	\$ 293.169,59		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PVC-P DIAM=3"	ML	89,46	15.922,12 \$	\$ 1.424.382,69	89,46	\$ 1.424.382,69		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PVC-P DIAM=3"	UND	26,00	42.765,29 \$	\$ 1.111.897,49	26,00	\$ 1.111.897,49		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PUERTA DIAM=3" CUERPO EN BRONCE	UND	2,00	684.257,45 \$	\$ 1.368.514,90	2,00	\$ 1.368.514,90		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ETIQUETA SELLO NITRILLO DIAM=3" CUERPO EN	UND	2,00	715.100,30 \$	\$ 1.430.200,61	2,00	\$ 1.430.200,61		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
RSAL DIAM=3" PVC ROSCA NPT.	UND	2,00	132.515,03 \$	\$ 265.030,07	2,00	\$ 265.030,07		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PO PERA 3"	UND	2,00	15.160,39 \$	\$ 30.320,78	2,00	\$ 30.320,78		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
AS DIAM= 3"	UND	4,00	19.227,00 \$	\$ 76.907,98	4,00	\$ 76.907,98		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
2 C800 DIAM= 4"	ML	100,77	10.230,08 \$	\$ 1.040.405,55	100,77	\$ 1.040.405,55		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ERO NEGRO SCHD10 DIAM= 4"	ML	51,34	67.079,58 \$	\$ 3.443.865,46	51,34	\$ 3.443.865,46		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ERO NEGRO SCHD10 DIAM= 2,1/2"	ML	7,55	47.192,79 \$	\$ 356.305,54	7,55	\$ 356.305,54		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ERO NEGRO SCHD10 DIAM= 2"	ML	15,57	38.376,52 \$	\$ 597.522,47	15,57	\$ 597.522,47		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ERO NEGRO SCHD10 DIAM= 1,1/2"	ML	403,09	30.906,30 \$	\$ 12.458.022,45	403,09	\$ 12.458.022,45		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ERO NEGRO SCHD10 DIAM= 1,1/4"	ML	88,58	118.342,44 \$	\$ 8.115.924,44	88,58	\$ 8.115.924,44		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ERO NEGRO SCHD40 DIAM= 1"	ML	138,41	24.551,02 \$	\$ 3.398.106,54	138,41	\$ 3.398.106,54		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
5 PVC C800 DIAM= 4"	UND	39,00	446.722,82 \$	\$ 17.422.190,03	39,00	\$ 17.422.190,03		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
3 ACERO RANURADOS DIAM= 4"	UND	29,00	72.795,68 \$	\$ 2.111.075,15	29,00	\$ 2.111.075,15		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
3 ACERO RANURADOS DIAM= 2,1/2"	UND	8,00	36.246,49 \$	\$ 289.871,94	8,00	\$ 289.871,94		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
3 ACERO RANURADOS DIAM= 2"	UND	57,00	44.623,39 \$	\$ 2.543.532,82	57,00	\$ 2.543.532,82		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
3 ACERO RANURADOS DIAM= 1,1/2"	UND	287,00	27.098,30 \$	\$ 7.785.246,24	287,00	\$ 7.785.246,24		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
3 ACERO ROSCADO DIAM= 1,1/4"	UND	50,00	25.320,02 \$	\$ 1.266.000,84	50,00	\$ 1.266.000,84		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
3 ACERO ROSCADO DIAM= 1"	UND	246,00	24.235,37 \$	\$ 5.961.901,44	246,00	\$ 5.961.901,44		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ES BELL RESTRAINER SERIES 300 CHD DIAM=	UND	88,00	283.954,76 \$	\$ 24.988.019,16	88,00	\$ 24.988.019,16		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ES TUF GRIP HEXAGONAL HD DIAM= 4"	UND	27,00	326.108,10 \$	\$ 8.804.918,69	27,00	\$ 8.804.918,69		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
NSORA DE FLUJO DIAM= 2"	UND	1,00	332.417,46 \$	\$ 332.417,46	1,00	\$ 332.417,46		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
NSORA DE FLUJO DIAM= 1,1/2"	UND	4,00	196.738,73 \$	\$ 786.946,91	4,00	\$ 786.946,91		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
M= 2"	UND	1,00	193.040,07 \$	\$ 193.040,07	1,00	\$ 193.040,07		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
M= 1,1/2"	UND	4,00	129.945,50 \$	\$ 519.782,02	4,00	\$ 519.782,02		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 2			ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
O MARIPOSA CON SUPERVISOR DIAM= 2"	UND	1,00	\$ 402.878,55	\$ 402.878,55	1,00	\$ 402.878,55		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
O MARIPOSA CON SUPERVISOR DIAM= 1 1/2"	UND	4,00	\$ 202.513,47	\$ 810.053,87	4,00	\$ 810.053,87		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1/2"	UND	117,00	\$ 19.768,65	\$ 2.312.932,36	117,00	\$ 2.312.932,36		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1/2"	UND	43,00	\$ 24.724,73	\$ 1.063.183,18	43,00	\$ 1.063.183,18		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	UND	654,00	\$ 17.797,02	\$ 11.639.250,22	654,00	\$ 11.639.250,22		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
PULSORA DE AIRE 1"	UND	54,00	\$ 22.305,04	\$ 1.204.472,05	54,00	\$ 1.204.472,05		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
E CORTE 1"	UND	3,00	\$ 288.512,62	\$ 865.538,46	3,00	\$ 865.538,46		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
BOMBOS DIAM= 2 1/2"	UND	9,00	\$ 177.644,74	\$ 1.598.802,68	9,00	\$ 1.598.802,68		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
DE GLICERINA 0-300 PSI	UND	5,00	\$ 532.577,08	\$ 2.662.885,32	5,00	\$ 2.662.885,32		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
UTOMATICO PENDIENT (K=5.6) SUM Y MONT	UND	5,00	\$ 71.057,30	\$ 355.286,51	5,00	\$ 355.286,51		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
UTOMATICO UP-RIGHT (K=5.6) SUM Y MONT	UND	114,00	\$ 44.244,92	\$ 5.043.921,43	114,00	\$ 5.043.921,43		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
AULICO ROCIADOR	UND	2,00	\$ 39.864,19	\$ 79.728,38	2,00	\$ 79.728,38		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
LA TUBERIA	ML	116,00	\$ 34.919,87	\$ 4.050.682,12	116,00	\$ 4.050.682,12		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
JLTIPOPOSITO ABC 10 LB	UND	684,54	\$ 6.892,51	\$ 4.718.199,01	684,54	\$ 4.718.199,01		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
BASE DE COX 10 LB	UND	3,00	\$ 85.796,79	\$ 257.390,36	3,00	\$ 257.390,36		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
PUESTO (CONTIENE 9 ROCIADORES DE IPO PENDIENT)	UND	6,00	\$ 286.762,45	\$ 1.720.574,72	6,00	\$ 1.720.574,72		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
O PERA UL/FM 4"	UND	1,00	\$ 672.764,18	\$ 672.764,18	1,00	\$ 672.764,18		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
O PERA UL/FM 2 1/2"	UND	12,00	\$ 19.547,68	\$ 234.571,90	12,00	\$ 234.571,90		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
O PERA UL/FM 2"	UND	2,00	\$ 15.947,48	\$ 31.894,96	2,00	\$ 31.894,96		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
O PERA UL/FM 1 1/2"	UND	4,00	\$ 15.100,60	\$ 60.401,99	4,00	\$ 60.401,99		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
O PERA UL/FM 1 1/4"	UND	89,00	\$ 13.973,20	\$ 1.243.614,79	89,00	\$ 1.243.614,79		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
O PERA UL/FM 1"	UND	16,00	\$ 13.304,55	\$ 212.872,82	16,00	\$ 212.872,82		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
SMO RESISTENTE 4 VIAS	UND	31,00	\$ 12.659,45	\$ 392.443,09	31,00	\$ 392.443,09		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
AS UL/FM DIAM= 4"	UND	6,00	\$ 149.534,89	\$ 897.209,34	6,00	\$ 897.209,34		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
AS UL/FM DIAM= 1"	UND	8,00	\$ 18.811,23	\$ 150.489,86	8,00	\$ 150.489,86		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2 1/2" CON CHEQUE INTEGRADO	UND	4,00	\$ 14.312,73	\$ 57.250,92	4,00	\$ 57.250,92		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
2"	UND	1,00	\$ 5.663,28	\$ 5.663,28	1,00	\$ 5.663,28		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ASE II	UND	1,00	\$ 384.704,17	\$ 384.704,17	1,00	\$ 384.704,17		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
PVC C900 A ACERO	UND	6,00	\$ 76.589,00	\$ 459.534,01	6,00	\$ 459.534,01		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
SCH 40 DIAM= 1"	UND	4,00	\$ 845.055,11	\$ 3.380.340,46	4,00	\$ 3.380.340,46		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
SCH 40 DIAM= 3/4"	ML	32,95	\$ 27.742,82	\$ 914.119,33	32,95	\$ 914.119,33		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
SCH 40 DIAM= 1/2"	ML	33,24	\$ 20.324,75	\$ 675.594,80	33,24	\$ 675.594,80		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3 A.G SCH 40 DIAM= 1"	ML	15,36	\$ 16.479,25	\$ 253.121,27	15,36	\$ 253.121,27		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3 A.G SCH 40 DIAM= 3/4"	ML	20,00	\$ 6.181,39	\$ 123.227,83	20,00	\$ 123.227,83		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3 A.G SCH 40 DIAM= 1/2"	ML	19,00	\$ 5.053,15	\$ 96.008,78	19,00	\$ 96.008,78		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
E BOLA DIAM= 1/2"	UND	41,00	\$ 4.184,29	\$ 171.555,89	41,00	\$ 171.555,89		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	UND	4,00	\$ 59.193,76	\$ 236.775,04	4,00	\$ 236.775,04		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 2		ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
30 AMARILLA DIAM= 1" 30 AMARILLA DIAM= 3/4" DIAM= 1" DIAM= 3/4" UNICA ETAPA	UND	1,00	\$ 1.080.659,61	\$ 1.080.659,61	1,00	\$ 1.080.659,61	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	ML	26,33	\$ 24.573,66	\$ 647.024,13	26,33	\$ 647.024,13	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	ML	4,75	\$ 17.642,00	\$ 83.799,52	4,75	\$ 83.799,52	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	ML	3,00	\$ 37.106,92	\$ 111.320,75	3,00	\$ 111.320,75	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	ML	2,00	\$ 25.183,70	\$ 50.367,41	2,00	\$ 50.367,41	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	GL	1,00	\$ 70.893,23	\$ 70.893,23	1,00	\$ 70.893,23	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	UND	1,00	\$ 18.690,27	\$ 18.690,27	1,00	\$ 18.690,27	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	UND	1,00	\$ 18.690,27	\$ 18.690,27	1,00	\$ 18.690,27	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	UND	2,00	\$ 15.442,49	\$ 30.884,99	2,00	\$ 30.884,99	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	UND	2,00	\$ 281.767,80	\$ 563.535,60	2,00	\$ 563.535,60	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
30 AMARILLA DIAM= 1" 30 AMARILLA DIAM= 3/4" DIAM= 1" DIAM= 3/4" UNICA ETAPA	UND	1,00	\$ 510.234,21	\$ 510.234,21	1,00	\$ 510.234,21	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
			\$ 288.961.880,46	\$ 288.961.880,46		\$ 288.961.880,46		\$ -		\$ -		\$ -
	ML	35,00	\$ 11.529,44	\$ 403.530,27	35,00	\$ 403.530,27	-	\$ -	6,00	\$ 69.176,62	6,00	\$ 69.176,62
	ML	11,00	\$ 10.587,34	\$ 116.460,79	11,00	\$ 116.460,79	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	ML	20,00	\$ 12.139,66	\$ 242.793,16	20,00	\$ 242.793,16	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	ML	125,00	\$ 8.927,98	\$ 1.115.996,94	125,00	\$ 1.115.996,94	-	\$ -	123,00	\$ 1.098.140,99	123,00	\$ 1.098.140,99
	ML	795,00	\$ 14.034,43	\$ 11.157.368,77	795,00	\$ 11.157.368,77	-	\$ -	409,30	\$ 5.744.290,61	409,30	\$ 5.744.290,61
	UND	3,00	\$ 5.871,67	\$ 17.615,00	6,00	\$ 35.230,00	-	\$ -	6,00	\$ 35.230,00	6,00	\$ 35.230,00
	UND	1,00	\$ 5.454,79	\$ 5.454,79	1,00	\$ 5.454,79	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	UND	2,00	\$ 6.090,70	\$ 12.181,40	2,00	\$ 12.181,40	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
30 AMARILLA DIAM= 1" 30 AMARILLA DIAM= 3/4" DIAM= 1" DIAM= 3/4" UNICA ETAPA	UND	2,00	\$ 5.037,91	\$ 10.075,83	10,00	\$ 50.379,15	-	\$ -	10,00	\$ 50.379,15	10,00	\$ 50.379,15
	UND	2,00	\$ 5.002,58	\$ 10.005,17	249,00	\$ 1.240.640,50	-	\$ -	248,00	\$ 1.240.640,50	248,00	\$ 1.240.640,50
	UND	265,00	\$ 4.869,53	\$ 1.295.725,28	265,00	\$ 1.295.725,28	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	ML	35,00	\$ 40.209,97	\$ 1.407.348,89	35,00	\$ 1.407.348,89	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	ML	11,00	\$ 24.638,66	\$ 271.025,31	11,00	\$ 271.025,31	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	ML	20,00	\$ 21.450,53	\$ 429.010,67	20,00	\$ 429.010,67	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	ML	125,00	\$ 16.996,99	\$ 2.124.624,33	125,00	\$ 2.124.624,33	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	ML	40,00	\$ 40.209,97	\$ 1.608.398,73	40,00	\$ 1.608.398,73	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	UND	3,00	\$ 55.506,14	\$ 166.518,41	3,00	\$ 166.518,41	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	UND	1,00	\$ 809.904,05	\$ 809.904,05	1,00	\$ 809.904,05	-	\$ -	1,00	\$ 809.904,05	1,00	\$ 809.904,05
30 AMARILLA DIAM= 1" 30 AMARILLA DIAM= 3/4" DIAM= 1" DIAM= 3/4" UNICA ETAPA	UND	1,00	\$ 311.481,09	\$ 311.481,09	1,00	\$ 311.481,09	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	UND	265,00	\$ 18.316,79	\$ 4.908.898,64	265,00	\$ 4.908.898,64	-	\$ -	67,00	\$ 1.227.224,66	67,00	\$ 1.227.224,66
	UND	98,00	\$ 16.375,96	\$ 1.604.834,03	98,00	\$ 1.604.834,03	-	\$ -	12,00	\$ 198.510,29	12,00	\$ 198.510,29
	ML	605,00	\$ 6.159,16	\$ 3.750.493,78	605,00	\$ 3.750.493,78	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 2			ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SLADO FLUR NO 12 - PARA SISTEMA DE	ML	2,385.00	\$ 5,339.50	\$ 12,734,701.11	2385.00	\$ 12,734,701.11		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
SLADO LSZH NO 8 - PARA ALIMENTADOR	ML	130.00	\$ 8,477.32	\$ 1,102,051.27	130.00	\$ 1,102,051.27		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
SLADO LSZH NO 8 - PARA ALIMENTADOR	ML	230.00	\$ 9,985.39	\$ 2,292,039.96	230.00	\$ 2,292,039.96		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
SLADO LSZH NO 4 - PARA ALIMENTADOR	ML	130.00	\$ 14,133.08	\$ 1,837,300.94	130.00	\$ 1,837,300.94		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
SLADO LSZH NO 2 - PARA ALIMENTADOR	ML	60.00	\$ 21,779.27	\$ 1,270,756.08	60.00	\$ 1,270,756.08		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
SLADO LSZH NO 10 - PARA ALIMENTADOR	ML	30.00	\$ 31,174.02	\$ 935,220.89	30.00	\$ 935,220.89		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
SLADO LSZH NO 20 - PARA ALIMENTADOR	ML	160.00	\$ 34,690.84	\$ 5,545,734.34	160.00	\$ 5,545,734.34		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
SLADO LSZH NO 30 - PARA ALIMENTADOR	ML	240.00	\$ 40,407.61	\$ 9,697,827.51	240.00	\$ 9,697,827.51		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
SLADO LSZH NO 250	ML	10.00	\$ 58,997.90	\$ 589,979.02	10.00	\$ 589,979.02		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ESNUDO NO 20 - CABLE DE PUESTA A TIERRA	ML	75.00	\$ 36,039.73	\$ 2,702,979.04	75.00	\$ 2,702,979.04		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1 MM - PARA SIPRA	ML	65.00	\$ 10,604.19	\$ 689,272.32	65.00	\$ 689,272.32		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1 OM4	ML	50.00	\$ 13,962.54	\$ 698,126.85	50.00	\$ 698,126.85		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
GORIA 6A FUTP DE 500 MHZ	ML	1050.00	\$ 6,003.34	\$ 6,303,511.37	1050.00	\$ 6,303,511.37		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
PO PALA NO 8	UND	22.00	\$ 4,885.32	\$ 107,477.05	22.00	\$ 107,477.05		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
PO PALA NO 6	UND	18.00	\$ 6,314.52	\$ 113,661.36	18.00	\$ 113,661.36		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
PO PALA NO 4	UND	4.00	\$ 8,070.43	\$ 24,281.73	4.00	\$ 24,281.73		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
PO PALA NO 2	UND	12.00	\$ 7,157.05	\$ 85,884.60	12.00	\$ 85,884.60		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
PO PALA NO 10	UND	8.00	\$ 8,281.14	\$ 66,249.11	8.00	\$ 66,249.11		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
PO PALA NO 20	UND	12.00	\$ 8,368.93	\$ 100,427.16	12.00	\$ 100,427.16		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
PO PALA NO 30	UND	24.00	\$ 8,675.11	\$ 208,202.63	24.00	\$ 208,202.63		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
PO PALA NO 250	UND	2.00	\$ 19,333.12	\$ 38,666.25	2.00	\$ 38,666.25		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
WELL 2.4 MTS	UND	8.00	\$ 171,860.54	\$ 1,374,884.36	8.00	\$ 1,374,884.36		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ELECTRICO TRIFASICO 12 CTOS CON ESPACIO DE	UND	4.00	\$ 592,145.30	\$ 2,368,581.19	4.00	\$ 2,368,581.19		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ELECTRICO TRIFASICO TGA DE 2000MM X 80 MM	UND	1.00	\$ 18,739,778.44	\$ 18,739,778.44	1.00	\$ 18,739,778.44		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ADRO DE CARGAS INCLUTE DPS	UND	1.00	\$ 14,200,386.54	\$ 14,200,386.54	1.00	\$ 14,200,386.54		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ELECTRICO TRIFASICO TGN DE 2000MM X 80 MM	UND	1.00	\$ 16,469,433.73	\$ 16,469,433.73	1.00	\$ 16,469,433.73		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ADRO DE CARGAS	UND	48.00	\$ 32,433.77	\$ 1,558,821.14	48.00	\$ 1,558,821.14		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
1X20A	UND	7.00	\$ 32,433.77	\$ 227,036.42	7.00	\$ 227,036.42		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3X20A - CON ICC 10KA	UND	2.00	\$ 51,351.30	\$ 102,702.61	2.00	\$ 102,702.61		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3X50A	UND	4.00	\$ 240,343.83	\$ 961,375.30	4.00	\$ 961,375.30		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3X70A	UND	2.00	\$ 483,654.46	\$ 967,308.91	2.00	\$ 967,308.91		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3X150A	UND	1.00	\$ 483,654.46	\$ 483,654.46	1.00	\$ 483,654.46		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
3X175A - CON ICC 15KA	UND	58.00	\$ 19,440.58	\$ 1,127,553.83	58.00	\$ 1,127,553.83		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
EN TOMA CORRIENTE DOBLE MONOFASICA DE A TIERRA (COLOR BLANCO)	UND	58.00	\$ 19,440.58	\$ 1,127,553.83	58.00	\$ 1,127,553.83		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 2			ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
EN TOMA CORRIENTE DOBLE D INCRUSTAR O A TIERRA TIPO GFCC (COLOR BLANCO)	UND	6,00	\$ 70.890,66	\$ 425.343,97	6,00	\$ 425.343,97		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
EN TOMA CORRIENTE DOBLE D INCRUSTAR O A TIERRA TIPO REGULADA (COLOR NARANJA)	UND	35,00	\$ 26.249,35	\$ 918.727,11	35,00	\$ 918.727,11		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
DE TOMA TRIFASICA TOMA DE EMPOTRAR	UND	1,00	\$ 57.562,18	\$ 57.562,18	1,00	\$ 57.562,18		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ARA SENSOR DE MOVIMIENTO DE DOBLE S DE RADIO - INCLUYE SENSOR	UND	18,00	\$ 110.382,58	\$ 1.986.886,53	18,00	\$ 1.986.886,53		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ARA INTERRUPTOR DOBLE DE INCRUSTAR CON D LED	UND	15,00	\$ 29.034,94	\$ 435.524,14	15,00	\$ 435.524,14		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ARA INTERRUPTOR SECILLO DE INCRUSTAR STIGO LED	UND	25,00	\$ 27.011,59	\$ 675.289,71	25,00	\$ 675.289,71		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	UND	65,00	\$ 22.782,49	\$ 1.479.581,88	65,00	\$ 1.479.581,88		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	UND	45,00	\$ 24.381,04	\$ 1.097.146,60	45,00	\$ 1.097.146,60		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	UND	18,00	\$ 21.953,22	\$ 395.158,01	18,00	\$ 395.158,01		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
INCLUYE PONCHADO	UND	80,00	\$ 34.804,45	\$ 2.784.356,21	80,00	\$ 2.784.356,21		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
SENCILLO CATEGORIA 8A PARA JACK	UND	40,00	\$ 20.939,02	\$ 837.590,74	40,00	\$ 837.590,74		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
DE 2 MTS. - CATEGORIA 8A LSZH	UND	70,00	\$ 37.625,85	\$ 2.633.809,35	70,00	\$ 2.633.809,35		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
PUERTOS DE 10 GR DE FIBRA OPTICA	UND	1,00	\$ 8.503.750,44	\$ 8.503.750,44	1,00	\$ 8.503.750,44		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
E CORE DE 24 PUERTOS CAT 8A - CAPA 3 CON USAR COMO ABLINKS A LOS SWITCHES DE 1000	UND	1,00	\$ 9.649.893,90	\$ 9.649.893,90	1,00	\$ 9.649.893,90		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
E DISTRIBUCION DE 24 PUERTOS CAT 6	UND	1,00	\$ 8.455.911,35	\$ 8.455.911,35	1,00	\$ 8.455.911,35		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
E ACCESO DE 48 PUERTOS CAT 6A	UND	2,00	\$ 8.941.932,04	\$ 17.883.864,08	2,00	\$ 17.883.864,08		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
E POE DE 24 PUERTOS CAT 6A	UND	2,00	\$ 13.206.825,73	\$ 26.413.651,46	2,00	\$ 26.413.651,46		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
DE 24 PUERTOS PARA RACK DE 45U - INCLUYE	UND	8,00	\$ 535.352,29	\$ 3.212.113,73	8,00	\$ 3.212.113,73		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ORES DE CABLE VERTICAL PARA RACK DE 45U	UND	2,00	\$ 350.724,44	\$ 701.448,87	2,00	\$ 701.448,87		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ADORA IONIZANTE DE 2 MTS INCLUYE BASE Y	UND	12,00	\$ 734.891,58	\$ 8.818.699,00	12,00	\$ 8.818.699,00		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
O CRUZ PARA CABLE INCLUYE MOLDE Y	UND	4,00	\$ 106.478,81	\$ 425.915,24	4,00	\$ 425.915,24		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
O T PARA CABLE INCLUYE MOLDE Y	UND	8,00	\$ 105.523,88	\$ 844.191,02	8,00	\$ 844.191,02		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
MODA DIRECTA)	UND	1,00	\$ 934.275,07	\$ 934.275,07	1,00	\$ 934.275,07		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
UPOTENCIAL DE TIERRAS EN CU INCLUYE	UND	2,00	\$ 303.276,23	\$ 606.552,46	2,00	\$ 606.552,46		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
INCENDIOS DIRECCIONABLE CON MINIMO 4 ACCION Y PUESTA EN MARCHA	UND	1,00	\$ 2.423.952,85	\$ 2.423.952,85	1,00	\$ 2.423.952,85		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
DE HUMO OPTICO CON RANGO DE COBERTURA	UND	21,00	\$ 386.409,12	\$ 8.114.591,58	21,00	\$ 8.114.591,58		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

CICLO	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 2			ACUMULADO ANTERIOR		EJECUTADO PRESENTE ACTA		ACUMULADO TOTAL	
		CANTIDAD	VR UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL		CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
TIPO LOUVER RTLV - 8"x8"	UND	2,00	\$ 110.592,76	\$ 221.185,52	2,00	\$ 221.185,52		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
TIPO LOUVER RTLV - 10"x10"	UND	1,00	\$ 121.298,37	\$ 121.298,37	1,00	\$ 121.298,37		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
TIPO LOUVER RTLV - 12"x10"	UND	1,00	\$ 129.882,85	\$ 129.882,85	1,00	\$ 129.882,85		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
TIPO LOUVER RTLV - 12"x12"	UND	4,00	\$ 137.356,78	\$ 549.427,12	4,00	\$ 549.427,12		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
TIPO LOUVER RTLV - 16"x16"	UND	1,00	\$ 180.179,21	\$ 180.179,21	1,00	\$ 180.179,21		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
TIPO LOUVER RTLV - 30"x16"	UND	1,00	\$ 358.821,74	\$ 358.821,74	1,00	\$ 358.821,74		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados)	ML	45,00	\$ 43.965,64	\$ 1.978.453,80	45,00	\$ 1.978.453,80		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados)	ML	22,00	\$ 63.963,96	\$ 1.400.607,09	22,00	\$ 1.400.607,09		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados)	ML	45,00	\$ 69.712,63	\$ 3.137.088,23	45,00	\$ 3.137.088,23		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
DE COBRE TIPO L (Ambos tubos aislados)	ML	22,00	\$ 80.311,18	\$ 1.786.845,94	22,00	\$ 1.786.845,94		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
a refrigerante adicional R410A	KG	5,00	\$ 50.460,06	\$ 252.300,29	5,00	\$ 252.300,29		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
IS ELECTRICOS TAE-01	UND	1,00	\$ 3.856.599,81	\$ 3.856.599,81	1,00	\$ 3.856.599,81		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
control TC-01	UND	1,00	\$ 4.158.497,96	\$ 4.158.497,96	1,00	\$ 4.158.497,96		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
infral VRF <=64 UI	UND	1,00	\$ 7.044.885,16	\$ 7.044.885,16	1,00	\$ 7.044.885,16		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
controlador de campo BACnet IP/MSTP con interfaz	UND	2,00	\$ 7.385.123,50	\$ 14.770.246,99	2,00	\$ 14.770.246,99		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
os VRF independientes por área	UND	3,00	\$ 576.885,71	\$ 1.730.657,14	3,00	\$ 1.730.657,14		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ortente	UND	6,00	\$ 466.617,95	\$ 2.799.707,70	6,00	\$ 2.799.707,70		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
de control SENSORES (incluye canalización y	ML	30,00	\$ 33.040,83	\$ 991.224,80	30,00	\$ 991.224,80		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
de control COMUNICACION (incluye canalización y	ML	120,00	\$ 29.829,14	\$ 3.579.497,31	120,00	\$ 3.579.497,31		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
				\$ 35.394.434,41		\$ 35.394.434,41		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
E=3CM	M2	942,00	\$ 18.115,98	\$ 17.068.092,05	942,00	\$ 17.068.092,05		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
E=4CM	M2	153,00	\$ 34.537,22	\$ 5.284.194,76	153,00	\$ 5.284.194,76		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
DO PARA PLAZA DE FORMACION E=4CM	M2	155,00	\$ 34.231,15	\$ 5.305.827,87	155,00	\$ 5.305.827,87		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	M2	42,00	\$ 27.198,11	\$ 1.142.320,43	42,00	\$ 1.142.320,43		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	ML	29,89	\$ 53.074,85	\$ 1.586.407,12	29,89	\$ 1.586.407,12		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
ETO 3000 PSI ESMAL TADO a= 0,10m	ML	2,96	\$ 91.824,58	\$ 271.600,75	2,96	\$ 271.600,75		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	ML	171,50	\$ 26.552,01	\$ 4.553.669,26	171,50	\$ 4.553.669,26		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	ML	9,40	\$ 40.651,30	\$ 382.122,17	9,40	\$ 382.122,17		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
				\$ 162.120.394,64		\$ 162.120.394,64		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
80	M2	114,00	\$ 74.517,59	\$ 8.495.005,57	114,00	\$ 8.495.005,57		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
80	M2	40,00	\$ 71.145,59	\$ 2.845.823,54	40,00	\$ 2.845.823,54		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	M2	78,00	\$ 58.538,33	\$ 4.565.989,79	78,00	\$ 4.565.989,79		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -
	ML	47,61	\$ 11.645,23	\$ 554.429,43	47,61	\$ 554.429,43		-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -

26

15/05/2015



15/05/2015

CION	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 2			ACUMULADO ANTERIOR			EJECUTADO PRESENTE ACTA			ACUMULADO TOTAL		
		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	
JULDA - RAYAS HORIZONTALES COLOR GRIS -	M2	207,00	\$ 84.341,09	\$ 17.458.805,89	207,00	\$ 17.458.805,89		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
TERIOR PREPULIDA - RAYAS HORIZONTALES	ML	68,27	\$ 59.038,76	\$ 4.030.576,48	68,27	\$ 4.030.576,48		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ONMO 30 X 30	M2	778,00	\$ 94.040,25	\$ 73.163.315,71	778,00	\$ 73.163.315,71		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
L PLOMO 30 X 30	ML	541,73	\$ 65.828,18	\$ 35.681.097,31	541,73	\$ 35.681.097,31		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
	ML	25,80	\$ 14.748,70	\$ 377.568,73	25,80	\$ 377.568,73		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ISPE GRIS - INCLUYE CINTA FOTOLUMINISCENTE	ML	154,00	\$ 97.194,70	\$ 14.987.984,20	154,00	\$ 14.987.984,20		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
IS				\$ 1.813.964,06		\$ 1.813.964,06			\$ -			\$ -			\$ -	
ICHE EN LAMINA GALVANIZADA - ANCHO=25cm	ML	63,80	\$ 16.186,01	\$ 1.029.430,01	63,80	\$ 1.029.430,01		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ICHE EN LAMINA GALVANIZADA - ANCHO=45cm	ML	11,99	\$ 22.899,09	\$ 272.182,05	11,99	\$ 272.182,05		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
	UND	11,00	\$ 40.493,32	\$ 445.426,47	11,00	\$ 445.426,47		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
RES - 0.15 X 0.15m	UND	5,00	\$ 13.389,11	\$ 66.945,53	5,00	\$ 66.945,53		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
GETALES				\$ 32.657.769,94		\$ 32.657.769,94			\$ -			\$ 14.983.325,60			\$ 14.983.325,60	
	M2	441,00	\$ 74.053,90	\$ 32.657.769,94	441,00	\$ 32.657.769,94		-	\$ -		202,33	\$ 14.983.325,60		202,33	\$ 14.983.325,60	
				\$ 705.282.702,12		\$ 705.282.702,12			\$ -			\$ -			\$ -	
- 1.85 X 3,0m	UND	1,00	\$ 17.984.092,87	\$ 17.984.092,87	1,00	\$ 17.984.092,87		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
(3,0m	UND	1,00	\$ 11.665.357,19	\$ 11.665.357,19	1,00	\$ 11.665.357,19		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PL_1 - 0,75 X 2,5m _ INCLUYE MARCO	UND	5,00	\$ 924.596,26	\$ 4.622.981,30	5,00	\$ 4.622.981,30		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PL_2 - 0,75 X 3,0m _ INCLUYE MARCO	UND	4,00	\$ 1.109.515,29	\$ 4.438.061,18	4,00	\$ 4.438.061,18		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PL_3 - 0,85 X 2,3m _ INCLUYE MARCO	UND	2,00	\$ 964.045,36	\$ 1.928.090,71	2,00	\$ 1.928.090,71		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PL_4 - 0,85 X 2,5m _ INCLUYE MARCO	UND	1,00	\$ 1.047.875,61	\$ 1.047.875,61	1,00	\$ 1.047.875,61		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PL_5 - 0,85 X 3,0m _ INCLUYE MARCO	UND	6,00	\$ 1.257.450,74	\$ 7.544.704,44	6,00	\$ 7.544.704,44		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PL_6 - 0,85 X 3,0m _ INCLUYE MARCO	UND	2,00	\$ 1.405.386,18	\$ 2.810.772,37	2,00	\$ 2.810.772,37		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PL_7 - 1,05 X 2,50m _ INCLUYE MARCO	UND	1,00	\$ 1.294.434,34	\$ 1.294.434,34	1,00	\$ 1.294.434,34		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PL_8 - 1,05 X 3,0m _ INCLUYE MARCO	UND	1,00	\$ 1.553.321,53	\$ 1.553.321,53	1,00	\$ 1.553.321,53		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
PL_9 - 0,95 X 3,0m _ INCLUYE MARCO METALICO	UND	1,00	\$ 1.171.154,98	\$ 1.171.154,98	1,00	\$ 1.171.154,98		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
SUPERIOR - PL_10 - 0,95 X 3,0m _ INCLUYE	UND	1,00	\$ 1.405.386,18	\$ 1.405.386,18	1,00	\$ 1.405.386,18		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
APLETA - PL_11 - 2,05 X 3,0m _ INCLUYE MARCO	UND	1,00	\$ 3.032.675,00	\$ 3.032.675,00	1,00	\$ 3.032.675,00		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ICULAR D=3,00 X 3,00 m _ INCLUYE MARCO	UND	1,00	\$ 3.032.675,00	\$ 3.032.675,00	1,00	\$ 3.032.675,00		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ALICA - PCF1 - 1,05 X 2,50m	UND	2,00	\$ 2.619.769,33	\$ 5.239.538,67	2,00	\$ 5.239.538,67		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ALICA - PCF2 - 1,05 X 3,0m	UND	4,00	\$ 3.118.773,78	\$ 12.475.095,12	4,00	\$ 12.475.095,12		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ALICA - PCF3 - 1,25 X 3,0m	UND	2,00	\$ 3.118.773,78	\$ 6.237.547,56	2,00	\$ 6.237.547,56		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
IVEL III + PLACA DE REFORZAMIENTO +	M2	9,30	\$ 2.945.796,84	\$ 27.395.910,66	9,30	\$ 27.395.910,66		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	

89

159

UN	UNIDAD	CANTIDADES CONTRACTUALES			CONDICIONES ACTUALIZADAS BALANCE No. 2			ACUMULADO ANTERIOR			EJECUTADO PRESENTE ACTA			ACUMULADO TOTAL		
		CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR		CANTIDAD	VALOR	
EL III + PLACA DE REFORZAMIENTO +	M2	23,66	\$ 2.945.796,84	\$ 69.687.553,35	23,66	\$ 69.687.553,35		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
II	UND	1,00	\$ 4.701.903,03	\$ 4.701.903,03	1,00	\$ 4.701.903,03		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
	UND	1,00	\$ 3.722.339,90	\$ 3.722.339,90	1,00	\$ 3.722.339,90		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
	UND	2,00	\$ 3.722.339,90	\$ 7.444.679,80	2,00	\$ 7.444.679,80		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
	UND	1,00	\$ 958.056,83	\$ 958.056,83	1,00	\$ 958.056,83		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
	UND	1,00	\$ 756.878,99	\$ 756.878,99	1,00	\$ 756.878,99		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
DETALLE ARQUITECTONICO	UND	1,00	\$ 1.602.950,69	\$ 1.602.950,69	1,00	\$ 1.602.950,69		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ACA DE REFORZAMIENTO V01 D= 2x3,56mt	UND	1,00	\$ 23.071.484,51	\$ 23.071.484,51	1,00	\$ 23.071.484,51		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ACA DE REFORZAMIENTO V02 D= 3,9x0,4mt	UND	8,00	\$ 5.054.987,90	\$ 40.439.903,24	8,00	\$ 40.439.903,24		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ACA DE REFORZAMIENTO V03 D= 3,9x0,8mt	UND	1,00	\$ 7.582.482,39	\$ 7.582.482,39	1,00	\$ 7.582.482,39		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ACA DE REFORZAMIENTO V04 D= 4x4,05mt	UND	2,00	\$ 52.494.108,44	\$ 104.988.216,87	2,00	\$ 104.988.216,87		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ACA DE REFORZAMIENTO V05 D=	UND	10,00	\$ 13.155.931,11	\$ 131.559.311,11	10,00	\$ 131.559.311,11		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ACA DE REFORZAMIENTO V06 D= 6,83x0,4mt	UND	7,00	\$ 8.852.710,27	\$ 61.968.971,92	7,00	\$ 61.968.971,92		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ACA DE REFORZAMIENTO V07 D= 2,9x0,8mt	UND	1,00	\$ 5.638.256,19	\$ 5.638.256,19	1,00	\$ 5.638.256,19		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ACA DE REFORZAMIENTO V13 O= 1,91x0,7mt	UND	1,00	\$ 3.072.804,97	\$ 3.072.804,97	1,00	\$ 3.072.804,97		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ACA DE REFORZAMIENTO V14 D= 1,7x0,7mt	UND	15,00	\$ 2.734.957,39	\$ 41.024.360,84	15,00	\$ 41.024.360,84		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
ACA DE REFORZAMIENTO V15 D= 1,64x0,7mt	UND	1,00	\$ 2.638.429,21	\$ 2.638.429,21	1,00	\$ 2.638.429,21		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
AL A MURO ESCALERAS Y CERRAMIENTO	ML	139,17	\$ 170.553,19	\$ 23.735.886,80	139,17	\$ 23.735.886,80		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
E MURO ALOJAMIENTOS	ML	12,70	\$ 170.553,19	\$ 2.186.025,45	12,70	\$ 2.186.025,45		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
RES SUPERIORES 2° - INFERIORES 1° - SEGÚN	ML	8,71	\$ 272.566,92	\$ 2.374.057,86	8,71	\$ 2.374.057,86		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
RES 2° - INFERIORES 1° - SEGÚN DETALLE	ML	24,61	\$ 272.566,92	\$ 6.707.871,85	24,61	\$ 6.707.871,85		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
RA CUBIERTA - A=0,25m	ML	9,80	\$ 384.913,82	\$ 3.870.155,45	9,80	\$ 3.870.155,45		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
RA PLAZA DE FORMACION - A=0,25m	ML	20,74	\$ 305.527,35	\$ 6.336.637,25	20,74	\$ 6.336.637,25		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
DA A MURO	UND	16,10	\$ 384.913,82	\$ 6.358.112,53	16,10	\$ 6.358.112,53		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
BLE	UND	1,00	\$ 635.642,83	\$ 635.642,83	1,00	\$ 635.642,83		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
QUITECTONICO - PC-01 - 1,73 X 2,45m	UND	1,00	\$ 1.672.064,38	\$ 1.672.064,38	1,00	\$ 1.672.064,38		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
QUITECTONICO - PC-02 - 2,50 X 2,45m	UND	1,00	\$ 2.416.277,99	\$ 2.416.277,99	1,00	\$ 2.416.277,99		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
DO SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO	UND	1,00	\$ 1.831.943,64	\$ 1.831.943,64	1,00	\$ 1.831.943,64		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
DO SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO	UND	1,00	\$ 3.245.728,37	\$ 3.245.728,37	1,00	\$ 3.245.728,37		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
DO SEGÚN DETALLE ARQUITECTONICO -	M2	18,37	\$ 794.026,38	\$ 14.588.264,64	18,37	\$ 14.588.264,64		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	
LUYE MARCO METALICO	UND	1,00	\$ 1.317.750,14	\$ 1.317.750,14	1,00	\$ 1.317.750,14		-	\$ -		-	\$ -		-	\$ -	



DIRECTOR DE OBRA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA



CONTRATO No:

PN DIRAF No.06-6-10295-23

CONTRATISTA:

CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

CAPITULO

3. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRÁNEAS

ITEM	N.
------	----

© 2006 The Authors
Journal compilation © 2006 Blackwell Publishing Ltd

DESCRIPCION	
1.00	1.00
2.00	2.00
3.00	3.00
4.00	4.00
5.00	5.00
6.00	6.00
7.00	7.00
8.00	8.00
9.00	9.00
10.00	10.00
11.00	11.00
12.00	12.00
13.00	13.00
14.00	14.00
15.00	15.00
16.00	16.00
17.00	17.00
18.00	18.00
19.00	19.00
20.00	20.00
21.00	21.00
22.00	22.00
23.00	23.00
24.00	24.00
25.00	25.00
26.00	26.00
27.00	27.00
28.00	28.00
29.00	29.00
30.00	30.00
31.00	31.00
32.00	32.00
33.00	33.00
34.00	34.00
35.00	35.00
36.00	36.00
37.00	37.00
38.00	38.00
39.00	39.00
40.00	40.00
41.00	41.00
42.00	42.00
43.00	43.00
44.00	44.00
45.00	45.00
46.00	46.00
47.00	47.00
48.00	48.00
49.00	49.00
50.00	50.00
51.00	51.00
52.00	52.00
53.00	53.00
54.00	54.00
55.00	55.00
56.00	56.00
57.00	57.00
58.00	58.00
59.00	59.00
60.00	60.00
61.00	61.00
62.00	62.00
63.00	63.00
64.00	64.00
65.00	65.00
66.00	66.00
67.00	67.00
68.00	68.00
69.00	69.00
70.00	70.00
71.00	71.00
72.00	72.00
73.00	73.00
74.00	74.00
75.00	75.00
76.00	76.00
77.00	77.00
78.00	78.00
79.00	79.00
80.00	80.00
81.00	81.00
82.00	82.00
83.00	83.00
84.00	84.00
85.00	85.00
86.00	86.00
87.00	87.00
88.00	88.00
89.00	89.00
90.00	90.00
91.00	91.00
92.00	92.00
93.00	93.00
94.00	94.00
95.00	95.00
96.00	96.00
97.00	97.00
98.00	98.00
99.00	99.00
100.00	100.00

Downloaded from <http://ajphaphysocpharm.sagepub.com> at 10:06 11 November 2014

10.1111/j.1365-3113.2011.04591.x

UNB

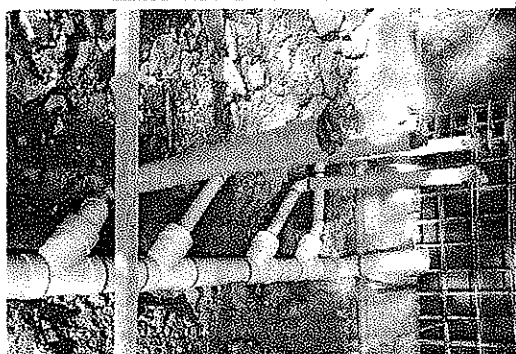
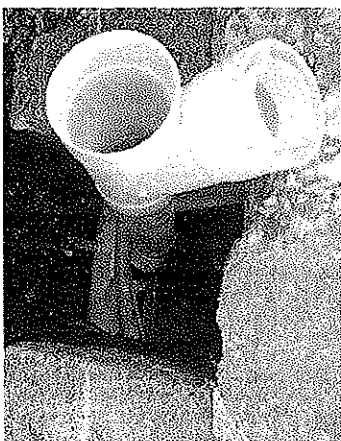
3	3.11
---	------

ACCESORIOS TUBERIA DE DRENAJE 4"

1000

END

FOTOGRAFIA - PLANOS



ACTA N.º 3

DIA

MES

AÑO

30

7

2024

OBRA

CANTID

SUMA

.....

8

8

OBSERVACIONES:

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORRI

88

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

8

CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO

REP. LEGAL CONSTRUCCIONES SAS

LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS



CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE



CONTRATO No:

PN DIRAF No.06-6-10295-23

CONTRATISTA:

CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENTOR

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

CAPITULO

3. DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS

N°

ITEM

DESCRIPCION

UND

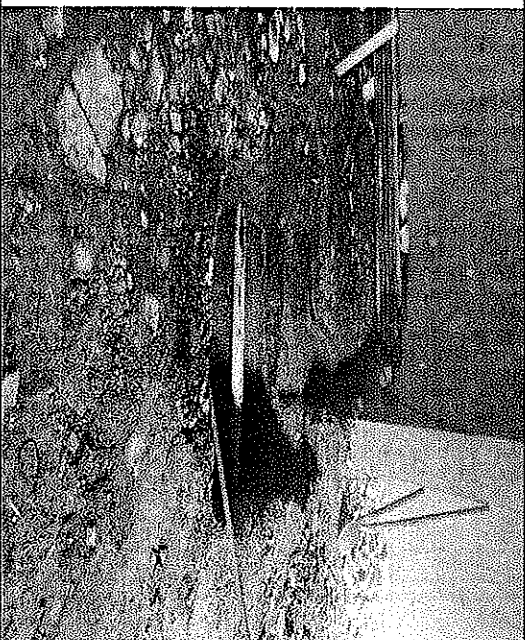
3

SUMINISTRO E INSTALACION CAJAS DE INSPECCIÓN AGUAS RESIDUALES (0.80X0.80)M

UND

FOTOGRAFIA - PLANOS

ACTA N° 3



OBSERVACIONES:

FECHA ACTA		DIA	MES	AÑO
UBICACIÓN		30	7	2024
ELEMENTO		OBRA		
MODULO 2		CANTIDAD		SUMA
Caja Inspección Sotano			1	1,0
Caja Inspección casa de la cultura			2	2,0
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE				3
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA				3
CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO				
REP LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS				

LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

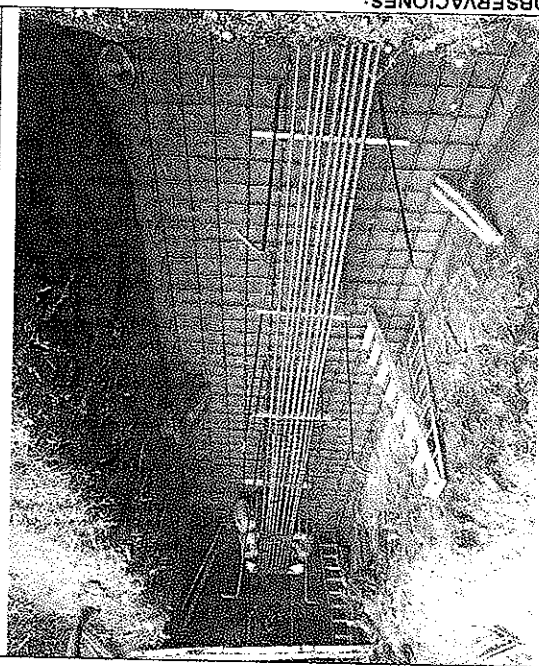
LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJABIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE																																																																								
		PN DIRAF No.06-6-10296-23																																																																								
CONTRATO No:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S																																																																								
CONTRATISTA:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S																																																																								
INTERVENTOR																																																																										
CAPITULO		DESAGÜES E INSTALACIONES SUBTERRANEAS																																																																								
Nº	ITEM	DESCRIPCION																																																																								
3	3.3.1	RETIRO MATERIAL DE EXCAVACION																																																																								
		UND	M3																																																																							
ACTA N.º 3																																																																										
FOTOGRAFIA - PLANOS		<table border="1"> <tr> <td colspan="2">FECHA ACTA</td> <td colspan="2">UBICACION</td> </tr> <tr> <td>ANO</td> <td>MES</td> <td>DIA</td> <td>OBRA</td> </tr> <tr> <td>2024</td> <td></td> <td>30</td> <td>7</td> </tr> </table>			FECHA ACTA		UBICACION		ANO	MES	DIA	OBRA	2024		30	7																																																										
FECHA ACTA		UBICACION																																																																								
ANO	MES	DIA	OBRA																																																																							
2024		30	7																																																																							
OBSERVACIONES: Para optimizar los recursos del proyecto y de acuerdo a lo realizado en obra, el retiro de material de excavacion es de 873,34 solo se paga el 52% ya que no se utilizo maquinaria y se relleno el lote vecino el cual autorizo su disposicion, por lo cual la cantidad es de 332,58		<table border="1"> <tr> <td>ELEMENTO</td> <td>LOCALIZACION</td> <td>CANTIDAD</td> <td>LARGO</td> <td>ALTO</td> <td>ANCHO</td> <td>SUMA</td> </tr> <tr> <td>EXCAVACION CIMENTACION ITEM 2.1.5</td> <td>1023,75</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>1023,75</td> </tr> <tr> <td>EXCAVACION PARA DESAGUES ITEM 3.1.1</td> <td>49,42</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>49,42</td> </tr> <tr> <td>RELLENOS EXCAVACIONES ITEMS 3.2.6</td> <td>-199,83</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-199,83</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD TOTAL</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>873,34</td> </tr> <tr> <td>PORCENTAJE RESTANTE</td> <td>52%</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>454,14</td> </tr> <tr> <td>CANTIDAD ACTA 1</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td>-60,78</td> </tr> <tr> <td colspan="7">CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE</td> </tr> <tr> <td colspan="7">CANTIDAD TOTAL EJECUTADA</td> </tr> <tr> <td colspan="7">332,58</td> </tr> </table>			ELEMENTO	LOCALIZACION	CANTIDAD	LARGO	ALTO	ANCHO	SUMA	EXCAVACION CIMENTACION ITEM 2.1.5	1023,75					1023,75	EXCAVACION PARA DESAGUES ITEM 3.1.1	49,42					49,42	RELLENOS EXCAVACIONES ITEMS 3.2.6	-199,83					-199,83	CANTIDAD TOTAL						873,34	PORCENTAJE RESTANTE	52%					454,14	CANTIDAD ACTA 1						-60,78	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE							CANTIDAD TOTAL EJECUTADA							332,58						
		ELEMENTO	LOCALIZACION	CANTIDAD	LARGO	ALTO	ANCHO	SUMA																																																																		
		EXCAVACION CIMENTACION ITEM 2.1.5	1023,75					1023,75																																																																		
		EXCAVACION PARA DESAGUES ITEM 3.1.1	49,42					49,42																																																																		
		RELLENOS EXCAVACIONES ITEMS 3.2.6	-199,83					-199,83																																																																		
		CANTIDAD TOTAL						873,34																																																																		
		PORCENTAJE RESTANTE	52%					454,14																																																																		
		CANTIDAD ACTA 1						-60,78																																																																		
		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE																																																																								
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA																																																																								
332,58																																																																										
REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS			CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO																																																																							
MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS																																																																										

		CONTRATO NO:		PN DIRAF No.06-6-10296-23		CONTRATISTA:		CONSTRUCCAM CONSTRUCCIONES S.A.S		INTERVENIOR:		CAPITULO		ITEM		N°	
ACERO 60.000 PSI/420 MPA																	
29.1																	
DESCRIPCION																	
UND																	
KG																	
ACTA N° 3																	
FECHA ACTA																	
UBICACION																	
ELEMENTO																	
DIAMETRO																	
CANTIDAD																	
LONGITUD																	
TRASLAPPO																	
LONG. TOTAL																	
PESOML																	
SUMA																	
8843.18455																	
VIGAS CIMENTACION																	
VIGA 1000																	
No.5																	
4.00																	
7.30																	
1.10																	
33.60																	
2.235																	
75.10																	
FLEJES																	
No.3																	
25.00																	
1.20																	
30.00																	
0.56																	
16.80																	
VIGA 1001																	
No.5																	
4.00																	
8.10																	
1.10																	
36.80																	
2.235																	
82.25																	
FLEJES																	
No.3																	
32.00																	
1.20																	
38.40																	
0.56																	
21.60																	
VIGA 1002																	
No.5																	
4.00																	
6.10																	
1.10																	
36.80																	
2.235																	
82.25																	
FLEJES																	
No.3																	
32.00																	
1.20																	
38.40																	
0.56																	
21.60																	
VIGA 1003																	
No.5																	
4.00																	
7.25																	
1.10																	
33.40																	
2.235																	
74.65																	
FLEJES																	
No.3																	
25.00																	
1.20																	
30.00																	
0.56																	
16.80																	
VIGA 1004																	
No.8																	
2.00																	
8.20																	
1.60																	
19.80																	
3.042																	
59.82																	
FLEJES																	
No.3																	
30.00																	
1.20																	
36.00																	
0.56																	
20.16																	
VIGA 1005																	
No.7																	
4.00																	
8.00																	
1.60																	
38.40																	
3.042																	
116.81																	
FLEJES																	
No.3																	
29.00																	
1.20																	
34.80																	
0.56																	
19.49																	
VIGA 1006																	
No.5																	
5.00																	
4.70																	
28.20																	
2.235																	
63.03																	
VIGA 1006																	
No.5																	
6.00																	
9.40																	
1.10																	
63.00																	
2.235																	
140.81																	
FLEJES																	
No.3																	
93.00																	
2.40																	
223.20																	
0.56																	
124.99																	
VIGA 1007																	
No.5																	
5.00																	
9.80																	
1.10																	
66.40																	
2.235																	
146.17																	
VIGA 1007																	
No.5																	
5.00																	
4.10																	
24.80																	
2.235																	
54.98																	
FLEJES																	
No.3																	
69.00																	
2.40																	
166.60																	
0.56																	
92.74																	
VIGA 1008																	
No.5																	
6.00																	
9.60																	
1.10																	
84.20																	
2.235																	
143.49																	
VIGA 1008																	
No.5																	
6.00																	
4.10																	
24.60																	
2.235																	
54.98																	
FLEJES																	
No.3																	
88.00																	
2.40																	
211.20																	
0.56																	
118.27																	
VIGA 1009																	
No.5																	
3.00																	
9.60																	
1.10																	
32.10																	
2.235																	
71.74																	
VIGA 1009																	
No.5																	
3.00																	
9.60																	
1.60																	
34.35																	
3.042																	
104.49																	
VIGA 1009																	
No.7																	
3.00																	
9.60																	
4.30																	
3.00																	
93.00																	
2.40																	
9.86																	
FLEJES																	
No.3																	
93.00																	
2.40																	
223.20																	
0.56																	
124.99																	
GANCHO																	
No.4																	
4.00																	
2.40																	
9.92																	
0.994																	
9.86																	
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE																	
2.003.79																	
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA																	
10.846.97																	
CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO SAS																	
REF. LEGAL CONSTRUCCAM CONSTRUCCIONES SAS																	
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S																	
DIRECTOR DE INTERVENTORIA																	
LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ																	
DIRECTOR DE OBRA																	
OBSERVACIONES:																	

67
R

		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJABIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE																																																																																																																																																													
CONTRATO No:		PN DIRAF No. 06-6-10296-23																																																																																																																																																													
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S																																																																																																																																																													
INTERVENIOR:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S																																																																																																																																																													
CAPITULO:		2 CIMENTACION																																																																																																																																																													
N°		ITEM		DESCRIPCION																																																																																																																																																											
		29.1		ACERO 60.000 PSI/420 MPA																																																																																																																																																											
KG		UND																																																																																																																																																													
FOTOGRAFIA - PLANOS																																																																																																																																																															
																																																																																																																																																															
OBSERVACIONES:																																																																																																																																																															
<table><tr><td colspan="2">CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE</td><td colspan="2">6,959.21</td></tr><tr><td colspan="2">CANTIDAD TOTAL EJECUTADA</td><td colspan="2">8,843.18</td></tr></table>						CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE		6,959.21		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		8,843.18																																																																																																																																																			
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE		6,959.21																																																																																																																																																													
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		8,843.18																																																																																																																																																													
<table><tr><td colspan="2">FECHA ACTA</td><td colspan="2">UBICACION</td><td colspan="2">OBRA</td></tr><tr><td colspan="2">ANO</td><td colspan="2">DIA</td><td colspan="2">MES</td></tr><tr><td colspan="2">2024</td><td colspan="2">30</td><td colspan="2">7</td></tr></table>						FECHA ACTA		UBICACION		OBRA		ANO		DIA		MES		2024		30		7																																																																																																																																									
FECHA ACTA		UBICACION		OBRA																																																																																																																																																											
ANO		DIA		MES																																																																																																																																																											
2024		30		7																																																																																																																																																											
<table><tr><td colspan="2">ZAPATA 9</td><td colspan="2">No. 5</td><td colspan="2">16.00</td><td colspan="2">11.50</td><td colspan="2">2.20</td><td colspan="2">2.25</td><td colspan="2">489.91</td></tr><tr><td colspan="2">ZAPATA 9</td><td colspan="2">No. 8</td><td colspan="2">16.00</td><td colspan="2">1.80</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2.25</td><td colspan="2">64.37</td></tr><tr><td colspan="2">ZAPATA 10</td><td colspan="2">No. 6</td><td colspan="2">14.00</td><td colspan="2">11.50</td><td colspan="2">2.20</td><td colspan="2">2.25</td><td colspan="2">2508.15</td></tr><tr><td colspan="2">ZAPATA 10</td><td colspan="2">No. 6</td><td colspan="2">14.00</td><td colspan="2">1.80</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2.25</td><td colspan="2">428.67</td></tr><tr><td colspan="2">ZAPATA 10</td><td colspan="2">No. 6</td><td colspan="2">14.00</td><td colspan="2">1.80</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2.25</td><td colspan="2">56.32</td></tr><tr><td colspan="2">ZAPATA 11</td><td colspan="2">No. 5</td><td colspan="2">14.00</td><td colspan="2">4.05</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">3.973</td><td colspan="2">1271.16</td></tr><tr><td colspan="2">ZAPATA 11</td><td colspan="2">No. 7</td><td colspan="2">58.00</td><td colspan="2">3.75</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">1.552</td><td colspan="2">299.85</td></tr><tr><td colspan="2">ZAPATA 12</td><td colspan="2">No. 5</td><td colspan="2">12.00</td><td colspan="2">11.95</td><td colspan="2">1.80</td><td colspan="2">1.552</td><td colspan="2">256.08</td></tr><tr><td colspan="2">ZAPATA 12</td><td colspan="2">No. 6</td><td colspan="2">58.00</td><td colspan="2">3.25</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">2.235</td><td colspan="2">421.30</td></tr><tr><td colspan="2">ZAPATA 13</td><td colspan="2">No. 5</td><td colspan="2">10.00</td><td colspan="2">11.90</td><td colspan="2">1.80</td><td colspan="2">1.552</td><td colspan="2">212.62</td></tr><tr><td colspan="2">ZAPATA 13</td><td colspan="2">No. 5</td><td colspan="2">46.00</td><td colspan="2">3.55</td><td colspan="2"></td><td colspan="2">1.552</td><td colspan="2">289.14</td></tr></table>						ZAPATA 9		No. 5		16.00		11.50		2.20		2.25		489.91		ZAPATA 9		No. 8		16.00		1.80				2.25		64.37		ZAPATA 10		No. 6		14.00		11.50		2.20		2.25		2508.15		ZAPATA 10		No. 6		14.00		1.80				2.25		428.67		ZAPATA 10		No. 6		14.00		1.80				2.25		56.32		ZAPATA 11		No. 5		14.00		4.05				3.973		1271.16		ZAPATA 11		No. 7		58.00		3.75				1.552		299.85		ZAPATA 12		No. 5		12.00		11.95		1.80		1.552		256.08		ZAPATA 12		No. 6		58.00		3.25				2.235		421.30		ZAPATA 13		No. 5		10.00		11.90		1.80		1.552		212.62		ZAPATA 13		No. 5		46.00		3.55				1.552		289.14	
ZAPATA 9		No. 5		16.00		11.50		2.20		2.25		489.91																																																																																																																																																			
ZAPATA 9		No. 8		16.00		1.80				2.25		64.37																																																																																																																																																			
ZAPATA 10		No. 6		14.00		11.50		2.20		2.25		2508.15																																																																																																																																																			
ZAPATA 10		No. 6		14.00		1.80				2.25		428.67																																																																																																																																																			
ZAPATA 10		No. 6		14.00		1.80				2.25		56.32																																																																																																																																																			
ZAPATA 11		No. 5		14.00		4.05				3.973		1271.16																																																																																																																																																			
ZAPATA 11		No. 7		58.00		3.75				1.552		299.85																																																																																																																																																			
ZAPATA 12		No. 5		12.00		11.95		1.80		1.552		256.08																																																																																																																																																			
ZAPATA 12		No. 6		58.00		3.25				2.235		421.30																																																																																																																																																			
ZAPATA 13		No. 5		10.00		11.90		1.80		1.552		212.62																																																																																																																																																			
ZAPATA 13		No. 5		46.00		3.55				1.552		289.14																																																																																																																																																			
ACTA N° 3																																																																																																																																																															
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S																																																																																																																																																															
CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S																																																																																																																																																															
CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO																																																																																																																																																															
RECTORAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS																																																																																																																																																															
DIRECTOR DE OBRAS																																																																																																																																																															
LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ																																																																																																																																																															
DIRECTOR DE INTERVENTORIA																																																																																																																																																															
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S																																																																																																																																																															



MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS

CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS
SIN
FORMULA DE REAJUSTE



CONTRATO No:

PN DIRAF No.06-6-10295-23

CONTRATISTA:

CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S

INTERVENIOR

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

CAPITULO

2. CIMENTACION

Nº ITEM

2.9.1 ACERO 60 000 PSI/420 MPA

DESCRIPCION

UND

KG

FOTOGRAFIA - PLANOS

ACTA N° 3

FECHA ACTA

DIA

30

MES

7

AÑO

2024

UBICACION

CANTIDAD

ELEMENTO

DIAMETRO

CANTIDAD

VARILLAS

LONGITUD

LONG. TOTAL

PESOML

SUMA

3

ZAPATA 1

No.5

34,00

3,30

112,20

1,552

522,4032

1

ZAPATA 2

No.5

14,00

1,80

25,20

1,552

39,1104

1

ZAPATA 3

No.5

10,00

3,40

34,00

1,552

52,768

1

ZAPATA 3

No.5

14,00

2,40

33,60

1,552

52,1472

4

ZAPATA 4

No.5

12,00

3,90

46,80

1,552

290,5344

4

ZAPATA 4

No.5

22,00

2,20

48,40

1,552

300,4672

2

ZAPATA 5

No.5

8,00

3,30

26,40

1,552

81,9456

2

ZAPATA 5

No.5

16,00

1,80

28,80

1,552

89,3852

2

ZAPATA 6

No.5

8,00

1,50

12,00

1,552

37,248

2

ZAPATA 6

No.5

6,00

1,80

10,80

1,552

33,5232

1

ZAPATA 7

No.5

23,00

2,60

59,80

1,552

92,8096

1

ZAPATA 7

No.5

14,00

4,10

57,40

1,552

89,0848

1

ZAPATA 8

No.5

15,00

4,20

63,00

1,552

97,776

1

ZAPATA 8

No.5

25,00

2,70

67,50

1,552

104,76

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE

1.883,97

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA

1.883,97

OBSERVACIONES:



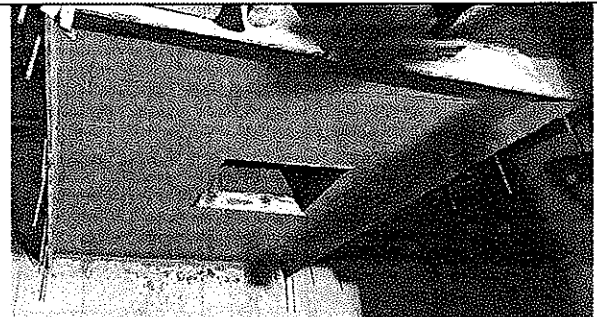
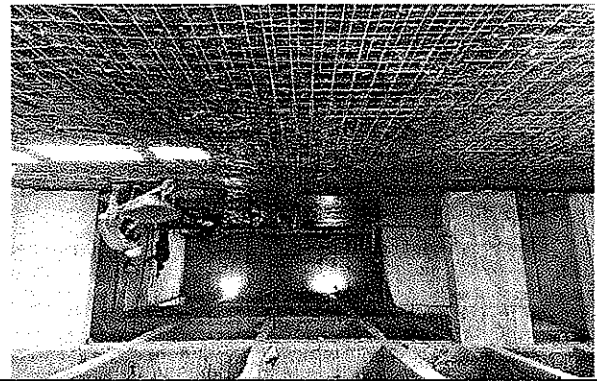
LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA

CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO
REP. LEGAL CONSTRUCCAM CONSTRUCCIONES SAS


GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

68
m

LEONEL RAUL POVEDA
DIRECTOR DE OBRA
HERNANDEZ
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

			
CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			
PN DIRAF No.06-6-10295-23			
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S	
INTERVENTOR:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S	
CAPITULO		CIMENTACION	
Nº	ITEM	DESCRIPCION	
	2.6.12	PLACA DE CONTRAPISO E=10CM	
UND		M2	
MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS			
CONTRATO No:			
FOTOGRAFIA - PLANOS			
OBSERVACIONES:			
 			
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE			
178.42			
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			
178.42			
CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO			
REP. LEGAL CONSTRUCCIONES SAS			

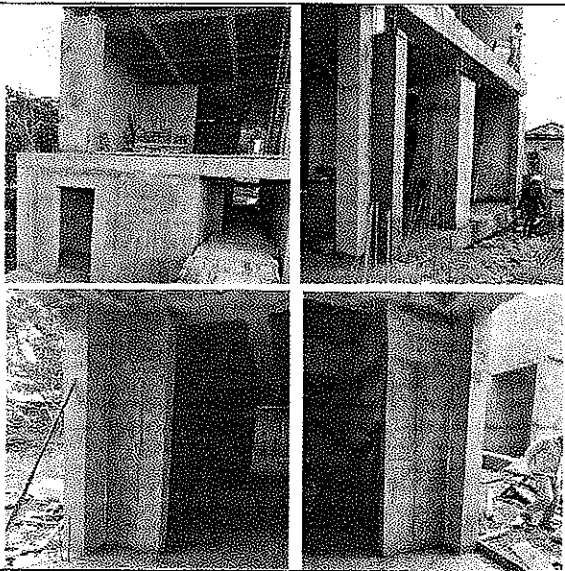


RAUL POVEDA HE

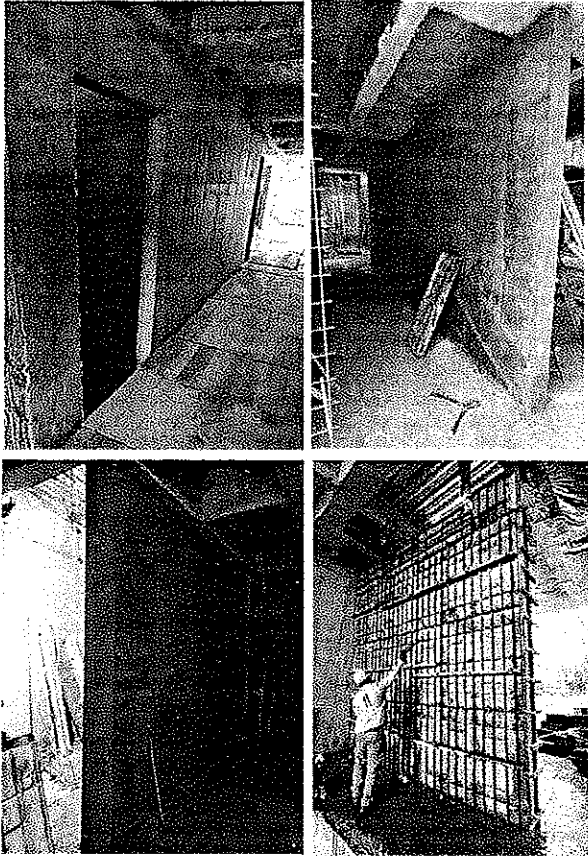




CONSTRUCTORA CONSTRUC
C. MONTESINOS
CONSTRUC

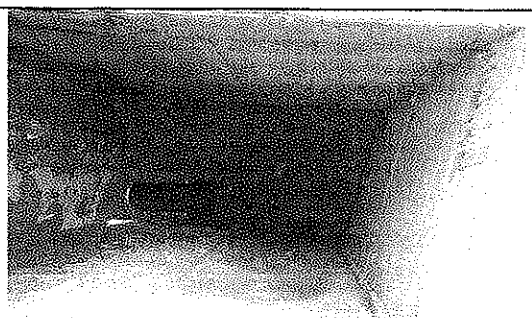
[illegible]


189
32
RW

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS							
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE					
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23					
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S					
INTERVENTOR:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S					
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA					
N°	ITEM	DESCRIPCION			UND		
4	4.2.22	MURO NO ESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 4000 PSI E=20CM			M2		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3					
		FECHA ACTA		DIA	MES	AÑO	
				30	7	2024	
		UBICACION					
		ELEMENTO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO	SUMA
		MUROS B-1 N+005	EJE 5 ENTRE A Y B	5,48	0,2	3,60	19,73
			EJE 5 ENTRE B Y C	5,35	0,2	3,60	19,26
			PUERTA	-0,9	0,2	3,00	-2,70
			EJE 4 Y B	0,4	0,2	3,60	1,44
			EJE 1 EN B	1,4	0,2	3,10	4,34
			EJE 1 EN C	0,6	0,2	3,10	1,86
	EJE 1 EN B	0,4	0,2	3,10	1,24		
	EJE 1 ENTRE A Y B	0,95	0,2	3,10	2,95		
	EJE 1 EN A	0,405	0,2	3,10	1,26		
		MUROS B-1 N+400	EJE 4 EN C	1,32	0,2	5,07	6,69
			EJE 4 EN A	1,32	0,2	5,07	6,69
			EJE 4 EN B	2,41	0,2	5,07	12,22
		MUROS B-2 N+6,25	EJE 10 EN C	0,7	0,2	3,00	2,10
			EJE 10 EN A	0,5	0,2	3,00	1,50
		CANTIDAD ACTA 1				-30,00	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE				78,57	
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA				48,57	
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS					
 LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA		 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA					


MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS						
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE				
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23				
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S				
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S				
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA				
N°	ITEM	DESCRIPCION			UND	
4	4.2.23	MURO NO ESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 4000 PSI E=15CM			M2	
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3				
		FECHA ACTA		DÍA	MES	AÑO
				30	7	2024
		UBICACIÓN				
		ELEMENTO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	ALTO
MUROS:B1 - PISO 1		EJE B ENTRE 4 Y 6	2,2	0,15	3,6	7,92
		CIERRE CELDA HOMBRES	1,91	0,15	3,6	6,876
		EJE 2 ENTRE B Y C (ASEO)	1,62	0,15	3,6	5,832
		EJE B ENTRE 2 Y 3	7,4	0,15	3,6	26,64
		EJE B ENTRE 2 Y 3 (PUERTA1)	0,75	0,15	3,07	-2,3025
		EJE B ENTRE 2 Y 3 (PUERTA2)	1,02	0,15	3,07	-3,1314
		EJE 3 ENTRE B Y C	1,45	0,15	3,6	5,22
		DIVISION CELDAS HOMBRE Y MUJER	3,11	0,15	3,6	11,196
		DINTELES CELDAS	3,64	0,15	1,01	3,6784
		EJE B ENTRE 3 Y 4	3,25	0,15	3,6	11,7
		EJE 1 Y 2 ENTRE B Y C	3,9	0,15	3,6	14,04
MUROS:B1 - PISO 2:		EJES 1 Y 2 ENTRE B Y C	4,33	0,15	4,1	17,753
MUROS:B-2-N-6,25		EJE 8 Y 9 ENTRE B Y C	5,3	0,15	3,1	16,43
		EJE 9 Y 10 ENTRE B Y C	5,8	0,15	3,1	17,98
CANTIDAD ACTA 1						-30
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE				139,83
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA				109,83
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS				
						
LEONEL RAÚL POVEDA HERNÁNDEZ DIRECTOR DE OBRA		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA				

144
73
Pw

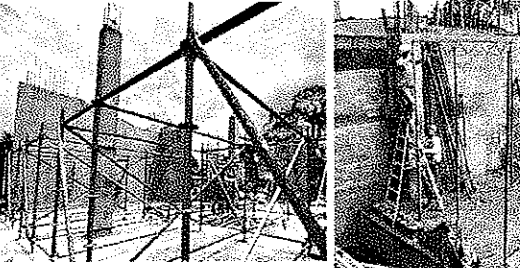



MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS					
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23			
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S			
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA			
N°	ITEM	DESCRIPCION		UND	
	4.2.25	MURO NO ESTRUCTURAL EN CONCRETO DE 4000 PSI E=10CM		M2	
FOTOGRAFIA - PLANOS					
		ACTA N° 3			
		FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
			30	7	2024
		UBICACIÓN			
		CAJA DE INSPECCION BLOQUE 1			
		ELEMENTO	LARGO	ANCHO	ALTO
MURO		1,00	-1,00	-1,00	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE			-1,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			-1,00
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO			
		REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS			



LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA



GORDILLO & ASOCIADOS
S.A.S
DIRECTOR DE
INTERVENTORIA

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS														
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE												
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-8-10295-23												
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S												
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S												
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA												
N°	ITEM	DESCRIPCION	UND											
	4.2.31	COLUMNAS RECTANGULARES EN CONCRETO DE 4000 PSI	M3											
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3												
    		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th colspan="2" style="text-align: center;">FECHA ACTA</th> <th style="text-align: center;">DÍA</th> <th style="text-align: center;">MES</th> <th style="text-align: center;">AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td style="text-align: center;">30</td> <td style="text-align: center;">7</td> <td style="text-align: center;">2024</td> </tr> </tbody> </table>			FECHA ACTA		DÍA	MES	AÑO			30	7	2024
		FECHA ACTA		DÍA	MES	AÑO								
				30	7	2024								
		UBICACIÓN			BLOQUE 1									
		ELEMENTO	LOCALIZACIÓN	LADO	LADO	ALTO								
		COLUMNA	C1	0,4	0,4	8,88								
			C2	0,4	0,4	11								
			C3	0,4	0,4	12,22								
			C4	0,3	0,4	6,9								
			C4	0,3	0,4	6,9								
			C4	0,3	0,4	6,9								
			C5	0,5	0,5	10,95								
			C5	0,5	0,5	10,95								
		COLUMNETAS MUROS MAMPOSTERIA BLOQUE												
		MÓDULO 1												
PISO 1	21,00	0,12	0,25	3,07										
PISO 1'	9,00	0,12	0,25	3,07										
PISO 1''	1,00	0,12	0,25	0,77										
PISO 1'''	3,00	0,12	0,25	1,61										
PISO 2	11,00	0,12	0,25	3,07										
PISO 2'	3,00	0,12	0,25	4,15										
PISO 2''	3,00	0,12	0,25	4,46										
MÓDULO 2														
SOTANO	10,00	0,12	0,25	2,57										
SOTANO'	3,00	0,12	0,25	1,53										
ADICION	5,00	0,12	0,25	2,83										
VIGA CINTA DE MUROS MAMPOSTERIA BLOQUE														
PISO 1														
GUARDIA RADIOS	0,12	0,25	11,92	0,3576										
TABLEROS ELECTRICOS	0,12	0,25	3,59	0,1077										
PLANTA ELECTRICA	0,12	0,25	9,80	0,2940										
ZONA SEGURIDAD	0,12	0,25	1,00	0,0300										
CELDA	0,12	0,25	5,06	0,1818										
CIRCULACION	0,12	0,25	12,00	0,3600										
ATE. CIUDADANO	0,12	0,25	4,64	0,1392										
BASURAS	0,12	0,25	3,73	0,1119										
PISO 2														
ARCHIVOS	0,12	0,25	5,70	0,1710										
CCTV	0,12	0,25	11,56	0,3465										
TELECOMUNICACIONES	0,12	0,25	2,16	0,0648										
BAÑOS	0,12	0,25	5,50	0,1650										
CIRCULACION	0,12	0,25	11,02	0,3305										
SALA MULTIPLE	0,12	0,25	11,02	0,3305										
CANTIDAD ACTA 1				-10,00										
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE			21,82									
		CORTE												
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			11,82									
														
LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS												
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA														

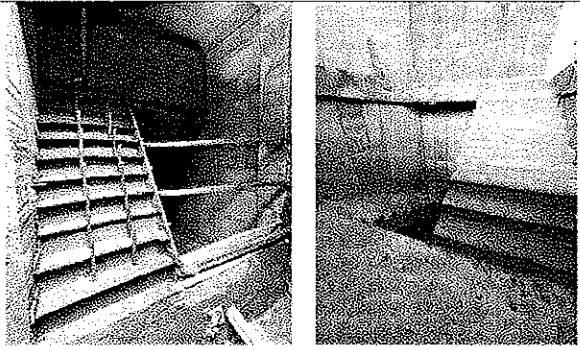
MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS							
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE					
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23					
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S					
INTERVENTOR:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S					
CAPITULO		ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA					
N°	ITEM	DESCRIPCION			UND		
	4.5.1	LOSA ALIGERADA SIN TORTA INFERIOR EN CONCRETO DE 4000 PSI H=0,70 m compuesta por una Losa			M2		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N°.3					
		FECHA ACTA		DIA	MES	AÑO	
				30	7	2024	
		UBICACIÓN		BLOQUE 1			
		ELEMENTO	LOCALIZACION	LARGO	ANCHO	CANTIDAD	SUMA
		LOSA PISO 2 N+2,20		23,5	11,5	1	270,25
		VACIO ESCALERA		5,24	2,95	-1	-15,46
		VACIO MARQUESINA		6,42	3,95	-1	-25,36
		VACIO DUCTOS		0,25	1,4	-2	-0,70
VACIO DUCTOS SANITARIOS		1,32	0,15	-2	-0,40		
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE				228,34	
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA				228,34	
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS					


LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ
DIRECTOR DE OBRA


REP. LEGAL CONSTRUCAI

Lucas Aro
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

194

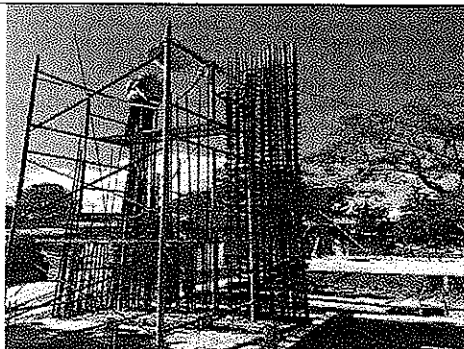
MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS																																																																																							
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE																																																																																					
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10296-23																																																																																					
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S																																																																																					
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S																																																																																					
CAPITULO		ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA																																																																																					
N°	ITEM	DESCRIPCION			UND																																																																																		
	4.6.1	ESCALERA EN CONCRETO - VOLUMEN ADMINISTRATIVO			M3																																																																																		
FOTOGRAFIA - PLANOS  ACTA N°3 <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">FECHA ACTA</th> <th>DIA</th> <th>MES</th> <th>AÑO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="2"></td> <td>30</td> <td>7</td> <td>2024</td> </tr> </tbody> </table> <table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="3">UBICACIÓN</th> <th colspan="3">BLOQUE 1</th> </tr> <tr> <th>ELEMENTO</th> <th>CANTIDAD</th> <th>LADO</th> <th>LADO</th> <th>ALTO</th> <th>SUMA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="6">ESCALERA PISO 1 A PISO 2</td> </tr> <tr> <td>PLACA PISO 1</td> <td></td> <td>1,6</td> <td>3,85</td> <td>0,2</td> <td>1,26</td> </tr> <tr> <td>ESCALONES P1</td> <td>11</td> <td>1,6</td> <td>0,3</td> <td>0,17</td> <td>0,45</td> </tr> <tr> <td>PLACA DESCA</td> <td></td> <td>1,63</td> <td>4</td> <td>0,2</td> <td>1,30</td> </tr> <tr> <td>PLACA PISO 2</td> <td></td> <td>1,4</td> <td>3,8</td> <td>0,2</td> <td>1,06</td> </tr> <tr> <td>ESCALONES P2</td> <td>11</td> <td>1,4</td> <td>0,3</td> <td>0,17</td> <td>0,39</td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>						FECHA ACTA		DIA	MES	AÑO			30	7	2024	UBICACIÓN			BLOQUE 1			ELEMENTO	CANTIDAD	LADO	LADO	ALTO	SUMA	ESCALERA PISO 1 A PISO 2						PLACA PISO 1		1,6	3,85	0,2	1,26	ESCALONES P1	11	1,6	0,3	0,17	0,45	PLACA DESCA		1,63	4	0,2	1,30	PLACA PISO 2		1,4	3,8	0,2	1,06	ESCALONES P2	11	1,4	0,3	0,17	0,39																								
FECHA ACTA		DIA	MES	AÑO																																																																																			
		30	7	2024																																																																																			
UBICACIÓN			BLOQUE 1																																																																																				
ELEMENTO	CANTIDAD	LADO	LADO	ALTO	SUMA																																																																																		
ESCALERA PISO 1 A PISO 2																																																																																							
PLACA PISO 1		1,6	3,85	0,2	1,26																																																																																		
ESCALONES P1	11	1,6	0,3	0,17	0,45																																																																																		
PLACA DESCA		1,63	4	0,2	1,30																																																																																		
PLACA PISO 2		1,4	3,8	0,2	1,06																																																																																		
ESCALONES P2	11	1,4	0,3	0,17	0,39																																																																																		
OBSERVACIONES:				CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE		4,47																																																																																	
				CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		4,47																																																																																	
				CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS																																																																																			

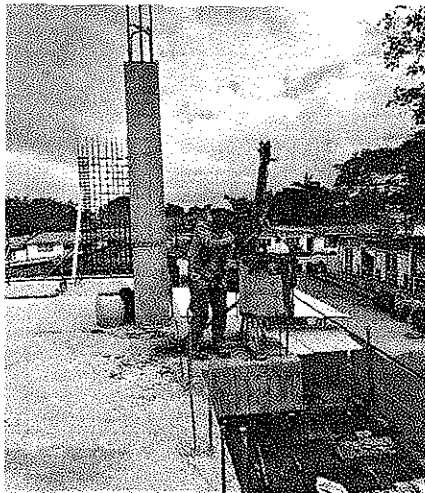

 LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ
 DIRECTOR DE OBRA


 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

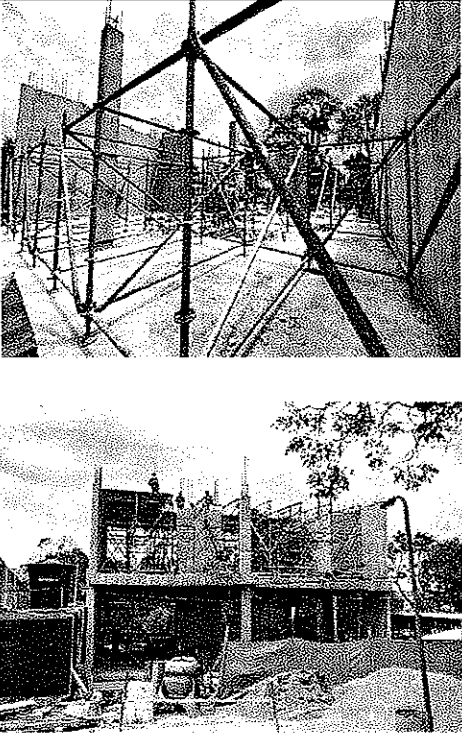
425
75
Rw



MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS									
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE							
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23							
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S							
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S							
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA							
N°	ITEM	DESCRIPCION							UND
	4.10.1	ACERO 60.000 PSI/420 MPA							KG

FOTOGRAFIA - PLANOS				ACTA N° 3							
				FECHA ACTA				DIA	MES	AÑO	
								30	7	2024	
				UBICACIÓN							
ELEMENTO PANTALLA	VARILLA No. MODULO 1	CANTIDAD	LONGITUD	TRASLAPO	LONG. TOTAL	PESO/ML	SUMA				
P1	4,00	8,00	1,80		14,40	0,994	28,6272				
	4,00	8,00	7,80	0,75	68,40	0,994	135,9792				
	4,00	8,00	3,10		24,80	0,994	49,3024				
	4,00	4,00	5,10		20,40	0,994	40,5552				
	4,00	4,00	6,80	0,75	30,60	0,994	60,8328				
x	4,00	8,00	3,70		29,60	0,994	58,8448				
	4,00	8,00	8,30	0,75	72,40	0,994	143,9312				
2	4,00	10,00	7,70	0,75	84,50	0,994	167,988				
	4,00	10,00	4,30		43,00	0,994	85,484				
	3,00	106,00	1,90		201,40	0,56	225,568				
	4,00	106,00	1,00		106,00	0,994	210,728				
	3,00	106,00	0,34		36,04	0,56	40,3648				
P2	3,00	265,00	0,34		90,10	0,56	100,912				
	8,00	6,00	2,70		16,20	3,973	128,7252				
	8,00	6,00	9,00	1,60	64,80	3,973	514,9008				
	8,00	6,00	4,00		24,00	3,973	190,704				
	7,00	6,00	6,00		36,00	3,042	219,024				
x	7,00	6,00	7,80	1,60	56,40	3,042	343,1376				
	4,00	8,00	4,00		32,00	0,994	63,616				
2	4,00	8,00	8,80	0,75	76,40	0,994	151,6832				
	4,00	10,00	8,00	0,75	87,50	0,994	173,95				
	4,00	10,00	4,80		48,00	0,994	95,424				
	3,00	114,00	1,90		216,60	0,56	242,692				
	4,00	145,00	1,00		145,00	0,994	288,26				
P3	3,00	145,00	0,34		49,30	0,56	55,216				
	3,00	285,00	0,34		96,90	0,56	108,528				
	7,00	12,00	2,80		33,60	3,04	102,2112				
	7,00	12,00	9,50	1,60	133,20	3,04	405,1944				
	7,00	12,00	3,90		46,80	3,04	142,3656				
x	7,00	12,00	6,40	1,60	96,00	3,04	292,032				
	7,00	12,00	8,40	1,60	120,00	3,04	365,04				
	4,00	6,00	8,60	0,75	56,10	0,99	55,7634				
	4,00	6,00	5,40		32,40	0,99	32,2056				
	4,00	6,00	4,50		27,00	0,99	26,838				
1	4,00	6,00	9,50	0,75	61,50	0,99	61,131				
	3,00	126,00	1,90		239,40	0,56	134,064				
	4,00	252,00	1,24		312,48	0,99	310,60512				
	3,00	315,00	0,34		107,10	0,56	59,976				
	6,00	6,00	6,00		36,00	2,24	80,46				
P4	6,00	6,00	8,30	1,10	56,40	2,24	126,054				
	5,00	6,00	2,50		15,00	1,55	23,28				
	5,00	6,00	9,30	0,90	61,20	1,55	94,9824				
	5,00	6,00	3,30		19,80	1,55	30,7296				
	4,00	8,00	4,50		36,00	0,99	35,784				
x	4,00	8,00	9,50	0,75	82,00	0,99	81,508				
	4,00	10,00	8,60	0,75	93,50	0,99	92,939				
	4,00	10,00	5,40		54,00	0,99	53,676				
	3,00	126,00	1,90		239,40	0,56	134,064				
	4,00	121,00	1,00		121,00	0,99	120,274				
1	3,00	121,00	0,34		41,14	0,56	23,0384				
	3,00	315,00	0,34		107,10	0,56	59,976				
	6,00	6,00	6,80	1,10	47,40	2,24	105,939				
	6,00	6,00	8,90	1,10	60,00	2,24	134,1				
	5,00	6,00	3,00		18,00	1,55	27,936				
P5	5,00	6,00	9,50	0,90	62,40	1,55	96,8448				

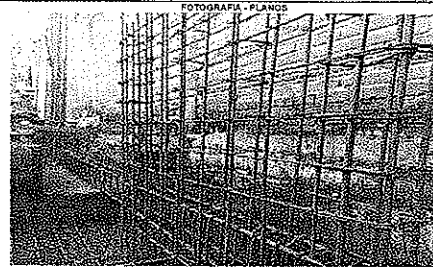
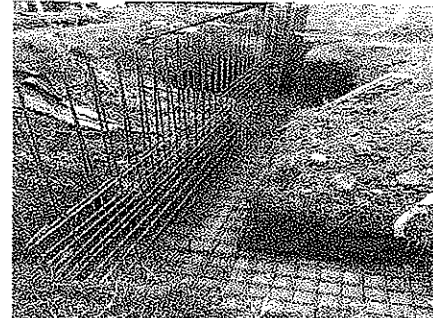
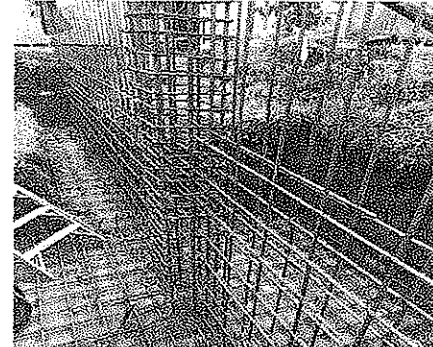
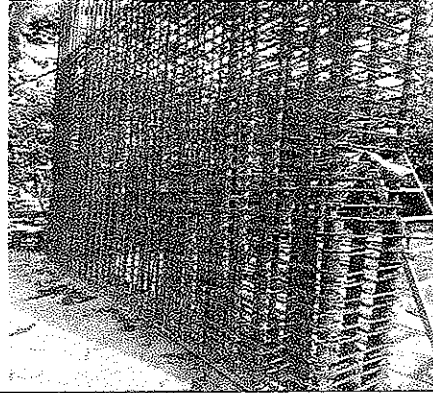
			
			

196

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS									
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE							
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23							
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S							
INTERVENTOR:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S							
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA							
N°	ITEM	DESCRIPCION					UND		
	4.10.1	ACERO 60.000 PSI/420 MPA					KG		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3							
			5,00	6,00	3,90		23,40	1,55	36,3168
			4,00	8,00	5,30		42,40	0,99	42,1456
		x	4,00	6,00	10,00	0,75	86,00	0,99	85,484
			4,00	10,00	9,20	0,75	99,50	0,99	98,903
			4,00	10,00	6,00		60,00	0,99	59,64
		2	3,00	138,00	1,90		262,20	0,66	146,832
			4,00	138,00	1,00		138,00	0,99	137,172
			3,00	138,00	0,34		46,92	0,66	26,2762
			3,00	345,00	0,34		117,30	0,66	66,688
			6,00	8,00	2,40		19,20	2,24	42,912
		P6	6,00	9,00	8,30	1,10	75,20	2,24	168,072
			6,00	8,00	3,50		26,00	2,24	62,68
			7,00	8,00	6,00		48,00	3,04	146,016
			7,00	8,00	7,60	1,60	73,60	3,04	223,8912
			4,00	10,00	4,00		40,00	0,99	39,76
		x	4,00	10,00	8,80	0,75	95,60	0,99	94,927
			4,00	10,00	8,00	0,75	87,60	0,99	86,975
			4,00	10,00	4,80		48,00	0,99	47,712
		1	3,00	118,00	2,25		265,50	0,66	148,68
			4,00	114,00	1,20		136,80	0,99	135,9792
			3,00	228,00	0,34		77,52	0,66	43,4112
			3,00	295,00	0,34		100,30	0,66	56,168
		P7	8,00	18,00	6,60	1,80	149,40	3,97	593,5662
			7,00	18,00	8,60	1,60	181,60	3,04	553,0366
			7,00	16,00	2,80		50,40	3,04	153,3168
			7,00	18,00	9,80	1,60	199,60	3,04	607,7916
			7,00	18,00	3,80		68,40	3,04	208,0728
			7,00	8,00	5,30		42,40	3,04	128,9808
		x	7,00	8,00	9,40	1,60	88,00	3,04	267,696
			7,00	8,00	5,30		42,40	3,04	128,9808
	7,00	8,00	5,30		42,40	3,04	128,9808		
1	7,00	8,00	5,60		44,00	3,04	133,848		
	3,00	170,00	2,35		399,60	0,66	223,72		
	4,00	124,00	1,20		148,60	0,99	147,9072		
	4,00	248,00	1,40		347,20	0,99	345,1168		
	3,00	340,00	0,34		116,60	0,66	64,736		
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE						12.915,38	
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA						12.915,38	
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS							

 LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA
--	--

147
76
Fw

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS									
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE							
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23							
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S							
INTERVENTOR:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S							
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA							
N°	ITEM	DESCRIPCION ACERO						UND	
4.10.1		60.000 PSI/420 MPA						KG	
		FECHA ACTA		AC N°		DIA	MES	AÑO	
		UBICACION				30	7	2024	
		ELEMENTO	VARILLA No.	CANTIDAD	LONGITUD	TRASLAP	LONG. TOTAL	PESO/ML	SUMA
		PANTALLA	MODULO 1						
		PANTALLAS MODULO 2							
		P8	7,00	22,00	9,60	1,60	246,40	3,04	1499,10
			7,00	22,00	9,60	1,60	246,40	3,04	1499,10
			6,00	22,00	4,80		105,60	2,24	472,03
6,00	22,00		9,60	1,60	246,40	2,24	1101,41		
		x	6,00	22,00	6,00		132,00	2,24	590,04
			4,00	20,00	7,20	0,75	159,00	0,99	316,09
			4,00	20,00	6,00		120,00	0,99	238,56
			4,00	18,00	7,20	0,75	143,10	0,99	284,48
		2	4,00	18,00	11,25	0,75	216,00	0,99	429,41
			3,00	42,00	4,60		193,20	0,56	216,38
			4,00	41,00	4,60		186,60	0,99	374,94
			4,00	569,00	1,28		728,32	0,99	1447,90
		P9	4,00	139,00	1,06		147,34	0,99	292,91
			10,00	12,00	9,80	4,50	171,60	6,40	1098,93
			10,00	12,00	9,50	2,25	141,00	6,40	902,96
			8,00	12,00	5,30		63,60	3,97	252,68
		x	8,00	12,00	9,50	1,80	135,60	3,97	538,74
			8,00	12,00	6,00		72,00	3,97	286,06
			7,00	20,00	7,90	1,60	190,00	3,04	577,98
			7,00	20,00	6,10	1,60	154,00	3,04	465,47
		1	5,00	20,00	6,00		120,00	1,55	186,24
			6,00	18,00	7,40	1,10	153,00	2,24	341,96
			6,00	16,00	10,90	1,10	216,00	2,24	482,75
			3,00	214,00	3,40		727,60	0,56	407,46
		P10	4,00	134,00	1,90		254,60	0,99	253,07
			3,00	272,00	0,44		119,68	0,56	67,02
			3,00	975,00	0,44		429,00	0,56	240,24
			10,00	5,00	9,80	4,50	71,50	6,40	457,89
		x	10,00	5,00	9,50	2,25	58,75	6,40	376,24
			10,00	5,00	5,40		27,00	6,40	172,91
			8,00	5,00	9,50	1,80	96,50	3,97	224,47
			8,00	5,00	6,00		30,00	3,97	119,19
		1	10,00	8,00	8,40	2,25	85,20	6,40	545,62
			10,00	5,00	9,80	4,50	71,50	6,40	457,89
			10,00	5,00	9,50	2,25	58,75	6,40	376,24
			10,00	5,00	5,40		27,00	6,40	172,91
		P10	8,00	5,00	9,50	1,80	96,50	3,97	224,47
			8,00	5,00	6,00		30,00	3,97	119,19
			10,00	10,00	8,40	2,25	106,50	6,40	682,03
			5,00	10,00	2,90		29,00	1,55	45,01
		x	6,00	10,00	2,90		29,00	2,24	64,82
			5,00	10,00	6,60	0,90	75,00	1,55	116,40
			4,00	10,00	6,00		60,00	0,99	58,64
			6,00	10,00	10,90	1,10	120,00	2,24	268,20
		1	6,00	18,00	6,00		108,00	2,24	241,36
			3,00	170,00	3,40		575,00	0,56	323,56
			4,00	40,00	3,20		128,00	0,99	127,23
			3,00	262,00	0,54		141,48	0,56	79,23
		x	4,00	40,00	2,80		112,00	0,99	111,33
			3,00	217,00	0,54		117,18	0,56	66,62
			4,00	30,00	1,90		57,00	0,99	56,66
			3,00	30,00	0,54		16,20	0,56	9,07
		1	3,00	176,00	0,54		95,04	0,56	53,22
			4,00	51,00	1,80		91,80	0,99	91,25

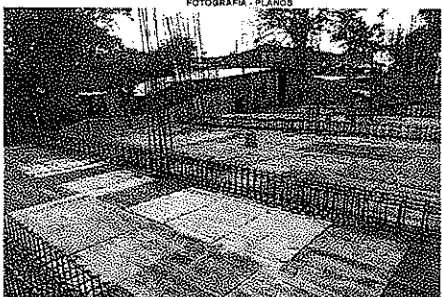

1

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS

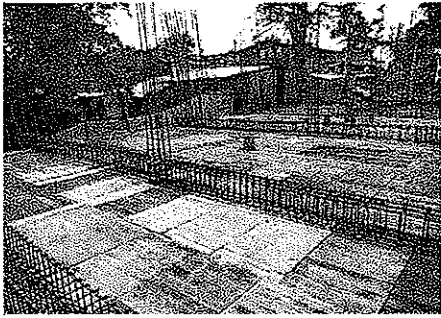
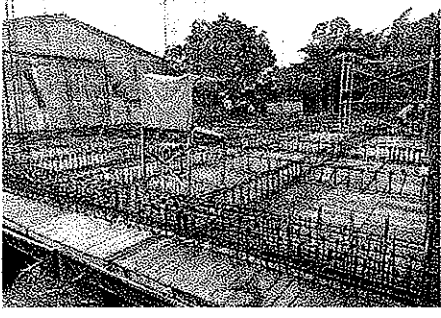
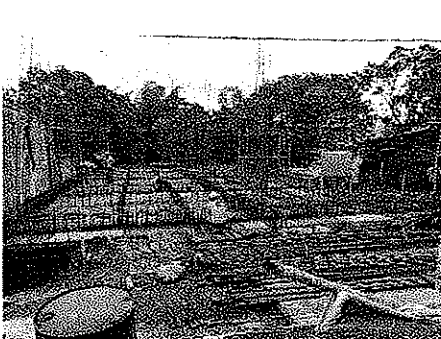


108


		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE						
CONTRATO No.		PN DIRAF No.06-6-10295-23						
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S						
INTERVENTOR:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S						
CAPITULO		4 ESTRUCTURAS EN CONCRETO METALICAS Y MADERA						
Nº	ITEM	DESCRIPCION ACERO					UND	
4.10.1							KG	
 		3,00	51,00	AC Nº	24,99	0,66	13,99	
		3,00	230,00	0,49	112,70	0,66	63,11	
		5,00	6,00	9,20	0,90	60,60	1,55	94,05
		7,00	6,00	9,50	1,60	86,60	3,04	202,60
P11	5,00	6,00	4,70	28,20	1,55	43,77		
	5,00	6,00	9,30	0,90	61,20	1,55	94,98	
	7,00	6,00	6,00	36,00	3,04	109,51		
	x	4,00	6,00	7,20	0,75	63,60	0,99	63,22
1	4,00	6,00	5,70	45,60	0,99	45,33		
	4,00	6,00	6,00	48,00	0,99	47,71		
	4,00	10,00	7,20	0,75	79,50	0,99	79,02	
	4,00	10,00	11,25	0,75	120,00	0,99	119,28	
P12	3,00	136,00	1,90	258,40	0,66	144,70		
	4,00	135,00	1,00	135,00	0,99	134,19		
	3,00	135,00	0,34	45,90	0,66	25,70		
	3,00	345,00	0,34	117,30	0,66	65,69		
x	8,00	6,00	9,50	1,80	67,80	3,97	269,37	
	8,00	6,00	9,60	1,80	67,80	3,97	269,37	
	6,00	6,00	5,20	31,20	2,24	69,73		
	8,00	6,00	9,50	1,80	67,80	3,97	269,37	
1	8,00	6,00	6,00	36,00	3,97	143,03		
	4,00	6,00	8,50	0,75	55,50	0,99	55,17	
	4,00	6,00	8,80	33,00	0,99	32,80		
	4,00	6,00	6,00	36,00	0,99	35,78		
P13	4,00	6,00	8,50	0,75	55,50	0,99	55,17	
	4,00	6,00	11,25	0,75	72,00	0,99	71,57	
	3,00	178,00	1,40	249,20	0,66	139,56		
	4,00	106,00	1,00	106,00	0,99	105,36		
x	3,00	106,00	0,39	41,34	0,66	23,15		
	3,00	268,00	0,39	104,52	0,66	58,53		
	7,00	6,00	9,30	1,60	65,40	3,04	397,89	
	7,00	6,00	9,50	1,60	66,60	3,04	405,19	
2	7,00	6,00	5,10	30,60	3,04	186,17		
	7,00	6,00	9,50	1,60	66,60	3,04	405,19	
	7,00	6,00	6,00	36,00	3,04	219,02		
	4,00	10,00	7,20	0,75	79,50	0,99	158,05	
x	4,00	10,00	5,70	57,00	0,99	113,32		
	4,00	10,00	6,00	60,00	0,99	119,28		
	4,00	10,00	7,20	0,75	79,50	0,99	158,05	
	4,00	10,00	11,25	0,75	120,00	0,99	238,56	
2	3,00	136,00	2,40	326,40	0,66	365,67		
	4,00	127,00	1,30	166,10	0,99	328,22		
	3,00	257,00	0,34	87,38	0,66	97,87		
	3,00	345,00	0,34	117,30	0,66	131,38		
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE					27.016,61	
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA					39.931,19	
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO						
		REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS						
 LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA		 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA						


199
37
RW

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS									
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FUOS SIN FORMULA DE REAJUSTE							
CONTRATO No:		PN DIRAF No.05-6-10295-23							
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S							
INTERVENTOR:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S							
CAPITULO:		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA							
N°	ITEM	DESCRIPCION ACERO					UND		
	4.10.1	60.000 PSI/420 MPA					KG		
FOTOGRAFIA - PLANOS  		FECHA ACTA	ACT N°		DIA	MES	AÑO		
		UBICACIÓN							
		ELEMENTO	VARILLA No.	CANTIDAD	LONGITUD	TRASLAPO	LONG. TOTAL	PESO/ML	
		PANTALLAS	MODULO 1 y 2					SUMA	
		COLUMNAS						39931,185	
		C1	8,00	4,00	2,20		8,80	2,24	19,87
			8,00	4,00	8,80	1,80	42,40	3,97	168,46
			8,00	4,00	3,30		13,20	3,97	52,44
			6,00	4,00	5,50		22,00	2,24	49,17
			8,00	4,00	7,30	1,80	36,40	3,97	144,62
4,00	104,00		1,52		158,08	0,99	157,13		
C2	4,00	208,00	0,56		116,48	0,99	115,78		
	8,00	4,00	6,50	1,80	33,20	3,97	131,90		
	10,00	4,00	8,80	2,25	44,20	6,40	283,06		
	6,00	4,00	2,90		11,60	2,24	25,93		
	8,00	4,00	9,90	1,80	46,80	3,97	185,94		
	8,00	4,00	3,70		14,80	3,97	58,80		
C3	4,00	123,00	1,52		186,96	0,99	186,94		
	6,00	4,00	2,90		11,60	2,24	25,93		
	6,00	4,00	9,10	1,10	40,80	2,24	91,19		
	6,00	4,00	4,30		17,20	2,24	38,44		
	6,00	4,00	6,50	1,10	30,40	2,24	67,94		
	6,00	4,00	8,90	1,10	40,00	2,24	89,40		
C4	4,00	138,00	1,52		209,76	0,99	208,50		
	4,00	276,00	0,56		154,56	0,99	153,63		
	6,00	12,00	8,70	1,10	117,60	2,24	262,84		
	6,00	12,00	8,70	1,10	117,60	2,24	262,84		
	4,00	246,00	1,32		324,72	0,99	322,77		
	4,00	246,00	0,56		137,76	0,99	136,93		
C5	4,00	246,00	0,46		113,16	0,99	112,48		
	8,00	12,00	5,60		67,20	3,97	266,99		
	10,00	12,00	10,00	4,50	174,00	6,40	1114,30		
	10,00	12,00	6,00		72,00	6,40	461,09		
	10,00	12,00	9,60	2,25	142,20	6,40	910,65		
	10,00	12,00	10,00	4,50	174,00	6,40	1114,30		
	4,00	292,00	1,92		560,64	0,99	557,28		
	4,00	596,00	0,66		386,76	0,99	384,44		
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE					8.160,65		
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA					48.091,84		
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO							
		REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS							
 LEONEL RAÚL POVEBA HERNÁNDEZ DIRECTOR DE OBRA		 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA							

200

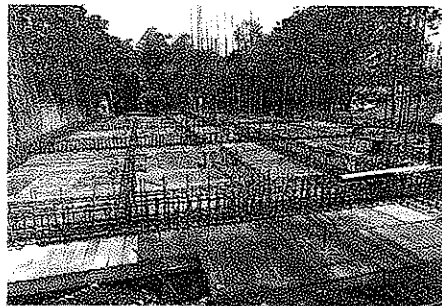
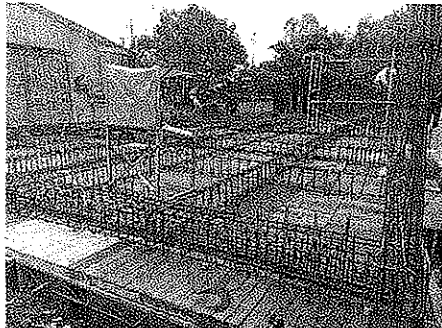


MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS										
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA								
CONTRATO No.		DE REAJUSTE								
CONTRATISTA		PN DIRAF No.05-6-10295-23								
INTERVENTOR		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S								
CAPITULO		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S								
N°		ITEM		DESCRIPCION ACERO					UNO	
4.10.1		60.000 PSI/420 MPA								
		FECHA ACTA				DIA		MES	KG	
		UBICACION				30		7	AÑO	
									2024	
		ELEMENTO	VARILLA No.	CANTIDAD	LONGITUD	TRASLAPO	LONG. TOTAL	PESO/ML	SUMA	
		PANTALLAS	MODULO 1 y 2							
		COLUMNAS		48091,83532						
		VIGAS LOSA N°0,05 M1								
		V1100	6,00	3,00	9,40	1,10	31,50	2,24	70,40	
		6,00	3,00	11,70	2,20	41,70	2,24	93,20		
		V1101	6,00	3,00	9,80	1,10	31,80	2,24	71,07	
		6,00	3,00	11,30	2,20	42,30	2,24	94,54		
		3,00	95,00	1,58		150,10	0,56	84,06		
		V1102	4,00	53,00	1,58		83,74	0,99	83,24	
		3,00	95,00	0,99		55,05	0,56	31,39		
		4,00	53,00	0,63		33,39	0,99	33,19		
		V1103	5,00	3,00	4,80		14,40	1,56	22,46	
		5,00	3,00	12,00	1,80	41,40	1,56	64,58		
		5,00	3,00	7,10	0,90	24,00	1,56	37,44		
		V1104	6,00	3,00	9,00	1,10	30,30	2,24	67,72	
		6,00	3,00	6,90	1,10	24,00	2,24	63,84		
		6,00	3,00	8,70	1,10	29,40	2,24	65,71		
		V1105	3,00	175,00	1,58		278,08	0,56	155,72	
		6,00	3,00	9,40	1,10	31,50	2,24	70,40		
		6,00	3,00	6,00		18,00	2,24	40,23		
		V1106	6,00	3,00	7,60	1,10	26,10	2,24	58,33	
		6,00	3,00	9,50	1,10	31,80	2,24	71,07		
		6,00	3,00	6,40	1,10	22,50	2,24	50,29		
		V1107	6,00	3,00	7,80	1,10	26,70	2,24	59,67	
		3,00	166,00	1,58		262,28	0,56	146,88		
		6,00	4,00	9,90	1,10	44,00	2,24	98,34		
		V1108	6,00	4,00	3,80		15,20	2,24	33,97	
		6,00	4,00	8,60	1,10	38,80	2,24	86,72		
		6,00	4,00	5,30		21,20	2,24	47,38		
		V1109	5,00	1,00	2,00		2,00	1,56	3,12	
		3,00	90,00	1,58		178,20	0,56	99,79		
		3,00	90,00	0,59		53,10	0,56	29,74		
		V1110	6,00	3,00	10,70	1,10	36,40	2,24	79,12	
		6,00	3,00	2,90		8,70	2,24	19,44		
		6,00	3,00	10,40	1,10	34,50	2,24	77,11		
		V1111	6,00	3,00	3,60		10,80	2,24	23,47	
		7,00	3,00	2,30		6,90	3,04	20,99		
		6,00	4,00	2,00		8,00	2,24	17,88		
		V1112	3,00	51,00	1,58		80,58	0,56	45,12	
		4,00	34,00	1,58		53,72	0,99	53,40		
		3,00	51,00	0,59		30,09	0,56	16,86		
		V1113	4,00	34,00	0,63		21,42	0,99	21,29	
		7,00	3,00	9,80	1,60	34,20	3,04	104,04		
		7,00	3,00	3,80		11,40	3,04	34,68		
		V1114	6,00	3,00	11,00	2,20	39,60	2,24	88,51	
		6,00	3,00	2,70		8,10	2,24	18,10		
		6,00	4,00	2,00		8,00	2,24	17,88		
		V1115	5,00	1,00	2,00		2,00	1,56	3,12	
		3,00	74,00	1,58		116,92	0,56	66,48		
		4,00	20,00	1,58		31,60	0,99	31,41		
		V1116	3,00	74,00	0,59		43,65	0,56	24,45	
		4,00	20,00	0,63		12,60	0,99	12,52		
		6,00	3,00	9,40	1,10	31,50	2,24	70,40		
		V1117	6,00	3,00	3,80		11,40	2,24	25,48	
		5,00	3,00	8,00	0,90	26,70	1,56	41,65		
		5,00	3,00	5,40		16,20	1,56	25,27		
		V1118	7,00	1,00	2,00		2,00	3,04	6,08	
		3,00	87,00	1,58		137,46	0,56	76,98		
		3,00	87,00	0,59		51,33	0,56	28,74		
		V1119	6,00	3,00	9,30	0,90	30,50	1,56	47,74	
		5,00	3,00	3,80		11,40	1,56	17,78		
		5,00	3,00	8,00	0,90	26,70	1,56	41,65		
		V1120	6,00	3,00	5,30		15,90	1,56	24,80	
		5,00	1,00	2,00		2,00	1,56	3,12		
		3,00	86,00	1,58		135,88	0,56	76,09		
		V1121	3,00	86,00	0,59		50,74	0,56	28,41	
		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE							3.213,38	
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA							51.305,21	
OBSERVACIONES:		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO								
		REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS								

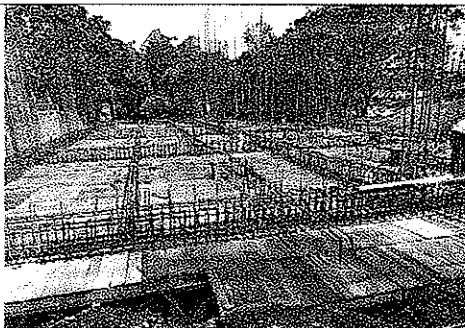
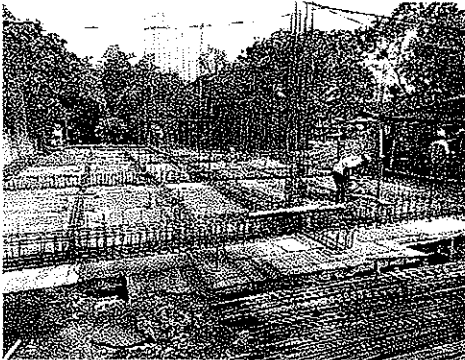



CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO
DIRECTOR DE OBRA


GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE INTERVENCIÓN

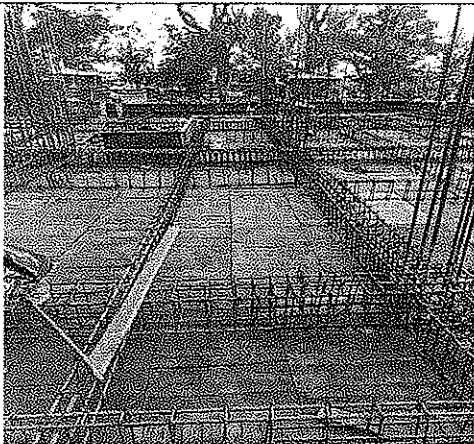
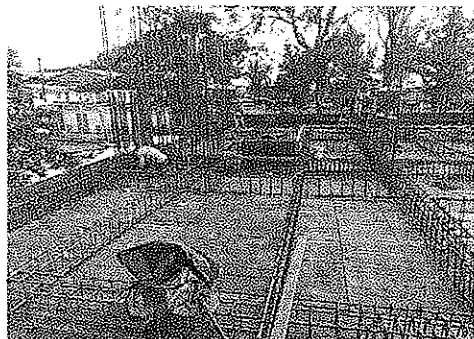
201
78
PUC

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS

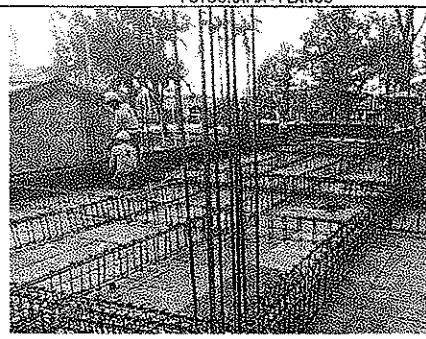
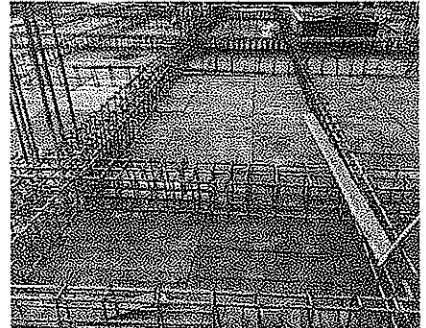

		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA							
		DE REAJUSTE							
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23							
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S							
INTERVENTOR:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S							
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA							
N°	ITEM	DESCRIPCION ACERO			UND				
	60.000 PSI/420 MPA								
4.10.1									
KG									
FOTOGRAFIA - PLANOS									
		FECHA ACTA		AC N°	DIA	MES	AÑO		
					30	7	2024		
		UBICACIÓN							
		ELEMENTO PANTALLAS	VÁRILLA No. MODULO 1 y 2	CANTIDAD	LONGITUD	TRASLAP O	LONG. TOTAL	PESO/ML	SUMA
		COLUMNAS, VIGAS LOSA						51305,21420	
		VIGUETAS LISA N°0,05 M1							
		VT1100	7,00	2,00	9,20	1,60	21,60	3,04	65,71
			6,00	2,00	12,00	2,20	28,40	2,24	63,47
			6,00	2,00	11,60	2,20	27,40	2,24	61,24
			5,00	2,00	9,90	0,90	21,60	1,56	33,70
			3,00	98,00	1,08		105,84	0,56	59,27
		VT1101	5,00	2,00	2,05		4,10	1,56	6,40
			5,00	2,00	2,05		4,10	1,56	6,40
			3,00	7,00	1,18		8,26	0,56	4,63
			6,00	2,00	10,20	2,20	24,80	2,24	55,43
		VT1102	6,00	2,00	10,60	2,20	25,60	2,24	57,22
			6,00	2,00	3,40		6,80	2,24	15,20
			5,00	2,00	8,30	0,90	18,40	1,56	28,70
			5,00	2,00	6,60	0,90	15,00	1,56	23,40
			5,00	2,00	6,60	0,90	15,00	1,56	23,40
			5,00	2,00	4,00		8,00	1,56	12,48
			3,00	111,00	1,08		119,88	0,56	67,13
		VT1103	7,00	4,00	9,20	1,60	43,20	3,04	131,41
			6,00	4,00	10,80	2,20	52,00	2,24	116,22
			6,00	4,00	3,20		12,80	2,24	28,61
			6,00	4,00	11,60	2,20	54,80	2,24	122,48
			5,00	4,00	8,30	0,90	36,80	1,56	57,41
			5,00	4,00	3,90		15,60	1,56	24,34
			3,00	196,00	1,08		211,68	0,56	118,54
			3,00	14,00	0,57		7,98	0,56	4,47
		VT1104	5,00	2,00	2,80		5,60	1,56	8,74
			5,00	2,00	2,80		5,60	1,56	8,74
			3,00	10,00	1,18		11,80	0,56	6,61
		VT1105	5,00	2,00	6,61	0,90	16,02	1,56	23,43
			7,00	2,00	6,71	1,60	16,62	3,04	50,56
			7,00	2,00	3,60		7,20	3,04	21,90
			3,00	29,00	1,18		34,22	0,56	19,16
		VT1106	7,00	2,00	9,25	1,60	21,70	3,04	66,01
			5,00	2,00	9,15	0,90	20,10	1,56	31,36
			3,00	43,00	1,18		50,74	0,56	28,41
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE							1.452,15
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA							52.757,37
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS							
		 LEONOR AULIPOOL HERNÁNDEZ DIRECTOR DE OMA		 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENCIÓN					

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS									
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE							
REAJUSTE									
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23							
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S							
INTERVENTOR:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S							
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA							
N°	ITEM	DESCRIPCION						UND	
	4.10.1	ACERO 60.000 PSI/420 MPA						KG	
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N°3							
		FECHA ACTA				DIA	MES	ANO	
						30	7	2024	
		UBICACION							
		ELEMENTO	VARILLA No.	CANTIDAD	LONGITUD	TRASLAP	LONG. TOTAL	PESO/ML	SUMA
		PANTALLAS MODULO 1 y 2							
		COLUMNAS, VIGAS Y VIGUETA							
		LOSA							
		RIOSTRAS LOSA N+0,05 M1							
				R-1 EJE 1 Y 2 A-C	4,00	2,00	6,00		12,00
4,00	2,00				6,00		12,00	0,99	11,93
4,00	2,00				2,00		4,00	0,99	3,98
4,00	2,00				2,00		4,00	0,99	3,98
4,00	2,00				6,00		12,00	0,99	11,93
R-1 EJE 2 Y 3 A-C	4,00			2,00	6,00		12,00	0,99	11,93
	4,00			2,00	6,00		12,00	0,99	11,93
	4,00			2,00	2,00		4,00	0,99	3,98
	4,00			2,00	2,00		4,00	0,99	3,98
	4,00			2,00	6,00		12,00	0,99	11,93
R-1-1 EJE 3 Y 4 B-C	4,00	2,00	6,00		12,00	0,99	11,93		
	4,00	2,00	6,00		12,00	0,99	11,93		
	4,00	2,00	2,00		4,00	0,99	3,98		
	4,00	2,00	6,00		12,00	0,99	11,93		
	4,00	2,00	6,00		12,00	0,99	11,93		
R-1-2 EJE 3 Y 4 A-B	4,00	2,00	6,00		12,00	0,99	11,93		
	4,00	2,00	6,00		12,00	0,99	11,93		
	4,00	2,00	1,50		3,00	0,99	2,98		
	4,00	2,00	6,00		12,00	0,99	11,93		
	4,00	2,00	6,00		12,00	0,99	11,93		
R-1 (FOSO ASENSOR)	4,00	4,00	2,50		10,00	0,99	9,94		
	3,00	9,00	1,20		10,80	0,56	6,05		
	4,00	8,00	2,30		18,40	0,99	18,29		
R-1 X2 (BUISTRON)	4,00	8,00	2,30		18,40	0,99	18,29		
	3,00	16,00	1,20		19,20	0,56	10,75		
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE							346,49
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA							53.103,86
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS							
 LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA  GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA									

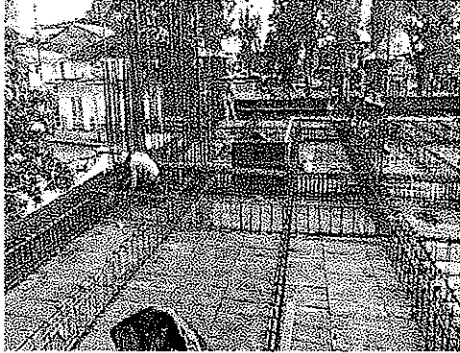
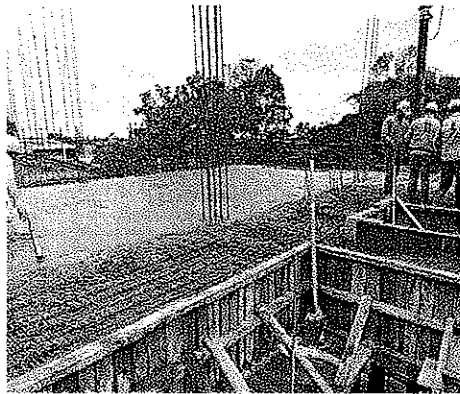


203
79
60

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS											
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE									
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23									
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S									
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S									
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA									
N°	ITEM	DESCRIPCION						UNO			
	4.10.1	ACERO 60.000 PSI/420 MPA						KG			
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N°3									
		FECHA ACTA				DIA		MES		AÑO	
						30		7		2024	
		UBICACION									
		ELEMENTO	VARILLA No.	CANTIDAD	LONGITUD	TRASLAPO	LONG. TOTAL	PESO/ML		SUMA	
		PANTALLAS MODULO 1 y 2 COLUMNAS, VIGAS Y VIGUETA,									
RIOSTRAS DE LOSA VIGAS LOSA N°4.00 M1								53103,85944			
V1200	6,00	3,00	9,40	1,10	31,50	2,24	70,40				
	6,00	3,00	11,70	2,20	41,70	2,24	93,20				
	6,00	3,00	9,50	1,10	31,80	2,24	71,07				
	6,00	3,00	11,90	2,20	42,30	2,24	94,54				
	5,00	1,00	4,30		4,30	1,56	6,71				
	5,00	1,00	4,30		4,30	1,56	6,71				
	3,00	95,00	1,58		150,10	0,56	84,06				
	4,00	53,00	1,62		85,86	0,99	85,34				
	3,00	95,00	0,59		56,05	0,56	31,39				
	4,00	53,00	0,63		33,39	0,99	33,19				
V1201	6,00	3,00	10,40	2,20	37,80	2,24	84,48				
	6,00	3,00	11,90	2,20	42,30	2,24	94,54				
	5,00	3,00	11,50	1,80	40,20	1,56	62,71				
	5,00	3,00	10,90	1,80	38,10	1,56	59,44				
	3,00	155,00	1,58		246,48	0,56	138,03				
	3,00	155,00	0,69		107,64	0,56	60,28				
	6,00	3,00	9,40	1,10	31,50	2,24	70,40				
V1202	6,00	3,00	11,70	2,20	41,70	2,24	93,20				
	6,00	3,00	9,50	1,10	31,80	2,24	71,07				
	6,00	3,00	11,90	2,20	42,30	2,24	94,54				
	5,00	1,00	4,30		4,30	1,56	6,71				
	7,00	1,00	4,30		4,30	3,04	13,08				
	4,00	1,00	4,30		4,30	0,99	4,27				
	6,00	1,00	4,30		4,30	2,24	9,61				
	3,00	95,00	1,58		150,10	0,56	84,06				
	4,00	53,00	1,62		85,86	0,99	85,34				
	3,00	95,00	0,59		56,05	0,56	31,39				
	4,00	53,00	0,63		33,39	0,99	33,19				
	6,00	4,00	9,90	1,10	44,00	2,24	96,34				
	6,00	4,00	3,80		15,20	2,24	33,97				
	6,00	4,00	5,65	1,10	39,00	2,24	87,17				
V1203	6,00	4,00	5,30		21,20	2,24	47,38				
	6,00	2,00	2,00		4,00	2,24	8,94				
	6,00	2,00	2,60		5,20	2,24	11,62				
	6,00	1,00	2,10		2,10	2,24	4,69				
	3,00	90,00	1,98		178,20	0,56	99,79				
	3,00	90,00	0,59		53,10	0,56	29,74				
	8,00	3,00	11,00	3,60	43,80	3,97	174,02				
	8,00	3,00	2,90		8,70	3,97	34,57				
	7,00	3,00	11,00	3,20	42,60	3,04	129,59				
	7,00	3,00	3,40		10,20	3,04	31,03				
V1204	8,00	2,00	2,00		4,00	3,97	15,89				
	8,00	2,00	3,80		7,60	3,97	30,19				
	8,00	1,00	2,90		2,90	3,97	11,52				
	3,00	40,00	1,58		63,20	0,56	35,39				
	4,00	58,00	1,58		91,64	0,99	91,09				
	3,00	40,00	0,59		23,60	0,56	13,22				
	4,00	56,00	0,63		36,54	0,99	36,32				
	8,00	3,00	9,70	1,80	34,50	3,97	137,07				
	8,00	3,00	4,10		12,30	3,97	48,87				
	7,00	3,00	8,80	1,60	31,20	3,04	94,91				
V1205	7,00	3,00	5,40		16,20	3,04	49,28				
	10,00	2,00	3,30		6,60	6,23	41,09				
	8,00	2,00	2,30		4,60	3,97	18,28				
	6,00	2,00	2,00		4,00	2,24	8,94				
	5,00	3,00	2,00		6,00	1,56	9,36				
											

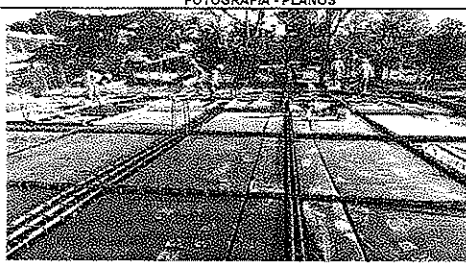
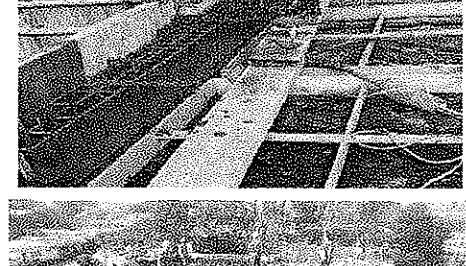


205
80
20

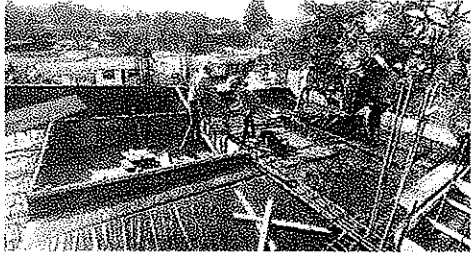
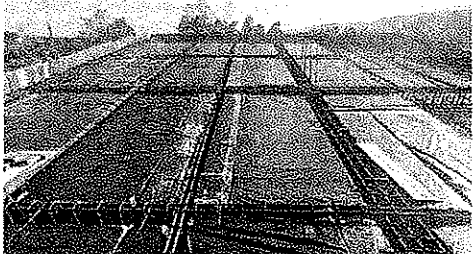
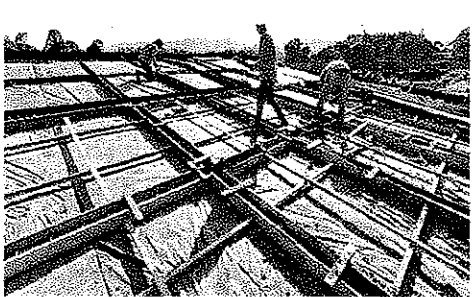


MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS									
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA							
		DE REAJUSTE							
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23							
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S							
INTERVENIOR:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S							
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA							
N°	ITEM	DESCRIPCION					UNO		
	4.10.1	ACERO 60.000 PSI/420 MPA					KG		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3							
		FECHA ACTA		DIA		MES	AÑO		
				30		7	2024		
		UBICACION							
		ELEMENTO	VARILLA No.	CANTIDAD	LONGITUD	TRASLAPO	LONG. TOTAL	PESO/ML	SUMA
		PANTALLAS MODULO 1 y 2							
		COLUMNAS, VIGAS LOSA							
		VIGUETAS LOSA N°4.00 M1							
		VT1200	7,00	2,00	9,20	1,60	21,60	3,04	65,71
			7,00	2,00	9,60	1,60	22,40	3,04	68,14
			6,00	2,00	11,50	2,20	27,40	2,24	61,24
			6,00	2,00	7,40	1,10	17,06	2,24	38,00
			3,00	86,00	1,08		92,88	0,56	52,01
		VT1201	4,00	2,00	3,25		6,50	0,99	6,46
			4,00	2,00	3,25		6,50	0,99	6,46
			3,00	13,00	1,08		14,04	0,56	7,86
		VT1202	7,00	2,00	10,30	1,60	23,80	3,04	72,40
			6,00	2,00	12,00	2,20	28,40	2,24	63,47
			6,00	2,00	6,80	1,10	15,80	2,24	35,31
			5,00	2,00	6,60	0,90	15,00	1,56	23,40
			5,00	2,00	9,90	0,90	21,60	1,56	33,70
			3,00	104,00	1,08		112,32	0,56	62,90
		VT1203	7,00	2,00	9,20	1,60	21,60	3,04	65,71
			6,00	2,00	12,00	2,20	28,40	2,24	63,47
			6,00	2,00	11,50	2,20	27,40	2,24	61,24
			5,00	2,00	9,90	0,90	21,60	1,56	33,70
			3,00	70,00	1,08		75,60	0,56	42,34
			3,00	29,00	1,18		34,22	0,56	19,16
		VT1204	4,00	2,00	6,30	0,75	14,10	0,99	14,02
			7,00	2,00	6,60	1,60	16,20	3,04	49,28
			4,00	2,00	6,30	0,75	14,10	0,99	14,02
			3,00	28,00	1,08		30,24	0,56	16,93
		VT1205	5,00	2,00	9,05	0,90	19,90	1,56	31,04
			7,00	2,00	9,15	1,50	21,50	3,04	65,40
			6,00	2,00	2,30		4,60	2,24	10,28
			3,00	42,00	1,08		45,36	0,56	25,40
			5,00	2,00	2,80		5,60	1,56	8,74
		VT1206	5,00	2,00	2,80		5,60	1,56	8,74
			3,00	10,00	1,18		11,80	0,56	9,61
			5,00	2,00	9,00	0,90	19,80	1,56	30,89
			5,00	2,00	4,20		8,40	1,56	13,10
			5,00	2,00	5,45		10,90	1,56	17,00
		VT1207	5,00	2,00	8,00	0,90	17,80	1,56	27,77
			4,00	2,00	2,00		4,00	0,99	3,98
			3,00	59,00	1,18		68,62	0,56	38,99
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE							1.264,86
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA							58.144,89
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO							
		REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS							
									
LEONEL RAÚL POVEJA HERNÁNDEZ		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S							
DIRECTOR DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA							

206

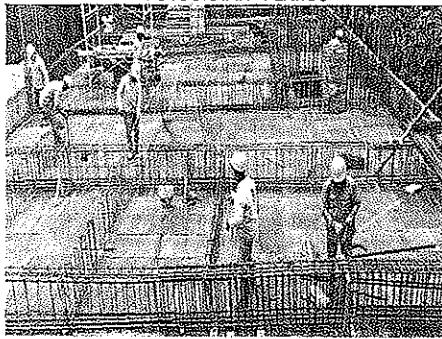
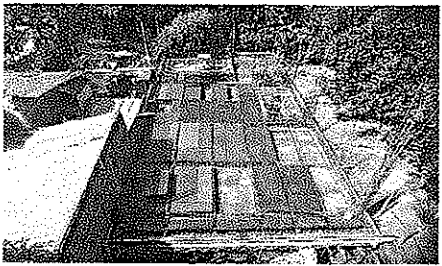
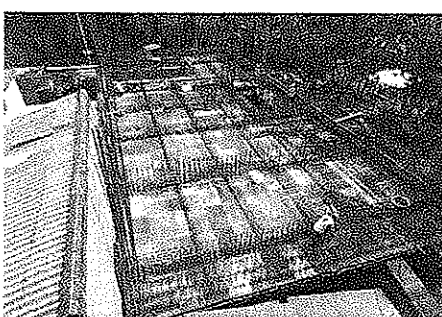
MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS													
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE											
CONTRATO No:		PW DIRAF No.06-6-10295-23											
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S											
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S											
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA											
Nº	ITEM	DESCRIPCION							UND				
	4.10.1	ACERO 60.000 PSI/420 MPA							KG				
FOTOGRAFIA - PLANOS					ACTA Nº 3								
 					FECHA ACTA		DIA		MES	AÑO			
							30		7	2024			
					UBICACIÓN								
					ELEMENTO	VARILLA No.	CANTIDAD	LONGITUD	TRASLAPO	LONG. TOTAL	PESO/ML	SUMA	
					PANTALLAS MODULO 1 y 2 COLUMNAS, VIGAS Y VIGUETA								
					LOSA								
					RIOSTRAS LOSA N+4,00 M1								
					58144,68704								
					R-1 EJE 1 Y 2 A C								
					R-1 EJE 2 Y 3 A C								
R-1-2 EJE 3 Y 4 B-C													
R-1-3 EJE 3 Y 4 B-C													
R-1 (BULTRON)													
R-1 (ESCALERA)													
R-1 (VACIO EJE 4 Y 5 A-B)													
OBSERVACIONES:													
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE								379,93					
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA								58.524,62					
CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO													
REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS													
 LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA					 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA								

202
81
202

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS											
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE									
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23									
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S									
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S									
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA									
N°	ITEM	DESCRIPCION						UND			
	4.10.1	ACERO 60.000 PSI/420 MPA						KG			
FOTOGRAFIA - PLANOS											
		ACTA N° 3									
		FECHA ACTA				DIA		MES		AÑO	
						30		7		2024	
		UBICACIÓN									
		ELEMENTO	VARILLA No.	CANTIDAD	LONGITUD	TRASLAPO	LONG. TOTAL	PESO/ML	SUMA		
		PANTALLAS MODULO 1 y 2 COLUMNAS, VIGAS Y VIGUETA,									
		RIOSTRAS DE LOSA VIGAS LOSA N° 9.40 M. 1							58524,61904		
		V1300	6,00	3,00	9,40	1,10	31,50	2,24	70,40		
			5,00	3,00	10,20	1,10	33,90	2,24	75,77		
6,00	3,00		9,50	1,10	31,80	2,24	71,07				
6,00	3,00		10,40	1,10	34,50	2,24	77,11				
3,00	125,00		1,58		197,50	0,56	110,60				
V1301	3,00	125,00	0,59		73,75	0,56	41,30				
	6,00	3,00	10,40	1,10	34,50	2,24	77,11				
	6,00	3,00	10,30	1,10	34,20	2,24	76,44				
	5,00	3,00	9,30	0,90	30,60	1,56	47,74				
	5,00	3,00	11,70	1,80	40,50	1,56	63,18				
V1302	3,00	141,00	1,58		222,78	0,56	124,76				
	3,00	141,00	0,59		83,19	0,56	46,59				
	6,00	3,00	9,30	1,10	31,20	2,24	69,73				
	6,00	3,00	10,20	1,10	33,90	2,24	75,77				
	6,00	3,00	9,50	1,10	31,80	2,24	71,07				
V1303	6,00	3,00	10,40	1,10	34,50	2,24	77,11				
	3,00	131,00	1,58		206,98	0,56	115,91				
	3,00	131,00	0,59		77,29	0,56	43,28				
	6,00	3,00	9,80	1,10	32,70	2,24	73,05				
	6,00	3,00	3,90		11,70	2,24	26,15				
V1304	5,00	3,00	8,70	0,90	28,80	1,56	44,93				
	5,00	3,00	5,30		15,90	1,56	24,80				
	6,00	1,00	2,00		2,00	2,24	4,47				
	3,00	90,00	1,58		142,20	0,56	79,63				
	3,00	90,00	0,59		53,10	0,56	29,74				
V1305	6,00	3,00	3,80		11,40	2,24	25,48				
	6,00	3,00	9,80	1,10	32,70	2,24	73,05				
	6,00	3,00	5,20		15,60	2,24	34,87				
	6,00	3,00	8,70	1,10	29,40	2,24	65,71				
	8,00	1,00	2,00		2,00	3,97	7,95				
V1306	7,00	2,00	2,30		4,60	3,04	13,99				
	5,00	1,00	2,10		2,10	1,56	3,28				
	3,00	60,00	1,58		94,80	0,56	53,09				
	4,00	29,00	1,58		45,82	0,99	45,55				
	3,00	89,00	0,59		52,51	0,56	29,41				
V1307	7,00	3,00	4,20		14,40	3,04	43,80				
	7,00	3,00	8,80	1,60	31,20	3,04	94,91				
	8,00	3,00	5,20		15,60	3,97	61,98				
	6,00	3,00	9,10	1,10	30,60	2,24	68,39				
	8,00	3,00	2,60		7,80	3,97	30,99				
V1308	6,00	1,00	2,00		2,00	2,24	4,47				
	3,00	51,00	1,58		80,58	0,56	45,12				
	4,00	32,00	1,58		50,56	0,99	50,25				
	3,00	51,00	0,59		30,09	0,56	16,85				
	4,00	32,00	0,63		20,16	0,99	20,04				
V1309	5,00	3,00	9,40	0,90	30,90	1,56	48,20				
	5,00	3,00	3,80		11,40	1,56	17,78				
	5,00	3,00	8,30	0,90	27,60	1,56	43,06				
	5,00	3,00	5,20		15,60	1,56	24,34				
	4,00	1,00	2,00		2,00	0,99	1,99				
V1310	3,00	88,00	1,58		138,04	0,99	138,21				
	3,00	88,00	0,59		51,92	0,56	29,08				
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE						2,709,58			
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA						61.234,20			
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO									
		REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS									
											
LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S									
DIRECTOR DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA									

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS									
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE							
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23							
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S							
INTERVENTOR:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S							
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA							
N°	ITEM	DESCRIPCION					UND		
	4.10.1	ACERO 60.000 PSI/420 MPA					KG		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3							
  		FECHA ACTA		DIA		MES	AÑO		
				30		7	2024		
		UBICACIÓN							
		ELEMENTO	VARILLA No.	CANTIDAD	LONGITUD	TRASLAPO	LONG. TOTAL	PESO/ML	SUMA
		PANTALLAS MODULO 1 y 2							
		COLUMNAS, VIGAS Y VIGUETA							
		RIOSTRAS DE LOSA							
		VIGUETAS LOSA N+9,40 M1		61234,20306					
		VT1300	5,00	6,00	9,00	0,90	59,40	1,56	92,66
			5,00	6,00	10,60	0,90	69,00	1,56	107,54
5,00	6,00		7,50	0,90	50,40	1,56	78,62		
5,00	6,00		10,60	0,90	69,00	1,56	107,64		
3	5,00	6,00	2,65		15,90	1,56	24,80		
	3,00	270,00	1,08		291,60	0,66	163,30		
VT1301	5,00	2,00	10,00	0,90	21,80	1,56	34,01		
	5,00	2,00	10,70	0,90	23,20	1,56	36,19		
	5,00	2,00	6,60	0,90	16,80	1,56	29,33		
	5,00	2,00	10,60	0,90	23,00	1,56	35,88		
	5,00	2,00	2,80		5,60	1,56	8,74		
	3,00	90,00	1,08		97,20	0,66	64,43		
1	3,00	6,00	0,67		3,42	0,66	1,92		
VT1302	5,00	2,00	2,80		5,60	1,56	8,74		
	5,00	2,00	2,80		5,60	1,56	8,74		
1	3,00	10,00	1,18		11,80	0,66	6,61		
	5,00	2,00	9,80	0,90	21,40	1,56	33,36		
	4,00	2,00	3,80		7,60	0,99	7,55		
	4,00	2,00	7,80	0,75	17,10	0,99	17,06		
VT1303	4,00	2,00	5,90		11,80	0,99	11,73		
	1	3,00	58,00	1,08		62,64	0,66	35,08	
	5,00	2,00	9,00	0,75	19,50	1,56	30,42		
	5,00	2,00	4,20		8,40	1,56	13,10		
VT1304	5,00	2,00	5,40		10,80	1,56	16,65		
	5,00	2,00	8,00	0,75	17,50	1,56	27,30		
	4,00	2,00	2,00		4,00	0,99	3,98		
	1	3,00	59,00	1,08		63,72	0,66	35,68	
RIOSTRAS LOSA N+9,40 M1:									
R-1 EJE 1 Y 2 A-C	4,00	12,00	12,50	1,50	168,00	1,56	262,08		
	3,00	177,00	1,20		212,40	0,66	118,94		
R-1 EJE 2 Y 3 A-C	4,00	4,00	3,40		13,60	1,56	21,22		
	4,00	4,00	1,80		7,20	0,66	4,03		
	3,00	52,00	1,20		62,40	0,66	34,94		
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE					1.472,53		
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA					62.708,73		
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO							
		REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS							
 LEONEL RAÚL POVEDA HERNÁNDEZ DIRECTOR DE OBRA		 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA							

209
 22
 2W

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS									
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA							
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23							
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S							
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S							
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA							
N°	ITEM	DESCRIPCION ACERO 60.000 PSI/420 MPA							UNO
4.10.1									KG
FOTOGRAFIA - PLANOS									
  		FECHA ACTA		ACTA N° 3		DIA		MES	ANO
		UBICACIÓN				30		7	2024
		ELEMENTO	VARILLA No.	CANTIDAD	LONGITUD	TRASLAPO	LONG. TOTAL	PESO/ML	SUMA
		PANTALLAS	MODULO 1 y 2.						
		COLUMNAS MODULO 1 Y 2.							
		VIGAS, VIGUETA, RIOSTRAS M1							62706,73286
		VIGAS LOSA N-2,55 M2							
V2100	7,00	3,00	9,00	1,60		31,80	3,04	95,74	
	7,00	3,00	6,90	1,60		25,60	3,04	77,57	
	7,00	3,00	11,60	3,20		44,40	3,04	135,06	
	7,00	3,00	9,30	1,60		32,70	3,04	99,47	
	7,00	3,00	7,30	1,60		26,70	3,04	81,22	
	7,00	3,00	12,00	3,20		45,60	3,04	138,72	
	3,00	199,00	2,18			433,82	0,56	242,94	
	7,00	3,00	7,80	1,60		28,20	3,04	85,78	
	7,00	3,00	7,80	1,60		28,20	3,04	85,78	
	3,00	46,00	1,98			91,08	0,56	51,00	
V2101	3,00	46,00	0,74			34,04	0,56	19,06	
	7,00	3,00	9,00	1,60		31,80	3,04	96,74	
	7,00	3,00	6,90	1,60		25,60	3,04	77,57	
	7,00	3,00	11,60	3,20		44,40	3,04	135,06	
	7,00	3,00	9,30	1,60		32,70	3,04	99,47	
	7,00	3,00	7,30	1,60		26,70	3,04	81,22	
	7,00	3,00	12,00	3,20		45,60	3,04	138,72	
	3,00	191,00	2,18			416,38	0,56	233,17	
	7,00	4,00	6,30	1,60		31,60	3,04	96,13	
	7,00	4,00	6,80	1,60		33,60	3,04	102,21	
V2102	6,00	4,00	3,30			13,20	2,24	29,50	
	6,00	4,00	9,90	1,10		44,00	2,24	98,34	
	6,00	2,00	2,00			4,00	2,24	8,94	
	4,00	77,00	2,18			167,86	0,99	166,85	
	3,00	16,00	2,18			34,88	0,56	19,53	
	3,00	93,00	0,84			78,12	0,56	43,75	
	7,00	3,00	6,50	1,60		24,30	3,04	73,82	
	7,00	3,00	6,50	1,60		24,30	3,04	73,82	
	7,00	3,00	10,00	1,60		34,80	3,04	105,86	
	7,00	3,00	3,60			10,80	3,04	32,55	
V2103	3,00	59,00	1,98			116,82	0,56	65,42	
	3,00	59,00	0,74			43,66	0,56	24,45	
	7,00	3,00	8,20	1,60		29,40	3,04	89,43	
	7,00	3,00	4,90			14,70	3,04	44,72	
	7,00	3,00	10,00	1,60		34,80	3,04	105,86	
	7,00	3,00	3,50			10,50	3,04	31,94	
	7,00	2,00	2,60			5,20	3,04	15,82	
	3,00	69,00	2,02			139,38	0,56	78,05	
	4,00	16,00	1,98			31,68	0,99	31,49	
	3,00	85,00	0,74			62,90	0,56	35,22	
V2104	8,00	3,00	7,40	1,80		27,60	3,97	109,65	
	8,00	3,00	5,60			16,80	3,97	66,75	
	7,00	3,00	8,80	1,60		31,20	3,04	94,91	
	7,00	3,00	4,60			13,80	3,04	41,98	
	7,00	1,00	3,20			3,20	3,04	9,73	
	7,00	1,00	2,80			2,80	3,04	8,52	
	3,00	32,00	1,98			63,36	0,56	35,48	
	4,00	52,00	2,92			105,04	0,99	104,41	
	3,00	32,00	0,74			23,88	0,56	13,26	
	4,00	52,00	0,78			40,56	0,99	40,32	
V2105	7,00	3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01	
	7,00	3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01	
	8,00	3,00	4,20			12,60	3,97	50,06	
	8,00	3,00	9,50	1,60		33,30	3,97	132,30	
	7,00	2,00	2,55			5,10	3,04	15,51	
	7,00	2,00	2,55			5,10	3,04	15,51	
	7,00	2,00	4,90			9,80	3,04	29,81	
	3,00	93,00	2,18			202,74	0,56	113,53	
	3,00	93,00	0,84			78,12	0,56	43,75	
	V2106	7,00	3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01
7,00		3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01	
8,00		3,00	4,20			12,60	3,97	50,06	
8,00		3,00	9,50	1,60		33,30	3,97	132,30	
7,00		2,00	2,55			5,10	3,04	15,51	
7,00		2,00	2,55			5,10	3,04	15,51	
7,00		2,00	4,90			9,80	3,04	29,81	
3,00		93,00	2,18			202,74	0,56	113,53	
3,00		93,00	0,84			78,12	0,56	43,75	
V2107		7,00	3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01
	7,00	3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01	
	8,00	3,00	4,20			12,60	3,97	50,06	
	8,00	3,00	9,50	1,60		33,30	3,97	132,30	
	7,00	2,00	2,55			5,10	3,04	15,51	
	7,00	2,00	2,55			5,10	3,04	15,51	
	7,00	2,00	4,90			9,80	3,04	29,81	
	3,00	93,00	2,18			202,74	0,56	113,53	
	3,00	93,00	0,84			78,12	0,56	43,75	
	V2108	7,00	3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01
7,00		3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01	
8,00		3,00	4,20			12,60	3,97	50,06	
8,00		3,00	9,50	1,60		33,30	3,97	132,30	
7,00		2,00	2,55			5,10	3,04	15,51	
7,00		2,00	2,55			5,10	3,04	15,51	
7,00		2,00	4,90			9,80	3,04	29,81	
3,00		93,00	2,18			202,74	0,56	113,53	
3,00		93,00	0,84			78,12	0,56	43,75	
V2109		7,00	3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01
	7,00	3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01	
	8,00	3,00	4,20			12,60	3,97	50,06	
	8,00	3,00	9,50	1,60		33,30	3,97	132,30	
	7,00	2,00	2,55			5,10	3,04	15,51	
	7,00	2,00	2,55			5,10	3,04	15,51	
	7,00	2,00	4,90			9,80	3,04	29,81	
	3,00	93,00	2,18			202,74	0,56	113,53	
	3,00	93,00	0,84			78,12	0,56	43,75	
	V2110	7,00	3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01
7,00		3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01	
8,00		3,00	4,20			12,60	3,97	50,06	
8,00		3,00	9,50	1,60		33,30	3,97	132,30	
7,00		2,00	2,55			5,10	3,04	15,51	
7,00		2,00	2,55			5,10	3,04	15,51	
7,00		2,00	4,90			9,80	3,04	29,81	
3,00		93,00	2,18			202,74	0,56	113,53	
3,00		93,00	0,84			78,12	0,56	43,75	
V2111		7,00	3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01
	7,00	3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01	
	8,00	3,00	4,20			12,60	3,97	50,06	
	8,00	3,00	9,50	1,60		33,30	3,97	132,30	
	7,00	2,00	2,55			5,10	3,04	15,51	
	7,00	2,00	2,55			5,10	3,04	15,51	
	7,00	2,00	4,90			9,80	3,04	29,81	
	3,00	93,00	2,18			202,74	0,56	113,53	
	3,00	93,00	0,84			78,12	0,56	43,75	
	V2112	7,00	3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01
7,00		3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01	
8,00		3,00	4,20			12,60	3,97	50,06	
8,00		3,00	9,50	1,60		33,30	3,97	132,30	
7,00		2,00	2,55			5,10	3,04	15,51	
7,00		2,00	2,55			5,10	3,04	15,51	
7,00		2,00	4,90			9,80	3,04	29,81	
3,00		93,00	2,18			202,74	0,56	113,53	
3,00		93,00	0,84			78,12	0,56	43,75	
V2113		7,00	3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01
	7,00	3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01	
	8,00	3,00	4,20			12,60	3,97	50,06	
	8,00	3,00	9,50	1,60		33,30	3,97	132,30	
	7,00	2,00	2,55			5,10	3,04	15,51	
	7,00	2,00	2,55			5,10	3,04	15,51	
	7,00	2,00	4,90			9,80	3,04	29,81	
	3,00	93,00	2,18			202,74	0,56	113,53	
	3,00	93,00	0,84			78,12	0,56	43,75	
	V2114	7,00	3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01
7,00		3,00	6,40	1,60		24,00	3,04	73,01	
8,00		3,00	4,20			12,60	3,97	50,06	
8,00		3,00	9,50	1,60		33,30	3,97	132,30	
7,00</									

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS									
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE							
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23							
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S							
INTERVENTOR:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S							
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA							
N°	ITEM	DESCRIPCION					UND		
4.10.1	ACERO 60.000 PSI/420 MPA						KG		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N°3							
		FECHA ACTA				DIA	MES	AÑO	
						30	7	2024	
		UBICACION							
		ELEMENTO	VARILLA No.	CANTIDAD	LONGITUD	TRASLAPO	LONG. TOTAL	PESO/ML	SUMA
		PANTALLAS MODULO 1 y 2.							
		COLUMNAS MODULO 1 Y 2.							
		VIGAS, VIGUETA, ROSTRAS M1							
		VIGAS M2							
		VIGUETAS LOSA N-2.50 M2							
		VT2100		5,00	4,00	9,00	0,90	39,60	1,56
		5,00	4,00	12,00	1,80	55,20	1,56	86,11	
		5,00	4,00	10,20	0,90	44,40	1,56	69,28	
		5,00	4,00	11,30	2,20	54,00	2,24	120,69	
		4,00	6,00	2,00		16,00	0,99	15,90	
		3,00	194,00	1,38		267,72	0,56	149,92	
VT2101		5,00	4,00	2,70		10,80	1,56	16,86	
		5,00	4,00	2,70		10,80	1,56	16,86	
		3,00	18,00	1,38		24,84	0,56	13,91	
VT2102		5,00	2,00	8,60	0,90	19,00	1,56	29,64	
		6,00	2,00	6,50	1,10	15,20	2,24	33,97	
		6,00	2,00	12,00	2,20	28,40	2,24	63,47	
		5,00	2,00	12,00	2,20	28,40	1,56	44,30	
		6,00	2,00	7,90	1,10	16,00	2,24	40,23	
		5,00	2,00	7,80	1,10	17,80	1,56	27,77	
		3,00	123,00	1,38		169,74	0,56	95,05	
VT2103		5,00	4,00	11,20	1,80	52,00	1,56	81,12	
		5,00	4,00	11,20	1,80	52,00	1,56	81,12	
		3,00	100,00	1,38		138,00	0,56	77,28	
VT2104		5,00	4,00	8,50	0,90	37,60	1,56	58,66	
		6,00	2,00	8,50	1,10	19,20	2,24	42,91	
		7,00	2,00	8,60	1,60	20,40	3,04	62,06	
		3,00	75,00	1,38		104,88	0,56	59,73	
VT2105		6,00	2,00	4,10		8,20	2,24	18,33	
		6,00	2,00	4,10		8,20	2,24	18,33	
		3,00	16,00	1,78		28,48	0,56	15,95	
VT2106		6,00	2,00	11,90	2,20	28,20	2,24	63,03	
		6,00	2,00	11,90	2,20	28,20	2,24	63,03	
		3,00	59,00	1,58		93,22	0,56	52,20	
RIOSTRAS LOSA N-2.50 M2									
R-3 EJE 5 Y 6 A-C		5,00	8,00	12,00	1,80	110,40	1,56	172,22	
		3,00	96,00	1,50		144,00	0,56	80,64	
R-3 EJE 7 Y 8 B-C		5,00	4,00	5,00		20,00	1,56	31,20	
		3,00	20,00	1,50		30,00	0,56	16,80	
R-3 EJE 8 Y 9 A-B		5,00	4,00	8,50	1,80	41,20	1,56	64,27	
		3,00	34,00	1,50		51,00	0,56	28,56	
R-3 EJE 9 Y 10 A-C		5,00	4,00	11,50	1,80	53,20	1,56	82,99	
		3,00	46,00	1,20		55,20	0,56	30,91	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE						2.086,06	
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA						89.213,83	
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO							
		REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS							

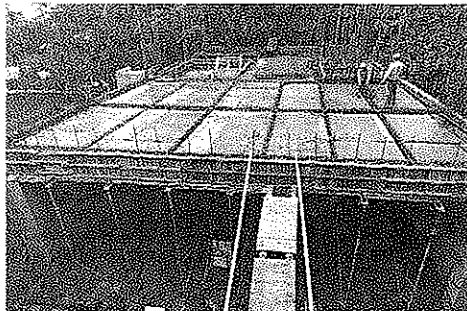
LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA
--	---

211
83
K-6

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS

		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE GUABIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE	
CONTRATO No:	PN DIRAF No.06-6-10295-23		
CONTRATISTA:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S		
CAPITULO	4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA		
N°	ITEM	DESCRIPCION	UND
	4.10.1	ACERO 60.000 PSI/420 MPA	KG

FOTOGRAFIA - PLANOS






ACTA N°3

FECHA ACTA					DIA	MES	AÑO
UBICACION					30	7	2024
ELEMENTO	VARILLA No.	CANTIDAD	LONGITUD	TRASLAPO	LONG. TOTAL	PESO/ML	SUMA
PANTALLAS MODULO 1 y 2.							
COLUMNAS MODULO 1 Y 2.							
VIGAS, VIGUETA, RIOSTRAS M1							
VIGAS, VIGUETA, RIOSTRAS M2							
VIGAS LOSA N+2.20 M2							69213,82792
1	7,00	3,00	7,55	1,60	27,46	3,04	83,50
	6,00	3,00	7,30	1,10	25,20	2,24	56,32
	7,00	3,00	10,30	1,60	35,70	3,04	108,60
	7,00	3,00	7,65	1,60	27,75	3,04	84,42
	6,00	3,00	8,10	1,10	27,90	2,24	61,69
	6,00	3,00	10,30	2,20	38,10	2,24	85,16
	3,00	173,00	1,88		325,24	0,56	182,13
1	8,00	3,00	7,90	1,80	29,10	3,97	118,51
	7,00	3,00	7,80	1,60	28,20	3,04	85,78
	3,00	46,00	2,18		100,28	0,56	56,16
	3,00	46,00	0,84		38,64	0,56	21,64
1	7,00	3,00	7,80	1,60	27,30	3,04	83,05
	7,00	3,00	6,60	1,60	24,60	3,04	74,83
	8,00	3,00	11,10	3,60	44,10	3,97	175,21
	7,00	3,00	7,85	1,60	28,35	3,04	86,24
	7,00	3,00	6,90	1,60	25,50	3,04	77,57
	8,00	3,00	11,90	3,20	45,30	3,97	179,98
	3,00	141,00	1,88		265,08	0,56	148,44
	4,00	40,00	1,92		76,80	0,99	76,34
1	7,00	4,00	6,30	1,60	31,60	3,04	96,13
	7,00	4,00	6,80	1,60	33,60	3,04	102,21
	8,00	4,00	4,00		16,00	3,97	63,57
	8,00	4,00	9,70	1,80	46,00	3,97	182,76
	7,00	3,00	3,30		9,90	3,04	30,12
	8,00	3,00	3,30		9,90	3,97	39,33
	7,00	2,00	3,25		6,50	3,04	19,77
	6,00	2,00	3,20		6,40	2,24	14,30
	4,00	77,00	2,32		178,64	0,99	177,57
	3,00	16,00	2,28		36,48	0,56	20,43
1	3,00	93,00	0,84		78,12	0,56	43,75
	7,00	3,00	6,50	1,60	24,30	3,04	73,92
	7,00	3,00	6,50	1,60	24,30	3,04	73,92
	8,00	3,00	10,10	1,80	35,70	3,97	141,84
	8,00	3,00	3,80		11,40	3,97	45,29
	8,00	2,00	2,60		5,20	3,97	20,66
	8,00	2,00	6,00		12,00	3,97	47,68
	3,00	95,00	2,18		207,10	0,56	115,98
	3,00	95,00	0,84		79,80	0,56	44,69
	8,00	3,00	8,10	1,80	29,70	3,97	118,00
1	7,00	3,00	5,00		15,00	3,04	45,63
	8,00	3,00	10,10	1,80	35,70	3,97	141,84
	7,00	3,00	3,70		11,10	3,04	33,77
	8,00	2,00	3,20		6,40	3,97	25,43
	3,00	69,00	2,18		150,42	0,56	84,24
	4,00	16,00	2,22		35,52	0,99	35,31
	3,00	85,00	0,84		71,40	0,56	39,98


212

216

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS							
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE					
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23					
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S					
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S					
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA					
N°	ITEM	DESCRIPCION					UND
	4.10.1	ACERO 60.000 PSI/420 MPA					KG
FOTOGRAFIA - PLANOS				ACTA N° 3			
							
ANCLAJES DE M.N.E CONCRETO, BLOQUE, COLUMNAS Y VIGAS							
MODULO 1							
SOTANO	3	112	0,60		67,20	0,56	37,63
PISO 1	3	61	1,50		91,50	0,56	51,24
PISO 1'	4	133	1,00		133,00	0,99	132,20
PISO 1''	4	4	1,10		4,40	0,99	4,37
PISO 2	3	16	1,50		24,00	0,56	13,44
PISO 2'	3	56	1,00		56,00	0,56	31,36
PISO 2''	6	16	1,50		24,00	2,24	53,64
PISO 2'''	4	7	1,00		7,00	0,99	6,96
PISO 2''''	5	30	1,00		30,00	1,56	46,80
MODULO 2							
SOTANO	4	108	1,00		108,00	0,99	107,35
SOTANO	4	27	0,80		21,60	0,99	21,47
PISO 2	6	11	1,30		14,30	2,25	32,18
PISO 2'	3	116	0,85		98,60	0,56	55,22
PISO 3	4	16	2,00		32,00	0,99	31,81
CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE						1.394,40	
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA						78.826,18	
CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO							
REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS							

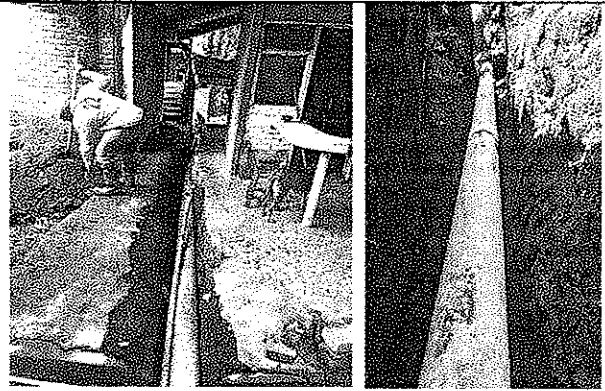
	
LEONEL RAÚL POVEDA HERNÁNDEZ	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA



217

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS									
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE							
REAJUSTE									
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23							
CONTRATISTA		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S							
INTERVENIOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S							
CAPITULO		4. ESTRUCTURAS EN CONCRETO, METALICAS Y MADERA							
N°	ITEM	DESCRIPCION					UND		
	4.10.1	ACERO 60.000 PSI/420 MPA					KG		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N°3							
		FECHA ACTA		DIA		MES	ANO		
				30		7	2024		
		UBICACIÓN							
		ELEMENTO	VARRILLA No.	CANTIDAD	LONGITUD	TRASLAP	LONG. TOTAL	PESO/ML	SUMA
		PANTALLAS MÓDULO 1 y 2 COLUMNAS MÓDULO 1 Y 2. VIGAS, VIGUETA, ROSTRAS M1 VIGAS, VIGUETA, ROSTRAS M2 GARITA, COLUMNETAS V.CINTA							
		GRAFILES							
		M1 PISO 1							
		GUARDIA RADIOS	8,00	5,66		45,28	0,10	4,53	
			4,00	0,95		3,80	0,10	0,38	
			4,00	0,93		3,72	0,10	0,37	
		WC Y TABLEROS	8,00	6,80		54,40	0,10	5,44	
		PLANTA ELÉCTRICA	8,00	12,83		102,64	0,10	10,26	
		ZONA SEGURIDAD	8,00	7,03		56,24	0,10	5,62	
		ATE. CIUDADANO	8,00	5,67		45,36	0,10	4,54	
		CUARTO ASEO	8,00	3,88					
		ESCALERAS	4,00	4,00		16,00	0,10	1,60	
		M1 PISO 2							
		ARCHIVO	8,00	6,53		52,24	0,10	5,22	
		TEL. COMUNICACION Y CCTV	8,00	6,56		52,48	0,10	5,25	
		WC	8,00	3,87		30,96	0,10	3,10	
		SALA MULTIPLE	8,00	5,74		45,92	0,10	4,59	
		WC OFICINADANTE	8,00	3,89		31,12	0,10	3,11	
		WC OF COMINDANTE	8,00	3,00					
		M2 SOTANOS N-6,25							
		WC-11	6,00	5,04		30,21	0,10	3,02	
		CUARTO ASEO	6,00	1,84		11,04	0,10	1,10	
		BANO	6,00	3,50		21,00	0,10	2,10	
		DESPELUSA	6,00	1,97		11,82	0,10	1,18	
		ESCALERAS MODULO 1							
		PISO 1 A 2	4	16,00	5,50		88,00	0,99	87,47
			3	16,00	4,20		67,20	0,56	37,63
			4	10,00	1,70		17,00	0,99	16,90
			3	38,00	1,50		57,00	0,56	31,92
			3	40,00	1,70		68,00	0,56	38,08
			4	16,00	5,20		83,20	0,99	82,70
			4	12,00	2,50		30,00	0,99	29,82
			4	20,00	1,50		30,00	0,99	29,82
			4	20,00	2,00		40,00	0,99	39,76
		PISO 2	4	10,00	2,19		21,90	0,99	21,77
			4	8,00	1,64		13,12	0,99	13,04
		ESCALERAS MODULO 2							
		SOTANO A PISO 1	4	7,00	3,61		25,27	0,99	25,12
			4	6,00	1,65		9,87	0,99	9,81
			5	6,00	2,55		15,30	1,56	23,87
			5	4,00	2,09		8,36	1,56	13,04
			5	2,00	1,73		3,56	1,56	5,55
		PISO 1 A PISO 2	5	2,00	2,61		5,22	1,56	8,14
			5	4,00	2,67		10,68	1,56	16,66
			5	6,00	3,07		18,42	1,56	28,74
			4	6,00	1,90		11,40	0,99	11,33
			4	6,00	3,14		18,84	0,99	18,73
		PISO 2 A PISO 3	5	4,00	1,10		4,39	1,56	6,85
		DESPERDICIO	5%						4027,38
		CANTIDAD ACTA	1						-64350,00
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE						-59,664,44	
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA						19.161,75	
				CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS					
LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENIORIA							

LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

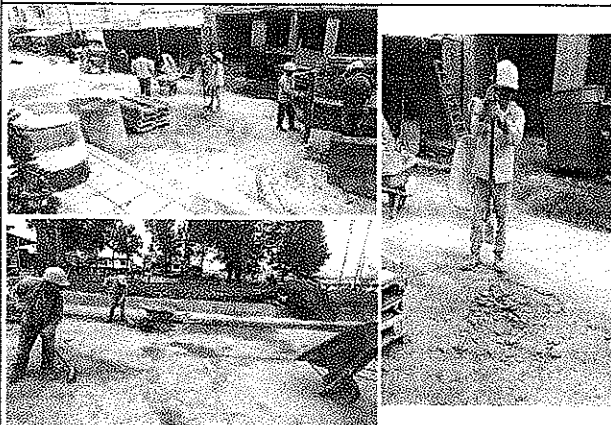
221
88

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS					
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23			
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S			
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			
CAPITULO		INSTALACION HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS			
N°	ITEM	DESCRIPCION	UND		
8	8.8.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160MM	ML		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3			
		FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
			30	7	2024
		UBICACIÓN	OBRA		
		ELEMENTO		LARGO	SUMA
		PLACA CONTRA PISO M2 N-6,25		5,10	5,10
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE			5,10
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			5,10
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO			
		REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS			

	
LEONEL RAÚL POVEDA HERNÁNDEZ	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

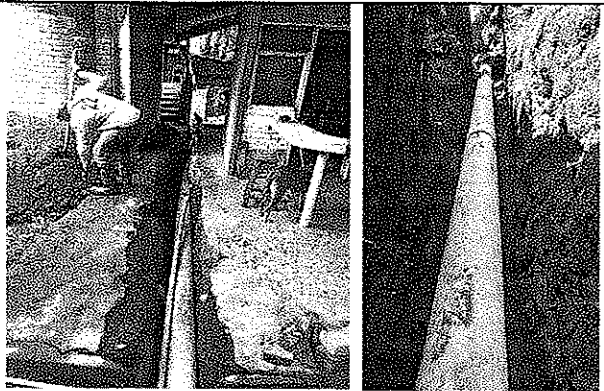



142

[illegible]

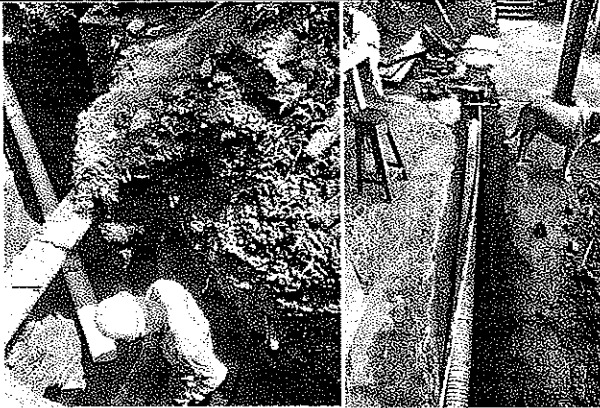
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


225
90
24

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS					
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23			
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S			
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			
CAPITULO		INSTALACION HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS			
Nº	ITEM	DESCRIPCION	UND		
8	8.8.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 160MM	ML		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA Nº.3			
		FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
		UBICACIÓN	OBRA		
		ELEMENTO	LARGO		SUMA
		PLACA CONTRA PISO M2 N-6,25	5,10		5,10
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE			5,10
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			5,10
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS			

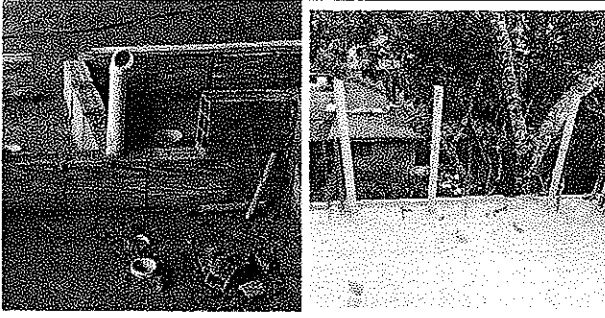
 LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA
---	--



226

		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE				
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-S-10295-23				
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S				
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S				
CAPITULO		INSTALACION HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS				
Nº	ITEM	DESCRIPCION			UND	
8	8.8.15	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 110MM			ML	
FOTOGRAFIA - PLANOS			ACTA N.º 3			
			FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
				24	6	2024
			UBICACIÓN	OBRA		
			ELEMENTO	LARGO	SUMA	
			PLACA CONTRA PISO M2 N-6,25	55,50	55,50	
OBSERVACIONES:			CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE		55,50	
			CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		55,50	
			CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS			

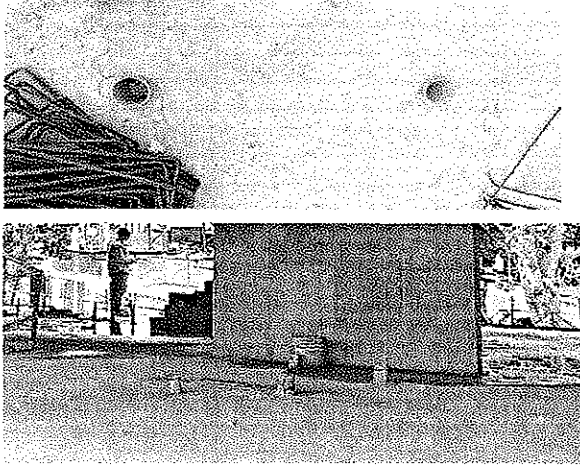
 LEONEL RAÚL POVEJA HERNÁNDEZ DIRECTOR DE OBRA	 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA
---	---


227
91
RW

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS					
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23			
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S			
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			
CAPITULO		5. INSTALACION HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS			
N°	ITEM	DESCRIPCION	UND		
8	8.8.35	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC-S DIAM= 2"	ML		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3			
		FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
			24	6	2024
		UBICACIÓN	OBRA		
		ELEMENTO	CANTIDAD	LARGO	SUMA
		PLACA ENTRE PISO M2 N+2,20	1,00	3,00	3,00
		PLACA ENTRE PISO M1 N+0,05	1,00	0,55	0,55
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE			3,55
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			3,55
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS			
		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			

 LEONEL RAÚL POVEDA HERNÁNDEZ DIRECTOR DE OBRA	 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA
---	--

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23			
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S			
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			
CAPITULO		INSTALACION HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS			
N°	ITEM	DESCRIPCION			UND
8	8.8.41	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-5 DIAM= 4"			UND
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N°3			
		FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
			24	6	2024
		UBICACIÓN	ELEMENTO	CANTIDAD	SUMA
		PLACA ENTRE PISO M1 N+0,05	UNIONES	3,00	3,00
		PLACA ENTRE PISO M1 N+4,00	UNIONES	3,00	3,00
		PLACA ENTRE PISO M1 N+4,01	REDUCCIONES	4,00	4,00
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE			10,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			10,00
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS			


	
LEONEL RAÚL POVEDA HERNÁNDEZ	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S



229
OL
RW



MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS					
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23			
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S			
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			
CAPITULO		6. INSTALACION HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS			
N°	ITEM	DESCRIPCION	UND		
6	8.8.42	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S DIAM= 3"	UND		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N°3			
		FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
			24	6	2024
		UBICACIÓN	ELEMENTO	CANTIDAD	SUMA
		PLACA CONTRA PISO M2 N-6,25	CODO	1,00	1,00
		PLACA ENTRE PISO M2 N+2,20	UNIONES	12,00	12,00
		PLACA ENTRE PISO M1 N+0,05	UNIONES	4,00	4,00
		PLACA ENTRE PISO M1 N+4,00	UNIONES	3,00	3,00
		PLACA ENTRE PISO M1 N+4,01	REDUCCIONES	3,00	3,00
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE			23,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			23,00
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO			
		REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS			
		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			

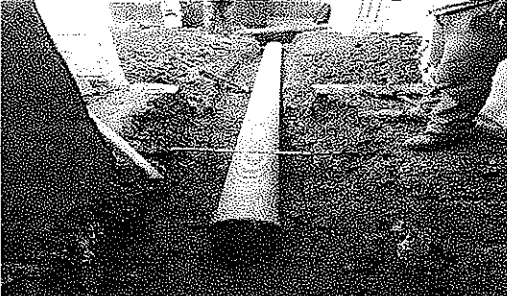

	
LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA


DIRECTOR DE INTERVENTORIA

230

		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23			
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S			
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			
CAPITULO		INSTALACION HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS			
N°	ITEM	DESCRIPCION			UND
8	8.8.43	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S DIAM= 2"			UND
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N°:3			
 		FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
			24	6	2024
		UBICACIÓN	ELEMENTO	CANTIDAD	SUMA
		PLACA ENTRE PISO M2 N+2,20	CODOS	6,00	6,00
			UNIONES	8,00	8,00
		PLACA ENTRE PISO M1 N+0,06	CODO	1,00	1,00
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE			15,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			15,00
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS			

	
LEONEL RAÚL POVEDA HERNÁNDEZ	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA



MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS						
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE				
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23				
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S				
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S				
CAPITULO		8. INSTALACION HIDROSANITARIA, INCENDIO Y DE GAS				
N°	ITEM	DESCRIPCION	UND			
8	8.10.16	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC ALCANTARILLADO 110MM	ML			
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N°3				
		FECHA ACTA		DIA	MES	AÑO
				24	6	2024
		UBICACION		OBRA		
		ELEMENTO	LARGO	ANCHO	ALTO	SUMA
		PVC - 110MM	-27,00			-27,00
		INSTALACION SANITARIA CASA CULTURAL			90,00	90,00
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE				63,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA				63,00
						
		CARLOS ALBERTO MANECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS				
GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S						

 LEONEL RAÚL POVEDA HERNÁNDEZ DIRECTOR DE OBRA	 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA
--	--

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

232

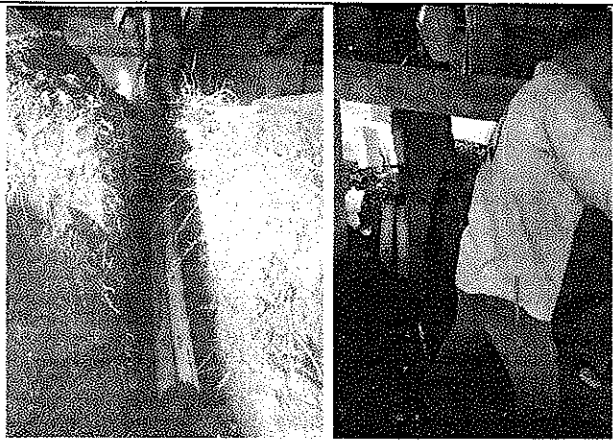
MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS					
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23			
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S			
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			
CAPITULO		8. INSTALACION HIDROSANTARIA, INCENDIO Y DE GAS			
N°	ITEM	DESCRIPCION	UND		
8	8.10.38	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC-S DIAM= 4"	UND		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3			
		FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
			24	6	2024
		UBICACIÓN	ELEMENTO	CANTIDAD	SUMA
		PLACA CUBIERTA M1 N°8,45	UNIONES	5,00	5,00
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE			5,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			5,00
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS			



	
LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

253

94
FW

		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE				
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23				
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S				
INTERVENTOR:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S				
CAPITULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CCTV				
N°	ITEM	DESCRIPCION			UND	
9	9.1.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P Diam= 3"			ML	
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N°3				
		FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO	
			24	6	2024	
		UBICACIÓN	OBRA			
		ELEMENTO	DIAMETRO	CANTIDAD	LARGO	SUMA
		CAJA 2 A PLANTA ELECTRICA	3	1,00	6,00	6,00
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE			6,00	
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			6,00	
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS				
		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S				

 LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA
---	---

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

234

		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIAO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE					
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23					
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S					
INTERVENTOR:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S					
CAPITULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CCTV					
N°	ITEM	DESCRIPCION					UND
5	9.1.6	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P DIAM= 1" - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION					ML
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3					
		FECHA ACTA	DIA		MES	AÑO	
				24		8	2024
		UBICACIÓN		OBRA			
		ELEMENTO	DIAMETRO	CANTIDAD	LARGO	SUMA	
		ACOM PRINCIPAL NORMAL N+0,05	1	1,00	60,00	60,00	
		ACOM PRINCIPAL REGULADA N-0,00	1	1,00	27,00	27,00	
		ACOM PRINCIPAL NORMAL N-6,25	1	1,00	36,00	36,00	
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE					123,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA					123,00
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS					

LEONEL RAUL POVEDA HERNANDEZ	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE OBRA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S

235

05
REV

		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23			
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S			
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			
CAPITULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CCTV			
Nº	ITEM	DESCRIPCION			UND
9	9.1.7	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC P DIAM= 3/4" - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION			ML

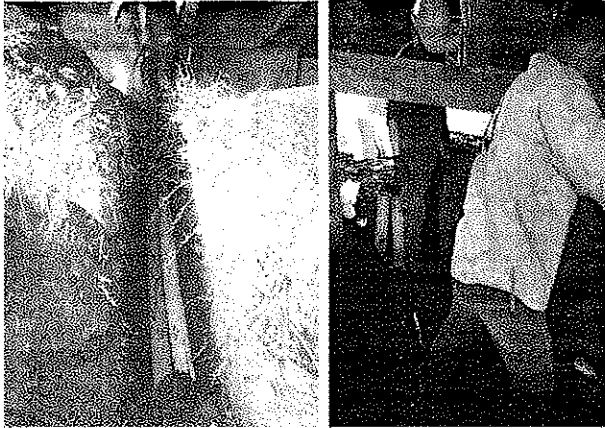


FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3					
		FECHA ACTA	DIA	MES	ANO		
			24	6	2024		
		UBICACION	OBRA				
		ELEMENTO	DIAMETRO	CANTIDAD	LARGO	SUMA	
		MÓDULO 1					
		PLACA ENTRE PISO 1 N=0,05	3/4	1	37	37,00	
		P1 EJE C	3/4	1	2,3	2,30	
		P5 EJE C	3/4	1	2,3	2,30	
		P7 EJE C	3/4	1	9	9,00	
		GUARDIA	3/4	4,00	2,20	8,80	
			3/4	2,00	3,00	6,00	
		CUARTO ASEO	3/4	1,00	2,10	2,10	
		ZONA SEGURIDAD	3/4	1,00	2,10	2,10	
			3/4	1,00	3,00	3,00	
		CHUT BASURAS	3/4	1,00	2,15	2,15	
		PLANTA ELECTRICA	3/4	1,00	2,15	2,15	
		ATE. CIUDADANO	3/4	2,00	3,00	6,00	
		ESCALERA SIRENA	3/4	2,00	2,20	4,40	
		DENUNCIAS	3/4	1,00	3,00	3,00	
		PLACA ENTRE PISO 2 N=4,00	3/4	1,00	42,40	42,40	
		PLACA CAMARAS	3/4	1,00	24,55	24,55	
		SALA MULTIPLE	3/4	6,00	3,00	18,00	
			3/4	6,00	0,40	2,40	
			3/4	2,00	2,35	4,70	
			3/4	1,00	1,80	1,80	
		ARCHIVO	3/4	3,00	3,00	9,00	
			3/4	1,00	2,30	2,30	
		VIGILANCIA Y ADOLESCENCIA	3/4	1,00	2,25	2,25	
			3/4	3,00	3,00	9,00	
		CCTV Y TELECOMUNICACION	3/4	2,00	2,35	4,70	
		MÓDULO 2					
		P8 Y P9 SOTANO	3/4	2,00	4,50	9,00	
		COCINA	3/4	1,00	8,70	8,70	
		BAÑOS	3/4	1,00	9,00	9,00	
		P9 PISO 1	3/4	1,00	11,30	11,30	
		P10	3/4	1,00	5,00	5,00	
		PLACA ENTRE PISO 1 N=2,50	3/4	1,00	72,00	72,00	
		PLACA ENTRE PISO 2 N=2,20	3/4	1,00	32,20	32,20	
		P. CONTRAP SOTANO COCINA A TABLERO	3/4	4,00	3,00	12,00	
		P. CONTRAP SOTANO POLICAFE A TABLERO	3/4	2,00	3,00	6,00	
		P. CONTRAP SOTANO POLICAFE	3/4	5,00	1,70	8,50	
		P. CONTRAP SOTANO POLICAFE	3/4	1,00	9,25	9,25	
		P. CONTRAP SOTANO POLICAFE	3/4	3,00	2,35	7,05	
		P. CONTRAP SOTANO POLICAFE	3/4	1,00	2,40	2,40	
		ESCALERA ALARMA SOTANO	3/4	1,00	1,70	1,70	
		P13 EJE A PISO 2	3/4	2,00	0,40	0,80	
		DESPENSA	3/4	1,00	2,00	2,00	

OBSERVACIONES: FEONEL RAÚL PÉREZ HERNÁNDEZ DIRECTOR DE OMA GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE		409,30
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		409,30
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS		

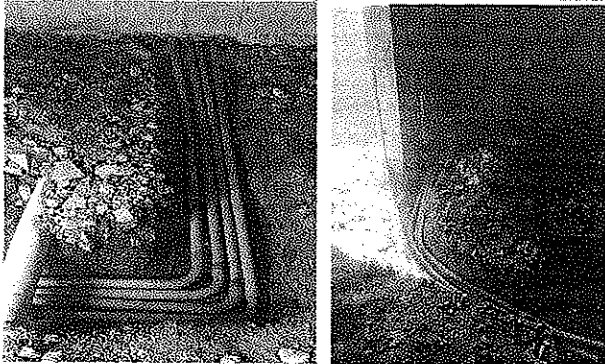

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

236

		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23			
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S			
INTERVENTOR:		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			
CAPITULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CCTV			
N°	ITEM	DESCRIPCION			UND
9	9.1.11	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P Diam= 3"			UND

FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3						
		FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO			
			24	6	2024			
		UBICACIÓN	OBRA					
		ELEMENTO	DIAMETRO	CANTIDAD	SUMA			
		CAJA 2 A PLANTA ELECTRICA	3	6,00	6,00			
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE		6,00				
 		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		6,00				
<table border="1"> <tr> <td>EDER NAUL POVEDA HERNANDEZ DIR. MUNICIPIO</td> <td>GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA</td> </tr> </table>		EDER NAUL POVEDA HERNANDEZ DIR. MUNICIPIO	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA	<table border="1"> <tr> <td>CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS</td> </tr> </table>				CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS
EDER NAUL POVEDA HERNANDEZ DIR. MUNICIPIO	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA							
CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS								

237
96
Fw

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS					
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23			
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S			
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			
CAPITULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CCTV			
N°	ITEM	DESCRIPCION	UND		
9	9.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P DIAM= 1" - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N°3			
		FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
			30	7	2024
		UBICACIÓN	OBRA		
		ELEMENTO	DIAMETRO	CANTIDAD	SUMA
		ACOM PRINCIPAL NORMAL N-0.05	1	8,00	8,00
		ACOM PRINCIPAL REGULADA N-000	1	2,00	2,00
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE			10,00
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA			10,00
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS			
 LEONEL RAÚL POVEDA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA		 GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA			



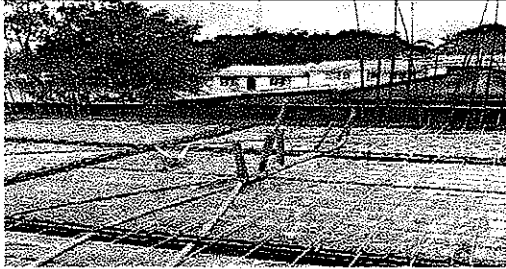


CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA
A PRECIOS UNITARIOS
FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE



CONTRATO No:	PN DIRAF No.06-6-10295-23		
CONTRATISTA:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S		
CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ, DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CCTV		
N°	ITEM	DESCRIPCION	UND
9	9.1.15	SUMINISTRO E INSTALACION ACCESORIOS PVC P DIAM= 3/4" - INCLUYE ELEMENTOS DE FIJACION	UND

FOTOGRAFIA - PLANOS



ACTA N°3

FECHA ACTA	DIA	MES	ANO
	30	7	2024
UBICACION	OBRA		
ELEMENTO	DIAMETRO	CANTIDAD	SUMA
MODULO 1			
PLACA ENTRE PISO 1 N+0,05	CURVAS	3/4	9,00
CUARTO ASEO	CURVAS	3/4	1,00
CHUT BASURAS	CURVAS	3/4	1,00
PLACA ENTRE PISO 2 N+4,00	CURVAS	3/4	28,00
DISPONIBLE	UNION	3/4	3,00
GUARDIA	UNION	3/4	10,00
ZONA SEGURIDAD	UNION	3/4	2,00
CUATO DE ASEO	UNION	3/4	1,00
CHUT BASURAS	UNION	3/4	2,00
PLANTA ELECTRICA	UNION	3/4	1,00
ATE. CIUDADANO	UNION	3/4	3,00
ESCALERA SIRENA	UNION	3/4	2,00
	UNION	3/4	1,00
OFICINA DENUNCIAS	UNION	3/4	1,00
SALA MULTIPLE	UNION	3/4	6,00
	UNION	3/4	3,00
	UNION	3/4	4,00
OFI. COMANDANTE	UNION	3/4	3,00
CCTV Y TELECOMUNICACION	UNION	3/4	6,00
ARCHIVOS	UNION	3/4	7,00
	UNION	3/4	3,00
ATENCION CIUDADANO	UNION	3/4	1,00
VIGILANCIA Y ADOLESCENCIA	UNION	3/4	1,00
DENUNCIAS	UNION	3/4	1,00
MODULO 2			
PLACA CONTRA PISO 1 N-6,25	CURVAS	3/4	3,00
PLACA ENTRE PISO 1 N-2,50	CURVAS	3/4	16,00
ESCALERAS PISO 1	CURVAS	3/4	5,00
PLACA ENTRE PISO 2 N+2,20	CURVAS	3/4	22,00
PLACA CONTRAPISO SOTANO	CURVAS	3/4	49,00
ESCALERA ALARMA SOTANO	CURVAS	3/4	2,00
COCINA	UNION	3/4	4,00
	UNION	3/4	2,00
DESPENSA	UNION	3/4	4,00
DESPENSA	CURVAS	3/4	1,00
PASILLO	UNION	3/4	5,00
	UNION	3/4	3,00
	UNION	3/4	2,00
ESCALERAS SOTANO	UNION	3/4	4,00
	UNION	3/4	2,00
ESCALERAS PISO 1	UNION	3/4	3,00
	UNION	3/4	6,00
	UNION	3/4	4,00
ALOJAMIENTO H	UNION	3/4	6,00
	UNION	3/4	1,00
ESCALERAS PISO 2	UNION	3/4	4,00
	UNION	3/4	1,00

OBSERVACIONES:

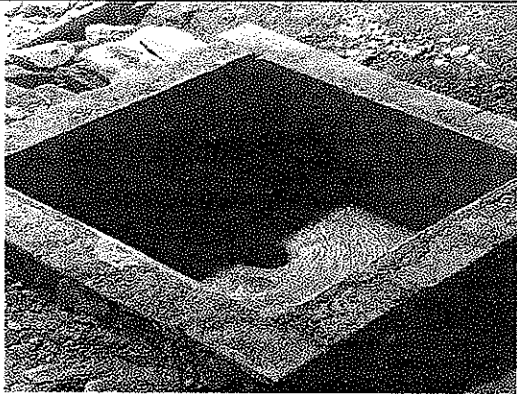


LEONEL RAÚL POVEDRA HERNÁNDEZ DIRECTOR DE OBRA	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE 248,00

CANTIDAD TOTAL EJECUTADA 248,00

CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO
REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS

239
07
RW

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS					
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23			
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S			
INTERVENTOR		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			
CAPITULO		INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ,DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CCTV			
N°	ITEM	DESCRIPCION	UND		
9	9.5.3	SUMINISTROE INSTALACION CAJA EN MAMPOSTERIA SENCILLA INSPECCION 1.00 X 1.00 - REF	UND		
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N°3			
		FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
			30	7	2024
		UBICACIÓN	OBRA		
		ELEMENTO		CANTIDAD	SUMA
		MODULO 2			
		SOTANO		1,00	1,00
OBSERVACIONES:		CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE		1,00	
		CANTIDAD TOTAL EJECUTADA		1,00	
		CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS			
					
LEONEL RAÚL POVEDA HERNÁNDEZ		GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S			
DIRECTOR DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA			

GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

240

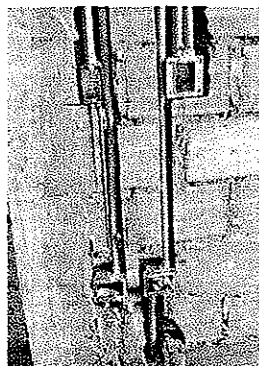
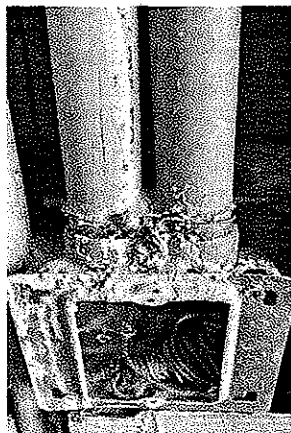
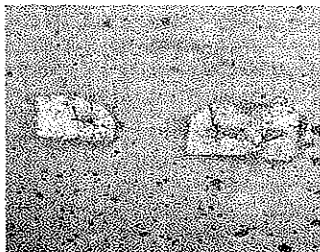


CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A
PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE



CONTRATO No:	PN DIRAF No.06-6-10255-23		
CONTRATISTA:	CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S		
INTERVENTOR:	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S		
CAPITULO	INSTALACIONES ELÉCTRICAS, VOZ,DATOS, SISTEMA DE DETECCIÓN DE INCENDIOS, CCTV		
N°	ITEM	DESCRIPCION	UND
9	9.5.14	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA RAWELT 4X4	UND

FOTOGRAFIA - PLANOS



ACTA N°3

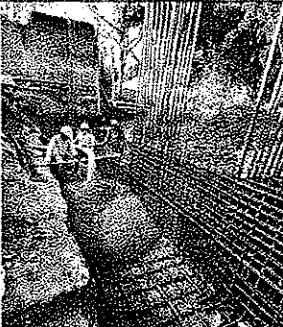
FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
	30	7	2024
UBICACIÓN	OBRA		
ELEMENTO	CANTIDAD	SUMA	
MODULO 1			
DISPONIBLE	3,00		3,00
GUARDIA	4,00		4,00
ZONA SEGURIDAD	1,00		1,00
CHUT BASURAS	1,00		1,00
ATE, CIUDADANO	3,00		3,00
ESCALERA SIRENA	1,00		1,00
	1,00		1,00
OFICINA DENUNCIAS	1,00		1,00
SALA MULTIPLE	6,00		6,00
	1,00		1,00
	2,00		2,00
OFI. COMANDANTE	3,00		3,00
CCTV Y TELECOMUNICACION	3,00		3,00
ARCHIVOS	3,00		3,00
	3,00		3,00
VIGILANCIA Y ADOLESCENCIA	1,00		1,00
MODULO 2			
COCINA	2,00		2,00
	2,00		2,00
DESPENSA	3,00		3,00
PASILLO	6,00		6,00
	1,00		1,00
	1,00		1,00
ESCALERAS SOTANO	2,00		2,00
	2,00		2,00
ESCALERAS PISO 1	3,00		3,00
	2,00		2,00
	1,00		1,00
ALOJAMIENTO H	3,00		3,00
	1,00		1,00
ESCALERAS PISO 2	1,00		1,00
	1,00		1,00

OBSERVACIONES:

FUNEL RAUL POVEDRA HERNANDEZ DIRECTOR DE OBRA	GORDILLO & ASOCIADOS S.A.S DIRECTOR DE INTERVENTORIA

CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE CORTE	67,00
CANTIDAD TOTAL EJECUTADA	67,00

CARLOS ALBERTO MAHECHA MORENO
REP. LEGAL CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES SAS

MEMORIAS DE CANTIDADES EJECUTADAS					
		CONSTRUCCION Y DOTACION DE LA ESTACION DE POLICIA DEL MUNICIPIO DE CAJIBIO EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE			
CONTRATO No:		PN DIRAF No.06-6-10295-23			
CONTRATISTA:		CONSTRUCAM CONSTRUCCIONES S.A.S			
INTERVENTOR:		GÓRDILLO & ASOCIADOS S.A.S			
CAPITULO		ACTIVIDADES NO PREVISTAS			
N°	ITEM	DESCRIPCION		UND	
	14.2.1	IMPERMEABILIZACION ACRILICA - CERESIT		M2	
FOTOGRAFIA - PLANOS		ACTA N° 3			
  		FECHA ACTA	DIA	MES	AÑO
			30	7	2024
		UBICACIÓN	OBRA		
		ELEMENTO	LARGO	ANCHO	SUMA
		ZAPATA 1	2,90	2,90	8,41
		ZAPATA 2	1,40	1,40	1,96
		ZAPATA 3	2,00	3,00	6,00
		ZAPATA 4	1,80	3,50	6,30
		ZAPATA 5	1,40	2,90	4,06
		ZAPATA 6	1,10	1,40	1,54
		ZAPATA 7	2,20	3,70	8,14
		ZAPATA 8	2,30	3,80	8,74
		ZAPATA 9	6,30	4,00	25,20
		ZAPATA 10	7,00	3,50	24,50
		ZAPATA 11	6,40	3,30	21,12
ZAPATA 12	7,00	2,90	20,30		
ZAPATA 13	6,10	3,20	19,52		
VC-1000	1,75	0,25	0,44		
VC-1001	2,30	0,25	0,58		
VC-1002	2,30	0,25	0,58		
VC-1003	1,75	0,25	0,44		
VC-1004	2,80	0,25	0,70		
VC-1005	2,80	0,25	0,70		
