

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

210

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
FIRMA CONTRATO		16/10/2024
ACTA DE INICIO		12/11/2024
OTROSI MODIFICATORIO No. 1		31/01/2025
OTROSI MODIFICATORIO No. 2		10/04/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1		N/A
ACTA DE REINICIO N°1		N/A

4.1.1. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	CDP	RP	VALOR	VIGENCIA
"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA."	2024000271	2024000579	\$ 107.311.701,00	2024
	2025000061	2025000047	\$ 107.311.701,00	2025

4.1.2. RELACION PERSONAL

PROFESIONAL INTERVENTORÍA		
NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO
DANIELA CARRILLO TAVERA	1.007.750.886	REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORÍA
FELIPE STAND VILLAREAL	79.533.915	DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
WILLIAM RAMIREZ SALINAS	12.137.865	RESIDENTE DE INTERVENTORIA
NELSON MUÑOZ LOSADA	1.075.255.228	PROFESIONAL HSEQ
YESSIKA TOLIMA MOLINA GARATIVO	1.075.210.127	PROFESIONAL HSEQ

	FORMATO			CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			VERSIÓN	1
				VIGENCIA	MAYO 2021

4.1.3 RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza legalización del CONTRATO:								
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533058523			
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA			
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO	
					Cumplimiento del contrato	16/10/2024	16/07/2025	\$21.462.340,20
					Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	16/10/2024	16/01/2025	\$10.731.170,10
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100032369	0	12/10/2024	Calidad del Servicio	16/10/2024	16/01/2025	\$21.462.340,20	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533058543			
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA			
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO	
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100005879	0	17/11/2024		16/10/2024	16/01/2025	\$ 260.000.000,00	

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533062221		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
					12/11/2024	12/08/2025	\$21.462.340,20
					12/11/2024	12/02/2025	\$10.731.170,10
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100032369	1-2	13/11/2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/08/2025	\$21.462.340,20
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/02/2025	\$10.731.170,10
				Calidad del Servicio	12/11/2024	12/02/2025	\$21.462.340,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533062223		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100005879	1-2	13/11/2024		12/11/2024	12/02/2025	\$ 260.000.000,00

Póliza actualizada x Otrosí No. 1 y Acta de justificación No. 1:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533074976		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100032369	3	06/02/2025	Cumplimiento del contrato	31/01/2025	12/10/2025	\$21.462.340,20
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	31/01/2025	12/04/2028	\$10.731.170,10
				Calidad del Servicio	12/04/2025	12/04/2030	\$21.462.340,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533074980		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100005879	3	06/02/2025		12/11/2024	12/04/2025	\$ 284.700.000,00

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderrhuila.gov.co - atencionusuario@inderrhuila.gov.co
 Neiva-Huila

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

212

Póliza actualizada x Otrosí No. 2 y Acta de justificación No. 2:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533085132		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100032369	4	14/04/2025	Cumplimiento del contrato	10/04/2025	12/12/2025	\$21.462.340,20
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	10/04/2025	12/06/2025	\$10.731.170,10
				Calidad del Servicio	12/06/2025	12/06/2030	\$21.462.340,20
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	533085135		
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100005879	4	14/04/2025		12/11/2024	12/06/2025	\$ 284.700.000,00

4.2 CONTRATO DE OBRA

Que mediante la Resolución 079 del 6 de junio de 2024 la Entidad abrió el Proceso de Contratación No. LOPIH001 - 2024, Que por medio de la Resolución 109 del 20 de agosto de 2024 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista **V&M INGENIERIA SAS.** cuya representante legal es **FERNANDO CAMACHO LADINO.**

CONTRATO No.	CLOPIH221 DE 2024
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	"CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA".
CONTRATISTA:	V&M INGENIERIA SAS NIT: 900.062.688-7 Representante Legal: YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO Celular: 3103273184 Correo Electrónico: vyingenieriasas@gmail.com
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$1.453.038.929,00) MCTE.
VALOR ADICIONAL:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$1.453.038.929,00) MCTE.
FECHA SUSCRIPCIÓN:	17/09/2024

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

213

PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES, contados a partir del acta de inicio
PLAZO ADICIONAL 01:	OTROSI No. 1: 31/01/2025 Prórroga: DOS (02) MESES.
PLAZO ADICIONAL 02:	OTROSI No. 2: 10/04/2025 Prórroga: DOS (02) MESES.
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	12 DE NOVIEMBRE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN 1:	N/A
FECHA DE REINICIO 1:	N/A
FECHA TERMINACION:	11 DE JUNIO DE 2025

Estado Financiero del Contrato de Obra					CLOPIH221 DE 2024
Objeto: "CONSTRUCCION CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA"					
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha	Valor Acta	Amortización 20%	Valor pagado	
Valor Anticipo	04/03/2025	\$290.607.785.20		\$290.607.785.20	
Acta Parcial No. 1	En tramite	\$1.166.288.639,00	\$233.257.727,80	\$933.030.911,20	
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado	
\$1.453.038.929,00	\$ 0	\$1.453.038.929,00	\$1.166.288.639,00	\$286.750.290,00	

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
FIRMA CONTRATO	10 de septiembre de 2024			
Iniciación	12 DE NOVIMEBRE DE 2024			
Plazo adicional No. 1	31/01/2025			
Plazo adicional No. 2	10/04/2025			
Suspensión No. 1	N/A			
Reiniciación No. 1	N/A			
Terminación Cto.	N/A			
TOTAL DIAS		188	0	

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
FIRMA CONTRATO		10/09/2024
ACTA DE INICIO		12/11/2024
OTROSI MODIFICATORIO No. 1		31/01/2025
OTROSI MODIFICATORIO No. 2		10/04/2025
ACTA DE SUSPENSIÓN N°1		N/A
ACTA DE REINICIO N°1		N/A

4.2.1 INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	CDP	RP	VALOR	VIGENCIA
"CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA."	2024000231	2024000480	\$ 1.453.038.929,00	2024
	2025000062	2025000049	\$ 1.453.038.929,00	2025

4.2.2 RELACION PERSONAL

PROFESIONAL OBRA		
NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	7.713.933	REPRESENTANTE LEGAL DE OBRA
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	7.713.933	DIRECTOR DE OBRA
ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO	1.079.409.298	RESIDENTE DE OBRA
OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	1.075.213.839	PROFESIONAL SISO
PABLO ARBEY LIZARAZO CORREA	17.709.845	MAESTRO DE OBRA
JOSE OTAIN CLAROS RODRIGUEZ	1.084.900.110	AYUDANTE
YANCARLOS BERNAL PIEDRAHITA	1.004.300.965	AYUDANTE
MANUEL BUSTOS SALDAÑA	1.006.531.292	AYUDANTE
DIEGO ALBERTO CASTILLA SCARPETTA	1.000.514.656	AYUDANTE
JOSE OTAIN CLAROS CABRERA	83.225.779	AYUDANTE
DEINER RAMOS ALVAREZ	1.081.513.643	AYUDANTE
DANIEL JOSE SANTOS MENDOZA	1.002.230.693	AYUDANTE
MARIO JOSE SANTOS URAN	92.533.487	AYUDANTE
LEONARDO TOVAR BETES	1.083.882.691	AYUDANTE
YOHAN ESTIH MAHECHA GUACA	1.007.451.455	AYUDANTE

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

205

4.2.3 RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza legalización del CONTRATO:								
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	N/A			
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA			
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO	
					Cumplimiento del contrato	27/09/2024	27/06/2025	\$145,303,893.00
					Buen Manejo y correcta inversión del Anticipo	27/09/2024	27/06/2025	\$290,607,786.00
					Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	27/09/2024	27/12/2027	\$72,651,946.50
Estabilidad y Calidad de la Obra	SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 0 DIAS		\$145,303,893.00					
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)				No. Certificado	N/A			
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA			
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO	
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101020276	0	27/09/2024		27/09/2024	27/12/2024	\$ 260.000.000,00	

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-101055753	1-2	19/11/2024	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/08/2025	\$145,303,893.00
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	12/08/2025	\$290,607,786.00
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/02/2028	\$72,651,946.50
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años, 0 meses y 0 día a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra objeto de la Interventoría.		\$145,303,893.00
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA			
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO	
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101020276	1-2	19/11/2024	12/11/2024	11/02/2025	\$ 260.000.000,00	

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

Póliza actualizada x PRORROGA No. 1:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO – OTRO SI No. 1 (31/01/2025) (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-101055753	3	12/02/2025	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/10/2025	\$145,303,893.00
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	12/10/2025	\$290,607,786.00
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/04/2028	\$72,651,946.50
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años, 0 meses y 0 día a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra objeto de la Interventoría.		\$145,303,893.00
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL – OTRO SI No. 1 (31/01/2025) (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101020276	3-4	12/02/2025		12/11/2024	12/04/2025	\$ 284.700.000,00

Póliza actualizada x PRORROGA No. 2:							
POLIZA DE CUMPLIMIENTO – OTRO SI No. 2 (31/01/2025) (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	61-44-101055753	4	16/04/2025	Cumplimiento del contrato	12/11/2024	12/12/2025	\$145,303,893.00
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	12/11/2024	12/12/2025	\$290,607,786.00
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	12/11/2024	12/06/2028	\$72,651,946.50
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 años, 0 meses y 0 día a partir de la suscripción del acta de recibo de la obra objeto de la Interventoría.		\$145,303,893.00
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL – OTRO SI No. 1 (31/01/2025) (Relacionar todas las actualizaciones)							
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA		
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)	VALOR ASEGURADO
SEGUROS DEL ESTADO	61-40-101020276	5	16/04/2025		12/11/2024	12/06/2025	\$ 284.700.000,00

 INDERHUILA	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

5. DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN

- El día 24 de octubre del 2024, la ingeniera **XIMENA ADELINDA JIMÉNEZ ZÚÑIGA** es designada mediante oficio por el Director del Inderhuila El doctor **FELIPE VICTORIA BARRAGÁN**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CIHCM228 – 2024** cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA", mediante proceso precontractual de selección de concurso de méritos No. 166-2024.
- El día 14 de febrero del 2025, el Ingeniero **LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ** es designado mediante oficio por la Director del Inderhuila El doctor **FELIPE VICTORIA BARRAGÁN**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CIHCM228 – 2024** cuyo objeto es la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTÉTICA VILLA OLÍMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE DEPARTAMENTO DEL HUILA", mediante proceso precontractual de selección de concurso de méritos No. 166-2024.

6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO POR EL APOYO A LA SUPERVISION

Dentro de las actividades desarrolladas se tiene las siguientes:

- El 12 de noviembre de 2024, con el apoyo de la supervisora, ingeniera Ximena Adelinda Jiménez Zúñiga, suscribió el acta de inicio del contrato de interventoría No. CIHCM229 de 2024.
- El 26 de noviembre de 2024 se llevó a cabo un comité en las instalaciones del Inderhuila, con la presencia de la ingeniera Ximena Adelinda Jiménez Zúñiga, en calidad de apoyo a la supervisión de la interventoría; Yerson Fernando Camacho Ladino, representante legal de la empresa V&M Ingeniería S.A.S.; y Daniela Carrillo Tavera, representante legal de Construmac Ingenieros S.A.S. Durante la reunión se revisaron los avances del proyecto y se atendieron inquietudes relacionadas con los diseños y el presupuesto de obra, identificándose inconsistencias entre los planos, las dimensiones y el presupuesto presentado. Como resultado, se acordó realizar una reunión técnica el día 2 de diciembre de 2024 para abordar dichas observaciones.
- El 23 de diciembre de 2024 se realizó un comité en las instalaciones del Inderhuila, con la participación de la ingeniera Ximena Adelinda Jiménez Zúñiga, como apoyo a la supervisión, y de los representantes legales de las firmas V&M Ingeniería S.A.S. y Construmac Ingenieros S.A.S., con el fin de socializar las respuestas de la Alcaldía Municipal de Guadalupe respecto a inquietudes del capítulo eléctrico. En dichas respuestas se confirmó la nueva ubicación de la cancha, lo cual implica realizar un balance de mayores y menores cantidades. El contratista informó que los avances de obra corresponden a la localización y replanteo, y se solicitó la entrega de los planes de manejo de tránsito, manejo ambiental, gerencia de calidad e informes mensuales.

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

4. El 17 de enero de 2025 se realizó un comité en las instalaciones del Inderhuila, con la participación de la ingeniera Ximena Adelinda Jiménez Zúñiga, como apoyo a la supervisión, y de los representantes legales de las firmas V&M Ingeniería S.A.S. y Construmac Ingenieros S.A.S., con el propósito de socializar el avance de obra a la fecha, correspondiente a actividades de localización, replanteo y descapote de la zona. Desde noviembre, el contratista ha realizado tres levantamientos topográficos para definir con precisión la ubicación del proyecto, identificando que el terreno presenta una topografía irregular que requiere mayores cortes y rellenos para lograr la nivelación. Dado que el contrato tiene como fecha de finalización el 11 de febrero y que, según el cronograma, no ha sido posible ejecutar las demás actividades, el contratista solicitó una prórroga de dos meses, la cual fue respaldada por la interventoría.
5. El 31 de enero de 2025, se elaboró el acta de justificación No. 1 de prórroga a contrato de obra No. CLIPHI221 de 2024 y al de la interventoría No. CIHCM228 de 2024.
6. El 18 de febrero de 2025, por medio del oficio IH 2-2025-0180 el apoyo de la supervisión, se hace una citación a la interventoría Construmac ingenieros SAS, la ingeniería Daniela Carrillo Tavera, a un comité en las instalaciones del INDERHUILA.
7. El 19 de febrero de 2025, se llevó a cabo un comité en las instalaciones del Inderhuila, con la presencia de la ingeniera Ximena, coordinadora de Gestión de Infraestructura; el ingeniero Luis Miguel Caquimbo, quien se incorporó como nuevo apoyo para la supervisión del contrato de interventoría; la ingeniera Adriana Mayorga, en representación del contratista; y Daniela Carrillo, en representación de la interventoría. El objetivo de la reunión fue socializar los avances de la obra y las dificultades presentadas hasta la fecha, así como presentar al ingeniero Luis Miguel Caquimbo como nuevo apoyo en la supervisión de la interventoría.
8. El 20 de febrero de 2025, **el ingeniero Luis Miguel Caquimbo, en calidad de apoyo a la supervisión de la interventoría**, realizó una solicitud de acompañamiento al comité de obra dirigida al ingeniero Deiber Calderón Rojas, secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de Guadalupe (Huila), mediante el oficio IH 2-2025-0197.
9. El 25 de febrero de 2025, en las instalaciones de la Secretaría de Planeación del municipio de Guadalupe, se llevó a cabo un comité técnico con el propósito de revisar el alcance de los diseños de la red eléctrica y de aguas pluviales, así como aclarar los puntos de conexión establecidos en el proyecto correspondiente al Contrato de Obra No. 382 de 2023, contratado por el Municipio de Guadalupe. En la reunión participaron el ingeniero **Luis Miguel Caquimbo Gómez, apoyo a la supervisión de la interventoría**, el ingeniero Yerson Fernando Camacho, RPL de V&M Ingeniería S.A.S., contratista de obra; la ingeniera Daniela Carrillo Tavera, RPL de Construmac Ingeniería S.A.S., contratista de interventoría; el ingeniero Felipe Herrera, apoyo eléctrico del Inderhuila y el Ingeniero Deiber Calderón, secretario de planeación del Municipio de Guadalupe. Posteriormente, los profesionales mencionados realizaron una visita técnica a la obra en el Municipio de Guadalupe Huila.
10. El 13 de marzo de 2025, el ingeniero Luis Miguel Caquimbo, en calidad de apoyo a la supervisión, mediante oficio IH 2-2025-0315, envió comunicación a la firma interventora Construmac Ingenieros S.A.S., representada por la ingeniera Daniela Carrillo Tavera, dando respuesta a la solicitud de aclaración sobre los estudios y diseños eléctricos, requerida mediante el oficio No. CONSTRU-INDER-2024-17. En dicha respuesta se remitieron los planos de distribución de acometidas, detalles del sistema de apantallamiento, distribución de la iluminación y el estudio fotométrico correspondiente.

 INDERHUILA	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

11. El 13 de marzo de 2025, el ingeniero Luis Miguel Caquimbo, en calidad de apoyo a la supervisión, mediante oficio IH 2-2025-0310 solicita informe detallado del avance de obra a la firma interventora Construmac Ingenieros S.A.S., representada por la ingeniera Daniela Carrillo Tavera.
12. El 28 de marzo de 2025, el ingeniero Luis Miguel Caquimbo, en calidad de apoyo a la supervisión, mediante oficio IH 2-2025-0380 cita a un comité en las instalaciones del Inderhuila a la firma interventora Construmac Ingenieros S.A.S., representada por la ingeniera Daniela Carrillo Tavera. Y al contratista V&M ingeniería SAS, representada por Yerson Fernando Camacho Ladino, así mismo para revisar avances de obra, balance y ajustes finales a los diseños eléctricos.
13. El 2 de abril de 2025 se llevó a cabo un comité en las instalaciones del Inderhuila, con la participación del ingeniero Luis Miguel Caquimbo, como apoyo a la supervisión del contrato de interventoría; del ingeniero Yerson Camacho, en representación del contratista; y de Daniela Carrillo, en representación de la interventoría, con el fin de revisar el avance de obra, las dificultades presentadas y el estado del balance de obra No. 1. Durante la reunión, el contratista manifestó que en el mes de marzo se presentaron retrasos debido a bloqueos en las vías y a demoras en la entrega de suministros ocasionadas por el paro arrocero, así como por las fuertes lluvias. Asimismo, se dejaron observaciones al balance para que el contratista las subsane, y la interventoría solicitó una prórroga por dos meses.
14. El 2 de abril de 2025, el ingeniero Luis Miguel Caquimbo, en calidad de apoyo a la supervisión, mediante el oficio IH 2-2025-0402, solicitó al ingeniero Deiber Calderón Rojas, secretario de Planeación y Obras Públicas del municipio de Guadalupe, el estado actual del proyecto "Construcción de infraestructura deportiva, pista de patinaje y canchas múltiples en el municipio de Guadalupe", contrato adjudicado por dicho municipio. Esta solicitud se realizó debido a los retrasos presentados en la ejecución del contrato No. CLPIH de 2024, suscrito por el Inderhuila, como consecuencia de ajustes en los diseños, entre ellos la implantación, el punto de conexión eléctrica y la red de aguas lluvias, actividades que deberán ser ejecutadas y finalizadas por el contratista de la Alcaldía de Guadalupe.
15. El 10 de Abril de 2025, se elaboró el acta de justificación No. 2 de prórroga a contrato de obra No. CLPIH221 de 2024 y al de la interventoría No. CIHCM228 de 2024.
16. El 14 de Abril de 2025, el ingeniero Luis Miguel Caquimbo, en calidad de apoyo a la supervisión, mediante oficio IH 2-2025-0504 Envía la justificación y OTROSI modificatorio No. 2 del contrato de interventoría No. 220 de 2024 y de obra 221 de 2024 a la firma interventora Construmac Ingenieros S.A.S., representada por la ingeniera Daniela Carrillo Tavera. Y al contratista V&M ingeniería SAS, representada por el ingeniero Yerson Camacho.
17. El 25 de abril de 2025, el ingeniero Luis Miguel Caquimbo, en calidad de apoyo a la supervisión, mediante el oficio IH 2-2025-0543, solicitó la entrega y aprobación del plan de gerencia, así como reiteró el incumplimiento del contrato de obra, en concordancia con lo manifestado previamente por la interventoría a través del oficio No. CONSTRU-INDER-2024-22, dirigido a la firma interventora Construmac Ingenieros S.A.S., representada por la ingeniera Daniela Carrillo Tavera.

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

18. El 7 de mayo de 2025 se llevó a cabo un comité en las instalaciones del Inderhuila, con la participación del ingeniero Luis Miguel Caquimbo, como apoyo a la supervisión del contrato de interventoría; el ingeniero Luis Miguel Ortega, en representación del contratista; y de la ingeniera Daniela Carrillo, en representación de la interventoría, con el fin de revisar el balance de obra presentado, sobre el cual se generaron observaciones técnicas que el contratista deberá subsanar. Asimismo, se socializaron observaciones a los informes mensuales de interventoría y, finalmente, la interventoría presentó la propuesta de cambio del profesional encargado del área de seguridad y salud en el trabajo (HSQ), proponiendo a la ingeniera Yessika Yolima Molina Garavito en reemplazo del señor Nelson Muñoz Losada. El apoyo a la supervisión revisó la documentación correspondiente y otorgó el aval, al verificarse el cumplimiento de los requisitos establecidos en el pliego de condiciones iniciales.
19. El 15 de mayo de 2025 se llevó a cabo un comité en obra en el municipio de Guadalupe - Huila, con la participación del ingeniero **Luis Miguel Caquimbo, como apoyo a la supervisión del contrato de interventoría**; del ingeniero Yerson Camacho, en representación del contratista; y de la ingeniera Daniela Carrillo, en representación de la interventoría, con el fin de revisar el avance físico y administrativo del contrato, las dificultades presentadas, el estado de los puntos eléctricos y de aguas lluvias, y el trámite del balance de obra No. 1. Durante la reunión, el contratista propuso una suspensión del contrato, argumentando que el contrato municipal No. 382 de 2023, encargado de ejecutar las actividades relacionadas con la red eléctrica y de aguas lluvias, aún no presenta avances, sumado a condiciones climáticas adversas que han afectado el desarrollo de las actividades en obra.

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo relacionado en el presente informe se han ejecutados las siguientes actividades:

1. PRELIMINARES.

- 1.1. Localización y replanteo
- 1.2. Descapote $e=0.20m$ a máquina incluye retiro manual

2. MOVIMIENTO DE TIERRAS

- 2.1. Excavación manual incluye retiro.
- 2.2. Excavación mecánica incluye retiro 1 Km.
- 2.3. Rellenos con recebo compactado mecánicamente.

3. RED DE AGUAS LLUVIAS

- 3.1. Construcción de cuneta perimetral en concreto 3000 PSI; Dimensiones: 40 cm de ancho y altura variable. incluye rejilla prefabricada en poliuretano.
- 3.4. Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4" + Tubería PVC drenajes de 6".

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

221

4. PLACA CANCHA

- 4.1. Placa de piso en concreto 3000 psi, e = 0,07m dilatada, junta machimbrada incluye malla electrosoldada de 5mm.
- 4.3. Suministro e instalación de césped monofilamentado rafia de 50mm de altura, con protección de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadrado de rafia, de 13200 dtx, base: backing doble capa, demarcación de color blanco con césped de blanco de fábrica, incluye granulo de caucho, pegamento importado.
- 4.4. Suministro e instalación de almohadilla de choque shock pad 20 mm
- 4.5. suministro e instalación de bordillos prefabricados 20x50x50

5. CERRAMIENTO

- 5.1. Concreto ciclópeo 2500 psi (60% concreto- 40% piedra media zonga) para cimentación cerramiento
- 5.2. Concreto 3000 psi viga de cimentación cerramiento 0,2x0,2m
- 5.3. Muro cerramiento en ladrillo semiprensado a la vista
- 5.4. Acero de refuerzo 37000 psi incluye figurado e instalación
- 5.5. Tubería galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, tapa
- 5.6. Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en Angulo 1 1/2"x1/8 con varilla de 5/8" lisa cada 14 cms, diagonales en Angulo 1 1/2" x 1/8 y lamina cal 16 10X10 cms de refuerzo en la esquinas (lado norte y sur) h=2,5m.
- 5.7. Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en Angulo 1 1/2"x1/8 con malla eslabonada cal 10 hueco 2 1/4" x2 1/4, diagonales en ángulo 1 1/2" x 1/8 y lamina cal 16 10X10cm de refuerzo en las esquinas (lado oriente y occidente) h= 2,5m
- 5.8. varilla de 5/8" lisa cada 14 cms, diagonales en Angulo 1 1/2" x 1/8 y lamina cal 16 10X10 cms de refuerzo en la esquinas (lado norte y sur) h=2,5m.
- 5.9. Concreto 3000 psi andenes perimetrales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta
- 5.10. Suministro e instalación de malla de cerramiento en nylon 100% alta densidad con protección UV, ojo 13x13, calibre #4 incluye; guaya, tensores y tubo de 2".
- 5.11. Pie de amigo en tubería galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, concreto 3000 psi 50x50x60 costados norte y sur.

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

8. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1									
CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				\$ 13.460.304,00		\$ 13.460.304,00		\$ 13.460.304,00
1.1	Localización y replanteo manual	m ²	1.924,00	\$ 2.226,00	\$ 4.282.824,00	1924,00	\$ 4.282.824,00	1924,00	\$ 4.282.824,00
1.2	Descapote e=0,20m a máquina incluye retiro material	m ²	1.924,00	\$ 4.770,00	\$ 9.177.480,00	1924,00	\$ 9.177.480,00	1924,00	\$ 9.177.480,00
2	MOVIMIENTO DE TIERRA				\$ 84.830.852,00		\$ 84.830.852,00		\$ 84.830.852,00
2.1	Excavación manual incluye retiro	m ³	119,94	\$ 31.545,00	\$ 3.783.507,00	119,94	\$ 3.783.507,00	119,94	\$ 3.783.507,00
2.2	Excavación mecánica incluye retiro 1 Km	m ³	384,80	\$ 19.793,00	\$ 7.616.346,00	384,80	\$ 7.616.346,00	384,80	\$ 7.616.346,00
2.3	Rellenos con recebo compactado mecánicamente	m ³	384,80	\$ 190.829,00	\$ 73.430.999,00	384,80	\$ 73.430.999,00	384,80	\$ 73.430.999,00
3	RED DE AGUAS LLUVIAS				\$ 38.483.328,00		\$ 31.568.417,00		\$ 31.568.417,00
3.1	Construcción de cuneta perimetral en concreto 3000 PSI; Dimensiones: 40 cm de ancho y altura variable. incluye rejilla prefabricada en poliuretano	ml	104,00	\$ 137.428,00	\$ 14.292.512,00	100,54	\$ 13.817.011,00	100,54	\$ 13.817.011,00
3.2	Caja inspección 1,0x 1,0 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	4,00	\$ 657.029,00	\$ 2.628.116,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.3	Red de aguas lluvias suministro e instalación de tubería PVC Ø 8" incluye: Transporte al sitio de la obra, cama con arena 15 cms y relleno material de la excavación a zanjón	ml	30,00	\$ 79.488,00	\$ 2.384.640,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1									
CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
3.4	Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4" + Tubería PVC drenajes de 6"	ml	178,00	\$ 99.727,00	\$ 17.751.406,00	178,00	\$ 17.751.406,00	178,00	\$ 17.751.406,00
3.5	Caja inspección 1.2x 1.2 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	2,00	\$ 713.327,00	\$ 1.426.654,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4	PLACA CANCHA				\$ 741.397.052,00		\$ 616.568.271,00		\$ 616.568.271,00
4.1	Placa de piso en concreto 3000 psi, e =0,07m dilatada, junta machimbrada incluye malla electrosoldada de 5mm.	m²	1.750,00	\$ 87.325,00	\$ 152.818.750,00	1460,55	\$ 127.542.529,00	1460,55	\$ 127.542.529,00
4.2	Marco para microfútbol futbol 8 6mX2m, en tubo galvanizado tipo pesado de 4", según especificaciones técnicas, incluye anclaje, malla e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und	2,00	\$ 2.344.832,00	\$ 4.689.664,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.3	Suministro e instalación de césped monofilamentado rafia de 50mm de altura, con protección de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadrado de rafia, de 13200 dtx, base: backing doble capa, demarcación de color blanco con césped de blanco de fábrica, incluye granulo de caucho, pegamento importado.	m²	1.750,00	\$ 181.076,00	\$ 316.883.000,00	1460,55	\$ 264.470.552,00	1460,55	\$ 264.470.552,00

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 - 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionsuuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila



FORMATO

PM-GID-F01

VERSIÓN

1

VIGENCIA

MAYO 2021

INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1									
CONDICIONES CONTRACTUALES									
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UNID	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	OBRA EJECUTADA		ACUMULADA	
						PRESENTE ACTA	CANTIDAD	VR/TOTAL	VR/TOTAL
4.4	Suministro e instalación de alimohadilla de choque shock pad 20 mm	m²	1.750,00	\$ 146.659,00	\$ 256.653.250,00	1460,55	1460,55	\$ 214.202.802,00	\$ 214.202.802,00
4.5	Suministro e instalación de bordillos prefabricado 20X50X50	ml	186,00	\$ 55.658,00	\$ 10.352.388,00	186,00	186,00	\$ 10.352.388,00	\$ 10.352.388,00
5	CERRAMIENTO				\$ 231.083.695,00			\$ 186.603.068,00	\$ 186.603.068,00
5.1	Concreto ciclópeo 2500 psi (60% concreto- 40% piedra media zonga) para cimentación	m³	16,74	\$ 376.028,00	\$ 6.294.709,00	15,52	15,52	\$ 5.835.955,00	\$ 5.835.955,00
5.2	Concreto 3000 psi viga de cimentación cerramiento 0,2x0,2m	m³	37,40	\$ 659.191,00	\$ 24.653.743,00	12,41	12,41	\$ 8.180.560,00	\$ 8.180.560,00
5.3	Muro cerramiento en ladrillo semiprensado a la vista	m²	112,50	\$ 105.765,00	\$ 11.898.563,00	93,28	93,28	\$ 9.865.759,00	\$ 9.865.759,00
5.4	Acero de refuerzo 37000 psi incluye figurado e instalación	kg	1.057,108	\$ 6.647,00	\$ 7.026.597,00	1041,24	1041,24	\$ 6.921.122,00	\$ 6.921.122,00
5.5	Tubería galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, tapa	ml	220,40	\$ 44.432,00	\$ 9.792.813,00	220,40	220,40	\$ 9.792.813,00	\$ 9.792.813,00
5.6	Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en ángulo 1 1/2"x1/8 con varilla de 5/8" lisa cada 14 cms, diagonales en ángulo 1 1/2" x 1/8 y lamina cal 16 10X10 cms de refuerzo en la esquinas (lado norte y sur) h=2,5m	m²	200,00	\$ 109.070,00	\$ 21.814.000,00	196,27	196,27	\$ 21.407.169,00	\$ 21.407.169,00
5.7	Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en ángulo 1 1/2"x1/8 con malla eslabonada cal 10 hueco 2 1/4"x2 1/4", diagonales en ángulo 1 1/2"x1/8 y lamina cal 16 10X10cm de	m²	268,75	\$ 54.091,00	\$ 14.536.956,00	265,92	265,92	\$ 14.383.879,00	\$ 14.383.879,00

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1									
CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
	refuerzo en la esquinas (lado oriente y occidente) h=2,5m								
5.8	Suministro e instalación de puerta en tubería 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado.	und	1,00	\$ 802.805,00	\$ 802.805,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.9	Concreto 3000 psi andenes perimetrales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta	m²	148,80	\$ 80.868,00	\$ 12.033.158,00	147,19	\$ 11.902.961,00	147,19	\$ 11.902.961,00
5.10	Suministro e instalación de malla de cerramiento en nylon 100% alta densidad con protección UV, ojo 13x13, calibre #4 incluye; guaya, tensores y tubo de 2"	m²	3.031,00	\$ 37.545,00	\$ 113.798.895,00	2408,00	\$ 90.408.360,00	2408,00	\$ 90.408.360,00
5.11	Pie de amigo en tubería galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, concreto 3000 psi 50x50x60 costados norte y sur	und	32,00	\$ 263.483,00	\$ 8.431.456,00	30,00	\$ 7.904.490,00	30,00	\$ 7.904.490,00
6	ILUMINACIÓN				\$ 53.175.912,00		\$ 0,00		\$ 0,00
6.1	Suministro, montaje y conexión de Proyector led 300 W SYLFLOOD, temperatura de color 5000K, vida útil 100000h, flujo luminoso 39000 lm incluye soporte	und	6,00	\$ 1.718.814,00	\$ 10.312.884,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
6.2	Suministro e Instalación de Tablero de 6 Circuitos con puerta incluye 3 breaker de 30 amp con normativa RETIE	und	1,00	\$ 511.864,00	\$ 511.864,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00



FORMATO

**INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA**

CODIGO

PM-GID-F01

VERSIÓN

1

VIGENCIA

MAYO 2021

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1

CONDICIONES CONTRACTUALES				OBRA EJECUTADA			ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	VR/TOTAL
6.3	Suministro e instalación de Acometida en CABLE CU AISL THHN/THWN - 2x8F+1x10T en tubería PVC 1"	ml	50,00	\$ 45.333,00	\$ 2.266.650,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6.4	Salida Parcial Eléctrica (2 THHN No.10 + 1 THHN No.12)	ml	50,00	\$ 42.110,00	\$ 2.105.500,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6.5	Suministro e instalación de postes de concreto pretensado L= 12 m 750 kg incluye transporte e izada	und	6,00	\$ 2.884.636,00	\$ 17.307.816,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6.6	Puesta a tierra en varilla coper weld cobre de 1/2" incluye conectores, cableado, soldadura y mejoramiento de tierra	und	1,00	\$ 513.186,00	\$ 513.186,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6.7	Murete para tablero de control en muro con bloque # 5	und	1,00	\$ 377.230,00	\$ 377.230,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6.8	Construcción de cajas de inspección tipo alumbrado en concreto de 30x30	und	6,00	\$ 266.806,00	\$ 1.600.836,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6.9	Cajas de inspección de 60X60 CM (medida interior)	und	8,00	\$ 336.951,00	\$ 2.695.608,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
6.10	Suministro e instalación de sistema de apantallamiento	und	1,00	\$ 15.484.338,00	\$ 15.484.338,00	0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
	TOTAL COSTO DIRECTO				\$ 1.162.431.143,00		\$ 933.030.912,00	\$ 933.030.912,00
	Administración	20%			\$ 232.486.229,00		\$ 186.606.182,00	\$ 186.606.182,00
	Imprevistos	1%			\$ 11.624.311,00		\$ 9.330.309,00	\$ 9.330.309,00
	Utilidad	4%			\$ 46.497.246,00		\$ 37.321.236,00	\$ 37.321.236,00
	TOTAL COSTO				\$ 1.453.038.929,00		\$ 1.166.288.639,00	\$ 1.166.288.639,00

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila

226

		FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01				
INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				VERSIÓN	1				
				VIGENCIA	MAYO 2021				
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1									
CONDICIONES CONTRACTUALES			OBRA EJECUTADA						
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
	AMORTIZACIÓN ANTICIPO			20%			\$ 233.257.728,80		
	VALOR TOTAL MENOS (-) AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO						\$ 933.030.911,20		
	% AVANCE DE OBRA						80,26547780%		80,26547780%

	FORMATO	CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	MAYO 2021

229

9. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO POR EL APOYO A LA SUPERVISION

1. Acta de inicio del contrato de interventoría No. CIHCM229 de 2024.

 ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA NÚMERO CIHCM229 DE 2024 ELABORADO ENTRE EL INSTITUTO ESPARTEANO DEL DEPORTE, LA COLEGACIÓN DEPORTIVA Y EL APOYO TECNICO DEL INSTITUTO DEPORTIVO DE NEIVA.	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ELABORADO ENTRE EL INSTITUTO ESPARTEANO DEL DEPORTE, LA COLEGACIÓN DEPORTIVA Y EL APOYO TECNICO DEL INSTITUTO DEPORTIVO DE NEIVA.
1. INFORMACION GENERAL CONTRATO DE OBRA CONTRATO DE OBRA VALOR DE APROXIMACIÓN DE \$ 1.000.000.000,00 FECHA DE EMISIÓN: 20 DE OCTUBRE DE 2024	2. INFORMACION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO VALOR \$ 1.000.000.000,00

 ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ELABORADO ENTRE EL INSTITUTO ESPARTEANO DEL DEPORTE, LA COLEGACIÓN DEPORTIVA Y EL APOYO TECNICO DEL INSTITUTO DEPORTIVO DE NEIVA.	ACTA DE INICIO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA ELABORADO ENTRE EL INSTITUTO ESPARTEANO DEL DEPORTE, LA COLEGACIÓN DEPORTIVA Y EL APOYO TECNICO DEL INSTITUTO DEPORTIVO DE NEIVA.
3. INFORMACION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO VALOR \$ 1.000.000.000,00	4. INFORMACION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO VALOR \$ 1.000.000.000,00

2. Acta de Comité realizado el 26 de noviembre de 2024

 ACTA DE COMITÉ ELABORADO ENTRE EL INSTITUTO ESPARTEANO DEL DEPORTE, LA COLEGACIÓN DEPORTIVA Y EL APOYO TECNICO DEL INSTITUTO DEPORTIVO DE NEIVA.	ACTA DE COMITÉ ELABORADO ENTRE EL INSTITUTO ESPARTEANO DEL DEPORTE, LA COLEGACIÓN DEPORTIVA Y EL APOYO TECNICO DEL INSTITUTO DEPORTIVO DE NEIVA.
5. INFORMACION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO VALOR \$ 1.000.000.000,00	6. INFORMACION PRESUPUESTAL PRESUPUESTO VALOR \$ 1.000.000.000,00

229

 INDERHUILA	FORMATO	CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	MAYO 2021

3. Acta de comité realizada el 23 de diciembre de 2024.

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, INFORME DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
ACTA DE COMITÉ DE OBRA
Código: PM-GID-F01
Versión: 1.0
Página: 1 de 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23/12/2024
FECHA DE EJECUCIÓN: 23/12/2024
FECHA DE ENTREGA: 23/12/2024
FECHA DE PAGO: 23/12/2024

FECHA DE ENTREGA: 23/12/2024
FECHA DE PAGO: 23/12/2024

FECHA DE ENTREGA: 23/12/2024
FECHA DE PAGO: 23/12/2024

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, INFORME DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
ACTA DE COMITÉ DE OBRA
Código: PM-GID-F01
Versión: 1.0
Página: 2 de 1

FECHA DE APROBACIÓN: 23/12/2024
FECHA DE EJECUCIÓN: 23/12/2024
FECHA DE ENTREGA: 23/12/2024
FECHA DE PAGO: 23/12/2024

FECHA DE ENTREGA: 23/12/2024
FECHA DE PAGO: 23/12/2024

FECHA DE ENTREGA: 23/12/2024
FECHA DE PAGO: 23/12/2024

4. Acta de comité realizada el 17 de enero de 2025,

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, INFORME DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
ACTA DE COMITÉ DE OBRA
Código: PM-GID-F01
Versión: 1.0
Página: 1 de 1

FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2025
FECHA DE EJECUCIÓN: 17/01/2025
FECHA DE ENTREGA: 17/01/2025
FECHA DE PAGO: 17/01/2025

FECHA DE ENTREGA: 17/01/2025
FECHA DE PAGO: 17/01/2025

FECHA DE ENTREGA: 17/01/2025
FECHA DE PAGO: 17/01/2025

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, INFORME DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
ACTA DE COMITÉ DE OBRA
Código: PM-GID-F01
Versión: 1.0
Página: 2 de 1

FECHA DE APROBACIÓN: 17/01/2025
FECHA DE EJECUCIÓN: 17/01/2025
FECHA DE ENTREGA: 17/01/2025
FECHA DE PAGO: 17/01/2025

FECHA DE ENTREGA: 17/01/2025
FECHA DE PAGO: 17/01/2025

FECHA DE ENTREGA: 17/01/2025
FECHA DE PAGO: 17/01/2025

5. Acta de justificación No. 1 de prorroga a contrato de obra No. CLPIH221 de 2024 y al de la interventoría No. CIHCM228 de 2024, del 31 de enero de 2025

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, INFORME DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
ACTA DE COMITÉ DE OBRA
Código: PM-GID-F01
Versión: 1.0
Página: 1 de 1

FECHA DE APROBACIÓN: 31/01/2025
FECHA DE EJECUCIÓN: 31/01/2025
FECHA DE ENTREGA: 31/01/2025
FECHA DE PAGO: 31/01/2025

FECHA DE ENTREGA: 31/01/2025
FECHA DE PAGO: 31/01/2025

FECHA DE ENTREGA: 31/01/2025
FECHA DE PAGO: 31/01/2025

**INFORME DE SUPERVISIÓN DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN, INFORME DE GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA**
ACTA DE COMITÉ DE OBRA
Código: PM-GID-F01
Versión: 1.0
Página: 2 de 1

FECHA DE APROBACIÓN: 31/01/2025
FECHA DE EJECUCIÓN: 31/01/2025
FECHA DE ENTREGA: 31/01/2025
FECHA DE PAGO: 31/01/2025

FECHA DE ENTREGA: 31/01/2025
FECHA DE PAGO: 31/01/2025

FECHA DE ENTREGA: 31/01/2025
FECHA DE PAGO: 31/01/2025



CODIGO	PM-GID-F01
VERSIÓN	1
VIGENCIA	MAYO 2021

 BOGOTÁ Fecha Aprobación: 13/03/2023	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIP-G	Código: DSI-CGID-F15 Versión: 2
	ACTA DE JUSTIFICACIÓN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA	

[illegible][illegible][illegible]

 MUNICIPALIDAD MOMPURA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DAI-COIN-E18 Versión: 2
	ACTA DE JUSTIFICACIÓN PROYECTOS INFRAESTRUCTURA	Página 2 de 6

CONTRATO DE OBRAS CLOP2421 DE 2024

[illegible]

FECHA PRESENTE ACTA: Treinta y seis (36) de mayo de 2025.

[illegible][illegible]

7. Acta de comité realizada el 19 de febrero de 2025

[illegible]

8. Oficio IH 2-2025-0197 del 20 de febrero de 2025.

[illegible]

9. Acta de comité técnico realizado el 25 de febrero de 2025

[illegible]



INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

[illegible]

 REPUBLICA DEL ECUADOR	MINISTERIO INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN - MING EFECTOR DE ACTAS DE COMISIÓN DE INVESTIGACIÓN DEPORTIVA	Código: 001-028-811 Fecha: 06/11/2013 Versión: 1.0 Página: 2 de 2
	ACTA DE COMISIÓN DE ORDEN	
	DISABOLLO	
	Informe de obra a que debió a proporcionar datos en este día de comisión se deberá adjuntar cantidad y monto efectivo de ser necesario.	
TABLAS - COMPROMISOS - TEMAS PRINCIPALES REUNIONES.		
Tema	Tarea	Responsable
1. Aporte de balance de obra de Capitalización de aguas lluvias.	VARI DUAL MIA RIA SCS	11 de febrero de 2013.
EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ysmael Jimenez Cordero Gerente General	Y. J. JIMENEZ CORDERO GERENTE GENERAL	 Y. J. JIMENEZ CORDERO
Jaime Gonzalez Alvarado Gerente General	J. GONZALEZ ALVARADO GERENTE GENERAL	 J. GONZALEZ ALVARADO
Luis Alvarado Gonzalez Gerente General	L. ALVARADO GONZALEZ GERENTE GENERAL	 L. ALVARADO GONZALEZ



10. Oficio IH 2-2025-0315 del 13 de marzo de 2025.

[illegible][illegible]

	<p>SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN - MIPG</p>	<p>Código: GIN-GEAR-ECG Versión: 2 Página 2 de 3</p>
<p>Fecha Actualización: 26/10/2022</p>	<p>COMUNICACIONES Y OFICIALES EXTERNAS</p>	

Página 31 de 44

	FORMATO	CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	MAYO 2021

15. Acta de justificación No. 2 de prórroga a contrato de obra No. CLIPIH221 de 2024 y al de la interventoría No. CIHCM228 de 2024. Del El 10 de Abril de 2025

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN: MPO	Código: DM-GID-F01
	ACTA DE JUSTIFICACIÓN PROYECTOS INFRAESTRUCTURA	Versión: 2 Página: 1 de 5

Qué el Comité de Interventoría No. CIHCM228 de 2024, al estar en vigencia, suscribe y respalda el presente Acta de Interventoría No. 2 de 2025, en el marco de la ejecución del contrato de obra No. CLIPIH221 de 2024.

CONTENIDO DEL CONTRATO DE INTERVENCIÓN

CONTRATO	INTERVENCIÓN
OBJETO	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE NEIVA, S.A.S.
CONTRATANTE	INDERHUILA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS GARCÍA GARCÍA
APROBADO POR	ANDRÉS GARCÍA GARCÍA
FECHA DE APROBACIÓN	10 de abril de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 de abril de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 de abril de 2025
FECHA DE EJECUCIÓN	10 de abril de 2025

RESOLUCIÓN

El Comité de Interventoría No. CIHCM228 de 2024, al estar en vigencia, suscribe y respalda el presente Acta de Interventoría No. 2 de 2025, en el marco de la ejecución del contrato de obra No. CLIPIH221 de 2024.

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN: MPO	Código: DM-GID-F01
	ACTA DE JUSTIFICACIÓN PROYECTOS INFRAESTRUCTURA	Versión: 2 Página: 2 de 5

Qué el Comité de Interventoría No. CIHCM228 de 2024, al estar en vigencia, suscribe y respalda el presente Acta de Interventoría No. 2 de 2025, en el marco de la ejecución del contrato de obra No. CLIPIH221 de 2024.

CONTENIDO DEL CONTRATO DE INTERVENCIÓN

CONTRATO	INTERVENCIÓN
OBJETO	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE NEIVA, S.A.S.
CONTRATANTE	INDERHUILA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS GARCÍA GARCÍA
APROBADO POR	ANDRÉS GARCÍA GARCÍA
FECHA DE APROBACIÓN	10 de abril de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 de abril de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 de abril de 2025
FECHA DE EJECUCIÓN	10 de abril de 2025

RESOLUCIÓN

El Comité de Interventoría No. CIHCM228 de 2024, al estar en vigencia, suscribe y respalda el presente Acta de Interventoría No. 2 de 2025, en el marco de la ejecución del contrato de obra No. CLIPIH221 de 2024.

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN: MPO	Código: DM-GID-F01
	ACTA DE JUSTIFICACIÓN PROYECTOS INFRAESTRUCTURA	Versión: 2 Página: 3 de 5

Qué el Comité de Interventoría No. CIHCM228 de 2024, al estar en vigencia, suscribe y respalda el presente Acta de Interventoría No. 2 de 2025, en el marco de la ejecución del contrato de obra No. CLIPIH221 de 2024.

CONTENIDO DEL CONTRATO DE INTERVENCIÓN

CONTRATO	INTERVENCIÓN
OBJETO	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE NEIVA, S.A.S.
CONTRATANTE	INDERHUILA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS GARCÍA GARCÍA
APROBADO POR	ANDRÉS GARCÍA GARCÍA
FECHA DE APROBACIÓN	10 de abril de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 de abril de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 de abril de 2025
FECHA DE EJECUCIÓN	10 de abril de 2025

RESOLUCIÓN

El Comité de Interventoría No. CIHCM228 de 2024, al estar en vigencia, suscribe y respalda el presente Acta de Interventoría No. 2 de 2025, en el marco de la ejecución del contrato de obra No. CLIPIH221 de 2024.

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN: MPO	Código: DM-GID-F01
	ACTA DE JUSTIFICACIÓN PROYECTOS INFRAESTRUCTURA	Versión: 2 Página: 4 de 5

Qué el Comité de Interventoría No. CIHCM228 de 2024, al estar en vigencia, suscribe y respalda el presente Acta de Interventoría No. 2 de 2025, en el marco de la ejecución del contrato de obra No. CLIPIH221 de 2024.

CONTENIDO DEL CONTRATO DE INTERVENCIÓN

CONTRATO	INTERVENCIÓN
OBJETO	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE NEIVA, S.A.S.
CONTRATANTE	INDERHUILA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS GARCÍA GARCÍA
APROBADO POR	ANDRÉS GARCÍA GARCÍA
FECHA DE APROBACIÓN	10 de abril de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 de abril de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 de abril de 2025
FECHA DE EJECUCIÓN	10 de abril de 2025

RESOLUCIÓN

El Comité de Interventoría No. CIHCM228 de 2024, al estar en vigencia, suscribe y respalda el presente Acta de Interventoría No. 2 de 2025, en el marco de la ejecución del contrato de obra No. CLIPIH221 de 2024.

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN: MPO	Código: DM-GID-F01
	ACTA DE JUSTIFICACIÓN PROYECTOS INFRAESTRUCTURA	Versión: 2 Página: 5 de 5

Qué el Comité de Interventoría No. CIHCM228 de 2024, al estar en vigencia, suscribe y respalda el presente Acta de Interventoría No. 2 de 2025, en el marco de la ejecución del contrato de obra No. CLIPIH221 de 2024.

CONTENIDO DEL CONTRATO DE INTERVENCIÓN

CONTRATO	INTERVENCIÓN
OBJETO	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO DE OBRA DE LA CONSTRUCCIÓN DE LA CARRERA 18 CALLE 17 ESQUINA DE LA UNIDAD DEPORTIVA, EN EL MUNICIPIO DE NEIVA, DEPARTAMENTO DE NEIVA, S.A.S.
CONTRATANTE	INDERHUILA S.A.S.
REPRESENTANTE LEGAL	ANDRÉS GARCÍA GARCÍA
APROBADO POR	ANDRÉS GARCÍA GARCÍA
FECHA DE APROBACIÓN	10 de abril de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 de abril de 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN	10 de abril de 2025
FECHA DE EJECUCIÓN	10 de abril de 2025

RESOLUCIÓN

El Comité de Interventoría No. CIHCM228 de 2024, al estar en vigencia, suscribe y respalda el presente Acta de Interventoría No. 2 de 2025, en el marco de la ejecución del contrato de obra No. CLIPIH221 de 2024.

[illegible]

[illegible][illegible][illegible][illegible]

	FORMATO	CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	MAYO 2021

18. Acta de comité del 7 de mayo de 2025

	MODELO INFORMATIVO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG PROYECTO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ACTA COMITÉ DE OBRA	Código: GID-F01 Versión: 1.0 Página: 1 de 1
RESUMEN Se informa al Comité de Obra sobre el avance de las obras de construcción de la cancha deportiva, se revisa el avance de las obras y se toma las decisiones correspondientes.		
DESARROLLO Se informa al Comité de Obra sobre el avance de las obras de construcción de la cancha deportiva, se revisa el avance de las obras y se toma las decisiones correspondientes.		
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se recomienda continuar con las obras de construcción de la cancha deportiva, se revisa el avance de las obras y se toma las decisiones correspondientes.		

19. Acta de comité en obra del 15 de mayo de 2025.

	MODELO INFORMATIVO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG PROYECTO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ACTA COMITÉ DE OBRA	Código: GID-F01 Versión: 1.0 Página: 1 de 1
RESUMEN Se informa al Comité de Obra sobre el avance de las obras de construcción de la cancha deportiva, se revisa el avance de las obras y se toma las decisiones correspondientes.		
DESARROLLO Se informa al Comité de Obra sobre el avance de las obras de construcción de la cancha deportiva, se revisa el avance de las obras y se toma las decisiones correspondientes.		
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se recomienda continuar con las obras de construcción de la cancha deportiva, se revisa el avance de las obras y se toma las decisiones correspondientes.		

	MODELO INFORMATIVO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG PROYECTO DE GESTIÓN DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA ACTA COMITÉ DE OBRA	Código: GID-F01 Versión: 1.0 Página: 1 de 1
RESUMEN Se informa al Comité de Obra sobre el avance de las obras de construcción de la cancha deportiva, se revisa el avance de las obras y se toma las decisiones correspondientes.		
DESARROLLO Se informa al Comité de Obra sobre el avance de las obras de construcción de la cancha deportiva, se revisa el avance de las obras y se toma las decisiones correspondientes.		
CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES Se recomienda continuar con las obras de construcción de la cancha deportiva, se revisa el avance de las obras y se toma las decisiones correspondientes.		

240

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DE OBRA



Socialización de proyecto de obra



Conformación De veeduría



1.1 Localización y replanteo

241


	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021



1.2 Descapote e=0,20m a máquina incluye retiro material



Retiro de material sobrante

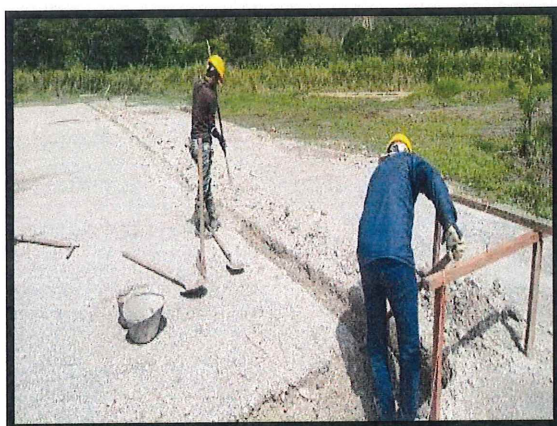

2.1 Excavación manual



2.2 Excavación mecánica incluye retiro

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021



2.3 Relleno con recebo compactado mecánicamente



3.1 Construcción cuneta perimetral



3.4 Construcción de filtros laterales recubrimiento en geotextil

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021



4.1 Placa de piso en concreto 3000 PSI



4.3 Suministro e Instalacion de cespel




4.4 Suministro e instalacion de almohadilla

244

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021



4.5 Suministro e instalación de bordillos prefabricados

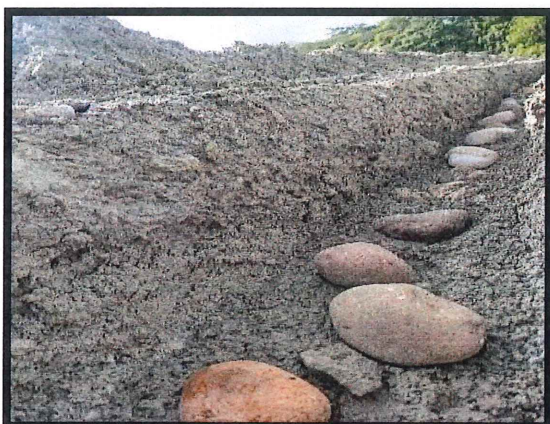

5.1 Concreto ciclópeo 2500 psi



5.2 Concreto 3000 PSI viga de cimentación

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderrhuila.gov.co - atenciomusuario@inderrhuila.gov.co
 Neiva-Huila

245

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021



5.3 Muro cerramiento en ladrillo




5.4 Acero de refuerzo



5.5 Tubería Galvanizada

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021

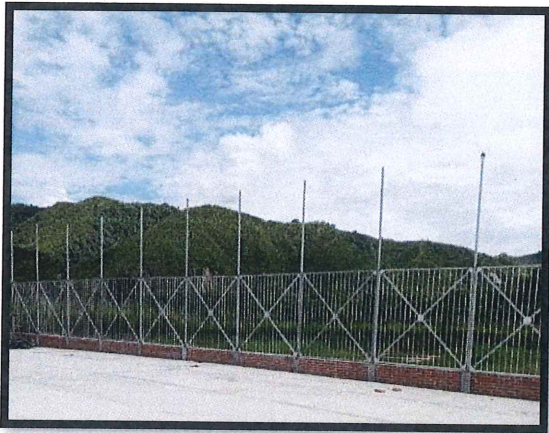

5.6 y 5.7 Módulos de cerramiento



5.9 Concreto 3000 PSI andenes



5.10 Suministro e instalación de malla de cerramiento en Nylon

247

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	MAYO 2021



Pie De amigo en tubería galvanizada

10. AVANCE DE OBRAS Y TRABAJOS

El porcentaje de obra ejecutado a la fecha del presente informe es del 80.27%.

Ing. LUIS MIGUEL CAQUIMBO GOMEZ
Apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría

INFORME PARCIAL DE OBRA. (FIRMA CONTRATISTA E INTERVENTOR)

v&m
ingeniería
SAS

246

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F28
		Versión: 2
	INFORME DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA	Página 1 de 44

CONTRATO DE OBRA No. CLOPIH221 de 2024

INFORME DE OBRA No. 1

PARCIAL

☒

FINAL

☐

Objeto Contrato: "CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"



MUNICIPIO: GUADALUPE

DEPARTAMENTO: HUILA

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DIH-CGID-F28	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA	
	Versión: 2 Página 2 de 44	

CONTRATO DE (OBRA) No. CLOPIH221 DE 2024 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y LA FIRMA V&M INGENIERIA SAS

APOYO A LA SUPERVISIÓN	LUIS MIGUEL CAQUIMBO	ENTIDAD	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CLOPIH221 DE 2024		
OBJETO	"CONSTRUCCIÓN CANCHA SINTETICA VILLA OLIMPICA DEL MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA"	PERIODO DEL INFORME	Entre 12 de noviembre de 2024 al 19 de mayo de 2025
CONTRATISTA	V&M INGENIERIA SAS	NIT:	900.062.688-7
REPRESENTANTE LEGAL:	YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	C.C:	7.713.933
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	27 DE SEPTIEMBRE DE 2024		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	12 DE NOVIEMBRE DE 2024		
PLAZO INICIAL	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	31 DE ENERO DE 2025 DOS (02) MESES		
PLAZO ADICIONAL (No.2) (D/M/A):	10 DE ABRIL DE 2025 DOS (02) MESES		
PLAZO TOTAL:	SIETE (07) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO Y CONFORME AL ADICIONAL EN TIEMPO MEDIANTE PRORROGA NO.2		
VALOR INICIAL:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$1.453.038.929,00) MCTE		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	N/A		
VALOR TOTAL:	MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES MILLONES TREINTA Y OCHO MIL NOVECIENTOS VEINTINUEVE PESOS (\$1.453.038.929,00) MCTE		
INTERVENTOR:	CONSTRUMAC INGENIEROS SAS	NIT:	900.116.571-8
REPRESENTANTE LEGAL:	DANIELA CARRILLO TAVERA	C.C:	1.007.750.886
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO			
<p>El proyecto Construcción Cancha Sintética Villa Olímpica del Municipio de Guadalupe, Departamento del Huila, se ubica en el municipio de Guadalupe, - Huila, en la región andina de Colombia.</p> <p>Esta localidad se encuentra rodeada de paisajes montañosos y ríos, es conocida por su belleza natural y su enorme herencia cultural. La cancha sintética se construirá dentro de las instalaciones del proyecto macro Villa Olímpica, área designada para actividades deportivas y recreativas que beneficiarán a la comunidad local.</p> <p>MUNICIPIO DE GUADALUPE HUILA, ESPECIFICAMENTE EN EL KM 3 VIA MUNICIPIO DE GUADALUPE AL MUNICIPIO DE ALTAMIRA.</p>			

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F28
	INFORME DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA	Versión: 2 Página 3 de 44
Fecha Aprobación: 13/02/2023		



3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

La construcción de la cancha sintética tendrá una superficie total de 1750 m² y contará con una serie de características y componentes, incluyendo:

- Red de aguas lluvias con cuneta perimetral de concreto de 3000 psi, cajas de inspección y filtros laterales
- Placa de piso de 3000 psi
- Instalación de césped
- Demarcación de la cancha
- Cerramiento perimetral
- Iluminación

El proyecto busca proporcionar un espacio seguro y de alta calidad para la práctica deportiva y recreativa, así como para la realización de eventos culturales y comunitarios.

4. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

Se realiza reunión con el Comité de Veeduría, secretaria de Planeación y directores de la obra para supervisar avances y calidad del proceso de construcción del proyecto CLOPIH 221/2024. El director de la obra presenta los resultados alcanzados y la gestión del control de la obra, con el fin de garantizar el cumplimiento de los objetivos establecidos y la transparencia en el proceso.

5. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	12/11/2024			
Otrosi No.1 – Prorroga	31/01/2025	80		12/04/2025

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DIH-CGID-F28	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA	
	Versión: 2 Página 4 de 44	

Otrosí No. 2 – Prorroga	10/04/2025	69		11/06/2025
Suspensión No. 1	N/A		1	
Reiniciación No. 1	N/A			
TERMINACIÓN Cto.	11/06/2025			
TOTAL, DIAS		188	1	

6. ACTAS

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO		12/11/2024
ACTA DE MODIFICACIÓN	1	31/01/2025
ACTA DE MODIFICACIÓN	2	10/04/2025
ACTA PARCIAL	1	19/05/2025

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). Actividades administrativas	<p>Registro en la bitácora de obra de las actividades realizadas durante el periodo del informe.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Presentación de informes mensuales para revisión y aprobación de la interventoría, según los lineamientos contractuales. - Respuesta oportuna mediante oficios a los requerimientos relacionados con la ejecución del contrato por parte del interventor o la supervisión. - Revisión y trámite oportuno de las actas levantadas en el periodo del informe - Solicitud de adición, prórroga y/o solicitud de modificación, suspensión, reiniciación o liquidación del contrato por parte del contratista con el fin de suscribir modificatorio No. 3 durante el periodo en mención. - Control financiero de las obras ejecutadas y control presupuestal. - Pago de servicios públicos provisionales para la ejecución de la obra. - Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones de todo el personal que se encuentra laborando para la ejecución de la obra. - Cumplimiento con obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral del personal vinculadora a la obra. - Afiliación de personal directo, verificando que se ubique en el nivel de riesgo correspondiente. - Cuantificación de mayores y menores cantidades para entrega de balance No.1
b.) Actividades operativas	<p>En el marco de la ejecución del contrato, durante el periodo comprendido desde el 12 de noviembre de 2024 al 19 de mayo de 2025 se llevaron a cabo las actividades programadas correspondientes a los capítulos:</p> <ol style="list-style-type: none"> PRELIMINARES. <ul style="list-style-type: none"> ➤ 1.1. Localización y replanteo ➤ 1.2. Descapote e=0.20m a máquina incluye retiro manual MOVIMIENTO DE TIERRAS

251

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F28
	INFORME DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA	Versión: 2 Página 5 de 44
Fecha Aprobación: 13/02/2023		

	<ul style="list-style-type: none">➤ 2.1. Excavación manual incluye retiro.➤ 2.2. Excavación mecánica incluye retiro 1 Km.➤ 2.3. Rellenos con recebo compactado mecánicamente. <p>3. RED DE AGUAS LLUVIAS</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 3.1. Construcción de cuneta perimetral en concreto 3000 PSI; Dimensiones: 40 cm de ancho y altura variable. incluye rejilla prefabricada en poliuretano.➤ 3.4. Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4" + Tubería PVC drenajes de 6" <p>4. PLACA CANCHA</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 4.1. Placa de piso en concreto 3000 psi, e =0,07m dilatada, junta machimbrada incluye malla electrosoldada de 5mm.➤ 4.3. Suministro e instalación de césped monofilamentado rafia de 50mm de altura, con proteccion de rayos UV, con 1300 gramos por metro cuadrado de rafia, de 13200 dtx, base: backing doble capa, demarcacion de color blanco con cesped de blanco de fábrica, incluye granulo de caucho, pegamento importado.➤ 4.4. Suministro e instalacion de almohadilla de choque shock pad 20 mm➤ 4.5. suministro e instalación de bordillos prefabricados 20x50x50 <p>5. CERRAMIENTO</p> <ul style="list-style-type: none">➤ 5.1. Concreto ciclópeo 2500 psi (60% concreto- 40% piedra media zonga) para cimentación cerramiento➤ 5.2. Concreto 3000 psi viga de cimentación cerramiento 0,2x0,2m➤ 5.3. Muro cerramiento en ladrillo semiprensado a la vista➤ 5.4. Acero de refuerzo 37000 psi incluye figurado e instalación➤ 5.5. Acero de refuerzo 37000 psi incluye figurado e instalación➤ 5.6. Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en angulo 1 1/2"x1/8 con varilla de 5/8" lisa cada 14 cms, diagonales en Angulo 1 1/2" x 1/8 y lamina cal 16 10X10 cms de refuerzo en la esquinas (lado norte y sur)h=2,5m➤ 5.9. Concreto 3000 psi andenes perimentrales e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta➤ 5.10. Suministro e instalacion de malla de cerramiento en nylon 100% alta densidad con proteccion UV, ojo 13x13, calibre #4 incluye; guaya, tensores y tubo de 2"➤ 5.11. Suministro e instalacion de malla de cerramiento en nylon 100% alta densidad con proteccion UV, ojo 13x13, calibre #4 incluye; guaya, tensores y tubo de 2"
--	---


8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO DURANTE EL PERIODO

Durante el periodo comprendido a partir del 12 de noviembre de 2024 al 19 de mayo de 2025, el municipio de Guadalupe, Huila, experimentó condiciones climáticas adversas con fuertes precipitaciones que dificultaron el desarrollo óptimo de las actividades programadas. La ola invernal que afecta la región ha generado dificultades en la movilidad, interrupción de actividades y daños a la infraestructura, lo que ocasionó pérdidas económicas considerables al contratista y retrasos en el cronograma de actividades predecesoras.


De acuerdo a lo anterior esto genero costos adicionales, reprogramación de las actividades ajuste del cronograma de ejecución con medidas de mitigación a la eventualidad presentada.




Promedio mensual de lluvias en diciembre – Guadalupe Huila

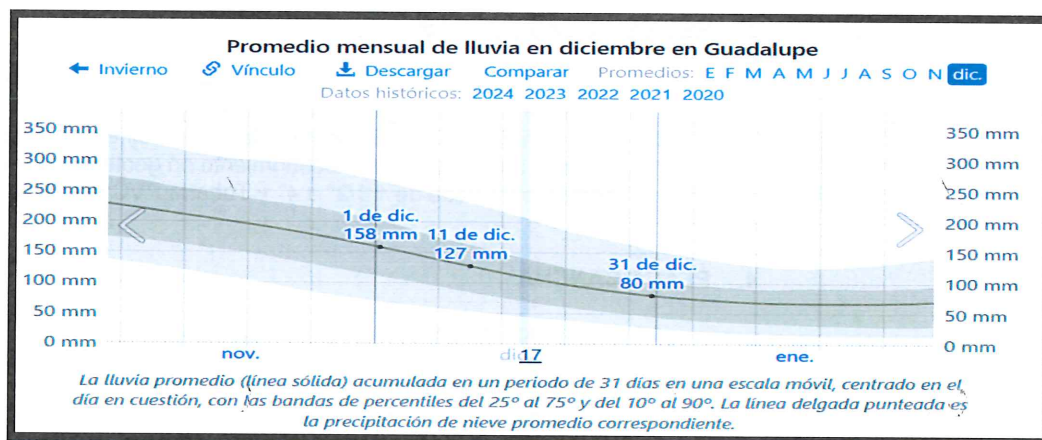


Promedio mensual de lluvia en enero - Guadalupe Huila

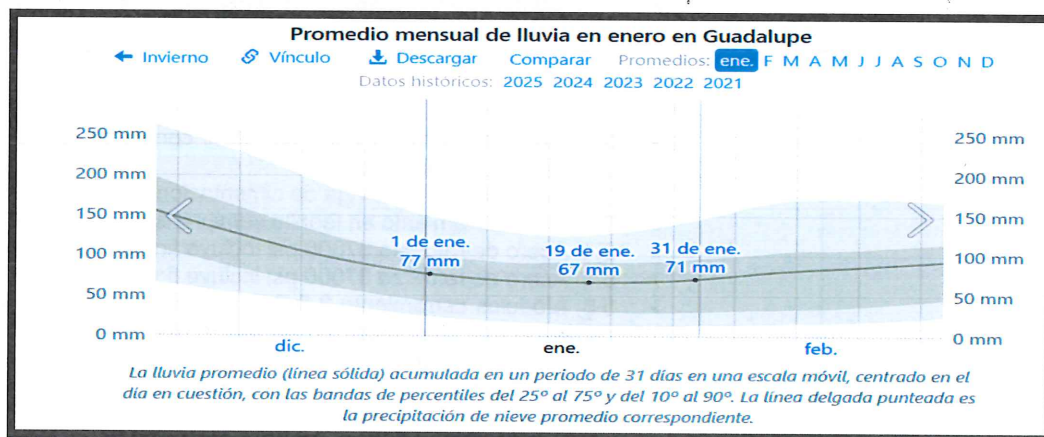


Promedio mensual de lluvia en febrero - Guadalupe Huila

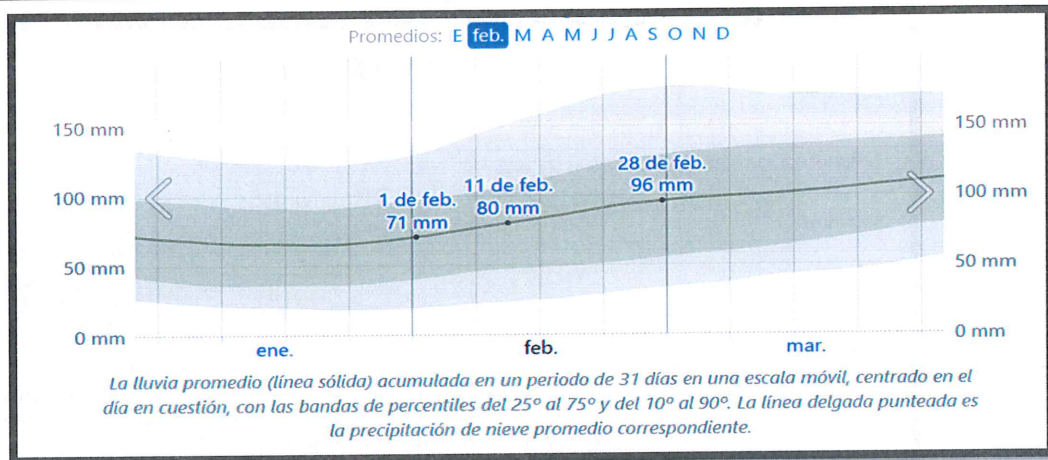

Promedio mensual de lluvia en marzo en Guadalupe

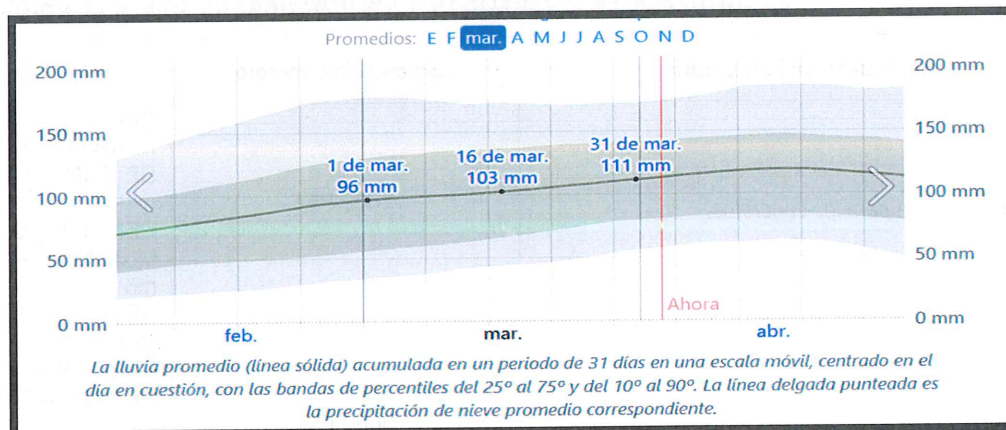


Promedio mensual de lluvia en abril en Guadalupe

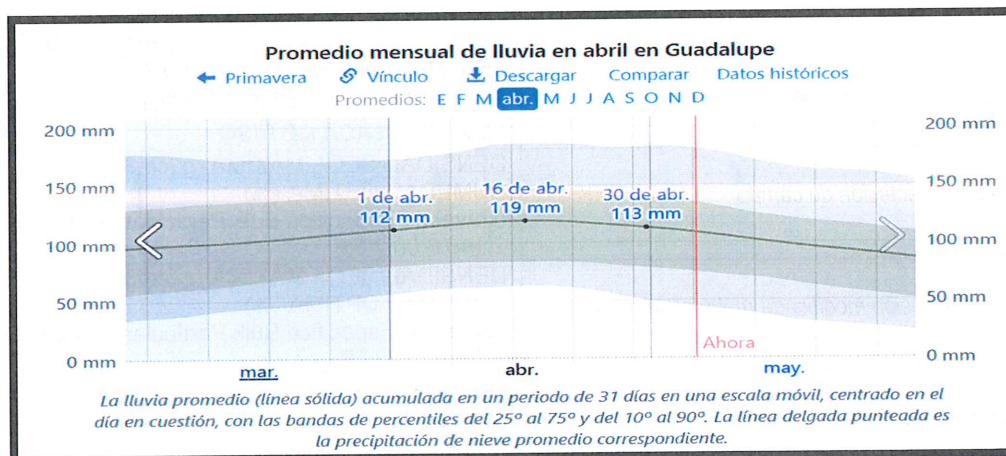

Promedio mensual de lluvia en mayo en Guadalupe

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F28
		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA	Página 8 de 44

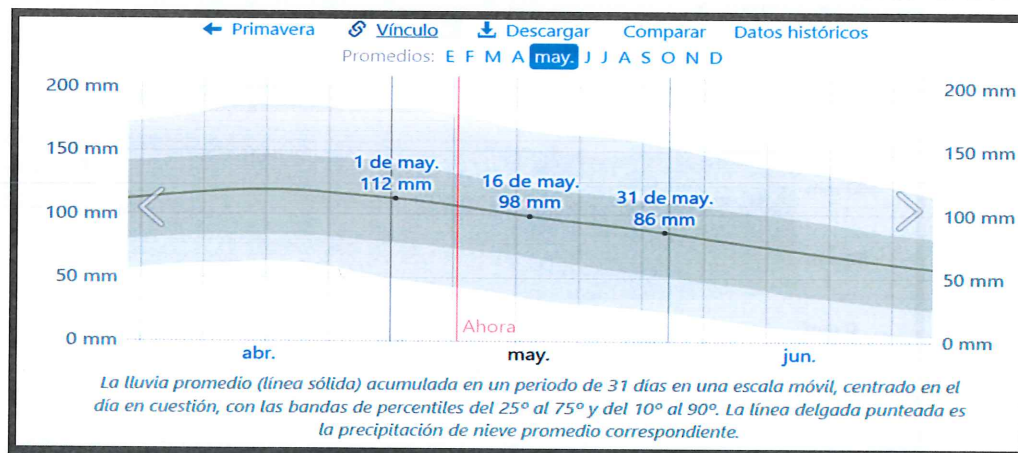

9. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO DURANTE EL PERIODO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	2500 PSI	CANTIDADES EN VOLUMEN SUELTO PARA PREPARAR UN METRO CÚBICO DE CONCRETO (M3) 18Mpa CEMENTO: 6,78 Bulto Mixto Fuente Acopio Héctor Vargas 1,22 m3 AGUA:175 Litros
Diseños de mezcla para base.	3000 PSI	CANTIDADES EN VOLUMEN SUELTO PARA PREPARAR UN METRO CÚBICO DE CONCRETO (M3) 21Mpa CEMENTO: 7,49 Bulto Mixto Fuente Acopio Héctor Vargas 1,2 m3 AGUA:175 Litros
Compresión simple al concreto.	2500 PSI CONCRETO CICLOPEO	
	3000 PSI VIGA DE CIMENTACION	
	3000 PSI PLACA DE PISO	
Ensayo de compactación de campo	DENSIDAD SECA MÁXIMA (g./cm3) HUMEDAD ÓPTIMA (%) Gravedad Especifica Bulk Partículas Gruesas, K (g/cm3) R ² = 0.9954 2.145 6.00 2.56	
Proctor compactación modificada material de relleno	DENSIDAD SECA MÁXIMA (g./cm3) HUMEDAD ÓPTIMA (%) Gravedad Especifica Bulk Partículas Gruesas, K (g/cm3) R ² = 0.9954 2.145 6.00 2.56	
NOTA: Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Artículo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.		
Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio		

**SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG****Código: DIH-CGID-F28****Versión: 2****Página 9 de 44****Fecha Aprobación:
13/02/2023****INFORME DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA**

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Anden, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
		02/04/2025						
Concreto ciclópeo cerramiento	28/02/2025	14/03/2025		x		2500 PSI	2438.02 PSI	NO CUMPLE
		14/03/2025		x		2500 PSI	2370.43 PSI	NO CUMPLE
		28/03/2025			x	2500 PSI	3031.89 PSI	CUMPLE
		28/03/2025			x	2500 PSI	2937.53 PSI	CUMPLE
Viga de cimentación cerramiento	11/03/2025	18/03/2025	x			2100 PSI	2568.95 PSI	CUMPLE
		18/03/2025	x			2100 PSI	2603.43 PSI	CUMPLE
		08/04/2025			x	3000 PSI	3820.44 PSI	CUMPLE
		08/04/2025			x	3000 PSI	3774.89 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	15/03/2025	22/03/2025	x			2100 PSI	2029.94 PSI	NO CUMPLE
		22/03/2025	x			2100 PSI	1950.58 PSI	NO CUMPLE
		12/04/2025			x	3000 PSI	3080.31 PSI	CUMPLE
		12/04/2025			x	3000 PSI	3138.43 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	18/03/2025	25/03/2025	x			2100 PSI	2123.86 PSI	CUMPLE
		25/03/2025	x			2100 PSI	2031.63 PSI	CUMPLE
		15/04/2025			x	3000 PSI	3221.44 PSI	CUMPLE
		15/04/2025			x	3000 PSI	3145.13 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	20/03/2025	27/03/2025	x			2100 PSI	1857.42 PSI	NO CUMPLE
		27/03/2025	x			2100 PSI	1842.53 PSI	NO CUMPLE
		17/04/2025			x	3000 PSI	3022.05 PSI	CUMPLE
		17/04/2025			x	3000 PSI	3005.63 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	22/03/2025	29/03/2025	x			2100 PSI	2215.39 PSI	CUMPLE
		29/03/2025	x			2100 PSI	2221.70 PSI	CUMPLE
		19/04/2025			x	3000 PSI	3197.64 PSI	CUMPLE
		19/04/2025			x	3000 PSI	3056.12 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	25/03/2025	01/04/2025	x			2100 PSI	2229.13 PSI	CUMPLE
		01/04/2025	x			2100 PSI	2170.02 PSI	CUMPLE
		22/04/2025			x	3000 PSI	3045.84 PSI	CUMPLE
		22/04/2025			x	3000 PSI	3072.10 PSI	CUMPLE
	27/03/2025	03/04/2025	x			2100 PSI	1947.24 PSI	NO CUMPLE

**SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG****Código: DIH-CGID-F28****Fecha Aprobación:
13/02/2023****INFORME DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA****Versión: 2****Página 10 de 44**

Placa de piso polideportivo		03/04/2025	x			2100 PSI	2093.61 PSI	NO CUMPLE
		24/04/2025			x	3000 PSI	3051.59 PSI	CUMPLE
		24/04/2025			x	3000 PSI	3130.33 PSI	CUMPLE
Placa de piso polideportivo	31/03/2025	07/04/2025	x			2100 PSI	2451.60 PSI	CUMPLE
		07/04/2025	x			2100 PSI	2402.31 PSI	CUMPLE
		28/04/2025			x	3000 PSI	3565.25 PSI	CUMPLE
		28/04/2025			x	3000 PSI	3072.98 PSI	CUMPLE

DENSIDADES MÉTODO CONO DE ARENA

No. ENSAYO	ABSCISA/EJE	PROFUNDIDAD/ALTURA - DEL ENSAYO EN CM.	MATERIAL	PORCENTAJE COMPACTACIÓN (%)	CUMPLE/ NO CUMPLE
D-0001	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	99.26%	CUMPLE
D-0002	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	98.37%	CUMPLE
D-0003	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	98.80%	CUMPLE
D-0004	Cancha sintética costado izquierdo	12.00	Relleno	99.17%	CUMPLE
D-0005	Cancha sintética costado derecho	12.00	Relleno	98.95%	CUMPLE
D-0006	Cancha sintética costado derecho	12.00	Relleno	98.14%	CUMPLE

10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (20%)	04/03/2025	\$ 290.607.785, 80		\$ 290.607.785, 80

254

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F28
	INFORME DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA	Versión: 2 Página 11 de 44
Fecha Aprobación: 13/02/2023		

Acta Parcial No. 1	20/05/2025	\$1,166,288,639.0	\$233,257,727.80	\$ 933,030,911.20
Acta Parcial No. 2	N/A	\$	\$	\$
Acta Parcial No. 3	N/A	\$	\$	\$
Acta Recibo Final No.4	N/A	\$	\$	\$
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$ 1,453,038,929.00	N/A	\$1,453,038,929.00	\$1,166,288,639.0	\$286,750,290.00

11. COMITES DE OBRA DURANTE EL PERIODO

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité
19 DE NOVIEMBRE DE 2024	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	<p>En el municipio de Guadalupe se desarrolló socialización del contrato de obra e interventoría y se realizó constitución de veeduría ciudadana.</p> <p>Asistentes: Ingeniera Jimena Jiménez (apoyo a la supervisión) - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino (representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra) - Ingeniera Daniela Carrillo Tavera (representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría)</p>
26 DE NOVIEMBRE DE 2024	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	<p>Se lleva a cabo reunión en las instalaciones del INDER HUILA con el fin de discutir el avance del contrato de obra CLOPIH 221 de 2024.</p> <p>Asistentes: - Ingeniera Jimena Jiménez (apoyo a la supervisión) - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino (representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra) - Ingeniera Daniela Carrillo Tavera (representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría)</p> <p>Objetivo: Solicitar avances de ejecución del contrato y discutir dificultades presentadas.</p>
23 DE DICIEMBRE 2024	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	<p>Se lleva a cabo reunión en las instalaciones del INDER HUILA con el fin de discutir el contrato CLOPIH 221 de 2024.</p> <p>Asistentes: - Ingeniera Jimena Jiménez (apoyo a la supervisión) - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino Representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra - Ingeniera Daniela Carrillo Tavera Representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría</p> <p>Objetivo: Analizar las respuestas de la Alcaldía de Guadalupe sobre topografía y diseños, revelando una nueva localización del proyecto que difiere de la etapa precontractual.</p>

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F28
		Versión: 2 Página 12 de 44
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA	

23 DE ENERO DE 2025	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	<p>En instalaciones de INDER Neiva se realizó comité técnico para socializar el avance de la obra hasta la fecha, que abarca actividades de localización, replanteo y descapote de la zona.</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingeniera Jimena Jiménez (apoyo a la supervisión) - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino <p>Representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingeniera Daniela Carrillo Tavera <p>Representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría</p>
25 DE FEBRERO DE 2025	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	<p>Se realizó comité técnico el pasado 25 de febrero de 2025 para evaluar el desarrollo y avance de las actividades, del mismo desprendieron ciertos compromisos a evaluar por parte del ente supervisor del contrato, el contratista de obra y la evaluación y aprobación de la interventoría:</p> <p>En el marco del comité, se acordó revisar y actualizar los estudios y diseños del sistema eléctrico para su implementación en la cancha sintética del municipio de Guadalupe.</p> <p>El objetivo es realizar una cuantificación y distribución adecuada del sistema eléctrico mediante la revisión de estudios y diseños para dar cumplimiento al marco contractual de las actividades y que este sea acorde a las necesidades del escenario deportivo.</p>
02 DE ABRIL DE 2025	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	<p>Se lleva a cabo reunión en las instalaciones del INDER HUILA con el fin de discutir el contrato CLOPIH 221 de 2024.</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino <p>Representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daniela Carrillo Tavera <p>Representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luis Miguel Caquimbo (supervisor por parte de INDERHUILA) <p>Objetivo: Revisar el avance del contrato y discutir dificultades presentadas.</p> <p>Se estipula que la obra se desarrolla a un ritmo inferior al estipulado debido a condiciones externas y cambios en el diseño eléctrico, por ende, se solicita y aprueba prorrogar el contrato por 2 meses, con el fin de presentar el balance de obra aprobado por interventoría y gestionar la modificación del proyecto y adición presupuestal.</p>
15/05/2025	Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila. (INDERHUILA)	<p>Se llevó a cabo comité técnico en las instalaciones de la obra cuyo objeto es construcción de cancha sintética Villa olímpica del municipio de Guadalupe Huila.</p> <p>Asistentes:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ingeniero Yerson Fernando Camacho Ladino <p>Representante legal de V&M INGENIERÍA SAS, contratista de obra</p> <ul style="list-style-type: none"> - Daniela Carrillo Tavera <p>Representante legal de CONSTRUMAC INGENIERO SAS, interventoría</p> <ul style="list-style-type: none"> - Luis Miguel Caquimbo (supervisor por parte de INDERHUILA) - Deiber Calderón Rojas: (secretario de planeación)

255

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DIH-CGID-F28	
	Versión: 2	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA	
	Página 13 de 44	

		Objetivo: Se realizó un análisis detallado del avance del contrato, identificando retrasos debido a condiciones externas y cambios en el diseño eléctrico. Se determinó la necesidad de suspender temporalmente el contrato para presentar el balance de obra aprobado por interventoría y gestionar la modificación del proyecto y adición presupuestal.
--	--	---

12. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por Inderhuila)	FORMATO (Físico/Digital)
Correspondencia (periodo del (12/11/2024 al (19/05/2025) Cobro anticipo de obra	(27/11/2024)	1-2024-2356	Físico
Pólizas otrosí No. 1	(12/02/2025)	1-2025-263	Físico
Póliza otrosí No.1 RC Ajustada	(20/02/2025)	1-2025-306	Físico
Pólizas otrosí No. 2	(16/04/2025)	1-2025-722	Físico
Presentación cronograma actualizado según otrosí i No. 2	(22/04/2025)	1-2025-749	Físico
Entrega acta de mayores y menores cantidades - Ítems no previstos para adición de recursos	(28/04/2025)		Físico
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (12/11/2024) al (19/05/2025)	(19/05/2025)		Físico
Informe HSEQ (periodo del (12/11/2024) al (19/05/2025)	(19/05/2025)		Físico
Registros de ensayos de laboratorio (periodo del (01/03/2024) al (30/04/2025)	(19/05/2025)		Físico
Registros de ensayos de calidad (periodo del (12/11/2024) al (19/05/2025)	(19/05/2025)		Físico

13. RELACION DE PERSONAL DURANTE EL PERIODO

NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	7.713.933	REPRESENTANTE LEGAL	Indefinido
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	7.713.933	REPRESENTANTE LEGAL	Indefinido
ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO	1.079.409.298	RESIDENTE DE OBRA	Prestación de servicios
OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	1.075.213.839	PROFESIONAL SST	Prestación de servicios

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F28
		Versión: 2
	INFORME DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA	Página 14 de 44

PABLO ARBEY LIZARAZO CORREA	17.709.845	MAESTRO DE OBRA	Prestación de servicios
JOSE OTAIN CLAROS RODRIGUEZ	1.084.900.110	AYUDANTE	Obra o Labor
YANCARLOS BERNAL PIEDRAHITA	1.004.300.965	AYUDANTE	Obra o Labor
MANUEL BUSTOS SALDAÑA	1.006.531.292	AYUDANTE	Obra o Labor
DIEGO ALBERTO CASTILLA SCARPETTA	1.000.514.656	AYUDANTE	Obra o Labor
JOSE OTAIN CLAROS CABRERA	83.225.779	AYUDANTE	Obra o Labor
DEINER RAMOS ALVAREZ	1.081.513.643	AYUDANTE	Obra o Labor
DANIEL JOSE SANTOS MENDOZA	1.002.230.693	AYUDANTE	Obra o Labor
MARIO JOSE SANTOS URAN	92.533.487	AYUDANTE	Obra o Labor
LEONARDO TOVAR BETES	1.083.882.691	AYUDANTE	Obra o Labor
YOHAN ESTIH MAHECHA GUACA	1.007.451.455	AYUDANTE	Obra o Labor

14. RELACIÓN DE PAGOS



TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	191796625 - P.A. ANT V&M INGENIERIA SAS	04/03/2025
ACTA PARCIAL		EN TRAMITE

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL


MES NOVIEMBRE							
PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALS	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 90.500	\$ 52.000	\$ 0.00	31527963	08/11/2024
ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO	\$ 256.000	\$ 200.000	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0.00	PY 31730295 PI 9477138795	09/06/2025 28/11/2024
OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 90.500	\$ 0	\$ 0.00	PY 31432532 PI 31247197	08/11/2024 06/11/2024
MES DICIEMBRE							
PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALS	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 90.500	\$ 52.000	\$ 0.00	31905315	11/12/2024
ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO	\$ 256.000	\$ 200.000	\$ 6.800	\$ 0	\$ 0.00	PY 32364755 PI 9478348348	09/06/2025 12/12/2024
OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	\$ 208.000	\$ 162.500	\$ 90.500	\$ 0	\$ 0.00	PY 32239644 PI 31516700	14/01/2025 09/12/2024
MES ENERO							

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DIH-CGID-F28
	INFORME DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA		Versión: 2
			Página 15 de 44
Fecha Aprobación: 13/02/2023			




PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALS	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	\$ 227.800	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 57.000	\$ 0.00	32219152	14/01/2025
ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO	\$ 275.200	\$ 215.000	\$ 106.600	\$ 0.00	\$ 0.00	PY 32364783 PI 9480892171	09/06/2025 24/02/2025
OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 99.100	\$ 0.00	\$ 0.00	PY 32408056 PI 32082478	10/02/2025 07/01/2025
MES FEBRERO							
PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALS	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	\$ 227.800	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 57.000	\$ 0.00	32364582	10/02/2025
ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO	\$ 275.200	\$ 215.000	\$ 104.300	\$ 0.00	\$ 0.00	PY 32771522 PI 9481228254	09/06/2025 03/03/2025
OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 99.100	\$ 0.00	\$ 0.00	PY 32789910 PI 32168401	11/03/2025 10/02/2025
PABLO ARBEY LIZARAZO CORREA	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 99.100	\$ 0.00	\$ 0.00	PY 32641761 PI 32499841	11/03/2025 11/03/2025
JOSE OTAIN CLAROS RODRIGUEZ	\$ 22.800	\$ 5.700	\$ 10.000	\$ 0.00	\$ 0.00	32641757	11/03/2025
MES MARZO							
PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALS	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	\$ 227.800	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 57.000	\$ 0.00	32771461	11/03/2025
ADRIANA LISETH MAYORCA PERDOMO	\$ 275.200	\$ 215.000	\$ 104.300	\$ 0.00	\$ 0.00	PY 33699968 PI 9482869663	09/06/2025 31/03/2025
OMAIRA ANDREA TRUJILLO POLANCO	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 99.100	\$ 0.00	\$ 0.00	PY 32822235 PI 32506437	04/04/2025 05/03/2025
PABLO ARBEY LIZARAZO CORREA	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 99.100	\$ 0.00	\$ 0.00	PY 32821749 PI 32819891	02/04/2025 02/04/2025
YANCARLOS BERNAL PIEDRAHITA	\$ 91.200	\$ 22.800	\$ 39.700	\$ 22.800	\$ 0.00	33013650	02/04/2025
MANUEL BUSTOS SALDAÑA	\$ 182.300	\$ 45.600	\$ 79.300	\$ 45.600	\$ 0.00	33013650	02/04/2025
DIEGO ALBERTO CASTILLA SCARPETTA	\$ 83.600	\$ 20.900	\$ 36.400	\$ 20.900	\$ 0.00	33013650	02/04/2025
JOSE OTAIN CLAROS CABRERA	\$ 68.400	\$ 17.100	\$ 29.800	\$ 17.100	\$ 0.00	33013650	02/04/2025
DEINER RAMOS ALVAREZ	\$ 7.600	\$ 1.900	\$ 3.400	\$ 1.900	\$ 0.00	33013650	02/04/2025
DANIEL JOSE SANTOS MENDOZA	\$ 182.300	\$ 45.600	\$ 79.300	\$ 45.600	\$ 0.00	33013650	02/04/2025
MARIO JOSE SANTOS URAN	\$ 205.000	\$ 51.300	\$ 89.200	\$ 51.300	\$ 0.00	33013650	02/04/2025
LEONARDO TOVAR BETES	\$ 151.900	\$ 38.000	\$ 66.100	\$ 38.000	\$ 0.00	33013650	02/04/2025
MES ABRIL							
PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALS	N° PLANILLA	FECHA DE PAGO
YERSON FERNANDO CAMACHO LADINO	\$ 227.800	\$ 57.000	\$ 99.100	\$ 57.000	\$ 0.00	33033425	04/04/2025

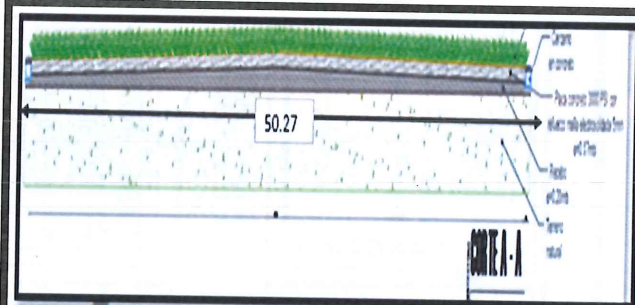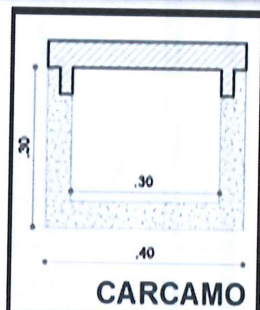

Detalle de cuenta perimetral - Cárcamo

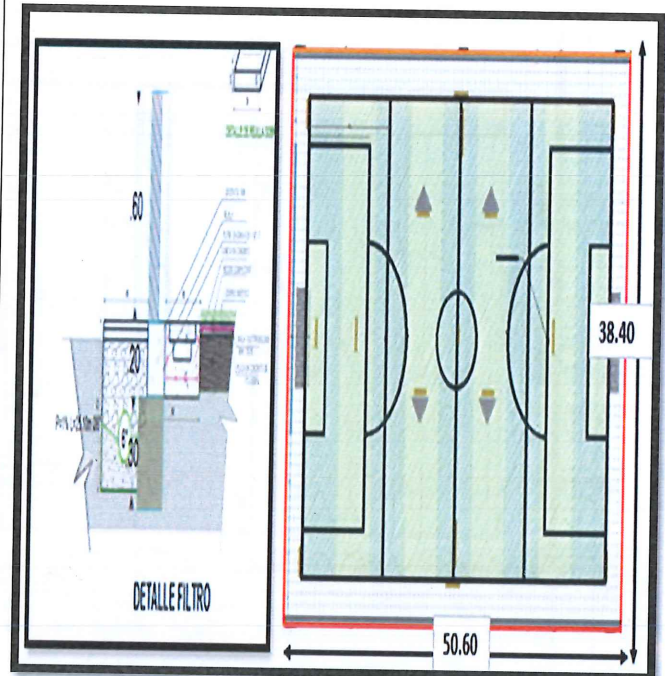

Detalle filtros laterales externos

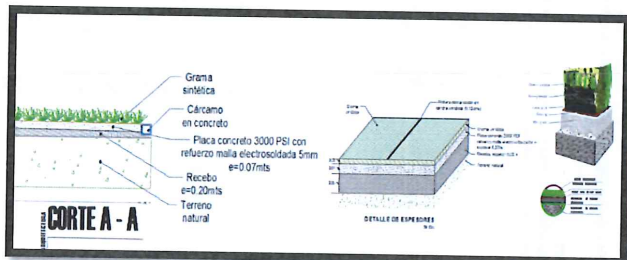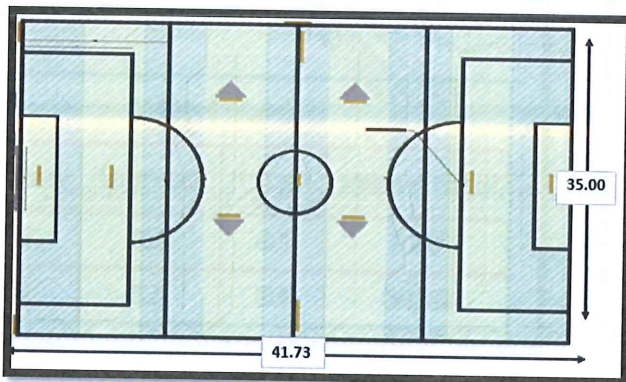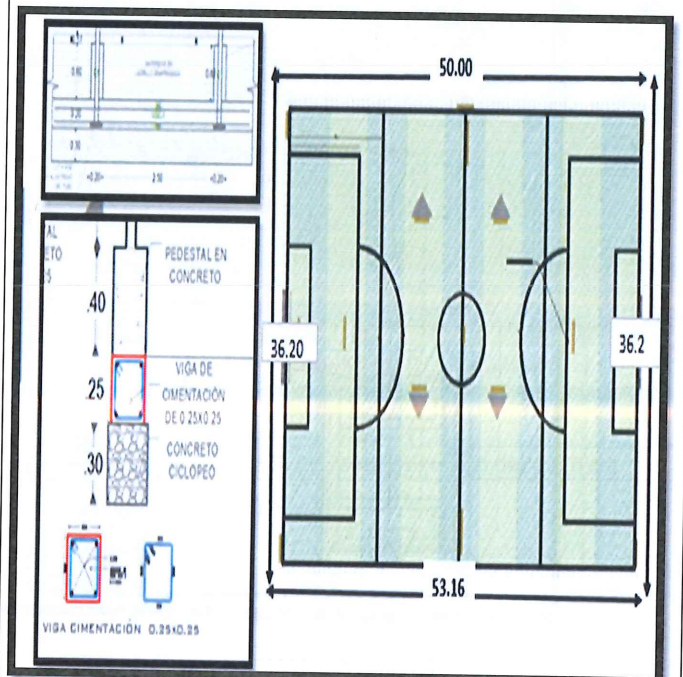





Fecha Aprobación:
13/02/2023

INFORME DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA


Detalle placa de piso en concreto de 3000 PSI

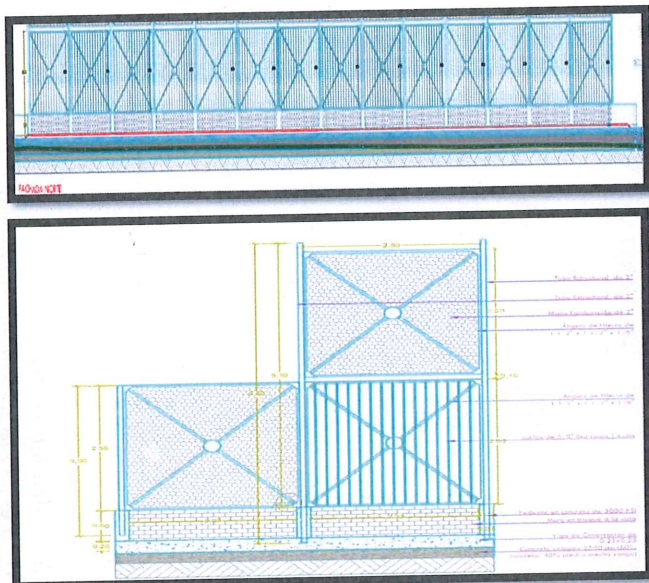


Detalle concreto ciclópeo, viga de cimentación y pedestales

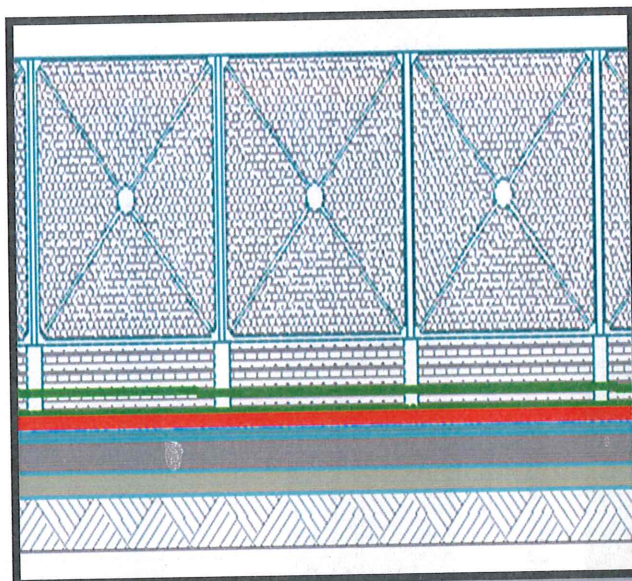

Detalle de cerramiento metálico Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en
ángulo 1 1/2"x1/8 con varilla de 5/8"

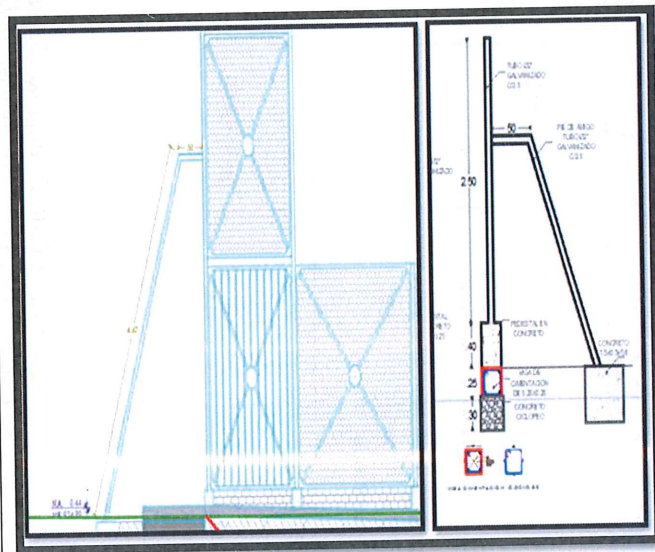

Detalle cerramiento metálico Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en
malla eslabonada

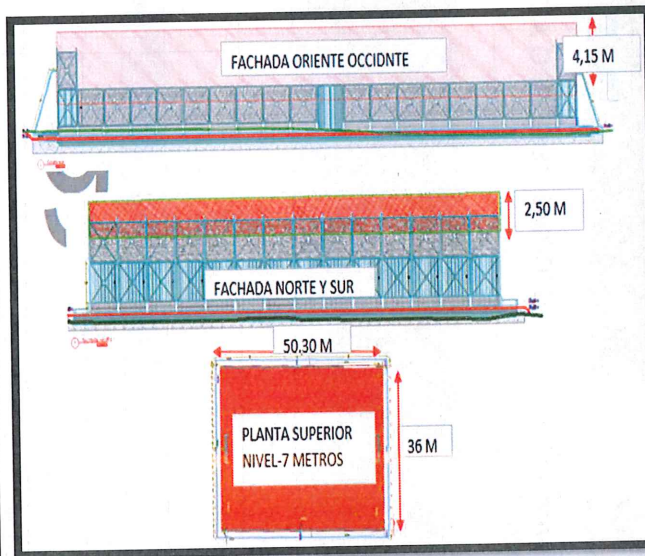

Detalle cerramiento perimetral, tubería galvanizada y pie de amigo

Detalle instalación de malla de cerramiento en nylon

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1											
CONDICIONES CONTRACTUALES						OBRA EJECUTADA					
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	ACUMULADA	VR/TOTAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES				\$ 13.460.304,00		\$ 13.460.304,00		\$ 13.460.304,00		\$ 13.460.304,00
1.1	Localización y replanteo manual	m²	1.924,00	\$ 2.226,00	\$ 4.282.824,00	1924,00	\$ 4.282.824,00	1924,00	\$ 4.282.824,00		\$ 4.282.824,00
1.2	Descapote e=0,20m a máquina incluye retiro material	m²	1.924,00	\$ 4.770,00	\$ 9.177.480,00	1924,00	\$ 9.177.480,00	1924,00	\$ 9.177.480,00		\$ 9.177.480,00
2	MÓVIMIENTO DE TIERRA				\$ 84.830.852,00		\$ 84.830.852,00		\$ 84.830.852,00		\$ 84.830.852,00
2.1	Excavación manual incluye retiro	m³	119,94	\$ 31.545,00	\$ 3.783.507,00	119,94	\$ 3.783.507,00	119,94	\$ 3.783.507,00		\$ 3.783.507,00
2.2	Excavación mecánica incluye retiro 1 Km	m³	384,80	\$ 19.793,00	\$ 7.616.346,00	384,80	\$ 7.616.346,00	384,80	\$ 7.616.346,00		\$ 7.616.346,00
2.3	Rellenos con recebo compactado mecánicamente	m³	384,80	\$ 190.829,00	\$ 73.430.999,00	384,80	\$ 73.430.999,00	384,80	\$ 73.430.999,00		\$ 73.430.999,00
3	RED DE AGUAS LLUVIAS				\$ 38.483.328,00		\$ 38.483.328,00		\$ 31.568.417,00		\$ 31.568.417,00
3.1	Construcción de cuneta perimetral en concreto 3000 PSI; Dimensiones: 40 cm de ancho y altura variable. Incluye rejilla prefabricada en poliuretano	ml	104,00	\$ 137.428,00	\$ 14.292.512,00	100,54	\$ 13.817.011,00	100,54	\$ 13.817.011,00		\$ 13.817.011,00
3.2	Caja inspección 1,0x 1,0 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	4,00	\$ 657.029,00	\$ 2.628.116,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00
3.3	Red de aguas lluvias suministro e instalación de tubería PVC Ø 8" incluye: Transporte al sitio de la obra, cama con arena 15 cms y relleno material de la excavación a zanjón	ml	30,00	\$ 79.488,00	\$ 2.384.640,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00		\$ 0,00



SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Código: DIH-CGID-F28
Versión: 2
Página 23 de 44


Fecha Aprobación:
13/02/2023

INFORME DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1									
CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
						CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
3.4	Construcción de filtros laterales externos en un ancho de 0.40 m, con altura variable menor a 0.50 m, recubrimiento en geotextil no tejido NT-1600, con gravilla común o triturado de 1 1/2" a 4" + Tubería PVC drenajes de 6"	ml	178.00	\$ 99.727,00	\$ 17.751.406,00	178,00	\$ 17.751.406,00	178,00	\$ 17.751.406,00
3.5	Caja inspección 1,2x 1,2 m medida interna en concreto 3000 psi para empalme sistema de drenaje, incluye tapa con marco y cañuela, altura variable	und	2,00	\$ 713.327,00	\$ 1.426.654,00	-	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4	PLACA CANCHA				\$ 741.397.052,00		\$ 616.568.271,00		\$ 616.568.271,00
4.1	Placa de piso en concreto 3000 psi, e = 0,07m dilatada, junta machimbrada incluye malla electrosoldada de 5mm.	m²	1.750,00	\$ 87.325,00	\$ 152.818.750,00	1460,55	\$ 127.542.529,00	1460,55	\$ 127.542.529,00
4.2	Marco para microfútbol futbol 8 6mX2m, en tubo galvanizado tipo pesado de 4", según especificaciones técnicas, incluye anclaje, malla e instalación y todo lo necesario para su correcto funcionamiento.	und	2,00	\$ 2.344.832,00	\$ 4.689.664,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionsuuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila

260



Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Neiva-Huila

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DIH-CGID-F28
			Versión: 2
			Página 25 de 44
Fecha Aprobación: 13/02/2023		INFORME DE COBRO ACTA PARCIAL DE OBRA	

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 1									
CONDICIONES CONTRACTUALES					OBRA EJECUTADA				
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD	VR/UNIT	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL	CANTIDAD	VR/TOTAL
5.6	Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en ángulo 1 1/2"x1/8 con varilla de 5/8" lisa cada 14 cms, diagonales en ángulo 1 1/2" x 1/8 y lamina cal 16 10X10 cms de refuerzo en la esquinas (lado norte y sur)h=2,5m	m²	200,00	\$ 109.070,00	\$ 21.814.000,00	196,27	\$ 21.407.169,00	196,27	\$ 21.407.169,00
5.7	Módulos cerramiento 2,5x2,5 m en ángulo 1 1/2"x1/8 con malla eslabonada cal 10 hueco 2 1/4"x2 1/4", diagonales en ángulo 1 1/2" x1/8 y lamina cal 16 10X10cm de refuerzo en la esquinas (lado oriente y occidente) h=2,5m	m²	268,75	\$ 54.091,00	\$ 14.536.956,00	265,92	\$ 14.383.879,00	265,92	\$ 14.383.879,00
5.8	Suministro e instalación de puerta en tubería 2" galvanizada cal 2mm con malla eslabonada cal 10 y con portacandado, incluye pasador porta candado.	und	1,00	\$ 802.805,00	\$ 802.805,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.9	Concreto 3000 psi andenes périmetros e=8cm, incluye malla electrosoldada y formaleta	m²	148,80	\$ 80.868,00	\$ 12.033.158,00	147,19	\$ 11.902.961,00	147,19	\$ 11.902.961,00
5.10	Suministro e instalación de malla de cerramiento en nylon 100% alta densidad con protección UV, ojo 13x13, calibre #4 incluye; guaya, tensores y tubo de 2"	m²	3.031,00	\$ 37.545,00	\$ 113.798.895,00	2408,00	\$ 90.408.360,00	2408,00	\$ 90.408.360,00
5.11	Pie de amigo en tubería galvanizada 2" cal 2mm incluye anclajes, concreto 3000 psi 50x50x60 costados norte y sur	und	32,00	\$ 263.483,00	\$ 8.431.456,00	30,00	\$ 7.904.490,00	30,00	\$ 7.904.490,00

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionsuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila
