

JR	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACIAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 1
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

CONTRATO DE INTERVENTORIA 978 DE 2023



PERIODO DEL INFORME
01 DE JULIO DEL 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 2
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

REVISION Y APROBACION

Objeto de Interventoría:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
Título de Documento:	informe de Interventoría No 14 (01 de julio del 2025 al 31 de julio del 2025)		
Documento No:	INFM-014		
APROBACION			
	Nombre:	ING. JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	
Responsable por la elaboración:	Firma:		
	Fecha:	01-08-2025	
	Nombre:	ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
Vo Bo representante legal:	Firma:		
		01-08-2025	

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 3
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	5
2	RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO	6
2.1	Generalidades del contrato	6
2.2	Localización del Proyecto y Descripción	8
2.3	Análisis inicial de costos del contrato de interventoría para el contrato	9
2.4	Organigrama del contrato de interventoría	10
2.5	Avance en Tiempo.....	11
2.6	Avance de Ejecución contrato de obra.....	12
2.7	Resumen de interventoría.....	14
2.8	Justificación	14
2.9	Aspectos Técnicos.....	14
3	ASPECTOS FINANCIEROS	16
3.1	Control Presupuestal	16
3.2	Avance Financiero	17
3.3	Anticipo.....	17
4	ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS	20
4.1	Cronología contractual	20
4.2	Control de Pólizas	21
4.3	Actas generadas.....	23
4.4	Comités de Obra y Reuniones.....	23
4.5	Relación de personal y aportes Sistema Integral de Seguridad Social y Parafiscales .	23
4.6	Instalaciones administrativas.....	25
4.7	Equipos de topografía.....	27
4.8	Ensayos de laboratorio.....	28
4.9	Transporte	29
5	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA.....	30
5.1	Actividades Básicas.....	30
5.2	Funciones principales realizadas.....	30
5.3	Seguimiento y control Técnico de la Obra	31
5.4	Seguimiento y control de Impacto Urbano y mitigación	32
5.5	Seguimiento y control predial en la ejecución	32
5.6	Seguimiento y control compromisos laborales y sistema integral de seguridad social	32

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página 4
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

5.7	Seguimiento y control al Estado del Tiempo.....	32
5.8	Seguimiento y control al plan de calidad	32
5.9	Seguimiento y control de Seguridad Industrial.....	33
5.10	Seguimiento y control cumplimiento plan de manejo de trafico o transito	33
5.11	Seguimiento y control cumplimiento de las obligaciones del contratista	33
5.12	Seguimiento y control plan de manejo ambiental.....	33
5.13	Seguimiento y control a los permisos legales, ambientales y fichas.....	34
5.14	Seguimiento y control programa de gerencia	34
6	CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES	34
7	INCONVENIENTES O PROBLEMAS PRESENTADOS	47
8	CONCLUSIONES	48
9	ANEXOS.....	49
9.1	Registro Fotográfico	50
9.2	Actas de comité de obra.	51
9.3	Informes semanales	52
9.4	Afiliaciones y/o pagos del personal a la seguridad social interventoría.....	53
9.5	Correspondencia enviada y recibida.	54
9.6	Informe de inversión recursos de anticipo.....	55
9.7	Copia de bitácora de obra.....	56
9.8	Certificaciones varias	57
9.9	Informe de especialistas.....	58
9.10	Soportes de costos interventoría.....	¡Error! Marcador no definido.
10	CUADROS ANEXOS	59
10.1.	Control estado general del tiempo.....	60
10.2.	Control de ensayos de laboratorio.....	61
10.3.	Control personal que labora interventoría.	62
10.4.	Control seguridad industrial.....	63
10.5.	Control correspondencia	64
10.6.	Control equipos contratista.....	65
10.7.	Control implementación pma	66

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página 5
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

1 INTRODUCCIÓN

El Municipio de acacias mediante proceso contractual No CM-OCA-013-2023 y resolución de adjudicación No 203 del 22 de diciembre de 2023 suscribió el contrato de interventoría 978 de 2023 cuyo objeto contractual es **"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS"** cuyo contratista obra como persona natural y es **JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA** identificado con cedula de ciudadanía No 9.658.796.

El objetivo del presente informe es certificar la ejecución de las labores de seguimiento financiero, administrativo, jurídico y técnico con el fin de lograr la correcta ejecución del contrato de obra No 929 de 2023 cuyo objeto contractual es **"CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS"**. Lo anterior teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 32 de la ley 80 de 1993 el cual señala: *"...En los contratos de obra que hayan sido celebrados como resultado de un proceso de licitación públicos, la interventoría deberá ser contratada con una persona independiente de la entidad contratante y del contratista, quien responderá por los hechos y omisiones que le fueren imputables en los términos previstos en el artículo 53 del presente estatuto..."* Igualmente se hizo necesario contratar esta interventoría si se tiene en cuenta lo señalado en el parágrafo 1 de artículo 83 de la Ley 1474 de 2011 el cual establece: *"...En adición a la obligación de contar con interventoría, teniendo en cuenta la capacidad de la entidad para asumir o no la respectiva supervisión en los contratos de obra a que se refiere el artículo 32 de la Ley 80 de 1993, los estudios previos de los contratos cuyo valor supere la menor cuantía de la entidad, con independencia de la modalidad de selección, se pronunciarán sobre la necesidad de contar con interventoría..."*.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACIAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página 6
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

2 RESUMEN EJECUTIVO DEL CONTRATO

2.1 Generalidades del contrato

En el siguiente cuadro se muestran los aspectos más importantes del contrato de interventoría:


PROCESO CONTRACTUAL:	CM-OCA-013-2023
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE ACACIAS
RESOLUCION DE ADJUDICACION	203 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO DE:	INTERVENTORIA
No. DEL CONTRATO:	978 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	27 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$627.081.787,00) M/CTE
ADICIONAL No.1:	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO (\$291.652.095)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO:	NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS (\$918.733.882)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT No 9.658.796-1
CORREO ELECTRONICO	interpuntechichimene@gmail.com
CÉDULA DE CIUDADANÍA	9.658.796 DE YOPAL
No. Y FECHA RP INICIAL:	5156 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2023
SUPERVISOR:	IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CORREO ELECTRONICO	infraestructura@acacias.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION	CRISTIAN FUENTES AMADO
CORREO ELECTRONICO	cristhian.f9393@gmail.com

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página 7
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	27 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE ABRIL DE 2025
FECHA SUSPENSIÓN No.1	24 DE ABRIL DEL 2025, (TIEMPO 45 DIAS)
AMPLIACIÓN No.1 A LA SUSPENSIÓN No.1	8 DE JUNIO DEL 2025, (TIEMPO 30 DIAS)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN No.1:	10 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE REINICIO ANTICIPADO:	17 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL SEGÚN REINICIO ANTICIPADO	20 DE JUNIO DEL 2025
PRORROGA No.1	7 MESES ADICIONALES, TOTAL DE PLAZO 18 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN PRORROGA No.1	20 DE ENERO DEL 2026

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACIAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14	

2.2 Localización del Proyecto y Descripción

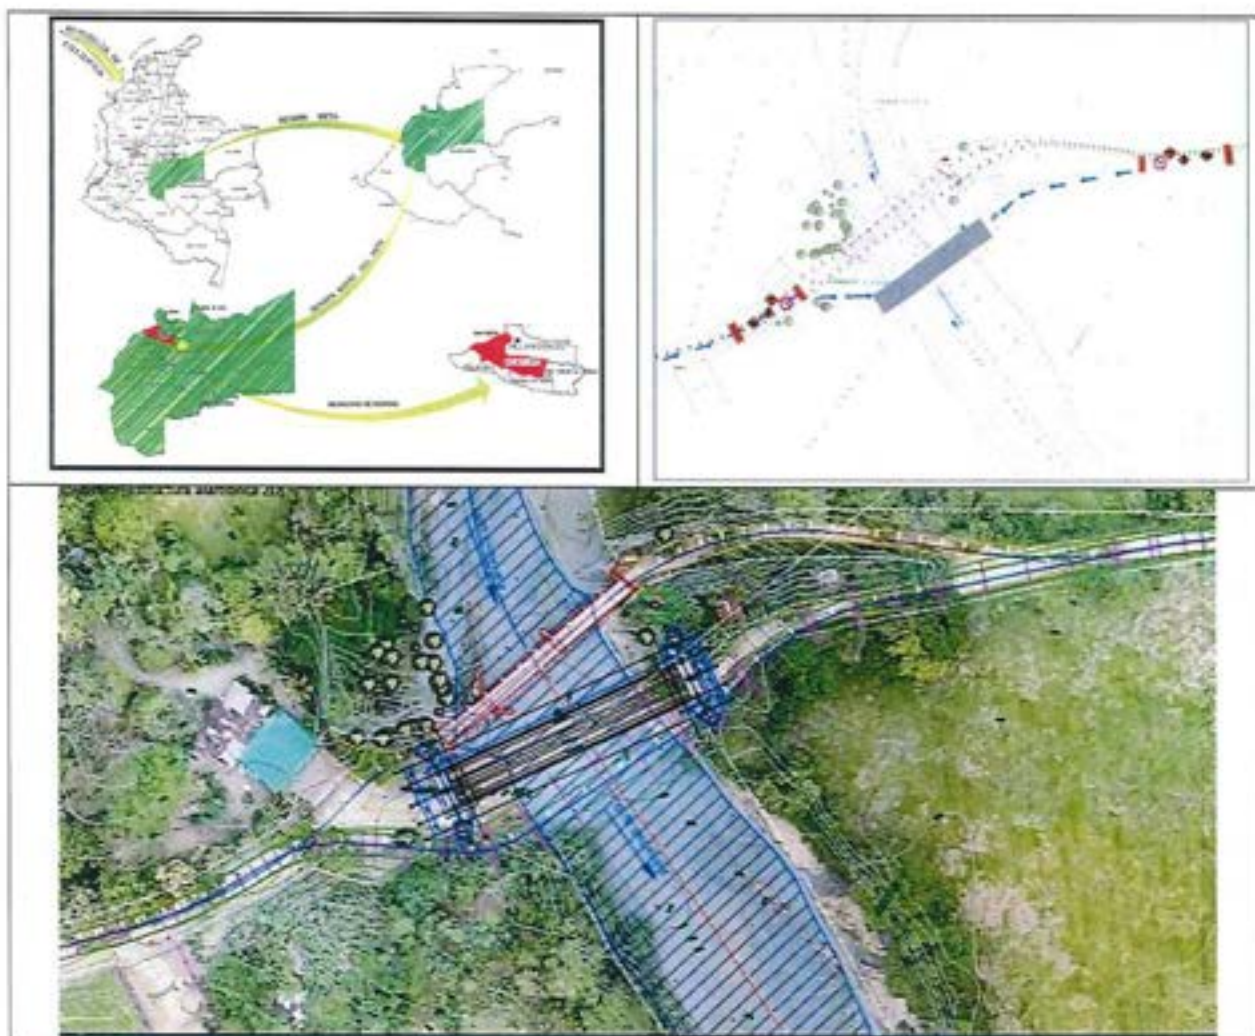

La zona para intervenir se encuentra ubicada en el Municipio de Acacias, específicamente está ubicada en la vía Terciaria que conduce a la vereda quebraditas a 34.4 Km del casco urbano del Municipio de Acacias Meta, de cuales 13.56 se encuentran en afirmado, las coordenadas de ubicación son las 03°57'39,99" N y 73°30'17.67" O

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023		INFORME No. 14
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		Página 9

2.3 Análisis de costos del contrato inicial de interventoría.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS						
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	TIEMPO DURACIÓN (mes)	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL (\$)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*(2)+(3)*(4) = (5)	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
PERSONAL PROFESIONAL						
1	INGENIERO CIVIL O ING DE TRANSPORTE Y VÍAS	\$ 7.690.568,00	11	50%	\$ 42.298.124,00	
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA INGENIERO CIVIL	\$ 5.905.213,00	11	100%	\$ 64.957.343,00	
1	TECNÓLOGO EN HSEQ	\$ 3.334.768,00	11	50%	\$ 18.341.224,00	
1	INGENIERO AMBIENTAL	\$ 5.266.230,00	11	20%	\$ 11.585.706,00	
1	INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	\$ 5.266.230,00	11	20%	\$ 11.585.706,00	
PERSONAL TÉCNICO						
1	TOPOGRAFO	\$ 2.302.915,00	11	40%	\$ 10.132.826,00	
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
1	CADENERO 1	\$ 1.428.965,00	11	40%	\$ 6.287.446,00	
1	OPERARIO	\$ 1.449.395,00	11	100%	\$ 15.943.345,00	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					\$ 181.131.720,00	
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					2,1	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					\$ 380.376.612,00	
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (\$)	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL (\$)
(8)			(9)	(10)	(11)	(8)*(9)*(10)*(11) = (12)
OTROS COSTOS DIRECTOS						
VIÁTICOS						
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA						
1	CAMIONETA TIPO PICK UP	MES	\$ 5.849.422,00	100%	11	\$ 64.343.642,00
1	TOPOGRAFIA	MES	\$ 3.458.149,00	40%	11	\$ 15.215.856,00
1	LABORATORIO - INTERVENTORIAS	MES	\$ 9.139.867,00	22,9%	11	\$ 23.023.375,00
1	ARRIENDO DE OFICINA	MES	\$ 1.500.000,00	100%	11	\$ 16.500.000,00
1	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	MES	\$ 2.500.000,00	100%	11	\$ 27.500.000,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (11) = (B)					\$ 146.582.873,00	
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					\$ 526.959.485,00	
IVA = 19% * (E) = (F)					\$ 100.122.302,15	
COSTO TOTAL = (E) + (F)					\$ 627.081.787,00	

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		 ALCALDÍA DE ACACIAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023		INFORME No. 14 Página 10
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

2.4 Análisis de costos según Modificatoria No.1 del contrato de interventoría.


INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS						
CANT.	CARGO / OFICIO	COSTOS DE PERSONAL	TIEMPO DURACIÓN (mes)	PARTICIPACIÓN (h-mes)	VALOR PARCIAL (\$)	
(1)		(2)	(3)	(4)	(1)*(2)*(3)/(4) = (5)	
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL						
PERSONAL PROFESIONAL						
1	INGENIERO CIVIL O ING DE TRANSPORTE Y VÍAS	\$ 7.690.568,00	18	50%	\$ 69.215.112,00	
1	RESIDENTE DE INTERVENTORIA INGENIERO CIVIL	\$ 5.905.213,00	18	100%	\$ 106.293.834,00	
1	TECNÓLOGO EN HSEQ	\$ 3.334.768,00	18	50%	\$ 30.012.912,00	
1	INGENIERO AMBIENTAL	\$ 5.266.230,00	18	20%	\$ 18.958.428,00	
1	INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	\$ 5.266.230,00	18	20%	\$ 18.958.428,00	
PERSONAL TÉCNICO						
1	TOPOGRAFO	\$ 2.302.915,00	18	40%	\$ 16.580.988,00	
PERSONAL ADMINISTRATIVO						
1	CADENERO 1	\$ 1.428.965,00	18	40%	\$ 10.288.548,00	
1	OPERARIO	\$ 1.449.395,00	11	100%	\$ 15.943.345,00	
PERSONAL AUXILIAR TÉCNICO						
OTROS COSTOS DE PERSONAL						
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = SUMATORIA DE (5) = (6)					\$ 286.251.595,00	
FACTOR MULTIPLICADOR (7)					2,1	
SUBTOTAL COSTOS DE PERSONAL = (6) * (7) = (A)					\$ 601.128.350,00	
CANT.	CONCEPTO	UNIDAD	COSTO (\$)	INCIDENCIA SOBRE LA TARIFA	UTILIZACIÓN	VALOR PARCIAL (\$)
(8)			(9)	(10)	(11)	(8)*(9)*(10)/(11) = (12)
OTROS COSTOS DIRECTOS						
VIÁTICOS						
COSTOS DE ALQUILER DE EQUIPOS Y OFICINA						
1	CAMIONETA TIPO PICK UP	MES	\$ 5.849.422,00	100%	11	\$ 64.343.642,00
1	TOPOGRAFIA	MES	\$ 3.458.149,00	40%	18	\$ 24.898.673,00
1	LABORATORIO - INTERVENTORÍAS	MES	\$ 9.139.887,00	22,9%	18	\$ 37.674.614,00
1	ARRIENDO DE OFICINA	MES	\$ 1.500.000,00	100%	11	\$ 16.500.000,00
1	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	MES	\$ 2.500.000,00	100%	11	\$ 27.500.000,00
OTROS COSTOS						
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS = SUMATORIA DE (12) = (B)					\$ 170.916.929,00	
SUBTOTAL COSTOS BASICOS = (A) + (B) = (C)					\$ 772.045.279,00	
PROVISION FRENTE ADICIONAL = (D)					N.A	
VALOR TOTAL BÁSICO					\$ 772.045.279,00	
IVA = 19% * (E) = (F)					\$ 146.688.603,01	
COSTO TOTAL = (E) + (F)					\$ 918.733.882,00	

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 11
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14	

2.5 Organigrama del contrato de interventoría



2.6 Avance en Tiempo

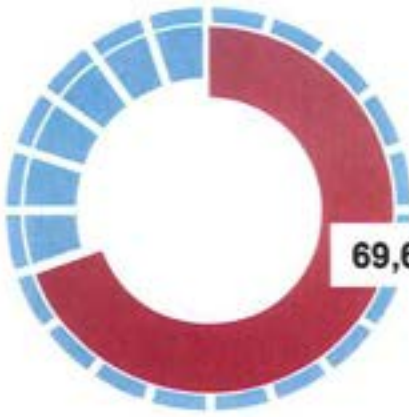PLAZO ACTUALIZADO	ACTA DE INICIO	TIEMPO DE EJECUCION AL CORTE	PORCENTAJE DE TIEMPO TRANSCURRIDO	% EJECUT
DIECIOCHO (18) MESES	27/05/2023	TRESCIENTOS SETENTA Y SEIS (376) DIAS	69,63%	22,374%
FECHA DE INICIO		27/05/2024	 69,63%	
FECHA DE SUSPENSION		24/04/2025		
FECHA DE REINICIO		17/06/2025		
FECHA DE TERMINACION		20/01/2026		
HOY		31/07/2025		
DIAS TRANCURRIDOS		376,00		
MESES TRANCURRIDOS		12,53		
PLAZO DIAS		540,00		
PLAZO MESES		18,00		
AVANCE EN TIEMPO DIAS		69,63%		
AVANCE EN TIEMPO MESES		69,63%		



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA



ALCALDÍA DE
ACACÍAS

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME No. 14

Página 12

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14

2.7 Avance de Ejecución contrato de obra



El análisis anterior se realiza con base en la reprogramación presentada y aprobada por interventoría con fecha 21 de junio de 2025 y los datos correspondientes a la semana No 56, la cual es más cercana a la fecha de corte del informe, así mismo se toma su avance de cantidades ejecutadas según la misma semana.

CAPITAL	VALOR CAPITAL INICIAL	%	VALOR MODIFICATORIA	%	VALOR PROG POR CAPITAL	% PROG	VALOR EJECUTADO POR CAPITAL	% EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR CAPITAL	ATRASO	AVANCE	%	
1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR	\$ 10.462.704.340,00		\$ 11.302.588.179,00		\$ 5.126.704.475,28	49,00%	\$ 3.704.804.075,00	29,97%	\$ 8.867.584.105,28	1-5	\$ 1.402.380.400,28	-	-11,32%
1.1 PRESUPUESTO	\$ 275.182.210,00	2,62%	\$ 470.771.210,00	4,14%	\$ 303.704.887,88	60,00%	\$ 200.528.605,00	46,47%	\$ 213.202.811,88	1-5	\$ 153.258.282,88	-	-39,89%
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 81.121.880,00	0,78%	\$ 98.794.100,00	0,85%	\$ 56.798.181,87	100,00%	\$ 44.728.740,00	78,78%	\$ 12.066.442,87	1-6	\$ 12.360.441,87	-	-21,73%
1.3 INFRAESTRUCTURA	\$ 1.215.733.887,00	9,79%	\$ 1.408.303.888,00	9,50%	\$ 1.231.673.562,00	87,69%	\$ 954.750.000,00	67,79%	\$ 433.603.891,00	1-6	\$ 278.323.494,00	-	-39,89%
1.4 SUPERESTRUCTURA	\$ 384.786.300,00	3,72%	\$ 379.988.870,00	3,70%	\$ 16.228.540,00	4,07%	\$ -	0,00%	\$ 379.988.870,00	1-6	\$ 16.228.540,00	-	-4,07%
1.5 ACERO DE REFUERZO	\$ 8.249.688.620,00	81,42%	\$ 9.987.868.870,00	88,28%	\$ 3.444.362.813,60	34,70%	\$ 2.304.808.687,88	25,29%	\$ 7.452.858.319,00	1-6	\$ 698.553.150,88	-	-9,40%
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 294.344.780,00	1,92%	\$ 384.670.870,00	1,91%	\$ 2.431.984,00	1,90%	\$ -	0,00%	\$ 384.670.870,00	1-6	\$ 2.431.984,00	-	-1,90%
2. SER DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRADITAS	\$ 2.487.060.880,00		\$ 4.487.881.280,00		\$ 188.885.970,88	7,79%	\$ 28.718.304,00	3,89%	\$ 4.488.172.979,00	1-6	\$ 140.167.668,88	-	-3,21%
2.1 PRESUPUESTO	\$ 3.198.948,00	0,09%	\$ 3.802.014,00	0,09%	\$ 3.672.816,88	90,00%	\$ 1.328.173,00	34,72%	\$ 3.498.345,00	1-6	\$ 2.343.840,88	-	-58,47%
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 880.018.180,00	8,09%	\$ 480.886.024,00	3,71%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 480.886.024,00	1-6	\$ -	-	0,00%
2.3 PLANTA	\$ 285.715.880,00	2,09%	\$ 91.671.480,00	0,90%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 91.671.480,00	1-6	\$ -	-	0,00%
2.4 OBRAS DE PROTECCIÓN	\$ 374.328.370,00	2,76%	\$ 1.117.471.880,00	9,92%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 1.117.471.880,00	1-6	\$ -	-	0,00%
2.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN	\$ 384.727.884,00	1,29%	\$ 387.787.120,00	1,02%	\$ 131.585.873,84	34,34%	\$ 38.390.670,00	10,89%	\$ 178.798.488,00	1-6	\$ 100.288.240,84	-	-40,89%
2.6 SANEAMIENTO	\$ 320.075.111,00	2,39%	\$ 228.470.220,00	1,07%	\$ 34.727.282,88	15,89%	\$ 36.888,00	0,09%	\$ 255.873.835,00	1-6	\$ 34.888.750,88	-	-15,59%
2.7 PAVIMENTO ASFALTICO	\$ 348.488.880,00	2,39%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ -	1-6	\$ -	-	0,00%
2.8 ACEROS Y ESPACIO PUBLICO	\$ 488.284.100,00	3,49%	\$ 3.362.194.000,00	11,02%	\$ -	0,00%	\$ -	0,00%	\$ 3.362.194.000,00	1-6	\$ -	-	0,00%
2.9 IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 70.000.000,00	0,89%	\$ 70.000.000,00	0,84%	\$ 81.795.580,14	69,89%	\$ 42.488.347,00	66,89%	\$ 30.210.653,00	1-6	\$ 8.306.223,14	-	-25,47%
2.10 IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁFICO	\$ 30.000.000,00	0,29%	\$ 30.000.000,00	0,21%	\$ 24.171.270,56	80,59%	\$ 19.428.302,00	80,65%	\$ 10.571.698,00	1-6	\$ 4.342.888,56	-	-40,47%
	\$ 13.430.269.893,00	100,00%	\$ 16.970.259.458,00	100,00%	\$ 5.351.067.293,77	31,53%	\$ 3.796.860.082,67	22,374%	\$ 12.173.398.375,00	1-6	\$ 1.594.207.211,10	-	-9,158%



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA




ALCALDÍA DE
ACACÍAS

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME No. 14

Página 13

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14

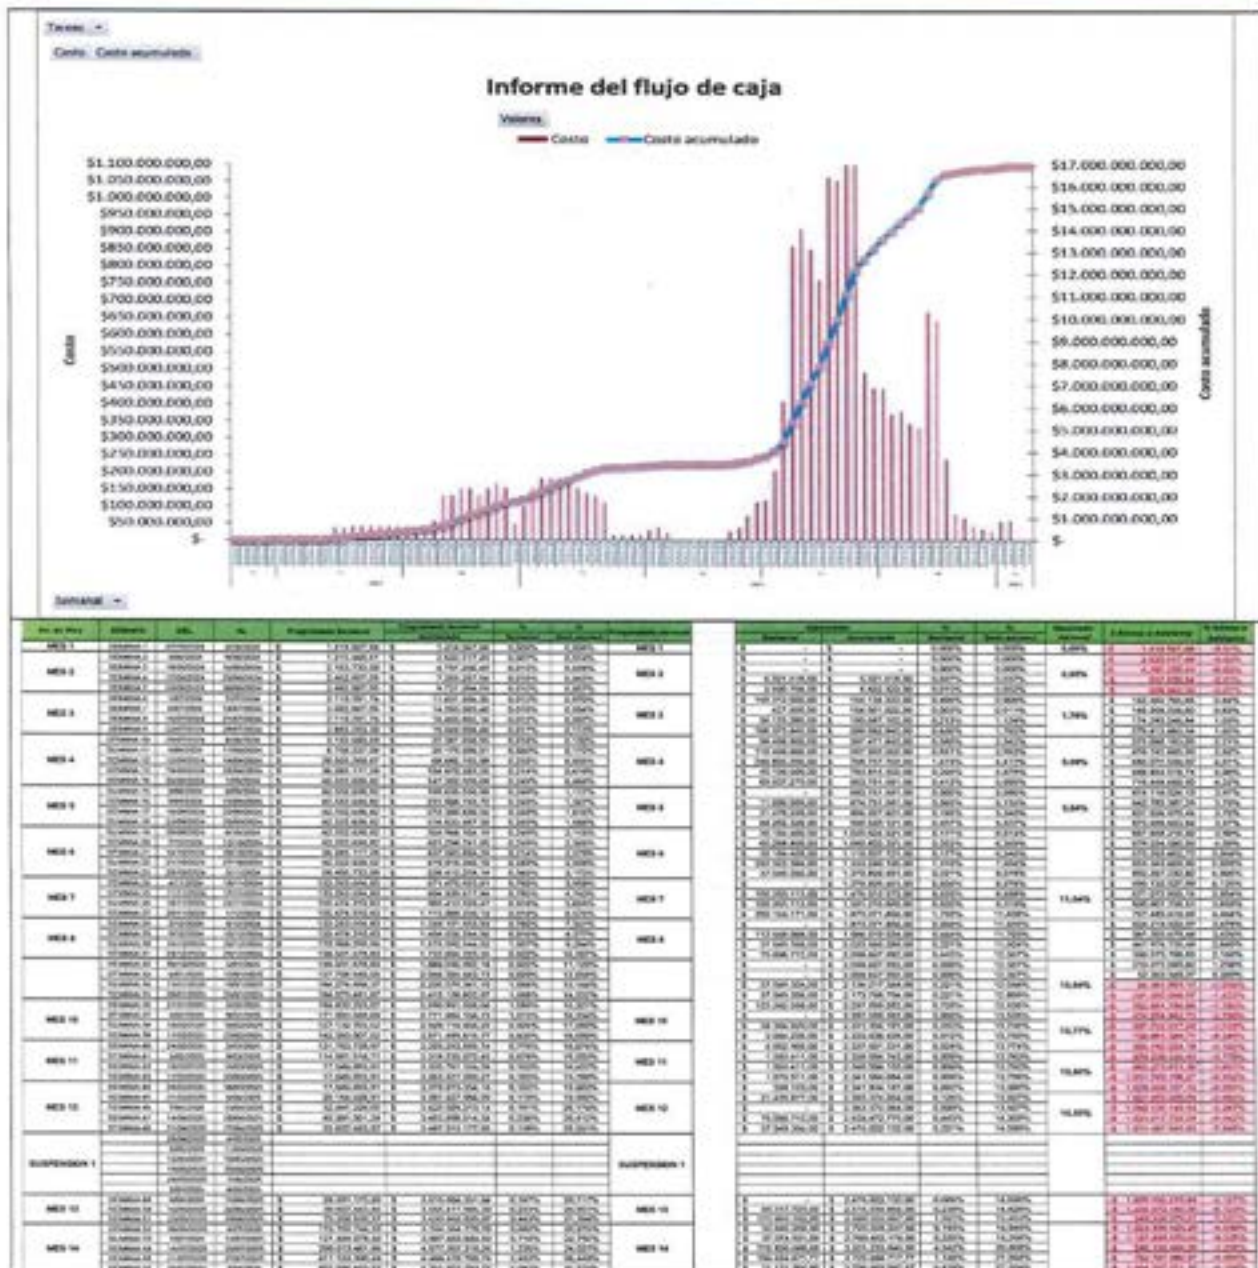

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACIAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página 14
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

2.8 Resumen de interventoría

RESUMEN DEL CONTRATO	
DESCRIPCION	VALOR
Valor inicial del contrato	\$627.081.787,00
Plazo inicial	Once (11) meses
Valor del contrato según Modificatoria No.1	\$918.733.882,00
Nuevo plazo según Modificatoria No.1	Dieciocho (18) meses

2.9 Justificación

Es de anotar que el concepto de Interventoría hace referencia al conjunto de funciones o actividades desempeñadas por un responsable designado o contratado para el efecto, que realiza el seguimiento al ejercicio del cumplimiento obligacional por parte del contratista, con la finalidad de promover la ejecución satisfactoria del contrato, mantener permanentemente a la entidad contratante de su estado técnico, jurídico y financiero, evitando perjuicios a la entidad y al contratista o parte del negocio jurídico, Así mismo la interventoría se encargará de supervisar, controlar y vigilar las acciones del contratista para hacer cumplir las especificaciones técnicas, las actividades administrativas, legales y presupuestales o financieras establecidas en los contratos o convenios celebrados.

Así mismo corresponde al Interventor, supervisar, controlar y coordinar la ejecución de los contratos que le sean asignados, a fin de garantizar al dueño de la obra, el cumplimiento de las condiciones y obligaciones pactadas en los mismos, así como el control técnico, administrativo y financiero de acuerdo con la naturaleza del contrato buscando satisfacer el fin perseguido.

Los interventores externos responderán civil y penalmente tanto por el cumplimiento de las obligaciones derivadas del contrato de Interventoría, como por los hechos u omisiones que le fueren imputables y que causen daño o perjuicio a las entidades, derivadas de la celebración y ejecución de los contratos, respecto de los cuales, haya ejercido funciones de Interventoría.

2.10 Aspectos Técnicos

La entidad a través de un concurso de méritos suscribió el contrato de consultoría 375 de 2022 con el Consorcio Consultorías Puentes Acacias cuyo objeto contractual fue " ESTUDIO Y DISEÑO DE SEIS PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN LOS BARRIOS PABLO VI, LAS VEGAS, CARRERA 14 Y 11° VEREDAS SAN CRISTÓBAL, EL DIAMANTE Y QUEBRADITAS EN EL MUNICIPIO DE ACACIAS, META" quien es el responsable de los estudios y diseños, documentos técnicos, presupuestales y toda la documentación necesaria y requerida para la construcción del puente.

El municipio de Acacias a través de la secretaria de Infraestructura realizó la entrega real y material de toda la etapa de diseños, en el cual se realizó un análisis detallado de las condiciones actuales que se encuentran en el proyecto, como se evidencia a continuación.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 15
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

DOCUMENTO		CASILLA DE VERIFICACION	OBSERVACIONES
Propuesta técnica económica		OK	Se recibe en medio magnético
Contrato legalizado		OK	Se recibe en medio magnético
Registro presupuestal		OK	Se recibe en medio magnético
Garantías aprobadas		OK	Se recibe en medio magnético
Licencias y/o permisos ambientales		OK	Se recibe en medio magnético
Especificaciones técnicas del proyecto		OK	Se recibe en medio magnético
Análisis de precios unitarios y presupuesto oficial		OK	Se recibe en medio magnético
Estudios y Diseños	Levantamiento topográfico y batimetría	OK	Se recibe en medio magnético
	Estudio de geología y geotecnia	OK	Se recibe en medio magnético
	Estudio de suelos	OK	Se recibe en medio magnético
	Estudio de tránsito	OK	Se recibe en medio magnético
	Estudio hidrológico, hidráulico y de socavación	OK	Se recibe en medio magnético
	Diseños estructurales del puente	OK	Se recibe en medio magnético
	Memorias de cálculo	OK	Se recibe en medio magnético
Plan de Manejo de Tránsito		OK	Se recibe en medio magnético
Plan de Manejo Ambiental		OK	Se recibe en medio magnético

Así mismo frente a la documentación los archivos entregados fueron los siguientes:

DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
Informe de diagnóstico	OK	Se recibe en medio magnético
Estudio topográfico	OK	Se recibe en medio magnético
Estudio de suelos geología y geotecnia	OK	Se recibe en medio magnético
Estudio hidrológico hidráulico y de socavación	OK	Se recibe en medio magnético
Estudio sistema de alcantarillado	OK	Se recibe en medio magnético
Estudio de tránsito, capacidad y niveles	OK	Se recibe en medio magnético
Plan de manejo de tránsito	OK	Se recibe en medio magnético
Estudio y diseño de estructuras	OK	Se debe modificar especificación acero estructural
Plan de manejo ambiental	OK	Se recibe en medio magnético
Análisis de precios unitarios	OK	Se recibe en medio magnético
D memorías eléctricas	OK	Se recibe en medio magnético
Especificaciones técnicas pt1	OK	Se recibe en medio magnético
Especificaciones técnicas pt2	OK	Se recibe en medio magnético
Memorias de cálculo pt1	OK	Se recibe en medio magnético
Memorias de cálculo pt2	OK	Se recibe en medio magnético
Resolución 2235 expediente 3.37.3.023.078	OK	Se recibe en medio magnético

Igualmente, los planos entregados fueron los siguientes:

PLANO	CASILLA DE VERIFICACIÓN	OBSERVACIONES
RAGP- QUEBRADITAS ELECTRICAS-V1-E-2	OK	No hay detalle, punto de conexión y demás
RAGP- QUEBRADITAS REDES-V3-E-1 E-2	OK	No hay detalle
RAGP-DISEÑO-GEOMETR-QUEBRADIT-V3-(1 al 6)	OK	Se debe modificar diseño geométrico
RAGP-PUENTE QUEBRADIT-V12-E-1-E-2,E-3, E-4, E-5, E-6, E-7, E-8	OK	Hacen falta planos estructurales
RAGP-TOPOGRAFIA-QUEBRADIT-V6-(1 al 5)	OK	Se recibe en medio magnético, debe documentación

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página 16
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

3 ASPECTOS FINANCIEROS

3.1 Control Presupuestal del contrato inicial.

El valor del contrato se encuentra amparado de acuerdo con el certificado de Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2023000056 de fecha 10 de abril de 2023 expedido por la Alcaldía de Acacías y con el CDP 5723 de fecha 10 de abril de 2023 expedido por SPGR y el Registro Presupuestal No. 2023000071 del 27 de diciembre del 2023.

Rubro presupuestal	Fuente de financiación	SECCION PPTAL	PRODUCTO MGA	FUENTE	Valor
6.3.24.2401.000011 PROYECTO 202335000604 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	2.3.2.02.02.05 CONSTRUCIO N Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCIO N	44 RECURSOS CORRIENTES SGR	PUENTE CONSTRUI DO RED TERCIARIA	ASIGNACIO NES DIRECTAS ANTICIPAD AS	\$ 627.081.787,00
TOTAL					\$ 627.081.787,00

3.2 Control Presupuestal del contrato según Adicional No.1.

El valor del contrato se encuentra amparado de acuerdo con el Certificado de Disponibilidad Presupuestal No. 2025000040 de fecha 12 de junio de 2025 expedido por la Alcaldía de Acacías y con el CDP 4625 de fecha 12 de junio de 2025 expedido por SPGR y el Registro Presupuestal No. 2023000071 del 27 de diciembre de 2023.

Rubro presupuestal	Fuente de financiación	SECCION PPTAL	PRODUCTO MGA	FUENTE	Valor
6.3.24.2402.0600.11 PROYECTO 2023500060004 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	2.3.2.02.02.005 CONSTRUCIO N Y SERVICIOS DE LA CONSTRUCIO N	44 RECURSOS CORRIENTES SGR	2402044 PUENTE CONSTRUI DO RED TERCIARIA	2.2.8.1.00.01 ASIGNACION ES DIRECTAS ANTICIPADA S	\$ 291.652.095,00
TOTAL					\$ 291.652.095,00

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 17
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14	

3.3 Avance Financiero

Según la cláusula octava el valor del contrato el municipio pagara al contratista mediante actas parciales hasta sumar máximo el noventa por ciento (90%) del valor del contrato, de acuerdo al avance de la obra objeto de la interventoría, liquidada sobre el porcentaje que le corresponda al calcular la equivalencia entre el valor del contrato de obra y el de interventoría, y con la presentación del informe mensual, acreditación de que se encuentra al día en el pago al Sistema de Seguridad Social Integral y parafiscales, acta parcial suscrita entre el contratista y el supervisor, certificado de cumplimiento por parte de la supervisión, el informe del supervisor aprobando las actividades realizadas por el contratista y entrega de la respectiva factura o documento equivalente.

CONCEPTO	VALOR CONTRATO	VALOR EJECUTADO	VALOR ANTICIPO POR AMORTIZAR	VALORES NETOS
VALOR INICIAL CONTRATO	\$ 627.081.787,00			
ANTICIPO				\$ 188.124.536,10
ACTA PARCIAL No.1		\$ 85.094.998,51	\$ 25.528.499,55	
ADICIONAL No.1	\$ 291.652.095,00			\$ 291.652.095,00
VALOR FALTANTE POR FACTURAR		\$ 627.081.787,00	\$ 188.124.536,10	\$ 438.957.250,90
SUMAS IGUALES	\$ 918.733.882,00	\$ 85.094.998,51	\$ 25.528.499,55	\$ 918.733.882,00

VALOR ACTUALIZADO		\$ 627.081.787,00			
ACTA	VALOR	AMORTIZACIÓN	VALOR NETO	ACUMULADO PAGOS EFECTUADOS	
				\$	%
ACTA PARCIAL No.1	\$ 85.094.998,51	\$ 25.528.499,55	\$ 59.566.498,96	\$ 25.528.499,55	13,57%

CONCEPTO	VALOR	AMORTIZACIÓN	FECHA	%
ANTICIPO	\$ 188.124.536,00		18/07/2024	30%
PARCIAL No.1	\$ 85.094.998,51	\$ 25.528.499,55	12/06/2025	13,57%

El pago del acta parcial No.1 se realizó con corte del 27 de mayo del 2024 al 02 de diciembre del 2024 con un porcentaje del 13,57%, equivalente a un valor de \$85.094.998,51 menos una amortización de \$25.528.499,55 para un valor de desembolso neto de \$59.566.498,96.


	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023		INFORME No. 14
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		Página 18

Según la cláusula 6 del contrato suscrito estableció "...Un anticipo equivalente al treinta (30%) del valor total del contrato, previa legalización de este y suscripción del acta de inicio con el supervisor, y plan de inversión del anticipo aprobado el mismo..."


A la fecha la entidad realizó el giro de recursos de anticipo por valor de \$ 188.124.536,00 el cual fue girado a la cuenta DAVIVIENDA S.A. CUENTA DE AHORROS DAMAS No 0550488436755992 con fecha 18 de julio de 2024, la distribución de recursos es el siguiente:

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Pago de salarios y costos directos del personal	\$ 112.874.721,66	60,00%
1.1	Director de Interventoría	\$ 28.943.502,26	15,4%
1.2	Residente de Interventoría	\$ 39.269.666,45	20,9%
1.3	HSEQ	\$ 11.088.103,60	5,9%
1.4	Ing. Ambiental	\$ 7.004.085,90	3,7%
1.5	Esp. Estructuras	\$ 7.004.085,90	3,7%
1.6	Topógrafo	\$ 6.125.753,90	3,3%
1.7	Cadenero	\$ 3.801.046,90	2,0%
1.8	Operario	\$ 9.638.476,75	5,1%
2	Alquiler de equipos de computo y oficina	\$ 28.218.680,42	15,00%
2.1	Equipos computo	\$ 14.109.340,21	7,5%
2.2	Oficina	\$ 14.109.340,21	7,5%
3	Alquiler camioneta tipo PICK UP	\$ 47.031.134,03	25,00%
3.1	Camioneta	\$ 47.031.134,03	25,00%
TOTAL		\$ 188.124.536,10	100%

DISTRIBUCION RECURSOS ANTICIPO

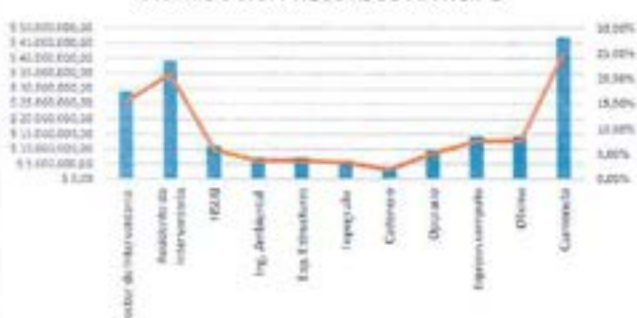

DISTRIBUCION ANTICIPO POR CAPITULO

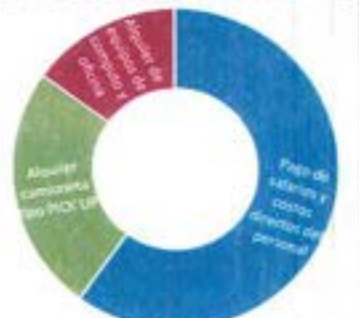



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA



ALCALDÍA DE
ACACIAS

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME No. 14

Página 19

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14

MOVIM ENTO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM AFECTADO	DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN
1	31/07/2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	\$ 17.486.042,20	2	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
2	31/07/2024	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	\$ 26.868.719,15	3	Reembolso por pago salario, prestaciones y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
3	31/07/2024	FLOR ANGELA NARVAEZ	\$ 7.586.587,20	4	Reembolso por pago salario, prestaciones y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
4	31/07/2024	KAROL PAOLA SANTANA TORRES	\$ 4.782.269,30	5	Reembolso por pago salario, prestaciones y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
5	31/07/2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	\$ 4.782.269,30	6	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
6	31/07/2024	OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON	\$ 4.191.305,30	7	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
7	31/07/2024	MICHELL VANESA TRUJILLO	\$ 2.600.716,30	8	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
8	31/07/2024	PEDRO ELADIO ALFEREZ	\$ 6.594.747,25	9	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
9	31/07/2024	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	\$ 14.109.340,20	11	Anticipo alquiler equipos de computo personal
10	31/07/2024	SERGEY MESA	\$ 14.109.340,20	12	Anticipo contrato de arrendamiento oficina
11	31/07/2024	JORGE ESTEBAN RODRIGUEZ MEDINA	\$ 23.515.567,00	13	Anticipo contrato de arrendamiento vehiculo
12	31/08/2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	\$ 6.075.096,40	2	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
13	31/08/2024	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	\$ 12.400.947,30	3	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
14	31/08/2024	FLOR ANGELA NARVAEZ	\$ 3.501.806,40	4	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
15	31/08/2024	KAROL PAOLA SANTANA TORRES	\$ 2.211.816,60	5	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
16	31/08/2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	\$ 2.211.816,60	6	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
17	31/08/2024	OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON	\$ 1.934.448,60	7	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
18	31/08/2024	MICHELL VANESA TRUJILLO	\$ 1.200.330,60	8	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
19	31/08/2024	PEDRO ELADIO ALFEREZ	\$ 3.043.729,50	9	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
20	31/08/2024	JORGE ESTEBAN RODRIGUEZ MEDINA	\$ 23.515.567,00	13	Anticipo 2 contrato de arrendamiento vehiculo
21	30-09-2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	\$ 3.372.363,60	13	Abono salario director de interventoria
TOTAL APROBADO			\$ 188.124.536,00		

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	VALOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	PAGO DE SALARIOS Y COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	\$ 112.874.721,60	\$ 3.372.363,60	\$ 109.502.358,00	\$ 112.874.721,60	\$ -
2	DIRECTOR INGENIERO CIVIL O ING DE TRANSPORTE Y VAS	\$ 28.943.502,20	\$ 3.372.363,60	\$ 25.571.138,60	\$ 28.943.502,20	\$ -
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA INGENIERO CIVIL	\$ 39.269.666,45		\$ 39.269.666,45	\$ 39.269.666,45	\$ -
4	TECNOLOGO EN HSE	\$ 11.088.103,60		\$ 11.088.103,60	\$ 11.088.103,60	\$ -
5	INGENIERO AMBIENTAL	\$ 7.004.085,90		\$ 7.004.085,90	\$ 7.004.085,90	\$ -
6	INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	\$ 7.004.085,90		\$ 7.004.085,90	\$ 7.004.085,90	\$ -
7	TOPOGRAFO	\$ 6.125.753,90		\$ 6.125.753,90	\$ 6.125.753,90	\$ -
8	CADENERO 1	\$ 3.801.046,90		\$ 3.801.046,90	\$ 3.801.046,90	\$ -
9	OPERARIO	\$ 9.636.476,75		\$ 9.636.476,75	\$ 9.636.476,75	\$ -
10	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA	\$ 28.218.680,40	\$ 0,00	\$ 28.218.680,40	\$ 28.218.680,40	\$ -
11	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 14.109.340,20	\$ 0,00	\$ 14.109.340,20	\$ 14.109.340,20	\$ -
12	ARRIENDO DE OFICINA	\$ 14.109.340,20	\$ 0,00	\$ 14.109.340,20	\$ 14.109.340,20	\$ -
13	ALQUILER CAMIONETA TIPO PICK UP	\$ 47.031.134,00	\$ 0,00	\$ 47.031.134,00	\$ 47.031.134,00	\$ -
14	CAMONETA TIPO PICK UP	\$ 47.031.134,00		\$ 47.031.134,00	\$ 47.031.134,00	\$ -
TOTAL		\$ 188.124.536,00	\$ 3.372.363,60	\$ 184.752.172,40	\$ 188.124.536,00	\$ 0,00

ITEM Nº	DESCRIPCIÓN	VALOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTICIPO
1	PAGO DE SALARIOS Y COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	\$ 112.874.721,60	\$ 3.372.363,60	\$ 109.502.358,00	\$ 112.874.721,60	\$ -
2	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA	\$ 28.218.680,40	\$ 0,00	\$ 28.218.680,40	\$ 28.218.680,40	\$ -
3	ALQUILER CAMIONETA TIPO PICK UP	\$ 47.031.134,00	\$ 0,00	\$ 47.031.134,00	\$ 47.031.134,00	\$ -
TOTAL		\$ 188.124.536,00	\$ 3.372.363,60	\$ 184.752.172,40	\$ 188.124.536,00	\$ 0,00

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 20
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14	



4 ASPECTOS ADMINISTRATIVOS Y JURIDICOS

4.1 Cronología contractual

Los documentos contractuales suscritos en el contrato son los siguientes:

ACTA	FECHA
Resolución de adjudicación	22 de diciembre de 2023
suscripción del contrato	27 de diciembre de 2023
Suscripción de Acta de inicio	27 de mayo de 2024
Acta de suspensión No.1	23 de abril del 2025
Acta de Ampliación No.1 a la suspensión N	6 de junio del 2025
Acta de Reinicio No.1	17 de junio del 2025
Acta de Adición No.1 y Prorroga No.1	21 de junio del 2015

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14	Página 21

4.2 Control de Pólizas

A continuación, se relaciona la información de la póliza que ampara el Contrato según suscripción de este:

Póliza de Cumplimiento:	30-44-101056712 ANEXO 0		
Responsabilidad civil extracontractual:	30-40-101020567 ANEXO 0		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.		
Fecha de expedición.	27 DE DICIEMBRE DEL 2023		
Fecha de aprobación entidad	30 DE DICIEMBRE DEL 2023		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento de Contrato	27/12/2023	27/03/2025	\$125.416.357,40
Buena manejo y correcta inversión del anticipo	27/12/2023	27/03/2025	\$188.124.536.,10
Salarios y Prestaciones Sociales Legales	27/12/2023	27/11/2027	\$31.354.089,35
Calidad del servicio	27/11/2024	27/11/2029	\$125.416.357,40
Responsabilidad civil extracontractual:	27/11/2024	27/11/2024	\$232.000.000,00

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato según suscripción del acta de inicio:

Póliza de Cumplimiento:	30-44-101056712 ANEXO 2		
Responsabilidad civil extracontractual:	30-44-101020567 ANEXO 2		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.		
Fecha de expedición.	28 DE MAYO DEL 2024		
Fecha de aprobación entidad	05 DE JUNIO DE 2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento de Contrato	27/05/2024	26/08/2025	\$125.416.357,40
Buena manejo y correcta inversión del anticipo	27/05/2024	26/08/2025	\$188.124.536.,10
Salarios y Prestaciones Sociales Legales	27/05/2024	27/04/2028	\$31.354.089,35
Calidad del servicio	27/05/2024	28/04/2030	\$125.416.357,40
Responsabilidad civil extracontractual:	27/11/2024	28/04/2025	\$232.000.000,00

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 22
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato según Suspensión No.1 y Reinicio No.1:

Póliza de Cumplimiento:	30-44-101056712 ANEXO 4		
Responsabilidad civil extracontractual:	30-44-101020567 ANEXO 5		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.		
Fecha de expedición.	20 DE JUNIO DEL 2025		
Fecha de aprobación entidad	20 DE JUNIO DE 2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento de Contrato	27/05/2024	20/10/2025	\$125.416.357,40
Buena manejo y correcta inversión del anticipo	27/05/2024	20/10/2025	\$188.124.536.,10
Salarios y Prestaciones Sociales Legales	27/05/2024	20/06/2028	\$31.354.089,35
Calidad del servicio	28/04/2025	28/04/2030	\$125.416.357,40
Responsabilidad civil extracontractual:	27/05/2024	20/06/2025	\$284.700.000,00

A continuación, se relaciona la información de las pólizas que amparan el Contrato según Adición No.1 y Prorroga No.1:

Póliza de Cumplimiento:	30-44-101056712 ANEXO 6		
Responsabilidad civil extracontractual:	30-44-101020567 ANEXO 6		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.S.		
Fecha de expedición.	28 DE MAYO DEL 2024		
Fecha de aprobación entidad	05 DE JUNIO DE 2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento de Contrato	27/05/2024	20/05/2026	\$183.746.776,40
Buena manejo y correcta inversión del anticipo	27/05/2024	20/05/2026	\$275.620.164.,80
Salarios y Prestaciones Sociales Legales	27/05/2024	20/01/2029	\$45.936.694,10
Calidad del servicio	28/04/2025	28/04/2030	\$125.416.357,40
Responsabilidad civil extracontractual:	27/11/2024	28/04/2025	\$183.746.776,40

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 23
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

4.3 Actas generadas

Las actas generadas en el contrato son las siguientes:

ACTA	FECHA
Acta de vecindad	Variables
Acta de aprobación factor multiplicador	28 de diciembre del 2023
Acta aprobación personal	29 de diciembre del 2023
Acta de visita previa	23 de febrero de 2024
Acta de socialización	13 de abril de 2024
Acta de inicio	27 de mayo de 2024
Acta de suspensión No.1	23 de abril del 2025
Acta de Ampliación No.1 a la suspensión N	6 de junio del 2025
Acta de Reinicio No.1	17 de junio del 2025
Acta de Adición No.1 y Prorroga No.1	21 de junio del 2015

4.4 Comités de Obra y Reuniones

En el periodo comprendido del presente informe mensual se realizaron los siguientes comités de obra y reuniones, los cuales se anexan al presente informe:

No DE	FECHA	LUGAR
41	02-07-2025	Realizado en la oficina de infraestructura del municipio de acacias
42	04-07-2025	Realizado en obra con socialización a la comunidad del reinicio de obra
43	17-07-2025	Realizado mediante enlace virtual https://meet.google.com/iwa-ikae-dwg?hs=224

4.5 Relación de personal y aportes Sistema integral de Seguridad Social y Parafiscales

Las planillas correspondientes a los pagos de salud, ARL, pensiones y demás aportes parafiscales de los trabajadores, correspondientes al periodo del 01 al 31 de julio de 2025, no se presentan dado que la fecha límite de pago aún no ha vencido.

Mes	Planilla No	Referencia de pago	Pago EPS	Pago Pensión	Pago ARL	Pago CCF	Pago Total
junio	Sin pago	Sin pago	\$1.160.603,91	\$2.634.643,20	\$1.146.069,79	\$540.556,54	\$5.481.873,44
Junio	88655747	9488655747	\$740,700	\$1,007,400	\$412,400,00	\$118,500,00	\$2,279,000,00
julio	9489830854		\$1.160.603,91	\$2.634.643,20	\$1.146.069,79	\$540.556,54	\$5.481.873,44
Julio	9490185291	90185291	\$740,700	\$1,007,400	\$412,400,00	\$118,500,00	\$2,279,000,00

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página 24
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Tipo de Vinculación	AFILIACIÓN			
			EPS	Pensión	ARL	CCF
Jimmy Andres Torres Castro	Director Interventoría	Dependiente	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM
Jorge Augusto Rodríguez Reina	Residente Interventoría	Independiente	ESP SURA	COLPENSIONES	SURA	COFREM
Jimmy Andres Torres Castro	Especialista Estructural	Dependiente	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM
Oscar Hernán Alarcón Ortigón	Ingeniero Ambiental	Dependiente	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM
Flor Angela Narváez Castro	Profesional SISO	Dependiente	FOSYGA REGIME	PORVENIR	SURA	COFREM
Oscar Hernán Alarcón Ortigón	Topógrafo	Dependiente	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM
Pedro Eladio Alferez	Cadenero	Dependiente	NUEVA EPS	COLPENSIONES	SURA	COFREM

Se aclara que se anexa al presente informe no solo las planillas de pago al sistema integral de seguridad social, sino también cuadro de control de seguridad social del personal que labora en el contrato, con dedicaciones y cálculos de IBC.

	
---	--



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME No. 14

Página 25


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14	Página 26

4.6 Instalaciones administrativas

La interventoría cuenta con instalaciones administrativas en la ciudad de Villavicencio ubicada en la Calle 49 No.30-16 oficina 203 barrio caudal alto dedicada al contrato suscrito, así mismo cuenta con oficina en el casco urbano del municipio de acacias el cual complementa el funcionamiento de la interventoría.



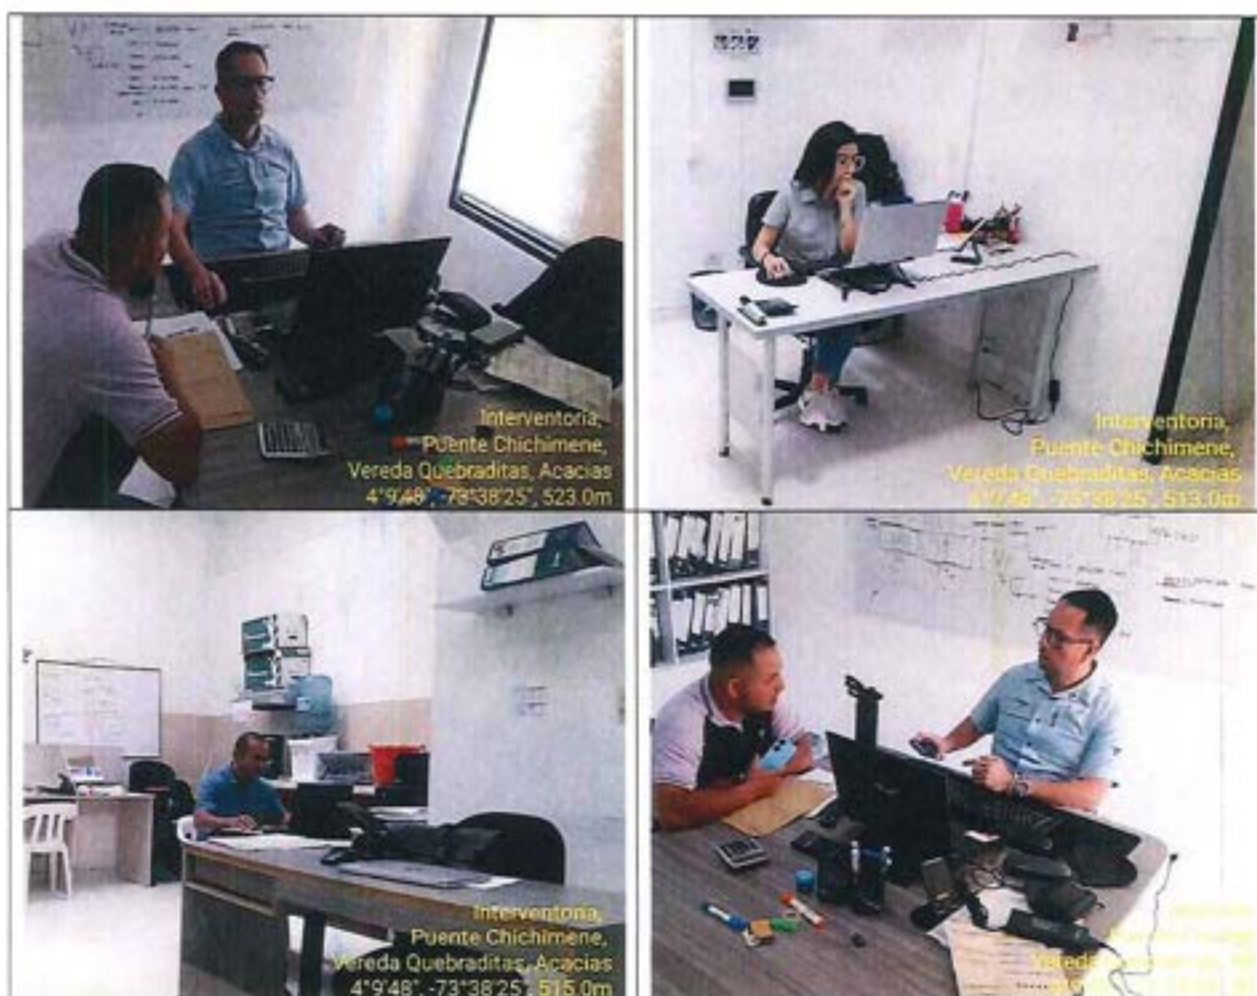

**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME No. 14

Página 27

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14

4.7 Equipos de topografía

La interventoría ha realizado todas las actividades topográficas por el método de poligonal cerrada con ceros atrás, las cuales se encuentran amarradas a las coordenadas magnas sirgas obtenidas en el traslado de coordenadas. El trazado de la poligonal parte de la base topográfica con la estación total TOPCON GTS-GTS-236W No.285524 el cual cuenta con certificado de calibración No 055/23 de fecha 09 de diciembre de 2023 y adicional a lo anterior para el control de alturas el equipo utilizado es un nivel óptico de precisión de marca TOPCON AT-B4 serie No RY1632 y certificado de calibración No 570/24 de fecha 09 de febrero de 2024.

Equipo	Serie	Certificado calibración
TOPCON GTS-GTS-236W	285524	055/23
TOPCON AT-B4	RY1632	570/24
GPS GARMIN OREGON	010-00697-10	N.A.
ACCESORIOS Y HERRAMIENTAS MENORES	N.A.	N.A.



	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 28
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

4.8 Ensayos de laboratorio

La interventoría cuenta con la disponibilidad para el proyecto de la empresa de Laboratorios de suelos, concretos y pavimentos INGEGAR INGENIERIA SAS identificada con Nit No 900055611-1, la cual cuenta con certificado del El Organismo Nacional de Acreditación de Colombia ONAC No ECCO-0204/14 para las actividades de consultoría den laboratorio de suelos, concretos y pavimentos, estudios geotécnicos, diseños de pavimentos y cimentaciones conforme los requisitos ISO 9001:2025.

Durante este periodo, se efectuó la toma de muestras de concreto correspondientes al vaciado realizado para la construcción de un dado de la viga cabezal del estribo ubicado en el costado Palomas.

 <p>INGEGAR INGENIERIA S.A.S. Calle 49 No. 30-16 oficina 203, Barrio Caudal Villavicencio – Meta Teléfono: 317 456 1234 Correo electrónico: info@ingegar.com</p> <p>Ing. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA C.C. 9.876.543.210 Especialista en Interventoría</p> <p>Ing. JUAN CARLOS GONZALEZ C.C. 1.234.567.890 Especialista en Laboratorio</p> <p>Ing. MARIA ANA GONZALEZ C.C. 5.678.901.234 Especialista en Geotecnia</p> <p>Ing. CARLOS ALBERTO GONZALEZ C.C. 9.012.345.678 Especialista en Pavimentos</p> <p>Ing. LUIS ALBERTO GONZALEZ C.C. 3.456.789.012 Especialista en Cimentaciones</p> <p>Ing. ANDREA GONZALEZ C.C. 7.890.123.456 Especialista en Estudios Geotécnicos</p> <p>Ing. DIEGO GONZALEZ C.C. 1.357.902.468 Especialista en Diseños de Pavimentos</p> <p>Ing. FABIAN GONZALEZ C.C. 5.210.987.654 Especialista en Cimentaciones</p> <p>Ing. GABRIEL GONZALEZ C.C. 9.643.210.987 Especialista en Estudios Geotécnicos</p> <p>Ing. HENRIQUE GONZALEZ C.C. 3.098.765.432 Especialista en Diseños de Pavimentos</p> <p>Ing. ISABEL GONZALEZ C.C. 7.432.109.876 Especialista en Cimentaciones</p> <p>Ing. JAVIER GONZALEZ C.C. 1.876.543.210 Especialista en Estudios Geotécnicos</p> <p>Ing. JULIANA GONZALEZ C.C. 5.321.098.765 Especialista en Diseños de Pavimentos</p> <p>Ing. KENNY GONZALEZ C.C. 9.765.432.109 Especialista en Cimentaciones</p> <p>Ing. LUISA GONZALEZ C.C. 3.109.876.543 Especialista en Estudios Geotécnicos</p> <p>Ing. MARCO GONZALEZ C.C. 7.543.210.987 Especialista en Diseños de Pavimentos</p> <p>Ing. NANCY GONZALEZ C.C. 1.987.654.321 Especialista en Cimentaciones</p> <p>Ing. OSCAR GONZALEZ C.C. 5.432.109.876 Especialista en Estudios Geotécnicos</p> <p>Ing. PABLO GONZALEZ C.C. 9.876.543.210 Especialista en Diseños de Pavimentos</p> <p>Ing. RAFAEL GONZALEZ C.C. 3.210.987.654 Especialista en Cimentaciones</p> <p>Ing. SILVIA GONZALEZ C.C. 7.654.321.098 Especialista en Estudios Geotécnicos</p> <p>Ing. TATIANA GONZALEZ C.C. 1.098.765.432 Especialista en Diseños de Pavimentos</p> <p>Ing. UGO GONZALEZ C.C. 5.543.210.987 Especialista en Cimentaciones</p> <p>Ing. VALERIA GONZALEZ C.C. 9.987.654.321 Especialista en Estudios Geotécnicos</p> <p>Ing. WILSON GONZALEZ C.C. 3.321.098.765 Especialista en Diseños de Pavimentos</p> <p>Ing. XIMENA GONZALEZ C.C. 7.765.432.109 Especialista en Cimentaciones</p> <p>Ing. YANIS GONZALEZ C.C. 1.109.876.543 Especialista en Estudios Geotécnicos</p> <p>Ing. YOLANDA GONZALEZ C.C. 5.654.321.098 Especialista en Diseños de Pavimentos</p> <p>Ing. ZORBA GONZALEZ C.C. 9.098.765.432 Especialista en Cimentaciones</p>	 <p>Applus+ Certificación de Calidad de la Organización INGEGAR INGENIERIA S.A.S. Calle 49 No. 30-16 oficina 203, Barrio Caudal Villavicencio – Meta Teléfono: 317 456 1234 Correo electrónico: info@ingegar.com</p> <p>Ing. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA C.C. 9.876.543.210 Especialista en Interventoría</p> <p>Ing. JUAN CARLOS GONZALEZ C.C. 1.234.567.890 Especialista en Laboratorio</p> <p>Ing. MARIA ANA GONZALEZ C.C. 5.678.901.234 Especialista en Geotecnia</p> <p>Ing. CARLOS ALBERTO GONZALEZ C.C. 9.012.345.678 Especialista en Pavimentos</p> <p>Ing. LUIS ALBERTO GONZALEZ C.C. 3.456.789.012 Especialista en Cimentaciones</p> <p>Ing. ANDREA GONZALEZ C.C. 7.890.123.456 Especialista en Estudios Geotécnicos</p> <p>Ing. DIEGO GONZALEZ C.C. 1.357.902.468 Especialista en Diseños de Pavimentos</p> <p>Ing. FABIAN GONZALEZ C.C. 5.210.987.654 Especialista en Cimentaciones</p> <p>Ing. GABRIEL GONZALEZ C.C. 9.643.210.987 Especialista en Estudios Geotécnicos</p> <p>Ing. HENRIQUE GONZALEZ C.C. 3.098.765.432 Especialista en Diseños de Pavimentos</p> <p>Ing. ISABEL GONZALEZ C.C. 7.432.109.876 Especialista en Cimentaciones</p> <p>Ing. JAVIER GONZALEZ C.C. 1.876.543.210 Especialista en Estudios Geotécnicos</p> <p>Ing. JULIANA GONZALEZ C.C. 5.321.098.765 Especialista en Diseños de Pavimentos</p> <p>Ing. KENNY GONZALEZ C.C. 9.765.432.109 Especialista en Cimentaciones</p> <p>Ing. LUISA GONZALEZ C.C. 3.109.876.543 Especialista en Estudios Geotécnicos</p> <p>Ing. MARCO GONZALEZ C.C. 7.543.210.987 Especialista en Diseños de Pavimentos</p> <p>Ing. NANCY GONZALEZ C.C. 1.987.654.321 Especialista en Cimentaciones</p> <p>Ing. OSCAR GONZALEZ C.C. 5.432.109.876 Especialista en Estudios Geotécnicos</p> <p>Ing. PABLO GONZALEZ C.C. 9.876.543.210 Especialista en Diseños de Pavimentos</p> <p>Ing. RAFAEL GONZALEZ C.C. 3.210.987.654 Especialista en Cimentaciones</p> <p>Ing. SILVIA GONZALEZ C.C. 7.654.321.098 Especialista en Estudios Geotécnicos</p> <p>Ing. TATIANA GONZALEZ C.C. 1.098.765.432 Especialista en Diseños de Pavimentos</p> <p>Ing. UGO GONZALEZ C.C. 5.543.210.987 Especialista en Cimentaciones</p> <p>Ing. VALERIA GONZALEZ C.C. 9.987.654.321 Especialista en Estudios Geotécnicos</p> <p>Ing. WILSON GONZALEZ C.C. 3.321.098.765 Especialista en Diseños de Pavimentos</p> <p>Ing. XIMENA GONZALEZ C.C. 7.765.432.109 Especialista en Cimentaciones</p> <p>Ing. YANIS GONZALEZ C.C. 1.109.876.543 Especialista en Estudios Geotécnicos</p> <p>Ing. YOLANDA GONZALEZ C.C. 5.654.321.098 Especialista en Diseños de Pavimentos</p> <p>Ing. ZORBA GONZALEZ C.C. 9.098.765.432 Especialista en Cimentaciones</p>
 <p>Interventoría: Puente Chichimene, Vereda Cuibadilla, Acacías, 3° 57' 34" N - 73° 30' 19" W, 328.5m 23/07/2023 17:45:47</p>	 <p>Interventoría: Puente Chichimene, Vereda Cuibadilla, Acacías, 3° 57' 34" N - 73° 30' 19" W, 328.5m 23/07/2023 08:45:14</p>

JR	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 29
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

4.9 Transporte

La interventoría cuenta con la disponibilidad para el proyecto de 1 (un) vehículo tipo camioneta Pick up doble cabina con las siguientes características

MARCA	NISSAN	MODELO	2014	LINEA	D22/NP300
PLACA	HBV493	No POLIZA	84930866-600004083		
CLASE	CAMIONETA	SERVICIO	PARTICULAR	COLOR	BLANCO



	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página 30
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

5 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

5.1 Actividades Básicas

La interventoría realiza un seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista apoyando la realización de todos los objetivos contractuales, también vigila y controla para que se cumplan los pliegos de condiciones del contrato, como lo son: tiempo, calidad, cantidades y el correcto uso de los recursos, así mismo ha sostenido una comunicación fluida y coordinada entre todas las partes involucradas en la realización del proyecto, logrando con ello la organización de reuniones, se han conformado comités de trabajo, se ha pedido los informes de los procesos y se ha verificado que todo se lleve de manera adecuada y en la eventualidad de inconvenientes ha brindado prontas soluciones lo que permite monitorear y controlar los riesgos que han sido identificados, así mismo resulta claro que el objetivo general de esta interventoría es vigilar y controlar en forma eficaz y de manera permanente todas las etapas contractuales, para hacer cumplir las especificaciones técnicas, tiempos, las actividades administrativas, legales, financieras, presupuestales y sociales establecidas en el contrato.

5.2 Funciones principales realizadas

La Interventoría, implica una posición imparcial, por lo tanto, en la interpretación del contrato y en la toma de decisiones, la Interventoría ha sido consecuente con sus objetivos principales los cuales ha aplicado así:

Función de Absolver: En cuanto a este objetivo y en virtud del principio de intermediación, esta interventoría ha sido la encargada de resolver las dudas que se han presentado en el desarrollo del contrato, garantizando la comunicación entre las partes.

Función de Colaborar: La Interventoría y el Contratista han conformado un grupo de trabajo de profesionales idóneos en cuya labor en conjunto se resuelven dificultades con razones de orden técnico, jurídico, administrativo y financiero, aclarando que ello signifique, renunciar al ejercicio de sus atribuciones y responsabilidades específicas o pérdida de su autonomía e independencia frente al contratista.

Función de Controlar: Este objetivo es el más importante y se ha logrado por medio de una labor de inspección, asesoría, supervisión, comprobación y evaluación, estableciendo de esta forma que la ejecución se ajusta a lo pactado. Especialmente en relación con:

- Las especificaciones técnicas del objeto contratado.
- Actividades administrativas a cargo del contratista.
- Actividades legales.
- Actividades financieras y presupuestales.
- Toda estipulación contractual.
- Proteger los intereses de la Entidad y salvaguardar su responsabilidad.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página 31
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

- Vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado.
- Los plazos, términos y demás condiciones contractuales, garantizando la eficiente y
- oportuna inversión de los recursos establecidos contractualmente.

Función de Exigir: La interventoría cuando ha encontrado que en el desarrollo de la relación contractual no se está cumpliendo estrictamente con las cláusulas pactadas, ha exigido al Contratista el debido cumplimiento de los términos y condiciones contractuales y las garantías constituidas para dicho fin.

Función de Solicitar: Esta interventoría ha pedido al Contratista oportunamente, que subsane de manera inmediata, las fallas que se han presentado en ejecución del contrato.

Función de Prevenir: Esta interventoría ha establecido que el control no está destinado exclusivamente a sancionar el incumplimiento de las obligaciones, sino a corregir los conceptos erróneos, impidiendo que se desvíe el objeto del contrato.

Función de Asegurar la calidad de los trabajos: Esta interventoría ha realizado la vigilancia en la calidad de los trabajos.

Función de Verificar: esta interventoría ha verificado el cumplimiento de la normatividad vigente, por parte del contratista en la ejecución del contrato, esta actividad se ha concretado mediante la aplicación de correctivos, la exigencia del cumplimiento de lo pactado y solución de los problemas.

5.3 Seguimiento y control Técnico de la Obra

La Interventoría ha realizado presencia en las actividades realizadas por el contratista como son:

- Como Interventoría se verificó el cumplimiento de las implantaciones en la ubicación de los pilotes, perforación para instalación de las camisas perdidas y la instalación final de acero y concreto de los pilotes que hacen parte de los elementos de infraestructura del puente y demás componentes del presupuesto.
- también se realizó verificación en el cumplimiento de las especificaciones para el inicio de la instalación y armado de los aceros para la viga cabzal de los estribos.
- Se han realizado un seguimiento a las actividades realizadas por el contratista realizando un registro fotográfico de cada una de las actividades.
- Se realizó control en la ejecución de cada una de las actividades ejecutadas conforme las especificaciones técnicas del proyecto.
- Como Interventoría se verifica y se controla la ejecución del contrato mediante un balance en el que se evidencie las condiciones actuales de las actividades ejecutadas y así poder establecer y garantizar el alcance del contrato.
- Se realiza acompañamiento en cada una de las actividades administrativas del contrato.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 32
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

5.4 Seguimiento y control de Impacto Urbano y mitigación

El concepto de evaluación de impacto urbano podemos definirlo como un conjunto de aplicaciones que buscan como propósito fundamental de minimizar el manejo de los asuntos humanos de forma que sea posible un sistema de vida en armonía con el desarrollo del proyecto, siendo claro que el proyecto en ejecución corresponde a una intervención de una vía terciaria. Se puede concluir que existe relación directa que afecta el entorno rural, social y económicos, no obstante, esta interventoría requirió al contratista para que, al realizar la intervención de la vía y la construcción del puente, se deba realizar su debida señalización con cinta peligro, elementos de señalización vertical, horizontal, pendones de aviso para el aislamiento de la comunidad y con el objetivo de no tener inconvenientes de accidentes con los mismos.

5.5 Seguimiento y control predial en la ejecución

Si bien es cierto que la interventoría es responsable de velar por el cumplimiento de las metas establecidas, así como también seguir los lineamientos de seguimiento y control en materia predial aunque no exista una obligación establecida ni forma parte del proyecto como componente presupuestal, si es necesario tomar decisiones efectivas y concretas que en materia predial no traben ni entorpezcan el cumplimiento en la ejecución del proyecto, así como generar una herramienta que coadyuve al cumplimiento de las metas planteadas por la Entidad.

5.6 Seguimiento y control compromisos laborales y sistema integral de seguridad social

Durante el presente periodo del informe, esta interventoría realizo seguimiento y control a que el contratista proporcionara un entorno de trabajo seguro, ofreciera salarios pactados en su propuesta, así como al pago de prestaciones sociales y a cumplir las leyes, reglamentos laborales establecidas en el Código del Trabajo y demás que contienen normas laborales, para ello se adjunta cuadro de control de personal de obra e interventoría el cual relaciona uno a uno el estado de vinculación a cada componente de cada trabajador junto con su número de planilla, fecha de pago y aporte realizado al sistema integral de seguridad social.

5.7 Seguimiento y control al Estado del Tiempo

Durante el presente periodo del informe, esta interventoría realizo seguimiento y control al comportamiento de las condiciones climatológicas para de esta forma analizar la incidencia de estas en la ejecución del contrato, para ello se adjunta como anexo cuadro de control estado general del tiempo el cual discrimina día a día cual fue la condición predominante.

5.8 Seguimiento y control al plan de calidad

Durante el presente periodo del informe, esta interventoría realizo seguimiento y control al alcance del plan, a la verificación de elementos de entrada, al cumplimiento de los objetivos, al cumplimiento

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página 33
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

de las responsabilidades de la dirección, a la verificación del control de documentos, datos, registros y Gestión de los recursos.

5.9 Seguimiento y control de Seguridad Industrial.

Durante el presente periodo del informe, la interventoría realizó control al contratista, en la implementación de los elementos de protección personal (EPP), al personal durante la ejecución de los trabajos, de igual manera se hizo seguimiento al cumplimiento Decreto Único 1072 – Año 2015 el cual no modificó las normas, solo las unificó, haciendo que todas las empresas, sin importar su nivel de riesgo, implementaran el SG-SST de forma obligatoria, para ello se adjunta cuadro de control seguridad industrial el cual califica frente a la entrega de documentación básica legal, entrega de elementos de protección personal, gestión ambiental y sanitaria, medicina preventiva, gestión del peligro, señalización, manejo de cargas y maquinaria pesada, trabajo en alturas, preparación y respuestas ante emergencias y gestión en campo, así mismo se genera cuadro de control personal de obra el cual relaciona el estado de cada trabajador al sistema integral de seguridad social.

5.10 Seguimiento y control cumplimiento plan de manejo de tráfico o tránsito

Durante el presente periodo del informe, la interventoría realizó control al contratista, en la implementación de la señalización necesaria para el manejo del tránsito tanto vehicular como peatonal, así como al cumplimiento de alternativas de solución que permitan mitigar los conflictos en términos de movilidad en la zona de influencia adyacente a las intersecciones, como también los desvíos necesarios y los sentidos de circulación de los vehículos durante el desarrollo de la obra, es importante mencionar que se identificaron los impactos que el proyecto generó sobre la movilidad circundante en el área de influencia directa, y los puntos críticos y se establecieron las mejores condiciones de movilidad para los usuarios, con el fin de llevar a cabo los trabajos sin afectar de manera traumática la circulación del flujo vehicular y peatonal.

5.11 Seguimiento y control cumplimiento de las obligaciones del contratista

Durante el presente periodo del informe, la interventoría realizó control al cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente en la cláusula 9 obligaciones generales y específicas del contratista, de igual forma se requirió al contratista ante el incumplimiento de alguna de ellas con el objetivo de conminarlo a su cumplimiento.

5.12 Seguimiento y control plan de manejo ambiental

Durante el presente periodo del informe, la interventoría realizó control al cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente en la cláusula 9 obligaciones generales y específicas del contratista, de igual forma se requirió al contratista ante el incumplimiento de alguna de ellas con el objetivo de conminarlo a su cumplimiento, para ello se adjunta como anexo cuadro de control en la implementación del plan de manejo ambiental, como también acta de seguimiento ambiental, acta de seguimiento a la flora y fauna.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página 34
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

5.13 Seguimiento y control a los permisos legales, ambientales y fichas.

Durante el presente periodo del informe, esta interventoría realizó seguimiento y control al cumplimiento de las siguientes resoluciones emitidas por la corporación ambiental:

TRAMITE	RESOLUCION	EXPEDIENTE	VIGENCIA
Permiso de ocupación de cauce sobre el caño Chichimene, para la construcción de un puente vehicular, dos cabezales de descarga de aguas lluvias de 12" y la demolición del puente antiguo, en la vereda Quebraditas del municipio de Acacías	PS-GJ. 1.2.6.23.2235	3.37.3.023.078	Hasta el 10 de octubre de 2024

Debemos mencionar que, previendo el vencimiento de la resolución, la secretaria de infraestructura a través de oficio 1080.30//0393 de fecha 19 de junio de 2024, radico ante la corporación ambiental la solicitud de prorroga a la resolución por un año, la cual no ha sido emitida por la entidad ambiental.

5.14 Seguimiento y control programa de gerencia

Durante el presente periodo del informe, la interventoría realizó control al cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente en la cláusula 9 obligaciones generales y específicas del contratista, de igual forma se requirió al contratista ante el incumplimiento de alguna de ellas con el objetivo de conminarlo a su cumplimiento.

6 CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES

Durante el presente periodo del informe, la interventoría dio cumplimiento a cada una de las obligaciones generadas en la cláusula novena y se resume así:

	CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
1	Cumplir con las condiciones establecidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Durante el presente periodo la interventoría ha cumplido con las condiciones establecidas en el proceso de contratación.
2	Desarrollar el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.	Durante el presente periodo la interventoría ha desarrollado el objeto del contrato en las condiciones de calidad, oportunidad, y obligaciones definidas en los Documentos del Proceso de Contratación.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 35
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

3	Garantizar la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.	Durante el presente periodo la interventoría ha garantizado la calidad de los bienes y servicios prestados, de acuerdo con el Anexo Técnico, el Pliego de Condiciones y demás Documentos del Proceso.
4	Dar a conocer a la Entidad cualquier reclamación que indirecta o directamente pueda tener algún efecto sobre el objeto del contrato o sobre sus obligaciones, sin costo adicional para el municipio.	Durante el presente periodo no se presentó reclamaciones ni eventos que tengan efecto sobre el objeto del contrato.
5	Abstenerse de ordenar y/o aprobar trabajos sin contar con el debido respaldo presupuestal.	Durante el presente periodo la interventoría no ha ordenado ni aprobado trabajos, fuera del presupuesto.
6	Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el Documento base y en el "Anexo 1 -Anexo Técnico", en los plazos acordados con la Entidad.	La interventoría acredita el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definidos en el proceso contractual.
7	Identificar las oportunidades para promover la vinculación de mano de obra de personal local durante la ejecución del contrato.	La interventoría ha gestionado y ha promovido la vinculación de mano de obra de personal local para la ejecución del contrato.
8	Dar cabal cumplimiento al pacto de transparencia y declaraciones de la carta de presentación de la oferta.	La interventoría ha dado cumplimiento al pacto de transparencia según propuesta presentada.
9	Informar a la Entidad cuando ocurra una situación que implique una modificación del estado de los riesgos existentes al momento de proponer o celebrar el contrato, como sería el caso de la existencia de investigaciones, medidas de aseguramiento o condenas proferidas en Colombia o en el extranjero que afecten al Interventor o incidan en su capacidad para continuar con la ejecución del contrato.	Durante el presente periodo no se ha informado pues no ha existido ninguna situación que altere los riesgos existentes, y que puedan tener incidencia en la capacidad para continuar con la ejecución del contrato.
10	Comunicarle a la Entidad circunstancias políticas, jurídicas, sociales, económicas, técnicas, ambientales o de cualquier tipo, que puedan afectar la ejecución de este contrato.	Durante el presente periodo no se ha comunicado a la entidad pues no ha existido ninguna circunstancia que afecte la ejecución del contrato.
11	Durante la ejecución del contrato deberá observar las leyes y los reglamentos relativos con Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).	Durante el presente periodo la interventoría ha conminado al contratista y al personal de interventoría a dar cumplimiento a los programas de seguridad y salud en el trabajo, así como se ha verificado la entrega de elementos de protección personal.
12	Informar los cambios en la composición del capital social de la persona jurídica cada vez que ocurran, la existencia de pactos o acuerdos de accionistas que guarden relación con las actividades de la sociedad; su pertenencia o no a un grupo empresarial, si se trata de una matriz, subordinada, o Sucursal de sociedad extranjera, así como la información relevante de índole jurídica, comercial o financiera, como lo es indicar si está en proceso de liquidación la persona jurídica o sus representantes legales, socios o accionistas.	Durante el presente periodo no se ha presentado cambios en la composición de capital social de la persona jurídica ni para el contrato de obra ni para el contrato de interventoría.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 36
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

13	Cumplir con sus obligaciones laborales respecto del personal a su cargo y con las obligaciones tributarias y ambientales que le correspondan de acuerdo con su labor.	Durante el presente periodo la interventoría ha dado cumplimiento a las obligaciones laborales, tributarias y ambientales que corresponden.
14	Ejecutar el contrato con el Personal Clave Evaluable ofrecido en el Procedimiento de Contratación. En caso de requerir el cambio de personal, por razones que deben quedar sustentadas en el expediente del contrato, el Interventor presentará las hojas de vida del aspirante, con sus respectivos soportes para evaluación de la Entidad, en un plazo no mayor a 10 días hábiles, contados a partir de que el Interventor solicite el cambio del personal. La persona que reemplazará al profesional del Personal Clave Evaluable debe cumplir con los requisitos mínimos descritos en la "Matriz 4- Lineamientos de requisitos del personal" y tener el año de experiencia específica adicional y/o tener el título de formación académica adicional, si se trata de un profesional por el cual se asignó puntaje.	Durante el presente periodo la interventoría ha ejecutado el contrato con el personal clave evaluable, sin que haya existido la necesidad de realizar cambios de estos.
15	Realizar sus entregables (comunicaciones, informes, memorias de cálculo, diseños por componentes) en papel que cumpla con las siguientes características: (i) estar certificado en el Sello Ambiental Colombiano o (ii) estar en papel reciclado o procedente de fuentes forestales sostenibles o naturales y libre de cloro elemental.	Durante el presente periodo la interventoría ha certificado a través del oficio CI- OCA-978.2023-006 la ficha técnica del papel con sello ambiental colombiano que se utilizara para elaborar todos los documentos entregables durante la ejecución del contrato
16	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de al Sistema de Seguridad Social Integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá demostrar el aporte a los Sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscal (artículo 50 de la Ley 789 de 2002 y el artículo 23 de la Ley 80 de 1993) que le corresponda para cada pago o abono en cuenta según la forma de pago.	Durante el presente periodo la interventoría ha realizado los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales, así como se ha dado cumplimiento al sistema integral de seguridad social, de acuerdo con lo que normativamente exige, para ello se adjuntan planillas de seguridad social que soportan el pago.
17	Manejar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	Durante el presente periodo la interventoría ha manejado con confidencialidad la información a la cual se ha tenido acceso y la generada en ejecución.
18	Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por la Entidad.	Durante el presente periodo la interventoría ha reportado a través de oficios, informes semanales y comités de obra información de la ejecución del contrato.
19	Acreditar el cumplimiento de la formación académica y la experiencia del equipo de trabajo definida en el documento base y en el "Anexo 1 -Anexo Técnico" en los plazos acordados con la Entidad.	Durante el presente periodo la interventoría ha acreditado debidamente la formación académica mediante oficio CI- OCA-978.2023-007 y acta de aprobación de personal.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 37
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

20	Cumplir los Protocolos de Bioseguridad, en particular a los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019, o la norma que lo modifique, complemente o sustituya.	Durante el presente periodo la interventoría ha cumplido los Estándares Mínimos del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo previstos en la Resolución 312 de 2019.
21	Incorporar como mínimo el [La Entidad incorporará el porcentaje definido en el numeral 4.4.1 del documento base que sea por lo menos del cien por ciento (100 %), sin perjuicio de incluir uno superior] de personal colombiano para el cumplimiento del contrato.	La interventoría ha incorporado en un 100% personal de nacionalidad colombiano, según exigencia del pliego de condiciones.
22	Incorporar como mínimo el cien por ciento (100 %) de personal técnico, operativo y profesional de origen colombiano para el cumplimiento del contrato.	La interventoría ha incorporado en un 100% personal de nacionalidad colombiano, según exigencia del pliego de condiciones.

	CLÁUSULA 9. OBLIGACIONES GENERALES DEL INTERVENTOR	VERIFICACION DEL CUMPLIMIENTO
1	Realizar la interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, jurídica, ambiental y social del proyecto en mención y de los recursos destinados por el Municipio para ello.	Durante el presente periodo se ha realizado la interventoría administrativa, técnica, financiera, contable, jurídica, ambiental y social del proyecto en mención y de los recursos destinados por el Municipio para ello.
2	Dar cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento, las condiciones y los ofrecimientos presentados en la propuesta.	Durante el presente periodo se ha dado cumplimiento al objeto y alcance del contrato de acuerdo con lo establecido en el presente documento, las condiciones y los ofrecimientos presentados en la propuesta.
3	Aportar todo su conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.	Durante el presente periodo se ha aportado todo el conocimiento y experiencia para desarrollar adecuadamente el objeto del contrato de conformidad con lo requerido por el contratante.
4	Disponer del personal ofertado y del personal adicional idóneo que sea requerido, así como de los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad establecida y durante toda la ejecución del contrato, sin costos adicionales para el municipio.	Durante el presente periodo se ha dispuesto del personal ofertado, así como los recursos logísticos, materiales, y/o equipos, necesarios para desarrollar el contrato dentro de la oportunidad establecida y durante toda la ejecución del contrato, sin costos adicionales para el municipio.
5	Verificar que el contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma ágil, y eficiente. Verificar además que el contratista vincule a la ejecución del contrato población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional en un porcentaje que no será superior al 10% ni inferior al 5%. El no cumplimiento de la obligación se impondrán las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado, aplicando para el efecto la cláusula de multas prevista en el	Durante el presente periodo se ha verificado que contratista, ocupe en el lugar de los trabajos el personal profesional y técnico ofrecido y aprobado en la propuesta, para que las actividades se ejecuten en forma ágil, y eficiente, también se ha solicitado al contratista que vincule a la ejecución del contrato población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional en un porcentaje que no será superior al 10% ni inferior al 5%.



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME No. 14

Página 38

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14

	contrato.	
6	Realizar previo al inicio de la obra documento que contenga el análisis sobre las condiciones actuales en materia de salud pública, el estado de los recursos naturales y del bienestar social, describiendo las condiciones físicas, económicas y sociales del municipio y del área objeto de intervención.	Previo al inicio y/o suscripción del acta de inicio se realizó el análisis sobre las condiciones en materia de salud pública, el estado de los recursos naturales y del bienestar social, describiendo las condiciones físicas, económicas y sociales del municipio y del área objeto de intervención.
7	Elaborar antes de iniciar el proyecto, las actas de socialización del proyecto acta de vecindad con el respectivo registro fotográfico y de video, firmada por el contratista, el interventor y los vecinos, por cada Sector o frente de trabajo.	Previo al inicio y/o suscripción del acta de inicio del contrato se realizó la respectiva socialización del contrato con fecha 13 de abril de 2024, así mismo se encuentra en elaboración las actas de vecindad de las viviendas circundantes.
8	Exigir al contratista la iniciación y ejecución de los trabajos en los plazos establecidos en el contrato	Durante el presente periodo se ha exigido al contratista la ejecución de los trabajos en los plazos establecidos.
9	Tener conocimiento completo y detallado del objeto del contrato sometido a seguimiento, de los respectivos pliegos de condiciones, del contrato mismo, de las especificaciones, de la propuesta del contratista, del cronograma de ejecución, en especial de las normas técnicas aplicables a la obra y de cualquier otro documento que haga parte del contrato.	La interventoría tiene conocimiento completo y detallado del objeto del contrato, de los respectivos pliegos de condiciones, del contrato mismo, de las especificaciones, de la propuesta del contratista, del cronograma de ejecución, en especial de las normas técnicas aplicables a la obra y de cualquier otro documento que haga parte del contrato.
10	Aprobar el Cronograma de las actividades a realizar por parte del Contratista de obra y hacer el seguimiento a este y a la programación de la obra.	La interventoría ha aprobado el cronograma de actividades a realizar por parte del Contratista de obra y se ha realizado el seguimiento a este y a la programación de la obra.
11	Supervisar, revisar y ajustar en caso de requerirse, los estudios, diseños u otros documentos técnicos entregados por el municipio para el desarrollo del proyecto. En caso de requerirse una modificación sustancial, se deberá informar a la Entidad Contratante y hacer el acompañamiento técnico propio de la interventoría.	Considerando que los estudios y diseños son resultados del contrato de consultoría 275 de 2022 ejecutado por el Consorcio Consultoría Puentes Acacias, todas las observaciones al diseño han sido reportadas por el contratista, esta interventoría informo a la entidad hallazgos incoherentes en los diseños y están en proceso de corrección.
12	Efectuar, en coordinación con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para verificar su estado, accesos, permisos y demás aspectos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto y de la interventoría, dejando las respectivas constancias.	Durante el presente periodo la interventoría ha realizado en coordinación con el contratista, el reconocimiento las zonas del proyecto para verificar su estado, accesos, permisos y demás aspectos que resulten necesarios para la ejecución del proyecto y de la interventoría, dejando las respectivas constancias.
13	Analizar antes y durante la ejecución con el Contratista las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, deberá plantear soluciones de manera previsiva y proactiva informando a la entidad contratante de la medidas administrativas y financieras necesarias para terminación del proyecto, general deberá procurar todas las acciones que permita el correcto desarrollo del objeto contractual.	Durante el presente periodo la interventoría ha analizado antes y durante la ejecución con el Contratista las especificaciones del proyecto, el programa de trabajo, el equipo disponible, la seguridad industrial e higiene del personal a cargo de los trabajos, se han planteado soluciones de manera previsiva y proactiva informando a la entidad contratante de la medidas administrativas y financieras necesarias para terminación del proyecto.



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



ALCALDÍA DE
ACACÍAS

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME No. 14

Página 39

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14

14	Todas las actas o documentos que se generen durante el desarrollo y al finalizar el objeto contractual deberán ser presentados en los formatos establecidos por la secretaría de Infraestructura; de igual forma la presentación de informes mensuales deberán contener toda la documentación adicional que a juicio del supervisor considere necesarios, estos deben ser entregados en PDF, WORD, EXCEL, AUTOCAD, debidamente firmados por el personal idóneo de interventoría.	Durante el presente periodo la interventoría ha generado todos los documentos y actas en los formatos establecidos por la secretaría de infraestructura; así mismo los informes mensuales contienen toda la documentación adicional que a necesidad y serán entregados en PDF, WORD, EXCEL, AUTOCAD, debidamente firmados por el personal idóneo de interventoría.
15	Exigir la entrega, revisar el contenido y avalar el mismo, de cada uno de los documentos de soporte técnico como planos, memorias de cálculo, cartera de topografía entre otros que serán entregados en los formatos indicados en la obligación anterior.	Durante el presente periodo la interventoría ha exigido al contratista la entrega, ha revisado el contenido y se ha avalado el mismo, de cada uno de los documentos de soporte técnico como planos, memorias de cálculo, cartera de topografía entre otros que serán entregados en los formatos indicados en la obligación anterior.
16	El interventor asegurará con la presentación de los informes que fueron cumplidas cabalmente las especificaciones, alcances y objetivos en lo técnico, financiero, administrativo, social, de predios, de permisos requeridos y ambientales de acuerdo con la naturaleza del proyecto.	Durante el presente periodo la interventoría asegura con la presentación de los informes que fueron cumplidas cabalmente las especificaciones, alcances y objetivos en lo técnico, financiero, administrativo, social, de predios, de permisos requeridos y ambientales de acuerdo con la naturaleza del proyecto.
17	Gestionar con la debida confidencialidad la información a que tenga acceso, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.	Durante el presente periodo la interventoría ha gestionado con la debida confidencialidad la información, así como la producida a lo largo de la ejecución del contrato.
18	Reportar la información relacionada con la ejecución del contrato o que tenga incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.	Durante el presente periodo la interventoría ha reportado la información relacionada con la ejecución del contrato o que pueda tener incidencia en ella cuando sea requerida por el contratante.
19	Verificar la debida ejecución del contrato objeto de interventoría e informar por escrito al Municipio oportunamente en caso de incumplimiento por parte del Contratista de Obra	Durante el presente periodo la interventoría ha verificado la debida ejecución del contrato objeto de interventoría y ha informado por escrito al Municipio oportunamente situaciones de análisis.
20	Estar en permanente comunicación con el supervisor del contrato.	Durante el presente periodo la interventoría ha estado en permanente comunicación con el supervisor del contrato.
21	Concurrir en forma oportuna a las diferentes reuniones que sean programadas, debiendo para tal efecto dejarse constancia en el Acta respectiva que se deberá suscribir.	Durante el presente periodo la interventoría ha concurrido en forma oportuna a las diferentes reuniones que fueron programadas, dejando constancia en el Acta respectiva.
22	Facilitar la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor o el interventor, atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se realicen.	Durante el presente periodo la interventoría ha facilitado la labor de seguimiento y control que realiza el supervisor atendiendo y dando respuesta oportuna a las observaciones o requerimientos que se han realizado.



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



ALCALDÍA DE
ACACÍAS

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME No. 14

Página 40

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14

23	Verificar y certificar de manera documentada que el objeto de obra contratado se cumpla de manera idónea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y económica, metodología, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.	Durante el presente periodo la interventoría ha verificado y certificado de manera documentada que el objeto de obra contratado se cumpla de manera idónea y oportuna, de conformidad con los cronogramas, propuestas técnica y económica, metodología, especificaciones, calidad costos y plazos pactados en el contrato.
24	Revisar y aprobar actas de obra y presentar el acta respectiva dentro de los 5 días siguientes al cumplimiento del mes de labores.	Durante el presente periodo la interventoría ha revisado y aprobado las actas de obra y se ha presentado el acta respectiva dentro de los 5 días siguientes al cumplimiento del mes de labores.
25	Efectuar las evaluaciones periódicas correspondientes, establecer los incumplimientos y recomendar los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para ello deberá mantener sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado de los contratos en relación con su avance, calidad y costo.	Durante el presente periodo la interventoría ha efectuado las evaluaciones periódicas correspondientes, ha establecido posibles incumplimientos y ha recomendado los correctivos y las sanciones a que haya lugar, para esto se cuenta con sistemas de seguimiento e información en tiempo real sobre el estado del contrato en relación con su avance, calidad y costo.
26	Exigir del contratista de obra el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad.	Durante el presente periodo la interventoría ha exigido al contratista de obra el cumplimiento de las normas técnicas obligatorias de calidad.
27	Cumplir con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rijan durante la vigencia del presente contrato y atender las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con lo previsto en el contrato y general los documentos que rigieron el proceso.	Durante el presente periodo la interventoría ha cumplido con las normas de gestión ambiental, así como con las normas de seguridad y salud en el trabajo que rigen durante la vigencia del presente contrato y ha atendido las acciones y evidencias que deben presentarse de conformidad con lo previsto en el contrato y general los documentos que rigieron el proceso.
28	Verificar el cumplimiento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el proyecto objeto de seguimiento.	Durante el presente periodo la interventoría ha verificado el cumplimiento de las obligaciones de seguridad industrial y salud ocupacional en el proyecto objeto de seguimiento.
29	Cumplir de manera cabal y oportuna con la guía de manejo ambiental, cuando a ello haya lugar de acuerdo con las características y naturaleza del contrato objeto de seguimiento.	Durante el presente periodo la interventoría ha cumplido de manera cabal y oportuna con la guía de manejo ambiental, cuando a ello haya lugar de acuerdo con las características y naturaleza del contrato objeto de seguimiento.
30	Cumplir con las actividades administrativas, técnicas, ambientales, prediales y financieras que están descritas en el manual de interventoría vigente y las demás que le correspondan en el ejercicio de su labor, atendiendo la normatividad vigente aplicable. En todos los casos, el alcance y sectores a intervenir se llevarán a cabo en coordinación con el Supervisor Técnico del Contrato de interventoría.	Durante el presente periodo la interventoría ha cumplido con las actividades administrativas, técnicas, ambientales, prediales y financieras que están descritas en el manual de interventoría vigente y las demás que le correspondan en el ejercicio de su labor, atendiendo la normatividad vigente aplicable.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACIAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 41
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

31	Asumir especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios. Lo anterior sin menoscabo de las acciones que del hecho se puedan predicar.	Durante el presente periodo la interventoría ha asumido especiales obligaciones de cuidado y custodia de los bienes que la entidad le llegue a entregar para el debido desarrollo de las obligaciones a cargo y en consecuencia estará obligado a hacer el correspondiente reintegro en especie o en dinero cuando por su culpa se produzca daño o pérdida, sin que esto excluya la indemnización de perjuicios.
32	Verificar estado, permanencia de los materiales, equipos y demás recursos del contratista, necesarios para la ejecución de las obras.	Durante el presente periodo la interventoría ha verificado el estado, permanencia de los materiales, equipos y demás recursos del contratista, necesarios para la ejecución de las obras.
33	Verificar la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografía entre otros.	Durante el presente periodo la interventoría ha verificado la disponibilidad de equipos técnicos, herramienta mayor y menor, equipo de topografía entre otros.
34	Realizar los ensayos de campo, de laboratorio, de campo y en general los que sean requeridos para la verificación del cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.	Durante el presente periodo la interventoría realizó toma de especímenes para ensayos de laboratorio ya que las actividades que lo requerían, y estuvo atento a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.
35	Revisión del cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales requeridos para los proyectos, para lo cual se utilizarán los ensayos de laboratorio y demás controles que pueden observarse en los formatos que se adjunten para el efecto.	Durante el presente periodo la interventoría ha revisado el cumplimiento de las especificaciones técnicas a través del control de los materiales requeridos para los proyectos, no se realizó ensayos de laboratorio ya que las actividades no lo requerían, pero estuvo atento a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra.
36	Tomar a su costo, los respectivos ensayos y pruebas, adicionales a las tomadas por los contratistas de obra, por medio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la calidad de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y necesaria dentro de la ejecución del contrato.	Durante el presente periodo la interventoría realizó toma de muestras para ensayos de laboratorio ya que las actividades lo requerían, y también estuvo atento a verificar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de la obra, sin embargo se dispone del servicio de un laboratorio debidamente certificado para verificar la calidad de los trabajos y de los materiales que suministre el contratista, en forma habitual y necesaria dentro de la ejecución del contrato.
37	Tomar los datos y hacer los cálculos necesarios para cuantificar los trabajos realizados y previstos en el contrato a través del fondo de contingencia, para los efectos del pago.	Durante el presente periodo la interventoría ha tomado los datos y ha realizado los cálculos necesarios para cuantificar los trabajos realizados y previstos en el contrato a través del fondo de contingencia, para los efectos del pago.
38	Ejercer un control de programación de avance del proyecto, a través de la línea de balance según programación de obra entregada por el Municipio, exigiendo su cumplimiento, dicha programación deberá ser solicitada y actualizada en cada proroga, suspensión y/o modificación.	Durante el presente periodo la interventoría ha ejercido un control de programación de avance del proyecto, a través de la línea de balance según programación de obra entregada y ha exigido su cumplimiento.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página 42
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

39	Informar oportunamente y por escrito al Supervisor del contrato de interventoría y al contratista de obra sobre las anomalías que se detecten en la calidad de cualquiera de los proyectos.	Durante el presente periodo la interventoría ha informado oportunamente y por escrito al Supervisor del contrato de interventoría y al contratista de obra sobre las anomalías que se detecten en la calidad.
40	Coordinar con el contratista de obra y con el Supervisor del Contrato de interventoría, en caso de la ocurrencia de emergencias, la correspondiente atención.	Durante el presente periodo la interventoría ha coordinado con el contratista de obra y con el Supervisor del Contrato de interventoría, en caso de la ocurrencia de emergencias, la correspondiente atención.
41	Elaborar planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.	Durante el presente periodo la interventoría ha solicitado los planes de contingencia para atender eventos imprevistos que puedan afectar la seguridad, calidad, costo o plazo de los proyectos, de manera que se eviten o mitiguen las implicaciones de tales eventos.
42	Presentar informes integrales periódicos (mensuales) a la secretaria de Infraestructura sobre la forma como se desarrolla la ejecución del contrato, indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las irregularidades, anomalías y demás circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.	La interventoría presentará los informes integrales periódicos (mensuales) a la secretaria de Infraestructura sobre la forma como se desarrolla la ejecución del contrato, indicando todos los detalles que sean necesarios y poniendo en conocimiento las irregularidades, anomalías y demás circunstancias atinentes al cumplimiento del contratista.
43	Estudiar las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista; avisar de ellas de manera oportuna al supervisor, a la oficina de Contratación, resolviendo oportunamente aquellas que sean de su competencia.	Durante el presente periodo la interventoría ha estudiado las sugerencias, reclamaciones y consultas del contratista como también ha avisado de manera oportuna al supervisor, resolviendo oportunamente aquellas que sean de su competencia.
44	Atender oportuna y adecuadamente las observaciones o requerimientos que le formule el Supervisor del Contrato y corregir las fallas	Durante el presente periodo la interventoría ha atendido oportuna y adecuadamente las observaciones o requerimientos que le formule el Supervisor del Contrato y corregir las fallas
45	Emitir concepto técnico, jurídico, ambiental, contable y financiero de viabilidad respecto de las modificaciones y/o adiciones necesarias para la ejecución del contrato de obra. Para el efecto deberá generar los documentos requeridos, todos los cuales deberán estar suscritos por el personal idóneo de la interventoría.	La interventoría emitirá cuando sea requerido concepto técnico, jurídico, ambiental, contable y financiero de viabilidad respecto de las modificaciones y/o adiciones necesarias para la ejecución del contrato de obra. Para el efecto deberá generar los documentos requeridos, todos los cuales deberán estar suscritos por el personal idóneo de la interventoría.
46	Comunicar en forma inmediata a la oficina de Contratación, a través del Supervisor, las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecución del contrato, de lo que enviará copia al contratista.	La interventoría emitirá cuando sea requerido comunicación en forma inmediata a la oficina de Contratación, a través del Supervisor, de las determinaciones tomadas relacionadas con la ejecución del contrato, de lo que enviará copia al contratista.
47	Adelantar las revisiones periódicas que sean necesarias para garantizar que el contratista cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.	Durante el presente periodo la interventoría ha adelantado las revisiones periódicas que han sido necesarias para garantizar que el contratista cumpla con las especificaciones y condiciones de calidad del objeto contratado.
48	El personal indicado en el Presupuesto como de tiempo completo tendrán disponibilidad permanente durante el plazo de ejecución del contrato de interventoría.	Durante el presente periodo la interventoría ha dispuesto el personal indicado en el presupuesto de forma permanente.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 43
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

49	Adoptar, durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las medidas que sean necesarias para asegurar y mantener los altos niveles de eficiencia de las condiciones técnicas, mecánicas, profesionales, económicas y financieras ofrecidas por el contratista tanto de obra como de interventoría.	Durante el presente periodo la interventoría ha adoptado durante el desarrollo y ejecución del contrato, todas las medidas necesarias para asegurar y mantener los altos niveles de eficiencia de las condiciones técnicas, mecánicas, profesionales, económicas y financieras ofrecidas por el contratista tanto de obra como de interventoría.
50	Vigilar el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento obligatorio.	Durante el presente periodo la interventoría ha vigilado el cumplimiento por parte del contratista de las disposiciones legales de carácter laboral vigente y exigir que se apliquen las normas de seguridad industrial que son de cumplimiento obligatorio.
51	Realizar todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones a que haya lugar e igualmente dar cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal que llegare a emplear en la ejecución del contrato, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá cumplir con el pago del aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 50 Ley 789 de 2002).	Durante el presente periodo la interventoría ha realizado todos los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales e indemnizaciones y se ha dado cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social integral (salud, pensiones y riesgos), que le correspondan de acuerdo con el personal ofertado, en las cuantías establecidas por la ley y oportunamente. Deberá cumplir con el pago del aporte a los sistemas de seguridad social integral y parafiscales que le corresponda (Art. 50 Ley 789 de 2002).
52	Verificar el cumplimiento del pago de seguridad social y parafiscales por parte del contratista de obra.	Durante el presente periodo la interventoría ha verificado el cumplimiento del pago de seguridad social y parafiscales por parte del contratista de obra.
53	Solicitar a la Supervisión, su intervención cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto así lo requieran, para ello deberá informar oportunamente y por escrito al Supervisor del contrato, sobre anomalías que se detecten en la calidad de los proyectos a intervenir.	La interventoría solicitará a la Supervisión, su intervención cuando las circunstancias, naturaleza o magnitud del asunto así lo requieran, para ello deberá informar oportunamente y por escrito al Supervisor del contrato, sobre anomalías que se detecten en la calidad del proyecto a intervenir.
54	Participar activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en torno a las actividades a desarrollar en cada caso en concreto.	Durante el presente periodo la interventoría ha participado activamente en las decisiones conjuntas que se tomen con el municipio en torno a las actividades a desarrollar en cada caso en concreto.
55	Acompañar las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por la Administración u otras entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos.	La interventoría acompañará las comisiones evaluadoras o de inspección enviadas por la Administración u otras entidades y suministrarles los datos pertinentes que sean requeridos, en el momento que se requiera.
56	Verificar que la obra se reciba y se liquide de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual deberá comprobar su calidad y estabilidad de las obras.	La interventoría verificará que la obra se reciba y se liquide de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato y ofrecidas en la propuesta del contratista, para lo cual deberá comprobar su calidad y estabilidad de las obras, en el momento requerido.
57	Atender las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el proveedor del contratista, resolviendo aquellas que sean de su competencia o dando traslado de las que no lo sean, adjuntado en todo caso su concepto al respecto.	La interventoría ha atendido las reclamaciones, sugerencias y demás solicitudes elevadas por el proveedor del contratista, y ha resuelto aquellas que han sido de su competencia y ha dado traslado de las que no son de la competencia, adjuntado en todo caso su concepto al respecto, cuando se ha requerido.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 44
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

58	En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, informar a la dependencia responsable de la Supervisión a fin de que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.	En caso de incumplimiento por causas imputables al contratista, la interventoría informará a la dependencia responsable de la Supervisión a fin de que se adopten las medidas para que se hagan efectivas las sanciones correspondientes.
59	Diligenciar en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicación de sanciones, multas, garantías y cláusulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere pertinente.	La Interventoría diligenciará en forma oportuna los informes técnicos indispensables, para la aplicación de sanciones, multas, garantías y cláusulas excepcionales de los contratos de obras, si fuere pertinente.
60	Adelantar las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones, multas y garantías a que hubiere lugar.	La interventoría adelantará las gestiones necesarias para el reconocimiento y cobro oportuno de las sanciones, multas y garantías a que hubiere lugar.
61	Actuar de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Administración, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.	La interventoría actuará de tal modo que se impida que por causas imputables a él o al contratista, sobrevenga un mayor costo en contra de los intereses patrimoniales de la Administración, en el cumplimiento de las obligaciones contractuales.
62	Verificar y autorizar las actas parciales y final de pago que se presenten en el desarrollo del contrato. Documento que deben presentarse debidamente firmados por los profesionales de la interventoría, a la dependencia encargada de la supervisión y a la oficina de contratación.	La interventoría ha verificado y autorizado las actas parciales presentadas en el desarrollo del contrato. Documentos que serán presentados debidamente firmados por los profesionales de la interventoría, a la dependencia encargada de la supervisión y a la oficina de contratación, en el momento que se requiera.
63	Llevar junto con el constructor, así como custodiar y verificar un diario de obra "BITÁCORA DE OBRA" el cual deberá permanecer disponible en el sitio de obra, en él se consignarán todas las instrucciones, observaciones y determinaciones relacionadas con el desarrollo de la obra, y deberá ser firmado por los residentes de obra y de interventoría en forma diaria, y por los directores de estas en cada visita, esta se entregará en original en la liquidación.	Durante el presente periodo la interventoría ha llevado de forma conjunta con el contratista la bitácora de obra, la cual permanece en el sitio de obra y es firmado por los residentes de obra y de interventoría en forma diaria, y por los directores de estas en cada visita, esta se entregará en original en la liquidación.
64	Mantener la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada en desarrollo de los proyectos	Durante el presente periodo la interventoría ha mantenido la reserva profesional sobre la información que le sea suministrada en desarrollo de los proyectos
65	Ejecutar en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía exigida y la garantía presunta por los derechos del municipio como consumidor.	Durante el presente periodo la interventoría ha ejecutado en forma idónea, oportuna, eficaz y eficiente el objeto del contrato y responder por su calidad, sin perjuicio de la respectiva garantía exigida y la garantía presunta por los derechos del municipio como consumidor.
66	Desarrollar las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de interventoría verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la interventoría, en sus diferentes ámbitos, ya registradas en este estudio previo.	Durante el presente periodo la interventoría ha desarrollado las actividades de seguimiento y control del contrato de obra objeto de interventoría verificando el cumplimiento de cada una de las especificaciones técnicas y obligaciones especiales fijadas para este; y a las exigencias propias de la interventoría, en sus diferentes ámbitos, ya registradas en este estudio previo.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página 45
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

67	Acatar las indicaciones que la Supervisión le señale en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.	Durante el presente periodo la interventoría ha acatado las indicaciones que la Supervisión ha señalado en cumplimiento del objeto contratado conforme a las especificaciones del proyecto a ejecutar.
68	Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.	Durante el presente periodo la interventoría ha obrado con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y en trabamientos.
69	No acceder a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.	Durante el presente periodo la interventoría no ha accedido a peticiones o amenazas de quienes actúen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir algún hecho.
70	Facturar según lo estipulado en el artículo 615 del Estatuto Tributario.	La interventoría facturara según lo estipulado en el artículo 615 del Estatuto Tributario, en el momento que sea requerido.
71	Radicar las facturas o documento equivalente por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas parciales y el acta de liquidación.	La interventoría radicará las facturas o documentos equivalentes por el trabajo ejecutado de conformidad con las actas parciales y el acta de liquidación, en el momento que sea requerido.
72	El contratista deberá presentar en sus cuentas de cobro, parciales y de liquidación, detallando los valores causados por la ejecución de los componentes contable, jurídico, ambiental, financiero y técnico de conformidad con la oferta económica aprobada por la entidad.	La interventoría presentará cuentas de cobro, parciales y de liquidación, detallando los valores causados por la ejecución de los componentes contable, jurídico, ambiental, financiero y técnico de conformidad con la oferta económica aprobada por la entidad, cuando sea requerido.
73	Solicitar con la debida anticipación la prórroga o extensión del plazo de ejecución del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna.	La interventoría solicitará con la debida anticipación la prórroga o extensión del plazo de ejecución del contrato si es del caso y de conformidad con la Ley, a fin de que pueda ser analizada y decidida en forma oportuna, cuando sea requerido.
74	Suscribir con el supervisor el acta de liquidación del contrato de obra e interventoría, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado.	La interventoría suscribirá con el supervisor el acta de liquidación del contrato de obra e interventoría, de conformidad con lo previsto en el contrato y dar estricto cumplimiento a todo lo allí pactado, cuando sea requerido.
75	Mantener vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este.	Durante el presente periodo la interventoría ha mantenido vigentes todas las garantías que amparan el contrato en los términos de este.
76	Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato, en caso de se requiera una asesoría externa con profesionales o especialistas, esta será asumida por el contratista y no acarreará costo alguno al municipio.	Durante el presente periodo la interventoría ha cumplido con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecución del contrato.
77	El Interventor se llega a requerir personal adicional al requerido, deberá vincular en la ejecución del contrato población en pobreza extrema, desplazados por la violencia, personas en proceso de reintegración o reincorporación y sujetos de especial protección constitucional en un porcentaje que no será superior al 10% ni inferior al 5%. El no cumplimiento de la obligación se impondrán las sanciones pecuniarias producto del incumplimiento injustificado, aplicando para el efecto la cláusula de multas prevista en el	Durante el presente periodo la interventoría ha vinculado nuevo personal adicional requerido para actividades del proyecto.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACIAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 46
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

	contrato	
78	Tener una oficina en la jurisdicción del municipio de Acacias durante todo el tiempo de la ejecución de la obra la cual debe funcionar como mínimo durante el mismo horario de atención al público de la Alcaldía de Acacias.	La interventoría cuenta con una oficina en jurisdicción del municipio de Acacias.
79	Mantener actualizado el domicilio y correos electrónicos en la oficina de contratación y la secretaria de infraestructura.	Durante el presente periodo la interventoría ha mantenido actualizado el domicilio y correos electrónicos en la oficina de contratación y la secretaria de infraestructura.
80	Dar estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo suspender o abandonar el objeto contratado.	Durante el presente periodo la interventoría ha dado estricto cumplimiento a los términos pactados y por ningún motivo se ha suspendido o abandonado el objeto contratado.
81	El interventor deberá gestionar y realizar la liquidación del contrato de obra objeto de interventoría, suscribiendo los documentos y actas que en el trámite se generen. En todo caso será su responsabilidad entregar el contrato de obra liquidado.	La interventoría gestionara y realizar la liquidación del contrato de obra objeto de interventoría, suscribiendo los documentos y actas que en el trámite se generen, siendo responsabilidad entregar el contrato de obra liquidado, en el momento que sea requerido.
82	El interventor deberá Asistir a todas las actividades de gestión social exigidas en el Contrato para todas las fases del proyecto y a todas aquellas que cite el MUNICIPIO. Durante el desarrollo de reuniones informativas con la comunidad o con el comité de sostenibilidad, el área social debe acudir a las mismas en compañía de un delegado del área técnica, cuando sea necesario, con el fin de informar a la comunidad en aspectos técnicos.	Durante el presente periodo la interventoría ha asistido a todas las actividades de gestión social exigidas en el Contrato para todas las fases del proyecto así mismo se han realizado reuniones informativas con la comunidad con el fin de informar a la comunidad en aspectos técnicos.
83	Realizar seguimiento a los compromisos adquiridos por parte del CONTRATISTA en los diferentes comités y reuniones con la comunidad.	Durante el presente periodo la interventoría ha realizado seguimiento a los compromisos adquiridos por parte del CONTRATISTA en los diferentes comités y reuniones con la comunidad.
84	Identificar las inquietudes de los ciudadanos y garantizar que el CONTRATISTA brinde atención y respuesta soportado en la viabilidad de estas, para lo cual la INTERVENTORIA revisará y aprobará la información que será suministrada.	Durante el presente periodo la interventoría ha identificado las inquietudes de los ciudadanos y ha garantizado que el CONTRATISTA brinde atención y respuesta soportado en la viabilidad de estas.
85	Las demás derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebre, de la ley, del pliego de condiciones y las que en relación con el objeto del contrato le sean solicitadas por el Supervisor de este.	Durante el presente periodo la interventoría ha realizado y revisado todas las obligaciones derivadas de la esencia y naturaleza del contrato que se celebre, de la ley, del pliego de condiciones y las que en relación con el objeto del contrato.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 47
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

7 INCONVENIENTES O PROBLEMAS PRESENTADOS

Durante la etapa inicial de ejecución de actividades, se evidenció una diferencia entre el perfil estratigráfico identificado en las perforaciones para la cimentación y el presentado en el estudio de suelos entregado por la entidad. Esta situación generó una consulta técnica al geotecnista designado por la entidad, la cual no fue atendida oportunamente. Como consecuencia, se presentaron dificultades en el procedimiento constructivo del pilotaje, afectando el cronograma y retrasando la ejecución general del proyecto. Cabe destacar que esta condición prolongó significativamente las labores de excavación de pilotes, generando un impacto negativo en el avance de la obra.

Durante la etapa inicial de ejecución de actividades también se identificó una inconsistencia entre el ítem presupuestado (acero ASTM A588) y el especificado en los diseños estructurales (acero ASTM A709 Gr 50), requerido para elementos como vigas metálicas, rigidizadores y conectores. El acero A709, con mayor resistencia y durabilidad según la norma CCP14, implica un mayor costo. Este cambio, al no estar contemplado contractualmente y tener alta incidencia presupuestal, requiere ajuste en el proyecto, lo cual afecta la ejecución debido a la demora en la gestión de recursos adicionales.

Durante la etapa inicial también se identificó que el ancho vial proyectado (5 m) es insuficiente frente a la sección del puente (7,30 m), generando incompatibilidad en los enfoques. Se ajusta el diseño a un ancho de vía de 6 m y andenes de 1,6 m, considerando restricciones prediales, manteniendo continuidad funcional con el puente y minimizando afectaciones a predios privados.

Durante este periodo, el nivel freático ha seguido afectando el desarrollo de las actividades relacionadas con la construcción de las obras de cimentación, debido a que la temporada invernal continua alimentando la infiltración de agua en el subsuelo. Esto ha mantenido elevados los niveles freáticos, dificultando el control y manejo del agua requerido para el normal desarrollo de las labores constructivas.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14 Página 48
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

8 CONCLUSIONES

La Interventoría ha realizado seguimiento continuo a las actividades del contratista, velando por el cumplimiento de los objetivos contractuales y de los pliegos de condiciones, en aspectos como tiempo, calidad, cantidades y uso adecuado de los recursos. Ha promovido una comunicación coordinada entre las partes, facilitando la realización de reuniones técnicas, comités de obra y socializaciones, y ha verificado el desarrollo adecuado de los procesos mediante revisión de informes. Ante eventuales inconvenientes, ha brindado soluciones oportunas, permitiendo el control de riesgos. Además, ha ejercido vigilancia permanente sobre todas las etapas contractuales, garantizando el cumplimiento de las especificaciones técnicas, administrativas, legales, financieras, presupuestales, sociales y ambientales, con el personal ofertado conforme a las dedicaciones establecidas en el análisis de costos ofertado.

Mediante Acta de Adición No. 1 y la Prórroga No. 1, aprobadas por la Entidad, se otorga un presupuesto adicional al inicialmente contratado, así como una ampliación del plazo contractual por siete (7) meses. Estos actos administrativos entran en vigor a partir del 21 de junio de 2025, estableciendo como nueva fecha de terminación del contrato el 20 de enero de 2026

El análisis de ejecución del contrato para el presente periodo se realiza con base en la reprogramación presentada por el contratista y aprobada conforme a las condiciones establecidas en la Modificatoria No. 1. Para este análisis se toma como fecha de corte la semana 56, al ser la más cercana a la fecha de elaboración del informe, considerando el avance de cantidades ejecutadas correspondiente a dicha semana. De acuerdo con lo anterior, el valor programado acumulado del contrato debía ascender a \$5.351.067.293,77, lo que equivale al 31,532% del total contractual. No obstante, el valor ejecutado acumulado corresponde a \$3.796.860.082,67, representando un avance del 22,374%. En consecuencia, se evidencia un atraso en la ejecución por un valor de \$927.266.682,15, correspondiente a una desviación negativa del 9,158% frente a lo programado.

Firma	Firma
	
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página 49
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

9 ANEXOS

- ANEXO 1. REGISTRO FOTOGRAFICO ACTIVIDADES DESARROLLADAS.
- ANEXO 2. ACTAS DE COMITE OBRA.
- ANEXO 3. INFORMES SEMANALES
- ANEXO 4. AFILIACIONES Y/O PAGOS DEL PERSONAL A LA SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA.
- ANEXO 5. CORRESPONDENCIA ENVIADA y RECIBIDA.
- ANEXO 6. INFORME DE INVERSION RECURSOS DE ANTICIPO.
- ANEXO 7. COPIA BITACORA DE OBRA.
- ANEXO 8. CERTIFICACIONES VARIAS.
- ANEXO 9. INFORME DE ESPECIALISTAS

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

9.1 Registro Fotográfico



CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2025
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	0	M	A
INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 01: Limpieza y preparación del área para armado de acero para la zapata aletas margen Palomas.




Fotografía 02: limpieza y preparación del área para armado de acero para la zapata aletas margen Palomas.



Fotografía 03: Armado de acero para la zapata aletas margen Palomas.



Fotografía 04: Armado de acero para la zapata aletas margen Palomas.


JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 05: Armado de aceros para la viga cabezal estribo Palomas.



Fotografía 06: Armado de aceros para la viga cabezal estribo Palomas.



Fotografía 07: Limpieza y preparación de acero para encofrado de la viga cabezal margen Quebraditas.

[Signature]
JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



Fotografía 08: Limpieza y preparación de acero para encofrado de la viga cabezal margen Quebraditas.

[Signature]
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2025
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	D	M	A
INTERVENTORIA		CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 09: Instalación de formaletas para encofrado del dado de la viga cabezal en estribo Quebraditas.



Fotografía 10: Instalación de formaletas para encofrado del dado de la viga cabezal en estribo Quebraditas.




Fotografía 11: Instalación de formaletas para encofrado del dado de la viga cabezal en estribo Quebraditas.


JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



Fotografía 12: Instalación de formaletas para encofrado del dado de la viga cabezal en estribo Quebraditas.


JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 13: Acopio de aceros de refuerzo para estribos.



Fotografía 14: Acopio de aceros de refuerzo para estribos.




Fotografía 15: Demolición de una sección del puente antiguo.



Fotografía 16: Demolición de una sección del puente antiguo.


JIMMY ANORES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 17: Verificación de elementos de emergencia.



Fotografía 18: Verificación de elementos de emergencia.



Fotografía 19: Verificación de elementos de emergencia.



Fotografía 20: Verificación de elementos de emergencia.


JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2025
		0	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 21: Manejo de aguas mediante bombeo mecánico.




Fotografía 22: Manejo de aguas mediante bombeo mecánico.




Fotografía 23: Manejo de aguas mediante bombeo mecánico.



Fotografía 24: Manejo de aguas mediante bombeo mecánico.


JIMMY ANDRÉS TORBES CASTRO
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACÍAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 25: Verificación señalización preventiva.



Fotografía 26: Verificación señalización preventiva.



Fotografía 27: Verificación señalización preventiva.



Fotografía 28: Verificación señalización preventiva.


JIMMY ANÓRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 29: Verificación de puntos ecológicos.




Fotografía 30: Verificación de puntos ecológicos.



Fotografía 31: Limpieza de unidades sanitarias.



Fotografía 32: Limpieza de unidades sanitarias.


JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1 D	8 M	2025 A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 33: Verificación del control vial.



Fotografía 34: Verificación del control vial.



Fotografía 35: Verificación del control vial.

[Signature]
JIMMY ANDRÉS TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



Fotografía 36: Verificación del control vial.

[Signature]
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		




Fotografía 37: Instalación de separadores de acero.



Fotografía 38: Instalación de separadores de acero.




Fotografía 39: Verificación de la distribución, separación y traslape de aceros en viga cabeza margen Quebraditas.


JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA



Fotografía 40: Limpieza de los aceros y lavado de lodos sedimentados


JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
 RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		




Fotografía 41: Vaciado de concreto de 4.000 PSI para el dado de la viga cabezal en estribo Quebraditas.



Fotografía 42: Vaciado de concreto de 4.000 PSI para el dado de la viga cabezal en estribo Quebraditas.




Fotografía 43: Vaciado de concreto de 4.000 PSI para el dado de la viga cabezal en estribo Quebraditas.


JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



Fotografía 44: Vaciado de concreto de 4.000 PSI para el dado de la viga cabezal en estribo Quebraditas.


JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA				
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 45: Inspección de armado de aceros para la viga cabezal margen Quebraditas.




Fotografía 46: Inspección vaciado de concreto de 4.000 PSI para el dado de la viga cabezal en estribo Quebraditas.




Fotografía 47: Inspección de armado de aceros para la muro aletas de margen Palomas.



Fotografía 48: Verificación de la distribución, separación y traslape de aceros en muro aletas margen Palomas.


JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 49: Control de Concreto mediante Ensayo de Asentamiento para viga cebazal margen Quebraditas.



Fotografía 50: Control de Concreto mediante Ensayo de Asentamiento para viga cebazal margen Quebraditas.



Fotografía 51: Toma de Muestra de Concreto Fresco para Ensayo de Laboratorio de viga cebazal margen Quebraditas.



Fotografía 52: Toma de Muestra de Concreto Fresco para Ensayo de Laboratorio de viga cebazal margen Quebraditas.


JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA				
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 53: Excavación con Retroexcavadora para Plataforma de Trabajo de Vigas Metálicas.




Fotografía 54: Excavación con Retroexcavadora para Relleno Perimetral de Viga Cabezal – Margen Palomas



Fotografía 55: Cargue y transporte de material sobrante de la excavación.



Fotografía 56: Cargue y transporte de material sobrante de la excavación.


JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA				
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 57: Charla de seguridad previo al inicio de la jornada laboral.



Fotografía 58: Charla de seguridad previo al inicio de la jornada laboral.



Fotografía 59: Cargue y transporte de material sobrante de la excavación.

Jimmy Andres Torres Castro
JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



Fotografía 60: Cargue y transporte de material sobrante de la excavación.

Jorge Augusto Rodriguez Reina
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		




Fotografía 61: Comité Técnico de Control de Obra.



Fotografía 62: Socialización con la Comunidad ante el reinicio de Obra.




Fotografía 63: Cargue y transporte de material sobrante de la excavación.


JIMMY ANDRÉS TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



Fotografía 64: Visita de seguimiento de la Supervisión de la Entidad.


JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		



Fotografía 65: Entrega de EPPs al personal operativo.




Fotografía 66: Verificación de entrega de EPPs al personal operativo.




Fotografía 67: Uso de EPPs por el personal operativo de obra.



Fotografía 68: Uso de EPPs por el personal operativo de obra.


JIMMY ANDRÉS TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA


JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CONTRATO No 978 DE 2023	OBJETO DEL CONTRATO	FECHA DEL INFORME		
		1	8	2025
		D	M	A
TIPO CONTRATO	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS	CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023		
INTERVENTORIA				
CONTRATISTA	SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA ALCALDIA DE ACACIAS	CONTRATISTA		
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA G.		




Fotografía 69: Verificación topográfica de las cotas de la viga cabezal.



Fotografía 70: Replanteo topográfico del componente vial.




Fotografía 71: Inspección topográfica y verificación de cotas de los aceros y la viga cabezal margen Quebraditas.


JIMMY ANDRÉS TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



Fotografía 72: Inspección topográfica y verificación de cotas de los aceros y la viga cabezal margen Palomas.


JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

9.2 Actas de comité de obra.



ALCALDÍA DE ACACIAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

FECHA 2 7 25

OBJETO DE CONTRATO:

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

I. TEMAS A TRATAR EN EL COMITÉ

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 1.Revisión compromisos acta anterior | 7.GESPROY |
| 2.Cambio de personal profesional | 8.Certificados de calidad y fichas técnicas de concretos. |
| 3.Reprogramación de actividades | 9.Permanencia de residente en obra. |
| 4.Informes mensuales | 10.Procedimientos constructivos de los componentes del proyecto. |
| 5.Análisis de parcial No.2 | 11.Planillas seguridad. |
| 6.Socialización con la comunidad | |

II. OBJETO

COMITÉ TECNICO DE OBRA No.41 REALIZADO DE FORMA PRESENCIAL EN LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA DE ACACIAS

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1	Solicitud Cambio de personal profesional	No se ha entregado y soportes del Directo de obra	No cumple
2	Reprogramación de actividades	No se ha entregado	No cumple
3	Informes mensuales	No ha entregado Informe No.12 de abril	Cumple parcialmente
4	Análisis de parcial No.2	No ha entregado parcial No.2	Este compromiso quedas a decisión del contratista
5	Actualización de garantías	Hoy 2 de julio vence este compromiso	Esta vigente
6	Materiales en obra	Vence el 15 de julio	Esta vigente
7	Socialización con la comunidad	La entidad programa para el viernes 4 de julio	N/A

V. TEMAS TRATADOS

GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS	
CONTRATO OBRA No	929 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS, META
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ NIT No 901.767.420-0
VALOR	TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$13.430.269.893.00)
PLAZO	ONCE (11) MESES. CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ADICION No.1	TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$3.539.989.565)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$16.970.259.458)
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	24 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE REINICIO No.1	17 DE JUNIO DEL 2025
CONTRATO INTER No	978 DE 2023
CONTRATISTA	JÓRGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA NIT No 9.658.796-1
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
VALOR	SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$627.081.787.00) M/CTE
PLAZO	ONCE (11) MESES. CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ADICION No.1	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO (\$291.652.095)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS (\$918.733.882)
FECHA DE SUSPENSIÓN No.1	24 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE REINICIO No.1	17 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE INICIO	27 DE MAYO DE 2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	26 DE ABRIL DE 2025
NUEVO PLAZO DEL CONTRATO	18 MESES
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	20 DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR	IVAN MAURICIO ROJAS
APOYO SUPERVISION	CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO



ALCALDÍA DE
ACACIAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



La zona para intervenir se encuentra ubicada en el Municipio de Acacias, específicamente está ubicada en la vía Terciaria que conduce a la vereda quebraditas a 34.4 Km del casco urbano del Municipio de Acacias Meta, de cuales 13.56 se encuentran en afirmado, las coordenadas de ubicación son las 03°57'39,99" N y 73°30'17,67" O

DETALLES DEL PUENTE Y ALCANCE DEL CONTRATO



En el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" se plantea la construcción de un puente vehicular de 58.0 metros de luz entre ejes de apoyo y un tablero con un ancho de 10.7 metros a bordes externos, ancho efectivo de calzada de 7.30 metros, andenes a ambos costados de 1.20 metros; en el diseño realizado se plantea como apoyo del tablero 4 vigas en I metálicas de acero ASTM A-709 Grado 50W en alma llena, con una separación interna de 2.5 metros y una altura de 2465 milímetros; la infraestructura es una cimentación tipo pilote construyendo 8 pilotes por estribo para un total de 16 pilotes con un diámetro $\Phi 1.50$ metros y una profundidad de 12 metros cada uno; las barandas serán metálicas, tendrá protectores en concreto tipo new jersey los apoyos y juntas estarán en neopreno, las aletas y estribos serán en concreto reforzado y el tablero así como las placas de aproximación serán concreto reforzado, el puente contará con señalización horizontal y vertical respectivamente.

Se realizará la construcción de un pluvial en una longitud de 877 metros, la construcción de 34 sumideros laterales y 11 pozos de inspección; de igual manera se realizará la construcción de una red de alumbrado público con un transformador de 5 KVA, instalación de 660 metros de red eléctrica, la instalación de 26 mástiles metálicos con luminarias tipo led; se realizará la construcción de 288 m³ de bolsacretos con las respectivas horas máquina para el manejo del río.



Se realizará la intervención de 592 metros lineales de vía con estructura de subbase de 30 cms y base 20 cm s.



ALCALDÍA DE **ACACÍAS**

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ESQUEMAS DEL PUENTE

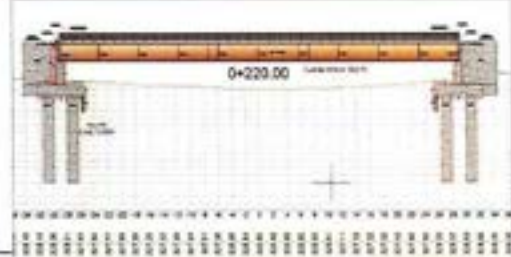


ALCANCE PRESUPUESTAL

CAPÍTULOS	(\$) INICIAL	(\$) MODIFICATORIA	%
1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR			
1.1 PRELIMINARES Y NPS	\$ 272.192.313,00	\$ 413.731.216,00	1,60%
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 61.121.996,00	\$ 56.786.182,00	0,36%
1.3 INFRAESTRUCTURA	\$ 1.310.733.807,00	\$ 1.408.353.969,00	7,72%
1.4 SUPERESTRUCTURA	\$ 364.786.302,00	\$ 370.956.872,00	2,15%
1.5 ACERO DE REFUERZO	\$ 8.249.530.635,00	\$ 9.907.668.976,00	48,61%
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 204.344.290,00	\$ 204.870.970,00	1,20%
2. VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRADITAS			0,00%
2.1 PRELIMINARES	\$ 3.136.848,00	\$ 3.628.016,00	0,02%
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 880.519.181,00	\$ 460.066.324,00	5,19%
2.3 PLUVIAL	\$ 295.715.682,00	\$ 91.871.488,00	1,74%
2.4 OBRAS DE PROTECCIÓN	\$ 374.028.372,00	\$ 1.117.411.963,00	2,20%
2.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN	\$ 169.737.664,00	\$ 207.107.129,00	1,00%
2.6 ILUMINACIÓN	\$ 320.579.141,00	\$ 255.412.335,00	1,89%
2.7 PAVIMENTO ASFÁLTICO	\$ 348.485.660,00	\$ -	2,05%
2.8 ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO	\$ 465.358.102,00	\$ 594.184.788,00	2,74%
ITEMS NO PREVISTOS VIA		\$ 1.768.009.238,00	0,60%
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	0,44%
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	0,21%
	\$ 13.430.269.893,00	\$ 16.970.259.458,00	100,00%

1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR



2. VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRADITAS





ALCALDÍA DE ACACIAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ESTADO DE LA OBRA A LA FECHA

MATERIALES EN OBRA				EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OBRA			
No	ELEMENTO	UND	CANTIDAD	OBSERVACION	No	CANTIDAD	MAQUINARIA Y/O EQUIPO
1	Acero instalado y en vigas cabezal	KG	58.488,14	Acero para las vigas cabezales	1	1	Tractobomba de 6" Estribo Quebraditas.
					2	1	Planta electrica de 440 V
					3	2	Equipo electricos menores manuales.
					4	1	Herramienta menor

Observaciones: Ya se tiene construidos los 16 pilotes descabezados y se dio inicio al armado de acero para la viga cabezal del estribo Palomas.

Observaciones: A la fecha no se tiene mas equipos

PERSONAL			
NO	TIPO PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION
1	ADMINISTRATIVO		DIRECTOR
2	ADMINISTRATIVO	1	RESIDENTE
3	ADMINISTRATIVO		ESP ESTRU
4	ADMINISTRATIVO		ESP VIAS
5	ADMINISTRATIVO	1	SISO
6	ADMINISTRATIVO		
7	OPERATIVO		TOPOGRAFO
8	OPERATIVO		VIALISTAS
9	OPERATIVO		VIGILANTE
10	OPERATIVO	11	OPERATIVOS
11	OPERATIVO		OPERADOR
12	OPERATIVO		

Observaciones: El personal esta realizando actividades armado de aceros para la viga cabezal del estribo Palomas.




Observaciones: A la fecha se han aprobado toda las ordenes de operación por un valor total del anticipo que corresponde al 100.00%.

ESTADO DEL CONTRATO			
Fecha de inicio:	lunes, 27 de mayo de 2024		
Fecha de suspension	jueves, 24 de abril de 2025		
Fecha de Reinicio:	martes, 17 de junio de 2025		
Fecha terminación inicial:	sábado, 26 de abril de 2025		
Nueva fecha terminación:	martes, 20 de enero de 2026		
Plazo días:	540,00	plazo meses:	18
Fecha de análisis:	lunes, 30 de junio de 2025		
Plazo transcurrido días:	345,00	meses:	11,500
% transcurrido en tiempo:	63,889%	meses:	63,889%
Avance programado \$:	\$ 3.630.662.025,87		
Avance programado %:	21,394%		
Avance ejecutado \$:	\$ 2.703.395.343,72		
Avance ejecutado %:	15,930%		
Atraso (-) o avance (+) \$:	-\$ 927.266.682,15		
Atraso (-) o avance (+) %:	-5,464%		

Observaciones: El contratista no ha entregado reprogramación de la Modificatoria No.1



Observaciones: El contratista no ha entregado reprogramación de la Modificatoria No.1

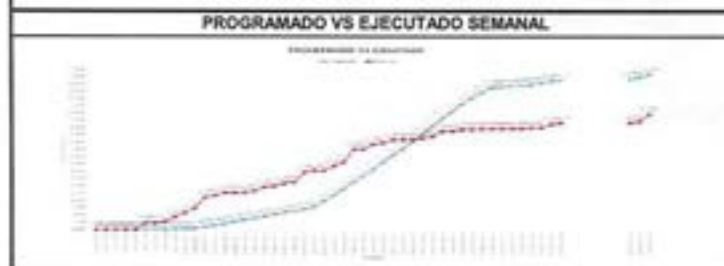

Observaciones: El contratista no ha entregado reprogramación de la Modificatoria No.1



Observaciones: El contratista no ha entregado reprogramación de la Modificatoria No.1




ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO


ANÁLISIS DE AVANCE

PROGRAMADO VS EJECUTADO

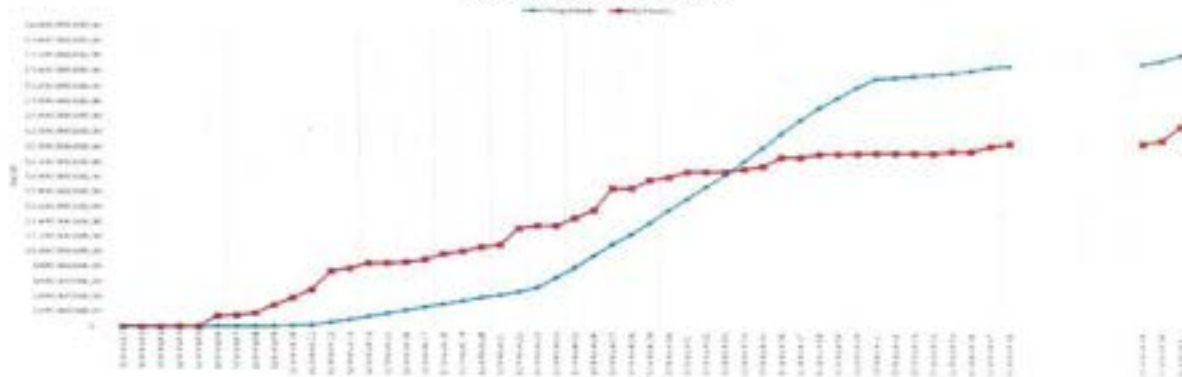

ANÁLISIS DESEMPÑO DE LA EJECUCIÓN

DESEMPÑO POR CAPITULOS

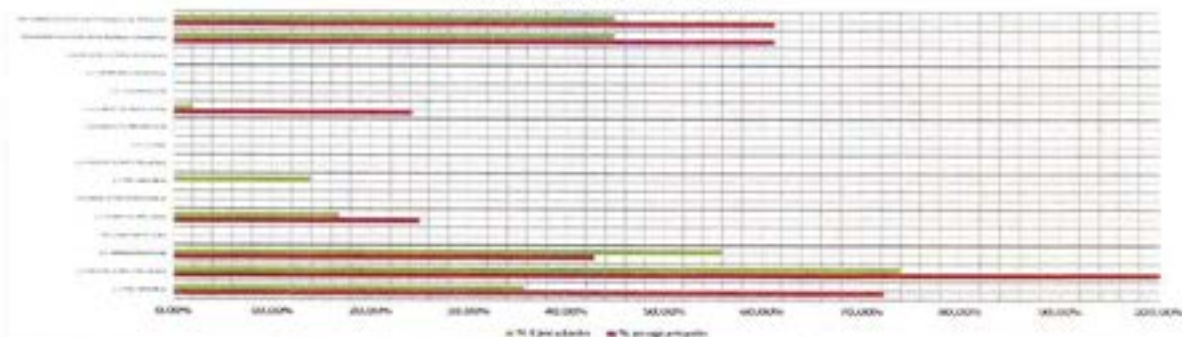

ANÁLISIS PORCENTUAL Y DE RECURSOS

CAPÍTULO	VALOR CAPÍTULO INICIAL	%	VALOR MODIFICATORIA	%	VALOR PROG POR CAPÍTULO	% PROG	VALOR EJECUTADO POR CAPÍTULO	% EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR CAPÍTULO	ATRASO	ADELANTO	%
1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR	\$ 10,462,720,340.00		\$ 12,362,368,175.00		\$ 2,497,676,794.00	23.89%	\$ 2,648,306,796.00	21.49%	\$ 9,715,061,580.00	\$ -	\$ 848,565,649.00	-4.44%
1.1 PRES. INYECT.	\$ 272,182,213.00	2.60%	\$ 413,737,216.00	3.44%	\$ 308,085,527.86	34.47%	\$ 148,027,793.00	36.77%	\$ 260,727,493.00	\$ -	\$ 160,277,744.96	-38.39%
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 81,121,886.00	0.44%	\$ 36,786,180.00	0.30%	\$ 36,786,181.97	100.00%	\$ 42,027,420.00	74.17%	\$ 14,688,762.00	\$ -	\$ 14,688,762.97	-21.87%
1.3 INFRAESTRUCTURA	\$ 1,135,720,807.00	3.79%	\$ 1,409,353,899.00	8.30%	\$ 646,214,733.75	45.46%	\$ 789,843,773.00	60.67%	\$ 618,710,186.00	\$ -	\$ 148,428,089.25	35.41%
1.4 SUPERESTRUCTURA	\$ 364,795,202.00	2.72%	\$ 275,366,872.00	2.19%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 275,366,872.00	\$ -	\$ -	0.00%
1.5 ACERO DE REPLAZO	\$ 8,249,520,426.00	61.42%	\$ 9,367,668,676.00	98.36%	\$ 2,493,795,265.26	26.16%	\$ 1,668,657,639.00	16.89%	\$ 6,238,111,137.00	\$ -	\$ 623,232,611.96	-4.37%
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 304,344,260.00	1.02%	\$ 204,470,870.00	1.71%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 204,470,870.00	\$ -	\$ -	0.00%
2. VALS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRANTAS	\$ 2,897,580,550.00		\$ 4,497,897,280.00		\$ 83,508,888.94	1.42%	\$ 4,588,548.00	0.10%	\$ 4,485,302,734.00	\$ -	\$ 98,235,120.96	-1.32%
2.1 PRES. INYECT.	\$ 2,136,849.00	0.02%	\$ 3,828,216.00	0.02%	\$ -	0.00%	\$ 321,689.00	11.89%	\$ 2,286,549.00	\$ -	\$ 521,689.00	11.89%
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 880,519,181.00	6.99%	\$ 480,766,204.00	3.71%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 480,766,204.00	\$ -	\$ -	0.00%
2.3 PUENTE	\$ 286,715,882.00	2.28%	\$ 91,871,488.00	0.94%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 91,871,488.00	\$ -	\$ -	0.00%
2.4 OBRAS DE PROTECCIÓN	\$ 274,028,372.00	2.78%	\$ 1,117,471,860.00	6.99%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 1,117,471,860.00	\$ -	\$ -	0.00%
2.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN	\$ 199,737,384.00	1.98%	\$ 257,107,120.00	1.28%	\$ 63,857,850.54	30.83%	\$ 4,078,382.00	1.84%	\$ 253,088,744.00	\$ -	\$ 98,836,479.54	-26.80%
2.6 ALIENACIÓN	\$ 320,878,147.00	2.89%	\$ 285,413,238.00	1.01%	\$ 95,879.40	0.02%	\$ 38,800.00	0.02%	\$ 285,374,838.00	\$ -	\$ 12,379.40	-0.00%
2.7 PAVIMENTO ASFÁLTICO	\$ 345,445,480.00	2.59%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	\$ -	\$ -	0.00%
2.8 HIGIENIZ. Y ESPACIO PÚBLICO	\$ 485,194,102.00	3.48%	\$ 236,194,028.00	11.67%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 236,194,028.00	\$ -	\$ -	0.00%
3. IMPLANTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 75,300,000.00	0.90%	\$ 75,300,000.00	0.44%	\$ 48,981,325.88	64.84%	\$ 33,750,000.00	43.97%	\$ 41,290,000.00	\$ -	\$ 13,211,325.88	-17.60%
4. IMPLANTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	\$ 30,000,000.00	0.29%	\$ 30,000,000.00	0.21%	\$ 21,875,285.21	72.82%	\$ 19,750,000.00	65.83%	\$ 18,250,000.00	\$ -	\$ 6,145,285.21	-17.60%
	\$ 33,439,269,895.00	100.00%	\$ 35,679,359,458.00	106.00%	\$ 3,630,852,525.87	21.30%	\$ 2,793,593,544.00	15.930%	\$ 14,266,864,114.00	\$ -	\$ 927,266,681.87	-6.49%



ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 10:30 horas del día 2 de julio del 2025, se inicia comité técnico de control de obra modo presencial, en las oficinas de Infraestructura del municipio de Acacias, convocado por la entidad y con la participación de apoyo a la supervisión, como también del representante del contratista, lo mismo que representante legal de la Interventoría.

La Interventoría hace apertura al comité con el saludo y bienvenida al comité y la verificación de los participantes, luego se socializa el estado actual del proyecto con las nuevas condiciones de modificación y prórroga.

Se hace un resumen del estado financiero del proyecto con los datos más actualizados como se resume a continuación:

•Actualmente, el contratista adelanta las actividades correspondientes a la fase inicial del reinicio de la obra, enfocadas en la organización logística, la movilización de personal y equipos. Aunque aún no ha presentado la reprogramación o el cronograma actualizado, se mantiene el seguimiento técnico y administrativo, con el fin de verificar el cumplimiento de los plazos y la calidad en la ejecución de las actividades pendientes. A la fecha, se registra la construcción de 16 pilotes y el armado del acero de refuerzo para los dados de las vigas cabecal de ambos estribos.

Temas para la presente visita técnica:

- 1.Revisión compromisos acta anterior
- 2.Cambio de personal profesional
- 3.Reprogramación de actividades
- 4.Informes mensuales
- 5.Análisis de parcial No.2
- 6.Socialización con la comunidad
- 7.GESPROY
- 8.Certificados de calidad y fichas técnicas de concretos.
- 9.Permanencia de residente en obra.
- 10.Procedimientos constructivos de los componentes del proyecto.
- 11.Planillas seguridad.

TEMA 1: Revisión compromisos acta anterior.

- 1.Cambio de personal profesional
- 2.Reprogramación de actividades
- 3.Informes mensuales
- 4.Análisis de parcial No.2
- 5.Actualización de Garantías
- 6.Materiales en obra
- 7.Socialización con la comunidad

1. Cambio de personal profesional: La Interventoría comenta que en cuanto al tema de profesionales, el contratista aporta la documentación de los profesionales de Salud Ocupacional y del director de Obra y se realizó la verificación de los documentos donde la profesional StSO no tiene inconveniente, aporta toda la documentación y cumple con el perfil, mientras que el director no aporta documentación y no pueden ser aprobado si no cuenta con la documentación requerida, también comenta en que la supervisión hace énfasis en el acompañamiento permanente de los profesionales en obra tanto del residente como el director, y espera que el nuevo director se involucre de manera activa y técnica en la ejecución del proyecto.

El Contratista comenta que ya está en el proceso de reunir toda la documentación y será entregada lo antes posible para subsanar este requerimiento.

La Interventoría sugiere que la entrega sea a más tardar el día 3 de julio del 2025.



DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

2. reprogramación de actividades; La Interventoría reitera que la reprogramación presentada por el contratista a la Entidad no ha sido revisada ni validada por esta Interventoría. Es importante resaltar que el seguimiento al avance del contrato y a los trazos de obra se realiza con base en dicha reprogramación actualizada, la cual, hasta la fecha, no ha sido entregada oficialmente a la Interventoría. Por lo anterior, se hace un llamado urgente al contratista para que remita formalmente este documento, asegurando que sea el mismo que fue presentado ante la Entidad, con el fin de evitar contratiempos y discrepancias en la información que puedan afectar el adecuado seguimiento y avance del proyecto.

El Contratista comenta que ya se hizo el envío de la reprogramación al correo oficial el día anterior.

La Interventoría manifiesta que, en caso de que la reprogramación haya sido enviada por correo electrónico, se procederá con su revisión y, de no encontrarse observaciones, será tomada como la programación oficial para continuar con el seguimiento y control del proyecto, basados en dicha programación. Por lo tanto se cumple con este compromiso.

3. Informes mensuales: La Interventoría informa que ya se recibió el Informe No.11, sin embargo, aún está pendiente la entrega del Informe No.12, cuyo retraso en la entrega es considerable.

El contratista manifiesta que el Informe No.12 ya se encuentra elaborado y será entregado durante el presente comité para su respectiva revisión y aprobación por parte de la Interventoría. Este compromiso se cumple parcialmente por la tardanza en la entrega del informe.

4. Análisis de parcial No.2; En relación con la Parcial No. 2, la Interventoría señala que, pese a haber sido solicitada con un mes de anticipación, está aún no ha sido presentada por el contratista. Se recuerda que el trámite de revisión, verificación y aprobación puede requerir, como mínimo, un mes. Por tanto, corresponde al contratista definir, según sus necesidades, el momento oportuno para la presentación de esta parcial, teniendo en cuenta que su entrega tardía podría generar presiones innecesarias sobre el proceso de aprobación. Este compromiso queda a discreción del contratista.

5. Actualización de Garantías; La Interventoría reitera que la actualización de las pólizas es un requisito inaplazable y debe ser presentada en la fecha acordada. En caso de incumplimiento, se procederá a requerir formalmente al contratista para su entrega oportuna.

Por su parte, el contratista manifiesta que las pólizas ya se encuentran en trámite y que su emisión depende del tiempo requerido por la aseguradora, comprometiéndose a entregarlas a la Entidad tan pronto como sean expedidas. Este compromiso está vigente.

6. Materiales en obra; El Contratista comenta que continua el ensamble de las vigas metálicas y se estima que en 15 días a más tardar ya está llegando la primera viga prearmada a la obra, es decir que el 15 de julio esta la primera viga en la obra.

7. Socialización con la comunidad; La Entidad manifiesta que se programó la socialización con la comunidad para el viernes 4 de julio del 2025 a las 3:00 pm en la sede educativa de la población.

TEMA 2: Cambio de personal profesional.

La Interventoría comenta que en cuanto al tema de profesionales, el contratista aporta la documentación de los profesionales de Salud Ocupacional y del director de Obra y se realizó la verificación de los documentos donde la profesional SISO no tiene inconveniente, aporta toda la documentación y cumple con el perfil, mientras que el director no aporta documentación y no pueden ser aprobado si no cuenta con la documentación requerida, también comenta en que la supervisión hace énfasis en el acompañamiento permanente de los profesionales en obra tanto del residente como el director, y espera que el nuevo director se involucre de manera activa y técnica en la ejecución del proyecto. El Contratista comenta que ya está en el proceso de reunir toda la documentación y será entregada lo antes posible para subsanar este requerimiento.

La Interventoría sugiere que la entrega sea a más tardar el día 3 de julio del 2025.

TEMA 3: Reprogramación de actividades.

La Interventoría reitera que la reprogramación presentada por el contratista a la Entidad no ha sido revisada ni validada por esta Interventoría. Es importante resaltar que el seguimiento al avance del contrato y a los trazos de obra se realiza con base en dicha reprogramación actualizada, la cual, hasta la fecha, no ha sido entregada oficialmente a la Interventoría. Por lo anterior, se hace un llamado urgente al contratista para que remita formalmente este documento, asegurando que sea el mismo que fue presentado ante la Entidad, con el fin de evitar contratiempos y discrepancias en la información que puedan afectar el adecuado seguimiento y avance del proyecto.



DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El Contratista comenta que ya se hizo el envío de la reprogramación al correo oficial el día anterior.

La Interventoría manifiesta que, en caso de que la reprogramación haya sido enviada por correo electrónico, se procederá con su revisión y, de no encontrarse observaciones, será tomada como la programación oficial para continuar con el seguimiento y control del proyecto, basados en dicha programación.

TEMA 4: Informes mensuales.

La Interventoría informa que ya se recibió el Informe No.11, sin embargo, aún está pendiente la entrega del Informe No.12, cuyo retraso en la entrega es considerable.

El contratista manifiesta que el Informe No.12 ya se encuentra elaborado y será entregado durante el presente comité para su respectiva revisión y aprobación por parte de la Interventoría. Este compromiso se cumple parcialmente por la tardanza en la entrega del informe.

TEMA 5: Análisis de parcial No.2

En relación con la Parcial No. 2, la Interventoría señala que, pese a haber sido solicitada con un mes de anticipación, está aún no ha sido presentada por el contratista. Se recuerda que el trámite de revisión, verificación y aprobación puede requerir, como mínimo, un mes. Por tanto, corresponde al contratista definir, según sus necesidades, el momento oportuno para la presentación de esta parcial, teniendo en cuenta que su entrega tardía podría generar presiones innecesarias sobre el proceso de aprobación. Este compromiso queda a discreción del contratista.

TEMA 6: Socialización con la comunidad

La Entidad informa que se ha programado la socialización con la comunidad para el viernes 4 de julio de 2025 a las 3:00 p. m., en la sede educativa de la población.

Por lo tanto, la Interventoría recomienda que durante dicha socialización se informe a la comunidad sobre la inminente clausura definitiva del paso por el puente antiguo, ya que su demolición está prevista para los próximos días. Esta comunicación tiene como propósito brindar un preaviso a la comunidad y evitar que esta situación los tome por sorpresa generando malestar e inconformidad entre los habitantes, y permitir que la comunidad identifique y adopte alternativas de tránsito en la zona.

TEMA 7: Información para GESPROY.

La Interventoría comenta que la información que se presenta a la entidad para el cargue a GERPROY no se ha podido entregar debido a que se debe presentar el avance con base en la nueva programación la cual no ha sido entregada por parte del contratista, por lo tanto, una vez revisada la reprogramación enviada por el contratista, se procederá con su revisión y, de no encontrarse observaciones, será tomada como la programación oficial para continuar con el seguimiento y control del proyecto, basados en dicha programación, lo mismo que para la presentación del corte de avance para el GERPROY.

TEMA 8: Certificados de calidad y fichas técnicas de concretos.

La Interventoría señala que mediante el oficio CI-OCA-978.2023-196, enviado al contratista el pasado 27 de junio, se solicitó la entrega de los certificados de calidad de los materiales y las fichas técnicas de la fórmula del concreto, no obstante, el contratista únicamente presentó las granulometrías, sin adjuntar los certificados ni las fichas técnicas de la mezcla de concretos.

El contratista se compromete a gestionar dichos documentos con el proveedor y a entregarlos a la Interventoría, a más tardar el próximo 8 de julio de 2025.

TEMA 9: Permanencia de residente en obra.

Respecto a la permanencia de los profesionales en obra, la Interventoría señala que la supervisión ha sido enfática en requerir el acompañamiento permanente tanto del residente como del director de obra, y espera que el nuevo director asuma un rol activo y técnico en el desarrollo del proyecto. Por su parte, el contratista manifiesta que acatará esta observación y se compromete a garantizar la presencia continua de los profesionales durante la ejecución del proyecto.



DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

TEMA 10: Procedimientos constructivos de los componentes del proyecto.

La Interventoría reitera la necesidad de que el Contratista presente, de manera oficial y técnica, los procedimientos constructivos que se aplicarán durante la ejecución del proyecto. Aunque este tema ha sido abordado en reuniones anteriores, aún no se ha establecido con claridad. Es fundamental definir estos procedimientos, ya que permiten identificar anticipadamente las posibles problemáticas, proponer alternativas de solución y contar con las bases técnicas necesarias para actuar de manera oportuna ante cualquier eventualidad, garantizando así el adecuado desarrollo del proyecto. En este sentido, se invita al Contratista a formalizar y presentar dichos procedimientos, teniendo en cuenta los diferentes componentes del proyecto, tales como: el componente del puente, el vial, el hidráulico, el eléctrico y el de redes pluviales y sanitarias. A través de esta formalización, se busca conocer la secuencia, coordinación y alternancia en la ejecución de cada uno de estos componentes. En este caso la interventoría propone que en el próximo comité el Contratista presente un adelanto respecto a estos procedimientos y tenga un a fecha definida a plazo inmediato para formalizar estos documentos.

La Interventoría propone que en el próximo comité el Contratista presente un avance sobre estos procedimientos, y establezca una fecha concreta e inmediata para su formalización definitiva.

El Contratista manifiesta su conformidad con la propuesta planteada por la Interventoría.

TEMA 11: Planillas seguridad.

Frente al reinicio del proyecto, la interventoría hace énfasis en la importancia de contar con la seguridad social de los todos los trabajadores del proyecto un llamado al contratista para que presente los soportes de afiliación de todo el personal y la documentación reglamentaria que hace parte de la contratación con el fin de tener tranquilidad en el evento de alguna situación adversa que pueda poner en riesgo la integridad del personal y los intereses económicos del contratista.

Este tema se sugiere coordinar y gestionar esta documentación con el profesional SISO de obra, de igual manera se recuerda que esta tema ya fue solicitado anteriormente mediante el oficio CI-OCA-978.2023-196, enviado al contratista el pasado 27 de junio del 2025.

Observaciones:

Respecto a la bitácora, La interventoría comenta que debido al atraso que se presenta de parte del contratista en la entrega de esta información entonces decide que a partir del reinicio de obra, la bitácora será diligenciada por la interventoría.

Se da por terminado el comité con las recomendaciones y sugerencias recibidas desde la supervisión.

B. COMPROMISOS PACTADOS

	FECHA	RESPONSABLES
1 Cambio de personal profesional	3 de julio de 2025	Contratista
2 Análisis de parcial No.2;	A decisión del contratista	Contratista
3 Actualización de Garantías	2 de julio de 2025	Contratista
4 Materiales en obra, (Vigas estructura puente)	15 de julio de 2025	Contratista
5 Socialización con la comunidad	4 de julio de 2025	Entidad
6 Información para GESPROY	3 de julio de 2025	Interventoría
7 Certificados de calidad y fichas técnicas de concretos	8 de julio de 2025	Contratista
8 Procedimientos constructivos de los componentes del proyecto	Proximo comité entrega previa	Contratista
9 Planillas seguridad	Se coordina desde obra	Contratista
0		

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA
DÍA MES AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma acta asistencia de la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Dos (2) días del mes de Julio de 2025
(Día en letra) (Mes en letra o año)



ALCALDÍA DE
ACACIAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL COMITÉ REALIZADO



Interventoría,

Puente Chichimene,

Vereda Diebraditas, Acacias

8°54' 73" 45'34", 545.0m

02/07/2025 11:06:47 a. m.



Interventoría,

Puente Chichimene,

Vereda Diebraditas, Acacias

8°54' 73" 45'34", 545.0m

02/07/2025 11:06:47 a. m.



ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO





ACACIAS

[illegible]



ALCALDÍA DE ACACIAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

FECHA 4 7 25

OBJETO DE CONTRATO:

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

I. TEMAS A TRATAR EN EL COMITÉ

1. Socialización con la comunidad

II. OBJETO

COMITÉ TECNICO DE OBRA No.42 REALIZADO EN LA SEDE EDUCATIVA DEL CENTRO POBLADO DE QUEBRADITAS COMO LA SOCIALIZACION DE REINICIO DE OBRA

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
	N/A	N/A	N/A

V. TEMAS TRATADOS

GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS	
CONTRATO OBRA No	929 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	ALCALDÍA MUNICIPAL DE ACACIAS, META
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R.L FRANCISCO MORA GUTIERREZ NIT No 901.767.420-0
VALOR	TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$13.430.269.893.00)
PLAZO	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ADICION No.1	TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$3.539.989.565)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$16.970.259.458)
FECHA DE SUSPENSION No.1	24 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE REINICIO No.1	17 DE JUNIO DEL 2025
CONTRATO INTER No	978 DE 2023
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT No 9.658.796-1
OBJETO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
VALOR	SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$627.081.787,00) M/CTE
PLAZO	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ADICION No.1	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO (\$291.852.095)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS (\$918.733.882)
FECHA DE SUSPENSION No.1	24 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE REINICIO No.1	17 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE INICIO	27 DE MAYO DE 2024
FECHA TERMINACION INICIAL	26 DE ABRIL DE 2025
NUEVO PLAZO DEL CONTRATO	18 MESES
NUEVA FECHA TERMINACION	20 DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR	IVAN MAURICIO ROJAS
APOYO SUPERVISION	CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO



ALCALDÍA DE
ACACIAS


ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



La zona para intervenir se encuentra ubicada en el Municipio de Acacias, específicamente está ubicada en la vía Terciaria que conduce a la vereda quebraditas a 34.4 Km del casco urbano del Municipio de Acacias Meta, de cuales 13.56 se encuentran en afirmado, las coordenadas de ubicación son las 03°57'39,99" N y 73°30'17,67" O

DETALLES DEL PUENTE Y ALCANCE DEL CONTRATO

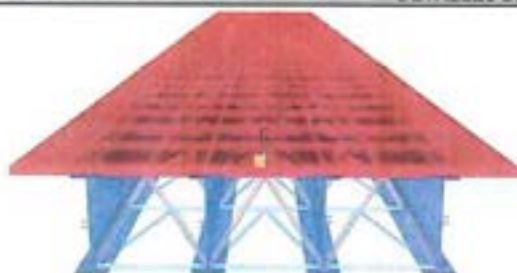

En el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CANO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" se plantea la construcción de un puente vehicular de 58.0 metros de luz entre ejes de apoyo y un tablero con un ancho de 10.7 metros a bordes externos, ancho efectivo de calzada de 7.30 metros, andenes a ambos costados de 1.20 metros; en el diseño realizado se plantea como apoyo del tablero 4 vigas en I metálicas de acero ASTM A-709 Grado 50W en alma llena, con una separación interna de 2.5 metros y una altura de 2465 milímetros; la infraestructura es una cimentación tipo pilote construyendo 8 pilotes por estribo para un total de 16 pilotes con un diámetro $\Phi 1.50$ metros y una profundidad de 12 metros cada uno; las barandas serán metálicas, tendrá protectores en concreto tipo new jersey los apoyos y juntas estarán en neopreno, las aletas y estribos serán en concreto reforzado y el tablero así como las placas de aproximación serán concreto reforzado, el puente contará con señalización horizontal y vertical respectivamente.

Se realizará la construcción de un pluviel en una longitud de 877 metros, la construcción de 34 sumideros laterales y 11 pozos de inspección; de igual manera se realizará la construcción de una red de alumbrado público con un transformador de 5 KVA, instalación de 660 metros de red eléctrica, la instalación de 26 mástiles metálicos con luminarias tipo led; se realizará la construcción de 288 m3 de bolsacretos con las respectivas horas maquina para el manejo del río.


Se realizará la intervención de 592 metros lineales de vía con estructura de subbase de 30 cms y base 20 cms.



ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ESQUEMAS DEL PUENTE




ALCANCE PRESUPUESTAL

CAPITULOS	(\$) INICIAL	(\$) MODIFICATORIA	%
1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR			
1.1 PRELIMINARES Y NPS	\$ 272.192.313,00	\$ 413.731.216,00	1,60%
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 61.121.996,00	\$ 56.786.182,00	0,36%
1.3 INFRAESTRUCTURA	\$ 1.310.753.807,00	\$ 1.408.353.959,00	7,72%
1.4 SUPERESTRUCTURA	\$ 364.786.302,00	\$ 370.956.872,00	2,15%
1.5 ACERO DE REFUERZO	\$ 8.249.530.635,00	\$ 9.907.668.976,00	48,61%
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 204.344.290,00	\$ 204.870.970,00	1,20%
2. VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRADITAS			0,00%
2.1 PRELIMINARES	\$ 3.136.848,00	\$ 3.828.018,00	0,02%
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 880.519.181,00	\$ 460.066.324,00	5,19%
2.3 PLUVIAL	\$ 295.715.682,00	\$ 91.871.488,00	1,74%
2.4 OBRAS DE PROTECCIÓN	\$ 374.028.372,00	\$ 1.117.411.963,00	2,20%
2.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN	\$ 169.737.564,00	\$ 207.107.129,00	1,00%
2.6 ILUMINACIÓN	\$ 320.579.141,00	\$ 258.412.335,00	1,89%
2.7 PAVIMENTO ASFALTICO	\$ 348.485.660,00	\$ -	2,05%
2.8 ANDENES Y ESPACIO PUBLICO	\$ 465.358.102,00	\$ 594.184.788,00	2,74%
ITEMS NO PREVISTOS VIA		\$ 1.768.009.238,00	0,00%
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	0,44%
IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	0,21%
	\$ 13.430.269.893,00	\$ 16.970.259.458,00	100,00%

1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR



2. VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRADITAS





ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ESTADO DE LA OBRA A LA FECHA

MATERIALES EN OBRA					EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OBRA		
No	ELEMENTO	UND	CANTIDAD	OBSERVACION	No	CANTIDAD	MAQUINARIA Y/O EQUIPO
1	Acero instalado y en vigas cabesal	KG	58.488,14	Acero para las vigas cabesales	1	1	Tractobomba de 6" Estribo Quebraditas.
					2	1	Planta electrica de 440 V
					3	2	Equipo electricos menores manuales.
					4	1	Herramienta menor

Observaciones: Ya se tiene construidos los 16 pilotes descabezados y se dio inicio al armado de acero para la viga cabesal del estribo Palomas.

Observaciones: A la fecha no se tiene mas equipos

PERSONAL				
NO	TIPO PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	ADMINISTRATIVO		DIRECTOR	
2	ADMINISTRATIVO	1	RESIDENTE	No permanece en obra
3	ADMINISTRATIVO		ESP ESTRU	
4	ADMINISTRATIVO		ESP VIAS	
5	ADMINISTRATIVO	1	SISO	En obra
6	ADMINISTRATIVO			
7	OPERATIVO		TOPOGRAFO	
8	OPERATIVO		VIALISTAS	
9	OPERATIVO		VIGILANTE	
10	OPERATIVO	11	OPERATIVOS	En obra
11	OPERATIVO		OPERADOR	En obra (Retroexc)
12	OPERATIVO			

Observaciones: El personal esta realizando actividades armado de aceros para la viga cabesal del estribo Palomas.



Observaciones: A la fecha se han aprobado todas las ordenes de operacion por un valor total del anticipo que corresponde al 100.00%.

ESTADO DEL CONTRATO			
Fecha de inicio:	lunes, 27 de mayo de 2024		
Fecha de suspension	jueves, 24 de abril de 2025		
Fecha de Reinicio:	martes, 17 de junio de 2025		
Fecha terminación inicial:	sabado, 26 de abril de 2025		
Nueva fecha terminación:	martes, 20 de enero de 2026		
Plazo dias:	540,00	plazo meses:	18
Fecha de análisis:	viernes, 4 de julio de 2025		Semana 51
Plazo transcurrido dias:	349,00	meses:	11,633
% transcurrido en tiempo:	64,630%	meses:	64,630%
Avance programado \$:	\$ 3.630.662.025,87		
Avance programado %:	21,394%		
Avance ejecutado \$:	\$ 2.703.395.343,72		
Avance ejecutado %:	15,939%		
Atraso (-) o avance (+) \$:	-\$ 927.266.682,15		
Atraso (-) o avance (+) %:	-5,464%		

Observaciones: El contratista no ha entregado reprogramacio de la Modificatoria No.1



Observaciones: El contratista no ha entregado reprogramacio de la Modificatoria No.1



Observaciones: El contratista no ha entregado reprogramacio de la Modificatoria No.1



Observaciones: El contratista no ha entregado reprogramacio de la Modificatoria No.1




ALCALDÍA DE ACACIAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO


ANÁLISIS DE AVANCE

PROGRAMADO VS EJECUTADO

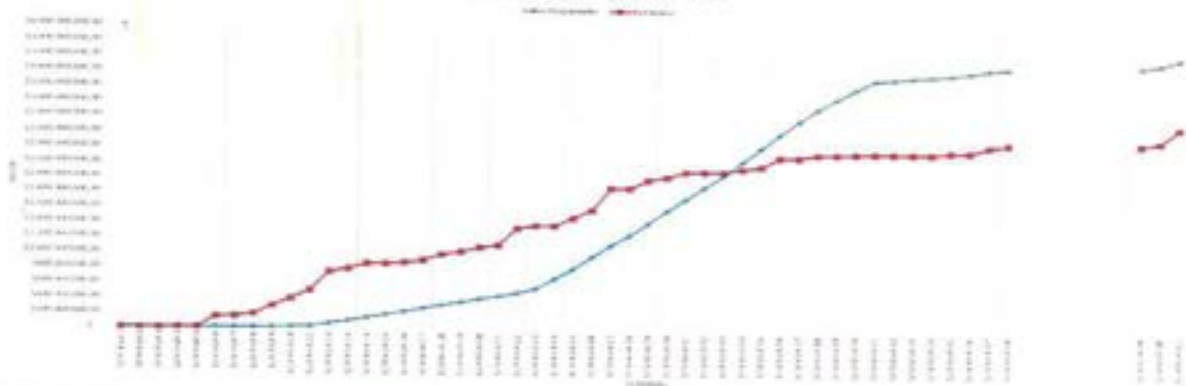

ANÁLISIS DESEMPEÑO DE LA EJECUCIÓN

DESEMPEÑO POR CAPITULOS

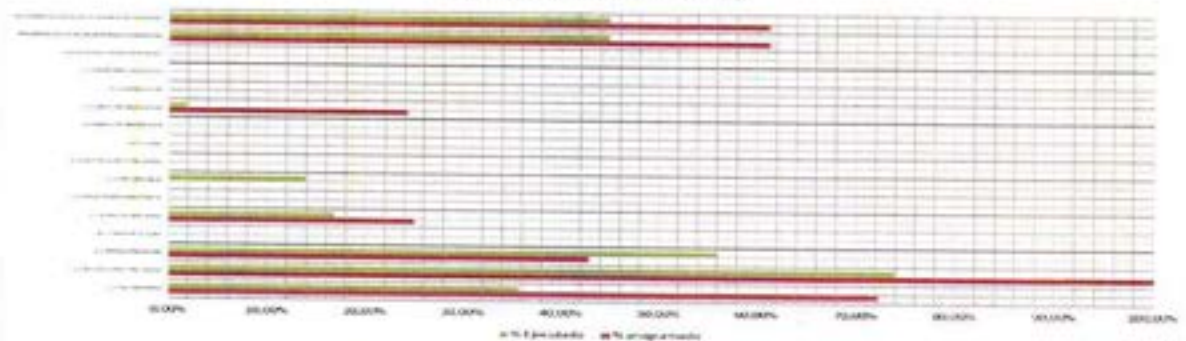

ANÁLISIS PORCENTUAL Y DE RECURSOS

CAPITULO	VALOR CAPITAL INICIAL	%	VALOR MODIFICACIONES	%	VALOR PRESUPUESTO POR CAPITAL	% PRESUPUESTO	VALOR EJECUTADO POR CAPITAL	% EJECUTADO	VALOR PENDIENTE POR CAPITAL	ATRASO	ADELANTO	%
1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR	\$ 11,482,799,340.00		\$ 13,362,388,075.00		\$ 3,487,676,734.00	30.35%	\$ 2,649,306,736.00	21.43%	\$ 8,338,359,678.00		\$ 945,969,943.40	-8.96%
1.1. PRELIMINARES	\$ 273,182,373.00	2.38%	\$ 419,737,216.00	3.14%	\$ 308,085,527.96	8.84%	\$ 148,027,763.00	28.57%	\$ 160,057,764.96		\$ 160,057,764.96	-35.95%
1.2. EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 81,121,898.90	0.71%	\$ 36,796,182.00	0.27%	\$ 58,796,181.97	1.71%	\$ 42,087,420.00	71.75%	\$ 16,698,761.97		\$ 16,698,761.97	-28.41%
1.3. INFRAESTRUCTURA	\$ 1,250,735,827.00	10.89%	\$ 1,426,353,889.00	10.67%	\$ 945,274,733.78	27.44%	\$ 799,643,773.00	84.60%	\$ 146,631,060.78		\$ 146,631,060.78	-15.46%
1.4. SUPERESTRUCTURA	\$ 344,786,322.00	3.00%	\$ 379,895,872.00	2.78%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 379,895,872.00		\$ -	0.00%
1.5. ACERO DE REFUERZO	\$ 8,244,526,035.00	71.92%	\$ 8,307,888,079.00	61.46%	\$ 2,492,790,350.26	71.49%	\$ 1,689,807,809.00	67.76%	\$ 6,617,718,270.26		\$ 823,232,911.00	-9.37%
1.6. OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 274,344,295.00	2.39%	\$ 294,870,875.00	2.19%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 294,870,875.00		\$ -	0.00%
2. VÍA DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UNICADO EN LA RED VIAL QUEBRADENSE	\$ 2,887,982,330.00		\$ 4,487,891,380.00		\$ 83,808,669.34	1.47%	\$ 4,588,548.00	5.47%	\$ 4,483,352,732.00		\$ 58,320,120.34	-1.31%
2.1. PRELIMINARES	\$ 3,138,848.00	0.11%	\$ 2,828,019.00	0.06%	\$ -	0.00%	\$ 837,669.00	13.89%	\$ 3,138,848.00		\$ -	0.00%
2.2. EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 881,819,181.00	3.05%	\$ 482,086,324.00	1.71%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 482,086,324.00		\$ 482,086,324.00	-54.68%
2.3. PLAZA	\$ 288,713,982.00	10.01%	\$ 91,871,488.00	3.18%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 91,871,488.00		\$ -	0.00%
2.4. OBRAS DE PROTECCIÓN	\$ 374,028,373.00	12.95%	\$ 1,117,471,863.00	38.70%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 1,117,471,863.00		\$ -	0.00%
2.5. OBRAS DE DENSIFICACIÓN	\$ 388,737,384.00	13.46%	\$ 387,187,036.00	13.41%	\$ 63,857,850.94	16.45%	\$ 4,818,360.00	7.54%	\$ 382,368,676.00		\$ 58,839,470.94	-15.38%
2.6. ILUMINACIÓN	\$ 383,879,141.00	13.31%	\$ 385,413,539.00	13.51%	\$ 60,819.40	0.02%	\$ 38,500.00	0.06%	\$ 385,375,039.00		\$ 12,219.40	-0.00%
2.7. PAVIMENTO ASFALTICO	\$ 348,489,485.00	12.29%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -		\$ -	0.00%
2.8. ADEQUACIÓN Y ESPACIO PÚBLICO	\$ 489,359,131.00	16.94%	\$ 2,362,194,028.00	17.69%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 2,362,194,028.00		\$ -	0.00%
2.9. IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 75,000,000.00	2.59%	\$ 75,000,000.00	2.44%	\$ 46,961,325.86	61.28%	\$ 33,790,000.00	44.37%	\$ 41,209,000.00		\$ 13,211,325.86	-32.32%
2.10. IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	\$ 35,000,000.00	1.19%	\$ 35,000,000.00	1.21%	\$ 21,875,385.31	62.50%	\$ 15,750,000.00	45.00%	\$ 19,250,000.00		\$ 6,125,385.31	-29.04%
TOTAL	\$ 13,436,263,893.00	100.00%	\$ 18,179,358,458.00	135.39%	\$ 3,630,962,525.67	27.01%	\$ 2,703,395,944.00	15.93%	\$ 14,268,967,914.00		\$ 1,927,288,681.67	-14.06%



ALCALDÍA DE
ACACIAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 15:30 horas del día 4 de julio de 2025 en un aula de las instalaciones de la sede educativa del centro poblado de Quebraditas, se inició la socialización con la comunidad sobre las nuevas condiciones y alcance del Contrato de Obra No. 929 de 2023, cuyo objeto es la "CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS", por un valor de dieciséis mil novecientos setenta millones doscientos cincuenta y nueve mil cuatrocientos cincuenta y ocho pesos (\$16.970.259.458 m/cte). De acuerdo con la Modificatoria No. 1, el plazo de ejecución será de dieciocho (18) meses.

En la socialización participaron integrantes de la comunidad, incluyendo el presidente de la Junta de Acción Comunal; representantes de la supervisión de la entidad contratante; representantes del contratista; y representantes de la interventoría.

El Contratista inicia la socialización, exponiendo las condiciones iniciales del contrato y las razones que motivaron su suspensión. Asimismo, explica las condiciones del reinicio, las nuevas disposiciones contractuales y el alcance del proyecto, socializando el objeto del contrato y resumiendo las actividades que se ejecutarán a partir de este reinicio y el avance actual físico del proyecto.

Se socializan las generalidades del contrato como la obras que comprende el puente, y resumen de las proyecciones de los demás componentes del proyecto como son el componente vial, el componente hidráulico, el componente eléctrico, el componente de obras de protección y los cambios que se definen en la modificación del contrato.

Se da a conocer las problemáticas que obligó a tomar la decisión de suspensión, lo mismo que los inconvenientes de algunos elementos que se deben corregir contractualmente para poder avanzar con el proyecto.

Luego interviene la supervisión de la entidad corroborando lo manifestado en la socialización que presentó el contratista, explicando que no es como dicen algunas personas que vienen a grabar videos de que estaba abandonada la obra, sino que siempre se ha estado trabajando para ella. Así sea desde una oficina, diseñando las obras que se les socializado y haciendo la gestión para casi 4 mil millones que se le invirtieron a la adición para una inversión total de casi de 17 mil millones de pesos, afirma que a pesar de los inconvenientes se sacara adelante este proyecto.

también comenta la supervisión que el contratista y la entidad lo mismo que la interventoría está presta a escuchar a la comunidad y atender cualquier consulta o inquietud con respecto a la ejecución del proyecto.

Queda el compromiso de la supervisión de realizar visitas a la obra los viernes de cada semana con el fin de verificar los avances del proyecto e identificar los inconvenientes.

Finalmente se toma las firmas de la asistencia de la comunidad y se da por terminada la socialización a las 16:30.

Se anexa el archivo de presentacion de la socializacion y la planilla de firmas de los asistentes

B. COMPROMISOS PACTADOS

FECHA

RESPONSABLES

1 Visita de la supervision cada seman los dias viernes Cada semana Entidad

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA 15 7 2025
DIA MES AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma acta asistencia de la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Cuatro (4)
(Día en letra)

días del mes de

Julio

de

2025

(Día en que se firma el acta)



ALCALDÍA DE
ACACIAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL COMITÉ REALIZADO





ALCALDÍA DE
ACACIAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL COMITÉ REALIZADO



Interventoria,
Puente Chichimene,
Vereda Quebraditas, Acacias
3°57'33", -73°30'19", 342.0m
04/07/2025 03:45:30 p. m.



Interventoria,
Puente Chichimene,
Vereda Quebraditas, Acacias
3°57'33", -73°30'19", 339.0m
04/07/2025 03:57:18 p. m.



LISTA DE ASISTENCIA

F-019

Version: 04

Octubre del 2024

DESCRIPCIÓN GENERAL

CAPACITACIÓN ☐ REUNIÓN ☐ CHARLA ☐ OTRO ☒ CUAL: SocializaciónPROYECTO: Conorcio Acaca- Contrato No. OCA-924 de 2023FECHA: 09-Julio-2025

LUGAR / FRENTES DE OBRA

TEMA: Socialización con Comunidad

DURACIÓN:

CONTENIDO: socialización informativo de Reinicio de labores a la Comunidad Vereda Quebrachas y Vereda San José de los Palomares

FACILITADOR:

FIRMA:

CARGO:

ASISTENTES

No.	NOMBRES COMPLETOS	CARGO	VINCULACIÓN			FIRMA
			Directa	Indirecta	Voluntaria	
1	Blasiusdillucillo					
2	Carmen Alicia Puyar					
3	Lysse Orozco					
4	Umana					
5	Oscar Ruiz					
6	Leidy Cárdenas					
7	Tecno 2020					
8	Rafael Nazareth					
9	Diana C. Guerrero					
10	Lina Maria Garbora					
11	Auris Estela					
12	AURIS					
13	Quilson Espitia					
14	Yelson Jose					
15	Enrique Pujin					
16	Joseth Garcia					
17	Pedro Eladio Alfaro R	Interventoria				
18	Esola Tame Nioz Jacho	HSE Conorcio				
19	Alexander Chacon					
20	ANDERSON CHACON					
21	Christian Fuentes Rueda	Infraestructura				
22						
23						
24						
25						

EVALUACIÓN DE EFICACIA

APLICA: SI ☐ NO ☒

Fecha de aplicación:

METODO DE EVALUACIÓN

Escrita ☐ Oral ☐ Mejora en desempeño del cargo ☐ Retroalimentación a demás funcionarios ☐
Inspección planeada ☐ Auditoria interna ☐ Seguimiento acción correctiva o preventiva ☐
Capacitación eficaz: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES



ALCALDÍA DE ACACIAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

FECHA 17 7 25

OBJETO DE CONTRATO:

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

I. TEMAS A TRATAR EN EL COMITE

- 1.Revisión compromisos acta anterior
- 2.Avançe físico y financiero
- 3.Falta de insumos en obra

II. OBJETO

COMITÉ TECNICO DE OBRA No.43 REALIZADO DE FORMA VIRTUAL MEDIANTE ENLACE <https://meet.google.com/jwa-akw-dtun?pwd=224>

III. LECTURA ACTA ANTERIOR Y POSIBLES OBSERVACIONES A LA MISMA

N.A.

IV. VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS PACTADOS SEGÚN ACTA ANTERIOR

No.	COMPROMISO Y/O ACCIÓN DE MEJORA	AVANCE DEL COMPROMISO	EVIDENCIA DEL CUMPLIMIENTO
1	Solicitud Cambio de personal profesional	No se ha entregado y soportes del Directo de obra	No cumple
2	Análisis de parcel No.2;	A decisión del contratista	A decisión del contratista
3	Actualización de Garantías	Notificación a correo Interventoría 6 de julio	Cumple
4	Materiales en obra, (vigas estructura puente)	Estaba el compromiso para 15 de julio llegaba primer viga	No cumple
5	Socialización con la comunidad	Realizada 4 de julio	Cumple
6	Información para GESPROY	Enviado el 3 de julio	Cumple
7	Certificados de calidad y fichas técnicas de concreto	Plazo el 8 de Julio	No cumple
8	Procedimientos constructivos de los componentes del proyecto	Entrega preliminar 11 de julio	No cumple
9	Planillas seguridad	Se deben tener pagas el 15 de julio	No cumple

V. TEMAS TRATADOS

GENERALIDADES DE LOS CONTRATOS	
CONTRATO OBRA No	929 DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2023
CONTRATANTE	ALCALDIA MUNICIPAL DE ACACIAS, MEYA
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R.L FRANCISCO MORA GUTIERREZ NIT No 901.767.420-0
VALOR	TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE (\$13.430.269.893,00)
PLAZO	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ADICION No.1	TRES MIL QUINIENTOS TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS SESENTA Y CINCO PESOS (\$3.539.989.565)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$16.970.259.458)
FECHA DE SUSPENSION No.1	24 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE REINICIO No.1	17 DE JUNIO DEL 2025
CONTRATO INTER No	978 DE 2023
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT No 9.658.796-1
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
VALOR	SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS (\$627.081.787,00) M/CTE
PLAZO	ONCE (11) MESES, CONTADOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
ADICION No.1	DOSCIENTOS NOVENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y DOS MIL NOVENTA Y CINCO (\$291.652.095)
NUEVO VALOR DEL CONTRATO	NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS (\$918.733.882)
FECHA DE SUSPENSION No.1	24 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE REINICIO No.1	17 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE INICIO	27 DE MAYO DE 2024
FECHA TERMINACIÓN INICIAL	26 DE ABRIL DE 2025
NUEVO PLAZO DEL CONTRATO	18 MESES
NUEVA FECHA TERMINACIÓN	20 DE ENERO DE 2026
SUPERVISOR	IVAN MAURICIO ROJAS
APOYO SUPERVISIÓN	CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO



ALCALDÍA DE
ACACIAS


ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO



La zona para intervenir se encuentra ubicada en el Municipio de Acacias, específicamente está ubicada en la vía Terciaria que conduce a la vereda quebraditas a 34,4 Km del casco urbano del Municipio de Acacias Meta, de cuales 13,56 se encuentran en afirmado, las coordenadas de ubicación son las 03°57'39,99" N y 73°30'17,67" O

DETALLES DEL PUENTE Y ALCANCE DEL CONTRATO

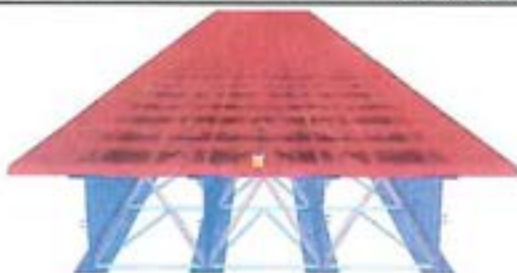

En el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" según modificatoria No 1 estableció en su ajuste lo siguiente: se plantea la construcción de un puente vehicular de 58,0 metros de luz entre ejes de apoyo y un tablero con un ancho de 10,7 metros a bordes externos, ancho efectivo de calzada de 7,30 metros, andenes a ambos costados de 1,20 metros; en el diseño realizado se plantea como apoyo del tablero 4 vigas en I metálicas de acero ASTM A-709 Grado 50W en alma llena, con una separación interna de 2,5 metros y una altura de 2465 milímetros; la infraestructura es una cimentación tipo pilote construyendo 8 pilotes por estribo para un total de 16 pilotes con un diámetro $\Phi 1.50$ metros y una profundidad de 12 metros cada uno; las barandas serán metálicas, tendrá protectores en concreto tipo new jersey los apoyos y juntas estarán en neopreno, las aletas y estribos serán en concreto reforzado y el tablero así como las placas de aproximación serán concreto reforzado, el puente contará con señalización horizontal y vertical respectivamente.

Se realizará la intervención del pívual existente en una longitud de 140 metros, la construcción de 34 sumideros laterales y 1 pozos de inspección, así como la limpieza de los componentes existentes; de igual manera se realizará la construcción de un sistema de alumbrado público el cual está conformado por 29 mástiles metálicos con luminarias Solares con foto celda Completa.

En el componente hidráulico y de protección se construirán 103 m3 de gaviones revestidos en concreto, 789 unidades de bolsacretos, distribuidos en una longitud de 76,87ml margen derecha y 39,06 margen izquierda, así como 160 horas de canalización en el río.


El componente vial se pavimentarán en concreto hidráulico 720 ml de vía en un espesor de 0,23m y anchos viales de 6 mts, incluyendo bocacalles, dicha longitud se distribuye 476ml sector quebraditas, 159ml sector palomas y bocacalles sportada en una subbase granular de espesor 0,25m, dicha intervención se complementa con sardineles, bordillos y 962m2 de espacio público.



ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO


ESQUEMAS DEL PUENTE




ALCANCE PRESUPUESTAL

CAPÍTULOS	(\$) INICIAL	(\$) MODIFICATORIA	%
1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR			
1.1 PRELIMINARES Y NPS	\$ 272.162.313,00	\$ 413.731.216,00	1,60%
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 61.121.996,00	\$ 56.786.182,00	0,36%
1.3 INFRAESTRUCTURA	\$ 1.310.733.807,00	\$ 1.408.353.959,00	7,72%
1.4 SUPERESTRUCTURA	\$ 364.786.302,00	\$ 370.956.872,00	2,15%
1.5 ACERO DE REFUERZO	\$ 8.249.530.635,00	\$ 9.907.668.976,00	48,61%
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 204.344.290,00	\$ 204.870.970,00	1,20%
2. VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRADITAS			
2.1 PRELIMINARES	\$ 3.136.848,00	\$ 3.828.018,00	0,02%
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 880.519.181,00	\$ 480.068.324,00	5,19%
2.3 PLUVIAL	\$ 295.715.682,00	\$ 91.871.488,00	1,74%
2.4 OBRAS DE PROTECCIÓN	\$ 374.028.372,00	\$ 1.117.411.963,00	2,20%
2.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN	\$ 169.737.564,00	\$ 207.107.129,00	1,00%
2.6 ILUMINACIÓN	\$ 320.579.141,00	\$ 255.412.335,00	1,89%
2.7 PAVIMENTO ASFALTICO	\$ 348.485.660,00	\$ -	2,05%
2.8 ANDENES Y ESPACIO PUBLICO	\$ 465.358.102,00	\$ 594.184.788,00	2,74%
ITEMS NO PREVISTOS VIA		\$ 1.768.009.238,00	0,00%
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 75.000.000,00	\$ 75.000.000,00	0,44%
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	\$ 35.000.000,00	\$ 35.000.000,00	0,21%
	\$ 13.430.269.893,00	\$ 16.970.259.458,00	100,00%

1. CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR



2. VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRADITAS





ALCALDÍA DE ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

ESTADO DE LA OBRA A LA FECHA

MATERIALES EN OBRA					EQUIPOS Y MAQUINARIA EN OBRA				
No	ELEMENTO	UND	CANTIDAD	OBSERVACION	No	CANTIDAD	MAQUINARIA Y/O EQUIPO		
1	Acero instalado y en pilotes	KG	31338,18	Acero para pilotes	1	1	Tractobomba de 6° Estribo Quebraditas.		
2	Acero instalado y viga cabezal	KG	14646,37	Acero para las vigas cabezales	2	1	Planta eléctrica de 440 V		
					3	2	Equipo eléctricos menores manuales.		
					4	1	Herramienta menor		
					5	1	Retroexcavadora		


Observaciones: Ya se tiene construidos los 16 pilotes descabezados y se dio inicio al armado de acero para la viga cabezal del estribo Palomas.

Observaciones: A la fecha no se tiene mas equipos

PERSONAL				
NO	TIPO PERSONAL	CANTIDAD	DESCRIPCION	OBSERVACION
1	ADMINISTRATIVO	1	DIRECTOR	En obra
2	ADMINISTRATIVO	1	RESIDENTE	En obra
3	ADMINISTRATIVO		ESP ESTRU	
4	ADMINISTRATIVO		ESP VIAS	
5	ADMINISTRATIVO	1	SIÑO	En obra
6	ADMINISTRATIVO			
7	OPERATIVO	2	TOPOGRAFO	
8	OPERATIVO	1	VIALISTAS	En obra
9	OPERATIVO		VIGILANTE	
10	OPERATIVO	11	OPERATIVOS	En obra
11	OPERATIVO	1	OPERADOR	En obra (Retroexo)
12	OPERATIVO			

Observaciones: El personal esta realizando actividades armado de aceros para la viga cabezal del estribo Quebraditas.

ANÁLISIS FINANCIERO ANTICIPO Y PARCIALES




Observaciones: A la fecha se han aprobado todas las ordenes de operación por un valor total del anticipo que corresponde al 100,00%.

ESTADO DEL CONTRATO			
Fecha de inicio:	lunes, 27 de mayo de 2024		
Fecha de suspensión	jueves, 24 de abril de 2025		
Fecha de Reinicio:	martes, 17 de junio de 2025		
Fecha terminación inicial:	sábado, 26 de abril de 2025		
Nueva fecha terminación:	martes, 20 de enero de 2026		
Plazo días:	540,00	plazo meses:	18
Fecha de análisis:	martes, 17 de junio de 2025		Semana 53
Plazo transcurrido días:	332,00	meses:	11,067
% transcurrido en tiempo:	61,481%	meses:	61,481%
Avance programado \$:	\$ 3.867.853.848,50		
Avance programado %:	22,792%		
Avance ejecutado \$:	\$ 2.773.485.474,61		
Avance ejecutado %:	16,343%		
Atraso (-) o avance (+) \$:	-\$ 1.094.368.373,89		
Atraso (-) o avance (+) %:	-6,449%		


Observaciones: Del presente análisis se concluye que el contratista mantiene un rezago constante en el cumplimiento del cronograma establecido.

GRÁFICO FLUJO DE CAJA

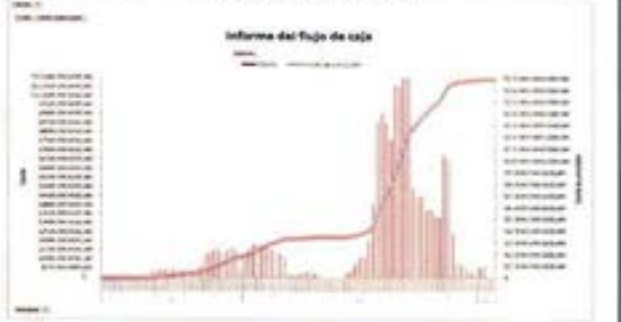

Observaciones: Este flujo de caja se encuentra ajustado a la nueva programación establecida mediante la Modificatoria No. 1.

PROGRAMADO VS EJECUTADO SEMANAL



Observaciones: La gráfica permite evidenciar un incremento progresivo en el atraso acumulado por parte del contratista frente a la programación establecida

AVANCE PROGRAMADO EJECUTADO POR CAPITULO



Observaciones: La gráfica permite evidenciar un incremento progresivo en el atraso acumulado por parte del contratista frente a la programación establecida




ALCALDÍA DE ACACIAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO


ANÁLISIS DE AVANCE

PROGRAMADO VS EJECUTADO

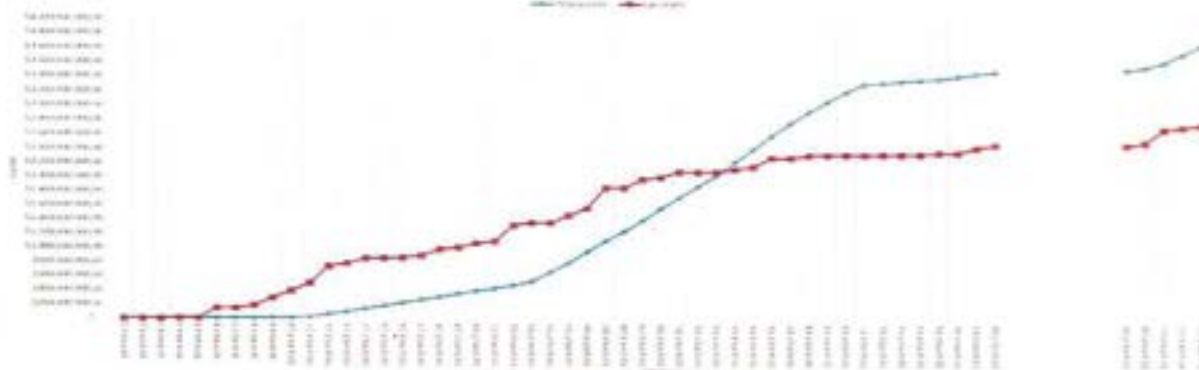

ANÁLISIS DESEMPEÑO DE LA EJECUCIÓN

DESEMPEÑO POR CAPITULOS

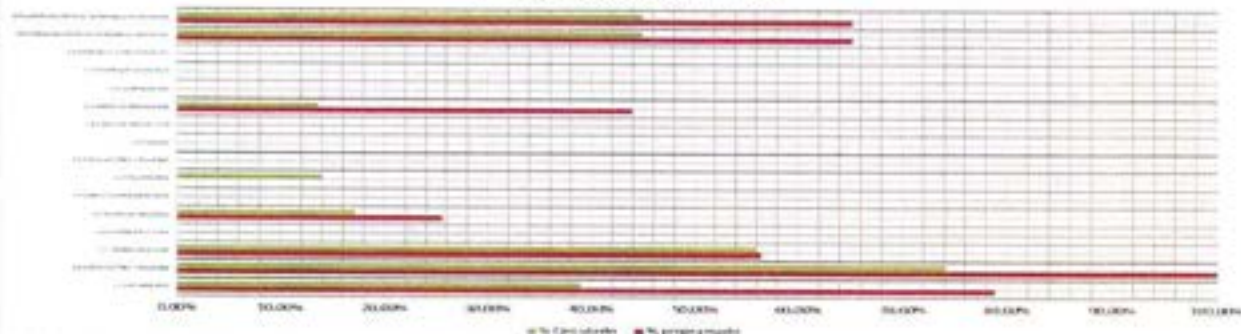

ANÁLISIS PORCENTUAL Y DE RECURSOS

CAPITULO	VALOR CAPITULO INICIAL	%	VALOR MODIFICATORIA	%	VALOR PROG POR CAPITULO	% PROG	VALOR EJECUTADO POR CAPITULO	% EJECUTADO	VALOR PORCENTE POR CAPITULO	ATRASO	ACELERATO	%	
1. CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR	\$ 10,482,798,343.00		\$ 12,292,388,175.00		\$ 3,709,589,832.48	26.87%	\$ 2,695,044,475.00	21.80%	\$ 9,687,323,500.00	-	\$ 1,895,944,945.48	-	-4.17%
1.1. PRELIMINARES	\$ 273,152,713.00	2.61%	\$ 413,732,216.00	3.36%	\$ 328,343,258.96	76.86%	\$ 181,050,443.00	54.90%	\$ 262,690,773.00	-	\$ 165,294,915.96	-	-39.88%
1.2. EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 81,127,895.00	0.77%	\$ 88,786,182.00	0.72%	\$ 56,786,181.87	68.86%	\$ 42,097,430.00	74.12%	\$ 14,688,752.00	-	\$ 14,688,752.00	-	-26.87%
1.3. INFRAESTRUCTURA	\$ 1,270,733,807.00	9.76%	\$ 1,408,352,860.00	8.30%	\$ 794,539,440.00	56.40%	\$ 789,643,773.00	56.07%	\$ 618,710,146.00	-	\$ 4,868,687.20	-	-4.98%
1.4. SUPERESTRUCTURA	\$ 384,786,302.00	3.72%	\$ 375,868,872.00	3.59%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 375,868,872.00	-	\$ -	-	0.00%
1.5. ACERO DE REFUERZO	\$ 8,240,830,636.00	81.42%	\$ 9,907,668,876.00	80.38%	\$ 2,527,368,741.52	29.37%	\$ 1,762,253,036.00	17.18%	\$ 8,208,415,837.00	-	\$ 838,116,799.52	-	-4.32%
1.6. OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 204,944,282.00	1.92%	\$ 204,879,870.00	1.92%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 204,879,870.00	-	\$ -	-	0.00%
2. VAL DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA GUERRASITAS	\$ 2,807,382,000.00		\$ 4,487,891,280.00		\$ 81,101,578.06	2.89%	\$ 28,930,800.00	0.64%	\$ 4,488,970,480.00	-	\$ 62,180,718.06	-	-1.98%
2.1. PRELIMINARES	\$ 1,138,848.00	0.02%	\$ 5,528,216.00	0.02%	\$ -	0.00%	\$ 521,669.00	13.89%	\$ 3,296,349.00	-	\$ -	\$ 521,669.00	13.89%
2.2. EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 880,818,181.00	0.31%	\$ 488,388,324.00	2.71%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 488,388,324.00	-	\$ -	\$ -	0.00%
2.3. PUNAL	\$ 265,719,893.00	2.02%	\$ 31,871,488.00	0.34%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 31,871,488.00	-	\$ -	\$ -	0.00%
2.4. OBRAS DE PROTECCION	\$ 274,528,212.00	2.75%	\$ 1,117,471,863.00	8.98%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 1,117,471,863.00	-	\$ -	\$ -	0.00%
2.5. OBRAS DE DEMOLICION	\$ 189,737,384.00	1.28%	\$ 207,107,128.00	1.02%	\$ 85,948,558.86	43.91%	\$ 28,390,837.00	13.89%	\$ 178,736,496.00	-	\$ 62,598,438.86	-	-36.23%
2.6. UMBRACION	\$ 320,878,141.00	2.38%	\$ 285,470,306.00	1.91%	\$ 152,458.20	0.06%	\$ 38,520.00	0.02%	\$ 285,373,835.00	-	\$ 113,958.20	-	-0.04%
2.7. PAVIMENTO ASFALTICO	\$ 348,485,887.00	3.39%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ -	-	\$ -	\$ -	0.00%
2.8. MUEBLES Y ESPACIO PUBLICO	\$ 485,958,100.00	3.49%	\$ 2,382,194,028.00	13.82%	\$ -	0.00%	\$ -	0.00%	\$ 2,382,194,028.00	-	\$ -	\$ -	0.00%
3. IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 75,000,000.00	0.88%	\$ 75,000,000.00	0.44%	\$ 48,888,027.68	65.19%	\$ 30,790,000.00	40.00%	\$ 41,290,000.00	-	\$ 15,145,027.68	-	-26.97%
4. IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO DE TRAFICO	\$ 30,000,000.00	0.28%	\$ 30,000,000.00	0.24%	\$ 22,817,679.41	76.19%	\$ 15,750,000.00	49.50%	\$ 15,250,000.00	-	\$ 7,567,679.41	-	-38.19%
	\$ 18,438,389,893.00	19.01%	\$ 24,876,238,616.00	10.02%	\$ 3,807,353,948.00	22.79%	\$ 2,775,440,475.00	15.34%	\$ 14,196,753,860.00	-	\$ 11,094,388,373.00	-	-4.48%



DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Siendo las 11:00 horas del día 17 de julio del 2025, se inicia comité técnico de control de obra modo virtual, mediante enlace <https://meet.google.com/lwa-ikae-dwg?hs=224>, convocado por la entidad y con la participación de apoyo a la supervisión, como también del representante del contratista, lo mismo que representante legal de la Interventoría.

La Interventoría da apertura al comité con saludo y verificación de participantes. Se socializa el estado actual del proyecto, el avance frente a la programación, disponibilidad de recursos en obra, actividades ejecutadas y cumplimiento del cronograma.

El estado financiero se resume a continuación:

El avance programado acumulado corresponde a \$3.867.853.848,60, lo que equivale al 22,792% del total contractual, mientras el valor ejecutado acumulado corresponde a \$2.773.465.474,61, representando un avance del 16,343%. En consecuencia, se evidencia un atraso en la ejecución por un valor de \$1.094.388.373,99, correspondiente a una desviación negativa del 6,449% frente a lo programado.

A la fecha, se registra la construcción de 16 pilotes y una viga cabezal y se continúa el armado del acero de refuerzo para la segunda viga cabezal.

Temas para tratar en el presente comité técnico:

- 1.Revisión compromisos acta anterior
- 2.Avanace físico y financiero del proyecto
- 3.Falta de insumos en obra

TEMA 1: Revisión compromisos acta anterior.

- 1.Solicitud Cambio de personal profesional, (No cumple)
- 2.Análisis de parcial No.2, (A decisión del Contratista)
- 3.Actualización de Garantías (Cumple)
- 4.Materiales en obra, (Vigas estructura puente)(No Cumple)
- 5.Socialización con la comunidad(Cumple)
- 6.Información para GESPROY (Cumple)
- 7.Certificados de calidad agregados de concretos(No cumple)
- 8.Procedimientos constructivos de los componentes del proyecto.(No Cumple)
- 9.Planillas seguridad.(No cumple)

INTERVENCIÓN INTERVENTORIA

se da inicio al desarrollo del comité con los temas a tratar en esta reunión y descritos por la interventoría:

1. Solicitud Cambio de personal profesional: La Interventoría comenta que la documentación para la profesional HS cumple con los requisitos, pero está pendiente la entrega de toda la documentación correspondiente al perfil del director de obra que hasta el momento este compromiso ha sido incumplido, pues no nos ha llegado los soportes del director de obra, por lo tanto no tenemos la certeza si se puede aprobar este perfil, por lo tanto, seguimos pendientes de esa entrega de la documentación., la cual debe hacerse de manera inmediata.

2. Análisis de parcial No.2: Comenta la Interventoría este tema queda en manos del contratista quien tome la determinación de presentarla debido que ya se ha insistido en varios comités y a la fecha, el contratista no ha entregado este documento. Por lo tanto, estamos en manos de que el contratista decida y ponga la fecha para la entrega de esa parcial No.2 para iniciar la revisión.

3. actualización de garantías: El contratista ya notifico al correo las pólizas y realizo el cargue a la plataforma de la entidad y estaríamos a la espera de que la entidad las verifique y nos entregue el acta de aprobación de estas pólizas.

4. Materiales en obra, (Vigas estructura puente): En los comités anteriores el contratista propuso una fecha estimada para que el 15 de julio estaría llegando la primera viga a la obra, pero hasta el momento no ha llegado esa estructura que hacen parte del puente. El contratista comenta que se está trabajando en la logística referente a esa actividad con el fin de suministrar estos elementos lo más pronto posible.

5. Socialización con la comunidad: La socialización se realizó sin inconvenientes el día 4 de julio. Todo quedó en orden, incluyendo el registro de la reunión con la asociación, el cual fue debidamente reportado a la Entidad. Queda subsanado este compromiso.



DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

6. Información para GESPROY: Este compromiso fue adquirido por parte de la interventoría el cual ya se dio solución 3 de julio con la entrega del acta de cantidades con los archivos correspondientes. Queda subsanado este compromiso

7. Certificados de calidad agregados de concretos: Estos certificados no han llegado, si, nos hicieron entrega de una granulometría y ficha técnica del concreto, pero certificados que nos garantizan la calidad de los elementos no los han entregado. Por lo tanto no cumple con este compromiso.

8. Procedimientos constructivos de los componentes: Aunque este compromiso no tenía una fecha establecida, se acordó que el contratista presentaría, de manera previa al siguiente comité, un procedimiento en elaboración. Sin embargo, dicho compromiso no fue cumplido.

9. Planillas seguridad: Pese a que el pago de planillas está sujeta a una fecha de pago previamente establecida, este compromiso debe cumplirse con carácter urgente, ya que la fecha límite sería posterior al vencimiento, y se requiere contar con dichas planillas para su inclusión en el informe pendiente correspondiente al mes de junio.

TEMA 2: Avance físico y financiero del proyecto.

La Interventoría continúa con la descripción del estado actual del proyecto, abordando en primer lugar el avance físico y, posteriormente, el estado financiero del contrato.

Se continúa con la descripción del estado actual del proyecto comentando que actualmente, la obra presenta un avance importante en la instalación de materiales estructurales. Ya se ha instalado el acero de los pilotes, así como el acero correspondiente a las vigas cabeceras. En conjunto, se estima un total aproximado de 45 toneladas de acero instaladas, las cuales pueden ser consideradas dentro de los avances físicos reportados hasta la fecha. En cuanto al suministro e instalación de materiales, se reporta un avance significativo en los elementos estructurales, a la fecha, se ha completado la instalación del acero de refuerzo correspondiente a los 16 pilotes, así como el acero de las vigas cabeceras. En conjunto, se estima que el volumen total instalado asciende a aproximadamente 45 toneladas de acero, lo cual representa un avance físico importante.

Con respecto a la maquinaria, se informa que la obra cuenta con,

1 planta eléctrica

2 motobombas

1 retroexcavadora, la cual fue incorporada hace aproximadamente 4 o 5 días y ya se encuentra en operación, ejecutando labores de excavación y remoción de material.

En recurso humano la obra cuenta actualmente con un total de 18 personas asignadas, distribuidas de la siguiente manera:

3 personas del área administrativa

15 personas del área operativa, dentro de las cuales se incluye personal de topografía, oficiales y ayudantes de obra.

Respecto al avance financiero se hizo el análisis en referencia al corte de la semana inmediatamente anterior en este caso corresponde a la semana número 53. Los resultados obtenidos son los siguientes:

Avance de tiempo transcurrido: 61.48%

Avance físico programado acumulado: 22.792%, equivalente a \$3.867.453.848

Avance físico ejecutado acumulado: 16.343%, equivalente a \$2.773.465.474

La comparación entre el avance ejecutado y el programado evidencia un atraso del 6.449%, lo que representa una diferencia económica de \$1.094.338.373. Este desfase muestra una tendencia creciente en la brecha entre lo programado y lo efectivamente ejecutado, situación que ha venido siendo identificada de manera recurrente en los cortes semanales. Por lo tanto, se recomienda intensificar las acciones de control y seguimiento para mitigar el impacto de este atraso en la ejecución global del proyecto.

TEMA 3: Falta de insumos en obra que generan inactividad.

La supervisión consulta a la Interventoría si ha recibido alguna respuesta formal al requerimiento del informe relacionado con el cese de actividades.

Según la información recibida, se habría presentado una suspensión parcial de aproximadamente una semana, situación que, si bien no fue abordada como compromiso en el comité anterior, aún permanece pendiente de aclaración y documentación por parte del contratista.



DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

El contratista manifiesta que la obra no ha estado suspendida durante ocho días, como pudo haberse interpretado. El único incidente ocurrió el 8 de julio, cuando una falla en el transporte de combustible impidió la continuidad por un día. La situación fue superada al día siguiente, y los trabajos continuaron normalmente. Reconozco que no se respondió oportunamente al correo sobre este hecho, ya que en su momento consideré que se trataba de un impase menor que pudo haberse aclarado con una llamada. Sin embargo, asumo la responsabilidad por no haber informado formalmente, y reitero que no se trató de una suspensión formal ni de una afectación significativa al avance del proyecto.

La interventoría comenta que efectivamente, se solicita al contratista un informe formal que explique lo ocurrido. Aunque no se trató de una suspensión oficial, sí hubo una inactividad puntual por falta de combustible, y la Alcaldía ya se pronunció al respecto. El objetivo no es atribuir una suspensión, sino dejar constancia documentada de los hechos, con una justificación clara, que permita a la entidad y a la interventoría darle el tratamiento adecuado en los informes.

INTERVIENE EL CONSORCIO ACACIA

En respuesta a lo señalado por la Interventoría, el contratista confirma que sí existe un compromiso previo para el envío de las vigas metálicas ensambladas en Bogotá. Sin embargo, la entrega no ha sido posible debido a un inconveniente con el transporte de material de relleno necesario para construir la base de recepción.

El contratista contrató recientemente una volqueta local para iniciar movimientos de tierra, lo que generó un bloqueo por parte del gremio de volqueteros del municipio, quienes exigen ser los únicos autorizados para prestar ese servicio. En una reunión reciente, el gremio planteó pretensiones económicas que duplican o triplican el presupuesto del proyecto para transporte de material, solicitando valores cercanos al millón de pesos por viaje.

Dado que se requerirían aproximadamente 450 viajes, esto representaría un costo cercano a los 450 millones de pesos, cifra considerada desproporcionada y no viable dentro del presupuesto del contrato. Este conflicto con el gremio de volqueteros ha impedido el cumplimiento del compromiso de entrega de estructuras metálicas, ya que incluso el equipo y el suministro de material para la base están contratados con la empresa Gravicon.

El contratista solicita la intervención de la Alcaldía para ayudar a resolver esta situación y poder avanzar con las actividades previstas.

En relación con los concretos, se informa que la empresa Gravicon recibió una solicitud de información por parte de la Interventoría. Según Gravicon, ya habían enviado la documentación estándar antes de la fundición de la viga cabecal, y fue la misma que se compartió con ustedes. Sin embargo, la empresa solicita mayor claridad sobre la información requerida, especialmente en lo relacionado con la verificación de resistencia, ya que consideran que podría ser responsabilidad del equipo de obra. Posiblemente hubo falta de precisión en la solicitud, lo que generó confusión.

Respecto a la hoja de vida del nuevo director del proyecto, se aclara que su aceptación estaba condicionada a la renuncia oficial del director anterior, la cual fue entregada hace pocos días. Por ello, la documentación completa del nuevo director debió enviarse ayer o esta mañana. En caso de no haberse hecho, se enviará inmediatamente después de esta reunión.

Respecto a los procedimientos, se informa que actualmente se está elaborando un documento detallado por frentes de trabajo, conforme a lo solicitado por la Interventoría. Cada responsable está recopilando la información técnica correspondiente a su área (iluminación, accesos, estructura metálica, concretos, entre otros), por lo que el proceso toma tiempo. Se están haciendo gestiones internas para consolidar toda la información y remitirla de manera completa.

En cuanto a las planillas de seguridad social, ya se enviaron las correspondientes a meses anteriores. Actualmente se está gestionando con contabilidad la información del mes de junio. Los pagos están al día hasta el mes de la suspensión, y las planillas actualizadas serán compartidas tan pronto se realice el pago correspondiente.

INTERVENCIÓN DE LA INTERVENTORIA

Estas son las observaciones que, por parte de la interventoría, ponemos en conocimiento y que generan preocupación. En dos o tres semanas se proyecta un incremento significativo en el pico de avance del proyecto; sin embargo, bajo la curva actual de ejecución, este aumento implicaría un crecimiento porcentual en los atrasos acumulados. Observamos que, pese a contar con una programación establecida, esta no se ha implementado plenamente. Aunque aún no se contempla el inicio formal de todos los componentes del presupuesto, notamos que el contratista continúa enfocado exclusivamente en la ejecución del puente.



DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

En el último comité, en el que participó el ingeniero Francisco, o posiblemente el ingeniero Alexander, se mencionó que ya estaban llegando las cuadrillas necesarias para iniciar la intervención en la vía, uno de los componentes con mayor peso presupuestal. No obstante, hasta la fecha, no se han iniciado actividades en ese frente. Asimismo, persisten pendientes los componentes de reemplazo o construcción de la red pluvial, así como las obras hidráulicas, los cuales tampoco han sido abordados. Si bien se está interviniendo el componente de mayor peso presupuestal, es importante recordar que dicho presupuesto está distribuido en al menos cuatro o cinco componentes adicionales. De ahí la importancia de contar con los procedimientos constructivos y los informes técnicos que detallen cómo se va a abordar cada uno de estos frentes. Esta situación ha sido comunicada oportunamente a la entidad mediante informes semanales, llamadas, mensajes, y ahora se pone también en conocimiento formal a través de este comité. Quedamos atentos a si, por parte del contratista, el ingeniero Cristian desea complementar o aclarar algo al respecto.

INTERVIENE EL CONSORCIO ACACIA

Aunque aún no se evidencian trabajos físicos avanzados en obra, sí se han realizado gestiones técnicas y de planificación. En los últimos días han estado en sitio los equipos de iluminación, protección hidráulica y alcantarillado. Se aclara que no es falta de premura, sino que se busca evitar interferencias técnicas entre frentes, como podría ocurrir si se construye la vía sin coordinar con el sistema de iluminación. Esta mañana se realizó una reunión de articulación con todos los equipos para definir requerimientos y asegurar un avance coordinado.

Se está evaluando la designación de un "contraamaestre" cuya función será coordinar las necesidades de los diferentes frentes de trabajo, evitando interferencias y posibles reprocesos que afecten la funcionalidad o estética del proyecto. Cada equipo está avanzando en sus tareas, y se han venido gestionando distintas actividades en ese sentido. Se solicita confirmar si se concretó la visita del responsable del sistema de iluminación, prevista entre lunes y martes, para verificar que se esté cumpliendo con la articulación entre los distintos frentes técnicos.

INTERVIENE LA SUPERVISION

La supervisión menciona 4 puntos:

- 1. Seguimiento a los tiempos del contrato:** En primer lugar, quiero expresar la preocupación manifestada por el ingeniero Iván en relación con los tiempos de ejecución. En tres días se cumplirá un mes desde la aprobación de la modificatoria, lo que significa que restan únicamente seis meses para finalizar el proyecto. Consideramos importante redoblar esfuerzos y mantenemos estrictamente dentro del cronograma establecido, ya que la intención es no solicitar nuevas prórrogas ni modificaciones adicionales. Según lo expresado anteriormente por ustedes, este tiempo adicional concedido era el necesario para completar la obra, por lo tanto, esperamos que se cumpla en su totalidad.
- 2. Informe sobre el cese de actividades:** En segundo lugar, quisiéramos consultar si la interventoría ha recibido alguna respuesta formal al requerimiento del informe relacionado con el cese de actividades. Según la información recibida, se presentó una suspensión parcial de aproximadamente una semana, situación que, si bien no fue tratada como compromiso en el comité anterior, sigue pendiente de aclaración y documentación por parte del contratista.
- 3. Consulta sobre ejecución mensual del PMA y PMT:** El ingeniero César, del área de planeación, nos hizo llegar algunas observaciones y preguntas técnicas que consideramos importante trasladar. En particular, se refirió a la ejecución mensual del Plan de Manejo Ambiental (PMA) y del Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Se preguntó por qué estos dos ítems no se están ejecutando mes a mes, considerando que la obra está en curso y que ambos planes deberían tener acciones concretas en cada periodo mensual. Esta recomendación deberá tenerse en cuenta para los siguientes informes y seguimientos.
- 4. Reprogramación del proyecto:** Finalmente, informamos que el día lunes se llevó a cabo una reprogramación del proyecto, en la que se realizaron algunos ajustes menores en precios unitarios, específicamente en los totales que no coincidían. Este asunto ya está siendo atendido directamente con el ingeniero Alexander, quien fue el responsable de elaborar el cronograma de flujo actualizado.

INTERVIENE EL CONSORCIO ACACIA

Aclaro que la obra nunca estuvo suspendida por ocho días, como pudo haberse interpretado. El 8 de julio hubo una dificultad puntual por falta de combustible debido a una avería en el vehículo de transporte, que se solucionó al día siguiente, permitiendo la continuidad del trabajo. Reconozco que debí responder antes al correo sobre este incidente, pero consideré que no era necesario un reporte formal para un problema tan puntual. Aunque la Interventoría debe reportar todas las novedades, este caso pudo haberse aclarado más rápidamente, ya que no afectó el desarrollo general de la obra.



DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Quisiera aclarar que si se están ejecutando las actividades del Plan de Manejo de Tránsito (PMT) y del componente ambiental, conforme a lo establecido en el proyecto. Ayer participé en una reunión con el gremio de volqueteros y llevé a la profesional encargada del componente ambiental, quien sigue trabajando en el sitio según su programa. Por tanto, la percepción de que estas actividades no se realizan podría deberse a una falta de comunicación o reporte, pero no a una omisión, ya que se están cumpliendo los compromisos y documentos presentados al inicio del proyecto.

INTERVIENE LA SUPERVISION

El ingeniero César señala que, aunque mensualmente se reporta el avance financiero, en los últimos 3 o 4 meses no se ha registrado ejecución para el Plan de Manejo Ambiental (PMA) ni para el Plan de Manejo de Tránsito (PMT). Por ello, se insiste en la importancia de concertar entre Interventoría y contratista para validar las cantidades ejecutadas. Puede haber omisiones o errores en el registro, por lo que es vital mantener una comunicación constante para que los informes reflejen fielmente el avance real, corrigiendo esta situación cuanto antes para evitar distorsiones en el seguimiento del proyecto.

INTERVIENE EL CONSORCIO ACACIA

Actualmente estoy con la ingeniera ambiental, quien colabora parcialmente en este proyecto y también en otros de la entidad. Ella confirma haber entregado toda la información ambiental al anterior director del proyecto, pero al parecer este no la trasladó oportunamente, generando el desconocimiento actual. Estoy revisando los archivos para organizar y enviar los documentos faltantes. Aunque no justifico la situación, es importante mencionar que el ingeniero Jacinto tuvo dificultades recurrentes para entregar informes a tiempo, lo que pudo causar estas omisiones. Agradezco la comprensión y nos comprometemos a actualizar toda la información ambiental conforme a lo presentado inicialmente.

INTERVIENE LA SUPERVISION

Voy a compartir pantalla para mostrar exactamente la información que los ingenieros Pedro y Jimmy nos envían mensualmente sobre la ejecución. Por ejemplo, en el reporte correspondiente al mes de junio, que fue recientemente enviado y cargado en el sistema gestor, podemos observar que los ítems de "Implementación del Plan de Manejo Ambiental" y "Plan de Manejo de Tránsito" aparecen con ejecución en cero. Esta misma situación se presenta en los meses anteriores: en el mes 13, abril y marzo, también figuran con valores en cero.

INTERVENCIÓN DE LA INTERVENTORIA

Desde la interventoría realizamos conciliación de cantidades mes a mes. Cuando no contamos con acompañamiento del contratista, cuantificamos únicamente lo que se evidencia en obra. En el caso del PMA y el PMT, si no se implementan de forma adecuada o no se observan avances en campo, se reportan con ejecución en cero. La respuesta a la Secretaría de Planeación es clara: si no se ejecuta ni se verifica in situ, no se puede certificar. Por eso, es fundamental que el contratista coordine con la interventoría la verificación oportuna de estas actividades para evitar discrepancias en los informes.

INTERVIENE EL CONSORCIO ACACIA

Ingeniero, quiero aclarar que, aunque su comentario es válido, no refleja toda la realidad. La ingeniera Tatiana ha cumplido rigurosamente sus funciones; hace menos de ocho días mostró evidencia fotográfica de actividades en campo, que usted mismo validó. Por lo tanto, el problema no es la falta de ejecución, sino posiblemente la presentación de la información. Por ejemplo, aunque el control vial se detuvo temporalmente por la suspensión, la comunidad solicitó su regreso y actualmente hay dos controladoras activas y afiliadas. En resumen, las actividades sí se están realizando según lo comprometido, aunque puede haber fallas en cómo se reportan.

INTERVENCIÓN DE LA INTERVENTORIA

Se reconoce que algunas actividades no se han reportado correctamente debido a fallas en la documentación. Por eso, es clave fortalecer la coordinación en obra con el ingeniero residente. Se propone que el residente presente un listado detallado de actividades y cantidades ejecutadas o registradas, para analizarlas junto con la interventoría y definir qué se puede incluir en los informes mensuales. La invitación es a trabajar de manera conjunta y organizada para incorporar toda ejecución real en los próximos cortes, asegurando una mejor conciliación y seguimiento del proyecto.



DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

Se solicita al contratista un informe formal sobre la inactividad del 8 de julio, detallando qué pasó, la causa y las medidas tomadas. Aunque la Alcaldía pudo interpretar esto como una suspensión, en realidad fue una interrupción puntual por falta de combustible, sin suspensión oficial. El informe busca aclarar los hechos para que la entidad e interventoría puedan darles el tratamiento adecuado. El contratista debe informar las acciones correctivas que adoptará tras el incidente, para que se reporte a la entidad tanto lo ocurrido como las medidas que evitarán que se repita en el futuro. Ese es el objetivo principal del requerimiento.

La interventoría enfatiza la urgencia de recibir los procedimientos constructivos de los demás componentes del proyecto, junto con las fechas de inicio para los frentes viales, fluviales y de obras de protección, y la proyección del componente eléctrico. Preocupa que, a un mes de la modificatoria, no haya avances visibles, lo que aumenta el riesgo de retrasos. Se insta al contratista a iniciar estas actividades y aprovechar el plazo adicional, ya que no se esperan nuevas prórrogas, y cumplir con los compromisos a tiempo.

INTERVIENE EL CONSORCIO ACACIA

Quisiera comentarle al ingeniero Cristian sobre la problemática con el gremio local de volqueteros, que exige tarifas y condiciones muy desfavorables, afectando el equilibrio económico del contrato. Solicito coordinar una reunión para analizar alternativas, y evaluar si es posible contar con respaldo institucional o incluso apoyo de la fuerza pública para permitir el ingreso del material con los vehículos contratados, que son más económicos y necesarios para mantener la viabilidad del proyecto.

El segundo punto es para el ingeniero Jorge. Quisiera confirmar si podemos concretar la reunión acordada para revisar el acta parcial, ya sea en sus oficinas en Villavicencio o en Acacias. Estoy dispuesto a desplazarme el viernes a la hora que les convenga.

INTERVIENE LA SUPERVISION

Voy a escalar este tema de inmediato. Creo que es necesario reunimos con el gremio de volqueteros en Acacias, ya que sus exigencias podrían afectar el normal desarrollo de la obra y parecer prácticas abusivas. Considero que la situación puede manejarse como en un proyecto anterior similar. Informaré a las autoridades competentes y le comunicaré cualquier respuesta para coordinar acciones.

CONCLUSIONES DEL COMITE

•La interventoría expresa preocupación por el enfoque exclusivo en el puente. No hay avances en componentes viales, red pluvial u obras hidráulicas. Se solicita entrega de procedimientos por componente con fechas definidas. Se han informado avances e inconsistencias a la entidad mediante reportes semanales, llamadas y comités.

•El contratista informa sobre bloqueo de volqueteros que impide llegada de vigas, solicita apoyo institucional. Menciona avances técnicos en campo, visitas de frentes de iluminación e hidráulica, y necesidad de mejor articulación. Propone figura de contramaestre para coordinar frentes. Confirma elaboración de procedimientos por componente y gestión de planillas de seguridad social

•La supervisión se manifiesta en cuatro puntos:

- ☐ Preocupación por cronograma, se ha cumplido un mes de modificatoria y restan seis meses.
- ☐ Solicitud de informe formal por cese de actividades del 8 de julio.
- ☐ Pregunta por no ejecución mensual del PMA y PMT, según reportes aparece en ceros.
- ☐ Ajustes menores en la reprogramación del proyecto, coordinados con el ingeniero Alexander.

•La Interventoría aclara que solo se certifica lo evidenciado en obra.

•El contratista admite que las actividades sí se han realizado, pero no se han reportado correctamente. Se acuerda conciliación de cantidades mes a mes en campo.



ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

- Se aclara que la supuesta suspensión fue una inactividad por falta de combustible. Se solicita informe detallado.
- La Interventoría exige definición de fechas de inicio para frentes viales, fluviales y eléctricos.
- Se discute tema de exigencias con los gremios volqueteros, contratista solicita reunión de apoyo institucional para buscar una salida.

No habiendo más intervenciones, se da por finalizada la sesión.

B. COMPROMISOS PACTADOS

	FECHA	RESPONSABLES
1 Solicitud Cambio de personal profesional	17 de julio de 2025	Contratista
2 Certificados de calidad agregados de concretos	21 de julio de 2025	Contratista
3 Procedimientos constructivos de los componentes	22 de julio de 2025	Contratista
4 Planillas seguridad	21 de julio de 2025	Contratista
5 Oficio aclaratorio de interrupción de actividades a falta de insumos	21 de julio de 2025	Contratista
6 Gestión de acercamiento con el gremio de volqueteros	22 de julio de 2025	Entidad
7		
8		
9		
0		

VII. PRÓXIMA REUNIÓN

FECHA
DÍA MES AÑO

Para constancia de lo anterior, se firma acta asistencia de la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

Diecisiete (17)

(Día en letras)

días del mes de

Julio

de

2025

(Día en que se firma el acta)



REGISTRO FOTOGRAFICO DEL COMITE REALIZADO



ALCALDÍA DE
ACACÍAS

ACTA COMITÉ DE SEGUIMIENTO ACTIVIDADES DEL CONTRATO
REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL COMITÉ REALIZADO



	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

9.3 Informes semanales



PERIODO No. 12
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:
CONTRATO DE INTERVENTORA No. 1

DEL 30/06/2025 AL 30/07/2025
12/07/2025
979 DE 2023

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORA

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORA: No. CONTRATO: 979 DE 2023
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CARO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: No. CONTRATO: 929 DE 2023
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CARO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO ACADA RL FRANCISCO MORA SUTERREZ NIT 901.767.400-0
INTERVENOR: JORGE ALBERTO RODRIGUEZ REINA NIT 9.556.796-1
SUPERVISIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INGENIERO IVAN RAFAEL ROJAS NOVOA
APOYO A LA SUPERVISIÓN INGENIERO CRISTIAN EDUARDO PUEBLES AMADO
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 27 DE 5 DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 26 DE 4 DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN MODIFICATORIA No.1: 20 DE 1 DE 2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
VALOR INICIAL	\$ 13.430.269.893.00	VALOR INICIAL	\$ 627.061.767.00
VALOR MODIFICATORIA No.1	\$ 16.970.256.458.00	VALOR MODIFICATORIA No.1	\$ 916.733.882.00

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA EN EJECUCIÓN

ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA EN EJECUCIÓN

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023

ANÁLISIS SEGUN REPROGRAMACIÓN DE OBRA (SEGUN PLAZO TRANSCURRIDO)			EJECUTADO		
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO	TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO
% Obra Programada	22.62%	22.62%	% Obra Ejecutada	0.193%	16.123%
Valor de la Obra Programada	\$ 115.722.746.33	\$ 3.746.364.773.20	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 32.685.200.00	\$ 2.736.090.543.72

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMADO SEGUN ACTA DE INICIO CAPITULO	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN (- ATRASO + ADELANTO)	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CAPITULO
1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR	29.11%	21.89%	-7.21%	El contratista registra un avance de 16 pilotes constructivos y desmontados en ambos extremos del puente, una viga cabecal en el extremo Palmar y continúa con el armado de los pilotes para la construcción de las vigas cabecal del extremo Quebraditas. No obstante, a pesar de estos avances, la ejecución del proyecto presenta un atraso respecto al cronograma establecido.
1.1 PRELIMINARES	76.67%	30.77%	-45.89%	El contratista realizó las excavaciones y descargas en las áreas de operación. También realizó parte de la modificación en la adecuación de las plataformas y se realizó manejo de aguas de las excavaciones con moldes.
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	100.00%	74.12%	-25.87%	El contratista realizó las excavaciones para realizar el desmonte de todos los 16 pilotes, y para la construcción de la viga cabecal. Sin embargo este capítulo registra un atraso.
1.3 INFRAESTRUCTURA	90.94%	56.07%	-34.87%	A la fecha se han construido 16 pilotes en ambos extremos del puente y una viga cabecal en el extremo sur. Palmar. Asimismo, se avanza con el armado de los aceros de refuerzo para la viga cabecal del extremo Quebraditas.
1.4 SUPERESTRUCTURA	0.00%	0.00%	0.00%	Según el cronograma se espera que ya del inicio de corte y encuentro de los aceros estructurales para las vigas del puente.
1.5 ACERO DE REFUERZO	25.37%	17.16%	-8.21%	Se tiene acero instalado en los 16 pilotes constructivos como también el acero de las vigas cabecales, y una viga cabecal y se está realizando el armado de acero para la viga cabecal. Este capítulo registra un atraso debido a actividades no programadas que están incluidas en la modificación.
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	0.00%	0.00%	0.00%	No se han ejecutado actividades de este capítulo.
2. VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRADITAS	1.72%	0.10%	-1.62%	Debido a este componente, el contratista presentó los diseños correspondientes a los capítulos de Pavimentación, Adecuación, Obras Puntuales y Obras de Protección, los cuales fueron aprobados por la Entidad mediante la Modificación No. 1. Asimismo, se encuentran en proceso de planificación las actividades necesarias para dar inicio a la ejecución de estos capítulos.
2.1 PRELIMINARES	0.00%	15.89%	15.89%	El contratista ya presentó un diseño de la vía principal desde el puente hacia el centro urbano de Quebraditas y la traza desde el puente hacia la vía Palmar, el cual se encuentra aprobado mediante modificación No. 1, ya se tiene un levantamiento topográfico inicial y está ejecutando de acuerdo a la reprogramación.
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	0.00%	0.00%	0.00%	No se han ejecutado actividades de este capítulo.
2.3 PLUVIAL	0.00%	0.00%	0.00%	No se han ejecutado actividades correspondientes a este capítulo; sin embargo, se cuenta con un nuevo diseño aprobado mediante la Modificación No. 1, el cual será implementado conforme a la reprogramación establecida.
2.4 OBRAS DE PROTECCIÓN	0.00%	0.00%	0.00%	No se han ejecutado actividades correspondientes a este capítulo; sin embargo, se cuenta con un nuevo diseño aprobado mediante la Modificación No. 1, el cual será implementado conforme a la reprogramación establecida.
2.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN	37.37%	1.94%	-35.43%	Las actividades de demolición del puente continúan sujetas a la falta de condiciones seguras para trabajos en altura y al cumplimiento de requisitos ambientales. Aunque el contratista ya presentó el plan de manejo ambiental, la demolición no se ha finalizado, dado que se ha priorizado la modificación de un poco provisional y temporal para la comunidad. No obstante, se tiene previsto reanudar estas labores en el corto plazo.
2.6 LAMINACIÓN	0.04%	0.02%	-0.02%	No se han ejecutado actividades correspondientes a este capítulo; sin embargo, se cuenta con un nuevo diseño aprobado mediante la Modificación No. 1, el cual será implementado conforme a la reprogramación establecida.
2.7 PAVIMENTO ASFALTICO	0.00%	0.00%	0.00%	No se han ejecutado actividades correspondientes a este capítulo; sin embargo, se cuenta con un nuevo diseño aprobado mediante la Modificación No. 1, el cual será implementado conforme a la reprogramación establecida.
2.8 ANCHOS Y ESPACIO PÚBLICO	0.00%	0.00%	0.00%	No se han ejecutado actividades correspondientes a este capítulo; sin embargo, se cuenta con un nuevo diseño aprobado mediante la Modificación No. 1, el cual será implementado conforme a la reprogramación establecida.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	43.86%	40.00%	-3.86%	Se ha realizado implementación del PMA, sin embargo este capítulo presenta atraso.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	43.86%	40.00%	-3.86%	Se ha realizado implementación del PMT, sin embargo este capítulo presenta atraso.

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Para este corte semanal se registra la construcción de 16 pilotes, distribuidos en 8 pilotes en el extremo del costado Palmar y 8 pilotes en el extremo del costado Quebraditas, así como la construcción de la viga cabecal del extremo Palmar y se continúa con la instalación de los aceros de refuerzo para la viga cabecal del extremo Quebraditas. La programación acumulada de obra a la fecha corresponde a un 22.62%, equivalente a \$3.746.364.773,20, mientras que el avance ejecutado alcanza un 16.123 %, correspondiente a \$2.736.090.543,72. Esto evidencia un retraso del -5.503%, que en términos monetarios representa - \$1.010.274.228,48, reflejando un atraso en la ejecución respecto a lo programado para este corte.



PERIODO No. 01
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

DEL 30/06/2025 AL 30/06/2025
01/07/2025
979 DE 2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES:

- En el presente corte semanal, el contrato de obra continúa con la preparación de la logística, el almacenamiento de equipos y la organización del personal necesario para dar inicio a la ejecución bajo las nuevas condiciones establecidas en la Modificación No. 1.
- Del análisis correspondiente a este corte, se evidencia un atraso, debido a que aún no se han cuantificado algunas cantidades de obra ya ejecutadas, las cuales se encuentran en proceso de cálculo con el fin de determinar sus volúmenes y ser incluidas en los siguientes cortes semanales.
- Persisten dificultades en el trazo de aguas en las excavaciones para la construcción de las vigas cebra, ocasionadas por el elevado caudal del río Irbid, lo que dificulta su adecuada ejecución. Esta situación se ve agravada por la temporada invernal, que mantiene altos los niveles freáticos.
- Se recomienda al contratista implementar de manera inmediata la reprogramación de las actividades, con el fin de mitigar el aumento del atraso y optimizar el cumplimiento del cronograma establecido.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la Interventoría contratada y el cumplimiento de las obligaciones contractuales, en la ciudad de Acacias, a las

SETE

Y

DE

2025

2025

[Firma]
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



ALCALDÍA DE ACACIAS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 53 DEL 7/07/2025 AL 13/07/2025
 FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME: 14/07/2025
 CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 929 DE 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. CONTRATO: 929 DE 2023
 INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: No. CONTRATO: 929 DE 2023
 CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO ACACIA RL FRANCISCO MORA GUTIERREZ NT 901.767.420-0
 INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NT 9.658.796-1

SUPERVISIÓN SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA INGENIERO IVAN MIKURDIO ROJAS NOVOA

APOYO A LA SUPERVISIÓN INGENIERO CRISTIAN EDUARDO FUENTES ARANGO

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 27 DE 5 DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 26 DE 4 DE 2025

NUOVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN MODIFICATORIA No.1: 20 DE 1 DE 2026

Control de Obra

Control de Interventoría

VALOR INICIAL \$ 13.430.269.893,00

VALOR INICIAL \$ 627.081.787,00

VALOR MODIFICATORIA No.1 \$ 16.970.258.458,00

VALOR MODIFICATORIA No.1 \$ 918.733.882,00

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA EN EJECUCIÓN

ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA EN EJECUCIÓN

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023

ANÁLISIS SEGUN REPROGRAMACIÓN DE OBRA (SEGUN PLAZO TRANSCURRIDO)				EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
% Obra Programada	0,716%	22,792%	% Obra Ejecutada	0,220%	16,343%
Valor de la Obra Programada	\$ 121.489.078,40	\$ 3.867.853.848,60	Valor de la Obra Ejecutada	\$ 37.374.930,88	\$ 2.773.485.474,61

FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMADO SEGUN ACTA DE INICIO CAPITULO	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN (- ATRASO + ADELANTO)	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CAPITULO
1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR	29,37%	21,60%	-8,77%	El contratista registra un avance de 18 pilotes construidos y descastados en ambos extremos del puente, una viga cabecal en el extremo Palomas y continúa con el armado de las aceras para la construcción de los viga cabecal del extremo Quebraditas. No obstante, a pesar de estos avances, la ejecución del proyecto presenta un atraso respecto al cronograma establecido.
1.1 PRELIMINARES	78,88%	38,80%	-40,82%	El contratista realizó las excavaciones y descargas en las áreas de operación. También realizó parte de la canalización en la abstracción de las plataformas y se realizó manejo de aguas de las excavaciones con mampuestas. Este capítulo registra un atraso.
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	100,00%	74,12%	-25,87%	El contratista realizó las excavaciones para realizar el descastado de todos los 18 pilotes, y para la construcción de la viga cabecal. Sin embargo este capítulo registra un atraso.
1.3 INFRAESTRUCTURA	98,42%	98,07%	-0,35%	A la fecha se han construido 18 pilotes en ambos extremos del puente y una viga cabecal en el extremo sentido Palomas. Actualmente, se avanza con el armado de las aceras de refuerzo para la viga cabecal del extremo Quebraditas.
1.4 SUPERESTRUCTURA	0,00%	0,00%	0,00%	Según el contratista comentó que ya está iniciando el corte y ensamble de las aceras estructurales para las vigas del puente.
1.5 ACERO DE REFUERZO	25,01%	17,18%	-8,23%	Se tiene acero instalado en los 18 pilotes construidos como también el acero de las cornisas peritadas, y una viga cabecal y se está realizando el armado de acero para la viga cabecal. Este capítulo registra un atraso debido a cantidades no cuantificadas que están incluidas en la modificación.
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	0,00%	0,00%	0,00%	No se ha ejecutado actividades de este capítulo.
2. VIAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRADITAS	2,00%	0,64%	-1,36%	Como de esta componente, el contratista presentó los diseños correspondientes a los capítulos de Pavimentación, Alumbrado, Drenaje Pluvial y Obras de Protección, los cuales fueron aprobados por la Entidad mediante la Modificatoria No. 1. Sin embargo el contratista no ha iniciado la ejecución de estos capítulos.
2.1 PRELIMINARES	0,00%	13,89%	13,89%	El contratista ya presentó un diseño de la vía principal desde el puente hasta el centro poblado de Quebraditas y la conexión desde el puente hasta la vía Palomas, el cual se encuentra aprobado mediante modificatoria No. 1, ya se tiene un levantamiento topográfico inicial y será ejecutado de acuerdo a la reprogramación.
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	0,00%	0,00%	0,00%	No se ha ejecutado actividades de este capítulo.
2.3 PLUVIAL	0,00%	0,00%	0,00%	No se han ejecutado actividades correspondientes a este capítulo; sin embargo, se cuenta con un nuevo diseño aprobado mediante la Modificatoria No. 1, el cual será implementado conforme a la reprogramación establecida.
2.4 OBRAS DE PROTECCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	No se han ejecutado actividades correspondientes a este capítulo; sin embargo, se cuenta con un nuevo diseño aprobado mediante la Modificatoria No. 1, el cual será implementado conforme a la reprogramación establecida.
2.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN	43,91%	13,89%	-30,22%	Las actividades de demolición del puente continúan suspendidas debido a la falta de condiciones seguras para trabajos en altura y el cumplimiento de medidas ambientales. Aunque el contratista ya presentó el plan de manejo ambiental, la demolición no se ha finalizado, dato que se ha priorizado la habilitación de un paso provisional y temporal para la comunidad. No obstante, se tiene previsto reanudar estas labores en el corto plazo.
2.6 ILUMINACIÓN	0,00%	0,00%	-0,00%	No se han ejecutado actividades correspondientes a este capítulo; sin embargo, se cuenta con un nuevo diseño aprobado mediante la Modificatoria No. 1, el cual será implementado conforme a la reprogramación establecida.
2.7 PAVIMENTO ASFALTICO	0,00%	0,00%	0,00%	No se han ejecutado actividades correspondientes a este capítulo; sin embargo, se cuenta con un nuevo diseño aprobado mediante la Modificatoria No. 1, el cual será implementado conforme a la reprogramación establecida.
2.8 ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO	0,00%	0,00%	0,00%	No se han ejecutado actividades correspondientes a este capítulo; sin embargo, se cuenta con un nuevo diseño aprobado mediante la Modificatoria No. 1, el cual será implementado conforme a la reprogramación establecida.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	65,19%	45,00%	-20,19%	No se ha realizado implementación del PMA, sin embargo este capítulo presenta atraso.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRANSITO	65,19%	45,00%	-20,19%	No se ha realizado implementación del PNT, sin embargo este capítulo presenta atraso.

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Para este corte semanal se registra la construcción de 18 pilotes, distribuidos en 8 pilotes en el costado Palomas y 8 pilotes en el costado Quebraditas, asimismo la construcción de la viga cabecal del extremo Palomas y se continúa con la instalación de los aceros de refuerzo para la viga cabecal del extremo Quebraditas. La programación acumulada de obra a la fecha corresponde a un 22,972 %, equivalente a \$3.867.853.848,60, mientras que el avance ejecutado alcanza un 16,343 %, correspondiente a \$2.773.485.474,61. Esto evidencia un retraso del -8,449%, que en términos monetarios representa - \$1.094.368.373,99, reflejando un atraso en la ejecución respecto a lo programado para este corte.



ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

PERIODO No: 52
FECHA DE ELABORACIÓN DE INFORME:
CONTRATO DE INTERVENTORIA No:

DEL 14/07/2025 AL 19/07/2025
14/07/2025
978 DE 2023

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO



OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

- En el presente corte semanal, el contrato de obra continúa con la preparación de la logística, el alistamiento de equipos y la organización del personal necesario para dar inicio a la ejecución bajo las nuevas condiciones establecidas en la Modificatoria No. 1.
- Del análisis correspondiente a este corte, se evidencia un atraso con tendencia a aumentar progresivamente.
- Persisten dificultades en el manejo de aguas en las excavaciones para la construcción de las vigas cabecera, ocasionadas por el elevado caudal del río Arriba, lo que dificulta su adecuada evacuación. Esta situación se ve agravada por la temporada invernal, que mantiene altos los niveles freáticos.
- Se recomienda al contratista implementar de manera inmediata la reprogramación de las actividades, con el fin de mitigar el aumento del atraso y optimizar el cumplimiento del cronograma establecido.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoría contratada y el cumplimiento de las obligaciones establecidas contractualmente, en la ciudad de Acacías, a los

QUINCE

DE

DE

2025
[Firma]
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PERIODO No. 54 DEL 14/07/2023 AL 20/07/2023
FECHA DE ELABORACION DE INFORME: 21/07/2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 978 DE 2023

1. ANTECEDENTES

OBJETO CONTRATO DE INTERVENTORIA: No. CONTRATO: 978 DE 2023
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

OBJETO CONTRATO DE OBRA ASOCIADO: No. CONTRATO: 929 DE 2023
CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

CONTRATISTA: CONSORCIO ACACIA RL FRANCISCO MORA GUTIERREZ **NT** 901.767.430-0

INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA **NT** 9.658.796-1

SUPERVISIÓN SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA INGENIERO IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

APOYO A LA SUPERVISIÓN INGENIERO CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO

FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 27 DE 5 DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONTRATO: 28 DE 4 DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN SEGUN MODIFICATORIA No. 1: 20 DE 1 DE 2025

Contrato de Obra		Contrato de Interventoría	
VALOR INICIAL	\$ 13.430.269.893,00	VALOR INICIAL	\$ 627.081.787,00
VALOR MODIFICATORIA No.1	\$ 16.970.259.458,00	VALOR MODIFICATORIA No.1	\$ 918.733.882,00

ESTADO DEL CONTRATO DE OBRA EN EJECUCION

ESTADO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA EN EJECUCION

2. AVANCES DEL CONTRATO DE OBRA 929 DE 2023

ANÁLISIS SEGUN REPROGRAMACION DE OBRA (SEGUN PLAZO TRANSCURRIDO)				EJECUTADO	
TOTAL CONTRATO	SEMANAL	ACUMULADO		SEMANAL	ACUMULADO
% Obra Programada	1,235%	24,027%		4,542%	25,808%
Valor de la Obra Programada	\$ 209.513.451,66	\$ 4.677.367.315,26		Valor de la Obra Ejecutada	\$ 775.830.967,48
					\$ 3.531.233.944,59
FRENTE DE TRABAJO	% PROGRAMADO SEGUN ACTA DE INICIO CAPITULO	% EJECUTADO (FÍSICO)	% VARIACIÓN (- ATRASO + ADELANTO)	ACTIVIDADES REALIZADAS Y POR REALIZAR PARA GARANTIZAR LA EJECUCIÓN DEL CAPITULO	
1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR	31,54%	27,87%	-3,67%	El contratista registra un avance de 16 pilotes constructores y descañados en ambos extremos del puente, una viga cabecera en el extremo Palomas y continúa con el armado de los aceros para la construcción de las vigas cabeceras del extremo Quebraditas. No obstante, a pesar de estos avances, la ejecución del proyecto presenta un atraso respecto al cronograma establecido.	
1.1 PRELIMINARES	81,58%	48,32%	-33,76%	El contratista realiza las excavaciones y descañados en los sitios de operación. También realiza parte de la canalización en la adecuación de las plataformas y se realizó manejo de agua de las excavaciones con moldes. Este capítulo registra un atraso.	
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	100,00%	88,76%	-11,24%	El contratista realiza las excavaciones para realizar el descañado de todos los 16 pilotes, y para la construcción de la viga cabecera. Sin embargo este capítulo registra un atraso.	
1.3 INFRAESTRUCTURA	67,60%	65,44%	-2,16%	A la fecha se han construido 16 pilotes en ambos extremos del puente y una viga cabecera en el extremo Palomas. Actualmente, se avanza con el armado de los aceros de refuerzo para la viga cabecera del extremo Quebraditas y los muros base de las vigas Palomas.	
1.4 SUPERESTRUCTURA	0,00%	0,00%	0,00%	Según el contratista comenta que ya dio inicio el corte y ensamblaje de los aceros estructurales para las vigas del puente.	
1.5 ACERO DE REFUERZO	25,79%	24,61%	-1,18%	Se tiene acero instalado en los 16 pilotes constructores como también el acero de los ramblas perfiles, y una viga cabecera y se está realizando el armado de acero para la otra viga cabecera. Este capítulo registra un atraso debido a cantidades no justificadas que están incluidas en la modificación.	
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	0,00%	0,00%	0,00%	No se han ejecutado actividades de este capítulo.	
2. VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRADITAS	2,33%	0,64%	-1,69%	Dentro de este componente, el contratista presentó los diseños correspondientes a los capítulos de Pavimentos, Iluminación, Drenaje Pluvial y Obras de Protección, los cuales fueron aprobados por la Entidad mediante la Modificación No. 1. Sin embargo el contratista no ha iniciado la ejecución de estos capítulos.	
2.1 PRELIMINARES	0,00%	13,89%	13,89%	El contratista ya presenta un diseño de la vía principal desde el puente hacia el centro poblado de Quebraditas y la tracción desde el puente hacia la vía Palomas, el cual se encuentra aprobado mediante modificación No. 1, ya se tiene un levantamiento topográfico inicial y se está ejecutando de acuerdo a la reprogramación.	
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	0,00%	0,00%	0,00%	No se han ejecutado actividades de este capítulo.	
2.3 PLUVIAL	0,00%	0,00%	0,00%	No se han ejecutado actividades correspondientes a este capítulo, sin embargo, se cuenta con un nuevo diseño aprobado mediante la Modificación No. 1, el cual será implementado conforme a la reprogramación establecida.	
2.4 OBRAS DE PROTECCIÓN	0,00%	0,00%	0,00%	No se han ejecutado actividades correspondientes a este capítulo, sin embargo, se cuenta con un nuevo diseño aprobado mediante la Modificación No. 1, el cual será implementado conforme a la reprogramación establecida.	
2.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN	50,46%	13,89%	-36,76%	Las actividades de demolición del puente continúan suspendidas debido a la falta de condiciones seguras para trabajos en altura y al cumplimiento de requisitos ambientales. Aunque el contratista ya presentó el plan de manejo ambiental, la demolición no se ha finalizado, dado que se ha priorizado la construcción de un paso provisional y temporal para la comunidad. No obstante, se tiene previsto reanudar estas labores en el corto plazo.	
2.6 ILUMINACIÓN	0,08%	0,02%	-0,06%	No se han ejecutado actividades correspondientes a este capítulo, sin embargo, se cuenta con un nuevo diseño aprobado mediante la Modificación No. 1, el cual será implementado conforme a la reprogramación establecida.	
2.7 PAVIMENTO ASFÁLTICO	0,00%	0,00%	0,00%	No se han ejecutado actividades correspondientes a este capítulo, sin embargo, se cuenta con un nuevo diseño aprobado mediante la Modificación No. 1, el cual será implementado conforme a la reprogramación establecida.	
2.8 ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO	0,00%	0,00%	0,00%	No se han ejecutado actividades correspondientes a este capítulo, sin embargo, se cuenta con un nuevo diseño aprobado mediante la Modificación No. 1, el cual será implementado conforme a la reprogramación establecida.	
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	88,46%	52,30%	-36,16%	Se ha realizado implementación del PMA, sin embargo este capítulo presenta atraso.	
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	88,46%	52,30%	-36,16%	Se ha realizado la implementación del PMT, sin embargo este capítulo presenta atraso.	

3. RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Para el presente conteo semanal se reporta la construcción de 16 pilotes, distribuidos equitativamente entre los extremos de los costados Palomas (8 pilotes) y Quebraditas (8 pilotes). Asimismo, se ejecutó la viga cabecera del extremo Palomas y se avanzó en la instalación del acero de refuerzo para la viga cabecera del extremo Quebraditas, así como en los muros base de alas del extremo Palomas. La programación acumulada de obra a la fecha corresponde al 24,027%, equivalente a \$4.677.367.315,26, mientras que el avance físico ejecutado alcanza el 25,808%, correspondiente a \$3.531.233.944,59. Esto representa un retraso del -3,218%, equivalente a -\$548.133.465,67, lo cual evidencia un desfase en la ejecución frente a lo programado, aunque con una disminución del atraso respecto a la semana anterior.




ALCALDÍA DE ACACIAS

PERIODO No. 34
FECHA DE ELABORACION DE INFORME:
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

DEL 14/07/2025 AL 20/07/2025
21/07/2025
978 DE 2023

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORIA

4. REGISTRO FOTOGRÁFICO

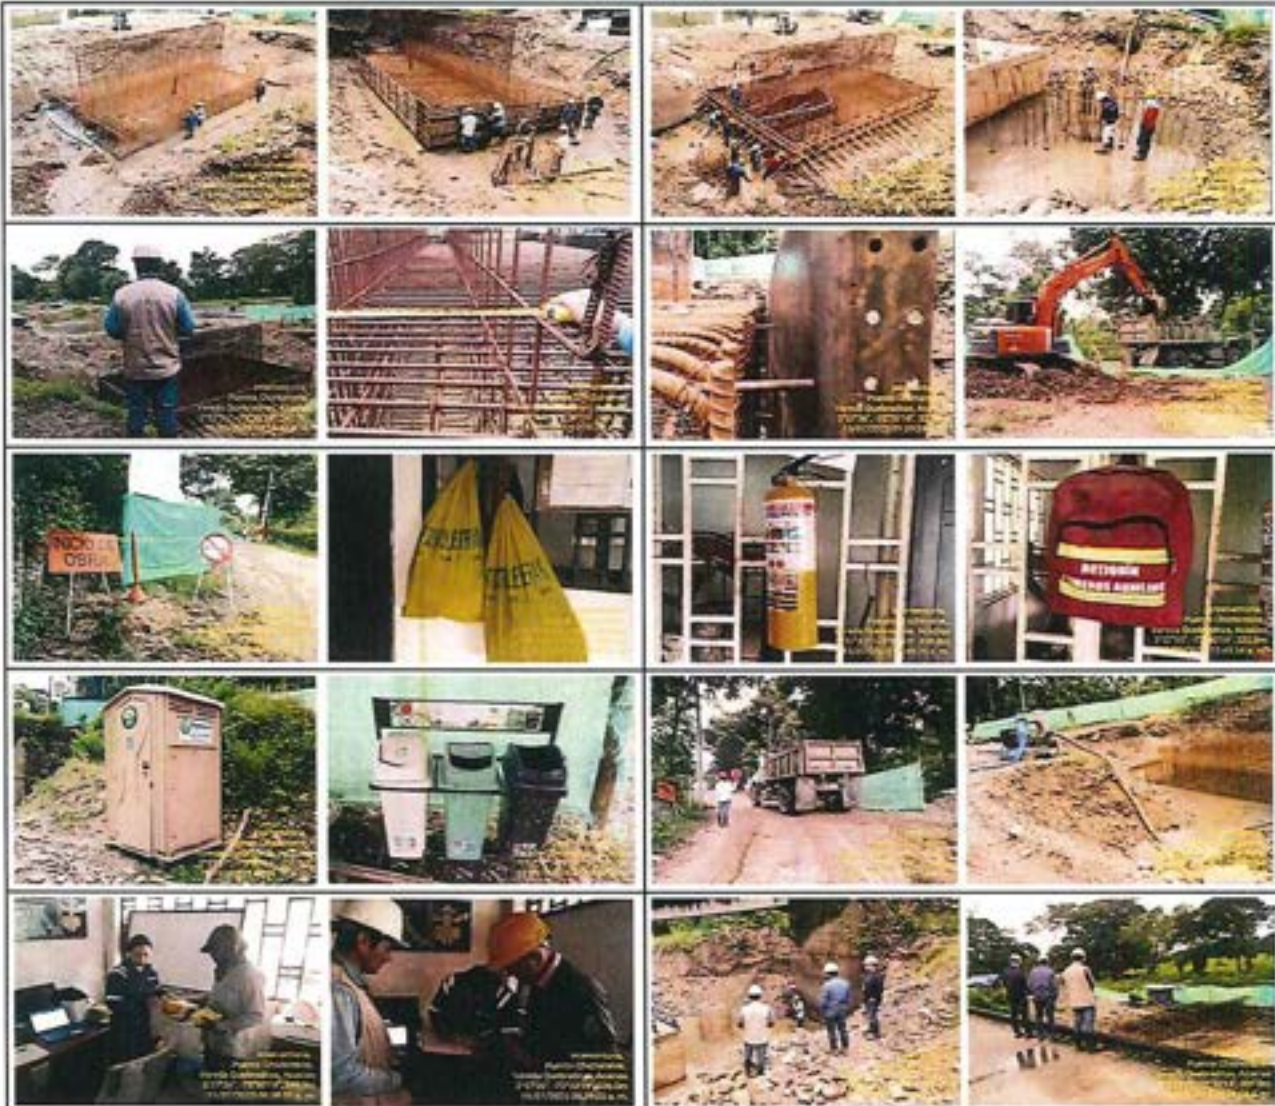

OBSERVACIONES Y/O RECOMENDACIONES:

- En el presente corte semanal, el control de obra continúa con la preparación de la logística, el almacenamiento de equipos y la organización del personal necesario para dar inicio a la ejecución bajo las nuevas condiciones establecidas en la Modificatoria No. 1.
 - Del análisis correspondiente a este corte, se evidencia un disminución en el atraso con respecto al corte semanal anterior.
 - Perseverar dificultades en el manejo de aguas en las excavaciones para la construcción de las vigas laterales, ocasionadas por el elevado caudal del nivel freático, lo que dificulta su adecuada evacuación. Esta situación se ve agravada por la temporada invernal, que mantiene altos los niveles freáticos.
 - Se recomienda al contratista implementar de manera inmediata la reprogramación de las actividades, con el fin de mitigar el aumento del atraso y optimizar el cumplimiento del cronograma establecido.
- NOTA: En el presente corte semanal se ajustan algunas cantidades que, debido a errores de cálculo, habían sido reportadas de forma incorrecta. Una vez identificadas y corregidas dichas inconsistencias, se modifican las cifras de avance en un porcentaje porcentual a partir de la semana No. 38. Los ítems ajustados fueron el ítem 1.2.2 y el ítem 1.3.1, los cuales presentaban cifras de ejecución superiores a las aprobadas en la modificatoria.

Para constancia de lo anterior, se firma el presente informe bajo la responsabilidad de la interventoría contratada por el contratista, en la ciudad de Acacias, a los

VEINTINO 21

DE

JULIO

2025

(Firma)
DIRECTO DE INTERVENTORIA



ALCALDÍA DE ACACIAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

1. FECHA ELABORACIÓN: 28 7 2023 2. No. INFORME 55 3. SEMANA No. 55 21 al 27 Julio

4. PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

5. SUPERVISOR: Ing. IVAN MAURICIO ROJAS

A. DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS

6. CONTRATO OBRA No: 929-2023 7. FECHA CONTRATO: 27 12 2023 8. VALOR CONTRATO: \$ 13.430.269.893,00
9. FECHA ACTA INICIO: 27 5 2024 10. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 1 2026 11. PLAZO: 18 Meses
12. PRORROGAS: 210 13. SUSPENSIONES: 54 días 14. ADICIONES: \$ 3.539.989.565,00
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
16. CONTRATISTA: CONSORCIO ACACIA
17. CONTRATO INTEVENTORIA No: 978-2023 18. FECHA CONTRATO: 27 12 2023 19. VALOR CONTRATO: \$ 627.061.787,00
20. FECHA ACTA INICIO: 27 5 2024 21. FECHA DE TERMINACIÓN: 20 1 2026 22. PLAZO: 18 Meses
23. PRORROGAS: 210 24. SUSPENSIONES: 54 días 25. ADICIONES: \$ 251.652.095,00
26. INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
27. APOYO A LA SUPERVISION: INGENIERO CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPITULO SEGÚN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERÍODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR	34,73%	29,41%	Construidos 16 pilotes y 2 vigas cabezal	Presentar un atraso respecto al cronograma de programación.
1.1 PRELIMINARES	83,29%	48,47%	Avance en descripción y parametrización de las actividades.	Este capítulo registra un atraso.
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	100,00%	73,45%	Excavación para formaleas de zapatas.	Este capítulo registra un atraso.
1.3 INFRAESTRUCTURA	79,47%	67,79%	Armado de aceros zapata aletas, lado Palomas	Este capítulo registra un atraso.
1.4 SUPERESTRUCTURA	1,31%	0,00%	Ya dio inicio el corte y ensamble de vigas	Este capítulo registra un atraso.
1.5 ACERO DE REFUERZO	27,94%	24,61%	Armado y encofrado de zapata, lado Palomas	Este capítulo registra un atraso.
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	0,00%	0,00%	Sin ejecución en este capítulo.	Este capítulo registra un atraso.
2. VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO	2,67%	0,66%	Indicaciones para el replanteo de la obra.	Este capítulo registra un atraso.
2.1 PRELIMINARES	46,67%	34,72%	Replanteo vial del diseño aprobado	Este capítulo registra un atraso.
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	0,00%	0,00%	Ejecución de acuerdo a la reprogramación.	Este capítulo registra un atraso.
2.3 PLUVIAL	0,00%	0,00%	Ejecución de acuerdo a la reprogramación.	Este capítulo registra un atraso.
2.4 OBRAS DE PROTECCIÓN	0,00%	0,00%	Ejecución de acuerdo a la reprogramación.	Este capítulo registra un atraso.
2.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN	56,99%	13,69%	Demolición de muros de mampostería por uso privativo.	Este capítulo registra un atraso.
2.6 ELIMINACIÓN	0,10%	0,02%	Ejecución de acuerdo a la reprogramación.	Este capítulo registra un atraso.
2.7 PAVIMENTO ASFÁLTICO		0,00%	Ejecución de acuerdo a la reprogramación.	Este capítulo registra un atraso.
2.8 ANDENS Y ESPACIO PÚBLICO	0,00%	0,00%	Diseño aprobado; ejecución según reprogramación	Este capítulo registra un atraso.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	67,77%	54,88%	Se ha realizado implementación permanente	Este capítulo registra un atraso.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	67,77%	54,88%	Se ha realizado implementación permanente	Este capítulo registra un atraso.
TOTAL				


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	Ejecutado	Programado	Atraso(-) Adelanto (+)
Acumulado anterior	\$ 3.531.233.644,29	\$ 4.077.367.310,26	-\$ 546.133.665,97
Durante el periodo	\$ 194.454.871,69	\$ 411.103.390,48	-\$ 216.648.518,79
Acumulado Actual	\$ 3.725.688.716,95	\$ 4.488.470.700,74	-\$ 762.781.984,79

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	2,422%	26,449%
Valor de la Obra Programada	\$ 411.103.390,48	\$ 4.488.470.700,74

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	1,146%	21,954%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 194.454.871,67	\$ 3.725.688.716,25

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

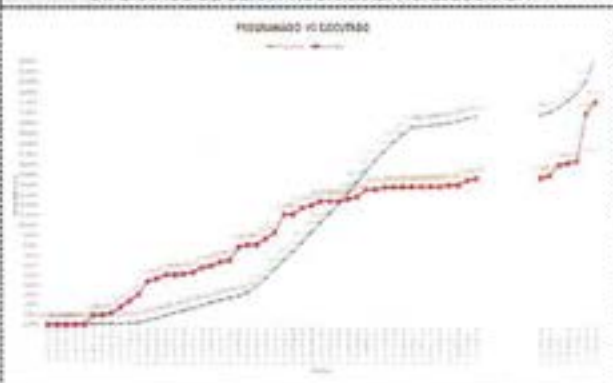

Ingresar Código Tabla de Retención Documental



ALCALDÍA DE ACACÍAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

C. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

35. CONDICIONES DEL CONTRATO				
ITEM	DESCRIPCIÓN	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.0	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR	\$	\$	\$
1.1	PRELIMINARES	\$ 13.042.680,00	\$ 187.485.925,00	\$ 200.528.605,00
1.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 3.785.400,00	\$ 37.922.020,00	\$ 41.707.420,00
1.3	INFRAESTRUCTURA	\$ 173.993.192,10	\$ 780.756.876,00	\$ 954.750.068,00
1.4	SUPERESTRUCTURA	\$	\$	\$
1.5	ACERO DE REFUERZO	\$	\$ 2.438.618.224,00	\$ 2.438.618.224,00
1.6	OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$	\$	\$
2.0	VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRADITAS	\$	\$	\$
2.1	PRELIMINARES	\$ 797.503,80	\$ 531.869,00	\$ 1.329.173,00
2.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$	\$	\$
2.3	PLUVIAL	\$	\$	\$
2.4	OBRAS DE PROTECCIÓN	\$	\$	\$
2.5	OBRAS DE DEMOLICIÓN	\$	\$ 28.350.631,00	\$ 28.350.631,00
2.6	ILUMINACIÓN	\$	\$ 38.500,00	\$ 38.500,00
2.7	PAVIMENTO ASFÁLTICO	\$	\$	\$
2.8	ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO	\$	\$	\$
PMA	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 1.933.701,66	\$ 39.225.000,00	\$ 41.158.702,00
PMT	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	\$ 902.394,11	\$ 18.305.000,00	\$ 19.207.394,00
Subtotal:		\$ 191.618.775,90	\$ 3.473.793.845,00	\$ 3.665.322.621,00
A.I.U.		\$ 48.678.941,90	\$ 900.589.885,74	\$ 950.268.827,67
Valor total:		\$ 194.454.871,87	\$ 3.531.233.845,00	\$ 3.725.688.717,00

D. RECURSOS DEL CONTRATISTA

36. PERSONAL OPERATIVO OBRA		37. EQUIPOS EN OBRA		38. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DÍA	ESTADO
Administrativos (Residente, Directo, SISO)	3	Retroexcavadora	1	LUNES	L
Operativos (Maestro, Ayudantes, Operarios)	12	Planta eléctrica 440KV	1	MARTES	L
Cuadrilla topografía	1	Motobombas	3	MIÉRCOLES	L
Residente Interventoría	1			JUEVES	L
				VIERNES	F
				SÁBADO	L
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

E. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar el armado de acero para las zapatas de las aletas de los dos costados
Encostrado para muro aletas del costado Palomas para realizar vaciado de concreto
Replanteo topográfico total del componente vial

F. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- En el presente corte semanal, el contratista realizó el replanteo topográfico para iniciar las actividades correspondientes al componente vial.
- Del análisis efectuado, se evidencia un leve incremento en el atraso respecto al corte semanal anterior.
- Persisten dificultades en el manejo de aguas en las excavaciones para la construcción de las vigas cabeceras y los muros de las aletas, ocasionadas por el alto caudal del nivel freático, lo que dificulta su adecuada
- Se recomienda al contratista implementar de manera inmediata una reprogramación de actividades, con el fin de mitigar el aumento del atraso y optimizar el cumplimiento del cronograma establecido.

(Nombre) 
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Secretaría de Infraestructura - Supervisión
Copia: Interventor y contratista

Ingresar Código Tabla de Retención Documental



ALCALDÍA DE ACACIAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN: 28 7 2025 No. INFORME 55 SEMANA No. 55 21 al 27 Julio

OBJETO DEL CONTRATO CONTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL

CONTRATO OBRA No: 929 CONTRATISTA CONSORCIO ACACIA

CONTRATO 978 INVENTORIA JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 14-Julio-2025
DESCRIPCIÓN: Inicio de encofrado del dado viga Quebraditas



FECHA FOTO: 15-Julio-2025
DESCRIPCIÓN: Inicio de encofrado del dado viga Quebraditas



FECHA FOTO: 19-Julio-2025
DESCRIPCIÓN: Verificación de la distribución de los aceros para viga cabezal costado Quebraditas.



FECHA FOTO: 19-Julio-2025
DESCRIPCIÓN: Vaciado de concreto para viga cabezal costado Quebraditas.



FECHA FOTO: 19-Julio-2025
DESCRIPCIÓN: Vaciado de concreto para viga cabezal costado Quebraditas.



FECHA FOTO: 23-Julio-2025
DESCRIPCIÓN: Ensayo de asentamiento para control de calidad del concreto para la viga cabezal costado Quebraditas.

**ALCALDÍA DE
ACACIAS**
INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN: 28 7 2025 No. INFORME 55 SEMANA No. 55 21 al 27 Julio
 OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL
 CONTRATO OBRA No: 929 CONTRATISTA CONSORCIO ACACIA
 CONTRATO 978 INTEVENTORIA JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 23-Julio-2025
 DESCRIPCIÓN: Toma de muestras para laboratorio y control de calidad del concreto para la viga cabezal costado Quebraditas.



FECHA FOTO: 21-Julio-2025
 DESCRIPCIÓN: Control vial para las actividades de obra.



FECHA FOTO: 21-Julio-2025
 DESCRIPCIÓN: Reforzamiento del encofrado para viga cabezal costado Quebraditas.



FECHA FOTO: 24-Julio-2025
 DESCRIPCIÓN: Replanteo topográfico preliminar de las actividades del componente vial.



FECHA FOTO: 23-Julio-2025
 DESCRIPCIÓN: Charlas de capacitación ambiental por parte del contratista.



FECHA FOTO: 25-Julio-2025
 DESCRIPCIÓN: Visita de control de obra por parte de la supervisión

**ALCALDÍA DE
ACACIAS**
INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

1. FECHA ELABORACIÓN:	4	8	2025	2. No. INFORME	56	3. SEMANA No.	56
4. PROYECTO: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS							
5. SUPERVISOR: IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA							
A. DATOS GENERALES DE LOS CONTRATOS							
6. CONTRATO OBRA No:	929-2023	7. FECHA CONTRATO:	27	12	2023	8. VALOR CONTRATO:	\$ 13.430.269.893,00
9. FECHA ACTA INICIO:	27	5	2024	10. FECHA DE TERMINACIÓN:	20	1	2026
11. PLAZO:	18 Meses/días						
12. PRORROGAS:	210	13. SUSPENSIONES:	54	Meses/días		14. ADICIONES:	\$ 3.539.989.565,00
15. OBJETO DEL CONTRATO OBRA: CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS							
16. CONTRATISTA: CONSORCIO ACACIA R.L FRANCISCO MORA GUTIERREZ							
17. CONTRATO INVENTORIA No:	978-2023	18. FECHA CONTRATO:	27	12	2023	19. VALOR CONTRATO:	\$ 627.081.787,00
20. FECHA ACTA INICIO:	27	5	2024	21. FECHA DE TERMINACIÓN:	20	1	2026
22. PLAZO:	18 Meses/días						
23. PRORROGAS:	210	24. SUSPENSIONES:	54	Meses/días		25. ADICIONES:	\$ 291.652.095,00
26. INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA							
27. APOYO A LA SUPERVISION: CRISTIAN EDUARDO FUENTES AMADO							

B. CONTROL DE PROGRAMACIÓN

28. CAPITULO SEGUN CONTRATO	29. % PROGRAMADO	30. % EJECUTADO	31. PRINCIPALES ACTIVIDADES ADELANTADAS EN EL PERIODO	32. EVALUACIÓN AVANCE
1. CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR	41,30%	29,97%	Construidos 18 pilotes y 2 vigas cabezal	Presentar un avance respectivo a
1.1 PRELIMINARES	85,50%	48,47%	Armar en el terreno y de las acciones de	Este capítulo registra un atraso.
1.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	100,00%	78,78%	Excavación para formateras de zapatas.	Este capítulo registra un atraso.
1.3 INFRAESTRUCTURA	87,45%	67,79%	Armado de aceros zapata aletas, lado Palomas	Este capítulo registra un atraso.
1.4 SUPERESTRUCTURA	4,37%	0,00%	Ya dio inicio el corte y ensamble de vigas	Este capítulo registra un atraso.
1.5 ACERO DE REFUERZO	34,76%	25,28%	Armado y encofrado de zapata, lado Palomas	Este capítulo registra un atraso.
1.6 OBRAS COMPLEMENTARIAS	1,19%	0,00%	Sin ejecución en este capítulo.	Este capítulo registra un atraso.
2. VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN	3,78%	0,66%	Montar en el terreno y de las acciones de	Este capítulo registra un atraso.
2.1 PRELIMINARES	93,33%	34,72%	Replanteo vial del diseño aprobado	Este capítulo registra un atraso.
2.2 EXCAVACIONES Y RELLENOS	0,00%	0,00%	Ejecución de acuerdo a la reprogramación.	Este capítulo registra un atraso.
2.3 PLUVIAL	0,00%	0,00%	Ejecución de acuerdo a la reprogramación.	Este capítulo registra un atraso.
2.4 OBRAS DE PROTECCIÓN	0,00%	0,00%	Ejecución de acuerdo a la reprogramación.	Este capítulo registra un atraso.
2.5 OBRAS DE DEMOLICIÓN	63,54%	13,89%	Demolicion permanente por usar protección; se	Este capítulo registra un atraso.
2.6 ILUMINACIÓN	13,60%	0,02%	Ejecutado de acuerdo a la reprogramación.	Este capítulo registra un atraso.
2.7 PAVIMENTO ASFÁLTICO	0,00%	0,00%	Ejecución de acuerdo a la reprogramación.	Este capítulo registra un atraso.
2.8 ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO	0,00%	0,00%	Diseño aprobado; ejecución según reprogramación	Este capítulo registra un atraso.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	69,06%	56,65%	Se ha realizado implementación permanente	Este capítulo registra un atraso.
IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	69,06%	56,65%	Se ha realizado implementación permanente	Este capítulo registra un atraso.
TOTAL				


33. CONSOLIDADO AVANCE DE OBRA

EJECUCIÓN	Ejecutado	Programado	Atraso(-) Adelanto(+)
Acumulado anterior	\$ 3.725.686.717,77	\$ 4.488.470.700,74	- \$ 762.783.982,97
Durante el periodo	\$ 71.171.364,90	\$ 802.596.593,03	- \$ 791.425.228,13
Acumulado Actual	\$ 3.796.858.082,67	\$ 5.391.067.293,77	- \$ 1.594.209.211,10

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Programada	5,08%	31,53%
Valor de la Obra Programada	\$ 862.596.593,03	\$ 5.351.067.293,77

	SEMANA	ACUMULADO
Obra Ejecutada	0,42%	22,374%
Valor de la Obra Ejecutada	\$ 71.171.364,90	\$ 3.796.858.082,67

34. GRÁFICO DE OBRA PROGRAMADA vs. EJECUTADA

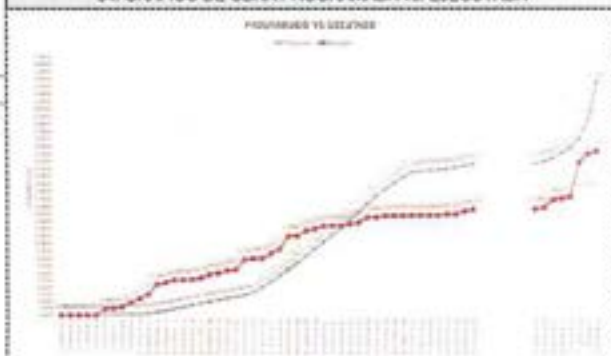

Ingresar Código Tabla de Retención Documental

**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**
INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA

C. RESUMEN DE AVANCE ACTUAL DE OBRA

35. CONDICIONES DEL CONTRATO				
ITEM	DESCRIPCION	SEMANA ACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO ACTUAL
1.	CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.1	PRELIMINARES	\$ 0,00	\$ 200.528.605,00	\$ 200.528.605,00
1.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 3.028.320,00	\$ 41.707.420,00	\$ 44.735.740,00
1.3	INFRAESTRUCTURA	\$ 0,00	\$ 954.750.068,00	\$ 954.750.068,00
1.4	SUPERESTRUCTURA	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
1.5	ACERO DE REFUERZO	\$ 96.191.432,40	\$ 2.438.618.324,60	\$ 2.504.809.657,00
1.6	OBRAS COMPLEMENTARIAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.	VÍAS DE ACCESO PUENTE VEHICULAR UBICADO EN LA VEREDA QUEBRACITAS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.1	PRELIMINARES	\$ 0,00	\$ 1.329.173,00	\$ 1.329.173,00
2.2	EXCAVACIONES Y RELLENOS	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.3	PLUVIAL	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.4	OBRAS DE PROTECCIÓN	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.5	OBRAS DE DEMOLICIÓN	\$ 0,00	\$ 28.350.631,00	\$ 28.350.631,00
2.6	ILUMINACIÓN	\$ 0,00	\$ 38.500,00	\$ 38.500,00
2.7	PAVIMENTO ASFÁLTICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
2.8	ANDENES Y ESPACIO PÚBLICO	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
PMIA	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	\$ 1.330.645,16	\$ 41.158.702,00	\$ 42.489.347,00
PMIT	IMPLEMENTACIÓN PLAN DE MANEJO DE TRÁNSITO	\$ 620.967,74	\$ 19.207.394,00	\$ 19.828.362,00
Subtotal		\$ 99.219.752,40	\$ 3.665.322.621,60	\$ 3.734.542.374,00
A.I.U.		\$ 17.945.861,73	\$ 950.286.827,82	\$ 968.214.689,56
Valor total		\$ 71.171.365,30	\$ 3.725.689.717,60	\$ 3.796.860.063,00

D. RECURSOS DEL CONTRATISTA

36. PERSONAL OPERATIVO OBRA		37. EQUIPOS EN OBRA		38. ESTADO DEL TIEMPO	
CARGO	CANTIDAD	EQUIPO	CANTIDAD	DÍA	ESTADO
Administrativos(Residente, Directo, SISO)	3	Retroexcavadora	1	LUNES	L
Operativos(Maestro, Ayudantes, Operarios)	12	Planta electrica 440KV	1	MARTES	L
Cuadrilla topografía	2	Motobombas	3	MIERCOLES	F
Residente Interventoria	1			JUEVES	F
				VIERNES	F
				SABADO	L
				LLUVIOSO (L) FAVORABLE (F) SOLEADO (S)	

E. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

Continuar el armado de acero para las zapatas de las aletas de los dos costados
 Encofrado para muro aletas del costado Palomas para realizar vaciado de concreto
 Replanteo topográfico total del componente vial y pozos de inspeccion

F. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

- En el presente corte semanal, el contratista realizó el replanteo topográfico para dar inicio a las actividades del componente vial y de los pozos de inspección pluvial.
- Del análisis efectuado, se evidencia que persiste el incremento en el atraso con respecto al corte semanal anterior.
- Persisten dificultades en el manejo de aguas en las excavaciones para la construcción de las vigas cabezal y los muros de las aletas, debido al alto caudal del nivel freático, lo que dificulta su adecuada ejecución
- Se recomienda al contratista implementar de manera inmediata una reprogramación de actividades, con el fin de mitigar el aumento del atraso y optimizar el cumplimiento del cronograma establecido.


 (Nombre) JIMMY ANDRÉS TORRES CASTRO
 DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Original: Secretaría de Infraestructura - Supervisión
 Copia: Interventor y contratista

Ingresar Código Tabla de Retención Documental



ALCALDÍA DE ACACIAS

INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA REGISTRO FOTOGRÁFICO

FECHA ELABORACIÓN:

4 8 2025

No. INFORME

56

SEMANA No.

56

OBJETO DEL CONTRATO
OBRA:

CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

CONTRATO OBRA No:

929-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ

CONTRATO
INTERVENTORÍA No:

978-2023

INTEVENTORÍA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 28-julio-2025

DESCRIPCIÓN: Armado de aceros para zapata de aletas lado Palomas



FECHA FOTO: 28-julio-2025

DESCRIPCIÓN: Armado de aceros para zapata de aletas lado Palomas



FECHA FOTO: 28-julio-2025

DESCRIPCIÓN: Replanteo topográfico preliminar para el inicio de las actividades del componente vial



FECHA FOTO: 28-julio-2025

DESCRIPCIÓN: Replanteo topográfico preliminar para el inicio de las actividades del componente vial



FECHA FOTO: 29-julio-2025

DESCRIPCIÓN: Verificación de cotas de aceros para el estribo del lado Quebraditas



FECHA FOTO: 31-julio-2025

DESCRIPCIÓN: Reforzamiento de formaleta con material de relleno para zapata d aletas costado Palomas.



ALCALDÍA DE
ACACIAS

**INFORME SEMANAL AVANCE DE OBRA
REGISTRO FOTOGRÁFICO**

FECHA ELABORACIÓN:

4 8 2025

No. INFORME

56

SEMANA No.

56

OBJETO DEL CONTRATO
OBRA:

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

CONTRATO OBRA No:

829-2023

CONTRATISTA

CONSORCIO ACACIA R.L. FRANCISCO MORA GUTIERREZ

CONTRATO
INTERVENTORÍA No:

978-2023

INTEVENTORÍA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

G. REGISTRO FOTOGRÁFICO



FECHA FOTO: 01-Agosto-2025

DESCRIPCIÓN: Excavación y cargue de material en despeje de área para actividades del componente vial.



FECHA FOTO: 01-Agosto-2025

DESCRIPCIÓN: Excavación para sietas y relleno con material seleccionado en perímetro de vial cavetaz.



FECHA FOTO: 29-Julio-2025

DESCRIPCIÓN: Manejo de aguas mediante bombeo mecánico



FECHA FOTO: 29-Julio-2025

DESCRIPCIÓN: Señalización de elementos de emergencia.



FECHA FOTO: 29-Julio-2025

DESCRIPCIÓN: Manejo y disposición de residuos sólidos



FECHA FOTO: 31-Julio-2025

DESCRIPCIÓN: Aseo y mantenimiento a unidades sanitarias.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

9.4 Afiliaciones y/o pagos del personal a la seguridad social Interventoría.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Telefono	Economado SINIA e ICBF	
CC 9088796		ROMEROZ MESA JOSE AUGUSTO	8 - MENOS DE 200 COLTANTES	INTERVENTORIA	CALLE 17 27 - 25	VILLALBAZCO-ARITA	6433-605	31	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo	Clase	Clave	Plazilla	Plazilla	Fecha	Pago	Valor		
2023-06	Salud	2023-07	948800004		2023/07/12				

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																								
EMPLEADO				NOVEDADES				PENSION				SALUD				CCF				BESGOS																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																				
No.	Identificación	Nombre																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Secundaria Principal	Direccion	Ciudad/Departamento	Teléfono	Exonerado SERNA e ICAP
C.C. 948794		BOGOTAZAR MORA JORGE ALBERTO	B - MENOS DE 200 CONTRATISTAS		INTERVENTORA	CALLE 17 27 J - 15	VILLAVICENCIO-META	4612195	SI
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo		Fecha		Pago		
Presión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-06	2025-07		948880014	E	2025/07/21			9	
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO		CODIGO	NT	ON	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
APP (ADMINISTRADORAS: 2)					16	\$5,275,900	\$32,400	\$0	\$5,808,300
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	7	\$3,027,600	\$17,600	\$0	\$3,044,600
POBIVIVIR		230301	800,224,808	8	9	\$2,748,300	\$15,400	\$0	\$2,763,700
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					17	\$2,611,900	\$14,700	\$0	\$2,626,600
ARL SUBA		14-11	890,903,790	5	17	\$2,611,900	\$14,700	\$0	\$2,626,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					17	\$1,595,500	\$8,500	\$0	\$1,610,000
COPIRIA		CCF34	892,000,146	3	17	\$1,595,500	\$8,500	\$0	\$1,610,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					17	\$1,595,500	\$8,600	\$0	\$1,610,100
NUEVA E.P.S.		EP5037	900,156,264	2	2	\$217,400	\$1,300	\$0	\$218,700
NUEVA EPS MOVILIDAD		EP5041	900,156,264	2	1	\$44,100	\$400	\$0	\$44,500
SALUD TOTAL		EP5002	800,130,907	4	5	\$418,400	\$2,400	\$0	\$420,800
SANTITAS		EP5005	800,251,440	6	9	\$801,600	\$4,500	\$0	\$806,100
TOTAL					17	\$11,350,850	\$54,200	\$0	\$11,435,050

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	de	Razon Social	Ciudad Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono
C.C. 9438796		RODRIGUEZ RIVERA JORGE AUGUSTO	BOGOTÁ	PRINCIPAL	Calle 17 #31 35	VILLALBAZAR	2745884

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago	
Presión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Planilla	Límite	Pago	Banco	Valor
2023-07	2023-07	10180291	5400180291	1		2023/08/29	2023/08/11	BANCO AV VELA	\$2,375,000

LEONIDACION DETALLADA DE APORTES

[illegible]

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Seguridad Principal	Dirección	Ciudad/Departamento	Teléfono	Examinado SINIA a	
CC 98181794		RODRIGUEZ BENA JORGE AUGUSTO	INDEPENDIENTE	PUBLICAFAL	Calle 12 373 35	VILLAVICENCIO-ARICA	8705884	ICBF	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN

Periodo		Clase		Tipo		Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago	Pensión	Pensión	Planilla	Limite	Limite	Pago	Valor
2025-07	2025-07	10181291	10181291	1	1	2025-08-19	2025-08-19	2025-08-19	\$2,179,000

RESUMEN DE PAGO

RECEBO	CODIGO	NIT	CV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$1,007,400	\$0	\$0	\$1,007,400
COLPENSIORES	25-14	900,136,004	7	1	\$1,007,400	\$0	\$0	\$1,007,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$412,400	\$0	\$0	\$412,400
ARL SUBA	14-11	890,903,790	5	1	\$412,400	\$0	\$0	\$412,400
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$118,500	\$0	\$0	\$118,500
CCF REUN	CCF34	892,000,146	3	1	\$118,500	\$0	\$0	\$118,500
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$740,700	\$0	\$0	\$740,700
EPS SUBA (ANTES SUSALUS)	EP5010	800,088,702	2	1	\$740,700	\$0	\$0	\$740,700
TOTAL				1	\$2,179,000	\$0	\$0	\$2,179,000

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

9.5 Correspondencia enviada y recibida.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

9.5.1. Correspondencia enviada

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Acacias, 1 de julio de 2025

Ingeniero:

IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Secretaría de Infraestructura – Alcaldía de Acacias

infraestructura@acacias.gov.co

Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

CL: OCA-978-2023-197

RECIBIDO

Fecha: 2-07-25

Hora: 9:46 am

Por: Rodolfo Mondragón

Anexo: Tres (3) carpetas

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por valor de \$918.733.882,00 y su plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Asunto: Radicación informe mensual obra No 11 del contratista del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de (\$16.970.259.458,00) m/cie. y su plazo de ejecución será de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales me permito remitir para su conocimiento revisión y archivo el informe mensual No.11 de obra entregado por el contratista para el contrato de obra, como también el informe de interventoría No.11 para el contrato de obra que relacionamos a continuación:


INFORME MENSUAL	PERIODO		CARPETAS	FOLIOS
No 11 DEL CONTRATISTA DE OBRA	01-03-25	31-03-2025	1 de 2	163
No 11 DEL CONTRATISTA DE OBRA	01-03-25	31-03-2025	2 de 2	116
No 11 DE INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA	01-03-25	31-03-2025	1	134

Debemos precisar que los respectivos informes fueron entregados físicamente de forma tardía a la interventoría y es por esta razón que se entregan a la fecha, una vez fueron revisados y viabilizados.

Anexo:

- Informe Mensual No 11 de obra del contratista (2 Carpetas)
- Informe Mensual No 11 de interventoría al contrato de obra (1 Carpeta)

Cordialmente,


ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Ing. Cristian Fuentes Arpado - Apoyo a la supervisión cristian.fuentes@acacias.gov.co
C.C. Dr. Henry Andres Quintero Novoa apoyo.infraestructura.cps1@acacias.gov.co

Calle 49 No.30-16 oficina 203, Barrio Caudal
Villavicencio – Meta
interpuentechichimeme@gmail.com

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1



Acacias, 1 de julio de 2025

CI- OCA-978.2023-198

Señor:

CONSORCIO ACACIA

R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ

consorcioacacia.info23@gmail.com

Calle 26 No. 68C- 61 Oficina 316 Bogotá D.C

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por valor de \$918.733.882,00 y su plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Asunto: Reiteración compromisos del comité Mo.40 del 24 de junio del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de (\$16.970.259.458,00) m/cte, y su plazo de ejecución será de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que en comité realizado el día 24 de junio del 2025 se acordaron los siguientes compromisos:

COMPROMISOS PACTADOS		FECHA	RESPONSABLES
1	Solicitud Cambio de personal profesional	24 de junio de 2025	Contratista
2	Reprogramación de actividades	25 de junio de 2025	Contratista
3	Informes mensuales	25 de junio de 2025	Contratista
4	Análisis de parcial No.2	27 de junio de 2025	Contratista
5	Actualización de garantías	2 de julio de 2025	Contratista
6	Materiales en obra	15 de julio de 2025	Contratista

De lo cuales no se ha dado cumplimiento, además se hizo una reiteración anterior en el oficio CI- OCA-978.2023-195 del 27 de junio, sin embargo, estas solicitudes a la fecha no han sido acatadas. También me permito recordar que en el comité se hizo énfasis en la urgencia de subsanar estos compromisos con el objetivo de evitar mayor traumatismo a causa de estos incumplimientos y a la vez el propósito de mejorar la oportuna entrega de toda documentación requerida durante la ejecución del proyecto.

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1



COMPROMISO No.1 Solicitud Cambio de personal profesional:

La interventoría realiza la revisión de los perfiles de cada profesional ofertado de los cuales, el Profesional en Salud Ocupacional, **cumple** con los requisitos exigidos en el contrato.

El profesional director de Obra -Ingeniero Civil o Ingeniero de Vías y Transporte **No cumple** con los requisitos exigidos en el contrato, el cual le falta la documentación que se relaciona en el siguiente cuadro:

Falta	Copia de Cedula de ciudadanía
Falta	Copia de matrícula Profesional
Falta	Copia de Diploma de Pregrado
Falta	Certificado de Antecedentes COPNIA
Falta	Dos certificados como director de Obra como mínimo en (2) contratos terminados y liquidados cuyos valores sean igual o superior al presupuesto oficial de la presente convocatoria que cuyo objeto haya sido o consistido en la CONSTRUCCION DE PUENTES VEHICULARES O FERREOS EN ESTRUCTURA METALICA

también deben adjuntar la siguiente documentación en formatos originales y debidamente firmados:

1	Carta de renuncia de los profesionales anteriores
2	Certificados de disponibilidad de los profesionales nuevos
3	Acta de aprobación del personal

Por lo tanto se solicita entregar de manera urgente esta documentación relacionada.

COMPROMISO No.2 Reprogramación de actividades:

No se ha recibido a la fecha y de esta entrega depende el control y seguimiento de avance o atraso del proyecto. **Se solicita entregar de maneras inmediata la entrega de esta reprogramación.**

COMPROMISO No.3 Informes mensuales:

Falta la entrega del informe mensual No.12 del mes de abril el cual se ha reiterado la entrega sin obtener respuesta.

Me permito recordar que estos informes se deben presentar a la Interventoría a más tardar el último día de cada mes, para de esta forma poder liberarlos y radicarlos a la entidad dentro de los plazos establecidos y evitar incumplimientos con la entrega de estos documentos.

Se solicita entregar de manera inmediata este informe No.12 del mes de abril.



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

COMPROMISO No.4 Análisis de parcial No.2:

No se ha hecho entrega del acta parcial No.2 para la revisión.

Se recomienda hacer entrega lo antes posible para la respectiva revisión

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier inquietud.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Inventoría

C.C. Ing. Iván Mauricio Rojas Novoa secretario de Infraestructura – Supervisor infraestructura@acacias.gov.co

C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión crishian.f9383@gmail.com

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1



Acacias, 1 de julio de 2025

CI- OCA-978.2023-199

Ingeniero:

IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Secretaría de Infraestructura – Alcaldía de Acacias

infraestructura@acacias.gov.co

Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por valor de \$918.733.882,00 y su plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Asunto: Radicación de comité de obra No.40 del 24 de junio del 2025 del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de (\$16.970.259.458,00) m/cte. y su plazo de ejecución será de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales me permito remitir para su conocimiento e información el comité de obra No 40 de fecha 24 de junio de 2025 del contrato citado en el asunto.

COMITÉ No	FECHA
No 40	24-06-2025

Aclaremos que dichos comités serán adjuntados en original en el informe mensual que se radique y el envío por este medio es de conocimiento para las partes.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Consorcio Acacia, R/L Francisco Mora Gutiérrez ing@geotecnia.co - consorcioacacia.info23@gmail.com
C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión cristian.f9383@gmail.com

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Acacias, 3 de julio de 2025

Ingeniero:

IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Secretaria de Infraestructura – Alcaldía de Acacias

infraestructura@acacias.gov.co

Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

CI-OCA-978.2023-200

RECIBIDO

Fecha: 4-07-25

Hora: 8:14 am

Firma: Rojas Novoa Iván

Anejo: Uno (1) carpeta
Secretaria de Infraestructura

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por valor de \$918.733.882,00 y su plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.


Asunto: Radicación acta de aprobación de personal del Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por valor de \$918.733.882,00 y su plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Cordial saludo,

Por medio de la presente me permito enviar, para su conocimiento y trámite correspondiente, el acta de aprobación de personal, donde se relaciona el personal que estará participando en el proyecto, conforme a lo establecido en dicha acta.

Agradezco su atención y quedo atento(a) a cualquier comentario.

Cordialmente,



ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Consorcio Acacia, R/L Francisco Mora Gutiérrez ing@gentecnia.co - consorciopacacia.info23@gmail.com
C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión cristian.f2093@gmail.com

Calle 49 No.30-16 oficina 203, Barrio Ceudal
Villavicencio – Meta
interpuentechichimeme@gmail.com



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Acacias, 10 de julio de 2025

CI- OCA-978.2023-201

Señor:

CONSORCIO ACACIA

R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ

consorcioacacia.info23@gmail.com

Calle 26 No. 68C- 61 Oficina 316 Bogotá D.C

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por valor de \$918.733.882,00 y su plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Asunto: Carencia de insumos en obra del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de (\$16.970.259.458,00) m/cte, y su plazo de ejecución será de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Cordial saludo,

La Interventoría ha evidenciado que la obra se encuentra en condición de inactividad desde el mediodía del pasado martes 8 de julio, situación atribuida a la falta de combustible necesario para el funcionamiento de la maquinaria y equipos. Si bien se indicó que el suministro de dicho insumo llegaría esa misma tarde, a la fecha no se ha cumplido con lo informado, lo que ha generado una afectación directa en la ejecución de las actividades. En consecuencia, se hace un llamado al contratista para que gestione de la manera pronta el abastecimiento del combustible requerido y se restablezcan las labores en obra.

Recordamos la importancia de garantizar el suministro oportuno de los recursos requeridos para el desarrollo continuo de las actividades contractuales, a fin de evitar afectaciones en el cronograma de ejecución.

Sin otro particular, quedamos atentos a su respuesta

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Ing. Iván Mauricio Rojas Novoa secretario de Infraestructura - Supervisor infraestructura@acacias.gov.co

C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión crishian.f9393@gmail.com

Calle 49 No.30-16 oficina 203, Barrio Caudal

Villavicencio - Meta

interpuentechichimene@gmail.com

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Acacias, 10 de julio de 2025

CI- OCA-978.2023-202

Ingeniero

IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Secretaria de Infraestructura – Alcaldía de Acacias

infraestructura@acacias.gov.co

Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por valor de \$918.733.882,00 y su plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1:

Asunto: Radicación de informe semanal No.50, No.51 y No.52 del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de (\$16.970.259.458,00) m/cte, y su plazo de ejecución será de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales me permito remitir para su conocimiento e información el informe semanal No.50, No.51 y No.52 del contrato citado en el asunto para el siguiente periodo:

INFORME SEMANAL	PERIODO		AVANCE (+) ATRASO (-) \$	AVANCE (+) ATRASO (-) %
No 50	17-07-2025	22-06-2025	-\$1.026.009.843,58	-6,046%
No 51	23-06-2025	29-06-2025	-\$927.266.682,15	-5,464%
No 51	30-06-2025	06-06-2025	-\$927.266.682,15	-5,953%

Los valores y porcentajes programados corresponden a la programación presentada y aprobada por la Interventoría. De igual manera, los valores ejecutados reflejan las verificaciones en campo realizadas por el equipo de interventoría. Se aclara que, a partir de la semana No. 50, la programación de obra fue actualizada



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

como resultado de la aprobación de la Modificatoria No.1, la cual entró en vigor el 21 de junio de 2025.

Anexo:

- Informe semanal No 50
- Informe semanal No 51
- Informe semanal No 52

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Consorcio Acacia, R/L Francisco Mora Gutiérrez ing@geotecnica.co - consorcioacacia.info23@gmail.com
C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión crsthan.19393@gmail.com



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Acacias, 10 de julio de 2025

CI- OCA-978.2023-203

Ingeniero

IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Secretaría de Infraestructura – Alcaldía de Acacias

infraestructura@acacias.gov.co

Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por valor de \$918.733.882,00 y su plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Asunto: Notificación atraso del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de (\$16.970.259.458,00) m/cte, y su plazo de ejecución será de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que esta Interventoría, en el ejercicio de sus funciones, ha evidenciado un atraso progresivo y significativo en la ejecución de las actividades programadas, de acuerdo con el cronograma vigente aprobado mediante la Modificatoria No. 1, con vigencia a partir del 21 de junio de 2025, se informa lo siguiente:

Con corte a la fecha, el avance físico acumulado alcanza el 16,123 %, equivalente a \$2.736.090.543,72, frente a una programación del 22,076 %, correspondiente a \$3.746.364.770,20. Esto representa un desfase de -5,953 %, equivalente a -\$1.010.274.226,48.

A la fecha han transcurrido 11,83 meses de los 18 meses de ejecución pactados contractualmente y ampliados mediante la Modificatoria No. 1, lo que representa un 65,74 % del plazo total. De acuerdo con el siguiente cuadro, se presenta la programación y el avance de obra estimados para el tiempo restante:

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1



De lo anterior se concluye que para la presente semana 52 se presenta un atraso así:

	SEMANAL (\$)	ACUMULADO (\$)	% SEM	% ACUM
PROGRAMADO	\$ 115.702.744,33	\$ 3.746.364.770,20	0,682%	22,076%
EJECUTADO	\$ 32.695.200,00	\$ 2.736.090.543,72	0,193%	16,123%
(+) AVANCE (-) ATRASO	-\$ 83.007.544,33	-\$ 1.010.274.226,48	-0,489%	-5,953%

Bajo el entendido de que la interventoría contractual tiene como función principal el seguimiento al cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista, esta interventoría ha evidenciado dificultades significativas que afectan el cumplimiento adecuado del objeto contractual. A pesar de los múltiples requerimientos realizados a través de oficios y comités de obra, el contratista no ha atendido ni resuelto dichas observaciones de manera efectiva.

En este sentido, solicitamos respetuosamente a través de su dependencia, en calidad de supervisora del contrato, que se adopte alguna medida con el propósito de conminar al contratista al cumplimiento efectivo de sus obligaciones y garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual.

Cabe reiterar que esta interventoría ha informado de manera clara y oportuna a la entidad sobre los constantes y reiterados incumplimientos por parte del contratista, precisando detalladamente la ocurrencia de situaciones que se apartan del normal y satisfactorio desarrollo del contrato y que constituyen claros incumplimientos contractuales.



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Así mismo, es importante resaltar que esta interventoría ha cumplido con su responsabilidad de informar oportunamente a la entidad sobre dichas situaciones, las cuales no han sido atendidas ni solucionadas por el contratista dentro de los plazos expresamente otorgados para tal fin, pese a los requerimientos formales realizados.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Consorcio Acacia, R/L Francisco Mora Gutiérrez ing@geotecnia.co - consorcioacacia.info23@gmail.com
C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión cristhian.f3393@gmail.com



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Acacias, 11 de julio de 2025

CI- OCA-978.2023-204

Señor:

CONSORCIO ACACIA

R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ

consorcioacacia.info23@gmail.com

Calle 26 No. 68C- 61 Oficina 316 Bogotá D.C

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por valor de \$918.733.882,00 y su plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Asunto: Solicitud plan de contingencia por atraso de programación del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de (\$16.970.259.458,00) m/cte, y su plazo de ejecución será de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta que esta interventoría, en ejercicio de sus funciones, ha requerido al contratista mediante los oficios No. CI-OCA-978.2023-124 del 12 de noviembre de 2024 y CI-OCA-978.2023-129 del 25 de noviembre de 2024, en los cuales se solicitó la presentación de un plan de contingencia orientado a la recuperación de los atrasos evidenciados; y que, pese a la elaboración de una reprogramación asociada a la aprobación y entrada en vigor de la Modificatoria No. 1, la cual establece el marco para el desarrollo de las actividades, el análisis del avance de obra en las últimas semanas continúa evidenciando un atraso progresivo y sostenido en la ejecución del proyecto.

Es así como a la fecha han transcurrido 11,83 meses de los 18 meses de ejecución pactados contractualmente y ampliados mediante la Modificatoria No. 1, lo que representa un 65,74 % del plazo total. De acuerdo con el siguiente cuadro, se presenta la programación y el avance de obra estimados para el tiempo restante:

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1



De lo anterior se concluye que para la presente semana 52 se presenta un atraso así:

	SEMANAL (\$)	ACUMULADO (\$)	% SEM	% ACUM
PROGRAMADO	\$ 115.702.744,33	\$ 3.746.364.770,20	0,682%	22,076%
EJECUTADO	\$ 32.695.200,00	\$ 2.736.090.543,72	0,193%	16,123%
(+) AVANCE (-) ATRASO	-\$ 83.007.544,33	-\$ 1.010.274.226,48	-0,489%	-5,953%

Es por lo anterior que la Interventoria reitera al contratista la solicitud del plan de contingencia que le permita recuperar el avance que se ha perdido, y garantizar que la ejecución del proyecto se cumpla como lo contempla la nueva programación establecida en el marco de la Modificatoria aprobada.

Así mismo para que se intensifique la ejecución del contrato, se implemente y se tomen las medidas acertadas para aprovechar las condiciones favorables y se optimicen, dichas medidas podrán ser:

- Aumento en la mano de obra no calificada.
- Aumento en la jornada laboral o implementación de doble jornada.
- Intervención todos los frentes de trabajo.
- Aumento de rendimientos en la ejecución de actividades.
- Aumento rendimiento de maquinaria o aumento en la cantidad requerida.
- Programación ajustada de llegada de materiales ya comprados con recursos de anticipo.



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Por otra parte, y con el mismo objetivo, se observa que actualmente se adelanta la construcción de las vigas cabecal de los dos estribos; no obstante, el avance de esta actividad es notoriamente lento, lo que genera preocupación, ya que, de mantenerse este ritmo, el atraso acumulado podría incrementarse hasta volverse incontrolable, comprometiendo seriamente el cumplimiento del objetivo final del proyecto.

Por tal razón la interventoría considera pertinente conocer de parte del contratista dentro del plan de contingencia los siguientes aspectos:

- Que se tiene organizado frente a estas actividades.
- Que equipos se van a adquirir y/o utilizar para realizar estas demoliciones.
- Disponibilidad de personal para estas actividades
- Cuál es el cronograma se va a implementar para lograr la ejecución de estas actividades, fecha de llegada de equipos, de inicio de actividad en los demás frentes y vinculación de personal.

De igual manera, solicitamos nos informen el estado actual del proceso de ensamble del acero estructural, el armado de las vigas del puente, el arriostramiento, las cartelas y demás elementos requeridos de construcción de la superestructura y para lo cual se desembolsaron con recursos de anticipo y la programación para la llegada de estos elementos a la obra, teniendo en cuenta que el plazo adicional otorgado ya se encuentra en curso y, hasta el momento, se desconoce el avance real de estas actividades. Esta información es fundamental para adoptar medidas oportunas que permitan evitar nuevos retrasos que afecten aún más la programación y el progreso del proyecto. En este sentido, solicitamos informar lo siguiente:

- Que se tiene organizado frente a estas actividades.
- En qué estado de avance va el armado de las vigas.
- Vinculación y disponibilidad de personal para todas las actividades
- Cuál es el cronograma se va a implementar para lograr la ejecución de estas actividades, fecha de llegada de las vigas, de inicio de actividad en los demás frentes y vinculación de personal.

Agradecemos realizar la entrega de dicho plan de contingencia de manera inmediata con el fin de evaluar y viabilizar dicha implementación.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Consorcio Acacia, R/L Francisco Mora Gutiérrez ing@geotecnia.co - consorcioacacia.info23@gmail.com
C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión crsthan.f9393@gmail.com



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Acacias, 11 de julio de 2025

CI- OCA-978.2023-205

Ingeniero

IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Secretaría de Infraestructura – Alcaldía de Acacias

infraestructura@acacias.gov.co

Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por valor de \$918.733.882,00 y su plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Asunto: Radicación comité de obra No 41 del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de (\$16.970.259.458,00) m/cte, y su plazo de ejecución será de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales me permito remitir para su conocimiento la información el comité de obra No 41 de fecha 02 de julio de 2025 del contrato citado en el asunto.

COMITÉ No	FECHA
No 41	02-07-2025

Aclaremos que dicho comité será adjuntado en original en el informe mensual que se radique y él envió por este medio es de conocimiento para las partes, de igual forma los compromisos pactados en dicho comité fueron los siguientes:

#	B. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA	RESPONSABLE
1	Cambio de personal profesional	3 de julio de 2025	Contratista
2	Análisis de parcial No.2;	A decisión del contratista	Contratista
3	Actualización de Garantías	2 de julio de 2025	Contratista
4	Materiales en obra, (Vigas estructura puente)	15 de julio de 2025	Contratista
5	Socialización con la comunidad	4 de julio de 2025	Entidad
6	Información para GESPROY	3 de julio de 2025	Interventoría
7	Certificados de calidad y fichas técnicas de concretos	8 de julio de 2025	Contratista



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

8	Procedimientos constructivos de los componentes del proyecto	próximo comité entrega previa	Contratista
9	Planillas seguridad	Se coordina desde obra	Contratista

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier aclaración

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Consorcio Acacia, R/L Francisco Mora Gutiérrez ing@geotecnica.co - consorcioacacia.info23@gmail.com
C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión crishian.f9393@gmail.com



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Acacias, 11 de julio de 2025

CI- OCA-978.2023-206

Ingeniero

IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Secretaria de Infraestructura – Alcaldía de Acacias

infraestructura@acacias.gov.co

Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro.

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por valor de \$918.733.882,00 y su plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Asunto: Radicación comité de socialización No 42 del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de (\$16.970.259.458,00) m/cte, y su plazo de ejecución será de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales me permito remitir para su conocimiento la información el acta de comité de socialización de obra No 42 de fecha 04 de julio de 2025 del contrato citado en el asunto.

COMITÉ DE SOCIALIZACION No.	FECHA
No 42	04-07-2025

Aclaremos que dicho comité será adjuntado en original en el informe mensual que se radique y él envió por este medio es de conocimiento para las partes, de igual forma queda como compromiso pactado en este lo siguientes:

#	B. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA	RESPONSABLE
1	Realizar visitas a la obra los viernes de cada semana	Cada semana	Entidad



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Se anexa los siguientes documentos:

- Planilla de firmas de asistencia.
- Archivo de la presentación de la socialización.

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier aclaración

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Consorcio Acacia, R/L Francisco Mora Gutiérrez ing@geotecnia.co - consorcioacacia.info23@gmail.com
C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión crishian.f3393@gmail.com

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Acacias, 14 de julio de 2025

Ingeniero:

IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Secretaría de Infraestructura – Alcaldía de Acacias

infraestructura@acacias.gov.co

Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

RECIBIDO OCA-978.2023-207

Fecha: 14-07-25

Hora: 11:45 pm

Firma: Iván Mauricio Rojas Novoa

Ancel: Doc 12) carpeta

Secretaría de Infraestructura

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por valor de \$918.733.882,00 y su plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Asunto: Radicación informe mensual obra No 12 del contratista del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de (\$16.970.259.458,00) m/cte. y su plazo de ejecución será de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales me permito remitir para su conocimiento revisión y archivo el informe mensual No.12 de obra entregado por el contratista para el contrato de obra, como también el informe de interventoría No.12 para el contrato de obra que relacionamos a continuación:


INFORME MENSUAL	PERIODO		CARPETAS	FOLIOS
No 12 DEL CONTRATISTA DE OBRA	01-04-25	23-04-2025	1	234
No 12 DE INTERVENTORIA AL CONTRATO DE OBRA	01-04-25	23-04-2025	1	129

Se precisa que el presente informe fue entregado físicamente por el contratista a la Interventoría de manera extemporánea. En consecuencia, su radicación se realiza en la fecha actual, una vez concluido el proceso de revisión y viabilización por parte del equipo interventor.

Anexo:

- Informe Mensual No 12 de obra del contratista (1 Carpeta)
- Informe Mensual No 12 de interventoría al contrato de obra (1 Carpeta)

Cordialmente,


ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión cristhian.f9393@gmail.com
C.C. Dr. Henry Andres Quintero Novoa apoyo.infraestructura.cps1@acacias.gov.co

Calle 49 No.30-16 oficina 203, Barrio Caudal
Villavicencio – Meta
interpuentechichimene@gmail.com



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Acacias, 15 de julio de 2025

CI- OCA-978.2023-208

Señor:

CONSORCIO ACACIA

R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ

consorcioacacia.info23@gmail.com

Calle 26 No. 68C- 61 Oficina 316 Bogotá D.C

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por valor de \$918.733.882,00 y su plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Asunto: Requerimiento entrega informe mensual No.13 del mes de abril, del contrato No. 929 De 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de (\$16.970.259.458,00) m/cte. y su plazo de ejecución será de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Cordial saludo,

Considerando que ya se venció la fecha de entrega del informe mensual No.13 del contrato de obra No. 929 De 2023 correspondiente al mes de Junio y con el objetivo de dar cumplimiento a la cláusula No.10 obligaciones específicas del contratista la cual determina en su numeral 8 "...Rendir y elaborar con una periodicidad mensual, los informes, conceptos, estudios, ensayos de laboratorio y demás trabajos que se le soliciten en desarrollo y liquidación del contrato..."; numeral 35 "...Presentar dentro de las fechas establecidas y de acuerdo con las indicaciones del interventor y la secretaria de infraestructura los informes mensuales, parciales y final del contrato en medio magnético y editable (PDF y editable), en original con fotos a todo color y copia, en los cuales determinan las condiciones y cantidades de obra ejecutadas a la fecha..."; numeral 39 "... El contratista deberá involucrar dentro de los costos de la propuesta, la presentación mensual de informes de la obra para el Municipio, en medio físico y magnético (cd), los cuales contienen entre otros elementos indicados por la interventoría, los ensayos de laboratorio necesarios y que demuestren la correcta ejecución de los trabajos, planos as- built, fotografías de los sectores intervenidos, relación de personal y pagos al SGSS, parafiscales, manejo del anticipo y sus soportes, así como todos los demás determinados por la Secretaria de Infraestructura...", respetuosamente solicitamos la entrega en formato físico del informe referido, el cual, a la fecha, no ha sido recibido por parte de esta Interventoría.

Debo recordar que estos informes se deben presentar a la Interventoría a más tardar el último día de cada mes, para de esta forma poder liberarlos y radicarlos a la entidad dentro de los plazos establecidos y evitar incumplimientos con la entrega de estos documentos. Recordamos las fechas de entrega de dichos informes:



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

INFORME	PERIODO	FECHA DE ENTREGA A INTERVENTORIA	FECHA DE ENTREGA A SUPERVISOR	OBSERVACION
1	27-05-24 al 31-05-24	Se entrego tardíamente	Se entrego a la entidad	OK
2	01-06-24 al 30-06-24	Se entrego tardíamente	Se entrego a la entidad	OK
3	01-07-24 al 31-07-24	Se entrego tardíamente	Se entrego a la entidad	OK
4	01-08-24 al 31-08-24	Se entrego tardíamente	Se entrego a la entidad	OK
5	01-09-24 al 30-09-24	Se entrego tardíamente	Se entrego a la entidad	OK
6	01-10-24 al 31-10-24	Se entrego tardíamente	Se entrego a la entidad	OK
7	01-11-24 al 30-11-24	Se entrego tardíamente	Se entrego a la entidad	OK
8	01-12-24 al 31-12-24	Se entrego tardíamente	Se entrego a la entidad	OK
9	01-01-25 al 31-01-25	Se entrego tardíamente	Se entrego a la entidad	OK
10	01-02-25 al 28-02-25	Se entrego tardíamente	Se entrego a la entidad	OK
11	01-03-25 al 31-03-25	Se entrego tardíamente	Se entrego a la entidad	OK
12	01-04-25 al 23-04-25	Se entrego tardíamente	Se entrego a la entidad	OK
13	17-06-25 al 30-06-25	No se ha entregado	No se ha entregado	Vencido
14	01-07-25 al 31-07-25	01-08-2025	04-08-2025	
15	01-08-25 al 31-08-25	01-09-2025	04-09-2025	
16	01-09-25 al 30-09-25	01-10-2025	04-10-2025	
17	01-10-25 al 31-10-25	01-11-2025	04-11-2025	
18	01-11-25 al 30-11-25	01-12-2025	04-12-2025	
19	01-12-25 al 31-12-25	01-01-2026	04-01-2026	
20	01-01-26 al 31-01-26	01-02-2026	04-02-2026	

Quedo atento a que este requerimiento sea atendido y subsanado oportunamente.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Consorcio Acacia, R/L Francisco Mora Gutiérrez ing@geotecnica.co - consorcioacacia.info23@gmail.com
C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión crishtian.f9393@gmail.com



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Acacias, 15 de julio de 2025

CI- OCA-978.2023-209

Señor:

CONSORCIO ACACIA

R/L. FRANCISCO MORA GUTIERREZ

consorcioacacia.info23@gmail.com

Calle 26 No. 68C- 61 Oficina 316 Bogotá D.C

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por valor de \$918.733.882,00 y su plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Asunto: Requerimiento informe por suspensión de actividades a falta de insumos, del contrato No. 929 De 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de (\$16.970.259.458,00) m/cte. y su plazo de ejecución será de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Cordial saludo,

En atención al Oficio No. 16.01/0274, emitido por la entidad con fecha 11 de julio de 2025, me permito solicitar de manera atenta, pero enfática, al contratista la remisión de un informe detallado y debidamente sustentado, en el que se expliquen las causas que originaron la suspensión de actividades en el frente de obra, ocurrida el pasado 8 de julio, por la falta de insumos necesarios para el funcionamiento de los equipos de trabajo, específicamente combustible.

Es de vital importancia que este informe sea presentado a la mayor brevedad posible, en virtud de la gravedad que representa la interrupción del cronograma de ejecución contractual y las posibles consecuencias administrativas derivadas de esta situación. La claridad en la justificación y la documentación de los hechos permitirá a la entidad evaluar las medidas correctivas pertinentes y garantizar el cumplimiento de los compromisos establecidos en el contrato.

Quedo atento a su pronta respuesta, a fin de dar traslado oportuno a la entidad sobre las causas de este requerimiento.

- Anexo oficio requerimiento por parte de la entidad

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

Interventoría

C.C. Consorcio Acacia, R/L Francisco Mora Gutiérrez ing@necotecnia.co - consorcioacacia.info23@gmail.com

C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión cristhian.f9393@gmail.com



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Acacias, 15 de junio de 2025

CI- OCA-978.2023-210

Señor:

CONSORCIO ACACIA

R/L. FRANCISO MORA GUTIERREZ

consorcioacacia.info23@gmail.com

Calle 26 No. 68C- 61 Oficina 316 Bogotá D.C

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por valor de \$918.733.882,00 y su plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Asunto: Requerimiento de cronograma y plan de recursos para obras complementarias, del contrato No. 929 De 2023 cuyo objeto es "CONTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de (\$16.970.259.458,00) m/cte. y su plazo de ejecución será de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Cordial saludo,

En el marco del seguimiento técnico al Contrato de Obra No. 929 De 2023, cuyo plazo de ejecución adicional es de siete (7) meses, se ha verificado que ha transcurrido el primer mes del plazo adicional sin que se haya iniciado las actividades correspondientes a las obras complementarias en los demás componentes y frentes de trabajo, situación que representa un riesgo para el cumplimiento oportuno de las metas físicas programadas.

Por lo anterior, y con el fin de mitigar posibles desviaciones de la programación contractual, se requiere al contratista las que de manera urgente suministre la siguiente documentación:

La presentación de un cronograma de actividades actualizado, en el cual se especifique de manera detallada fechas de inicio de estas actividades de los diferentes componentes de la obra, y en cada uno de los frentes que aún no han iniciado.

La entrega de los procedimientos constructivos para cada uno de los componentes, debidamente estructurados, que permitan verificar la viabilidad técnica y operativa de la programación propuesta.

La disponibilidad oportuna de equipos, maquinaria y personal técnico y operativo suficiente, que asegure la ejecución simultánea de las actividades en todos los frentes de trabajo, conforme a la planeación contractual.

Se hace énfasis en que no se contempla la aprobación de prórrogas adicionales al plazo contractual, por lo cual el contratista debe ajustar su programación con la mayor precisión con el fin de lograr la ejecución a los términos pactados.

Calle 49 No.30-16 oficina 203, Barrio Caudal

Villavicencio - Meta

interpuentechichimene@gmail.com



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Este requerimiento tiene carácter preventivo y busca salvaguardar el cumplimiento del objeto contractual en los tiempos establecidos, por lo tanto, se solicita respuesta formal a la mayor **brevedad**, acompañada de los documentos mencionados, para su análisis y seguimiento correspondiente.

Se recuerda que el Contrato de Obra, en su cláusula **9, numeral 2, y cláusula 10, numeral 4**, establece obligaciones contractuales específicas relacionadas con la presente solicitud, las cuales, al igual que las demás disposiciones contenidas en dichas cláusulas, son de estricto cumplimiento por parte del contratista, con el fin de garantizar la adecuada ejecución del objeto contractual.

Asimismo, debe señalarse que el incumplimiento de dichas disposiciones contractuales da lugar a la aplicación de las medidas sancionatorias previstas en la cláusula **15, numerales 1 y 6** del mismo contrato, conforme a los mecanismos de control y seguimiento pactados.

La interventoría estará atenta a la implementación de la nueva programación y a la efectividad en el acatamiento de esta solicitud. También se acogerá a satisfacción cualquier acción de mejora encaminada a mejorar el rendimiento y la calidad que permita lograr una mayor efectividad en la materialización del objeto del proyecto.

Sin otro particular quedo atento a cualquier inquietud frente a estos requerimientos y prestos a coadyubar en pro de la buena marcha del proyecto.

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Consorcio Acacia, R/L Francisco Mora Gutiérrez ing@geotecnica.co - consorcioacacia.info23@gmail.com
C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión crishian.f9393@gmail.com



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Acacias, 21 de julio de 2025

CI- OCA-978.2023-211

Ingeniero

IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Secretaría de Infraestructura – Alcaldía de Acacias

infraestructura@acacias.gov.co

Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por valor de \$918.733.882,00 y su plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Asunto: Radicación de informe semanal No.53 del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de (\$16.970.259.458,00) m/cte, y su plazo de ejecución será de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales me permito remitir para su conocimiento e información el informe semanal No.53 del contrato citado en el asunto para el siguiente periodo:

INFORME SEMANAL	PERIODO		AVANCE (+) ATRASO (-) \$	AVANCE (+) ATRASO (-) %
No 53	07-07-2025	13-07-2025	-\$1.094.388.373,99	-6,449%

Los valores y porcentajes programados corresponden a la programación presentada y aprobada por la Interventoría. De igual manera, los valores ejecutados reflejan las verificaciones en campo realizadas por el equipo de interventoría. Se aclara que, a partir de la semana No. 50, la programación de obra fue actualizada como resultado de la aprobación de la Modificatoria No.1, la cual entró en vigor el 21 de junio de 2025.



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Anexo:

- Informe semanal No 53

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Consorcio Acacia, R/L Francisco Mora Gutiérrez ing@geotecnica.co - consorcioacacia.info23@gmail.com
C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión cristhian.f9393@gmail.com



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

Acacias, 21 de julio de 2025

CI- OCA-978.2023-212

Ingeniero

IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Secretaría de Infraestructura – Alcaldía de Acacias

infraestructura@acacias.gov.co

Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por valor de \$918.733.882,00 y su plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Asunto: Radicación comité de obra No 43 del contrato de obra 929 DE 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de (\$16.970.259.458,00) m/cte, y su plazo de ejecución será de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No.1.

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales, me permito remitir para su conocimiento la información correspondiente al Comité de Obra No. 43, llevado a cabo el 17 de julio de 2025, en el marco del contrato citado en el asunto.

COMITÉ No	FECHA
No 43	17-07-2025

Aclaremos que dicho comité será adjuntado en original en el informe mensual que se radique y él envió por este medio es de conocimiento para las partes, de igual forma los compromisos pactados en dicho comité fueron los siguientes:

#	B. COMPROMISOS PACTADOS	FECHA	RESPONSABLE
1	Solicitud Cambio de personal profesional	17 de julio de 2025	Contratista
2	Certificados de calidad agregados de concretos	21 de julio de 2025	Contratista

Calle 49 No.30-16 oficina 203, Barrio Caudal

Villavicencio – Meta

interpuentechichimene@gmail.com



JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1

3	Procedimientos constructivos de los componentes	22 de julio de 2025	Contratista
4	Planillas seguridad de junio	21 de julio de 2025	Contratista
5	Oficio aclaratorio de interrupción de actividades a falta de insumos	21 de julio de 2025	Contratista
6	Gestion de acercamiento con el gremio de volqueteros	22 de julio de 2025	Entidad

Agradezco su atención y quedo atento a cualquier aclaración

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Consorcio Acacia, R/L Francisco Mora Gutiérrez info@geotecnia.co - consorcioacacia.info23@gmail.com
C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión crstthian.f9393@gmail.com

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
NIT 9.658.796-1

Acacias, 30 de julio del 2025

Ingeniero
IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA
Secretario de Infraestructura
Secretaría de Infraestructura – Alcaldía de Acacias
infraestructura@acacias.gov.co
Carrera 16 No. 12-10 Barrio Centro

RECIBIDO OCA-978-2023-213

Fecha: 31-07-25
Hora: 8:05 am
Firma: Pedro Mondragón
Anexo: Dos (2) carpetas
Secretaría de Infraestructura

Referencia: Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por valor de \$918.733.882,00 y su plazo de ejecución de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No. 1

Asunto: Radicación de informe mensual No 13 del contrato de interventoría No. OCA-978 DE 2023 cuyo objeto contractual es "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" por un valor de (\$16.970.259.458,00) m/cte, y su plazo de ejecución será de dieciocho (18) meses, según Modificatoria No. 1

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones contractuales me permito remitir para su conocimiento revisión y archivo el informe mensual que radicamos a continuación del contrato citado en el asunto para el siguiente periodo:

INFORME MENSUAL	PERIODO		FOLIOS
No 13 Interventoría	17-06-2025	30-06-2025	254

La información que contiene el informe radicado es la siguiente:

CARPETA 1	124 folios
	Informe mensual de interventoría - ANEXOS: Registro Fotográfico Actas de comité de obra Informes semanales Afilaciones y/o pagos del personal a la seguridad social Interventoría Correspondencia enviada y recibida Informe de inversión recursos de anticipo Copia de bitácora Certificaciones vanas
CARPETA 2	130 folios
	- INFORME DE ESPECIALISTAS: Informe estructural Informe de seguridad y salud en el trabajo Informe topográfico Informe ambiental Soporte costos de interventoría

Call's 49 No.30-16 oficina 203, Barrio Caudal
Villavicencio – Meta
informetechichimemo@gmail.com

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

NIT 9.658.796-1



	CUADROS ANEXOS Control estado general del tiempo. Control ensayos de laboratorio Control personal de Interventoría Control seguridad industrial Control correspondencia Control equipos Control implementación plan de manejo ambiental
--	--

Debemos precisar que los respectivos informes hacen referencia y análisis única y exclusivamente a la certificación de actividades ejecutadas del contrato de interventoría para que este sea archivado en el expediente de este y una vez que el contratista de obra entregue la información física del contrato de obra se radicara informe de interventoría para el contrato de obra con todos los anexos enfocados al control y seguimiento del contrato de obra

Anexo:

- Informe Mensual contrato de interventoría No 13

Cordialmente,

ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Interventoría

C.C. Ing. Cristian Fuentes Amado - Apoyo a la supervisión crislian.f9393@gmail.com

Calle 49 No.30-16 oficina 203, Barrio Caudal
Villavicencio - Meta
interpuentechichimene@gmail.com

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

9.5.2. Correspondencia recibida

	Contrato de obra No. OCA-929 de 2023, Construcción Puente Vehicular sobre el caño Chichimene en la Vereda Quebraditas del Municipio de Acacias.	
---	---	---

Acacias, 02 de julio 2025

Señores:

JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ
INTERVENTORIA

Ref.: contrato de obra no. oca-929 de 2023, con objeto "CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS"

Asunto: Invitación a la socialización de reinicio de obra

Cordial saludo ingeniero

La presente es para invitarlo a la socialización de reinicio de obra del proyecto ya mencionado y contar con su asistencia.

Dicha socialización se realizará de la siguiente manera.

LUGAR	FECHA	HORA
Escuela Quebraditas	4/07/2025	3:00pm

La finalidad de la socialización de reinicio de obra es informar a la comunidad el alcance y condiciones actuales de la obra. Además, de resolver inquietudes.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente



FRANCISCO MORA GUTIERREZ

Representante Legal

Correo: consorcioplacahuellaacacias@gmail.com

	Contrato de obra No. OCA-929 de 2023, Construcción Puente Vehicular sobre el caño Chichimene en la Vereda Quebraditas del Municipio de Acacias.	
---	---	---

Acacias, 02 de julio 2025

Ingeniero:

IVAN MAURICIO ROJAS

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA

Ref.: contrato de obra no. oca-929 de 2023, con objeto "CONSTRUCCIÓN PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS"

Asunto: Invitación a la socialización de reinicio de obra

Cordial saludo ingeniero

La presente es para invitarlo a la socialización de reinicio de obra del proyecto ya mencionado y contar con su asistencia.


Dicha socialización se realizará de la siguiente manera.

LUGAR	FECHA	HORA
Escuela Quebraditas	4/07/2025	3:00pm

La finalidad de la socialización de reinicio de obra es informar a la comunidad el alcance y condiciones actuales de la obra. Además, de resolver inquietudes.

Agradezco la atención prestada

Cordialmente



FRANCISCO MORA GUTIERREZ

Representante Legal

Correo: consorcioplacahuellaacacias@gmail.com



Acacias, 11 de julio de 2025

Al contestar cite 16.01/0274

Señor (es):

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA

R/L INTERVENTORÍA

interpuentechichimene@gmail.com

+57 312 440 3276

FRANCISCO MORA GUTIERREZ

R/L CONSORCIO ACACIA

Consortioacacia.info23@gmail.com

+57 311 819 0371 – (571) 601 – 8089634

Asunto: Solicitud de pronunciamiento frente a suspensión de actividades en obra del Contrato de obra No. OCA-929 de 2023.

Cordial saludo,

En atención a los recientes reportes de seguimiento al contrato de obra No. OCA-929 de 2023, cuyo objeto es la CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS, se ha evidenciado la suspensión de actividades constructivas en el frente de obra, según se nos ha informado, por falta de suministro de combustible, situación que viene afectando el normal desarrollo del cronograma pactado de acuerdo con la Modificatoria No 1.

En este sentido, de manera atenta se solicita a usted, en su calidad de Interventor, emitir un pronunciamiento formal que dé cuenta de los hechos que han generado esta situación, así como las acciones tomadas por parte de la interventoría frente a la suspensión de actividades y la afectación al cumplimiento del contrato.

Así mismo, teniendo en cuenta que este tipo de situaciones podrían constituir un posible incumplimiento por parte del contratista, se le solicita sea remitido a la supervisión el informe de interventoría donde se sustente las actuaciones y/o posibles obligaciones incumplidas, en los términos establecidos en el artículo 86 de la Ley 1474 del 2011, SS y demás normas aplicables.

Agradecemos su atención y pronta respuesta, con el fin de adoptar las medidas correctivas y contractuales que correspondan.

Cordialmente,

Firmado
digitalmente por
Ivan Mauricio
Rojas Novoa

IVAN MAURICIO ROJAS NOVOA

Secretario de Infraestructura

Proyectó: Cristian Fuentes Amado / Profesional de Apoyo a la Supervisión
Revisó: Gina Melissa / Profesional Jurídico Secretaria de Infraestructura

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

9.6 Informe de inversión recursos de anticipo



INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO

ALCALDÍA DE
ACACIAS

CONTRATO N°

978 DE 2023

CONTRATO INTERVENTORIA N

978 DE 2023

OBJETO

INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS

CONTRATISTA

JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT: 9558756-1

VALOR DEL CONTRATO DE

\$ 827.281.787,00

VALOR ANTICIPO DEL 30%

\$ 188.124.536,00

NO CONTRATO O CUENTA

DAVIVIENDA S.A. CUENTA DE AHORROS DAMAS No 0550489436756992

FECHA DE DESEMPEÑO


18 DE JULIO DE 2024

VALOR GIRADO MUNICIPIO

\$ 188.124.536,00

DATOS PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	PAGO DE SALARIOS Y COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	\$ 112.874.721,60	60,00%
2	DIRECTOR INGENIERO CIVIL, O ING DE TRANSPORTE Y VIAS	\$ 28.943.502,20	15,38%
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA INGENIERO CIVIL	\$ 38.265.666,45	20,87%
4	TECNOLOGO EN HBRO	\$ 11.088.103,60	5,89%
5	INGENIERO AMBIENTAL	\$ 7.004.085,90	3,72%
6	INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	\$ 7.004.085,90	3,72%
7	TOPOGRAFO	\$ 6.126.753,90	3,26%
8	CADENERO 1	\$ 3.801.046,90	2,02%
9	OPERARIO	\$ 5.638.476,75	3,12%
10	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA	\$ 28.218.680,40	15,00%
11	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 14.109.340,20	7,50%
12	ARRENDAMIENTO DE OFICINA	\$ 14.109.340,20	7,50%
13	ALQUILER CAMIONETA TIPO PICK UP	\$ 47.031.134,00	25,00%
13	CAMIONETA TIPO PICK UP	\$ 47.031.134,00	25,00%
TOTAL		\$ 188.124.536,00	100%



DISTRIBUCION DE ANTICIPO POR C/P FLUJO



No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	PAGO DE SALARIOS Y COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	\$ 112.874.721,60	60,00%
2	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA	\$ 28.218.680,40	15,00%
3	ALQUILER CAMIONETA TIPO PICK UP	\$ 47.031.134,00	25,00%
TOTAL		\$ 188.124.536,00	100%

DATOS MOVIMIENTOS REALIZADOS


MOVIMIENTO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	ITEM AFECTADO	DESCRIPCIÓN DE LA ORDEN
1	31/07/2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	\$ 17.486.042,20	2	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
2	31/07/2024	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	\$ 28.868.719,15	3	Reembolso por pago salario, prestaciones y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
3	31/07/2024	FLOR ANGELA NARVAEZ	\$ 7.586.597,20	4	Reembolso por pago salario, prestaciones y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
4	31/07/2024	KAROL PAOLA SANTANA TORRES	\$ 4.792.268,30	5	Reembolso por pago salario, prestaciones y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
5	31/07/2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	\$ 4.792.268,30	6	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
6	31/07/2024	OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON	\$ 4.191.306,30	7	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
7	31/07/2024	MICHELL VANESA TRUJILLO	\$ 2.600.716,30	8	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
8	31/07/2024	PEDRO ELADIO ALFEREZ	\$ 8.594.747,25	9	Reembolso por pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas meses de mayo, junio y julio de 2024
9	31/07/2024	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	\$ 14.109.340,20	11	Anticipo alquiler equipos de computo personal
10	31/07/2024	SERGEY MESA	\$ 14.109.340,20	12	Anticipo contrato de arrendamiento oficina
11	31/07/2024	JORGE ESTEBAN RODRIGUEZ MEDINA	\$ 23.515.567,00	13	Anticipo contrato de arrendamiento vehiculo
12	31/08/2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	\$ 8.075.096,40	2	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
13	31/08/2024	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	\$ 12.400.947,30	3	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
14	31/08/2024	FLOR ANGELA NARVAEZ	\$ 3.501.506,40	4	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
15	31/08/2024	KAROL PAOLA SANTANA TORRES	\$ 2.211.816,80	5	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
16	31/08/2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	\$ 2.211.816,80	6	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
17	31/08/2024	OSCAR HERNAN ALARCON ORTEGON	\$ 1.934.448,60	7	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
18	31/08/2024	MICHELL VANESA TRUJILLO	\$ 1.200.330,60	8	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
19	31/08/2024	PEDRO ELADIO ALFEREZ	\$ 3.043.729,50	9	Pago salario, prestaciones sociales, sistema integral de seguridad social y demas mes de agosto 2024
20	31/08/2024	JORGE ESTEBAN RODRIGUEZ MEDINA	\$ 23.515.567,00	13	Anticipo 2 contrato de arrendamiento vehiculo
21	30-09-2024	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO	\$ 3.372.363,60	13	Abono salario director de interventoria
TOTAL APROBADO			\$ 188.124.536,00		

RESUMEN DE RECURSOS APROBADOS Y SALDOS DE ANTIPO

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTIPO
1	PAGO DE SALARIOS Y COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	\$ 112.874.721.60	\$ 3.372.363.60	\$ 109.502.358.00	\$ 112.874.721.60	\$ -
2	DIRECTOR INGENIERO CIVIL O ING DE TRANSPORTE Y VIAS	\$ 28.943.502.20	\$ 3.372.363.60	\$ 25.571.138.60	\$ 28.943.502.20	\$ -
3	RESIDENTE DE INTERVENTORIA INGENIERO CIVIL	\$ 39.269.666.45		\$ 39.269.666.45	\$ 39.269.666.45	\$ -
4	TECNOLOGO EN HSEQ	\$ 11.088.103.60		\$ 11.088.103.60	\$ 11.088.103.60	\$ -
5	INGENIERO AMBIENTAL	\$ 7.004.085.90		\$ 7.004.085.90	\$ 7.004.085.90	\$ -
6	INGENIERO CIVIL - ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS	\$ 7.004.085.90		\$ 7.004.085.90	\$ 7.004.085.90	\$ -
7	TOPOGRAFO	\$ 6.125.753.90		\$ 6.125.753.90	\$ 6.125.753.90	\$ -
8	CADENERO I	\$ 3.801.046.90		\$ 3.801.046.90	\$ 3.801.046.90	\$ -
9	OPERARIO	\$ 9.638.476.75		\$ 9.638.476.75	\$ 9.638.476.75	\$ -
10	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA	\$ 28.218.680.40	\$ 0.00	\$ 28.218.680.40	\$ 28.218.680.40	\$ -
11	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO	\$ 14.109.340.20	\$ 0.00	\$ 14.109.340.20	\$ 14.109.340.20	\$ -
12	ARRIENDO DE OFICINA	\$ 14.109.340.20	\$ 0.00	\$ 14.109.340.20	\$ 14.109.340.20	\$ -
13	ALQUILER CAMIONETA TIPO PICK UP	\$ 47.031.134.00	\$ 0.00	\$ 47.031.134.00	\$ 47.031.134.00	\$ -
14	CAMIONETA TIPO PICK UP	\$ 47.031.134.00		\$ 47.031.134.00	\$ 47.031.134.00	\$ -
	TOTAL	\$ 188.124.536.60	\$ 3.372.363.60	\$ 184.752.172.40	\$ 188.124.536.60	\$ 0.00

ITEM No.	DESCRIPCIÓN	VALOR	PRESENTE PERIODO	ACUMULADO ANTERIOR	ACUMULADO TOTAL	SALDO ANTIPO
1	PAGO DE SALARIOS Y COSTOS DIRECTOS DEL PERSONAL	\$ 112.874.721.60	\$ 3.372.363.60	\$ 109.502.358.00	\$ 112.874.721.60	\$ -
2	ALQUILER DE EQUIPOS DE COMPUTO Y OFICINA	\$ 28.218.680.40	\$ 0.00	\$ 28.218.680.40	\$ 28.218.680.40	\$ -
3	ALQUILER CAMIONETA TIPO PICK UP	\$ 47.031.134.00	\$ 0.00	\$ 47.031.134.00	\$ 47.031.134.00	\$ -
	TOTAL	\$ 188.124.536.60	\$ 3.372.363.60	\$ 184.752.172.40	\$ 188.124.536.60	\$ 0.00

GRAFICOS DE INVERSION DE RECURSOS DE ANTIPO

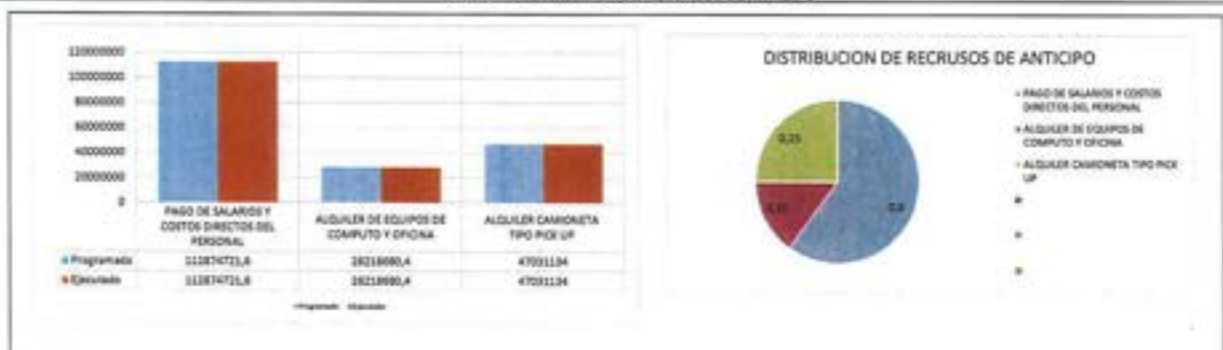

GRAFICOS DE INVERSION DE RECURSOS DE ANTIPO



Dirigido:
Nombre: SAMY ANDRÉS TORRES CASTRO
Director de Interventoría

Firmado:
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Residente de Interventoría

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

9.7 Copia de bitácora de obra.

MARTES 01 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades: 7:00 AM.
- * Clima del día: lluvias durante la mañana (4 hr).
- * Se realiza charla de seguridad al inicio de la jornada laboral por parte del area SST de obra.
- * Personal en obra: 1 residente de obra, 1 Director de obra, 1 profesional SST de obra, 1 maestro general de obra, 1 oficial de obra, 7 ayudantes de obra, 1 auxiliar vial, 1 residente de Interventoría.
- * Equipos y maquinaria en obra: 1 planta eléctrica de 440 KV, 2 motobombas de 6", 1 electrobomba sumergible de 2", 2 martillos eléctricos, Herramienta eléctrica menor, Herramienta manual menor, Equipos de oficina (computador - Impresora).
- * Actividades:
 - Se inicia el distanciamiento y adecuación del área para instalación de formaletas para encofrado de la viga cabecal del estribo Quebraditas.
 - Se realiza la verificación de aceros de refuerzo conforme al diseño con el fin de advertir si se encuentra algún faltante.
 - Se realiza manejo de agua de forma permanente mediante bombeo mecánico. //

Residente de obra.
Ing. Alexander Herrera

Profesional SST de obra.
Dra. Maria Fernanda Rodriguez.

Director de Interventoría.
Ing. Blenny Andres Torres

Residente de Interventoría
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Apoyo de Interventoría.
Ing. Pedro Alfaro

MIÉRCOLES 2 DE JUNIO DEL 2025

- * Inicio de la jornada: 7:00 AM.
- * Clima del día: lluvias durante todo el día (8 hr).
- * Se realiza charla de seguridad al inicio de la jornada por parte del area SST de obra.
- * Personal en obra: 1 residente de obra, 1 profesional SST de obra, 1 Director de obra, 1 maestro general de obra, 1 oficial de obra, 7 ayudantes de obra, 1 auxiliar vial, 1 residente de Interventoría, 1 profesional SST de Interventoría.
- * Equipos y maquinaria en obra: 1 planta eléctrica de 440 KV, 2 motobombas de 6", 1 electrobomba sumergible de 2", 2 martillos eléctricos, Herramienta eléctrica menor, Herramienta manual menor, Equipos de oficina (computador - Impresora).
- * Actividades
 - Se continua alistamiento del area para instalacion de formaletas para encofrado de la viga Cabecal del estribo Quebraditas.
 - No se pudo realizar mayor actividad por intensas lluvias que se presentaron durante todo el día. //

Residente de obra:
Ing. Alexander Herrera

Profesional SST de obra
Dra. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoría.
Ing. Jimmy Andres Torres

Residente de Interventoría.
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Profesional SST de Interventoría
Dra. Angela Narvaes Castro

Apoyo de Interventoría.
Ing. Pedro Alferez

JUEVES 3 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades: 7:00 AM.
- * Clima del día: Tiempo seco durante toda la jornada
- * Se realiza charla de seguridad al inicio de la jornada por parte de area SST de obra
- * Personal en obra: 1 Ing. residente de obra, 1 Director de obra, 1 profesional SST de obra, 1 maestro general de obra, 1 oficial de obra, 7 ayudantes de obra, 1 auxiliar vial, 1 residente de Interventoria.
- * Equipos y maquinaria en obra: 1 planta eléctrica de 440 KV, 2 motobombas de 6", 1 electrobomba sumergible de 2", 2 martillos eléctricos, Herramienta eléctrica menor, Herramienta manual menor, equipos de oficina (computador - impresora).
- * Actividades:
 - Se continúa alistamiento y adecuación de área para instalar formaletas para el encofrado de la viga cabecal del estribo Quebraditas.
 - Se inicia remoción de material y despeje del perímetro de la viga cabecal del estribo Palomas para el desencofrado de esta estructura.
 - Se realiza manejo de aguas de manera permanente mediante bombeo mecánico. //

Residente de obra:
Ing. Alexander Herrera

Profesional SST de obra:
Dra. María Fernanda Rodríguez

Director de Interventoria
Ing. Dimas Andres Torres

Residente de Interventoria
Ing. Jorge Augusto Rodríguez

Apoyo de Interventoria:
Ing. Pedro Alfaro

VIERNES 4 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades 7:00 AM
- * Clima del día: Lluvias en la mañana - (3hr)
- * Se realiza charla de seguridad al inicio de la jornada por parte del area SST de obra
- * Personal en obra: 1 residente de obra, 1 director de obra, 1 profesional SST de obra, 1 maestro general, 1 oficial de obra, 7 ayudantes de obra, 1 auxiliar vial, 1 residente de Interventoría, 1 profesional SST de Interventoría.
- * Equipos y maquinaria en obra: 1 planta eléctrica de 440 kv, 2 motobombas de 6", 1 electrobomba sumergible de 2", 2 martillos eléctricos, Herramienta eléctrica menor, Herramienta manual menor, Equipos de oficina (computador-impresora).
- * Actividades:
 - Se continúa distanciamiento y adecuación del área para instalación de formidotas y encofrado para la viga cabezal estribo Quebraditas.
 - Se continúa con el retiro de material de tensión del encofrado en el perímetro de la viga cabezal construida en el estribo folomas con el fin de proceder al desencofrado.
 - Se continúa manejo de aguas en los frentes de trabajo mediante bombeo mecánico. //

Residente de obra.
Ing. Alexander Herrera.

Profesional SST de obra.
Dra. María Fernanda Rodríguez

Director de Interventoría.
Ing. Jimmy Andrés Torres

Residente de Interventoría.
Ing. Jorge Augusto Rodríguez

Profesional SST de Interventoría.
Dra. Angela Navarro Castro

Apoyo de Interventoría.
Ing. Pedro Alferez

SABADO 5 DE JULIO DEL 2025

- * Se inicia actividades a las 7:00 AM.
- * Clima del día: Se presentan lluvias en la tarde (4 hr).
- * Se realiza charla de seguridad al inicio de la jornada por parte del area SST de obra.
- * Personal en obra: 1 residente de obra, 1 Director de obra, 1 profesional SST de obra, 1 maestro general, 1 oficial de obra, 7 ayudantes de obra, 1 auxiliar vial, 1 residente de Interventoria.
- * Equipos y maquinaria en obra: 1 planta eléctrica de 4400 Kv, 2 motobombas de 6", 1 electrobomba sumergible de 2", 2 martillos eléctricos, Herramienta eléctrica menor, Herramienta manual menor, Equipos de oficina (computador e impresora).
- * Actividades:
 - Se continua adecuacion de areas y perimetro para instalacion de formaletas de encofrado para la viga cabecal del estibo quebraditas
 - Se termina la remision de material de contension del encofrado de la viga cabecal en estibo Palomas y se inicia el desensofrado.
 - Se continua el manejo de aguas en los frentes de trabajo mediante bombeo mecánico. //

Residente de obra
Ing. Alexander Herrera

Director de obra
Ing. Juan de Jesus Garcia

Director de Interventoria
Ing. Jimmy Andres Torrez

Residente de Interventoria
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Apoyo de Interventoria
Ing. Pedro Alfores

profesional SST de obra.
Dra. Maria Fernanda Rodriguez

LUNES 7 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades: 7:00 AM.
- * Clima del día: lluvias en la mañana (2 hr)
- * Se realiza charla de seguridad al inicio de la jornada por parte del área SST de obra.
- * Personal de obra: 1 residente de obra, 1 Director de obra, 1 profesional SST de obra, 1 maestro general de obra, 1 oficial de obra, 7 ayudantes de obra, 1 auxiliar vial, 1 residente de Interventoría, 1 profesional ambiental de Interventoría.
- * Equipos y maquinaria en obra: 1 planta eléctrica 240 kv, 2 motobombas de 6", 1 electrobomba de 3" sumergible, 2 martillos eléctricos, Herramienta eléctrica menor, Herramienta manual menor, Equipos de oficina (computador-impresora).
- * Actividades:
 - Se continúa adecuación de áreas perimetrales para el cercofrado de la viga cabozal del estibo Quebraditas.
 - Se continúa con el cercofrado de la viga cabozal del estibo Palomas
 - Se realiza manejo de aguas en los frentes de trabajo mediante bombeo mecánico. //

Residente de obra
Ing. Alexander Herrera

Director de obra
Ing. Juan de Jesús García

Profesional SST de obra
Dra. María Fernanda Rodríguez

Director de Interventoría
Ing. Jimmy Andrés Torres

Residente de Interventoría
Ing. Jorge Augusto Rodríguez

Profesional ambiental Interventoría
Ing. Oscar Hernán Alarcón

Apoyo de Interventoría
Ing. Pedro Alférez

MARTES 8 DE JULIO DEL 2025

* Inicio de labores a las 7:00 AM previa a charla SST.

* Personal en obra: 1 Ing Residente Obra, 1 profesional SST, 1 maestro general, 1 Director de obra, 1 maestro general, 1 oficial, 7 Agudantes, 1 auxiliar vial, 1 residente de Interventoria, 1 profesional SST de Interventoria.

* Clima del día: Nubias en la mañana (3 hr).

* Equipos y maquinaria: 1 planta eléctrica de 440 KV, 2 motobombas de 6", 1 electrobomba sumergible de 2", 2 martillos eléctricos, Herramienta eléctrica menor, Herramienta manual menor, Equipos de oficina (computador - impresora).

* Actividades:

- Se continúa despeje y adecuación de area perimetral para el exofrado de la viga en el estibo Quebraditas.
- Se continúa el desenfocado de la viga cabecal estibo Palomas.
- Se inicia el traslado de formetas del costado Palomas al estibo Quebraditas.
- Se continúa manejo de aguas mediante bomba mecánica.

* Nota: Se agota el combustible para los equipos y por lo tanto se interrumpe el bombeo para manejo de aguas causando una interrupción en las actividades. //

Residente de obra.
Ing. Alexander Herrera

Director de obra.
Ing. Juan de Dios Garcia

Profesional SST de obra.
Dra. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoria.
Ing. Jimmy Andres Torres

Residente de Interventoria.
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Profesional SST de Interventoria
Dra. Angela Narvaez Casero

Apoyo de Interventoria.
Ing. Pedro Alferez

MIÉRCOLES 9 de Julio - 2025

Se recibió visita de DIEL INGENIERIA

ING: FABIO R. RODRIGUEZ

Juan C. Castiblanco

Asunto: ILUMINACION VIA.

OBS: - Se encuentra una línea de media tensión costado- oriental

- Arborización - se requiere poda
- Se sugiere alternar Iluminación no estrictamente si no de acuerdo a árboles que generan sombra.

* Inicio de actividades: 7:00 AM

* Clima del día: Sin lluvias y nublado

* Se realiza charla de seguridad al inicio de la jornada por parte del área SST de obra.

* Personal en obra: 1 Ing. Residente de obra, 1 Director de obra, 1 profesional SST de obra, 1 maestro general, 1 oficial, 7 ayudantes, 1 auxiliar vial, 1 residente de Interventoría.

* Equipos en obra: 1 planta eléctrica 440 KV, 2 motobombas de 6", 1 electrobomba sumergible 2", 2 martillos eléctricos, Herramienta eléctrica menor, Herramienta manual menor, Equipos de oficina, (computador-impresora).

* Actividades:

- Visita de los profesionales eléctricos que van a presentar propuesta para la construcción del componente eléctrico, verificación en campo de las cantidades, los alcances y especificaciones técnicas.
- Las Actividades continúan restringidas por falta de combustible, por lo tanto no se tiene el manejo de agua para el normal desarrollo de actividades. //

Residente de obra
Ing. Alexander Herrera

Director de obra
Ing. Juan de Dios García

Profesional SST de obra
Dra. María Fernanda Rodríguez

[Signature]
Director de Interventoría
Ing. Jimmy Andrés Torres

[Signature]
Residente de Interventoría
Ing. Jorge Augusto Rodríguez

[Signature]
Profesional SST de Interventoría
Dra. Angela Norvaz Castro

[Signature]
Apoyo a la Interventoría
Ing. Pedro Alfaro

JUEVES 10 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades: 7:00 AM
- * Clima del día: Tiempo seco y nublado durante la jornada
- * Se realiza charla de seguridad al inicio de la jornada por parte del área SST de obra.
- * Personal en obra: 1 residente de obra, 1 director de obra, 1 profesional SST de obra, 1 maestro general, 1 oficial, 7 ayudantes, 1 auxiliar vial, 1 residente de Interventoría, 1 profesional SST Interventoría.
- * Equipos en obra: 1 planta eléctrica 440V, 2 motobombas 6", 1 electrobomba sumergible 2", 2 martillos eléctricos, Herramienta eléctrica menor, Herramienta manual menor, Equipos de oficina (computador-impresora)
- * Actividades:
 - El combustible llega a obra en horas de la mañana, superando así la interrupción de actividades.
 - Se continúa con el despeje y adecuación del área perimetral para el encafrado de la viga cabecera en el estribo quebraditas, también se inicia limpieza y despeje de las áreas perimetrales para iniciar armado de aceros de los muros de las alas costado Palomas.
 - Se continúa el traslado de formaletas del costado Palomas al costado Quebraditas.
 - Se continúa bombeo mecánico para manejo de aguas en los frentes de trabajo. //

[Signature]
Residente de obra
Ing. Alexander Herrera

[Signature]
Director de obra
Ing. Juan da Jesus Grazia

[Signature]
Profesional SST de obra
Dra. Maria Fernanda Rodríguez

[Signature]
Director de Interventoría
Ing. Jimmy Andrés Torres

[Signature]
Residente de Interventoría
Ing. Jorge Augusto Rodríguez

[Signature]
Apoyo a Interventoría
Ing. Pedro Alferez.

VIERNES 11 DE JULIO DEL 2025.

- * Inicio de actividades. 7:00 AM.
- * Clima del día: Tiempo seco pero nublado.
- * Se realiza charla de seguridad al inicio de la jornada por parte del área SST de obra.
- * Personal en obra: 1 residente de obra, 1 director de obra, 1 propietario SST de obra, 1 maestro general, 1 oficial, 7 ayudantes, 1 auxiliar vital, 1 operador-retro, 1 residente de interventoría.
- * Equipos y maquinaria: 1 planta eléctrica 400 W, 2 motobombas 6", 1 distribuidora 2" sumergible, 2 martillos eléctricos, Herramienta eléctrica menor, Herramienta manual menor, 1 retroexcavadora orugada, equipos de oficina (computador, impresora).
- * Actividades:
 - Se recibe en obra 1 retroexcavadora orugada con operador.
 - Se continúa encofrado para viga cabezal estribo Quebraditas.
 - Se continúa limpieza y adecuación de área para iniciar armado de aceros en muros de las estribos Palomas.
 - Se termina el traslado de formidetas de lado Palomas a Quebraditas.
 - Se continúa manejo de aguas mediante bombeo mecánico.
 - La retro-excavadora inicia adecuación de plataforma para las actividades de armado y ensamble de vigas metálicas. //

[Signature]
Residente de obra
Ing. Alexander Herrera

[Signature]
Director de obra.
Ing. Juan de Jesús Gracia

[Signature]
Propietario SST de obra
Dra. María Fernanda Rodríguez

[Signature]
Director de Interventoría
Ing. Jimmy Andrés Torres

[Signature]
Residente de Interventoría
Ing. Jorge Augusto Rodríguez

Fuente
 Profesional SST de Interventoría
 Dra. Angélica Norraced Castro

Pedro Jr.
 Apoyo a Interventoría
 Ing. Pedro Alferez

SABADO 12 DE JULIO DEL 2025.

- * Inicio de actividades: 7:00 AM.
- * Clima del día: Tiempo seco durante la jornada.
- * Se realiza charla de seguridad al inicio de la jornada area SST obra.
- * Personal en obra: 1 residente de obra, 1 Director de obra, profesional SST de obra, 1 maestro general, 1 oficial, 1 operador, 1 auxiliar vial, 1 residente de Interventoría.
- * Equipos y maquinaria: 1 Retroexcavadora cargada, 1 planta eléctrica de 440 KV, 2 motobombas de 6", 1 electrobomba sumergible de 2", 2 martillos eléctricos, Herramienta eléctrica menor, Herramienta manual menor, Equipos de oficina (computador-impresora)
- * Actividades:
 - Se continúa enrofrado en viga cabeza al estibo Quebraditas
 - Se inicia armado de aceros de refuerzo para aletas estibo Palomas
 - Adecuación de plataforma costado Palomas para armado y ensamble de las vigas metálicas.
 - se realiza manejo de aguas en los frentes de trabajo mediante bombeo mecánico //

Alexander Herrera
 Residente de obra
 Ing. Alexander Herrera

Juan de Dios
 Director de obra
 Ing. Juan de Dios Garcia

Mayra Fernanda Rodríguez
 profesional SST de obra.
 Dra. Mayra Fernanda Rodríguez


Jimmy Andres Torres
 Director de Interventoría
 Ing. Jimmy Andres Torres


Jorge Augusto Rodríguez
 Residente de Interventoría.
 Ing. Jorge Augusto Rodríguez


Pedro Jr.
 Apoyo a Interventoría.
 Ing. Pedro Alferez

LUNES 14 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades: 7:00 AM
- * Clima del día: lluvias en la mañana (4. hr)
- * Se realiza charla de seguridad al inicio de la jornada por parte del area SST de obra.
- * Personal en obra: 1 residente de obra, 1 Director de obra, 1 profesional SST de obra, 1 maestro general, 1 oficial, 1 operador, 1 auxiliar vial, 1 residente de Interventoria, 1 profesional ambiental de Interventoria, 9 ayudantes de obra.
- * Equipos y maquinaria: 1 retroexcavadora orugada, 1 planta eléctrica de 440KV, 2 motobombas 6", 1 electrobomba sumergible de 2", 2 martillos eléctricos, Herramienta eléctrica y manual menor, Equipos de oficina (computador- impresora).
- * Actividades:
 - Se continúa encofrado para viga cabeza al estribo Quebraditas.
 - Armado de aceros de refuerzo para aletas de estribo Palomas.
 - Se continúa adecuación de plataforma para armado y ensamble de las vigas metálicas, ramision de material con retroexcavadora.
 - Se continúa manejo de aguas en los frentes de trabajo mediante bombeo mecánico. //

Residente de obra: 
Ing. Alexander Herrera

Director de obra: 
Ing. Juan de Jesus Garcia

Profesional SST de obra: 
Dra. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoria: 
Ing. Jimmy Andres Torres

Residente de Interventoria: 
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Profesional Ambiental Interventoria: 
Ing. Oscar Hernan Alarcon

Apoyo de Interventoria: 
Ing. Pedro Alferez

MARTES 15 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades: 7:00 AM.
- * Clima del día: Tiempo nublado.
- * Se realiza charla de seguridad al inicio de la jornada por parte del área SST de obra.
- * Personal en obra: 1 residente de obra, 1 director de obra, 1 profesional SST de obra, 1 maestro general, 1 oficial, 1 operador, 9 ayudantes, 1 auxiliar viol, 1 residente Interventoría, 1 profesional SST de Interventoría.
- * Equipos y maquinaria: 1 Retroexcavadora, 1 planta eléctrica de 440 KV, 2 motobombas de 6", 1 életróbomba sumergible de 2", 2 martillos eléctricos, Herramientas eléctricas y manual menor, Equipos de oficina (computador-impresora)
- * Actividades:
 - Se continúa enrofrado de viga cabecera estribo Quebradillas.
 - Se continúa armado de accros de refuerzo en dctas estribo palomas.
 - Se continúa adecuación de plataforma en costado palomas para el armado y ensamble de las vigas metálicas.
 - Se continúa manejo de aguas en los frentes de trabajo mediante bombeo mecánico. //

Residente de obra.
Ing. Alexander Herrera

Director de obra.
Ing. Juan de Dios García

Profesional SST de obra
Dra. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoría
Ing. Jimmy Andres Torres

Residente de Interventoría
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Profesional SST de Interventoría
Dra. Argelia Manuarez Castro

Apoyo de Interventoría
Ing. Pedro Alferez

MIERCOLES 16 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades: 7:00 AM.
- * Clima del día: Tiempo seco durante la jornada.
- * Se realiza charla de seguridad previo al inicio de la jornada por parte del área SST de obra.
- * Personal en obra: 1 residente de obra, 1 Director de obra, 1 profesional SST de obra, 1 maestro general, 1 oficial, 10^{os} Ayudantes, 1 operador, 1 auxiliar vital, 1 residente de interventoría.
- * Equipos y maquinaria: 1 Retroexcavadora orugada, 1 planta eléctrica 440KV, 2 motobombas 6", 1 electrobomba 9" sumergible, 2 martillos eléctricos, Herramienta menor eléctrica y manual, Equipos de oficina (computador-impresora)
- * Actividades:
 - Se continua encofrado para viga cabeza/ en estribo Quebraditas
 - Se continua armado de aceros de refuerzo para aletas del estribo Palmas
 - Se continua adecuación de plataforma para armado y ensamble de vigas metálicas, recepción de material con retroexcavadora.
 - Constante manejo de aguas en los dos frentes de trabajo mediante bomba mecánica. //

Residente de obra.
Ing. Alexander Herrera

Director de obra.
Ing. Juan de Jesús García

Profesional SST de obra.
Dra. María Fernández Rodríguez

Director de Interventoría.
Ing. Jimmy Andrés Torres

Residente de Interventoría.
Ing. Jorge Augusto Rodríguez

Apoyo de Interventoría.
Ing. Pedro Alfaro

JUEVES 17 DE JULIO DEL 2025.

- * Inicio de actividades: 7:00 AM.
- * Clima del día: Lluvias en la mañana (4 hr.) moderadas
- * Se realiza charla de seguridad al inicio de la jornada por parte del area SST de obra.
- * Personal en obra: 1 residente de obra, 1 Director de obra, 1 profesional SST de obra, 1 maestro general, 1 oficial, 10 ayudantes, 1 operador, 1 auxiliar vial, 1 residente de interventoría.
- * Equipos y maquinaria: 1 retroexcavadora Orugada, 1 planta eléctrica de 440 KV, 2 motobombas 6", 1 electrobomba 2" sumergible, 2 martillos eléctricos, Herramienta menor eléctrica y manual, Equipos de oficina (computador-impresora).
- * Actividades:
 - Se continua encofrado para viga cabeza del estribo Quebraditas.
 - Se continua armado de aceros para muro de las aletas estribo Pakame.
 - Se continua adecuación de plataforma para el armado y ensamble de las vigas metálicas, con remoción de materiales con retroexcavadora.
 - Se realiza manejo de aguas permanentemente mediante bombas mecánicas, motobombas. //

Residente de obra
Ing. Alexander Herrera

Director de obra
Ing. Juan de Jesus Gracia

Profesional SST de obra.
Dra. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoría.
Ing. Jimmy Andres Torres

Residente de Interventoría.
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Apoyo de Interventoría.
Ing. Pedro Alfaraci

VIERNES 18 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades: 7:00 AM.
- * Clima del día: Se presentan lluvias mañana y tarde. (4 hr.-AM)
(3 hr.-PM). Lluvias fuertes.
- * Se realiza charla de seguridad por parte del area SST de obra al inicio de la jornada.
- * Personal en obra: 1 residente de obra, 1 Director de obra, 1 profesional SST de obra, 1 maestro general, 1 oficial, 10 Agu-dantes, 1 operader, 1 auxiliar vid, 1 residente de Interventoria, 1 profesional SST de Interventoria.
- * Equipos y maquinaria en obra: 1 retroexcavadora orugada, 1 planta eléctrica de 440 KV, 2 motobombas 6", 1 electro-bomba de 2" sumergible, 2 martillos eléctricos, Herramienta menor eléctrica y manual, Equipos de oficina (computador-impresora).
- * Actividades:
 - Se continua encofrado para viga cabzal estribo Quebraditas.
 - Se continua armado de ascens para muro aletas estribo Palomas.
 - Se continua adecuación de la plataforma de operacion para armado y ensamble de las vigas metalicas.
 - Se continua manejo de aguas permanentemente en los dos frentes de trabajo, mediante bombeo mecánico.
- * NOTA: Se recibe visita por parte de la supervision de la entidad, con el objeto de realizar seguimiento a las actividades desarrolladas y verificar el estado de avance de la ejecución contractual. //

Residente de obra
Ing. Alexander Herrera

Director de obra
Ing. Juan de Jesús Orsain

Profesional SST de obra
Dra. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoria
Ing. Jimmy Andres Torres

Residente de Interventoria
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Profesional SST de Interventoria
Dra. Angela Narvaez Castro

Apoyo de Interventoria: Ing. Pedro Alferez

SABADO 19 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades: 7:00 AM.
- * Clima del día: Lluvias en la mañana (2 h.) intermitentes
- * Se realiza charla de seguridad por parte del area SST de obra al inicio de la jornada.
- * Personal en obra: 1 residente de obra, 1 Director de obra, 1 profesional SST de obra, 1 maestro general, 1 oficial, 10 ayudantes, 1 auxiliar vial, 1 residente de Interventoría, 1 operador
- * Equipos y maquinaria en obra: 1 retroexcavadora oropada, 1 planta eléctrica 440 Kv, 2 motobombas 6", 1 eléctrobomba 2" sumergible, 2 martillos eléctricos, Herramienta menor eléctrica y manual, Equipos de oficina (computador-impresora).
- * Actividades:
 - Se continua encofrado para viga cabecal del estribo Quebraditas.
 - Se continua armado de aceros para marcos de aletas estribo Palomas.
 - Se continua manejo de aguas permanente en los frentes de trabajo mediante bombeo mecánico. //

Residente de obra
Ing. Alexander Herrera

Director de obra:
Ing. Juan de Jesus Garcia

Profesional SST de obra.
Sra. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoría.
Ing. Jermmy Andras Torres

Residente de Interventoría.
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Apoyo de Interventoría.
Ing. Pedro Alferez

LUNES 21 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades: 7:00 AM.
- * Clima del día: Lluvias en la tarde (2 hr) moderadas
- * Personal SST de obra realiza charla de seguridad al inicio de la jornada laboral.
- * Personal en obra: 1 residente de obra, 1 Director de obra, 1 profesional SST de obra, 1 maestro general, 1 oficial, 10 Ayudantes, 1 operador, 1 auxiliar vial, 1 residente de interventoría, 1 Topógrafo, 1 codenoro.
- * Equipos y maquinaria: 1 retroexcavadora orugada, 1 planta eléctrica de 440KV, 2 motobombas 6", 1 electrobomba 2" sumergible, 2 martillos eléctricos, Herramienta menor eléctrica y manual, Equipos de oficina (computador - impresora).
- * Actividades:
 - Se continúa limpieza y lavado de aceros y del solado para la viga cabecial, también reforzamiento con material perimetral de apoyo a la formaleta del encofrado, en el estribo costado Quebraditas.
 - Armado de aceros para los muros de las aletas en estribo Palomas.
 - Se realiza replanteo y verificación de cotas y niveles topográficos de las estructuras de los dos estribos del puente.
 - Manejo de aguas permanente mediante bombeo mecánico.
 - El contratista informa programación de vaciado para la viga cabecial del estribo quebraditas para el día miércoles 23 Julio a las 7:00 AM.

Residente de obra.
Ing. Alexander Herrera

Director de obra
Ing. Juan de Jesús Gracia

Profesional SST de obra.
Dra. María Fernanda Rodríguez

Director de interventoría
Ing. Jimmy Andros Torres

Residente de interventoría
Ing. Jorge Augusto Rodríguez

Apoyo de Interventoría.
Ing. Pedro Alfaro

MARTES 22 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades: 7:00 AM
- * Clima del día: Lluvias en la mañana (3 hr.) moderadas.
- * Se realiza charla de seguridad por parte del aren SST de obra al inicio de la jornada laboral.
- * Personal en obra: 1- residente de obra, 1-Director de obra, 1-profesional SST de obra, 1-maestro general, 1-Oficial, 11-Ayudantes, 1-Operador, 1-Auxiliar vial, 1-Residente de Interventoría, 1-profesional SST de Interventoría.
- * Equipos y maquinaria en obra: 1-retroexcavadora orugada, 1-planta eléctrica 440 KV, 2 motobombas 6", 1-electrobomba 2° sumergible, 2 morteros eléctricos, Herramienta menor eléctrica y manual, equipos de oficina (computador-impresora).

* Actividad

- Se continúa limpieza y lavado de aceros y soldado previo a la fundida de la viga cabezal del estribo quebraditas, como también el reapreciamiento perimetral del encofrado con material de rejoso para la contención.
- Se continúa el armado de aceros de refuerzo para muros alcas del estribo Palomas.
- Se continúa chequeo topográfico de cotas y niveles previo al vaciado de la viga cabezal Quebraditas y muro alcas de Palomas.
- Manejo de aguas permanente mediante bombeo mecánico.

* NOTA - Se realiza verificación en campo de la distribución, cantidades, posiciones y traslapes de aceros para viga en estribo Quebraditas y se libera para el vaciado. //

Residente de Obra
Ing. Alexander Herrera

Director de obra
Ing. Juan de Jesús Gracia

Profesional SST de obra
Dra. María Fernanda Rodríguez

Director de Interventoría
Ing. Jimmy Padua Torres

Residente de Interventoría
Ing. Jorge Augusto Rodríguez

Profesional SST de Interventoría
Dra. Ángela Narvعة Castro

Apoyo a Interventoría
Ing. Pedro Alfaro

MIERCOLES 23 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades: 6:00 AM
- * Clima del día: Nubias moderadas en la mañana (2 hr)
- * Se realiza charla de seguridad por parte del area SST de obra al inicio de la jornada.
- * Personal en obra: 1- residente de obra, 1- Director de obra, 1- profesional SST de obra, Profesional ambiental de obra, maestro general, 1- oficial, 11- Ayudantes, 1- operador, 1- Auxiliar vial, 1- residente de Interventoria, Topografo y cadenera de obra, profesional ambiental de Interventoria.
- * Equipos en obra: 1- retroexcavadora orugada, 1- planta eléctrica 440 KV, 2 motobombas 6", 1- electrobomba 2" sumergible, 2 mangueras eléctricas, Herramienta menor manual y eléctrica, Equipos de oficina (computador-impresora), maquinaria para vaciado de concreto (autobomba y mixeros para suministro).
- * Actividades:
 - Inicio de vaciado para viga cabecal Quebraditas a las 7:20 AM.
 - Y se finaliza a las 14:20, descargadas 17 mixer sin novedad.
 - Se continúa armado de aceros para muros de alotas estribo Palomas.
 - Mandeo de aguas permanentemente mediante bombas mecánicas.
 - Se toman especímenes del concreto para ensayos de laboratorio.
 - Replanteo topográfico en el componente vial. //

Residente de obra
Ing. Alexander Herrera

Director de obra
Ing. Juan de Jesús Gracia

Profesional SST de obra
Dra. María Fernanda Rodríguez

Profesional ambiental de obra
Ing. Wendy Tatiana Zapata

Director de Interventoria
Ing. Jimmy Andrés Torres

Residente de Interventoria
Ing. Jorge Augusto Rodríguez

Profesional ambiental Interventoria
Ing. Oscar Hernán Alarcón

Apoyo Interventoria
Ing. Pedro Alfaro

JUEVES 24 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades: 7:00 AM
- * Clima del día: Lluvias 8:00 AM. a 10:00 AM (2 hr) mod.
- * Se realiza charla de seguridad por parte de SST de obra al inicio de la jornada.
- * Personal en obra: 1. residente de obra, 1. director de obra, 1. profesional SST de obra,
1. maestro general, 1. oficial, 11. ayudantes, 1. operador, 1. auxiliar vial, 1. topógrafo,
1. cadenero, 1. residente de Interventoría.
- * Equipos y maquinaria: 1. retroexcavadora orugada, 1. planta eléctrica 440 KV,
2. motobombas 6", 1. electrobomba 7" sumergible, 2. martillos eléctricos, Herramienta menor eléctrica y manual, Equipos de oficina (computador - impresora).
- * Actividades:
 - Se continúa armado de aceros para muros de las aletas estribo Palomas
 - Se inicia el deshierpado de la viga cabozal del estribo quebraditas
 - Se continúa el replanteo topográfico en el componente vial del proyecto por el costado salida a Palomas.
 - Manejo de aguas permanentemente mediante bombeo mecánico
- ⇒ "NOTA: En esta fecha renuncia un ayudante de obra, se reduce entonces a 10 ayudantes a partir del día siguiente." //

Residente de obra.
Ing. Alexander Herrera

Director de obra
Ing. Juan de Dios Gracia

Profesional SST de obra.
Dra. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoría
Ing. Jimmy Andres Torres

Residente de Interventoría
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Apoya a Interventoría.
Ing. Pedro Alfaro

VIERNES 25 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades: 7:00 AM
- * Clima del día: Tiempo seco durante toda la jornada.
- * Se realiza charla de seguridad por parte del area SST de obra al inicio de la jornada.
- * Personal en obra: 1-residente de obra, 1-director de obra, 1-profesional SST de obra, 1-maestro general, 1-opical, 10-Ayudantes, 1 topografo, 1-cadenero, 1-operador, 1 residente de Interventoria, 1-profesional SST Interventoria.
- * Maquinaria en obra: 1-retroexcavadora equipada, 1-planta eléctrica 44KV, 2 motobombas 6", 1-electrobomba 2"sumergible, 2 martillos neumáticos, Herramienta menor eléctrica y manual, Equipos de oficina (computador-impresora).
- * Actividades:

- Se continua armado de aceros para muro aletas del estribo palomas.
- Se continua desmontaje de la viga cabecal del estribo Quebraditas.
- Se continua replanteo topografico preliminar del componente vial.

⇒ **NOTA:** Se realiza visita por parte de la supervisión y recorrido a obra y realiza pregunta respecto al acercamiento del contratista con el grupo de vidueltas y el contratista indicó que se está a la espera que desde la gerencia se gestione la negociación. También pregunta acerca de la llegada de las vigas, manifestando que se espera la llegada en unos 20 días, finalmente se le indicó que la proxima semana se realizará vaciado en muro aletas palomas."

- Se continua manejo de aguas permanente mediante bombeo mecánico.
- Traslado de formidetas desde castado Quebraditas a castado palomas.

Residente de obra.
Ing. Alexander Herrera

Director de obra.
Ing. Juan de Jesus Garcia

Profesional SST de obra.
Dra. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoria.
Ing. Jimmy Andres Torres

Residente de Interventoria.
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Profesional SST de Interventoria.
Dra. Angela Navarro Castro

Apoyo de Interventoria.
Ing. Pedro Alferez

SABADO 26 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades: 7:00 AM.
- * Clima del día: Lluvias en la mañana (4 h) fuertes lluvias
- * Se realiza charla de seguridad por parte del área SST de obra al inicio de la jornada.
- * Personal en obra: 1-residente de obra, 1-Director de obra, 1-profesional SST de obra, 1-maestro general, 1-oficial, 10-Ayudantes, 1-topógrafo, 1-cadeneta, 1-Auxiliar Vial, 1-operador, 1-residente de Interventoría.
- * Maquinaria en obra: 1-retroexcavadora cargada, 1-planta eléctrica HUKY, 2-motobombas 6", 1-electrobomba 2" sumergible, Herramienta menor, eléctrica y manual, Equipos de oficina.
- * Actividades:
 - Se continúa traslado de formaletas del costado Quebraditas al costado Palmas.
 - Retiro de lodos de las excavaciones por motivo de la inundación a causa del invierno.
 - Manejo de aguas permanente mediante bombas mecánicas.
 - No se pudo realizar mayor actividad por motivos de fuertes lluvias durante toda la mañana y en los días Sábado se labora solo media jornada. //

Residente de obra.
Ing. Alexander Herrera

Director de obra.
Ing. Juan de Trespalacio

Profesional SST de obra
Dra. María Fernanda Rodríguez

Director de Interventoría.
Ing. Jimmy Andrés Torres

Residente de Interventoría.
Ing. Jorge Augusto Rodríguez

Apoyo de Interventoría
Ing. Pedro Algora

LUNES 28 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades: 7:00 AM
- * Clima del día: Nubias fuertes en la tarde (2 h).
- * Se realiza charla de seguridad por parte del area SST de obra al inicio de la jornada.
- * Personal en obra: 1-residente de obra, 1-Director de obra convenio, 1-profesional SST de obra, 1-maestro general, 1-oficial, 10-Ayudantes, 1-topografo, 1-cadenero, 1-operador, 1-Auxiliar vial, 1-residente de Interventoria, 1-profesional SST de Interventoria, 1-profesional ambiental de obra.
- * Equipos y maquinaria: 1-retroexcavadora orugada, 1-planta eléctrica de 440 KV, 2 motobombas 6", 1-eléctrobomba 2" sumergible, Herramienta menor eléctrica y manual, Equipos de oficina (computador, Impresora).
- * Actividades:
 - Se continua armado de aceros para los muros de las del estiba Palomas.
 - Se continua replanteo topografico en la implementacion del componente vial en centro poblado de Quibraditas.
 - Se termina desenchufado de la viga cabozal del estiba Quibraditas.
 - Manejo de aguas permanente mediante bombas mecánicas.

Residente de obra
Ing. Alexander Herrera

Director de obra.
Ing. Juan de Jesus Gracia

Profesional SST de obra
Dra. Mariana Fernandez Rodriguez

Profesional ambiental de obra.
Ing. Tatiana Zapata

Director de Interventoria.
Ing. Timothy Andres Torres

Residente de Interventoria
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Profesional SST de Interventoria.
Dra. Angela Norvaz Castro

Ayudante de Interventoria.
Ing. Pedro Alferez

MARTES 29 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades:
- * clima del día: lluvias moderadas AM (1hr) lluvias fuertes PM (2hr)
- * Personal en obra: 1-residente de obra, 1-Director de obra, 1-profesional SST de obra, 1-maestro general, 1-oficial, 10-Ayudantes, 1-topógrafo, 1-cordencero, 1-operador, 1-Auxiliar Vial, 1-residente de Interventoría, 1-profesional SST de Interventoría, Profesional ambiental Interventoría.
- * Maquinaria y equipos: 1-retroexcavadora arugada, 1-planta eléctrica 440 KV, 2 motobombas de 6", 1-eléctrobomba 2"sumergible, Herramienta menor tipo eléctrica y manual, Equipos de oficina (computador, impresora)
- * Actividades:
 - Se continúa armado de aceros en muros de ductos del estribo Palemas.
 - Se realiza armado de aceros para los estribos y espaldas superiores del estribo Quebraditas.
 - Se realiza chequeo, verificación y replanteo topográfico para instalación de aceros del estribo superior Quebraditas.
 - Manejo agua permanente en las excavaciones mediante bombeo mecánico //

Residente de obra
Ing. Alexander Herrera

Director de obra
Ing. Juan de Jesús Gracia

Profesional SST de obra
Dra. María Fernanda Rodríguez

Director de Interventoría
Ing. Jimmy Andrés Torres

Residente de Interventoría
Ing. Jorge Augusto Rodríguez

Profesional SST de Interventoría
Ing. Angella Navarro Castro

Profesional ambiental Interventoría
Ing. Oscar Hernán Alarcón

Apoyo de Interventoría
Ing. Pedro Alférez

MIERCOLES 30 DE JULIO DEL 2025

- * Inicio de actividades: 7 A.M.
 - * Clima del día: SOLEADO EN LA MAÑANA Y TARDE
 - * Se realiza charla de seguridad por parte del área SST de obra al inicio de la jornada.
 - * Personal en obra: (1) Director de obra, (1) MESTRO (1) operario excavadora
- Actividades: se realizó hiello para alatar costado Quebraditas
- Comisión de Topografía verifica distancia entre estripos, ok! ± 1 cm

[Firma]
Director de obra

- * Personal en obra: 1. residente de obra, 1. profesional SST de obra, 10. Ayudantes, 1. oficial, 1. Topógrafo, 1. Cadenero, 1. Auxiliar vial, 1. residente de Interventoría,
- * Equipos y maquinaria: 1. retroexcavadora orugada, 1. planta eléctrica 440 KV, 2. motobombas 6", 1. electrobomba 2" sumergible, Herramienta menor, equipos de oficina.
- * Actividades:
 - Se continúa manejo de aguas de las excavaciones mediante bombas mecánicas
 - Armado de aceros y formaletas en muros alatar costado Palmas. //

[Firma]
Residente de obra.
Ing. Alexander Herrera

[Firma]
Profesional SST de obra
Ing. María Fernanda Rodríguez

[Firma]
Director de Interventoría.
Ing. Jimmy Andrés Torres

[Firma]
Residente de Interventoría.
Ing. Jorge Augusto Rodríguez

[Firma]
Apoyo de Interventoría.
Ing. Pedro Alfaro

Jueves 31 de Julio de 2025

INICIO ACTIVIDADES: 7. A.M.

Clima: Despejado y soleado en la mañana

Actividades: - Se apuntala formadeta base aletas - palomas.
- Se drena base sector Quebraditas para amarrar hierro base aletas - Quebraditas.

- * Se realiza charla de seguridad por parte del área SST de obra al inicio de la jornada.
- * Personal en obra: 1-residente de obra, 1-Director de obra, 1-profesional SST de obra, 1-maestro general, 1-Oficial, 10-Ayudantes, 1-operador, 1-topografo, 1-cadenero, 1-Auxiliar Vial, 1-residente de Interventoria.
- * Equipos y maquinaria en obra: 1-retroexcavadora orugada, 1-planta eléctrica 440, 2 motobombas 6", 1-electrobomba 2" sumergible, Herramienta menor, equipos de oficina.
- * Mas Actividades:
 - Se Continúa aseguramiento total de la formadeta para las zapatas de las aletas del costado Palomas
 - Se inicia armado de aceros para zapatas de aletas costado Quebraditas.
 - Bombeo mecánico permanente para manejo de agua en las excavaciones donde se adelantan actividades. //

Residente de obra.
Ing. Alexander Herrera

Director de obra
Ing. Juan de Jesus Grajales

Prof. SST de obra
Dra. Maria Fernanda Rodriguez

Director de Interventoria
Ing. Pineda Andres Torres

Residente de Interventoria.
Ing. Jorge Augusto Rodriguez

Oficio de Interventoria
Ing. Pedro Alferez

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

9.8 Certificaciones varias

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	
		Página 1
CERTIFICADO		

Por medio de la presente yo HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY en mi condición de contadora de JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA identificado con cedula de ciudadanía 9.658.796 de Yopal, en su condición de CONTRATISTA identificado con NIT numero 9.658.796-1, tiene vinculado en su planta de personal como trabajador en condición de discapacidad al señor CARLOS ALBERTO SANCHEZ RIOS identificado con cedula de ciudadanía número 10.031.206 de Pereira en el periodo del 01 de julio del 2025 al 31 de julio de 2025.

En constancia, se firma en Villavicencio a los 01 días del mes de agosto del 2025.



HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
C.C 1.121.884.207 de Villavicencio
T.P 189521-T

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	Página 1
	CERTIFICADO	

Por medio de la presente yo HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY en mi condición de contadora del JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA identificado con Nit número 9658796-1 certifico que en el periodo del 01 de julio del 2025 al 31 de julio de 2025:

- Se ha cumplido con los pagos al sistema de seguridad social y salud, pensiones y riesgos profesionales y con los aportes parafiscales correspondientes a los empleados que se han vinculado por contrato de trabajo, por lo que declaro que el consorcio se encuentra a paz y salvo con las empresas Promotoras de Salud EPS, Fondos de Pensiones, Administradoras de Riesgos Profesionales ARP Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y SENA.

En constancia, se firma en Villavicencio a los 01 días del mes de agosto del 2025.



HEIDY ALEJANDRA LANCHEROS CANTY
C.C 1.121.884.207 de Villavicencio
T.P 189521-T

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

9.9 Informe de especialistas

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME AMB No. 14 Página 1
INFORME AMBIENTAL N° 14		

CONTRATO DE INTERVENTORIA 978 DE 2023

INFORME AMBIENTAL N°14

“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS”



PERIODO DEL INFORME

01 DE JULIO DEL 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME AMB No. 14 Página 2
INFORME AMBIENTAL N° 14		

REVISION Y APROBACION

Objeto de Interventoría:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	
Título de Documento:	Informe Ambiental No 14 (01 DE JULIO DEL 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025)	
Documento No:	INFAMBIENTAL- 014	
APROBACION		
	Nombre:	ING. OSCAR HERNÁN ALARCÓN ORTEGÓN
Responsable por la elaboración:	Firma:	
	Fecha:	01-08-2025
	Nombre:	ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Vo Bo representante legal:	Firma:	
		01-08-2025

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME AMB No. 14 Página 3
INFORME AMBIENTAL N° 14		

CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.....	4
2	RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO	5
2.1	Localización del Proyecto y Descripción.....	5
2.2	Aspectos ambientales	6
2.3	Alcance	7
2.4	Estado inicial de la zona a intervenir	7
2.2	Estado actual de la zonas intervenidas	8
2.3	Componentes Básicos de Ejecución del Proyecto	9
3	ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA	10
3.1	Actividades Básicas	10
3.2	Control Técnico ambiental	11
3.3	Seguimiento a los permisos legales, ambientales y fichas.	13
4	CUMPLIMIENTO AL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	17
5	INCONVENIENTES PRESENTADOS.....	21
6	CONCLUSIONES.....	21

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME AMB No. 14
		Página 4
INFORME AMBIENTAL N° 14		

1 INTRODUCCIÓN

Dentro del plan de manejo ambiental se contemplan diferentes programas ambientales que permitan planificar el uso sostenible, la protección, y/o prevención, de los recursos naturales que puedan ser afectados en el desarrollo para la construcción del nuevo puente de la vereda Quebraditas sobre el caño Chichimene.

Los Programas ambientales realizados en el documento contienen el plan operativo y de contingencia donde se definen los proyectos a desarrollar en el corto plazo y los requerimientos técnicos y financieros para alcanzar las metas propuestas. Se establecen los mecanismos e instrumentos de seguimiento y evaluación, y los indicadores ambientales y de gestión que permitan evaluar el cumplimiento del plan.

Con la información técnica correspondiente al proyecto, (planos, imágenes, descripción de actividades y procesos), se logró tipificar los posibles impactos ambientales generados con el proyecto, llegando a los lineamientos para la prevención, mitigación, corrección y compensación de estos posibles impactos generados por la ejecución de la obra. Se realiza una revisión de la Normatividad Ambiental vigente aplicable al proyecto, para así generar un marco de referencia normativo, acorde con el tipo de proyecto a ejecutar.

Se realiza una descripción sobre la demanda, uso, aprovechamiento y/o oferta de los recursos naturales, como de las aguas superficiales, vertimientos, ocupación de cauces, materiales de construcción, y aprovechamiento forestal.


En la Evaluación ambiental se identifican y evalúan los impactos generados durante la etapa de demolición y construcción del puente del proyecto y se plantean los programas ambientales que permitan generar unos lineamientos de las acciones a ejecutar en cada componente, durante la etapa de construcción de estos.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACIAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME AMB No. 14 Página 5
INFORME AMBIENTAL N° 14		

2 RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

2.1 Localización del Proyecto y Descripción

La zona para intervenir se encuentra ubicada en el Municipio de Acacias, específicamente está ubicada en la vía Terciaria que conduce a la vereda quebraditas a 34.4 Km del casco urbano del Municipio de Acacias Meta, de cuales 13.56 se encuentran en afirmado, las coordenadas de ubicación son las 03°57'39,99" N y 73°30'17.67" O

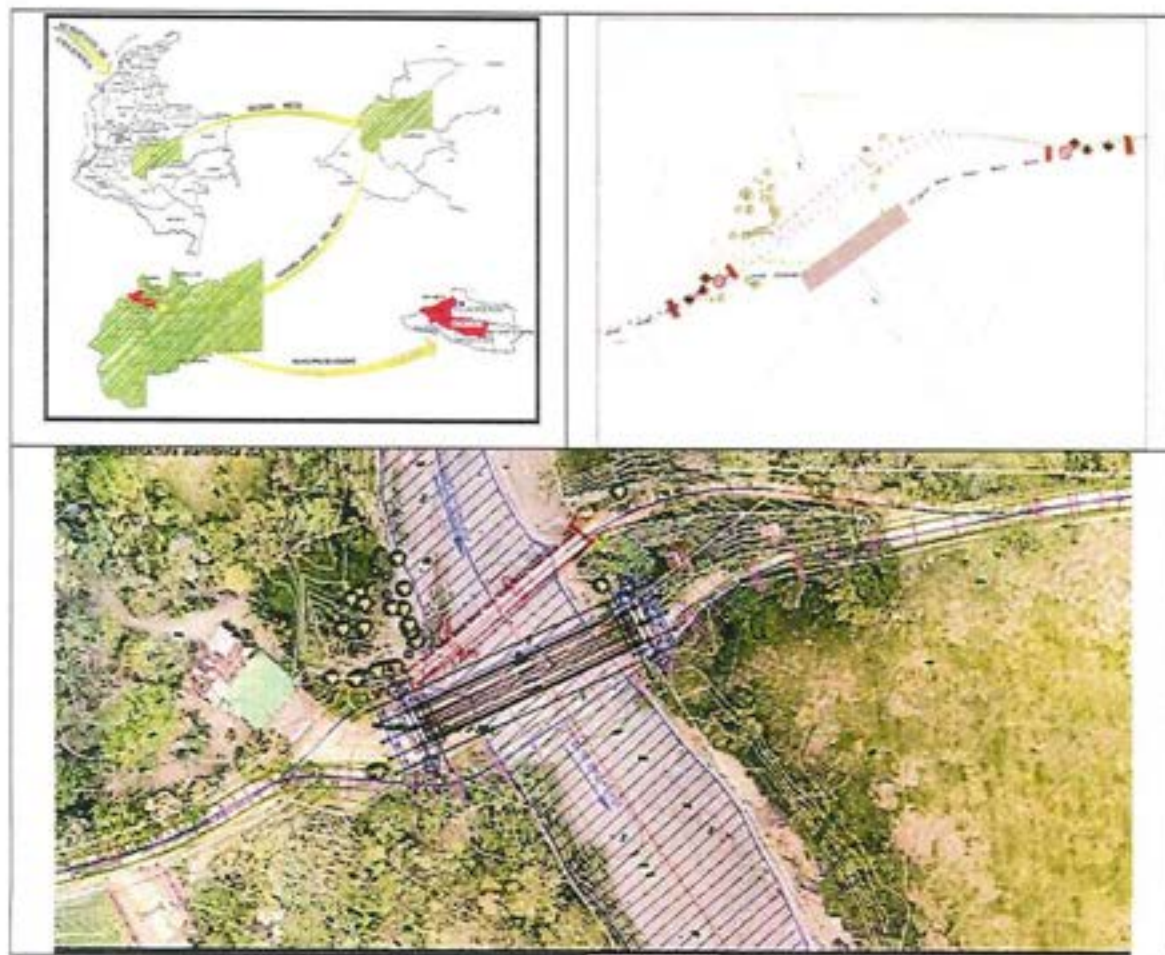

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME AMB No. 14 Página 6
	INFORME AMBIENTAL N° 14	

2.2 Aspectos ambientales

La construcción de una estructura puede influir en el medioambiente provocando diferentes tipos de afecciones como son:

- Modificación del medioambiente, con diferentes tipos de polución: física y química, fisiológica, biológica y luminosa.
- Consumo de recursos, con el empleo de combustibles y **otras** energías y materias primas no recuperables.
- Producción de residuos, generada en la extracción de materias primas, ejecución de obras y demoliciones.

La reducción del Impacto Ambiental en el sector de la construcción se centra en tres aspectos fundamentales, el control del consumo de recursos, la reducción de las emisiones contaminantes y la minimización y correcta gestión de los residuos que se generan a lo largo del proceso constructivo, así mismo la mayor parte de los recursos empleados en las obras de puentes son inertes, sin que puedan provocar daños peligrosos al medio ambiente, pero existen otros elementos que si generan afecciones peligrosas medioambientales, como son plásticos, aceites y combustibles.

En el caso de construcción de puentes las mayores afecciones se producen en los movimientos de tierras, por lo que es necesario cuidar la regeneración del perfil original del terreno una vez terminadas las obras, incluyendo la regeneración de la vegetación que existía en un principio.

DOCUMENTOS LEGALES	CASILLA DE VERIFICACION	OBSERVACIONES
LICENCIA AMBIENTAL	N/A	Para el proyecto no aplica.
PERMISO DE CONCESIÓN DE AGUAS	N/A	Para el proyecto no aplica.
PERMISO DE VERTIMIENTOS	N/A	Para el proyecto no aplica.
PERMISO DE OCUPACION DE CAUCE	SI	Resolución PS-GJ. 1.2.6.23.2235 del expediente 3.37.3.023.078, solicitud de prórroga 1080.30//0393 de fecha 19 de junio de 2024. A la espera de renovación
PERMISO DE APROVECHAMIENTO FORESTAL	N/A	Para el proyecto no aplica.
PERMISO DE EXPLOTACION DE MATERIAL	SI	Concesión minera No 19099 para extracción y transporte de material granular. Río Guayuriba vigencia hasta el 28 de diciembre de 2030, Licencia ambiental Resolución No PS-GJ-1.2.6.013-1941 para extracción y transporte de material granular. Río Guayuriba, vigencia hasta el 28 de diciembre de 2030


	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME AMB No. 14 Página 7
INFORME AMBIENTAL N° 14		

PERMISO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ORDINARIOS	N/A	Para el proyecto no aplica, pero si se deberá solicitar permiso ambiental a la empresa prestadora del servicio.
PERMISO DE DISPOSICION FINAL DE RESIDUOS SOLIDOS ESPECIALES	N/A	Para el proyecto no aplica, pero si se deberá solicitar permiso ambiental a la empresa prestadora del servicio.

2.3 Alcance

El presente informe permitirá dar a conocer el cumplimiento por parte del contratista de cada uno de los programas propuestos para el manejo integral de los componentes ambiental y social de la zona afectada por la obra de manera que se identifiquen los impactos y se implemente de manera asertiva las medidas de control, mitigación y compensación que haya lugar.

2.4 Estado inicial de la zona a intervenir

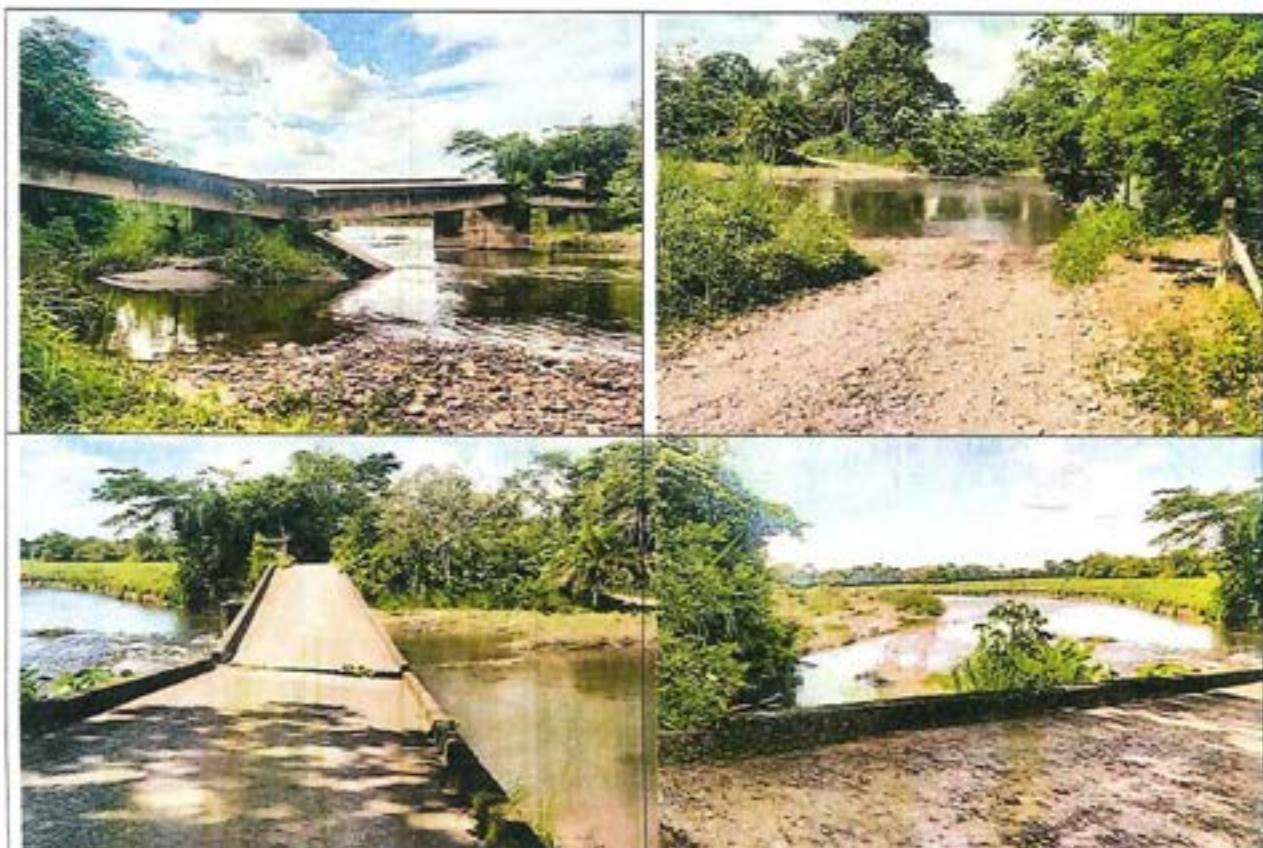

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME AMB No. 14 Página 8
INFORME AMBIENTAL N° 14		



2.2 Estado actual de la zonas intervenidas





**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME AMB No. 14

Página 9

INFORME AMBIENTAL N° 14



2.3 Componentes Básicos de Ejecución del Proyecto

El contrato desde el inicio de las actividades; se relaciona las siguientes actividades realizadas o en ejecución:


CAPITULO	ACTIVIDADES CONTRACTUALES VIGENTES	ACTIVIDADES REALIZADAS E INICIADAS A LA FECHA DEL CORTE
PMA	PLAN AMBIENTAL GENERAL AJUSTADO	1. El PMA es reemplazado por el Plan PAGA el cual fue aprobado y se encuentra en implementación cuyos componentes se ajustan a los requerimientos exigidos en este tipo de proyectos.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME AMB No. 14 Página 10
INFORME AMBIENTAL N° 14		

3 ACTIVIDADES DESARROLLADAS POR LA INTERVENTORÍA

3.1 Actividades Básicas

La interventoría realiza un seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista establecidas en el plan de manejo ambiental aprobado por la interventoría y supervisión del contrato; esto se lleva a cabo mediante el profesional ambiental en campo, el cual realiza un registro fotográfico diario de cada actividad con las respectivas fichas de seguimiento y evaluación semanales que son el soporte del presente informe.

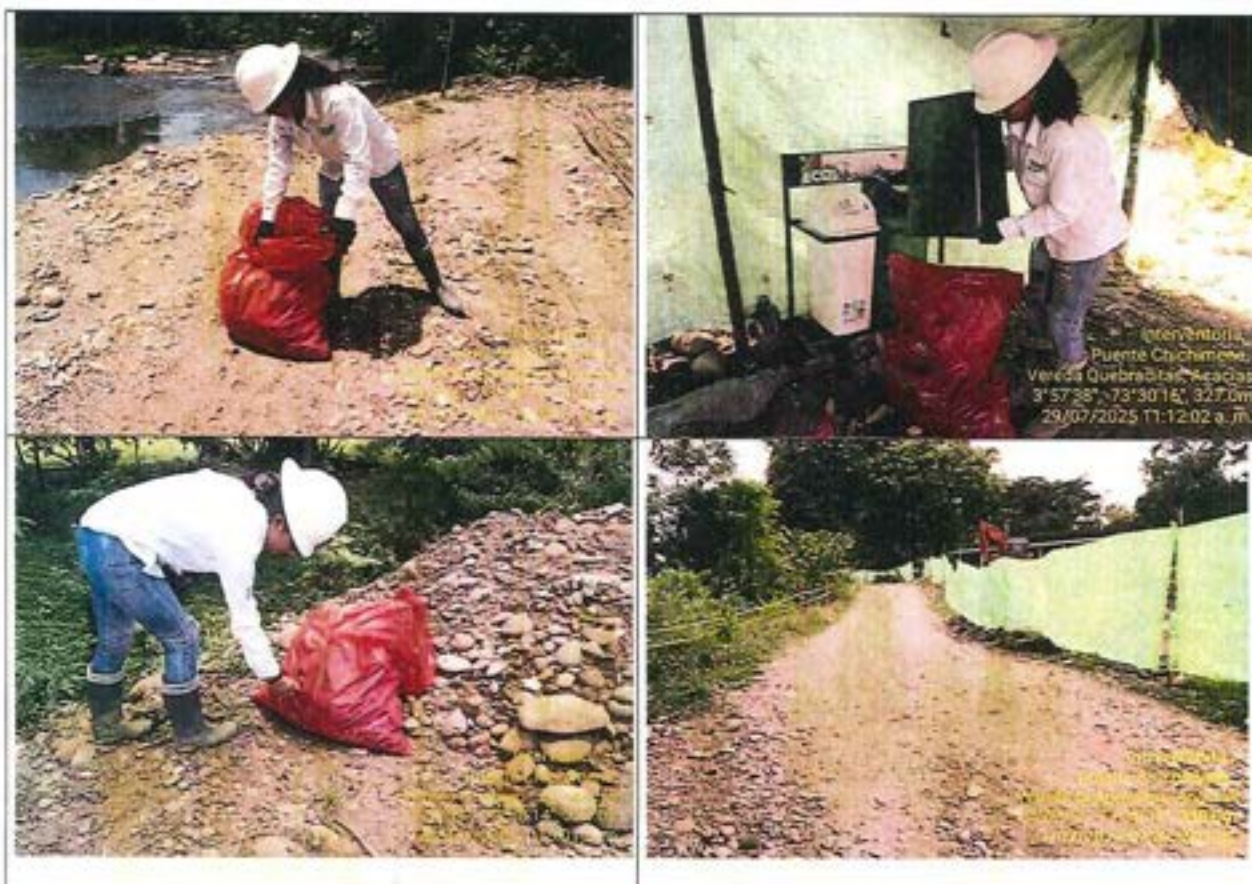

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME AMB No. 14 Página 11
INFORME AMBIENTAL N° 14		

3.2 Control Técnico ambiental

La Interventoría desde el área ambiental ha realizado presencia en las actividades realizadas por el contratista como son:

- Revisión de todos los documentos legales ambientales para la ejecución de las obras, con el fin de realizar el oportuno seguimiento a las obligaciones establecidas en cada resolución o plan aprobado.
- Revisión del PMA, plan social, cronogramas de actividades para aprobación de las medidas a implementar por parte del contratista.





**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME AMB No. 14

Página 12

INFORME AMBIENTAL N° 14



	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACIAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME AMB No. 14 Página 13
INFORME AMBIENTAL N° 14		

3.3 Seguimiento a los permisos legales, ambientales y fichas.

Para el presente contrato aplica permiso de ocupación de cauce por lo cual es necesario realizar el continuo seguimiento a lo establecido por la autoridad ambiental en cada una de las obligaciones adquiridas.

3.3.1 Permisos de ocupación de cauce

TRAMITE	RESOLUCION	EXPEDIENTE	VIGENCIA
Permiso de ocupación de cauce sobre el caño Chichimene, para la construcción de un puente vehicular, dos cabezales de descarga de aguas lluvias de 12" y la demolición del puente antiguo, en la vereda Quebraditas del municipio de Acacias	PS-GJ. 1.2.6.23.2235	3.37.3.023.078	Hasta el 10 de octubre de 2024, ya la entidad solicito prorroga mediante oficio 1080.30//0393 de fecha 19 de junio de 2024. A la espera de la renovación.

ARTICULO No	DESSCRIPCION	CUMPLE
1	ACOGER el concepto técnico según expediente, el cual hará parte integral del presente acto administrativo.	SI
2	OTORGAR a favor del municipio de Acacias, identificado con Nit 892.001.457-3, actuando a través de su representante legal, el permiso de ocupación de cauce sobre el caño Chichimene, para la construcción de un puente vehicular, dos cabezales de descarga de aguas lluvias de 12" y la demolición del puente antiguo, en la vereda Quebraditas del municipio de Acacias, en las siguientes coordenadas	SI
3	El plazo para ejecutar, el permiso de ocupación de cauce y ronda es de un (1) año, contado a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo. Parágrafo: El presente permiso podrá ser prorrogado ante esta Autoridad Ambiental, a solicitud del interesado tres (03) meses antes de su vencimiento.	Se radicó solicitud de renovación
4	El presente permiso de ocupación de cauce se otorga única y exclusivamente para la construcción de un puente vehicular, dos cabezales de descarga de aguas lluvias de 12" y la demolición del puente antiguo, en la vereda Quebraditas del municipio de Acacias.	SI
5	El titular deberá ejecutar las actividades conforme a los informes presentados para la evaluación de CORMACARENA y demás especificaciones técnicas. Parágrafo: Cualquier modificación de las obras, o la realización de items no previstos para la ejecución del proyecto, se deberá reportar a la Corporación de manera inmediata, para que sea evaluada sobre la conveniencia o no de dichas modificaciones y se tomen las respectivas medidas a que haya lugar, previo a la ejecución de estas.	SI
6	El titular será responsable por cualquier deterioro y/o daño ambiental causado directamente o por los contratistas, durante y después de la ejecución del proyecto, en las coordenadas descritas en el artículo 2 del presente acto administrativo. Parágrafo: El titular del presente permiso deberá realizar las actividades necesarias para corregir, compensar y mitigar si se presentan efectos adversos por la implementación del proyecto	SI
7	Respecto a la demolición de: la estructura existente, teniendo en cuenta que en la margen izquierda se encuentra una vivienda y una estación hidrometeorológica de Cormacarena, se requiere al municipio para que previo a las intervenciones, y posterior a las mismas, presente un informe con registro fotográfico, detallando el estado de las estructuras cercanas al área de intervención.	SI
8	El titular deberá dar estricto cumplimiento a las siguientes obligaciones, recomendaciones y prohibiciones; que le son comunes a cada una de las disposiciones del resuelve el presente acto administrativo:	SI
9	1. Cualquier efecto adverso generado por los trabajos en la margen o aguas abajo de los sectores de influencia de la fuente hídrica, será responsabilidad del titular del presente permiso, por lo cual solamente deberá realizarse, conforme a lo establecido en los diseños, evaluados por personal de CORMACARENA.	SI
10	2. El diseño estructural, de los diferentes elementos y obras que se realizarán y la reposición de las áreas,	SI



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME AMB No. 14

Página 14

INFORME AMBIENTAL N° 14

	es responsabilidad del titular.	
11	3. El titular deberá garantizar que la maquinaria a utilizar se encuentre en perfecto estado, libre de fugas de aceite y/o gasolina, y que el lavado, reparación y mantenimiento se realice fuera de la fuente hídrica y su ronda de protección, según indica el programa de medidas ambientales y; la ficha específica; estas actividades se deben realizar en sitios autorizados por la interventoría de la obra para tal fin.	SI
12	4. El titular deberá abstenerse de disponer dentro del cauce de la fuente hídrica a intervenir, materiales extraños como aceites, residuos y en general cualquier tipo de desechos sólidos o líquidos que puedan afectar la calidad del agua de los sitios intervenidos.	SI
13	5. El titular deberá almacenar los residuos sólidos generados durante las actividades del proyecto, fuera del cauce y de la ronda de protección de la fuente hídrica a intervenir, en un área provisional adecuada técnica y ambientalmente para tal efecto y disponerlos en un sitio autorizado ambientalmente para el desarrollo de estas obras.	SI
14	6. El titular, en caso de presentarse alguna contingencia por derrame de elementos peligrosos (combustible, aceites y demás) sobre el cauce y/o la ronda, de protección en desarrollo de las actividades del permiso de ocupación de cauce, deberá reportar de manera inmediata a CORMACARENA; además de activar el correspondiente plan de contingencia planteado para este proyecto.	SI
15	7. El titular deberá adoptar medidas preventivas y correctivas ante posibles derrames de sustancias o residuos ajenos a la fuente hídrica y al suelo a fin de minimizar los efectos negativos hacia el Medio Ambiente durante la etapa constructiva.	SI
16	8. El titular deberá garantizar y soportar que los materiales de construcción requeridos sean comprados en sitios autorizados, que cuenten con título minero y la respectiva licencia ambiental para su explotación y/o comercialización, información que debe ser plasmada en el informe final a presentar a CORMACARENA.	SI
17	9. El titular no podrá realizar extracción de material aluvial en el cauce de la fuente hídrica a intervenir con fines de comercialización ni trasladarlo a sitios diferentes a los establecidos en el Concepto Técnico No. PM.GA. 3.44.23.984 del 23 de mayo del año 2023, que es donde se desarrollarán las actividades.	SI
18	10. El titular deberá garantizar la adecuada señalización de las áreas de trabajo y el uso de los elementos de protección personal (EPP) necesarios para el desarrollo de las diferentes actividades, contando con la prestación de primeros auxilios en campo, personal calificado y disposición de vehículo (ambulancia).	SI
19	11. Cualquier imprevisto o accidente generado durante la fase de construcción y posterior operación, del proyecto, es de responsabilidad única y exclusiva del titular del presente permiso ambiental.	SI
20	12. El titular deberá efectuar un reconocimiento periódico a las obras construidas, en el sector autorizado, bajo las coordenadas indicadas, en especial luego de cada temporada invernal; con el fin de detectar problemas de estabilidad o necesidad de mantenimiento que permita plantear soluciones.	SI
21	13. El titular deberá informar a CORMACARENA cualquier modificación en las condiciones del otorgamiento del presente permiso ambiental, para su respectiva aprobación. Igualmente se deberá solicitar y obtener la modificación de los permisos cuando se pretenda usar, aprovechar o afectar un recurso natural renovable no contemplado.	SI
22	14. Se advierte al titular, que el presente acto administrativo, no otorga el aprovechamiento de ninguna especie arbórea, en el evento de que se requiera del aprovechamiento forestal; deberá tramitar ante CORMACARENA la respectiva solicitud para la obtención del correspondiente permiso ambiental.	SI
23	15. CORMACARENA podrá suspender en cualquier momento el permiso de ocupación de cauce, si las condiciones climatológicas, ambientales y técnicas presentes en la zona son adversas y atentan contra las condiciones naturales de la fuente hídrica, en las coordenadas otorgadas donde se ejecutará el proyecto.	SI
24	16. En caso de haberse presentado la ocurrencia de alguna contingencia que haya alterado las condiciones ambientales, sociales y/o económicas del área de influencia del proyecto, deberá presentarse, mediante informe, las medidas, tomadas que respondieron a los riesgos identificados, también de manera concreta, describir la organización, los medios técnicos y humanos que se emplearon para llevar a cabo dicho plan.	SI
25	17. El titular deberá radicar ante CORMACARENA en un término de treinta (30) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES, indicando claramente la fecha de inicio y fecha de terminación de las obras.	SI
26	18. El titular deberá allegar en un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el PLAN DE CONTINGENCIAS planteado para este proyecto, donde se describa las medidas preventivas, de atención y de recuperación que responden a los riesgos identificados, también de manera concreta, describir la Organización, los medios técnicos y humanos que se emplearán para llevar a cabo este plan.	SI
27	19. El titular deberá allegar en un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES Y SUS RESPECTIVAS FICHAS, en las que se indiquen claramente, las actividades a realizar para desarrollar técnica y ambientalmente las obras durante el proceso constructivo, el cual debe incluir la medidas necesarias y	SI



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACIAS**

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME AMB No. 14

Página 15

INFORME AMBIENTAL N° 14

	acciones de control y monitoreo, para garantizar la mínima afectación de los ecosistemas existentes; así como las acciones necesarias que permitan y garanticen la restauración de las condiciones semejantes a las iniciales del sector a intervenir. Parágrafo único: El PMA deberá ser realizado y soportado con firma y tarjeta profesional de personal idóneo en esta área, con el propósito de realizar el respectivo análisis y aprobación por parte de CORMACARENA, teniendo en cuenta la importancia técnica que esto requiere para el desarrollo del proyecto; además de hacer énfasis en el manejo de residuos sólidos, sobrantes, escombros, residuos líquidos, medidas de restauración, limpieza del sitio.	
28	20. El titular deberá allegar en un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, el INFORME DE CARACTERIZACIÓN CON LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD DE LAS LADERAS, de la fuente hídrica a partir de la localización de las obras a construir en una longitud de 250 metros (150 m aguas abajo del final de las obras y 100 m aguas arriba del inicio de las obras) en cada una de las márgenes intervenidas en la fuente hídrica, debe contener registro fotográfico, coordenadas de localización aguas arriba y aguas abajo actividad que debe ser realizada por profesional idóneo en el área de la ingeniería, geología y/o geotecnia.	SI
29	21. El titular deberá allegar en un plazo de treinta (30) días calendario, contados a partir de la ejecutoria del presente acto administrativo, EL INFORME DEL ESTADO ACTUAL DE LAS MÁRGENES DE LA FUENTE HÍDRICA A INTERVENIR, a partir de la localización, de las obras cincuenta (50) metros, aguas arriba y cincuenta (50) metros aguas abajo, este informe debe contener la descripción del estado actual del sitio, coordenada de inicio y coordenada final, registro fotográfico (con coordenadas de la toma), la descripción o pie de foto deberá evidenciar las condiciones de la fuente hídrica antes de la intervención.	SI
30	22. La presente Resolución una vez ejecutoriada constituye al titular en sujeto de derecho y obligaciones del presente permiso ambiental.	SI
31	23. El titular del presente permiso ambiental, deberá publicar en un periódico de alta circulación Nacional o Regional, el encabezado y la parte resolutoria del presente acto administrativo, dentro de los diez (10) días hábiles siguientes a la notificación de este, acreditando la ejecución mediante envío de una copia legible del ejemplar respectivo, dentro de los tres (3) días siguientes a la fecha de su publicación, con destino al expediente de referencia.	SI
32	24. CORMACARENA impondrá al autorizado o a sus legítimos representantes, según sea el caso, las medidas preventivas y sancionatorias, de acuerdo al procedimiento establecido en la Ley 1333 de 2009 o la norma que la adicione, modifique o sustituya, si se comprobare que ha infringido cualquiera de las obligaciones impuestas en esta resolución sin perjuicio de la revocatoria del acto administrativo que otorga el aprovechamiento si fuere necesario, según el artículo 2.2.3.2.24.5 del Decreto 1076 de 2015.	SI
33	25. Los derechos y obligaciones derivados con el otorgamiento del permiso ambiental de ocupación de cauce, solo podrá ser transferido mediante autorización previa y expresa de esta Corporación, quien podrá negarla cuando por causas de utilidad pública e interés social lo estime conveniente, mediante providencia motivada, requisitos sin los cuales el MUNICIPIO DE ACACIAS, seguirá siendo sujeto de los derechos, deberes y obligaciones impuestos y otorgados en la presente resolución.	SI
34	Una vez finalizada las obras sobre la fuente hídrica, el titular deberá en un término de treinta (30) días calendario, radicar ante CORMACARENA: 1. UN (1) INFORME EJECUTIVO donde se indique cuáles fueron los trabajos efectuados y cuantificación de estos, el cual deberá incluir una breve descripción de las obras realizadas, soportada con anexo fotográfico, avalado por el interventor y/o supervisor, coordenada de inicio y coordenada final de las obras realizadas, registro fotográfico donde se evidencie el estado inicial y el estado final de la zona intervenida y planos AS BUILT firmados de las actividades ejecutadas. 2. Copia del ACTA DE TERMINACIÓN del contrato o constancia de terminación total del proyecto. 3. EL INFORME DE CUMPLIMIENTO DEL PROGRAMA DE MEDIDAS AMBIENTALES Y SUS RESPECTIVAS FICHAS, este informe deberá contar con registro fotográfico, y demás soportes; el informe deberá relacionar el personal a cargo del cumplimiento. 4. El INFORME RESPECTO AL PLAN DE CONTINGENCIAS planteado para este proyecto, si hubo la ocurrencia de contingencias que haya alterado las condiciones ambientales, sociales y económicas del área de influencia del proyecto, así mismo deben describirse las medidas preventivas, de atención y de recuperación que respondieron a los riesgos identificados, también de manera concreta, describir la organización, los medios técnicos y humanos que se emplearon para llevar a cabo este plan. 5. EL INFORME DE CARACTERIZACIÓN CON LAS CONDICIONES DE ESTABILIDAD DE LAS LADERAS, en la fuente hídrica a partir de la localización de las obras a construir en una longitud de 250 metros (150 m aguas abajo del final de las obras y 100 m aguas arriba del inicio de las obras) en cada una de las márgenes intervenidas en la fuente hídrica, teniendo en cuenta las condiciones evidenciadas en la caracterización inicial, en el que se muestre el seguimiento realizado por profesional idóneo, indicando claramente, si es o no necesario tomar medidas correctivas por la ejecución de las obras longitudinales, para garantizar la estabilidad de estas, y la no afectación de otras áreas.	SI



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME AMB No. 14

Página 16

INFORME AMBIENTAL N° 14

	Parágrafo único. - Es de indicar que esta fecha de finalización será tomada teniendo en cuenta el cronograma de actividades presentado previo al inicio de las obras o cuando se entienda la terminación o finalización de las mismas.	
35	Durante la ejecución de los trabajos y/o una vez culminados los mismos y para efectos de restauración del sitio de acuerdo con las condiciones iniciales del cauce y ronda, a la vez como una medida de control y seguimiento, se realizará la revisión del cumplimiento del presente acto administrativo, la evaluación de la información entregada y se realizará visita en compañía de un funcionario y/o contratista de la Subdirección de Gestión Ambiental de CORMACARENA del grupo suelo y subsuelo; con el fin de verificar las condiciones del sitio y el efecto causado por la obra, de tal forma que se pueda tomar una decisión técnica, y de ser necesario, ordenar la adecuación del sitio a las condiciones iniciales y/o el control de las posibles afectaciones generadas, cuyo costo será asumido por el beneficiario del permiso ambiental, de acuerdo con las tarifas establecidas.	SI
36	Será causal de caducidad del presente permiso el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones expresamente señaladas en este acto administrativo, así como las previstas en el Decreto único 1076 de 2015 y demás normas concordantes.	SI
37	CORMACARENA podrá revocar o suspender los permisos, autorizaciones o concesiones para el uso o aprovechamiento de los recursos naturales y del medio ambiente, cuando quiera que las condiciones y exigencias por ella establecidas no se estén cumpliendo conforme a los términos definidos en este acto administrativo; lo anterior, con fundamento en el artículo 62 de la Ley 99 de 1993, so pena de iniciar el respectivo proceso administrativo sancionatorio ambiental dispuesto en la Ley 1333 de 2009 por el incumplimiento de los términos, condiciones y obligaciones previstos en el presente acto administrativo, y sin perjuicio de la revocatoria del permiso si fuere necesario, según el artículo 2.2.3.2.24.5 del Decreto 1076 de 2015.	SI
38	Para todos los efectos de comunicaciones, presentación de informes, cumplimiento de obligaciones, P,QRSDF o cualquier documento o acción relacionada con el presente permiso menor, el titular deberá dirigirlas a CORMACARENA señalando en el documento el expediente No. PM-GA. 3.37.3.023.078.	SI
39	CORMACARENA publicará en la página web www.cormacarena.gov.co , el presente acto administrativo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo - Ley 1437 de 2011, con el fin de dar cumplimiento a los principios de publicidad y transparencia de los actos administrativos emitidos por autoridades administrativas.	SI
40	Notificar el presente acto administrativo al MUNICIPIO DE ACACIAS, al Email. alcaldia@acacias.gov.co , en el evento de no poderse realizar la notificación electrónica, se deberá enviar comunicación al celular 321-4636223, en la forma prevista en los artículos 67 y 69 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo Ley 1437 del año 2011, del concepto técnico al titular.	SI
41	El grupo TIC'S y Servicio al Ciudadano adscrito a la Subdirección de Planeación y Ordenamiento Ambiental, deberá publicar el presente acto administrativo en la página web de CORMACARENA.	SI
42	Ejecutoriado el presente acto administrativo envíese copia a la Subdirección administrativa y financiera, y al grupo Rentas de la Oficina Asesora Jurídica de CORMACARENA, para lo de su competencia.	SI
43	Contra el presente acto administrativo procede el recurso de reposición, el cual podrá interponerse por escrito en diligencia de notificación personal o dentro de los diez (10) días siguientes a ella, o a la notificación por aviso o la publicación, según sea el caso ante la Dirección General de CORMACARENA, de conformidad con el art. 74 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo	SI



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME AMB No. 14

Página 17

INFORME AMBIENTAL N° 14

4 Cumplimiento al Plan de manejo ambiental

SUELO						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		SI	NO	APLICA		
MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	5	Se ha capacitado personal
	Separación y clasificación		X	SI	5	No se ha dado cumplimiento
	Disposición Final	X		SI	5	Se ha dispuesto en sitios autorizados
	Programación de retiro	X		SI	5	No se ha dado cumplimiento
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas		X	SI	0	No se ha manejado sustancias peligrosas
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	5	Se mantiene en buena limpieza
	Almacenamiento de materiales y combustibles	X		SI	3	Se cumple almacenamiento lejos de contaminantes
	Campamento	X		SI	6	Disponen de campamento cercano a la obra
	Manejo de Vegetación	X		SI	0	No se ha intervenido
	Estabilidad de Taludes			NO	0	No se ha afectado
Calificación:		Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5			SUMATORIA	34
					PROMEDIO	3,4

AGUA						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		SI	NO	APLICA		
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal	X		SI	5	Se ha capacitado el personal
	Manejo Escorrentia			NO	0	No es necesario dicho manejo
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas.		X	SI	0	No se ha implementado la protección por sustancias contaminantes
	Medidas de contingencia		X	SI	3	No se ha realizado entrega
	Zonas de trabajo secas		X	SI	5	No se han definido, dichas zonas
	Manejo nivel freático	X		SI	6	Manejado con bombas mecánicas
	Separación y clasificación de vertimientos			NO	0	No se ha requerido para el proyecto
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domésticas)			NO	0	No es requerido para el proyecto
	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5			SUMATORIA	19	
Calificación:					PROMEDIO	2,4



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME AMB No. 14

Página 18

INFORME AMBIENTAL N° 14

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	AIRE				
		PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACION	OBSERVACION
ATMOSFERICO Y CONTROL DE RUIDO	Capacitación Personal	X		SI	5	Se ha capacitado personal
	Humedecimiento de áreas de trabajo			N/A	0	No ha sido requerido
	Cubrimiento de acopios de materiales	X		SI	4	Se protegen con plásticos los aceros acopiados
	Uso de mallas protectoras		X	SI	0	Se ha implementado
	No exceder volúmenes del volcú de los camiones	X		SI	6	Se ha transportado material
	Olores desagradables	X		SI	6	No se ha presentado
	Aseo Interno y externo de la obra	X		SI	6	Se ha contado con limpieza
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	5	La maquinaria utilizada cumple
	Apantallamiento sonoro del área		X	N/A	0	No aplica para el proyecto
	Planificación de horarios de trabajo	X		SI	6	Se tiene definidos horarios
			X	SI	3	No se ha capacitado personal, ni se ha informado el plan
	Medidas de Contingencia					
Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5					SUMATORIA	41
					PROMEDIO	3,73

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	SEÑALIZACIÓN				
		PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACION	OBSERVACION
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal	X		SI	5	Se han dado capacitaciones y charlas
	Demarcación del perímetro	X		SI	6	Se tiene cerramiento y aislamiento del área de trabajo.
	Zonificación de la obra	X		SI	5	Se tiene zona de operatividad y zona de administración.
	Lona de Cerramiento	X		SI	5	Se tiene cerramiento con lona en un 80 % del perímetro.
	Cinta de Reflectiva	X		SI	6	Los elementos de señalización cuentan con cinta reflectiva
	Señales Informativas y preventivas	X		SI	6	Se tiene señalización preventiva en toda el área y de aproximación.
	Uso de Paleteros	X		SI	5	Permanecen dos controladores viales
	Iluminación Nocturna		X	SI	2	Cuenta con iluminación nocturna
Calificación: Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5					SUMATORIA	40
					PROMEDIO	5,0



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



ALCALDÍA DE
ACACÍAS

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME AMB No. 14

Página 19

INFORME AMBIENTAL N° 14

GESTIÓN SOCIAL						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	PRESENTA			CALIFICACIÓN	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal		X	SI	3	No se ha capacitado personal
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	5	Se ha entregado elementos de EPP
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	5	Se cuenta con plan aprobado
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	5	Se ha dispuesto oficina para ello
	Programa de información a la comunidad	X		SI	5	Se cuenta con oficina en campamento
	Socializaciones	X		SI	6	Se ha realizado socialización del proyecto
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5				SUMATORIA	29
					PROMEDIO	4,8

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal	X		SI	5	Se ha capacitado el operador
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	5	Se ha realizado mantenimientos preventivos a la maquinaria
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	6	se han definido los horarios
	Ficha de control de actividades	X		SI	5	Se lleva el control de actividades
	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X		SI	5	La maquinaria está en buen estado
	Elementos de protección personal	X		SI	6	Se cuenta con EPP
	Extintores	X		SI	6	Se tiene disponibilidad de extintores
	Medidas de Contingencia		X	SI	1	No se ha programado medidas
	Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5			SUMATORIA	39
				PROMEDIO	4,875	

MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	PRESENTA			CALIFICACIÓN	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal		X	SI	4	No se ha capacitado personal
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	5	Se ha realizado mantenimiento de volquetas y excavadora
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	6	Se han definido horarios de cargue



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



ALCALDÍA DE
ACACÍAS

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME AMB No. 14

Página 20

INFORME AMBIENTAL N° 14

Ficha de control de actividades		X	SI	2	No se cuenta con fichas
Uso de equipos en buen estado, Certificados	X		SI	5	Se cuenta con equipos en buen estado
Elementos de protección personal	X		SI	6	El personal cuenta con elementos
Extintores	X		SI	6	Se cuenta con extintores
Medidas de Contingencia		X	SI	0	No se ha entregado
Volumen de material (m3)	X		SI	6	Se ha cuantificado material
Volumen de excavación (m3)	X		SI	5	Se ha cuantificado material
Volumen de demolición (m3)	X		SI	6	Se ha cuantificado material
Volumen de tierra (m3)	X		SI	6	Se ha cuantificado material
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5			SUMATORIA	57
				PROMEDIO	4,75

MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACIÓN	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal		X	SI	0	No se ha presentado
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	5	Se cuenta con elementos de EPP
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	5	Se cuenta con manual aprobado
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	5	Se cuenta en oficina con espacio para la comunidad
	Programa de información a la comunidad	X		SI	5	Se cuenta con constante comunicación
	Socializaciones	X		SI	6	Se han realizado socializaciones
	Arboles talados		X	N/A	0	
	Arboles podados		X	N/A		
	Arboles bloqueados		X	N/A		
	Arboles sembrados		X	N/A		
Calificación:	Buena: 4,6 - 6 Aceptable: 2,6 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5			SUMATORIA	25	
				PROMEDIO	3,57	

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME AMB No. 14 Página 21
INFORME AMBIENTAL N° 14		

5 Inconvenientes presentados

Durante el periodo evaluado persistió las dificultades ocasionadas por el alto nivel freático alimentado por la permanencia de la temporada invernal afectando la zona de construcción de las vigas cabezal, lo que ha limitado la evacuación oportuna del agua acumulada. Esta situación obligó a implementar un sistema de bombeo permanente y a ampliar la capacidad de los drenajes, con el fin de controlar las filtraciones y acumulaciones de aguas. Por lo tanto, estas condiciones han restringido el avance normal, generando retrasos en el armado de acero de la cimentación de las vigas cabezal y aletas en ejecución.

6 Conclusiones

1. Durante el presente periodo se ha realizado armado de acero para la viga cabezal y zapatas de las aletas, lo mismo que vaciado de concreto para la viga cabezal margen Quebraditas.
2. La interventoría ha realizado un seguimiento continuo al personal encargado por parte del contratista para dar cumplimiento a cada una de las actividades propuestas en PMA.
3. El proyecto ha cumplido con la implementación de las estrategias de conservación y preservación de especies tanto de fauna como flora nativa, gracias al apoyo continuo de la administración municipal, interventoría y contratista.
4. El contratista ha acatado de manera receptiva las recomendaciones realizadas por interventoría, gestionando los materiales y equipos requeridos para dar cumplimiento a las diferentes fichas de manejo ambiental propuestas.
5. Se recomienda implementar un plan de contingencia y ajustar la programación de actividades, con el fin de mitigar los efectos de los retrasos identificados en el cronograma de ejecución, los cuales podrían comprometer el cumplimiento del plazo contractual establecido.


Firma	Firma
	
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	ING. OSCAR HERNÁN ALARCÓN ORTEGÓN INGENIERO AMBIENTAL

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME ESTR No. 14 Página 1
INFORME ESTRUCTURAL N° 14		

CONTRATO DE INTERVENTORIA 978 DE 2023

INFORME ESTRUCTURAL N°14

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS"

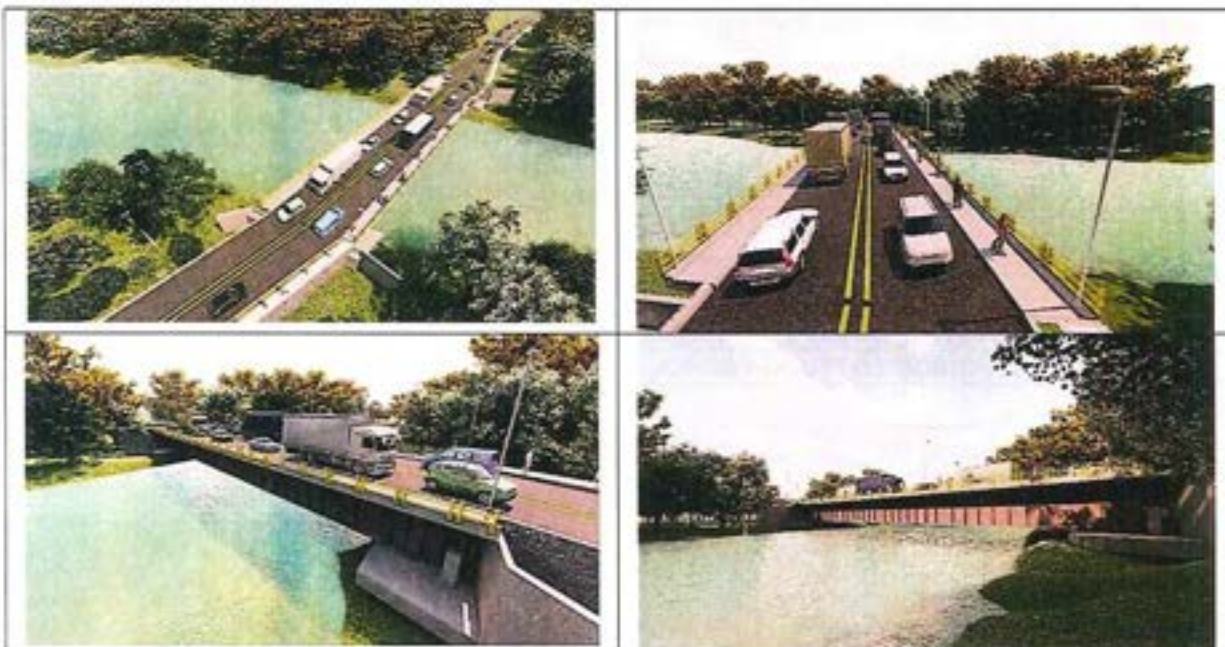

PERIODO DEL INFORME

01 DE JULIO DEL 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME ESTR No. 14 Página 3
INFORME ESTRUCTURAL N° 14		

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVOS	5
2.1. Objetivo General	5
2.2. Objetivos específicos	5
3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO	6
3.1. Localización del proyecto y descripción	6
3.2. Alcance del proyecto estructural.....	7
3.3. Puente vehicular metálico	8
3.4. Vigas principales.....	9
3.1. Arriostramiento	10
3.2. Neopreno y topes sísmicos.....	12
3.3. Estribos.....	13
3.4. Pilotes	14
3.5. Relación de diseños y planos estructurales	15
3.6. Control técnico en obra de los diseños estructurales.....	16
4. VERIFICACIONES DE DISEÑO.....	17
5. INCONVENIENTES PRESENTADOS Y/O OBSERVACIONES	18
6. CONTROL DE CALIDAD ESTRUCTURAL	19
7. CONCLUSIONES.....	25
8. REGISTRO FOTOGRAFICO	26

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME ESTR No. 14
	INFORME ESTRUCTURAL N° 14	
		Página 4

1. INTRODUCCIÓN

El presente informe corresponde a la revisión y control del componente estructural cuya información fue entregada por la entidad contratante resultado de los estudios y diseños realizados a través del contrato de consultoría 375 de 2022 con la empresa Consorcio Consultorías Puentes Acacias cuyo objeto contractual fue " ESTUDIO Y DISEÑO DE SEIS PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN LOS BARRIOS PABLO VI, LAS VEGAS, CARRERA 14 Y 11° VEREDAS SAN CRISTÓBAL, EL DIAMANTE Y QUEBRADITAS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META" quien es el responsable de los estudios y diseños y que además fueron los encargados a través del Ingeniero Ricardo Andres González de la modelación y diseño del puente vehicular el cual se construirá a través del contrato de obra 929 de 2023 cuyo objeto contractual es "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS-META".

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME ESTR No. 14 Página 5
INFORME ESTRUCTURAL N° 14		

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Realizar la supervisión, seguimiento y control del cumplimiento a lo establecido estructuralmente en cada uno de los documentos que fueron entregados por la entidad y que forman parte de la consultoría, así mismo atender todas las consultas estructurales que se puedan presentar como resultado de la construcción o implantación real del proyecto.

2.2. Objetivos específicos


- Describir las actividades ejecutadas del proyecto estructural de cada una de las estructuras a construir.
- Realizar observaciones y soluciones a inconvenientes que se puedan presentar en la etapa constructiva del proyecto.
- Realizar un análisis de información entregada por parte de la consultoría.
- Analizar viabilizar, sugerir y/o conceptuar cualquier situación técnica estructural que pueda ser consultado por parte del contratista.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME ESTR No. 14 Página 6
INFORME ESTRUCTURAL N° 14		

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

3.1. Localización del proyecto y descripción

La zona para intervenir se encuentra ubicada en el Municipio de Acacias, específicamente está ubicada en la vía Terciaria que conduce a la vereda quebraditas a 34.4 Km del casco urbano del Municipio de Acacias Meta, de cuales 13.56 se encuentran en afirmado, las coordenadas de ubicación son las 03°57'39,99" N y 73°30'17.67" O

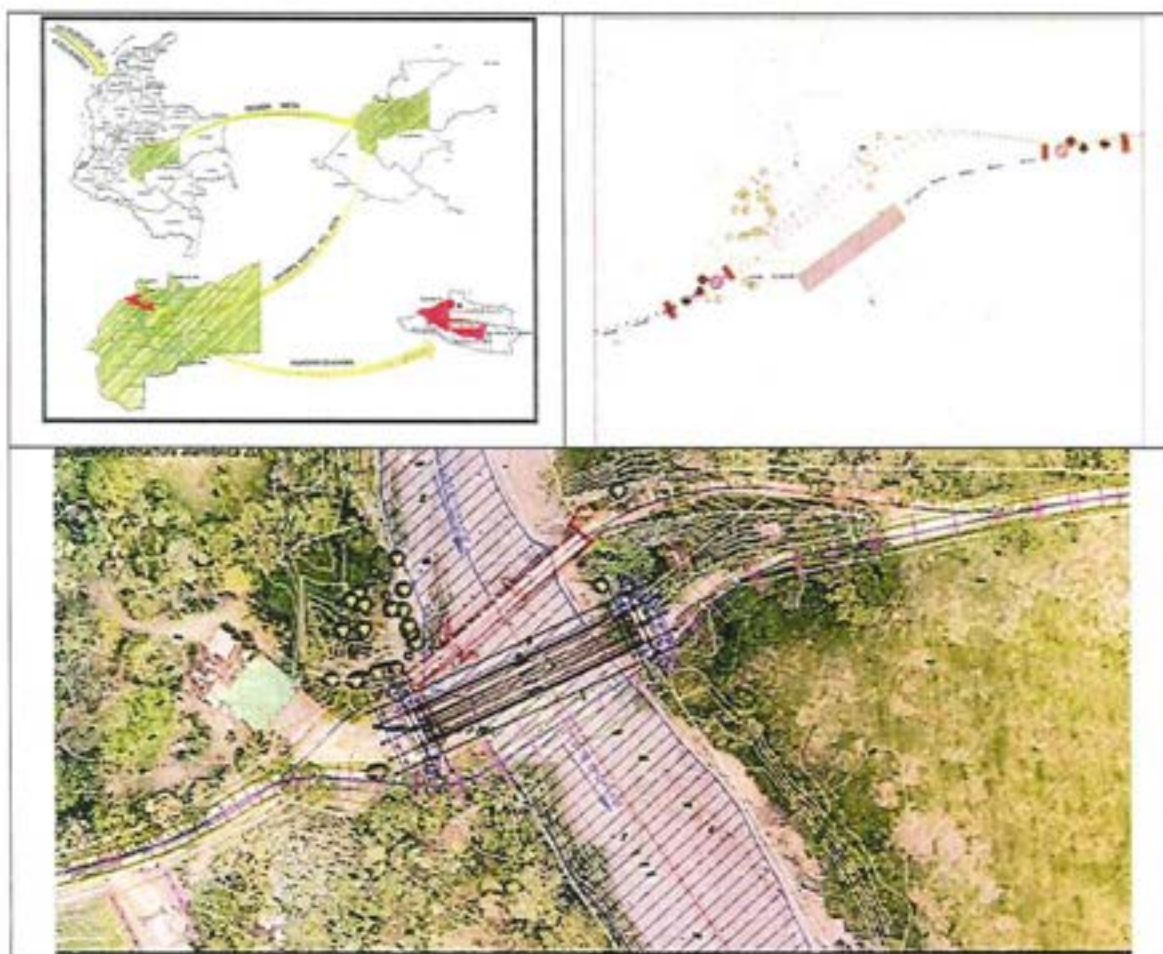


	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME ESTR No. 14 Página 7
INFORME ESTRUCTURAL N° 14		

3.2. Alcance del proyecto estructural

El presente alcance corresponde a la revisión y control del componente estructural de la información entregada por la entidad contratante de los estudios y diseños realizados a través del contrato de consultoría 375 de 2022 con la empresa Consultorías Puentes Acacias cuyo objeto contractual fue " ESTUDIO Y DISEÑO DE SEIS PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN LOS BARRIOS PABLO VI, LAS VEGAS, CARRERA 14 Y 11° VEREDAS SAN CRISTÓBAL, EL DIAMANTE Y QUEBRADITAS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META" quien es el responsable de los estudios y diseños y que además fueron los encargados de realizar la modelación estructural del proyecto de construcción en las cuales se construirá el alcance del contrato.

El componente estructural plantea la construcción de un puente vehicular de 58.0 metros de luz entre ejes de apoyo y un tablero con un ancho de 10.7 metros a bordes externos, ancho efectivo de calzada de 7.30 metros, andenes a ambos costados de 1.20 metros; la infraestructura es una cimentación tipo pilote construyendo 8 pilotes por estribo para un total de 16 pilotes con un diámetro $\Phi 1.50$ metros y una profundidad de 12 metros cada uno; las aletas y estribos serán en concreto reforzado y el tablero así como las placas de aproximación serán concreto reforzado, el puente contará con señalización horizontal y vertical respectivamente.

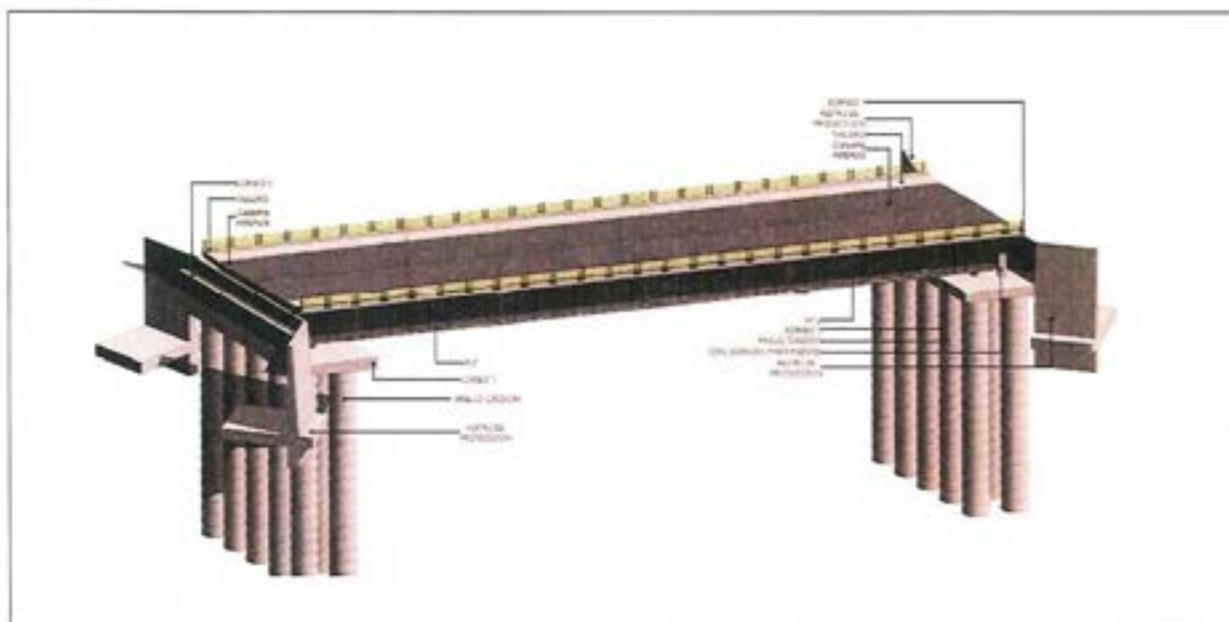


	<p align="center">JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA</p>	<p align="center">  </p>
	<p align="center">Contrato de Interventoría N° 978 de 2023</p>	<p align="center">INFORME ESTR No. 14 Página 8</p>
	<p align="center">INFORME ESTRUCTURAL N° 14</p>	

3.3. Puente vehicular metálico

Se plantea la construcción de un puente vehicular metálico, cuya luz es de 58.0 metros entre ejes de apoyos y un tablero con un ancho de 10.7 metros a bordes externos, construido en concreto reforzado con un resistencia a la compresión f'_c de 28 MPa y para el acero corrugado con esfuerzo a la fluencia f_y de 420 MPa, la superestructura del puente también cuenta con un sistema de arriostramiento horizontal superior e inferior y verticalmente localizados por debajo del tablero los cuales están constituidos por ángulos en acero ASTM A-709 Grado 50W. Para los miembros principales que sirven de apoyo al tablero se utilizaron cuatro vigas en I metálicas de acero ASTM A-709 Grado 50W con una separación interna de 2.5 metros y una altura de: 2465. Para las vigas principales se plantea una contra flecha de 20 cm en el centro de la luz.

Para el apoyo de superestructura en los estribos se plantean cuatro (4) apoyos en neopreno dureza 60 reforzado, los cuales se fijan al estribo cada uno con 4 pernos de diámetro 1 3/4" grado S.

En la subestructura del puente se utilizaron dos estribos en concreto reforzado con las mismas especificaciones del tablero, los cuales sirven de apoyo a la superestructura, estos estribos están cimentados sobre dos líneas de tres pilotes con diámetros de 1.50 metros y longitudes de 12 metros. Y los cuales tendrán camisas metálicas no recuperables, la cota de cimentación en ambos costados es de 314.0 msnm.

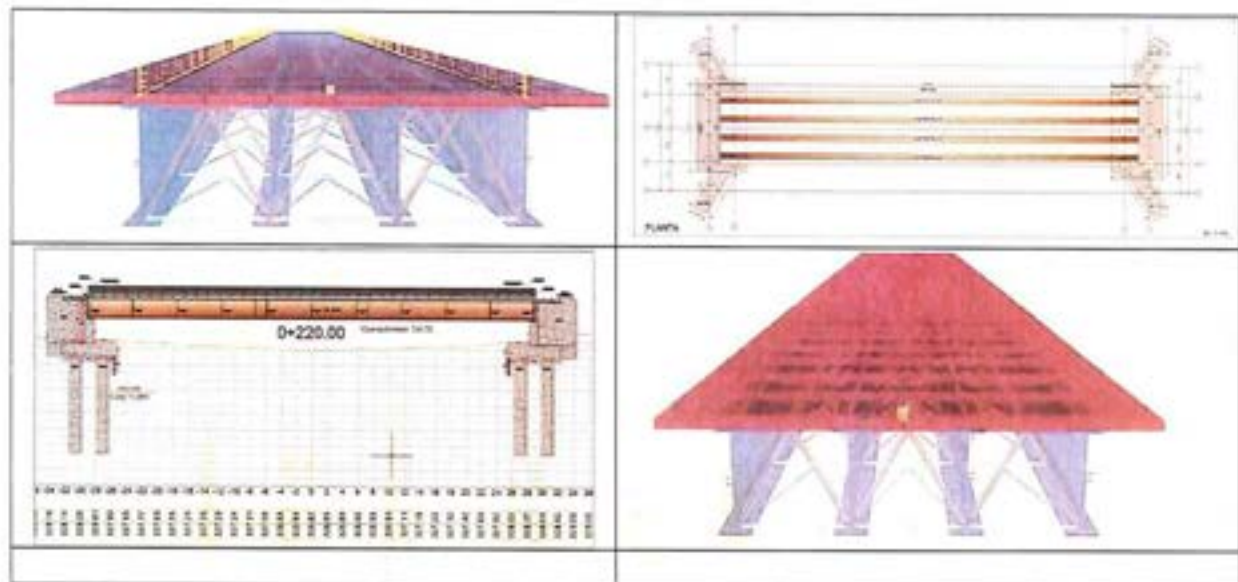

The figure contains three technical drawings of the bridge structure:

- Top Left:** A cross-section of the bridge deck labeled "SECCION TRANSVERSAL DE SUPERESTRUCTURA". It shows a symmetrical design with a central span and two side spans. Dimensions include a total width of 1.30 m and a central span length of 2.52 m. The drawing includes details of the deck, girders, and supports.
- Top Right:** A perspective view of the bridge structure, showing the longitudinal profile and the arrangement of the spans and supports.
- Bottom Left:** A detailed cross-section of the steel beam, labeled "6.2 VP-2". It shows the dimensions of the beam, including the flange width, web height, and overall depth. The drawing includes a table of dimensions and a list of materials.
- Bottom Right:** A perspective view of the steel beam, showing its I-shaped profile and the dimensions of the flanges and web.



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME ESTR No. 14


Página 10

INFORME ESTRUCTURAL N° 14

3.1. Arriostramiento

El arriostramiento es una técnica utilizada en la construcción para reforzar y estabilizar la estructura, consiste en la adición de elementos estructurales como vigas que conectan diferentes partes de la estructura y ayudan a distribuir la carga de forma más equilibrada, su funcionamiento es respuesta ante cambios de la configuración teórica de la estructura estas permiten generar fuerzas que tienden a restituirla, su ubicación es cerca de las extremidades de la estructura, para resistir cualquier efecto de torsión

Arriostramiento inferior y superior horizontal

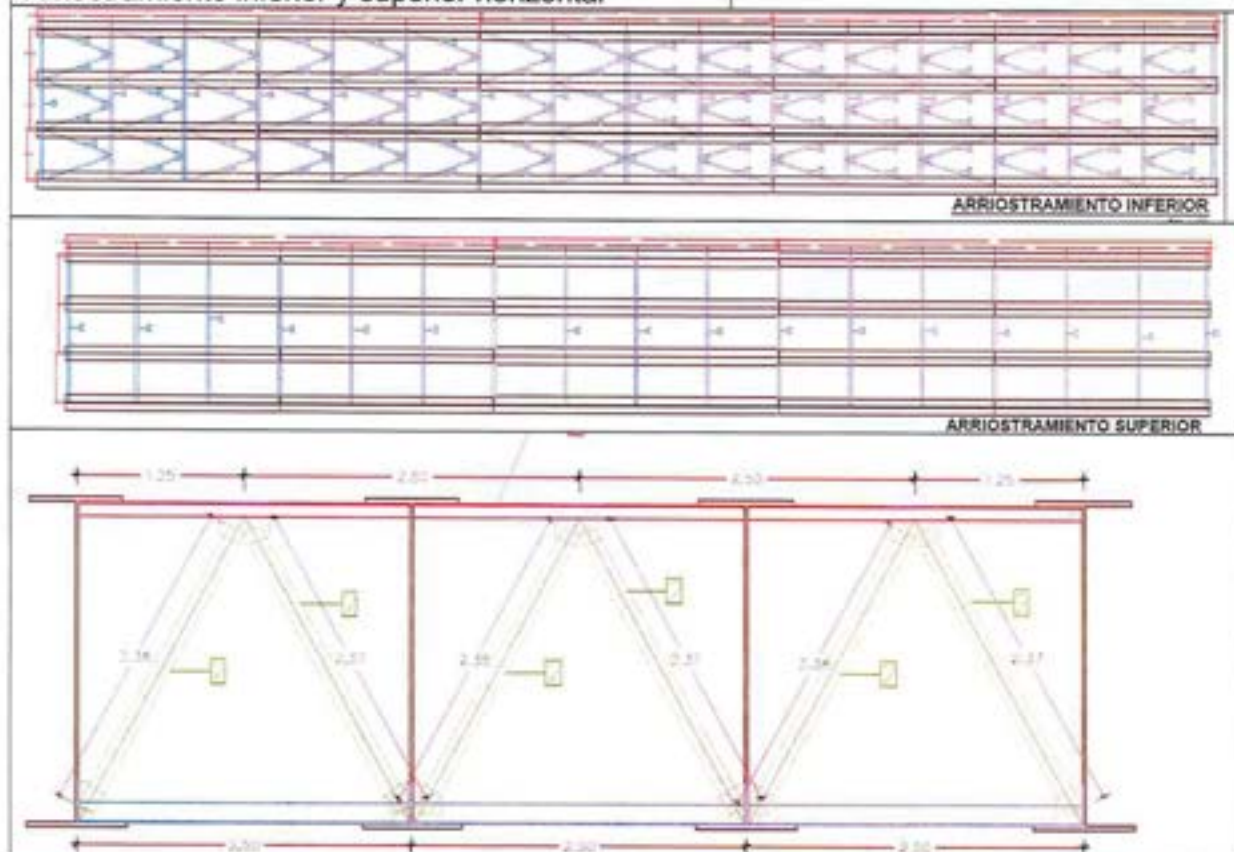



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**




**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME ESTR No. 14

Página 11


INFORME ESTRUCTURAL N° 14

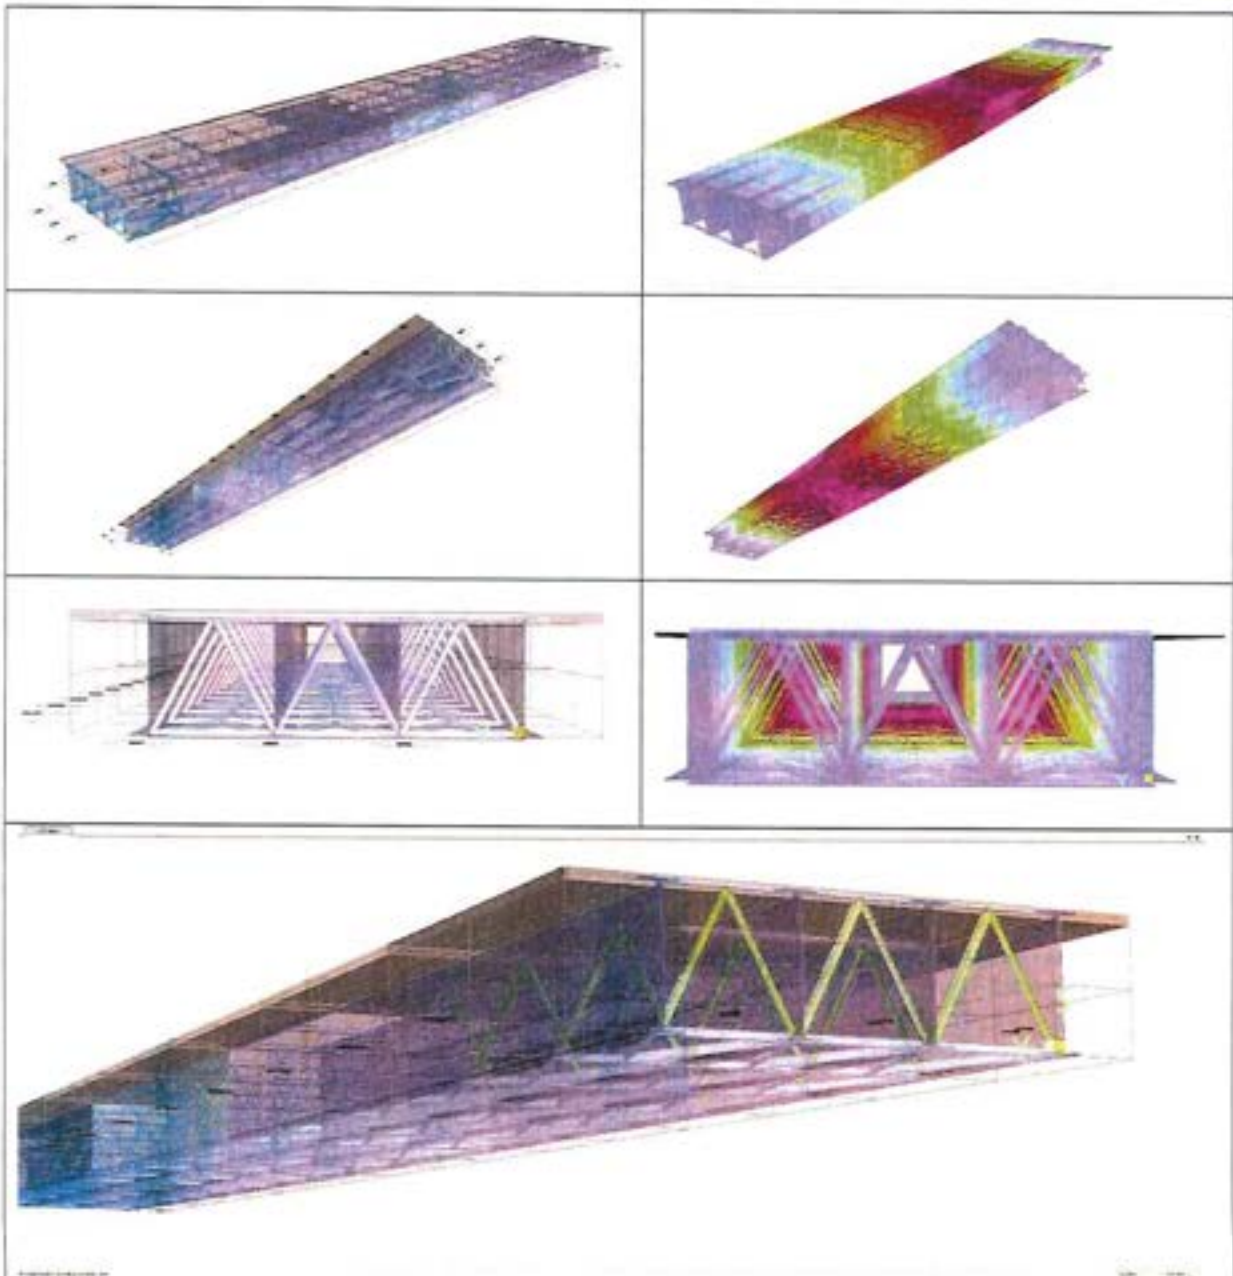

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME ESTR No. 14 Página 12
INFORME ESTRUCTURAL N° 14		

3.2. Neopreno y topes sísmicos

Los apoyos de neopreno, o también llamados "apoyos elastoméricos" son dispositivos colocados entre dos elementos de una estructura (cubierta, y vigas o pilares en el caso de los puentes) que garantizan la transmisión de cargas de un elemento a otro al soportar el paso de vehículos de diferentes cargas, de igual forma los topes sísmicos tienen como propósito evitar los desplazamientos excesivos en dirección transversal y/o longitudinal del tablero, estos se colocan sobre los cabezales de las pilas con una separación que generalmente está comprendida entre 0 y 5 cm con respecto a la pared de la viga transversal, para el caso los topes tendrán una armadura vertical en cada cara de 1No 6 cada 0,20m y horizontal 1 No 4 cada 0,10m.

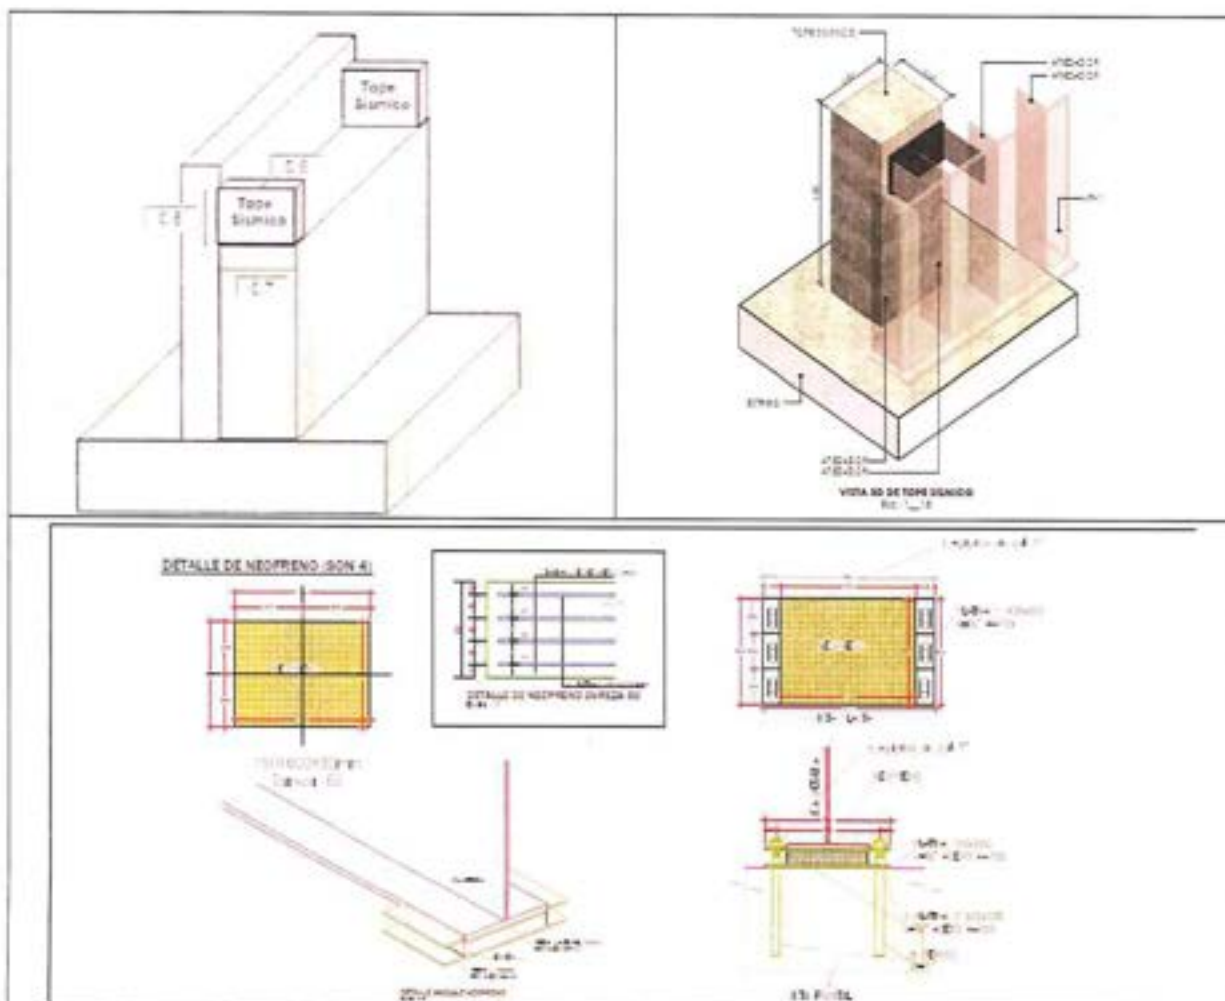


	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME ESTR No. 14 Página 13

INFORME ESTRUCTURAL N° 14

3.3. Estribos

El estribo constituye una de las partes de un puente, que, junto con las pilas, está destinada a soportar las cargas del tablero, sus objetivos son los transmitir el peso a los cimientos, mantener la disposición de la tierra, unir la estructura a las vías de acceso, servir de apoyo a un arco dentro de una estructura, su configuración es zarpa trasera o talón, vástago o pantalla y zarpa delantero o dedo, las dimensiones son de 7 mts por una altura de 1,50 mts y una longitud de 11,70 mts

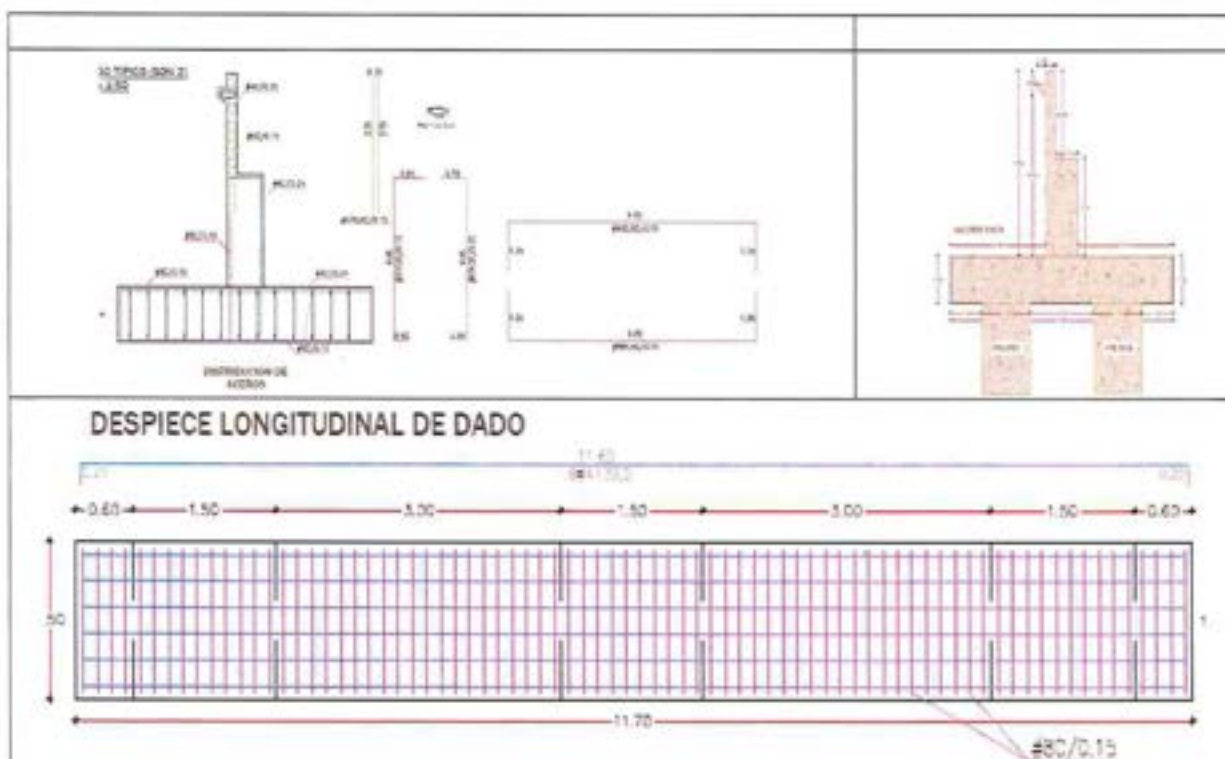



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023


INFORME ESTR No. 14

Página 14

INFORME ESTRUCTURAL N° 14

3.4. Pilotes

Estos son elementos estructurales formados por hormigón armado de gran longitud comparada con su sección transversal y que transmiten las cargas a niveles profundos del terreno, para el caso particular estarán cimentados sobre dos líneas de tres pilotes con diámetros de 1.50 metros y longitudes de 12 metros, los cuales tendrán camisas metálicas no recuperables, la cota de cimentación en ambos costados es de 314.0 msnm.

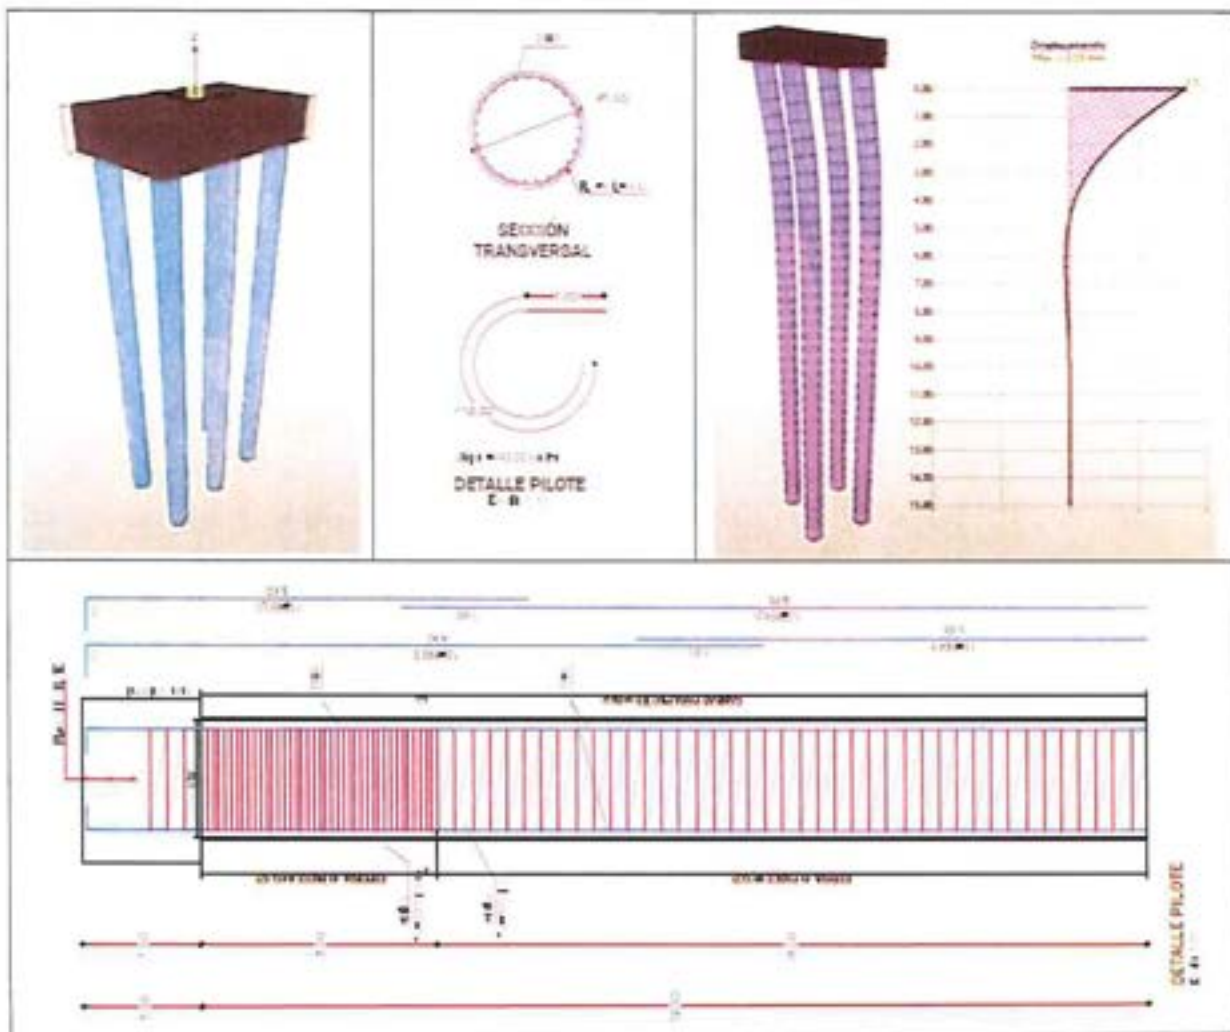

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME ESTR No. 14 Página 15
INFORME ESTRUCTURAL N° 14		

3.5. Relación de diseños y planos estructurales

El municipio de Acacias a través de la secretaria de Infraestructura realizó la entrega real y material de toda la etapa de diseños, en el cual se realizó un análisis detallado de las condiciones actuales que se encuentran en el proyecto, la relación de documentos estructurales es la siguiente:

DOCUMENTO		CASILLA DE VERIFICACION	OBSERVACIONES
Estudios y Diseños	Levantamiento topográfico y batimetría	OK	Se recibe en medio magnético
	Estudio de geología y geotecnia	OK	Se recibe en medio magnético
	Estudio de suelos	OK	Se recibe en medio magnético
	Estudio de tránsito	OK	Se recibe en medio magnético
	Estudio hidrológico, hidráulico y de socavación	OK	Se recibe en medio magnético
	Diseños estructurales del puente	OK	Se recibe en medio magnético
	Memorias de cálculo	OK	Se recibe en medio magnético

Así mismo frente a la documentación los archivos entregados fueron los siguientes:

DOCUMENTO	CASILLA DE VERIFICACION	OBSERVACIONES
Informe de diagnostico	OK	Se recibe en medio magnético
Estudio y diseño de estructuras	OK	Se debe modificar acero especificación acero estructural

Igualmente, los planos entregados fueron los siguientes:

PLANO	CASILLA DE VERIFICACION	OBSERVACIONES
RAGP-PUENTE QUEBRADITAS-V12-E-1-E-2,E-3, E-4, E-5, E-6, E-7, E-8	OK	Hacen falta planos estructurales

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME ESTR No. 14 Página 16
INFORME ESTRUCTURAL N° 14		

3.6. Control técnico en obra de los diseños estructurales

La Interventoría ha realizado la revisión de los documentos técnicos entregados los cuales se ajustan a las condiciones establecidas así:

REQUISITOS MÍNIMOS SEGÚN LA CAPACIDAD DE DISIPACIÓN DE ENERGÍA DE LA ESTRUCTURA		
VIGAS PRINCIPALES I	CRITERIO DE CALCULO	CRITERIO DE ACEPTACION
Dimensiones	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Planos estructurales
Localización	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Planos estructurales
Geometría	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Planos estructurales
Material	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Modelación estructural
Soldaduras	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Planos estructurales
Deflexiones	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Modelación estructural
ARRIOSTRAMIENTO	CRITERIO DE CALCULO	CRITERIO DE ACEPTACION
Dimensiones	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Planos estructurales
Localización	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Planos estructurales
Geometría	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Planos estructurales
Material	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Modelación estructural
Soldaduras	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Planos estructurales
Deflexiones	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 6	Modelación estructural
ESTRIBOS	CRITERIO DE CALCULO	CRITERIO DE ACEPTACION
Dimensiones	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Planos estructurales
Localización	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Planos estructurales
Geometría	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Planos estructurales
Material	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Modelación estructural
Aceros	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Modelación estructural
VIGA CABEZAL	CRITERIO DE CALCULO	CRITERIO DE ACEPTACION
Dimensiones	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Planos estructurales
Localización	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Planos estructurales
Geometría	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Planos estructurales
Material	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Modelación estructural
Aceros	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Modelación estructural
PILOTES	CRITERIO DE CALCULO	CRITERIO DE ACEPTACION
Dimensiones	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 10	Planos estructurales
Localización	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 10	Planos estructurales
Geometría	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 10	Planos estructurales
Material	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 10	Modelación estructural
Aceros	Norma colombiana de diseño de puentes CCP-14 Sección 11	Modelación estructural

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME ESTR No. 14
		Página 17
INFORME ESTRUCTURAL N° 14		

4. VERIFICACIONES DE DISEÑO

GALIBOS:

El galíbo sobre las vías principales en áreas rurales debe ser por lo menos 4.90 m. en todo el ancho de la vía y debe preverse la posibilidad de repavimentación. En vías principales de áreas urbanas, debe preverse un galíbo mínimo de 4.90 m. excepto en áreas altamente desarrolladas. Debe preverse un galíbo mínimo de 4.90 en áreas rurales y urbanas cuando tal galíbo se requiera por seguridad. En todas las otras vías el galíbo debe ser de 4.50m mínimo sobre el ancho de la vía de debe preverse la posibilidad de repavimentación.

CARGA VIVA:

Los puentes ubicados en las vías que forman parte de la Red Nacional de Carreteras deben diseñarse para carga C40-95. Los puentes ubicados en las nuevas carreteras que se construyan con recursos del Instituto Nacional de Vías deben diseñarse para la carga C40-95, los puentes ubicados en las carreteras que no forma parte de la Red Nacional pueden diseñarse para la carga C32-95, los puentes urbanos ubicados en las vías no contempladas en las carreteras nacionales pueden diseñarse para la carga C32-95.

CARGA POR SISMO:

Los movimientos sísmicos de diseño están basados en una probabilidad de 10% de que sean excedidos en un lapso de 50 años, correspondiente a la vida útil promedio de un puente. Los puentes y sus componentes que se diseñen y construyan de acuerdo con los requisitos del código pueden sufrir daño durante un sismo, pero tendrán una baja probabilidad de sufrir colapso debido a los movimientos sísmicos del terreno.

CARGAS:

El diseño debe incluir avalúo de cargas muertas, vivas (camión de diseño o línea de carga equivalente), impacto, cargas de peatones, empujes sobre barandas y sardineles, cargas sísmicas según las diferentes categorías de comportamiento, carga de viento, y otras cargas aplicables según el caso, como empujes de tierra e hidráulico, fuerzas térmicas, flotación, fuerza de corrientes de agua. Dichas cargas deben combinarse para producir los máximos efectos, según los diferentes grupos de carga y según el método de diseño escogido.

SUPERESTRUCTURA:

El Supervisor Técnico de Diseño debe verificar las consideraciones de distribución de cargas de rueda sobre el tablero, transversal y/o longitudinalmente, para los diferentes elementos estructurales que lo compongan (concretos reforzado y preesforzado, acero estructural; apoyos, barandas) y señalización.

SUBESTRUCTURA:

El Supervisor Técnico de Diseño debe verificar las consideraciones de diseño de la subestructura (estribos, muros de contención, pilas, fundaciones superficiales y profundas, elementos de concreto (reforzado y preesforzado) conductos enterrados y tierra armada).

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME ESTR No. 14 Página 18
INFORME ESTRUCTURAL N° 14		

El control de planos incluye la verificación de los siguientes aspectos:

- Definición y localización de la estructura
- Grado de detalle (completo)
- Consistencia y uniformidad entre los diferentes dibujos y planos.
- Detalles de los elementos estructu- rales
- Detalles constructivos especiales Dimensionamiento completo
- Especificaciones de materiales
- Especificaciones de la carga de diseño
- Especificaciones especiales sobre la fundación de estructuras

El control de los cálculos incluye la verificación de los siguientes aspectos:

- Contenido general
- Cargas de diseño, sus combinaciones y método empleado.
- Especificaciones de los materiales de la estructura y de la Fundación Modelos de análisis
- Programas de computador utilizados y su descripción
- Categorías de comportamiento sísmico
- Resultados de análisis
- Diseño de elementos
- Cálculo de cantidades de obra

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS Y/O OBSERVACIONES

Durante el presente período se han mantenido los inconvenientes relacionados con el manejo de aguas en las actividades de armado de acero para la viga cabezal, debido al alto nivel freático y al considerable volumen de agua alimentado por la permanencia de la temporada invernal en la zona. Esta situación ha dificultado la evacuación adecuada del agua acumulada, lo que obligó a implementar un sistema de bombeo permanente y a realizar ajustes en los sistemas de drenaje, incrementando su capacidad. Asimismo, fue necesario reprogramar tareas críticas para mitigar el impacto sobre el cronograma de obra. Estas condiciones han impedido el avance normal de las actividades, generando retrasos en el armado de los aceros correspondientes a las vigas cabezal y los muros aletas de la cimentación en la que se está trabajando.

En el siguiente registro fotográfico se ilustra la dificultad para ejecutar actividades debido al gran volumen y alto nivel freático de la zona de trabajo.


	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME ESTR No. 14 Página 19
INFORME ESTRUCTURAL N° 14		



6. CONTROL DE CALIDAD ESTRUCTURAL

6.1. Control de calidad del concreto

Durante la construcción de los pilotes en los periodos anteriores, los ensayos realizados fueron tomados durante la colocación de concreto cuyo objetivo fue verificar la resistencia requerida del diseño de la estructura. Estos especímenes fueron tomados durante la colocación del concreto a los cuales se les realizó el proceso de curado y se fallaron en laboratorio en diferentes edades con el fin de verificar la resistencia que coincidiera con la requerida en el diseño, resultados que cumplieron con estas condiciones sin presentar novedad alguna.

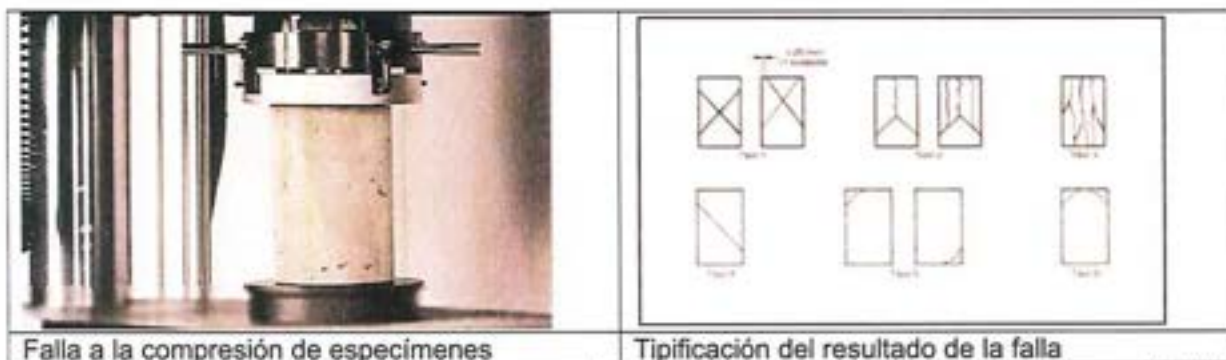

La resistencia a la compresión se define como la capacidad para soportar una carga por unidad de área, y se expresa en términos de esfuerzo, generalmente en kg/cm², MPa. El ensayo se realiza sobre probetas cilíndricas elaboradas en moldes especiales que se someten a una presión mecánica para medir su resistencia en diferentes edades.

JR	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME ESTR No. 14 Página 20
INFORME ESTRUCTURAL N° 14		

El tipo de falla registrado da como resultado una resistencia a la compresión el cual debe estar dentro de los rangos establecidos en la norma INVI-E-410

Este control se realizó en cada uno los pilotes donde de demostró que la resistencia efectivamente coincidió con la requerida en el diseño.

Para este periodo no se realizó toma de muestras de concreto debido a que las actividades realizadas no contemplaban suministro de concreto para la obra.

6.2. Control de integridad de los pilotes

Durante la construcción de los pilotes en los periodos anteriores, las verificaciones de calidad estuvieron enfocadas en las actividades ensayos y diagnósticos del estado final de los pilotes con el fin de garantizar que la estructura cumpla con las especificaciones técnicas y los diseños definidos para la subestructura del proyecto, por lo tanto se solicitó al contratista realizar pruebas de integridad de cada pilote, prueba que consiste en el análisis de la propagación de impulsos de vibración mecánica que se genera por medio de un martillo especial y su recepción, con la ejecución de esta prueba se detecta la longitud y/o el comportamiento del pilote. En este procedimiento, la interventoría realizó el seguimiento y verificación del ensayo dando como resultado que los pilote no presentan anomalía y por lo tanto se da el aval para continuar las actividades de la etapa de la viga cabezal.



La emisión de los impulsos de vibración generados por medio de un martillo especial y su recepción, a través de un sensor colocado en la cabeza del pilote, detecta la longitud y/o el comportamiento del pilote como lo establece la norma ASTM D5882-07.



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME ESTR No. 14



Página 21

INFORME ESTRUCTURAL N° 14

6.3. Construcción de la viga cabezal.

Una vez terminada la construcción de los pilotes se continua la construcción de la viga cabezal iniciando con el armado de los aceros de refuerzo.

Todo acero de refuerzo al ser colocado en la obra y antes de la fundición del concreto, deberá estar libre de polvo, escamas de oxido, rebabas, pintura, aceite, grasa o cualquier otro tipo de suciedad que pueda afectar la adherencia del acero en el concreto. Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de los planos, y deberán ser aseguradas firmemente en las posiciones señaladas, de manera que no sufran desplazamientos durante la colocación del concreto. Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las intersecciones, el alambre usado para el amarre deberá ser del tipo negro calibre número diez y ocho (No. 18). Las barras de refuerzo deberán quedar colocadas de tal manera, que la distancia libre entre barras paralelas colocadas en una fila no sea menor que el diámetro de la barra. Se debe garantizar recubrimiento mínimo de los aceros. Los traslapes y uniones de las barras de refuerzo deberán cumplir las especificaciones y diseños. El suministro, almacenamiento, transporte e instalación del acero de refuerzo efectivamente colocado en la estructura, así como el manejo de los desperdicios ocasionados, deberá realizarse en un todo de acuerdo con la normatividad ambiental vigente.

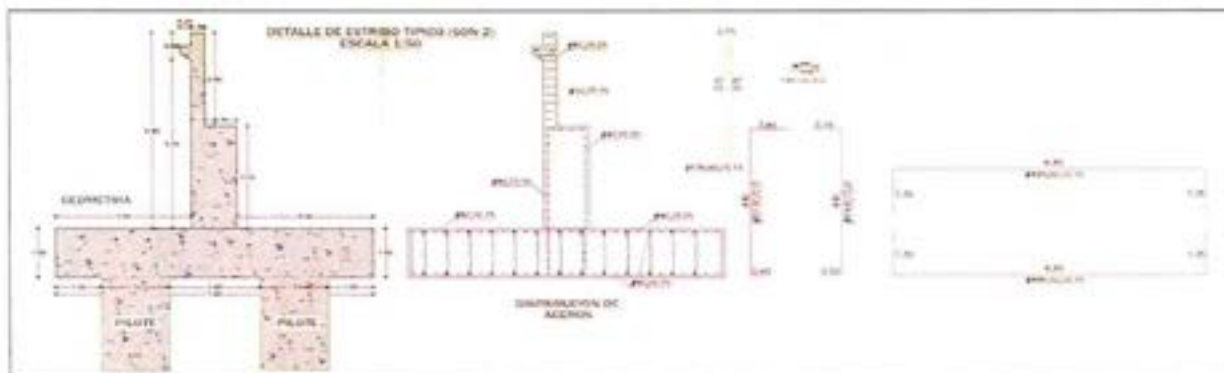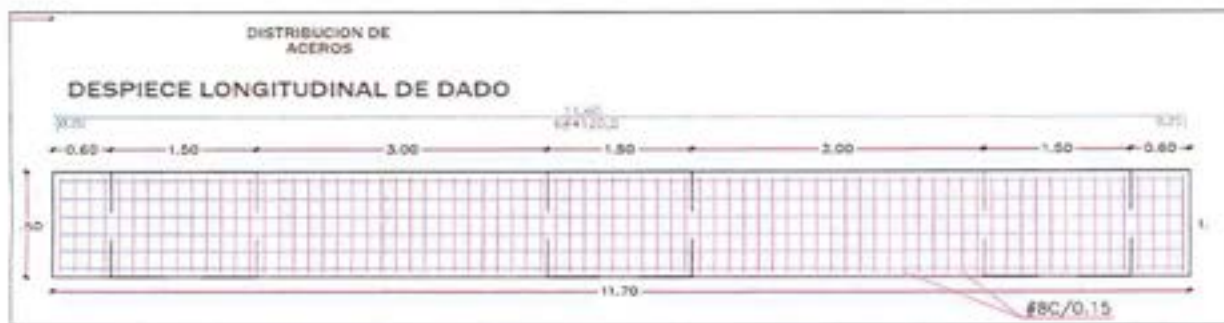



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME ESTR No. 14

Página 22

INFORME ESTRUCTURAL N° 14

Para este periodo se realizó el armado del acero de refuerzo para la viga cabezal margen Quebraditas y los muros aletas en las dos márgenes, lo mismo que la instalación de la formaleta y el vaciado del concreto para la viga cabezal margen Quebraditas. El armado del acero se realiza conforme a los planos estructurales, asegurando la correcta ubicación, amarre y recubrimiento de las barras. Posteriormente, se instala la formaleta, garantizando su estabilidad, alineación y estanqueidad. Finalmente, se procede al vaciado del concreto de forma continua y controlada, cuidando la adecuada consolidación del material y evitando desplazamientos del refuerzo.

Previo al vaciado del concreto, se instala el encofrado, asegurando su alineación, nivelación y fijación, para resistir las presiones del concreto fresco sin deformaciones ni fugas. Este debe estar limpio y con la separación que garantice el recubrimiento del acero de refuerzo según planos y especificaciones.



Armado de aceros para la viga cabezal.



Armado de aceros para la viga cabezal.



Control de distribución de los aceros.



Control de distribución de los aceros.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME ESTR No. 14 Página 23
INFORME ESTRUCTURAL N° 14		

Una vez verificado el cumplimiento de las condiciones anteriormente descritas para el acero de refuerzo, se procede a realizar el vaciado del concreto, garantizando que este proceso se lleve a cabo de manera continua y uniforme, evitando desplazamientos del refuerzo y asegurando una adecuada consolidación de la materia.



Verificación de vaciado de concreto para viga cabezal margen Quebraditas.



Verificación de vaciado de concreto para viga cabezal margen Quebraditas.



Verificación de vaciado de concreto para viga cabezal margen Quebraditas.



Verificación de vaciado de concreto para viga cabezal margen Quebraditas.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME ESTR No. 14
	INFORME ESTRUCTURAL N° 14	Página 24

Para el control de calidad del concreto, se realiza la verificación del asentamiento mediante el ensayo de revenimiento (slump test) y se toman muestras del concreto fresco para la elaboración de cilindros, los cuales se ensayan posteriormente a compresión, conforme a la normatividad vigente




Verificación del "slump" o asentamiento.



Verificación del "slump" o asentamiento.



Toma de muestras para laboratorio.

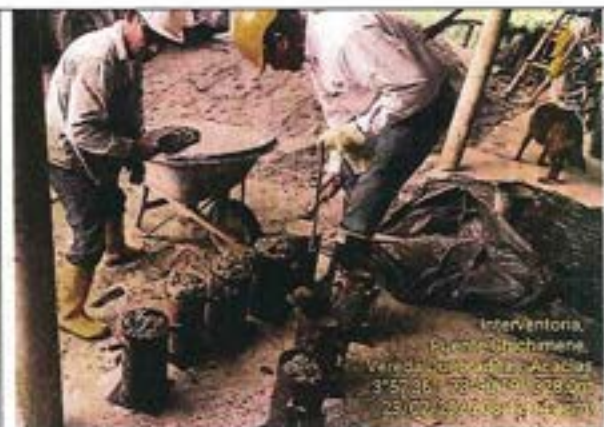

Toma de muestras para laboratorio.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME ESTR No. 14
		Página 25
INFORME ESTRUCTURAL N° 14		

7. CONCLUSIONES

En el presente periodo se ha venido realizando el control según diseño estructural el cual está fundamentado en el Código Colombiano de Diseño Sísmico de Puentes de 1996, "Norma Colombiana de Diseño de Puentes CCP 2014", el cual provee los requisitos mínimos para lograr un diseño seguro y funcional de puentes y demás estructuras viales considerando los efectos de mayores cargas y de sismos para los estudios, diseños, construcción y mantenimiento de puentes que se adelanten en la Red Vial Nacional a cargo del Instituto Nacional de Vías (INVIAS).

El control realizado durante el presente periodo se ha enfocado en la verificación de la calidad de los insumos recibidos en la obra, así como en la ejecución de pruebas que permitan comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño. Estas acciones tienen como objetivo garantizar la calidad, seguridad y durabilidad de los trabajos ejecutados.

También se verificó el armado de los aceros de refuerzo, incluyendo la correcta ubicación, amarre y recubrimiento, de acuerdo con los planos estructurales y las especificaciones del diseño, asegurando el cumplimiento de los criterios de resistencia, adherencia y funcionalidad requeridos para el adecuado desempeño estructural del elemento como lo es la estructura de viga cabezal margen Quebraditas.

También se realizó el control del procedimiento de instalación del encofrado, el cual es fundamental para mantener las dimensiones del elemento, evitar filtraciones y garantizar que resista las presiones del concreto fresco sin presentar deformaciones

Se verificó el vaciado del concreto, asegurando que la colocación se realizara de manera continua y controlada, con una adecuada compactación y sin generar desplazamientos del acero de refuerzo.

Firma	Firma
	
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	ESPECIALISTA EN ESTRUCTURAS



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**


Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME ESTR No. 14

Página 26

INFORME ESTRUCTURAL N° 14

8. REGISTRO FOTOGRAFICO

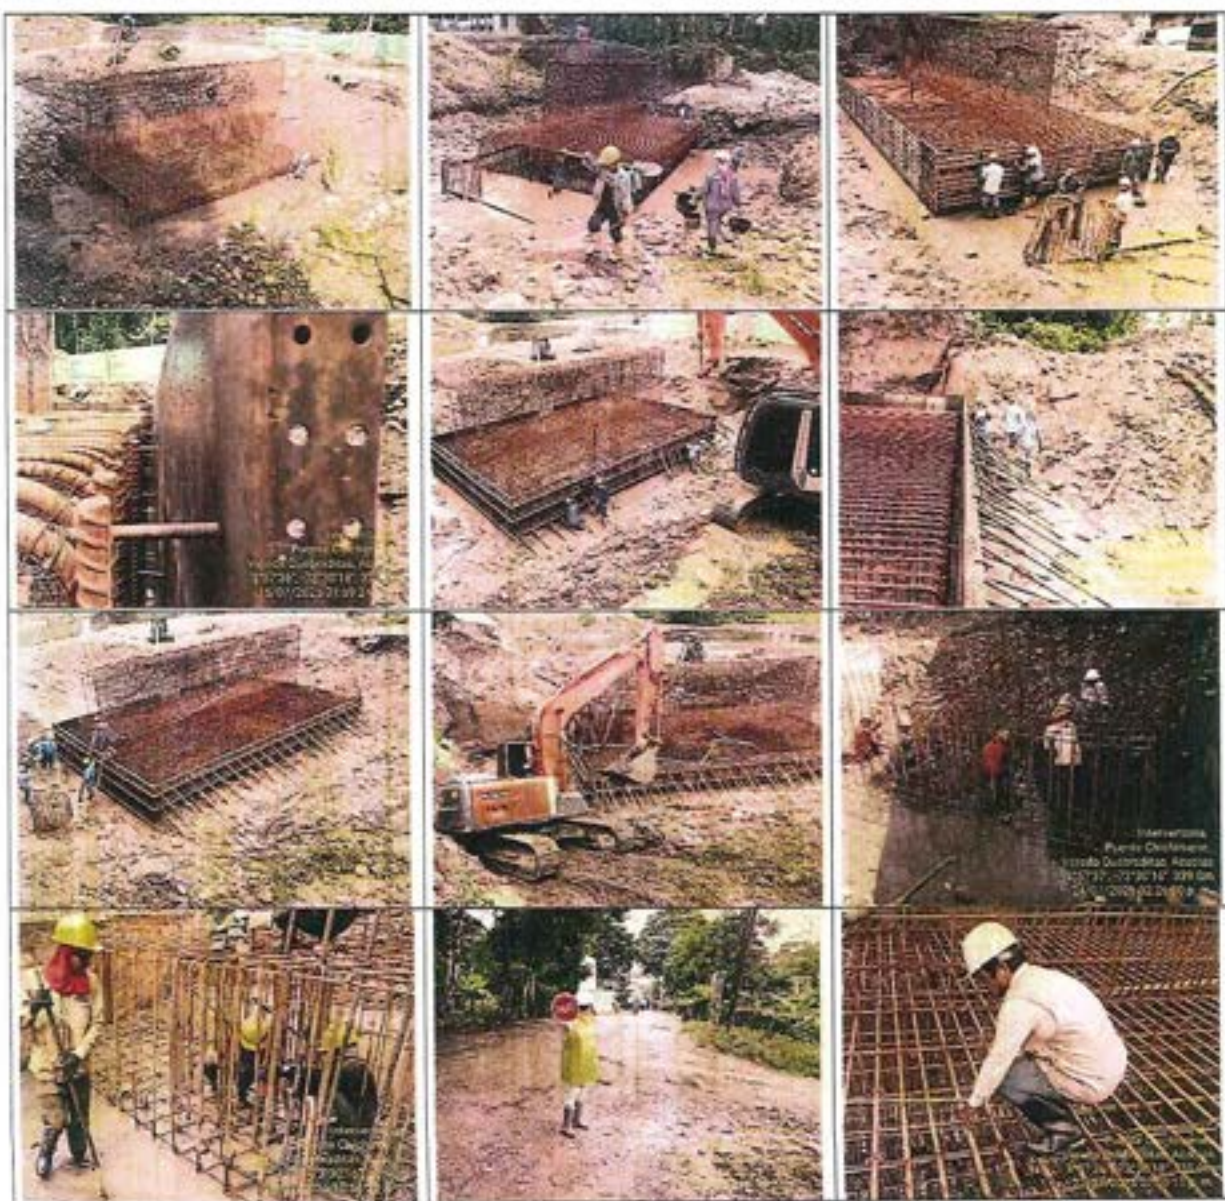



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**




ALCALDÍA DE
ACACÍAS

Contrato de Interventoría N° 978 de 2023

INFORME ESTR No. 14

Página 27

INFORME ESTRUCTURAL N° 14

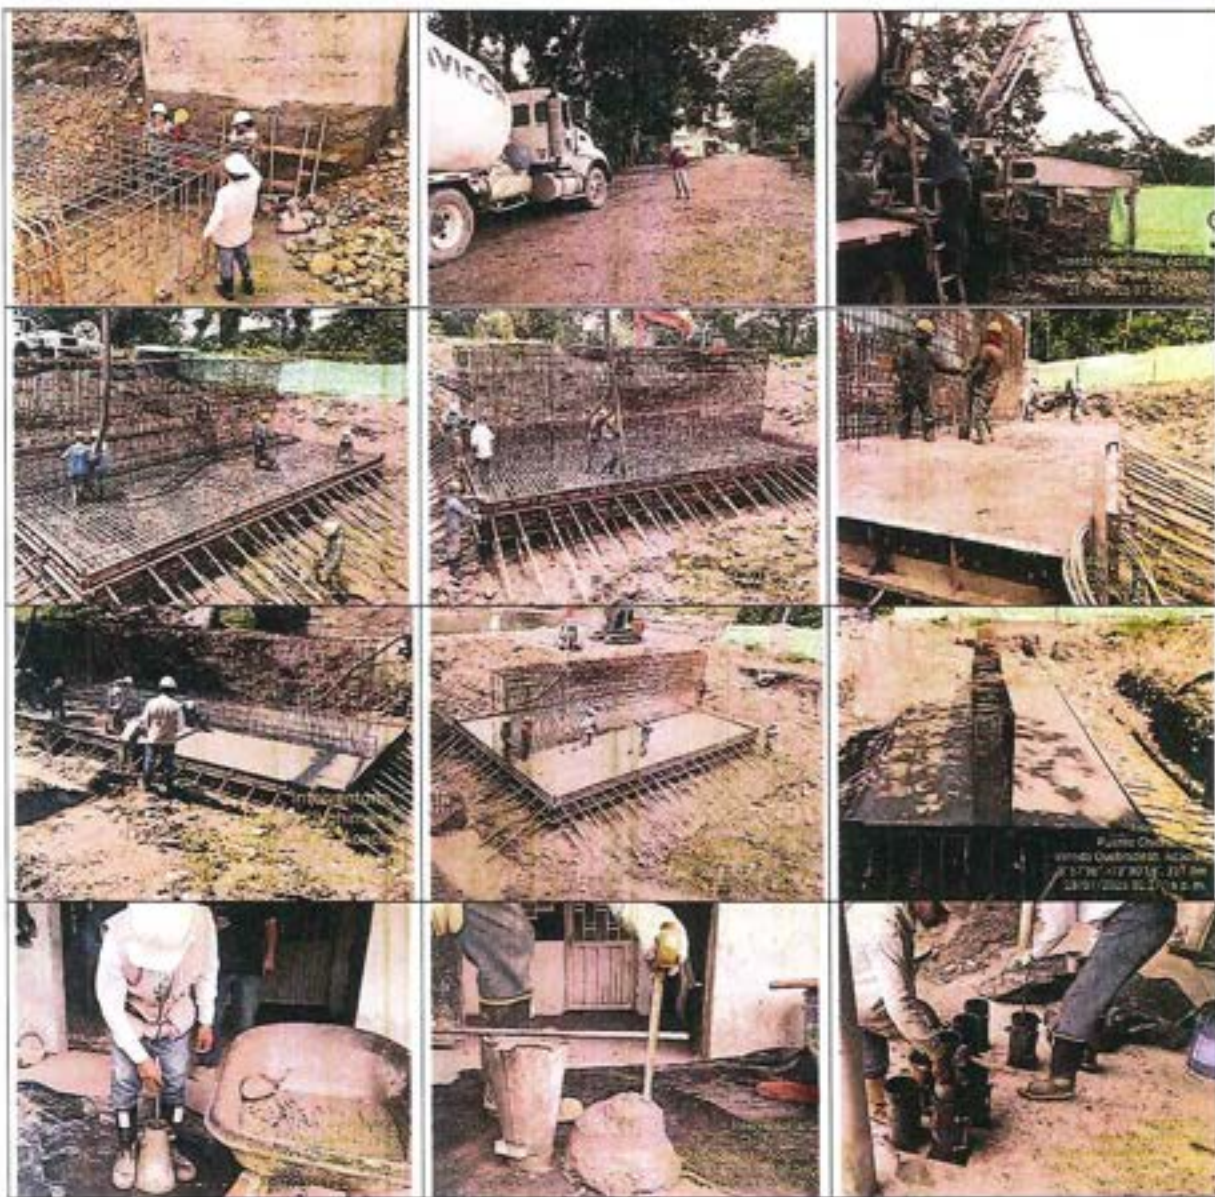

JR	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME TOP No. 14 Página 1
INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14		

CONTRATO DE INTERVENTORIA 978 DE 2023

INFORME DE TOPOGRAFIA N°14

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS"



PERIODO DEL INFORME
01 DE JULIO DEL 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME TOP No. 14 Página 2
INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14		

REVISION Y APROBACION

Objeto de Interventoría:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS	
Título de Documento:	Informe de Topografía No 14 (01 DE JULIO DEL 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025)	
Documento No:	INFTOP-014	
APROBACION		
	Nombre:	OSCAR HERNÁN ALARCÓN ORTEGÓN
Responsable por la elaboración:	Firma:	
	Fecha:	01-08-2025
	Nombre:	ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Vo Bo representante legal:	Firma:	
		01-08-2025

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDIA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME TOP No. 14 Página 3
INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14		

Contenido

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. OBJETIVOS	5
2.1. Objetivo General	5
2.2. Objetivos específicos	5
3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO	6
3.1. Localización del proyecto y descripción.	6
3.2. Alcance del proyecto en topografía e información entregada	7
3.3. Estado inicial de la zona de trabajos	9
4. INFORME DE TOPOGRAFIA	12
4.1. Trabajos de campo realizados.....	12
4.2. Planimetría.....	12
4.3. Altimetría	13
4.4. Especificaciones equipos utilizados.....	13
4.5. Coordenadas planas y geográficas de los puntos geodésicos iniciales.....	16
4.6. Coordenadas planas y geográficas de los puntos geodésicos finales.....	17
4.7. Puntos de referencia.	17
4.8. Toma de datos.....	17
4.9. Dibujo y replanteo.....	18
4.10. Carteras de campo.....	18
4.11. Carteras de cálculo.....	18
4.12. Verificación constante de los ejes de los pilotes en el proceso de excavación. 18	
4.13. Monitoreo puente existente.	18
5. INCONVENIENTES PRESENTADOS	21
6. CONCLUSIONES.....	22
7. REGISTRO FOTOGRAFICO	23

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME TOP No. 14 Página 4
INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14		

1. INTRODUCCIÓN

Este proyecto surge de la necesidad expresada, la cual requiere realizar el seguimiento topográfico para la construcción del Puente Caño Chichimene, Vereda La Quebradita del Municipio de Acacias, Meta y sus obras complementarias, que permita mejorar el paso vehicular seguro para el desarrollo en este importante municipio.

El control Topográfico se realizará a partir de estaciones de control, a fin de mantenerse dentro de los parámetros cartográficos establecidos, así mismo los puntos de control horizontal y vertical se controlarán con la toma de una cantidad adecuada de puntos de levantamiento a fin de representar fidedignamente el terreno existente y las obras ejecutadas según planos topográficos. La poligonal ha sido realizada utilizando equipos de precisión como la estación total, que, a partir de esta, se realizara las lecturas para la toma de datos periféricos importantes que nos permitan verificar, controlar y supervisar el contrato. Las nivelaciones se cerrarán con una precisión menor de 0.012 m/Km, y se colocarán puntos aislados que no interrumpan las labores de la maquinaria que ejecuta el contrato.

Los puntos observados en el Levantamiento topográfico para la generación de las curvas de nivel se tomarán cada 10 m, formando entre sí un reticulado de tal forma que permita tener la configuración exacta de los niveles del terreno, representadas por las curvas de nivel, así mismo, disponer de la "Raw Data", suficiente para generar la información necesaria para el control del proyecto.

El control, seguimiento y revisión se adelantará con el levantamiento topográfico el cual se realizará a partir de dos vértices georreferenciados, tomando datos para curvas de nivel a cada cambio de nivel de terreno, linderos, vegetación y paramentos, para su posterior procesamiento de datos en oficina e iniciar el proceso de diseño del proyecto.

Tomando como base todo lo anterior, este informe se realizará periódicamente por la interventoría a cargo de JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA identificado con NIT 9.658.796-1, el cual tiene como prioridad cumplir con la supervisión y seguimiento a las actividades que, han sido planificadas y presentadas por el contratista y de esta forma velar por el cumplimiento de condiciones establecidas en el proyecto, así mismo certificar las cantidades ejecutadas en torno al mismo.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACIAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME TOP No. 14 Página 5
INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14		

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

El objetivo general es realizar y controlar la topografía para la Construcción del Puente Vehicular sobre el Caño Chichimene del Municipio de Acacias, Meta y sus pobras complementarias; posterior dar una descripción de la topografía de terreno, suficiente para generar los perfiles, secciones, volúmenes y cantidades de obra necesarias para el proyecto, que de tal forma que permita que el replanteo y los niveles se den de una forma adecuada y presentar el control y seguimiento a la ejecución del contrato 929 de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE DEL MUNICIPIO DE ACACIAS-META".

2.2. Objetivos específicos


- Describir las actividades ejecutadas del proyecto topográfico de cada una de las estructuras y áreas a intervenir en la construcción.
- Realizar observaciones y soluciones a inconvenientes que se puedan presentar en la etapa constructiva del proyecto referente a situaciones topográficas.
- Realizar el control tanto en planimetría como en altimetría del terreno y de las obras a ejecutar de tal forma que se obtenga una representación fidedigna de lo construido.
- Realizar los trabajos de campo que permitan elaborar los planos topográficos de control.
- Posibilitar la definición precisa de la ubicación y las dimensiones de los elementos Estructurales diseñados acorde a la implantación entregada.
- Establecer puntos de referencia para el replanteo durante la construcción.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACIAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME TOP No. 14 Página 6
INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14		

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

3.1. Localización del proyecto y descripción.

La zona para intervenir se encuentra ubicada en el Municipio de Acacias, específicamente está ubicada en la vía Terciaria que conduce a la vereda quebraditas a 34.4 Km del casco urbano del Municipio de Acacias Meta, de cuales 13.56 se encuentran en afirmado, las coordenadas de ubicación son las 03°57'39,99" N y 73°30'17.67" O

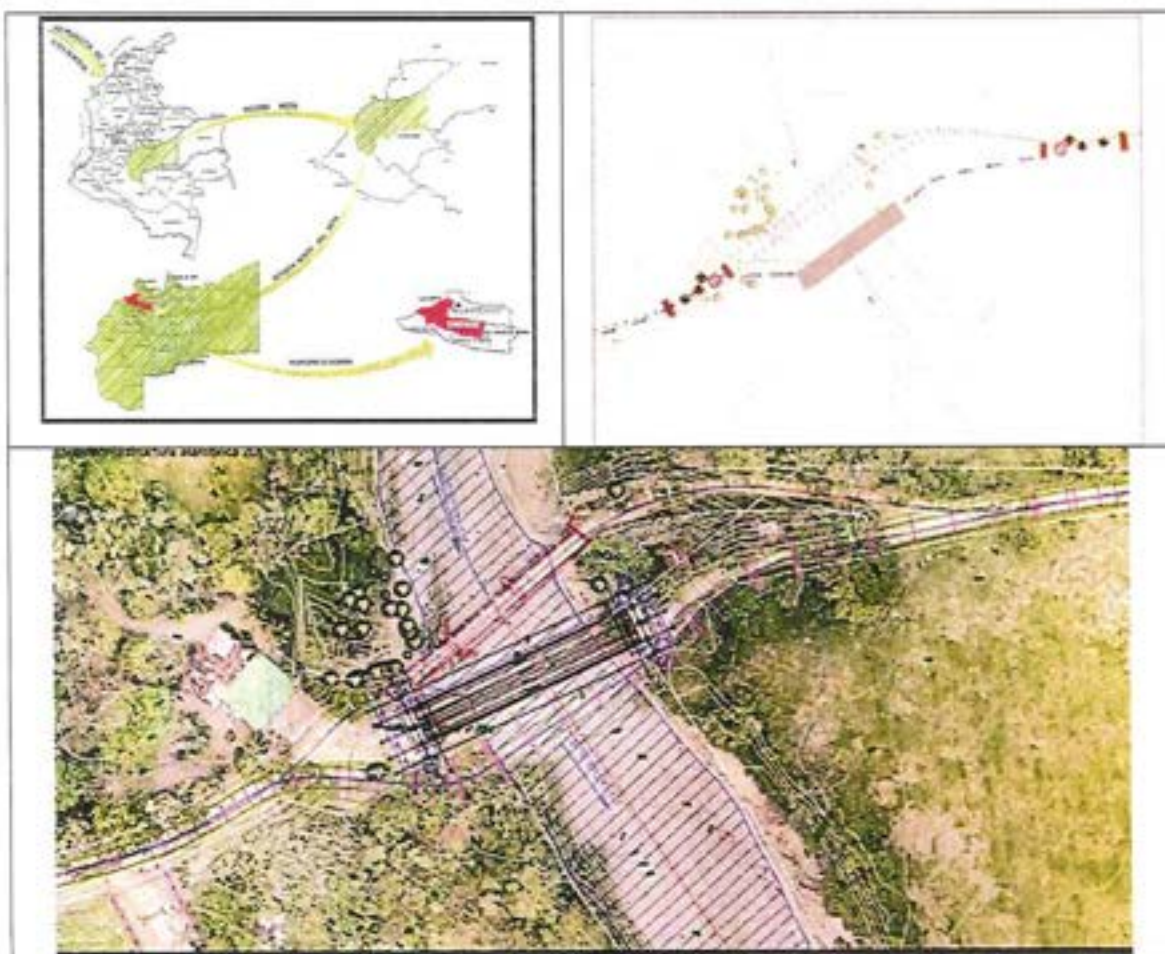

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME TOP No. 14 Página 7
INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14		

3.2. Alcance del proyecto en topografía e información entregada

El presente alcance corresponde a la revisión y control del componente topográfico e implantación de la información entregada por la entidad contratante de los estudios y diseños realizados a través del contrato de consultoría 375 de 2022 con la empresa Consorcio Consultorías Puentes Acacias cuyo objeto contractual fue "ESTUDIO Y DISEÑO DE SEIS PUENTES VEHICULARES UBICADOS EN LOS BARRIOS PABLO VI, LAS VEGAS, CARRERA 14 Y 11° VEREDAS SAN CRISTÓBAL, EL DIAMANTE Y QUEBRADITAS EN EL MUNICIPIO DE ACACÍAS, META" quien es el responsable de los estudios y diseños y que además fueron los encargados de realizar el levantamiento topográfico del proyecto de construcción en las cuales se construirá el alcance del contrato:

En el proyecto "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS" según modificatoria No 1 estableció en su ajuste lo siguiente; se plantea la construcción de un puente vehicular de 58.0 metros de luz entre ejes de apoyo y un tablero con un ancho de 10.7 metros a bordes externos, ancho efectivo de calzada de 7.30 metros, andenes a ambos costados de 1.20 metros; en el diseño realizado se plantea como apoyo del tablero 4 vigas en I metálicas de acero ASTM A-709 Grado 50W en alma llena, con una separación interna de 2.5 metros y una altura de 2465 milímetros; la infraestructura es una cimentación tipo pilote construyendo 8 pilotes por estribo para un total de 16 pilotes con un diámetro $\Phi 1.50$ metros y una profundidad de 12 metros cada uno; las barandas será metálicas, tendrá protectores en concreto tipo new jersey los apoyos y juntas estarán en neopreno, las aletas y estribos serán en concreto reforzado y el tablero así como las placas de aproximación serán concreto reforzado, el puente contara con señalización horizontal y vertical respectivamente.

Se realizará la intervención del pluvial existente en una longitud de 140 metros, la construcción de 34 sumideros laterales y 1 pozos de inspección, así como la limpieza de los componentes existentes; de igual manera se realizará la construcción de un sistema de alumbrado público el cual está conformado por 29 mástiles metálicos con luminarias Solares con foto celda Completa.

En el componente hidráulico y de protección se construirán 103 m3 de gaviones revestidos en concreto, 789 unidades de bolsacretos, distribuidos en una longitud de 76,87ml margen derecha y 39,06 margen izquierda, así como 160 horas de canalización en el río.

El componente vial se pavimentará en concreto hidráulico 720 ml de vía en un espesor de 0,23m y anchos viales de 6 mts, incluyendo bocacalles, dicha longitud se distribuye 476ml sector quebraditas, 159ml sector palomas y bocacalles, dicha intervención se complementa con sardineles, bordillos y 962m2 de espacio publico



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**




**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023

INFORME TOP No. 14

Página 8

INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14

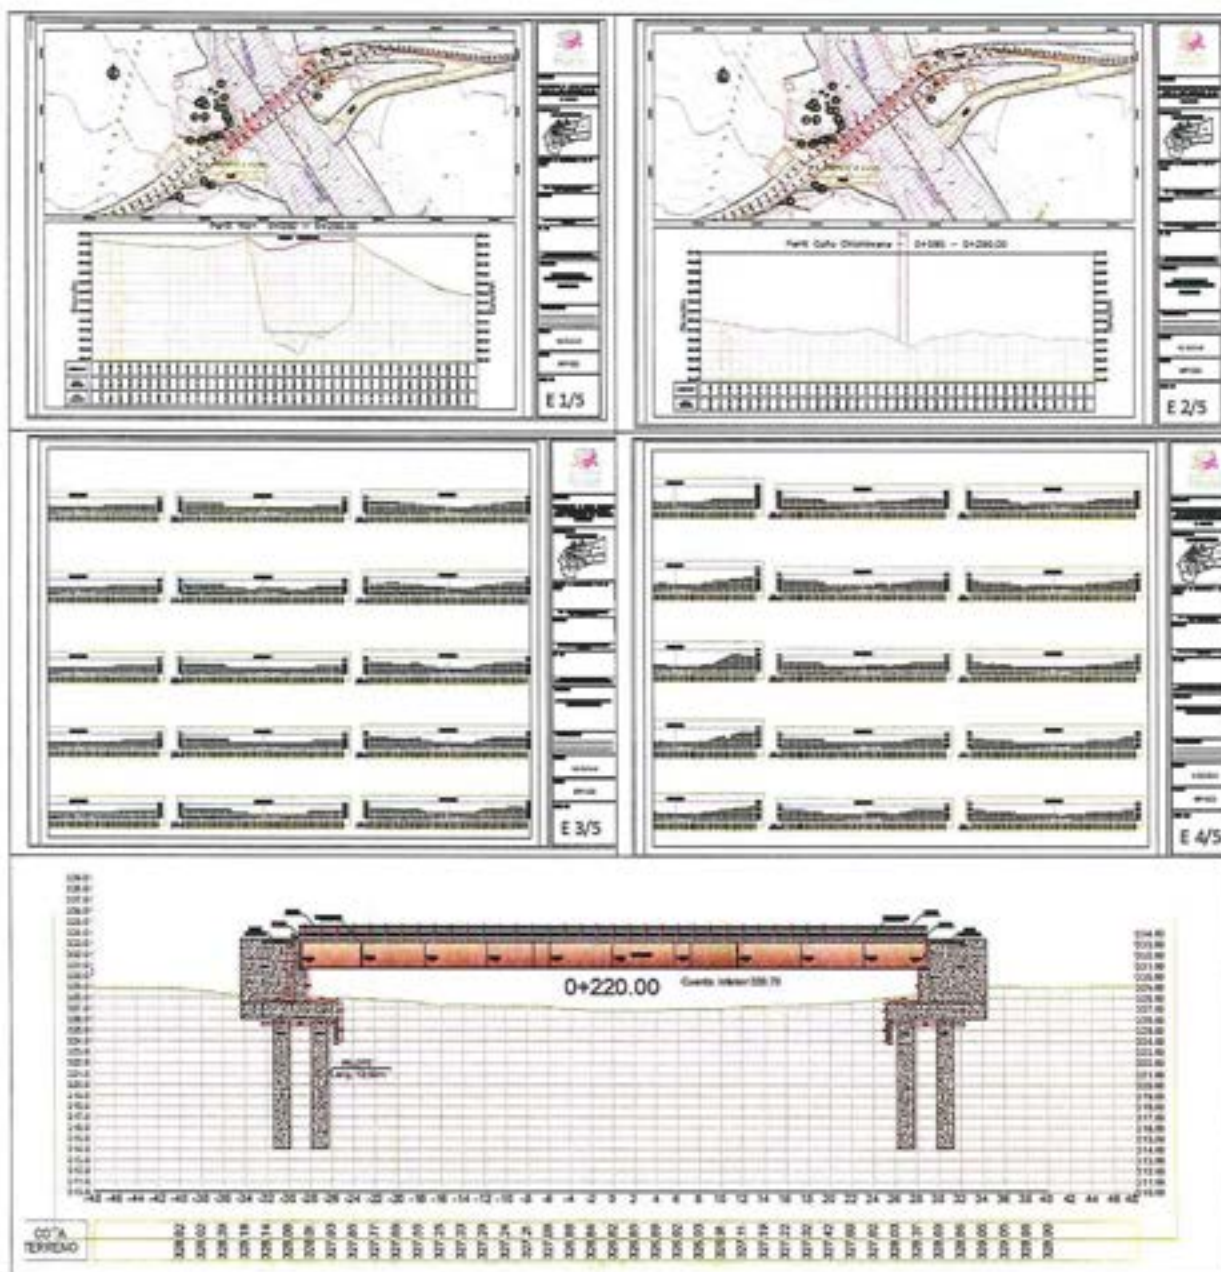



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**




**ALCALDÍA DE
ACACIAS**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023

INFORME TOP No. 14

Página 9

INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14

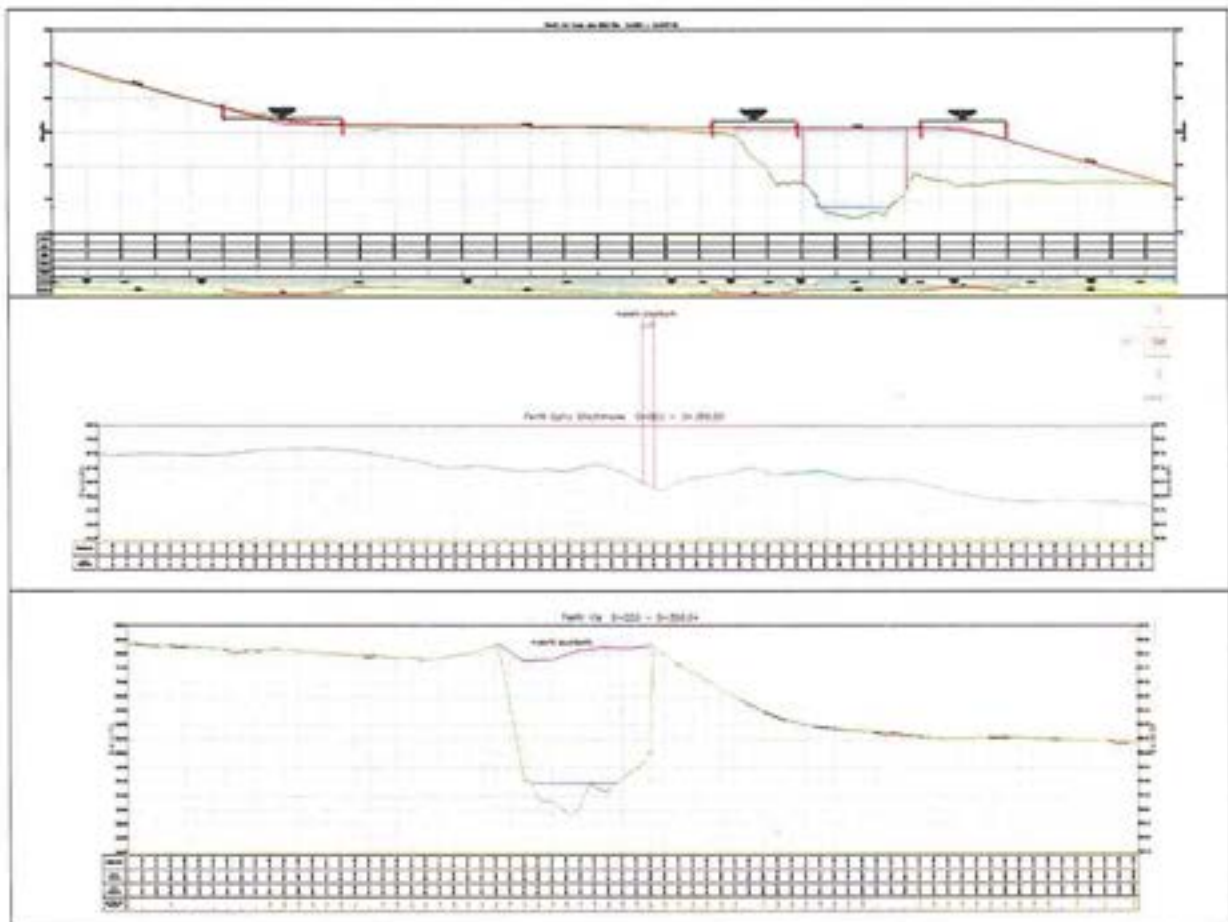

3.3. Estado inicial de la zona de trabajos

Se realizó la auscultación y evaluación del estado actual del puente sobre el caño Chichimene en la vereda Quebraditas en el municipio de Acacias, el cual básicamente se encuentra fuera de servicio debido a la inminente emergencia en la que se encuentra la estructura, la cual debido a su alto grado de deterioro no debe ser reparada, si no, demolida y construir un nuevo puente que cumpla la normatividad vigente en Colombia, además de tener elementos con patologías muy graves, el puente carece de elementos como: Pasos peatonales, barandas e iluminación, también por efectos de socavación los apoyos intermedios que actúan como pilas ya sufrieron demasiado y se hundieron tanto que sometieron la super estructura a esfuerzos para los cuales no estaban diseñados sus elementos, es importante recalcar que el puente ya cumplió su vida útil y repararlo es hacer inversiones que posteriormente se perderán.



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**




**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023

INFORME TOP No. 14

Página 10

INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14

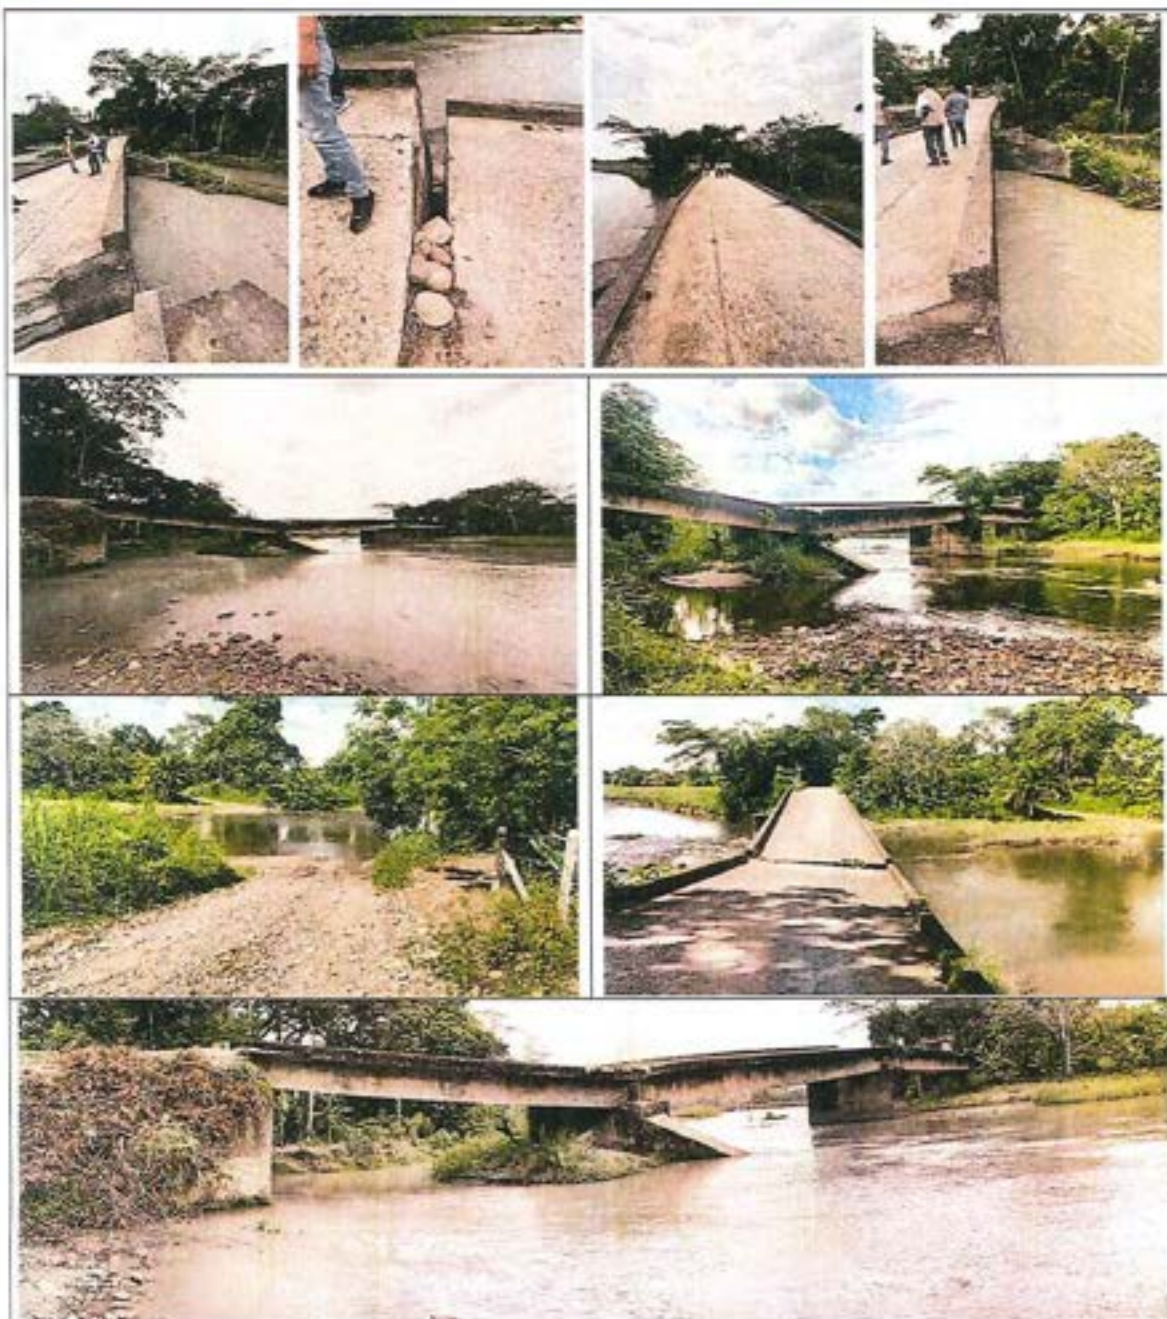



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023

INFORME TOP No. 14

Página 11

INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14



JR	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME TOP No. 14 Página 12
INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14		


4. INFORME DE TOPOGRAFIA

4.1. Trabajos de campo realizados.

Se ha realizó la implantación topográfica teniendo que analizar su localización exacta pues podría interferir y sobreponerse con la aleta y/o estribo del puente existente. Posteriormente del análisis de incidencia de la aleta en la ejecución de la cimentación del puente, se determinó relocalizar las coordenadas del puente desplazándolo 3,0 metros de forma longitudinal en dirección al costado Quebraditas sin afectación alguna a las especificaciones del diseño de la estructura. De igual forma es prudente no realizar las actividades de demolición previamente, pues estas nos generan una protección a las obras que se realizaran aguas abajo.

4.2. Planimetría

La Planimetría es la parte de la topografía que estudia los procedimientos para la representación de una superficie terrestre en un plano horizontal. Para la obtención del plano planimétrico, se realizarán dos tipos de trabajos: el trabajo de campo para la obtención de los datos necesarios sobre el terreno, y el trabajo de oficina para plasmar estos datos en un plano, con sus anotaciones y características, el método a emplear en este estudio será el de poligonal abierta con azimut atrás, se realiza entrega por parte del contratista de una nueva relocalización, para el presente periodo se han realizado la reubicación en las siguiente coordenadas:

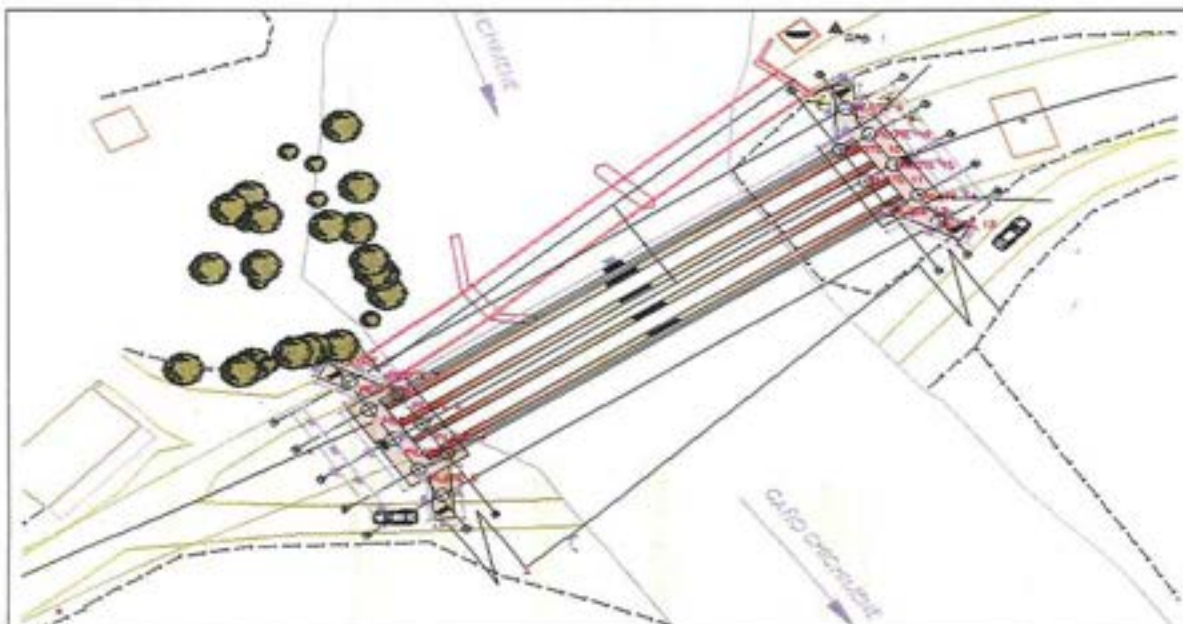


	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023		INFORME TOP No. 14
	INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14		Página 13

4.3. Altimetría

La altimetría es la parte de la topografía que estudia los métodos y los procedimientos para la determinación de la distancia vertical entre diversos puntos del terreno, es decir, la representación del relieve de este. Las cotas o niveles de los diversos puntos, puede ser absoluta (entre ellos) o bien comparada con un plano horizontal de origen: el nivel del mar.

Para determinar las diferencias de nivel del terreno en estudio se tomará como referencia la altura de los puntos de amarre, para las que se obtenga la altura sobre el nivel del mar, obtenida mediante el uso de GPS. Posteriormente se realizará la nivelación trigonométrica por los vértices de la poligonal, ya que este método solo requiere de la lectura del ángulo vertical o la diferencia de pendiente entre dos vértices, la distancia y las alturas instrumentales de ambos puntos, incluso el mismo equipo almacenara esta información y calculara las alturas que corresponden a cada vértice las curvas de nivel serán empleadas para indicar el relieve en planos o mapas.

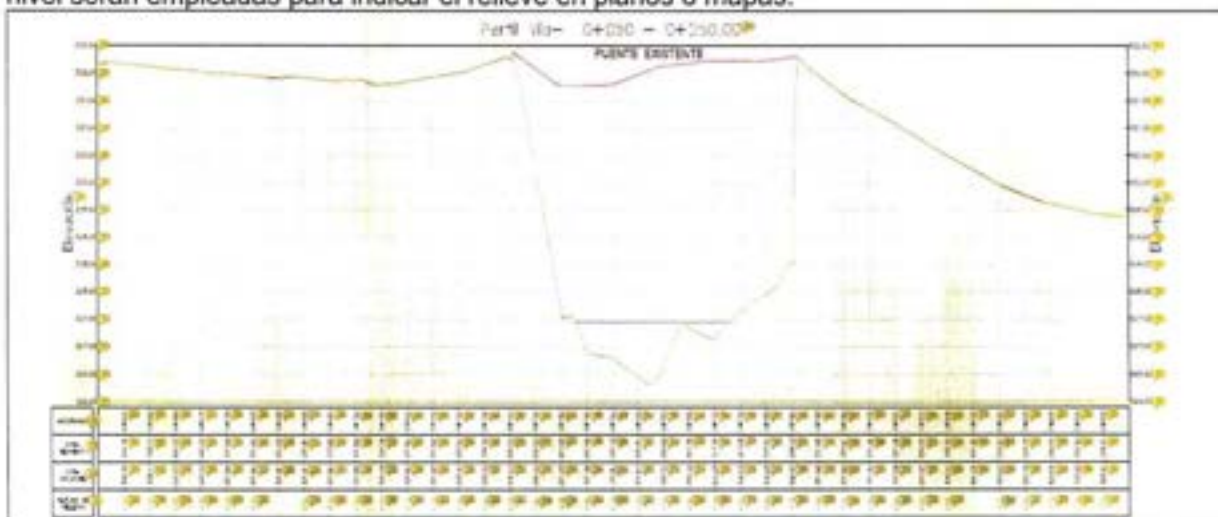

4.4. Especificaciones equipos utilizados.

El trazado de las poligonales se realizará con la estación total TOPCON GTS-GTS-236W No.285524 el cual cuenta con certificado de calibración No 055/23 de fecha 09 de diciembre de 2023 y adicional a lo anterior para el control de alturas el equipo utilizado es un nivel óptico de precisión de marca TOPCON AT-B4 serie No RY1632 y certificado de calibración No 570/24 de fecha 09 de febrero de 2024.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME TOP No. 14 Página 16
INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14		

 J. R. RODRIGUEZ REINA		SERVICIO DE LABORATORIO OPTICO-MECANICO Y ELECTRONICO		CERTIFICADO N° 0702
INTERVENIENTE	EPS	FECHA DE SERVICIO	28 DE JULIO DE 2023	INTERVENIENTE
PARTE	3. CUBIERTA	AUTORIZACION PARA SERVICIO	28 DE JULIO DE 2023	PARTE
INTERVENIENTE	EPS	FECHA	28 DE JULIO DE 2023	INTERVENIENTE
PARTE	3. CUBIERTA	FECHA	28 DE JULIO DE 2023	PARTE
INTERVENIENTE	EPS	FECHA	28 DE JULIO DE 2023	INTERVENIENTE
PARTE	3. CUBIERTA	FECHA	28 DE JULIO DE 2023	PARTE
				
				

4.5. Coordenadas planas y geográficas de los puntos geodésicos iniciales.

Nombre	Planas Magna Sirgas Bogotá		Geográficas	
	Grid Easting	Grid Northing	Longitud	Latitud
PILOTE 1	1063568.7200m	929682.9980m	W073° 30' 18.40"	N003° 57' 36.40"
PILOTE 2	1063573.6115m	929681.5069m	W073° 30' 18.25"	N003° 57' 36.36"
PILOTE 3	1063576.1009m	929677.7581m	W073° 30' 18.17"	N003° 57' 36.23"
PILOTE 4	1063578.5902m	929674.0094m	W073° 30' 18.08"	N003° 57' 36.11"
PILOTE 5	1063578.0668m	929668.9226m	W073° 30' 18.10"	N003° 57' 35.95"
PILOTE 6	1063575.6745m	929672.0732m	W073° 30' 18.18"	N003° 57' 36.05"
PILOTE 7	1063573.1852m	929675.8220m	W073° 30' 18.26"	N003° 57' 36.17"
PILOTE 8	1063570.6958m	929679.5707m	W073° 30' 18.34"	N003° 57' 36.29"
PILOTE 9	1063619.2865m	929716.5766m	W073° 30' 16.76"	N003° 57' 37.50"
PILOTE 10	1063618.7631m	929711.4898m	W073° 30' 16.78"	N003° 57' 37.33"
PILOTE 11	1063621.2525m	929707.7410m	W073° 30' 16.70"	N003° 57' 37.21"
PILOTE 12	1063623.7418m	929703.9923m	W073° 30' 16.62"	N003° 57' 37.09"
PILOTE 13	1063628.6333m	929702.5012m	W073° 30' 16.46"	N003° 57' 37.04"
PILOTE 14	1063626.6575m	929705.9284m	W073° 30' 16.53"	N003° 57' 37.15"
PILOTE 15	1063624.1682m	929709.6772m	W073° 30' 16.61"	N003° 57' 37.27"
PILOTE 16	1063621.6788m	929713.4259m	W073° 30' 16.69"	N003° 57' 37.39"

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME TOP No. 14 Página 17
INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14		

4.6. Coordenadas planas y geográficas de los puntos geodésicos finales.

Nombre	Planas Magna Sirgas Bogotá		Geográficas	
	Grid Easting	Grid Northing	Longitud	Latitud
PILOTE 1	1063566.22m	929681.34m	W073° 30' 18.40"	N003° 57' 36.40"
PILOTE 2	1063571.11m	929679.85m	W073° 30' 18.25"	N003° 57' 36.36"
PILOTE 3	1063573.6m	929676.1m	W073° 30' 18.17"	N003° 57' 36.23"
PILOTE 4	1063576.09m	929672.35m	W073° 30' 18.08"	N003° 57' 36.11"
PILOTE 5	1063575.57m	929667.26m	W073° 30' 18.10"	N003° 57' 35.95"
PILOTE 6	1063573.18m	929670.41m	W073° 30' 18.18"	N003° 57' 36.05"
PILOTE 7	1063570.69m	929674.16m	W073° 30' 18.26"	N003° 57' 36.17"
PILOTE 8	1063568.2m	929677.91m	W073° 30' 18.34"	N003° 57' 36.29"
PILOTE 9	1063616.79m	929714.92m	W073° 30' 16.76"	N003° 57' 37.50"
PILOTE 10	1063619.18m	929711.77m	W073° 30' 16.78"	N003° 57' 37.33"
PILOTE 11	1063621.67m	929708.02m	W073° 30' 16.70"	N003° 57' 37.21"
PILOTE 12	1063624.16m	929704.27m	W073° 30' 16.62"	N003° 57' 37.09"
PILOTE 13	1063626.13m	929700.84m	W073° 30' 16.46"	N003° 57' 37.04"
PILOTE 14	1063621.24m	929702.33m	W073° 30' 16.53"	N003° 57' 37.15"
PILOTE 15	1063618.75m	929706.08m	W073° 30' 16.61"	N003° 57' 37.27"
PILOTE 16	1063616.26m	929709.83m	W073° 30' 16.69"	N003° 57' 37.39"

4.7. Puntos de referencia.

Se reconoció el terreno con el objetivo de optimizar tiempo, donde se identificó los puntos de referencia estratégicos determinados por el consultor para el Puente Caño Chichimene.

COORDENADAS PLANAS Y GEOGRÁFICAS DE LOS PUNTOS GEODÉSICOS

PUNTO	NORTE	ESTE	ELEVACIÓN	LONGITUD	LATITUD
GPS-1	929731.281	1063630.013	331.101	73°30'16.42"	3°57'37.97"
GPS-2	929634.799	1063497.154	331.718	73°30'20.73"	3°57'34.84"

4.8. Toma de datos

Para Toma de datos se utilizará el método de radiación, este tipo de levantamiento topográfico consiste en ubicar un punto estratégico (Estación) dentro o fuera del terreno a medir, en donde se ubica el equipo de Topografía, para luego medir el azimut y distancia horizontal a todo el largo y ancho de la zona del puente sobre El Caño Chichimene. También se realizarán lecturas de toma de datos al Terreno Natural esto con el fin de hacer un molde del terreno y poder así saber que tan accidentada esta; (nivel más altos y bajos).

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME TOP No. 14
		Página 18
INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14		

4.9. Dibujo y replanteo.

En base al levantamiento realizado se implantarán los diseños entregados por la entidad para su construcción.

4.10. Carteras de campo.

Todos los datos que se tomaran en campo quedaran registrados en la memoria interna del equipo; de lo cual se entregara el archivo digital de lo registrado con el equipo en campo (archivos crudos).

4.11. Carteras de cálculo.

Se presentarán anexas las carteras electrónicas (archivos RAW y ASCII) con las lecturas realizadas en campo y las coordenadas. Estas coordenadas las obtiene el mismo equipo, o se pueden procesar con los datos de campo, con ayuda del software de descarga y edición de datos del equipo utilizado.

4.12. Verificación constante de los ejes de los pilotes en el proceso de excavación.

El realizo el seguimiento en el procedimiento de excavación de los pilotes monitoreando constantemente los ejes de los pilotes con el fin de identificar errores y generar las correcciones correspondientes. Los pilotes ya se construyeron en su totalidad con el acompañamiento y control permanente por parte de la interventoría donde se logró verificar que no se presentó anomalías y se pudo que no se presentó anomalías durante este procedimiento y el producto final cumple con las especificaciones técnicas de diseño.

Para este periodo de realizo acompañamiento y control en la construcción de las vigas cabezal, las cuales se encuentran en la etapa de armado de aceros, realizando verificación de niveles y coordenadas con el fin de garantizar la correcta distribución de los refuerzos y las posiciones de acuerdo con los diseños.


4.13. Monitoreo puente existente.

Se ha realizado la demolición parcial del puente antiguo, avanzando actualmente en una sección del costado Quebraditas. No ha sido posible ejecutar la demolición total, ya que el puente sigue siendo utilizado como paso provisional por la comunidad. Se prevé que la demolición completa se lleve a cabo en los próximos días, previa socialización con la comunidad, informando que dicho paso alterno dejará de estar disponible.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME TOP No. 14
	INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14	Página 19



Puente existente en proceso de demolición.

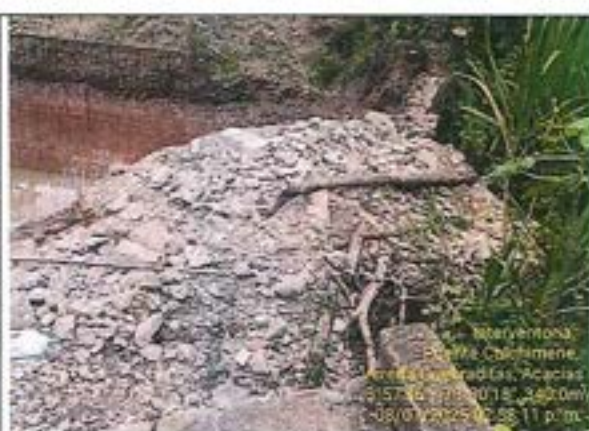

Puente existente en proceso de demolición.

Durante el periodo se llevaron a cabo las labores de armado de acero de refuerzo, instalación de formaleta y vaciado de concreto estructural en la viga cabezal del estribo Quebraditas, así como el armado de aceros para las aletas en la margen Palomas, en concordancia con los planos y especificaciones estructurales. Paralelamente, se efectuaron controles topográficos para la verificación de cotas, posiciones y niveles, garantizando el cumplimiento de los parámetros técnicos en esta etapa constructiva.

ACOMPANIAMIENTO TOPOGRAFICO DE LA INTERVENTORIA EN LA ACTIVIDAD DE VIGA CABEZAL



Verificación de cotas para colocación de aceros de la viga cabezal por parte de interventoría.



Verificación de cotas para colocación de aceros de la viga cabezal por parte de interventoría..



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



ALCALDÍA DE
ACACÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023

INFORME TOP No. 14

Página 20

INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14



Armado de aceros para la viga cabezal del costado Quebraditas.



Armado de aceros para la viga cabezal del costado Quebraditas.



Instalación de formaletas para encofrado de la viga cabezal del costado Quebraditas.



instalación de formaletas para encofrado de la viga cabezal del costado Quebraditas.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME TOP No. 14 Página 21
INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14		



Vaciado de concreto para viga cabezal del costado Quebraditas.



Vaciado de concreto para viga cabezal del costado Quebraditas.

5. INCONVENIENTES PRESENTADOS

- Durante este periodo, el nivel freático se mantuvo elevado, afectando el desarrollo de las actividades de cimentación. La temporada invernal se ha mantenido provocando el incremento en la recarga del acuífero y de la infiltración generando saturación del terreno. Esta condición dificultó la operación de los sistemas de abatimiento y control hidráulico, reduciendo la efectividad en el manejo de filtraciones y condicionando el avance programado de las obras.
- Se ha presentado una limitación en la ejecución de la demolición total del puente existente, debido a la presión ejercida por la comunidad, que continúa utilizándolo como paso provisional. Esta situación ha restringido el avance de la actividad, por lo que se requiere gestionar, con el acompañamiento de la entidad contratante, una solución concertada que garantice las condiciones de seguridad para los usuarios y viabilice la continuidad de la obra.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME TOP No. 14
		Página 22
INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14		

6. CONCLUSIONES

En el presente informe se analiza las actividades realizadas durante este periodo por parte del contratista, así mismo las actividades y acompañamientos realizados por parte de la interventoría reiterando lo manifestado en el informe anterior donde se concluye:

- Para este periodo de realizo acompañamiento, control y verificación de la calidad de los insumos recibidos en la obra, así como en la ejecución de pruebas que permitan comprobar el cumplimiento de las especificaciones técnicas de diseño.
- Se verificó el armado del acero de refuerzo conforme a planos y especificaciones, asegurando su correcta ubicación, amarre y recubrimiento para garantizar el desempeño estructural del elemento .
- También se realizó el control del procedimiento de instalación del encofrado, el cual es fundamental para mantener las dimensiones del elemento, evitar filtraciones y garantizar que resista las presiones del concreto fresco sin presentar deformaciones
- Se verificó el vaciado del concreto, asegurando que la colocación se realizara de manera continua y controlada, con una adecuada compactación y sin generar desplazamientos del acero de refuerzo

Firma	Firma
	
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	OSCAR HERNÁN ALARCÓN ORTEGÓN
CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	TOPOGRAFO



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**


CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023

INFORME TOP No. 14

Página 23

INFORME DE TOPOGRAFIA N° 14

7. REGISTRO FOTOGRAFICO

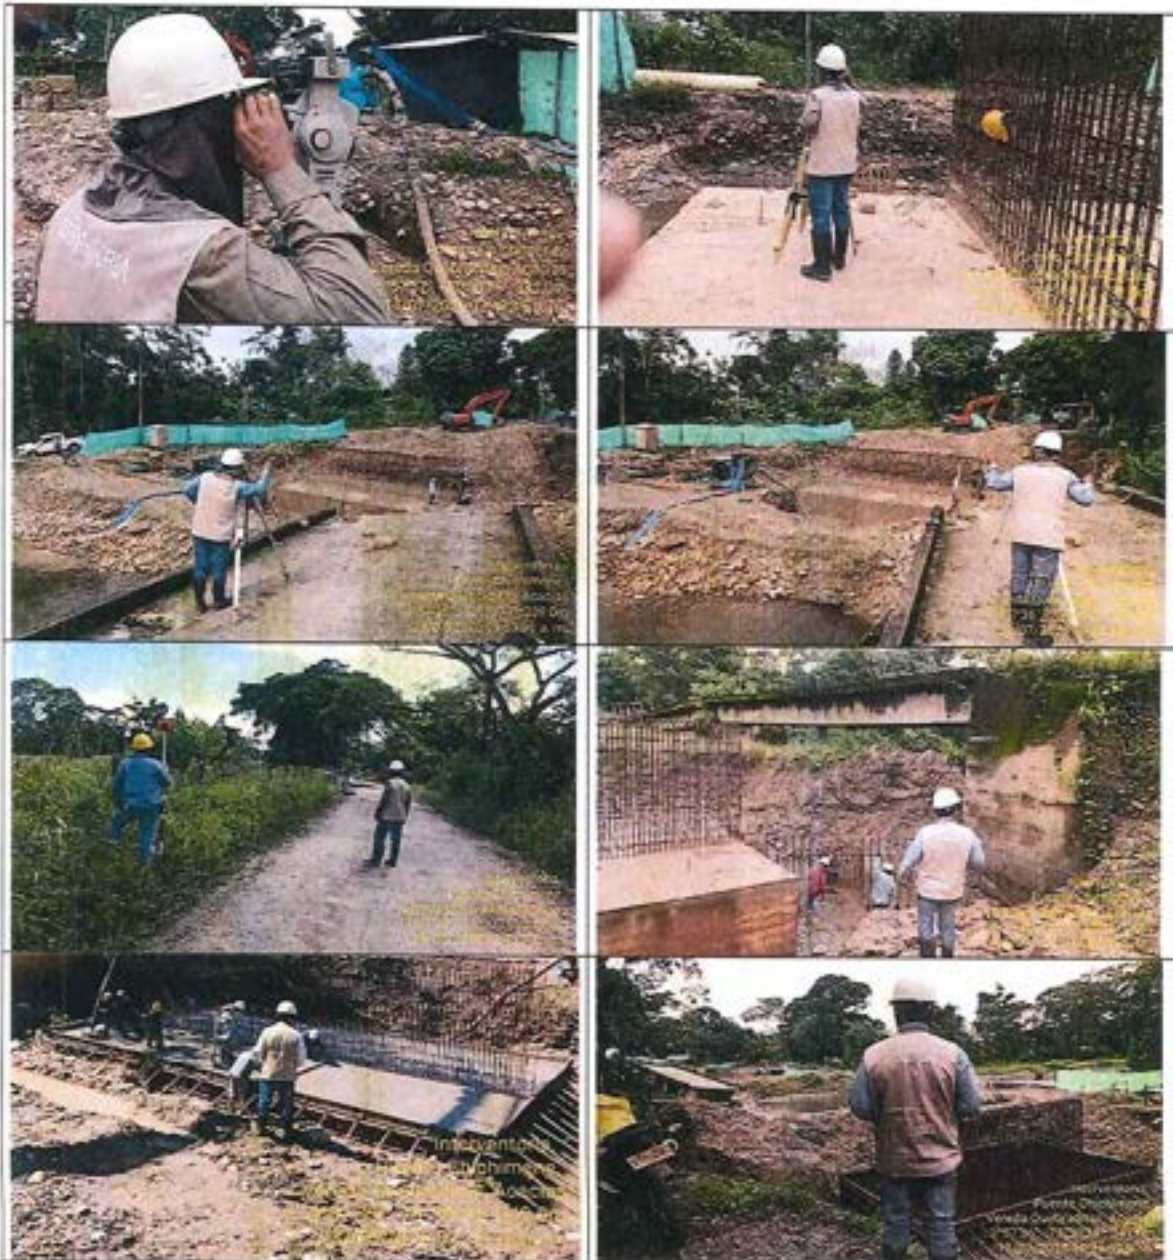

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14 Página 1
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14		

CONTRATO DE INTERVENTORIA 978 DE 2023

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N°14

"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS"




PERIODO DEL INFORME

01 DE JULIO DEL 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14 Página 2
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14		

REVISION Y APROBACION

Objeto de Interventoría:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
Título de Documento:	informe de Interventoría de Seguridad y Salud en el Trabajo No 14 (01 DE JULIO DEL 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025)		
Documento No:	INFMSST-014		
APROBACION			
	Nombre:	FLOR ANGELA NARVÁEZ CASTRO	
Responsable por la elaboración:	Firma:		
	Fecha:	01-08-2025	
	Nombre:	ING. JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
Vo Bo representante legal:	Firma:		
		01-08-2025	

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14 Página 3
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14	

CONTENIDO

1.	INTRODUCCIÓN.....	4
2.	OBJETIVOS	5
2.1.	Objetivo General.....	5
2.2.	Objetivos específicos	5
3.	RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO	6
3.1.	Localización del proyecto y descripción.....	6
3.2.	Alcance del proyecto en seguridad y salud en el trabajo.	7
3.3.	Estado inicial de la zona de trabajos	7
4.	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORÍA.....	8
4.1.	Actividades desarrolladas por la interventoría.....	8
4.2.	Generalidades contrato de interventoría.....	8
4.3.	Marco Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo.	10
4.4.	Instalaciones administrativas de la interventoría.....	10
4.5.	Personal de interventoría.	10
4.6.	Pagos de seguridad social de interventoría.	11
4.7.	Control técnico de la obra en el área de seguridad y salud en el trabajo.	13
5.	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA	14
5.1.	Generalidades contrato de obra.	14
5.2.	Instalaciones administrativas del contratista.	15
5.3.	Relación personal del contratista.....	15
5.4.	Seguimiento a compromisos laborales.....	16
5.5.	Exámenes médicos.	17
5.6.	Supervisión asistencia a charlas preoperacionales	19
5.7.	Supervisión entrega de dotación y EPP.	22
5.8.	Supervisión elementos de emergencias.	24
1.1.	capacitación en SST	25
1.2.	Supervisión de induction y reinduction	26
2.	Pagos de seguridad social del contratista.....	28
2.1.	Seguimiento a indicadores de seguridad y salud en el trabajo por AT.....	31
3.	REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES DE SST	32
4.	CONCLUSIONES.....	33

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14
		Página 4
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14		

1. INTRODUCCIÓN

La Seguridad y Salud en el Trabajo es un área multidisciplinaria y está relacionada no solo con la seguridad, también vincula la salud y la calidad en el ámbito de los trabajadores, su función es la de proteger a todo trabajador que se vea afectado por el ambiente ocupacional.

La Salud Ocupacional, se construye por medio de un ambiente psicosocial, físico, emocional, donde el trabajador pueda desarrollar una actividad con dignidad, con libre expresión, con ser respetado donde sus condiciones sean seguras y las más adecuadas, no solamente la salud ocupacional se encarga de la parte de salud física si no de la actividad o estado emocional en que se encuentre el trabajador, ya que ellos pueden llegar a presentar algún tipo de inconformidad, problema, y esto afectará el rendimiento en sus diferentes actividades laborales.

Tomando como base esto, este informe que realizará mensualmente JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA identificado con NIT 9.658.796-1, tiene como prioridad cumplir con la supervisión y seguimiento a las actividades que, han sido planificadas y presentadas por el contratista y de esta forma velar por el cumplimiento de condiciones idóneas para los trabajadores, respaldados siempre con la normatividad vigente, garantizando siempre la divulgación y sensibilización de las normas en seguridad y salud en el trabajo, para facilitar el control de los factores de riesgo y prevenir la aparición de Accidentes y Enfermedades de origen laboral.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14
		Página 5
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14		

2. OBJETIVOS

2.1. Objetivo General

Presentar los registros de supervisión, seguimiento y control del cumplimiento a los compromisos establecidos en los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, por el contratista de obra en desarrollo de la interventoría, durante el periodo del presente informe.

2.2. Objetivos específicos


- Describir las actividades de SST que se desarrollaron durante el periodo evaluado; las cuales se encuentran divididas por componentes y programas de acuerdo con lo establecido en el plan de acción SST de la interventoría y del Contratista, junto con lo establecido en el Programa de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo.
- Generar registros que evidencien el cumplimiento de las actividades SST por parte del contratista y el seguimiento a estas por parte de la interventoría.
- Verificar y validar el seguimiento de la totalidad de las actividades SST dando cumplimiento a lo establecido en el contrato, leyes, decretos, resoluciones, normas, manuales y guías de seguridad y salud en el trabajo vigente para el contrato.
- Propender porque durante el desarrollo del contrato se implementen las medidas de manejo de SST por parte del contratista.
- Verificar el cumplimiento en los soportes de pagos de seguridad social y nómina del personal de los contratistas y el contrato de interventoría.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14	

3. RESUMEN EJECUTIVO DEL PROYECTO

3.1. Localización del proyecto y descripción.

La zona para intervenir se encuentra ubicada en el Municipio de Acacias, específicamente está ubicada en la vía Terciaria que conduce a la vereda quebraditas a 34.4 Km del casco urbano del Municipio de Acacias Meta, de cuales 13.56 se encuentran en afirmado, las coordenadas de ubicación son las 03°57'39,99" N y 73°30'17.67" O

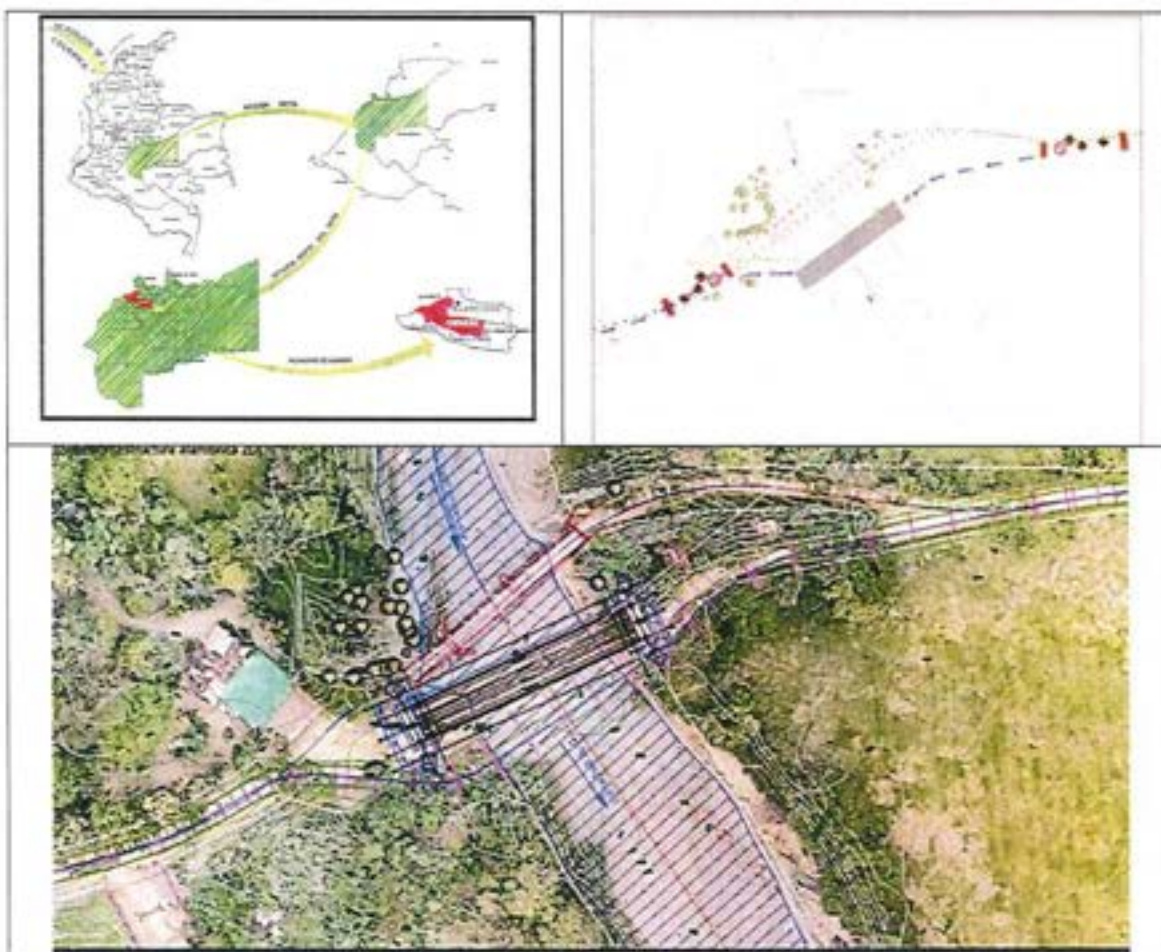


	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14 Página 7
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14	

3.2. Alcance del proyecto en seguridad y salud en el trabajo.

Teniendo en cuenta que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo (SG-SST) es un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora, con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud de los trabajadores (Decreto 1072 de 2015), por lo anterior esta interventoría tiene como objetivo principal garantizar que los trabajadores que hacen parte del proyecto, desarrollen las actividades que han sido planeadas de manera segura y responsable siempre brindando al personal vinculado con el contrato las condiciones idóneas y seguras en cumplimiento de la normatividad legal vigente.

3.3. Estado inicial de la zona de trabajos

El profesional en SST de la interventoría realiza la inspección a la zona de trabajo para verificar su estado, en ella encontramos que el proyecto se ubica en el centro poblado de quebraditas, sector rural del municipio de acacias, una vía terciaria en material granular donde se va a construir un puente vehicular y se tiene que demoler el puente existente el cual ha colapsado.

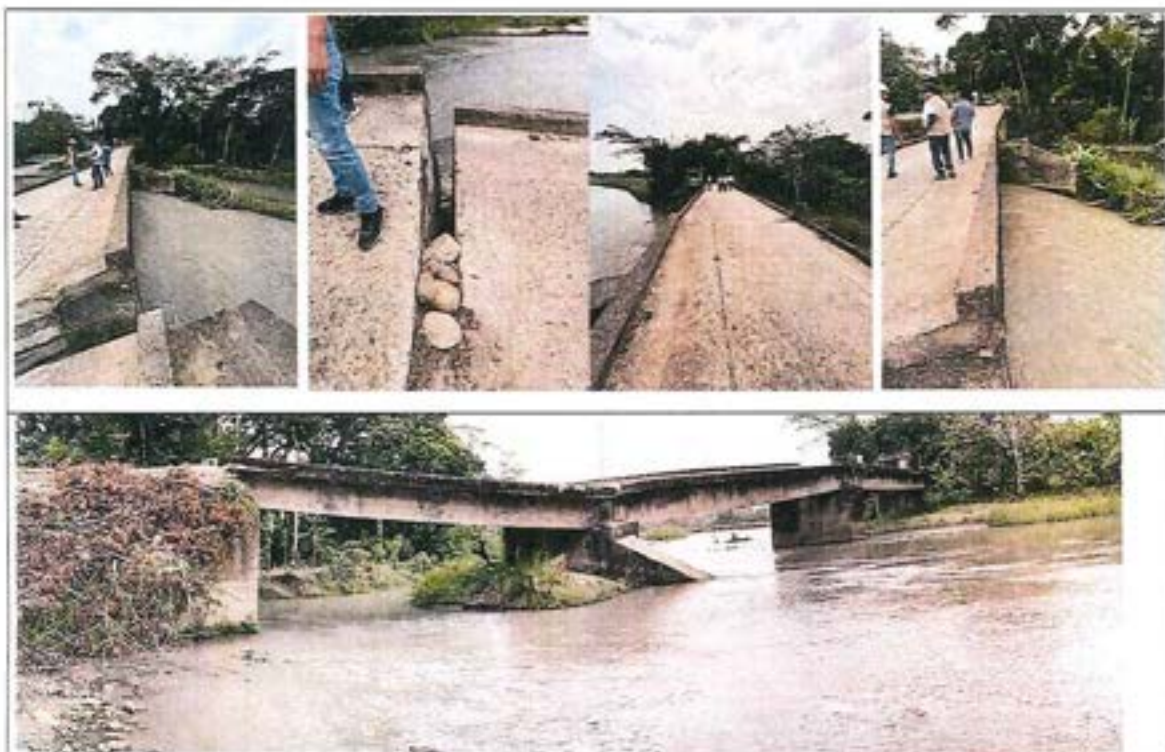

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14
		Página 8
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14		

4. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE INTERVENTORÍA

4.1. Actividades desarrolladas por la interventoría.

El presente informe corresponde a las actividades realizadas por el profesional SST de la Interventoría, en cumplimiento de sus actividades de seguimiento al contrato de obra No 929 de 2023 cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS".

La interventoría realiza un seguimiento a las actividades ejecutadas por el contratista en el área SST, este seguimiento se ha realizado dejando como evidencia un registro fotográfico, formatos de control, seguimiento y cumplimiento a los indicadores SST, con el fin de promover, mantener y mejorar las condiciones de salud y trabajo, y preservar un estado de salud, bienestar físico, mental y social de los trabajadores, la prevención de accidentes y enfermedades laborales factibles de intervención, dando cumplimiento a la normatividad vigente.

La interventoría, en su función de seguimiento a la aplicación del SG SST, realizó la verificación de su implementación, a través de las medidas de seguridad establecidas para el control de los factores de riesgo presentes en la ejecución del contrato de obra en el periodo del presente informe.

4.2. Generalidades contrato de interventoría.

PROCESO CONTRACTUAL:	CM-OCA-013-2023
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE ACACIAS
RESOLUCION DE ADJUDICACION	203 DEL 22 DE DICIEMBRE DE 2023
CONTRATO DE:	INTERVENTORIA
No. DEL CONTRATO:	978 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	27 DE DICIEMBRE DE 2023
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS
VALOR INICIAL:	SEISCIENTOS VEINTISIETE MILLONES OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS M/CTE (\$627.081.787,00) M/CTE
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN ADICIONAL No.1:	NOVECIENTOS DIECIOCHO MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y TRES MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS M/CTE (\$918.733.882,00) M/CTE

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14 Página 9
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14		

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA NIT No 9.658.796-1
CORREO ELECTRONICO	interpuentechichimene@gmail.com
CÉDULA DE CIUDADANÍA	9.658.796 DE YOPAL
No. Y FECHA RP INICIAL:	5156 DEL 22 DE AGOSTO DEL 2023
SUPERVISOR:	IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CORREO ELECTRONICO	infraestructura@acacias.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION	CRISTIAN FUENTES AMADO
CORREO ELECTRONICO	crithian.f9393@gmail.com
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	27 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	26 DE ABRIL DE 2025
FECHA SUSPENSION No:1	24 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE REINICIO	8 DE JUNIO DEL 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSION No.1:	10 DE JUNIO DEL 2025
AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No.1	8 DE JUNIO DEL 2025, (TIEMPO 30 DIAS)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN AMPLIACION A LA SUSPENSION No.1:	10 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE REINICIO ANTICIPADO:	17 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL SEGÚN REINICIO ANTICIPADO	20 DE JUNIO DEL 2025
PRORROGA No.1	7 MESES ADICIONALES, TOTAL DE PLAZO 18 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.1	20 DE ENRO DEL 2026

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14 Página 10
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14		

4.3. Marco Legal en Seguridad y Salud en el Trabajo.

Los requisitos legales relacionados con el aspecto de Seguridad y Salud en el Trabajo, se encuentra incluido dentro del SGSST que fue entregado a la interventoría, en la fase preliminar. En el seguimiento realizado al SG SST, se evidencia que se cuenta con la matriz de requisitos legales ajustados a la ejecución de las actividades establecidas para el contrato.

4.4. Instalaciones administrativas de la interventoría.

Las instalaciones de la interventoría están ubicadas en la Calle 49 No.30-16 oficina 203 Barrio el Caudal en el municipio de Villavicencio Meta, de igual forma se cuenta con oficina en el caso urbano del Municipio de acacias donde se llevan a cabo todos los procesos administrativos por parte de la interventoría y se atenderá al público en general en caso de ser necesario.

4.5. Personal de interventoría.

Durante el presente periodo la interventoría, realizó el acompañamiento de forma permanente con los profesionales en salud ocupacional con sus debidas funciones de supervisar, verificar, controlar y apoyar de forma eficaz y oportuna las acciones de seguridad y salud en el trabajo, por tanto, la interventoría a velado por que se cumpla la normativa vigente legal, y se exigió al contratista el cumplimiento de las mismas con el personal a su cargo durante el desarrollo de los trabajos, con el fin de mitigar los riesgos presentes en obra y crear un ambiente de trabajo seguro, y adecuado para cada labor y así mismo evitar accidentes e incidentes de trabajo y/o enfermedades laborales futuras.

Para estas labores se relaciona el grupo de profesionales de interventoría.

Nombres y Apellidos	Cargo y/o oficio	Tipo de Vinculación	AFILIACIÓN			
			EPS	Pensión	ARL	CCF
Jimmy Andrés Torres Castro	Director interventoría	Dependiente	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM
Jorge Augusto Rodriguez Reina	Residente interventoria	Independiente	ESP SURA	COLPENSIONES	SURA	COFREM
Jimmy Andrés Torres Castro	Especialista Estructural	Dependiente	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM
Oscar Hernán Alarcón Ortega	Ingeniero Ambiental	Dependiente	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM
Flor Angela Narváez Castro	Profesional SISO	Dependiente	FDSYGA REGIME	PORVENIR	SURA	COFREM
Oscar Hernán Alarcón Ortega	Topógrafo	Dependiente	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM
Pedro Eladio Alferez	Cadenero	Dependiente	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14 Página 11
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14		

4.6. Pagos de seguridad social de interventoría.

Se realiza la entrega de las planillas de los reportes de pagos de salud, ARL, Pensiones y demás parafiscales de los trabajadores en el periodo comprendido del 01 de agosto de 2024 al 31 de agosto de 2024, las cuales resumen la siguiente información:

Mes	Planilla No	Referencia de pago	Pago EPS	Pago Pensión	Pago ARL	Pago CCF	Pago Total
Junio			\$1.160.603,91	\$2.634.643,20	\$1.146.069,79	\$540.556,54	\$5.481.873,44
Junio	9488655747	88655747	\$740,700	\$1.007,400	\$412,400,00	\$118,500,00	\$2.279,000,00
Julio	9489830654		\$1.160.603,91	\$2.634.643,20	\$1.146.069,79	\$540.556,54	\$5.481.873,44
Julio	9490185291	90185291	\$740,700	\$1.007,400	\$412,400,00	\$118,500,00	\$2.279,000,00

	
---	--



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023

INFORME SST No. 14

Página 12

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14 Página 13
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14		

4.7. Control técnico de la obra en el área de seguridad y salud en el trabajo.

La Interventoría ha realizado presencia en las actividades realizadas por el contratista de manera permanente y se ha realizado un seguimiento a las actividades realizadas por medio de un registro fotográfico y formatos de control y seguimiento.

Para cumplir de manera idónea la interventoría le solicitó al contratista la siguiente documentación:

- ✓ Documentación del SG.SST de la empresa en cumplimiento de la Resolución 1072 del 2015 y la Resolución 0312 2019.
- ✓ Plan de trabajo SST anual.
- ✓ Certificado de funcionamiento de la IPS donde se realizan los exámenes médicos ocupacionales.
- ✓ Hoja de vida de los trabajadores
- ✓ Cedula del trabajador
- ✓ Inducción al cargo.
- ✓ Constancia de Afiliación ARL.
- ✓ Constancia de fondo de pensión y Caja de Compensación Familiar.
- ✓ Constancia de afiliación de EPS con número de radicado (No Adres).
- ✓ Formato entrega de dotación.
- ✓ Formato inducción al cargo.
- ✓ Contrato laboral.
- ✓ Examen médico ocupacional de ingreso.
- ✓ Planillas de seguridad social.
- ✓ Certificado de accidentalidad emitido por la ARL
- ✓ Carta de Idoneidad (para actividades de alto riesgo)
- ✓ Paz y salvos de personal retirado.
- ✓ Informes de SST. Con evidencia fotográfica.
- ✓ Inspecciones a los siguientes formatos:
- ✓ Formato Entrega de EPP
- ✓ Formato Asistencia diaria - charlas preoperacionales
- ✓ Formato capacitaciones programadas
- ✓ Formato inspección herramienta y equipos
- ✓ Formato de Inspección punto ecológico, punto sanitario.
- ✓ Formato de inspección locativa.
- ✓ Formato ATS.
- ✓ Formato inspección camilla y extintores.
- ✓ Formato inspección de botiquín acondicionado de acuerdo con la cantidad de trabajadores

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14 Página 14
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14		

5. INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO DE OBRA

5.1. Generalidades contrato de obra.

PROCESO CONTRACTUAL:	OCA-LP-009-2023
ENTIDAD CONTRATANTE	ALCALDIA DE ACACIAS
RESOLUCION DE ADJUDICACION	151 DEL 24 DE OCTUBRE DE 2023
CONTRATO DE:	OBRA PUBLICA
No. DEL CONTRATO:	929 DE 2023
FECHA DE SUSCRIPCION	01 DE NOVIEMBRE DE 2023
OBJETO:	CONSTRUCCION DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS
VALOR INICIAL:	TRECE MIL CUATROCIENTOS TREINTA MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS (\$13.430.269.893)
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN ADICIONAL No.1:	DIECISEIS MIL NOVECIENTOS SETENTA MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y OCHO PESOS (\$16.970.259.458,00)
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA NIT 901967420-0
REPRESENTANTE LEGAL	RODRIGO SUAREZ QUINONEZ HASTA EL 24 DE JUNIO DE 2024
REPRESENTANTE LEGAL	FRANCISO MORA GUTIERREZ DESDE EL 24 DE JUNIO DE 2024
CORREO ELECTRONICO	consorcioacacia.info23@gmail.com hacienda1@vshco.es
CÉDULA DE CIUDADANIA	79.426.913 DE BOGOTA
No. Y FECHA RP INICIAL:	2023000069 DEL 11 DE DICIEMBRE DEL 2023
INTERVENTOR	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
CONTRATO DEINTERVENTORIA	978 DE 2023
SUPERVISOR:	IVÁN MAURICIO ROJAS NOVOA
CARGO DEL SUPERVISOR:	SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
CORREO ELECTRONICO	infraestructura@acacias.gov.co
APOYO A LA SUPERVISION	CRISTIAN FUENTES AMADO
CORREO ELECTRONICO	cristhian.f393@gmail.com
PLAZO INICIAL:	ONCE (11) MESES
FECHA DE INICIO:	27 DE MAYO DE 2024
FECHA DE TERMINACIÓN:	26 DE ABRIL DE 2025
FECHA SUSPENSION No.1	24 DE ABRIL DEL 2025
FECHA DE REINICIO	8 DE JUNIO DEL 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN:	10 DE JUNIO DEL 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN SUSPENSION No.1:	10 DE JUNIO DEL 2025
AMPLIACION No.1 A LA SUSPENSION No.1	8 DE JUNIO DEL 2025, (TIEMPO 30 DIAS)
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN AMPLIACION A LA SUSPENSION No.1:	10 DE JULIO DEL 2025
FECHA DE REINICIO ANTICIPADO:	17 DE JUNIO DEL 2025
FECHA DE TERMINACION INICIAL SEGÚN REINICIO ANTICIPADO	20 DE JUNIO DEL 2025
PRORROGA No.1	7 MESES ADICIONALES, TOTAL DE PLAZO 18 MESES
NUEVA FECHA DE TERMINACION SEGÚN PRORROGA No.1	20 DE ENRO DEL 2026

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACIAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14
		Página 15
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14		

5.2. Instalaciones administrativas del contratista.

El contratista con una oficina ubicada en el casco urbano del municipio de Acacias en la dirección carrera 39 No 16 – 49 Barrio Villa aurora 2, así mismo cuenta con oficina ubicada en Bogotá en la dirección carrera 34 # 10-72 y por estrategia y logística una Oficina en la Vereda Quebraditas, sitio de la Obra, y corresponde a la casa del Señor Yesid Baquero Junto al Puente antiguo.

5.3. Relación personal del contratista.

Para el presente periodo el contratista tiene en su nómina el siguiente personal, sin embargo, no ha generado y presentado pago de planillas de seguridad social correspondientes al mes de junio del 2025.

Nombres y Apellidos	Cargo	Tipo de Vinculación	\$ EPS	\$ Pensión	\$ ARL	CCF
SERGIO REDONDO	ING. ESTRUCTURAL	INDEPENDIENTE	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
SEBASTIAN SANCHEZ	ING. HIDRAULICO	INDEPENDIENTE	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
ZAPATA COMBITA WENDY TATIANA	INGENIERO AMBIENTAL	INDEPENDIENTE	FAMISANAR	PORVENIR	SURA	N/A
JAIME ALEXANDER HERRERA	RESIDENTE DE OBRA	DEPENDIENTE	SANITAS	COLFONDOS	SURA	N/A
JOSE LUIS CERON	GERENTE DE PROYECTO	DEPENDIENTE	SALUD TOTAL	PORVENIR	SURA	N/A
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ	PROFECIONAL SST	DEPENDIENTE	SANITAS	PORVENIR	SURA	N/A
JUAN DE JESUS GRACIA	DIRECTOR DE OBRA	DEPENDIENTE	SANITAS	N/A	SURA	N/A
					SURA	
OPERATIVOS						
GONZALEZ MORENO JAIRO NEL	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	SANITAS	PORVENIR	SURA	COFREM
CARLOS ARTURO MELO NIÑO	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COFREM
LUIS ENRIQUE OLAYA LOMBANA	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	CAJA COPI	N/A-	SURA	COFREM
RUBEN YECID JIMENEZ	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	CAJA COPI	COLPENSION ES	SURA	COFREM
EDER JOSE CAICEDO GALVIS	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	CAJA COPI	PORVENIR	SURA	COFREM
ADOLFO ALVAREZ	AYUDANTE DE OBRA	DEPENDIENTE	NUEVA EPS	PORVENIR	SURA	COFREM
CLAUDIA DURAN CABRERA	OFICIOS VARIOS	DEPENDIENTE	CAPITAL SALUD	PORVENIR	SURA	COFREM
KATHERINE HERNANDEZ CASTIBLANCO	OFICIOS VARIOS	DEPENDIENTE	CAJACOP	PORVENIR	SURA	COFREM


	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDIA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14
		Página 16
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14		

5.4. Seguimiento a compromisos laborales.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	1ª Quincena		2ª Quincena		
	SI	NO	SI	NO	
El contratista tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X		X		Tienen 10 personas en obra
Los vehículos maquinaria y equipo del contratista cumplen con los siguientes requisitos:	X		X		Se tiene documentación de la maquinaria y operador de excavadora
- SOAT					
- Seguro de automóviles contra todo riesgo					
- Tarjeta de propiedad					
- Licencia de conducción de la persona responsable					
El contratista presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		X		Se ha presentado planillas
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		X		Se han generado pagos
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.		X	X		Se ha retirado 2 personas
El contratista tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		X		Se ha presentado planillas



interpuentech@chinone@gmail.com



interpuentech@chime.net



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023

INFORME SST No. 14

Página 23

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO
14/05/2023	14/05/2023	14/05/2023

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO
14/05/2023	14/05/2023	14/05/2023

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO
14/05/2023	14/05/2023	14/05/2023

FECHA DE EMISIÓN	FECHA DE VIGENCIA	FECHA DE VENCIMIENTO
14/05/2023	14/05/2023	14/05/2023

El presente informe de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) es el resultado de la inspección realizada el día 14 de mayo de 2023, en el sitio de trabajo de la Alcaldía de Acacías, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el contrato de interventoría N° 978 de 2023.

Se observó que el personal de la Alcaldía de Acacías está recibiendo capacitación en SST, lo cual es un aspecto positivo. Sin embargo, se identificaron algunas áreas de mejora, como la falta de capacitación en primeros auxilios para el personal de mantenimiento y la necesidad de mejorar la señalización de las zonas de riesgo.

Se recomienda que el personal de mantenimiento reciba capacitación en primeros auxilios y que se mejore la señalización de las zonas de riesgo. Además, se sugiere que se realice una inspección de seguimiento en un futuro cercano para verificar el cumplimiento de las recomendaciones.

El presente informe es el resultado de la inspección realizada el día 14 de mayo de 2023, en el sitio de trabajo de la Alcaldía de Acacías, con el fin de verificar el cumplimiento de las normas y procedimientos establecidos en el contrato de interventoría N° 978 de 2023.

Se observó que el personal de la Alcaldía de Acacías está recibiendo capacitación en SST, lo cual es un aspecto positivo. Sin embargo, se identificaron algunas áreas de mejora, como la falta de capacitación en primeros auxilios para el personal de mantenimiento y la necesidad de mejorar la señalización de las zonas de riesgo.

Se recomienda que el personal de mantenimiento reciba capacitación en primeros auxilios y que se mejore la señalización de las zonas de riesgo. Además, se sugiere que se realice una inspección de seguimiento en un futuro cercano para verificar el cumplimiento de las recomendaciones.

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14 Página 24
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14		

	
--	--

5.8. Supervisión elementos de emergencias.

	
---	--



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023

INFORME SST No. 14

Página 25

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14

NOMBRE DE LA EMPRESA: INTERCOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE TELEFONIA		NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA DE ACACIAS	
NOMBRE DEL INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
FECHA: 14/05/2023	HORA: 10:00 AM	LUGAR: ACACIAS	PROYECTO: SERVICIO DE TELEFONIA
DESCRIPCION DEL TRABAJO: SE REALIZO LA VERIFICACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS LINEAS DE TRABAJO.			
OBSERVACIONES: SE ENCONTRO EL SERVICIO EN BUEN ESTADO.			
FIRMA DEL INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA			
FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA			
FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CLIENTE: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA			

1.1. capacitación en SST

NOMBRE DE LA EMPRESA: INTERCOMUNICACIONES Y SERVICIOS DE TELEFONIA		NOMBRE DEL CLIENTE: ALCALDIA DE ACACIAS	
NOMBRE DEL INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		NOMBRE DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
FECHA: 14/05/2023	HORA: 10:00 AM	LUGAR: ACACIAS	PROYECTO: SERVICIO DE TELEFONIA
DESCRIPCION DEL TRABAJO: SE REALIZO LA VERIFICACION DEL SERVICIO DE TELEFONIA EN LAS LINEAS DE TRABAJO.			
OBSERVACIONES: SE ENCONTRO EL SERVICIO EN BUEN ESTADO.			
FIRMA DEL INTERVENTOR: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA			
FIRMA DEL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA			
FIRMA DEL REPRESENTANTE DEL CLIENTE: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA			



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023

INFORME SST No. 14

Página 27

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14

SECCIÓN DE TRABAJO Y SALUD		SECCIÓN DE TRABAJO Y SALUD	
FORMULARIO DE INSPECCIÓN Y MONITORIO		FORMULARIO DE INSPECCIÓN Y MONITORIO	
<p>1. IDENTIFICACIÓN</p> <p>Nombre del contratante: ALCALDÍA DE ACACÍAS</p> <p>Nombre del contratista: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA</p> <p>Objeto del contrato: INTERVENCIÓN DE LA SUBESTACIÓN DE TRANSFORMACIÓN DE 15 KV</p>		<p>2. DESCRIPCIÓN DEL TRABAJO</p> <p>Actividad principal: REPARACIÓN DE LA LÍNEA DE TRANSMISIÓN DE 15 KV</p> <p>Ubicación: PARQUE INDUSTRIAL DE ACACÍAS</p> <p>Fecha de inspección: 15/05/2023</p>	
<p>3. EVALUACIÓN DE RIESGOS</p> <p>Riesgo de caída de objetos: Alto</p> <p>Riesgo de electrocución: Alto</p> <p>Riesgo de incendio: Medio</p> <p>Riesgo de contaminación: Bajo</p>		<p>4. MEDIDAS DE CONTROL</p> <p>Medida de control: Implementación de medidas de seguridad</p> <p>Medida de control: Implementación de medidas de seguridad</p> <p>Medida de control: Implementación de medidas de seguridad</p>	
<p>5. OBSERVACIONES</p> <p>Observación: Se observó el uso de EPPs por parte de los trabajadores</p> <p>Observación: Se observó el uso de EPPs por parte de los trabajadores</p> <p>Observación: Se observó el uso de EPPs por parte de los trabajadores</p>		<p>6. MEDIDAS DE CONTROL</p> <p>Medida de control: Implementación de medidas de seguridad</p> <p>Medida de control: Implementación de medidas de seguridad</p> <p>Medida de control: Implementación de medidas de seguridad</p>	
<p>7. FIRMAS</p> <p>Firma del contratante: Jorge Augusto Rodriguez Reina</p> <p>Firma del contratista: Jorge Augusto Rodriguez Reina</p>		<p>8. FIRMAS</p> <p>Firma del contratante: Jorge Augusto Rodriguez Reina</p> <p>Firma del contratista: Jorge Augusto Rodriguez Reina</p>	
<p>9. CONTROL DE TRABAJO</p> <p>Control de trabajo: Implementación de medidas de seguridad</p> <p>Control de trabajo: Implementación de medidas de seguridad</p> <p>Control de trabajo: Implementación de medidas de seguridad</p>		<p>10. CONTROL DE TRABAJO</p> <p>Control de trabajo: Implementación de medidas de seguridad</p> <p>Control de trabajo: Implementación de medidas de seguridad</p> <p>Control de trabajo: Implementación de medidas de seguridad</p>	



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023

INFORME SST No. 14

Página 28

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14

2. Pagos de seguridad social del contratista.

NOTA: Respecto al estado de la seguridad social del personal activo del contratista debo aclarar que no allegaron los soportes de pago de planillas correspondientes a los meses de junio ni julio del 2025.

Mes		Empresa	Planilla No	Referencia de pago	Pago Total
Febrero	Aportes en Línea	Parker SAS	9473334803	916394572	\$1,422,400
Febrero	Aportes en Línea	Consortio Acacia	9481527807	1256070250	\$2,876,300,00
Febrero	Aportes en Línea	Consortio Acacia	9481369156	1244972948	\$369,900,00
Febrero	Mi Planilla	Jacinto Alfonso Malagón S.	9481369386	1244981986	\$175.000,00
Febrero	SOI	Jhoan Sebastián Sánchez C.	7956817441	1244981986	\$398.500,00
Febrero	Mi Planilla	Sergio Andres Redondo A.	9481369386	1244981986	\$505.100,00
Febrero	Aportes en Línea	Parker SAS	9473334803	916394572	\$1,422,400
Marzo	Aportes en Línea	Parker SAS	9473334803	916394572	\$1,422,400
Marzo	Aportes en Línea	Consortio Acacia	9481527807	1256070250	\$2,876,300,00
Marzo	Aportes en Línea	Consortio Acacia	9481369156	1244972948	\$369,900,00
Marzo	Mi Planilla	Jacinto Alfonso Malagón S.	9481369386	1244981986	\$175.000,00
Marzo	SOI	Jhoan Sebastián Sánchez C.	7956817441	1244981986	\$398.500,00
Marzo	Mi Planilla	Sergio Andres Redondo A.	9481369386	1244981986	\$505.100,00
Marzo	Aportes en Línea	Parker SAS	9473334803	916394572	\$1,422,400



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023

INFORME SST No. 14

Página 29

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14

CONSORCIO ACACIA

CONSORCIO ACACIA



**JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ
REINA**



**ALCALDÍA DE
ACACÍAS**

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023

INFORME SST No. 14

Página 30

INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14 Página 31
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14		

2.1. Seguimiento a indicadores de seguridad y salud en el trabajo por AT.

Durante el presente periodo del informe, la interventoría en sus funciones de control y supervisión al contratista, en la implementación de cada uno de los ítems relacionados, no evidencia cumplimiento.

ESTADO				
DESCRIPCIÓN	BUENO	REGULAR	MALO	OBSERVACIONES
DOTACIÓN DEL PERSONAL				
Dotación completa		X		Se cuenta con personal y se ha entregado dotación acorde a las necesidades
Buen estado	X			
Uso según zona de trabajo	X			
DOTACIÓN CAMPAMENTO				
Dotación completa	X			Se cuenta con campamento ubicado en predio cercano a la localización del puente
Buen estado	X			
Fácil acceso y operación	X			
Uso según zona de trabajo	X			
Existencia de elementos primeros auxilios	X			
MAQUINARIA - EQUIPO				
Estado del equipo	X			Solamente se cuenta con una maquinaria encargada de excavaciones y descapote.
Regularidad del mantenimiento	X			
Vibraciones /Ruidos		X		
Protecciones / Guardas / Frenos		X		
Idoneidad operarios	X			
SEÑALIZACIÓN, DEMARCACIÓN, ILUMINACIÓN.				
Uso permanente	X			Se encuentra debidamente señalizada y delimitada
Uso según zona de trabajo	X			
VIGILANCIA				
Personal suficiente			X	No se cuenta con personal para vigilancia
Diurna		X		
Nocturna			X	
CENTRO DE ATENCIÓN INMEDIATA				
Convenio centro de asistencia			X	No han aportado documentación
Afiliación del Personal al Sistema de Seguridad Social y ARP			X	

INDICADORES HSE			
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0	0	0
Total, de HHTT Mes:	0	Total, HHTT acumuladas:	0
Indicador de Lesiones con Incapacidad durante el mes:	0	Días de ausentismo por Incapacidad:	0
Accidentes de trabajo sin lesiones:	0	0	0
DURANTE ESTE PERIODO NO SE PRESENTO ACCIDENTES LABORALES QUE PUEDAN INCIDIR EN EL OBJETIVO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.			

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14 Página 32
	INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14	

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO DE ACTIVIDADES DE SST




	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	CONTRATO DE INTERVENTORÍA N° 978 DE 2023	INFORME SST No. 14 Página 33
INFORME DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO N° 14		

4. CONCLUSIONES

En el presente informe se establece las capacidades y el personal, con el que cuenta la interventoría el cual cuenta con la experiencia necesaria para la ejecución de los trabajos que son requeridos para realizar cada una de las tareas del proyecto.

Así mismo se evidencia el control realizado por la sección de Salud y seguridad en el trabajo, de la interventoría soportado mediante el informe los diferentes puntos de inspección y supervisión, lo anterior con las directrices y normas exigidas para un proyecto de estas características dentro de la normatividad colombiana.

Adicional, se establece puntos para mejorar por parte del contratista como: - puntualidad en la entrega total de la documentación del personal, efectividad en la presentación de soportes de afiliación a seguridad social, disponibilidad y cumplimiento en la entrega de EPP, diligenciamiento de formatos de inspección, soportes de charlas preoperacionales, señalización adecuada, pagos de seguridad social y entrega oportuna de informes.

Firma	Firma
	
JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA CONTRATISTA DE INTERVENTORIA	FLOR ANGELA NARVÁEZ CASTRO PROFESIONAL EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14	

10 CUADROS ANEXOS

- 10.1 CONTROL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO.
- 10.2 CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO.
- 10.3 CONTROL PERSONAL QUE LABORA INTERVENTORIA.
- 10.4 CONTROL SEGURIDAD INDUSTRIAL
- 10.5 CONTROL CORRESPONDENCIA
- 10.6 CONTROL EQUIPOS CONTRATISTA
- 10.7 CONTROL IMPLEMENTACION PMA

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA N° 14		

10.1. Control estado general del tiempo.



ALCALDÍA DE
ACACIAS

CONTROL ESTADO DEL TIEMPO



CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORIA:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

MES DE JULIO DEL 2025																															
DIA	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Tiempo en la mañana																															
Soleado			X		X				X	X	X	X			X	X					X				X			X		X	X
Lluvias moderadas	X			X			X	X								X	X	X	X		X	X	X	X				X			
Lluvias intensas		X											X													X					
Tiempo en la Tarde																															
Soleado	X		X	X			X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X		X	X	X	X	X	X			X	X	
Lluvias moderadas		X		X																	X										
Lluvias intensas																		X										X	X		

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 31 de julio del 2025

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

10.2. Control de ensayos de laboratorio.



CONTROL ENSAYOS Y PRUEBAS DE LABORATORIO



CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 202300050004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA RIL FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORIA:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACÍAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	9658796-1		

RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO MES DE JULIO DEL 2025

Fecha de Toma	Fecha de Prueba	Ensayo realizado por C / I*	Material	Nombre Prueba / Ensayo	Localización	Laboratorio	Norma / Especificación	Resultados		Análisis de Resultados	Observaciones / Decisiones tomadas cuando no cumple norma o especificación
								Rango	Porcentaje Obtenido %		
20-jun	6-jul	Ingegar	Concreto 4.000	C-10684	Villavicencio	Ingegar	NORMA: INV-E-410	Completando 7 días (58-72)	67.3	Cumple	Cumpe
20-jun	13-jul	Ingegar	Concreto 4.000	C-10685	Villavicencio	Ingegar	NORMA: INV-E-410	14 días (79-86)	84.2	si	Cumpe
20-jun	27-jul	Ingegar	Concreto 4.000	C-10686	Villavicencio	Ingegar	NORMA: INV-E-410	28 días (100-)	109.5	si	Cumpe
23-jul	30-jul	Ingegar	Concreto 4.000	C-10687	Villavicencio	Ingegar	NORMA: INV-E-410	7 días (58-72)	64.6	si	Cumpe

En el presente periodo se realizaron las pruebas de laboratorio correspondientes a tres fechas de muestreo de la viga cabzal en el margen Palomas del 29 de Junio. Además, se tomaron muestras de concreto durante el vaciado de la viga cabzal del estribo Quebraditas el 23 de Julio del 2025, y se efectuó la prueba de la primer fecha de estas últimas muestras.

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 31 de julio del 2025

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTAÑO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

10.3. Control personal que labora interventoría.



CONTROL SISTEMA INTEGRAL DE SEGURIDAD SOCIAL Y PERSONAL INTERVENTORIA



CONTRATO N°	078 DE 2023	PROYECTO N°	IPIN 202300000004
OBJETO DEL CONTRATO	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIME EN LA VEREDA QUEBRANTAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT	NIT No 9 656 796-1		
CONTRATO INTERVENTORIA N°	078 DE 2023		
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA	NAN MAURICIO ROJAS NOZOA		

PLANILLA No	Estado "No pago"		REFERENCIA DE PAGO		Estado "No pago"	DÍAS LABORADOS		30 DIAS	PÉRDIDA COMPRENDIDO ENTRE:						del	01 DE JULIO 2025	al	31 DE JULIO 2025
	Cargo y/o oficio	Cedula	Tipo de Vinculación	Fecha de Ingreso		Fecha de Retiro	% Dedicación propuesta		Días cotizados	Salud	%	Pensión	%	AFLIACIÓN				
Nombres y Apellidos																		
Jenny Andres Torres Castro	Director Interventoria	86.083.202	Dependiente	27/05/2024		\$ 7.890.500,00	50%	14,00	\$ 71.278,83	4%	\$ 287.114,54	18%	\$ 124.894,82	6,96%	\$ 71.278,83	4%	\$ 1.794.455,87	
Jorge Augusto Rodriguez Reina	Residente de Interventoria	9.656.796	Independiente	27/05/2024		\$ 5.805.213,00	100%	14,00	\$ 344.470,76	12,5%	\$ 440.822,57	18%	\$ 191.891,32	6,96%	\$ 55.115,32	2%	\$ 2.755.766,07	
Fior Angela Narvaez Castro	Tecnólogo en HREC	1.121.891.708	Dependiente	27/05/2024		\$ 3.334.768,00	50%	14,00	\$ 31.124,55	4%	\$ 124.498,01	18%	\$ 54.196,63	6,96%	\$ 31.124,55	4%	\$ 778.112,53	
Oscar Hernán Alarcón Olayón	Ingeniero Ambiental	1.121.822.709	Dependiente	27/05/2024		\$ 5.266.250,00	20%	14,00	\$ 19.680,59	4%	\$ 78.642,37	18%	\$ 34.209,43	6,96%	\$ 19.680,59	4%	\$ 481.514,80	
Jenny Andres Torres Castro	Ingeniero especialista en Edilidades	86.083.202	Dependiente	27/05/2024		\$ 5.266.250,00	20%	14,00	\$ 19.680,59	4%	\$ 78.642,37	18%	\$ 34.209,43	6,96%	\$ 19.680,59	4%	\$ 481.514,80	
Oscar Hernán Alarcón Olayón	Topógrafo	93.293.668	Dependiente	27/05/2024		\$ 2.302.915,00	40%	14,00	\$ 17.195,10	4%	\$ 68.780,39	18%	\$ 29.919,47	6,96%	\$ 17.195,10	4%	\$ 429.877,47	
Pedro Esteban Alérez R.	Calibrare	3.274.632	Dependiente	27/05/2024		\$ 1.428.965,00	40%	14,00	\$ 10.659,61	4%	\$ 42.678,42	18%	\$ 19.585,11	6,96%	\$ 10.659,61	4%	\$ 266.740,13	
TOTAL									\$ 514.550,78		\$ 1.521.278,67		\$ 487.766,22		\$ 225.204,35			

Nota: Se aclara que el valor del IBC de la planilla aportada corresponde a la afectación de los días laborados, por lo anterior se realiza el siguiente cuadro el cual demuestra que el valor a cotizar es inferior al cotizado cumpliendo de esta forma las condiciones contractuales, así mismo los porcentajes determinados para salud del personal dependen de acuerdo con el Estándar Tributario, en el artículo 114-1.

NOMBRES Y APELLIDOS	IBC PROPUESTA EN DOL	DÍAS LABORADOS	IBC PROPUESTA EN DOL LABORADOS	IBC PLANILLA
Jenny Andres Torres Castro	\$ 1.794.455,87	30	\$ 1.794.455,87	\$ 1.794.455,87
Jorge Augusto Rodriguez Reina	\$ 2.755.766,07	30	\$ 2.755.766,07	\$ 2.755.766,07
Fior Angela Narvaez Castro	\$ 778.112,53	30	\$ 778.112,53	\$ 778.112,53
Oscar Hernán Alarcón Olayón	\$ 481.514,80	30	\$ 481.514,80	\$ 481.514,80
Jenny Andres Torres Castro	\$ 481.514,80	30	\$ 481.514,80	\$ 481.514,80
Oscar Hernán Alarcón Olayón	\$ 429.877,47	30	\$ 429.877,47	\$ 429.877,47
Pedro Esteban Alérez R.	\$ 266.740,13	30	\$ 266.740,13	\$ 266.740,13

Mediante la presente acta se acredita que el personal de la ejecución del proyecto se encuentra Afiliado a los sistemas de seguridad social en Salud, Pensión y Riesgos

Firma:
Nombre: JENNY ANDRÉS TORRES CASTRO
DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: FLOR ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL SISO

Firma:
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

10.4. Control seguridad industrial

CONTRATO N°	878 DE 2023	PROYECTO N°	BPN 202300000004
OBJETO	INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
PERIODO DE INSPECCIÓN	05-JULIO-2023 AL 31-JULIO-2023	N° DE TRABAJADORES	10

CRITERIO DE EVALUACIÓN SISO DE INTERVENTORIA				
Escriba el valor correspondiente en la columna "criterio de satisfacción" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (2 puntos); E. No aplica el ítem.				

ITEM	DOCUMENTACIÓN BÁSICA LEGAL DE INTERVENTORIA	CRITERIO DE SATISFACCIÓN					ITEM	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CRITERIO DE SATISFACCIÓN				
		A	B	C	D	E			A	B	C	D	E
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliación (nómina) y pagos (+ 30 días) AEP, EPS y AFP	x					24	El personal posee y utiliza de manera adecuada las EPP requeridos para la labor	x				
2	Cuenta el Registro de Challa diaria (de la semana en curso) o (separación)						25	El personal cuenta con botas adecuadas	x				
3	Existen inspecciones o registros de inspecciones de (herramientas, EPP)	x					26	Casco de seguridad con resaca para trabajos en altura	x				
4	Existe un plan de riesgos actualizado acorde a las actividades						27	Se cuenta con barbuquejo		x			
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa	x					28	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada		x			
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el sitio de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.)					x	29	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada					x
7	Se poseen procedimientos de trabajo, en el cual encuentran identificados las actividades críticas con sus riesgos y controles					x	40	Protección respiratoria adecuada para la labor	x				
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades críticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada	x					41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado	x				
9	El personal cuenta con un programa de inducción en SSGST, salud ambiental, actividades y riesgos del cargo (derivación de procedimientos)	x					42	Cuarenta con gafas de seguridad oscuras y claras	x				
SUBTOTAL		40	15	0	0	1	43	Existen ofreciendo protección auditiva adecuada para la labor	x				
Valor Estructura: % Obtenido (A+B-C)(10-NA)		73%					44	Se cuenta en campo con elementos de protección de personal para responder según necesidad	x				

ITEM	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	10	5	3	0	N/A	46	repositor según necesidad	x				
10	Existe la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.	x					45	El personal visitante tiene las EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.	x				
11	Las unidades sanitarias fijas o portátiles están limpias.	x						SUBTOTAL	80	10	3	0	
12	Están demarcados y etiquetados el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final	x						Valor Estructura: % Obtenido (A+B-C)(10-NA)					80%
13	Está demarcado y etiquetado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas las zonas.	x											
14	Los equipos y herramientas están organizados	x					ITEM	MEDICINA PREVENTIVA	10	5	3	0	N/A
15	Las herramientas de trabajo están cubiertas y protegidas	x					46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores. Ver registro (Registro expedido por médico especialista en S.O)	x				
16	El sitio de trabajo está en orden y aseo	x					47	Capacitación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo	x				
							48	Examen diagnóstico de vacunación y reporte para el personal de conformidad con el Artículo 21 de la Ley 30 de 1990					x
	SUBTOTAL	40	15	0	0	0		SUBTOTAL	0	10	0	0	1
	Valor Estructura: % Obtenido (A+B-C)(10-NA)					75%		Valor Estructura: % Obtenido (A+B-C)(10-NA)					50%

SECCION DEL PELIGRO							10	5	3	1	N/A
17	Las Excavaciones son seguras (prohibido a 1 metro de la orilla o mas segun profundidad)	x									
18	La excavación cuenta con escudos, para fines, señalización, se tiene entablado o se maneja salud, el personal está alejado de la herramienta mecánica					x					
19	Herramientas y/o escombros en áreas vecinas, que generen algún tipo de riesgo al personal					x					
20	Hay recurso de comunicaciones constante en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesidad	x									
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmosféricas (gases)					x					
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Ranos, matorrales, etc.)					x					
23	Se cuenta con equipos de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados	x									
SUBTOTAL							20	0	0	0	4
Valor Estructura: % Obtenido (A+B-C)(10-NA)							80%				

ITEM	SEÑALIZACIÓN CARPAMENTO DE INTERVENTORIA	10	5	3	1	N/A
49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales			x		
50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vías, etc.	x				
51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras o postes	x				
52	Se tiene señalizado y demarcado las áreas de trabajo	x				
53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención	x				
SUBTOTAL		40	0	0	0	0
Valor Estructura: % Obtenido (A+B-C)(10-NA)		80%				

ITEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	CRITERIO DE SATISFACCIÓN											
		A	B	C	D	E							
24	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y número de trabajadores expuestos	x											
25	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencia a trabajadores y visitantes	x											
26	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización	x											
27	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro	x											
28	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado	x											
29	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (rescate, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico	x											
SUBTOTAL		20	10	0	0	0							
Valor Estructura: % Obtenido (A+B-C)(10-NA)		75%											

Gestión en Campo		CRITERIO DE SATISFACCIÓN				
COMPONENTES		A	B	C	D	E
1	DOCUMENTACIÓN EN CAMPO	40	15	0	0	1
2	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	80	10	0	0	1
3	GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA	40	15	0	0	0
4	MEDICINA PREVENTIVA	0	10	0	0	1
5	GESTIÓN DEL PELIGRO	20	0	0	0	4
6	SEÑALIZACIÓN	40	0	0	0	0
7	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS	20	15	0	0	0
RESULTADO DE MUESTRA GESTIÓN EN CAMPO		200	70	0	0	7
ALTO		75,73%				

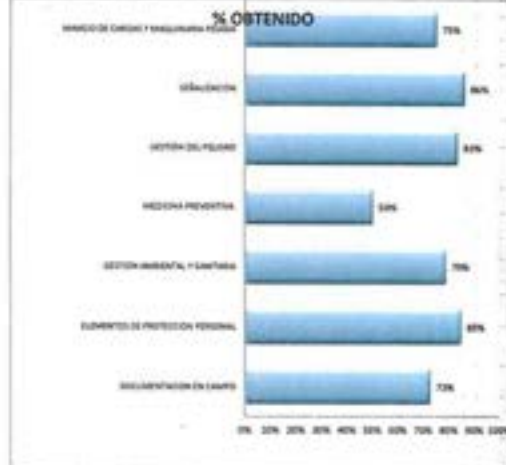


GRAFICO DE GESTION SISO

Firma: *[Firma]*
Nombre: ANDRÉS JORRÉS CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma: *[Firma]*
Nombre: ANGELA NARVAEZ CASTRO
PROFESIONAL, SISO

Firma: *[Firma]*
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

CONTRATO N°		929 DE 2023		PROYECTO N°		EPIN 202300060004	
OBJETO DEL PROYECTO:		CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS					
CONTRATISTA:		CONSORCIO ACACIA S.R.L. FRANCISCO MORA GUTIERREZ					
NIT		NIT 901787425-0					
CONTRATO DE INTERVENCIÓN N°		929 DE 2023					
OBJETO INTERVENCIÓN:		INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHMENE EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS					
CONTRATISTA		JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA					
PERIODO DE INSPECCIÓN:		01-JULIO-2023 AL 31-JULIO-2023		N° DE TRABAJADORES:		18	

CRITERIO DE EVALUACIÓN DE RISO													
Escriba el valor correspondiente en la columna "Criterio de calificación" teniendo en cuenta los siguientes rangos: A. Cumple completamente con el criterio enunciado (10 puntos); B. Cumple parcialmente con el criterio enunciado (5 puntos); C. Cumple con el mínimo del criterio enunciado (3 puntos); D. No cumple con el criterio enunciado (0 puntos); E. No aplica el ítem.													
ITEM	DOCUMENTACIÓN BÁSICA LEGAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN					ITEM	ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL	CRITERIO DE CALIFICACIÓN				
		A	B	C	D	E			A	B	C	D	E
		10	5	3	0	N.A.			10	5	3	0	N.A.
1	Tiene copia cada trabajador de Afiliaciones (nuevas) y pagos (> 30 días) ARP, EPS y APP		x				34	El personal posee y utiliza de manera adecuada los EPP requeridos para la labor		x			
2	Existe el Registro de charla diaria (de la semana en curso), y capacitación	x					35	El personal cuenta con dotación adecuada		x			
3	Existen inspecciones o registros propropietarios de (Herramientas, EPP)	x					36	Cascos de seguridad conatchet para trabajos en alturas	x				
4	Existe un panorama de riesgos actualizado acorde a las actividades.			x			37	Se cuenta con cinturones			x		
5	Se cuenta con el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo actualizado, disponible, vigente y firmado por el representante legal de la empresa		x				38	Botas de caucho en buen estado con punta reforzada		x			
6	Se cuentan con las hojas de seguridad de los productos químicos en el año de trabajo y almacenamiento (combustibles, etc.)				x		39	Botas de cuero en buen estado con punta reforzada		x			
7	Se poseen procedimientos de trabajo, en el cual encuentran identificadas las actividades críticas con sus riesgos y controles.		x				40	Protección respiratoria adecuada para la labor.		x			
8	Se cuenta con el plan de emergencia, para actividades críticas y en general que correspondan al alcance de la actividad desarrollada.			x			41	Camisa manga larga y pantalón en buen estado		x			
9	El personal cuenta con un programa de inducción en S&ST, Medio ambiente, actividades y riesgos del cargo (divulgación de procedimientos)		x				42	Cuentan con gafas de seguridad oscuras y claras	x				
SUBTOTAL		20	20	0	0	0	43	Están utilizando protección auditiva adecuada para la labor.	x				
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(30-N.A)		51%					44	Se cuenta en campo con elementos de protección de personal para reposición según necesidad.	x				
ITEM		GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA					ITEM		MEDICINA PREVENTIVA				
		10	5	3	0	N.A.			10	5	3	0	N.A.
10	Está la zona de trabajo limpia, ordenada sin residuos.	x					45	El personal visitante tiene los EPP de acuerdo al riesgo para ingresar.	x				
11	Las unidades sanitarias fijas o portátiles están limpias.	x					SUBTOTAL		50	30	0	0	0
12	Están demarcado y organizado el almacenamiento provisional de los residuos para la disposición final	x					Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(120-N.A)		68%				
13	Está demarcado y organizado el almacenamiento provisional de residuos generados de todas clases.		x				ITEM		SEÑALIZACIÓN				
14	El material, equipos y herramientas están organizados.	x							10	5	3	0	N.A.
15	El material de desecho se envía y se protege				x		46	Se han practicado los exámenes de ingreso y periódicos a los trabajadores. Ver registro (Registro expedido por medico especialista en S.O)			x		
16	La bodega de almacenamiento está en orden y uso	x					47	Confirmación, Capacitación, del Comité Paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo			x		
SUBTOTAL		50	5	0	0	1	48	Existen beneficios de recreación y deporte para el personal, de conformidad con el Artículo 21 de la Ley 95 de 1990.				x	
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(75-N.A)		32%					SUBTOTAL		0	0	0	0	0
ITEM		GESTIÓN DEL PELIGRO					ITEM		SEÑALIZACIÓN				
		10	5	3	0	N.A.			10	5	3	0	N.A.
17	Las Excavaciones son seguras (rescorte a 1 metro de la orilla o más según profundidad)	x					49	Se evidencian etiquetas con advertencias de peligro e instrucciones generales.	x				
18	La excavación cuenta con: escaleras, pasos firmes, señalización, se tiene embudo o se maneja talud, el personal está alejado de la herramienta mecánica.			x			50	Se cuenta con avisos preventivos, conos, demarcación con cinta peligro, identificando excavaciones, trabajos en vías, etc.	x				
19	Herramientas y/o escombros en áreas vecinas, que generen algún tipo de riesgo al personal.				x		51	Tienen Protección o señalización las varillas salientes de las estructuras a prior		x			
20	Hay recurso de comunicaciones consistente en buen estado de funcionamiento que garanticen la comunicación integral en caso de necesidad.		x				52	Se tiene señalizada y demarcada las áreas de trabajo	x				
21	Se cuenta con los equipos necesarios para realizar monitoreo de atmósferas requerido (gaseo)				x		53	Las áreas de trabajo están delimitadas y tiene avisos de prevención	x				
22	Los equipos tienen guarda de seguridad (Barras, moxileadoras, etc.)			x			SUBTOTAL		40	5	0	0	0
23	Se cuenta con equipo de rescate en sitio para trabajos en alturas y/o espacios confinados			x			Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/(50-N.A)		90%				
SUBTOTAL		0	10	0	0	3							


CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	EPIN 202300000004
OBJETO DEL PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
NIT	NIT 90198429-0		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	976 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORIA:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
PERIODO DE INSPECCIÓN:	01-JULIO-2023 AL 31-JULIO-2023	N° DE TRABAJADORES:	19


Valor % Obtenido (A+B+C)(70-NA)						40%					
ITEM	MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA					10	5	3	0	N/A	
24	Están los Eslingas en óptimo estado de funcionamiento y cuentan con etiqueta de capacidad de carga y características del fabricante					x					
25	Se cuenta con Plan de trabajo y tiene todos los riesgos asociados a la labor, cuenta con cálculos según norma (capacidades, puntos de apoyo ASME B30.5).									x	
26	El personal que realiza la labor se encuentra certificado (aprendizaje, supervisor del trabajo, Operador).									x	
27	Se señalizan y demarca la carga					x					
SUBTOTAL						0	10	0	0	2	
Valor : % Obtenido (A+B+C)(40-NA)						50%					

Valor % Obtenido (A+B+C)(70-NA)						40%					
ITEM	TRABAJOS EN ALTURAS					10	5	3	0	N/A	
34	Se cuenta con elementos de protección pasiva, equipos certificados y cumplen con especificaciones técnicas. (resotaseras, andamios, plataformas).					x					
35	Se cuenta con los elementos y equipos de protección personal de acuerdo al trabajo a realizar (arnés, cuerdas, eslingas, conectores) y se tienen las fichas de inspección de cada uno. (ver registro)					x					
36	Se cuenta con kit y plan de rescate para trabajos en altura específico para la labor									x	
37	Se cuenta con el coordinador certificado para trabajo seguro en alturas									x	
38	Se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas									x	
SUBTOTAL						0	10	0	0	0	
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)(50-NA)						43%					

GESTION EN CAMPO												
	COMPONENTES					% OBTENIDO	10	5	3	0	N/A	
DOCUMENTACIÓN EN CAMPO							51%	20	20	0	0	
ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL							69%	50	30	3	0	
GESTIÓN AMBIENTAL Y SANITARIA							92%	50	5	0	1	
MEDICINA PREVENTIVA							20%	0	0	0	0	
GESTIÓN DEL PELIGRO							40%	0	10	0	3	
SEÑALIZACIÓN							90%	40	5	0	0	
MANEJO DE CARGAS Y MAQUINARIA PESADA							50%	0	10	0	2	
TRABAJO EN ALTURAS							25%	0	10	0	0	
ITEM	PREPARACIÓN Y RESPUESTA ANTE EMERGENCIAS							10	5	3	0	N/A
28	Se cuenta con el kit de primeros auxilios en el frente de trabajo de acuerdo a la labor y número de trabajadores expuestos.							X				
29	Se realiza divulgación y entrenamiento en el plan de emergencias a trabajadores y visitantes							X				
30	Los extintores están ubicados adecuadamente en el área y los trabajadores conocen su ubicación y utilización							X				
31	La ruta de evacuación está debidamente señalizada, y el personal está enterado de la ubicación del punto de encuentro								X			
32	La empresa tiene contemplado un plan para la atención de emergencias de riesgo identificado								X			
33	Se tienen conformadas la brigada de emergencia (higiene, evacuación, primeros auxilios) y poseen un programa de entrenamiento periódico.									X		
SUBTOTAL								10	10	5	0	0
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)/50-N/A)								43%				

TRABAJO EN ALTURAS										
ITEM		10	5	3	0	N/A				
34	Se cuenta con elementos de protección pasiva, equipos certificados y cumplen con especificaciones técnicas (escaleras, andamios, plataformas).		x							
35	Se cuenta con los elementos y equipos de protección personal de acuerdo al trabajo a realizar (arnés, cuerdas, eslingas, conectores) y se tienen las fichas de inspección de cada uno. (Ver registro)		x							
36	Se cuenta con kit y plan de rescate para trabajos en altura específicos para la labor				x					
37	Se cuenta con el coordinador certificado para trabajo seguro en alturas				x					
38	Se cuenta con el rescatista certificado para trabajo seguro en alturas				x					
SUBTOTAL		0	10	0	0	0				
Valor Estructura: % Obtenido (A+B+C)(40-NA)		20%								

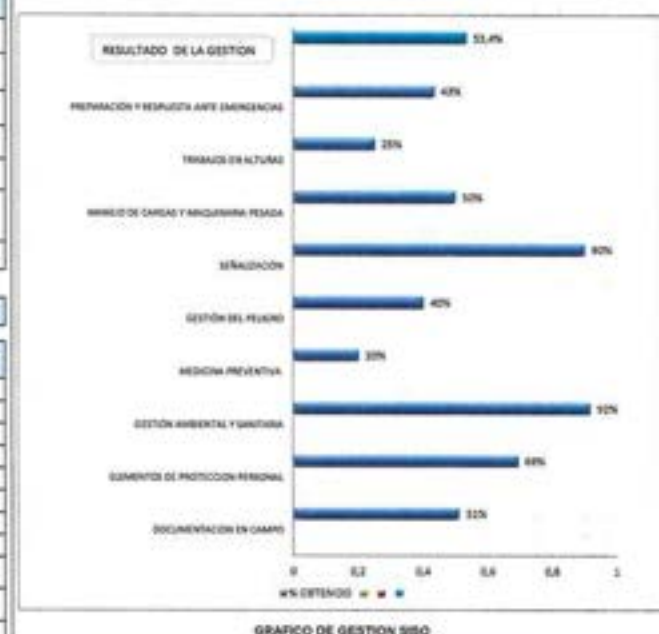

OBSERVACIONES			FECHA DE SEGUIMIENTO AL CUMPLIMIENTO		
ITEM RELACIONADO	RECOMENDACIONES				
OBSERVACIONES GENERALES					
<div><div><p>Firma Nombre: ANDRÉS TORRES CASTRO DIRECTOR DE INTERVENTORIA</p></div><div><p>Firma Nombre: PIEDAD ANGÉLICA NARVÁEZ CASTRO PROFESIONAL SISO</p></div><div><p>Firma Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA RESIDENTE DE INTERVENTORIA</p></div></div>					

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACIAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

10.5. Control correspondencia



CONTROL CORRESPONDENCIA ENVIADA DURANTE EL PERIODO
DEL 01 DE JULIO DEL 2025 AL 31 DE JULIO DEL 2025

JR

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPN 202300000004	
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS			
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R.L. FRANCISCO MORA GUTIERREZ			
NIT:	NIT 901767420-0			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°	978 DE 2023			
OBJETO INTERVENTORÍA:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS			
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA			
RELACION DE CORRESPONDENCIA ENVIADA DEL MES DE JULIO DEL 2025				
FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
1 de julio de 2025	CI- OCA-978.2023-197	Radicación informe mensual No.11 de Obra y de Interventoría a Obra	interpuentechichime@gmail.com	interpuentechichime@gmail.com
1 de julio de 2025	CI- OCA-978.2023-198	Oficio Reiteración compromisos del comité No.40 del 24 de junio	interpuentechichime@gmail.com	interpuentechichime@gmail.com
1 de julio de 2025	CI- OCA-978.2023-199	Radicación de comité de obra No.40 del 24 de junio del 2025	interpuentechichime@gmail.com	interpuentechichime@gmail.com
3 de julio de 2025	CI- OCA-978.2023-200	Radicación acta de aprobación de personal del Contrato de Interventoría No. OCA-978 DE 2023	interpuentechichime@gmail.com	interpuentechichime@gmail.com
10 de julio de 2025	CI- OCA-978.2023-201	Carencia de insumos en obra del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichime@gmail.com	interpuentechichime@gmail.com
10 de julio de 2025	CI- OCA-978.2023-202	Radicación de informe semanal No.50, No.51 y No.52 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichime@gmail.com	interpuentechichime@gmail.com
10 de julio de 2025	CI- OCA-978.2023-203	Notificación atraso del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichime@gmail.com	interpuentechichime@gmail.com
11 de julio de 2025	CI- OCA-978.2023-204	Solicitud plan de contingencia por atraso de programación del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichime@gmail.com	interpuentechichime@gmail.com
11 de julio de 2025	CI- OCA-978.2023-205	Radicación comité de obra No 41 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichime@gmail.com	interpuentechichime@gmail.com
11 de julio de 2025	CI- OCA-978.2023-206	Radicación comité de socialización No 42 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichime@gmail.com	interpuentechichime@gmail.com
14 de julio de 2025	CI- OCA-978.2023-207	Radicación informe mensual obra No 12 del contratista del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichime@gmail.com	interpuentechichime@gmail.com
15 de julio de 2025	CI- OCA-978.2023-208	Requerimiento entrega informe mensual No.13 del mes de abril, del contrato No. 929 De 2023	interpuentechichime@gmail.com	interpuentechichime@gmail.com
15 de julio de 2025	CI- OCA-978.2023-209	Requerimiento informe por suspensión de actividades a falta de insumos en obra.	interpuentechichime@gmail.com	interpuentechichime@gmail.com
15 de julio de 2025	CI- OCA-978.2023-210	Requerimiento de cronograma y plan de recursos para obras complementarias, del contrato No. 929 De 2023	interpuentechichime@gmail.com	interpuentechichime@gmail.com
21 de julio de 2025	CI- OCA-978.2023-211	Radicación de informe semanal No.53 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichime@gmail.com	interpuentechichime@gmail.com
21 de julio de 2025	CI- OCA-978.2023-212	Radicación comité de obra No 43 del contrato de obra 929 DE 2023	interpuentechichime@gmail.com	interpuentechichime@gmail.com
30 de julio de 2025	CI- OCA-978.2023-213	Radicación de informe mensual No 13 del contrato de interventoría No. OCA-978 DE 2023	interpuentechichime@gmail.com	interpuentechichime@gmail.com

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 31 de julio del 2025

Firma:
Nombre: SAMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA



CONTROL CORRESPONDENCIA RECIBIDA DURANTE EL PERIODO
DEL 17 DE JUNIO DEL 2025 AL 30 DE JUNIO DEL 2025



CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA ML. FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORIA:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

RELACION DE CORRESPONDENCIA RECIBIDA DEL MES DE JULIO DEL 2025				
FECHA	# OFICIO	ASUNTO	ENVIA	RECIBE
2 de julio de 2025	20250702	Invitación a Infraestructura a la socialización de relicto de obra	comunicacion@acacias.gov.co	infraestructura@acacias.gov.co ordhen.0293@gmail.com
2 de julio de 2025	20250702	Invitación a Infraestructura a la socialización de relicto de obra	comunicacion@acacias.gov.co	interquien@chichimeme@gmail.com
11 de julio de 2025	16.01/0274	Solicitud pronunciamiento frente a suspensión de actividades en obra	infraestructura@acacias.gov.co	interquien@chichimeme@gmail.com comunicacion@acacias.gov.co

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 31 de julio del 2025

Firma
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
Director de Interventoria

Firma
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
Residente de Interventoria

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	 ALCALDÍA DE ACACÍAS
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

10.6. Control equipos contratista



CONTROL EQUIPOS DEL CONTRATISTA



CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO DEL CONTRATO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS		
CONTRATISTA:	CONSORCIO ACACIA R/L FRANCISO MORA GUTIERREZ		
NIT:	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORIA:	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS		
CONTRATISTA:	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		
NIT:	NIT 9658796-1		

MAQUINARIA Y EQUIPO

TIPO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	MES DE JULIO DEL 2025																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
Motoniveladora																																
Retrorcavadora											X	X			X	X	X	X			X	X	X	X	X			X	X	X	X	
Vibrocompactador																																
Volquetes																																
Piloteadora																																
Excavadora																																
Vehículo pick up																																
Herramienta menor	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Equipos de topografía	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Motobomba	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Planta eléctrica	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Electrobomba	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

Nota: Se aclara que el presente documento se elabora con corte al día 31 de julio del 2025

Firma:
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma:
Nombre: JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA
RESIDENTE DE INTERVENTORIA

	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA	
	Contrato de Interventoría N° 978 de 2023	INFORME No. 14
		Página
INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA N° 14		

10.7. Control implementación Plan De Manejo Ambiental

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 202300060004	
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS			
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA S.R.L. FRANCISCO MORA GUTIERREZ			
NIT	NIT 901787420-0			
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023			
OBJETO INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS			
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA			
PERIODO IMPLEMENTACIÓN:	01-JULIO-2025 AL 31-JULIO-2025			
ESTADO PERMISOS AMBIENTALES				
Permisos: Ambiental y otros	Aplica	Números y fecha de acto administrativo que otorga el permiso	Estado de cumplimiento requerimientos	Observaciones
Permiso de ocupación de cauces	SI	PS-GJ. 1.2.6.23.2235 Hasta el 10 de octubre de 2024	Se solicitó la prórroga y en espera de la aprobación.	Se radica solicitud de prórroga por parte de la entidad contratante
Permiso de aprovechamiento forestal	NO			No aplica al proyecto
Permiso de vertimientos	NO			No aplica al proyecto
Permiso de concesión de aguas	NO			No aplica al proyecto
Autorización de sitios de disposición final de sobrantes	SI		Pendiente de entrega de autorización del privado	Se ha dispuesto el material sobrante de descápcote, en un predio privado el cual cuenta con autorización.
Permiso de emisiones atmosféricas	NO			No aplica al proyecto
Permiso de explotación de materiales	NO	Concesión minera No 19099 para extracción y transporte de material granular. Río Guayuribá vigencia hasta el 28 de diciembre de 2030, Licencia ambiental Resolución No PS-GJ-1.2.6.013-1941 para extracción y transporte de material granular. Río Guayuribá, vigencia hasta el 28 de diciembre de 2030		Se ha aportado documentación de la mina que suministrara material granular
Permiso de cierres temporales de vías	NO		No se han realizado cierres viales	No se ha ejecutado obras que requieran cierres viales
Pago de tasas y/o regalías	NO			No aplica al proyecto
Permiso de trabajos nocturnos	NO			No aplica al proyecto
Otro (cual):	NO			

VERIFICACIÓN DE PROGRAMAS AMBIENTALES
CUMPLIMIENTO DE METAS

Programa ambiental	Aplica	Cumplimiento de metas %	Observaciones
Desarrollo e implementación del sistema de gestión ambiental	SI	80%	Se han ejecutado actividades de acuerdo al Pla ambiental General. Ajustado presentado y avalado por la comunidad.
Manejo integral de residuos sólidos	SI	80%	Se ha generado residuos sólidos en proporciones pequeñas tipo domésticos.
Manejo integral de materiales de construcción	SI	80%	Los materiales de construcción (aceros) se le ha dado manejo adecuado según PMA.
Explotación fuentes de materiales	SI	0%	No se ha suministrado material ni explotación de sitios para la ejecución de la obra.
Manejo integral de aguas y residuos líquidos	SI	90%	La ejecución de obra no ha generado residuos líquidos y se ha dado un manejo adecuado a las aguas existentes.
Control de erosión, estabilidad de taludes y laderas	SI	0%	No se ha presentado erosión ni afectaciones de estabilidad de taludes y/o laderas.
Instalación, funcionamiento y desmantelamiento de campamento y sitios de acopio temporal	SI	100%	El lugar de acopio de material es ubicado en un predio privado en sintonía con la ejecución del proyecto.
Instalación, funcionamiento y abandono de las plantas de trituración, asfalto y concreto	N/A	0%	El contrato no establece operación de plantas para fabricación de concreto y/o asfalto, ya que se compra a proveedores autorizados por la corporación ambiental.
Manejo de maquinaria, equipos y vehículos	SI	90%	El manejo y control de los equipos y vehículos ha sido acorde a lo establecido en el PMA del proyecto.
Manejo de Vegetación	SI	0%	No se ha presentado afectación a la vegetación de la zona.
Manejo de fauna	SI	0%	No se ha presentado afectación a la fauna de la zona.
Protección de fauna	SI	0%	Se han tomado todas las medidas y precauciones que garantizan la protección de fauna.
Protección de áreas sensibles	SI	0%	No se presentan áreas sensibles ambientalmente del proyecto.
Plan de Gestión Social	SI	60%	Se ha implementado el plan de gestión social de acuerdo a las necesidades del proyecto.
Programa de higiene y salud ocupacional	SI	100%	Se ha dado cumplimiento al programa de seguridad y salud en el trabajo según documento anexo.
Otros	SI	100%	Se ha cumplido lo establecido en el PMA.

Nota: Diligencie las casillas de programa ambiental teniendo en cuenta lo establecido en el PMA o EIA; de acuerdo a la necesidad puede incluir mas filas con los programas que no encuentre diligenciados en el presente formato.

CONTRATO N°	829 DE 2023	PROYECTO N°	EPN 202300000004	
CLIENTE PROYECTO	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS			
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA RS. FRANCISCO MORA GUTIERREZ			
NT	NT 901767420-0			
CONTRATO DE INTERVENTORA N°	979 DE 2023			
OBJETO INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURIDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS			
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA			
PERIODO IMPLEMENTACIÓN:	01-JULIO-2025 AL 31-JULIO-2025			
RESTAURACIÓN O RECUPERACIÓN DE ÁREAS INTERVENIDAS				
Cumplió con los requerimientos para la entrega de áreas intervenidas?	N/A			
Localización:	N/A			
No. de individuos sembrados	N/A			
Estado fitosanitario de los individuos	N/A			
Área sembrada (m²)	N/A			
Observaciones: No es requerido la restauración de áreas intervenidas, sin embargo se evaluará el impacto durante la ejecución de la obra para lo cual obligar al contratista a su recuperación si existe afectación.				
TRATAMIENTOS SILVICULTURALES EJECUTADOS				
Tratamiento Autorizado	EJECUTADO			
	Aplica	unidad	Localización	Período
Tala	NO			
Poda	NO			
Otro, cual?	N/A			
SITIOS DE DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES				
Material	Volumen dispuesto (m³)	Nombre de Sitio de disposición		
Sobranje de excavación	144	Finca los cerros		
MONITOREOS				
MONITOREOS	Aplica	N°	Período	Requerimientos Cumplidos
AGUA	NO			
AIRE	NO			
RUIDO	N/A			
VEGETACIÓN	NO			
INTERVENCIÓN CORRIENTES DE AGUAS				
Se intervienen corrientes de aguas durante el transcurso del proyecto:	NO			
Nombre:	NO			
Tipo de intervención:	NO			
Medidas para su recuperación:	NO			
PASIVOS AMBIENTALES PENDIENTES PARA EL CIERRE				
RADICAR MEDIDAS DE MANEJO DEL PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE Y CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES				
(Cualquier)				
CONCLUSIONES, COMENTARIOS O RECOMENDACIONES				
SE RECOMIENDA DAR CUMPLIMIENTO A REQUERIMIENTOS AMBIENTALES EN CUANTO A LOS PERMISOS AMBIENTALES OTORGADOS DE OCUPACIÓN DE CAUCE				

Firma

Nombre: JIMMY ANDRÉS TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma

Nombre: OSCAR HERNÁN ALARCÓN ORTEGÓN
PROFESIONAL AMBIENTAL DE INTERVENTORIA

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500060004
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R.L. FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
NIT	NIT 901767420-0		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRÍGUEZ REINA		

PERIODO DE INSPECCIÓN:
01-JULIO-2025 AL 31-JULIO-2025

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	SUELO			CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		SI	NO	APLICA		
MANEJO DE RESIDUOS SÓLIDOS	Capacitación Personal	X		SI	5	Se ha capacitado personal
	Separación y clasificación		X	SI	5	No se ha dado cumplimiento
	Disposición Final	X		SI	5	Se ha dispuesto en sitios autorizados
	Programación de retiro	X		SI	5	De acuerdo a plan de la zona
	Protección del suelo en manejo de sustancias peligrosas		X	SI	0	No se ha manejado sustancias peligrosas
	Limpieza interna y externa de la obra	X		SI	5	Se mantiene en buena limpieza
	Almacenamiento de materiales y combustibles	X		SI	3	Se cumple almacenamiento lejos de contaminantes
	Campamento	X		SI	6	Disponen de campamento cercano a la obra
	Manejo de Vegetación	X		SI	0	No se ha intervenido
	Estabilidad de Taludes			NO	0	No se ha afectado
Calificación:	Buena: 4,5 - 6 Aceptable: 2,5 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA			34	
		PROMEDIO			3,4	

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	AGUA			CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		SI	NO	APLICA		
MANEJO DE VERTIMIENTOS	Capacitación Personal	X		SI	5	Se ha capacitado al personal
	Manejo Escombro			NO	0	No es necesario dicho manejo
	Protección del suelo y agua en la manipulación de sustancias peligrosas		X	SI	0	No se ha implementado la protección por sustancias
	Medidas de contingencia		X	SI	3	No se ha realizado entrega
	Zonas de trabajo secas		X	SI	5	No se han definido, dichas zonas
	Manejo nivel freático	X		SI	6	Manejado con bombas mecánicas
	Separación y clasificación de vertimientos			NO	0	No se ha requerido para el proyecto
	Conexión a sistema de tratamiento (manejo de aguas residuales domésticas)			NO	0	No es requerido para el proyecto
Calificación:	Buena: 4,5 - 6 Aceptable: 2,5 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA			19	
		PROMEDIO			2,4	

RESOLUCIONES		NÚMERO	VIGENCIA
CONCESIÓN DE AGUAS		N.A	
CONCESIÓN DE AGUAS SUBTERRÁNEAS		N.A	
OCUPACIÓN DE CAUCE	Permiso ocupación de cauce Del caño Chichimene, para la construcción de un puente vehicular, dos cabezales de descarga de aguas lluvias de 12" y la demolición del puente antiguo, en la vereda Quebraditas del municipio de Apacías	PS-GJ. 1.2.6.23.2235	VENCIO 10 DE OCTUBRE DE 2024. YA SE RADICÓ SOLICITUD DE PRORROGA DEL PERMISO DE OCUPACIÓN Y ESTAMOS A LA ESPERA DE LA RESOLUCIÓN.

COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	AIRE			CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
		SI	NO	APLICA		
ATMOSFÉRICO Y CONTROL DE RUIDO	Capacitación Personal	X		SI	5	Se ha capacitado personal
	Humedecimiento de áreas de trabajo			N/A	0	No ha sido requerido
	Cubrimiento de acopios de materiales	X		SI	4	Se protegen con plásticos los aceros acopiados
	Uso de mallas protectoras		X	SI	0	No es ha implementado
	No exceder volúmenes del volco de los camiones	X		SI	6	Se ha transportado material en volúmenes controlados
	Cones de advertencia	X		SI	6	No se ha presentado
	Asfo interno y externo de la obra	X		SI	6	Se ha conlato con limpieza
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	5	La maquinaria utilizada cumple
	Apantallamiento sonoro del área		X	N/A	0	No aplica para el proyecto
	Planificación de horarios de trabajo	X		SI	6	Se tiene definidos horarios
Calificación:	Buena: 4,5 - 6 Aceptable: 2,5 - 4,5 Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA			41	
		PROMEDIO			3,75	

CONTRATO N°	329 DE 2023	PROYECTO N°	RPIN 202300060004
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R.L. FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
MIT	MIT 901767420-2		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		

CAMPAMENTO, ALMACENAMIENTO DE MATERIALES Y COMBUSTIBLES						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	PRESENTA		CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	
		SI	NO	APLICA		OBSERVACIÓN
CUIDADOS AMBIENTALES	Programa de manejo y almacenamiento de materiales	X		SI	6	Se cuenta con recipientes herméticos para el combustible
	Almacenamiento adecuado de combustibles		X	SI	2	Se cuenta con bodega retrada del cualquier posible afectación
	Localización y señalización en el Campamento	X		SI	6	Cuenta con cercanía a la obra tiene deficiente señalización
	Elementos de seguridad, botiquín, camilla, extintor entre otros	X		SI	6	Cuenta con elementos de seguridad y atención emergencias
	Obras de contención		X	N/A	0	No es requerido para el proyecto
	Capacitación del Personal	X		SI	5	Se realizan algunas capacitaciones
Calificación:		Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	25
					PROMEDIO	4,17

SEÑALIZACIÓN						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	PRESENTA		CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	
		SI	NO	APLICA		OBSERVACIÓN
AISLAMIENTO DEL FRENTE DE TRABAJO Y SEÑALIZACIÓN	Capacitación Personal	X		SI	5	Se han dado capacitaciones y charlas
	Demarcación del perímetro	X		SI	6	Se tiene cerramiento y aislamiento del área de trabajo
	Zonificación de la obra	X		SI	5	Se tiene zona de operatividad y zona de administración
	Lona de Cerramiento	X		SI	5	Se tiene cerramiento con lona en un 80 % del perímetro
	Cinta de Reflectiva	X		SI	6	Los elementos de señalización cuentan con cinta reflectiva
	Señales Informativas y preventivas	X		SI	6	Se tiene señalización preventiva en toda el área y de aproximación
	Uso de Paleteros	X		SI	5	Permanece un controlador vial
	Iluminación Nocturna		X	SI	2	No cuenta con iluminación nocturna
Calificación:		Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	40
					PROMEDIO	5,00

GESTIÓN SOCIAL						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	PRESENTA		CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	
		SI	NO	APLICA		OBSERVACIÓN
AMBIENTE LABORAL, CONVIVENCIA Y COMUNICACIÓN CON LA COMUNIDAD	Capacitación Personal		X	SI	3	No se ha capacitado personal
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	5	Se ha entregado elementos de EPP
	Adopción de Medidas de seguridad	X		SI	5	Se cuenta con plan aprobado
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	5	Se ha dispuesto oficina para esto
	Programa de información a la comunidad	X		SI	5	Se cuenta con oficina en campamento
	Socializaciones	X		SI	6	Se ha realizado socialización del proyecto
Calificación:		Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	29
					PROMEDIO	4,8

MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	PRESENTA		CALIFICACIÓN	CALIFICACIÓN	
		SI	NO	APLICA		OBSERVACIÓN
MANEJO DE MAQUINARIA Y EQUIPOS	Capacitación del Personal	X		SI	5	Se ha capacitado al operador
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	5	Se ha realizado mantenimientos preventivos a la maquinaria
	Definición de horarios de trabajo	X		SI	6	se han definido los horarios
	Ficha de control de actividades	X		SI	5	Se lleva el control de actividades
	Uso de equipos en buen estado	X		SI	5	La maquinaria está en buen estado
	Elementos de protección personal	X		SI	6	Se cuenta con EPP
	Extintores	X		SI	6	Se tiene disponibilidad de extintores
	Medidas de Contingencia		X	SI	1	No se ha proceido medidas
Calificación:		Buena: 4,6 - 6	Aceptable: 2,6 - 4,5	Deficiente: 0 - 2,5	SUMATORIA	39
					PROMEDIO	4,875

CONTRATO N°	929 DE 2023	PROYECTO N°	BPIN 2023500065004
OBJETO PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS		
CONTRATISTA	CONSORCIO ACACIA R.L. FRANCISCO MORA GUTIERREZ		
INT	NIT 901767420-9		
CONTRATO DE INTERVENTORIA N°	978 DE 2023		
OBJETO INTERVENTORIA	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, CONTABLE, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE PUENTE VEHICULAR SOBRE EL CAÑO CHICHIMEME EN LA VEREDA QUEBRADITAS DEL MUNICIPIO DE ACACIAS		
CONTRATISTA	JORGE AUGUSTO RODRIGUEZ REINA		


MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACION	PRESENTA			CALIFICACION	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACION	OBSERVACION
MANEJO DE MATERIALES DE ESCOMBROS	Capacitación del Personal		X	SI	4	No se ha capacitado personal
	Mantenimiento Preventivo	X		SI	5	Se ha realizado mantenimiento de volquetas y excavadora
	Definición de Horarios de trabajo	X		SI	6	Se han definido horarios de trabajo
	Ficha de control de actividades		X	SI	2	No se cuenta con fichas
	Uso de equipos en buen estado, Certificados	X		SI	5	Se cuenta con equipos en buen estado
	Elementos de protección personal	X		SI	6	El personal cuenta con elementos
	Extintores	X		SI	6	Se cuenta con extintores
	Medidas de Contingencia		X	SI	0	No se ha entregado
	Volumen de material (m3)	X		SI	6	Se ha cuantificado material
	Volumen de excavación (m3)	X		SI	5	Se ha cuantificado material
	Volumen de demolición (m3)	X		SI	6	Se ha cuantificado material
	Volumen de tierra (m3)	X		SI	6	Se ha cuantificado material
Calificación: Buena: 4.6 - 6 Aceptable: 2.6 - 4.5 Deficiente: 0 - 2.5					SUMATORIA	67
					PROMEDIO	4.75

DOCUMENTACIÓN			NÚMERO			
REGISTRO PROVEEDOR:			NO SE HA REALIZADO ENTREGA			
RESOLUCIÓN DE APROBACIÓN ESCOMBRERA:			NO SE HA REALIZADO ENTREGA			
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES						
COMPONENTE	MEDIDAS DE MITIGACIÓN	PRESENTA			CALIFICACIÓN	
		SI	NO	APLICA	CALIFICACIÓN	OBSERVACIÓN
MANEJO DE ACTIVIDADES SILVICULTURALES	Capacitación Personal		X	SI	0	No se ha presentado
	Dotación de elementos de protección personal	X		SI	5	Se cuenta con elementos de EPP
	Adopción de Medidas de seguridad industrial y salud ocupacional	X		SI	5	Se cuenta con manual aprobado
	Espacio para peticiones, quejas y reclamos	X		SI	5	Se cuenta en oficina con espacio para la comunidad
	Programa de información a la comunidad	X		SI	5	Se cuenta con constante comunicación
	Socializaciones	X		SI	6	Se han realizado socializaciones
	Arboles talados		X	N/A	0	N/A
	Arboles podados		X	N/A		N/A
	Arboles bloqueados		X	N/A		N/A
	Arboles sembrados		X	N/A		N/A
Calificación:	Buena: 4.6 - 6	Aceptable: 2.6 - 4.5	Deficiente: 0 - 2.5	SUMATORIA	26	
				PROMEDIO	3.71	

RESULTADO DE LA GESTION EN CAMPO	PUNTAJE	%	RESULTADO
	32.09	59.4	Aceptable

OBSERVACIONES GENERALES
EL CONTRATISTA HA IMPLEMENTADO DURANTE EL PRESENTE PERIODO LAS RECOMENDACIONES Y OBLIGACIONES CONTRACTUALES DE ACUERDO A LOS TRABAJOS A REALIZAR. HA IMPLEMENTADO CADA UNA DE LAS EXIGENCIAS REALIZADAS.

Firma: 
Nombre: JIMMY ANDRES TORRES CASTRO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Firma: 
Nombre: OSCAR HERNAN ALARCÓN ORTEGA
PROFESIONAL AMBIENTAL INTERVENTORIA
