

INFORME MENSUAL DEL CONTRATISTA DE OBRA NO. 2

ARAMCO INGENIEROS S.A.S.
NIT. 901.597.963-8

**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE
ARÁNZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE
PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**



**PERIODO COMPRENDIDO
DESDE 1 DE JUNIO DE 2025 A 28 DE JUNIO DE 2025**



ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

DOCUMENTO	RESPONSABLE	FIRMA
Elaboró: Componentes Técnico, Administrativo, Financiero y Jurídico	Ing. WILLIAM FERNANDO MEDINA ALVIRA Supervisor de Obra	William F. Medina A.
Revisó: Componentes Técnico, Administrativo, Financiero y Jurídico	KAREN DAYANA ROJAS ROJAS Profesional de Gestión Técnica y de Proyectos	Karen Dayana Rojas
Elaboró: Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ing. JEFERSON DAMIAN DALLOS OJEDA Profesional SST	JEFERSON DAMIAN DALLOS
Revisó: Componente de Seguridad y Salud en el Trabajo	Ing. BRAYAN FERNANDO SANABRIA VEGA Profesional de Gestión Integrada HSEQ	Brayan Fernando
Revisó y Aprobó: Informe Consolidado y Anexos	Ing. ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ CUENCA Representante Legal	Andrés Mauricio Ramírez Cuenca



TABLA DE CONTENIDO

	Pág.
1. INTRODUCCIÓN	4
2. GENERALIDADES DEL PROYECTO.....	5
2.1. LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN.....	5
2.2. SITUACIÓN ACTUAL POR INTERVENIR.....	6
3. INFORME TÉCNICO	8
3.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 2025 Y 28 DE JUNIO DE 2025	8
3.2. PROBLEMAS, DIFICULTADES Y SOLUCIONES ADOPTADAS.....	17
3.3. ESTADO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO.....	17
3.4. COMPARACIÓN DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO	18
4. INFORME ADMINISTRATIVO.....	19
4.1. RELACIÓN DE ACTAS	19
4.2. CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA Y MUNICIPIO	19
5. INFORME FINANCIERO	20
5.1. PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO MENSUAL	20
5.2. RELACIÓN DE PAGOS Y DESEMBOLSOS	34
6. INFORME JURÍDICO.....	35
6.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	35
7. INFORME COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	36
8. CONCLUSIONES.....	37



1. INTRODUCCIÓN

Los acueductos y las obras de infraestructura que garantizan el acceso al agua potable son fundamentales para el desarrollo y bienestar de las comunidades, especialmente aquellas cuyos sistemas han quedado obsoletos con el paso del tiempo. La falta de acceso a agua limpia y segura no solo limita la calidad de vida, sino que también desencadena problemas graves de salud pública, como enfermedades gastrointestinales, infecciones y desnutrición, afectando de manera desproporcionada a los sectores más vulnerables. Es responsabilidad del Estado priorizar estas inversiones, no solo para cumplir con el derecho esencial al agua potable, sino también para promover la equidad social, reducir las desigualdades y asegurar un entorno más saludable y digno para toda la población. La modernización de estas estructuras es más que una necesidad técnica: es un compromiso con la justicia social y el progreso humano.

Acorde con lo anterior, la CORPORACIÓN NASA KIWE, en la actualidad ejecuta el proyecto de inversión denominado "IMPLEMENTACIÓN DE ACCIONES DE INTERVENCIÓN PARA LA COBERTURA DE LAS NECESIDADES BÁSICAS DE LA POBLACIÓN DE LOS MUNICIPIOS DE LA JURISDICCIÓN DE LA CORPORACIÓN NASA KIWE" identificado con BPIN 20240000000040. De este propósito resultó la celebración del Contrato de Obra Pública No. 052 de 2025 suscrito el 22 de abril de 2025 con la Sociedad ARAMCO INGENIEROS S.A.S. identificada con NIT. 901.597.963-8 el cual tiene por objeto llevar a cabo la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARÁNZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025 con un periodo máximo de ejecución estimado desde la firma del Acta de Inicio y hasta el 30 de noviembre de 2025, dentro del cual se tiene contemplada la obligación del Contratista de presentar Informes de ejecución Mensual en los componentes técnico, administrativo y financiero desarrollados en el periodo de ejecución.

De conformidad con lo estipulado en el Contrato y sus Anexos, en el presente Informe se relaciona lo pertinente en cuanto al cumplimiento del Objeto Contractual en el periodo comprendido entre el 1 de Junio de 2025 al 28 de Junio de 2025, se detallan las actividades realizadas, recursos empleados, hitos alcanzados y las dificultades encontradas, todo lo anterior teniendo en cuenta las Normas Técnicas de Construcción vigentes en el País y los parámetros dados por la Entidad Estatal para la ejecución de las Obras de Construcción, proporcionando así una visión integral del estado actual del proyecto y sirviendo como herramienta de seguimiento y evaluación para los diferentes actores involucrados.



2. GENERALIDADES DEL PROYECTO

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE
CONTRATISTA:	ARAMCO INGENIEROS S.A.S. NIT. 901.597.963-8
REPRESENTANTE LEGAL:	ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ CUENCA C.C. 1.081.415.530 DE LA PLATA
DIRECCIÓN:	CALLE 2 SUR NO. 9 – 13, APTO 201, EL PORTAL II ETAPA LA PLATA, HUILA
CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 052 DE 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARÁNZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE \$ 462.896.150,00
PLAZO INICIAL:	DESDE FIRMA DEL ACTA DE INICIO HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
SUPERVISOR:	ING. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ ASESOR ÁREA DE SALUD Y SANEAMIENTO BÁSICO
FECHA DE INICIO:	25 DE ABRIL DE 2025
FECHA ESTIMADA DE TERMINACIÓN:	30 DE NOVIEMBRE DE 2025

2.1. LOCALIZACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

El proyecto se encuentra localizado en el Municipio de Páez, ubicado en el Departamento del Cauca, a 130 kilómetros de Popayán, ciudad capital del Departamento. La cabecera municipal se localiza a 2°38'49" Latitud Norte, 75°58'18" Longitud Oeste y 1380 msnm.

Ilustración 1. Localización Geográfica de Páez en el Departamento del Cauca y Colombia



La localidad de Aránzazu se encuentra ubicada en el territorio del Resguardo Indígena de Ricaurte, reconocido por su riqueza cultural y su diversidad étnica. Se distancia en aproximadamente 29,3 Km de la Cabecera Municipal de Páez (Belálcazar) a la cual se llega tomando la Ruta 37 desde el



Municipio de La Plata, en el Departamento del Huila. Esta zona se encuentra bajo administración indígena y cuenta con una estructura organizativa propia, lo que requiere una coordinación constante con las autoridades tradicionales del resguardo para la ejecución de las actividades del proyecto. El territorio presenta características geográficas propias de la región andina, con terrenos de topografía irregular y acceso mediante vías terciarias.

Ilustración 2. Imagen Satelital Localización PTAP Localidad Aránzazu



2.2. SITUACIÓN ACTUAL POR INTERVENIR

La localidad de Aránzazu enfrenta una problemática crítica en relación con la obsolescencia y el deterioro de su infraestructura hidráulica. Las actuales redes de conducción y distribución presentan un desgaste significativo, limitando su capacidad operativa para asegurar un suministro confiable y continuo de agua potable a las 60 familias de la comunidad. De igual manera, las estructuras destinadas al tratamiento del agua, incluyendo las unidades de captación, aducción y desarenación, han superado su ciclo de vida útil, resultando en deficiencias en la calidad del recurso hídrico proveniente de la microcuenca abastecedora. La intervención proyectada incluye la renovación integral de las redes deterioradas, la implementación de unidades de tratamiento avanzadas (filtros gruesos dinámicos, filtros de flujo ascendente y filtros lentos en arena), así como la construcción de nuevas estructuras de almacenamiento para optimizar la operación del sistema.

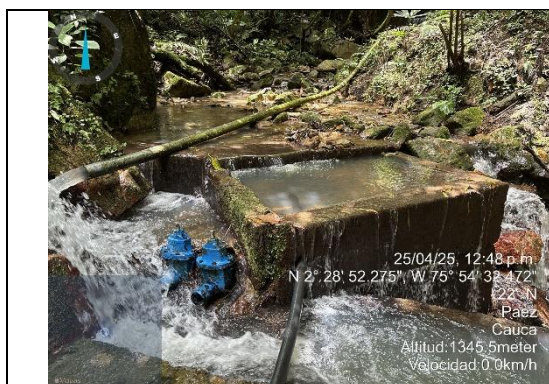


Ilustración 3. Localización en sitio de estructura llegada a PTAP



Ilustración 4. Localización en sitio de estructura llegada a PTAP



Ilustración 5. Localización en sitio de estructura llegada a PTAP



Ilustración 6. Localización en sitio de estructura llegada a PTAP

El área tiene una topografía irregular con predominancia de terrenos montañosos y acceso limitado a través de vías terciarias, lo que genera desafíos logísticos para el transporte de materiales y equipos. Además, debido a que es un territorio ancestral bajo administración indígena, cualquier intervención requiere concertación previa con las autoridades tradicionales del resguardo, quienes participan en el proceso de planificación y ejecución del proyecto.

Se ha realizado un reconocimiento preliminar del terreno, en el cual se identificaron los puntos críticos a intervenir, incluyendo el trazado para la conducción, las zonas para instalación de estructuras de tratamiento y las áreas previstas para las acometidas domiciliarias. La intervención proyectada tiene como objetivo garantizar el acceso sostenible y de calidad al agua potable, respetando el contexto cultural, social y ambiental del territorio.



3. INFORME TÉCNICO

El sitio donde se desarrolla el proyecto se encuentra ubicado a un costado de la Cordillera Central, para acceder a él se debe transitar el Tramo 3701 de la Ruta Nacional 37 que comunica el Municipio de La Plata con Guadualejo en la Transversal Huila - Cauca. Previo a llegar a este Centro Poblado, a un costado, entre el PR 68 Y PR 69 se toma un desvío hacia la localidad de Aránzazu. Durante el periodo correspondiente a este informe, se ha contado con la presencia constante de la supervisión en el sector de intervención, con el fin de verificar el desarrollo de las actividades, su correspondencia con los planos del proyecto y realizar los ajustes necesarios derivados de las condiciones topográficas del terreno. Habiendo transcurrido a la fecha 64 días a corte de 28 de Junio, en el sitio del proyecto se han venido realizando las actividades que se relacionan a continuación.

3.1. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1 DE JUNIO DE 2025 Y 28 DE JUNIO DE 2025

Durante el periodo correspondiente al presente informe, las actividades ejecutadas se centraron en la realización de excavaciones manuales en material de tipo conglomerado en seco, así como excavaciones manuales en roca. Estas labores se llevaron a cabo en las zonas correspondientes a la planta de tratamiento de agua potable, con el objetivo de preparar el terreno para las estructuras proyectadas. Las excavaciones se realizaron conforme a los diseños técnicos y considerando las condiciones particulares del terreno, garantizando el cumplimiento de los criterios de profundidad, alineación y estabilidad requeridos.

3.1.1. ESTRUCTURAS DE LLEGADA A PTAP EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO EN SECO

Se ejecutó excavación manual en material tipo conglomerado en seco para la cimentación de la estructura de llegada. Esta actividad se realizó con herramientas manuales debido a las restricciones de acceso y a la necesidad de preservar la geometría del terreno. Se garantizó el cumplimiento de las dimensiones y profundidades establecidas en los planos, así como la estabilidad de los taludes mediante cortes controlados.

 <p>3/06/2025, 2:30:20 p.m. 2° 28' 37.318" N, 75° 55' 4.720" W 162° S Paez Cauca Colombia Paez Altitud: 1168.7 meter Velocidad: 2.0 km/h</p>	 <p>3/06/2025, 2:30:41 p.m. 2° 28' 37.280" N, 75° 55' 4.711" W 222° SW Paez Cauca Colombia Paez Altitud: 1168.8 meter Velocidad: 1.8 km/h</p>
<p><i>Ilustración 7. Excavaciones Manuales de Estructura de Llegada a PTAP</i></p>	<p><i>Ilustración 8. Excavaciones de Estructura de Llegada a PTAP</i></p>



 <p>11 jun 2025 8:49:21 a.m. 2° 28' 37.374" N 75° 55' 4.41" W Altitud: 1168.9 m Velocidad: 0.2 km/h Número de índice: 250</p>	 <p>11 jun 2025 9:48:46 a.m. 2° 28' 37.266" N 75° 55' 4.35" W Altitud: 1186.6 m Velocidad: 0.2 km/h Número de índice: 252</p>	 <p>11 jun 2025 10:21:21 a.m. 2° 28' 37.182" N 75° 55' 4.476" W Altitud: 1196.6 m Velocidad: 0.3 km/h Número de índice: 260</p>
Ilustración 9. Excavaciones Estructura de Llegada a PTAP	Ilustración 10. Excavaciones Estructura de Llegada a PTAP	Ilustración 11. Excavaciones Estructura de Llegada a PTAP
	 <p>16/06/2025 2:42:49 p.m. 2° 28' 38.240" N 75° 55' 4.452" W Altitud: 1184.1 m Velocidad: 0.3 km/h Número de índice: 265</p>	
Ilustración 12. Excavaciones Estructura de Llegada a PTAP	Ilustración 13. Excavaciones Estructura de Llegada a PTAP	

EXCAVACIONES EN ROCA EN SECO

Se ejecutó excavación manual en roca en seco mediante técnicas de fragmentación controlada, utilizando herramientas manuales como barras y combos. Esta actividad permitió conformar el área de cimentación respetando las cotas de diseño y evitando sobre excavaciones que pudieran comprometer la estabilidad estructural.

	 <p>11 jun 2025 7:31:58 a.m. 2° 28' 36.798" N 75° 55' 4.592" W Altitud: 1239.3 m Velocidad: 0.9 km/h Número de índice: 242</p>	
<p><i>Ilustración 14. Excavaciones Manuales de Material Rocoso</i></p>	<p><i>Ilustración 15. Excavaciones Manuales de Material Rocoso</i></p>	<p><i>Ilustración 16. Excavaciones Manuales de Material Rocoso</i></p>



3.1.2. FILTRO GRUESO DINÁMICO FGDi EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO EN SECO

La excavación manual en conglomerado en seco permitió conformar el área destinada al filtro grueso dinámico. Se trabajó con especial cuidado en la nivelación del fondo de excavación, asegurando una base estable para la posterior instalación de estructuras hidráulicas. Se respetaron las pendientes de diseño y se controló la generación de material suelto.

 <p>16/06/2025, 2:59:12 p.m. 2° 28' 38.090" N, 75° 55' 43.00" W 201° S Paéz Cauca Colombia Paéz Altitud: 1054.8 meter Velocidad: 0.6 km/h</p>	 <p>16/06/2025, 3:42:21 p.m. 2° 28' 37.474" N, 75° 55' 43.00" W 217° SW Paéz Cauca Colombia Paéz Altitud: 1054.8 meter Velocidad: 0.6 km/h</p>
<p><i>Ilustración 17. Excavación de Material Conglomerado de FGDi</i></p>	<p><i>Ilustración 18. Excavación de Material Conglomerado de FGDi</i></p>
	 <p>10 jun 2025 8:51:42 a.m. 2° 28' 37.224" N, 75° 55' 43.554" W Altitud: 1189.1m Velocidad: 0.2 km/h Número de índice: 226</p>
<p><i>Ilustración 19. Excavaciones Manuales Zona FGDi</i></p>	<p><i>Ilustración 20. Excavaciones Manuales Zona FGDi</i></p>

EXCAVACIONES EN ROCA EN SECO

La excavación en roca en seco para el filtro grueso dinámico se realizó con precisión, garantizando una base firme y estable. Se aplicaron métodos de corte manual para remover el material rocoso, minimizando vibraciones y daños a estructuras adyacentes.



	
<p><i>Ilustración 21. Excavaciones Manuales de Material Rocoso en FGDí</i></p>	<p><i>Ilustración 22. Excavaciones en Material Rocoso</i></p>
	
<p><i>Ilustración 23. Excavaciones Manuales de Material Rocoso en la Zona de FGDí</i></p>	<p><i>Ilustración 24. Excavaciones Manuales de Material Rocoso en la Zona de FGDí</i></p>

3.1.3. FILTRO GRUESO ASCENDENTE

EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO EN SECO

Se realizó excavación manual en conglomerado en seco para habilitar el espacio correspondiente al filtro grueso ascendente. La actividad se ejecutó siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto, con énfasis en la precisión de las cotas de profundidad y la limpieza del fondo de excavación para garantizar una correcta cimentación.

	
<p><i>Ilustración 25. Excavación en Conglomerado en Zona de Filtro Grueso Ascendente</i></p>	<p><i>Ilustración 26. Excavación en Conglomerado en Zona de Filtro Grueso Ascendente</i></p>





EXCAVACIONES EN ROCA EN SECO

Se llevó a cabo excavación manual en roca en seco para esta estructura, con énfasis en la conformación de un fondo regular y nivelado. La dureza del material exigió una ejecución cuidadosa para evitar fisuras o desprendimientos que afectaran la seguridad del área de trabajo.



3.1.4. FILTRO LENTO EN ARENA

EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO EN SECO

La excavación en conglomerado en seco para esta estructura se enfocó en lograr una superficie uniforme y nivelada, adecuada para la instalación de capas filtrantes. Se controló la compactación natural del terreno y se evitó la alteración del perfil del suelo, manteniendo la integridad del material base.





EXCAVACIONES EN ROCA EN SECO

La excavación en roca en seco para el filtro lento se centró en lograr una superficie estable y con la pendiente adecuada para el funcionamiento del sistema. Se garantizó la limpieza del fondo y la eliminación de fragmentos sueltos que pudieran interferir con la instalación de capas filtrantes.



3.1.5. CÁMARA DE LAVADO DE GRAVAS EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO EN SECO

Se ejecutó excavación manual en conglomerado en seco para la cámara de lavado de gravas, cuidando la conformación de los bordes y la profundidad requerida. Esta actividad fue clave para garantizar la correcta ubicación de los elementos hidráulicos y facilitar el flujo de operación del sistema.





EXCAVACIONES EN ROCA EN SECO

Se realizó excavación manual en roca en seco para la cámara de lavado de gravas, cuidando la precisión en las dimensiones y la estabilidad del perímetro excavado. La actividad se ejecutó con herramientas manuales para evitar daños en zonas sensibles del terreno.



3.1.6. CÁMARA DE LAVADO DE ARENAS

EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO EN SECO

La excavación se realizó manualmente en conglomerado en seco, con atención especial a la geometría del fondo y a la estabilidad de los taludes. Se respetaron las dimensiones proyectadas y se preparó el terreno para recibir las estructuras de lavado sin comprometer la capacidad portante del suelo.





Ilustración 42. Excavación para Cámara de Lavado de Arenas



Ilustración 43. Excavaciones Manuales Cámara de Lavado de Arenas

EXCAVACIONES EN ROCA EN SECO

La excavación en roca en seco para esta estructura se ejecutó con técnicas manuales de corte y retiro progresivo del material. Se garantizó la conformación adecuada del espacio y la preparación del terreno para la instalación de componentes hidráulicos.



Ilustración 44. Excavación en Material Rocoso Cámaras



Ilustración 45. Excavaciones en Roca en Seco



Ilustración 46. Excavaciones en Zona de Cámaras

3.1.7. CASETA DE ALMACENAMIENTO DE ARENA EXCAVACIONES EN CONGLOMERADO EN SECO

Se llevó a cabo excavación manual en conglomerado en seco para la cimentación de la caseta de almacenamiento. La actividad incluyó la delimitación precisa del área de trabajo, el retiro de material suelto y la preparación del terreno para la instalación de la estructura liviana.



<p>Ilustración 47. Excavación para Caseta de Almacenamiento</p>	<p>Ilustración 48. Excavación de Zona para Caseta</p>	
<p>Ilustración 49. Ubicación Caseta de Almacenamiento</p>	<p>Ilustración 50. Excavaciones de Zona Caseta</p>	<p>Ilustración 51. Excavaciones de Zona Caseta</p>

RELLENOS COMPACTADOS CON MATERIAL SELECCIONADO DE EXCAVACIÓN

Se realizaron rellenos compactados utilizando material seleccionado proveniente de las excavaciones del mismo proyecto. El material fue previamente clasificado para asegurar su idoneidad, y posteriormente colocado en capas sucesivas, compactadas mecánicamente hasta alcanzar la densidad requerida según especificaciones técnicas del proyecto.

<p>Ilustración 52. Rellenos con Material Seleccionado en Caseta de Almacenamiento</p>	<p>Ilustración 53. Rellenos con Material Seleccionado en Caseta de Almacenamiento</p>



3.2. PROBLEMAS, DIFICULTADES Y SOLUCIONES ADOPTADAS

En el periodo comprendido entre el 1 de Junio y 28 de junio de 2025, se presentaron condiciones meteorológicas variables, caracterizadas por nubosidad persistente y precipitaciones de intensidad moderada a alta durante lapsos prolongados. Estas condiciones afectaron significativamente el desarrollo normal de las actividades constructivas, generando una disminución en los rendimientos programados. Las lluvias continuas limitaron la ejecución de labores a cielo abierto y otras actividades asociadas al avance físico del proyecto. Asimismo, se presentaron dificultades en el acceso a las zonas de trabajo y en la operación de equipos. Estas condiciones generaron riesgos operativos, afectando la eficiencia en la ejecución de las tareas programadas.

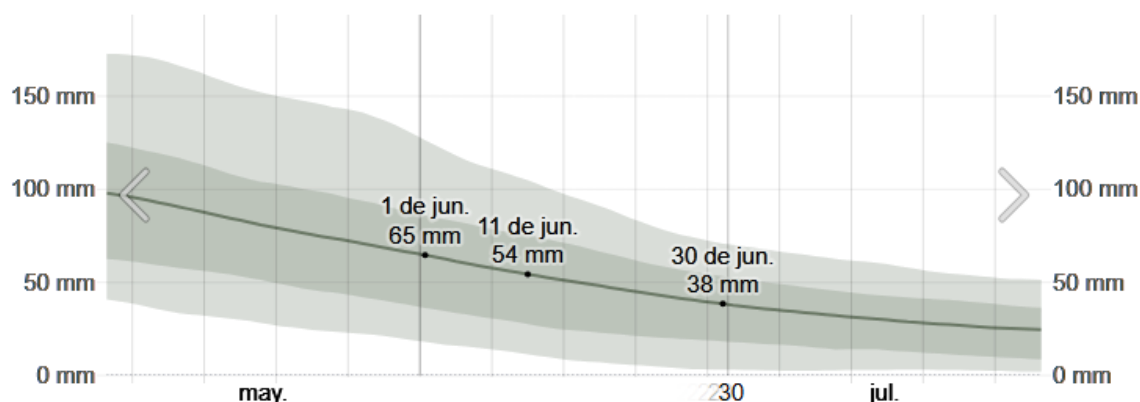


Ilustración 54. Gráfico Promedio de Precipitaciones en Junio de 2025 en La Plata Huila (Población Geográficamente más Cercana al Sitio de Ejecución del Proyecto)

Fuente: <https://es.weatherspark.com/m/22387/6/Tiempo-promedio-en-junio-en-La-Plata-Colombia#Figures-Rainfall>

Como contratista se han enfocado los esfuerzos en proveer el terreno de trabajo de condiciones adecuadas de drenaje para evitar en lo posible afectación por escorrentía natural, no obstante, cuando las lluvias son torrenciales se producen deslizamientos, asentamientos y fallos del suelo de soporte, lo que se convierte en imprevistos y reprocesos que ocasionan el empleo de mayor cantidad de horas hombre en la ejecución de actividades.

3.3. ESTADO Y AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

CAPÍTULO	DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES	PORCENTAJE DE AVANCE
1	Bocatoma	0,00%
2	Aducción y Viaductos	0,00%
3	Desarenador	0,00%
4	Redes de Distribución	0,00%
5	Estructura de Llegada a PTAP	14,69%
6	Filtro Grueso Dinámico FGD _i	5,16%
7	Filtro Grueso Ascendente	3,39%
8	Filtro Lento en Arena	4,69%
9	Cámara de Lavado de Gravas	5,10%
10	Cámara de Lavado de Arenas	10,08%



11	Caseta de Almacenamiento de Arena	2,42%
12	Conexiones Hidráulicas	0,00%
13	Otros	0,00%
PORCENTAJE TOTAL DE AVANCE DEL PROYECTO FECHA DE CORTE 28 DE JUNIO DE 2025		2,28%

AVANCES POR MES O PERIODO	VALOR DEL CONTRATO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN ACUM.	VALOR MENSUAL O PERIODO
01 de Junio de 2025 a 28 de Junio de 2025	\$ 462.896.150,00	2,28%	\$ 10.540.082,69

3.4. COMPARACIÓN DE AVANCE DE OBRA PROGRAMADO VS EJECUTADO

AVANCE FÍSICO (%)				
Avance	Acum. Anterior	Periodo Mes	Acum. Periodo	En Días
Programado (%)	0,29%	3,44%	3,73%	
Ejecutado (%)	0,87%	1,41%	2,28%	
Diferencia	0,58%	-2,03%	-1.45%	-4,00
AVANCE FINANCIERO (MILES DE PESOS)				
Avance	Acum. Anterior	Periodo Mes	Acum. Periodo	En %
Programado (\$)	\$ 1.338,71	\$ 15.943,79	\$ 17.282,50	
Ejecutado (\$)	\$ 4.036,03	\$ 6.504,06	\$ 10.540,09	
Diferencia	\$ 2.697,32	-\$ 9.439,73	-\$ 6.742,41	-1,45%

A la fecha, el proyecto presenta un atraso de 1,45% en cuanto a la ejecución de la obra acorde con lo programado inicialmente.



4. INFORME ADMINISTRATIVO

La carpeta contractual contiene los documentos referentes a estudios previos, CDP, RP, Acta de Inicio, Informes de Supervisión, Soportes Documentales, Aprobación de Pólizas y la fase Precontractual soportada en todos los documentos publicados en el Portal de Contratación (SECOP II). El proyecto fue adjudicado a la Sociedad ARAMCO INGENIEROS S.A.S. representada legalmente por Andrés Mauricio Ramírez Cuenca.

4.1. RELACIÓN DE ACTAS

Relación de las diferentes Actas: Acta de Inicio, Acta de Suspensión, Acta de Reinicio, Acta de Modificación, Acta Parcial de Obra Ejecutada, Acta de Recibo Final, Acta de Reunión, etc.

TIPO DE ACTA	NO.	FECHA
Acta de Inicio		25 de Abril de 2025
Acta de Reunión – Socialización del Proyecto con la Comunidad Beneficiaria		25 de Abril de 2025
Acta de Visita y Entrega de Sitio		25 de Abril de 2025
Acta de Visita de Obra	02	15 de Mayo de 2025
Acta de Visita de Obra	03	4 de Junio de 2025
Acta de Visita de Obra	04	19 de Junio de 2025

4.2. CORRESPONDENCIA GENERADA ENTRE EL CONTRATISTA Y MUNICIPIO

Relación de la diferente Correspondencia: Oficios, Solicitudes, Comunicados, Peticiones, Quejas, Reclamos, Sugerencias, etc.

FECHA	CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO
21/04/2025	Correo Electrónico	Corporación Nasa Kiwe	Planos del Contrato de Obra
21/04/2025	Correo Electrónico	Corporación Nasa Kiwe	Modelo de Valla Informativa y Especificaciones
02/05/2025	Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Cronograma de Obra para Ejecución del Proyecto
16/05/2025	Correo Electrónico	Corporación Nasa Kiwe	Planos del Contrato de Obra Ajustados
19/05/2025	Correo Electrónico	Corporación Nasa Kiwe	Planos del Contrato de Obra Editables
17/06/2025	CO-052-20250617001 Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Entrega Informe Mensual Ejecución de Obra Periodo Mayo
24/06/2025	Correo Electrónico	Corporación Nasa Kiwe	Observaciones Informe Mes de Mayo
24/06/2025	Correo Electrónico	Aramco Ingenieros S.A.S.	Respuesta Observaciones y Correcciones Informe Mes de Mayo



5. INFORME FINANCIERO

VALOR DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE \$ 462.896.150,00
VALOR DEL ANTICIPO:	CERO PESOS M/CTE \$ 0,00
AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO:	CERO PESOS M/CTE \$ 0,00
SALDO DEL CONTRATO:	CUATROCIENTOS SESENTA Y DOS MILLONES OCHOCIENTOS NOVENTA Y SEIS MIL CIENTO CINCUENTA PESOS M/CTE \$ 462.896.150,00

5.1. PRESUPUESTO DE OBRA EJECUTADO MENSUAL

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
	CAPTACION - CONDUCCIÓN - ALMACENAMIENTO Y REDES							
01	BOCATOMA							
1.01	Localización y replanteo obras	m2	23.68	\$ 3,904.00	\$ 92,447.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.02	Limpieza y nivelación del espacio de trabajo e=0.30m.	m2	25.68	\$ 8,257.00	\$ 212,040.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.03	Manejo de quebrada que incluye desvío y encauce para trabajos en area libre	Un	1.00	\$ 1,953,399.00	\$ 1,953,399.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.04	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	8.30	\$ 29,736.00	\$ 246,809.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.05	Excavaciones en conglomerado bajo agua	m3	8.30	\$ 56,497.00	\$ 468,925.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.06	Excavaciones en roca bajo agua	m3	3.85	\$ 201,777.00	\$ 776,841.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.07	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	10.78	\$ 18,227.00	\$ 196,487.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.08	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	19.26	\$ 42,423.00	\$ 817,067.00	0.00	\$ 0.00	0.00%

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
1.09	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para zapatas de muros de contención y losas de pisos.	m3	5.69	\$ 958,110.00	\$ 5,451,646.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.10	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	6.28	\$ 996,736.00	\$ 6,259,502.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.11	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	800.60	\$ 7,555.00	\$ 6,048,533.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.12	Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	1.68	\$ 330,845.00	\$ 555,820.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.13	Sum. e inst. de rejilla de captación an angulo metalico 1 1/2"X1 1/2"X3/16" y varilla 1/2" según plano	Un	1.00	\$ 218,275.00	\$ 218,275.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.14	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 3" tipo pesada	ml	6.50	\$ 33,724.00	\$ 219,206.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.15	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	4.50	\$ 46,889.00	\$ 211,001.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.16	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 6" Tipo pesada	ml	3.60	\$ 94,384.00	\$ 339,782.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.17	Sum. e inst. de adaptador de limpieza PVC D = 4"	Un	2.00	\$ 40,497.00	\$ 80,994.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.18	Sum. e inst. de adaptador de limpieza PVC D = 6"	Un	3.00	\$ 90,716.00	\$ 272,148.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.19	Sum. e inst. de codo sanitaria PVC CxC D = 4"x90°	Un	2.00	\$ 27,042.00	\$ 54,084.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
1.20	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la bocatoma.	kg	36411.70	\$ 100.00	\$ 3,641,170.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
				SUBTOTAL:	\$ 28,116,176.00		\$ 0.00	0.00%
02	ADUCCION Y VIADUCTOS							
2.01	Localización y replanteo tuberías	ml	35.00	\$ 2,134.00	\$ 74,690.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
2.02	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	20.70	\$ 29,736.00	\$ 615,535.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
2.03	Excavación en roca en seco	m3	4.60	\$ 176,555.00	\$ 812,153.00	0.00	\$ 0.00	0.00%

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
2.04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	14.00	\$ 18,227.00	\$ 255,178.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
2.05	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	4.00	\$ 42,423.00	\$ 169,692.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
2.06	Concreto ciclópeo 60% piedra y 40% concreto de 21 Mpa	m3	6.00	\$ 690,272.00	\$ 4,141,632.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
2.07	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	36.14	\$ 7,555.00	\$ 273,038.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
2.08	Suministro e Instalación Cable flexible alma de acero de d=1/2" 6x7, incluye empalmes , accesorios de fijación y tensado.	MI	49.00	\$ 26,575.00	\$ 1,302,175.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
2.09	Suministro e instalación abrazaderas en platina de 1 1/2 x 1/8", tornillos de 2 x 3/8", terminadas con anticorrosivo.	Un	33.00	\$ 20,330.00	\$ 670,890.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
2.10	Sum. e inst. Tubería HD PE 10 D = 63 mm	MI	35.00	\$ 23,538.00	\$ 823,830.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
2.11	Punto de union entre tubería PE 63mm y tubería PVC Presion de 2 1/2" mediante acople o union universal con adaptadores macho PE y adaptador hembra PVC	Un	1.00	\$ 245,575.00	\$ 245,575.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
2.12	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la aducción.	kg	17063.14	\$ 100.00	\$ 1,706,314.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
				SUBTOTAL:	\$ 11,090,702.00		\$ 0.00	0.00%
03	DESARENADOR							
3.01	Localización y replanteo obras	m2	29.70	\$ 3,904.00	\$ 115,949.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
3.02	Descapote, limpieza y nivelación e=0.20m.	m2	28.88	\$ 8,257.00	\$ 238,462.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
3.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	33.00	\$ 29,736.00	\$ 981,288.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
3.04	Excavación en roca en seco	m3	2.00	\$ 176,555.00	\$ 353,110.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
3.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	18.63	\$ 18,227.00	\$ 339,569.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
3.06	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	10.79	\$ 42,423.00	\$ 457,744.00	0.00	\$ 0.00	0.00%

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
3.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de pisos.	m3	2.05	\$ 958,110.00	\$ 1,964,126.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
3.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	6.59	\$ 996,736.00	\$ 6,568,490.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
3.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	1250.50	\$ 7,555.00	\$ 9,447,528.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
3.10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de 15 cm.	ml	12.50	\$ 70,173.00	\$ 877,163.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
3.11	Sum. e inst. Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	1.87	\$ 330,845.00	\$ 618,680.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
3.12	Sum. e inst. Escaleras uña de gato en hierro 5/8"	Un	12.00	\$ 37,061.00	\$ 444,732.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
3.13	Sum. e inst. Tubería PVC D = 2 1/2" RDE 21	ml	66.00	\$ 47,510.00	\$ 3,135,660.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
3.14	Sum. e inst. Codo presión PVC 90° x 2 1/2"	Un	3.00	\$ 66,358.00	\$ 199,074.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
3.15	Sum. e inst. Tee presión PVC 2 1/2"	Un	3.00	\$ 69,633.00	\$ 208,899.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
3.16	Sum. e inst. Chimenea PVC 2 1/2 x 3/4"	Un	1.00	\$ 38,836.00	\$ 38,836.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
3.17	Sum. e inst. Válvula compuerta elástica HD 3" incluye accesorios de empalme	Un	3.00	\$ 860,433.00	\$ 2,581,299.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
3.18	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 4"	Un	1.00	\$ 685,637.00	\$ 685,637.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
3.19	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la aducción.	kg	25450.50	\$ 100.00	\$ 2,545,050.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
				SUBTOTAL:	\$ 31,801,296.00		\$ 0.00	0.00%
04	REDES DE DISTRIBUCION							
4.01	Localización y replanteo tuberías	ml	1195.00	\$ 2,134.00	\$ 2,550,130.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
4.02	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	408.69	\$ 29,736.00	\$ 12,152,806.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
4.03	Excavación en roca en seco	m3	21.51	\$ 176,555.00	\$ 3,797,698.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
4.04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	430.20	\$ 18,227.00	\$ 7,841,255.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
4.05	Retiro de tubería PVC existente	ml	1195.00	\$ 2,568.00	\$ 3,068,760.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
4.06	Sum. e inst. Tubería PVC D = 1 1/2" RDE 21	ml	410.00	\$ 20,152.00	\$ 8,262,320.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
4.07	Sum. e inst. Tubería PVC D = 1" RDE 21	ml	785.00	\$ 9,264.00	\$ 7,272,240.00	0.00	\$ 0.00	0.00%

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
4.08	Conexión de acometidas existentes a nueva tubería con Sum. e inst. de collarín de derivación de 1"X1/2" y accesorios	Un	15.00	\$ 31,277.00	\$ 469,155.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
4.09	Sum. e inst. Válvula PVC de Bola 1"	Un	1.00	\$ 48,177.00	\$ 48,177.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
4.10	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la aducción.	kg	680.55	\$ 100.00	\$ 68,055.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
				SUBTOTAL:	\$ 45,530,596.00		\$ 0.00	0.00%
	PLANTA DE TRATAMIENTO							
05	ESTRUCTURAS DE LLEGADA A PTAP							
5.01	Localización y replanteo obras	m2	44.52	\$ 3.904.00	\$ 173.806.00	44.52	\$ 173.806.00	100.00%
5.02	Limpieza y descapote	m2	50.50	\$ 8.257.00	\$ 416.979.00	50.50	\$ 416.979.00	100.00%
5.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	4.23	\$ 29.736.00	\$ 125.783.00	4.23	\$ 125.783.00	100.00%
5.04	Excavación en roca en seco	m3	1.00	\$ 176.555.00	\$ 176.555.00	1.00	\$ 176.555.00	100.00%
5.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	3.15	\$ 18.227.00	\$ 57.415.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
5.06	Suministro y colocación de concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	4.83	\$ 42.423.00	\$ 204.903.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
5.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de pisos.	m3	0.50	\$ 958.110.00	\$ 479.055.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
5.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	1.06	\$ 996.736.00	\$ 1.056.540.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
5.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	217.85	\$ 7.555.00	\$ 1.645.857.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
5.10	Sum. e inst. Tubo 160mm (6") alcantarillado PVC estructural	ml	15.00	\$ 65.369.00	\$ 980.535.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
5.11	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 6"	Un	3.00	\$ 90.716.00	\$ 272.148.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
5.12	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	4897.50	\$ 100.00	\$ 489.750.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
				SUBTOTAL:	\$ 6.079.326.00		\$ 893.123.00	14.69%
06	FILTRO GRUESO DINAMICO FGD							
6.01	Localización y replanteo obras	m2	31.03	\$ 3.904.00	\$ 121.141.00	31.03	\$ 121.141.00	100.00%

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
6.02	Limpieza y descapote	m2	33.00	\$ 8.257.00	\$ 272.481.00	33.00	\$ 272.481.00	100.00%
6.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	13.08	\$ 29.736.00	\$ 388.947.00	13.08	\$ 388.947.00	100.00%
6.04	Excavación en roca en seco	m3	1.00	\$ 176.555.00	\$ 176.555.00	1.00	\$ 176.555.00	100.00%
6.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	6.72	\$ 18.227.00	\$ 122.485.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	7.92	\$ 42.423.00	\$ 335.990.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	1.59	\$ 958.110.00	\$ 1.523.395.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	2.84	\$ 996.736.00	\$ 2.830.730.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	507.90	\$ 7.555.00	\$ 3.837.185.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de tipo bulbo de 15 cm.	ml	8.60	\$ 70.173.00	\$ 603.488.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.11	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	30.00	\$ 30.155.00	\$ 904.650.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.12	Sum. e inst. Codo presión PVC 90° x 2"	Un	4.00	\$ 21.664.00	\$ 86.656.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.13	Sum. e inst. Buje presión PVC 3x2"	Un	4.00	\$ 36.457.00	\$ 145.828.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.14	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 3"	ml	13.40	\$ 33.724.00	\$ 451.902.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.15	Sum. e inst. Tubería perforada sanitaria PVC D = 3"	ml	1.80	\$ 31.741.00	\$ 57.134.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.16	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" Tipo pesada	ml	4.00	\$ 46.889.00	\$ 187.556.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.17	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 3"	Un	6.00	\$ 28.129.00	\$ 168.774.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.18	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	2.00	\$ 40.497.00	\$ 80.994.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.19	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 3"	Un	6.00	\$ 18.150.00	\$ 108.900.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.20	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 3"x90°	Un	6.00	\$ 16.937.00	\$ 101.622.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.21	Sum. e inst. Válvula compuerta elástica no ascendente HD 3"	Un	2.00	\$ 860.433.00	\$ 1.720.866.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.22	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 3"	Un	2.00	\$ 614.366.00	\$ 1.228.732.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.23	Sum. e inst. Grava para filtro 1" a 3/4"	m3	0.39	\$ 212.406.00	\$ 82.838.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.24	Sum. e inst. Grava para filtro 3/4" a 1/2"	m3	0.39	\$ 212.406.00	\$ 82.838.00	0.00	\$ 0.00	0.00%

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
6.25	Sum. e inst. Grava para filtro 1/2" a 1/4"	m3	0.39	\$ 212.406.00	\$ 82.838.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.26	Sum. e inst. Tubo 160mm (6") alcantarillado PVC estructural	ml	24.00	\$ 65.369.00	\$ 1.568.856.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
6.27	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	13132.90	\$ 100.00	\$ 1.313.290.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
				SUBTOTAL:	\$ 18.586.671.00		\$ 959.124.00	5.16%
07	FILTRO GRUESO ASCENDENTE							
7.01	Localización y replanteo obras	m2	36.14	\$ 3.904.00	\$ 141.091.00	36.14	\$ 141.091.00	100.00%
7.02	Limpieza y descapote	m2	43.80	\$ 8.257.00	\$ 361.657.00	43.80	\$ 361.657.00	100.00%
7.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	16.63	\$ 29.736.00	\$ 494.510.00	16.63	\$ 494.510.00	100.00%
7.04	Excavación en roca en seco	m3	1.75	\$ 176.555.00	\$ 308.971.00	1.75	\$ 308.971.00	100.00%
7.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	8.30	\$ 18.227.00	\$ 151.284.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	12.24	\$ 42.423.00	\$ 519.258.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	2.51	\$ 958.110.00	\$ 2.404.856.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	7.97	\$ 996.736.00	\$ 7.943.986.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	1792.88	\$ 7.555.00	\$ 13.545.208.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de tipo bulbo de 15 cm.	ml	12.60	\$ 70.173.00	\$ 884.180.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.11	Sum. e inst. Tapa en madera plástica de varetas de 80x40x5mm	m2	4.45	\$ 330.845.00	\$ 1.472.260.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.12	Sum. e inst. Escaleras uña de gato en hierro 5/8"	Un	7.00	\$ 37.061.00	\$ 259.427.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.13	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	18.00	\$ 30.155.00	\$ 542.790.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.14	Sum. e inst. Codo presión PVC 90° x 2"	Un	6.00	\$ 21.664.00	\$ 129.984.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.15	Sum. e inst. Adaptador de limpieza PVC 2"	Un	2.00	\$ 13.092.00	\$ 26.184.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.16	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 3" Tipo pesada	ml	2.00	\$ 33.724.00	\$ 67.448.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.17	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" Tipo pesada	ml	12.00	\$ 46.889.00	\$ 562.668.00	0.00	\$ 0.00	0.00%

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
7.18	Sum. e inst. Tubería perforada sanitaria PVC D = 4"	ml	6.00	\$ 37.184.00	\$ 223.104.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.19	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 6" Tipo pesada	ml	12.00	\$ 94.384.00	\$ 1.132.608.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.20	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 3"	Un	6.00	\$ 28.129.00	\$ 168.774.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.21	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	6.00	\$ 40.497.00	\$ 242.982.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.22	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 6"	Un	2.00	\$ 90.716.00	\$ 181.432.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.23	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 4"	Un	6.00	\$ 33.799.00	\$ 202.794.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.24	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 4"x90°	Un	8.00	\$ 27.042.00	\$ 216.336.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.25	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 4"	Un	2.00	\$ 685.637.00	\$ 1.371.274.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.26	Sum. e inst. Grava para filtro 1" a 3/4"	m3	1.60	\$ 212.406.00	\$ 339.850.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.27	Sum. e inst. Grava para filtro 3/4" a 1/2"	m3	1.33	\$ 212.406.00	\$ 282.500.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.28	Sum. e inst. Grava para filtro 1/2" a 1/4"	m3	1.06	\$ 212.406.00	\$ 225.150.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.29	Sum. e inst. Grava para filtro 1/4" a 1/8"	m3	1.06	\$ 212.406.00	\$ 225.150.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.30	Sum. e inst. Grava para filtro 1/8" a 1/16"	m3	1.06	\$ 212.406.00	\$ 225.150.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.31	Sum. e inst. Tubo 160mm (6") alcantarillado PVC estructural	ml	9.00	\$ 65.369.00	\$ 588.321.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
7.32	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	31230.88	\$ 100.00	\$ 3.123.088.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
				SUBTOTAL:	\$ 38.564.275.00		\$ 1.306.229.00	3.39%
08	FILTRO LENTO EN ARENA							
8.01	Localización y replanteo obras	m2	59.08	\$ 3.904.00	\$ 230.648.00	59.08	\$ 230.648.00	100.00%
8.02	Limpieza y descapote	m2	74.89	\$ 8.257.00	\$ 618.367.00	74.89	\$ 618.367.00	100.00%
8.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	59.35	\$ 29.736.00	\$ 1.764.832.00	59.35	\$ 1.764.832.00	100.00%
8.04	Excavación en roca en seco	m3	3.12	\$ 176.555.00	\$ 550.852.00	3.12	\$ 550.852.00	100.00%
8.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	10.30	\$ 18.227.00	\$ 187.738.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	28.90	\$ 42.423.00	\$ 1.226.025.00	0.00	\$ 0.00	0.00%

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
8.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	6.99	\$ 958.110.00	\$ 6.697.189.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	10.09	\$ 996.736.00	\$ 10.057.066.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	2907.85	\$ 7.555.00	\$ 21.968.807.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.10	Sum. e inst. junta hidráulica PVC de tipo bulbo de 15 cm.	ml	23.90	\$ 70.173.00	\$ 1.677.135.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.11	Sum. e inst. Tapa en madera plástica de vareta de 80x40x5mm	m2	1.19	\$ 330.845.00	\$ 393.706.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.12	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	12.00	\$ 30.155.00	\$ 361.860.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.13	Sum. e inst. Codo presión PVC 90° x 2"	Un	2.00	\$ 21.664.00	\$ 43.328.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.14	Sum. e inst. Adaptador de limpieza PVC 2"	Un	1.00	\$ 13.092.00	\$ 13.092.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.15	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	12.00	\$ 46.889.00	\$ 562.668.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.16	Sum. e inst. Tubería perforada tipo filtro PVC D = 4"	ml	56.00	\$ 37.184.00	\$ 2.082.304.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.17	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 6"	ml	20.00	\$ 94.384.00	\$ 1.887.680.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.18	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 6"	Un	2.00	\$ 90.716.00	\$ 181.432.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.19	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 4"	Un	2.00	\$ 33.799.00	\$ 67.598.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.20	Sum. e inst. Tee sanitaria PVC 6x4"	Un	20.00	\$ 235.246.00	\$ 4.704.920.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.21	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 4"x90°	Un	8.00	\$ 27.042.00	\$ 216.336.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.22	Sum. e inst. Codo sanitaria PVC D = 6"x90°	Un	2.00	\$ 184.096.00	\$ 368.192.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.23	Sum. e inst. Tapón filtro PVC D = 4"	Un	20.00	\$ 11.242.00	\$ 224.840.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.24	Sum. e inst. Válvula tipo wafer PVC 6"	Un	2.00	\$ 989.693.00	\$ 1.979.386.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.25	Sum. e inst. Grava para filtro 1/4" a 1/8"	m3	3.11	\$ 212.406.00	\$ 660.583.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.26	Sum. e inst. Grava para filtro 1/8" a 1/16"	m3	2.07	\$ 212.406.00	\$ 439.680.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.27	Sum. e inst. Arena gruesa de 20mm	m3	16.58	\$ 181.767.00	\$ 3.013.697.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
8.28	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	52557.85	\$ 100.00	\$ 5.255.785.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
				SUBTOTAL:	\$ 67.435.746.00		\$ 3.164.699.00	4.69%

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
09	CAMARA DE LAVADO DE GRAVAS							
9.01	Localización y replanteo obras	m2	8.05	\$ 3.904.00	\$ 31.427.00	8.05	\$ 31.427.00	100.00%
9.02	Limpieza y descapote	m2	12.00	\$ 8.257.00	\$ 99.084.00	12.00	\$ 99.084.00	100.00%
9.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	0.98	\$ 29.736.00	\$ 29.141.00	0.98	\$ 29.141.00	100.00%
9.04	Excavación en roca en seco	m3	0.05	\$ 176.555.00	\$ 8.828.00	0.05	\$ 8.828.00	100.00%
9.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	2.50	\$ 18.227.00	\$ 45.568.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
9.06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	1.71	\$ 42.423.00	\$ 72.543.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
9.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	0.18	\$ 958.110.00	\$ 172.460.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
9.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	0.24	\$ 996.736.00	\$ 239.217.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
9.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	122.64	\$ 7.555.00	\$ 926.545.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
9.10	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	27.60	\$ 30.155.00	\$ 832.278.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
9.11	Sum. e inst. Codo presión PVC 90° x 2"	Un	6.00	\$ 21.664.00	\$ 129.984.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
9.12	Sum. e inst. Tee PVC Presión 2"	Un	2.00	\$ 26.792.00	\$ 53.584.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
9.13	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" Tipo pesada	ml	6.00	\$ 46.889.00	\$ 281.334.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
9.14	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	2.00	\$ 40.497.00	\$ 80.994.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
9.15	Sum. e inst. Válvula PVC de Bola 2"	Un	1.00	\$ 120.782.00	\$ 120.782.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
9.16	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	1803.64	\$ 100.00	\$ 180.364.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
				SUBTOTAL:	\$ 3.304.133.00		\$ 168.480.00	5.10%
10	CAMARA DE LAVADO DE ARENAS							
10.01	Localización y replanteo obras	m2	18.95	\$ 3,904.00	\$ 73,981.00	18.95	\$ 73,981.00	100.00%
10.02	Limpieza y descapote	m2	25.30	\$ 8,257.00	\$ 208,902.00	25.30	\$ 208,902.00	100.00%
10.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	3.38	\$ 29,736.00	\$ 100.508.00	3.38	\$ 100.508.00	100.00%
10.04	Excavación en roca en seco	m3	0.18	\$ 176,555.00	\$ 31.780.00	0.18	\$ 31.780.00	100.00%
10.05	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	4.10	\$ 18,227.00	\$ 74,731.00	0.00	\$ 0.00	0.00%

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
10.06	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	4.55	\$ 42,423.00	\$ 193,025.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
10.07	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para losas de piso.	m3	0.46	\$ 958,110.00	\$ 440,731.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
10.08	Suministro y colocación de concreto de 28 Mpa para muros.	m3	0.73	\$ 996,736.00	\$ 727,617.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
10.09	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	87.44	\$ 7,555.00	\$ 660,609.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
10.10	Sum. e inst. Tubo PVC Presión RDE 21 D=2"	ml	20.15	\$ 30,155.00	\$ 607,623.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
10.11	Sum. e inst. Codo presión PVC 90° x 2"	Un	4.00	\$ 21,664.00	\$ 86,656.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
10.12	Sum. e inst. Tee PVC Presión 2"	Un	1.00	\$ 26,792.00	\$ 26,792.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
10.13	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	6.00	\$ 46,889.00	\$ 281,334.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
10.14	Sum. e inst. Adaptador de limpieza sanitario PVC 4"	Un	2.00	\$ 40,497.00	\$ 80,994.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
10.15	Sum. e inst. Válvula PVC de Bola 2"	Un	1.00	\$ 120,782.00	\$ 120,782.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
10.16	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	4024.44	\$ 100.00	\$ 402,444.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
SUBTOTAL:					\$ 4,118,509.00		\$ 415.171.00	10.08%
11	CASETA DE ALMACENAMIENTO DE ARENA							
11.01	Localización y replanteo obras	m2	19.32	\$ 3,904.00	\$ 75.425.00	19.32	\$ 75.425.00	100.00%
11.02	Limpieza y descapote	m2	25.00	\$ 8,257.00	\$ 206.425.00	25.00	\$ 206.425.00	100.00%
11.03	Excavaciones en conglomerado en seco	m3	22.70	\$ 29,736.00	\$ 675.007.00	22.70	\$ 675.007.00	100.00%
11.04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	2.90	\$ 18,227.00	\$ 52.858.00	2.90	\$ 52.858.00	100.00%
11.05	Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	5.38	\$ 42,423.00	\$ 228,236.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.06	Concreto ciclopeo 21 MPa 40% en piedra para cimientos	m3	1.46	\$ 690,272.00	\$ 1,007,797.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.07	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas de cimentación de 0.20X0.20	ml	16.30	\$ 58,798.00	\$ 958,407.00	0.00	\$ 0.00	0.00%

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
11.08	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para placa de piso e=0.07m	m2	14.52	\$ 63,682.00	\$ 924,663.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.09	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para columnetas de 0.15X0.15	ml	20.70	\$ 51,694.00	\$ 1,070,066.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.10	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para vigas de amarre de 0.15X0.20	ml	16.30	\$ 69,026.00	\$ 1,125,124.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.11	Suministro y colocación de concreto de 21 Mpa para cintas de coronamiento de 0.15X0.10	ml	9.20	\$ 57,902.00	\$ 532,698.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.12	Suministro, corte, figuración y colocación de acero de refuerzo	kg	429.90	\$ 7,555.00	\$ 3,247,895.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.13	Sum. y Constr. de muro en ladrillo tolete común, revitado y a la vista.	m2	34.55	\$ 97,766.00	\$ 3,377,815.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.14	Sum. e inst. Correas metálicas en perlines 100x50x1.2 mm	ml	16.00	\$ 36,301.00	\$ 580,816.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.15	Sum. y Constr. de cubierta en teja de fibrocemento.	m2	18.40	\$ 50,493.00	\$ 929,071.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.16	Sum. e inst. Sum. e inst. Piso en cerámica	m2	1.26	\$ 68,775.00	\$ 86,657.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.17	Sum. e inst. Enchape pared en porcelana	m2	7.62	\$ 93,975.00	\$ 716,090.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.18	Sum. y Constr. de Cuneta en concreto simple de 21 MPa con grava y e=.07m h=.25m	ml	144.40	\$ 53,976.00	\$ 7,794,134.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.19	Sum. y Constr. de Andenes en concreto simple de 21 Mpa de e=0.07, b=1.0m	ml	144.40	\$ 81,139.00	\$ 11,716,472.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.20	Sum. e inst. Tubería sanitaria PVC D = 4" tipo pesada	ml	24.50	\$ 46,889.00	\$ 1,148,781.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.21	Sum. y Constr. de Cajas de inspección en concreto 50x50	Un	1.00	\$ 314,589.00	\$ 314,589.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.22	Sum. y Constr. de Punto sanitario PVC 2"	Un	1.00	\$ 40,811.00	\$ 40,811.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.23	Sum. y Constr. de Punto sanitario PVC 3"	Un	2.00	\$ 50,939.00	\$ 101,878.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.24	Sum. y Constr. de Punto sanitario PVC 4"	Un	1.00	\$ 63,528.00	\$ 63,528.00	0.00	\$ 0.00	0.00%

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
11.25	Sum. y Constr. de Red hidráulica PVC 1/2" RDE 13.5	ml	18.00	\$ 5,305.00	\$ 95,490.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.26	Sum. y Constr. de Punto hidráulico PVC 1/2"	Un	4.00	\$ 34,933.00	\$ 139,732.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.27	Sum. e inst. de Sanitario blanco S/M.	Un	1.00	\$ 360,594.00	\$ 360,594.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.28	Sum. e inst. de Lavamanos blanco	Un	1.00	\$ 173,314.00	\$ 173,314.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.29	Sum. e inst. de Grifos de 1/2"	Un	2.00	\$ 27,111.00	\$ 54,222.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.30	Sum. e inst. de Juego de incrustaciones	Un	1.00	\$ 64,596.00	\$ 64,596.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.31	Sum. e inst. de puerta y marco en lamina galvanizada C20, incluye chapa, pinta, terminada completamente.	m2	2.87	\$ 353,989.00	\$ 1,015,948.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.32	Sum. e inst. de ventana en lamina galvanizada C20, pinta, incluye vidrio 4 mm, terminada completamente.	m2	3.18	\$ 302,288.00	\$ 961,276.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
11.33	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	19219.74	\$ 100.00	\$ 1,921,974.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
SUBTOTAL:					\$ 41,762,389.00		\$ 1.009.715.00	2.42%
12	CONEXIONES HIDRÁULICAS							
12.01	Localización y replanteo tuberías	ml	161.96	\$ 2,134.00	\$ 345,623.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
12.02	Excavación en conglomerado	m3	264.57	\$ 29,736.00	\$ 7,867,254.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
12.03	Sum. y Constr. de Entibados de madera para protección de excavaciones.	m2	75.00	\$ 42,910.00	\$ 3,218,250.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
12.04	Rellenos compactados con material seleccionado de excavación	m3	220.24	\$ 18,227.00	\$ 4,014,314.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
12.05	Sum. e inst. de Material granular seleccionado para encamado de tuberías	m3	13.00	\$ 133,966.00	\$ 1,741,558.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
12.06	Sum. e inst. de Tubería PVC 8" estructural para alcantarillado	ml	118.00	\$ 91,901.00	\$ 10,844,318.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
12.07	Sum. y Constr. de Cajas de inspección en concreto simple 60X60	Un	3.00	\$ 370,765.00	\$ 1,112,295.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
12.08	Sum. y Constr. de Concreto de 14 MPa para solados de limpieza	m2	10.62	\$ 42,423.00	\$ 450,532.00	0.00	\$ 0.00	0.00%

ITEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUTADO ACUMULADO MENSUAL		
		UND	CANT.	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	%
12.09	Sum. y Constr. de Placa base de pozo de inspección Di=1.60m concreto f'c = 21MPa elab. en obra. e=0.20m mas cañuela esmaltada en ccto	Un	6.00	\$ 532,400.00	\$ 3,194,400.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
12.10	Sum. y Constr. de Cilindro Pozo Inspección D=1.20m (concreto simple f'c 21MPa elab. en obra. e=0.20m.)	ml	12.00	\$ 685,953.00	\$ 8,231,436.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
12.11	Sum. y Constr. de Brocal con tapa de pozo de inspección Di=1.60m concreto f'c 21MPa elab. en obra. e=0.20m, incluye acero de refuerzo y aros metálicos según detalle	Un	6.00	\$ 723,688.00	\$ 4,342,128.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
12.12	Escaleras uña de gato en hierro 5/8" @ 40cm	Un	30.00	\$ 37,061.00	\$ 1,111,830.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
12.13	Acarreo de materiales (Cemento, arena, triturado y acero) al sitio de la planta de potabilización	kg	27830.74	\$ 100.00	\$ 2,783,074.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
SUBTOTAL:					\$ 49,257,012.00		\$ 0.00	0.00%
13	OTROS							
13.01	Señalización de obra según Norma y medidas de seguridad industrial. Incluye cinta de seguridad, casco, botas, guantes y cerramiento del area de trabajo en tela verde para cerramiento y bastidores, donde se requiera.	Un	1.00	\$ 2,029,412.00	\$ 2,029,412.00	0.00	\$ 0.00	0.00%
SUBTOTAL:					\$ 2,029,412.00		\$ 0.00	0.00%

	COSTO TOTAL DIRECTO				\$ 347.676.243.00		\$ 7.916.541.00	2.28%
	ADMINISTRACIÓN	24%			\$ 83.442.298.00		\$ 1.899.969.00	2.28%
	IMPREVISTOS	2%			\$ 6.953.525.00		\$ 158.331.00	2.28%
	UTILIDAD	6%			\$ 20.860.575.00		\$ 474.993.00	2.28%
	COSTO TOTAL INDIRECTO (AUI): 32%				\$ 111.256.398.00		\$ 2.533.293.00	2.28%
	COSTO TOTAL SIN IVA				\$ 458.932.641.00		\$ 10.449.834.00	2.28%
	IVA (19% sobre la utilidad)				\$ 3.963.509.00		\$ 90.249.00	2.28%
	COSTO TOTAL OBRA				\$ 462.896.150.00		\$ 10.540.083.00	2.28%

5.2. RELACIÓN DE PAGOS Y DESEMBOLSOS

CONCEPTO	VALOR
Valor Inicial del Contrato	\$ 462.896.150,00
Valor Adicional del Contrato	\$ 0,00
Valor Total del Contrato	\$ 462.896.150,00
Valor Causado que No se Ha Pagado	\$ 10.540.083,00
Valor Total Ejecutado	\$ 10.540.083,00
Valor Saldo por Ejecutar	\$ 452.356.067,00

CONCEPTO	FECHA	VALOR	OBSERVACIÓN



6. INFORME JURÍDICO

Para la celebración y ejecución de este contrato se aplicó la Normatividad que regula esta clase de contratos como son: Ley 80 de 1993 Artículo 42, Ley 1150 de 2007 Artículo 2 Numeral 4 y el Decreto Reglamentario 1082 de 2015. Con relación a las Garantías estipuladas en el Contrato se relacionan a continuación con los amparos y su vigencia debidamente aprobadas por la Corporación Nasa Kiwe.

Los Anexos que no se relacionan a continuación comprenden cifras negativas que surgen al momento de realizar una Actualización o Modificación de las Garantías, esto no implica la Anulación o Retiro de la Póliza, sino que se presenta por situaciones de manejo en el sistema interno de cada una de las Aseguradoras.

6.1. GARANTÍAS DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA

ENTIDAD	OBJETO	No. PÓLIZA	VALOR	VIGENCIA	
				DESDE	HASTA
PÓLIZAS A LA FIRMA DEL CONTRATO DE OBRA					
Compañía Mundial de Seguros S.A.	Cumplimiento del Contrato	B-100061451 Anexo 0	\$ 46.289.615,00	22/04/2025	30/03/2026
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones		\$ 23.144.807,50	22/04/2025	30/11/2028
	Estabilidad y Calidad de la Obra		\$ 92.579.230,00	30/11/2025	30/11/2030
	Calidad y Correcto Funcionamiento		\$ 46.289.615,00	22/04/2025	30/03/2026
Compañía Mundial de Seguros S.A.	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	B-100016719 Anexo 0	\$ 284.700.000,00	22/04/2025	30/11/2025
PÓLIZAS A LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO					
Compañía Mundial de Seguros S.A.	Cumplimiento del Contrato	B-100061451 Anexo 2	\$ 46.289.615,00	25/04/2025	02/04/2026
	Pago de Salarios, Prestaciones Sociales Legales e Indemnizaciones		\$ 23.144.807,50	25/04/2025	03/12/2028
	Estabilidad y Calidad de la Obra		\$ 92.579.230,00	03/12/2025	03/12/2030
	Calidad y Correcto Funcionamiento		\$ 46.289.615,00	25/04/2025	02/04/2026
Compañía Mundial de Seguros S.A.	Póliza de Responsabilidad Civil Extracontractual	B-100016719 Anexo 2	\$ 284.700.000,00	25/04/2025	03/12/2025



7. INFORME COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Verificar Informe Componente Seguridad y Salud en el Trabajo – Anexo No. 1



8. CONCLUSIONES

El Contrato de Obra Pública No. 052 de 2025 que tiene por objeto la CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARÁNZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025 a corte del 28 de Junio de 2025 tiene un porcentaje de avance ejecutado de 2,28%, por debajo de lo planeado en 1,45%. Se tiene en cuenta que las condiciones climáticas adversas que se presentaron durante el mes limitaron parcialmente el desarrollo de las actividades en campo. A pesar de las condiciones climáticas adversas presentadas durante el periodo de ejecución se iniciaron las excavaciones manuales en distintos frentes de obra, correspondientes a estructuras clave del sistema, lo cual representa un hito importante en el desarrollo del proyecto.

Si bien se evidenció un retraso respecto al cronograma inicialmente establecido, debido a factores externos como las condiciones meteorológicas y la complejidad del terreno, se han definido acciones correctivas orientadas a optimizar el desempeño en obra. Entre estas medidas se incluyen la reprogramación de actividades críticas, el refuerzo de frentes de trabajo, y la implementación de estrategias de gestión de recursos que permitan compensar los tiempos perdidos y recuperar el ritmo de ejecución previsto. Estas acciones buscan garantizar el cumplimiento de los plazos contractuales sin comprometer la calidad técnica del proyecto.

Las actividades realizadas a la fecha y los métodos constructivos empleados a lo largo de la construcción se han ejecutado siguiendo estricto cumplimiento de las especificaciones técnicas del Contrato, verificadas y acompañadas permanentemente por la Entidad Contratante a efectos de garantizar los estándares de calidad.



ANEXO - COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

ARAMCO INGENIEROS S.A.S.
NIT. 901.597.963-8

**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE
ARÁNZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE
PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**



**PERIODO COMPRENDIDO
DESDE 1 DE JUNIO DE 2025 A 28 DE JUNIO DE 2025**



COMPONENTE DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1. ASPECTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

1.1. RELACIÓN DE PERSONAL ESENCIAL ADMINISTRATIVO DE OBRA

El contratista ha designado el siguiente personal para las actividades administrativas y técnicas que exige la ley y de las cuales se ha confirmado su idoneidad:

No.	Nombre del Empleado	Cédula	Cargo
1	William Fernando Medina Alvira	1.081.418.004	Supervisor de Obra
2	Yamid Hernando Medina Salazar	12.281.348	Maestro de Obra
3	Jeferson Damian Dallos Ojeda	1.002.461.147	Profesional SST
4	Diego Armando Yasno Triana	1.081.397.892	Topógrafo

1.2. LISTADO DE PERSONAL ACTIVO DEL CONTRATISTA EMPLEADO EN EJECUCIÓN DE OBRA

El contratista cuenta con el siguiente personal activo para el desarrollo de las actividades propias de construcción del proyecto:

No.	Nombre del Empleado	Cédula	Cargo
1	Gildardo Gutiérrez López	12.272.753	Obrero
2	Heyner Efrén Gutiérrez Ramos	1.081.411.218	Obrero
3	Cristian Hernán López Yasnó	12.283.706	Obrero
4	Richard Yasno Lopez	12.280.951	Obrero
5	Yohemir Yasno Pill	12.277.456	Obrero

1.3. INGRESOS DE PERSONAL (JUNIO) Y SU AFILIACIÓN AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL ¹

Para el mes de junio ingresaron un total de 4 colaboradores. Lo anterior se ve relacionado en las siguientes tablas con fechas de ingreso.

No.	Nombre del Empleado	Cédula	Cargo	EPS	AFP	ARL	Ingreso
1	Heyner Efrén Gutiérrez Ramos	1.081.411.218	Obrero	Asociación Indígena del Cauca	Porvenir	SURA	03/06/25
2	Cristian Hernán López Yasnó	12.283.706	Obrero	Nueva EPS	Porvenir	SURA	03/06/25
3	Richard Yasnó López	12.280.951	Obrero	Salud Total EPS	Porvenir	SURA	10/06/25
4	Yohemir Yasnó Pill	12.277.456	Obrero	Asociación Indígena del Cauca	Porvenir	SURA	11/06/25

1.4. RELACIÓN DE PERSONAL DEL SUBCONTRATISTA EMPLEADO EN EJECUCIÓN DE OBRA

El contratista ha subcontratado Mano de Obra con la sociedad L.O. CONSTRUCCIONES S.A.S. identificada con NIT. 901.839.529-4 la cual cuenta con el siguiente personal activo y a disposición para el desarrollo de las actividades propias de construcción del proyecto:

¹ Sistema de seguridad social integral, cumplimiento de la Ley 100 de 1993 "CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE COLOMBIA".



No.	Nombre del Empleado	Cédula	Cargo
1	Marcos Javier Liscano Cardozo	12.274.525	Contramaestro

1.5. VERIFICACIÓN PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL PERSONAL ESENCIAL ADMINISTRATIVO DE OBRA

Se realiza el reporte del pago de planillas de seguridad social del personal relacionado con el Contrato de Obra No. 052 – 2025 durante el mes de junio. Se relacionan Planillas de Seguridad Social en Anexo 1.5.1.

Nombre del Empleado	Tipo de Vinculación	Cumple Pago Seguridad Social Integral		Observación / Evidencia
		SI	NO	
William Fernando Medina Alvira	Prestación de Servicios	X		Planilla 9487827909
Yamid Hernando Medina Salazar	Prestación de Servicios	X		Planilla 9487291343
Jeferson Damian Dallos Ojeda	Prestación de Servicios	X		Planilla 7978004721
Diego Armando Yasno Triana	Prestación de Servicios	X		Planilla 33473343

PERSONAL DEL CONTRATISTA EMPLEADO EN EJECUCIÓN DE OBRA

Nombre del Empleado	Tipo de Vinculación	Cumple Pago Seguridad Social Integral		Observación / Evidencia
		SI	NO	
Gildardo Gutiérrez López	Obra o Labor	X		Planilla 9488536481 Ver Anexo 1.5.2
Heyner Efrén Gutiérrez Ramos	Obra o Labor	X		
Cristian Hernán López Yasnó	Obra o Labor	X		
Richard Yasno Lopez	Obra o Labor	X		
Yohemir Yasno Pill	Obra o Labor	X		

PERSONAL DEL SUBCONTRATISTA EMPLEADO EN EJECUCIÓN DE OBRA

Nombre de Empleados del Subcontratista	Tipo de Vinculación	Cumple Pago Seguridad Social Integral		Observación / Evidencia
		SI	NO	
Marcos Javier Liscano Cardozo	Obra o Labor	X		Planilla 9488535722 Ver Anexo 1.5.3

1.6. EXÁMENES OCUPACIONALES DE INGRESO, PERIÓDICOS Y DE EGRESO ²

Descripción	Cumple		N/A	Número de Exámenes Realizados de Acuerdo con el Número de Empleados Contratados y Retirados												Observación / Evidencia
	SI	NO		E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
Examen de Ingreso	X			-	-	-	-	3	2	-	-	-	-	-	-	Ver Anexo 1.6.1

² Exámenes médicos ocupacionales, cumplimiento de la Resolución 1072 de 2015, Art. 2.2.4.2.2.18 y el Decreto 723 de 2013, Art. 18.



Examen Periódico			X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No se realizaron exámenes periódicos.
Examen de Egreso			X	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	No se realizaron exámenes de egreso.

1.7. AFILIACIÓN A ARL, EPS, AFP Y CCF ³

Se realiza el reporte del pago de planillas de seguridad social del personal relacionado con el Contrato de Obra No. 052 – 2025 durante el mes de junio.

Descripción	Cumple		Número de Empleados por Mes												Observación / Evidencia
	SI	NO	E	F	M	A	M	J	J	A	S	O	N	D	
ARL	X		-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	Ver Anexo 1.7.1
EPS	X		-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	Ver Anexo 1.7.2
AFP	X		-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	Ver Anexo 1.7.3
CCF	X		-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	Ver Anexo 1.7.4

1.8. ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL ⁴

El contratista para el mes de junio actualiza la lista de entrega de los elementos de protección personal (EPP) de la siguiente forma:

No.	Nombre del Empleado	Cédula	Cargo	Entrega de EPP		Observación / Evidencia
				SI	NO	
1	Heyner Efrén Gutiérrez Ramos	1.081.411.218	Obrero	X		Ver Anexo 1.8.1
2	Cristian Hernán López Yasnó	12.283.706	Obrero	X		
3	Richard Yasno Lopez	12.280.951	Obrero	X		
4	Yohemir Yasno Pill	12.277.456	Obrero	X		
5	Marcos Javier Liscano Cardozo	12.274.525	Contramaestro	X		

1.9. ACCIDENTALIDAD, AUSENTISMO Y ENFERMEDADES LABORALES ⁵

Descripción	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Observación / Evidencia
No. Accidentes de Trabajo	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	No se generaron accidentes de trabajo.
No. Accidentes de Tránsito	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	No se generaron accidentes de tránsito.

³ Cumplimiento del Contrato de Obra No. 052 – 2025 Sección Segunda (OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA), numeral 4, 5, 7.

⁴ Suministro de elementos de protección personal (EPP), en cumplimiento de la Resolución 1072 de 2015, Art. 2.2.4.6.24 literal 5.

⁵ Reporte de accidentes y enfermedades a la dirección, en cumplimiento con la Resolución 1072 de 2015, Art. 2.2.4.1.7



No. Incidentes de Trabajo	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	No se generaron incidentes de trabajo.
No. Ausentismo Causa Justificada	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	No se generaron ausentismos con causa justificada.
No. Ausentismo Causa No Justificada	-	-	-	-	0	4	-	-	-	-	-	-	Se generaron ausentismos con causa NO justificada. Ver Anexo 1.9.5
No. Casos de Enfermedad Laboral	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	No se presentaron casos.
No. Casos de Enfermedad Común	-	-	-	-	0	0	-	-	-	-	-	-	No se presentaron casos.

Se reportaron cuatro ausencias laborales no justificadas, se redactó un comunicado interno informando sobre el ausentismo de los empleados, evidenciándose que 2 empleados no asistieron durante 2 días a desarrollar sus labores cotidianas. Se iniciaron las acciones disciplinarias correspondientes según la política de la empresa.

1.10. CAPACITACIÓN Y/O INDUCCIÓN ⁶

Se impartió capacitación por parte del profesional SST al personal en obra, así mismo proporciono conocimientos para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con sus actividades, con el fin de prevenir accidentes y enfermedades laborales.

Descripción	Ene.	Feb.	Mar.	Abr.	May.	Jun.	Jul.	Ago.	Sep.	Oct.	Nov.	Dic.	Observación / Evidencia
No. de Empleados que reciben Inducción de SST	-	-	-	-	1	5	-	-	-	-	-	-	Ver Anexo 1.10.1
No. de Capacitaciones y/o Charlas Realizadas en el Mes	-	-	-	-	0	7	-	-	-	-	-	-	Ver Anexo 1.10.2.

De igual forma se anexa constancia de inducción y evaluación efectuada al personal en obra, para a su vez verificar si el nuevo empleado ha comprendido la información clave del programa de inducción y si se siente preparado para realizar sus funciones.

⁶ Capacitación orientada a la identificación de peligros y control de riesgos, en cumplimiento con la Resolución 1072 de 2015, Art. 2.2.4.6.11



1.11. INSPECCIÓN

No.	Inspección	Número de Inspecciones	Periodo	Favorable		Observación / Evidencia
				SI	NO	
1	Inspección del Estado y Uso de los EPP	2	03/06/2025 30/06/2025	X		Ver Anexo 1.11.1
2	Inspección de Condiciones de Orden y Aseo en Obra	1	03/06/2025 30/06/2025	X		Ver Anexo 1.11.2
3	Inspección de Punto Ecológico y Residuos	1	03/06/2025 30/06/2025	X		Ver Anexo 1.11.3
4	Inspección a Botiquines y Camillas	1	03/06/2025 30/06/2025	X		Ver Anexo 1.11.4

Se realizaron las inspecciones mencionadas anteriormente con el fin de identificar y corregir condiciones peligrosas y actos inseguros para prevenir accidentes y enfermedades laborales. Esto implica evaluar las condiciones de trabajo, identificar riesgos, asegurar el cumplimiento de normativas y, en última instancia, promover un entorno laboral seguro y saludable.

2. DOCUMENTOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO – SST (ANEXOS)

Anexo 1.5.1. Planilla de Seguridad Social Administrativos
 Anexo 1.5.2. Planilla de Seguridad Social Empleados de Obra
 Anexo 1.5.3. Planilla de Seguridad Social Subcontratista
 Anexo 1.6.1. Concepto Médico Ocupacional
 Anexo 1.7.1. Afiliaciones a ARL del mes de junio 2025
 Anexo 1.7.2. Afiliaciones a EPS del mes de junio 2025
 Anexo 1.7.3. Afiliaciones a AFP del mes de junio 2025
 Anexo 1.7.4. Afiliaciones a CCF del mes de junio 2025
 Anexo 1.8.1. Entrega de EPP del mes de junio 2025
 Anexo 1.9.5. Ausentismo por causa NO justificada del mes de junio 2025
 Anexo 1.10.1. Inducción y Constancia de Inducción en el SG-SST de personal del mes de junio 2025
 Anexo 1.10.2. Capacitaciones y/o charlas del mes de junio 2025
 Anexo 1.11.1. Inspección del estado y uso de los EPP del mes de junio 2025
 Anexo 1.11.2. Inspección de condiciones de orden y aseo en obra del mes de junio 2025
 Anexo 1.11.3. Inspección de punto ecológico y residuos del mes de junio 2025
 Anexo 1.11.4. Inspección a botiquines y camillas del mes de junio 2025



3. REGISTRO FOTOGRÁFICO





Ilustración 9. Señalización de Seguridad



Ilustración 10. Señalización de Seguridad



Ilustración 11. Inspección del Botiquín en Obra



Ilustración 12. Inspección del Punto Ecológico en Obra



Ilustración 13. Charla de SST del Personal de Obra



Ilustración 14. Inspección del Estado y Uso de los EPP del Personal de Obra



Anexo 1.5.1. Planilla de Seguridad Social Administrativos



DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1081418004		MEDINA ALVIRA WILLIAM FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 2A SUR NO 2 04	LA PLATA-HUILA	8372016	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1597884390	9487827909	I	2025/07/02	2025/07/02	NEQUI	0	\$413,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	1081418004	MEDINA WILLIAM																		230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EP5037	30	\$1,423,500	\$178,000		0		\$0	\$0	14-23	30	\$1,423,500	\$7,500	0		\$0	\$0	No	\$413,300
Total Afiliados(1)																						\$1,423,500	\$227,800			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$1,423,500	\$7,500			\$0	\$0		\$413,300		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1081418004		MEDINA ALVIRA WILLIAM FERNANDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CALLE 2A SUR NO 2 04	LA PLATA-HUILA	8372016	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2025-06	2025-06	1597884390	9487827909	I	2025/07/02	2025/07/02	NEQUI	0	\$413,300

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$227,800	\$0	\$0	\$227,800	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	\$7,500	\$0	\$0	\$7,500	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$413,300	\$0	\$0	\$413,300	

Se certifica que YAMID HERNANDO MEDINA SALAZAR identificado(a) con CC 12281348 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: MEDINA SALAZAR YAMID HERNANDO CC 12281348																								
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades														
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct
9487291343	1000000672	I	2025-06-12	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30															
9487291343	1000000672	I	2025-06-12	AFP	230301	PORVENIR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30															
9487291343	1000000672	I	2025-06-12	ARL	14-23	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-05	30															

Este certificado se expide el día 2025-06-12 a las 19:06.

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO PARA EL COTIZANTE CC 1002461147

DATOS GENERALES DEL APORTANTE			
Nombre ó Razón Social	JEFERSON DAMIAN DALLOS OJEDA		
Tipo Identificación	CÉDULA DE CIUDADANÍA	Número de Identificación	1002461147
Ciudad/Municipio	LA PLATA	Departamento	HUILA
Dirección	CLL 4 A SUR # 5-40	Teléfono	3186004
Tipo Empresa	PRIVADA	Actividad Económica	Actividades de saneamiento ambiental
Tipo Aportante	02-INDEPENDIENTE	Clase Aportante	I-INDEPENDIENTE
Forma Presentación	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA			
Número Planilla	7978004721	Tipo de Planilla	I-INDEPENDIENTES
Periodo Cotización Otros	junio / 2025	Periodo Cotización Salud	junio / 2025
Días de Mora	0	Fecha Pago	2025/07/07
Número Autorización	1606084228		

INFORMACIÓN BÁSICA			
Nombres	JEFERSON DAMIAN	Apellidos	DALLOS OJEDA
Tipo de Identificación	CC	Número de Identificación	1002461147
Tipo cotizante	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL	Subtipo Cotizante	
Colombiano Temporalmente en el Exterior	NO	Extranjero no obligado a cotizar Pensión	NO
COTIZANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) :			NO
Departamento	CAUCA	Municipio	PAEZ
Salario Básico	\$ 1.423.500	Tipo de Salario	

NOVEDADES																
ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	COR	VSP	VST	SLN	COM	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP

APORTES REALIZADOS A SEGURIDAD SOCIAL			
PENSIÓN		Administradora	230301-PORVENIR
Días	30	IBC	\$ 1.423.500
Tarifa	16,000 %	Cotización Obligatoria	\$ 227.800
FSP - Solidaridad	\$ 0	FSP - Subsistencia	\$ 0
Aportes Voluntarios Empleador	\$ 0	Aportes Voluntarios Cotizante	\$ 0
Indicador tarifa especial	Normal	Total Aporte	\$ 227.800

SALUD		Administradora	EPS037-NUEVA EPS
Días	30	IBC	\$ 1.423.500
Tarifa	12,500 %	Cotización Obligatoria	\$ 178.000
Nro Incapacidad por Enf. General		Valor	\$ 0
Nro Licencia de Maternidad		Valor	\$ 0
Valor ADRES	\$ 0	Total Aporte	\$ 178.000

RIESGOS PROFESIONALES		Administradora	14-11 - ARL SURA
Días	30	IBC	\$ 1.423.500
Clase de Riesgo	III	Tarifa	2,436 %
Centro de Trabajo	100246114	Total Aporte	\$ 34.700

TOTAL PAGADO:

\$ 440.500



RAZÓN SOCIAL :	DIEGO ARMANDO YASNO TRIANA
IDENTIFICACIÓN:	CC-1081397892
COD. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	0
NOM. DEPENDENCIA O SUCURSAL:	
FECHA GENERACIÓN REPORTE:	2025-07-04
FECHA LÍMITE DE PAGO:	2025-07-01
FECHA DE PAGO:	2025-07-01
ENTIDAD DE PAGO:	BANCOLOMBIA
PERÍODO PENSIÓN:	2025-05
PERÍODO SALUD:	2025-05
NÚMERO PLANILLA:	33473343
TOTAL COTIZANTES:	1
REFERENCIA DE PAGO (PIN):	33473343
TIPO DE PLANILLA:	I

CÓDIGO ENTIDAD	NIT	NOMBRE	NÚMERO AFILIADOS	IBC	FONDO SOLIDARIDAD	FONDO SUBSISTENCIA	TOTAL INTERESES	VALOR PAGAR SIN INTERESES	VALOR PAGAR
EPS037	900156264	NUEVA E.P.S. S.A.	1	\$ 2.009.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.200	\$ 251.200	\$ 252.400
230301	800224808	PORVENIR	1	\$ 2.009.000	\$ 0	\$ 0	\$ 1.500	\$ 321.500	\$ 323.000
14-23	860011153	POSITIVA	1	\$ 2.009.000	\$ 0	\$ 0	\$ 300	\$ 49.000	\$ 49.300
Total a pagar					\$ 0	\$ 0	\$ 3.000	\$ 621.700	\$ 624.700

PAGADO

FECHA DE PAGO DEL SIGUIENTE MES:	21/07/2025
----------------------------------	------------

Anexo 1.5.2. Planilla de Seguridad Social Empleados de Obra



DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901597963	8	ARAMCO INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ARAMCO INGENIEROS SAS	CARRERA 11E NO. 5-25	LA PLATA-HUILA	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION							
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco
2025-06	2025-07	1609281999	9488536481	E	2025/07/14	2025/07/07	BANCOLOMBIA
						Dias Mora	Valor
							\$5,821,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																						
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																			
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																													
SUCURSAL: PAEZ CAUCA (5 Afiliados)																																			\$6,026,150	\$964,400			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150		\$419,600		\$0	\$0		\$1,866,600
Centro de Trabajo: ARANZANZU (5 Afiliados)																																			\$6,026,150	\$964,400			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150		\$419,600		\$0	\$0		\$1,866,600
Ciudad: PAEZ Depto: CAUCA (5 Afiliados)																																			\$6,026,150	\$964,400			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150		\$419,600		\$0	\$0		\$1,866,600
1	CC	12272753	GUTIERREZ LOPEZ GILDARDO																	25-14	30	\$1,423,500	\$227,800	EPSIC3	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF14	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900																													
2	CC	1081411218	GUTIERREZ RAMOS HEYNER EFREN	X																230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPSIC3	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF14	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	6.960%	\$92,500	28	\$0	\$0	Si	\$411,500																													
3	CC	12283706	LOPEZ YASNO CRISTIAN HERNAN	X																230301	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS037	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF14	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	6.960%	\$92,500	28	\$0	\$0	Si	\$411,500																													
4	CC	12280951	YASNO LOPEZ RICHARD	X																230301	21	\$996,450	\$159,500	EPS002	21	\$996,450	\$39,900	CCF14	21	\$996,450	\$39,900	14-11	21	\$996,450	6.960%	\$69,400	21	\$0	\$0	Si	\$308,700																													
5	CC	12277456	YASNO PILL YOHEMIR	X																230301	20	\$949,000	\$151,900	EPSIC3	20	\$949,000	\$38,000	CCF14	20	\$949,000	\$38,000	14-11	20	\$949,000	6.960%	\$66,100	20	\$0	\$0	Si	\$294,000																													
Total Afiliados(5)																							\$6,026,150	\$964,400			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150	\$241,300			\$6,026,150		\$419,600		\$0	\$0		\$1,866,600																								

RESUMEN DE PAGO					
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO
AFP (ADMINISTRADORAS: 2)					5
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$227,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	4	\$736,600
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					5
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	5	\$419,600
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					5
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	5	\$241,300
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)					5
A.I.C.	EPSIC3	817,001,773	3	3	\$148,200
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$53,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$39,900
TOTAL					5
					\$1,866,600

Anexo 1.5.3. Planilla de Seguridad Social Subcontratista



DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901839529	4	L.O. CONSTRUCCIONES S.A.S	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	LO CONSTRUCCIONES SAS	CALLE 3 B SUR 4B 53	LA PLATA-HUILA	3185243456	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION								
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago	
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-06	2025-07	1609268571	9488535722	E	2025/07/08	2025/07/07	BANCOLOMBIA	\$3,174,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	ide	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	lge	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
SUCURSAL: ARANZAZU (1 Afiliados)																							\$1,328,600	\$212,600			\$1,328,600	\$53,200			\$1,328,600	\$53,200			\$1,328,600	\$92,500			\$0	\$0		\$411,500
Centro de Trabajo: ACUEDUCTO ARANZAZU (1 Afiliados)																							\$1,328,600	\$212,600			\$1,328,600	\$53,200			\$1,328,600	\$53,200			\$1,328,600	\$92,500			\$0	\$0		\$411,500
Ciudad: PAEZ Depto: CAUCA (1 Afiliados)																							\$1,328,600	\$212,600			\$1,328,600	\$53,200			\$1,328,600	\$53,200			\$1,328,600	\$92,500			\$0	\$0		\$411,500
1	CC	12274525	LISCANO CARDOZO MARCO JAVIER	X																231001	28	\$1,328,600	\$212,600	EPS041	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF14	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	6.960%	\$92,500	28	\$0	\$0	SI	\$411,500	
Total Afiliados(1)																							\$1,328,600	\$212,600			\$1,328,600	\$53,200			\$1,328,600	\$53,200			\$1,328,600	\$92,500			\$0	\$0		\$411,500

RESUMEN DE PAGO						
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$212,600	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$212,600	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$92,500	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$92,500	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$53,200	
COMFACAUCA	CCF14	891,500,182	0	1	\$53,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$53,200	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$53,200	
TOTAL				1	\$411,500	

Anexo 1.6.1.

Concepto Médico

Ocupacional





Nit. 900604369-1
Cel. 312 724 8808 - 310 273 1165
Carrera 9 N°2A- 33 - La Plata
serviciosintegralesdesaludips@gmail.com



CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

N° 41.833

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL			
09 DÍA	06 MES	2025 AÑO	LA PLATA (HUILA, COLOMBIA)	CONSULTA MEDICA OCUPACIONAL INGRESO (MEDICO)			
DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE							
ARAMCO INGENIEROS S.A.S.							
Empresa en misión							
DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC, Cedula de Ciudadanía, CE, Cedula de Extranjería, TI, Tarjeta de Identidad, PT, Pasaporte)							
YASNO LOPEZ RICHARD				Genero	Edad	Documento de Identificación	
Apellidos y Nombres				MASCULINO	43 AÑOS 6 MESES 2 DÍAS	CC	12280951
Cargos				Tipo			
AYUDANTE DE OBRA				Número			
CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL							
EL EXAMEN MÉDICO NO PRESENTA DEFECTOS NI PATOLOGÍAS							
Observaciones: NO APLICA							
N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)							
RESTRICCIONES LABORALES				TIPO		RECOMENDACIONES	
SIN RESTRICCIONES LABORALES				NO APLICA		NO APLICA	
El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:							
CONSULTA DE MEDICINA OCUPACIONAL				ESPIROMETRIA O CURVA DE FLUJO VOLUMEN SIMPLE			
AUDIOMETRIA SOD				EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR			
MEDICION DE AGUDEZA VISUAL (VISIOMETRIA)							
RECOMENDACIONES MÉDICAS			RECOMENDACIONES OCUPACIONALES			HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES	
USAR CORRECCIÓN VISUAL			USO DE EPP			HABITOS SALUDABLES	
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO : USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUAL			SVE VISUAL			ACTIVIDAD FÍSICA AERÓBICA	
			PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL			DIETA BALANCEADA	
			SVE OSTEOMUSCULAR				
			CAPACITACIÓN : ERGONOMIA				
OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
<p>Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.</p>							
Médico				Aspirante o Trabajador			
 Firma: _____ Nombre: HERNANDEZ VERGEL GLORIA JIMENA R. M.: 1384/2006 L.S.O.: 1376/2021				 Código de Seguridad Q631W1C41833			
				 Firma: _____ Nombre: YASNO LOPEZ RICHARD CC: 12280951			





Nit. 900604369-1
Cel. 312 724 8808 - 310 273 1165
Carrera 9 N°2A- 33 - La Plata
serviciosintegralesdesaludips@gmail.com



N° 41.858

CONCEPTO MÉDICO OCUPACIONAL

FECHA Y CIUDAD DE REALIZACIÓN DEL EXÁMEN				TIPO DE EXÁMEN MÉDICO OCUPACIONAL			
10 DÍA	06 MES	2025 AÑO	LA PLATA (HUILA, COLOMBIA)	CONSULTA MEDICA OCUPACIONAL INGRESO (MEDICO)			
DATOS DE LA EMPRESA DONDE LABORA, LABORARÁ O LABORO EL TRABAJADOR O ASPIRANTE							
ARAMCO INGENIEROS S.A.S.							
Empresa en misión							
DATOS DEL TRABAJADOR / ASPIRANTE (Tipo de Documento de Identificación CC, Cedula de Ciudadanía, CE, Cedula de Extranjería, TI, Tarjeta de Identidad, PT, Pasaporte)							
YASNO PILL YOHEMIR				Genero	Edad	Documento de Identificación	
Apellidos y Nombres				MASCULINO	51 AÑOS 10 MESES 13 DÍAS	CC Tipo	12277456 Número
Cargo AYUDANTE DE OBRA							
CONCEPTO DE APTITUD OCUPACIONAL EL EXAMEN MÉDICO PRESENTA CONDICIONES DE SALUD QUE NO DISMINUYEN SU CAPACIDAD LABORAL							
Observaciones: NO APLICA							
N/A NO SE EVALUARÓN REQUISITOS DE SALUD (Alturas, Espacios Confinados, Manipular Alimentos)							
RESTRICCIONES LABORALES				TIPO		RECOMENDACIONES	
SIN RESTRICCIONES LABORALES				NO APLICA		NO APLICA	
El concepto de Aptitud se definió a partir de los siguientes exámenes practicados:							
CONSULTA DE MEDICINA OCUPACIONAL				ESPIROMETRIA O CURVA DE FLUJO VOLUMEN SIMPLE			
AUDIOMETRIA SOD				EXAMEN MEDICO OCUPACIONAL CON ENFASIS OSTEOMUSCULAR			
MEDICION DE AGUDEZA VISUAL (VISIOMETRIA)							
RECOMENDACIONES MÉDICAS			RECOMENDACIONES OCUPACIONALES			HABITOS Y ESTILO DE VIDA SALUDABLES	
USAR CORRECCIÓN VISUAL : USAR CORRECCIÓN ÓPTICA PARA VISIÓN PROXIMA USO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN VISUAL			USO DE EPP			HABITOS SALUDABLES	
EXAMEN VISUAL DE CONTROL EN UN AÑO			SVE VISUAL			CONTROL DE PESO	
VALORACIÓN POR EPS : TAMIZAJE DE TENSION			PÁUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL			HACER DEPORTE	
			SVE OSTEOMUSCULAR			DIETA BALANCEADA	
			CAPACITACIÓN : ERGONOMIA				
OTRAS OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES							
<p>Consentimiento informado del Aspirante o Trabajador: autorizo al doctor(a) abajo mencionado a realizar mi examen médico ocupacional registrado en este documento. El doctor(a) abajo mencionado me ha explicado la naturaleza y propósito del examen. He comprendido y he tenido la oportunidad de analizar el propósito, los beneficios, la interpretación, las limitaciones, y riesgos del examen médico a partir de la asesoría brindada. Entiendo que la realización de este examen es voluntaria y que tuve la oportunidad de retirar mi consentimiento en cualquier momento. Fui informado de las medidas para proteger la confidencialidad de mis resultados. Las respuestas dadas por mí en este examen son completas y verídicas. Autorizo al doctor(a) para que suministre a las personas o entidades contempladas en la legislación vigente, la información registrada en este documento, para el buen cumplimiento del sistema de seguridad y salud en el trabajo y para las situaciones contempladas en la misma legislación, igualmente para que remitan la Historia Clínica a la EPS a la cual me encuentro actualmente afiliado. Finalmente manifiesto que he leído y comprendido perfectamente lo anterior y que todos los espacios en blanco han sido completados antes de mi firma y que me encuentro en capacidad de expresar mi consentimiento.</p>							
Médico				Aspirante o Trabajador			
 Firma: _____ Nombre: HERNANDEZ VERGEL GLORIA JIMENA R. M.: 1384/2006 L.S.O.: 1376/2021				 Código de Seguridad J631P1V41858 Firma: _____ Nombre: YASNO PILL YOHEMIR CC: 12277456			

Impreso el 10/06/2025 a las 12:04 p.m.

Página 1 de 1

Software para el sector salud - www.biofile.com.co



Anexo 1.7.1. Afiliación a ARL de Junio de 2025



Medellín, 31 de May de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ARAMCO INGENIEROS S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000004 ARANZAZU				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C1081411218	GUTIERREZ RAMOS HEYNER EFREN	03/06/2025		31286262	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 31/05/2025 18:54:21.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.174.228.41, 192.230.104.9, 172.16.42.57

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



Medellín, 31 de May de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ARAMCO INGENIEROS S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000004 ARANZAZU				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C12283706	LOPEZ YASNO CRISTIAN HERNAN	03/06/2025		173189a2	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 31/05/2025 18:56:03.
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.174.228.41, 192.230.104.9, 172.16.42.57

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA
VIGILADO



Medellín, 09 de June de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ARAMCO INGENIEROS S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000004 ARANZAZU				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C12280951	YASNO LOPEZ RICHARD	10/06/2025		13301951	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación. Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 09/06/2025 17:45:55.

Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.

Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.174.228.41, 192.230.104.9, 172.16.42.57

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



Medellín, 10 de June de 2025

LA DIRECCIÓN DE AFILIACIONES Y RECAUDOS

HACE CONSTAR:

Que la(s) persona(s) relacionada(s) en el siguiente listado, se encuentra(n) afiliada(s) en Riesgos Laborales desde las fechas indicadas, a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A como trabajadores de ARAMCO INGENIEROS S.A.S..

A continuación se relacionan las fechas de afiliación

Número identificación	Nombre	Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura	Código de transacción	Tipo Cotizante	Estado
Centro de trabajo: 0000000004 ARANZAZU				Clase: 5	Porcentaje Cotización:	6.96 %
C12277456	YASNO PILL YOHEMIR	11/06/2025		t8I23127	DEPENDIENTE	POR INICIAR

null

Atentamente,



Dirección de Afiliaciones y Recaudos

Este certificado tiene validez para efectos de afiliación del trabajador a SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A así como para su desafiliación
Importante: La información contenida en este certificado puede ser validada en cualquier momento por SEGUROS DE VIDA SURAMERICANA S.A

Este certificado fue generado con la información registrada en la base de datos el 10/06/2025 12:32:44 .
Los trabajadores marcados con asterisco (*) son afiliados Independientes.
Las coberturas marcadas con dos asteriscos (**) son coberturas pendientes de retiro.

Dirección IP: 181.174.228.41, 192.230.104.9, 172.16.42.57

SUPERINTENDENCIA FINANCIERA
DE COLOMBIA

VIGILADO



Anexo 1.7.2. Afiliación a EPS de Junio de 2025





FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA

Formulario No. 30065440355418

Fecha de radicación 05/06/2025

EPSIC3

I. DATOS TRÁMITE

Tipo de Trámite		Tipo de afiliación:		Regimen	Contribución Solidaria
A. Afiliación ☐	B. Reporte de Novedades ☒	A. Individual	-Cotizante o Cabeza de familia ☒ -Beneficiario o afiliado adicional ☐	A. Contributivo ☒ B. Subsidiado ☐	SI ☐ NO ☒
		B. Colectiva ☐	C. Institucional ☐ D. De oficio ☐		
Tipo de afiliado:		Tipo de Cotizante		Código	
A. Cotizante ☒	B. Cabeza de familia ☐ C. Beneficiario ☐	A. Dependiente ☒ B. Independiente ☐ C. Pensionado ☐		registrar por la EPS 1	

A. AFILIACIÓN

II. DATOS BASICOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
GUTIERREZ	RAMOS	HEYNER	EFREN
Tipo de documento de identidad	Número de documento de identidad	Sexo Biológico	Sexo Identificación
CC	1081411218	Femenino ☐ Masculino ☒	F ☐ M ☒ T ☐ NB ☐ Otro ☐ Cuál:
Nacionalidad	País de nacimiento	Departamento de nacimiento	Municipio de nacimiento
COL	COLOMBIA	CAUCA	PAEZ
			Fecha de nacimiento
			21/12/1992

III. DATOS COMPLEMENTARIOS DE IDENTIFICACIÓN (del cotizante o cabeza de familia)

Datos personales

Etnia	Comunidad	Discapacidad	Categoría de discapacidad
01 - Indígena		SI ☐ NO ☒	Ninguna
Tiene encuesta SISBEN	Nivel SISBEN	Grupo SISBEN	Grupo de población especial
SI ☐ NO ☒	No aplica		17 - Comunidad indígena
Administradora de Riesgos Laborales	Administradora de Pensiones	Ingreso base de cotización IBC	Tarifa contribución solidaria
14-28: ARL Sura	230301: Fondo de Pensiones y Cesantías Porvenir	\$ 1.423.500	
Dirección Residencia	Teléfono fijo	Celular	Correo electrónico cotizante
ARANSAZU		3118192085	heynerfregutierrezramos@gmail.com
Departamento	Municipio/Distrito	Localidad/Comuna	Zona
CAUCA	PAEZ	R011 - RICAURTE	Cab Municipal ☐ Centro poblado ☐ Rural disperso ☒ Resto rural ☐

IV. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DE LOS MIEMBROS DEL NÚCLEO FAMILIAR

NO HAY BENEFICIARIOS EN EL GRUPO FAMILIAR

Selección de la IPS Primaria

No	Nombre de la IPS primaria	Código de la IPS
0	ASOCIACION DE AUTORIDADES ANCESTRALES TERRITORIALES NASHA CXHA CXHA PAEZ - CALLE 6 No. 6-44	1951700071 Sede: 01

V. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL EMPLEADOR Y OTROS APORTANTES O DE LAS ENTIDADES RESPONSABLES DE LA AFILIACIÓN COLECTIVA, INSTITUCIONAL O DE OFICIO

Nombre o Razón social		Identificación	Tipo de aportante o pagador de pensiones	
ARAMCO INGENIEROS S.A.S		NI901597963		
Dirección	Teléfono	Correo electrónico	Municipio/Distrito	Departamento
KR 11 E 5 25	6088888888	talentohumano@aramcoingenieros.com	LA PLATA	HUILA

B. REPORTE DE NOVEDADES

Tipo Novedad





FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de ASOCIACIÓN

INDIGENA DEL CAUCA

Formulario No. 30065440355418

Fecha de radicación 05/06/2025

EPSIC3

☐ 1. Modificación de datos básicos de identificación.	☐ 12. Vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
☐ 2. Corrección de datos básicos de identificación.	☐ 13. Desvinculación de una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas.
☐ 3. Actualización del documento de identificación	☒ 14. Movilidad: ☒ A. Régimen Contributivo
☐ 4. Actualización y corrección de datos complementarios.	☐ B. Régimen Subsidiado
☐ 5. Terminación de la inscripción en la EPS. Código: <input type="text"/>	☐ 15. Traslado: ☐ A. Mismo Régimen
☐ 6. Reporte de pago a través de un tercero	☐ B. Diferente Régimen
☐ 7. Inclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.	☐ 16. Reporte de fallecimiento del cotizante o Cabeza de familia.
☐ 8. Exclusión de beneficiarios o de afiliados adicionales.	☐ 17. Reporte de trámite de protección al cesante.
☒ 9. Inicio de relación laboral o adquisición de condiciones para cotizar.	☐ 18. Reporte de la calidad de Pre-pensionado.
☐ 10. Terminación de la relación laboral o pérdida de las condiciones para seguir cotizando.	☐ 19. Reporte de la calidad de Pensionado.
☐ 11. Inscripción EPS retorno al país.	☐ 20. Ingreso a Contribución Solidaria.
	☐ 21. Retiro de Contribución Solidaria.

VI. DATOS PARA EL REPORTE DE LA NOVEDAD

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre	Identificación	Sexo biológico	Sexo identificación
Fecha de nacimiento	Fecha	EPS anterior	Motivo del traslado	Caja de compensación familiar o pagador de pensiones		
	03/06/2025					

VII. DECLARACIONES Y AUTORIZACIONES

☒ Declaración de dependencia económica de los beneficiarios o afiliados adicionales.
☒ Declaración de la no obligación de afiliarse al Régimen Contributivo, Especial o de Excepción
☒ Declaración de existencia de razones de fuerza mayor o caso fortuito que impiden la entrega de los documentos que acreditan la condición de beneficiarios
☒ Declaración de no internación del cotizante, cabeza de familia, beneficiarios o afiliados adicionales en una Institución Prestadora de Servicios de Salud
☒ Autorización para que la EPS solicite y obtenga datos y copia de la historia clínica del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales
☒ Autorización para que la EPS reporte la información que se genere de la afiliación o del reporte novedades en la base de datos de afiliados vigentes y a las entidades públicas que por sus funciones la requieran
☒ Autorización para que la EPS maneje los datos personales del cotizante o cabeza de familia y de sus beneficiarios o afiliados adicionales. de acuerdo con lo previsto en la Ley 1581 de 2012 y el Decreto 1377 de 2013
☒ Autorización para que la EPS envíe información al correo electrónico o el celular como mensajes de texto

VIII. CONTRIBUCIÓN SOLIDARIA

En caso de ausencia o fallecimiento del cabeza de familia reporte la persona de su grupo familiar que se hará cargo del pago de la contribución solidaria

Primer apellido	Segundo apellido	Primer nombre	Segundo nombre
Tipo de documento de identidad		Número de documento de identidad	

IX. FIRMAS


El cotizante, cabeza de familia o beneficiario




El empleador, representante o entidad responsable de la afiliación colectiva, institucional o de oficio





FORMULARIO ÚNICO DE AFILIACIÓN Y REGISTRO DE NOVEDADES AL SGSSS

Esta afiliación se encuentra radicada en el sistema de Información de ASOCIACIÓN

INDIGENA DEL CAUCA

Formulario No. 30065440355418

Fecha de radicación 05/06/2025

EPSIC3

X. ANEXOS

☒	56. Anexo copia de documento de identidad	CN	RC	TI	CC	PA	CE	CD	SC	
	Cantidad:				1					Total
										1
☐	Certificación de vinculación a una entidad autorizada para realizar afiliaciones colectivas									
☐	Copia de la autorización de traslado por parte de la Superintendencia Nacional de Salud									
☐	Copia de la escritura pública o sentencia judicial que declare el divorcio, sentencia judicial que declare la separación de cuerpos y escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la terminación de unión marital									
☐	Copia de la orden judicial o decreto administrativo de custodia									
☐	Copia del acto administrativo o providencia de las autoridades competentes en la que conste la calidad de beneficiario o se ordene la afiliación de oficio									
☐	Copia del certificado de adopción o acta de entrega del menor									
☐	Copia del dictamen de incapacidad permanente emitido por la autoridad competente									
☐	Copia del registro civil de matrimonio, o de la Escritura pública, acta de conciliación o sentencia judicial que declare la unión marital									
☐	Documento en el que conste la pérdida de la patria potestad, o el certificado de defunción de los padres o la declaración suscrita por el cotizante sobre la ausencia de los dos padres									

XI. DATOS A SER DILIGENCIADOS POR LA ENTIDAD TERRITORIAL

Municipio Entidad Territorial	Departamento Entidad Territorial	No ficha SISBÉN	Puntaje SISBÉN	Nivel SISBÉN	Fecha radicación	Fecha validación
Primer apellido Funcionario	Segundo apellido Funcionario	Primer nombre Funcionario	Segundo nombre Funcionario	Firma del Funcionario		
Tipo de documento de identificación		Número de identificación				

Observaciones
Observaciones:
Empresa: Asesor: SOL BIBIANA ULE PASTUSO, Sucursal: Teléfono: 3176584768, Correo Electrónico: registrocauca9@aicosalud.org.co
Puede verificar la autenticidad de este formulario en la página web de ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA e ingresando el código: 238E8DB9-5509-402E-8
Url: https://salud.aicosalud.org.co/Publico/BoxaludPublico/pages/CQR.aspx





NUEVA EPS S.A

NIT: 900156264-2

CERTIFICA QUE:

El 03/06/2025, el empleador ARAMCO INGENIEROS S.A.S identificado con NIT número 901597963 registró la siguiente solicitud de reingreso en nuestro portal transaccional.

NÚMERO DE RADICACIÓN	FECHA DE RADICACIÓN	TIPO DE SOLICITUD
8853974	03/06/2025	Reingresos

DETALLE

TIPO	IDENTIFICACIÓN	NOMBRE COTIZANTE	IBC	CARGO	FECHA
CÉDULA DE CIUDADANÍA	12283706	CRISTIANHERNAN LOPEZ YASNO	1423500	AYUDANTE DE OBRA	2025-06-03

La siguiente certificación se expide a solicitud del interesado a los 3 días del mes de Junio del año 2025.

Cordialmente,

GERENCIA NACIONAL DE AFILIACIONES

Nueva





SALUD TOTAL EPS S.A.
NIT. 800.130.907-4

CERTIFICA QUE:

El 10/06/2025, el empleador ARAMCO INGENIEROS S A S identificado con NIT 901597963 registró la siguiente solicitud de novedad en nuestro portal transaccional:

Fecha de radicación	Tipo de solicitud
10/06/2025	Novedad de inicio relación laboral

DETALLE

No. Formulario	Tipo Documento	Documento	Nombre Cotizante	IBC	Tipo Cotizante	Fecha Inicio Relación Laboral
4014885677	CEDULA DE CIUDADANIA	12280951	RICHARD YASNO LOPEZ	\$ 1,423,500.00	Dependiente	10/06/2025

La Presente certificación se expide a solicitud del interesado a los 11 días del mes junio del año 2025

Cordialmente,

GERENCIA DE OPERACIONES COMERCIAL





ASOCIACION INDIGENA DEL CAUCA
Resolución 083 del 15 de Diciembre de 1997
Dirección General de Asuntos Indígenas – Ministerio del Interior
EPSI 03 Resolución 1074 de Junio 22 de 2006
Ministerio de la Protección social y Superintendencia Nacional de Salud
NIT. 817.001.773-3



ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA

NIT: 817.001.773-3

HACE CONSTAR

Que el(la) señor(a) YOHEMIR YASNO PILL identificado(a) con CC 12277456, se encuentra Afiliado en el Plan de Beneficios en Salud PBS, de ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA por ARAMCO INGENIEROS S.A.S NI 901597963 en calidad de Dependiente según información contenida a la fecha en nuestra base de datos.

Fecha inicio relación laboral	Fecha fin relación laboral
11/jun./2025	
Fecha inicio cobertura	Fecha fin cobertura
11/jul./2025	

Informacion beneficiarios:

No hay beneficiarios en el grupo familiar.

El presente certificado se expide a solicitud de el(la) interesado(a) a los 19 días del mes de jun. de 2025.

Observaciones

Con destino a: Solicitud del Interesado

Información sujeta a verificación por parte de ASOCIACIÓN INDIGENA DEL CAUCA, cualquier aclaración con gusto será atendida en la línea 018000932811 - Documento no válido como autorización de traslado - No es válido para aclarar situación de duplicidad en el SGSSS. Semanas de cotización según LEY 1122/07.

Cordialmente,

Líder de afiliación y Operaciones
BDUA
AIC EPSI



Calle 1 N° 4-66 B/ Vásquez Cobo Teléfono (092) 8380200 Popayán – Cauca
www.aicsalud.org.co



Anexo 1.7.3. Afiliación a AFP de Junio de 2025





**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

HEYNER EFREN GUTIERREZ RAMOS, identificado(a) con cédula de ciudadanía 1.081.411.218, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 4 de Junio del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. - Nit. 800.144.331-3

Grupo
Filia de



Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del

FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

CRISTIAN HERNAN LOPEZ YASNO, identificado(a) con cédula de ciudadanía **12.283.706**, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 4 de Junio del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. - Nit. 800.144.331-3

Grupo
Filiat de



Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia



**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

RICHARD YASNO LOPEZ, identificado(a) con cédula de ciudadanía **12.280.951**, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 10 de Junio del 2025.

Cordialmente,

Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es importante que sea constante en realizar los aportes obligatorios para su pensión, así lograría recibir el ingreso que desea cuando obtenga su beneficio pensional.

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. - Nit. 800.144.331-3

Grupo
Filiat de



Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

**SOCIEDAD ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y CESANTÍAS
PORVENIR S.A.**

En su condición de administradora del
FONDO DE PENSIONES OBLIGATORIAS PORVENIR

NIT 800.224.808-8

CERTIFICA QUE:

YOHEMIR YASNO PILL, identificado(a) con cédula de ciudadanía **12.277.456**, se encuentra afiliado(a) al Fondo de Pensiones Obligatorias Porvenir.

La presente certificación se expide el 11 de Junio del 2025.

Cordialmente,



Gerencia de Clientes



Tenga en cuenta:

Es fundamental que revise periódicamente su Historia Laboral, el capital ahorrado y las semanas que tiene registradas, si presenta inconsistencias, ingrese a www.porvenir.com.co y actualice su Historia Laboral.

Sociedad Administradora de Fondos de Pensiones y Cesantías S.A. - Nit. 800.144.331-3

Filial de **Grupo AVAL**



Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

Anexo 1.7.4. Afiliación a CCF de Junio de 2025





FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR

NIT. 891.500.182-0

No. 651523

Diligencie este formulario en letra impresa y tinta color negro

PARTE A INFORMACIÓN DE LA EMPRESA
 NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (Como figura en el RUT) **ARAMCO INGENIEROS S.A.S.** NIT ☒ C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐
 No. **901597963-8**

PARTE B INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR (A)
 PRIMER APELLIDO **GUTIERREZ** SEGUNDO APELLIDO **RAMOS** PRIMER NOMBRE **HEYNER** SEGUNDO NOMBRE **EFREN** FECHA DE NACIMIENTO **1992** **12** **21** GÉNERO ☐ F ☒ M
 C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD. ☐ PER. ☐ PPT. ☐ VISA ☐ OTRO ☐ ESTADO CIVIL ☒ SOLTERO ☐ CASADO ☐ UNIÓN LIBRE ☐ VIUDO ☐ SEPARADO ☐ DIVORCIADO ☐ I ☐
 DIRECCIÓN DE RESIDENCIA / BARRIO / VEREDA **Vereda ARANZAZU** SECTOR ☐ URBANO ☒ RURAL **PAEZ** TELÉFONO CELULAR **3118192085** TELÉFONO FIJO **PAEZ**
 MUNICIPIO **PAEZ** DEPARTAMENTO **CAUCA** PAÍS **COLOMBIA** E-MAIL **heynerfregutierrezramos@gmail.com**

FACTOR DE VULNERABILIDAD
☒ No disponible
☐ Cabeza de familia
☐ Desplazado
☐ Población migrante
☐ Ejercicio del trabajo sexual
☐ En condición de discapacidad
☐ Desmovilizado o reinsertado
☐ Hijos (as) de desmovilizados o reinsertados
☐ Dermificado desastre natural
☐ Hijo (as) de madres cabeza de familia
☐ Población zonas frontera (nacionales)
☐ Víctima del conflicto armado (no desplazado)

ORIENTACIÓN SEXUAL
☐ Heterosexual
☐ Homosexual
☐ Bisexual
☒ Información no disponible

NIVEL EDUCATIVO
☐ Preescolar
☐ Básica
☐ Secundaria
☐ Media
☐ Técnico / tecnológico
☐ Profesional universitario
☐ Posgrado / maestría
☒ Ninguno

PERTENENCIA ÉTNICA
☐ Afrocolombiano
☐ Comunidad negra
☐ Indígena
☐ Raíz del archipiélago de San Andrés
☐ Providencia y Santa Catalina
☐ Palenquero
☐ Romñoliano
☒ No disponible

MUNICIPIO DONDE LABORA **PAEZ** SECTOR ☐ URBANO ☒ RURAL **PAEZ** FECHA DE INGRESO A SU EMPRESA **2025** **06** **03** OCUPACIÓN / PROFESIÓN **AYUDANTE DE OBRA** HORAS LABORALES AL MES **230** SALARIO MENSUAL **1423500**
 VALOR **1423500** Suma todos los conceptos salariales

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA PARA PAGO DEL SUBSIDIO FAMILIAR
 ¿DESEA QUE EL PAGO SEA CONSIGNADO A SU CUENTA? ☐ SI ☒ NO El pago del subsidio a través de cuenta bancaria, garantiza que el mismo no prescriba (venza), acorde a lo establecido en el artículo 8 de la Ley 211982.
 NOMBRE DEL BANCO ☐ Cta. Ahorros ☐ Cta. Corriente No. Cuenta

PARTE C INFORMACIÓN DEL (A) CONYUGE Y/O COMPAÑERO (A) ACTUAL
 PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO GÉNERO
 C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD. ☐ PER. ☐ PPT. ☐ VISA ☐ OTRO ☐ CONVIVEN ☐ SI ☐ NO NOMBRE DE EMPLEADOR CON QUIEN LABORA IDENTIFICACIÓN EMPLEADOR

PARTE D DATOS DEL PADRE O MADRE BIOLÓGICO (A) DE LOS HIJOS A INSCRIBIR QUE NO CONVIVE CON EL TRABAJADOR (A)
 PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO GÉNERO
 C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD. ☐ PER. ☐ PPT. ☐ VISA ☐ OTRO ☐ NOMBRE DE EMPLEADOR CON QUIEN LABORA IDENTIFICACIÓN EMPLEADOR

PARTE E INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS A CARGO DEL TRABAJADOR (A)
 PRIMER APELLIDO SEGUNDO APELLIDO PRIMER NOMBRE SEGUNDO NOMBRE FECHA DE NACIMIENTO GÉNERO C.T. T. PARENTESCO IDENTIFICACIÓN C.C. T.C. R. REGISTRO CIVIL (NUP) USO BURO C.C.F.C.
 AÑO MES DÍA F M I C O R Tipo Número N/A

DECLARACIÓN:
 DISC. DISCAPACITADO HIJO- HIJOPRE. PADRE HIJNO- HERMANO HIJTR- HIJASTRO
 Declaramos que la información suministrada en el presente formulario es verdadera, cuenta con los soportes probatorios correspondientes y podrá ser verificada en cualquier momento por parte de la Caja de Compensación Familiar del Cauca COMFACAUCÁ, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 37 de la ley 21 de 1982. En el evento que la información suministrada cambie, me comprometo a reportar modificación de los datos a más tardar el día 10 de mes siguiente de ocurrida la novedad. El suministro de datos falsos por parte del empleador, a la Caja o la violación de la norma sobre salarios mínimos, es causal de desafiliación según artículo 45 de la Ley 21 de 1982.
 Conforme a lo establecido en la Ley 1581 del 2012 y demás decretos reglamentarios, autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cauca, COMFACAUCÁ, para el tratamiento y manejo de mis datos personales consignados en el presente formulario, el cual consiste en recolectar, almacenar, depositar, usar, analizar, circular y cruzar información propia, con el fin de facilitar la prestación de servicios, pago de cuotas monetarias, alinear las gestiones de cobro, reportar a centrales de riesgo cuando corresponda y en general todas las acciones que se deriven de los servicios que de conformidad con la Ley presta esta Caja de Compensación Familiar. Declaro que soy responsable de la veracidad de mis datos suministrados. Así mismo autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cauca, COMFACAUCÁ, a efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a la dirección de correspondencia y/o correo electrónico antes mencionados. Declaro que he sido informado de los derechos que me asisten como titular de la identificación, dirección y teléfono del responsable del tratamiento de mis datos de conformidad con la Ley 1581 del 2012 y sus decretos reglamentarios. La Caja garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, veracidad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos.
 De igual manera, autorizo a COMFACAUCÁ, en caso que cobre cuotas monetarias a las cuales no tenga derecho, me sean descontadas de los próximos pagos de la cuota monetaria de subsidio familiar a que hubiere lugar.

ESPACIO PARA RADICACIÓN COMFACAUCÁ
comfacaucá
 al servicio del trabajador y su familia
 SECCIÓN SUBSIDIO FAMILIAR
 2025-06-03

FIRMA DEL TRABAJADOR (A) No. de identificación **FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA**

OBSERVACIONES

RECIBE **DIGITA** **REVISY Y DIGITALIZA**
 FECHA **2025-06-03** FECHA FECHA
 NOMBRE **COMFACAUCÁ EN LÍNEA** NOMBRE NOMBRE

MAYORES INFORMES: COMFACAUCÁ POPAYÁN: Calle 2 N° 6A-54 Barrio Modelo PBX: (0928) 231868 Ext: 120-122-190-221 FAX: 8203961 nomina@comfacaucá.com - promociones@comfacaucá.com
 Santander de Quilichao: Calle 5 # 9-79 PBX: (0926) 252185 - Puerto Tejada: Cra. 20 # 16-25 Barrio E Centro Tel: (0926) 282189 - 282430 - El Bordo: C/7 # 4-33 PBX: 8262111
 Quapi: Calle 8 Vía principal Cel: 3104881750 - Miranda: Calle 7 13 B-451-73 PBX: 8281487 - 8478330 - www.comfacaucá.com

VERSION 1 / Junio 28 de 2022 ORIGINAL






El empleo es de todos

Minitrabajo

DECLARACIÓN JURAMENTADA

FECHA DE SOLICITUD

AÑO MES DÍA

CIUDAD / MUNICIPIO

YO:

Identificado(a) con:

C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD ☐ PEP ☐ PPT ☐ VISA ☐ OTRO ☐ CUAL:

No.

Declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERDICA. Autorizo que por cualquier medio se verifique los datos aquí contenidos y en caso de falsedad, se apliquen las sanciones contempladas en la ley.

MOTIVO DE LA DECLARACIÓN

Marque con una X el motivo de la declaración

☐ 1. Convivencia y dependencia económica ☐ 2. Unión marital de hecho / Unión libre ☐ 3. Padres o hermanos huérfanos de padres ☐ 4. Otros

1. CONVIVENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA

A través del diligenciamiento del siguiente recuadro usted demostrará y aceptará que las personas relacionadas hacen parte de su grupo familiar (cónyuge, hijos, hijastros) conviven y dependen económicamente del trabajador(a)

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	PARENTESCO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
TIPO	Número			

2. UNIÓN MARITAL DE HECHO (UNIÓN LIBRE)

A través del diligenciamiento del siguiente espacio demostrará y aceptará que usted convive y tiene una comunidad de vida singular con su compañera(o) permanente

Declaro que el (la) señor(a) _____ identificado(a) con el tipo de documento _____ número _____ es mi compañera(o) permanente y convivimos desde hace _____ años y _____ meses. Además el (la) señor(a) actualmente se desempeña como:

☐ Dependiente ☐ Independiente ☐ Pensionado(a) ☐ Estudiante ☐ No labora

3. PADRES O HERMANOS HUÉRFANOS(S)

A través del diligenciamiento del siguiente recuadro declaro que mi padre / madre, hermano(a) huérfano(s) de padres relacionado(s) como parte del núcleo familiar, no recibe(n) subsidio familiar, salario, renta o pensión alguna, ni está(n) afiliado(s) a otra caja de compensación familiar.

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	PARENTESCO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
TIPO	Número			

Firma del padre _____ Firma de la madre _____

4. OTROS

Declaro que desconozco la ubicación del señor(a) _____ identificado con _____ padre / madre biológico(a) del menor _____ identifico con _____ por lo que no puedo aportar los datos relacionados con su certificación laboral

NOTA: La fecha de lanzamiento de la presente declaración juramentada no puede tener una vigencia superior a treinta(30) días y deberá ser firmada por el (la) declarante. La información contiene la manifestación expresa del trabajador y su grupo familiar, y por tal razón se presume que corresponden a sus condiciones y realidad actual, no obstante, las cajas de compensación familiar podrán realizar las verificaciones internas y externas en cualquier momento durante su vinculación, con el fin de corroborar la veracidad de la información a través de los mecanismos que considero pertinentes. En todo caso de evidenciar inconsistencias en lo manifestado a través del presente documento, tendrán la facultad de retirar del grupo familiar a la (s) persona (s) a cargo y/o suspender el reconocimiento del subsidio familiar.

Firma del declarante y documento _____

Observaciones _____

REQUISITOS DOCUMENTALES DE AFILIACIÓN.

- ☐ Formulario de afiliación
- ☐ Documento de identificación del trabajador.
- ☐ Documento de identificación del Conyuge/Compañero(a) permanente del trabajador.
- ☐ Documento de identificación de los padres del trabajador.
- ☐ Registro civil de nacimiento del trabajador.
- ☐ Registro civil de nacimiento de los hijos, hijastros, hermanos.
- ☐ Documento de identificación actualizado de los hijos, hijastros, hermanos.
- ☐ Certificado de estudio o al boletín de calificaciones para hijos mayores de 12 años, hasta los 18 años y 11 meses. (No obligatorio Independiente y Pensionado)
- ☐ Certificado de discapacidad o pérdida de capacidad laboral expedido por la EPS o entidad competente para personas a cargo en condición de invalidez si aplica el caso.
- ☐ Para desafiar a un conyuge se debe presentar el documento en el que conste la cesación de efectos civiles del matrimonio, liquidación de la sociedad conyugal o unión marital de hecho.
- ☐ Constancia laboral del Conyuge/Compañero permanente. Si el Conyuge/Compañero(a) permanente no labora: Diligenciar declaración juramentada establecida por Confacauca y Ministerio de trabajo/ si el conyuge es pensionado, anexar copia de pago de la mesada.
- ☐ Custodia expedida por autoridad competente. (ICBF, Comisarias, Juzgados de familia, centros de conciliación, jueces de familia, civil, promiscuo municipal y de paz, personería y en caso de no haber ninguna de las anteriores, el inspector de policía)
- ☐ Certificado EPS, donde conste tipo de afiliación (Si el padre o la madre se encuentra afiliado al Régimen Subsidado en Salud puede ser beneficiario del trabajador y recibir cuota monetaria)
- ☐ Registro civil de defunción de los padres del trabajador.
- ☐ Copia de resolución de pensión (Colfondos) que reconozca la calidad de pensionado(a), o certificado de pensión con sábanas pensional (Fondos Privados)
- ☐ Copia del último desprendible de pago, para pensionados hasta 1.5 SMMLV y Mayores 1.5 SMMLV.

Carta de solicitud con nombre completo del solicitante, domicilio, identificación, lugar de residencia, valor mensual de ingresos y declaración de la fuente de los ingresos y manifestación sobre si estaba o no afiliado a alguna Caja de Compensación Familiar con anterioridad a la solicitud.

☐ 16 Certificado de paz y salvo, en el caso de afiliación anterior a otra caja

☐ 17 Si uno de los padres es fallecido, Registro Civil de Defunción.

☐ 18 Certificación veteranos

☐ 19 Certificación en la que indique que es madre comunitaria con el NIT, nombre, dirección, municipio y teléfono donde labora

☐ 20 Copia de la planilla PILA con el pago de la caja de compensación

☐ 21

REQUISITOS DOCUMENTALES DE AFILIACIÓN SEGÚN MODALIDAD

Trabajador	Adjuntar documentos de estos numerales										
Dependiente	1	2									
Independiente	1	2	16	17	21						
Pensionado	1	2	15	16	17						
Veterano	1	2	19								
Madres comunitarias	1	2	21	20							
Facultativos	1	2	21								

Personas a Cargo del Trabajador (Dependiente, Independiente y Pensionado 0.6 y 2% - NO APLICA para Pensionado por Fidelidad)

Conyuge/Compañero(a) permanente sin hijos.	3										
Conyuge/Compañero(a) permanente e hijos de la unión.	3	6	7	8	9	10	11				
Conyuge/Compañero(a) permanente e hijastros(s).	3	6	7	8	9	10	11	12			
Hijos de trabajador(a) separado(a).	3	6	7	8	9	10	11				
Hijos no reconocidos por uno de los padres (mencionar en cada registro civil figura únicamente uno de los padres)	6	7	8	9							
Padres.	4	5	9	10	13	18					
Hermanos huérfanos de padres	5	6	7	8	9	10	14				






El empleo es de todos

Mi trabajo

DECLARACIÓN JURAMENTADA

FECHA DE SOLICITUD

AÑO MES DÍA

CUIDAD / MUNICIPIO

YO:

Identificado(a) con:

C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD ☐ PEP ☐ PPT ☐ VISA ☐ OTRO ☐ CUAL:

No.

Declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERDICA. Autorizo que por cualquier medio se verifique los datos aquí contenidos y en caso de falsedad, se apliquen las sanciones contempladas en la ley.

MOTIVO DE LA DECLARACIÓN

Marque con una X el motivo de la declaración

☐ 1. Convivencia y dependencia económica ☐ 2. Unión marital de hecho / Unión libre ☐ 3. Padres o hermanos huérfanos de padres ☐ 4. Otros

1. CONVIVENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA

A través del diligenciamiento del siguiente recuadro usted demostrará y aceptará que las personas relacionadas hacen parte de su grupo familiar (cónyuge, hijos, hijastros) conviven y dependen económicamente del trabajador(a)

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	PARENTESCO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
TIPO	Número			

2. UNIÓN MARITAL DE HECHO (UNIÓN LIBRE)

A través del diligenciamiento del siguiente espacio demostrará y aceptará que convive y tiene una comunidad de vida singular con su compañera(o) permanente

Declaro que el (la) señor(a) _____ identificado(a) con el tipo de documento _____ número _____ es mi compañera(o) permanente y convivimos desde hace _____ años y _____ meses. Además el (la) señor(a) actualmente se desempeña como:

☐ Dependiente ☐ Independiente ☐ Pensionado(a) ☐ Estudiante ☐ No labora

3. PADRES O HERMANOS HUÉRFANOS(S)

A través del diligenciamiento del siguiente recuadro declaro que mi padre / madre, hermano(a) huérfano(s) de padres relacionado(s) como parte del núcleo familiar, no recibe(n) subsidio familiar, salario, renta o pensión alguna, ni está(n) afiliado(s) a otra caja de compensación familiar.

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	PARENTESCO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
TIPO	Número			

Firma del padre _____ Firma de la madre _____

4. OTROS

Declaro que desconozco la ubicación del señor(a) _____ identificado con _____ padre / madre biológico(a) del menor _____ identifico con _____ por lo que no puedo aportar los datos relacionados con su certificación laboral

NOTA: La fecha de lanzamiento de la presente declaración juramentada no puede tener una vigencia superior a treinta(30) días y deberá ser firmada por el (la) declarante. La información contiene la manifestación expresa del trabajador y su grupo familiar, y por tal razón se presume que corresponden a sus condiciones y realidad actual, no obstante, las cajas de compensación familiar podrán realizar las verificaciones internas y externas en cualquier momento durante su vinculación, con el fin de corroborar la veracidad de la información a través de los mecanismos que considere pertinentes. En todo caso de evidenciar incongruencias en lo manifestado a través del presente documento, tendrán la facultad de retirar del grupo familiar a la (s) persona (s) a cargo y/o suspender el reconocimiento del subsidio familiar.

Firma del declarante y documento _____

Observaciones _____

REQUISITOS DOCUMENTALES DE AFILIACIÓN.

1 ☐ Formulario de afiliación

2 ☐ Documento de identificación del trabajador.

3 ☐ Documento de identificación del Conyuge/Compañero(a) permanente del trabajador.

4 ☐ Documento de identificación de los padres del trabajador.

5 ☐ Registro civil de nacimiento del trabajador.

6 ☐ Registro civil de nacimiento de los hijos, hijastros, hermanos.

7 ☐ Documento de identificación actualizado de los hijos, hijastros, hermanos.

8 ☐ Certificado de estudio o al boletín de calificaciones para hijos mayores de 12 años, hasta los 18 años y 11 meses. (No obligatorio Independiente y Pensionado)

9 ☐ Certificado de discapacidad o pérdida de capacidad laboral expedido por la EPS o entidad competente para personas a cargo en condición de invalidez si aplica el caso.

10 ☐ Para desafiliar a un conyuge se debe presentar el documento en el que conste la cesación de efectos civiles del matrimonio, liquidación de la sociedad conyugal o unión marital de hecho.

11 ☐ Constancia laboral del Conyuge/Compañero permanente. Si el Conyuge/Compañero(a) permanente no labora: Diligenciar declaración juramentada establecida por Confacauca y Ministerio de trabajo/ si el conyuge es pensionado, anexar copia de pago de la mesada.

12 ☐ Custodia expedida por autoridad competente. (ICBF, Comisarias, Juzgados de familia, centros de conciliación, jueces de familia, civil, promiscuo municipal y de paz, personería y en caso de no haber ninguna de las anteriores, el inspector de policía)

13 ☐ Certificado EPS, donde conste tipo de afiliación (Si el padre o la madre se encuentra afiliado al Régimen Subsidado en Salud puede ser beneficiario del trabajador y recibir cuota monetaria)

14 ☐ Registro civil de defunción de los padres del trabajador.

15 ☐ Copia de resolución de pensión (Colfondos) que reconozca la calidad de pensionado(a), o certificado de pensión con sábanas pensional (Fondos Privados)

16 ☐ Copia del último desprendible de pago, para pensionados hasta 1.5 SMMLV y Mayores 1.5 SMMLV.

Carta de solicitud con nombre completo del solicitante, domicilio, identificación, lugar de residencia, valor mensual de ingresos y declaración de la fuente de los ingresos y manifestación sobre si estaba o no afiliado a alguna Caja de Compensación Familiar con anterioridad a la solicitud.

17 ☐ Certificado de paz y salvo, en el caso de afiliación anterior a otra caja

18 ☐ Si uno de los padres es fallecido, Registro Civil de Defunción.

19 ☐ Certificación veteranos

20 ☐ Certificación en la que indique que es madre comunitaria con el NIT, nombre, dirección, municipio y teléfono donde labora

21 ☐ Copia de la planilla PILA con el pago de la caja de compensación

REQUISITOS DOCUMENTALES DE AFILIACIÓN SEGÚN MODALIDAD

Trabajador	Adjuntar documentos de estos numerales											
Dependiente	1	2										
Independiente	1	2	16	17	21							
Pensionado	1	2	15	16	17							
Veterano	1	2	19									
Madres comunitarias	1	2	21	20								
Facultativos	1	2	21									
Personas a Cargo del Trabajador (Dependiente, Independiente y Pensionado 0.6 y 2% - NO APLICA para Pensionado por Fidelidad)												
Conyuge/Compañero(a) permanente sin hijos.	3											
Conyuge/Compañero(a) permanente e hijos de la unión.	3	6	7	8	9	10	11					
Conyuge/Compañero(a) permanente e hijastros(s).	3	6	7	8	9	10	11	12				
Hijos de trabajador(a) separado(a).	3	6	7	8	9	10	11					
Hijos no reconocidos por uno de los padres (mencionar en cada registro civil figura únicamente uno de los padres)	6	7	8	9								
Padres.	4	5	9	10	13	18						
Hermanos huérfanos de padres	5	6	7	8	9	10	14					






El empleo
es de todos

Mintrabajo

DECLARACIÓN JURAMENTADA

FECHA DE SOLICITUD
AÑO MES DÍA

CIUDAD / MUNICIPIO

YO:

Identificado(a) con:

C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD ☐ PEP ☐ PPT ☐ VISA ☐ OTRO ☐ CUAL:

No.

Declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERDICA. Autorizo que por cualquier medio se verifique los datos aquí contenidos y en caso de falsedad, se apliquen las sanciones contempladas en la ley.

MOTIVO DE LA DECLARACIÓN

Marque con una X el motivo de la declaración

☐ 1. Convivencia y dependencia económica ☐ 2. Unión marital de hecho / Unión libre ☐ 3. Padres o hermanos huérfanos de padres ☐ 4. Otros

1. CONVIVENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA

A través del diligenciamiento del siguiente recuadro usted demostrará y aceptará que las personas relacionadas hacen parte de su grupo familiar (cónyuge, hijos, hijastros) conviven y dependen económicamente del trabajador(a)

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN TIPO Número	PARENTESCO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO

2. UNIÓN MARITAL DE HECHO (UNIÓN LIBRE)

A través del diligenciamiento del siguiente espacio demostrará y aceptará que usted convive y tiene una comunidad de vida singular con su compañera(o) permanente

Declaro que el (la) señor(a) _____ identificado(a) con el tipo de documento _____ número _____ es mi compañera(o) permanente y convivimos desde hace _____ años y _____ meses. Además el(la) señor(a) actualmente se desempeña como:

☐ Dependiente ☐ Independiente ☐ Pensionado(a) ☐ Estudiante ☐ No labora

3. PADRES O HERMANO(S) HUÉRFANO(S)

A través del diligenciamiento del siguiente recuadro declaro que mi padre / madre, hermano(a) huérfano(s) de padres relacionado(s) como parte del núcleo familiar, no recibe(n) subsidio familiar, salario, renta o pensión alguna, ni está(n) afiliado(a)s a otra caja de compensación familiar.

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN TIPO Número	PARENTESCO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO

Firma del padre _____ Firma de la madre _____

4. OTROS

Declaro que desconozco la ubicación del señor(a) _____ identificado con _____ padre / madre biológico(a) del menor _____ identificado con _____ por lo que no puedo aportar los datos relacionados con su certificación laboral

NOTA: La fecha de lanzamiento de la presente declaración juramentada no puede tener una vigencia superior a treinta(30) días y deberá ser firmada por el (la) declarante. La información contiene la manifestación expresa del trabajador y su grupo familiar, y por tal razón se presume que corresponden a sus condiciones y realidad actual, no obstante, las cajas de compensación familiar podrán realizar las verificaciones internas y externas en cualquier momento durante su vinculación, con el fin de corroborar la veracidad de la información a través de los mecanismos que considere pertinentes. En todo caso de evidenciar inconsistencias en lo manifestado a través del presente documento, tendrán la facultad de retirar del grupo familiar a la (s) persona (s) a cargo y/o suspender el reconocimiento del subsidio familiar.

Firma del declarante y documento _____

Observaciones _____

REQUISITOS DOCUMENTALES DE AFILIACIÓN.

1 ☐ Formulario de afiliación
2 ☐ Documento de identificación del trabajador.
3 ☐ Documento de identificación del Conyuge/Compañero(a) permanente del trabajador.
4 ☐ Documento de identificación de los padres del trabajador.
5 ☐ Registro civil de nacimiento del trabajador.
6 ☐ Registro civil de nacimiento de los hijos, hijastros, hermanos.
7 ☐ Documento de identificación actualizado de los hijos, hijastros, hermanos.
8 ☐ Certificado de estudio o el boletín de calificaciones para hijos mayores de 12 años, hasta los 15 años y 11 meses. (No obligatorio Independiente y Pensionado)
9 ☐ Certificado de discapacidad o pérdida de capacidad laboral expedido por la EPS o entidad competente para personas a cargo en condición de invalidez si aplica el caso.
10 ☐ Para desafiliar a un conyuge se debe presentar el documento en el que conste la cesación de efectos civiles del matrimonio, liquidación de la sociedad conyugal o unión marital de hecho.
11 ☐ Constancia laboral del Conyuge/Compañero permanente.
Si el Conyuge/Compañero(a) permanente no labora: Diligenciar declaración juramentada establecida por Confacauca y Ministerio de trabajo/ si el conyuge es pensionado, anexas cédula de pago de la mesada.
12 ☐ Custodia expedida por autoridad competente. (ICBF, Comisarias, Juzgados de familia, centros de conciliación, jueces de familia, civil, promiscuo municipal y de paz, personería y en caso de no haber ninguna de las anteriores, el inspector de policía)
13 ☐ Certificado EPS, donde conste tipo de afiliación (Si el padre o la madre se encuentra afiliado al Régimen Subsidado en Salud puede ser beneficiario del trabajador y recibir cuota monetaria).
14 ☐ Registro civil de defunción de los padres del trabajador.
15 ☐ Copia de resolución de pensión (Cofondos) que reconozca la calidad de pensionado(a), o certificado de pensión con sábana pensional (Fondos Privados)
15 ☐ Copia del último desprendible de pago, para pensionados hasta 1.5 SMMLV y Mayores 1.5 SMMLV.

16 ☐ Carta de solicitud con nombre completo del solicitante, domicilio, identificación, lugar de residencia, valor mensual de ingresos y declaración de la fuente de los ingresos y manifestación sobre si estaba o no afiliado a alguna Caja de Compensación Familiar con anterioridad a la solicitud.
17 ☐ Certificado de paz y salvo, en el caso de afiliación anterior a otra caja
18 ☐ Si uno de los padres es fallecido, Registro Civil de Defunción.
19 ☐ Certificación veteranos
20 ☐ Certificación en la que indique que es madre comunitaria con el NIT, nombre, dirección, municipio y teléfono donde labora
21 ☐ Copia de la planilla PILA con el pago de la caja de compensación

REQUISITOS DOCUMENTALES DE AFILIACIÓN SEGÚN MODALIDAD

Trabajador	Adjuntar documentos de estos numerales											
Dependiente	1	2										
Independiente	1	2	16	17	21							
Pensionado	1	2	15	16	17							
Veterano	1	2	19									
Madres comunitarias	1	2	21	20								
Facultativos	1	2	21									

Personas a cargo del Trabajador (Dependiente, Independiente y Pensionado 0,6 y 2% - NO APLICA para Pensionado por Fidelidad)

	3	6	7	8	9	10	11	12
Conyuge/Compañero(a) permanente sin hijos.								
Conyuge/Compañero(a) permanente e hijos de la unión.	3	6	7	8	9	10	11	
Conyuge/compañero(a) permanente o hijastro(s).	3	6	7	8	9	10	11	12
Hijos de trabajador(a) separado(a).	3	6	7	8	9	10	11	
Hijos no reconocidos por uno de los padres (no viene en su registro civil figura únicamente uno de los padres)	6	7	8	9				
Padres.	4	5	9	10	13	18		
Hermanos huérfanos de padres	5	6	7	8	9	10	14	





www.confacauca.com





FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN AL SUBSIDIO FAMILIAR

NIT. 891.500.182-0

No. 655150

Diligencie este formulario
en letra imprenta y tinta color negro

MODALIDAD DE INSCRIPCIÓN

DEPENDIENTE		INDEPENDIENTE		Índice de Aporte		PENSIONADO		Índice de Aporte		
				0,6%	2%			0%	0,6%	2%
Regular	☐	Regular	☐	☐	☐	Fidelidad 25 años	☐	☐	☐	☐
Servicio Domestico	☐	Taxista	☐	☐	☐	Menos de 1,5 SMMLV	☐	☐	☐	☐
Madre Comunitaria	☐	Facultativos	☐	☐	☐	Más de 1,5 SMMLV	☐	☐	☐	☐
Veteranos	☐	Colombiano en el Exterior	☐	☐	☐		☐	☐	☐	☐

PARTE A INFORMACIÓN DE LA EMPRESA

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DE LA EMPRESA (Como figura en el RUT)

NIT ☒ C.C ☐ T.I. ☐ C.E ☐ PAS ☐

No. 901597963-8

PARTE B INFORMACIÓN DEL TRABAJADOR (A)

PRIMER APELLIDO YASNO		SEGUNDO APELLIDO PILL		PRIMER NOMBRE YOHEMR		SEGUNDO NOMBRE		FECHA DE NACIMIENTO 1973 07 27		GÉNERO F	
C=CX ☐ TI ☐ CF ☐ PASC ☐ CDB ☐ PEP ☐ PPT ☐ YISA ☐ OTRO ☐		ESTADO CIVIL: ☒ SOLTERO ☐ CASADO ☐ UNIÓN LIBRE ☐ CONV ☐ SEPARADO ☐ DIVORCIADO		SECTOR ☐ URBANO ☒ RURAL		TELÉFONO CELULAR 000000000000000000		TELÉFONO FIJO		E-MAIL YOHEMRYASNOPI@gmail.com	
DIRECCIÓN DE RESIDENCIA / BARRIO / VEREDA Vereda CP ARANZAZU				MUNICIPIO ARANZAZU		DEPARTAMENTO CALDAS		PAÍS COLOMBIA			

FACTOR DE VULNERABILIDAD ☒ No disponible ☐ Cabeza de familia ☐ Desplazado ☐ Población migrante ☐ Ejercicio del trabajo sexual ☐ En condición de discapacidad ORIENTACIÓN SEXUAL ☐ Heterosexual ☐ Homosexual ☐ Bisexual ☒ Información no disponible	NIVEL EDUCATIVO ☐ Preescolar ☐ Básica ☐ Secundaria ☐ Media ☐ Técnico / tecnológico ☐ Profesional universitario ☐ Posgrado / maestría ☒ Ninguno	PERTENENCIA ÉTNICA ☐ Afrocolombiano ☐ Comunidad negra ☐ Indígena ☐ Raíz del archipiélago de San Andrés ☐ Provincia y Santa Catalina ☐ Palenquero ☐ Roomingito ☒ No disponible
---	--	---

MUNICIPIO DONDE LABORA	SECTOR	FECHA DE INGRESO A SU EMPRESA	OCCUPACIÓN / PROFESIÓN	HORAS LABORADAS AL MES	SALARIO MENSUAL
PAEZ	☐ URBANO	AÑO MES DÍA	AYUDANTE DE OBRA	230	☒ Básico ☐ Mesada Pensional Comisiones ☒
	☒ RURAL	2025 06 11			VALOR 1423500
					Suma todos los conceptos salariales

INFORMACIÓN CUENTA BANCARIA PARA PAGO DEL SUBSIDIO FAMILIAR

¿DESEA QUE EL PAGO SEA CONSIGNADO A SU CUENTA? ☐ SI ☒ NO

El pago del subsidio a través de cuenta bancaria, garantiza que el mismo no prescriba (venza), acorde a lo establecido en el artículo 6 de la Ley 21/1982.

NOMBRE DEL BANCO

☐ Cta. Ahorros

Cta. Corrientes

PARTE C INFORMACIÓN DEL (A) CONYUGE Y/O COMPAÑERO (A) ACTUAL

PRIMER APELLIDO		SEGUNDO APELLIDO		PRIMER NOMBRE		SEGUNDO NOMBRE		FECHA DE NACIMIENTO			OCUPACIÓN/PROFESIÓN		GÉNERO
								AÑO	MES	DÍA			F
C	E	T	I	C	E	P	A	S	I				
CD		PSP		PPT		VISA		OTRO					
CONVIVEN													
SI		NO											
NOMBRE DE EMPLEADOR CON QUIEN LABORA								IDENTIFICACIÓN EMPLEADOR					

CÓDIGO		NOMBRE		NÚM.	
PARTE D					
DATOS DEL PADRE O MADRE BIOLÓGICO (A) DE LOS HIJOS A INSCRIBIR QUE NO CONVIVE CON EL TRABAJADOR (A)					

PRIMER APELLIDO										SEGUNDO APELLIDO										PRIMER NOMBRE										SEGUNDO NOMBRE										FECHA DE NACIMIENTO										OCUPACIÓN/PROFESIÓN										GÉNERO									
C.C. ☐ T.I. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD ☐ PEP ☐ PPT ☐ VISA ☐ OTRO ☐																				NOMBRE DE EMPLEADOR CON QUIEN LABORA										IDENTIFICACIÓN EMPLEADOR																				F ☐ M ☐																			

CUAL:	No.	No.
PARTES 5		
INFORMACIÓN DE LAS PERSONAS A CARGO DEL TRABAJADOR (A)		

[illegible]

DECLARACIÓN:

Declaro que la información suministrada en el presente formulario es verdadera, cuenta con los soportes probatorios correspondientes y podrá ser verificada en cualquier momento por parte de la Caja de Compensación Familiar del Cauca COMCAFCAUCA, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 73 de la ley 21 de 1982. En el evento que la información suministrada cambie, me comprometo a reportar modificación de los datos a más tardar el día 10 del mes siguiente de ocurrida la novedad. El suministro de datos falsos por parte del empleador, a la Caja o la violación de la norma sobre salarios mínimos, es causal de desafiliación según artículo 45 de la Ley 21 de 1982.

CONFECCIÓN. El presente en la Ley 1981 de 2016, los datos decretos reglamentarios, adscrito a la Caja de Compensación Familiar del Cauca, COMCAFAMCA, para el tratamiento y manejo de mis datos personales consignados en el formulario, al cual consentí en recolectar, almacenar, depositar, usar, analizar, circular y crear información propia con el fin de facilitarla prestación de servicios, pago de cuotas monetarias, personalizar las gestiones de cobro, reportar a centrales de riesgo cuando corresponda y en general todas las acciones que se derivan de los servicios que de conformidad con la Ley presta esta Caja de Compensación Familiar. Declaro que soy responsable de la veracidad de mis datos suministrados. Así mismo autorizo a la Caja de Compensación Familiar del Cauca, COMCAFAMCA, a efectuar sus procedimientos de notificación y comunicación a los terceros interesados, así como a utilizar toda la información suministrada por mí para fines administrativos, legales, comerciales, financieros, tecnológicos, operativos, de gestión, de control interno y de auditoría de acuerdo a los derechos de correspondencia y/o como electrónico antes mencionados. Declaro que la siguiente lista de los derechos que me asisten con relación a la identificación, dirección y titulación del responsable del tratamiento de mis datos de conformidad con la Ley 1981 de 2016 y sus decretos reglamentarios. La Caja garantiza la confidencialidad, libertad, seguridad, transparencia, acceso y circulación restringida de mis datos.

De igual manera, autorizo a COMFACAUCA, en caso que cobre cuotas monetarias a las cuales no tenga derecho, me sean descontadas de los próximos pagos de la cuota monetaria de subsidio familiar a que hubiere lugar.

FIRMA DEL TRABAJADOR (A) No. de identificación

FIRMA Y SELLO DE LA EMPRESA

OBSERVACIONES

RECIBE		DIGITA		REVISY Y DIGITALIZA	
FECHA	2025-06-11	FECHA		FECHA	
NOMBRE	COMFACAUCA EN LÍNEA	NOMBRE		NOMBRE	

MAYORES INFORMES: COMFACAUCA POPAYÁN: Calle 2 Nte. N° 6A-54 Barrio Modelo PBX: (0928) 231868 Ext. 120-122-190-221 FAX: 8203691 nomina@
Santander de Quilichao: Calle 5 # 9-79 PBX: (0928) 252183 • **Puerto Tejada:** Cra. 20 # 16-25 Barrio El Centro Tel: (0928) 262189 - 282430 -
Guapi: Calle 6 Vía principal Cel: 3104681793 • **Miranda:** Calle 7 13 B #51-73 PBX: 8281487 - 8476330 - www.comfauca.com

MAYORES INFORMES: COMFACAUCA



MAYORES INFORMES: COMFACAUCA POPAYÁN: Calle 2 Nta. Nº 6A-54 Barrio Modelo PBX: (0928) 231868 Ext: 120-122-190-221 FAX: 8203961 nomina@comfauca.com - promoportes@comfauca.com

Guapi: Calle 6 Vía principal Cel: 3104681793 - **Miranda:** Calle 7 13 B #51-73 PBX: 8281487 - 8476330 - www.comfacauc.com

Guapi: Calle 5 # 9-79 PBX: (0528) 282183 - **Puerto Tejada**: Cra. 20 # 16-25 Barrio El Centro Tel: (0528) 282189 - 282430 - **El Bordo**:
Guapi: Calle 6 Vía principal Cel: 3104681793 - **Miranda**: Calle 7 13 B #51-73 PBX: 8281487 - 8476330 - www.comfacauca.com

VERSION 1 / Junho 28 de 2022 ORIGINAL



Cil 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia




El empleo
es de todos

Mintrabajo

DECLARACIÓN JURAMENTADA

FECHA DE SOLICITUD
AÑO MES DÍA

CIUDAD / MUNICIPIO

YO:

identificado(a) con:

C.C. ☐ T.J. ☐ C.E. ☐ PAS ☐ CD ☐ PEP ☐ PPT ☐ VISA ☐ OTRO ☐ CUAL:

No.

Declaro bajo la gravedad de juramento que toda la información aquí suministrada es VERDICA. Autorizo que por cualquier medio se verifique los datos aquí contenidos y en caso de falsedad, se apliquen las sanciones contempladas en la ley.

MOTIVO DE LA DECLARACIÓN

Marque con una X el motivo de la declaración

☐ 1. Convivencia y dependencia económica ☐ 2. Unión marital de hecho / Unión libre ☐ 3. Padres o hermanos huérfanos de padres ☐ 4. Otros

1. CONVIVENCIA Y DEPENDENCIA ECONOMICA

A través del diligenciamiento del siguiente recuadro usted demostrará y aceptará que las personas relacionadas hacen parte de su grupo familiar (cónyuge, hijos, hijastros) conviven y dependen económicamente del trabajador(a)

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	PARENTESCO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
TIPO	Número			

2. UNIÓN MARITAL DE HECHO (UNIÓN LIBRE)

A través del diligenciamiento del siguiente espacio demostrará y aceptará que usted convive y tiene una comunidad de vida singular con su compañera(o) permanente

Declaro que el (la) señor(a) _____ identificado(a) con el tipo de documento _____ número _____ es mi compañera(o) permanente y convivimos desde hace _____ años y _____ meses. Además el(a) señor(a) actualmente se desempeña como:

☐ Dependiente ☐ Independiente ☐ Pensionado(a) ☐ Estudiante ☐ No labora

3. PADRES O HERMANOS HUÉRFANOS

A través del diligenciamiento del siguiente recuadro declaro que mi padre / madre, hermano(a) huérfano(s) de padres relacionado(a) como parte del núcleo familiar, no recibe(n) subsidio familiar, salario, renta o pensión alguna, ni esta(n) afiliado(a)s a otra caja de compensación familiar.

NOMBRE COMPLETO DEL BENEFICIARIO	DOCUMENTO IDENTIFICACIÓN	PARENTESCO	TELÉFONO	CORREO ELECTRÓNICO
TIPO	Número			

Firma del padre _____ Firma de la madre _____

4. OTROS

Declaro que desconozco la ubicación del señor(a) _____ identificado con _____ padre / madre biológico(a) del menor _____ identifico con _____ por lo que no puedo aportar los datos relacionados con su certificación laboral

NOTA: La fecha de lanzamiento de la presente declaración juramentada no puede tener una vigencia superior a treinta(30) días y deberá ser firmada por el (la) declarante. La información contiene la manifestación expresa del trabajador y su grupo familiar, y por tal razón se presume que corresponden a sus condiciones y realidad actual, no obstante, las cajas de compensación familiar podrán realizar las verificaciones internas y externas en cualquier momento durante su vinculación, con el fin de corroborar la veracidad de la información a través de los mecanismos que considere pertinentes. En todo caso de evidenciar incongruencias en lo manifestado a través del presente documento, tendrán la facultad de retirar del grupo familiar a la (s) persona (s) a cargo y/o suspender el reconocimiento del subsidio familiar.

Firma del declarante y documento _____ Observaciones _____

REQUISITOS DOCUMENTALES DE AFILIACIÓN.

- ☐ Formulario de afiliación
- ☐ Documento de identificación del trabajador.
- ☐ Documento de identificación del Conyuge/Compañero(a) permanente del trabajador.
- ☐ Documento de identificación de los padres del trabajador.
- ☐ Registro civil de nacimiento del trabajador.
- ☐ Registro civil de nacimiento de los hijos, hijastros, hermanos.
- ☐ Documento de identificación actualizado de los hijos, hijastros, hermanos.
- ☐ Certificado de estudio o el boletín de calificaciones para hijos mayores de 12 años, hasta los 16 años y 11 meses. (No obligatorio Independiente y Pensionado)
- ☐ Certificado de discapacidad o pérdida de capacidad laboral expedido por la EPS o entidad competente para personas a cargo en condición de invalidez si aplica el caso.
- ☐ Para desafiliarse a un conyuge se debe presentar el documento en el que conste la cesación de efectos civiles del matrimonio, liquidación de la sociedad conyugal o unión marital de hecho.
- ☐ Constancia laboral del Conyuge/Compañero permanente.
- ☐ Si el Conyuge/Compañero(a) permanente no labora: Diligenciar declaración juramentada establecida por Confacauca y Ministerio de trabajo/ si el conyuge es pensionado, anexar copia de pago de la mesada.
- ☐ Custodia expedida por autoridad competente. (ICBF, Comisarias, Juzgados de familia, centros de conciliación, jueces de familia, civil, promiscuo municipal y de paz, personería y en caso de no haber ninguna de las anteriores, el inspector de policía)
- ☐ Certificado EPS, donde conste tipo de afiliación (Si el padre o la madre se encuentra afiliado al Régimen Subsidiado en Salud puede ser beneficiario del trabajador y recibir cuota monetaria)
- ☐ Registro civil de defunción de los padres del trabajador.
- ☐ Copia de resolución de pensión (Colfondos) que reconozca la calidad de pensionado(a), o certificado de pensión con sábana pensional (Fondos Privados)
- ☐ Copia del último desprendible de pago, para pensionados hasta 1.5 SMMVL y Mayores 1.5 SMMVL.

Carta de solicitud con nombre completo del solicitante, domicilio, identificación, lugar de residencia, valor mensual de ingresos y declaración de la fuente de los ingresos y manifestación sobre si estaba o no afiliado a alguna Caja de Compensación Familiar con anterioridad a la solicitud.

☐ 17. Certificado de paz y salvo, en el caso de afiliación anterior a otra caja

☐ 18. Si uno de los padres es fallecido, Registro Civil de Defunción.

☐ 19. Certificación veteranos

☐ 20. Certificación en la que indique que es madre comunitaria con el NIT, nombre, dirección, municipio y teléfono donde labora

☐ 21. Copia de la planilla PILA con el pago de la caja de compensación

REQUISITOS DOCUMENTALES DE AFILIACIÓN SEGÚN MODALIDAD

Trabajador	Adjuntar documentos de estos numerales											
Dependiente	1	2										
Independiente	1	2	16	17	21							
Pensionado	1	2	15	16	17							
Veterano	1	2	19									
Madres comunitarias	1	2	21	20								
Facultativos	1	2	21									

Personas a Cargo del Trabajador (Dependiente, Independiente y Pensionado 0.6 y 2% - NO APLICA para Pensionado por Fidelidad)

	3	6	7	8	9	10	11	12
Conyuge/Compañero(a) permanente sin hijos.								
Conyuge/Compañero(a) permanente e hijos de la unión.	3	6	7	8	9	10	11	
Conyuge/compañero(a) permanente e hijastro(s).	3	6	7	8	9	10	11	12
Hijos de trabajador(a) separado(a).	3	6	7	8	9	10	11	
Hijos no reconocidos por uno de los padres (Excluido el hijo no reconocido por uno de los padres)	6	7	8	9				
Padres.	4	5	9	10	13	18		
Hermanos huérfanos de padres	5	6	7	8	9	10	14	



Anexo 1.8.1.

Entrega de EPP



ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE COLABORADOR: _HEYNER EFRÉN GUTIÉRREZ RAMOS_ CÉDULA: _1.081.411.218_ CARGO: _Ayudante de Obra_

TIPO		DESCRIPCIÓN	MARCA	ESTADO		CANT	UND	FECHA	FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBE	OBSERVACIONES
DOT	EPP			OTROS	Nuevo						
	X			X		1		03/06/25		HENRI BOUTIER	
	X	Casco Amariuo		X		1				HENRI BOUTIER	
	X	Gauchos Veget.		X		1				HENRI BOUTIER	
	X	Gauchos Transp.		X		1				HENRI BOUTIER	
	X	Tapa Ombos Ins.		X		1				HENRI BOUTIER	
X	X	Chavero Reflec.		X		1				HENRI BOUTIER	
							</				

DOT: Dotación - EPP: Elementos de protección personal - CANT: Cantidad - UND: Unidad

1. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del mantenimiento de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar consciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo de acuerdo con el Art. 2.2.4.6.36; del Decreto 1072 de 2015.

Los SPP y la dotación es exclusiva del personal que labora para la Empresa, por lo tanto, es responsabilidad del empleado hacer uso debido de la misma, portarla y preservarla en buen estado, de igual forma deberá responder por pérdida o robo si se comprueba negligencia en cualquier de los casos anteriormente mencionados

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE COLABORADOR: _CRISTIAN HERNÁN LÓPEZ YASNÓ_ CÉDULA: _12.283.706_ CARGO: _Ayudante de Obra_

TIPO			DESCRIPCIÓN	MARCA	ESTADO		CANT	UND	FECHA	FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBE	OBSERVACIONES
DOT	EPP	OTROS			Nuevo	Usado						
	X		Casco Amariño		X		1		03/06/25		03/06/25	
	X		Gauchos Vaguet.		X		1				03/06/25	
	X		Gauchos Transpord.		X		1				03/06/25	
	X		Tapa Ochoas Ins.		X		1				03/06/25	
X	X		Chaleco Retiec.		X		1				03/06/25	

DOT: Dotación - EPP: Elementos de protección personal - CANT: Cantidad - UND: Unidad

1. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del mantenimiento de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar consciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo de acuerdo con el Art. 2.2.4.6.36; del Decreto 1072 de 2015.

- Los EPP y la dotación es exclusiva que labora para la Empresa, por lo tanto, es responsabilidad del empleado hacer uso debido de la misma, portarla y preservarla en buen estado, de igual forma deberá responder por pérdida o robo si se comprueba negligencia en cualquier de los casos anteriormente mencionados

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE COLABORADOR: RICHARD YASNO LOPEZ CÉDULA: 12.280.951 CARGO: Ayudante de Obra

[illegible]

DOT: Dotación - EPP: Elementos de protección personal - CANT: Cantidad - UND: Unidad

1. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del mantenimiento de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar consciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo de acuerdo con el Art. 2.4.6.36; del Decreto 1072 de 2015.
2. Los EPP y la dotación es exclusiva del personal que labora para la Empresa, por lo tanto, es responsabilidad del empleado hacer uso debido de la misma, portarla y preservarla en buen estado, de igual forma deberá responder por pérdida o robo si se comprueba negligencia en cualquier de los casos anteriormente mencionados

DOT: Dotación - EPP: Elementos de protección personal	CANT: Cantidad	UND: Unidad
NOTAS:		
1. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del mantenimiento de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar consciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituye causal de terminación del contrato de trabajo de acuerdo con el Art. 2.2.4.6.36; del Decreto 1072 de 2015.		
2. Los EPP y la dotación es exclusiva del personal que labora para la Empresa, por lo tanto, es responsabilidad del empleado hacer uso debido de la misma, portarla y preservarla en buen estado, de igual forma deberá responder por pérdida o robo si se comprueba negligencia en cualquier de los casos anteriormente mencionados		

ENTREGA DE DOTACIÓN Y ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

NOMBRE DE COLABORADOR: _MARCOS JAVIER LISCANO CARDOZO_ CÉDULA: _12.274.525_ CARGO: _Maestro_

TIPO			DESCRIPCIÓN	MARCA	ESTADO		CANT	UND	FECHA	FIRMA ENTREGA	FIRMA RECIBE	OBSERVACIONES
DOT	EPP	OTROS			Nuevo	Usado						
	x		Casco Amarillo		x	1		03 / 06 / 25				
	x		Guaantes Ligeros		x	1						
	x		Botas Transpa.		x	1						
	x		Tapa oídos Ins.		x	1						
x	x		Chaleco Reflec.		x	1						

NOTAS:

1. El funcionario declara estar enterado de los riesgos que conlleva el no uso de los elementos de protección personal y por ende será responsable del mantenimiento de los elementos recibidos; adicionalmente, declara estar consciente que el no uso de los elementos de protección personal, de acuerdo con las actividades realizadas, puede conllevar a sanciones disciplinarias y constituir causal de terminación del contrato de trabajo de acuerdo con el Art. 2.2.4.6.36; del Decreto 1072 de 2015.
2. Los EPP y la dotación es exclusiva del personal que labora para la Empresa, por lo tanto, es responsabilidad del empleado hacer uso debido de la misma, portarla y preservarla en buen estado, de igual forma deberá responder por pérdida o robo si se comprueba negligencia en cualquier de los casos anteriormente mencionados

Anexo 1.9.5. Ausentismo por causa NO justificada en el mes de Junio de 2025



**LA PROFESIONAL DE GESTIÓN DE TALENTO HUMANO
DE ARAMCO INGENIEROS S.A.S**

CERTIFICA QUE

En cumplimiento del Contrato de Obra 052 de 2025, para la construcción del sistema de acueducto de la localidad Aránzazu, Resguardo de Ricaurte Municipio de Páez, durante el mes de junio de 2025 se registró el siguiente ausentismo laboral:

Periodo de Reporte: 01 junio de 2025 al 30 junio de 2025					
No	Nombre	Cargo	Fecha	No. Hrs	Observación
1	Richard Yasnó López	Ayudante de Obra	24/06/2025	8	Sin justa causa ¹
			25/06/2025	8	
2	Yohemir Yasnó Pill	Ayudante de Obra	24/06/2025	8	Sin justa causa
			25/06/2025	8	

La presente certificación se expide el 30 de junio de 2025 en La Plata Huila, para los fines que la parte interesada considere pertinentes.


MARIA ALEJANDRA CABRERA SARRIA
Profesional Gestión de Talento Humano

¹ Sin Justa Causa: Art. 60 numeral 4 CST: Faltar al trabajo sin justa causa de impedimento o sin permiso del empleador, excepto en los casos de huelga, en los cuales deben abandonar el lugar del trabajo.



Anexo 1.10.1. Inducción y Constancia de Inducción en el SG- SST de personal en el mes de Junio de 2025



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSTANCIA DE INDUCCIÓN Y/O RE-INDUCCIÓN EN EL SG-SST

Nombres y Apellidos	Cristian Hernan Lopez Yasso
Número de Identificación	12283706
Lugar de Trabajo	Aramco
Cargo	Ayudante
Fecha	03-06-2023

TEMA	RESPONSABLE	FIRMA CAPACITADOR	FIRMA/HUELLA EMPLEADO O COLABORADOR
<p>Capacitación recibida para desempeño del Cargo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reglamento Interno de Trabajo. - Generalidades SST. - Contexto normativo de Riesgos Laborales. - ARL a la cual se encuentra afiliada la Empresa. - Generalidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Políticas del SG-SST. - Política de alcohol y drogas. - Definición de Peligro, Riesgo, Incidente, Accidente de Trabajo, Enfermedad Laboral. - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. - Reporte de Accidente de Trabajo, Autorreporte de Peligros, Incidentes y condiciones de salud. - Identificación y control de peligros y riesgos en su trabajo, evaluación y valoración de riesgos. - Definición de COPASST Vigía SST e integrantes. - Definición de Comité de Convivencia e Integrantes. - Qué es Acoso laboral y formato de reporte del Acoso. - Equipo investigador de AT. - Plan de Prevención, Preparación y Respuesta a Emergencias. (Brigadas de emergencias, equipos de emergencias, punto de encuentro). 		<p>JEFFERSON DANIAN DALLOS</p>	<p>Cristian Lopez</p> 

OBSERVACIONES:



Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia



Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSTANCIA DE INDUCCIÓN Y/O RE-INDUCCIÓN EN EL SG-SST

Nombres y Apellidos	HERNAN BUSTAMANTE
Número de Identificación	1081411218
Lugar de Trabajo	ARAMCO
Cargo	AYUDANTE
Fecha	03-06-2025

TEMA	RESPONSABLE	FIRMA CAPACITADOR	FIRMA/HUELLA EMPLEADO O COLABORADOR
<p>Capacitación recibida para desempeño del Cargo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reglamento Interno de Trabajo, - Generalidades SST, - Contexto normativo de Riesgos Laborales, - ARL a la cual se encuentra afiliada la Empresa, - Generalidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, - Políticas del SG-SST, - Política de alcohol y drogas, - Definición de Peligro, Riesgo, Incidente, Accidente de Trabajo, Enfermedad Laboral, - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial, - Reporte de Accidente de Trabajo, Autorreporte de Peligros, Incidentes y condiciones de salud, - Identificación y control de peligros y riesgos en su trabajo, evaluación y valoración de riesgos, - Definición de COPASST Vigía SST e integrantes, - Definición de Comité de Convivencia e Integrantes, - Qué es Acoso laboral y formato de reporte del Acoso, - Equipo investigador de AT, - Plan de Prevención, Preparación y Respuesta a Emergencias, (Brigadas de emergencias, equipos de emergencias, punto de encuentro). 		<p>JEFFERSON DAMIAN DALUS</p>	 

OBSERVACIONES:



Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia



Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONSTANCIA DE INDUCCIÓN Y/O RE-INDUCCIÓN EN EL SG-SST

Nombres y Apellidos	Maxo Javier Liscano
Número de Identificación	12 274 525
Lugar de Trabajo	Azon 2270
Cargo	Mas FRO
Fecha	03-06-2025

TEMA	RESPONSABLE	FIRMA CAPACITADOR	FIRMA/HUELLA EMPLEADO O COLABORADOR
<p>Capacitación recibida para desempeño del Cargo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Generalidades SST. - Contexto normativo de Riesgos Laborales. - ARL a la cual se encuentra afiliada la Empresa. - Generalidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Políticas del SG-SST. - Política de alcohol y drogas. - Definición de Peligro, Riesgo, Incidente, Accidente de Trabajo, Enfermedad Laboral. - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. - Reporte de Accidente de Trabajo, Autorreporte de Peligros, Incidentes y condiciones de salud. - Identificación y control de peligros y riesgos en su trabajo, evaluación y valoración de riesgos. - Definición de COPASST Vigía SST e integrantes. - Definición de Comité de Convivencia e Integrantes. - Qué es Acoso laboral y formato de reporte del Acoso. - Equipo investigador de AT. - Plan de Prevención, Preparación y Respuesta a Emergencias. (Brigadas de emergencias, equipos de emergencias, punto de encuentro). 		JEFFERSON DAMIAN DA LUOS	<p>Maxo Javier Liscano</p> 

OBSERVACIONES:



Cil 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia



Cil 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

Código: FO-HSEQ-002

Fecha: 01/06/2025

Versión: 01

[illegible]

Brayan Fernando
Firma Profesional Gestión Integrada HSEQ
Nombre: Brayan Fernando Sencabrial.
C.C.: 1081415537.

JEFERSON DAMIAN
Firma Profesional Seguridad Y Salud En El Trabajo
Nombre: JEFERSON DAMIAN DALLOS
C.C.: 1002461147



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSTANCIA DE INDUCCIÓN Y/O RE-INDUCCIÓN EN EL SG-SST

Nombres y Apellidos	Richard Yasno Lopez
Número de Identificación	12280951
Lugar de Trabajo	Arensato
Cargo	Ayudante
Fecha	11-06-2025

TEMA	RESPONSABLE	FIRMA CAPACITADOR	FIRMA/HUELLA EMPLEADO O COLABORADOR
<p>Capacitación recibida para desempeño del Cargo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reglamento Interno de Trabajo. - Generalidades SST. - Contexto normativo de Riesgos Laborales. - ARL a la cual se encuentra afiliada la Empresa. - Generalidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Políticas del SG-SST. - Política de alcohol y drogas. - Definición de Peligro, Riesgo, Incidente, Accidente de Trabajo, Enfermedad Laboral. - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. - Reporte de Accidente de Trabajo, Autorreporte de Peligros, Incidentes y condiciones de salud. - Identificación y control de peligros y riesgos en su trabajo, evaluación y valoración de riesgos. - Definición de COPASST Vigia SST e integrantes. - Definición de Comité de Convivencia e Integrantes. - Qué es Acoso laboral y formato de reporte del Acoso. - Equipo investigador de AT. - Plan de Prevención, Preparación y Respuesta a Emergencias. (Brigadas de emergencias, equipos de emergencias, punto de encuentro). 		<p>JEREBSON DAMIAN DALLOS</p>	<p>Richard Yasno Lopez</p> 

OBSERVACIONES:



Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tél. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia



Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tél. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

Código: FO-HSEQ-002

Fecha: 01/06/2025

Versión: 01

[illegible]

Brayan Fernando
Firma Profesional Gestión Integrada HSEQ
Nombre: Brayan Fernando Sanabria U.
C.C.: 1081415537

JEFFERSON DAMIAN
Firma Profesional Seguridad Y Salud En El Trabajo
Nombre: JEFFERSON DAMIAN DALLOS
C.C.: 1002461147



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
CONSTANCIA DE INDUCCIÓN Y/O RE-INDUCCIÓN EN EL SG-SST

Nombres y Apellidos	YOHANIE GOSNO PILL
Número de Identificación	12277456
Lugar de Trabajo	ARONIAZ A213
Cargo	AYUDANTE
Fecha	17 06 2025

TEMA	RESPONSABLE	FIRMA CAPACITADOR	FIRMA/HUELLA EMPLEADO O COLABORADOR
<p>Capacitación recibida para desempeño del Cargo:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Reglamento Interno de Trabajo. - Generalidades SST. - Contexto normativo de Riesgos Laborales. - ARL a la cual se encuentra afiliada la Empresa. - Generalidades del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo. - Políticas del SG-SST. - Política de alcohol y drogas. - Definición de Peligro, Riesgo, Incidente, Accidente de Trabajo, Enfermedad Laboral. - Reglamento de Higiene y Seguridad Industrial. - Reporte de Accidente de Trabajo, Autorreporte de Peligros, Incidentes y condiciones de salud. - Identificación y control de peligros y riesgos en su trabajo, evaluación y valoración de riesgos. - Definición de COPASST Vigia SST e integrantes. - Definición de Comité de Convivencia e Integrantes. - Qué es Acoso laboral y formato de reporte del Acoso. - Equipo investigador de AT. - Plan de Prevención, Preparación y Respuesta a Emergencias. (Brigadas de emergencias, equipos de emergencias, punto de encuentro). 		JEFERSON DAMIAN DALLOS	<p>YOHANIE GOSNO PILL</p> 

OBSERVACIONES:



El presente documento es propiedad de ARAMCO Ingenieros y debe ser guardado en un lugar seguro. No se permite su reproducción o uso no autorizado. La firma y el sello son obligatorios.



Anexo 1.10.2. Capacitaciones y/o Charlas en el mes de Junio de 2025



REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

Código: FO-HSEQ-002

Fecha: 01/06/2025

Versión: 01

ARAMCO

PROYECTO:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 052 DE ABRIL DE 2025 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZÚ, RESGUARDO DE RICAURTE MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA.					
TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO			INTENSIDAD
Inducción	Charla	X	DD	MM	AAAA	5 minutos	
Reinducción	Capacitación		11	6	2025	LUGAR DEL EVENTO	
Sensibilización	Reunión Informativa					Aranzazú	
NOMBRE DEL EXPOSITOR:		JEFFERSON DAMIAN DALLOS				CARGO:	
TEMA DEL EVENTO:		Prevención de Caídas y resbalones.					
PARTICIPANTES							
NOMBRES Y APELLIDOS		CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO		FIRMA		
Cristian Lopez Yarno		12283706	Ayudante				
HENRICH BATTISTOL		1081411218	Ayudante				
Gildardo Sotomayor L.		12272753	Ayudante				
Marco Jaisir Liscano		12 274525	Maestro				
YOHANILE YASICO PILL		12 277456	AYUDANTE				
Richard Yarno L.		12280951	Ayudante				
OBJETIVOS							
Sensibilizar a los empleados sobre los peligros asociados a estos accidentes y proporcionarles herramientas y conocimientos para evitarlos.							

Firma Profesional Gestión Integrada HSEQ
Nombre: Brayan Fernando Sotomayor L.
C.C.: 1081415537

Firma Profesional Seguridad Y Salud En El Trabajo
Nombre: JEFFERSON DAMIAN DALLOS
C.C.: 1002461147



REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

Código: FO-HSEO-002

Fecha: 01/06/2025

Versión: 01

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 052 DE ABRIL DE 2025							
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZÚ, RESGUARDO DE RICAURTE MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO			INTENSIDAD
Inducción		Charla	X	DD	MM	AAAA	5 minutos
Reinducción		Capacitación		16	6	2025	LUGAR DEL EVENTO
Sensibilización		Reunión Informativa					Aranzazú
NOMBRE DEL EXPOSITOR:		JEFFERSON DAMIAN DALLOS				CARGO:	
TEMA DEL EVENTO:		Actitudes que causan accidentes.					
PARTICIPANTES							
NOMBRES Y APELLIDOS			CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO		FIRMA	
Gildardo Jukerry I			19772253	Ayudante		Gildardo Jukerry I	
Christian López y			12283706	Ayudante		Chris	
Hernán Buticarel			1081411218	Ayudante		He	
YONIZMIR YASNO			12277456	AYUDANTE		YONIZMIR Y	
Richard Yasno L.			12280951	Ayudante		Ry	
OBJETIVOS							
Crear conciencia sobre los comportamientos inseguros y promover la adopción de prácticas seguras en el trabajo, con el fin de reducir la incidencia de accidentes.							

Brayan Fernando
Firma Profesional Gestión Integrada HSEQ
Nombre: Brayan Fernando Sanchelal.
C.C.: 1081415537.

JEFFERSON DAMIAN
Firma Profesional Seguridad Y Salud En El Trabajo
Nombre: JEFFERSON DAMIAN DAWS
C.C.: 1002461747





REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

Código: FO-HSEQ-002

Fecha: 01/06/2025

Versión: 01

PROYECTO:		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 052 DE ABRIL DE 2025 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZÚ, RESGUARDO DE RICAURTE MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA.			
TIPO DE EVENTO		FECHA DEL EVENTO			INTENSIDAD
Inducción	Charla	X	DD	MM	AAAA
Reinducción	Capacitación		19	6	2025
Sensibilización	Reunión Informativa				
					5 minutos
					LUGAR DEL EVENTO
					Aranzazú
NOMBRE DEL EXPOSITOR:		JEFERSON DAMIAN DALLOS			CARGO:
TEMA DEL EVENTO:		Respo Público			
PARTICIPANTES					
NOMBRES Y APELLIDOS		CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO		FIRMA
Gildardo Gutierrez L.		12272753	Ayudante		Gildardo Gutierrez
Cristian Lopez Y		12283766	Ayudante		Cristian Lopez
HILYNER GUTIERREZ		1081411218	Ayudante		HILYNER GUTIERREZ
YOSNER YASNO		12277956	Ayudante		YOSNER YASNO
Richard Yasno L.		12280951	Ayudante		Richard Yasno
OBJETIVOS					
Sensibilizar a los trabajadores sobre los peligros potenciales en el entorno (grupos al margen de la ley), mejorando así su seguridad personal y la de sus compañeros.					

Brayan Fernando
Firma Profesional Gestión Integrada HSEQ
Nombre: Brayan Fernando Sanabria V.
C.C.: 108141537

JEFERSON DAMIAN
Firma Profesional Seguridad Y Salud En El Trabajo
Nombre: JEFERSON DAMIAN DALLOS
C.C.: 1002461143



REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

Código: FO-HSEQ-002

Fecha: 01/06/2025

Versión: 01

ARAMCO

PROYECTO:	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 052 DE ABRIL DE 2025 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZÚ, RESGUARDO DE RICAURTE MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA.				
TIPO DE EVENTO			FECHA DEL EVENTO		INTENSIDAD
Inducción	Charla	X	DD	MM	AAAA
Reinducción	Capacitación		20	6	2025
Sensibilización	Reunión Informativa				
NOMBRE DEL EXPOSITOR:			JEFERSON DAMIAN DALLOS		CARGO:
TEMA DEL EVENTO:			Entrenamiento EPP.		
PARTICIPANTES					
NOMBRES Y APELLIDOS		CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO	FIRMA	
Aldardo Gutierrez L.		12272755	Ayudante	Aldardo Gutierrez	
Christian Lopez y		12283706	Ayudante	Christian Lopez	
HEYACER BUTIERREZ		1081411218	Ayudante	HEYACER BUTIERREZ	
YONHEIR YASNO		12277446	Ayudante	YONHEIR Y.	
Richard Yasno L.		12280951	Ayudante	Richard Yasno	
OBJETIVOS					
Instruir a los trabajadores sobre la correcta selección, uso, cuidado y mantenimiento de los EPP para prevenir accidentes y enfermedades laborales.					

Brayon Fernando
Firma Profesional Gestión Integrada HSEQ
Nombre: Brayon Fernando Sencibia U.
C.C.: 1081415537

JEFERSON DAMIAN
Firma Profesional Seguridad Y Salud En El Trabajo
Nombre: JEFERSON DAMIAN DALLOS
C.C.: 1002461147



REGISTRO DE ASISTENCIA Y PARTICIPACIÓN

Código: FO-HSEQ-002

Fecha: 01/06/2025

Versión: 01

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 052 DE ABRIL DE 2025							
PROYECTO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZÚ, RESGUARDO DE RICAURTE MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA.						
TIPO DE EVENTO				FECHA DEL EVENTO			INTENSIDAD
Inducción		Charla	X	DD	MM	AAAA	5 minutos
Reinducción		Capacitación		24	6	2025	LUGAR DEL EVENTO
Sensibilización		Reunión Informativa					Aranzazu
NOMBRE DEL EXPOSITOR:	JEFFERSON DAHIAN D ALLOS					CARGO:	
TEMA DEL EVENTO:	Riesgos de Tránsito						
PARTICIPANTES							
NOMBRES Y APELLIDOS			CÉDULA DE CIUDADANÍA	CARGO		FIRMA	
HENNER GUTIERREZ			1089411218	Ayudante		[Firma]	
CRISTINA LOPEZ Y			12283706	AYUDANTE		[Firma]	
GILDARDO GUTIERREZ			12272753	ayudante		Gildardo Gutierrez	
MARCO JAVIER LISANO			12274525	Maestro		Marco Lisano	
OBJETIVOS							
Informar y concienciar a los trabajadores sobre los peligros asociados con la movilidad, tanto dentro como fuera del entorno laboral, para prevenir accidentes y promover una cultura de seguridad.							

Brayan Fernando
Firma Profesional Gestión Integrada HSEQ
Nombre: Brayan Fernando Sotobrial.
C.C.: 1081415537

JEFERSON DAMIAN
Firma Profesional Seguridad Y Salud En El Trabajo
Nombre: JEFERSON DAMIAN DALWS
C.C.: 1002461147



Versión: 01

Brayan Fernando
Firma Profesional Gestión Integrada HSEQ
Nombre: Brayan Fernando Sandoval U.
C.C.: 1081475537

JEFERSON DAMIAN
Firma Profesional Seguridad Y Salud En El Trabajo
Nombre: JEFERSON DAMIAN DALLOS
C.C.: 1002461147

Anexo 1.11.1. Inspección del estado y uso de los EPP en el mes de junio de 2025



Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

Cll 2 sur No. 9 - 13 / Apto 201. El Portal 2da Etapa
Tel. +57 318 542 3456
contacto@aramcoingenieros.com
La Plata, Huila, Colombia

Anexo 1.11.2. Inspección de condiciones de orden y aseo en obra del mes de junio 2025



Anexo 1.11.3. Inspección de punto ecológico y residuos del mes de junio 2025



INSPECCIÓN DE PUNTO ECOLÓGICO Y RESIDUOS

Código: FO-HSEQ-011
Fecha: 01/06/2025
Versión: 02

PROYECTO: CONTRATO DE OBRA PÚBLICA NO. 052 DE ABRIL DE 2023 CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZO, RESGUARDO DE RICHAURTE MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA.	
RESPONSABLE DE REALIZAR INSPECCIÓN: <i>Juan C. Quintana</i> CARGO: <i>Ing. Ambiental</i>	LUGAR DE TRABAJO: <i>Aranzazo</i> PERIODO COMPRENDIDO: DE <i>03-06-25</i> A <i>30-06-25</i>

INSTRUCCIONES PARA LA INSPECCIÓN

Debe revisar los puntos ecológicos contenidos por contenedor verificando los siguientes criterios:

Separación: que los residuos dispuestos allí sean acordes con el código de colores establecido para la caneca.

Ubicación: que los contenedores se encuentren en espacios adecuados (pasillos y áreas de tránsito), al alcance de los funcionarios, contristas y visitantes de la entidad.

Señalización / Rotulado: Verificar que en el rotulado se identifique el tipo de residuo y sea acorde al color de la caneca.

Estado: Que los contenedores se encuentren en condiciones físicas adecuadas, que no estén averiados, sin tapa, rotos, etc.

Diligencie:
Marque con una X: (C = Cumple NC = No Cumple)

LOCALIZACIÓN DEL PUNTO ECOLÓGICO	Separación		Ubicación		Señalización		Estado		OBSERVACIONES
	C	NC	C	NC	C	NC	C	NC	
<i>2° 58' 37" N 75° 35' 43" W</i>	X		X		X		X		<i>N/A</i>

ALMACENAMIENTO TEMPORAL

ASPECTOS A EVALUAR	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
Fácil acceso para la disposición y recolección por parte de usuarios, operarios y carro recolector.	X		
Su ubicación no genera molestias a funcionarios, contratistas visitantes de la entidad.	X		
Se encuentra en condiciones que evita el acceso a presencia de vectores (insectos, roedores, animales).	X		
Permite la protección de los residuos de condiciones climáticas (luz, sol y vientos).	X		
Cuenta con con buena iluminación y sistemas de ventilación.	X		
El espacio permite su fácil limpieza.	X		
Los contenedores son de material plástico, con tapa y se encuentran en buen estado.	X		
Se tienen contenedores para la separación de residuos aprovechables.	X		
El espacio se encuentra limpio, organizado y en condiciones adecuadas de aseo.	X		

PLAN DE ACCIÓN

FECHA	ACCIÓN MEJORA	RESPONSABLE

Brayan Fernando

Firma Profesional Gestión Integrada HSEQ
Nombre: *Brayan Fernando Sanabria*
C.C.: *108145533*

Firma Profesional Ingeniería Ambiental
Nombre: *Juan C. Quintana*
C.C.: *1253877070*



Anexo 1.11.4. Inspección a botiquines y camillas del mes de junio 2025.



	SISTEMA DE GESTION DE LA SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO PROTOCOLO DE INSPECCIONES DE SEGURIDAD INSPECCIÓN A BOTIQUINES Y CAMILLAS		Codigo: FO-HSEQ-013		
			Fecha: 01/06/2025		
			Versión: 02		
CONSORCIO:	Acueducto Aranzabú		LUGAR DE TRABAJO:	Aranzabú	
FECHA DE INSPECCIÓN:	25 - 06 - 2025				
DATOS DE UBICACIÓN DEL BOTIQUÍN					
Área / Sección:		Ubicación: Aranzabú			
TIPO DE BOTIQUÍN: (Marque con una (X) según corresponda)		Fijo	De Brigadistas ☒		
Marque con una (X) en la casilla de SI / NO según el botiquín tenga o no cada uno de los ítems relacionadas en el listado.					
Antisépticos	SI	NO	Antisépticos	SI	NO
Yodo en Solución (1 frasco)	☒		Agua oxigenada (1 frasco)		
Isodine espuma (1 frasco)	☒		Alcohol (1 frasco)	☒	
Material de Curación			Condiciones Encontradas		
Gasa (1 caja)	☒		Elementos vencidos		
Toallas Higiénicas (4 uds)	☒		Elementos deteriorados		
Curas (10 uds)	☒		Elementos no permitidos		
Esparadrapo de tela (1 rollo)	☒		Estado		
Micropore (2 cm de ancho)	☒		Fácil acceso al botiquín?		
Aplicadores (10 uds)	☒		Se puede disponer de él oportunamente?		
Bajalenguas (20 uds)	☒		El botiquín de encuentra señalizado?		
Guantes desechables (5 pares)	☒		Se evidencia botiquín en buen estado?		
Suero fisiológico o solución salina normal (1 bolsa)	☒		El botiquín se encuentra aseado y ordenado?		
Tijeras (1 ud)	☒		Se inspecciona periódicamente?		
Tapabocas (3 uds)	☒				
Algodón (1 paquete)	☒				
Otros Elementos					
Parches oculares (2 unidades)	☒		Libreta y lapicero (1 ud)	☒	
Inmovilizador miembros superiores (2 uds)			Frazada o cobija (1 ud)		
Inmovilizador miembros inferiores (2 uds)			Linterna pequeña (1 unidad)	☒	
Cuello ortopédico (1 ud)			Pilas (para la linterna)		
Vendas elásticas (2 uds - 10 cm ancho)	☒		Lista de teléfonos de emergencia		
Jeringas	☒		Manual o folleto de primeros auxilios		
Termómetro (1 ud)	☒		Alcohol antiséptico (1 frasco)		
Camilla disponible (1 ud)	☒		Silbato de emergencia		
Cinturones, agarraderas (camilla)	☒		Sobres de Suero Oral Rehidratación (4 sobres)		
Responsable de Botiquín					
El botiquín tiene asignado responsable?			Está capacitado en el manejo del botiquín?		
Está entrenado en primeros auxilios?			Diligencia registros de uso del Botiquín?		
Responsable de la Inspección			Responsable del Botiquín		
Firma: <u>Brayan Fernando Sanabria Vega</u>			Firma: <u>Marco Javier Escobar</u>		
Nombre: <u>Brayan Fernando Sanabria Vega</u>			Nombre: <u>Marco Javier Escobar</u>		
Cargo: <u>Profesional HSEQ</u>			Cargo: <u>Alcaldé</u>		
Consolidado Resumen de la Inspección					



ANEXO - BITÁCORA DE OBRA

ARAMCO INGENIEROS S.A.S.
NIT. 901.597.963-8





**CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE
ARÁNZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE
PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025**



**PERIODO COMPRENDIDO
DESDE 1 DE JUNIO DE 2025 A 28 DE JUNIO DE 2025**



 	PROCESO OBRAS DE INFRAESTRUCTURA	
	FORMATO PARA CARATULA BITACORA DE OBRA	

BITACORA DE OBRA		
CONTRATO DE OBRA NO	052 DEL 22 DE ABRIL DE 2025	
OBJETO CONTRACTUAL	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARÁNZAZU, RESGUARDO DE RICAURTE MUNICIPIO DE PÁEZ DEPARTAMENTO DEL CAUCA	
PLAZO INICIAL	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025 A PARTIR DE LA FIRMA DEL ACTA DE INICIO	
PLAZO PRORROGA		
	NOMBRE	FIRMA
CONTRATANTE	CORPORACIÓN NASA KIWE	
CONTRATISTA	ARAMCO INGENIEROS SAS NIT: 901.597.963-8 ANDRÉS MAURICIO RAMÍREZ CUENCA Representante Legal	
NOMBRE DEL SUPERVISOR	ING. DIEGO FELIPE CUERVO GONZÁLEZ	
NOMBRE DE APOYO A LA SUPERVISION	ING. DIEGO ERNESTO BRAVO LASSO	
NOMBRE DEL INTERVENTOR	N/A	
NOMBRE DEL SUPERVISOR DE OBRA DEL CONTRATISTA	ING. WILLIAM FERNANDO MEDINA ALVIRA	William F. Medina
NOMBRE ACOMPAÑAMIENTO A LA SUPERVISION	PEDRO NEL CASAS	
NOMBRE MAESTRO DE OBRA	YAMID HERNANDO MEDINA SALAZAR	

Sede Bogotá Calle 12B N° 8-38 Mezanine Edificio Camargo Tel: 2427400 Ext. 2200 Sede Belalcázar calle 5 No 1A-17 Barrio La Primavera Sede La Plata (Huila) Calle 4° # 5-37 Tel: 8370346 Correo electrónico: info@nasakiwe.gov.co Página web: www.nasakiwe.gov.co	CODIGO: F19-OI-400 VERSION: 02 FECHA ACTUALIZACION DICIEMBRE 16 DE 2016
---	--

FECHA:	Viernes, 25 de Abril de 2025			FOLIO NO.	001
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Soleado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Se llevó a cabo la elaboración y firma del acta de inicio del proyecto, en la cual se oficializa el comienzo de las actividades contractuales entre las partes. El documento establece las condiciones iniciales del contrato, las fechas de ejecución y los compromisos técnicos y administrativos para el desarrollo de la obra.</p> <p>Se formalizó el acta de Recibo de Sitio, mediante la cual se hace constar que el contratista recibe el área de intervención en las condiciones acordadas. En esta acta se verificaron las condiciones físicas del terreno, el acceso, la disponibilidad de servicios y cualquier observación relevante para el desarrollo del proyecto.</p>					
William F. Medina					
Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Sábado, 26 de Abril de 2025			FOLIO NO.	002
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Nublado	TARDE:	Soleado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Se inician las actividades de revisión técnica de los estudios y diseños entregados, con el propósito de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad desde los enfoques técnico, normativo y funcional. Esta labor permite identificar de manera oportuna posibles inconsistencias, ajustes requeridos o adaptaciones necesarias antes del inicio de las actividades constructivas, lo cual es clave para evitar reprocesos, optimizar recursos y garantizar una ejecución eficiente y conforme a los objetivos del proyecto. La revisión detallada constituye una fase crítica de planificación, que permite alinear el diseño con la realidad del sitio y asegurar una adecuada toma de decisiones en obra.</p>					
William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista.			Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Lunes, 28 de Abril de 2025				FOLIO NO.	003
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Soleado	TIEMPO PERDIDO:	
PERSONAL EN OBRA:		MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:				
- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:						
<p>Se continúa con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional. Esta labor es fundamental para garantizar que las decisiones constructivas se ajusten a la realidad del sitio y se ejecuten conforme a los lineamientos establecidos, asegurando así una correcta planificación y desarrollo eficiente de las siguientes fases de obra.</p>						
William F. Medina						
Profesional Autorizado por Contratista				Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Martes, 29 de Abril de 2025			FOLIO NO.	004
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Nublado	TARDE:	Nublado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Se continúa con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional. Esta labor es fundamental para garantizar que las decisiones constructivas se ajusten a la realidad del sitio y se ejecuten conforme a los lineamientos establecidos, asegurando así una correcta planificación y el desarrollo eficiente de las siguientes fases de obra.</p>					
William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Miércoles. 30 de Abril de 2025			FOLIO NO.	005
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Nubado	TARDE:	Soleado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Se continúa con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional. Esta labor es fundamental para garantizar que las decisiones constructivas se ajusten a la realidad del sitio y se ejecuten conforme a los lineamientos establecidos, asegurando así una correcta planificación y el desarrollo eficiente de las siguientes fases de obra.</p>					
William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Viernes, 2 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	006
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Nublado	TARDE:	Soleado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Se continúa con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional. Esta labor es fundamental para garantizar que las decisiones constructivas se ajusten a la realidad del sitio y se ejecuten conforme a los lineamientos establecidos, asegurando así una correcta planificación y el desarrollo eficiente de las siguientes fases de obra.</p>					
William F. Medina					
Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Sábado, 3 de Mayo de 2025				FOLIO NO.	007
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Soleado	TIEMPO PERDIDO:	
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:			
- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:						
<p>Se continúa con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional. Esta labor es fundamental para garantizar que las decisiones constructivas se ajusten a la realidad del sitio y se ejecuten conforme a los lineamientos establecidos, asegurando así una correcta planificación y el desarrollo eficiente de las siguientes fases de obra.</p>						
William F. Medina						
Profesional Autorizado por Contratista				Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Lunes, 5 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	008
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Nublado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Se continúa con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional. Esta labor es fundamental para garantizar que las decisiones constructivas se ajusten a la realidad del sitio y se ejecuten conforme a los lineamientos establecidos, asegurando así una correcta planificación y el desarrollo eficiente de las siguientes fases de obra.</p>					
William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Martes, 6 de Mayo de 2025				FOLIO NO.	009
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Lluvias moderadas	TARDE:	Nublado	TIEMPO PERDIDO:	
PERSONAL EN OBRA:		MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:				
- Supervision de Obra = 1 (Oficina)						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:						
<p>Se continúa con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional. Esta labor es fundamental para garantizar que las decisiones constructivas se ajusten a la realidad del sitio y se ejecuten conforme a los lineamientos establecidos, asegurando así una correcta planificación y el desarrollo eficiente de las siguientes fases de obra.</p>						
William F. Medina						
Profesional Autorizado por Contratista				Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:		Miércoles, 7 de Mayo de 2025		FOLIO NO.		010	
ESTADO DEL TIEMPO:		MAÑANA:	Nublado	TARDE:	Lluvioso	TIEMPO PERDIDO:	
PERSONAL EN OBRA:				MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:			
- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)							
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:							
<p>Se continúa con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales de terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional. Esta labor es fundamental para garantizar que las decisiones constructivas se ajusten a la realidad del sitio y se ejecuten conforme a los lineamientos establecidos, asegurando así una correcta planificación y el desarrollo eficiente de las siguientes fases de obra.</p>							
William F. Medina							
Profesional Autorizado por Contratista				Profesional Autorizado por Interventoría			

FECHA:	Jueves, 8 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	011
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Nublado	TARDE:	Nublado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:		MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:			
- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Se continúa con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional. Esta labor es fundamental para garantizar que las decisiones constructivas se ajusten a la realidad del sitio y se ejecuten conforme a los lineamientos establecidos, asegurando así una correcta planificación y el desarrollo eficiente de las siguientes fases de obra.</p>					
<i>William F. Medina</i> Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:		Viernes, 9 de Mayo de 2025		FOLIO NO.	012
ESTADO DEL TIEMPO:		MAÑANA:	Nubado	TARDE:	Soleado
PERSONAL EN OBRA:		MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:			
- Supervisor de Obra = 1 (Opilima)					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se continua con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional. Esta labor es fundamental para garantizar que las decisiones constructivas se ajusten a la realidad del sitio y se ejecuten conforme a los lineamientos establecidos, asegurando así una correcta planificación y el desarrollo eficiente de las siguientes fases de obra.

William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista	Profesional Autorizado por Interventoría
---	--

FECHA:	Sábado, 10 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	013
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:		TARDE:		TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Equipo de Topografía = - Topógrafo = 1 - Cadenero = 1 - Supervisor de Obra = 1 			<ul style="list-style-type: none"> - Estación Total - Nivel de precisión equipo RTK 		

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

En la presente jornada se inician las labores en campo correspondientes al proyecto de construcción del sistema de acueducto, comenzando con las actividades de localización y replanteo de las estructuras proyectadas, actividad realizada con equipo de precisión, de acuerdo con los planos topográficos y de diseño, se logra identificar en campo la zona correspondiente a estructura de llegada a PTAP, FAD, FGA y FLA, cámara de lavado de gravas, cámara de lavado de arenas y caseta de almacenamiento.

Se realiza levantamiento topográfico completo por diferencias encontrada en terreno respecto a cotas y perfiles del terreno real. Estas labores se desarrollan como etapa preliminar fundamental para la correcta ejecución de la obra.



William F. Medina

Profesional Autorizado por Contratista

Profesional Autorizado por Interventoría

FECHA:	Lunes, 12 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	014
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Lluvioso	TARDE:	Lluvioso	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Se continúa con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional. Esta labor es fundamental para garantizar que las decisiones constructivas se ajusten a la realidad del sitio y se ejecuten conforme a los lineamientos establecidos, asegurando así una correcta planificación y el desarrollo eficiente de las siguientes fases de obra.</p>					
William F. Medina					
Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Martes, 13 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	015
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Nublado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Se continúa con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional. Esta labor es fundamental para garantizar las decisiones constructivas se ajustan a la realidad del sitio y se ejecuten conforme a los lineamientos establecidos, asegurando así una correcta planificación y el desarrollo eficiente de las siguientes fases de obra.</p>					
William F. Medina					
Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Miércoles, 14 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	016
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Nublado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Se continúa con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional. Esta labor es fundamental para garantizar que las decisiones constructivas se ajusten a la realidad del sitio y se ejecuten conforme a los lineamientos establecidos, asegurando así una correcta planificación y el desarrollo eficiente de las siguientes fases de obra.</p>					
William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		


FECHA:	Jueves, 15 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	017
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Soleado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se continúa con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional.

Acta de visita de Obra #1

Se recibe vista técnica de la CNK en campo con el fin de realizar reconocimiento de la zona destinada para la realización de las primeras estructuras que hacen parte del sistema de acueducto; se define posición de éstas y ajustes necesarios para optimización del diseño propuesto considerando la diferencia en diseños y ubicación de estructuras de la PTAR. Se contó con presencia del equipo contratista, equipo de supervisión y presidente de la junta de acción comunal.

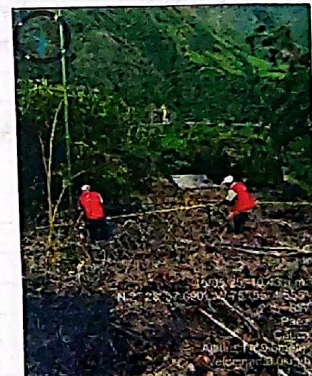

William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista	Profesional Autorizado por Interventoría
---	--

FECHA:	Viernes, 16 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	018
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Nublado	TARDE:	Lluvias leves	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Supervisor de Obra = 1 (Oficina) 					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<ul style="list-style-type: none"> - Se continúa con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional. Esta labor es fundamental para garantizar que las decisiones constructivas se ajusten a la realidad del sitio y se ejecuten conforme a los lineamientos establecidos, asegurando así una correcta planificación y el desarrollo eficiente de las siguientes fases de obra. - Se obtienen diseños de mezcla con materiales de la zona (SEND Suelos y Concretos S.A.S) 					
William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Sábado, 17 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	019
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Lluvias leves	TARDE:	Lluvias moderadas	TIEMPO PERDIDO:

PERSONAL EN OBRA:

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:

- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se continúa con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional.

William F. Medina

Profesional Autorizado por Contratista

Profesional Autorizado por Interventoría

FECHA:	Lunes, 19 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	020
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Lluvia moderada	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<p>- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)</p>					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Se continúa con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional.</p>					
<p>William F. Medina</p> <p>Profesional Autorizado por Contratista</p>			<p>Profesional Autorizado por Interventoría</p>		


FECHA:	Martes, 20 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	021
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Nublado	TARDE:	Soleado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
-- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Se continúa con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional</p>					
William F. Medina					
Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Miércoles, 21 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	022
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Nubado	TARDE:	Nubado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Se continúa con las actividades de revisión y análisis de los estudios y diseños entregados, con el objetivo de verificar su correspondencia con las condiciones reales del terreno y evaluar su viabilidad técnica, normativa y funcional.</p>					
William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		



FECHA:	Jueves. 22 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	023
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Nublado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
- Profesional SST= 1					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Se presenta déficit en la contratación de personal de apoyo en obra, debido a la baja disponibilidad de mano de obra en la zona y a la falta de cumplimiento de requisitos por parte de algunos aspirantes.</p> <p>Como parte del proceso de selección, se enviaron a realizar exámenes médicos ocupacionales a los posibles candidatos para el cargo de ayudantes de obra, con el fin de verificar su aptitud para las labores a desempeñar, cumpliendo con los requisitos establecidos en la normativa de seguridad y salud en el trabajo.</p> <p>Se está a la espera de los resultados médicos para continuar con el proceso de vinculación. Esta situación ha generado una ligera afectación al ritmo normal de las actividades programadas.</p>					
William F. Medina					
Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		



FECHA:	Viernes, 23 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	024
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Nublado	TARDE:	Lluvias moderadas	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none">- Profesional SST = 1- Supervisor de Obra = 1 (Oficina)					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Se está a la espera de los resultados médicos para continuar con el proceso de vinculación. Esta situación ha generado una ligera afectación en el ritmo normal de las actividades programadas.</p>					
William F. Medina					
Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

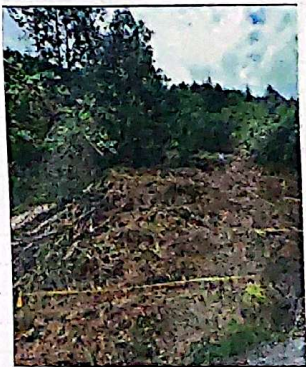FECHA:	Sábado, 24 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	025
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Soleado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
- Equipo de Topografía - Topógrafo = 1 - Cadenero = 1 - Supervisor de Obra = 1			- Estación Total - Nivel de precisión equipo RTK		
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Se recibió en obra la visita de la comisión de topografía con el objetivo de reafirmar la localización definitiva de las estructuras, en concordancia con las modificaciones realizadas y aprobadas durante la visita de Obra #1.</p> <p>Durante la jornada se revisaron los nuevos puntos de implantación y se validaron los ejes y cotas ajustadas, asegurando que las estructuras se posicionen correctamente conforme a los planos actualizados y las condiciones del terreno.</p> <p>Esta verificación es fundamental para dar continuidad a los trabajos de replanteo y cimentación con base en los ajustes acordados.</p>					
 					
William F. Medina			Profesional Autorizado por Interventoría		
Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Lunes, 26 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	026
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Nublado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra : 1 - Profesional SST: 1 - Supervisor de Obra : 1 - Maestro de Obra : 1 					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>En la presente jornada se incorpora ayudante de obra, quien inicia labores asignadas con la ejecución de actividades de limpieza general del terreno. Previamente se realiza entrega de EEP y proceso de inducción en el SG-SST.</p> <p>Estas tareas incluyeron el retiro de residuos, material vegetal y elementos que interfieren con el correcto desarrollo de las siguientes fases constructivas. La actividad se realiza con el fin de preparar el área para su intervención conforme a la programación de obra.</p> <p>Aunque las condiciones climáticas se mantienen inestables con lluvias intermitentes, se logró avanzar de manera parcial en los sectores con mejor accesibilidad y menor afectación por humedad.</p>					
 					
<i>William F. Medina</i> Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

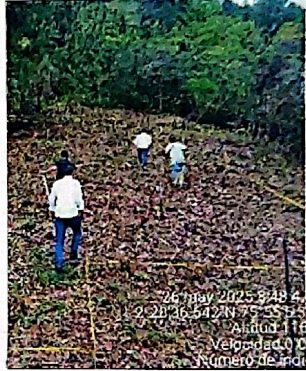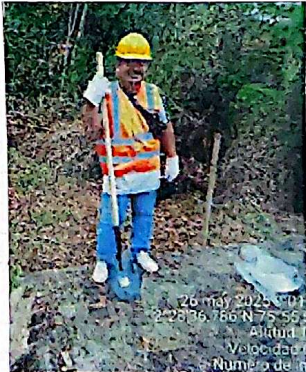FECHA:	Martes, 27 de Mayo de 2025				FOLIO NO.	027
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Nublado	TARDE:	Soleado	TIEMPO PERDIDO:	
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:			
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra : 1 - Supervisor de Obra : 1 - Maestro de Obra : 1 						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:						
<p>En la jornada, continúan las labores asignadas con la ejecución de actividades de limpieza general del terreno.</p> <p>Estas tareas incluye el retiro de residuos, material vegetal y elementos que interfieren con el correcto desarrollo de las siguientes fases constructivas. La actividad se realiza con el fin de preparar el área para su intervención conforme a la programación de obra.</p>						
 						
William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista				Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Miércoles, 28 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	028
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Lluvias moderadas	TIEMPO PERDIDO:

PERSONAL EN OBRA:

- Ayudante de Obra : 1
- Profesional SST = 1
- Maestro de Obra = 1

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

En la jornada, continúan los labores asignados con la ejecución de actividades de limpieza general del terreno.

Estas tareas incluyen el retiro de residuos, material vegetal y elementos que interfieren con el correcto desarrollo de las siguientes fases constructivas. La actividad se realiza con el fin de preparar el área para su intervención conforme a la programación de obra.



William F. Medina

Profesional Autorizado por Contratista


Profesional Autorizado por Interventoría

FECHA:	Jueves, 29 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	029
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Nublado	TARDE:	Lluvias leves	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
- Ayudante de Obra : 1 - Maestro de Obra : 1					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se inician los labores de nivelación del terreno mediante excavación manual, con el objetivo de adecuar la superficie según las cotas establecidas en los planos topográficos del proyecto.

La actividad incluye el retiro de material excedente y la conformación de taludes donde sea necesario, garantizando una base uniforme y estable para el desarrollo de las siguientes etapas constructivas. Los trabajos se ejecutan con herramienta menor y bajo supervisión técnica, conforme a los criterios establecidos en el diseño.

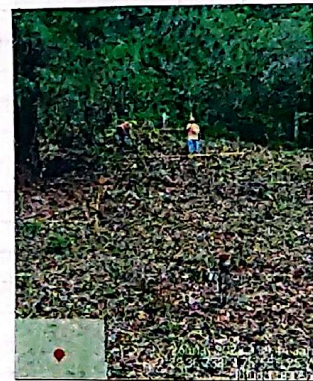


William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista	Profesional Autorizado por Interventoría
---	--

FECHA:	Viernes, 30 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	030
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Lloviznas moderadas	TARDE:	Nublado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra : 1 - Maestro de Obra : 1 					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

En la jornada de hoy, continúan las labores de nivelación del terreno mediante excavación manual, con el objetivo de adecuar la superficie según las cotas establecidas en los planos topográficos del proyecto.

La actividad incluye el refiro de material excedente y la conformación de taludes donde sea necesario, garantizando una base uniforme y estable para el desarrollo de las siguientes etapas constructivas. Los trabajos se ejecutan con herramienta menor y bajo supervisión técnica, conforme a los criterios establecidos en el diseño.

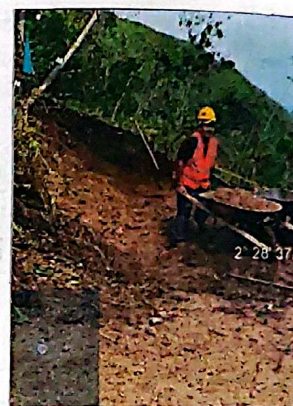

William F. Medina

Profesional Autorizado por Contratista

Profesional Autorizado por Interventoría

FECHA:	Sábado, 31 de Mayo de 2025				FOLIO NO.	031
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Soleado	TIEMPO PERDIDO:	
PERSONAL EN OBRA:				MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra : 1 - Maestro de Obra : 1 						

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se finalizan los kibores de limpieza y descapote del terreno en el marco del proyecto de construcción del sistema de acueducto, en el área destinada para cámara de lavado de arenas y caseta de almacenamiento, permitiendo una superficie disponible para las próximas actividades programadas.





William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista	Profesional Autorizado por Interventoría
---	--

FECHA:	Martes, 3 de Junio de 2025			FOLIO NO.	032
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Nubado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra : 4 - Profesional SST : 1 - Maestro de Obra : 1 - Supervisor de Obra : 1 					



ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante la jornada se realizó el ingreso de nuevos ayudantes de obra, previamente se realiza entrega de EPP y proceso de inducción en el SG-SST. Estas personas fueron asignadas a las labores de excavación manual en material en conglomerado en seco para la adecuación del área donde se construirá la estructura de llegada a la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP).

Los trabajos se ejecutan siguiendo las especificaciones técnicas del proyecto, con énfasis en el control de niveles, dimensiones y alineamientos, dado el tipo de material intervenido. La actividad se desarrolla con herramienta menor y bajo supervisión permanente, como preparación para las fases posteriores de cimentación y armado estructural.

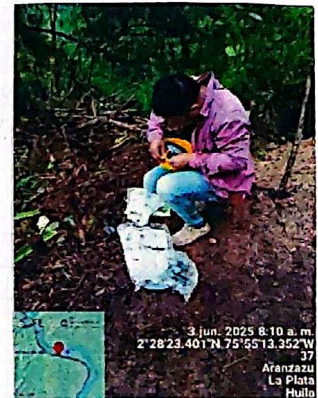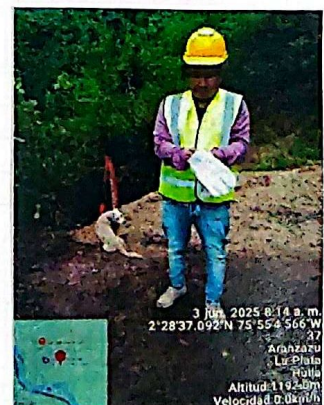

William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista	 Profesional Autorizado por Interventoría
---	--

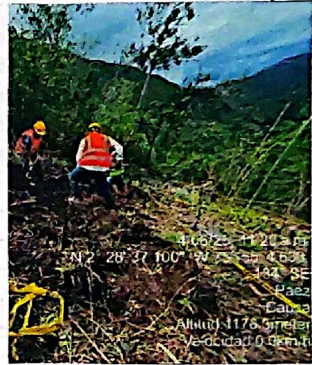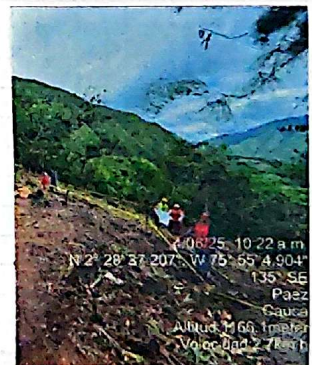
FECHA:	Miércoles, 4 de Junio de 2025			FOLIO NO.	033
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Nubado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra : 4 - Maestro de Obra : 1 					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<ul style="list-style-type: none"> - Continúan las labores de excavación manual en material conglomerado en seco para la adecuación del área donde se construirá la estructura de llegada a la Planta de Tratamiento de Agua Potable (PTAP). - Acta de Visita de Obra #2 Se realiza visita técnica en campo por parte de la supervisión con el fin de realizar inspección del avance de las actividades en obra. Se contó con presencia del equipo contratista y equipo de supervisión. 					
 					
William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Jueves, 5 de Mayo de 2025			FOLIO NO.	034
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Nublado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra : 4 - Maestro de Obra : 1 - Supervisor de Obra : 1 					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Continúa la excavación manual para la conformación de terrazas en el área designada del proyecto. Esta actividad tiene como objetivo generar superficies estables y escalonadas que permitan la correcta ejecución de obras posteriores, facilitando el acceso, circulación y la distribución de cargas en terreno con pendiente.

Los trabajos se realizan con herramienta menor, siguiendo los niveles y dimensiones establecidos en los planos topográficos, y bajo supervisión técnica para asegurar el cumplimiento de las especificaciones del diseño. La conformación de terrazas también contempla el manejo adecuado del material excavado y su disposición en zona autorizada.

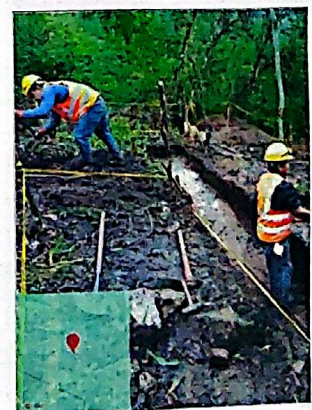


William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista	Profesional Autorizado por Interventoría
---	--

FECHA:	Viernes, 6 de Junio de 2025			FOLIO NO.	035
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Lluvias moderadas	TARDE:	Nublado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra : 4 - Maestro de Obra = 1 - Supervisor de Obra = 1 					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante la jornada continuaron las labores de excavación manual. A pesar de las condiciones climáticas inestables, con lluvias intermitentes, se logró avanzar parcialmente en los sectores con mejor accesibilidad y menor afectación por humedad.

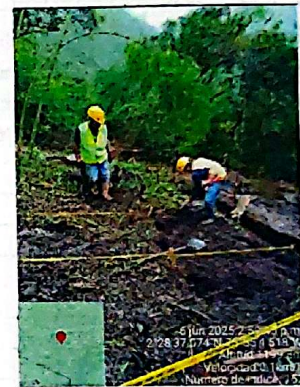

William F. Medina

Profesional Autorizado por Contratista

Profesional Autorizado por Interventoría

FECHA:			Sábado, 7 de Junio de 2025		FOLIO NO.	036
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Lluvias moderadas	TARDE:	Lluvias moderadas	TIEMPO PERDIDO:	
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:			
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra : 4 - Supervisor SST : 1 - Maestro de Obra : 1 						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:						
<p>Durante la jornada continuaron las labores de excavación manual. A pesar de las condiciones climáticas inestables, con lluvias intermitentes, se logró avanzar parcialmente en los sectores con mejor accesibilidad y menor afectación por humedad.</p>						
						
William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista				Profesional Autorizado por Interventoría		



FECHA:	Lunes, 9 de Junio de 2025			FOLIO NO.	037
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Nublado	TARDE:	Soleado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra = 4 - Supervisor SST = 1 - Maestro de Obra = 1 - Supervisor de Obra = 1 					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Se realiza la instalación de plástico negro sobre el terreno destinado para el acopio de materiales de obra, con el fin de proteger la zona de almacenamiento de la humedad, evitar el contacto directo con el suelo y preservar en buen estado los insumos constructivos.</p> <p>Esta actividad se ejecuta como medida preventiva, considerando las condiciones climáticas y la necesidad de mantener el área limpia y ordenada para facilitar la logística y el manejo de materiales durante el desarrollo del proyecto.</p>					
					
<i>William F. Medina</i> Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Martes, 10 de Junio de 2025			FOLIO NO.	038
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Nublado	TARDE:	Nublado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra = 5 - Maestro de Obra = 1 - Supervisor de Obra = 1 					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante la jornada se vincula nuevo ayudante de obra, previamente se realiza entrega de EPP y proceso de inducción en el SG-SST. Continúan los trabajos de adecuación en la zona destinada para la recepción y acopio de materiales. Las labores incluyen nivelación del terreno, compactación manual en sectores puntuales y cubrimiento del área con plástico negro previamente instalado, con el objetivo de garantizar condiciones óptimas para el almacenamiento y manejo de insumos de obra.

Estas acciones buscan optimizar la logística en el sitio, prevenir afectaciones por humedad y facilitar el acceso para la descarga y distribución de materiales.

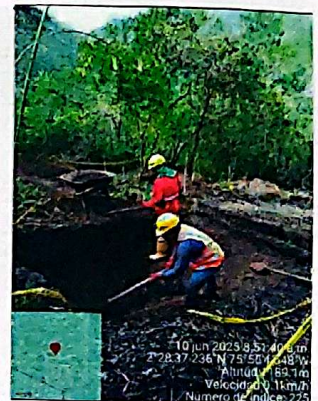

William F. Medina

Profesional Autorizado por Contratista


Profesional Autorizado por Interventoría

FECHA:	Miércoles. 11 de Junio de 2025			FOLIO NO.	039
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Nubado	TARDE:	Nubado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra: 5 - Maestro de Obra = 1 - Supervisor SST = 1 - Supervisor de Obra = 1 					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante la jornada continuaron las labores de excavación manual para la conformación de terrazas en el área designada del proyecto.

A pesar de las condiciones climáticas inestables, se logró avanzar en los sectores con mejor accesibilidad y menor afectación por humedad.

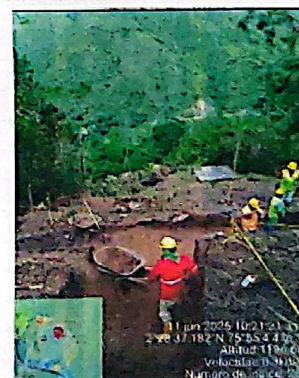

William F. Medina

Profesional Autorizado por Contratista

Profesional Autorizado por Interventoría

FECHA:	Jueves, 12 de Junio de 2025			FOLIO NO.	040
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Soleado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra : 5 - Maestro de Obra : 1 					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante la jornada continuaron las labores de excavación manual para la conformación de terrazas en el área designada del proyecto. Los trabajos se realizan con herramienta menor, siguiendo los niveles y dimensiones establecidas en los planos topográficos, y bajo supervisión técnica para asegurar el cumplimiento de las especificaciones del diseño.



William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista	Profesional Autorizado por Interventoría
---	--

FECHA:	Viernes, 13 de junio de 2025				FOLIO NO.	041
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Soleado	TIEMPO PERDIDO:	
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:			
- Ayudante de Obra : 5 - Maestro de Obra : 1						
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:						
<p> Durante la jornada continuaron las labores de excavación manual para la conformación de terrazas en el área designada del proyecto. Se avanzó en la excavación del sector destinado a la estructura de entrada de la Planta de Tratamiento de Agua Potable, perfilando el terreno conforme a los niveles y dimensiones establecidas en los planos técnicos. Estas actividades se desarrollaron con el objetivo de preparar adecuadamente la base para las futuras obras civiles asociadas a dicha estructura. </p>						
William F. Medina						
Profesional Autorizado por Contratista				Profesional Autorizado por Interventoría		



ARAMCO
INGENIEROS

BITÁCORA DE OBRA
FO-GTP-030
Fecha: 01/02/2024
Versión: 01

FECHA:	Sábado, 14 de junio de 2025			FOLIO NO.	042
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	TIEMPO PERDIDO:	

PERSONAL EN OBRA:	MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:
<ul style="list-style-type: none">- Ayudante de Obra : 5- Maestro de Obra : 1- Supervisor de Obra : 1	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante la jornada continuaron las labores de excavación manual para la conformación de terrazas en el área designada del proyecto. A pesar de las condiciones climáticas inestables, se logró avanzar en los sectores con mejor accesibilidad y menor afectación por humedad.



William F. Medina


Profesional Autorizado por Contratista

Profesional Autorizado por Interventoría

FECHA:	Lunes, 16 de junio de 2025			FOLIO NO.	043
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Soleado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra: 5 - Maestro de Obra: 1 - Supervisor de Obra: 1 - Profesional SST: 1 					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante la jornada continuaron las labores de excavación manual para la conformación de terrazas en el área designada del proyecto. En particular, se trabajó en la zona correspondiente a la cámara de lavado de grava, avanzando en la adecuación del terreno según las cotas y dimensiones establecidas en los planos técnicos.

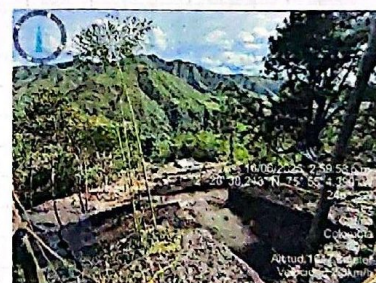


William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista	Profesional Autorizado por Interventoría
---	--


FECHA:	Martes, 17 de junio de 2025			FOLIO NO.	044
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:	Soleado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra : 5 - Maestro de Obra : 1 - Supervisor de Obra : 1 					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Durante la jornada se dio continuidad a las labores de excavación manual en la zona destinada a la cámara de lavado de grava. Se avanzó en la conformación de las terrazas y en la adecuación del terreno, alcanzando mayor profundidad y aproximándose a las cotas finales establecidas en los planos del proyecto. Las actividades se desarrollaron de acuerdo con las especificaciones técnicas, manteniendo las condiciones de seguridad y estabilidad del talud.

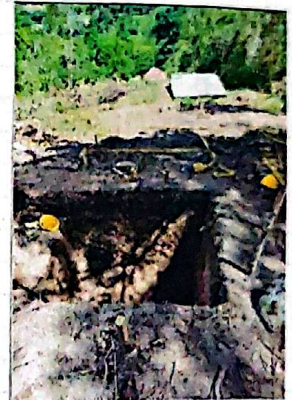

<p>William F. Medina</p> <p>Profesional Autorizado por Contratista</p>	<p>Profesional Autorizado por Interventoría</p>
--	---

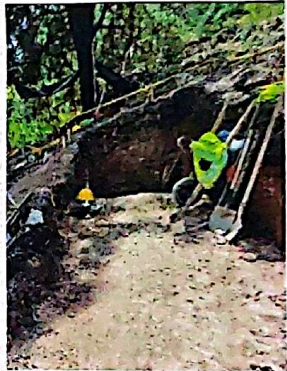FECHA:	Miércoles, 18 de junio de 2025			FOLIO NO.	045
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:		TARDE:		TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra: 5 - Maestro de Obra: 1 - Profesional SST: 1 					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Durante la jornada se iniciaron los labores de excavación manual en el área destinada al filtro grueso ascendente. Las actividades se centraron en la remoción de material y la conformación inicial del terreno, siguiendo las cotas y alineamientos definidos en los planos del proyecto. Se verificó la estabilidad del terreno excavado y se mantuvieron las condiciones de seguridad requeridas para este tipo de intervención.</p>					
					
William F. Medina					
Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Jueves 19 Junio			FOLIO NO.	046
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Nublado	TARDE:	Nublado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra: 5 - Maestro de Obra: 1 - Supervisor de Obra: 1 					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Se realiza visita a obra por parte me. Diego Bravo, apoyo a supervisión CNR; Se encuentra en obra 1 maestro, 1 ing. residente, 5 obreros se encuentran realizando labores de excavación para los espacios de las estructuras. Se verifican anchos, largos, alturas y espacios de tal manera que las estructuras estén correctamente ubicadas y su cimentación se de en terreno firme.


El filtro grueso descendente cuenta con una caja de valvula y para recepción de aguas de lavado y de excesos que en diseño debido al nivel uniforme que estableció como posición del terreno, tiene una altura de 2,30 a partir del fondo del filtro y una altura total desde borde de filtro de 3,25 m. Esta caja de manejo de lavado y excesos al localizarse en el terreno y debido al alta pendiente del terreno que es 1: se tendrían cortes y alturas del talud de 4,80 m, por lo son absolutamente necesarios para que la caja quede tan profunda, a 2,30 m.

Conjuntamente con el contratista y supervisión se revisa bien estas medidas y se establece la funcionalidad de la caja únicamente para el manejo de excesos y lavados esporádicos y debido a la disposición del terreno se decide establecer la profundidad libre de la caja en 4,0 m espacio suficiente para el manejo del agua de lavado; las medidas de ancho y largo de la caja de lavado NO se modifica.

En el momento se encuentran establecidos los niveles de las estructuras encontrando por la supervisión que no es necesario bajar mas, ya que esta en terreno firme.

En obra se encuentra señalizado y demarcado los espacios. Los trabajadores están con sus debidos EPP.

En la parte de acceso a la localidad se encuentra material acopiado.

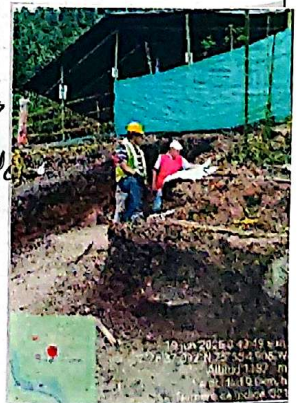

William F. Medina

Profesional Autorizado por Contratista

me. Diego Bravo CNR

Profesional Autorizado por Interventoría

FECHA:	Viernes 20 Junio			FOLIO NO.	047
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Lluvias moderadas	TARDE:	Nublado	TIEMPO PERDIDO:

PERSONAL EN OBRA:	MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:
- Ayudante de Obra : 5 - Maestro de Obra : 1	

ACTIVIDADES DESARROLLADAS: <p>Continuaron las labores de excavación manual en el área del proyecto. A pesar de las condiciones climáticas inestables, se logró avanzar significativamente en los sectores con mejor accesibilidad. El equipo de trabajo mantuvo un ritmo constante, priorizando las zonas menos afectadas por la humedad del terreno.</p> <p>Se implementaron medidas de seguridad adicionales para mitigar riesgos asociados a la inestabilidad del suelo, y se realizó un monitoreo continuo del clima para ajustar la planificación diaria de las actividades.</p>


William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista	Profesional Autorizado por Interventoría
---	--



ARAMCO
INGENIEROS

BITÁCORA DE OBRA
FO-GTP-030
Fecha: 01/02/2024
Versión: 01

FECHA:	Sábado, 21 de junio de 2025			FOLIO NO.	048
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Nubado	TARDE:	TIEMPO PERDIDO:	
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none">- Ayudante de Obra: 5- Maestro de Obra: 1- Profesional SST: 1					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Durante la jornada se iniciaron las labores de excavación manual en el área destinada al filtro lento. Las actividades se centraron en la remoción de material y la conformación inicial del terreno, siguiendo las cotas y alineamientos definidos en los planos del proyecto. Se verificó la estabilidad del terreno excavado y se mantuvieron las condiciones de seguridad requeridas para este tipo de intervención.</p>					
William F. Medina					
Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

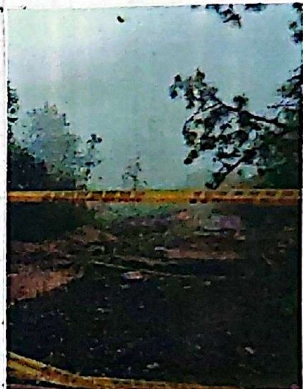FECHA:	Martes, 24 de Junio de 2025			FOLIO NO.:	049
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Lluvias moderadas	TARDE:	Nubado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra: 3 - Maestro de Obra: 1 - Supervisor de Obra: 1 					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Continúan las actividades de excavación manual en el área destinada a la construcción del filtro lento. Estas labores se están llevando a cabo conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto, asegurando el cumplimiento de los niveles y dimensiones requeridas.</p> <p>Se dio inicio al proceso de transporte de materiales hasta el sitio de la obra. Para ello, se ejecutaron labores logísticas previas que permitieron coordinar eficientemente el traslado, garantizando la disponibilidad oportuna de los insumos necesarios para el desarrollo del proyecto.</p>					
 					
William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Miercoles, 25 de Junio de 2025			FOLIO NO.	050
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Lluvias moderadas	TARDE:	Lluvias moderadas	TIEMPO PERDIDO:

PERSONAL EN OBRA:

- Ayudante de Obra : 3
- Maestro de Obra : 1
- Profesional SST : 1

MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

Continúan las actividades de excavación manual en el área destinada a la construcción del filtro lento. Estas labores se están llevando a cabo conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto, asegurando el cumplimiento de los niveles y dimensiones requeridas.





William F. Medina

Profesional Autorizado por Contratista

Profesional Autorizado por Interventoría

FECHA:	Jueves, 26 de Junio de 2025			FOLIO NO.	
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Nubado	TARDE:	Nubado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra: 5 - Maestro de Obra: 1 - Supervisor de Obra: 1 					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Continúan las actividades de excavación manual en el área destinada a la construcción del filtro lento. Estas labores se están llevando a cabo conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto, asegurando el cumplimiento de los niveles y dimensiones requeridas.</p> 					
William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista			 Profesional Autorizado por Interventoría		

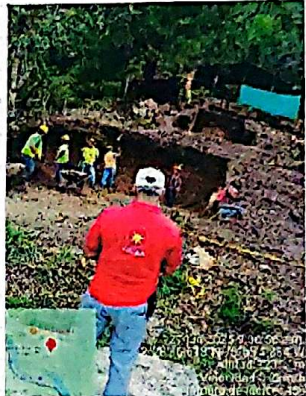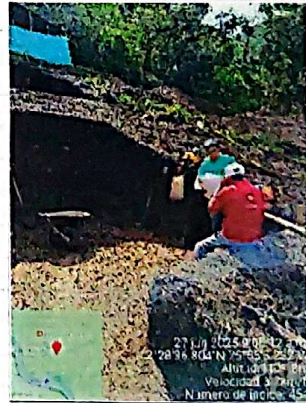FECHA:	Viernes, 27 de Junio de 2025			FOLIO NO.	052
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Nubado	TARDE:	Nubado	TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra: 5 - Maestro de Obra: 1 - Profesional SST: 1 					
ACTIVIDADES DESARROLLADAS:					
<p>Continúan las actividades de excavación manual en el área destinada a la construcción del filtro lento. Estas labores se están llevando a cabo conforme a los planos y especificaciones técnicas del proyecto, asegurando el cumplimiento de los niveles y dimensiones requeridas. Se tiene visita del maestro de CNK para supervisión de avances en obra.</p>					
 					
William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista			Profesional Autorizado por Interventoría		

FECHA:	Sábado, 28 de Junio de 2025			FOLIO NO.	053
ESTADO DEL TIEMPO:	MAÑANA:	Soleado	TARDE:		TIEMPO PERDIDO:
PERSONAL EN OBRA:			MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA:		
<ul style="list-style-type: none"> - Ayudante de Obra: 5 - Maestro de Obra: 1 - Profesional SST: 1 - Supervisor de Obra: 1 					

ACTIVIDADES DESARROLLADAS:

En la fecha correspondiente, se llevó a cabo el transporte de acero de refuerzo desde el área de almacenamiento hasta el sitio de ejecución de la obra destinada a la planta del acueducto. Esta actividad se realizó con el objetivo de disponer del material necesario para las labores de armado de estructuras de concreto. El traslado se efectuó cumpliendo con las medidas de seguridad establecidas, utilizando equipo adecuado para la manipulación del acero, y garantizando la integridad del material durante el proceso logístico.



William F. Medina Profesional Autorizado por Contratista	Profesional Autorizado por Interventoría
---	--
