

MUNICIPIO DE PAYA

NIT 800065411-5
Calle 3 No 3 - 45 C.P. 155330
Administración Central



Fecha: 20/08/2025

Comprobante de Egreso No. 989

C.C./NIT. : 826000391 Beneficiario : INGTEC LTDA
Cta. Cte. No. : 415163014632
Banco : BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - Cta. 4-1516-301-463-2 Maestra SGP Agua Potable
Referencias : CDP: -1, CRP: -15, OP: 1051 - CDP: 210, CRP: 424, OP: 1052
: LIQUIDACION DE Reserva - 2024 Doc. No. 1365 - CONTRATO MP-SAMC-003 DE 2024.
(13/12/2024). REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA
PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA
ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Concepto

CONCEPTOS

Código	Descripción	Débito	Crédito
240102	Proyectos de inversión	63.581.768,27	
111006	Cuenta de ahorro		63.581.768,27
Total Documento:		63.581.768,27	63.581.768,27

TOTAL: SESENTA Y TRES MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON VEINTISIETE CENTAVOS (63.581.768,27)

CHEQUES

Número	Chequera	Beneficiario	Valor
T.ELO0215	TRANSF ELET. 41516301463-2	INGTEC LTDA	63.581.768,27

TOTAL DESCUENTOS APLICADOS

Descuentos	Base	Valor
Contratos de Construcción 2%	76.003.353,27	1.521.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	76.003.353,27	1.521.000,00
CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - FONSET - 5%	76.003.353,27	3.800.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%	76.003.353,27	3.040.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 2%	76.003.353,27	1.521.000,00
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SERVICIOS - 1%	76.003.353,27	760.033,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	12.927.608,89	258.552,00
Total Descuentos		12.421.585,00

* Nota: Los descuentos corresponden al total en la orden de pago más no al valor proporcional del egreso

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

ID	Código	Descripción	Valor
9010	23201010010308-01-124600-01-40031400-202400000006862	Construcción - Mejoramiento y Optimización de Acueductos Municipales - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y	12.927.608,89
9221	53201010010316-01-124600-01-40031400-202400000006862	Construcción y mejoramiento de acueductos y plantas de tratamiento - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO	63.075.744,38
Total Rubros			76.003.353,27

Pago electrónico realizado a la cuenta No. 372092288 del BANCO DE BOGOTÁ


REPRESENTANTE LEGAL
o JEFE DE LA UNIDAD

GUILLERMO PARRALES FUENTES
Secretaría de Hacienda

FIRMA BENEFICIARIO

Identidad: C.C o NIT
Cel. o Tel.

Documento elaborado por 4204692



MUNICIPIO DE PAYA

NIT 800065411-5

Calle 3 No 3 - 45 C.P. 155330

Administración Central

CANCELACIÓN REGISTRO PRESUPUESTAL

Número : 424 Fecha Reg. : 20/08/2025 Referencia : 424
Concepto : SE LIBERAN RECURSOS NO EJECUTADOS SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL ADICIONAL 01 AL CONTRATO MP-SAMC-003 DE 2024. (25/04/2025). REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Pag: 1 de 1


DETALLES

Código	Fte	Descripción	Valor
23201010010308-01-124600-01-1.2.4.6.00	40031400-2024000000006862	Construcción - Mejoramiento y Optimización de Acueductos Municipales - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Alcaldia - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	5.356.701,41

TOTAL : CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (5.356.701,41)

VoBo

Documento elaborado por 4204692



MUNICIPIO DE PAYA

NIT 800065411-5
Calle 3 No 3 - 45 C.P. 155330
Administración Central

CANCELACIÓN DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

Número : 210 Fecha Reg. : 20/08/2025 Referencia : 210
Concepto : SE LIBERAN RECURSOS NO EJECUTADOS SEGUN ACTA DE LIQUIDACION DEL ADICIONAL 01 AL CONTRATO MP-SAMC-003 DE 2024. (25/04/2025). REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Pag: 1 de 1


DETALLES

Código	Fte	Descripción	Valor
23201010010308-01-124600-01-1.2.4.6.00	40031400-2024000000006862	Construcción - Mejoramiento y Optimización de Acueductos Municipales - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Alcaldia - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	5.356.701,41

TOTAL : CINCO MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS UN PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS (5.356.701,41)

VoBo

Documento elaborado por 4204692



MUNICIPIO DE PAYA

NIT 800065411-5

Calle 3 No 3 - 45 C.P. 155330

Administración Central

LIQUIDACIÓN DE CUENTAS

Fecha : 20/08/2025

Orden de Pago No. 1051

C.C/NIT. : 826000391
 Beneficiario : INGTEC LTDA
 Referencias : CDP : -1, CRP : -15
 Descripción : LIQUIDACION DE Reserva - 2024 Doc. No. 1365 - CONTRATO MP-SAMC-003 DE 2024. (13/12/2024). REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	63.075.744,38
Valor IVA	0,00
SubTotal	63.075.744,38
Descuentos	Valor
Contratos de Construcción 2%	1.262.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	1.262.000,00
CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - FONSET - 5%	3.154.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%	2.523.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 2%	1.262.000,00
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SERVICIOS - 1%	630.757,00
Total Descuentos	10.093.757,00
Neto a Pagar	52.981.987,38

TOTAL : CINCUENTA Y DOS MILLONES NOVECIENTOS OCHENTA Y UN MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS CON TREINTA Y OCHO CENTAVOS (52.981.987,38)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

Registro : -15 Fecha : 01/01/2025

ID	Código	Descripción	Valor
9221	53201010010316-01-124600-01-40031400-202400000006862	Construcción y mejoramiento de acueductos y plantas de tratamiento - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Alcaldia - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	63.075.744,38

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____

Banco : 415163014632 - Cta. 4-1516-301-463-2 Maestra SGP Agua Potable BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - 410


REPRESENTANTE LEGAL
o JEFE DE LA UNIDAD

GUILLERMO RAMOS FUENTES
Secretario de Hacienda

FIRMA BENEFICIARIO

Identidad: C.C o NIT
Cel. o Tel.

Documento elaborado por 4204692



MUNICIPIO DE PAYA
NIT 800065411-5
Calle 3 No 3 - 45 C.P. 155330
Administración Central
LIQUIDACIÓN DE CUENTAS



Fecha : 20/08/2025
 Orden de Pago No. 1052

C.C/NIT. : 826000391
Beneficiario : INGTEC LTDA
Referencias : CDP : 210, CRP : 424
Descripción : LIQUIDACION DEL ADICIONAL 01 AL CONTRATO MP-SAMC-003 DE 2024. (25/04/2025). REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

DETALLES

Concepto	Valor
Valor Cuenta	12.927.608,89
Valor IVA	0,00
SubTotal	12.927.608,89
Descuentos	Valor
Contratos de Construcción 2%	259.000,00
ESTAMPILLA PROCULTURA 2%	259.000,00
CONTRIBUCION CONTRATOS DE OBRA PUBLICA - FONSET - 5%	646.000,00
ESTAMPILLA PROADULTO MAYOR 4%	517.000,00
TASA PRO DEPORTE Y RECREACION - 2%	259.000,00
RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO -SERVICIOS - 1%	129.276,00
ESTAMPILLA PARA LA JUSTICIA FAMILIAR	258.552,00
Total Descuentos	2.327.828,00
Neto a Pagar	10.599.780,89

TOTAL : DIEZ MILLONES QUINIENTOS NOVENTA Y NUEVE MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS CON OCHENTA Y NUEVE CENTAVOS (10.599.780,89)

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL


Registro : 424 Fecha : 25/04/2025

ID	Código	Descripción	Valor
9010	23201010010308-01-124600-01-40031400-202400000006862	Construcción - Mejoramiento y Optimización de Acueductos Municipales - FTE: SGP-AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO BASICO - DEP: Alcaldia - SEC: Vivienda, Ciudad Y Territorio - PROG: Acceso de la población a los servicios de agua potable y saneamiento básico - SUBP: Intersubsectorial Vivienda y Desarrollo territorial	12.927.608,89

TESORERÍA

Cheque No. : _____ Fecha : _____
 Banco : 415163014632 - Cta. 4-1516-301-463-2 Maestra SGP Agua Potable BANCO AGRARIO DE COLOMBIA S.A. - 410

 REPRESENTANTE LEGAL
 o JEFE DE LA UNIDAD



 GUILLERMO PARRA FUENTES
 Secretario de Hacienda

 FIRMA BENEFICIARIO

 Identidad: C.C o NIT
 Cel. o Tel.

Documento elaborado por 4204692



REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PAYA

NIT. 800.065.411-5

SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

CÓDIGO: 210-GC-02.08

VERSIÓN: 5

FECHA: 18/dic/2024

Página 1 de 12

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA DE MAYORES (+) Y MENORES (-) No. 03

22 DE JULIO DE 2025
MP-SAMC-003 DE 2024
MUNICIPIO DE PAYA
JUVENAL PEREZ VEGA
ALCALDE MUNICIPAL
800.065.411-5
INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
9286000391-1
JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
74.374.894 de DUITAMA
LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal
REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACA
17 DICIEMBRE DE 2024
\$ 186.330.833.82
\$ 18.284.310.30
\$ 204.615.144,12
HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O CONTADO A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
27 DE DICIEMBRE DE 2024
21 DE ENERO DE 2025
22 DE ENERO DE 2025
28 DE MARZO DE 2025
11 DE ABRIL DE 2025
23 DE ABRIL DE 2025
24 DE ABRIL DE 2025
24 DE MAYO DE 2025
24 DE JUNIO DE 2025
24 DE JULIO DE 2025

FECHA DE INICIO:
VALOR INICIAL:
VALOR ADICIONAL:
VALOR TOTAL:
PLAZO DE EJECUCION:
SUSPENSION No. 01:
REINICIO No. 01:
PRORROGA 01:
SUSPENSION No. 02:
AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSION No. 02
REINICIO No. 02:
PRORROGA 02:
PRORROGA 03:
PRORROGA 04:
FECHA DE TERMINACION:

OBJETO:
FECHA DE INICIO:
VALOR INICIAL:
VALOR ADICIONAL:
VALOR TOTAL:
PLAZO DE EJECUCION:
SUSPENSION No. 01:
REINICIO No. 01:
PRORROGA 01:
SUSPENSION No. 02:
AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSION No. 02
REINICIO No. 02:
PRORROGA 02:
PRORROGA 03:
PRORROGA 04:
FECHA DE TERMINACION:

En el municipio de Paya-Boyacá, a los veintidos (22) días del mes de julio de 2025 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingéniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA, identificado con cedula de ciudadanía N° 74.374.894 de Duitama, en condición de representante legal del contratista con el fin de suscribir la presente:

ACTA DE MAYORES (+) Y MENORES (-) No. 03

ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CONDICIONES INICIALES			MAYORES Y MENORES (01)			MAYORES Y MENORES (02)			MAYORES Y MENORES (03)		
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS		
												CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS	CONDICIONES ACTUALIZADAS
MILAGROS-JULIO SANCHEZ														
1														
1.1	INSTALACION DE RED DE 2"	ML	535,00	\$ 31.417,53	\$ 16.808.378,55	535,00	\$ 16.808.378,55	535,00	\$ 16.808.378,55	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 16.808.378,55
1.2	INSTALACION DE RED DE 1,5"	ML	1000,00	\$ 22.673,61	\$ 22.673.610,00	1000,00	\$ 22.673.610,00	1000,00	\$ 22.673.610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 22.673.610,00
1.3	EXCAVACION MATERIAL COMUN 30X15CM	M3	21,91	\$ 64.546,54	\$ 1.414.214,69	111,83	\$ 7.217.916,84	111,83	\$ 7.217.916,84	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 7.217.916,84
1.4	EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA 30X15CM	M3	17,41	\$ 241.343,15	\$ 4.201.784,24	11,25	\$ 2.715.110,44	11,25	\$ 2.715.110,44	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 2.715.110,44



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACIA
MUNICIPIO DE PAYA
NIT. 800.065.411-5
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO

CÓDIGO: 210-GC-02.08

VERSIÓN: 5

FECHA: 18/dic/2024

Página 3 de 12

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA DE MAYORES (+) Y MENORES (-) No. 03

FECHA PRESENTE ACTA: 22 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: MP-SAMC-003 DE 2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C: 800.065.411-5
CONTRATISTA: INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT /C.C: 826000391-1
R. LEGAL: JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
CEDULA: 74.374.894 de DUITAMA
SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
Secretaria de Planeación y Desarrollo Municipal

OBJETO: REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA DE INICIO: 17 DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL: \$ 186.330.833,82
VALOR ADICIONAL: \$ 18.284.310,30
VALOR TOTAL: \$ 204.615.144,12

PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O CONTADO A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

SUSPENSIÓN No. 01: 27 DE DICIEMBRE DE 2024
REINICIO No. 01: 21 DE ENERO DE 2025
PRORROGA 01: 22 DE ENERO DE 2025
SUSPENSIÓN No. 02: 28 DE MARZO DE 2025
AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02: 11 DE ABRIL DE 2025
REINICIO No. 02: 23 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA 02: 24 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA 03: 24 DE MAYO DE 2025
PRORROGA 04: 24 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE JULIO DE 2025

MILAGROS-ESCUELA									
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO	CANTIDAD	VALOR TOTAL	VALOR UNITARIO
1.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAFA (pierrez) FORGED DE TRABAJO TIPO PESADO PARA CABLE 3/8"	UND	6,00	\$ 18.584,00	\$ 111.384,00	6,00	\$ 111.384,00	\$ 111.384,00	6,00
1.7.3	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 2"	UND	20,00	\$ 6.936,00	\$ 138.720,00	20,00	\$ 138.720,00	\$ 138.720,00	20,00
NP-07	SUMINISTRO Y/O SERVICIO DE REPOSICIÓN DE CABLE DE ALUMINIO EN CABLES DE ALUMINIO	Kg	0,00	\$ 4.033,00	\$ 0,00	26,14	\$ 219.647,70	\$ 219.647,70	26,14
1.8	REGISTRO	UND	2,00	\$ 41.269,20	\$ 82.538,40	2,00	\$ 82.538,40	\$ 82.538,40	2,00
1.9	Transporte carga mular/hasta 4 KM	CARGA	3,00	\$ 98.584,55	\$ 295.753,65	12,00	\$ 1.183.014,60	\$ 1.183.014,60	12,00
	SUBTOTAL			\$ 58.081.917,32	\$ 81.044.015,46		\$ 81.044.015,46	\$ 81.044.015,46	
2	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DOMICILIARIA TUBERIA PVC-P 1/2"	ML	286,00	\$ 2.548,32	\$ 677.853,12	0,00	\$ 0,00	\$ 677.853,12	0,00
2.1	SUMINISTRO DE UNION DE 1/2 P	UND	43,00	\$ 980,00	\$ 42.140,00	0,00	\$ 0,00	\$ 42.140,00	0,00
2.1.1	EXCAVACION MATERIAL COMUN 30X15CM	M3	11,97	\$ 64.546,54	\$ 772.622,08	0,00	\$ 0,00	\$ 772.622,08	0,00
3.1	MANTENIMIENTO E IMPERMEABILIZACION DE TANQUE DE ALMACENAMIENTO (PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3)	M2	98,13	\$ 30.780,52	\$ 3.020.492,43	0,00	\$ 0,00	\$ 3.020.492,43	0,00
3.2	MANTENIMIENTO BOCATOMA	JR	1,00	\$ 95.545,00	\$ 95.545,00	0,00	\$ 0,00	\$ 95.545,00	0,00
3.3	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ACUEDUCTO - TANQUE DE AGUA CRUDA	M2	7,20	\$ 40.686,00	\$ 292.939,20	3,00	\$ 122.058,00	\$ 414.997,20	3,00
	SUBTOTAL			\$ 40.686,00	\$ 122.058,00		\$ 122.058,00	\$ 122.058,00	
	TOTAL			\$ 81.044.015,46	\$ 81.044.015,46		\$ 81.044.015,46	\$ 81.044.015,46	



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE PAYA
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
NIT. 800.065.411-5
ACTA DE MAYORES (+) Y MENORES (+) No. 03

CÓDIGO: 210-GC-02.08
VERSIÓN: 5
FECHA: 18/dic/2024
Página 4 de 12

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

FECHA PRESENTE ACTA: 22 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: MP-SAMC-003 DE 2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C: 800.065.411-5
CONTRATISTA: INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT /C.C: 826000391-1
R. LEGAL: JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
CEDULA: 74.374.894 de DUITAMA
SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
Secretaria de Planeación y Desarrollo Municipal

OBJETO: REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA DE INICIO: 17 DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL: \$ 186.330.833,82
VALOR ADICIONAL: \$ 18.284.310,30
VALOR TOTAL: \$ 204.615.144,12

PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O CONTADO A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

SUSPENSIÓN No. 01: 21 DE ENERO DE 2025
REINICIO No. 01: 22 DE ENERO DE 2025
PRORROGA 01: 28 DE MARZO DE 2025
SUSPENSIÓN No. 02: 11 DE ABRIL DE 2025
REINICIO No. 02: 23 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA 02: 24 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA 03: 24 DE MAYO DE 2025
PRORROGA 04: 24 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE JULIO DE 2025

Item	Descripción	Unidad	Cantidad	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total	Valor Unitario	Valor Total
3.4	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa - (6000 PSI) IMPERMEABILIZADO	M3	3,85	\$ 1.194.223,80	\$ 4.597.761,63	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
3.5	MALLA ELECTROSOLDADA 0,15 X 0,15 M.D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	40,40	\$ 7.389,45	\$ 298.533,78	15,99	\$ 118.135,14	0,00	\$ 0,00	-15,99	\$ 0,00
NP-01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	M3	0,00	\$ 20.385,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
NP-02	CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI)	M3	0,00	\$ 677.498,00	\$ 0,00	0,90	\$ 609.748,20	0,00	\$ 0,00	-0,90	\$ 0,00
NP-04	MURO TOLETE COMUN E=0,10 mts.	M2	0,00	\$ 96.657,00	\$ 0,00	7,00	\$ 676.599,00	0,00	\$ 0,00	-7,00	\$ 0,00
NP-05	PANELE RUSTICO MUIROS 1:5	M2	0,00	\$ 38.983,00	\$ 0,00	14,00	\$ 545.762,00	0,00	\$ 0,00	-14,00	\$ 0,00
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	0,00	\$ 91.591,00	\$ 0,00	9,34	\$ 855.459,94	0,00	\$ 0,00	-9,34	\$ 0,00
NP-9	DEMOLICIÓN MURO CONCRETO HASTA E= 15CM	M2	0,00	\$ 35.872,86	\$ 0,00	19,50	\$ 698.500,77	0,00	\$ 0,00	-19,50	\$ 0,00
3.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADOR TIPO PESADO DE 2"	UND	1,00	\$ 768.250,90	\$ 768.250,90	1,00	\$ 768.250,90	0,00	\$ 0,00	-1,00	\$ 0,00
3.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE LLAVES DE 1/2"	UND	4,00	\$ 1.194.223,80	\$ 4.776.895,20	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE PAYA
NIT. 800.065.411-5
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO

CÓDIGO: 210-GC-02.08
VERSIÓN: 5
FECHA: 18/dic/2024
Página 5 de 12

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA DE MAYORES (+) Y MENORES (-) No. 03

FECHA PRESENTE ACTA: 22 DE JULIO DE 2025

CONTRATO: MP-SAMC-003 DE 2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA

REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA

CARGO: ALCALDE MUNICIPAL

NIT /C.C: 800.065.411-5

CONTRATISTA: INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT /C.C: 828000391-1

R. LEGAL: JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA

CEDULA: 74.374.894 de DUITAMA

SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO

Secretaria de Planeación y Desarrollo Municipal

REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACA

OBJETO: 17 DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE INICIO: \$ 186.330.833,82

VALOR INICIAL: \$ 18.284.310,30

VALOR ADICIONAL: \$ 204.615.144,12

VALOR TOTAL: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O CONTADO A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL PLAZO DE EJECUCIÓN: ACTA DE INICIO.

SUSPENSION No. 01: 27 DE DICIEMBRE DE 2024

REINICIO No. 01: 21 DE ENERO DE 2025

PRORROGA 01: 22 DE ENERO DE 2025

SUSPENSION No. 02: 28 DE MARZO DE 2025

AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSION No. 02: 11 DE ABRIL DE 2025

REINICIO No. 02: 23 DE ABRIL DE 2025

PRORROGA 02: 24 DE ABRIL DE 2025

PRORROGA 03: 24 DE MAYO DE 2025

PRORROGA 04: 24 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE JULIO DE 2025

3.8	SUMINISTRO INSTALACION DE REGISTRO DE 1/2"	UND	1,00	\$ 41.269,20	\$ 41.269,20	1,00	\$ 41.269,20	1,00	\$ 41.269,20	0,00	-1,00	0,00	\$ 0,00
3.9	TRANSPORTE CARGA MILITAR HASTA 4KM	CARGA	3,00	\$ 96.594,55	\$ 295.753,65	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL				\$ 15.680.956,19	\$ 4.436.803,15		\$ 4.436.803,15		\$ 4.436.803,15				\$ 0,00
GUAYABAL-ESCUELA													
3.1	INSTALACION DE RED EN MANGUERA TIPO PESADO DE 1"	ML	1080,00	\$ 3.473,61	\$ 3.751.498,80	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
NP-8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA TIPO PESADO 1"	ML	0,00	\$ 7.928,00	\$ 0,00	1080,00	\$ 6.562.240,00	0,00	\$ 6.562.240,00	0,00	0,00	1080,00	\$ 6.562.240,00
3.2	INSTALACION DE RED DOMICILIARIA TUBERIA PVC-P 1/2"	ML	388,00	\$ 6.669,68	\$ 2.587.835,84	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	0,00	\$ 15.420,12	\$ 0,00	488,00	\$ 7.525.018,56	0,00	\$ 7.525.018,56	0,00	0,00	488,00	\$ 7.525.018,56
3.3	EXCAVACION MATERIAL COMUN 60X15CM MANGUERA TIPO PESADO DE 1"	M3	97,20	\$ 64.546,54	\$ 6.273.923,69	81,00	\$ 5.228.269,74	0,00	\$ 5.228.269,74	0,00	0,00	81,00	\$ 5.228.269,74
3.4	EXCAVACION MATERIAL COMUN 30X15CM TUBERIA PVC-P 1/2"	M3	17,46	\$ 64.546,54	\$ 1.126.982,59	21,96	\$ 1.417.442,02	0,00	\$ 1.417.442,02	0,00	0,00	21,96	\$ 1.417.442,02
3.5	SUMINISTRO DE TUBERIA 1/2" PARA USUARIOS	ML	1200,00	\$ 1.889,60	\$ 2.243.520,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL				\$ 3.473,61	\$ 3.751.498,80		\$ 0,00		\$ 0,00				\$ 0,00



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE PAYA
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
NIT. 800.065.411-5
ACTA DE MAYORES (+) Y MENORES (-) No. 03
Página 6 de 12

CÓDIGO: 210-GC-02.08
VERSION: 5
FECHA: 18/dic/2024

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

FECHA PRESENTE ACTA: 22 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: MP-SAMC-003 DE 2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C 800.065.411-5
CONTRATISTA: INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT /C.C 826000391-1
R. LEGAL: JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
CEDULA: 74.374.894 de DUITAMA
SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
Secretaria de Planeación y Desarrollo Municipal
OBJETO: REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACA
FECHA DE INICIO: 17 DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL: \$ 186.330.833,82
VALOR ADICIONAL: \$ 18.284.310,30
VALOR TOTAL: \$ 204.615.144,12
PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O CONTADO A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
SUSPENSIÓN No. 01: 27 DE DICIEMBRE DE 2024
REINICIO No. 01: 21 DE ENERO DE 2025
PRORROGA 01: 22 DE ENERO DE 2025
SUSPENSIÓN No. 02: 28 DE MARZO DE 2025
AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02: 11 DE ABRIL DE 2025
REINICIO No. 02: 23 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA 02: 24 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA 03: 24 DE MAYO DE 2025
PRORROGA 04: 24 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE JULIO DE 2025

NP-01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	M3	0,00	\$ 20.365,00	\$ 0,00	102,96	\$ 2.096.780,40	0,00	0,00	0,00	102,96	\$ 2.096.780,40	
3.5.1	SUMINISTRO DE UNION DE 1/2 P	UND	264,00	\$ 990,00	\$ 258.720,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	
3.6	MUERTOS EN CONCRETO PARA PASO ELEVADO	ML	2,00	\$ 638.293,14	\$ 1.276.586,28	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	
3.7	GUAYA DE 3/8"	ML	113,00	\$ 13.066,00	\$ 1.476.558,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	
3.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA (perros) FORGED DE TRABAJO TIPO PESADO PARA CABLE 3/8"	UND	5,00	\$ 16.564,00	\$ 111.384,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	
3.9	REGISTRO DE 2"	UND	2,00	\$ 41.289,20	\$ 82.538,40	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	
3.10	TRANSPORTE CARGA MULAR HASTA 4KM	CARGA	3,00	\$ 98.584,55	\$ 295.753,65	4,00	\$ 394.338,20	0,00	0,00	0,00	4,00	\$ 394.338,20	
NP-02	CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI)	M3	0,00	\$ 677.499,00	\$ 0,00	0,90	\$ 609.748,20	0,00	-0,14	0,00	0,76	\$ 514.844,28	
NP-04	MURO TOILETE COMUN E=0,10 ms.	M2	0,00	\$ 96.657,00	\$ 0,00	7,00	\$ 676.599,00	0,00	-0,48	0,00	6,52	\$ 690.203,64	
NP-05	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5	M2	0,00	\$ 38.989,00	\$ 0,00	14,00	\$ 545.762,00	0,00	-2,37	0,00	11,63	\$ 453.461,95	
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	0,00	\$ 91.591,00	\$ 0,00	9,34	\$ 855.459,94	0,00	-1,70	0,00	7,64	\$ 699.645,33	
NP-9	DEMOLICIÓN MURO CONCRETO HASTA E= 15CM	M2	0,00	\$ 35.872,86	\$ 0,00	9,75	\$ 349.760,39	0,00	-1,17	0,00	8,58	\$ 307.789,14	
3.11	MALLA ELECTROSOLDADA 0,15 X 0,15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	0,00	\$ 7.389,45	\$ 0,00	10,08	\$ 74.485,66	0,00	-5,61	0,00	4,47	\$ 33.021,97	
SUBTOTAL											\$ 19.485.201,25	\$ 28.335.904,10	\$ 27.863.655,23



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PAYA
NIT. 800.065.411-5
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

CODIGO: 210-GC-02.08
VERSIÓN: 5
FECHA: 18/dic/2024
Página 7 de 12

MACROPROCESO: APOYO
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

FECHA PRESENTE ACTA: 22 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: MP-SAMC-003 DE 2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C 800.065.411-5
CONTRATISTA: INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT /C.C 826000391-1
R. LEGAL: JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
CEDULA: 74.374.894 de DUITAMA
SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO

Objeto: Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal
REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA DE INICIO: 17 DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL: \$ 186.330.833,82
VALOR ADICIONAL: \$ 18.284.310,30
VALOR TOTAL: \$ 204.615.144,12

PLAZO DE EJECUCIÓN: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O CONTADO A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

SUSPENSIÓN No. 01: 27 DE DICIEMBRE DE 2024
REINICIO No. 01: 21 DE ENERO DE 2025
PRORROGA 01: 22 DE ENERO DE 2025
SUSPENSIÓN No. 02: 28 DE MARZO DE 2025
AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02: 11 DE ABRIL DE 2025
REINICIO No. 02: 23 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA 02: 24 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA 03: 24 DE MAYO DE 2025
PRORROGA 04: 24 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE JULIO DE 2025

ALTIMIRA-ESCUELA														
4	4.1	INSTALACION DE RED DOMICILIARIA TUBERIA PVC-P 2"	ML	\$ 31.417,53	\$ 15.300.337,11	\$ 15.300.337,11	487,00	0,00	511,00	\$ 16.054.357,83	115,00	0,00	626,00	\$ 19.667.273,76
	3.5.1	SUMINISTRO DE UNION DE 2" P	UND	\$ 7.645,00	\$ 611.600,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
	4.2	EXCAVACION MATERIAL COMÚN 30X15CM	M3	\$ 64.546,54	\$ 1.414.214,69	\$ 1.414.537,42	21,92	0,00	23,00	\$ 1.484.247,69	5,18	0,00	28,17	\$ 1.818.276,03
	NP-01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	M3	\$ 20.365,00	\$ 0,00	\$ 446.298,98	21,92	0,00	23,00	\$ 468.293,18	5,18	0,00	28,17	\$ 573.882,05
	4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPON DE 2" ROSCADO	UND	\$ 9.231,90	\$ 18.463,80	\$ 18.463,80	2,00	0,00	2,00	\$ 18.463,80	0,00	0,00	2,00	\$ 18.463,80
	4.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERIA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DE DERIVACION Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXION	UND	\$ 120.308,94	\$ 601.544,70	\$ 601.544,70	5,00	0,00	5,00	\$ 601.544,70	0,00	0,00	5,00	\$ 601.544,70
	4.4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ACUEDUCTO - TANQUE DE AGUA CRUDA	M2	\$ 40.686,00	\$ 292.939,20	\$ 292.939,20	7,20	0,00	7,20	\$ 292.939,20	0,00	-3,53	3,68	\$ 149.521,05
	4.4.2	CONCRETO SIMPLE DE 28 MPa (4000 PSI) IMPERMEABILIZADO	M3	\$ 1.194.223,90	\$ 4.587.761,63	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
	NP-02	CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI)	M3	\$ 877.498,00	\$ 0,00	\$ 609.748,20	0,90	0,00	0,90	\$ 609.748,20	0,00	-0,24	0,66	\$ 448.164,93
	NP-04	MURO TOILETE COMUN E=0.10 mts	M2	\$ 96.657,00	\$ 0,00	\$ 676.599,00	7,00	0,00	7,00	\$ 676.599,00	0,00	-0,18	6,82	\$ 658.814,11
	NP-05	PANETE RUSTICO MUROS 1.5	M2	\$ 38.983,90	\$ 0,00	\$ 545.762,00	14,00	0,00	14,00	\$ 545.762,00	0,00	-0,37	13,63	\$ 531.416,26



MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE PAYA
NIT. 800.065.411-5
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO
ACTA DE MAYORES (+) Y MENORES (-) No. 03

CÓDIGO: 210-GC-02.08

VERSIÓN: 5

FECHA: 18/dic/2024

Página 8 de 12

FECHA PRESENTE ACTA: 22 DE JULIO DE 2025

CONTRATO: MP-SAMIC-003 DE 2024

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA

REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA

CARGO: ALCALDE MUNICIPAL

NIT /C.C: 800.065.411-5

CONTRATISTA: INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

R. LEGAL: 826000391-1

CEDULA: 74.374.894 de DUITAMA

SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO

OBJETO: Secretaria de Planeación y Desarrollo Municipal

REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA DE INICIO: 17 DICIEMBRE DE 2024

VALOR INICIAL: \$ 186.330.833,82

VALOR ADICIONAL: \$ 18.284.310,30

VALOR TOTAL: \$ 204.615.144,12

PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O CONTADO A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

SUSPENSION No. 01: 27 DE DICIEMBRE DE 2024

REINICIO No. 01: 21 DE ENERO DE 2025

PRORROGA 01: 22 DE ENERO DE 2025

SUSPENSION No. 02: 28 DE MARZO DE 2025

AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSION No. 02: 11 DE ABRIL DE 2025

REINICIO No. 02: 23 DE ABRIL DE 2025

PRORROGA 02: 24 DE ABRIL DE 2025

PRORROGA 03: 24 DE MAYO DE 2025

PRORROGA 04: 24 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 24 DE JULIO DE 2025

NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	0,00	\$ 91.591,00	\$ 0,00	9,34	\$ 855.459,94	0,00	-0,49	8,85	\$ 810.560,35
4.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA 0,15 X 0,15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	40,40	\$ 7.389,45	\$ 298.533,78	10,08	\$ 74.485,66	0,00	-5,19	4,89	\$ 36.117,78
4.4.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA FLOTADOR TIPO PESADO DE 2"	UND	1,00	\$ 788.250,90	\$ 788.250,90	1,00	\$ 788.250,90	0,00	-1,00	0,00	\$ 0,00
4.5	GUAYA DE 3/8"	ML	35,00	\$ 13.066,00	\$ 457.310,00	35,00	\$ 457.310,00	0,00	0,00	35,00	\$ 457.310,00
4.6	SUMINISTRO DE TUBERIA 1/2" PARA USUARIOS	ML	1200,00	\$ 1.869,60	\$ 2.243.520,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
4.6.1	SUMINISTRO DE UNION DE 1/2 P	UND	199,00	\$ 980,00	\$ 195.020,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
4.6.2	MUERTOS EN CONCRETO PARA PASO ELEVADO	M3	2,00	\$ 638.293,14	\$ 1.276.586,28	1,00	\$ 638.293,14	0,00	-0,42	0,58	\$ 367.656,35
4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA (pernis) FORGED DE TRABAJO TIPO PESADO PARA CABLE 3/8"	UND	6,00	\$ 18.564,00	\$ 111.384,00	6,00	\$ 111.384,00	0,00	0,00	6,00	\$ 111.384,00
4.8	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 2"	UND	5,00	\$ 6.936,00	\$ 34.680,00	5,00	\$ 34.680,00	0,00	0,00	5,00	\$ 34.680,00
NP-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kg	0,00	\$ 8.403,00	\$ 0,00	13,07	\$ 109.823,85	0,00	-3,76	9,31	\$ 78.208,40
4.9	TRANSPORTE CARGA MILITAR HASTA 4KM	CARGA	3,00	\$ 98.384,55	\$ 295.750,65	6,00	\$ 591.507,30	0,00	0,00	6,00	\$ 591.507,30
	SUBTOTAL				\$ 28.517.895,74		\$ 24.393.150,38				\$ 26.954.701,39



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACA
MUNICIPIO DE PAYA
SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO
NIT. 800.065.411-5
ACTA DE MAYORES (+) Y MENORES (-) No. 03

CÓDIGO: 210-GC-02.08
VERSION: 5
FECHA: 18/dic/2024
Página 9 de 12

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

FECHA PRESENTE ACTA: 22 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: MP-SAMC-003 DE 2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C: 800.065.411-5
CONTRATISTA: INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT /C.C: 826000391-1
R. LEGAL: JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
CEDULA: 74.374.894 de DUITAMA
SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
Secretaria de Planeación y Desarrollo Municipal

OBJETO: REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACA

FECHA DE INICIO: 17 DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL: \$ 186.330.833,82
VALOR ADICIONAL: \$ 18.284.310,30
VALOR TOTAL: \$ 204.615.144,12

PLAZO DE EJECUCIÓN:

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O CONTADO A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

SUSPENSIÓN No. 01: 27 DE DICIEMBRE DE 2024

REINICIO No. 01: 21 DE ENERO DE 2025

PRORROGA 01: 22 DE ENERO DE 2025

SUSPENSIÓN No. 02: 28 DE MARZO DE 2025

AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02: 11 DE ABRIL DE 2025

REINICIO No. 02: 23 DE ABRIL DE 2025

PRORROGA 02: 24 DE ABRIL DE 2025

PRORROGA 03: 24 DE MAYO DE 2025

PRORROGA 04: 24 DE JUNIO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN: 24 DE JULIO DE 2025

NISCOTA-ESCUELA											
#	DESCRIPCIÓN	ML	70,00	\$ 2.548,32	\$ 178.382,40	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED DOMICILIARIA TUBERIA PVC-P 1/2"	ML	0,00	\$ 15.420,12	\$ 0,00	70,00	\$ 1.079.408,40	0,00	\$ 0,00	70,00	\$ 1.079.408,40
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	UND	12,00	\$ 980,00	\$ 11.760,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
4.6.1	SUMINISTRO DE UNION DE 1/2"	M3	3,15	\$ 64.546,54	\$ 203.321,60	3,15	\$ 203.321,60	0,00	\$ 0,00	3,15	\$ 203.321,60
5.1.2	EXCAVACION MATERIAL COMUN 30X15CM	M3	1,80	\$ 241.343,15	\$ 434.417,67	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.1.3	EXCAVACION EN ROCA CON COMPRESOR Y DINAMITA 30X15CM	M3		\$ 20.365,00		3,15	\$ 64.149,75	0,00	\$ 0,00	3,15	\$ 64.149,75
NP-01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	UND	10,00	\$ 7.645,00	\$ 76.450,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.2	SUMINISTRO DE UNIONES DE 2"	UND	5,00	\$ 120.308,94	\$ 601.544,70	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERIA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DE DERIVACION Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXION	M3	0,40	\$ 638.293,14	\$ 255.317,26	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 MPA (2500) PARA BASES	ML	35,00	\$ 13.066,00	\$ 457.310,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
5.5	GUAYA DE 3/8"										



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PAYA
NIT. 800.065.411-5
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

CÓDIGO: 210-GC-02.08
VERSIÓN: 5
FECHA: 18/dic/2024
Página 10 de 12

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA DE MAYORES (+) Y MENORES (-) No. 03

FECHA PRESENTE ACTA:

22 DE JULIO DE 2025

CONTRATO:

MP-SAMC-003 DE 2024

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE PAYA

REPRESENTANTE LEGAL:

JUVENAL PEREZ VEGA

CARGO:

ALCALDE MUNICIPAL

NIT /C.C

800.065.411-5

CONTRATISTA:

INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

NIT /C.C

826000391-1

R. LEGAL:

JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA

CEDULA:

74.374.894 de DUITAMA

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO

Secretaria de Planeación y Desarrollo Municipal

REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

17 DICIEMBRE DE 2024

\$ 186.330.833,82

\$ 18.284.310,30

\$ 204.615.144,12

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O CONTADO A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

27 DE DICIEMBRE DE 2024

21 DE ENERO DE 2025

22 DE ENERO DE 2025

28 DE MARZO DE 2025

11 DE ABRIL DE 2025

23 DE ABRIL DE 2025

24 DE ABRIL DE 2025

24 DE MAYO DE 2025

24 DE JUNIO DE 2025

24 DE JULIO DE 2025

OBJETO:
REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA DE INICIO:

VALOR INICIAL:

VALOR ADICIONAL:

VALOR TOTAL:

PLAZO DE EJECUCION:

SUSPENSION No. 01:

REINICIO No. 01:

PRORROGA 01:

SUSPENSION No. 02:

AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSION No. 02

REINICIO No. 02:

PRORROGA 02:

PRORROGA 03:

PRORROGA 04:

FECHA DE TERMINACION:

5.6	SUMINISTRO DE TUBERIA 1/2" PARA USUARIOS	ML	1200,00	\$ 1.869,80	\$ 2.243.520,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
5.7	MUERTOS EN CONCRETO PARA PASO ELEVADO	ML	2,00	\$ 539.293,14	\$ 1.276.586,28	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
5.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA (prems) FORGED DE TRABAJO TIPO PESADO PARA CABLE 3/8"	UND	6,00	\$ 19.564,00	\$ 111.384,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
5.8.1	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 2"	UND	5,00	\$ 6.996,00	\$ 34.880,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
5.9	TRANSPORTE CARGA MULAR HASTA 4KM	CARGA	3,00	\$ 98.594,55	\$ 295.753,65	1,00	\$ 98.594,55	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 98.594,55
NP-02	CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI)	M3	0,00	\$ 877.488,00	\$ 0,00	0,90	\$ 609.745,20	0,90	0,00	\$ 609.745,20	0,00	-0,23	\$ 455.279,66
NP-04	MURO TOILETE COMUN E=0.10 mts	M2	0,00	\$ 96.657,00	\$ 0,00	7,00	\$ 676.595,00	7,00	0,00	\$ 676.595,00	0,00	-1,20	\$ 560.881,24
NP-05	PANETE RUSTICO Muros 1.5	M2	0,00	\$ 39.993,00	\$ 0,00	14,00	\$ 545.762,00	14,00	0,00	\$ 545.762,00	0,00	-2,37	\$ 453.461,95
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	0,00	\$ 91.591,00	\$ 0,00	9,34	\$ 855.459,94	9,34	0,00	\$ 855.459,94	0,00	#REF!	#REF!
NP-9	DEMOLICIÓN MURO CONCRETO HASTA E= 15CM	M2	0,00	\$ 35.872,86	\$ 0,00	12,35	\$ 443.029,82	12,35	0,00	\$ 443.029,82	0,00	-12,35	\$ 0,00
5.10	MALLA ELECTROSOLDADA Ø. 15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	0,00	\$ 7.399,45	\$ 0,00	10,08	\$ 74.485,66	10,08	0,00	\$ 74.485,66	0,00	-5,61	\$ 33.021,97
	SUBTOTAL				\$ 6.180.427,56		\$ 4.650.549,92			\$ 4.650.549,92			#REF!
6	LLANO DE MIGUEL-ESCUELA												
6.1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	17,00	\$ 64.546,54	\$ 1.097.291,18	17,00	\$ 1.097.291,18	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 1.097.291,18
6.2	LIMPIEZA DE ADUCCIÓN, CONDUCCIÓN Y TANQUES	UND	7,00	\$ 81.943,58	\$ 573.605,06	7,00	\$ 573.605,06	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 573.605,06



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PAYA
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

CÓDIGO: 210-GC-02.08
VERSIÓN: 5
FECHA: 18/dic/2024
Página 11 de 12

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA DE MAYORES (+) Y MENORES (-) No. 03

FECHA PRESENTE ACTA: 22 DE JULIO DE 2025
CONTRATO: MP-SAMC-003 DE 2024
CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA
CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
NIT /C.C: 800.065.411-5
CONTRATISTA: INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT /C.C: 826000391-1
R. LEGAL: JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
74.374.894 de DUITAMA
CEDULA: LADY PAOLA GARAVITO MARINO
SUPERVISOR DEL CONTRATO: Secretaria de Planeación y Desarrollo Municipal
OBJETO: REALIZAR ADECUACION, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA DE INICIO: 17 DICIEMBRE DE 2024
VALOR INICIAL: \$ 186.330.833,82
VALOR ADICIONAL: \$ 18.284.310,30
VALOR TOTAL: \$ 204.615.144,12
PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O CONTADO A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

SUSPENSION No. 01: 27 DE DICIEMBRE DE 2024
REINICIO No. 01: 21 DE ENERO DE 2025
PRORROGA 01: 22 DE ENERO DE 2025
SUSPENSION No. 02: 28 DE MARZO DE 2025
AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSION No. 02: 11 DE ABRIL DE 2025
REINICIO No. 02: 23 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA 02: 24 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA 03: 24 DE MAYO DE 2025
PRORROGA 04: 24 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACION: 24 DE JULIO DE 2025

		M2	39,26	\$ 1.208.443,22	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
6.3	PANETE IMPERMEABILIZADO 1.3	M2	39,26	\$ 1.208.443,22	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
6.4	CONCRETO CICLOPEO 17.5MPa (2300 PSI) RELACION 60C/40P	M3	4,90	\$ 495.243,91	6,31	\$ 3.126.722,43	0,00	0,00	6,31	0,00	\$ 3.126.722,43
6.5	PINTURA EPÓXICA	GAL	5,52	\$ 259.900,00	8,50	\$ 2.209.150,00	0,00	0,00	8,50	0,00	\$ 2.209.150,00
6.6	CERÁMICA EGEO BLANCO	M2	1,00	\$ 47.300,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
6.7	PINTURA EPÓXICA	GAL	5,52	\$ 259.900,00	0,00	\$ 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	\$ 0,00
	SUBTOTAL			\$ 8.219.522,56		\$ 8.215.211,88					\$ 7.006.768,67
MANTENIMIENTO PTAP MUNICIPIO DE PAYA											
7	LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO DE ESTRUCTURAS DE CONDUCCIÓN Y TANQUES.	UND	5,00	\$ 409.717,90	5,00	\$ 409.717,90	0,00	0,00	5,00	0,00	\$ 409.717,90
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MARCO Y TAPA EN ACERO 0.4x0.8m	UND	1,00	\$ 295.747,65	1,00	\$ 295.747,65	0,00	0,00	1,00	0,00	\$ 295.747,65
7.2	PANETE LISO MUROS 1:5	M2	2,00	\$ 50.623,80	8,00	\$ 202.495,20	0,00	0,00	8,00	0,00	\$ 202.495,20
7.3	VINILO TIPO II SOBRE PANETE DOS MANOS EN MUROS	M2	45,00	\$ 355.364,10	71,70	\$ 566.210,73	0,00	0,00	71,70	0,00	\$ 566.210,73
7.4	PINTURA EPÓXICA PARA ESTRUCTURAS	GAL	15,30	\$ 5.506.480,56	15,30	\$ 5.506.480,56	0,00	0,00	15,30	0,00	\$ 5.506.480,56
7.5	LAVAPLATOS DE ACERO INOXIDABLE 50x40 Cm ALTA CALIDAD INCLUDE ACCESORIOS	UND	1,00	\$ 548.422,00	1,00	\$ 548.422,00	0,00	0,00	1,00	0,00	\$ 548.422,00
7.6	SUBTOTAL			\$ 7.166.356,01		\$ 7.166.356,01					\$ 7.529.074,04



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PAYA

NIT 800.065.411-5

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

ACTA DE MAYORES (+) Y MENORES (-) No. 03

CODIGO: 210-GC-02-08

VERSIÓN: 5

FECHA: 18/dic/2024

Página 12 de 12

MACROPROCESO: APOYO
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

FECHA PRESENTE ACTA:

22 DE JULIO DE 2025

CONTRATO:

MP-SAMC-003 DE 2024

CONTRATANTE:

MUNICIPIO DE PAYA

REPRESENTANTE LEGAL:

JUVENAL PEREZ VEGA

CARGO:

ALCALDE MUNICIPAL

NIT /C.C

800.065.411-5

CONTRATISTA:

INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

R. LEGAL:

828000391-1

CEDULA:

74.374.894-06 DUITAMA

SUPERVISOR DEL CONTRATO:

JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA

OBJETO:

LADY PAOLA GARAVITO MARINO
Secretaria de Planeación y Desarrollo Municipal

FECHA DE INICIO:

17 DICIEMBRE DE 2024

VALOR INICIAL:

\$ 186.330.833,82

VALOR ADICIONAL:

\$ 18.284.310,30

VALOR TOTAL:

\$ 204.615.144,12

PLAZO DE EJECUCIÓN:

HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O CONTADO A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

SUSPENSIÓN No. 01:

27 DE DICIEMBRE DE 2024

PRORROGA 01:

21 DE ENERO DE 2025

SUSPENSIÓN No. 02:

22 DE ENERO DE 2025

AMPLIACIÓN No. 01 A LA SUSPENSIÓN No. 02

28 DE MARZO DE 2025

REINICIO No. 02:

11 DE ABRIL DE 2025

PRORROGA 02:

23 DE ABRIL DE 2025

PRORROGA 03:

24 DE ABRIL DE 2025

PRORROGA 04:

24 DE MAYO DE 2025

FECHA DE TERMINACIÓN:

24 DE JULIO DE 2025

	TOTAL COSTO DIRECTO	\$ 143.331.410,55	\$ 157.396.264,70	\$ 157.396.264,70	#REF!
ADMINISTRACIÓN	\$ 0,20	\$ 23.666.292,13	\$ 31.479.252,94	\$ 31.479.252,94	#REF!
IMPUESTOS	\$ 0,05	\$ 7.166.570,53	\$ 7.969.813,24	\$ 7.969.813,24	#REF!
UTILIDAD	\$ 0,05	\$ 7.166.570,53	\$ 7.969.813,24	\$ 7.969.813,24	#REF!
VALOR TOTAL		\$ 168.330.833,82	\$ 204.615.144,12	\$ 204.615.144,12	#REF!

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JUVENAL PEREZ VEGA
CONTRATANTE


LADY PAOLA GARAVITO MARINO
SUPERVISORA

JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
CONTRATISTA.

Elabora:
NIDIER ALEXIS GARCÍA GARCÉS
Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación

Revisor:
LADY PAOLA GARAVITO MARINO
Secretaria de Planeación y Desarrollo

Aprobó:
JUVENAL PEREZ VEGA
Alcalde Municipal



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PAYA
NIT. 800.065.411-5
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO

CÓDIGO: 210-GC-02.11

VERSIÓN: 5

FECHA: 18/dic/2024

MACROPROCESO: APOYO

PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL (SABANA DE CANTIDADES)

Página 1 de 3

FECHA PRESENTE ACTA: 24 DE JULIO DE 2025
 CONTRATO: MP-SAMC-003 DE 2024
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
 REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA
 CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
 NIT /C.C 800.065.411-5
 CONTRATISTA: INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 NIT /C.C 826000391-1
 R. LEGAL: JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
 CEDULA: 74.374.894 de DUITAMA
 SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
 Secretaria de Planeacion y Desarrollo Municipal

OBJETO: REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA DE INICIO: 17 DICIEMBRE DE 2024
 VALOR INICIAL: \$ 186.330.833,82
 VALOR ADICIONAL: \$ 18.284.310,30
 VALOR TOTAL: \$ 204.615.144,12
 PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O CONTADO A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

SUSPENSION No. 01: 27 DE DICIEMBRE DE 2024
 REINICIO No. 01: 21 DE ENERO DE 2025
 PRORROGA 01: 22 DE ENERO DE 2025
 SUSPENSION No. 02: 28 DE MARZO DE 2025
 AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSION No. 02: 11 DE ABRIL DE 2025
 REINICIO No. 02: 23 DE ABRIL DE 2025
 PRORROGA 02: 24 DE ABRIL DE 2025
 PRORROGA 03: 23 DE MAYO DE 2025
 PRORROGA 04: 24 DE JUNIO DE 2025
 FECHA DE TERMINACION: 24 DE JULIO DE 2025

En el municipio de Paya-Boyacá, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2025 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA, identificado con cedula de ciudadanía N° 74.374.894 de Duitama, en condición de representante legal del contratista con el fin de suscribir la presente:

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL (SABANA DE CANTIDADES)

El contratista hace entrega de:

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
GUAYABAL-ESCUELA					
3					
NP-8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA TIPO PESADO 1"	ML	1080,00	\$ 7.928,00	\$ 8.562.240,00
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	488,00	\$ 15.420,12	\$ 7.525.018,56
3.3	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 60X15CM MANGUERA TIPO PESADO DE 1"	M3	81,00	\$ 64.546,54	\$ 5.228.269,74
3.4	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 30X15CM TUBERÍA PVC-P 1/2"	M3	21,96	\$ 64.546,54	\$ 1.417.442,02
NP-01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	M3	102,96	\$ 20.365,00	\$ 2.096.780,40
3.10	TRANSPORTE CARGA MULAR HASTA 4KM	CARGA	4,00	\$ 98.584,55	\$ 394.338,20
NP-02	CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI)	M3	0,76	\$ 677.498,00	\$ 514.844,28
NP-04	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	6,52	\$ 96.657,00	\$ 630.203,64
NP-05	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5	M2	11,63	\$ 38.983,00	\$ 453.461,95
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	7,64	\$ 91.591,00	\$ 699.645,33
NP-9	DEMOLICIÓN MURO CONCRETO HASTA E= 15CM	M2	8,58	\$ 35.872,86	\$ 307.789,14
3.11	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	4,47	\$ 7.389,45	\$ 33.021,97
	SUBTOTAL			\$	27.863.055,23



FECHA PRESENTE ACTA: 24 DE JULIO DE 2025
 CONTRATO: MP-SAMC-003 DE 2024
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
 REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA
 CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
 NIT /C.C 800.065.411-5
 CONTRATISTA: INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 NIT /C.C 826000391-1
 R. LEGAL: JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
 CEDULA: 74.374.894 de DUITAMA
 SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
 Secretaría de Planeación y Desarrollo Municipal

OBJETO: REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA DE INICIO: 17 DICIEMBRE DE 2024
 VALOR INICIAL: \$ 186.330.833,82
 VALOR ADICIONAL: \$ 18.284.310,30
 VALOR TOTAL: \$ 204.615.144,12
 PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O CONTADO A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

SUSPENSION No. 01: 27 DE DICIEMBRE DE 2024
 REINICIO No. 01: 21 DE ENERO DE 2025
 PRORROGA 01: 22 DE ENERO DE 2025
 SUSPENSION No. 02: 28 DE MARZO DE 2025
 AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSION No. 02: 11 DE ABRIL DE 2025
 REINICIO No. 02: 23 DE ABRIL DE 2025
 PRORROGA 02: 24 DE ABRIL DE 2025
 PRORROGA 03: 23 DE MAYO DE 2025
 PRORROGA 04: 24 DE JUNIO DE 2025
 FECHA DE TERMINACION: 24 DE JULIO DE 2025

4 ALTAMIRA-ESCUELA					
4,1	INSTALACION DE RED DOMICILIARIA TUBERÍA PVC-P 2"	ML	626,00	\$ 31.417,53	\$ 19.667.373,78
4,2	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 30X15CM	M3	28,17	\$ 64.546,54	\$ 1.818.276,03
NP-01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	M3	28,17	\$ 20.365,00	\$ 573.682,05
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN DE 2" ROSCADO	UND	2,00	\$ 9.231,90	\$ 18.463,80
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DE DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU	UND	5,00	\$ 120.308,94	\$ 601.544,70
4.4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ACUEDUCTO - TANQUE DE AGUA CRUDA	M2	3,68	\$ 40.686,00	\$ 149.521,05
NP-02	CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI)	M3	0,66	\$ 677.498,00	\$ 448.164,93
NP-04	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	6,82	\$ 96.657,00	\$ 658.814,11
NP-05	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5	M2	13,63	\$ 38.983,00	\$ 531.416,26
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	8,85	\$ 91.591,00	\$ 810.580,35
4.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	4,89	\$ 7.389,45	\$ 36.117,78
4,5	GUAYA DE 3/8"	ML	35,00	\$ 13.066,00	\$ 457.310,00
4.6.2	MUERTOS EN CONCRETO PARA PASO ELEVADO	M3	0,58	\$ 638.293,14	\$ 367.656,85
4,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA (perros) FORGED DE TRABAJO TIPO PESADO PARA CABLE 3/8"	UND	6,00	\$ 18.564,00	\$ 111.384,00
4,8	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 2"	UND	5,00	\$ 6.936,00	\$ 34.680,00
NP-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kg	9,31	\$ 8.403,00	\$ 78.208,40
4,9	TRANSPORTE CARGA MULAR HASTA 4KM	CARGA	6,00	\$ 98.584,55	\$ 591.507,30
SUBTOTAL					\$ 26.954.701,39
4 NISCOTA-ESCUELA					
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	70,00	\$ 15.420,12	\$ 1.079.408,40
5.1.2	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 30X15CM	M3	3,15	\$ 64.546,54	\$ 203.321,60



FECHA PRESENTE ACTA: 24 DE JULIO DE 2025
 CONTRATO: MP-SAMC-003 DE 2024
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
 REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA
 CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
 NIT /C.C 800.065.411-5
 CONTRATISTA: INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 NIT /C.C 826000391-1
 R. LEGAL: JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
 CEDULA: 74.374.894 de DUITAMA
 SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
 Secretaria de Planeacion y Desarrollo Municipal

OBJETO: REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA DE INICIO: 17 DICIEMBRE DE 2024
 VALOR INICIAL: \$ 186.330.833,82
 VALOR ADICIONAL: \$ 18.284.310,30
 VALOR TOTAL: \$ 204 615 144,12
 PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O CONTADO A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

SUSPENSION No. 01: 27 DE DICIEMBRE DE 2024
 REINICIO No. 01: 21 DE ENERO DE 2025
 PRORROGA 01: 22 DE ENERO DE 2025
 SUSPENSION No. 02: 28 DE MARZO DE 2025
 AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSION No. 02: 11 DE ABRIL DE 2025
 REINICIO No. 02: 23 DE ABRIL DE 2025
 PRORROGA 02: 24 DE ABRIL DE 2025
 PRORROGA 03: 23 DE MAYO DE 2025
 PRORROGA 04: 24 DE JUNIO DE 2025
 FECHA DE TERMINACION: 24 DE JULIO DE 2025

NP-01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	M3	3,15	\$ 20.365,00	\$ 64.149,75
5,9	TRANSPORTE CARGA MULAR HASTA 4KM	CARGA	1,00	\$ 98.584,55	\$ 98.584,55
NP-02	CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI)	M3	0,67	\$ 677.498,00	\$ 455.278,66
NP-04	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	5,80	\$ 96.657,00	\$ 560.881,24
NP-05	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5	M2	11,63	\$ 38.983,00	\$ 453.461,95
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	7,62	\$ 91.591,00	\$ 698.253,15
5.10	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	4,47	\$ 7.389,45	\$ 33.021,97
SUBTOTAL					\$ 3.646.361,27
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 58.464.117,89
ADMINISTRACIÓN					20% \$ 11.692.823,58
IMPREVISTOS					0,05 \$ 2.923.205,89
UTILIDAD					0,05 \$ 2.923.205,89
VALOR TOTAL					\$ 76.003.353,26

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JUVENAL PEREZ VEGA
 CONTRATANTE

JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
 INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 CONTRATISTA.

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
 SUPERVISORA

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES Profesional de Apoyo Secretaría de Planeación	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO Secretaría de Planeación y Desarrollo	JUVENAL PEREZ VEGA Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-02.12
	SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: APOYO		FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: GESTIÓN CONTRACTUAL	ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL	Página 1 de 1

FECHA PRESENTE ACTA: 24 DE JULIO DE 2025
 CONTRATO: MP-SAMC-003 DE 2024
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
 REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA
 CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
 NIT /C.C: 800.065 411-5
 CONTRATISTA: INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 NIT /C.C: 826000391-1
 R. LEGAL: JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
 CEDULA: 74.374.894 de DUITAMA
 SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
 Secretaria de Planeacion y Desarrollo Municipal

OBJETO: REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA DE INICIO: 17 DICIEMBRE DE 2024
 VALOR INICIAL: \$ 186.330.833,82
 VALOR ADICIONAL: \$ 18.284.310,30
 VALOR TOTAL: \$ 204 615.144.12
 PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O CONTADO A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO

SUSPENSION No. 01: 27 DE DICIEMBRE DE 2024
 REINICIO No. 01: 21 DE ENERO DE 2025
 PRORROGA 01: 22 DE ENERO DE 2025
 SUSPENSION No. 02: 28 DE MARZO DE 2025
 AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSION No. 02: 11 DE ABRIL DE 2025
 REINICIO No. 02: 23 DE ABRIL DE 2025
 PRORROGA 02: 24 DE ABRIL DE 2025
 PRORROGA 03: 23 DE MAYO DE 2025
 PRORROGA 04: 24 DE JUNIO DE 2025
 FECHA DE TERMINACION: 24 DE JULIO DE 2025

En el municipio de Paya-Boyacá, a los veinticuatro (24) días del mes de julio de 2025 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA, identificado con cedula de ciudadanía N° 74.374.894 de Duitama, en condición de representante legal del contratista con el fin de suscribir la presente:

ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL

DESCRIPCION	FECHA	VALOR PAGADO
VALOR CONTRATADO	13/12/2023	\$ 186.330.833,82
VALOR ADICIONAL	24/04/2024	\$ 18.284.310,30
VALOR ACTA PARCIAL N° 1	27/05/2025	\$ 123.255.089,44
VALOR PRESENTE ACTA FINAL (a pagar)	24/07/2025	\$ 76.003.353,26
VALOR POR EJECUTAR		\$ 5.356.701,42

Total a pagar presente ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL

SETENTA Y SEIS MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE. (\$ 76.003.353,26).r

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JUVENAL PEREZ VEGA
 CONTRATANTE

JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
 INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 CONTRATISTA

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
 SUPERVISORA

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
NIDIER ALEXIS GARCIA GARCES Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO Secretaria de Planeación y Desarrollo	JUVENAL PEREZ VEGA Alcalde Municipal



FECHA PRESENTE ACTA: 11 DE AGOSTO DE 2025
 CONTRATO: MP-SAMC-003 DE 2024
 CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
 REPRESENTANTE LEGAL: JUVENAL PEREZ VEGA
 CARGO: ALCALDE MUNICIPAL
 NIT /C.C: 800.065.411-5
 CONTRATISTA: INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 NIT /C.C: 826000391-1
 R. LEGAL: JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
 CEDULA: 74.374.894 de DUITAMA
 SUPERVISOR DEL CONTRATO: LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
 Secretaria de Planeación y Desarrollo Municipal

OBJETO: REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FECHA DE INICIO: 17 DICIEMBRE DE 2024
 VALOR INICIAL: 186330833,8
 VALOR ADICIONAL: 18284310,3
 VALOR TOTAL: 204615144,1
 PLAZO DE EJECUCION: HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O CONTADO A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.

SUSPENSION No. 01: 27 DE DICIEMBRE DE 2024
 REINICIO No. 01: 21 DE ENERO DE 2025
 PRORROGA 01: 22 DE ENERO DE 2025
 SUSPENSION No. 02: 28 DE MARZO DE 2025
 AMPLIACION No. 01 A LA SUSPENSION No: 11 DE ABRIL DE 2025
 REINICIO No. 02: 23 DE ABRIL DE 2025
 PRORROGA 02: 24 DE ABRIL DE 2025
 PRORROGA 03: 23 DE MAYO DE 2025
 PRORROGA 04: 24 DE JUNIO DE 2025
 FECHA DE TERMINACION: 24 DE JULIO DE 2025

En el municipio de Paya-Boyacá, a los once (11) días del mes de agosto de 2025 se reunieron: El Doctor JUVENAL PEREZ VEGA en su condición de Alcalde, la Ingeniera LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO, Secretaria de Planeación y Desarrollo en condición de supervisora del contrato y el señor JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA, identificado con cedula de ciudadanía N° 74.374.894 de Duitama, en condición de representante legal del contratista con el fin de suscribir la presente:

ACTA DE LIQUIDACIÓN

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado		\$186.330.833,82
Valor adicional		\$18.284.310,30
Valor acta parcial No. (1)	\$123.255.089,44	
Valor acta de Liquidación	\$76.003.353,26	
Valor NO ejecutado (-)	\$5.356.701,41	
SUMAS IGUALES	\$ 204.615.144,12	\$204.615.144,12

BALANCE GENERAL		
Valor total contratado		\$204.615.144,12
Valor total recibido	\$123.255.089,44	
Valor saldo multas	0,00	
Valor saldo no ejecutado	\$5.356.701,41	
Saldo a favor del contratista	\$76.003.353,26	
Saldo en contra	0,00	
SUMAS IGUALES	\$204.615.144,12	\$204.615.144,12

Total a pagar presente acta DE LIQUIDACION:

SETENTA Y SEIS MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE. (\$ 76.003.353,26).

En constancia se firma por los que en esta intervinieron:

JUVENAL PEREZ VEGA
 CONTRATANTE

JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
 INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
 CONTRATISTA

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
 SUPERVISORA

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
NIDIER ALEXIS GARCIA GARCÉS Profesional de Apoyo Secretaria de Planeación	LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO Secretaria de Planeación y Desarrollo	JUVENAL PEREZ VEGA Alcalde Municipal

NIT 860 037 013-6
 SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
 IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: ECfj285RNqCz1f1+QMU0gQ==

No. PÓLIZA BY-100048259		No. ANEXO 9		No. CERTIFICADO 36200535		No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN 24/07/2025		SUC. EXPEDIDORA - AGENCIA BOYACA CASAN	
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	
00:00 Horas Del 17/12/2024		24:00 Horas Del 30/07/2028				N/A	
VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA						N/A	
TOMADOR		INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA				No. DOC. IDENTIDAD 826.000.391-1	
DIRECCIÓN		DUITAMA CR 15 16 22 OF. 406 TEL. 7621241				TELÉFONO 3202359640	
ASEGURADO		MUNICIPIO DE PAYA				No. DOC. IDENTIDAD 800.065.411-5	
DIRECCIÓN		CALLE 3 N3 -45				TELÉFONO 3202838493	
BENEFICIARIO		MUNICIPIO DE PAYA				No. DOC. IDENTIDAD 800.065.411-5	
DIRECCIÓN		CALLE 3 N3 -45				TELÉFONO 3202838493	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE HACE MODIFICACION A LA VIGENCIA DEL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA SEGUN ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL DE FECHA 24/07/2025

 ESTABILIDAD DE LA OBRA DESDE 24/07/2025 HASTA 24/07/2028
 GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO No.MP-SAMC-003 DE 2024 , CUYO OBJETO ES

REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

HOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADAS	VALOR PRIMAS
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 24/06/2025	24:00 Horas Del 30/01/2026	40.923.028,82	0,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 24/06/2025	24:00 Horas Del 30/07/2028	40.923.028,82	0,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 24/07/2025	24:00 Horas Del 24/07/2028	20.461.514,41	0,00
TOTAL ASEGURADO			\$ 102.307.572,05	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN	PRIMA BRUTA	\$	0,00	
SANDRA CONSUELO PATIÑO ALBA	AGENTES	100,00	DESCUENTOS	\$		
DISTRIBUCIÓN COASEGURO			EXTRA PRIMA			
COMPAÑIA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN	PRIMA NETA	\$ 0,00
CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 24/07/2025					GASTOS EXP.	\$ 0,00
					IVA	\$ 0,00
					TOTAL A PAGAR	\$ 0,00

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA)

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIALSEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LÍNEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990. LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑIA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA. EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑIA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

 Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
 ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

 Líneas de Atención al Cliente:
 • Nacional: 01 8000 111 935
 • Bogotá: 327 4712 - 327 4713

 Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
 Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.



tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6

SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

DIRECCION GENERAL CALLE 33 N. 06 - 24 PISO 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSUNIDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 06-04-2021-1317-P-05-PPSUS2R00000059-D001

No. PÓLIZA	BY-100048259	No. ANEXO	9	No. CERTIFICADO	36200535	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO		FECHA DE EXPEDICIÓN	24/07/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BOYACA CASAN		
VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS		VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE	VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA
00:00 Horas Del	17/12/2024	24:00 Horas Del	30/07/2028			N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
 Página web: www.segurosmundial.com.co
 Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
 Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"



LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza BY-100048259 y endoso, 9 cuyo afianzado es: **INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA** Asegurado o Beneficiario: **MUNICIPIO DE PAYA / MUNICIPIO DE PAYA** , expedida por la Compañía en **24/07/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BOYACA CASAN a los 24 días del mes JULIO del año 2025.



Firma Autorizada
Compañía mundial de Seguros S.A.

COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A. VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE BOYACA

LÍNEAS DE ATENCIÓN AL CLIENTE

Bogotá: (+601) 327 47 12/13 | Nacional: 01 8000 111 935 | Sitio Web: www.segurosmondial.com.co



Cumplimos con los sueños de nuestro planeta
actuando responsablemente. Protege el Medio
Ambiente evitando la impresión de este documento

@SegurosMundial






INGTEC S.A.S

NIT: 826.000.391 - 1
CRA 14 16 22 ED. OFICENTRO 403
DUITAMA - BOYACA - COLOMBIA
TEL: 3202359640
contabilidad.ingtec@gmail.com

Responsables de IVA

No somos autorretenedores
Actividad Económica ICA 4290 6.10 X 1000



Factura Electrónica De Venta

ING - 138

FECHA FACTURA | FECHA VENCIMIENTO

12/08/2025

13/10/2025

Documento Oficial de Autorización de Numeración
Facturación Electrónica No. 18764079333629 que
habilita desde ING 96 hasta ING 1000. Vence 2025-09-11

CLIENTE	MUNICIPIO DE PAYA
NIT	800065411 5
DIRECCIÓN	CIUDAD
CL 3 3 45	Payá

E-MAIL	TELÉFONO	VENDEDOR	FORMA DE PAGO
tesoreria@paya-boyaca.gov.co	6359360	JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA	Credito

Item	Código	Descripción	Cantidad	U Medida	Valor Unitario	IVA	Valor IVA	Total
1	I-04	CONTRATO DE OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE OBRAS DE INGENIERIA CIVIL	1	Und.	76.003.353,26	0%	0,00	76.003.353,26

Total líneas o ítems: 1

SUBTOTAL	76.003.353,26
DESCUENTO	0,00
IVA	0,00
TOTAL DE LA OPERACIÓN	76.003.353,26
RETEFUENTE	0,00
RETEIVA	0,00
RETEICA	0,00
TOTAL MENOS RETENCIONES	76.003.353,26

Valor en Letras

SETENTA Y SEIS MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS M/CTE


OBSERVACIONES

ACTA FINAL
MP-SAMC-003 DE 2024
REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURALD EL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica

Fecha y Hora de Generación: 12/08/2025 10:57:46

Página 1 de 1

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo		FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual	INFORME	Página 1 de 17

**INFORME DE SUPERVISIÓN FINAL
AL CONTRATO DE OBRA No. MP-SAMC-003-2024**

LUGAR Y FECHA: PAYA, Boyacá, 11 de agosto de 2025.


ASUNTO: "REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMAS DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ".

Se procedió con los siguientes resultados

1. ANTECEDENTES:

CONTRATO:	MP-SAMC-003 de 2024
FECHA:	13 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA
NIT:	800.065.411-5
CONTRATISTA:	INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT /CC:	826000391-1
DURACIÓN:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O CONTADO A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PRORROGA No. 01	HASTA EL 25 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA No. 02	UN (01) MES

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaría de Planeación y Desarrollo	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo		FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual	INFORME	Página 2 de 17


PRORROGA No. 03	UN (01) MES
PRORROGA No. 04	UN (01) MES
VALOR INICIAL:	\$186.330.833,82
VALOR ADICIONAL:	\$18.284.310,30
VALOR TOTAL:	\$204.615.144,12

- A. UBICACIÓN:** Municipio de Paya.
- B. ACTA DE INICIO:** Con fecha de 17 de diciembre de 2024.
- C. ACTA DE INICIO:** Con fecha de 28 de mayo de 2025.
- D. INFORME CONTRATISTA O BALANCE DEL SERVICIO:** El contratista presenta un el informe para constatar la ejecución del objeto contractual y de acuerdo la supervisión lo revisa y da visto bueno, informe con fecha de radicación el día 11 de agosto del 2025; el cual está contenido en fotografías de cada uno de los ítems acordados en el contrato de OBRA No. MP-SAMC-003-2024, en el informe anexa soportes del cumplimiento del objeto del contrato.
- E. DOCUMENTOS A REALIZAR:** Sabana de cantidades final, Acta de cumplimiento final y acta de liquidación.

2. SITUACIÓN ESPECÍFICA:

El presente documento corresponde al Informe de SUPERVISIÓN realizado al CONTRATO DE OBRA No. **MP- SAMC-003-2024** de la referencia y busca describir los ítems ejecutados por el contratista en cumplimiento del objeto del contrato de obra, de conformidad con el análisis documental de los soportes allegados, y visto

<i>Elaboró:</i>	<i>Revisó:</i>	<i>Aprobó:</i>
<i>Lady Paola Garavito Mariño</i>	<i>Lady Paola Garavito Mariño</i>	<i>Juvenal Pérez Vega</i>
<i>Secretaría de Planeación y Desarrollo</i>	<i>Secretaría de Planeación y Desarrollo</i>	<i>Alcalde Municipal</i>



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PAYA
NIT. 800.065.411-5

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

CÓDIGO: 210-GC-27.01

VERSIÓN: 5

FECHA: 18/dic/2024

MACROPROCESO: Apoyo

PROCESO: Gestión Contractual

INFORME

Página 3 de 17

bueno por parte de la secretaria de Planeación Municipal y acompañamiento constante en la realización las actividades:


CANTIDADES EJECUTADAS

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	GUAYABAL-ESCUELA				
NP-8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA TIPO PESADO 1"	ML	1080,00	\$ 7.928,00	\$ 8.562.240,00
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	488,00	\$ 15.420,12	\$ 7.525.018,56
3,3	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 60X15CM MANGUERA TIPO PESADO DE 1"	M3	81,00	\$ 64.546,54	\$ 5.228.269,74
3,4	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 30X15CM TUBERÍA PVC-P 1/2"	M3	21,96	\$ 64.546,54	\$ 1.417.442,02
NP-01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	M3	102,96	\$ 20.365,00	\$ 2.096.780,40
3.10	TRANSPORTE CARGA MULAR HASTA 4KM	CARGA	4,00	\$ 98.584,55	\$ 394.338,20
NP-02	CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI)	M3	0,76	\$ 677.498,00	\$ 514.844,28
NP-04	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	6,52	\$ 96.657,00	\$ 630.203,64
NP-05	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5	M2	11,63	\$ 38.983,00	\$ 453.461,95
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	7,64	\$ 91.591,00	\$ 699.645,33
NP-9	DEMOLICIÓN MURO CONCRETO HASTA E= 15CM	M2	8,58	\$ 35.872,86	\$ 307.789,14
Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
Lady Paola Garavito Mariño		Lady Paola Garavito Mariño		Juvenal Pérez Vega	
Secretaría de Planeación y Desarrollo		Secretaría de Planeación y Desarrollo		Alcalde Municipal	

Web: www.paya-boyaca.gov.co

Celular: 3202838493 – 3202838476, Dirección: calle 3 No. 3-45, Código postal. 151820-151827

E-mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co, planeacion@paya-boyaca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PAYA
NIT. 800.065.411-5

CÓDIGO: 210-GC-27.01

VERSIÓN: 5

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

FECHA: 18/dic/2024

MACROPROCESO: Apoyo

PROCESO: Gestión Contractual

INFORME

Página 4 de 17

3.11	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	4,47	\$ 7.389,45	\$ 33.021,97
	SUBTOTAL				\$ 27.863.055,23

4	ALTAMIRA-ESCUELA				
----------	-------------------------	--	--	--	--


4,1	INSTALACION DE RED DOMICILIARIA TUBERÍA PVC-P 2"	ML	626,00	\$ 31.417,53	\$ 19.667.373,78
4,2	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 30X15CM	M3	28,17	\$ 64.546,54	\$ 1.818.276,03
NP-01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	M3	28,17	\$ 20.365,00	\$ 573.682,05
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN DE 2" ROSCADO	UND	2,00	\$ 9.231,90	\$ 18.463,80
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DE DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	UND	5,00	\$ 120.308,94	\$ 601.544,70
4.4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ACUEDUCTO - TANQUE DE AGUA CRUDA	M2	3,68	\$ 40.686,00	\$ 149.521,05
NP-02	CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI)	M3	0,66	\$ 677.498,00	\$ 448.164,93
NP-04	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	6,82	\$ 96.657,00	\$ 658.814,11

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaría de Planeación y Desarrollo	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

Web: www.paya-boyaca.gov.co

Celular: 3202838493 – 3202838476, Dirección: calle 3 No. 3-45, Código postal. 151820-151827

E-mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co, planeacion@paya-boyaca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PAYA
NIT. 800.065.411-5

CÓDIGO: 210-GC-27.01

VERSIÓN: 5

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

MACROPROCESO: Apoyo

FECHA: 18/dic/2024

PROCESO: Gestión Contractual

INFORME


Página 5 de 17

NP-05	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5	M2	13,63	\$ 38.983,00	\$ 531.416,26
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	8,85	\$ 91.591,00	\$ 810.580,35
4.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	4,89	\$ 7.389,45	\$ 36.117,78
4,5	GUAYA DE 3/8"	ML	35,00	\$ 13.066,00	\$ 457.310,00
4.6.2	MUERTOS EN CONCRETO PARA PASO ELEVADO	M3	0,58	\$ 638.293,14	\$ 367.656,85
4,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA (perros) FORGED DE TRABAJO TIPO PESADO PARA CABLE 3/8"	UND	6,00	\$ 18.564,00	\$ 111.384,00
4,8	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 2"	UND	5,00	\$ 6.936,00	\$ 34.680,00
NP-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kg	9,31	\$ 8.403,00	\$ 78.208,40
4,9	TRANSPORTE CARGA MULAR HASTA 4KM	CARGA	6,00	\$ 98.584,55	\$ 591.507,30
	SUBTOTAL				\$ 26.954.701,39
4	NISCOTA-ESCUELA				
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	70,00	\$ 15.420,12	\$ 1.079.408,40
5.1.2	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 30X15CM	M3	3,15	\$ 64.546,54	\$ 203.321,60
Elaboró:		Revisó:		Aprobó:	
Lady Paola Garavito Mariño		Lady Paola Garavito Mariño		Juvenal Pérez Vega	
Secretaria de Planeación y Desarrollo		Secretaria de Planeación y Desarrollo		Alcalde Municipal	

Web: www.paya-boyaca.gov.co

Celular: 3202838493 – 3202838476, Dirección: calle 3 No. 3-45, Código postal. 151820-151827

E-mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co, planeacion@paya-boyaca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PAYA
NIT. 800.065.411-5

CÓDIGO: 210-GC-27.01

VERSIÓN: 5

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

FECHA: 18/dic/2024

MACROPROCESO: Apoyo

PROCESO: Gestión Contractual


INFORME

Página 6 de 17

NP-01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	M3	3,15	\$ 20.365,00	\$ 64.149,75
5,9	TRANSPORTE CARGA MULAR HASTA 4KM	CARGA	1,00	\$ 98.584,55	\$ 98.584,55
NP-02	CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI)	M3	0,67	\$ 677.498,00	\$ 455.278,66
NP-04	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	5,80	\$ 96.657,00	\$ 560.881,24
NP-05	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5	M2	11,63	\$ 38.983,00	\$ 453.461,95
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	7,62	\$ 91.591,00	\$ 698.253,15
5.10	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	4,47	\$ 7.389,45	\$ 33.021,97
SUBTOTAL					\$ 3.646.361,27
TOTAL COSTO DIRECTO					\$58.464.117,89
ADMINISTRACIÓN				20%	\$11.692.823,58
IMPREVISTOS				5%	\$ 2.923.205,89
UTILIDAD				5%	\$ 2.923.205,89
VALOR TOTAL					\$76.003.353,26

Por tanto, se concluye que el contratista ha cumplido **TOTALMENTE** con el objeto contractual estipulado en el **CONTRATO DE OBRA No. MP-SAMC-003-2024**.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaría de Planeación y Desarrollo	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal



REPUBLICA DE COLOMBIA
 DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
 MUNICIPIO DE PAYA
 NIT. 800.065.411-5

CÓDIGO: 210-GC-27.01

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
 DESARROLLO

VERSIÓN: 5

MACROPROCESO: Apoyo

FECHA: 18/dic/2024

PROCESO: Gestión Contractual


INFORME



Página 7 de 17

3. REGISTRO FOTOGRÁFICO

<p>Instalación de manguera tipo pesada 1" para la red de conducción del abasto de agua de la vereda Guayabal.</p>	<p>Instalación de tubería PVC 1/2" RDE 9 para la red de distribución del abasto de agua de la vereda Guayabal.</p>
<p>Excavación en material común para la red de conducción del abasto de agua de la vereda Guayabal.</p>	<p>Excavación en material común para la red de distribución del abasto de agua de la vereda Guayabal.</p>


Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaría de Planeación y Desarrollo	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo		FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual	INFORME	Página 8 de 17

	
Relleno con material proveniente de excavación para la red de conducción del abasto de agua de la vereda Guayabal.	Relleno con material proveniente de excavación en material común para la red de distribución del abasto de agua de la vereda Guayabal.

	
cargue de material para la instalación de la red de conducción del abasto de agua de la vereda Guayabal.	Instalación de concreto para la placa del tanque de almacenamiento de la escuela de Guayabal.

Elaboró: Lady Paola Garavito Mariño Secretaria de Planeación y Desarrollo	Revisó: Lady Paola Garavito Mariño Secretaria de Planeación y Desarrollo	Aprobó: Juvenal Pérez Vega Alcalde Municipal
--	---	---



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PAYA
NIT. 800.065.411-5

CÓDIGO: 210-GC-27.01

VERSIÓN: 5

FECHA: 18/dic/2024


SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

MACROPROCESO: Apoyo

PROCESO: Gestión Contractual

INFORME


Página 9 de 17

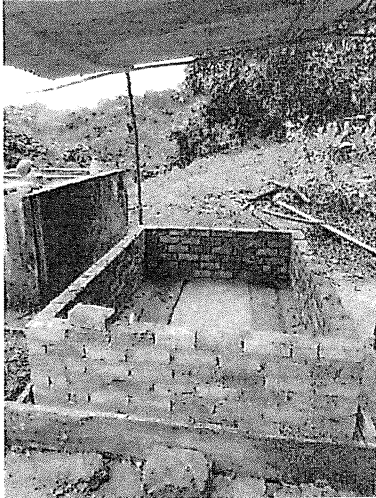


Instalación de ladrillo tolete común del tanque de almacenamiento de la escuela de Guayabal.



Pañete del ladrillo del tanque de almacenamiento de la escuela de Guayabal.

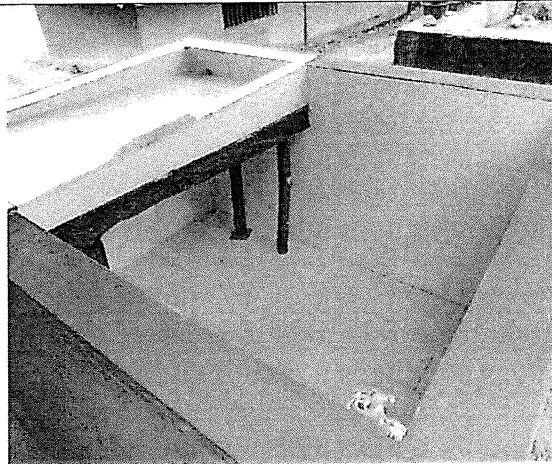

Instalación de enchape del tanque de almacenamiento de la escuela de Guayabal.

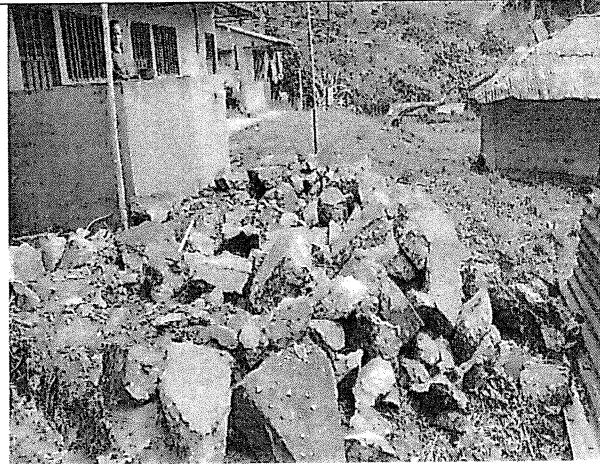


Demolición de tanque fuera de servicio de la escuela de Guayabal.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaría de Planeación y Desarrollo	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

Web: www.paya-boyaca.gov.co

Celular: 3202838493 – 3202838476, Dirección: calle 3 No. 3-45, Código postal. 151820-151827

E-mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co, planeacion@paya-boyaca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PAYA
NIT. 800.065.411-5

CÓDIGO: 210-GC-27.01

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

VERSIÓN: 5

MACROPROCESO: Apoyo

FECHA: 18/dic/2024

PROCESO: Gestión Contractual

INFORME

Página **10** de **17**



Instalación de malla electro sodada para la placa del tanque de almacenamiento de la escuela de Guayabal.



Instalación de tubería PVC 2" para la red de conducción del abasto de agua de la vereda Altamira.



Excavación de material común para la red de conducción del abasto de agua de la vereda Altamira.




Relleno con material proveniente de la excavación de material común para la red de conducción del abasto de agua de la vereda Altamira.

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaría de Planeación y Desarrollo	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

Web: www.paya-boyaca.gov.co

Celular: 3202838493 – 3202838476, Dirección: calle 3 No. 3-45, Código postal. 151820-151827

E-mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co, planeacion@paya-boyaca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PAYA
NIT. 800.065.411-5

CÓDIGO: 210-GC-27.01

VERSIÓN: 5

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

FECHA: 18/dic/2024

MACROPROCESO: Apoyo


PROCESO: Gestión Contractual

INFORME

Página **11** de **17**



Instalación de tapón roscado de 2" para tanque de almacenamiento de agua cruda del abasto de agua de la vereda Altamira.

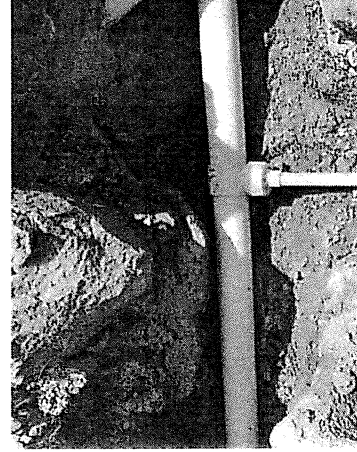

Derivación de acometidas




Localización y replanteo para tanque de almacenamiento de la escuela de la vereda de Altamira.



Instalación de concreto para la placa del tanque de almacenamiento de la escuela de la vereda de Altamira.

Elaboró: Lady Paola Garavito Mariño Secretaría de Planeación y Desarrollo	Revisó: Lady Paola Garavito Mariño Secretaría de Planeación y Desarrollo	Aprobó: Juvenal Pérez Vega Alcalde Municipal
--	---	---



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PAYA
NIT. 800.065.411-5

CÓDIGO: 210-GC-27.01

VERSIÓN: 5

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

FECHA: 18/dic/2024

MACROPROCESO: Apoyo


PROCESO: Gestión Contractual

INFORME


Página 12 de 17



Instalación de ladrillo tolete común para tanque de almacenamiento de la escuela de la vereda de Altamira.

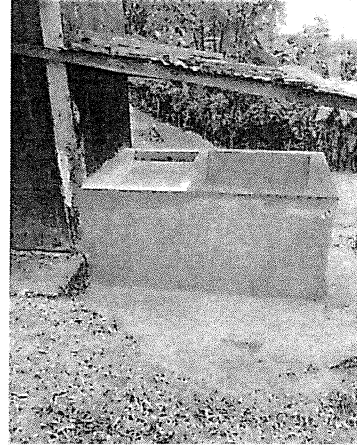

Pañete para muros del tanque de almacenamiento de la escuela de la vereda de Altamira.

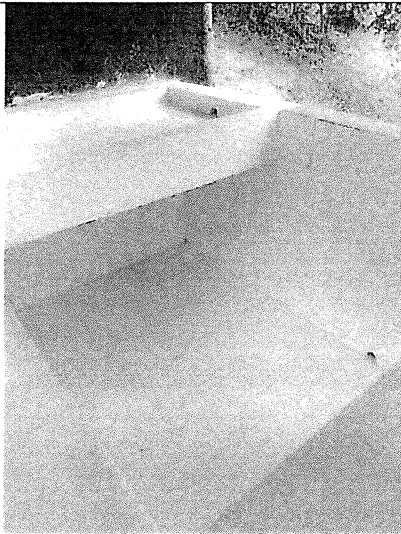


Instalación de enchape para tanque de almacenamiento de la escuela de la vereda de Altamira.



Instalación de malla electrosoldada para la placa del tanque de

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaría de Planeación y Desarrollo	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PAYA
NIT. 800.065.411-5

CÓDIGO: 210-GC-27.01

VERSIÓN: 5

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

FECHA: 18/dic/2024


MACROPROCESO: Apoyo

PROCESO: Gestión Contractual

INFORME

Página 13 de 17

almacenamiento de la escuela de la vereda de Altamira.

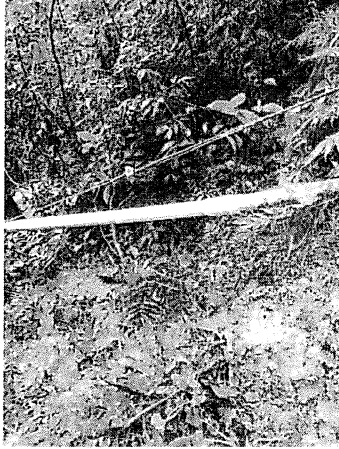


Instalación de guaya para la red de conducción del abasto de agua de la vereda Altamira.



Instalación de cámara de anclaje para guaya del paso elevado de la red de conducción del abasto de agua de la vereda Altamira.



Instalación de grapas para guaya del paso elevado de la red de conducción

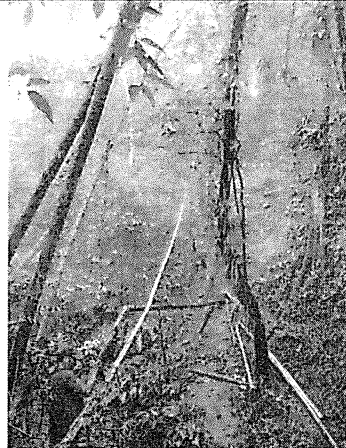


Instalación de abrazaderas para guaya del paso elevado de la red de

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaría de Planeación y Desarrollo	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal

Web: www.paya-boyaca.gov.co

Celular: 3202838493 – 3202838476, Dirección: calle 3 No. 3-45, Código postal. 151820-151827

E-mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co, planeacion@paya-boyaca.gov.co



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PAYA
NIT. 800.065.411-5

CÓDIGO: 210-GC-27.01

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

VERSIÓN: 5

MACROPROCESO: Apoyo

FECHA: 18/dic/2024

PROCESO: Gestión Contractual

INFORME

Página 14 de 17

del abasto de agua de la vereda
Altamira.

conducción del abasto de agua de la
vereda Altamira.




Instalación de acero para la cámara
de anclaje del paso elevado del
abasto de agua de la vereda
Altamira.

Transporte de material para construcción
de paso elevado del abasto de agua de la
vereda Altamira.



Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PAYA
NIT. 800.065.411-5

CÓDIGO: 210-GC-27.01

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

VERSIÓN: 5

MACROPROCESO: Apoyo

FECHA: 18/dic/2024

PROCESO: Gestión Contractual

INFORME

Página 15 de 17



Instalación de tubería PVC ½" RDE 9 para la red de distribución del abasto de agua de la vereda Niscota.

Excavación en material común para la red de distribución del abasto de agua de la vereda Niscota.



Relleno con material proveniente de excavación en material común para la red de distribución del abasto de agua de la vereda Niscota.

Transporte de material para red de distribución del abasto de agua de la vereda Niscota.

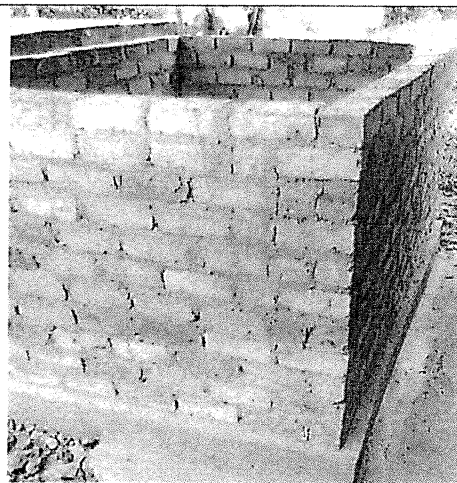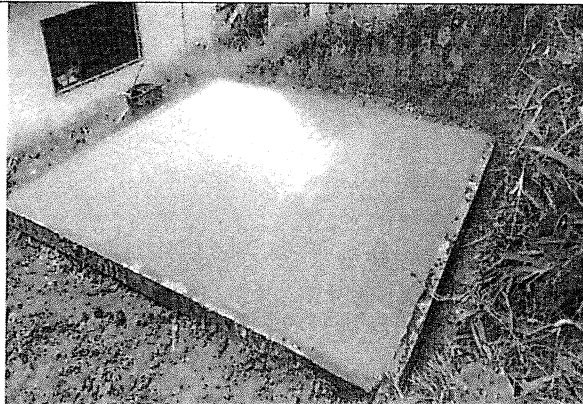

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaría de Planeación y Desarrollo	Secretaría de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal



Web: www.paya-boyaca.gov.co

Celular: 3202838493 – 3202838476, Dirección: calle 3 No. 3-45, Código postal. 151820-151827

E-mail: alcaldia@paya-boyaca.gov.co, planeacion@paya-boyaca.gov.co

	REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ MUNICIPIO DE PAYA NIT. 800.065.411-5	CÓDIGO: 210-GC-27.01
	SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y DESARROLLO	VERSIÓN: 5
MACROPROCESO: Apoyo		FECHA: 18/dic/2024
PROCESO: Gestión Contractual	INFORME	Página 16 de 17

Instalación de concreto para la placa del tanque de almacenamiento de la escuela de la vereda de Niscota.	Instalación de ladrillo tolete común para tanque de almacenamiento de la escuela de la vereda de Niscota.
---	---

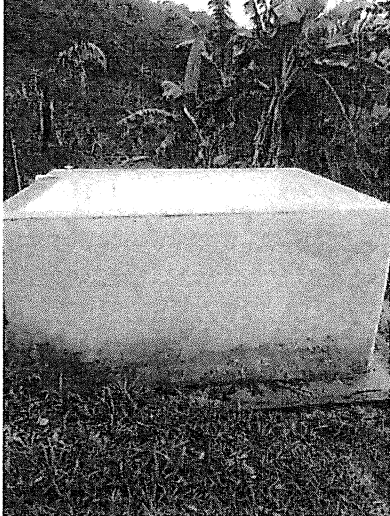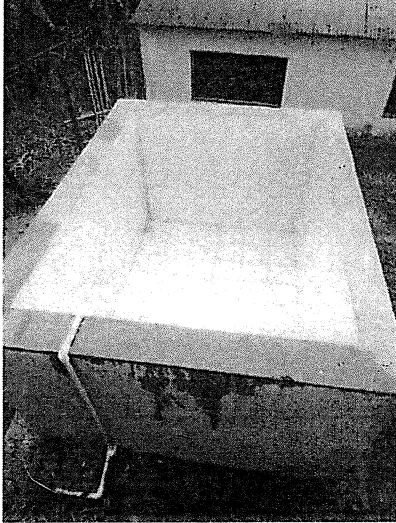
	
Pañete para muros del tanque de almacenamiento de la escuela de la vereda de Niscota.	Instalación de enchape para tanque de almacenamiento de la escuela de la vereda de Niscota.

4. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO:

4.1. RESUMEN DEL ESTADO DEL CONTRATO:

VALOR TOTAL CONTRATADO		
Valor total contratado		\$186.330.833,82
Valor adicional		\$18.284.310,30
Valor acta parcial No. (1)	\$123.255.089,44	
Valor acta de Liquidación	\$76.003.353,26	

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ
MUNICIPIO DE PAYA
NIT. 800.065.411-5

CÓDIGO: 210-GC-27.01

VERSIÓN: 5

SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y
DESARROLLO

FECHA: 18/dic/2024

MACROPROCESO: Apoyo

PROCESO: Gestión Contractual

INFORME

Página 17 de 17

Valor NO ejecutado (-)	\$5.356.701,41	
SUMAS IGUALES	\$ 204.615.144,12	\$204.615.144,12


BALANCE GENERAL		
Valor total contratado		\$204.615.144,12
Valor total recibido	\$123.255.089,44	
Valor saldo multas	0,00	
Valor saldo no ejecutado	\$5.356.701,41	
Saldo a favor del contratista	\$76.003.353,26	
Saldo en contra	0,00	
SUMAS IGUALES	\$204.615.144,12	\$204.615.144,12

4.2. VALOR ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL:

SETENTA Y SEIS MILLONES TRES MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS CON VEINTISÉIS CENTAVOS M/CTE. (\$ 76.003.353,26).

Teniendo en cuenta lo anterior esta supervisión **AUTORIZA Y RECOMIENDA EL ACTA DE CUMPLIMIENTO FINAL** de los compromisos adquiridos en el contrato en mención.

En constancia firma,



Ing. LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
Supervisora del contrato

Elaboró:	Revisó:	Aprobó:
Lady Paola Garavito Mariño	Lady Paola Garavito Mariño	Juvenal Pérez Vega
Secretaria de Planeación y Desarrollo	Secretaria de Planeación y Desarrollo	Alcalde Municipal.

CONTRATO No. MP-SAMC-003 de 2024.

**REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE
LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y
SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL
MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ.**

INFORME DE OBRA FINAL

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA

**CONTRATISTA: INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA NIT 826000391-1**

**SUPERVISOR: ING. LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
Secretaria de Planeación y Desarrollo
Municipal**

PAYA, 11 DE AGOSTO DE 2025

PAYA, 11 DE AGOSTO DE 2025

Ingeniera:

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO

Secretaria de Planeación y Desarrollo

Supervisora

Alcaldía Municipal De Paya

Referencia: Informe de obra FINAL al contrato No. MP-SAMC-003 de 2024
"REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA
DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMAS DE ACUEDUCTO
DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO
DE BOYACÁ.

El informe incluye los siguientes aspectos:

1. Aspecto Legal y Administrativo
2. Aspecto Financiero
3. Aspecto Técnico – Constructivo

Sin otro particular

Atentamente,



JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA

R. LEGAL INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

1. ASPECTO LEGAL Y ADMINISTRATIVO

1.1. CONTRATO DE OBRA

CONTRATO:	MP-SAMC-003 de 2024
FECHA:	13 DE DICIEMBRE DE 2024
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PAYA
NIT:	800.065.411-5
CONTRATISTA:	INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA
NIT /CC:	826000391-1
DURACIÓN:	HASTA EL 30 DE DICIEMBRE DE 2024 O CONTADO A PARTIR DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO, APROBACIÓN DE GARANTÍAS Y SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.
PRORROGA No. 01	HASTA EL 25 DE ABRIL DE 2025
PRORROGA No. 02	UN (01) MES
PRORROGA No. 03	UN (01) MES
PRORROGA No. 04	UN (01) MES
VALOR INICIAL:	\$186.330.833,82
VALOR ADICIONAL:	\$18.284.310,30
VALOR TOTAL:	\$204.615.144,12

1.2. RELACIÓN DE ACTAS SUSCRITAS

NUMERO	DESCRIPCION	FECHA
1	Acta Iniciación de obra	17/12/2024
2	Suspensión No. 01	27/12/2024
3	Reinicio No. 01:	21/01/2025
4	Prorroga 01:	21/01/2025
5	Suspensión No. 02:	28/03/2025
6	Ampliación No. 01 A La Suspensión No. 02	11/04/2025
7	Reinicio No. 02:	23/04/2025
8	Prorroga 02:	24/04/2025
9	Prorroga 03:	23/05/2025
10	Prorroga 04:	24/06/2025

1.3. PERSONAL A CARGO DEL PROYECTO

INGENIERO CONTRATISTA:

INGENIERO RESIDENTE:

OFICIAL:

MAESTRO:

1.4. GARANTÍAS CONTRATO DE OBRA

POLIZAS CONTRATO DE OBRA ACTUALIZADAS

AMPAROS	DESDE	HASTA	VALOR ASEGURADO
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	24/06/2025	30/01/2026	\$40.923.028,82
PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	24/06/2025	30/07/2028	\$40.923.028,82
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	24/07/2025	24/07/2028	\$20.461.514,41

1.5. RELACIÓN DE MAQUINARIA UTILIZADA

CANTIDAD	DESCRIPCION
1	CAMIONETA DOBLE CABINA
1	CAMION ESTACAS
1	MEZCLADORA DE CONCRETO DE 1 BULTO

1.6. MATERIALES EMPLEADOS PARA LA EJECUCION DE LA OBRA UTILIZADA

CEMENTO ARGOS TIPO GENERAL

TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9

TUBERÍA UNIÓN MECÁNICA RD 21

GUAYA DE ACERO INOXIDABLE

PERROS FORGED

MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM

ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA

2. ASPECTO FINANCIERO

ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
3	GUAYABAL-ESCUELA				
NP-8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA TIPO PESADO 1"	ML	1080,00	\$ 7.928,00	\$ 8.562.240,00
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	488,00	\$ 15.420,12	\$ 7.525.018,56
3,3	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 60X15CM MANGUERA TIPO PESADO DE 1"	M3	81,00	\$ 64.546,54	\$ 5.228.269,74
3,4	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 30X15CM TUBERÍA PVC-P 1/2"	M3	21,96	\$ 64.546,54	\$ 1.417.442,02
NP-01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	M3	102,96	\$ 20.365,00	\$ 2.096.780,40
3.10	TRANSPORTE CARGA MULAR HASTA 4KM	CARGA	4,00	\$ 98.584,55	\$ 394.338,20
NP-02	CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI)	M3	0,76	\$ 677.498,00	\$ 514.844,28
NP-04	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	6,52	\$ 96.657,00	\$ 630.203,64
NP-05	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5	M2	11,63	\$ 38.983,00	\$ 453.461,95
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	7,64	\$ 91.591,00	\$ 699.645,33
NP-9	DEMOLICIÓN MURO CONCRETO HASTA E= 15CM	M2	8,58	\$ 35.872,86	\$ 307.789,14
3.11	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	4,47	\$ 7.389,45	\$ 33.021,97
	SUBTOTAL				\$ 27.863.055,23

4	ALTAMIRA-ESCUELA				
4,1	INSTALACION DE RED DOMICILIARIA TUBERÍA PVC-P 2"	ML	626,00	\$ 31.417,53	\$ 19.667.373,78
4,2	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 30X15CM	M3	28,17	\$ 64.546,54	\$ 1.818.276,03
NP-01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	M3	28,17	\$ 20.365,00	\$ 573.682,05
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN DE 2" ROSCADO	UND	2,00	\$ 9.231,90	\$ 18.463,80
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DE DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	UND	5,00	\$ 120.308,94	\$ 601.544,70
4.4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ACUEDUCTO - TANQUE DE AGUA CRUDA	M2	3,68	\$ 40.686,00	\$ 149.521,05
NP-02	CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI)	M3	0,66	\$ 677.498,00	\$ 448.164,93
NP-04	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	6,82	\$ 96.657,00	\$ 658.814,11
NP-05	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5	M2	13,63	\$ 38.983,00	\$ 531.416,26
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	8,85	\$ 91.591,00	\$ 810.580,35
4.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	4,89	\$ 7.389,45	\$ 36.117,78
4,5	GUAYA DE 3/8"	ML	35,00	\$ 13.066,00	\$ 457.310,00

4.6.2	MUERTOS EN CONCRETO PARA PASO ELEVADO	M3	0,58	\$ 638.293,14	\$ 367.656,85
4,7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA (perros) FORGED DE TRABAJO TIPO PESADO PARA CABLE 3/8"	UND	6,00	\$ 18.564,00	\$ 111.384,00
4,8	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 2"	UND	5,00	\$ 6.936,00	\$ 34.680,00
NP-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kg	9,31	\$ 8.403,00	\$ 78.208,40
4,9	TRANSPORTE CARGA MULAR HASTA 4KM	CARGA	6,00	\$ 98.584,55	\$ 591.507,30
	SUBTOTAL				\$ 26.954.701,39
4	NISCOTA-ESCUELA				
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	70,00	\$ 15.420,12	\$ 1.079.408,40
5.1.2	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 30X15CM	M3	3,15	\$ 64.546,54	\$ 203.321,60
NP-01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	M3	3,15	\$ 20.365,00	\$ 64.149,75
5,9	TRANSPORTE CARGA MULAR HASTA 4KM	CARGA	1,00	\$ 98.584,55	\$ 98.584,55
NP-02	CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI)	M3	0,67	\$ 677.498,00	\$ 455.278,66
NP-04	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	5,80	\$ 96.657,00	\$ 560.881,24
NP-05	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5	M2	11,63	\$ 38.983,00	\$ 453.461,95
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	7,62	\$ 91.591,00	\$ 698.253,15
5.10	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO	Kg	4,47	\$ 7.389,45	\$ 33.021,97

FIJACION INSTALACION)	E			
SUBTOTAL				\$ 3.646.361,27
TOTAL COSTO DIRECTO				\$58.464.117,89
ADMINISTRACIÓN			20%	\$11.692.823,58
IMPREVISTOS			5%	\$ 2.923.205,89
UTILIDAD			5%	\$ 2.923.205,89
VALOR TOTAL				\$76.003.353,26

3. ASPECTO TÉCNICO – CONSTRUCTIVO


ACTIVIDADES O ITEM EJECUTADOS


ALCANCE DEL PROYECTO

Durante el periodo de construcción de la obra se realizaron varios comités de obra, en donde se trataron temas relacionados con las actividades realizadas en el proyecto, avance de obra, rendimientos, permisos, inconvenientes técnicos y demás temas relacionados con el aspecto técnico del proyecto.


Las actividades ejecutadas para este periodo de ejecución del contrato corresponden básicamente a:


ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-8	SUMINISTRO E INSTALACION DE MANGUERA TIPO PESADO 1"	ML	1080,00	1080,00
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	488,00	488,00
				


ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
3,3	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 60X15CM MANGUERA TIPO PESADO DE 1"	M3	81,00	81,00
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
3,4	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 30X15CM TUBERÍA PVC-P 1/2"	M3	21,96	21,96
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	M3	102,96	102,96
				


ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
3.10	TRANSPORTE CARGA MULAR HASTA 4KM	CARGA	4,00	4,00
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-02	CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI)	M3	0,76	0,76
				

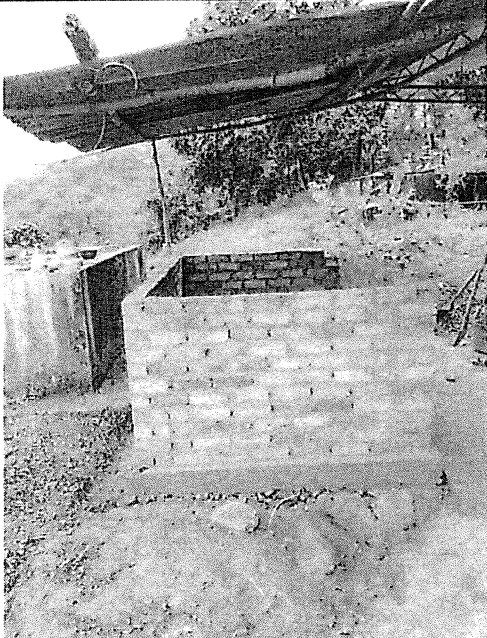ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-04	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	6,52	6,52
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-05	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5	M2	11,63	11,63
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	7,64	7,64
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-9	DEMOLICIÓN MURO CONCRETO HASTA E= 15CM	M2	8,58	8,58
				


ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
3.11	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	4,47	4,47
				


ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
4,1	INSTALACION DE RED DOMICILIARIA TUBERÍA PVC-P 2"	ML	626,00	626,00
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
4,2	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 30X15CM	M3	28,17	28,17
				


ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	M3	28,17	28,17
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
4,3	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN DE 2" ROSCADO	UND	2,00	2,00
				

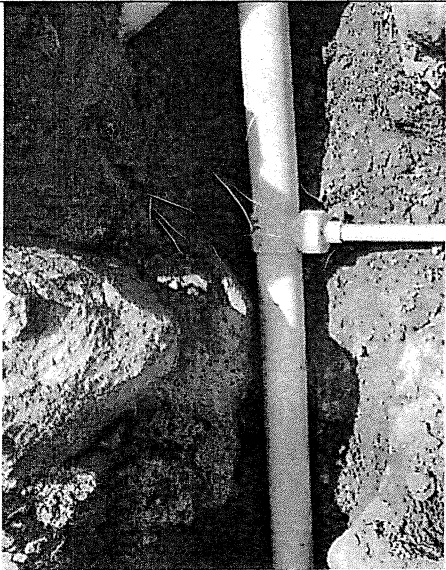
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
4,4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOMETIDA 2" X 1/2" INCLUYE TUBERÍA PF + UAD 1/2", REGISTRO DE CORTE, COLLAR DE DERIVACIÓN Y ACCESORIOS COMPLEMENTARIOS PARA SU CONEXIÓN.	UND	5,00	5,00
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
4.4.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO DE ACUEDUCTO - TANQUE DE AGUA CRUDA	M2	3,68	3,68
				


ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-02	CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI)	M3	0,66	0,66
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-04	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	6,82	6,82
				


ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-05	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5	M2	13,63	13,63

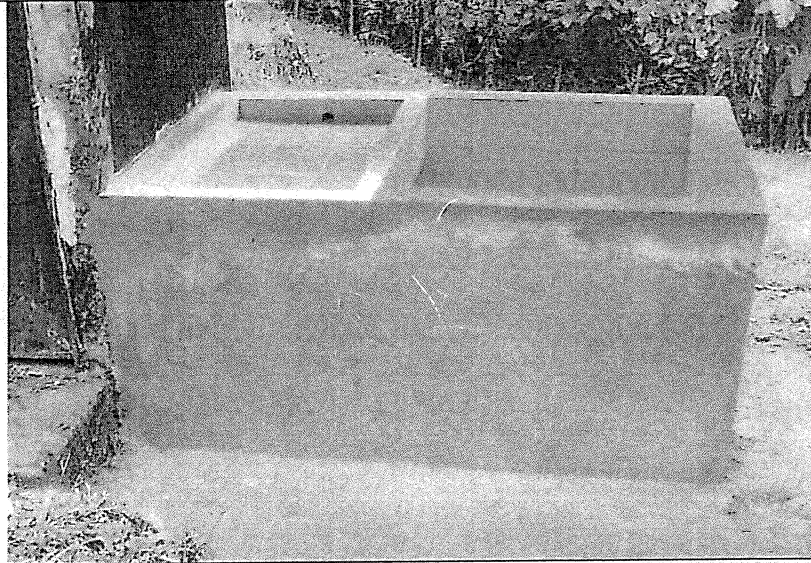

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAFE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	8,85	8,85

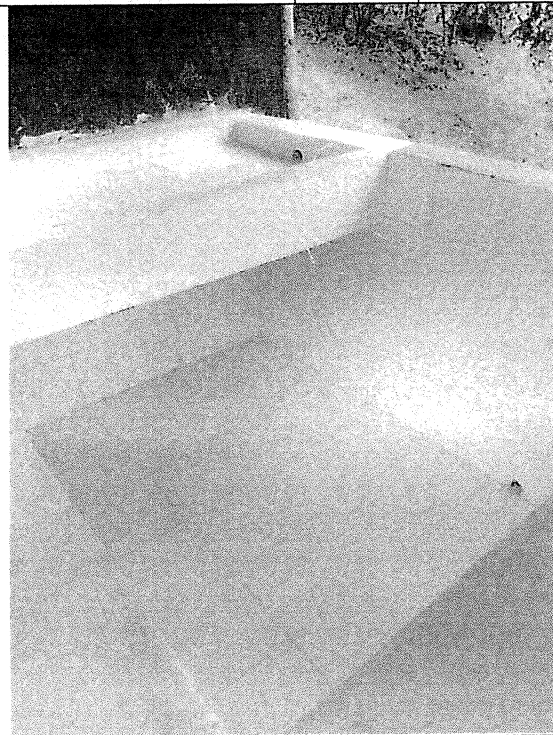


Dirección: Carrera 15 No. 16 – 22, Edificio Oficentro, Oficina 403, Duitama. Telefax: (098) 7621241
 Celular: 320 2359640. E mail: ingtec96.sas@gmail.com

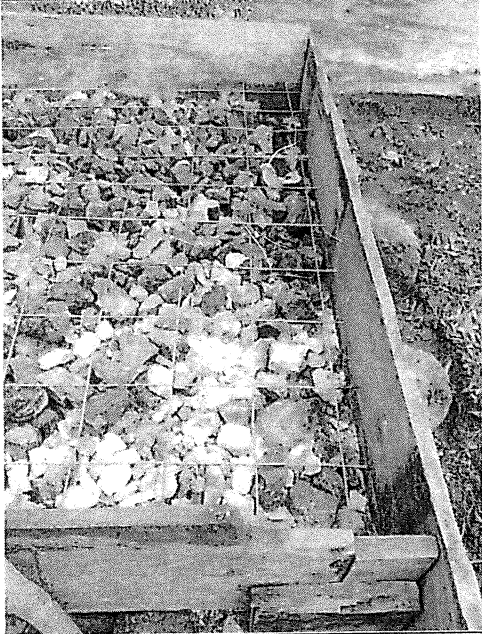ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
4.4.2	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	4,89	4,89
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
4,5	GUAYA DE 3/8"	ML	35,00	35,00
				


ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
4.6.2	MUERTOS EN CONCRETO PARA PASO ELEVADO	M3	0,58	0,58
				


ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA (perros) FORGED DE TRABAJO TIPO PESADO PARA CABLE 3/8"	UND	6,00	6,00
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
4,8	ABRAZADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 2"	UND	5,00	5,00
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-07	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI 420 MPA	Kg	9,31	9,31
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
4,9	TRANSPORTE CARGA MULAR HASTA 4KM	CARG A	6,00	6,00
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	70,00	70,00
				


ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
5.1.2	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 30X15CM	M3	3,15	3,15
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-01	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA	M3	3,15	3,15
				


ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
5,9	TRANSPORTE CARGA MULAR HASTA 4KM	CARG A	1,00	1,00
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-02	CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI)	M3	0,67	0,67
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-04	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mts.	M2	5,80	5,80

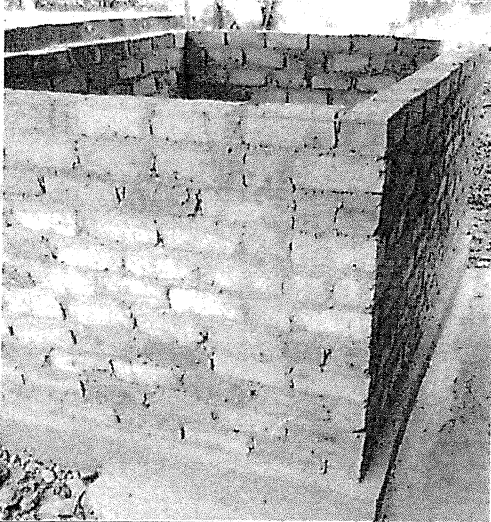

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-05	PAÑETE RUSTICO MUROS 1:5	M2	11,63	11,63



ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
NP-06	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	7,62	7,62
				

ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANTIDAD CONTRATADA	CANTIDAD EJECUTADA
5.10	MALLA ELECTROSOLDADA 0.15 X 0.15 M D= 4MM (INCLUYE SUMINISTRO FIJACION E INSTALACION)	Kg	4,47	4,47
				

EL SUSCRITO JEFE DEL DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO DE LA
CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR DE BOYACA - COMFABOY
NIT 891800213 - 8
C E R T I F I C A

1. Que los aportes recibidos por la Caja de Compensación Familiar de Boyacá - COMFABOY, se originaron de una relación laboral, por tanto, todo pago de aportes parafiscales que aquí se certifican, se tomaron únicamente de la autoliquidación que efectuó la empresa aportante a través de Planilla PILA.

2. Que los aportes recibidos correspondieron a la autoliquidación de la empresa aportante, quien es la que relaciona a los trabajadores en la planilla PILA de acuerdo al artículo 50 de la Ley 789 de 2002 la entidad contratante es quien tiene la obligación de validar y certificar que todos los trabajadores vinculados en la ejecución de la obra debieron estar afiliados a la seguridad social y pago de parafiscales.

3. Que la Caja de compensación al no poder establecer que todos los trabajadores que ejecutaron el contrato están relacionados en esta autoliquidación, se reserva el derecho a realizar las auditorias que correspondan, tanto a la entidad contratante como al contratista sobre los pagos que se debieron cancelar a la seguridad social y parafiscales.


4. Que esta certificación expedida por COMFABOY no tiene efectos de paz y salvo sobre los valores que debería cancelar el contratista respecto de la ejecución del contrato, ni tiene efectos para la afiliación a otra Caja de Compensación Familiar.

5. Que los pagos de aportes mensuales efectuados por la empresa INGTEC S.A.S. con nit 826000391 en la vigencia solicitada, se relacionan a continuación:

Fecha	Planilla	# Trab	Val Tot	Consig	Mes Pago	Valor 4% Pagado	Valor Nomina	Valor Nomina Con Subs. Transp. paplceap
11/02/2025	868634846105	5	490,900	202501	490,900	\$12,270,500	\$12,270,500	
11/02/2025	868634621806	1	57,000	202501	57,000	\$1,423,500	\$1,423,500	
12/02/2025	868634885128	2	64,200	202501	64,200	\$1,603,334	\$1,603,334	
25/02/2025	8632470010	23	1,994,000	202501	1,994,000	\$49,820,400	\$49,820,400	
16/07/2025	8633565738	1	80,000	202501	80,000	\$2,000,000	\$2,000,000	
25/03/2025	868635442349	1	57,000	202502	57,000	\$1,423,500	\$1,423,500	
25/03/2025	868635442325	5	494,900	202502	494,900	\$12,370,500	\$12,370,500	
07/04/2025	8633077043	1	71,400	202502	71,400	\$1,783,950	\$1,783,950	
09/04/2025	8633119655	1	38,000	202502	38,000	\$949,000	\$949,000	
28/04/2025	8633247739	1	95,900	202502	95,900	\$2,395,740	\$2,395,740	
06/05/2025	868636059270	22	1,871,500	202502	1,871,500	\$46,758,722	\$46,758,722	
23/05/2025	8632732341	1	57,000	202502	57,000	\$1,423,500	\$1,423,500	
16/07/2025	8632732073	1	2,700	202502	2,700	\$66,667	\$66,667	
07/04/2025	8633077429	1	50,000	202503	50,000	\$1,248,765	\$1,248,765	
23/04/2025	8633073193	1	57,000	202503	57,000	\$1,423,500	\$1,423,500	
23/04/2025	8633072929	5	494,900	202503	494,900	\$12,370,500	\$12,370,500	
25/04/2025	8633229339	1	67,100	202503	67,100	\$1,677,018	\$1,677,018	
06/05/2025	868636060205	20	1,066,300	202503	1,066,300	\$26,637,258	\$26,637,258	
15/05/2025	868636189844	4	106,400	202503	106,400	\$2,657,200	\$2,657,200	
23/05/2025	8633133576	1	47,500	202503	47,500	\$1,186,250	\$1,186,250	
14/05/2025	868636172114	5	494,900	202504	494,900	\$12,370,500	\$12,370,500	
14/05/2025	868636172127	1	57,000	202504	57,000	\$1,423,500	\$1,423,500	
15/05/2025	868636189772	4	182,400	202504	182,400	\$4,555,200	\$4,555,200	
13/06/2025	8633750282	5	494,900	202505	494,900	\$12,370,500	\$12,370,500	
13/06/2025	8633580405	1	57,000	202505	57,000	\$1,423,500	\$1,423,500	
15/07/2025	8634084214	1	57,000	202506	57,000	\$1,423,500	\$1,423,500	
15/07/2025	8634084165	6	449,400	202506	449,400	\$12,370,500	\$12,370,500	
TOTALES:			\$9,056,300		\$9,056,300	\$227,427,004	\$227,427,004	

FECHA DE EXPEDICION: 24/07/2025

Cordialmente:



LUIS VICENTE AVENDANO ALBA
JEFE DEPARTAMENTO DE APORTES Y SUBSIDIO

VALIDO: LUIS ARIEL RODRIGUEZ - subapo15
DPTO. APORTES Y SUBSIDIO

F - 12 - 276 | Versión 2 | 13/09/2018
Certificación de aportes 2025 Afil.:53125 NIT: 826000391





Servicio Nacional de Aprendizaje

SENA

MINISTERIO DE TRABAJO

CERTIFICA:

Que el constructor con razón social INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA identificado con el NIT 826000391, por concepto de Fondo Nacional de Formación Profesional de la Industria de la Construcción FIC, realizó a través del botón electrónico de pagos las siguientes transacciones:

N° Licencia/Contrato	Nombre Obra	Ciudad Ejecución	Valor Pago	Periodo	Fecha	Ticket
MP-SAMC-003 DE 2024	ADECUACION, MANTENIMIENTO Y OP	PAYA	511,550	2025-07	08-AGO-2025	137478113
		Total	511,550			

Expedido por el SENA, a los once (11) días del mes de Agosto de 2025

“LA EXPEDICIÓN DE ESTA CERTIFICACIÓN, NO IMPIDE QUE EL SENA VERIFIQUE LA BASE DE LIQUIDACIÓN DE FIC Y QUE CONSTATE EL CUMPLIMIENTO EN FONDO NACIONAL DE FORMACIÓN PROFESIONAL DE LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN FIC.”

NO TIENE VALIDEZ PARA FINES TRIBUTARIOS

Este documento no tiene validez en procesos de selección contractual con entidades del estado.


La expedición de esta certificación, no impide que el SENA verifique la base de liquidación de aportes y que constate el cumplimiento en Contrato de Aprendizaje.

Expedido por el Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, 2025-08-11

Generado por : Sandra Milena Estepa Fonseca

¿Desea saber si este certificado es auténtico?, por favor ingrese a la página web <https://certificadoempresarios.sena.edu.co/> enlace CONSULTAR CODIGO CERTIFICADO y digite:


el código de verificación: 747505645 y el Número de Certificado: 413052




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO: REALIZAR ADECUACION, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


FASE/ETAPA:	ACTIVIDAD TERMINADA	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA	CONTRATO OBRA N°:
MEMORIAS DE CANTIDADES	CONSTRUCTOR: NGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	MP-SAMC-003 DE 2024	
CAPITULO:	GUAYABAL-ESCUELA	N/A	CONTRATO INTERV N°:
ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9		N/A
NP-3			UNIDAD: ML

FOTO, PLANO O IMAGEN:	LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO	OTROS		
	ACOMETIDA USUARIO ARLEX	150					150,00
	ACOMETIDA USUARIO CARMENZ	120					120,00
	ACOMETIDA USUARIO EDILIA	70					70,00
	ACOMETIDA USUARIO INES	84					84,00
	ACOMETIDA ESCUELA	64					64,00
TOTAL							488,00

OBSERVACIONES:



 APYO PROFESIONAL
 SECRETARIA DE PLANEACION


 LADY PROA PARAVITO MARINO
 SUPERVISOR-SECRETARIA DE PLANEACION






MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: REALIZAR ADECUACION, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

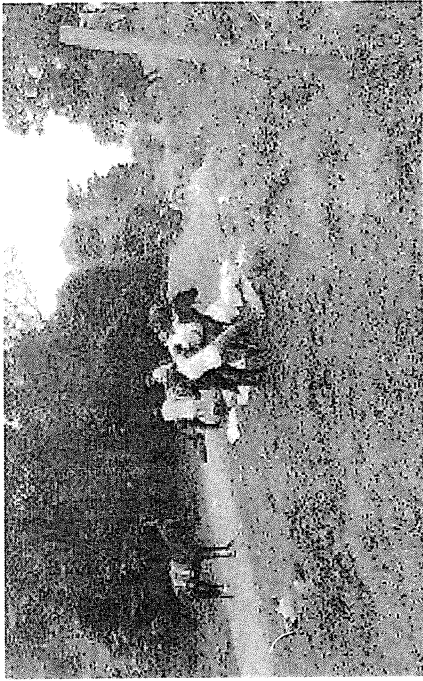FASE/ETAPA:	ACTIVIDAD TERMINADA	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA	
MEMORIAS DE CANTIDADES	CONSTRUCTOR:	CONTRATO OBRA N°:	MP-SAMC-003 DE 2024
CAPITULO:	INTERVENOR:	CONTRATO INTERV N°:	N/A
ITEM:	UNIDAD:	CARGA	
3.10	TRANSPORTE CARGA MULAR HASTA 4KM		
FOTO, PLANO O IMAGEN:		DIMENSIONES	
		LOCALIZACION	TOTAL
		CARGA MANGUERA TIPO PESADA	4,00
		LARGO	
		ANCHO	
		ALTO	
		OTROS	
		CANT	4,00
		TOTAL	4,00




OBSERVACIONES:


<p style="text-align: center;">  JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA <small>R/L INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA</small> </p>	<p style="text-align: center;">  LADY PAOLA GARAVITO MARINO <small>SUPERVISOR-SECRETARIA DE PLANEACION</small> </p>
---	---



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO: REALIZAR ADECUACION, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ



FASE/ETAPA:	ACTIVIDAD TERMINADA		CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA		
MEMORIAS DE CANTIDADES	CONSTRUCTOR:	INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	CONTRATO OBRA N°:	MP-SAMC-003 DE 2024	
CAPITULO:	INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO INTERV N°:	N/A	
ITEM:	INSTALACION DE RED DOMICILIARIA TUBERÍA PVC-P 2"		UNIDAD:	ML	
4.1	FOTO, PLANO O IMAGEN: 		DIMENSIONES		
			LOCALIZACION	LARGO	ALTO
		RED DE CONDUCCIÓN	626		
				OTROS	
					CANT
					TOTAL
					626,00
OBSERVACIONES:					
 JUAN MAURICIO MANÓSAVALVA MAYA R/L INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		 LADY PAOLA GARCÍA VITORIANO SUPERVISOR - SECRETARÍA DE PLANEACIÓN			




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: REALIZAR ADECUACION, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


FASE/ETAPA:	ACTIVIDAD TERMINADA			CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA		
MEMORIAS DE CANTIDADES	CONSTRUCTOR:	NGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		CONTRATO OBRA N°:	MP-SAMC-003 DE 2024	
CAPITULO:	INTERVENTOR:	N/A		CONTRATO INTERV N°:	N/A	
ITEM:	EXCAVACIÓN MATERIAL COMÚN 30X15CM			UNIDAD:	M3	
4.2	FOTO, PLANO O IMAGEN:			DIMENSIONES		
				LOCALIZACION	LARGO	ALTO
				RED DE CONDUCCIÓN	626	0.3
				OTROS		0.15
				CANT		
				TOTAL		
			28,17			


OBSERVACIONES:	
 JUAN MAURICIO MANGSALVA AMAYA <small>APOYO PROFESIONAL</small> SECRETARIA DE PLANEACION	 LADY PAOLA GARA VITO MARÍÑO <small>SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACION</small>





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: REALIZAR ADECUACION, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FASE/ETAPA:	ACTIVIDAD TERMINADA			CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA				
MEMORIAS DE CANTIDADES	CONSTRUCTOR:	NGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	CONTRATO OBRA N°:	MP-SAMC-003 DE 2024				
CAPITULO:	INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO INTERV N°:	N/A				
ITEM:	RELLENO CON MATERIAL SELECCIONADO PROVENIENTE DE EXCAVACION COMPACTADO CON PLANTA VIBRADORA			UNIDAD:	M3			
NP-01	FOTO, PLANO O IMAGEN:			CANT	TOTAL			
		LOCALIZACION	DIMENSIONES					
		RED DE CONDUCCIÓN	LARGO	ALTO	ANCHO		OTROS	
			626	0.3	0.15			28,17
TOTAL					28,17			
OBSERVACIONES:								


 APOYO PROFESIONAL
 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN



 LADY RAOLA GARAVITO MARINO
 SUPERVISOR-SECRETARIA DE PLANEACIÓN




MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO: REALIZAR ADECUACION, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


FASE/ETAPA:	ACTIVIDAD TERMINADA			CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA
MEMORIAS DE CANTIDADES	CONSTRUCTOR:	NGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		CONTRATO OBRA N°: MP-SAMC-003 DE 2024
CAPITULO:	ALTAMIRA-ESCUELA	INTERVENTOR:	N/A	CONTRATO INTERV N°: N/A
ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE TAPÓN DE 2" ROSCADO			UNIDAD: UND
4.3				

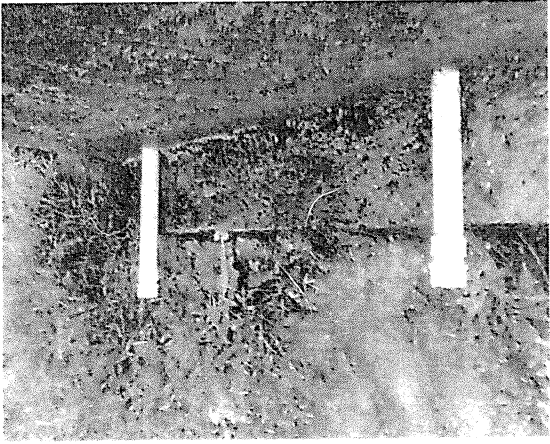FOTO, PLANO O IMAGEN:	LOCALIZACION	DIMENSIONES				CANT	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO	OIROS		
	TANQUE DE AGUA CRUDA					2,00	2,00
TOTAL						2,00	

OBSERVACIONES:



JUAN MAURICIO MANDOSALVA AMAYA
R/L INGTec SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA


LADY PAOLA GARAVITO MARÍN
SUPERVISOR-SECRETARIA DE PLANEACIÓN





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO: REALIZAR ADECUACION, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACION DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FASE/ETAPA:	ACTIVIDAD TERMINADA			CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA					
MEMORIAS DE CANTIDADES	CONSTRUCTOR:	INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA		CONTRATO OBRA N°:	MP-SAMC-003 DE 2024				
CAPITULO:	INTERVENTOR:	N/A		CONTRATO INTERV N°:	N/A				
ITEM:	CONCRETO CLASE D 21 MPA (3000 PSI)			UNIDAD:	M3				
NP-02	FOTO, PLANO O IMAGEN: 			DIMENSIONES					
				LOCALIZACION	LARGO	ALTO	ANCHO	OTROS	CANT
				PLACA PISO	2.1	0.18	1.75		0.66
	TOTAL			0.66					

OBSERVACIONES:



JUAN MAURICIO MAMÁ
R/L INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA



LADY POLA GARAVITO MARIÑO
SUPERVISOR-SECRETARIA DE PLANEACION





MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: REALIZAR ADECUACION, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

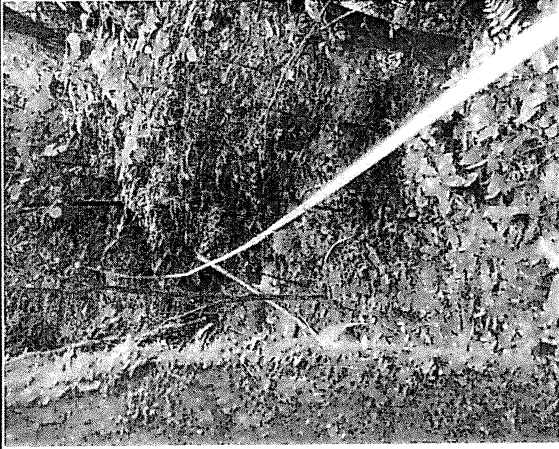FASE/ETAPA:	ACTIVIDAD TERMINADA				CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA							
MEMORIAS DE CANTIDADES	CONSTRUCTOR: NGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA				CONTRATO OBRA N°: MP-SAMC-003 DE 2024							
CAPITULO:	ALTAMIRA-ESQUELA				CONTRATO INTERV N°: N/A							
ITEM:	GUAYA DE 3/8"				UNIDAD: ML							
		4,5										
FOTO, PLANO O IMAGEN:		LOCALIZACION		DIMENSIONES								
		PASO ELEVADO		LARGO	ALTO	ANCHO	OTROS			CANT	TOTAL	
				35							35,00	
		TOTAL								35,00		
OBSERVACIONES:												



 JUAN MAURICIO MANDOTVA AMAYA
 APOYO PROFESIONAL
 SECRETARIA DE PLANEACION


 LADY PAOLA GABAVITO MARINO
 SUPERVISOR-SECRETARIA DE PLANEACION



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA


OBJETO: REALIZAR ADECUACION, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FASE/ETAPA:	ACTIVIDAD TERMINADA			CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA							
MEMORIAS DE CANTIDADES	CONSTRUCTOR:	INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA			CONTRATO OBRA N°:	MP-SAMC-003 DE 2024					
CAPITULO:	ALTAMIRA-ESCUELA	INTERVENTOR:	N/A			CONTRATO INTERV N°:	N/A				
ITEM:	4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE GRAPA (perros) FORGED DE TRABAJO TIPO PESADO PARA CABLE 3/8"			UNIDAD:	UND					
FOTO, PLANO O IMAGEN:		LOCALIZACION		DIMENSIONES							
		PASO ELEVADO		LARGO	ALTO	ANCHO	OTROS	CANT	TOTAL		
			6						6,00		
		TOTAL							6,00		
OBSERVACIONES:											

JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
R/L INTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

APOYO PROFESIONAL
SECRETARIA DE PLANEACION


LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACION



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ


FASE/ETAPA:	ACTIVIDAD TERMINADA			CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA	
MEMORIAS DE CANTIDADES	CONSTRUCTOR:	NGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	CONTRATO OBRA N°:	MP-SAMC-003 DE 2024	
CAPITULO:	NISCOTA ESCUELA	N/A	CONTRATO INTERV N°:	N/A	
ITEM:	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9			UNIDAD:	ML
NP-3					

FOTO, PLANO O IMAGEN:	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO		
	RED DE CONDUCCIÓN	70				70,00
TOTAL						70,00

OBSERVACIONES:

JUAN MAURICIO MANOSALVA AMAYA
R/L INGTec SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

LADY PAOLA GARAVITO MARIÑO
SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACION



MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA

OBJETO: REALIZAR ADECUACIÓN, MANTENIMIENTO Y OPTIMIZACIÓN DE LA PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUA POTABLE (PTAP) Y SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA ZONA URBANA Y RURAL DEL MUNICIPIO DE PAYA DEPARTAMENTO DE BOYACÁ

FASE/ETAPA:	ACTIVIDAD TERMINADA	CONTRATANTE: MUNICIPIO DE PAYA	
MEMORIAS DE CANTIDADES	CONSTRUCTOR: NGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA	CONTRATO OBRA N°:	MP-SAMC-003 DE 2024
CAPITULO:	NISCOTA-ESCUJELA	CONTRATO INTERV N°:	N/A
ITEM:	5.9	UNIDAD:	CARGA
	TRANSPORTE CARGA MULAR HASTA 4KM		

FOTO, PLANO O IMAGEN:	LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT	TOTAL
		LARGO	ALTO	ANCHO OTROS		
	RED DE CONDUCCIÓN			1		1,00
	TOTAL					

OBSERVACIONES:

JUAN MAURICIO MAROSALVA AMAYA
 R/INGTEC SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA

LADYDA GARAVITO MARÍN
 SUPERVISOR SECRETARIA DE PLANEACION

