

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA</p>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Contrato de Obra No. 0159-2023 LP-006-2023 LP-MSBV-008-2023	Contratista: CONSORCIO PROVIDENCIA CONSORCIO PAVIMENTO BARRANQUILLITA CONSORCIO L&S
Contrato de Interventoría No. 5053-2023	Interventoría: CONSORCIO INGECON-INCO

Objeto Contrato de Obra: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio de Los Cordobas, Departamento de Córdoba, MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio de San Bernardo del Viento, Departamento de Córdoba y MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio de Planeta Rica

INFORME MENSUAL No. 10	MES O PERIODO: NOVIEMBRE DE 2024
-------------------------------	---

No.	CONTENIDO	FORMATO	PAGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	
1	INTRODUCCIÓN		
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		
2.1	Localización		
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		
2.4	Características técnicas del proyecto		
3	INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA		
3.1	Información general del contrato		
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		
3.3	Seguimiento Items no previstos		
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		
4	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-2-FR-1 MEPI-MN-IN-2-FR-2	
	• Seguimiento Programa de Obra		
	• Seguimiento Programa de Inversiones	MEPI-MN-IN-6-FR-1 MEPI-MN-IN-6-FR-2	
	• Actas de Comité de Obra	MEPI-MN-IN-14-FR-1	
	• Actas de Reunión	MEPI-MN-IN-14-FR-2	
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
5.1	Información general del contrato		
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		
5.3	Informes especialistas y profesionales		
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		
5.5	Informe matriz de riesgos.		
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría		
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.		
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1 MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		
8	Anexos		
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____
 Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
 Resolución de designación No. 3490 de fecha 08 DE AGOSTO 2023

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
 Copias: Interventor, Dirección Territorial

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1

Resumen mensual Estado General del Proyecto – MEPI-MN1-IN-15-FR-2.



FECHA
30/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

PERIODO MES: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

CONTRATO DE OBRA No.: 159-2023

OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA
EN EL MARCO DEL CONVENIO N°286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA

PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023

FECHA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023

FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 DE FEBRERO DE 2024

FECHA DE REANUDACIÓN: 01 DE FEBRERO DE 2024

FECHA DE VENCIMIENTO: 20 DE DICIEMBRE DE 2024

PLAZO ACUMULADO: HASTA 20 DE DICIEMBRE 2024

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 14.100.000.000,00

VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 14.100.000.000,00

ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 5.287.336.678,80

ANTICIPO AMORTIZADO: \$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 5053 DE 2023

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECONINCO

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OLIVERA

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación	M	4.980
Construcción		
Mejoramiento		
Rehabilitación		
Estructuras		
Túneles		
Puentes		
Pontones		
Mantenimiento		
Otros		
(Especificar cuáles)	UD	16
Box culvert - Alcantarillas		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación	M	398,8	1223,6
Construcción			
Mejoramiento			
Rehabilitación			
Estructuras			
Túneles			
Puentes			
Pontones			
Mantenimiento			
Otros			
(Especificar cuáles)	UD	0	0
Box culvert - Alcantarillas			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 13.218.339.697,00		\$ 13.218.339.697,00
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 84.516.798,00		\$ 84.516.798,00
BOLSA DE AJUSTE	\$ 528.733.588,00		\$ 528.733.588,00
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 67.230.000,00	\$ 12.773.700,00	\$ 80.003.700,00
PAGA	\$ 56.222.821,00		\$ 56.222.821,00
PMT	\$ 132.183.396,00		\$ 132.183.396,00
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PRELIAL Y DE SOSTENIBILIDAD	\$ -		\$ -
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 14.087.226.300,00	\$ 12.773.700,00	\$ 14.100.000.000,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 1.469.999.821,00	\$ -	\$ 1.469.999.821,00	\$ 4.288.933.577,00
AJUSTES	0			
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES				
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN				
ESTUDIOS Y DISEÑOS			\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)				
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)				
GESTIÓN PRELIAL (PREACTA)				
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)				
VALOR EJECUTADO	\$ 1.469.999.821,00	\$ -	\$ 1.469.999.821,00	\$ 4.288.933.577,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 13.218.339.697,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 4.288.933.577,00

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 32,45%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 9

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 4

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 15

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 28

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Suministro, extensión y compactación de subbase granular. Abscisa K2+100.





Construcción de pavimento rígido MR38 premezclado. Abscisa K1+850.

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

EL PROCESO SANCIONATORIO CONTINÚA SU CURSO NORMAL Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA REANUDACIÓN DE AUDIENCIA. DE IGUAL MANERA, LA INTERVENTORIA SOLICITÓ AL MUNICIPIO INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES SST.

Firma
Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor, Dirección Territorial

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO</div>	<div>CÓDIGO MEPIAN-IN-15-FR-2</div> <div>VERSION 1</div> <div>PÁGINA</div>																																																																																			
		<div>FECHA 30/1/2024 <small>(Día - Mes / Año)</small></div>																																																																																			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA	PERIODO MES: 1 AL 30 NOVIEMBRE 2024																																																																																			
CONTRATO DE OBRA No.: I.P.006-2023	PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023	PLAZO FINAL: 29 DE DICIEMBRE DE 2023																																																																																			
OBJETO: MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA BARRANQUILITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FECHA DE SUSPENSIÓN: 29 DE DICIEMBRE DE 2023	FECHA DE REANUDACIÓN: 01 DE FEBRERO DE 2024																																																																																			
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VÍA BARRANQUILITA	FECHA DE VENCIMIENTO: 20 DE DICIEMBRE DE 2024	PLAZO ACUMULADO: HASTA 20 DE DICIEMBRE 2024																																																																																			
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 5063 DE 2023	INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON-INO	SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUIS MIGUEL GONZÁLEZ OZUNA																																																																																			
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO		AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																																																			
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>M</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td>2 325</td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Pavimentos</td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td>Box culvert - Alcantarillas</td><td>UD</td></tr><tr><td></td><td></td><td>3</td></tr></tbody></table>		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción	M	Mejoramiento	2 325	Estructuras	Túneles		Puentes		Mantenimiento	Pavimentos		Otros (Especificar cuáles)	Box culvert - Alcantarillas	UD			3	<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td rowspan="2">Pavimentación</td><td>Construcción</td><td>M</td><td>445.95</td></tr><tr><td>Mejoramiento</td><td></td><td>1081.43</td></tr><tr><td rowspan="2">Estructuras</td><td>Túneles</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Mantenimiento</td><td>Pavimentos</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuáles)</td><td>Box culvert - Alcantarillas</td><td>UD</td><td>0</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>3</td></tr></tbody></table>	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción	M	445.95	Mejoramiento		1081.43	Estructuras	Túneles			Puentes			Mantenimiento	Pavimentos			Otros (Especificar cuáles)	Box culvert - Alcantarillas	UD	0				3																															
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																																																			
Pavimentación	Construcción	M																																																																																			
	Mejoramiento	2 325																																																																																			
Estructuras	Túneles																																																																																				
	Puentes																																																																																				
Mantenimiento	Pavimentos																																																																																				
	Otros (Especificar cuáles)	Box culvert - Alcantarillas	UD																																																																																		
		3																																																																																			
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																																																		
Pavimentación	Construcción	M	445.95																																																																																		
	Mejoramiento		1081.43																																																																																		
Estructuras	Túneles																																																																																				
	Puentes																																																																																				
Mantenimiento	Pavimentos																																																																																				
	Otros (Especificar cuáles)	Box culvert - Alcantarillas	UD	0																																																																																	
			3																																																																																		
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES		VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																																																			
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>5.873.079.611,00</td><td></td><td>5.873.079.611,00</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>58.740.219,04</td><td></td><td>58.740.219,04</td></tr><tr><td>BOLSA DE AJUSTE</td><td>181.263.432,86</td><td></td><td>181.263.432,86</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>22.667.600,00</td><td>4.306.844,00</td><td>26.974.444,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>6.135.750.863,00</td><td>4.306.844,00</td><td>6.140.057.707,00</td></tr></tbody></table>			BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	5.873.079.611,00		5.873.079.611,00	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	58.740.219,04		58.740.219,04	BOLSA DE AJUSTE	181.263.432,86		181.263.432,86	ESTUDIOS Y DISEÑOS	22.667.600,00	4.306.844,00	26.974.444,00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD				VALOR TOTAL DEL CONTRATO	6.135.750.863,00	4.306.844,00	6.140.057.707,00	<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>1.458.030.401,44</td><td>0,00</td><td>1.458.030.401,44</td><td>3.789.144.251,21</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>1.458.030.401,44</td><td>0,00</td><td>1.458.030.401,44</td><td>3.789.144.251,21</td></tr></tbody></table>		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	1.458.030.401,44	0,00	1.458.030.401,44	3.789.144.251,21	AJUSTES					OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES					JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN					ESTUDIOS Y DISEÑOS					GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)					GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)					GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)					GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)					VALOR EJECUTADO	1.458.030.401,44	0,00	1.458.030.401,44	3.789.144.251,21
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																																																		
OBRAS	5.873.079.611,00		5.873.079.611,00																																																																																		
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	58.740.219,04		58.740.219,04																																																																																		
BOLSA DE AJUSTE	181.263.432,86		181.263.432,86																																																																																		
ESTUDIOS Y DISEÑOS	22.667.600,00	4.306.844,00	26.974.444,00																																																																																		
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD																																																																																					
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	6.135.750.863,00	4.306.844,00	6.140.057.707,00																																																																																		
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																																																	
OBRAS	1.458.030.401,44	0,00	1.458.030.401,44	3.789.144.251,21																																																																																	
AJUSTES																																																																																					
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																																																					
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																																																					
ESTUDIOS Y DISEÑOS																																																																																					
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)																																																																																					
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)																																																																																					
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)																																																																																					
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)																																																																																					
VALOR EJECUTADO	1.458.030.401,44	0,00	1.458.030.401,44	3.789.144.251,21																																																																																	
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																																																					
INVERSIÓN EN OBRA		EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																																																			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 5.873.079.611,00		MANO DE OBRA CALIFICADA: 0																																																																																			
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 3.789.144.251,21		MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 4																																																																																			
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 64,52%		EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0																																																																																			
		TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 4																																																																																			
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																																																					
<div></div>																																																																																					
Suministro, extensión y compactación de material de subbase granular de la K0+600 - K1+000																																																																																					
Colocación de rieles, acero y fundida de concreto de 3000 psi para cunetas de la Abs K1+883 - K1+656,5 lado izquierdo																																																																																					
<div></div>																																																																																					
Colocación de rieles, acero y fundida de concreto de 3000 psi para cunetas de la Abs K1+000 - K0+476 lado derecho																																																																																					
Colocación de rieles, y acero para pavimento de la Abs K2+000,6 - K1+653,5 carril izquierdo y de la Abs K1+283,5 - K0+730,2 carril derecho																																																																																					
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																																																					
NA																																																																																					
<div> Firma Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES Director de Interventoría Matrícula Profesional No. 17202-153798 CLD <small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVRAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial</small></div>																																																																																					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO	CÓDIGO MEP/IN-15-FR-2																																																							
		VERSION 1																																																							
		PÁGINA																																																							
		FECHA 30/11/2024 (Día / Mes / Año)																																																							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA	PERIODO MES: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024																																																							
CONTRATO DE OBRA No.: LP-MSRV-008-2023																																																									
PLAZO INICIAL: CUATRO (04) MESES																																																									
FECHA DE INICIO: 28/12/2023																																																									
FECHA DE SUSPENSIÓN 1: 29/12/2023																																																									
FECHA DE REANUDACIÓN 1: 1/02/2024																																																									
FECHA DE SUSPENSIÓN 2: 16/03/2024																																																									
FECHA DE REANUDACIÓN 2: 16/05/2024																																																									
FECHA DE VENCIMIENTO: 29/12/2024																																																									
PLAZO ACUMULADO: 8 (7) MESES																																																									
VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 2.115.723.321,00																																																									
VALOR ADICIONALES (incluido IVA): N/A																																																									
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 2.115.723.321,00																																																									
ANTICIPO CONCEDIDO: \$ 634.716.996,30																																																									
ANTICIPO AMORTIZADO: N/A																																																									
CONTRATISTA: CONSORCIO LAS																																																									
CONTRATO DE INTERVENTORIA: 5053-2023																																																									
INTERVENTOR: CONSORCIO INGECONINCO																																																									
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: LUIS GONZALEZ OZUNA																																																									
ALCANCE FÍSICO CONTRATADO																																																									
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td>M 600</td></tr><tr><td></td><td>Rehabilitación</td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Box culvert</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Puentes</td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pontones</td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Box culvert - Alcantarillas</td><td>UD 1</td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	Pavimentación	Construcción			Mejoramiento	M 600		Rehabilitación		Estructuras	Box culvert			Puentes			Pontones		Mantenimiento			Otros (Especificar cuales)	Box culvert - Alcantarillas	UD 1																												
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD																																																							
Pavimentación	Construcción																																																								
	Mejoramiento	M 600																																																							
	Rehabilitación																																																								
Estructuras	Box culvert																																																								
	Puentes																																																								
	Pontones																																																								
Mantenimiento																																																									
Otros (Especificar cuales)	Box culvert - Alcantarillas	UD 1																																																							
AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO																																																									
<table><thead><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>UNIDAD</th><th>CANTIDAD MES</th><th>CANTIDAD ACUMULADA</th></tr></thead><tbody><tr><td>Pavimentación</td><td>Construcción</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Mejoramiento</td><td>M 75</td><td>360</td></tr><tr><td></td><td>Rehabilitación</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estructuras</td><td>Box culvert</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Puentes</td><td></td><td></td></tr><tr><td></td><td>Pontones</td><td></td><td></td></tr><tr><td>Mantenimiento</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Otros (Especificar cuales)</td><td>Box culvert - Alcantarillas</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>			ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	Pavimentación	Construcción				Mejoramiento	M 75	360		Rehabilitación			Estructuras	Box culvert				Puentes				Pontones			Mantenimiento				Otros (Especificar cuales)	Box culvert - Alcantarillas																					
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA																																																						
Pavimentación	Construcción																																																								
	Mejoramiento	M 75	360																																																						
	Rehabilitación																																																								
Estructuras	Box culvert																																																								
	Puentes																																																								
	Pontones																																																								
Mantenimiento																																																									
Otros (Especificar cuales)	Box culvert - Alcantarillas																																																								
AVANCE FINANCIERO																																																									
VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES																																																									
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 2.008.640.979,00</td><td></td><td>\$ 2.008.640.979,00</td></tr><tr><td>BOLSA DE AJUSTE</td><td>\$ 71.819.728,74</td><td></td><td>\$ 71.819.728,74</td></tr><tr><td>AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td>\$ 20.289.176,58</td><td></td><td>\$ 20.289.176,58</td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 12.582.720,00</td><td>\$ 2.390.716,80</td><td>\$ 14.973.437,00</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD</td><td></td><td></td><td>\$ 0,00</td></tr><tr><td>VALOR TOTAL DEL CONTRATO</td><td>\$ 2.113.332.604,00</td><td>\$ 2.390.716,80</td><td>\$ 2.115.723.321,00</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	OBRAS	\$ 2.008.640.979,00		\$ 2.008.640.979,00	BOLSA DE AJUSTE	\$ 71.819.728,74		\$ 71.819.728,74	AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 20.289.176,58		\$ 20.289.176,58	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 12.582.720,00	\$ 2.390.716,80	\$ 14.973.437,00	GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			\$ 0,00	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.113.332.604,00	\$ 2.390.716,80	\$ 2.115.723.321,00																											
	BÁSICO	IVA	TOTAL																																																						
OBRAS	\$ 2.008.640.979,00		\$ 2.008.640.979,00																																																						
BOLSA DE AJUSTE	\$ 71.819.728,74		\$ 71.819.728,74																																																						
AJUSTES, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ 20.289.176,58		\$ 20.289.176,58																																																						
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 12.582.720,00	\$ 2.390.716,80	\$ 14.973.437,00																																																						
GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIA, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD			\$ 0,00																																																						
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 2.113.332.604,00	\$ 2.390.716,80	\$ 2.115.723.321,00																																																						
VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES																																																									
<table><thead><tr><th></th><th>BÁSICO</th><th>IVA</th><th>TOTAL</th><th>ACUMULADO</th></tr></thead><tbody><tr><td>OBRAS</td><td>\$ 337.716.087,94</td><td></td><td>\$ 337.716.087,94</td><td>\$ 1.208.294.844,21</td></tr><tr><td>AJUSTES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>ESTUDIOS Y DISEÑOS</td><td>\$ 12.582.720,00</td><td>\$ 2.390.716,80</td><td>\$ 14.973.436,80</td><td>\$ 14.973.436,80</td></tr><tr><td>GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)</td><td>\$ -</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>VALOR EJECUTADO</td><td>\$ 350.298.807,94</td><td>\$ 2.390.716,80</td><td>\$ 352.689.524,74</td><td>\$ 1.223.268.281,01</td></tr></tbody></table>				BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO	OBRAS	\$ 337.716.087,94		\$ 337.716.087,94	\$ 1.208.294.844,21	AJUSTES					OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES					JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN					ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 12.582.720,00	\$ 2.390.716,80	\$ 14.973.436,80	\$ 14.973.436,80	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -				GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -				GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -				GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	\$ -				VALOR EJECUTADO	\$ 350.298.807,94	\$ 2.390.716,80	\$ 352.689.524,74	\$ 1.223.268.281,01
	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO																																																					
OBRAS	\$ 337.716.087,94		\$ 337.716.087,94	\$ 1.208.294.844,21																																																					
AJUSTES																																																									
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES																																																									
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN																																																									
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 12.582.720,00	\$ 2.390.716,80	\$ 14.973.436,80	\$ 14.973.436,80																																																					
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -																																																								
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -																																																								
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -																																																								
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	\$ -																																																								
VALOR EJECUTADO	\$ 350.298.807,94	\$ 2.390.716,80	\$ 352.689.524,74	\$ 1.223.268.281,01																																																					
Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.																																																									
INVERSIÓN EN OBRA																																																									
EMPLEOS GENERADOS EN EL MES																																																									
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 2.008.640.979,00																																																									
MANO DE OBRA CALIFICADA: 12																																																									
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 1.208.294.844,21																																																									
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 7																																																									
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 60,15%																																																									
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:																																																									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 19																																																									
REGISTRO FOTOGRÁFICO																																																									
																																																									
																																																									
Vista general - Abscisa k0+000																																																									
Vista general pavimento - Abscisa k0+075																																																									
PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)																																																									
																																																									
Firma																																																									
ANGELA DAVILA MORALES																																																									
Director de Interventoría																																																									
Matrícula Profesional No. 17202-153798 CLD																																																									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.																																																									
Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																									

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”.		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
	INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024		VERSIÓN	1
			PÁGINA	2

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10



REPÚBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE TRANSPORTE

SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 DEL 2023

01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ELABORADO POR:	REVISADO POR:	APROBADO POR:
 VICENTE URZOLA BADEL RESIDENTE DE INTERVENTORIA	 ANGELA DAVILA MORALES DIRECTOR DE INTERVENTORIA	 LUIS GONZALEZ OZUNA SUPERVISOR INVIAS TERRITORIAL CÓRDOBA

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1". INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	3

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN.	6
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.	8
2.1	LOCALIZACIÓN.....	9
2.2	Inventario y estado inicial de la vía.....	11
2.3	Características técnicas del proyecto.....	14
2.4	COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LOS CONTRATISTAS DE OBRA	19
3.1	INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA.	20
3.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.	23
3.2.1	MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023: 23	
3.2.2	MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023:.....	35
3.2.3	MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023:.....	40
3.3	SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS.....	44
3.4	ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA	44
4	REPORTES EJECUCION MENSUAL.....	48
4.1	Informe semanal - MEPI-MN1-IN-15-FR-3.....	48
4.2	Maquinaria y equipo contrato de obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-4.	49
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-6.	50
4.4	Informe financiero y presupuestal contrato de obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-8.....	51
4.5	Estado general del tiempo - MEPI-MN1-IN-15-FR-10.....	52

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1". INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	4

4.6	Resumen ensayos de Laboratorio - MEPI-MN1-IN-15-FR-11.	53
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-12.....	54
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra - MEPI-MN-1IN-15-FR-1455	
4.9	Seguimiento a la inversión del Anticipo - MEPI-MN-IN-2-FR-1 y MEPI-MN-IN-2-FR-2	56
4.10	Seguimiento al Programa de inversiones - MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2	57
4.11	Actas de comité de obra - MEPI-MN-IN-14-FR-1 y MEPI-MN-IN-14-FR-2	58
5	INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.	59
5.1	INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.....	59
5.2	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.	60
5.3	INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.	65
5.3.1	INFORMES ESPECIALISTAS.	65
5.3.2	INFORMES PROFESIONALES.....	66
5.4	INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC	67
5.5	INFORME MATRIZ DE RIESGOS	68
5.6	INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA.....	74
6	REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.....	75
6.1	Equipo y vehiculos contrato de interventoria - MEPI-MN1-IN-15-FR-5.	75

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1". INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	5

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-7.	76
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-9.	77
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-13.....	78
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-15.....	79
6.6 Otros documentos de seguimiento mensual:.....	80
• Seguimiento a la inversión del Anticipo - MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2.	80
• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado - MEPI-MN-IN-9-FR-2.	81
• Seguimiento al Plan de Cargas - MEPI-MN-IN-9-FR-3.	82
7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	83
8 ANEXOS.	88
8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.	88
8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO.	92
8.3 BITACORA DE OBRA.	98

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	6

1 INTRODUCCIÓN.

El Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte y el Instituto Nacional de Vías – INVIAS, estructuró el programa – “COLOMBIA RURAL”, por lo cual, suscribieron el convenio No. 2286 de 2023 con el municipio de Planeta Rica con objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA EN EL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”, el convenio No. 2217 de 2023 con el municipio de los Córdoba con objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, y el convenio No. 2222 de 2023 con el municipio de San Bernardo Del Viento con objeto “AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO EN EL DEPARTAMENTO DEL CORDOBA DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL”, los cuales buscan realizar el mejoramiento y mantenimiento de los corredores viales productivos garantizando la transitabilidad, y estableciendo acciones en favor de la sostenibilidad.

Por su parte, los municipios adelantaron los procesos contractuales bajo la modalidad de licitación pública de las obras consistentes en el AUNAR ESFUERZOS PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE CORREDORES RURALES EN LOS MUNICIPIOS DE PLANETA RICA, LOS CORDOBA Y SAN BERNARDO DEL VIENTO, EN EL MARCO DEL PROGRAMA “COLOMBIA RURAL, los contratos derivados de cada uno de los convenios antes mencionados, a continuación, se relaciona la información general de los contratos.

ENTIDAD CONTRATANTE	No. DEL CONTRATO	OBJETO DEL CONTRATO	VALOR
MUNICIPIO PLANETA RICA	159-223	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	\$14.100.000.000

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	7

MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA	LP-006-2023	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	\$6.140.057.707
MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	LP-MSBV-008-2023	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	\$2.115.723.321

Por parte del Instituto Nacional de Vías, mediante resolución 4606 del 15 de diciembre del 2023, se adjudicó el contrato No. 5053-2023 al CONSORCIO INGECON – INCO, representada legalmente por ANGELA MARIA DAVILA MORALES, para ejecutar la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1.

La cual realizará la Interventoría siguiendo los parámetros técnicos establecidos en el manual de interventoría versión 2022 y los documentos contractuales.

La orden para el inicio de la interventoría fue dada por el INVÍAS, mediante Oficio SVR 2023S-UVBOG-033-085, de fecha 28 de diciembre de 2023, el plazo inicial es hasta el 31 de diciembre de 2023, se realizó una prórroga hasta el 31 de diciembre de 2024.

El proyecto se desarrolla en la Jurisdicción de la territorial Córdoba, entidad que ejerce la supervisión al contrato de interventoría a través del ingeniero Luis Gonzalez Ozuna, y el gestor técnico para el proyecto el ingeniero Luis Guillermo Torres Hernandez.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1". INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	8

2 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO.

El proyecto en ejecución es la “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1” para el cumplimiento de las obras en los siguientes municipios, de acuerdo a lo descrito en cada uno de los anexos técnicos de obra:

- **Municipio de Planeta Rica – Contrato de obra No.159-2023:** La vía de Planeta Rica - Providencia, ubicada en el departamento de Córdoba, el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la Granjita hasta el corregimiento de Providencia, en la zona rural del municipio de Planeta Rica, que busca optimizar la transitabilidad de la población, con un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto de piezas prefabricadas, colocación de afirmado material para mejoramiento, instalación de señales verticales de tránsito y línea de demarcación con pintura en frio, construcción de obras hidráulicas como son 10 Box Coulvert de 1,00mX1,00mX8m y 6 boxculvert de 2,00mX2,00mX8m.

- **Municipio de los Córdoba – Contrato de obra No. LP-006-2023:** La vía que comunica de Barranquillita con la vereda El Mango, en la zona rural del municipio de los Córdoba, a través de la construcción de un pavimento rígido con una estructura compuesta por un mejoramiento en relleno seleccionado de cantera con un espesor de 0.25m, una capa de subbase granular tipo C de 0.15m y una losa de rodamiento en concreto rígido MR38 con espesor de 0.20m; en una longitud total de 1.421 metros. La vía a intervenir está constituida por una calzada bidireccional de 5.40 metros de sección transversal incluyendo berma-cunetas, también contempla la instalación de bordillo en concreto. Construcción de obras hidráulicas: 6 box coulvert de 1,00mX1,00m y L= 6m. De igual manera, se instalará señalización vertical y líneas de demarcación con pintura en frio. El proyecto también contempla obras de protección y estabilización de taludes mediante la construcción de un muro de contención en concreto de 21MPa reforzado con acero $F_y = 4200$ MPa, el muro cuenta con una longitud de 90.00 m y un espesor de 0.35m.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	9

- **Municipio de San Bernardo del Viento – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023:** La construcción de la vía que conduce desde la intersección de la vía que lleva desde la vereda Rimini hasta la intersección de la vía nacional San Bernardo del Viento - Moñitos y que es una de los principales corredores ecoturísticos de municipio, esto debido a que es un sector de playas que a su vez es muy apetecido por los turistas y comercial del municipio. El proyecto consta de 780m, en concreto rígido, lo que permitiría tener una superficie de rodadura de buena calidad en todas las épocas del año, además de que es una solución real a las problemáticas de movilidad de la población y sus costos de mantenimientos serían muy bajos a largo plazo.

2.1 LOCALIZACIÓN.

La ejecución de los proyectos se realizará en el departamento de Córdoba, el cual está situado en la región Caribe, limitando al norte con el mar Caribe (océano Atlántico), al este con los departamentos de Sucre y Bolívar, y al sur y oeste con el departamento de Antioquia, el área de influencia directa de los proyectos está en los municipios de Planeta Rica, Los Córdoba y San Bernardo del Viento:

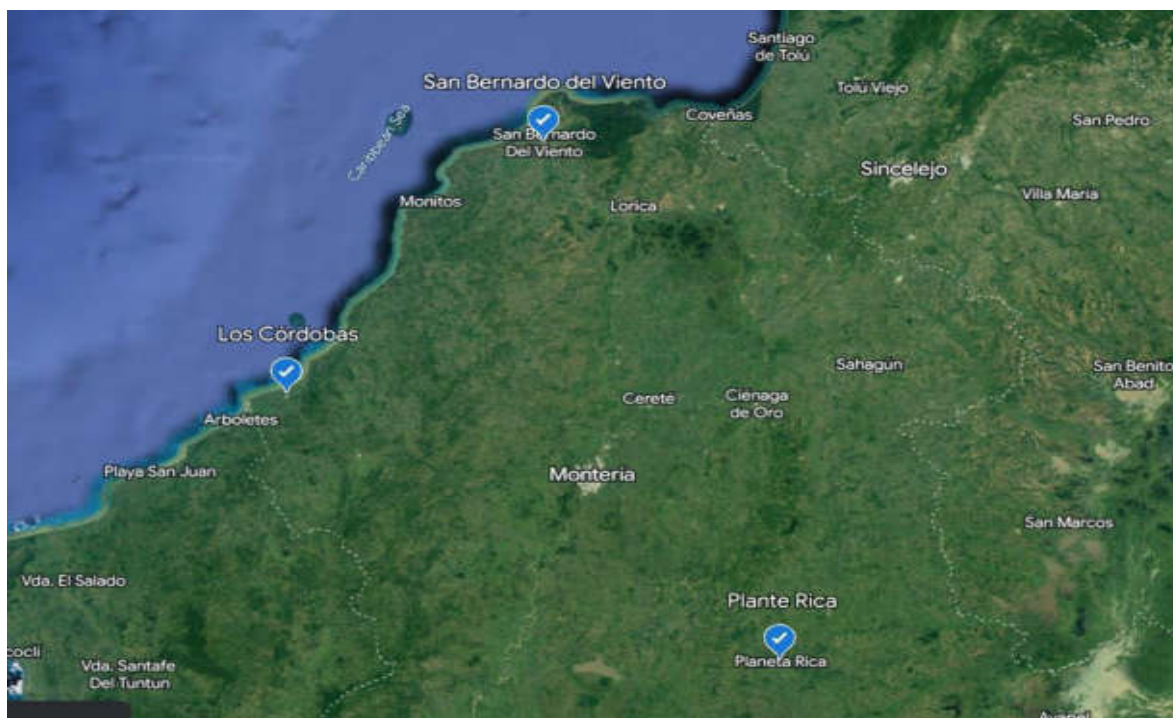


Imagen 1. Localización de los municipios a intervenir con los proyectos dentro del departamento de Córdoba

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	10

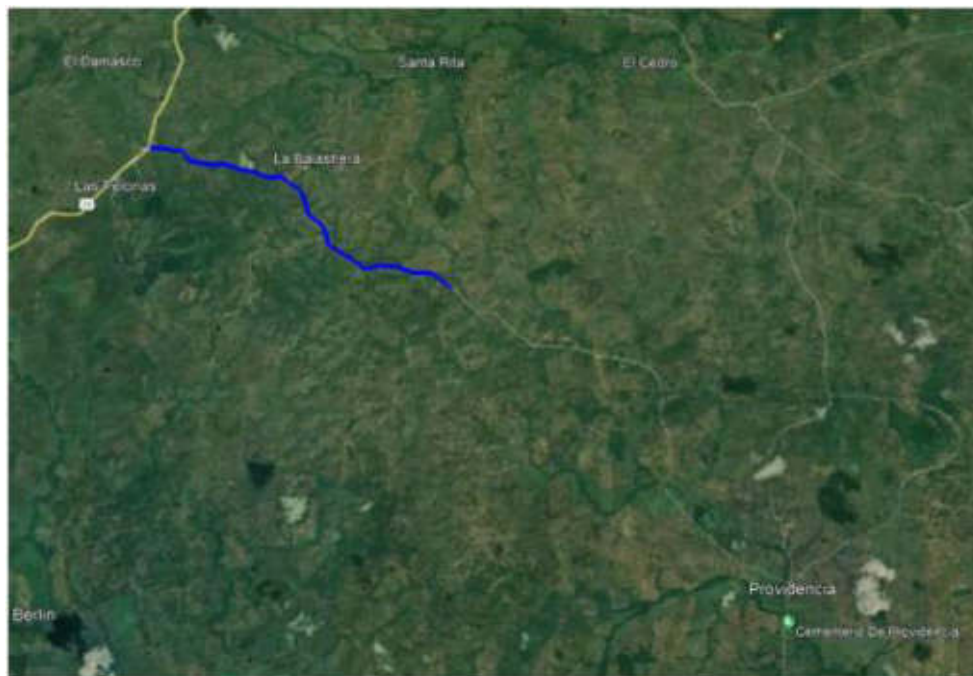


Imagen 2. Localización del tramo a intervenir en el municipio de Planeta Rica departamento de Córdoba



Imagen 3. Localización del tramo a intervenir en el municipio de Los Córdoba departamento de Córdoba

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	11

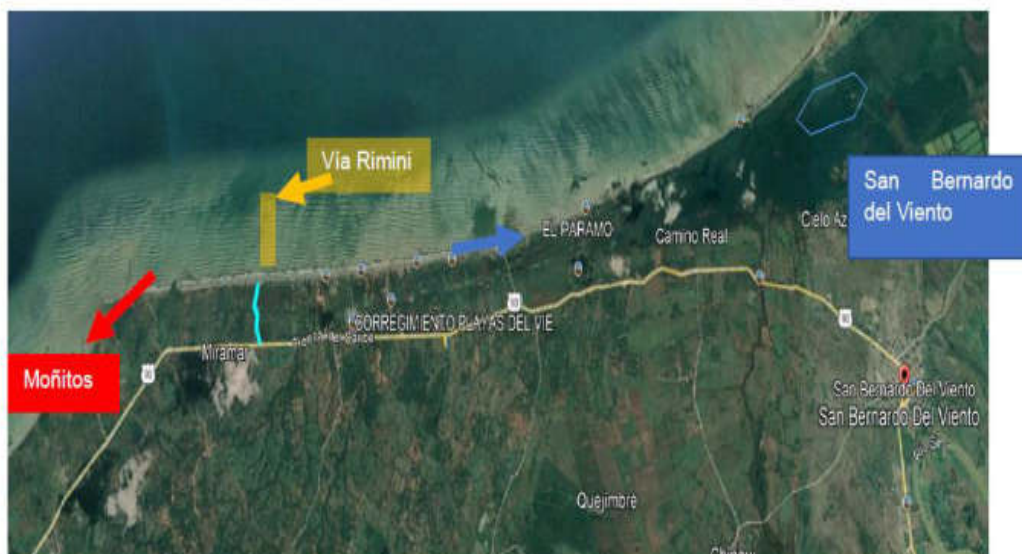


Imagen 4. Localización del tramo a intervenir en el municipio de San Bernardo del Viento departamento de Córdoba

2.2 Inventario y estado inicial de la vía.

A continuación, se describe el inventario y estado inicial de las vías objeto de los proyectos en cada uno de los Municipios:


- **Municipio de Planeta Rica – Contrato de obra No.159-2023:** La vía rural que comunica de Planeta Rica - Providencia, ubicada en el departamento de Córdoba *“se encuentra en mal estado para la transitabilidad vehicular, con presencia de baches, lodo y desgaste de la capa de rodadura. Los productores no cuentan con vías óptimas para transportar sus productos al casco rural del Municipio y demás veredas circunvecinas. La longitud total de la vía a intervenir en pavimento rígido suma 4980 metros.”*



Estado inicial. Abscisa K0+090.

Estado actual. Abscisa K0+090.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	12

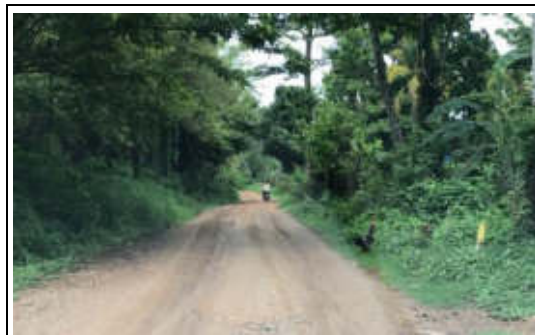

Estado inicial. Abscisa K0+320.



Estado actual. Abscisa K0+320.

- **Municipio de los Córdoba – Contrato de obra No. LP-006-2023:** La vía a intervenir que comunica a la vereda Barranquillita con la vereda El Mango del municipio Los Córdoba, “*se caracteriza por presentar una topografía ondulada, se encuentra en afirmado y en mal estado lo que afecta de manera directa la transitabilidad vehicular. Dicho tramo vial cuenta una considerable presencia de baches, lodo, desgaste de la capa de rodadura y se evidencia la ausencia de estructuras superficiales de captación y recolección de aguas lluvias. En virtud de lo anterior, los productores de esa región, no cuentan con vías óptimas para transportar sus productos al casco rural del Municipio y demás veredas circunvecinas.*”



Estado inicial. Abscisa K0+000



Estado actual. Abscisa K0+000 (Inicio)



Estado inicial. Abscisa K2+322



Estado actual. Abscisa K2+322

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	13

- **Municipio de San Bernardo del Viento – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023:** La vía que conduce desde la intersección que lleva desde la vereda Rimini hasta la intersección de la vía nacional San Bernardo del Viento – Moñitos, *“la infraestructura vial actual es deficiente, dado que a pesar de que se encuentra en afirmado este se encuentra deteriorado en todos los 780 metros lo que obliga a invertir varias veces recursos al año para su mantenimiento, adicionalmente, en verano genera gran cantidad de material particulado lo que afecta la salud de las poblaciones cercanas además del sector hotelero.”*



	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	14

2.3 Características técnicas del proyecto.

Las obras objeto de esta interventoría se ejecutan en los municipios de Planeta Rica, Los Córdoba y San Bernardo del Viento, estos proyectos cuentan con una etapa de revisión y/o ajustes a los diseños iniciales, la cual deberá ser realizada por los especialistas de cada contratista. Una vez entregados los diseños definitivos, estos fueron aprobados parcialmente por la interventoría, dando inicio a la ejecución de actividades físicas de los proyectos, en ciertos tramos definidos.

- **Objeto y alcance.**

El objeto de los contratos de obra es:

➤ **Municipio de Planeta Rica – Contrato de obra No.159-2023:**

Objeto: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”. Cuyo alcance comprende;

ETAPA 1: REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLACA HUELLA, PAVIMENTO Y ESTRUCTURAS DE DRENAJE)

ETAPA 2: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS, EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA.

El presente proyecto consiste en el mejoramiento y mantenimiento de la vía planeta rica – providencia el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la granjita hasta el corregimiento de Providencia, en la zona rural del municipio de Planeta Rica, que busca optimizar la transitabilidad de la población, con un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto.

Construcción de obras hidráulicas: 10 box couvert de 1x1 L= 8m, y también construcción de 6 box couvert de 2x2 L=8m.

También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frío.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	16

➤ **Municipio de los Córdoba – Contrato de obra No. LP-006-2023:**

Objeto: MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”. Cuyo alcance comprende:

ETAPA 1: REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO.


El presente proyecto consiste en el “MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA BARRANQUILLITA LOCALIZADAS EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA”, y busca facilitar la movilidad vehicular y el adecuado desplazamiento de las escorrentías superficiales en la vía que comunica a Barranquillita con la vereda El Mango, en la zona rural del municipio de Los Córdoba a través de la construcción de un pavimento con una estructura compuesta por un mejoramiento en relleno seleccionado de cantera con un espesor de 0.25m, una capa de subbase granular tipo C de 0.15m y una losa de rodamiento en concreto rígido MR38 con espesor de 0.20m; en una longitud total de 1.421 metros. La vía a intervenir está constituida por una calzada bidireccional de 5.40 metros de sección transversal incluyendo berma-cunetas, también contempla la instalación de bordillo en concreto.

Construcción de obras hidráulicas: 6 box culvert de 1.00 m x 1.00m y L= 6m.

De igual manera se instalará señalización vertical y líneas de demarcación con pintura en frío.

El proyecto también contempla obras de protección y estabilización de taludes mediante la construcción de un muro de contención en concreto de 21MPa reforzado con acero $F_y = 4200$ MPa, el muro cuenta con una longitud de 90.00 m y un espesor de 0.35m.

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

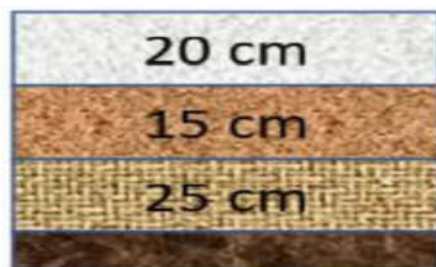


Losa de Concreto MR 3.8 Mpa

Subbase Granular C

Mejoramiento CBR 10 %

Subrasante

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	17

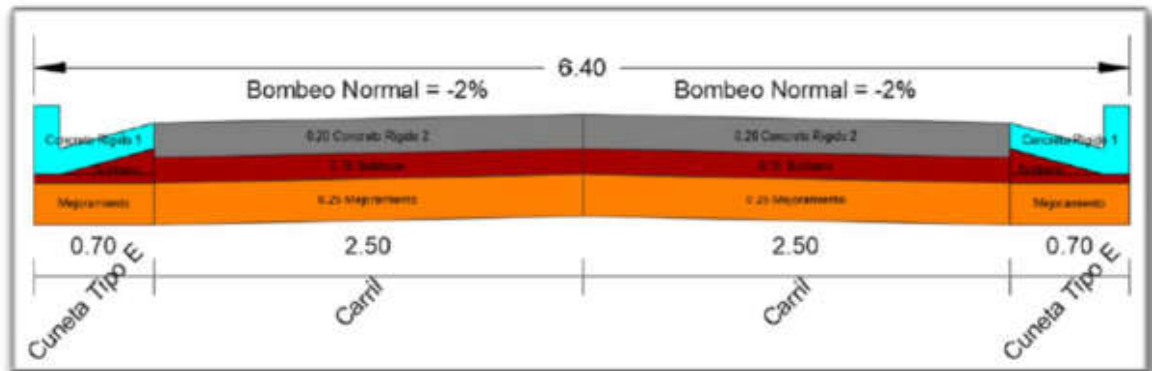

➤ **Municipio de San Bernardo del Viento – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023:**

Objeto: *MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA – COLOMBIA RURAL.* Cuyo alcance comprende:


ETAPA 1: REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS

ETAPA 2: EJECUCIÓN DE LAS OBRAS EN EL TIEMPO ESTABLECIDO


El proyecto consta de 780 ml en concreto rígido, lo que permitiría tener una superficie de rodadura de buena calidad en todas las épocas del año, además de que es una solución real a las problemáticas de movilidad de la población y sus costos de mantenimientos serían muy bajos a largo plazo.

Construcción de obras hidráulicas: 1 box coulvert de 1.50 m x 1.50m doble y L= 8m.

ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO

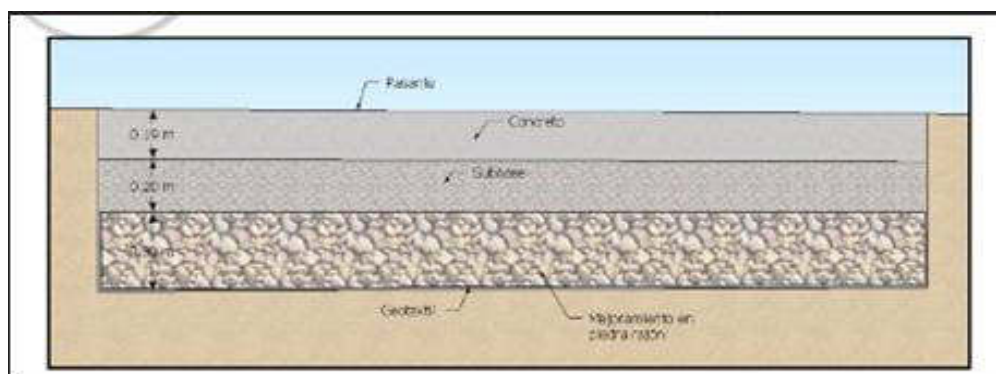

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	18

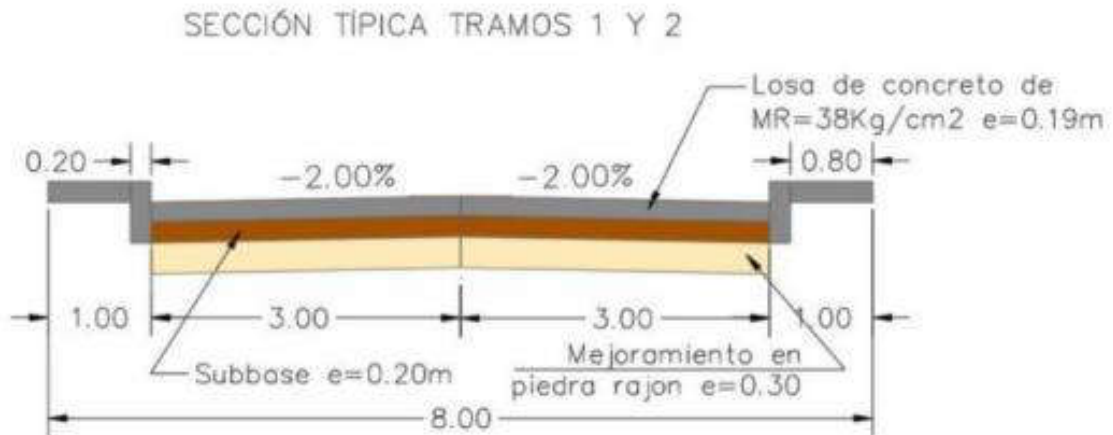

Lo anterior apegado a la norma específica o en alguna eventualidad especial que impida el cumplimiento de las normas del INSTITUTO, la obra y los elementos suministrados por el contratista deberán cumplir los requisitos de las normas aplicables que se mencionan en el siguiente orden de prioridades:

- Instituto de Norma Técnicas ICONTEC.
- American Society for Testing and Materials ASTM.
- American Concrete Institute ACI.
- Portland Cement Association PCA.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	19

2.4 COMPOSICIÓN ACCIONARIA DE LOS CONTRATISTAS DE OBRA

La firma de los CONTRATISTAS DE OBRA está compuesta de la siguiente manera:

➤ Municipio de Planeta Rica – Contrato de obra No.159-2023:

Tabla 1 COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO PROVIDENCIA.

CONTRATO DE OBRA 159 DE 2023		
CONSORCIO PROVIDENCIA		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO	5%	COLOMBIA
BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S	85%	COLOMBIA
KAP CONSTRUCCIONES S.A.S	10%	COLOMBIA

➤ Municipio de los Córdoba – Contrato de obra No. LP-006-2023:

Tabla 2. COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

CONTRATO DE OBRA LP-006 DE 2023		
CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
MARIO ALBERTO ALMANZA SOLAN	10%	COLOMBIA
E INGCARQ S.A.S	90%	COLOMBIA

➤ Municipio de San Bernardo del Viento – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023:

Tabla 3. COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO L&S

CONTRATO DE OBRA LP-MSBV-008-2023		
CONSORCIO L&S		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
LA COMERCIALA S.A.S	50%	COLOMBIA
SIS ORGANIZATION S.A.S	50%	COLOMBIA

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	20

3.1 INFORMACIÓN GENERAL DE LOS CONTRATOS DE OBRA.

➤ Municipio de Planeta Rica – Contrato de obra No.159-2023:

Tabla 4 INFORMACION CONTRATO DE OBRA 0159-2023.

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA N° 159-2023 – Convenio N° 2286-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIDENCIA	NIT:	901.764.629 - 9
INTEGRANTES (CONSORCIO):	EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO 5% BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 85% KAP CONSTRUCCIONES S.A.S 10%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023.	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta No.1
VALOR INICIAL:	\$ 14.100.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 0,00		
ADICIÓN NN:	\$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 14.100.000.000,00		
ANTICIPO	40% de la etapa 2 del contrato		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 5.287.335.878,80		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 5.287.335.878,80		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1 (uno)		
PRÓRROGA 1:	Hasta 20 de diciembre de 2024		
PRÓRROGA 2:	N/A		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023		
AMPLIACIÓN NO. 1	29/01/2024		
SUSPENSIÓN 1:			
REINICIO 1:	01/02/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 de diciembre de 2024		

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	21

➤ **Municipio de los Córdoba – Contrato de obra No. LP-006-2023:**

Tabla 5. INFORMACION CONTRATO DE OBRA LP-006-2023.

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023 – Convenio N° 2217-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	NIT:	901.168.925 - 2
INTEGRANTES (CONSORCIO):	MARIO ALBERTO ALMANZA SOLAN 10% INGCARQ S.A.S 90%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	29 de diciembre de 2023.	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta No.1
VALOR INICIAL:	\$ 6.140.057.707,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 0,00		
ADICIÓN NN:	\$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 6.140.057.707,00		
ANTICIPO	30% del contrato		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 1.842.017.312,10		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 1.842.017.312,10		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	1 (uno)		
PRÓRROGA 1:	Hasta 30 de noviembre de 2024		
PRÓRROGA 2:	Hasta 20 de diciembre de 2024		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023		
AMPLIACIÓN NO. 1	29/01/2024		
SUSPENSIÓN 1:			
REINICIO 1:	01/02/2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN:	20 de diciembre de 2024		

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	22

➤ **Municipio de San Bernardo del Viento – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023:**

Tabla 6. INFORMACION CONTRATO DE OBRA LP-MSBV-008-2023

CONTRATO DE OBRA O CONVENIO NO.	CONTRATO DE OBRA N° LP-MSBV-008-2023 – Convenio N° 2222-2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO L&S	NIT:	901.765.372 - 6
INTEGRANTES (CONSORCIO):	LA COMERCIALA S.A.S 50% SIS ORGANIZATION S.A.S 50%		
OBJETO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023.	No. de Oficio o fecha estado en ejecución plataforma SECOP (el que aplique:	Acta No.1
VALOR INICIAL:	\$ 2.115.723.321,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 0,00		
ADICIÓN NN:	\$ 0,00		
VALOR ACTUAL:	\$ 2.115.723.321,00		
ANTICIPO	30% del valor básico del contrato		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 634.716.996,30		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 634.716.996,30		
PLAZO INICIAL:	Hasta 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:	02		
PRÓRROGA 1:	Hasta 27 de octubre de 2024		
PRÓRROGA 2:	Hasta 20 de diciembre de 2024		
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023		
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 1:	29/01/2024		
REINICIO 1:	01/02/2024		
SUSPENSIÓN 2:	16/03/2024		
AMPLIACIÓN 1 A LA SUSPENSIÓN 2:	16/04/2024		
AMPLIACIÓN 2 A LA SUSPENSIÓN 2:	01/05/2024		
REINICIO 2:	14/05/2024		
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:	27 de julio de 2024		
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUALIZADA:	20 de diciembre de 2024		

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	23

3.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES.

A fecha del corte del presente informe se realizaron las siguientes actividades para cada uno de los contratos:

3.2.1 MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023:

- **SEMANA No.40: del 01/10/2024 al 07/11/2024**

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA SON:

- ESTADO DEL TIEMPO:

- EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 3:00 A.M. A 10:00 A.M. Y DESDE 6:00P.M. A 8:00 P.M.

- EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 3:00 A.M. A 7:00 A.M.

- EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 2:00 A.M. A 6:00 A.M.

- EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 4:00 A.M. A 7:00 A.M.

- EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 9:00 A.M. A 10:00 A.M. Y DESDE 3:00 P.M A 4:00 P.M.

- SE MANTIENE INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS EN EL CORREDOR VIAL, ENTRE LAS ABSCISAS K0+084 HASTA A K3+540.

- SE UTILIZAN PALETEROS PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LOS TRAMOS EN INTERVENCIÓN.

- SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (AFIRMADO), PROVENIENTE DE LA CANTERA JOMEVE EN CIENAGA DE ORO.

- SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (SUBBASE GRANULAR), PROVENIENTE DE LA CANTERA SIBERIA.

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA QUE AVANCE CON LA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO DESDE LA ABSCISA K2+000 HACIA MAYORES.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	24

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA QUE AVANCE CON LA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DESDE LA ABSCISA K2+000 HACIA MAYORES.

- SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES IN SITU PARA VERIFICAR COMPACTACIÓN DE TERRENO.

- LA INTERVENTORÍA REALIZA CHEQUEO TOPOGRÁFICO PARA VERIFICAR NIVELES Y VOLÚMENES DE AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR.

- PARA LA INTERVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO MR38 SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

SE REALIZA COLOCACIÓN DE RIELES DESDE LA ABSCISA K1+766 HASTA LA K1+952 (CARRIL IZQUIERDO).

SE REALIZA CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE RIELES PARA GARANTIZAR BOMBEO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO A CONSTRUIR.

SE REALIZA REPLANTEO PARA RESPETAR LA MODULACIÓN DE LAS LOSAS Y SE LOCALIZA CON TOPOGRAFÍA LAS JUNTAS EN LOS TRAMOS CURVOS PARA GARANTIZAR LA DEFLEXIÓN.

SE VERIFICAN ANCHO Y ESPESORES PARA EL PAVIMENTO RÍGIDO A CONSTRUIR A LO LARGO DEL TRAMO DESDE LA ABSCISA K1+766 HASTA LA K1+952 (CARRIL IZQUIERDO).

SE VERIFICA DIMENSIONES DE LAS CANASTILLAS GARANTIZANDO ANCHO PARA DOVELAS CON LONGITUD DE 35CM, SEPARACIÓN CENTRO A CENTRO DE 30 CM Y ALTURA DE UBICACIÓN DE DOVELA DE 9CM.

SE VERIFICAN DOVELAS DE 1” CON UNA LONGITUD DE 35CM.

SE VERIFICA ACERO LONGITUDINAL DE ½” CON UNA LONGITUD DE 85CM ESPACIADOS CADA 1,2CM.

SE REALIZA FUNDIDA DE PAVIMENTO RÍGIDO MR-38 PREMEZCLADO, DESDE LA ABSCISA K1+766 HASTA LA K1+952 (CARRIL IZQUIERDO).

SE REALIZA PRUEBA SLUMP EN OBRA PARA VERIFICAR ASENTAMIENTO DEL CONCRETO.

SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO (VIGUETAS) PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.

SE REALIZA VIBRADO DEL CONCRETO A LO LARGO DE LOS TRAMOS FUNDIDOS.

SE REALIZA TEXTURIZADO Y ACABADO FINAL DE LAS LOSAS DE CONCRETO.

SE APLICÓ ANTISOL A LO LARGO DEL TRAMO DE PAVIMENTO RÍGIDO CONSTRUIDO.

SE REALIZA CORTE CADA 3M EN LAS JUNTAS DE DILATACIÓN DEL TRAMO DE PAVIMENTO RÍGIDO MR38 CONSTRUIDO.

SE REALIZA LIMPIEZA Y SELLO DE LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL PAVIMENTO CONSTRUIDO.

- SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA 160ML DE BERMACUNETAS E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	25

- SE REALIZA FUNDIDA DE 160 ML BERMACUNETAS DE 3000 PSI CON CONCRETO PREMEZCLADO.

- SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO 3000 PSI DE BERMACUNETAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.

- LA INTERVENTORIA REALIZA VERIFICACIÓN DE LA APERTURA DEL BUZÓN PQRS UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA OBRA, EL CUAL NO PRESENTA PETICIONES DE LA COMUNIDAD.

- LA INTERVENTORIA SOLICITA QUE SE INICIEN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS BOXCULVERT 2X1 UBICADO EN LA ABSCISA k3+610 Y EL BOXCULVERT 2X1.5 UBICADO EN LA ABSCISA K3+920.

- LA INTERVENTORÍA SOLICITA AUMENTAR EL RENDIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, CON EL FIN DE TERMINAR EL TRAMO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA SU EJECUCIÓN. DE IGUAL MANERA, SE REQUIERE SUBSANAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PLAN DE CONTIGENCIA DEL TRAMO K0+084 A K3+540.

- EL PROCESO SANCIONATORIO CONTINÚA SU CURSO NORMAL Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA REANUDACIÓN DE AUDIENCIA. DE IGUAL MANERA, LA INTERVENTORIA SOLICITÓ AL MUNICIPIO INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES SST.

- IGUALMENTE, EN EL TRANCURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS:

- CINGE-INV-5053-0397-24 Remisión informe mensual No. 9 correspondiente al periodo de octubre 2024.

- CINGE-INV-5053-0399-24 Respuesta oficio OFI-CONS-0121-2024. Orden de operación No.10

- CINGE-INV-5053-0401-24 Respuesta oficio OFI-CONS-0120-2024. Orden de operación No. 9

- **SEMANA No.41: del 08/11/2024 al 14/11/2024.**

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA SON:

- ESTADO DEL TIEMPO:

- EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 1:00 P.M. A 4:00 P.M.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	26

- EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 4:00 A.M. A 8:00 A.M.

- EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 5:00 P.M. A 9:00 P.M.

- EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 4:00 A.M. A 8:00 A.M.

- SE MANTIENE INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS EN EL CORREDOR VIAL, ENTRE LAS ABSCISAS K0+084 HASTA A K3+540.

- SE UTILIZAN PALETEROS PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LOS TRAMOS EN INTERVENCIÓN.

- SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (AFIRMADO), PROVENIENTE DE LA CANTERA JOMEVE EN CIENAGA DE ORO.

- SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (SUBBASE GRANULAR), PROVENIENTE DE LA CANTERA SIBERIA.

- SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO DESDE LA ABSCISA K2+000 A K2+100.

- SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DESDE LA ABSCISA K2+000 A K2+100.

- SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES IN SITU PARA VERIFICAR COMPACTACIÓN DE TERRENO.

- LA INTERVENTORÍA REALIZA CHEQUEO TOPOGRÁFICO PARA VERIFICAR NIVELES Y VOLÚMENES DE AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR.

- PARA LA INTERVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO MR38 SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
SE REALIZA COLOCACIÓN DE RIELES DESDE LA ABSCISA K1+952 HASTA LA K2+054 (CARRIL IZQUIERDO).

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	27

SE REALIZA CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE RIELES PARA GARANTIZAR BOMBEO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO A CONSTRUIR.

SE REALIZA REPLANTEO PARA RESPETAR LA MODULACIÓN DE LAS LOSAS Y SE LOCALIZA CON TOPOGRAFÍA LAS JUNTAS EN LOS TRAMOS CURVOS PARA GARANTIZAR LA DEFLEXIÓN.

SE VERIFICAN ANCHO Y ESPESORES PARA EL PAVIMENTO RÍGIDO A CONSTRUIR A LO LARGO DEL TRAMO DESDE LA ABSCISA K1+952 HASTA LA K2+054 (CARRIL IZQUIERDO).

SE VERIFICA DIMENSIONES DE LAS CANASTILLAS GARANTIZANDO ANCHO PARA DOVELAS CON LONGITUD DE 35CM, SEPARACIÓN CENTRO A CENTRO DE 30 CM Y ALTURA DE UBICACIÓN DE DOVELA DE 9CM.

SE VERIFICAN DOVELAS DE 1” CON UNA LONGITUD DE 35CM.

SE VERIFICA ACERO LONGITUDINAL DE ½” CON UNA LONGITUD DE 85CM ESPACIADOS CADA 1,2CM.

SE REALIZA FUNDIDA DE PAVIMENTO RÍGIDO MR-38 PREMEZCLADO, DESDE LA ABSCISA K1+952 HASTA LA K2+054 (CARRIL IZQUIERDO).

SE REALIZA PRUEBA SLUMP EN OBRA PARA VERIFICAR ASENTAMIENTO DEL CONCRETO.

SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO (VIGUETAS) PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.

SE REALIZA VIBRADO DEL CONCRETO A LO LARGO DE LOS TRAMOS FUNDIDOS.

SE REALIZA TEXTURIZADO Y ACABADO FINAL DE LAS LOSAS DE CONCRETO.

SE APLICÓ ANTISOL A LO LARGO DEL TRAMO DE PAVIMENTO RÍGIDO CONSTRUIDO.

SE REALIZA CORTE CADA 3M EN LAS JUNTAS DE DILATACIÓN DEL TRAMO DE PAVIMENTO RÍGIDO MR38 CONSTRUIDO.

SE REALIZA LIMPIEZA Y SELLO DE LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL PAVIMENTO CONSTRUIDO.

- SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA 160ML DE BERMACUNETAS E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.

- SE REALIZA FUNDIDA DE 300 ML BERMACUNETAS DE 3000 PSI CON CONCRETO PREMEZCLADO.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	28

- SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO 3000 PSI DE BERMACUNETAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.

- LA INTERVENTORIA REALIZA VERIFICACIÓN DE LA APERTURA DEL BUZÓN PQRS UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA OBRA, EL CUAL NO PRESENTA PETICIONES DE LA COMUNIDAD.

- SE REALIZAN CHARLAS AL EQUIPO DE TRABAJO SOBRE LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN.

- LA INTERVENTORIA REITERA SOLICITUD QUE SE INICIEN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS BOXCULVERT 2X1 UBICADO EN LA ABSCISA K3+610 Y EL BOXCULVERT 2X1.5 UBICADO EN LA ABSCISA K3+920.

- LA INTERVENTORÍA SOLICITA AUMENTAR EL RENDIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, CON EL FIN DE TERMINAR EL TRAMO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA SU EJECUCIÓN. DE IGUAL MANERA, SE REQUIERE SUBSANAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PLAN DE CONTIGENCIA DEL TRAMO K0+084 A K3+540.

- EL PROCESO SANCIONATORIO CONTINÚA SU CURSO NORMAL Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA REANUDACIÓN DE AUDIENCIA. DE IGUAL MANERA, LA INTERVENTORIA SOLICITÓ AL MUNICIPIO INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES SST.

- IGUALMENTE, EN EL TRANCURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS:

- CINGE-INV-5053-0411-24 Respuesta comunicado - OFI-CONS-105-2024 actas de vecindad faltantes de los tramos ubicados en la Balustrera 1 y Balustrera 2.

- CINGE-INV-5053-0414-24 Respuesta al comunicado OFI-CONS-122-2024– Subsanación informe ambiental julio y agosto 2024.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	29

- CINGE-INV-5053-0415-24 Apremio Comunicados OFI-CONS-111-2024 y OFI-CONS-115-2024 –Informes SST febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto y septiembre 2024.

- CINGE-INV-5053-0416-24 Reiteración a compromisos pactados.

- CINGE-INV-5053-0417-24 Revisión resultados de ensayos.

- CINGE-INV-5053-0418-24 Respuesta a comunicado OFI-CONS-116-2024. Plan de contingencia actualizado y flujo de caja.

- CINGE-INV-5053-0419-24 Alcance comunicado CING-INV-5053-0414-24, respuesta al comunicado OFI-CONS-122-2024– Subsanación informe ambiental julio y agosto 2024.

- **SEMANA No.42: del 15/11/2024 al 21/11/2024**

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA SON:

- ESTADO DEL TIEMPO:

- EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 8:00 A.M. A 11:00 A.M.

- EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 1:30 P.M. A 2:30 P.M.

- SE TREALIZA COMITE DE OBRA CON PARTICIPACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA, CON EL FIN DE HACER SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS.

- SE MANTIENE INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS EN EL CORREDOR VIAL, ENTRE LAS ABSCISAS K0+084 HASTA A K3+540.

- SE UTILIZAN PALETEROS PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LOS TRAMOS EN INTERVENCIÓN.

- SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (AFIRMADO), PROVENIENTE DE LA CANTERA JOMEVE EN CIENAGA DE ORO.

- SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (SUBBASE GRANULAR), PROVENIENTE DE LA CANTERA SIBERIA.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	30

- SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO DESDE LA ABSCISA K2+300 HACIA MAYORES.

- SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA AVANZAR EN EL SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DESDE LA ABSCISA K2+100 HACIA MAYORES.

- LA INTERVENTORÍA REALIZA CHEQUEO TOPOGRÁFICO PARA VERIFICAR NIVELES Y VOLÚMENES DE SUBBASE GRANULAR.

- PARA LA INTERVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO MR38 SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:

SE REALIZA COLOCACIÓN DE RIELES DESDE LA ABSCISA K0+084 HASTA LA K0+936 (CARRIL DERECHO).

SE REALIZA CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE RIELES PARA GARANTIZAR BOMBEO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO A CONSTRUIR.

SE REALIZA REPLANTEO PARA RESPETAR LA MODULACIÓN DE LAS LOSAS Y SE LOCALIZA CON TOPOGRAFÍA LAS JUNTAS EN LOS TRAMOS CURVOS PARA GARANTIZAR LA DEFLEXIÓN.

SE VERIFICAN ANCHO Y ESPESORES PARA EL PAVIMENTO RÍGIDO A CONSTRUIR A LO LARGO DEL TRAMO DESDE LA ABSCISA K0+084 HASTA LA K0+936 (CARRIL DERECHO).

SE VERIFICA DIMENSIONES DE LAS CANASTILLAS GARANTIZANDO ANCHO PARA DOVELAS CON LONGITUD DE 35CM, SEPARACIÓN CENTRO A CENTRO DE 30 CM Y ALTURA DE UBICACIÓN DE DOVELA DE 9CM.

SE VERIFICAN DOVELAS DE 1” CON UNA LONGITUD DE 35CM.

SE VERIFICA ACERO LONGITUDINAL DE ½” CON UNA LONGITUD DE 85CM ESPACIADOS CADA 1,2CM.

SE REALIZA FUNDIDA DE PAVIMENTO RÍGIDO MR-38 PREMEZCLADO, DESDE LA ABSCISA K0+084 HASTA LA K0+936 (CARRIL DERECHO).

SE REALIZA PRUEBA SLUMP EN OBRA PARA VERIFICAR ASENTAMIENTO DEL CONCRETO.

SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO (VIGUETAS) PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.

SE REALIZA VIBRADO DEL CONCRETO A LO LARGO DE LOS TRAMOS FUNDIDOS.

SE REALIZA TEXTURIZADO Y ACABADO FINAL DE LAS LOSAS DE CONCRETO.

SE APLICÓ ANTISOL A LO LARGO DEL TRAMO DE PAVIMENTO RÍGIDO CONSTRUIDO.

SE REALIZA CORTE CADA 3M EN LAS JUNTAS DE DILATACIÓN DEL TRAMO DE PAVIMENTO RÍGIDO MR38 CONSTRUIDO.

SE REALIZA LIMPIEZA Y SELLO DE LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL PAVIMENTO CONSTRUIDO.

- SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA 576ML DE BERMACUNETAS E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	31

- SE REALIZA FUNDIDA DE 576ML BERMACUNETAS DE 3000 PSI CON CONCRETO PREMEZCLADO.
- SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO 3000 PSI DE BERMACUNETAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.
- LA INTERVENTORIA REALIZA VERIFICACIÓN DE LA APERTURA DEL BUZÓN PQRS UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA OBRA, EL CUAL NO PRESENTA PETICIONES DE LA COMUNIDAD.
- SE REALIZAN CHARLAS AL EQUIPO DE TRABAJO SOBRE LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN.
- SE REALIZA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA VEEDURIA CIUDADANA, MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA, CON EL FIN DE DAR A CONOCER EL AVANCE DEL PROYECTO Y ACLARAR INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD.
- LA INTERVENTORIA REITERA SOLICITUD QUE SE INICIEN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS BOXCULVERT 2X1 UBICADO EN LA ABSCISA K3+610 Y EL BOXCULVERT 2X1.5 UBICADO EN LA ABSCISA K3+920.
- LA INTERVENTORÍA SOLICITA AUMENTAR EL RENDIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, CON EL FIN DE TERMINAR EL TRAMO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA SU EJECUCIÓN. DE IGUAL MANERA, SE REQUIERE SUBSANAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PLAN DE CONTIGENCIA DEL TRAMO K0+084 A K3+540.
- EL PROCESO SANCIONATORIO CONTINÚA SU CURSO NORMAL Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA REANUDACIÓN DE AUDIENCIA. DE IGUAL MANERA, LA INTERVENTORIA SOLICITÓ AL MUNICIPIO INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES SST.
- IGUALMENTE, EN EL TRANCURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS:
 - CINGE-INV-5053-0421-24 Respuesta comunicado OFI-CONS-123-2024 (entrega informe periodo octubre de 2024).
 - CINGE-INV-5053-0424-24 Respuesta a comunicado OFI-CONS-114-2024. PLANETA RICA, CÓRDOBA. SUBSANACION DISEÑO HIDRÁULICO.
 - CINGE-INV-5053-0426-24 Incumplimiento a compromisos pactados comité de obra.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	32

• **SEMANA No.43: del 22/11/2024 al 28/11/2024.**

LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA SON:

• ESTADO DEL TIEMPO:

- EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 6:00 P.M. A 7:00 P.M.

- EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 5:00 P.M. A 8:00 P.M.

- EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 1:00 A.M. A 3:00 A.M.

- EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 1:00 P.M. A 3:00 P.M.

• SE REALIZA COMITE DE OBRA CON PARTICIPACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA, CON EL FIN DE HACER SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS.

• SE MANTIENE INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS EN EL CORREDOR VIAL, ENTRE LAS ABSCISAS K0+084 HASTA A K3+540.

• SE UTILIZAN PALETEROS PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LOS TRAMOS EN INTERVENCIÓN.

• SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (AFIRMADO), PROVENIENTE DE LA CANTERA JOMEVE EN CIENAGA DE ORO.

• SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (SUBBASE GRANULAR), PROVENIENTE DE LA CANTERA SIBERIA.

• SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO DESDE LA ABSCISA K2+300 HASTA LA K3+000.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	33

- SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DESDE LA ABSCISA K2+100 A K2+300.
- SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES IN SITU PARA VERIFICAR COMPACTACIÓN DE TERRENO.
- LA INTERVENTORÍA REALIZA CHEQUEO TOPOGRÁFICO PARA VERIFICAR NIVELES Y VOLÚMENES DE SUBBASE GRANULAR.
- PARA LA INTERVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO MR38 SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:
SE REALIZA COLOCACIÓN DE RIELES DESDE LA ABSCISA K0+936 HASTA LA K1+733,2 (CARRIL DERECHO) Y DESDE K2+054 A K2+204 (CARRIL IZQUIERDO).
SE REALIZA CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE RIELES PARA GARANTIZAR BOMBEO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO A CONSTRUIR.
SE REALIZA REPLANTEO PARA RESPETAR LA MODULACIÓN DE LAS LOSAS Y SE LOCALIZA CON TOPOGRAFÍA LAS JUNTAS EN LOS TRAMOS CURVOS PARA GARANTIZAR LA DEFLEXIÓN.
SE VERIFICAN ANCHO Y ESPESORES PARA EL PAVIMENTO RÍGIDO A CONSTRUIR A LO LARGO DEL TRAMO DESDE LA ABSCISA K0+936 HASTA LA K1+733,2 (CARRIL DERECHO) Y DESDE K2+054 A K2+204 (CARRIL IZQUIERDO).
SE VERIFICA DIMENSIONES DE LAS CANASTILLAS GARANTIZANDO ANCHO PARA DOVELAS CON LONGITUD DE 35CM, SEPARACIÓN CENTRO A CENTRO DE 30 CM Y ALTURA DE UBICACIÓN DE DOVELA DE 9CM.
SE VERIFICAN DOVELAS DE 1” CON UNA LONGITUD DE 35CM.
SE VERIFICA ACERO LONGITUDINAL DE ½” CON UNA LONGITUD DE 85CM ESPACIADOS CADA 1,2CM.
SE REALIZA FUNDIDA DE PAVIMENTO RÍGIDO MR-38 PREMEZCLADO, DESDE LA ABSCISA K0+936 HASTA LA K1+733,2 (CARRIL DERECHO) Y DESDE K2+054 A K2+204 (CARRIL IZQUIERDO).
SE REALIZA PRUEBA SLUMP EN OBRA PARA VERIFICAR ASENTAMIENTO DEL CONCRETO.
SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO (VIGUETAS) PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	34

SE REALIZA VIBRADO DEL CONCRETO A LO LARGO DE LOS TRAMOS FUNDIDOS.

SE REALIZA TEXTURIZADO Y ACABADO FINAL DE LAS LOSAS DE CONCRETO.

SE APLICÓ ANTISOL A LO LARGO DEL TRAMO DE PAVIMENTO RÍGIDO CONSTRUIDO.

SE REALIZA CORTE CADA 3M EN LAS JUNTAS DE DILATACIÓN DEL TRAMO DE PAVIMENTO RÍGIDO MR38 CONSTRUIDO.

SE REALIZA LIMPIEZA Y SELLO DE LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL PAVIMENTO CONSTRUIDO.

- SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA 390.92ML DE BERMACUNETAS E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.

- SE REALIZA FUNDIDA DE 390.92ML BERMACUNETAS DE 3000 PSI CON CONCRETO PREMEZCLADO.

- SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO 3000 PSI DE BERMACUNETAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.

- LA INTERVENTORIA REALIZA VERIFICACIÓN DE LA APERTURA DEL BUZÓN PQRS UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA OBRA, EL CUAL NO PRESENTA PETICIONES DE LA COMUNIDAD.

- LA INTERVENTORIA REITERA SOLICITUD QUE SE INICIEN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS BOXCULVERT 2X1 UBICADO EN LA ABSCISA K3+610 Y EL BOXCULVERT 2X1.5 UBICADO EN LA ABSCISA K3+920.

- LA INTERVENTORÍA SOLICITA AUMENTAR EL RENDIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, CON EL FIN DE TERMINAR EL TRAMO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA SU EJECUCIÓN. DE IGUAL MANERA, SE REQUIERE SUBSANAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DEL TRAMO K0+084 A K3+540.

- EL PROCESO SANCIONATORIO CONTINÚA SU CURSO NORMAL Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA REANUDACIÓN DE AUDIENCIA. DE IGUAL MANERA, LA

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	35

INTERVENTORIA SOLICITÓ AL MUNICIPIO INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES SST.

• IGUALMENTE, EN EL TRANCURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS:

- CINGE-INV-5053-0434-24 Remisión comunicados del INVIAS 2024S-VBOG-087127 - 2024S-VBOG-087125 - Revisión PAGA e informes de estado ambiental.

- CINGE-INV-5053-0437-24 Respuesta a comunicado OFI-CONS-124-2024. Geotecnia muro.

- CINGE-INV-5053-0438-24 Respuesta a comunicado OFI-CONS-125-2024. Subsanación informe ambiental julio y agosto 2024.

- CINGE-INV-5053-0441-24 Respuesta a comunicado OFI-CONS-117-2024. Diseño estructural.

- CINGE-INV-5053-0442-24 Respuesta a comunicado OFI-CONS-106-2024. Diseño estructural.

3.2.2 MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023:

- **SEMANA No.40: del 01/11/2024 al 07/11/2024**

En el transcurso de la actual semana se realizó lo siguiente:

- El día 05 de noviembre de 2024, se realizó comité de obra, donde asistió la secretaria de planeación, el asesor de planeación, el contratista y la interventoría, con el fin de realizar seguimiento a la ejecución de la obra y compromisos pendientes.

- Durante la semana se presentaron lluvias en la zona los días 01 de noviembre de 2024 (desde las 6:10 am hasta las 7:10 am) y el día 07 de noviembre de 2024 (desde las 3:50 am hasta las 5:00 am).

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	36

- Se realiza suministro, extensión y compactación de subbase granular de la abscisa k0+990 a la k0+840

- Se verifica con topografía niveles de la vía y espesores de cunetas.

- Se realiza verificación con topografía por parte de la interventoría el bombeo de la vía, nivelación, espesores y colocación de rieles para cunetas.

- Se realiza colocación de rieles para cunetas lado izquierdo y lado derecho y de pavimento carril derecho.

- Se realiza amarre y colocación de acero para cunetas lado izquierdo y lado derecho.

- Se realiza colocación de acero para losas de pavimento carril izquierdo

- Se realiza fundición de concreto de 3000 psi para cunetas de la abscisa k1+883 - k1+656,5 lado izquierdo.

- Se realiza fundición de concreto de 3000 psi para bordillos de la abscisa k2+322 - k2+252 lado izquierdo.

- Se realiza fundición de concreto de 3000 psi para cunetas de la abscisa k1+442,2 - k1+410 lado derecho.

- Se realiza fundición de concreto mr38 para pavimento rígido de la abscisa k2+000,6 - k1+787 carril izquierdo.

- Se realiza toma de muestras de concreto de cunetas y de losas de pavimento.

- En el transcurso de la semana se envió por correo electrónico el siguiente comunicado:

- CING-INV-5053-0402-24 Identificación losas reparación 07/11/2024

- En el transcurso de la semana se recibió por correo electrónico el siguiente comunicado:

- COBQ-079-24 Informe mensual ambiental-octubre 05/11/2024

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	37

• **SEMANA No.41: del 08/11/2024 al 14/11/2024**

En el transcurso de la actual semana se realizó lo siguiente:

- El día 13 de noviembre de 2024, se realizó comité de obra, donde asistió la secretaria de planeación, el asesor de planeación, el contratista y la interventoría, con el fin de realizar seguimiento a la ejecución de la obra y compromisos pendientes.
- Durante la semana se presentaron lluvias en la zona los días 08 de noviembre de 2024 (desde las 3:00 am hasta las 6:00 am y desde la 1:10 pm hasta las 3:00 pm), el día 10 de noviembre de 2024 (desde las 11:00 pm hasta la 1:00 am) y el día 11 de noviembre de 2024 (desde las 12:30 am hasta las 2:00 am y desde las 2:00 am hasta las 9:30 am).
- Se realiza suministro, extensión y compactación de subbase granular de la abscisa k0+840 - k0+480.
- Se verifica con topografía niveles de la vía y espesores de cunetas y de losas de pavimento.
- Se realiza verificación con topografía por parte de la interventoría el bombeo de la vía, nivelación, espesores.
- Se realiza colocación de acero para losas de pavimento carril izquierdo y carril derecho.
- Se realiza fundición de concreto de 3000 psi para bordillos de la abscisa k2+252 - k2+135 lado derecho y de la abscisa k2+325 - k2+143 lado izquierdo.
- Se realiza fundición de concreto mr38 para pavimento rígido de la abscisa k1+787 - k1+714 y de la abscisa k1+711,4 - k1+656,5 carril izquierdo, y de la abscisa k1+271,5 - k1+142,5 carril derecho.
- Se realiza toma de muestras de concreto de losas de pavimento y de bordillos.
- Se realiza toma de densidades in situ de la capa de subbase granular de la abscisa k0+960 - k0+600.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	38

•En el transcurso de la semana se envió por correo electrónico el siguiente comunicado:

– CING-INV-5053-0412-24 - Respuesta comunicado cobq078-24– informe sst junio, julio y septiembre 2024. 12/11/2024 respuesta a los comunicados cobq079-24 informe ambiental octubre 2024. 12/11/2024

• **SEMANA No.42: del 15/11/2024 al 21/11/2024**

En el transcurso de la actual semana se realizó lo siguiente:

- El día 19 de noviembre de 2024, se realizó comité de obra, donde asistió la secretaria de planeación, el asesor de planeación, el contratista y la interventoría, con el fin de realizar seguimiento a la ejecución de la obra y compromisos pendientes.
- Durante la semana se presentaron lluvias en la zona los días 19 de noviembre de 2024 (desde las 1:10 pm hasta las 3:15 pm) y el día 21 de noviembre de 2024 (desde las 3:00 am hasta las 4:10 am).
- Se realiza suministro, extensión y compactación de subbase granular de la abscisa k0+480 - k0+220
- Se verifica con topografía niveles de la vía y espesores de cunetas y de losas de pavimento.
- Se realiza verificación con topografía por parte de la interventoría el bombeo de la vía, nivelación, espesores.
- Se realiza colocación de acero para losas de pavimento carril derecho.
- Se realiza fundición de concreto de 3000 psi para bordillos de la abscisa k2+135 - k2+036 lado derecho y de la abscisa k2+143 - k1+981 lado izquierdo.
- Se realiza fundición de concreto mr38 para pavimento rígido de la abscisa k1+142,5 - k0+970 y k1+961 - k0+800,5 carril derecho.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	39

•Se realiza toma de muestras de concreto de losas de pavimento, cunetas y de bordillos.

•En el transcurso de la semana se envió por correo electrónico los siguientes comunicados:

- CING-INV-5053-0422-24 ENSAYOS - 18/11/2024
- CING-INV-5053-0423-24 INFORME - 19/11/2024
- CING-INV-5053-0427-24 AVAL PRORROGA- 20/11/2024
- CING-INV-5053-0425-24 INFORMES SST - 21/11/2024

•En el transcurso de la semana se recibió por correo electrónico los siguientes comunicados:

- COBQ-081-2024 Informe sst periodo octubre - 18/11/2024
- COBQ 083-2024 Informe fiducia octubre - 18/11/2024
- COBQ-084-24 Acciones correctivas a fisuras en losas 19/11/2024
- CORREO 19/11/2024- Ajustes al plan de contingencia octubre

• **SEMANA No.43: del 22/11/2024 al 28/11/2024**

En el transcurso de la actual semana se realizó lo siguiente:

• El día 27 de noviembre de 2024, se realizó socialización del 50% de ejecución del proyecto, donde asistió el supervisor de invias y apoyo a la supervisión de invias, el alcalde municipal, la secretaria de planeación, el asesor de planeación, el contratista, la interventoría y la comunidad de la zona del proyecto con el fin de informar el avance de la ejecución de las actividades de la obra. Igualmente se realizó comité de veeduría.

• Durante la semana se presentaron lluvias en la zona el día 28 de noviembre de 2024 (desde las 11:00 pm hasta las 3:00 a.m.).

•Se realiza suministro, extensión y compactación de subbase granular de la abscisa k0+220 - k0+030.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	40

- Se verifica con topografía niveles de la vía y espesores de cunetas y de losas de pavimento.
- Se realiza chequeo topográfico por parte de la interventoría el bombeo de la vía, nivelación y espesores.
- Se realiza colocación de acero para losas de pavimento y cunetas carril derecho.
- Se realiza fundición de concreto de 3000 psi para bordillos de la abscisa k2+036 - k1+927 lado derecho y de la abscisa k1+981 - k1+872 lado izquierdo.
- Se realiza fundición de concreto de 3000 psi para cunetas de la abscisa k0+800,5 - k0+630 y de la abscisa k0+972 - k0+960 lado derecho
- Se realiza fundición de concreto mr38 para pavimento rígido de la abscisa k0+970 - k0+734 carril derecho.
- Se realiza toma de muestras de concreto de losas de pavimento, cunetas y de bordillos.
- En el transcurso de la semana se recibió por correo electrónico los siguientes comunicados:
 - COBQ 085-204 Ajustes informe SST agosto y octubre.

3.2.3 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023:

• SEMANA No.40: del 01/11/2024 al 07/11/2024

Durante la semana, se llevaron a cabo actividades significativas en el proyecto que contribuyeron al avance de las obras. Se realizó la tala de árboles para aprovechamiento forestal en el tramo comprendido entre las abscisas K0+470 y K0+500, lo que permitió despejar el área para las siguientes etapas de construcción. Además, se llevó a cabo la excavación entre las abscisas K0+450 y K0+500, preparando el terreno para la instalación de geotextil y piedra rajón en el mismo tramo. También se instaló material de sello entre las abscisas K0+450 y K0+500, asegurando la estabilidad del suelo. Durante la semana, se registraron llegadas al proyecto

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	41

de materiales como piedra rajón, material de sello, geotextil y subbase, lo que facilitó la continuidad de las actividades. Se avanzó en el vaciado de pavimento entre las abscisas K0+075 y K0+000, marcando un progreso importante en la ejecución del proyecto. El mantenimiento de la vía alterna continuó durante toda la semana, garantizando un acceso seguro y eficiente para los usuarios. Por último, se recibió la resolución aprobando la ocupación temporal del cauce por parte de la CVS, lo cual es fundamental para la construcción del box culvert en la abscisa K0+685. Estas actividades reflejan un compromiso constante con la calidad y eficiencia en la ejecución del proyecto.

Durante la semana, la interventoría envió comunicaciones oficiales expresando lo siguiente:

CINGE-INV-5053-0333-24 SOLICITUD REUNIÓN PRESENCIAL.

CING-INV-5053-0336-24 SOLICITUD ESTADO DEL INFORME PRESENTADO POR LA CVS AL TRAMITE DE PERMISO DE OC Y APROVECHAMIENTO FORESTAL.

- **SEMANA No.41: del 08/11/2024 al 14/11/2024**

Durante la semana, se llevaron a cabo varias actividades clave en el proyecto que contribuyeron al avance de las obras. Se realizó la excavación entre las abscisas K0+650 y K0+680, preparando el terreno para las siguientes etapas de construcción. En el tramo comprendido entre las abscisas K0+500 y K0+550, se llevó a cabo la instalación de geotextil y piedra rajón, así como la instalación de material de sello, asegurando la estabilidad del suelo y la calidad del pavimento. Además, se registró la llegada al proyecto de viajes de materiales esenciales, incluyendo piedra rajón, material de sello, geotextil y subbase, lo que facilitó la continuidad de las actividades. El mantenimiento de la vía alterna continuó durante toda la semana, garantizando un acceso seguro para los usuarios. Estas acciones reflejan un compromiso constante con la calidad y eficiencia en la ejecución del proyecto, alineándose con los estándares establecidos por el INVIAS.

Igualmente, en el transcurso de la semana la interventoría envió oficios manifestando lo siguiente:

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	42

CING-INV-5053-0341-24 RESPUESTA DISEÑO ESTRUCTURAL BOX COULVERT OFI-60-2024

CINGE-INV-5053-0349-24 RESPUESTA A ORDEN DE OPERACIÓN No. 1

CING-INV-5053-0350-24 RESPUESTA AL COMUNICADO 066-2024 CARACTERIZACIÓN AFIRMADO DE LA CANTERA EL ESFUERZO.

- **SEMANA No.42: del 15/11/2024 al 21/11/2024**

Durante la semana, se llevaron a cabo varias actividades fundamentales en el proyecto que contribuyeron al avance de las obras. Se realizó la instalación de geotextil y piedra rajón entre las abscisas K0+550 y K0+600, así como la instalación de material de sello en el mismo tramo, lo que garantiza la estabilidad del suelo y la calidad del pavimento. Además, se extendió y compactó el material de subbase entre las abscisas K0+360 y K0+500, asegurando una base sólida para las futuras capas de pavimento. Durante esta semana, también se registró la llegada al proyecto de viajes de materiales esenciales, incluyendo piedra rajón, material de sello, geotextil y subbase, lo que facilitó la continuidad en las actividades programadas. Por último, se continuó con el mantenimiento de la vía alterna durante todo el mes, asegurando un acceso seguro y eficiente para los usuarios. Estas acciones reflejan un compromiso constante con la calidad y eficiencia en la ejecución del proyecto, alineándose con los estándares establecidos por el INVIAS.

Igualmente, en el transcurso de la semana la interventoría envió oficios manifestando lo siguiente:

CINGE-INV-5053-0354-24 RESPUESTA COMUNICADO No. 062-2024 (REMISIÓN DE INFORMES).

CINGE-INV-5053-0355-24 RESPUESTA A ORDENES DE OPERACIÓN No. 1 Y No. 2.

- **SEMANA No.43: del 22/11/2024 al 28/11/2024**

Durante la semana, se realizaron diversas actividades que contribuyeron al avance del proyecto. Se llevó a cabo la excavación entre las abscisas K0+600 y K0+680, preparando el terreno para las siguientes etapas de construcción. En el tramo

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	43

comprendido entre las abscisas K0+600 y K0+680, se realizó la instalación de geotextil y piedra rajón, así como la instalación de material de sello, lo que garantiza la estabilidad del suelo y la calidad del pavimento. Además, se extendió y compactó el material de subbase entre las abscisas K0+500 y K0+600, asegurando una base sólida para las futuras capas de pavimento. Durante esta semana, también se registró la llegada al proyecto de viajes de materiales esenciales, incluyendo piedra rajón, material de sello, geotextil y subbase, lo que facilitó la continuidad de las actividades programadas. Por último, se continuó con el mantenimiento de la vía alterna durante todo el mes, asegurando un acceso seguro y eficiente para los usuarios. Estas acciones reflejan un compromiso constante con la calidad y eficiencia en la ejecución del proyecto, alineándose con los estándares establecidos por el INVIAS.

Igualmente, en el transcurso de la semana se enviaron por correo electrónico los siguientes comunicados:

CING-INV-5053-0352-24 RESPUESTA AL COMUNICADO 071-2024 SOLICITUD PRÓRROGA No. 2.

CING-INV-5053-0359-24 SOLICITUD DE ENTREGA DE PENDIENTES.

CING-INV-5053-0360-24 RESPUESTA AL COMUNICADO 062-2024 – INFORMES AMBIENTALES Y SST PERIODO DE FEBRERO, MARZO Y MAYO 2024.

CING-INV-5053-0371-24 RESPUESTA AL COMUNICADO 074-2024 CARACTERIZACIÓN SUBBASE GRANULAR DE LA CANTERA EL ESFUERZO.

CING-INV-5053-0372-24 RESPUESTA AL COMUNICADO 080-2024 RESULTADO DENSIDADES EN SUBBASE GRANULAR.

CING-INV-5053-0367-24 SOLICITUD MANTENIMIENTO VÍA ALTERNA, UTILIZADA COMO DESVIO.

CING-INV-5053-0374-24 RESPUESTA AL COMUNICADO 079-2024 DISEÑO DE MEZCLA DE CONCRETOS.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	44

3.3 SEGUIMIENTO ITEMS NO PREVISTOS

➤ **MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023:**

En el periodo correspondiente al presente informe se presentaron precios no previstos y se legalizaron con acta de pactación de precios.

➤ **MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023:**

En el periodo correspondiente al presente informe se presentaron precios no previstos y se legalizaron con acta de pactación de precios.

➤ **MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023:**

En el periodo correspondiente al presente informe se presentaron precios no previstos y se legalizaron con acta de pactación de precios.

3.4 ESTADO DE AVANCE Y ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE INTERVENTORIA

➤ **MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023:**

A través del seguimiento que realiza la interventoría a la ejecución del contrato de obra 159-2023, para el presente período de ejecución se presenta el siguiente avance:

Valor Total ejecutado acumulado al mes 10	\$ 4.288.933.577,00
Valor Obra Básica en el mes 10	\$ 1.308.013.349,00
Valor Básico Estudios y Diseños	\$0,00
Valor total Iva	\$ 0,00
Porcentaje ejecutado acumulado obra básico	32.45%
Porcentaje programado acumulado obra básico	98.14%

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 32.45%, vs avance programado del 98.14%, presentando atraso del -65.70% de acuerdo a la programación de inversiones #1 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista proceder de forma inmediata, con el aumento de

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	45

rendimientos, mediante la apertura de nuevos frentes de obra para avanzar en las labores de ejecución, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución. Adicionalmente, la Alcaldía inició el proceso de presunto incumplimiento, el cual se realizó la primera audiencia, y se está a la espera de la reanudación de la audiencia, así mismo, se solicitó al municipio iniciar un proceso sancionatorio de multa por incumplimiento en las obligaciones sst.

➤ **MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023:**

A través del seguimiento que realiza la interventoría a la ejecución del contrato de obra LP-006-2023, para el presente período de ejecución se presenta el siguiente avance:

Valor Total ejecutado acumulado al mes 10	\$ 3.789.144.251,00
Valor Obra Básica en el mes 10	\$ 1.458.030.401,00
Valor Básico Estudios y Diseños	\$0,00
Valor total Iva	\$ 0,00
Porcentaje ejecutado acumulado obra básico	64.52%
Porcentaje programado acumulado obra básico	100%

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 64.52%, vs avance programado del 100%, presentando atraso del - 35.48% de acuerdo a la programación de inversiones #1 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista proceder de forma inmediata, con el aumento de rendimientos, mediante la apertura de nuevos frentes de obra para avanzar en las labores de ejecución, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	46

➤ **MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023:**

A través del seguimiento que realiza la interventoría a la ejecución del contrato de obra LP-MSBV-008-2023, para el presente período de ejecución se presenta el siguiente avance:

Valor Total ejecutado acumulado al mes 10	\$ 1.208.294.844,00
Valor Obra Básica en el mes 10	\$ 337.716.087,00
Valor Básico Estudios y Diseños	\$ 0,00
Valor total Iva	\$ 0,00
Porcentaje ejecutado acumulado obra básico	60.15%
Porcentaje programado acumulado obra básico	81.01%

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 60.15%, vs avance programado del 81.01%, presentando atraso del -20.86% de acuerdo con la programación de inversiones #3 aprobado, por lo tanto, se le solicita al contratista de obra cumplir a cabalidad la nueva reprogramación para alcanzar la meta física en el tiempo estipulado para su ejecución.

Actividades ejecutadas en el periodo del presente informe:

- Se realizaron los informes semanales.
- Reuniones de comité de obra con Invias, contratista y administración municipal.
- Seguimiento técnico (verificación aleatoria o selectiva de medición de cantidades por parte del residente de Interventoría, verificación del avance de obra, calidad de los trabajos, verificación de ensayos realizados, verificación de la disponibilidad de recursos físicos de equipos y maquinaria).
- Seguimiento administrativo (verificación de pagos de salud pensión y demás, manejo ambiental, seguridad industrial, programa de salud ocupacional, aspectos sociales, permisos y licencias, Otros).
- Verificar el estado y funcionamiento de toda la maquinaria.
- Observar el desempeño del personal del contratista exigiéndole que provea una dirección competente y emplee personal técnico y/o profesional según

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	47

corresponda en cada frente de trabajo de conformidad con lo establecido en el pliego de condiciones y en el contrato respectivo y personal de obra de acuerdo a las actividades ejecutadas.

- Labores de verificación topográfica y de calidad de materiales a usar. Control y verificación del PAGA de la Obra.
- Registro de Bitácora.
- Registro fotográfico para demostrar los avances de obra y los procesos de cada de una actividad contractuales desarrolladas por el contratista.
- Efectuar un estricto control de la calidad de los materiales empleados por el Contratista a partir de las especificaciones técnicas generales y particulares contratadas.
- Asegurar el cumplimiento de las metas contractuales logrando que se desarrolle el contrato de obra dentro del presupuesto de tiempo e inversión previstos originalmente.

Acciones a seguir por parte de la Interventoría.

Seguimiento a los trámites en proceso:

Corresponde a realizar el control y seguimiento a los trámites como licencias, permisos, autorizaciones referentes a los componentes técnico, ambiental y social, que realiza el contratista para los tramos en intervención.

- Revisión y seguimiento de documentos contractuales (programa de inversión y PAGA).
- Revisión de los balances parciales del proyecto.
- Revisión de las observaciones del contratista en los tramos a intervenir.
- Reuniones y comités de obra.
- Definición de las estructuras hidráulicas a intervenir en los diferentes corredores viales.

Adicionalmente, la Interventoría hace vigilancia y seguimiento técnico, administrativo, presupuestal y ambiental, con el objetivo de garantizar el correcto funcionamiento del proyecto.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	48

4 REPORTES EJECUCION MENSUAL

Se anexa al informe los siguientes formatos suscritos por los responsables, siguiendo el orden establecido en el Manual de interventoría Versión 2022.

4.1 Informe semanal - MEPI-MN1-IN-15-FR-3.

	NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO MEPMN-16-15-FR-3
			VERSIÓN 1
			PÁGINA

		FECHA	7/11/2024 <small>(Del Mes / Año)</small>
--	--	--------------	--

I INFORMACIÓN GENERAL	
PROYECTO: COLOMBIA RURAL	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: JUAN GONZALEZ OZUNA	
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: JUAN GUILLERMO TORRES	
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto. Construcción de obras hidráulicas: 10 box culvert de 1x1 L=8m, y también construcción de 6 box culvert de 2x2 L=8m. También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frío.	

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica – Providencia el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la Granja hasta el corregimiento de Providencia, La vía rural se encuentra en mal estado para la transitabilidad vehicular, con presencia de baches, toldo y desgaste de la capa de rodadura.

CONTRATO DE OBRA:	CONTRATO DE INTERVENTORIA:
CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS 5%, BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S 85% Y KAP CONSTRUCCIONES S.A.S. 10%	INTERVENTOR: CONSORCIO INGEGCON INCO INGENIERIA Y CONSULTORIA INGEGCON SAS 90% E INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS 10%
INTEGRANTES: VALOR INICIAL: \$ 14.100.000.000,00 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ VALOR ANTICIPO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$ SALDO POR AMORTIZAR: \$	INTEGRANTES: VALOR INICIAL: \$ 2.219.000.000,00 VALOR ADICIONES: \$ VALOR ACUMULADO: \$ VALOR ANTICIPO: \$ VALOR AMORTIZADO: \$ SALDO POR AMORTIZAR: \$

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:				
CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 14.100.000.000		
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 14.100.000.000		
	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 2.219.000.000		
INTERVENTORIA	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$		
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 2.219.000.000		

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	13.218.339.687,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	11.758.811.407,17	--88,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	2.914.148.006,00	--22,05%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	8.844.663.401,17	--66,91%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	80.003.700,00	--0,57%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	11.838.815.107,17	--83,96%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	2.994.151.706,00	--21,24%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	16.844.663.401,17	--59,73%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	369.561.475,25	--2,80%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	33.216.321,25	--0,72%

INTERVENTORIA			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	2.219.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	866.903.356,25	--39,1%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	30.026.972,50	--0,01%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	33.216.321,25	--0,01%

SI	NO
X	

SI	NO
X	

RADICAL FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO APLICA

PERIODO FACTURADO:

VALOR FACTURA: \$.....

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)

Observaciones: EL CONTRATISTA ESTÁ AVANZANDO CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE OBRA Y CONTINUA SUBSANANDO DOCUMENTOS INICIALES.

ANTICIPOS		INDICADOR LC	
Otorgado \$	\$ 5.287.335.876,80	En el mes:	\$ 10,84
Amortizado \$	\$ -	Acumulado:	\$ 10,84
Saldo \$	\$ 5.287.335.876,80		


III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	88,96%	Avance o Atraso Físico %	-66,91%
Meta Física Ejecutada %	22,05%		

Meta Física Programa de Obra) Línea Base

Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GL	1	Prog		\$ 80.003.700,00				\$ 80.003.700,00	0,57%
			Ejec		\$ 80.003.700,00				\$ 80.003.700,00	0,57%
Obra	GL	1	Prog		\$ 13.218.339.687,00				\$ 13.218.339.687,00	88,96%
			Ejec		\$ 2.914.148.					

V. GESTIÓN SOCIAL									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO DE OBRA						
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	16	23							
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	8	14							
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	6	11							
	4	7							
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 43									
VI. GESTIÓN PREDIAL									
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A AVALUOS APROBADOS: N/A PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A			OBSERVACIONES: PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE REQUERIRÁ LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS, DADO QUE SE CUENTA CON UNA VÍA EXISTENTE, CON UN ANCHO DISPONIBLE SUFICIENTE PARA ALBERGAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE DISEÑO.						
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD									
EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD.									
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS									
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA SON:									
<ul style="list-style-type: none">• ESTADO DEL TIEMPO:- EL DIA 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 3:00 A.M. A 10:00 A.M. Y DESDE 6:00P.M. A 8:00 P.M.- EL DIA 02 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 3:00 A.M. A 7:00 A.M.- EL DIA 03 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 2:00 A.M. A 6:00 A.M.- EL DIA 04 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 4:00 A.M. A 7:00 A.M.- EL DIA 06 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 9:00 A.M. A 10:00 A.M. Y DESDE 3:00 P.M A 4:00 P.M.• SE MANTIENE INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS EN EL CORREDOR VIAL, ENTRE LAS ABSCSISAS K0+084 HASTA A K3+540.• SE UTILIZAN PALETEROS PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LOS TRAMOS EN INTERVENCIÓN.• SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (AFIRMADO), PROVENIENTE DE LA CANTERA JOMEVE EN CIENAGA DE ORO.• SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (SUBBASE GRANULAR), PROVENIENTE DE LA CANTERA SIBERIA.• SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA QUE AVANCE CON LA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO DESDE LA ABSCSISA K2+000 HACIA MAYORES.• SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA QUE AVANCE CON LA ACTIVIDAD DE SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DESDE LA ABSCSISA K2+000 HACIA MAYORES.• SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES IN SITU PARA VERIFICAR COMPACTACIÓN DE TERRENO.• LA INTERVENTORIA REALIZA CHEQUEO TOPOGRÁFICO PARA VERIFICAR NIVELES Y VOLUMENES DE AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR.• PARA LA INTERVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO MR38 SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SE REALIZA COLOCACIÓN DE RIELES DESDE LA ABSCSISA K1+766 HASTA LA K1+952 (CARRIL IZQUIERDO). SE REALIZA CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE RIELES PARA GARANTIZAR BOMBO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO A CONSTRUIR. SE REALIZA REPLANTEO PARA RESPETAR LA MODULACIÓN DE LAS LOSAS Y SE LOCALIZA CON TOPOGRAFIA LAS JUNTAS EN LOS TRAMOS CURVOS PARA GARANTIZAR LA DEFLEXIÓN. SE VERIFICAN ANCHO Y ESPESORES PARA EL PAVIMENTO RIGIDO A CONSTRUIR A LO LARGO DEL TRAMO DESDE LA ABSCSISA K1+766 HASTA LA K1+952 (CARRIL IZQUIERDO). SE VERIFICA DIMENSIONES DE LAS CANASTILLAS GARANTIZANDO ANCHO PARA DOVELAS CON LONGITUD DE 35CM, SEPARACIÓN CENTRO A CENTRO DE 30 CM Y ALTURA DE UBICACIÓN DE DOVELA DE 9CM. SE VERIFICAN DOVELAS DE 1" CON UNA LONGITUD DE 35CM. SE VERIFICA ACERO LONGITUDINAL DE 1/2" CON UNA LONGITUD DE 85CM ESPACIADOS CADA 1,2CM. SE REALIZA FUNDIDA DE PAVIMENTO RIGIDO MR-38 PREMEZCLADO, DESDE LA ABSCSISA K1+766 HASTA LA K1+952 (CARRIL IZQUIERDO). SE REALIZA PRUEBA SLUMP EN OBRA PARA VERIFICAR AGENTAMIENTO DEL CONCRETO. SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO (VIGUETAS) PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA. SE REALIZA VIBRADO DEL CONCRETO A LO LARGO DE LOS TRAMOS FUNDIDOS. SE REALIZA TEXTURIZADO Y ACABADO FINAL DE LAS LOSAS DE CONCRETO. SE APLICÓ ANTISOL A LO LARGO DEL TRAMO DE PAVIMENTO RIGIDO CONSTRUIDO. SE REALIZA CORTE CADA 3M EN LAS JUNTAS DE DILATACIÓN DEL TRAMO DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 CONSTRUIDO. SE REALIZA LIMPIEZA Y SELLO DE LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL PAVIMENTO CONSTRUIDO.• SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA 160ML DE BERMACUNETAS E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.• SE REALIZA FUNDIDA DE 160 ML BERMACUNETAS DE 3000 PSI CON CONCRETO PREMEZCLADO .• SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO 3000 PSI DE BERMACUNETAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.• LA INTERVENTORIA REALIZA VERIFICACIÓN DE LA APERTURA DEL BUZÓN PQRS UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA OBRA, EL CUAL NO PRESENTA PETICIONES DE LA COMUNIDAD.• LA INTERVENTORIA REITERA SOLICITUD QUE SE INICIEN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS BOXCULVERT 2X1 UBICADO EN LA ABSCSISA K3+610 Y EL BOXCULVERT 2X1.5 UBICADO EN LA ABSCSISA K3+920.• LA INTERVENTORIA SOLICITA AUMENTAR EL RENDIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, CON EL FIN DE TERMINAR EL TRAMO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA SU EJECUCIÓN. DE IGUAL MANERA, SE REQUIERE SUBSANAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DEL TRAMO K0+084 A K3+540.• EL PROCESO SANCIONATORIO CONTINÚA SU CURSO NORMAL Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA REANUDACIÓN DE AUDIENCIA. DE IGUAL MANERA, LA INTERVENTORIA SOLICITÓ AL MUNICIPIO INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES SST.• IGUALMENTE, EN EL TRANSURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS: - CINGE-INV-5053-0397-24 Remisión informe mensual No. 9 correspondiente al periodo de octubre 2024. - CINGE-INV-5053-0399-24 Respuesta oficio OFI-CONS-0121-2024. Orden de operación No.10 - CINGE-INV-5053-0401-24 Respuesta oficio OFI-CONS-0120-2024. Orden de operación No. 9 - CINGE-INV-5053-0406-24 Respuesta a diseño geotecnico K4+100 - CINGE-INV-5053-0407-24 Respuesta oficio OFI-CONS-0120-2024. Orden de operación No. 5 - CINGE-INV-5053-0408-24 Respuesta oficio OFI-CONS-0120-2024. Orden de operación No. 6									
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA									
<ul style="list-style-type: none">• SE REALIZARÁ ACOPIO DE MATERIALES GRANULARES (AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR).• SE REALIZARÁ SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO DESDE K2+000 HACIA MAYORES.• SE REALIZARÁ SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DESDE LA ABSCSISA K2+000 HACIA MAYORES.• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE LA ABSCSISA K1+952 HACIA MAYORES.• EL CONTRATISTA DE OBRA SUBSANARÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL TRAMO COMPLETO Y DEMAS DOCUMENTOS INICIALES.									
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS									
<div><p>Título del gráfico</p><table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Metas Físicas Programadas</td><td>\$11,500,000,000.00</td></tr><tr><td>Metas Físicas Ejecutadas</td><td>\$2,500,000,000.00</td></tr></tbody></table></div> <p>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEP1-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.</p>				Categoría	Valor	Metas Físicas Programadas	\$11,500,000,000.00	Metas Físicas Ejecutadas	\$2,500,000,000.00
Categoría	Valor								
Metas Físicas Programadas	\$11,500,000,000.00								
Metas Físicas Ejecutadas	\$2,500,000,000.00								

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
Instalación de acero de refuerzo para el pavimento rígido MR38 premezclado. Abscisa K1+820.	Construcción de pavimento rígido MR38 premezclado. Abscisa K1+770.	Construcción de Bermacunetas 3000 PSI premezclado. Abscisa K0+180.
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
1. Revisión y aprobación de documentos contractuales. 2. Realizar seguimiento a las actividades preliminares. 3. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos.		FIRMA:  NOMBRE: ANGELA MARÍA DAVILA MORALES Matrícula Profesional No.: 17201153788 CLD
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutiva, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

V. GESTIÓN SOCIAL		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	26	25
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	11
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	7
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 51		
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1		
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 1		
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO DE OBRA		
OBSERVACIONES: EL CAMPAMENTO DE OBRA UBICADO EN LA ABSCISA K1+080 SE UTILIZA COMO SEDE PARA SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO.		
VI. GESTIÓN PREDIAL		
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A	
AVALÚOS APROBADOS:	N/A	
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A	
OBSERVACIONES: PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE REQUERIRÁ LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS DADO QUE SE CUENTA CON UNA VÍA EXISTENTE CON UN ANCHO DISPONIBLE SUFICIENTE PARA ALBERGAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE DISEÑO.		
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD		
EL CONTRATISTA HA PRESENTADO LA GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD. INFORMES MENSUALES AMBIENTALES Y SOCIALES		
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS		
EN EL TRANCURSO DE LA ACTUAL SEMANA SE REALIZÓ LO SIGUIENTE:		
• EL DÍA 05 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE REALIZÓ COMITÉ DE OBRA, DONDE ASISTIÓ LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EL ASESOR DE PLANEACIÓN, EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA, CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y COMPROMISOS PENDIENTES.		
• DURANTE LA SEMANA SE PRESENTARON LLUVIAS EN LA ZONA LOS DÍAS 01 DE NOVIEMBRE DE 2024 (DESDE LAS 6:10 AM HASTA LAS 7:10 AM) Y EL DÍA 07 DE NOVIEMBRE DE 2024 (DESDE LAS 3:50 AM HASTA LAS 5:00 AM).		
• SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DE LA ABSCISA K0+990 A LA K0+840		
• SE VERIFICA CON TOPOGRAFÍA NIVELES DE LA VÍA Y ESPESORES DE CUNETAS.		
• SE REALIZA VERIFICACIÓN CON TOPOGRAFÍA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA EL BOMBEO DE LA VÍA, NIVELACIÓN, ESPESORES Y COLOCACIÓN DE RIELES PARA CUNETAS.		
• SE REALIZA COLOCACIÓN DE RIELES PARA CUNETAS LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO Y DE PAVIMENTO CARRIL DERECHO.		
• SE REALIZA AMARRE Y COLOCACIÓN DE ACERO PARA CUNETAS LADO IZQUIERDO Y LADO DERECHO.		
• SE REALIZA COLOCACIÓN DE ACERO PARA LOSAS DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO		
• SE REALIZA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETAS DE LA ABSCISA K1+883 - K1+656,5 LADO IZQUIERDO.		
• SE REALIZA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLOS DE LA ABSCISA K2+322 - K2+252 LADO IZQUIERDO.		
• SE REALIZA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETAS DE LA ABSCISA K1+442,2 - K1+410 LADO DERECHO.		
• SE REALIZA FUNDICIÓN DE CONCRETO MR38 PARA PAVIMENTO RÍGIDO DE LA ABSCISA K2+000,6 - K1+787 CARRIL IZQUIERDO.		
• SE REALIZA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO DE CUNETAS Y DE LOSAS DE PAVIMENTO.		
• EN EL TRANCURSO DE LA SEMANA SE ENVIÓ POR CORREO ELECTRÓNICO EL SIGUIENTE COMUNICADO:		
CING-INV-5053-0402-24 IDENTIFICACIÓN LOSAS REPARACIÓN 07/11/2024		
• EN EL TRANCURSO DE LA SEMANA SE RECIBIÓ POR CORREO ELECTRÓNICO EL SIGUIENTE COMUNICADO:		
COBQ-079-24 INFORME MENSUAL AMBIENTAL-OCTUBRE 05/11/2024		
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA		
• SE AVANZARÁ CON EL SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL SUBBASE GRANULAR DE LA ABSCISA K0+840 A MENORES.		
• SE AVANZARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE LA K1+656,5 A MENORES LADO IZQUIERDO.		
• SE AVANZARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO CARRIL IZQUIERDO DE KK+787 A MENORES.		
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS		
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPH-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.		
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
Fundida de concreto MR38 pavimento carril izquierdo	Fundida de concreto para cunetas lado izquierdo y bordillo lado izquierdo	Comité de Obra
Fundida de concreto para cunetas lado derecho	Toma de muestras de concreto	Verificación de niveles
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1. Realizar seguimiento a las actividades. 2. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos. 3. Duplicar rendimientos en las actividades de cunetas y losas de pavimento.		FIRMA NOMBRE: ANGELA MARIA DAVILA MORALES Matrícula Profesional/No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVRAS.


Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)			OBSERVACIONES:																		
ESTADO: SE ENCUENTRA APROBADO DESDE EL 24/09/2024																					
V. GESTIÓN SOCIAL																					
<table><tr><td>TOTAL EMPLEOS GENERADOS:</td><td>OBRA</td><td>INTER</td></tr><tr><td>EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:</td><td>19</td><td>25</td></tr><tr><td>EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:</td><td>12</td><td>14</td></tr><tr><td>EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:</td><td>7</td><td>11</td></tr></table>		TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	19	25	EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	12	14	EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	11	<table><tr><td>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:</td><td>2</td></tr><tr><td>No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:</td><td>1</td></tr><tr><td>DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:</td><td>CAMPAMENTO RIMINI</td></tr></table>		No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	CAMPAMENTO RIMINI
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER																			
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	19	25																			
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	12	14																			
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	11																			
No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	2																				
No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	1																				
DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	CAMPAMENTO RIMINI																				
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 44		OBSERVACIONES: <ul style="list-style-type: none">LAS ACTAS DE VECINDA FUERON ENTREGADAS Y REVISADAS POR LA INTERVENTORÍA.LOS INFORMES SOCIALES CORRESPONDIENTES A LOS MESES DE JUNIO, JULIO, AGOSTO LA INTERVENTORIA REALIZO LAS OBSERVACIONES QUE DEBE ATENDER EL CONTRATISTA.																			
VI. GESTIÓN PREDIAL																					
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A		OBSERVACIONES: LA ALCALDIA DIRECTAMENTE Y BAJO SU TUTELA Y GESTIÓN REALIZÓ LA ADQUISION PREDIAL, PARA ELLO SE REALIZÓ SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ENTRE EL 16 DE MARZO 2024 Y EL 13 DE MAYO 2024. A LA FECHA DEL REINICIO 14 DE MAYO 2024, LA ENTIDAD YA HABÍA GESTIONADO EL ÁREA PREDIAL REQUERIDA Y EL DESPLAZAMIENTO DE LAS CERCAS CON LOS PROPIETARIOS PARA LIBERAR LA ZONA REQUERIDA PARA EL PROYECTO.																			
FICHAS PEDIALES APROBADAS: N/A																					
AVALÚOS APROBADOS: N/A																					
PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A																					
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD																					
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS																					
DURANTE EL PERIODO DE LA ACTUAL SEMANA SE REALIZÓ LO SIGUIENTE: <ul style="list-style-type: none">BLOQUEO DE LA TRONCAL SAN BERNARDO DEL VIENTO - MOÑITOS A LA ALTURA DE BRISAS DEL MAR 06/11/2024 Y 07/11/2024.SE CONTINÚA CON EL TEXTURIZADO MEDIANTE PULIDORA ENTRE LAS ABCISAS K0+102 AL K0+075.BOMBEO DE AGUAS DENTRO DE LA EXCAVACIÓN CON MOTOBOMBA ENTRE LAS ABCISAS K0+535 AL K0+650.EL CONTRATISTA REALIZA MANTENIMIENTO DE LA VÍA ALTERNA, VIA DE DESVIOSE CONTINÚA CON LA INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y PIEDRA RAJÓN ENTRE LAS ABCISAS K0+450 AL K0+460CEREO ENTRE LAS ABCISAS K0+075 A K0+000.FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO PARA LAS PARRILLAS.INSTALACIÓN DE COSTALES CON SUELO Y PLÁSTICO PARA MANEJO DE LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA.EL CONTRATISTA TROZA EL ÁRBOL CAIDO A CAUSA DE FUERTES LLUVIAS REGISTRADAS EL DÍA 01/11/2024. IGUALMENTE, EN EL TRANSURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS: <ul style="list-style-type: none">CINGE-INV-5053-0395-24 AJUSTE EN LA ÓRDENES DE OPERACIÓN NO. 1 Y NO. 2CINGE-INV-5053-0398-24 RESPUESTA A COMUNICADO 085-2024 ORDEN DE OPERACIÓN NO. 3CING-INV-5053-0400-24 REPORTE TALA DE ÁRBOLES POR LA COMUNIDAD.																					
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA																					
<ul style="list-style-type: none">DISEÑO DEL BOX COULVERT EN REVISIÓN.CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN K0+440 AL K0+535.INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL, PIEDRA RAJÓN, MATERIAL DE SELLO ENTRE LAS ABCISAS K0+440 AL K0+500.MANTENIMIENTO DE LA VÍA ALTERNACONSTRUCCIÓN PAVIMENTO RÍGIDO ENTRE LAS ABCISAS K0+075 AL K0+000.																					
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS																					
<div>AVANCE DEL PROYECTO</div> <table><thead><tr><th>Categoría</th><th>Valor (\$)</th></tr></thead><tbody><tr><td>METAS FÍSICAS PROGRAMADAS</td><td>~1,200,000,000.00</td></tr><tr><td>METAS FÍSICAS EJECUTADAS</td><td>~1,000,000,000.00</td></tr></tbody></table>					Categoría	Valor (\$)	METAS FÍSICAS PROGRAMADAS	~1,200,000,000.00	METAS FÍSICAS EJECUTADAS	~1,000,000,000.00											
Categoría	Valor (\$)																				
METAS FÍSICAS PROGRAMADAS	~1,200,000,000.00																				
METAS FÍSICAS EJECUTADAS	~1,000,000,000.00																				
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.																					
XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO																					
<div><div></div><div></div><div></div></div> <div><div>Árbol caído por fuertes lluvias 01/11/2024 k0+360</div><div>Panoramica avance del pavimento rígido k0+075</div><div>Pavimento rígido k0+075</div></div>																					
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA																					
<div>1. Revisión y aprobación de documentos contractuales.</div> <div>2. Realizar seguimiento a las actividades preliminares.</div> <div>3. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos.</div>		<div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div> <div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: ANGELA MARIA DAVILA MORALES</div><div>Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD</div></div>																			
<div>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.</div> <div>Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.</div>																					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-3																																																																																																																	
			VERSIÓN	1																																																																																																																	
			PÁGINA																																																																																																																		
			FECHA	14/11/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																																																	
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																																					
PROYECTO: COLOMBIA RURAL																																																																																																																					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA SEMANA No.: 41 del 8/11/2024 al 14/11/2024 Último Informe Semanal SI ☐ (Numeración consecutiva)																																																																																																																					
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA: LUIS GONZALEZ OZUNA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GUILLERMO TORRES																																																																																																																					
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS																																																																																																																					
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL. (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4.980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto. Construcción de obras hidráulicas: 10 box coulvert de 1x1 L= 8m, y también construcción de 6 box coulvert de 2x2 L=8m. También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frío.																																																																																																																					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica – Providencia el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la Granjita hasta el corregimiento de Providencia, La vía rural se encuentra en mal estado para la transitabilidad vehicular, con presencia de baches, lodo y desgaste de la capa de rodadura.																																																																																																																					
<table><tr><td colspan="2">CONTRATO DE OBRA:</td><td colspan="2">CONTRATO DE INTERVENTORÍA:</td></tr><tr><td>CONTRATISTA:</td><td>CONSORCIO PROVIDENCIA EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS 5%, BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.85% y KAP</td><td>INTERVENTOR:</td><td>CONSORCIO INGECON INCO</td></tr><tr><td>INTEGRANTES:</td><td>CONSTRUCCIONES S.A.S. 10%</td><td>INTEGRANTES:</td><td>INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 90% E INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS 10%</td></tr><tr><td>CONTRATO No:</td><td>159-2023 VALOR INICIAL: \$ 14.100.000.000,00</td><td>CONTRATO No:</td><td>5053-2023 VALOR INICIAL: \$ 2.219.000.000,00</td></tr><tr><td>FECHA DE INICIO:</td><td>28/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -</td><td>FECHA DE INICIO:</td><td>28/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -</td></tr><tr><td>FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:</td><td>31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 14.100.000.000,00</td><td>FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:</td><td>31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 2.219.000.000,00</td></tr><tr><td>FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:</td><td>20/12/2024 VALOR ANTICIPO: \$ 4.355.000.130,55</td><td>FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:</td><td>31/12/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -</td></tr><tr><td></td><td>VALOR AMORTIZADO: \$ -</td><td></td><td>VALOR AMORTIZADO: \$ -</td></tr><tr><td></td><td>SALDO POR AMORTIZAR: \$ 4.355.000.130,55</td><td></td><td>SALDO POR AMORTIZAR: \$ -</td></tr></table>					CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIDENCIA EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS 5%, BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.85% y KAP	INTERVENTOR:	CONSORCIO INGECON INCO	INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES S.A.S. 10%	INTEGRANTES:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 90% E INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS 10%	CONTRATO No:	159-2023 VALOR INICIAL: \$ 14.100.000.000,00	CONTRATO No:	5053-2023 VALOR INICIAL: \$ 2.219.000.000,00	FECHA DE INICIO:	28/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO:	28/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 14.100.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 2.219.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	20/12/2024 VALOR ANTICIPO: \$ 4.355.000.130,55	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -		VALOR AMORTIZADO: \$ -		VALOR AMORTIZADO: \$ -		SALDO POR AMORTIZAR: \$ 4.355.000.130,55		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																													
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORÍA:																																																																																																																			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIDENCIA EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS 5%, BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S.85% y KAP	INTERVENTOR:	CONSORCIO INGECON INCO																																																																																																																		
INTEGRANTES:	CONSTRUCCIONES S.A.S. 10%	INTEGRANTES:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 90% E INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS 10%																																																																																																																		
CONTRATO No:	159-2023 VALOR INICIAL: \$ 14.100.000.000,00	CONTRATO No:	5053-2023 VALOR INICIAL: \$ 2.219.000.000,00																																																																																																																		
FECHA DE INICIO:	28/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -	FECHA DE INICIO:	28/12/2023 VALOR ADICIONES: \$ -																																																																																																																		
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 14.100.000.000,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023 VALOR ACUMULADO: \$ 2.219.000.000,00																																																																																																																		
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	20/12/2024 VALOR ANTICIPO: \$ 4.355.000.130,55	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024 VALOR ANTICIPO: \$ -																																																																																																																		
	VALOR AMORTIZADO: \$ -		VALOR AMORTIZADO: \$ -																																																																																																																		
	SALDO POR AMORTIZAR: \$ 4.355.000.130,55		SALDO POR AMORTIZAR: \$ -																																																																																																																		
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																																					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:																																																																																																																					
CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026																																																																																																																
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 14.100.000.000																																																																																																																			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 14.100.000.000																																																																																																																			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 2.219.000.000																																																																																																																			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -																																																																																																																			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 2.219.000.000																																																																																																																			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)																																																																																																																					
<table><tr><td colspan="2">OBRA</td><td colspan="2">INTERVENTORIA</td></tr><tr><td>VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):</td><td>\$ 13.218.339.697,00</td><td>TOTAL INVERSIÓN</td><td>\$ 2.219.000.000,00</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:</td><td>\$ 12.158.452.280,43</td><td>PROGRAMADA:</td><td>\$ 2.219.000.000,00</td></tr><tr><td>INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):</td><td>\$ 3.084.058.414,00</td><td>TOTAL INVERSIÓN</td><td>\$ 2.219.000.000,00</td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO DE OBRA:</td><td>\$ (9.074.393.866,43)</td><td>EJECUTADA:</td><td>\$ 900.119.677,50</td></tr><tr><td>OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:</td><td>\$ 80.003.700,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:</td><td>\$ 12.238.455.980,43</td><td></td><td></td></tr><tr><td>TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:</td><td>\$ 3.164.062.114,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td>AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:</td><td>\$ (9.074.393.866,43)</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 399.640.873,26</td><td></td><td></td></tr><tr><td>INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA</td><td>\$ 169.910.408,00</td><td></td><td></td></tr><tr><td colspan="2">SI NO</td><td colspan="2">SI NO</td></tr><tr><td colspan="2">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X</td><td colspan="2">RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X</td></tr><tr><td colspan="2">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO APLICA</td><td colspan="2">No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: oct-24</td></tr><tr><td colspan="2">PERIODO FACTURADO:</td><td colspan="2">PERIODO FACTURADO:</td></tr><tr><td colspan="2">VALOR FACTURA: \$ -</td><td colspan="2">VALOR FACTURA: \$ 132.567.285,00</td></tr><tr><td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td><td colspan="2">(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</td></tr><tr><td colspan="2">Observaciones: EL CONTRATISTA ESTÁ AVANZANDO CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE OBRA Y CONTINUA SUBSANANDO DOCUMENTOS INICIALES.</td><td colspan="2">Observaciones: EL INTERVENTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTAN EJECUTANDO EN OBRA, DE IGUAL MANERA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.</td></tr><tr><td colspan="2"><table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>\$ 5.287.335.878,80</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>\$ 5.287.335.878,80</td></tr></table></td><td colspan="2"><table><tr><td colspan="2">INDICADOR I/C</td></tr><tr><td>En el mes:</td><td>\$ 11,25</td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td>\$ 11,25</td></tr></table></td><td colspan="2"><table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td></td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td></td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td></td></tr></table></td></tr></table>						OBRA		INTERVENTORIA		VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 13.218.339.697,00	TOTAL INVERSIÓN	\$ 2.219.000.000,00	INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 12.158.452.280,43	PROGRAMADA:	\$ 2.219.000.000,00	INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 3.084.058.414,00	TOTAL INVERSIÓN	\$ 2.219.000.000,00	AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ (9.074.393.866,43)	EJECUTADA:	\$ 900.119.677,50	OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 80.003.700,00			(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)				TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 12.238.455.980,43			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 3.164.062.114,00			AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ (9.074.393.866,43)			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 399.640.873,26			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 169.910.408,00			SI NO		SI NO		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO APLICA		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: oct-24		PERIODO FACTURADO:		PERIODO FACTURADO:		VALOR FACTURA: \$ -		VALOR FACTURA: \$ 132.567.285,00		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		Observaciones: EL CONTRATISTA ESTÁ AVANZANDO CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE OBRA Y CONTINUA SUBSANANDO DOCUMENTOS INICIALES.		Observaciones: EL INTERVENTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTAN EJECUTANDO EN OBRA, DE IGUAL MANERA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.		<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>\$ 5.287.335.878,80</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>\$ 5.287.335.878,80</td></tr></table>		ANTICIPOS		Otorgado \$	\$ 5.287.335.878,80	Amortizado \$	\$ -	Saldo \$	\$ 5.287.335.878,80	<table><tr><td colspan="2">INDICADOR I/C</td></tr><tr><td>En el mes:</td><td>\$ 11,25</td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td>\$ 11,25</td></tr></table>		INDICADOR I/C		En el mes:	\$ 11,25	Acumulado:	\$ 11,25	<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td></td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td></td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td></td></tr></table>		ANTICIPOS		Otorgado \$		Amortizado \$		Saldo \$									
OBRA		INTERVENTORIA																																																																																																																			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$ 13.218.339.697,00	TOTAL INVERSIÓN	\$ 2.219.000.000,00																																																																																																																		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 12.158.452.280,43	PROGRAMADA:	\$ 2.219.000.000,00																																																																																																																		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$ 3.084.058.414,00	TOTAL INVERSIÓN	\$ 2.219.000.000,00																																																																																																																		
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$ (9.074.393.866,43)	EJECUTADA:	\$ 900.119.677,50																																																																																																																		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$ 80.003.700,00																																																																																																																				
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)																																																																																																																					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$ 12.238.455.980,43																																																																																																																				
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$ 3.164.062.114,00																																																																																																																				
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$ (9.074.393.866,43)																																																																																																																				
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$ 399.640.873,26																																																																																																																				
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$ 169.910.408,00																																																																																																																				
SI NO		SI NO																																																																																																																			
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X		RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X																																																																																																																			
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO APLICA		No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: oct-24																																																																																																																			
PERIODO FACTURADO:		PERIODO FACTURADO:																																																																																																																			
VALOR FACTURA: \$ -		VALOR FACTURA: \$ 132.567.285,00																																																																																																																			
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)																																																																																																																			
Observaciones: EL CONTRATISTA ESTÁ AVANZANDO CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE OBRA Y CONTINUA SUBSANANDO DOCUMENTOS INICIALES.		Observaciones: EL INTERVENTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTAN EJECUTANDO EN OBRA, DE IGUAL MANERA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.																																																																																																																			
<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td>\$ 5.287.335.878,80</td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td>\$ -</td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td>\$ 5.287.335.878,80</td></tr></table>		ANTICIPOS		Otorgado \$	\$ 5.287.335.878,80	Amortizado \$	\$ -	Saldo \$	\$ 5.287.335.878,80	<table><tr><td colspan="2">INDICADOR I/C</td></tr><tr><td>En el mes:</td><td>\$ 11,25</td></tr><tr><td>Acumulado:</td><td>\$ 11,25</td></tr></table>		INDICADOR I/C		En el mes:	\$ 11,25	Acumulado:	\$ 11,25	<table><tr><td colspan="2">ANTICIPOS</td></tr><tr><td>Otorgado \$</td><td></td></tr><tr><td>Amortizado \$</td><td></td></tr><tr><td>Saldo \$</td><td></td></tr></table>		ANTICIPOS		Otorgado \$		Amortizado \$		Saldo \$																																																																																											
ANTICIPOS																																																																																																																					
Otorgado \$	\$ 5.287.335.878,80																																																																																																																				
Amortizado \$	\$ -																																																																																																																				
Saldo \$	\$ 5.287.335.878,80																																																																																																																				
INDICADOR I/C																																																																																																																					
En el mes:	\$ 11,25																																																																																																																				
Acumulado:	\$ 11,25																																																																																																																				
ANTICIPOS																																																																																																																					
Otorgado \$																																																																																																																					
Amortizado \$																																																																																																																					
Saldo \$																																																																																																																					
III. AVANCE FÍSICO																																																																																																																					
Meta Física Programada % 91,98% Avance o Atraso Físico % -68,65% Meta Física Ejecutada % 23,33%																																																																																																																					
<table><tr><td colspan="5">Meta Física (Programa de Obra) Línea Base</td><td colspan="5">Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada</td></tr><tr><td>Descripción de la Meta Física Contractual</td><td>Unidad</td><td>Cantidad</td><td>Vigencia 2023</td><td>Vigencia (n)</td><td>Avance Físico</td><td>Tramo y/o sector 1</td><td>Tramo y/o sector 2</td><td>Tramo y/o sector (n)</td><td>Total</td><td>%</td></tr><tr><td rowspan="2">Estudios y diseños</td><td rowspan="2">GL</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>Prog</td><td>\$ 80.003.700,00</td><td></td><td></td><td>\$ 80.003.700,00</td><td>0,57%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td>\$ 80.003.700,00</td><td></td><td></td><td>\$ 80.003.700,00</td><td>0,57%</td></tr><tr><td rowspan="2">Obra</td><td rowspan="2">GL</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>Prog</td><td>\$ 13.218.339.697,00</td><td></td><td></td><td>\$ 12.158.452.280,43</td><td>91,98%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td>\$ 3.084.058.414,00</td><td></td><td></td><td>\$ 3.084.058.414,00</td><td>23,33%</td></tr><tr><td rowspan="2">Obras de compensación ambiental y PAGA</td><td rowspan="2">GL</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>Prog</td><td>\$ 169.033.596,00</td><td></td><td></td><td>\$ 169.033.596,00</td><td>25,00%</td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td rowspan="2">Programa de Manejo de Tránsito</td><td rowspan="2">GL</td><td rowspan="2">1</td><td rowspan="2"></td><td rowspan="2"></td><td>Prog</td><td>\$ 132.183.396,00</td><td></td><td></td><td>\$ 132.183.396,00</td><td></td></tr><tr><td>Ejec</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table> <p>* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).</p> <p>TRAMO Y/O SECTOR 1: Vía Planeta Rica – Providencia TRAMO Y/O SECTOR 2:</p>						Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%	Estudios y diseños	GL	1			Prog	\$ 80.003.700,00			\$ 80.003.700,00	0,57%	Ejec	\$ 80.003.700,00			\$ 80.003.700,00	0,57%	Obra	GL	1			Prog	\$ 13.218.339.697,00			\$ 12.158.452.280,43	91,98%	Ejec	\$ 3.084.058.414,00			\$ 3.084.058.414,00	23,33%	Obras de compensación ambiental y PAGA	GL	1			Prog	\$ 169.033.596,00			\$ 169.033.596,00	25,00%	Ejec						Programa de Manejo de Tránsito	GL	1			Prog	\$ 132.183.396,00			\$ 132.183.396,00		Ejec																												
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada																																																																																																																
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%																																																																																																											
Estudios y diseños	GL	1			Prog	\$ 80.003.700,00			\$ 80.003.700,00	0,57%																																																																																																											
					Ejec	\$ 80.003.700,00			\$ 80.003.700,00	0,57%																																																																																																											
Obra	GL	1			Prog	\$ 13.218.339.697,00			\$ 12.158.452.280,43	91,98%																																																																																																											
					Ejec	\$ 3.084.058.414,00			\$ 3.084.058.414,00	23,33%																																																																																																											
Obras de compensación ambiental y PAGA	GL	1			Prog	\$ 169.033.596,00			\$ 169.033.596,00	25,00%																																																																																																											
					Ejec																																																																																																																
Programa de Manejo de Tránsito	GL	1			Prog	\$ 132.183.396,00			\$ 132.183.396,00																																																																																																												
					Ejec																																																																																																																
IV. GESTIÓN AMBIENTAL																																																																																																																					
<table><tr><td colspan="4">FUENTES DE MATERIALES</td><td colspan="4">PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL</td></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td>CANTERA JOMEVE CIENAGA DE ORO</td><td>PERMISO MINERO:</td><td>SI NO</td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI NO</td><td>ZONAS DE DEPOSITO</td><td>SI NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>APROVECHAMIENTO FORESTAL:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td>UBICACIÓN:</td><td>CANTERA SIBERIA VIA A MONTERIA</td><td>PERMISO MINERO:</td><td>SI NO</td><td>LICENCIA AMBIENTAL:</td><td>SI NO</td><td>CONCESIÓN DE AGUAS:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td>X</td><td></td><td>X</td><td>OCCUPACIÓN DE CAUCES:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>VERTIMIENTOS:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>EMISIONES:</td><td>SI NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>OTROS (Especificar cual)</td><td>SI NO</td><td>N/A</td><td>X</td></tr><tr><td colspan="4">OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA REALIZÓ APROBACIÓN DE LAS CANTERAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR.</td><td colspan="4">OBSERVACIONES: LA ALCALDIA SUMINISTRÓ LINEAMIENTOS Y SITIO AUTORIZADO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE. SE ENVIO EL 12-11-2024, LA SOLICITUD DE OCCUPACION DE CAUCE A LA CVS</td></tr><tr><td colspan="4">P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)</td><td colspan="4">OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA PRESENTÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES AL PAGA V3, LA CUAL SE REVISÓ Y SE APROBO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.</td></tr><tr><td colspan="4">ESTADO: APROBADO</td><td colspan="4"></td></tr></table>						FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL				UBICACIÓN:	CANTERA JOMEVE CIENAGA DE ORO	PERMISO MINERO:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A	X				X		X	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A	X							APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	X	UBICACIÓN:	CANTERA SIBERIA VIA A MONTERIA	PERMISO MINERO:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A	X				X		X	OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A	X							VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A	X							EMISIONES:	SI NO	N/A	X							OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	X	OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA REALIZÓ APROBACIÓN DE LAS CANTERAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR.				OBSERVACIONES: LA ALCALDIA SUMINISTRÓ LINEAMIENTOS Y SITIO AUTORIZADO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE. SE ENVIO EL 12-11-2024, LA SOLICITUD DE OCCUPACION DE CAUCE A LA CVS				P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA PRESENTÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES AL PAGA V3, LA CUAL SE REVISÓ Y SE APROBO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.				ESTADO: APROBADO							
FUENTES DE MATERIALES				PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL																																																																																																																	
UBICACIÓN:	CANTERA JOMEVE CIENAGA DE ORO	PERMISO MINERO:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	ZONAS DE DEPOSITO	SI NO	N/A	X																																																																																																												
			X		X	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	N/A	X																																																																																																												
						APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI NO	N/A	X																																																																																																												
UBICACIÓN:	CANTERA SIBERIA VIA A MONTERIA	PERMISO MINERO:	SI NO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI NO	CONCESIÓN DE AGUAS:	SI NO	N/A	X																																																																																																												
			X		X	OCCUPACIÓN DE CAUCES:	SI NO	N/A	X																																																																																																												
						VERTIMIENTOS:	SI NO	N/A	X																																																																																																												
						EMISIONES:	SI NO	N/A	X																																																																																																												
						OTROS (Especificar cual)	SI NO	N/A	X																																																																																																												
OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA REALIZÓ APROBACIÓN DE LAS CANTERAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR.				OBSERVACIONES: LA ALCALDIA SUMINISTRÓ LINEAMIENTOS Y SITIO AUTORIZADO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE. SE ENVIO EL 12-11-2024, LA SOLICITUD DE OCCUPACION DE CAUCE A LA CVS																																																																																																																	
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)				OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA PRESENTÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES AL PAGA V3, LA CUAL SE REVISÓ Y SE APROBO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.																																																																																																																	
ESTADO: APROBADO																																																																																																																					

V. GESTIÓN SOCIAL				
	OBRA	INTER		
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	18	25	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:	1
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	8	14	No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:	2
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	11	DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:	CAMPAMENTO DE OBRA
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	7		
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 43				
OBSERVACIONES: EL CAMPAMENTO DE OBRA UBICADO EN LA ABSCISA K1+510, ES EL SITIO QUE SE UTILIZA PARA ATENCIÓN AL USUARIO. PENDIENTE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO Y CONFORMACIÓN DE VEEDURIA CIUDADANA.				
VI. GESTIÓN PREDIAL				
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:		N/A	OBSERVACIONES: PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE REQUERIRÁ LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS, DADO QUE SE CUENTA CON UNA VIA EXISTENTE, CON UN ANCHO DISPONIBLE SUFICIENTE PARA ALBERGAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE DISEÑO.	
FICHAS PREDIALES APROBADAS:		N/A		
AVALÚOS APROBADOS:		N/A		
PREDIOS ADQUIRIDOS:		N/A		
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD				
EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD.				
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS				
<p>LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA SON:</p> <ul style="list-style-type: none">ESTADO DEL TIEMPO:EL DIA 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 1:00 P.M. A 4:00 P.M.EL DIA 09 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 4:00 A.M. A 8:00 A.M.EL DIA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 5:00 P.M. A 9:00 P.M.EL DIA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 4:00 A.M. A 8:00 A.M.SE MANTIENE INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS EN EL CORREDOR VIAL, ENTRE LAS ABSCISAS K0+084 HASTA A K3+540.SE UTILIZAN PALETEROS PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LOS TRAMOS EN INTERVENCIÓN.SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (AFIRMADO), PROVENIENTE DE LA CANTERA JOMEVE EN CIENAGA DE ORO.SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (SUBBASE GRANULAR), PROVENIENTE DE LA CANTERA SIBERIA.SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO DESDE LA ABSCISA K2+000 A K2+100.SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DESDE LA ABSCISA K2+000 A K2+100.SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES IN SITU PARA VERIFICAR COMPACTACIÓN DE TERRENO.LA INTERVENTORÍA REALIZA CHEQUEO TOPOGRÁFICO PARA VERIFICAR NIVELES Y VOLÚMENES DE AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR.PARA LA INTERVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO MR38 SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES: SE REALIZA COLOCACIÓN DE RIELES DESDE LA ABSCISA K1+952 HASTA LA K2+054 (CARRIL IZQUIERDO). SE REALIZA CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE RIELES PARA GARANTIZAR BOMBEO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO A CONSTRUIR. SE REALIZA REPLANTEO PARA RESPETAR LA MODULACIÓN DE LAS LOSAS Y SE LOCALIZA CON TOPOGRAFÍA LAS JUNTAS EN LOS TRAMOS CURVOS PARA GARANTIZAR LA DEFLEXIÓN. SE VERIFICAN ANCHO Y ESPESORES PARA EL PAVIMENTO RÍGIDO A CONSTRUIR A LO LARGO DEL TRAMO DESDE LA ABSCISA K1+952 HASTA LA K2+054 (CARRIL IZQUIERDO). SE VERIFICA DIMENSIONES DE LAS CANASTILLAS GARANTIZANDO ANCHO PARA DOVELAS CON LONGITUD DE 35CM, SEPARACIÓN CENTRO A CENTRO DE 30 CM Y ALTURA DE UBICACIÓN DE DOVELA DE 9CM. SE VERIFICAN DOVELAS DE 1" CON UNA LONGITUD DE 35CM. SE VERIFICA ACERO LONGITUDINAL DE ½" CON UNA LONGITUD DE 85CM ESPACIADOS CADA 1,2CM. SE REALIZA FUNDIDA DE PAVIMENTO RÍGIDO MR-38 PREMEZCLADO, DESDE LA ABSCISA K1+952 HASTA LA K2+054 (CARRIL IZQUIERDO). SE REALIZA PRUEBA SLUMP EN OBRA PARA VERIFICAR ASENTAMIENTO DEL CONCRETO. SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO (VIGUETAS) PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA. SE REALIZA VIBRADO DEL CONCRETO A LO LARGO DE LOS TRAMOS FUNDIDOS. SE REALIZA TEXTURIZADO Y ACABADO FINAL DE LAS LOSAS DE CONCRETO. SE APLICO ANTISOL A LO LARGO DEL TRAMO DE PAVIMENTO RÍGIDO CONSTRUIDO. SE REALIZA CORTE CADA 3M EN LAS JUNTAS DE DILATACIÓN DEL TRAMO DE PAVIMENTO RÍGIDO MR38 CONSTRUIDO. SE REALIZA LIMPIEZA Y SELLO DE LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL PAVIMENTO CONSTRUIDO.SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA 160ML DE BERMACUNETAS E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.SE REALIZA FUNDIDA DE 300 ML BERMACUNETAS DE 3000 PSI CON CONCRETO PREMEZCLADO .SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO 3000 PSI DE BERMACUNETAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.LA INTERVENTORIA REALIZA VERIFICACIÓN DE LA APERTURA DEL BUZÓN PQRS UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA OBRA, EL CUAL NO PRESENTA PETICIONES DE LA COMUNIDAD.SE REALIZAN CHARLAS AL EQUIPO DE TRABAJO SOBRE LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN.LA INTERVENTORIA REITERA SOLICITUD QUE SE INICIEN LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS BOXCULVERT 2X1 UBICADO EN LA ABSCISA K3+610 Y EL BOXCULVERT 2X1.5 UBICADO EN LA ABSCISA K3+920.LA INTERVENTORÍA SOLICITA AUMENTAR EL RENDIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, CON EL FIN DE TERMINAR EL TRAMO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA SU EJECUCIÓN. DE IGUAL MANERA, SE REQUIERE SUBSANAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DEL TRAMO K0+084 A K3+540.EL PROCESO SANCIONATORIO CONTINÚA SU CURSO NORMAL Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA REANUDACIÓN DE AUDIENCIA. DE IGUAL MANERA, LA INTERVENTORIA SOLICITÓ AL MUNICIPIO INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES SST.IGUALMENTE, EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS:<ul style="list-style-type: none">CINGE-INV-5053-0411-24 Respuesta comunicado - OFI-CONS-105-2024 actas de vecindad faltantes de los tramos ubicados en la Balastrera 1 y Balastrera 2.CINGE-INV-5053-0414-24 Respuesta al comunicado OFI-CONS-122-2024– Subsanación informe ambiental julio y agosto 2024.CINGE-INV-5053-0415-24 Premio Comunicados OFI-CONS-111-2024 y OFI-CONS-115-2024 –Informes SST febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto y septiembre 2024.CINGE-INV-5053-0416-24 Reiteración a compromisos pactados.CINGE-INV-5053-0417-24 Revisión resultados de ensayos.CINGE-INV-5053-0418-24 Respuesta a comunicado OFI-CONS-116-2024: Plan de contingencia actualizado y flujo de caja.CINGE-INV-5053-0419-24 Alcance comunicado CING-INV-5053-0414-24, respuesta al comunicado OFI-CONS-122-2024– Subsanación informe ambiental julio y agosto 2024.				
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA				
<ul style="list-style-type: none">SE REALIZARÁ ACOPIO DE MATERIALES GRANULARES (AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR).SE REALIZARÁ SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO DESDE K2+100 HACIA MAYORES.SE REALIZARÁ SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DESDE LA ABSCISA K2+100 HACIA MAYORES.SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE LA ABSCISA K2+054 HACIA MAYORES.EL CONTRATISTA DE OBRA SUBSANARÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL TRAMO COMPLETO Y DEMAS DOCUMENTOS INICIALES.				
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS				
<p>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.</p>				

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
Instalación de acero de refuerzo para el pavimento rígido MR38 premezclado. Abscisa K1+980.	Construcción de pavimento rígido MR38 premezclado. Abscisa K2+020.	Construcción de Bermacunetas 3000 PSI premezclado. Abscisa K0+120.
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
1. Revisión y aprobación de documentos contractuales. 2. Realizar seguimiento a las actividades preliminares. 3. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos.		FIRMA  NOMBRE: ANGELA MARIA DAVILA MORALES Matricula Profesional No.: 17202-153798 CLD
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.		

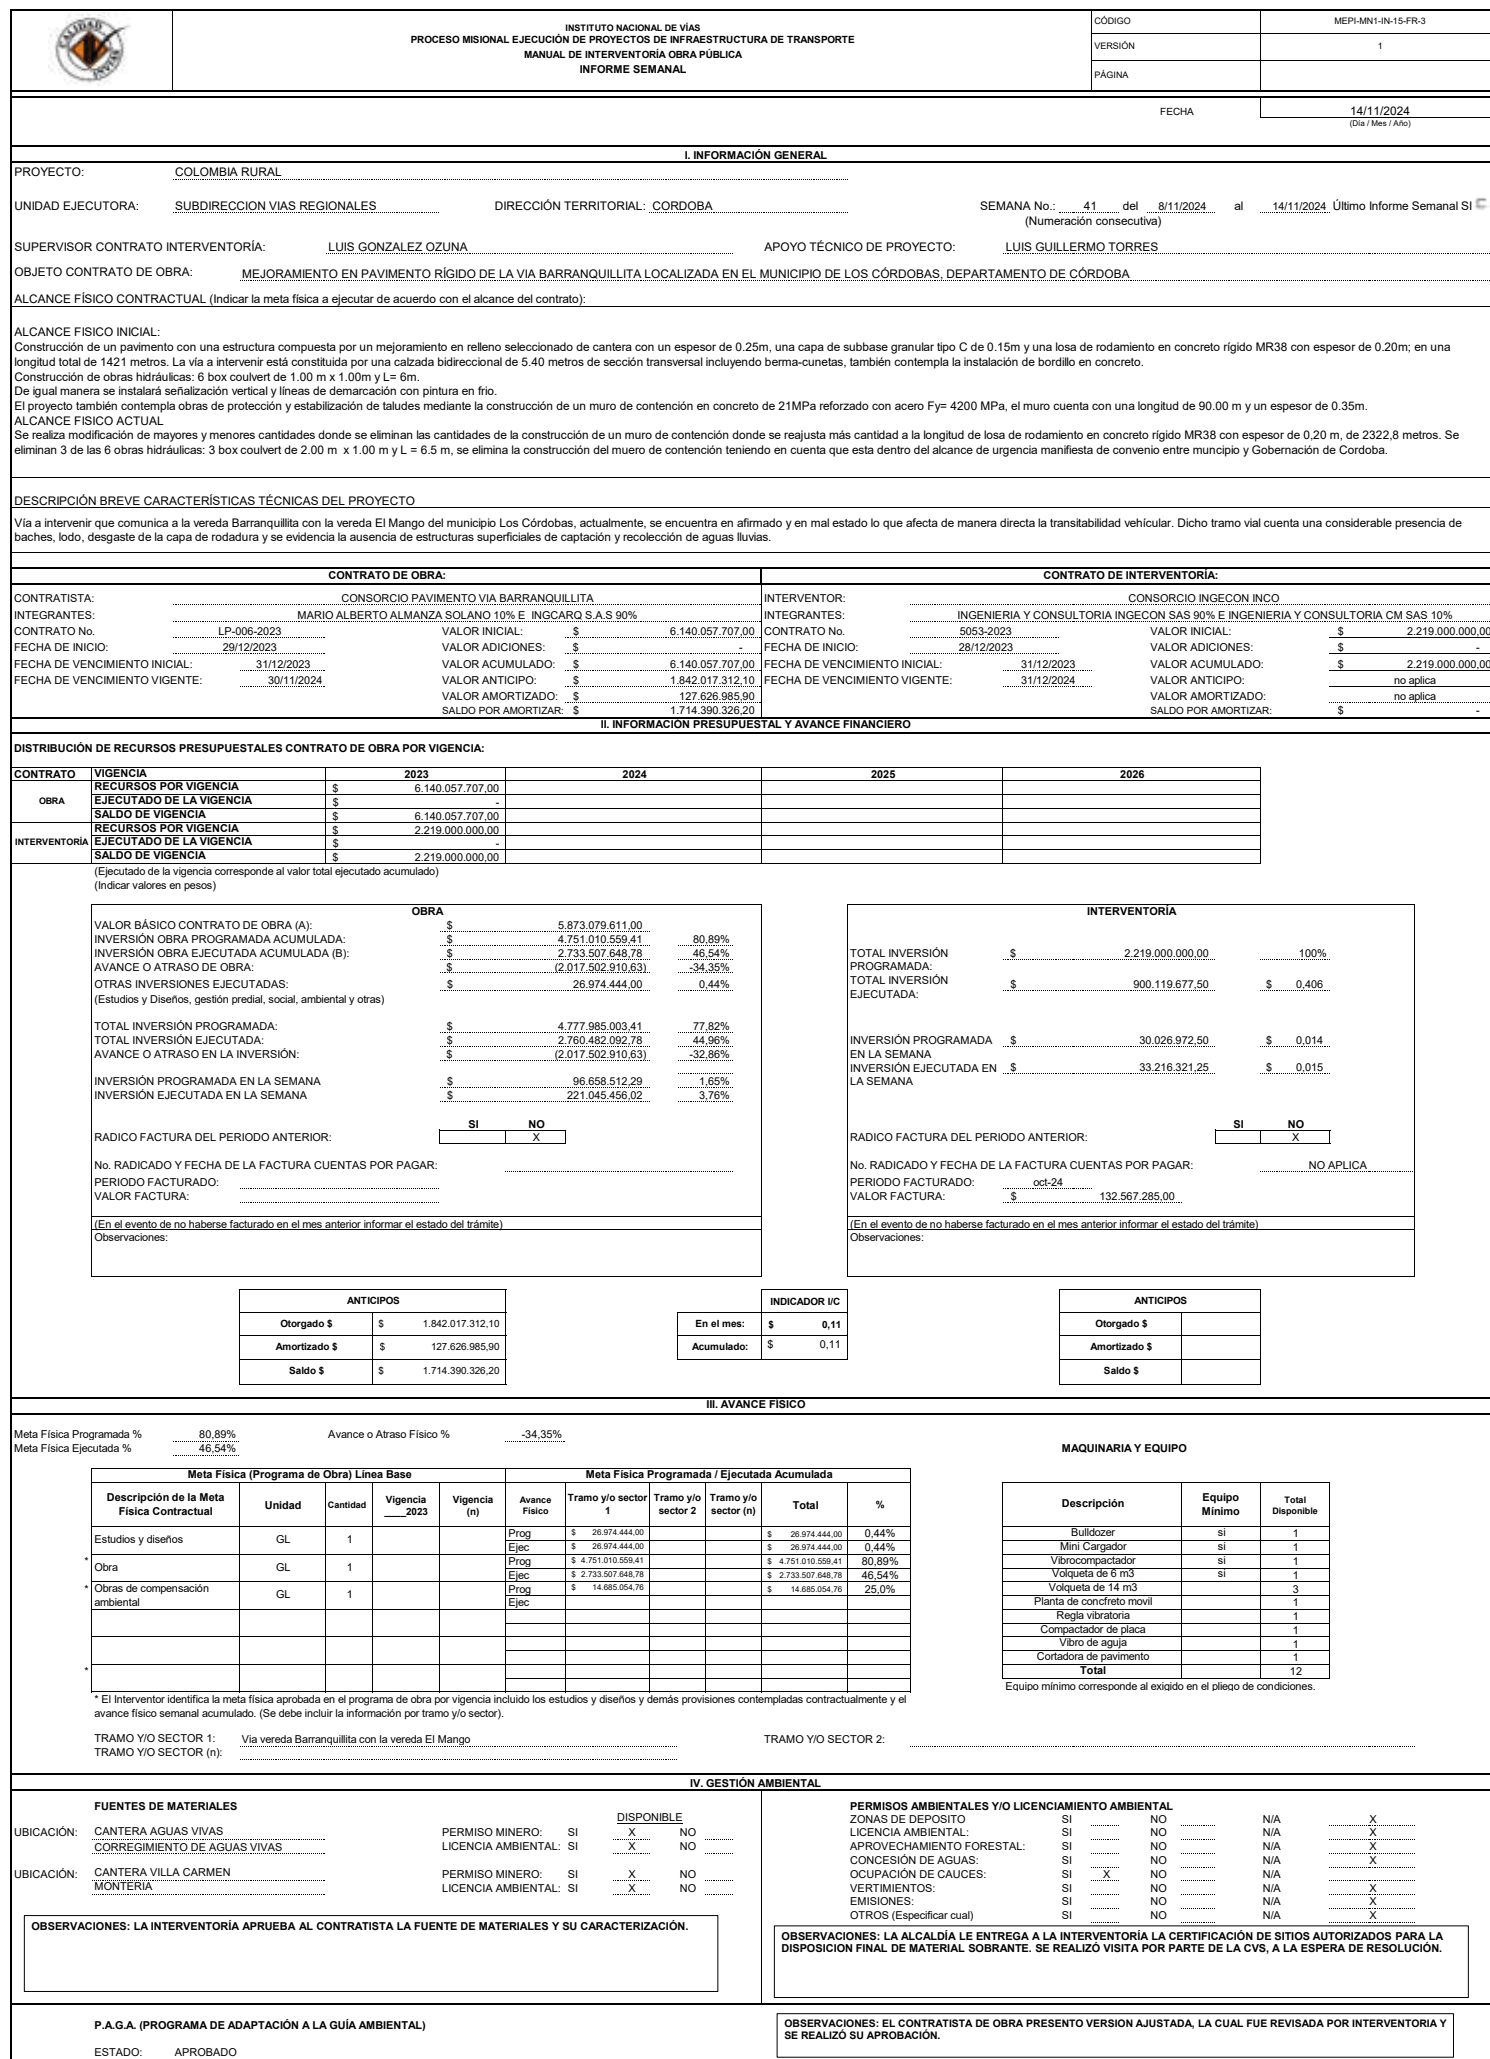

FECHA	14/11/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:	COLOMBIA RURAL		
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CORDOBA
		SEMANA No.:	41 del 8/11/2024 al 14/11/2024. Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA:	LUIS GONZALEZ OZUNA	APOYO TÉCNICO DE PROYECTO:	LUIS GUILLERMO TORRES
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):			

ALCANCE FISICO INICIAL:
 Construcción de un pavimento con una estructura compuesta por un mejoramiento en relleno seleccionado de cantera con un espesor de 0.25m, una capa de subbase granular tipo C de 0.15m y una losa de rodamiento en concreto rígido MR38 con espesor de 0.20m; en una longitud total de 1421 metros. La vía a intervenir está constituida por una calzada bidireccional de 5.40 metros de sección transversal incluyendo berna-cunetas, también contempla la instalación de bordillo en concreto.
 Construcción de obras hidráulicas: 6 box culvert de 1.00 m x 1.00m y L= 6m.
 De igual manera se instalará señalización vertical y líneas de demarcación con pintura en frío.
 El proyecto también contempla obras de protección y estabilización de taludes mediante la construcción de un muro de contención en concreto de 21MPa reforzado con acero $F_y = 4200$ MPa, el muro cuenta con una longitud de 90.00 m y un espesor de 0.35m.

ALCANCE FISICO FINAL:
 Se realiza modificación de mayores y menores cantidades donde se eliminan las cantidades de la construcción de un muro de contención donde se reajusta más cantidad a la longitud de losa de rodamiento en concreto rígido MR38 con espesor de 0.20 m, de 2322.8 metros. Se eliminan 3 de las 6 obras hidráulicas: 3 box culvert de 2.00 m x 1.00 m y L = 6.5 m, se elimina la construcción del muro de contención teniendo en cuenta que está dentro del alcance de urgencia manifiesta de convenio entre municipio y Gobernación de Córdoba.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Vía a intervenir que comunica a la vereda Barranquillita con la vereda El Mango del municipio Los Córdoba, actualmente, se encuentra en afirmado y en mal estado lo que afecta de manera directa la transitabilidad vehicular. Dicho tramo vial cuenta una considerable presencia de baches, lodo, desgaste de la capa de rodadura y se evidencia la ausencia de estructuras superficiales de captación y recolección de aguas lluvias.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLA				INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON INCO			
INTEGRANTES: MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO 10% E INGCARQ S.A.S 90%				INTEGRANTES: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 90% E INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS 10%			
CONTRATO No. LP-006-2023		VALOR INICIAL:	\$ 6.140.057.707,00	CONTRATO No. 5053-2023		VALOR INICIAL:	\$ 2.219.000.000,00
FECHA DE INICIO: 29/12/2023		VALOR ADICIONES:	-	FECHA DE INICIO: 28/12/2023		VALOR ADICIONES:	-
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	\$ 6.140.057.707,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023		VALOR ACUMULADO:	\$ 2.219.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 30/11/2024		VALOR ANTICIPO:	\$ 1.842.017.312,10	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024		VALOR ANTICIPO:	no aplica
		VALOR AMORTIZADO:	\$ 127.626.985,90			VALOR AMORTIZADO:	no aplica
		Saldo por amortizar:	\$ 1.714.390.326,20			Saldo por amortizar:	\$ -

II. INFORMACION PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 6.140.057.707.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 6.140.057.707.00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 2.219.000.000.00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 2.219.000.000.00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	5.875.079.611,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	4.751.010.559,41	80,89%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	2.733.507.648,78	46,54%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(2.017.502.910,63)	-34,35%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	26.974.444,00	0,44%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	4.777.985.003,41	77,82%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	2.760.482.092,78	44,96%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(2.017.502.910,63)	-32,86%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	96.658.512,29	1,65%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	221.045.456,02	3,76%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
 PERIODO FACTURADO:
 VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado \$	\$	1.842.017.312,10
Amortizado \$	\$	127.626.985,90
Saldo \$	\$	1.714.390.326,20

INDICADOR I/C

En el mes:	\$ 0,11
Acumulado:	\$ 0,11

INTERVENTORIA

TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	2.219.000.000,00	100%
TOTAL INVERSIÓN EFECTUADA:	\$	900.119.677,50	\$ 0,406

INVERSIÓN PROGRAMADA	\$	30.026.972,50	\$	0,014
EN LA SEMANA				
INVERSIÓN EJECUTADA EN	\$	33.216.321,25	\$	0,015
LA SEMANA				

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO APLICA

PERIODO FACTURADO: oct-24

VALOR FACTURA: \$ 132 567 285 00

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)	
Observaciones:	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Fisica Programada %	80,89%	Avance o Atraso Fisico %	-34,35%
Meta Fisica Ejecutada %	46,54%		

[illegible]

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo v/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via vereda Barranquillita con la vereda El Mango

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES

		DISPONIBLE	
UBICACIÓN:	CANTERA AGUAS VIVAS	PERMISO MINERO:	SI X NO
	CORREGIMIENTO DE AGUAS VIVAS	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X NO
UBICACIÓN:	CANTERA VILLA CARMEN	PERMISO MINERO:	SI X NO
	MONTERIA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI X NO

DISPONIBLE

PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL

ZONAS DE DEPOSITO	SI	NO	N/A	X
LICENCIA AMBIENTAL:	SI	NO	N/A	X
APROVECHAMIENTO FORESTAL:	SI	NO	N/A	X
CONCESION DE AGUAS:	SI	NO	N/A	X
OCCUPACION DE CAUCES:	SI	X	N/A	X
VERTIMIENTOS:	SI	NO	N/A	X
EMISIONES:	SI	NO	N/A	X
OTROS (Especificar cual)	SI	NO	N/A	X

OBSERVACIONES: LA ALCALDÍA LE ENTREGA A LA INTERVENTORÍA LA CERTIFICACIÓN DE SITIOS AUTORIZADOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBLENTE. SE REALIZÓ VISITA POR PARTE DE LA CVS, A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA DE OBRA PRESENTO VERSION AJUSTADA, LA CUAL FUE REVISADA POR INTERVENTORIA Y SE REALIZÓ SU APROBACIÓN.

<div><div></div><div></div><div></div></div>			<div>V. GESTIÓN SOCIAL</div> <div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: <u>CAMPAMENTO DE OBRA</u></div>		<div>OBSERVACIONES: EL CAMPAMENTO DE OBRA UBICADO EN LA ABCISCA K1+080 SE UTILIZA COMO SEDE PARA SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO.</div>	
<div>TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 35 25 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 32 14 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3 11 EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 4 7</div>			<div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 60</div>			
<div>VI. GESTIÓN PREDIAL</div> <div>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A AVALÚOS APROBADOS: N/A PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A</div> <div>OBSERVACIONES: PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE REQUERIRA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS DADO QUE SE CUENTA CON UNA VIA EXISTENTE CON UN ANCHO DISPONIBLE SUFICIENTE PARA ALBERGAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE DISEÑO.</div>						
<div>VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD</div> <div>EL CONTRATISTA HA PRESENTADO LA GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD.INFORMES MENSUALES AMBIENTALES Y SOCIALES</div>						
<div>VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS</div> <div>EN EL TRANSURSO DE LA ACTUAL SEMANA SE REALIZÓ LO SIGUIENTE: • EL DIA 13 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE REALIZÓ COMITÉ DE OBRA, DONDE ASISTIÓ LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, EL ASESOR DE PLANEACIÓN, EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA, CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y COMPROMISOS PENDIENTES. • DURANTE LA SEMANA SE PRESENTARON LLUVIAS EN LA ZONA LOS DÍAS 08 DE NOVIEMBRE DE 2024 (DESDE LAS 3:00 AM HASTA LAS 6:00 AM Y DESDE LA 1:10 PM HASTA LAS 3:00 PM), EL DÍA 10 DE NOVIEMBRE DE 2024 (DESDE LAS 11:00 PM HASTA LA 1:00 AM) Y EL DÍA 11 DE NOVIEMBRE DE 2024 (DESDE LAS 12:30 AM HASTA LAS 2:00 AM Y DESDE LAS 2:00 AM HASTA LAS 9:30 AM). • SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DE LA ABCISCA K0+840 - K0+480 • SE VERIFICA CON TOPOGRAFIA NIVELES DE LA VIA Y ESPESORES DE CUNETAS Y DE LOSAS DE PAVIMENTO. • SE REALIZA VERIFICACIÓN CON TOPOGRAFIA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA EL BOMBEO DE LA VIA, NIVELACIÓN, ESPESORES . • SE REALIZA COLOCACIÓN DE ACERO PARA LOSAS DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO Y CARRIL DERECHO. • SE REALIZA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLOS DE LA ABCISCA K2+252 - K2+135 LADO DERECHO Y DE LA ABCISCA K2+325 - K2+143 LADO IZQUIERDO. • SE REALIZA FUNDICIÓN DE CONCRETO MR38 PARA PAVIMENTO RIGIDO DE LA ABCISCA K1+787 - K1+714 Y DE LA ABCISCA K1+711,4 - K1+656,5 CARRIL IZQUIERDO, Y DE LA ABCISCA K1+271,5 -K1+142,5 CARRIL DERECHO. • SE REALIZA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO DE LOSAS DE PAVIMENTO Y DE BORDILLOS. • SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES EN SITU DE LA CAPA DE SUBBASE GRANULAR DE LA ABCISCA K0+960 - K0+600. • SE AJUSTA EL ABCISADO DE LA VIA, QUEDANDO ACTUALIZADA LA META FISICA A 2325 ML DE PAVIMENTO RIGIDO. • EN EL TRANSURSO DE LA SEMANA SE ENVIÓ POR CORREO ELECTRÓNICO EL SIGUIENTE COMUNICADO: CING-INV-5053-0412-24 - RESPUESTA COMUNICADO COBQ078-24-- INFORME SST JUNIO, JULIO Y SEPTIEMBRE 2024. 12/11/2024 RESPUESTA A LOS COMUNICADOS COBQ079-24 INFORME AMBIENTAL OCTUBRE 2024. 12/11/2024</div>						
<div>IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA</div> <div>• SE AVANZARÁ CON EL SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DEL MATERIAL SUBBASE GRANULAR DE LA ABCISCA K0+480 A MENORES. • SE AVANZARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA K2+135 A MENORES LADO DERECHO. • SE AVANZARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA K2+143 A MENORES LADO DE IZQUIERDO. • SE AVANZARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE LA K0+990 A MENORES LADO DERECHO. • SE AVANZARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO CARRIL DERECHO DE K0+990 A MENORES.</div>						
<div>X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS</div> <div><div>Título del gráfico</div><div>\$ - METAS FÍSICAS PROGRAMADAS METAS FÍSICAS EJECUTADAS</div></div> <div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.</div>						
<div>XI. REGISTRO FOTOGRAFICO</div> <div><div><div>Fundida de concreto MR38 pavimento carril derecho e izquierdo</div></div><div><div>Fundida de concreto para bordillos lado derecho y lado izquierdo</div></div><div><div>Comité de Obra</div></div><div><div>Suministro, extensión y compactación de capa de subbase granular</div></div><div><div>Toma de muestras de concreto y densidades en campo</div></div><div><div>Verificación de niveles</div></div></div>						
<div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</div> <div>1. Realizar seguimiento a las actividades. 2. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos. 3. Duplicar rendimientos en las actividades de cunetas y losas de pavimento.</div>					<div>DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</div> <div><div>FIRMA</div><div>NOMBRE: <u>ANGELA MARIA DIVILA MORALES</u></div><div>Matricula Profesional No.: <u>17202-153798 CUD</u></div></div>	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copios: Unidad Ejecutora, Subinterventoría, Contratación, Interventoría, Dirección, Tercerista

<div><div><div></div></div></div>	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL</div>	<div><div>CODIGO</div><div>MEPHM1-IN-15-FR-3</div></div> <div><div>VERSIÓN</div><div>1</div></div> <div><div>PÁGINA</div><div></div></div>
-----------------------------------	---	--

		FECHA 14/11/2024 (Día / Mes / Año)																																																																																																		
I. INFORMACIÓN GENERAL																																																																																																				
PROYECTO:COLOMBIA RURAL																																																																																																				
UNIDAD EJECUTORA:SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA SEMANA No.: 41 del 8/11/2024 al 14/11/2024 Último Informe Semanal SI (Numeración consecutiva)																																																																																																				
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:LUIS GONZALEZ OZUNA GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO:ALVARO GALVIS ARAGÓN																																																																																																				
OBJETO CONTRATO DE OBRA:MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA																																																																																																				
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato): Inicialmente el alcance físico contemplaba: Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 780 metros. Y box coulvert Sin embargo, una vez terminada etapa de revisión de estudios y diseños, se estableció dentro del alcance contractual una reducción de meta física de 689 ml de pavimento y un box coulvert, lo anterior debido a la necesidad de inclusión de precio no previsto de pedraplen.																																																																																																				
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Vía que conduce desde la intersección de la vía que lleva desde la vereda Rimini hasta la intersección de la vía nacional San Bernardo del Viento - Moñitos, incluye obras de drenaje, andenes, señalización																																																																																																				
CONTRATO DE OBRA: CONTRATISTA:CONSORCIO L&S INTEGRANTES:LA COMERCIAL S.A.S 50% y SIS ORGANIZATION S.A.S 50% CONTRATO No.:LP-MSBV-008-2023 FECHA DE INICIO:28/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:29/04/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:20/12/2024 VALOR INICIAL:\$ 2.115.723.321,00 VALOR ADICIONES:\$ - VALOR ACUMULADO:\$ 2.115.723.321,00 VALOR ANTICIPO:\$ 634.716.996,30 VALOR AMORTIZADO:\$ - SALDO POR AMORTIZAR:\$ 634.716.996,30																																																																																																				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA: CONTRATISTA:CONSORCIO INGECON INCO INTEGRANTES:INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 90% E INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS 10% CONTRATO No.:5053-2023 FECHA DE INICIO:28/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:31/12/2024 VALOR INICIAL:\$ 2.219.000.000,00 VALOR ADICIONES:\$ - VALOR ACUMULADO:\$ 2.219.000.000,00 VALOR ANTICIPO:\$ - VALOR AMORTIZADO:\$ - SALDO POR AMORTIZAR:\$ -																																																																																																				
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO																																																																																																				
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:	CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026		---------------	--------------------------	---------------------	------	------	------		OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 2.115.723.321,00						EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						SALDO DE VIGENCIA	\$ 2.115.723.321,00						RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 2.219.000.000,00					INTERVENTORÍA	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -						SALDO DE VIGENCIA	\$ 2.219.000.000,00				(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos) OBRA VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):\$ 2.008.640.979,00 INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:\$ 1.400.806.147,00 69,74% INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):\$ 1.085.172.109,91 54,03% AVANCE O ATRASO DE OBRA:\$ (315.634.037,09) -15,71% OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:\$ 14.973.437,00 0,71% (Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras) TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:\$ 1.415.779.584,00 66,92% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$ 1.100.145.546,91 52,00% AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:\$ (315.634.037,09) -14,92% INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA\$ 219.765.422,00 10,94% INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA\$ 128.119.094,98 6,38% RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO APLICA PERIODO FACTURADO: VALOR FACTURA:\$ - (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) Observaciones: SE APROBÓ PRORROGA DEL CONTRATO HASTA EL 20 DE DICIEMBRE DE 2024. INTERVENTORÍA TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:\$ 2.219.000.000,00 100% TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:\$ 900.119.677,50 0,406 INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA\$ 30.026.972,50 0,014 INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA\$ 33.216.321,25 0,015 RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: SI NO X No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO APLICA PERIODO FACTURADO:oct-24 VALOR FACTURA:\$ 132.567.285,00 (En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite) Observaciones: EL INTERVENTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN INICIAL Y SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. ANTICIPOS				---------------	-------------------		Otorgado \$	\$ 634.716.996,30		Amortizado \$	\$ -		Saldo \$	\$ 634.716.996,30	INDICADOR I/C				------------	---------		En el mes:	\$ 0,27		Acumulado:	\$ 0,27	ANTICIPOS				---------------	--		Otorgado \$			Amortizado \$			Saldo \$				
III. AVANCE FÍSICO Meta Física Programada % 69,74% Meta Física Ejecutada % 54,03% Avance o Atraso Físico % -15,71% MAQUINARIA Y EQUIPO	Descripción	Equipo Mínimo	Total Disponible		---------------------------------------	---------------	------------------		Volqueta	1	1		Minicargador	1	1		Motoniveladora	1	1		Vibrocompactador	1	1		Retroexcavadora de llantas (pajarita)	1	1		Total		4	Equipo mínimo corresponde al exigido en el pliego de condiciones.																																																																				
IV. GESTIÓN AMBIENTAL FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: CANTERA AGUAS VIVAS VIA LOS CORDOBAS UBICACIÓN: EL ESFUERZO LORICA PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL: SI DISPONIBLE X X NO NO PERMISO MINERO: SI LICENCIA AMBIENTAL: SI X X NO NO PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPÓSITO: SI LICENCIA AMBIENTAL: SI APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI CONCESIÓN DE AGUAS: SI OCCUPACIÓN DE CAUCES: SI VERTIENTOS: SI EMISIONES: SI OTROS (Especificar cual): SI N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A X X X X X X X OBSERVACIONES: LA INTERVENTORÍA HA DADO EL VISTO BUENO A LAS CANTERAS PARA EL SUMINISTRO DEL MATERIAL. OBSERVACIONES: PRIMER APREMIO POR LA NO ENTREGA INFORMES AMBIENTALES Y SST PERIODO DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024. SE EVIDENCIA UN GRAVE INCUMPLIMIENTO EN SUS OBLIGACIONES CONTRACTUALES EN EL ÁREA SST Y AMBIENTAL. CONTINUA PENDIENTE LA RESOLUCIÓN DE LA CVS PARA EL APROVECHAMIENTO FORESTAL. LA DOCUMENTACIÓN DE DONACIÓN DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SE ENCUENTRA PENDIENTE POR PARTE DE LA ALCALDIA PARA FIRMA DEL SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA.																																																																																																				

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:SE ENCUENTRA APROBADO DESDE EL 24/09/2024

OBSERVACIONES:

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	19	25
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		11
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	7	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:44

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:1

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO:CAMPAMENTO RIMINI

OBSERVACIONES:

- LOS INFORMES SOCIALES CORRESPONDIENTE AL MES DE JUNIO FUE APROBADO, LOS MESES JULIO Y AGOSTO TIENEN OBSERVACIONES QUE EL CONTRATISTA DEBE ATENDER.
- EN LA URNA NO SE REGISTRA PQR.

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS:N/A

AVALÚOS APROBADOS:N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS:N/A

OBSERVACIONES: LA ALCALDIA DIRECTAMENTE Y BAJO SU TUTELA Y GESTIÓN REALIZÓ LA ADQUISIÓN PREDIAL, PARA ELLO SE REALIZÓ SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ENTRE EL 16 DE MARZO 2024 Y EL 13 DE MAYO 2024. A LA FECHA DEL REINICIO 14 DE MAYO 2024, LA ENTIDAD YA HABÍA GESTIONADO EL ÁREA PREDIAL REQUERIDA Y EL DESPLAZAMIENTO DE LAS CERCAS CON LOS PROPIETARIOS PARA LIBERAR LA ZONA REQUERIDA PARA EL PROYECTO.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

DURANTE EL PERIODO DE LA ACTUAL SEMANA SE REALIZÓ LO SIGUIENTE:

LA COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA LOCALIZÓ Y VERIFICÓ LAS JUNTAS CORRESPONDIENTES A LA MODULACIÓN DE LAS LOSAS, GARANTIZANDO LAS PENDIENTES TRANSVERSALES Y LONGITUDINALES ENTRE LAS ABCISAS K0+075 A K0+000. SIMULTÁNEAMENTE, SE ADELANTÓ LA INSTALACIÓN DE RIELES EN EL MISMO TRAMO. SE VERIFICÓ EL ACERO PARA LOS PASADORES DE CARGA Y LAS BARRAS DE ANCLAJE, Y EL CONTRATISTA REALIZÓ EL VACIADO PARA EL PAVIMENTO RÍGIDO ENTRE LAS ABCISAS+ K0+075 A K0+000, INCLUYENDO EL ACABADO, TEXTURIZADO, APLICACIÓN DEL ANTISOL, CORTE PARA LAS JUNTAS DE DILATACIÓN Y SEÑALIZACIÓN PREVENTIVA PARA EVITAR EL TRÁNSITO DE VEHÍCULOS SOBRE EL PAVIMENTO. ADICIONALMENTE, SE AVANZÓ EN LA EXCAVACIÓN ENTRE LAS ABCISAS K0+450 A K0+500, Y SE INSTALÓ EL GEOTEXTIL NT2500, LA PIEDRA RAJÓN Y EL MATERIAL DE SELLO ENTRE K0+445 A K0+480. PARA MANEJAR LAS AGUAS DE ESCORRENTÍA, EL CONTRATISTA EMPLEÓ UNA MOTOBOMBA PARA EXTRAER LAS AGUAS EMPOZADAS EN LA EXCAVACIÓN. SE REGISTRARON 5 VIAJES DE MATERIAL: 1 VIAJE DE PIEDRA RAJÓN DE 15 M3 DE LA CANTERA DE AGUAS VIVAS Y 4 VIAJES DE AFIRMADO DE 15 M3 CADA UNO DE LA CANTERA EL ESFUERZO. EL ESTADO DEL TIEMPO PRESENTÓ LLUVIAS FUERTES EL 11/11/2024 ENTRE 2:00 AM Y 5:00 AM, Y LLUVIAS MODERADAS DESDE LAS 5:00 AM HASTA LAS 6:00 PM.

IGUALMENTE, EN EL TRANSURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS:

- CING-INV-5053-0409-24 REPUESTA A COMUNICADO NO. 073 – REMISIÓN INFORMES AMBIENTALES, SOCIALES SST.
- CING-INV-5053-0410-24 REPUESTA A COMUNICADO NO. 083 – REMISIÓN INFORMES AMBIENTALES, SOCIALES SST.
- CING-INV-5053-0420-24 PRIMER APREMIO POR LA NO ENTREGA INFORMES AMBIENTALES Y SST PERIODO DE JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- DISEÑO DEL BOX COULVERT EN REVISIÓN.
- CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN K0+500 A K0+535.
- INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL, PIEDRA RAJÓN, MATERIAL DE SELLO ENTRE LAS ABCISAS K0+480 AL K0+535.
- MANTENIMIENTO DE LA VÍA ALTERNA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DEL PROYECTO

Categoría	Valor (Millones de \$)
METAS FISICAS PROGRAMADAS	1400
METAS FISICAS EJECUTADAS	1100

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación de material de sello k0+480

Panoramica avance del pavimento rígido k0+000

Avance de la excavación k0+500

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Revisión y aprobación de documentos contractuales.

2. Realizar seguimiento a las actividades preliminares.

3. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:ANGELA MARIA DAVILA MORALES

Matricula Profesional No.:17202-153798 CLD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del RNVAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	<div>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</div> <div>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</div> <div>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</div> <div>INFORME SEMANAL</div>	<div>CÓDIGO</div> <div>VERSIÓN</div> <div>PÁGINA</div>	<div>MEPRM-1-IN-10-FR-3</div> <div>1</div> <div></div>							
		FECHA	21/11/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>							
I. INFORMACIÓN GENERAL										
PROYECTO: COLOMBIA RURAL										
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA								
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS GONZALEZ OZUNA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GUILLERMO TORRES								
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA										
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL <small>(Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato)</small>										
Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4 980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto.										
Construcción de obras hidráulicas: 10 box couvert de 1x1 L= 8m, y también construcción de 6 box couvert de 2x2 L=8m.										
También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frío.										
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO										
Mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica – Providencia el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la Granjita hasta el corregimiento de Providencia, La vía rural se encuentra en mal estado para la transitabilidad vehicular, con presencia de baches, lodo y desgaste de la capa de rodadura.										
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:								
CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA		INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON INCO								
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS 5%, BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. 85% y KAP		INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS, 90% E INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS, 10%								
CONSTRUCCIONES S.A.S. 10%		CONTRATO No. 2053-2023								
VALOR INICIAL: 14.100.000.000		VALOR INICIAL: 2.219.000.000,00								
FECHA DE INICIO: 29/12/2023		FECHA DE INICIO: 29/12/2023								
VALOR ADICIONES: -		VALOR ADICIONES: -								
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023								
VALOR ACUMULADO: 14.100.000.000,00		VALOR ACUMULADO: 2.219.000.000,00								
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20/12/2024		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024								
VALOR ANTICIPO: 4.355.000.130,55		VALOR ANTICIPO: -								
VALOR AMORTIZADO: -		VALOR AMORTIZADO: -								
SALDO POR AMORTIZAR: 4.355.000.130,55		SALDO POR AMORTIZAR: -								
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO										
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:										
CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026					
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 14.100.000.000								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 14.100.000.000								
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 2.219.000.000								
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -								
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 2.219.000.000								
<small>(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)</small>										
OBRA			INTERVENTORIA							
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 13.218.339.697,00			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 2.219.000.000,00 100%							
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 12.564.079.113,69 95,05%			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 933.335.998,75 \$ 0,421							
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 3.556.814.846,00 26,91%			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 30.026.972,50 \$ 0,014							
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ (9.007.264.265,69) -68,14%			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 33.216.321,25 \$ 0,015							
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 80.003.700,00 0,57%										
<small>(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)</small>										
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 12.644.082.813,69 89,67%										
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 3.636.819.548,00 28,79%										
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ (9.007.264.265,69) -63,88%										
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 405.626.833,26 3,07%										
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 472.756.434,00 3,58%										
SI NO			SI NO							
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X			RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X							
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO APLICA			No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 15/11/2024							
PERIODO FACTURADO: -			PERIODO FACTURADO: 03-24							
VALOR FACTURA: -			VALOR FACTURA: 132.567.295,00							
<small>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</small>			<small>(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)</small>							
Observaciones: EL CONTRATISTA ESTÁ AVANZANDO CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE OBRA Y CONTINUA SUBSANANDO DOCUMENTOS INICIALES.			Observaciones: EL INTERVENTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO EN OBRA, DE IGUAL MANERA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.							
ANTICIPOS			INDICADOR IC							
Otorgado \$ 5.287.335.878,80			En el mes: \$ 11,67							
Amortizado \$ -			Acumulado: \$ 11,67							
Saldo \$ 5.287.335.878,80										
			ANTICIPOS							
			Otorgado \$							
			Amortizado \$							
			Saldo \$							
III. AVANCE FÍSICO										
Meta Física Programada % 95,05% Avance o Atraso Físico % -68,14%										
Meta Física Ejecutada % 26,91%										
MAQUINARIA Y EQUIPO										
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base										
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada										
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico	Tramo y/o sector 1	Tramo y/o sector 2	Tramo y/o sector (n)	Total	%
Estudios y diseños	GL	1			Prog \$ 80.003.700,00				\$ 80.003.700,00	0,57%
					Ejec \$ 80.003.700,00				\$ 80.003.700,00	0,57%
Obra	GL	1			Prog \$ 13.218.339.697,00				\$ 12.564.079.113,69	95,05%
					Ejec \$ 3.556.814.846,00				\$ 3.556.814.846,00	26,91%
Obras de compensación ambiental y PAGA	GL	1			Prog \$ 169.033.596,00				\$ 169.033.596,00	25,00%
					Ejec \$ 169.033.596,00				\$ 169.033.596,00	
Programa de Manejo de Tránsito	GL	1			Prog \$ 132.163.321,25				\$ 132.163.321,25	
					Ejec \$ 132.163.321,25				\$ 132.163.321,25	
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).										
TRAMO Y/O SECTOR 1: Vía Planeta Rica - Providencia						TRAMO Y/O SECTOR 2:				
TRAMO Y/O SECTOR (n):										
IV. GESTIÓN AMBIENTAL										
FUENTES DE MATERIALES										
DISPONIBLE										
UBICACIÓN:	CANTERA JOMEVE	PERMISO MINERO:	SI	X	NO					
	CIENAGA DE ORO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO					
UBICACIÓN:	CANTERA SIBERIA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO					
	VIA A MONTERIA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO					
OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA REALIZÓ APROBACIÓN DE LAS CANTERAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR.						OBSERVACIONES: LA ALCALDIA SUMINISTRÓ LINEAMIENTOS Y SITIO AUTORIZADO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRIANTE. SE ENVIO EL 12-11-2024, LA SOLICITUD DE OCUPACION DE CAUCE A LA CVS				
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACION A LA GUÍA AMBIENTAL)						OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA PRESENTÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES AL PAGA V3, LA CUAL SE REVISÓ Y SE APROBÓ POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.				
ESTADO: APROBADO										

V. GESTIÓN SOCIAL									
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO DE OBRA						
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	18	25							
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	11							
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	7							
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 43									
VI. GESTIÓN PREDIAL									
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A	OBSERVACIONES: PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE REQUERIRÁ LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS, DADO QUE SE CUENTA CON UNA VIA EXISTENTE, CON UN ANCHO DISPONIBLE SUFICIENTE PARA ALBERGAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE DISEÑO.							
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A								
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A								
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD									
EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD.									
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS									
LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA SON:									
<ul style="list-style-type: none">ESTADO DEL TIEMPO:EL DIA 17 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 8:00 A.M. A 11:00 A.M.EL DIA 18 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A APARTIR DE 1:30 P.M. A 2:30 P.M.SE REALIZA COMITE DE OBRA CON PARTICIPACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA, CON EL FIN DE HACER SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS.SE MANTIENE INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS EN EL CORREDOR VIAL, ENTRE LAS ABSCSIS K0+084 HASTA A K3+540.SE UTILIZAN PALETEROS PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LOS TRAMOS EN INTERVENCIÓN.SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (AFIRMADO), PROVENIENTE DE LA CANTERA JOMEVE EN CIENAGA DE ORO.SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (SUBBASE GRANULAR), PROVENIENTE DE LA CANTERA SIBERIA.SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO DESDE LA ABSCSA K2+300 HACIA MAYORES.SE SOLICITA AL CONTRATISTA DE OBRA AVANZAR EN EL SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DESDE LA ABSCSA K2+100 HACIA MAYORES.LA INTERVENTORIA REALIZA CHEQUEO TOPOGRÁFICO PARA VERIFICAR NIVELES Y VOLUMENES DE SUBBASE GRANULAR.PARA LA INTERVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO MR38 SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:<ul style="list-style-type: none">SE REALIZA COLOCACIÓN DE RIELES DESDE LA ABSCSA K0+084 HASTA LA K0+936 (CARRIL DERECHO).SE REALIZA CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE RIELES PARA GARANTIZAR BOMBEO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DEL PAVIMENTO RÍGIDO A CONSTRUIR.SE REALIZA REPLANTEO PARA RESPETAR LA MODULACIÓN DE LAS LOSAS Y SE LOCALIZA CON TOPOGRAFIA LAS JUNTAS EN LOS TRAMOS CURVOS PARA GARANTIZAR LA DEFLEXIÓN.SE VERIFICAN ANCHO Y ESPESORES PARA EL PAVIMENTO RIGIDO A CONSTRUIR A LO LARGO DEL TRAMO DESDE LA ABSCSA K0+084 HASTA LA K0+936 (CARRIL DERECHO).SE VERIFICA DIMENSIONES DE LAS CANASTILLAS GARANTIZANDO ANCHO PARA DOVELAS CON LONGITUD DE 35CM. SEPARACIÓN CENTRO A CENTRO DE 30 CM Y ALTURA DE UBICACIÓN DE DOVELA DE 9CM.SE VERIFICAN DOVELAS DE 1" CON UNA LONGITUD DE 35CM.SE VERIFICA ACERO LONGITUDINAL DE 1/2" CON UNA LONGITUD DE 85CM ESPACIADOS CADA 1,2CM.SE REALIZA FUNDIDA DE PAVIMENTO RIGIDO MR-38 PREMEZCLADO, DESDE LA ABSCSA K0+084 HASTA LA K0+936 (CARRIL DERECHO).SE REALIZA PRUEBA SLUMP EN OBRA PARA VERIFICAR ASENTAMIENTO DEL CONCRETO.SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO (VIGUETAS) PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.SE REALIZA VIBRADO DEL CONCRETO A LO LARGO DE LOS TRAMOS FUNDIDOS.SE REALIZA TEXTURIZADO Y ACABADO FINAL DE LAS LOSAS DE CONCRETO.SE APLICÓ ANTISOL A LO LARGO DEL TRAMO DE PAVIMENTO RIGIDO CONSTRUIDO.SE REALIZA CORTE CADA 3M EN LAS JUNTAS DE DILATACIÓN DEL TRAMO DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 CONSTRUIDO.SE REALIZA LIMPIEZA Y SELLO DE LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL PAVIMENTO CONSTRUIDO.SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA 576ML DE BERMACUNETAS E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.SE REALIZA FUNDIDA DE 576ML BERMACUNETAS DE 3000 PSI CON CONCRETO PREMEZCLADO .SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO 3000 PSI DE BERMACUNETAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.LA INTERVENTORIA REALIZA VERIFICACIÓN DE LA APERTURA DEL BUZÓN PQRS UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA OBRA, EL CUAL NO PRESENTA PETICIONES DE LA COMUNIDAD.SE REALIZAN CHARLAS AL EQUIPO DE TRABAJO SOBRE LIDERAZGO Y MOTIVACIÓN.SE REALIZA REUNIÓN DE SEGUIMIENTO CON LA VEEDURIA CIUDADANA, MIEMBROS DE LA COMUNIDAD, CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA, CON EL FIN DE DAR A CONOCER EL AVANCE DEL PROYECTO Y ACLARAR INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD.LA INTERVENTORIA REITERA SOLICITUD QUE SE INICIE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS BOXCULVERT 2X1 UBICADO EN LA ABSCSA K3+610 Y EL BOXCULVERT 2X1.5 UBICADO EN LA ABSCSA K3+920.LA INTERVENTORIA SOLICITA AUMENTAR EL RENDIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, CON EL FIN DE TERMINAR EL TRAMO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA SU EJECUCIÓN. DE IGUAL MANERA, SE REQUIERE SUBSANAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DEL TRAMO K0+084 A K3+540.EL PROCESO SANCIONATORIO CONTINÚA SU CURSO NORMAL Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA REANUDACIÓN DE AUDIENCIA. DE IGUAL MANERA, LA INTERVENTORIA SOLICITÓ AL MUNICIPIO INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES SST.IGUALMENTE, EN EL TRANSURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS:<ul style="list-style-type: none">CINGE-INV-5053-0421-24 Respuesta comunicado OFI-CONS-123-2024 (entrega informe periodo octubre de 2024).CINGE-INV-5053-0424-24 Respuesta a comunicado OFI-CONS-114-2024. PLANETA RICA, CÓRDOBA. SUBSANACION DISEÑO HIDRÁULICO.CINGE-INV-5053-0426-24 Incumplimiento a compromisos pactados comité de obra.									
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA									
<ul style="list-style-type: none">SE REALIZARÁ ACOPIO DE MATERIALES GRANULARES (AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR).SE REALIZARÁ SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO DESDE K2+100 HACIA MAYORES.SE REALIZARÁ SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DESDE LA ABSCSA K2+100 HACIA MAYORES.SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE LA ABSCSA K2+054 HACIA MAYORES - CARRIL IZQUIERDO.SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE LA ABSCSA K0+936 HACIA MAYORES - CARRIL DERECHO.EL CONTRATISTA DE OBRA SUBSANARÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL TRAMO COMPLETO Y DEMAS DOCUMENTOS INICIALES.									
X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS									
<div><div>Título del gráfico</div><table border="1"><thead><tr><th>Categoría</th><th>Valor</th></tr></thead><tbody><tr><td>Metas Físicas Programadas</td><td>\$12,500,000,000.00</td></tr><tr><td>Metas Físicas Ejecutadas</td><td>\$3,500,000,000.00</td></tr></tbody></table></div>				Categoría	Valor	Metas Físicas Programadas	\$12,500,000,000.00	Metas Físicas Ejecutadas	\$3,500,000,000.00
Categoría	Valor								
Metas Físicas Programadas	\$12,500,000,000.00								
Metas Físicas Ejecutadas	\$3,500,000,000.00								
El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.									

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
Construcción de pavimento rígido MR38 premezclado. Abscisa K0+260.	Construcción de pavimento rígido MR38 premezclado. Abscisa K0+470.	Construcción de Bermacunetas 3000 PSI premezclado. Abscisa K1+180.
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
1. Revisión y aprobación de documentos contractuales. 2. Realizar seguimiento a las actividades preliminares. 3. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos.		FIRMA NOMBRE: ANGELA MARÍA DAVILA MORALES Matrícula Profesional No.: 17200-153788 CID
<small>Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratación, Interventoría y Dirección Territorial.</small>		

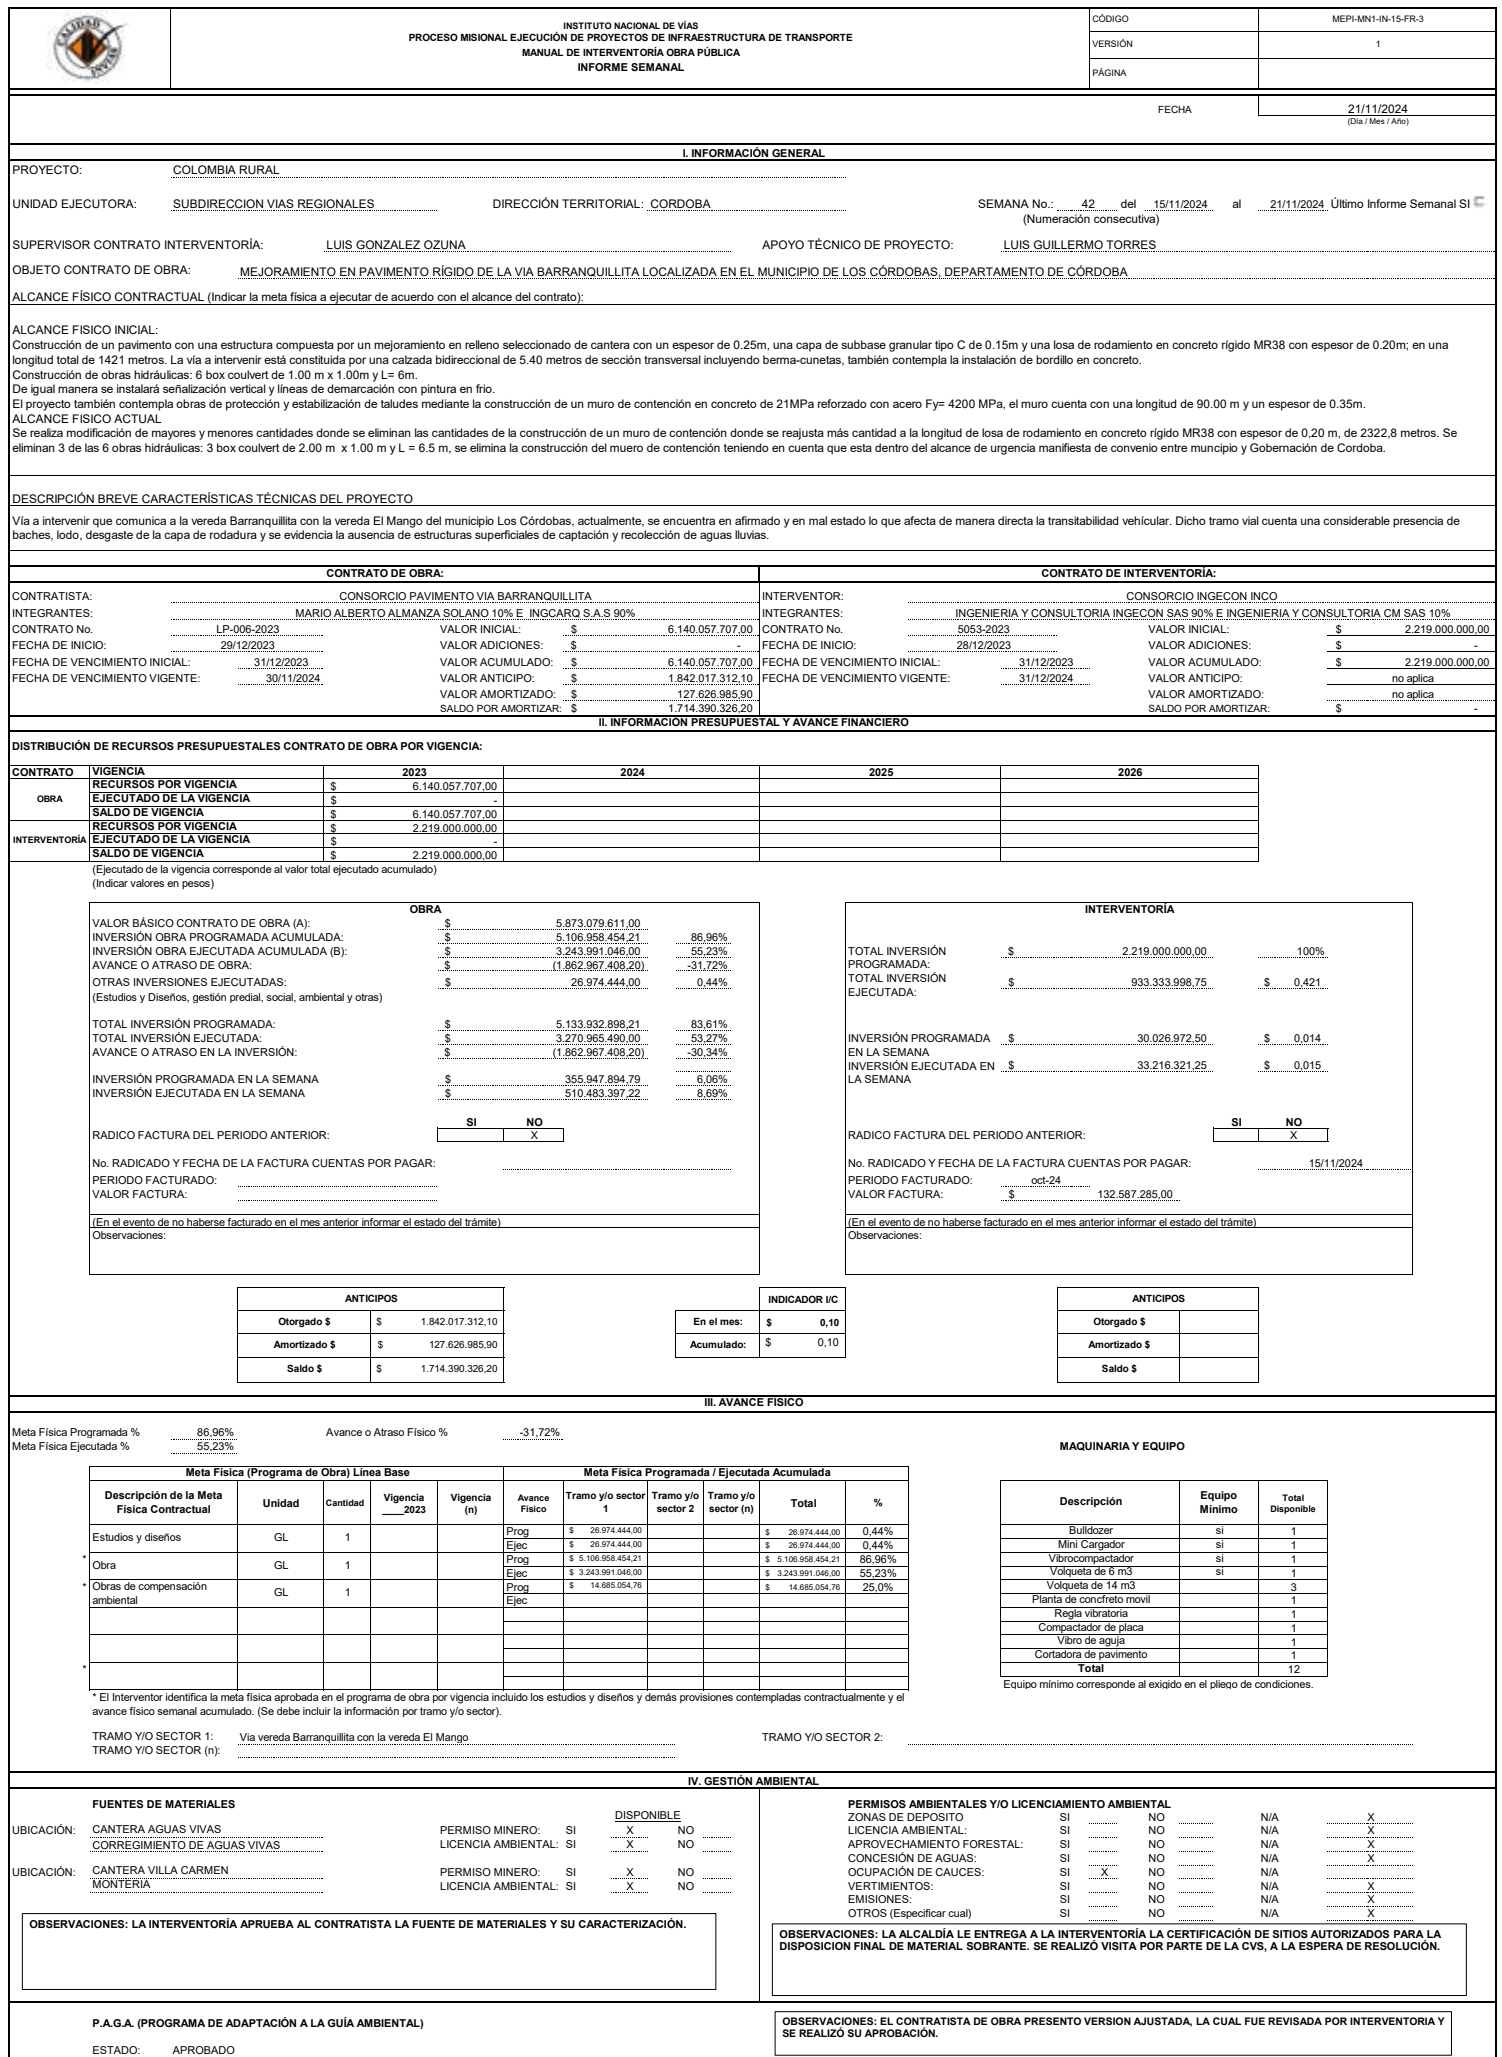

FECHA	21/11/2024 (Día / Mes / Año)
-------	---------------------------------

I. INFORMACIÓN GENERAL

PROYECTO:	COLOMBIA RURAL		
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CORDOBA
		SEMANA No.:	42 del 15/11/2024 al 21/11/2024. Último Informe Semanal SI
		(Numeración consecutiva)	
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORÍA:	LUIS GONZALEZ OZUNA	APOYO TÉCNICO DE PROYECTO:	LUIS GUILLERMO TORRES
OBJETO CONTRATO DE OBRA:	MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.		
ALCANCE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato):			

ALCANCE FÍSICO INICIAL:
Construcción de un pavimento con una estructura compuesta por un mejoramiento en relleno seleccionado de cantera con un espesor de 0.25m, una capa de subbase granular tipo C de 0.15m y una losa de rodamiento en concreto rígido MR38 con espesor de 0.20m; en una longitud total de 1421 metros. La vía a intervenir está constituida por una calzada bidireccional de 5.40 metros de sección transversal incluyendo bermas-cunetas, también contempla la instalación de bordillo en concreto.
Construcción de obras hidráulicas: 6 box coverted de 1.00 m x 1.00m y L= 6m.
De igual manera se instalará señalización vertical y líneas de demarcación con pintura en frío.
El proyecto también contempla obras de protección y estabilización de taludes mediante la construcción de un muro de contención en concreto de 21MPa reforzado con acero Fy= 4200 MPa, el muro cuenta con una longitud de 90.00 m y un espesor de 0.35m.

ALCANCE FÍSICO ACTUAL.
Se realiza modificación de mayores y menores cantidades donde se eliminan las cantidades de la construcción de un muro de contención donde se reajusta más cantidad a la longitud de losa de rodamiento en concreto rígido MR38 con espesor de 0.20 m, de 3232.8 metros. Se eliminan 3 de las 6 obras hidráulicas: 3 box coverted de 2.00 m x 1.00 m y L = 6.5 m, se elimina la construcción del muro de contención teniendo en cuenta que esta dentro del alcance de urgencia manifiesta de convenio entre municipio y Gobernación de Córdoba.

DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Via a intervenir que comunica a la vereda Barranquillita con la vereda El Mango del municipio Los Córdoba, actualmente, se encuentra en afirmado y en mal estado lo que afecta de manera directa la transitabilidad vehicular. Dicho tramo vial cuenta una considerable presencia de baches, lodo, desgaste de la capa de rodadura y se evidencia la ausencia de estructuras superficiales de captación y recolección de aguas lluvias.

CONTRATO DE OBRA:				CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA			INTERVENTOR:	CONSORCIO INGECON INCO		
INTEGRANTES:	MARIO ALBERTO ALMANZA SOLANO 10% E INGACRO S.A.S 90%			INTEGRANTES:	INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS 90% E INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS 10%		
CONTRATO No.	LP-006-2023	VALOR INICIAL:	\$ 6.140.057.707,00	CONTRATO No.	5053-2023	VALOR INICIAL:	\$ 2.219.000.000,00
FECHA DE INICIO:	29/12/2023	VALOR ADICIONES:	\$ -	FECHA DE INICIO:	28/12/2023	VALOR ADICIONES:	\$ -
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 6.140.057.707,00	FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023	VALOR ACUMULADO:	\$ 2.219.000.000,00
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	30/11/2024	VALOR ANTICIPO:	\$ 1.842.017.312,10	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE:	31/12/2024	VALOR ANTICIPO:	no aplica
		VALOR AMORTIZADO:	\$ 127.626.985,90			VALOR AMORTIZADO:	no aplica
		SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 1.714.390.326,20			SALDO POR AMORTIZAR:	\$ -

II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:

CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 6.140.057.707,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 6.140.057.707,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 2.219.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 2.219.000.000,00			

(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado)
(Indicar valores en pesos)

OBRA			
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A):	\$	5.873.079.611,00	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA:	\$	5.106.958.454,21	86,96%
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B):	\$	3.243.991.046,00	55,23%
AVANCE O ATRASO DE OBRA:	\$	(1.866.967.408,20)	-31,72%
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS:	\$	26.974.444,00	0,44%
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)			
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA:	\$	5.133.932.898,21	83,61%
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA:	\$	3.270.965.490,00	53,27%
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN:	\$	(1.862.967.408,20)	-30,34%
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA	\$	355.947.894,79	6,06%
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA	\$	510.483.397,22	8,69%

	SI	NO
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR:		X

No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR:
 PERIODO FACTURADO:
 VALOR FACTURA:

(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)
Observaciones:

ANTICIPOS		
Otorgado \$	\$	1.842.017.312,10
Amortizado \$	\$	127.626.985,90
Saldo \$	\$	1.714.390.326,20

INDICADOR I/C	
\$	0,10
\$	0,10

ANTICIPOS	
Otorgado \$	
Amortizado \$	
Saldo \$	

III. AVANCE FÍSICO

Meta Física Programada %	86,96%	Avance o Atraso Físico %	-31,72%
Meta Física Ejecutada %	55,23%		

[illegible]

* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).

TRAMO Y/O SECTOR 1: Via vereda Barranquillita con la vereda El Mango

TRAMO Y/O SECTOR 2:

IV. GESTIÓN AMBIENTAL

FUENTES DE MATERIALES UBICACIÓN: CANTERA AGUAS VIVAS PERMISO MINERO: SI X NO CORREGIMIENTO DE AGUAS VIVAS LICENCIA AMBIENTAL: SI X NO		PERMISOS AMBIENTALES Y/O LICENCIAMIENTO AMBIENTAL ZONAS DE DEPOSITO SI NO N/A X LICENCIA AMBIENTAL: SI NO N/A X APROVECHAMIENTO FORESTAL: SI NO N/A X CONCESIÓN DE AGUAS: SI NO N/A X OCUPACIÓN DE CAUCES: SI X NO N/A VERTIENTES: SI NO N/A X EMISIONES: SI NO N/A X OTROS (Especificar cual) SI NO N/A X	
OBSERVACIONES: LA INTERVENTORÍA APRUEBA AL CONTRATISTA LA FUENTE DE MATERIALES Y SU CARACTERIZACIÓN.		OBSERVACIONES: LA ALCALDÍA LE ENTREGA A LA INTERVENTORÍA LA CERTIFICACIÓN DE SITIOS AUTORIZADOS PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRANTE. SE REALIZÓ VISITA POR PARTE DE LA CVS, A LA ESPERA DE RESOLUCIÓN.	

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO: APROBADO

OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA DE OBRA PRESENTO VERSION AJUSTADA, LA CUAL FUE REVISADA POR INTERVENTORIA Y SE REALIZÓ SU APROBACIÓN.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	35	25
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	32	14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	3	11
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	7

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 60

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2

DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO DE OBRA

OBSERVACIONES: EL CAMPAMENTO DE OBRA UBICADO EN LA ABCSISA K1+080 SE UTILIZA COMO SEDE PARA SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO.

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A

AVALÚOS APROBADOS: N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A

OBSERVACIONES: PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE REQUERIRÁ LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS DADO QUE SE CUENTA CON UNA VÍA EXISTENTE CON UN ANCHO DISPONIBLE SUFICIENTE PARA ALBERGAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE DISEÑO.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

EL CONTRATISTA HA PRESENTADO LA GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD.INFORMES MENSUALES AMBIENTALES Y SOCIALES

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

EN EL TRANSCURSO DE LA ACTUAL SEMANA SE REALIZÓ LO SIGUIENTE:

• EL DÍA 19 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE REALIZÓ COMITÉ DE OBRA, DONDE ASISTIÓ LA SECRETARÍA DE PLANEACIÓN, EL CONTRATISTA Y LA INTERVENTORIA, CON EL FIN DE REALIZAR SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN DE LA OBRA Y COMPROMISOS PENDIENTES.

• DURANTE LA SEMANA SE PRESENTARON LLUVIAS EN LA ZONA LOS DÍAS 19 DE NOVIEMBRE DE 2024 (DESDE LAS 1:10 PM HASTA LAS 3:15 PM) Y EL DÍA 21 DE NOVIEMBRE DE 2024 (DESDE LAS 3:00 AM HASTA LAS 4:10 AM).

• SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DE LA ABCSISA K0+480 - K0+220

• SE VERIFICA CON TOPOGRAFÍA NIVELES DE LA VÍA Y ESPESORES DE CUNETAS Y DE LOSAS DE PAVIMENTO.

• SE REALIZA VERIFICACIÓN CON TOPOGRAFÍA POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA EL BOMBEO DE LA VÍA, NIVELACIÓN, ESPESORES .

• SE REALIZA COLOCACIÓN DE ACERO PARA LOSAS DE PAVIMENTO CARRIL DERECHO.

• SE REALIZA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLOS DE LA ABCSISA K2+135 - K2+036 LADO DERECHO Y DE LA ABCSISA K2+143 - K1+981 LADO IZQUIERDO.

• SE REALIZA FUNDICIÓN DE CONCRETO MR38 PARA PAVIMENTO RÍGIDO DE LA ABCSISA K1+142,5 - K0+970 Y K1+961 - K0+800,5 CARRIL DERECHO.

• SE REALIZA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO DE LOSAS DE PAVIMENTO, CUNETAS Y DE BORDILLOS.

• EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS:

CING-INV-5053-0422-24 ENSAYOS - 18/11/2024

CING-INV-5053-0423-24 INFORME - 19/11/2024

CING-INV-5053-0427-24 AVAL PRORROGA- 20/11/2024

CING-INV-5053-0425-24 INFORMES SST - 21/11/2024

• EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA SE RECIBIERON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS:

COBQ-081-2024 INFORME SST PERIODO OCTUBRE - 18/11/2024

COBQ 083-2024 INFORME FIDUCIA OCTUBRE - 18/11/2024

COBQ-084-24 ACCIONES CORRECTIVAS A FISURAS EN LOSAS 19/11/2024

CORREO 19/11/2024- AJUSTES AL PLAN DE CONTINGENCIA OCTUBRE

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

• SE AVANZARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA K2+036 A MENORES LADO DERECHO.

• SE AVANZARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA K1+981 A MENORES LADO DE IZQUIERDO.

• SE AVANZARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE LA K0+800,5 A MENORES LADO DERECHO.

• SE AVANZARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO CARRIL DERECHO DE K0+915 A MENORES.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

Título del gráfico

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Fundida de concreto MR38 pavimento carril derecho

Fundida de concreto para bordillos lado derecho y lado izquierdo

Fundida de concreto para cunetas lado derecho

Suministro, extensión y compactación de capa de subbase granular

Toma de muestras de concreto

Comité de Obra

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Realizar seguimiento a las actividades.

2. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos.

3. Duplicar rendimientos en las actividades de cunetas y losas de pavimento.

FIRMA

NOMBRE: ANGELA MARÍA DAVILA MORALES

Matrícula Profesional No.: 17202-153798/CLD

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:SE ENCUENTRA APROBADO DESDE EL 24/09/2024

OBSERVACIONES:

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	16	25
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		11
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:2

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:2

DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:CAMPAMENTO RIMINI

OBSERVACIONES:

- LOS INFORMES SOCIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO TIENEN OBSERVACIONES PENDIENTES POR PARTE DEL CONTRATISTA.
- EN LA URNA NO SE REGISTRA PQR.

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS:N/A

AVALÚOS APROBADOS:N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS:N/A

OBSERVACIONES:

LA ALCALDIA DIRECTAMENTE Y BAJO SU TUTELA Y GESTIÓN REALIZÓ LA ADQUISION PREDIAL. PARA ELLO SE REALIZÓ SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ENTRE EL 16 DE MARZO 2024 Y EL 13 DE MAYO 2024. A LA FECHA DEL REINICIO 14 DE MAYO 2024. LA ENTIDAD YA HABÍA GESTIONADO EL ÁREA PREDIAL REQUERIDA Y EL DESPLAZAMIENTO DE LAS CERCAS CON LOS PROPIETARIOS PARA LIBERAR LA ZONA REQUERIDA PARA EL PROYECTO.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

DURANTE EL PERIODO DE LA ACTUAL SEMANA SE REALIZÓ LO SIGUIENTE:

DURANTE LA SEMANA, SE LLEVARON A CABO DIVERSAS ACTIVIDADES EN EL PROYECTO BAJO LA SUPERVISIÓN DE INVIAS. LA COMISIÓN DE TOPOGRAFÍA REALIZÓ EL REPLANTEO Y CHEQUEO DE LA EXCAVACIÓN ENTRE LAS ABCISAS K0+480 A K0+555. SE COMPLETÓ LA EXCAVACIÓN Y CONFORMACIÓN PARA EL BORDILLO ENTRE LAS ABCISAS K0+360 A K0+260 POR LA MARGEN IZQUIERDA, ASÍ COMO LA EXCAVACIÓN Y NIVELACIÓN DE LA SUBRASANTE ENTRE K0+480 A K0+535, CONTINUANDO CON LA NIVELACIÓN MANUALMENTE DESDE K0+535 A K0+570. ADEMÁS, SE REALIZÓ LA CONFORMACIÓN DE LA CALZADA ENTRE LAS ABCISAS K0+460 A K0+550. EL CONTRATISTA TAMBIÉN LLEVÓ A CABO LA INSTALACIÓN DEL GEOTEXTIL Y LA EXTENDIDA DE PIEDRA RAJÓN EN EL TRAMO MENCIONADO. SE EJECUTÓ EL DESRAICE CORRESPONDIENTE AL APROVECHAMIENTO FORESTAL AUTORIZADO POR LA CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE LOS VALLES DEL SINÚ Y DEL SAN JORGE (CVS) Y SE REALIZÓ MANTENIMIENTO A LA VÍA ALTERNA. DURANTE ESTA SEMANA, SE REGISTRARON LLUVIAS MODERADAS EL 16 DE NOVIEMBRE Y FUERTES LOS DÍAS 18 Y 21 DE NOVIEMBRE, LO QUE AFECTÓ TEMPORALMENTE LAS OPERACIONES. EL CONTRATISTA GESTIONÓ ORDEN Y ASEO DE LOS RIELES, ASÍ COMO EL BOMBEO DEL AGUA EMPOZADA EN LA EXCAVACIÓN, UTILIZANDO MOTOBOMBA. FINALMENTE, SE REGISTRÓ LA LLEGADA AL PROYECTO DE 2 ROLLOS DE GEOTEXTIL NT, 3 VIAJES DE PIEDRA RAJÓN, Y 1 VIAJE DE AFIRMADO DE 15 M³ CADA UNO, PROVENIENTES DE LA CANTERA EL ESFUERZO. SE RECIBIO DE PARTE DE LA CVS PERMISO DE OCUPACIÓN DE CAUCE PARA EL BOX COULVERT. SE REALIZO COMITE EN LA ALCALDIA CON PARTICIPACION DE CONTRATISTA, INTERVENTORIA Y ENTIDAD CONTRATANTE DE OBRA.

IGUALMENTE, EN EL TRANSURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS:

- CING-INV-5053-0431-24 COMUNICADOS 088-24 Y 095-24 PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCE Y APROVECHAMIENTO FORESTAL.
- CING-INV-5053-0428-24 COMUNICADOS 090-2024, 091-2024 Y 092-2024 – INFORMES SST Y AMBIENTAL PERIODO DE FEBRERO, MARZO, MAYO, JUNIO, JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE 2024.
- CING-INV-5053-0428-24 SOLICITUD DE RESPUESTA A COMUNICACIONES PENDIENTES.
- CING-INV-5053-0430-24 RESPUESTA AL COMUNICADO 089-2024 RESULTADO DENSIDADES EN SUBBASE GRANULAR.

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- EXCAVACIÓN, CONFORMACIÓN Y VACIADO DE BORDILLOS K0+360 A K0+260
- CONTINUAR CON LA NIVELACIÓN DE LA SUBRASANTE K0+555 A K0+680.
- INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL, PIEDRA RAJÓN, MATERIAL DE SELLO ENTRE LAS ABCISAS K0+555 AL K0+680.
- CORTE Y FIGURACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA EL BOX COULVERT.
- MANTENIMIENTO DE LA VÍA ALTERNA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DEL PROYECTO

Categoría	Valor (Millones de \$)
METAS FÍSICAS PROGRAMADAS	1600
METAS FÍSICAS EJECUTADAS	1200

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Instalación de material de sello k0+535

Panoramica pavimento rígido k0+130

Avance de la excavación k0+555

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Revisión y aprobación de documentos contractuales.

2. Realizar seguimiento a las actividades preliminares.

3. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos.

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

FIRMA

NOMBRE:ANGELA MARIA DAVILA MORALES

Matricula Profesional No.:17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME SEMANAL	CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA	MEPRM-1-10-19-3 1 1		
		FECHA	28/11/2024 (Día / Mes / Año)		
I. INFORMACIÓN GENERAL					
PROYECTO: COLOMBIA RURAL					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA			
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA: LUIS GONZALEZ OZUNA		GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO: LUIS GUILLERMO TORRES			
OBJETO CONTRATO DE OBRA: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA					
ALCANJE FÍSICO CONTRACTUAL (Indicar la meta física a ejecutar de acuerdo con el alcance del contrato) Construcción de un pavimento en concreto rígido con una longitud total de 4 980 metros, un ancho de calzada de 5 metros con una resistencia MR 38, instalación de bordillo en concreto. Construcción de obras hidráulicas: 10 box culvert de 1x1 L= 8m, y también construcción de 6 box culvert de 2x2 L=8m. También se instalará señalización vertical y demarcación de pintura en frío.					
DESCRIPCIÓN BREVE CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO Mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica – Providencia el cual tiene por objeto el mejoramiento de la vía que conduce de la Granjita hasta el corregimiento de Providencia, La vía rural se encuentra en mal estado para la transitabilidad vehicular, con presencia de baches, lodo y desgaste de la capa de rodadura.					
CONTRATO DE OBRA:		CONTRATO DE INTERVENTORIA:			
CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS 5%, BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S. 85% y KAP		INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON INCO			
INTEGRANTES: CONSTRUCCIONES S.A.S. 10% CONTRATO No. 2053-2023 FECHA DE INICIO: 28/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 20/12/2024		INTEGRANTES: INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON SAS, 90% E INGENIERIA Y CONSULTORIA CM SAS, 10% CONTRATO No. 2053-2023 FECHA DE INICIO: 28/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/12/2024			
VALOR INICIAL: \$ 14.100.000.000,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 14.100.000.000,00 VALOR ANTICIPO: \$ 4.355.000.130,55 VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ 4.355.000.130,55		VALOR INICIAL: \$ 2.219.000.000,00 VALOR ADICIONES: \$ - VALOR ACUMULADO: \$ 2.219.000.000,00 VALOR ANTICIPO: \$ - VALOR AMORTIZADO: \$ - SALDO POR AMORTIZAR: \$ -			
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTAL Y AVANCE FINANCIERO					
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS PRESUPUESTALES CONTRATO DE OBRA POR VIGENCIA:					
CONTRATO	VIGENCIA	2023	2024	2025	2026
OBRA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 14.100.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 14.100.000.000,00			
INTERVENTORIA	RECURSOS POR VIGENCIA	\$ 2.219.000.000,00			
	EJECUTADO DE LA VIGENCIA	\$ -			
	SALDO DE VIGENCIA	\$ 2.219.000.000,00			
(Ejecutado de la vigencia corresponde al valor total ejecutado acumulado) (Indicar valores en pesos)					
OBRA			INTERVENTORIA		
VALOR BÁSICO CONTRATO DE OBRA (A): \$ 13.218.339.697,00			TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 2.219.000.000,00 100%		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 12.972.903.604,89 98,14%			TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 966.552.320,00 \$ 0,436		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 4.288.933.577,00 32,45%			INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 30.026.972,50 \$ 0,014		
AVANCE O ATRASO DE OBRA: \$ (9.663.970.027,89) -65,70%			INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 33.216.321,25 \$ 0,015		
OTRAS INVERSIONES EJECUTADAS: \$ 80.003.700,00 0,57%					
(Estudios y Diseños, gestión predial, social, ambiental y otras)					
TOTAL INVERSIÓN PROGRAMADA: \$ 13.052.907.304,89 92,57%					
TOTAL INVERSIÓN EJECUTADA: \$ 4.368.937.277,00 30,99%					
AVANCE O ATRASO EN LA INVERSIÓN: \$ (8.683.970.027,89) -61,59%					
INVERSIÓN PROGRAMADA EN LA SEMANA \$ 408.824.491,20 3,09%					
INVERSIÓN EJECUTADA EN LA SEMANA \$ 732.118.729,00 5,54%					
SI NO			SI NO		
RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X			RADICO FACTURA DEL PERIODO ANTERIOR: X		
No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: NO APLICA			No. RADICADO Y FECHA DE LA FACTURA CUENTAS POR PAGAR: 15/11/2024		
PERIODO FACTURADO: PERIODO FACTURADO: 003-24			PERIODO FACTURADO: 003-24		
VALOR FACTURA: \$ -			VALOR FACTURA: \$ 132.567.295,00		
(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)			(En el evento de no haberse facturado en el mes anterior informar el estado del trámite)		
Observaciones: EL CONTRATISTA ESTÁ AVANZANDO CON ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EJECUCIÓN DE OBRA Y CONTINUA SUBSANANDO DOCUMENTOS INICIALES.			Observaciones: EL INTERVENTOR SE ENCUENTRA REALIZANDO SEGUIMIENTO Y SUPERVISIÓN A LAS ACTIVIDADES QUE SE ENCUENTRAN EJECUTANDO EN OBRA, DE IGUAL MANERA REVISIÓN DE LA DOCUMENTACIÓN.		
ANTICIPOS			INDICADOR IC		
Otorgado \$ 5.287.335.878,80			En el mes: \$ 12,08		
Amortizado \$ -			Acumulado: \$ 12,08		
Saldo \$ 5.287.335.878,80					
			ANTICIPOS		
			Otorgado \$		
			Amortizado \$		
			Saldo \$		
III. AVANCE FÍSICO					
Meta Física Programada % 98,14% Avance o Atraso Físico % -65,70%					
Meta Física Ejecutada % 32,45%					
MAQUINARIA Y EQUIPO					
Meta Física (Programa de Obra) Línea Base					
Meta Física Programada / Ejecutada Acumulada					
Descripción de la Meta Física Contractual	Unidad	Cantidad	Vigencia 2023	Vigencia (n)	Avance Físico
Estudios y diseños	GL	1			Prog \$ 80.003.700,00 0,57%
					Ejec \$ 80.003.700,00 0,57%
Obra	GL	1			Prog \$ 13.218.339.697,00 98,14%
					Ejec \$ 4.288.933.577,00 32,45%
Obras de compensación ambiental y PAGA	GL	1			Prog \$ 169.033.596,00 25,00%
					Ejec \$ 169.033.596,00 25,00%
Programa de Manejo de Tránsito	GL	1			Prog \$ 132.163.321,25
					Ejec \$ 132.163.321,25
* El Interventor identifica la meta física aprobada en el programa de obra por vigencia incluido los estudios y diseños y demás provisiones contempladas contractualmente y el avance físico semanal acumulado. (Se debe incluir la información por tramo y/o sector).					
TRAMO Y/O SECTOR 1: Vía Planeta Rica - Providencia					
TRAMO Y/O SECTOR 2:					
IV. GESTIÓN AMBIENTAL					
FUENTES DE MATERIALES					
DISPONIBLE					
UBICACIÓN:	CANTERA JOMEVE	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	CIENAGA DE ORO	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
UBICACIÓN:	CANTERA SIBERIA	PERMISO MINERO:	SI	X	NO
	VIA A MONTERIA	LICENCIA AMBIENTAL:	SI	X	NO
OBSERVACIONES: LA INTERVENTORIA REALIZÓ APROBACIÓN DE LAS CANTERAS PARA SUMINISTRO DE MATERIAL GRANULAR.					
OBSERVACIONES: LA ALCALDIA SUMINISTRÓ LINEAMIENTOS Y SITIO AUTORIZADO PARA LA DISPOSICIÓN FINAL DE MATERIAL SOBRIANTE. SE ENVÍO EL 12-11-2024, LA SOLICITUD DE OCUPACIÓN DE CAUCE A LA CVS					
P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)					
ESTADO: APROBADO					
OBSERVACIONES: EL CONTRATISTA PRESENTÓ LAS SUBSANACIONES CORRESPONDIENTES AL PAGA V3, LA CUAL SE REVISÓ Y SE APROBÓ POR PARTE DE LA INTERVENTORIA. SIN EMBARGO, FUE OBSERVADA POR LE INVÍAS, Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA SUBSANACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA.					

V. GESTIÓN SOCIAL			
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	OBRA	INTER	No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 1 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO DE OBRA
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	18	25	
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:	6	11	
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	7	
TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 43			
VI. GESTIÓN PREDIAL			
TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:	N/A		OBSERVACIONES: PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE REQUERIRÁ LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS, DADO QUE SE CUENTA CON UNA VÍA EXISTENTE, CON UN ANCHO DISPONIBLE SUFICIENTE PARA ALBERGAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE DISEÑO.
FICHAS PREDIALES APROBADAS:	N/A		
PREDIOS ADQUIRIDOS:	N/A		
VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD			
EL CONTRATISTA NO HA PRESENTADO LA GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD.			
VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS			
<p>LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE LA PRESENTE SEMANA SON:</p> <ul style="list-style-type: none">• ESTADO DEL TIEMPO:- EL DIA 22 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 6:00 P.M. A 7:00 P.M.- EL DIA 23 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 5:00 P.M. A 8:00 P.M.- EL DIA 24 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 1:00 A.M. A 3:00 A.M.- EL DIA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 SE PRESENTARON LLUVIAS A PARTIR DE 1:00 P.M. A 3:00 P.M.• SE REALIZA COMITE DE OBRA CON PARTICIPACIÓN DEL CONTRATISTA DE OBRA E INTERVENTORIA, CON EL FIN DE HACER SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA Y AL CUMPLIMIENTO DE LOS COMPROMISOS PACTADOS.• SE MANTIENE INSTALACIÓN DE SEÑALES PREVENTIVAS EN EL CORREDOR VIAL, ENTRE LAS ABCISAS K0+084 HASTA A K3+540.• SE UTILIZAN PALETEROS PARA CONTROLAR EL TRÁFICO DE LOS VEHICULOS QUE TRANSITAN POR LOS TRAMOS EN INTERVENCIÓN.• SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (AFIRMADO), PROVENIENTE DE LA CANTERA JOMEVE EN CIENAGA DE ORO.• SE REALIZA ACOPIO DE MATERIAL GRANULAR (SUBBASE GRANULAR), PROVENIENTE DE LA CANTERA SIBERIA.• SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO DESDE LA ABCISA K2+300 HASTA LA K3+000.• SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DESDE LA ABCISA K2+100 A K2+300.• SE REALIZA TOMA DE DENSIDADES IN SITU PARA VERIFICAR COMPACTACIÓN DE TERRENO.• LA INTERVENTORIA REALIZA CHEQUEO TOPOGRÁFICO PARA VERIFICAR NIVELES Y VOLUMENES DE SUBBASE GRANULAR.• PARA LA INTERVENCIÓN Y CONSTRUCCIÓN DEL PAVIMENTO RIGIDO MR38 SE REALIZAN LAS SIGUIENTES ACTIVIDADES:<ul style="list-style-type: none">SE REALIZA COLOCACIÓN DE RIELES DESDE LA ABCISA K0+936 HASTA LA K1+733.2 (CARRIL DERECHO) Y DESDE K2+054 A K2+204 (CARRIL IZQUIERDO).SE REALIZA CHEQUEO Y VERIFICACIÓN DE RIELES PARA GARANTIZAR BOMBEO TRANSVERSAL Y LONGITUDINAL DEL PAVIMENTO RIGIDO A CONSTRUIR.SE REALIZA REPLANTEO PARA RESPETAR LA MODULACIÓN DE LAS LOSAS Y SE LOCALIZA CON TOPOGRAFIA LAS JUNTAS EN LOS TRAMOS CURVOS PARA GARANTIZAR LA DEFLEXIÓN.SE VERIFICAN ANCHO Y ESPESORES PARA EL PAVIMENTO RIGIDO A CONSTRUIR A LO LARGO DEL TRAMO DESDE LA ABCISA K0+936 HASTA LA K1+733.2 (CARRIL DERECHO) Y DESDE K2+054 A K2+204 (CARRIL IZQUIERDO).SE VERIFICA DIMENSIONES DE LAS CANASTILLAS GARANTIZANDO ANCHO PARA DOVELAS CON LONGITUD DE 35CM, SEPARACIÓN CENTRO A CENTRO DE 30 CM Y ALTURA DE UBICACIÓN DE DOVELA DE 9CM.SE VERIFICAN DOVELAS DE 1" CON UNA LONGITUD DE 35CM.SE VERIFICA ACERO LONGITUDINAL DE 1/2" CON UNA LONGITUD DE 85CM ESPACIADOS CADA 1.2CM.SE REALIZA FUNDIDA DE PAVIMENTO RIGIDO MR-38 PREMEZCLADO, DESDE LA ABCISA K0+936 HASTA LA K1+733.2 (CARRIL DERECHO) Y DESDE K2+054 A K2+204 (CARRIL IZQUIERDO).SE REALIZA PRUEBA SLUMP EN OBRA PARA VERIFICAR ASENTAMIENTO DEL CONCRETO.SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO (VIGUETAS) PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.SE REALIZA VIBRADO DEL CONCRETO A LO LARGO DE LOS TRAMOS FUNDIDOS.SE REALIZA TEXTURIZADO Y ACABADO FINAL DE LAS LOSAS DE CONCRETO.SE APLICÓ ANTISOL A LO LARGO DEL TRAMO DE PAVIMENTO RIGIDO CONSTRUIDO.SE REALIZA CORTE CADA 3M EN LAS JUNTAS DE DILATACIÓN DEL TRAMO DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 CONSTRUIDO.SE REALIZA LIMPIEZA Y SELLO DE LA JUNTA DE DILATACIÓN DEL PAVIMENTO CONSTRUIDO.• SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR PARA 390 92ML DE BERMACUNETAS E INSTALACIÓN DE ACERO DE REFUERZO.• SE REALIZA FUNDIDA DE 390.92ML BERMACUNETAS DE 3000 PSI CON CONCRETO PREMEZCLADO.• SE TOMAN MUESTRAS DE CONCRETO 3000 PSI DE BERMACUNETAS PARA ENSAYOS DE RESISTENCIA.• LA INTERVENTORIA REALIZA VERIFICACIÓN DE LA APERTURA DEL BUZÓN PQRS UBICADO EN EL CAMPAMENTO DE LA OBRA, EL CUAL NO PRESENTA PETICIONES DE LA COMUNIDAD.• LA INTERVENTORIA REITERA SOLICITUD QUE SE INICIE LAS ACTIVIDADES DE CONSTRUCCIÓN DE LOS BOXCULVERT 2X1 UBICADO EN LA ABCISA K3+610 Y EL BOXCULVERT 2X1.5 UBICADO EN LA ABCISA K3+920.• LA INTERVENTORIA SOLICITA AUMENTAR EL RENDIMIENTO EN EL DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES, CON EL FIN DE TERMINAR EL TRAMO EN EL TIEMPO ESTABLECIDO PARA SU EJECUCIÓN. DE IGUAL MANERA, SE REQUIERE SUBSANAR EL CUMPLIMIENTO EN EL PLAN DE CONTINGENCIA DEL TRAMO K0+084 A K3+540.• EL PROCESO SANCIONATORIO CONTINÚA SU CURSO NORMAL Y SE ESTÁ A LA ESPERA DE LA REANUDACIÓN DE AUDIENCIA. DE IGUAL MANERA, LA INTERVENTORIA SOLICITÓ AL MUNICIPIO INICIAR UN PROCESO SANCIONATORIO DE MULTA POR INCUMPLIMIENTO EN LAS OBLIGACIONES SST.• IGUALMENTE, EN EL TRANSCURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS:<ul style="list-style-type: none">- CINGE-INV-5053-0434-24 Remisión comunicados del INVIAS 2024S-VBOG-087127 - 2024S-VBOG-087125 - Revisión PAGA e informes de estado ambiental.- CINGE-INV-5053-0437-24 Respuesta a comunicado OFI-CONS-124-2024. Geotecnia muro.- CINGE-INV-5053-0438-24 Respuesta a comunicado OFI-CONS-125-2024. Subsanación informe ambiental julio y agosto 2024.- CINGE-INV-5053-0441-24 Respuesta a comunicado OFI-CONS-117-2024. Diseño estructural.- CINGE-INV-5053-0442-24 Respuesta a comunicado OFI-CONS-106-2024. Diseño estructural.			
IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA			
<ul style="list-style-type: none">• SE REALIZARÁ ACOPIO DE MATERIALES GRANULARES (AFIRMADO Y SUBBASE GRANULAR).• SE REALIZARÁ SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE AFIRMADO DESDE K3+000 HACIA MAYORES.• SE REALIZARÁ SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DESDE LA ABCISA K2+300 HACIA MAYORES.• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE LA ABCISA K2+204 HACIA MAYORES - CARRIL IZQUIERDO.• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE LA ABCISA K1+733.2 HACIA MAYORES - CARRIL DERECHO.• SE AVANZARÁ CON LA ACTIVIDAD DE CONSTRUCCIÓN DE BERMACUNETAS - LADO IZQUIERDO.• EL CONTRATISTA DE OBRA SUBSANARÁ LA INFORMACIÓN REQUERIDA CON EL FIN DE GARANTIZAR LA APROBACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS DEL TRAMO COMPLETO Y DEMAS DOCUMENTOS INICIALES.			
X. ESQUEMA GRAFICO AVANCE METAS FISICAS PROGRAMADAS VS METAS FISICAS EJECUTADAS			
<p>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta fisica programada vs meta fisica ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPJ-MN1-IN-15 del Manual de Interventoria.</p>			

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO		
		
Construcción de pavimento rígido MR38 premezclado. Abcisa K1+390.	Construcción de pavimento rígido MR38 premezclado. Abcisa K1+550.	Construcción de Bermacunetas 3000 PSI premezclado. Abcisa K1+730.
XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA		DIRECTOR DE INTERVENTORIA
1. Revisión y aprobación de documentos contractuales. 2. Realizar seguimiento a las actividades preliminares. 3. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos.		FIRMA _____ NOMBRE: ANGELA MARIA DAVILA MORALES Matrícula Profesional No.: 17200-153788 CLD
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial.		

<div><div></div><div></div><div></div></div>			<div>V. GESTIÓN SOCIAL</div> <div>No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS: 2 No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS: 2 DIRECCIÓN SEDE SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO: CAMPAMENTO DE OBRA</div>		<div>OBSERVACIONES: EL CAMPAMENTO DE OBRA UBICADO EN LA ABCISA K1+080 SE UTILIZA COMO SEDE PARA SERVICIO DE ATENCIÓN AL USUARIO. SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN DEL 50% DE EJECUCIÓN Y COMITE DE VEEDURÍA.</div>			
<div>TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 35 25 EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS: 32 14 EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 3 11 EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA: 4 7</div>			<div>TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO: 60</div>					
<div>VI. GESTIÓN PREDIAL</div> <div>TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR: N/A FICHAS PREDIALES APROBADAS: N/A AVALÚOS APROBADOS: N/A PREDIOS ADQUIRIDOS: N/A</div> <div>OBSERVACIONES: PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO NO SE REQUERIRA LA ADQUISICIÓN DE PREDIOS DADO QUE SE CUENTA CON UNA VIA EXISTENTE CON UN ANCHO DISPONIBLE SUFICIENTE PARA ALBERGAR LA SECCIÓN TRANSVERSAL DE DISEÑO.</div>								
<div>VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD</div> <div>EL CONTRATISTA HA PRESENTADO LA GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD INFORMES MENSUALES AMBIENTALES Y SOCIALES</div>								
<div>VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS</div> <div>EN EL TRANSURSO DE LA ACTUAL SEMANA SE REALIZÓ LO SIGUIENTE: • EL DIA 27 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE REALIZÓ SOCIALIZACIÓN DEL 50% DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO, DONDE ASISTIÓ EL SUPERVISOR DE INVIAS Y APOYO A LA SUPERVISIÓN DE INVIAS, EL ALCALDE MUNICIPAL, LA SECRETARIA DE PLANEACIÓN, EL ASESOR DE PLANEACIÓN, EL CONTRATISTA, LA INTERVENTORIA Y LA COMUNIDAD DE LA ZONA DEL PROYECTO CON EL FIN DE INFORMAR EL AVANCE DE LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA OBRA. IGUALMENTE SE REALIZÓ COMITE DE VEEDURÍA. • DURANTE LA SEMANA SE PRESENTARON LLUVIAS EN LA ZONA EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE DE 2024 (DESDE LAS 11:00 PM HASTA LAS 3:00 A.M.). • SE REALIZA SUMINISTRO, EXTENSIÓN Y COMPACTACIÓN DE SUBBASE GRANULAR DE LA ABCISA K0+220 - K0+030. • SE VERIFICA CON TOPOGRAFIA NIVELES DE LA VIA Y ESPESORES DE CUNETAS Y DE LOSAS DE PAVIMENTO. • SE REALIZA CHEQUEO TOPOGRAFICO POR PARTE DE LA INTERVENTORIA EL BOMBEO DE LA VIA, NIVELACIÓN Y ESPESORES . • SE REALIZA COLOCACIÓN DE ACERO PARA LOSAS DE PAVIMENTO Y CUNETAS CARRIL DERECHO. • SE REALIZA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA BORDILLOS DE LA ABCISA K2+036 - K1+927 LADO DERECHO Y DE LA ABCISA K1+981 - K1+872 LADO IZQUIERDO. • SE REALIZA FUNDICIÓN DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA CUNETAS DE LA ABCISA K0+800.5 - K0+630 Y DE LA ABCISA K0+972 - K0+960 LADO DERECHO • SE REALIZA FUNDICIÓN DE CONCRETO MR38 PARA PAVIMENTO RIGIDO DE LA ABCISA K0+970 - K0+734 CARRIL DERECHO. • SE REALIZA TOMA DE MUESTRAS DE CONCRETO DE LOSAS DE PAVIMENTO , CUNETAS Y DE BORDILLOS. • EN EL TRANSURSO DE LA SEMANA SE RECIBIÓ POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS: COBQ 085-204 AJUSTES INFORME SST AGOSTO Y OCTUBRE - 25/11/2024</div>								
<div>IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA</div> <div>• SE AVANZARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA K1+927 A MENORES LADO DERECHO. • SE AVANZARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE BORDILLOS DE LA K1+872 A MENORES LADO DE IZQUIERDO. • SE AVANZARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE CUNETAS DE LA K0+630 A MENORES LADO DERECHO. • SE AVANZARÁ CON LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RIGIDO CARRIL DERECHO DE K0+734 A MENORES.</div>								
<div>X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS</div> <div><div>Título del gráfico</div><table><tr><td>METAS FÍSICAS PROGRAMADAS</td><td>METAS FÍSICAS EJECUTADAS</td></tr></table></div> <div>El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.</div>							METAS FÍSICAS PROGRAMADAS	METAS FÍSICAS EJECUTADAS
METAS FÍSICAS PROGRAMADAS	METAS FÍSICAS EJECUTADAS							
<div>XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO</div> <div><div><p>Fundida de concreto MR38 pavimento carril derecho</p></div><div><p>Fundida de concreto para bordillos lado derecho y lado izquierdo</p></div><div><p>Fundida de concreto para cunetas lado derecho</p></div><div><p>Suministro, extensión y compactación de capa de subbase granular</p></div><div><p>Chequeo de capa de subbase granular</p></div><div><p>Socialización del 50% y comité de veeduría</p></div></div>								
<div>XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORIA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA</div> <div>1. Realizar seguimiento a las actividades. 2. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos. 3. Duplicar rendimientos en las actividades de cunetas y losas de pavimento.</div>					<div>DIRECTOR DE INTERVENTORIA</div> <div><p>FIRMA NOMBRE: ANGELA MARIA DAVILA MORALES Matricula Profesional No.: 17202-153798 CUD</p></div>			

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copiar: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contraloría, Interventoría y Dirección Territorial

P.A.G.A. (PROGRAMA DE ADAPTACIÓN A LA GUÍA AMBIENTAL)

ESTADO:SE ENCUESTRA APROBADO DESDE EL 24/09/2024

OBSERVACIONES: SE PRESENTARON OBSERVACIONES AL PAGA POR PARTE DE LA DIRECCION DE SOSTENIBILIDAD, EL CONTRATISTA AUN NO LAS HA SUBSANADO.

	OBRA	INTER
TOTAL EMPLEOS GENERADOS:	16	25
EMPLEOS DIRECTOS GENERADOS:	12	14
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS:		11
EMPLEOS EN LA ZONA DE INFLUENCIA:	4	

TOTAL EMPLEOS DEL PROYECTO:41

No. DE SOCIALIZACIONES REALIZADAS:3

No. DE CAPACITACIONES REALIZADAS:2

DIRECCION SEDE SERVICIO DE ATENCION AL USUARIO:CAMPAMENTO RIMINI

OBSERVACIONES:

- LOS INFORMES SOCIALES CORRESPONDIENTE A LOS MESES JULIO Y AGOSTO Y SEPTIEMBRE SON APROBADOS POR LA INTERVENTORIA.
- EN LA URNA NO SE REGISTRA POR.
- SE REALIZA COMITÉ DE LA VEDURÍA 28/11/2024.
- SE REALIZÓ LA SOCIALIZACIÓN CON LA COMUNIDAD DE RIMINI LA SUPERACIÓN DEL 50% DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO 28/11/2024.

TOTAL ESTIMADO PREDIOS A ADQUIRIR:N/A

FICHAS PREDIALES APROBADAS:N/A

AVALÚOS APROBADOS:N/A

PREDIOS ADQUIRIDOS:N/A

OBSERVACIONES: LA ALCALDIA DIRECTAMENTE Y BAJO SU TUTELA Y GESTIÓN REALIZÓ LA ADQUISICION PREDIAL. PARA ELLO SE REALIZO SUSPENSIÓN DEL CONTRATO ENTRE EL 16 DE MARZO 2024 Y EL 13 DE MAYO 2024. A LA FECHA DEL REINICIO 14 DE MAYO 2024. LA ENTIDAD YA HABÍA GESTIONADO EL ÁREA PREDIAL REQUERIDA Y EL DESPLAZAMIENTO DE LAS CERCAS CON LOS PROPIETARIOS PARA LIBERAR LA ZONA REQUERIDA PARA EL PROYECTO.

VII. GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD

VIII. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA Y ACUMULADAS

DURANTE EL PERIODO DE LA ACTUAL SEMANA SE REALIZÓ LO SIGUIENTE:

DURANTE LA SEMANA DEL 22 AL 28 DE NOVIEMBRE DE 2024, SE COMPLETÓ LA EXCAVACIÓN DE LA VÍA HASTA LA ABCISCA K0+535. POSTERIORMENTE, SE REALIZÓ LA LIMPIEZA DE LA SUBRASANTE DE MANERA MECÁNICA Y MANUAL ENTRE LAS ABCISCAS K0+535 Y K0+650, SEGUIDA DE LA INSTALACIÓN DEL GEOTEXTIL NT EN EL TRAMO K0+555 A K0+610. LA INSTALACIÓN DE PIEDRA RAJÓN CONTINUÓ ENTRE LAS ABCISCAS K0+550 Y K0+605, MIENTRAS QUE EL MATERIAL DE SELLO SE ENCUESTRA HASTA LA ABCSISA K0+520. ADEMÁS, SE REGISTRÓ LA LLEGADA DEL ACERO DE REFUERZO Y DE LA FORMALETA NECESARIA PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL BORDILLO. DEBIDO A LAS AFECTACIONES POR LLUVIAS, SE LLEVÓ A CABO UN LLENO Y CONFORMACIÓN ENTRE LAS ABCISCAS K0+360 Y K0+320. EN CUANTO AL SUMINISTRO DE MATERIALES, SE DOCUMENTARON TRES (3) VIAJES DE AFIRMADO DE 15 M³ CADA UNO PROVENIENTES DE LA CANTERA EL ESFUERZO, ASÍ COMO DOS (2) VIAJES DE PIEDRA RAJÓN DE 15 M³ DESDE LA CANTERA AGUAS VIVAS. TAMBIÉN SE REALIZARON ACTIVIDADES DE EXCAVACIÓN, CONFORMACIÓN, FIGURADO DEL ACERO DE REFUERZO, ENCOFRADO Y VACIADO DEL BORDILLO DEL LADO IZQUIERDO DE LA VÍA ENTRE LAS ABCISCAS K0+360 Y K0+280. DURANTE ESTA SEMANA, SE REGISTRARON LLUVIAS MODERADAS LOS DÍAS 24 Y 27 DE NOVIEMBRE, LO QUE AFECTÓ TEMPORALMENTE ALGUNAS ACTIVIDADES. FINALMENTE, SE LLEVÓ A CABO EL MANTENIMIENTO DE LA VÍA ALTERNA UTILIZADA POR LA COMUNIDAD Y LOS EQUIPOS DEL PROYECTO, ASEGURANDO ASÍ LA CONTINUIDAD DEL TRÁNSITO EN LA ZONA.

ADEMÁS SE REGISTRA CIERRE DEL PUENTE DE LA DOCTRINA POR MANTENIMIENTO DEL MISMO EL DÍA 28 DE NOVIEMBRE, POR LO ANTERIOR NO SE PROGRAMÓ INGRESO DE MATERIAL PROVENIENTE DE LA CANTERA EL ESFUERZO.

IGUALMENTE, EN EL TRANSURSO DE LA SEMANA SE ENVIARON POR CORREO ELECTRÓNICO LOS SIGUIENTES COMUNICADOS:

- CING-INV-5053-0435-24 REMISIÓN COMUNICADOS INVIAS 2024S-VBOG-087128 Y 2024S-VBOG-087125 – PAGA E INFORMES DE ESTADO AMBIENTAL.
- CING-INV-5053-0436-24 RESPUESTA A OFICIO 075. BOX COULVERT.
- CING-INV-5053-0439-24 SOLICITUD DE PROCEDIMIENTO PARA LA REPARACIÓN DE FISURAS EN EL TRAMO K0+000 A K0+360.
- CINGE-INV-5053-0440-24 RESPUESTA COMUNICADO NO. 094-2024 (SUBSANACIÓN DE INFORMES SOCIALES).

IX. ACTIVIDADES A REALIZAR EN LA SIGUIENTE SEMANA

- CONTINUAR CON LA EXCAVACIÓN, CONFORMACIÓN Y VACIADO DE BORDILLOS.
- CONTINUAR CON LA NIVELACIÓN DE LA SUBRASANTE K0+555 A K0+680.
- CONTINUAR CON LA INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL, PIEDRA RAJÓN, MATERIAL DE SELLO ENTRE LAS ABCISCAS K0+555 AL K0+680.
- CORTE Y FIGURACIÓN ACERO DE REFUERZO PARA EL BORDILLO.
- MANTENIMIENTO DE LA VÍA ALTERNA.

X. ESQUEMA GRÁFICO AVANCE METAS FÍSICAS PROGRAMADAS VS METAS FÍSICAS EJECUTADAS

AVANCE DEL PROYECTO

Categoría	Valor (Millones de \$)
METAS FÍSICAS PROGRAMADAS	1600
METAS FÍSICAS EJECUTADAS	1200

El esquema gráfico será definido por el Interventor de acuerdo con la meta física programada vs meta física ejecutada del contrato de obra y según las indicaciones dadas en el instructivo MEPI-MN1-IN-15 del Manual de Interventoría.

XI. REGISTRO FOTOGRÁFICO

Bordillo lado izquierdo entre las abscisas k0+360 a k0+280

Socialización avance del proyecto con la comunidad de Rimini

Avance instalación de la piedra rajón k0+605

XII. DESCRIBIR LAS ACCIONES A SEGUIR POR PARTE DE LA INTERVENTORÍA QUE CONTRIBUYAN AL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTRACTUALES POR PARTE DEL CONTRATISTA DE OBRA

1. Revisión y aprobación de documentos contractuales.

2. Realizar seguimiento a las actividades preliminares.

3. Emitir comunicados de seguimiento a actividades y compromisos.

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

FIRMA

NOMBRE:ANGELA MARIA DAVILA MORALES


Matricula Profesional No.:17202-153798 CLD


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Subdirección de Sostenibilidad, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	49

4.2 Maquinaria y equipo contrato de obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-4.

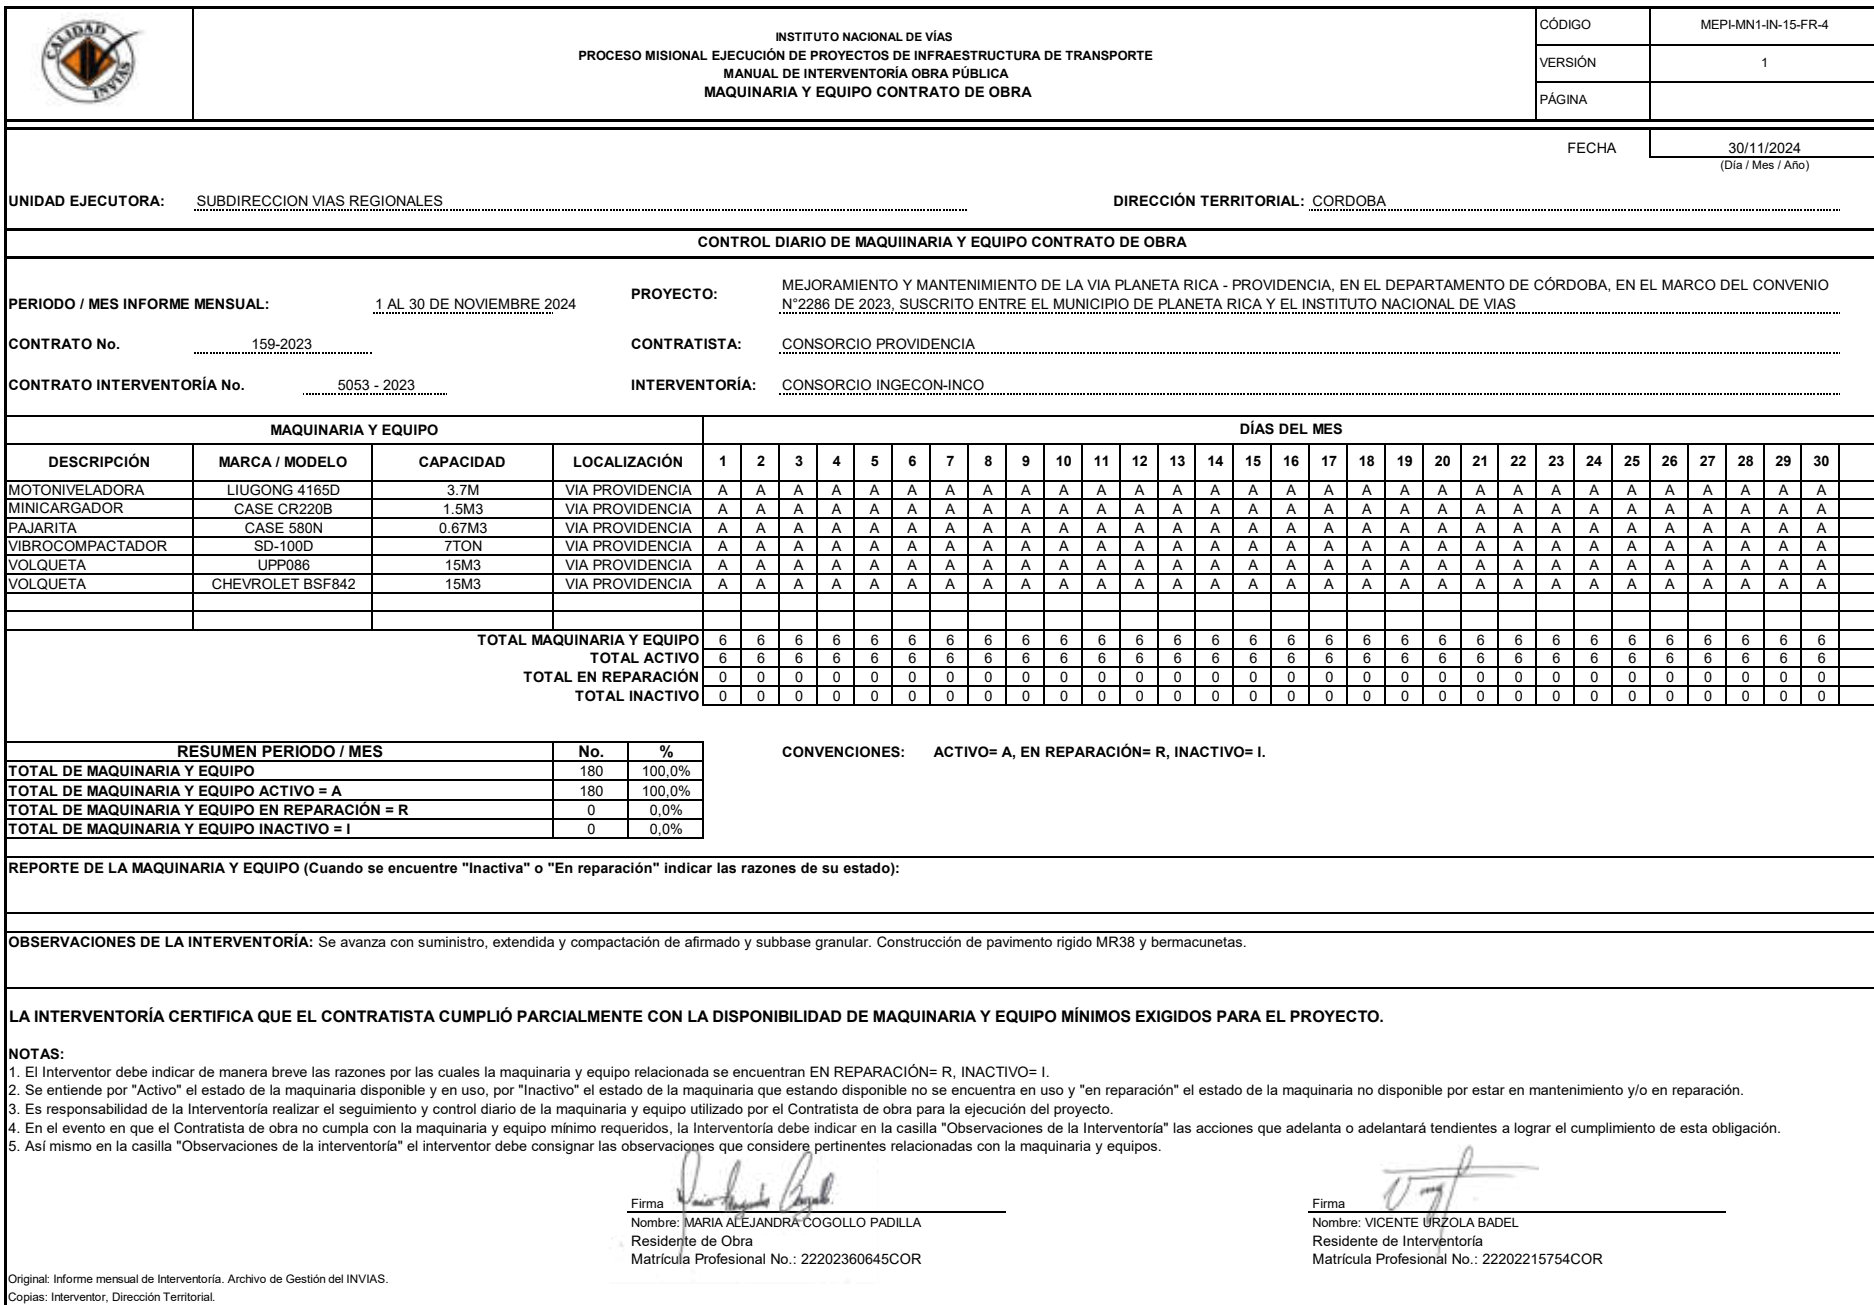

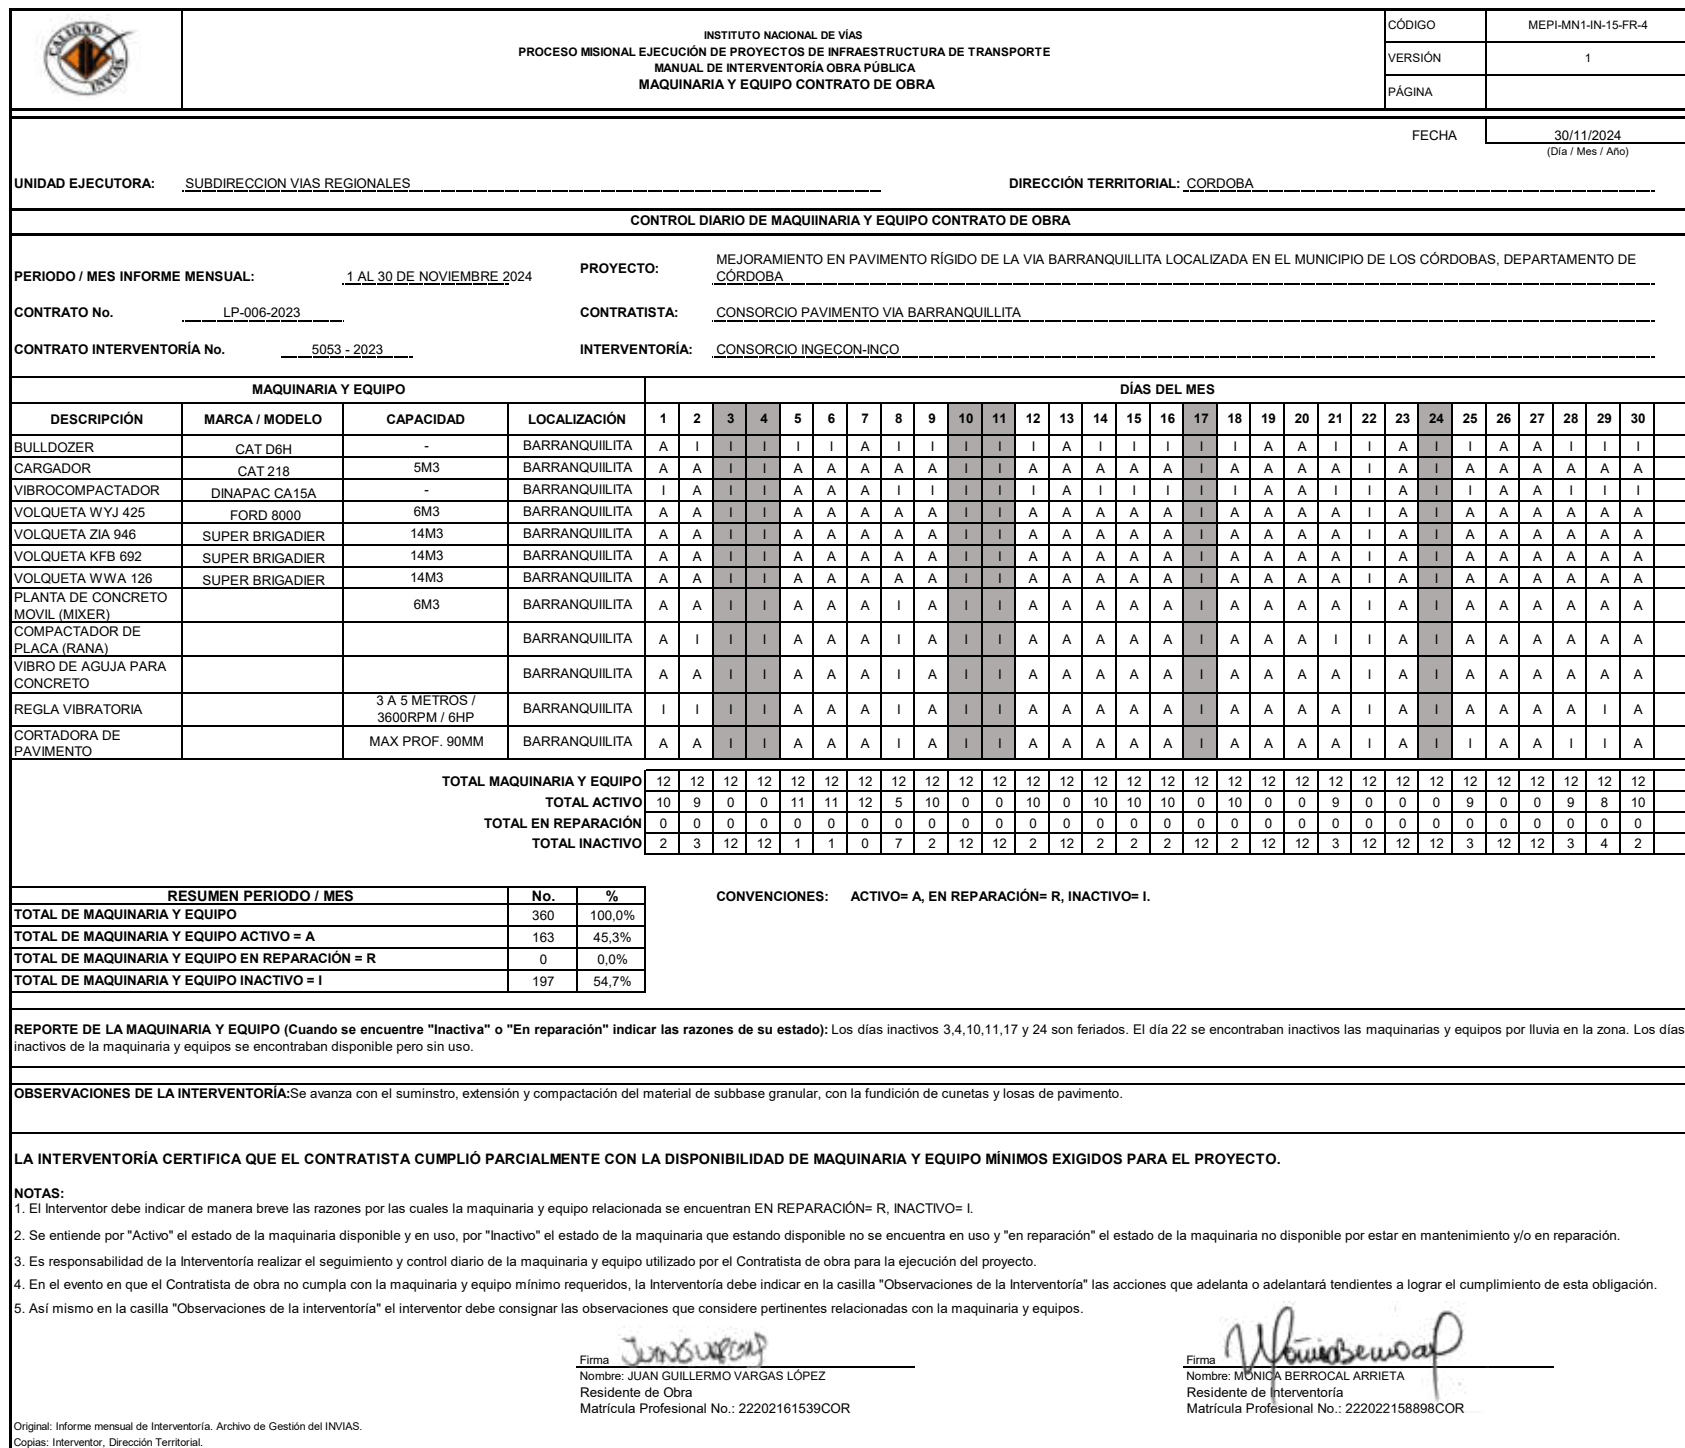

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
			VERSIÓN	1	
			PÁGINA		

FECHA

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

CONTROL DIARIO DE MAQUINARIA Y EQUIPO CONTRATO DE OBRA

PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA

CONTRATO No. LP-MSBV-008-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO L&S

CONTRATO INTERVENTORÍA No. 5053 - 2023

INTERVENTORÍA: CONSORCIO INGECON-INCO

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
RETROEXCAVADORA	CASE 580N		SECTOR RIMINI	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
VOLQUETA	INTERNATIONAL SNO699	7M3	SECTOR RIMINI																															
MINICARGADOR	CASE		SECTOR RIMINI	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	A	A	A		
VIBROCOMPACTADOR	INGERSOL RAND	7 TON	SECTOR RIMINI	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	
TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
TOTAL ACTIVO				2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
TOTAL EN REPARACIÓN				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL INACTIVO				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

volqueta international SNO699

TOTAL MAQUINARIA Y EQUIPO

TOTAL ACTIVO

TOTAL EN REPARACIÓN

TOTAL INACTIVO

CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.

RESUMEN PERIODO / MES	No.	%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO	90	100,0%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO ACTIVO = A	86	95,6%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN REPARACIÓN = R	3	3,3%
TOTAL DE MAQUINARIA Y EQUIPO INACTIVO = I	0	0,0%

REPORTE DE LA MAQUINARIA Y EQUIPO (Cuando se encuentre "Inactiva" o "En reparación" indicar las razones de su estado): LA INACTIVIDAD DE LA RETROEXCAVADORA, VIBROCOMPACTADOR Y MINICARGADOR ES DEBIDO A MANTENIMIENTO PREVENTIVO.

OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORÍA:

LA INTERVENTORÍA CERTIFICA QUE EL CONTRATISTA CUMPLIÓ PARCIALMENTE CON LA DISPONIBILIDAD DE MAQUINARIA Y EQUIPO MÍNIMOS EXIGIDOS PARA EL PROYECTO.

NOTAS:
1. El Interventor debe indicar de manera breve las razones por las cuales la maquinaria y equipo relacionada se encuentran EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.
2. Se entiende por "Activo" el estado de la maquinaria disponible y en uso, por "Inactivo" el estado de la maquinaria que estando disponible no se encuentra en uso y "en reparación" el estado de la maquinaria no disponible por estar en mantenimiento y/o en reparación.
3. Es responsabilidad de la Interventoría realizar el seguimiento y control diario de la maquinaria y equipo utilizado por el Contratista de obra para la ejecución del proyecto.
4. En el evento en que el Contratista de obra no cumpla con la maquinaria y equipo mínimo requeridos, la Interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones de la Interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.
5. Así mismo en la casilla "Observaciones de la Interventoría" el interventor debe consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con la maquinaria y equipos.

Firma
Nombre: HARRY BEJARANO
Residente de Obra
Matrícula Profesional No.: 25202252683CND

Firma
Nombre: LUIS JACOBO VARGAS D.
Residente de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202166700CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	50

4.3 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL. CONTRATO DE OBRA															CÓDIGO	MEPAIN-IN-15-FR-6																															
																	VERSIÓN	1																														
																	PÁGINA																															
																	FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES																	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA																															
CONTRATO DE OBRA No: LP-006-2023																	CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA																															
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24																	PROYECTO: MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBA, DEPARTAMENTO DE CORDOBA																															
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5053 DE 2023																	INTERVENTOR: CONSORCIO INGENIERIA																															
NOMBRE ARL: ARL SURA																	NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN: COMFACOR																															
VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL																																																
No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																														Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBC)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidad, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30			Valor Cotizado ARL	Clase de Riesgo (De I a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF	
1	OSCAR GOMEZ	10787424	DIRECTOR DE OBRA	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	SANTAS	9477276668	\$ 52.000	COLFONDOS	9477276668	\$ 208.000	\$ 52.000	NO	NO			
2	JHON MONTES	1069482164	SISO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9477276668	\$ 52.000	COLPENSIONES	9477276668	\$ 208.000	\$ 52.000	NO	NO			
3	CESAR ROS	78744425	REPRESENTANTE LEGAL	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	SANTAS	9477276668	\$ 52.000	PROTECCIÓN	9477276668	\$ 208.000	\$ 52.000	NO	NO			
4	JUAN VARGAS	78382082	RESIDENTE DE OBRA	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	SANTAS	9477276668	\$ 52.000	COLFONDOS	9477276668	\$ 208.000	\$ 52.000	NO	NO			
5	CARLOS GONZALEZ	78712123	AYUDANTE	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	SANTAS	9477276668	\$ 52.000	PORVENIR	9477276668	\$ 208.000	\$ 52.000	NO	NO			
6	YOANIS JARAMILLO	10766754	OPERADOR	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9477276668	\$ 52.000	COLPENSIONES	9477276668	\$ 208.000	\$ 52.000	NO	NO			
7	ANDERSON NIETO	1063651852	AYUDANTE	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9477276668	\$ 52.000	PORVENIR	9477276668	\$ 208.000	\$ 52.000	NO	NO			
8	BADNTON PNEDA	78590713	AYUDANTE	\$ 1.300.000																													CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	SANTAS	9477276668	\$ 52.000	PROTECCIÓN	9477276668	\$ 52.000	\$ 13.000	NO	NO			
9	ARMILLO DORA COGOLLO	78700606	TOPOGRAFO	\$ 1.300.000																														CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9475602706	54200	PROTECCION	9475602706	69400	\$ 13.000	NO	NO		
10	JEISON PAEZ CASARUBIA	1003093724	AYUDANTE	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	-	-	-	-	-	\$ 13.000	NO	NO			
11	YONATAN VALENCIA ACOSTA	2000011774	AYUDANTE	\$ 1.300.000																														CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9475603495	\$ 52.000	COLPENSIONES	9475603495	\$ 69.400	\$ 13.000	NO	NO		
12	ADRIANA MADERA	1042436111	AUX DE TRANSITO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9477276668	\$ 52.000	PORVENIR	9477276668	\$ 208.000	\$ 52.000	NO	NO		
13	JORGE SANCIA	15674663	MAESTRO	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	-	-	-	-	-	\$ 13.000	NO	NO			
14	CARLOS HOYOS AYAZO	1067937700	OPERADOR	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	SANTAS	9477276668	\$ 52.000	PORVENIR	9477276668	\$ 208.000	\$ 52.000	NO	NO		
15	GLENS POLO VELLJUN	42656803	AUX DE TRANSITO	\$ 1.300.000																														CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9475602706	\$ 54.200	PORVENIR	9475602706	\$ 69.400	\$ 13.000	NO	NO		
16	JESUS SEGURA SALGADO	1067845204	AYUDANTE	\$ 1.300.000																														CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9472707004	\$ 54.200	PORVENIR	9472707004	\$ 69.400	\$ 13.000	NO	NO		
17	LEWIS SANCIA ARGEL	1067843204	OFICIAL	\$ 1.300.000																														CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9475603429	\$ 54.200	PORVENIR	9475603429	\$ 69.400	\$ 13.000	NO	NO		
18	DULIS VERRIGARA ACOSTA	11032341	OFICIAL	\$ 1.300.000																														CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9475603679	\$ 54.200	PORVENIR	9475603679	\$ 69.400	\$ 13.000	NO	NO		
19	EDUAR ENRIQUE GONZALEZ GOMEZ	1063650335	AYUDANTE	\$ 1.300.000																														CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9475602807	\$ 54.200	PORVENIR	9475602807	\$ 69.400	\$ 13.000	NO	NO		
20	ELVIN GOMEZ GONZALEZ	1193143435	AYUDANTE	\$1,300,000																														CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 260.000	\$ 18.100	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9475602946	\$ 54.200	PORVENIR	9475602946	\$ 69.400	\$ 13.000	NO	NO		
21	JORGE ALBERTO MARTINEZ MESTRA	1003093453	AYUDANTE	\$1,300,000																														CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 606.667	\$ 42.300	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9475603135	\$ 54.200	PORVENIR	9475603135	\$ 69.400	\$ 13.000	NO	NO		
22	JEISON JANITH CASARUBIA	1003093724	AYUDANTE	\$1,300,000																														CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9475603204	\$ 54.200	PORVENIR	9475603204	\$ 69.400	\$ 13.000	NO	NO		
23	JAIDER MORENO RUIZ	1007357209	AYUDANTE	\$1,300,000																														CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.213.334	\$ 84.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9475603165	\$ 54.200	PORVENIR	9475603165	\$ 69.400	\$ 13.000	NO	NO		
24	JORGE LUIS RUIZ RAMOS	1003093153	AYUDANTE	\$1,300,001																														CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 606.667	\$ 42.300	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9475603135	\$ 54.200	PORVENIR	9475603135	\$ 69.400	\$ 13.000	NO	NO		
25	JULIO JARIO JAVIER	11032204	AYUDANTE	\$1,300,000																														CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.213.334	\$ 84.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9475603026	\$ 54.200	PORVENIR	9475603026	\$ 69.400	\$ 13.000	NO	NO		
26	PASCUAL CAVDIA	70531232	AYUDANTE	\$1,300,000																														CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	\$ 1.213.334	\$ 84.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9475603083	\$ 54.200	PORVENIR	9475603026	\$ 69.400	\$ 13.000	NO	NO		
OBSERVACIONES DE LA INTERVENTORIA																																																
Numeral 4, disponibilidad del personal requerido:																																																
El contratista adjunta la certificación de fecha _____ NA _____ a la que se refiere la nota 8 del presente formato.																																																
NOTAS:																																																
1. Es responsabilidad de la Interventoría verificar que el personal profesional este debidamente aprobado y se cumpla con la dedicación contractual.																																																
2. Es responsabilidad de la Interventoría relacionar todo el personal utilizado durante el mes para la ejecución del contrato incluida mano de obra calificada y no calificada y diligenciar la casilla "Observaciones".																																																
3. En el evento en que el Contratista no cumple con la dedicación del personal profesional establecido contractualmente, el Interventor debe indicar en la casilla "Observaciones" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación.																																																
4. El Contratista es el responsable de la afiliación y pago de los aportes al sistema de la seguridad social y contribuciones parafiscales de los empleados a su cargo vinculados por contrato laboral y asociados a la ejecución del contrato. Cuando se trate de Consorcio Mario Pomplio Sinesterra, debe indicarse el integrante que realiza los pagos. Los pagos pueden ser realizados por el Contratista o por uno de los integrantes del Contratista en el caso de Consorcio Mario Pomplio Sinesterra, los cuales deben corresponder con la información consignada en la nómina electrónica cuando aplique.																																																
5. En el evento en que el pago de los aportes se efectúa por uno de los integrantes del Consorcio Mario Pomplio Sinesterra, debe indicarse el nombre del integrante que efectúa los pagos.																																																
6. El Interventor es el responsable de la verificación del pago de los Aportes Legales y Seguridad Social del personal vinculado al Contrato de Obra, así como el cumplimiento por parte del contratista de la normatividad vigente en relación con la nómina electrónica cuando aplique.																																																
7. El Contratista es el responsable de verificar que sus contratistas de prestación de servicios asociados a la ejecución de la obra, cumplan con sus obligaciones con el sistema de la seguridad social, para lo cual debe presentar a la Interventoría la certificación suscrita por el Representante Legal o Revisor Fiscal según el caso en la cual se relacionen los nombres de los contratistas de prestación de servicios, el monto correspondiente a los pagos de seguridad social de cada uno de conformidad con la normatividad vigente y la entidad prestadora del servicio.																																																
8. El Interventor debe señalar con un (*) a continuación del nombre, el personal vinculado por contrato de prestación de servicios. Así mismo debe diligenciar la dedicación en los días que prestó el servicio.																																																
Firma _____ Nombre: CESAR AUGUSTO ROS GONZALEZ Representante legal o asociado del Contratista Matrícula Profesional No.: CN230 28549																																																
Firma _____ Nombre: ANGELA MARIA DAHLA MORALES Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD																																																
Diagonal: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial																																																



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORA OBRA PUBLICA

PERSONAL, CONTROL APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEP/MI-15-FR-6

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

30/11/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

CONTRATO DE OBRA No:

LP-MSEV-008-2023

CONTRATISTA:

CONSORCIO L&S

MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL:

nov-24

PROYECTO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENCIÓN No:

5053 DE 2023

INTERVENTOR:

CONSORCIO INGECON-INGO

NOMBRE ARL:

ARL SURA

NOMBRE CAJA DE COMPENSACIÓN:

COMFACOR

VERIFICACIÓN PERSONAL, DOCUMENTACIÓN APORTES LEGALES Y SEGURIDAD SOCIAL

No.	Nombres y Apellidos	C.C.	Cargo	Salarios	Días del Mes																															Razón Social del Responsable del Pago (Ver nota 5)	Índice Base de Cotización (IBCT)	1. SEGURIDAD SOCIAL								PARAFISCALES			Observaciones (Indicar novedades de vacaciones, incapacidades, retiros, licencias, entre otros)
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	Valor Cotizado ARL			Clase de Riesgo (De 1 a V)	Nombre EPS	No. Planilla	Valor Cotizado EPS	Nombre Administradora de Fondos de Pensiones	No. Planilla	Valor Cotizado Pensión	Valor Caja de Compensación	Valor SENA	Valor ICBF		
1	AGAMEZ ANDY	1067940218	ING. RESIDENTE	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO L&S	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	SALUD TOTAL	9475644721	\$ 52.000	PROTECCIÓN	9475644721	\$ 208.000	\$ 52.000	NO	NO			
2	AVILA ARISTIDES	1067897855	AYUDANTE	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO L&S	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	MUTUAL SER	9475644721	\$ 52.000	COLFONDOS	9475644721	\$ 208.000	\$ 52.000	NO	NO			
3	BEJARANO HARRY	1067927353	ING. AMBIENTAL	\$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO L&S	\$ 2.000.000	\$ 139.200	V	SALUD TOTAL	9475644721	\$ 80.000	PORVENIR	9475644721	\$ 320.000	\$ 80.000	NO	NO			
4	CASTILLO IVÁN	78753670	MAESTRO DE OBRA	\$ 2.000.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO L&S	\$ 2.000.000	\$ 139.200	V	SANITAS	9475644721	\$ 80.000	COLFONDOS	9475644721	\$ 320.000	\$ 80.000	NO	NO			
5	CORRALES YURY	1073825317	PROFESIONAL SST	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO L&S	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	NUEVA EPS MOVILIDAD	9475644721	\$ 52.000	PORVENIR	9475644721	\$ 208.000	\$ 52.000	NO	NO			
6	LOPEZ DANIEL	73088530	AYUDANTE	\$ 1.300.000	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	CONSORCIO L&S	\$ 1.300.000	\$ 90.500	V	SURA	9475644721	\$ 52.000		9475644721	\$ 208.000	\$ 52.000					

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	51

4.4 Informe financiero y presupuestal contrato de obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-8.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO	MEPH-MN1-IN-15-FR-8			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA				
											FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES											DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA				
CONTRATO DE OBRA No: 159-2023											CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA				
MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024											MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, PROYECTO: SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5053 DE 2023											INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON-INCO				
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior								
2024	.000270	COLOMBIA RURAL CONVENIO 2286 DE 2023 - INV/IAS	2.3.2.01.01.001-03-02	NACIÓN	159-2023	\$ 14.100.000.000,00	\$ 14.100.000.000,00								
TOTAL						\$ 14.100.000.000,0	\$ 14.100.000.000,0								
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 14.100.000.000,0															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Cobro parcial	feb-22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	\$ 14.100.000.000,00	\$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
2	Cobro parcial	mar-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	\$ 14.100.000.000,00	\$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
3	Cobro parcial	abr-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	\$ 14.100.000.000,00	\$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
4	Cobro parcial	may-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	\$ 14.100.000.000,00	\$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
5	Cobro parcial	jun-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	\$ 14.100.000.000,00	\$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
6	Cobro parcial	jul-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	\$ 14.100.000.000,00	\$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
7	Cobro parcial	ago-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	\$ 14.100.000.000,00	\$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
8	Cobro parcial	sep-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	\$ 14.100.000.000,00	\$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
9	Cobro parcial	oct-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	\$ 14.100.000.000,00	\$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
10	Cobro parcial	nov-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	000270 - 26 marzo de 2024	\$ 14.100.000.000,00	\$ 14.100.000.000,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -			\$ 14.100.000.000,00	\$ 14.100.000.000,00				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.															
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO															
		VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL									
BÁSICO TOTAL DE OBRA:		\$ -		\$ -		\$ -									
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS:		\$ -		\$ -		\$ -									
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)		\$ -		\$ -		\$ -									
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS		\$ -		\$ -		\$ -									
VALOR TOTAL		\$ -		\$ -		\$ -									
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.															
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.															
<div><div></div><div>Firma Nombre: EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 25202-151814</div></div> <div><div></div><div>Firma Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD</div></div>															
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INV/IAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
													VERSIÓN	1	
													PÁGINA		
													FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES													DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		
CONTRATO DE OBRA No: LP-006-2023													CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA		
MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024													PROYECTO: MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 DE 2023													INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON-INCO		
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA															
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior				
2024	.007	COLOMBIA RURAL CONVENIO 2217 DE 2023 - INVIAS		2.3.2.02.02.005	NACION		LP-006-2023		\$ 6.140.057.707,00		\$ 3.920.267.266,00				
TOTAL									\$ 6.140.057.707,0		\$ 3.920.267.266,00				
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 6.140.057.707,00															
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA															
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Cobro parcial	feb-22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0007 - 3 enero de 2024	\$ 6.140.057.707,00	\$ 6.140.057.707,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
2	Cobro parcial	mar-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0007 - 3 enero de 2024	\$ 6.140.057.707,00	\$ 6.140.057.707,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
3	Cobro parcial	abr-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	0	0007 - 3 enero de 2024	\$ 6.140.057.707,00	\$ 6.140.057.707,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
-	Anticipo	may-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.842.017.312,10	\$ 1.842.017.312,10	0007 - 3 enero de 2024	\$ 4.298.040.394,90	\$ 4.298.040.394,90				ANTICIPO 30%
4	Cobro parcial N°1	may-24	\$ 8.187.603,00	\$ -	\$ 8.187.603,00	\$ 2.456.281,00	\$ 5.731.322,00	\$ 1.839.561.031,10	0007 - 3 enero de 2024	\$ 6.131.870.104,00	\$ 6.131.870.104,00	-	-	-	EL CONTRATISTA PRESENTÓ ACTA PARCIAL N°1
5	Cobro parcial	jun-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.839.561.031,10	0007 - 3 enero de 2024	\$ 6.131.870.104,00	\$ 6.131.870.104,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
6	Cobro parcial	jul-24	\$ 412.928.839	\$ 4.306.844	\$ 417.235.683	\$ 125.170.705	\$ 292.064.978	\$ 1.714.390.326,20	0007 - 3 enero de 2024	\$ 5.714.634.421,00	\$ 5.714.634.421,00	-	-	-	EL CONTRATISTA PRESENTÓ ACTA PARCIAL N°2 - A CORTE DE 30 DE JULIO DE 2024
7	Cobro parcial	ago-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.714.390.326,20	0007 - 3 enero de 2024	\$ 5.714.634.421,00	\$ 5.714.634.421,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
8	Cobro parcial N°2	sep-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.714.390.326,20	0007 - 3 enero de 2024	\$ 5.714.634.421,00	\$ 5.714.634.421,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
9	Cobro parcial	oct-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.714.390.326,20	0007 - 3 enero de 2024	\$ 5.714.634.421,00	\$ 5.714.634.421,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO
10	Cobro parcia N°3	nov-24	\$ 1.794.367.155	\$ -	\$ 1.794.367.155	\$ 538.310.147	\$ 1.256.057.008,00	\$ 1.176.080.179,20	0007 - 3 enero de 2024	\$ 3.920.267.266,00	\$ 3.920.267.266,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA PARCIAL N°3 A CORTE DEL 1 DE AGOSTO A 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
TOTALES			\$ 2.215.483.597,00	\$ 4.306.844	\$ 2.219.790.441,00					\$ 3.920.267.266,00	\$ 3.920.267.266,00				
Todas las Actas aprobadas por la Interventoria deben relacionarse esten o no facturadas.															

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
				VERSIÓN	1
				PÁGINA	
FECHA					30/11/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES					DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO					
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL		
BASICO TOTAL DE OBRA:	\$ 2.215.483.597,00	\$ 4.306.844	\$ 2.219.790.441,00		
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS:	\$ -	\$ -	\$ -		
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	\$ -	\$ -	\$ -		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -		
VALOR TOTAL	\$ 2.215.483.597,00		\$ 2.219.790.441,00		
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.					
NOTA: Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.					
Firma		Firma			
Nombre: CESAR AUGUSTO RIOS GONZALEZ Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: CN230 28549		Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES Director de Interventoria Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD			
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor y Dirección Territorial.					

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA												CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8		
														VERSIÓN	1	
														PÁGINA		
														FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES														DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA		
CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-008-2023														CONTRATISTA: CONSORCIO L&S		
MES INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024														PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 DE 2023														INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON-INCO		
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior					
2023	230675	COLOMBIA RURAL CONVENIO 2222 DE 2023 - INVIAS		1.3.1.07.1	NACIÓN		LP-MSBV-008-2023		\$ 2.115.723.321,00		\$ 2.115.723.321,00					
TOTAL									\$ 2.115.723.321,0		\$ 2.115.723.321,0					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 2.115.723.321,00																
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones	
													SI	NO		
1	Cobro parcial	feb-22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	230675 - 20 octubre de 2023	\$ 2.115.723.321,00	\$ 2.115.723.321,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO	
2	Cobro parcial	mar-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	230675 - 20 octubre de 2023	\$ 2.115.723.321,00	\$ 2.115.723.321,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO	
3	Cobro parcial	may-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	230675 - 20 octubre de 2023	\$ 2.115.723.321,00	\$ 2.115.723.321,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO	
4	Cobro parcial	jun-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	230675 - 20 octubre de 2023	\$ 2.115.723.321,00	\$ 2.115.723.321,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO	
5	Cobro parcial	jul-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	230675 - 20 octubre de 2023	\$ 2.115.723.321,00	\$ 2.115.723.321,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO	
6	Cobro parcial	ago-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	230675 - 20 octubre de 2023	\$ 2.115.723.321,00	\$ 2.115.723.321,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO	
7	Cobro parcial	sep-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	230675 - 20 octubre de 2023	\$ 2.115.723.321,00	\$ 2.115.723.321,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO	
8	Cobro parcial	oct-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	230675 - 20 octubre de 2023	\$ 2.115.723.321,00	\$ 2.115.723.321,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO	
9	Cobro parcial	nov-24	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	230675 - 20 octubre de 2023	\$ 2.115.723.321,00	\$ 2.115.723.321,00	-	-	-	EL CONTRATISTA NO PRESENTÓ ACTA DE COBRO	
TOTALES			\$ -	\$ -	\$ -					\$ 2.115.723.321,00	\$ 2.115.723.321,00					
Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.																

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
BASICO TOTAL DE OBRA:	\$ -	\$ -	\$ -
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS:	\$ -	\$ -	\$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	\$ -	\$ -	\$ -
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ -	\$ -	\$ -

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTA:

Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma

Nombre: **HABIB CHAAR SAKR**
Representante legal o apoderado del Contratista
Cédula de ciudadanía No.: 15.647.894

Firma

Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	52

4.5 Estado general del tiempo - MEPI-MN1-IN-15-FR-10.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA																													
CONTRATO DE OBRA No: 159-2023			CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24			PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5053 de 2023			INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON-INCO																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		Total
Seco	15	21	20	21	24	22	24	21	20	20	20	24	24	24	24	24	21	23	24	24	24	23	21	22	24	24	24	22	20	24		668
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Lluvias intensas	9	3	4	3	0	2	0	3	4	4	4	0	0	0	0	0	3	1	0	0	0	1	3	2	0	0	0	2	4	0		52
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div><div></div><div>Firma</div><div>Nombre: MARIA ALEJANDRA COGOLLO PADILLA</div><div>Residente de Obra</div><div>Matrícula Profesional No.: 22202360645COR</div></div> <div><div></div><div>Firma</div><div>Nombre: VICENTE URZOLA BADEL</div><div>Residente de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 22202215754COR</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA																													
CONTRATO DE OBRA No: LP-006-2023			CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24			MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5053 de 2023			INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON-INCO																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																														Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30		
Seco	24	24	24	24	24	24	22,9	21	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	22	24	23	18	24	24	24	24	24	20	24	24		702,2
Lluvias moderadas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2,1	0	1,1	3,1	0	0	0	0	0	3	0	0		9,3
Lluvias intensas	0	0	0	0	0	0	1,1	3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3,4	0	0	0	0	0	1	0	0		8,5
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24		
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
<div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: JUAN GUILLERMO VARGAS LÓPEZ</div><div>Residente de Obra</div><div>Matrícula Profesional No.: 22202161539COR</div></div><div><div>Firma</div><div></div><div>Nombre: MONICA BERROCAL ARRIETA</div><div>Residente de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 222022158898COR</div></div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA																													
CONTRATO DE OBRA No: LP-MSBV-008-2023			CONTRATISTA: CONSORCIO L&S																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24			PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5053 de 2023			INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON-INCO																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco	14	24	22	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	708,25
Lluvias moderadas	4,8		2																													6,83
Lluvias intensas	4,9																															4,92
Total horas	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES: LA INTERVENTORÍA INDICA QUE EL ESTADO GENERAL DEL TIEMPO REPORTADO PARA EL MES DE NOVIEMBRE SE EXTIENDE HASTA EL 6 DE NOVIEMBRE DE 2024, CONFORME A LA PROYECCIÓN SOLICITADA POR EL INVIAS.																																
<div><div> Firma Nombre: HARRY BEJARANO Residente de Obra Matrícula Profesional No.: 25202252683CND</div><div> Firma Nombre: LUIS JACOBO VARGAS D. Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 17202166700CLD</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	53


4.6 Resumen ensayos de Laboratorio - MEPI-MN1-IN-15-FR-11.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES							DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		
CONTRATO DE OBRA No.: 159-2023							CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24							PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA. EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5053 DE 2023							INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON-INCO		
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	3/10/2024	DENSIDADES IN SITU	E - 161	PROVIDENCIA	1	95%	100,0%	SI	K1+500 IZQUIERDA AFIRMADO
2	3/10/2024	DENSIDADES IN SITU	E - 161	PROVIDENCIA	1	95%	101,0%	SI	K1+600 DERECHA AFIRMADO
3	8/10/2024	ENSAYO A FLEXION	E - 414 (38 MPA)	PROVIDENCIA	1	100% (28 DIAS)	102,50%	SI	PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE LA ABCSCISA K0+186 HASTA K0+285 CARRIL IZQUIERDO
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	3/10/2024	DENSIDADES IN SITU	E - 161	PROVIDENCIA	1	95%	101,0%	SI	K1+500 IZQUIERDA AFIRMADO
2	3/10/2024	DENSIDADES IN SITU	E - 161	PROVIDENCIA	1	95%	104,0%	SI	K1+620 DERECHA AFIRMADO
3	5/09/2024	DENSIDADES IN SITU	E - 161	PROVIDENCIA	1	95%	100,0%	SI	K1+120 IZQUIERDA SUBBASE GRANULAR
4	5/09/2024	DENSIDADES IN SITU	E - 161	PROVIDENCIA	1	95%	99,56%	SI	K1+240 DERECHA SUBBASE GRANULAR
5	18/09/2024	DENSIDADES IN SITU	E - 161	PROVIDENCIA	1	95%	100,1%	SI	K1+400 DERECHA SUBBASE GRANULAR
6	5/10/2024	ENSAYO A FLEXION	E - 414 (38 MPA)	PROVIDENCIA	1	100% (28 DIAS)	115,00%	SI	PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE LA ABCSCISA K0+084 HASTA K0+186 CARRIL IZQUIERDO
7	8/10/2024	ENSAYO A FLEXION	E - 414 (38 MPA)	PROVIDENCIA	1	100% (28 DIAS)	112,00%	SI	PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE LA ABCSCISA K0+186 HASTA K0+285 CARRIL IZQUIERDO
8	10/10/2024	ENSAYO A FLEXION	E - 414 (38 MPA)	PROVIDENCIA	1	100% (28 DIAS)	107,00%	SI	PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE LA ABCSCISA K0+285 HASTA K0+384 CARRIL IZQUIERDO
9	12/10/2024	ENSAYO A FLEXION	E - 414 (38 MPA)	PROVIDENCIA	1	100% (28 DIAS)	109,00%	SI	PAVIMENTO RIGIDO MR38 DESDE LA ABCSCISA K0+384 HASTA K0+534 CARRIL IZQUIERDO
Para este periodo el contratista de obra no ha presentado los resultados de los ensayos.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma:  Nombre: EMIRO CARLOS BARGUIL CUEILLOS Representante legal o apoderado del Contratista Matrícula Profesional No.: 25202-151814					Firma:  Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO</p>						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
								FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES						DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA			
CONTRATO DE OBRA No.: LP-006-2023						CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA			
						MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA			
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24						PROYECTO:			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5053 DE 2023						INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON-INCO			
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple Si o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	14/11/2024	METODO CONO Y ARENA	E-161	VIA BARRANQUILLITA	K0+560 DER	95%	100,50%	SI	COMPACTACION EN EL TERRENO DEL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR
2	14/11/2024	METODO CONO Y ARENA	E-161	VIA BARRANQUILLITA	K0+520 IZQ	95%	96,30%	SI	COMPACTACION EN EL TERRENO DEL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR
3	14/11/2024	METODO CONO Y ARENA	E-161	VIA BARRANQUILLITA	K0+480 EJE	95%	97,90%	SI	COMPACTACION EN EL TERRENO DEL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR
4	14/11/2024	METODO CONO Y ARENA	E-161	VIA BARRANQUILLITA	K0+440 IZQ	95%	99,60%	SI	COMPACTACION EN EL TERRENO DEL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR
5	14/11/2024	METODO CONO Y ARENA	E-161	VIA BARRANQUILLITA	K0+400 DER	95%	99,20%	SI	COMPACTACION EN EL TERRENO DEL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR
6	14/11/2024	METODO CONO Y ARENA	E-161	VIA BARRANQUILLITA	K0+360 IZQ	95%	97,90%	SI	COMPACTACION EN EL TERRENO DEL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR
1	29/11/2024	METODO CONO Y ARENA	E-161	VIA BARRANQUILLITA	K0+320 DER	95%	95,20%	SI	COMPACTACION EN EL TERRENO DEL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR
2	29/11/2024	METODO CONO Y ARENA	E-161	VIA BARRANQUILLITA	K0+280 IZQ	95%	96,10%	SI	COMPACTACION EN EL TERRENO DEL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR
3	29/11/2024	METODO CONO Y ARENA	E-161	VIA BARRANQUILLITA	K0+240 DER	95%	98,10%	SI	COMPACTACION EN EL TERRENO DEL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR
4	29/11/2024	METODO CONO Y ARENA	E-161	VIA BARRANQUILLITA	K0+200 IZQ	95%	96,90%	SI	COMPACTACION EN EL TERRENO DEL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR
5	29/11/2024	METODO CONO Y ARENA	E-161	VIA BARRANQUILLITA	K0+160 DER	95%	94,80%	SI	COMPACTACION EN EL TERRENO DEL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR
6	29/11/2024	METODO CONO Y ARENA	E-161	VIA BARRANQUILLITA	K0+120 IZQ	95%	98,90%	SI	COMPACTACION EN EL TERRENO DEL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR
7	29/11/2024	METODO CONO Y ARENA	E-161	VIA BARRANQUILLITA	K0+080 DER	95%	96,20%	SI	COMPACTACION EN EL TERRENO DEL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR
8	29/11/2024	METODO CONO Y ARENA	E-161	VIA BARRANQUILLITA	K0+040 IZQ	95%	96,50%	SI	COMPACTACION EN EL TERRENO DEL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR
9	29/11/2024	METODO CONO Y ARENA	E-161	VIA BARRANQUILLITA	K0+005 EJE	95%	95,40%	SI	COMPACTACION EN EL TERRENO DEL MATERIAL DE SUBBASE GRANULAR
1	26/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	E-410	VIA BARRANQUILLITA	1	3000 PSI	2332 PSI	SI	EDAD 7 DIAS - CUNETAS LADO IZQUIERDO K2+084 - K2+044
2	26/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	E-410	VIA BARRANQUILLITA	2	3000 PSI	2636 PSI	SI	EDAD 14 DIAS - CUNETAS LADO IZQUIERDO K2+084 - K2+044
3	26/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	E-410	VIA BARRANQUILLITA	3	3000 PSI	3140 PSI	SI	EDAD 28 DIAS - CUNETAS LADO IZQUIERDO K2+084 - K2+044
1	28/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	E-410	VIA BARRANQUILLITA	1	3000 PSI	2295 PSI	SI	EDAD 7 DIAS - CUNETAS LADO IZQUIERDO K2+044 - K1+964
2	28/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	E-410	VIA BARRANQUILLITA	2	3000 PSI	2676 PSI	SI	EDAD 14 DIAS - CUNETAS LADO IZQUIERDO K2+044 - K1+964
3	28/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	E-410	VIA BARRANQUILLITA	3	3000 PSI	3187 PSI	SI	EDAD 28 DIAS - CUNETAS LADO IZQUIERDO K2+044 - K1+964
1	30/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	E-410	VIA BARRANQUILLITA	1	3000 PSI	2280 PSI	SI	EDAD 7 DIAS - CUNETAS LADO IZQUIERDO K1+964 - K1+883
2	30/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	E-410	VIA BARRANQUILLITA	2	3000 PSI	2632 PSI	SI	EDAD 14 DIAS - CUNETAS LADO IZQUIERDO K1+964 - K1+883
3	30/10/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	E-410	VIA BARRANQUILLITA	3	3000 PSI	3219 PSI	SI	EDAD 28 DIAS - CUNETAS LADO IZQUIERDO K1+964 - K1+883
1	1/11/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	E-410	VIA BARRANQUILLITA	1	3000 PSI	2350 PSI	SI	EDAD 7 DIAS - CUNETAS LADO IZQUIERDO K1+883 - K1+723
2	1/11/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	E-410	VIA BARRANQUILLITA	2	3000 PSI	2635 PSI	SI	EDAD 14 DIAS - CUNETAS LADO IZQUIERDO K1+883 - K1+723
3	1/11/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	E-410	VIA BARRANQUILLITA	3	3000 PSI	3204 PSI	SI	EDAD 28 DIAS - CUNETAS LADO IZQUIERDO K1+883 - K1+723
1	6/11/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	E-410	VIA BARRANQUILLITA	1	3000 PSI	2330 PSI	SI	EDAD 7 DIAS - CUNETAS LADO IZQUIERDO K1+723 - K1+656
2	6/11/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	E-410	VIA BARRANQUILLITA	2	3000 PSI	2675 PSI	SI	EDAD 14 DIAS - CUNETAS LADO IZQUIERDO K1+723 - K1+656
1	7/11/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	E-410	VIA BARRANQUILLITA	1	3000 PSI	2317 PSI	SI	EDAD 7 DIAS - CUNETAS LADO DERECHO K1+442 - K1+410
1	20/11/2024	RESISTENCIA A LA COMPRESIÓN DE CILINDROS DE CONCRETO	E-410	VIA BARRANQUILLITA	1	3000 PSI	2230 PSI	SI	EDAD 7 DIAS - CUNETAS LADO DERECHO K0+961 - K0+800
1	19/09/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 33,22 Kg/cm2	SI	EDAD 7 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K2+282 - K2+207
2	19/09/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 37,95 Kg/cm2	SI	EDAD 14 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K2+282 - K2+207
3	19/09/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 42,68 Kg/cm2	SI	EDAD 28 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K2+282 - K2+207

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11
								VERSIÓN	1
								PAGINA	
								FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA				
1	25/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 34,14 Kg/cm2	SI	EDAD 7 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL DERECHO K1+304 - K1+283
2	25/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 36,50 Kg/cm2	SI	EDAD 28 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL DERECHO K1+304 - K1+283
3	25/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 43,20 Kg/cm2	SI	EDAD 28 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL DERECHO K1+885 - K1+817
1	30/10/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 32,17 Kg/cm2	SI	EDAD 7 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K2+100 - K2+070
2	30/10/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 36,24 Kg/cm2	SI	EDAD 14 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K2+100 - K2+070
3	30/10/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 41,36 Kg/cm2	SI	EDAD 28 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K2+100 - K2+070
1	31/10/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 32,04 Kg/cm2	SI	EDAD 7 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K2+070 - K2+000
2	31/10/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 36,77 Kg/cm2	SI	EDAD 14 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K2+070 - K2+000
3	31/10/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 40,58 Kg/cm2	SI	EDAD 28 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K2+070 - K2+000
1	2/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 32,30 Kg/cm2	SI	EDAD 7 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K2+000 - K1+930
2	2/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 36,90 Kg/cm2	SI	EDAD 14 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K2+000 - K1+930
3	2/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 41,49 Kg/cm2	SI	EDAD 28 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K2+000 - K1+930
1	5/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 30,20 Kg/cm2	SI	EDAD 7 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K1+930 - K1+847
2	5/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 35,32 Kg/cm2	SI	EDAD 14 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K1+930 - K1+847
1	6/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 30,20 Kg/cm2	SI	EDAD 7 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K1+847 - K1+797
2	6/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 35,32 Kg/cm2	SI	EDAD 14 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K1+847 - K1+797
1	7/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 34,14 Kg/cm2	SI	EDAD 7 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K1+797 - K1+777
2	7/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 34,67 Kg/cm2	SI	EDAD 14 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K1+797 - K1+777
1	9/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 30,73 Kg/cm2	SI	EDAD 7 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K1+777 - K1+735 - CARRIL DERECHO K1+442 - K1+410
2	9/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 34,27 Kg/cm2	SI	EDAD 14 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K1+777 - K1+735 - CARRIL DERECHO K1+442 - K1+410
1	12/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 31,78 Kg/cm2	SI	EDAD 7 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL DERECHO K1+271 - K1+201
2	12/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 34,40 Kg/cm2	SI	EDAD 14 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL DERECHO K1+271 - K1+201
1	13/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 31,65 Kg/cm2	SI	EDAD 7 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K1+735- K1+714 Y K1+711 - K1+661
2	13/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 35,19 Kg/cm2	SI	EDAD 14 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K1+735- K1+714 Y K1+711 - K1+661
1	14/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 31,38 Kg/cm2	SI	EDAD 7 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K1+661 - K1+641 Y CARRIL DERECHO K1+201 - K1+132
2	14/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 35,06 Kg/cm2	SI	EDAD 14 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K1+661 - K1+641 Y CARRIL DERECHO K1+201 - K1+132
1	15/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 32,83 Kg/cm2	SI	EDAD 7 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL DERECHO K1+132 - K1+060
2	15/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 37,16 Kg/cm2	SI	EDAD 14 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL DERECHO K1+132 - K1+060
1	18/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 32,30 Kg/cm2	SI	EDAD 7 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL DERECHO K1+060 - K1+030
1	19/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 31,65 Kg/cm2	SI	EDAD 7 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL DERECHO K1+030 - K0+971
1	21/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 32,57 Kg/cm2	SI	EDAD 7 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL DERECHO K0+971 - K0+902
1	23/11/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38 Kg/cm2	MR 33,35 Kg/cm2	SI	EDAD 7 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL DERECHO K0+902 - K0+852
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	25/10/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38	MR 28,4	SI	EDAD 7 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K2+208 - K2+189

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES							DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA		
2	25/10/2024	RESISTENCIA A LA FLEXIÓN DEL CONCRETO USANDO UNA VIGA	E-414	VIA BARRANQUILLITA	1	MR 38	MR 25,5	NO	EDAD 28 DIAS - LOSA DE PAVIMENTO CARRIL IZQUIERDO K2+208 - K2+189
La muestra de vigueta a los 28 días de la fundida del día 25-10-2024 arrojó un porcentaje del 64% el cual no cumple con las normas, lo cual se debe esperar a los 56 días del testigo.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de construcción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma					Firma				
Nombre: CESAR AUGUSTO RÍOS GONZALEZ					Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES				
Representante legal o apoderado del Contratista					Director de Interventoría				
Matrícula Profesional No.: CN230 28549					Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES							DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA		
CONTRATO DE OBRA No.: LP-MSBV-008-2023							CONTRATISTA: CONSORCIO L&S		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: NOVIEMBRE DE 2024							PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5053 DE 2023							INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON-INCO		
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple SI o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
1	29/10/2024	ENSAYO DE RESISTENCIA A LA FLEXIÓN	NTC 2871	SECTOR RIMINI	3	80%	84,00%	SI	
2	21/10/2024	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E.-161	RIMINI - SAN BERNARDO DEL VIENTO	1	95	101	SI	ABSCISA K0+345
3	21/10/2024	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E.-161	RIMINI - SAN BERNARDO DEL VIENTO	1	95	104	SI	ABSCISA K0+323
4	21/10/2024	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E.-161	RIMINI - SAN BERNARDO DEL VIENTO	1	95	101	SI	ABSCISA K0+300
5	5/07/2024	CARACTERIZACIÓN DE AFIRMADO	INV E-122-13 INV E-123-13 INV E-125-13 INV E-126-13 INV E-218-13 INV E-211-13 INV E-129-13 INV E-142-13 INV E-220-13	RIMINI - SAN BERNARDO DEL VIENTO	1	-	-	SI	CANTERA EL ESFUERZO
6	15/10/2024	CARACTERIZACIÓN DE SUB BASE		RIMINI - SAN BERNARDO DEL VIENTO	1	-	-	SI	CANTERA EL ESFUERZO
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
1	18/10/2024	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E.-161	RIMINI - SAN BERNARDO DEL VIENTO	1	95	103	SI	ABSCISA K0+332
2	18/10/2024	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E.-161	RIMINI - SAN BERNARDO DEL VIENTO	1	95	105	SI	ABSCISA K0+290
3	18/10/2024	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E.-161	RIMINI - SAN BERNARDO DEL VIENTO	1	95	105	SI	ABSCISA K0+270
4	18/10/2024	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E.-161	RIMINI - SAN BERNARDO DEL VIENTO	1	95	104	SI	ABSCISA K0+240
5	18/10/2024	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E.-161	RIMINI - SAN BERNARDO DEL VIENTO	1	95	105	SI	ABSCISA K0+170
6	18/10/2024	DENSIDAD Y PESO UNITARIO DEL SUELO EN EL TERRENO POR MÉTODO DEL CONO DE ARENA	I.N.V. E.-161	RIMINI - SAN BERNARDO DEL VIENTO	1	95	103	SI	ABSCISA K0+160
Para el periodo reportado, se consideran los ensayos realizados en el mes anterior, en atención a la solicitud de proyección correspondiente para noviembre de 2024, tal como fue requerido por el INVIAS.									
NOTAS: 1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo. 2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo. 3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad. 4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras. 5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual. 6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma  Nombre: HABIB CHAAR SAKR Representante legal o apoderado del Contratista Cédula de ciudadanía No.: 15.647.894					Firma  Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES Representante legal o apoderado del Interventor Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	54

4.7 Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra - MEPI-MN1-IN-15-FR-12

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA				30	11	2024
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
--	--------------------------------

CONTRATO DE OBRA No. 159-2023	CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA
-------------------------------	------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	

FECHA DE INICIO: 28 DE DICIEMBRE DE 2023	
PLAZO INICIAL: HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023	
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 20 DE DICIEMBRE DE 2024 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>	
VALOR INICIAL: \$ 14.100.000.000,00	
VALOR ACUMULADO: \$ 14.100.000.000,00 <small>(Incluye adiciones)</small>	
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 80.003.700,00	
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS: \$ 80.003.700,00	

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 DE 2023	INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON-INCO
--	-------------------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL
--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Cumplimiento	10	\$ 1.410.000.000,00	Desde			Hasta		
			19	10	2023	30/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	\$ 5.640.000.000,00	19	10	2023	30/06/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.820.000.000,00	19	10	2023	31	12	2025
Calidad de Estudios y Diseños	30	\$ 24.001.110,00	31	12	2023	31	12	2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	\$ 4.230.000.000,00	31	12	2023	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400052428	
Certificado de modificación o anexo No.: 0 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small>	
Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP: N.D	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL
--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% del valor de la pérdida	\$ 705.000.000,00	Desde			Hasta		
			19	10	2023	31	12	2023
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400052429	OTRAS PÓLIZAS No.
Certificado de modificación o anexo No.: 0 <small>(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)</small>	
Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS	
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: N.D	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA				30	11	2024
				(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
--	--------------------------------

CONTRATO DE OBRA No. 159-2023	CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA
-------------------------------	------------------------------------

OBJETO DEL CONTRATO:	
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.	
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.:
MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10	\$ 1.410.000.000,00	19	10	2023	20/06/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	\$ 5.640.000.000,00	19	10	2023	20/06/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 2.820.000.000,00	19	10	2023	20	12	2027
Calidad de Estudios y Diseños	30	\$ 24.001.110,00	31	12	2023	20	12	2029
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	\$ 4.230.000.000,00	31	12	2023	20	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 400052428	
Certificado de modificación o anexo No. 3 <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small>	
Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS	
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES	
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.	
ADICIONAL No.:	PRÓRROGA No.: 6
MODIFICACIÓN No.:	SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% del valor de la pérdida	\$ 705.000.000,00	19	10	2023	20	12	2024
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 400052429		OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No. 3 <small>(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)</small>			
Razón Social Compañía Aseguradora: NACIONAL DE SEGUROS			
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

OBSERVACIONES:
El contratista de obra presentó la actualización de pólizas según prórroga y el municipio presentó resolución de aprobación.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

 Firma	Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD
--	---

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		30	11	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CORDOBA
-------------------	------------------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	LP-006-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
----------------------	-------------	--------------	--

OBJETO DEL CONTRATO:				
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA				

FECHA DE INICIO:	29 DE DICIEMBRE DE 2023			
PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	20 DE DICIEMBRE DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)			
VALOR INICIAL:	\$	6.140.057.707,00		
VALOR ACUMULADO:	\$	6.140.057.707,00		
		(Incluye adiciones)		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	26.974.444,00		
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$	26.974.444,00		

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5053 DE 2023	INTERVENTOR:	CONSORCIO INGECON-INCO
-------------------------------	--------------	--------------	------------------------

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL									
			VIGENCIA						
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Desde			Hasta			
Cumplimiento	10	\$ 614.005.770,70	27	12	2023	11/08/2024			
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	100	\$ 1.842.017.312,10	27	12	2023	11/08/2024			
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20	\$ 1.228.011.541,40	27	12	2023	11	2	2027	
Calidad de Estudios y Diseños	30	\$ 1.842.017.312,10	27	12	2023	27	12	2028	
Estabilidad y/o Calidad de Obra	30	\$ 1.842.017.312,10	31	12	2023	31	12	2028	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	53-44-101029789
Certificado de modificación o anexo No.:	0
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)	
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	N.D

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL									
			VIGENCIA						
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Desde			Hasta			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10% del valor de la pérdida	\$ 580.000.000,00	27	12	2023	11	2	2024	
Otros			Día	Mes	Año	Día	Mes	Año	

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	53-40-101009808	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	0		
(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)			
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:	N.D		

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.									
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		1		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:	
Amparo			% Amparo	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA			
						Desde			Hasta
Cumplimiento			10	\$ 614.005.770,70		27 12 2023			15/05/2025
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			100	\$ 1.842.017.312,10		27 12 2023			15/05/2025
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			20	\$ 1.228.011.541,40		27 12 2023			15 11 2027
Calidad de Estudios y Diseños			30	\$ 1.842.017.312,10		27 12 2023			29 12 2028
Estabilidad y/o Calidad de Obra			30	\$ 1.842.017.312,10		31 12 2023			30 11 2029
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 53-44-101029789									
Certificado de modificación o anexo No.: 4 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)									
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A									
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:									
SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES									
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.									
ADICIONAL No.:		PRÓRROGA No.:		6		MODIFICACIÓN No.:		SUSPENSIÓN No.:	
Seguro			% Asegurado	Valor Asegurado (\$)		VIGENCIA			
						Desde			Hasta
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)			10% del valor de la pérdida	\$ 650.000.000,00		27 12 2023			15 11 2024
Otros						Día Mes Año			Día Mes Año
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 53-40-101009808 OTRAS PÓLIZAS No.									
Certificado de modificación o anexo No. 5 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)									
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A									
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP: 21/02/2024									
OBSERVACIONES:									
El contratista de obra presentó la actualización de pólizas por parte de la aseguradora relacionada con la prórroga #1.									
NOTAS:									
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.									
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).									
Firma									
Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES									
Director de Interventoría									
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.									
Copias: Interventor y Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		30	11	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CÓRDOBA
-------------------	---------------------------------	------------------------	---------

CONTRATO DE OBRA No.	LP-MSBV-008-2023	CONTRATISTA:	CONSORCIO L&S
----------------------	------------------	--------------	---------------

OBJETO DEL CONTRATO:	MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA		
----------------------	---	--	--

FECHA DE INICIO:	28/12/2023		
PLAZO INICIAL:	31/12/2023		
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	20/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)		
VALOR INICIAL:	\$ 2.115.723.321,00		
VALOR ACUMULADO:	\$ - (Incluye adiciones)		
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ 14.973.437,00		
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5053-2023	INTERVENTOR:	CONSORCIO INGECON-INCO

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL			
---	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 211.572.332,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	\$ 634.716.996,30
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	\$ 211.572.332,10
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	\$ 211.572.332,10

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
28	12	2023	28	10	2024
28	12	2023	28	10	2024
28	12	2023	30	4	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÁS					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	11-44-101211826
Certificado de modificación o anexo No.:	2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL			
---	--	--	--

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 348.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
28	12	2023	29	4	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	11-40-101057085	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	2 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	SEGUROS DEL ESTADO S.A.		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA SEGUIMIENTO GARANTIAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		30	11	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento	10%	\$ 211.572.332,10
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	30%	\$ 634.716.996,30
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	10%	\$ 211.572.332,10
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	10%	\$ 211.572.332,10

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
28	12	2023	30	11	2024
28	12	2023	30	11	2024
28	12	2023	31	5	2027
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
SI AMPARA 5 AÑOS, 0 MESES Y 1 DÁS					

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 11-44-101211826

Certificado de modificación o anexo No.: 4
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: 2 MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		\$ 348.000.000,00
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
28	12	2023	31	5	2024
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. 11-40-101057085 OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A.


Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).



Firma

Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES

Director de Interventoría

Matrícula Profesional No.: 17202153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	55

4.8 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra - MEPI-MN-1IN-15-FR-14

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	FECHA	30/11/2024 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
--	-------	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 159-2023
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
 MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA

FECHA DE INICIO: 28/12/2023 PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO: 20/12/2024
(Indicar día, mes y año) (Indicando el día, mes y año) (Incluye prórrobas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053-2023
(Indicar número y año)

INTERVENTOR: _____

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☐ NO ☐ VERSIÓN No. _____ FECHA DE VERSIÓN: _____

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI ☐ NO ☒ No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: _____
 PRESENTE INFORME DE AUDITORÍA: SI ☐ NO ☐ No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: _____ FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: _____

OBSERVACIONES:
 Durante el mes no se tenían programadas auditorías de calidad.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI ☒ NO ☐ APROBADO: SI ☐ NO ☐ FECHA DE APROBACIÓN: _____

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES 0 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 0
 CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ☐ NO ☐

OBSERVACIONES:
 Durante el mes no se contaron ensayos y medicion.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
 La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
 La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0
 No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0
 No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0
 No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0
 No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA		30/11/2024
		(Día) (Mes) (Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

Durante el mes del presente informe no se han realizado ensayos y calibración de equipos.

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma
Nombre: EMIRO CARLOS BÁRGUIL CUBILLOS
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 25202-151814

Firma
Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma
Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante legal
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA

30/11/2024

(Día) (Mes) (Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No.

LP-006-2023

(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

Mejoramiento en pavimento rígido de la vía Barranquillita localizada en el municipio de los Córdoba, departamento de Córdoba

CONTRATISTA:

CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

FECHA DE INICIO:

28/12/2023

(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL:

31/12/2023

FECHA DE VENCIMIENTO:

30/11/2024

(Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

5053-2023

(Indicar número y año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO INGECON-INCO

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO:

SI

NO

..

APROBADO:

SI

X

..

N

.....

VERSIÓN No.

2

FECHA DE VERSIÓN:

11/04/2024

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:

...

NO

..X.....

o. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:

0

FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:

PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:

...

NO

.....

No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:

FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

Durante el mes no se tenían programadas auditorías de calidad.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO:

SI

X

NO

..

APROBADO:

SI

X

..

NO

FECHA DE APROBACIÓN:

29/04/2024

No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL ME:

0

No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:

0

CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:

SI

.....

.....

OBSERVACIONES:

Durante el mes no se contaron ensayos y medicion.

El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute.
La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes:

0

No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:

0

No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:

0

No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:

0

No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

0

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:

0

No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:

0

No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:

0

No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:

0

No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:

0

No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

0

OBSERVACIONES:

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

30/11/2024

(Día) (Mes) (Año)

6. INDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

Durante el mes del presente informe no se han realizado ensayos y calibración de equipos.

NOTA:

Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.



Firma

Nombre: CESAR AUGUSTO RÍOS GONZALEZ
Rep. Legal - Contratista de obra
Matrícula Profesional No.: CN230 28549



Firma

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Obra
Matrícula Profesional No.:



Firma

Nombre: ANGELA MARÍA DÁVILA MORALES
Rep. Legal - Interventoría
Matrícula Profesional No.:




Firma

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-14
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	
			FECHA	30/11/2024 <small>(Día) (Mes) (Año)</small>
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	
CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023 <small>(Indicar número y año)</small>				
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: Mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en el municipio de San Bernardo del Viento, Departamento de Córdoba				
CONTRATISTA: CONSORCIO L&S				
FECHA DE INICIO: 28/12/2023 <small>(Indicar día, mes y año)</small> PLAZO INICIAL: 31/12/2023 FECHA DE VENCIMIENTO: 20/12/2024 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 5053-2023 <small>(Indicar número y año)</small>				
INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON-INCO				
1. PLAN DE CALIDAD				
PRESENTADO: SI N ... APROBADO: SI ... NO ... VERSIÓN No. 1 FECHA DE VERSIÓN: 8/03/2024				
OBSERVACIONES:				
2. AUDITORIAS DE CALIDAD				
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: ... N .X. ... No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: 0 FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA: ... PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: ... N ... No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: ... FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA: ...				
OBSERVACIONES: Durante el mes no se tenían programadas auditorias de calidad.				
3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)				
PRESENTADO: SI NO .X. ... APROBADO: SI ... NO ... FECHA DE APROBACIÓN: ...				
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: 0 No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES: 0				
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI ...				
OBSERVACIONES: Durante el mes no se contaron ensayos y medicion.				
El plan de Inspección, medición y ensayo debe cumplir en un todo con las exigencias contractuales, las normas de ensayos y las especificaciones de construcción del Instituto Nacional de Vías. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en las exigencias del PIMyE y en la obra que se ejecute. La cantidad de ensayos realizados debe responder a las exigencias del PIMyE y de la obra ejecutada.				
4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES				
No. de No Conformidades reportadas en el mes: 0 No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes: 0				
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: 0 No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato: 0				
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato: 0				
OBSERVACIONES:				
5. QUEJAS Y RECLAMOS				
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: 0 No. De quejas y reclamos atendidas en el mes: 0				
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato: 0				
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: 0 No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato: 0				
OBSERVACIONES:				
Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-JN-15-FR-14				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA					
		FECHA	30/11/2024 (Día) (Mes) (Año)				
6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)							
Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)					
IG1: Índice de gestión 1 =							
IG2: Índice de gestión 2 =							
IG3: Índice de gestión 3 =							
IG4: Índice de gestión 4 =							
IG5: Índice de gestión 5 =							
IGn: Índice de gestión n =							
Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.							
OBSERVACIONES:							
7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).							
No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios
OBSERVACIONES:							
Durante el mes del presente informe no se han realizado ensayos y calibración de equipos.							
NOTA: Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.							
Firma 	Firma	Firma 	Firma				
Nombre: HABIB CHAAR SAKR Rep. Legal - Contratista de obra Cédula de ciudadanía No.: 15.647.894	Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Obra Matrícula Profesional No.:	Nombre: ANGELA MARIA DÁVILA MORALES Director de la Interventoría Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD	Nombre: Profesional en Calidad Contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.:				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.							

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	56

4.9 Seguimiento a la inversión del Anticipo - MEPI-MN-IN-2-FR-1 y MEPI-MN-IN-2-FR-2

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO MENSUALIZADO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-2-FR-1			
			VERSIÓN	1			
			PÁGINA	1	DE	1	
			FECHA	30	11	2024	
				(Día)	(Mes)	(Año)	
UNIDAD EJECUTORA <u>MUNICIPIO DE PLANETA RICA - CÓRDOBA</u> DIRECCIÓN TERRITORIAL _____							
DATOS GENERALES							
CONTRATO DE OBRA No. <u>159</u> DE <u>2023</u> CONTRATISTA: <u>CONSORCIO PROVIDENCIA</u>							
OBJETO DEL CONTRATO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. <u>5053</u> DE <u>2023</u> INTERVENTOR: <u>CONSORCIO INGECON - INCO</u>							
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. <u>3</u>							
JUSTIFICACIÓN Teniendo en cuenta la dinamica del proyecto, se hace necesario un cambio del plan de manejo del anticipo, bajandole el porcentaje de la mano de obra, quitando el ítem de compra de maquinaria y aumentandole así al ítem de suministro de materiales y transporte, garantizando con esto el flujo de suministro de materiales tipo concreto, acero y subbase. Siendo esto una necesidad para darle el avance requerido a la obra							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO							
ITEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COMPRA DE MATERIALES	\$ 435.500.013,06	\$ 777.450.024,80	\$ 1.399.500.065,27		\$ 2.612.450.103,13	59,99%
2	PAGO DE MANO DE OBRA	\$ -	\$ 217.750.006,53	\$ 217.000.000,00		\$ 434.750.006,53	9,98%
3	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CON SUS REPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	0,00%
4	TRANSPORTE	\$ 217.750.006,53	\$ 529.050.014,36	\$ 561.000.000,00		\$ 1.307.800.020,89	30,03%
5							
TOTAL		\$ 653.250.019,58	\$ 1.524.250.045,69	\$ 2.177.500.065,27	\$ -	\$ 4.355.000.130,55	100%
NOTAS: a) Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor del anticipo otorgado al contratista. b) El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo con sus repuestos, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el contratista y revisados y aprobados por la interventoría. c) Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo con sus repuestos; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se estudiará y conceptuará por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realizará por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General del INVIAS para cada caso específico. d) No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria. e) El contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.							
Firma: 		Firma: 					
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS Representante Legal CONSORCIO PROVIDENCIA Contratista		ANGELA MARIA DAVILA MORALES Representante Legal CONSORCIO INGECON - INCO Interventor					
Original: Archivo de Gestión del contrato (Subdirección Administrativa) Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.							

	<small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small> <small>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</small> <small>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</small> <small>INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA</small>	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

	1 de 1 FECHA: 30/11/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
--	---

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA
--	--------------------------------

DATOS GENERALES			
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____	MES: NOVIEMBRE	INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐	
CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 <small>(Indicar número y año)</small>			
CONTRATO DE FIDUCIA No. 3-1-119640 DE 2024 <small>(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)</small>		ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA BOGOTÁ	
CUENTA BANCARIA No. 003003712 BANCO BOGOTÁ <small>(Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)</small>		SUCURSAL: BOGOTÁ D.C.	
ANTICIPO OTORGADO: 40 % VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: \$ 4.355.000.130,55 (M/CTE)			

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 de 2023 <small>(Indicar número y año)</small>	
INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON - INCO	

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO						
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	FEN 468	25-sep-24	JDC INGENIERIA SAS	\$ 26.200.301,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	FEN 469	25-sep-24	JDC INGENIERIA SAS	\$ 40.951.311,00	4	TRANSPORTE
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	CCJ016380	14-sep-24	FERRETERIA LA TRONCAL	\$ 57.900,02	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	CCJ016539	25-sep-24	FERRETERIA LA TRONCAL	\$ 1.080.598,50	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	CCJ016199	3-sep-24	FERRETERIA LA TRONCAL	\$ 1.366.001,50	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	CCJ016456	19-sep-24	FERRETERIA LA TRONCAL	\$ 1.124.598,50	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	CCJ016122	28-ago-24	FERRETERIA LA TRONCAL	\$ 915.000,01	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	CCJ016496	23-sep-24	FERRETERIA LA TRONCAL	\$ 990.598,50	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	IDP 14	26-sep-24	INVERSIONES D&P S.A.S	\$ 174.621.367,80	4	TRANSPORTE
FACT. PROFORMA	No.1	15-oct-24	JDC INGENIERIA SAS	\$ 88.386.504,88	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. PROFORMA	No.1	15-oct-24	JDC INGENIERIA SAS	\$ 136.612.745,46	4	TRANSPORTE
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	FEN 478	9-oct-24	JDC INGENIERIA SAS	\$ 22.939.566,22	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	FEN 479	9-oct-24	JDC INGENIERIA SAS	\$ 35.854.749,33	4	TRANSPORTE
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	FEN 470	27-sep-24	JDC INGENIERIA SAS	\$ 21.509.417,61	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	FEN 471	27-sep-24	JDC INGENIERIA SAS	\$ 33.619.416,75	4	TRANSPORTE
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	FEN 480	22-oct-24	JDC INGENIERIA SAS	\$ 18.584.298,62	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. ELECTRONICA DE VENTA	FEN 481	22-oct-24	JDC INGENIERIA SAS	\$ 29.149.952,76	4	TRANSPORTE
FACT. PROFORMA	No.11868	21-oct-24	FERRETERIA LA TRONCAL	\$ 319.792.101,00	1	COMPRA DE MATERIALES
FACT. PROFORMA	No.2	2-nov-24	JDC INGENIERIA SAS	\$ 277.425.721,20	4	TRANSPORTE
FACT. PROFORMA	No.2	2-nov-24	JDC INGENIERIA SAS	\$ 179.490.497,29	1	COMPRA DE MATERIALES
VALOR TOTAL:				\$ 1.410.672.647,95		

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM						
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	COMPRA DE MATERIALES	\$ 2.612.450.103,13	\$ 502.946.886,35	\$ 179.490.497,29	\$ 682.437.383,64	\$ 1.930.012.719,49
2	PAGO MANO DE OBRA	\$ 434.750.006,53	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 434.750.006,53
3	COMPRA DE MAQUINARIA Y EQUIPOS CON SUS REPUESTOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	TRANSPORTE	\$ 1.307.800.020,89	\$ 450.809.543,10	\$ 277.425.721,20	\$ 728.235.264,30	\$ 579.564.756,59
TOTALES		\$ 4.355.000.130,55	\$ 953.756.429,46	\$ 456.916.218,49	\$ 1.410.672.647,95	\$ 2.944.327.482,60

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (NOVIEMBRE):	\$ -
	<small>(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)</small>
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:	\$ -
	<small>(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)</small>

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO
A LA FECHA DEL PRESENTE INFORME NO SE HA REALIZADO DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS					

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)

OBSERVACIONES:
PENDIENTE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS.

NOTA:
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.

Firma: Nombre: EMIRO CARLOS BARGUIL-CUBILLOS Representante Legal o su Apoderado Contratista: CONSORCIO PROVIDENCIA Matricula Profesional No.: 25202-151814	Firma: Nombre: ÁNGELA DAVILA MORALES Representante Legal o su Apoderado Interventor: CONSORCIO INGECON - INCO Matricula Profesional No.: 17202-153798 CLD
--	---

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-2-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA		30/11/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)		

DATOS GENERALES	
CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023 (Indicar número y año)	CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
OBJETO DEL CONTRATO:	
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 DE 2023 (Indicar número y año)	INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON - INCO
JUSTIFICACIÓN:	
NA	
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)	

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2			VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	MATERIALES	\$ 386.823.636,00	\$ 165.781.558,00			\$ 552.605.194,00	30%
2	MAQUINARIA Y EQUIPO	\$ 193.411.818,00	\$ 82.890.779,00			\$ 276.302.597,00	15%
3	TRANSPORTE	\$ 322.353.030,00	\$ 138.151.298,00			\$ 460.504.328,00	25%
4	COSTO PERSONAL	\$ 386.823.636,00	\$ 165.781.557,10			\$ 552.605.193,10	30%
TOTAL		\$ 1.289.412.120,00	\$ 552.605.192,10			\$ 1.842.017.312,10	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:		Firma:	
Nombre: CESAR AUGUSTO RIOS GONZALEZ		Nombre: ANGELA DAVILA MORALES	
Representante Legal o su Apoderado		Representante Legal o su Apoderado	
Contratista: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA		Interventor : CONSORCIO INGECON - INCO	
Matrícula Profesional No.: CN230-28549		Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD	

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO	1 de 1 MEPI-MN1-IN-2-FR-2		
				VERSIÓN	1		
				PÁGINA			
				FECHA		30/11/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA			
DATOS GENERALES							
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____				MES: NOVIEMBRE		INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐	
CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023 (Indicar número y año)				ENTIDAD FINANCIERA: FIDUCIARIA			
CONTRATO DE FIDUCIA No. FID 3-1-8940 DE 28/02/2024 (Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)				SUCURSAL: MONTERIA			
CUENTA BANCARIA No. 892-82618-1 BANCO BANCO DE OCCIDENTE (Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)							
ANTICIPO OTORGADO: 30 %							
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: \$ 1.842.017.312,10 (M/CTE)							
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:							
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA							
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 de 2023 (Indicar número y año)							
INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON - ICO							
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO							
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	*ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	
FACTURA ELEC. DE VENTA	FETC-5	3-may-24	TRANSPORTE Y CARGA SAS	\$ 161.850.000,00	TRANSPORTE	Anticipo Transporte Material	
CUENTA DE COBRO	001-BQLL	5-abr-24	RAMON MONTIEL BANDA	\$ 187.500.000,00	MANO DE OBRA	Anticipo Mano de Obra	
FACTURA ELEC. DE VENTA	105808	3-abr-24	DEPOSITO ABO SAS	\$ 336.814.259,00	MATERIALES	Compra Materiales	
PREFACTURA	223467984	3-abr-24	EMARCO SAS	\$ 49.960.000,00	MATERIALES	Suministro de Triturado	
FACTURA ELEC. DE VENTA	FETC-6	30-jul-24	TRANSPORTE Y CARGA SAS	\$ 254.800.000,00	TRANSPORTE	Anticipo Transporte Material	
CUENTA DE COBRO	002-BQLL	17-jul-24	RAMON MONTIEL BANDA	\$ 145.000.000,00	MANO DE OBRA	Anticipo Mano de Obra	
FACTURA ELEC. DE VENTA	112284	1-ago-24	DEPOSITO ABO SAS	\$ 200.094.213,00	MATERIALES	Compra Materiales	
FACTURA ELEC. DE VENTA	CRE 58	1-oct-24	DEPOSITO ABO SAS	\$ 505.996.767,00	MATERIALES	Compra Materiales	
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría)							
** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.							
NOTA: El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.							
SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)	
1	MATERIALES	\$ 1.092.867.312,10	\$ 586.868.472,00	\$ 505.996.767,00	\$ 1.092.865.239,00	\$ 2.073,10	
2	MAQUINARIA Y EQUIPO			\$ -	\$ -	\$ -	
3	TRANSPORTE	\$ 416.650.000,00	\$ 416.650.000,00	\$ -	\$ 416.650.000,00	\$ -	
4	COSTO DE PERSONAL	\$ 332.500.000,00	\$ 332.500.000,00	\$ -	\$ 332.500.000,00	\$ -	
TOTALES		\$ 1.842.017.312,10	\$ 1.336.018.472,00	\$ 505.996.767,00	\$ 1.842.015.239,00	\$ 2.073,10	
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (NOVIEMBRE) : \$ 103.696,65 (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)							
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ 103.696,65 (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)							
RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES							
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO		
892F042241000001	\$ 1.842.017.312		\$ 352.329.68	9/04/2024	\$ 352.329.68		
892F042241300001	\$ 1.842.017.312		\$ 377.518.34	9/05/2024	\$ 729.848.02		
892F042241630001	\$ 1.842.017.312		\$ 290.400.93	11/06/2024	\$ 1.020.248.95		
M892127	\$ 1.842.017.312		\$ 226.690.32	10/07/2024	\$ 1.246.939.27		
M892119	\$ 1.842.017.312		\$ 234.231.02	9/08/2024	\$ 1.481.170.29		
M892324	\$ 1.842.017.312		\$ 156.369.19	9/09/2024	\$ 1.637.539.48		
M892121	\$ 1.842.017.312		\$ 103.696.65	9/10/2024	\$ 1.741.236.13		
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)							
OBSERVACIONES:							
NOTA: Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista							
Firma:  Nombre: CESAR AUGUSTO RIOS GONZALEZ Representante Legal o su Apoderado Contratista: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA Matrícula Profesional No.: CN230-28549			Firma:  Nombre: ANGELA DAVILA MORALES Representante Legal o su Apoderado Interventor: CONSORCIO INGECON - INCO Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.							



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO

MEPI-MN1-IN-2-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

FECHA

30/11/2024

(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CÓRDOBA

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No.

(Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)

DATOS GENERALES

CONTRATO DE OBRA No.

LP-MSBV-008-2023

(Indicar número y año)

CONTRATISTA:

CONSORCIO L&S

OBJETO DEL CONTRATO:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.

5053 DE 2023

(Indicar número y año)

INTERVENTOR:

CONSORCIO INGECON-INCO

JUSTIFICACIÓN:

N/A

(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)

DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES 4	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	SALARIOS, HONORARIOS, MANO DE OBRA		\$ 32.491.702,00	\$ 72.990.503,00	\$ 129.363.081,00	\$ 234.845.286,00	37%
2	TRANSPORTE DE MATERIAL Y MAQUINARIA		\$ 24.588.315,00	\$ 55.236.057,00	\$ 97.896.386,00	\$ 177.720.758,00	28%
3	COMPRA DE MATERIALES		\$ 30.735.394,00	\$ 69.045.071,00	\$ 122.370.487,30	\$ 222.150.952,30	35%
	TOTAL	\$ -	\$ 87.815.411,00	\$ 197.271.631,00	\$ 349.629.954,30	\$ 634.716.996,30	100%

NOTAS:

1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Contratista.

2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del contrato tales como, materiales, maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del anticipo deben estar sustentados por el Contratista y revisados y aprobados por la Interventoría.

3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de maquinaria y equipo; en el evento en que se requiera un mayor porcentaje se debe estudiar y conceptuar por parte del Interventor, previa solicitud y justificación del Contratista. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo para compra de maquinaria y equipo debe realizarse por medio de Resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de obra específico.

4. No se podrá invertir porcentaje alguno del anticipo en alquiler de maquinaria.

5. El Contratista deberá programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con la Interventoría para su inversión.

6. Invertida la totalidad del anticipo o terminado el contrato de manera anticipada, el Contratista y el Interventor deben cancelar la cuenta bancaria anulando los cheques sobrantes y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Subdirección Financiera y a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del contrato y el nombre del Contratista. Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.

Firma:



Nombre: **HABIB CHAAR SAKR**

Representante legal o apoderado del Contratista

Cédula de ciudadanía No.: 15.647.894

Firma:



Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**

Representante Legal o su Apoderado

Interventor

Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO 1 MEPI-MN1-IN-2-FR-2			
		VERSIÓN 1				
		PÁGINA				
FECHA			30/11/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA				
DATOS GENERALES						
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____		MES: NOVIEMBRE	INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐			
CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023 (Indicar número y año)						
CONTRATO DE FIDUCIA No. 318977 DE 2024 (Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo a través de patrimonio autónomo)		ENTIDAD FINANCIERA: FIDUOCCIDENTE				
CUENTA BANCARIA No. 25690968-0 BANCO OCCIDENTE (Diligenciar si corresponde al manejo del anticipo en cuenta bancaria conjunta)		SUCURSAL: MONTERIA				
ANTICIPO OTORGADO: 30 %						
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: \$ 634.716.996,00 (M/CTE)						
OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:						
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS						
CONTRATISTA: CONSORCIO L&S						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 de 2023 (Indicar número y año)						
INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON - INCO						
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO						
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
FACTURA ELECTRONICA	FBO3	20-sep-24	BOOCAS CONSTRUCCION E INGENIERIA SAS	\$ 70.000.000,00	2	TRANSPORTE DE MATERIALES
CUENTA DE COBRO	DPTO-CT-00016	7-oct-24	DISTRIAS SAS	\$ 29.629.602,66	3	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA ELECTRONICA	DM5948	16-sep-24	CONSORCIO L&S	\$ 4.637.944,08	3	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA ELECTRONICA	DM525	16-sep-24	CONSORCIO L&S	\$ 6.183.925,44	3	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA ELECTRONICA	DM3169	16-sep-24	CONSORCIO L&S	\$ 4.637.944,08	3	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA ELECTRONICA	DM1222	16-sep-24	CONSORCIO L&S	\$ 1.167.488,29	3	COMPRA DE MATERIALES
FACTURA ELECTRONICA	CL1468	29-oct-24	CONCRETO DE LORICA SAS	\$ 50.000.000,00	2	TRANSPORTE DE MATERIALES
FACTURA ELECTRONICA	CL1469	29-oct-24	CONCRETO DE LORICA SAS	\$ 50.000.000,00	3	COMPRA DE MATERIALES
			ROQUE RAFAEL JANNE MIGUEL	\$ 50.000.000,00	3	COMPRA DE MATERIALES
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).						
** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de obra formato MEPI-MN1-IN-2-FR-1.						
NOTA: El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo y copia de los informes presentados por la correspondiente Fiduciaria en los casos de anticipos manejados en patrimonios autónomos.						
SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE OBRA POR ÍTEM						
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
1	SALARIOS, HONORARIOS, MANO DE OBRA	\$ 234.845.286,00		\$ -	\$ -	\$ 234.845.286,00
2	TRANSPORTE DE MATERIAL Y MAQUINARIA	\$ 177.720.758,00	\$ 120.000.000,00	\$ 57.720.758,00	\$ 177.720.758,00	\$ -
3	COMPRA DE MATERIALES	\$ 222.150.952,30	\$ 146.000.000,00	\$ 70.000.000,00	\$ 216.000.000,00	\$ 6.150.952,30
	TOTALES	\$ 634.716.996,30	\$ 266.000.000,00	\$ 127.720.758,00	\$ 393.720.758,00	\$ 240.996.238,30
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (AGOSTO) : (Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)						
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: (Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)						
RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES						
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO	
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-2)						
OBSERVACIONES: SE ENCUENTRA PENDIENTE DEVOLUCIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL ANTICIPO.						
NOTA: Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Contratista de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros <u>indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Contratista.</u>						
Firma:  Nombre: HABIB CHAAR SAKR Representante Legal o su Apoderado Contratista: CONSORCIO L&S Cédula de ciudadanía No.: 15.647.894		Firma:  Nombre: ANGELA DAVILA MORALES Representante Legal o su Apoderado Interventor : CONSORCIO INGECON - INCO Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial						

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	57

4.10 Seguimiento al Programa de inversiones - MEPI-MN-IN-6-FR-1 y MEPI-MN-IN-6-FR-2

<small>INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</small> <small>PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</small> <small>MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA</small> <small>PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES N°1</small>															CÓDIGO	MEP/MTI-046-FR-1			
															VERSIÓN	0			
															PÁGINA				
															FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>					DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CÓRDOBA</u>					PROGRAMA DE INVERSIONES <u>1</u> REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. <u>1</u> (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)									
CONTRATO No.: <u>159-2023</u>					PLAZO INICIAL: <u>HASTA 31 DE DICIEMBRE DE 2023</u> (En meses según contrato principal)					PLAZO ACUMULADO: <u>10.66 MESES</u> (En meses según las prórrogas sin suspensiones)									
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO N°2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS					FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: <u>28/12/2023</u> (Indique día/mes/año)					FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: <u>20/12/2024</u> (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)									
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO PROVIDENCIA</u>					FECHA DE SUSPENSIÓN: <u>28/12/2023</u> (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)					FECHA DE REANUDACIÓN: <u>1/02/2024</u> (Indique día/mes/año)									
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: <u>5053 DE 2023</u>					INTERVENIENTOR: <u>CONSORCIO INGECONINCO</u>					VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): <u>\$ 14.100.000.000.00</u> (Según contrato principal)					VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): <u>\$</u>				
					VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): <u>\$ 14.100.000.000.00</u>														

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado \$ Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
	VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA	% Ejecutado												
EXPLANACIONES	\$123.340	0.93%	0.92%	% P \$92.227 \$41.113	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24	100%
ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=8M	\$272.647	2.06%	0.00%	% E \$2.165 \$65.919 \$84.611												90%
CONSTRUCCIÓN DE BOX CULVERT 2X2(L=8M)	\$411.914	3.12%	0.00%	% P \$0 \$0												80%
PAVIMENTO EN CONCRETO RIGIDO PLACAS 2.5X3	\$12.243.642	92.63%	27.90%	% P \$3.687.490 \$0												70%
TRANSPORTE	\$102.696	0.78%	3.63%	% E \$479.670 \$0												60%
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	\$64.100	0.48%	0.00%	% P \$0 \$0												50%
				% E \$0 \$0												40%
				% P \$0 \$0												30%
				% E \$0 \$0												20%
				% P \$0 \$0												10%
				% E \$0 \$0												0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 13.218.339.70	100.00%	32.45%	% E												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ -	0.00%		% E												

	%	0.00%	0.75%	5.05%	12.44%	12.46%	14.64%	11.62%	13.61%	10.75%	11.39%	7.38%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$90.980	\$667.461	\$1.644.691	\$1.646.497	\$1.835.527	\$1.798.713	\$1.421.547	\$1.806.007	\$975.584	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$90.980	\$768.431	\$2.411.122	\$4.067.620	\$5.903.146	\$7.616.478	\$9.315.191	\$10.736.739	\$12.242.746	\$13.218.339.70
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13.538	\$254.139	\$628.126	\$829.297	\$1.093.844	\$1.470.000	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$0	\$13.538	\$267.677	\$895.803	\$1.725.099	\$2.818.934	\$4.288.934	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
1. ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN AJUSTES Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 80.003.70	\$ 80.003.70	0.57%
2. OBRAS DE COMPLEMENTACIÓN AUMENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS	\$ 84.516.80	\$ -	%
3. BOLSA DE AJUSTE	\$ 528.733.59	\$ -	%
4. PAGA	\$ 56.222.82	\$ -	%
5. PMT	\$ 132.183.40	\$ -	%
6. -	\$ -	\$ -	%
7. -	\$ -	\$ -	%
8. -	\$ -	\$ -	%
9. -	\$ -	\$ -	%
10. VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (1+2+3+4+5+6+7+8+9+10)	\$ 881.660.30		%
11. VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 14.100.000.00	\$ 4.368.937.28	30.99%

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTAS:

- En los eventos de suspensión del plazo contractual, el período real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.
- El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o al Valor Básico de Obra Actualizado (A').
- El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.


OBSERVACIONES:

--

Aprobado Firma: Emiro Carlos Banguile Cubillos
 Nombre: **EMIRO CARLOS BANGUILE CUBILLOS**
 Representante legal o apoderado del Contratista
 Matrícula Profesional No.: 25202-151814

Aprobado Firma: Angela María Dávila Morales
 Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
 Representante legal o apoderado del Interventor
 Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

	PROGRAMADO	EJECUTADO
	<div style="width: 100%; background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black;"></div>
	<div style="width: 100%; background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black;"></div>
	<div style="width: 100%; background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black;"></div>	<div style="width: 100%; background-color: #d3d3d3; border: 1px solid black;"></div>



CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	5053 DE 2023	INTERVENTOR:	CONSORCIO INGECON-INCO	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 14.100.000.000,00
--------------------------------	--------------	--------------	------------------------	---	----------------------

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	0.00%	0.75%	5.05%	12.44%	12.46%	14.64%	11.82%	13.61%	10.75%	11.39%	7.38%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$98,580	\$667,451	\$1,644,691	\$1,935,527	\$1,823,332	\$1,798,713	\$1,421,547	\$1,506,007	\$975,594
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	0.00%	0.75%	5.80%	18.24%	30.70%	45.34%	56.86%	70.47%	81.23%	92.62%	100.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$98,580	\$766,431	\$2,411,122	\$4,367,620	\$7,516,478	\$9,315,191	\$10,736,739	\$12,242,746	\$13,218,339.70
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	0.00%	0.00%	0.00%	1.36%	0.13%	0.00%	4.27%	8.12%	11.12%	10.00%	0.00%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$10,538	\$284,139	\$628,126	\$829,287	\$1,093,844	\$1,470,000	\$0
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.13%	2.03%	6.79%	13.95%	21.33%	32.49%	32.49%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$10,538	\$294,678	\$922,803	\$1,752,000	\$2,845,844	\$4,315,844	\$4,315,844

Matricula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

[illegible]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIÓN EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES N°1	CÓDIGO: MEP/MN-1-N-6-FR-2 VERSIÓN: 1 PÁGINA:
		FECHA: 30/11/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA	ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 3 DE 21/1/2024 (Indicar mes y año) SEGUIMIENTO No. 3 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)
CONTRATO No.: LP-006-2023		PLAZO ACUMULADO: 10.82 MESES (En meses según los cronogramas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 2012/2024 (Incluidas las suspensiones, indique días/meses/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA		FECHA DE REANUDACIÓN: 1/02/2024 (Indique días/meses/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 5053 DE 2023 INTERVENTOR: CONSORCIO INGENCO INICIO		VALOR INICIAL (incluido IVA (A)): \$ 6.140.057.707,00 (Según contrato original) VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A)+(B): \$ 6.140.057.707,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECCUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	% Programado / Valor Programado	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	Miles de pesos		Miles de pesos	% Ejecutado	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24
EXPLANACIONES	\$1.050.418	17,89%	\$1.050.418	17,89%				\$198.000	\$198.000	\$198.000				\$456.418
PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	\$4.076.484	69,41%	\$4.076.484	69,41%				\$1.000.000	\$1.000.000	\$1.000.000				\$2.000.000
ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOXCULVERT	\$90.638	1,54%	\$90.638	1,54%				\$45.319	\$45.319	\$45.319				\$90.638
MUROS DE CONTENCIÓN	\$0	0,00%	\$0	0,00%				\$0	\$0	\$0				\$0
TRANSPORTE	\$503.311	8,57%	\$503.311	8,57%				\$71.902	\$71.902	\$71.902				\$71.902
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	\$47.246	0,48%	\$47.246	0,48%				\$0	\$0	\$0				\$47.246
ITEM NO PREVISTOS	\$104.982	1,79%	\$104.982	1,79%				\$0	\$0	\$0				\$104.982
TOTAL OTROS ITEMS														
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	\$ 5.873.079,62	100%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')														

ETAPA DE AJUSTES ESTUDIOS Y DISEÑOS

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES	
TIPO DE DEBILLO	
BARRAS	PROGRAMADO: \$ Valor EJECUTADO: \$ Valor
CURVAS	PROGRAMADO: - - - - - EJECUTADO: —————

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	0,00%	0,00%	0,00%	5,37%	12,31%	11,54%	15,11%	15,11%	17,37%	22,88%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$315.221	\$722.869	\$677.590	\$677.198	\$677.198	\$1.626.503	\$1.343.616
INVERSIÓN OBRA EJECTADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$315.221	\$1.038.090	\$1.715.640	\$2.602.838	\$3.490.037	\$4.810.339	\$5.853.955
INVERSIÓN OBRA EJECTADA ACUMULADA	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$630.442	\$1.753.959	\$3.469.599	\$6.072.437	\$9.562.575	\$14.372.914	\$20.226.869
	%	0,00%	0,00%	0,00%	5,37%	12,31%	11,54%	15,11%	15,11%	17,37%	22,88%
	VALOR (Miles de Pesos)	\$0	\$0	\$0	\$630.442	\$1.753.959	\$3.469.599	\$6.072.437	\$9.562.575	\$14.372.914	\$20.226.869

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN AJUSTES Y/O MODIFICACION Y/O COMPLEMENTACION DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 26.974,44	\$ 26.974,44	0,44%
OBRAS DE COMPENSACION AMBIENTAL Y O COMPLEMENTARIAS	\$ 58.740,22	\$ -	%
* BOLSA DE AJUSTE	\$ 181.263,43	\$ -	%
	\$ -	\$ -	%
	\$ -		

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENCIÓN OBRA PÚBLICA PROGRAMA DE INVERSIONES O REPROGRAMACIÓN AL PROGRAMA DE INVERSIONES N°2														CÓDIGO	MEP/IN-INV-S-FR-1	
														VERSIÓN	0	
														PÁGINA		
														FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)	

UNIDAD EJECUTORA: <u>SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES</u>	DIRECCIÓN TERRITORIAL: <u>CÓRDOBA</u>	PROGRAMA DE INVERSIONES
REPROGRAMACIÓN PROGRAMA DE INVERSIONES No. <u>2</u> (Se debe llevar de forma consecutiva la numeración)		

CONTRATO No.: <u>LP-MSEV-008-2023</u>	PLAZO INICIAL: CUATRO (4) MESES (En meses según contrato original)	PLAZO ACUMULADO: 8.76 MESES (En meses según las órdenes sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: <u>28/12/2023</u> (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: <u>20/12/2024</u> (Incluidas las suspensiones. Indique día/mes/año)
CONTRATISTA: <u>CONSORCIO LAS</u>	FECHA DE SUSPENSIÓN: <u>29/12/2023</u> (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: <u>28/10/2024</u> (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: <u>5053 DE 2023</u>	INTERVENITOR: <u>CONSORCIO INGENCO INCO</u>	VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C+A+B): \$ <u>2.115.723.321,00</u>

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA	(%) OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA	(%) VALOR EJECUTADO	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	Miles de pesos		Miles de pesos	Miles de pesos	dic-23	ene-24	feb-24	mar-24	abr-24	may-24	jun-24	jul-24	ago-24	sep-24	oct-24	nov-24	dic-24
EXPLANACIONES	\$ 61.336,94	3,05%	\$100.086	\$ 61.336,94				\$ 0,00		\$ 37.322,14	\$ 0,00	\$ 1.434	\$ 32.158,43	\$ 15.269,52	\$ 15.269,52	\$ 15.901,39	\$ 15.901,39
PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO	\$ 1.504.593,63	74,91%	\$55.177	\$ 1.504.593,63				\$ 0,00		\$ 23.282	\$ 258.315,49	\$ 24.184,00	\$ 160.266,23	\$ 136.931	\$ 486.909	\$ 639.071	\$ 231.556
ANDENES	\$ 156.996,14	7,82%	\$0	\$ 156.996,14				\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 54.876,34	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 81.253
ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT	\$ 196.326,96	9,77%	\$0	\$ 196.326,96				\$ 0,00		\$ 3.465	\$ 25.741,71	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 35.988	\$ 69.570
TRANSPORTE	\$ 77.224,99	3,84%	\$0	\$ 77.224,99				\$ 0,00		\$ 45.262,56	\$ 7.473,21	\$ 9.120,04	\$ 10.214,45	\$ 6.471	\$ 6.471	\$ 6.203	\$ 0,00
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD VIAL	\$ 12.162,30	0,61%	\$0	\$ 12.162,30				\$ 0,00		\$ 0,00	\$ 6.081,15	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 11.592
VALOR BASICO DE OBRA (A)	\$ 2.008.640,38	100,00%	60,15%														
VALOR BASICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	\$ -	0,00%	0,00%														

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	VALOR (Miles de Pesos)	%	0,00%	0,00%	3,09%	10,09%	7,85%	25,27%	34,71%	18,99%
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	\$ 0	0,00%	0,00%	\$ 62.026,92	\$ 202.630,11	\$ 157.892,17	\$ 507.870,35	\$ 697.132,82	\$ 381.471,36	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	\$ 0	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	\$ 0	0,00%	0,00%	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Indique IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
* ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTES Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ 14.973,44	\$ 14.973,44	0,71%
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y O COMPLEMENTARIAS	\$ 20.289,18	\$ -	%
* BOLSA DE AJUSTE	\$ 71.819,73	\$ -	%
-	\$ -	\$ -	%
-	\$ -	\$ -	%
-	\$ -	\$ -	%
-	\$ -	\$ -	%
-	\$ -	\$ -	%
-	\$ -	\$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	\$ 107.082,34		%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')			%
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	\$ 2.115.723,32		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	\$ 1.223.267,44	\$ 87,82%	

NOTAS:

- En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.
- Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
- El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
- El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
- El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.
- El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').
- El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.
- Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

OBSERVACIONES:

Aproba Habib Chaar Sakr
Nombre: **HABIB CHAAR SAKR**
Representante legal o apoderado del Contratista
Cédula de ciudadanía No.: 15.647.894

Aproba ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Nombre: **ANGELA MARIA DAVILA MORALES**
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Original: Archivo de Gestión del INAVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

TIPO DE DIBUJO	CONVENCIONES			
	PROGRAMADO	REPROGRAMADO	REPROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS				
CURVAS				

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	58

4.11 Actas de comité de obra - MEPI-MN-IN-14-FR-1 y MEPI-MN-IN-14-FR-2



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEP/INV-01-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 12/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 156-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5053-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON - INCO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
LECTURA DE COMPROMISOS

APU: SE ENTREGARON. ESTÁ PENDIENTE DE REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
PROGRAMACIÓN: SE ENTREGÓ EL DÍA 7 DE ABRIL 2024. SE PRESENTAN OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
HOJA DE VIDA: EL CONTRATISTA SUBSANÓ LA HOJA DE VIDA DEL CAMBIO DEL DIRECTOR DE OBRA.
MAQUINARIA: SE SUBSANÓ Y ESTÁ EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
PMT: SE ENTREGARON. ESTÁ PENDIENTE DE REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN: SE ENTREGARON. ESTÁ PENDIENTE DE REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
PAGA: LA INTERVENTORIA LO DEVOLVIÓ CON OBSERVACIONES VERSIÓN 3. PENDIENTE ENTREGA.
FUENTES DE MATERIALES: PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA DE SIBERA. DEVUELTO CON OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: EL CONTRATISTA DE OBRA LOS PRESENTÓ EN EL DISEÑO DE PAVIMENTO. SOLO SE ENTREGÓ SUBBASE. PENDIENTE CARACTERIZACIÓN DE AFIRMADO.
PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA TRAMO PRIORIZADO: NO CUMPLE CON LA ENTREGA.
BALANCE DE OBRA: SE ENTREGÓ EL DÍA 12 DE JUNIO 2024. SE PRESENTAN OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
FUERON RADICADOS EL DÍA DE HOY 3 DE JULIO DE 2024.
FIDUCIA: PENDIENTE SUBSANACIONES.
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL SE ENTREGARON.
AJUSTE DE PÓLIZAS SE APROBARON.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Estado de la etapa de estudios y diseños
2. Estado de los documentos de inicio
3. Estado del inicio de la etapa de ejecución de obra
4. Propositiones y varios



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MNT-06-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 13/11/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Estado de estudios y diseños:

Diseño de pavimentos: Aprobado susceptible a cambios, si hay cambio de canteras.

Diseño geométrico: fue avalado, pendiente subsanación de documentos de forma.

Diseño hidráulico: La interventoría aprobó los drenes, y las obras hidráulicas aprobadas, se observa el diseño del muro ubicado en el K3+890. No se ha vuelto a radicar, el diseño ajustado del muro y tampoco se ha radicado la aleta del puente del K4+200. Se radico diseño pro parte del contratista y esta en revision por parte de la interventoria.

Diseño estructural: el contratista remitió diseño pendiente el envío de respuestas a observaciones. Esta en revision por parte de la interventoria.

Topografía: Aprobada.

PAGA: Se hizo entrega del documento y la interventoría aprobó con condicionantes.

CVS: se informa por parte del contratista que se remitió subsanación al municipio el día 28 de octubre de 2024, se envió memorias de los box, pendiente la información hidráulica sin subsanar, sin copia a la interventoría, pendiente revision por parte del municipio. El día 12 de noviembre se remitió solicitud de ocupación de cauce a la CVS.

2. Estado de los documentos de inicio: A continuación se listan los documentos y su estado:

APU: SE ENTREGARON. ESTÁ PENDIENTE DE REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

PROGRAMACIÓN: SE ENTREGÓ SUBSANADA EL DÍA 16 DE JULIO, EN REVISIÓN POR INTERVENTORIA.

HOJA DE VIDA: EL CONTRATISTA SUBSANÓ HOJA DE VIDA DEL RESIDENTE DE OBRA, EN REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORIA.

MAQUINARIA: SUBSANADOS LOS EQUIPOS.

PMT: SE ENTREGARON. ESTÁ PENDIENTE DE REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN: SE ENTREGARON. ESTÁ PENDIENTE DE REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

FUENTES DE MATERIALES: SE REMITIÓ LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA DE SIBERA UBICADA A 48.79 KM DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO, ESTA SUMINISTRARÁ SUBBASE GRANULAR.

CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: SE ENTREGÓ EL DÍA 16 DE JULIO LA SUBSANACIÓN DE LA SB, AFIRMADO Y TERRAPLEN Y

DISEÑO DE MEZCLA: SE RADICÓ EL DÍA 21 DE AGOSTO, ESTÁ EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA: EL CONTRATISTA LO REMITIÓ EL 27 DE JULIO DE 2024, EXCLUSIVAMENTE PARA EL

TRAMO PRIORIZADO DEL K0+083 HASTA EL K0+700. EL SIGUIENTE TRAMO PRIORIZADO SE ENTREGARÁ EL 8 DE AGOSTO DE 2024.

EL CONTRATISTA NO CUMPLIÓ CON LA ENTREGA, LO ENTREGARÁ EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2024. SE SOLICITA POR PARTE DE LA

INTERVENTORIA, CELERIDAD EN LA ENTREGA Y CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO.

POLIZAS: SE RADICARON POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA ENTIDAD, EL MUNICIPIO INFORMA QUE SE ENUESTRAN APROBADAS.

FIDUCIA: QUEDÓ APROBADO EL ENCARGO FIDUCIARIO, SE RADICÓ A LA ENTIDAD LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO POR EL 20% QUE CORRESPONDE AL VALOR AUTORIZADO DEL CONTRATO.

3. Estado de la etapa de ejecución de obra: En la presente semana, el contratista avanzó en el suministro, instalación y compactación de la segunda capa de afirmado, abscisa K2+100 sección completa. Se instaló subbase hasta la abscisa K2+00. Se fundieron losas, desde K1+662 hasta la K1+952, carril izquierdo. Completando 1841.2 m construidos carril izquierdo. El contratista continuará hasta la K2+300 en afirmado y subbase y llegar en concreto hasta dicha abscisa. Cuneta de 717 m fundidos carril izquierdo. Para la siguiente semana llegará a K1+037 en cuneta.

Se presenta cierre parcial con controladores de tráfico, en acopio tienen 140 m³ afirmado y se tienen 60 m³ de subbase en acopio. Pavimento llegará hasta K2+152 carril izquierdo.

El contratista hizo entrega desde el día 26 de septiembre del acta de pactación de precios: filtro, concreto de 4000 Mpa, conformación de calzada y revestimiento están aprobados por la interventoría, no se ha enviado a la entidad ya que no se ha presentado el balance para validar que si hay recursos disponibles el contratista lo radicará el 19 de diciembre de 2024. Fechas anteriores para su entrega, no las cumplió. (El día 20 de noviembre la interventoría presentará al municipio los precios avalados para su revisión y posible inclusión en el contrato, para ello el contratista radicará el balance el día 2 de octubre en interventoría. No cumplió, lo entregarán el día 1 de noviembre de 2024.)

El contratista informará sobre las actividades que realmente puede ejecutar al 20 de diciembre el día 15 de noviembre de 2024.

La interventoría autorizó el inicio de las actividades propuestas en los box couvert ubicados en el K3+610 (2x1) y K3+920 (2x1.5) para iniciarse de manera inmediata, y aun no se ha iniciado dicha actividad, generando mayor atraso en el contrato, por lo cual se recomienda abrir dos frentes de obra nuevos e independientes para su ejecución de manera inmediata, el contratista los iniciará el día 4 de octubre de 2024. No se cumplió, el contratista lo iniciará 22 de octubre de 2024. El contratista no cumplió, se compromete nuevamente a iniciar esa actividad 4 de noviembre. Se compromete a iniciar actividades el día 18 de noviembre de 2024. En el plan de contingencia recibido el 28 de octubre de 2024, no se proyectó la presente actividad, se solicita volver a enviar el plan de contingencia con todas las actividades aprobadas a la fecha. El contratista lo enviará el día 19 de noviembre de 2024.

El atraso actual que tiene el proyecto es del 68.43 % sobre el valor total del contrato, con un avance de 23.11%, avance programado 91.54%, según plazos contractuales, el contratista remitió el día 28 de octubre plan de contingencia con flujo de caja, se devolvió por parte de la interventoría, el contratista se compromete a entregar el ajuste del plan de contingencia el día 19 de noviembre de 2024, nuevamente se solicita aumentar rendimientos, recursos, mano de obra, equipo. El contratista aumentó jornada, extendiendo una hora diaria y el sábado se extienden hasta las 3 de la tarde, sin embargo, la interventoría solicita tomar nuevas acciones, ya que el atraso es demasiado grave para limitarse a una sola alternativa.

Se hizo mesa de trabajo para balance general del contrato, el contratista lo radicará el 4 de octubre de 2024. No se cumplió. Se entregará el 25 de octubre de 2024. la interventoría requiere y reitera su entrega pronta para que la entidad pueda tomar decisiones para abrir nuevos frentes.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 13/11/2024

(Día / Mes / Año)

se requiere adicionalmente, la entrega de las actividades que pona finalizar y terminar el contratista de acá al 20 de diciembre, ya que la realidad del contrato da cuenta que no se podrá en el plazo restante invertir la totalidad de los recursos, el contratista lo radicará el día 6 de septiembre de 2024. no cumplió con esa fecha, se remitirá 25 de septiembre de 2024, no cumplió con esa fecha, se remitirá 2 de octubre de 2024. no cumplió con esa fecha, se remitirá el 25 de octubre de 2024, no se cumplió, lo entregará el 1 de noviembre de 2024. no se cumplió lo radicará el 15 de noviembre de 2024.

Se solicita los resultados de ensayos, de ejecución de obra, densidades y viguetas, el contratista lo entregará el 2 de octubre de 2024. se entregó parcial, los resultados faltantes se entregaron el 24 de octubre de 2024. se revisaron por parte de la interventoría, son acorde a lo requerido, sin embargo, se solicita la entrega del tramo que se lleva ejecutado, densidades de afirmado, de subbase, viguetas a las 7, 14 y 28 días de pavimento hasta la K1+952 y resultado de cilindros de cuneta hasta lo que se lleva construido, el contratista lo entregará el día 22 de noviembre.

Se reitera por parte de la interventoría, que toda la demora presentada es imputable al contratista, no pudiendo alegar posteriormente hecho de demora en la ejecución.

4. Proposiciones y varios:

Respecto al componente SST: Se hizo devolución de informe de los meses de febrero hasta septiembre, porque la información no está completa, no está por carpetas, por personal activo y quienes están retirados, carpetas que contengan la totalidad de los soportes de las afiliaciones a la seguridad social, inducciones, entregas de EPP y exámenes médico ocupacional de ingreso, la interventoría está pendiente de la respuesta a observaciones de los informes de febrero a septiembre y a la fecha el contratista no ha subsanado. A continuación se presenta lo siguiente: el contratista dará respuesta el 20 de noviembre, se propone por parte de la interventoría hacer mesa de trabajo para revisar punto a punto las observaciones.

Se reitera que, un día antes de ingresar personal a la obra, se debe presentar los soportes de exámenes de ingreso, afiliación a la seguridad social y ARL, para su aprobación. El personal que se encuentre en el desarrollo del proyecto que no se encuentre afiliado, será retirado del frente de obra. se realizó capacitación sobre herramientas portátiles y manuales, concepto de emergencia. Los informes sat se devolvieron con observaciones y se subsanaron más tarde el 1 de noviembre de 2024. Se hizo capacitación sobre uso de señalización y normas de seguridad vial a la comunidad. Al personal se hizo capacitación uso de EPP y riesgos físicos. Se solicitó proceso de incumplimiento por este componente el 15 de octubre de 2024.

Respecto al componente ambiental: De informes ambientales se aprobó de marzo a junio, se enviaron por correo informes subsanados de julio y agosto, se observaron por interventoría esta en revisión por parte de la interventoría, el cual se dará respuesta el día 19 de noviembre de 2024, y el contratista radicará los informes pendientes de septiembre y octubre el día 15 de noviembre de 2024. Se hicieron capacitaciones de esta semana de manejo integral de residuos líquidos.

Respecto al componente social: Los informes mensuales sociales, están aprobados hasta septiembre, el contratista remitió octubre esta en revisión por parte de la interventoría, esta semana no se hizo capacitación, esta programa para el día 14 de noviembre con el equipo de trabajo en obra, sobre liderazgo y motivación. NO se han presentado PQR. Sin embargo, el secretario de infraestructura manifiesta que hubo una petición por parte del capitán del cabildo indígena de loma de piedra, sobre la contratación de personal de su cabildo, se le informa al secretario que no ha habido acercamiento del cabildo a la veeduría ni al contratista, sin embargo, se invitara a un espacio de comité con la veeduría para explicarle sobre el proceso de contratación. Adicionalmente, se está presentado dificultades al interior de la veeduría y los líderes de las diferentes comunidades que intervienen por lo cual se invitara a la personería para que haga acompañamiento en la próxima reunión 20 de noviembre de 2024, ya que no se tiene claro los roles de la veeduría.

Del área social se solicita el personal que está contratado del área de influencia directa del proyecto, para este caso, el contratista informa que el porcentaje corresponde a mano de obra no calificada es el 100% de la zona de influencia, de la mano de obra calificada se tiene un 33%, ya que el director es del sector, y el 40% del personal contratado para el proyecto son mujeres. De población diferencial, se cuentan con dos personas vinculadas al proyecto. En la obra se cuenta actualmente con 25 personas.

El comité de veeduría se tiene programado para el 20 de noviembre.

El contratista debe entregar los rendimientos financieros del anticipo, generados a la fecha, los entregará el día 22 de noviembre de 2024.

El municipio debe entregar los rendimientos financieros de la cuenta convenio, generados a la fecha.

Asiste a la reunión por parte del contratista, el director de obra Ing. José Ruiz y la residente social.

El anticipo se realizó el desembolso por parte de la entidad a la cuenta de la fiducia, el contratista ha presentado 10 órdenes de operación, se han aprobado 8 órdenes correspondiente al pago de la planta de concreto, ferretería y transporte, no hay órdenes en revisión por parte de la interventoría, a la fecha se ha desembolsado 1400 millones aproximadamente.

El contratista solicitó aplazamiento de la audiencia de presunto incumplimiento hasta nuevo aviso.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNT-04-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA 13/11/2024
(Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Ver compromisos en temas desarrollados

Según puntos anteriores

Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

20/11/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modificar por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Vicente Vizola B	Res. Interventoría	Cons. Ingenieros - Lugo	[Firma]
Jorge Isaac Gal	Sec. n.º Fran	Alcaldía	[Firma]
Marcelo Gil G	Prof. Secel	Cons. Ingenieros	[Firma]
María Gamba Jairo H	Prof. Social	Consorcio Plan de Desarrollo	[Firma]
Angela María Daura	Dirección Interventoría	C. Ingenieros - Lugo	[Firma]
Abner R. Ruiz	Dir. Obra	Cons. Prov.	[Firma]

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEP/MN1-B4-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 4

FECHA 20/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 159-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2266 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5053-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON - INCO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

LECTURA DE COMPROMISOS:

APU: SE ENTREGARON. ESTA PENDIENTE DE REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
PROGRAMACION: SE ENTREGÓ EL DIA 7 DE ABRIL 2024. SE PRESENTAN OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
HOJA DE VIDA: EL CONTRATISTA SUBSANÓ LA HOJA DE VIDA DEL CAMBIO DEL DIRECTOR DE OBRA.
MAQUINARIA: SE SUBSANÓ Y ESTA EN REVISIÓN POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
PMT: SE ENTREGARON. ESTÁ PENDIENTE DE REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN: SE ENTREGARON. ESTÁ PENDIENTE DE REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
PAGA: LA INTERVENTORIA LO DEVOLVIÓ CON OBSERVACIONES VERSIÓN 3. PENDIENTE ENTREGA.
FUENTES DE MATERIALES: PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA DE SIBERA. DEVUELTO CON OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: EL CONTRATISTA DE OBRA LOS PRESENTÓ EN EL DISEÑO DE PAVIMENTO, SOLO SE ENTREGÓ SUBBASE, PENDIENTE CARACTERIZACIÓN DE AFIRMADO.
PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA TRAMO PRIORIZADO: NO CUMPLE CON LA ENTREGA.
BALANCE DE OBRA: SE ENTREGÓ EL DIA 12 DE JUNIO 2024. SE PRESENTAN OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
FUERON RADICADOS EL DIA DE HOY 3 DE JULIO DE 2024
FIDUCIA: PENDIENTE SUBSANACIONES.
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL: SE ENTREGARON
AJUSTE DE PÓLIZAS: SE APROBARON

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Estado de la etapa de estudios y diseños
2. Estado de los documentos de inicio
3. Estado del inicio de la etapa de ejecución de obra
4. Propositiones y varios



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEP/MI-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 4

FECHA 20/11/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Estado de estudios y diseños:

Diseño de pavimentos: Aprobado susceptible a cambios, si hay cambio de canteras.

Diseño geométrico: fue avalado, pendiente subsanación de documentos de forma

Diseño hidráulico: La interventoría aprobó los drenes, y las obras hidráulicas aprobadas, se observa el diseño del muro ubicado en el K3+890. No se ha vuelto a radicar, el diseño ajustado del muro y tampoco se ha radicado la aleta del puente del K4+200. Se radico diseño pro parte del contratista y esta en revision por parte de la interventoría.

Diseño estructural: el contratista remitió diseño pendiente el envío de respuestas a observaciones. Esta en revision por parte de la interventoría

Topografía: Aprobada

PAGA: Se hizo entrega del documento y la interventoría aprobo con condicionantes.

CVS: se informa por parte del contratista que se remitió subsanación al municipio el día 28 de octubre de 2024, se envió memorias de los box, pendiente la información hidráulica sin subsanar, sin copia a la interventoría, pendiente revision por parte del municipio. El día 12 de noviembre se remitió solicitud de ocupación de cauce a la CVS

2. Estado de los documentos de inicio: A continuación se listan los documentos y su estado:

APU: SE ENTREGARON. ESTA PENDIENTE DE REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

PROGRAMACION: SE ENTREGÓ SUBSANADA EL DIA 16 DE JULIO, EN REVISION POR INTERVENTORIA.

HOJA DE VIDA: EL CONTRATISTA SUBSANÓ HOJA DE VIDA DEL RESIDENTE DE OBRA. EN REVISIÓN POR PARTE DE INTERVENTORIA.

MAQUINARIA: SUBSANADOS LOS EQUIPOS.

PMT: SE ENTREGARON. ESTÁ PENDIENTE DE REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN: SE ENTREGARON. ESTÁ PENDIENTE DE REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

FUENTES DE MATERIALES: SE REMITIÓ LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA DE SIBERA UBICADA A 48,79 KM DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO, ESTA SUMINISTRARÁ SUBBASE GRANULAR.

CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: SE ENTREGO EL DIA 16 DE JULIO LA SUBSANACIÓN DE LA SB, AFIRMADO Y TERRAPLEN Y DISEÑO DE MEZCLA. SE RADICO EL DIA 21 DE AGOSTO, ESTA EN REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA: EL CONTRATISTA LO REMITO EL 27 DE JULIO DE 2024, EXCLUSIVAMENTE PARA EL TRAMO PRIORIZADO DEL K0+083 HASTA EL K0+700, EL SIGUIENTE TRAMO PRIORIZADO SE ENTREGARA EL 8 DE AGOSTO DE 2024, EL CONTRATISTA NO CUMPLIO CON LA ENTREGA, LO ENTREGARA EL DIA 27 DE AGOSTO DE 2024, SE SOLICITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, CELERIDAD EN LA ENTREGA Y CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

POLIZAS: SE RADICARON POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA ENTIDAD, EL MUNICIPIO INFORMA QUE SE ENEUNTAN APROBADAS.

FIDUCIA: QUEDO APROBADO EL ENCARGO FIDUCIARIO, SE RADICO A LA ENTIDAD LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO POR EL 20% QUE CORRESPONDE AL VALOR AUTORIZADO DEL CONTRATO.

3. Estado de la etapa de ejecución de obra: En la presente semana, el contratista no avanzo en el suministro, instalación y compactación de la segunda capa de afirmado quedando en abscisa K2+100 seccion completa. No se instalo subbase quedando en la abscisa K2+100. Se fundieron losas, desde K1+952 hasta la K2+054 carril izquierdo. Completando 1943,2 m construidos carril izquierdo. Carril derecho K0+084 hasta K0+744. Completando una longitud de 660 m. Cuneta de 1292,28 m fundidos carril izquierdo. Carril derecho no se ha iniciado en cunetas.

Se presenta cierre parcial con controladores de trafico, en acopio tienen 196 m3 afirmado y se tienen 84 m3 de subbase en acopio. Pavimento llega hasta K2+054 carril izquierdo. Se pasara a carril derecho y quedará K1+733,2. Cuneta costado Izq avanzará hasta 440 m. No se avanzará en subbase y afirmado. Las actividades de box se iniciaran el 25 de noviembre de 2024.

El contratista hizo entrega desde el día 26 de septiembre del acta de pactación de precios: filtro, concreto de 4000 Mpa, conformación de calzada y revestimiento estan aprobados por la interventoría, no se ha enviado a la entidad ya que no se ha presentado el balance para validar que si hay recursos disponibles el contratista lo radicara el 19 de diciembre de 2024. Fechas anteriores para su entrega, no las cumplió. (El día 20 de noviembre la interventoría presentará al municipio los precios avalados para su revisión y posible inclusion en el contrato, para ello el contratista radicará el balance el día 2 de octubre en interventoría. No cumplió, lo entregarán el día 1 de noviembre de 2024.) No cumplió se deberá entregar el 22 de noviembre de 2024 so pena de iniciar proceso de incumplimiento por su no entrega.

El contratista informará sobre las actividades que realmente puede ejecutar al 20 de diciembre el día 15 de noviembre de 2024. No se cumplio, se entregaran el 22 de noviembre de 2024.

La interventoría autorizó el inicio de las actividades propuesta en los box couvert ubicados en el K3+610 (2x1) y K3+920 (2x1,5) para iniciarse de manera inmediata, y aun no se ha iniciado dicha actividad, generando mayor atraso en el contrato, por lo cual se recomienda abrir dos frentes de obra nuevos e independientes para su ejecución de manera inmediata, el contratista los iniciará el día 4 de octubre de 2024. No se cumplio, el contratista lo iniciará 22 de octubre de 2024. EL contratista no cumplio, se compromete nuevamente a iniciar esa actividad 4 de noviembre. Se compromete a iniciar actividades el día 18 de noviembre de 2024. Se compromete a iniciarlo el 25 de noviembre de 2024. En el plan de contingencia recibido el 28 de octubre de 2024, no se proyecto la presente actividad, se solicita volver a enviar el plan de contingencia con todas las actividades aprobadas a la fecha. El contratista lo enviará el día 19 de noviembre de 2024. No cumplió, lo entregará el 25 de noviembre de 2024.

El atraso actual que tiene el proyecto es del 68,44 % sobre el valor total del contrato, con un avance de 26,17%, avance programado 94,61%, segun plazos contractuales, el contratista remitió el día 28 de octubre plan de contingencia con flujo de caja, se devolvió por parte de la interventoría, el contratista se compromete a entregar el ajuste del plan de contingencia el día 19 de noviembre de 2024, no cumplio con su entrega, lo entregará el 25 de noviembre de 2024. Nuevamente se solicita aumentar rendimientos, recursos, mano de obra, equipo. El contratista aumento jornada, extendiendo una hora diaria y el sábado se extienden hasta las 3 de la tarde, sin embargo, la interventoría solicita tomar nuevas acciones, ya que el atraso es demasiado grave para limitarse a una sola alternativa.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MN1-#1-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 4

FECHA 20/11/2024
(Día / Mes / Año)

Se hizo mesa de trabajo para balance general del contrato, el contratista lo radicará el 4 de octubre de 2024. No se cumplió. Se entregará el 25 de octubre de 2024. la interventoría requiere y reitera su entrega prioritaria para que la entidad pueda tomar decisiones para abrir nuevos frentes, se requiere adicionalmente, la entrega de las actividades que podría finalizar y terminar el contratista de aca al 20 de diciembre, ya que la realidad del contrato da cuenta que no se podrá en el plazo restante invertir la totalidad de los recursos, el contratista lo radicará el día 6 de septiembre de 2024. no cumplió con esa fecha, se remitirá 25 de septiembre de 2024, no cumplió con esa fecha, se remitirá 2 de octubre de 2024, no cumplió con esa fecha, se remitirá el 25 de octubre de 2024, no se cumplió, lo entregará el 1 de noviembre de 2024. no se cumplió lo radicará el 15 de noviembre de 2024. No se cumplió, lo deberá entrega el 22 de noviembre de 2024.

Se solicita los resultados de ensayos, de ejecución de obra, densidades y viguetas, el contratista lo entregará el 2 de octubre de 2024. se entregó parcial, los resultados faltantes se entregaron el 24 de octubre de 2024. se revisaron por parte de la Interventoría, son acorde a lo requerido, sin embargo, se solicita la entrega del tramo que se lleva ejecutado, densidades de afirmado, de subbase, viguetas a las 7, 14 y 28 días de pavimento hasta la K1+952 y resultado de cilindros de cuneta hasta lo que se lleva construido, el contratista lo entregará el día 22 de noviembre.

Se reitera por parte de la interventoría, que toda la demora presentada es imputable al contratista, no pudiendo alegar posteriormente hecho de demora en la ejecución.

4. Propositiones y varios:

Respecto al componente SST: Se hizo devolución de informe de los meses de febrero hasta septiembre, porque la información no esta completa, no esta por carpetas, por personal activo y quienes estan retirados, carpetas que contengan la totalidad de los soportes de las afiliaciones a la seguridad social, inducciones, entregas de EPP y exámenes medico ocupacional de ingreso, la interventoría esta pendiente de la respuesta a observaciones de los informes de febrero a septiembre y a la fecha el contratista no ha subsanado. A continuación se presenta lo siguiente: el contratista dara respuesta el 20 de noviembre, se propone por parte de la interventoría hacer mesa de trabajo para revisar punto a punto las observaciones. No se cumplió por parte del contratista, lo entregará el día 27 de noviembre de 2024.

Se reitera que, un día antes de ingresar personal a la obra, se debe presentar los soportes de exámenes de ingreso, afiliación a la seguridad social y ARL, para su aprobación. El personal que se encuentre en el desarrollo del proyecto que no se encuentre afiliado, será retirado del frente de obra. se realizo capacitación sobre herramientas portátiles y manuales, concepto de emergencia. Los informes sst se devolvieron con observaciones y se subsanarara mas tardar el 27 de noviembre de 2024. Se hizo capacitación sobre riesgo eléctrico.

Respecto al componente ambiental: De informes ambientales se aprobo de marzo a junio, se enviaron por correo informes subsanados de julio y agosto, se observaron por interventoría esta en revisión por parte de la Interventoría, el cual se dara respuesta el día 19 de noviembre de 2024, no se cumplió y se radicarán el 25 de noviembre de 2024 y el contratista radicara los informes pendientes de septiembre y octubre el día 15 de noviembre de 2024. No se cumplió y se debera radicar el 25 de noviembre de 2024. Se hicieron capacitaciones de esta semana de impactos al componente biótico y manejo integral de residuos líquidos.

Respecto al componente social: Los informes mensuales sociales, estan aprobados hasta octubre, esta semana se hizo capacitacion sobre trabajo en equipo, liderazgo y motivación. NO se han presentado PQR. Sin embargo, el secretario de infraestructura manifiesta que hubo una peticion por parte del capitan del cabildo indigena de loma de piedra, sobre la contratacion de personal de su cabildo, se le informa al secretario que no ha habido acercamiento del cabildo a la veeduría ni al contratista, sin embargo, se invitó a un espacio de comite con la veeduría para explicarle sobre el proceso de contratacion. Se realizo la socialización con la veeduría y con líderes comunitarios, quedando compromisos en acta.

Del area social se solicita el personal que esta contratado del area de influencia directa del proyecto, para este caso, el contratista informa que el porcentaje corresponde a mano de obra no calificada es el 100% de la zona de influencia, de la mano de obra calificada se tiene un 33%, ya que el director es del sector, y el 40% del personal contratado para el proyecto son mujeres. De poblacion diferencial, se cuentan con dos personas vinculadas al proyecto. Se contrato una persona en condicion de discapacidad. En la obra se cuenta actualmente con 30 personas.

El comite de veeduría se realizó el 20 de noviembre de 2024

El contratista debe entregar los rendimientos financieros del anticipo, generados a la fecha, los entregará el día 22 de noviembre de 2024.

El municipio debe entregar los rendimientos financieros de la cuenta convenio, generados a la fecha.

Asiste a la reunión por parte del contratista, el director de obra Ing. Jose Ruiz y la residente social y residente sst.

El anticipo se realizo el desembolso por parte de la entidad a la cuenta de la fiducia, el contratista ha presentado 10 ordenes de operacion, se han aprobado 8 ordenes correspondiente al pago de la planta de concreto, ferreteria y transporte, no hay ordenes en revisión por parte de la interventoría, a la fecha se ha desembolsado 1400 millones aproximadamente.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEP1-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 4

FECHA 29/11/2024
(Día / Mes / Año)

El contratista solicitó aplazamiento de la audiencia de presunto incumplimiento hasta nuevo aviso.

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Ver compromisos en temas desarrollados	Según puntos anteriores	Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 27/11/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Vicente Vigola B.	Res. Interventoria	Cons. Ingenieros-Inco	
José R. Ruiz	Director de Obra	Cons. Ingenieros-Inco	
Marcela Gil G.	Prof. Social	C. Ingenieros-Inco	
Patricia Cárdenas Torres	Prof. Social	Cons. Ingenieros-Inco	
Angela M. Dávalos	Directora Interventoria	C. Ingenieros-Inco	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 4

FECHA 27/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. 159-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5053-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON - INCO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

LECTURA DE COMPROMISOS:

APU: SE ENTREGARON.
PROGRAMACION: SE ENTREGÓ EL DIA 7 DE ABRIL 2024.
HOJA DE VIDA: EL CONTRATISTA SUBSANÓ LA HOJA DE VIDA .
MAQUINARIA: SE SUBSANÓ
PMT: SE ENTREGARON.
PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN: SE ENTREGARON.
PAGA.APROBADO V3
FUENTES DE MATERIALES: PRESENTÓ LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA DE SIBERA.
CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: EL CONTRATISTA ENTREGO
PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA TRAMO PRIORIZADO: NO CUMPLE CON LA ENTREGA.
BALANCE DE OBRA: SE ENTREGÓ EL DIA 12 DE JUNIO 2024. SE PRESENTAN OBSERVACIONES POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.
PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL:NO SE ENTREGARON

NO SE HA CUMPLIDO CON EL CIERRE DE LA ETAPA DE ESTUDIOS Y DISEÑOS.

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Estado de la etapa de estudios y diseños
2. Estado de los documentos de inicio
3. Estado del inicio de la etapa de ejecución de obra
4. Propositiones y varios



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 4

FECHA 27/11/2024
(Día / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Estado de estudios y diseños:

Diseño de pavimentos: Aprobado susceptible a cambios, si hay cambio de canteras.

Diseño geométrico: fue avalado, pendiente subsanación de documentos de forma

Diseño hidráulico: La interventoría aprobó los drenes, y las obras hidráulicas aprobadas, se observa el diseño del muro ubicado en el K3+890. No se ha vuelto a radicar, el diseño ajustado del muro y tampoco se ha radicado la aleta del puente del K4+200. Se radico diseño pro parte del contratista y esta en revision por parte de la interventoría.

Diseño estructural: el contratista remitió diseño pendiente al envío de respuestas a observaciones. Esta en revision por parte de la interventoría

Topografía: Aprobada

PAGA: Se hizo entrega del documento y la interventoría aprobó con condicionantes.

CVS: se informa por parte del contratista que se remitió subsanación al municipio el día 28 de octubre de 2024, se envió memorias de los box, pendiente la información hidráulica sin subsanar, sin copia a la interventoría, pendiente revision por parte del municipio. El día 12 de noviembre se remitió solicitud de ocupación de cauce a la CVS

2. Estado de los documentos de inicio: A continuación se listan los documentos y su estado:

APU: SE ENTREGARON. ESTA PENDIENTE DE REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

PROGRAMACION: SE ENTREGÓ SUBSANADA EL DÍA 16 DE JULIO, EN REVISION POR INTERVENTORIA.

HOJA DE VIDA: EL CONTRATISTA SUBSANÓ HOJA DE VIDA DEL RESIDENTE DE OBRA. EN REVISION POR PARTE DE INTERVENTORIA.

MAQUINARIA: SUBSANADOS LOS EQUIPOS.

PMT: SE ENTREGARON. ESTÁ PENDIENTE DE REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

PLAN DE CALIDAD Y PLAN DE INSPECCIÓN: SE ENTREGARON. ESTÁ PENDIENTE DE REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA.

FUENTES DE MATERIALES: SE REMITIÓ LOS DOCUMENTOS DE LA CANTERA DE SIBERA UBICADA A 48,79 KM DEL CENTRO DE GRAVEDAD DEL PROYECTO, ESTA SUMINISTRARÁ SUBBASE GRANULAR.

CARACTERIZACIÓN DE LOS MATERIALES: SE ENTREGO EL DÍA 16 DE JULIO LA SUBSANACIÓN DE LA SB, AFIRMADO Y TERRAPLEN Y DISEÑO DE MEZCLA. SE RADICO EL DÍA 21 DE AGOSTO, ESTA EN REVISION POR PARTE DE LA INTERVENTORIA

PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA: EL CONTRATISTA LO REMITIÓ EL 27 DE JULIO DE 2024, EXCLUSIVAMENTE PARA EL TRAMO PRIORIZADO DEL K0+083 HASTA EL K0+700, EL SIGUIENTE TRAMO PRIORIZADO SE ENTREGARÁ EL 8 DE AGOSTO DE 2024, EL CONTRATISTA NO CUMPLIÓ CON LA ENTREGA, LO ENTREGARÁ EL DÍA 27 DE AGOSTO DE 2024, SE SOLICITA POR PARTE DE LA INTERVENTORIA, CELERIDAD EN LA ENTREGA Y CUMPLIMIENTO DE LO PACTADO

POLIZAS: SE RADICARON POR PARTE DEL CONTRATISTA A LA ENTIDAD, EL MUNICIPIO INFORMA QUE SE ENCUENTRAN APROBADAS.

FIDUCIA: QUEDO APROBADO EL ENCARGO FIDUCIARIO, SE RADICO A LA ENTIDAD LA SOLICITUD DE DESEMBOLSO DEL ANTICIPO POR EL 20% QUE CORRESPONDE AL VALOR AUTORIZADO DEL CONTRATO.

3. Estado de la etapa de ejecución de obra: En la presente semana, el contratista avanzó en el suministro, instalación y compactación de la segunda capa de afirmado desde abscisa K2+100 hasta la K2+300 seccion completa, se tomaron densidades. Se ha instalado subbase entre la abscisa K2+100 hasta la K2+300, aun no se han tomado densidades por tanto no se autoriza fundida de losas, el contratista manifiesta que hoy liberara densidades. Se fundieron losas, quedo en la K2+054 carril izquierdo. Completando 1943,2 m construidos carril izquierdo. Carril derecho K0+744 hasta K1+551. Completando una longitud de 807 m. Cuneta de 1649,2 m fundidos carril izquierdo. Carril derecho no se ha iniciado en cunetas.

Se presenta cierre parcial con controladores de trafico, en acopio tienen 144 m3 afirmado y se tienen 112 m3 de subbase en acopio. De lo proyectado para esta semana. Pavimento llega hasta K2+054 carril izquierdo. Se pasó a carril derecho y quedará K1+733,2. no cumplió. Cuneta costado izq avanzará hasta 440 m. cumplió. No se avanzará en subbase y afirmado. Si avanza. Las actividades de box se iniciaran el 25 de noviembre de 2024. NO se cumplió.

La siguiente semana en Pavimento llegara hasta K2+254 carril izquierdo. Y en carril derecho y quedará K2+030. Cuneta costado izq avanzará hasta la K2+053. se avanzará en subbase llegara hasta K2+500 y afirmado hasta la K3+000. Las actividades de box se iniciaran el 2 de diciembre de 2024.

El contratista hizo entrega desde el día 26 de septiembre del acta de pactacion de precios: filtro, concreto de 4000 Mpa, conformación de calzada y revestimiento estan aprobados por la interventoría, no se ha enviado a la entidad ya que no se ha presentado el balance para validar que si hay recursos disponibles el contratista lo radicara el 19 de noviembre de 2024. Fechas anteriores para su entrega, no las cumplió. (El día 20 de noviembre la interventoría presentará al municipio los precios avalados para su revision y posible inclusion en el contrato, para ello el contratista radicará el balance el día 2 de octubre en interventoría. No cumplió, lo entregarán el día 1 de noviembre de 2024.) No cumplió se deberá entregar el 22 de noviembre de 2024. No cumplió, el contratista lo presentará el 5 de diciembre de 2024, la interventoría recomendará iniciar proceso de presunto incumplimiento por la entrega del balance y no cumplimiento de las solicitudes de la interventoría dentro de los plazos establecidos.

El contratista informará sobre las actividades que realmente puede ejecutar al 20 de diciembre el día 15 de noviembre de 2024. No se cumplió, se entregaran el 22 de noviembre de 2024. no se cumplió, se entregaran el 5 de diciembre de 2024. la interventoría recomendará iniciar proceso de presunto incumplimiento por la entrega de las actividades al 20 de diciembre y no cumplimiento de las solicitudes de la interventoría dentro de los plazos establecidos.

La interventoría autorizó el inicio de las actividades propuesta en los box couvert ubicados en el K3+610 (2x1) y K3+920 (2x1,5) para iniciarse de manera inmediata, y aun no se ha iniciado dicha actividad, generando mayor atraso en el contrato, por lo cual se recomienda abrir dos frentes de obra nuevos e independientes para su ejecución de manera inmediata, el contratista los iniciará el día 4 de octubre de 2024. No se cumplió, el contratista lo iniciará 22 de octubre de 2024. EL contratista no cumplió, se compromete nuevamente a iniciar esa actividad 4 de noviembre. No cumplió. Se compromete a iniciar actividades el día 18 de noviembre de 2024. No cumplió. Se compromete a iniciarlo el 25 de noviembre de 2024. No cumplió. Se compromete a iniciar el 2



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MN1-84-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 4

FECHA 27/11/2024

De diciembre de 2024. En el plan de contingencia recibido el 20 de octubre de 2024, no se proyecta la presente actividad, se solicita volver a enviar el plan de contingencia con todas las actividades aprobadas a la fecha. El contratista lo enviará el día 19 de noviembre de 2024. No cumplió, lo entregará el 25 de noviembre de 2024. No cumplió, se se entregará el 5 de diciembre de 2024, la interventoría recomendará iniciar proceso de presunto incumplimiento por la no entrega del plan de contingencia y el no inicio de las actividades de los box y no cumplimiento de las solicitudes de la interventoría dentro de los plazos establecidos.

El atraso actual que tiene el proyecto es del 66,8 % sobre el valor total del contrato, con un avance de 30,89%, avance programado 97,69%, según plazos contractuales, el contratista remitió el día 28 de octubre plan de contingencia con flujo de caja, se devolvió por parte de la interventoría, el contratista se compromete a entregar el ajuste del plan de contingencia el día 19 de noviembre de 2024, no cumplió con su entrega, lo entregará el 25 de noviembre de 2024. No cumplió, lo entregará el 5 de diciembre de 2024. Nuevamente se solicita aumentar rendimientos, recursos, mano de obra, equipo. El contratista aumento jornada, extendiendo una hora diaria y el sábado se extienden hasta las 3 de la tarde, sin embargo, la interventoría solicita tomar nuevas acciones, ya que el atraso es demasiado grave para limitarse a una sola alternativa.

Se hizo mesa de trabajo para balance general del contrato, el contratista lo radicará el 4 de octubre de 2024. No se cumplió. Se entregará el 25 de octubre de 2024. la interventoría requiere y reitera su entrega prioritaria para que la entidad pueda tomar decisiones para abrir nuevos frentes, se requiere adicionalmente, la entrega de las actividades que podría finalizar y terminar el contratista de aca al 20 de diciembre, ya que la realidad del contrato da cuenta que no se podrá en el plazo restante invertir la totalidad de los recursos, el contratista lo radicará el día 6 de septiembre de 2024, no cumplió con esa fecha, se remitirá 25 de septiembre de 2024, no cumplió con esa fecha, se remitirá 2 de octubre de 2024. no cumplió con esa fecha, se remitirá el 25 de octubre de 2024, no se cumplió, lo entregará el 1 de noviembre de 2024. no se cumplió lo radicará el 15 de noviembre de 2024. No se cumplió, lo deberá entrega el 22 de noviembre de 2024. No cumplió, lo entregará el 5 de diciembre de 2024.

Se solicita los resultados de ensayos, de ejecución de obra, densidades y viguetas, el contratista lo entregará el 2 de octubre de 2024. se entregó parcial, los resultados faltantes se entregaron el 24 de octubre de 2024. se revisaron por parte de la interventoría, son acorde a lo requerido, sin embargo, se solicita la entrega del tramo que se lleva ejecutado, densidades de afirmado, de subbase, viguetas a las 7, 14 y 28 días de pavimento hasta la K1+952 y resultado de cilindros de cuneta hasta lo que se lleva construido, el contratista lo entregará el día 22 de noviembre. no cumplió, los entregara el 28 de noviembre de 2024.

Se reitera por parte de la interventoría, que toda la demora presentada es imputable al contratista, no pudiendo alegar posteriormente hecho de demora en la ejecución.

4. Propositiones y varios:

Respecto al componente SST: Se hizo devolución de informe de los meses de febrero hasta septiembre, porque la información no esta completa, no esta por carpetas, por personal activo y quienes estan retirados, carpetas que contengan la totalidad de los soportes de las afiliaciones a la seguridad social, inducciones, entregas de EPP y exámenes medico ocupacional de ingreso, la interventoría esta pendiente de la respuesta a observaciones de los informes de febrero a septiembre y a la fecha el contratista no ha subsanado. A continuación se presenta lo siguiente: el contratista dara respuesta el 20 de noviembre, se propone por parte de la interventoría hacer mesa de trabajo para revisar punto a punto las observaciones. No se cumplió por parte del contratista, lo entregará el día 27 de noviembre de 2024. aun no se remite. Se advierte que de no recibir las planillas el día de hoy, a partir de mañana se suspenden las actividades de obra por parte de la interventoría.

Se reitera que, un día antes de ingresar personal a la obra, se debe presentar los soportes de exámenes de ingreso, afiliación a la seguridad social y ARL, para su aprobación. El personal que se encuentre en el desarrollo del proyecto que no se encuentre afiliado, será retirado del frente de obra. se realizo capacitación sobre actos inseguros, que es incidente y accidente laboral.

Respecto al componente ambiental: De informes ambientales se aprobo de marzo a junio, de los informes de julio y agosto esta pendiente para subsanar la certificación de compra de materiales, de septiembre y octubre no se han radicado la primera vez, el contratista esta incumpliendo su obligacion, se radicaran segun lo manifestado el día 29 de noviembre de 2024. Se hicieron capacitaciones de esta semana de impactos con material articulado y la importancia del reciclaje. Respecto al requerimiento de las unidades sanitarias, aun no se ha dado respuesta por parte del contratista, se dará respuesta del mismo el día 27 de noviembre de 2024.

Respecto al componente social: Los informes mensuales sociales, estan aprobados hasta octubre, esta semana no se hizo capacitacion, esta programada para el 28 de noviembre de 2024. NO se han presentado PQR. Sin embargo, el secretario de infraestructura manifiesta que hugo una petición por parte del capitan del cabildo indigena de koma de piedra, sobre la contratación de personal de su cabildo, se le informa al secretario que no ha habido acercamiento del cabildo a la veduría ni al contratista, sin embargo, se invitó al espacio de comité con la veduría realizado el 20 de noviembre de 2024, y se le explico sobre el proceso de contratación.

Del area social se solicita el personal que esta contratado del area de influencia directa del proyecto, para este caso, el contratista informa que el porcentaje corresponde a mano de obra no calificada es el 100% de la zona de influencia, de la mano de obra calificada se tiene un 33%, ya que el director es del sector, y el 40% del personal contratado para el proyecto son mujeres. De población diferencial, se cuentan con dos personas vinculadas al proyecto Se contrato una persona en condicion de discapacidad. En la obra se cuenta actualmente con 30 personas.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEP-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	4 de 4

FECHA 27/11/2024
(Día / Mes / Año)

El comité de veeduría se realizó el 20 de noviembre de 2024.

El contratista debe entregar los rendimientos financieros del anticipo, generados a la fecha, los entregará el día 22 de noviembre de 2024. No se cumplió, el contratista los deberá radicar el día 2 de diciembre.

El municipio debe entregar los rendimientos financieros de la cuenta convenio, generados a la fecha.

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Ver compromisos en temas desarrollados

Según puntos anteriores

Contratista

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

6/12/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtirse de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Vicente Uizola B.	Res. Interventoría	Cons. Ingenieros - Inco	
José I. Ruiz	Dir. Obra	Cons. Prov.	
Marcela Gil B	Com. Prof. Social	Cons. Ingenieros	
María Carolina Toro Torres	Cons. Prof. Social	Consorcio Planvendero	
Angela María Díaz M.	Cons. Ingenieros - Inco	Dirección Intermedia	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 5/11/2024
(Día / Mes / Año) 1 de 3

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 5053-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON - INCO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
SE REALIZA REVISION DE COMPROMISOS:

- COMPROMISOS SST
- COMPROMISOS AMBIENTALES
- COMPROMISOS TECNICOS
- COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Estado de la etapa de estudios y diseños
2. Estado de los documentos de inicio
3. Estado del inicio de la etapa de ejecución de obra
4. Propositiones y varios



DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Estado de estudios y diseños: El diseño geométrico: Se encuentra aprobado
Diseño hidráulico: Queda aprobado el diseño por parte de la interventoría con la intervención de 3 box couvert de 2x1
Dentro del diseño de pavimentos Queda aprobado el diseño por parte de la interventoría.
Dentro del PAGA Queda aprobado el diseño por parte de la interventoría
Diseño estructural: El contratista envió comunicando acogiendo a lo establecido en las cartillas, y se remitió el día 17 de julio el informe sobre premisas de diseño
topografía: Aprobada.
Se realizó el pago del trámite ante la CVS por valor de \$11.300.000, ya se tiene el auto de apertura por parte de la CVS, posterior a la visita, se está a la espera de la resolución. El trámite continúa de igual manera, y se está a la espera que la parte jurídica de la CVS expida la resolución. Se solicita al municipio gestionar mediante oficio a la CVS para agilizar trámite, el cual enviarían el día 07/11/2024.

2. Estado de los documentos de inicio: A continuación se listan los documentos y su estado:

Análisis de precios Unitarios contractuales: aprobado
Programación de obra: Aprobado
Hoja de vida: Aprobado
Maquinaria mínima: Aprobado
PMT: Aprobado
Plan de calidad y plan de inspección de ensayos: Aprobado
PAGA: Aprobado
Fuentes de material: aprobadas
Caracterización de materiales: aprobado.

3. Estado de la etapa de ejecución de obra: El contratista se encuentra suministro, extendida y compactación de capa de subbase entre la K1+150 hasta la K1+000, en la presente semana no se avanzó con la actividad de subbase granular. Esta semana se realizó actividad de cuneta entre la K1+056 hasta la K1+000 costado derecho, en la presente semana no se avanzó con esta actividad por este lado, y en el costado izquierdo se trabajó entre la K1+964 hasta la K1+804, y no se avanzó con concreto de pavimento camil derecho, quedó en la abscisa K1+283 y costado izquierdo desde K2+187 hasta la K1+930,6. El contratista radicó balance ajustado a la entidad y se encuentra aprobado, y el balance de obra #2 se encuentra en revisión por parte de la interventoría. El contratista de obra manifiesta que tiene 3 cuadrillas independientes, una de construcción de cunetas, otra de instala rieles y otra cuadrilla de realiza fundida de pavimento, realizando aproximadamente 200ml de pavimento y 200 ml de cunetas semanalmente. La interventoría solicita aumentar rendimientos en la ejecución de actividades.

La siguiente semana el contratista continuará con el suministro, instalación y compactación de material de subbase, de la K1+000 a la K0+800. concreto de losas, es decir hasta K1+283 carril derecho. Por el lado izquierdo hasta la K1+930,6 hasta K1+800. En cunetas lado izq K1+804 a la K1+650. Se está realizando reparación de losas, a la fecha se lleva un 100% (25 losas), realizar un inventario para identificar si hay mas grietas en el pavimento, se presentará comunicado por parte de interventoría al contratista de obra el día de 06/11/2024. Actualmente, el contrato presenta un atraso del 37,91% basados en el valor total del contrato, sin embargo, se presentará nuevo balance para ampliar física con los mismos recursos lo que permite evidenciar que el % de atraso se está calculando sobre un valor superior al costo de la meta física actual, avance ejecutado 39,69% y programado 77,60% estos datos son tomados de la reprogramación No.1, esta información se realiza de acuerdo a la acta de modificación de mayores y menores e inclusión de precios no previstos. El contratista entregó el plan de contingencia y la interventoría realiza observaciones, por lo tanto, el contratista se compromete a presentar subsanaciones el día 07/11/2024.

El nuevo balance la interventoría lo está revisando para su aprobación. El contratista presentó solicitud de prórroga y está en revisión por parte de interventoría.

En acopio se tiene 140 m3 de triturado y 70 m3 de arena y 760 bultos de cemento, en bodega se cuenta con acero para armado de parrillas.

El contratista tiene pendiente la entrega de la respuesta a la no conformidad de los resultados de los concretos de las losas. Se realizará prueba de cilindros a los 56 días, con el fin de verificar resistencia.

4. Propositiones y varios: En el tema SST el contratista subsano observaciones de junio, julio y agosto, y están aprobados, informe de septiembre, se encuentra aprobado por parte de interventoría. El informe de octubre lo entregan el día 07/11/2024. El contratista de obra que se están tomando acciones para el orden y aseo en la obra, tales como bolsas de agua y cemento tiradas, herramienta menor en lugares no autorizados. El contratista de obra manifiesta que presentó un cronograma de charlas, y se han implementando.

Respecto al componente ambiental, se hicieron observaciones al informe de septiembre y se encuentra aprobado. El informe ambiental de octubre de 2024 se entrega el día 07/11/2024.

Respecto al componente social, se realizó la reunión de seguimiento con veeduría y se hicieron capacitaciones sobre participación ciudadana, liderazgo y control social. El informe de septiembre está aprobado por parte de la interventoría. El informe de octubre lo presentan el día 07/11/2024. No se ha presentado ninguna PQR. Presentaron programación de octubre y noviembre de las capacitaciones por parte del contratista.

Respecto al reporte de las personas contratadas el 70% corresponde a mano de obra no calificada, de ese 70% el 30,77% corresponde a MO no calificada del área de influencia directa del contrato, el restante es del municipio de los Cordobas, el 15% del total del personal son mujeres.

Pendiente convocatoria de veeduría para el mes de noviembre, con el fin de realizar la socialización del avance del 50% del contrato.

Respecto a los rendimientos del anticipo, el contratista remitió rendimientos de agosto y se enviaron a la subdirección financiera, el informe de

[Handwritten signature]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE COMITÉ DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	
		FECHA	5/11/2024 (Día / Mes / Año)
<p>septomero lo entregaron y se inicio el tramite de liquidacion de obra. Presentaron soporte de junio 2024. El contratista se compromete a entregar gestionar los soportes de la liquidación de obra para el día 09/11/2024.</p> <p>Respecto a los rendimientos de la cuenta convenio, el municipio envió solicitud de traslado de rendimientos de septiembre, al tesoro nacional. Pendiente traslado y soporte de octubre de 2024.</p> <p>El municipio realizó la actualización de la plataforma secop y se encuentra al día.</p> <p>El contratista de obra manifiesta que el acta parcial 3 se encuentra en revisión por parte de la interventoria, por lo que solicita trámite lo antes posible.</p>		8 de 3	
COMPROMISOS PACTADOS		FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
<u>Ver compromisos en temas desarrollados</u>			
FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA		<u>13/11/2024</u> (Día / Mes / Año)	
NOTAS:			
1. Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.			
2. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.			
3. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.			
LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:			
NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
<u>Monica Barrocal</u>	<u>Residente de Interventoría</u>	<u>Consorcio INGECON INCO</u>	
<u>Marcela Gil</u>	<u>Profesional Social de Interventoría</u>	<u>Consorcio INGECON INCO</u>	
<u>Vicente Urzola</u>	<u>Residente de Interventoría</u>	<u>Consorcio INGECON INCO</u>	
<u>Cesar Rios</u>	<u>Rep. Legal Contratista</u>	<u>Consorcio Pavimento Via Barranquillita</u>	
<u>Ximena Valverde</u>	<u>Secretaria de Planeación</u>	<u>Municipio de Los Cordobas</u>	
<u>Cesar Teheran</u>	<u>Asesor</u>	<u>Municipio de Los Cordobas</u>	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.			
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial			



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 13/11/2024
(Día / Mes / Año) 1 de 3

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON - INCO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE REALIZA REVISION DE COMPROMISOS:

- COMPROMISOS SST
- COMPROMISOS AMBIENTALES
- COMPROMISOS TECNICOS
- COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Estado de la etapa de estudios y diseños
2. Estado de los documentos de inicio
3. Estado del inicio de la etapa de ejecución de obra
4. Propositiones y varios



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 13/11/2024

(Día / Mes / Año)
2 de 3

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Estado de estudios y diseños: El diseño geométrico: Se encuentra aprobado
Diseño hidráulico: Queda aprobado el diseño por parte de la interventoría con la intervención de 3 box couliert de 2x1
Dentro del diseño de pavimentos Queda aprobado el diseño por parte de la interventoría.
Dentro del PAGA Queda aprobado el diseño por parte de la interventoría
Diseño estructural: El contratista envió comunicando acogiéndose a lo establecido en las cartillas. y se remitió el día 17 de julio el informe sobre premisas de diseño
topografía: Aprobada.
Se realizó el pago del trámite ante la CVS por valor de \$11.300.000, ya se tiene el auto de apertura por parte de la CVS, posterior a la visita, se está a la espera de la resolución. El trámite continúa de igual manera, y se está a la espera que la parte jurídica de la CVS expida la resolución.
Se solicita al municipio gestionar mediante oficio a la CVS para agilizar trámite, el cual enviarían el día 07/11/2024. El municipio envió comunicado a la CVS el día 12 de noviembre con el fin de presionar la respuesta de dicha entidad.

2. Estado de los documentos de inicio: A continuación se listan los documentos y su estado:

Análisis de precios Unitarios contractuales: aprobado
Programación de obra: Aprobado
Hoja de vida: Aprobado
Maquinaria mínima: Aprobado
PMT: Aprobado
Plan de calidad y plan de inspección de ensayos: Aprobado
PAGA: Aprobado
Fuentes de material: aprobadas
Caracterización de materiales: aprobado.

3. Estado de la etapa de ejecución de obra: El contratista se encuentra suministro, extendida y compactación de capa de subbase entre la k1+000 hasta la K0+840. Esta semana se realizó actividad de cuneta entre la K1+056 hasta la K1+000 costado derecho, en la presente semana no se avanzó con esta actividad por este lado, y en el costado izquierdo se trabajó entre la K1+804 hasta la K1+645, y se avanzó con concreto de pavimento carril derecho, desde K1+283 hasta K1+201,5 y costado izquierdo desde K1+930,6 hasta la K1+735,1. El contratista radicó balance ajustado a la entidad y se encuentra aprobado. y el balance de obra #2 se encuentra en revisión por parte de la interventoría. El contratista de obra manifiesta que tiene 3 cuadrillas independientes, una de construcción de cunetas, otra de instala rieles y otra cuadrilla de realiza fundida de pavimento, realizando aproximadamente 200ml de pavimento y 200 ml de cunetas semanalmente. La interventoría solicita aumentar rendimientos en la ejecución de actividades. El contratista inicio actividades de bordillo en ambos costados, llegando a la abscisa K2+210. Se aclara que se hizo ajuste al abscisado verificado con interventoría y el alcance actual real es 2325 ml.

La siguiente semana el contratista continuará con el suministro, instalación y compactación de material de subbase, de la K0+840 a la k0+460, concreto de losas, hasta k1+000 carril derecho. Por el lado izquierdo hasta la K1+735.1 hasta K1+645. En cunetas lado izq se queda en la abscisa k1+645, no se trabajara esa semana en esta actividad y del lado del quedará en la k1+000. Se esta realizando reparacion de losas, a la fecha se lleva un 100% (25 losas), realizar un inventario para identificar si hay mas grietas en el pavimento, se presentó comunicado por parte de interventoría remitir respuesta el día 15 de noviembre de 2024. Actualmente, el contrato presenta un atraso del 36,57% basados en el valor total del contrato, sin embargo, se presentará nuevo balance para ampliar física con los mismos recursos lo que permite evidenciar que el % de atraso se esta calculando sobre un valor superior al costo de la meta física actual, avance ejecutado 42,78% y programado 79,25% estos datos son tomados de la reprogramación No.1, esta información se realiza de acuerdo a la acta de modificación de mayores y menores e inclusion de precios no previstos. El contratista entregó el plan de contingencia y la interventoría realiza observaciones, por lo tanto, el contratista se compromete a presentar subsanaciones el día 07/11/2024. No se cumplió con esa fecha, el contratista lo presentará el 15 de noviembre de 2024

El nuevo balance la interventoría lo está revisando para su aprobación. El contratista presentó solicitud de prórroga y está en revisión por parte de interventoría.

En acopio se tiene 98 m3 de triturado y 42 m3 de arena y 240 bultos de cemento, en bodega se cuenta con acero para armado de parrillas.

El contratista tiene pendiente la entrega de la respuesta a la no conformidad de los resultados de los concretos de las losas. Se realizará prueba de cilindros a los 56 días, con el fin de verificar resistencia. Dichos nucleos se tomaran el 14 de noviembre de 2024 a las 8:00am

4. Propositiones y varios: En el tema SST el contratista subsano observaciones de junio, julio y agosto, y estan aprobados, informe de septiembre, se encuentra aprobado por parte de interventoría. El informe de octubre lo entregan el día 07/11/2024. No se entrego, lo entregaran el 15/11/2024. El contratista de obra que se están tomando acciones para el orden y aseo en la obra, tales como bolsas de agua y cemento tiradas, herramienta menor en lugares no autorizados. El contratista de obra manifiesta que presentó un cronograma de charlas, y se han implementando.

Respecto al componente ambiental, se hicieron observaciones al informe de septiembre y se encuentra aprobado. El informe ambiental de octubre de 2024 se encuentra aprobado.

Respecto al componente social, se realizó la reunión de seguimiento con veeduría y se hicieron capacitaciones sobre participación ciudadana, liderazgo y control social. El informe de septiembre está aprobado por parte de la interventoría. El informe de octubre esta en revision. No se ha presentado ninguna PQR. Presentaron programación de octubre y noviembre de las capacitaciones por parte del contratista. La capacitación sobre cultura vial se realizará el 27 de noviembre de 2024.

Se informa por parte del contratista que la junta de accion comunal se reunió con los miembros de la comunidad que tienen queja de altas velocidades en la vía para llegar a compromisos

Respecto al reporte de las personas contratadas el 80% corresponde a mano de obra no calificada. de ese 80% el 30.77% corresponde a MO no



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 13/11/2024
(Día / Mes / Año)

calificada del área de influencia directa del contrato, el restante es del municipio de los Cordobas y del corregimiento La Salada, el 10% del total del personal son mujeres.

Pendiente convocatoria de veeduría para el mes de noviembre, con el fin de realizar la socialización del avance del 50% del contrato.

Respecto a los rendimientos del anticipo, el contratista remitió rendimientos de agosto y se enviaron a la subdirección financiera, el informe de septiembre lo entregaron y se inició el trámite de liquidación de fiducia. Presentaron soporte de junio 2024. El contratista se compromete a entregar gestionar los soportes de la liquidación de fiducia para el día 08/11/2024. No se entregó, el contratista informa que se demora dos meses.

Respecto a los rendimientos de la cuenta convenio, el municipio envió solicitud de traslado de rendimientos de septiembre, al tesoro nacional. Pendiente traslado y soporte de octubre de 2024. Se está haciendo el trámite.

El municipio realizó la actualización de la plataforma secop y se encuentra al día.

COMPROMISOS PACTADOS

FECHA DE CUMPLIMIENTO
(Día / Mes / Año)

RESPONSABLES

Ver compromisos en temas desarrollados

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA

19/11/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Vicente Vizola B.	Residente Intervent.	Cous. Ingenieros-Inco	
Mónica Berrocal A.	Residente de Interventoría	C. H&S CON INCO	
Ximena Valverde	Sec. de Planeación	Alcaldía LC.	
Marcela Göt G.	Profesional Social	Ingenieros-Inco	
Cecilia Mas G	El. Construcción	C. Puro Vio Aguila	
Angela M. Danta M.	Directora Interventoria	C. Ingenieros-Inco	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 19/11/2024
(Día / Mes / Año)
1 de 3

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. _____
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:
MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON - INCO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

SE REALIZA REVISION DE COMPROMISOS:

- COMPROMISOS SST
- COMPROMISOS AMBIENTALES
- COMPROMISOS TECNICOS
- COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Estado de la etapa de estudios y diseños
2. Estado de los documentos de inicio
3. Estado del inicio de la etapa de ejecución de obra
4. Propositiones y varios



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA 19/11/2024

(Día / Mes / Año)
2 de 3

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Estado de estudios y diseños: El diseño geométrico: Se encuentra aprobado
Diseño hidráulico: Queda aprobado el diseño por parte de la interventoría con la intervención de 3 box culvert de 2x1
Dentro del diseño de pavimentos Queda aprobado el diseño por parte de la interventoría
Dentro del PAGA Queda aprobado el diseño por parte de la interventoría
Diseño estructural: El contratista envió comunicando acogiéndose a lo establecido en las cartillas, y se remitió el día 17 de julio el informe sobre premisas de diseño
topografía: Aprobada
Se realizó el pago del trámite ante la CVS por valor de \$11.300.000, ya se tiene el auto de apertura por parte de la CVS, posterior a la visita, se está a la espera de la resolución. El trámite continúa de igual manera, y se está a la espera que la parte jurídica de la CVS expida la resolución.
Se solicita al municipio gestionar mediante oficio a la CVS para agilizar trámite, el cual enviarían el día 07/11/2024. El municipio envió comunicado a la CVS el día 12 de noviembre con el fin de presionar la respuesta de dicha entidad. El municipio remitió información solicitada por la CVS referente a coordenadas y registro fotográfico.

2. Estado de los documentos de inicio: A continuación se listan los documentos y su estado:

Análisis de precios Unitarios contractuales: aprobado

Programación de obra: Aprobado

Hoja de vida: Aprobado

Maquinaria mínima Aprobado

PMT: Aprobado

Plan de calidad y plan de inspección de ensayos: Aprobado

PAGA: Aprobado

Fuentes de material: aprobadas

Caracterización de materiales: aprobado.

3. Estado de la etapa de ejecución de obra: El contratista se encuentra suministro, extendida y compactación de capa de subbase entre la K0+840 hasta la K0+350, superando la meta física inicial, es decir los 1421 ml. Esta semana no se realizó actividad de cuneta en el lado derecho quedando en la K1+000 costado derecho, y en el costado izquierdo se quedó en la K1+645, y se avanzó con concreto de pavimento camil derecho, desde K1+201,5 hasta K1+030 y costado izquierdo desde K1+735,1 hasta la K1+645. El contratista radicó balance ajustado a la entidad y se encuentra aprobado, y el balance de obra #2 se encuentra en revisión por parte de la interventoría. El contratista de obra manifiesta que tiene 3 cuadrillas independientes, una de construcción de cunetas, otra de instala rieles y otra cuadrilla de realiza fundida de pavimento, realizando aproximadamente 200ml de pavimento y 200 ml de cunetas semanalmente. La interventoría solicita aumentar rendimientos en la ejecución de actividades. El contratista continuo con actividades de bordillo en ambos costados, llegando a la abscisa K2+103.

La siguiente semana el contratista continuará con el suministro, instalación y compactación de material de subbase, de la K0+350 a la K0+000, concreto de losas, hasta K0+800 camil derecho. Por el lado izquierdo no trabajara esta semana para avanzar en lado derecho. En cunetas lado izq se queda en la abscisa K1+645, no se trabajara esa semana en esta actividad y del lado del quedará en la K0+800. Bordillo llegará a la K1+950 por ambos lados. Se esta realizando reparacion de losas, a la fecha se lleva un 100% (25 losas), realizar un inventario para identificar si hay mas grietas en el pavimento, se presentó comunicado por parte de interventoría remita respuesta el día 15 de noviembre de 2024. Actualmente, el contrato presenta un atraso del 34,35% basados en el valor total del contrato, sin embargo, se presentará nuevo balance para ampliar física con los mismos recursos lo que permite evidenciar que el % de atraso se esta calculando sobre un valor superior al costo de la meta física actual, avance ejecutado 46,50% y programado 80,89% estos datos son tomados de la reprogramación No.1, esta información se realiza de acuerdo a la acta de modificación de mayores y menores e inclusion de precios no previstos. El contratista entregó el plan de contingencia y la interventoría realiza observaciones, por lo tanto, el contratista se compromete a presentar subsanaciones el día 07/11/2024. No se cumplió con esa fecha, el contratista lo presentará el 15 de noviembre de 2024

El nuevo balance la interventoría lo está revisando para su aprobación. El contratista presentó solicitud de prórroga y está en revisión por parte de interventoría.

En acopio se tiene 56 m3 de triturado y 42 m3 de arena y 500 bultos de cemento, en bodega se cuenta con acero para armado de parrillas.

El contratista tiene pendiente la entrega de la respuesta a la no conformidad de los resultados de los concretos de las losas. Se reprogramó prueba de cilindros a los 56 días, con el fin de verificar resistencia. Dichos núcleos se tomaran el 21 de noviembre de 2024 a las 8:00am,

4. Proposiciones y varios: En el tema SST el contratista subsano observaciones de junio, julio y agosto, y estan aprobados, informe de septiembre, se encuentra aprobado por parte de interventoría. El informe de octubre lo entregaron el día 19/11/2024 esta en revision de la interventoría. El contratista de obra que se están tomando acciones para el orden y aseo en la obra, tales como bolsas de agua y cemento tiradas, herramienta menor en lugares no autorizados. El contratista de obra manifiesta que presentó un cronograma de charlas, y se han implementando. Se realizó esta semana charla de proceso de afiliaciones y aclaraciones sobre regimen subsidiado al personal.

Respecto al componente ambiental, se hicieron observaciones al informe de septiembre y se encuentra aprobado. El informe ambiental de octubre de 2024 se encuentra aprobado.

Respecto al componente social, informe de septiembre se encuentra aprobado. El informe de octubre de 2024 se encuentra aprobado. No se ha presentado ninguna PQR. Presentaron programación de octubre y noviembre de las capacitaciones por parte del contratista. La capacitacion sobre cultura vial se realizará el 27 de noviembre de 2024.

Respecto al reporte de las personas contratadas el 80% corresponde a mano de obra no calificada, de ese 80% el 30.77% corresponde a MO no calificada del área de influencia directa del contrato, el restante es del municipio de los Cordobas y del corregimiento La Salada, el 10% del total del personal son mujeres.

La convocatoria de veeduría para el mes de noviembre quedo para el 27 de noviembre a las 3:00 pm, y se realizará la socialización del avance del 50% del contrato.

Respecto a los rendimiento del anticipo, el contratista remito rendimientos de agosto y se enviaron a la subdirección financiera, el informe de septiembre lo entregaron y se inició el tramite de liquidación de fiducia. Presentaron soporte de junio 2024. El contratista se compromete a entregar gestionar los soportes de la liquidación de fiducia para el día 08/11/2024. No se entregó, el contratista informa que se demora dos meses. Se remitió informe de fiducia de octubre de 2024.

Respecto a los rendimientos de la cuenta convenio, el municipio envió solicitud de traslado de rendimientos de septiembre, al tesoro nacional. Se envió soporte de octubre de 2024.

El municipio realizó la actualización de la plataforma secop y se encuentra al día.

El acta parcial 3 se encuentra en subsanacion por parte del contratista, por lo que solicita trámite lo antes posible.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	19/11/2024 (Día / Mes / Año)

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO (Día / Mes / Año)	RESPONSABLES
Ver compromisos en temas desarrollados		

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 27/11/2024
(Día / Mes / Año)

NOTAS:

- Corresponde a la Interventoría ejercer el control y vigilancia de la obra, en consecuencia es el Interventor quien dirige los Comités de Obra.
- Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra, no pueden modificar ni modifican por sí solas el Contrato de Obra ni el contrato de Interventoría suscritos. En el evento de requerirse una modificación contractual debe surtir de manera previa el trámite interno correspondiente.
- Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	CARGO	EMPRESA / ENTIDAD	FIRMA
Vicente Urgola B.	Res. Interventoría	Consorcio Ingecon-Inco	
Mónica Berrocal A.	Res. Interventoría	C. INGECON INCO	
Marcela Gil G	Prof. Local	C. Ingenieros	
César A. Ríos G	Legal Contralista	C. Purovia Bg.	
Angela M. Oñala M.	Director Interventoría	C. Ingecon-Inco	

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 de 1

FECHA 19/11/2024
(Día / Mes / Año)

(Este formato aplica únicamente para Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No.
(La numeración será consecutiva)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA

CONTRATO DE OBRA No. LP-M&BV-008
(Indicar número de contrato y año)

CONTRATISTA: CONSORCIO L&S

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE CORREDORES RURALES PRODUCTIVO EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA - COLOMBIA RURAL

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. EC51-2023
(Indicar número de contrato y año)

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON - INCO

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS
SE VERIFICAN LOS COMPROMISOS ESTABLECIDOS EN EL COMITÉ ANTERIOR

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Estado de la etapa de estudios y diseños
2. Estado de los documentos de inicio
3. Estado del inicio de la etapa de ejecución de obra
4. Proposiciones y varios.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE OBRA

CÓDIGO	MEP-HMG-MS-144-R-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	2 de 4

FECHA 19/11/2024

(CH / Mes / Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Estado de estudios y diseños: Esta aprobado la topografía, diseño de pavimentos fue apropiado y la Interventoría avala concepto del especialista de obra, Diseño hidráulico: Se entró el ajuste en el acceso con el oficio 040-2024, el 27 junio 2024, Interventoría aprobó con comunicado CING-INV-6053-01 73-24 del 2 de julio.

El PAGA: El contratista está haciendo el ajuste, están solicitando el certificado de disposición final de residuos a la alabía del municipio, se hizo mesa de trabajo entre especialista de Interventoría y contratista y como falta el certificado por parte del componente social está pendiente adscribir el plan de trabajo.

Diseño hidráulico: Aprobado

Diseño estructural: La Interventoría remitió observaciones al contratista radicará el 15 de octubre de 2024.

Respecto a los términos ante la CVS se hicieron las dos visitas por parte de dicha entidad, la visita del permiso de ocupación se realizó en 20 de agosto y la de aprovechamiento forestal se realizó hoy, 17 de septiembre de 2024. La CVS solicita ampliación de la información sobre el marginal contratista aclaro lo solicitado y a la fecha no ha llegado el pronunciamiento. Se cuenta con la resolución de aprovechamiento forestal de fecha 15 de noviembre de 2024, estableciéndose tasa de 5 individuos y por cada mangle y se debe hacer compensación de 53 individuos.

2. Estado de los documentos de diseño: A continuación se listan los documentos y su estado:

Análisis de precios Unitarios contractuales: El contratista lo remite esta en revisión de la Interventoría

Programación de obra: Aprobada

Hoja de vida: Aprobado

Maquinaria mínima: Se subscrito el día 25 de junio de 2024, en revisión por parte de la Interventoría

HMT: aprobado

Plan de calidad: Aprobado

PAGA: ver punto 1

Fuentes de material: aprobados

Caracterización de materiales: aprobado, pendiente la caracterización del material de la cantera aguas vivas.

3. Estado de la etapa de ejecución de obra: Esta semana se avanza en excavaciones desde K0+140 hasta K0+333. Se adelantó el ceto de la piedra rajón desde K0+350 hasta el K0+520, se adelantó piedra desde K0+350 hasta el K0+520, goterón hasta K0+535, se realizó mantenimiento a la vía alternas. No se ha instalado subbase, por parte de alumbrado, se traslado del poste ubicado en el K0+010, y del tramo de los postes que se encuentran ladoados en el K0+520, no se ha realizado ninguna labor por parte de oficina. El contratista fundió pavimento del primer tramo completo desde K0+350 hasta la K0+000. Se está realizando excavación en el budo izquierdo para bordillo, desde K0+350 hasta K0+260. La siguiente semana se tendrán 300 mt de bordillo.

Esta semana no se realizó actividad de subbase hasta no tener liberado tramo. Se continuará con excavación para bordillo todo derecho desde el K0+350 hasta el K0+260, fundición de bordillo, excavación, instalación de goterón y suministro de pedraplen, instalación de sellu se realizará desde K0+530 hasta K0+680, no se tiene en acopio subbase, el material que llega se va instalando. Se sigue figurando acero, se tiene acopio de piedra. No se autoriza mas instalación de pavimento por parte del contratista, hasta tanto no se entregue y apruebe el diseño de mezcla por parte de la interventoría.

A la presente semana se tiene un ejecutado de 55,02%, programado de 67,13%, para un atraso del 12,71%, por lo cual se solicita plan de contingencia para mitigar el atraso que se tiene el proyecto, el contratista lo entregará el día 21 de noviembre de 2024.

Teniendo las resoluciones dadas por la CVS, se pueda iniciar con las talas y podas del mangle para su intervención.

4. Propositiones y varios: El contratista remite solicitud de desembolso de anticipo el 21 de noviembre de 2024, se solicita la entrega de los rendimientos financieros.

Del componente social, se aprobaron por parte de la Interventoría informes de los meses de febrero, marzo, mayo, junio respecto a los informes de julio, agosto, septiembre y octubre se entregaron por el contratista y están en revisión por parte de la Interventoría; PAGA aprobado, las aulas de vecindad se subscritas, y se aprobaron por parte de la Interventoría.

Se programara reunión correspondiente al 50% de avance del contrato.

A la fecha no se han recibido PQR's anexoales a la de octubre.

El comité de vecindad se realizará el 28 de noviembre a las 2:00 pm, se realizará una capacitación sobre comité social, participación ciudadana y liderazgo en la reunión de vecindad.

Se instaló La valla el día 22 de septiembre de 2024.

Dentro del programa social se tiene la implementación de unas capacitaciones, se tiene programada para el 28 de noviembre

Del componente ambiental, del PAGA v4, se reunió el día 24 de septiembre de 2024 con convocantes, respecto a los directores de la CVS, respecto a los informes ambientales de febrero, marzo y mayo se aprobaron por parte de la Interventoría. El 18 de noviembre se entregaron los informes pendientes junio, julio, agosto, septiembre y octubre se encuentran en revisión de la Interventoría. Se le solicita al contratista usar los puntos de acopio que se encuentran registrados en el PAGA, el contratista ajustó el documento PAGA con la totalidad de los puntos. Respecto al material de donación, el contratista presentó documentación de acta de entrega, cedida a la alcaldía para la firma del secretario de infraestructura, una vez se cuente con ellos, remitirá a Interventoría para su trámite.

Del componente SST, la información del personal al contratista ha ido remitiendo a la Interventoría la información, sin embargo, aun está pendiente de entregar la totalidad de la misma, se debe entregar por carpeta cada personal, que contenga entre otros, exámenes médicos, afiliaciones de la afp, de manera organizada, respecto a los informes mensuales, se entregaron los meses de febrero, marzo y mayo, junio, julio, agosto, septiembre y octubre a la Interventoría, se encuentran en revisión se reitera la recomendación sobre el ingreso del personal un día antes a la Interventoría. El contratista subscritó la señalización preventiva.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE COMITÉ DE ODPA

CÓDIGO	MEH-MH1-S3-14-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	3 de 4

FECHA 19/11/2024

(Día/Mes/Año)

Se entrega acta de parcelado de estudios y diseños, y acta de obra está en revisión de la Interventora.

Se solicita la consignación de los rendimientos del mes de octubre de 2024.

Se solicita los ajustes a los volúmenes, para el día 30 de noviembre de 2024 respectos de prórrogas.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	59

5 INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

5.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO.

Tabla 7 INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	5053 de 2023		
CONTRATISTA:	CONSORCIO INGECON-INCO	NIT:	901.783.007-9
INTEGRANTES (CONSORCIO O UNION TEMPORAL):	<ul style="list-style-type: none"> • INGENIERIA Y CONSULTORIA INGE CON S.A.S 90% • INGENIERIA Y CONSULTORIA CM S.A.S 10% 		
OBJETO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1		
FECHA DE INICIO:	28 de diciembre de 2023	No. de Oficio SVR 2023S-UVBOG-033-085	SIGLA UNIDAD EJECUTORA SVR
VALOR INICIAL:	\$ 2.219.000.000,00		
VALOR ADICIONES:	\$ 0,00		
ADICIÓN 1:	\$ 0,00		
ADICIÓN N:			
VALOR ACTUAL:	\$ 2.219.000.000,00		
ANTICIPO	\$ 932.352.941,00		
ANTICIPO OTORGADO:	\$ 0.00		
ANTICIPO EN CUENTA:	\$ 0,00		
ANTICIPO AMORTIZADO:	\$ 0,00		
SALDO POR AMORTIZAR:	\$ 0,00		
PLAZO INICIAL:	Hasta el 31 de diciembre de 2023		
TOTAL, PRÓRROGAS:			
PRÓRROGA 1:	02/02/2024		

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	60

PRÓRROGA N:	
SUSPENSIÓN 1:	29/12/2023
REANUDACIÓN 1:	01/02/2024
MODIFICACIÓN:	N/A
FECHA DE FINALIZACIÓN ACTUAL:	31 de diciembre de 2024

5.2 DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR.

La interventoría hizo seguimiento a los contratos de obra de acuerdo a lo establecido en el manual de interventoría del INVIAS donde se establecen las siguientes, actividades administrativas, técnicas, ambientales y sociales, en el periodo del 1 al 30 de noviembre de 2024:

Actividades Administrativas:

- Revisión por parte de los especialistas de la interventoría de los informes técnicos de la revisión a los estudios y diseños presentados durante el presente periodo de los proyectos de los contratos No. 159-2023 del municipio de Planeta rica, No. LP-006-2023 del municipio de Los Córdoba y No. LP-MSBV-008-2023 del municipio de San Bernardo del Viento.
- Revisión para aprobación de la documentación exigida en los pliegos de condiciones de los contratos No. 159-2023 del municipio de Planeta rica, No. LP-006-2023 del municipio de Los Córdoba y No. LP-MSBV-008-2023 del municipio de San Bernardo del Viento.
- La interventoría entregó al Invias Territorial Córdoba informes semanales contratos No. 159-2023 del municipio de Planeta rica, No. LP-006-2023 del municipio de Los Córdoba y No. LP-MSBV-008-2023 del municipio de San Bernardo del Viento.
- Entrega de informes y documentación generada en desarrollo del proyecto a las secretarías de infraestructura y planeación de los municipios.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	61

Actividades Técnicas:

- Verificación y control de los materiales utilizados en las obras de los proyectos de Planeta Rica, los Córdoba y San Bernardo del Viento.
- Verificación de procedimientos constructivos de acuerdo con los diseños aprobados.
- Medición de las cantidades ejecutadas y reporte de avance de ejecución.
- Toma de muestras de ensayos de laboratorio de las actividades ejecutadas.
- La interventoría llevó el registro diario de obra (Bitácora), donde queda consignado en detalle las actividades realizadas por el contratista, registro diario del clima las 24 horas y otras situaciones que se relacionen con el Proyecto.
- Control de personal y de equipos en la obra.
- Verificación del cumplimiento de los planes de manejo de tráfico en las obras.

Actividades Ambientales y SST:

- La interventoría realiza la revisión y la inspección de señalización provisional en cada frente de obra.
- La interventoría realiza inspección y verificación de las afiliaciones a la seguridad social del personal de cada frente de obra.
- La interventoría verifica las inspecciones necesarias a los equipos y herramientas de cada frente de obra.
- La interventoría realiza inspección y verificación de dotación de elementos de protección personal en cada frente de obra.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	62

- La interventoría de igual manera en este periodo también cumple con las solicitudes a los contratistas del pago de la seguridad social y soporte de pago de la planilla de aportes, por medio de comunicados.
- Plan de mejora para control de tráfico mediante utilización de paleteros en los frentes de obra de Planeta rica y los Córdoba.
- Verificar las afiliaciones del personal de cada frente de obra.

Con el fin de dar un resumen de la gestión ambiental realizada por interventoría a los proyectos de Planeta rica, Los Córdoba y San Bernardo del Viento, se tiene lo siguiente:

➤ **MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023:**

- Como se evidencia en el presente informe, el contrato 159-2023 correspondiente al municipio de Planeta rica a cargo del contratista Consorcio Providencia, se revisa los informes ambientales mensuales.

➤ **MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023:**

- El contrato LP-006-2023 del municipio de los Córdoba a cargo del Consorcio Pavimento Vía Barranquillita, en el periodo de noviembre continuo con las actividades de obra, así mismo, se evidencio la implementación de algunas de las fichas ambientales descritas en el documento PAGA V04 avalado por interventoría.

➤ **MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023:**

- El contrato LP-MSBV-008-2023 del municipio de San Bernardo del Viento a cargo de Consorcio L&S, al mes del presente informe continua con actividades de obra, el documento PAGA fue aprobado por la interventoría en su V4.1, el contratista presento los informes ambientales.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	63

Con el fin de dar un resumen de la gestión social realizada por interventoría a los proyectos de Planeta rica, Los Córdoba y San Bernardo del Viento, se tiene lo siguiente:

➤ **MUNICIPIO DE PLANETA RICA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023:**

- En el periodo reportado no se presentar PQRS.
- El contratista envía el informe social del periodo de octubre de 2024, la cual fue revisado por interventoría y aprobado.
- Se desarrolló el cuarto comité con la veeduría ciudadana.
- Desarrolló una jornada de capacitación dirigida a la veeduría ciudadana y líderes comunitarios acerca de violencia basada en género y acciones para la seguridad vial.
- Desarrolló una jornada de capacitación dirigida al equipo de trabajo acerca de Cultura, buen trato y convivencia.
- Desarrolló una jornada de capacitación dirigida al equipo de trabajo acerca del trabajo en equipo, liderazgo y motivación.
- El contratista reporta la vinculación de madres cabeza de hogar del área de influencia.

➤ **MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023:**

- El contratista e interventoría hizo el acompañamiento al sexto comité (mensual) con la veeduría ciudadana.
- En el periodo reportado no se presentar PQRS.
- El contratista envía el informe social del periodo de octubre de 2024, la cual fue revisado por interventoría y aprobado.
- El área social del contratista desarrolló un espacio de capacitación con temáticas asociadas a cultura vial dirigida al equipo de trabajo en obra.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	64

- El día 27 de noviembre a través de una reunión colectiva el contratista informa a la comunidad y a miembros de la veeduría ciudadana acerca de las actividades adelantadas en el marco del proyecto *MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.*

➤ **MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO – CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023:**

- El contratista y la interventoría hizo el acompañamiento al quinto comité (mensual) con la veeduría ciudadana.
- El contratista subsana los informes de julio, agosto y septiembre los cuales fueron aprobados y envía informe social de octubre que se encuentra en revisión para aprobación.
- En el periodo reportado no se presentan PQRS.
- El área social del contratista desarrolló un espacio de capacitación con temáticas asociadas a cultura vial dirigida al equipo de trabajo en obra.
- El día 28 de noviembre a través de una reunión colectiva el contratista informa a la comunidad y a miembros de la veeduría ciudadana acerca de las actividades adelantadas en el marco del proyecto *MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS Terciarias en el Municipio de San Bernardo del Viento, Departamento de Cordoba.*
- El contratista adelanta gestión ante la secretaria de gobierno del municipio de San Bernardo del Viento, con el fin de que se notique si hay presencia o no de grupos indígenas constituidos sobre el área de influencia del proyecto.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	65

5.3 INFORMES ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES.

5.3.1 INFORMES ESPECIALISTAS.

Para el presente informe, no se cuenta con revisión de informes por parte de los especialistas de la Interventoría.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	66

5.3.2 INFORMES PROFESIONALES.

INFORME EJECUTIVO DE LA DIRECCIÓN DE INTERVENTORIA



REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS
SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 DEL 2023

PERIODO 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

ELABORADO POR:	APROBADO POR:
 Directora de Interventoría	 Supervisor del INVÍAS

1 INTRODUCCIÓN.

Durante el periodo, correspondiente al 1 al 30 de noviembre de 2024, en el presente informe se presentan las principales actividades desarrolladas por la dirección de la Interventoría en el cumplimiento de sus funciones para el contrato de interventoría No. 5053 de 2023 cuyo objeto es INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1 y que tiene a cargo el seguimiento y control de tres contratos de obra:

- Contrato de obra No. 159 de 2023. Contratista: Consorcio Providencia. Contratante: Municipio de Planeta Rica
- Contrato de obra No. LP-006 DE 2023. Contratista: Consorcio Pavimiento Via Barranquillita. Contratante: Municipio de Los Cordobas.
- Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023. Contratista: Consorcio L&S. Contratante: Municipio de San Bernardo del Viento.

2. OBJETIVO GENERAL

Cumplir con las obligaciones correspondientes al cargo de director de Interventoría para el contrato 5053 de 2023.

3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES:

Durante el presente periodo, la dirección de interventoria:

- Continúa verificación información aportada por el Contratista de Providencia (Planeta Rica), correspondiente a la etapa de revisión de estudios y diseños.
- Se realiza mesa de trabajo con especialistas hidráulico y estructural del contratista con el fin de determinar las actividades de diseño pendiente de entrega.
- Se realiza seguimiento a las actividades en campo desarrolladas por el contratista de Consorcio Providencia (Planeta Rica) correspondiente a la etapa de obra.

- Se realiza seguimiento a actividades en campo desarrolladas por el contratista Consorcio Pavimento Via Barranquillita (Los Cordobas) correspondiente a la etapa de obra.
- Se realiza desembolso de anticipo del contrato de Planeta Rica
- Se realiza desembolso de anticipo del contrato de SBV
- Se realiza seguimiento a actividades en campo desarrolladas por el contratista Consorcio L&S (San Bernardo del Viento) correspondiente a la etapa de obra.
- Asistencia y participación en la reunión con veeduría del contrato del tramo Rimini (San Bernardo del Viento).
- Revisión y observaciones al trámite de desembolso de Anticipo correspondientes al Consorcio L&S (San Bernardo del Viento).
- Se realiza visitas de verificación al tramo Pueblo Nuevo - Providencia, verificando obras adicionales, requeridas para garantizar estabilidad de obra.
- Participación en reunión de socialización del 50% del consorcio Pavimento Via Barranquillita.
- Asistencia y participación en INVIAS territorial Córdoba.
- Programó, desarrolló y lideró los comités semanales de seguimiento realizados conjuntamente con el consorcio providencia y la alcaldía de Planeta Rica.
- Programó, desarrolló y lideró los comités semanales de seguimiento realizados conjuntamente con el consorcio pavimento via barranquilla y la alcaldía de Los Cordobas.

- Programó, desarrolló y lidero mesas de trabajo con el director de obra de Consorcio L&S.
- Revisó y complemento los informes semanales presentados al Instituto correspondientes a los tres contratos de obra bajo su seguimiento.
- Revisó y complemento el informe mensual presentado al Instituto correspondientes a los tres contratos de obra bajo su seguimiento.
- Revisó y complemento las actas de costos presentadas al Instituto correspondientes al contrato de Interventoría.
- Revisó y avaló acta de obra presentada por el Consorcio Pavimento Via Barranquilla para su envio a la Alcaldia de Los Córdoba.
- Atendió los requerimientos realizados por el instituto, tales como comunicados y/o convocatorias a reuniones y mesas de trabajo.
- Dio cumplimiento a las obligaciones en materia legal, técnica, ambiental social, SST establecidas en el Manual de Interventoría.
- Requirió a cada uno de los contratistas el cumplimiento de sus obligaciones establecidas tanto en el contrato como en el convenio, de acuerdo a los lineamientos del Instituto.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'AMDA', is positioned above the name of the signatory.

ANGELA MARIA DAVILA M
DIRECTORA DE INTERVENTORIA
TP 17202-153798 CLD

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORIA

FECHA:

DD	MM	AA
30	11	2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA N°: 5053 de 2023

Desde:

01	11	2024
----	----	------

Hasta:

30	11	2024
----	----	------

Nombre: Vicente Carlos Urzola Badel

Cargo: Residente de Interventoría

No.	Actividades realizadas durante el mes de noviembre 2024	Observaciones
1	Elaboración de diferente comunicados remitidos al contratista	Se proyectan comunicados para revisión del director de interventoría y posterior envío al contratista de obra. Donde se registran los diferentes requerimientos para el seguimiento y desarrollo del proyecto.
2	Diligenciamiento de bitácora de obra	se registraron las actividades diarias, equipos utilizados, observaciones, indicaciones, registros de lluvias, etc. del mes de noviembre de 2024.
3	Revisión de cantidades de obra	Se revisan las cantidades ejecutadas durante el periodo de 01 al 30 de noviembre de 2024.
4	Revisión del balance de obra	Se revisa balance de obra, en archivos editables previo para firma de los representantes legales y para envío los documentos de las cuentas por pagar.
5	Actualización de cantidades de obra	De manera diaria se lleva el control de las cantidades de obra, tomados del registro diario de las actividades ejecutadas en obra, por lo que se actualiza el consolidado de las cantidades ejecutadas.
7	Control de avance de obra.	Se entrega de manera semanal el control de los avances de obra con respecto a la inversión programada aprobada, el cual quedaron registrado en los informes semanales: No. 40 . No. 41 . No. 42 . No. 43 .
8	Elaboración del informe mensual de interventoría	Se realiza informe mensual mes de noviembre 2024, con anexos, que entrega al INVIAS.

9	Recorridos diario a la vía	Se realiza visita permanente en los corredores viales, se ejecutaron: Suministro, extendida y compactación de afirmado y subbase granular, construcción de pavimento rígido MR38, etc..
---	----------------------------	---

No.	Actividades realizadas durante el mes de noviembre 2024	Observaciones
10	Revisión de los ensayos de laboratorio de suelos	Se revisa los ensayos de control de caracterización de afirmado y subbase granular; en el mes de noviembre 2024.
11	Revisión de los ensayos de laboratorio de suelos	Los resultados se registran en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.
12	Se realiza registro fílmico y fotografías de avance	Se presenta el registro del frente de obra.
13	APU no previsto	Se presentaron apu de ítem no previstos y se firma acta de pactación de precios.

Firma:



Vicente Urzola Badel
T.P: 22202215754COR


INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**FECHA:**

DD	MM	AA
30	11	2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: 5053 - 2023**NOMBRE:** Mónica Berrocal Arrieta**Cargo:** Ingeniera Residente de Interventoría

N°	Actividades realizadas durante el mes de noviembre 2024	Observaciones
1	Elaboración de diferentes comunicados remitidos al contratista	Se proyectan comunicados para revisión del director de interventoría y posterior envío al contratista de obra. Donde se registran los diferentes requerimientos para el seguimiento y desarrollo del proyecto.
2	Diligenciamiento de bitácora de obra	Se registraron las actividades diarias, equipos utilizados, observaciones, indicaciones, registros de lluvias, etc. del mes de noviembre de 2024.
3	Revisión de cantidades de obra	Se revisan las cantidades ejecutadas durante el periodo de 01 al 30 de noviembre de 2024.
4	Entrega del balance de obra N°1	Se hizo entrega de balance de obra N°1, el cual se encuentra legalizado y aprobado. Posteriormente, se encuentra a la espera que el contratista haga entrega de balance N°2.
5	Actualización de cantidades de obra	De manera diaria se lleva el control de las cantidades de obra, tomados del registro diario de las actividades ejecutadas en obra, por lo que se actualiza el consolidado de las cantidades ejecutadas.
6	Control de avance de obra.	Se entrega de manera semanal el control de los avances de obra con respecto a la inversión programada aprobada, el cual quedaron registrado en los informes semanales: <ul style="list-style-type: none">• No.40• No.41• No.42• No.43
7	Elaboración del informe mensual de interventoría	Se realiza informe mensual mes de noviembre 2024, con anexos, que entrega al INVIAS.

8	Recorridos diarios a la vía	Se realiza visita permanente en los corredores viales, se ejecutaron: suministro, extensión y compactación de subbase granular; construcción de cunetas de concreto de 3000 psi, construcción de losas de pavimento de concreto MR 38, verificación de niveles y espesores de cunetas y losas de pavimento, inspección visual de daños de losas de pavimento.
9	Revisión de los ensayos de laboratorio de suelos	<p>Se revisa los ensayos de control de Toma de densidad y peso unitario del suelo en el terreno por método del cono de arena de la capa de afirmado y subbase granular; toma de muestras de concreto de resistencia de 3000 psi y resistencia a la flexión con módulo de rotura de 38kg/cm2 en el mes de noviembre de 2024.</p> <p>Los resultados se registran en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.</p>
10	Se realiza registro fílmico y fotografías de avance	Se presenta en los informes mensuales de interventoría del frente de obra.
11	APU no previsto	Para este periodo no aplica.

Firma: 
Mónica Berrocal Arrieta
T.P: 22202158895 COR

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA**FECHA:**

DD	MM	AA
30	11	2024

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°: 5053 - 2023**NOMBRE:** Luis Jacobo Vargas Dávila**Cargo:** Ingeniero Residente de Interventoría

N°	Actividades realizadas durante el mes de noviembre 2024	Observaciones
1	Elaboración de diferentes comunicados remitidos al contratista	Se proyectan comunicados para revisión del director de interventoría y posterior envío al contratista de obra. Donde se registran los diferentes requerimientos para el seguimiento y desarrollo del proyecto.
2	Diligenciamiento de bitácora de obra	Se registraron las actividades diarias, equipos utilizados, observaciones, indicaciones, registros de lluvias, etc. del mes de noviembre de 2024.
3	Revisión de cantidades de obra	Se revisan las cantidades ejecutadas durante el periodo de 01 al 30 de noviembre de 2024.
4	Revisión del balance de obra #01	Se revisa balance de obra #01, en archivos editables previo para firmade los representantes legales y para envío los documentos, con el fin de legalizar el proceso.
5	Actualización de cantidades de obra	De manera diaria se lleva el control de las cantidades de obra, tomados del registro diario de las actividades ejecutadas en obra, por lo que se actualiza el consolidado de las cantidades ejecutadas.
6	Control de avance de obra.	Se entrega de manera semanal el control de los avances de obra con respecto a la inversión programada aprobada, el cual quedaron registrado en los informes semanales: <ul style="list-style-type: none">• No.40• No.41• No.42• No.43
7	Elaboración del informe mensual de interventoría	Se realiza informe mensual mes de noviembre 2024, con anexos, que entrega al INVIAS.

8	Recorridos diarios a la vía	Se realiza visita permanente en los corredores viales, se ejecutaron: suministro, extendida y compactación de segunda capa afirmado; suministro, extensión y compactación de subbase granular, construcción de pavimento etc.
9	Revisión de los ensayos de laboratorio de suelos	<p>Se revisa los ensayos de control de toma de densidad y peso unitario del suelo en el terreno por método del cono de arena de la capa de afirmado y subbase granular; toma de muestras de concreto de resistencia de 3000 psi en el mes de noviembre de 2024.</p> <p>Los resultados se registran en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-11RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO.</p>
10	Se realiza registro fílmico y fotografías de avance	Se presenta en los informes mensuales de interventoría del frente de obra.
11	APU no previsto	Para este periodo no aplica.

Firma: _____



Luis Jacobo Vargas Dávila
T.P: 17202166700CLD

**INFORME DE GESTIÓN SOCIAL INTERVENTORIA
NOVIEMBRE 2024**

PROYECTO: CONTRATO INTERVENTORIA N. 5053 DE 2023
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1.

El alcance de los programas a implementar dentro de la gestión social estipulados en el PAGA – Componente social se encuentra a continuación:

1. Subprograma y/o Proyecto: Atención a la comunidad
2. Subprograma y/o Proyecto: Información y Divulgación.
3. Subprograma y/o Proyecto: Cultura Vial y Participación Comunitaria.
4. Subprograma y/o Proyecto: Inclusión Social con perspectiva de género y transversalización
5. Subprograma y/o Proyecto: Infraestructura de predios
6. Subprograma y/o Proyecto: Contratación de mano de obra con enfoque de género de derecho y diferencial.
7. Subprograma y/o Proyecto: Acompañamiento al desarrollo y cumplimiento de la consulta previa, libre e informada con comunidades étnicas.

1. SUBPROGRAMA Y/OPROYECTO: DE ATENCION A LA COMUNIDAD.

- Los contratistas de los proyectos pavimento vía Barranquillita, pavimento vía Providencia y pavimento vía Rimini cuentan con la instalación de buzón móvil en las respectivas áreas de influencia de los proyectos, en aras de garantizar la atención oportuna a los ciudadanos a las quejas, reclamos, solicitudes y peticiones que surjan en el marco de los proyectos.

INDICADOR DE GESTIÓN

INDICADOR	VALOR	%	OBSERVACIONES
Número de solicitudes respondidas satisfactoriamente/ Número de solicitudes recibidas	\$0	0%	Se espera atención oportuna por parte del contratista en caso dado de presentarse PQRS.

2. SUBPROGRAMA Y/O PROYECTO: INFORMACIÓN Y DIVULGACIÓN.

Durante el mes de noviembre se realizó seguimiento a las actividades de información y divulgación dirigidas a las comunidades de los proyectos y/o contratos asociados a la INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1.

Consorcio L&S: el contratista convoca a la comunidad y a la veeduría ciudadana a través de folletos y grupo de WhatsApp a reunión para socializar el avance del 50% de ejecución de proyecto.

El día 28 de noviembre a través de una reunión colectiva el contratista informa a la comunidad y a miembros de la veeduría ciudadana acerca de las actividades adelantadas en el marco del proyecto *MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.*

Consorcio Pavimento Vía Barranquillita: el contratista convoca a la comunidad y a la veeduría ciudadana a través de folletos a reunión para socializar el avance del 50% de ejecución de proyecto.

El día 27 de noviembre a través de una reunión colectiva el contratista informa a la comunidad y a miembros de la veeduría ciudadana acerca de las actividades adelantadas en el marco del proyecto *MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA*

SUBPROGRAMA Y/O PROYECTO: CULTURA VIAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA.

Capacitaciones

Consorcio L&S: En el mes de noviembre el contratista realizó charla dirigida al equipo de trabajo en obra sobre cultura vial.

Consorcio Pavimento Vía Barranquillita: En el mes de noviembre el contratista realizó charla dirigida al equipo de trabajo en obra sobre cultura vial.

Reuniones - Comités con la veeduría ciudadana

Los contratistas; Consorcio Providencia, Consorcio Pavimento Vías Barranquillita y Consorcio L&S realizaron comités con las veedurías ciudadanas, con el fin de informar el avance de las obras y su vez generar un espacio de conversación con los miembros de la veeduría para escuchar sus inquietudes, solicitudes y aportes.

SUBPROGRAMA/PROYECTO: INCLUSIÓN SOCIAL CON PERSPECTIVA DE GÉNERO Y TRANSVERSALIZACIÓN.

Se hace seguimiento a la permanencia o aumentó a la vinculación de hombres y mujeres del área de influencia en igualdad de condiciones, toda vez que se requiere de la participación a los habitantes de la población de manera equitativa, promoviendo el empleo temporal, lo cual contribuye a mejorar las condiciones económicas de las comunidades.

Espacios educativos para la inclusión social

Consorcio Providencia:

- Charla dirigida al equipo de trabajo acerca de Cultura, buen trato y convivencia.
- Charla dirigida al equipo de trabajo acerca del trabajo en equipo, liderazgo y motivación.
- Charla dirigida a la veeduría ciudadana y líderes comunitarios acerca de violencia basada en género y acciones para la seguridad vial.

3. SUBPROGRAMA/PROYECTO: INFRAESTRUCTURA DE PREDIOS

Levantamiento de Actas de Vecindad

Durante el periodo no se realizó el diligenciamiento de actas de vecindad, debido a que los contratistas han realizado el levantamiento de información en los predios que se encuentran ubicados sobre los tramos de vía autorizados a la fecha para su intervención.

INDICADOR DE GESTIÓN

Actas de vecindad levantadas	Corredor	Total
7 tramo Barranquillita – Los Mangos. 57 tramos 1 y 2 - Providencia 29 tramos de vía Rimini y vía alterna	*Vereda Barranquilla del Municipio de los córdobas – Córdoba *Vereda Providencia del municipio de Planeta Rica – Córdoba * Vereda Rimini del municipio de San Bernardo del Viento – Córdoba	93 actas levantadas

4. SUBPROGRAMA/PROYECTO: CONTRATACIÓN DE MANO DE OBRA CON ENFOQUE DE GÉNERO, DE DERECHO Y DIFERENCIAL.

Se hace seguimiento a la permanencia o aumento a la contratación de mano de obra con enfoque de género, es decir la participación de mujeres cabeza de hogar, jóvenes, personas en situación de discapacidad y miembros de las comunidades indígenas, toda vez que se requiere la participación de la población diferencial, lo que permite visibilizar el reconocimiento de derechos y eliminación de barreras, obstáculos, discriminación, prejuicios e imaginarios que impiden el acceso y garantía y capacidad para hacer un ejercicio de los derechos y libertades en igualdad de condiciones y oportunidades.

Puntualmente el contratista Consorcio Providencia vinculó a un miembro de la comunidad en situación de discapacidad, condición que no le impide o lo limita a realizar labores en la obra, de momento ha cumplido con las actividades asignadas para lo cual el contratista le ha proporcionado herramientas y condiciones de trabajo dignas.

5. SUBPROGRAMA/PROYECTO: ACOMPAÑAMIENTO AL DESARROLLO Y CUMPLIMIENTO DE LA CONSULTA PREVIA, LIBRE E INFORMADA CON COMUNIDADES ÉTNICAS.

- A la fecha los contratistas Consorcio Barranquillita no reporta avance en la gestión ante las entidades competentes, resultados y/o respuestas que lleven a la identificación o no de comunidades indígenas en las áreas de influencia con las que se tenga que adelantar posibles procesos de consulta previa.

- El contratista Consocio L&S adelanta gestión ante la secretaria de gobierno del municipio de San Bernardo del Viento, con el fin de que se notique si hay presencia o no de grupos indígenas constituidos sobre el área de influencia del proyecto.

OBSERVACIONES:

- Durante el periodo se solicita el cumplimiento de actividades asociadas a los programas y proyectos descritos en el PAGA – Componente Social.
- Seguimiento a la entrega de informes sociales por parte de los contratistas, las cuales deben ser entregadas de manera mensual en los formatos autorizados por INVIAS, con sus respectivos soportes
- De manera permanente se dispone la participación para el acompañamiento y seguimiento a las actividades programadas por parte de los contratistas.



LEIDY MARGELA GIL GONZÁLEZ

Profesional Social – Interventoría

Registro Profesional: 26035741

INFORME TOPOGRAFICO

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 DE 2023

Título Documento	INFORME TOPOGRAFICO DE INTERVENTORÍA	
Responsable de elaboración	Nombre:	ERIK DAVID CUADRADO LÓPEZ
Cargo: Topógrafo	Firma:	
Responsable por revisión	Nombre:	VICENTE URZOLA BADEL
Cargo: Ingeniero residente	Firma:	
Responsable de Aprobación	Nombre	ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Cargo: Directora Interventoria	Firma:	
Fecha:	NOVIEMBRE-2024	



NIT. 901.783.007-9

Página 2 de 24

INFORME MENSUAL TOPOGRAFICO No 10.

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

OBJETIVOS

El objetivo del Estudio Topográfico es proporcionar información básica y necesaria basada en informes recopilados y evaluados, en data topográfica tomada en campo y procesada en gabinete de la topografía, cartografía, elementos estructurales, y demás de la zona materia del estudio.

INTRODUCCION

EL CONSORCIO INGECON-INCO, presenta al Instituto Nacional de Vías, el **Informe Mensual de Topografía No 10**, correspondiente al periodo comprendido entre el **01 y el 30 de Noviembre de 2024**, el cual contiene las actividades realizadas por la comisión topográfica y el seguimiento efectuado por la misma a las actividades topográficas realizadas por los contratistas de obra en los diferentes frentes de trabajo que componen el alcance del objeto contractual del contrato de Interventoría cuyo objeto es: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.



LOCALIZACIÓN

El contrato de interventoría se encuentra enmarcado en la ejecución, administrado por el Instituto nacional de vías – INVIAS. Las actividades topográficas se desarrollan en diferentes vías de la zona rural del departamento de Córdoba. Para la fecha del presente informe los proyectos donde se desarrollaron las actividades topográficas son la Siguietes: Planeta rica, Los Córdoba y San Bernardo del Viento en el departamento de Córdoba.



Figura 1. Ubicación frentes de trabajo.

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES DESARROLLADAS. LEVANTAMIENTOS TOPOGRAFICOS.

Es el conjunto de operaciones y procedimientos utilizados para determinar la posición de puntos sobre la superficie contemplando las elevaciones que tiene el terreno, sobre un plano de referencia. No se considera la verdadera forma de la tierra, sino que se supone esta como en una superficie plana; en caso de tomar medidas de ángulos, estos se consideran planos.

NIVELACION GEOMETRICA SIMPLE: *Es aquella en la cual desde un punto o una sola posición del aparato se puede conocer las cotas o elevaciones de los diferentes puntos que deseamos nivelar. En este se sitúa el nivel en el punto más conveniente el cual ofrezca mejores condiciones de visibilidad. se va leyendo la mira sobre los puntos. Las diferencias de lectura de mira darán el desnivel entre los puntos.*

NIVELACION GEOMETRICA COMPUESTA: *Es una cadena de mediciones simples. Con la única diferencia que el aparato se plantara más de una vez, es necesario tomar una serie de puntos intermedios (de cambio), obteniéndose el desnivel entre cada dos consecutivos. Los puntos cuyo desnivel se desea conocer serán los extremos del camino a recorrer (itinerario) y deben estar materializados en el terreno de acuerdo con el tiempo que vayan a ser utilizados (mojón, estaca, accidente natural o artificial, etc.) y ser fácilmente localizables.*

CONCEPTOS CLAVES.

Altura instrumental: *Es aquella elevación del nivel o equipo de medición utilizado, a partir de una superficie de referencia conocida.*

Cota: *Es la altura entre un punto y un determinado nivel de referencia.*

Puntos de cambio: *Es un punto intermedio en el cual se hacen dos referencias, una adelante y una hacia atrás.*

Vista adelante: *Es la lectura que se toma en el punto el cual queremos saber su elevación, generalmente se usa cuando se hace un punto de cambio.*

Vista atrás: Es una lectura realizada sobre el BM o un punto de referencia fija.

Vista intermedia: Es la lectura que se le realiza a puntos cuya altura queremos saber.

ECUACIONES.

Cálculo de alturas instrumentales:

$$Hi = BM + Vista\ atras$$

Cálculo de cotas: Para el cálculo de cotas se utiliza la siguiente ecuación.

$$V1 = Hi - Vista\ intermedia$$

Como se realizaron punto de cambios para poder calcular sus cotas se utilizó la siguiente ecuación:

$$PC = Hi - V. adelante$$

EQUIPOS UTILIZADOS.

Nivel Topcon AT - G6: Equipo encargado de medir los desniveles que existen en un terreno entre determinados puntos que se encuentran en diferentes alturas.



Figura 2. Nivel topográfico.

Trípode: Se utiliza para sostener el nivel o la estación total, consta de tres patas plegables y graduables.



Figura 3. Trípode

Mira: Se utiliza para medir distancias verticales a un punto determinado que está ubicado en el terreno.



Figura 4. Mira topográfica.

Cinta métrica: Con este instrumento se pueden medir las distancias horizontales del terreno.



Figura 5. Cinta métrica.

RADIACION.

El método de radiación es el método comúnmente empleado en levantamientos de superficies de mediana y gran extensión, en zonas topográficas accidenta con vegetación espesa. Este método se apoya en una poligonal base previamente levantada a partir de cuyos vértices se hacen radiaciones a fin de determinar la ubicación o coordenadas (X, Y, H) desde un punto fijo para situar los puntos de relleno y detalles. Tomando nota de las lecturas acimutales, cenitales, distancia de los diferentes puntos y la altura del instrumento. Los datos previos que requiere el método son las coordenadas del punto de estación y el acimut (o las coordenadas, que permitirán deducirlo) de al menos una referencia. Si se ha de enlazar con trabajos topográficos anteriores, estos datos previos habrán de sernos proporcionados antes de comenzar el trabajo, si los resultados para los que se ha decidido aplicar el método de radiación pueden estar en cualquier sistema, estos datos previos podrán ser arbitrarios.

Radiación Simple: Consiste en hacer un barrido horizontal con el anteojo de la estación, para realizarla medición de todos los puntos que constituyan la superficie a medir. Esté método tiene la necesidadde exigir visibilidad desde el punto de estacionamiento a todos aquellos puntos que definan la superficie a estudiar o levantar.

Radiación Compuesta: Esto se realiza tomando lecturas de los ángulos horizontales, distancia entre puntos y altura instrumental. Con diferencia a el sistema de levantamiento por radiación es simple, que se toman puntos por lo general fuera de la poligonal (deltas) que sirven de transición para lograr una visualización del terreno cuando se encuentran obstáculos que no permitan la visibilidad de la zona y se emplea si el área de terreno es relativamente pequeña.

CONCEPTOS CLAVES.

Angulo de deflexión: Es el ángulo que forma una línea de una poligonal con la prolongación de una línea inmediatamente anterior. Los ángulos de deflexión se consideran positivos (+) cuando la poligonal deflacta hacia la derecha y negativos (-) cuando deflacta a la izquierda.

Azimut: Es en ángulo medida respecto a un norte real o arbitrario en sentido de las manecillas del reloj en un rango de 0°-360°. Se usa para determinar orientaciones en un sistema de triangulación.

Coordenadas: Conjunto de puntos y valores que permiten definir de manera precisa la ubicación de un en el espacio, generalmente sobre los ejes “X” y “Y” y si se requiere un espacio tridimensional se utiliza el “Z”.

Distancias: Es una medida longitudinal que separa 2 o más puntos.

Mojón: Construcción realizada en la superficie terrestre a fin de materializar e indicar la posición de un punto en el terreno.

Poligonales: Es una serie de líneas consecutivas cuyas longitudes y direcciones son determinadas a partir de mediciones en campo.

Poligonal Abierta: Las líneas no regresan al punto de partida.

Poligonal Cerrada: Las líneas regresan al punto de partida, formándose así un polígono cerrado geométrica y analíticamente.

Rumbo: Es el ángulo medido con respecto al meridiano Norte -Sur tomando en el sentido Este-Oeste en un rango de 0°-90°.

ECUACIONES.

Los cálculos de coordenadas de un punto radiado, P , desde una determinada estación, E , se realiza mediante el paso de coordenadas polares (azimut y distancia reducida) a rectangulares (coordenadas $\Delta X, \Delta Y$)

$$X_c = X_a + D_{ac} * \text{Sen} (\text{Azimut}_{ac})$$

$$Y_c = Y_a + D_{ac} * \text{Cos} (\text{Azimut}_{ac})$$

EQUIPOS UTILIZADOS.

Estación total GEOMAX ZOOM 10: Este instrumento se utiliza para medir distancias y ángulos, acimuts, también guarda información en tiempo real.



Figura 6. Estación total

Jalones: Se utiliza para determinar la localización de un punto en el terreno o para indicar la dirección de un punto a otro.



Figura 7. Jalón

Prisma: Se utiliza para devolver la señal enviada por el láser de la estación total y así obtener las coordenadas del punto donde este se encuentra.



Figura 8. Prisma.

Estacas de madera: Son objetos largos y afilados que se clavan en el suelo, se usan intención demarcar de los deltas o puntos de interés para la nivelación.



Figura 9. Estaca de madera.

Pintura y brocha: Una brocha es un instrumento que tiene cerdas unidas por medio de un mango que se utiliza para pintar, mientras que la pintura es una sustancia o producto de textura líquida o espesa con que se da color a una cosa, permitiendo que la demarcación se observe con mayor claridad.



Figura 10. Pintura y Brocha.

RESULTADO DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS**NOVIEMBRE DEL AÑO 2024****Actividad realizada: Nivelación y levantamiento topográfico.**

La nivelación y el levantamiento topográfico es la ubicación de todos los puntos necesarios para poder materializar los ejes principales del proyecto en el terreno, así como los linderos del mismo. La nivelación se inicia tomando un punto de referencia conocido, este puede ser un lindero, una carretera, la esquina de una construcción, entre otros.

Luego de haber replanteado o trazados los ejes, y verificar que todo estuviera acorde a lo que está diseñado, se procede a realizar las actividades de conformación de calzada existente y excavación de la explanación

La conformación de calzada existente y las excavaciones de la explanación, comprende el conjunto de actividades necesarias para la remoción de terreno natural, adicional al desmonte, limpieza y descapote, con el fin de alcanzar las cotas requeridas del Proyecto. Esto también incluye las tareas de desagüe, bombeo, drenado, entibado y apuntalamiento (si se requiere) que sea necesario realizar. Además, incluye la correcta disposición del material excavado en los lugares autorizados. Se entenderá por líneas de excavación, las líneas límite horizontal, vertical o inclinadas, acotadas en los planos, definiendo las dimensiones de las secciones longitudinales y transversales de las excavaciones.

Este chequeo se realiza por medio de una nivelación, es un proceso de medición de elevaciones o altitudes de puntos sobre la superficie de la Tierra. Entendiéndose por elevación o altitud a la distancia vertical medida desde una superficie de referencia hasta el punto considerado.

Luego de tener abscisa de la vía nos guiamos con la cartera del diseño, y usando un nivel topográfico. Se realiza el chequeo de la vía, tomando las cotas de los laterales y los ejes en cada una de las abscisas, esto con el fin de comprobar si se está haciendo el corte de manera adecuada.



NIT. 901.783.007-9

Página 14 de 24

ANEXO CARTERAS TOPOGRAFICAS.

➤ CARTERA DE NIVELACION SUBBASE FRENTE DE OBRA LOS CORDOBAS/BARRANQUILLITA.

Se realizo liberación de subbase granular en frente de obra los córdobas desde K2+322 HASTA K1+640 CARRIL IZQUIERDO.

CARTERA DE LIBERACION SUBBASE GRANULAR FRENTE BARRANQUILLITA / LOS CORDOBAS													
ABS	COTAS DE PAVIMENTO			COTAS DE SUBBASE			ALTURA DE SUBBASE			PROMEDIO	ANCHO	VOL M2	VOL M3
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER				
1640	80,273	80,328		80,073	80,128		0,15	0,15		0,15	2,70	0,00	0,00
1650	80,222	80,277		80,022	80,077		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1660	80,17	80,225		79,970	80,025		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1670	80,119	80,174		79,919	79,974		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1680	80,068	80,123		79,868	79,923		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1690	80,017	80,072		79,817	79,872		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1700	79,965	80,02		79,765	79,820		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1710	79,914	79,969		79,714	79,769		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1720	79,871	79,926		79,671	79,726		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1730	80,041	80,096		79,841	79,896		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1740	80,504	80,559		80,304	80,359		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1750	81,055	81,11		80,855	80,910		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1760	81,607	81,662		81,407	81,462		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1770	82,158	82,213		81,958	82,013		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1780	82,709	82,764		82,509	82,564		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1790	83,261	83,316		83,061	83,116		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1800	83,812	83,867		83,612	83,667		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1810	84,364	84,419		84,164	84,219		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1820	84,915	84,97		84,715	84,770		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1825	85,191	85,246		84,991	85,046		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1830	85,467	85,522		85,267	85,322		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1835	85,742	85,797		85,542	85,597		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1840	86,018	86,073		85,818	85,873		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1850	86,57	86,625		86,370	86,425		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1860	87,121	87,176		86,921	86,976		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1870	87,672	87,727		87,472	87,527		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1880	88,224	88,279		88,024	88,079		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1890	88,775	88,83		88,575	88,630		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1900	89,327	89,382		89,127	89,182		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1910	89,878	89,933		89,678	89,733		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1920	90,417	90,472		90,217	90,272		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1930	90,718	90,773		90,518	90,573		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1940	90,71	90,765		90,510	90,565		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1950	90,619	90,674		90,419	90,474		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1960	90,528	90,583		90,328	90,383		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1970	90,438	90,493		90,238	90,293		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1980	90,347	90,402		90,147	90,202		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
1990	90,256	90,311		90,056	90,111		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2000	90,166	90,221		89,966	90,021		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2010	90,075	90,13		89,875	89,930		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2015	90,029	90,084		89,829	89,884		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2020	89,984	90,039		89,784	89,839		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2025	89,939	89,994		89,739	89,794		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2030	89,893	89,948		89,693	89,748		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2035	89,848	89,903		89,648	89,703		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2040	89,803	89,858		89,603	89,658		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2045	89,757	89,812		89,557	89,612		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2050	89,712	89,767		89,512	89,567		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2055	89,666	89,721		89,466	89,521		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2060	89,621	89,676		89,421	89,476		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2065	89,576	89,631		89,376	89,431		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2070	89,53	89,585		89,330	89,385		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2075	89,485	89,54		89,285	89,340		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2080	89,44	89,495		89,240	89,295		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2085	89,394	89,449		89,194	89,249		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2090	89,349	89,404		89,149	89,204		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2095	89,304	89,359		89,104	89,159		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2100	89,258	89,313		89,058	89,113		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2105	89,213	89,268		89,013	89,068		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2110	89,167	89,222		88,967	89,022		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2115	89,122	89,177		88,922	88,977		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2120	89,077	89,132		88,877	88,932		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2130	88,986	89,041		88,786	88,841		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2140	88,895	88,95		88,695	88,750		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2150	88,805	88,86		88,605	88,660		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2160	88,714	88,769		88,514	88,569		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2170	88,623	88,678		88,423	88,478		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2180	88,532	88,587		88,332	88,387		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2190	88,442	88,497		88,242	88,297		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2200	88,351	88,406		88,151	88,206		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2210	88,26	88,315		88,060	88,115		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2220	88,169	88,224		87,969	88,024		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2230	88,079	88,134		87,879	87,934		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2240	88,048	88,103		87,848	87,903		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2250	88,231	88,286		88,031	88,086		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2255	88,4	88,455		88,200	88,255		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2260	88,577	88,632		88,377	88,432		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2270	88,931	88,986		88,731	88,786		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2280	89,285	89,34		89,085	89,140		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2290	89,638	89,693		89,438	89,493		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2300	89,992	90,047		89,792	89,847		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2310	90,346	90,401		90,146	90,201		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2320	90,7	90,755		90,500	90,555		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05
2322,819	90,799	90,854		90,599	90,654		0,15	0,15		0,15	2,70	0,41	4,05

336,15

FIRMA :


TOPOGRAFO INTERVENTORIA
ERIK CUADRADO LÓPEZ

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia

➤ **CARTERA DE NIVELACION SUBBASE FRENTE DE OBRA LOS CORDOBAS/BARRANQUILLITA.**

CARTERA DE LIBERACION SUBBASE GRANULAR FRENTE BARRANQUILLITA /LOS CORDOBAS													
ABS	COTAS DE PAVIMENTO			COTAS DE SUBBASE			ALTURA DE SUBBASE			PROMEDIO	ANCHO	VOL M2	VOL M3
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER				
600	19,364	19,419	19,364	19,164	19,219	19,164	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,00	0,00
610	20,571	20,626	20,571	20,371	20,426	87,656	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
620	21,778	21,833	21,778	21,578	21,633	87,832	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
630	22,985	23,04	22,985	22,785	22,840	88,143	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
640	24,192	24,247	24,192	23,992	24,047	88,371	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
650	25,399	25,454	25,399	25,199	25,254	88,569	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
660	26,605	26,66	26,605	26,405	26,460	88,830	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
665	27,209	27,264	27,209	27,009	27,064	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
670	27,812	27,867	27,812	27,612	27,667	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
675	28,416	28,471	28,416	28,216	28,271	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
680	29,019	29,074	29,019	28,819	28,874	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
685	29,622	29,677	29,622	29,422	29,477	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
690	30,226	30,281	30,226	30,026	30,081	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
695	30,829	30,884	30,829	30,629	30,684	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
700	31,433	31,488	31,433	31,233	31,288	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
705	32,036	32,091	32,036	31,836	31,891	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
710	32,639	32,694	32,639	32,439	32,494	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
715	33,243	33,298	33,243	33,043	33,098	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
720	33,846	33,901	33,846	33,646	33,701	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
725	34,45	34,505	34,450	34,250	34,305	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
730	35,041	35,096	35,041	34,841	34,896	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
735	35,54	35,595	35,540	35,340	35,395	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
740	35,935	35,99	35,935	35,735	35,790	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
745	36,225	36,28	36,225	36,025	36,080	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
750	36,423	36,478	36,423	36,223	36,278	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
755	36,607	36,662	36,607	36,407	36,462	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
760	36,791	36,846	36,791	36,591	36,646	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
765	36,975	37,03	36,975	36,775	36,830	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
770	37,159	37,214	37,159	36,959	37,014	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
775	37,343	37,398	37,343	37,143	37,198	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
780	37,527	37,582	37,527	37,327	37,382	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
785	37,711	37,766	37,711	37,511	37,566	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
790	37,895	37,95	37,895	37,695	37,750	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
795	38,078	38,133	38,078	37,878	37,933	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
800	38,262	38,317	38,262	38,062	38,117	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
805	38,446	38,501	38,446	38,246	38,301	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
810	38,63	38,685	38,630	38,430	38,485	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
815	38,814	38,869	38,814	38,614	38,669	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
820	38,998	39,053	38,998	38,798	38,853	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
830	39,366	39,421	39,366	39,166	39,221	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
840	39,734	39,789	39,734	39,534	39,589	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
850	40,064	40,119	40,064	39,864	39,919	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
860	40,136	40,191	40,136	39,936	39,991	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
870	39,953	40,008	39,953	39,753	39,808	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
880	39,734	39,789	39,734	39,534	39,589	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
890	39,516	39,571	39,516	39,316	39,371	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
900	39,298	39,353	39,298	39,098	39,153	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
910	39,079	39,134	39,079	38,879	38,934	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
920	38,861	38,916	38,861	38,661	38,716	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
930	38,643	38,698	38,643	38,443	38,498	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
940	38,424	38,479	38,424	38,224	38,279	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
950	38,206	38,261	38,206	38,006	38,061	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
960	37,988	38,043	37,988	37,788	37,843	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
970	37,769	37,824	37,769	37,569	37,624	90,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
980	37,556	37,611	37,556	37,356	37,411	91,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
985	37,51	37,565	37,510	37,310	37,365	92,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
990	37,53	37,585	37,530	37,330	37,385	93,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
995	37,622	37,677	37,622	37,422	37,477	94,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
1000	37,781	37,836	37,781	37,581	37,636	95,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
													469,80

FIRMA :

 TOPOGRAFO INTERVENTORIA
 ERIK DAVID CUADRADO LOPEZ

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia

➤ **CARTERA DE NIVELACION SUBBASE FRENTE DE OBRA LOS CORDOBAS/BARRANQUILLITA.**

CARTERA DE LIBERACION SUBBASE GRANULAR FRENTE BARRANQUILLITA /LOS CORDOBAS													
ABS	COTAS DE PAVIMENTO			COTAS DE SUBBASE			ALTURA DE SUBBASE			PROMEDIO	ANCHO	VOL M2	VOL M3
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER				
480	14,327	14,382	14,327	14,127	14,182	14,127	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,00	0,00
490	14,214	14,269	14,214	14,014	14,069	87,832	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
500	14,146	14,201	14,146	13,946	14,001	88,143	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
510	14,234	14,289	14,234	14,034	14,089	88,569	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
515	14,338	14,393	14,338	14,138	14,193	88,830	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
520	14,479	14,534	14,479	14,279	14,334	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
530	14,826	14,881	14,826	14,626	14,681	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
540	15,175	15,23	15,175	14,975	15,030	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
550	15,524	15,579	15,524	15,324	15,379	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
560	15,873	15,928	15,873	15,673	15,728	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
570	16,349	16,404	16,349	16,149	16,204	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
580	17,11	17,165	17,110	16,910	16,965	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
590	18,158	18,213	18,158	17,958	18,013	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
600	19,364	19,419	19,364	19,164	19,219	89,617	0,15	0,15	0,15	0,15	5,40	0,81	8,10
													105,30

FIRMA :



TOPOGRAFO INTERVENTORIA
ERIK DAVID CUADRADO LOPEZ

➤ **CARTERA DE NIVELACION SUBBASE FRENTE DE OBRA PLANETA RICA/PROVIDENCIA.**

Se realizo verificación de niveles de subbase granular en el frente de obra vía a providencia municipio de planeta rica córdoba, desde **K0+084 HASTA K0+850 CARRIL DERECHO.**

CARTERA DE LIBERACION SUBBASE GRANULAR FRENTE DE OBRA PROVIDENCIA/PLANETA RICA													
ABS	COTAS DE PAVIMENTO			COTAS DE SUBBASE			ALTURA DE SUBBASE			PROMEDIO	ANCHO	VOL M2	VOL M3
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER				
K0+084		88,729	88,674		88,529	88,494		0,20	0,20	0,20	2,70	0,00	0,00
K0+090		88,744	88,689		88,564	88,509		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+100		88,845	88,790		88,665	88,610		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+110		88,948	88,893		88,768	88,713		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+120		89,052	88,997		88,872	88,817		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+130		89,156	89,101		88,976	88,921		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+140		89,271	89,216		89,091	89,036		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+150		89,401	89,346		89,221	89,166		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+160		89,543	89,488		89,363	89,308		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+170		89,685	89,630		89,505	89,450		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+180		89,828	89,773		89,648	89,593		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+190		89,996	89,941		89,816	89,761		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+200		90,290	90,235		90,110	90,055		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+210		90,719	90,664		90,539	90,484		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+220		91,282	91,227		91,102	91,047		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+230		91,981	91,926		91,801	91,746		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+240		92,770	92,715		92,590	92,535		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+250		93,562	93,507		93,382	93,327		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+260		94,353	94,298		94,173	94,118		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+270		95,145	95,090		94,965	94,910		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+280		95,825	95,770		95,645	95,590		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+290		96,306	96,251		96,126	96,071		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+300		96,599	96,544		96,419	96,364		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+310		96,846	96,791		96,666	96,611		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+320		97,093	97,038		96,913	96,858		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+330		97,341	97,286		97,161	97,106		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+340		97,588	97,533		97,408	97,353		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+350		97,835	97,780		97,655	97,600		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+360		98,083	98,028		97,903	97,848		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+370		98,332	98,277		98,152	98,097		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+380		98,605	98,550		98,425	98,370		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+390		98,906	98,851		98,726	98,671		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+400		99,235	99,180		99,055	99,000		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+410		99,591	99,536		99,411	99,356		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+420		99,956	99,901		99,776	99,721		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+430		100,321	100,266		100,141	100,086		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+440		100,686	100,631		100,506	100,451		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+450		101,051	100,996		100,871	100,816		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+460		101,413	101,358		101,233	101,178		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+470		101,759	101,704		101,579	101,524		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+480		102,092	102,037		101,912	101,857		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+490		102,422	102,367		102,242	102,187		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+500		102,753	102,698		102,573	102,518		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+510		103,083	103,028		102,903	102,848		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+520		103,414	103,359		103,234	103,179		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+530		103,845	103,790		103,665	103,610		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+540		104,442	104,387		104,262	104,207		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+550		105,173	105,118		104,993	104,938		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+560		105,916	105,861		105,736	105,681		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+570		106,660	106,605		106,480	106,425		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+580		107,348	107,293		107,168	107,113		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+590		107,804	107,749		107,624	107,569		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+600		108,016	107,961		107,836	107,781		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+610		107,983	107,928		107,803	107,748		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+620		107,705	107,650		107,525	107,470		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+630		107,245	107,190		107,065	107,010		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+640		106,775	106,720		106,595	106,540		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+650		106,404	106,349		106,224	106,169		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+660		106,194	106,139		106,014	105,959		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+670		106,146	106,091		105,966	105,911		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+680		106,222	106,167		106,042	105,987		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+690		106,306	106,251		106,126	106,071		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+700		106,390	106,335		106,210	106,155		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+710		106,474	106,419		106,294	106,239		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+720		106,558	106,503		106,378	106,323		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+730		106,642	106,587		106,462	106,407		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+740		106,742	106,687		106,562	106,507		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+750		106,876	106,821		106,696	106,641		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+760		107,042	106,987		106,862	106,807		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+770		107,220	107,165		107,040	106,985		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+780		107,399	107,344		107,219	107,164		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+790		107,577	107,522		107,397	107,342		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+800		107,755	107,700		107,575	107,520		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+810		107,957	107,902		107,777	107,722		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+820		108,269	108,214		108,089	108,034		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+830		108,700	108,645		108,520	108,465		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+840		109,187	109,132		109,007	108,952		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+850		109,675	109,620		109,495	109,440		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40

415,80

FIRMA :


TOPOGRAFO INTERVENTORIA
ERIK CUADRADO LÓPEZ

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia

➤ **CARTERA DE NIVELACION SUBBASE FRENTE DE OBRA PLANETA RICA/PROVIDENCIA.**

CARTERA DE LIBERACION SUBBASE GRANULAR FRENTE PROVIDENCIA/PLANETA RICA													
ABS	COTAS DE PAVIMENTO			COTAS DE SUBBASE			ALTURA DE SUBBASE			PROMEDIO	ANCHO	VOL M2	VOL M3
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER				
K0+850		109,625	109,425		109,445	109,245		0,20	0,20	0,20	2,70	0,00	0,00
K0+860		110,162	110,112		109,982	109,932		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+870		110,65	110,56		110,470	110,380		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+880		111,096	111,006		110,916	110,826		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+890		111,442	111,376		111,262	111,196		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+900		111,687	111,699		111,507	111,519		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+910		111,831	111,906		111,651	111,726		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+920		111,911	111,986		111,731	111,806		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+930		111,991	112,066		111,811	111,886		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+940		112,07	112,145		111,890	111,965		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+950		112,149	112,224		111,969	112,044		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+960		112,226	112,301		112,046	112,121		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+970		112,241	112,316		112,061	112,136		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+980		112,163	112,238		111,983	112,058		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K0+990		111,991	112,066		111,811	111,886		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+000		111,741	111,816		111,561	111,636		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+010		111,499	111,55		111,319	111,370		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+020		111,315	111,302		111,135	111,122		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+030		111,194	111,144		111,014	110,964		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+040		111,136	111,086		110,956	110,906		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+050		111,14	111,09		110,960	110,910		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+060		111,205	111,12		111,025	110,940		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+070		111,286	111,201		111,106	111,021		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+080		111,368	111,303		111,188	111,123		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+090		111,449	111,399		111,269	111,219		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+100		111,53	111,48		111,350	111,300		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+110		111,611	111,561		111,431	111,381		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+120		111,693	111,643		111,513	111,463		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+130		111,846	111,848		111,666	111,668		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+140		112,141	112,227		111,961	112,047		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+150		112,575	112,675		112,395	112,495		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+160		113,15	113,25		112,970	113,070		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+170		113,834	113,934		113,654	113,754		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+180		114,491	114,591		114,311	114,411		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+190		114,973	115,073		114,793	114,893		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+200		115,265	115,326		115,085	115,146		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+210		115,369	115,344		115,189	115,164		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+220		115,283	115,233		115,103	115,053		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+230		115,044	114,973		114,864	114,793		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+240		114,793	114,718		114,613	114,538		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+250		114,555	114,489		114,375	114,309		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+260		114,397	114,347		114,217	114,167		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+270		114,323	114,273		114,143	114,093		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+280		114,333	114,283		114,153	114,103		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+290		114,368	114,318		114,188	114,138		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
K1+300		114,403	114,353		114,223	114,173		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
												243,00	

FIRME :


TOPOGRAGO INTERVENTORIA
ERIK D. CUADRADO LOPEZ

➤ **CARTERA DE NIVELACION SUBBASE FRENTE DE OBRA PLANETA RICA/PROVIDENCIA.**

CARTERA DE LIBERACION SUBBASE GRANULAR FRENTE PROVIDENCIA/PLANETA RICA													
ABS	COTAS DE PAVIMENTO			COTAS DE SUBBASE			ALTURA DE SUBBASE			PROMEDIO	ANCHO	VOL M2	VOL M3
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER				
k1+300		114,353	114,403		114,173	114,223		0,20	0,20	0,20	2,70	0,00	0,00
k1+310		114,446	114,496		114,266	114,316		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
k1+320		114,641	114,691		114,461	114,511		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
k1+330		114,938	114,988		114,758	114,808		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
k1+340		115,337	115,387		115,157	115,207		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
k1+350		115,794	115,889		115,614	115,709		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
k1+360		116,397	116,492		116,217	116,312		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
k1+370		117,111	117,175		116,931	116,995		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
k1+380		117,837	117,836		117,657	117,656		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
k1+390		118,395	118,352		118,215	118,172		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
k1+400		118,709	118,649		118,529	118,469		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
k1+410		118,909	118,849		118,729	118,669		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
k1+420		118,95	118,89		118,770	118,710		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
k1+430		118,857	118,797		118,677	118,617		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
k1+440		118,747	118,687		118,567	118,507		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
k1+450		118,638	118,578		118,458	118,398		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
k1+460		118,531	118,471		118,351	118,291		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
k1+470		118,483	118,423		118,303	118,243		0,20	0,20	0,20	2,70	0,54	5,40
													91,80

FIRMA : 
 TOPOGRAFO INVENTORIA
 ERIK CUADRADO

➤ **CARTERA DE NIVELACION SUBBASE FRENTE DE OBRA PLANETA RICA/PROVIDENCIA.**

- Se realizo liberación de afirmado en la obra vía providencia desde el k1+900 hasta k2+400.

CARTERA DE LIBERACION AFIRMADO FRENTE PROVIDENCIA/PLANETA RICA													
ABS	COTAS DE PAVIMENTO			COTAS DE AFIRMADO			ALTURA DE AFIRMADO			PROMEDIO	ANCHO	VOL M2	VOL M3
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER				
K1+900	116,616	116,666	116,616	116,236	116,286	116,236	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	0,00	0,00
K1+910	116,623	116,657	116,623	116,243	116,277	116,243	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K1+920	116,697	116,672	116,697	116,317	116,292	116,317	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K1+930	116,779	116,709	116,779	116,399	116,329	116,399	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K1+940	116,825	116,755	116,825	116,445	116,375	116,445	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K1+950	116,872	116,802	116,872	116,492	116,422	116,492	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K1+960	116,918	116,848	116,918	116,538	116,468	116,538	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K1+970	116,964	116,894	116,964	116,584	116,514	116,584	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K1+980	117,013	116,943	117,013	116,633	116,563	116,633	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K1+990	117,083	117,013	117,083	116,703	116,633	116,703	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+000	117,178	117,108	117,178	116,798	116,728	116,798	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+010	117,298	117,228	117,298	116,918	116,848	116,918	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+020	117,443	117,373	117,443	117,063	116,993	117,063	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+030	117,614	117,544	117,614	117,234	117,164	117,234	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+040	117,797	117,727	117,797	117,417	117,347	117,417	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+050	117,962	117,909	117,962	117,582	117,529	117,582	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+060	118,094	118,102	118,094	117,714	117,722	117,714	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+070	118,281	118,331	118,281	117,901	117,951	117,901	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+080	118,547	118,597	118,547	118,167	118,217	118,167	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+090	118,767	118,867	118,767	118,387	118,487	118,387	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+100	118,966	119,066	118,966	118,586	118,686	118,586	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+110	119,087	119,187	119,087	118,707	118,807	118,707	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+120	119,131	119,231	119,131	118,751	118,851	118,751	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+130	119,098	119,198	119,098	118,718	118,818	118,718	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+140	119,032	119,132	119,032	118,652	118,752	118,652	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+150	118,966	119,066	118,966	118,586	118,686	118,586	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+160	118,9	119	118,9	118,520	118,620	118,520	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+170	118,856	118,934	118,856	118,476	118,554	118,476	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+180	118,818	118,868	118,818	118,438	118,488	118,438	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+190	118,753	118,803	118,753	118,373	118,423	118,373	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+200	118,7	118,75	118,7	118,320	118,370	118,320	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+210	118,67	118,72	118,67	118,290	118,340	118,290	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+220	118,632	118,71	118,632	118,252	118,330	118,252	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+230	118,632	118,722	118,632	118,252	118,342	118,252	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+240	118,666	118,756	118,666	118,286	118,376	118,286	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+250	118,721	118,811	118,721	118,341	118,431	118,341	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+260	118,799	118,887	118,799	118,419	118,507	118,419	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+270	118,9	118,985	118,9	118,520	118,605	118,520	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+280	119,024	119,105	119,024	118,644	118,725	118,644	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+290	119,167	119,24	119,167	118,787	118,860	118,787	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+300	119,311	119,377	119,311	118,931	118,997	118,931	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+310	119,454	119,514	119,454	119,074	119,134	119,074	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+320	119,591	119,651	119,591	119,211	119,271	119,211	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+330	119,727	119,787	119,727	119,347	119,407	119,347	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+340	119,864	119,924	119,864	119,484	119,544	119,484	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+350	120,001	120,061	120,001	119,621	119,681	119,621	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+360	120,138	120,198	120,138	119,758	119,818	119,758	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+370	120,275	120,335	120,275	119,895	119,955	119,895	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+380	120,435	120,471	120,435	120,055	120,091	120,055	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+390	120,611	120,608	120,611	120,231	120,228	120,231	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
K2+400	120,783	120,698	120,783	120,403	120,318	120,403	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
													570,00

FIRME :


TOPOGRAGO INTERVENTORIA
ERIK D. CUADRADO LOPEZ

➤ **CARTERA DE NIVELACION EXCAVACION OBRA SAN BERNARDO/RIMINI.**

Se realizo chequeo para liberación de excavación en el frente de obra rimini municipio de san bernardo, Desde el **K0+310 Hasta K0+500.**

LIBERACION EXCAVACION RIMINI SAN BERNARDO															
ABS	COTAS DE PAVIMENTO			COTAS DE EXCAVACION			COTAS DE TERRENO			ALTURA DE CORTE			PROMEDIO EXCAVACION	ANCHO CALZADA	VOL M3
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER			
0+310.00	6,55	6,616	6,55	5,860	5,926	5,860	6,751	6,571	7,131	0,891	0,645	1,271	0,000	6,00	0,000
0+320.00	6,363	6,429	6,363	5,673	5,739	5,673	6,331	5,991	6,711	0,658	0,252	1,038	0,649	6,00	38,960
0+330.00	6,06	6,126	6,06	5,370	5,436	5,370	5,360	5,110	5,160	-0,010	-0,326	-0,210	-0,182	6,00	-10,920
0+340.00	5,641	5,707	5,641	4,951	5,017	4,951	3,820	3,330	3,360	-1,131	-1,687	-1,591	-1,470	6,00	-88,180
0+350.00	5,106	5,172	5,145	4,416	4,482	4,455	2,588	2,628	2,538	-1,828	-1,854	-1,917	-1,866	6,00	-111,980
0+360.00	4,516	4,586	4,656	3,826	3,896	3,966	2,628	2,528	2,438	-1,198	-1,368	-1,528	-1,365	6,00	-81,880
0+370.00	3,904	4,000	4,095	3,214	3,310	3,405	2,993	2,783	2,663	-0,221	-0,527	-0,742	-0,497	6,00	-29,800
0+380.00	3,351	3,447	3,542	2,661	2,757	2,852	2,793	2,833	2,803	0,132	0,076	-0,049	0,053	6,00	3,180
0+390.00	3,062	3,129	3,149	2,372	2,439	2,459	2,588	2,628	2,538	0,216	0,189	0,079	0,161	6,00	9,680
0+400.00	2,979	3,045	2,979	2,289	2,355	2,289	2,618	2,508	2,468	0,329	0,153	0,179	0,220	6,00	13,220
0+410.00	2,929	2,995	2,929	2,239	2,305	2,239	2,628	2,528	2,438	0,389	0,223	0,199	0,270	6,00	16,220
0+420.00	2,879	2,945	2,879	2,189	2,255	2,189	2,708	2,708	2,858	0,519	0,453	0,669	0,547	6,00	32,820
0+430.00	2,829	2,895	2,829	2,139	2,205	2,139	2,993	2,783	2,663	0,854	0,578	0,524	0,652	6,00	39,120
0+440.00	2,779	2,845	2,815	2,089	2,155	2,125	2,793	2,833	2,803	0,704	0,678	0,678	0,687	6,00	41,200
0+450.00	2,729	2,795	2,861	2,039	2,105	2,171	2,993	2,923	2,833	0,954	0,818	0,662	0,811	6,00	48,680
0+460.00	2,677	2,744	2,81	1,987	2,054	2,120	3,103	3,043	2,863	1,116	0,989	0,743	0,949	6,00	56,960
0+470.00	2,63	2,654	2,679	1,940	1,964	1,989	3,367	3,137	3,247	1,427	1,173	1,258	1,286	6,00	77,160
0+480.00	2,577	2,514	2,452	1,887	1,824	1,762	3,697	3,417	3,477	1,810	1,593	1,715	1,706	6,00	102,360
0+490.00	2,455	2,36	2,264	1,765	1,670	1,574	3,927	3,277	3,527	2,162	1,607	1,953	1,907	6,00	114,440
0+500.00	2,3	2,205	2,109	1,610	1,515	1,419	3,297	2,597	3,207	1,687	1,082	1,788	1,519	6,00	91,140
													0,302		362,380

FIRMA :


TOPOGRAFO - INTERVENTORIA
ERIK CUADRADO
C.P.N.T No: 01-21703

➤ **CARTERA DE NIVELACION PEDRAPLÉN OBRA SAN BERNARDO/RIMINI.**

Se realizo chequeo para liberación de Pedraplén en el frente de obra rimini municipio de san bernardo,
Desde el **K0+360** Hasta **K0+500**.

CARTERA LIBERACION PEDRAPLEN FRENTE OBRA RIMINI/SAN BERNARDO													
ABS	COTAS DE DISEÑO PAVIMENTO			COTA DE PEDRAPLEN			ALTURA DE PEDRAPLEN			PROMEDIO	ANCHO	VOL M2	VOL M3
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER				
0+360.00	4,516	4,586	4,656	4,126	4,196	4,266	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	0,00	0,00
0+370.00	3,904	4,000	4,095	3,514	3,610	3,705	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+380.00	3,351	3,447	3,542	2,961	3,057	3,152	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+390.00	3,062	3,129	3,149	2,672	2,739	2,759	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+400.00	2,979	3,045	2,979	2,589	2,655	2,589	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+410.00	2,929	2,995	2,929	2,539	2,605	2,539	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+420.00	2,879	2,945	2,879	2,489	2,555	2,489	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+430.00	2,829	2,895	2,829	2,439	2,505	2,439	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+440.00	2,779	2,845	2,815	2,389	2,455	2,425	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+450.00	2,729	2,795	2,861	2,339	2,405	2,471	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+460.00	2,677	2,744	2,81	2,287	2,354	2,420	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+470.00	2,63	2,654	2,679	2,240	2,264	2,289	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+480.00	2,577	2,514	2,452	2,187	2,124	2,062	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+490.00	2,455	2,36	2,264	2,065	1,970	1,874	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+500.00	2,3	2,205	2,109	1,910	1,815	1,719	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
												159,60	

FIRMA :


TOPOGRAFO - INTERVENTORIA
ERIK CUADRADO
C.P.N.T No: 01-21703

➤ **CARTERA DE NIVELACION PEDRAPLÉN OBRA SAN BERNARDO/RIMINI**

Se realizo chequeo para liberación de Subbase Granular en el frente de obra rimini municipio de san bernardo, Desde el **K0+360 Hasta K0+500.**

CARTERA LIBERACION SUBBASE GRANULAR FRENTE OBRA RIMINI/SAN BERNARDO													
ABS	COTAS DE DISEÑO PAVIMENTO			COTA DE SUBBASE			ALTURA DE SUBBASE			PROMEDIO	ANCHO	VOL M2	VOL M3
	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER	IZQ	EJE	DER				
0+360.00	4,516	4,586	4,656	4,326	4,396	4,466	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	0,00	0,00
0+370.00	3,904	4,000	4,095	3,714	3,810	3,905	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+380.00	3,351	3,447	3,542	3,161	3,257	3,352	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+390.00	3,062	3,129	3,149	2,872	2,939	2,959	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+400.00	2,979	3,045	2,979	2,789	2,855	2,789	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+410.00	2,929	2,995	2,929	2,739	2,805	2,739	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+420.00	2,879	2,945	2,879	2,689	2,755	2,689	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+430.00	2,829	2,895	2,829	2,639	2,705	2,639	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+440.00	2,779	2,845	2,815	2,589	2,655	2,625	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+450.00	2,729	2,795	2,861	2,539	2,605	2,671	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+460.00	2,677	2,744	2,81	2,487	2,554	2,620	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+470.00	2,63	2,654	2,679	2,440	2,464	2,489	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+480.00	2,577	2,514	2,452	2,387	2,324	2,262	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+490.00	2,455	2,36	2,264	2,265	2,170	2,074	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
0+500.00	2,3	2,205	2,109	2,110	2,015	1,919	0,20	0,20	0,20	0,20	5,70	1,14	11,40
													159,60

FIRMA :



TOPOGRAFO - INTERVENTORIA
ERIK CUADRADO
C.P.N.T No: 01-21703

➤ **REGISTRO FOTOGRAFICO.**



	<p>INFORME MENSUAL SST DE INTERVENTORIA 01 AL 30 NOVIEMBRE DEL 2024</p>	
---	---	---

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVÍAS



INFORME SISTEMA DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO
01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024

CONSORCIO INGECO-INCO

 <p>ELABORÓ</p>	<p>REVISÓ</p>
<p>Ing. ANGIE VERSOLATTO G. INSPECTORA SST</p>	<p>Ing. ANGELA MARIA DAVILA DIRECTOR DE INTERVENTORÍA</p>

Tabla Contenido

INTRODUCCIÓN	3
1 ALCANCE DE INFORME	4
2 LOCALIZACION	5
3 GENERALIDADES	5
3.1 Información contrato de interventoría	5
3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA	5
4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SST	6
4.1 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
CONTRATISTAS	6
4.1.1 CTO LP-006 DE 2023 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS	6
4.1.2 CTO. 159 DE 2023 MUNICIPIO DE PLANETA RICA	10
4.1.3 CTO LP-008-2023 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO	17
4.2 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	
INTERVENTORIA	22
4.2.1 Política SG – SST	22
4.2.2 Estado de personal e ingresos	23
4.2.3 Vehículos	25
4.2.4 Indicadores al SG-SST	25
5 CONCLUSIONES	26



INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024



INTRODUCCIÓN

El presente informe mensual de interventoría, tiene como propósito realizar acompañamiento, verificación y seguimiento del SG-SST de los contratistas de obra y la implementación de este en las diferentes actividades desarrolladas durante el período comprendido entre el 01 al 30 de noviembre del 2024 en los municipios de los Córdoba, San Bernardo del Viento y Planeta Rica, en el departamento de Córdoba.

A su vez continuar la implementación del Sistema de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) de la empresa Ingeniería Y Consultoría INGECON SAS con el fin de brindar a los trabajadores un ambiente laboral que sea adecuado, cómodo y eficiente, para poder cumplir a cabalidad con las tareas designadas de manera óptima, segura y confiable y mitigar al máximo los peligros a los que se encuentran expuestos.



INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA
01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024



1 ALCANCE DE INFORME

- a) Informe mensual SST de interventoría etapa de obra.
- b) Listado de vehículos utilizados en el mes para la obra.
- c) Relación de los equipos y/o maquinaria utilizada por los contratistas de obra, donde se verifique el cumplimiento de las actividades de mantenimiento presentado por el contratista y aprobado por la interventoría.
- d) Resumen de las actividades realizadas por la interventoría en cumplimiento del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus respectivos soportes.
- e) Afiliaciones y pagos del personal del contrato de obra, al Sistema General de Seguridad Social Integral.
- f) Afiliaciones y pagos del personal del contrato de interventoría, al Sistema General de Seguridad Social Integral.

	<p style="text-align: center;">INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>	 CONSORCIO INGECON-INCO
---	--	--

2 LOCALIZACION

El proyecto a ejecutar se localiza en los municipios de los Córdoba, San Bernardo del Viento y Planeta Rica, en el departamento de Córdoba.

3 GENERALIDADES

3.1 Información contrato de interventoría

CONTRATANTE:	CONSORCIO INGECON-INCO
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORÍA
OBJETO DEL CONTRATO:	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1
VALOR DEL CONTRATO:	DOS MIL DOSCIENTOS DIECINUEVE MILLONES DE PESOS (\$2.219.000.000) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023
ORDEN DE INICIO:	28 DE DICIEMBRE DEL 2023
PRORROGAS:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
ADICIONES:	N/A
SUSPENSIONES:	29 DE DICIEMBRE DEL 2023 AL 28 DE ENERO DEL 2024
FECHA PREVISTA DE TERMINACION:	31 DE DICIEMBRE DEL 2024

3.2 INFORMACIÓN CONTRATO DE OBRA

Tabla 1 COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO PROVIDENCIA.

CONTRATO DE OBRA 159 DE 2023 CONSORCIO PROVIDENCIA		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLO	5%	COLOMBIA
BARMAR CONSTRUCCIONES S.A.S	85%	COLOMBIA
KAP CONSTRUCCIONES S.A.S	10%	COLOMBIA

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1

	<p align="center">INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>	 CONSORCIO INGECON-INCO
---	--	--

Tabla 2. COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO PAVIMENTO BARRANQUILLITA

CONTRATO DE OBRA LP-006 DE 2023		
CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
MARIO ALBERTO ALMANZA SOLAN	10%	COLOMBIA
E INGCARQ S.A.S	90%	COLOMBIA

Tabla 3. COMPOSICION CONTRATISTA CONSORCIO L&S

CONTRATO DE OBRA LP-MSBV-008-2023		
CONSORCIO L&S		
INTEGRANTES	%	ORIGEN
LA COMERCIALA S.A.S	50%	COLOMBIA
SIS ORGANIZATION S.A.S	50%	COLOMBIA

4 DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES SST

En el presente informe queda evidenciado el seguimiento que viene realizando la interventoría en el periodo del presente informe, adicionalmente se plasma la gestión que viene realizando cada contratista.

4.1 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO CONTRATISTAS.

4.1.1 CTO LP-006 DE 2023 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

Durante el mes de noviembre del 2024, el contratista continuo con las siguientes actividades de obra:

- Se realizó socialización del 50% de ejecución del proyecto, donde asistió el supervisor de invias y apoyo a la supervisión de invias, el alcalde municipal, la secretaria de planeación, el asesor de planeación, el contratista, la interventoría y la comunidad de la zona del proyecto con el fin de informar el avance de la ejecución de las actividades de la obra. Igualmente se realizó comité de veeduría.
- Se continuo con el suministro, extensión y compactación de subbase granular de la abscisa k0+220 - k0+030.
- Se verifica con topografía niveles de la vía y espesores de cunetas y de losas de pavimento.



INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024



- Se realiza chequeo topográfico por parte de la interventoría el bombeo de la vía, nivelación y espesores.
- Se continua con la colocación de acero para losas de pavimento y cunetas carril derecho.
- Se realiza fundición de concreto de 3000 psi para bordillos de la abscisa k2+036 - k1+927 lado derecho y de la abscisa k1+981 - k1+872 lado izquierdo.
- Se realiza fundición de concreto de 3000 psi para cunetas de la abscisa k0+800,5 - k0+630 y de la abscisa k0+972 - k0+960 lado derecho

4.1.1.1 Política al SG-SST

El contratista no ha realizado entrega del informe SST del mes de noviembre del 2024, pero se evidencia las políticas de Seguridad y Salud en el Trabajo, política de No consumo de alcohol, tabaco y sustancias psicoactivas y política de Uso de EPP firmadas por el representante legal, las cuales, se encuentra divulgada en las inducciones al personal.

4.1.1.2 Estado del Personal e ingresos

A continuación, se relaciona el personal que se encuentra laborando para el periodo reportado, en obra:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGOS	ESTADO	TIPO DE AFILIACION
JUAN GUIILERMO VARGAS	78382082	RESIDENTE DE OBRA	ACTIVO	DEPENDIENTE
OSCAR GOMEZ	10767424	DIRECTOR DE OBRA	ACTIVO	DEPENDIENTE
JHON RENNE	1069482164	PROFESIONAL SST	ACTIVO	DEPENDIENTE
ANDERSON NIETO	1063651852	OBRERO	ACTIVO	DEPENDIENTE
CARLOS GONZALEZ	78712123	OPERADOR	ACTIVO	DEPENDIENTE
YOANIS JARAMILLO	10766754	OPERADOR	ACTIVO	DEPENDIENTE
BADINTON PINEDA	78590713	OBRERO	ACTIVO	DEPENDIENTE
JONATAN VALENCIA	2000011774	OBRERO	ACTIVO	INDEPENDIENT
ARMILO JOAQUIN DORIA	78700606	OBRERO	ACTIVO	INDEPENDIENT
JEISON JANITH	1003093724	OBRERO	ACTIVO	INDEPENDIENT
GLENIS ESTHER	42656803	OBRERO	ACTIVO	INDEPENDIENT
JESUS MANUEL SEGURA	1067845204	OBRERO	ACTIVO	INDEPENDIENT
LEWIS MIGUEL SEGURA	1067881228	OBRERO	ACTIVO	INDEPENDIENT
DULIS ACOSTA	11032341	OBRERO	ACTIVO	INDEPENDIENT
CARLOS HOYOS AYAZO	1067937700	OPERADOR	ACTIVO	DEPENDIENTE
JORGE LUIS SIMANCA	1567663	MAESTRO	ACTIVO	DEPENDIENTE
ADRIANA MADERA GUZMAN	1042436111	VIAL	ACTIVO	DEPENDIENTE
JAIDER MORENO RUIZ	1007357209	OBRERO	ACTIVO	INDEPENDIENT



INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA
01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024



NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGOS	ESTADO	TIPO DE AFILIACION
EDWAR ENRIQUE GONZÁLEZ GÓMEZ	10636553635	OBRERO	ACTIVO	INDEPENDIET
JAIRO JAVIER JULIO	11032204	OBRERO	ACTIVO	INDEPENDIET
LUIS EDUARDO TOBAR NUÑEZ	1003451648	OBRERO	ACTIVO	INDEPENDIET
JORGE LUIS RUIZ RAMOS	1003093153	OBRERO	ACTIVO	INDEPENDIET
JORGE ALBERTO MARTINEZ MESTRA	1033375849	OBRERO	ACTIVO	INDEPENDIET
ELKIN GONZÁLEZ GÓMEZ	1193143435	OBRERO	ACTIVO	INDEPENDIETE
PASCUAL CAVADIA	70531232	ORERO	ACTIVO	INDEPENDIENTE

Para el periodo en mención se tuvo el ingreso del siguiente personal:

- Santiago José Fuentes Ricardo, cedula: 11030951
- Jorge Iván Sáez Reyes, cedula: 1003405923
- Gabriel Antonio Pastrana Soto, cedula: 78699760

Relacionado de igual manera en el formato INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

4.1.1.3 Planillas y afiliaciones

Para el periodo del presente informe, el contratista no ha radicado el informe de noviembre con las respectivas planillas de seguridad social.

Se adjunta las planillas del periodo del mes de octubre del 2024, en el anexo 1, las cuales se encontraban pendientes de presentar.

4.1.1.4 Identificación de peligros

El contratista presenta la matriz de peligros, de acuerdo a los peligros y riesgos los cuales suelen ser de tipo Administrativos y/u Operativos.

4.1.1.5 Programa de capacitaciones

Para el periodo del presente informe, el contratista no ha radicado el informe de noviembre del 2024.



INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024



Se confirma las capacitaciones llevadas acabo en el periodo de octubre del 2024:

- Charla de higiene postural
- Manejo de extintores
- Seguridad Vial
- Manejo seguro de cargas
- Manejo de residuos solidos
- Espacios confinados

Se presentan las actas, en el anexo 2.

4.1.1.6 Programa de medicina preventiva del trabajo, promoción y prevención de la salud

Para el periodo del presente informe, el contratista no ha radicado el informe de noviembre del 2024, que permita confirmar las capacitaciones realizadas durante el mes.

Pero se confirma las actividades realizadas para el mes de octubre, donde se evidencia el cumplimiento a las charlas de prevención.

4.1.1.7 Inspecciones

El contratista cuenta con un campamento aledaño al proyecto, el cual, corresponde para el acopio de material y herramienta menor, el cual, se evidencio que se esta implementando el plan de emergencia (botiquín y camilla), se presenta en Anexo 3.

Así mismo, en el frente de obra vienen realizando jornada de orden y aseo, la implementación a la señalización de obra de acuerdo al PMT aprobado por interventoría.

4.1.1.8 Medición de Indicadores

El contratista no ha presentado informe del mes de noviembre del 2024, con la verificación de los indicadores.

Se reporta los indicadores del mes de octubre del 2024, en el anexo 4

4.1.1.9 Maquinaria

Se evidencio el ingreso de la siguiente maquinaria, relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4:

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
BULLDOZER	CAT D6H	-	BARRANQUILITA	I	A	A	A	A	A	I	I	A	I	I	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I
CARGADOR	CAT 21H	6M3	BARRANQUILITA	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	A	A	A	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A
VIBROCOMPACTADOR	DINAPAC CA15A	-	BARRANQUILITA	I	I	I	I	A	A	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	I	A	A	I	I	I	A	A	A	A	A	I	I	A
VOLQUETA WYJ 425	FORD 8000	6M3	BARRANQUILITA	I	A	A	A	A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	I	I	A	A	A	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	A
VOLQUETA ZIA 146	SUPER BRIGADIER	14M3	BARRANQUILITA	I	A	A	A	A	A	I	I	R	R	A	I	A	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	A	A	I	I	A
VOLQUETA KFB 692	SUPER BRIGADIER	14M3	BARRANQUILITA	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	I	A	I	I	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	A	I	I	A
VOLQUETA WWA 126	SUPER BRIGADIER	14M3	BARRANQUILITA	I	A	A	A	A	A	I	I	R	A	R	R	R	I	I	A	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A
VOLQUETA HYA 302	FORD 8000	6M3	BARRANQUILITA	I	A	A	A	I	A	I	I	I	A	I	I	A	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	A	A	A	A	I	I	I
PLANTA DE CONCRETO MOVIL (MIKER)		6M3	BARRANQUILITA	I	A	A	A	A	I	I	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A
COMPACTADOR DE PLACA (RANA)			BARRANQUILITA	I	I	I	I	I	I	I	I	I	A	I	I	A	I	I	I	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	I
VIBRO DE AGUIJA PARA CONCRETO			BARRANQUILITA	I	A	A	A	A	A	I	I	I	A	A	I	A	A	I	I	A	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A
REGLA VIBRATORIA		3 A 5 METROS / 3600RPM / 6HP	BARRANQUILITA	I	A	A	A	A	I	I	I	I	A	A	I	I	I	I	I	I	A	A	I	A	I	A	A	A	A	A	I	I	A
CORTADORA DE PAVIMENTO		MAX PROF. 90MM	BARRANQUILITA	I	I	A	A	A	A	I	I	I	I	I	A	I	I	I	I	I	A	A	I	A	I	A	A	A	A	I	I	I	I

Se presenta los preoperacionales de la maquinaria correspondiente al periodo de octubre del 2024, en el anexo 5.

4.1.2 CTO. 159 DE 2023 MUNICIPIO DE PLANETA RICA

El contratista continuo con las actividades de instalación de señales preventivas en El corredor vial, entre las abscisas k0+084 hasta a k3+540.

Se utilizan paleteros para controlar el tráfico de los vehículos que transitan por los tramos en intervención.

Se realiza acopio de material granular (afirmado), proveniente de la cantera JOMEVE en Ciénaga de oro.

Se realiza acopio de material granular (subbase granular), proveniente de la cantera Siberia.

Se realiza suministro, extendida y compactación de afirmado desde la abscisa k2+300 hasta la k3+000.

Se realiza suministro, extendida y compactación de subbase granular desde la abscisa k2+100 a k2+300.

Se realiza toma de densidades in situ para verificar compactación de terreno.

Se inicio con la intervención y construcción del pavimento rígido MR38.

	<p align="center">INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>	 CONSORCIO INGECON-INCO
---	---	--

Se realiza suministro, extendida y compactación de subbase granular para 390.92ml de berma cunetas e instalación de acero de refuerzo.

Se realiza fundida de 390.92ml berma cunetas de 3000 psi con concreto premezclado.

4.1.2.1 Política de SG-SST

El contratista presenta la política de seguridad y salud en el trabajo, prevención de alcohol, tabaco y drogas, las cuales se encuentran publicados en la bodega y fueron socializados a todo el personal vinculado, a través de la inducción SST, se evidencia a continuación.



4.1.2.2 Estado del personal e ingresos

A continuación, se relaciona el personal que se encuentra laborando para el periodo reportado en obra:



INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA
01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024



CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	ARL	AFILIACION
DIRECTOR DE OBRA	José Ricardo Ruiz Hoyos	15.677.277	SURA	20/06/2024
RESIDENTE DE OBRA	Maria Alejandra Cogollo	1.064.999.603	SURA	04/07/2024
TECNICO SISO	Angie Daniela Carrascal Ochoa	1.066.750.679	SURA	27/06/2024
Monitora Ambiental	Luisa Fernanda Sierra	1.066.729.677	SURA	04/07/2024
Profesional social	Maria Camila Tano	1.066.748.940	sura	04/07/2024
Coordinador de Topografía	José Luis Ortiz Berrio	71.310.821	SURA	20/06/2024
Topógrafo	Néstor Luis Salgado Ramos	1.003.359.117	SURA	5/07/2024
Cadenero	Luis Antonio Yáñez Hernández	1.003.305.026	SURA	20/06/2024
Operador de motoniveladora	Gustavo Alfonso Montes Calderón	1.100.691.991	SURA	20/06/2024
operador de retrocargador	Obeth Naim Banqueth Fuentes	1.063.296.113	SURA	27/06/2024
Operador de vibrocompac	Álvaro José Méndez	1.067.929.146	SURA	
AYUDANTES DE OBRA	Jorge Miguel Delgado Mercado	1.007.849.446	SURA	20/06/2024
	Juan Pablo Mercado Martínez	1.003.305.631	SURA	20/06/2024
	Brayan Alfonso Martínez Padilla	1.067.292.005	SURA	20/06/2024

Nº	NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	INGRESO
1	Isabel del Carmen Martínez	1.066.718.119	Controladora vial	06-09-24
2	María del Carmen Gaspar	1.003.195.953	Controladora vial	06-09-24
3	Wilson Almario Oviedo	1.066.732.613	Oficial	07-09-24
4	Wilmer Alberto Almario Oviedo	1.066.732.611	Oficial	07-09-24
5	Daniel Antonio Payares Soto	1.066.739.185	Oficial	07-09-24
6	Carlos Rafael Ramírez	1.003.309.075	Ayudante	07-09-24
7	Carmelo Antonio Rojas Pérez	1.003.307.115	Ayudante	07-09-24
8	Mauricio Mercado Martínez	1.067.286.481	Ayudante	07-09-24
9	Arnol Pastrana Rojas	1.067.280.762	Ayudante	07-09-24
10	Juan Francisco cogollo	1.066.736.685	Oficial	11-09-24
11	Víctor Reyes Arrieta	1.067.293.338	Oficial	18-09-24



INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA
01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024



--	--	--	--	--

El contratista presenta la siguiente relación del personal que laboro en el mes de septiembre del 2024:

NIT: 901764629-9									
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA									
SEPTIEMBRE									
No.	BENEFICIARIO	CARGO	NIT/CEDULA	VALOR CONTRATO	DIAS LABO RAD OS	VALOR DIAS LABORADOS	PRESTA MO	TOTAL A PAGAR	FIRMA
1	NESTOR LUIS SALGADO RAMOS	TOPOGRAFO	1.003.359.177	5.500.000	15	2.750.000		2.750.000	Nestor Salgado
2	OBETH BANQUET FUENTES	OPERARIO PAJARITA	1.063.296.113	2.300.000	15	1.150.000		1.150.000	Obeth Banquet
3	GUSTAVO MONTES CALDERON	OPERARIO MOTONIVELAD	1.100.691.991	2.700.000	15	1.350.000		1.350.000	Gustavo Montes
4	MARIA CAMILA TANO HOYOS	TRABAJADORA SOCIAL	1.066.748.940	1.650.000	15	825.000		825.000	Maria Camila Tano
5	ANGIE DANIELA CARRASCAL OCHOA	SST	1.066.750.679	1.650.000	15	825.000		825.000	Angie Carrascal
6	LUISA FERNANDA SIERRA MARTINEZ	MONITOREO AMBIENTAL	1.066.724.677	1.300.000	15	650.000		650.000	Luisa Sierra
7	JOSÉ RICARDO RUIZ HOYOS	INGENIERO	15.677.277	4.000.000	15	2.000.000		2.000.000	José Ricardo Ruiz
8	CARELIS ALEJANDRA BEDOYA QUINT	INGENIERA	1.066.575.053	2.000.000	15	1.000.000		1.000.000	Carelis Bedoya
9	MARIA ALEJANDRA COGOLLO PADIL	INGENIERA	1.064.999.603	5.000.000	15	2.500.000		2.500.000	Maria Alejandra Cogollo
10	KAROL MELBA SOTO GONZALEZ	SECRETARIA	1.066.726.313	1.300.000	15	650.000		650.000	Karol Melba Soto
11	HERNAN GONZALES SOTO	CELADOR	6.662.166	1.300.000	15	650.000		650.000	Hernan Gonzales
12	YAIR APARCIO LOZANO	OBRERO	50.710.461	1.300.000	15	650.000		650.000	Yair Aparcio
13	RAFAEL ARRIETA ARRIETA	OBRERO	1.003.306.948	1.300.000	15	650.000		650.000	Rafael Arrieta
14	MANUEL LOPEZ HERNANDEZ	OBRERO	10.893.894	1.300.000	15	650.000		650.000	Manuel Lopez



INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024



15	JAIDER CUETO ALVARADO	OBrero	15.679.846	1.300.000	15	650.000	650.000	
16	RODRIGO BUSTAMANTE JIMENEZ	OBrero	11.105.864	1.300.000	15	650.000	650.000	
17	JUAN PABLO MERCADO MARTINEZ	OBrero	1.003.305.631	1.300.000	15	650.000	650.000	Juan Pablo
18	JORGE MIGUEL DELGADO MERCADO	OBrero	1.007.849.446	1.300.000	15	650.000	650.000	Jorge d
19	BRAYAN ALFONSO PADILLA MARTIN	OBrero	1.067.292.005	1.300.000	15	650.000	650.000	BRAYAN Padilla!
20	CARLOS CARDONA VASCO	OBrero	70.112.749	1.300.000	15	650.000	650.000	Carlos Cardona
21	ALFREDO ALEANS CORDOBA	OBrero	15.662.274	1.300.000	15	650.000	650.000	Alfredo Aleans
22	LUIS PACHECO LOZANO	OBrero	11.106.531	1.300.000	15	650.000	650.000	
23	FRANKLIN MONTES NARVAEZ	OBrero	15.669.482	1.300.000	15	650.000	650.000	Franklin M
24	CAMILLO OVIEDO MUÑOZ	OBrero	1.007.706.541	1.300.000	15	650.000	650.000	Camilo Oviedo
25	JHON ALMARIO	MAESTRO(CUA DRILLA)	1.193.562.960	20.000		876.64	17.532.800	Jhon Almario
			63.132.800	40.332.800			40.332.800	

Elaborado por:
Lina Yepes Cardona
Lina Yepes
CC. 1066740063

Aprobado por:
Emiro Banguil Cubillos
Emiro Banguil
A.L. Consorcio providencia

Donde, relacionan personal que no ha sido evidenciado en obra y que tampoco lo reportan en el informe de septiembre presentado por el contratista en comunicado OFI-CONS-094-2024 como son:

- Carelis Alejandra Bedoya – Ingeniera
- Karol Melisa Soto – Secretaria
- Hernan Gozalez Soto – Celador
- Yair Aparicio Lozano – obrero
- Rafael Arrieta Arrieta – obrero
- Manuel Lopez Hernandez – obrero
- Jaider Cueto Alvarado – obrero
- Rodrigo Bustamante Jimenez – obrero
- Carlos Cardona Basto
- Alfredo Aleans Cordoba – obrero
- Luis Pache Lozano – obrero
- Franklin Montes Narváez – Obrero
- Camilo Oviedo Muñoz - Obrero
- Jhon Alamario - obrero

	<p style="text-align: center;">INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>	 CONSORCIO INGECON-INCO
---	---	--

El contratista mediante comunicado OFI-CONS-069-2024 del 01 de septiembre, presenta los exámenes médicos del siguiente personal:

- José Ricardo Ruiz
- Jorge Miguel Delgado
- Gustavo Alfonso Montes
- Brayan Padilla
- Angie Daniela Carrascal
- Luisa Fernanda Sierra
- Maria Camila Tano
- Maria Alejandra Cogollo
- Luis Antonio Yanez
- Juan Pablo Mercado
- Nestor Luis Salgado
- Obet Banquet

Así mismo, la interventoría informa al contratista que teniendo en cuenta el seguimiento a las actividades de obra, se evidencia en obra el siguiente personal:

PERSONAL EN OBRA - CONSORCIO PROVIDENCIA			
No.	NOMBRES	IDENTIFICACIÓN	CARGO
11	ALVARO JOSE MENDES RUIZ	1.067.929.146	OP.VIBRO
14	ISSABEL DEL CARMEN MARTÍNEZ BERTEL	1.066.718.119	PALETERA
15	MARIA DEL CARMEN GASPAR CHICA	1.003.195.953	PALETERA
16	EDINSON JULIO ZAPATA BRAVO	1.192.761.933	OP. MINICARGADOR
17	SALMA FLOREZ AVILA	1.193.562.960	AUX. SST
No.	NOMBRES - CUADRILLA DE PAVIMENTO	IDENTIFICACIÓN	CARGO
1	JHON LUIS ARMARIO JULIO	15.669.981	MAESTRO
2	VICTOR ALFONZO REYES ARRIETA	1.067.293.338	OFICIAL
3	WILMER ALBERTO ARMARIO AVIEDO	1.066.732.611	OFICIAL
4	JUAN FEANSISCO COGOLLO MIRANDA	1.066.736.685	OFICIAL
5	WILSON DAVID ARMARIO OVIEDO	1.066.732.653	OFICIAL
6	DANNIEL ANTONIO PAYARES SOTO	1.066.739.185	OFICIAL
7	MAURICIO MANUEL MERCADO MARTINEZ	1.067.286.481	AYUDANTE
8	CARMELO ANTONIO ROJAS PEREZ	1.003.307.115	AYUDANTE
9	ARNOLD ANTONIO PASTRANA ROJAS	1.067.280.762	AYUDANTE
10	CARLOS RAFAEL RAMIREZ BERTEL	1.003.309.075	AYUDANTE

Por todo lo anteriormente expuesto y dado que el contratista no ha acatado las observaciones realizadas por interventoría, se informa que mediante comunicado CING-INV-5053-0357-24 del 15 de octubre del 2024, se recomendó a la secretaría de planeación del municipio de Planeta Rica iniciar un proceso sancionatorio con aplicación de la cláusula de multa, toda vez que, se evidencia un grave incumplimiento en sus obligaciones contractuales, ya que a la fecha no se cuenta

con la documentación exigida del personal que actualmente se encuentre laborando al contrato de obra No 159-2023 y las planillas de seguridad social de cada periodo laborado.

El contratista presenta los comunicados OFI-CONS-111-2024 del 28 de octubre del 2024 y OFI-CONS-115-2024 del 01 de noviembre del 2024, donde remite los Informes SST de febrero a septiembre del 2024, por el cual, la interventoría en comunicado CING-INV-5053-0415-24 del 12 de noviembre del 2024, realiza devolución de los mismos, dado que los informes presentados se evidencia en borrador e incompletos sin dar respuesta a las observaciones que viene realizando la interventoría, tampoco adjuntan la documentación del personal que relacionan y no se encuentran las planillas de seguridad de los periodos que están reportando, por lo tanto, se ratificó a la secretaría de planeación del municipio de Planeta Rica continuar con el proceso sancionatorio presentado en comunicado CING-INV-5053-0357-24 del 15 de octubre del 2024 con aplicación de la cláusula de multa, toda vez que, se evidencia un grave incumplimiento por parte del contratista en sus obligaciones contractuales.

Así mismo, en comunicado CING-INV-5053-0432-24 del 21 de noviembre del 2024, se realizo requerimiento SST incluir las baterías sanitarias, se evidencia que la ubicación actual de las controladoras viales, se encuentra retirada de la vivienda que tiene actualmente el contratista para uso de almacén y unidad sanitaria, adicionalmente, dada la actividad de las controladoras viales, las cuales deben permanecer en su punto, no es posible el traslado del mismo.

4.1.2.3 Programa de Capacitaciones

Para el periodo del presente informe, el contratista no ha radicado el informe de octubre y noviembre del 2024.

4.1.2.4 Maquinaria

Se evidencio el ingreso de la siguiente maquinaria, relacionada en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4:

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																													
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
MOTONIVELADORA	LIUGONG 4165D	3.7M	VIA PROVIDENCIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MINICARGADOR	CASE CR220B	1.5M3	VIA PROVIDENCIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
PAJARITA	CASE 580N	0.67M3	VIA PROVIDENCIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VIBROCOMPACTADOR	SD-1000	7TON	VIA PROVIDENCIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA	UPP086	15M3	VIA PROVIDENCIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VOLQUETA	CHEVROLET BSF842	15M3	VIA PROVIDENCIA	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A



INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024



4.1.2.5 INDICADORES SG-SST

Para el periodo del presente informe, el contratista no ha radicado el informe de octubre y noviembre del 2024.

4.1.2.6 Inspecciones

Se evidencio durante el periodo el uso de los EPP por parte del personal, pese a que dentro de la gestión documental esta pendiente las actas de entrega de EPP firmadas por todo el personal.

El contratista cuenta con una bodega ubicada en la balastrera 1, la cual, se evidencia la implementación del punto de emergencia.

Se evidencia que la ubicación actual de las controladoras viales, se encuentra retirada de la vivienda que tiene actualmente el contratista para uso de almacén y unidad sanitaria, adicionalmente, dada la actividad de las controladoras viales, las cuales deben permanecer en su punto, no es posible el traslado del mismo, teniendo en cuenta que no cuenta con alguien que las releve, por lo tanto, en comunicado CING-INV-5053-0432-24 del 21 de noviembre del 2024, se realizó requerimiento SST al contratista para incluir las baterías sanitarias de forma INMEDIATA.

Así mismo, la instalación de señalización preventiva en el frente de obra.

4.1.3 CTO LP-008-2023 MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO

El contratista para el mes de noviembre, continua con las siguientes actividades:

Se completó la excavación de la vía hasta la abscisa k0+535. Posteriormente, se realizó la limpieza de la subrasante de manera mecánica y manual entre las abscisas k0+535 y k0+650, seguida de la instalación del geotextil nt en el tramo k0+555 a k0+610. La instalación de piedra rajón continuó entre las abscisas k0+550 y k0+605, mientras que el material de sello se encuentra hasta la abscisa k0+520.

Se registró la llegada del acero de refuerzo y de la formaleta necesaria para la construcción del bordillo. Debido a las afectaciones por lluvias, se llevó a cabo un lleno y conformación entre las abscisas k0+360 y k0+320. En cuanto al suministro de materiales, se documentaron tres (3) viajes de afirmado de 15 m³ cada uno provenientes de la cantera el esfuerzo, así como dos (2) viajes de piedra rajón de 15 m³ desde la cantera aguas vivas.

	<p style="text-align: center;">INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>	 CONSORCIO INGECON-INCO
---	--	--

También se realizaron actividades de excavación, conformación, figurado del acero de refuerzo, encofrado y vaciado del bordillo del lado izquierdo de la vía entre las abscisas k0+360 y k0+280.

Se registraron lluvias moderadas los días 24 y 27 de noviembre, lo que afectó temporalmente algunas actividades. Finalmente, se llevó a cabo el mantenimiento de la vía alterna utilizada por la comunidad y los equipos del proyecto, asegurando así la continuidad del tránsito en la zona.

El contratista presenta en comunicados 090-2024 del 14 de noviembre del 2024, 091-2024 del 15 de noviembre del 2024 y 092-2024 del 18 de noviembre del 2024, los informes SST de los periodos de febrero a octubre del 2024, donde la interventoría en comunicado CING-INV-5053-0428-24 del 20 de noviembre del 2024 aprobó los informes SST de febrero a junio del 2024, se presentaron observaciones al mes de Julio a Octubre del 2024 se solicito presentar las planillas de octubre, dado que la presentada en dicho informe corresponde al mes de septiembre del 2024.

4.1.3.1 Estado de Personal e Ingresos

Para el periodo del mes de noviembre del 2024, el contratista cuenta con el siguiente personal:

CARGO	NOMBRE	IDENTIFICACION	ARL
DIRECTOR DE OBRA	WILLIAM URZOLA	73088530	SURA 15/05/2024
RESIDENTE DE OBRA	HARRY ETNIEL BEJARANO	1067897855	SURA 15/07/2024
PROFESIONAL SST	IVAN CASTILLO SOLANO	1067927353	SURA 15/05/2024
AUX RESIDENTE	ANDY MIGUEL AGAMEZ	1067940218	SURA 12/07/2024
MAESTRO	JULIO CESAR LUNA	78753670	SURA 12/07/2024
AYUDANTE	JOSE MANUEL VALETA	1064985045	SURA
AYUDANTE	ALCIDES MANUEL NAVARRO	1073825317	SURA 12/07/2024
AYUDANTE	LUIS ALBERTO HERNANDEZ	1070806069	NO PRESENTA
AYUDANTE	HUGO CESAR LUNA	NO PRESENTA	NO PRESENTA
AYUDANTE	ARISTIDES AVILA HERNANDEZ	10939611	SURA 23/07/2024
TOPOGRAFO	VALENTIN ORTEGA	1069503240	SURA 10/07/2024
AYUDANTE	DANIEL LOPEZ	1192738436	SURA 10/07/2024
AUXILIAR SST	YURY ESTHER CORRALES	1070822976	SURA 31/07/2024
Operador de retroexcavadora	FIDEL COGOLLO HERNANDEZ	NO PRESENTA	NO PRESENTA
AYUDANTE	ELIAS IGNACIO VELASQUEZ	1067912090	SURA 09/07/2024

Así mismo, la interventoría en seguimiento a las actividades que viene ejecutando el contratista, se evidencio el ingreso del siguiente personal:

NOMBRE	IDENTIFICACION	ARL
JAVIER CAUSADO SALCEDO	10943898	SURA 19/10/2024
JAIDER MANUEL COLON OSPINA	1070812177	SURA 19/10/2024
CAMILO JOSE HERNANDEZ	1003563000	SURA 19/10/2024
SAMUEL RAVELES QUINTERO	1068737586	SURA 19/10/2024
JOSE MAUEL VALETA RIVER	1064985045	SURA 19/10/2024
JOSE ANTONIO VELASQUEZ	11155672	SURA 19/10/2024
ADER LUIS URUETA	1070815381	SURA 22/10/2024
JHON FERNANDO CORDOBA	1068736520	SURA 24/10/2024

El contratista no ha presentado el informe del mes de noviembre del 2024, a la fecha no han remitido las planillas de seguridad del mes octubre y noviembre.

4.1.3.2 Capacitaciones

El contratista no ha presentado el informe del mes de noviembre del 2024.

Se confirma las capacitaciones realizadas por el contratista en el periodo de octubre del 2024:

- Procedimientos de Seguridad Vial, para la prevención de accidentes de conductores, peatones y demás actores viales.
- Inducciones al personal que ingreso en el periodo de octubre 2024.

Se remite en el Anexo 6.

4.1.3.3 Maquinaria

Para el periodo del presente informe, se evidencio la siguiente maquinaria que se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4:

MAQUINARIA Y EQUIPO				DÍAS DEL MES																														
DESCRIPCIÓN	MARCA / MODELO	CAPACIDAD	LOCALIZACIÓN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
RETROEXCAVADORA	CASE 580N		SECTOR RIMINI	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	R	A	A	A	A	A	A	I	I	I	I	R	A	A	A	A	A	A	
VOQUETA	INTERNATIONAL SNO699	7M3	SECTOR RIMINI																															
MINICARGADOR	CASE		SECTOR RIMINI									A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	I	I	I	R	A	A	A	A	A	A	

El contratista no ha presentado los preoperacionales de la maquinaria utilizada en el periodo de noviembre del 2024.

Se presenta los preoperacionales del mes de octubre del 2024, en el anexo 7.

4.1.3.4 Inspecciones

El contratista cuenta con un campamento aledaño al proyecto, el cual, corresponde para el acopio de material y herramienta menor, el cual, se evidencio que se está implementando el plan de emergencia (botiquín y camilla), se presentan las inspecciones realizadas en el mes de octubre del 2024, en el anexo 8.

Se evidencio el cumplimiento a la entrega de EPP, se presentan las actas de entrega en el Anexo 9.

Así mismo, en el frente de obra vienen realizando jornada de orden y aseo, se inició con la implementación de señalización preventiva, aun así, no se realizo el cerramiento de la obra.

4.1.3.5 Indicadores

El contratista no ha presentado el informe de noviembre del 2024, pero se remite la evaluación de los indicadores del periodo de octubre del 2024.


		INDICADORES DE ACCIDENTALIDAD Y AUSENTISMO						
NOMBRE DEL INDICADOR	DEFINICIÓN	FÓRMULA	INTERPRETACIÓN	PERIODICIDAD	RESULTADOS			
					JUL	AGO	SEP	OCT
Frecuencia de accidentalidad	Número de veces que ocurre un accidente de trabajo en el mes.	$\frac{\text{Número de accidentes de trabajo que se presentaron en el mes}}{\text{Número de trabajadores en el mes}} \times 100$	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se presentaron X accidentes de trabajo.	MESESUAL	0	0	0	0
Severidad de accidentalidad	Número de días perdidos por accidentes de trabajo en el mes.	$\frac{\text{No. de días de incapacidad por Accidente de Trabajo en el mes} \times \text{número de días cargados en el mes}}{\text{Número de trabajadores en el mes}} \times 100$	Por cada cien (100) trabajadores que laboraron en el mes, se perdieron X días por accidente de trabajo.	MESESUAL	0	0	0	0
Ausentismo por causa médica	Ausentismo es la no asistencia al trabajo, con incapacidad médica.	$\frac{\text{Número de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes}}{\text{Número de días programados en el mes}} \times 100$	En el mes se perdió X% de días programados de trabajo por incapacidad médica.	MESESUAL	0%	0%	0%	0%
Prevalencia de la enfermedad laboral	Número de casos de enfermedad laboral presentes en una población en un periodo de tiempo.	$\frac{\text{No. de casos nuevos y antiguos de enfermedad laboral en el periodo Z}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo Z}} \times 100.000$	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos de enfermedad laboral en el periodo Z.	ANUAL	0	0	0	0
Incidencia de la enfermedad laboral	Número de casos nuevos de enfermedad laboral en una población determinada en un periodo de tiempo.	$\frac{\text{No. de casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z}}{\text{Promedio de trabajadores en el periodo Z}} \times 100.000$	Por cada 100.000 trabajadores existen X casos nuevos de enfermedad laboral en el periodo Z.	ANUAL	0	0	0	0
Proporción de accidentes de trabajo mortales	Número de accidentes de trabajo mortales en el año.	$\frac{\text{No. De Accidentes de trabajo mortales que se presentaron en el año}}{\text{Total de Accidentes del Trabajo que se presentaron en el año}} \times 100$	En el año, el X% de accidentes de trabajo fueron mortales.	ANUAL	0%	0%	0%	0%




INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024



GRÁFICOS DE RESULTADOS DE INDICADORES DE FRECUENCIA, SEVERIDAD Y AUSENTISMO POR PERIODO.

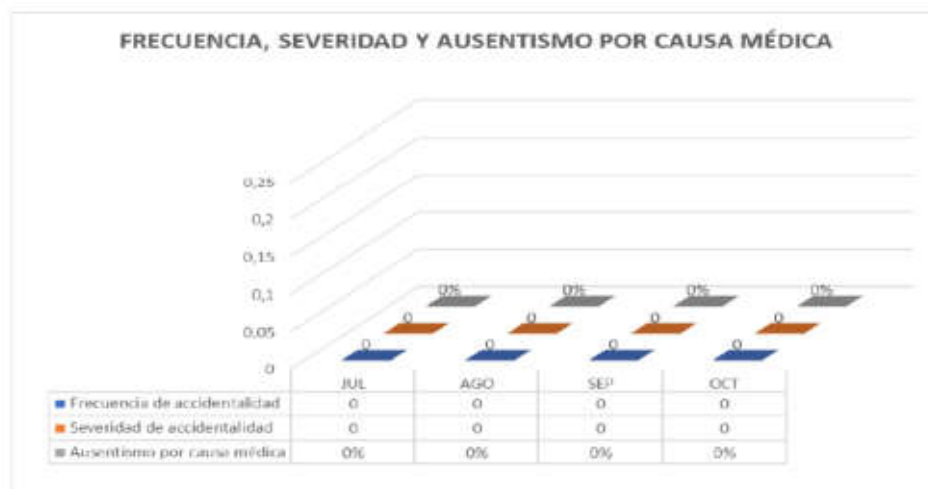

GRÁFICOS DE RESULTADOS DE INDICADORES DE PREVALENCIA, INCIDENCIA Y PORCIÓN DE AT MORTALES.

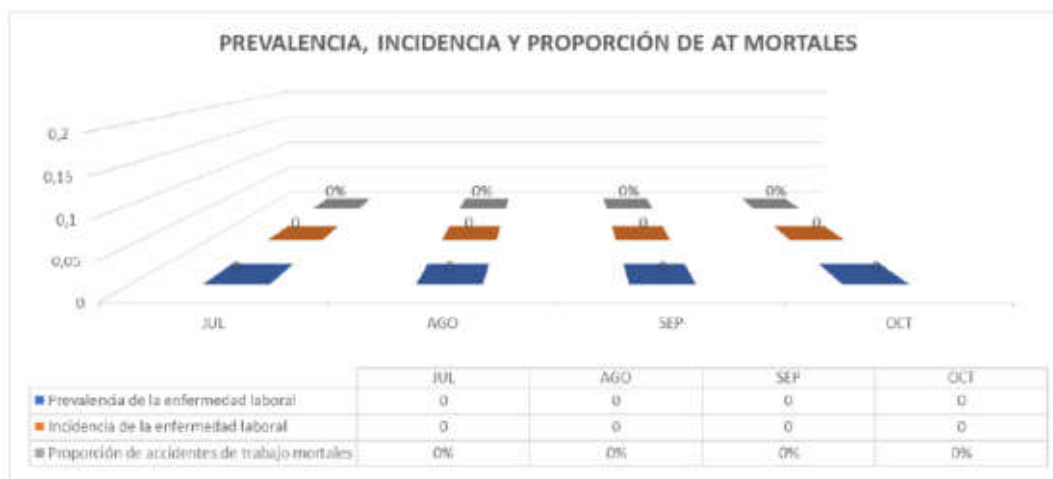



INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024



4.2 SISTEMA DE GESTION DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO INTERVENTORIA

Se realizó seguimiento a las actividades en materia de Seguridad y Salud en el Trabajo teniendo en cuenta la normatividad del decreto 1072 de 2015 y 1443 de 2014 en cuanto a los Sistemas de Gestión de Seguridad y salud en el Trabajo SG-SST.

Teniendo en cuenta el ciclo PHVA en el SG-SST, como el procedimiento lógico y por etapas que permite el mejoramiento continuo a través de los siguientes pasos:

- 1. Planificar:** Se debe planificar la forma de mejorar la seguridad y salud de los trabajadores, encontrando qué cosas se están haciendo incorrectamente o se pueden mejorar y determinando ideas para solucionar esos problemas.
- 2. Hacer:** Implementación de las medidas planificadas.
- 3. Verificar:** Revisar que los procedimientos y acciones implementados están consiguiendo los resultados deseados.
- 4. Actuar:** Realizar acciones de mejora para obtener los. mayores beneficios en la seguridad y salud de los trabajadores.

Dentro de las actividades desarrolladas se realizaron las siguientes:

4.2.1 Política SG – SST

La interventoría Consorcio ingecon-inco, cuenta con las políticas al SG-SST, política de plan de emergencia y acoso laboral, las cuales, han sido socializadas en las inducciones y divulgadas en las oficinas ubicadas en los Córdoba y Planeta Rica, como se evidencia a continuación:



4.2.2 Estado de personal e ingresos

Para el periodo del presente informe la interventoría cuenta con el siguiente personal, el cual, se relaciona en el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-7

[illegible]

Para la fecha del presente periodo, no se cuenta con las planillas PAGAS, por lo tanto, serán presentadas en el próximo informe.

En el presente informe se presenta las planillas de seguridad social, correspondientes al periodo de octubre del 2024, en el anexo 10.

4.2.2.1 Identificación de peligros, evaluación y valoración de riesgos.

La interventoría ha evaluado y dado prioridad a los factores de riesgo utilizando una matriz de riesgo, identificando las condiciones de riesgo asociadas a las actividades planificadas en cada área y etapa del proyecto. Además, se han establecido medidas de intervención específicas para mitigar cada riesgo identificado. Se remite en el anexo 11.

Por lo tanto, se vienen realizando las siguientes medidas:

- La interventoría desde el área SG-SST realizó las siguientes capacitaciones:
 - Primeros auxilios viales - Pasos para actuar ante un accidente de tránsito
 - Hábitos saludables, higiene del sueño, higiene postural y pausas activas



INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024



- **Seguimientos Pausas activas.** La interventoría realiza pausas activas diarias en horario de 10:30 am y 3:30 pm.




- **Implementación al plan de emergencias**

Las oficinas ubicadas en el municipio de los Córdoba y Planeta Rica, cuenta con sus respectivos extintor, botiquín y camillas.



Oficina Planeta Rica

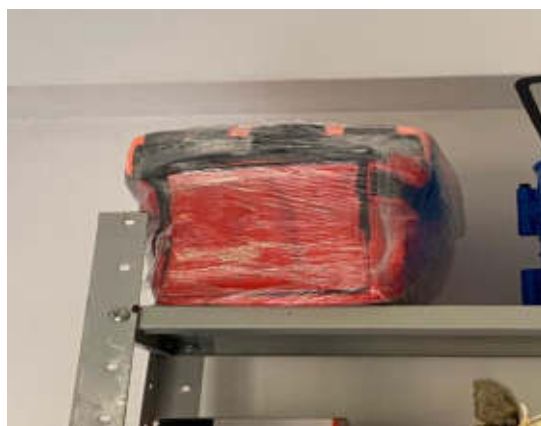

Oficina Planeta Rica



Oficina Córdoba



Oficina Córdoba

4.2.3 Vehículos.

La interventoría relaciona los siguientes vehículos y presenta formato MEPI-MN1-IN-15-FR-5 Equipo Y Vehículos Contrato De Interventoría.

EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES MARZO DEL 2024																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
VEHÍCULO	RENAULT CLUSTER QW432	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHÍCULO	SSANGYONG ACTYON EV950B	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHÍCULO	SSANGYONG DAZ79E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	MOTOCICLETA 150cc DE PLACAS R25 83G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	MOTOCICLETA 150cc DE PLACAS URB 75G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	MOTOCICLETA 150cc DE PLACAS OC 100E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A

Se presentarán los preoperacionales del periodo de noviembre en el anexo 12.

4.2.4 Indicadores al SG-SST

En cumplimiento a lo establecido en la resolución 0312 del 2019, la interventoría viene realizando la medición de los indicadores de frecuencia, los cuales, se presentan en el anexo 13.



INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024



5 CONCLUSIONES

Como se evidencia en el presente informe, LP-006-2023 del municipio de los Córdoba a cargo del Consorcio Pavimento Vía Barranquillita, viene implementando el SG-SST, para el periodo del presente informe el contratista no ha radicado los soportes del mes de noviembre del 2024

Como se evidencia en el presente informe, el contrato 159-2023 correspondiente al municipio de Planeta Rica a cargo del contratista Consorcio Providencia, aunque en obra ha implementado la señalización, se ha evidenciado las charlas que realiza la inspectora SISO y el personal de obra cuenta con los elementos EPP, el contratista no han soportado la documentación del personal que ha ingresado a la fecha al proyecto, no ha presentado planillas de seguridad social, no ha presentado los preoperacionales de la maquinaria, situación que ha sido informada por la interventoría en reiterados comunicados y comités de seguimiento, sin que a la fecha del corte del presente informe se cuente con un pronunciamiento del contratista, por lo tanto, se recomendó al municipio iniciar con un proceso de incumplimiento a las obligaciones contractuales del contratista.

El contrato LP-MSBV-008-2023 del municipio de San Bernardo del Viento a cargo de Consorcio L&S, al mes del presente informe continuo con las actividades de obra, donde se cuenta con un campamento aledaño al proyecto, señalización informativa y elementos de protección del personal, el contratista ha venido presentando documentación del personal, pero no ha soportado la implementación del SG-SST y no han presentado las planillas de seguridad social del periodo del presente informe, situación que ha sido reportada por la interventoría en reiterados comunicados y comités de seguimiento.

	<p>INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>	 CONSORCIO INGECON-INCO
---	--	--

**ANEXO 1. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL OCTUBRE CTO LP-006-2023
MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS**

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901768925	2	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PAVIMENTO BARRANQUILLA	CRA 1 W N 35 35 JUAN XXIII	LOS CORDOBAS-CORDOBA	3167454512	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1049337273	9477276668	E	2024/11/08	2024/11/14	BANCOLOMBIA	6	\$2,887,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES															PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	yip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	10767424	GOMEZ NEGRETTE OSCAR LUIS		X																231001	1	\$43,334	\$7,000	EPS005	1	\$43,334	\$1,800	CCF16	1	\$43,334	\$1,800	14-11	1	\$43,334	\$3,100	1	\$0	\$0	Si	\$13,700
2	CC	78712123	GONZALEZ DURANGO CARLOS ALFONSO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
3	CC	1067937700	HOYOS AYAZO CARLOS ALBERTO	X																	230301	13	\$563,334	\$90,200	EPS005	13	\$563,334	\$22,600	CCF16	13	\$563,334	\$22,600	14-11	13	\$563,334	\$39,300	13	\$0	\$0	Si	\$174,700
4	CC	10766754	JARAMILLO MARTINEZ YOANIS ARMANDO																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
5	CC	1042436111	MADERA GUZMAN ADRIANA	X																	230301	14	\$606,667	\$97,100	EPS041	14	\$606,667	\$24,300	CCF16	14	\$606,667	\$24,300	14-11	14	\$606,667	\$42,300	14	\$0	\$0	Si	\$188,000
6	CC	1069482164	MONTES MEJIA JOHN RENE																		25-14	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS041	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
7	CC	1063651852	NIETO ARROYO ANDERSON	X																	230301	13	\$563,334	\$90,200	EPS041	13	\$563,334	\$22,600	CCF16	13	\$563,334	\$22,600	14-11	13	\$563,334	\$39,300	13	\$0	\$0	Si	\$174,700
8	CC	78590713	PINEDA CHIMA BADINTON ANTONIO																		231001	7	\$325,000	\$52,000	0		\$0	\$0	CCF16	7	\$325,000	\$13,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	7	\$0	\$0	No	\$155,500
9	CC	78744425	RIOS GONZALEZ CESAR AUGUSTO																		230201	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
10	CC	15674663	SIMANCA GALARCIO JORGE LUIS																		230301	7	\$325,000	\$52,000	0		\$0	\$0	CCF16	7	\$325,000	\$13,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	7	\$0	\$0	No	\$155,500
11	CC	78382082	VARGAS LOPEZ JUAN GUILLERMO																		231001	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS005	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-11	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
Total		Afiliados(11)																					\$8,926,669	\$1,428,500			\$8,276,669	\$331,300			\$8,926,669	\$357,300		\$10,876,669	\$757,500		\$0	\$0		\$2,874,600	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 78700606		DORIA COGOLLO ARMILO JOAQUIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	12125272	9475602706	I	2024/11/02	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	20	\$125,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	78700606	DORIA COGOLLO ARMILO JOAQUIN		X																	230201	10	\$433,334	\$69,400	EP5037	10	\$433,334	\$54,200		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$123,600	
Total		Afiliados(1)																					\$433,334	\$69,400			\$433,334	\$54,200			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$123,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 78700606		DORIA COGOLLO ARMILO JOAQUIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	12125272	9475602706	I	2024/11/02	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	20	\$125,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,400	\$1,000	\$0	\$70,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$69,400	\$1,000	\$0	\$70,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,200	\$800	\$0	\$55,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$54,200	\$800	\$0	\$55,000	
TOTAL				1	\$123,600	\$1,800	\$0	\$125,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 11032341		VERGARA ACOSTA DULIS ALONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	12115328	9475603679	I	2024/11/09	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	13	\$124,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																														
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES										
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes				
1	CC	11032341	VERGARA ACOSTA DULIS ALONSO		X																	230301	10	\$433,334	\$69,400	EP5037	10	\$433,334	\$54,200		0		\$0	\$0		0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	No	\$123,600	
Total Afiliados(1)																						\$433,334	\$69,400			\$433,334	\$54,200				\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0		\$123,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11032341		VERGARA ACOSTA DULIS ALONSO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	12115328	9475603679	I	2024/11/09	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	13	\$124,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,400	\$700	\$0	\$70,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$69,400	\$700	\$0	\$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,200	\$600	\$0	\$54,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$54,200	\$600	\$0	\$54,800
TOTAL				1	\$123,600	\$1,300	\$0	\$124,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1063653635		GONZALEZ GOMEZ EDWAR ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	05027315	9475602807	I	2024/11/08	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	14	\$124,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	1063653635	GONZALEZ GOMEZ EDWAR ENRIQUE	X																	230301	10	\$433,334	\$69,400	EP5037	10	\$433,334	\$54,200		0		\$0	\$0		0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	No	\$123,600
Total Afiliados(1)																							\$433,334	\$69,400			\$433,334	\$54,200			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0		\$123,600		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1063653635		GONZALEZ GOMEZ EDWAR ENRIQUE	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	05027315	9475602807	I	2024/11/08	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	14	\$124,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,400	\$700	\$0	\$70,100
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$69,400	\$700	\$0	\$70,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,200	\$600	\$0	\$54,800
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$54,200	\$600	\$0	\$54,800
TOTAL				1	\$123,600	\$1,300	\$0	\$124,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1193143435		GONZALEZ GOMEZ ELKIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	05030413	9475602946	I	2024/11/08	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	14	\$124,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	1193143435	GONZALEZ GOMEZ ELKIN	X																	230301	10	\$433,334	\$69,400	EP5037	10	\$433,334	\$54,200	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	No	\$123,600
Total Afiliados(1)																							\$433,334	\$69,400			\$433,334	\$54,200			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0		\$123,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1193143435		GONZALEZ GOMEZ ELKIN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	05030413	9475602946	I	2024/11/08	2024/11/22	BANCO DE OCCIDENTE	14	\$124,900

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,400	\$700	\$0	\$70,100	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$69,400	\$700	\$0	\$70,100	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,200	\$600	\$0	\$54,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$54,200	\$600	\$0	\$54,800	
TOTAL				1	\$123,600	\$1,300	\$0	\$124,900	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 03			INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	12125272	9475602706	I	2024/11/02	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	20	\$125,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes		
1	CC	03		X																	230201	10	\$433,334	\$69,400	EP5037	10	\$433,334	\$54,200	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	No	\$123,600	
Total Afiliados(1)																							\$433,334	\$69,400			\$433,334	\$54,200			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$123,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 03			INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	12125272	9475602706	I	2024/11/02	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	20	\$125,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,400	\$1,000	\$0	\$70,400	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$69,400	\$1,000	\$0	\$70,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,200	\$800	\$0	\$55,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$54,200	\$800	\$0	\$55,000	
TOTAL				1	\$123,600	\$1,800	\$0	\$125,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1007357209		MORENO RUIZ JAIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	05040303	9475603165	I	2024/11/03	2024/11/22	BANCO DE OCCIDENTE	19	\$125,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES								
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	1007357209	MORENO RUIZ JAIDER	X																	230301	10	\$433,334	\$69,400	EP5037	10	\$433,334	\$54,200		0		\$0	\$0		0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	No	\$123,600
Total Afiliados(1)																							\$433,334	\$69,400			\$433,334	\$54,200			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0		\$123,600			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1007357209		MORENO RUIZ JAIDER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	05040303	9475603165	I	2024/11/03	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	19	\$125,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,400	\$1,000	\$0	\$70,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$69,400	\$1,000	\$0	\$70,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,200	\$800	\$0	\$55,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$54,200	\$800	\$0	\$55,000	
TOTAL				1	\$123,600	\$1,800	\$0	\$125,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1003093724		PAEZ CASARRUBIA JEISON JANITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	05043534	9475603204	I	2024/11/07	2024/11/22	BANCO DE OCCIDENTE	15	\$125,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES					
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1003093724	PAEZ CASARRUBIA JEISON JANITH	X																	230301	10	\$433,334	\$69,400	EP5037	10	\$433,334	\$54,200		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$123,600
Total Afiliados(1)																							\$433,334	\$69,400			\$433,334	\$54,200			\$0	\$0			\$0	\$0		\$0	\$0		\$123,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003093724		PAEZ CASARRUBIA JEISON JANITH	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	05043534	9475603204	I	2024/11/07	2024/11/22	BANCO DE OCCIDENTE	15	\$125,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,400	\$800	\$0	\$70,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$69,400	\$800	\$0	\$70,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,200	\$600	\$0	\$54,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$54,200	\$600	\$0	\$54,800	
TOTAL				1	\$123,600	\$1,400	\$0	\$125,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067845204		SEGURA SALGADO JESUS MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	12106392	9475603352	I	2024/11/02	2024/11/22	BANCO DE OCCIDENTE	20	\$125,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1067845204	SEGURA SALGADO JESUS MANUEL		X																	230301	10	\$433,334	\$69,400	EP5037	10	\$433,334	\$54,200		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$123,600
Total		Afiliados(1)																				\$433,334	\$69,400			\$433,334	\$54,200			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$123,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067845204		SEGURA SALGADO JESUS MANUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	12106392	9475603352	I	2024/11/02	2024/11/22	BANCO DE OCCIDENTE	20	\$125,400

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,400	\$1,000	\$0	\$70,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$69,400	\$1,000	\$0	\$70,400
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,200	\$800	\$0	\$55,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$54,200	\$800	\$0	\$55,000
TOTAL				1	\$123,600	\$1,800	\$0	\$125,400

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1033375849		MARTINEZ MESTRA JORGE ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	05036884	9475603135	I	2024/11/10	2024/11/22	BANCO DE OCCIDENTE	12	\$124,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																											
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																							
No.	Identificación		Nombre		ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																	
1	CC	1033375849	MARTINEZ MESTRA JORGE ALBERTO	X																		230301	10	\$433,334	\$69,400	EP5037	10	\$433,334	\$54,200	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	No	\$123,600																
Total Afiliados(1)																								\$433,334	\$69,400			\$433,334	\$54,200			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0		\$123,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1033375849		MARTINEZ MESTRA JORGE ALBERTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	05036884	9475603135	I	2024/11/10	2024/11/22	BANCO DE OCCIDENTE	12	\$124,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,400	\$600	\$0	\$70,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$69,400	\$600	\$0	\$70,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,200	\$500	\$0	\$54,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$54,200	\$500	\$0	\$54,700	
TOTAL				1	\$123,600	\$1,100	\$0	\$124,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 10030931 3		M	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	05036884	9475603135	I	2024/11/10	2024/11/22	BANCO DE OCCIDENTE	12	\$124,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																												
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes			
1	CC	10030931 3	M	X																	230301	10	\$433,334	\$69,400	EP5037	10	\$433,334	\$54,200		0		\$0	\$0		0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	No	\$123,600
Total Afiliados(1)																							\$433,334	\$69,400			\$433,334	\$54,200			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0		\$123,600		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 10030931 3		M	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	05036884	9475603135	I	2024/11/10	2024/11/22	BANCO DE OCCIDENTE	12	\$124,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,400	\$600	\$0	\$70,000	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$69,400	\$600	\$0	\$70,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,200	\$500	\$0	\$54,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$54,200	\$500	\$0	\$54,700	
TOTAL				1	\$123,600	\$1,100	\$0	\$124,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 11032204		JULIO JAIRO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	05034004	9475603026	I	2024/11/02	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	20	\$125,400

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							
1	CC	11032204	JULIO JAIRO JAVIER	X																	230301	10	\$433,334	\$69,400	EP5037	10	\$433,334	\$54,200	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	No	\$123,600																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																						
Total Afiliados(1)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 11032204		JULIO JAIRO JAVIER	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	05034004	9475603026	I	2024/11/02	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	20	\$125,400

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,400	\$1,000	\$0	\$70,400	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$69,400	\$1,000	\$0	\$70,400	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,200	\$800	\$0	\$55,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$54,200	\$800	\$0	\$55,000	
TOTAL				1	\$123,600	\$1,800	\$0	\$125,400	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1067881228		SIMANCA ARGEL LEWIS MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	12109726	9475603429	I	2024/11/07	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	15	\$125,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	1067881228	SIMANCA ARGEL LEWIS MIGUEL	X																	230301	10	\$433,334	\$69,400	EP5037	10	\$433,334	\$54,200		0	\$0	\$0		0	\$0	\$0	0	\$0	\$0	No	\$123,600	
Total Afiliados(1)																							\$433,334	\$69,400			\$433,334	\$54,200			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0		\$123,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1067881228		SIMANCA ARGEL LEWIS MIGUEL	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	12109726	9475603429	I	2024/11/07	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	15	\$125,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,400	\$800	\$0	\$70,200	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$69,400	\$800	\$0	\$70,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,200	\$600	\$0	\$54,800	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$54,200	\$600	\$0	\$54,800	
TOTAL				1	\$123,600	\$1,400	\$0	\$125,000	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1003451648		TOBAR NUÑEZ LUIS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	12112537	9475603461	I	2024/11/10	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	12	\$124,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																										
EMPLEADO			NOVEDADES																	PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	1003451648	TOBAR NUÑEZ LUIS EDUARDO	X																	230201	10	\$433,334	\$69,400	EP5037	10	\$433,334	\$54,200	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	No	\$123,600
Total Afiliados(1)																							\$433,334	\$69,400			\$433,334	\$54,200			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	\$0		\$123,600

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1003451648		TOBAR NUÑEZ LUIS EDUARDO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	12112537	9475603461	I	2024/11/10	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	12	\$124,700

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,400	\$600	\$0	\$70,000	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$69,400	\$600	\$0	\$70,000	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,200	\$500	\$0	\$54,700	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$54,200	\$500	\$0	\$54,700	
TOTAL				1	\$123,600	\$1,100	\$0	\$124,700	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 2000011774		VALENCIA ACOSTA YONATAN FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Días Mora	Valor
2024-10	2024-10	21222010	9475603495	I	2024/11/17	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	3	\$124,100

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES						
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes	
1	CC	2000011774	VALENCIA ACOSTA YONATAN FABIAN	X																	230301	10	\$433,334	\$69,400	EP5037	10	\$433,334	\$54,200	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	0		\$0	\$0	No	\$123,600
Total		Afiliados(1)																				\$433,334	\$69,400			\$433,334	\$54,200			\$0	\$0			\$0	\$0	\$0	\$0		\$123,600			

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 2000011774		VALENCIA ACOSTA YONATAN FABIAN	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	CLL 14 CRA15	MONTERIA-CORDOBA	3126541245	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave	Tipo	Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-10	21222010	9475603495	I	2024/11/17	2024/11/19	BANCO DE OCCIDENTE	3	\$124,100

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$69,400	\$300	\$0	\$69,700	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	\$69,400	\$300	\$0	\$69,700	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$54,200	\$200	\$0	\$54,400	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	\$54,200	\$200	\$0	\$54,400	
TOTAL				1	\$123,600	\$500	\$0	\$124,100	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901768925	2	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	A - 200 O MAS COTIZANTES	PAVIMENTO BARRANQUILLA	CRA 1 W N 35 35 JUAN XXIII	LOS CORDOBAS-CORDOBA	3167454512	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1049337273	9477276668	E	2024/11/08	2024/11/14	BANCOLOMBIA	6	\$2,887,200

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				11	\$1,428,500	\$6,200	\$0	\$1,434,700	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	3	\$267,000	\$1,200	\$0	\$268,200	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	\$416,000	\$1,800	\$0	\$417,800	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	\$537,500	\$2,300	\$0	\$539,800	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$208,000	\$900	\$0	\$208,900	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$757,500	\$3,300	\$0	\$760,800	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	11	\$757,500	\$3,300	\$0	\$760,800	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				11	\$357,300	\$1,600	\$0	\$358,900	
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	11	\$357,300	\$1,600	\$0	\$358,900	
EPS (ADMINISTRADORAS: 2)				9	\$331,300	\$1,500	\$0	\$332,800	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	4	\$150,900	\$700	\$0	\$151,600	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	5	\$180,400	\$800	\$0	\$181,200	
TOTAL				11	\$2,874,600	\$12,600	\$0	\$2,887,200	

	<p>INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>	 CONSORCIO INGECON-INCO
---	--	--

ANEXO 2. CAPACITACIONES OCTUBRE CTO LP-006-2023 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

CONDICIONES AMBIENTALES HA SAREMAGUILLAS		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, SST Y AMBIENTAL)		Versión: 02 RE-SST-02 Fecha: 30/05/2023 Página 1 de 1	
INDUCCIÓN	☐	CAPACITACIÓN	☐	REUNIÓN	☐
CHARLA	☒	CAPACITADOR: Diana Palacios		FECHA ACTIVIDAD:	13 10 24
TEMA:		Higiene Postural			
No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	
1	Carlos Durango	7 812 123	Operario	Carlos Durango	
2	Yohan Jaramillo	10 766 674	Operario	Yohan Jaramillo	
3	Jesús Quintero	10 365 183	Ayudante	Jesús Quintero	
4	Anderson Nieto	1063651852	Ayudante	Anderson Nieto	
5	Yelson Paez	1003093724	Ayudante	Yelson Paez	
6	Arnoldo Dorio	78700 606	Topografo	Arnoldo Dorio	
7	Yonathan Valencia	2000011774	Ayudante	Yonathan Valencia	
8	Badinton Pineda	78590 713	Operario	Badinton Pineda	
9	Adriana Madera	1042436111	Controladora	Adriana Madera	
10	Carlos Hoyos	1067937700	Operario	Carlos Hoyos	
11	Jorge Simanca	15674663	Maestro	Jorge Simanca	
12	Dulcis Bergara	11 032 341	Operario	Dulcis Bergara	
13	Glenis Polo	42 656803	Controladora	Glenis Polo	
14	Jesús Segura	1067845204	Ayudante	Jesús Segura	
15	Lewis Simanca	1067881228	Operario	Lewis Simanca	
16	Talder Moreno	1007357209	Ayudante	Talder Moreno	
17	Edwar Gonzalez	1063653635	Ayudante	Edwar Gonzalez	
18	Jairo Julio	11 032 204	Ayudante	Jairo Javier Julio	
19	Luis Nuñez	1003457648	Ayudante	Luis Nuñez	
20	Jorge Ruiz	1003093153	Ayudante	Jorge Ruiz	
21	Jorge Martinez	1033375649	Ayudante	Jorge Martinez	
22	Elkin Gonzalez	1193143435	Ayudante	Elkin Gonzalez	
23	Pascual Cavallia	70 531 232	Ayudante	Pascual Cavallia	


 JHON RENE MONTES
 PROFESIONAL PGIO



 DIANA PALACIOS
 AUX SIS0

 LONCELO MONTE Y AMBIENTE		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, SST Y AMBIENTAL)		Versión 02 RE-SST-02 Fecha 30/05/2023 Página 1 de 1
INDUCCIÓN ☐	CAPACITACIÓN ☒	REUNIÓN ☐	FECHA ACTIVIDAD: 4 10 24	
CHARLA ☐	CAPACITADOR: Diana Palacios		DURACIÓN:	10 min
TEMA: Manejo de extintores				
No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Carlos Durango	7 812 123	Operario	Carlos Durango
2	Yosnu Jaramila	10 766 674	Operario	Yosnu Jaramila
3	Jesús Quintero	10 365 183	Ayudante	Jesús Quintero
4	Anderson Nieto	1063651852	Ayudante	Anderson Nieto
5	Yelson Paez	1003093724	Ayudante	Yelson Paez
6	Armilo Porio	78700 606	Topografo	Armilo Porio
7	Yonathan Valencia	2000011774	Ayudante	Yonathan Valencia
8	Badinton Pineda	78590 713	Operario	Badinton Pineda
9	Adriana Madera	1042436111	Controladora	Adriana Madera
10	Carlos Hoyos	1067937700	Operario	Carlos Hoyos
11	Jorge Simanca	15674663	Maestro	Jorge Simanca
12	Dulcis Lergara	11 032 341	Operario	Dulcis Lergara
13	Glenis Polo	42 656803	Controladora	Glenis Polo
14	Jesús Segura	1067845204	Ayudante	Jesús Segura
15	Lewis Simanca	1067881228	Operario	Lewis Simanca
16	Jaidier Moreno	1007357209	Ayudante	Jaidier Moreno
17	Edwar Gonzalez	1063653635	Ayudante	Edwar Gonzalez
18	Jairo Julio	11 032 204	Ayudante	Jairo Javier Julio
19	Luis Nuñez	1 003 457 648	Ayudante	Luis Eduardo Nuñez
20	Jorge Ruiz	1003 093153	Ayudante	Jorge Ruiz Ramos
21	Jorge Martinez	1033375649	Ayudante	Jorge Martinez
22	Elkin Gonzalez	1193143435	Ayudante	Elkin Gonzalez
23	Paswal Cavallia	70 531 232	Ayudante	Paswal Cavallia


 JHON RENÉ MONTES
 PROFESIONAL PGIO


 DIANA PALACIOS
 AUX SIS0

 CONECCO MINISTRO DEL AMBIENTE		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, SST Y AMBIENTAL)		Versión: 02 RE-SST-02 Fecha 30/05/2023 Página 1 de 1
INDUCCIÓN ☐ CHARLA ☐	CAPACITACIÓN ☒ CAPACITADOR: Diana Palacios	REUNIÓN ☐	FECHA ACTIVIDAD: 8 10 24 DURACIÓN: 10: min	
TEMA: Seguridad vial				
No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Carlos Durango	7 812 123	Operario	Carlos Durango
2	Yosany Jaramillo	10 766 674	Operario	Yosany Jaramillo
3	Jesús Quintero	10 365 183	Ayudante	Jesús Quintero
4	Anderson Nieto	1063651852	Ayudante	Anderson Nieto
5	Yelson Pérez	1003093724	Ayudante	Yelson Pérez
6	Armilo Pardo	78 700 606	Topógrafo	Armilo Pardo
7	Yonathan Valencia	2000011774	Ayudante	Yonathan Valencia
8	Badinton Pinecla	78 590 713	Operario	Badinton Pinecla
9	Adriana Macera	1042436111	Controladora	Adriana Macera
10	Carlos Hoyos	1067937700	Operario	Carlos Hoyos
11	Jorge Simanca	15674663	Maestro	Jorge Simanca
12	Dulvis Vergara	11 032 341	Operario	Dulvis Vergara
13	Glenis Polo	42 656803	Controladora	Glenis Polo
14	Jesús Segura	1067845204	Ayudante	Jesús Segura
15	Lewis Simanca	1067881228	Operario	Lewis Simanca
16	Taidar Moreno	1007357209	Ayudante	Taidar Moreno
17	Eduar Gonzalez	1063653635	Ayudante	Eduar Gonzalez
18	Jairo Julio	11 032 204	Ayudante	Jairo Javier Julio
19	Luis Nuñez	1003457648	Ayudante	Luis Eduardo Nuñez
20	Jorge Ruiz	1003093153	Ayudante	Jorge I Ruiz Ramos
21	Jorge Martínez	1033375649	Ayudante	Jorge Simoni Martínez
22	Elkin Gonzalez	1193143435	Ayudante	Elkin Gonzalez
23	Pasqual Cavallia	70 531 232	Ayudante	Pasqual Cavallia


 JHON RENE MONTES
 PROFESIONAL PGIO



 DIANA PALACIOS
 AUX SISO

 CONECHO PREVENIO DEL AMBIENTE		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, SST Y AMBIENTAL)		Versión: 02 RE-SST-02 Fecha: 30/05/2023 Página: 1 de 1
INDUCCIÓN ☒	CAPACITACIÓN ☐	REUNIÓN ☐	FECHA ACTIVIDAD: 9 10 2024	
CHARLA ☐	CAPACITADOR: Diana Palacios		DURACIÓN:	10 min
TEMA: Seguridad y salud en el trabajo SG SST				
No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA
1	Carlos Durango	7 812 123	Operario	Carlos Durango
2	Yosnu Jaramillo	10 766 674	Operario	Yosnu Jaramillo
3	Jesús Quintero	10 365 183	Ayudante	Jesús Quintero
4	Anderson Nieto	1063651852	Ayudante	Anderson Nieto
5	Yelson Pérez	1003093724	Ayudante	Yelson Pérez
6	Armilo Porio	78700 606	Topografo	Armilo Porio
7	Yonathan Valencia	2000011774	Ayudante	Yonathan Valencia
8	Badinton Pinecla	78590713	Operario	Badinton Pinecla
9	Adriana Madera	1042436111	Controladora	Adriana Madera
10	Carlos Hoyos	1067937700	Operario	Carlos Hoyos
11	Jorge Simanca	15674663	Maestro	Jorge Simanca
12	Dulcis Vergara	11 032 341	Operario	Dulcis Vergara
13	Glenis Polo	42 656803	Controladora	Glenis Polo
14	Jesús Segura	1067845204	Ayudante	Jesús Segura
15	Lewis Simanca	1067881228	Operario	Lewis Simanca
16	Jaidier Moreno	1007357209	Ayudante	Jaidier Moreno
17	Edwar Gonzalez	1063653635	Ayudante	Edwar Gonzalez
18	Jairo Julio	11 032 204	Ayudante	Jairo Javier Julio
19	Luis Nuñez	1 003 457 648	Ayudante	Luis Eduardo Nuñez
20	Jorge Ruiz	1003 093153	Ayudante	Jorge L Ruiz Ramos
21	Jorge Martínez	1033375649	Ayudante	Jorge Martínez
22	Elkin Gonzalez	1193143435	Ayudante	Elkin Gonzalez
23	Pascual Cavallia	70 531 232	Ayudante	Pascual Cavallia


 SHÓN RENÉ MONTES
 PROFESIONAL PGIO


 DIANA PALACIOS
 AUX SISO

		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, SST Y AMBIENTAL)		Versión: 02 RE-SST-02 Fecha: 30/05/2023 Página 1 de 1	
INDUCCIÓN ☐		CAPACITACIÓN ☐		REUNIÓN ☐	
CHARLA ☒		CAPACITADOR: Diana Palacios		FECHA ACTIVIDAD: 11 10 24	
DURACIÓN: 8 min					
TEMA: Manejo Seguro de cargas					
No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	
1	Carlos Durango	7 812 123	Operario	Carlos Durango	
2	Yosnu Jaramillo	10 766 674	Operario	Yosnu Jaramillo	
3	Jesús Quintero	10 365 183	Ayudante	Jesús Quintero	
4	Anderson Nieto	1063651852	Ayudante	Anderson Nieto	
5	Yelson Paez	1003093724	Ayudante	Yelson Paez	
6	Armilo Dorio	78700606	Topografo	Armilo Dorio	
7	Yonathan Valencia	2000011774	Ayudante	Yonathan Valencia	
8	Badinton Pineda	78590713	Operario	Badinton Pineda	
9	Adriana Macera	1042436111	Controladora	Adriana Macera	
10	Carlos Hoyos	1067937700	Operario	Carlos Hoyos	
11	Jorge Simanca	15674663	Maestro	Jorge Simanca	
12	Dulcis Vergara	11 032 341	Operario	Dulcis Vergara	
13	Glenio Polo	42 656803	Controlador	Glenio Polo	
14	Jesús Segura	1067845204	Ayudante	Jesús Segura	
15	Lewis Simanca	1067881228	Operario	Lewis Simanca	
16	Jaidier Moreno	1007357209	Ayudante	Jaidier Moreno	
17	Eduar Gonzalez	1063653655	Ayudante	Eduar Gonzalez	
18	Jairo Julio	11 032 204	Ayudante	Jairo Julio	
19	Luis Nuñez	1 003 457 648	Ayudante	Luis Nuñez	
20	Jorge Ruiz	1003093153	Ayudante	Jorge Ruiz	
21	Jorge Martinez	1033375649	Ayudante	Jorge Martinez	
22	Elkin Gonzalez	1193143435	Ayudante	Elkin Gonzalez	
23	Pascual Cavallia	70 531 232	Ayudante	Pascual Cavallia	


 JHON RENE MONTES
 PROFESIONAL PGIO


 DIANA PALACIOS
 AUX SIS0

		SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, SST Y AMBIENTAL)		Versión: 02 RE-SST-02 Fecha: 30/05/2023 Página 1 de 1	
INDUCCIÓN ☐		CAPACITACIÓN ☐		REUNIÓN ☐	
CHARLA ☒		CAPACITADOR: Diana Palacios		FECHA ACTIVIDAD: 17 10 24	
DURACIÓN: 10 min					
TEMA: Manejo de Residuos sólidos					
No.	NOMBRE	IDENTIFICACION	CARGO	FIRMA	
1	Carlos Durango	7 812 123	Operario	Carlos Durango	
2	Yosany Jaramillo	10 766 674	Operario	Yosany Jaramillo	
3	Jesús Quintero	10 365 183	Ayudante	Jesús Quintero	
4	Anderson Nieto	1063651852	Ayudante	Anderson Nieto	
5	Yerison Paez	1003093724	Ayudante	Yerison Paez	
6	Armilo Dorio	78700606	Topografo	Armilo Dorio	
7	Yonathan Valencia	2000011774	Ayudante	Yonathan Valencia	
8	Badinton Pinecla	78590713	Operario	Badinton Pinecla	
9	Adriana Maclera	1042436111	Controladora	Adriana Maclera	
10	Carlos Hoyos	1067937700	Operario	Carlos Hoyos	
11	Jorge Simanca	15674663	Maestro	Jorge Simanca	
12	Dulio Vergara	11 032 341	Operario	Dulio Vergara	
13	Glenis Polo	42 656803	Controladora	Glenis Polo	
14	Jesús Segura	1067845204	Ayudante	Jesús Segura	
15	Lewis Simanca	1067881228	Operario	Lewis Simanca	
16	Taidor Moreno	1007357209	Ayudante	Taidor Moreno	
17	Edwar Gonzalez	1063653635	Ayudante	Edwar Gonzalez	
18	Jairo Julio	11 032 204	Ayudante	Jairo Julio	
19	Luis Nuñez	1 003 451 648	Ayudante	Luis Nuñez	
20	Jorge Ruiz	1003093153	Ayudante	Jorge Ruiz	
21	Jorge Martinez	1033375649	Ayudante	Jorge Martinez	
22	Elkin Gonzalez	1193143435	Ayudante	Elkin Gonzalez	
23	Pascual Cavallia	70531271	Ayudante	Pascual Cavallia	


 RENÉE MONTES
 PROFESIONAL PGIO


 DIANA PALACIOS
 AUX SISO

	<p>INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>	 CONSORCIO INGECON-INCO
---	--	--

ANEXO 3. INSPECCIONES OCTUBRE CTO LP-006-2023 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

	FORMATO INSPECCIÓN DE BOTIQUINES Y CAMILLAS	Código	AP4P5
		Versión	02
		Fecha de Actualización	2024/09/23

Ubicación del botiquín	Exterior, Bodega	Ubicación de la camilla	EXT Bodega
------------------------	------------------	-------------------------	------------

Marque con una X según las condiciones observadas:

El botiquín se encuentra instalado en la pared?	SI	X	NO	Localizado en lugar visible?	SI	X	NO
El botiquín se encuentra libre de obstáculos?	SI	X	NO	El botiquín se encuentra señalizado?	SI	X	NO
Fecha de recepción de elementos del botiquín	22/05/24			El botiquín es de:	Lona	X	Metálico

Bueno	B	-	Regular	R	-	Malo	M
-------	---	---	---------	---	---	------	---

INSPECCIÓN DE BOTIQUINES							
Descripción del elemento del botiquín de primeros auxilios	B	R	M	No tiene	Cantidad	Observaciones	
1 Estado del botiquín	X					Disponible para usar cuando se requiere.	
2 Manual uso de botiquín	X						
3 Collar cervical	X						
4 Guantes de látex / nitrilo	X						
5 Lodopovidona solución	X						
6 Suero fisiológico	X						
7 Gasa estéril	X						
8 Aposito de algodón estéril	X						
9 Venda triangular tipo cabestrillo				X			
10 Venda de algodón				X			
11 Venda elástica	X						
12 Tapabocas	X						
13 Esparadrapo de tela				X			
14 Esparadrapo micropore	X						
15 Aplicadores de algodón	X						
16 Curas	X						
17 Bajalenguas	X						
18 Parches oculares	X						
19 Termómetro				X			
20 Linterna				X			
21 Tijera trauma				X			
22 Mascara de reanimación RCP				X			
23 Alcohol acéptico	X						
24							
25							

* Nota: Solo se deben tener medicamentos en el botiquín si existe personal entrenado para suministrarlos (médico o enfermera)

INSPECCIÓN DE CAMILLA							
Descripción del elemento	B	R	M	No tiene	Observaciones		
1 Instalación (Sitio de ubicación)	X				Lista para usar cuando se requiere.		
2 Señalización	X						
3 Estado del soporte	X						
4 Correas de seguridad	X						
5 Sujetadores para agarre	X						
6 Juego de inmovilizadores de miembro inferior y superior	X						

Otras observaciones:

Inspeccionó:	
Nombre:	DIANA PALACIOS
Firma:	
Cargo:	AUX SISO



CONSORCIO PAVIMENTO
VIA BARRANQUILLITA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, SST Y
AMBIENTAL)

Versión: 02

RF-SST-02

Fecha: 30/05/2023

FORMATO DE INSPECCIONES LOCATIVAS

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

CONTRATO N°: LP 006 DE 2023

OBRA/PROYECTO: MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE
LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

FECHA: 02/10/2024

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
GENERALES				
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejados de focos de contaminación y salubridad	X			
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	X			
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de animales o personas			X	
Los accesos se encuentran limpios, son materiales adecuados y se encuentran en buen estado			X	
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas			X	
Los alrededores están libres de basura y aguas estancadas	X			
Se encuentran claramente señaladas las diferentes áreas, de acceso, circulación de personas, servivio, seguridad, salida de emergencia	X			
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado			X	
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles y roturas			X	
Las ventanas se encuentran en buen estado (incluye estado de marcos y vidrios)			X	
Las puertas se encuentran en buen estado (incluye estado de marcos y vidrios)			X	
INSTALACIONES				
La temperatura ambiental y la ventilación son las adecuadas y no afectan la comodidad de las personas			X	
La iluminación es adecuada para cada labor desarrollada en cada uno de los espacios de las instalaciones			X	
INSTALACIONES SANITARIAS				

Las oficinas cuentan con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente separados por sexo, ventilados y en perfecto funcionamiento			X	
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores			X	
CONDICIONES DE SANEAMIENTO				
El agua que se utiliza es potable			X	
El suministro de agua y su presión son adecuadas para todas las operaciones de las instalaciones			X	
El tanque de almacenamiento de agua está protegido, es de capacidad suficiente, se le hace limpieza y se desinfecta periódicamente			X	
Limpieza, desinfección y control de plagas			X	
Existen procedimientos específicos de limpieza y desinfección			X	
				
Firma del responsable				



CONSORCIO PAVIMENTO
VIA BARRANQUILLITA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, SST Y
AMBIENTAL)

Versión: 02

RF-SST-02

Fecha: 30/05/2023

FORMATO DE INSPECCIONES LOCATIVAS

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

CONTRATO N°: LP 006 DE 2023

OBRA/PROYECTO: MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE
LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

FECHA: 9/10/2024

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
GENERALES				
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejados de focos de contaminación y salubridad	X			
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	X			
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de animales o personas			X	
Los accesos se encuentran limpios, son materiales adecuados y se encuentran en buen estado			X	
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas			X	
Los alrededores están libres de basura y aguas estancadas	X			
Se encuentran claramente señaladas las diferentes áreas, de acceso, circulación de personas, servivio, seguridad, salida de emergencia	X			
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado			X	
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles y roturas			X	
Las ventanas se encuentran en buen estado (incluye estado de marcos y vidrios)			X	
Las puertas se encuentran en buen estado (incluye estado de marcos y vidrios)			X	
INSTALACIONES				
La temperatura ambiental y la ventilación son las adecuadas y no afectan la comodidad de las personas			X	
La iluminación es adecuada para cada labor desarrollada en cada uno de los espacios de las instalaciones			X	
INSTALACIONES SANITARIAS				

Las oficinas cuentan con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente separados por sexo, ventilados y en perfecto funcionamiento			X	
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores			X	
CONDICIONES DE SANEAMIENTO				
El agua que se utiliza es potable			X	
El suministro de agua y su presión son adecuadas para todas las operaciones de las instalaciones			X	
El tanque de almacenamiento de agua está protegido, es de capacidad suficiente, se le hace limpia y se desinfecta periódicamente			X	
Limpieza, desinfección y control de plagas			X	
Existen procedimientos específicos de limpieza y desinfección			X	
				
Firma del responsable				

	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, SST Y AMBIENTAL)		Versión: 02		
			RF-SST-02		
			Fecha 30/05/2023		
FORMATO DE INSPECCIONES LOCATIVAS					
CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA					
CONTRATO N°: LP 006 DE 2023					
OBRA/PROYECTO: MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA					
FECHA: 16/10/2024					
DESCRIPCIÓN		SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
GENERALES					
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejados de focos de contaminación y salubridad		X			
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios		X			
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de animales o personas				X	
Los accesos se encuentran limpios, son materiales adecuados y se encuentran en buen estado				X	
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas				X	
Los alrededores están libres de basura y aguas estancadas		X			
Se encuentran claramente señaladas las diferentes áreas, de acceso, circulación de personas, servivio, seguridad, salida de emergencia		X			
Las paredes se encuentran limpas y la pintura se mantiene en buen estado				X	
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles y roturas				X	
Las ventanas se encuentran en buen estado (incluye estado de marcos y vidrios)				X	
Las puertas se encuentran en buen estado (incluye estado de marcos y vidrios)				X	
INSTALACIONES					
La temperatura ambiental y la ventilación son las adecuadas y no afectan la comodidad de las personas				X	
La iluminación es adecuada para cada labor desarrollada en cada uno de los espacios de las instalaciones				X	
INSTALACIONES SANITARIAS					

Las oficinas cuentan con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente separados por sexo, ventilados y en perfecto funcionamiento			X	
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores			X	
CONDICIONES DE SANEAMIENTO				
El agua que se utiliza es potable			X	
El suministro de agua y su presión son adecuadas para todas las operaciones de las instalaciones			X	
El tanque de almacenamiento de agua está protegido, es de capacidad suficiente, se le hace limpia y se desinfecta periódicamente			X	
Limpieza, desinfección y control de plagas			X	
Existen procedimientos específicos de limpieza y desinfección			X	
				
Firma del responsable				



SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, SST Y AMBIENTAL)

Versión: 02

RF-SST-02

Fecha 30/05/2023

FORMATO DE INSPECCIONES LOCATIVAS

CONTRATISTA: CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

CONTRATO N°: LP 006 DE 2023

OBRA/PROYECTO: MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

FECHA: 23/10/2024

DESCRIPCIÓN	SI	NO	N.A.	OBSERVACIONES
GENERALES				
Las instalaciones están ubicadas en un lugar alejados de focos de contaminación y salubridad	X			
La construcción ofrece protección del medio ambiente a los funcionarios	X			
Las oficinas presentan aislamiento y protección contra el libre acceso de animales o personas			X	
Los accesos se encuentran limpios, son materiales adecuados y se encuentran en buen estado			X	
Se controla el crecimiento de maleza alrededor de las oficinas			X	
Los alrededores están libres de basura y aguas estancadas	X			
Se encuentran claramente señaladas las diferentes áreas, de acceso, circulación de personas, servicio, seguridad, salida de emergencia	X			
Las paredes se encuentran limpias y la pintura se mantiene en buen estado			X	
Los pisos y paredes se encuentran en buen estado, sin grietas, perforaciones, desniveles y roturas			X	
Las ventanas se encuentran en buen estado (incluye estado de marcos y vidrios)			X	
Las puertas se encuentran en buen estado (incluye estado de marcos y vidrios)			X	
INSTALACIONES				
La temperatura ambiental y la ventilación son las adecuadas y no afectan la comodidad de las personas			X	
La iluminación es adecuada para cada labor desarrollada en cada uno de los espacios de las instalaciones			X	
INSTALACIONES SANITARIAS				

Las oficinas cuentan con servicios sanitarios bien ubicados, en cantidad suficiente separados por sexo, ventilados y en perfecto funcionamiento			X	
Existe un lugar adecuado para el consumo de alimentos de los trabajadores			X	
CONDICIONES DE SANEAMIENTO				
El agua que se utiliza es potable			X	
El suministro de agua y su presión son adecuadas para todas las operaciones de las instalaciones			X	
El tanque de almacenamiento de agua está protegido, es de capacidad suficiente, se le hace limpia y se desinfecta periódicamente			X	
Limpeza, desinfección y control de plagas			X	
Existen procedimientos específicos de limpieza y desinfección			X	
				
Firma del responsable				



CONSEJO PRIVADO
DE SEGURIDAD

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, SST Y AMBIENTAL)

Código A-P3-F7

INSPECCIÓN ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA

Versión:02

Fecha: 30/05/2023

Si cumple marque con un ☒

Si no cumple marque con ☒

05 10 24

ITEM	NORMATIVIDAD REQUERIDA				OBSERVACIONES
		B	M	NA	
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS					
1	Existen canecas de reciclaje separadas de colores, para el reciclaje.	X			
2	Se disponen los desechos en las canecas de reciclaje acorde con el color.	X			
MANEJO DE ESCOMBROS					
3	El material de escombros se acopia en un sitio específico de la obra.	X			
4	Se retira oportunamente los escombros de los sitios de trabajo.	X			
5	El total de escombros supera la cantidad de 5m3.			X	
ORDEN					
6	Todas las herramientas y equipos permanecen en sus sitios de almacenamiento al terminar la jornada.	X			
7	Se archivan de forma cronológica los documentos, AZ y libros en estantes.			X	
8	Se ubican adecuadamente los libros, AZ y documentos en estantes.			X	
ASEO Y LIMPIEZA					
9	Los vestidores permanecen limpios y propios para su uso.			X	
10	Los sitios de trabajo (computadores, escritorios, sillas), se encuentran limpios.			X	
11	Los extintores, camillas y botiquines se encuentran libres de materiales y objetos que eviten el acceso a ellos.				
12	Las rutas de evacuación se encuentran libres de objetos, permitiendo el libre paso.	X			
13	Los baños se encuentran limpios, aseados y organizados y se realiza mantenimiento dos veces por semana.			X	
TOTAL					

TOTAL

NOMBRE QUIEN REALIZA INSPECCIÓN:
JHON RENE MONTES

CARGO:
PROFESIONAL PGIO

FIRMA

[Firma]

INDICADOR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Número de condiciones positivas encontradas

x 100

Número total de condiciones definidas

Número de condiciones positivas encontradas=

porcentaje cumplimiento =

Total de condiciones definidas =

OBSERVACIONES:

Firma Responsable

[Firma]



CONSORCIO INTERMUNICIPAL
DE LA ZONA NOROCCIDENTAL

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, SST Y AMBIENTAL)

Código A-P3-F7

INSPECCIÓN ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA

Versión:02

Fecha: 30/05/2023

Si cumple marque con un ☒

Si no cumple marque con un ☐

12 10 24

ITEM	NORMATIVIDAD REQUERIDA	CLASIFICACIÓN DE RESUPOS			OBSERVACIONES
		B	M	NA	
CLASIFICACIÓN DE RESUPOS					
1	Existen canchales de reciclaje separados de colores, para el reciclaje.	X			
2	Se disponen los desechos en las canchales de reciclaje acorde con el color.	X			
MANEJO DE ESCOMBROS					
3	El material de escombros se acopia en un sitio específico de la obra.	X			
4	Se retira oportunamente los escombros de los sitios de trabajo.	X			
5	El total de escombros supera la cantidad de 6m3.			X	
ORDEN					
6	Todas las herramientas y equipos permanecen en sus sitios de almacenamiento al terminar la jornada.	X			
7	Se archivan de forma cronológica los documentos, AZ y libros en estantes.			X	
8	Se ubican adecuadamente los libros, AZ y documentos en estantes.			X	
ASEO Y LIMPIEZA					
9	Los vestidores permanecen limpios y propios para su uso.			X	
10	Los sitios de trabajo (computadores, escritorios, sillas), se encuentran limpios.			X	
11	Los extintores, camillas y botiquines se encuentran libres de materiales y objetos que eviten el acceso a ellos.	X			
12	Las rutas de evacuación se encuentran libres de objetos, permitiendo el libre paso.	X			
13	Los baños se encuentran limpios, aseados y organizados y se realiza mantenimiento dos veces por semana.			X	
TOTAL					
NOMBRE QUIEN REALIZA INSPECCIÓN: JHON RENE MONTES		CARGO: PROFESIONAL PGIO			FIRMA

INDICADOR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO

Número de condiciones positivas encontradas

Número total de condiciones definidas

x 100

Número de condiciones positivas encontradas=

porcentaje cumplimiento =

Total de condiciones definidas =

OBSERVACIONES:

Firma Responsable

 <p>UNIVERSIDAD PRIVADA DEL PACÍFICO</p>	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, SST Y AMBIENTAL)			Código A-P3-F7
	INSPECCIÓN ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA			Versión: 02
				Fecha: 30/05/2023

Si cumple marque con un ☒
Si no cumple marque con un ☐


19 10 24

ITEM	NORMATIVIDAD REQUERIDA	CLASIFICACIÓN DE RESUPOS			OBSERVACIONES
		B	M	NA	
CLASIFICACIÓN DE RESUPOS					
1	Existen canchales de reciclaje separados por colores, para el reciclaje.	X			
2	No disponen los desechos en las canchales de reciclaje acorde con el color.	X			
MANEJO DE ESCOMBROS					
3	El material de escombros se acopia en un sitio específico de la obra.	X			
4	Se retira oportunamente los escombros de los sitios de trabajo.	X			
5	El total de escombros supera la cantidad de 5m3.			X	
ORDEN					
6	Todas las herramientas y equipos permanecen en sus sitios de almacenamiento al terminar la jornada.	X			
7	Se archivan de forma cronológica los documentos, AZ y libros en estantes.			X	
8	Se ubican adecuadamente los libros, AZ y documentos en estantes.			X	
ASEO Y LIMPIEZA					
9	Los vestidores permanecen limpios y propios para su uso.			X	
10	Los sitios de trabajo (computadores, escritorios, sillas), se encuentran limpios.			X	
11	Los extintores, camillas y botiquines se encuentran libres de materiales y objetos que eviten el acceso a ellos.	X			
12	Las rutas de evacuación se encuentran libres de objetos, permitiendo el libre paso.	X			
13	Los baños se encuentran limpios, aseados y organizados y se realiza mantenimiento dos veces por semana.			X	
TOTAL					

NOMBRE QUIEN REALIZA INSPECCIÓN:
JHON RENE MONTES

CARGO:
PROFESIONAL PGIO


FIRMA



INDICADOR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO	Número de condiciones positivas encontradas _____ x 100 Número total de condiciones definidas
Número de condiciones positivas encontradas=	porcentaje cumplimiento =
Total de condiciones definidas =	

OBSERVACIONES:

Firma Responsable





UNIVERSIDAD
DE LA GUAYANA

SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL (CALIDAD, SST Y AMBIENTAL)

Código A-P3-F7

INSPECCIÓN ORDEN, ASEO Y LIMPIEZA

Versión:02

Fecha: 30/05/2023

Si cumple marque con un ☒

Si no cumple marque con ☐

26 10 24

ITEM	NORMATIVIDAD REQUERIDA	CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS			OBSERVACIONES
		S	M	NA	
CLASIFICACIÓN DE RESIDUOS					
1	Existen canecas de reciclaje separadas de colores, para el reciclaje.	X			
2	Se disponen los desechos en las canecas de reciclaje acorde con el color.	X			
MANEJO DE ESCOMBROS					
3	El material de escombros se acopia en un sitio específico de la obra.	X			
4	Se retira oportunamente los escombros de los sitios de trabajo.	X			
5	El total de escombros supera la cantidad de 6m3.			X	
ORDEN					
6	Todas las herramientas y equipos permanecen en sus sitios de almacenamiento al terminar la jornada.	X			
7	Se archivan de forma cronológica los documentos, A2 y libros en estantes.			X	
8	Se ubican adecuadamente los libros, A2 y documentos en estantes.			X	
ASEO Y LIMPIEZA					
9	Los vestidores permanecen limpios y propios para su uso.			X	
10	Los sitios de trabajo (computadores, escritorios, sillas), se encuentran limpios.			X	
11	Los extintores, camillas y botiquines se encuentran libres de materiales y objetos que eviten el acceso a ellos.	X			
12	Las rutas de evacuación se encuentran libres de objetos, permitiendo el libre paso.	X			
13	Los baños se encuentran limpios, aseados y organizados y se realiza mantenimiento dos veces por semana.			X	
TOTAL					
NOMBRE QUIEN REALIZA INSPECCIÓN: JHON RENE MONTES		CARGO: PROFESIONAL PGIO			FIRMA
INDICADOR PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO				Número de condiciones positivas encontradas _____ Número total de condiciones definidas _____ porcentaje cumplimiento =	
Número de condiciones positivas encontradas=					
Total de condiciones definidas =					
OBSERVACIONES:					
Firma Responsable					

	REGISTRO FOTOGRÁFICO	Código: F-GI-IH-115
		Versión: 03
	INSPECCIONES LOCATIVAS, EXTINTOR- CAMILLA , ORDEN Y ASEO	Fecha de Aprobación: Abril de 2022

CONTRATO DE OBRA PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	
LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO: MUNICIPIO LOS CORDOBAS- CORDOBA	
FECHA (D/M/A):OCTUBRE-2024	
DIRECCIÓN:	
SECTOR: ☒ Vías y Transporte ☐ Social Comunitario ☐ Espacio Público, Recreación y Deporte	
MODALIDAD DE INTERVENCIÓN: ☐ Unidad Sanitaria ☐ Unidad de Cocina ☐ Unidad Habitacional ☐ Pisos ☒ Cierta ☒ Área Aprendizaje	
KIT: ☐ KIT A - Sistema Séptico y Tanque de filtración ☐ KIT B - Tanque de almacenamiento ☐ KIT C -Personas con Discapacidad – Movilidad Reducida (barras y accesorios de apoyo) ☐ KIT D - Adecuaciones Especiales Personas con Discapacidad (eliminación de barreras arquitectónicas para personas con movilidad reducida) - Unidad Cocinas/ Habitacional	
1. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
Texto explicativo de la fotografía y Fecha. Registro fotografico Inspecciones locativas, extintor-camilla, Orden y Aseo	
<div>   </div> <div>   </div>	
Observación Técnica y/o Social (según el caso):	
Observación Técnica y/o Social (según el caso):	
<p>Nota: Garantice que durante cada período se evidencie el cumplimiento de las actividades. Las fotografías debe ser nítidas, a color y bien encuadradas. En este formato se pueden eliminar fotografías para cuando se requiera evidenciar y soportar una situación puntual del Proyecto. Algunos campos no son aplicables a la situación que se desea presentar, en cuyo caso se registrará N.A. (No aplica)</p> <div>  </div>	
Nombre:	Diana palacios
Cargo:	Auxiliar Siso


	<p>INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>	 CONSORCIO INGECON-INCO
---	--	--

ANEXO 4. INDICADORES OCTUBRE CTO LP-006-2023 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS

 CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA pavimentosbarranquillita@gmail.com		CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA					Versión:	1.0
		LOS CORDOBAS					Fecha:	15/12/2023
		NIT.901.768.925-2					Página:	1 de 1
		INDICADORES DE ESTRUCTURA						
ITEM	DEFINICIÓN	INTERPRETACIÓN	LIMITE	CALCULO	FUENTE PARA EL CALCULO	PERIODICIDAD	PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	
1.E	Divulgación de Política del SG-SST	Evalua la cantidad de personal que conoce la Política SST	≥90 % del Personal activo	(Cantidad de personal al que se le divulgo la política / Cantidad total del personal activo) *100	Listas de asistencia a divulgación.	Semestral	Representante Legal - Talento humano - Responsable de SST	
2.E	Divulgación de Objetivos y Metas del SG-SST	Evalua la cantidad de personal que conoce los Objetivos y Metas SST	≥90 % del Personal activo	(Cantidad de personal al que se le divulgo los Objetivos y Metas / Cantidad total del personal activo) *100	Listas de asistencia a divulgación.	Semestral	Representante Legal - Talento humano - Responsable de SST	
3.E	Asignación de Responsabilidades SST	Evalua la cantidad de cargos a los cuales fueron asignadas las responsabilidades del SST	100 % de los cargos de la empresa	(Cantidad de cargos asignados en SST / Cantidad total del personal) *100	Listas de asistencia a divulgación.	Semestral	Todo el personal	
4.E	Asignación de Recursos requeridos para la implementación del SG- SST	Evalua la existencia de los recursos para la implementación del SST	100%	Cumple o No cumple con el recurso y la ejecución del presupuesto SST ?	Presupuesto SST	Anual	Representante Legal	
5.E	Identificación y reporte de actos y condiciones inseguras en el SG-SST	Reporte actos y condiciones inseguras identificadas por los trabajadores	100%	(Cantidad total de actos y condiciones inseguras tabuladas / Cantidad de actos y condiciones inseguras reportadas en SST) * 100	Tarjetas de reporte de actos y condiciones inseguras / tabulación de reporte de actos y condiciones inseguras	Semestral	Todo el personal	
6.E	Conformación y funcionamiento del Vigia de Seguridad	Evalua el grado de cumplimiento de reuniones ejecutadas en el periodo	100% de Reuniones al año	(Cantidad total de actas de reunion firmadas y ejecutadas del VIGIA / Cantidad de Reuniones programadas del VIGIA) * 100	Actas y asistencia del VIGIA Cronograma de reuniones	Semestral	Todo el personal	
7.E	Documentación de soporte del SG-SST	Evalua el grado de cumplimiento de la documentación exigida en el SG-SST	100% de Cumplimiento en la documentación	(Cantidad total de puntos obtenidos en la autoevaluación del SG-SST / Cantidad total de puntos totales exigidos en la auto evaluación del SG-SST) * 100	Auto evaluación del SG-SST	Anual	Representante Legal - Responsable de SST	
8.E	Priorización de recomendaciones sobre el estado de salud de los trabajadores	Evalua el grado de cumplimiento de recomendaciones provenientes de los Diagnosticos de condiciones de salud	≥70% de Cumplimiento de recomendaciones emitidas por las IPS que realizan los EMO	(Cantidad total de recomendaciones cumplidas del dx de condiciones de salud / Cantidad total recomendaciones emitidas por las IPS en el dx de condiciones de salud) * 100	Diagnosticos de condiciones de salud emitidos por las IPS que realizan los Examen Médico Ocupacional (EMO)	Semestral	Representante Legal - Talento humano - Responsable de SST	
9.E	Cobertura del Plan de emergencias	Evalua el grado de cumplimiento en cuanto a divulgación del plan de emergencias	≥90 % del Personal activo	(Cantidad de personal al que se le divulgo el plan de emergencias / Cantidad total del personal activo) * 100	Listas de asistencia a divulgación.	Semestral	Todo el personal	

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR	
Definición	Divulgación de Política del SG-SST
Interpretación	Evalua la cantidad de personal que conoce la Política SST
Cálculo	$(\text{Cantidad de personal al que se le divulgo la política} / \text{Cantidad total del personal activo}) * 100$
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Semestral
Responsable de la Medición	Encargado de seguridad y salud en el trabajo
Meta o Limite:	>90 % del Personal activo
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable 61 a 70%: Aceptable 71 a 80%: Bueno 81 a 90%: Sobresaliente Superior a 90%: Excelente

2. DATOS												
VARIABLES	2024											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(Cantidad de personal al que se le divulgo la política)			6	6	6	8	14	19	24	25		
(Cantidad total del personal activo)			6	6	6	8	14	19	24	25		
Meta	90%											
Divulgación de la Política SG SST	100%											
Estado de Gestion	Excelente											

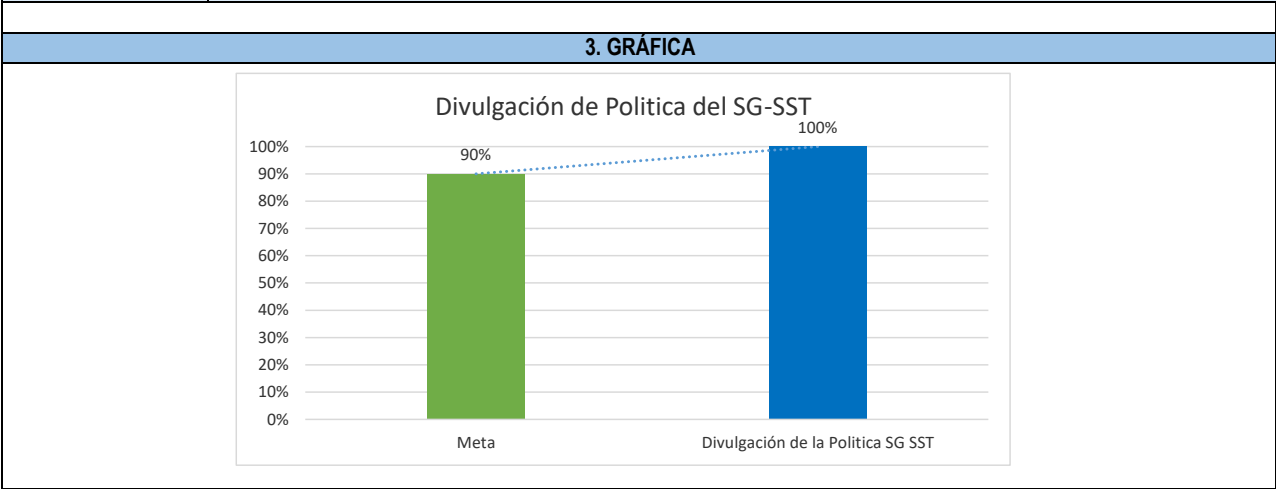


4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS	
1er. semestre 2024	
2do. semestre 2024	

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR																		
Definición	Divulgación de Objetivos y Metas del SG-SST																	
Interpretación	Evalua la cantidad de personal que conoce los Objetivos y Metas SST																	
Cálculo	$(\text{Cantidad de personal al que se le divulgo los Objetivos y Metas} / \text{Cantidad total del personal activo}) \cdot 100$																	
Unidad de medida:	Porcentaje																	
Frecuencia de Medicion	Semestral																	
Responsable de la Medición	Encargado de seguridad y salud en el trabajo																	
Meta o Limite:	>90 % del Personal activo																	
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable 61 a 70%: Aceptable 71 a 80%: Bueno 81 a 90%: Sobresaliente Superior a 90%: Excelente																	
2. DATOS																		
VARIABLES	2024																	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
(Cantidad de personal al que se le divulgo metas y objetivos SST)			6	6	6	8	14	19	24	25								
(Cantidad total del personal activo)			6	6	6	8	14	19	24	25								
Meta	90%																	
Divulgación de Metas y objetivos	100%																	
Estado de Gestion	Excelente																	
3. GRÁFICA																		
<div><p>Divulgación de Objetivos y Metas del SG-SST</p><p>The chart displays two vertical bars. The first bar, labeled 'Meta', is green and reaches the 90% mark on the y-axis. The second bar, labeled 'Divulgación de Metas y objetivos', is blue and reaches the 100% mark. A dotted blue line connects the tops of the two bars, showing an upward trend from 90% to 100%.</p><table><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>Meta</td><td>90%</td></tr><tr><td>Divulgación de Metas y objetivos</td><td>100%</td></tr></table></div>													Categoría	Porcentaje	Meta	90%	Divulgación de Metas y objetivos	100%
Categoría	Porcentaje																	
Meta	90%																	
Divulgación de Metas y objetivos	100%																	

4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS	
1er. Semestre 2024	
2do. semestre 2024	

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR	
Definición	Asignación de Responsabilidades SST
Interpretación	Evalua la cantidad de cargos a los cuales fueron asignadas las responsabilidades del SST
Cálculo	(Cantidad de cargos asignados en SST / Cantidad total del personal) *100
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Semestral
Responsable de la Medicion	Encargado de seguridad y salud en el trabajo
Meta o Limite	100 % de los cargos de la empresa
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable 61 a 70%: Aceptable 71 a 80%: Bueno 81 a 99%: Sobresaliente Superior o igual a 100%: Excelente

2. DATOS												
VARIABLES	2024											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(Cantidad de personal al que se le divulgo plan/cronograma de trabajo)		6	6	6	6	8	14	19	24	25		
(Cantidad total del personal activo)		6	6	6	6	8	14	19	24	25		
Meta	100%											
Asignación de responsabilidades SST	100%											
Estado de Gestion	Sobresaliente											

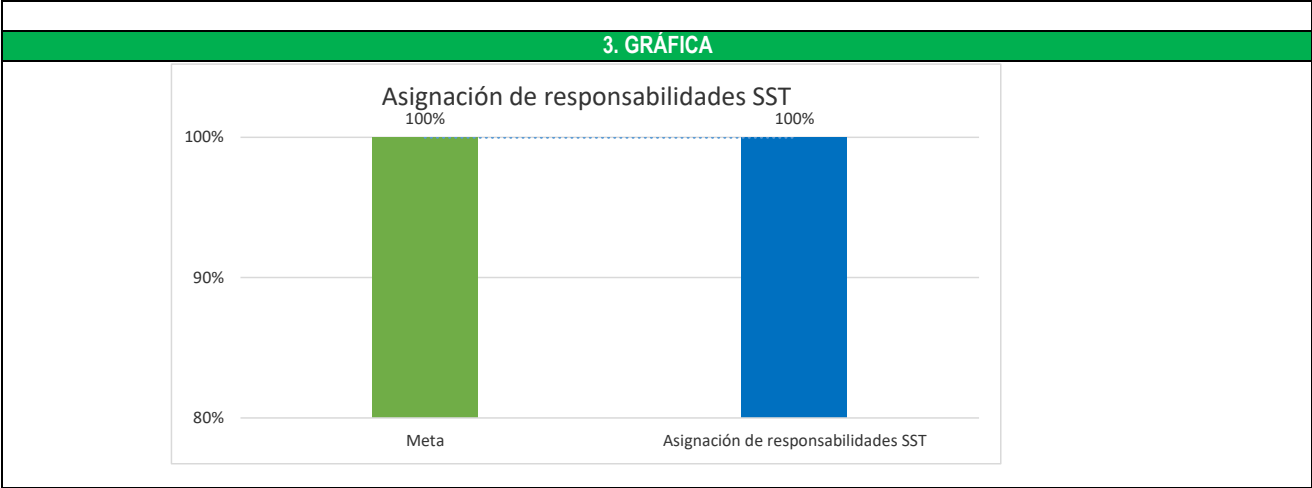

4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS	
1er. semestre 2024	
2do. semestre 2024	

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR	
Definición	Asignación de Recursos requeridos para la implementación del SG- SST
Interpretación	Evalua la existencia de los recursos para la implementación del SST
Cálculo	Cumple o No cumple con el recurso y la ejecución del presupuesto SST ?
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Anual
Responsable de la Medición	Encargado de seguridad y salud en el trabajo
Meta o Limite	100%
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable 61 a 70%: Aceptable 71 a 80%: Bueno 81 a 90%: Sobresaliente Superior a 90%: Excelente

2. DATOS												
VARIABLES	2024											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(Cantidad de presupuesto utilizado)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(Cantidad total del presupuesto)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Meta	100%											
Presupuesto utilizado	-											
Estado de Gestion	Excelente											

3. GRÁFICA


Asignación de Recursos requeridos para la implementación del SG-SST

Categoría	Porcentaje
Meta	100%
Presupuesto utilizado	0%

4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS	
Análisis Anual del Presupuesto SST	

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR	
Definición	Identificación y reporte de actos y condiciones inseguras en el SG-SST
Interpretación	Reporte actos y condiciones inseguras identificadas por los trabajadores
Cálculo	(Cantidad total de actos y condiciones inseguras tabuladas / Cantidad de actos y condiciones inseguras reportadas en SST) * 100
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Semestral
Responsable de la Medición	Encargado de seguridad y salud en el trabajo
Meta o Limite	100%
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable 61 a 70%: Aceptable 71 a 80%: Bueno 81 a 99%: Sobresaliente Superior o igual a 100%: Excelente

2. DATOS												
VARIABLES	2024											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(Cantidad total de actos y condiciones inseguras tabuladas)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(Cantidad de actos y condiciones inseguras reportadas en SST)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Meta	100%											
Actos y Condiciones inseguras tabuladas	-											
Estado de Gestion	Excelente											

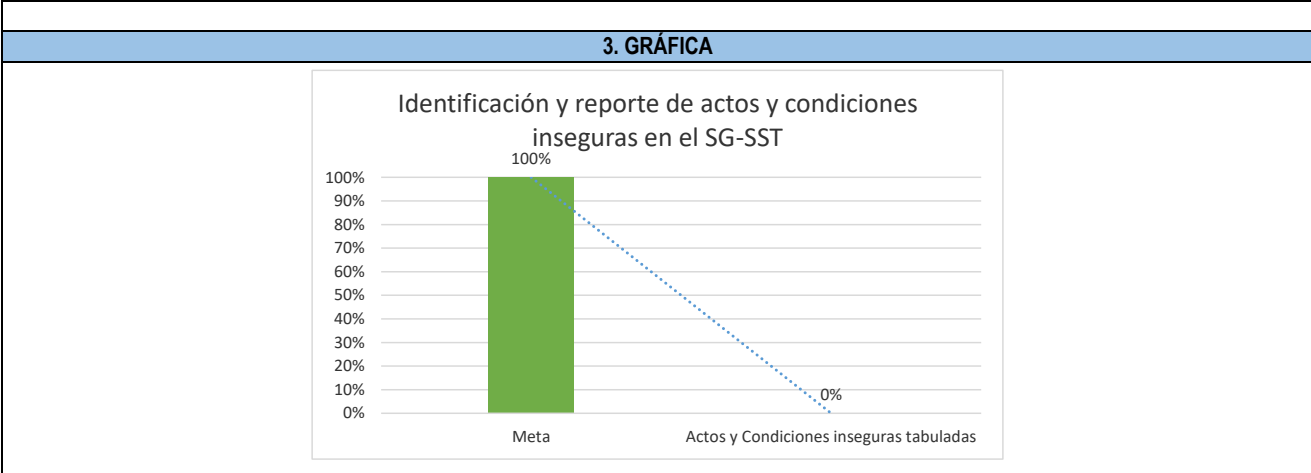

4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS	
1er. semestre 2024	
2do. semestre 2024	


1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR												
Definición	Documentación de soporte del SG-SST											
Interpretación	Evalua el grado de cumplimiento de la documentación exigida en el SG-SST											
Cálculo	(Cantidad total de puntos obtenidos en la autoevaluación del SG-SST / Cantidad total de puntos totales exigidos en la auto evaluación del SG-SST) * 100											
Unidad de medida	Porcentaje											
Frecuencia de la Medición	Anual											
Responsable de la Medición	Encargado de seguridad y salud en el trabajo											
Meta o Limite	100% de Cumplimiento en la documentación											
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable 61 a 70%: Aceptable 71 a 80%: Bueno 81 a 99%: Sobresaliente Superior o igual a 100%: Excelente											
2. DATOS												
VARIABLES	2024											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(Cantidad total de puntos obtenidos en la autoevaluación del SG-SST)			10	10	10	10	10	10	10	10		
(Cantidad total de puntos totales exigidos en la auto evaluación del SG-SST)			10	10	10	10	10	10	10	10		
Meta	100%											
Auto evaluación SST	100%											
Estado de Gestion	Excelente											
3. GRÁFICA												
<div><div>Documentación de soporte del SG-SST</div><div><div>100%</div><div>100%</div></div><div><div>100%</div><div>90%</div><div>80%</div></div><div><div>Meta</div><div>Auto evaluación SST</div></div></div>												

4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS	
Analisis de puntaje anual	

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR	
Definición	Priorización de recomendaciones sobre el estado de salud de los trabajadores
Interpretación	Evalua el grado de cumplimiento de recomendaciones provenientes de los Diagnosticos de condiciones de salud
Cálculo	(Cantidad total de recomendaciones cumplidas del dx de condiciones de salud / Cantidad total recomendaciones emitidas por las IPS en el dx de condiciones de salud) * 100
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Semestral
Responsable de la Medición	Encargado de seguridad y salud en el trabajo
Meta o Limite	>70% de Cumplimiento de recomendaciones emitidas por las IPS que realizan los EMO
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable 61 a 70%: Aceptable 71 a 80%: Bueno 81 a 90%: Sobresaliente Superior a 90%: Excelente

2. DATOS												
VARIABLES	2024											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(Cantidad total de recomendaciones cumplidas del dx de condiciones de salud)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(Cantidad total recomendaciones emitidas por las IPS en el dx de condiciones de salud)		0	0	0	0	0		0	0	0		
Meta	70%											
Recomendaciones cumplidas	-											
Estado de Gestion	Excelente											

3. GRÁFICA

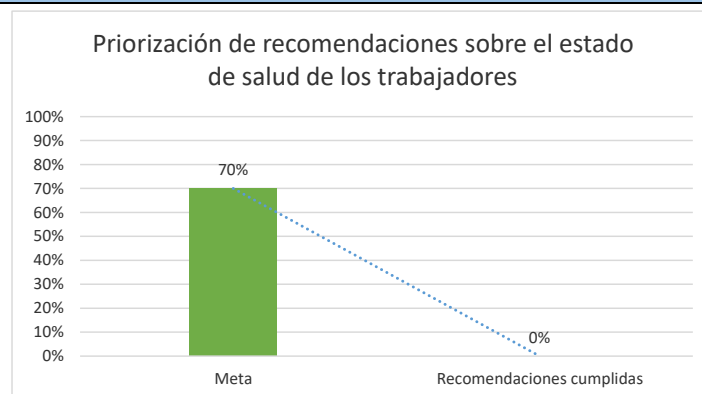

4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS


1er. semestre 2024	
2do. semestre 2024	

	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA		Versión:	1.0
	LOS CORDOBAS		Fecha:	15/12/2023
	NIT.901.768.925-2		Página:	1 de 1
	INDICADORES DE ESTRUCTURA			

ITEM	DEFINICIÓN	INTERPRETACIÓN	LIMITE	CALCULO	FUENTE DEL CALCULO	PERIODICIDAD	PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO
1.P	Ejecución de Plan de Trabajo Anual y su Cronograma	Evalúa la cantidad de actividades ejecutadas en el Plan de Trabajo Anual y su Cronograma de Trabajo del SST	$\geq 90\%$ de Actividades Programadas	$(\text{Cantidad de Actividades Ejecutadas en el Plan de Trabajo Anual y su Cronograma de trabajo} / \text{Cantidad Total de Actividades Programadas}) * 100$	Validación del cronograma/plan de trabajo con responsables y soportes de la ejecución de las mismas	Mensual	Representante Legal / Responsable de SST
2.P	Ejecución del Plan de Capacitaciones SST	Evalúa el grado de cumplimiento de las capacitaciones SST	$\geq 90\%$ del Personal Activo	$(\text{Cantidad de Capacitaciones Ejecutadas en el Periodo} / \text{Cantidad Total de Capacitaciones Programadas}) * 100$	Listas de asistencia a capacitación	Semestral	Representante Legal / Responsable de SST
3.P	Intervención de Peligros Identificados	Evalúa el grado de cumplimiento de recomendaciones provenientes de las matrices de peligros	$\geq 70\%$ de Cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Matriz de Peligros	$(\text{Cantidad total de recomendaciones corregidas por la matriz de peligros} / \text{Cantidad total recomendaciones emitidas por la matriz de peligros}) * 100$	Matriz de peligros	Anual	Representante Legal / Responsable de SST
4.P	Ejecución de actividades generadas de las Investigaciones de ATEL	Evalúa el grado de cumplimiento de las acciones correctivas de los ATEL	$\geq 70\%$ de cumplimiento de recomendaciones emitidas por las investigaciones de los ATEL	$(\text{Cantidad total de recomendaciones corregidas} / \text{Cantidad total recomendaciones emitidas por las investigaciones de los ATEL}) * 100$	Planes de acción de las investigaciones	Trimestral	Todos los trabajadores
5.P	Desarrollo de los PVE	Evalúa el grado de cumplimiento del cronograma de ejecución e implementación de los programas de vigilancia epidemiológica	100%	$(\text{Cantidad total de actividades ejecutadas del PVE} / \text{Cantidad total de actividades propuestas para los PVE}) * 100$	Cronograma de los PVE	Semestral	Representante Legal / Responsable de SST
6.P	Ejecución del Plan de Prevención y Atención de Emergencias	Evalúa el grado de cumplimiento del cronograma de ejecución e implementación del plan de emergencias	$\geq 70\%$ de cumplimiento de ejecución e implementación del plan de emergencias	$(\text{Cantidad de actividades ejecutadas} / \text{Cantidad total de actividades propuestas para la implementación y ejecución del plan de emergencias}) * 100$	Plan de emergencia y cronograma de ejecución	Semestral	Todos los trabajadores

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR	
Definición	Ejecución de Plan de Trabajo Anual y su Cronograma
Interpretación	Evalua la cantidad de actividades ejecutadas en el Plan de Trabajo Anual y su Cronograma de Trabajo del SST
Cálculo	(Cantidad de Actividades Ejecutadas en el Plan de Trabajo Anual y su Cronograma de trabajo / Cantidad Total de Actividades Programadas) * 100
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Mensual
Responsable de la Medición	Encargada de seguridad y salud en el trabajo
Meta o Limite	>90 % de Actividades Programadas
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable 61 a 70%: Aceptable 71 a 80%: Bueno 81 a 90%: Sobresaliente Superior a 90%: Excelente


2. DATOS												
VARIABLES	2024											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(Cantidad de actividades ejecutadas en el Plan de Trabajo Anual y su Cronograma)		0	0	0	2	3	3	3	3	3		
(Cantidad total de actividades programadas)		0	0	0	2	3	3	3	3	3		
Meta	90%											
Ejecución del plan de trabajo	100%											
Estado de Gestion	Excelente											

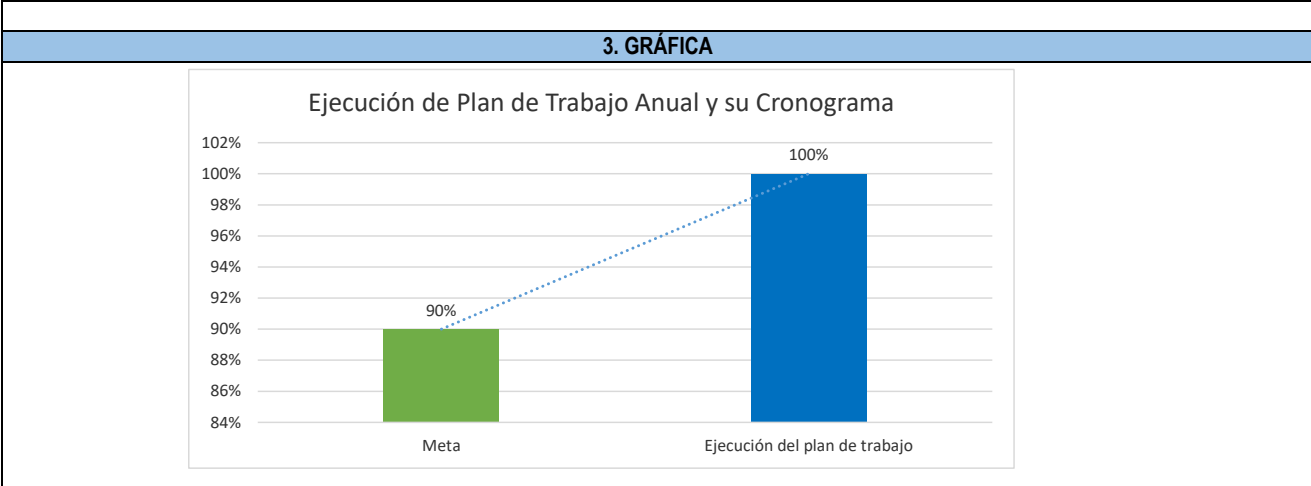

4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS	
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR	
Definición	Ejecución del Plan de Capacitaciones SST
Interpretación	Evalua el grado de cumplimiento de las capacitaciones SST
Cálculo	(Cantidad de Capacitaciones Ejecutadas en el Periodo / Cantidad Total de Capacitaciones Programadas) * 100
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Semestral
Responsable de la Medicion	Encargada de seguridad y salud en el trabajo
Meta o Limite	>90 % del Personal Activo
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable 61 a 70%: Aceptable 71 a 80%: Bueno 81 a 90%: Sobresaliente Superior a 90%: Excelente


2. DATOS												
VARIABLES	2024											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(Cantidad de capacitaciones ejecutadas en el periodo)		0	0	0	0	3	10	9	7	7		
(Cantidad total de capacitaciones programadas)		0	0	0	0	3	10	9	7	7		
Meta	90%											
Ejecución del plan de Capacitaciones	100%											
Estado de Gestion	Excelente											

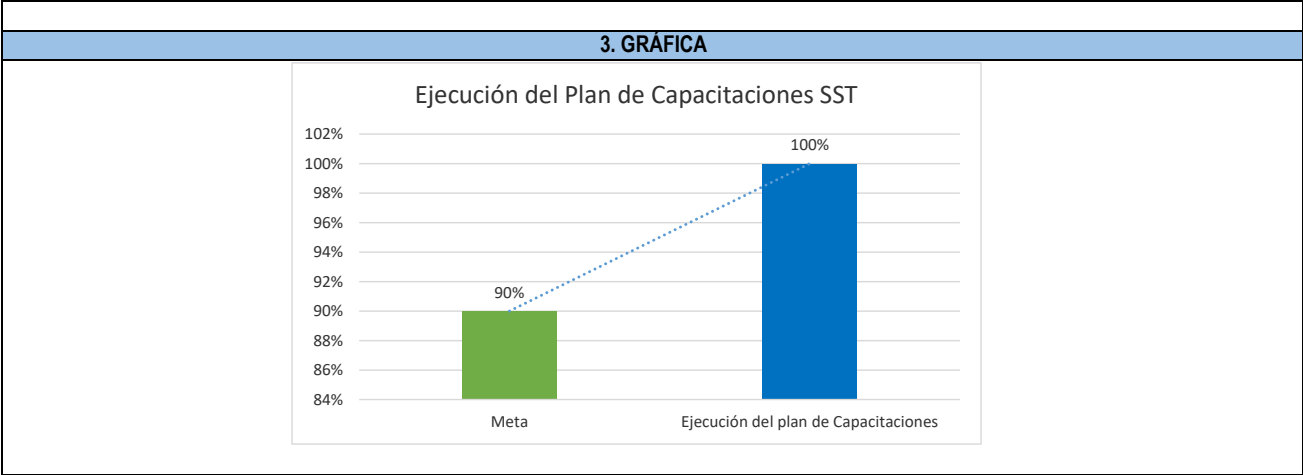

4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS	
1 Semestre 2024	
2 Semestre 2024	

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR	
Definición	Intervención de Peligros Identificados
Interpretación	Evalua el grado de cumplimiento de recomendaciones provenientes de las matrices de peligros
Cálculo	(Cantidad total de recomendaciones corregidas por la matriz de peligros / Cantidad total recomendaciones emitidas por la matriz de peligros) * 100
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de la Medición	Anual
Responsable de Medición	Encargada de seguridad y salud en el trabajo
Meta o Limite	>70% de Cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Matriz de Peligros
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable 61 a 70%: Aceptable 71 a 80%: Bueno 81 a 90%: Sobresaliente Superior a 90%: Excelente


2. DATOS												
VARIABLES	2024											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(Cantidad total de recomendaciones corregidas por la matriz de peligros)		2	2	2	2	2	1	1	1	1		
(Cantidad total recomendaciones emitidas por la matriz de peligros)		2	2	2	2	2	1	1	1	1		
Meta	70%											
Recomendaciones cumplidas	100%											
Estado de Gestion	Excelente											

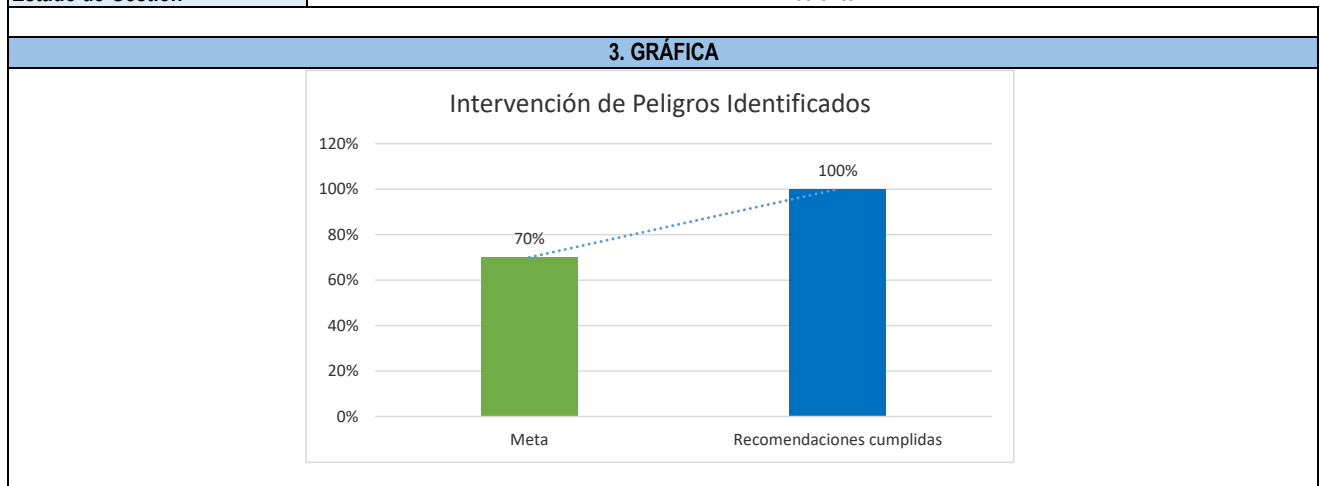

4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS	
<p>Analisis de recomendaciones cumplidas durante el año</p>	

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR	
Definición	Ejecución de actividades generadas de las Investigaciones de ATEL
Interpretación	Evalua el grado de cumplimiento de las acciones correctivas de los ATEL
Cálculo	(Cantidad total de recomendaciones corregidas) / Cantidad total recomendaciones emitidas por las investigaciones de los ATEL) * 100
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Trimestral
Responsable de la Medición	Encargada de seguridad y salud en el trabajo
Meta o Limite	>70% de cumplimiento de recomendaciones emitidas por las investigaciones de los ATEL
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable 61 a 70%: Aceptable 71 a 80%: Bueno 81 a 90%: Sobresaliente Superior a 90%: Excelente

2. DATOS												
VARIABLES	2024											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(Cantidad total de recomendaciones corregidas)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(Cantidad total recomendaciones emitidas por las investigaciones de los ATEL)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Meta	70%											
Recomendaciones cumplidas	-											
Estado de Gestion	Excelente											

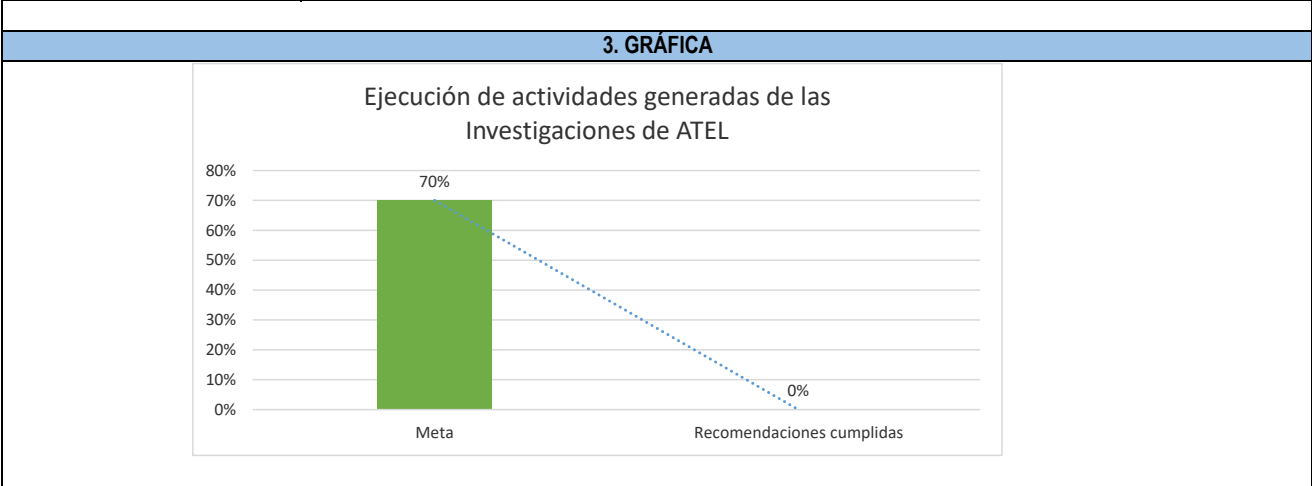

4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS	
Primer Trimestre 2024	
Segundo Trimestre 2024	
Tercer Trimestre 2024	
Cuarto Trimestre 2024	

1. INFORMACIÓN DEL INDICADOR	
Definición	Desarrollo de los PVE
Interpretación	Evalua el grado de cumplimiento del cronograma de ejecución e implementación de los programas de vigilancia epidemiológica
Cálculo	(Cantidad total de actividades ejecutadas del PVE / Cantidad total de actividades propuestas para los PVE) * 100
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Semestral
Responsable de la Medición	Encargada de seguridad y salud en el trabajo
Meta o Limite	100%
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable 61 a 70%: Aceptable 71 a 80%: Bueno 81 a 90%: Sobresaliente Superior a 90%: Excelente

	2. DATOS											
VARIABLES	2024											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(Cantidad total de actividades ejecutadas del PVE)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(Cantidad total de actividades propuestas para los PVE)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Meta	100%											
Ejecución de Actividades PVE	-											
Estado de Gestion	Excelente											

Estado de Gestión		Ejecución							
3. GRÁFICA									
<div><p>Desarrollo de los PVE</p><table><thead><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr></thead><tbody><tr><td>Meta</td><td>100%</td></tr><tr><td>Ejecución de Actividades PVE</td><td>0%</td></tr></tbody></table></div>		Categoría	Porcentaje	Meta	100%	Ejecución de Actividades PVE	0%		
Categoría	Porcentaje								
Meta	100%								
Ejecución de Actividades PVE	0%								

4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS	
Primer Semestre 2024	
Segundo Semestre 2024	

	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA						Versión:	1.0
	LOS CORDOBAS						Fecha:	15/12/2023
	NIT.901.768.925-2						Página:	1 de 1
	INDICADORES DE RESULTADO							
ITEM	DEFINICIÓN	INTERPRETACIÓN	LIMITE	CALCULO	FUENTE PARA EL CALCULO	PERIODICIDAD	PERSONAS QUE DEBEN CONOCER EL RESULTADO	
1R	Cumplimiento de los Requisitos Normativos	Evalua la cantidad de requisitos normativos que cumple la organización.	100%	(Cantidad de requisitos normativos cumplidos/ Cantidad total requisitos normativos que apliquen) * 100	Matriz legal	Semestral	Representante Legal / Responsable de SST	
2R	Cumplimiento de los Objetivos SST	Evalua el grado de cumplimiento de los Objetivos del SST	100%	(Cantidad de objetivos cumplidos / Cantidad total de objetivos) * 100	Auto evaluación del SST	Anual	Representante Legal / Responsable de SST	
3R	Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual SST	Evalua la cantidad de actividades ejecutadas en el Plan/Cronograma de trabajo del SST	>90 % de actividades programadas	(Cantidad de actividades ejecutadas en el Plan/Cronograma de trabajo / Cantidad total de actividades programadas) * 100	Validación del cronograma/plan de trabajo con responsables y soportes de la ejecución de las mismas	Mensual	Representante Legal / Talento Humano / Responsable de SST	
4R	Evaluación de las No Conformidades del Plan/cronograma SST	Evalua la cantidad de No Conformidades evidenciadas en el Plan/Cronograma de trabajo del SST	>90 % de las No Conformidades evidenciadas	(Cantidad de No Conformidades de la Evaluación del Plan/cronograma SST corregidas / Cantidad total de No Conformidades evidenciadas) * 100	Informe de revisión del Plan/cronograma del SST	Anual	Responsable de SST	
5R	Evaluación de las AC,AP,AM, de las investigaciones de los ATEL, e inspecciones de seguridad	Evalua las AC,AP,AM de las investigaciones de los ATEL, e inspecciones de seguridad	>70% de cumplimiento de ejecución e implementación de las AC,AP,AM	(Cantidad de AC,AP,AM de las investigaciones de ATEL corregidas / Cantidad total de AC,AP,AM) * 100	Investigaciones de ATEL e inspecciones de seguridad	Semestral	Responsable de SST	
6R	Cumplimiento de los SVE	Evalua el grado de cumplimiento de las actividades propuestas en los SVE	100%	(Cantidad total de actividades ejecutadas del SVE / Cantidad total de actividades propuestas para los SVE) *100	Cronograma de los SVE	Semestral	Representante Legal / Responsable de SST	
7R	Evaluación de los resultados de los Programas de rehabilitación de salud de los trabajadores	Evalua el grado de cumplimiento de los resultados de los programas de rehabilitación de salud de los trabajadores	>70% de cumplimiento de recomendaciones emitidas.	(Cantidad total de recomendaciones corregidas / Cantidad total recomendaciones emitidas por los programas de rehabilitación) *100	Programa de rehabilitación laboral	Semestral	Todos los trabajadores	
8R	Análisis de los registros de ATEL y Enfermedad Comun.	Evalua el grado de cumplimiento en registro de ATEL y Enfermedad Comun	100%	(Cantidad de ATEL registrados / Cantidad total de ATEL y enfermedad comun reportados) *100	Certificados de ARL, e investigaciones firmadas	Semestral	Representante Legal / Responsable de SST	
9R	Análisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los peligros identificados	Evalua el grado de cumplimiento de recomendaciones provenientes de las matrices de peligros	>70% de cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Matriz de Peligros	(Cantidad total de recomendaciones corregidas por la matriz de peligros / Cantidad total recomendaciones emitidas por la matriz de peligros)*100	Matriz de peligros	Anual	Representante Legal / Talento Humano / Responsable de SST	
10R	Cumplimiento del cronograma de mediciones higienicas	Evalua la cantidad de actividades ejecutadas en el cronograma de mediciones higienicas	>90 % de mediciones programadas	(Cantidad de mediciones higienicas ejecutadas / Cantidad total de mediciones higienicas programadas) *100	Cronograma de mediciones higienicas	Semestral	Representante Legal / Talento Humano / Responsable de SST	


1. INFORME DEL INDICADOR

Definición	Cumplimiento de los Requisitos Normativos
Interpretación	Evalúa la cantidad de requisitos normativos que cumple la organización.
Cálculo	(Cantidad de requisitos normativos cumplidos/ Cantidad total requisitos normativos que apliquen) * 100
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Semestral
Responsable de la medición	Encargado de seguridad y salud en el trabajo
Meta o Limite	100%
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable 61 a 70%: Aceptable 71 a 80%: Bueno 81 a 90%: Sobresaliente Superior a 90%: Excelente

2. DATOS

VARIABLES	2024											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(Cantidad de requisitos normativos cumplidos)		0	0	0	2	2	2	2	2	2		
(Cantidad total requisitos normativos que apliquen)		0	0	0	2	2	2	2	2	2		
Meta	100%											
Total de requisitos normativos	100%											
Estado de gestión	Excelente											

3. GRAFICO

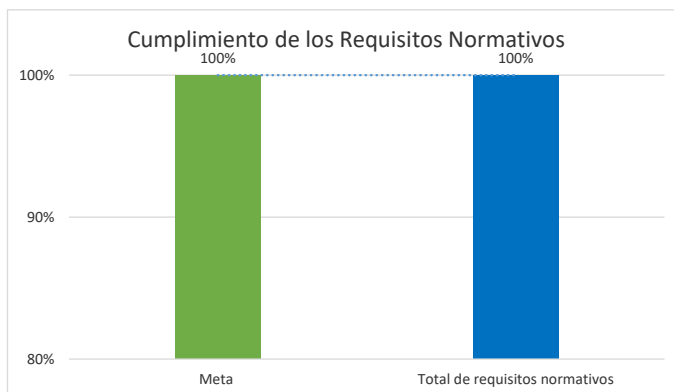

4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS

1° Semestre año	
2° Semestre año	

1. INFORME DEL INDICADOR																		
Definición	Cumplimiento de los Objetivos SST																	
Interpretación	Evalua el grado de cumplimiento de los Objetivos del SST																	
Cálculo	(Cantidad de objetivos cumplidos / Cantidad total de objetivos) * 100																	
Unidad de medida	Porcentaje																	
Frecuencia de Medición	Anual																	
Responsable de la medición	Encargado de seguridad y salud en el trabajo																	
Meta o Limite	100%																	
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable 61 a 70%: Aceptable 71 a 80%: Bueno 81 a 90%: Sobresaliente Superior a 90%: Excelente																	
2. DATOS																		
VARIABLES	2024																	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
(Cantidad de objetivos cumplidos)		4	4	4	4	4	4	4	4	4								
(Cantidad total de objetivos)		4	4	4	4	4	4	4	4	4								
Meta	100%																	
Objetivos cumplidos	100%																	
Estado de gestión	Excelente																	
3. GRAFICO																		
<div><p>Cumplimiento de los Objetivos SST</p><table><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>Meta</td><td>100%</td></tr><tr><td>Objetivos cumplidos</td><td>100%</td></tr></table></div>													Categoría	Porcentaje	Meta	100%	Objetivos cumplidos	100%
Categoría	Porcentaje																	
Meta	100%																	
Objetivos cumplidos	100%																	
4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS																		
Analisis del porcentaje de Objetivos Cumplidos durante el año																		


1. INFORME DEL INDICADOR

Definición	Cumplimiento del Plan de Trabajo Anual SST
Interpretación	Evalua la cantidad de actividades ejecudatas en el Plan/Cronograma de trabajo del SST
Cálculo	(Cantidad de actividades ejecutadas en el Plan/Cronograma de trabajo / Cantidad total de actividades programadas) * 100
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de Medición	Mensual
Responsable de la medición	Encargado de seguridad y salud en el trabajo
Meta o Limite	>90 % de actividades programadas
Grado de Gestión	<p>Inferior a 60%: Inaceptable</p> <p>61 a 70%: Aceptable</p> <p>71 a 80%: Bueno</p> <p>81 a 90%: Sobresaliente</p> <p>Superior a 90%: Excelente</p>

2. DATOS

VARIABLES	2024											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(Cantidad de actividades ejecutadas en el Plan/Cronograma de trabajo)		0	0	0	2	3	3	3	3	3		
(Cantidad total de actividades programadas)		0	0	0	2	3	3	3	3	3		
Meta	100%											
Actividades ejecutadas	100%											
Estado de gestión	Excelente											

3. GRAFICO

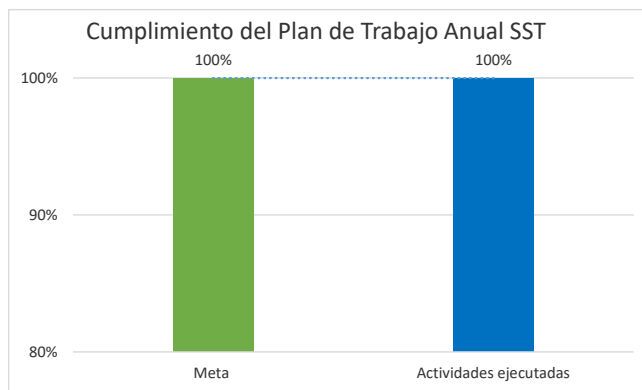


4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS

MAYORES DE EDAD Y PENSIONES	
Enero	
Febrero	
Marzo	
Abril	
Mayo	
Junio	
Julio	
Agosto	
Septiembre	
Octubre	
Noviembre	
Diciembre	

1. INFORME DEL INDICADOR																		
Definición	Evaluación de las No Conformidades del Plan/cronograma SST																	
Interpretación	Evalua la cantidad de No Conformidades evidenciadas en el Plan/Cronograma de trabajo del SST																	
Cálculo	(Cantidad de No Conformidades de la Evaluación del Plan/cronograma SST corregidas / Cantidad total de No Conformidades evidenciadas) * 100																	
Unidad de medida	Porcentaje																	
Frecuencia de Medición	Anual																	
Responsable de la Medición	Encargado de seguridad y salud en el trabajo																	
Meta o Limite	>90 % de las No Conformidades evidenciadas																	
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable 61 a 70%: Aceptable 71 a 80%: Bueno 81 a 90%: Sobresaliente Superior a 90%: Excelente																	
2. DATOS																		
VARIABLES	2024																	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
(Cantidad de NC de la evaluación del plan/cronograma SST corregidas)		0	0	0	0	0	0	0	0	„0								
(Cantidad total de No Conformidades evidenciadas)		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Meta	100%																	
NC Cerradas	-																	
Estado de gestión	Excelente																	
3. GRAFICO																		
<div>Evaluación de las No Conformidades del Plan/cronograma SST</div> <table><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>Meta</td><td>100%</td></tr><tr><td>NC Cerradas</td><td>0%</td></tr></table>													Categoría	Porcentaje	Meta	100%	NC Cerradas	0%
Categoría	Porcentaje																	
Meta	100%																	
NC Cerradas	0%																	
4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS																		
Analisis de NC Cerradas																		

3. GRAFICO

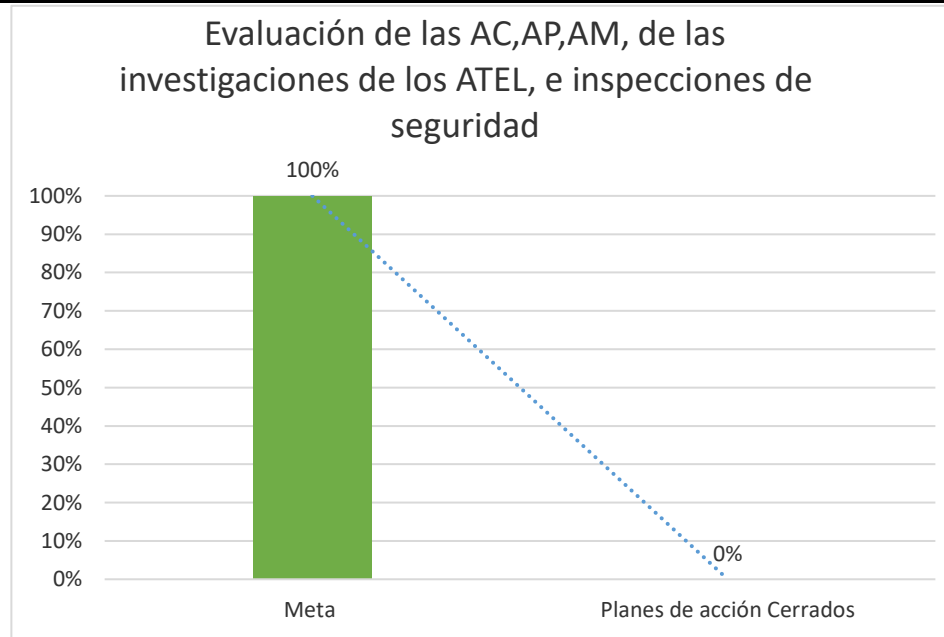

4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS

1° Semestre 2024

2° Semestre 2024

1. INFORME DEL INDICADOR																		
Definición	Cumplimiento de los SVE																	
Interpretación	Evalua el grado de cumplimiento de las actividades propuestas en los SVE																	
Cálculo	(Cantidad total de actividades ejecutadas del SVE / Cantidad total de actividades propuestas para los SVE) *100																	
Unidad de medida	Porcentaje																	
Frecuencia de la Merdición	Semestral																	
Responsable de la Medición	Encargado de seguridad y salud en el trabajo																	
Meta o Limite	100%																	
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable 61 a 70%: Aceptable 71 a 80%: Bueno 81 a 90%: Sobresaliente Superior a 90%: Excelente																	
2. DATOS																		
VARIABLES	2024																	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
(Cantidad total de actividades ejecutadas del SVE)		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
(Cantidad total de actividades propuestas para los SVE)		0	0	0	0	0	0	0	0	0								
Meta	100%																	
SVE	-																	
Estado de gestión	Excelente																	
3. GRAFICO																		
<div><p>Cumplimiento de los SVE</p><table><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>Meta</td><td>100%</td></tr><tr><td>SVE</td><td>0%</td></tr></table></div>													Categoría	Porcentaje	Meta	100%	SVE	0%
Categoría	Porcentaje																	
Meta	100%																	
SVE	0%																	
4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS																		
1° Semestre 2024																		
2° Semestre 2024																		


1. INFORME DEL INDICADOR

Definición	Evaluación de los resultados de los Programas de rehabilitación de salud de los trabajadores
Interpretación	Evalua el grado de cumplimiento de los resultados de los programas de rehabilitación de salud de los trabajadores
Cálculo	(Cantidad total de recomendaciones corregidas / Cantidad total recomendaciones emitidas por los programas de rehabilitación) *100
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de la Medición	Semestral
Responsable de la Medición	Encargado de seguridad y salud en el trabajo
Meta o Limite	>70% de cumplimiento de recomendaciones emitidas.
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable 61 a 70%: Aceptable 71 a 80%: Bueno 81 a 90%: Sobresaliente Superior a 90%: Excelente

2. DATOS

VARIABLES	2024											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(Cantidad total de recomendaciones corregidas)		0	0	0	2	0	0	0	0	0		
(Cantidad total recomendaciones emitidas por los programas de rehabilitación)		0	0	0	2	0	0	0	0	0		
Meta	70%											
Recomendaciones	100%											
Estado de gestión	Excelente											

3. GRAFICO

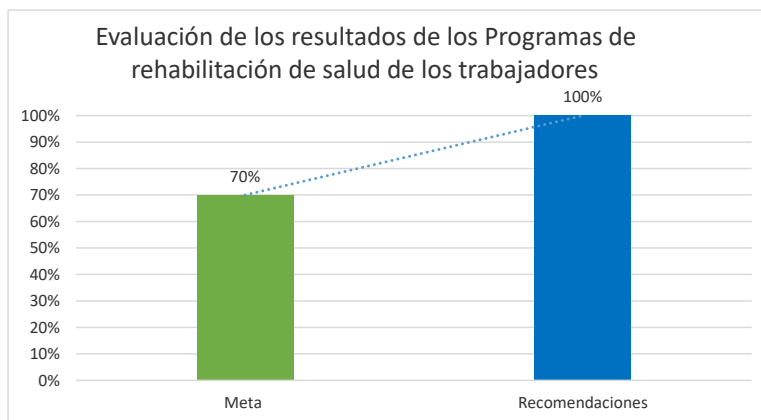

4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS

1° Semestre 2024	
2° Semestre 2024	


1. INFORME DEL INDICADOR

Definición	Análisis de los registros de ATEL y Enfermedad Común.
Interpretación	Evalua el grado de cumplimiento en registro de ATEL y Enfermedad Común
Cálculo	(Cantidad de ATEL registrados / Cantidad total de ATEL y enfermedad común reportados) *100
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de la Medición	Semestral
Responsable de la Medición	Encargado de seguridad y salud en el trabajo
Meta o Limite	100%
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable 61 a 70%: Aceptable 71 a 80%: Bueno 81 a 90%: Sobresaliente Superior a 90%: Excelente

2. DATOS

VARIABLES	2024											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(Cantidad de ATEL registrados)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
(Cantidad total de ATEL y enfermedad comun reportados)		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Meta	100%											
ATEL y Comun reportados	-											
Estado de gestión	Excelente											

3. GRAFICO

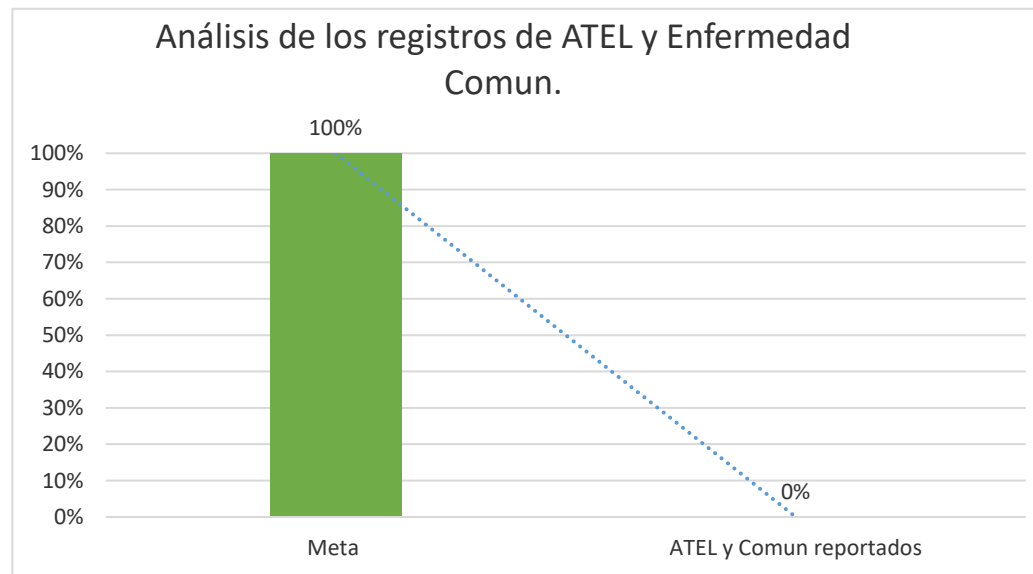

4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS

1° Semestre de 2022 Semestre

2° Semestre 2021


1. INFORME DEL INDICADOR

Definición	Analisis de los resultados en la implementación de las medidas de control en los peligros identificados
Interpretación	Evalua el grado de cumplimiento de recomendaciones provenientes de las matrices de peligros
Cálculo	(Cantidad total de recomendaciones corregidas por la matriz de peligros / Cantidad total recomendaciones emitidas por la matriz de peligros)*100
Unidad de medida	Porcentaje
Frecuencia de la Medición	Anual
Responsable de la Medición	Encargado de seguridad y salud en el trabajo
Meta o Limite	>70% de cumplimiento de recomendaciones emitidas por la Matriz de Peligros
Grado de Gestión	<p>Inferior a 60%: Inaceptable</p> <p>61 a 70%: Aceptable</p> <p>71 a 80%: Bueno</p> <p>81 a 90%: Sobresaliente</p> <p>Superior a 90%: Excelente</p>

2. DATOS

VARIABLES	2024											
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
(Cantidad total de recomendaciones corregidas por la matriz de peligros)		2	2	2	2	2	1	1	1	1		
(Cantidad total recomendaciones emitidas por la matriz de peligros)		2	2	2	2	2	1	1	1	1		
Meta	70%											
Recomendaciones	100%											
Estado de gestión	Excelente											

3. GRAFICO

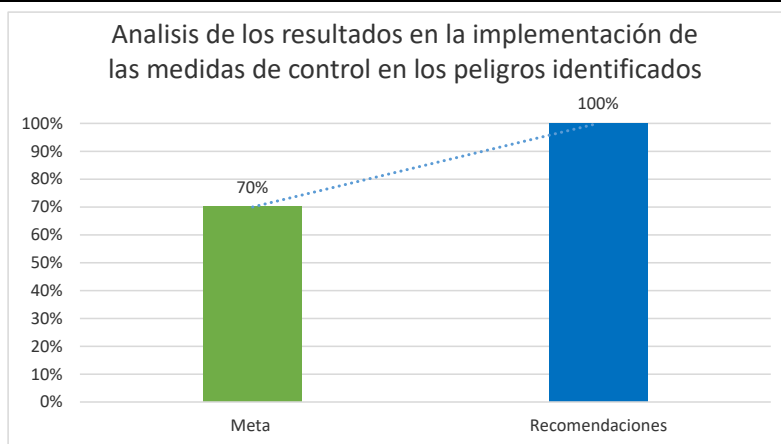

4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS

<p>Análisis de las recomendaciones controladas</p>	
---	--

1. INFORME DEL INDICADOR																		
Definición	Cumplimiento del cronograma de mediciones higienicas																	
Interpretación	Evalua la cantidad de actividades ejecutadas en el cronograma de mediciones higienicas																	
Cálculo	(Cantidad de mediciones higienicas ejecutadas / Cantidad total de mediciones higienicas programadas) *100																	
Unidad de medida	Porcentaje																	
Periodicidad	Semestral																	
Responsable de la Medición	Encargado de seguridad y salud en el trabajo																	
Meta o Limite	>90 % de mediciones programadas																	
Grado de Gestión	Inferior a 60%: Inaceptable																	
	61 a 70%: Aceptable																	
	71 a 80%: Bueno																	
	81 a 90%: Sobresaliente																	
	Superior a 90%: Excelente																	
2. DATOS																		
VARIABLES	2024																	
	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre						
(Cantidad de mediciones higienicas ejecutadas)		0	0	0	2	2	2	2	2	2								
(Cantidad total de mediciones higienicas programadas)		0	0	0	2	2	2	2	2	2								
Meta	90%																	
Mediciones higienicas	100%																	
Estado de gestión	Excelente																	
3. GRAFICO																		
<div><p>Cumplimiento del cronograma de mediciones higienicas</p><table><tr><th>Categoría</th><th>Porcentaje</th></tr><tr><td>Meta</td><td>90%</td></tr><tr><td>Mediciones higienicas</td><td>100%</td></tr></table></div>													Categoría	Porcentaje	Meta	90%	Mediciones higienicas	100%
Categoría	Porcentaje																	
Meta	90%																	
Mediciones higienicas	100%																	
4. ANÁLISIS DE DATOS Y TENDENCIAS																		
Analisis de las recomendaciones controladas																		

	<p>INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>	 CONSORCIO INGECON-INCO
---	--	--

ANEXO 5. PREOPERACIONALES OCTUBRE CTO LP-006-2023 MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS



CATERPILLAR

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA BULLDOZER

Codigo A-P3-17

Version: 02

Fecha: 20/05/2023

MARCA: CATERPILLAR MODELO: 1992 SERIE

OPERADO POR: LOCALIZACION: MUNICIPIO LOS CORDOBA EQUIPO No. 1

PERIODO: DEL 21 AL 27 DE OCT 2024

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
COMPONENTES DE LA MAQUINA														
Luces Delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
Luces Traceras	X		X		X		X		X		X		X	
Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
Barra anti volco	X		X		X		X		X		X		X	
Silla	X		X		X		X		X		X		X	
Indicadores	X		X		X		X		X		X		X	
Horometro	X		X		X		X		X		X		X	
Pito de mano	X		X		X		X		X		X		X	
Pito de reversa	X		X		X		X		X		X		X	
Guantera	X		X		X		X		X		X		X	
Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X	
Palancas de mando	X		X		X		X		X		X		X	
Pedales	X		X		X		X		X		X		X	
Gato hidráulico	X		X		X		X		X		X		X	
Cucharón	X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
Agua de motor	X		X		X		X		X		X		X	
Bateria	X		X		X		X		X		X		X	
Correas del motor	X		X		X		X		X		X		X	
Alternador	X		X		X		X		X		X		X	
Aranque	X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras	X		X		X		X		X		X		X	
Exhostos	X		X		X		X		X		X		X	
Radiador	X		X		X		X		X		X		X	
Filtros	X		X		X		X		X		X		X	
Graceritas	X		X		X		X		X		X		X	
Puerta	X		X		X		X		X		X		X	
Aceite hidraulico	X		X		X		X		X		X		X	
Aceite motor	X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X	
Protector radiador	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas traceras	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
Estado de la ferraienta (martillo, fresadora y pinzas)	X		X		X		X		X		X		X	
ACCESORIOS DE SEGURIDAD														
Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X		X	
Herramientas	X		X		X		X		X		X		X	
Gato - cruceta	X		X		X		X		X		X		X	
Conos	X		X		X		X		X		X		X	
Botiquin	X		X		X		X		X		X		X	

FIRMA DEL RESPONSABLE INSPECCIÓN:



COMUNIDAD DE
LOS RIOS DE LA VITA

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA MEZCLADOR

Código A-P-07

Version: 02

Fecha: 30/03/2023

MARCA: FORD MODELO: 1980 SERIE: _____

OPERADO POR: _____ LOCALIZACION: MUNICIPIO LOS CORDOBA EQUIPO No. 1

PERIODO: DEL 21 AL 27 DE Oct 2024

ITEM	LUN.		MAR.		MIÉ.		JUEV.		VIÉ.		SAB.		DOM.	
	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
COMPONENTES DE LA MAQUINA														
Luces Delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
Luces Traceras	X		X		X		X		X		X		X	
Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
Barra anti volco	X		X		X		X		X		X		X	
Silla	X		X		X		X		X		X		X	
Indicadores	X		X		X		X		X		X		X	
Horometro	X		X		X		X		X		X		X	
Pito de mano	X		X		X		X		X		X		X	
Pito de reversa	X		X		X		X		X		X		X	
Guantero	X		X		X		X		X		X		X	
Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X	
Palancas de mando	X		X		X		X		X		X		X	
Pedales	X		X		X		X		X		X		X	
Gato hidráulico	X		X		X		X		X		X		X	
Cucharón	X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
Agua de motor	X		X		X		X		X		X		X	
Batería	X		X		X		X		X		X		X	
Correas del motor	X		X		X		X		X		X		X	
Alternador	X		X		X		X		X		X		X	
Aranque	X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras	X		X		X		X		X		X		X	
Exhaustos	X		X		X		X		X		X		X	
Radiador	X		X		X		X		X		X		X	
Filtros	X		X		X		X		X		X		X	
Graceritas	X		X		X		X		X		X		X	
Puerta	X		X		X		X		X		X		X	
Aceite hidraulico	X		X		X		X		X		X		X	
Aceite motor	X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X	
Protector radiador	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas traceras	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
Estado de la ferramenta (martillo, fresadora y pinzas)	X		X		X		X		X		X		X	
ACCESORIOS DE SEGURIDAD														
Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X		X	
Herramientas	X		X		X		X		X		X		X	
Gato - crupeta	X		X		X		X		X		X		X	
Conos	X		X		X		X		X		X		X	
Botiquin	X		X		X		X		X		X		X	

FIRMA DEL RESPONSABLE INSPECCIÓN:

INSPECCION PREOPERACIONAL PARA MINICARGADOR

MARCA: NEW HOLLAND

MODELO: L220 - 2012 SERIE

OPERADO POR:

LOCALIZACION: MUNICIPIO LOS CORDOBAS EQUIPO No.

PERIODO: DEL 21 AL 27 DE OCT 2024

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIERN.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M


COMPONENTES DE LA MAQUINA

Luces Delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
Luces Traseras	X		X		X		X		X		X		X	
Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
Barra anti volco	X		X		X		X		X		X		X	
Silla	X		X		X		X		X		X		X	
Indicadores	X		X		X		X		X		X		X	
Horometro	X		X		X		X		X		X		X	
Pito de mano	X		X		X		X		X		X		X	
Pito de reversa	X		X		X		X		X		X		X	
Guantera	X		X		X		X		X		X		X	
Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X	
Palancas de mando	X		X		X		X		X		X		X	
Pedales	X		X		X		X		X		X		X	
Gato hidráulico	X		X		X		X		X		X		X	
Cucharón	X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
Agua de motor	X		X		X		X		X		X		X	
Bateria	X		X		X		X		X		X		X	
Correas del motor	X		X		X		X		X		X		X	
Alternador	X		X		X		X		X		X		X	
Aranque	X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras	X		X		X		X		X		X		X	
Exhostos	X		X		X		X		X		X		X	
Radiador	X		X		X		X		X		X		X	
Filtros	X		X		X		X		X		X		X	
Graceritas	X		X		X		X		X		X		X	
Puerta	X		X		X		X		X		X		X	
Aceite hidraulico	X		X		X		X		X		X		X	
Aceite motor	X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X	
Protector radiador	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas traseras	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
Estado de la ferraienta (martillo, fresadora y pinzas)	X		X		X		X		X		X		X	

ACCESORIOS DE SEGURIDAD

Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X		X	
Herramientas	X		X		X		X		X		X		X	
Gato - cruceta	X		X		X		X		X		X		X	
Conos	X		X		X		X		X		X		X	
Botiquin	X		X		X		X		X		X		X	

FIRMA DEL RESPONSABLE INSPECCION:



INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VIBROCOMPACTADOR

Control de Calidad
Versión 05.0
Fecha: 02/09/2023

MARCA: DYNAPAC

MODELO: 1982

SERIE

OPERADO POR:

LOCALIZACION: MUNICIPIO LOS CORDOBA EQUIPO No. 1

PERIODO: DEL 21 AL 27 DE OCT 2024

ITEM	LUN.		MAR.		MIE.		JUE.		VIE.		SAB.		DOM.	
	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
COMPONENTES DE LA MAQUINA														
Luces Delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
Luces Traceras	X		X		X		X		X		X		X	
Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
Barra anti volco	X		X		X		X		X		X		X	
Silla	X		X		X		X		X		X		X	
Indicadores	X		X		X		X		X		X		X	
Horometro	X		X		X		X		X		X		X	
Pito de mano	X		X		X		X		X		X		X	
Pito de reversa	X		X		X		X		X		X		X	
Guantes	X		X		X		X		X		X		X	
Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X	
Palancas de mando	X		X		X		X		X		X		X	
Pedales	X		X		X		X		X		X		X	
Gato hidráulico	X		X		X		X		X		X		X	
Cucharón	X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
Agua de motor	X		X		X		X		X		X		X	
Batería	X		X		X		X		X		X		X	
Correas del motor	X		X		X		X		X		X		X	
Alternador	X		X		X		X		X		X		X	
Aranque	X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras	X		X		X		X		X		X		X	
Exhostos	X		X		X		X		X		X		X	
Radiador	X		X		X		X		X		X		X	
Filtros	X		X		X		X		X		X		X	
Graseras	X		X		X		X		X		X		X	
Puerta	X		X		X		X		X		X		X	
Aceite hidraulico	X		X		X		X		X		X		X	
Aceite motor	X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X	
Protector radiador	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas traceras	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
Estado de la ferraienta (martillo, fresadora y pinzas)	X		X		X		X		X		X		X	
ACCESORIOS DE SEGURIDAD														
Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X		X	
Herramientas	X		X		X		X		X		X		X	
Gato - cruceta	X		X		X		X		X		X		X	
Conos	X		X		X		X		X		X		X	
Botiquin	X		X		X		X		X		X		X	

FIRMA DEL RESPONSABLE INSPECCIÓN:





INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA

El municipio de Los Cordoba
Tiene un total de 1000
El área total es de 1000

MARCA: CHEVROLET MODELO: 1994 SERIE:

OPERADO POR: LOCALIZACION: MUNICIPIO LOS CORDOBA EQUIPO No.:

PERIODO: DEL 21 AL 27 DE OCT 2024

ITEM	LUN.		MAR.		MIÉ.		JUEV.		VIÉ.		SAB.		DOM.	
	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
COMPONENTES DE LA MAQUINA														
Luces Delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
Luces Traceras	X		X		X		X		X		X		X	
Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
Barra anti volco	X		X		X		X		X		X		X	
Silla	X		X		X		X		X		X		X	
Indicadores	X		X		X		X		X		X		X	
Horometro	X		X		X		X		X		X		X	
Pito de mano	X		X		X		X		X		X		X	
Pito de reversa	X		X		X		X		X		X		X	
Cuantera	X		X		X		X		X		X		X	
Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X	
Palancas de mando	X		X		X		X		X		X		X	
Pedales	X		X		X		X		X		X		X	
Gato hidráulico	X		X		X		X		X		X		X	
Cucharón	X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
Agua de motor	X		X		X		X		X		X		X	
Bateria	X		X		X		X		X		X		X	
Correas del motor	X		X		X		X		X		X		X	
Alternador	X		X		X		X		X		X		X	
Aranque	X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras	X		X		X		X		X		X		X	
Exhostos	X		X		X		X		X		X		X	
Radiador	X		X		X		X		X		X		X	
Filtros	X		X		X		X		X		X		X	
Graceritas	X		X		X		X		X		X		X	
Puerta	X		X		X		X		X		X		X	
Aceite hidraulico	X		X		X		X		X		X		X	
Aceite motor	X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X	
Protector radiador	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas traceras	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
Estado de la ferraienta (martillo, fresadora y pinzas)	X		X		X		X		X		X		X	
ACCESORIOS DE SEGURIDAD														
Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X		X	
Herramientas	X		X		X		X		X		X		X	
Gato - cruceta	X		X		X		X		X		X		X	
Conos	X		X		X		X		X		X		X	
Botiquin	X		X		X		X		X		X		X	

FIRMA DEL RESPONSABLE INSPECCIÓN:



SECRETARÍA DE

INSPECCIÓN PREOPERACIONAL PARA VOLICETA

FORMA 001-01

SECT-001-01

FECHA: 01/01/2023

MARCA:

FOM:

MODELO:

1900

SERIE:

OPERADO POR:

LOCALIZACIÓN: PUERTO LOS CABALLEROS EQUIPO No. 1

FECHA: DEL 21 AL 27 DE OCT 2024

ITEM	LUN		MAR		MIE		JUE		VIE		SAB		DOM	
	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M	S	M
COMPONENTES DE LA MAQUINA														
Luces Delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
Luces Traseras	X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
Barras ant. volco	X		X		X		X		X		X		X	
Silla	X		X		X		X		X		X		X	
Indicadores	X		X		X		X		X		X		X	
Horometro	X		X		X		X		X		X		X	
Pito de mano	X		X		X		X		X		X		X	
Pito de reversa	X		X		X		X		X		X		X	
Cuentas	X		X		X		X		X		X		X	
Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X	
Palancas de mando	X		X		X		X		X		X		X	
Pedales	X		X		X		X		X		X		X	
Gato hidráulico	X		X		X		X		X		X		X	
Cucharón	X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
Agua de motor	X		X		X		X		X		X		X	
Batería	X		X		X		X		X		X		X	
Correas del motor	X		X		X		X		X		X		X	
Alternador	X		X		X		X		X		X		X	
Aranque	X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras	X		X		X		X		X		X		X	
Exhaustos	X		X		X		X		X		X		X	
Radiador	X		X		X		X		X		X		X	
Filtros	X		X		X		X		X		X		X	
Gracias	X		X		X		X		X		X		X	
Puerta	X		X		X		X		X		X		X	
Aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X	
Aceite motor	X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X	
Protector radiador	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas traseras	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
Estado de la herramienta (martillo, fresadora y pinzas)	X		X		X		X		X		X		X	
ACCESORIOS DE SEGURIDAD														
Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X		X	
Herramientas	X		X		X		X		X		X		X	
Gato - cruceta	X		X		X		X		X		X		X	
Conos	X		X		X		X		X		X		X	
Botiquin	X		X		X		X		X		X		X	

FIRMA DEL RESPONSABLE INSPECCIÓN:



INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA

Código A-P-E-P
Versión 09
Fecha: 06/05/2023MARCA: CHEVROLET MODELO: 1985 SERIE: _____OPERADO POR: _____ LOCALIZACION: MUNICIPIO LOS CORDOBA EQUIPO No. 1PERIODO: DEL 21 AL 27 DE Oct 2024

ITEM	LUN.		MAR.		MIER.		JUEV.		VIER.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
COMPONENTES DE LA MAQUINA														
Luces Delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
Luces Traceras	X		X		X		X		X		X		X	
Cinturon de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
Barra anti volco	X		X		X		X		X		X		X	
Silla	X		X		X		X		X		X		X	
Indicadores	X		X		X		X		X		X		X	
Horometro	X		X		X		X		X		X		X	
Pito de mano	X		X		X		X		X		X		X	
Pito de reversa	X		X		X		X		X		X		X	
Guanteras	X		X		X		X		X		X		X	
Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X	
Palancas de mando	X		X		X		X		X		X		X	
Pedales	X		X		X		X		X		X		X	
Gato hidráulico	X		X		X		X		X		X		X	
Cucharón	X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
Agua de motor	X		X		X		X		X		X		X	
Bateria	X		X		X		X		X		X		X	
Correas del motor	X		X		X		X		X		X		X	
Alternador	X		X		X		X		X		X		X	
Aranque	X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras	X		X		X		X		X		X		X	
Exhostos	X		X		X		X		X		X		X	
Radiador	X		X		X		X		X		X		X	
Filtros	X		X		X		X		X		X		X	
Graceritas	X		X		X		X		X		X		X	
Puerta	X		X		X		X		X		X		X	
Aceite hidraulico	X		X		X		X		X		X		X	
Aceite motor	X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X	
Protector radiador	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas traceras	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
Estado de la ferraienta (martillo, fresadora y pinzas)	X		X		X		X		X		X		X	
ACCESORIOS DE SEGURIDAD														
Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X		X	
Herramientas	X		X		X		X		X		X		X	
Gato - cruceta	X		X		X		X		X		X		X	
Conos	X		X		X		X		X		X		X	
Botiquin	X		X		X		X		X		X		X	

FIRMA DEL RESPONSABLE INSPECCIÓN:



INSPECCION PREOPERACIONAL PARA VOLQUETA

Código A-2577

Versión: 02

Fecha: 30/09/2023

MARCA: CHEVROLET MODELO: 1989 SERIE: Q1814402OPERADO POR: _____ LOCALIZACION: MUNICIPIO LOS CORDOBAS EQUIPO No. _____PERIODO: DEL 21 AL 27 DE Oct 2024

ITEM	LUN.		MAR.		MIÉ.		JUEV.		VIÉR.		SAB.		DOM.	
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
COMPONENTES DE LA MAQUINA														
Luces Delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
Luces Traceras	X		X		X		X		X		X		X	
Cinturón de seguridad	X		X		X		X		X		X		X	
Barra anti volco	X		X		X		X		X		X		X	
Silla	X		X		X		X		X		X		X	
Indicadores	X		X		X		X		X		X		X	
Horometro	X		X		X		X		X		X		X	
Pito de mano	X		X		X		X		X		X		X	
Pito de reversa	X		X		X		X		X		X		X	
Guanteras	X		X		X		X		X		X		X	
Retrovisor	X		X		X		X		X		X		X	
Palancas de mando	X		X		X		X		X		X		X	
Pedales	X		X		X		X		X		X		X	
Gato hidráulico	X		X		X		X		X		X		X	
Cucharón	X		X		X		X		X		X		X	
Control de fugas hidráulicas	X		X		X		X		X		X		X	
Agua de motor	X		X		X		X		X		X		X	
Batería	X		X		X		X		X		X		X	
Correas del motor	X		X		X		X		X		X		X	
Alternador	X		X		X		X		X		X		X	
Aranque	X		X		X		X		X		X		X	
Mangueras	X		X		X		X		X		X		X	
Exhaustos	X		X		X		X		X		X		X	
Radiador	X		X		X		X		X		X		X	
Filtros	X		X		X		X		X		X		X	
Graceritas	X		X		X		X		X		X		X	
Puerta	X		X		X		X		X		X		X	
Aceite hidráulico	X		X		X		X		X		X		X	
Aceite motor	X		X		X		X		X		X		X	
Tanque de combustible	X		X		X		X		X		X		X	
Protector radiador	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas traceras	X		X		X		X		X		X		X	
Llantas delanteras	X		X		X		X		X		X		X	
Estado de la ferramenta (martillo fresadora y pinzas)	X		X		X		X		X		X		X	
ACCESORIOS DE SEGURIDAD														
Extintor de incendio	X		X		X		X		X		X		X	
Herramientas	X		X		X		X		X		X		X	
Gato - cruceta	X		X		X		X		X		X		X	
Conos	X		X		X		X		X		X		X	
Botiquin	X		X		X		X		X		X		X	

FIRMA DEL RESPONSABLE INSPECCIÓN:

	<p>INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>	 CONSORCIO INGECON-INCO
---	--	--

ANEXO 6. CAPACITACIONES OCTUBRE CTO LP-008-2023 SAN BERNARDO DEL VIENTO



DIRIGIDA POR:	Presidente de COPASST
MIEMBROS:	POR EL EMPLEADOR:
	POR LOS TRABAJADORES:

ORDEN DEL DÍA

1°	Verificación de la Asistencia
2°	Funciones y Responsabilidades
3°	Verificación de Afiliaciones
4°	Acta de entrega EPP y Dotación
5°	Verificación de Accidentes de Trabajo
6°	Inspecciones
7°	Capacitaciones
8°	Propuestas, Compromisos y Acuerdos

DESARROLLO DE LA REUNIÓN		SEGUIMIENTO A SOPORTES
1°	Se verifica la asistencia de los miembros del COPASST y se determina que existe quorum para deliberar y tomar decisiones.	- ACTA DE COPASST
2°	Se da lectura al acta de reunión anterior y se informa a todos los miembros del comité el cumplimiento de los compromisos adquiridos en la reunión anterior.	- REGISTRO DE ASISTENCIA
3°	Se verifican las afiliaciones del personal a seguridad social.	- AFILIACIONES
4°	Se verificaron las actas de entrega de Elementos de Protección Personal y dotación a los trabajadores.	- ACTA ENTREGA EPP
5°	Se verifica que en lo corrido del mes no se han presentado accidentes de trabajo de los trabajadores.	- REPORTE DE ACCIDENTALIDAD
6°	Se ejecutaron las inspecciones programadas de los componentes SST y Ambiental.	- FORMATO DE INSPECCIONES
7°	Se ejecutaron las capacitaciones programadas de SST.	- PROGRAMA DE CAPACITACIONES
8° PROPUESTAS, COMPROMISOS Y ACUERDOS		SEGUIMIENTO A SOPORTES
1°	Continuar con el proceso de entrega y/o reposición de EPP y dotación.	Coordinador SST
2°	Garantizar el cumplimiento de los planes de trabajo implementados.	Coordinador SST COPASST



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO

VERSIÓN 1

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ PARITARIO DE SEGURIDAD Y SALUD
EN EL TRABAJO (COPASST)

Página 2 de 2

3°	Realizar las capacitaciones programadas de acuerdo con el plan de trabajo.	Coordinador SST
4°	Ejecución de inspecciones programadas.	Coordinador SST COPASST

REGISTRO DE ASISTENTES COPASST

No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
	Yony Camacho Casas	Coordinador SST	Yony Camacho Casas
	Iván Castillo	Miembro principal	Iván Castillo
	Asis. F. L. L.	Ayudante	Asis. F. L. L.
	Daniel Lopez Moreno	Ayudante	Daniel Lopez

Lugar: Campamento

Fecha: 18 de octubre de 2024

Hora: 06:50 a.m.



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO

VERSIÓN 1

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Página 1 de 2

DIRIGIDA POR:		Presidente de CCL	
MIEMBROS:		POR EL EMPLEADOR:	
		POR LOS TRABAJADORES:	
ORDEN DEL DÍA			
1°	Verificación de la asistencia		
2°	Seguimiento a reportes de presunto Acoso Laboral		
3°	Propuestas, Compromisos y Acuerdos		
DESARROLLO DE LA REUNION		SEGUIMIENTO A SOPORTES	
1°	Se verifica la asistencia de los miembros del Comité de Convivencia Laboral y se determina que existe quorum para deliberar y tomar decisiones.		- ACTA DE CCL
2°	El Comité de Convivencia Laboral informa que hasta la fecha no se han presentado quejas de presunto acoso laboral.		- N/A
3° PROPUESTAS, COMPROMISOS Y ACUERDOS		SEGUIMIENTO A SOPORTES	
1°	Convocar al CCL de forma extraordinaria en caso de presentarse un presunto caso de acoso laboral.		Coordinador SST Miembros CCL
2°	Fecha tentativa de próxima reunión: 29 de enero de 2025.		Coordinador SST Miembros CCL



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO

VERSIÓN 1

ACTA DE REUNIÓN COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL

Página 2 de 2

REGISTRO DE ASISTENTES CCL			
No.	NOMBRE Y APELLIDO	CARGO	FIRMA
	Valentin Ortega Torres	Topógrafo	Valentin Ortega
	Alcides Navarro Urbina	Oficial	Alcides NAVARRO
	Andy Agamez Geney	Auxiliar Residente	Andy Agamez
	Harry Bejarano A	Residente	Harry Bejarano

Lugar: Campamento

Fecha: 23 de octubre de 2024

Hora: 07:00 a.m.



ACTA DE REUNIÓN Y/O CAPACITACIÓN

CÓDIGO: PGIO-F01

VERSIÓN: 01

FECHA: 18/02/2024

PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio de San Bernardo del Viento Departamento de Córdoba".

FECHA

16-10-2024

DURACIÓN

30 min

CAPACITACIÓN
CHARLA
ENTRENAMIENTO
REUNIÓN☒
☐
☐
☐

TEMA:

Cultura vial

OBJETIVO

Capacitar al personal sobre las normas, señalizaciones y procedimientos de seguridad vial para la prevención de accidentes de conductores, peatones y demás actores viales.

FACILITADOR

Iney González

NOMBRE COMPLETO

IDENTIFICACIÓN

CARGO

FIRMA

Jorge E. Logallo Rodríguez

773384054

OF. ASISTENTE

F. J. Logallo

ARISTIDES GUILA HERNANDEZ

70939577

ASISTENTE

Aristides GUILA

Daniel Lopez Moreno

7792738436

ASISTENTE

Daniel Lopez

Alfonso Navarro Velazquez

7033825317

ASISTENTE

Alfonso NAVARRO

Andy M. Agamez Jerez

4067040528

I. ASISTENTE

Andy Agamez

Luis J. Rojas Rojas

7003914395

OF. M. N.

Luis J. C.B.

Carlos Martinez

7068505406

CARLOS

Martinez

Valentin Ortega Teken

7067503240

VALENTIN

Valentin Ortega



Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Médico especialista en salud ocupacional

Registro medico 8396

Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020

celular: 3117367321

FECHA

OCTUBRE/18/2024

C.C.

11,155,672

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO

JOSE ANTONIO VELASQUEZ GARCIA

FECHA DE NACIMIENTO

MAR/23/1976

T. SANGRE

B +

CIUDAD

SAN BERNARDO DEL VIENTO

EPS

CAJACOPI

EDAD

48 AÑOS

MOVIL

3126652791

EMPRESA

CONSORCIO L&S

ENFASIS

OSTEOMUSCULAR

CARGO

OFICIAL

MUNICIPIO

SAN BERNARDO

DICTAMEN

APTO

SI

APLAZADO

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA

apto para trabajo en
espacios confinados

Apto para trabajo en
excavaciones

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN

Fenómenos naturales

Biológico

Auditivo

Visual

Físico

Prevalente

Prevalente

Osteomuscular

Psicosocial

Biomecánico

Químico

Prevalente

Prevalente

Prevalente

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTE SIN PATOLOGÍA APERENTE QUE LO LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEO MUSCULARES.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR. 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID 19.

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometría

Visiometría

Espirometría

Cuadro Hemático

Perfil Lipídico

Glicemia Basal

Perfil Hepático

Test de Fobias

Electrocardiograma

Rx Tórax

KOH, Coprológico, Frotis Faringeo

Rx Columna Dinámica

RX Columna Lumbosacra

Psicométrico

Parcial de Orina

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Jose Velasquez

Firma del Paciente

Luis G. Aldana Otero
Médico Salud Ocupacional
C.O. 01252

Aldana O

Firma Médico Especialista en SO



Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Médico especialista en salud ocupacional

Registro medico 8396

Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020

celular: 3117367321

FECHA:

OCTUBRE/18/2024

C.C.

1,068,737,586

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO

SAMUEL RAVELES QUINTERO

FECHA DE NACIMIENTO

SEP/17/2000

T. SEXO:

O +

CIUDAD

SAN BERNARDO DEL VIENTO

EPS:

MUTUAL SER

EDAD

24 AÑOS

MOVIL

3011150858

EMPRESA

CONSORCIO L&S

ENFASIS

OSTEOMUSCULAR

CARGO

AYUDANTE

MUNICIPIO

SAN BERNARDO

DICTAMEN

APTO

SI

APLAZADO

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA

apto para trabajo en
espacios confinados

Apto para trabajo en
excavaciones

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN

Fenómenos naturales

Biológico

Auditivo

Visual

Físico

Osteomuscular

Psicosocial

Biomecánico

Químico

Prevalente

Prevalente

Prevalente

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTE SIN PATOLOGÍA APERENTE QUE LO LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES. SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEO MUSCULARES.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR. 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID 19.

EXAMENES PARA CLÍNICOS REALIZADOS

Audiometría

Visiometría

Espirometría

Cuadro Hemático

Perfil Lipídico

Glicemia Basal

Perfil Hepático

Test de Fobias

Electrocardiograma

Rx Tórax

KOH, Coprológico, Frotis Faringeo

Rx Columna Dinámica

RX Columna Lumbosacra

Psicométrico

Parcial de Orina

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2345 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Samuel Raveles

Firma del Paciente

Luis G. Aldana Otero
Médico Salud Ocupacional
L.S.O. 01252

Aldana O

Firma Médico Especialista en SO



Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Médico especialista en salud ocupacional

Registro medico 8396

Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020

celular: 3117367321

FECHA

OCTUBRE/18/2024

C.C.

1,064,985,045

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO

JOSE MANUEL VALETA RIVERA

FECHA DE NACIMIENTO

MAR/15/1988

T. SANGRE

A +

CIUDAD

SAN BERNARDO DEL VIENTO

EPS

MUTUAL SER

EDAD

36 AÑOS

MOVIL

3137866490

EMPRESA

CONSORCIO L&S

ENFASIS

OSTEOMUSCULAR

CARGO

OFICIAL

MUNICIPIO

SAN BERNARDO

DICTAMEN

APTO

SI

APLAZADO

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA

apto para trabajo en
espacios confinadosApto para trabajo en
excavaciones**PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN**

Fenomenos naturales

Biológico

Auditivo

Visual

Físico

Osteomuscular

Psicosocial

Biomecánico

Químico

Prevalente

Prevalente

Prevalente

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTE SIN PATOLOGÍA APARENTE QUE LO LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULARES.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR. 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID 19.

EXAMENES PARACLINICOS REALIZADOS

Audiometría

Visiometría

Espirometría

Cuadro Hemático

Perfil Lipídico

Glicemia Basal

Perfil Hepático

Test de Fobias

Electrocardiograma

Rx Tórax

KOH, Coprológico, Frotis Faringeo

Rx Columna Dinámica

RX Columna Lumbosacra

Psicométrico

Parcial de Orina

LEGALIDAD


Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2008 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Jose Valera

Firma del Paciente

Luis G. Aldana Otero
Médico Salud Ocupacional
L.S.O. 01252*Aldana O*

Firma Médico Especialista en SO



Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Médico especialista en salud ocupacional

Registro médico 8396

Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020

celular: 3117367321

FECHA

OCTUBRE/18/2024

C.C.

10.943.898

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO

JAVIER CAUSADO SALCEDO

FECHA DE NACIMIENTO

ABR/12/1988

T. SANGRE

O +

CIUDAD

SAN BERNARDO DEL VIENTO

EPS

MUTUAL SER

EDAD

36 AÑOS

MOVIL

3022414391

EMPRESA

CONSORCIO L&S

ENFASIS

OSTEOMUSCULAR

CARGO

AYUDANTE

MUNICIPIO

SAN BERNARDO

DICTAMEN

APTO

SI

APLAZADO

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA

apto para trabajo en
espacios confinados

Apto para trabajo en
excavaciones

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN

Fenómenos naturales

Biológico

Auditivo

Visual

Físico

Prevalente

Prevalente

Osteomuscular

Psicosocial

Biomecánico

Químico

Prevalente

Prevalente

Prevalente

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTE SIN PATOLOGÍA APARENTE QUE LO LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEO MUSCULARES.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR. 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID 19.

EXAMENES PARA CLINICOS REALIZADOS

Audiometría

Visiometría

Espirometría

Cuadro Hemático

Perfil Lipídico

Glicemia Basal

Perfil Hepático

Test de Fobias

Electrocardiograma

Rx Tórax

KOH, Coprológico, Frotis Faringeo

Rx Columna Dinámica

RX Columna Lumbosacra

Psicométrico

Parcial de Orina

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1818 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Javier Causado S
Firma del Paciente

Luis G. Aldana Otero
Médico Salud Ocupacional
C.S.O. 01252

Aldana O
Firma Médico Especialista en SO



Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Médico especialista en salud ocupacional

Registro médico 8396

Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020

celular: 3117367321

FECHA

OCTUBRE/18/2024

C.C.

1.003.563.000

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO

CAMILO JOSE HERNANDEZ VILLADIEGO

FECHA DE NACIMIENTO

OCT/02/2001

T. SANGRE

O +

CIUDAD

SAN BERNARDO DEL VIENTO

EPS

MUTUAL SER

EDAD

23 AÑOS

MÓVIL

3244277078

EMPRESA

CONSORCIO L&S

ENFASIS

OSTEOMUSCULAR

CARGO

AYUDANTE

MUNICIPIO

SAN BERNARDO

DICTAMEN

APTO

SI

APLAZADO

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA

apto para trabajo en
espacios confinadosApto para trabajo en
excavaciones**PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN**

Fenómenos naturales

Biológico

Auditivo

Visual

Físico

Osteomuscular

Psicosocial

Biomecánico

Químico

Prevalente

Prevalente

Prevalente

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTE SIN PATOLOGÍA APARENTE QUE LO LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES. SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DÉFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACIÓN FÍSICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEO MUSCULARES.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR. 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID 19.

EXÁMENES PARA CLÍNICOS REALIZADOS

Audiometría		Glicemia Basal		KOH, Coprológico, Frotis Faringeo	
Visionometría		Perfil Hepático		Rx Columna Dinámica	
Espirometría		Test de Fobias		RX Columna Lumbosacra	
Cuadro Hemático		Electrocardiograma		Psicométrico	
Perfil Lipídico		Rx Tórax		Parcial de Orina	

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1916 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Firma del Paciente

Luis G. Aldana Otero
Médico Salud Ocupacional
L.S.O. 01252

Firma Médico Especialista en SO



Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Médico especialista en salud ocupacional

Registro médico 8396

Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020

celular: 3117387321

FECHA

OCTUBRE/18/2024

C.C.

1,070,812,177

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO

JADER MANUEL COLON OSPINA

FECHA DE NACIMIENTO

ENE/12/1989

T. SANGRE

O +

CIUDAD

SAN BERNARDO DEL VIENTO

EPS

MUTUAL SER

EDAD

35 AÑOS

MOVIL

3234593858

EMPRESA

CONSORCIO L&S

ENFASIS

OSTEOMUSCULAR

CARGO

AYUDANTE

MUNICIPIO

SAN BERNARDO

DICTAMEN

APTO

SI

APLAZADO

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA

apto para trabajo en
espacios confinadosApto para trabajo en
excavaciones**PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN**

Fenómenos naturales

Biológico

Auditivo

Visual

Físico

Prevalente

Prevalente

Osteomuscular

Psicosocial

Biomecánico

Químico

Prevalente

Prevalente

Prevalente

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTE SIN PATOLOGÍA APERENTE QUE LO LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEOMUSCULARES.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR. 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID 19.

EXÁMENES PARACLÍNICOS REALIZADOS

Audiometría	Glicemia Basal	KOH, Coprológico, Frotis Faringeo
Visionometría	Perfil Hepático	Rx Columna Dinámica
Espirometría	Test de Fobias	Rx Columna Lombosacra
Cuadro Hemático	Electrocardiograma	Psicométrico
Perfil Lipídico	Rx Tórax	Parcial de Orina

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Jader Colon
Firma del Paciente

Luis G. Aldana Oter
Médico Salud Ocupacional
L.S.O. 01252

Aldana O
Firma Médico Especialista en SO



Salud Ocupacional

LUIS GABRIEL ALDANA OTERO

Médico especialista en salud ocupacional

Registro médico 8396

Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020

celular: 3117367321

FECHA

OCTUBRE/18/2024

C.C.

1,070,815,381

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO

ADER LUIS URUETA CORDOBA

FECHA DE NACIMIENTO

OCT/20/1989

T. SANGRE

A+

CIUDAD

SAN BERNARDO DEL VIENTO

EPS

MUTUAL SER

EDAD

35 AÑOS

MOVIL

3048957521

EMPRESA

CONSORCIO L&S

ENFASIS

OSTEOMUSCULAR

CARGO

AYUDANTE

MUNICIPIO

SAN BERNARDO

DICTAMEN

APTO

SI

APLAZADO

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA

apto para trabajo en
espacios confinados

apto para trabajo en
excavaciones

PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN

Fenómenos naturales

Biológico

Auditivo

Visual

Físico

Osteomuscular

Prevalente

Psicosocial

Prevalente

Biomecánico

Prevalente

Prevalente

Prevalente

Químico

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTE SIN PATOLOGÍA APARENTE QUE LO LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RESTRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACIÓN FÍSICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEO MUSCULARES.

RECOMENDACIONES ESPECÍFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR. 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID 19.

EXÁMENES PARA CLÍNICOS REALIZADOS

Audiometría	Glicemia Basal	KOH, Coprológico, Frotis Faringeo
Visiometría	Perfil Hepático	Rx Columna Dinámica
Espirometría	Test de Fobias	Rx Columna Lombosacra
Cuadro Hemático	Electrocardiograma	Psicométrico
Perfil Lipídico	Rx Tórax	Parcial de Orina

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Luis Urqueta C

Firma del Paciente

Luis G. Aldana Otero
Médico Salud Ocupacional
C.S.O. 01252

Aldana O

Firma Médico Especialista en SO

**LUIS GABRIEL ALDANA OTERO**

Médico especialista en salud ocupacional

Registro médico 8396

Licencia Salud Ocupacional: 01252 del 28/09/2020

celular: 3117367321

Salud Ocupacional

FECHA

OCTUBRE/18/2024

C.C.

1,068.736,520

DATOS PERSONALES

NOMBRE COMPLETO

JHON FERNANDO CORDOBA COLON

FECHA DE NACIMIENTO

DIC/06/1999

T. SANGRE

A +

CIUDAD

SAN BERNARDO DEL VIENTO

EPS

MUTUAL SER

EDAD

24 AÑOS

MOVIL

3189217860

EMPRESA

CONSORCIO L&S

ENFASIS

OSTEOMUSCULAR

CARGO

AYUDANTE

MUNICIPIO

SAN BERNARDO

DICTAMEN

APTO

SI

APLAZADO

APTO PARA TRABAJO EN ALTURA

apto para trabajo en
espacios confinadosApto para trabajo en
excavaciones**PROGRAMAS DE VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA QUE LE APLICAN**

Fenómenos naturales

Biológico

Auditivo

Visual

Físico

Prevalente

Prevalente

Osteomuscular

Psicosocial

Biomecánico

Químico

Prevalente

Prevalente

Prevalente

OBSERVACIONES AL CONCEPTO

PACIENTE SIN PATOLOGÍA APERENTE QUE LO LIMITA PARA EL DESARROLLO DE SUS FUNCIONES, PUEDE LABORAR SIN RETRICCIONES, SE LE DAN RECOMENDACIONES SIN DEFICIT CARDIOVASCULAR NI RESPIRATORIO. PACIENTE SIN LIMITACION FISICA PARA DESARROLLAR SUS FUNCIONES OSTEO MUSCULARES.

RECOMENDACIONES ESPECIFICAS

1. SEGUIR UN ESTILO DE VIDA SALUDABLE. 2. DIETA SANA Y EJERCICIOS. 3. PAUSAS ACTIVAS E HIGIENE POSTURAL. 4. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL. 5. AUTOEXAMEN TESTICULAR. 6. USO ADECUADO DE ELEMENTOS DE BIOSEGURIDAD FRENTE AL COVID 19.

EXAMENES PARA CLÍNICOS REALIZADOS

Audiometría		Glicemia Basal		KOH, Coprológico, Frotis Faringeo	
Visiometría		Peril Hepático		Rx Columna Dinámica	
Espirometría		Test de Fobias		RX Columna Lumbosacra	
Cuadro Hemático		Electrocardiograma		Psicométrico	
Perfil Lipídico		Rx Tórax		Parcial de Orina	

LEGALIDAD

Este documento hace parte de la historia clínica electrónica ocupacional y su contenido pleno es inmodificable. El trabajador manifiesta conocer el contenido registrado en el "Examen Médico de Ingreso"; el cual cumple con lo dispuesto en la Resolución 2346 de 2007. Se manifiesta informado de las medidas preventivas y correctivas en el cuidado de su salud. Autoriza al suscrito Médico para que custodie su Historia Clínica Ocupacional cumpliendo con el ordenamiento de la Resolución 1918 de 2009 y la Resolución 0839 de 2017. Su uso y copias solo pueden ser divulgadas en el momento y modo descritos por la Ley.

Jhon cordoba

Firma del Paciente

Luis G. Aldana Otero
Médico Salud Ocupacional
L.S.O. 01252Aldana O

Firma Médico Especialista en SO

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO****EVALUACIÓN INDUCCIÓN**

Código: PGIO-F27

Versión: 01

Fecha: 19-02-2024

Página: 1 de 2

CALIFICACION: 4.8

FECHA: 19/02/2024

NOMBRE COMPLETO: JAVIER CAUJADO SALCEDO

IDENTIFICACIÓN: 70.943.898

CARGO: ANFAGANTE

INDUCCIÓN ☒REINDUCCIÓN ☐**Marque con una X la respuesta correcta****1. ¿Cuál de las siguientes frases se evidencian en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio?:**

- ☒ a) Compromiso con la protección y promoción de la salud de los empleados, procurando conservar su integridad física mediante la gestión de los peligros y riesgos
- b) El consorcio luchará contra el acoso laboral desde un punto de vista preventivo y rechaza de raíz el acoso laboral, en todas sus modalidades y formas, sin primar quién sea la víctima o el ofensor, ni cuál sea su rango jerárquico.
- c) Destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios.
- d) Cumpliendo los requisitos legales aplicables

2. ¿Quién debe ser el principal responsable de la salud, cuidado e integridad de cada trabajador?

- a) El jefe de área
- ☒ b) El empleador
- c) Cada uno de los trabajadores
- d) El vecino

3. Cuáles de las siguientes frases se enmarcan en mis responsabilidades como trabajador:

- ☒ a) Usar los Elementos de Protección Personal (EPP)
- ☒ b) Reportar las condiciones o actos que puedan generar accidentes o enfermedades al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de los formatos o correo electrónico
- c) Generar chismes entre mis compañeros
- ☒ d) Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud
- ☒ e) Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
- f) Reportar los accidentes que ocurran en mi casa
- ☒ g) Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente
- h) Cruzar por los puentes peatonales cuando salga de mi casa
- i) Llevar a los niños a la escuela

4. La siguiente descripción hace referencia a: "Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo o por orden directa del jefe inmediato y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte"

- a) Incidente de trabajo
- b) Accidente común
- c) Enfermedad laboral
- ☒ d) Accidente laboral



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO

EVALUACIÓN INDUCCIÓN

Código: PGIO-F27

Versión: 01

Fecha: 19-02-2024

Página: 2 de 2

5. ¿Para qué sirve el COPASST?

- a) Apoyo para el trabajador al momento de presentar quejas
- ☒ b) Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo
- c) Se encarga de cumplir las normas ✓
- d) Ninguna de las anteriores

6. ¿Cuáles son las funciones del comité de convivencia?

- a) Atender problemas personales
- ☒ b) Analizar el ambiente de convivencia laboral, dignidad e integridad de las personas en el trabajo, con el objeto de mantener un buen o mejor aún excelente clima laboral
- c) Atender y buscar la resolución de casos reportados de daños ambientales
- d) Correctas b. y c.

7.Cuál es el procedimiento a seguir para reportar un accidente o incidente laboral?

- ☒ a) Notificar al profesional SST del evento o jefe inmediato, notificar al área Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigirse a la clínica en caso de ser necesario.
- b) Informar al compañero de trabajo
- c) Dirigirse a la clínica a recibir atención médica ✓
- d) Continuar laborando normalmente

8. ¿Por qué se debe implementar la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Consorcio?

- a) Para que nos paguen mejor
- b) Para lograr mejores condiciones laborales
- c) Para evitar que se presenten accidentes y enfermedades laborales ✓
- ☒ d) B y C son correctas
- e) Ninguna de las anteriores

9. Seleccione los factores de riesgos a lo que usted está expuesto en su trabajo, de acuerdo con la inducción que acaba de recibir.

- ☒ a) Caldas al mismo y distinto nivel
- ☒ b) No tener elementos de protección personal
- c) Drogas
- d) Desastres naturales
- e) Estrés laboral
- f) Accidentes de tránsito ✓
- g) Agresión por parte del público
- h) Virus, bacterias, hongos
- i) Ruido
- j) Iluminación
- k) Vibraciones
- l) Movimientos repetitivos
- m) Postura prolongada bípeda (de pie)
- n) Postura prolongada sedente (sentado)
- o) Atrapamiento por herramientas manuales
- p) Muerte por descarga eléctrica
- q) Quemaduras por manipulación de sustancias
- r) Inhalación de gases, vapores, humos

10. Si usted dentro de sus funciones laborales tiene personas a cargo, conteste la siguiente pregunta.

Es mi obligación:

- a) Reportar cuando un trabajador sufre un Accidente Laboral
- b) Reportar cuando un trabajador no usa los EPP (elementos de protección personal)
- c) Dar inducción sobre los procesos específicos de la tarea
- ☒ d) Todas las anteriores ✓

Javier Causado S

Firma del Participante

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO****EVALUACIÓN INDUCCIÓN**

Código: PGIO-F27

Versión: 01

Fecha: 19-02-2024

Página: 1 de 2

CALIFICACION: 4.8

FECHA: 19/02/2024

NOMBRE COMPLETO: CAMILO JOSE HERNANDEZ VILLALBA

IDENTIFICACIÓN: 7.003.563.000

CARGO: AYUDANTE

INDUCCIÓN ☒REINDUCCIÓN ☐**Marque con una X la respuesta correcta****1. ¿Cuál de las siguientes frases se evidencian en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio?:**

- ☒ a) Compromiso con la protección y promoción de la salud de los empleados, procurando conservar su integridad física mediante la gestión de los peligros y riesgos
- ☐ b) El consorcio luchará contra el acoso laboral desde un punto de vista preventivo y rechaza de raíz el acoso laboral, en todas sus modalidades y formas, sin primar quién sea la víctima o el ofensor, ni cuál sea su rango jerárquico.
- ☐ c) Destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios.
- ☐ d) Cumpliendo los requisitos legales aplicables

2. ¿Quién debe ser el principal responsable de la salud, cuidado e integridad de cada trabajador?

- ☐ a) El jefe de área
- ☒ b) El empleador
- ☐ c) Cada uno de los trabajadores
- ☐ d) El vecino

Y

3. Cuáles de las siguientes frases se enmarcan en mis responsabilidades como trabajador:

- ☒ a) Usar los Elementos de Protección Personal (EPP)
- ☒ b) Reportar las condiciones o actos que puedan generar accidentes o enfermedades al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de los formatos o correo electrónico
- ☐ c) Generar chismes entre mis compañeros
- ☒ d) Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud
- ☒ e) Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
- ☐ f) Reportar los accidentes que ocurran en mi casa
- ☐ g) Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente
- ☐ h) Cruzar por los puentes peatonales cuando salga de mi casa
- ☐ i) Llevar a los niños a la escuela

4. La siguiente descripción hace referencia a: "Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo o por orden directa del jefe inmediato y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte"

- ☐ a) Incidente de trabajo
- ☐ b) Accidente común
- ☐ c) Enfermedad laboral
- ☒ d) Accidente laboral



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO

EVALUACIÓN INDUCCIÓN

Código: PGIO-F27.

Versión: 01

Fecha: 19-02-2024

Página: 2 de 2

5. ¿Para qué sirve el COPASST?

- a) Apoyo para el trabajador al momento de presentar quejas
- ☒ b) Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo
- c) Se encarga de cumplir las normas
- d) Ninguna de las anteriores

6. ¿Cuáles son las funciones del comité de convivencia?

- a) Atender problemas personales
- ☒ b) Analizar el ambiente de convivencia laboral, dignidad e integridad de las personas en el trabajo, con el objeto de mantener un buen o mejor aún excelente clima laboral
- c) Atender y buscar la resolución de casos reportados de daños ambientales
- d) Correctas b. y c.

7. ¿Cuál es el procedimiento a seguir para reportar un accidente o incidente laboral?

- ☒ a) Notificar al profesional SST del evento o jefe inmediato, notificar al área Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigirse a la clínica en caso de ser necesario.
- b) Informar al compañero de trabajo
- c) Dirigirse a la clínica a recibir atención médica
- d) Continuar laborando normalmente

8. ¿Por qué se debe implementar la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Consorcio?

- a) Para que nos paguen mejor
- b) Para lograr mejores condiciones laborales
- c) Para evitar que se presenten accidentes y enfermedades laborales
- ☒ d) B y C son correctas
- e) Ninguna de las anteriores

9. Seleccione los factores de riesgos a lo que usted está expuesto en su trabajo, de acuerdo con la inducción que acaba de recibir.

- ☒ a) Caídas al mismo y distinto nivel
- ☒ b) No tener elementos de protección personal
- c) Drogas
- ☒ d) Desastres naturales
- ☒ e) Estrés laboral
- f) Accidentes de tránsito
- g) Agresión por parte del público
- ☒ h) Virus, bacterias, hongos
- i) Ruido
- j) Iluminación
- ☒ k) Vibraciones
- l) Movimientos repetitivos
- ☒ m) Postura prolongada bípeda (de pie)
- n) Postura prolongada sedente (sentado)
- o) Atrapamiento por herramientas manuales
- p) Muerte por descarga eléctrica
- q) Quemaduras por manipulación de sustancias
- r) Inhalación de gases, vapores, humos

10. Si usted dentro de sus funciones laborales tiene personas a cargo, conteste la siguiente pregunta.

Es mi obligación:

- a) Reportar cuando un trabajador sufre un Accidente Laboral
- b) Reportar cuando un trabajador no usa los EPP (elementos de protección personal)
- c) Dar inducción sobre los procesos específicos de la tarea
- ☒ d) Todas las anteriores

Pamilo Jose

Firma del Participante

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO****EVALUACIÓN INDUCCIÓN**

Código: PGIO-F27

Versión: 01

Fecha: 19-02-2024

Página: 1 de 2

CALIFICACION: 4.8FECHA: 19/10/2024NOMBRE COMPLETO: JADER MANUEL CECILIO ESPINAIDENTIFICACIÓN: 7070.312.777CARGO: AYUDANTE

INDUCCIÓN

☒

REINDUCCIÓN

☐**Marque con una X la respuesta correcta****1. ¿Cuál de las siguientes frases se evidencian en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio?:**

- ☒ a) Compromiso con la protección y promoción de la salud de los empleados, procurando conservar su integridad física mediante la gestión de los peligros y riesgos
- b) El consorcio luchará contra el acoso laboral desde un punto de vista preventivo y rechaza de raíz el acoso laboral, en todas sus modalidades y formas, sin primar quién sea la víctima o el ofensor, ni cuál sea su rango jerárquico.
- c) Destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios.
- d) Cumpliendo los requisitos legales aplicables

2. ¿Quién debe ser el principal responsable de la salud, cuidado e integridad de cada trabajador?

- a) El jefe de área
- ☒ b) El empleado
- c) Cada uno de los trabajadores
- d) El vecino

3. Cuáles de las siguientes frases se enmarcan en mis responsabilidades como trabajador:

- ☒ a) Usar los Elementos de Protección Personal (EPP)
- ☒ b) Reportar las condiciones o actos que puedan generar accidentes o enfermedades al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de los formatos o correo electrónico
- c) Generar chismes entre mis compañeros
- ☒ d) Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud
- ☒ e) Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
- f) Reportar los accidentes que ocurran en mi casa
- ☒ g) Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente
- h) Cruzar por los puentes peatonales cuando salga de mi casa
- i) Llevar a los niños a la escuela

4. La siguiente descripción hace referencia a: "Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo o por orden directa del jefe inmediato y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte"

- a) Incidente de trabajo
- b) Accidente común
- c) Enfermedad laboral
- ☒ d) Accidente laboral



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO

EVALUACIÓN INDUCCIÓN

Código: PGIO-F27

Versión: 01

Fecha: 19-02-2024

Página: 2 de 2

5. ¿Para qué sirve el COPASST?

- a) Apoyo para el trabajador al momento de presentar quejas
- ☒ b) Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo
- c) Se encarga de cumplir las normas
- d) Ninguna de las anteriores

6. ¿Cuáles son las funciones del comité de convivencia?

- a) Atender problemas personales
- ☒ b) Analizar el ambiente de convivencia laboral, dignidad e integridad de las personas en el trabajo, con el objeto de mantener un buen o mejor aún excelente clima laboral
- c) Atender y buscar la resolución de casos reportados de daños ambientales
- d) Correctas b. y c.

7.Cuál es el procedimiento a seguir para reportar un accidente o incidente laboral?

- ☒ a) Notificar al profesional SST del evento o jefe inmediato, notificar al área Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigirse a la clínica en caso de ser necesario.
- b) Informar al compañero de trabajo
- c) Dirigirse a la clínica a recibir atención médica
- d) Continuar laborando normalmente

8. ¿Por qué se debe implementar la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Consorcio?

- a) Para que nos paguen mejor
- b) Para lograr mejores condiciones laborales
- c) Para evitar que se presenten accidentes y enfermedades laborales
- ☒ d) B y C son correctas
- e) Ninguna de las anteriores

9. Seleccione los factores de riesgos a lo que usted está expuesto en su trabajo, de acuerdo con la inducción que acaba de recibir.

- | | |
|--|---|
| ☒ a) Caídas al mismo y distinto nivel | j) Iluminación |
| ☒ b) No tener elementos de protección personal | k) Vibraciones |
| c) Drogas | l) Movimientos repetitivos |
| d) Desastres naturales | ☒ m) Postura prolongada bípeda (de pie) |
| e) Estrés laboral | n) Postura prolongada sedente (sentado) |
| f) Accidentes de tránsito | o) Atrapamiento por herramientas manuales |
| ☒ g) Agresión por parte del público | p) Muerte por descarga eléctrica |
| h) Virus, bacterias, hongos | q) Quemaduras por manipulación de sustancias |
| i) Ruido | r) Inhalación de gases, vapores, humos |

10. Si usted dentro de sus funciones laborales tiene personas a cargo, conteste la siguiente pregunta.

Es mi obligación:

- a) Reportar cuando un trabajador sufre un Accidente Laboral
- b) Reportar cuando un trabajador no usa los EPP (elementos de protección personal)
- c) Dar inducción sobre los procesos específicos de la tarea
- ☒ d) Todas las anteriores

JADER COLON OSPINA.

Firma del Participante



EVALUACIÓN INDUCCIÓN

Código: PGIO-F27

Versión: 01

Fecha: 19-02-2024

Página: 1 de 2

CALIFICACION: 4.3

FECHA: 19/02/2024

NOMBRE COMPLETO: SAMUEL RAVELES GUINTERO

IDENTIFICACIÓN: 7.068.737.586

CARGO: AYUDANTE

INDUCCIÓN ☒REINDUCCIÓN ☐

Marque con una X la respuesta correcta

1. ¿Cuál de las siguientes frases se evidencian en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio?:

- ☒ a) Compromiso con la protección y promoción de la salud de los empleados, procurando conservar su integridad física mediante la gestión de los peligros y riesgos
- b) El consorcio luchará contra el acoso laboral desde un punto de vista preventivo y rechaza de raíz el acoso laboral, en todas sus modalidades y formas, ~~sin~~ primar quién sea la víctima o el ofensor, ni cuál sea su rango jerárquico.
- c) Destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios.
- d) Cumpliendo los requisitos legales aplicables

2. ¿Quién debe ser el principal responsable de la salud, cuidado e integridad de cada trabajador?

- a) El jefe de área
- ☒ b) El empleador
- c) Cada uno de los trabajadores
- d) El vecino

Y

3. Cuáles de las siguientes frases se enmarcan en mis responsabilidades como trabajador:

- ☒ a) Usar los Elementos de Protección Personal (EPP)
- ☒ b) Reportar las condiciones o actos que puedan generar accidentes o enfermedades al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de los formatos o correo electrónico
- c) Generar chismes entre mis compañeros
- ☒ d) Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud
- ☒ e) Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
- f) Reportar los accidentes que ocurran en mi casa
- g) Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente
- h) Cruzar por los puentes peatonales cuando salga de mi casa
- i) Llevar a los niños a la escuela

4. La siguiente descripción hace referencia a: "Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo o por orden directa del jefe inmediato y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte"

- a) Incidente de trabajo
- b) Accidente común
- c) Enfermedad laboral
- ☒ d) Accidente laboral

**PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO****EVALUACIÓN INDUCCIÓN**

Código: PGIO-F27

Versión: 01

Fecha: 19-02-2024

Página: 2 de 2

5. ¿Para qué sirve el COPASST?

- a) Apoyo para el trabajador al momento de presentar quejas
- b) Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo
- ☒ c) Se encarga de cumplir las normas
- d) Ninguna de las anteriores

6. ¿Cuáles son las funciones del comité de convivencia?

- a) Atender problemas personales
- ☒ b) Analizar el ambiente de convivencia laboral, dignidad e integridad de las personas en el trabajo, con el objeto de mantener un buen o mejor aún excelente clima laboral
- c) Atender y buscar la resolución de casos reportados de daños ambientales
- d) Correctas b. y c.

7.Cuál es el procedimiento a seguir para reportar un accidente o incidente laboral?

- ☒ a) Notificar al profesional SST del evento o jefe inmediato, notificar al área Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigirse a la clínica en caso de ser necesario.
- b) Informar al compañero de trabajo
- c) Dirigirse a la clínica a recibir atención médica
- d) Continuar laborando normalmente

8. ¿Por qué se debe implementar la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Consorcio?

- a) Para que nos paguen mejor
- b) Para lograr mejores condiciones laborales
- c) Para evitar que se presenten accidentes y enfermedades laborales
- ☒ d) B y C son correctas
- e) Ninguna de las anteriores

9. Seleccione los factores de riesgos a lo que usted está expuesto en su trabajo, de acuerdo con la inducción que acaba de recibir.

- | | |
|---|--|
| ☒ a) Caídas al mismo y distinto nivel | ☐ j) Iluminación |
| ☒ b) No tener elementos de protección personal | ☐ k) Vibraciones |
| ☒ c) Drogas | ☐ l) Movimientos repetitivos |
| ☐ d) Desastres naturales | ☐ m) Postura prolongada bípeda (de pie) |
| ☒ e) Estrés laboral | ☐ n) Postura prolongada sedente (sentado) |
| ☐ f) Accidentes de tránsito | ☐ o) Atrapamiento por herramientas manuales |
| ☐ g) Agresión por parte del público | ☐ p) Muerte por descarga eléctrica |
| ☐ h) Virus, bacterias, hongos | ☐ q) Quemaduras por manipulación de sustancias |
| ☒ i) Ruido | ☐ r) Inhalación de gases, vapores, humos |

10. Si usted dentro de sus funciones laborales tiene personas a cargo, conteste la siguiente pregunta.**Es mi obligación:**

- a) Reportar cuando un trabajador sufre un Accidente Laboral
- b) Reportar cuando un trabajador no usa los EPP (elementos de protección personal)
- c) Dar inducción sobre los procesos específicos de la tarea
- ☒ d) Todas las anteriores

Samuel B.
Firma del Participante



CALIFICACIÓN:

4.8

FECHA: 27/02/24

NOMBRE COMPLETO: VALENTA RIVERA JOSE MANUEL

IDENTIFICACIÓN: 7064985043

CARGO: Oficial

INDUCCIÓN



REINDUCCIÓN



Marque con una X la respuesta correcta

1. ¿Cuál de las siguientes frases se evidencian en la Política de Seguridad y Salud en el Trabajo del Consorcio?:

- ☒ a) Compromiso con la protección y promoción de la salud de los empleados, procurando conservar su integridad física mediante la gestión de los peligros y riesgos
- b) El consorcio luchará contra el acoso laboral desde un punto de vista preventivo y rechaza de raíz el acoso laboral, en todas sus modalidades y formas, sin primar quién sea la víctima o el ofensor, ni cuál sea su rango jerárquico.
- c) Destinando los recursos humanos, físicos y financieros necesarios.
- d) Cumpliendo los requisitos legales aplicables

2. ¿Quién debe ser el principal responsable de la salud, cuidado e integridad de cada trabajador?

- a) El jefe de área
- ☒ b) El empleador
- c) Cada uno de los trabajadores
- d) El vecino

3. Cuáles de las siguientes frases se enmarcan en mis responsabilidades como trabajador:

- ☒ a) Usar los Elementos de Protección Personal (EPP)
- ☒ b) Reportar las condiciones o actos que puedan generar accidentes o enfermedades al área de Seguridad y Salud en el Trabajo, a través de los formatos o correo electrónico
- c) Generar chismes entre mis compañeros
- ☒ d) Suministrar información clara, completa y veraz sobre su estado de salud
- ☒ e) Participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo
- f) Reportar los accidentes que ocurran en mi casa
- g) Reportar inmediatamente todo accidente de trabajo o incidente
- h) Cruzar por los puentes peatonales cuando salga de mi casa
- i) Llevar a los niños a la escuela

4. La siguiente descripción hace referencia a: "Todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo o por orden directa del jefe inmediato y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o la muerte"

- a) Incidente de trabajo
- b) Accidente común
- c) Enfermedad laboral
- ☒ d) Accidente laboral



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO

EVALUACIÓN INDUCCIÓN

Código: PGIO-F27

Versión: 01

Fecha: 19-02-2024

Página: 2 de 2

5. ¿Para qué sirve el COPASST?

- a) Apoyo para el trabajador al momento de presentar quejas
- ☒ b) Es un organismo de promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de Seguridad y Salud en el Trabajo
- c) Se encarga de cumplir las normas
- d) Ninguna de las anteriores

6. ¿Cuáles son las funciones del comité de convivencia?

- a) Atender problemas personales
- ☒ b) Analizar el ambiente de convivencia laboral, dignidad e integridad de las personas en el trabajo, con el objeto de mantener un buen o mejor aún excelente clima laboral
- c) Atender y buscar la resolución de casos reportados de daños ambientales
- d) Correctas b. y c.

7.Cuál es el procedimiento a seguir para reportar un accidente o incidente laboral?

- ☒ a) Notificar al profesional SST del evento o jefe inmediato, notificar al área Seguridad y Salud en el Trabajo, dirigirse a la clínica en caso de ser necesario.
- b) Informar al compañero de trabajo
- c) Dirigirse a la clínica a recibir atención médica
- d) Continuar laborando normalmente

8. ¿Por qué se debe implementar la Seguridad y Salud en el Trabajo en el Consorcio?

- a) Para que nos paguen mejor
- ☒ b) Para lograr mejores condiciones laborales
- ☒ c) Para evitar que se presenten accidentes y enfermedades laborales
- d) B y C son correctas
- e) Ninguna de las anteriores

9. Seleccione los factores de riesgos a lo que usted está expuesto en su trabajo, de acuerdo con la inducción que acaba de recibir.

- | | |
|--|---|
| ☒ a) Caídas al mismo y distinto nivel | ☐ j) Iluminación |
| ☒ b) No tener elementos de protección personal | ☒ k) Vibraciones |
| ☒ c) Drogas | ☐ l) Movimientos repetitivos |
| ☒ d) Desastres naturales | ☒ m) Postura prolongada bipeda (de pie) |
| e) Estrés laboral | ☐ n) Postura prolongada sedente (sentado) |
| ☒ f) Accidentes de tránsito | ☐ o) Atrapamiento por herramientas manuales |
| g) Agresión por parte del público | ☐ p) Muerte por descarga eléctrica |
| ☒ h) Virus, bacterias, hongos | ☐ q) Quemaduras por manipulación de sustancias |
| ☒ i) Ruido | ☐ r) Inhalación de gases, vapores, humos |

10. Si usted dentro de sus funciones laborales tiene personas a cargo, conteste la siguiente pregunta.

Es mi obligación:

- a) Reportar cuando un trabajador sufre un Accidente Laboral
- b) Reportar cuando un trabajador no usa los EPP (elementos de protección personal)
- c) Dar inducción sobre los procesos específicos de la tarea
- ☒ d) Todas las anteriores

José Manuel Valeta
Firma del Participante



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Código: PGIO-F12

Versión: 01

Fecha: 19-02-2024

Página: 1 de 3

PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

CARGOS

Oficiales y Ayudantes

ACTIVIDADES

Fundido de concreto, armado de acero, uso de equipos, instalación paramolinos y pabardores.

FECHA DE NOTIFICACIÓN

79/02/2024

RIESGO

DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	EFFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES
Virus	Biológico	Enfermedad COVID-19, Infección Respiratoria Aguda (IRA) Enfermedad pulmonar crónica, neumonía o isleita.	Tapabocas Vacunación Capacitaciones en prevención de contagio y medidas de bioseguridad
Bacterias	Biológico	Enfermedades infecciosas, hongos, virus	Charlas de autocuidado ATS
Picaduras Mordeduras	Biológico	Fiebre, enfermedades producidas por picaduras, lesiones menores en la piel	Procedimientos de segundas Fumigación de áreas, poda de malezas y vegetación no deseada
Sobreesfuerzos	Biomecánico	Lesiones osteomusculares, dolores en el cuerpo	Pausas activas Charlas de autocuidado Programa de prevención osteomuscular ATS
Posturas prolongadas y repetitivas	Biomecánico	Lumbalgia, Problemas osteomusculares, Cansancio.	Pausas activas Charlas de autocuidado Programa de prevención osteomuscular ATS
Movimientos repetitivos	Biomecánico	Lesiones osteomusculares, Cansancio	Pausas activas Charlas de autocuidado Programa de prevención osteomuscular ATS
Locativo Superficies de trabajo	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Golpes y/o contusiones Caídas a mismo y distinto nivel	Elementos de Protección Personal Instalación de señalización preventiva Nivelación de superficies
Locativo Condiciones de orden y uso	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Golpes, heridas, empujones, resbalones, Caídas a un mismo nivel	Elementos de Protección Personal Instalación de señalización preventiva Jornadas de orden y aseo
Contacto eléctrico	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Lesiones por energización (Alta y baja tensión)	Elementos de Protección Personal Señalización preventiva Inspección y mantenimiento de conexiones eléctricas
Publico Robos, Altracos, Asaltos	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Heridas, golpes, contusiones.	Capacitaciones sobre autocuidado Limitación de áreas Vigilancia
Accidentes de tránsito	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Fuльтиmatismos leves a severos	Seguridad Vial y Manejo Defensivo Mantenimiento de vehículos y maquinaria
Manejo inadecuado de herramientas manuales	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Golpes, heridas	Elementos de Protección Personal Inspección de herramientas Guardas de seguridad
Resacas, tormentas, ventarales, inundaciones	FENOMENOS NATURALES	Heridas, lesiones, atrapamientos	Entrenamiento al personal, participación en simulacros Pruebas conformadas y actividades, botadores, camillas, cobertor, botador, instalaciones señalizadas
Exposición a luz solar directa y luz deficiente	FÍSICO	Cansancio visual, pérdida parcial de la visión, fatiga, disminución de la destreza manual, mareos, dolor de ojos, agravamiento de trastornos cardiovasculares	Rotación de personal Mediciones Ambientales Hidratación constante Exámenes periódicos
Vibración	FÍSICO	Trastornos articulares, coágulos vasculares, alteración del sistema nervioso central, pérdida de la capacidad auditiva, dolor de espalda	Mantenimiento de Maquinaria, equipos y herramientas Elementos de Protección Personal Elementos de Protección Personal Inspecciones de seguridad
Ruido	FÍSICO	Cefaleas, Agresividad, Bajo rendimiento, Insomnio, Baja percepción del riesgo, Alteraciones auditivas, Disminución de la concentración	Mantenimiento de Maquinaria, equipos y herramientas Elementos de Protección Personal Inspecciones de seguridad
Contacto con Líquidos ACPM, Aceites, grasas y gases de soldadura autógena	QUÍMICO	Irritación de la piel, irritación en los ojos, quemaduras	Elementos de Protección Personal Inspecciones de seguridad Mantenimiento de Maquinaria, equipos y herramientas
Presencia de gases, vapores, humos.	QUÍMICO	Quemadura, neumonitis, bronquitis, neuritis, asma, prurito, EPOC, cáncer y muerte	Elementos de Protección Personal Inspecciones de seguridad Mantenimiento de Maquinaria, equipos y herramientas
Contacto o aspiradura de sustancias químicas	QUÍMICO	Irritación (piel, ojos, vías respiratorias), Intoxicación leve o severa	Elementos de Protección Personal Inspecciones de seguridad Rotación de sustancias químicas
Condiciones de trabajo Monotonía del trabajo, carga mental	PSICOSOCIAL	Estrés laboral, fatiga, agotamiento, Cansancio físico, Dismorfo	Capacitación Cantidad de convivencia laboral
¿OTRO?, ¿CUAL?			
¿OTRO?, ¿CUAL?			



PLAN DE GESTIÓN INTEGRAL DE OBRA - PGIO

NOTIFICACIÓN DE RIESGOS

Código: PGIO-F12

Versión: 01

Fecha: 19-02-2024

Página: 1 de 3

PROYECTO		"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".	
CARGOS		Ayudantes	
ACTIVIDADES		fundidos de concreto, armado de acero, uso de equipos, instalación pasadores.	
FECHA DE NOTIFICACIÓN		22/10/24	
RIESGO			
DESCRIPCIÓN	CLASIFICACIÓN	EFFECTOS POSIBLES	CONTROLES EXISTENTES
Virus	BIOLOGICO	Enfermedad COVID-19, Infección Respiratoria Aguda (IRA), Enfermedad pulmonar crónica, neumonía o muerte.	Tapabocas Vacunación Capacitaciones en prevención del contagio y medidas de bioseguridad
Bacterias	BIOLOGICO	Enfermedades infecciosas, hongos, virus	Charlas de autocuidado ATS
Picaduras Mordeduras	BIOLOGICO	Fiebre, enfermedades producidas por picaduras, lesiones menores en la piel	Procedimientos de seguridad Fumigación de áreas, poda de malezas y vegetación no deseada
Sobreesfuerzos	BIOMECANICO	Lesiones osteomusculares, dolores en el cuerpo	Pauses activas Charlas de autocuidado Programa de prevención osteomuscular ATS
Posturas prolongadas y mantenidas	BIOMECANICO	Lumbalgia, Problemas osteomusculares, Cansancio.	Pauses activas Charlas de autocuidado Programa de prevención osteomuscular ATS
Movimientos repetitivos	BIOMECANICO	Lesiones osteomusculares, Cansancio	Pauses activas Charlas de autocuidado Programa de prevención osteomuscular ATS
Locativo Superficies de trabajo	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Golpes y/o contusiones Caídas a mismo y distinto nivel	Elementos de Protección Personal Instalación de señalización preventiva Inspección de superficies
Locativo Condiciones de orden y aseo	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Golpes, heridas, laceraciones, raspones, Caídas a un mismo nivel	Elementos de Protección Personal Instalación de señalización preventiva Juntas de orden y aseo
Contacto eléctrico	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Lesiones por electrificación (Alta y baja tensión)	Elementos de Protección Personal Señalización preventiva Inspección y mantenimiento de conexiones eléctricas Capacitaciones sobre autocuidado Limitación de áreas Vigilancia
Público Robos, Alarcos Accidentes	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Fendos, golpes, contusiones.	Segundas Vías y Manejo Defensivo Mantenimiento de vehículos y maquinaria Elementos de Protección Personal Inspección de herramientas Guardas de seguridad
Accidentes de tránsito	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Politraumatismos leves o severos	Entrenamiento al personal, participación en simulacros. Brigadas conformadas y entrenadas, Extintores, camillas, botiquín de primeros auxilios, instalaciones señalizadas
Mecánico Manejo inadecuado de herramientas manuales Sismos, tormentas, vientos, inundaciones	CONDICIONES DE SEGURIDAD	Golpes, heridas	Dulzón correcta Verificación Anticorrosivos Indicación constante Exámenes periódicos
Iluminación Luz solar directa y luz deficiente	FISICO	Cansancio visual, pérdida parcial de la visión, fatiga, disminución de la destreza manual, mareos, desmayos, agravamiento de trastornos cardiovasculares. Trastornos articulares, daños vasculares, alteración de sistema nervioso central, pérdida de la capacidad auditiva, dolor de espalda	Mantenimiento de Maquinaria, equipos y herramientas Elementos de Protección Personal Inspecciones de seguridad Mantenimiento de Maquinaria, equipos y herramientas
Vibración	FISICO	Cefaleas, Agresividad, Bajo rendimiento, Insomnio, Baja percepción del riesgo, Alteraciones auditivas, Disminución de la concentración	Elementos de Protección Personal Inspecciones de seguridad Mantenimiento de Maquinaria, equipos y herramientas
Ruido	FISICO	Iritación de la piel, irritación en los ojos, quemaduras	Elementos de Protección Personal Inspecciones de seguridad Mantenimiento de Maquinaria, equipos y herramientas
Contacto con Líquidos ACPM, Aceites, grasas y gases de soldadura autógena	QUIMICO	Quemadura, neumonitis, hipoxia, neumonitis, asma profesional, EPOC, cáncer y muerte.	Elementos de Protección Personal Inspecciones de seguridad Mantenimiento de Maquinaria, equipos y herramientas
Presencia de gases, vapores, humos.	QUIMICO	Iritación (piel, ojos, vías respiratorias), intoxicación leve o severa	Elementos de Protección Personal Inspecciones de seguridad Mantenimiento de Maquinaria, equipos y herramientas
Contacto o soldadura de sustancia química	QUIMICO	Estrés laboral, fatiga, agotamiento, Cansancio físico, Desconfort	Capacitación Comité de convivencia laboral
Condiciones de la tarea Monotonía del trabajo, carga mental	PSICOSOCIAL		
¿OTRO?, ¿CUAL?			
¿OTRO?, ¿CUAL?			

AUXILIAR \$ST

	<p>INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>	 CONSORCIO INGECON-INCO
---	--	--


**ANEXO 7. PREOPERACIONALES OCTUBRE CTO LP-008-2023 SAN
BERNARDO DEL VIENTO**

INSPECCIÓN A PREOPERACIONAL MAQUINARIA

	INSPECCIÓN A PREOPERACIONAL MAQUINARIA		
	CÓDIGO: PGIO-F23	VERSIÓN: 01	FECHA: 18/02/2024

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio de San Bernardo del Viento Departamento de Córdoba"		
MÁQUINA	VIBRO COMPACTADOR		
MARCA	INPEKSOL RSC	OPERADOR	CELA M. J. P. R. E. Z.
MODELO		PERIODO INSPECCIÓN	DESDE 07-10-24 HASTA 12-10-24

SISTEMA	DESCRIPCIÓN	NO APLICA	LUNES		MARTES		MIÉRCOLES		JUEVES		VIERNES		SÁBADO		DOMINGO	
			B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M
ELÉCTRICO / TABLERO DE CONTROL	Funcionamiento y estado de batería, bombas y cables		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de temperatura		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de aceite		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de batería		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de refrigerante		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de combustible		X		X		X		X		X		X			
	Indicador de filtro de aire		X		X		X		X		X		X			
	Horómetro		X		X		X		X		X		X			
LUCES	Frontales de trabajo		X		X		X		X		X		X			
	Traseras de trabajo (Reflector)		X		X		X		X		X		X			
	Direccionales	X														
	De stop y señal trasera	X														
HIDRÁULICO	Nivel de aceite del motor (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Nivel de aceite de la transmisión (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Nivel del sistema hidráulico (verificar ausencia de fugas)		X		X		X		X		X		X			
	Nivel del líquido refrigerante (verificar ausencia de fugas)	X														
MECÁNICO	Fugas hidráulicas		X		X		X		X		X		X			
	Pasadores, suspensión		X		X		X		X		X		X			
	Pedales	X														
	Orugas (tensionadas)		X		X		X		X		X		X			
	Mecanismos de giro		X		X		X		X		X		X			
	Bomba hidráulica		X		X		X		X		X		X			
	Mandos de avance		X		X		X		X		X		X			
	Mando de estacionamiento		X		X		X		X		X		X			
	Estado general balda	X			X											
	Ruidos extraños en el motor		X		X		X		X		X		X			
GENERAL	Pito			X		X		X		X		X		X		
	Alarma de retroceso			X		X		X		X		X		X		
	Freno de servicio		X		X		X		X		X		X			
	Freno de emergencia		X		X		X		X		X		X			
	Cinturón de seguridad		X		X		X		X		X		X			
	Cabina entubulada (R.O.P.S) certificada		X	X		X		X		X		X		X		
	Extintor contra incendios															
	Asiento		X		X		X		X		X		X			
	Llantas sin cortaduras profundas o abultamientos		X		X		X		X		X		X			
	Escaleras y apoyos de acceso		X		X		X		X		X		X			

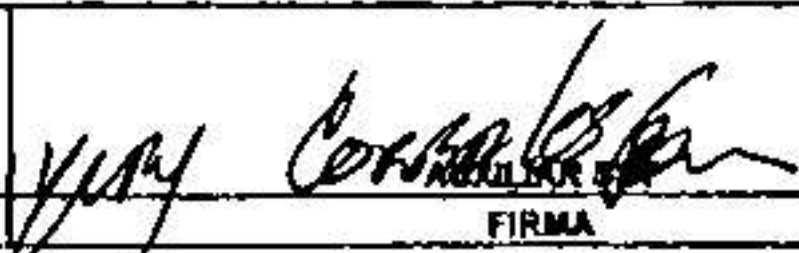OBSERVACIONES		
CELA M. J. P. R. E. Z. OPERADOR		
FIRMA	FIRMA	FIRMA



INVENTARIO E INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

CÓDIGO: PGIO-F10

VERSIÓN: 01

FECHA: 19/02/2024

PROYECTO


"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

FECHA


24/10/24

No	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO		OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	
1	INICIO DE OBRA	1	B		
2	PARA SIGA	2	B		
3	BARRERA	1	B		
4	FIN DE OBRA	1	B		
5	COLOMBINAS	6	B		
6	BOTIQUIN	1	B		
7	EXTINTOR	1	B		
8	DESVIOS	2	B		
9	TRABAJO EN LA VIA	1	B		
10	MAQUINARIA EN LA VIA	1	B		
11	PELIGRO DE OBSTACULOS	1	B		
12	SALIDA DE EMERGENCIA	1	B		
13	CINTA PELIGRO	1	B		
14	FIN DE OBRA	1	B		
15					

AUXILIAR SST


FIRMA

COORDINADOR SST



	<p>INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>	 <p>CONSORCIO INGECON-INCO</p>
---	--	---

ANEXO 8. INSPECCIONES OCTUBRE CTO LP-008-2023 SAN BERNARDO DEL VIENTO



INSPECCIÓN ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

CÓDIGO: PGIO-F06

VERSIÓN: 01

FECHA: 19/02/2024

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA"		
FECHA	27/02/24		
COORDINADOR SST	[Signature]		
UBICACIÓN	OBRA		
AUXILIAR SST	[Signature]		
SEÑALIZACIÓN S/L NO			

NOMBRE COMPLETO	LISTA DE VERIFICACIÓN														OBSERVACIONES
	CASCO		BOTAS		GUANTES		GAFAS		PROTECCIÓN AUDITIVA		PROTECCIÓN RESPIRATORIA		DOTACIÓN (CAMISA PANTALÓN)		
	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	B	M	
ALFRED WARRASO VELASQUEZ	B		B		B		B		B		B		B		
Valentin Chirica Juan	B		B		B		B						B		
Manuel Moreno Lopez	B		B		B		B						B		
WILSON GARCIA HERNANDEZ	B		B		B		B						B		
Andrés M. Ospina Gomez	B		B		B		B						B		
Andrés L. Urbina Campesano	B		B		B		B						B		
Andrés M. Colon Ospina	B		B		B		B						B		
Andrés J. Hernandez Villalobos	B		B		B		B						B		
Andrés Campesano Salcedo	B		B		B		B						B		
Andrés Bernaldo Romero	B		B		B		B						B		
Andrés B. Velasquez GARCIA	B		B		B		B						B		
Andrés F. Campesano Colon	B		B		B		B						B		
Andrés Manuel Velasco Rivera	B		B		B		B		B				B		





INSPECCIÓN A BOTIQUÍN

CÓDIGO: PGIO-F05

VERSIÓN: 01

FECHA: 19/02/2024

PROYECTO	"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio de San Bernardo del Viento Departamento de Córdoba".		
FECHA	27/10/2024		
COORDINADOR SST		AUXILIAR SST	
UBICACIÓN	OBRA		SEÑALIZACIÓN SI X NO

No.	ELEMENTO A INSPECCIONAR	CANTIDAD	FECHA DE VENCIMIENTO	CUMPLE		OBSERVACIONES
				SI	NO	
1	SOLUCIÓN SALINA 250 CC Ó 500 CC	UNIDAD	02/2026	SI		
2	ALCOHOL ANTISÉPTICO	UNIDAD	12/2025	SI		
3	BAJALENGUAS	PAQUETE X 20		SI		
4	ESPARADRAPO DE TELA ROLLO 4"	UNIDAD	03/2028	SI		
5	GASAS LIMPIAS	PAQUETE X 20		SI		
6	GUANTES DE LÁTEX	CAJA		SI		
7	YODOPOVIDONA	UNIDAD	12/07/2026	SI		
8	TERMÓMETRO	UNIDAD				
9	VENDA ELÁSTICA 2X5 YARDAS	UNIDAD	07/2028	SI		
10	VENDA ELÁSTICA 3X5 YARDAS	UNIDAD	03/2028	SI		
11	VENDA ELÁSTICA 5X5 YARDAS	UNIDAD		SI		
12	VENDA DE ALGODÓN	UNIDAD	07/2028	SI		
13	ALGODÓN	PAQUETE X 25g		SI		
14	CURAS	10 UNIDADES		SI		
15	TIJERAS	UNIDAD		SI		



INVENTARIO E INSPECCIÓN DE HERRAMIENTAS Y EQUIPOS

CÓDIGO: PGIO-F09

VERSIÓN: 01

FECHA: 19/02/2024

PROYECTO

"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias en el Municipio de San Bernardo del Viento Departamento de Córdoba".

FECHA

17/10/2024

No	HERRAMIENTA / EQUIPO	CANTIDAD	ESTADO		OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	
1	Carretilla - Buggy	2	X		
2	Pala	6	X		
3	Pico	3	X		
4	Maca	2	X		
5	Barra	2	X		
6	Barra	1	X		
7	Polipona	1	X		
8	Telepico	1	X		
9	Barra	1	X		
10	Extension	1	X		
11	Bisla	2	X		
12	Barra	2	X		
13					
14					
15					

AUXILIAR SST

FIRMA

COORDINADOR SST

FIRMA



INSPECCIÓN DE ORDEN Y ASEO

VERSION D1

PGIO-F28

PROYECTO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA".

QUIEN INSPECCIONA: *Vany Rosales Gue*

Fecha de ejecución: *24/10/2014*

5 "S"	ESTÁNDAR DE ORDEN Y ASEO	Insp. 1		
		Nivel 1	Nivel 3	Nivel 5
SEIRI Clasificar	1. En la zona de trabajo existe señalización y demarcación.			5
	2. Existen depósitos de materiales (Mecánicos o civiles)			5
	3. Existe zona de parqueo de máquinas y/o vehículos señalizada			5
	4. El almacenamiento de combustible es adecuado/líquido		3	
	5. Se dispone de un área para el consumo de alimentos			5
	6. Existe puesto a tierra de los contenedores, los cables, las herramientas y los equipos.		3	
	7. Los residuos de residuos se encuentran correctamente identificados y rotulados de acuerdo a su tipo.			5
	8. Se dispone de servicios sanitarios para las necesidades fisiológicas.			5
	9. Existe punto ecológico de residuos generados en obra			5
	10. Fuente de limitación / Señalización de Excavaciones.			5
	11. Los escombros se encuentran acopiados y dispuestos correctamente.		3	
	12. Los materiales y maquinaria se encuentran ubicados e identificados correctamente.		3	
SEITON Ordenar	13. Los frentes y pasillos de trabajo se encuentran ordenados			5
	14. Se dispone de vitros identificados para ubicar elementos que se emplean con poca frecuencia.			5
	15. La maquinaria se encuentra correctamente ordenada y limpia.			5
	16. Hay cables sueltos o a la vista en la zona de trabajo.		3	
	17. Las vías de acceso se encuentran libres de obstáculos como barriles y demás objetos.			5
	18. Las salidas de emergencia se encuentran identificadas y señalizadas.			5
	19. El punto ecológico se encuentra ordenado respecto a residuos generados en la obra.		3	
	20. Las herramientas de trabajo se encuentran correctamente ubicada y señalizadas			5
	21. La maquinaria se encuentra ubicada en el lugar correspondiente			5
	22. Se dispone de agua potable para el consumo y de vasos desechables			5
	23. Los trabajadores disponen de un área para ubicar sus pertenencias.			5
	24. Las baterías sanitarias se encuentran limpias.			5
SEISO Limpiar Inspeccionar	25. Los Planos / Pasarelas provisionales se encuentran libres de escombros, grasas y barro.		3	
	26. Se identifican frentes y puestos de trabajo limpios.		3	
	27. Se dispone de elementos para el aseo de los SPS			5
	28. El contenedor se encuentra limpio en su totalidad.			5
Señalar ESTANDARIZAR	29. Se aplican correctamente las 5 "S" aplicadas, en la zona de trabajo			5
	30. Se realizan mejoras en el ambiente de trabajo, respecto a las anteriores inspecciones? (Aplica para la segunda inspección en adelante)			5
CULTIVAR MANTENER OBTENER OBTENER	31. Se mantiene con hábitos o como norma normal, la puesta en práctica de procedimientos de las 5 "S" y de HSP-1?			5
	32. El personal realiza actividades de orden y aseo sin que se lo recuerde a los trabajadores?			5
	33. La gente sigue los cursos que se dan respecto al Orden y aseo de la zona de trabajo?			5
	34. La empresa es conciente y constante respecto a las anteriores inspecciones?			5

Calificación para cada estandar

Nivel 1 = Insatisfactorio (no se cumple con el estándar). / Nivel 3 = Aceptable (el estándar se observa parcialmente). / Nivel 5 = Satisfactorio (se cumple con el estándar).

Observaciones:

Firma Coordinador: *[Firma]*



INVENTARIO E INSPECCIÓN DE SEÑALIZACIÓN

CÓDIGO: PGIO-F10

VERSIÓN: 01

FECHA: 19/02/2024

PROYECTO


"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS Terciarias EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

FECHA


24/10/24

No	TIPO DE SEÑALIZACIÓN	CANTIDAD	ESTADO		OBSERVACIONES
			BUENO	MALO	
1	INICIO DE OBRA	1	B		
2	PARA SIGA	2	B		
3	BARRERA	1	B		
4	FIN DE OBRA	1	B		
5	COLOMBINAS	6	B		
6	BOTIQUIN	1	B		
7	EXTINTOR	1	B		
8	DESVIOS	2	B		
9	TRABAJOS EN LA VIA	1	B		
10	MAQUINARIA EN LA VIA	1	B		
11	PELIGRO DE OBSTACULOS	1	B		
12	SALIDA DE EMERGENCIA	1	B		
13	CINTA PELIGRO	1	B		
14	FIN DE OBRA	1	B		
15					

AUXILIAR SST


FIRMA

COORDINADOR SST



	<p>INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>	 CONSORCIO INGECON-INCO
---	--	--

ANEXO 9. ACTAS DE ENTREGA OCTUBRE CTO LP-008-2023 SAN BERNARDO DEL VIENTO

	<p>INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>	 CONSORCIO INGECON-INCO
---	--	--

ANEXO 10. PLANILLAS DE SEGURIDAD SOCIAL INTERVENTORIA MES DE OCTUBRE 2024

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901783007	9	CONSORCIO INGECON - INCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 148 7G 42 BARRIO CEDRO GOLF	MONTERIA-CORDOBA	4672384	Si	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1027939377	9476827200	E	2024/11/05	2024/11/05	BANCOLOMBIA	0	\$8,111,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1066729376	ABAD RAMOS ALVARO EMILIO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	EPS037	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
2	CC	1068666394	ARGEL CASTAÑO JESUS ADRIAN																		230301	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS037	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF16	30	\$2,200,000	\$88,000	14-7	30	\$2,200,000	\$153,200	30	\$0	\$0	Si	\$681,200
3	CC	1067839406	BERROCAL ARRIETA MONICA PATRICIA																		25-14	30	\$5,150,000	\$824,000	EPS002	30	\$5,150,000	\$206,000	CCF16	30	\$5,150,000	\$206,000	14-7	30	\$5,150,000	\$358,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,594,500
4	CC	1010035275	CAICEDO HERNANDEZ CRISTHIAN ALBERTO																		230201	30	\$2,200,000	\$352,000	EPS002	30	\$2,200,000	\$88,000	CCF16	30	\$2,200,000	\$88,000	14-7	30	\$2,200,000	\$153,200	30	\$0	\$0	Si	\$681,200
5	CC	26035741	GIL GONZALEZ LEIDY MARCELA																		231001	30	\$3,750,000	\$600,000	EPS037	30	\$3,750,000	\$150,000	CCF16	30	\$3,750,000	\$150,000	14-7	30	\$3,750,000	\$261,000	30	\$0	\$0	Si	\$1,161,000
6	CC	78695315	OQUENDO PAEZ NEDER ANTONIO																		230301	30	\$1,300,000	\$208,000	ESSC24	30	\$1,300,000	\$52,000	CCF16	30	\$1,300,000	\$52,000	14-7	30	\$1,300,000	\$90,500	30	\$0	\$0	Si	\$402,500
7	CC	1103094267	URZOLA BADEL VICENTE CARLOS																		25-14	30	\$5,150,000	\$824,000	EPS002	30	\$5,150,000	\$206,000	CCF16	30	\$5,150,000	\$206,000	14-7	30	\$5,150,000	\$358,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,594,500
8	CC	75075537	VARGAS DAVILA LUIS JACOBO																		25-14	30	\$5,150,000	\$824,000	EPS010	30	\$5,150,000	\$206,000	CCF16	30	\$5,150,000	\$206,000	14-7	30	\$5,150,000	\$358,500	30	\$0	\$0	Si	\$1,594,500
Total Afiliados(8)																							\$26,200,000	\$4,192,000			\$26,200,000	\$1,048,000			\$26,200,000	\$1,048,000			\$26,200,000	\$1,823,900		\$0	\$0		\$8,111,900

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901783007	9	CONSORCIO INGECON - INCO	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CL 148 7G 42 BARRIO CEDRO GOLF	MONTERIA-CORDOBA	4672384	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-10	2024-11	1027939377	9476827200	E	2024/11/05	2024/11/05	BANCOLOMBIA	0	\$8,111,900

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$4,192,000	\$0	\$0	\$4,192,000
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$600,000	\$0	\$0	\$600,000
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	3	\$2,472,000	\$0	\$0	\$2,472,000
PORVENIR	230301	800,224,808	8	3	\$768,000	\$0	\$0	\$768,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	\$352,000	\$0	\$0	\$352,000
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$1,823,900	\$0	\$0	\$1,823,900
SEGUROS BOLIVAR	14-7	860,002,503	2	8	\$1,823,900	\$0	\$0	\$1,823,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				8	\$1,048,000	\$0	\$0	\$1,048,000
COMFACOR	CCF16	891,080,005	1	8	\$1,048,000	\$0	\$0	\$1,048,000
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				8	\$1,048,000	\$0	\$0	\$1,048,000
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	1	\$52,000	\$0	\$0	\$52,000
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$206,000	\$0	\$0	\$206,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$290,000	\$0	\$0	\$290,000
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	3	\$500,000	\$0	\$0	\$500,000
TOTAL				8	\$8,111,900	\$0	\$0	\$8,111,900

Se certifica que JAIME LEONARDO ESPINOSA LLANOS identificado(a) con CC 1023865222 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S NI 810002747

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2024-10	2024-11	1028080538	9476715188	E	2024-11-05																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,300,000						\$208,000										
ARL		SEGUROS BOLIVAR		30	0.522%	\$1,300,000						\$6,800										
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$1,300,000						\$52,000										
EPS		SANITAS		30	4%	\$1,300,000						\$52,000										

Este certificado se expide el día 2024-11-29 a las 03:07.

Se certifica que ANGELA MARIA DAVILA MORALES identificado(a) con CC 42160437 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S NI 810002747																			
Periodo		Clave		Planilla		Novedades													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp
2024-10	2024-11	1028080538	9476715188	E	2024-11-05														
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización									
AFP		PROTECCION		30	16%	\$10,000,000				\$1,600,000									
AFP		FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL		30		\$10,000,000				\$50,000									
AFP		SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA		30		\$10,000,000				\$50,000									
ARL		SEGUROS BOLIVAR		30	6.96%	\$10,000,000				\$696,000									
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$10,000,000				\$400,000									
EPS		SANITAS		30	4%	\$10,000,000				\$400,000									

Este certificado se expide el día 2024-11-29 a las 03:05.


Se certifica que ANGIE KATHERINE VERSOLATTO GONZALEZ identificado(a) con CC 1110547301 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INGENIERIA Y CONSULTORIA INGECON S.A.S NI 810002747																				
Periodo		Clave		Planilla		Novedades														
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct
2024-10	2024-11	1028080538	9476715188	E	2024-11-05															
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC					Cotización									
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$3,000,000					\$480,000									
ARL		SEGUROS BOLIVAR		30	6.96%	\$3,000,000					\$208,800									
CCF		COLSUBSIDIO		30	4%	\$3,000,000					\$120,000									
EPS		SANITAS		30	4%	\$3,000,000					\$120,000									

Este certificado se expide el día 2024-11-29 a las 03:08.

	<p>INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>	 CONSORCIO INGECON-INCO
---	--	--

ANEXO 11. MATRIZ DE PELIGRO INTERVENTORIA

[illegible]

	<p>INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>	 CONSORCIO INGECON-INCO
---	--	--

ANEXO 12. PREOPERACIONALES INTERVENTORIA

FECHA: 18-11-2024 Al 23-11-2024
 CIUDAD: Las cordobas
 PLACA: RJP-508
 SEDE: Las cordobas
 MARCA: Ssangyong

Convenciones para diligenciamiento:
☒ Estándar, el elemento opera de manera segura.
☒ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo.
 N/A : No Aplica

		KILOMETRAJE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABA	DOM
	EXTERIOR	ESTANDAR							
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llantas / Rines / Pernos / Lanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	INTERIOR	ESTANDAR							
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar:Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebillas, candado y sistema retráctil	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales: manilla, cables ignición.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	MOTOR	ESTANDAR							
	Líquido de Frenos	A nivel del depósito.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Líquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Líquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Líquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cableado	Sin desgaste y conectados	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Batería.	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
CONDUCTOR	Condiciones físicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción								
Firma y C.C. de quien diligencia	Nederaquenda 78.695.315								
Firma y C.C. Área SST									
Observaciones:									



FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA MOTOCICLETA - DIARIO

SST-3-PA-133

Versión: 1

FECHA:
PLACA:
MARCA:

11-11-24 AL 16-11-24
BBA-04 H
Bajos

CARGO
CIUDAD

barrioquillo Centro punto
inspector
Las Cordobas

Convenciones para diligenciamiento
☒ Estandar, el elemento opera de manera segura
☒ Estandar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el equipo para operar
☒ N/A : No Aplica

EXTERIOR	ITEM	KILOMETRAJE	905	905	905	9080	9110	9125	DOM
		ESTANDAR	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	
	Láminas	Sin golpes, sin corrosión, sin bordes filosos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Guardabarros	Delantero / trasero en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llantas / Rines / Pernos	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 1 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sillín	En buen estado sin riesgo de desprendimiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno	Deben encender todas las luces bajas, altas, direccionales, parqueo y freno.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aseo general	Verificar aseo del equipo para mantenimiento del mismo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
INTERIOR	ITEM	ESTANDAR	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Velocímetro	El velocímetro de estar funcional	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de tensión de Clich	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cadena / sprokles	Juego libre aprox. entre 20 y 30mm en el centro. Buen estado de lubricación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno	Debe estar fijo y funcional.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Guayas	En buen estado, lubricadas, sin riesgo de desprendimiento							
MOTOR	ITEM	ESTANDAR	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
	Líquido de Frenos	A nivel del depósito.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Refrigerante	A nivel del depósito.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Combustible	Al menos a nivel medio del tanque	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cableado	En buen estado y conectado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Batería	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados y nivel en óptimo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SEGURIDAD	ITEM	ESTANDAR	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
	Equipo de lluvia	En buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Chaleco reflectivo	En buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Casco de seguridad	En buen estado, visera sin ralladuras que impidan visibilidad, NTC 4533	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Guantes	En buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Botas de seguridad	En buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bocina	Debe sonar y escucharse a volumen normal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Herramientas	Llaves, alicate, destornillador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DOCUMENTACIÓN	ITEM	ESTANDAR	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
	Cédula de ciudadanía	Poseer cédula de ciudadanía	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Licencia de conducir	Licencia vigente y según categoría correspondiente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Carné manejo defensivo	Curso vigente de manejo defensivo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tarjeta de propiedad	Poseer Tarjeta de propiedad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Revisión técnica	Revisión vigente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pólizas	Si aplica, pólizas vigentes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CONDUCTOR	Condiciones físicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción								
Firma y C.C. de quien diligencia		Jesús Arroyave 1.068666394							
Firma y C.C. del Área de seguridad y salud en el trabajo O Delegado									

FECHA: 04-11-2024 Hasta 09-11-2024
 CIUDAD: Los cordobas
 PLACA: TJP-508
 SEDE: Los cordobas
 MARCA: SsangYong

Convenciones para diligenciamiento:
☒ Estándar, el elemento opera de manera segura.
☒ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo.
 N/A : No Aplica

15685 / 1572 / 1576 / 1580 / 1585

		KILOMETRAJE	LUN	MAR	MIER	JUE	VIE	SABA	DOM
	EXTERIOR	ITEM	ESTANDAR						
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones /abren o cierran por dentro y fuera.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm		✓	✓	✓	✓	✓	
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes o fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.		✓	✓	✓	✓	✓	
	INTERIOR	ITEM	ESTANDAR						
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estandar: Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebilla, candado y sistema retráctil		✓	✓	✓	✓	✓	
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.		✓	✓	✓	✓	✓	
Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna; adicionales contractuales: manila, cables ignición.		✓	✓	✓	✓	✓		
Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Pólizas Contra/Extracontractual		✓	✓	✓	✓	✓		
	MOTOR	ITEM	ESTANDAR						
	Líquido de Frenos	A nivel del depósito.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas		✓	✓	✓	✓	✓	
	Líquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Líquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Líquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.		✓	✓	✓	✓	✓	
	Cableado	Sin desgaste y conectados		✓	✓	✓	✓	✓	
	Batería.	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.		✓	✓	✓	✓	✓	
	CONDUCTOR	Condiciones físicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción		✓	✓	✓	✓	✓	
Firma y C.C. de quien diligencia	Neder oxendo 78695315		✓	✓	✓				
Firma y C.C. Área SST			✓						
Observaciones:									




INSPECCION MENSUAL DE VEHICULOS Y CONDUCTORES

SST-3-PA-133

Versión 1

Fecha: 01-10-24	KM: 156.983	Tipo de vehículo: WAGON	Serial motor: 66495110541255
Modelo: 2012	Color: ROJO	Marca: SEAT LEON	Placa: RJP-508
N° Seguro Obligatorio SOAT: 931001237084	Fecha Vencimiento SOAT: 27/02/2025	Tipo de Combustible: DIESEL	N° Tarjeta de Propiedad:
Extracto del Contrato:	Fecha vencimiento Revisión Técnico mecánica: 27/02/2025	N° Seguro Responsabilidad Civil:	
N° Tarjeta operación:	Fecha vencimiento Tarjeta Operación:	Fecha Vencimiento SRC:	
Nombre propietario: Consultorio Ingeniería Estudios EC 40405	Cedula o Nit: 850043881	N° Licencia de tránsito: 1002199270	
Nombre del conductor: Nader Oquendo	Cedula:		

DESCRIPCION	Cant	B	M	N/A
Estado parabrisas				
Vidrio frontal		✓		
Limpia-parabrisas derecho		✓		
Limpia-parabrisas izquierdo		✓		
Lavaparabrisas		✓		
Estado de presentación				
Aseo		✓		
Latas		✓		
Pintura		✓		
Tapetes		✓		
Estado de comodidad				
Aire acondicionado		✓		
Siletería		✓		
Luz interior		✓		
Radio		✓		
Televisor		✓		
D.V.D		✓		
Estado de luces				
Luces auxiliares		✓		
Luces principales		✓		
Luces altas		✓		
Luces bajas		✓		
Direccional izq. Delantera		✓		
Direccional der. Delantera		✓		
Direccional izq. Trasera		✓		
Direccional der. Trasera		✓		
Luces de parqueo		✓		
Luz freno		✓		
Luz reverso		✓		
Luz placa		✓		
Estado espejo				
Lateral derecho		✓		
Lateral izquierdo		✓		
Retrovisor interno		✓		
Estado llantas				
Delantera derecha		✓		
Delantera izquierda		✓		
Trasera derecha		✓		
Trasera izquierda		✓		
Rines		✓		
Elementos de constata Mantenimiento				
Acéite		✓		
Cables de alta		✓		
Correa ventilador		✓		
Estado batería		✓		



DESCRIPCION	Cant	B	M	N/A
Elementos de Mantenimiento				
Filtro de aire		✓		
Líquido frenos		✓		
Líquido refrigerante		✓		
Tapa tanque combustible		✓		
Tapas recipientes volcô		✓		
Instrumentos				
Luces del tablero		✓		
Nivel combustible		✓		
Holómetro		✓		
Tacómetro		✓		
Velocímetro		✓		
Indicador de aceite		✓		
Indicador de temperatura		✓		
Elementos, Equipo y sistemas de Seguridad				
Pito		✓		
Alarma de reversa		✓		
Alarma bloqueo central		✓		
Sistema de frenos		✓		
Cinturón de seguridad		✓		
Puertas (Cierres)		✓		
Seguros de puertas		✓		
Barra antivuelco				✓
Sistema PSG				
Dirección hidráulica				
Bolsa de aire o airbag		✓		
Vidrios del parabrisas frontal		✓		
Película de seguridad del Vidrios		✓		
Ventanas		✓		
Apoya cabezas		✓		
Chaleco reflectivo		✓		
Conos o triángulos reflectivos		✓		
Tacos		✓		
Gato		✓		
Cruceña-copa rueda		✓		
Juego de herramientas		✓		
Extintor ABC				
Fecha Vencimiento extintor.				DD / MM / AAAA
Bolsquín				
Requerimientos adicionales				
Kit ambiental / Anti derrame				

Observaciones: Presenta rayones en varios rinde de la carrocería
Grietas del conductor Aterido en un costado
NOTA: Esta pendiente, el seguro de Responsabilidad civil

Quien Inspecciona / Entrega

Quien Inspecciona / Recibe

VoBo, Administrativo/Técnico/Otros



FORMATO DE INSPECCIÓN PRE OPERACIONAL PARA MOTOCICLETA - DIARIO

SST-3-PA-133

Versión: 1

FECHA:
PLACA:
MARCA:28-10-24 - 02-11-24
BBM-04 H
BAJASÁREA DE TRABAJO
CARGO
CIUDADBambagay / 1116 Costa Rica
Inspector
Los Corobos

Convenciones para diligenciamiento
✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
✗ No estándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el equipo para operar
N/A : No Aplica

EXTERIOR	ITEM	KILOMETRAJE	7.230	7.250	7.265	7.300	7.310	7.340	DOM
		ESTANDAR	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	
	Láminas	Sin golpes, sin corrosión, sin bordes flojos	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Guardabarros	Delantero / trasero en buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Llantas / Rines / Pernos	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 1 mm	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Espéjos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Sillín	En buen estado sin riesgo de desprendimiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Luces Delanteras / Traseras / Direccional / Freno	Deben encender todas las luces bajas, altas, direccionales, parqueo y freno	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aseo general	Verificar aseo del equipo para mantenimiento del mismo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	INTERIOR	ITEM	ESTANDAR	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Velocímetro	El velocímetro de estar funcional	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Estado de tensión de Cadena	Deben estar fijos y funcionales	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cadena / sprockets	Juego libre aprox. entre 20 y 30mm en el centro. Buen estado de lubricación	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Freno	Debe estar fijo y funcional	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Guías	En buen estado, lubricadas, sin riesgo de desprendimiento	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
MOTOR	ITEM	ESTANDAR	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
	Líquido de Frenos	A nivel del depósito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Refrigerante	A nivel del depósito	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Combustible	Al menos a nivel medio del tanque	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Cableado	En buen estado y conectado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Batería	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados y nivel en óptimo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
SEGURIDAD	ITEM	ESTANDAR	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
	Equipo de lluvia	En buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Chaleco reflectivo	En buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Casco de seguridad	En buen estado, visera sin ralladuras que impidan visibilidad, NTC 4533	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Guantes	En buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Botas de seguridad	En buen estado	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Bocina	Debe sonar y escucharse a volumen normal	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Herramientas	Llaves, alicate, destornillador	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
DOCUMENTACIÓN	ITEM	ESTANDAR	LUN	MAR	MIE	JUE	VIE	SAB	DOM
	Cédula de ciudadanía	Poseer cédula de ciudadanía	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Licencia de conducir	Licencia vigente y según categoría correspondiente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Camé manejo defensivo	Curso vigente de manejo defensivo	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Tarjeta de propiedad	Poseer Tarjeta de propiedad	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Revisión técnico-mecánica	Revisión vigente	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Pólizas	Si aplica, pólizas vigentes	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
CONDUCTOR	Condiciones físicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción								
Firma y C.C. de quien diligencia		Jesús Arroyel C 4-068666394							
Firma y C.C. del área de seguridad y salud en el trabajo O Delegado									

Observaciones:



FORMATO DE INSPECCIÓN MENSUAL DE MOTOCICLETA

SST-3-PA-133

Versión: 1

Fecha Inspección: 07-10-24 AL 31-10-24 Inspector: Jesus Adrian Arget Costano

Conductor: Jesus Adrian Arget C

MOTOCICLETAS

Marca: Bojas

Placa: BOM-011

Kilometraje: 7340

CARACTERÍSTICA A INSPECCIONAR		B	M	N/A
Láminas	Sin golpes, sin corrosión, sin bordes filosos	✓		
Guardabarros	Delantero / trasero en buen estado	✓		
Llantas / Rines / Pernos	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos Profundidad mín 1 mm	✓		
Espesores retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras	✓		
Sillín	En buen estado sin riesgo de desprendimiento	✓		
Luces Delanteras / Traseras / Direccionales / Freno / estacionarias	Deben encender todas las luces bajas, altas, direccionales, parqueo y freno	✓		
Aseo general	Verificar aseo del equipo para mantenimiento del mismo	✓		
Tablero / Testigos	Los testigos deben encender	✓		
Velocímetro	El velocímetro de estar funcional	✓		
Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales	✓		
Estado de tensión de Cíoché	Deben estar fijos y funcionales	✓		
Cadena / sprokes	Juego libre aprox. entre 20 y 30mm en el centro. Buen estado de lubricación	✓		
Bujes tijera	Sin desgaste	✓		
Ruedas	Sin juego axial	✓		
Kit de arrastre	cadena y plato en buen estado	✓		
Freno	Debe estar fijo, funcional y sin fugas.	✓		
Guayas	En buen estado, lubricadas, sin riesgo de desprendimiento, acción suave	✓		
Líquido de Frenos	A nivel del depósito.	✓		
Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas	✓		
Refrigerante	A nivel del depósito.	✓		
Combustible	Al menos a nivel medio del tanque	✓		
Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.	✓		
Cableado	En buen estado, aislado y conectado	✓		
Batería	Asegurada, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados y niveles de líquido en óptimo	✓		
Equipo de lluvia	En buen estado		✓	
Chaleco refractivo	En buen estado		✓	
Casco de seguridad	En buen estado, visera sin ralladuras que impidan visibilidad, NTC 4533	✓		
Guantes	En buen estado		✓	
Botas de seguridad	En buen estado		✓	
Bucina	Debe sonar y escucharse a volumen normal	✓		
Herramientas	Llaves, alicate, destornillador	✓		
Cédula de ciudadanía	Poseer cédula de ciudadanía	✓		
Licencia de conducir	Licencia vigente y según categoría correspondiente	✓		
Carné manejo defensivo	Curso vigente de manejo defensivo	✓		
Tarjeta de propiedad	Poseer Tarjeta de propiedad	✓		
Revisión técnico-mecánica	Revisión vigente	✓		
Pólizas	Si aplica, pólizas vigentes	✓		

Observaciones:

Firma Inspector: Jesus Arget C

Firma del responsable:

FECHA: 28-10-24 Hasta el 02-11-24
 CIUDAD: Los Cordobos
 PLACA: PPS-508
 SEDE: Los Cordobos
 MARCA: SSAMBYONG

Convenciones para diligenciamiento:

- ✓ Estándar, el elemento opera de manera segura
- ✗ Subestándar, compromete la seguridad del recorrido e inhabilita el vehículo para operarlo.
- N/A : No Aplica

		KILOMETRAJE	LUN	MAR	MIÉ	JUE	VIE	SAB	DOM
	EXTERIOR	ESTÁNDAR							
	Láminas / Puertas	Sin golpes, rayones (abren o cierran por dentro y fuera).	✓	✓	✓	✓	✓		
	Llantas / Rines / Pernos / Llanta de repuesto	Sin golpes, deformación, desgaste excesivo / Pernos completos. Profundidad min 2 mm	✓	✓	✓	✓	✓		
	Faros Delanteros / Traseros	Sin agua, ni golpes ni fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Vidrios / Ventanas / Limpia brisas	Sin rayones ni fisuras / Limpia brisas funcional.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, sin rupturas ni fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Extintor / Válvula / Manómetro	Carga con presión requerida y vigente.	✓	✓	✓	✓	✓		
	INTERIOR	ESTÁNDAR							
	Tablero / Testigos	Los testigos deben encender.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mandos / Pedales	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Barra de Cambio	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Freno de Parqueo	Deben estar fijos y funcionales.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cinturones de Seguridad / Hebillas / Candados	Condiciones estándar Un cinturón por silla, sin desgaste. Hebillas, candado y sistema retráctil.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Espejos retrovisores	Estables, uno en el centro, sin rupturas ni fisuras.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Bocina	Debe sonar y escucharse a 50 m.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Luces Delanteras / Traseras / Direccional / Freno / Reversa	Deben encender todas las luces bajas, medias, altas, direccionales, parqueo, freno y reversa.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Equipo de Prevención y Seguridad	botiquín, gato, cruceta, triángulos, tacos, herramienta, extintor, llanta repuesto y linterna, adicionales contractuales: manilla, cables ignición.	✓	✓	✓	✓	✓		
Documentación	C.C., Licencia conductor, Tarjeta de Propiedad, SOAT, Tecnicomecánica, Polizas Contra Extracontractual.	✓	✓	✓	✓	✓			
	MOTOR	ESTÁNDAR							
	Líquido de Frenos	A nivel del depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Aceite de Motor	A nivel de la aguja y sin impurezas.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Líquido de Embrague	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Refrigerante	A nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Líquido de dirección	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Líquido limpia brisas	En el nivel establecido en el depósito.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Correas	Estado estándar en ambas caras y tensión.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Mangueras	Sin rupturas ni desgaste, conectadas con abrazaderas.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Cableado	Sin desgaste y conectados.	✓	✓	✓	✓	✓		
	Batería	Con soporte, sin corrosión, bornes sin sulfatar y conectados.	✓	✓	✓	✓	✓		
	CONDUCTOR	Condiciones físicas y de descanso adecuadas para la actividad de conducción.	✓	✓	✓	✓	✓		
Firma y C.C. de quien diligencia	Heder Oquendo 78.695.315								
Firma y C.C. Área SST									
Observaciones:									

	<p>INFORME SST MENSUAL DE INTERVENTORIA 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024</p>	 CONSORCIO INGECON-INCO
---	--	--

ANEXO 13. INDICADORES INTERVENTORIA



TIPO DE INDICADOR
RESULTADO

INDICADORES DEL SG-SST

Versión: 05

Fecha: 18/01/2023

FRECUENCIA DE ACCIDENTALIDAD


META PLANEADA

0

1. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

1. FÓRMULA	$\frac{\text{N° de AT presentados en el mes}}{\text{N° de trabajadores en el mes} \times 100}$											
2. FUENTE DE DATOS	Ausentismo 2024											
3. FRECUENCIA DEL CÁLCULO	Mensual											
4. RESPONSABLE DEL CÁLCULO	Coordinador de SST											
CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
No de accidentes laborales del mes	0	0	0	0	0	5	0	0	0	0		
N° de trabajadores en el mes	0	2	2	3	6	10	9	9	9	9		
INDICE DE FRECUENCIA	#DIV/0!	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	#DIV/0!
META	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

2. REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR

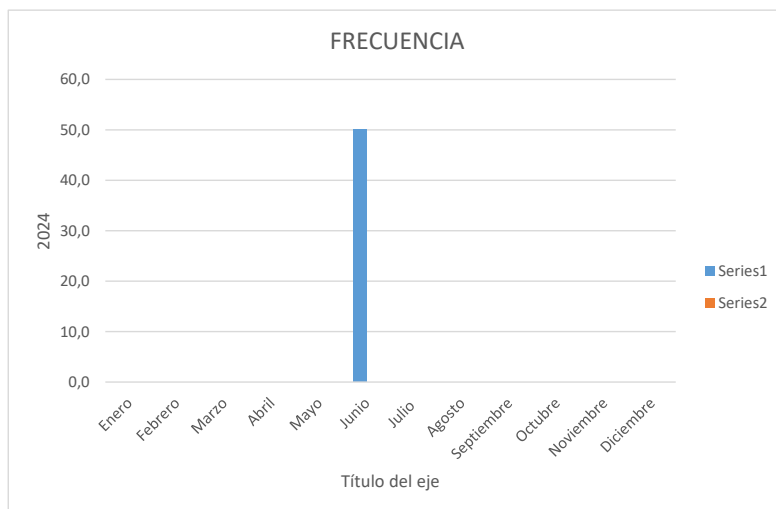

3. CONCLUSIONES Y ACCIONES

1. En el mes de enero no se presento accidentes de trabajo
2. En el mes de febrero no se presento accidentes de trabajo
3. En el mes de marzo no se presento accidentes de trabajo
4. En el mes de abril no se presento accidentes de trabajo
5. En el mes de mayo no se presenta accidentes de trabajo
6. En le mes de junio no se presenta accidentes de trabajo
7. En el mes de julio no se presento accidentes de trabajo
8. En el mes de agosto no se presento accidentes de trabajo
9. En el mes de septiembre no se presento accidentes de trabajo
10. En el mes de octubre no se presento accidentes de trabajo
11. En el mes de noviembre no se presento accidentes de trabajo
12. En el mes de diciembre no se presento accidentes de trabajo



INDICADORES DEL SG-SST

Versión: 05

Fecha: 18/01/2023

TIPO DE INDICADOR
RESULTADO

SEVERIDAD DE ACCIDENTALIDAD

META PLANEADA


0 días

1. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

1. FÓRMULA	$\frac{\text{N}^\circ \text{ total días de incapacidad por AT} + \text{N}^\circ \text{ de días cargados en el mes}}{\text{N}^\circ \text{ de trabajadores en el mes} \times 100}$
2. FUENTE DE DATOS	Ausentismo 2024
3. FRECUENCIA DEL CÁLCULO	Mensual
4. RESPONSABLE DEL CÁLCULO	Coordinador de SST

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
N° total días de incapacidad por AT + N° de días cargados en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
N° de trabajadores en el mes	0	2	2	3	6	10	9	9	9			
META	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
CUMPLIMIENTO	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL INDICADOR

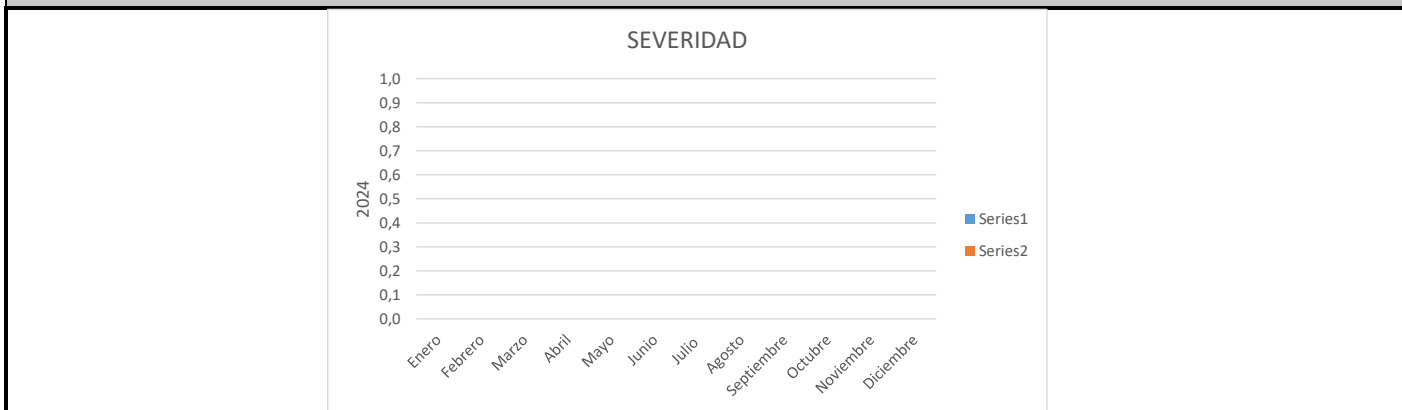

3. CONCLUSIONES Y ACCIONES

1. En el mes de enero no se presentaron accidentes de trabajo
2. En el mes de febrero no se presentaron accidentes de trabajo
3. En el mes de marzo no se presentaron accidentes de trabajo
4. En el mes de abril no se presentaron accidentes de trabajo
5. En el mes de mayo no se presentaron accidentes de trabajo
6. En el mes de junio no se presentaron accidentes de trabajo
7. En el mes de julio no se presentaron accidentes de trabajo
8. En el mes de agosto no se presentaron accidentes de trabajo
9. En el mes de septiembre no se presentaron accidentes de trabajo
10. En el mes de octubre no se presentaron accidentes de trabajo
11. En el mes de noviembre no se presentaron accidentes de trabajo
12. En el mes de diciembre no se presentaron accidentes de trabajo



INDICADORES DEL SG-SST

Versión: 05

Fecha: 18/01/2023

TIPO DE INDICADOR
RESULTADO

PROPORCIÓN DE ACCIDENTES DE TRABAJO MORTALES

META PLANEADA

0%


1. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

1. FÓRMULA	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de AT mortales en el año}}{\text{total de AT que se presentaron en el año}} \times 100$
2. FUENTE DE DATOS	Ausentismo 2024
3. FRECUENCIA DEL CÁLCULO	Anual
4. RESPONSABLE DEL CÁLCULO	Coordinador de SST

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
N° de AT mortales en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
Total de AT que se presentaron en el mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
META	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CUMPLIMIENTO	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!

2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL INDICADOR

MORTALIDAD

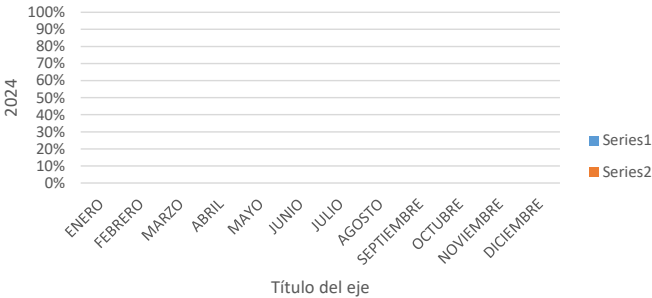

3. CONCLUSIONES Y ACCIONES

1. En el mes de enero no se presento accidentes de trabajo
2. En el mes de febrero no se presento accidentes de trabajo
3. En el mes de marzo no se presento accidentes de trabajo
4. En el mes de abril no se presento accidentes de trabajo
5. En el mes de mayo no se presenta accidentes de trabajo
6. En le mes de junio no se presenta accidentes de trabajo
7. En el mes de julio no se presento accidentes de trabajo
8. En el mes de agosto no se presento accidentes de trabajo
9. En el mes de septiembre no se presento accidentes de trabajo
10. En el mes de octubre no se presento accidentes de trabajo
11. En el mes de noviembre no se presento accidentes de trabajo
12. En el mes de diciembre no se presento accidentes de trabajo



TIPO DE INDICADOR
RESULTADO

INDICADORES DEL SG-SST

Versión: 05

Fecha: 18/01/2023

PREVALENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL

META PLANEADA

0,5%

1. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

1. FÓRMULA	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de casos nuevos y antiguos de E.L. en el periodo "Z"} / \text{promedio de trabajadores en el periodo "Z"} * 100.000}{1}$
2. FUENTE DE DATOS	Ausentismo 2024
3. FRECUENCIA DEL CÁLCULO	Anual
4. RESPONSABLE DEL CÁLCULO	Coordinador de SST

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
N° de casos nuevos y antiguos de EL en el periodo "Z"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Promedio de trabajadores en el periodo "Z"	0	2	2	3	6	10	9	9	9	9		
META	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
CUMPLIMIENTO	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	#DIV/0!

2. REPRESENTACIÓN GRAFICA DEL INDICADOR



3. CONCLUSIONES Y ACCIONES

1. En el mes de enero no se presenta enfermedades laborales
2. En el mes de febrero no se presenta enfermedades laborales
3. En el mes de marzo no se presenta enfermedades laborales
4. En el mes de abril no se presenta enfermedades laborales
5. En el mes de mayo no se presenta enfermedades laborales
6. En el mes de junio no se presenta enfermedades laborales
7. En el mes de julio no se presenta enfermedades laborales
8. En el mes de agosto no se presenta enfermedades laborales
9. En el mes de septiembre no se presenta enfermedades laborales
10. En el mes de octubre no se presenta enfermedades laborales
11. En el mes de noviembre no se presenta enfermedades laborales
12. En el mes de diciembre no se presenta enfermedades laborales



INDICADORES DEL SG-SST

Versión: 05

Fecha: 18/01/2023

TIPO DE INDICADOR
RESULTADO

INCIDENCIA DE LA ENFERMEDAD LABORAL

META PLANEADA

0,5%

1. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

1. FÓRMULA	$\frac{\text{N}^\circ \text{ de casos nuevos de E.L. en el periodo "Z"}}{\text{promedio de trabajadores en el periodo "Z"} * 100.000}$
2. FUENTE DE DATOS	Ausentismo 2024
3. FRECUENCIA DEL CÁLCULO	Anual
4. RESPONSABLE DEL CÁLCULO	Coordinador de SST

CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
N° de casos nuevos de EL en el periodo "Z"	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Promedio de trabajadores en el periodo "Z"	0	2	2	3	6	10	9	9	9	9		
META	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%	0,5%
CUMPLIMIENTO	#DIV/0!	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	#DIV/0!	#DIV/0!

2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL INDICADOR



3. CONCLUSIONES Y ACCIONES

1. En el mes de enero no se presenta enfermedades laborales
2. En el mes de febrero no se presenta enfermedades laborales
3. En el mes de marzo no se presenta enfermedades laborales
4. En el mes de abril no se presenta enfermedades laborales
5. En el mes de mayo no se presenta enfermedades laborales
6. En el mes de junio no se presenta enfermedades laborales
7. En el mes de julio no se presenta enfermedades laborales
8. En el mes de agosto no se presenta enfermedades laborales
9. En el mes de septiembre no se presenta enfermedades laborales



TIPO DE INDICADOR
RESULTADO

INDICADORES DEL SG-SST

Versión: 05

Fecha: 18/01/2023

AUSENTISMO POR CAUSA MÉDICA

META PLANEADA


0%

1. DESCRIPCIÓN DEL INDICADOR

1. FÓRMULA	$\text{N}^\circ \text{ de días de ausencia por incapacidad laboral o común en el mes} / \text{N}^\circ \text{ de días de trabajo programados en el mes} * 100$
2. FUENTE DE DATOS	Ausentismo 2024
3. FRECUENCIA DEL CÁLCULO	Mensual
4. RESPONSABLE DEL CÁLCULO	Coordinador de SST

CONCEPTO	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
N° DE DÍAS DE AUSENCIA POR INCAPACIDAD LABORAL Y COMÚN	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
N° DE DÍAS DE TRABAJO PROGRAMADOS	21	21	18	22	21	18	22	20	21	22	19	21
META	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%
CUMPLIMIENTO	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%

2. REPRESENTACIÓN GRÁFICA DEL INDICADOR



3. CONCLUSIONES Y ACCIONES

1. En el mes de enero No se presenta incapacidades
2. En el mes de febrero No se presenta incapacidades
3. En el mes de marzo No se presenta incapacidades
4. En el mes de abril no se presenta incapacidades
5. En el mes de mayo No se presenta incapacidades
6. En el mes de junio No se presenta incapacidades

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	67

5.4 INFORME DEL PROGRAMA ANUAL DE CAJA – PAC

Teniendo claro que los contratistas de obras tienen una relación directa con los municipios y que, por consiguiente, según sus contratos, no están obligados a realizar cobros mensuales, y se basan en los avances de obra, por lo tanto, no se presentan actas de cobro mensuales por avance de obra, continuación, se presenta en el siguiente cuadro los precios contractuales.

CONTRATO DE OBRA	VALOR BASICO	VALOR TOTAL	% AVANCE	VALOR EJECUTADO
159-2023 PLANETA RICA	\$ 13.218.339.697,00	\$ 14.100.000.000,00	32.45	\$ 4.288.933.577,00
LP-006-2023 LOS CÓRDOBA	\$ 5.873.079.611,00	\$ 6.140.057.707,00	64.52	\$ 3.789.144.251,00
LP-MSBV-008-2023 SAN BERNARDO DEL VIENTO	\$ 2.008.640.979,00	\$ 2.115.723.321,00	60.15	\$ 1.208.294.844,00
TOTALES OBRA: \$ 22.355.781.028,00				
TOTALES INTERVENTORIA: \$ 2.219.000.000,00				

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	68

5.5 INFORME MATRIZ DE RIESGOS

A corte del presente informe no se presentó ningún tipo de riesgo que afectara la ejecución de los contratos de obra e interventoría. En cumplimiento con lo estipulado dentro del Manual de Interventoría 2022, se incluye la matriz de riesgos y oportunidades correspondiente al contrato de Interventoría.

No.	Clase	Fuente	Etapas	Tipo de Riesgo	Descripción (Que puede pasar y como puede ocurrir)	Consecuencia de ocurrencia del evento	Probabilidad	Impacto	Valoración	Categoría	A QUIEN SE ASIGNA	
											INVIAS	PROPONENTE Y/O INTERVENTOR
1	General	Externo	Selección - Ejecución	Riesgo Económico - Riesgo Operacional	Factor Multiplicador y Precios Por debajo del Presupuesto Oficial en la propuesta del PROPONENTE y/o INTERVENTOR	Impacto económico al Interventor	2	2	4	Riesgo Bajo		X
2	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo presentado por la terminación anticipada de la Interventoría, por estar ligada contractualmente al desarrollo del Contrato de Obra , de tal manera que si éste llegare a terminarse por cualquiera de las causales previstas en el Contrato de Obra o por la Ley, el contrato de interventoría producto del presente concurso de méritos, será liquidado por terminación de su objeto, sin lugar a indemnización. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Impacto económico al Interventor	2	5	7	Riesgo Alto		X
3	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por la deficiente Interventoría al Ajuste y/o Actualización y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios realizados por el Contratista, que resultaren deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto, y que fueron revisados y aprobados por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios	2	4	6	Riesgo Alto		X
4	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, que conlleve a generar problemas a causa del no inicio de las obras y/o parálisis de la mismas por demoras ocasionadas por la revisión y aprobación por parte del INTERVENTOR, de los cálculos estructurales y/o estudios y/o diseños definitivos para la obra del contrato, elaborados por el CONTRATISTA de Obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Demora en la ejecución de las obras del proyecto.	2	3	5	Riesgo Medio		X
5	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar por parte de la INTERVENTORIA, la ejecución de obras que contravienen los cálculos y/o estudios y/o diseños aprobados; Por autorizar y/o aprobar la construcción de obras con cálculos y/o estudios y/o diseños deficientes realizados por el Contratista de Obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Obras deficientes, ya sea en calidad, estabilidad, durabilidad y/o funcionalidad. Demora en la ejecución de las obras Por correctivos necesarios	2	4	6	Riesgo Alto		X

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	69

6	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por la deficiente Interventoría, por autorizar y/o aprobar el personal del CONTRATISTA DE OBRA , sin que cumpla requisitos de acuerdo con las exigencias del pliego de condiciones y la normatividad vigente. Por permitir que el CONTRATISTA de Obra ejecute los trabajos sin un Ingeniero Residente y/o Director, y/o Especialistas, y/o Personal Profesional, debidamente aprobado. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Deficiencia en la ejecución del proyecto, por no contar el Contratista con el personal profesional idóneo requerido de acuerdo con lo estipulado en el Pliego de Condiciones.	2	5	7	Riesgo Alto		X
7	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por la deficiente Interventoría, por mediciones erróneas de las cantidades de obra ejecutadas por el CONTRATISTA DE OBRA y medidas por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Pérdida de control del presupuesto de la obra, con los consiguientes desfases por exceso ó por defecto.	3	2	5	Riesgo Medio		X
8	General	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la señalización preventiva en obra, falta o deficiencia en la señalización de aproximación e iluminación, equipos de radio para cierres parciales, temporales y demás señalización necesaria, y de seguridad industrial y de señalización y dotación de los operarios y trabajadores ,etc., a cargo del CONTRATISTA que pueda ocasionar accidentes y/o perjuicios, que debió ser observada y corregida por el INTERVENTOR. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Impacto Negativo en el proyecto por la probable ocurrencia de accidentes de usuarios de la vía y trabajadores de la obra, Inconformidad con la obra por parte de la comunidad.	3	2	5	Riesgo Medio		X
9	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento a la programación de actividades en obra que pudieran llevar a obras discontinuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Obras discontinuas, inconclusas ó con problemas para garantizar la estabilidad de obra ejecutada	3	4	7	Riesgo Alto		X
10	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por la deficiente Interventoría en el control y seguimiento de la Interventoría a los frentes obligatorios de obra. Riesgo que asume el INTERVENTOR	Ejecución inadecuada del proyecto, impacto negativo en el logro de las metas del alcance del proyecto	3	5	8	Riesgo Alto		X
11	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional	Riesgo por la deficiente Interventoría, que genere demora o ausencia en la toma de decisiones correspondientes al Interventor , que llegaren a generar efectos económicos al proyecto. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Impacto negativo en la ejecución del proyecto. Desfases económicos en la utilización del presupuesto del proyecto.	2	4	6	Riesgo Alto		X
12	Específico	Interno	Ejecución	Riesgo Operacional - Económico	Riesgo presentado por la deficiente Interventoría, en lo de su competencia, en los casos de procesos administrativos y/o judiciales con ocasión de la ejecución de las obras, tanto en la etapa contractual como en la postcontractual , ya sea por procesos de multas, sanciones, reparación directa, etc, o siniestros por estabilidad de obra ejecutada al contratista de Obra y/o siniestros por calidad del servicio de interventoría. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Dificultad en la ejecución del proyecto, por medidas sancionatorias. Impactos económicos negativos a los afectados,	3	2	5	Riesgo Medio		X
13	Específico	Interno	Planeación - Selección	Económico	Riesgo presentado por la no oportuna adjudicación de la Licitación Pública de Obra correspondiente a este proceso de Interventoría. Riesgo que asume el PROPONENTE Y/O INTERVENTOR, hasta seis (6) meses después de adjudicado el contrato de Interventoría, teniendo en cuenta que la Licitación Pública y/o proceso de selección del Contratista de Obra, es un proceso independiente, que podría presentar demoras por observaciones presentadas al proceso, notificaciones de ley, o quedar desierto, entre otros aspectos. Riesgo que asume INVIAS después de seis (6) meses de adjudicado el contrato de Interventoría.	Desplazamiento en la ejecución del proyecto o no ejecución del proyecto en caso de declararse desierta la licitación pública de la obra respectiva	1	4	5	Riesgo Medio	X	X

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	70

14	General	Externo	Ejecución	Riesgo Regulatorio	Expedición y/o modificación de normas: Ocurre por cambios normativos o por la expedición de normas posteriores al cierre del proceso de concurso de méritos, que afecten las condiciones económicas y/o técnicas inicialmente pactadas.	Afectación del desarrollo del contrato previsto con la normatividad existente al cierre del proceso de selección	2	3	5	Riesgo Medio	X	
15	Específico	Interno	Ejecucion	Riesgo Ambiental - Operacional	Riesgo por la deficiente Interventoría, causado por inadecuadas prácticas en el proceso constructivo que puedan generar daños técnicos y/o ambientales, autorizadas y/o aprobadas por el Interventor. Riesgo que asume el INTERVENTOR.	Demora en la ejecución de la obra por correctivos necesarios.	2	2	4	Riesgo Bajo		X
16	General	Externo	Ejecución	Riesgos de la Salud	Presencia de Riesgos Biológicos. Se refiere a la posibilidad que durante la ejecución del contrato, los colaboradores del Interventor, presenten síntomas de enfermedades altamente contagiosas y que afecten y deterioren la Salud del Personal.	Deterioro notorio y grave de la salud y posible contagio	3	4	7	Riesgo Alto		X
17	General	Externo	Ejecucion	Riesgos de la Salud	Disponibilidad de los Elementos de Protección Personal. Se refiere a la posibilidad de que el Interventor no disponga o suministre a sus colaboradores y demas, los Elementos de Protección Personal EPP y los de Riesgo Bilógico.	Accidentes de trabajo y posible exposición a Riesgos Biologicos	3	4	7	Riesgo Alto		X
18	General	Externo	Ejecucion	Riesgo Sociales o Politicos	Orden público: Posible ocurrencia de actos terroristas, paros, huelgas, manifestaciones, disturbios y demás que afecten el orden público y se ubiquen en las zonas de influencia de las obras.	Posible pérdida de Bienes del Interventor, daños en obras del proyecto, reprogramación de cronogramas, retrasos en la ejecución de las obras.	4	3	7	Riesgo Alto	X	X
19	General	Externo	Ejecucion	Riesgos de Corrupción	Gestión Indevida y dolosa de los Recursos Financieros, de Insumos y Obras. Se refiere a la posibilidad de que el Contratista de las Obras, de la Interventoría y de funcionarios de Invias, promuevan y participen de acciones fraudulentas en el manejo de los recursos destinados a las obras tanto en los aspectos financieros (anticipos), facturación, calidad y cantidad de materiales e insumos, diseños y obras sin justificar.	Graves daños personales e Institucionales. Daño a la reputación de la entidad, pérdida de recursos y daños sociales.	1	3	4	Riesgo Bajo	X	X

						CATEGORIA	VALORACION					
						RARO	1					
						IMPROBABLE	2					
						POSIBLE	3					
						PROBABLE	4					
						CASI CIERTO	5					
						IMPACTO DEL RIESGO						
						CATEGORIA	VALORACION					
						INSIGNIFICANTE	1					
						MENOR	2					
						MODERADO	3					
						MAYOR	4					
						CATASTROFICO	5					

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	71

TRATAMIENTO/CONTROL A SER IMPLEMENTADO	IMPACTO DESPUÉS DEL TRATAMIENTO				AFECTA LA EJECUCION DEL CONTRATO	RESPONSABLE POR IMPLEMENTAR EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE INICIA EL TRATAMIENTO	FECHA EN QUE SE COMPLETA EL TRATAMIENTO	MONITOREO Y REVISIÓN	
	PROBABILIDAD	IMPACTO	VALORACION	CATEGORIA					¿CÓMO SE REALIZA EL MONITOREO?	PERIODICIDAD
Implementacion de Controles en la Fase contractual que aseguren la eficiencia del Interventor en la ejecución del contrato conforme a sus obligaciones contractuales y a la oferta económica presentada.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores.	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control de la ejecución de la interventoría con el cumplimiento de todas sus funciones técnicas, administrativas, financieras y jurídicas. Visitas de supervisión, Seguimiento a informes, requerimientos escritos.	Mensual
Compromiso del Interventor en lo pertinente a sus obligaciones contractuales, en lograr el cumplimiento de la ejecución del contrato de obra, de manera que dentro de lo contractual se puedan solucionar oportunamente los problemas que se presenten en la ejecución del proyecto que puedan afectarlo de manera grave, con el riesgo de una terminación anticipada del mismo.	1	4	5	Riesgo medio	SI	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Vigilancia y control de la ejecución de la obra, solución oportuna de problemas, escalamiento a la Entidad cuando sea necesaria su intervención, seguimiento permanente a la problemática que se se presente, requerimientos escritos.	Permanente cuando se presente problemas que afecten de manera grave la ejecución de la obra.
Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. Realizar al Contratista de Obra las observaciones oportunamente y velar porque se corrija lo pertinente, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Interventor	al inicio de la Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	al final de la Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	la Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de su Director y Especialistas, al Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que los estudios revisados y aprobados por el Interventor aporten la confiabilidad y calidad requerida para ejecutar las obras.	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios
Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, de manera que se vaya observando y corrigiendo lo pertinente a medida que se realiza la actualización, modificación o elaboración de los estudios, permitiendo cumplir con el cronograma de entregas parciales acordado con el Contratista y una vez terminado el plazo de estudios se cuente con el resultado de los mismos debidamente revisado y aprobado por el Interventor.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Interventor	al inicio de la Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	al final de la Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	la Interventoría debe efectuar seguimiento continuo a través de su Director y Especialistas, al Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios por parte del Contratista, de manera que se cumplan con el cronograma de entregas parciales y con el resultado de los Estudios en el plazo estipulado. Seguimiento por parte del supervisor y/o Gestor, a la etapa de preconstrucción (Estudios), para verificar entregas parciales y entrega total de los estudios. Requerimientos escritos al Interventor.	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios
Con base en estudios y diseños confiables autorizar las obras respectivas; en caso de requerirse algún ajuste a los mismos por imprevistos encontrados en la ejecución de las obras, justificar, soportar y documentar técnicamente los cambios requeridos. Realizar seguimiento permanente y revisión detallada por parte del Interventor con sus Especialistas en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios, para evitar que resulten deficientes y/o incompletos y/o adversos para el proyecto. En caso de detectar alguna deficiencia y/o inconsistencia en los mismos al momento de ejecutar las obras, adoptar los correctivos técnicos necesarios, justificados, soportados y documentados.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Interventor	Al inicio de la Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios	Al final de la ejecución del contrato.	la Interventoría debe efectuar seguimiento permanente tanto en la etapa de estudios, en la revisión y aprobación de los mismos, en forma que resulten con la calidad y confiabilidad requerida, como en la implementación en obra de los estudios y diseños aprobados y estar atenta a los eventuales imprevistos que puedan presentarse en la ejecución de las obras con respecto a los diseños aplicados, de manera que puedan tomarse correctivos oportunamente si fueren necesarios, los cuales deberá justificar, soportar y documentar.	Semanal en la etapa de Ajuste y/o Actualizacion y/o Unificación y/o Modificación de estudios y diseños y/o elaboración de estudios complementarios y durante la ejecución de las obras del contrato.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	72

El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de los requisitos para el personal profesional de la obra establecido en el pliego de condiciones y velar por la utilización del personal aprobado, mínimo en la dedicación prevista en el mismo. El Supervisor de Contrato y/o Gestor deberá observar al Interventor cualquier irregularidad al respecto cuando la advierta, exigiéndole el cumplimiento de sus obligaciones al respecto como Interventor.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Interventor, Supervisores y/o Gestores	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que el Contratista cumpla, entre otros, con el personal profesional mínimo exigido en el pliego de condiciones, tanto en idoneidad como en dedicación.	Permanente en la ejecución de la obra.
Mediciones de obra ejecutada con el debido detalle, revisión de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría. Corrección oportuna de las mediciones erróneas.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI, Cuando los desfases son desproporcionados y no se corrigen	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Revisión de la medición de cantidades de obra por parte de los Ingenieros de la Interventoría.	La correspondiente a la medición de cada tipo de obra.
El Interventor debe exigir el estricto cumplimiento de la normatividad vigente sobre señalización temporal de obras, y seguridad industrial, verificar permanentemente su implementación, recurrir a medidas sancionatorias contractuales de ser necesario.	2	2	4	Riesgo Bajo	NO	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Inspecciones diarias del Interventor. Comités Técnicos, Seguimiento a informes, requerimientos escritos- Retroalimentación en los procedimientos adelantados por los responsables del tratamiento.	Diario
El Interventor debe ser estricto con la Programación de obras de acuerdo con el valor del contrato de obra y teniendo en cuenta las disponibilidades presupuestales anuales del mismo, de manera que cuando autorice una obra tenga la seguridad de que está financiada hasta su terminación, considerando también la continuidad en las obras ejecutadas. Revisión frecuente de la programación de obras para efectuar los ajustes necesarios con este fin.	1	2	3	Riesgo Bajo	SI	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en cumplimiento de la programación de las mismas. Revisiones periódicas de la programación de obras del proyecto, realización de los ajustes necesarios. Seguimiento a Informes de Interventoría y al cumplimiento en la ejecución del programa de inversiones <u>aprobado vigente</u>	Mensual ó cuando el Interventor lo considere necesario.
El Interventor debe exigir al Contratista de Obra los frentes obligatorios de obra y efectuar el seguimiento de manera que se cumpla la ejecución de las obras previstas en dichos frentes. Seguimiento de esta obligación del Interventor por parte de los Supervisores y/o Gestores	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Interventor, Supervisores y/o Gestores	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento permanente del Interventor a la ejecución de las obras en los frentes obligatorios de obra. Seguimiento a informes de Interventoría. Visitas de Supervisión.	Permanente del Interventor. Mensual del Supervisor y/o Gestor
Control y vigilancia de la ejecución del proyecto por parte del Interventor. Análisis por parte del Interventor de los problemas que se presenten, apoyándose en su personal, que le permitan adoptar las decisiones correspondientes en forma oportuna y eficaz, para no afectar la ejecución del proyecto.	2	2	4	Riesgo Bajo	SI	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control y vigilancia permanente del Interventor a la ejecución de la obra, de manera que detecte a tiempo los problemas que se presenten, los analice y los resuelva oportunamente.	Permanente en la ejecución de la obra.
Control y vigilancia por parte del Interventor a la ejecución de las obras, exigiendo el cumplimiento de obligaciones del Contratista, recurriendo de ser necesario a las medidas sancionatorias. Atención de procesos administrativos y judiciales en lo de su competencia, en los eventos previstos de multas, sanciones, reparaciones directas, etc., siniestros por estabilidad de obra y por calidad del servicio de interventoría	2	2	4	Riesgo Bajo	SI, dependiendo del tipo y magnitud del incumplimiento	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución del proyecto. Atención oportuna de los procesos administrativos y judiciales que sean requeridos ya sea en la etapa contractual o postcontractual, en lo de su competencia	Permanente en la ejecución de la obra y cuando se requiera en la etapa postcontractual.
Planeación, y estructuración de los proyectos, Atención a los procesos de selección para obra e interventoría, para evitar en lo posible demoras en el proceso de adjudicación de la obra.	1	3	4	Riesgo Bajo	SI	Personal de la Entidad de la Planeación, Estructuración, procesos de Selección, Evaluación y Adjudicación	Al inicio de la etapa de planeación	A la terminación de la etapa de selección	Revisión del proyecto objeto de la selección. Atención y seguimiento a los procesos de selección de licitación pública para obra y concurso de méritos para interventoría.	Durante la etapa de Planeación y Selección del proyecto



INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”.

INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10
PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024

CÓDIGO	
--------	--

MEPI-MN1-IN-15-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

73

Proceso precontractual con las normas aplicables vigentes. Revisión de los cambios sustanciales de normas que se produzcan posterior al cierre del proceso de licitación pública, que afecten el normal desarrollo del contrato, con el fin de estudiar los ajustes pertinentes a que hubiere lugar.	1	2	3	Riesgo Bajo	NO	Gestores y/o Supervisores, Interventor	Fase precontractual, y cuando se expida la nueva normatividad que pueda afectar el contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Seguimiento a la implementación de la nueva normatividad que aplique al proyecto, y a las medidas tomadas para mitigar su efecto en el contrato. Informes, requerimientos escritos.	Mensual
Interventoría permanente en la ejecución de las obras, para controlar obras autorizadas, materiales, procedimientos constructivos, ajustados a las obras requeridas y especificaciones técnicas contractuales, y evitar que se generen perjuicios técnicos y/o pasivos ambientales por esta causa. De ser necesario llevar a cabo procesos sancionatorios para conminar su cumplimiento o sancionar el incumplimiento.	1	1	2	Riesgo Bajo	NO	Interventor	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación de la ejecución del contrato	Control permanente por parte del Interventor de la ejecución de las obras requeridas del proyecto y del cumplimiento de especificaciones técnicas. Seguimiento por parte de Especialistas Ambientales de la Interventoría. Requerimientos escritos.	Permanente
La aplicación preventiva de las medidas de Bioseguridad establecidas por las Autoridades de Salud en Colombia y sus respectivos Protocolos, el cumplimiento de las Resoluciones 0312 de 2019 y 679 de 2020, Informar de inmediato las novedades de salud.	2	3	5	Riesgo Medio	SI	contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor Invias	Al inicio de la ejecución del contrato	A la terminación del contrato	Previo al inicio de la ejecución de las obras, Estudios, Diseños e Interventoría, el contratista deberá presentar certificación individual vigente del estado de salud de cada integrante colaborador (empleado o contratista) expedida por la ARL	Cada vez que haya novedades de cambio de personal
El contratista deberá suministrar todos los EPP a sus colaboradores en las obras, o solicitar a la ARL que los suministre	2	3	5	Riesgo Medio	SI	contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisor Invias	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia permanente de los cambios de salud de los colaboradores	Diario
Es responsabilidad del contratista de obra junto con la Interventoría, únicamente de Informar a las autoridades competentes la novedad sobre orden público en la zona de influencia de las obras y de proteger a sus colaboradores y los bienes puestos al servicio del contrato. El INVIAS de igual forma realizará la solicitud a las autoridades a fin de que se llegue a soluciones que permitan la continuidad en la ejecución del contrato. El contratista de Obra e Interventor deberán adoptar medidas de contingencia para superar los atrasos.	3	2	5	Riesgo Medio	SI	Gestores y/o Supervisores, Interventor-Contratista	Al inicio de la presentación del evento	A la terminación de la ocurrencia del evento	A partir de la información oficial, información del Interventor, del Contratista, de las Territoriales de INVIAS, se determinan acciones a seguir, para procurar la menor afectación al proyecto.	Cuando se presente el evento
Todos los participantes de la Ejecución de los Proyectos (Contratistas, Interventores, Supervisores, Funcionarios, Proveedores y Comunidad en general) deberán actuar de manera diáfana, con ética, altos valores y principios como regla de conducta imprescindible, y dar cumplimiento a la normatividad vigente en cuanto al manejo de los recursos públicos con transparencia y honestidad. Cualquier situación irregular deberá ser comunicada al INVIAS.	1	1	2	Riesgo Bajo	SI	Contratistas de Obras, de Estudios y Diseños interventor, Supervisores y/o Gestores y/o Funcionarios INVIAS	Al inicio de la ejecución del contrato y de manera permanente.	A la terminación del contrato	Vigilancia de cada una de las actuaciones de los participantes de las obras.	permanente

[illegible]

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	74

5.6 INFORMACIÓN OTROS PROGRAMAS Y APLICATIVOS SEGÚN PLIEGOS DE CONDICIONES CONTRATOS DE OBRA E INTERVENTORÍA

Para el presente informe de interventoría del mes de noviembre de 2024 se han cargados al sistema del aplicativo CIFRA los informes semanales de los contratos de obra de los contratistas Consorcio Providencia – Contrato de obra No. 159-2023 Municipio de Planeta Rica, Consorcio Pavimento Vía Barranquillita – Contrato de obra No. Lp-006-2023 Municipio de los Córdoba y Consorcio L&S – Contrato de obra No. LP-MSBV-008-2023 Municipio de San Bernardo del Viento.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	75


6 REPORTES EJECUCIÓN MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA.

6.1 Equipo y vehiculos contrato de interventoria - MEPI-MN1-IN-15-FR-5.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA EQUIPO Y VEHÍCULOS CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-5																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA																													
CONTROL DIARIO DE EQUIPOS Y VEHÍCULOS DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA																																
PERIODO / MES INFORME MENSUAL: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2024			PROYECTO: COLOMBIA RURAL																													
CONTRATO INTERVENTORIA No. 5053-2023			INTERVENTORIA: CONSORCIO INGECON-INCO																													
CONTRATO DE OBRA No. 0159-2023 LP-006-2023 LP-MSBV-008-2023			CONTRATISTA: CONSORCIO PROVIDENCIA CONSORCIO PAVIMENTOS BARRANQUILLITA CONSORCIO L&S																													
EQUIPOS Y VEHÍCULOS	DESCRIPCIÓN	DÍAS DEL MES																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
VEHÍCULO	RENAULT DUSTER GNS432	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHICULO	SSANGYONG ACTYON IDW589	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
VEHICULO	SSANGYONG DMZ790	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	MOTOCICLETA 150cc DE PLACAS RZS 83G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	MOTOCICLETA 150cc DE PLACAS LRS 75G	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
MOTOCICLETA	MOTOCICLETA 150cc DE PLACAS GCR 99E	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
CONVENCIONES: ACTIVO= A, EN REPARACIÓN= R, INACTIVO= I.																																
OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:																																
(Relacionar equipo de topografía, laboratorio y otros. Solo se reconocen pagos de vehículos y equipos que se encuentren activos y al servicio del proyecto. Esta relación es el soporte para el reconocimiento del Acta de Costos respectiva). (Para los vehículos se debe relacionar número de la placa, marca, cilindraje y modelo y para los otros equipos relacionar marca, modelo y serie).																																
RELACIONAR FECHA DE VENCIMIENTO DE CALIBRACIÓN DE LOS EQUIPOS Y FECHA DE MANTENIMIENTO DE LOS VEHÍCULOS:																																
EL INTERVENTOR MANIFIESTA QUE HA CUMPLIDO CON LA DISPONIBILIDAD DE LOS EQUIPOS Y VEHÍCULOS EXIGIDOS CONTRACTUALMENTE PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DEL PROYECTO.																																
NOTAS: 1. Se entiende por "Activo" el estado de los equipos y vehículos disponibles y en uso, por "Inactivo" el estado de los equipos y vehículos que estando disponibles no se encuentran en uso y "en reparación" el estado de los equipos y vehículos no disponibles por estar en mantenimiento y/o en reparación. 2. Es responsabilidad de la Interventoría cumplir con la disponibilidad diaria de los equipos y vehículos exigidos para el control y seguimiento del proyecto. 3. En el evento en que el Interventor no cumpla con los equipos y vehículos exigidos contractualmente, el Supervisor del contrato de interventoría debe indicar en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" las acciones que adelanta o adelantará tendientes a lograr el cumplimiento de esta obligación. 4. Así mismo en la casilla "Observaciones del Supervisor del contrato de interventoría" se deben consignar las observaciones que considere pertinentes relacionadas con los equipos y vehículos.																																
<div><div>Firma Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES Director de Interventoría Matrícula Profesional No.: 17202153798CLD</div><div>Firma Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA Matrícula Profesional No.: 22202204005COR</div></div>																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	76

6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-7.

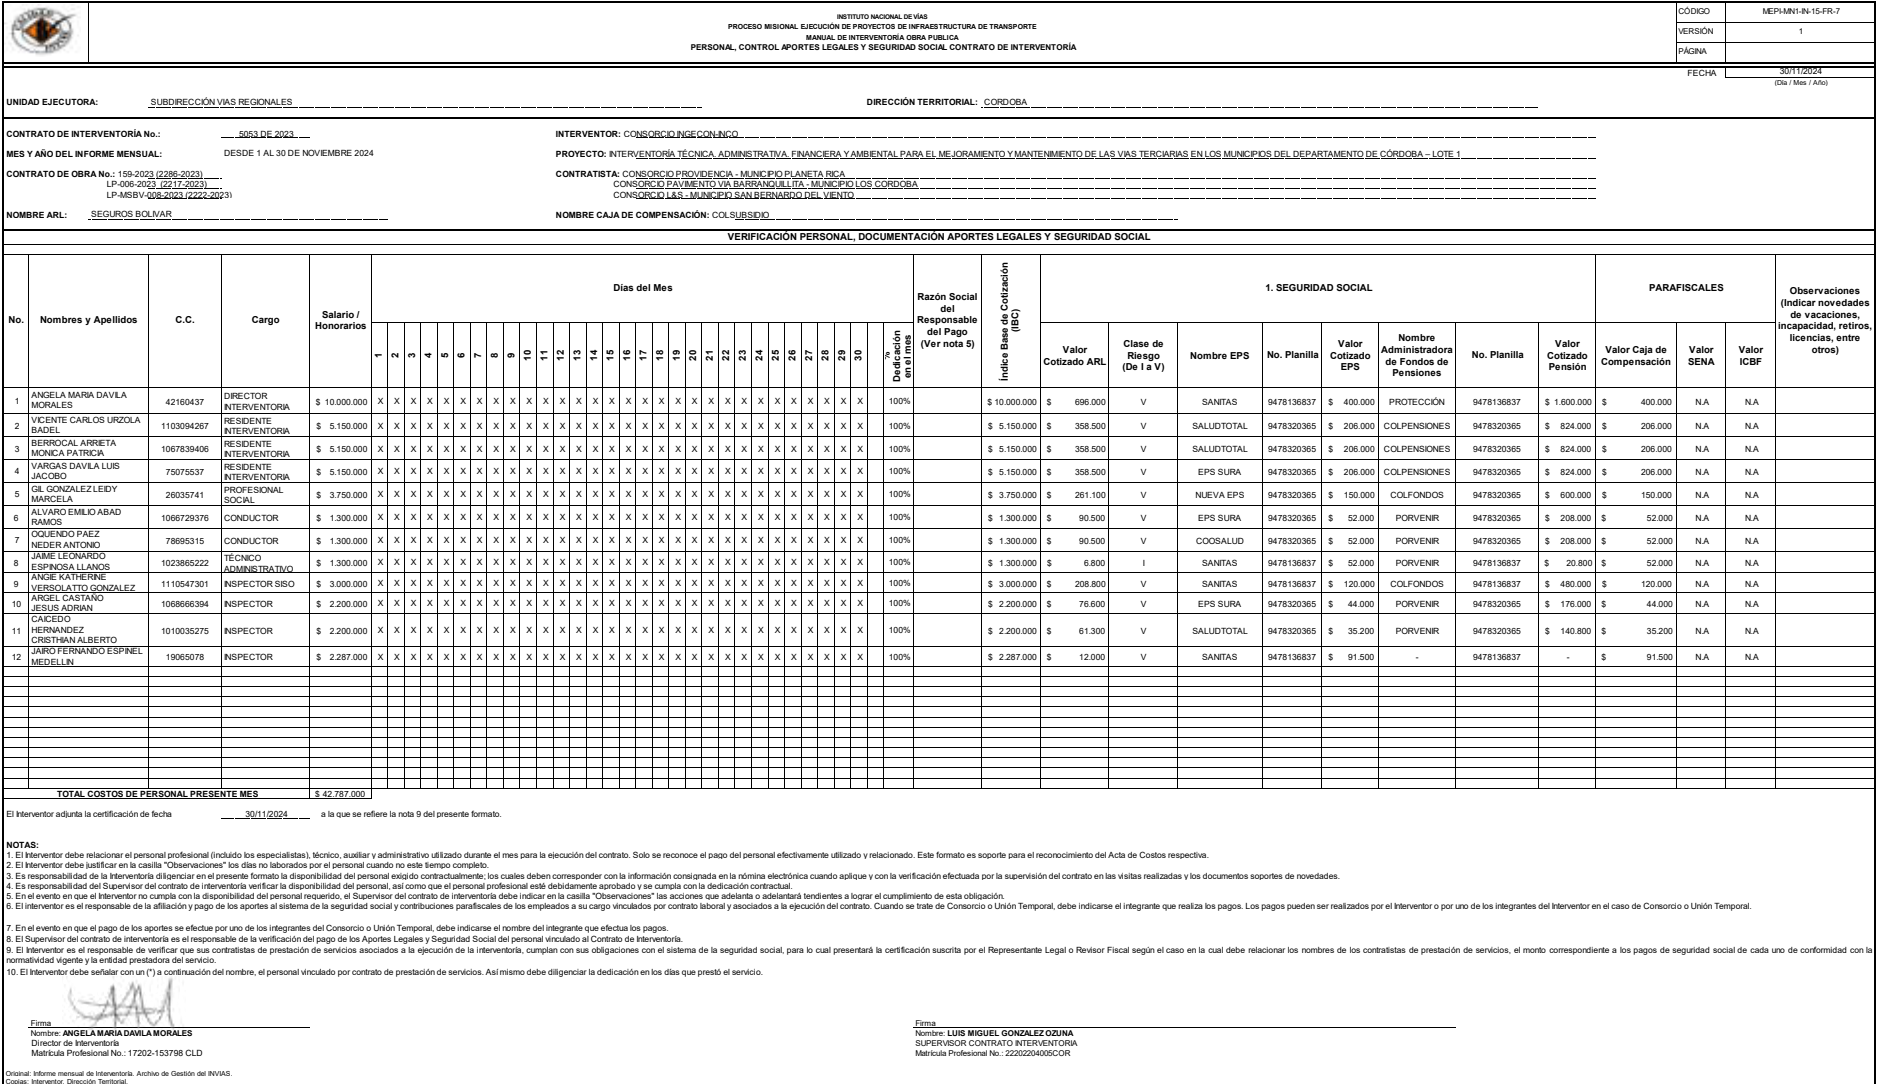

**EL SUSCRITO SUPERVISOR DEL CONTRATO No. 5053 DE 2023-
INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL
PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN
LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1**

HACE CONSTAR:

Que **CONSORCIO INGECON-INCO** con NIT 901783007-9 con contrato No. 5053-2023 , cuyo objeto es: **INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1**, presentó los soportes de pago por concepto de los aportes correspondientes a los Sistemas de Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, Cajas de Compensación Familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), a los empleados vinculados laboralmente con el contratista durante el periodo comprendido entre el 1 de noviembre de 2024 y el 30 de noviembre de 2024.

De igual manera el Contratista presentó las certificaciones expedidas por el representante legal, en la cual manifiesta encontrarse al día en el pago del personal contratado y vinculado para la ejecución del objeto contractual.

La presente Certificación se expide a los 30 días del mes de noviembre de 2024.

LUIS GONZALEZ OZUNA

Supervisor Contrato de Interventoría No. 5053-2023

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	77

6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-9.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE

MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA

INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

CÓDIGO

MEPMN1-86-15-FR-9

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

CORDOBA

FECHA

30/11/2024

(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:

5053 de 2023

INTERVENTOR:

CONSORCIO INGECON-RICO

MES INFORME MENSUAL:

DESDE 1 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024

PROYECTO:

INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA - LOTF 1

CONTRATO DE OBRA No.:

159-2023 / (2286-2023)
LP-006-2023 / (2217-2023)
LP-MSBV-008-2023 / (2222-2023)

CONTRATISTA:

CONSORCIO PROVIDENCIA - MUNICIPIO PLANETA RICA
CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA - MUNICIPIO LOS CORDOBA
CONSORCIO L&S - MUNICIPIO SAN BERNARDO DEL VIENTO

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORIA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2023	1433723	C-2402-0600-12-0-2402112-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 142.600.000,00	\$ 142.600.000,00
2023	1433723	C-2402-0600-12-0-2402041-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 570.400.000,00	\$ 570.400.000,00
2023	1433723	C-2402-0600-13-0-2402041-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 1.204.800.000,00	\$ 1.204.800.000,00
2023	1433723	C-2402-0600-13-0-2402112-02	11	NACION	CONTRATO PRINCIPAL	\$ 301.200.000,00	\$ 301.200.000,00
TOTAL						\$ 2.219.000.000,00	\$ 2.219.000.000,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 2.219.000.000,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORIA

Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	28 dic 2023 y desde 1 a 29 de Feb/2024	\$ 26.147.000,00	\$ 4.967.930,00	\$ 31.114.930,00	\$ -	\$ 31.114.930,00	\$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	\$ 111.485.070,00	\$ 2.187.885.070,00	5/03/2024	
2	Desde 1 a 31 de Marzo de 2024	\$ 38.790.580,00	\$ 7.370.210,00	\$ 46.160.790,00	\$ -	\$ 46.160.790,00	\$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	\$ 65.324.280,00	\$ 2.141.724.280,00	5/04/2024	
3	Desde 1 a 30 de Abril de 2024	\$ 42.143.500,00	\$ 8.007.265,00	\$ 50.150.765,00	\$ -	\$ 50.150.765,00	\$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	\$ 15.173.515,00	\$ 2.091.573.515,00	3/05/2024	
4	Desde 1 a 31 de Mayo de 2024	\$ 61.465.580,00	\$ 11.678.460,00	\$ 73.144.040,00	\$ -	\$ 15.173.515,00	\$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	\$ -	\$ 2.018.429.475,00	5/06/2024	
5	Desde 1 a 30 de Junio de 2024	\$ 99.955.280,00	\$ 18.991.503,00	\$ 118.946.783,00	\$ -	\$ 57.970.525,00	\$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	\$ 512.429.475,00			
6	Desde 1 a 31 de Julio de 2024	\$ 97.794.500,00	\$ 18.580.955,00	\$ 116.375.455,00	\$ -	\$ 118.946.783,00	\$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	\$ 393.482.692,00	\$ 1.899.482.692,00	5/07/2024	
7	Desde 1 a 31 de Agosto de 2024	\$ 110.977.900,00	\$ 21.085.801,00	\$ 132.063.701,00	\$ -	\$ 116.375.455,00	\$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	\$ 277.107.237,00	\$ 1.783.107.237,00	5/08/2024	
8	Desde 1 a 30 de Septiembre de 2024	\$ 111.651.500,00	\$ 21.213.785,00	\$ 132.865.285,00	\$ -	\$ 132.063.701,00	\$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	\$ 145.043.536,00	\$ 1.651.043.536,00	5/09/2024	
9	Desde 1 a 31 de octubre de 2024	\$ 111.651.500,00	\$ 21.213.785,00	\$ 132.865.285,00	\$ -	\$ 132.865.285,00	\$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	\$ 12.178.251,00	\$ 1.518.178.251,00	4/10/2024	
10	Desde 1 a 30 de noviembre de 2024	\$ 111.651.501,00	\$ 21.213.785,00	\$ 132.865.286,00	\$ -	\$ 12.178.251,00	\$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	\$ 1.084.112.966,00	\$ 1.385.312.966,00	5/11/2024	
TOTALES		\$ 812.228.841,00	\$ 154.323.479,00	\$ 966.552.320,00	\$ -	\$ 120.687.034,00	\$ -	1433723 de fecha 27-12-2023.	\$ 951.247.680,00	\$ 1.252.447.680,00	30/11/2024	

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoria deben relacionarse estén o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
TOTAL COSTOS DE PERSONAL (A)	\$ 83.898.000,00	\$ 15.940.620,00	\$ 99.838.620,00
SUBTOTAL OTROS COSTOS DIRECTOS (B)	\$ 27.753.501,00	\$ 5.273.165,00	\$ 33.026.665,00
PROVISIÓN FRENTE ADICIONAL	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL	\$ 111.651.501,00	\$ 21.213.785,00	\$ 132.865.286,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:
1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma

Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES

Director de Interventoria

Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma

Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA

Matrícula Profesional No.: 22202204005COR

Original: Informe mensual de Interventoria. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	78

6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-13.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		30/11/2024 (Día / Mes / Año)		
-------	--	---------------------------------	--	--

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	CORDOBA		
-------------------	---------------------------------	------------------------	---------	--	--

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	5053-2023	INTERVENTOR:	CONSORCIO INGECON-INCO		
--------------------------------	-----------	--------------	------------------------	--	--

OBJETO DEL CONTRATO:					
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1					

FECHA DE INICIO:	28/12/2023				
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2023				
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31 DE DICIEMBRE DE 2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)				
VALOR INICIAL:	\$	2.219.000.000,00			
VALOR ACUMULADO:	\$	2.219.000.000,00 (Incluye adiciones)			

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:	LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA				
---	----------------------------	--	--	--	--

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL					
---	--	--	--	--	--

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 221.900.000,00	29	12	2023	30/06/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1.109.500.000,00	26	12	2023	30/06/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 443.800.000,00	26	12	2023	31	12	2024
Calidad del servicio	30%	\$ 665.700.000,00	31	12	2028	31	12	2028

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	NB-100301347				
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)				
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A				
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:	29/12/2023				

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES					
---	--	--	--	--	--

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 221.900.000,00	29	12	2023	3/08/2024		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1.109.500.000,00	29	12	2023	3/08/2024		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 443.800.000,00	29	12	2023	3	2	2027
Calidad del servicio	30%	\$ 665.700.000,00	3	2	2024	3	2	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	NB-100301347				
Certificado de modificación o anexo No.:	2 (Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)				
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGURO S.A.				

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:
actualización de polizas de acuerdo a la suspensión.

GARANTIA UNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA					
			Desde			Hasta		
Cumplimiento	10%	\$ 221.900.000,00	3	2	2024	1/07/2025		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	50%	\$ 1.109.500.000,00	3	2	2024	1/07/2025		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 443.800.000,00	3	2	2024	31	12	2027
Calidad del servicio	30%	\$ 665.700.000,00	31	12	2024	31	12	2029

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. NB-100301347


Certificado de modificación o anexo No.: 3
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGURO S.A.

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:
Actualización de la póliza de acuerdo a la Prorroga 1

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).


Firma
Nombre: ANGELA DAVILA MORALES
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153798CLD


Firma
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 22202204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	79

6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría - MEPI-MN1-IN-15-FR-15.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA		CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA		30/11/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
-------	--	--

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA
--	--------------------------------

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	5053 DE 2023 <small>(Indicar número y año)</small>
--------------------------------	---

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – LOTE 1	

INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON-INCO			
-------------------------------------	--	--	--

FECHA DE INICIO:	PLAZO INICIAL:	HASTA 31 DE DICIEMBRE 2023	FECHA DE VENCIMIENTO: 31 DE DICIEMBRE 2024 <small>(Incluye prórrogas y suspensiones)</small>
28/12/2023 <small>(Indicar día, mes y año)</small>			

CONTRATO DE OBRA No:	159-2023 <small>(Indicar número y año)</small>
----------------------	---

CONTRATISTA:	CONSORCIO PROVIDENCIA
--------------	-----------------------

CONTRATO DE OBRA No:	LP-006-2023 <small>(Indicar número y año)</small>
----------------------	--

CONTRATISTA:	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
--------------	--

CONTRATO DE OBRA No:	LP-MSBV-008-2023 <small>(Indicar número y año)</small>
----------------------	---

CONTRATISTA:	CONSORCIO L&S
--------------	---------------

1. PLAN DE CALIDAD			
PRESENTADO	SI ☒ NO ☐	APROBADO	SI ☒ NO ☐
		VERSIÓN No.	1
		FECHA DE VERSIÓN:	

OBSERVACIONES:

2. AUDITORIAS DE CALIDAD			
PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO:	SI ☐ NO ☐	No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS:	
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA:	SI ☐ NO ☐	No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS:	
		FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:	
		FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:	

OBSERVACIONES:

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)			
PRESENTADO:	SI ☐ NO ☐	APROBADO:	SI ☐ NO ☐
		FECHA DE APROBACIÓN:	
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES:		No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:	
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES:	SI ☐ NO ☐		

OBSERVACIONES:

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra. La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTES DE NO CONFORMIDADES			
No. de No Conformidades reportadas en el mes:		No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:	
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato:		No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:	
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:			

OBSERVACIONES:

5. QUEJAS Y RECLAMOS			
No. De quejas y reclamos recibidas en el mes:		No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:	
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención:		No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:	
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato:		No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:	

OBSERVACIONES:

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título Indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: ANGELA MARIA DÁVILA MORALES
Rep. Legal - Interventoría
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma

N/A

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA
Matrícula Profesional No.: 22202204005COR

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	80

6.6 Otros documentos de seguimiento mensual:


- Seguimiento a la inversión del Anticipo - MEPI-MN-IN-3-FR-1 y MEPI-MN-IN-3-FR-2.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	1 de 1 MEPI-MN1-IN-3-FR-1				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA					
		FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CÓRDOBA					
DATOS GENERALES							
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. 1 (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 5053 DE 2023 (Indicar número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO INGECON-INCO					
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1							
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA							
JUSTIFICACIÓN: N/A (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSION DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3	NOTA: A LA FECHA DEL PRESENTE PERIODO NO SE HA TRAMITADO EL ANTICIPO.						%
4							%
5							%
N							%
TOTAL							100%
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. <u>No aplica para compra ni alquiler de vehículos.</u> 3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico. 4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.							
Firma: Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES Representante Legal o su Apoderado Interventor Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD		Firma: Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA Matrícula Profesional No.: 22202204005COR					
Original: Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORIA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2			
		VERSIÓN	1 de 1			
		PÁGINA				
		FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CORDOBA			
DATOS GENERALES						
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Indique si corresponde) (Indique si corresponde)						
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 5053 DE 2023 (Indicar número y año)						
CUENTA BANCARIA No.:		BANCO	SUCURSAL:			
ANTICIPO OTORGADO:		%				
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:		\$	- (M/CTE)			
OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CORDOBA – LOTE 1						
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA:						
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO						
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM
NOTA: A LA FECHA DEL PRESENTE PERIODO NO SE HA TRAMITADO EL ANTICIPO.						
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).						
** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.						
NOTA: El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.						
SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORIA POR ÍTEM						
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME ():				\$	-	
				(Indicar el mes)	(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)	
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:				\$	-	
				(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)		
RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES						
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO	
(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)						
NOTA: Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros <u>indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.</u>						
Firma: Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES Representante Legal o Delegado Interventor Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.			Firma: Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA SUPERVISOR CONTRATO INTERVENTORIA Matrícula Profesional No.: 22202204005COR			

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	81

- **Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado - MEPI-MN-IN-9-FR-2.**

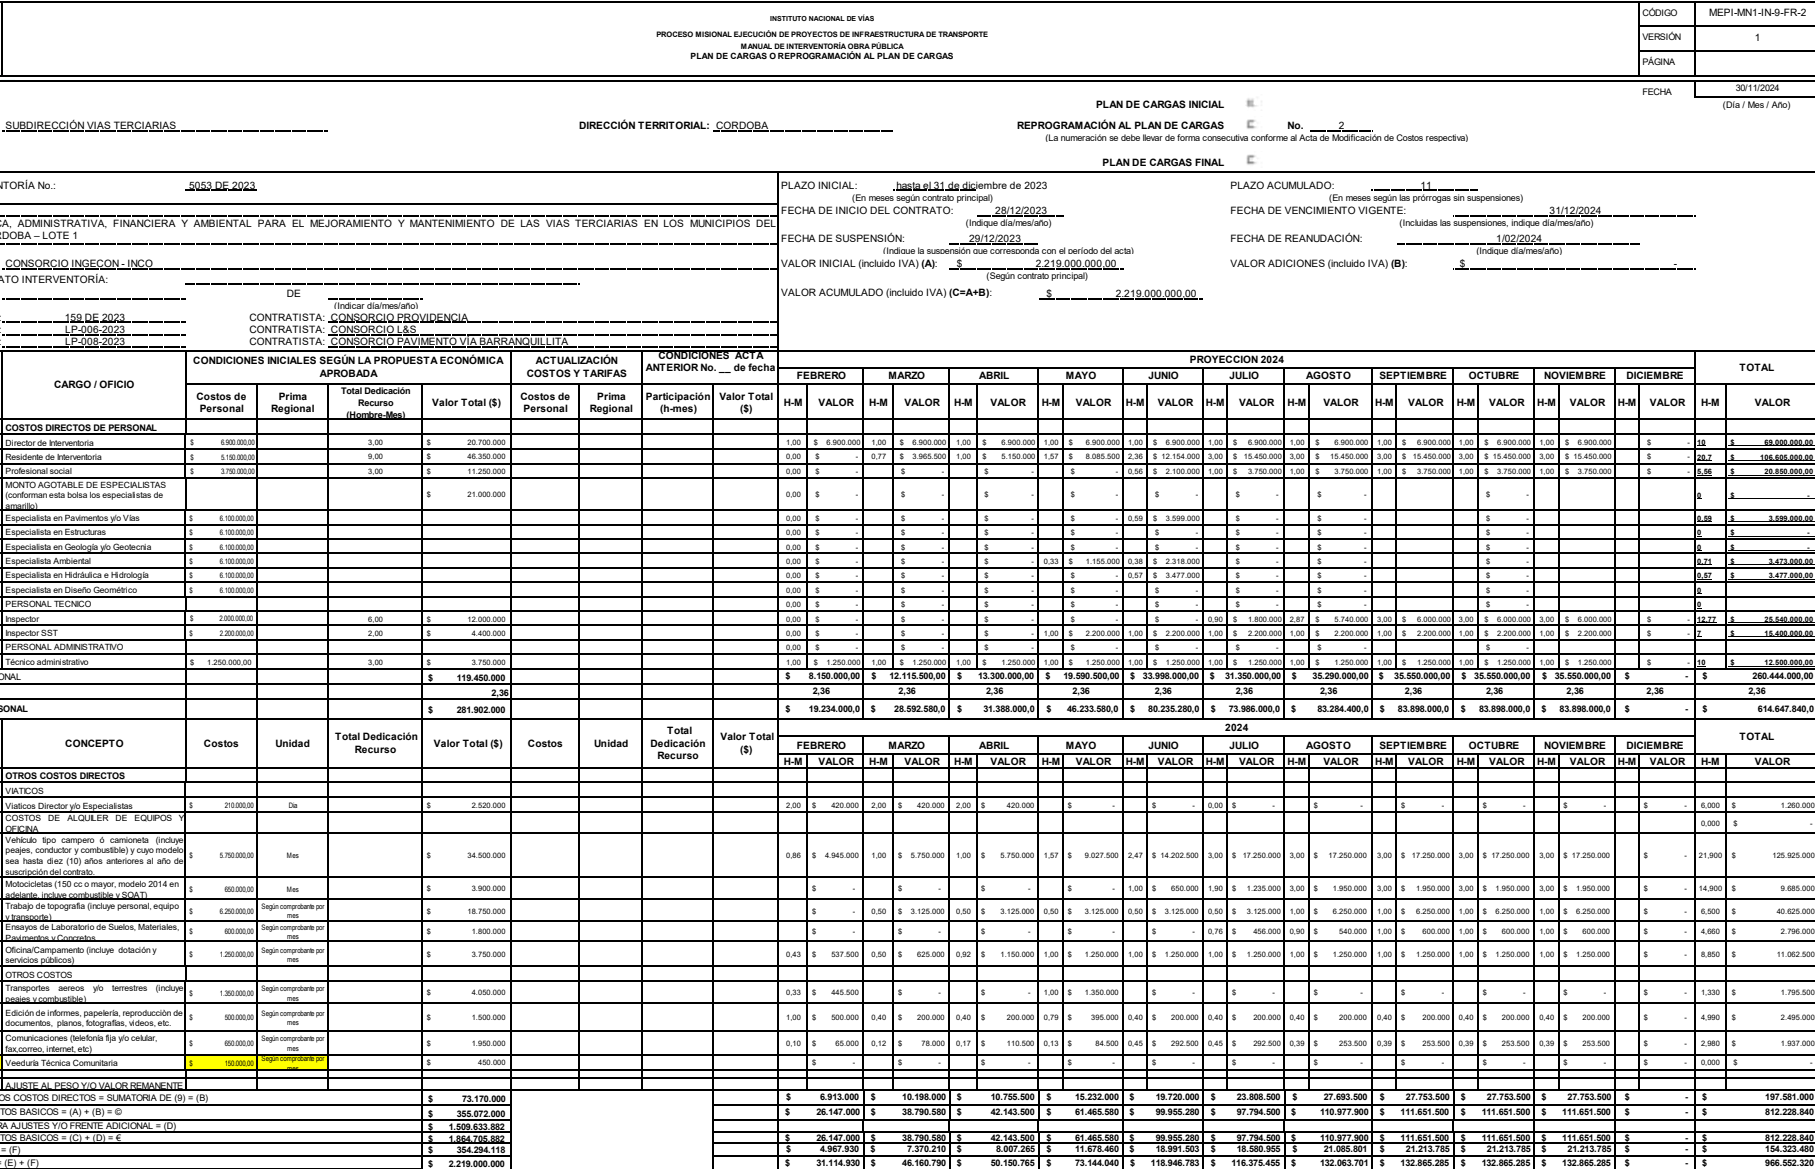[illegible]

Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversión; con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de dedicación, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

Para la Programación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del mismo.

La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de intervención.

En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la programación al plan de cargas.


El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Firma
Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal Interventor
Matrícula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma:
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 22202204005COR
(Suscribe según su competencia)

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	82

- **Seguimiento al Plan de Cargas - MEPI-MN-IN-9-FR-3.**

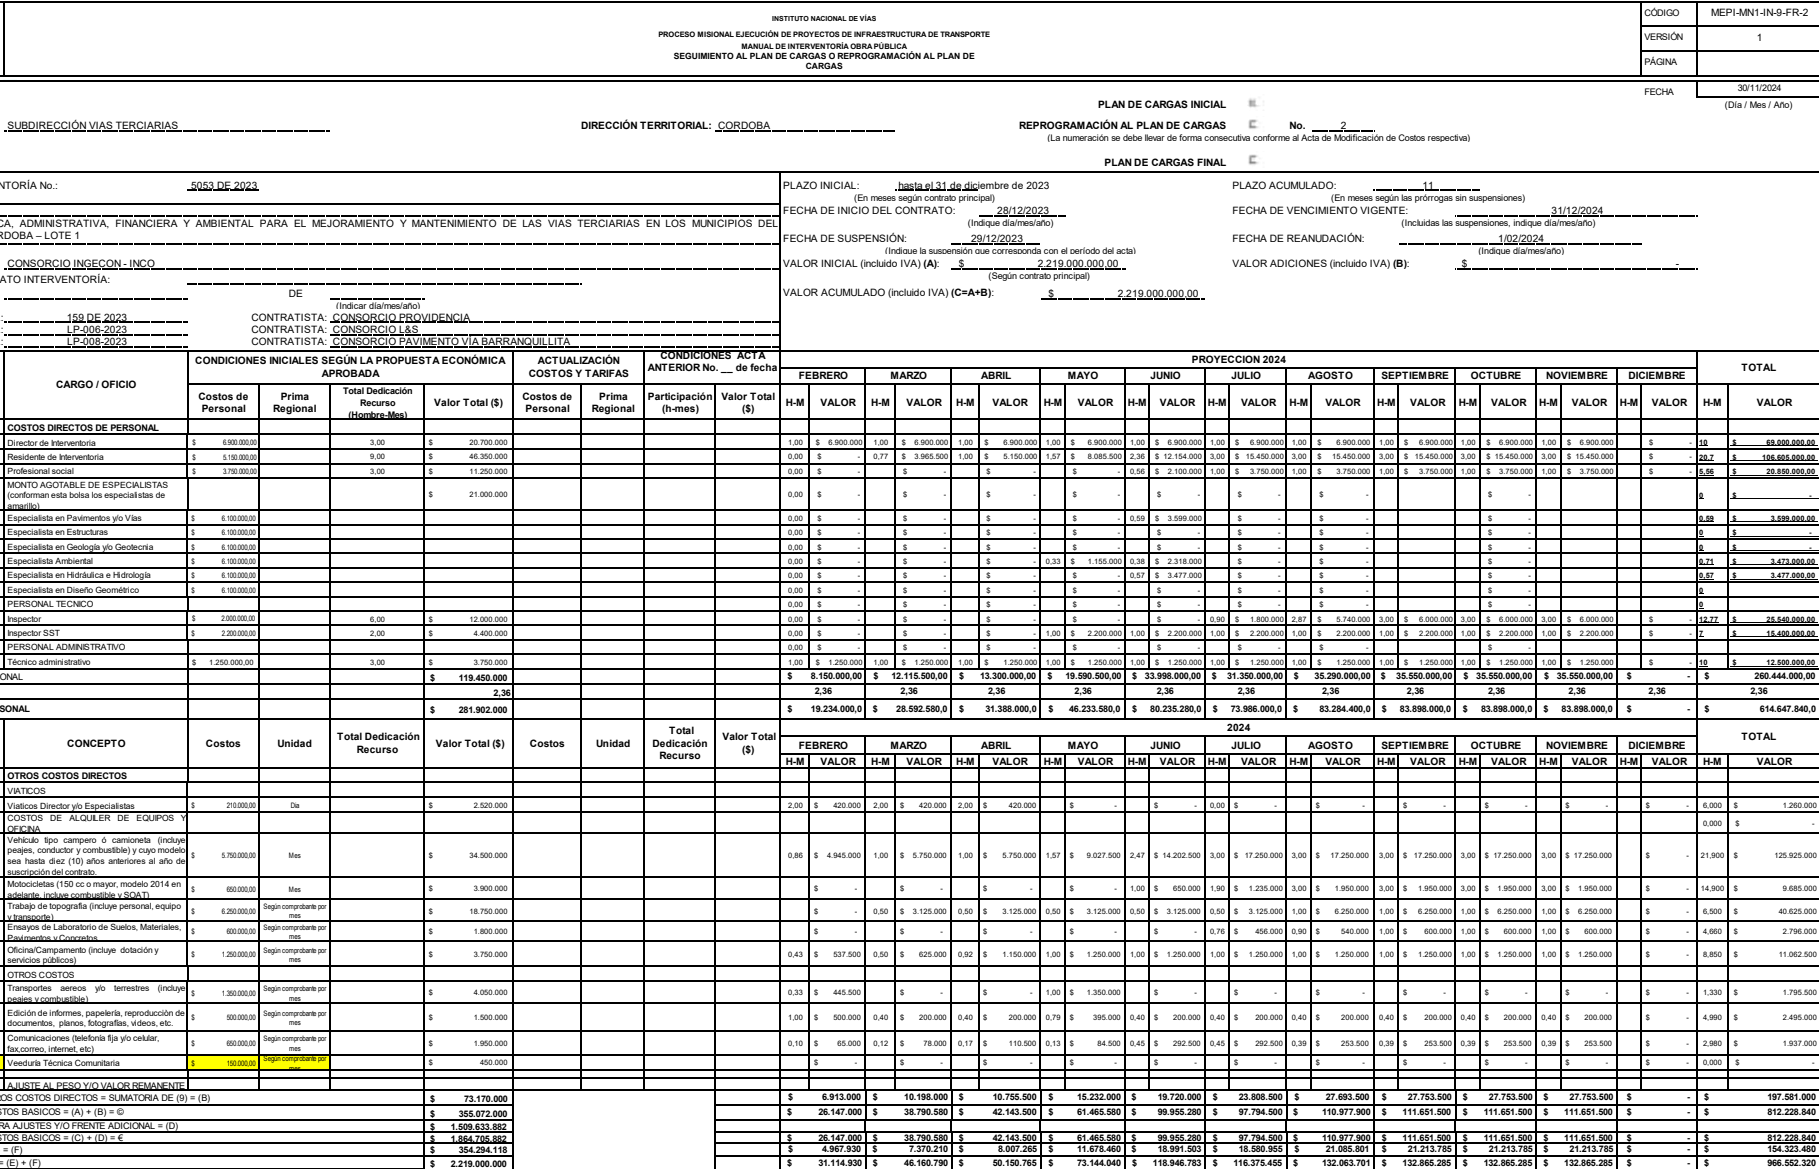[illegible]

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversiones antes que en estos documentos presente un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Programación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitados para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de Interventoría.

4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la programación al plan de cargas.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos en valores escalonados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Firma: _____
Nombre: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal Interventor
Matricula Profesional No.: 17202-153798 CLD

Firma: _____
Nombre: LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA
Supervisor de Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 2202204005COR
(Suscribe según su competencia)

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	83

7 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.

CONSORCIO PROVIDENCIA – CONTRATO DE OBRA No. 159 DE 2023.

La ejecución de las obras físicas del período representa un avance ejecutado acumulado del 32.45%, vs avance programado del 98.14%, presentando atraso del -65.70% de acuerdo a la programación de inversiones #1 aprobado, por lo tanto, se le ha solicitado al contratista proceder de forma inmediata, con el aumento de rendimientos, mediante la apertura de nuevos frentes de obra para avanzar en las labores de ejecución, con el fin de cumplir las metas físicas en el tiempo establecido para su ejecución.

El contratista de obra se encuentra incumpliendo el plan de contingencia, y se le solicitó realizar un nuevo plan de acción donde se unifique el tramo desde la abscisa K0+084 a K3+540, el cual no lo ha presentado actualizado y se solicita su cumplimiento a cabalidad, con el fin de garantizar la terminación del tramo en el plazo estipulado.

Con base en los avances reportados para el frente de obra, se solicita al Contratista, tomar las medidas de contingencia necesarias para dar cumplimiento a las metas físicas.

Se solicita al Consorcio Providencia, disponer los recursos de maquinaria, equipos y personal ofrecidos, para dar cumplimiento a la programación de obra aprobada, y avanzar en las actividades de ejecución de obra, y considerando que el contrato de obra vence el día 20 de diciembre de 2024, por lo que, el Contratista de Obra tiene que tomar medidas inmediatas de contingencia, con el fin de terminar las metas físicas en el menor tiempo posible.

Se realiza reunión de seguimiento con la veeduría ciudadana, contratista de obra e interventoría, con el fin de dar a conocer los avances del proyecto y aclarar dudas e inquietudes de la comunidad.

El día 27 de agosto de 2024, se dio apertura a la audiencia de presunto incumplimiento, en el desarrollo de la misma, se presentó por parte del apoderado del contratista, un informe de descargos y presentación de pruebas solicitando desistimiento del proceso, la aseguradora presentó sus descargos y se suspendió la audiencia para dar paso al análisis de pruebas, la cual se está a la espera de la

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	84

reanudación por parte del municipio. De igual manera, la Interventoria solicitó al municipio iniciar un proceso sancionatorio de multa por incumplimiento en las obligaciones SST.

El contratista de obra, durante el mes del presente informe ha presentado parcialmente los documentos exigidos; sin embargo, hay documentos pendientes por subsanar, para revisión y posterior aprobación por parte de la Interventoría.

El contratista de obra, ha constituido el encargo fiduciario para el manejo del anticipo, el municipio ha realizado el giro del recurso correspondiente, el cual tiene como destinación exclusiva la etapa de obra. La Interventoria está autorizando los desembolsos correspondientes que cuenten con toda la documentación legalizada con sus soportes, logrando desembolsar más de 1400 millones de pesos.

Se realiza reunión de avance mensual con participación de la veeduría ciudadana, comunidad, contratista de obra e Interventoria, con el fin de dar a conocer los avances técnicos que se han tenido en el desarrollo del proyecto y aclarar dudas e inquietudes de los asistentes.

A la fecha del presente informe, se tiene aprobado un tramo con una longitud de 3456ml, comprendido entre las abscisas K0+084 a K3+540, y se ha estado avanzando en la subsanación de los estudios y diseños hidráulicos y estructurales, por lo que se le ha solicitado al Consorcio Providencia finiquitar de carácter urgente las observaciones solicitadas por la Interventoria, con el fin de dar aprobación total a los diseños.

Se evidencia que se requieren trámites de permisos de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, ante la Corporación Autónoma del Valle del Sinú – CVS, por lo tanto, el contratista de obra y el municipio están adelantando el trámite pertinente.

Se han presentado las afiliaciones riesgos profesionales del personal vinculado a la obra. Pendiente entrega de las planillas pagadas del presente periodo.

Se ha cumplido con la señalización preventiva y temporal de obra.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	85

En el componente social, debe cumplir con los programas básicos, como son Información y divulgación, cultura vial, contratación de Mano de obra, Plan de Inversión Social, SAU.

A la fecha, el municipio ha consignado los rendimientos financieros de la cuenta convenio desde el año 2023 hasta septiembre 2024. Pendiente octubre y noviembre 2024.

A la fecha, esta pendiente por parte de la fiducia la devolución de los rendimientos financieros generados. Pendiente octubre y noviembre 2024.

CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA – CONTRATO DE OBRA No. LP-006-2023.

El Consorcio Pavimento Vía Barranquillita, constituyo el encargo fiduciario para el manejo del anticipo, el municipio hizo el giro del recurso correspondiente, el contratista envió los comprobantes de consignación de rendimientos financieros de la FIDUCIA. Actualmente se encuentra a la espera del cierre y liquidación de la cuenta.

A la fecha, se encuentra a la espera por parte de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y San Jorge la entrega de la resolución del permiso de ocupación de cauce.

Actualmente el contrato presenta un atraso del 32,59%, evidenciándose disminución respecto al mes pasado, se realizó la legalización ante la entidad el acta de modificación de mayores y menores e inclusión de precios no previstos y demás documentos que hacen parte de los requerimientos.

El contratista hace entrega de plan de contingencia ajustado a la reprogramación a la implementación del balance de obra, donde la interventoría realizó observaciones el cual se está a la espera de respuesta por parte del Contratista.

Al contratista se le realizó el pago del acta de recibo parcial No. 3 de fecha 21 de noviembre de 2024.

El contratista realizó en su totalidad las reparaciones de las losas reportadas a la fecha por la interventoría, donde estas, se encuentra en observación y se está a la

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	86

espera del comportamiento de dicha reparación, con el fin de proceder a su recibo definitivo. Se le envió otro comunicado con evidencias de fisuras en las losas que se han venido ejecutando, el contratista ha tomado medidas para evitar se siga presentando más fisuras en las losas de pavimento. Es importante resaltar que se tenga más cuidado al retirar los rieles de las losas de pavimento, ya que aún se encuentra en el proceso de fraguado y no se cuenta con la resistencia óptima.

Respecto a la bolsa de ajustes, se informa por parte del INVIAS, que dicho rubro, tal como lo establece el manual, se usa exclusivamente para contratos que tienen más de un año de ejecución, como en el caso particular, ese plazo no se ha cubierto; dicho monto se podrá distribuir en mayores cantidades de obra.

CONSORCIO L&S – CONTRATO DE OBRA No. LP-MBSV-008-2023.

El consorcio L&S, encargado de intervenir la vía que lleva desde la vereda Rimini hasta la intersección de la vía nacional San Bernardo del Viento – Moñitos, el Contratista continúa enviando documentos a la interventoría para su respectiva revisión.

Actualmente se encuentran pendientes de entrega a la Interventoría para su revisión y aprobación los siguientes documentos: estudios y diseños correspondientes al tramo entre las abscisas K0+350 y K0+600, diseño de las mezclas de concreto a utilizar en todo el proyecto y diseño de los diques. Por su parte, el Contratista ha entregado el diseño estructural del box culvert, el cual se encuentra en proceso de atención a los ajustes solicitados por parte de la Interventoría.

Como conclusión, la ejecución de las obras físicas durante el período reportado ha alcanzado un avance acumulado del 60.15%, en comparación con un avance programado del 81.01%, lo que resulta en un atraso del -24.05% respecto a la programación de inversiones #3 aprobada. Este desfase es significativo y requiere atención inmediata para evitar mayores retrasos en el cronograma del proyecto. En respuesta a esta situación, el Contratista ha presentado un programa de obra remedial que se encuentra actualmente en revisión por la Interventoría, lo que es un paso positivo hacia la recuperación del tiempo perdido.

Recomendaciones: Es fundamental que el Contratista implemente con urgencia las acciones correctivas propuestas en el programa remedial para alcanzar los porcentajes de obra programados. Además, se sugiere establecer un seguimiento más riguroso y frecuente del avance de las obras, así como una comunicación constante entre el Contratista y la Interventoría para identificar y resolver rápidamente cualquier desviación futura. También se recomienda realizar una evaluación exhaustiva de los recursos disponibles y optimizar su uso para mejorar

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	87

la eficiencia en la ejecución de las actividades pendientes. Por último, es crucial mantener al equipo informado sobre los plazos ajustados y fomentar un ambiente de colaboración para asegurar que todos los involucrados estén alineados con los objetivos del proyecto.

A la fecha, el municipio ha consignado los rendimientos financieros de la cuenta convenio del año 2024 desde enero hasta mayo 2024. Pendiente soporte de devolución de 2023, junio y julio de 2024.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	88

8 ANEXOS.

8.1 RELACIÓN DE CORRESPONDENCIA.

COMUNICADOS ENVIADOS			
Radicado	Fecha	Entidad	Asunto
CINGE-INV-5053-0397-24	2024-11-05	CONSORCIO PROVIDENCIA	Remisión informe mensual No. 9 correspondiente al periodo de octubre 2024.
CINGE-INV-5053-0398-24	2024-11-06	CONSORCIO L&S	Respuesta a OFICIO 085-202. ORDEN DE OPERACION 3
CINGE-INV-5053-0399-24	2024-11-06	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado OFI-CONS-121-2024 Orden de operación 10
CING-INV-5053-0400-24	2024-11-06	CONSORCIO L&S	Reporte tala de árboles por la comunidad.
CINGE-INV-5053-0401-24	2024-11-06	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado OFI-CONS-120-2024 Orden de operación 9
CINGE-INV-5053-0402-24	2024-11-06	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Identificación de daños N°3 en losas de pavimento.
CINGE-INV-5053-0403-24	2024-11-07	CONSORCIO L&S	Remisión acta de costos No. 9 correspondiente al periodo de octubre 2024.
CINGE-INV-5053-0404-24	2024-11-07	CONSORCIO L&S	Remisión informe mensual No. 10 correspondiente al periodo de noviembre 2024.
CINGE-INV-5053-0405-24	2024-11-07	CONSORCIO L&S	NTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENI
CING-INV-5053-0406-24	2024-11-07	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado OFI-CONS-103-2024. PLANETA RICA, CÓRDOBA. ESTUDIO GEOTÉCNICO ABSCISA K4+190
CINGE-INV-5053-0407-24	2024-11-07	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado OFI-CONS-118-2024 Orden de operación 5
CINGE-INV-5053-0408-24	2024-11-08	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado OFI-CONS-119-2024 Orden de operación 6
CING-INV-5053-0409-24	2024-11-09	CONSORCIO L&S	Repuesta a comunicado No. 073 – Remisión informes ambientales, sociales SST
CING-INV-5053-0410-24	2024-11-09	CONSORCIO L&S	Repuesta a comunicado No. 083 – Remisión informes ambientales, sociales SST
CINGE-INV-5053-0411-24	2024-11-09	CONSORCIO L&S	Respuesta comunicado - OFI-CONS-105-2024 actas de vecindad faltantes de los tramos ubicados en la Balastrea 1 y Balastrea 2.
CING-INV-5053-0412-24	2024-11-12	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Respuesta comunicado COBQ078-24– Informe SST Junio, Julio y septiembre 2024.
CING-INV-5053-0413-24	2024-11-12	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Respuesta a los comunicados COBQ079-24 Informe Ambiental octubre 2024
CING-INV-5053-0414-24	2024-11-12	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta al comunicado OFI-CONS-122-2024– Subsanación informe ambiental julio y agosto 2024
CING-INV-5053-0415-24	2024-11-12	CONSORCIO PROVIDENCIA	Comunicados OFI-CONS-111-2024 y OFI-CONS-115-2024 – Informes SST febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto y septiembre 2024
CINGE-INV-5053-0416-24	2024-11-12	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	ÍA TÉCNICA
CINGE-INV-5053-0417-24	2024-11-12	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	CNICA
CINGE-INV-5053-0418-24	2024-11-12	CONSORCIO L&S	A, ADMINISTRATI
CING-INV-5053-0419-24	2024-11-12	CONSORCIO PROVIDENCIA	Alcance comunicado CING-INV-5053-0414-24, respuesta al comunicado OFI-CONS-122-2024– Subsanación informe ambiental julio y agosto 2024
CING-INV-5053-0420-24	2024-11-12	CONSORCIO L&S	Primer apremio por la no entrega informes ambientales y SST periodo de junio, julio, agosto y septiembre 2024.

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	89

CINGE-INV-5053-0421-24	2024-11-15	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta comunicado OFI-CONS-123-2024 (entrega informe periodo octubre de 2024)
CINGE-INV-5053-0422-24	2024-11-15	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de resistencia a la flexión y resistencia a la compresión de cilindros del concreto.
CINGE-INV-5053-0423-24	2024-11-19	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Respuesta comunicado COBQ 080 - 2024 (informe periodo octubre de 2024)
CING-INV-5053-0424-24	2024-11-19	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta oficio OFI-CONS-114-2024. Subsanación diseño hidráulico
CING-INV-5053-0425-24	2024-11-19	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Respuesta comunicado COBQ081-24 y respuesta al correo 12 de noviembre– Informe SST agosto y octubre 2024.
CINGE-INV-5053-0426-24	2024-11-20	CONSORCIO PROVIDENCIA	, ADMINISTR
CING-INV-5053-0427-24	2024-11-20	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA	Respuesta a oficio COBQ-077-24. Prórroga
CING-INV-5053-0428-24	2024-11-20	CONSORCIO L&S	Comunicados 090-2024, 091-2024 y 092-2024 – informes SST y ambiental periodo de febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto y septiembre 2024.
CING-INV-5053-0429-24	2024-11-21	CONSORCIO L&S	Solicitud de Respuesta a Comunicaciones Pendientes
CING-INV-5053-0430-24	2024-11-21	CONSORCIO L&S	Respuesta al comunicado 089-2024 Resultado densidades en subbase granular.
CING-INV-5053-0431-24	2024-11-21	CONSORCIO L&S	Comunicados 088-24 y 095-24 Permiso ocupación de cauce y aprovechamiento forestal
CING-INV-5053-0432-24	2024-11-21	CONSORCIO PROVIDENCIA	Requerimiento SST – Implementación unidad sanitaria
CING-INV-5053-0433-24	2024-11-21	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS	Respuesta al comunicado 2024S-VBOG-060942 PAGA V03
CING-INV-5053-0434-24	2024-11-22	CONSORCIO PROVIDENCIA	Remisión comunicados del INVIAS 2024S-VBOG-087127 - 2024S-VBOG-087125 - Revisión PAGA e Informes de Estado ambiental
CING-INV-5053-0435-24	2024-11-22	CONSORCIO L&S	Remisión Comunicados INVIAS 2024S-VBOG-087128 Y 2024S-VBOG-087125 – PAGA e Informes de estado ambiental
CING-INV-5053-0436-24	2024-11-23	CONSORCIO L&S	Respuesta a Oficio 075. Box culvert
CING-INV-5053-0437-24	2024-11-23	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado OFI-CONS-124-2024. Geotecnia muro
CING-INV-5053-0438-24	2024-11-25	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta al comunicado OFI-CONS-125-2024– Subsanación informe ambiental julio y agosto 2024
CING-INV-5053-0439-24	2024-11-26	CONSORCIO L&S	Solicitud de Procedimiento para la Reparación de Fisuras en el Tramo K0+000 a K0+360.
CINGE-INV-5053-0440-24	2024-11-26	CONSORCIO L&S	Respuesta comunicado No. 094-2024 (subsanación de informes sociales)
CINGE-INV-5053-0441-24	2024-11-27	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado 117 Diseño estructural
CING-INV-5053-0442-24	2024-11-27	CONSORCIO PROVIDENCIA	Respuesta a comunicado 106 Diseño estructural

Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PROVIDENCIA

MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”

Asunto: **Respuesta al comunicado OFI-CONS-106-2024– Diseño estructural**

Respetado ingeniero,

En respuesta a la documentación que presenta el contratista en comunicado 106-2024., se remiten las observaciones realizadas por la especialista de estructuras a la revisión diseño estructural del muro K4+190:

Ítem	Observación
Aprobaciones previas	La revisión del componente estructural y su eventual no aprobación solo será válida para construcción si se cuenta con la aprobación de todos los estudios requeridos.
Normatividad	<ul style="list-style-type: none">• CCP-14. Ajustar el nombre de la norma, el correcto es Norma Colombiana de Diseño de Puentes LRFD – CCP-14.• NSR-10. Excluir, toda vez que no aplica al diseño de este tipo de estructuras.• Especificaciones Generales de construcción de Carreteras del INVIAS. Incluir esta especificación como referencia.
Análisis y diseño	El análisis y diseño del muro NO se ajusta a lo dispuesto en la Norma Colombiana de Diseño de Puentes LRFD – CCP-14, Secciones 3, 5, 10 y 11.

CING-INV-5053-0442-24

Página 2 de 2

Ítem	Observación
	Se evidencia que el análisis es realizado según criterios del Código de 1995 ya derogado y de la NSR-10, los cuales no aplican al caso.

Se solicita la respuesta punto a punto a lo anteriormente planteado, de no venir en esos términos el comunicado inmediatamente se devolverá, esto con el fin de facilitar la transferencia de información y la claridad que fue atendido el presente comunicado.

Así mismo, se propone reunión entre pares de especialistas con el fin de profundizar y direccionar lo aquí planteado.

Quedamos atentos a sus comentarios y confirmación de la reunión.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS
Reviso: Ing. Maria Camila Arenas
Elaboro: JC

Bogotá D.C., 27 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PROVIDENCIA

MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS"

Asunto: **Respuesta al comunicado OFI-CONS-117-2024– Diseño estructural**

Respetado ingeniero,

En respuesta a la documentación que presenta el contratista en comunicado 117-2024., se remiten las observaciones realizadas por la especialista de estructuras a la revisión diseño estructural de los box culvert de 2x1 y de 2x1.5:

Ítem	Observación
Aprobaciones previas	La revisión del componente estructural y su eventual no aprobación solo será válida para construcción si se cuenta con la aprobación de todos los estudios requeridos.
Análisis y diseño del Box (Numeral 3)	<p>Se indica que "...El diseño sísmico está de acuerdo a las disposiciones de esta Norma y de las dadas por la AASHTO Guide Specifications for LRFD Seismic Bridge Design..." y al respecto se aclara que de acuerdo con lo dispuesto en la Norma Colombiana de Diseño de Puentes LRFD – CCP-14, para estructuras como las del caso en estudio no aplica análisis sísmico, así:</p> <p>No es necesario considerar los efectos sísmicos para alcantarillas en cajón (box culverts) y estructuras enterradas, excepto donde crucen fallas activas.</p> <p>Por lo anterior, se debe ajustar lo pertinente.</p>
Capacidad Portante del Suelo (Numeral 4)	Los parámetros de capacidad de carga NO están dados en los términos de la CCP-14 sino en

Ítem	Observación
	<p>términos de la NSR-10, la cual no aplica al caso en estudio.</p> <p>Por lo anterior, se debe requerir al Especialista en Geotecnia reportar la capacidad de carga en los estados límite de resistencia, evento extremo y servicio, que son los aplicables según CCP-14.</p>
Movimientos sísmicos de diseño	<p>Como ya se indicó, no se requiere análisis sísmico del box, sin embargo, para el caso de las aletas, el análisis sísmico se debe realizar según lo dispuesto en la Sección 11 de la CCP-14.</p> <p>En virtud de lo anterior, se solicita realizar el ajuste correspondiente.</p>
Análisis y diseño estructural (Numeral 9)	<ul style="list-style-type: none"> • Dimensionamiento. Se debe optimizar el dimensionamiento del placas y muros, así como verificar la necesidad de implementar cartelas, ya que de acuerdo con la validación realizada por la Interventoría con el mismo software de diseño, es posible utilizar un espesor de 0.30 y omitir el uso de cartelas. • Altura del relleno. No se reporta altura del relleno sobre el box o si este es cero. • Datos del suelo. Ajustar de acuerdo con la capacidad que reporte el especialista en Geotecnia para los estados límite aplicables. • Constantes sísmicas. Deben ser validadas por el Especialista en Geotecnia y para el efecto, se solicita entregar el Estudio de Suelos aprobado para el proyecto. • Constantes de diseño. El recubrimiento mínimo debe ser de 7.50 cm. El acero secundario puede ser #3. El espaciamiento máximo debe ser definido conforme a lo dispuesto en la CCP-14. • Refuerzo mínimo. La cuantía de refuerzo 14/f, aplica a estructuras diseñados según NSR-10, por lo tanto no aplica al caso en estudio. • Zanja o Terraplén. Validar si aplica una u otra condición y explicarlo dentro de la memoria.

Ítem	Observación
	<ul style="list-style-type: none"> • Diseño. Optimizar, según observaciones planteadas en el presente documento. • Aletas <ul style="list-style-type: none"> – Constantes geotécnicas. Aplica lo indicado anteriormente. – Evaluación de capacidad de carga, volcamiento y deslizamiento. Solo se realiza para el estado límite de servicio, por lo que se deben incluir la evaluación para los estados límite de resistencia y evento extremo. Adicionalmente, La capacidad de carga reportada para el suelo en estas imágenes no corresponde a la indicada en los datos de entrada, por lo que se debe revisar lo pertinente. – Recubrimiento. Debe ser 7.50 cm. – Diseño. se debe optimizar. El refuerzo secundario puede ser reducido a #3.
Planos	<ul style="list-style-type: none"> • Notas. Ajustarlas al tipo de estructura objeto de construcción. En muchos apartes se evidencian aspectos que aplican a edificaciones. • General. Ajustar de acuerdo con la implementación de las observaciones planteadas en el presente documento.

Se solicita la respuesta punto a punto a lo anteriormente planteado, de no venir en esos términos el comunicado inmediatamente se devolverá, esto con el fin de facilitar la transferencia de información y la claridad que fue atendido el presente comunicado.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS
Reviso: Ing. Maria Camila Arenas
Elaboro: JC



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0440-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C, 26 de noviembre de 2024

Ingeniero

HABIB CHAAR SAKS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO L&S

MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. LP -MSBV – 008 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Asunto: **Respuesta comunicado No. 094-2024 (subsanción de informes sociales)**

En atención al comunicado No. 094-2024 *subsanción informes sociales período julio, agosto y septiembre de 2024*, nos permitimos emitir la aprobación de los documentos de referencia, toda vez que la información se diligenció en los formatos indicados y de manera adecuada con los anexos correspondientes. Sin embargo, queda pendiente la entrega del acta de constitución de la veeduría ciudadana con resolución emitida por la personería municipal de San Bernardo del Viento, se espera celeridad en la gestión y envío del documento que avala a la veeduría ciudadana en su ejercicio de control social y vigilancia sobre la ejecución del proyecto que nos ocupa.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres- Gestor técnico INVIAS

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia



CING-INV-5053-0439-24

Página 1 de 2



NIT. 901.783.007-9

Bogotá D.C., 26 de noviembre de 2024

Señores:

HABIB CHAAR SAKR

Representante Legal

Consorcio L&S

Referencia: Contrato de obra No. LP 008 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Asunto: **Solicitud de Procedimiento para la Reparación de Fisuras en el Tramo K0+000 a K0+360.**

Cordial Saludo,

La Interventoría se dirige al Contratista, con el fin de abordar un tema que ha surgido durante la ejecución de las obras.

Durante la inspección reciente del tramo comprendido entre las abscisas K0+000 y K0+360, hemos identificado la aparición de fisuras en la superficie del pavimento. Estas fisuras pueden comprometer la durabilidad y funcionalidad del pavimento, por lo que es imperativo tomar medidas correctivas a la brevedad.

Solicitud de Procedimiento:

En este sentido, le solicito amablemente que nos proporcione el procedimiento detallado que se implementará para la reparación de dichas fisuras. Este procedimiento debe incluir, pero no limitarse a:

Descripción del Método de Reparación: Indicar el tipo de reparación que se llevará a cabo (inyección, sellado, etc.).

Materiales a Utilizar: Especificar los materiales que se emplearán, incluyendo sus características técnicas.

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia



NIT. 901.783.007-9

CING-INV-5053-0439-24

Página 2 de 2

Cronograma de Ejecución: Proporcionar un plan temporal para la realización de las reparaciones.

Medidas Preventivas: Detallar las acciones que se tomarán para evitar la reaparición de fisuras en el futuro.

Control de Calidad: Incluir los procedimientos de control y verificación que se aplicarán durante la ejecución.

Agradezco su pronta atención a esta solicitud y quedo a la espera de su respuesta para coordinar una reunión si es necesario. Es fundamental garantizar que las reparaciones se realicen conforme a los estándares requeridos para asegurar la calidad y seguridad del pavimento.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PROVIDENCIA


MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”

Asunto: **Respuesta al comunicado OFI-CONS-125-2024– Subsanción informe ambiental julio y agosto 2024**

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente, nos permitimos aclarar que la interventoría dio alcance al comunicado CING-INV-5053-0414-24, con comunicado CING-INV-5053-0419-24 del 12 de noviembre del 2024, donde se confirma que se realiza la verificación de los siguientes anexos allegados:



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
008 AGOSTO 2024 - OBS INFORME.zip	16/10/2024 8:03 a. m.	Carpeta comprimida ...	42.185 KB
JULIO 2024 - OBS INFORME #5.zip	6/11/2024 7:39 a. m.	Carpeta comprimida ...	44.639 KB
RESPUESTA COMUNICADO CING-INV-5053-0310-24 (1).zip	12/11/2024 5:05 p. m.	Carpeta comprimida ...	86.824 KB

Por lo cual, nos permitimos manifestar lo siguiente:

CING-INV-5053-0438-24

Página 2 de 2

En la matriz de cumplimiento MASPS-MN1-IN-2-FR-3 en la ficha PAC-2.1-04, para el periodo de julio reportan un cantidad correspondiente a 780 m3 de afirmado y en el periodo de agosto una cantidad de 126 m3 de MTS -SUMINISTRO DETERRAPLEN, provenientes de la cantera JEMV, se evidencia en el informe de julio las remisiones de la cantera y en el informe de agosto una factura electrónica, pero para la fecha que están presentando los informes, el contratista ya debería contar con la certificación de la cantera, que corrobore las remisiones que adjuntan, por lo tanto, se solicita se adjunte en cada informe la certificación de la cantera JEMV donde confirme la cantidad que fue suministrada en cada periodo.

Por lo anterior, se reitera la solicitud de los informes ambientales correspondiente a los periodos septiembre y octubre del 2024 con sus respectivos soportes, así mismo, tener en cuenta las observaciones presentadas por el INVIAS con comunicado 2024S-VBOG-087125 del 21 de noviembre del 2024 y remitidas por interventoría en comunicado CING-INV-5053-0434-24.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS
Anexo: Oficio RCD de la secretaria de planeación municipal



CING-INV-5053-0437-24

Página 1 de 1



NIT. 901.783.007-9

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PROVIDENCIA
MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159-2023, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

Asunto: **Respuesta a comunicado OFI-CONS-124-2024. Geotecnia muro**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, se remite concepto del especialista geotécnico sobre el muro UBICADO EN LA ABSCISA K4+190:

Agradecemos la atención prestada y atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo torres- Gestor técnico INVIAS

elaboro: JJCO
reviso: MCA

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385
consorcioingeconinco.inter@gmail.com
Bogotá - Colombia



CING-INV-5053-0436-24

Página 1 de 2



NIT. 901.783.007-9

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024

Señor:
HABIB CHAAR SAKR
Secretario de Infraestructura y Planeación
Alcaldía de San Bernardo del Viento
San Bernardo del Viento, Córdoba

Referencia: Contrato de obra No. LP 008 de 2023, cuyo objeto es:
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN
EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Asunto: **Respuesta a oficio 075. Box coulvert.**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, se remite concepto del especialista estructural sobre el box coulvert:

Mediante comunicado del asunto, el Contratista manifiesta que “...*Por medio de la presente damos respuesta a las observaciones del oficio del asunto, **acogiéndonos** a la “CARTILLA DE OBRAS MENORES DE DRENAJE Y ESTRUCTURAS VIALES” del Instituto Nacional de Vías – INVIAS...*” (Resaltado fuera de texto), sin considerar para acoger los estudios y diseños planteados en la referida Cartilla debe tener en cuenta lo siguiente:

1. En el numeral 2. Notas de Responsabilidad de la referida Cartilla se establece que “...*Los planos y recomendaciones que se presentan en esta cartilla son documentos tipo, y **para su uso se debe verificar que el proyecto se adecue a las hipótesis y criterios de diseño empleados.** Por lo tanto el uso de los planos y elementos de esta cartilla no suponen responsabilidad del Instituto Nacional de Vías sobre la información que suministran y, por tanto, deben aceptarse tan sólo como complementos de toda la información que el constructor e interventor deben adquirir directamente y con sus propios medios para el cabal cumplimiento del contrato. **La responsabilidad de la calidad de la obra es única y exclusivamente del constructor e interventor y cualquier supervisión, revisión, comprobación o inspección que realice el Instituto Nacional de Vías o sus representantes***”

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia

se hará para verificar su cumplimiento, y no exime al constructor de su obligación sobre la calidad de las obras objeto del contrato... (Resaltado fuera de texto). Por lo que para acoger los estudios y diseños planteados en la Cartilla de Obras Menores de Drenaje y Estructuras Viales el Contratista “...***verificar que el proyecto se adecue a las hipótesis y criterios de diseño empleados...***”, lo cual no ha realizado.


2. Tal y como se indica de manera expresa en el numeral 5. Box Culvert de la Cartilla “...Se presenta el diseño estructural de los diferentes tipos de Box Culvert y estructuras de acceso en trece planos, ***dando los parámetros técnicos con los que se adelantó el diseño, los cuales deben ser verificados en el sitio de una obra particular y si no se cumplen en su totalidad, el diseño estructural deberá ser revisado y ajustado para las condiciones del sitio...***”, lo cual corrobora lo requerido en la Notas de Responsabilidad.

En virtud de lo anterior,

3. Se debe requerir al Contratista informe en el que se valide que las hipótesis de diseño de la Cartilla se ajustan a las condiciones particulares de los sitios en los cuales se pretende implantar el diseño de Cartilla, informe que debe contemplar como mínimo la validación del componente hidráulico, geotécnico y estructural tanto para los box culvert como para las aletas o estructuras de encole y descole.

Agradecemos la atención prestada y atentos a sus comentarios.

Cordialmente,


ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo torres- Gestor técnico INVIAS

elaboro: JJCO
reviso: MCA



NIT 901.783.007-9

CING-INV-5053-0435-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024

Señores:

HABIB CHAAR SAKR

Representante Legal

Consorcio L&S

Referencia: Contrato de obra No. LP 008 de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Asunto: **Remisión Comunicados INVIAS 2024S-VBOG-087128 Y 2024S-VBOG-087125 – PAGA e Informes de estado ambiental**

Respetados señores,

Por medio de la presente, esta interventoría se permite remitir el comunicado del INVIAS 2024S-VBOG-087128 del 21 de noviembre del 2024, mediante el cual, la subdirección de sostenibilidad del INVIAS presenta observaciones al PAGA V4.1 radicado por el contratista en comunicado 061-2024 del 18 de septiembre del 2024 y avalado por la interventoría en comunicado CINGE-INV-5053-0308-24 del 24 de septiembre del 2024, así mismo, el comunicado 2024S-VBOG-087125 del 21 de noviembre del 2024, donde la subdirección de sostenibilidad del INVIAS, solicita para los informes de estado ambiental los respectivos soportes de seguimiento a las fichas ambientales.

Por lo anterior, se solicita al contratista en un plazo no mayor a cinco (5) días atender los requerimientos expuestos por el INVIAS y se reitera al contratista lo expuesto en comunicado CING-INV-5053-0428-24 del 21 de noviembre del 2024 de la entrega de los informes ambientales pendientes de julio a octubre del 2024 con sus respectivos soportes.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Toro - Gestor técnico INVIAS
Anexo: Oficios INVIAS



Al contestar cite este radicado: **2024S-VBOG-087128**

Fecha: **2024-11-21 11:10:17**

SEÑOR(A):

ANGELA MARIA DAVILA MORALES

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INGECON - INCO

CALLE 148 No. 7g 42

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta a entrada 2024E-VUVRAZ-107683 del 2024-10-28. CO-LP-MSBV-008-23; CI-5053-23. Colombia Rural - Municipio de San Bernardo del Viento. Departamento de Córdoba.

Referencia: *Contrato de Interventoría No. 5053 de 2023 "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 1"*

Respetada Ingeniera Angela María,

En atención a su comunicación CING-INV-5053-0381-24 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-107683 del 28 de octubre de 2024 mediante el cual la interventoría remite de manera extemporánea y fuera de todo termino contractual el PAGA Versión No. 4 del contrato de obra No. LP-MSBV-008 de 2023 con objeto: *"Mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en el municipio de San Bernardo del Viento departamento de Córdoba"*. Por lo tanto, las observaciones se realizan sin perjuicio de las acciones que se hayan adelantado o se prevean de parte de la supervisión por el presunto incumplimiento dada la extemporaneidad de la presentación de la documentación sobre la gestión ambiental.

Revisada la información, esta subdirección se permite informar que:

Teniendo en cuenta la fecha de radicación del documento PAGA y el plazo para la terminación del contrato el cual venció el pasado 26 de octubre de 2024, se hace claridad que la Subdirección de Sostenibilidad no contó con los insumos suficientes para la revisión y seguimiento de la gestión ambiental durante las etapas de ejecución del proyecto. Por lo tanto, es importante resaltar que el documento PAGA debió vincularse como instrumento de verificación permanente para el contratista y de seguimiento por parte de la interventoría.

Se evidencia incumplimiento en la entrega de los formatos *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental del Proyecto*, *MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental* (N. 1) y el documento PAGA, debido a que no fueron presentados según los plazos contractuales y habiendo superado el 15% del tiempo total de ejecución del contrato de Obra, según lo establecido en el Manual de Interventoría.

A la fecha se encuentra pendiente la entrega del Balance Ambiental a la terminación del contrato. Se recuerda a la interventoría que toda la información radicada deberá cumplir con los lineamientos mínimos establecidos en el Manual de Interventoría de Obra Pública. De igual manera, se solicita que la información sobre la gestión inicial del componente ambiental sea radicada de manera independiente del componente social.

En cuanto al Documento PAGA, no se evidencian los programas de seguimiento, control y monitoreo, los cuales se indican en el Volumen 5 de la Guía de Manejo Ambiental del Instituto en su Versión 2022. Por otra parte, la complejidad del proyecto establecida no coincide con los criterios descritos en la guía, teniendo en cuenta que para este tipo de complejidad (media – baja) no se requiere de permisos de aprovechamiento forestal e instalación de campamentos, lo cual se indica en el documento que se llevara cabo para el desarrollo del proyecto. Aunado lo anterior, la complejidad mencionada anteriormente indica que para otro tipo de permisos serán tramitados por terceros y según lo reportado se realizó un trámite por permiso de ocupación de cauce. Por lo tanto, se sugiere revisar y ajustar si a ello hubiere lugar.

En el formato *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental del Proyecto*, se solicita diligenciar la información del numeral 2.7.1. Sitios de disposición final de sobrantes de obra y numeral 2.7.4.1. Captación. De igual manera, según la información evidenciada, se solicitar indicar el estado actual de los permisos de ocupación de cauce y de aprovechamiento forestal que fueron tramitados para el desarrollo del proyecto. No se evidencia soporte de suministro de agua. Asimismo, se solicita dar claridad sobre la competencia del profesional designado por parte del contratista para el componente ambiental, teniendo en cuenta que el numeral 2.1 corresponde al personal Ambiental y se registra un Ingeniero Industrial.

Por lo tanto, se solicita subsanar las observaciones anteriormente realizadas y remitir la información que se encuentra pendiente sobre el componente ambiental en un tiempo no mayor a cinco días después de recibida esta comunicación.

La presente se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas a cada una de las partes, sin perjuicio de las acciones que desde la Supervisión de la Interventoría y la Junta de Acción Comunal se requiera realizar en el marco de su competencia, para lo cual se envía copia a Unidad Ejecutora y Dirección Territorial Córdoba.

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: NICOLAS RODRIGUEZ BARRAGAN
Revisado por:
Aprobado por:

Copia Interna a: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO (1120300), ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO (1000012)
Copia Externa a:



Jairo Fernando Argueta Urrego, SUBDIRECTOR DE S

2024-11-21T11:10:20:05:00 Documento Firmado

Digitamente. Escane el Código QR Para Validarlo

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES



Fecha: 2024-11-21T11:10:22:05:00
Jairo Fernando Argueta Urrego
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD
1110500 SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS



NIT. 901.783.007-9

CING-INV-5053-0434-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 22 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PROVIDENCIA

MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS"

Asunto: **Remisión comunicados del INVIAS 2024S-VBOG-087127 - 2024S-VBOG-087125 - Revisión PAGA e Informes de Estado ambiental**

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente, esta interventoría se permite remitir el comunicado del INVIAS 2024S-VBOG-087127 del 21 de noviembre del 2024, mediante el cual, la subdirección de sostenibilidad del INVIAS presenta observaciones al PAGA V03 radicado por el contratista en comunicado OFI-CONS-078-2024 del 20 de septiembre del 2024 y avalado por la interventoría en comunicado CING-INV-5053-0317-24 del 25 de septiembre del 2024.

Así mismo, el comunicado 2024S-VBOG-087125 del 21 de noviembre del 2024, donde la subdirección de sostenibilidad del INVIAS, solicita para los informes de estado ambiental los respectivos soportes de seguimiento a las fichas ambientales.

Por lo anterior, se solicita al contratista en un plazo no mayor a cinco (4) días atender los requerimientos expuestos por el INVIAS y se reitera al contratista lo expuesto en comunicado CING-INV-5053-0419-24 del 12 de noviembre del 2024 de la entrega de los informes ambientales de los periodos septiembre y octubre del 2024 con sus respectivos soportes.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES

Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Anexo: Oficios INVIAS

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia



NIT. 901.783.007-9

CING-INV-5053-0433-24

Página 1 de 2

Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2024

Ing.

JAIRO FERNANDO ARGÜELLO

Subdirector de Sostenibilidad

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS

Calle 25G # 73B-90 Complejo Empresarial Central Point

Bogotá, D.C - Colombia

Referencia: Contrato de obra No. LP 006 de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Asunto: **Respuesta al comunicado 2024S-VBOG-060942 PAGA V03**

Respetado Ingeniero,

En atención al comunicado en asunto, esta interventoría se permite dar respuesta a cada uno de los puntos de la siguiente manera:

1. *Formato de Radicación y Actualización Ambiental de Proyectos - MASPS-MN1-IN-1-FR-1. Se presenta el formato de radicación y actualización ambiental de proyectos, con fecha 20 de febrero de 2024, debidamente firmada por las partes. Una vez revisado el formato de radicación ambiental, esta Dependencia solicita aclaración respecto a:*

Numeral 2.7.4.1. Captación: Se debe diferenciar si se requiere permiso de concesión de aguas. En el caso de requerirse, se indica el cuerpo de agua, localización del punto de abastecimiento, estado del permiso, número de acto administrativo o radicado de solicitud, caudal autorizado y vigencia. En caso de no contar con concesión de aguas y adquirir el recurso a través de un tercero, se debe indicar el nombre del proveedor y relacionar el documento mediante el cual se otorgó el permiso (...).

Respuesta: Se realiza el ajuste del formato MASPS-MN1-IN-1-FR-1, donde se confirma que el proyecto no requiere de permiso de captación de agua, dado que el mismo se está adquiriendo por medio de un tercero que corresponde a la empresa Administración Cooperativa de Servicios Públicos Domiciliario de los Córdoba – AGUACOR A.P.C, en el anexo 4 se adjunta la certificación otorgada por el proveedor para el suministro del recurso hídrico en las actividades a desarrollar en el proyecto.

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia

2. *Formato Plan de Inversión Ambiental No. 1 - MASPS-MN1-IN-1-FR-2. El Plan de Inversión Ambiental No. 1, se presenta con fecha 25 de octubre de 2022 firmado por las partes en donde se informa que el valor total de la Inversión ambiental es de \$0. Sin embargo, se solicita a la interventoría aclaración frente a la fecha de diligenciamiento, teniendo en cuenta que el Contrato de Obra tiene como fecha de inicio el 01 de febrero de 2024 y diligenciar todos los campos que se encuentran en el formato.*

Respuesta: Se atiende la solicitud y se ajusta la fecha de diligenciamiento, teniendo en cuenta que el mismo corresponde para el reporte al mes de febrero, así mismo, se realiza el diligenciamiento completo de los campos.

3. *Documento PAGA: La interventoría manifiesta que mediante oficio CING-INV-5053-0106- 24 del 16 de mayo de 2024, aprobó el documento PAGA V3 presentado por el contratista de obra. El documento PAGA presentado, debe ser vinculado como instrumento de control y seguimiento ambiental de obligatorio cumplimiento para el contratista. Teniendo en cuenta la fecha de inicio del contrato (01 de febrero de 2024), se solicita a la interventora remitir los informes de estado ambiental con sus respectivos anexos que se encuentran pendientes a la fecha.*

Respuesta: Los informes trimestrales del mes de febrero a abril y mayo a julio del 2024, fueron presentados por interventoría en comunicado CING-INV-5053-0353-24 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ103448 del 18 de octubre de 2024.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIA

CING-INV-5053-0432-24

Página 1 de 2

Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PROVIDENCIA

MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”

Asunto: **Requerimiento SST – Implementación unidad sanitaria**

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente, nos permitimos informar que, en seguimiento a las actividades de obra del contratista, se evidencia que la ubicación actual de las controladoras viales, se encuentra retirada de la vivienda que tiene actualmente el contratista para uso de almacén y unidad sanitaria, adicionalmente, dada la actividad de las controladoras viales, las cuales deben permanecer en su punto, no es posible el traslado del mismo, teniendo en cuenta que no cuenta con alguien que las releve:



Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia

CING-INV-5053-0432-24

Página 2 de 2

Por lo tanto, se requiere al contratista de forma INMEDIATA la implementación de baterías sanitarias móviles, tal como se manifestó en comité de veeduría el día 20 de noviembre del 2024, así mismo, se debe presentar a la interventoría, la documentación de la empresa que prestara el servicio, informar la frecuencia de limpieza y reportar dentro de los informes mensuales ambientales y SST el estado de los mismo con los respectivos certificados de limpieza.

Por último, se ratifica que a la fecha del presente comunicado el contratista no ha dado respuesta a las observaciones realizadas en los informes SST en comunicado CING-INV-5053-0415-24 del 12 de noviembre del 2024, por lo tanto, se ratifica a la secretaría de Infraestructura y planeación del municipio de Planeta Rica continuar con el proceso sancionatorio presentado en comunicado CING-INV-5053-0357-24 del 15 de octubre del 2024 con aplicación de la cláusula de multa, toda vez que, se evidencia un grave incumplimiento en sus obligaciones contractuales, por lo tanto, solicitamos al Consorcio Providencia atender las observaciones realizadas por interventoría y presentar los informes con toda la documentación exigida del personal que actualmente se encuentre laborando al contrato de obra No 159-2023 y las planillas de seguridad social de cada periodo que corresponda al personal presentado y aprobado por interventoría.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Arq. Jorge Isaac Gil – Secretario de Infraestructura y Planeación – Alcaldía municipio de Planeta Rica

Anexo: Acta de comité de veeduría



NIT 901.783.007-9

CING-INV-5053-0431-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2024

Señores:

HABIB CHAAR SAKR

Representante Legal

Consorcio L&S

Referencia: Contrato de obra No. LP 008 de 2023, cuyo objeto es:
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN
EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Asunto: **Comunicados 088-24 y 095-24 Permiso ocupación de cauce y
aprovechamiento forestal**

Respetados señores,

Por medio de la presente y teniendo en cuenta las resoluciones otorgadas por la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, para permiso de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, se solicita al contratista actualizar el PAGA V4.1, con sus respectivos formatos actualizados, el formato de actos administrativos debe venir diligenciado en su totalidad con los requerimiento y obligaciones que así establezcan, de igual manera, se deberá actualizar de forma inmediata el formato Plan de inversión ambiental, teniendo en cuenta los costos generados para la obtención de dichas resoluciones.

Dicho lo anterior, se solicita al contratista en un plazo no mayor a cinco (5) días hábiles atender lo expuesto en el presente comunicado.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES

Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIA

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia



CING-INV-5053-0430-24

Página 1 de 2



NIT. 901.783.007-9

Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2024

Señores:

HABIB CHAAR SAKR

Representante Legal

Consorcio L&S

Referencia: Contrato de obra No. LP 008 de 2023, cuyo objeto es:
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN
EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Asunto: **Respuesta al comunicado 089-2024 Resultado densidades en
subbase granular.**

Cordial Saludo,

En nuestra calidad de interventoría del proyecto de mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en el municipio de San Bernardo del Viento, hemos revisado los resultados de las tomas de densidad en campo de la subbase granular, realizados el 25 de octubre de 2024 material procedente de la Cantera El Esfuerzo (Lorica, Córdoba).

Los resultados de las pruebas, que fueron realizadas conforme a la norma INV E-161-13, se resumen a continuación:

- **Muestra DENSIDAD-M-002-1-Km 0+218:** Densidad seca in situ de 2,163 g/cm³, alcanzando un 103% de la densidad máxima de laboratorio.
- **Muestra DENSIDAD-M-002-2-Km 0+130:** Densidad seca in situ de 2,078 g/cm³, alcanzando un 99% de la densidad máxima de laboratorio.
- **Muestra DENSIDAD-M-002-3-Km 0+050:** Densidad seca in situ de 2,062 g/cm³, alcanzando un 98% de la densidad máxima de laboratorio.

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia



NIT. 901.783.007-9

CING-INV-5053-0430-24

Página 2 de 2

- **Muestra DENSIDAD-M-002-4-Km 0+035:** Densidad seca in situ de 2,058 g/cm³, alcanzando un 98% de la densidad máxima de laboratorio.

Los resultados indican que las tomas de densidad cumplen con las especificaciones requeridas, superando el 95% de la densidad Proctor modificada máxima de laboratorio, lo cual es satisfactorio para el proyecto. Estas mediciones reflejan una adecuada compactación del material, asegurando la estabilidad y durabilidad de la estructura.

Agradecemos su colaboración y esfuerzo continuo para mantener los estándares requeridos y así mantener la calidad del proyecto.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS



CING-INV-5053-0429-24

Página 1 de 2



NIT. 901.783.007-9

Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2024

Señores:

HABIB CHAAR SAKR

Representante Legal

Consortio L&S

Referencia: Contrato de obra No. LP 008 de 2023, cuyo objeto es:
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN
EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Asunto: **Solicitud de Respuesta a Comunicaciones Pendientes**

Cordial Saludo,

La Interventoría solicita de manera urgente una pronta respuesta a las comunicaciones enviadas al Contratista (Ver anexo). Es fundamental que recibamos sus respuestas a la mayor brevedad posible para garantizar el avance eficiente de nuestros proyectos y el cumplimiento de los plazos establecidos.

COMUNICACIONES PENDIENTE DE RESPUESTA	FECHA ENVÍO
CING-INV-5053-0231-24 Solicitud del Procedimiento Constructivo	26/07/2024
CING-INV-5053-0266-24 Solicitud_Ensayos_Piedra_Rajón	19/08/2024
CING-INV-5053-0275-24 Solicitud_Diseño_Box_Coulvert	23/08/2024
CING-INV-5053-0276-24 Solicitud_Diseño_Diques	23/08/2024
CING-INV-5053-0302-24 Incumplimiento_Especificaciones	13/09/2024
CING-INV-5053-0305-24 Diferencias Cantidades Box Coulvert	18/09/2024
CING-INV-5053-0306-24 Solicitud Concepto Diseñador	18/09/2024
CING-INV-5053-0359-24 Solicitud_Entrega_Pendientes	19/10/2024
CING-INV-5053-0374-24 Solicitud_Diseños_Concreto	23/10/2024

La falta de respuesta puede generar demoras significativas en la ejecución de las obras, afectar el cronograma general y la aprobación de actas de recibo parcial de

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia



NIT. 901.783.007-9

CING-INV-5053-0429-24

Página 2 de 2

obra. Por lo tanto, les agradecemos la priorización de las solicitudes y nos proporcionen la información requerida a la mayor brevedad.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS



NIT 901.783.007-9

CING-INV-5053-0428-24

Página 1 de 6

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2024

Señores:

HABIB CHAAR SAKR

Representante Legal

Consorcio L&S

Referencia: Contrato de obra No. LP 008 de 2023, cuyo objeto es:
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN
EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Asunto: **Comunicados 090-2024, 091-2024 y 092-2024 – informes SST y
ambiental periodo de febrero, marzo, mayo, junio, julio, agosto y
septiembre 2024.**

Respetados señores,

En revisión a lo presentado en el comunicado en asunto, esta interventoría se
permite manifestar lo siguiente:

➤ **Informes SST**

Se aprueba los informes SST de los periodos febrero, marzo, mayo y junio del
2024.

- **Informe de julio 2024**

Se evidencian las siguientes observaciones:

En la tabla del personal vinculado se evidencia al sr. Luis Alberto Hernández Villadiego y retirado en el mismo, pero en los soportes no se evidencia el paz y salvo firmado por el profesional, donde permita corroborar que la empresa se encuentra al día con pago de parafiscales y honorario o nomina de los días laborales.

Se evidencia la ARL del Sr. Elías Velásquez, donde los datos del contratante esta a nombre de José David Sánchez, por favor, se solicita al contratista aclarar el tipo de vinculación que tiene con el contratante con el proyecto en referencia y presentar la documentación completa del Sr. Elías Velásquez y que cargo cumple dentro del proyecto, adicionalmente no lo están contemplando en la tabla del informe del personal vinculado y el formato del INVIAS MEPI-MN1-IN-15-FR-6.

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia

La retroexcavadora de marca CASE SR220, no cuenta con la documentación exigida de dicha maquinaria, dado que la maquinaria y vehículos presentados a la interventoría corresponde a:

Vehículo	Marca	Placa	Modelo	Licencia de Transito	Manifiesto de Importación	Póliza RC	SOAT	Revisión Técnico Mecánica
Volqueta	HINO	SRO450	2008	Entregado	El número se encuentra en la parte posterior de la T R	No presenta	No presenta	No presenta
Volqueta	INTERNATIONAL	SNO699	2008	Entregado	El número se encuentra en la parte posterior de la T R	No presenta	No presenta	No presenta

Maquinaria	Marca	Serie	Modelo	Tarjeta de Registro	Manifiesto de Importación	Soporte Mantenimiento
Minicargador	BOBCAT	525022644	2005	Entregado	El número se encuentra en la parte posterior de la T R	Entregado
Motoniveladora	Caterpillar	CAT0420DVFD25381	2005	Entregado	El número se encuentra en la parte posterior de la T R	Entregado
Vibrocompactador	Caterpillar	CS533E	2014	No presenta	Entregado	Entregado

Por lo tanto, se solicita al contratista informar si hubo cambio de la maquinaria presentada inicial y reportar en el presente informe la documentación

correspondiente a dicha maquinaria, así mismo, presentar el contrato del alquiler de las maquinarias.

- Informe Agosto

Se reitera la observación del Sr. Elías Velásquez, teniendo en cuenta que la planilla es cancelada a nombre de JOSE DAVID SANCHEZ ANAYA, por favor, se solicita al contratista aclarar el tipo de vinculación que tiene con el contratante con el proyecto en referencia.

El contratista reporta en maquinaria lo siguiente:

6.17. MAQUINARIA DURANTE EL PERIODO

Maquinaria en obra durante el periodo:

MAQUINARIA					
No.	TIPO DE MÁQUINA	MARCA Y MODELO	OPERADOR	TIPO DE VINCULACIÓN	OBSERVACIÓN
1	RETROEXCAVADORA	CASE 580 N	FIDEL COGOLLO	SUBCONTRATADA	EN OBRA

Se reitera la observación, de presentar la documentación requerida de dicha maquinaria dado que no corresponde a la reportada en el informe de Julio, así mismo, presentar el contrato de alquiler que cuentan con dicha maquinaria.

- Informe Septiembre

Se evidencia planilla del Sr. Fidel Eduardo Cogollo Rodríguez y Luis Javier Caballero Borja, cancelada a nombre de JOSE DAVID SANCHEZ ANAYA, pero no están reportando en el periodo ingreso de dicho personal y tampoco presentan la documentación exigida (Soportes de inducción, entrega de EPP, exámenes médicos, afiliaciones y notificación de riesgos del personal), por lo tanto, se solicita al contratista presentar la documentación completa de dicho personal y aclarar el tipo de vinculación que tiene el Sr. José David Sánchez con el proyecto en referencia.

En maquinaria el contratista relaciona la siguiente:

CING-INV-5053-0428-24

Página 4 de 6

6.17. MAQUINARIA DURANTE EL PERIODO

Maquinaria en obra durante el periodo:

MAQUINARIA					
No.	TIPO DE MÁQUINA	MARCA Y MODELO	OPERADOR	TIPO DE VINCULACIÓN	OBSERVACIÓN
1	RETROEXCAVADORA	CASE 580 N	FIDEL COGOLLO	SUBCONTRATADA	EN OBRA
2	MINICARGADOR	CASE SR220	LUIS CABALLERO	SUONTRATADA	EN OBRA

El minicargador que ingresa en el periodo de septiembre, no corresponde a la reportada inicialmente, por lo tanto, se reitera presentar la documentación exigida de dicha maquinaria, as así mismo, presentar el contrato de alquiler que cuentan con dicha maquinaria.

- Informe Octubre

La planilla que adjuntan de Consorcio L&S corresponde al periodo de septiembre como se evidencia a continuación:

[illegible]

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia

Se evidencia la planilla de Luis Javier Caballero Borja, Celso de Jesús Martínez Palacio y Holber Alfredo Sánchez, se reitera la observación, dicho personal no se encuentra en la tabla del informe del personal vinculado, no presentan la documentación del personal, la planilla esta cancelada a nombre del sr. JOSE DAVID SANCHEZ ANAYA, por lo tanto, se ratifica la observación de aclarar el tipo de vinculación que tiene el Sr. José David con el proyecto en referencia.

En maquinaria el contratista relaciona la siguiente:

INFORME SST OCTUBRE.pdf (PROTEGIDO) - Adobe Acrobat Pro DC (64-bit)

Inicio Herramientas INFORME SST OCT...

19 / 110 100%

6.17. MAQUINARIA DURANTE EL PERIODO

Maquinaria en obra durante el periodo:

MAQUINARIA					
No.	TIPO DE MÁQUINA	MARCA Y MODELO	OPERADOR	TIPO DE VINCULACIÓN	OBSERVACIÓN
1	RETROEXCAVADORA	CASE 580 N	HOLBER SANCHEZ	SUBCONTRATADA	EN OBRA
2	MINICARGADOR	CASE SR220	LUIS CABALLERO	SUBCONTRATADA	EN OBRA
3	VIBROCOMPACTADOR	INGERSOLL RAND	CELSO MARTINEZ	SUBCONTRATADA	EN OBRA


El vibrocompactador que ingresa en el periodo de octubre, no corresponde a la reportada inicialmente, por lo tanto, se reitera presentar la documentación exigida de dicha maquinaria, así mismo, presentar el contrato de alquiler que cuentan con dicha maquinaria.

➤ Informes Ambientales

Se aprueba los informes ambientales de febrero, marzo, mayo y junio del 2024

- Informe Julio, agosto, septiembre y octubre 2024

Los formatos presentados en EXCEL no abren como se evidencia a continuación:



No se evidencia el acta de conformación del grupo ambiental.

Las actas de donación de material no se encuentran firmadas por el secretario de planeación del municipio, teniendo en cuenta que no es posible adjuntar toda la documentación exigida en el PAGA para donación de material, por lo tanto, se requiere que las actas sean aprobadas por el municipio.


No se adjuntan los soportes del pago del alquiler de la vivienda y la evidencia de que las unidades sanitarias se encuentran en óptimas condiciones para el personal.

No se evidencia certificado de la cantera aprobada con el tipo de material y cantidad suministrada en cada periodo.

No se evidencia registro de puntos ecológicos y el manejo de disposición final de los residuos convencionales.

Por lo anterior, se solicita al contratista en un plazo no mayor a tres (3) atender las observaciones expuestas en el presente comunicado.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIA



NIT. 901.783.007-9

CING-INV-5053-0427-24

Página 1 de 5

Bogotá D.C., 19 de noviembre de 2024

Ingeniero

CESAR AUGUSTO RIOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

MONTERIA

Ingeniera

XIMENA VALVERDE

SECRETARIA DE PLANEACION

ALCALDIA DE LOS

CORDOBAS LOS CORDOBAS

Referencia: Contrato de obra No. LP 006 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

Asunto: **Respuesta a oficio COBQ-077-24. Prórroga**

Respetados señores,

Por medio de la presente y en atención al comunicado COBQ-077-24 mediante el cual el CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA solicita prórroga No. 2 del contrato de obra No. LP-006-23, esta interventoría en cumplimiento de sus funciones, se permite pronunciarse de la siguiente manera:

ANTECEDENTES:

- Que el contrato es derivado del proceso licitatorio No. LP-006-2023.
- Tiene como fecha de adjudicación el 26 de octubre de 2023 adjudicando al oferente CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA, con un plazo hasta el 31 de diciembre de 2023. Cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.
- Que el contrato de obra No. LP-006-2023, se suscribió entre las partes el 15 de noviembre de 2023.
- Que el día 29 de diciembre de 2023 se suscribió el acta de inicio del contrato de obra.

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia

- Que el día 28 de diciembre de 2023, se dio orden de inicio a la interventoría designada por parte del Instituto Nacional de Vías, para realizar las labores de supervisión del contrato de obra.
- Que el día 29 de diciembre de 2023, se suspendió el contrato de obra por un término de un mes, por las razones que se mencionan a continuación: “ La Administración municipal se encuentra finalizando su proceso de empalme administrativo debido a la finalización e inicio de los periodos constitucionales de los respectivos mandatarios, razón por la cual no se ha impartido la prórroga al respectivo contrato de obra; entre otros, porque el cambio de administración implica el cambio de funcionarios, supervisores y personal de apoyo, lo cual afecta la capacidad operativa de los entes territoriales para conducir la correcta ejecución de los contratos.”
- Que el día 29 de enero de 2024, se realizó prórroga No. 1 a la suspensión No. 1, toda vez, que aun no se superaban los hechos que dieron origen a la suspensión,
- Que el día 1 de febrero de 2024, se realizó la reanudación del contrato de obra No. LP-006-23, quedando tres días de plazo contractual según lo establecido en el contrato.
- Que el día 1 de febrero de 2024, se realizó prórroga del contrato de obra No. LP-006-23 hasta el 30 de noviembre de 2024, sin adición.

PRONUNCIAMIENTO FRENTE A LAS MOTIVACIONES DE LA SOLICITUD DE PRORROGA Y CONCEPTO SOBRE LA MISMA:

Según el comunicado COBQ-077-24, el contratista manifiesta lo siguiente:

“En la ejecución del Contrato en referencia se ha presentado una variación considerable en las actividades y cantidades inicialmente establecidas contractualmente, debido a lo siguiente. El Proyecto tenía inicialmente 3 grandes capítulos a ejecutar, los cual eran 1. Obras de Pavimento, 2 Obras Hidráulicas y 3. Muro de Contención. Al momento de Inicio de los Trabajos, nos encontramos con la situación que el Muro de Contención, incluido en el alcance inicial del proyecto y dada su urgencia, porque este tenía comprometida una estructura hidráulica de gran magnitud como lo es un puente de 20mt de longitud el Municipio de Los Córdoba, gestiono de manera de Urgencia Manifiesta las Obras mediante un convenio con la Gobernación de Córdoba. De tal forma y por solicitud de la Comunidad y la Alcaldía de Córdoba, los recursos correspondientes a este Muro de Contención se Balancearon y se convirtieron en longitud adicional de pavimento, aumentando su alcance en casi un 80% mas de pavimento y logrando llegar a la población del Mango. Debido a esta situación la Actividad inicial de Revisión y Ajuste a Diseños, aumento su alcance pasando de una meta física de 1400ml a 2323ml de longitud

de pavimento. Además, nos encontramos con dos Ítems en el presupuesto, tales como Bolsa de Ajuste y Obras de Compensación Ambiental y Complementarias, las cuales después de hacer las consultas jurídicas y administrativas respectivas no se tienen cabida de ejecución en su totalidad en el presente Contrato y los montos de las cuales también pasarían a aumento de alcance de Meta Física.

Es claro anotar q a fecha 30 de noviembre de 2024, fecha establecida inicialmente para la entrega de obra, el alcance inicial de 1400ML de pavimento se va a lograr dentro del plazo establecido, pero para poder lograr el alcance adicional de Meta Física, es necesario hacer una solicitud de un plazo adicional al establecido inicialmente, el cual estimamos en Cuatro (4) meses adicionales, teniendo como fecha de entrega prevista el día 30 de marzo de 2025 .”

Respuesta: Tal como lo manifiesta el contratista, es un hecho cierto que en recorrido inicial se evidencia que el muro de contención que se encontraba dentro del alcance físico inicial del contrato, se estaba ejecutando por cuenta de contrato independiente por urgencia manifiesta suscrito, producto de convenio interadministrativo entre Gobernación de Córdoba y Municipio de los Córdoba, razón por la cual fue necesario suprimir esta actividad del presente contrato y balancear los recursos para ejecutar mayor meta física de pavimento rígido pasando de 1421 ml a 2325 ml de pavimento rígido incluida cuneta. Es decir, un incremento de mas del 63% de longitud. Cantidades que fueron incorporadas en el acta de modificación No. 1 de fecha 16 de octubre de 2024.

Como lo aclara el contratista según las proyecciones realizadas y rendimientos de obra, dentro del plazo actual, es decir, al 30 de noviembre de 2024, el contratista finalizará la meta física inicial, correspondiente a los 1421 ml de pavimento rígido, pero requiere tiempo adicional para el total de los 2325 ml, razón por la cual, la interventoría avala dicha prórroga, sin embargo, únicamente se puede aprobar la misma hasta el 20 de diciembre de 2024, fecha límite que tienen los demás contratos de obra los cuales esta Interventoría tiene dentro de su alcance, lo anterior, toda vez que el plazo actual de la presente interventoría va hasta el 31 de diciembre de 2024, y como se ha informado en reiteradas oportunidades, los recursos del contrato de interventoría 5053 de 2023 corresponden a recursos reserva, y no es posible con las condiciones actuales pasar al próximo año y como es de su conocimiento por regla general, el contrato de obra siempre debe contar con interventoría para su ejecución.

Ahora bien, respecto a modificar e incorporar en el presupuesto de obra los *dos Ítems en el presupuesto, tales como Bolsa de Ajuste y Obras de Compensación Ambiental y Complementarias, las cuales después de hacer las consultas jurídicas y administrativas respectivas no se tienen cabida de ejecución en su totalidad en el*

presente Contrato y los montos de las cuales también pasarían a aumento de alcance de Meta Física. “

Respuesta; Debido al plazo actual disponible, no es posible realizar dicho ajuste ya que el plazo restante es insuficiente para que el contratista pueda disponer de esos recursos en aumento de meta física adicional a los 2325 ml de pavimento rígido, este rubro quedará supeditado a la prórroga del contrato de interventoría o un nuevo contrato de interventoría, situación que será comunicada al Instituto Nacional de Vías, para su análisis y gestión, ya que es la entidad que tiene a cargo la contratación de la interventoría, según lo establece el convenio interadministrativo suscrito entre INVIAS y el Municipio de Los Cordobas.

Así la cosas, una vez analizados los puntos que dan origen a la petición del contratista sobre prorrogar el contrato, esta interventoría avala dicha prórroga, sin embargo, únicamente se puede aprobar la misma hasta el 20 de diciembre de 2024, fecha límite que tienen los demás contratos de obra los cuales esta Interventoría tiene dentro de su alcance, lo anterior, toda vez que el plazo actual de la presente interventoría va hasta el 31 de diciembre de 2024, y como se ha informado en reiteradas oportunidades, los recursos del contrato de interventoría 5053 de 2023 corresponden a recursos reserva, y no es posible con las condiciones actuales pasar al próximo año:

Por lo tanto, recomendamos al Municipio de los Córdoba, prorrogar hasta el 20 de diciembre de 2024, el contrato de obra bajo los fundamentos y argumentos esbozados por CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA respecto a la ampliación de la meta física del contrato, citado en su comunicado del asunto, con el fin de llevar a feliz término las metas físicas y financieras del contrato de la referencia y terminar el proyecto de la mejor manera cumpliendo los fines del estado, que a través del contrato de la referencia se pretende lograr, y del cual la CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA es el medio para tal ejecución, sin olvidar que las comunidades y el municipio son los principales beneficiarios de tales obras como bien lo establece la Honorable Corte Constitucional:

“Sentencia C-949 de 2001 Por regla general, los contratos estatales pueden ser modificados cuando sea necesario para lograr su finalidad y en aras de la realización de los fines del Estado, a los cuales sirve el contrato. Así lo prevén por ejemplo los artículos 14 y 16 de la ley 80, los cuales facultan a las entidades contratantes a modificar los contratos de común acuerdo o de forma unilateral, para “(...) evitar la paralización o la afectación grave de los servicios públicos a su cargo y asegurar la inmediata, continua y adecuada prestación”, entre otros.

En el mismo sentido, en la sentencia C-949 de 2001, la Corte Constitucional señaló que las prórrogas de los contratos –como especie de modificación- pueden ser un

instrumento útil para lograr los fines propios de la contratación estatal.[13] Al respecto, vale la pena destacar lo señalado por la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado en concepto del 13 de agosto de 2009: “La contratación estatal responde de múltiples maneras a ese mandato y, en cuanto al concepto que se emite, se resalta que la posibilidad de modificar los contratos estatales es una especial forma de hacer prevalecer la finalidad del contrato sobre los restantes elementos del mismo. Por mutabilidad del contrato estatal se entiende el derecho que tiene la administración de variar, dadas ciertas condiciones, las obligaciones a cargo del contratista particular, cuando sea necesario para el cumplimiento del objeto y de los fines generales del Estado”

Se aclara que la presente prórroga No. 2 para el contrato de obra, no requiere adición presupuestal pues cuenta con los recursos para su ejecución.

Cordialmente,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'AMDM', is written over a horizontal line.

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0426-24

Página 1 de 2

Bogotá D.C., 20 de noviembre de 2024

Ingeniero:

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PROVIDENCIA

MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”.

Asunto: **Incumplimiento a compromisos pactados comité de obra.**

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría para el desarrollo del contrato referenciado, y de acuerdo a comité de seguimiento de obra realizado el día 13 de noviembre de 2024, donde se establecieron los siguientes compromisos de entrega, fechas que no fueron cumplidas por el contratista y a la fecha se encuentran pendientes:

- Avanzar suministro, extendida y compactación de afirmado y subbase granular hasta la abscisa K2+300: No cumple.
- Balance de obra general: No cumple.
- Subsanación de las actividades reales a ejecutar del proyecto al día 20 de diciembre de 2024: No cumple.
- Iniciar actividades de construcción de boxculvert 2x1m en la abscisa K3+610 y un boxculvert 2x1.5m en la abscisa K3+920: No cumple.
- Subsanación plan de contingencia: No cumple.
- Subsanación informes ambientales de julio y agosto: No cumple.

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0426-24

Página 2 de 2

- Radicación informes ambientales de septiembre y octubre: No cumple.
- Subsanación de informes SST: No cumple.

Es preocupante para esta Interventoria, el continuo **incumplimiento** por parte del consorcio providencia de los compromisos pactados en los diferentes comités de obra, por lo tanto, se reitera cumplir a cabalidad con el programa de obra y presentar de manera inmediata la información descrita, so pena de seguir solicitando a la entidad, el inicio del proceso sancionatorio. Se aclara que toda demora presentada es de entera responsabilidad del contratista de obra.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS



NIT. 901.783.007-9

CING-INV-5053-0425-24

Página 1 de 2

Bogotá D.C., 19 de noviembre del 2024

Ingeniero

CESAR AUGUSTO RIOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. LP 006 de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Asunto: **Respuesta comunicado COBQ081-24 y respuesta al correo 12 de noviembre– Informe SST agosto y octubre 2024.**

Respetado ingeniero,

En revisión al informe presentado por el contratista esta interventoría se permite manifestar lo siguiente:

Informe Agosto

No se evidencia la planilla de seguridad social del siguiente personal:

JONATAN VALENCIA	2000011774	OBRERO	ACTIVO	INDP
ARMILLO JOAQUIN DORIA	78700606	OBRERO	ACTIVO	INDP
JEISON JANITH	1003093724	OBRERO	ACTIVO	INDP

Informe Octubre

El contratista adjunta la planilla del personal que se encuentra independiente, pero corresponde a la ARL, nuevamente se ratifica que deben adjuntar de igual manera la planilla correspondiente a la seguridad social, teniendo en cuenta que el contrato laboral entre el empleador y el empleado, establece que: “*Cláusula 6 – Declaraciones del contratista: Está a paz y salvo con sus obligaciones laborales y frente al sistema de seguridad social integral.*”, por lo tanto, el contratista debe requerir al personal con contrato de prestación de servicios la respectiva planilla de seguridad social paga de cada periodo.

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia



CING-INV-5053-0425-24

Página 2 de 2



NIT. 901.783.007-9

Por lo anterior, se solicita al contratista atender los requerimientos expuestos en el presente comunicado en un plazo no mayor a cinco días.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Álvaro Galvis - Gestor técnico INVIAS.

Bogotá D.C., 18 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PROVIDENCIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".

Asunto: **Respuesta a comunicado OFI-CONS-114-2024. PLANETA RICA, CÓRDOBA. SUBSANACION DISEÑO HIDRÁULICO**

Respetado ingeniero,

En respuesta a la documentación que presenta el contratista en comunicado OFI-CONS-114-2024., se remiten las observaciones realizadas por el especialista hidráulico a la revisión diseño en la abscisa K4+190 y K3+980.

Se solicita la respuesta punto a punto a lo anteriormente planteado, de no venir en esos términos el comunicado inmediatamente se devolverá, esto con el fin de facilitar la transferencia de información y la claridad que fue atendido el presente comunicado.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Reviso: amdm

Elabora: JC



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0423-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C, 19 de noviembre de 2024

Ingeniero

CESAR AUGUSTO RIOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. LP 006 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Asunto: **Respuesta comunicado COBQ 080 - 2024 (informe periodo octubre de 2024)**

En atención al oficio No. COBQ 080-2024 *entrega informe social período octubre de 2024*, nos permitimos emitir la aprobación de los documentos de referencia, toda vez que la información se diligenció en los formatos indicados y de manera adecuada con los anexos correspondientes.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Torres Hernández - Gestor técnico INVIAS



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0422-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 15 de noviembre de 2024

Ingeniero

CESAR AUGUSTO RÍOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PAVIMENTO VÍA BARRANQUILLITA

MONTERÍA

Referencia: Contrato de obra No. LP 006 de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Asunto: **Entrega de resultados de ensayos de laboratorio de resistencia a la flexión y resistencia a la compresión de cilindros del concreto.**

Respetado ingeniero:

De acuerdo al cumplimiento de las obligaciones contractuales del proyecto de la referencia y con el fin de garantizar la calidad de los materiales utilizados en la ejecución de las actividades, la interventoría solicita hacer la entrega de resultados de resistencia de las viguetas y los cilindros a los 7 y 14 días de todas las fundidas realizadas desde la fecha 22 de octubre de 2024 de las bermacunetas y desde el 29 de octubre de 2024 de las losas de pavimento.

Esto es con el fin de garantizar el cumplimiento y la calidad en el desarrollo del proyecto de la referencia.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

ANGELA MARÍA DÁVILA MORALES

Representante Legal

cc. – Luis Guillermo Torres Gestor técnico INVIAS

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0421-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C, 15 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PROVIDENCIA

MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159-2023, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

Asunto: **Respuesta comunicado OFI-CONS-123-2024 (entrega informe periodo octubre de 2024)**

En atención al comunicado No. OFI-CONS-123-2024 *entrega informe social período octubre 2024*, nos permitimos emitir la aprobación de los documentos de referencia, toda vez que la información se diligenció en los formatos indicados y de manera adecuada con los anexos correspondientes.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES

Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres- Gestor técnico INVIAS

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia

CING-INV-5053-0420-24

Página 1 de 2

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2024

Señores:

HABIB CHAAR SAKR

Representante Legal



Consorcio L&S

Referencia: Contrato de obra No. LP 008 de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Asunto: **Primer apremio por la no entrega informes ambientales y SST periodo de junio, julio, agosto y septiembre 2024.**

Respetados señores,

Por medio de la presente, nos permitimos reiterar lo expuesto en el comunicado CING-INV-5053-0390-24 del 29 de octubre del 2024, mediante el cual, se solicito al contratista presentar nuevamente los informes ambientales del periodo junio, julio, agosto y septiembre, dado que, al momento de descargar, no abre los archivos de Excel, como se evidencia a continuación:




Correspondiente a los informes SST, se viene solicitando al contratista desde el comité de seguimiento del 19 de septiembre del 2024, en comunicados CING-INV-5053-0360-24 del 21 de octubre y CING-INV-5053-0390-24 del 29 de octubre del 2024, que se debe presentar un informe detallado con los siguientes aspectos:

- Presentar una tabla en cada informe del estado del personal si encontraba activo o retirado, así mismo el ingreso de nuevo personal, con el tipo de contrato.
- Planillas de seguridad de cada periodo, debe corresponder al personal que relacionan en la matriz MEPI-MN1-IN-15-FR-6: Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra.
- Soportes de inducción, entrega de EPP, exámenes médicos, afiliaciones y notificación de riesgos del personal se aprobó en cada mes.
- Un plan de capacitaciones para el tiempo que tiene el proyecto y el cumplimiento del mismo en cada mes, con sus respectivos soportes.
- Política de SG-SST firmado por el representante legal y debe haber registro fotográfico de la divulgación del mismo.
- Matriz de identificación de peligros.
- Medición de los indicadores mínimos de acuerdo a la resolución 0312 del 2019
- Relacionar la maquinaria utilizada en cada periodo, debe corresponder a la presentada a interventoría y el formato MEPI-MN1-IN-15-FR-4, con los preoperacionales.
- Presentar el plan de emergencia y evidencia de la implementación de mismo.
- Acta de designación del personal para el COPASST y CCL
- El registro fotográfico debe estar con hora y fecha

Por lo anterior y dado que a la fecha el contratista no ha dado cumplimiento a los requerimientos de la interventoría, se ratifica al consorcio L&S presentar los informes solicitados en el presente comunicado con sus respectivos soportes en un plazo no mayor a dos (2) días, así mismo, el informe ambiental y SST del mes de octubre, so pena de recomendar al municipio el inicio del proceso sancionatorio con aplicación de la cláusula de multa, toda vez que, se evidencia un grave incumplimiento en sus obligaciones contractuales en el área SST y ambiental,

Cordialmente,


ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIA

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PROVIDENCIA


MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”

Asunto: **Alcance comunicado CING-INV-5053-0414-24, respuesta al comunicado OFI-CONS-122-2024– Subsanación informe ambiental julio y agosto 2024**

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente, nos permitimos dar alcance al comunicado CING-INV-5053-0414-24, dado que no se descargaron todos los soportes que había presentado el contratista en comunicado OFI-CONS-122-2024, por lo tanto, se realiza la verificación de los siguientes anexos allegados:



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
008 AGOSTO 2024 - OBS INFORME.zip	16/10/2024 8:03 a. m.	Carpeta comprimida ...	42.185 KB
JULIO 2024 - OBS INFORME #5.zip	6/11/2024 7:39 a. m.	Carpeta comprimida ...	44.639 KB
RESPUESTA COMUNICADO CING-INV-5053-0310-24 (1).zip	12/11/2024 5:05 p. m.	Carpeta comprimida ...	86.824 KB

Por lo cual, nos permitimos manifestar lo siguiente:

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia

En la matriz de cumplimiento MASPS-MN1-IN-2-FR-3 en la ficha PAC-2.1-04, para el periodo de julio reportan un cantidad correspondiente a 780 m3 de afirmado y en el periodo de agosto una cantidad de 126 m3 de MTS -SUMINISTRO DETERRAPLEN, provenientes de la cantera JEMV, se evidencia en el informe de julio las remisiones de la cantera y en el informe de agosto una factura electrónica, pero para la fecha que están presentando los informes, el contratista ya debería contar con la certificación de la cantera, que corrobore las remisiones que adjuntan, por lo tanto, se solicita se adjunte en cada informe la certificación de la cantera JEMV donde confirme la cantidad que fue suministrada en cada periodo.

Por lo anterior, se reitera la solicitud de los informes ambientales correspondiente a los periodos septiembre y octubre del 2024 con sus respectivos soportes, para que sean remitidos en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles.

Cordialmente,


ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS
Anexo:



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0418-24

Página 1 de 2

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2024

Ingeniero:

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PROVIDENCIA

MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”.

Asunto: **Respuesta a comunicado OFI-CONS-116-2024. Plan de contingencia actualizado y flujo de caja.**

Cordial saludo,

De conformidad con el seguimiento que se viene realizando a la ejecución del proyecto relacionado en la referencia, y una vez revisada la información suministrada mediante comunicado OFI-CONS-116-2024, solicitamos que el consorcio providencia, disponga los recursos de maquinaria, equipos y personal ofrecidos, para dar cumplimiento a la programación de obra, correspondiente a la ejecución del tramo entre las abscisas K0+084 a K3+540 (3456 ml) en intervención y a las dos obras de arte a construir, y tomar las medidas inmediatas de contingencia, con el fin de mitigar el atraso y terminar la meta física del presente plan de acción en el plazo contractual.

De acuerdo a la programación semanal presentada, se solicita que cumplan los plazos descritos, toda vez que, el proyecto no permite holguras en la ejecución de actividades, y de acuerdo a la ejecución semanal que se ha estandarizado, no cumplirían con los plazos establecidos, por lo tanto, se solicita de carácter urgente que apliquen de manera real un plan de acción en la ejecución de las actividades de la obra para disminuir el atraso presentado, y garantizar la terminación del tramo en el tiempo establecido para su ejecución.

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0418-24

Página 2 de 2

En relación con la inversión en el flujo de caja y los tiempos descritos en el plan de contingencia, estarían acorde a la programación presentada, y coinciden con los valores financieros de las semanas programadas.

Teniendo en cuenta, que en el plan de contingencia manifiestan que el primer corte se realizó el pasado 07 de noviembre de 2024, y de acuerdo al avance en la ejecución de actividades semanales y al no inicio de las obras de arte, esta Interventoria ve con preocupación que no están cumpliendo el plan de acción, por lo tanto, para su aprobación se les solicita que implementen todo lo necesario descrito en el plan de contingencia para garantizar una adecuada ejecución, con el fin de realizar un seguimiento real al desarrollo del proyecto.

Cordialmente,


ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0417-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PROVIDENCIA

MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".

Asunto: **Revisión resultados de ensayos.**

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría para el desarrollo del contrato, y de acuerdo a los resultados de ensayos presentados mediante comunicado OFI-CONS-100-2024, una vez revisada la información, esta Interventoría aprueba la documentación suministrada, sin embargo, se solicita hacer entrega de los resultados faltantes, relacionados con las resistencias de las viguetas a los 7, 14 y 28 días de todas las fundidas realizadas a lo largo del pavimento rígido MR38 construido, de igual manera, hacer entrega de los resultados faltantes de las densidades de afirmado y subbase granular hasta el tramo liberado (K1+952).

Así mismo, se solicita hacer entrega de los resultados de los cilindros a los 7, 14 y 28 días de todas las fundidas realizadas a lo largo de las bermacunetas (3000 PSI) construidas.

Se solicita al contratista de obra, presentar la información faltante a más tardar el día viernes 15 de noviembre de 2024, con el fin de garantizar el cumplimiento y la calidad en el desarrollo del proyecto.

Cordialmente,


ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia

CINGE-INV-5053-0416-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PROVIDENCIA

MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".

Asunto: **Reiteración a compromisos pactados.**

Cordial saludo,

En cumplimiento de las obligaciones de la Interventoría para el desarrollo del contrato, y de acuerdo a comité de seguimiento de obra realizado el día 28 de octubre de 2024, donde se establecieron los siguientes compromisos de entrega, fechas que no fueron cumplidas por el contratista y a la fecha se encuentran pendientes:

- Balance general de obra: No cumple.
- Subsananación de las actividades reales a ejecutar del proyecto al día 20 de diciembre de 2024: No cumple.
- Iniciar actividades de construcción de boxculvert 2x1m en la abscisa K3+610 y un boxculvert 2x1.5m en la abscisa K3+920: No cumple.

Se solicita al contratista de obra, presentar de manera inmediata la información solicitada, so pena de seguir solicitando a la entidad, el inicio del proceso sancionatorio. Se reitera que toda demora presentada es de entera responsabilidad del contratista de obra.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia



NIT. 901.783.007-9

CING-INV-5053-0415-24

Página 1 de 10

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PROVIDENCIA

MONTERIA

Arquitecto

JORGE ISAAC GIL

SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA Y PLANEACION

ALCALDIA MUNICIPIO DE PLANETA RICA

Planeta Rica, Córdoba

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”

Asunto: **Apremio Comunicados OFI-CONS-111-2024 y OFI-CONS-115-2024 – Informes SST febrero, marzo, abril, mayo, julio, agosto y septiembre 2024**

Respetado ingeniero,

En respuesta a la documentación que presenta el contratista en comunicado en asunto, nos permitimos informar que se están remitiendo los informes en borrador e incompletos sin dar respuesta a las observaciones que viene realizando la interventoría, las cuales, se reiteran nuevamente y se solicita al contratista presentar los informes completos con todos sus soportes:



INFORMES FEBRERO, MARZO Y ABRIL 2024

1. No presenta las planillas de seguridad social de los periodos de febrero y marzo.

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia

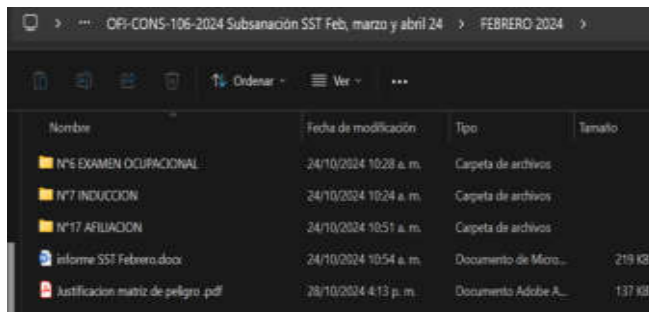

En el informe de abril del 2024, relacionan el siguiente personal:

Nombre y apellido	Cedula	Cargo	Ingreso	Activo o retirado
Gustavo Ortega	8.364.940	Dir. Obra		Activo
Santiago Sánchez	1.067.912.244	Residente obra		Activo
Sofía López	1.066.742.985	SST	19 de abril 2024	activo

Pero la planilla de seguridad social que reportan de dicho periodo relacionan corresponde al siguiente personal:

202404 2024 05 - PLANILLA PERSONAL NUEVO CONVOCIO PROVIDENCIA ABRIL-MAYO (1).pdf - Adobe Acrobat Pro DC (64-bit)

Archivos Edición Ver Formas electrónicas Ventanas Ayuda

Inicio Herramientas 202404 2024 05 - P. <

<

Por lo tanto, se puede evidenciar en lo señalado en el cuadro rojo, que el personal no corresponde al reportado según el informe de abril del 2024, por ende, se ratifica que las planillas de seguridad social que reportan en cada periodo deben corresponder al personal que se encontraba laborando en dicho mes.

Así mismo, dentro de la información de afiliaciones por lo menos, debe contener el certificado de EPS, ARL, PENSIÓN Y CAJA DE COMPENSACIÓN, documentos que tampoco soportan en su totalidad de cada persona que ingreso desde el mes de febrero del 2024.


2. No están los soportes de entrega de EPP del personal que relacionan en los informes de febrero, marzo y abril.
3. No presentan un plan de capacitaciones para el tiempo que tiene el proyecto y el cumplimiento del mismo en cada mes, con sus respectivos soportes.
4. No están adjuntando la política de SG-SST firmado por el representante legal y debe haber registro fotográfico de la divulgación del mismo.
5. No están adjuntando la matriz de identificación de peligros.
6. No están relacionando la maquinaria a utilizar durante el proyecto, la cual, ya fue presentada a la interventoría y debe estar toda la documentación.
7. No adjuntan el plan de emergencia.
8. No presenta los formatos establecidos en el manual de interventoría INVIAS 2022:

- MEPI-MN1-IN-15-FR-4: Maquinaria y Equipo Contrato de Obra
- MEPI-MN1-IN-15-FR-6: Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra
- MEPI-MN1-IN-15-FR-11: Resumen Ensayos de Laboratorio

INFORMES MAYO 2024

1. En el informe de mayo, presenta una planilla de seguridad, pero solo relacionan a Sofía López y en el informe del mes de mayo relacionan el siguiente personal:

Nombre y Apellido	Cedula	Cargo	Ingreso o Retiro	Activo o Retirado
Gustavo Ortega	8.364.940	Dir. Obra		Activo
Santiago Sánchez	1.067.912.244	Residente obra	29 de mayo 2024	Retirado
Sofía López	1.066.742.985	SST	29 de mayo 2024	Retirado
José Ricardo Ruiz		Residente obra	30 de mayo 2024	Activo
Angie Daniela Carrascal Ochoa	1.066.750.679	SST	30 de mayo 2024	Activo




De acuerdo a la tabla en mención, se ratifica que las planillas de seguridad social que reportan en cada periodo deben corresponder al personal que se encontraba laborando en dicho mes.

- No presentan un plan de capacitaciones para el tiempo que tiene el proyecto y el cumplimiento del mismo en cada mes, con sus respectivos soportes.
- No están adjuntando la política de SG-SST firmado por el representante legal y debe haber registro fotográfico de la divulgación del mismo.
- No están adjuntando la matriz de identificación de peligros.
- No están relacionando la maquinaria a utilizar durante el proyecto, la cual, ya fue

presentada a la interventoría y debe estar toda la documentación.

- No adjuntan el plan de emergencia.
 - No presenta los formatos establecidos en el manual de interventoría INVIAS 2022.
2. No presentan el informe de Junio del 2024, con todos los soportes correspondientes.
 3. En el informe de julio 2024, no adjuntan las planillas de seguridad social, del siguiente personal que relacionan en dicho periodo:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ACTIVO O RETIRADO
Gustavo Alfonso Montes	1.100.691.991	Op. Motoniveladora	Activo
Obet Banqueth Fuente	1.063.296.113	Op. Retroexcavadora	Activo
Brayan Padilla Martínez	1.067.292.005	Obrero	Activo
Juan Pablo Mercado	1.003.305.631	Obrero	Activo
Jorge Miguel Delgado	1.067.849.446	Obrero	Activo
Néstor Luis Salgado	1.003.359.117	Obrero	Activo
José Ricardo Ruiz	15.677.277	Dir. Obra	Activo
Mónica Isabel Cárcamo	26.039.273	Dir. Obra	Retirado
Angie Daniela Carrascal	1.066.750.679	SST	Activo
Álvaro José Méndez	1.067.929.146	Op. Vibro compactador	Activo
Luis Antonio Yáñez Hernández	1.003.359.117	Cadenero	Activo
María Camila Tano Hoyos	1.066.748.940	Trabajadora social	Activo
Luisa Fernanda Sierra	1.066.724.677	Monitora ambiental	Activo
María Alejandra Cogollo Padilla	1.064.999.603	Residente obra	Activo

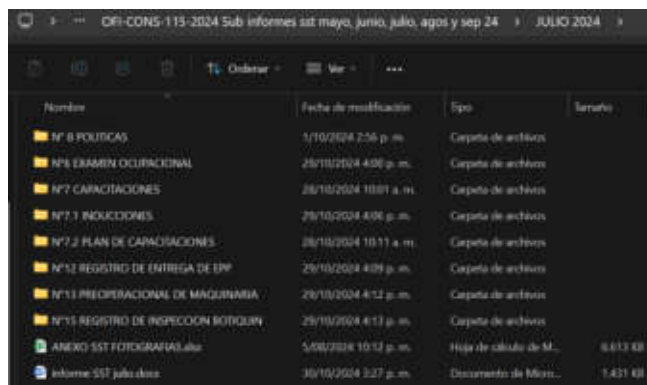


Del personal que ingresa en dicho periodo no presentan afiliaciones por lo menos, debe contener el certificado de EPS, ARL, PENSIÓN Y CAJA DE COMPENSACIÓN y licencia de conducción vigente (correspondiente al personal de maquinaria y vehículos).

- No presenta los formatos establecidos en el manual de interventoría INVIAS 2022.
 - No están adjuntando la matriz de identificación de peligros.
4. En el informe de agosto 2024, no adjuntan las planillas de seguridad social del siguiente personal que relacionan:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ACTIVO O RETIRADO
Gustavo Alfonso Montes	1.100.691.991	Op. Motoniveladora	Activo
Obet Banqueth Fuente	1.063.296.113	Op. Retroexcavadora	Activo
Brayan Padilla Martínez	1.067.292.005	Obrero	Activo
Juan Pablo Mercado	1.003.305.631	Obrero	Activo
Jorge Miguel Delgado	1.067.849.446	Obrero	Activo
Néstor Luis Salgado	1.003.359.117	Obrero	Activo
José Ricardo Ruiz	15.677.277	Dir. Obra	Activo
Angie Daniela Carrascal	1.066.750.679	SST	Activo
Álvaro José Méndez	1.067.929.146	Op. Vibro compactador	Activo

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ACTIVO O RETIRADO
Luis Antonio Yáñez Hernández	1.003.305.026	Cadenero	Activo
María Camila Tano Hoyos	1.066.748.940	Trabajadora social	Activo
Luisa Fernanda Sierra	1.066.724.677	Monitora ambiental	Activo
María Alejandra Cogollo Padilla	1.064.999.603	Residente obra	Activo

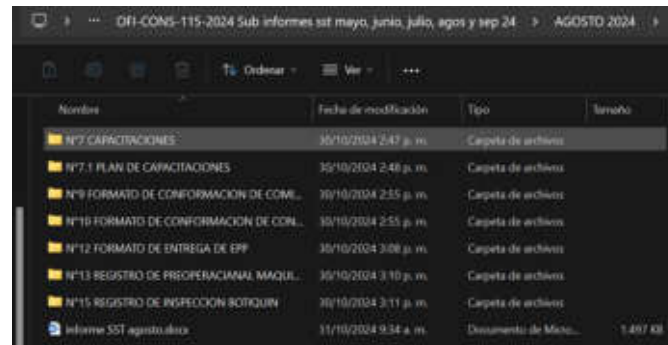


- No están adjuntando la política de SG-SST firmado por el representante legal y debe haber registro fotográfico de la divulgación del mismo.
- No presenta los formatos establecidos en el manual de interventoría INVIAS 2022.
- No están adjuntando la matriz de identificación de peligros

5. En el informe de septiembre 2024, no adjuntan las planillas de seguridad social del siguiente personal que relacionan:

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ACTIVO O RETIRADO
Gustavo Alfonso Montes	1.100.691.991	Op. Motoniveladora	Activo
Obet Banqueth Fuente	1.063.296.113	Op. Retroexcavadora	Activo
Brayan Padilla Martínez	1.067.292.005	Obrero	Activo
Juan Pablo Mercado	1.003.305.631	Obrero	Activo

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ACTIVO O RETIRADO
Jorge Miguel Delgado	1.067.849.446	Obrero	Activo
Néstor Luis Salgado	1.003.359.117	Obrero	Activo
José Ricardo Ruiz	15.677.277	Dir. Obra	Activo
Angie Daniela Carrascal	1.066.750.679	SST	Activo
Álvaro José Méndez	1.067.929.146	Op. Vibro compactador	Activo
Luis Antonio Yáñez Hernández	1.003.305.026	Cadenero	Activo
María Camila Tano Hoyos	1.066.748.940	Trabajadora social	Activo
Luisa Fernanda Sierra	1.066.724.677	Monitora ambiental	Activo
María Alejandra Cogollo Padilla	1.064.999.603	Residente obra	Activo
Isabel del Carmen Martínez	1.066.718.119	Controladora vial	Activo
María del Carmen Gaspar	1.003.195.953	Controladora vial	Activo
Wilson Almario Oviedo	1.066.732.613	Oficial	Activo
Wilmer Alberto Almario Oviedo	1.066.732.611	Oficial	Activo
Daniel Antonio Payares Soto	1.066.739.185	Oficial	Activo
Carlos Rafael Ramírez	1.003.309.075	Ayudante	Activo
Carmelo Antonio Rojas Pérez	1.003.307.115	Ayudante	Activo
Mauricio Mercado Martínez	1.067.286.481	Ayudante	Activo
Arnol Pastrana Rojas	1.067.280.762	Ayudante	Activo
Juan Francisco Cogollo	1.066.736.685	Oficial	Activo
Víctor Reyes Arrieta	1.067.293.338	Oficial	Activo
Yair Aparacio	50.710.461	Obrero	Activo
Rafael Arrieta Arrieta	1.003.306.948	Obrero	Activo

NOMBRE DEL TRABAJADOR	CEDULA	CARGO	ACTIVO O RETIRADO
Manuel López Hernández	10.893.894	Obrero	Activo
Jader Cueto Alvarado	15.679.846	Obrero	Activo
Rodrigo Bustamante Jiménez	11.105.854	Obrero	Activo
Carlos Cardona Vasco	70.112.749	Obrero	Activo
Alfredo Aleans Cordoba	15.662.274	Obrero	Activo
Luis Pacheco Lozano	11.106.531	Obrero	Activo
Camilo Oviedo Muñoz	1.007.706.541	Obrero	Activo
Jhon Almario	15.669.981	Maestro	Activo
Carelis Alejandra Bedoya	1.066.575.053	Ingeniera civil Administrativa	Activo
Karol Melisa Soto	1.066.726.313	Secretaria	Activo
Hernán Gonzales Soto	6.662.166	Celador	Activo



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
FORMATOS DE INVA	4/10/2024 4:39 p. m.	Carpeta de archivos	
N°6 EXAMENES OCUPACIONAL	31/10/2024 4:41 p. m.	Carpeta de archivos	
N°7 INDUCCION	1/11/2024 3:59 p. m.	Carpeta de archivos	
N°7.1 CAPACITACIONES	1/11/2024 4:13 p. m.	Carpeta de archivos	
N°7.2 PLAN DE CAPACITACION	1/11/2024 4:15 p. m.	Carpeta de archivos	
N°12 ENTREGA DE ELEMENTO DE EPP	1/11/2024 4:27 p. m.	Carpeta de archivos	
N°13 REGISTRO PREOPERACIONAL DE MAQUIL	1/11/2024 4:30 p. m.	Carpeta de archivos	
N°15 INPECCION DE BOTIQUIN	1/11/2024 4:31 p. m.	Carpeta de archivos	
Informe SST SEPTIEMBRE.docx	1/11/2024 4:31 p. m.	Documento de Micro...	1.568 KB

Del personal que ingresa en dicho periodo no presentan afiliaciones por lo menos, debe contener el certificado de EPS, ARL, PENSIÓN Y CAJA DE COMPENSACIÓN y licencia de conducción vigente (correspondiente al personal de maquinaria y vehículos).

CING-INV-5053-0415-24

Página 10 de 10

- No están adjuntando la política de SG-SST firmado por el representante legal y debe haber registro fotográfico de la divulgación del mismo.
- No están adjuntando la matriz de identificación de peligros
- Actas de conformación de COPASST y CCL

Por todo lo anteriormente expuesto y dado que el contratista continua sin atender las observaciones realizadas por interventoría, se ratifica a la secretaría de planeación del municipio de Planeta Rica continuar con el proceso sancionatorio presentado en comunicado CING-INV-5053-0357-24 del 15 de octubre del 2024 con aplicación de la cláusula de multa, toda vez que, se evidencia un grave incumplimiento en sus obligaciones contractuales, por lo tanto, solicitamos al Consorcio Providencia atender las observaciones realizadas por interventoría y presentar los informes con toda la documentación exigida del personal que actualmente se encuentre laborando al contrato de obra No 159-2023 y las planillas de seguridad social de cada periodo que corresponda al personal presentado y aprobado por interventoría, así mismo, se debe presentar el informe SST del mes de octubre del 2024 con toda la documentación exigida.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PROVIDENCIA


MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”

Asunto: **Respuesta al comunicado OFI-CONS-122-2024– Subsanación informe ambiental julio y agosto 2024**

Respetado ingeniero,

Por medio de la presente, nos permitimos informar que, en revisión a lo expuesto por el contratista en comunicado en asunto, no se evidencian todos los soportes dentro de los anexos presentados para subsanar los informes julio y agosto 2024, como es el formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE PMA O PAGA, el cual, el contratista en su comunicado en asunto, manifiesta haber subsanado lo requerido por interventoría, pero tal como se evidencia en los anexos allegados en comunicado en asunto, dicho formato no se encuentra dentro de los soportes presentados:



Nombre	Fecha de modificación	Tipo	Tamaño
ANEXO No. 6.1	23/10/2024 8:15 a. m.	Carpeta de archivos	
ANEXO No. 6.9	23/10/2024 8:22 a. m.	Carpeta de archivos	
RESPUESTA OFICIO CING-INV-5053-0364.zip	12/11/2024 9:17 a. m.	Carpeta comprimida ...	1.594 KB
RESPUESTA OFICIO INF. JUNIO 2024 - 01.docx	23/10/2024 8:17 a. m.	Documento de Micro...	17 KB

Así mismo, en el comunicado en asunto, el contratista no da respuesta a la observación realizada en el informe del mes de agosto del 2024

INFORME MES DE AGOSTO

4. MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe estado ambiental, numeral 3.1, complementar la información con las actividades realizadas de forma constructiva, teniendo en cuenta la información que presentan en el anexo 11.
5. En el anexo 1, MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, debe especificar en qué estado se encuentra el trámite ante la CVS de forma más clara y detallada, si durante el periodo el contratista radico información o no, si es el caso relacionar comunicado, así mismo, deben venir adjuntos.

- PROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, la evaluación del indicador no es clara teniendo en cuenta que la fórmula es:

INDICADOR (FÓRMULA)	EVALUACIÓN INDICADOR
Profesionales vinculados * 100 / Equipo mínimo de profesionales	1
Asistentes a inducción * 100 / Personal nuevo vinculado	1
Asistentes a capacitación * 100 / Trabajadores del proyecto	1
Autorización y permisos tramitados * 100 / Autorización y permisos requeridos	0
Lugares almacenamiento adecuado * 100 / Lugares almacenamiento requeridos	1
Vol. Material obtenido de fuentes licenciatas * 100 / Vol. Material utilizado en el proyecto	0.0076

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385
consorcioingeconinco.inter@gmail.com
 Bogotá - Colombia

Se requiere precisar si el valor de 0.0076 corresponde al volumen de material utilizado en el proyecto, por lo cual, el % de cumplimiento que informan que es del 0.76% no concuerda, si se realiza la fórmula que especifican, de acuerdo a los valores que indican en el anexo 11, manifiesta que se realizó compra de 128 m3 a la cantera JEMV y la factura que adjuntan en el anexo 6.6 corresponde a 126 m3, por lo tanto, debe haber congruencia con la información.

Adicional el contratista en el anexo 11, manifiesta que: "No se reportan materiales de cantera a la fecha, un reporte del 0.76%." cuando hubo un ingreso de 126 m3 de acuerdo a la factura de la cantera JEMV. Se solicita al contratista ser claro con la información y revisar la evolución del indicador.

CING-INV-5053-0414-24

Página 3 de 3

Por lo anterior, se da un plazo no mayor a tres (3) días, para presentar lo soportes pendientes que permitan evidenciar la subsanación de las observaciones realizadas por interventoría en comunicado CING-INV-5053-0310-24 y poder remitir aprobación a los mismos, así mismo, se reitera la solicitud de entrega INMEDIATA de los informes ambientales de septiembre y octubre del 2024 con sus respectivos soportes.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS
Anexo: Oficio RCD de la secretaria de planeación municipal



NIT. 901.783.007-9

CING-INV-5053-0413-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 12 de noviembre de 2024

Ingeniero

CESAR AUGUSTO RIOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. LP 006 de 2023, cuyo objeto es:
"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA
BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS
CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Asunto: **Respuesta a los comunicados COBQ079-24 Informe Ambiental
octubre 2024**

Respetado ingeniero,

En revisión a los informes ambientales presentando en comunicado en asunto, esta
interventoría APRUEBA el informe ambiental del mes de octubre del 2024.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS.



NIT. 901.783.007-9

CING-INV-5053-0412-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 12 de noviembre del 2024

Ingeniero

CESAR AUGUSTO RIOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA

MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. LP 006 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Asunto: **Respuesta comunicado COBQ078-24– Informe SST Junio, Julio y septiembre 2024.**

Respetado ingeniero,

En revisión al informe presentado por el contratista esta interventoría se permite dar aprobación al informe SST del mes de junio, julio y septiembre del 2024, está pendiente la subsanación del informe del mes de agosto correspondiente a las planillas de seguridad social del personal independiente de ese periodo, manifestado en el en comunicado CING-INV-5053-0307-24 del 23 de septiembre del 2024 las cuales, a la fecha no han sido subsanadas por el contratista, así mismo, se requiere presentar el informe SST del mes de octubre del 2024 con todos sus respectivos soportes.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS.



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0411-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C, 09 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PROVIDENCIA

MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. 159-2023, cuyo objeto es MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS.

Asunto: **Respuesta comunicado - OFI-CONS-105-2024 actas de vecindad faltantes de los tramos ubicados en la Balustrera 1 y Balustrera 2.**

Cordial saludo,

En atención al oficio No. OFI-CONS-105-2024 – como se manifestó en comité de seguimiento, se informa que las actas de vecindad levantadas sobre los predios faltantes ubicados en la Balustrera 1 y Balustrera 2, se encuentran diligenciadas de acuerdo con lo solicitado, por lo cual se emite concepto de aprobación por parte de la interventoría.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres- Gestor técnico INVIAS

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia



NIT. 901.783.007-9

CING-INV-5053-0410-24

Página 1 de 2

Bogotá D.C., 09 de noviembre de 2024

Ingeniero
HABIB CHAAR SAKS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO L&S
MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. LP -MSBV – 008 2023, cuyo objeto es:
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Asunto: **Repuesta a comunicado No. 083 – Remisión informes ambientales, sociales SST**

Respetado Ingeniero,

Teniendo en cuenta el comunicado No. 083 -2024, por medio del cual se radicaron los informes ambientales, sociales y SST, me permito informar que desde el componente social se realizan las siguientes observaciones.

1. En la carpeta del plan de inversión debes anexar el certificado del mes, tal cual como se presentó para el mes de junio.
2. Anexar a la carpeta de pre- acta y matriz de cumplimiento las certificaciones y anexos donde se constate que se adelantó tales actividades como; actas de comité con la veeduría ciudadana e instalación de valla informativa.
3. Revisar y anexar comunicados enviados por parte de ustedes, los cuales se deben anexar en la carpeta de oficios generados por parte de interventoría y contratista. Falta anexar comunicado donde se remite los informes sociales de febrero, marzo y mayo de 2024.
4. Se está diligenciando en el formato de matriz de cumplimiento que se realizó taller sobre cultura vial y no se evidencian dichas actividades, todo lo que se reporta en los formatos sea este o cualquier otro se debe anexar actas, registros fotográficos y listados de asistencia.

De manera general de debe tener en cuenta lo siguiente:

- Todo lo que se registra en los formatos debe quedar evidenciado, actas de reuniones, comités, capacitaciones, instalación de buzón, toda acción que se realice, se deben levantar actas, anexar registros fotográficos y listados de asistencia y subirlas en las carpetas.
- En cada informe debes agregar los certificados justificando las actividades realizadas y las que no, en este caso aplica para el formato de Pre-acta y Matriz de cumplimiento de actividades sociales, para el caso de la carpeta del formato de Plan de Inversión debes agregar mes a mes el certificado.
- Se reitera la importancia de implementar actividades dirigidas a la comunidad (veeduría ciudadana y líderes) y equipo de trabajo en obra, tal como lo estipula el PAGA - Componente Social.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres- Gestor técnico INVIAS



NIT. 901.783.007-9

CING-INV-5053-0409-24

Página 1 de 2

Bogotá D.C., 09 de noviembre de 2024

Ingeniero
HABIB CHAAR SAKS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO L&S
MONTERIA

Referencia: Contrato de obra No. LP -MSBV – 008 2023, cuyo objeto es:
“MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO, DEPARTAMENTO DE CORDOBA.

Asunto: **Repuesta a comunicado No. 073 – Remisión informes ambientales, sociales SST**

Respetado Ingeniero,

Teniendo en cuenta el comunicado No. 073 -2024, por medio del cual se radicaron los informes ambientales, sociales y SST, me permito informar que desde el componente social el informe del mes de junio queda aprobado, sin embargo, se realizan observaciones para el ajuste de los informes de los meses de julio y agosto de 2024.

A continuación, se relacionan las siguientes observaciones:

1. Con relación al acta de conformación de la veeduría ciudadana, no se anexa acta con número de resolución la cual es expedida por la personería municipal. Revisar y ajustar
2. En la carpeta del plan de inversión debes anexar las certificaciones de cada mes tal cual como se presentó para el mes de junio.
3. Anexar a la carpeta de pre- acta y matriz de cumplimiento las certificaciones y anexos donde se constate que se adelantó tales actividades (reunión de inicio del proyecto, inicio de levantamiento de actas de vecindad, acompañamiento a la conformación de la veeduría ciudadana, actas de comité con la veeduría ciudadana y constancia de instalación del buzón móvil.
4. No se evidencian comunicados por parte de ustedes, lo cuales deben ir anexos en la carpeta de oficios generados por interventoría y contratista, recuerden que nos

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia

remitieron las actas de vecindad. Revisar cuales más comunicados fueron enviados por parte de ustedes y anexar en las carpetas.

5. En anexo *Balance del estado social del proyecto*, carpeta 13, se agrega un certificado de junio, se recuerda que debe ser del mes de julio y agosto
6. Se está diligenciando en el formato de matriz de cumplimiento que se realizó taller sobre cultura vial y no se evidencian dichas actividades, todo lo que se reporta en los formatos sea este o cualquier otro se debe anexar actas, registros fotográficos y listados de asistencia.

De manera general de debe tener en cuenta lo siguiente:

- Todo lo que se registra en los formatos debe quedar evidenciado, actas de reuniones, comités, capacitaciones, instalación de buzón, toda acción que se realice, se deben levantar actas, anexar registros fotográficos y listados de asistencia y subirlas en las carpetas.
- En cada informe debes agregar los certificados justificando las actividades realizadas y las que no, en este caso aplica para el formato de Pre-acta y Matriz de cumplimiento de actividades sociales, para el caso de la carpeta del formato de Plan de Inversión debes agregar mes a mes el certificado.
-

Cordialmente,


ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres- Gestor técnico INVIAS



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0408-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 7 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PROVIDENCIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".

Asunto: **Respuesta a orden de operación No. 6**

Cordial saludo,

De acuerdo al comunicado OFI-CONS-0119-2024 recibido el 5 de noviembre de 2024, mediante el cual el contratista remite orden de operación No.6, una vez revisado esta interventoría se permite manifestar que:

INVERSIONES D&P5 SAS identificados con **NIT 901798929-1**: correspondiente a la siguiente factura:

1. PROFORMA FACTURA DE VENTA 004 por valor de \$250.000.000. Afecta el Ítem 4 del plan de inversión: COMPRA DE MATERIALES DE SUBBASE Y AFIRMADO
VALOR A PAGAR: \$250.000.000

No se autoriza el pago ya que no se evidencia ningún soporte que el material suministrado corresponderá a las fuentes de material autorizadas.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0407-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 7 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PROVIDENCIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".

Asunto: **Respuesta a orden de operación No. 5**

Cordial saludo,

De acuerdo al comunicado OFI-CONS-118-2024 recibido el 5 de noviembre de 2024, mediante el cual el contratista remite orden de operación No. 5, una vez revisado esta interventoría se permite manifestar que:

T.M.C OLASCUAGA S.A.S - FABRICA LA CABAÑA identificados con **NIT 901236854-5**: correspondiente a la siguiente factura:

1. Factura proforma No. 10 por valor de \$299,077,410.32. Afecta el ítem de plan de inversión: COMPRA DE MATERIALES DE SUBBASE Y AFIRMADO
VALOR A PAGAR: 299,077,410.32

No se autoriza el pago ya que no se evidencia ningún soporte que el material suministrado corresponderá a las fuentes de material autorizadas.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

CING-INV-5053-0406-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 7 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PROVIDENCIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”.

Asunto: **Respuesta a comunicado OFI-CONS-103-2024. PLANETA RICA, CÓRDOBA. ESTUDIO GEOTÉCNICO ABSCISA K4+190**

Respetado ingeniero,

En respuesta a la documentación que presenta el contratista en comunicado OFI-CONS-103-2024., se remiten las observaciones realizadas por la especialista de geotecnia a la revisión diseño en la abscisa K4+190.

Se solicita la respuesta punto a punto a lo anteriormente planteado, de no venir en esos términos el comunicado inmediatamente se devolverá, esto con el fin de facilitar la transferencia de información y la claridad que fue atendido el presente comunicado.

Quedamos atentos a sus comentarios.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Reviso: amdm

Elaboro: JC



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0405-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 07 de noviembre de 2024

Ingeniero:

LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

Supervisor del contrato de interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Montería

Referencia: Contrato de interventoría No. 5053 de 2023, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”.

Asunto: **Remisión acta de costos No. 10 correspondiente al periodo de noviembre 2024.**

Respetado ingeniero:

Mediante el presente comunicado, esta interventoría en cumplimiento a lo establecido en el contrato en referencia, se permite remitir el acta de costos No. 10 correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre de 2024, para su revisión y aprobación, el cual se encuentra en el siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1glarg6v1JlsXaY204xQcgR-kjKo-6GBB?usp=sharing>

Agradecemos la atención prestada, quedamos atentos a cualquier comentario.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0404-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 07 de noviembre de 2024

Ingeniero:

LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

Supervisor del contrato de interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Montería

Referencia: Contrato de interventoría No. 5053 de 2023, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”.

Asunto: **Remisión informe mensual No. 10 correspondiente al periodo de noviembre 2024.**

Respetado ingeniero:

Mediante el presente comunicado, esta interventoría en cumplimiento a lo establecido en el contrato en referencia, se permite remitir el informe mensual No. 10 correspondiente al periodo del 1 al 30 de noviembre de 2024, para su revisión y aprobación, el cual se encuentra en el siguiente link:

<https://drive.google.com/drive/folders/1rqBnmiAawuYrDIOGvGGWdmzizuHqVbSH?usp=sharing>

Agradecemos la atención prestada, quedamos atentos a cualquier comentario.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0403-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 07 de noviembre de 2024

Ingeniero:

LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

Supervisor del contrato de interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Montería

Referencia: Contrato de interventoría No. 5053 de 2023, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”.

Asunto: **Remisión acta de costos No. 9 correspondiente al periodo de octubre 2024.**

Respetado ingeniero:

Mediante el presente comunicado, esta interventoría en cumplimiento a lo establecido en el contrato en referencia, se permite remitir el acta de costos No. 9 correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2024, para su revisión y aprobación, el cual se encuentra en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/14b_PXpzYY83NkPuDDPamLvGL_z4DdGPc?usp=sharing

Agradecemos la atención prestada, quedamos atentos a cualquier comentario.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Bogotá D.C., 06 de noviembre de 2024

Ingeniero

CESAR AUGUSTO RÍOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PAVIMENTO VÍA BARRANQUILLITA

MONTERÍA


Referencia: Contrato de obra No. LP 006 de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RÍGIDO DE LA VÍA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Asunto: **Identificación de daños N°3 en losas de pavimento.**


Respetado ingeniero:


De acuerdo al cumplimiento de las obligaciones contractuales de la Interventoría para el desarrollo del proyecto de la referencia, se evidencia que se están presentando daños en las losas de pavimento construidas en el carril izquierdo lo que se logra observar es que estas se están afectando por corte tardío de juntas y otras por temperatura, a continuación, se emite registro fotográfico y ubicación de estas:


	
Fisura. Abs K2+317 a 9 cm de la junta	Fisura. Abs K2+263,9 a 40 cm de la junta

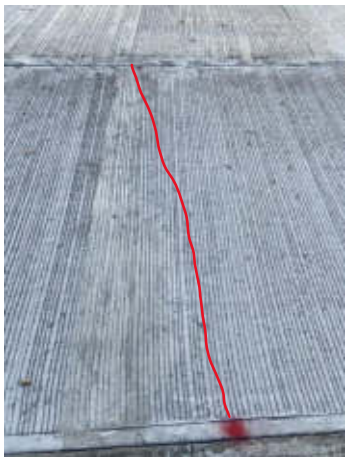	
<p>Fisura. Abs K2+245.65 a 60 cm de la junta</p>	<p>Fisura. Abs K2+167.9 a 1.68 m de la junta</p>

	
<p>Fisura. Abs K2+158,1 a 5 cm de la junta</p>	<p>Fisura. Abs K2+035,6 a 9 cm de la junta</p>

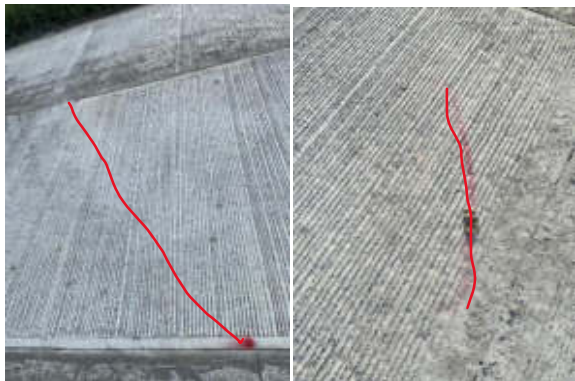	
<p>Fisura. Abs K2+026,6 a 0.65m de la junta</p>	<p>Fisura. Abs K1+952 a 1.5 m de la junta. Esta losa presenta 2 fisuras, una desde la mitad haciendo recorrido en diagonal hasta cerca a la junta y la otra cer a la junta</p>

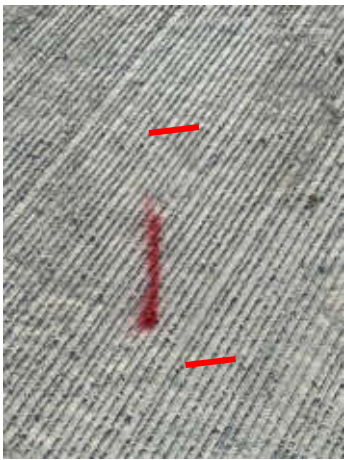	
<p>Fisura. Abs K1+947 se encuentra 1m de la junta</p>	<p>Grieta. Abs K1+947 a 30 cm de la junta</p>

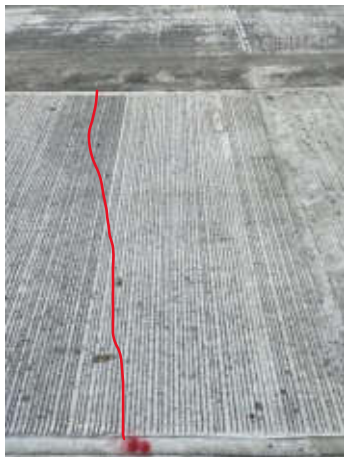	
<p>Fisura. Abs K1+945,5 a 1,2m de la junta</p>	<p>Fisura. Abs K1+937,7 a 0.8 m de la junta</p>

Por lo siguiente, se le solicita al contratista hacer la entrega de la propuesta de reparación, ya que la enviada previamente presentó observaciones que no han sido subsanadas, una vez se apruebe la propuesta de reparación, se debe presentar cronograma de intervención para hacer las reparaciones dentro del plazo contractual.

Se recuerda que el informe debe contener clasificación del tipo de patología, establecer cuál es la causa principal, y la reparación de la misma y cronograma de reparaciones, con el fin de verificar y monitorear el procedimiento por parte de la Interventoría. Adicionalmente, si la causa es el corte tardío de la junta se debe remitir plan de acciones ya que esta es una situación recurrente que fue previamente advertida.

Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,



ANGELA MARÍA DÁVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres- Gestor técnico INVIAS



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0401-24

Página 1 de 2

Bogotá D.C., 6 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO PROVIDENCIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".

Asunto: **Respuesta oficio OFI-CONS-0120-2024. Orden de operación No. 9**

Cordial saludo,

De acuerdo a su oficio recibido el pasado 5 de noviembre de 2024, mediante el cual el contratista remite orden de operación No.9, una vez revisado esta interventoría se permite manifestar que:

- a. Orden de operación a favor de SEBASTIAN LOPEZ SANCHEZ:**
correspondiente a las siguientes facturas:

PROFORMA DE FACTURA DE VENTA # 040. VALOR A PAGAR: \$
217.375.003,2 Afecta el Ítem 2 del plan de inversión: PAGO DE MANO DE OBRA

- El plazo del contrato presentado supera el plazo del contrato No. 159 de 2023
- El valor girado a título de anticipo no determina como se va a devolver, ni a amortizar
- No se evidencia el valor del contrato de donde sale, no hay actividades a ejecutar, ni productos a entregar.
- No se evidencia en el contrato en caso de terminación sin previo aviso los dineros a título de anticipo como se cobrarán,
- No hay garantías de ningún tipo, y mas cuando el contrato supera los \$200.000.000 de pesos
- Las condiciones del contrato son nocivas para los intereses del consorcio pues no permiten validar que el contratista pueda cumplir con el objeto del contrato.
- No hay causales de terminación.
- No hay obligaciones del contratante.

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0401-24

Página 2 de 2

- El contrato a pesar del monto, carece de los mínimos requisitos para considerarse un acuerdo de voluntades que proteja los intereses del contratante.

Por lo anterior, no se aprueba la orden de operación no. 9 para desembolso de recursos de anticipo.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES

Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS



NIT. 901.783.007-9

CING-INV-5053-0400-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 06 de noviembre de 2024

Arquitecto:

DAVID ROJAS

Secretario de Infraestructura y Planeación

Alcaldía de San Bernardo del Viento

San Bernardo del Viento, Córdoba

Referencia: Contrato de obra No. LP 008 de 2023, cuyo objeto es:
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN
EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Asunto: **Reporte tala de árboles por la comunidad**

Cordial Saludo,

Por medio de la presente, nos dirigimos a ustedes en nuestra calidad de Interventoría del proyecto MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCIARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, con el fin de informarles acerca de una situación que requiere su atención.

Se reporta que la comunidad ha procedido a talar los árboles que aún se encontraban pendientes de autorización por parte de la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge (CVS). Esta acción se realizó sin el debido consentimiento, lo cual contraviene las normativas ambientales vigentes.

La tala no autorizada de estos árboles representa una grave infracción a la normatividad ambiental vigente y pone en riesgo la viabilidad del proyecto, ya que podría generar sanciones por parte de la autoridad ambiental y retrasar significativamente el avance de las obras.

Se solicita de sus buenos oficios con el fin de hacer la gestión ante la corporación ambiental para evitar afectaciones al proyecto.

Cordialmente,


ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0399-24

Página 1 de 2

Bogotá D.C., 6 de noviembre de 2024

Ingeniero

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO PROVIDENCIA

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: “MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA – PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS”.

Asunto: **Respuesta oficio OFI-CONS-0121-2024. Orden de operación No. 10**

Cordial saludo,

De acuerdo a su oficio recibido el pasado 5 de noviembre de 2024, mediante el cual el contratista remite orden de operación No.10, una vez revisado esta interventoría se permite manifestar que:

- a. Orden de operación a favor de JDC INGENIERIA SAS:** correspondiente a las siguientes facturas:

Factura PROFORMA No. 02. VALOR A PAGAR: \$ 179,490,497.29. Afecta el Ítem 1 del plan de inversión: COMPRA DE MATERIALES

Factura PROFORMA No. 02. VALOR A PAGAR: \$ 277,425,721.20 Afecta el Ítem 4 del plan de inversión: TRANSPORTE

Cantidad reportada 767,92 m3,

Por lo anterior, la factura proforma presentada por el contratista para anticipo de concreto y transporte, se aprueba, se recuerda que una vez el suministro llegue a obra se deberá ir legalizando y presentar la factura electrónica de venta.



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0399-24

Página 2 de 2

Se advierte, que la presente es la última proforma que se aprueba para el proveedor JDC INGENIERIA SAS, hasta tanto no se legalice la proforma 1, girada con la orden de operación No. 7.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES

Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0398-24

Página 1 de 2

Bogotá D.C., 06 de noviembre de 2024

Señores:

HABIB CHAAR SAKR

Representante Legal

Consorcio L&S

Referencia: Contrato de obra No. LP 008 de 2023, cuyo objeto es:
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN
EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO
DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA.

Asunto: **Respuesta a comunicado 085-2024 orden de operación No. 3**

Cordial saludo,

De acuerdo al envío de la orden de operación No. 3, la cual contiene la solicitud de desembolso consignada en el comunicado 085-2024, una vez revisado esta interventoría se permite manifestar que:

Orden de operación No. 3

Oficio 085-24 contiene solicitud de desembolso para giro de anticipo para la empresa Concretos de Lórica SAS NIT. 900.963.542-7 mediante cuenta de cobro, por valor de \$ 100.000.000 distribuidos \$ 50.000.000 para suministro de materiales afectando el ítem 3 del plan de inversión: COMPRA DE MATERIALES. Y \$ 50.000.000 para Transporte de materiales afectando el ítem 2 del plan de inversión: Se aprueba para desembolso, se requiere su legalización (factura y remisiones) una vez se consuma el anticipo otorgado.

Oficio 085-24 contiene solicitud de reembolso para giro de anticipo para la empresa Consorcio L&S NIT. 901.765.372-6 mediante remisión de planillas de seguridad social del personal desde diciembre hasta septiembre, excluyendo los periodos de suspensión, por valor de \$ 18.884.700, por lo que se aprueba el documento, afectando el ítem 1 del plan de inversión: MANO DE OBRA. Así:

PLANILLA	VALOR
----------	-------

Calle 148 N° 7 G – 42 Barrio Cedro Golf, Teléfonos: 4672384 / 4672385

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

Bogotá - Colombia

NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0398-24

Página 2 de 2

DICIEMBRE	\$ 125.600,00
FEBRERO	\$ 1.781.900,00
MARZO	\$ 872.300,00
MAYO	\$ 1.461.300,00
JUNIO	\$ 1.848.400,00
JULIO	\$ 3.635.300,00
AGOSTO	\$ 4.628.900,00
SEPTIEMBRE	\$ 4.530.800,00
TOTAL	\$ 18.884.500,00

Item 1: Salarios, honorarios, mano de obra valor aprobado en la presente orden \$ 18.884.700,00

Item 2: Transporte de materiales valor aprobado en la presente orden \$ 50.000.000,00

Item 3: Compra de materiales valor aprobado en la presente orden \$ 50.000.000,00

Por lo anterior, se autoriza para seguir el trámite ante el encargo fiduciario para su aprobación final.

Cordialmente,



ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS



NIT. 901.783.007-9

CINGE-INV-5053-0397-24

Página 1 de 1

Bogotá D.C., 05 de noviembre de 2024

Ingeniero:

LUIS MIGUEL GONZALEZ OZUNA

Supervisor del contrato de interventoría

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS – INVIAS

Montería

Referencia: Contrato de interventoría No. 5053 de 2023, cuyo objeto es: “INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”.

Asunto: **Remisión informe mensual No. 9 correspondiente al periodo de octubre 2024.**

Respetado ingeniero:

Mediante el presente comunicado, esta interventoría en cumplimiento a lo establecido en el contrato en referencia, se permite remitir el informe mensual No. 9 correspondiente al periodo del 1 al 31 de octubre de 2024, para su revisión y aprobación, el cual se encuentra en el siguiente link:

https://drive.google.com/drive/folders/1xd0_Epmt-ULGEQGaVPAP_wBWZSzxflFlo?usp=sharing

Agradecemos la atención prestada, quedamos atentos a cualquier comentario.

Cordialmente,

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal

cc. Ing. Luis Guillermo Torres - Gestor técnico INVIAS

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	90

COMUNICADOS RECIBIDOS			
Cons.	Fecha	Asunto	Entidad
088-2024	2024-11-01	Remisión de permiso de ocupación de cauce.	CONSORCIO L&S
OFI-CONS-115-2024	2024-11-05	Subsanación del informe mes de mayo, junio , julio , agosto y septiembre	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-116-2024	2024-11-05	RESPUESTA A COMUNICADO CINGE-INV-5053-0388-2024. PLAN DE CONTINGENCIA, FLUJO DE CAJA	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-117-2024	2024-11-05	DISEÑO BOX COULVERT 2X1 Y 2X1.5 CON SUS MEMORIAS DE CANTIDADES , PRESUPUESTO Y MEMORIAS DE CALCULO. INFORME TECNICO.	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-118-2024	2024-11-05	OPDEN DE OPERACION 5	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-119-2024	2024-11-05	ORDEN DE OPERACION 6	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-120-2024	2024-11-05	ORDEN DE OPERACION 9	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-121-2024	2024-11-05	ORDEN DE OPERACION 10	CONSORCIO PROVIDENCIA
COBQ-079-2024	2024-11-08	INFORME MENSUAL AMBIENTAL - OCTUBRE.	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
COBQ-080-2024	2024-11-08	INFORME MENSUAL SOCIAL DE OCTUBRE	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
089-2024	2024-11-08	Resultado densidades en subbase granular	CONSORCIO L&S
OFI-CONS-122-2024	2024-11-08	Respuesta comunicado cing-inv-5053-0310-24 - componente ambiental	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-123-2024	2024-11-12	Informe del mes de octubre del componente social	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-124-2024	2024-11-12	RESPUESTA A COMUNICADO CING-INV-5053-0406-24. ESTUDIO GEOTECNICO, DISEÑO ESTRUCTURAL MURO UBICADO EN LA ABCISA K4+190.	CONSORCIO PROVIDENCIA
COBQ-081-2024	2024-11-13	AJUSTES INFORME MENSUAL SST - AGOSTO.	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
OFI-CONS-122-2024	2024-11-13	Respuesta comunicado cing-inv-5053-0310-24 - Componente ambiental	CONSORCIO PROVIDENCIA
OFI-CONS-125-2024	2024-11-13	Respuesta a comunicado CING-INV-5053-0414-24 - Observaciones al informe de julio y agosto 2024.	CONSORCIO PROVIDENCIA
18112024	2024-11-18	Solicitud de concepto para determinar la necesidad de permisos de ocupacion de cauce en el proyecto con objeto " MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VIA PLANETA RICA PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CORDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023,SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS"	CONSORCIO PROVIDENCIA
090-2024	2024-11-18	Remisión de informes ambiental y SST	CONSORCIO L&S
091-2024	2024-11-18	Remisión informes ambiental octubre	CONSORCIO L&S
2024162000117380	2024-11-18	Concepto sobre contrato de obra no .159-2023 Objeto: mejoramiento y mantenimiento de la vía planeta rica - providencia, en el departamento de córdoba, en el marco del convenció 2286 de 2023, suscrito entre el municipo de planeta rica y el Instituto nacional de vías 3 rad. 2024184200102852	CONSORCIO PROVIDENCIA

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	91

COBQ-081-2024	2024-11-18	INFORME MENSUAL SST-OCTUBRE	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
COBQ-084-2024	2024-11-19	ACCIONES CRRECTIVAS A FISURAS EN LOSAS	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
092-2024	2024-11-19	Remisión informes SST octubre	CONSORCIO L&S
094-2024	2024-11-19	remisión informe social octubre e informes subsanados	CONSORCIO L&S
095-2024	2024-11-22	Resolución No 238 del 15 de noviembre de 2024. CVS	CONSORCIO L&S
2024S-VBOG-087125	2024-11-22	Respuesta a entrada 2024E-VUVRAZ-103448 del 2024-10-18. CI-5056-23; CO-LP-006-23; CO-159-23;CO-LP-MSBV-008-23. Colombia Rural. Municipios de Los Córdoba, Planeta Rica y San Bernardo del Viento. Departamento de Córdoba.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
2024S-VBOG-087127	2024-11-22	Respuesta a entrada 2024E-VUVRAZ-107679 del 2024-10-28. CO-159-23; CI-5053-23. Colombia Rural - Municipio de Planeta Rica. Departamento de Córdoba.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
2024S-VBOG-087128	2024-11-22	Respuesta a entrada 2024E-VUVRAZ-107683 del 2024-10-28. CO-LP-MSBV-008-23; CI 5053-23. Colombia Rural - Municipio de San Bernardo del Viento. Departamento de Córdoba.	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
OFI-CONS-128-2024	2024-11-26	PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPIO N° 4	CONSORCIO PROVIDENCIA
COBQ-085-24	2024-11-26	AJUSTES INFORME SST PERIODO AGOSTO Y OCTUBRE DE 2024.	CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
2024S-VBOG-088906	2024-11-27	Respuesta a entrada 2024E-VUVRAZ-112076 del 2024-11-07 . CI-1649-21;CO-LP-003-21; CO-LP-002-21; CO-1025-21. Colombia Rural; Municipio de Briceño, Valdivia y Toledo. Departamento de Antioquia	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS - INVIAS
096-2024	2024-11-28	Actas parcial de Obra No 1; Acta Parcial de Obra No 2; y Acta Parcial de Obra No 3	CONSORCIO L&S



1-11-24 34149

Montería, 01 de noviembre de 2024

088-2024

Señores

CONSORCIO INGECON – INCO

Atn. Ing. Ángela María Dávila Morales

Representante Legal

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Asunto: Remisión de permiso de ocupación de cauce.

Cordial saludo;

Por medio del presente remitimos permiso de ocupación de cause expedido por CVS y radicado a nuestro consorcio el día 30 de octubre de 2024.

Quedamos atentos a sus observaciones.

Atentamente,

Habib Chaar Sakr
HABIB CHAAR SAKR
R/L CONSORCIO L&S

	INGECON SAS
RECIBIDO:	
Fecha: 1-11-24	Hora: 12:20
No. de folios: 1	
Firma: <i>[Signature]</i>	
El recibido de este documento no implica su aceptación	

c.c. Arq. David José Rojas Muñoz – Secretario de Infraestructura del municipio de San Bernardo del Viento.
Anexo:

- Anexo PERMISO OCUPACIÓN DE CAUCE

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Planeta Rica, Córdoba, 1 de noviembre de 2024.

OFI-CONS-115-2024

Señor(es):

CONSORCIO INGECON - INCO

ANGELA MARIA DAVILA MORALES

Representante Legal

Calle 148 N° 7G - 42. Barrio Cedro Golf.

Bogotá - Colombia.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.


ASUNTO: Subsanación del informe mes de mayo, junio, julio, agosto y septiembre

Estimados Señores:

Mediante la presente me dirijo a usted en calidad de representante legal del CONSORCIO PROVIDENCIA, con el propósito de remitir la siguiente documentación, para su estudio y posterior aprobación:

- Subsanación del informe mes de mayo, junio, julio, agosto y septiembre

Atentamente,



EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

obraprovidencia1@gmail.com

		INGECON SAS	
		RECIBIDO:	
Fecha:	5-11-24	Hora:	8:14
No. de folios:	1		
Firma:			
El recibido de este documento no implica su aceptación			

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com

TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274

PLANETA RICA, CÓRDOBA

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Planeta Rica, Córdoba. 01 de noviembre de 2024.

OFI-CONS-116-2024

Señor(es):

CONSORCIO INGECON - INCO

ANGELA MARIA DAVILA MORALES

Representante Legal

Calle 148 N° 7G - 42. Barrio Cedro Golf. Bogotá - Colombia.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

ASUNTO: RESPUESTA A COMUNICADO CINGE-INV-5053-0388-2024. PLAN DE CONTINGENCIA, FLUJO DE CAJA.

Estimados Señores:

Mediante la presente me dirijo a usted en calidad de representante legal del Consorcio Providencia, con el propósito de radicar el PLAN DE CONTINGENCIA Y FLUJO DE CAJA relacionados con el objeto "CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. CONSORCIO PROVIDENCIA.

Adjunto a este correo electrónico se encuentran los documentos correspondientes a; *flujo de fondos y Plan de Contingencia actualizados*, incluyendo las dos obras de arte a construir en las abscisas K3+610 y K3+920.


Agradecemos amablemente dar respuesta a este oficio con copia a la secretaría de infraestructura del municipio de Planeta Rica. De tal forma que se pueda realizar el seguimiento oportuno de los avances del contratista por parte de la entidad.

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com

TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274


PLANETA RICA, CÓRDOBA.

INGECON SAS	
RECIBIDO:	
Fecha: 5-11-24	Hora: 8:14
No. de folios: 2	
Firma: 	
El recibido de este documento no implica su aceptación	

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Atentamente.


EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9
obraprovidencia1@gmail.com

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com
TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274
PLANETA RICA, CÓRDOBA.

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Planeta Rica, Córdoba. 01 de noviembre de 2024.

OFI-CONS-117-2024

Señor(es):

CONSORCIO INGECON - INCO

ANGELA MARIA DAVILA MORALES

Representante Legal

Calle 148 N° 7G - 42. Barrio Cedro Golf. Bogotá - Colombia.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

ASUNTO: DISEÑO BOX COULVERT 2X1 Y 2X1.5 CON SUS MEMORIAS DE CANTIDADES, PRESUPUESTO Y MEMORIAS DE CALCULO. INFORME TÉCNICO.

Estimados Señores:

Mediante la presente me dirijo a usted en calidad de representante legal del Consorcio Providencia, con el propósito de radicar el diseño de los BOX COULVERT DE 2X1.0 Y 2X1.5 relacionados con el objeto "CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS. CONSORCIO PROVIDENCIA.

Adjunto a este correo electrónico se encuentran los documentos correspondientes a; *BOX COULVERT DE 2*1 Y 2*1.5, con sus memorias de cantidades, presupuesto y memorias de cálculos de cada uno de ellos y se anexa el informe técnico de los box existentes.*

Agradecemos amablemente dar respuesta a este oficio con copia a la secretaría de infraestructura del municipio de Planeta Rica. De tal forma que se pueda realizar el seguimiento oportuno de los avances del contratista por parte de la entidad.

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com

TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274


PLANETA RICA, CÓRDOBA.

		INGECON SAS	
		RECIBIDO:	
Fecha:	S-11-24	Hora:	9.30
No. de folios:	9		
Firma:			
El recibido de este documento no implica su aceptación			

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Atentamente.



EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

obraprovidencial@gmail.com

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-MAIL: obraprovidencial@gmail.com

TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274

PLANETA RICA, CÓRDOBA.

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Planeta Rica, Córdoba. 05 de noviembre de 2024.

OFI-CONS-118-2024

Ingeniera
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL **CONSORCIO**
INGECON-INCO

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es:
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA
- PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL
MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL
MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE
VÍAS".

Asunto: ORDEN DE OPERACIÓN 5

Cordial saludo,

El consorcio providencia solicita a la interventoría la revisión y posterior aprobación de la PROFORMA-ANTICIPO emitida por la empresa T.M.C OLASCUAGA SAS identificada con nit 901.236.854 por concepto de transporte.

Se adjunta PROFORMA y documentos anexos.


EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
C.C. N gravedad ° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9
obraprovidencial@gmail.com

		INGECON SAS	
RECIBIDO:			
Fecha:	5-11-24	Hora:	9:55
No. de folios:	9		
Firma:			
El recibido de este documento no implica su aceptación			

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-MAIL: obraprovidencial@gmail.com
TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274
PLANETA RICA, CÓRDOBA

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Planeta Rica, Córdoba. 05 de noviembre de 2024.

OFI-CONS-120-2024

Ingeniera
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO
INGECON-INCO


Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es:
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA
- PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL
MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL
MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE
VÍAS".

Asunto: ORDEN DE OPERACIÓN 9

Cordial saludo,

El consorcio providencia solicita a la interventoría la revisión y posterior aprobación de la PROFORMA-ANTICIPO emitida por **SEBASTIAN LOPEZ SANCHEZ** identificado con nit 1.065.011.943-5 por concepto de MANO DE OBRA.

Se adjunta PROFORMA y documentos anexos.



EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
C.C. N gravedad ° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9
obraprovidencial@gmail.com

		INGECON SAS	
		RECIBIDO:	
Fecha:	5-11-24	Hora:	9:57
No. de folios:	7		
Firma:			
El recibido de este documento no implica su aceptación			

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27, BARRIO LOS ANGELES,
E-MAIL: obraprovidencial@gmail.com
TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274
PLANETA RICA, CÓRDOBA

5-11-24

34156

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Planeta Rica, Córdoba. 05 de noviembre de 2024.

OFI-CONS-121-2024

Ingeniera
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
REPRESENTANTE LEGAL **CONSORCIO**
INGECON-INCO


Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es:
"MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA
- PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL
MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL
MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE
VÍAS".

Asunto: ORDEN DE OPERACIÓN 10

Cordial saludo,

El consorcio providencia solicita a la interventoría la revisión y posterior aprobación de la PROFORMA-ANTICIPO emitida por la empresa JDC INGENIERIA SAS identificados con nit 901.164.144-4 por concepto de compra de materiales y transporte.

Se adjunta PROFORMA y documentos anexos.


EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
C.C. N gravedad ° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9
obraprovidencia1@gmail.com

	INGECON SAS
RECIBIDO:	
Fecha: 5-11-24	Hora: 9:57
No. de folios:	
Firma:	
El recibido de este documento no implica su aceptación	

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27, BARRIO LOS ANGELES,
E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com
TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274
PLANETA RICA, CÓRDOBA



CONSORCIO PAVIMENTO
VIA BARRANQUILLITA

pavimentobarranquillita@gmail.com

Montería, 05 de noviembre de 2024

Señores

COBQ 079-2024

CONSORCIO INGECON-INCO

Ciudad.

Referencia: Contrato de obra No. LP 006 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

Asunto: INFORME MENSUAL AMBIENTAL- OCTUBRE.

Respetada Ingeniera,

Por medio la presente, el contratista de obra CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA, se permite hacer entrega del informe mensual Componente Ambiental del periodo del 01 al 30 de octubre del 2024, con el fin de que sea revisado por esta interventoría.

Quedando atentos a cualquier comentario,

Cordialmente,

	INGECON SAS
RECIBIDO:	
Fecha: 8-11-24	Hora: 8:09
No. de folios: 1	
Firma:	
El recibido de este documento no implica su aceptación	

CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
Rpr. Legal CESAR AUGUSTO RIOS GONZALEZ
CONTRATISTA

8-11-24

34158



CONSORCIO PAVIMENTO
VIA BARRANQUILLITA

pavimentobarranquillita@gmail.com

Montería., 07 de Noviembre de 2024

Señores

COBQ 080-2024

CONSORCIO INGECON-INCO

Ciudad.

Referencia: Contrato de obra No. LP 006 de 2023, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"**.

Asunto: **INFORME MENSUAL SOCIAL DE OCTUBRE**

Respetada Ingeniera

Por medio la presente, el contratista de obra **CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA**, se permite hacer entrega del informe mensual Social del periodo del 01 al 30 de Octubre del 2024 , con el fin de que sean revisados por esta interventoría.

Quedando atentos a cualquier comentario,

Cordialmente,

	INGECON SAS
RECIBIDO:	
Fecha: 8-11-24	Hora: 8:09
No. de folios: 1	
Firma: 	
El recibido de este documento no implica su aceptación	



CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
Rpr. Legal CESAR AUGUSTO RIOS GONZALEZ
CONTRATISTA



Montería, 6 de noviembre de 2024

089-2024

Señores

CONSORCIO INGECON – INCO P

Atn. Ing. ÁNGELA MARIA DÁVILA MORALES

Representante Legal

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Asunto: Resultado densidades en subbase granular

Cordial saludo,

Adjuntamos a la presente, el resultado de los ensayos de densidad practicados a la subbase granular instalada, en el K0+035, K0+050, K0+218 y K0+130, cumpliendo con los requerimientos de calidad de la Especificaciones Generales de Construcción de Carreteras 2022 del Instituto Nacional de Vías.

Quedamos atento a sus observaciones

Atentamente,


Ing. WILLIAM URZOLA VISBAL

Director de obra

CONSORCIO L&S

c.c. Arq. David José Rojas Muñoz – Secretario de Infraestructura del municipio de San Bernardo del Viento.

Anexos:

DENSIDADE SBG (CANTERA EL ESFUERZO)-25102024. PDF (224KB)

	INGECON SAS
RECIBIDO:	
Fecha: 8-11-24	Hora: 8:10
No. de folios: 3	
Firma: 	
El recibido de este documento no implica su aceptación	

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Planeta Rica, Córdoba. 06 de noviembre de 2024.

OFI-CONS-122-2024

Señor(es):

CONSORCIO INGECON - INCO
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal
Calle 148 N° 7G - 42. Barrio Cedro Golf.
Bogotá - Colombia.

		INGECON SAS	
		RECIBIDO:	
Fecha:	8-11-24	Hora:	8:10
No. de folios:	3		
Firma:			
El recibido de este documento no implica su			

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".

Asunto: Respuesta comunicado cing-inv-5053-0310-24 - Componente ambiental

Estimados Señores:

Mediante la presente me dirijo a usted en calidad de representante legal del CONSORCIO PROVIDENCIA, con el propósito de remitir la siguiente documentación, para su estudio y posterior aprobación:

- ✓ Subsanación de informes mes de julio y agosto, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Interventoría, se atienden los requerimientos de acuerdo con lo solicitado, a fin de subsanar y dar trámite a los informes.

1. MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe estado ambiental, numeral 3.1, no detalla de forma específica las actividades realizadas por el contratista en dicho periodo, teniendo en cuenta la información que presentan en el anexo 11.

Para el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4, en el numeral 3.1 informe de estado ambiental del proyecto, se describe las actividades realizadas por el consorcio providencia en materia ambiental, conforme a lo establecido en el anexo 11, para los informes de julio y agosto 2024.

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com

TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274

PLANETA RICA, CÓRDOBA.

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

2. En el anexo 1, MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, debe especificar en qué estado se encuentra el trámite ante la CVS de forma más clara y detallada, si durante el periodo el contratista radico información o no, si es el caso relacionar comunicado, así mismo, deben venir adjuntos.

En relación a este punto, se aclara que a la fecha del presente periodo, el consorcio providencia está gestionando los documentos necesarios solicitados por la entidad contratante, para que el municipio de planeta rica, realice la solicitud y gestión pertinente ante la autoridad CAR-CVS para el permiso de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, para poder intervenir los boxculvert ubicados en el cauce del arroyo y la tala de árboles para la construcción de un muro de contención, por este motivo, no se adjunta documento a la fecha y el presente formato se diligencia informando que los documentos requeridos se encuentran trámite, de igual manera, no se cuenta con un acto administrativo. Una vez el consorcio providencia radique la información ante el municipio, suministrará copia del radicado con sus respectivos soportes. Se anexa formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 diligenciado, esto aplica para los dos informes en mención.

3. El formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE PMA O PAGA:

- PROYECTO: CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AL PERSONAL DE OBRA, las capacitaciones que relacionan en el anexo 6.1 corresponde solo al área SST, no al componente ambiental, teniendo en cuenta los temas que relacionan en el PAGA V03, ficha SM-DAGA-1.2-02

Se subsana el Anexo No. 6.1 donde se incluyen capacitaciones realizadas por el grupo de gestión ambiental, y esto aplica para los dos informes en mención.

- PROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES, en la ficha el contratista relaciona que en el periodo no hubo generación de residuos de RCD, tal como se evidencia en la evaluación del indicador.

Pero en el informe presentado en el anexo 11, manifiestan lo siguiente: Se registra material acopiado en punto, debidamente confinado. Anexo No. 6.16.", por lo cual, el contratista debe relacionar la cantidad de material producto de excavación acopiado y que está pendiente de su respectivo retiro a sitio de disposición final.

Se subsana el Anexo No. 6.9, donde se soporta el material RCD dispuesto en el punto aprobado por la entidad contratante, tanto para el mes de julio como para el mes de agosto 2024.

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com

TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274

PLANETA RICA, CÓRDOBA.

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

- Se solicita al contratista que el soporte fotográfico debe venir con fecha y hora.

Para el periodo de agosto 2024 no se tenía conocimiento que se debían entregar las fotografías con fecha y hora, por lo tanto, no cuento con registro fotográfico que incluya esa información, requerimiento a tener en cuenta de ahora en adelante, por consiguiente, se anexan los registros fotográficos reales tomados durante el periodo de ejecución.

- Se solicita que la evaluación de los indicadores se diligencie tal cual como se está reportando la fórmula, ya que como se viene reportando en el formato no es clara la información, por ejemplo:

Asistentes a capacitación / Trabajadores del proyecto * 100

$$6/13*100 = 46\%$$


Se subsanan las fórmulas del formato de Matriz de seguimiento al PAGA, para los meses de julio y agosto 2024.

- Conforme a lo expuesto anteriormente, se recuerda al contratista los requerimientos realizados por la interventoría en comunicados CINGE-INV-5053-0190-24 del 11 de julio del 2024 y CINGE-INV-5053-0251-24 del 12 de agosto del 2024, donde se solicitó presentar los formatos requeridos por la alcaldía municipal para la cuantificación de los residuos, con la finalidad de cumplir con lo exigido por la autoridad ambiental CVS, lo cual, deben venir adjuntos de forma trimestral.

La información solicitada en los comunicados descritos se subsana, teniendo en cuenta que, desde el mes de julio 2024, se cuenta con la autorización por parte de la Alcaldía Municipal de Planeta Rica, Córdoba, para realizar la debida gestión de los materiales RCD.

Por todo lo anteriormente expuesto, el consorcio providencia se encuentra comprometido en subsanar cada uno de los requerimientos solicitados, con el fin de avanzar en el desarrollo de las actividades y llevar a feliz término la aprobación del informe ambiental del mes de agosto de 2024

Atentamente,



EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

C.C. N gravedad ° 78.034.207 de Cereté, Córdoba. CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

obraprovidencia1@gmail.com

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com

TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274

PLANETA RICA, CÓRDOBA.

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Planeta Rica, Córdoba. 08 de noviembre del 2024.

OFI-CONS-123-2024

Señor(es):

CONSORCIO INGECON - INCO
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
Representante Legal
Calle 148 N° 76 - 42. Barrio Cedro Golf.
Bogotá - Colombia.

INGECON SAS	
RECIBIDO:	
Fecha: 12-11-24	Hora: 10:04
No. de folios: 1	
Firma: <i>[Firma]</i>	
El recibido de este documento no implica su	

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".

Asunto: Informe del mes de octubre del componente social

Estimados Señores:

Mediante la presente me dirijo a usted en calidad de representante legal del CONSORCIO PROVIDENCIA, con el propósito de remitir la siguiente documentación, para su estudio y posterior aprobación:

✓ Informe del mes de octubre del componente social.

Atentamente,

[Firma]

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

C.C. N° gravedad 78.034.207 de Cereté, Córdoba. CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9

obraprovidencia1@gmail.com

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com

TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274

PLANETA RICA, CÓRDOBA.

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Planeta Rica, Córdoba. 12 de noviembre de 2024.

OFI-CONS-124-2024

Señor(es):

CONSORCIO INGECON - INCO

ANGELA MARIA DAVILA MORALES

Representante Legal

Calle 148 N° 76 - 42. Barrio Cedro Golf.

Bogotá - Colombia.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.

ASUNTO: RESPUESTA A COMUNICADO CING-INV-5053-0406-24. ESTUDIO GEOTECNICO, DISEÑO ESTRUCTURAL MURO UBICADO EN LA ABSCISA K4+190.


Estimados Señores:

Mediante la presente me dirijo a usted en calidad de representante legal del CONSORCIO PROVIDENCIA, con el propósito de remitir la siguiente documentación, para su estudio y posterior aprobación.

- ❖ Respuesta a comunicado CING-INV-5053-0406-24 Estudio Geotécnico, Diseño Estructural Muro ubicado en la abscisa K4+190.

Atentamente.


EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9
obraprovidencia1@gmail.com

		INGECON SAS	
		RECIBIDO:	
Fecha:		12-11-24	hora: 16:02
No. de folios:		4	
Firma:			
Aprobado de esta dependencia en la fecha su aprobación			

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES,
E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com
TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274
PLANETA RICA, CÓRDOBA

13 - 11 - 24

34168



CONSORCIO PAVIMENTO
VIA BARRANQUILLITA

pavimentobarranquillita@gmail.com

Montería., 12 de Noviembre de 2024

Señores

COBQ 081-2024

CONSORCIO INGECON-INCO

Ciudad.

Referencia: Contrato de obra No. LP 006 de 2023, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"**.

Asunto: **AJUSTES INFORME MENSUAL SST - AGOSTO.**

Respetada Ingeniera,

Por medio la presente, el contratista de obra **CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA**, se permite hacer entrega de los documentos solicitados inicialmente mediante oficio *CING-INV-5053-0307-24* de fecha 23 de Septiembre de 2024, con el fin de darle alcance al informe SST del periodo que va del (01 al 30 de Agosto del 2024).

Quedando atentos a cualquier comentario,

Cordialmente,

	INGECON SAS
RECIBIDO:	
Fecha: <u>13-11-24</u>	Hora: <u>0:39</u>
No. de folios: <u>27</u>	
Firma: 	
El recibido de este documento no implica su aceptación	



CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
Rpr. Legal **CESAR AUGUSTO RIOS GONZALEZ**
CONTRATISTA

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Planeta Rica, Córdoba. 06 de noviembre de 2024.

Señor(es):

CONSORCIO INGECON - INCO

ANGELA MARIA DAVILA MORALES

Representante Legal

Calle 148 N° 7G - 42. Barrio Cedro Golf.

Bogotá - Colombia.

OFI-CONS-122-2024

		INGECON SAS	
		RECIBIDO:	
Fecha:	13-11-24	Hora:	8:40
No. de folios:	3		
Firma:			
El recibido de este documento no implica su aceptación			

Referencia: Contrato de obra No. 159 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS".

Asunto: Respuesta comunicado cing-inv-5053-0310-24 - Componente ambiental

Estimados Señores:

Mediante la presente me dirijo a usted en calidad de representante legal del CONSORCIO PROVIDENCIA, con el propósito de remitir la siguiente documentación, para su estudio y posterior aprobación:

- ✓ Subsanación de informes mes de julio y agosto, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Interventoría, se atienden los requerimientos de acuerdo con lo solicitado, a fin de subsanar y dar trámite a los informes.

1. MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe estado ambiental, numeral 3.1, no detalla de forma específica las actividades realizadas por el contratista en dicho periodo, teniendo en cuenta la información que presentan en el anexo 11.

Para el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4, en el numeral 3.1 informe de estado ambiental del proyecto, se describe las actividades realizadas por el consorcio providencia en materia ambiental, conforme a lo establecido en el anexo 11, para los informes de julio y agosto 2024.

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com

TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274

PLANETA RICA, CÓRDOBA.

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

2. En el anexo 1, MASPS-MN1-IN-2-FR-2 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE ACTOS ADMINISTRATIVOS, debe especificar en qué estado se encuentra el trámite ante la CVS de forma más clara y detallada, si durante el periodo el contratista radico información o no, si es el caso relacionar comunicado, así mismo, deben venir adjuntos.

En relación a este punto, se aclara que a la fecha del presente periodo, el consorcio providencia está gestionando los documentos necesarios solicitados por la entidad contratante, para que el municipio de planeta rica, realice la solicitud y gestión pertinente ante la autoridad CAR-CVS para el permiso de ocupación de cauce y aprovechamiento forestal, para poder intervenir los boxculvert ubicados en el cauce del arroyo y la tala de árboles para la construcción de un muro de contención, por este motivo, no se adjunta documento a la fecha y el presente formato se diligencia informando que los documentos requeridos se encuentran trámite, de igual manera, no se cuenta con un acto administrativo. Una vez el consorcio providencia radique la información ante el municipio, suministrará copia del radicado con sus respectivos soportes. Se anexa formato MASPS-MN1-IN-2-FR-2 diligenciado, esto aplica para los dos informes en mención.

3. El formato MASPS-MN1-IN-2-FR-3 MATRIZ DE CUMPLIMIENTO AMBIENTAL DE PMA O PAGA:

- PROYECTO: CAPACITACIÓN Y CONCIENCIACIÓN AL PERSONAL DE OBRA, las capacitaciones que relacionan en el anexo 6.1 corresponde solo al área SST, no al componente ambiental, teniendo en cuenta los temas que relacionan en el PAGA V03, ficha SM-DAGA-1.2-02

Se subsana el Anexo No. 6.1 donde se incluyen capacitaciones realizadas por el grupo de gestión ambiental, y esto aplica para los dos informes en mención.

- PROYECTO: MANEJO INTEGRAL DE LOS RESIDUOS SOLIDOS CONVENCIONALES Y ESPECIALES, en la ficha el contratista relaciona que en el periodo no hubo generación de residuos de RCD, tal como se evidencia en la evaluación del indicador.

Pero en el informe presentado en el anexo 11, manifiestan lo siguiente: Se registra material acopiado en punto, debidamente confinado. Anexo No. 6.16.", por lo cual, el contratista debe relacionar la cantidad de material producto de excavación acopiado y que está pendiente de su respectivo retiro a sitio de disposición final.

Se subsana el Anexo No. 6.9, donde se soporta el material RCD dispuesto en el punto aprobado por la entidad contratante, tanto para el mes de julio como para el mes de agosto 2024.

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com

TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274

PLANETA RICA, CÓRDOBA.

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

- Se solicita al contratista que el soporte fotográfico debe venir con fecha y hora.

Para el periodo de agosto 2024 no se tenía conocimiento que se debían entregar las fotografías con fecha y hora, por lo tanto, no cuento con registro fotográfico que incluya esa información, requerimiento a tener en cuenta de ahora en adelante, por consiguiente, se anexan los registros fotográficos reales tomados durante el periodo de ejecución.

- Se solicita que la evaluación de los indicadores se diligencie tal cual como se está reportando la formula, ya que como se viene reportando en el formato no es clara la información, por ejemplo:

Asistentes a capacitación / Trabajadores del proyecto * 100

$$6/13*100 = 46\%$$


Se subsanan las fórmulas del formato de Matriz de seguimiento al PAGA, para los meses de julio y agosto 2024.

- Conforme a lo expuesto anteriormente, se recuerda al contratista los requerimientos realizados por la interventoría en comunicados CINGE-INV-5053-0190-24 del 11 de julio del 2024 y CINGE-INV-5053-0251-24 del 12 de agosto del 2024, donde se solicitó presentar los formatos requeridos por la alcaldía municipal para la cuantificación de los residuos, con la finalidad de cumplir con lo exigido por la autoridad ambiental CVS, lo cual, deben venir adjuntos de forma trimestral.

La información solicitada en los comunicados descritos se subsana, teniendo en cuenta que, desde el mes de julio 2024, se cuenta con la autorización por parte de la Alcaldía Municipal de Planeta Rica, Córdoba, para realizar la debida gestión de los materiales RCD.

Por todo lo anteriormente expuesto, el consorcio providencia se encuentra comprometido en subsanar cada uno de los requerimientos solicitados, con el fin de avanzar en el desarrollo de las actividades y llevar a feliz término la aprobación del informe ambiental del mes de agosto de 2024

Atentamente,



EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

C.C. N gravedad ° 78.034.207 de Cereté, Córdoba. CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

obraprovidencia1@gmail.com

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com

TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274

PLANETA RICA, CÓRDOBA.

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

000 AGOSTO 2024 - CBS INFORME.msp					
Archivo Herramientas Seguridad Opciones Ayuda					
Archivos Carpetas Computador Ver Herramientas Seguridad Asistente Informacion Servicios Conexiones Auto-establecer					
000 AGOSTO 2024 - CBS INFORME.msp - Archivo ZIP, tamaño descomprimido: 44.816.111 bytes					
Nombre	Tamaño	Comprimido	Fecha	Modificado	ORC12
Carpetas de archivos					
ANEXO No. 1	62.213	43.888	Carpetas de archivos	10/10/2024 08...	
ANEXO No. 2	104.515	403.522	Carpetas de archivos	05/10/2024 06...	
ANEXO No. 4	80.434	129.322	Carpetas de archivos	03/10/2024 06...	
ANEXO No. 5	429.560	117.407	Carpetas de archivos	02/10/2024 06...	
ANEXO No. 6	42.494.695	44.932.658	Carpetas de archivos	10/10/2024 06...	
ANEXO No. 11	163.470	346.337	Carpetas de archivos	10/10/2024 07...	
000 MASPS MPA No. 1 - PR INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROCESIO MPA...	89.490	87.234	Hojas de cálculo de...	10/10/2024 08...	75A4E787
Total: 6 carpetas, 1 archivo: 44.816.111 bytes					
CARPETA ANEXO No. 6					
000 AGOSTO 2024 - CBS INFORME.msp					
Archivo Herramientas Seguridad Opciones Ayuda					
Archivos Carpetas Computador Ver Herramientas Seguridad Asistente Informacion Servicios Conexiones Auto-establecer					
000 AGOSTO 2024 - CBS INFORME.msp/ANEXO No. 6 - Archivo ZIP, tamaño descomprimido: 43.491.686 bytes					
Nombre	Tamaño	Comprimido	Fecha	Modificado	ORC12
Carpetas de archivos					
ANEXO No. 6.1	12.328.768	11.918.424	Carpetas de archivos	03/10/2024 11...	
ANEXO No. 6.4	1.241.071	1.194.358	Carpetas de archivos	03/10/2024 11...	
ANEXO No. 6.3	9.886.119	9.143.907	Carpetas de archivos	03/10/2024 06...	
ANEXO No. 6.0	127.063	93.484	Carpetas de archivos	03/10/2024 11...	
ANEXO No. 6.7	245.017	227.603	Carpetas de archivos	05/10/2024 12...	
ANEXO No. 6.2	1.058.722	1.003.805	Carpetas de archivos	05/10/2024 12...	
ANEXO No. 6.8	399.581	362.077	Carpetas de archivos	10/10/2024 07...	
ANEXO No. 6.10	13.862.711	9.880.384	Carpetas de archivos	03/10/2024 11...	
ANEXO No. 6.11	3.257.034	3.123.958	Carpetas de archivos	05/10/2024 02...	
ANEXO No. 6.12	130.214	120.242	Carpetas de archivos	05/10/2024 12...	
ANEXO No. 6.13	8.625.201	8.654.886	Carpetas de archivos	10/10/2024 03...	
ANEXO No. 6.16	455.0387	450.6383	Carpetas de archivos	05/10/2024 03...	
000 MASPS MPA No. 2 - PR INFORME COMPLEMENTARIO AMBIENTAL MPA Q. RUSA MPA...	10.309	66.579	Hojas de cálculo de...	10/10/2024 03...	3C25A708
Total: 12 carpetas, 1 archivo: 43.491.686 bytes					
JULIO 2024					

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com

TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274

PLANETA RICA, CÓRDOBA.

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Carpeta de archivos					
Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRCL
ANEXO No. 1	57,224	6,779	Carpeta de archivos	05/10/2024 11:...	
ANEXO No. 2	489,706	410,135	Carpeta de archivos	05/10/2024 09:...	
ANEXO No. 3	141,434	59,367	Carpeta de archivos	05/10/2024 11:...	
ANEXO No. 4	130,039	117,465	Carpeta de archivos	05/10/2024 11:...	
ANEXO No. 5	45,245,699	44,570,468	Carpeta de archivos	05/11/2024 09:...	
ANEXO No. 6	339,539	143,325	Carpeta de archivos	05/11/2024 04:...	
01 MAPA MPA-01-1 RE 4 INFORME ESTADO AMBIENTAL DEL PROYECTO #5000	122,442	97,843	Ficha de carácter de...	05/11/2024 04:...	54010493
Total: 6 carpetas, 1 archivo, 46,995,115 bytes					

Carpeta de archivos					
Nombre	Tamaño	Comprimido	Tipo	Modificado	CRCL
ANEXO No. 1	11,505,939	11,521,751	Carpeta de archivos	05/11/2024 04:...	
ANEXO No. 2	1,135,341	2,059,367	Carpeta de archivos	04/10/2024 01:...	
ANEXO No. 3	92,777,479	165,529,677	Carpeta de archivos	05/11/2024 09:...	
ANEXO No. 4	626,011	578,464	Carpeta de archivos	05/10/2024 4:02:...	
ANEXO No. 5	2,876,052	2,572,561	Carpeta de archivos	05/10/2024 11:...	
ANEXO No. 6	7,053,295	6,784,738	Carpeta de archivos	05/10/2024 09:...	
ANEXO No. 7	3,634,046	3,243,545	Carpeta de archivos	05/10/2024 08:...	
01 MAPA MPA-01-1 RE 4 MATRIZ CUMPLIMIENTO AMBIENTAL PMA 020000 #5000	75,288	46,943	Ficha de carácter de...	05/11/2024 02:...	A700094C
Total: 7 carpetas, 1 archivo, 45,745,693 bytes					

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
 E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com
 TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274
 PLANETA RICA, CÓRDOBA.

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Recibidos

Destacados

Respuestas

Enviados

Borradores

IMAP

Etiquetas

PIERO CARLOS CAROULL LUBILLOS

C.C. N° gravada * 28.834.207 de Cereté, Córdoba, CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

providencia1@gmail.com

RESPUESTA COMUNICADO CRAS JW-5083-0330

24/20

3 archivos adjuntos

Analizador de Grama (3)

Documento Provisional de

CONSORCIO PROVIDENCIA

RECIBIDO POR: 24/20

CON-CONS-113-3

REPOSICIONAR

Responder

Reenviar

EVIDENCIA DE LAS RESPUESTAS A LOS DOS INFORMES

Estimados Señores:

Mediante la presente me dirijo a usted en calidad de representante legal del CONSORCIO PROVIDENCIA, con el propósito de remitir la siguiente documentación, para su estudio y posterior aprobación:

✓ Subsanación del informe mes de julio y agosto, teniendo en cuenta las observaciones realizadas por la Interventoría, se atienden los requerimientos de acuerdo con lo solicitado, a fin de subsanar y dar trámite a los informes.

1. MASPS-MN1-IN-1-FR-4 Informe estado ambiental, numeral 3.1, no detalla de forma específica las actividades realizadas por el contratista en dicho periodo, teniendo en cuenta la información que presentan en el anexo 11.

Para el formato MASPS-MN1-IN-1-FR-4, en el numeral 3.1 informe de estado ambiental del proyecto, se describe las actividades realizadas por el consorcio providencia en materia ambiental, conforme a lo establecido en el anexo 11, para los informes de julio y agosto 2024.

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com

TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274

PLANETA RICA, CÓRDOBA.

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com

TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274

PLANETA RICA, CÓRDOBA.

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Teniendo en cuenta lo anterior, manifestamos que debido al parecido en las observaciones de los meses de julio y agosto 2024, todo fue contemplado en una sola respuesta.

Sin más, quedamos atentos a cualquier inquietud por parte de ustedes.

Atentamente,

EMIRO CARLOS BURGUIL CUBILLOS

C.C. N gravedad ° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Obraprovidencia1@gmail.com

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.

E-MAIL: obraprovidencia1@gmail.com

TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274

PLANETA RICA, CÓRDOBA.



Republica de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Planeta Rica
Nit: 800096765-1



Planeta Rica, 12 de noviembre de 2024

Señores:

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL - CVS

Albeiro Arrieta López

Subdirector de Gestión Ambiental



ASUNTO: Solicitud de concepto para determinar la necesidad de permisos de ocupación de cauce en el proyecto con objeto "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS"

Cordial Saludo,

En atención al proyecto de infraestructura que se viene adelantando en la vía que conduce del casco urbano del Municipio de Planeta Rica al Corregimiento de providencia, se requiere definir la necesidad de obtención de permisos de ocupación de cauce en atención al alcance del proyecto y a las condiciones hidráulicas e hidrológicas de la zona, por lo cual nos permitimos solicitar de manera muy respetuosa un concepto asociado a las siguientes obras de infraestructura a desarrollar con relación a si se requiere o no la obtención de permiso ambiental:

- 1) **Coordenadas primer obra de arte:** 8°25'57"N y 75°29'12"W – Alcantarilla triple a intervenir solamente en soleras para protección (no se van a desarrollar obras de arte nuevas) – Cauce quebrada.
- 2) **Coordenadas segunda obra de arte:** 8°25'56"N y 75°29'10"W – Obra de arte a demoler y reemplazar por boxculvert 2x1 sencillo (obra nueva) – Escorrentía de aguas lluvias.
- 3) **Coordenadas primer muro de contención:** 8°25'54"N y 75°29'03", trabajos a desarrollar sobre la rivera del cauce – Cauce quebrada.
- 4) **Coordenadas tercera obra de arte:** 8°25'54"N y 75°29'01"W – Obra de arte a demoler y reemplazar por boxculvert 2x1.5 sencillo (obra nueva) – Escorrentía de aguas lluvias.
- 5) **Coordenadas cuarta obra de arte:** 8°25'50"N y 75°28'53"W – Obra de arte a intervenir en una aleta para protección y la construcción del segundo muro de contención – Cauce quebrada.

Calle 18 #10-09 Tel: 7662274, 7662547 Código Postal 233040
Planeta Rica Córdoba Colombia
contactenos@planetarica-cordoba.gov.co





República de Colombia
Departamento de Córdoba
Municipio de Planeta Rica
Nit: 800096765-1



Sin más quedamos atentos a cualquier inquietud y a su respuesta respectiva. Se anexa documentación complementaria.

Atentamente,

JORGE ISAAC GIL MERCADO
Secretario de Infraestructura y Planeación.
Alcaldía de Planeta Rica

Proyectó: Miguel Ángel Marín Grondona
Profesional Universitario Grado 1, Cód. 219
Secretaría de Infraestructura y Planeación



Calle 18 #10-09 Tel: 7662274, 7662547 Código Postal 233040
Planeta Rica Córdoba Colombia
contactenos@planetarica-cordoba.gov.co






Montería, 14 de noviembre de 2024

Señores

CONSORCIO INGECON – INCO

Atn. Ing. Ángela María Dávila Morales
Representante Legal

		INGECON SAS	
RECIBIDO:			
Fecha:	18-11-24	Hora:	8:52
No. de folios:	1		
Firma:			
El recibido de este documento no implica su aceptación			

090-2024

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Asunto: Remisión de informes ambiental y SST.

Cordial saludo;

Por medio del presente remitimos informes ambientales correspondientes a los periodos febrero, marzo, mayo, junio, julio y septiembre de 2024 con sus respectivos anexos adjuntos debido al error que se les presenta al descargar los archivos.

Igualmente, informes de SST correspondientes a los periodos de febrero, marzo, mayo, junio, julio y septiembre de 2024 con sus respectivos anexos adjuntos.

Quedamos atentos a sus observaciones.

Atentamente,


HABIB CHAAR SAKR
R/L CONSORCIO L&S

c.c. Arq. David José Rojas Muñoz – Secretario de Infraestructura del municipio de San Bernardo del Viento.

Anexo:

- Anexo INFORMES SST



Montería, 15 de noviembre de 2024

Señores

CONSORCIO INGECON – INCO

Atn. Ing. Ángela María Dávila Morales
Representante Legal

18-11-24 34174

INGECON SAS	
RECIBIDO:	
Fecha: 18-11-24	Hora: 8:53
No. de folios: 1	
Firma:	
El recibido de este documento no implica su aceptación	

091-2024

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Asunto: Remisión informe ambiental octubre

Cordial saludo;

Por medio del presente remitimos informe ambiental correspondiente al periodo de octubre de 2024 con sus respectivos anexos.

Quedamos atentos a sus observaciones.

Atentamente,

HABIB CHAAR SAKR
R/L CONSORCIO L&S

c.c. Arq. David José Rojas Muñoz – Secretario de Infraestructura del municipio de San Bernardo del Viento.

Anexo:

- Anexo INFORME AMBIENTAL OCTUBRE

**ICANH****ICANH - 2024162000117381****No. Entrada 2024184200102852**

Bogotá D.C., 15-11-2024

Señor

EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS

Consorcio Providencia

obraprovidencia1@gmail.com

		INGECON SAS	
RECIBIDO:			
Fecha:	18-11-24	Hora:	10:37
No. de folios:	4		
Firma:			
El recibido de este documento no implica su recepción			

Asunto: Concepto sobre contrato de obra no. 159-2023 Objeto: mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica - Providencia, en el departamento de Córdoba, en el marco del convenio 2286 de 2023, suscrito entre el municipio de Planeta Rica y el Instituto Nacional de Vías 3 Rad. 2024184200102852

Reciba un cordial saludo.

El Instituto Colombiano de Antropología e Historia - ICANH ha recibido la comunicación citada en el asunto, relacionada con su "Solicitud de Consultante e Icanh -INSTITUTO COLOMBIANO DE ANTROPOLOGIA E HISTORIA-Como respuesta al No. Entrada 2024184200080842 se relaciona por este medio los soportes e información requerida por ustedes para el proceso de consulta".

Al respecto, nos permitimos informarle lo siguiente:

1. De conformidad con lo previsto en el numeral 1.6. del artículo 11 de la Ley 397 de 1997, modificado por el artículo 131 del Decreto 2106 del 2019, "Los titulares de proyectos, obras o actividades que requieran licenciamiento ambiental o estén sujetos a la aprobación de Planes de Manejo Ambiental deberán presentar un Programa de Arqueología Preventiva al Instituto Colombiano de Antropología e Historia, y que tiene por objeto garantizar la protección del patrimonio arqueológico ante eventuales hallazgos arqueológicos en el área del proyecto, obra o actividad. Sin la aprobación del Programa no podrán adelantarse las obras".



ICANH

2. En virtud del anterior marco normativo, el proyecto "*Contrato de obra no. 159-2023 objeto: mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica – Providencia, en el departamento de Córdoba, en el marco del convenio 2286 de 2023, suscrito entre el municipio de Planeta Rica y el Instituto Nacional de Vías 3*", localizado en el municipio de Planeta Rica, departamento de Córdoba, **NO** se encuentra en la obligación legal de registrar e implementar un Programa de Arqueología Preventiva ante esta entidad, dado que no requiere licencia ambiental ni la aprobación de un Plan de Manejo Ambiental.
3. Así mismo, a la fecha, el proyecto **NO** se encuentra en la obligación de implementar medidas de manejo arqueológico, toda vez que, verificando la información disponible en el Instituto:
 - No se han reportado sitios ni bienes pertenecientes al patrimonio arqueológico dentro del área objeto de la consulta.
 - No se encontró superposición del polígono consultado con áreas arqueológicas protegidas.
 - El polígono consultado no cuenta con Planes de Manejo Arqueológico previamente aprobados por el ICANH.

Lo anterior, sin perjuicio de que puedan existir sitios o bienes arqueológicos que aún no han sido reportados ante esta autoridad.

4. No obstante, el ICANH como única autoridad nacional en materia de patrimonio arqueológico, se permite informar que, conforme lo previsto en el parágrafo 2 del artículo 2.6.1.8. del Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, modificado por el Decreto 138 de 2019, **si en el desarrollo del proyecto "Contrato de obra no. 159-2023 objeto: mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica – Providencia, en el departamento de Córdoba, en el marco del convenio 2286 de 2023, suscrito entre el municipio de Planeta Rica y el Instituto Nacional de Vías 3" se hicieron hallazgos arqueológicos de manera fortuita, el responsable tendrá que implementar lo previsto en los numerales 3 y 4 del "Protocolo de manejo de hallazgos fortuitos de patrimonio arqueológico" adoptado por el ICANH mediante Resolución 797 de 06 de octubre de 2020, el cual se encuentra publicado en el siguiente enlace:**
https://www.icanh.gov.co/recursos_user/ICANH%20PORTAL/SUBDIRECCI%C3%93N%20CIENT%C3%8DFICA/ARQUEOLOGIA/2020/Protocolo_de_hallazgos_fortuitos.pdf



5. Teniendo en cuenta que las entidades territoriales están obligadas a adoptar las medidas necesarias para contribuir al manejo adecuado tendiente a la protección del patrimonio arqueológico situado en sus respectivas circunscripciones, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2.6.1.9 del Decreto 1080 de 2015, modificado por el Decreto 138 de 2019, resulta de especial relevancia el seguimiento que le realicen a este proyecto, para que se aplique de manera efectiva el protocolo en caso de un hallazgo fortuito, razón por la cual se copia el presente oficio a la entidad territorial competente.
6. Nos permitimos recordarle que, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 2.6.5.1. del Decreto 1080 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Cultura, modificado por el Decreto 138 de 2019, los Programas de Arqueología Preventiva pueden formularse por solicitud de los interesados, para aquellos proyectos que no estén en la obligación legal de hacerlo.

Lo anterior teniendo en cuenta que el Programa de Arqueología Preventiva resulta ser un importante instrumento de planeación que busca facilitar el desarrollo de obras y proyectos, con el fin de contar de manera previa con medidas de manejo que permitan gestionar posibles hallazgos, y evitar la interrupción de las obras ante hallazgos fortuitos.

Finalmente, se resalta que **el presente concepto aplica únicamente para el Contrato de obra no. 159-2023 objeto: mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica – Providencia, en el departamento de Córdoba, en el marco del convenio 2286 de 2023, suscrito entre el municipio de Planeta Rica y el Instituto Nacional de Vías 3, a desarrollarse dentro de las siguientes coordenadas:**

No	X	Y
1	-8408945.097	943208.352
2	-8406308.019	947527.044
3	-8391364.58	937972.416
4	-8397173.794	933883.035
5	-8397173.794	933997.69
6	-8408945.097	943208.352

Mapa SRC: EPSG:9377- MAGNA- SIRGAS 2018/Origen

De esta manera, si se requiere adelantar otras obras o actividades, o intervenir áreas diferentes, se deberá realizar una nueva consulta.



ICANH

El ICANH lo invita a diligenciar una encuesta ingresando al siguiente enlace: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeJZNcGyn1sdGJBLLoH0VxOaO7-ZbeAcvBwbUTUP0_xT9fBug/viewform con la cual busca conocer su percepción sobre los trámites y servicios que presta la entidad.

Atentamente,

Firmado digitalmente
por Juan Manuel Díaz
Ortiz
Fecha: 2024.11.15
16:07:18 -05'00'

JUAN MANUEL DÍAZ ORTIZ

Subdirector (E) de Gestión del Patrimonio
Instituto Colombiano de Antropología e Historia

Con copia a: Alcaldía Municipal de Planeta Rica Córdoba
Correo contactenos@planetarica-cordoba.gov.co

Transcribió:

Heidy Yuliet Sepúlveda
Contratista
Grupo de Arqueología

Revisó:

Rodolfo Cepeda
Contratista
Grupo de Arqueología

Aprobó:

Rodolfo Cepeda
Contratista
Grupo de Arqueología

18-11-24

34178



CONSORCIO PAVIMENTO
VIA BARRANQUILLITA

pavimentobarranquillita@gmail.com

Montería, 18 de Noviembre de 2024

Señores

COBQ 081-2024

CONSORCIO INGECON-INCO

Ciudad.

Referencia: Contrato de obra No. LP 006 de 2023, cuyo objeto es: **"MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"**.


Asunto: **INFORME MENSUAL SST-OCTUBRE**


Respetada Ingeniera,

Por medio la presente, el contratista de obra **CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA**, se permite hacer entrega del informe mensual Componente SST del periodo del 01 al 30 de octubre del 2024, con el fin de que sea revisado por esta interventoría.

Quedando atentos a cualquier comentario,

Cordialmente,

	INGECON SAS
RECIBIDO:	
Fecha: 18-11-24	Hora: 3:02
No. de folios:	1
Firma:	
El recibido de este documento no implica su aceptación	



CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
Rpr. Legal CESAR AUGUSTO RIOS GONZALEZ
CONTRATISTA

19-11-24

34180



CONSORCIO PAVIMENTO
VIA BARRANQUILLITA

pavimentobarranquillita@gmail.com

Los Córdoba, 19 de noviembre de 2024
COBQ-084-24

Ingeniera
ANGELA MARIA DAVILA MORALES
CONSORCIO INGECON - INCO
Interventor

REFERENCIA: Contrato de Obra No. LP 006-2023 - MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA

ASUNTO: ACCIONES CORRECTIVAS A FISURAS EN LOSAS

Cordial Saludo,

De acuerdo al Informe Patológico del especialista acerca de las causas a las fisuras transversales en losas de pavimento, durante el proceso de construcción de han realizado acciones correctivas, tales como:\

1. DISMINUCION DE VENTANA DE CORTE, el proceso de corte para juntas de dilatación se pasó de 6 a 4 horas.
2. CURADO DE CONCRETO, se ha mejorado el proceso de curado y humectación de losas de pavimento, dado que luego del Curado Químico inicial con Antisol, se ha incrementado la frecuencia el Curado posterior con Agua a las losas contrarrestando las altas temperaturas que se están presentando durante el proceso constructivo.

Estas acciones descritas han disminuido al mínimo la fisuras que se estaban presentando en las losas de pavimento.

Atentamente,


CESAR AUGUSTO RIOS GONZALEZ
C.C. No. 78.744.425 de Montería.
RL CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
Rut 901768925-2

		INGECON SAS	
		RECIBIDO:	
Fecha:	19-11-24	Hora:	3:14
No. de folios:	1		
Firma:			
El recibido de este documento no implica su aceptación			



Montería, 18 de noviembre de 2024

Señores
CONSORCIO INGECON – INCO
Atn. Ing. Ángela María Dávila Morales
Representante Legal

19-11-24 DE 34181

INGECON SAS	
RECIBIDO:	
Fecha: 19-11-24	Hora: 3:14
No. de folios: 1	
Firma:	
El recibido de este documento no implica su aceptación	

092-2024

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Asunto: Remisión informe SST octubre

Cordial saludo;

Por medio del presente remitimos informe SST correspondiente al periodo de octubre de 2024 con sus respectivos anexos.

Quedamos atentos a sus observaciones.

Atentamente,

HABIB CHAAR SAKR
R/L CONSORCIO L&S

c.c. Arq. David José Rojas Muñoz – Secretario de Infraestructura del municipio de San Bernardo del Viento.

Anexo:

- Anexo INFORME SST OCTUBRE



Montería, 19 de noviembre de 2024

Señores

CONSORCIO INGECON – INCO

Atn. Ing. Ángela María Dávila Morales

Representante Legal

19-11-24 34182

		INGECON SAS	
RECIBIDO:			
Fecha:	19-11-24	Hora:	3:15
No. de folios:	1		
Firma:			
El recibido de este documento no implica su aceptación			

094-2024

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Asunto: Remisión informe social octubre e informes subsanados

Cordial saludo;

Por medio del presente remitimos informe social correspondiente al periodo de octubre de 2024 con sus respectivos anexos, igualmente, remitimos informe periodos de julio, agosto y septiembre con la subsanación a las observaciones presentadas en el comunicado CING-INV-5053-0410-24.

Quedamos atentos a sus observaciones.

Atentamente,


HABIB CHAAR SAKR
R/L CONSORCIO L&S

c.c. Arq. David José Rojas Muñoz – Secretario de Infraestructura del municipio de San Bernardo del Viento.
Anexo:

- Anexo INFORME SOCIAL OCTUBRE
- Anexo INFORME SOCIAL JULIO, AGOSTO Y SEPTIEMBRE



22-11-24 34186

Montería, 20 de noviembre de 2024

		INGECON SAS	
		RECIBIDO:	
Fecha: 22-11-24		Hora: 7:16	
No. de folios: 1			
Firma: 			
El recibido de este documento no implica su aceptación			

095-2024

Señores

CONSORCIO INGECON – INCO P

Atn. Ing. ÁNGELA MARIA DÁVILA MORALES

Representante Legal

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Asunto: Resolución No 238 del 15 de noviembre de 2024. CVS

Cordial saludo,

Mediante el **Comunicado No.: 20242115883**, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinú y del San Jorge – CVS, procedió a surtir la notificación electrónica del contenido de la **Resolución No 238 del 15 de noviembre de 2024, "Por la cual se otorga un permiso de aprovechamiento forestal árboles aislados y tratamiento silvicultural de árboles aislados"**

Adjuntamos a la presente el Comunicado y la Resolución, mencionada arriba, para su conocimiento y fines pertinentes.

Quedamos atento a sus observaciones

Atentamente,



Ing. WILIAM ORZOLA VISBAL

Director de obra

CONSORCIO L&S

c.c. Arq. David José Rojas Muñoz – Secretario de Infraestructura del municipio de San Bernardo del Viento.

Anexos:

- Comunicado No 20242115883 de la CVS. PDF. 982KB
- Resolución No 238 del 15 de noviembre de 2024. PDF. 1.687 KB



Fecha: 2024-11-21 11:06:08
 Radicado: 2024S-VBOG-087125
 Destino: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
 Anexos: 0



INVIAS
 Juan Fernando Argüello Umbeo, SUBDIRECTOR DE
 Planeación y Desarrollo Urbano, Regional y
 Equipamiento, Oficina de Gestión del Riesgo y
 Vigilancia

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-087125

Fecha: 2024-11-21 11:06:08

SEÑOR(A):

ANGELA MARIA DAVILA MORALES
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO INGECON - INCO

CALLE 148 No. 7g # 42

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta a entrada 2024E-VUVRAZ-103448 del 2024-10-18. CI-5056-23; CO-LP-006-23; CO-159-23; CO- LP-MSBV-008 -23. Colombia Rural. Municipios de Los Córdoba, Planeta Rica y San Bernardo del Viento. Departamento de Córdoba.

INGECON SAS	
RECIBIDO:	
Fecha: 22-11-24	Hora: 7:20
No. de folios: 4	
Firma: <i>lf</i>	
El recibido de este documento no implica su aceptación	

Referencia: Contrato de Interventoría No. 5053 de 2023 "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 1"

Respetada Ingeniera Angela María,

En atención a su comunicación CING-INV-5053-0353-24 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-103448 del 18 de octubre de 2024 mediante el cual la interventoría Consorcio INGECON remite de manera extemporánea los informes de estado ambiental No.1 correspondiente al periodo 01 de febrero al 30 de abril y No.2 correspondiente al periodo del 01 de mayo al 31 de julio de los siguientes contratos de obra:

Contrato de Obra No. LP-006 de 2023: "Mejoramiento en pavimento rígido de la vía Barranquillita localizada en el municipio de los Córdoba, departamento de Córdoba"

Contrato de Obra No. 159 de 2023: "Mejoramiento de la vía Planeta Rica -Providencia, en el departamento de Córdoba, en el marco del convenio 2286 de 2023, suscrito entre el municipio de Planeta Rica y el Instituto Nacional de Vías."

Contrato de Obra No. LP-MSBV-008 de 2023: "Mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en el municipio de San Bernardo del Viento departamento de Córdoba."

Por lo tanto, las observaciones se realizan sin perjuicio de las acciones que se hayan adelantado o se prevean de parte de la supervisión por el presunto incumplimiento dada la extemporaneidad de la presentación de la documentación sobre la gestión ambiental. Revisada la información, la Subdirección de Sostenibilidad se permite indicar que, en primer lugar, se asume plena responsabilidad de la información contenida teniendo en cuenta que lo anterior se encuentra previamente aprobado por Interventoría.

- Contrato de Obra No. LP-006 de 2023:

Informes de Estado Ambiental No. 1





recuerda a la interventoría que **toda la información del componente ambiental debe ser radicada de manera independiente del componente social según lo establecido en el Manual de Interventoría**. Dicho lo anterior, se deberán subsanar todas las observaciones realizadas anteriormente de manera prioritaria en un plazo no mayor a cinco días después de recibida esta comunicación.

La presente se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas a cada una de las partes, sin perjuicio de las acciones que desde la Supervisión de la Interventoría y la Junta de Acción Comunal se requiera realizar en el marco de su competencia, para lo cual se envía copia a Unidad Ejecutora y Dirección Territorial Córdoba.

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: NICOLAS RODRIGUEZ BARRAGAN

Revisado por:

Aprobado por:

Copia Interna a: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO (1000012), OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO (1120300)

Copia Externa a:



INVIAS
Jairo Fernando Aguado Umpa, SUBDIRECTOR DE
2024-11-21 11:06:10 6580 Documento Firmado
Organismo Emisor: e-Code del Párrafo 14 del

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Firma: 2024-11-21 11:06:10 6580
Jairo Fernando Aguado Umpa
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS SUBDIRECCION DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS



Fecha: 2024-11-21 11:09:21
 Radicado: 2024S-VBOG-087127
 Destino: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
 Anexos: 0

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-087127

Fecha: 2024-11-21 11:09:21

SEÑOR(A):
 ANGELA MARIA DAVILA MORALES
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO INGECON - INCO
 Calle 148No 7g-42
 consorcioingeconinco.inter@gmail.com
 BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

INGECON SAS	
RECIBIDO:	
Fecha: 22-11-24	Hora: 7:21
No. de folios: 3	
Firma:	
El recibido de este documento no implica su aceptación	

ASUNTO: Respuesta a entrada 2024E-VUVRAZ-107679 del 2024-10-28. CO-159-23; CI-5053-23. Colombia Rural - Municipio de Planeta Rica. Departamento de Córdoba.

Referencia: Contrato de Interventoría No. 5053 de 2023 "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 1"

Respetada Ingeniera Angela María,

En atención a su comunicación CING-INV-5053-0383-24 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-107679 del 28 de octubre de 2024 mediante el cual la interventoría remite el documento PAGA Versión No.3 del contrato de obra No. 159 de 2023 con objeto: "Mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica - Providencia, en el departamento de Córdoba, en el marco del convenio 2286 de 2023, suscrito entre el municipio de Planeta Rica y el Instituto Nacional de Vías". Por lo tanto, las observaciones se realizan sin perjuicio de las acciones que se hayan adelantado o se prevean de parte de la supervisión por el presunto incumplimiento dada la extemporaneidad de la presentación de la documentación sobre la gestión ambiental.

Revisada la información, la Subdirección de Sostenibilidad se permite indicar que:

En primer lugar, se evidencia incumplimiento en la entrega de los formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental del Proyecto, MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (N. 1) y el documento PAGA, debido a que no fueron presentados según los plazos contractuales y habiendo superado el 15% del tiempo total de ejecución del contrato de Obra, según lo establecido en el Manual de Interventoría. De igual forma se indica que a la fecha se encuentran pendientes los Informes de Estado Ambiental.

En cuanto al documento PAGA presentado, la complejidad del proyecto establecida no coincide con los criterios descritos en la guía de manejo ambiental del Instituto Nacional de Vías en su versión 2022, teniendo en cuenta que para este tipo de complejidad (media – baja) no se requiere de permisos de aprovechamiento forestal y en el documento que se indica que se llevara a cabo el respectivo trámite para el desarrollo del proyecto. Aunado lo anterior, la complejidad mencionada anteriormente indica que otro tipo de permisos serán tramitados por terceros y según lo reportado se realizó un trámite por permiso de ocupación de cauce. Por lo tanto, se sugiere revisar y ajustar si a ello hubiere lugar; de igual manera se solicita indicar el estado actual de los permisos de ocupación de cauce y de aprovechamiento forestal que fueron tramitados ante la autoridad ambiental para el desarrollo del proyecto.



No se evidencian los programas de seguimiento, control y monitoreo, los cuales se indican en el Volumen 5 de la Guía de Manejo Ambiental del Instituto en su Versión 2022. Se sugiere revisar y ajustar la información mínima exigida para la línea base de acuerdo con el tipo de complejidad, según lo establecido en la Guía de Manejo Ambiental. De igual manera, se recuerda a la interventoría que la información del componente ambiental sea radicada de manera independiente del componente social.

Por lo tanto, se solicita subsanar las observaciones anteriormente realizadas y remitir la información que se encuentra pendiente sobre el componente ambiental en un tiempo no mayor a cinco días después de recibida esta comunicación.

La presente se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas que le competen a esta Subdirección; sin perjuicio de las acciones que desde la supervisión de la Interventoría y Contratista se requiera realizar en el marco de su competencia, para lo cual se envía copia a Unidad ejecutora y Dirección territorial correspondiente para conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD


Proyectado por: NICOLAS RODRIGUEZ BARRAGAN

Revisado por:

Aprobado por:

Copia Interna a: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO (1000012), OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO (1120300)

Copia Externa a:



REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES


Fecha: 2024-11-21T11:00:00-0300
Junto Firmado Argentinio Uruguay
SUBDIRECCION DE BIENESTAR TURISTICO DE LOS ESTADOS UNIDOS
DOCUMENTO FIRMADO POR EL GOBIERNO DE URUGUAY EN EL CORREO DE LA PAZ VIRTUAL



Fecha: 2024-11-21 11:09:21
 Radicado: 2024S-VBOG-087127
 Destino: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
 Anexos: 0

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-087127

Fecha: 2024-11-21 11:09:21

SEÑOR(A):
 ANGELA MARIA DAVILA MORALES
 REPRESENTANTE LEGAL
 CONSORCIO INGECON - INCO
 Calle 148No 7g-42
 consorcioingeconinco.inter@gmail.com
 BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

INGECON SAS	
RECIBIDO:	
Fecha: 22-11-24	Hora: 7:21
No. de folios: 3	
Firma:	
El recibido de este documento no implica su aceptación	

ASUNTO: Respuesta a entrada 2024E-VUVRAZ-107679 del 2024-10-28. CO-159-23; CI-5053-23. Colombia Rural - Municipio de Planeta Rica. Departamento de Córdoba.

Referencia: Contrato de Interventoría No. 5053 de 2023 "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 1"

Respetada Ingeniera Angela María,

En atención a su comunicación CING-INV-5053-0383-24 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-107679 del 28 de octubre de 2024 mediante el cual la interventoría remite el documento PAGA Versión No.3 del contrato de obra No. 159 de 2023 con objeto: "Mejoramiento y mantenimiento de la vía Planeta Rica - Providencia, en el departamento de Córdoba, en el marco del convenio 2286 de 2023, suscrito entre el municipio de Planeta Rica y el Instituto Nacional de Vías". Por lo tanto, las observaciones se realizan sin perjuicio de las acciones que se hayan adelantado o se prevean de parte de la supervisión por el presunto incumplimiento dada la extemporaneidad de la presentación de la documentación sobre la gestión ambiental.

Revisada la información, la Subdirección de Sostenibilidad se permite indicar que:

En primer lugar, se evidencia incumplimiento en la entrega de los formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental del Proyecto, MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (N. 1) y el documento PAGA, debido a que no fueron presentados según los plazos contractuales y habiendo superado el 15% del tiempo total de ejecución del contrato de Obra, según lo establecido en el Manual de Interventoría. De igual forma se indica que a la fecha se encuentran pendientes los Informes de Estado Ambiental.

En cuanto al documento PAGA presentado, la complejidad del proyecto establecida no coincide con los criterios descritos en la guía de manejo ambiental del Instituto Nacional de Vías en su versión 2022, teniendo en cuenta que para este tipo de complejidad (media – baja) no se requiere de permisos de aprovechamiento forestal y en el documento que se indica que se llevara a cabo el respectivo trámite para el desarrollo del proyecto. Aunado lo anterior, la complejidad mencionada anteriormente indica que otro tipo de permisos serán tramitados por terceros y según lo reportado se realizó un trámite por permiso de ocupación de cauce. Por lo tanto, se sugiere revisar y ajustar si a ello hubiere lugar; de igual manera se solicita indicar el estado actual de los permisos de ocupación de cauce y de aprovechamiento forestal que fueron tramitados ante la autoridad ambiental para el desarrollo del proyecto.



No se evidencian los programas de seguimiento, control y monitoreo, los cuales se indican en el Volumen 5 de la Guía de Manejo Ambiental del Instituto en su Versión 2022. Se sugiere revisar y ajustar la información mínima exigida para la línea base de acuerdo con el tipo de complejidad, según lo establecido en la Guía de Manejo Ambiental. De igual manera, se recuerda a la interventoría que la información del componente ambiental sea radicada de manera independiente del componente social.

Por lo tanto, se solicita subsanar las observaciones anteriormente realizadas y remitir la información que se encuentra pendiente sobre el componente ambiental en un tiempo no mayor a cinco días después de recibida esta comunicación.

La presente se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas que le competen a esta Subdirección; sin perjuicio de las acciones que desde la supervisión de la Interventoría y Contratista se requiera realizar en el marco de su competencia, para lo cual se envía copia a Unidad ejecutora y Dirección territorial correspondiente para conocimiento y fines pertinentes.

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: NICOLAS RODRIGUEZ BARRAGAN

Revisado por:

Aprobado por:

Copia Interna a: ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO (1000012), OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO (1120300)

Copia Externa a:



REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES


Fecha: 2024-11-21T11:02:34-05:00
Junto Firmado Argento Uruguay
SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
110209 SUBDIRECCION DE BIENESTAR SOCIAL
INVIAS



Fecha: 2024-11-21 11:10:17
 Radicado: 2024S-VBOG-087128
 Destino: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
 Anexos: 0

Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-087128

Fecha: 2024-11-21 11:10:17

SEÑOR(A):

ANGELA MARIA DAVILA MORALES

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INGECON - INCO

CALLE 148 No. 7g 42

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

ASUNTO: Respuesta a entrada 2024E-VUVRAZ-107683 del 2024-10-28. CO-LP-MSBV-008-23; CI-5053-23. Colombia Rural - Municipio de San Bernardo del Viento. Departamento de Córdoba.

INGECON SAS	
RECIBIDO:	
Fecha: 22-11-24	Hora: 7:21
No. de folios: 3	
Firma:	
El recibido de este documento no implica su aceptación	

Referencia: Contrato de Interventoría No. 5053 de 2023 "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias en los municipios del departamento de Córdoba – Lote 1"

Respetada Ingeniera Angela María,

En atención a su comunicación CING-INV-5053-0381-24 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-107683 del 28 de octubre de 2024 mediante el cual la interventoría remite de manera extemporánea y fuera de todo termino contractual el PAGA Versión No. 4 del contrato de obra No. LP-MSBV-008 de 2023 con objeto: "Mejoramiento y mantenimiento de vías terciarias en el municipio de San Bernardo del Viento departamento de Córdoba". Por lo tanto, las observaciones se realizan sin perjuicio de las acciones que se hayan adelantado o se prevean de parte de la supervisión por el presunto incumplimiento dada la extemporaneidad de la presentación de la documentación sobre la gestión ambiental.

Revisada la información, esta subdirección se permite informar que:

Teniendo en cuenta la fecha de radicación del documento PAGA y el plazo para la terminación del contrato el cual venció el pasado 26 de octubre de 2024, se hace claridad que la Subdirección de Sostenibilidad no contó con los insumos suficientes para la revisión y seguimiento de la gestión ambiental durante las etapas de ejecución del proyecto. Por lo tanto, es importante resaltar que el documento PAGA debió vincularse como instrumento de verificación permanente para el contratista y de seguimiento por parte de la interventoría.

Se evidencia incumplimiento en la entrega de los formatos MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental del Proyecto, MASPS-MN1-IN-1-FR-2 Plan de Inversión Ambiental (N. 1) y el documento PAGA, debido a que no fueron presentados según los plazos contractuales y habiendo superado el 15% del tiempo total de ejecución del contrato de Obra, según lo establecido en el Manual de Interventoría.

A la fecha se encuentra pendiente la entrega del Balance Ambiental a la terminación del contrato. Se recuerda a la interventoría que toda la información radicada deberá cumplir con los lineamientos mínimos establecidos en el Manual de Interventoría de Obra Pública. De igual manera, se solicita que la información sobre la gestión inicial del componente ambiental sea radicada de manera independiente del componente social.



En cuanto al Documento PAGA, no se evidencian los programas de seguimiento, control y monitoreo, los cuales se indican en el Volumen 5 de la Guía de Manejo Ambiental del Instituto en su Versión 2022. Por otra parte, la complejidad del proyecto establecida no coincide con los criterios descritos en la guía, teniendo en cuenta que para este tipo de complejidad (media – baja) no se requiere de permisos de aprovechamiento forestal e instalación de campamentos, lo cual se indica en el documento que se llevara cabo para el desarrollo del proyecto. Aunado lo anterior, la complejidad mencionada anteriormente indica que para otro tipo de permisos serán tramitados por terceros y según lo reportado se realizó un trámite por permiso de ocupación de cauce. Por lo tanto, se sugiere revisar y ajustar si a ello hubiere lugar.

En el formato *MASPS-MN1-IN-1-FR-1 Formato de Radicación y Actualización Ambiental del Proyecto*, se solicita diligenciar la información del numeral 2.7.1. Sitios de disposición final de sobrantes de obra y numeral 2.7.4.1. Captación. De igual manera, según la información evidenciada, se solicitar indicar el estado actual de los permisos de ocupación de cauce y de aprovechamiento forestal que fueron tramitados para el desarrollo del proyecto. No se evidencia soporte de suministro de agua. Asimismo, se solicita dar claridad sobre la competencia del profesional designado por parte del contratista para el componente ambiental, teniendo en cuenta que el numeral 2.1 corresponde al personal Ambiental y se registra un Ingeniero Industrial.

Por lo tanto, se solicita subsanar las observaciones anteriormente realizadas y remitir la información que se encuentra pendiente sobre el componente ambiental en un tiempo no mayor a cinco días después de recibida esta comunicación.

La presente se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas a cada una de las partes, sin perjuicio de las acciones que desde la Supervisión de la Interventoría y la Junta de Acción Comunal se requiera realizar en el marco de su competencia, para lo cual se envía copia a Unidad Ejecutora y Dirección Territorial Córdoba.

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: NICOLAS RODRIGUEZ BARRAGAN

Revisado por:

Aprobado por:

Copia Interna a: OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO (1120300), ELLEN OBEIMAR AICARDY GALEANO (1000012)

Copia Externa a:



INVIAS
Instituto Nacional de Vigilancia de Alimentos
y Medicamentos
Departamento Especial de Control de Alimentos

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Fecha: 2024-11-27T11:50:20-0500
Firma: [Firma Digital]
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD
INVIAS

CONSORCIO PROVIDENCIA

NIT. 901.764.629 - 9

Planeta Rica, Córdoba. 25 de noviembre de 2024.

OFI-CONS-128-2024

Señor(es):

CONSORCIO INGECON - INCO

ANGELA MARIA DAVILA MORALES

Representante Legal

Calle 148 N° 7G - 42. Barrio Cedro Golf.

Bogotá - Colombia.

REFERENCIA: CONTRATO DE OBRA No. 159-2023 OBJETO: "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA PLANETA RICA - PROVIDENCIA, EN EL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA, EN EL MARCO DEL CONVENIO 2286 DE 2023, SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE PLANETA RICA Y EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS.


ASUNTO: PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPOP N° 4.

Estimados Señores:

Mediante la presente me dirijo a usted en calidad de representante legal del CONSORCIO PROVIDENCIA, con el propósito de remitir la siguiente documentación, para su estudio y posterior aprobación.

❖ Plan de Inversión del anticipo N°4.

Atentamente.


EMIRO CARLOS BARGUIL CUBILLOS
C.C. N° 78.034.207 de Cereté, Córdoba.
CONSORCIO PROVIDENCIA
NIT. 901.764.629 - 9
obraprovidencial@gmail.com

		INGECON SAS	
		RECIBIDO:	
Fecha:	26-11-24	Hora:	3:17
No. de folios:	1		
Firma:			
El recibido de este documento no implica su aceptación			

DIRECCIÓN: CALLE 9 N° 7B - 27. BARRIO LOS ANGELES.
E-MAIL: obraprovidencial@gmail.com
TELÉFONO: 3104057905 - 3234029274
PLANETA RICA, CÓRDOBA

CONSORCIO PAVIMENTO
VIA BARRANQUILLITA

Calle 100 No. 100-100 Barranquillita

Montería, 25 de Noviembre de 2024

Señores

COBO 085-24

CONSORCIO INGECON-INCO

Ciudad.

Referencia: Contrato de obra No. LP-006 de 2023, cuyo objeto es: "MEJORAMIENTO EN PAVIMENTO RIGIDO DE LA VIA BARRANQUILLITA LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE LOS CORDOBAS, DEPARTAMENTO DE CORDOBA".

Asunto: AJUSTES INFORME SST PERIODO AGOSTO Y OCTUBRE DE 2024.

Respetada Ingeniera

Teniendo en cuenta comunicación de Numero de Fecha, el contratista de obra CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA, se permite hacer entrega de los ajustes del componente SST solicitados mediante Oficio CING-INV-5053-0425-24 del 19 de Noviembre de 2024.

Quedando atentos a cualquier comentario,


Cordialmente,

CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA
Rpr. Legal CESAR AUGUSTO RIOS GONZALEZ
CONTRATISTA

INGECON-INC	
R. C. 00000000000000000000	
Fecha	26-11-24 13:19
Plazo de validez	
Firma	
Código de verificación: 11111111111111111111	



Fecha: 2024-11-26 16:25:47
 Radicado: 2024S-VBOG-088906
 Destino: ANGELA MARIA DAVILA MORALES
 Anexo: 0



Al contestar cite este radicado: 2024S-VBOG-088906

Fecha: 2024-11-26 16:25:47

INGENIERA

ANGELA MARIA DAVILA MORALES

REPRESENTANTE LEGAL

CONSORCIO INGECON - INCO

CALLE 148 No. 7g 42

consorcioingeconinco.inter@gmail.com

BOGOTÁ, D.C., BOGOTA

INGECON SAS	
RECIBIDO:	
Fecha: 27-11-24	Hora: 7:13
No. de folios: 4	
Firma: <i>[Signature]</i>	
El recibido de este documento no implica su recepción	

ASUNTO: Respuesta a entrada 2024E-VUVRAZ-112076 del 2024-11-07. CI-1649-21; CO-LP-003-21; CO-LP-002-21; CO-1025-21. Colombia Rural; Municipio de Briceño, Valdivia y Toledo. Departamento de Antioquia.

Referencia: Contrato de Interventoría No.1649 de 2021: "Interventoría técnica, administrativa, financiera y ambiental para el mantenimiento y mejoramiento de vías terciarias del programa "Colombia Rural" en los municipios del departamento de Antioquia - Grupo 3"

Respetada Ingeniera Angela María,


En atención a su comunicación ING-INV-1649-0033-24 con radicado INVIAS 2024E-VUVRAZ-112076 del 07 de noviembre de 2024 mediante el cual la interventoría *Ingeniería y Consultoría INGECON S.A.S* remite de manera extemporánea y fuera de termino contractual el Balance Ambiental de los siguientes contratos:

Contrato de Obra No. LP-003-2021: "Mantenimiento y mejoramiento de las vías terciarias en el municipio de Valdivia en el departamento de Antioquia en el marco del convenio interadministrativo 2022 de 2020 suscrito entre el municipio de Valdivia y el Instituto Nacional de Vías - INVIAS, del programa Colombia Rural"

Contrato de Obra No. LP-002-2021: "Mejoramiento de vías rurales (Corregimiento Las Auras, Vereda El Robal) en el municipio de Briceño, departamento de Antioquia, del programa "Colombia Rural" en el marco del convenio interadministrativo Convenio No. 2140-2020, firmado con el Instituto Nacional de Vías y el municipio de Briceño"

Contrato de Obra No. 1025-2021: "Mejoramiento y mantenimiento a todo costo de la vía terciaria que conduce a la vereda Helechales del municipio de Toledo, Antioquia, en el marco del convenio No. 1732 de 2020, suscrito entre el Instituto Nacional de Vías - INVIAS y el municipio de Toledo, Antioquia"

Teniendo en cuenta los plazos establecidos para la terminación de cada uno de los contratos y la fecha en la cual se realizó la presentación de la información, las observaciones se realizan sin perjuicio de las acciones que se hayan adelantado o se prevean de parte de la supervisión por el presunto incumplimiento dada la extemporaneidad en la entrega de la




documentación sobre la gestión ambiental. Una vez revisada la información, la Subdirección de Sostenibilidad se permite informar que:

1. El Balance Ambiental a la terminación de cada uno de los contratos de obra citados en el asunto, NO cumple con los lineamientos mínimos exigidos por el Manual de Interventoría, teniendo en cuenta que únicamente se evidencia el formato: *MASPS-MN1-IN-2-FR-1: Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra*. Por lo tanto, se recuerda a la interventoría que el Manual cuenta con el instructivo *MASPS-MN1-IN-2 Balance Ambiental*, en el que se indica detalladamente el procedimiento para la entrega de la información y cada uno de los parámetros que deben ser tenidos en cuenta en el diligenciamiento de los formatos y la remisión de todos los anexos que son exigidos por el Instituto.
2. El formato *MASPS-MN1-IN-2-FR-1: Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra* de los municipios de Toledo y Valdivia, no cuenta con las respectivas firmas, por lo cual se hace claridad que todo formato en el que se evidencie la ausencia de las firmas en los espacios destinados para cada uno de los profesionales se considera como NO válido.

Es importante para la entrega del balance, que toda la información que exige cada uno de los formatos sea diligenciado correctamente, lo anterior, basados en que el formato remitido no cuenta con la información suficiente sobre cada uno de los numerales dispuestos en el mismo.

3. De igual manera, revisada la carpeta de seguimiento a la gestión ambiental del contrato, se evidencia que se encuentra pendiente la remisión de la documentación ambiental inicial es decir documento PAGA de los contratos y de seguimiento para cada uno de los proyectos, es decir informes trimestrales ambientales. En caso de haberse realizado la presentación de la información, se solicita de manera atenta, remitir la trazabilidad (fecha y número de radicado) de la gestión realizada ante la entidad.
4. De otra parte, toda la información que se reporte tanto el formato *MASPS-MN1-IN-2-FR-1: Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra* como en los demás formatos, deberá contar con el concepto expreso por parte de la interventoría, en el espacio designado de cada uno de los numerales.

Es importante tener en cuenta que, se evidencia incumplimiento al Manual de Interventoría de Obra Pública del Instituto y por ende al seguimiento y control a la gestión ambiental, incumpliendo el principio de responsabilidad de acuerdo a los contemplados en el artículo No. 23 de la Ley 80 de 1993 y la cláusula décimo séptima del contrato 1649 de 2021 la cual establece: "El interventor dará cumplimiento a las obligaciones ambientales contenidas en el manual de interventoría y en los apéndices del pliego de condiciones del contrato de obra objeto de la presente interventoría".



Dicho lo anterior, se requiere que la información sea remitida a la Subdirección de Sostenibilidad en un tiempo no mayor a cinco (5) días después de recibida esta comunicación.

La presente se manifiesta en ejercicio de las funciones establecidas en el Manual de Interventoría, Manual de Contratación y las demás actividades delegadas a cada una de las partes, sin perjuicio de las acciones que desde la Supervisión de la Interventoría y Contratista se requiera realizar en el marco de su competencia, para lo cual se envía copia a Unidad Ejecutora y Dirección Territorial de Antioquia.

Cordialmente,

JAIRO FERNANDO ARGUELLO URREGO
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD

Proyectado por: NICOLAS RODRIGUEZ BARRAGAN

Revisado por:

Aprobado por:

Copia Interna a: MAURICIO HOYOS SIERRA (1000002), OSCAR RODOLFO ACEVEDO CASTRO (1120300)

Copia Externa a:



Juan Fernando Aguado Ureaga SUBDIRECTOR DE
2024-11-20T14:25:00-05:00 Documento Firmado
Elaborado: Oficina de Control OIR Peru Valiente

REGISTRO DE FIRMAS DIGITALES

Fecha: 2024-11-20T14:25:00-05:00
Para: Juan Fernando Aguado Ureaga
SUBDIRECTOR DE SOSTENIBILIDAD
EN1050 SUBDIRECCIÓN DE SOSTENIBILIDAD
BVALE



28-11-24. 34239

Copia No Controlada

Montería, 27 de noviembre de 2024

096-2024

Señores

CONSORCIO INGECON – INCO P

Atn. Ing. ÁNGELA MARIA DÁVILA MORALES

Representante Legal

Referencia: CONTRATO DE OBRA No. LP-MSBV-008-2023 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS TERCARIAS EN EL MUNICIPIO DE SAN BERNARDO DEL VIENTO DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA"

Asunto: Actas Parcial de Obra No 1; Acta Parcial de Obra No 2; y Acta Parcial de Obra No 3

Cordial saludo,

Por medio de la presente le remitimos las actas del asunto para su revisión y sus comentarios a que den a lugar.

En caso de ser aprobadas procederemos a imprimirlas, firmas y radicación.

Quedamos atento a sus observaciones

Atentamente,

Ing. WILLIAM URZOLA VISBAL

Director de obra

CONSORCIO L&S

c.c. Arq. David José Rojas Muñoz – Secretario de Infraestructura del municipio de San Bernardo del Viento.

Anexos:

- Acta Parcial de Obra No 1. PDF. 30.406KB
- Acta Parcial de Obra No 2. PDF. 30.419KB
- Acta Parcial de Obra No 3. PDF. 31.032KB

		INGECON SAS	
RECIBIDO:			
Fecha: 28-11-24		Hora: 8:21	
No. de folios: ↓			
Firma: 			
El recibido de este documento no implica su aceptación			

Email: consorciolys24@gmail.com Teléfono: 300 542 9589 Dirección: Cra 6 N° 62B – 32 Of 310

Formato Entrega de Dotacion y E.P.P v2.xlsx

INGECON S.A.S

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	92

8.2 REGISTRO FOTOGRÁFICO.

CONSORCIO PROVIDENCIA – CONTRATO DE OBRA No. 159-2023.

<p>Foto 1. Construcción de Bermacunetas premezclado. Abscisa K0+310.</p> 	<p>Foto 1. Construcción de Bermacunetas premezclado. Abscisa K0+230.</p> 
<p>Foto 3. Construcción de Bermacunetas premezclado. Abscisa K0+140.</p> 	<p>Foto 4. Instalación de acero de refuerzo y construcción de pavimento rígido MR38 premezclado. Abscisa K1+850.</p> 

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	93

<p>Foto 5. Suministro, extendida y compactación de subbase granular. Abscisa K1+780.</p> 	<p>Foto 6. Suministro, extendida y compactación de subbase granular. Abscisa K1+870.</p> 
<p>Foto 7. Suministro, extendida y compactación de subbase granular. Abscisa K1+900.</p> 	<p>Foto 8. Suministro, extendida y compactación de subbase granular. Abscisa K2+100.</p> 

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VÍAS Terciarias en los Municipios del Departamento de Córdoba – Lote 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	94

CONSORCIO PAVIMENTO VIA BARRANQUILLITA – CTO No. LP-006-2023

<p>Foto 9. Colocación de rieles para cunetas lado izquierdo</p> 	<p>Foto 10. Colocación de rieles para cunetas lado izquierdo</p> 
<p>Foto 11. Instalación de rieles y acero para cunetas lado izquierdo de la Abs K1+883 - K0+933</p> 	<p>Foto 12. Fundida de concreto de 3000 psi para cunetas lado izquierdo de la Abs K1+883 - K0+933</p> 

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	95

Foto 13. Aseo de losas de pavimento	Foto 14. Riego de antisol
	
Foto 15. Fundida de concreto MR 38 para losas de pavimento de la Abs K2+000,6 -K1+240.6 carril izquierdo	Foto 16. Toma de muestras de concreto MR 38
	

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	96

CONSORCIO L&S – CONTRATO DE OBRA No. LP-MBSV-008-2023

<p>Foto 17. Vista general extensión sub base – abscisa k0+075 a k0+000.</p> 	<p>Foto 18. Avance excavación – abscisa k0+450</p> 
<p>Foto 19 Vista general sub base instalada – abscisa k0+075.</p> 	<p>Foto 20. Nivelación de sub base – abscisas k0+000 a k0+010.</p> 

	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS Terciarias EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	97

Foto 21. Caída de árbol por fuertes lluvias – en la abscisa k0+360



Foto 22. Retiro de rieles – entre abscisas k0+105 a k0+075.



Foto 23. Vista general del proyecto.



Foto 24. Compactación sub base – entre abscisas k0+075 a k0+000.



	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LAS VIAS TERCARIAS EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DE CÓRDOBA – LOTE 1”. INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No.10 PERIODO: 01 AL 30 DE NOVIEMBRE 2024	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	98

8.3 BITACORA DE OBRA.

* 01 de Noviembre 2024


Estado del tiempo: llovias a partir 3:00 am a 10:00 am y de 6:00 pm a 8:00 pm.

No se realizan actividades en obra por las llovias presentadas, debido a que el terreno se encuentra muy saturado.

Se mantiene señalización en obra.

Se utilizan paleteros para controlar trafico de Vehiculos circulan por los tramos en intervencion.


Director obra


Residente Interventoria
Vicente Urzola B.

* 02 de Noviembre 2024

Estado del tiempo: llovias a partir de 3:00 am a 7:00 am.

No se realizaron actividades en obra por las llovias presentadas, debido a que el terreno se encuentra muy saturado.

Se mantiene señalización en obra.

Se utilizan paleteros para controlar trafico que de los Vehiculos que circulan por los tramos en intervencion.


Director obra


Residente Interventoria
Vicente Urzola B.

* 03 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Lluvias a partir de 2:00 am a 6:00 am.

No se realizan actividades en obra (Domingo).


Director de


Residente Interventoría
Vicente Urdola B.

* 04 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Lluvias a partir 4:00 am a 7:00 am.

No se realizan actividades en obra (festivo).


Director obra


Residente Interventoría
Vicente Urdola B.

* 05 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Seco.

Se mantiene Señalización preventiva en obra.

Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.

Se realiza adecuación de subbase granular para bermas/acuerdas.

Se realiza instalación de rieles entre las abscisas K1726 a K1850 Camil izquierdo.


Director obra


Residente Interventoría
Vicente Urdola B.

* 6 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Lluvias aparte de 9:00 am a 10:00 am y desde 3:00 pm a 4:00 pm.

Se mantiene señalización en obra.

Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los Vehículos que circulan por los tramos en intervención.

Se realiza fundición de pavimento rígido M238 premezclado entre las abscisas Kt 766 a Kt 850 Carril izquierdo.

Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.

Se realiza adecuación de terreno para bermas nuevas.

Se realiza suministro, extendida y compactación de subbase granular entre las abscisas Kt 880 a Kt 960.

Se realiza instalación de rieles entre las abscisas Kt 850 a Kt 880. Carril izquierdo



Director Obra



Residente Interventoria
Vicente Urzola B.

* 07 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Nublado.

Se mantiene señalización preventiva en obra.

Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los Vehículos que circulan por los tramos en intervención.

Se realiza instalación de rieles entre las abscisas Kt 880 a Kt 952 Carril izquierdo.

Se realiza toma de densidades in situ.

Para Verificar Compactación del terreno

Se realiza fundición de pavimento rígido

MR38 entre las abscisas Kt850 a Kt952 Camil izquierdo.

Se realiza instalación de rieles entre las abscisas Kt661.6 a Kt667.6 Camil izquierdo.

Se realiza fundida de pavimento rígido MR38 premezclado entre las abscisas Kt661.6 a Kt667.6 Camil izquierdo.

Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.



Director de obra



Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 08 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Lluvias a partir 1:00 pm a 4:00 pm.

Se mantiene señalización preventiva en obra
Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.

Se realiza fundida de 170ml de bermocuentas.

Se realiza acopio de materiales granulados.

Se realiza figuración de acero de refuerzo para bermocuentas.

Se realiza Jornada de aseo y limpieza general en la obra.



Director de obra



Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 09 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Lluvias a partir 4:00 am a 8:00 am.

Se mantiene señalización preventiva en obra. Se utilizan paleteros para controlar tráfico de vehículos que circulan por los tramos en intervención.

Se realiza adecuación de terreno -subb se graval para bermas nuevas.

Se realiza figuración y armado de cuerdas de refuerzo para bermas nuevas.

[Signature]

Director de obra

[Signature]

Residente Interventoría.
Vicente Urgola B.

* 10 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Lluvias a partir de 5:00 pm a 9:00 pm.

No se realizan actividades en obra (Domingo).

[Signature]

Director de obra

[Signature]

Residente Interventoría
Vicente Urgola B.

* 11 de noviembre 2024.

Estado del tiempo: Lluvias a partir 4:00 am a 8:00 am.

No se realizan actividades en obra (festivo).

[Signature]

Director de obra

[Signature]

Residente Interventoría
Vicente Urgola B.

* 12 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Nublado.

Se mantiene señalización preventiva en obra.

Se utilizan paletas para controlar tráfico de vehículos que circulan por los tramos en intervención.

Se realiza fricción de 80 ml de bermacuetas en el carril izquierdo.

Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.


Director


Residente Interventora
Vicente Urgola B.

* 13 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Sol.

Se mantiene señalización preventiva en obra.

Se utilizan paletas para controlar el tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.

Se realiza suministro, extendida y Compactación de afirmado entre las abscisas K2+000 a K2+500 Segunda Capa.

Se realiza adición de Subbase granular para bermacuetas.

Se realiza figuración y armado de acero de refuerzo para bermacuetas.

Se realiza suministro, extendida y Compactación de Subbase entre las abscisas K2+960 a K2+060.

Se toman densidades in situ para verificar Compactación de terreno.

Se realiza acopio de materiales granulares.

de a firmado y Subbase granular.
Se realiza instalación de rieles entre las abscisas
Kt952 a Kt2054. Carril izquierdo.


Director


Residente Interventora
Vicente Urzola B.

* 14 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Seco.

Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para controlar tráfico
de vehículos que circulan por los tramos
en intervención.

Se realiza fundida de pavimento rígido ME38
premezclando entre las abscisas Kt952 a
Kt2054 carril izquierdo.


Se toman muestras de Concreto para ensayos
de resistencia.


Se realiza fundida de 130 ml. de bermas en
vías Lado izquierdo.

Se realiza adecuación de Subbase granular
e instalación de rieles entre las abscisas
Kt2054 a Kt186 Carril derecho.

Se habilita tránsito por el Carril izquierdo
con el fin de avanzar en la construcción
del pavimento por el Carril derecho.

Se realiza Gunitado, extendida y compac-
tación de Subbase granular entre las abs-
cisas Kt2000 a Kt2200.


Director


Residente Interventora
Vicente Urzola B.

{ { { { {

* 15 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Seco.

Se mantiene señalización preventiva en obra.

Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.

Se realiza fundida pavimento rígido MR38 premezclado entre las abscisas K+084 a K+182 Camil derecho.

Se realiza fundida de Cunetas 110 cm lado izquierdo.

Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.

Se toman densidades in situ para verificar Compactación de terreno.

Se realiza adecuación de Subbase granular e instalación de rieles entre las abscisas K+186 a K+250 Camil derecho.

Se realiza adecuación de Subbase granular e instalación de rieles para bermas cunetas.

DPH

Director Obra

Residente Interventoría.
Vicente Urzola B.

* 16 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Seco.

Se mantiene señalización preventiva en obra.

Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.

Se realiza fundida de 110 cm de bermas cunetas.

Se realiza figuración y armado de acero de refuerzo para bermas cunetas.

Se toman muestras de Concreto para en-

Gayos de resistencia.
Se realiza adecuación de Subbase granular e instalación de rieles entre las abscisas K+250 a K+286 Camil derecho.

MRH
Director de

Vinyf.
Residente Interventoria
Vicente Urzola B.

* 17 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Lluvias a partir 8:00 am a 11:00 am.

No se realizan actividades en obra (Domingo)

MRH
Director de

Vinyf.
Residente Interventoria
Vicente Urzola B.

* 18 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Lluvias a partir 2:30pm a 2:30pm

Se mantiene Señalización preventiva en obra.

Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los Vehículos que Circulan por los tramos en intervención.

Se realiza adecuación y Compactación de Subbase granular e instalación de rieles entre las abscisas K+286 a K+378 Camil derecho.

Se realiza fundida de pavimento rígido ME38 premezclado entre las abscisas K+182 a K+378 Camil derecha

Se toman muestras de concreto para ensayos

de resistencia.

Se realiza adecuación y compactación de subbase granular para bermasuetas.

Se realiza fijación y armado de acero de refuerzo para bermasuetas.



Director obra



Residente Interventoría.
Vicente Urzola B.

* 19 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Seco.

Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para controlar tráfico de vehículos que circulan por los flancos en intervención.

Se realiza fundida de bermasuetas 145m.
Se realiza adecuación y recompactación de subbase granular entre las abscisas K+378 a K+580 Carril derecho.

Se realiza fundida de pavimento rígido MR30 premezclado entre las abscisas K+378 a K+564 Carril derecho.

Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.

Se continúa con la adecuación de subbase granular e instalación de rieles entre las abscisas K+580 a K+764 Carril derecho.



Director obra



Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 20 de noviembre 2024

Estado del tiempo: seco.

Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan en los tramos en intervención.

Se realiza adecuación de Subbase granular para bermasuetas.

Se utilizan figuración y armado de acero de refuerzo para bermasuetas.

Se realiza acoplo de materiales granulares.

Se realiza fundida de pavimento rígido MK38 entre las abscisas K+564 a K+768.

Carril derecho - premezclado.

Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.

JPH

Director obra



Residente Interventoría
Vicente Urzola B.

* 21 de noviembre 2024

Estado del tiempo: seco.

Se mantiene señalización preventiva en obra.

Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.

Se realiza adecuación de Subbase granular e instalación de rieles Carril derecho entre las abscisas K+768 a K+960.

Se realiza fundida de pavimento rígido MK38 premezclado entre las abscisas K+768 a K+960 Carril derecho.

Se realiza fundida de bermasuetas 136 cm Lado izquierdo.

Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.

Se realiza adecuación de subbase granular e instalación de rieles entre las abscisas K+960 a K+152 Carril derecho.

Se realiza figuración de acero de refuerzo para bermasnetas.

Se realiza suministro, extendida y compactación de subbase granular entre las abscisas K+200 a K+300.

UDH

Director obra



Residente Interventoria
Vicente Orzola B.

* 22 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Serio. Lluvias de 6:00pm a 7:00pm

Se mantiene señalización preventiva en obra.

Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.

Se realiza fundida de pavimento rígido MC38 premezclado entre las abscisas K+960 a K+152 Carril derecho.

Se toman muestras de Concreto para ensayos de resistencia.

Se realiza adecuación de subbase granular para bermasnetas.


Se realiza figuración de acero de refuerzo para bermasnetas.

Se realiza suministro, extendida y compactación de subbase granular entre las abscisas K+300 a K+400 Calzada Completa.

Se realiza acopio de materiales granulares.

Se realiza adecuación de subbase granular e instalación de rieles entre las abscisas K+152 a K+352 Carril derecho.


Director obra



Residente Interventoria
Vicente Orgola B.

* 23 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Sec. Lluvias 5:00 pm a 8:00 pm.

Se mantiene Señalización preventiva en obra.

Se utilizan palteros para controlar tráfico de vehículos que circulan por los tramos en intervención.

Se realiza fundida de pavimento rígido MK38 primizado entre las abscisas K+152 a K+266 Carril derecho.

Se realiza fundida de 160 ml Bermas curuetas lado izquierdo.

Se realiza adecuación de subbase granular para bermas curuetas.

Se realiza fijación de acero de refuerzo para bermas curuetas.


Director obra



Residente Interventoria
Vicente Orgola B.

* 24 de noviembre 2024

Estado del tiempo: llovias a partir 1:00 am a 3:00 am.

No se realizan actividades en obra (Domingo).


Director obra


Residente Interventoría
Vicente Uzgola B.

* 25 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Seco.

Se mantiene señalización preventiva en obra.

Se utilizan paleteros para controlar tráfico de vehículos que circulan por los tramos en intervención.


Se realiza fundida de pavimento rígido MC38 premezclado entre las abscisas Kt+266 a Kt+350.

Se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia.


Se realiza adecuación de subbase granular e instalación de rieles entre las abscisas Kt+352 a Kt+562 Carril derecho.

Se realiza adecuación de subbase granular entre las bermas laterales.

Se realiza figuración de acero de refuerzo para bermas laterales.


Director obra


Residente Interventoría
Vicente Uzgola B.



* 26 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Gero.

Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para controlar tráfico de vehículos que circulan por los tramos en intervención.

Se realiza fundida de pavimento rígido MR38 premezclado entre las abscisas K+350 a K+551. Carril derecho.

Se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia.

Se realiza fundida de 160 ml de bermasuetas por el lado izquierdo.

Se realiza figuración de acero de refuerzo para bermasuetas.



Director Obra



Residente Interventoría
Vicente Urgola B.

* 27 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Gero.

Se mantiene señalización preventiva en obra.

Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.

Se realiza sello de juntas de dilatación a lo largo del tramo de pavimento rígido construido.

Se realiza instalación de rieles entre las abscisas K+054 a K+204 Carril izquierdo.

Se realiza adecuación de subbase granular para bermasuetas.

Se realiza figuración de acero de refuerzo para bermasuetas.

Se realiza adewación de subbase granular e instalación de rieles entre las abscisas Kt+551 a Kt+733.2 Carril derecho.


Directo obra


Residente Interventoria
Vicente Urgola B.

* 28 de Noviembre 2024

Estado del tiempo: Sin lluvias 1:00pm a 3:00pm.

Se mantiene señalización preventiva en obra.

Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.

Se realiza fundida de pavimento rígido M438 premezclado entre las abscisas Kt+544 a Kt+704 Carril izquierdo.

Se realiza toma de muestras de Concreto para ensayos de resistencia.

Se realiza adewación de subbase granular para bermocunetas.

Se realiza figuración de acero de refuerzo

Se realiza suministro, extendida y compactación de afirmado entre las abscisas Kt+500 a Kt+700 Calzada Completa.

Se realiza fundida 160ml de bermocunetas.


Directo obra


Residente Interventoria
Vicente Urgola B.

* 29 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Lluvias 2:00pm a 6:00pm.
Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.

Se realiza fundida de pavimento rígido MK38 premezclado entre las abscisas Kt551 a Kt692 Carril derecho.

Se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia.

Se realiza adecuación de subbase granular e instalación de rieles entre las abscisas Kt204 a Kt324 Carril izquierdo.

[Signature]

Director obra

[Signature]

Residente Interventor
Vicente Urcola B.

* 30 de noviembre 2024

Estado del tiempo: Seco.

Se mantiene señalización preventiva en obra.
Se utilizan paleteros para controlar tráfico de los vehículos que circulan por los tramos en intervención.

Se realiza fundida pavimento rígido MK38 premezclado entre las abscisas Kt692 a Kt733.2 Carril derecho.

Se realiza fundida pavimento rígido MK38 premezclado entre las abscisas Kt204 a Kt276 Carril izquierdo.

Se realiza fundida de T60 ml de Bermeas.

se toman muestras de concreto para ensayos de resistencia.



Director obra.



Residente Interventor
Vicente Vizola B.

- Se continúa con la extensión de afirmado según la observación del topógrafo de la interventora entre la Abscisa $K0+500 - K0+465$.
- Se realiza colocación de rieles para cunetas lado izquierdo con topografía.
- Se realiza fundida de concreto MR 38 para lasas de pavimento de la Abscisa $K2+070,6 - K2+000,6$ carril izquierdo. (70 ml)
- Se realiza Toma de muestras de concreto MR 38.
- Se funde guarda revedas del Box $K1+720$.


Cesar Rios
Rep. legal - Contratista.


Mónica Barrocal A
Residente de Interventoría

- Viernes, 07 de noviembre de 2024

• Estado del tiempo: lluvia moderado desde las 6:10 Am — 7:10 am

• Maquinario y equipos:

- buldozer (1) - WYJ-425 (A) - Rana (A)

- Vibro compactador (1) - ZIA - 946 (A) - Cortador (1)

- Mini cargador (A) - WWA - 126 (A) - Vibro de aguja (A)

- Mixer (A) - KFB - 692 (A) - Vibro de reglo (1)


• Se realiza colocación de rieles para cunetas lado izquierdo

• Se coloca parrillo de Acero para cunetas lado izquierdo

• Se realizó Adecuación de terreno con la Rana para cunetas.

• Se realizó fundido de concreto de 3000 psi para cunetas desde la Abscisa $K1+883 - K1+723$ lado izquierdo. (160ml).


• Se toma Muestro de concreto de 3000 psi.





Cesar Arios

Rep. ICGOL - Contratista



Mónica Berrocal

Accidente de Interventoría

- Sábado 02 de Noviembre 2024

• estado del tiempo: soleado

• Maquinaria y equipo

- bulldozer (1) - WYJ-425 (A) - Rana (A)

- vibro compactador (1) - ZIA-946 (A) - Cortadora (1)


- mini cargador (A) - WWA-126 (A) - vibro de Aguja (A)

- Mixer (A) - KPB-692 (A) - vibro de Rgb (A)

• Se realiza fundido de concreto MR 38 para losos de pavimento carril izquierdo de las ABSCISA K2+600,6 - K2+930,6 (70ml).


• Se realiza toma de muestra de concreto MR 38

• Se realiza corte junto de losos de pavimento.



Cesar Arios

Rep. ICGOL - Contratista



Mónica Berrocal A.

Accidente de Interventoría

- Domingo 03 de Noviembre de 2024

• estado del tiempo: soleado

• Sin Actividad por ser día feriado




Cesar Arios

Rep. ICGOL - Contratista



Mónica Berrocal A.

Accidente de Interventoría




- Lunes 04 de noviembre 2024 (Festivo)
- estado del tiempo: Soleado
- Sin Actividad por día festivo



Cesar Rios

Rep. Legal - Contratista



Mónica Berracol A.

Residente de Interventoría

(A) Martes 05 - de noviembre 2024

- (1) • estado del tiempo: Soleado


(A) • se suministra, extiende y compacta capa de Apimado desde la Abscisa K+400 - K+360

- se Realizo Comité en obra con la participación de la secretaria de planeación, Contratista e Interventoría con el fin de Hacer seguimiento a Actividades y Compromiso pactados.

- se continuó con la colocación de rieles para cuneta lado izquierdo


- se Realizo fundido de concreto MR 38 para base de pavimento K+830.6 - K+847 Carril izquierdo (83.6 mL)

- se Realizo toma de muestra de concreto MR 38



Cesar Rios

Rep. Legal - Contratista



Mónica Berracol A.

Residente de Interventoría

- Miércoles, 06 de noviembre de 2024.


- Estado del tiempo: Soleado

- Se inicia con la instalación de formaleter para completar cuneta lado izquierdo. (bordillo)


- Se realiza colocación de rieles para cunetas en la Abscisa K+455.1 - K+422.9 lado derecho.

- Se suministra, extiende y compacta material de subbase Granular de la Abscisa K+490 - K+880

- Se realiza la colocación de parrillas de acero para cunetas lado izquierdo.
- Se realiza fundida de concreto MR 38 para losas de pavimento de la Abscisa K1+847 - K1+797 carril izquierdo (50ml)
- Se toma muestras de concreto MR 38.
- Se realiza fundida de concreto de 3000 PSI para cunetas lado izquierdo de la Abscisa K1+723 - K1+710 (22,5 ml)
- Se toma muestras de concreto de 3000 PSI.
- Se realiza fundida de concreto de 3000 PSI para cunetas lado izquierdo de la Abscisa K1+704,55 - K1+656,5 (58 ml).
(K1+714,75 - K1+656,5)


Cesar Rios

Rep. legal - Contratista.


Mónica B.

Mónica Bernal A.

Residente de Interventoría

- Jueves, 07 de noviembre de 2024.

- Estado del tiempo: lluvias intensas desde las 3:50 am - 5:00 am.

• En las horas de la mañana el terreno está muy húmedo.

• Fundida de bordillos en concreto de 3000 PSI lado izquierdo de la Abscisa K2+322 - K2+241,4 (80,6 ml).

• Se realiza colocación de rieles para losas de pavimento carril derecho de la Abs K1+291,50 - K1+221,50.

• Se realiza suministro, extensión y compactación de material de subbase granular de la Abscisa K0+950 - K0+840.


• Se realiza fundida de concreto MR 38 para losas de pavimento de la Abscisa K1+789,1 - K1+777,10 (10 ml) carril izquierdo. Nota: Se hace corrección de Abscisado.

• Se toma muestras de concreto MR 38.


• Se realiza aplicación de antisol a las losas de pavimento fundidas.

• Se realiza fundida de concreto 3000 PSI para cunetas lado derecho de la abscisa K1+442,10 - K1+409,9 (32,2 ml).

• Se toma muestras de concreto de 3000 PSI.


Cesar Rios

Rep. legal - Contratista


Mónica B.

Mónica Bernal A.

Residente de Interventoría

- Viernes, 08 de noviembre de 2024.

- Estado del tiempo: Nublas intensas desde las 3:00 am - 6:00 am. y de 1:10 pm - 3:00 pm.

• Se realizó colocación de rieles para borillo lado derecho.

• Se realizó fundida de bordillos de caneta lado derecho de la Abscisa K2+322 - K2+232 (90 m).

• Se realiza toma de muestra de concreto de 3000 psi.


Cesar Rios

Rep. legal - Contralista


Mónica Berrocal

Mónica Berrocal A.

Residente de Interventoría

- Sábado, 09 de noviembre de 2024.

- Estado del tiempo: Soleado.

• Se realiza colocación de formaleta para bordillos lado izquierdo y derecho.

• Se funde concreto de 3000 psi para bordillos lado (izquierdo) derecho de la abs. K2+232 - K2+206 lado derecho.

• Se coloca acero para losas de pavimento.


• Se funde concreto MK 38 de la abs. K1+77.10 - K1+735.1 carril izquierdo y de la abs. K1+442.10 - K1+410 (32.1).

carril derecho.

• Se toma muestras de concreto MK 38.


Cesar Rios

Rep. legal - Contralista


Mónica Berrocal


Mónica Berrocal A.

Residente de Interventoría

- Domingo, 10 de noviembre de 2024.

- Estado del tiempo: Soleado (llover fuertes 11:00 pm - 1:00 am)

• Sin actividades por ser día feriado


Cesar Rios

Rep. legal - Contralista


Mónica Berrocal

Mónica Berrocal A.


Residente de Interventoría

- Lunes, 11 de noviembre de 2024. (Festivo)

- Estado del tiempo: lluvias fuertes: 12:30 - 2:00 am y moderada: 2:00 am - 9:30
- Sin actividades por fuertes lluvias del día anterior y en la madrugada, el cual fue suspendida las actividades que estaban programadas para el día de hoy.


Cesar Rios

Rep. legal - Contratista.



Mónica Benocal A.

Residente de Interventoría


- Martes, 12 de noviembre de 2024

• Estado del Tiempo: Soleado.

- Se realiza retiro de formateras para bordillos y se realiza colocación lado derecho e izquierdo.
- Se realiza fundida de concreto de 3000 psi para bordillos de la Abscisa K2+205 - K2+193 lado izquierdo y de la abscisa K2+232 - K2+205 (27 ml) lado derecho.
- Se realiza colocación de acero para losas de pavimento.
- Se funde concreto MR 38 para losas de pavimento de la Abscisa K1+271,5 - K1+201,5 (70 ml) carril derecho.
- Se toma muestras de concreto MR 38.


Cesar Rios

Rep. legal - Contratista


Mónica Benocal A.


Residente de Interventoría


- Miércoles, 13 de noviembre de 2024.

• Estado del tiempo: Soleado

- Se realiza, suministro, extensión y compactación de material de subbase granular de la Abscisa K0+840 - K0+580
- Se realiza colocación de rieles para losas de pavimento lado derecho
- Se realiza adecuación de terreno para fundir losas de pavimento lado izquierdo.
- Se coloca acero de losas de pavimento carril izquierdo.

- Se funde concreto H238 para losas de pavimento de la Abscisa $K1+735.1 - K1+714$ (21,1 m) y de la Abscisa $K1+711,4 - K1+661,4$ (50 m) carril izquierdo.
- Se toma muestras de concreto H238.
- Se realiza riego de agua a losas de pavimento.
- Se realiza corte de junta para losa de pavimento.
- Se funde concreto de 3000 psi para bordillos de la Abscisa $K2+193 - K2+143$ lado izquierdo (50 m).
- Se continúa con la colocación de formaletas para bordillos lado derecho.
- Se le realizó una observación al contratista que debe mejorar el acabado de los bordillos, ya que están quedando porosos y en otras están quedando asperos y no lisos.
- Se realiza cierre de obra para seguimiento de las actividades.


Cesar Rios


Mónica Benorral

Mónica Benorral A.

Contratista Dep. legal.

Residente de Interventoría

- Jueves, 14 de noviembre de 2024

- Estado del tiempo: Soleado.
- Se realiza colocación de rieles para losas de pavimento carril derecho.
- Se realiza verificación de espesores de la capa de subbase Granular con topografía interventoría, donde a prueba tramo de la Abscisa $K0+990 - K0+600$.
- Se realiza verificación de rieles, espesores de losas con topografía.
- Se funde concreto de 3000 psi para bordillos de la abscisa $K2+203,4 - K2+153$ lado derecho.
- Se suministra, extiende y compacta material granular de la capa de subbase $K0+380 - K0+480$.
- Se realiza riego de agua a las losas de pavimento.
- Se adecua terreno de la abscisa $K1+132 - K1+201$ con la rana.
- Se realiza colocación de acero para losas de pavimento

- Se funde concreto MA 38 para losas de pavimento de la Abscisa K1+201 - K1+132 (69 ml) carril derecho.
- Se realiza toma de muestras de concreto MR 38.
- Se funde concreto MR 38 para losas de pavimento de la Abscisa K1+662 - K1+641 (21 ml) carril izquierdo.
- Se realiza toma de densidades in situ de la Abscisa K0+960 a K0+600, donde se abre el tramo.
- Se realiza colocación de cinta de señalización en los tramos fundidos de losas de pavimento.



Cesar Rios
Rep. legal - Contratista.




Mónica Benocal A.
Residente de Interventoría


- Viernes, 15 de noviembre de 2024.
- Estado del tiempo: Soleado.
- Se realiza corte de junta de losas de pavimento.
- Se realiza adecuación de terreno con ranga.
- Se realiza la colocación de rieles para losas de pavimento lado derecho con topografía.
- Se realiza verificación de espesores.
- Se funde concreto ME 38 para losas de pavimento de la Abscisa K1+132 - K1+060 (70 ml) carril derecho.
- Se realiza colocación de formaletas para bordillos lado derecho.
- Se toman muestras de concreto ME 38.
- Se funde concreto de 3000 PSI para bordillos de la Abscisa K2+153,2 - K2+103,2 lado derecho (50 ml).



Cesar Rios
Rep. legal - Contratista.




Mónica Benocal A.
Residente de Interventoría




- Sábado, 16 de noviembre de 2024.

- Estado del tiempo: Soleado.
- Se realiza colocación de formateras para bordillos lado izquierdo.
- Se realiza fundida de concreto de 3000 psi para bordillos de la abscisa K2+143 - K2+103 Lado izquierdo (40 ml).
- Se realiza colocación de rieles para Losas de la Abscisa L0+990 - K1+653 lado derecho.


Cesar Rios


Rep. legal-Contratista


Mónica Bernal A.


Residente de Interventoría

- Domingo, 17 de noviembre de 2024

- Estado del tiempo: Soleado.
- Sin actividades por ser día feriado.


Cesar Rios

Rep. legal-Contratista


Mónica Bernal A.

Residente de Interventoría

- Lunes, 18 de noviembre de 2024.


- Estado del tiempo: Soleado.
- Se realiza colocación de formateras para bordillos.
- Se funde concreto de 3000 psi para bordillos de la Abscisa K2+103 - K2+053 lado derecho.
- Se toma muestras de concreto.
- Se adecua terreno con la vanga para Fundida de losas.
- Se verifica espesores de losas de pavimento.
- Se funde concreto M2 38 para losas de pavimento de la Abscisa K1+060 - K1+030 (30 ml) Camil derecho.
- Se toma muestras de concreto M2 38.
- Se continúa con la colocación de rieles para cunetas lado derecho.
- Se adecua terreno para cunetas.

→

- Se realiza rieco de agua de losas de pavimento


Cesar Rios

Rep. legal-contratista.



Mónica Bernal A.
Residente de Interventoría

- Martes, 19 de Noviembre de 2024.

- Estado del tiempo: Soleado. Tarde: 1:10 pm - 3:15 pm. Lluvia moderada
- Se realiza comité de seguimiento de obra con la participación del contratista e interventoría con el fin de hacer seguimiento a las actividades y compromisos pactados.
- Se realiza colocación de formaletas para bordillos lado izquierdo.
- Se realiza extensión de material de subbase granular de la Abscisa K0+480 - K0+350; No se compacta por lluvias en la zona, se humedeció el material.
- Se funde concreto de 3000 psi para bordillos de la abscisa K2+103 - K2+053 (50 ml). lado izquierdo.
- Se realiza colocación de rieles para cunetas lado derecho con topografía.
- Se realiza fundición de concreto HR 38 para losas de pavimento de la Abscisa K1+030 - K0+975 (49 ml) carril derecho.
- Se realiza toma de muestra HR 38.


Cesar Rios

Rep. legal-contratista.



Mónica Bernal A.
Residente de Interventoría

- Miércoles, 20 de Noviembre de 2024.

- Estado del tiempo: Soleado.
- Se continúa con la colocación de rieles para cunetas lado derecho.
- Se realiza verificación de dimensiones y espesores de la cuneta lado derecho.
- Se realiza corte de junta para losas de pavimento

- Se suministra, extiende y compacta material de subbase granular de la abscisa $K0+300 - K0+260$
- Se llevan del campamento las muestras de concreto de losas, cunetas y bordillos.
- Se realiza retiro y colocación de formaletas para cunetas lado izquierdo
- Se realiza fundida de bordillos de la Abscisa $K2+053 - K2+036,75$ lado derecho. (300 psi) (16,25 ml)
- Se realiza fundida de concreto ME 38 para losas de pavimento de la Abscisa $K0+975 - K0+970,9$ (4,1 ml) carril derecho.
- Se funde concreto de 3000 psi para cunetas de la Abscisa $K0+961 - K0+800,5$ lado derecho (160,5 ml)
- Se realiza toma de muestras de concreto 3000 psi y ME 38.
- Se realiza fundida de bordillo de la Abscisa $K2+053 - K2+041$ lado izquierdo (12 ml)


Cesar Rios


Yónica Benavides A
Residente de Interventoría

República - Contratación


- Jueves, 21 de Noviembre de 2024

- Estado del tiempo: Soleado.
- Se realiza colocación de rieles para losas de pavimento lado derecho con topografía.
- Se realiza colocación de aceros para losas de pavimento
- Se verifica espesores y niveles.
- Se funde concreto ME 38 para losas de pavimento de la Abscisa $K0+962 - K0+902$ carril derecho. (60 ml)
- Se realiza muestras de concreto ME 38.
- Se realiza fundida de concreto de 3000 psi para bordillos de la Abscisa $K2+041 - K1+981$ lado izquierdo (60 ml)
- Se realiza suministro, extensión y compactación de material de subbase granular de la Abscisa $K0+260 - K0+220$.

- Se realiza riego de agua a losas de pavimento.


Cesar Rios


Rep. legal - Contratista.


Mónica Berracal A.
Residente de Interventoría

- Viernes, 22 de Noviembre de 2024.
- Estado del tiempo: lluvias intensas desde las 12:20 am hasta las 4:00 am y lluvia moderada desde las 9:50 am hasta las 1:20 pm.
- Se realiza colocación de formaletas para bordillos - lado derecho.
- No se realizaron las demás actividades por lluvia en la zona, Terreno muy humedo.


Cesar Rios


Rep. legal - Contratista



Mónica Berracal A.
Residente de Interventoría

- Sábado, 23 de Noviembre de 2024.
- Estado del tiempo: Soleado.
- Se realiza colocación de rieles de anetas
- Se fonde concreto de 3000 psi para bordillos de la Abscisa K2+036 - K1+986 (50 ml) lado derecho.
- Se fonde concreto MR 38 para losas de pavimento de la Abscisa K0+902 - K0+852 (50 ml) lado derecho.
- Se realiza muestras de concreto MR 38.
- Se realiza aseo y limpieza de la obra.


Cesar Rios

Rep. legal - Contratista


Mónica Berracal A.
Residente de Interventoría




- Domingo, 24 de Noviembre de 2024.

- Estado del tiempo: Soleado.
- Sin actividades en la obra por ser día festivo.


Cesar Rios


Rep. legal - Contratista.


Mónica Baracal


Mónica Baracal A.
Residente de Interventoría

- Lunes, 25 de Noviembre de 2024.

- Estado del tiempo: Soleado.
- Se realiza colocación de rieles para cunetas lado derecho.
- Se instala formateras para bordillo lado izquierdo.
- Se funde concreto de 3000 psi para cunetas de la Abscisa $K0+975 - K0+962,9$ (12,10 ml) lado derecho.
- Se toma muestra de concreto de 3000 psi.
- Se funde concreto MR 38 para losas de pavimento de la Abscisa $K0+858 - K0+810,36$ (41,64 ml) lado derecho.
- Se realiza toma de concreto MR 38.
- Se funde concreto de 3000 psi de la Abs $K0+800 - K0+770,4$ (29,6 ml) LD.


Cesar Rios

Rep. legal - Contratista.


Mónica Baracal

Mónica Baracal A.
Residente de Interventoría

- Martes, 26 de Noviembre de 2024.


- Estado del tiempo: Soleado.
- Se realiza colocación de rieles para losas de pavimento lado derecho con topografía.
- Se realiza verificación de espesores y niveles con topografía.
- Localmente se realiza colocación de rieles para cunetas lado derecho.
- Se funde concreto de 3000 psi para bordillos de la Abscisa $K1+981 - K1+919$ lado izquierdo (62 ml).
- Se suministra, extiende y compacta material de subbase granular de la abscisa $K0+220 - K0+180$.

→

- Se funde concreto MR 38 para losas de pavimento de la Abscisa $K0+975 - K0+962,9$ (12,10 ml); y de la Abscisa $K0+823 - K0+783,8$ (39,2 ml).
- Se toma muestras de concreto MR 38.


Cesar Rios

Rep. Legal - Contratista



Mónica Bernal A.
Residente de Interventoría

• Miércoles, 27 de noviembre de 2024.

- Estado del Tiempo: Soleado.
- Se realiza colocación de rieles para cunetas.
- Se realiza colocación de parillas de acero para cunetas.
- Se chequea niveles de cupa de subbase granular de la Abscisa $K0+500 - K0+480$ donde se indica que el bombeo de la vía tiene a la izquierda.
- Se realiza verificación de niveles y espesores para la cuneta.
- En las horas de la tarde, se realiza socialización del 50% de avance de ejecución de actividades con la participación de INURAS, Alcalde Municipal, secretaria de planeación, asesor de planeación, contratista e interventoría y comunidad de la zona de influencia.
- Posteriormente se realiza comité de veeduría.
- Se funde concreto de 3000 psi para cunetas de la Abscisa $K0+770,4 - K0+600,2$ lado derecho (170,2 ml).
- Se realiza toma de muestras de concreto 3000 psi.
- Se funde concreto de 3000 psi para bordillos de la Abscisa $K1+986 - K1+926$ lado derecho (60 ml).
- Se realiza limpieza de la vía.



Cesar Rios

Rep. legal - Contratista



Mónica Bernal A.
Residente de Interventoría

- Jueves, 28 de noviembre de 2024.

- Estado del tiempo: lluvia intensa desde las 11:00 pm - 12:00 pm y lluvia moderada desde 12:00 pm - 3:00 am.
- Se espera a que ore para iniciar actividades
- Se adecua terreno con vana para compactar terreno para fundir.
- Se instala parrilla de dovelas para pavimento
- Se verifica espesores y nivelar para losas de pavimento
- Se funde concreto ME 38 para losas de pavimento de la Abscisa $K0+783,8 - K0+718,4$ lado derecho (65,4 ml)
- Se toma muestras de concreto de ~~3000~~ 3400 psi ME 38.
- Se funde concreto 3000 psi para bordillos de la Abscisa $K1+919 - K1+891,1$ lado izquierdo. (47.3 ml).


Cesar Rios

Rep. legal - Contratista



Mónica B

Mónica Berraca


Residente de Interventora

- Viernes, 29 de Noviembre de 2024.

- Estado del tiempo: Soleado
- Se realiza colocación de formateras para bordillos lado derecho 40 ml y lado izquierdo 13 ml
- Se realiza colocación de rieles para cunetas lado derecho con topografía.
- Se verifica espesores y niveles para cunetas.
- Se toman densidades en campo de la capa de subbase de la $K0+560 - K0+000$.
- Se realiza corte de juntas
- Se funde concreto 3000 psi para bordillos de la Abs $K0+871,1 - K1+858,1$ (13 ml) lado izquierdo y de la Abs $K1+926 - K1+885,1$ lado derecho. (40.9 ml)
- Se funde cuneta de la Abs $K0+600,2 - K0+476,2$ lado derecho (124 ml)
- Se toma muestras de concreto 3000 psi para cunetas.


Cesar Rios

Rep legal - Contratista


Mónica B

Mónica Berraca
Residente Interventora

- Sábado, 30 de Noviembre de 2024.

• Estado del Tiempo: Soleado.

• Se realiza colocación de formaletas para bordillos.

• Se realiza colocación de rieles para losas de pavimento lado derecho.

• Se funde concreto de 3000 psi para bordillos de la Abscisa K1+885,1 - K1+839,1 (46 ml) lado derecho.

• Se funde concreto M238 para losas de pavimento de la Abscisa K0+718,4 - K0+636,7 (81,70 ml) lado derecho.

• Se toman muestras de concreto M238 para losas de pavimento.

• Se realiza aplicación de antisol a las losas fundidas.


Cesar Rios

Rep. legal - Contratista.


Mónica Benítez

Mónica Benítez A

Residente de Interventoría

Yusef Z. Arz
Harry Pagarano
Ing. Residente de Obra

Juan Jacobo Viquez D.
Ing. Residente Interventor.

31/10/2024.

El Contratista continúa con el texturizado del pavimento con pulidora por afectación de las lluvias fuertes y se presentaron lloviznas anteriores entre las abscisas K0+102 al K0+075. Realizan orden y aseo de la obra y se retiran las ciclas del pavimento variado entre las abscisas K0+105 al K0+075.

Yusef Z. Arz
Harry Pagarano
Ing. Residente de obra

Juan Jacobo Viquez D.
Ing. Residente Interventor.

01/11/2024

El Contratista continúa con la demarcación del texturizado con pulidora entre las abscisas K0+102 al K0+075. Se registra caída de un árbol en la abscisa K0+360 por fuertes lluvias, se realiza el retiro del mismo acopiándolo en el lado derecho de la vía.

Se presentaron lluvias moderadas entre 12:00 am - 1:05 am
Lluvias fuertes entre 1:05 am - 6:00 am
Lluvias Moderadas entre 4:15 pm - 8:00 pm.

Yusef Z. Arz
Harry Pagarano
Ing. Residente de obra

Juan Jacobo Viquez D.
Ing. Residente Interventor.

02/11/2024

Fuente inactivo debido a las lluvias y se han registrado.

Yusef Z. Arz
Harry Pagarano
Ing. Residente de obra

Juan Jacobo Viquez D.
Ing. Residente Interventor.

03/11/2024

Se registran lluvias moderadas entre 8:00 am a 10:00 am

Jhon Zúñiga

Ing. Residente de obra

Jorge D.

Luis Jacobo Viny D.

Ing. Residente Interventoría.

04/11/2024

Se registra tiempo seco en el sector de Riverini.

Jhon Zúñiga

Ing. Residente de obra

Harry Bazarano

Jorge D.

Luis Jacobo Viny D.

Ing. Residente Interventoría.

05/11/2024.

El Contratista continúa con el cerco entre las abscisas K0+075 al K0+000 y chequeo topográfico por parte del Contratista. Retiro e instalación de las rieles preparando zona variada de concreto MR38 para pavimento rígido entre abscisas K0+075 al K0+040.

Bombeo de aguas q' se encuentran en la excavación entre las abscisas K0+650 al K0+535 mediante motobomba y chequeo topográfico de la piedra rajón instalada entre las abscisas K0+445 al K0+420.

Jhon Zúñiga

Harry Bazarano

Ing. Residente de obra

Jorge D.

Luis Jacobo Viny D.

Ing. Residente Interventoría.

06/11/2024

Se registran lluvias moderadas entre las 7:50 am hasta las 8:30 am.

Iguualmente se registra bloqueo de la comunidad de la troncal entre San Bernardo del Viento - Moritot a la altura del sector Brisas del Mar.


Jorge D.

Luis Jacobo Viny D.

Ing. Residente Interventoría.


07/11/2024

Revisión y ajuste de actas (oficina contratista - Montoria)
 El Contratista realiza corte, figurado y amarre de acero de refuerzo. Se continúa con la excavación entre las abscisas K0+450 a K0+470, Instalación de piedra sapín entre las abscisas K0+450 a K0+465. y geotextil entre las abscisas K0+450 a K0+470.



Harry Bejarano

Ing. Residente de obra




Luis Jacobo Viny D.

Ing. Residente Interventoria


08/11/2024

El Contratista instala y realiza chequeo de los rieles y los niveles de la subbase con la comisión de topografía. Revisa y alista el acero de las barras de amarre y para las juntas las dadas. Se realiza el vaciado de concreto MR38 para pavimento rígido entre las abscisas K0+075 a K0+045 complementado con las actividades del texturizado, aplicación del outisel, corte para las juntas con una cortadora de disco. (0,06m).



Harry Bejarano

Ing. Residente de obra



Luis Jacobo Viny D.

Ing. Residente Interventoria


09/11/2024

Se continúa con la excavación entre las abscisas K0+470 a K0+480. e instalación del geotextil entre abscisa K0+470 a K0+480 e instalación de piedra sapín entre las abscisas K0+465 a 475.



Harry Bejarano

Ing. Residente de obra



Luis Jacobo Viny D.

Ing. Residente Interventoria

10/11/2024

No se registraron lluvias en el sector de Rimini.

V. J. J. J.

Harry Bejarano

ing. Residente de obra

J. J. J. J.

José Jacobo Viquez

Ing. Residente Interventoría

11/11/2024

Se registraron lluvias fuertes entre las 2:00 am hasta las 5:00 am. y lluvias moderadas entre las 5:00 am hasta 6:00 pm. Fomte inactivo por lluvias durante el turno.

V. J. J. J.

Harry Bejarano

ing. Residente de obra

J. J. J. J.

José Jacobo Viquez

Ing. Residente Interventoría

12/11/2024

Se realiza el vallado de concreto MR34 para perimetro oigido entre las abscisas K0+045 a K0+000. Complementado con las actividades de instalación de rieles, chequeo de los rieles y niveles de la subbase por la comisión de topografía, revisión y chequeo de los aceros de dardos, acero de amarre, acero de refuerzo para el sector del K0+000, además del fortificado, aplicación de entisol y corte para las puntas con cortadora de disco.

Se continúa con la excavación entre las abscisas K0+480 a K0+485.

V. J. J. J.

Harry Bejarano

ing. Residente de obra

J. J. J. J.

José Jacobo Viquez

Ing. Residente Interventoría

13/11/2024

Se continúa con la excavación entre las abscisas K0+485 a K0+500 y conformación de la vía. Demolición de subestructuras de manera manual.

Bombeo de las aguas por lluvias por medio de motobombas.

Se registran 2 viajes de aporreado de $15m^3$ cada uno y se extiende entre los abscisas K0+410 a K0+450.

Yuse Zu Ray
Harry Bazarano
Ing. Residente de obra

Jenny D.
Luis Jacobo Vargas D.
Ing. Residente Interventoría

14/III/2024

Se registran 2 viajes de piedra sapón de $15m^3$ en proveniéndose de la cantera aguas vivas.

Se extiende aporreado entre los abscisas K0+450 a K0+480, piedra sapón entre abscisas K0+475 a K0+480 y se extiende geotextil entre abscisas K0+480 a K0+485.

Yuse Zu Ray
Harry Bazarano
Ing. Residente de obra

Jenny D.
Luis Jacobo Vargas D.
Ing. Residente Interventoría

15/III/2024

Se registran 2 viajes de piedra sapón de $15m^3$ proveniente de la cantera aguas vivas.

Se realiza la instalación de geotextil entre los abscisas K0+485 a K0+501, instalación de piedra sapón entre los abscisas K0+475 a K0+500, instalación de material de sello entre los abscisas K0+480 a K0+495.

Yuse Zu Ray
Harry Bazarano
Ing. Residente de obra

Jenny D.
Luis Jacobo Vargas D.
Ing. Residente Interventoría

16/III/2024

Se registra el ingreso de 2 rollos de geotextil NT

Se continúa con la excavación entre los abscisas K0+500 a K0+525 e instalación de geotextil K0+501 a K0+525; instalación de piedra sapón entre los abscisas K0+500 a K0+520.

Juan José Ruiz
Harry Bejarano,
ing. Presidente de obra

Jorge D.
Luis Jacobo Viquez D.
Ing. Residente Interventoría

17/11/2024

No se registran lluvias - tiempo seco.

Juan José Ruiz
Harry Bejarano
ing. Presidente de obra

Jorge D.
Luis Jacobo Viquez D.
Ing. Residente Interventoría

18/11/2024

Se registran lluvias fuertes entre las 6:00 am hasta las 8:30 am.

El Contratista realiza la actividad de limpieza de los rieles y el bombeo de agua presente en la excavación K0+535 a K0+650 a causa de las lluvias mediante motobomba.

Juan José Ruiz
Harry Bejarano
ing. Presidente de obra

Jorge D.
Luis Jacobo Viquez D.
Ing. Residente Interventoría

19/11/2024

El Contratista inicia con la actividad de excavación y conformación para la construcción del bordillo entre el absciso K0+360 a K0+280. Se continúa con la excavación entre los abscisos K0+525 a K0+535, se extiende piedra rajón entre los abscisos K0+500 a K0+530, extendido de material de relleno entre los abscisos K0+495 a K0+520 e instalación de geotextil entre los abscisos K0+525 a K0+535.

Juan José Ruiz
Harry Bejarano
ing. Presidente de obra

Jorge D.
Luis Jacobo Viquez D.
Ing. Residente Interventoría

20/11/2024

El Contratista realiza limpieza de la subrasante tanto mecánicamente como manual entre las abscisas K0+535 a K0+550; se lleva a cabo la instalación de piedra ripán entre las abscisas K0+530 a K0+550, instalación del geotextil NT entre las abscisas K0+535 a K0+555.

Se registra el viaje de piedra ripán de 15 m^3 provenientes de la cantera aguas vivas.

Jhon Zule Aris
Harry Bejarano
Ing. Presidente de obra

Jorge D.
Luis Jacobo Vungo D.
Ing. Residente Interventoría

21/11/2024

Se registran lluvias fuertes 00:30 am a 1:30 am
03:00 am a 6:00 am

Se continúa limpieza de la subrasante de forma manual y mecánica entre las abscisas K0+550 a K0+560.

Se registra el viaje de afirmado de 15 m^3 proveniente de la cantera al espuerto.

Jhon Zule Aris
Harry Bejarano
Ing. Presidente de obra

Jorge D.
Luis Jacobo Vungo D.
Ing. Residente Interventoría

22/11/2024

Se registra el viaje de afirmado de 15 m^3 proveniente de la cantera al espuerto.

El Contratista continúa con la limpieza manual de la subrasante entre las abscisas K0+560 a K0+610; instalación de geotextil entre las abscisas K0+555 a K0+575, instalación de piedra ripán entre las abscisas K0+550 a K0+560.

Jhon Zule Aris
Harry Bejarano
Ing. Presidente de obra

Jorge D.
Luis Jacobo Vungo D.
Ing. Residente Interventoría

23/11/2024

El Contratista continua con la excavación y conformación para la construcción del bordillo entre las abscisas K0+360 a K0+280.

Se realiza acarreo de la piedra ripión entre el acopio del K0+370 hasta el K0+560. y se viñes acopiados sobre la vía entre las abscisas K0+390 a K0+470 hacia el K0+560, Instalación de piedra ripión entre las abscisas K0+560 a K0+565.

Jh. Gue. Arz

Harry Bejarano

Ing. Residente de obra

Jh. Gue. Arz

Ing. Residente Interventoría

Ing. Residente Interventoría

24/11/2024

Se registran lluvias moderadas entre las 4:00 am hasta las 6:30 am.

Jh. Gue. Arz

Harry Bejarano

Ing. Residente de obra

Jh. Gue. Arz

Ing. Residente Interventoría

Ing. Residente Interventoría

25/11/2024

El Contratista continua con la instalación de la piedra ripión entre las abscisas K0+565 a K0+570. El movimiento de tierra se termina a las 3:00 pm. Se registra la llegada de la formideta y el carro de reparto; se realiza llenado de sacos con suelo y se inicia con el llenado y conformación de la refectación por lluvias al talud de la margen izquierda entre las abscisas K0+360 a K0+320.

Jh. Gue. Arz

Harry Bejarano

Ing. Residente de obra

Jh. Gue. Arz

Ing. Residente Interventoría

Ing. Residente Interventoría

26/11/2024

Se registran 2 viñes de piedra ripión de 15 m³ c/u para la construcción del bordillo. Se instala geotextil entre las abscisas K0+575 a K0+585; extendido de piedra

separar entre los abscisos K0+570 a K0+580; instalación
cierre de formaleta para el bordillo e instalación del
alero de refuerzo.

Juan José Arce
Harry Berrango
Ing. Residente de obra

Juan José Arce D.
Luis Jacobo Vargas D.
Ing. Residente Interventoría

21/11/2024

Se registran lluvias moderadas entre las 15 am hasta
las 2:00 am.

Se registran 2 viajes de afirmado de $15 m^3$ C/A pro-
venientes de la cantera el espuzo; se realiza el vacia-
do de concreto para el bordillo entre los abscisos
K0+260 a K0+280. Aseo requirido. Instalación piedra refón
K0+580 a K0+590 y geotextil K0+585 a K0+595.

Juan José Arce
Harry Berrango
Ing. Residente de obra

Juan José Arce D.
Luis Jacobo Vargas D.
Ing. Residente Interventoría

28/11/2024

Se registran 1 viaje de piedra refón de $15 m^3$ provenien-
tes de la cantera de aguas vivas.

Se realiza el desmoldado del bordillo y aseo de la for-
maleta.

Se realizó la socialización del proyecto con la comunidad
ya que se supera el 50% de ejecución del proyecto y
el comité de la vecindad. Instalación de geotextil entre
los abscisos K0+595 a K0+615 y instalación de piedra
refón entre los abscisos K0+590 a K0+610. y se re-
gistra cierre manteniendo cuanto la doctrina.

Juan José Arce
Harry Berrango
Ing. Residente de obra

Juan José Arce D.
Luis Jacobo Vargas D.
Ing. Residente Interventoría

29/11/2024

Se registran lluvias moderadas entre las 9:00 am

hasta la 1:00pm y el cierre del puente la doctrina por mantenimiento. El Contratista continúa con la excavación y conformación para la construcción del bordillo entre las abscisas K+360 a K+280 lado derecho y K+280 a K+260 lado izquierdo. Corte y figurado de acero de refuerzo para el bordillo. Se continúa con la conformación de la piedra refina entre las abscisas K+590 a K+610. El mini cargador se pincha una llanta a las 3:00pm.

Juan José Díaz
Harry Bejarano
Ing. Residente de obra

Juan José Díaz
Luis Jacobo Vargas D.
Ing. Residente Interventoría.

30/11/2024

Se registre bombeo de las aguas represadas por la lluvia del día anterior mediante motobomba.

El Contratista realice el vaciado de los bordillos entre las abscisas K+360 a K+280 lado derecho y entre el K+280 a K+260 del lado izquierdo complementado con las actividades de tallado del bordillo, curado con la aplicación de antisal y se realice el corte para las juntas del bordillo vaciado.

Juan José Díaz
Harry Bejarano
Ing. Residente de obra

Juan José Díaz
Luis Jacobo Vargas D.
Ing. Residente Interventoría.

01/12/2024

Se registre tiempo seco.

Juan José Díaz
Harry Bejarano
Ing. Residente de obra

Juan José Díaz
Luis Jacobo Vargas D.
Ing. Residente Interventoría.

02/12/2024

El Contratista realiza la instalación del geotextil entre las abscisas K+615 a K+135 e instala
