



**MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL**

**Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031
DE 2023**

14 FEBRERO DE 2025



Contrato No. 4917031-2023




136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio:
Fecha Fin Actual:

2/06/2023
01/07/2025

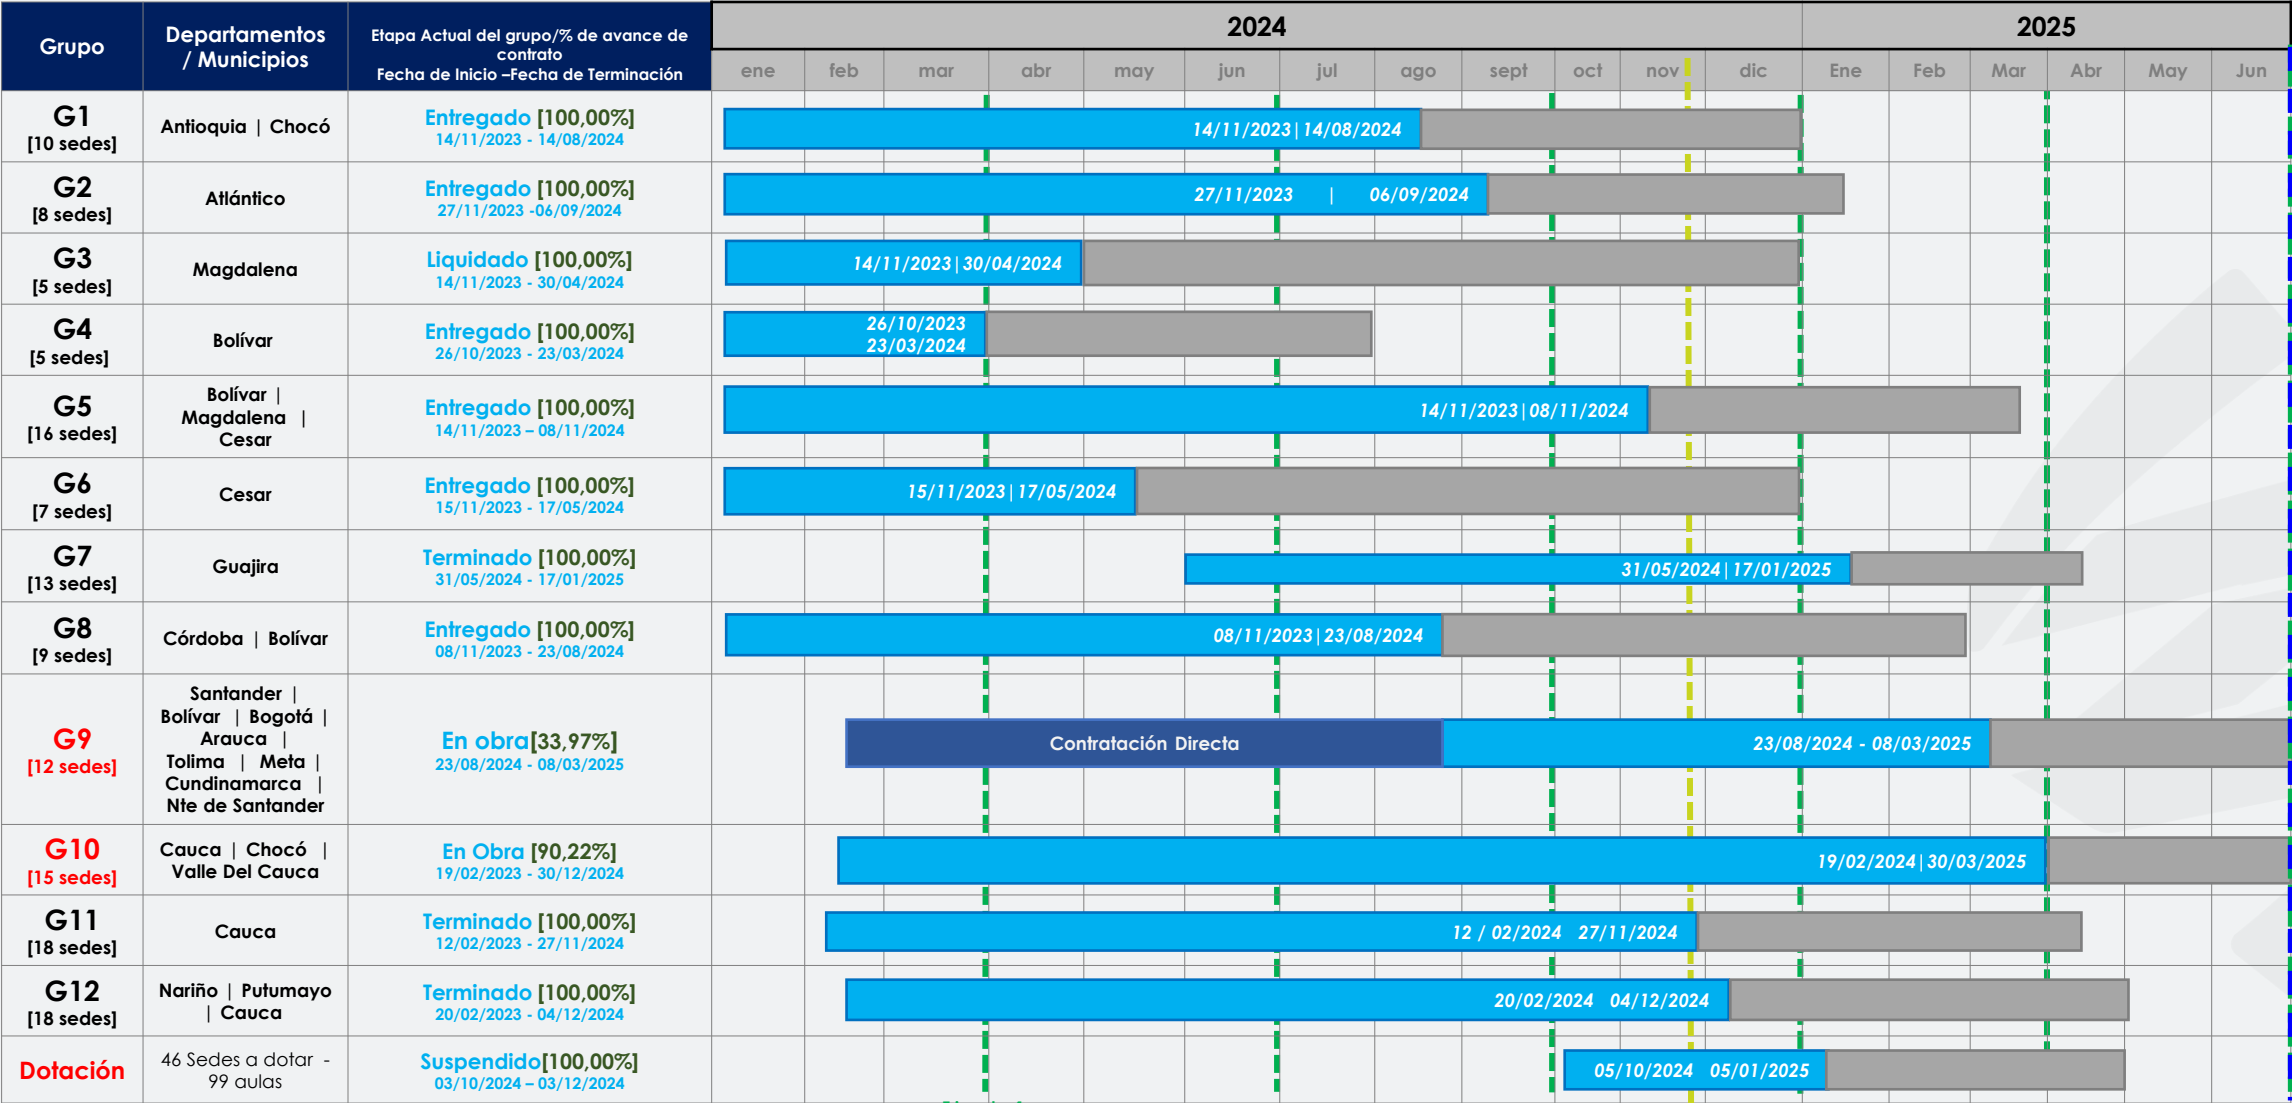

21/11/2024

1 julio de 2025 - Fecha Fin Interadministrativa

Aulas Móviles

Contrato No. 4917031-2023



136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

ENTREGADAS

116 sedes
85,29%

TERMINADAS

5 sedes
3,68%

Físicamente culminadas. A la espera de firma de actas para ser entregadas


EN EJECUCIÓN

15 sedes
9,56%

POR INICIAR

2 sedes
1,47%

Estado de entrega y ejecución de Sedes

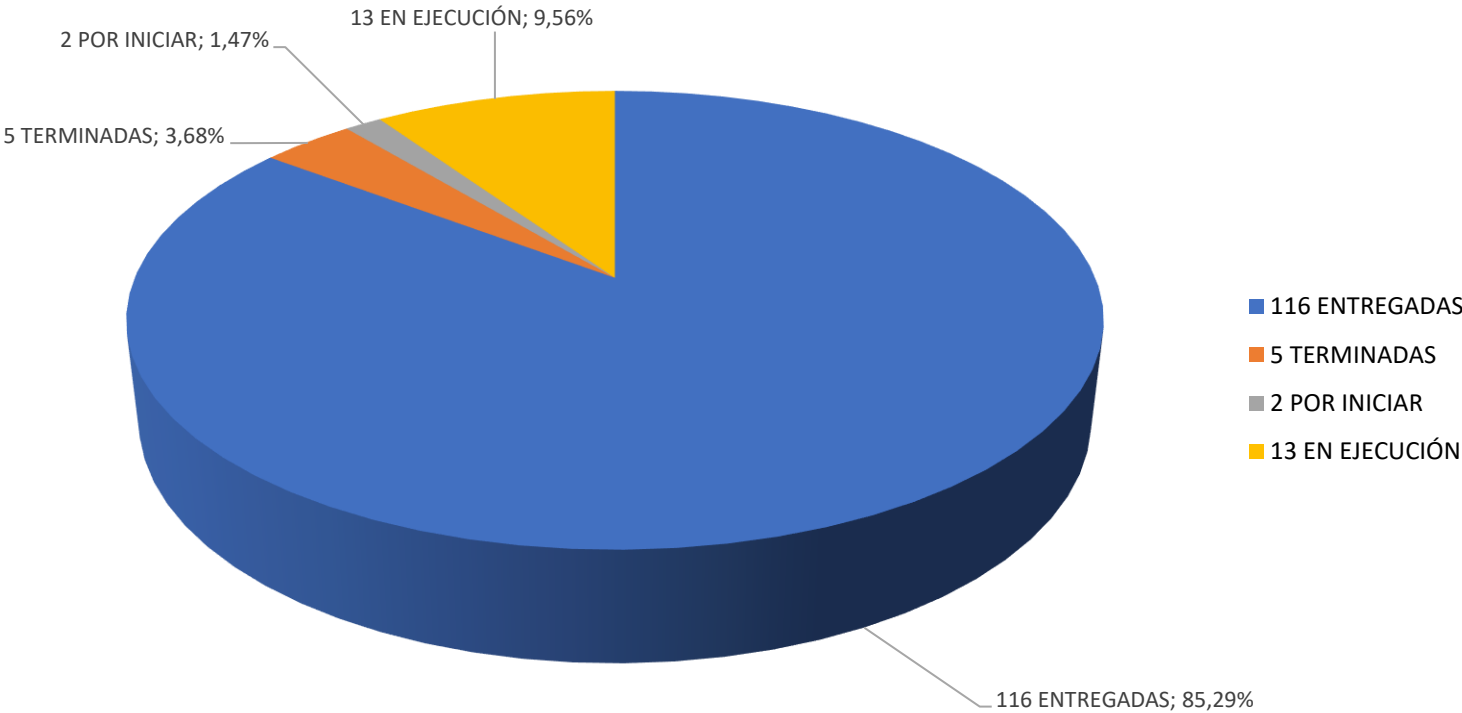

Estado de entrega y ejecución de Sedes



136 sedes educativas
[instalación de aulas y
mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

ENTREGADAS	TERMINADAS	EN EJECUCIÓN	POR INICIAR
116 sedes 85,29%	5 sedes 3,68%	13 sedes 9,56%	2 sedes 1,47%
Grupo 1 - 10 Grupo 2 - 8 Grupo 3 - 5 Grupo 4 - 5 Grupo 5 - 16 Grupo 6 - 7 Grupo 7 - 13 Grupo 8 - 9 Grupo 10 - 10 Grupo 11 - 16 Grupo 12 - 17	Grupo 9 - 1 Grupo 10 - 1 Grupo 11 - 2 Grupo 12 - 1	Grupo 9 - 9 Grupo 10 - 4	Grupo 9 - 2 Grupo 10 - 4

PAGOS ASISTENCIA TECNICA



136 sedes educativas
[instalación de aulas y
mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

VALOR AT

\$ 4.164.018.692

Cobrado
(a dic de 2024)

\$3.585.749.431,31

Pagado
(a dic de 2024)

\$3.585.749.431, 31

SALDO

\$ 578.269.260,69

Resumen Informe Financiero – Corte 31 de diciembre de 2024

**136** **sedes educativas**
[instalación de aulas y
mejoramientos]

**\$ 63.650**
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

VALOR EJECUTADO	VALOR POR EJECUTAR	VALOR COMPROMETIDO	SALDO
\$ 49.435 mll	\$ 14.573 mll	\$ 59.515 mll	\$ 398,2 mll*

*El saldo es a corte de 09 de febrero de 2025

Rendimientos Financieros – Relación de Pagos



Contrato Interadministrativo No. COI.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS
01 de diciembre al 31 de diciembre de 2024



FECHA	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO	VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC	TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS	FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS	VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS	AJUSTES / RETENCIONES	SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS	DESVALORIZACION ACUMULADA
ago-23	82.351.406,35	443.947.650,01	526.299.056,36				-	-
sep-23	108.927.246,74	548.880.836,71	657.808.083,45				-	-
oct-23	131.902.760,66	436.008.307,20	567.911.067,86				-	-
nov-23	144.907.033,92	718.224.229,49	863.131.263,41				-	-
dic-23	143.221.271,36	788.090.860,63	931.312.131,99	13/12/2023	2.615.149.472,00		-	-
ene-24	133.626.379,48	427.858.051,59	561.484.431,07	10/01/2024	931.312.131,99		-	-
feb-24	120.547.529,88	474.970.095,24	595.517.625,12	12/02/2024	561.484.430,15		-	-
mar-24	117.745.976,50	478.495.863,61	596.241.840,11	12/03/2024	595.517.625,12		-	-
abr-24	100.331.907,69	259.736.382,70	360.068.290,39	10/04/2024	596.241.840,11		-	-
may-24	89.374.457,56	353.632.163,66	443.006.621,22	11/05/2024	360.068.290,39		-	-
jun-24	76.820.331,89	266.323.590,41	343.143.922,30	13/06/2024	443.006.621,22		-	-
jul-24	68.012.790,67	294.233.627,01	362.246.417,68	15/07/2024	343.143.922,30		-	-
ago-24	21.741.419,32	313.006.436,96	334.747.856,28	14/08/2024	362.246.417,68		-	-
sep-24	20.861.120,00	192.185.501,19	213.046.621,19	10/09/2024	334.747.856,28		-	-
oct-24	27.022.756,52	71.175.915,03	98.198.671,55	18/10/2024	213.046.621,19		-	-
nov-24	21.729.373,21	129.213.183,82	150.942.557,03	13/11/2024	98.198.671,55		-	-
dic-24	19.252.522,64	66.886.746,40	86.139.269,04	10/12/2024	150.942.557,03		86.139.269,04	-
TOTAL	1.428.376.284,39	6.262.869.441,66	7.691.245.726,05		7.605.106.457,01		-	86.139.269,04

Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

Fecha Actual: 2024/12/10 | Hora: 12:04 | IP: 190.164.258.210



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (x): LAURA IVONETTE PINZON CONTRERAS

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	36523	PLN2103LO	2024/12/10	\$150,842,557.00	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2024/12/10	15:29:12	15:31:28	DIANA PAOLA CORREAL	2024/12/11	18:30:01	\$150,842,557.00	\$150,842,557.00

Valor Registros Enviados	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechazado
\$0.00	2	2		0	KATHERIN PINOZ UNASIGA

Detalle de pago:

Producto Original	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Recupera	Nombre Recupera	No. Ruta	Entidad Financiera	No. Digno Cheques	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Original	Propósito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
30004855450	2024/12/10	\$21,726,373.21	400970341	FONDO NACIONAL DEL RES	00001	Banco BBVA Viajes Agentes Colombia S.A.	9	Credito Cuenta Ahorro	30954583	000000830053691	PAGOS		Procesado
30004855450	2024/12/10	\$128,273,183.80	400970341	FONDO NACIONAL DEL RES	00001	Banco BBVA Viajes Agentes Colombia S.A.	9	Credito Cuenta Ahorro	30954583	000000830053691	PAGOS		Procesado

NOTA: Teniendo en cuenta el contrato MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 8 el cual dice:

"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter."

Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:

- **Banco:** BBVA
- **Tipo:** Ahorros
- **No. Cuenta:** 309-054583
- **Nombre de la Cuenta:** FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL

AULAS MOVILES INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

Febrero 14 de 2025



CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
GRUPO 9	Arauca, Bolívar, Cundinamarca Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.	12	23/08/2024	08/03/2025	82,61%	47,90%	Se han presentado inconvenientes por precipitaciones para los proyectos ubicados en el Tolima, lo cual está generando que se tenga que solicitar una prórroga por dos (2) meses y quince (15) días calendario para la culminación de actividades en estas sedes. Se han presentado demoras en la ejecución de actividades e inicio de obras en algunas sedes educativas, lo cual a la fecha genera un alto atraso; por lo anterior, se inició proceso de apremio el cual fue notificado por la fiduciaria el 03 de febrero de 2025 y se presentaron descargos el día 11/02/2024, los cuales están siendo analizados por la interventoría para la continuación del mismo.
GRUPO 10	Cauca, Valle del Cauca y Choco	15	19/02/2024	30/03/2025	89,07%	86,23%	Los proyectos del Cauca se han visto afectados por temas de orden público en los últimos días de enero y primeros de febrero, lo cual han generando suspensión actividades parciales y retiro de personal trabajador por temor a la situación, hechos que han afectado los avances de los proyectos y actualmente están generando atrasos frente a la programación. Adicional el proyecto de Santander de Quilichao se encuentra en avance a su programación pero pendiente de que la administración municipal construya las acometidas para realizar las conexiones pertinentes por parte del proyecto, se ha reiterado al solicitud y necesidad de la misma, sobre la cual informan que se encuentran adelantando los tramites para abrir la convocatoria y adjudicar el contrato, ya que en el mes de diciembre adelantaron este proceso pero el mismo se declaro desierto.

Departamento	Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.
\$	Valor Inicial Obra: \$ 4.810.476.306,00 Interventoría: \$ 313.800.000
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$165.685.393,30
	Valor Pagado Obra: CI- \$245.711.234,70 CII - \$ 1.177.717.523,99 Interventoría: CI - \$0 CII - \$ 96.927.168,55
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otrosí No. 1: Retiro de tres (3) sedes del alcance Otrosí No. 2: Prórroga tres (3) meses obra e interventoría, adición interventoría por \$165.685.393,30
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	El contratista se retrasó en el inicio de las obras en todas las sedes educativas; se han iniciado actividades en algunas sedes educativas faltantes, sin embargo, esto no mitiga los atrasos que tiene el contrato. A la fecha se tienen en ejecución 10 de las 12 sedes educativas. Se encuentra en espera de presentación de descargos por parte del contratista e informe de la interventoría para continuación de aplicación de apremio. Se presenta la necesidad de hacer una prórroga por 2,5 meses para las sedes ubicadas en el departamento del Tolima por los inconvenientes en transporte que se han presentado.



Sedes:	12
En ejecución:	10
Por iniciar:	2

Grupo 09

COLEGIO UNIVERSITARIO - ID No. 7



IE DEL CERRO DE VERACRUZ -ID No. 124



CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE - ID No. 138



CENTRO EDUCATIVO LA PAVA - ID No. 56



ESCUELA SIETE DE AGOSTO - ID No. 96



SEDE LA PEÑA – ID No. 132



EL DESCANSO - ID No. 104



CAMPO PAYARES -ID No. 123



Departamento	Cauca, Valle del Cauca y Choco
\$	Valor Inicial Obra: \$6.014.978.800 Interventoría: \$327.496.568
	Adiciones Obra: \$602.576.550 Interventoría: \$197.588.004,15 (\$79.155.973,39 asumidos por el contrato de obra) (\$118.432.030,76 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: \$5.620.758.289,00 Interventoría: \$394.815.767,36
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (9 meses y 27 días) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas (9 meses y 27 días) y adiciones (\$197.588.004,15)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	En cumplimiento al alcance <u>se tienen 11 sedes entregadas y AEP&SC suscritas, y 4 sedes en ejecución, (2 Suarez, 1 Santander de Quilichao, 1 Bahía Solano).</u> Se adelanta programa para realizar la entrega de la sede la Huaca en Bahía solano de la semana del 18 al 21 si se logra coordinar la agenda con el rector, frente a las obras de Suarez y Santander de Quilichao se continua con el avance de actividades con un personal mínimo derivado de los temas de orden publico que están afectando los avances de los proyectos y se evalúa una no posible terminación dentro de los tiempos contractuales.



Sedes:	15
En ejecución:	4
Por iniciar:	0
Entregadas:	11

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE
PRINCIPAL ID MEN. 188.



INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE
INMACULADA ID MEN. 189.



INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE
FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12.
MUNICIPIO DE TORIBIO ID MEN: 12.



INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE
DOMINGO LASSO ID 164.



INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE
PRINCIPAL ID 16



Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE
JOHN F. KENNEDY



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE
SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE
PRINCIPAL



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA
HONDA .



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA
PLANTA .



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE
CRISTOBAL COLÓN



lica

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA)



IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS



IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR



CONTRATOS SUSPENDIDOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
DOTACIÓN	Antioquia, Atlántico, Bolivar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima, Valle del Cauca	46	03/10/2024	02/12/2024	Valor del contrato inicial de \$584.310.000,00 y otro sí proyectado de \$364.000.000 y adición de 3 meses por las condiciones de accesibilidad de las nuevas sedes. Contrato Suspendido para la incorporación de los recursos. Se realiza el Otro Sí y se citará a comité la 3era semana del mes de febrero. Dotación entregada en los grupos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 11 y, pendiente la entrega de los grupos 5, 7, 9, 10 y 12. La ejecución se realiza en 16 departamentos, 38 municipios y se realiza la dotación de 99 aulas nuevas construidas.

Estado Entrega de Dotación



**CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO
PADILLA YUKPA**

Sede El Coso La Paz – Cesar



**INSTITUCION EDUCATIVA SAN
JERONIMO**

Sede Escuela Nueva Parcelas Londres
Ayapel – Córdoba



**INSTITUCION EDUCATIVA EL
PALMAR**

Escuela Nueva Mixta Divino Salvador
Monte Líbano – Córdoba



**INSTITUCION EDUCATIVA
DOMINGUILLO**

Sede Principal Santander de Quilichao -
Cauca



**INSTITUCION EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL DE LA PACHA
ERM MARIA AUXILIADORA**

Sede
Sebastián de Buenavista - Magdalena



**INSTITUCION EDUCATIVA
TIERRA FIRME**

Mompox - Bolivar

CONTRATOS TERMINADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
GRUPO 11	Cauca	18	12/02/2024	27/11/2024	Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría, las cuales son Santa Teresita en el municipio de Rosas y Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. Inicialmente el recibo de estas sedes se atrasó debido al periodo de vacaciones de los Directivos, y una vez reanudado el año escolar se informaron posventas en algunos espacios. En la IE Francisco Javier sede Garay las posventas ya fueron atendidas y se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. En la IE Santa Teresita están próximos a terminar la subsanación de las posventas informadas.
GRUPO 12	Cauca, Huila, Nariño y Putumayo	1	20/02/2024	05/12/2024	Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría, las cuales son Santa Teresita en el municipio de Rosas y Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. Inicialmente el recibo de estas sedes se atrasó debido al periodo de vacaciones de los Directivos, y una vez reanudado el año escolar se informaron posventas en algunos espacios. En la IE Francisco Javier sede Garay las posventas ya fueron atendidas y se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. En la IE Santa Teresita están próximos a terminar la subsanación de las posventas informadas.

Departamento	Cauca
\$	Valor Inicial Obra: \$ 4.728.021.810 Interventoría: \$ 312.927.160
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$ 99.972.853,00 (\$ 54.867.110,00 asumidos por el contrato de obra) (\$ 45.105.743,00 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: \$ 4.721.624.076,00 Interventoría: \$ 379.820.020,17
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - \$ 99.972.853,00)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contratista avanza en las gestiones de entrega a Directivos de las sedes terminadas y recibidas por interventoría, las cuales son Santa Teresita en el municipio de Rosas y Francisco Javier sede Garay en el municipio de la Vega. Inicialmente el recibo de estas sedes se atrasó debido al periodo de vacaciones de los Directivos, y una vez reanudado el año escolar se informaron posventas en algunos espacios. En la IE Francisco Javier sede Garay las posventas ya fueron atendidas y se esta gestionando la firma del acta de recibo por parte del Rector. En la IE Santa Teresita están próximos a terminar la subsanación de las posventas informadas.




Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega

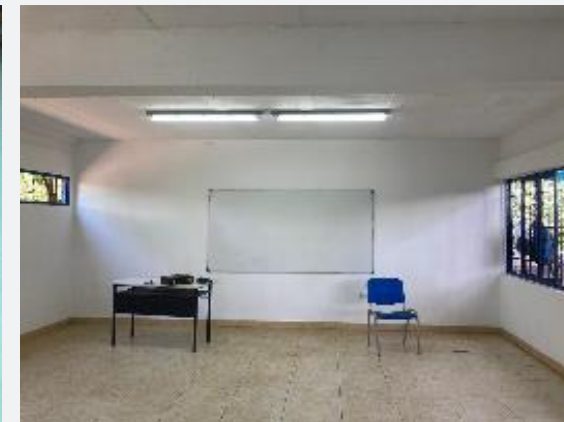

C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa



C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas



C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar



I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yervas
Rosas



I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista
Rosas



I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los
Remedios - Bolívar



Departamento	Cauca, Huila, Nariño y Putumayo
\$	Valor Inicial Obra: \$ 4.918.276.400,00 Interventoría: \$ 318.105.088,00
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$ 152,015,642,00
	Valor Pagado Obra: \$ 4.906.706.463,00 Interventoría: \$ 413.123.412
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	2 otros íes obra: Prórrogas (6 meses) 2 otros íes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - \$ 152,015,642,00)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Total de 18 sedes, entregadas a satisfacción con recibo de interventoría y rectores de 17 sedes y pendiente la entrega de 1 sede en Piamonte ID 125. Inst Educ Agric Piamonte – Cauca, se encuentra pendiente recibo por el rector, se solicitó acompañamiento a Cobertura, Secretaria de Educación del Cauca y MEN para realizar la suscripción el día 14/02/2025. Se solicitó a la empresa de energía del Putumato y Alcaldía realizar los trámites necesarios sobre la ampliación de carga de la institución, dado que las obras realizadas por este contrato son de mejoramiento y no afecto la carga actual de la institución. Se solicita compromiso para realizar trámite por la Secretaria de Planeación de Piamonte – Cauca y reunión seguimiento 18/02/2025.



Estado GRUPO 12, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



ID1 Pasto, Nariño - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE



ID8 El Rosario - Nariño, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA



ID26 Acevedo, Huila - INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS



ID27 Piamonte - Cauca, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA



CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 1	Antioquia, Chocó	10	14/11/2023	14/08/2024	- CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Liquidación realizada el 31.01.2025. - CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Terminado el 29.10.2024 - Liquidación radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisas INC 2024-002246, asignación liquidador Mireya Artunduaga, el 11.02.2025 se traslada a revisión y VoBo de la Fiduciaria Popular para solicitar Firmas, proceso que se proyecta se de en la semana al 15 de febrero de 2025.
Grupo 2	Atlántico	8	27/11/2023	05/09/2024	<u>CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023</u>: Terminado el 05.09.2024 <u>CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023</u>: Terminado el 05.11.2024 AERS COMPONENTE 2: - Contrato de obra suscrita el 10.02.2025 y en proceso de actualización de pólizas para revisión y aprobación por parte de la Fiduciaria Popular. - Contrato de interventoría en proceso de revisión para presentar a firmas, proceso que se espera se de en la semana del 17 al 21 de febrero de 2025 En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 28 de febrero de 2025 y posterior la de interventoría.

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 4	Magdalena y Bolívar	7	24/10/2023	07/02/2024	Se encuentra liquidado el contrato de obra. El contrato de interventoría iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago.
Grupo 5	Magdalena y Bolívar	16	14/11/2023	08/11/2024	<u>CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023</u>: Terminado el 08.11.2024 <u>CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023</u>: Terminado el 08.01.2025 AERS COMPONENTE 2: Contrato de Obra e Interventoría, en proceso de revisión y VoBo por parte de la Fiduciaria Popular, para pasar a firmas, una vez se tenga las AERS suscritas se procederá a solicitar la actualización de pólizas. En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 15 de marzo de 2025 y posterior la de interventoría.
Grupo 7	La Guajira	13	31/05/2024	17/01/2025	Se encuentra en elaboración por parte de la interventoría el AERS del componente II para tramitar firma ante fidupopular. El contrato de obra iniciará su trámite de liquidación una vez que quede desembolsado el último pago; el cual deben facturar a inicios de marzo y pagado a finales de marzo 2025. Con respecto a la interventoría le falta facturar casi un 60% y se estima si liquidación para iniciar a finales de abril 2025.
Grupo 8	Córdoba y Bolívar	9	08/11/2023	08/07/2024	En expedición el acta de liquidación del contrato. En consolidación la información del contrato de interventoría. Se proyecta su liquidación en el mes de marzo

Departamento	Antioquia, Chocó
\$	Valor Inicial Obra: \$3.447.332.359 Interventoría: \$271.455.247
	Adiciones Obra: \$201.152.963 Interventoría: \$53.764.065,32 (\$28.580.295 asumidos por el contrato de obra) (\$25.183.770,32 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: \$3.425.566.080,21 Interventoría: \$300.482.403,41
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	2 otrosíes obra: Prórrogas (5 meses y 15 días) y adición (\$201.152.963) 2 otrosíes interventoría: Prórrogas (6 meses) y adiciones (\$53.764.065,32)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	- CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Liquidación realizada el 31.01.2025. - CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Terminado el 29.10.2024 - Liquidación radicada el 2 de diciembre de 2024, mediante prisa INC 2024-002246, asignación liquidador Mireya Artunduaga, el 11.02.2025 se traslada a revisión y VoBo de la Fiduciaria Popular para solicitar Firmas, proceso que se proyecta se de en la semana al 15 de febrero de 2025.



GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL GUINEO - SEDE CE
EL OSITO - ID No. 161



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL EL REPOSO
ID No. 118



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CADENA LAS PLAYAS
ID No. 66



INSTITUCIÓN EDUCATIVA RURAL CHURIDÓ
PUEBLO
ID No. 86



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAGRADO
CORAZÓN DE JESÚS SEDE EU JESÚS MORA
ID No. 112



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN MARTÍN DE
PORRES SEDE EU GONZALO MEJÍA



GRUPO 1, Departamentos de Antioquia – Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-049-2023 – OBRAS CAPITAL S.A.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-052-2023 – INTERVENTORIAS Y CONSULTORIAS S.A.S.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA JOSÉ MARÍA HERRÁN
SEDE CER PAULINA PUERTA
ID No. 42

INSTITUCIÓN EDUCATIVA TÉCNICO
AGROAMBIENTAL SEDE MARÍA AUXILIADORA DE
MANUNGARA
ID No. 150



INSTITUCIÓN EDUCATIVA NORMAL SUPERIOR
DEMETRIO SALAZAR CASTILLO SEDE CE
ESCUELA FRANCISCO MIRANDA



CENTRO EDUCATIVO PUEBLO NUEVO SEDE PRINCIPAL
ID No. 94



Grupo 2

Fecha inicio: 27/11/2023
Fecha Fin: 05/09/2024



Departamento	Atlántico
\$	Valor Inicial Obra: \$4.044.124.630 Interventoría: \$295.715.000
	Adiciones Obra: \$ 0,00 Interventoría: \$113.699.014 (\$57.808.105,6 asumidos por el contrato de obra) (\$55.890.908,4 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: \$4.028.747.780,96 Interventoría: \$374.270.637,53
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (5 meses y 5 días) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas (5 meses y 5 días) y adiciones (\$113.699.014)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Terminado el 05.09.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Terminado el 05.11.2024 AERS COMPONENTE 2: - Contrato de obra suscrita el 10.02.2025 y en proceso de actualización de pólizas para revisión y aprobación por parte de la Fiduciaria Popular. - Contrato de interventoría en proceso de revisión para presentar a firmas, proceso que se espera se de en la semana del 17 al 21 de febrero de 2025 En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 28 de febrero de 2025 y posterior la de interventoría.



INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE
PRINCIPAL - ID EN 018



INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE
PRINCIPAL - ID EN 018



INSTITUCION EDUCATIVA BLAS TORRES DE
LA TORRE (ITIDA) - ID MEN 144



INSTITUCION EDUCATIVA DE MESOLANDIA - ID
MEN 197



INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS
TABLAS Y PITA, SEDE PITA - ID MEN 092





INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS
TABLAS Y PITA, SEDE LAS TABLAS - ID MEN 083



INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE
VILLA ROSA, SEDE LA LOMA - ID MEN 084

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DE
GALAPA - ID MEN 064

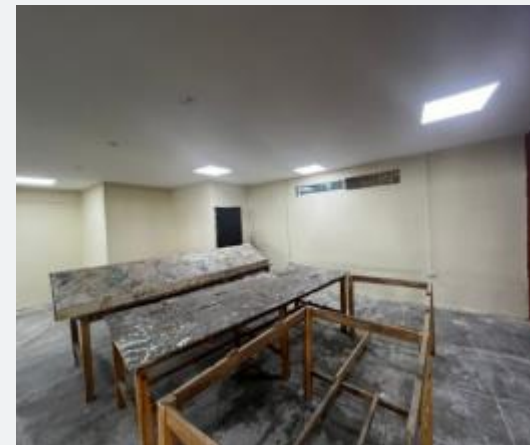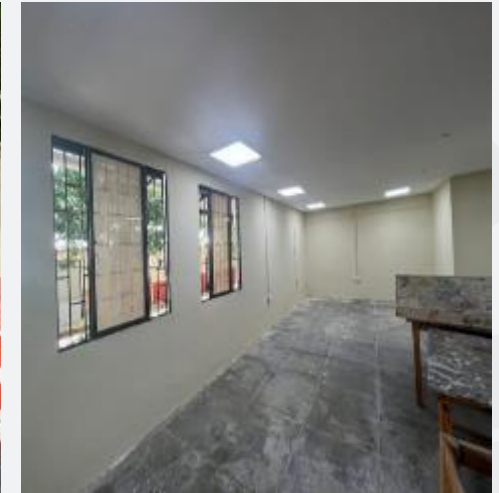

Grupo 4

Fecha inicio: 24/10/2023
Fecha Fin: 07/02/2024



Departamento	Magdalena y Bolívar
\$	Valor Inicial Obra: \$3.566.467.466.00
	Valor inicial Interventoria: \$264.974.745,00
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$20.000.000.00 (El contratista pago \$10.000.000.00 y el convenio \$10.000.000.00) Valor final Interventoria \$ 284.974.745,00
	Valor Pagado Obra: \$3.361.652.674.57 Valor Liberado contrato de obra: \$204.814.791.43 Interventoría: \$279.439.929.41 Valor a Liberar:\$5.534.815.59
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otro Sí 1: Prorroga un (1) y quince (15) días. Otro Sí 2: Exclusion de dos (2) (TACAMOCHO y EDM JAIME) por la imposibilidad técnica para ejecutar.
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de Obra Liquidado y culminado. Se inicia tramite de liquidación de la interventoría el 17 de febrero 2025.



Grupo 5

Fecha inicio: 14/11/2023
Fecha Fin: 08/11/2024

Departamento	Magdalena y Bolívar
\$	Valor Inicial Obra: \$4.102.044.984 Interventoría: \$300.856.990
	Adiciones Obra: \$778.973.616 Interventoría: \$172.224.091 (\$91.100.000 asumidos por el contrato de obra) (\$81.124.091 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: \$4.745.371.433 Interventoría: \$420.967.384,31
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	5 otrosíes obra: Prórrogas (7 meses y 20 días) y adiciones (\$778.973.616) 5 otrosíes interventoría: Prórrogas (7 meses y 20 días) y adiciones (\$172.224.091)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Terminado el 08.11.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Terminado el 08.01.2025 AERS COMPONENTE 2: Contrato de Obra e Interventoría, en proceso de revisión y VoBo por parte de la Fiduciaria Popular, para pasar a firmas, una vez se tenga las AERS suscritas se procederá a solicitar la actualización de pólizas. En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 15 de marzo de 2025 y posterior la de interventoría.



GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.



INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO
PALLARES SEDE PRINCIPAL
ID No. 30



INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO
PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101



INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO
PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO
SEDE CHINELA
ID No. 97



INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE
PUERTO LA ESTANCIA
ID No. 147



INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE
TORRECILLA
ID No. 148



GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.


INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE
TRONCONAL
ID No. 146



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE ISLITA
ID No. 32



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
OSCAR PISCIOTTI NUMA SEDE INMACULADA
CONCEPCION

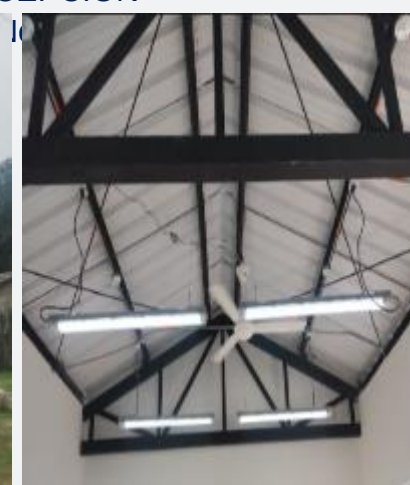

INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ
VANEGAS



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE
BALSAMO SEDE PRIMARIA
ID No. 13



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE
BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL
ID No. 14



GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO
VIDES ESCOBAR SEDE PRINCIPAL
ID No. 06



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO
VIDES ESCOBAR SEDE CERRITO
ID No. 10



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO
VIDES ESCOBAR SEDE ATASCOZA
ID No. 09



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR SEDE PLAN BONITO
ID No. 43



Departamento	La Guajira		
\$	Valor Inicial Obra: \$4.158.777.879 Interventoría: \$295.239.000		
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$0		
	Valor Pagado Obra: \$ 3.738.535.259,01 (89,89%) Interventoría: \$121.499.000 (41,15%)		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión 1	por 20 días	28 de oct de 2024
	Prórroga 1	por 45 días	13 de sep de 2024
	Suspensión 2	por 30 días	18 de nov de 2024
	Prórroga 2	por 30 días	19 de dic de 2024
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-ATMEN5-O-036-2024: Terminado el 17.01.2025 CONTRATO PAF-MENAM-I-059-2023: Fecha de Terminación el 17.03.2025 Actualmente el contrato de obra está en elaboración del AERS del componente II por parte de la interventoría para firma en fidupopular.		



REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)



ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)




ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)



REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)

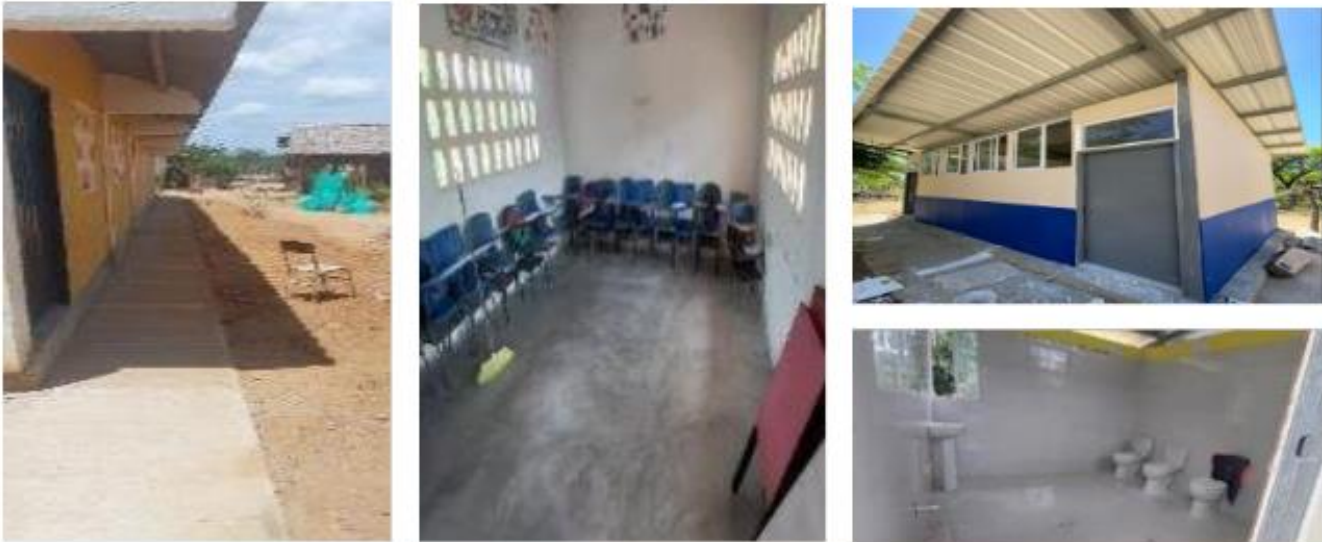

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)



REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011-
ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)



ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA
ESTRELLA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-
YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152-
YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)



Departamento	Córdoba y Bolívar
\$	Valor Inicial Obra: \$\$4.706.470.280 M/CTE Interventoría: \$297.097.668,00 M/CTE
	Adiciones Obra: \$1.455.000.000 Interventoría: \$144.106.877
	Valor Pagado Obra: \$6.161.470.280 Interventoría: \$277.437.804
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prorroga 1: 2 meses y 15 días Prorroga 1: 2 meses
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de obra: liquidado. Contrato de interventoría: En consolidación y revisión documentos por la supervisión para el inicio del proceso de liquidación.



REGISTRO FOTOGRAFICO

Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano



Sede Buenos Aires - María La Baja



Sede Los Cerros - Planeta Rica



Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja



Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel



Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín



REGISTRO FOTOGRAFICO

Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador



Sede Níspero-María La Baja



Sede Los Aguacates - Cotorra



CONTRATOS LIQUIDADADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 3	Magdalena	5	14/11/2023	12/04/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 01/10/2024, pagado 100%. LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 20/12/2024, pagado 100%.
Grupo 6	Cesar	7	15/11/2023	29/04/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-056-2023: Suscrita Acta de liquidación el 20/11/2024 y pagado al 100%. LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-058-2023: Suscrita Acta de liquidación el 27/11/2024 y pagado al 100%.

COMPROMISOS

- Definir por parte de Findeter el valor de la posible adición para el grupo 9.
- Revisar por parte de Findeter el cronograma general de ejecución del convenio teniendo en cuenta que aún no ha iniciado las actividades de 2 sedes en el grupo 9. Tiempos de liquidación será muy corto.
- Agilizar por parte de Findeter el Otro Sí de la dotación y su firma con base en los comité técnicos y fiduciarios a citar.
- Remitir por parte de Findeter el informe de avance de las sedes de Grupo 10, sobre todo de las sedes ejecutadas en Suárez.
- Compartir desde Findeter las actas de entregas de las sedes del Cauca al ing. Juan Carlos Folleco Olave de la secretaria de Educación del Cauca.
- Revisar y confirmar por parte de Findeter que el seguimiento con la Fiduprevisora se ha realizado permanentemente y que la información en la carpeta compartida se encuentra al día.



Findeter

Banca de Desarrollo Territorial



GRACIAS

www.findeter.gov.co

f @findetercol i @findetercol
t @findeter in linkedin.com/company/findeter



**MINISTERIO DE EDUCACION
NACIONAL**

**Contrato No. CO1.PCCNTR. 4917031
DE 2023**

10 DE ABRIL DE 2025

Contrato No. 4917031-2023




136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio:
Fecha Fin Actual:

2/06/2023
01/07/2025

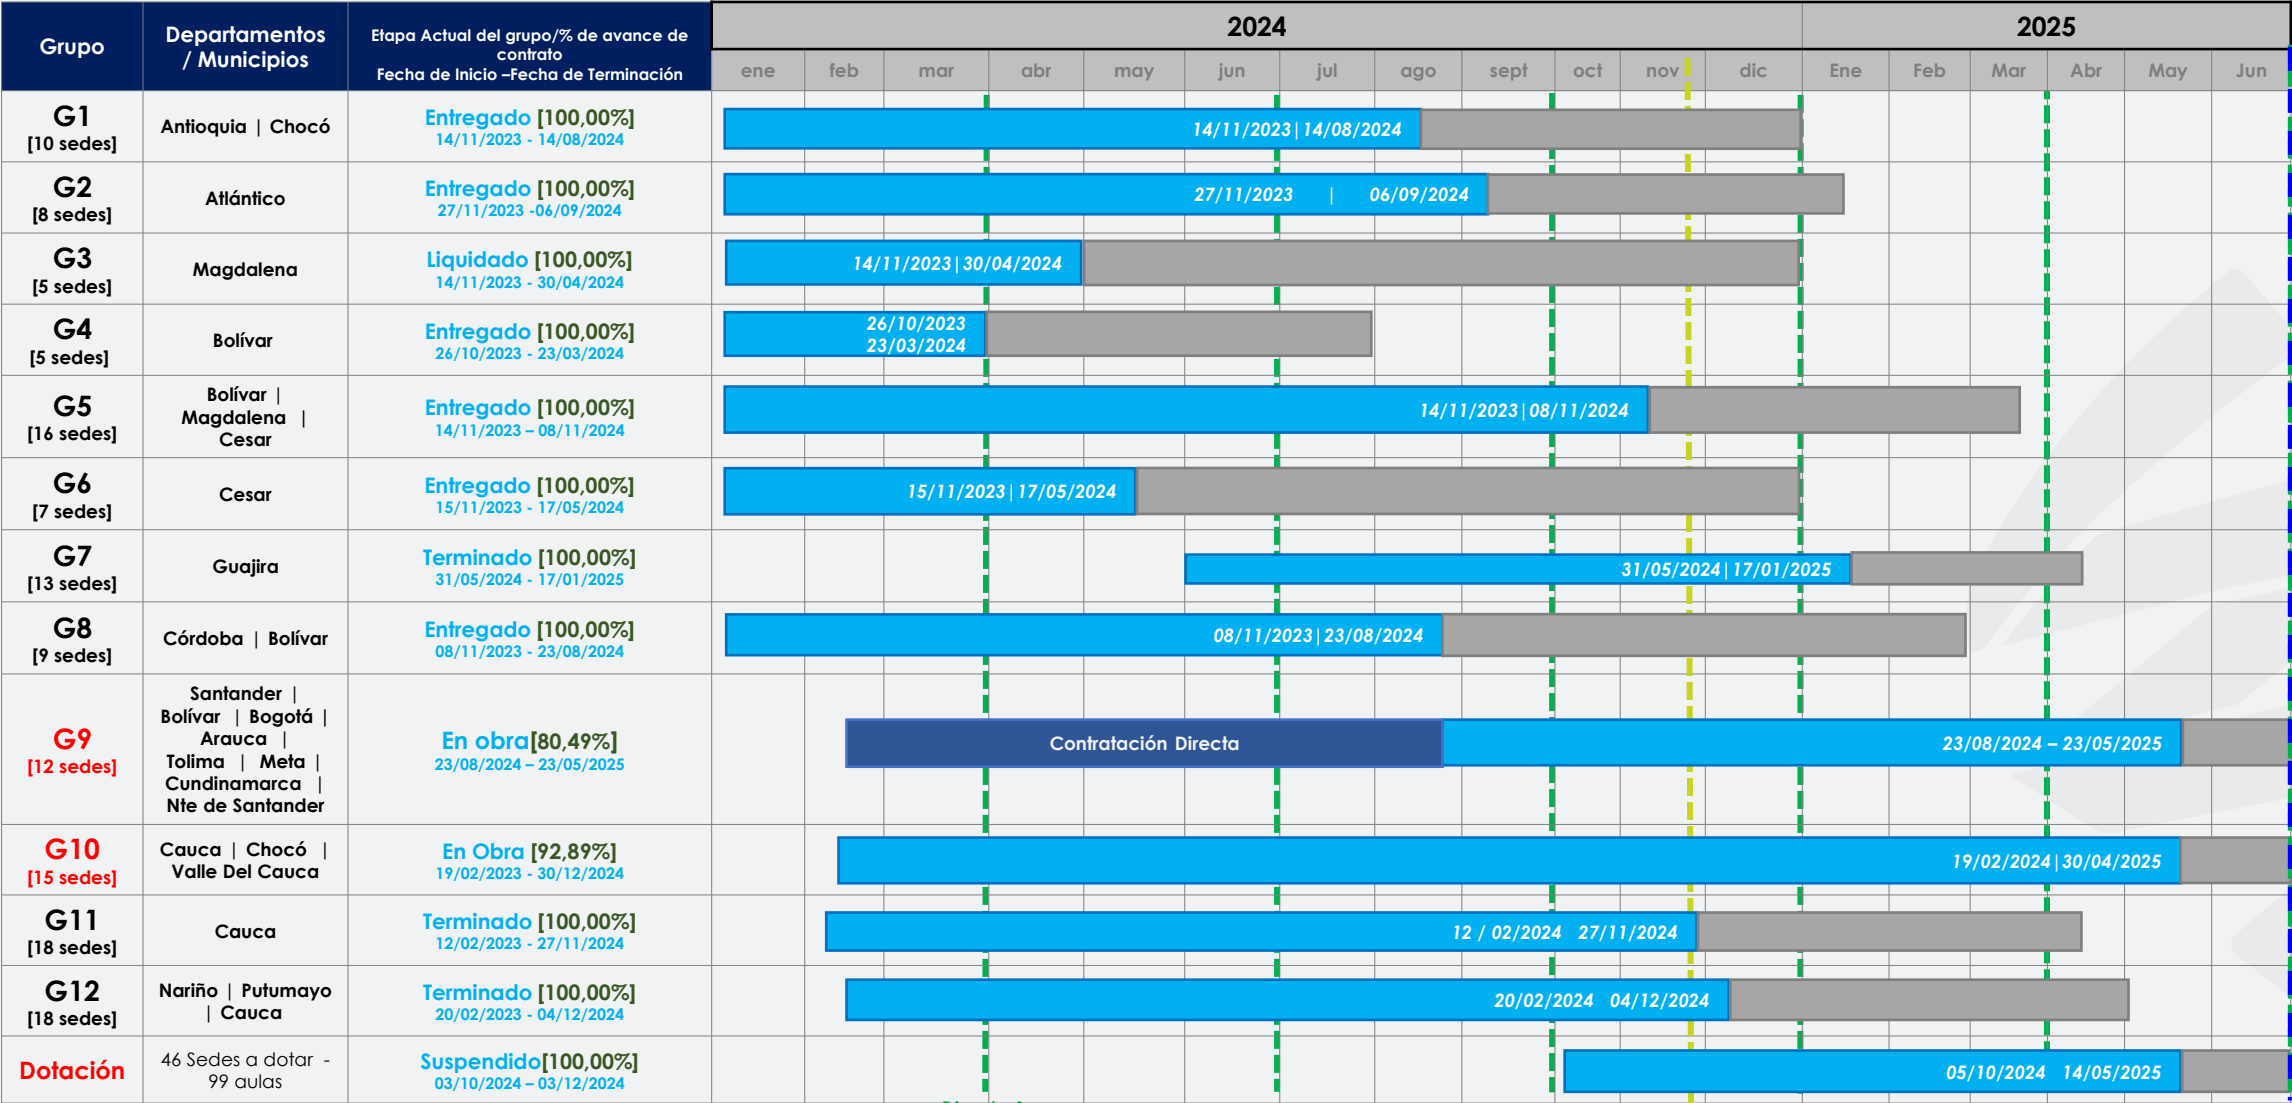

21/11/2024

1 julio de 2025 - Fecha Fin Interadministrativa

Aulas Móviles

Contrato No. 4917031-2023



136 sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

ENTREGADAS

118 sedes
86,76%

TERMINADAS


Físicamente culminadas. A la espera de firma de actas para ser entregadas

8 sedes
3,68%

EN EJECUCIÓN

13 sedes
9,56%

Estado de entrega y ejecución de Sedes

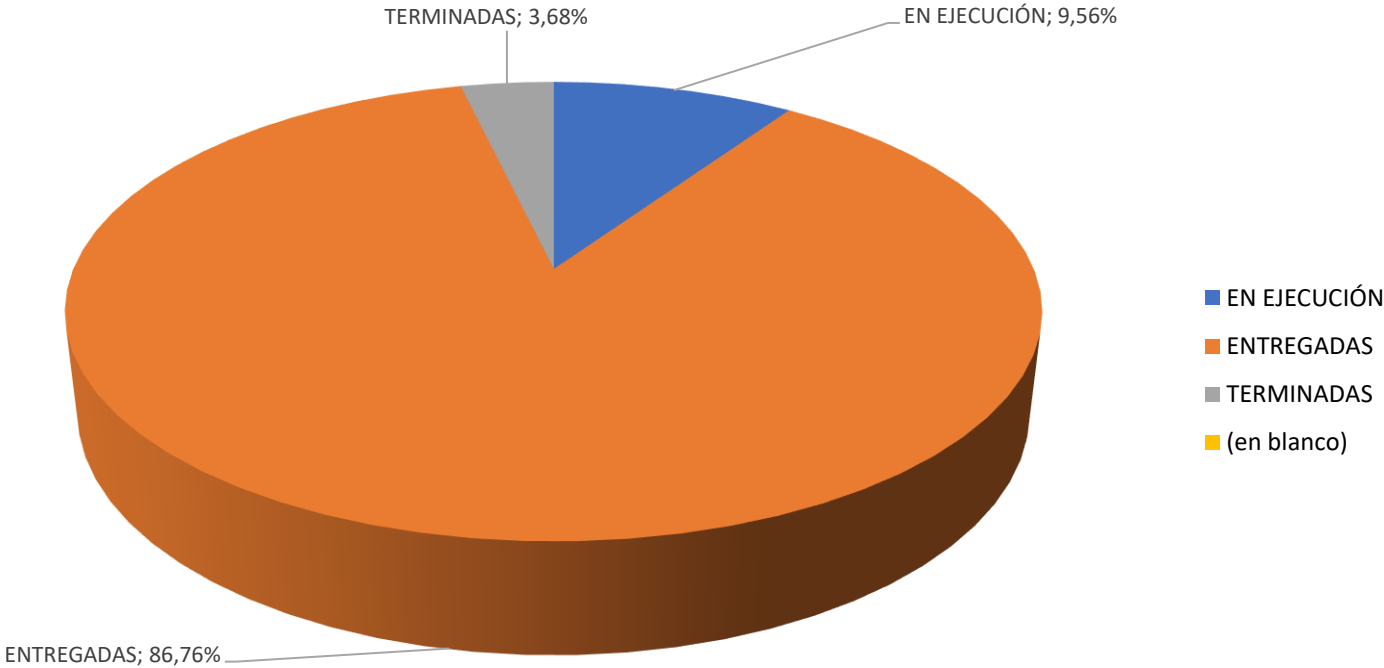

Estado de entrega y ejecución de Sedes



136 sedes educativas
[instalación de aulas y
mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

ENTREGADAS	TERMINADAS	EN EJECUCIÓN	POR INICIAR
124 sedes 91,18%	3 sedes 2,21%	9 sedes 6,62%	0 sedes 0%
Grupo 1 - 10 Grupo 2 - 8 Grupo 3 - 5 Grupo 4 - 5 Grupo 5 - 16 Grupo 6 - 7 Grupo 7 - 13 Grupo 8 - 9 Grupo 9 - 4 Grupo 10 - 11 Grupo 11 - 18 Grupo 12 - 18	Grupo 9 - 2 Grupo 10 - 1	Grupo 9 - 6 Grupo 10 - 3	

PAGOS ASISTENCIA TECNICA



136 sedes educativas
[instalación de aulas y
mejoramientos]

\$ 63.650
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

VALOR AT
\$ 4.164.018.692

Cobrado
(a enero de 2025)

\$3.925.094.903,52

Pagado
(a enero de 2025)

\$ 3.925.094.903,52

SALDO

\$ 238.923.788,48

* Pendiente la autorización de cuenta del mes de enero por valor de \$ 96.078.561,89

Resumen Informe Financiero – Corte 28 de febrero de 2024

**136** sedes educativas
[instalación de aulas y mejoramientos]

**\$ 63.650**
Millones de pesos



Fecha inicio: 02/06/2023
Fecha Fin: 01/07/2025

**VALOR
EJECUTADO**

\$ 53.416 mll

**VALOR POR
EJECUTAR**

\$ 10.363 mll

**VALOR
COMPROMETIDO**

\$ 59.515 mll

SALDO

\$ 403,4 mll*

*El saldo es a corte de 28 de febrero de 2025

Rendimientos Financieros – Relación de Pagos



Contrato Interadministrativo No. CO1.PCCNTR. 4917031
Ministerio de Educación Nacional
Financiera del Desarrollo S.A.
[7. RENDIMIENTOS FINANCIEROS](#)
01 de febrero al 28 de febrero de 2025



FECHA	RENDIMIENTOS CAUSADOS CUENTA DE AHORRO	VALORACIÓN /DESVALORIZACION CAUSADOS FONDO DE INVERSION COLECTIVA - FIC	TOTAL RENDIMIENTOS, VALORACION DEVALORIZACION CAUSADOS	FECHA TRASLADO REINTEGRO RENDIMIENTOS	VALOR TRASLADO RENDIMIENTOS	AJUSTES / RETENCIONES	SALDO PENDIENTE POR TRASLADAR RENDIMIENTOS	DESVALORIZACION ACUMULADA
ago-23	82.351.406,35	443.947.650,01	526.299.056,36				-	-
sep-23	108.927.246,74	548.880.836,71	657.808.083,45				-	-
oct-23	131.902.760,66	436.008.307,20	567.911.067,86				-	-
nov-23	144.907.033,92	718.224.229,49	863.131.263,41				-	-
dic-23	143.221.271,36	788.090.860,63	931.312.131,99	13/12/2023	2.615.149.472,00		-	-
ene-24	133.626.379,48	427.858.051,59	561.484.431,07	10/01/2024	931.312.131,99		-	-
feb-24	120.547.529,88	474.970.095,24	595.517.625,12	12/02/2024	561.484.430,15		-	-
mar-24	117.745.976,50	478.495.863,61	596.241.840,11	12/03/2024	595.517.625,12		-	-
abr-24	100.331.907,69	259.736.382,70	360.068.290,39	10/04/2024	596.241.840,11		-	-
may-24	89.374.457,56	353.632.163,66	443.006.621,22	11/05/2024	360.068.290,39		-	-
jun-24	76.820.331,89	266.323.590,41	343.143.922,30	13/06/2024	443.006.621,22		-	-
jul-24	68.012.790,67	294.233.627,01	362.246.417,68	15/07/2024	343.143.922,30		-	-
ago-24	21.741.419,32	313.006.436,96	334.747.856,28	14/08/2024	362.246.417,68		-	-
sep-24	20.861.120,00	192.185.501,19	213.046.621,19	10/09/2024	334.747.856,28		-	-
oct-24	27.022.756,52	71.175.915,03	98.198.671,55	18/10/2024	213.046.621,19		-	-
nov-24	21.729.373,21	129.213.183,82	150.942.557,03	13/11/2024	98.198.671,55		-	-
dic-24	19.252.522,64	66.886.746,40	86.139.269,04	10/12/2024	150.942.557,03		-	-
ene-25	16.704.545,81	83.803.505,05	100.508.050,86	8/01/2025	86.139.269,04		-	-
feb-25	13.476.388,13	66.394.607,02	79.870.995,15	11/02/2025	100.508.050,86		79.870.995,15	-
TOTAL	1.458.557.218,33	6.413.067.553,73	7.871.624.772,06		7.791.753.776,91		79.870.995,15	-

Rendimientos Financieros – Comprobante de pago

Fecha Actual: 2025/03/12 | Hora: 15:25 | IP: 190.144.253.210



WWW.BANCOPOPULAR.COM.CO

Archivos Cargados

Estimado (a): DIANA PAOLA DONCEL MORGOTE

A continuación el detalle de: Resumen Registros Enviados - Ver Registros

Tipo Archivo	Nombre Archivo	Nombre Técnico Archivo	Fecha Envío	Valor Total Archivo	No. Registros Enviados	Estado
Pagos	7330	POJFO1M1SU	2025/03/10	\$79,870,995.15	2	Procesado

Información Adicional

Fecha Carga	Hora Carga	Hora Envío	Usuario Creador	Fecha Actualización	Hora Actualización	Valor Total Archivo	Valor Archivo Enviado
2025/03/10	13:27:49	13:29:36	ANDRES FORERO PEREZ	2025/03/11	20:50:13	\$79,870,995.15	\$79,870,995.15

Valor Registros	Valor Registros Errores	No. Total Registros	No. Registros	No. Registros	No. Registros en	Usuario Aprobado/Rechaza
\$0.00		0	0		2	JORGE LINARES CUEVENTES

Detalle de pago

Producto Originador	Fecha Efectiva	Valor Transacción	No. Identificación Receptor	Nombre Receptor	No. Ruta	Entidad Financiera	No. Dígito Chequeo	Tipo Transacción	No. Producto Destino	No. Identificación Originador	Propósito de la Transacción	Descripción Causal Rechazo	Estado
500004650480	2025/03/10	\$13,476,398.13	900078341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Credito Cuenta Ahorros	309054583	000000630053891	PAGOS		Procesado
500004650480	2025/03/10	\$66,394,607.02	900078341	FONDO NACIONAL DEL RIE	00001	Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Colombia S.A.	9	Credito Cuenta Ahorros	309054583	000000630053891	PAGOS		Procesado

NOTA: Teniendo en cuenta el contrato MEN-4917031 2023 -TEMPORADA DE LLUVIAS, y en atención a la obligación descrita en la cláusula tercera, Obligaciones específicas del contratista, Numeral 8 el cual dice:

"8. El Patrimonio Autónomo — Findeter deberá reintegrar mensualmente los rendimientos financieros (si los hubiere) a la Dirección del Tesoro Nacional o en los términos que establezca la normatividad aplicable, es decir, que no ingresan ni hacen parte del Patrimonio Autónomo constituido por Findeter."

Se han consignado los rendimientos financieros a la siguiente cuenta:

- Banco: BBVA
- Tipo: Ahorros
- No. Cuenta: 309-054583
- Nombre de la Cuenta: FIDUPREVISORA S.A FNGRD – COLOMBIA VITAL

AULAS MOVILES INFORME DETALLADO POR GRUPO DE INTERVENCION

10 de Abril de 2025



CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	% PROGRAMADO	% EJECUTADO	ALERTAS, ASUNTOS PENDIENTES
GRUPO 9	Arauca, Bolívar, Cundinamarca Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.	12	23/08/2024	23/05/2025	89,84%	80,49%	Se presentaron inconvenientes en las dos (2) sedes ubicadas en el municipio de Santa Isabel, departamento del Tolima en razón a precipitaciones presentadas que perjudicaron la vía de acceso a la zona, lo cual ha generado que se realice el transporte de materiales con el uso de mulas; para estas sedes se aprobó prórroga de dos (2) meses y quince (15) días calendario para culminación de actividades. Para las demás sedes se presenta un retraso en seis (6) de las diez (10) sedes que están en ejecución y tienen fecha de terminación el 8 de marzo de 2025. Por lo anterior, se debe continuar el proceso de apremio hacia el contratista de obra por las moras que se han presentado y que son imputables a este.
GRUPO 10	Cauca, Valle del Cauca y Choco	15	19/02/2024	30/04/2025	94,54%	92,89%	Debido a los problemas de orden publico los proyectos del Cauca en el mes de enero y febrero generaron suspensión actividades parciales y retiro de personal trabajador por temor a la situación, hechos que afectaron los avances de los proyectos y derivado de esto, se adelanto un tramite de modificación a los contratos derivados en prorroga de un (1) mes para compensarle a los proyectos el tiempo perdido, por tal motivo la fecha de terminación del contrato de obra es el 30 de abril de 2025, actualmente <u>los proyectos del cauca residen afectación por temas de orden público que generan atrasos en las actividades contractuales</u>, que están generando atrasos frente a la programación. El proyecto de la sede Domingullo en el Municipio de Santander de Quilichao continua la ejecución de sus actividades contractuales, adicional la administración municipal continua avanzando en la ejecución de las obras de las acometidas eléctricas, hidráulicas y sanitarias, terminación que se espera se de para la ultima semana de abril y de esta forma poder realizar la conexión correspondiente para la funcionalidad del proyecto.

CONTRATOS EN EJECUCION

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
DOTACIÓN	Antioquia, Atlántico, Bolivar, Cauca, Cesar, Chocó, Córdoba, Cundinamarca, La Guajira, Magdalena, Meta, Nariño, Putumayo, Santander, Tolima, Valle del Cauca	46	03/10/2024	14/06/2025	Valor del contrato inicial de \$584.310.000,00. Dotación entregada en los grupos 1, 2, 3, 4, 6, 8, 10 y 11 y, pendiente la entrega de los grupos 5, 7, 9, 10 y 12. Mediante comité Fiduciario N. 54 del 14 de marzo se aprobó el Otro Sí, a la fecha se espera la legalización por parte de la fiducia Valor : \$359.945.454,80 y adición de 3 meses por las condiciones de accesibilidad de las nuevas sedes. La ejecución se realiza en 16 departamentos, 38 municipios y se realiza la dotación de 98 aulas nuevas construidas.

Grupo 09

Fecha inicio: 23/08/2024
Fecha Fin: 23/05/2025



Departamento	Arauca, Bolívar, Cundinamarca, Meta, Norte de Santander, Santander, Tolima y Bogotá D.C.
\$	Valor Inicial Obra: \$ 4.810.476.306,00 Interventoría: \$ 313.800.000
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$165.685.393,30
	Valor Pagado Obra: CI- \$245.711.234,70 CII - \$ 1.412.969.897,09 Interventoría: CI - \$0 CII - \$ 184.217.809,91
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otrosí No. 1: Retiro de tres (3) sedes del alcance Otrosí No. 2: Prórroga tres (3) meses obra e interventoría, adición interventoría por \$165.685.393,30 Otrosí No. 3: Prórroga dos (2) meses y quince (15) días calendario para las sedes del Tolima
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	ID No. 56 – Arauca: Entregada el 19/02/2025 ID No. 132 – La Playa: Entregada el 17/03/2025 ID No. 7 – Vélez: Entregada el 20/03/2025 ID No. 138 - Arauca: En culminación de pintura de salones, entrega tentativa el 29/04/2025 ID No. 104 – Anolaima: En terminación de actividades, entrega tentativa el 24/04/2025 ID No. 96 – Villavicencio: En subsanación de temas presentados en las aulas, entrega tentativa 02/05/2025 ID No. 124 – Simití: En actividades de limpieza y culminación, entrega tentativa 22/04/2025 ID No. 123 – Simití: Continúa en actividades de aula nueva, entrega tentativa 06/05/2025 ID No. 20 – Morales: Continúan en actividades de mejoramientos, se han presenta inconvenientes de orden público, entrega tentativa 07/05/2025. ID No. 17 – Betulia: Terminada, entrega tentativa el 25/04/2025 ID No. 67 y 100 – Santa Isabel: Se encuentran en actividades de cimentación y traslado de los kits de las aulas al lugar de intervención.



Sedes:	12
En ejecución:	8
Terminadas:	1
Entregadas:	3

COLEGIO UNIVERSITARIO - ID No. 7



IE DEL CERRO DE VERACRUZ -ID No. 124



CENTRO EDUCATIVO MONSERRATE - ID No. 138




EL DESCANSO - ID No. 104



ESCUELA SIETE DE AGOSTO - ID No. 96



SEDE LA PEÑA – ID No. 132

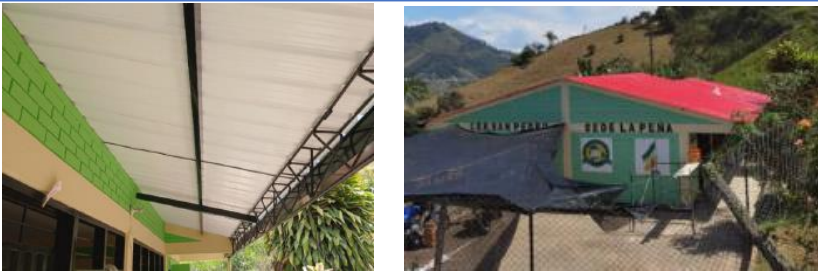

LA ARCADIA - ID No. 20



SANTA BARBARA - ID No. 17



CAMPO PAYARES - ID No. 123



EL BRASIL - ID No. 100



LA HUMAREDA - ID No. 67



Departamento	Cauca, Valle del Cauca y Choco
\$	Valor Inicial Obra: \$6.014.978.800 Interventoría: \$327.496.568
	Adiciones Obra: \$602.576.550 Interventoría: \$209.692.862,65 (\$79.155.973,39 asumidos por el contrato de obra) (\$130.536.889,26 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: \$5.819.633.384,00 Interventoría: \$409.151.416,98
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	4 otrosíes obra: Prórrogas (10 meses y 27 días) 4 otrosíes interventoría: Prórrogas (10 meses y 27 días) y adiciones (\$209.692.862,65)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	En cumplimiento al alcance <u>se tienen 11 sedes entregadas y AEP&SC suscritas, 1 en proceso de entrega y 3 en ejecución, (2 Suarez, 1 Santander de Quilichao).</u> En espera de agenda del rector para programar la entrega de la sede la Huaca en Bahía solano, proceso que se proyecta se de entre las semanas del 7 al 16 de abril, Frente a las obras de Suarez y Santander de Quilichao se continua con el avance de actividades con un personal mínimo derivado por los temas de orden publico, situación que reside en la zona y que a la fecha están afectando los avances de los proyectos.



Sedes:	15
En ejecución:	3
Terminadas:	1
Por iniciar:	0
Entregadas:	11

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE INMACULADA ID MEN. 189.



INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE PRINCIPAL ID 16



Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SAN JOSE (HUACA)



INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE FRANCISCO DE PAULA SANTANDER ID MEN. 190



Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



INSTITUCION E.TECNICA AGRARIA SEDE PRINCIPAL ID MEN. 188.

IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SECUNDINO RIVAS



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LA PLAYA ID MEN: 12.
MUNICIPIO DE TORIBIO ID MEN: 12.

INSTITUCION EDUCATIVA DOMINGUILLO SEDE
DOMINGO LASSO ID 164.

IE. LUIS LOPEZ DE MESA SEDE SIRENA DEL MAR



ica

Estado GRUPO 10, Departamentos de Cauca, Valle del Cauca - Chocó

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-080-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 10
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-062-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE
JOHN F. KENNEDY



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE
SEDE JULIAN MENDOZA GUERRERO



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE
PRINCIPAL



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA
HONDA .



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE LA
PLANTA .



IE. MANUEL ANTONIO SANCLEMENTE SEDE
CRISTOBAL COLÓN



lica

Estado Entrega de Dotación

CONTRATO INICIAL



PAF-ATMEN5-S-041-2024

Publicada

17 DE JULIO DE 2024.

Informe Definitivo:

Comité Fiduciario No 41 del 25 de agosto.

Adjudicado:

DOTAESCOL SAS

Valor Inicial \$ 584.310.000,00

Adición: \$ 359.945.454,80

Valor final: \$ 944.255.454,8

Acta de Inicio: 3 de octubre de 2024

5 meses de ejecución.

Terminación: 14 de junio de 2025

- ➡ 16 DEPARTAMENTOS
- ➡ 38 MUNICIPIOS
- ➡ 98 AULAS NUEVAS CON DOTACIÓN

CONTRATO ADICIÓN



Cronograma de Entregas Otro Sí (34 Aulas nuevas)

				CRONOGRAMA ENTREGAS
Grupo	Sede	Municipio	Departamento	
SEDES ADICIONALES				
5	CENTRO EDUCATIVO RURAL MIX JOSE DE L/	El Banco	Magdalena	22/04/2025
5	SEDE CHINELA	Curumaní	Cesar	24/04/2025
5	SEDE TRONCONAL	Chimichagua	Cesar	24/04/2025
7	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMAI	Manaure	La Guajira	29/04/2025
7	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	Maicao	La Guajira	2/05/2025
7	SEDE KASICHE	Maicao	La Guajira	6/05/2025
7	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	Barrancas	La Guajira	7/05/2025
7	SEDE LA ESTRELLA	Maicao	La Guajira	8/05/2025
7	YAMAIN - KASPOLIMANA	Maicao	La Guajira	9/05/2025
7	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	Maicao	La Guajira	10/05/2025
9	COLEGIO UNIVERSITARIO	Vélez	Santander	12/05/2025
9	LA HUMAREDA	Santa Isabel	Tolima	13/05/2025
9	ESCUELA SIETE DE AGOSTO	Villavicencio	Meta	14/05/2025
9	EL BRASIL	Santa Isabel	Tolima	15/05/2025
9	ESCUELA RURAL EL DESCANSO	Anolaima	Cundinamarca	16/05/2025
9	CAMPO PAYARES	Simití	Bolívar	16/05/2025
10	LA PLANTA	Guadalajara de Buga	Valle del Cauca	9/05/2025
10	SEDE DE SAN JOSE (HUACA)	Bahía Solano(Mutis)	Chocó	13/05/2025
12	INSTITUCION EDUCATIVA INMACULADA CON	Cumbal	Nariño	14/05/2025
12	ESC RUR MIX EL JARDIN ALTO TETEYE	Puerto Asís	Putumayo	19/05/2025
12	ESC RUR MIX EL PROGRESO	Puerto Asís	Putumayo	19/05/2025
12	ESC RUR MIX ALTO ORITO	Orito	Putumayo	19/05/2025
SUBTOTAL				
NO ENTREGADAS				
SUBTOTAL PARA FACTURAR				
TOTAL CONSOLIDADO				

Estado Entrega de Dotación



**CENTRO EDUCATIVO INDIGENA CAÑO
PADILLA YUKPA**

Sede El Coso La Paz – Cesar



**INSTITUCION EDUCATIVA SAN
JERONIMO**

Sede Escuela Nueva Parcelas Londres
Ayapel – Córdoba



**INSTITUCION EDUCATIVA EL
PALMAR**

Escuela Nueva Mixta Divino Salvador
Monte Líbano – Córdoba



**INSTITUCION EDUCATIVA
DOMINGUILLO**

Sede Principal Santander de Quilichao –
Cauca



**INSTITUCION EDUCATIVA
DEPARTAMENTAL DE LA PACHA
ERM MARIA AUXILIADORA**

Sede
Sebastián de Buenavista – Magdalena



**INSTITUCION EDUCATIVA
TIERRA FIRME**

Mompox – Bolivar

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 2	Atlántico	8	27/11/2023	05/09/2024	<u>CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023</u>: Terminado el 05.09.2024 <u>CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023</u>: Terminado el 05.11.2024 CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Documentos Liquidación radicados el 27.02.2025 a través PRISA INC 2025-000620, asignación liquidador el 5.03.2025 Rubén Moscoso, el liquidador envía observaciones el 08.03.2025 las cuales fueron ajustadas y radicadas nuevamente el 25.03.2025 para continuar tramite de liquidación CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Documentos Liquidación radicados el 27.02.2025 a través PRISA INC 2025-000621, y en revisión del área de liquidaciones.

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 4	Magdalena y Bolívar	7	24/10/2023	07/02/2024	Se encuentra liquidado el contrato de obra. El contrato de interventoría tuvo observaciones al informe final para firma del acta de recibo a satisfacción.
Grupo 5	Magdalena y Bolívar	16	14/11/2023	08/11/2024	<u>CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023</u>: Terminado el 08.11.2024 <u>CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023</u>: Terminado el 08.01.2025 CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Liquidación radicada el 25.03.2025, PRISA INC 2025-000861, asignación liquidador el 1.04.2025 Hernán Erazo, envía observaciones el 08.04.2025 las cuales serán revisadas y atendidas por la supervisión CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Liquidación radicada el 08.04.2025, PRISA INC 2025-000983, en espera asignación liquidador.
Grupo 7	La Guajira	13	31/05/2024	17/01/2025	AERS del componente II Obra firmada 28feb2025 por Rep. legal Fidupopular. El contrato de obra se estima iniciar su trámite de liquidación a mediados de abril; una vez adjunten toda la documentación correspondiente y se elabore acta conjunta con interventoría. Con respecto a la interventoría le falta facturar casi un 60% y se estima su liquidación para iniciar a finales de mayo 2025.
Grupo 8	Córdoba y Bolívar	9	08/11/2023	08/07/2024	En expedición el acta de liquidación del contrato. En consolidación la información del contrato de interventoría. Se proyecta su liquidación en el mes de marzo

CONTRATOS ENTREGADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 11	Cauca	18	12/02/2024	27/11/2024	Las 18 sedes educativas que conforman el contrato de obra fueron entregadas y recibidas a satisfacción por parte de los Directivos de Cada Sede. Acta de entrega y recibo a satisfacción del componente 2 suscrita y legalizada. Contratista e interventoría se encuentran consolidando documentos de cierre de componente 2 y documentos que soportan inicialmente la liquidación del contrato de obra.
Grupo 12	Cauca, Huila, Nariño y Putumayo	18	12/02/2024	04/12/2024	CONTRATO PAF-MENAM-O-076-2023: Radicado al equipo de liquidación de Findeter por PRISA No. INC 2025-000928 de fecha 04/04/2025 en revisión. CONTRATO PAF-MENAM-I-064-2023: En recopilación de información de liquidación, en suscripción de acta de entrega y recibo y actualización de pólizas. Radicación proyectada 30/04/2025.

Grupo 2

Fecha inicio: 27/11/2023
Fecha Fin: 05/09/2024



Departamento	Atlántico
\$	Valor Inicial Obra: \$4.044.124.630 Interventoría: \$295.715.000
	Adiciones Obra: \$ 0,00 Interventoría: \$113.699.014 (\$57.808.105,6 asumidos por el contrato de obra) (\$55.890.908,4 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: \$4.028.747.780,96 Interventoría: \$374.270.637,53
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (5 meses y 5 días) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas (5 meses y 5 días) y adiciones (\$113.699.014)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-MENAM-O-050-2023: Terminado el 05.09.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-053-2023: Terminado el 05.11.2024 AERS COMPONENTE 2: - Contrato de obra suscrita el 10.02.2025 y en proceso de actualización de pólizas para revisión y aprobación por parte de la Fiduciaria Popular. - Contrato de interventoría en proceso de revisión para presentar a firmas, proceso que se espera se de en la semana del 17 al 21 de febrero de 2025 En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 28 de febrero de 2025 y posterior la de interventoría.



INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE
PRINCIPAL - ID EN 018



INSTITUCION EDUCATIVA JOSEFA DONADO SEDE
PRINCIPAL - ID EN 018



INSTITUCION EDUCATIVA BLAS TORRES DE
LA TORRE (ITIDA) - ID MEN 144




INSTITUCION EDUCATIVA DE MESOLANDIA - ID
MEN 197



INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS
TABLAS Y PITA, SEDE PITA - ID MEN 092





INSTITUCION EDUCATIVA CIEN PESOS, LAS
TABLAS Y PITA, SEDE LAS TABLAS - ID MEN 083

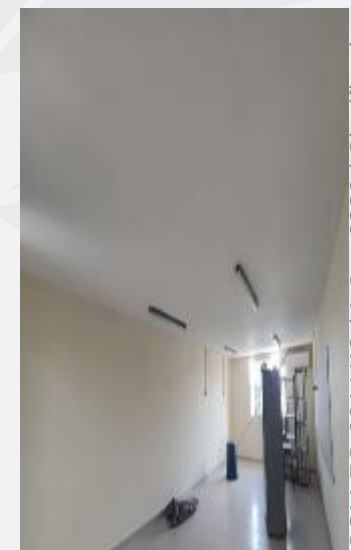

INSTITUCION EDUCATIVA TECNICA AGROPECUARIA DE
VILLA ROSA, SEDE LA LOMA - ID MEN 084

INSTITUCION EDUCATIVA MARIA AUXILIADORA DE
GALAPA - ID MEN 064

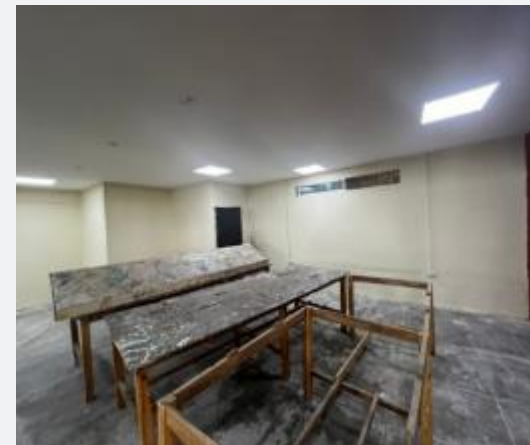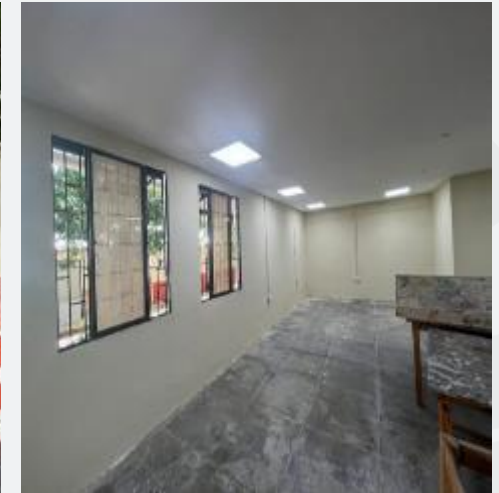

Grupo 4

Fecha inicio: 24/10/2023
Fecha Fin: 07/02/2024



Departamento	Magdalena y Bolívar
\$	Valor Inicial Obra: \$3.566.467.466.00
	Valor inicial Interventoria: \$264.974.745,00
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$20.000.000.00 (El contratista pago \$10.000.000.00 y el convenio \$10.000.000.00) Valor final Interventoria \$ 284.974.745,00
	Valor Pagado Obra: \$3.361.652.674.57 Valor Liberado contrato de obra: \$204.814.791.43 Interventoría: \$279.439.929.41 Valor a Liberar:\$5.534.815.59
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Otro Sí 1: Prorroga un (1) y quince (15) días. Otro Sí 2: Exclusion de dos (2) (TACAMOCHO y EDM JAIME) por la imposibilidad técnica para ejecutar.
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de Obra Liquidado y culminado. Se inicia tramite de liquidación: interventoría adelanta el proceso de radicación de los documentos para la liquidación 07/03/2025.



Grupo 5

Fecha inicio: 14/11/2023
Fecha Fin: 08/11/2024

Departamento	Magdalena y Bolívar
\$	Valor Inicial Obra: \$4.102.044.984 Interventoría: \$300.856.990
	Adiciones Obra: \$778.973.616 Interventoría: \$172.224.091 (\$91.100.000 asumidos por el contrato de obra) (\$81.124.091 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: \$4.745.371.433 Interventoría: \$420.967.384,31
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	5 otrosíes obra: Prórrogas (7 meses y 20 días) y adiciones (\$778.973.616) 5 otrosíes interventoría: Prórrogas (7 meses y 20 días) y adiciones (\$172.224.091)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-MENAM-O-053-2023: Terminado el 08.11.2024 CONTRATO PAF-MENAM-I-056-2023: Terminado el 08.01.2025 AERS COMPONENTE 2: Contrato de Obra e Interventoría, en proceso de revisión y VoBo por parte de la Fiduciaria Popular, para pasar a firmas, una vez se tenga las AERS suscritas se procederá a solicitar la actualización de pólizas. En recopilación documental, cierre de balances y memorias entre el contratista e interventoría, se proyecta radicar la liquidación del contrato de obra al 15 de marzo de 2025 y posterior la de interventoría.



GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.



INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO
PALLARES SEDE PRINCIPAL
ID No. 30



INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO
PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101



INSTITUCION EDUCATIVA CRISTIAN MORENO
PALLARES SEDE SERENOS
ID No. 101



INSTITUCIÓN EDUCATIVA CRISTIAN MORENO
SEDE CHINELA
ID No. 97



INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE
PUERTO LA ESTANCIA
ID No. 147



INSTITUCION EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE
TORRECILLA
ID No. 148



GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.

INSTITUCIÓN EDUCATIVA EL PUEBLITO SEDE
TRONCONAL
ID No. 146



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
RURAL SILVIA COTES DE BISWELL SEDE ISLITA
ID No. 32



INSTITUCION EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
OSCAR PISCIOTTI NUMA SEDE INMACULADA
CONCEPCION



INSTITUCIÓN EDUCATIVA DEPARTAMENTAL
ANTONIO NARIÑO SEDE JOSE DE LA PAZ
VANEGAS



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE
BALSAMO SEDE PRIMARIA
ID No. 13



INSTITUCIÓN EDUCATIVA SANTA CRUZ DE
BALSAMO SEDE JARDIN INFANTIL
ID No. 14



GRUPO 5, Departamentos de Cesar

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-053-2023 – CONSORCIO EDUCATIVO SJ 2023 G5.
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-056-2023 – CONSORCIO INFRAESTRUCTURA G5.



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO
VIDES ESCOBAR SEDE PRINCIPAL
ID No. 06



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO
VIDES ESCOBAR SEDE CERRITO
ID No. 10



INSTITUCIÓN EDUCATIVA LUIS GUILLERMO
VIDES ESCOBAR SEDE ATASCOZA
ID No. 09



INSTITUCIÓN EDUCATIVA TECNICA PESQUERA LEONIDAS ORTIZ ALVEAR SEDE PLAN BONITO
ID No. 43



Departamento	La Guajira		
\$	Valor Inicial Obra: \$4.158.777.879 Interventoría: \$295.239.000		
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$0		
	Valor Pagado Obra: \$ 3.738.535.259,01 (89,89%) Interventoría: \$121.499.000 (41,15%)		
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Suspensión 1	por 20 días	28 de oct de 2024
	Prórroga 1	por 45 días	13 de sep de 2024
	Suspensión 2	por 30 días	18 de nov de 2024
	Prórroga 2	por 30 días	19 de dic de 2024
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	CONTRATO PAF-ATMEN5-O-036-2024: Terminado el 17.01.2025 CONTRATO PAF-MENAM-I-059-2023: Fecha de Terminación el 17.03.20 AERS del componente II Obra firmada 28feb2025 por Rep. legal Fidupopular. El contrato de obra se estima iniciar su trámite de liquidación a mediados de abril; una vez adjunten toda la documentación correspondiente y se elabore acta conjunta con interventoría. Con respecto a la interventoría le falta facturar casi un 60% y se estima su liquidación para iniciar a finales de mayo 2025.		



REGISTRO FOTOGRAFICO

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE COOPERATIVO -060-(RIOHACHA)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 034-APÜNIMA´ANA1 -(RIOHACHA)



ESCUELA ETNOEDUCATIVA LA CAMPANA -050--(MAICAO)




ESCUELA ETNOEDUCATIVA WAYUMA'ANA -054- (MAICAO)



REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #7 - 117-WAKUAPAMANA -(RIOHACHA)

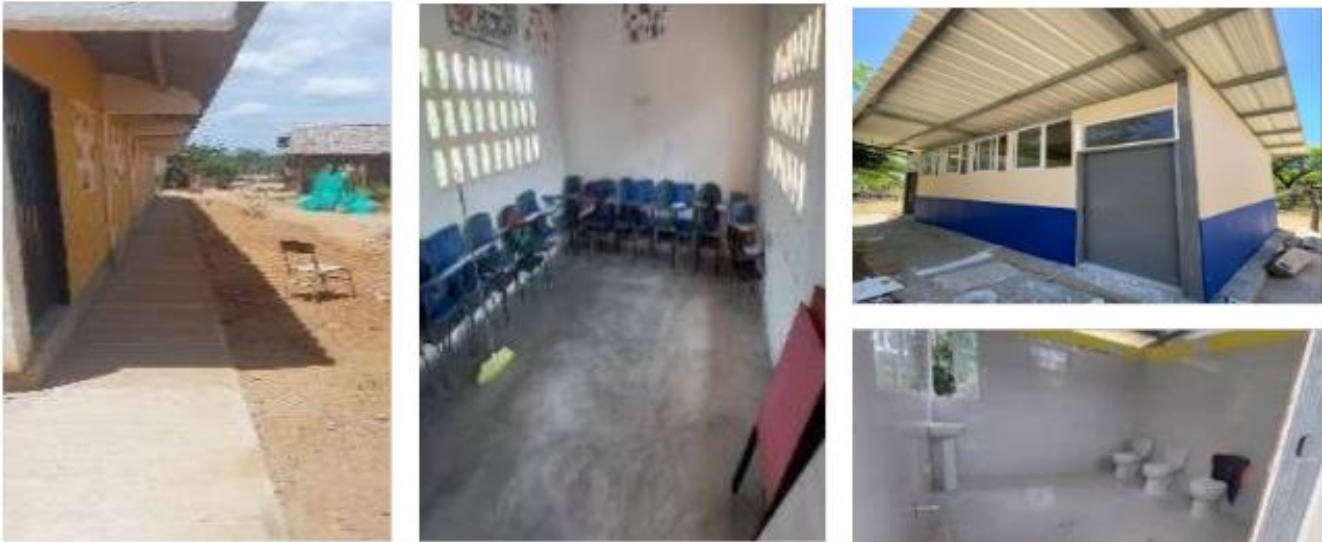

I.E. JOSE ANTONIO GALAN- SEDE PRINCIPAL -060-(RIOHACHA)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-TALOULUMA `ANA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL - 0143-PROVINCIAL -(BARRANCAS)



REGISTRO FOTOGRAFICO

INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA - 011-
ESCUELA RURAL INDIGENA KARALOUTAMANA -(MANAURE)



ESCUELA ETNOEDUCATIVA SEDE KASICHE -053- (MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 151-LA
ESTRELLA -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 051-
YAMAIN SEDE PRINCIPAL -(MAICAO)



INSTITUCIÓN ETNOEDUCATIVA #6 - 152-
YAMAIN KASPOLIMANA -(MAICAO)



Departamento	Córdoba y Bolívar
\$	Valor Inicial Obra: \$\$4.706.470.280 M/CTE Interventoría: \$297.097.668,00 M/CTE
	Adiciones Obra: \$1.455.000.000 Interventoría: \$144.106.877
	Valor Pagado Obra: \$6.161.470.280 Interventoría: \$277.437.804
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	Prorroga 1: 2 meses y 15 días Prorroga 1: 2 meses
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Contrato de obra: liquidado del 14 de marzo de 2025. Contrato de interventoría: En ajuste por parte del contratista, los documentos revisados por la supervisión previo al inicio del proceso de liquidación.



REGISTRO FOTOGRAFICO

Sede principal I. E. El Palmar - Montelíbano



Sede Buenos Aires - María La Baja



Sede Los Cerros - Planeta Rica



Sede Téc. Agrop. De Desarrollo Rural De María la baja - María La Baja



Sede Esc. Nueva Parcelas Londres - Ayapel



Sede Técnica Álvaro Ulcue Chocue - Tuchín



REGISTRO FOTOGRAFICO

Sede Esc. Nueva La Solita - Puerto Libertador



Sede Níspero-María La Baja



Sede Los Aguacates - Cotorra



Departamento	Cauca
\$	Valor Inicial Obra: \$ 4.728.021.810 Interventoría: \$ 312.927.160
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$ 99.972.853,00 (\$ 54.867.110,00 asumidos por el contrato de obra) (\$ 45.105.743,00 asumidos por el contrato interadministrativo)
	Valor Pagado Obra: \$ 4.721.624.076,00 Interventoría: \$ 379.820.020,17
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	3 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses) 3 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - \$ 99.972.853,00)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Las 18 sedes educativas que conforman el contrato de obra fueron entregadas y recibidas a satisfacción por parte de los Directivos de Cada Sede. Acta de entrega y recibo a satisfacción del componente 2 suscrita y legalizada. Contratista e interventoría se encuentran consolidando documentos de cierre de componente 2 y documentos que soportan inicialmente la liquidación del contrato de obra. 18 sedes entregadas a Directivos.




Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



I.E. Agropecuaria Santa Rita – Sede principal
La vega

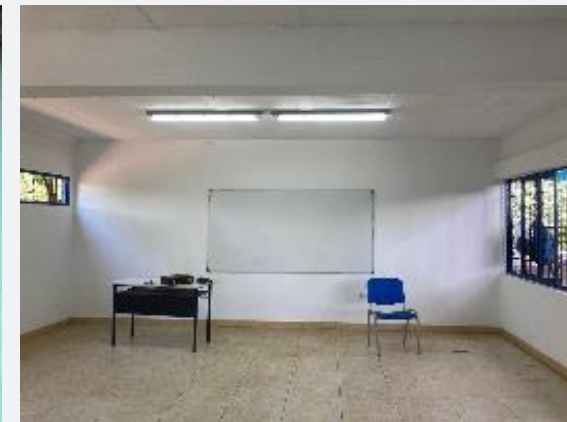

C.E. Buenos Aires – Sede Capitanes
Balboa



C.E. Guillermo León Valencia – Sede La Despensa
Rosas



C.E. Guillermo León Valencia – El Altillo
Rosas

Estado GRUPO 11, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-079-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 11

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-063-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



I.E. El Carmen – Sede principal
Bolívar



I.E. Alfonso Córdoba – Sede Las Yervas
Rosas



I.E. Alfonso Córdoba – Sede Bellavista
Rosas



I.E. Técnica Agropecuaria Nuestra Señora de los
Remedios - Bolívar



Departamento	Cauca, Huila, Nariño y Putumayo
\$	Valor Inicial Obra: \$ 4.918.276.400,00 Interventoría: \$ 318.105.088,00
	Adiciones Obra: \$ 0 Interventoría: \$ 152,015,642,00
	Valor Pagado Obra: \$ 4.906.706.463,00 Interventoría: \$ 413.123.412
MODIFICACIONES CONTRACTUALES	2 otrosíes obra: Prórrogas (6 meses) 2 otrosíes interventoría: Prórrogas y adiciones (6 meses - \$ 152,015,642,00)
OBSERVACIONES ESTADO ACTUAL	Total de 18 sedes, entregadas a satisfacción con recibo de interventoría y rectores de 18 sedes: - CONTRATO PAF-MENAM-O-076-2023: Radicado al equipo de liquidación de Findeter por PRISA No. INC 2025-000928 de fecha 04/04/2025 en revisión. - CONTRATO PAF-MENAM-I-064-2023: En recopilación de información de liquidación, en suscripción de acta de entrega y recibo y actualización de pólizas. Radicación proyectada 30/04/2025.



Estado GRUPO 12, Departamento del Cauca

Contratista de Diseño y Obra PAF-MENAM-O-076-2023 – CONSORCIO FIN GRUPO 12

Contratista Interventor PAF-MENAM-I-064-2023 – CARLOS GUSTAVO GOMEZ ROMERO



ID1 Pasto, Nariño - I.E.M. NUESTRA SEÑORA DE GUADALUPE



ID8 El Rosario - Nariño, CENTRO EDUCATIVO LA CLAUDIA



ID26 Acevedo, Huila - INSTITUCION EDUCATIVA BATEAS



ID27 Piamonte - Cauca, ESCUELA RURAL MIXTA LA ESPANOLA



CONTRATOS LIQUIDADADOS

GRUPO	Departamento	No SEDES	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINACION	OBSERVACIONES
Grupo 1	Antioquia y Chocó	10	14/11/2023	14/08/2024	CONTRATO PAF-MENAM-O-049-2023: Liquidación suscrita el 31 de enero e 2025 CONTRATO PAF-MENAM-I-052-2023: Liquidación suscrita el 25 de febrero e 2025
Grupo 3	Magdalena	5	14/11/2023	12/04/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-051-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 01/10/2024, pagado 100%. LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-054-2023: Suscrita Acta de liquidación de fecha 20/12/2024, pagado 100%.
Grupo 6	Cesar	7	15/11/2023	29/04/2024	LIQUIDACIÓN Contrato de Obra No. PAF-MENAM-O-056-2023: Suscrita Acta de liquidación el 20/11/2024 y pagado al 100%. LIQUIDACIÓN Contrato de Interventoría No. PAF-MENAM-I-058-2023: Suscrita Acta de liquidación el 27/11/2024 y pagado al 100%.

Comité de seguimiento atención temporada lluvias MEN -FINDETER

CONCLUSIONES/DECISIONES/RECOMENDACIONES/COMENTARIOS GENERALES:

1	<u>Compromisos:</u> FINDETER se compromete a enviar la solicitud de la prórroga el 22 de abril del 2025.
2	<u>Observaciones Generales:</u> FINDETER menciona de los grupos 9 y 10, que se tiene que generar una prórroga para terminar con eficiencia la liquidación de cada contrato, debido a que tuvieron problemas por orden público se atrasaron un poco las actividades de ejecución.
3	<u>Observaciones Generales:</u> FINDETER menciona que se realizara una visita a Suarez - Cauca para verificar las actividades realizadas durando la ejecución.
4	<u>Observaciones Generales:</u> FINDETER menciona que se reinicio de nuevo el contrato de Dotaciones con las sedes nuevas, su reinicio sera el dia 22 de abril del 2025.
5	<u>Compromisos:</u> FINDETER se compromete a enviar una presentacion con cada ficha de las sedes entregadas con las dotaciones.
6	<u>Observaciones Generales:</u> FINDETER menciona que hay dos sedes de dotaciones, que no se tiene fotografía en las aulas nuevas, debido a que cuando se entrego la dotación el rector encargado no tenia disponible el aula nueva. MEN recomienda que por favor se pueda conseguir con el resto esas fotos para compartir a la UNGRD.



Findeter 
Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

f @findetercol  @findetercol
t @findeter  [linkedin.com/company/findeter](https://www.linkedin.com/company/findeter)



**CI No. CO1.PCCNTR.
4917031 DE 2023**

Grupo 7 – La Guajira

Febrero de 2025

Estado GRUPO 7, Departamento de La Guajira

Contratista de Diseño y Obra PAF-ATMEN5-O-036-2024 – CONSORCIO GUAJIRA 7 (Máxima Solutions sas 50% Gancar Distribuciones sas 50%)
Contratista Interventor PAF-MENAM-I-059-2023 – GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN



GENERALIDADES

CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-036-2024

Objeto:	ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 7
Tiempo de ejecución:	Seis (06) meses
Valor componente I:	\$ 418.802.198 (\$ 297.303.198 obra + \$ 121.499.000 interventoría)
Valor componente II:	\$ 4.035.214.681 (\$ 3.672.644.709 obra +188.829.972 obra + \$ 173.740.000 interventoría)
Valor componente I y II:	\$ 4.454.016.879 (\$ 4.158.777.879 obra + \$ 295.239.000 interventoría)
Interventoría:	GERMÁN ADOLFO PERDOMO PACHÓN C.C.: 80.418.195
Contratista:	CONSORCIO GUAJIRA 7 N.I.T: 901.813.886-6
Fecha de inicio:	31 de mayo de 2024
Fecha de terminación:	17 de enero de 2025

CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-036-2024

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 7

ID	MUNICIPIO/DPTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CÓDIGO DANE SEDE	POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR COMPONENTE I	VALOR COMPONENTE II	VALOR TOTAL
11	MANAURE- LA GUAJIRA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA	244560002153	65	6 MESES	\$32.215.553,69	\$428.993.327,12	\$461.208.880,81
34	RIOHACHA – LA GUAJIRA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	APÜNIMA´ANA1	144001005053	280	6 MESES	\$32.215.553,69	\$96.424.601,96	\$128.640.155,65
50	MAICAO – LA GUAJIRA	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA CAMPANA	244430000078	315	3 MESES	\$32.215.553,69	\$66.085.442,24	\$98.300.995,93
51	MAICAO – LA GUAJIRA	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	244430000116	35	6 MESES	\$32.215.553,69	\$302.188.362,58	\$334.403.916,27

CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-036-2024

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/O OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 7

ID	MUNICIPIO/DPTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CÓDIGO DANE SEDE	POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR COMPONENTE I	VALOR COMPONENTE II	VALOR TOTAL
53	MAICAO- LA GUAJIRA	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE	244430000949	170	6 MESES	\$32.215.553,69	\$430.849.902,26	\$463.065.455,95
54	MAICAO – LA GUAJIRA	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE WAYUUMA ANA	244430003875	70	3 MESES	\$32.215.553,69	\$51.716.506,33	\$83.932.060,02
60	RIOHACHA – LA GUAJIRA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	COOPERATIVO	144001002114	245	3 MESES	\$32.215.553,69	\$143.531.971,28	\$175.747.524,97
95	RIOHACHA – LA GUAJIRA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN	144001000545	315	6 MESES	\$32.215.553,69	\$208.611.268,91	\$240.826.822,60

CONTRATO DE OBRA No. PAF-ATMEN5-O-036-2024

ELABORACIÓN DE DIAGNÓSTICOS, ESTUDIOS TÉCNICOS, DISEÑOS Y EJECUCIÓN DE OBRAS DE MEJORAMIENTO Y/U OBRAS REQUERIDAS PARA LA INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE AULAS Y/O BATERÍAS SANITARIAS EN SISTEMAS PREFABRICADOS, EN LAS SEDES EDUCATIVAS AFECTADAS POR LA TEMPORADA DE LLUVIAS - GRUPO 7

ID	MUNICIPIO/DPTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/SEDE	SEDE	CÓDIGO DANE SEDE	POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR COMPONENTE I	VALOR COMPONENTE II	VALOR TOTAL
117	RIOHACHA- LA GUAJIRA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	WAKUAPAMANA	244001800520	175	6 MESES	\$32.215.553,69	\$460.197.346,21	\$492.412.899,90
143	BARRANCAS – LA GUAJIRA	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	244078000712	35	6 MESES	\$32.215.553,69	\$300.331.787,44	\$332.547.341,13
151	MAICAO – LA GUAJIRA	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA	24430001694	35	6 MESES	\$32.215.553,69	\$300.331.787,44	\$332.547.341,13
152	MAICAO – LA GUAJIRA	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA	244430000116	100	6 MESES	\$32.215.553,69	\$443.041.656.41	\$475.257.210.11
153	MAICAO – LA GUAJIRA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	244430001694	290	6 MESES	\$32.215.553,69	\$802.910.721,58	\$835.126.275,27
						TOTAL:	\$418.802.198	\$4.035.214.681	\$4.454.016.879

INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6

Sede YAMAIN - KASPOLIMANA

Maicao – LA GUAJIRA

ALCANCE

- Construcción de una (01) aula nueva
- Mejoramiento de una (01) aula
- Construcción de una (01) batería sanitaria



ANTES

DESPUÉS

ID	MUNICIPIO/DPTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/SEDE	SEDE	CÓDIGO DANE SEDE	POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR COMPONENTE I	VALOR COMPONENTE II	VALOR TOTAL
152	MAICAO – LA GUAJIRA	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - KASPOLIMANA	244430000116	100 (incluidos 35 estudiantes beneficiados para el aula nueva)	6 MESES	\$32.215.553,69	\$443.041.656.41	\$475.257.210.11

ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA

Sede ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA

Maicao – LA GUAJIRA

ALCANCE

- Construcción de dos (02) aulas nuevas
- Mejoramiento de tres (03) baterías sanitarias



ANTES

DESPUÉS

ID	MUNICIPIO/DPTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/SEDE	SEDE	CÓDIGO DANE SEDE	POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR COMPONENTE I	VALOR COMPONENTE II	VALOR TOTAL
153	MAICAO – LA GUAJIRA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	ESCUELA RURAL MIXTA TALOULUMA'ANA	244430001694	290 (incluidos 70 estudiantes beneficiados para las aulas nuevas)	6 MESES	\$32.215.553,69	\$802.910.721,58	\$835.126.275,27

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA/ Sede ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA Manaure – LA GUAJIRA

ALCANCE

- Construcción de una (01) aula nueva
- Construcción de una (01) batería nueva



ANTES



DESPUÉS

ID	MUNICIPIO/DPTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CÓDIGO DANE SEDE	POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR COMPONENTE I	VALOR COMPONENTE II	VALOR TOTAL
11	MANAURE- LA GUAJIRA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA NUESTRA SEÑORA DE FATIMA	ESCUELA RURAL INDÍGENA KARALOUTAMANA	244560002153	65 (incluidos 35 estudiantes beneficiados para el aula nueva)	6 MESES	\$32.215.553,69	\$428.993.327,12	\$461.208.880,81

INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 - Sede LA ESTRELLA

Maicao – LA GUAJIRA

ALCANCE

- Construcción de una (01) aula



ANTES



DESPUÉS

ID	MUNICIPIO/DPTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/SEDE	SEDE	CÓDIGO DANE SEDE	POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR COMPONENTE I	VALOR COMPONENTE II	VALOR TOTAL
151	MAICAO – LA GUAJIRA	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA ESTRELLA	24430001694	35	6 MESES	\$32.215.553,69	\$300.331.787,44	\$332.547.341,13

INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6 YAMAIN - SEDE PRINCIPAL

Maicao – LA GUAJIRA

ALCANCE

- Construcción de una (01) aula nueva



ANTES



DESPUÉS

ID	MUNICIPIO/DPTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CÓDIGO DANE SEDE	POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR COMPONENTE I	VALOR COMPONENTE II	VALOR TOTAL
51	MAICAO – LA GUAJIRA	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 6	YAMAIN - SEDE PRINCIPAL	244430000116	35	6 MESES	\$32.215.553,69	\$302.188.362,58	\$334.403.916,27

INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 SEDE KASICHE

Maicao – LA GUAJIRA

ALCANCE

- Construcción de una (01) batería sanitaria nueva
- Construcción de una (01) aula nueva



ANTES



DESPUÉS

ID	MUNICIPIO/DPTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CÓDIGO DANE SEDE	POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR COMPONENTE I	VALOR COMPONENTE II	VALOR TOTAL
53	MAICAO- LA GUAJIRA	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE KASICHE	244430000949	170 (incluidos 35 estudiantes beneficiados para el aula nueva)	6 MESES	\$32.215.553,69	\$430.849.902,26	\$463.065.455,95

CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL
CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL
Barrancas – LA GUAJIRA

ALCANCE

- Construcción de una (01) aula



ANTES



DESPUÉS

ID	MUNICIPIO/DPTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/SEDE	SEDE	CÓDIGO DANE SEDE	POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR COMPONENTE I	VALOR COMPONENTE II	VALOR TOTAL
143	BARRANCAS – LA GUAJIRA	CENTRO ETNOEDUCATIVO RURAL PROVINCIAL	CENTRO ETNOEDUCATIVO PROVINCIAL	244078000712	35	6 MESES	\$32.215.553,69	\$300.331.787,44	\$332.547.341,13

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 Sede APÜNIMA'ANA1

Riohacha – LA GUAJIRA

ALCANCE

- Mejoramiento de 8 (ocho) aulas



ANTES



DESPUÉS

ID	MUNICIPIO/DPTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CÓDIGO DANE SEDE	POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR COMPONENTE I	VALOR COMPONENTE II	VALOR TOTAL
34	RIOHACHA – LA GUAJIRA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	APÜNIMA'ANA1	144001005053	280	6 MESES	\$32.215.553,69	\$96.424.601,96	\$128.640.155,65

INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 - SEDE LA CAMPANA

Maicao – LA GUAJIRA

ALCANCE

- Mejoramiento de nueve (09) aulas



ANTES



DESPUÉS

ID	MUNICIPIO/DPTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CÓDIGO DANE SEDE	POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR COMPONENTE I	VALOR COMPONENTE II	VALOR TOTAL
50	MAICAO – LA GUAJIRA	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE LA CAMPANA	244430000078	315	3 MESES	\$32.215.553,69	\$66.085.442,24	\$98.300.995,93

INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2 SEDE WAYUUMA ANA

Maicao – LA GUAJIRA

ALCANCE

- Mejoramiento de dos (02) aulas



ANTES



DESPUÉS

ID	MUNICIPIO/DPTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CÓDIGO DANE SEDE	POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR COMPONENTE I	VALOR COMPONENTE II	VALOR TOTAL
54	MAICAO – LA GUAJIRA	INSTITUCION EDUCATIVA INDIGENA NO. 2	SEDE WAYUUMA ANA	244430003875	70	3 MESES	\$32.215.553,69	\$51.716.506,33	\$83.932.060,02

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN - Sede COOPERATIVO

Riohacha – LA GUAJIRA

ALCANCE

- Mejoramiento de siete (07) aulas



ANTES



DESPUÉS

ID	MUNICIPIO/DPTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CÓDIGO DANE SEDE	POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR COMPONENTE I	VALOR COMPONENTE II	VALOR TOTAL
60	RIOHACHA – LA GUAJIRA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	COOPERATIVO	144001002114	245	3 MESES	\$32.215.553,69	\$143.531.971,28	\$175.747.524,97

INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN -

Sede PRINCIPAL

Riohacha – LA GUAJIRA

ALCANCE

-Construcción Batería Sanitaria



ANTES



DESPUÉS

ID	MUNICIPIO/DPTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA	SEDE	CÓDIGO DANE SEDE	POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR COMPONENTE I	VALOR COMPONENTE II	VALOR TOTAL
95	RIOHACHA – LA GUAJIRA	INSTITUCION EDUCATIVA JOSE ANTONIO GALAN	JOSE ANTONIO GALAN	144001000545	315	6 MESES	\$32.215.553,69	\$208.611.268,91	\$240.826.822,60

INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7 Sede - WAKUAPAMANA

Riohacha – LA GUAJIRA

ALCANCE

- Mejoramiento de Seis (06) aulas
- Construcción de batería sanitarias



ANTES



DESPUÉS

ID	MUNICIPIO/DPTO	INSTITUCIÓN EDUCATIVA/SEDE	SEDE	CÓDIGO DANE SEDE	POBLACIÓN ESCOLAR BENEFICIADA	TIEMPO DE EJECUCIÓN	VALOR COMPONENTE I	VALOR COMPONENTE II	VALOR TOTAL
117	RIOHACHA- LA GUAJIRA	INSTITUCION ETNOEDUCATIVA #7	WAKUAPAMANA	244001800520	175	6 MESES	\$32.215.553,69	\$460.197.346,21	\$492.412.899,90



Findeter 
Banca de Desarrollo Territorial

GRACIAS

www.findeter.gov.co

f @findetercol  @findetercol
t @findeter  [linkedin.com/company/findeter](https://www.linkedin.com/company/findeter)
