



CONTROL INFORMES CTO 2150-2024 SNR

INFORMES SEMANALES			CENTRO								ORINOQUIA	ANDINA		
			BOGOTA	CUNDINAMARCA		BOYACA		SANTANDER	HUILA		GUAVIARE	ANTIOQUIA	QUINDIO	
			FRENTE 1	FRENTE 2	FRENTE 3	FRENTE 4	FRENTE 5	FRENTE 6	FRENTE 7	FRENTE 8	FRENTE 9	FRENTE 10	FRENTE 11	
			BOGOTA	AGUA DE DIOS	LA PALMA	SANTA ROSA DE VITERBO	GUATEQUE	CONVENCION	NEIVA	GARZON	SAN JOSE GUAVIARE	SANTO DOMINGO	FILANDIA	
0	3-sep-24	martes												
1	10-sep-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
2	17-sep-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
3	24-sep-24	martes	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		
4	1-oct-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
5	8-oct-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
6	15-oct-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
7	22-oct-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
8	29-oct-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
9	5-nov-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
10	12-nov-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
11	19-nov-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
12	26-nov-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
13	3-dic-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
14	10-dic-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
15	17-dic-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
16	24-dic-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
17	31-dic-24	martes	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐		
			\$ 213.115.377,00	\$ 59.371.523,00	\$ 126.341.463,00	\$ 129.729.468,00	\$ 140.521.985,00	\$ 105.053.125,00	\$ 200.238.984,00	\$ 143.094.539,00	\$ 202.730.968,00	\$ 70.411.191,00	\$ 46.740.812,00	\$ 1.437.349.435,00
			SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL	OFICINA ORIP AGUA DE DIOS (Cundinamarca)	OFICINA ORIP LA PALMA (Cundinamarca)	ORIP SANTA ROSA DE VITERBO (Boyaca)	ORIP GUATEQUE (Boyaca)	ORIP CONVENCION (Norte de Santander)	ORIP NEIVA (Huila)	ORIP GARZON (Huila)	ORIP SAN JOSE DEL GUAVIARE (Guaviare)	ORIP SANTO DOMINGO (Antioquia)	ORIP FILANDIA (Quindio)	



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024



	<div>MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA</div> <div>PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div> <div>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div>	<div>Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07</div> <div>Versión: 01</div> <div>Fecha: 11 - 08 - 2021</div> <div>Página 1 de 1</div>				
<div>INFORME SEMANAL</div> <div>Semana Número: 3 Del: 17 de septiembre de 2024 Al: 24 de septiembre de 2024</div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Días</div> <div>ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES</div>						
<div>OBJETO:</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)</div>						
<table><tr><td><div>SEMANAL</div><div>ACUMULADO</div></td><td><div>SEMANAL</div><div>ACUMULADO</div></td></tr><tr><td><div>Obra programada (%)</div><div>Valor básico de la Obra programada: \$ 213.115.377,00</div></td><td><div>Obra Física Ejecutada (%)</div><div>Valor básico de la Obra Ejecutada:</div></td></tr></table>			<div>SEMANAL</div> <div>ACUMULADO</div>	<div>SEMANAL</div> <div>ACUMULADO</div>	<div>Obra programada (%)</div> <div>Valor básico de la Obra programada: \$ 213.115.377,00</div>	<div>Obra Física Ejecutada (%)</div> <div>Valor básico de la Obra Ejecutada:</div>
<div>SEMANAL</div> <div>ACUMULADO</div>	<div>SEMANAL</div> <div>ACUMULADO</div>					
<div>Obra programada (%)</div> <div>Valor básico de la Obra programada: \$ 213.115.377,00</div>	<div>Obra Física Ejecutada (%)</div> <div>Valor básico de la Obra Ejecutada:</div>					
<div>CONTRATO DE OBRA</div> <div>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</div>						
<table><tr><td><div>Contratista:</div><div>SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS</div><div>Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024</div><div>Valor Inicial: \$ 213.115.377,00</div><div>Valor Actualizado: \$ 213.115.377,00</div><div>Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024</div><div>Plazo Actualizado: 0</div><div>Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024</div><div>Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024</div></td><td><div>Interventor:</div><div>CONSORCIO REGIONES PRIA</div><div>Contrato No. 2147 DE 2024</div><div>Valor Inicial: \$ 210.823.861,00</div><div>Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00</div><div>Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</div><div>Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</div><div>Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024</div><div>Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024</div></td></tr></table>			<div>Contratista:</div> <div>SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS</div> <div>Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 213.115.377,00</div> <div>Valor Actualizado: \$ 213.115.377,00</div> <div>Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024</div> <div>Plazo Actualizado: 0</div> <div>Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024</div>	<div>Interventor:</div> <div>CONSORCIO REGIONES PRIA</div> <div>Contrato No. 2147 DE 2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 210.823.861,00</div> <div>Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00</div> <div>Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</div> <div>Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</div> <div>Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024</div>		
<div>Contratista:</div> <div>SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS</div> <div>Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 213.115.377,00</div> <div>Valor Actualizado: \$ 213.115.377,00</div> <div>Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024</div> <div>Plazo Actualizado: 0</div> <div>Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024</div>	<div>Interventor:</div> <div>CONSORCIO REGIONES PRIA</div> <div>Contrato No. 2147 DE 2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 210.823.861,00</div> <div>Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00</div> <div>Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</div> <div>Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</div> <div>Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024</div>					
<div>IMAGEN OFICINA</div> <div>IMAGEN OFICINA</div>						
<div>AVANCE</div>						
<div>EN LA SEMANA NUMERO TRES SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN EL ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES REMITIDA A LA INTERVENTORIA PARA SU RESPECTIVA REVISION Y APROBACION CON EL FIN DE AVANZAR EL LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO IDONEO PARA CADA ACTIVIDAD A EJECUTAR. ADICIONALMENTE SE REALIZO UNA SEGUNDA VISITA CON INTERVENTORIA PARA REVISAR EL INVENTARIO DE REDES SANITARIAS Y DE AGUA POTABLE CON EL FIN DE DARLE ALCANCE A ESTOS CAPITULOS EN COMPANIA DEL PLOMERO DE LA SEDE PARA ACLARAR Y CUATINIFICAR DICHAS ACTIVIDADES.</div>						
<div>IMAGENES AVANCE</div>						
<div>Comentario: TOMA DE MEDIDAS Y REVISION DE CANTIDADES PARA DAR ALCANCE AL BALANCE INICIAL</div> <div>Comentario: VISITA TECNICA SEDE PRINCIPAL BOGOTA</div>						



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024



	<p>MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA</p> <p>PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p> <p>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p>	<p>Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07</p> <p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 11 - 08 - 2021</p> <p>Página 1 de 1</p>
<p>INFORME SEMANAL</p>		
<p>Semana Número: 3 Del: 17 de septiembre de 2024 Al: 24 de septiembre de 2024</p> <p>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Días</p> <p>ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: SEDE SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES</p>		
<p>OBJETO:</p> <p>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)</p>		
<p>SEMANAL ACUMULADO</p> <p>Obra programada (%)</p> <p>Valor básico de la Obra programada: \$ 213.115.377,00 \$</p>		<p>SEMANAL ACUMULADO</p> <p>Obra Física Ejecutada (%)</p> <p>Valor básico de la Obra Ejecutada:</p>
<p>CONTRATO DE OBRA</p> <p>Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS</p> <p>Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024</p> <p>Valor Inicial: \$ 213.115.377,00</p> <p>Valor Actualizado: \$ 213.115.377,00</p> <p>Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024</p> <p>Plazo Actualizado: 0</p> <p>Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024</p> <p>Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024</p>		<p>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</p> <p>Interventor: CONSORCIO REGIONES PRIA</p> <p>Contrato No. 2147 DE 2024</p> <p>Valor Inicial: \$ 210.823.861,00</p> <p>Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00</p> <p>Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</p> <p>Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</p> <p>Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024</p> <p>Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024</p>
<p>Comentario: AREA DE INTERVENCION CIELO RASO PVC EN TABILLA</p>		<p>Comentario: AREA DE INTERVENCION A DEMOLER PISO Y ALISTADO DE PISO TERRAZA PISO 3</p>
<p>Comentario: REVISION DE AREAS Y OFICINAS PARA MANTENIMIENTO DE CIELO RASOS Y PINTURA</p>		<p>Comentario: REVISION DE AREAS Y OFICINAS PARA MANTENIMIENTO DE CIELO RASOS Y PINTURA</p>
<p>OBSERVACIONES</p> <p>La interventoria recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.</p>		<p>CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA</p> <p>Matricula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON</p> <p>Matricula No.: A25202001-79742098</p>



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024



	<p>MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA</p> <p>PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p> <p>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</p>	<p>Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07</p> <p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 11 - 08 - 2021</p> <p>Página 1 de 1</p>
<p>INFORME SEMANAL</p>		
<p>Semana Número: 3 Del: 17 de septiembre de 2024 Al: 24 de septiembre de 2024</p> <p>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Días</p> <p>ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: AGUA DE DIOS SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES</p>		
<p>OBJETO:</p> <p>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)</p>		
<p>SEMANAL ACUMULADO</p> <p>Obra programada (%)</p> <p>Valor básico de la Obra programada: \$ 59.371.523,00 \$</p>		<p>SEMANAL ACUMULADO</p> <p>Obra Física Ejecutada (%)</p> <p>Valor básico de la Obra Ejecutada:</p>
<p>CONTRATO DE OBRA</p>		<p>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</p>
<p>Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS</p> <p>Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024</p> <p>Valor Inicial: \$ 59.371.523,00</p> <p>Valor Actualizado: \$ 59.371.523,00</p> <p>Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024</p> <p>Plazo Actualizado: 0</p> <p>Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024</p> <p>Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024</p>		<p>Interventor: CONSORCIO REGIONES PRIA</p> <p>Contrato No. 2147 DE 2024</p> <p>Valor Inicial: \$ 210.823.861,00</p> <p>Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00</p> <p>Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</p> <p>Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</p> <p>Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024</p> <p>Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024</p>
<p>IMAGEN OFICINA</p>		<p>IMAGEN OFICINA</p>
<p>AVANCE</p>		
<p>EN LA SEMANA NUMERO TRES SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVSION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE. SE ESTA TRABAJANDO EN LOS CRONOGRAMAS CON LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN OBRA PARA REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACORDE CON LAS MISMAS.</p>		
<p>IMAGENES AVANCE</p>		
<p>Comentario:</p>		<p>Comentario:</p>



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PIRA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024






	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1
INFORME SEMANAL		
Semana Número: 3 Del: 17 de septiembre de 2024 Al: 24 de septiembre de 2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Días		
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: AGUA DE DIOS SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES		
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)		
SEMANAL Obra programada (%) Valor básico de la Obra programada: \$ 59.371.523,00		ACUMULADO Obra Física Ejecutada (%) Valor básico de la Obra Ejecutada:
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024 Valor Inicial: \$ 59.371.523,00 Valor Actualizado: \$ 59.371.523,00 Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024 Plazo Actualizado: 0 Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024 Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024		Interventor: CONSORCIO REGIONES PIRA Contrato No. 2147 DE 2024 Valor Inicial: \$ 210.823.861,00 Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00 Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024 Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024
Comentario:		Comentario:
Comentario:		Comentario:
OBSERVACIONES La interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.		CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024

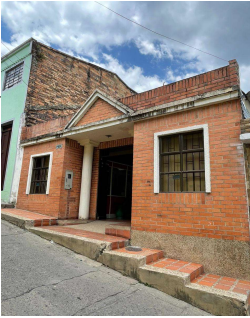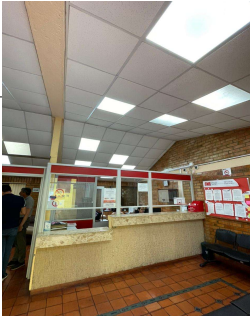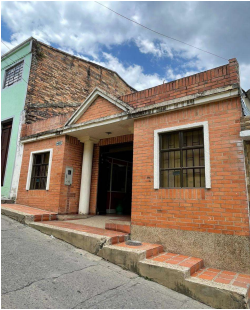

 <div>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la fe pública</small></div>	MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1
INFORME SEMANAL		
Semana Número: 3 Del: 17 de septiembre de 2024 Al: 24 de septiembre de 2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Dias		
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: LA PALMA SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES		
OBJETO:		
CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)		
SEMANAL Obra programada (%) Valor básico de la Obra programada: \$ 126.341.463,00		ACUMULADO Obra Física Ejecutada (%) Valor básico de la Obra Ejecutada:
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024 Valor Inicial: \$ 126.341.463,00 Valor Actualizado: \$ 126.341.463,00 Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024 Plazo Actualizado: 0 Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024 Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024		Inventor: CONSORCIO REGIONES PRIA Contrato No. 2147 DE 2024 Valor Inicial: \$ 210.823.861,00 Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00 Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024 Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024
IMAGEN OFICINA		IMAGEN OFICINA
		
AVANCE		
EN LA SEMANA NUMERO TRES SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVSION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE. SE ESTA TRABAJANDO EN LOS CRONOGRAMAS CON LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN OBRA PARA REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACORDE CON LAS MISMAS.		
IMAGENES AVANCE		
		
Comentario:		Comentario:



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024



	<p>MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA</p> <p>PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA</p> <p>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA</p>	<p>Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07</p> <p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 11 - 08 - 2021</p> <p>Página 1 de 1</p>
<p>INFORME SEMANAL</p>		
<p>Semana Número: 3 Del: 17 de septiembre de 2024 Al: 24 de septiembre de 2024</p> <p>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Dias</p> <p>ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: LA PALMA SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES</p>		
<p>OBJETO:</p> <p>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)</p>		
<p>SEMANAL ACUMULADO</p> <p>Obra programada (%)</p> <p>Valor básico de la Obra programada: \$ 126.341.463,00 \$</p>		<p>SEMANAL ACUMULADO</p> <p>Obra Física Ejecutada (%)</p> <p>Valor básico de la Obra Ejecutada:</p>
<p>CONTRATO DE OBRA</p>		<p>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</p>
<p>Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS</p> <p>Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024</p> <p>Valor Inicial: \$ 126.341.463,00</p> <p>Valor Actualizado: \$ 126.341.463,00</p> <p>Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024</p> <p>Plazo Actualizado: 0</p> <p>Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024</p> <p>Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024</p>		<p>Interventor: CONSORCIO REGIONES PRIA</p> <p>Contrato No. 2147 DE 2024</p> <p>Valor Inicial: \$ 210.823.861,00</p> <p>Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00</p> <p>Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</p> <p>Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</p> <p>Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024</p> <p>Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024</p>
<p>Comentario:</p>		<p>Comentario:</p>
<p>Comentario:</p>		<p>Comentario:</p>
<p>OBSERVACIONES</p> <p>La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.</p>		<p>CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA</p> <p>Matricula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON</p> <p>Matricula No.: A25202001-79742098</p>



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024



	MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1
INFORME SEMANAL		
Semana Número: 3 Del: 17 de septiembre de 2024 Al: 24 de septiembre de 2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Dias		
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: SANTA ROSA DE VITERBO SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES		
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)		
SEMANAL Obra programada (%) Valor básico de la Obra programada: \$ 129.729.468,00		ACUMULADO Obra Física Ejecutada (%) Valor básico de la Obra Ejecutada:
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024 Valor Inicial: \$ 129.729.468,00 Valor Actualizado: \$ 129.729.468,00 Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024 Plazo Actualizado: 0 Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024 Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024		Interventor: CONSORCIO REGIONES PRIA Contrato No. 2147 DE 2024 Valor Inicial: \$ 210.823.861,00 Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00 Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024 Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024
IMAGEN OFICINA		IMAGEN OFICINA
AVANCE		
EN LA SEMANA NUMERO TRES SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVSION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE. SE ESTA TRABAJANDO EN LOS CRONOGRAMAS CON LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN OBRA PARA REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACORDE CON LAS MISMAS.		
IMAGENES AVANCE		
Comentario:		Comentario:



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024



	<p>MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA</p> <p>PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA</p> <p>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA</p>	<p>Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07</p> <p>Versión: 01</p> <p>Fecha: 11 - 08 - 2021</p> <p>Página 1 de 1</p>
<p>INFORME SEMANAL</p>		
<p>Semana Número: 3 Del: 17 de septiembre de 2024 Al: 24 de septiembre de 2024</p> <p>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Dias</p> <p>ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: SANTA ROSA DE VITERBO SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES</p>		
<p>OBJETO:</p> <p>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)</p>		
<p>SEMANAL ACUMULADO</p> <p>Obra programada (%)</p> <p>Valor básico de la Obra programada: \$ 129.729.468,00 \$</p>		<p>SEMANAL ACUMULADO</p> <p>Obra Física Ejecutada (%)</p> <p>Valor básico de la Obra Ejecutada:</p>
<p>CONTRATO DE OBRA</p> <p>Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS</p> <p>Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024</p> <p>Valor Inicial: \$ 129.729.468,00</p> <p>Valor Actualizado: \$ 129.729.468,00</p> <p>Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024</p> <p>Plazo Actualizado: 0</p> <p>Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024</p> <p>Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024</p>		<p>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</p> <p>Interventor: CONSORCIO REGIONES PRIA</p> <p>Contrato No. 2147 DE 2024</p> <p>Valor Inicial: \$ 210.823.861,00</p> <p>Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00</p> <p>Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</p> <p>Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</p> <p>Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024</p> <p>Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024</p>
<p>Comentario:</p>	<p>Comentario:</p>	
<p>Comentario:</p>	<p>Comentario:</p>	
<p>OBSERVACIONES</p> <p>La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.</p>		<p>CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre : ARO SONIA PERARANDA</p> <p>Matricula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA</p> <p>Firma: </p> <p>Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON</p> <p>Matricula No.: A25202001-79742098</p>



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024



 <div>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la fe pública</small></div>	<div>MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA</div> <div>PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA</div> <div>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA</div>	<div>Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07</div> <div>Versión: 01</div> <div>Fecha: 11 - 08 - 2021</div> <div>Página 1 de 1</div>	
<div>INFORME SEMANAL</div>			
<div>Semana Número: 3 Del: 17 de septiembre de 2024 Al: 24 de septiembre de 2024</div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Dias</div> <div>ENTIDAD CONTRATANTE SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE GUATEQUE SUPERVISOR ING. BAYARDO BUSTOS LINARES</div>			
<div>OBJETO:</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)</div>			
<div>SEMANAL ACUMULADO</div> <div>Obra programada (%)</div> <div>Valor básico de la Obra programada: \$ 140.521.985,00 \$</div>		<div>SEMANAL ACUMULADO</div> <div>Obra Física Ejecutada (%)</div> <div>Valor básico de la Obra Ejecutada:</div>	
<div>CONTRATO DE OBRA</div>		<div>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</div>	
<div>Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS</div> <div>Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 140.521.985,00</div> <div>Valor Actualizado: \$ 140.521.985,00</div> <div>Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024</div> <div>Plazo Actualizado: 0</div> <div>Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024</div>	<div>Interventor: CONSORCIO REGIONES PRIA</div> <div>Contrato No. 2147 DE 2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 210.823.861,00</div> <div>Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00</div> <div>Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</div> <div>Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</div> <div>Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024</div>		
<div>IMAGEN OFICINA</div> <div></div>		<div>IMAGEN OFICINA</div> <div></div>	
<div>AVANCE</div>			
<div>EN LA SEMANA NUMERO TRES SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVSION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE. SE ESTA TRABAJANDO EN LOS CRONOGRAMAS CON LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN OBRA PARA REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACORDE CON LAS MISMAS.</div>			
<div>IMAGENES AVANCE</div>			
<div></div>		<div></div>	
<div>Comentario:</div>		<div>Comentario:</div>	



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024



	MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1
INFORME SEMANAL		
Semana Número: 3 Del: 17 de septiembre de 2024 Al: 24 de septiembre de 2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Dias		
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: GUATEQUE SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES		
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)		
SEMANAL Obra programada (%) Valor básico de la Obra programada: \$ 140.521.985,00		ACUMULADO Obra Física Ejecutada (%) Valor básico de la Obra Ejecutada:
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024 Valor Inicial: \$ 140.521.985,00 Valor Actualizado: \$ 140.521.985,00 Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024 Plazo Actualizado: 0 Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024 Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024		Interventor: CONSORCIO REGIONES PRIA Contrato No. 2147 DE 2024 Valor Inicial: \$ 210.823.861,00 Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00 Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024 Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024
Comentario:		Comentario:
Comentario:		Comentario:
OBSERVACIONES La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.		CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA Firma: Nombre: ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre: YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024



	<div>MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA</div> <div>PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA</div> <div>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA</div>	<div>Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07</div> <div>Versión: 01</div> <div>Fecha: 11 - 08 - 2021</div> <div>Página 1 de 1</div>
<div>INFORME SEMANAL</div> <div>Semana Número: 3 Del: 17 de septiembre de 2024 Al: 24 de septiembre de 2024</div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Dias</div> <div>ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: CONVENCION SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES</div>		
<div>OBJETO:</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)</div>		
<div>SEMANALACUMULADO</div> <div>Obra programada (%)</div> <div>Valor básico de la Obra programada: \$ 105.053.125,00 \$</div>		<div>SEMANALACUMULADO</div> <div>Obra Física Ejecutada (%)</div> <div>Valor básico de la Obra Ejecutada:</div>
<div>CONTRATO DE OBRA</div> <div>Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS</div> <div>Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 105.053.125,00</div> <div>Valor Actualizado: \$ 105.053.125,00</div> <div>Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024</div> <div>Plazo Actualizado: 0</div> <div>Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024</div>		<div>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</div> <div>Interventor: CONSORCIO REGIONES PRIA</div> <div>Contrato No. 2147 DE 2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 210.823.861,00</div> <div>Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00</div> <div>Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</div> <div>Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</div> <div>Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024</div>
<div>IMAGEN OFICINA</div> <div></div>		<div>IMAGEN OFICINA</div> <div></div>
<div>AVANCE</div> <div>EN LA SEMANA NUMERO TRES SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVSION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE. SE ESTA TRABAJANDO EN LOS CRONOGRAMAS CON LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN OBRA PARA REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACORDE CON LAS MISMAS.</div>		
<div>IMAGENES AVANCE</div> <div><div></div><div></div></div> <div><div>Comentario:</div><div>Comentario:</div></div>		



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024



	MACROPROCESO: GESTION ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1
INFORME SEMANAL		
Semana Número: 3 Del: 17 de septiembre de 2024 Al: 24 de septiembre de 2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Dias		
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: CONVENCION SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES		
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)		
SEMANAL Obra programada (%) Valor básico de la Obra programada: \$ 105.053.125,00		ACUMULADO Obra Física Ejecutada (%) Valor básico de la Obra Ejecutada:
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024 Valor Inicial: \$ 105.053.125,00 Valor Actualizado: \$ 105.053.125,00 Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024 Plazo Actualizado: 0 Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024 Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024		Interventor: CONSORCIO REGIONES PRIA Contrato No. 2147 DE 2024 Valor Inicial: \$ 210.823.861,00 Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00 Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024 Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024
Comentario:		Comentario:
Comentario:		Comentario:
OBSERVACIONES La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.		CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA Firma: Nombre: ARQ SONIA PENARANDA Matricula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA Firma: Nombre: YAMIL FABIAN CASTRILLON Matricula No.: A25202001-79742098



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024



	<div>MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA</div> <div>PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div> <div>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div>	<div>Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07</div> <div>Versión: 01</div> <div>Fecha: 11 - 08 - 2021</div> <div>Página 1 de 1</div>
<div>INFORME SEMANAL</div> <div>Semana Número: 3 Del: 17 de septiembre de 2024 Al: 24 de septiembre de 2024</div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Días</div> <div>ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: NEIVA SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES</div>		
<div>OBJETO:</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)</div>		
<div>SEMANAL</div> <div>Obra programada (%)</div> <div>Valor básico de la Obra programada: \$ 200.238.984,00 \$</div>		<div>ACUMULADO</div> <div>Obra Física Ejecutada (%)</div> <div>Valor básico de la Obra Ejecutada:</div>
<div>CONTRATO DE OBRA</div> <div>Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS</div> <div>Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 200.238.984,00</div> <div>Valor Actualizado: \$ 200.238.984,00</div> <div>Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024</div> <div>Plazo Actualizado: 0</div> <div>Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024</div>		<div>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</div> <div>Interventor: CONSORCIO REGIONES PRIA</div> <div>Contrato No. 2147 DE 2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 210.823.861,00</div> <div>Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00</div> <div>Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</div> <div>Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</div> <div>Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024</div>
<div>IMAGEN OFICINA</div> <div></div>		<div>IMAGEN OFICINA</div> <div></div>
<div>AVANCE</div> <div>EN LA SEMANA NUMERO TRES SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVISION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE. SE ESTA TRABAJANDO EN LOS CRONOGRAMAS CON LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN OBRA PARA REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACORDE CON LAS MISMAS.</div>		
<div>IMAGENES AVANCE</div> <div></div>		<div>IMAGENES AVANCE</div> <div></div>
<div>Comentario:</div>		<div>Comentario:</div>



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024



	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1
--	--	--

INFORME SEMANAL

Semana 3
Número: 3
Del: 17 de septiembre de 2024
Al: 24 de septiembre de 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
SEDE: NEIVA
SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		Obra Física Ejecutada (%)	
Valor básico de la Obra programada: \$ 200.238.984,00	\$	Valor básico de la Obra Ejecutada:	

CONTRATO DE OBRA

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS
Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024
Valor Inicial: \$ 200.238.984,00
Valor Actualizado: \$ 200.238.984,00
Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024
Plazo Actualizado: 0
Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024
Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Interventor: CONSORCIO REGIONES PRIA
Contrato No. 2147 DE 2024
Valor Inicial: \$ 210.823.861,00
Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00
Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024

Comentario:

Comentario:

Comentario:

Comentario:

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	<div><div></div><div>Firma: Nombre : ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA</div></div> <div><div></div><div>Firma: Nombre : YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098</div></div>



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024



	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1
--	--	--

INFORME SEMANAL

Semana 3
Número: 3
Del: 17 de septiembre de 2024
Al: 24 de septiembre de 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
SEDE: GARZON
SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		Obra Física Ejecutada (%)	
Valor básico de la Obra programada:	\$ 143.094.539,00	Valor básico de la Obra Ejecutada:	

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contratista:	SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS	Interventor:	CONSORCIO REGIONES PRIA
Contrato No.	No. 2150-2024 DE 2024	Contrato No.	2147 DE 2024
Valor Inicial:	\$ 143.094.539,00	Valor Inicial:	\$ 210.823.861,00
Valor Actualizado:	\$ 143.094.539,00	Valor Actualizado:	\$ 210.823.861,00
Plazo Inicial:	3 de septiembre de 2024	Plazo Inicial:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Plazo Actualizado:	0	Plazo Actualizado:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
Fecha de Iniciación:	3 de septiembre de 2024	Fecha de Iniciación:	SEPTIEMBRE 03 DEL 2024
Fecha de Vencimiento:	31 de diciembre de 2024	Fecha de Vencimiento:	DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO TRES SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LA VISITA TECNICA EN SITIO PARA DARLE ALCANCE A CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES DE NUESTRA PROPUESTA ECONOMICA ESTO CON EL FIN DE DARLE TRAMITE AL ACTA NUMERO UNO DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES PARA REMITIRLA A INTERVENTORIA Y LA SUPERVISION PARA SU REVISION Y APROBACION Y POSTERIOR A ESTO EMPEZAR A ENVIAR LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL OPERATIVO QUE VA ESTAR EN OBRA PARA SU APROBACION E INGRESO AL FRENTE. SE ESTA TRABAJANDO EN LOS CRONOGRAMAS CON LAS ACTIVIDADES DEFINIDAS EN OBRA PARA REALIZAR EN LOS TIEMPOS ESTABLECIDOS ACORDE CON LAS MISMAS.

IMAGENES AVANCE

Comentario:

Comentario:

CODIGO:GA-DMIF-PR-01-FR-12)

VERSIÓN:01

FECHA:28/08/2015



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024



	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1
--	--	--

INFORME SEMANAL

Semana 3
Número: 3
Del: 17 de septiembre de 2024
Al: 24 de septiembre de 2024
Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Días

ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO
SEDE: GARZON
SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		Obra Física Ejecutada (%)	
Valor básico de la Obra programada:	\$ 143.094.539,00	Valor básico de la Obra Ejecutada:	

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024 Valor Inicial: \$ 143.094.539,00 Valor Actualizado: \$ 143.094.539,00 Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024 Plazo Actualizado: 0 Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024 Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024	Interventor: CONSORCIO REGIONES PRIA Contrato No. 2147 DE 2024 Valor Inicial: \$ 210.823.861,00 Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00 Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024 Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024
---	---

Comentario:

Comentario:

Comentario:

Comentario:

OBSERVACIONES	CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.	Firma: Nombre: ARQ SONIA PEÑARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA
	Firma: Nombre: YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024



 <div>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la fe pública</small></div>	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1
--	--	--

INFORME SEMANAL

Semana
Número: 3

Del: 17 de septiembre de 2024

Al: 24 de septiembre de 2024

Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Días

ENTIDAD CONTRATANTE

SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO

SEDE

SAN JOSE DEL GUAVIARE

SUPERVISOR

ING. BAYARDO BUSTOS LINARES

OBJETO:

CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)

SEMANAL	ACUMULADO	SEMANAL	ACUMULADO
Obra programada (%)		Obra Física Ejecutada (%)	
Valor básico de la Obra programada: \$ 202.730.968,00 \$		Valor básico de la Obra Ejecutada:	

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORIA:

Contratista:

SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS

Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024

Valor Inicial: \$ 202.730.968,00

Valor Actualizado: \$ 202.730.968,00

Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024

Plazo Actualizado: 0

Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024

Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024

Interventor:

CONSORCIO REGIONES PRIA

Contrato No. 2147 DE 2024

Valor Inicial: \$ 210.823.861,00

Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00

Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024

Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024

Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024

IMAGEN OFICINA

IMAGEN OFICINA

AVANCE

EN LA SEMANA NUMERO TRES SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LO QUE TIENE QUE VER CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO LO ES LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, Y PROGRAMACION DE LA VISITA TECNICA PARA DAR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INICIAL Y POSTERIOR A ESTO ELABORAR INVENTARIOS Y ACTAS DE VECINDAD QUE APLIQUEN A LAS AREAS POR INTERVENIR, ADICIONALMENTE SE REMITIERON LAS POLIZAS DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE SOLICITARON LOS FORMATOS Y PLANOS PARA EMPEZAR A TRABAJAR EN LAS MEMORIAS DE CALCULO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES. ESPERANDO QUE SE REALICE LA VISITA TECNICA A ESTE FRENTE DE OBRA DE ACUERDO EL CRONOGRAMA DE LAS MISMAS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO.

IMAGENES AVANCE

Comentario:

Comentario:



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024



	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1
INFORME SEMANAL		
Semana Número: 3 Del: 17 de septiembre de 2024 Al: 24 de septiembre de 2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Días		
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: SAN JOSE DEL GUAVIARE SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES		
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)		
SEMANAL Obra programada (%) Valor básico de la Obra programada: \$ 202.730.968,00		ACUMULADO Obra Física Ejecutada (%) Valor básico de la Obra Ejecutada:
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista: Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024 Valor Inicial: \$ 202.730.968,00 Valor Actualizado: \$ 202.730.968,00 Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024 Plazo Actualizado: 0 Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024 Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024	Interventor: Contrato No. 2147 DE 2024 Valor Inicial: \$ 210.823.861,00 Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00 Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024 Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024	
Comentario:		Comentario:
Comentario:		Comentario:
OBSERVACIONES		CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.		Firma: Nombre: ARQ SONIA PENARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA
		Firma: Nombre: YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024




 <div>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la fe pública</small></div>	<div>MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA</div> <div>PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div> <div>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div>	<div>Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07</div> <div>Versión: 01</div> <div>Fecha: 11 - 08 - 2021</div> <div>Página 1 de 1</div>
<div>INFORME SEMANAL</div> <div>Semana Número: 3 Del: 17 de septiembre de 2024 Al: 24 de septiembre de 2024</div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Días</div> <div>ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: SANTO DOMINGO SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES</div>		
<div>OBJETO:</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)</div>		
<div>SEMANAL</div> <div>Obra programada (%)</div> <div>Valor básico de la Obra programada: \$ 70.411.191,00 \$</div>		<div>ACUMULADO</div> <div>Obra Física Ejecutada (%)</div> <div>Valor básico de la Obra Ejecutada:</div>
<div>CONTRATO DE OBRA</div> <div>Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS</div> <div>Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 70.411.191,00</div> <div>Valor Actualizado: \$ 70.411.191,00</div> <div>Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024</div> <div>Plazo Actualizado: 0</div> <div>Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024</div>		<div>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</div> <div>Interventor: CONSORCIO REGIONES PRIA</div> <div>Contrato No. 2147 DE 2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 210.823.861,00</div> <div>Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00</div> <div>Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</div> <div>Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</div> <div>Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024</div>
<div>IMAGEN OFICINA</div>		<div>IMAGEN OFICINA</div>
<div>AVANCE</div> <div>EN LA SEMANA NUMERO TRES SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LO QUE TIENE QUE VER CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO LO ES LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, Y PROGRAMACION DE LA VISITA TECNICA PARA DAR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INICIAL Y POSTERIOR A ESTO ELABORAR INVENTARIOS Y ACTAS DE VECINDAD QUE APLIQUEN A LAS AREAS POR INTERVENIR, ADICIONALMENTE SE REMITIERON LAS POLIZAS DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE SOLICITARON LOS FORMATOS Y PLANOS PARA EMPEZAR A TRABAJAR EN LAS MEMORIAS DE CALCULO DE CADA UNAS DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES. ESPERANDO QUE SE REALICE LA VISITA TECNICA A ESTE FRENTE DE OBRA DE ACUERDO EL CRONOGRAMA DE LAS MISMAS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO.</div>		
<div>IMAGENES AVANCE</div>		
<div></div>	<div></div>	
<div>Comentario:</div>	<div>Comentario:</div>	



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024



 <div>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la ley pública</small></div>	<div>MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA</div> <div>PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div> <div>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div>	<div>Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07</div> <div>Versión: 01</div> <div>Fecha: 11 - 08 - 2021</div> <div>Página 1 de 1</div>
<div>INFORME SEMANAL</div> <div>Semana Número: 3 Del: 17 de septiembre de 2024 Al: 24 de septiembre de 2024</div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Días</div> <div>ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: SANTO DOMINGO SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES</div>		
<div>OBJETO:</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)</div>		
<div>SEMANALACUMULADO</div> <div>Obra programada (%)</div> <div>Valor básico de la Obra programada: \$ 70.411.191,00 \$</div>		<div>SEMANALACUMULADO</div> <div>Obra Física Ejecutada (%)</div> <div>Valor básico de la Obra Ejecutada:</div>
<div>CONTRATO DE OBRA</div> <div>Contratista: SOLUCIONES INTEGRALES UNION SAS</div> <div>Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 70.411.191,00</div> <div>Valor Actualizado: \$ 70.411.191,00</div> <div>Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024</div> <div>Plazo Actualizado: 0</div> <div>Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024</div>		<div>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</div> <div>Interventor: CONSORCIO REGIONES PRIA</div> <div>Contrato No. 2147 DE 2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 210.823.861,00</div> <div>Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00</div> <div>Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</div> <div>Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</div> <div>Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024</div>
<div>Comentario:</div>	<div>Comentario:</div>	
<div>Comentario:</div>	<div>Comentario:</div>	
<div>OBSERVACIONES</div> <div>La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.</div>		<div>CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA</div> <div>Firma: </div> <div>Nombre: ARQ SONIA PENARANDA</div> <div>Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA</div> <div>Firma: </div> <div>Nombre: YAMIL FABIAN CASTRILLON</div> <div>Matrícula No.: A25202001-79742098</div>



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024




 <div>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la fe pública</small></div>	<div>MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA</div> <div>PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div> <div>PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA</div>	<div>Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07</div> <div>Versión: 01</div> <div>Fecha: 11 - 08 - 2021</div> <div>Página 1 de 1</div>	
<div>INFORME SEMANAL</div> <div>Semana Número: 3 Del: 17 de septiembre de 2024 Al: 24 de septiembre de 2024</div> <div>Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Días</div> <div>ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: FILANDIA SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES</div>			
<div>OBJETO:</div> <div>CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)</div>			
<div>SEMANAL</div> <div>Obra programada (%)</div> <div>Valor básico de la Obra programada: \$ 46.740.812,00 \$</div>		<div>ACUMULADO</div> <div>Obra Física Ejecutada (%)</div> <div>Valor básico de la Obra Ejecutada:</div>	
<div>CONTRATO DE OBRA</div>		<div>CONTRATO DE INTERVENTORIA:</div>	
<div>Contratista:</div> <div>Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 46.740.812,00</div> <div>Valor Actualizado: \$ 46.740.812,00</div> <div>Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024</div> <div>Plazo Actualizado: 0</div> <div>Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024</div>	<div>Interventor:</div> <div>Contrato No. 2147 DE 2024</div> <div>Valor Inicial: \$ 210.823.861,00</div> <div>Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00</div> <div>Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</div> <div>Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024</div> <div>Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024</div> <div>Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024</div>		
<div>IMAGEN OFICINA</div>		<div>IMAGEN OFICINA</div>	
<div>AVANCE</div> <div>EN LA SEMANA NUMERO TRES SE HA AVANZADO Y TRABAJADO EN LO QUE TIENE QUE VER CON LOS PROCESOS ADMINISTRATIVOS COMO LO ES LA RADICACION DE LA DOCUMENTACION DEL PERSONAL ADMINISTRATIVO Y OPERATIVO, Y PROGRAMACION DE LA VISITA TECNICA PARA DAR ALCANCE A LAS ACTIVIDADES DEL PRESUPUESTO INICIAL Y POSTERIOR A ESTO ELABORAR INVENTARIOS Y ACTAS DE VECINDAD QUE APLIQUEN A LAS AREAS POR INTERVENIR, ADICIONALMENTE SE REMITIERON LAS POLIZAS DEL CONTRATO POR PARTE DEL CONTRATISTA Y SE SOLICITARON LOS FORMATOS Y PLANOS PARA EMPEZAR A TRABAJAR EN LAS MEMORIAS DE CALCULO DE CADA UNA DE LAS ACTIVIDADES CONTRACTUALES. ESPERANDO QUE SE REALICE LA VISITA TECNICA A ESTE FRENTE DE OBRA DE ACUERDO EL CRONOGRAMA DE LAS MISMAS POR PARTE DE LA SUPERVISION DEL CONTRATO.</div>			
<div>IMAGENES AVANCE</div>			
<div>Comentario:</div>		<div>Comentario:</div>	



Informe Semanal
CONSORCIO REGIONES PRIA
NIT 901.863.627-9 Contrato 2147 DE 2024



 <div>SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO & REGISTRO <small>La guarda de la ley pública</small></div>	MACROPROCESO: GESTIÓN ADMINISTRATIVA PROCESO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA PROCEDIMIENTO: MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA	Código: MP - GNAD - PO - 05 - PR - 02 - FR - 07 Versión: 01 Fecha: 11 - 08 - 2021 Página 1 de 1
INFORME SEMANAL		
Semana Número: 3 Del: 17 de septiembre de 2024 Al: 24 de septiembre de 2024 Tiempo transcurrido desde la iniciación del contrato: 21 Días		
ENTIDAD CONTRATANTE: SUPERINTENDENCIA DE NOTARIADO Y REGISTRO SEDE: FILANDIA SUPERVISOR: ING. BAYARDO BUSTOS LINARES		
OBJETO: CONTRATAR POR EL SISTEMA DE PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FÓRMULA DE AJUSTE, LAS OBRAS DE MANTENIMIENTO, ADECUACIÓN Y MEJORAMIENTO DE INMUEBLES DONDE FUNCIONAN OFICINAS DE REGISTRO DE INSTRUMENTOS PÚBLICOS A NIVEL NACIONAL Y NIVEL CENTRAL. (21 ORIP Y OFICINA SUPERINTENDENCIA NIVEL CENTRAL)		
SEMANAL Obra programada (%) Valor básico de la Obra programada: \$ 46.740.812,00 \$		ACUMULADO Obra Física Ejecutada (%) Valor básico de la Obra Ejecutada:
CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA:
Contratista: Contrato No. No. 2150-2024 DE 2024 Valor Inicial: \$ 46.740.812,00 Valor Actualizado: \$ 46.740.812,00 Plazo Inicial: 3 de septiembre de 2024 Plazo Actualizado: 0 Fecha de Iniciación: 3 de septiembre de 2024 Fecha de Vencimiento: 31 de diciembre de 2024	Interventor: Contrato No. 2147 DE 2024 Valor Inicial: \$ 210.823.861,00 Valor Actualizado: \$ 210.823.861,00 Plazo Inicial: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Plazo Actualizado: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024 Fecha de Iniciación: SEPTIEMBRE 03 DEL 2024 Fecha de Vencimiento: DICIEMBRE 31 DEL 2024	
Comentario:		Comentario:
Comentario:		Comentario:
OBSERVACIONES		CONTRATISTA DE OBRA / INTERVENTORIA
La Interventoría recibe, revisa, verifica y avala el informe presentado por el contratista.		Firma:  Nombre: ARQ SONIA PENARANDA Matrícula No.: DIRECTORA DE CONTRATISTA DE OBRA
		Firma:  Nombre: YAMIL FABIAN CASTRILLON Matrícula No.: A25202001-79742098
