



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL
CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACION
21/08/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR				
CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	NIT	901925618-1	CONTRATO No.	2025040002	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	NIT	901925042-8	CONTRATO No.	2025050004	
CAPITULO	2.0	ITEM	2.2	EXCAVACION A MAQUINA EN MATERIAL HETEROGENEO E=10 A 2M, INCLUYE RETIRO DE MATERIAL		
				UNID.	M3	

BLOQUE 3

ZAPATAS

TIPO DE ZAPATA	LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTURA	CANT	M3
ZAPATA ZI/1	D2, D3, D4, D6, D7, D8, D9, D10, D11, D12, D14, D15	2.90	2.90	1.55	12	156.43
ZAPATA ZI/4	D1, D16	2.50	2.50	1.55	2	19.37
ZAPATA ZI/6	B2, B3, B7, B8, B9, B10, B11, B15	2.30	2.30	1.55	8	65.60
ZAPATA ZI/7	B1, B4, B6, B12, B14, B16, A1, A2, A3, A4, A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A14, A15, A16	2.00	2.00	1.55	20	124.00
ZAPATA ZI/10	C5, C13	5.50	3.00	1.55	2	51.15
TOTAL						416.55

VIGAS DE CIMENTACION



TIPO DE VIGA	LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTURA	CANT	M3
VC3/101, VC3/102	EJE B(1-16), EJE D(1-16)	0.70	100.70	1.05	2	147.15
VC3/107, VC3/108, VC3/109, VC3/110, VC3/111, VC3/112, VC3/113, VC3/114, VC3/115, VC3/116, VC3/117, VC3/118	EJE 1(A-D), EJE 2(A-D), EJE 3(A-D), EJE 4(A-D), EJE 6(A-D), EJE 7(A-D), EJE 8(A-D), EJE 9(A-D), EJE 10(A-D), EJE 11(A-D), EJE 12(A-D), EJE 14(A-D), EJE 15(A-D), EJE 16(A-D)	0.70	11.15	1.05	16	131.12
VC3/103, VC3/104, VC3/105, VC3/106	EJE B-C(4-6), EJE C-D(4-6), EJE B-C(12-14), EJE C-D(12-14)	0.70	7.80	1.05	5	28.67
TOTAL						306.94

BLOQUE 1

ZAPATAS

TIPO DE ZAPATA	LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTURA	CANT	M3
ZAPATA ZI/1	L1, L2, L4, L6, L7, L8, L9, L10, L11, L12, L14, L15, M1, M2, N3	2.90	2.90	1.55	15	195.53
ZAPATA ZI/4	L16, N8, P1, P2, P3, P4, P6, P7	2.50	2.50	1.55	8	77.50
ZAPATA ZI/3	N4, N6, N7	2.70	2.70	1.55	3	33.90
ZAPATA ZI/6	N9, N10, N11, N15, P8	2.30	2.30	1.55	5	41.00
ZAPATA ZI/7	N12, N14, N16, O8, O9, O10, O11, O12, O14, O15, O16	2.00	2.00	1.55	11	68.20
ZAPATA ZI/9	L3	2.50	5.50	1.55	1	21.31
ZAPATA ZI/10	M13	5.50	3.00	1.55	1	25.57
ZAPATA ZI/11	M4	1.30	1.30	1.55	1	2.62
TOTAL						465.64



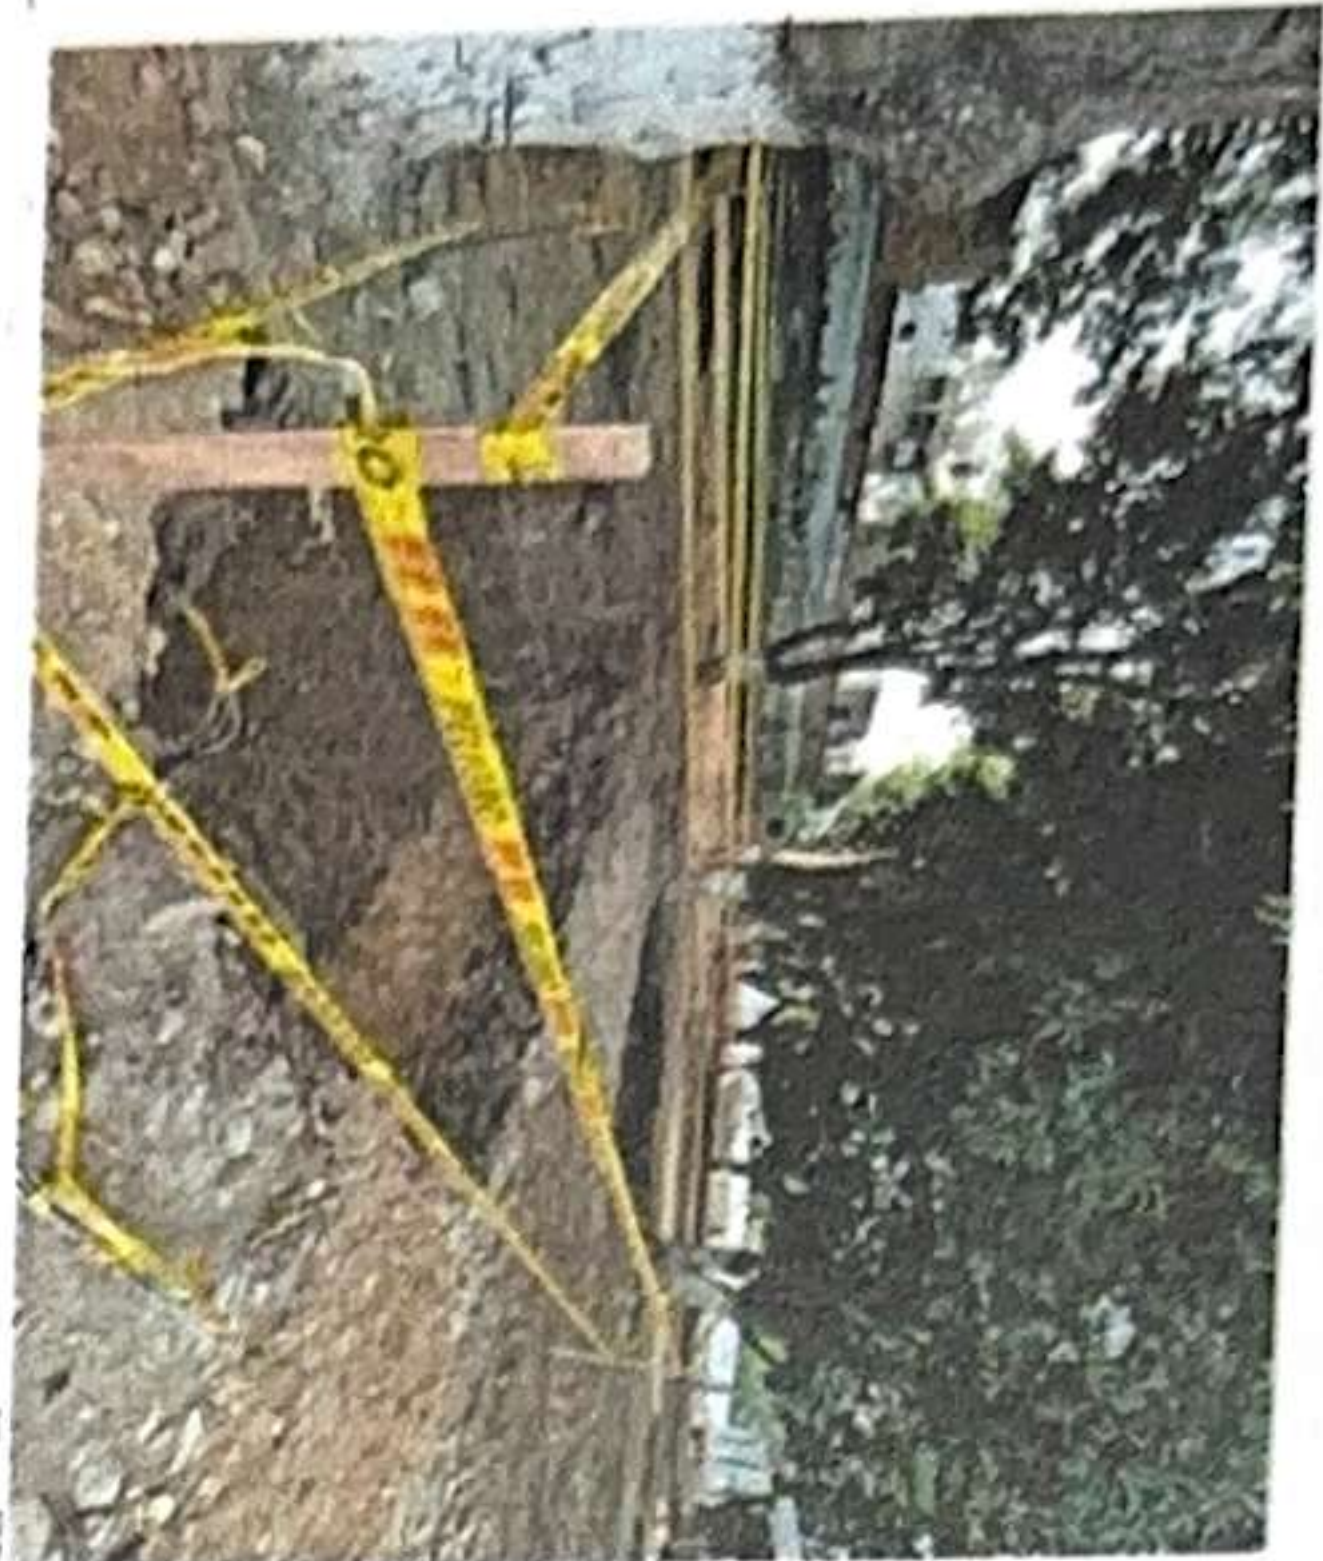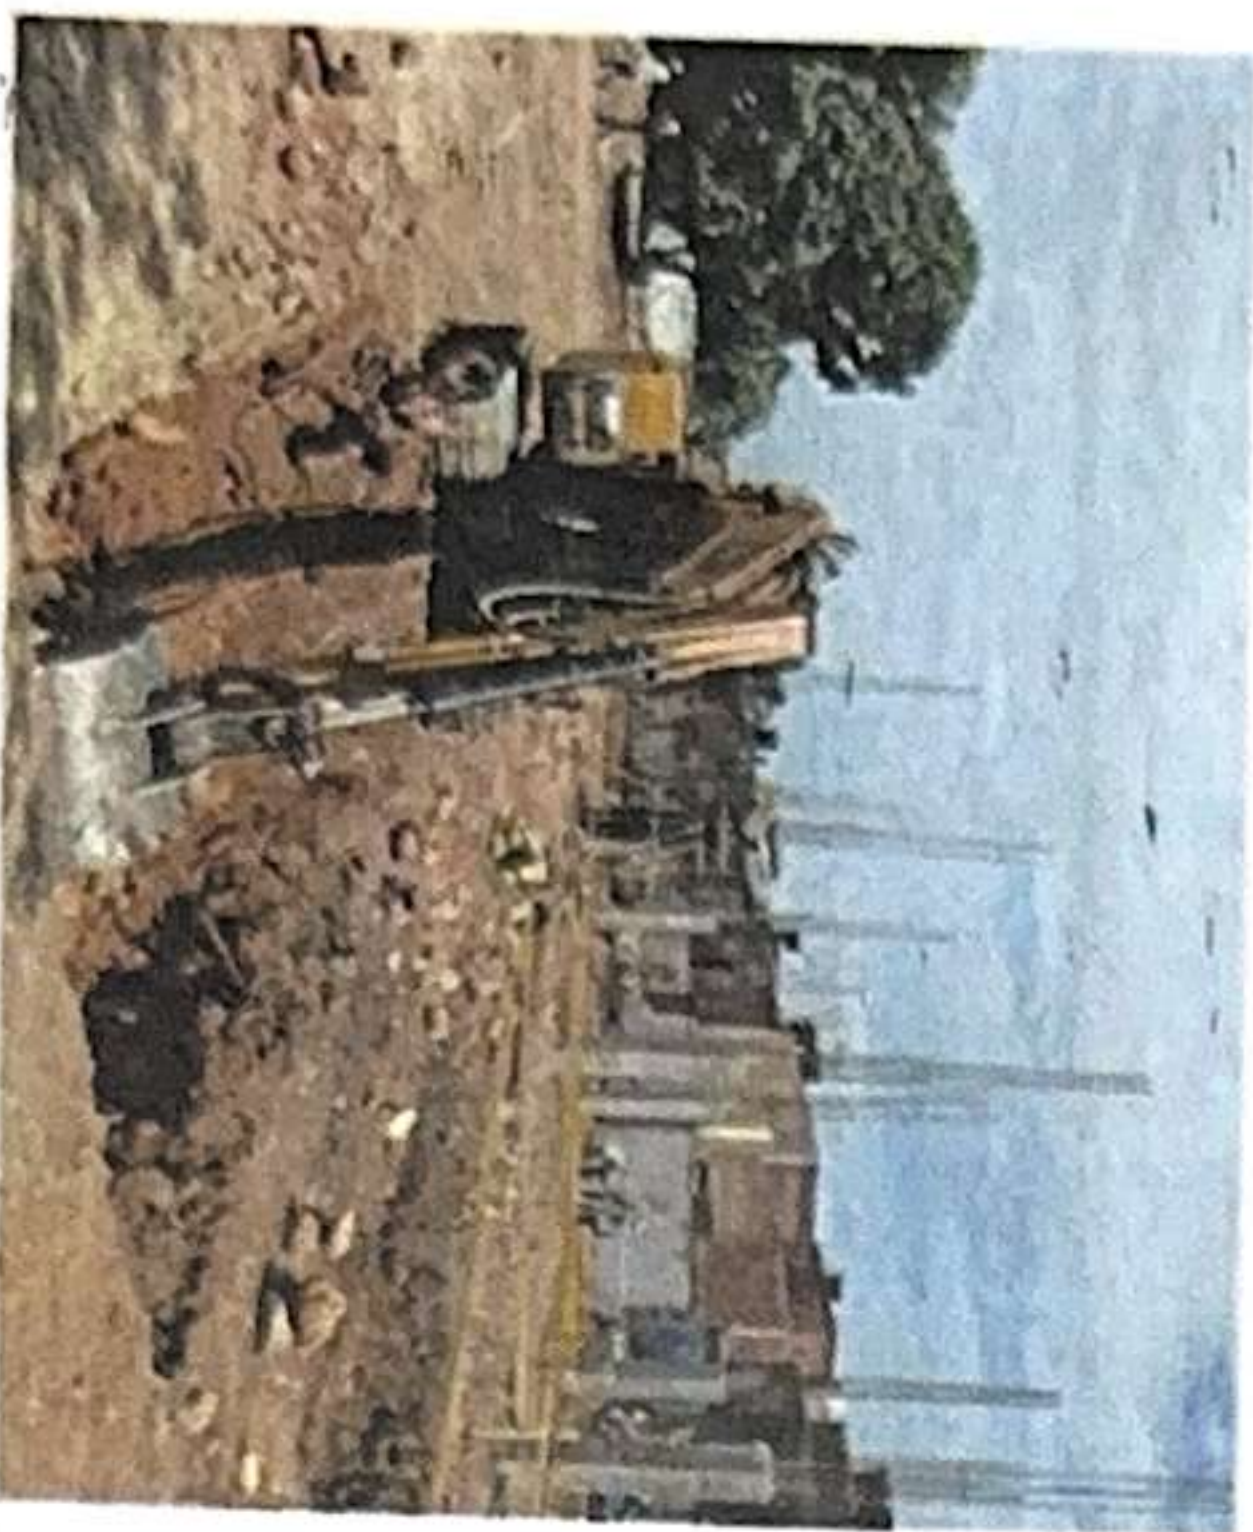

VIGAS DE CIMENTACIÓN						
TIPO DE VIGA	LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTURA	CANT	M3
VC1/101	EJE P(1-8)	0.70	45.30	1.05	1	33.20
VC1/102	EJE M(1-2), EJE (M'-N)(2-3), EJE N(3-16)	0.70	100.13	1.05	3	220.79
VC1/103	EJE L(1-16)	0.70	100.10	1.05	2	147.15
VC1/104	EJE 1(P-L)	0.70	15.10	1.05	2	22.20
VC1/105	EJE 2(P-L)	0.70	15.10	1.05	1	11.10
VC1/106	EJE 3(P-L)	0.70	15.10	1.05	1	11.10
VC1/107	EJE 4(P-L)	0.70	15.10	1.05	1	11.10
VC1/108	EJE 6(P-L)	0.70	15.10	1.05	1	11.10
VC1/109	EJE 7(P-L)	0.70	15.10	1.05	1	11.10
VC1/110	EJE 8(P-L)	0.70	15.10	1.05	1	11.10
VC1/111	EJE 9(O-L)	0.70	11.15	1.05	1	8.20
VC1/112	EJE 10(O-L)	0.70	11.15	1.05	1	8.20
VC1/113	EJE 11(O-L)	0.70	11.15	1.05	1	8.20
VC1/114	EJE 12(O-L)	0.70	11.15	1.05	1	8.20
VC1/115	EJE 14(O-L)	0.70	11.15	1.05	1	8.20
VC1/116	EJE 15(O-L)	0.70	11.15	1.05	1	8.20
VC1/117	EJE 16(O-L)	0.70	11.15	1.05	1	8.20
VC1/118	EJE 3-4(N-L)	0.70	8.60	1.05	2	12.64
VC1/119	EJE M-L(12-14)	0.70	7.80	1.05	2	11.47
VC1/120	EJE M-M(12-14)	0.70	7.80	1.05	2	11.47
TOTAL						582.96

BLOQUE 2

ZAPATAS						
TIPO DE ZAPATA	LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTURA	CANT	M3
ZAPATA ZT/1	E14, F14, G14, H14, I14, J14	2.90	2.90	1.55	6	78.21
ZAPATA ZT/6	E15, F15, G15, H15, I15, J15	2.30	2.30	1.55	6	49.20
ZAPATA ZT/7	E14, E14, F16, F16, G16, H16, I16, J16, K14, K14	2.00	2.00	1.55	10	62.00
TOTAL						189.41

VIGAS DE CIMENTACION

TIPO DE VIGA	LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTURA	CANT	M3
VC-1	EJE 15(E-J), EJE 16(E-J)	0.70	38.50	1.05	2	56.60
VC-1	EJE 14(E-K)	0.70	45.60	1.05	1	33.52
VC-1	EJE E(14-16), EJE F(14-16), EJE G(14-16), EJE H(14-16), EJE I(14-16), EJE J(14-16)	0.70	11.15	1.05	8	65.56
VC-1	EJE E(14-14), EJE K(14-14)	0.70	3.05	1.05	2	4.48
TOTAL						160.16

BLOQUE 4

ZAPATAS						
TIPO DE ZAPATA	LOCALIZACION	ANCHO	LARGO	ALTURA	CANT	M3
ZAPATA ZT/2	F3, G-3, H-3, I-3, J-3, F1, G1, H1, I1, J1	2.70	2.90	1.55	10	121.36



ZAPATAZ/16	F.2, J.2, F.1, J.1, E.1, K.1, E.2, F.2, G.2, H.2, I.2, J.2, K.2, E.3, F.3, G.3, H.3, I.3, J.3, K.3	2,30	2,30	1,55	20	163,99
TOTAL						255,35
VIGAS DE CIMENTACIÓN						
TIPO DE VIGA	LOCALIZACIÓN	ANCHO	LARGO	ALTURA	CANT	M3
VC/102	EJE 1(F-J)	0,7	30,20	1,05	1	22,20
VC/103	EJE 2(E-K)	0,7	45,00	1,05	2	66,15
VC/104	EJE 3(E-K)	0,7	45,00	1,05	2	66,15
VC/105	EJE -1(E-F)	0,7	7,63	1,05	2	11,22
VC/106	EJE -1(J-K)	0,7	7,63	1,05	1	5,61
VC/107	EJE E(1-3)	0,7	15,00	1,05	1	11,03
VC/108	EJE F(1-3)	0,7	14,25	1,05	1	10,47
VC/109	EJE G(3-3)	0,7	25,50	1,05	1	18,74
VC/110	EJE H(3-3)	0,7	25,50	1,05	1	18,74
VC/111	EJE I(3-3)	0,7	25,50	1,05	1	18,74
VC/112	EJE J(1-3)	0,7	14,25	1,05	2	20,95
VC/113	EJE K(1-3)	0,7	15,00	1,05	2	22,05
VC/114	EJE L(3-3), EJE H(3-3), EJE F(3-3)	0,7	2,70	1,05	3	5,95
VC/115	EJE -3(I-K)	0,7	11,75	1,05	1	8,64
VC/116	EJE -3(F-G)	0,7	7,60	1,05	1	5,59
VC/117	EJE G(3-3), EJE I(3-3)	0,7	2,70	1,05	2	3,97
VC/117	EJE -2(J-K)	0,7	4,38	1,05	2	6,44
VC/119	EJE J(K(3-1))	0,7	11,78	1,05	2	17,32
VC/119	EJE -2(E-F)	0,7	4,38	1,05	1	3,22
VC/120	EJE J(3-1))	0,7	10,25	1,05	1	7,53
VC/120	EJE -3(E-F)	0,7	4,15	1,05	1	3,05
VC/120	EJE F(3-2))	0,7	4,95	1,05	2	7,28
VC/123	EJE F(2-4-1))	0,7	5,30	1,05	2	7,79
TOTAL						368,82
TANQUE						
DESCRIPCION	REF	ANCHO	LARGO	ALTURA	CANT	M3
TANQUE GENERAL	TANQUE DE ALMACENAMIENTO	5,10	14,90	3,15	1	239,37
CAJUELA	DE AGUA	5,10	1,55	0,62	1	4,90
TOTAL						244,27
SUBESTACION						
ZAPATAS						
DESCRIPCION	REF	ANCHO	LARGO	ALTURA	CANT	M3
SUBESTACION	ZT	1,50	1,50	1,05	8	18,90
TOTAL						18,90

VIGAS DE CIMENTACIÓN						
DESCRIPCIÓN	REF	ANCHO	LARGO	ALTURA	CANT	M3
SUBESTACION	VC1	0.70	4.00	0.75	6	12.60
	VC2	0.70	5.00	0.75	4	10.50
	TOTAL					23.10
SUBTOTAL						3062.08
CANTIDAD ACTA Parcial No 01						2.269,74
CANTIDAD ACTA Parcial No 02						-
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03						792,35
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						3.062,08
CANTIDAD CONTRACTUAL						5.133,75
PENDIENTE POR PAGAR						2.071,67
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA						792,35

Nombre:
RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOURARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARROS BAQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA

DEPARTAMENTO DEL
CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACIÓN
21/08/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA
INTERVENOR

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

NIT
NIT

901925618-1
901925042-8

CONTRATO No.
CONTRATO No.

2025040002
2025050004

CAPITULO

2.0

ITEM

2.3

RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO SUB BASE,
INCLUYE SUMINISTRO Y COMPACTACIÓN

UNID.

M3



RELLENO EN MATERIAL SELECCIONADO SUB BASE

REFERENCIA	AREA (M2)	ESPESOR	M3
BLOQUES	6236.82	0.20	1247.36
ZONA INTERNA	3524.91	0.20	704.98
ZONA EXTERNA	4678.59	0.20	935.72
SUBTOTAL			2888.06
% FACTOR VOLUMETRICO DE COMPACTACION (30%)			866.42
TOTAL			3754.48
SUBTOTAL			3754.48
CANTIDAD ACTA Parcial No 01			2.538,05
CANTIDAD ACTA Parcial No 02			-
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03			1.216,43
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			3.754,48
CANTIDAD CONTRACTUAL			4.078,11
PENDIENTE POR PAGAR			323,63
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA			1216,43

Nombre:

RESIDENTE DE OBRA

DUBER DURAN

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA

OMAR MOUKARZEL

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GUSTAVO BARROS BAQUERO

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MARIA BERNARDA NOVA

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL
CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACIÓN
21/06/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR,
DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	NIT
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	NIT
CAPITULO	2.0	ITEM 2.4

901925678-1	CONTRATO No.	2025040002
901925042-8	CONTRATO No.	2025050004
RELLENO MANUAL EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN EXTENDIDO Y COMPACTADO	UNID.	M3



RELLENO MANUAL EN MATERIAL PROVENIENTE DE LA EXCAVACIÓN			
REFERENCIA	AREA (M2)	ESPESOR	M3
BLOQUES			2650.92
ZONA INTERNA			1414.82
ZONA EXTERNA			1455.09
SUBTOTAL			5520.83
% FACTOR VOLUMETRICO DE COMPACTACIÓN (30%)			1656.25
TOTAL			7.177.08
SUBTOTAL			7177.08
CANTIDAD ACTA Parcial No 01			5.265.46
CANTIDAD ACTA Parcial No 02			
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03			1.891.62
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			7.177.08
CANTIDAD CONTRACTUAL			7.666.86
PENDIENTE POR PAGAR			489.78
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA			1891.62

Nombre:
RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARROS BAQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACION
21/06/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO: CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	NIT	901925618-1	CONTRATO No.	2025040002
INTERVENIOR	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	NIT	901925042-8	CONTRATO No.	2025050004
CAPITULO	3.0	ITEM	3.5	CONSTRUCCION DE PLACA CONTRAPISO CONCRETO E=0.1M F=C-24.5 MPA (NO INCLUYE REFUERZO)	UNID. M2

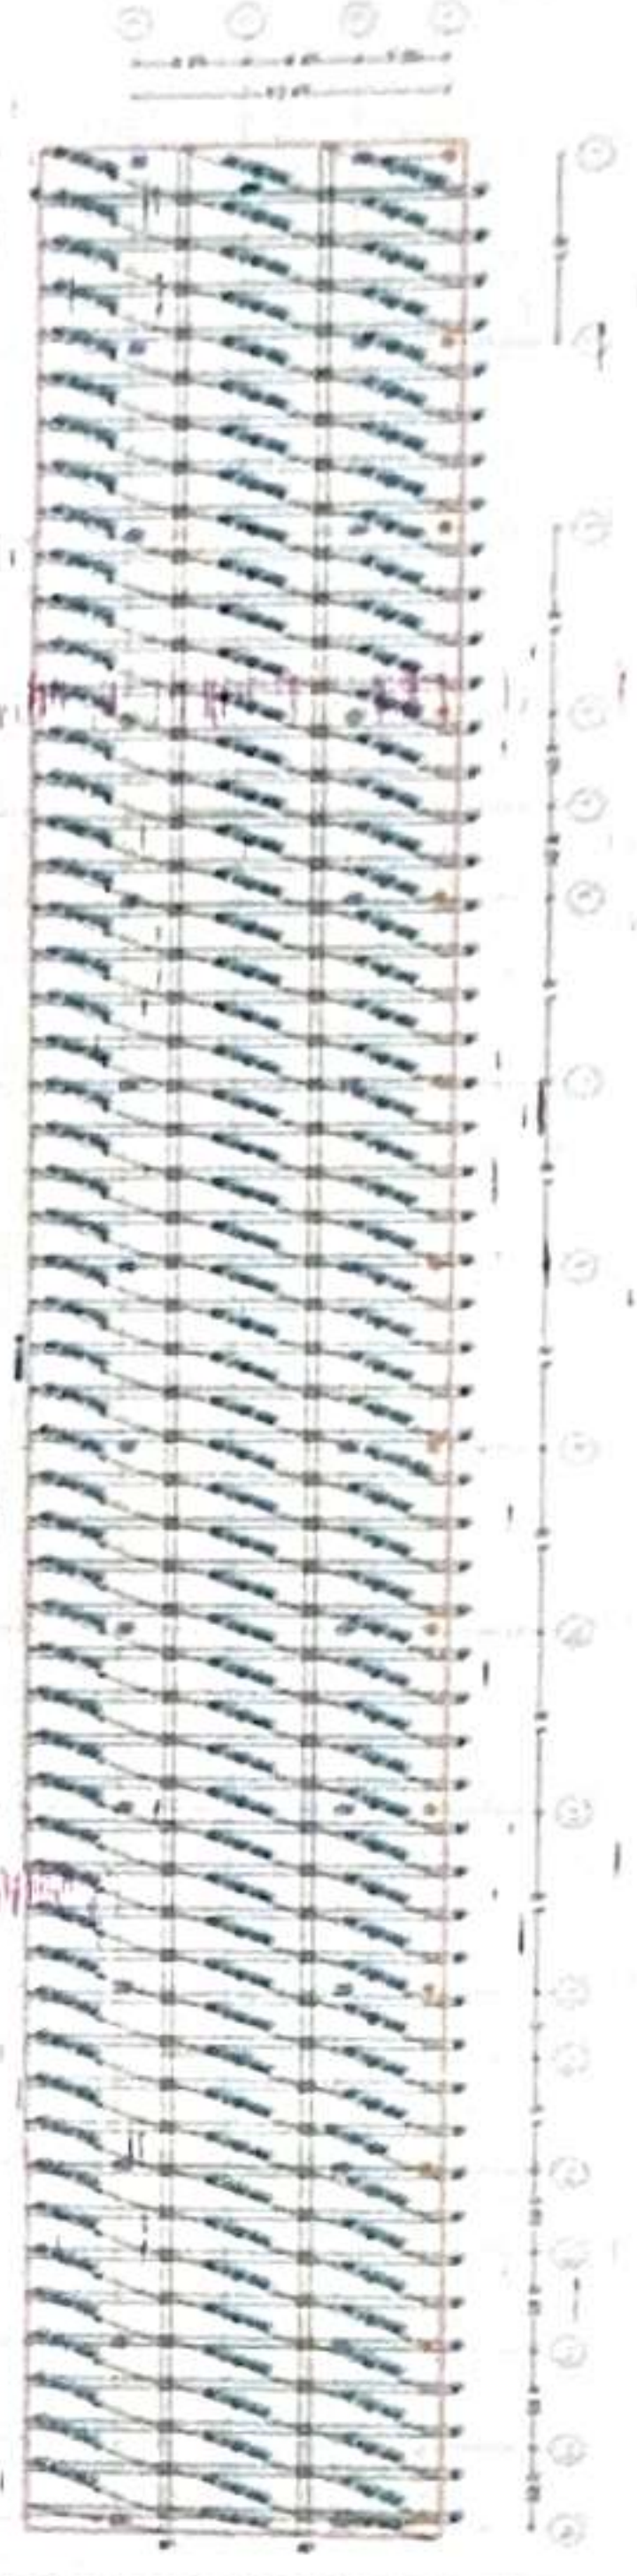


Diagrama Estructural de Localización mallas contrapiso N+0.00 (Bloque 3 - Salones)

BLOQUE 3-					
LOCALIZACION	DIMENSIONES			CANT	M2
	REF	LARGO	H		
BLOQUE 3	PLANO DE REFERENCIA				1794.53
DESCUENTO POR COLUMNA	PLANO ESTRUCTURAL B3 2112 LOCALIZACION DE LOSA DE CONTRAPISO N=0.00 m			1.00	6.81
TOTAL					1787.72
SUBTOTAL					1787.72
CANTIDAD ACTA Parcial No 01-					-
CANTIDAD ACTA Parcial No 02					-
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03					1.787.72
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					1.787.72
CANTIDAD CONTRACTUAL					7.180.34
PENDIENTE POR PAGAR					5.392.62
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA					1787.72

Nombre:
RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOUKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARROS BAQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACIÓN
21/06/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	NIT
INTERVENIOR	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	NIT
CAPITULO	3.0	ITEM 3.7


LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES	M2	N° MALLAS	KG
901925618-1	901925042-8	CONTRATO No.	2025040002	
		CONTRATO No.	2025050004	

UNID. KG

BLOQUE 3

LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES	M2	N° MALLAS	KG
MALLA ELECTROSOLDADA 6 x 2.35 m (Diámetro=6 mm), PLANOS DE REFERENCIA B3 212	2.99	1787.72	153.00	6450.33
LOCALIZACIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO N+0.00 m				
NOTA. Área tomada de memoria 3.5 Construcción de placa de contrapiso. Se calcula el número de mallas teniendo en cuenta el área útil (2.05x5.7 m) y se obtiene el peso total en cuenta el peso de una malla por m2, el número de mallas totales y el área efectiva de la malla (2.35x6.0 m).				
TOTAL				6450.33
CANTIDAD ACTA Parcial No 01				SUBTOTAL 6.450.33
CANTIDAD ACTA Parcial No 02				
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03				6.450.33
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				6.450.33
CANTIDAD CONTRACTUAL				22.956.19
PENDIENTE POR PAGAR				16.505.86
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA				6.450.33

Externa Estructural de Localización mallas contrapiso N+0.00
[Bloque 3 - Sabones]

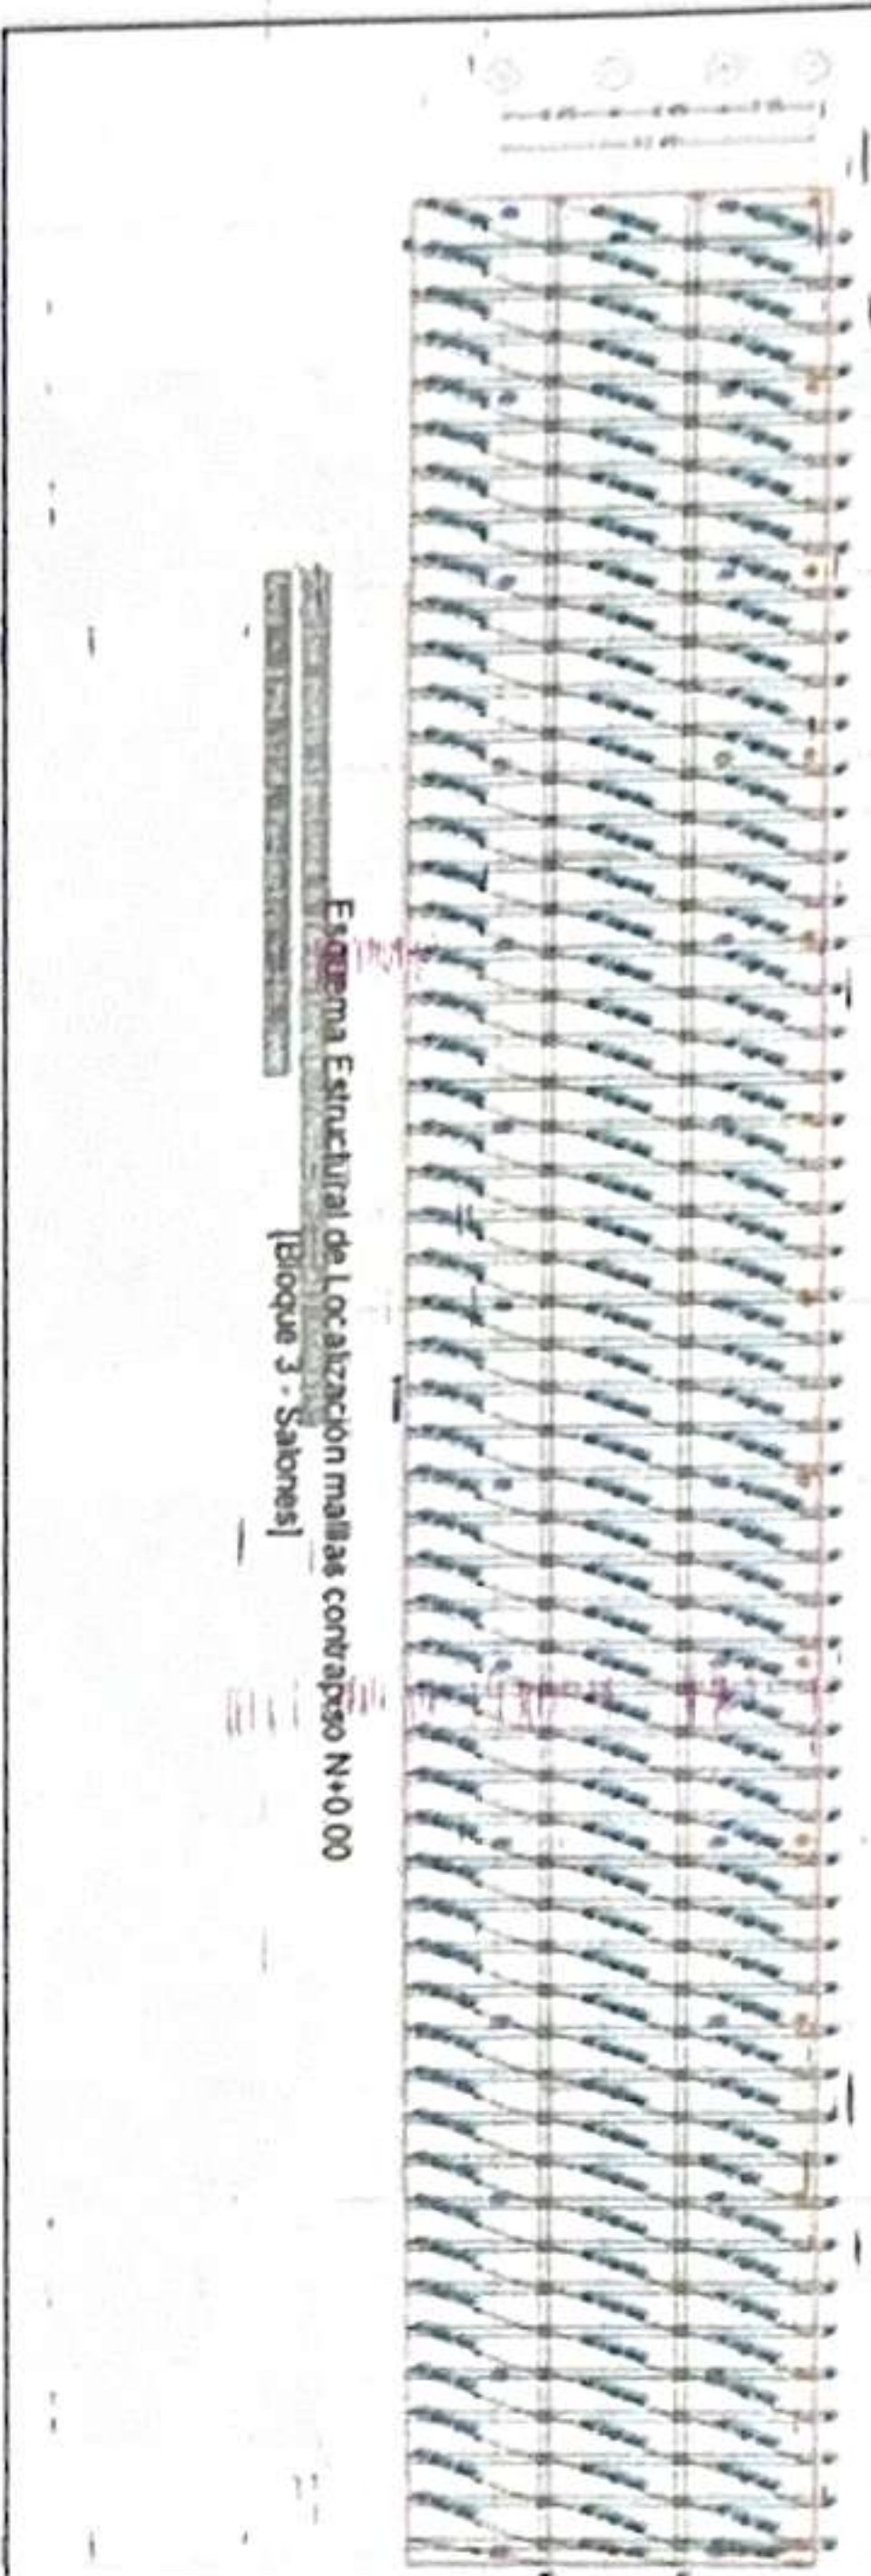

Nombre:
RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARROS BAQUERO

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOUKARZEL

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA-BERNARDA NOVA

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL CESAR
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACIÓN
21/06/2025 AL 16/07/2025


OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	
CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	NIT	901925618-1
INTERVENIOR	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	NIT	901926042-8
CAPITULO	5.0	ITEM	5.1

CONSTRUCCION DE VIGA APOYO MAMPPOSTERIA DE 0.125X0.1M. SOBRE PLACA. CONCRETO DE 3500 PSI PARA LADRILLO O BLOQUE

UNID. ML

BLOQUE 3

DESCRIPCION	REFERENCIA	LOCALIZACION	LONGITUD (M)	CANT	TOTAL (ML)
AULA DE CLASE	MURO 1	MURO INTERNO	8.3	1	8.30
	MURO 1	MURO INTERNO	0.69	1	0.69
	MURO 2	MURO BUTIRON	1.14	1	1.14
	MURO 4	BUTIRON	1.55	2	3.10
		ANTEPECHO	0.51	2	1.02
	MURO 5	VENTANA	5.34	1	5.34
	MURO 6	ACERCO	1.68	1	1.68
		BUTIRON			
	MURO 7	MEDIANERO 1	8.3	1	8.30
MURO 8	BUTIRON MEDIANERO 2	0.89	1	0.89	
MURO 9	MURO EXT ANTEPECHO VENTANA	7.59	1	7.59	

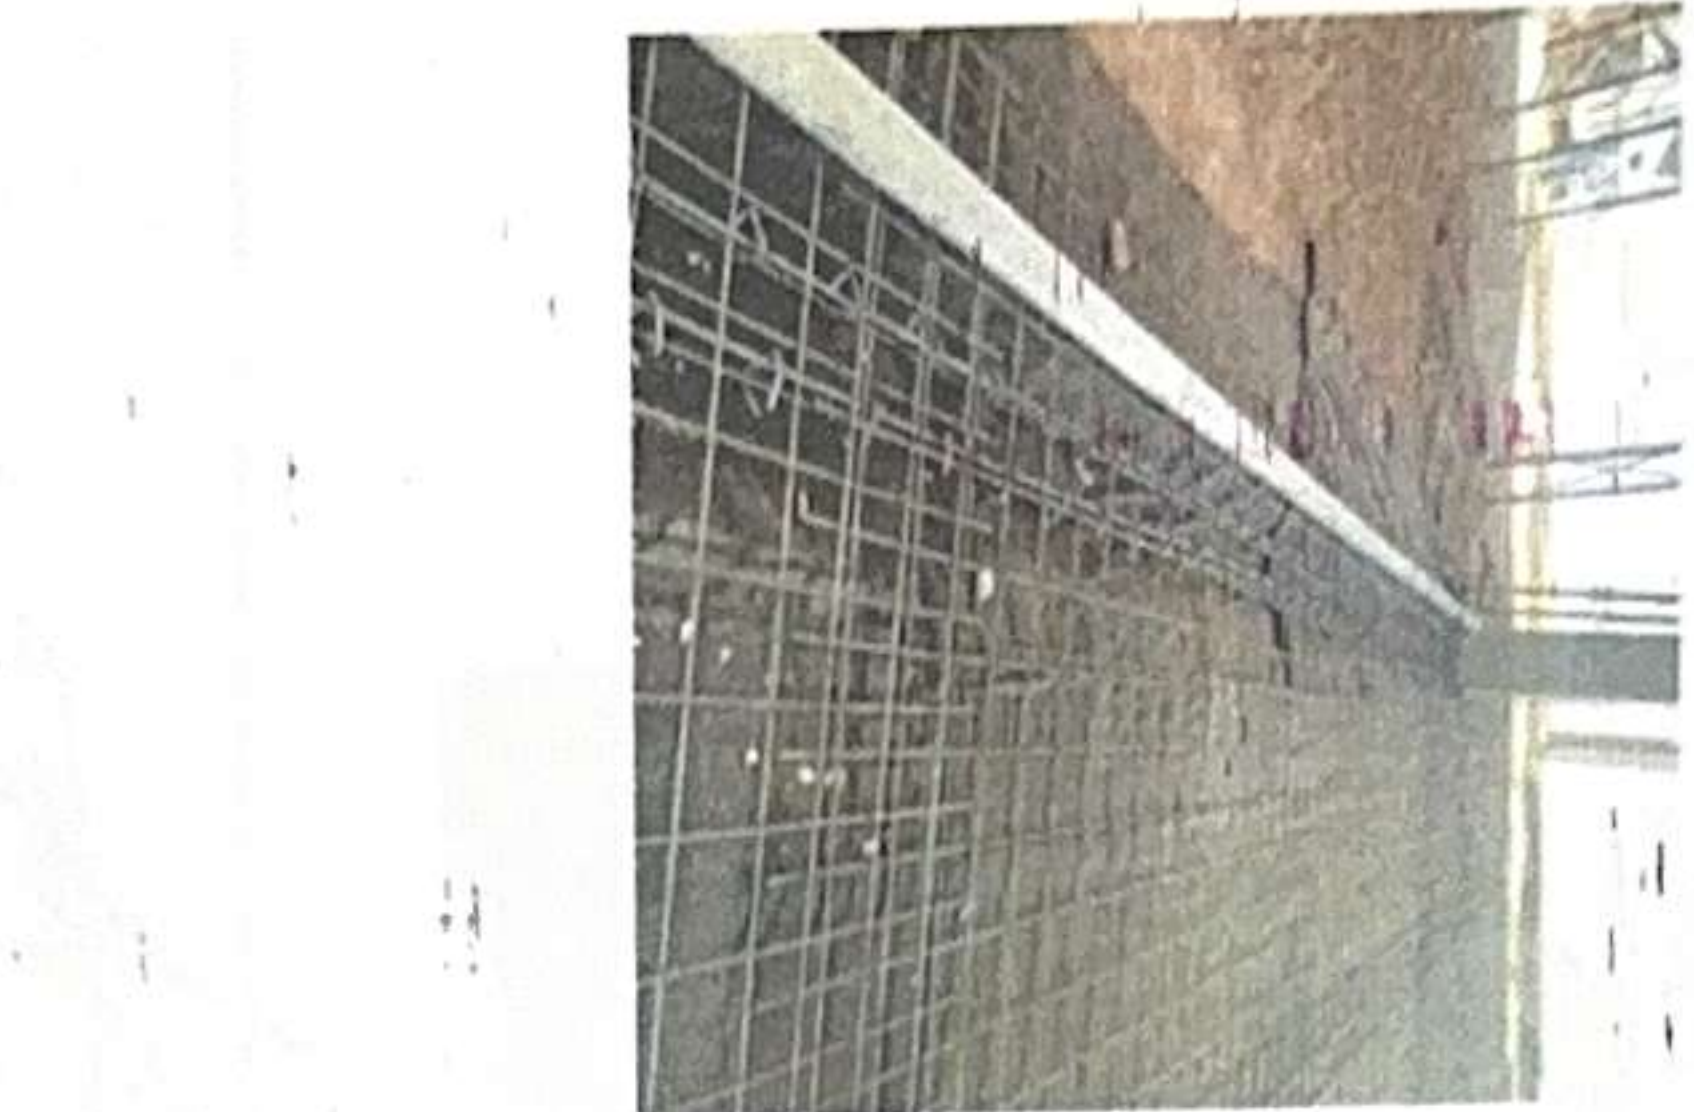

CANTIDAD ACTA Parcial No 01	SUBTOTAL	152.20
CANTIDAD ACTA Parcial No 02		
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03		152.20
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		152.20
CANTIDAD CONTRACTUAL		179.06
PENDIENTE POR PAGAR		26.86
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		152.20

Nombre:

RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOUKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARROS BAQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL
CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACION
21/06/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	
CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	NIT	901925618-1
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	NIT	901925042-8
CAPITULO	5.0	ITEM	5.3

CONSTRUCCION DE VIGAS DESCOLGADAS EN CONCRETO DE 3000 PSI DE 0.10X0.20 M

UNID. ML

BLOQUE 3

DESCRIPCION	REFERENCIA	LOCALIZACION	LONGITUD (M)	CANT	TOTAL (ML)
AULAS DE CLASE	MURO 5	DINTEL VENTANA ACCESO	5.34	1	5.34
	MURO 9	DINTEL EXT ANTEPECHO VENTANA	7.59	1	7.59

SUBTOTAL	12.93
No AULAS DE CLASE PISO 1	9.00
TOTAL	116.37

CANTIDAD ACTA Parcial No 01	116.37
CANTIDAD ACTA Parcial No 02	116.37
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03	116.37
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	1.540.85
CANTIDAD CONTRACTUAL	1.424.48
PENDIENTE POR PAGAR	116.37
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	116.37



Nombre:
RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
OMAR MUKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARROS BAQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL
CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACION
21/08/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

NIT

901925618-1

CONTRATO No.

2025040002

INTERVENIOR

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

NIT

901925042-8

CONTRATO No.

2025050004

CAPITULO

5.0


ITEM

5.4

CONSTRUCCION DE VIGA CINTA EN CONCRETO DE 3000 PSI, DE 0.10 * 0.05

UNID.

ML

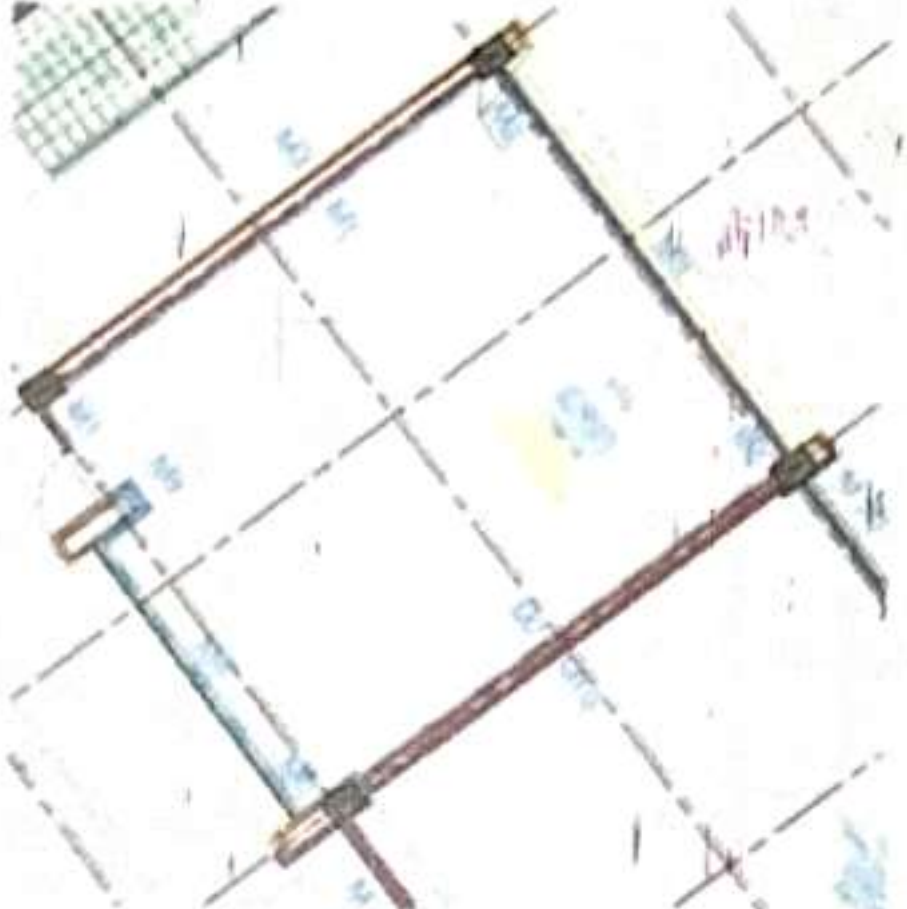

BLOQUE 3

DESCRIPCION	REFERENCIA	LOCALIZACION	LONGITUD (M)	CANT	TOTAL (ML)
AULAS DE CLASE	MURO 5	ANTEPECHO VENTANA ACCESO	5.34	1	5.34
	MURO 9	MURO EXT ANTEPECHO VENTANA	7.59	1	7.59
SUBTOTAL					12.93
No AULAS DE CLASE PISO 1					9.00
TOTAL					116.37
CANTIDAD ACTA Parcial No 01					116.37
CANTIDAD ACTA Parcial No 02					116.37
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03					116.37
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					944.86
CANTIDAD CONTRACTUAL					944.86
PENDIENTE POR PAGAR					828.59
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA					116.37

Nombre:

RESIDENTE DE OBRA

DUBER DURAN

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GUSTAVO BARROS BAQUERO

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA

OMAR MOUKARZEL

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MARIA BERNARDA NOVA

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACION
21/06/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	
CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	NIT	901925042-8
INTERVENIOR	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	NIT	901925042-8
CAPITULO	6.0	ITEM	6.1

ESTRUCTURA METALICA PARA COLUMNAS, VIGAS, CERRCHAS Y CORREAS DE CUBIERTAS, INCLUIRE:
APOYOS ARTICULADOS, CATERLAS, PLATINAS Y PERROS PARA FIJACION, SOPORTES, SOLDADURAS,
PINTURA EN ANTICORROSIVO, Y ACABADO EN PINTURA POLIURETANO BLANCA

- BLOQUE 3

LOCALIZACION	MATERIAL	ESPECIFICACION	KG/UNO	CANT	KG
BLOQUE 3 CUBIERTA	ANGULO 3" x 1/4"	6000mm	43.74	365	17277.30
BLOQUE 3 CUBIERTA	ANGULO 4" x 1/4"	6000mm	59.61	257	15319.77
BLOQUE 3 CUBIERTA	ANGULO 2" x 1/8"	6000mm	14.76	518	7845.68
BLOQUE 3 CUBIERTA	ANGULO 2" x 3/16"	6000mm	21.78	89	1938.42
BLOQUE 3 CUBIERTA	ANGULO 4" x 3/8"	6000mm	87.67	48	4205.28
BLOQUE 3 CUBIERTA	ANGULO 4" x 5/16"	6000mm	73.74	9	663.66
BLOQUE 3 CUBIERTA	ANGULO 2" x 1/4"	6000mm	28.5	2	57.00
BLOQUE 3 CUBIERTA	ANGULO 5" x 3/8"	6000mm	111.13	4	444.52
BLOQUE 3 CUBIERTA	PHR 305x80x2.5	12000mm	117.24	39	4572.36
BLOQUE 3 CUBIERTA	PHR 220x80x2.5	8090mm	79.0393	142	11223.58
BLOQUE 3 CUBIERTA	Medialdo 8" (219.08mm) 5.0mm	6000mm	160.56	159	18243.66
BLOQUE 3 CUBIERTA	Medialdo 8" (219.08mm) 8.0mm	6000mm	253.26	29	7344.54
BLOQUE 3 CUBIERTA	IPE 600	6000mm	732	85	4722.60
BLOQUE 3 CUBIERTA	PTC 100x100x3.0	6000mm	55.56	23	328.44
BLOQUE 3 CUBIERTA	PLATINA 2 1/2"x3/16"	6000mm	14.28	64	215.04
BLOQUE 3 CUBIERTA	VARILLA LISA Ø-3/8"	1000mm	0.56	42	23.52
BLOQUE 3 CUBIERTA	Varilla 3/8" Resaca Gr 2	4x8	288	3	864.00
BLOQUE 3 CUBIERTA	LAMINA HR A-36 12mm	4x8	144	20	2880.00
BLOQUE 3 CUBIERTA	LAMINA HR A-36 15mm	4x8	360	3	1080.00
BLOQUE 3 CUBIERTA	SOLDADURA	3600mm	8.235	10	82.35
BLOQUE 3 CUBIERTA	Varilla roscaada ASTM 193 Gr B7 3/4"	3600mm	14.5	0.00	0.00
BLOQUE 3 CUBIERTA	Arandela F 436 de 1"	Un	0.00	0.00	0.00
BLOQUE 3 CUBIERTA	Tuerca negra 2H 1"	Un	0.00	0.00	0.00
BLOQUE 3 CUBIERTA	Arandela F 436 de 3/4"	Un	0.00	0.00	0.00
BLOQUE 3 CUBIERTA	Tuerca negra 2H 3/4"	Un	0.00	0.00	0.00
BLOQUE 3 CUBIERTA	Tornillo Gr 2 - 1/2" x 3/4" con tuerca	Un	0.00	1096	0.00
TOTAL					102479.09

CANTIDAD ACTA Parcial No 01	SUBTOTAL	102479.09
CANTIDAD ACTA Parcial No 02		12387.05
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03		90082.05
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		102479.09
CANTIDAD CONTRACTUAL		291445.77
PENDIENTE POR PAGAR		188966.68
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		90082.05

Nombre:

RESIDENTE DE OBRA

DUBER DURAN

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA

OMAR MOKARZEL

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA

GUSTAVO BARRIOS BAQUERO

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MARIA BERNARDA NOVA

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACION
21/06/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	
CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	NIT	901925618-1
INTERVENIENTE	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	NIT	901925042-8
CAPITULO	8.0	ITEM	8.1

ANCLAJE CON EPOXICO DIAMETROS VARIADOS, PROF. +0.30M (INCL. PERFORACION)

UNID. UN

BLOQUE 3

LOCALIZACION	LONGITUD MURO (M)	ALTURA MURO (M)	SEPARACION DOVELAS (M)	CANT. DOVELAS	CANT. ANCLAJE	CANT. TOTAL ANCLAJES
ANCLAJES PARA DOVELAS						
MURO 1 - MURO INTERNO	8.30	3.20	1.2	8	2	16.00
MURO 1 - MURO INTERNO	0.89	3.20	1.2	2	2	4.00
MURO 1 - MURO INTERNO	0.40	3.20	1.2	1	2	2.00
MURO 2 - MURO BUTRON	1.14	3.74	1.2	2	2	4.00
MURO 2 - MURO BUTRON	0.40	3.74	1.2	1	2	2.00
MURO 3 - MURO EXTERNO	9.87	3.20	1.2	9	2	18.00
MURO 3 - MURO EXTERNO	3.10	3.74	1.2	4	2	8.00
MURO 3 - MURO EXTERNO	1.02	3.74	1.2	2	2	4.00
MURO 4 - BUTRON ACCESO	5.34	0.90	1.2	5	1	5.00
MURO 5 - ANTEPECHO VENTANA	1.68	3.74	1.2	2	2	4.00
MURO 6 - BUTRON MEDIANERO 1	8.30	3.20	1.2	8	2	16.00
MURO 6 - BUTRON MEDIANERO 2	0.89	3.74	1.2	2	2	4.00
MURO 6 - BUTRON MEDIANERO 2	0.40	3.74	1.2	1	2	2.00
MURO 9 - MURO EXT ANTEPECHO VENTANA	7.59	0.90	1.2	7	1	7.00
ANCLAJES PARA DIENTES SOBRE VENTANAS						
MURO 5 - ENRASE DIENTEL VENTANA POSTERIOR	5.34	1.13	0.5	12	1	12.00
MURO 9 - ENRASE DIENTEL MURO EXT POSTERIOR	7.59	1.13	0.5	16	1	16.00
MURO 5 - ENRASE DIENTEL VENTANA POSTERIOR	5.34	1.13			2	2.00
MURO 9 - ENRASE DIENTEL MURO EXT POSTERIOR	7.59	1.13			2	2.00
ANCLAJES PARA SILAR DE VENTANAS						
MURO 5 - ENRASE DIENTEL VENTANA POSTERIOR	5.34	1.13			2	2.00
MURO 9 - ENRASE DIENTEL MURO EXT POSTERIOR	7.59	1.13			2	2.00
SUBTOTAL A						
No AJUS DE CLASE PISO 1						
TOTAL						
SUBTOTAL						
CANTIDAD ACTA Parcial No 01						
CANTIDAD ACTA Parcial No 02						
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03						
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						
CANTIDAD CONTRACTUAL						
PENDIENTE POR PAGAR						
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA						
SUBTOTAL						
1188.00						



Nombre:
RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARROS BAQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNAARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOJIBANZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACION
21/08/2025 AL 18/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

NIT

90182618-1

CONTRATO No.

202500002

INTERVENIOR

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

NIT

901925042-8

CONTRATO No.

202500004

CAPITULO

2.0

ITEM

8.2

SUMINISTRO E INSTALACION DE ACERO DE REFUERZO 420 MPa (INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION, HORIZONTAL PARA MAMPONERIA Y ELEMENTOS NO ESTRUCTURALES)

JUND.

KG

ACERO DE MAMPONERIA (DOVELAS)

LOCALIZACION	DESCRIPCION	ACERO VERTICAL	ACERO HORIZONTAL
BLOQUE 3 PISO 1	AULAS DE CLASE	1/4"	3/8"
		21.00	85.55
			134.12

NOTA. Verticalmente se refuerzo acero de 1/4" y 3/8" el acero de 1/4" se ancló a las placas y vigas 1 m en cada extremo (superior e inferior) y el acero de 3/8" se usó para unir el acero de 1/4", siendo éste de la altura de cada muro. Ambos, se instalaron teniendo en cuenta que las dovelas se construyeron cada 1.2 m. Para el acero horizontal se instalaron 2 varillas de 1/4" después de la primera hilada de muros y seguidamente cada 3 hiladas.

ACERO EN DIENTES Y SILAR DE VENTANAS

LOCALIZACION	DESCRIPCION	1/4"	3/8"
BLOQUE 3 PISO 1	AULAS DE CLASE	10.01	69.24



NOTA. Se instalaron 2 varillas horizontales de 3/8" para dientes y sillares de ventanas, para conectar estas varillas se instalaron garuchos de 1/4" cada 15 cm en forma de S con una longitud total de 33 cm en los dientes y para los sillares se instalaron garuchos de 1/4" cada 15 cm en forma de S con una longitud total de 12 cm. Además, los dientes descargan de la boca de entreso con varilla de 3/8" asociada cada 50 cm.

ACERO EN VIGAS DE APOYO PARA MAMPONERIA

LOCALIZACION	DESCRIPCION	1/4"	3/8"
BLOQUE 3 PISO 1	AULAS DE CLASE	20.63	42.82


NOTA. Se instalaron 2 varillas de 3/8" en la totalidad de ml de viga de apoyo (ver memoria 5.1) Construcción de viga de apoyo mampostería sobre pilas para bloque), para conectar estas varillas se instalaron garuchos de 1/4" cada 15 cm en forma de C con una longitud total de 33 cm.

SUBTOTAL		363.16
No AULAS DE CLASE PISO 1		0.00
TOTAL		3448.42
CANTIDAD ACTA Parcial No 01		
CANTIDAD ACTA Parcial No 02		3.448.42
CANTIDAD ACTA Parcial No 03		3.448.42
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		15.839.78
CANTIDAD CONTRACTUAL		12.391.36
PENDIENTE POR PAGAR		3448.42
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		3448.42

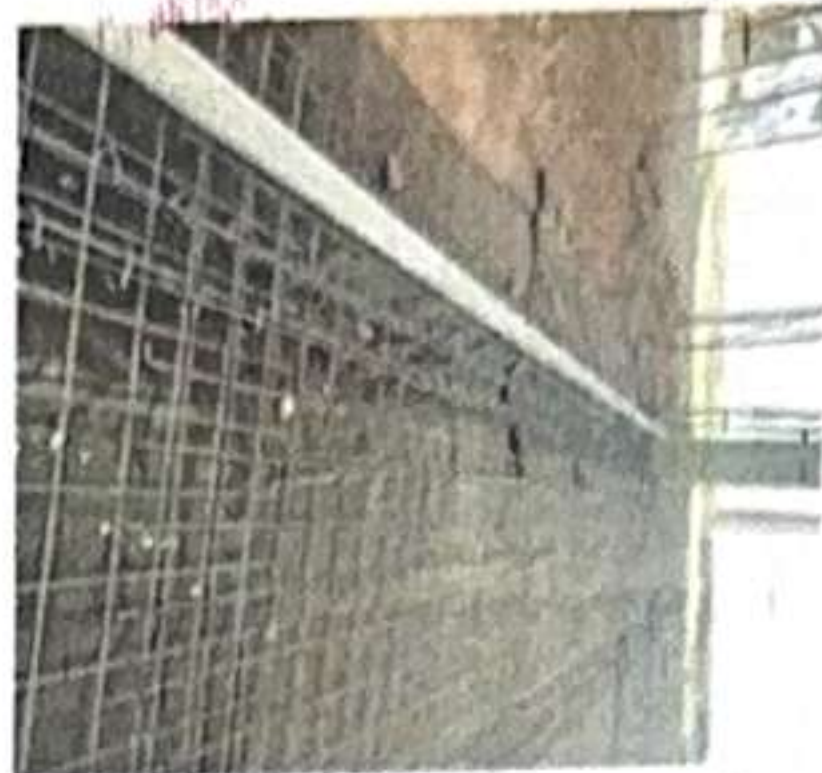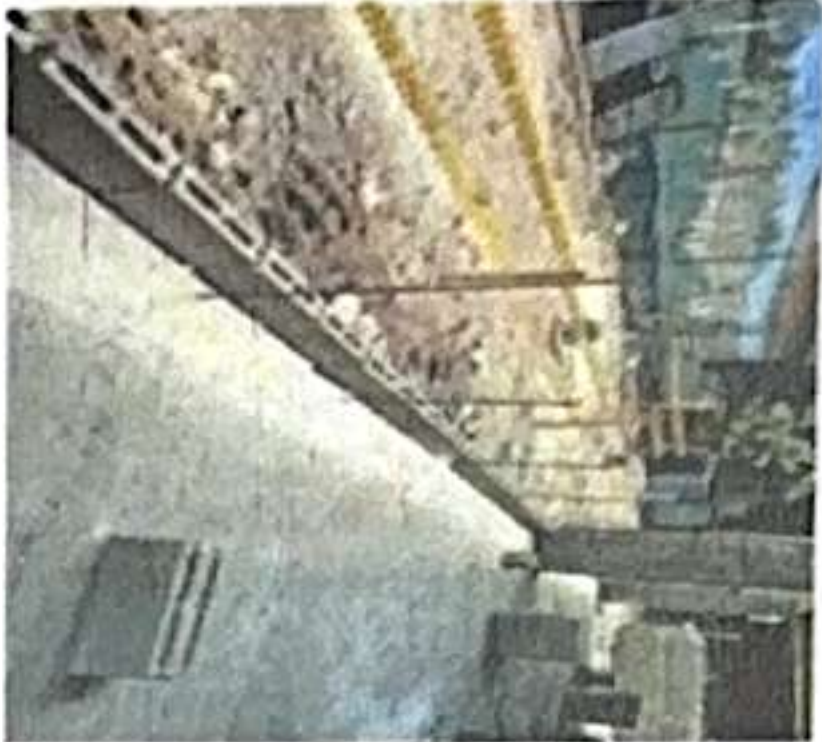

Nombre: 
RESIDENTE DE OBRA
GUSTAVO BARRIOS BAQUERO
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre: 
DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOLKARET
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre: 
RESIDENTE DE INTERVENIORIA
GUSTAVO BARRIOS BAQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre: 
DIRECTOR DE INTERVENIORIA
MARIA BERNARODA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

ACERO PARA MAMPOSTERIA

BLOQUE 3 PISO 1									
DESCRIPCION	LOCALIZACION	LONGITUD MURO (M)	ALTURA MURO (M)	CANT DOVELAS	CANT ANCLAJE X DOVELA	LONGITUD VARILLAS ANCLAJE 1/4" (M)	ACERO VERTICAL 1/4" (Kg)	ACERO 1/4" (Kg)	
AULA DE CLASE	MURO 1 - MURO INTERNO	8.30	3.20	8	2	1.00	4.00	14.34	25.50
	MURO 1 - MURO INTERNO	0.69	3.20	2	2	1.00	1.00	3.58	2.67
	MURO 2 - MURO BUTTRON	0.40	3.20	1	2	1.00	0.50	1.79	1.80
	MURO 2 - MURO BUTTRON	1.14	3.20	2	2	1.00	1.00	4.19	4.69
	MURO 3 - MURO EXTERNO	0.40	3.20	1	2	1.00	0.50	2.09	2.10
	MURO 3 - MURO EXTERNO	9.87	3.20	9	2	1.00	4.50	16.13	30.21
	MURO 4 - BUTTRON ACCESO	3.10	3.20	4	2	1.00	2.00	8.38	11.55
	MURO 5 - ANTEPECHO VENTANA ACCESO	1.02	3.20	2	2	1.00	1.00	4.19	4.27
	MURO 6 - BUTTRON MEDIANERO 1	5.34	0.90	5	1	0.00	0.00	2.52	5.54
AULA DE CLASE	MURO 7 - MURO MEDIANERO	1.68	3.20	2	2	1.00	1.00	4.19	6.58
	MURO 8 - BUTTRON MEDIANERO 2	8.30	3.20	8	2	1.00	4.00	14.34	25.50
	MURO 9 - MURO EXT ANTEPECHO VENTANA	0.89	3.20	2	2	1.00	1.00	4.19	3.82
	MURO 9 - MURO EXT ANTEPECHO VENTANA	0.40	3.20	1	2	1.00	0.50	2.09	2.10
TOTAL		7.59	0.90	7	1	0.00	0.00	3.53	7.79
TOTAL							21.00	85.55	134.12

ACERO PARA DINTELES Y SILLAR DE VENTANAS

BLOQUE 3 PISO 1									
DESCRIPCION	LOCALIZACION	LONGITUD VIGA (M)	ALTURA DINTEL (M)	CANT DOVELAS	ACERO DINTELES 3/8" (Kg)	ACERO 1/4" (Kg)	ACERO SILLAR 1/4" (Kg)		
AULA DE CLASE	MURO 5 - ENRASE DINTEL VENTANA	5.34	1.13	12.00	13.80	3.05	6.20	1.11	
	MURO 9 - ENRASE DINTEL MURO EXT POSTERIOR	7.59	1.13	16.00	33.66	4.29	15.58	1.56	
TOTAL					47.46	7.34	21.78	2.67	

ACERO EN VIGAS DE APOYO PARA MAMPOSTERIA

BLOQUE 3 PISO 1									
DESCRIPCION	REFERENCIA	LOCALIZACION	LONGITUD (M)	CANT	TOTAL (M)	ACERO DINTELES 3/8" (Kg)	ACERO DINTELES 1/4" (Kg)		
AULA DE CLASE	MURO 1	MURO INTERNO	8.3	1	8.30	9.30	4.62		
	MURO 1	MURO INTERNO	0.69	1	0.69	0.77	0.50		
	MURO 2	MURO BUTTRON	1.14	1	1.14	1.28	0.74		
	MURO 4	BUTTRON ACCESO	1.55	2	3.10	3.47	0.91		
	MURO 4	BUTTRON ACCESO	0.51	2	1.02	1.14	0.33		
	MURO 5	ANTEPECHO VENTANA ACCESO	5.34	1	5.34	5.98	3.05		
	MURO 6	BUTTRON MEDIANERO 1	1.68	1	1.68	1.88	0.99		
	MURO 7	MURO MEDIANERO	8.3	1	8.30	9.30	4.62		
	MURO 8	BUTTRON MEDIANERO 2	0.89	1	0.89	1.00	0.58		
TOTAL			7.59	1	7.59	8.50	4.29		
TOTAL						42.62	20.63		

DIMENSIONES NOMINALES DE LAS BARRAS DE REFUERZO

#	Ø	Kg/m
#2	1/4"	0.25
#3	3/8"	0.56
#4	1/2"	1.00
#5	5/8"	1.56
#6	3/4"	2.25
#7	7/8"	3.06
#8	1"	4.00



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACION
21/06/2025 AL 16/07/2025

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATISTA	
CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	CONTRATO No.	2025040002
INTERVENIOR	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	CONTRATO No.	2025050004
CAPITULO	8.0	ITEM	8.3

MURO DE 10 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO 0.10X0.20X0.40-MORTERO DE PEGA 1.4

UNID. M2



DESCRIPCION		BLOQUE 3			
REFERENCIA	LOCALIZACION	LONGITUD (M)	ALTURA (M)	CANT	AREA (M2)
MURO 1	MURO INTERNO	8.3	3.2	1	26.56
MURO 1	MURO INTERNO	0.69	3.2	1	2.21
MURO 2	MURO BUTIRON	1.14	3.74	1	4.26
MURO 3	MURO EXTERNO	9.87	3.2	1	31.58
MURO 4	ANTEPECHO	1.55	3.74	2	11.59
MURO 5	VENTANA	5.34	0.9	1	4.81
MURO 5	ACCESO	5.34	1.13	1	6.03
MURO 6	BUTIRON	1.68	3.74	1	6.28
MURO 7	MEDANERO 1	8.3	3.2	1	26.56
MURO 8	BUTIRON	0.89	3.74	1	3.33
MURO 8	MEDANERO 2	7.59	0.9	1	6.83
MURO 9	ANTEPECHO	7.59	0.9	1	6.83
MURO 9	VENTANA	7.59	1.13	1	8.58
MURO 9	ENRASE DINTEL	7.59	1.13	1	8.58
MURO 9	MURO EXT	7.59	1.13	1	8.58
MURO 9	POSTERIOR	7.59	1.13	1	8.58
SUBTOTAL				138.63	
No AUAS DE CLASE PISO 1				9.00	
TOTAL				1247.66	
SUBTOTAL				1247.66	
CANTIDAD ACTA Parcial No 01					
CANTIDAD ACTA Parcial No 02					
CANTIDAD ACTA Parcial No 03				1 247.66	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				1 247.66	
CANTIDAD CONTRACTUAL				10 615.68	
PENDIENTE POR PAGAR				9 368.02	
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA				9 368.02	
SUBTOTAL				1247.66	

Nombre:

RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOURARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARROS BAQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUCTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACION
21/06/2025 AL 16/07/2025

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	NIT	901925618-1	CONTRATO No.	2025040002
	INTERVENIOR	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	NIT	901925042-8	CONTRATO No.	2025050004

CAPITULO	8.0	ITEM	8.4	MURO DE .10 DE ESPESOR EN BLOQUE DE CEMENTO 0.10X0.20X0.40-MORTERO DE PEGA 1.4 A-0.80 M	UNID.	ML
----------	-----	------	-----	---	-------	----



BLOQUE 3						
DESCRIPCION	REFERENCIA	LOCALIZACION	LONGITUD (M)	ALTURA (M)	CANT	TOTAL (ML)
AULAS DE CLASE	MURO 1'	MURO EXTERNO	0.4	3.2	1	3.20
	MURO 2	MURO BUTIRON	0.4	3.74	1	3.74
	MURO 4	BUTIRON ACCESO	0.51	3.74	2	7.48
	MURO 8	BUTIRON MEDANERO 2	0.4	3.74	1	3.74
SUBTOTAL						18.16
No. AULAS DE CLASE PISO 1						9.00
TOTAL						163.44
CANTIDAD ACTA Parcial No 01						SUBTOTAL 163.44
CANTIDAD ACTA Parcial No 02						
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03						163.44
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						163.44
CANTIDAD CONTRACTUAL						2.443.35
PENDIENTE POR PAGAR						2.279.91
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA						163.44

Nombre:
RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOUKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARROS BAQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL
CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA


PERIODO DE EVALUACION
21/08/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	NIT
INTERVENTOR		
CAPITULO	10.0	ITEM 10.1

901925618-1	CONTRATO No.	2025040002
901925042-8	CONTRATO No.	2025050004
RECUBRIMIENTO CON GEOTEXTIL NT 1800 PARA CIMENTOS Y PLACA DE CONTRAPISO, INCLUYE COLOCACION		
	UNID.	M2

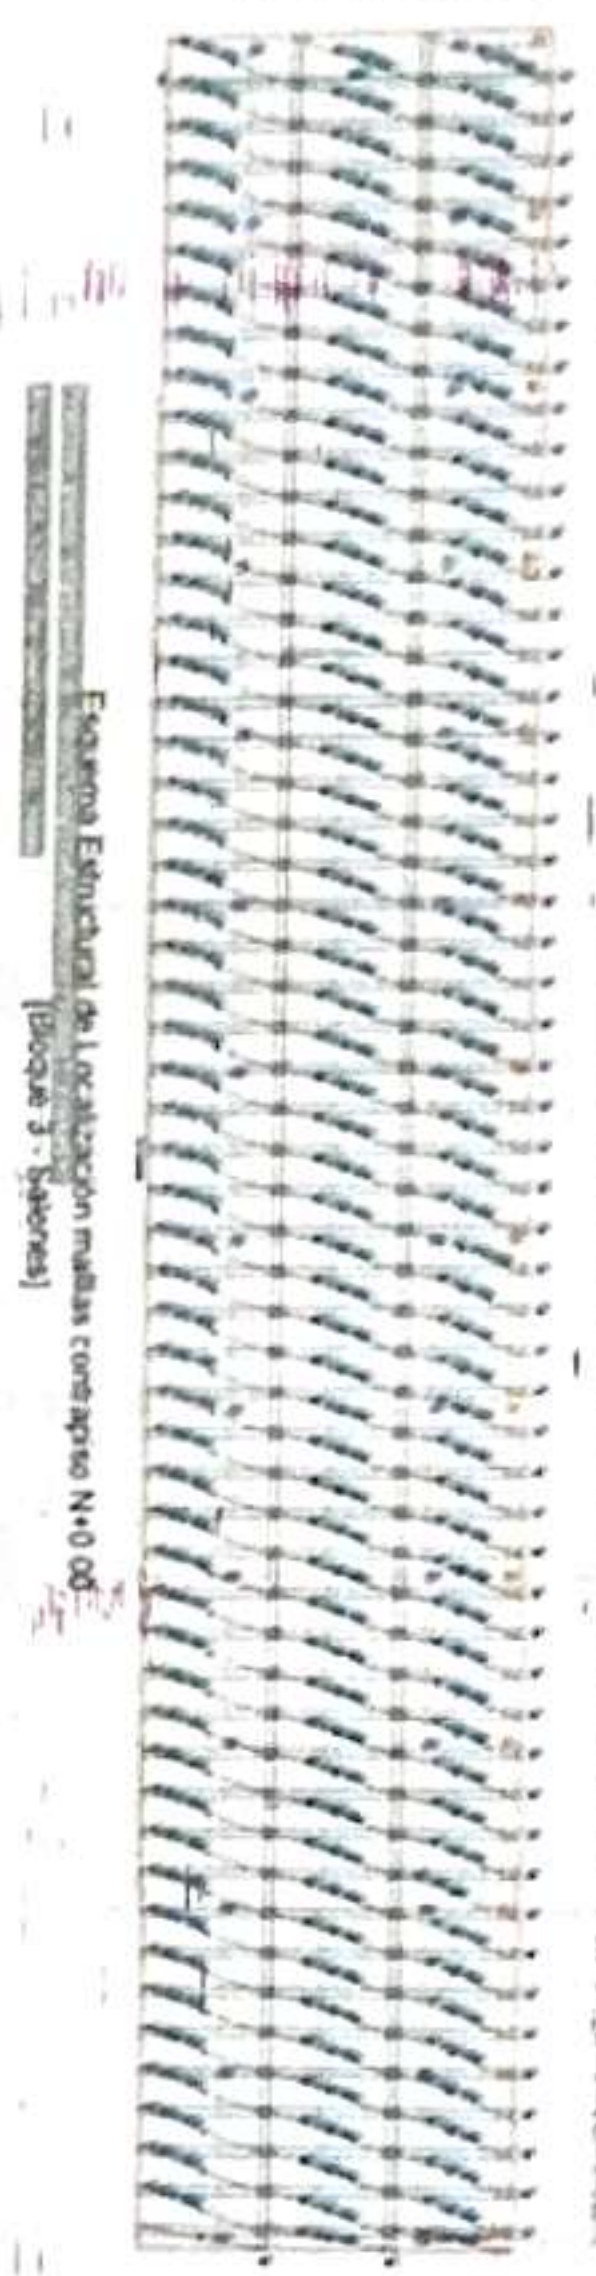

Esquema Estructural de Localización mallas contrapiso N+0.00
[Bocina 3 - Bocinas]

BLOQUE 3						
LOCALIZACIÓN	DIMENSIONES				CANT	M2
	REF	ANCHO	LARGO	H		
BLOQUE 3 (EJE A-D/11-16)	PLANO DE REFERENCIA PLANO ESTRUCTURAL B3 2/12 LOCALIZACIÓN DE LOSA DE CONTRAPISO N+0.00 m				1.00	598.18
DESCUENTO POR COLUMNA	CALCULO TOMADO DE CAD					2.27
TOTAL						595.91
SUBTOTAL						595.91
CANTIDAD ACTA Parcial No 01						-
CANTIDAD ACTA Parcial No 02						-
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03						595.91
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO						595.91
CANTIDAD CONTRACTUAL						599.31
PENDIENTE POR PAGAR						3.40
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA						595.91

Nombre:

RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOJIKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARROS BAQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO




REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACIÓN
21/06/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR			
CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA-CESARENSE	NIT	901425618-1	CONTRATO No.	2025-04-0002
INTERVENIENTOR	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	NIT	901925042-8	CONTRATO No.	2025-05-0004
CAPITULO	21	ITEM	21.11	UNID.	ML

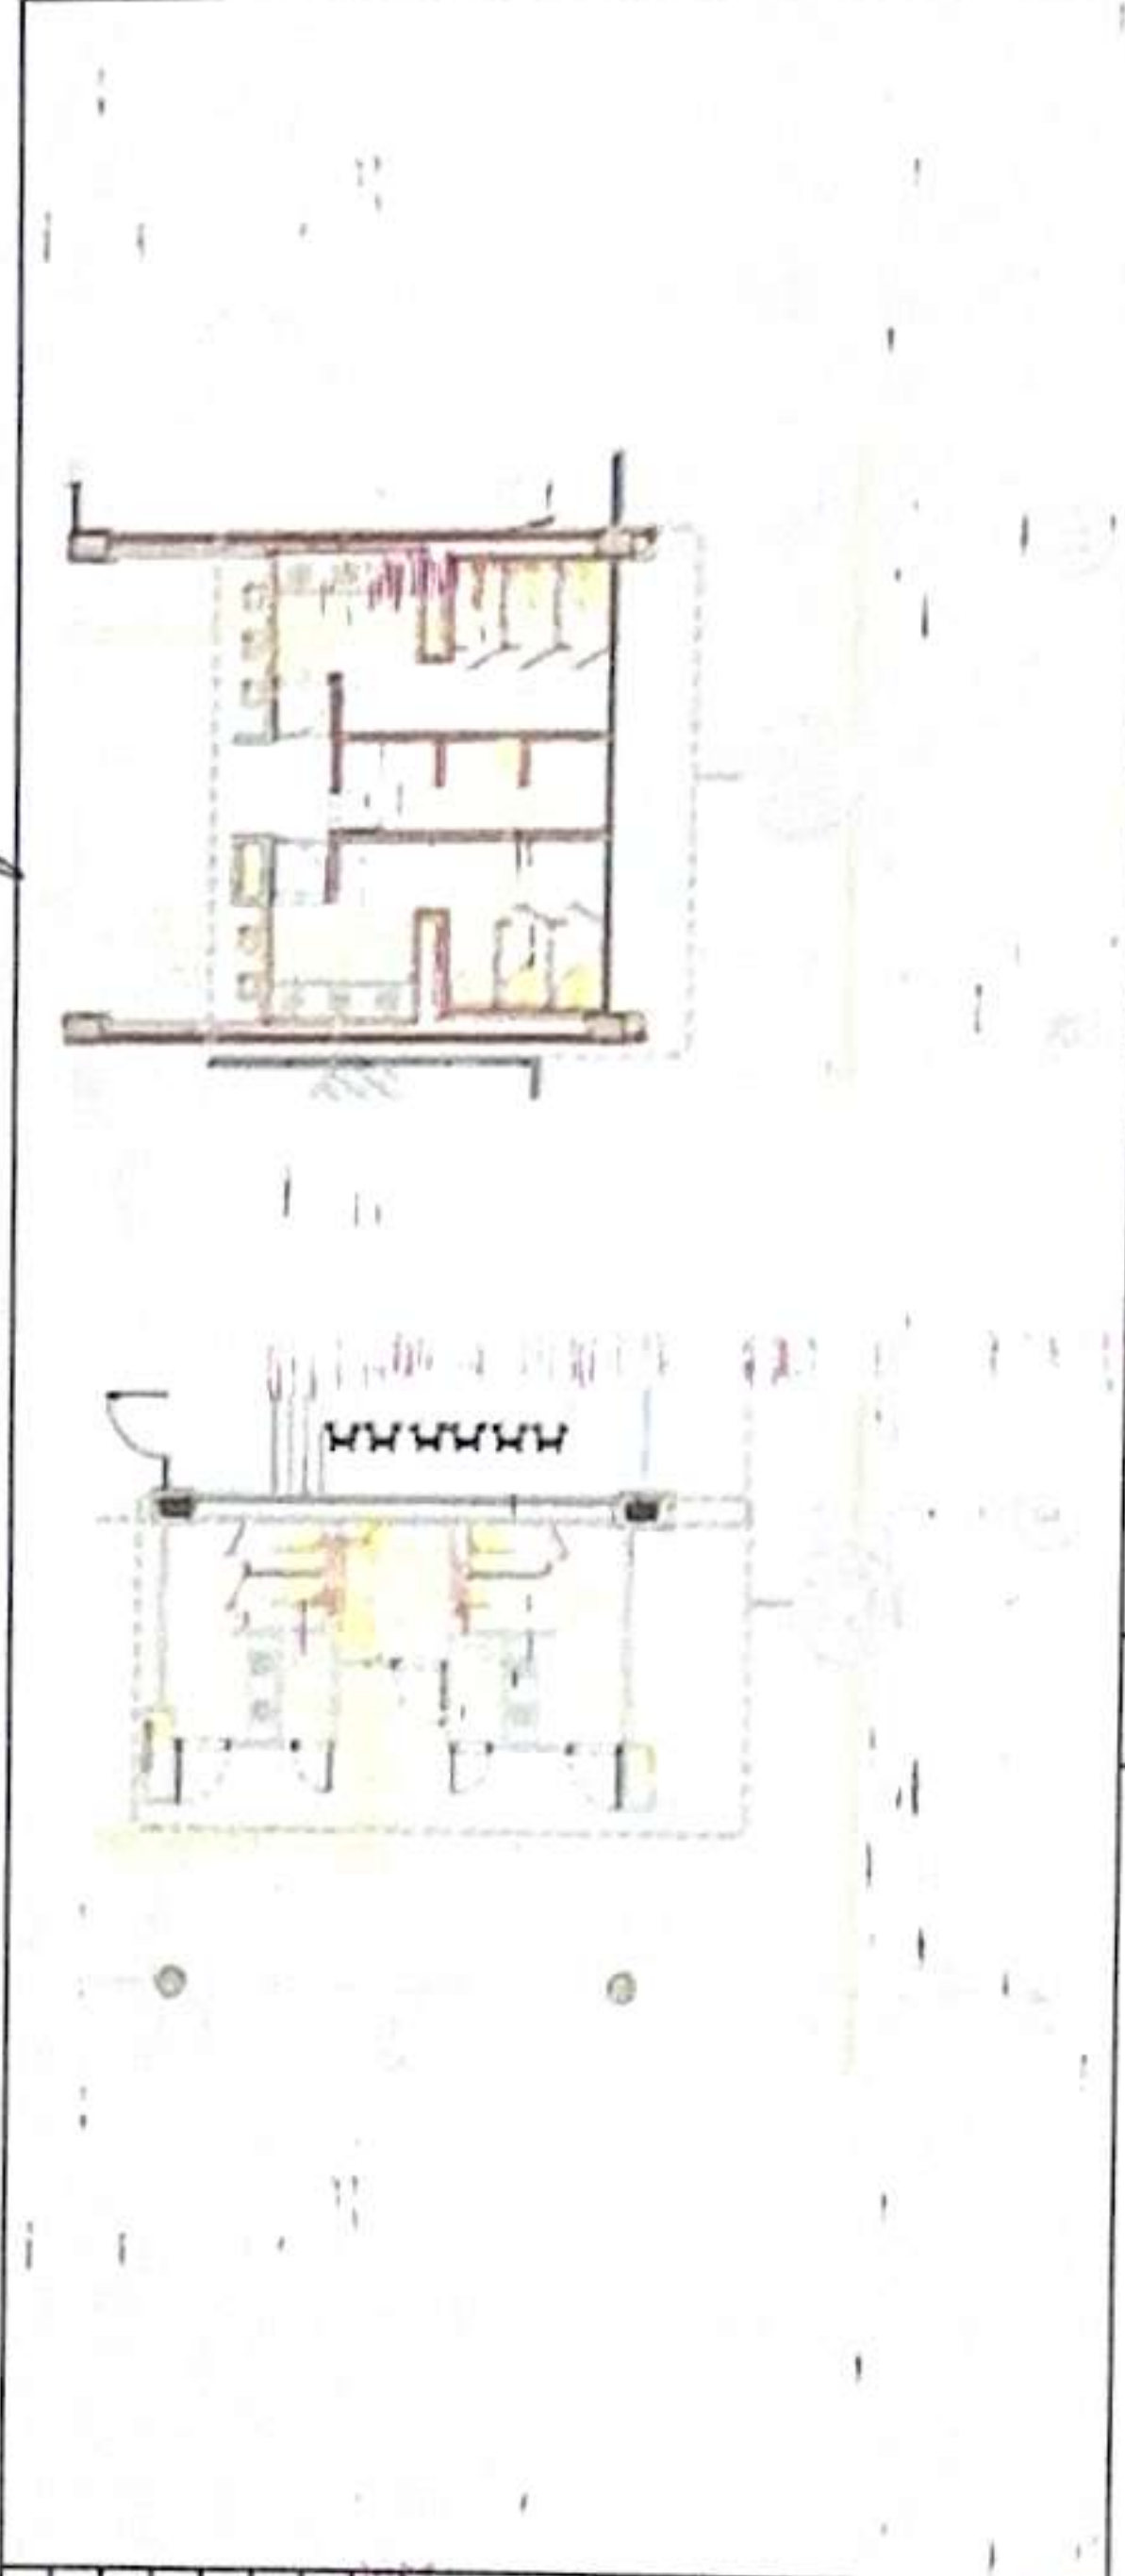

LOCALIZACIÓN		BLOQUE 3		REF		ML	
EJE 11 - EJE 12				BATERIA SANITARIA PISO 1		26.40	
EJE 3 - EJE 4				BATERIA SANITARIA PISO 1		1320	
				TOTAL		39.60	
				SUBTOTAL		39.60	
				CANTIDAD ACTA Parcial No 01			
				CANTIDAD ACTA Parcial No 02		39.60	
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03		39.60	
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		968.00	
				CANTIDAD CONTRACTUAL		968.00	
				PENDIENTE POR PAGAR		928.40	
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		39.60	

Nombre:
RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOUKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARRIOS BAQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA



PERIODO DE EVALUACION
21/06/2025 AL 19/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR	
CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	NIT	
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	NIT	
CAPITULO	21	ITEM	21.12

RED SANITARIA PVC-S 3"

UNID. ML

LOCALIZACION		REF	ML
EJE 11 - EJE 12		BATERIA SANITARIA PISO 1	8.60
EJE 3 - EJE 4		BATERIA SANITARIA PISO 1	17.60
		TOTAL	26.20

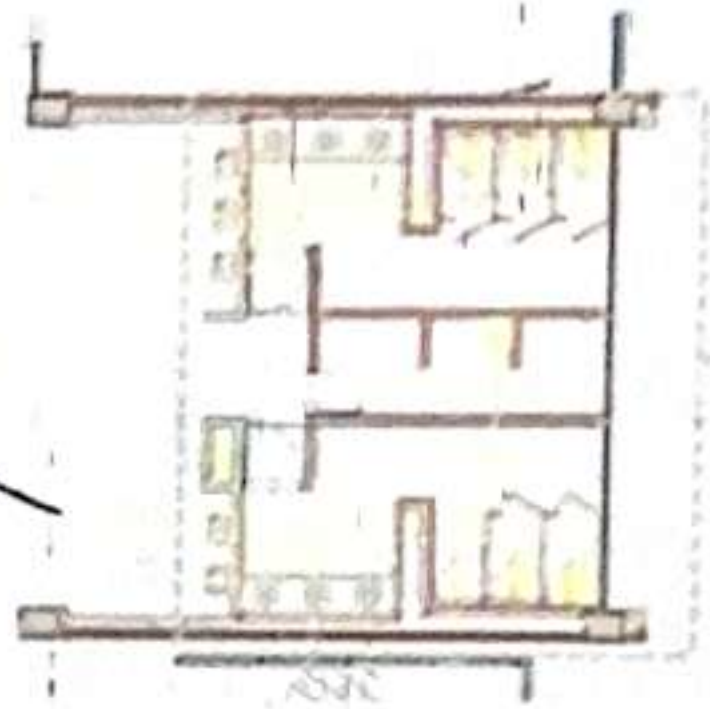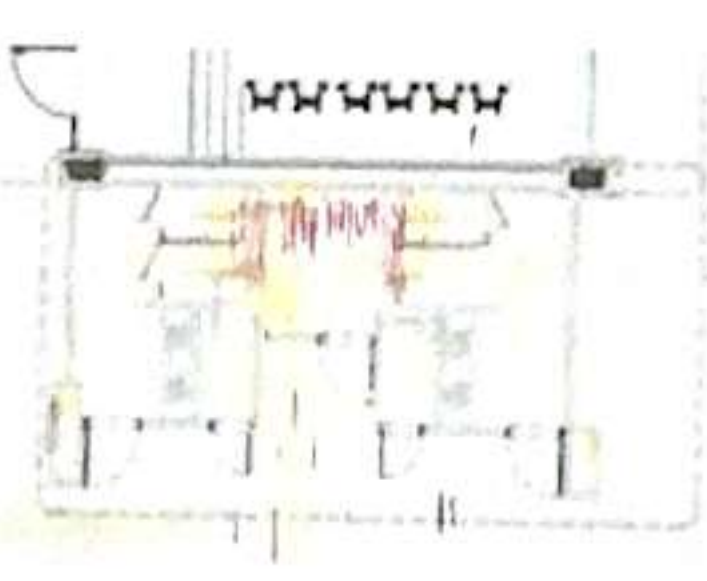

CANTIDAD ACTA Parcial No 01	SUBTOTAL	26.20
CANTIDAD ACTA Parcial No 02		
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03		26.20
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		26.20
CANTIDAD CONTRACTUAL		322.59
PENDIENTE POR PAGAR		296.39
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		26.20

Nombre:
RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOUKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARRIOS BAQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACION
21/09/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA
INTERVENIOR

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

CAPITULO

21

ITEM

21.1.3

NIT

NIT

901925618-1

901925642-8

CONTRATO No.

CONTRATO No.

2025040002

2025050004

RED SANITARIA PVC S 4"

UNID.

ML

BLOQUE 3

LOCALIZACION

EJE 11 - EJE 12

EJE 3 - EJE 4

REF

BATERIA SANITARIA PISO 1

BATERIA SANITARIA PISO 1

TOTAL

420.20

275.60

144.60

420.20

420.20

420.20

420.20

420.20

420.20

420.20

420.20

420.20



420.20

420.20

420.20

420.20

420.20

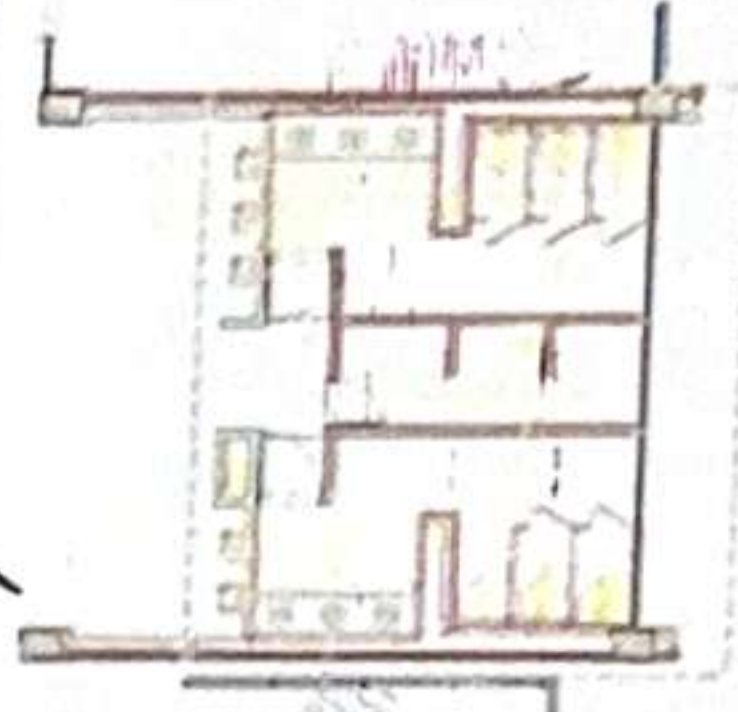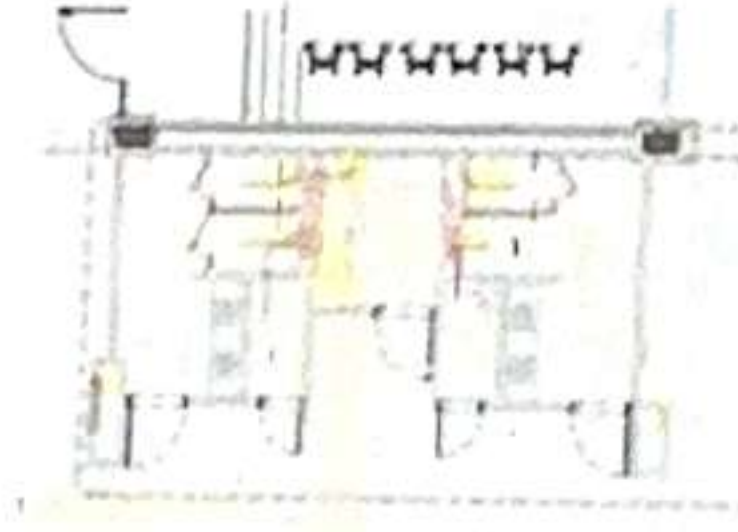

Nombre:
RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOURARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARRIOS BAQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACION
21/06/2025 AL 16/07/2025

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

OBJETO DEL CONTRATO	
CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE
INTERVENIOR	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO
CAPITULO	21
ITEM	-21.14

901925618-1	CONTRATO No.	2025040002
901925042-8	CONTRATO No.	2025050004
RED SANITARIA PVC-S 6"		UNID: ML



LOCALIZACION		BLOQUE 3	
LOCALIZACION	REF	ML	
EJE E	TUBERIA AGUAS NEGRAS 6"	13.90	
	BAIANTE AGUAS LUVIAS	49.00	
EJE 14	TUBERIA AGUAS NEGRAS 6"	45.00	
	BAIANTE AGUAS LUVIAS	49.00	
EJE 4	TUBERIA AGUAS NEGRAS 6"	55.00	
	TUBERIA AGUAS NEGRAS 6"	75.10	
EJE K	BAIANTE AGUAS LUVIAS	49.00	
TOTAL		336.00	
SUBTOTAL		336.00	
CANTIDAD ACTA Parcial No 01			
CANTIDAD ACTA Parcial No 02			
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03		336.00	
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		336.00	
CANTIDAD CONTRACTUAL		630.00	
PENDIENTE POR PAGAR		294.00	
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		336.00	

Nombre:

RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOUKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARROS BAQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA

DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACION
21/08/2025 AL 18/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

NIT

901825618-1

CONTRATO No.

2025040002

INTERVENIOR

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

NIT

901925042-8

CONTRATO No.

2025050004

CAPITULO

21

ITEM

21.1.7

PUNTO SANITARIO DE 2"



UNID.

UN

BLOQUE 3

LOCALIZACION	REF	UN
EJE 11 - EJE 12	BATERIA SANITARIA PISO 1	12.00
EJE 3 - EJE 4	BATERIA SANITARIA PISO 1	6.00
TOTAL		18.00

SUBTOTAL		18.00
CANTIDAD ACTA Parcial No 01		
CANTIDAD ACTA Parcial No 02		
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03		18.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		18.00
CANTIDAD CONTRACTUAL		177.00
PENDIENTE POR PAGAR		159.00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		18.00

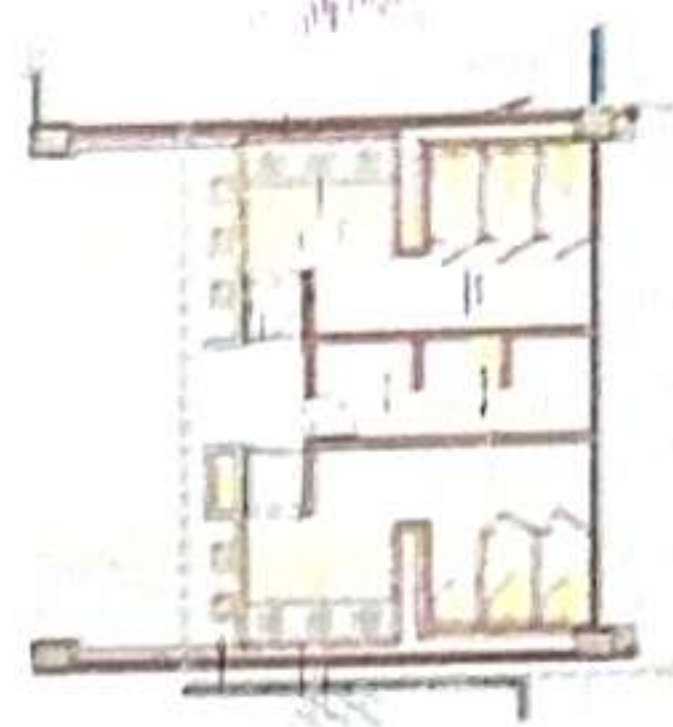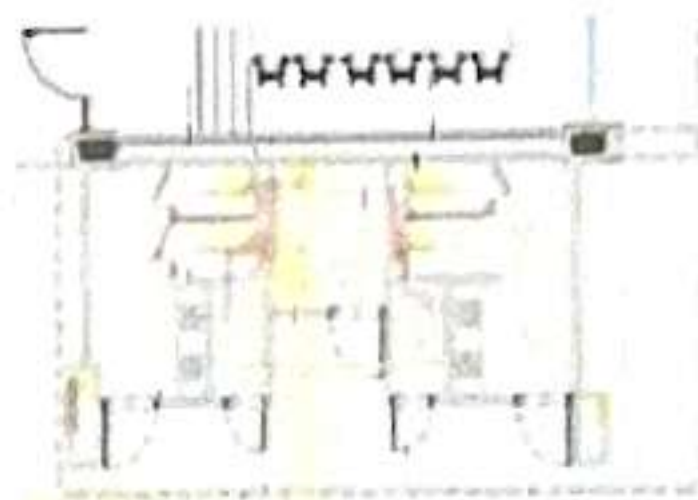

Nombre:

RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOKARZEL

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARROS BAQUERO

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACIÓN
21/09/2025 AL 19/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA
INTERVENIOR

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

NIT

901925042-1
901925042-8

CONTRATO No.
CONTRATO No.

2025040002
2025050004

CAPITULO

21

ITEM



-21.1.8

PUNTO SANITARIO DE 4"

UNID.

UN

BLOQUE 3		
LOCALIZACIÓN	REF.	UN
EJE 11 - EJE 12	BATERIA SANITARIA PISO 1	5.00
EJE 3 - EJE 4	BATERIA SANITARIA PISO 1	4.00
TOTAL		9.00
SUBTOTAL		
CANTIDAD ACTA Parcial No 01		9.00
CANTIDAD ACTA Parcial No 02		9.00
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03		9.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		9.00
CANTIDAD CONTRACTUAL		56.00
PENDIENTE POR PAGAR		47.00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		9.00

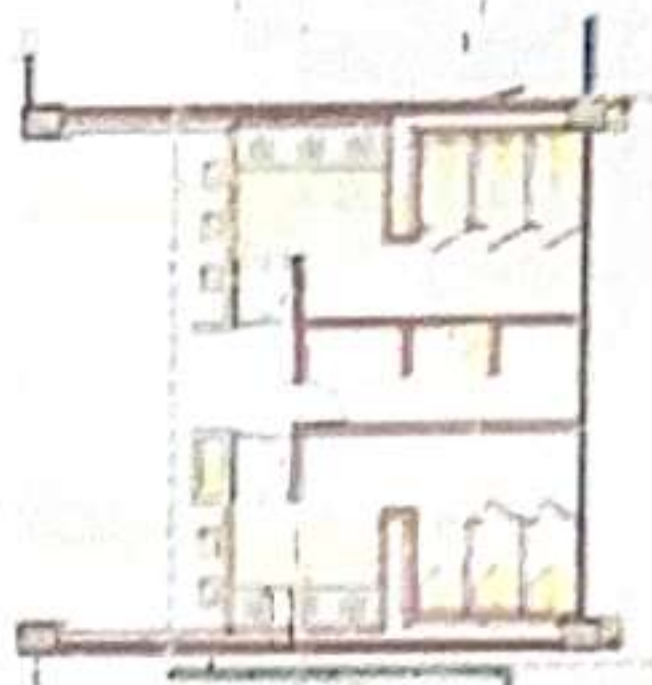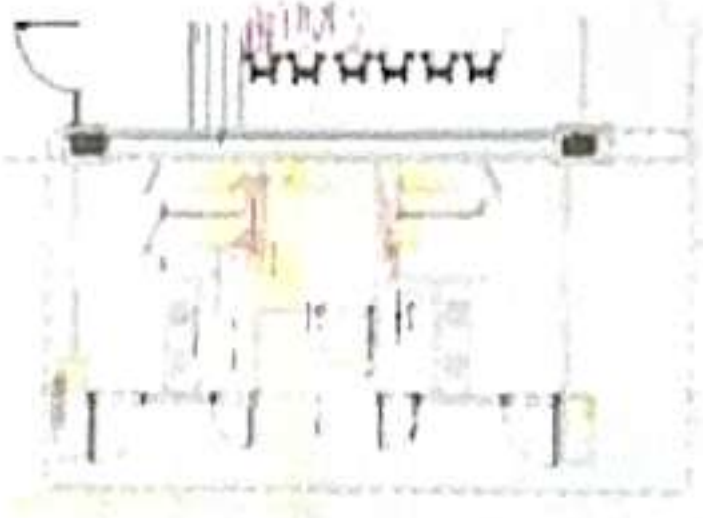

Nombre:
RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOUKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARRIOS BAQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACION
- 21/06/2025 AL 16/07/2025

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

OBJETO DEL CONTRATO		CONTRATISTA		INTERVENIENTOR		CAPITULO		ITEM	
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE		CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO		NIT		NIT		21.1.12	
901925618-1		CONTRATO No.		CONTRATO No.		2025040002		2025050004	
901925618-1		CONTRATO No.		CONTRATO No.		2025040002		2025050004	
CAJA DE INSPECCION DE BOMBAS, EN CONCRETO DE T-300PSI, INCLUYE EXCAVACION Y TAPE, TAPA Y HERAJES E INCLUYE TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO.		UNID.		UN		UN		UN	



LOCALIZACION		REF		UN	
EJE E				3.00	
EJE M				4.00	
EJE 4				3.00	
EJE K				7.00	
				17.00	
				SUBTOTAL	
				17.00	
				CANTIDAD ACTA Parcial No 01	
				17.00	
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 02	
				17.00	
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
				18.00	
				CANTIDAD CONTRACTUAL	
				18.00	
				PENDIENTE POR PAGAR	
				1.00	
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	
				17.00	

Nombre:

RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOUNARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARRIOS BAQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACION
21/06/2025 AL 19/07/2025

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATISTA	INTERVENIENTOR	CAPITULO
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	21	ITEM

901925018-1	CONTRATO No.	2025040002
901925042-8	CONTRATO No.	2025050004

EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL DE COMUN

UNID. M3

BLOQUE 3

LOCALIZACION	REF	LONGITUD	ANCHO	H	M3
EJE E	TUBERIA AGUAS NEGRAS 6"	13.9	0.6	0.9	7.51
	BALANTE AGUAS LLUVIAS	5	0.6	0.4	1.20
	3 REGISTROS AGUAS NEGRAS 80 X	0.8	0.8	1	1.92
EJE 14	TUBERIA AGUAS NEGRAS 80 X	45	0.8	1	27.00
	4 REGISTROS AGUAS NEGRAS 80 X	0.8	0.8	1.1	2.82
EJE 4	TUBERIA AGUAS NEGRAS 6"	55	0.6	1	33.00
	3 REGISTROS AGUAS NEGRAS 80 X	0.8	0.8	1.1	2.11
EJE K	TUBERIA AGUAS NEGRAS 6"	75.1	0.8	1.2	54.07
	7 REGISTROS AGUAS NEGRAS 80 X	0.8	0.8	1.3	5.82
SUBTOTAL					135.45
CANTIDAD ACTA Parcial No 01					135.45
CANTIDAD ACTA Parcial No 02					135.45
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03					135.45
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO					164.18
CANTIDAD CONTRACTUAL					164.18
PENDIENTE POR PAGAR					28.71
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA					135.45



Nombre:

RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOUKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARROS BACQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACION
21/06/2025 AL 18/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

NIT

INTERVENIOR

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

NIT

CAPITULO

21

ITEM

21.1.45

RELLENO DE EXCAVACION COMPACTADO

UNID.

M3

BLOQUE 3

LOCALIZACION

REF

LONGITUD

ANCHO

H

M3

EJE E

TUBERIA AGUAS NEGRAS 6"

13.9

0.6

0.6

5.00

EJE 14

BALANTE AGUAS LUVIAS

5

0.6

0.2

0.60

EJE 4

TUBERIA AGUAS NEGRAS 6"

45

0.6

0.7

18.90

EJE K

TUBERIA AGUAS NEGRAS 6"

55

0.6

0.7

23.10

SUBTOTAL

88.16

FACTOR VOLUMETRICO DE COMPACTACION (30%)

26.45

TOTAL

114.61

CANTIDAD ACTA Parcial No 01

114.61

CANTIDAD ACTA Parcial No 02

114.61

CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03

114.61

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

475.79

CANTIDAD CONTRACTUAL

475.79

PENDIENTE POR PAGAR

361.18

TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA

114.61



Nombre:

RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOUKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARROS BAQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACION
21/08/2025 AL 18/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

NIT

INTERVENIOR

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

NIT

CAPITULO

21-

ITEM

21.1.46-

ADECUACION DE ZANUA Y CAMA DE ARENA

UNID.

M3

BLOQUE 3

LOCALIZACION	REF	LONGITUD	ANCHO	H	M3
EJE E	TUBERIA AGUAS NEGRAS 6"	13.9	0.6	0.3	2.50
EJE 14	BALANTE AGUAS LLUVIAS	5	0.6	0.2	0.60
EJE 4	TUBERIA AGUAS NEGRAS 6"	45	0.6	0.3	8.10
EJE K	TUBERIA AGUAS NEGRAS 6"	55	0.6	0.3	9.90
	TUBERIA AGUAS NEGRAS 6"	75.1	0.6	0.3	13.52
					34.62

SUBTOTAL

34.62

CANTIDAD ACTA Parcial No 01

CANTIDAD ACTA Parcial No 02

CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03

TOTAL ELECUTADO ACUMULADO

CANTIDAD CONTRACTUAL

PENDIENTE POR PAGAR

TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA

34.62



Nombre:
RESIDENTE DE OBRA
DUBER DURAN
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
DIRECTOR DE OBRA
OMAR MUKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:
RESIDENTE DE INTERVENTORIA
GUSTAVO BARROS BAQUERO
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACIÓN
21/06/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	NIT	901925618-1	CONTRATO No.	2025040002
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	NIT	901925042-8	CONTRATO No.	2025050004
CAPITULO	22	ITEM	22.1.13	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO SB 305 (NORMA AFINIA) - INCLUYE INSTALACION, MATERIALES, EXCAVACIÓN, RETIRO DE ESCOMBROS, MARCO Y TAPA	UNID. UN



LOCALIZACIÓN		REF	UN
ACOMETIDA DE ENTRADA DE MEDIA TENSION A LA SUBESTACION ELECTRICA		PLANO DE REFERENCIA PLANO ELECTRICCO 01 RED MEDIA TENSION Y BAJA TENSION	1.00
CAJA DE PASO SB 305		TOTAL	1.00
CANTIDAD ACTA Parcial No 01			SUBTOTAL 1.00
CANTIDAD ACTA Parcial No 02			
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03			1.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			1.00
CANTIDAD CONTRACTUAL			15.00
PENDIENTE POR PAGAR			14.00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA			1.00

Nombre:

Juan Carlos Sierra

INGENIERO ELECTRICO DE OBRA
JUAN CARLOS SIERRA
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

OMAR MOUKARZEL

DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOUKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

Alvaro Alvarez

INGENIERO ELECTRICO DE INTERVENTORIA
ALVARO ALVAREZ
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:

MARIA BERNARDA NOVA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACIÓN
21/06/2025 AL 18/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	NIT	901925618-1	CONTRATO No.	2025040002
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	NIT	901928042-8	CONTRATO No.	2025050004
CAPITULO	22	ITEM	22.1.14	SUMINISTRO E INSTALACION CAJA DE PASO SB 325 - (NORMA AFINIA)- INCLUYE INSTALACION, MATERIALES, EXCAVACION, RETIRO DE ESCOMBROS, MARCO Y TAPA	UNID.



LOCALIZACIÓN		REF	UN
CAJA DE PASO SB-325			
ACOMETIDAS DE BAJA TENSION DESDE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA HASTA TABLERO DE DISTRIBUCIÓN		PLANO DE REFERENCIA PLANO ELECTRICO 01 RED MEDIA TENSION Y BAJA TENSION	19,00
TOTAL			19,00
SUBTOTAL			19,00
CANTIDAD ACTA Parcial No 01			
CANTIDAD ACTA Parcial No 02			
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03			19,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO			19,00
CANTIDAD CONTRACTUAL			20,00
PENDIENTE POR PAGAR			1,00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA			19,00

Nombre: Juan Carlos Sierra
INGENIERO ELECTRICO DE OBRA
JUAN CARLOS SIERRA
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre: [Signature]
DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOUKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre: Alvaro Alvarez
INGENIERO ELECTRICO DE INTERVENTORIA
ALVARO ALVAREZ
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre: [Signature]
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENT
O DEL CESAR
SECRETARIA
DE
INFRAESTRUTU
RA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACIÓN
21/06/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCIÓN DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	NIT	901925618-1	CONTRATO No.	2025040002
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	NIT	901925042-8	CONTRATO No.	2025050004

CAPITULO

22


ITEM

22.2.1

DESMONTE, RETIRO Y DESINSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA TRIFÁSICA EXISTENTE DE 75 KVA INCLUYE RETIRO GABINETES Y TABLEROS DE BAJA TENSÓN EXISTENTES, ACOMETIDAS DE BAJA TENSÓN, EQUIPOS Y DEMÁS

UNID.

UN

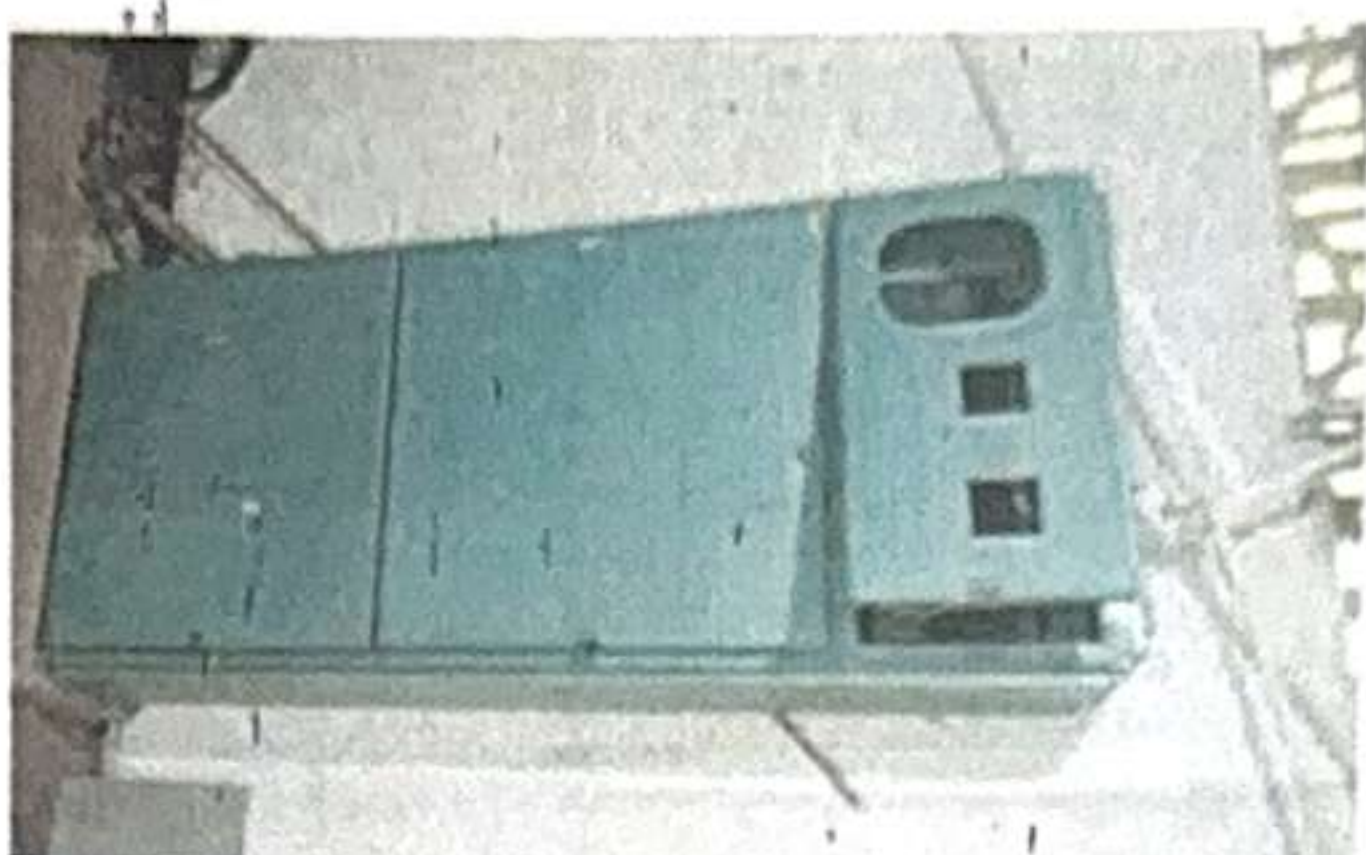

DESMONTE, RETIRO Y DESINSTALACIÓN DE SUBESTACIÓN ELÉCTRICA

LOCALIZACIÓN	REF	UN
SUBESTACIÓN ELÉCTRICA EXISTENTE	PLANO DE TENSÓN	
COLEGIO ANTIGUO	PLANO ELÉCTRICO 01 RED MEDIA TENSÓN Y BAJA TENSÓN	1,00
TOTAL		1,00
SUBTOTAL		
CANTIDAD ACTA Parcial No 01		1,00
CANTIDAD ACTA Parcial No 02		
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03		1,00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		1,00
CANTIDAD CONTRACTUAL		1,00
PENDIENTE POR PAGAR		
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		1,00

Nombre:

Juan Carlos Sierra

INGENIERO ELECTRICO DE OBRA

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

Alvaro Alvarez

INGENIERO ELECTRICO DE INTERVENTORIA

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:

Omar Moukarzel

DIRECTOR DE OBRA

OMAR MOUKARZEL

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

Maria Bernarda Nova

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MARIA BERNARDA NOVA

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA


MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACIÓN
21/06/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	NIT	901925618-1	CONTRATO No.	2025040002
INTERVENIOR	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	NIT	901925042-8	CONTRATO No.	2025050004

CAPITULO	22	ITEM	22.4.11	UNID.	ML
Suministro e instalacion de Acometida trifasica con Neutro y Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 3#20AWG(Fases)+1#20AWG(Neutro)+1#4AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 2" de diametro. Incluye bornas terminales de Cobre Estahado 1H, funda termoencofigible para codigo de colores segun rete y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tension.					
Tablero Normal Bloque#1 Pisco002-1					
Tablero Normal Bloque#1 Pisco003					
Tablero Normal Bloque#3 Pisco003					
Tablero Regulado Bloque#1 Pisco001					

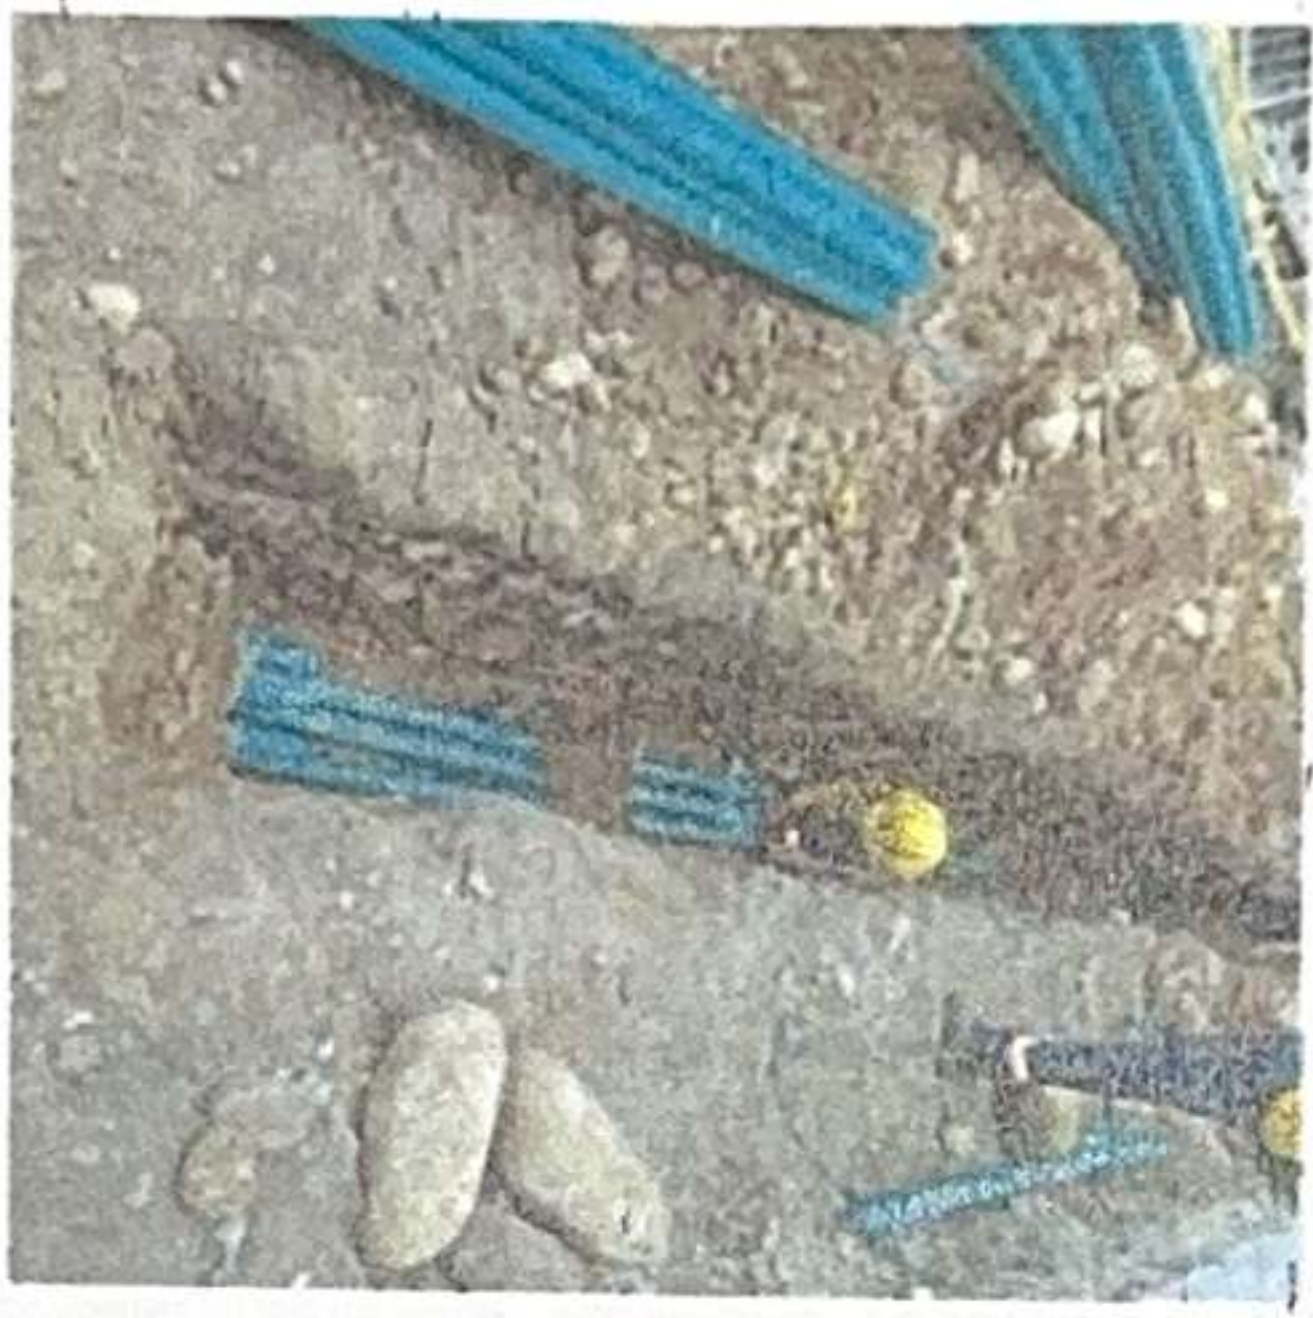

ACOMETIDA TRIFASICA		
LOCALIZACION	REF	ML
ACOMETIDA TRIFASICA DESDE SUBSTACION ELECTRICA A TABLEROS DE DISTRIBUCION EN BLOQUES PISO 1		
PLANO DE REFERENCIA PLANO ELECTRICO 01 RED MEDIA TENSION Y BAJA TENSION		315.00
TOTAL		315.00
SUBTOTAL		
CANTIDAD ACTA Parcial No 01		315.00
CANTIDAD ACTA Parcial No 02		-
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03		315.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		315.00
CANTIDAD CONTRACTUAL		463.00
PENDIENTE POR PAGAR		148.00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		315.00

Nombre: Juan Carlos Sierra
INGENIERO ELECTRICO DE OBRA
JUAN CARLOS SIERRA
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre: OMAR MOUKARZEL
DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOUKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre: Alvaro Alvarez
INGENIERO ELECTRICO DE INTERVENTORIA
ALVARO ALVAREZ
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre: Maria Bernarda Nova
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CÉSAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACIÓN
21/08/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CÉSAR

CONTRATISTA
INTERVENTOR

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

NIT

901925618-1
901925042-8

CONTRATO No.
CONTRATO No.

2025040002
2025050004

CAPITULO

22

ITEM

22.4.12

Suministro e instalación de Acometida trifásica con Neutro y Tierra en Cable de Cobre-Hibre de halógenos, retardante a la llama y baja emisión de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 3#1/0AWG(Fases)+1#1/0AWG(Neutro)+1#4AWG(Tierra) en Tubería conduit PVC de 2" de diámetro. Incluye bormas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termocongelable para código de colores según riel y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tensión.
Tablero Normal Bloque#1 Piso001-1
Tablero Normal Bloque#2 Piso003
Tablero Normal Bloque#3 Piso001
Tablero Normal Bloque#3 Piso002
Aire Auditorio 300.000BTU
Aire Biblioteca 300.000BTU
Tablero Aires001 Bloque#2

UNID.

ML



ACOMETIDA TRIFASICA

LOCALIZACIÓN

REF

ML

ACOMETIDA TRIFASICA DESDE SUBESTACION ELECTRICA A TABLEROS DE DISTRIBUCION EN BLOQUES PISO 1

PLANO DE REFERENCIA PLANO ELECTRICO 01 RED MEDIA TENSION Y BAJA TENSION

TOTAL

476.00

SUBTOTAL

476.00

CANTIDAD ACTA Parcial No 01

CANTIDAD ACTA Parcial No 02

CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03

476.00

TOTAL EJECUTADO ACUMULADO

476.00

CANTIDAD CONTRACTUAL

686.00

PENDIENTE POR PAGAR

210.00

TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA

476.00

Nombre: *Juan Carlos Sierra*
INGENIERO ELECTRICO DE OBRA
JUAN CARLOS SIERRA
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre: *Alvaro Alvarez*
INGENIERO ELECTRICO DE INTERVENTORIA
ALVARO ALVAREZ
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre: *Omar Moukartzel*
DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOUKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre: *Maria Bernada Nova*
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNADA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACION
21/06/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	NIT
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	NIT

CONTRATO No.	CONTRATO No.
901925618-1	2025040002
901925042-8	2025050004

CAPITULO

22

ITEM

22.4.13

Suministro e instalacion de Acometida trifasica con Neutro y Tierra en Cable de Cobre libre de halogenos, retardante a la llama y baja emision de humos (PE HF FR LS CT 80°C 750V) 3#2AWG(fases)+1#2AWG(Neutro)+1#4AWG(Tierra) en Tuberia conduit PVC de 2" de diametro. Incluye bornas terminales de Cobre Estañado 1H, funda termocoñible para codigo de colores segun rete y cinta de caucho autofundente para aislamiento en Baja tension.

UNID.

ML

Tablero Normal Bloque#2 Piso001
Tablero Normal Bloque#2 Piso002
Tablero Regulado Bloque#1 Piso002
Tablero Regulado Bloque#1 Piso003
Aire Piso001 290.0008BTU
Tablero Bombas



ACOMETIDA TRIFASICA		
LOCALIZACION	REF	ML
ACOMETIDA TRIFASICA DESDE SUBESTACION ELECTRICA A TABLEROS DE DISTRIBUCION EN BLOQUES PISO 1	PLANO DE REFERENCIA PLANO ELECTRICO 01 RED MEDIA TENSION Y BAJA TENSION	735.00
TOTAL		735.00
SUBTOTAL		
CANTIDAD ACTA Parcial No 01		735.00
CANTIDAD ACTA Parcial No 02		-
CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03		735.00
TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		735.00
CANTIDAD CONTRACTUAL		997.00
PENDIENTE POR PAGAR		262.00
TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		735.00

Nombre: *Juan Carlos Sierra*
INGENIERO ELECTRICO DE OBRA
JUAN CARLOS SIERRA
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre: *Alvaro Alvarez*
INGENIERO ELECTRICO DE INTERVENTORIA
ALVARO ALVAREZ
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre: *Omar Moukarzel*
DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOUKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre: *Maria Bernarda Nova*
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACIÓN
21/06/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA INTERVENIENTOR	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	NTI	NTI	Suministro e instalación de canalización en tubería conduct PVC 3/4" según Norma NTC2050 y cable libre de halógenos, retardante a la flama y baja emisión de humos según RETIE - Resolución # 4 0492 del 24 de abril de 2015 - Artículo 5, para Salida de Tomacorriente	UNID.	ML
CAPITULO	22	ITEM	22.5.10				



BLOQUE 3					PISO 1	
LOCALIZACIÓN	REF	ML	CANT	ML		
AULA DE CLASE	PLANO DE REFERENCIA PLANO ELECTRICOS 08 TOMACORRIENTES E P1	90	5	450.00		
					PISO 2	
AULA DE CLASE	PLANO DE REFERENCIA PLANO ELECTRICOS 09 TOMACORRIENTES E P2	90	5	450.00		
				TOTAL	900.00	
					SUBTOTAL	
					900.00	
					CANTIDAD ACTA Parcial No 01	
					CANTIDAD ACTA Parcial No 02	
					CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03	
					TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
					CANTIDAD CONTRACTUAL	
					PENDIENTE POR PAGAR	
					TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA	
					900.00	

Nombre: *Juan Carlos Sierra*
INGENIERO ELECTRICICO DE OBRA
JUAN CARLOS SIERRA
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre: *Alvaro Alvarez*
INGENIERO ELECTRICICO DE INTERVENTORIA
ALVARO ALVAREZ
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre: *Omar Moukarzel*
DIRECTOR DE OBRA
OMAR MOUKARZEL
CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre: *Maria Bernarda Nova*
DIRECTOR DE INTERVENTORIA
MARIA BERNARDA NOVA
CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO



REPUBLICA DE
COLOMBIA
DEPARTAMENTO
DEL CESAR
SECRETARIA DE
INFRAESTRUTURA

MEMORIA DE CALCULO DE CANTIDADES DE OBRA

PERIODO DE EVALUACIÓN
21/06/2025 AL 16/07/2025

OBJETO DEL CONTRATO

CONSTRUCCION DE LA INSTITUCION EDUCATIVA TECNICO JOSE EUGENIO MARTINEZ EN EL MUNICIPIO DE VALLEDUPAR, DEPARTAMENTO DEL CESAR

CONTRATISTA	CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE	NIT
INTERVENTOR	CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO	NIT

CONTRATO No.	901925618-1	2025040002
CONTRATO No.	901925042-8	2025050004

CAPITULO	22	ITEM	-22.6.18
----------	----	------	----------

EXCAVACIÓN MANUAL PARA TENDIDO DE TUBERIA, CONDUIT PVC TIPO PESADO	UNID.	ML
--	-------	----



EXCAVACIÓN MANUAL		LOCALIZACIÓN		REF		ML	
				PLANO DE REFERENCIA			
				PLANO ELECTRICO 01 RED MEDIA TENSION Y BAJA TENSION			
				TOTAL		436.00	
				PENDIENTE POR PAGAR		2.788.00	
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		436.00	
				SUBTOTAL		436.00	
				CANTIDAD ACTA Parcial No 01			
				CANTIDAD ACTA Parcial No 02			
				CANTIDAD PRESENTE ACTA Parcial No 03		436.00	
				TOTAL EJECUTADO ACUMULADO		436.00	
				CANTIDAD CONTRACTUAL		3.224.00	
				PENDIENTE POR PAGAR		2.788.00	
				TOTAL CANTIDAD PAGAR PRESENTE ACTA		436.00	

Nombre:

Juan Carlos Sierra

INGENIERO ELECTRICO DE OBRA

JUAN CARLOS SIERRA

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

Alvaro Alvarez

INGENIERO ELECTRICO DE INTERVENTORIA

ALVARO ALVAREZ

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO

Nombre:

Omar Moukarzel

DIRECTOR DE OBRA

OMAR MOUKARZEL

CONSORCIO PEDAGOGIA CESARENSE

Nombre:

Maria Bernarda Nova

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

MARIA BERNARDA NOVA

CONSORCIO INTERAVANCE EDUCATIVO
