

509

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F23
	INFORME DE OBRA	Versión: 2 Página 1 de 24

Fecha Aprobación:
30/06/2024

CONTRATO DE OBRA No. CSAMCIH 435 de 2023

INFORME DE OBRA No. 05

MENSUAL

☒

FINAL

☐

Objeto Contrato: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA.


INDERHUILA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: N° CSAMCIH435 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA Y EL CONSORCIO DANES - HC

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO DANES - HC
VALOR DE LA OBRA: \$141.746.627,00

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA: FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
VALOR DE LA INTERVENTORIA: \$17.343.270,00

FECHA DE INICIO: 30 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE FEBRERO DE 2024



MUNICIPIO: CAMPOALEGRE - ISNOS

DEPARTAMENTO: HUILA

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F23
	INFORME DE OBRA	Versión: 2 Página 2 de 24
Fecha Aprobación: 30/06/2024		

CONTRATO DE (OBRA) No. CSAMCIH 435 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y CONSORCIO DANES - HC

APOYO A LA SUPERVISIÓN	ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO	ENTIDAD	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO			
CONTRATO No.	CSAMCIH 435 DE 2023		
OBJETO	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA	PERIODO DEL INFORME	ENTRE 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE DE 2024
CONTRATISTA	CONSORCIO DANES – HC	NIT:	901.774.192 - 5
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	C.C:	1.079.182.594
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	22/11/2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	30/11/2023		
PLAZO INICIAL	El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	Un (1) mes		
PLAZO TOTAL:	El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
VALOR INICIAL:	\$ 283.493.254,00		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):	\$ 0,00		
VALOR TOTAL:	\$ 283.493.254,00		
INTERVENTOR:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	NIT:	7.711.430-0
REPRESENTANTE LEGAL:		C.C:	7.711.430
2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO			
El proyecto "Construcción y adecuación de parques infantiles" se desarrollará en la vereda Vega de Oriente del municipio de Campoalegre y la vereda Hornitos del municipio de Isnos, dichos municipios ubicados en el departamento del Huila.			
No.	MUNICIPIO	LUGAR	DIRECCIÓN
1	Campoalegre	Vereda Vega de Oriente	En la caseta comunal
2	Isnos	Vereda Hornitos	En la escuela de la vereda

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE OBRA	Código: DIH-CGID-F23
Fecha Aprobación: 30/06/2024		Versión: 2 Página 3 de 24

1. VEREDA VEGA DE ORIENTE – MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

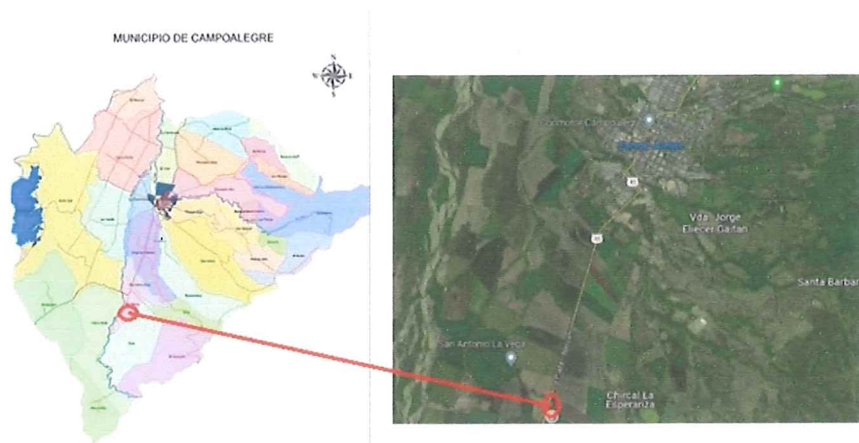


Ilustración No. 1 – Localización de Vereda Vega de Oriente – Campoalegre

2. VEREDA HORNITOS – MUNICIPIO DE ISNOS



Ilustración No. 2 – Localización de Vereda Hornitos – Isnos

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DIH-CGID-F23	
Fecha Aprobación: 30/06/2024	INFORME DE OBRA	
		Versión: 2 Página 4 de 24

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Se realizará la construcción de dos (2) parques infantiles, los cuales contarán con la placa de contrapiso pintada y juegos infantiles que garanticen el esparcimiento en la utilización de los parques en su totalidad del escenario sin que se vea afectado por el horario o condiciones climáticas del sector para la práctica deportiva en los municipios de Campoalegre e Isnos – departamento del Huila. El proyecto tendrá un plazo de ejecución de tres (3) meses contados a partir de la suscripción del acta de inicio.

Se llevará a cabo un proceso de mejoramiento en el recebo compactado mecánicamente, con el objetivo de lograr un suelo firme y estable capaz de soportar adecuadamente las cargas. En la parte inferior, se construirá un muro de concreto ciclópeo que brindará soporte a las vigas laterales del parque.

El parque contará con una placa de acceso diseñada para facilitar la entrada de personas con discapacidad. A los costados del parque se ubicarán cunetas para la evacuación de aguas lluvias, y se instalarán barandas alrededor del parque para proteger las zonas verdes.

En el interior, se habilitarán diversas áreas de juegos infantiles, destacando un módulo recreativo, un carrusel, un columpio inclusivo, un módulo triqui inclusivo, circuito, modulo ábaco y modulo piano

El proyecto arquitectónico contempla un área construida de 160.85 m2 por cada parque infantil y un Total de 321,70 m2 para el Proyecto, los PARQUES INFANTILES están ubicados en VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNIOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA la cual tiene una destinación de uso recreativo, deportivo y cultural

Las actividades u obras a ejecutar son las siguientes:

1. PRELIMINARES
2. MOVIMIENTO DE TIERRA
3. CIMENTACIÓN
4. ZONA VERDE
5. PLACA DE CONTRAPISO
6. INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES
7. OBRAS COMPLEMENTARIAS

4. INFORME CONCRETO SOBRE LA PARTICIPACIÓN DEL COMITÉ DE VIGILANCIA Y CONTROL DURANTE EL PERIODO

Una vez por semana, se realiza una reunión con la comunidad, el comité de veeduría, el presidente de la junta de acción comunal y los directores de la obra para supervisar los avances y la calidad del proceso de la obra. Durante estas reuniones, el director de la obra informa sobre la gestión del control de esta y presenta los resultados alcanzados en relación con los objetivos establecidos.

5. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDO S	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	30 de noviembre de 2023			28 de febrero de 2024

513

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F23
	INFORME DE OBRA	Versión: 2 Página 5 de 24
Fecha Aprobación: 30/06/2024		

Suspensión No. 1	28 de diciembre de 2023	28 días	157 días	
Reiniciación No. 1	05 de junio de 2024			06 de agosto de 2024
Otrosí No. 3 – prorroga (1 mes)	01 de agosto de 2024	57 días		06 de septiembre de 2024
Suspensión No. 2	04 de septiembre de 2024	32 días	84 días	
TOTAL, DIAS		117 días	241 días	

6. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Adjudicación del contrato	1	9 de noviembre de 2023
Suscripción del contrato	2	22 de noviembre de 2023
Acta de reunión	3	28 de noviembre de 2023
Acta de inicio	4	30 de noviembre de 2023
Acta de Socialización del proyecto – Campoalegre	5	01 de diciembre de 2023
Acta de conformación de Veeduría Ciudadana – Campoalegre	6	01 de diciembre de 2023
Acta de Socialización del proyecto – Isnos	7	12 de diciembre de 2023
Acta de conformación de Veeduría Ciudadana – Isnos	8	12 de diciembre de 2023
Acta de justificación No. 1 modificación clausula 6 Anticipo	9	07 de diciembre de 2023
Acta de reunión	10	12 de diciembre de 2023
Acta de justificación No. 2 para suspensión No. 1	11	28 de diciembre de 2023
Acta de Reunión de obra – citación contratistas parques.	12	19 de abril de 2024
Acta de Justificación No. 3 para Reinicio No. 1	13	05 de junio de 2024
Acta de Justificación No. 4 modificar la Cláusula 4 Plazo de ejecución -ajustando el cambio de vigencia del contrato-	14	12 de junio de 2024
Acta de reunión	15	19 de julio de 2024
Acta de Justificación No. 5 Prorroga y alcance de obra	16	22 de julio de 2024
Acta de justificación No. 6 para suspensión No. 2	17	04 de septiembre de 2024

7. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

a). Actividades administrativas	<p>En el presente lapso del informe, establecido desde el 01 al 03 de septiembre de 2024, se realizaron las siguientes actividades administrativas:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Durante el periodo del presente informe se dio cumplimiento al equipo de trabajo aprobado y descrito en el anexo técnico 1, director de obra, Residente de obra para los frentes del parque de la Vereda Vega de Oriente del Municipio de Campoalegre, y director de obra y Residente de obra para el frente del parque de la Vereda Hornitos del Municipio de Isnos del Departamento del Huila.
--	--

514

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F23
		Versión: 2 Página 6 de 24
Fecha Aprobación: 30/06/2024	INFORME DE OBRA	

	<ul style="list-style-type: none"> • Durante el periodo del presente informe se cumplió a cabalidad con las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP). • Durante el periodo del presente informe se dio cumplimiento con sus obligaciones laborales respecto del personal a cargo • Durante el periodo del presente informe se dio cumplimiento con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra • Durante el periodo se realizó control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no sobre pase el presupuesto pactado por parte y total del contrato. • Durante el periodo se realizó retiro de los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza. • Durante el periodo se realizó la presentación de informes mensuales, aprobados por la Interventoría, el avance de cada uno de los frentes de trabajo, de cada una de las actividades programadas, cantidades de obra ejecutadas, registros fotográficos, resultados de los ensayos de materiales y demás pruebas realizadas, fotocopia de la bitácora o libro de obra, resumen de las actividades realizadas en el periodo, relación del personal empleado en la ejecución de la obra, informe de seguridad industrial, informe de manejo ambiental, actualización del programa de ejecución de obra, acreditación de pago de aportes parafiscales relativos al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda.
--	--

515

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
		Código: DIH-CGID-F23
Fecha Aprobación: 30/06/2024	INFORME DE OBRA	Versión: 2 Página 7 de 24

b.) Actividades operativas	En el presente lapso del informe, establecido desde el 01 al 03 de septiembre de 2024, se realizaron las siguientes actividades operativas:		
	<ul style="list-style-type: none">• Durante el periodo del presente informe se ejecutó la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.• Durante el periodo del presente informe se da cumplimiento con respecto a la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, aportando los certificados de calidad y fichas técnicas.• Durante el periodo se realizó seguimiento, supervisión, y control de cada una de las actividades contratadas y programadas, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas descritas en los documentos contractuales, anexo técnico, estudio previos y demás documentos que indican las buenas prácticas en sus procesos constructivos.• Durante el periodo del presente informe se ejecutaron las siguientes cantidades de obra:		
	ACTIVIDADES	CANTIDAD EJECUTADA	MUNICIPIO
	Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.	3,00 m2	Campoalegre
	ACTIVIDADES	CANTIDAD EJECUTADA	MUNICIPIO
Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.	3,00 m2	Isnos	

8. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA

SEPTIEMBRE

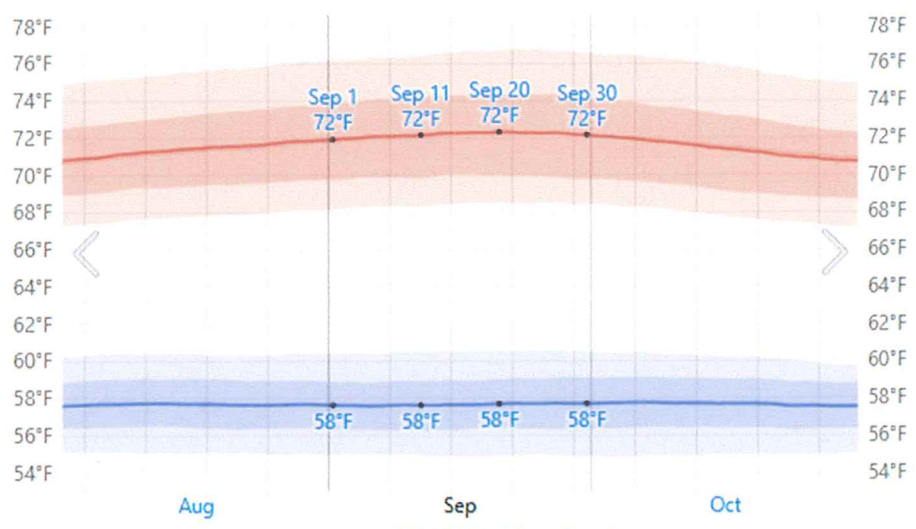
 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F23
	INFORME DE OBRA	Versión: 2 Página 8 de 24
Fecha Aprobación: 30/06/2024		

Clima en Isnos Colombia en septiembre

Las temperaturas máximas diarias rondan los 72 °F, y rara vez bajan de los 68 °F o superan los 77 °F. La temperatura máxima promedio diaria más alta es de 72 °F el 21 de septiembre.

Las temperaturas mínimas diarias rondan los 58 °F, rara vez bajan de los 55 °F o superan los 61 °F.

Temperatura media máxima y mínima en septiembre en Isnos



Fuente: [Web Wheather Spark](#)

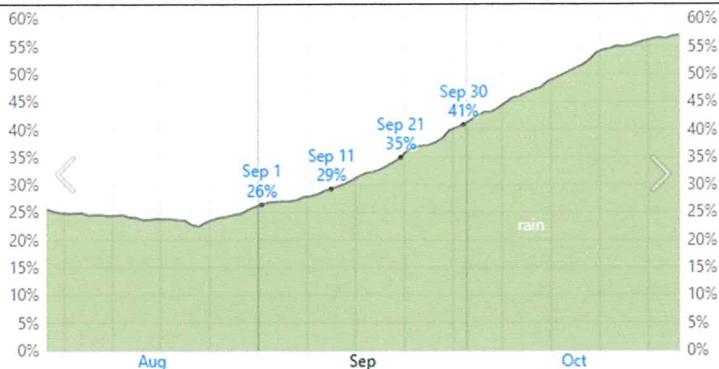
Precipitación

Un día lluvioso es aquel en el que se acumulan al menos 0,04 pulgadas de precipitación líquida o equivalente a líquido. En Isnos, la probabilidad de un día lluvioso a lo largo de septiembre aumenta muy rápidamente, comenzando el mes en un 26 % y terminándolo en un 41 %

Probabilidad de precipitación en septiembre en Isnos

517

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DIH-CGID-F23	
Fecha Aprobación: 30/06/2024	INFORME DE OBRA	
		Versión: 2 Página 9 de 24



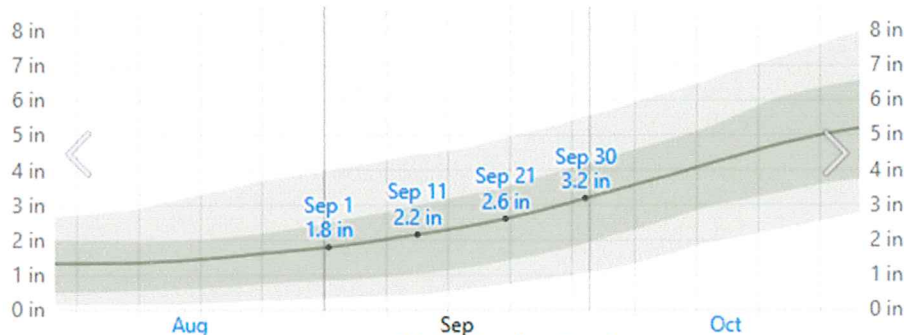
Fuente: [Web Wheather Spark](#)

Lluvia

Para mostrar la variación dentro del mes y no solo el total mensual, mostramos la precipitación acumulada durante un periodo móvil de 31 días centrado alrededor de cada día.

La precipitación media móvil de 31 días durante septiembre en Isnos aumenta rápidamente, comenzando el mes con 1,8 pulgadas, cuando rara vez supera las 4,0 pulgadas o cae por debajo de las 0,3 pulgadas , y terminando el mes con 3,2 pulgadas , cuando rara vez supera las 5,5 pulgadas o cae por debajo de las 1,1 pulgadas .

Precipitación media mensual en septiembre en Isnos



Fuente: [Web Wheather Spark](#)

RESUMEN CLIMATOLOGICO DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2024 VEREDA HORNIOS - ISNOS

DIA	ESTADO DEL TIEMPO
01/09/2024	LLUVIOSO
02/09/2024	NUBLADO
03/09/2024	NUBLADO

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F23
	INFORME DE OBRA	Versión: 2 Página 10 de 24

VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

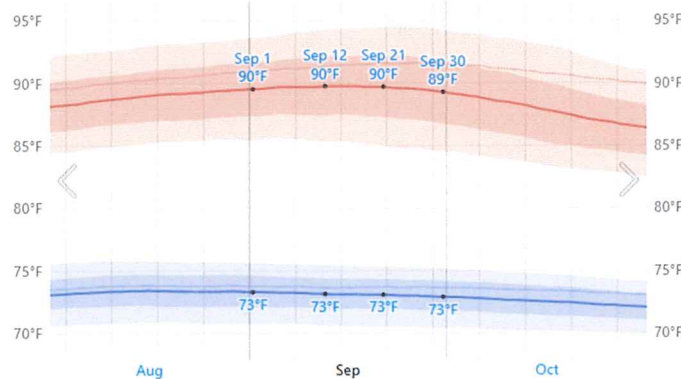
SEPTIEMBRE

El tiempo en septiembre en Campoalegre Colombia

Las temperaturas máximas diarias rondan los 90 °F, y rara vez bajan de los 85 °F o superan los 94 °F. La temperatura máxima promedio diaria más alta es de 90 °F el 15 de septiembre.

Las temperaturas mínimas diarias rondan los 73 °F, rara vez bajan de los 70 °F o superan los 76 °F.

Temperatura media máxima y mínima en septiembre en Campoalegre

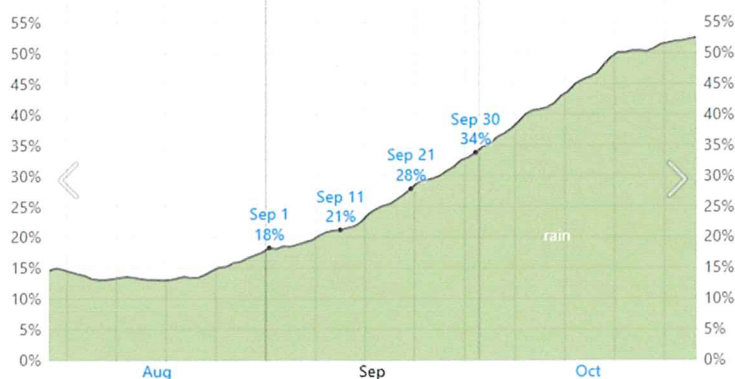


Fuente: [Web Weather Spark](#)

Precipitación

Un día lluvioso es aquel con al menos 0,04 pulgadas de precipitación líquida o equivalente a líquido. En Campoalegre, la probabilidad de un día lluvioso a lo largo de septiembre está aumentando muy rápidamente, comenzando el mes en 18% y terminándolo en 34%.

Probabilidad de Precipitación en septiembre en Campoalegre



Fuente: [Web Weather Spark](#)

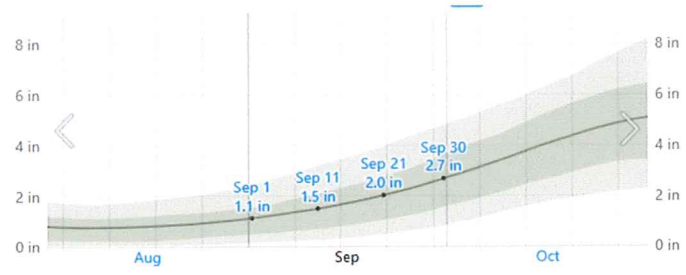
	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: DIH-CGID-F23	
Fecha Aprobación: 30/06/2024	INFORME DE OBRA	Versión: 2
		Página 11 de 24

Lluvia

Para mostrar la variación dentro del mes y no solo el total mensual, mostramos la precipitación acumulada durante un periodo móvil de 31 días centrado alrededor de cada día.

La precipitación media móvil de 31 días durante septiembre en Campoalegre aumenta rápidamente, comenzando el mes con 1,1 pulgadas, cuando rara vez supera las 2,4 pulgadas o cae por debajo de las 0,2 pulgadas, y terminando el mes con 2,7 pulgadas, cuando rara vez supera las 4,8 pulgadas o cae por debajo de las 0,8 pulgadas.

Precipitación media mensual en septiembre en Campoalegre



Fuente: [Web Wheather Spark](#)

RESUMEN CLIMATOLOGICO DEL 01 AL 03 DE SEPTIEMBRE 2024 VEREDA VEGA - CAMPOALEGRE	
DIA	ESTADO DEL TIEMPO
01/09/2024	LLUVIOSO
02/09/2024	NUBLADO
03/09/2024	NUBLADO

9. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseños de mezcla para los concretos.	3000 PSI	CEMENTO= 360,7 AGREGADO FINO= 894 AGREGADO GRUESO= 894 AGUA= 202

 Fecha Aprobación: 30/06/2024	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F23
	INFORME DE OBRA	Versión: 2 Página 12 de 24

<i>Compresión simple al concreto.</i>	Resultado resistencia a la compresión simple: fecha de toma de muestra: 14 de agosto de 2024 7 días - 21/08/2024= 3080 PSI 7 días - 21/08/2024=3248 PSI 14 – días 28/08/2024= 4450 PSI	CEMENTO= 360,7 AGREGADO FINO= 894 AGREGADO GRUESO= 894 AGUA= 202
---------------------------------------	---	---

NOTA: Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Artículo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.

"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA HORNIOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
<i>Diseños de mezcla para los concretos.</i>	3000 PSI	CEMENTO= 360,7 AGREGADO FINO= 894 AGREGADO GRUESO= 894 AGUA= 202
<i>Compresión simple al concreto.</i>	Resultado resistencia a la compresión simple: fecha de toma de muestra: 15 de agosto de 2024 7 días - 22/08/2024= 3228 PSI	CEMENTO= 360,7 AGREGADO FINO= 894 AGREGADO GRUESO= 894 AGUA= 202

NOTA: Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Artículo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio

CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"

DESCRIPCIÓN (Placa)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
INFORME LABORATORIO RESISTENCIA DE ESPECÍMENES DE CONCRETO	14/08/2024	21/08/2024	3080 PSI			3000 PSI	4450 PSI	CUMPLE
		21/08/2024		3248 PSI				
		28/08/2024			4450 PSI			
		11/09/2024						

521

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DIH-CGID-F23
	INFORME DE OBRA		Versión: 2
Fecha Aprobación: 30/06/2024			Página 13 de 24

"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA HORNIOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA"

DESCRIPCIÓN (Placa)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	21	28			
INFORME LABORATORIO RESISTENCIA DE ESPECÍMENES DE CONCRETO	15/08/2024	22/08/2024	3228 PSI			3000 PSI	3592	CUMPLE
		05/09/2024		3592 PSI				
		12/09/2024						
		12/09/2024						

10. ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	17 de junio de 2024	\$ 70.873.313,50	\$0,00	\$ 70.873.313,50
Acta Parcial No. 1	15 de agosto de 2024	\$ 47.865.725,00	\$ 11.966.431,25	\$ 35.899.293,75
Acta Parcial No. 2	23 de agosto de 2024	\$ 47.616.689,00	\$ 11.904.172,25	\$ 35.712.516,75
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$ 283.493.254,00	\$ 0,00	\$ 283.493.254,00	\$ 95.482.414,00	\$ 188.010.840,00

11. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
03/09/2024	OBRA – VEREDA HORNIOS DEL MUNICIPIO DE ISNOS	SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE OBRA, SOCIALIZACIÓN, ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LOS MOTIVOS POR EL CUAL SE SOLICITA SUSPENSIÓN No. 2 AL CONTRATO DE OBRA.

12. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
-------------------	--	---	--------------------------

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DIH-CGID-F23
	INFORME DE OBRA		Versión: 2
Fecha Aprobación: 30/06/2024			Página 14 de 24

Solicitud de suspensión No. 2	03/09/2024	N/A	Digital
-------------------------------	------------	-----	---------

13. RELACION DE PERSONAL (Profesional y Mano de obra)

NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA			
DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	1.079.182.594	DIRECTOR DE OBRA	Contrato indefinido
JAIME MAURICIO SOTO ANDRADE	7.720.885	RESIDENTE DE OBRA	Contrato indefinido
OSCAR ZULUAGA	76.006.590	MAESTRO DE OBRA	Por obra o labor contratada
HUGO CUELLAR	1.061.221.966	AYUDANTE DE OBRA	Por obra o labor contratada
"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"			
DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	1.079.182.594	DIRECTOR DE OBRA	Contrato indefinido
STEPHANY CASTRO SIERRA	1.075.276.718	RESIDENTE DE OBRA	Por obra o labor contratada
JUAN LUGO	1.082.124.445	MAESTRO DE OBRA	Por obra o labor contratada

14. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
ANTICIPO	2023003246	17/06/2024

15. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (Por Mes)

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	Nº PLANILLA	FECHA DE PAGO
DIRECTOR OBRA Y REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIADO DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 90.500	\$ 52.000	\$ 0,00	31334837	2024-10-17
RESIDENTE OBRA ISNOS JAIME MAURICIO SOTO ANDRADE	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 90.500	\$ 52.000	\$ 0,00	31334837	2024-10-17

823

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG					Código: DIH-CGID-F23	
	INFORME DE OBRA					Versión: 2	
Fecha Aprobación: 30/06/2024						Página 15 de 24	

RESIDENTE DE OBRA – CAMPOALEGRE STEPHANY CASTRO SIERRA	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 6.800	\$ 52.000	\$ 0,00	31334837	2024-10-17
OFICIAL DE OBRA JUAN LUGO - CAMPOALEGRE	\$ 41.600	\$ 10.400	\$ 18.100	\$ 10.400	\$ 0,00	9476236651	2024-10-29
OSCAR ZULUAGA MAESTRO DE OBRA – ISNOS	\$ 83.200	\$ 20.800	\$ 36.200	\$ 20.800	\$ 0,00	9476236651	2024-10-29
HUGO CUELLAR – AYUDANTE DE OBRA - ISNOS	\$ 83.200	\$ 20.800	\$ 36.200	\$ 20.800	\$ 0,00	9476236651	2024-10-29
NESTOR RODRIGO FIERRO LOSADA – REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIADO	\$ 208.000	\$ 52.000	\$ 6.800	\$ 52.000	\$ 0,00	9476236651	2024-10-29

RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

16. Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZAS INICIALES

ASEGURADORA						
ASEGURADORA	No.	END OZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0	61-44-101051955	0	23/11/2023	Cumplimiento del contrato	22/11/2023	22/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	22/11/2023	22/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/11/2023	22/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 0	61-40-101018914	0	23/11/2023	Predios labores y operaciones	22/11/2023	22/02/2024
				Contratistas y Subcontratistas	22/11/2023	22/02/2024
				Responsabilidad civil patronal	22/11/2023	22/02/2024

POLIZAS- ANULACIÓN CERTIFICADO PARA ACTUALIZACION ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1 ANULACIÓN	61-44-101051955	1	07/12/2023	Cumplimiento del contrato	22/11/2023	22/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	22/11/2023	22/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/11/2023	22/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	22/11/2023	22/02/2028
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 1 - ANULACIÓN	61-40-101018914	1	07/12/2023	Predios labores y operaciones	22/11/2023	22/02/2024
				Contratistas y Subcontratistas	22/11/2023	22/02/2024
				Responsabilidad civil patronal	22/11/2023	22/02/2024

POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 2 - ACT. VIGENCIAS ACTA DE INICIO	61-44-101051955	2	07/12/2023	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	30/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/11/2023	30/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/11/2023	02/03/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL	

524

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DIH-CGID-F23
	INFORME DE OBRA		Versión: 2
Fecha Aprobación: 30/06/2024			Página 16 de 24

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 2 – ACT. VIGENCIAS ACTA DE INICIO	61-40-101018914	2	07/12/2023		RECIBO FINAL DE LA OBRA	
				Predios labores y operaciones	30/11/2023	01/03/2024
				Contratistas y Subcontratistas	30/11/2023	01/03/2024
				Responsabilidad civil patronal	30/11/2023	01/03/2024
POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3 - ACT. VIGENCIAS ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO	61-44-101051955	3	07/06/2024	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	10/02/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/11/2023	10/02/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/11/2023	10/08/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 0 – ACT. VIGENCIAS ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO	61-40-101019855	0	07/06/2024	Predios labores y operaciones	07/05/2023	10/08/2024
				Contratistas y Subcontratistas	07/05/2023	10/08/2024
				Responsabilidad civil patronal	07/05/2023	10/08/2024
POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – OTROSI No. 1						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 4 - ACT. VIGENCIAS OTROSI No. 3	61-44-101051955	4	12/08/2024	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	10/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/11/2023	10/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/11/2023	10/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 1 – ACT. VIGENCIAS OTROSI No. 3	61-40-101019855	1	12/08/2024	Predios labores y operaciones	07/05/2023	10/09/2024
				Contratistas y Subcontratistas	07/05/2023	10/09/2024
				Responsabilidad civil patronal	07/05/2023	10/09/2024



17. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

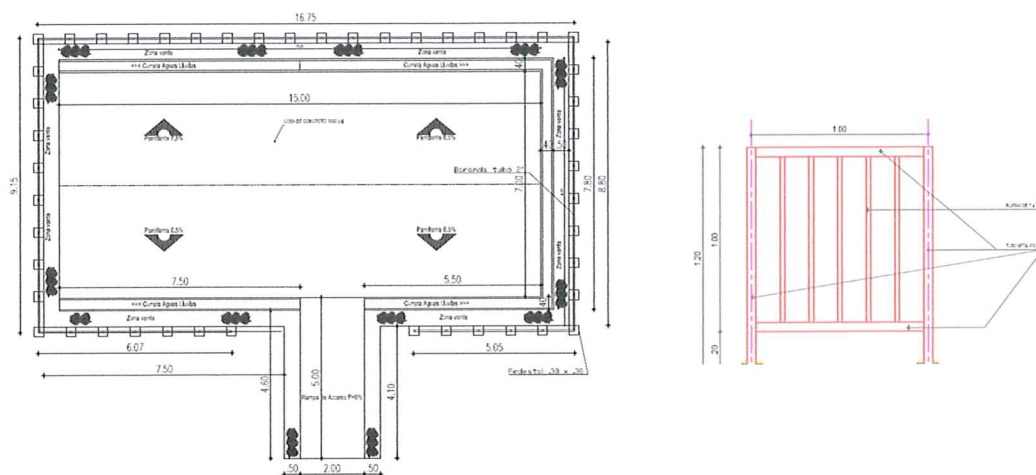


Ilustración No. 3 – Vista en planta y en perfil de la actividad de instalación de baranda metálica en tubo de 2".

526



SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Informe de Obra

Fecha Aprobación:
30/06/2024

Código: DIH-CGID-F23
Versión: 2
Página 18 de 24

18.1. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS – PARQUE DE LA VEREDA LA VEGA MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE													
CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA						
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION		
1	PRELIMINARES												
1.01	Localización y replanteo.	M2	160,85	\$ 3.584,00	\$ 576.486,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	160,85	\$ 576.486,00	100,00%		
2	MOVIMIENTO DE TIERRA												
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	68,90	\$ 46.338,00	\$ 3.192.688,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	68,90	\$ 3.192.688,00	100,00%		
2.02	Relleno en rebase seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	45,20	\$ 84.460,00	\$ 3.817.592,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	45,20	\$ 3.817.592,00	100,00%		
3	CIMENTACION												
3.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	5,91	\$ 34.260,00	\$ 202.477,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	5,91	\$ 202.477,00	100,00%		
3.02	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	2,29	\$ 636.912,00	\$ 1.458.529,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	2,29	\$ 1.458.529,00	100,00%		
3.03	Acero de refuerzo FY=60.000 P.S.I	KG	948,00	\$ 7.782,00	\$ 7.377.336,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	948,00	\$ 7.377.336,00	100,00%		
NP 3.04	Suministro e instalación de platina para pedestal de juego (incluye 4 pernos Ø1/2" L=0.55 con arandela, tuerca y platina .25x.25 e=1/4")	UND	24,00	\$ 152.519,00	\$ 3.660.456,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	24,00	\$ 3.660.456,00	100,00%		
4	ZONA VERDE												
4.01	Jardines perimetrales	M2	27,30	\$ 89.591,00	\$ 2.445.834,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%		
5	PLACA DE CONTRAPISO												
5.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	10,00	\$ 84.639,00	\$ 846.390,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	10,00	\$ 846.390,00	100,00%		
5.02	Pintura en acrílico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.	M2	115,00	\$ 24.055,00	\$ 2.766.325,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%		
5.03	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	35,80	\$ 84.463,00	\$ 3.023.775,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	35,80	\$ 3.023.775,00	100,00%		
NP 5.04	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,12 mts incluye corte de juntas y sello	M2	95,88	\$ 124.233,00	\$ 11.911.460,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	95,88	\$ 11.911.460,00	100,00%		
6	INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES												
6.1	suministro, transporte e instalación de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 7.566.326,00	\$ 7.566.326,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%		

527

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		
Fecha Aprobación: 30/06/2024	Código: DIH-CGID-F23		
	Versión: 2		
	Página 19 de 24		
INFORME DE OBRA			

6.2	Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 12.887.901,00	\$ 12.887.901,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.03	Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 11.835.634,00	\$ 11.835.634,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.04	Suministro, transporte e instalación de columpio inclusivo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 13.150.968,00	\$ 13.150.968,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.05	Suministro, transporte e instalación de modulo triqui inclusivo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 1.970.630,00	\$ 1.970.630,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.06	Suministro, transporte e instalación de modulo Abaco inclusivo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 4.075.165,00	\$ 4.075.165,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.07	Suministro, transporte e instalación de modulo plano inclusivo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 3.515.621,00	\$ 3.515.621,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
7.01	Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi	M3	2,57	\$ 320.614,00	\$ 823.978,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	2,57	\$ 823.978,00	100,00%
7.02	Baranda metálica en tubo de 2" y platina de 1"x1/8"	ML	0,00	\$ 157.521,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%
NP 7.03	Construcción de pedestales en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI de 30"30 altura 40 cm, para soportar barandas perimetrales. Incluye (4 pernos ø1/2" L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad)	UND	47,00	\$ 105.199,00	\$ 4.944.353,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	47,00	\$ 4.944.353,00	100,00%
NP 7.04	Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.	ML	46,17	\$ 208.502,00	\$ 9.626.249,00	3,00	\$ 625.506,00	6,50%	44,17	\$ 9.209.533,00	95,67%
8	TRANSPORTE										
NP 8.01	Transporte de materiales pétreos	M3-KM	1492,74	\$ 1.153,00	\$ 1.721.129,00	0,00	\$ 0,00	6,50%	1492,74	\$ 1.721.129,00	100,00%
	TOTAL, COSTO DIRECTO				\$ 113.397.302,00		\$ 625.506,00			\$ 52.766.182,00	
	Administración	%	20%		\$ 22.679.460,00		\$ 125.101,00			\$ 10.553.236,00	7,45%
	Imprevistos	%	1%				\$ 6.255,00			\$ 527.662,00	0,37%

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DIH-CGID-F23		
			Versión: 2		
			Página 20 de 24		
Fecha Aprobación: 30/06/2024			INFORME DE OBRA		

Utilidad	%	4%	\$ 4.535.892,00	\$ 25.020,00	\$ 2.110.647,00	1,49%
TOTAL, COSTO			\$ 141.746.627,00	\$ 781.882,00	\$ 65.957.727,00	
% AVANCE DE OBRA				0,55%		46,53%

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.

528



SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Fecha Aprobación:
30/06/2024

INFORME DE OBRA

Código: DIH-CGID-F23

Versión: 2

Página 21 de 24

18.2. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS – PARQUE DE LA VEREDA HORNIOS DEL MUNICIPIO DE ISNOS												
CONDICIONES CONTRACTUALES					EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL				EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA			
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION	
1	PRELIMINARES											
1.01	Localización y replanteo.	M2	160,94	\$ 3.584,00	\$ 576.809,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	160,94	\$ 576.809,00	100,00%	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	66,66	\$ 46.338,00	\$ 3.088.891,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	66,66	\$ 3.088.891,00	100,00%	
2.02	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	39,95	\$ 84.460,00	\$ 3.374.177,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	39,95	\$ 3.374.177,00	100,00%	
3	CIMENTACION											
3.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	5,85	\$ 34.260,00	\$ 200.421,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	5,85	\$ 200.421,00	100,00%	
3.02	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	2,29	\$ 636.912,00	\$ 1.458.528,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	2,29	\$ 1.458.528,00	100,00%	
3.03	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I	KG	948,00	\$ 7.782,00	\$ 7.377.336,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	948,00	\$ 7.377.336,00	100,00%	
NP 3.04	Suministro e instalación de platina para pedestal de juego (incluye 4 pernos ø1/2" L=0.55 con arandela, tuerca y platina .25x.25 e=1/2").	UND	24,00	\$ 152.519,00	\$ 3.660.456,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	24,00	\$ 3.660.456,00	100,00%	
4	ZONA VERDE											
4.01	Jardines perimetrales	M2	27,30	\$ 89.591,00	\$ 2.445.834,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0,00	0,00%	
5	PLACA DE CONTRAPISO											
5.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	10,00	\$ 84.639,00	\$ 846.390,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	10,00	\$ 846.390,00	100,00%	
5.02	Pintura en acrílico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.	M2	115,00	\$ 24.055,00	\$ 2.766.325,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	
5.03	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	35,80	\$ 84.463,00	\$ 3.023.775,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	35,80	\$ 3.023.775,00	100,00%	
NP 5.04	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,12 mts incluye corte de juntas y sello	M2	95,88	\$ 124.233,00	\$ 11.911.460,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	95,88	\$ 11.911.460,00	100,00%	
6	INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES											

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: DIH-CGID-F23
INFORME DE OBRA		Versión: 2	
		Página 22 de 24	
Fecha Aprobación: 30/06/2024			

6.01	suministro, transporte e instalación de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 7.566.326,00	\$ 7.566.326,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0	0%
6.2	Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 12.887.901,00	\$ 12.887.901,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0	0%
6.3	Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 11.835.634,00	\$ 11.835.634,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0	0%
6.4	Suministro, transporte e instalación de columpio inclusivo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 13.150.968,00	\$ 13.150.968,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0	0%
6.5	Suministro, transporte e instalación de modulo triqui inclusivo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 1.970.630,00	\$ 1.970.630,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0	0%
6.6	Suministro, transporte e instalación de modulo Abaco inclusivo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 4.075.165,00	\$ 4.075.165,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0	0%
6.7	Suministro, transporte e instalación de modulo plano inclusivo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 3.515.621,00	\$ 3.515.621,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0	0%
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
7.1	Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi	M3	2,61	\$ 320.614,00	\$ 836.803,00	0	0,00	\$ 0,00	2,61	\$ 836.803,00	100,00%
7.2	Baranda metálica en tubo de 2" y platina de 1"x1/8"	ML	0,00	\$ 157.521,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
NP 7,3	Construcción de pedestales en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI de 30"30 altura 40 cm, para soportar barandas perimetrales. Incluye (2 pernos ø1/2" L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad)	UND	48,00	\$ 105.199,00	\$ 5.049.552,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	48,00	\$ 5.049.552,00	100,00%
NP 7,4	Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.	ML	47,09	\$ 208.502,00	\$ 9.819.238,00	3,00	\$ 625.506,00	6,37%	45,09	\$ 9.401.355,00	95,74%
8	TRANSPORTE										
NP 8,1	Transporte de materiales pétreos	M3-KM	1699,10	\$ 1.153,00	\$ 1.959.062,00	0,00	0,00	\$ 0,00	1699,10	\$ 1.959.062,00	100,00%
	TOTAL, COSTO DIRECTO				\$ 113.397.302,00	\$ 625.506,00				\$ 52.765.015,00	



SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Código: DIH-CGID-F23
Versión: 2
Página 23 de 24

Fecha Aprobación:
30/06/2024

INFORME DE OBRA

Administración	%	20%	\$ 22.679.460,00	\$ 125.101,00	\$ 10.553.003,00	5,37%
Imprevistos	%	1%	\$ 1.133.973,00	\$ 6.255,00	\$ 527.650,00	0,27%
Utilidad	%	4%	\$ 4.535.892,00	\$ 25.020,00	\$ 2.110.601,00	1,07%
TOTAL COSTO			\$ 141.746.627,00	\$ 781.882,00	\$ 65.956.269,00	
% AVANCE DE OBRA						
VALOR TOTAL PARQUE INFANTIL ISNOS + PARQUE INFANTIL CAMPOALEGRE			\$ 283.493.254,00	\$106.403.625,00		46,53%
% AVANCE DE OBRA TOTAL						46,53%


NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.



ING. DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA
DIRECTOR DE OBRA



ING. DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE
DIRECTOR DE INTERVENTORIA



 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE OBRA	Código: DIH-CGID-F23
Fecha Aprobación: 30/06/2024		Versión: 2 Página 24 de 24

19 REGISTRO FOTOGRAFICO

PARQUE DE LA VEREDA LA VEGA MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE:

7.04. Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.



Ilustración No. 4 – Localización y replanteo de pedestales de derecha



Ilustración No. 5 – localización y replanteo pedestales zona izquierda

PARQUE DE LA VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS:

7.04. Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.




Ilustración No. 6 – Localización y replanteo zona de cuneta derecha



Ilustración No. 7 – localización y replanteo zona de cuneta izquierda

20 ANEXOS

- ACTAS DE COMITÉS.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP).

 ING. DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA FIRMA ORIGINAL	(06/09/2024) FECHA DE ENTREGA	 ING. DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE FIRMA ORIGINAL
DIRECTOR DE OBRA		Vo.Bo DIRECTOR DE INTERVENTORIA

 ASOPAGOS
S.p.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACION	DV	RAZON SOCIAL	CLASE	CODIGO	ARL	F. PRESENTACION	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 900949029	1	HC INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	UNICA	4390	Juridica	
MUN-DEP		DIRECCION	TELÉFONO		EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES		
41-1		CL. 78C NO 14W 71	8660138		INCONTEGRAL@GMAIL.COM		S		

[illegible]

Nº AFILIADOS	REF. DE PAGO (PIN)	FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
3	31334837	2024-10-08	Pagada

[illegible]

ASOPAGOS S.A.

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
IDENTIFICACIÓN	DV	RAZÓN SOCIAL	CLASE	CÓDIGO	ARL	F. PRESENTACIÓN	ACT. ECO	TIPO DE EMPRESA	
NI 900949029	1	HC INGENIERIA Y CONSTRUCCION INTEGRAL SAS	B	0	ARL SURA - 14-11	ÚNICA	4390	Jurídica	
MUN-DEP		DIRECCION			TELEFONO	EMAIL		EXENTO DE PARAFISCALES	
41-1		CL. 75C NO 1AW 71			8660138	INCOINTEGRAL@GMAIL.COM		S	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACIÓN										
PERÍODO PENSIÓN	PERÍODO SALUD	PLANILLA	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO	CENTRO DE TRABAJO	DEPARTAMENTO	MUNICIPIO	VALOR PAGO	INTERÉS X MORA	ENTIDAD RECAUDO
2024-01-01 2024-01-01	2024-01-01	24129.4037	E	2024-10-17	TODOS LOS CENTROS	TODOS	TODOS	1.131.400	7.600	BANCOLOMBIA

Nº AFIADOS	2024-09	2024-10	31334637	E
REF. DE PAGO (PIN)			FECHA LÍMITE PAGO	ESTADO PLANILLA
3		31334637	2024-10-08	Pagada


TOTALES IBC				
IBC PENSION	IBC SALUD	IBC RIESGOS	IBC CAJAS	IBC PARAF
3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000	3.900.000

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
AFP(Administradoras: 1)				3	624.000	0	4.100	0	628.100
COLPENSIONES	25-14	900338004	7	3	624.000	0	4.100	0	628.100
EPS(Administradoras: 2)				3	156.000	0	1.100	0	157.100
SANTAS	EPS005	800251440	-6	1	52.000	0	400	0	52.400
NUEVA EPS S.A.	EPS037	900759264	2	2	104.000	0	700	0	104.700

SUBSISTEMA	CÓDIGO	NIT	DV	AFLUJOS	VALOR LIQUIDADO	VALOR UPC	INTERESES MORA	SALDOS 1 INCAPACIDAD DESCONTADOS	VALOR A PAGAR
ARP(Administradoras: 1)				3	187,800	0	1,300	0	189,100
ARL SURA	14-11	890903790	5	3	187,800	0	1,300	0	189,100
CCF(Administradoras: 1)				3	156,000	0	1,100	0	157,100
COMFAMILAR DEL HUILA	CCF32	891180008	2	3	156,000	0	1,100	0	157,100
Gran Total					1,123,800	0	7,600	0	1,131,400

ASOPAGOS S.a.

PAGADO



Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				Exonerado SENA e ICBF			
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Teléfono	
NIT 900219918	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE 4 # 7-78 APTO 301	8641151	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION				Pago			
Periodo	Salud	Pago	Clave	Tipo	Fecha	Pago	Valor
2024-09	2024-10	12526388	9476236651	Planilla E	2024/10/04	2024/10/29	25
							\$1,619,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																								
EMPLEADO				PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte			
Sucesos: NEIVA (7 Afiliados)																								
Centro de Trabajo: PERSONAL ADMINISTRATIVO (2 Afiliados)																								
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (2 Afiliados)																								
1	CC 7719364	PIERRO NESTOR	230301	30	\$1,300,000	\$2,600,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$2,600,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$2,600,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$2,600,000	30	\$0	\$0			
2	CC 36067241	MEDINA SANDRA	25-14	30	\$1,300,000	\$2,600,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$2,600,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$2,600,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$2,600,000	30	\$0	\$0			
Centro de Trabajo: PERSONAL DE OBRA (5 Afiliados)																								
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (5 Afiliados)																								
3	CC 1061221966	CUELLAR HUGO	230301	12	\$520,000	\$908,300	EP5037	12	\$520,000	\$908,300	EP5037	12	\$520,000	\$908,300	EP5037	12	\$520,000	\$908,300	12	\$0	\$0			
4	CC 1004074270	LUGO JUAN	230301	8	\$346,667	\$908,300	EP5041	8	\$346,667	\$908,300	EP5041	8	\$346,667	\$908,300	EP5041	8	\$346,667	\$908,300	8	\$0	\$0			
5	CC 1004074241	TERRASANTO JONATHAN	230301	9	\$390,000	\$908,300	EP5005	9	\$390,000	\$908,300	EP5005	9	\$390,000	\$908,300	EP5005	9	\$390,000	\$908,300	9	\$0	\$0			
6	CC 1075306422	TRUJILLO NICOLAS	230301	30	\$1,300,000	\$2,600,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$2,600,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$2,600,000	EP5037	30	\$1,300,000	\$2,600,000	30	\$0	\$0			
7	CC 76066590	ZULUAGA OSCAR	230301	12	\$520,000	\$908,300	EP5037	12	\$520,000	\$908,300	EP5037	12	\$520,000	\$908,300	EP5037	12	\$520,000	\$908,300	12	\$0	\$0			
Total Afiliados(7)					\$5,676,667				\$227,100				\$5,676,667				\$227,100				\$5,676,667			

534

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE										
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF		
NIT 900219718	2	DANES INGENIEROS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	NEIVA	CALLE # 7-78 APTO 301	NEIVA-HUILA	8641151	SI		
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION										
Periodo	Clave		Tipo	Fecha	Pago	Banco	Pago		Valor	
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite		Dias Mora			
2024-09	2024-10	12526388		E	2024/10/04	2024/10/29	25		\$1,619,200	
BANCO DE OCCIDENTE										
RESUMEN DE PAGO										
RIESGO		CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)					7	\$908,300	\$16,400	\$0	\$924,700	
COLPENSIONES		25-14	900,336,004	7	1	\$208,000	\$3,800	\$0	\$211,800	
PORVENIR		230301	800,224,808	8	5	\$617,100	\$11,100	\$0	\$628,200	
PROTECCION		230201	800,229,739	0	1	\$83,200	\$1,500	\$0	\$84,700	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$227,900	\$4,100	\$0	\$232,000	
ARL SURA		14-11	890,903,790	5	7	\$227,900	\$4,100	\$0	\$232,000	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)					7	\$227,100	\$4,100	\$0	\$231,200	
CONFAMILIAR HUILA		CCF32	891,180,008	2	7	\$227,100	\$4,100	\$0	\$231,200	
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)					7	\$227,100	\$4,200	\$0	\$231,300	
A.I.C.		EPSI3	817,001,773	3	1	\$20,800	\$400	\$0	\$21,200	
NUEVA E.P.S.		EPS037	900,156,264	2	4	\$176,800	\$3,200	\$0	\$180,000	
NUEVA EPS MOVILIDAD		EPS041	900,156,264	2	1	\$13,900	\$300	\$0	\$14,200	
SANTAS		EPS005	800,251,440	6	1	\$15,600	\$300	\$0	\$15,900	
TOTAL					7	\$1,590,400	\$28,800	\$0	\$1,619,200	


30 agosto 2024


Clima: Seco

Personal: Ingeniero residente, Interventoría, maestro y ayudantes de obra

Equipos: Herramienta menor

Actividades: Se recibe material para la instalación de baranda metálica y se continúa con la colocación de baranda en zona lateral izquierda.


Director obra


PES COPA


Interventor Int.


31 agosto 2024


Clima: Seco


Personal: Ingeniero residente, Interventoría, maestro y ayudantes de obra

Equipos: Herramienta menor

Actividades: Se continúa con instalación de baranda metálica en zona frontal del parque


Director obra


PES COPA



Interventor Int.


1 Septiembre 2024

Clima: Lluvioso

No se realizaron actividades por ser día dominical


Director obra


PES COPA


Interventor Int.

28


2 Septiembre 2024


Clima: Nublado


Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director,
maestro y ayudantes de obra

Equipos: Herramienta menor

Actividades: se continua con instalacion de baranda
metalica, se hace limpieza de material que no
se utilizara



Director obra



PDS obra



Dnr Int

3 Septiembre 2024

Se realiza la solicitud y socializacion de la suspen-
sion y se otorga la viabilidad de manera inmediata



Director obra


PDS obra



Dnr Int

1 Septiembre 2024

No se realizaron labores por ser día dominical.


 Director obra

 Jaime Munuoz S.
 Residente obra


 Director Int.

2 Septiembre 2024

Clima: Nublado


Personal: Ingeniero residente, Interventoria, maestros y ayudantes de obra

Equipos: Herramienta menor

Actividades: Se continúa con la instalación de la base de metalica en zona frontal, se retiran excesos del material en el puntal sitio de acopio



 Director obra

 Jaime Munuoz S.
 Residente obra



 Director Int.

3 Septiembre 2024

Se realiza la solicitud y socialización de la suspensión y se otorga la viabilidad


 Director obra

 Jaime Munuoz S.
 Residente obra


 Director Int.

		SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG			
Nombre Proyecto		CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA		Acta No.	005 - 0
No. De Contrato obra		CSAMCIH 435 DE 2023		Lugar: VEREDA HORNITOS - ISNOS	
No. De Contrato Interventoría		CMCIH 414 DE 2023		SITIO DE OBRA	
Fecha	03 DE SEPTIEMBRE DE 2024	Hora Inicio	8:00 am	Hora Final	9:00 am

OBJETO DE LA REUNION	
SEGUIMIENTO DE OBRA	

AGENDA	
1-	SEGUIMIENTO DE EJECUCION DE OBRA

DESARROLLO	
<p>Se realiza acta de comité a fin de validar el avance de obra a la fecha:</p> <ul style="list-style-type: none"> Solicitud de suspensión temporal de las actividades constructivas debido a que la empresa especializada en la fabricación de los juegos de los parques infantiles presenta múltiples ocupaciones. No se establecen compromisos entre las partes en la presente acta. 	


TAREAS – COMPROMISOS – TEMAS PROXIMAS REUNIONES			
Tema	Tarea	Responsable	Fecha de Control

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:		
NOMBRE	CARGO	FIRMA



SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN - MIPG

EN CONSTANCIA FIRMAN EL ACTA:

DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	DIRECTOR DE OBRA	
JAIME MAURICIO SOTO ANDRADE	RESIDENTE DE OBRA	
DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	INTERVENTOR	

539

 INDERHUILA	FORMATO	CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	junio 2024

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMCIH414 DE 2023
CONTRATO DE OBRA No. CSAMCIH 435 DE 2023

INFORME MENSUAL No. 5 DE SUPERVISION

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por el Contratista y la Interventoría desde el **01 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024**

FINAL

☐

PARCIAL

☐

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA" E "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA".

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA.




CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: N° CSAMCIH435 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA Y EL CONSORCIO DANES - HC

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO DANES - HC
VALOR DE LA OBRA: \$141.746.627,00

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA:
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
VALOR DE LA INTERVENTORÍA: \$17.343.270,00

FECHA DE INICIO: 30 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE FEBRERO DE 2024



MUNICIPIO:

CAMPOALEGRE – ISNOS

DEPARTAMENTO:

HUILA

	FORMATO	CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	junio 2024

1. PRESENTACIÓN

El presente informe corresponde a las labores desarrolladas por la supervisión desde el 01 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024, en cumplimiento del contrato general de “INTERVENTORIA No. CIHCM341 DE 2023” cuyo objeto es “INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA; y el cumplimiento del contrato general de “OBRA No. CSAMCIH 435 DE 2023” cuyo objeto es “CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

Para lo cual se efectuará en Campoalegre e Isnos: “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA”.

Mediante cuadros anexos y registro fotográfico se pretende dejar constancia de los trabajos adelantados por la interventoría hasta lograr la culminación de los trabajos. En este informe se da a conocer las obras ejecutadas a la fecha de cada una de las actividades con un registro fotográfico mostrando la obra en ejecución.

2. JUSTIFICACIÓN

El espacio público es un lugar de uso colectivo y de convivencia social, donde se convierte en un elemento estructurante de la calidad de vida, en un dinamizador de la ciudad y en un elemento que da soporte a los diferentes procesos y dinámicas del espacio urbano. La estructura ambiental, los parques, las zonas verdes, las calles, las ciclo ruta, hacen parte de esta estructura que soporta la movilidad, la recreación, el deporte y servicios ecosistémicos que son de vital importancia para la ciudad y el bienestar de sus habitantes. Por lo que las ciudades tienen el compromiso de crear espacios de libre acceso donde sus habitantes se integren espontáneamente sin importar su condición social o económica. Esta dinámica de integración social genera un significado especial del espacio para los ciudadanos a la vez que hace ciudades más amables, más alegres y sobre todo más dignas. El activar los espacios deportivos de fácil acceso, desarrolla comportamientos saludables que reducen la inactividad física, estos están equipados para el acondicionamiento y desarrollo del bienestar humano. Por consiguiente, el crear una cultura de fomento que permita el desarrollo de actividades no cotidianas, da apertura al diseño de hábitos participativos que fomenten los programas que el mismo gobierno viene desarrollando, lo que motivaría al disfrute y participación de ciudadanos que no se encuentran familiarizados con dichos espacios. El esfuerzo físico no va ligado solamente al desarrollo de un deporte de alta competencia, si no a la dedicación que se proyecte el individuo para el logro de un objetivo, que domine ante cualquier adversidad, esa sensación de satisfacción y conlleve al mejoramiento del estado psicológico del

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	junio 2024

mismo La disponibilidad del espacio público en las ciudades es un reconocido indicador de calidad de vida para sus habitantes. Distintos análisis en salud urbana han propuesto que la presencia del espacio público peatonal, las ciclo rutas y los parques en las ciudades, son un motor para la promoción de la actividad física. El desarrollo urbano de estos espacios de esparcimiento, así como el de otros equipamientos recreativos y culturales, fomenta nuevos comportamientos sociales y promueve la actividad física en los habitantes, al tener acceso a todos los espacios. Es así como ciudades modelo a nivel mundial, son reconocidas por la cantidad y calidad de su espacio público. Además, las áreas verdes urbanas generan una serie de beneficios sociales y ambientales que van más allá del uso recreativo. Entre dichos beneficios se encuentran mejoras en la sanidad básica, reducción de contaminación del aire y enriquecimiento de la biodiversidad entre otros. (Walker Francisco, 2006, p.98). El espacio público al aire libre como los parques públicos y/o zonas verdes guardan una relación sobre la cantidad de habitantes que se vinculan a ella y no sobre la superficie que ocupan, a mayor cantidad de habitantes mayores requerimientos de espacio público, con relación a lo anterior la legislación colombiana a través del Decreto 1504 de 1998 y el documento Conpes 3718 de la Política Nacional de Espacio Público, propone para efectos de su medición un indicador de espacio público por habitante de 15m²; Lo anterior deja reflejado la necesidad de crear espacios públicos, pensado en proporcionar comodidad, acercamiento de los habitantes logrando el sentimiento de afecto hacia su territorio, protagonistas del escenario, actores felices y con disposición de ayudar a conservar y usar racionalmente la infraestructura y escenarios públicos, permitiendo así mejorar la calidad de vida.

3. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consta de la construcción de dos (2) parques infantiles, uno en la Vereda la Vega de Oriente del Municipio de Campoalegre, y el segundo parque ubicado en la Vereda Hornitos del Municipio de Isnos, los parques infantiles contemplan actividades de localización y replanteo, excavaciones para la conformación de vigas de cimentación, para mejoramiento del terreno con recebo seleccionado para cunetas, zonas verdes y pedestales para juegos infantiles y baranda perimetral también dentro de su alcance contempla el relleno en recebo seleccionado compactado en capas horizontales de 15 cm

Dentro del proyecto encontramos solado de limpieza en áreas de vigas de cimentación y áreas de los pedestales de anclaje de juegos infantiles, también el parque contempla actividades de acero en varilla 3/8 para vigas de cimentación, placa de contrapiso, pedestales para mobiliario de juegos infantiles y pedestales para baranda perimetral

Otras de las actividades del proyecto, se encuentra vigas de cimentación de 0.25m x 0.25 m de sección ubicadas en los extremos de la placa de contrapiso en sentido longitudinal, también encontramos una placa de contrapiso con espesor de 12 cm en un área de 7 metros de ancho por 15 metros de largo, dicha placa contempla acabado en pintura en acrílico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie cuyos colores van según diseño y figuras.

Contemplamos unas cunetas en forma de V cubriendo el área de la placa para recoger las aguas lluvia, estas cunetas se caracterizan por tener una dimensión de 0.40 m x 15 m y otra en el lateral derecho de dimensión de 0.40 m x 15 m.

	FORMATO	CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA	VERSIÓN	1
		VIGENCIA	junio 2024

Para proteger las zonas verdes se tendrá una baranda metálica en tubo de 2" que incluye anticorrosivo y pintura

Las zonas verdes están ubicadas al redor del parque infantil en las cuales se plantarán en tierra negra tipos de plantas como lo son: Ornamentales durantas, plantas Ixoras y Bismarckia.

En el parque infantil está ubicada una rampa en concreto de 3.000 PSI con una longitud de 2.00 m x 5.00 m y un espesor de 0.10 m, esta rampa esta reforzada con malla electrosoldada y nos dará acceso a 7 juegos infantiles que constan de: circuito de juego, modulo recreativo, carrusel, columpio inclusivo, triqui inclusivo, ábaco inclusivo y módulo de piano inclusivo.

3.1. LOCALIZACIÓN

El proyecto "Construcción y adecuación de parques infantiles" se desarrollará en la vereda Vega de Oriente del municipio de Campoalegre y la vereda Hornitos del municipio de Isnos, dichos municipios ubicados en el departamento del Huila.

No.	MUNICIPIO	LUGAR	DIRECCIÓN
1	Campoalegre	Vereda Vega de Oriente	En la caseta comunal
2	Isnos	Vereda Hornitos	En la escuela de la vereda

1. VEREDA VEGA DE ORIENTE – MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

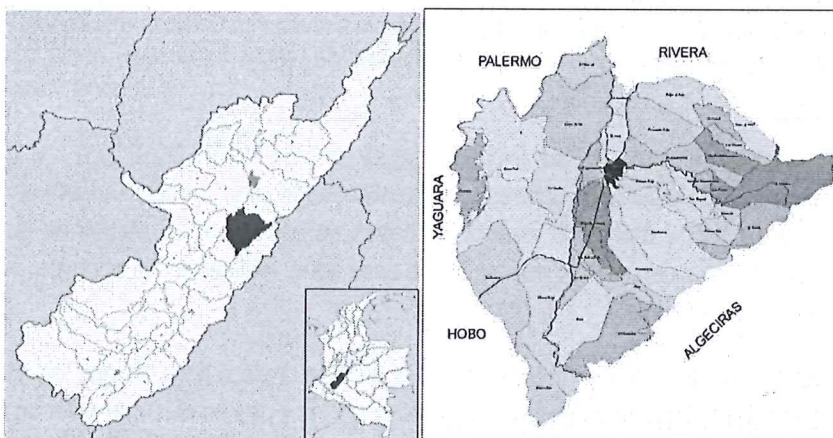


Ilustración No. 1 – Localización de Vereda Vega de Oriente – Campoalegre

841

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	junio 2024

2. VEREDA HORNITOS – MUNICIPIO DE ISNOS



Ilustración No. 2 – Localización de Vereda Hornitos – Isnos

3.2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

Las obras contemplan la construcción y adecuación de parques infantiles, en donde tiene por objeto contractual las siguientes actividades de ejecución:

- PRELIMINARES
- MOVIMIENTO DE TIERRA
- CIMENTACIÓN
- ZONA VERDE
- PLACA DE CONTRAPISO
- INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES
- OBRAS COMPLEMENTARIAS
- TRANSPORTE

4. INFORMACION GENERAL DE CONTRATOS

4.1. CONTRATO DE INTERVENTORIA

Que mediante el 10 de octubre de 2023, la entidad dio apertura al procedimiento de selección Mínima cuantía número IPMCIH008-2023 y que mediante Resolución No. 419 del 9 de noviembre de 2023, la entidad adjudico el contrato al señor FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA.

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderrhuila.gov.co - atencionusuario@inderrhuila.gov.co
Neiva-Huila

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	junio 2024

CONTRATO No.	CMCIH414 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE INTERVENTORIA
OBJETO:	"INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNIOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA".
CONTRATISTA:	ING. FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA NIT: 7.711.430-0 C.C: 7.711.430 DE NEIVA (H)
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL:	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (\$17.343.270,00) M/CTE.
VALOR ADICIONAL:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (\$17.343.270,00) M/CTE
FECHA SUSCRIPCIÓN:	17/11/2023
PLAZO INICIAL:	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL.
PLAZO ADICIONAL No. 01:	1 MES
PLAZO TOTAL:	CUATR (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL
FECHA DE INICIO:	30 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO No. 01:	05 de junio 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 02:	04 de septiembre de 2024

542

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	junio 2024

Estado Financiero del Contrato de Interventoría			CMCIH414 DE 2023	
Objeto: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA".				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización 30%	Valor pagado
Valor Anticipo	N/A			
Acta Parcial No. 1				
Acta Parcial No. 2				
Acta Recibo Final No.4				
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$ 17.343.270,00	\$ 0	\$ 17.343.270,00	\$ 0	\$ 17.343.270,00

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Iniciación	30 de noviembre de 2023			28 de febrero de 2024
Suspensión No. 1	28 de diciembre de 2023	28 días	159 días	
Reiniciación No. 1	05 de junio de 2024			06 de agosto de 2024
Otrosí No. 3 – prorroga (1 mes)	01 de agosto de 2024	57 días		06 de septiembre de 2024
Suspensión No. 2	04 de septiembre de 2024	32 días		
TOTAL DIAS		117 días	159 días	

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	No.	Fecha
Adjudicación del contrato	1	9 de noviembre de 2023
Suscripción del contrato	2	22 de noviembre de 2023
Acta de reunión	3	28 de noviembre de 2023

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	junio 2024

Acta de inicio	4	30 de noviembre de 2023
Acta de Socialización del proyecto – Campoalegre	5	01 de diciembre de 2023
Acta de conformación de Veeduría Ciudadana – Campoalegre	6	01 de diciembre de 2023
Acta de Socialización del proyecto – Isnos	7	12 de diciembre de 2023
Acta de conformación de Veeduría Ciudadana – Isnos	8	12 de diciembre de 2023
Acta de justificación No. 1 modificación cláusula 6 Anticipo	9	07 de diciembre de 2023
Acta de reunión	10	12 de diciembre de 2023
Acta de justificación No. 2 para suspensión No. 1	11	28 de diciembre de 2023
Acta de Reunión de obra – citación contratistas parques.	12	19 de abril de 2024
Acta de Justificación No. 3 para Reinicio No. 1	13	05 de junio de 2024
Acta de Justificación No. 4 modificar la Cláusula 4 Plazo de ejecución -ajustando el cambio de vigencia del contrato-	14	12 de junio de 2024
Acta de reunión	15	19 de julio de 2024
Acta de Justificación No. 5 Prorroga y alcance de obra	16	22 de julio de 2024
Acta de justificación No. 6 para suspensión No. 2	17	04 de septiembre de 2024

4.1.1. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2023000722	VALOR	VIGENCIA
Rubro 2.3.2.02.02.005 denominado Construcción y servicios de la construcción UNIDAD EJECUTORA: 0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA:4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreacion y deporte PRODUCTO: 4301010-Parques recreativos construidos y dotados CPC:5327-instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento META:9-Construccion y Dotación de 2 parques Recreativos ACTIV:91-Contruir y Dotar Gimnasios Recreativos Infantiles – PROYECTO 2023004410123- construcción y adecuación de parques infantiles Tutaina tuturu Huila- mi pesebre huilense Crece en unión familiar – Vereda Vega de Oriente -Municipio de Campoalegre Departamento del Huila: Fuente 1-50103- RB RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES F 2022		\$ 8.671.635,00	2023

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2023000722	VALOR	VIGENCIA
Rubro 2.3.2.02.02.005 denominado Construcción y servicios de la construcción UNIDAD EJECUTORA: 0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA:4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreacion y deporte PRODUCTO: 4301010-Parques recreativos construidos y dotados CPC:5327-instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento META:9-Construccion y Dotación de 2 parques Recreativos ACTIV:91PROYECTO 2023004410136- construcción y adecuación de parques infantiles Tutaina tuturu Huila- mi pesebre huilense Crece en unión familiar – Vereda Hornitos - Municipio de Isnos Departamento del Huila: Fuente 1-50103-RB RECURSOS PROPIOS – EXCEDENTES F 2022		\$ 8.671.635,00	2023

543

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	junio 2024

4.1.2. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

Póliza legalización del CONTRATO:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010832	0	20-11-2023	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	17/08/2024
				Prestaciones sociales	17/11/2023	17/02/2027
				Calidad del servicio	17/02/2024	17/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002178	0	20-11-2023		17-11-2023	17-02-2024
Póliza actualizada x anulación certificado anexo 0 para actualización de ACTA DE INICIO:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010832	1	05/12/2023	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	17/08/2024
				Prestaciones sociales	17/11/2023	17/02/2027
				Calidad del servicio	17/02/2024	17/02/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002178	1	05-12-2023		17/11/2023	17/02/2024
Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010832	2	05-12-2023	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	30/08/2024
				Prestaciones sociales	30/11/2023	02/03/2027
				Calidad del servicio	01/03/2024	02/03/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002178	2	05-12-2023		30/11/2023	01/03/2024

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	junio 2024

Póliza actualizada x ACTA DE SUSPENSION No. 1 - ACTA DE REINICIO No. 1:						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010832	3	07-06-2024	Cumplimiento del contrato	05/06/2024	11/02/2025
				Prestaciones sociales	05/06/2024	11/08/2027
				Calidad del servicio	11/08/2024	11/08/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002178	3	07-06-2024		30/11/2024	11/08/2024
Póliza actualizada x PRORROGA No. 1						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010832	4	12-08-2024	Cumplimiento del contrato	02/08/2024	11/03/2025
				Prestaciones sociales	05/08/2024	11/09/2027
				Calidad del servicio	11/09/2024	11/09/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)						
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)		VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002178	4	12-08-2024		30/11/2024	11-09-2024

4.2. CONTRATO DE OBRA

Que mediante la Resolución 302 DEL 25 DE SEPTIEMBRE DE 2023 la Entidad abrió el PROCESO SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTIA No. SAMCIH007-2023, Que por medio de la Resolución 419 del 09 de noviembre de 2023 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista **CONSORCIO DANS-HC**.

CONTRATO No.	CSAMCIH 435 DE 2023
TIPO DE CONTRATO:	CONTRATO DE OBRA
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA HORNIOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA
CONTRATISTA:	CONSORCIO DANES – HC

544

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	junio 2024

	NIT: 901.774.192 - 5 Representante Legal: DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA
CONTRATANTE:	INDERHUILA NIT: 813.005.578-7
VALOR INICIAL:	DOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (283.493.254,00) M/CTE.
VALOR ADICIONAL:	\$ 0
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	DOCIENTOS OCHENTA Y TRES MILLONES CUATROCIENTOS NOVENTA Y TRES MIL DOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS (283.493.254,00) M/CTE.
FECHA SUSCRIPCIÓN:	22/11/2023
PLAZO INICIAL:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA ENECUCIÓN DEL CONTRATO-SERÁ DE TRES (03) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
PLAZO ADICIONAL No. 01:	1 MES
PLAZO TOTAL:	EL PLAZO ESTIMADO PARA LA ENECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE CUATRO (04) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION, EN TODO CASO SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
FECHA DE INICIO:	30 de noviembre de 2023
FECHA DE SUSPENSIÓN No. 01:	28 de diciembre de 2023
FECHA DE REINICIO No. 01:	05 de junio de 2024

Estado Financiero del Contrato de Obra			CSAMCIH 435 DE 2023	
Objeto: “CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA”				
Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización 25%	Valor pagado
Valor Anticipo	17/06/2024	\$ 70.873.313,50		
Acta Parcial No. 1	15/08/2024	\$ 47.865.725,00	\$ 11.966.431,25	\$ 35.899.293,75
Acta Parcial No. 2	23/08/2024	\$ 47.616.689,00	\$ 11.904.172,25	\$ 35.712.516,75
Acta Parcial No. 3				
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	junio 2024

\$ 283.493.254,00	\$ 0	\$ 283.493.254,00	\$ 253.071.812,00	\$ 30.421.442,00
-------------------	------	-------------------	-------------------	------------------

HISTORIAL CRONOLÓGICO DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION
Iniciación	30 de noviembre de 2023			28 de febrero de 2024
Suspensión No. 1	28 de diciembre de 2023	28 días	159 días	
Reiniciación No. 1	05 de junio de 2024			06 de agosto de 2024
Otrosí No. 3 – prorroga (1 mes)	01 de agosto de 2024	57 días		06 de septiembre de 2024
Suspensión No. 2	04 de septiembre de 2024	32 días		
TOTAL DIAS		117 días	159 días	

ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de inicio, acta de suspensión, acta de reinicio, actas de modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)		
Tipo de Acta	No.	Fecha
Adjudicación del contrato	1	9 de noviembre de 2023
Suscripción del contrato	2	22 de noviembre de 2023
Acta de reunión	3	28 de noviembre de 2023
Acta de inicio	4	30 de noviembre de 2023
Acta de Socialización del proyecto – Campoalegre	5	01 de diciembre de 2023
Acta de conformación de Veeduría Ciudadana – Campoalegre	6	01 de diciembre de 2023
Acta de Socialización del proyecto – Isnos	7	12 de diciembre de 2023
Acta de conformación de Veeduría Ciudadana – Isnos	8	12 de diciembre de 2023
Acta de justificación No. 1 modificación clausula 6 Anticipo	9	07 de diciembre de 2023
Acta de reunión	10	12 de diciembre de 2023
Acta de justificación No. 2 para suspensión No. 1	11	28 de diciembre de 2023
Acta de Reunión de obra – citación contratistas parques.	12	19 de abril de 2024
Acta de Justificación No. 3 para Reinicio No. 1	13	05 de junio de 2024
Acta de Justificación No. 4 modificar la Cláusula 4 Plazo de ejecución -ajustando el cambio de vigencia del contrato-	14	12 de junio de 2024
Acta de reunión	15	19 de julio de 2024
Acta de Justificación No. 5 Prorroga y alcance de obra	16	22 de julio de 2024
Acta de justificación No. 6 para suspensión No. 2	17	04 de septiembre de 2024

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderrhuila.gov.co - atencionusuario@inderrhuila.gov.co
 Neiva-Huila

545

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	junio 2024

4.3. INFORMACION PRESUPUESTAL

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2024000506	VALOR	VIGENCIA
Construcción y servicios de la construcción UNIDAD EJECUTORA: 0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA:4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreacion y deporte PRODUCTO: 4301010-Parques recreativos construidos y dotados CPC:5327-instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento META:9-Construccion y Dotación de 2 parques Recreativos ACTIV:91-Contruir y Dotar Gimnasios Recreativos Infantiles PROYECTO: 2023004410136-CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA-MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNIÓN FAMILIAR- VEREDA HORNITOS- MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:1-50103-rb recursos propios PROPIOS-EXCEDENTES F 2022		\$ 141.746.627,00	2024

PROYECTO PRESUPUESTAL:	Número: 2024000506	VALOR	VIGENCIA
Construcción y servicios de la construcción UNIDAD EJECUTORA: 0-General SECTOR:43-DEPORTE Y RECREACIÓN PROGRAMA:4301-Fomento a la recreación, la actividad física y el deporte para desarrollar entornos de convivencia y paz SUBPROGRAMA: 1604-Recreacion y deporte PRODUCTO: 4301010-Parques recreativos construidos y dotados CPC:5327-instalaciones al aire libre para deportes y esparcimiento META:9-Construccion y Dotación de 2 parques Recreativos ACTIV:91-Contruir y Dotar Gimnasios Recreativos Infantiles PROYECTO: 2023004410123-CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA-MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNIÓN FAMILIAR- VEREDA VEGA DE ORIENTE- MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA FUENTE:1-50103-rb recursos propios PROPIOS-EXCEDENTES F 2022		\$ 70.873.313,50	2024

4.4. RELACION DE POLIZAS DE GARANTIAS

ASEGURADORA						
ASEGURADORA	No.	ENDOZ O	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
		0	23/11/2023	Cumplimiento del contrato	22/11/2023	22/08/2024

	FORMATO			CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA			VERSIÓN	1
				VIGENCIA	junio 2024

POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0	61-44-101051955			Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	22/11/2023	22/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/11/2023	22/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 0	61-40-101018914	0	23/11/2023	Predios labores y operaciones	22/11/2023	22/02/2028
				Contratistas y Subcontratistas	22/11/2023	22/02/2024
				Responsabilidad civil patronal	22/11/2023	22/02/2024
POLIZAS- ANULACIÓN CERTIFICADO PARA ACTUALIZACION ACTA DE INICIO						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1 ANULACIÓN	61-44-101051955	1	07/12/2023	Cumplimiento del contrato	22/11/2023	22/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	22/11/2023	22/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/11/2023	22/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 1 - ANULACIÓN	61-40-101018914	1	07/12/2023	Predios labores y operaciones	22/11/2023	22/02/2024
				Contratistas y Subcontratistas	22/11/2023	22/02/2024
				Responsabilidad civil patronal	22/11/2023	22/02/2024
POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – ACTA DE INICIO						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 2 - ACT. VIGENCIAS ACTA DE INICIO	61-44-101051955	2	07/12/2023	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	30/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/11/2023	30/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/11/2023	02/03/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
PÓLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 2 – ACT. VIGENCIAS ACTA DE INICIO	61-40-101018914	2	07/12/2023	Predios labores y operaciones	30/11/2023	01/03/2024
				Contratistas y Subcontratistas	30/11/2023	01/03/2024
				Responsabilidad civil patronal	30/11/2023	01/03/2024
POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3 - ACT. VIGENCIAS ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO	61-44-101051955	3	07/06/2024	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	10/02/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/11/2023	10/02/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/11/2023	10/08/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
		0	07/06/2024	Predios labores y operaciones	07/05/2023	10/08/2024

	FORMATO				CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA				VERSIÓN	1
					VIGENCIA	junio 2024

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 0 – ACT. VIGENCIAS ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO	61-40-101019855			Contratistas y Subcontratistas	07/05/2023	10/08/2024
				Responsabilidad civil patronal	07/05/2023	10/08/2024
POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – OTROSI No. 3						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 4 - ACT. VIGENCIAS OTROSI No. 3	61-44-101051955	4	12/08/2024	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	10/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/11/2023	10/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/11/2023	10/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 1 – ACT. VIGENCIAS OTROSI No. 3	61-40-101019855	1	12/08/2024	Predios labores y operaciones	07/05/2023	10/09/2024
				Contratistas y Subcontratistas	07/05/2023	10/09/2024
				Responsabilidad civil patronal	07/05/2023	10/09/2024

5. DESIGNACIÓN APOYO A LA SUPERVISIÓN

- El día 22 de noviembre del 2023, la ingeniera **NATALIA BUSTOS BOTERO** es designado mediante oficio por la Director del INDERHUILA **MIGDONIA PATIÑO ARIAS**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CMCIH414 DE 2023** cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA". mediante proceso precontractual de selección de Contratación mínima cuantía No. IPMCIH008-2023.
- El día 10 de julio del 2024, el arquitecto **YOVANY PEÑA FIERRO** es designado mediante oficio por la Director del INDERHUILA **FELIPE VICTORIA BARRAGAN**, como apoyo a la supervisión del contrato de Interventoría No. **CMCIH414 DE 2023** cuyo objeto es la "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA". mediante proceso precontractual de selección de Contratación mínima cuantía No. IPMCIH008-2023.

6. ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

Dentro de las actividades desarrolladas se tiene las siguientes:

	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	junio 2024

- ✓ Acta de comité de obra el 01 de agosto de 2024 - SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE OBRA localización y replanteo de áreas faltantes que corresponden a pedestales, cuneta, rampas, zona verde del parque infantil de la Vereda Hornitos del Municipio de Isnos.
- ✓ Acta de comité de obra el 09 de agosto de 2024 – Seguimiento de obra en las vigas de cimentación con acero de refuerzo para el parque infantil de la Vereda la Vega de Oriente del Municipio de Campoalegre
- ✓ Acta de comité de obra el 16 de agosto de 2024 – SEGUIMIENTO AVANCE DE OBRA.
- ✓ Acta de comité de obra el 19 de agosto de 2024 – AVANCE DE OBRA, SEGUIMIENTO Y VERIFICACIÓN DE OBRA localización de pedestales, acero de refuerzo para el parque infantil de la Vereda la Vega de Oriente del Municipio de Campoalegre
- ✓ Acta de comité de obra el 26 de agosto de 2024 – AVANCE DE OBRA, sustentación para suspensión de obra.

7. DESCRIPCIÓN DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA / INTERVENTORIA

- Por el momento se tiene avance de ejecución del parque de la Vereda la Vega de Oriente del Municipio de Campoalegre – Huila en el presente periodo del mes de septiembre es del 0,55% y avance acumulado es del 46,53%
- Por el momento se tiene avance de ejecución del parque de la Vereda Hornitos del Municipio de Isnos – Huila en el presente periodo del mes de septiembre es del 0,55% y avance acumulado es del 46,53%.
- Por el momento se tiene avance de ejecución general es del mes de septiembre es del 0,55% y el avance acumulado general es del 46,53%

7.1 AVANCE DE OBRAS Y TRABAJOS

"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA"

En el presente lapso del informe, establecido desde el 01 AL 3 DE SEPTIEMBRE DE 2024, de ejecutaron las siguientes obras:

- Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.

"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA"

- Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.

8. ANEXO REGISTRO FOTOGRAFICO

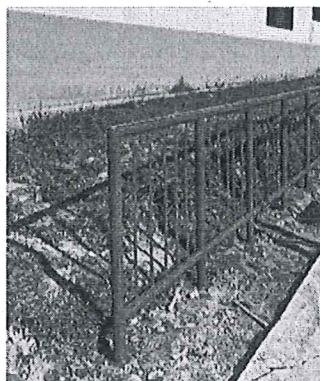
547


	FORMATO		CODIGO	PM-GID-F01
	INFORME DE SUPERVISIÓN CONTRATOS DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA		VERSIÓN	1
			VIGENCIA	junio 2024

BARANDA METÁLICA EN TUBO DE 2" - PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE
EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE



BARANDA METÁLICA EN TUBO DE 2" - PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE
CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS



			
Ato. YOVANY PEÑA FIERRO		(09/092024)	
FIRMA ORIGINAL APOYO A LA SUPERVISIÓN		FIRMA ORIGINAL Vo.Bo CONTRATISTA GESTIÓN INFRAESTRUCTURA	

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderrhuila.gov.co - atencionusuario@inderrhuila.gov.co
Neiva-Huila

548

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: IDH-CGID-F06	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2
		Página 1 de 29

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CMCIH414 DE 2023

INFORME DE INTERVENTORIA No. 5

MENSUAL

☒

FINAL

☐

Objeto Contrato: INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNIOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA.

OBJETO: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA.

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA: N° CSAMCIH435 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - INDERHUILA Y EL CONSORCIO DANES - HC

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO DANES - HC
VALOR DE LA OBRA: \$141.746.627,00

CONTRATISTA DE INTERVENTORIA:
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
VALOR DE LA INTERVENTORIA: \$17.343.270,00

FECHA DE INICIO: 30 DE NOVIEMBRE 2023
FECHA DE TERMINACIÓN: 29 DE FEBRERO DE 2024





MUNICIPIO: CAMPOALEGRE - ISNOS

DEPARTAMENTO: HUILA

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	Informe de Interventoria	Versión: 2 Página 2 de 29

CONTRATO DE (INTERVENTORIA) No. CMCIH414 DE 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPORTIVO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA

APOYO A LA SUPERVISIÓN	ARQ. YOVANY PEÑA FIERRO	ENTIDAD	INDERHUILA
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.	CMCIH414 DE 2023		
OBJETO	INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL, Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE VEREDA HORNITOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA"	PERIODO DEL INFORME	Del 01 al 3 septiembre del 2024
CONTRATISTA	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	NIT:	7.711.430-0
REPRESENTANTE LEGAL:	FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA	C.C:	7.711.430
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	17 de noviembre de 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	30 de noviembre de 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 (D/M/A):	28 de diciembre de 2023		
FECHA DE REINICIO N°1 (D/M/A):	05 de junio de 2024		
PLAZO INICIAL	TRES (03) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	Un (1) mes		
PLAZO TOTAL:	El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
VALOR INICIAL:	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (\$17.343.270,00) M/CTE		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):			
VALOR TOTAL:	DIECISIETE MILLONES TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL DOSCIENTOS SETENTA PESOS (\$17.343.270,00) M/CTE		
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA			
CONTRATO DE OBRA No.	CSAMCIH435 de 2023		

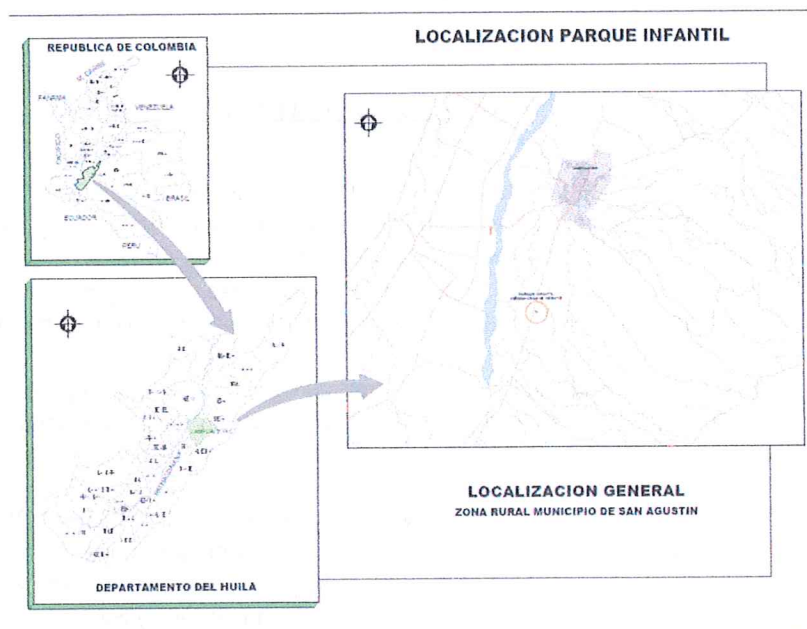
	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2 Página 3 de 29
Fecha Aprobación: 13/02/2023			

OBJETO:	"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA".		
CONTRATISTA	CONSORCIO DANES – HC	NIT:	901.774.192 - 5
REPRESENTANTE LEGAL:	DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA	C.C:	1.079.182.594
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):	22 de noviembre de 2023		
FECHA DE INICIO (D/M/A):	30 de noviembre de 2023		
FECHA DE SUSPENSIÓN N°1 (D/M/A):	28 de diciembre de 2023		
FECHA DE REINICIO N°1 (D/M/A):	05 de junio de 2024		
PLAZO INICIAL	El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de TRES (3) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	Un (1) Mes		
PLAZO TOTAL:	El plazo estimado para la ejecución del Contrato será de CUATRO (4) MESES, contados a partir de la suscripción del acta de inicio.		
VALOR INICIAL:	\$ 283.493.254,00		
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):			
VALOR TOTAL:	\$ 283.493.254,00		

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en dos Municipios del Departamento del Huila

- Ubicación: VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE
 Campoalegre ubicado en el centro del Departamento del Huila
 Vereda la Vega de Oriente ubicado al sur km 5 del casco urbano del Municipio de Campoalegre

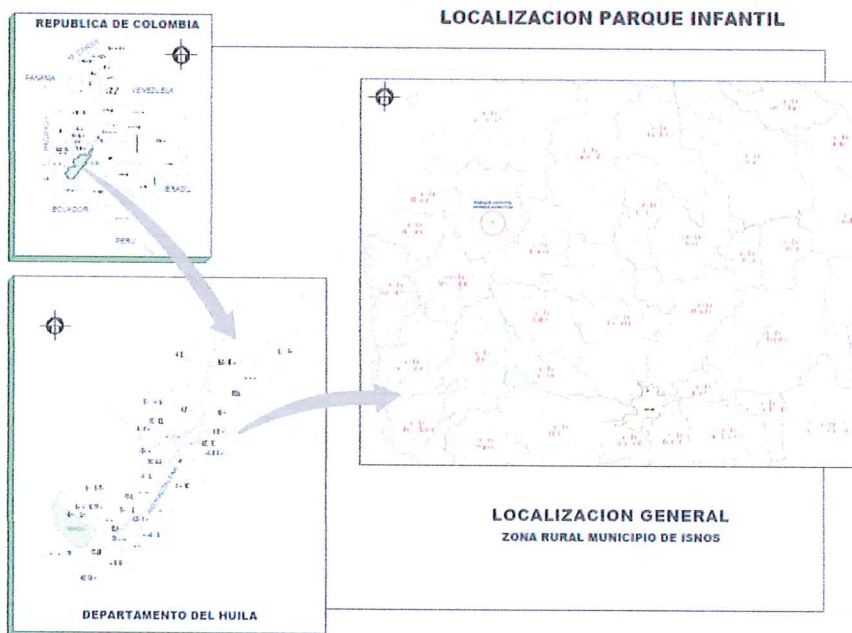


- Ubicación: VEREDA HORNITOS DE MUNICIPIO DE ISNOS

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Informe de Interventoria	Código: IDH-CGID-F06 Versión: 2 Página 4 de 29
Fecha Aprobación: 13/02/2023		

Isnos ubicado en el sur del Departamento del Huila

Vereda hornitos ubicado al sur Huila a 10 km del casco urbano del Municipio de Isnos.



4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto consta de la construcción de dos (2) parques infantiles, uno en la Vereda la Vega de Oriente del Municipio de Campoalegre, y el segundo parque ubicado en la Vereda Hornitos del Municipio de Isnos, los parques infantiles contemplan actividades de localización y replanteo, excavaciones para la conformación de vigas de cimentación, para mejoramiento del terreno con recebo seleccionado para cunetas, zonas verdes y pedestales para juegos infantiles y baranda perimetral también dentro de su alcance contempla el relleno en recebo seleccionado compactado en capas horizontales de 15 cm

Dentro del proyecto encontramos solado de limpieza en áreas de vigas de cimentación y áreas de los pedestales de anclaje de juegos infantiles, también el parque contempla actividades de acero en varilla 3/8" para vigas de cimentación, placa de contrapiso, pedestales para mobiliario de juegos infantiles y pedestales para baranda perimetral

Otras de las actividades del proyecto, se encuentra vigas de cimentación de 0.25m x 0.25 m de sección ubicadas en los extremos de la placa de contrapiso en sentido longitudinal, también encontramos una placa de contrapiso con espesor de 12 cm en un área de 7 metros de ancho por 15 metros de largo, dicha placa contempla acabado en pintura en acrílico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie cuyos colores van según diseño y figuras.

Contemplamos unas cunetas en forma de V cubriendo el área de la placa para recoger las aguas lluvia, estas cunetas se caracterizan por tener una dimensión de 0.40 m x 15 m y otra en el lateral derecho de dimensión de 0.40 m x 15 m.

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: IDH-CGID-F06	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2
		Página 5 de 29

Para proteger las zonas verdes se tendrá una baranda metálica en tubo de 2" que incluye anticorrosivo y pintura con una longitud de 46,17 ml.

Las zonas verdes están ubicadas al rededor del parque infantil en las cuales se plantarán en tierra negra tipos de plantas como lo son: Ornamentales durantas, plantas Ixoras y Bismarckia.

En el parque infantil está ubicada una rampa en concreto de 3.000 PSI con una longitud de 2.00 m x 5.00 m y un espesor de 0.10 m, esta rampa esta reforzada con malla electrosoldada y nos dará acceso a 7 juegos infantiles que constan de: circuito de juego, modulo recreativo, carrusel, columpio inclusivo, triqui inclusivo, ábaco inclusivo y módulo de piano inclusivo.

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS

En el presente lapso del informe, establecido desde el 01 al 3 de septiembre de 2024, se realizaron las siguientes actividades administrativas:

- Durante el periodo del presente informe se cumplió a cabalidad con las leyes y los reglamentos relativos con la Salud Ocupacional y Seguridad Industrial y tomar todas aquellas precauciones necesarias para evitar que se produzcan en las zonas de sus campamentos de trabajo, accidentes o condiciones insalubres; así como dotar a su personal y asegurar el uso adecuado de los elementos de protección personal (EPP).
- Durante el periodo del presente informe se dio cumplimiento con sus obligaciones laborales respecto del personal a cargo.
- Durante el periodo del presente informe se dio cumplimiento con las obligaciones frente al Sistema de Seguridad Social Integral, así como los propios al Servicio Nacional de Aprendizaje - SENA, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar – ICBF y las Cajas de Compensación Familiar, cuando corresponda, respecto del personal vinculado a la ejecución de la obra
- Durante el periodo se realizó control financiero estricto y exacto de cada una de las obras a ejecutar y controlar el presupuesto de tal manera que no sobre pase el presupuesto pactado por parte y total del contrato.
- Durante el periodo se realizó retiro de los materiales sobrantes y entregar las áreas intervenidas en perfecto estado y limpieza.

En el presente lapso del informe, establecido desde el 01 al 3 de septiembre de 2024, se realizaron las siguientes actividades operativas en el municipio de Isnos:

Las actividades ejecutadas en el periodo son:

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Informe de Interventoría	Código: IDH-CGID-F06 Versión: 2 Página 6 de 29
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	

ACTIVIDADES OPERATIVAS	ACTIVIDADES	CANTIDAD EJECUTADA	MUNICIPIO	
	Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.	3,00 m2	Campoalegre	
	ACTIVIDADES	CANTIDAD EJECUTADA	MUNICIPIO	
	Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.	3,00 m2	Isnos	
<div><div>1. Se realiza la revisión diaria de los avances de la bitácora de obra.</div><div>2. Durante el periodo se realizó seguimiento, supervisión, y control de cada una de las actividades contratadas y programadas, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas descritas en los documentos contractuales, anexo técnico, estudio previos y demás documentos que indican las buenas prácticas en sus procesos constructivos.</div><div>3. Se realizaron los debidos comités de obra.</div><div>4. Se vigilo las actividades realizadas por el contratista.</div><div>5. Se ha presentado los informes mensuales con sus debidos soportes.</div><div>6. Durante el periodo del presente informe se ejecutó la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios.</div><div>7. Durante el periodo del presente informe se da cumplimiento con respecto a la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, aportando los certificados de calidad y fichas técnicas.</div></div>				
6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO				
ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	30 de noviembre de 2023			28 de febrero de 2024
Suspensión No. 1	28 de diciembre de 2023	28 días		
Reiniciación No. 1	05 de junio de 2024		157 días	06 de agosto de 2024

SS/

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: IDH-CGID-F06	
	Versión: 2	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	
	Página 7 de 29	

Otrosí No. 2 – prorroga (1 mes)	02 de agosto de 2024	60 días		06 de septiembre de 2024
TOTAL, DIAS		88 días	157 días	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
Suscripción del contrato	1	17 de noviembre de 2023
Acta de inicio	1	30 de noviembre de 2023
Acta de justificación de suspensión	1	28 de diciembre de 2023
Acta de suspensión	1	28 de diciembre de 2023
Acta de Justificación de reinicio	2	05 de junio de 2024
Acta de reinicio No. 1	1	05 de junio de 2024
Acta de Justificación No. 3 modificar la Cláusula 4 -Plazo- cambio de vigencia	3	12 de junio de 2024
Otrosí No. 1 modificación clausula 4 -plazo del contrato-cambio de vigencia	1	12 de junio de 2024
Acta de Justificación No. 4 Prorroga y alcance de obra	4	23 de julio de 2024
Otrosí modificadorio N°2	2	2 de agosto del 2024

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO
(Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). Obligaciones de Carácter General.	<ol style="list-style-type: none"> Todas las actividades de obra se han ejecutado con los materiales, equipos, herramientas, mano de obra y transportes, acordes a los precios y la propuesta presentada por el contratista, para prueba de ello se tienen los informes mensuales, los ensayos de laboratorio, el registro fotográfico, entre otros. El contratista hasta la fecha está cumpliendo con la programación de obra. Se he realizado la entrega de documentación en papel reciclado. Se realizó los pagos de honorarios y/o salarios, parafiscales y se dio cumplimiento a las normas de afiliación y pago de seguridad social (Salud, Pensión y riesgos), que corresponden de acuerdo con el personal que se empleó. La interventoría cuenta con oficina en la carrera 4# 9-25 oficina 507
b). Actividades Administrativas.	<ol style="list-style-type: none"> Se verifica el personal del contratista de obra, tiempo de dedicación y se solicita al contratista los pagos de seguridad social los cuales se presentaran en el informe mensual de interventoría. <p>Se realiza control y seguimiento del personal que ejecuta la obra</p>

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 8 de 29

	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE PERSONAL	CARGO						
	Diego Armando Hernández Leiva	Director de Obra						
	Stephany Castro Sierra	Residente de Obra 1 (Campoalegre)						
	Jaime Mauricio Soto Andrade	Residente de Obra 2 (Isnos)						
	Rodolfo Hurtado Sierra	Maestro						
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE EQUIPOS	En este periodo se utilizó el equipo de soldadura						
	CONTROL Y SEGUIMIENTO DE MATERIALES	Solo se han realizado actividades de suministro e instalación de baranda						
	CONTROL Y SEGUIMIENTO A PORTES DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL	PLANILLA RELACIONADA- HC INGENIERIA Y CONSTRUCCIÓN INTEGRAL SAS (Consortiado) NRO. DE PLANILLA 31334837 PENSION: \$ 624.000 SALUD: \$ 156.000 ARL: \$ 187.800 CCF: \$ 156.000 Periodo pagado: 2024-09 Fecha de pago: 2024/10/17 PLANILLA RELACIONADA- DANES INGENIEROS SAS (Consortiado) NRO. DE PLANILLA 9476236651 PENSION: \$ 416.000 SALUD: \$ 104.000 ARL: \$ 97.300 CCF: \$ 104.000 Periodo pagado: 2024-09 Fecha de pago: 2024/10/29						
c). Actividades Operativas.	En el presente lapso del informe, establecido desde el 01 al 31 de agosto de 2024, se realizaron las siguientes actividades operativas: <table border="1" data-bbox="493 1497 1417 1768"> <thead> <tr> <th>ACTIVIDADES</th><th>CANTIDAD EJECUTADA</th><th>MUNICIPIO</th></tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.</td><td>3,00 m2</td><td>Campoalegre</td></tr> </tbody> </table>		ACTIVIDADES	CANTIDAD EJECUTADA	MUNICIPIO	Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.	3,00 m2	Campoalegre
ACTIVIDADES	CANTIDAD EJECUTADA	MUNICIPIO						
Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.	3,00 m2	Campoalegre						

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2 Página 9 de 29
Fecha Aprobación: 13/02/2023			

	ACTIVIDADES	CANTIDAD EJECUTADA	MUNICIPIO
	Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.	3,00 m2	Isnos
d). Actividades Logísticas.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realiza la revisión diaria de los avances de la bitácora de obra. 2. Durante el periodo se realizó seguimiento, supervisión, y control de cada una de las actividades contratadas y programadas, cumpliendo a cabalidad con las especificaciones técnicas descritas en los documentos contractuales, anexo técnico, estudio previos y demás documentos que indican las buenas prácticas en sus procesos constructivos. 3. Se realizaron los debidos comités de obra. 4. Se vigilo las actividades realizadas por el contratista. 5. Se ha presentado los informes mensuales con sus debidos soportes. 6. Durante el periodo del presente informe se ejecutó la obra con todos los equipos, maquinaria, herramientas, materiales y los demás elementos necesarios. 7. Durante el periodo del presente informe se da cumplimiento con respecto a la calidad de los materiales y elementos utilizados para el cumplimiento del objeto del contrato, aportando los certificados de calidad y fichas técnicas. 		
e). Obligaciones de Carácter Ambiental.	Se realizo seguimiento y control al plan de manejo ambiental.		
f). Actividades Financieras.	Se realizo el control y seguimiento a la inversión del anticipo realizada el 17 de junio de 2024 y acta parcial N°1.		
g). Actividades Jurídicos.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Se realiza seguimiento a pólizas y garantías 		

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2 Página 10 de 29

POLIZAS INICIALES						
ASEGURADORA						
ASEGURADORA	No.	ENDOZ O	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	HASTA (dd/mm/aaaa)
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 0	61-44- 1010519 55		23/11/2023	Cumplimiento del contrato	22/11/2023	22/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	22/11/2023	22/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/11/2023	22/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 0	61-40- 1010189 14		23/11/2023	Predios labores y operaciones	22/11/2023	22/02/2028
				Contratistas y Subcontratistas	22/11/2023	22/02/2024
				Responsabilidad civil patronal	22/11/2023	22/02/2024
POLIZAS- ANULACIÓN CERTIFICADO PARA ACTUALIZACION ACTA DE INICIO						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 1 ANULACIÓN	61-44- 1010519 55		07/12/2023	Cumplimiento del contrato	22/11/2023	22/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	22/11/2023	22/08/2024
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 1 - ANULACIÓN	61-40- 1010189 14		07/12/2023	Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	22/11/2023	22/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
				Predios labores y operaciones	22/11/2023	22/02/2024
				Contratistas y Subcontratistas	22/11/2023	22/02/2024
				Responsabilidad civil patronal	22/11/2023	22/02/2024
POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – ACTA DE INICIO						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 2 - ACT. VIGENCIAS ACTA DE INICIO	61-44- 1010519 55		07/12/2023	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	30/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/11/2023	30/08/2024
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/11/2023	02/03/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 2 – ACT. VIGENCIAS ACTA DE INICIO	61-40- 1010189 14		07/12/2023	Predios labores y operaciones	30/11/2023	01/03/2024
				Contratistas y Subcontratistas	30/11/2023	01/03/2024
				Responsabilidad civil patronal	30/11/2023	01/03/2024

553

 Fecha Aprobación: 13/02/2023	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2
			Página 11 de 29

POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 3 - ACT. VIGENCIAS ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO	61-44-101051955	3	07/06/2024	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	10/02/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/11/2023	10/02/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/11/2023	10/08/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 0 – ACT. VIGENCIAS ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO	61-40-101019855	0	07/06/2024	Predios labores y operaciones	07/05/2023	10/08/2024
				Contratistas y Subcontratistas	07/05/2023	10/08/2024
				Responsabilidad civil patronal	07/05/2023	10/08/2024
POLIZAS ACTUALIZACIÓN VIGENCIAS – OTROSI No. 1						
POLIZA DE CUMPLIMIENTO ANEXO 4 - ACT. VIGENCIAS OTROSI No. 3	61-44-101051955	4	12/08/2024	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	10/03/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/11/2023	10/03/2025
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	30/11/2023	10/09/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	5 AÑOS A PARTIR DEL RECIBO FINAL DE LA OBRA	
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL ANEXO 1 – ACT. VIGENCIAS OTROSI No. 3	61-40-101019855	1	12/08/2024	Predios labores y operaciones	07/05/2023	10/09/2024
				Contratistas y Subcontratistas	07/05/2023	10/09/2024
				Responsabilidad civil patronal	07/05/2023	10/09/2024

1. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

SEPTIEMBRE

El tiempo en septiembre en Campoalegre Colombia

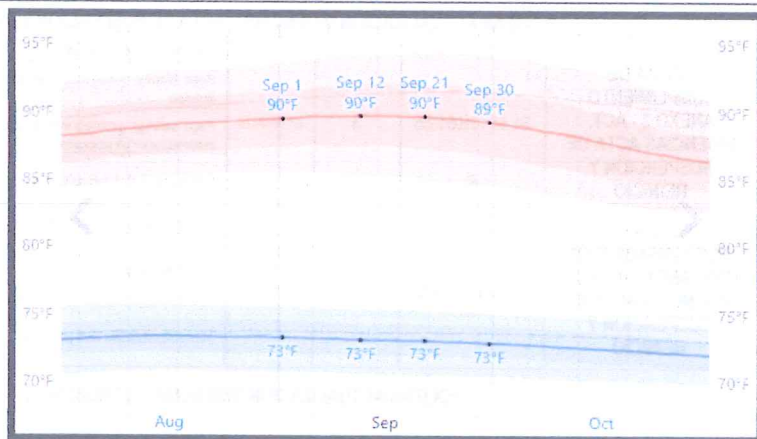
Las temperaturas máximas diarias rondan los 90 °F, y rara vez bajan de los 85 °F o superan los 94 °F. La temperatura máxima promedio diaria más alta es de 90 °F el 15 de septiembre.

Las temperaturas mínimas diarias rondan los 73 °F, rara vez bajan de los 70 °F o superan los 76 °F.

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	Informe de Interventoría		Versión: 2 Página 12 de 29

Fecha Aprobación:
13/02/2023

Informe de Interventoría



Fuente: [Web Wheather Spark](#)

Temperatura media máxima y mínima en septiembre en Campoalegre

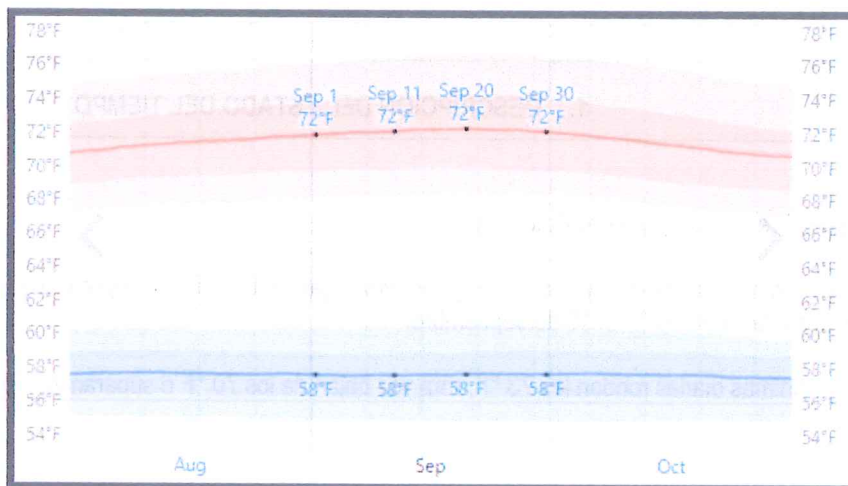
HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA

SEPTIEMBRE

Las temperaturas máximas diarias rondan los 72 °F, y rara vez bajan de los 68 °F o superan los 77 °F. La temperatura máxima promedio diaria más alta es de 72 °F el 21 de septiembre.

Las temperaturas mínimas diarias rondan los 58 °F, rara vez bajan de los 55 °F o superan los 61 °F.

Temperatura media máxima y mínima en septiembre en Isnos



Fuente: [Web Wheather Spar](#)

554

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	Página 13 de 29

2. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO								
Tipo Prueba de Laboratorio		Resistencia concreto			Relación volumétrica concreto			
Diseños de mezcla para los concretos.		3000 PSI			CEMENTO= 360,7 AGREGADO FINO= 894 AGREGADO GRUESO= 894 AGUA= 202			
Compresión simple al concreto.		Resultado resistencia a la compresión simple: fecha de toma de muestra: 15 de agosto de 2024 7 días - 22/08/2024= 3228 PSI			CEMENTO= 360,7 AGREGADO FINO= 894 AGREGADO GRUESO= 894 AGUA= 202			
Ensayo de compactación de campo		Cumple % de compactación=96,3 placa margen derecha % de compactación=96,3 placa margen izquierda			No aplica			
NOTA: Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Artículo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.								
Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por la INTERVENTORÍA								
DESCRIPCIÓN (Placa)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
INFORME LABORATORIO RESISTENCIA DE ESPECÍMENES DE CONCRETO	14/08/2024	21/08/2024	3661 PSI			3000 PSI	4834PSI	CUMPLE
		21/08/2024		4129				
		28/08/2024			4834			
		11/09/2024						
ENSAYO DE DENSIDADES Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA NORMA INVIAS I.N.V.E - 161 – 13	06/08/2024	06/08/2024	NO APLICA			COMPACTACIÓ N MINIMA 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	% de compactación=9 7,5 placa margen derecha % de compactación=9 7,4 placa margen izquierda	CUMPLE

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: IDH-CGID-F06	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	
		Versión: 2
		Página 14 de 29

(PROCTOR MODIFICADO DE COMPACTACION I.N.V. E- 142- 13)	06/08/2024	06/08/2024	NO APLICA	COMPACTACIÓN MINIMA 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	% de compactación=9 7,5 placa margen derecha % de compactación=9 7,4 placa margen izquierda	CUMPLE
--	------------	------------	-----------	--	--	--------

Control Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por el CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN (Zapata, Viga Cimentación, Columna, Viga canal, Placa, Andén, Muro concreto ciclópeo, Cuneta)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
INFORME LABORATORIO RESISTENCIA DE ESPECÍMENES DE CONCRETO	15/08/2024	22/08/2024	3228	PSI		3000 PSI		CUMPLE
		05/09/2024						
		12/09/2024						
		12/09/2024						
ENSAYO DE DENSIDADES Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA NORMA INVIAS I.N.V.E - 161 – 13	09/08/2024	09/08/2024	NO APLICA			COMPACTACIÓN MINIMA 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	% de compactación=9 6,3 placa margen derecha % de compactación=9 6,3 placa margen izquierda	CUMPLE
(PROCTOR MODIFICADO DE COMPACTACION I.N.V. E- 142- 13)	09/08/2024	09/08/2024	NO APLICA			COMPACTACIÓN MINIMA 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	% de compactación=9 6,3 placa margen derecha % de compactación=9	CUMPLE

55

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2
			Página 15 de 29
Fecha Aprobación: 13/02/2023			

					6,3 placa margen izquierda	
--	--	--	--	--	----------------------------------	--

RESULTADO DE ENSAYO Y PRUEBAS DE LABORATORIO - PARQUE DE LA VEREDA LA VEGA DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE

DESCRIPCIÓN (Placa)	FECHA TOMA DE MUESTRA (dd/mm/aaaa)	FECHA ROTURA (dd/mm/aaaa)	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
			7	14	28			
INFORME LABORATORIO RESISTENCIA DE ESPECÍMENES DE CONCRETO	14/08/2024	21/08/2024	3080 PSI			3000 PSI	3080 PSI	CUMPLE
		21/08/2024						
		28/08/2024						
		11/09/2024						
ENSAYO DE DENSIDADES Y PESO UNITARIO EN EL TERRENO METODO DEL CONO Y ARENA NORMA INVIAS I.N.V.E - 161 - 13	06/08/2024	06/08/2024	NO APLICA			COMPACTACIÓ N MINIMA 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	% de compactación=9 7,5 placa margen derecha % de compactación=9 7,4 placa margen izquierda	CUMPLE
(PROCTOR MODIFICADO DE COMPACTACION I.N.V. E- 142- 13)	06/08/2024	06/08/2024	NO APLICA			COMPACTACIÓ N MINIMA 95% DEL PROCTOR MODIFICADO	% de compactación=9 7,5 placa margen derecha % de compactación=9 7,4 placa margen izquierda	CUMPLE

3. CONTROL DE ANTICIPO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
Valor Anticipo (25%)	17 de junio de 2024	\$ 70.873.313,5	\$ 0,00	\$ 70.873.313,5
Acta Parcial No. 1	15 de agosto de 2024	\$ 47.865.725,00	\$ 11.966.431,25	\$ 35.899.293,75
Acta Parcial No. 2	23 de agosto de 2024	\$ 47.616.689,00	\$ 11.904.172,25	\$ 35.712.516,75

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023			Página 16 de 29

Acta Parcial No. 3		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Acta Recibo Final No.4		\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$ 283.493.254,00	\$ 0,00	\$ 283.493.254,00	\$ 95.482.414,00	\$ 188.010.840,00

4. COMITES DE OBRA		
Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
01/08/2024	VEREDA HORNITOS – ISNOS	Seguimiento y verificación de obra, socialización, análisis y aprobación de los motivos por el cual se solicita suspensión no. 2 al contrato de obra.

5. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS			
TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por Inderhuila)	FORMATO (Físico/Digital)
Solicitud de suspensión No. 2	03/09/2024	N/A	Digital
Copia bitácora de obra (periodo del (01/09/2024) al (03/09/2024))	29/09/2024	N/A	Físico

6. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoria)			
NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
FAIVER EDUARDO PERDOMO (R.L)	7.711.430	REPRESENTANTE LEGAL	PRESTACIÓN DE SERVICIO
DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	1.075.227.937	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	PRESTACIÓN DE SERVICIO

7. RELACIÓN DE PAGOS		
TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA
N/A	N/A	N/A

8. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL						
PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
FAIVER EDUARDO PERDOMO	\$562.900	\$439.800	\$85.700	\$	\$	7946333616

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2 Página 17 de 29
Fecha Aprobación: 13/02/2023			

DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	\$208.000	\$162.500	\$31.700	\$	\$	9475474260
-----------------------------------	-----------	-----------	----------	----	----	------------

9. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010832	0 1	20-11-2023 05-12-2023	Cumplimiento del contrato	17/11/2023	17/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	17/11/2023	17/02/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	17/02/2024	17/02/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	N/A	

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002178	0 1	20-11-2023 05-12-2023	17-11-2023	17-02-2024

Póliza actualizada x ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010832	2	05-12-2023	Cumplimiento del contrato	30/11/2023	30/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	30/11/2023	02/03/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	01/03/2024	02/03/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	N/A	

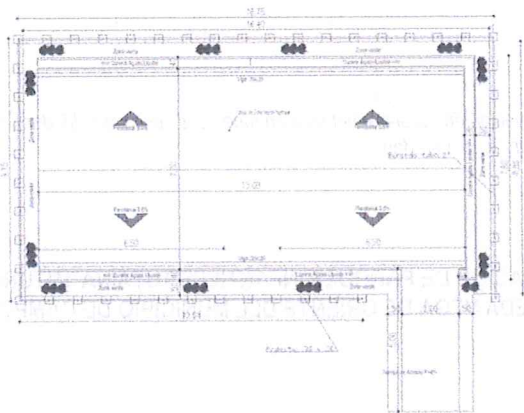
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2
			Página 18 de 29
Fecha Aprobación: 13/02/2023			

					(dd/mm/aaa aaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002178	2	05-12-2023	30/11/2023	01/03/2024
Póliza actualizada x ACTA DE REINICIO:					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA
					DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010832	3	07-06-2024	Cumplimiento del contrato	05/06/2024 11/02/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo	05/06/2024 11/08/2027
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	11/08/2024 11/08/2029
				Estabilidad y Calidad de Obras	N/A
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002178	3	07-06-2024	30/11/2023	11/08/2024
Póliza actualizada x PRORROGA No. 1					
POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA
					DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010832	4	12-08-2024	Cumplimiento del contrato	02/08/2024 11/03/2025
				Prestaciones sociales	05/08/2024 11/09/2027
				Calidad del servicio	11/09/2024 11/09/2029
POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)					
ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100002178	4	12-08-2024	30/11/2024	11-09-2024

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 19 de 29

<p align="center">10. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (Describir el contenido del plano)</p>
<p align="center">"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA HORNIOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA</p> <div align="center">  </div> <p><i>Ilustración No. 1 – vista de planta de la actividad de construcción de pedestales en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI de 30*30 altura 40 cm, para soportar barandas perimetrales. Incluye (4 pernos $\phi 1/2"$ L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad.</i></p> <div align="center">  </div> <p><i>Ilustración No. 2 – detalles de la actividad de construcción de pedestales en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI de 30*30 altura 40 cm, para soportar barandas perimetrales. Incluye (2 pernos $\phi 1/2"$ L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad.</i></p>

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Informe de Interventoría	Código: IDH-CGID-F06 Versión: 2 Página 20 de 29
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	

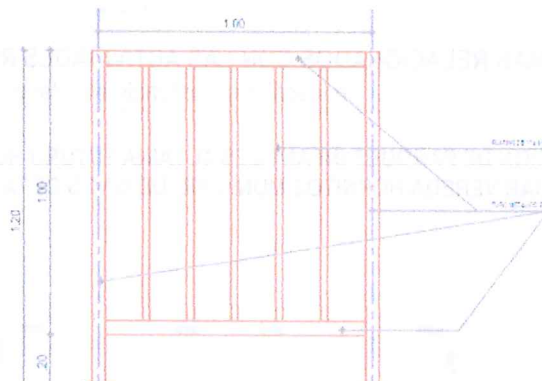


Ilustración No. 3 –Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.

"CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE DEL MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA

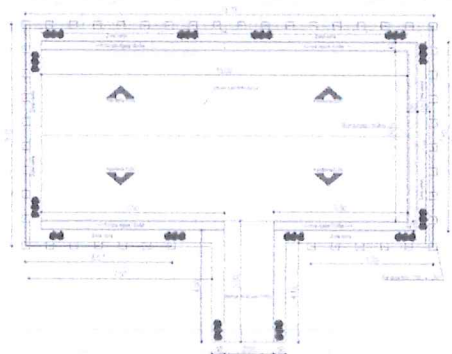


Ilustración No. 29 – vista de planta de la actividad de construcción de pedestales en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI de 30*30 altura 40 cm, para soportar barandas perimetrales. Incluye (4 pemos ø1/2" L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad.

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 21 de 29

Fecha Aprobación:
13/02/2023




Ilustración No. 30 – detalles de la actividad de construcción de pedestales en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI de 30*30 altura 40 cm, para soportar barandas perimetrales. Incluye (2 pernos $\phi 1/2"$ L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad.

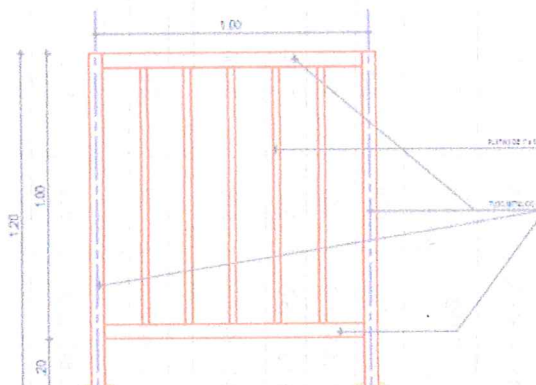


Ilustración No. 32 –Suministro e instalacion de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.



SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

INFORME DE INTERVENTORIA

Código: IDH-CGID-F06
Version: 2
Página 22 de 29

Fecha Aprobación:
13/02/2023

11.1 DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS – PARQUE DE LA VEREDA LA VEGA MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE												
CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR/UNITARIO	VR/TOTAL	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION	CANT	VR/TOTAL	% EJECUCION	
1	PRELIMINARES											
1.01	Localización y replanteo.	M2	160,85	\$ 3.584,00	\$ 576.486,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	160,85	\$ 576.486,00	100,00%	
2	MOVIMIENTO DE TIERRA											
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	68,90	\$ 46.338,00	\$ 3.192.688,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	68,90	\$ 3.192.688,00	100,00%	
2.02	Relleno en rebase seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	45,20	\$ 84.460,00	\$ 3.817.592,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	45,20	\$ 3.817.592,00	100,00%	
3	CIMENTACIÓN											
3.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mls	M2	5,91	\$ 34.260,00	\$ 202.477,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	5,91	\$ 202.477,00	100,00%	
3.02	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	2,29	\$ 636.912,00	\$ 1.458.529,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	2,29	\$ 1.458.529,00	100,00%	
3.03	Acero de refuerzo Fy=60 000 P.S.I	KG	948,00	\$ 7.782,00	\$ 7.377.336,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	948,00	\$ 7.377.336,00	100,00%	
NP 3.04	Suministro e instalación de platina para pedestal de juego (incluye 4 pernos ø1/2" L=0.55 con arandela, tuerca y platina .25x.25 e=1/4")	UND	24,00	\$ 152.519,00	\$ 3.660.456,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	24,00	\$ 3.660.456,00	100,00%	
4	ZONA VERDE											
4.01	Jardines perimetrales	M2	27,30	\$ 89.591,00	\$ 2.445.834,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%	
5	PLACA DE CONTRAPISO											
5.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts. incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2.35X6 15X15 4mm	M2	10,00	\$ 84.639,00	\$ 846.390,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	10,00	\$ 846.390,00	100,00%	
5.02	Pintura en acrílico antideslizante base agua, resistente a la abrasión. intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.	M2	115,00	\$ 24.055,00	\$ 2.766.325,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%	
5.03	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	35,80	\$ 84.463,00	\$ 3.023.775,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	35,80	\$ 3.023.775,00	100,00%	
NP 5.04	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,12 mts incluye corte de juntas y sello	M2	95,88	\$ 124.233,00	\$ 11.911.460,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	95,88	\$ 11.911.460,00	100,00%	
6	INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES											
6.1	suministro, transporte e instalación de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 7.566.326,00	\$ 7.566.326,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%	



Fecha Aprobación:
13/02/2023

SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Código: IDH-CGID-F06

Versión: 2

Página 23 de 29

INFORME DE INTERVENTORIA

6.2	Suministro, transporte e instalación de módulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 12.887.901,00	\$ 12.887.901,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.03	Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 11.835.634,00	\$ 11.835.634,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.04	Suministro, transporte e instalación de columpio inclusivo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 13.150.968,00	\$ 13.150.968,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.05	Suministro, transporte e instalación de módulo triqui inclusivo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 1.970.630,00	\$ 1.970.630,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.06	Suministro, transporte e instalación de módulo Abaco inclusivo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 4.075.165,00	\$ 4.075.165,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%
6.07	Suministro, transporte e instalación de módulo piano inclusivo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 3.515.621,00	\$ 3.515.621,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
7.01	Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi	M3	2,57	\$ 320.614,00	\$ 823.978,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	2,57	\$ 823.978,00	100,00%
7.02	Baranda metálica en tubo de 2" y platina de 1"x1/8"	ML	0,00	\$ 157.521,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%
NP 7.03	Construcción de pedestales en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI de 30"30 altura 40 cm, para soportar barandas perimetrales. Incluye (4 pernos ø 1/2" L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad)	UND	47,00	\$ 105.199,00	\$ 4.944.353,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	47,00	\$ 4.944.353,00	100,00%
NP 7.04	Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.	ML	44,17	\$ 208.502,00	\$ 9.626.249,00	3,00	\$ 625.506,00	6,50%	44,17	\$ 9.209.533,00	95,67%
8	TRANSPORTE										
NP 8.01	Transporte de materiales pétreos	M3-KM	1492,74	\$ 1.153,00	\$ 1.721.129,00	0,00	\$ 0,00	6,50%	1492,74	\$ 1.721.129,00	100,00%
	TOTAL, COSTO DIRECTO				\$ 113.397.302,00		\$ 625.506,00			\$ 52.766.182,00	
	Administración	%	20%		\$ 22.679.460,00		\$ 125.101,00			\$ 10.563.236,00	7,45%
	Imprevistos	%	1%		\$ 1.133.973,00		\$ 6.255,00			\$ 527.662,00	0,37%

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa

Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co

Neiva-Huila

559

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06	
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2	
			Página 24 de 29	
Fecha Aprobación: 13/02/2023				

Utilidad		%	4%	\$ 4.535.892,00	\$ 25.020,00	\$ 2.110.647,00	1,49%
TOTAL COSTO				\$ 141.746.627,00	\$ 781.882,00	\$ 65.957.727,00	
% AVANCE DE OBRA						0,55%	46,53%

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.



SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Código: IDH-CGID-F06

Versión: 2

Página 25 de 29

Fecha Aprobación: 13/02/2023

INFORME DE INTERVENTORIA

11.2. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS – PARQUE DE LA VEREDA HORNITOS DEL MUNICIPIO DE ISNOS													
CONDICIONES CONTRACTUALES				EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL				EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA					
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VR/UNITARIO	VRTOTAL	CANT	VRTOTAL	% EJECCION	CANT	VRTOTAL	% EJECCION		
1	PRELIMINARES												
1.01	Localización y replanteo.	M2	160,94	\$ 3.584,00	\$ 576.809,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	160,94	\$ 576.809,00	100,00%		
2	MOVIMIENTO DE TIERRA												
2.01	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	66,66	\$ 46.338,00	\$ 3.088.891,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	66,66	\$ 3.088.891,00	100,00%		
2.02	Relleno en rebase seleccionado y compactado mecánicamente.	M3	39,95	\$ 84.460,00	\$ 3.374.177,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	39,95	\$ 3.374.177,00	100,00%		
3	CIMENTACIÓN												
3.01	Solado en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	5,85	\$ 34.260,00	\$ 200.421,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	5,85	\$ 200.421,00	100,00%		
3.02	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	2,29	\$ 636.912,00	\$ 1.458.528,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	2,29	\$ 1.458.528,00	100,00%		
3.03	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I	KG	948,00	\$ 7.782,00	\$ 7.377.336,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	948,00	\$ 7.377.336,00	100,00%		
NP 3.04	Suministro e instalación de platina para pedestal de juego (incluye 4 pernos ø1/2" L=0.55 con arandela, tuerca y platina .25x.25 e=1/2").	UND	24,00	\$ 162.519,00	\$ 3.660.456,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	24,00	\$ 3.660.456,00	100,00%		
4	ZONA VERDE												
4.01	Jardines perimetrales	M2	27,30	\$ 89.591,00	\$ 2.445.834,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00%	\$ 0,00	0,00%		
5	PLACA DE CONTRAPISO												
5.01	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,10 mts, incluye corte de juntas y sello y Malla electrosoldada 2,35X6 15X15 4mm	M2	10,00	\$ 84.639,00	\$ 846.390,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	10,00	\$ 846.390,00	100,00%		
5.02	Pintura en acrílico antideslizante base agua, resistente a la abrasión, intemperie, con aplicación de tres (03) manos a placa en concreto color según diseño incluye figuras.	M2	115,00	\$ 24.055,00	\$ 2.766.325,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	0,00	\$ 0,00	0,00%		
5.03	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño	ML	35,80	\$ 84.463,00	\$ 3.023.775,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	35,80	\$ 3.023.775,00	100,00%		
NP 5.04	Placa de piso en concreto de 3000 PSI e=0,12 mts incluye corte de juntas y sello	M2	95,88	\$ 124.233,00	\$ 11.911.460,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	95,88	\$ 11.911.460,00	100,00%		
6	INSTALACIONES MOVILES DE LOS PARQUES INFANTILES												

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG			
	Código: IDH-CGID-F06			
	Versión: 2			
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA			
	Página 26 de 29			

6.01	suministro, transporte e instalación de circuito, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 7.566.326,00	\$ 7.566.326,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0	0%
6.2	Suministro, transporte e instalación de modulo recreativo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 12.887.901,00	\$ 12.887.901,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0	0%
6.3	Suministro, transporte e instalación de carrusel (sencilla), según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 11.835.634,00	\$ 11.835.634,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0	0%
6.4	Suministro, transporte e instalación de columpio inclusivo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 13.150.968,00	\$ 13.150.968,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0	0%
6.5	Suministro, transporte e instalación de modulo triqui inclusivo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 1.970.630,00	\$ 1.970.630,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0	0%
6.6	Suministro, transporte e instalación de modulo Abaco inclusivo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 4.075.165,00	\$ 4.075.165,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0	0%
6.7	Suministro, transporte e instalación de modulo plano inclusivo, según especificaciones técnicas e incluye anclajes y cimentación	UND	1,00	\$ 3.515.621,00	\$ 3.515.621,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	\$ 0	0%
7	OBRAS COMPLEMENTARIAS										
7.1	Muro de contención en concreto ciclópeo - 3000 psi	M3	2,61	\$ 320.614,00	\$ 836.803,00	0	0,00	\$ 0,00	2,61	\$ 836.803,00	100,00%
7.2	Baranda metálica en tubo de 2" y platina de 1"x1/8"	ML	0,00	\$ 157.521,00	\$ 0,00	0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00%
NP 7.3	Construcción de pedestales en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI de 30*30 altura 40 cm, para soportar barandas perimetrales. Incluye (2 pernos ø1/2" L=0.40 c/u, con arandela, tuerca y todas las actividades necesarias para correcta ejecución de la actividad)	UND	48,00	\$ 105.199,00	\$ 5.049.552,00	0,00	\$ 0,00	0,00%	48,00	\$ 5.049.552,00	100,00%
NP 7.4	Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thinner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.	ML	47,09	\$ 208.502,00	\$ 9.819.238,00	3,00	\$ 625.506,00	6,37%	45,09	\$ 9.401.355,00	95,74%
8	TRANSPORTE										
NP 8.1	Transporte de materiales pétreos	M3-KM	1699,10	\$ 1.153,00	\$ 1.959.062,00	0,00	0,00	\$ 0,00	1699,10	\$ 1.959.062,00	100,00%
	TOTAL, COSTO DIRECTO				\$ 113.397.302,00	\$ 625.506,00				\$ 52.765.015,00	



INDERHUILA

SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Código: IDH-CGID-F06

Versión: 2

Página 27 de 29

Fecha Aprobación:

13/02/2023

INFORME DE INTERVENTORIA

Administración	%	20%	\$ 22.679.460,00	\$ 125.101,00	\$ 10.553.003,00	5,37%
Imprevistos	%	1%	\$ 1.133.973,00	\$ 6.255,00	\$ 527.650,00	0,27%
Utilidad	%	4%	\$ 4.535.892,00	\$ 25.020,00	\$ 2.110.601,00	1,07%
TOTAL COSTO			\$ 141.746.627,00	\$ 781.882,00	\$ 65.956.269,00	
% AVANCE DE OBRA						
VALOR TOTAL PARQUE INFANTIL ISNOS + PARQUE INFANTIL CAMPOALEGRE			\$ 283.493.254,00	\$ 106.403.625,00		46,53%
% AVANCE DE OBRA TOTAL				0,55%		46,53%

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno

ING. DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA
DIRECTOR DE OBRA


DIEGO MAURICIO POLANIA A.
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionsuuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila

Página 27 de 29

561

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 28 de 29

12. REGISTRO FOTOGRAFICO

PARQUE DE LA VEREDA LA VEGA MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thiner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.	
	
	


PARQUE DE LA VEREDA HORNIOS MUNICIPIO DE ISNOS Suministro e instalación de baranda metálica en tubo de 2", incluye soldadura, thiner, anticorrosivo, pintura y todas las actividades necesarias para la correcta ejecución de la actividad.

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: IDH-CGID-F06	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2
		Página 29 de 29



13. ANEXOS

- BITACORA DE OBRA.
- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP) INTERVENTORIA

	(29/10/2024)	
ING. DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE		ARO YOVANY PEÑA FIERRO
FIRMA ORIGINAL DIRECTOR DE INTERVENTORIA	FECHA DE ENTREGA	FIRMA ORIGINAL Vo.Bo APOYO SUPERVISION



PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



TIPO IDENTIFICACIÓN: NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: FAVIER EDUARDO PERDOMO POJANA		CÉDULA DE CIUDADANÍA: 7711430		NÚMERO PLANILLA: 7946333816		TIPO DE PLANILLA: INDEPENDIENTES	
DIRECCIÓN: CR 49 25 OF 507		DEPARTAMENTO: NEIVA		PERÍODO COTIZACIÓN SALUD: 2024		MES: septiembre	
TELEFONO: 02 INDEPENDIENTE		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 8680020		FECHA PAGO (aammmdd): 2024/10/09		AÑO: 2024	
TIPO EMPRESA: PRIVADA		CLASE APORTANTE: UNICO		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2024/10/09		MORA: \$ 0	
ACTIVIDAD ECONOMICA: ACTIVIDADES DE arquitectura e ingeniería y otras		NÚMERO AUTORIZACIÓN: UNICO		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2024/10/09		MORA: \$ 0	
APORTANTE (CONTRATADO PAGO APORTES SALUD, SEHA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		NÚMERO AUTORIZACIÓN: UNICO		NÚMERO AUTORIZACIÓN: 2024/10/09		MORA: \$ 0	

TOTAL APORTES A PENSIÓN									
APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTAL		TOTAL	
CÓDIGO	EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	COTIZACIÓN	VALOR	APORTES	VALOR	APORTES	VALOR
230201		1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									

TOTAL APORTES A SALUD									
LICENCIA MATERNIIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
CÓDIGO	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	DESCUENTO	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO
230201		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
CÓDIGO	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	DESCUENTO	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO
230201		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTAL	
CÓDIGO	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR	DESCUENTO	VALOR PAGADO	VALOR PAGADO
230201		\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0
SUBTOTAL:									

TOTAL \$ 1.088.400

Planilla pagada

563

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 1075227937		DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	INDEPENDIENTE	Principal	calle 70 n 2w 02	NEIVA-HUILA	8710179	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banko	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	984327819		9475474260	2024/10/09	2024/10/16	BANCO CAJA SOCIAL	7	\$404.300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																														
EMPLEADO			NOVEDADES						PENSION				SALUD			CCF			RIESGOS				PARAFISCALES							
No.	Identificación	Nombre	Ing	ret	tae	tdp	tap	vsp	cor	sin	lge	lma	vac	avp	ret	lri	lrip	Codigo	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	IBC	Dias	Aporte	Exonerado SENA e CBF	Total Aportes		
SUCURSAL: Principal (1 Afiliados)																														
Centro de Trabajo: Principal (1 Afiliados)																														
Ciudad: NEIVA Depto: HUILA (1 Afiliados)																														
1	CC	1073227937													23100	30	\$1,300,000	\$208,000	EP5005	30	\$1,300,000	\$162,500	0	14-11	\$0	\$31,700	0	\$0	No	\$402,200
Total Afiliados (1)															1					\$208,000						\$31,700	\$0	\$0	\$402,200	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Dirección	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC. 10527937		DIEGO MAURICIO POLANIA ANDRADE	INDEPENDIENTE	Principal	calle 70 n 2w 02	NEIVA-HUILA	8710179	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Fecha		Pago			
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2024-09	2024-09	984327819		9475474260	2024/10/09	2024/10/16	BANCO CAJA SOCIAL	7	\$404.300

RESUMEN DE PAGO								
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$208,000	\$1,100	\$0	\$209,100
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$208,000	\$1,100	\$0	\$209,100
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$31,700	\$100	\$0	\$31,800
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	1	\$31,700	\$100	\$0	\$31,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$162,500	\$900	\$0	\$163,400
SANTITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$162,500	\$900	\$0	\$163,400
TOTAL				1	\$402,200	\$2,100	\$0	\$404,300


30 agosto 2024


Clima: Seco


Personal: Ingeniero residente, Interventoría, maestro y ayudantes de obra

Equipos: Herramienta menor

Actividades: Se recibe material para la instalación de baranda metálica y se continúa con la colocación de baranda en zona lateral izquierda.


Director obra


P.E.S. OBRA


Director Int.

31 agosto 2024


Clima: Seco


Personal: Ingeniero residente, Interventoría, maestro y ayudantes de obra

Equipos: Herramienta menor

Actividades: Se continúa con instalación de baranda metálica en zona frontal del parque


Director obra



P.E.S. OBRA



Director Int.


1 Septiembre 2024

Clima: Lluvioso

No se realizaron actividades por ser día dominical


Director obra


P.E.S. OBRA


Director Int.

28

2 Septiembre 2024


Clima: Nublado

Personal: Ingeniero residente, Ingeniero director,
Maestro y ayudantes de obra


Equipos: Herramienta menor

Actividades: Se continua con instalacion de baranda
metalica, se hace limpieza de material que no
se utilizara

Director obra



Pres. obra




Dir. Int.


3 Septiembre 2024

Se realiza la solicitud y socializacion de la suspen-
sion y se otorga la viabilidad de manera inmediata

Director obra



Pres. obra



Dir. Int.

Neiva, 3 de Septiembre de 2024.


RDO. FEPP414-027

Doctor

FELIPE VICTORIA BARRAGAN

Director

Instituto Departamental del Deporte, la Educación Física, la Recreación y Aprovechamiento del Tiempo Libre del Huila - INDERHUILA
Ciudad



REFERENCIA 1: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CMCIH414-2023, cuyo Objeto: "INTERVENTORIA TECNICA ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA".

REFERENCIA 2 : CONTRATO DE OBRA PUBLICA NO. CSAMCIH435-2023, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCION Y ADECUACION DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR VEREDA VEGA DE ORIENTE MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNITOS MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA".

ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSION No. 2 DE OBRA E INTERVENTORIA.

Cordial saludo,

En relación con el oficio radicado por el contratista de obra CONSORCIO DANES-HC, con respecto a la solicitud de suspensión No.2 del Contrato de Obra No. CSAMCIH435 de 2023 (se adjunta), esta interventoría ha revisado y analizado los factores mencionados que han afectado el desarrollo de las actividades de obra. Estos factores han sido socializados con la comunidad y evaluados en conjunto con la supervisión e interventoría.

Carrera 4 No. 9-25 Oficina 507 Edificio Diego de Ospina

Teléfono: 608 8668020

Correo Electrónico: faiverperdomo7@gmail.com

Neiva - Huila

Dado que las dificultades presentadas han impedido la terminación de la obra, consideramos viable la suspensión del Contrato de Obra No. CSAMCIH435 de 2023 y del Contrato de Interventoría No. CMCIH414-2023, por un término de un (1) mes o hasta que se superen las limitaciones señaladas en la solicitud.

Esta suspensión permitirá realizar las gestiones necesarias para la entrega de los juegos infantiles y la reanudación de las actividades pendientes de obra.


Agradecemos la colaboración y comprensión de todas las partes involucradas para garantizar la correcta ejecución del proyecto.

Atentamente,



FAIVER E PERDOMO P.
Representante Legal
Interventoría

C.C. DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA – Rep. Legal - CONSORCIO DANES – HC.



Neiva, 03 de septiembre de 2024

Señor
FAIVER EDUARDO PERDOMO POLANIA
INTERVENTORÍA
Neiva Huila

Referencia: Contrato de Obra No. CSAMCIH435 DE 2023.

Objeto: CONSTRUCCIÓN Y ADECUACIÓN DE PARQUES INFANTILES TUTAINA TUTURU HUILA - MI PESEBRE HUILENSE CRECE EN UNION FAMILIAR - VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE y VEREDA HORNIOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA.

Asunto: Solicitud de suspensión No. 2 al Contrato

Cordial Saludo,

Respetada interventoría, el suscrito Diego Armando Hernández Leiva, identificado con cedula No. 1.079.182.594 expedida en Campoalegre – Huila, representante legal del CONSORCIO DANES-HC, en calidad de Contratista Solicito comedidamente suspensión No. 2 del contrato de obra descrito en la referencia, debido a que una vez otorgado el anticipo del contrato, se procedió a realizar las respectivas negociaciones con la empresa especializada cuya razón social corresponde a: ARMAN JUEGOS Y PARQUES SAS, realizando suscripción de orden de servicio No. 254 el día 17 de junio de 2024, empresa con gran experiencia y trayectoria en la fabricación de parques infantiles


Que dentro de la orden de servicio se contrata la fabricación de dos juegos de parques infantiles: 1 PARA LA VEREDA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA, Y 1 VEREDA HORNIOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA"

Que, en las condiciones de plazo de la orden de servicio, el subcontratista ARMAN JUEGOS Y PARQUES SAS, oferta un plazo de 2 meses y quince 15 días para realizar la entrega de dos (2) juego de parques infantiles; manifestando que ya tenía otros compromisos ya pactados que le impiden dar un plazo dentro de lo normal que demanda la fabricación de los parques que corresponde a 1 mes.

En atención a lo anterior, Que debido a que la empresa especializada en la fabricación de los juegos de los parques infantiles presenta múltiples ocupaciones y que la fecha de entrega de los juegos de parques infantiles corresponde el 30 de agosto de 2024, Solicito suspender el contrato, mientras se nos realiza entrega de los móviles de juegos infantiles contratados.

Que el avance físico de la obra en el frente de LA VEREDA DE LA VEGA DE ORIENTE - MUNICIPIO DE CAMPOALEGRE DEPARTAMENTO DEL HUILA, correspondiente a las actividades Preliminares, movimiento de tierras, Cimentación, Placa de contrapiso, y obras complementarias de concreto ciclópeo y pedestales para baranda

Que el avance físico de la obra en el frente de VEREDA HORNIOS - MUNICIPIO DE ISNOS DEPARTAMENTO DEL HUILA", correspondiente a las actividades Preliminares, movimiento de tierras, Cimentación, Placa de contrapiso, y obras complementarias de concreto ciclópeo y pedestales para baranda



Que la actividad más representativa es la Instalación de juegos móviles infantiles con un 48,5% del contrato y que el avance restante depende de esta actividad siendo las actividades de pintura de placa y zona verde.

De acuerdo con lo anterior y aras de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del contrato, solicito suspender el contrato de la referencia por un término de un (1) mes y/o hasta que se subsane la motivación a la suspensión, hasta se nos entreguen los móviles de los parques infantiles y se reanuden las actividades faltantes.

Agradezco su atención prestada.

*Recusio, Diego
WGO
03/09/2024
9:00 AM*

Atentamente,


DIEGO ARMANDO HERNANDEZ LEIVA
CONSORCIO DANES-HC
NIT. 901.774.192-5
REPRESENTANTE LEGAL

