

INFORME No 7 DE INTERVENTORÍA

TOTALL INC SAS BIC



CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 1980 DE 2024
“INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA
REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE
INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 1980 DE 2024

PERIODO DE EJECUCIÓN:
01 DE JULIO AL 31 DE JULIO DE 2025

TABLA DE CONTENIDO

LISTA DE DISTRIBUCIÓN	5
ÍNDICE DE MODIFICACIONE	5
ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	5
1. INTRODUCCIÓN	6
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO	6
2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	6
2.1.1 ANTECEDENTES:	8
2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	8
2.3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO	10
2.3.1. CONTRATO DE OBRA 1970 DE 2024.	10
2.3.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1980 DE 2024.	11
2.3.3. RELACIÓN DE PÓLIZAS.	12
2.3.3.1 Pólizas contrato de obra	12
2.3.3.2 Pólizas contrato de interventoría	14
3. ESTADO DE MANEJO DEL ANTICIPO	15
4. LISTADO DE EQUIPAMIENTOS	18
5. INFORME TÉCNICO	21
5.1. Visitas diagnósticas	22
5.2. Frentes en ejecución	22
6. RECURSOS UTILIZADOS	23
6.1 PERSONAL AUTORIZADO POR SDSCJ:	23
6.2 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA	24
6.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA	24
6.4 RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA.	24
6.5 RECURSOS DEL CONTRATISTA.	24
7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ORDEN CONTRACTUAL	24

7.1. Actividades de Orden Financiero:	25
7.2. Acta de recibo parcial de obra	24
7.3 Acta de recibo parcial de interventoría	25
7.4 Actividades de orden administrativo	25
8. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO	26
8.1 Actividades Realizadas por el contrato de obra	26
8.1.1. Administrativo:	26
8.1.2. Actividades realizadas por el contrato de Interventoría	26
9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA	27
10. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES.	30
10.1. OBSERVACIONES	30
10.2. CONCLUSIONES	30
11. ANEXOS	
11.1. Informe semanal	47
11.2. Actas de comité	47
11.3. Relación de correspondencia enviada y recibida	47
11.4. Bitácoras de Emergencia y Obra	47
11.5. Registro Fotográfico	47
11.6. Conceptos Técnicos de los Especialistas Hidráulico y Eléctrico	47
11.7. Actualización Estado Casas de Justicia	47
11.8. Historial Pagos Proveedor	47
11.9. Informe SST	47
11.10. Informe Ambiental	47

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Resumen Contrato de Obra.....	8
Tabla 2. Resumen Contrato de Interventoría	9
Tabla 3. Pólizas iniciales de obra.	9
Tabla 4. Pólizas iniciales de interventoría.....	10
Tabla 5. Plan de Inversión del Anticipo	10
Tabla 6. Listado de equipamientos a intervenir.....	12
Tabla 7. Visitas Diagnósticos.	14
Tabla 8. Frente de Obra-Estación de Policía Ciudad Bolívar	15
Tabla 9. Frente de Obra-Estación de Policía Usme	17
Tabla 10. Frente de Obra-Nuevo Comando.....	19
Tabla 11. Frente de Obra-CAI Verbenal.....	22
Tabla 12. Frente de Obra-CJ Campo Verde.....	25
Tabla 13. Frente de Obra-CTP Campo Verde.....	27
Tabla 14. Frente de Obra-CAE Campo Verde.....	28
Tabla 15. Frente de Obra-Sala de Operaciones.....	30
Tabla 16. Frente de Obra-BAACA-BAFLA.....	32
Tabla 17. Frente de Obra-URI Pte. Aranda.....	34
Tabla 18. Frente de Obra-CER.....	37
Tabla 19. Frente de Obra-CAI Victoria.....	40
Tabla 20. Frente de Obra-CJ San Cristóbal.....	43
Tabla 21. Frente de Obra-CJ La Victoria.....	45
Tabla 22. Frente de Obra-CR Santa Fe	47
Tabla 23. Frente de Obra-BAMAR	49
Tabla 24. Frente de Obra-PM13	52
Tabla 25. Frente de Obra-CAI Dorado	54

Tabla 26. Frente de Obra-C4	62
Tabla 27. Frente de Obra-CJ Bosa	64
Tabla 28. Frente de Obra-CJ Mártires	65
Tabla 29. Frente de Obra-CJ Usme	67
Tabla 30. Frente de Obra-CAI Lourdes	69
Tabla 31. Frente de Obra-CAI Piamonte	72
Tabla 32. Frente de Obra-CAI Patio Bonito	74
Tabla 33. Frente de Obra-CAI Alquilería	77
Tabla 34. Frente de Obra-Cespa	80
Tabla 35. Frente de Obra-CAI Usme	82
Tabla 36. Frente de Obra-CJ Ciudad Bolívar.....	84
Tabla 37. Frente de Obra-CJ Tunjuelito.....	89
Tabla 38. Frente de Obra-Estación de Policía Usaquén.....	92
Tabla 39. Frente de Obra-Sub Estación Tres Reyes.....	94
Tabla 40. Frente de Obra-Estación de Policía San Cristóbal.....	96
Tabla 41. Frente de Obra-BASER 13.....	98
Tabla 42. Frente de Obra-PM15.....	100
Tabla 43. Frente de Obra-CAI Claret	102
Tabla 44. Frente de Obra-CAI Centenario.....	104
Tabla 45. Frente de Obra-CAI Hayuelos.....	106
Tabla 46. Frente de Obra-CAI Timiza.....	108
Tabla 47. Frente de Obra-CAI Juan Rey.....	110
Tabla 48. Frente de Obra-CAI Libertadores.....	112
Tabla 49. Frente de Obra-Cárcel Distrital.....	114

Tabla 50. Emergencias atendidas en el periodo.....	116
Tabla 51. Emergencias conciliadas en el periodo	118
Tabla 52. Personal SDSCJ	120
Tabla 53. Personal Totall INC SAS BIC.....	121
Tabla 54. Personal DIARQCO	122
Tabla 55. Maquinaria y/o equipos a disponibilidad de interventoría	123
Tabla 56. Maquinaria y/o equipos a disponibilidad del contratista	123
Tabla 57. Presupuestos iniciales.....	124
Tabla 58. Actas Parciales de Obra.	125
Tabla 59. Actas Parciales de Interventoría.....	126
Tabla 60. Informes mensuales Contrato de obra.....	127
Tabla 61. Informes mensuales Contrato de interventoría.	127
Tabla 62. Comités de obra.....	128

LISTA DE DISTRIBUCIÓN

El ORIGINAL del presente documento será entregado a la dependencia y entidad correspondiente, según se indica a continuación:

DEPENDENCIA

SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA
Biblioteca del Proyecto

No. DE COPIAS

Original
1

Las observaciones que resulten de su revisión y aplicación deben ser informadas para proceder a realizar las modificaciones pertinentes.

ÍNDICE DE MODIFICACIONES

Índice Revisión	Capítulo Modificado	Fecha de Modificación	Observaciones
0	-	-	VERSIÓN ORIGINAL

ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN

Título Documento		INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA No 1		
REVISIÓN		0	1	2
RESPONSABLE ELABORACIÓN	Nombre			
	Firma			
	Fecha	01/08/2025		
RESPONSABLE REVISIÓN	Nombre	MARIA PIEDAD ESPINOSA V.		
	Firma			
	Fecha	04/08/2025		
RESPONSABLE APROBACIÓN	Nombre	ALVARO JIMENEZ POLO		
	Firma			
	Fecha	04/08/2025		

1. INTRODUCCIÓN

LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA, mediante la Resolución No. 0491 20230925, ordenó la apertura del proceso de Selección de Concurso de Méritos Abiertos No. SCJ-SIF-CMA-003- 2024, cuyo objeto es: "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".

Se realizó acta de inicio del contrato de obra 1970 de 2024, acta que fue suscrita el día 03 del mes de enero de 2025, con fecha terminación del 02 de mayo de 2025 con un plazo de ejecución de cuatro (04) meses.

Del mismo modo, se realizó acta de inicio del contrato de interventoría 1980 de 2024, acta que fue suscrita el día 03 del mes de enero de 2025, con fecha terminación del 03 de junio de 2025 con un plazo de ejecución de cinco (05) meses.

El 29 de abril de 2025 se suscribió la prórroga al contrato de obra por 2 meses más quedando la fecha de finalización 02 de julio de 2025 con un plazo de ejecución de seis (06) meses.

El día veinticinco (25) de junio de 2025 se presentó al comité de contratación la solicitud de Adición Nro. 1 y Prórroga Nro. 2 al Contrato de Obra Nro. SCJ-1970-2024, la cual fue aprobada por unanimidad.

CLÁUSULA PRIMERA. - PRORROGAR el plazo de ejecución del Contrato de Obra Nro. SCJ-1970-2024 por el término de TRES (03) MESES, a partir del día siguiente de su vencimiento, esto es, desde el tres (3) de julio de 2025 hasta el dos (2) de octubre de 2025. Por lo anterior, la Cláusula Segunda – "PLAZO" del precitado documento contractual quedará así:

"CLÁUSULA TERCERA – PLAZO DE EJECUCIÓN: El plazo de ejecución del Contrato de Obra que se suscriba será de NUEVE (09) meses contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio".

CLÁUSULA SEGUNDA. - ADICIONAR la suma de MIL TRESCIENTOS MILLONES DE PESOS COLOMBIANOS (\$1.300.000.000 COP.), al valor total del Contrato de Obra Nro. SCJ-1970-2024.

Por lo anterior, la Cláusula Cuarta – "VALOR", del precitado contrato, quedará así:

"CLÁUSULA CUARTA. - VALOR: El valor del contrato corresponderá a la suma de SEIS MIL CIENTO SESENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE COLOMBIANOS (\$6.165.240.537 COP.), (incluido A.I.U. y Costos directos, impuestos y demás gastos en que debe incurrir el contratista)".

La Interventoría ejercerá la función de representar a la SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA en la supervisión y control de las acciones del Contratista de obra, verificando que se cumplan las especificaciones y normas técnicas, las actividades administrativas, legales, contables, financieras y presupuestales, establecidas en las reglas de participación y el Contrato celebrado por la Entidad.

El presente documento contiene el informe No 7 de Interventoría, en el cual se consigna los avances de los frentes de trabajo durante el periodo del 01 de julio al 31 de julio de 2025, en la ejecución del contrato de obra No 1970 de 2024.

2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO

2.1. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

2.1.1 ANTECEDENTES:

Que el Plan Distrital de Desarrollo Económico, Social, Ambiental y de Obras Públicas y el Plan Plurianual de Inversiones para Bogotá D.C para el período 2020-2025 “Un nuevo contrato social y ambiental para Bogotá D.C del siglo XXI”, tiene como objetivo fundamental, lograr una redistribución más equitativa de vivir en Bogotá, impulsar la recuperación socioeconómica y cultural, transformar las oportunidades de educación, salud, cultura, productividad, innovación, generación de ingresos y disminución de la pobreza multidimensional dirigidas a brindar mayor inclusión social y productiva a las mujeres, jóvenes y familias. Que la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia es un organismo de nivel central de orden distrital, creado mediante Acuerdo 637 de 2019 del Concejo de Bogotá, con cargo a los recursos de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia los bienes y servicios que la entidad requiere para el cumplimiento de su misión y las autoridades competentes requieran para optimizar la seguridad de todos los habitantes de Bogotá.

Que las actividades de la Secretaría de Seguridad, Convivencia y Justicia están enmarcadas en cuatro grandes líneas de inversión: a) Prevención y Control del Delito en el Distrito Capital, b) Acceso a la Justicia (Nuevos y mejores Equipamientos), c) Fortalecimiento de los Organismos de Seguridad del Distrito y d) Gestión Institucional (fortalecimiento en transparencia, gestión pública, modernización, administración y mejoramiento de las TIC).


Dentro de las funciones de la Secretaría Distrital de Seguridad, se encuentra:

a) Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en el Distrito capital, b) Proporcionar bienes y servicios a las autoridades competentes, con el fin de coadyuvar en la efectividad de la seguridad y convivencia ciudadana en Bogotá D.C. c) Adelantar la coordinación interinstitucional para mejorar las condiciones de seguridad a todos los habitantes del Distrito Capital, en sus fases de prevención, promoción, mantenimiento y restitución. D) Adquirir o suministrar los bienes, servicios y contratar las obras que se requieran para el mejoramiento de las condiciones de seguridad, convivencia y acceso a la justicia en el Distrito Capital.

2.2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las obras a ejecutar se desarrollarán en todas las localidades de Bogotá D.C. atendiendo los requerimientos de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia.

Plano. Localización del proyecto.



2.3. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

2.3.1. CONTRATO DE OBRA 1970 DE 2024.

A continuación, se relaciona los aspectos contractuales más relevantes relacionados con el Contrato de Obra 1970 de 2024.

Tabla 1. Resumen Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA 1970 DE 2024	
OBJETO	“REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS”
No CONTRATO	1970 de 2024
CONTRATISTA	DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.
NIT	900.185.357-2
REPRESENTANTE LEGAL	CARMEN ELISA RODRIGUEZ GONZALEZ
PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES
PRORROGA NO.1	DOS (02) MESES
PRORROGA NO.2	TRES (03) MESES

ACTA DE INICIO	03 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	02 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA NO. 1	02 DE JULIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA NO. 2	02 DE OCTUBRE DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA NO. 3	NA
VALOR INICIAL	\$ 4.865.240.537
ADICION NO. 1	\$ 1.300.000.000
ADICION NO. 2	NA
ADICION NO. 3	NA
VALOR TOTAL	\$ 6.165.240.537

2.3.2. CONTRATO DE INTERVENTORÍA 1980 DE 2024.

A continuación, se relaciona los aspectos contractuales más relevantes relacionados con el Contrato de Interventoría 1980 de 2024.

Tabla 2. Resumen Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORIA 1980 DE 2024	
OBJETO	"INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS".
No CONTRATO	1980 de 2024
CONTRATISTA	TOTALL INC SAS BIC
NIT	901.620.351-9
REPRESENTANTE LEGAL	Edgar Alfredo Salazar Bernal
PLAZO INICIAL	CINCO (05) MESES
ACTA DE INICIO	03 DE ENERO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	02 DE JUNIO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 1	02 DE AGOSTO DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN PRORROGA No. 2	NA
VALOR INICIAL	\$ 563.242.080
ADICIÓN No. 1	\$ 240.985.006
ADICIÓN No. 2	NA
VALOR TOTAL	\$ 804.227.086

2.3.3. RELACIÓN DE PÓLIZAS.

A continuación, se relaciona las pólizas con las que se encuentran amparados los contratos de obra e interventoría.

2.3.3.1 Pólizas contrato de obra

Tabla 3. Pólizas iniciales de obra.

Póliza No.	37-44-101043950		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
Fecha de expedición.	14/01/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento del Contrato	03/01/2025	03/11/2025	\$ 973.048.107,40
Buen manejo del anticipo	03/01/2025	03/11/2025	\$ 973.048.107,40
Calidad del Servicio	04/05/2025	04/05/2027	\$ 973.048.107,40
Prestaciones Sociales	03/01/2025	04/05/2028	\$ 243.262.026,85
Responsabilidad civil extracontractual	03/01/2025	04/05/2025	\$ 520.000.000,00

Tabla 3.1. Prorroga No. 1

Póliza No.	37-44-101043950		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
Fecha de expedición.	14/01/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento del Contrato	03/01/2025	02/01/2026	\$ 973.048.107,40
Buen manejo del anticipo	03/01/2025	02/01/2026	\$ 973.048.107,40
Calidad del Servicio	04/05/2025	04/05/2027	\$ 973.048.107,40
Prestaciones Sociales	03/01/2025	02/07/2028	\$ 243.262.026,85
Responsabilidad civil extracontractual	03/01/2025	02/07/2025	\$ 520.000.000,00

Tabla 3.2. Adición No. 1 - Prorroga No. 2

Póliza No.	37-44-101043950		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
Fecha de expedición.	14/01/2025		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento del Contrato	03/01/2025	02/04/2026	\$ 1.233.048.107,40
Buen manejo del anticipo	03/01/2025	02/04/2026	\$ 1.233.048.107,40
Calidad del Servicio	04/05/2025	04/05/2027	\$ 1.233.048.107,40
Prestaciones Sociales	03/01/2025	02/07/2028	\$ 308.262.026,85
Responsabilidad civil extracontractual	03/01/2025	02/10/2025	\$ 569.400.000,00

2.3.3.2 Pólizas contrato de interventoría

Tabla 4. Pólizas iniciales de interventoría

Póliza No.	21-44-101460731		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
Fecha de expedición.	30/12/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento del Contrato	27/12/2024	27/05/2026	\$ 112.648.416
Calidad del Servicio	27/05/2025	27/05/2030	\$ 112.648.416
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	27/12/2024	27/05/2028	\$ 28.162.104
Responsabilidad civil extracontractual	27/12/2024	27/05/2025	\$ 390.000.000

Tabla 4.1. Prorroga No. 1 Adición No. 1

Póliza No.	21-44-101460731		
Expedida por:	SEGUROS DEL ESTADO S. A		
Fecha de expedición.	30/12/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	Fecha Inicial	Fecha Final	
Cumplimiento del Contrato	27/12/2024	27/05/2026	\$160.845.417,20
Calidad del Servicio	27/05/2025	27/05/2030	\$160.845.417,20
Pagos de Salarios, Prestaciones Sociales legales e indemnizaciones laborales	27/12/2024	27/05/2028	\$40.211354,30
Responsabilidad civil extracontractual	27/12/2024	27/05/2025	\$ 426.450.000

3. ESTADO DE MANEJO DEL ANTICIPO

El contratista de obra actualiza el plan de manejo del anticipo.



Diseño / Arquitectura / Construcción

CONTRATO	No. SCJ-1970-2024		
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS		
FECHA DEL PRESENTE DOCUMENTO	22/06/2025		

PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO - REPROGRAMACIÓN

No. CONTRATO	No. SCJ-1970-2024		
OBJETO	REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SDSCJ Y AGENCIAS		
CONTRATANTE	SECRETARÍA DIGITAL DE SEGURIDAD CONVIVENCIA Y JUSTICIA		
COTRATISTA	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS		
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA	CARMEN ELISA RODRIGUEZ		
NIT	900.183.357-3		
VALOR DEL CONTRATO	4.885.340.537,00		
VALOR TOTAL DEL ANTICIPO (20%)	973.048.107,40		
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO	05 (5) MESES		
INTERVENIOR	TOTAL INC SAS INC		
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA	EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL		

ITEM	DESCRIPCIÓN	MES 1 ene-25	MES 2 feb-25	MES 3 mar-25	MES 4 abr-25	MES 5 may-25	MES 6 jun-25	TOTAL	%
1	SUBCONTRATOS	0	0	787.526.634,00	0	0	205.521.473,40	973.048.107,40	100%


Nota: El porcentaje se toma sobre el 100% del valor del anticipo sin retenciones.

ELABORÓ



CARMEN ELISA RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL
DIARQCO CONSTRUCTORES SAS

APROBÓ



EDGAR ALFREDO SALAZAR BERNAL
REPRESENTANTE LEGAL
TOTAL INC SAS BIC

www.diarqco.com

DIARQCO
CONSTRUCTORES S.A.S

Tabla 5. Plan de Inversión del Anticipo
Rendimientos Financieros

					
FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.		INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT			FECHA: 2025/04/10
Rango de fechas: 2025/03/01 - 2025/03/31					HORA: 10:42
17630		P.A. ANT DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S			PAGINA: 1
Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO				
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN				
111505	BANCOS NACIONALES				
111505514	CUENTAS DE AHORRO				
111505514694	AHO 26400008144 PA ANT DIARQCO				
890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	975,881,424.59	770,116,740.53	205,764,684.06
TOTAL	AHO 26400008144 PA ANT DIARQCO	0.00	975,881,424.59	770,116,740.53	205,764,684.06
TOTAL	CUENTAS DE AHORRO	0.00	975,881,424.59	770,116,740.53	205,764,684.06
TOTAL	BANCOS NACIONALES	0.00	975,881,424.59	770,116,740.53	205,764,684.06
TOTAL	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN	0.00	975,881,424.59	770,116,740.53	205,764,684.06
TOTAL	EFFECTIVO	0.00	975,881,424.59	770,116,740.53	205,764,684.06
16	CUENTAS POR COBRAR				
1690	DIVERSAS				
169095	OTRAS				
169095005	A FIDEICOMITENTES				
169095005001	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO				
890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
TOTAL	A FIDEICOMITENTES	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
TOTAL	OTRAS	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
TOTAL	DIVERSAS	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
TOTAL	CUENTAS POR COBRAR	0.00	2,800,000.00	2,800,000.00	0.00
TOTAL	ACTIVO	0.00	978,681,424.59	772,916,740.53	205,764,684.06
2	PASIVO				
29	OTROS PASIVOS				
2990	DIVERSOS				

Este informe financiero fue generado automáticamente por el sistema de contabilidad de la Fiduciaria Bancolombia S.A. y no debe ser utilizado como base para la toma de decisiones. El sistema de contabilidad de la Fiduciaria Bancolombia S.A. no garantiza la exactitud de los datos presentados en este informe.

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.		INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT			FECHA: 2025/04/10
Rango de fechas: 2025/03/01 - 2025/03/31					HORA: 10:42
17630		P.A. ANT DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S			PAGINA: 3
Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
3510	PAGOS (08) PATRIMONIO BIENES				
351010	PAGOS A TERCEROS				
351010001	PAGOS A TERCEROS				
351010001009	REEMBOLSOS				
900185357	DIARQCO CONSTRUCTORES SAS	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
TOTAL	REEMBOLSOS	0.00	120,000,000.00	0.00	120,000,000.00
351010001025	GIRO A TERCEROS				
901095872	CONSTRUCCIONES RDL S	0.00	317,526,634.00	0.00	317,526,634.00
901553913	EKRO INGENIERIA SAS	0.00	330,000,000.00	0.00	330,000,000.00
TOTAL	GIRO A TERCEROS	0.00	647,526,634.00	0.00	647,526,634.00
TOTAL	PAGOS A TERCEROS	0.00	767,526,634.00	0.00	767,526,634.00
TOTAL	PAGOS A TERCEROS	0.00	767,526,634.00	0.00	767,526,634.00
TOTAL	PAGOS (08) PATRIMONIO BIENES	0.00	767,526,634.00	0.00	767,526,634.00
TOTAL	PATRIMONIO ESPECIALES	0.00	1,740,574,741.00	1,948,896,214.00	208,321,473.00
39	GANANCIAS O PÉRDIDAS				
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	2,590,106.53	0.00	2,590,106.53DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	2,590,106.53	0.00	2,590,106.53DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	2,590,106.53	0.00	2,590,106.53DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	2,590,106.53	0.00	2,590,106.53DB
TOTAL	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	0.00	2,590,106.53	0.00	2,590,106.53DB
TOTAL	GANANCIAS O PÉRDIDAS	0.00	2,590,106.53	0.00	2,590,106.53DB
TOTAL	PATRIMONIO	0.00	1,743,164,847.53	1,948,896,214.00	205,731,366.47
5	GASTOS				

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT
Rango de fechas: 2025/03/01 - 2025/03/31
FECHA: 2025/04/10
HORA: 10:42
PAGINA: 3

FIDUCIARIA BANCOLOMBIA S.A.		INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT			FECHA: 2025/04/10
Rango de fechas: 2025/03/01 - 2025/03/31					HORA: 10:42
17630		P.A. ANT DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S			PAGINA: 4
Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Nuevo Saldo
51	GASTOS DE OPERACIONES				
5140	IMPUESTOS Y TASAS				
514005	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002	IMPUESTOS Y TASAS				
514005002003	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS				
890903938	BANCOLOMBIA SA	0.00	2,590,106.53	0.00	2,590,106.53
TOTAL	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS	0.00	2,590,106.53	0.00	2,590,106.53
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	2,590,106.53	0.00	2,590,106.53
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	2,590,106.53	0.00	2,590,106.53
TOTAL	IMPUESTOS Y TASAS	0.00	2,590,106.53	0.00	2,590,106.53
TOTAL	GASTOS DE OPERACIONES	0.00	2,590,106.53	0.00	2,590,106.53
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDA				
5905	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001	GANANCIAS Y PÉRDIDAS				
590500001001	GANANCIAS Y PÉRDIDAS M.L.				
830054539	PA FIDUCIARIA BANCOLOMBIA SA SOCIEDAD FIDUCIARIA	0.00	0.00	2,590,106.53	2,590,106.53CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS M.L.	0.00	0.00	2,590,106.53	2,590,106.53CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	0.00	2,590,106.53	2,590,106.53CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	0.00	2,590,106.53	2,590,106.53CR
TOTAL	GANANCIAS Y PÉRDIDAS	0.00	0.00	2,590,106.53	2,590,106.53CR
TOTAL	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDIDA	0.00	0.00	2,590,106.53	2,590,106.53CR
TOTAL	GASTOS	0.00	2,590,106.53	2,590,106.53	0.00

INFORME FINANCIERO NIVEL MOVIMIENTO CON NIT
Rango de fechas: 2025/03/01 - 2025/03/31
FECHA: 2025/04/10
HORA: 10:42
PAGINA: 4

17630		P.A. ANT DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S			AGINA: 1
Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
1	ACTIVO				
11	EFFECTIVO				
1115	BANCOS Y OTRAS ENTIDADES FINAN				
111805	BANCOS NACIONALES				
111805514	CUENTAS DE AHORRO				
111805514694	AHO 26400008144 PA ANT DIARQCO	205,764,684.06	848,427.10		206,613,111.16
0000890903938	BANCOLOMBIA SA	205,764,684.06	848,427.10		206,613,111.16
T O T A L	AHO 26400008144 PA ANT	205,764,684.06	848,427.10		206,613,111.16
T O T A L	CUENTAS DE AHORRO	205,764,684.06	848,427.10		206,613,111.16
T O T A L	BANCOS NACIONALES	205,764,684.06	848,427.10		206,613,111.16
T O T A L	BANCOS Y OTRAS ENTIDAD	205,764,684.06	848,427.10		206,613,111.16
T O T A L	EFFECTIVO	205,764,684.06	848,427.10		206,613,111.16
16	CUENTAS POR COBRAR				
1690	DIVERSAS				
169095	OTRAS				
169095005	A FIDEICOMITENTES				
169095005001	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA		823,000.00	823,000.00	.00
T O T A L	CUENTAS POR COBRAR CORTO PLAZO		823,000.00	823,000.00	.00
T O T A L	A FIDEICOMITENTES		823,000.00	823,000.00	.00
T O T A L	OTRAS		823,000.00	823,000.00	.00
T O T A L	DIVERSAS		823,000.00	823,000.00	.00
T O T A L	CUENTAS POR COBRAR		823,000.00	823,000.00	.00
T O T A L	ACTIVO	205,764,684.06	1,671,427.10	823,000.00	206,613,111.16
2	PASIVO				
29	OTROS PASIVOS				
2990	DIVERSOS				
299040	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001	INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCER				
299040001161	INTERESES CUENTA DE AHORROS				
0000890903938	BANCOLOMBIA SA		25,427.10	25,427.10	.00
0000899999061	BOGOTA DISTRITO CAPI	33,317.59	25,427.10	25,427.10	58,744.69
T O T A L	INTERESES CUENTA DE AH	33,317.59	25,427.10	50,854.20	58,744.69
T O T A L	INGRESOS RECIBIDOS PAR	33,317.59	25,427.10	50,854.20	58,744.69
T O T A L	INGRESOS RECIBIDOS PAR	33,317.59	25,427.10	50,854.20	58,744.69
T O T A L	DIVERSOS	33,317.59	25,427.10	50,854.20	58,744.69
T O T A L	OTROS PASIVOS	33,317.59	25,427.10	50,854.20	58,744.69

17630		P.A. ANT DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S			AGINA: 2
Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo
T O T A L	PASIVO	33,317.59	25,427.10	50,854.20	58,744.69
3	PATRIMONIO				
35	PATRIMONIO ESPECIALES				
3505	ACREEDORES FIDUCIARIOS				
350505	APORTES EN DINERO				
350505001	APORTES EN DINERO				
350505001001	APORTES EN DINERO				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOL	973,048,107.00			973,048,107.00
T O T A L	APORTES EN DINERO	973,048,107.00			973,048,107.00
350505001004	APOR REINTEGRO GAST A CARG FID				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOL	2,800,000.00		823,000.00	9,623,000.00
T O T A L	APOR REINTEGRO GAST A	2,800,000.00		823,000.00	9,623,000.00
T O T A L	APORTES EN DINERO	975,848,107.00		823,000.00	976,671,107.00
T O T A L	APORTES EN DINERO	975,848,107.00		823,000.00	976,671,107.00
T O T A L	ACREEDORES FIDUCIARIOS	975,848,107.00		823,000.00	976,671,107.00
3510	PAGOS (DB) PATRIMONIO BIENES				
351010	PAGOS A TERCEROS				
351010001	PAGOS A TERCEROS				
351010001009	REEMBOLSOS				
0000900185357	DIARQCO CONSTRUCTORE	120,000,000.00			120,000,000.00
T O T A L	REEMBOLSOS	120,000,000.00			120,000,000.00
351010001025	GIRO A TERCEROS				
0000901098872	CONSTRUCCIONES RDL	317,526,634.00			317,526,634.00
0000901553912	ERRO INGENIERIA SA	320,000,000.00			320,000,000.00
T O T A L	GIRO A TERCEROS	647,526,634.00			647,526,634.00
T O T A L	PAGOS A TERCEROS	767,526,634.00			767,526,634.00
T O T A L	PAGOS A TERCEROS	767,526,634.00			767,526,634.00
T O T A L	PAGOS (DB) PATRIMONIO	767,526,634.00			767,526,634.00
T O T A L	PATRIMONIO ESPECIALES	208,321,473.00		823,000.00	209,144,473.00
39	GANANCIAS O PERDIDAS				
3920	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
392000001001	PÉRDIDA DEL EJERCICIO				
0000830054539	PA FIDUCIARIA BANCOL	2,590,106.53DB			2,590,106.53DB
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,590,106.53DB			2,590,106.53DB
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,590,106.53DB			2,590,106.53DB
T O T A L	PÉRDIDA DEL EJERCICIO	2,590,106.53DB			2,590,106.53DB

17630		P.A. ANT DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S			AGINA: 2	
Cuenta	Descripción de la cuenta	Saldo Anterior	Debitos	Creditos	Nuevo Saldo	
T O T A L	PERDIDA DEL EJERCICIO	2,590,106.53DB			2,590,106.53DB	
T O T A L	GANANCIAS Y PERDIDAS	2,590,106.53DB			2,590,106.53DB	
T O T A L	PATRIMONIO	205,721,266.47		822,000.00	206,554,266.47	
S	GASTOS Y COSTOS					
51	GASTOS DE OPERACIONES					
5140	IMPUESTOS Y TASAS					
514005	IMPUESTOS Y TASAS					
514005002	IMPUESTOS Y TASAS					
514005002002	GRAVAMEN TRANS FINANCIERAS					
0000590902928	BANCOLOMBIA SA	2,590,106.53			2,590,106.53	
T O T A L	GRAVAMEN TRANS FINANCI	2,590,106.53			2,590,106.53	
T O T A L	IMPUESTOS Y TASAS	2,590,106.53			2,590,106.53	
T O T A L	IMPUESTOS Y TASAS	2,590,106.53			2,590,106.53	
T O T A L	IMPUESTOS Y TASAS	2,590,106.53			2,590,106.53	
T O T A L	GASTOS DE OPERACIONES	2,590,106.53			2,590,106.53	
59	GANANCIAS (EXCEDENTES) Y PÉRDI					
5905	GANANCIAS Y PERDIDAS					
590500	GANANCIAS Y PERDIDAS					
590500001	GANANCIAS Y PERDIDAS					
590500001001	GANANCIAS Y PERDIDAS M.L.					
0000590505459	FA FIDUCIARIA BANCOL	2,590,106.53CR			2,590,106.53CR	
T O T A L	GANANCIAS Y PERDIDAS M	2,590,106.53CR			2,590,106.53CR	
T O T A L	GANANCIAS Y PERDIDAS	2,590,106.53CR			2,590,106.53CR	
T O T A L	GANANCIAS Y PERDIDAS	2,590,106.53CR			2,590,106.53CR	
T O T A L	GANANCIAS Y PERDIDAS	2,590,106.53CR			2,590,106.53CR	
T O T A L	GANANCIAS (EXCEDENTES)	2,590,106.53CR			2,590,106.53CR	
T O T A L	GASTOS				.00	

4. LISTADO DE EQUIPAMIENTOS

En la siguiente tabla se muestra el inventario de equipamientos suministrado por la Entidad, y que podrán ser modificados de acuerdo con las necesidades que ésta requiera.

Inventario de Equipamientos Secretaría de Seguridad Convivencia y Justicia

ESTACIÓN DE POLICIA			
1	Teusaquillo	NUEVO COMANDO	AV. LA ESMERALDA # 22A
2	Ciudad Bolívar	ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	DG 70 sur
3	Usme	ESTACION DE POLICIA USME	Carrera 5 Con Cl 6 Usme Centro
4	Usaquén	FUERTE VILLA NIDIA	Calle 163 # 6A-25.
CAI			
1	Usaquén	CAI VERBENAL	Calle 44A sur # 72-40
2	Chapinero	CAI LOURDES	Calle 64 # 10-00.
3	Santafé	CAI DORADO	Carrera 8 Este con Calle 1a Bis 00
4	San Cristóbal	CAI VICTORIA	Cra. 3a Este #43a Sur30
5	Bosa	CAI PIAMONTE	Dg. 69b Sur, 78l-54, Bogotá
6	Kennedy	CAI PATIO BONITO	Calle 26 Sur con Carrera 87
7	Pte. Aranda	CAI ALQUERIA	Dirección. Calle 43 con Carrera 52C

EQUIPAMIENTOS DE JUSTICIA			
1	Pte. Aranda	CESPA	Cra. 30 # 11 - 85
2	Santa Fé	CASA RESTAURATIVA SANTAFE	Cra. 4 #23-28
3	San Cristóbal	CASA RESTAURATIVA LA VICTORIA	Dg. 31c Sur #67 este # 3
4	Bosa	CAE CAMPO VERDE	CALLE 85 SUR # 94
CASAS DE JUSTICIA			
1	Usme	CJ USME	CALLE 137 C Sur # 2 A 43
2	Mártires	CJ MARTIRES	Cra. 21 # 14 - 75
3	San Cristóbal	CJ SAN CRISTOBAL	Dg. 31c Sur #67 este # 3
4	Bosa	CJ BOSA	CARRERA 81 D # 59 A 59 Sur
6	Tunjuelito	CJ TUNJUELITO	Calle 51 sur # 7 - 35
5	Ciudad Bolívar	CJ CIUDAD BOLIVAR	Diagonal 62 sur # 20f - 20
6	Bosa	CJ CAMPO VERDE	CALLE 85 SUR # 94
7	Bosa	CTP CAMPO VERDE	CALLE 85 SUR # 94
CENTRO DE TRASLADO Y PROTECCIÓN			
1	Pte. Aranda	URI PTE ARANDA	Carrera 39 # 10-75
CENTRO DE TRASLADO Y PROTECCIÓN			
1	Pte. Aranda	CER	Carrera 39 # 10-75
CENTRO DE COMANDO, COMUNICACIÓN Y COMPUTO C4			
1	Fontibón	C4	Cra. 68b #2062

BRIGADA			
1	Usaquén	BASER 13	Calle 106 # 7- 25
2	Usaquén	SALA DE OPERACIONES - BACOM 24	Calle 106 # 7- 25
3	Usaquén	PM15	Calle 106 # 7- 25
4	Pte. Aranda	PM13	CARRERA 54 N 26 25
5	Tunjuelito	BAFLA	BATALLON DE ARTILLERIA 13
6	Sumapaz	BITER	BATALLON DE INSTRUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO
7	Sumapaz	BAMAR	BATALLON DE ALTA MONTAÑA

NOTA: La secretaria podrá modificar los equipamientos a intervenir previo aviso al contratista como resultado del análisis y de las consultas realizadas durante la etapa preliminar previstas en el numeral 2.5 de los estudios previos

5. INFORME TÉCNICO

En la siguiente tabla se detalla el número de equipamientos a intervenir y el valor proyectado para cada intervención, según criterio de priorización presentado por la Entidad.

Tabla 6. Listado de equipamientos a intervenir.

OBJETO: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE PROPIEDAD Y/O A CARGO DE LA SECRETARÍA DISTRITAL DE SEGURIDAD "			
Distribución Inicial de Rubros			
SEGURIDAD		JUSTICIA	
BRIGADA		CASAS DE JUSTICIA	
SALA OPERACIONES	90.051.177,00	TOTAL	789.060.537,00
PM 15	177.117.581,00	CIUDAD BOLIVAR	105.580.071,00
PM 13	153.949.170,00	MARTIRES	105.580.071,00
BITER	85.417.157,00	USME	105.580.071,00
BASER	189.791.853,00	SAN CRISTOBAL	105.580.071,00
BAMAR	219.417.264,00	TUNJUELITO	105.580.071,00
BAFLA	34.257.492,00	BOSA	105.580.071,00
EMERGENCIAS	50.000.136,00	CAMPO VERDE	105.580.071,00
TOTAL	1.000.000.000,00	CTP CAMPO VERDE	50.000.040,00
CENTRO , COMANDO, CONTROL Y COMPUTO (C4)		RESPONSABILIDAD PENAL Y ADOLESCENTE (RPA)	
\$150.000.000,00		SANTA FE	23.750.000,00
METROPOLITANA DE BOGOTA (MEBOG)		LA VICTORIA	23.750.000,00
ESTACIÓN DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	\$ 300.000.000	CESPA	23.750.000,00
ESTACIÓN DE POLICIA SAN CRISTOBAL	\$ 300.000.000	CAE CAMPO VERDE	79.021.000,00
VILLA NIDIA	\$ 200.000.000	TOTAL SIN EMERGENCIAS	150.271.000,00
ESTACIÓN DE POLICIA USME	\$ 250.000.000	EMERGENCIAS	7.909.000,00
NUEVO COMANDO	\$ 800.000.000	TOTAL	158.180.000,00
CAI 7 UNDS (\$35.000.000) C/U	\$ 385.000.000		
EMERGENCIAS	\$ 115.000.000		
TOTAL	\$ 2.350.000.000		
		CENTRO ESPECIAL DE RECLUSIÓN (CER)	
		\$200.000.000,00	
		UNIDAD DE REACCIÓN INMEDIATA (URI)	
		\$218.000.000,00	

SEGURIDAD	1.044.000.000
MEBOG EPOL FONTIBON	300.000.000
MEBOG CAI (5 UNIDADES)	350.000.000
MEBOG ATENCION DE EMERGENCIAS	150.000.000
OTROS EQUIPAMIENTOS MEBOG	200.000.000
C4	44.000.000
JUSTICIA	256.000.000
URI PUENTE ARANDA	200.000.000
EMERGENCIAS EN FRENTE DE JUSTICIA	56.000.000

5.1. Visitas de diagnóstico

Durante este periodo se realizaron conjuntamente con el contratista los diagnósticos de los diferentes equipamientos, el contratista presento presupuestos de los mismos para verificación y aprobación por partes de la interventoría.

Tabla 7. Visitas Diagnósticos

ITEM	FRENTE	FECHA	HORA
1	ESTACION POLICIA CIUDAD BOLIVAR	13/01/2025	09:00 am
2	NUEVO COMANDO MEBOG	14/01/2025	09:00 am
3	ESTACION POLICIA USME	15/01/2025	09:00 am
4	BRIGADA 13	16/01/2025	09:00 am
5	CENTRO ESPECIAL RECLUSIÓN CER	17/01/2025	09:00 am
6	URI PUENTE ARANDA	17/01/2025	11:00 am
7	CASA JUSTICA Y CTP CAMPO VERDE	20/01/2025	09:00 am

ITEM	FRENTE	FECHA	HORA
1	CAMPO VERDE CTP – CAE CASA JUSTICIA	20/01/2025	09:00 am
2	SALA DE OPERACIONES	22/01/2025	08:00 am
3	BASER 13	22/01/2025	02:00 Pm
4	PM15	22/01/2025	09:00 am
5	BAFLA	23/01/2025	09:00 am
6	CAI BERBENAL	23/01/2025	02:00 pm
7	CAI VILLA NIDIA	25/01/2025	08:00 am

ITEM	FRENTE	FECHA	HORA
1	CASA DE JUSTICIA LA VICTORIA	27/01/2025	09:00 am
2	CASA JUSTICIA SAN CRISTOBAL	27/01/2025	11:00 am
3	CESPA	27/01/2025	02:00 Pm
4	CASA JUSTICIA CIUDAD BOLIVAR	28/01/2025	09:00 am
5	CASA DE JUSTICIA MARTIRES	28/01/2025	11:00 am
6	CASA DE JUSTICIA TUNJUELITO	28/01/2025	1:00 Pm
7	CAI LOURDES	29/01/2025	09:00 am
8	CAI DORADO	29/01/2025	11:00 am
9	CAI PIAMONTO	29/01/2025	02:00 Pm
10	CAI PATIO BONITO	30/01/2025	09:00 am
11	CAI ALQUERIA	30/01/2025	11:00 am
12	CAI VICTORIA	30/01/2025	02:00 Pm

de sobr.), demolición mesón corrido (inc. retiro de sobr.), demolición de muros (e=0,15) en altura de 17m, incluye cargue y transporte, demolición de alistado de terrazas h=8cm (altura 5 pisos), regata sobre muros incluye retiro de sobrantes, desmonte puertas con marcos (inc. retiro de sobr.), desmonte ventanas y vidrios (inc. retiro de sobr.), desmonte y retiro de divisiones metálicas baños, escarificar pañetes (inc. retiro de sobr.), suspensión de salida sanitaria (inc. retiro de sobr.), suspensión de salida hidráulica (inc. retiro de sobr.), desmonte de sifones, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmonte de push sanitarios, demolición de acabados cerámicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye trasiego, retiro y disposición final de escombros), desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes), desmonte de espejo (incluye retiro y disposición final), desmonte de accesorios sanitarios (tapa registros, pomos, regaderas, incrustaciones, rejillas, etc...), desmonte de estructura en madera de cubierta existente. (incluye retiro y disposición final de sobrantes), corte de placa con pulidora. incluye aseo, regata en placa (incluye retiro de sobrantes), pase manual en placa de concreto con espesor de entre 12 y 20 cm para paso de tubería entre 2" y 4". (no incluye el resane), muro en bloque no. 5 e=15 cm, registro p/d red white ø 1/2" ó equivalente, accesorios cpvc de 1/2", tubería cpvc de 1/2", suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2" (incluye accesorios), punto desagüe pvc ø 2", reparaciones sanitarias en 2", punto desagüe pvc ø 3" - ø 4", sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), reinstalación de aparatos sanitarios, salida + interruptor, sencillo luminex o equivalente – pvc, salida para lampara fluorescente – pvc, salida para lampara fluorescente – emt, cableado 1#12, cableado 2#12, suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m, suministro e instalación de piso duro piso, mediacaña en granito h = 0.10 m, pirlan de aluminio, grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión ø 3/4" o 1/2", 24-aa-142006 docol o similar, kit válvula de descarga antivandálica alta presión p´orinal, conexión ø 3/4" o 1/2", 21-aa-950 docol ó similar, suministro e instalación de sifón en p, para lavamanos, metálico cromado. importado, marca a&a o similar, llave manguera 1/2" (sum e instalación), suministro e instalación de push antivandálico para sanitario, suministro e instalación de cielo raso en pvc, vinilo s/pañete - 2 manos, vinilo bajo placa - 2 manos, remoción de pintura suelta manual, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, desbaste de filo existente y conformación de filo biselado, con aplicación de mezcla y estuco, suministro y aplicación de vinilo lineal para interiores 3 manos para anchos iguales o inferiores a 40 cm, suministro e instalación de enchape cerámico con medida 30cmx60cm para muros en interiores incluye pegante, boquilla y todos los elementos para su correcta ejecución en alturas inferiores a 3 metros, Pinturas, instalación de cielo raso, instalación de drywall instalaciones eléctricas, luminarias carpintería metálica, instalación de pintura multicapas, Instalación de piso, mantenimiento sistema de bombeo. Mantenimiento del sistema de bombas, instalación de tableta de gres.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100 %	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		



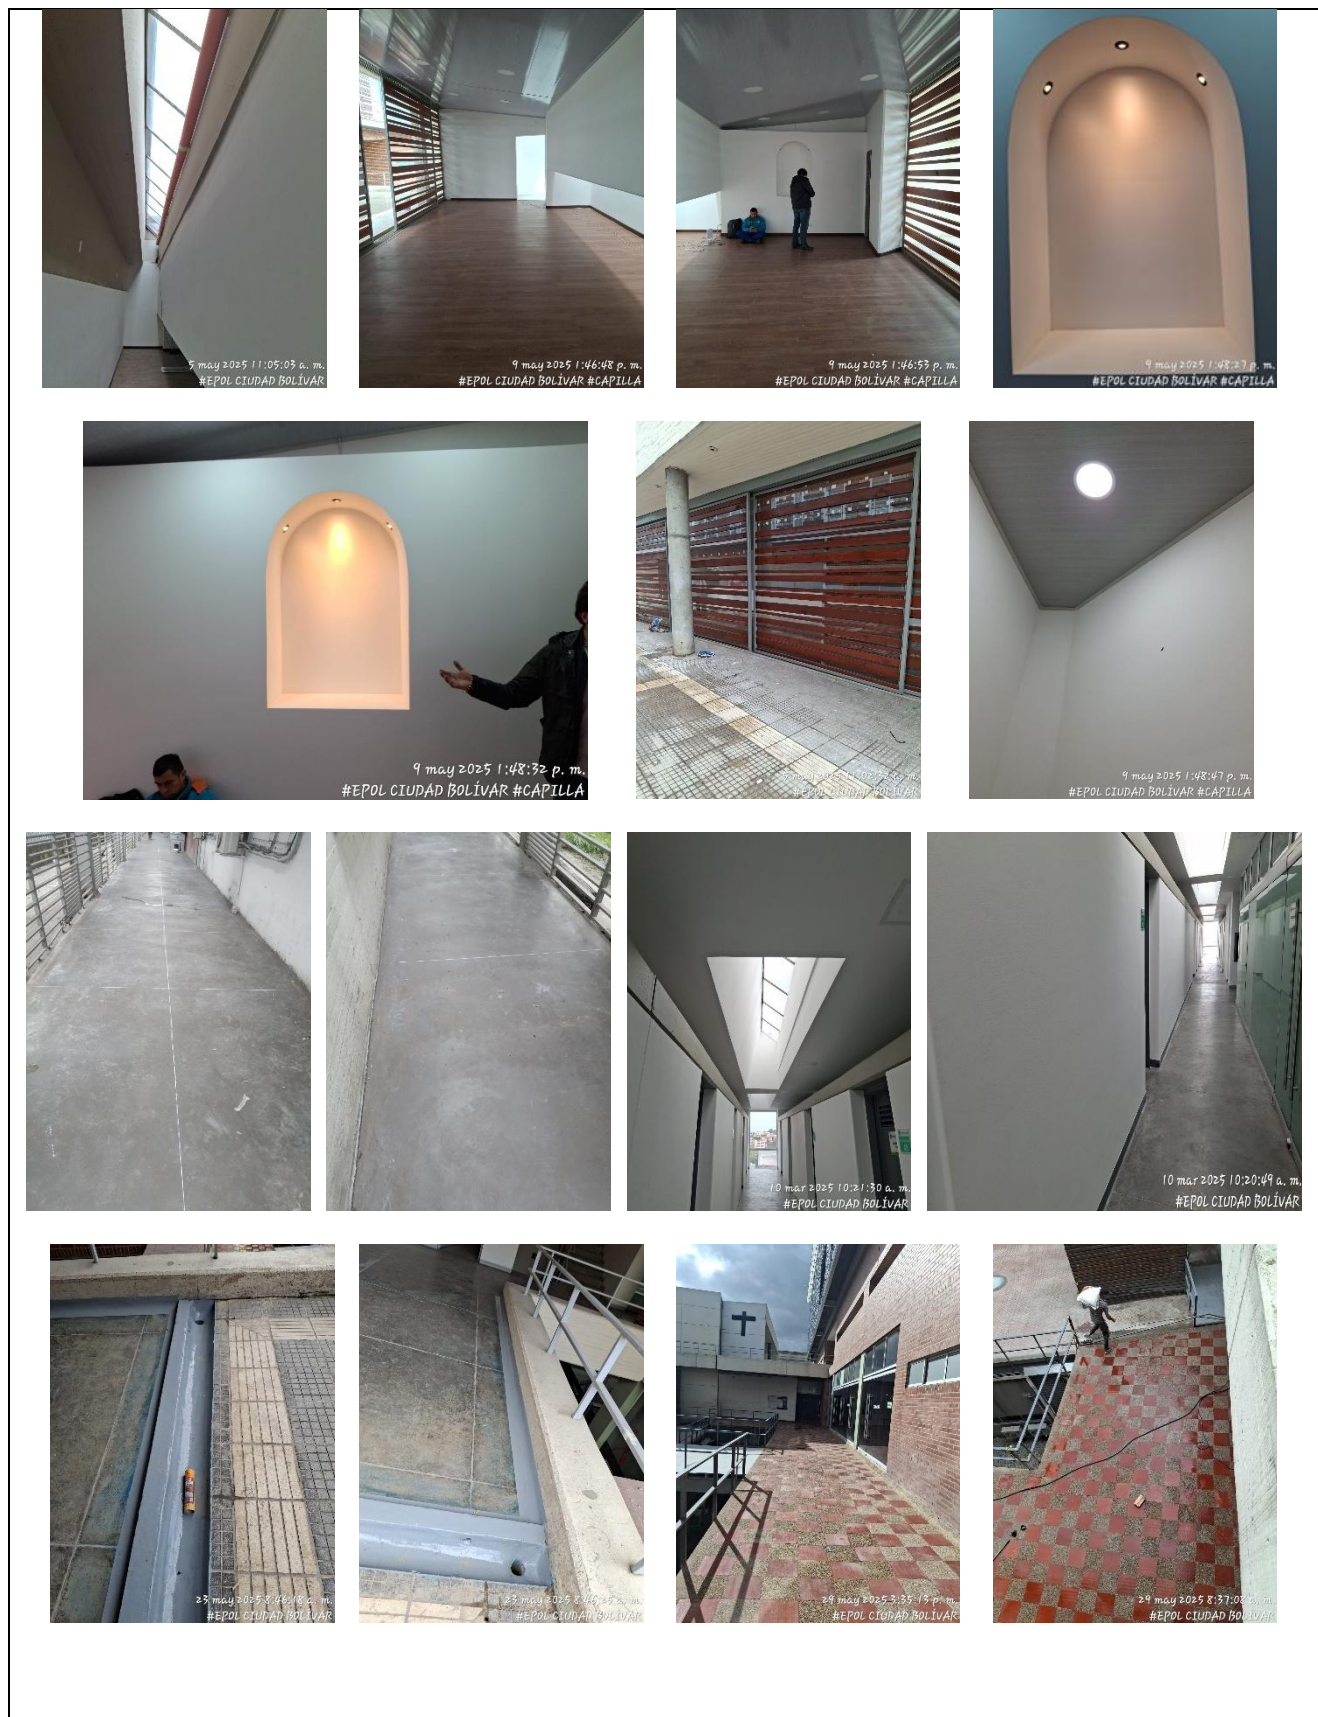


Tabla 9. Frente de Obra – ESTACION DE POLICIA USME.

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Usme	Estación de Policía Ciudad Usme	Carrera 5 Con Cl 6 Usme Centro	29/01/2025	02/05/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
ESTACION DE POLICIA USME	Usme	Carrera 5 Con Cl 6 Usme Centro

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:

demolición cielo raso falso (inc. retiro de sobr.), demolición de muros tolete e=12 cm. (inc. retiro de sobr.), demolición de pisos en baldosín (inc. retiro de sobr.), demolición pisos en tablón (inc. retiro de sobr.), demolición mesón corrido (inc. retiro de sobr.), demolición de muros (e=0,15) en altura de 17m, incluye cargue y transporte, demolición de alistado de terrazas h=8cm (altura 5 pisos), regata sobre muros incluye retiro de sobrantes, desmonte puertas con marcos (inc. retiro de sobr.), desmonte ventanas y vidrios (inc. retiro de sobr.), desmonte y retiro de divisiones metálicas baños, escarificar pañetes (inc. retiro de sobr.), suspensión de salida sanitaria (inc. retiro de sobr.), suspensión de salida hidráulica (inc. retiro de sobr.), desmonte de sifones, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmonte de push sanitarios, demolición de acabados cerámicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye trasiego, retiro y disposición final de escombros), desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes), desmonte de espejo (incluye retiro y disposición final), desmonte de accesorios sanitarios (tapa registros, pomos, regaderas, incrustaciones, rejillas, etc...), desmonte de estructura en madera de cubierta existente. (incluye retiro y disposición final de sobrantes), corte de placa con pulidora. incluye aseo, regata en placa (incluye retiro de sobrantes), pase manual en placa de concreto con espesor de entre 12 y 20 cm para paso de tubería entre 2" y 4". (no incluye el resane), muro en bloque no. 5 e=15 cm, registro p/d red white ø 1/2" o equivalente, accesorios cpvc de 1/2", tubería cpvc de 1/2", suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2" (incluye accesorios), punto desagüe pvc ø 2", reparaciones sanitarias en 2", punto desagüe pvc ø 3" - ø 4", sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), reinstalación de aparatos sanitarios, salida + interruptor, sencillo luminex o equivalente – pvc, salida para lampara fluorescente – pvc, salida para lampara fluorescente – emt, cableado 1#12, cableado 2#12, suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m, suministro e instalación de piso duro piso, mediacaña en granito h = 0.10 m, pirlan de aluminio, grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión ø 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, kit válvula de descarga antivandálica alta presión p´orinal, conexión ø 3/4" ó 1/2", 21-aa-950 docol ó similar,

suministro e instalación de sifón en p, para lavamanos, metálico cromado. importado, marca a&a o similar, llave manguera 1/2" (sum e instalación), suministro e instalación de push antivandálico para sanitario, suministro e instalación de cielo raso en pvc, vinilo s/pañete - 2 manos, vinilo bajo placa - 2 manos, remoción de pintura suelta manual, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, desbaste de filo existente y conformación de filo biselado, con aplicación de mezcla y estuco, suministro y aplicación de vinilo lineal para interiores 3 manos para anchos iguales o inferiores a 40 cm, suministro e instalación de enchape cerámico con medida 30cmx60cm para muros en interiores incluye pegante, boquilla y todos los elementos para su correcta ejecución en alturas inferiores a 3 metros.

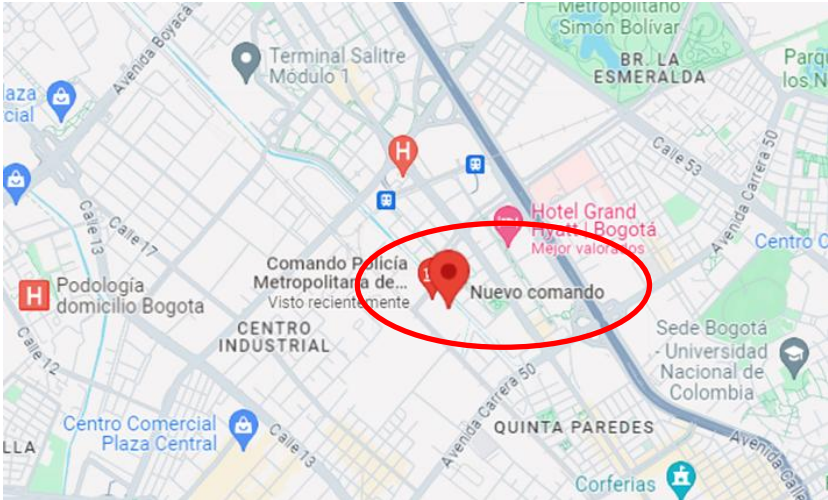
Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100 %	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		





Tabla 10. Frente de Obra – Comando Policía Metropolitana de Bogotá- NUEVO COMANDO.

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Teusaquillo	Comando Policía Metropolitana de Bogotá- Nuevo Comando	carrera 56 # 22-96	29/01/2025	02/05/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Comando Policía Metropolitana de Bogotá- NUEVO COMANDO	Teusaquillo	carrera 56 # 22-96
<div> <div>Polígono de intervención:</div>  </div>		
<div> <div>Descripción de actividades:</div> <p>Suministro e instalación de malla expandida imt-20 cal. 14 instalada a modo de cielo raso soldada sobre reja de seguridad. incluye platina pisa malla de 1 1/2x3/16" anticorrosivo y esmalte, desmonte piso flotante tipo porcelanato 60x60 e=2 cm incluye sistema succión para retiro de piezas, trasiego de piezas a zona de acopio incluye retiro plots e inventario de identificación. (equipamiento nuevo comando),lavado y secado de piso flotante en porcelanato 60x60 e=2 cm con sistema de lavado a presión incluye todos lo elementos para su ejecución (equipamiento nuevo comando),reinstalación piso flotante tipo porcelanato 60x60 e=2 cm incluye sistema succión para puesta de piezas, trasiego de piezas desde zona de acopio incluye instalación de plots.(equipamiento nuevo comando),suministro y aplicación de cordón tipo silicona para sello perimetral en zonas intervenidas de acuerdo a ficha técnica del fabricante (equipamiento nuevo comando),lavado de membrana impermeabilizante de acuerdo a ficha técnica del proveedor con sistema de presión graduable incluye todos lo elementos para su correcta ejecución (equipamiento nuevo comando),inspección y mantenimiento de tubería sistema manual húmedo (1 visita) en cumplimiento normativo nfpa 25. incluye herramienta menor, insumos de limpieza y pintura e informe de actividades y hallazgos. no incluye repuestos por acciones correctivas que sean necesarias; en caso de requerirse se cotizaran por separado. (equipamiento nuevo comando), tarjeta de control de generación avr, marca stamford, control regulador de voltaje del generador, incluye (cables, amarres, cinta, conexiones, terminales, valor mano de obra: desmonte e instalación de tarjeta de control de generación avr, marca stamford, control regulador de voltaje, programación y sincronización de información, puesta en funcionamiento de la planta eléctrica de emergencia. revisión y mantenimiento de equipos de ingreso de huella</p> </div>		

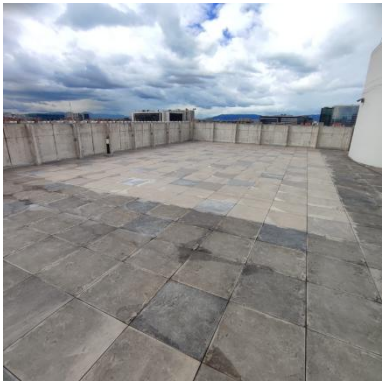
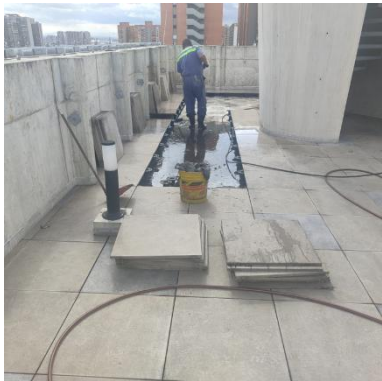
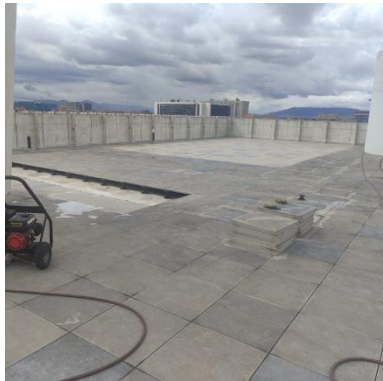
dactilar (biométrico) nuevo comando, desmonte de puertas en vidrio templado, desmonte de sifones, desmonte de push sanitarios, sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), suministro e instalación de sifón tipo acordeón plástico, sistema de accionamiento antivandálico alta presión p/orinal de colgar, docol ó similar (inc. válvula de descarga, botón de accionamiento antivandálico y accesorios para conexión posterior), mantenimiento y ajuste de puerta en vidrio de seguridad, incluye desmonte, ajuste, nivelación, lubricación y reinstalación.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
92,80%	96,37%	3,57%

Actividades pendientes por ejecutar

Mantenimiento sistema biométrico. (se continua con la actividad ya que algunos insumos son importados).

Registro fotográfico



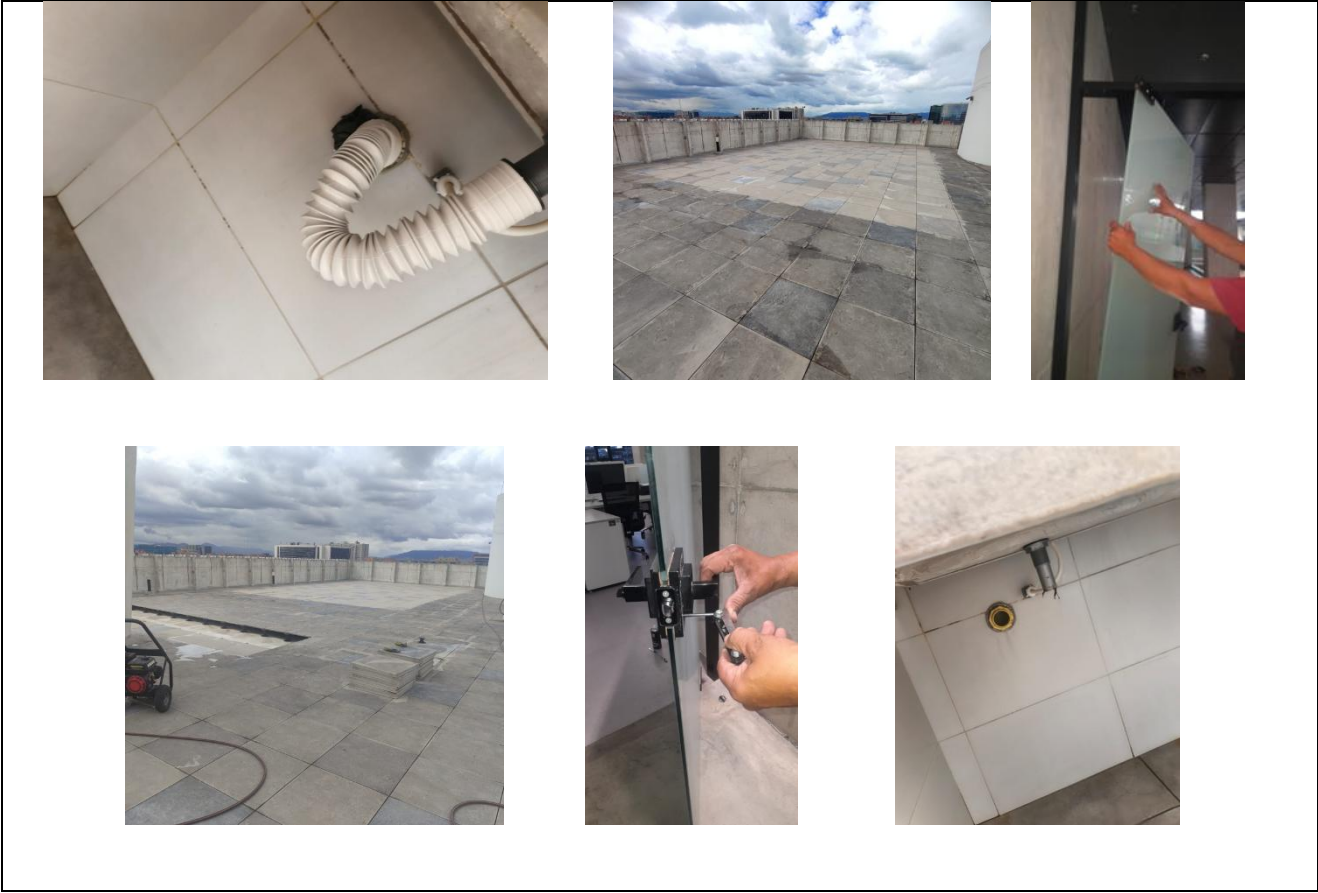


Tabla 11. Frente de Obra – CAI VERBENAL

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Usaquén	Caí VERBENAL	Calle 187 # 19 / 00	29/01/2025	29/02/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí VERBENAL	Usaquén	Calle 187 # 19 / 00
Polígono de intervención:		

Descripción de actividades:

Demolición de pisos en baldosín (inc. retiro de sobr.), regata sobre muros incluye retiro de sobrantes, desmonte puertas con marcos (inc. retiro de sobr.), escarificar pañetes (inc. retiro de sobr.), desmonte de sifones, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmonte de cerraduras (incluye retiro de sobrantes), desmonte de push sanitarios, demolición de acabados cerámicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye trasiego, retiro y disposición final de escombros), desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes), accesorios PVC-p $\varnothing$ 1/2", registro p/d red White $\varnothing$ 1/2" ó equivalente, tubería PVC rde 9 de 1/2", suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2" (incluye accesorios), sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), sellado y emboquillado de regata en muros y placas para tuberías de diámetros entre 1 1/2" a 4" sobre elementos de concreto, usando aditivos tipo sikadur 32 y sikatop 121 o similar., suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m., remoción de pintura suelta manual., suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra., desbaste de filo existente y conformación de filo biselado, con aplicación de mezcla y estuco., demolición mesón corrido (inc. retiro de sobr.), retiro de mantos asfálticos (inc. retiro de sobr.), desmonte de flanche en lámina galvanizada, desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), mantenimiento y limpieza de cajas de inspección. incluye limpieza de la caja, ajuste de marco y/o reparación de marco, salida para lámpara fluorescente – PVC, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 25w, 95-227v, 2320 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de interruptor doble, suministro e instalación de interruptor triple, suministro e instalación de toma corriente doble, suministro e instalación de toma gfci, suministro e instalación de interruptor sencillo, tubería emt 1/2" - suspendida incluye accesorios, suministro e instalación de tapa ciega, suministro e instalación de salida + tomacorriente doble en tubería emt de 1/2" sobrepuesta, (longitud promedio de salida 3 ml), suministro e instalación de caja metálica de paso, dimensiones 20x20x15, incluye tapa en plástico y adaptadores terminal emt 1/2", suministro e instalación de red eléctrica monofásica de cu 2 x n° 12 awg (1 fase + 1 neutro) + 1 x n° 12 t awg mantenimiento de tablero de 6 circuitos (incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de barrajes de neutros y tierras y limpieza general), loseta prefabricada concreto tipo a50 - 40 x 40 x 6 cm (incluye suministro e instalación. incluye base 4cm mortero 1:5, hecho en obra), dilatadores plásticos para piso, mantenimiento de piso en granito mediante resanes, pulida, brillada y sellada, suministro e instalación de piso duro piso, guarda escoba en granito h = 0.065, mediacaña en granito h = 0.10 m, mantenimiento de acabados de piso tipo losetas prefabricadas en concreto tipo a50 contemplando la reinstalación de las mismas losetas desmontadas. incluye base de mortero 1:5, cenefas en concreto de 0.30 - 3000 psi, flanche cal. 20 en lámina galvanizada desarrollo 30 cm, suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica, mantenimiento, restauración y reparación de mirilla metálica de caí. contempla la reparación de zonas afectadas, masillado y aplicación de pintura de acabado, mantenimiento y restauración de marcos de carpintería en aluminio mediante resane, masillado y aplicación de pintura de acabado tipo anoloc, suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable, medidas de 55x43cm, suministro e instalación de puerta corrediza de dos hojas cada una de 0,675x0,75m en lámina cold rolled calibre 18, incluye: manija, marco, aplicación de anticorrosivo y esmalte por ambas caras, suministro e instalación de mirilla metálica de 9,5x9,5cm, incluye seguro con platina y aplicación de pintura en esmalte, granito pulido mesones b = 60 cm incluye salpicadero y faldón, enchapes en piedra muñeca, win de aluminio, restauración de piedra muñeca. incluye re emboquillada, suministro e instalación de reflector de 100w, grifería lavaplatos tipo prisma o similar sobreponer (sum e instalación), instalación de grifería orinal, instalación de grifería sanitarios, orinal mediano de colgar institucional color blanco para conexión $\varnothing$ 5/8" ref 21-aa-

8860 mancesa ó similar + kit válvula de descarga anti vandálica alta presión para orinal, conexión $\varnothing$ 3/4" ó 1/2", 21-aa-950 docol ó similar, suministro e instalación sanitario de tanque tipo avanti ó similar, cambio de acople sanitario, suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio cumple con la. marca toto o similar, juego de incrustar acuacer o similar (sum e instalación), tapa registro 20 x 20 (sum e instalación), suministro e instalación de desagüe con rejilla para lavamanos, sencillo, con rebose, metálico, cromado, marca a&a o similar, llave manguera 1/2" (sum e instalación), sistema de accionamiento anti vandálico alta presión p/orinal de colgar, docol ó similar (inc. válvula de descarga, botón de accionamiento anti vandálico y accesorios para conexión posterior), grifería anti vandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión $\varnothing$ 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, esmalte sobre mampostería, vinilo bajo placa - 2 manos, pintura koraza para fachadas, suministro y aplicación de esmalte sobre lámina llena (contempla la preparación de la superficie previa aplicación), suministro y aplicación de doble mano de pintura bituminosa texsa o similar sobre manto asfáltico, cerradura safe o similar entrada 142a aluminio satinado, suministro e instalación de cerradura de seguridad 4 pasadores para puerta de acceso principal en CAIs, suministro e instalación de espejo cristal biselado de 4mm, suministro e instalación de espejo convexo de 30cm de diámetro. incluye soporte de fijación, limpieza de canales y bajantes, limpieza e impermeabilización de fachadas.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100 %	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
N/A		
Registro fotográfico		



Descripción de actividades:

demolición cielo raso falso (inc. retiro de sobr.), demolición de muros tolete e=12 cm. (inc. retiro de sobr.), desmonte y retiro de divisiones metálicas baños, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmonte de push sanitarios, demolición de acabados cerámicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye trasiego, retiro y disposición final de escombros), desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes), demolición de placa maciza de piso con espesor entre 10 y 15 cm. incluye retiro de sobrantes, accesorios pvc-p ø 1/2", tubería pvcp rde 9 de 1/2", punto hidráulico agua caliente, reparaciones hidráulicas pvc de 1/2" - 3/4" y 1", reparaciones sanitarias en 2" , accesorio pvc-s ø 2", tubería pvc sanitaria de 2" (incluye atraque en concreto), suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de luminaria panel led de 60*60 45w 6.000k 95-227v, 4.100lm, marco satín o blanco, 50.000 horas, grifería lavamanos tipo grival ó simil. (sum e instalación), kit válvula de descarga antivandálica alta presión para sanitario de conexión superior, docol ó similar, suministro e instalación de push antivandálico para sanitario, cielo raso plano drywall, estuco, vinilo s/pañete - 2 manos, vinilo bajo placa - 2 manos, remoción de pintura suelta manual, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, poda de césped (incluye retiro de sobrantes), suministro e instalación de enchape cerámico con medida 30cmx60cm para muros en interiores incluye pegante, boquilla y todos los elementos para su correcta ejecución en alturas inferiores a 3 metros, suministro e instalación de reja para ventana en varilla de 1/2". mantenimiento equipo de presión de agua potable, revisión succión de la bomba, incluye: 1 biching de 2 x 1 1/2", 2 niples de 1 1/2" y 1 coupling de 1 1/2", Carpintería metálica.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		



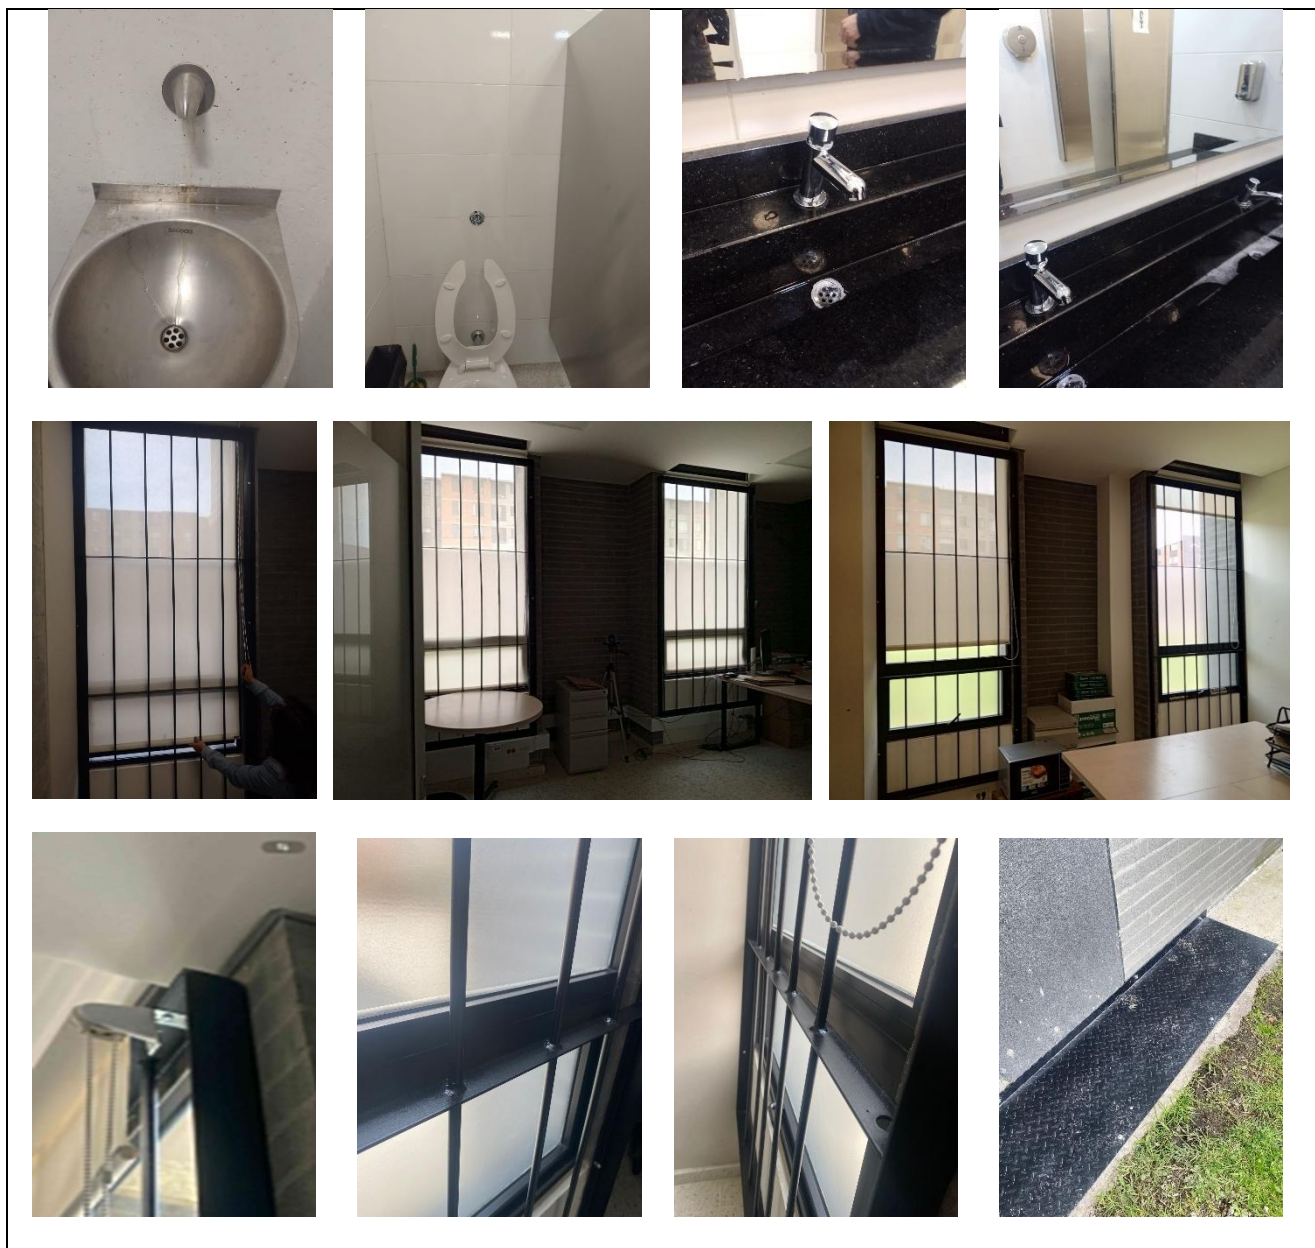


Tabla 13. Frente de Obra – CTP CAMPO VERDE.

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Bosa	CTP CAMPO VERDE	Cl. 85 SUR # 94.	24/02/2025	02/05/2025

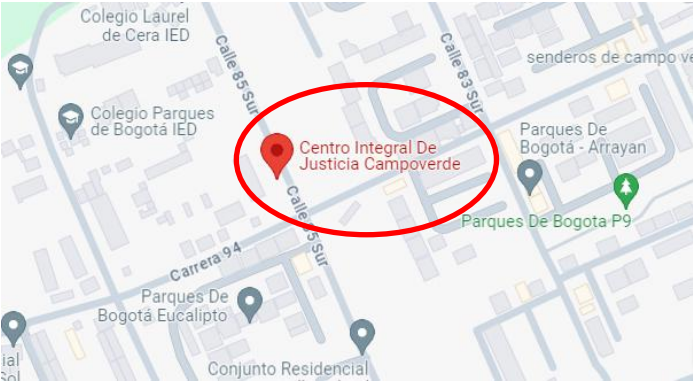
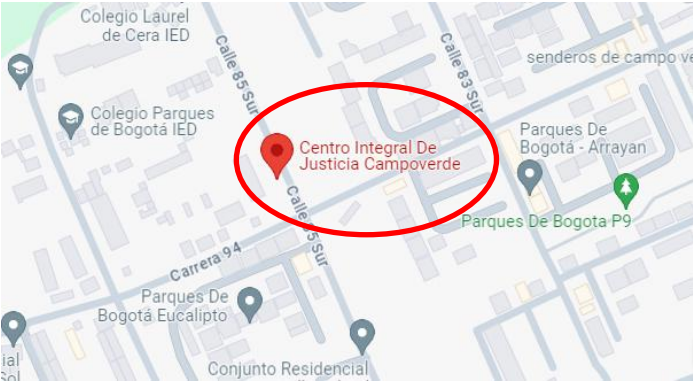
NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CTP CAMPO VERDE	BOSA	Cl. 85 SUR # 94.
Polígono de intervención:		
		
Descripción de actividades: demolición de muros tolete e=12 cm. (inc. retiro de sobr.), corte de placa con pulidora. incluye aseo, muro en ladrillo prensado santafe o similar e = 12 cm, muro en lámina de superboard, doble cara b 9 con espesor de 6 mm (incluye estructura, masilla acrílica y demás elementos para su correcta instalación), mantenimiento y limpieza de cajas de inspección. incluye limpieza de la caja, ajuste de marco y/o reparación de marco, suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m, media caña en cemento mortero 1:3, vinilo muros interiores 3 manos, líneas tráfico 0.10, mantenimiento de vidrios mediante el suministro e instalación de película sanblasting, mantenimiento de puerta metálica, desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), limpieza y desinfección de tanque en concreto para agua potable, mantenimiento y limpieza de cajas de inspección. incluye limpieza de la caja, ajuste de marco y/o reparación de marco, suministro e instalación de salida con caja rawel + tomacorriente doble en tubería emt de 3/8" hasta 3/4" sobrepuesta en placa, mantenimiento de puerta metálica entamborada de 2,1 x 1,30m corrediza. incluye desmonte, ajuste de riel, engrase, manija y montaje, suministro e instalación de brazo cierrapuertas de 150 kg.		
Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		



Tabla 14. Frente de Obra – CAE CAMPO VERDE.

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Bosa	CAE CAMPO VERDE	Cl. 85 SUR # 94.	24/02/2025	02/05/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CAE CAMPO VERDE	BOSA	Cl. 85 SUR # 94.
Polígono de intervención:		
		
Descripción de actividades: Demolición de muro liviano con alturas iguales o inferiores a 3 metros. incluye retiro de sobrantes, excavación manual tierra h<2.50 m. (inc. cargue, transporte y disposición final), cárcamo en concreto de 3000 psi hecho en obra con medidas internas de 40 cm de ancho, 60 cm de profundidad con muros de 10cm. (no incluye acero de refuerzo, ni rejilla), demolición de placa maciza de piso con espesor entre 10 y 15 cm. incluye retiro de sobrantes, chazos para carpintería, muro en lámina de superboard, doble cara b 9 con espesor de 6 mm (incluye estructura, masilla acrílica y demás elementos para su correcta instalación), accesorios pvc-p ø 1/2", accesorios pvc-p ø 3/4", accesorios pvc-p ø 1", suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2" (incluye accesorios), punto desagüe pvc ø 3" - ø 4", conducto, evacuación gas 15 x 22, punto eléctrico para toma corriente doble, suministro e instalación de interruptor doble, tubería emt 1/2" - suspendida incluye accesorios, cableado 1#12, cableado 2#12, suministro e instalación de salida con caja rawel + tomacorriente doble en tubería emt de 3/8" hasta 3/4" sobrepuesta en placa, suministro e instalación de malla expandida imt-20 cal. 14 instalada a modo de cielo raso soldada sobre reja de seguridad. incluye platina pisa malla de 1 1/2x3/16" anticorrosivo y esmalte, suministro e instalación de malla angeo en fibra de vidrio para mosquitos, roedores y aves, lampara 2x32 t8 bajo placa – hermética, suministro de punto sanitario d= 3", estuco, vinilo s/pañete - 2 manos, aplicación de pintura epóxica para pisos, suministro y aplicación de vinilo lineal para interiores 3 manos para anchos iguales o inferiores a 40 cm, suministro e instalación de lámina en acrílico de 5mm. incluye aplicación de sikaflex. Esmalte sobre mampostería, vinilo muros interiores 3 manos, placa en acrílico 100% calibre 3/16 blanco.		
Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		

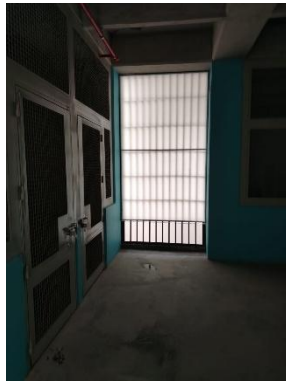
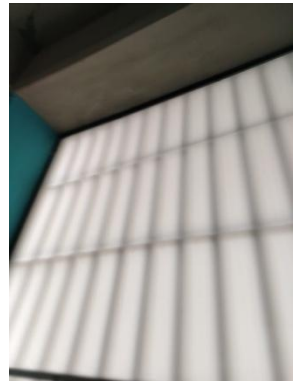
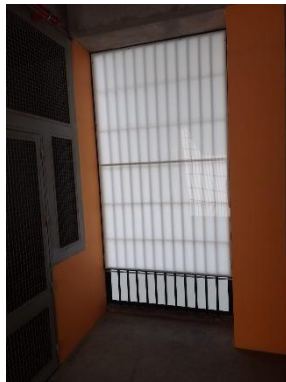
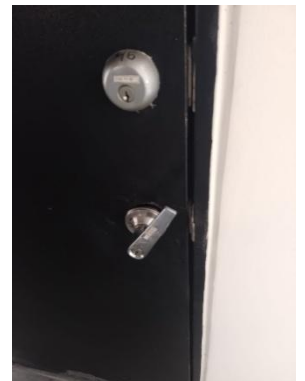
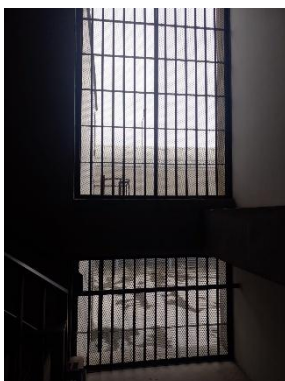
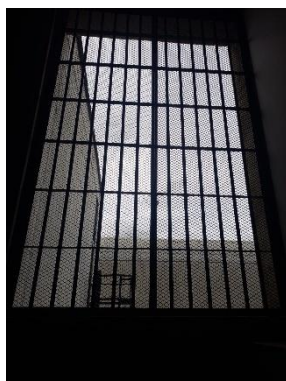
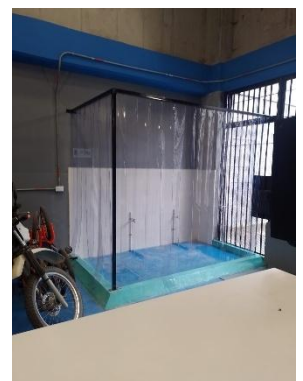
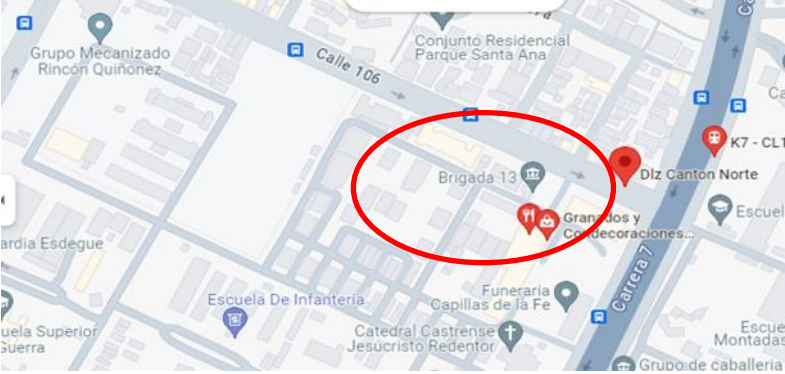


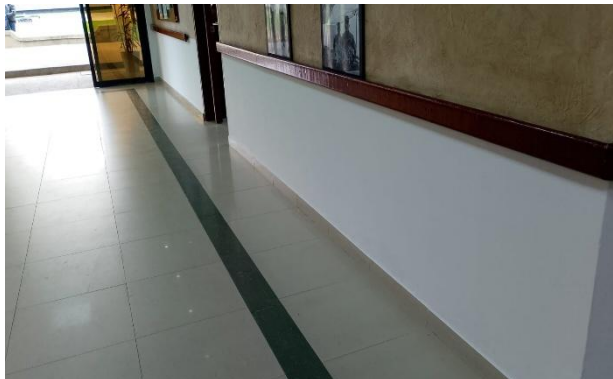
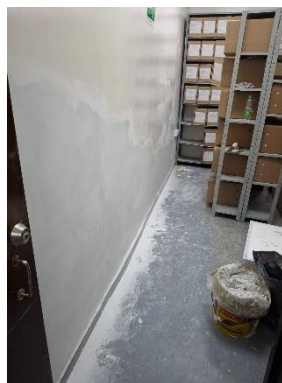
Tabla 15. Frente de Obra – SALA DE OPERACIONES.

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Usaquén	SALA DE OPERACIONES	Calle 106 # 7- 25.	18/02/2025	02/05/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
SALA DE OPERACIONES	USAQUEN	Calle 106 # 7- 25.
Polígono de intervención:		
		
Descripción de actividades: demolición de pisos en baldosín (inc. retiro de sobr.), demolición de guaradescoba (incluye retiro de sobrantes), desmonte ventanas o puertas metálicas (inc. retiro de sobrantes), desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmonte de cerraduras (incluye retiro de sobrantes), desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), desmonte de cerraduras (incluye retiro de sobrantes), desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes), reparaciones hidráulicas pvc de 1/2" - 3/4" y 1", sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), reinstalación de aparatos sanitarios, salida + tomacorriente doble monofásica – pvc, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 25w, 95-227v, 2320 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de luminaria panel led de 60*60 45w 6.000k 95-227v, 4.100lm, marco satín o blanco, 50.000 horas, desmonte de canaleta metálica de tomas y voz y datos. incluye retiro de sobrantes, resanes generales, suministro e instalación de piso tipo tableta de gres 30x30 grafilado. incluye emboquillado con mortero impermeabilizado, suministro e instalación de guaradescoba en tableta de gres unidad de 30 cm de largo, suministro e instalación de cubierta termoacústica tipo upvc e= 2,5mm o similar. incluye elementos de fijación y elementos para trabajo en altura. no incluye caballete, ventanas serie 8025 aluminio, puerta y marco en aluminio anodizado serie 3831/5020 - color mate natural + vidrio cristal templado incoloro 5 mm, ventanas aluminio anodizado serie 3831/5020 - color mate natural - incluye vidrio cristal templado incoloro 5 mm, suministro e instalación de canaleta metálica 12x5cm. incluye tapa metálica, mantenimiento de puerta metálica entamborada de 2,1 x 1,30m corrediza. incluye desmonte, ajuste de riel, engrase, manija y montaje, suministro e instalación de puerta en aluminio, incluye marco en aluminio, vidrio de 6mm incoloro y cerradura, pantalla led 24w 60x60 de incrustar, grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión ø 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol o similar, suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio cumple con la Ada. marca toto o similar, llave manguera 1/2" (sum e instalación), suministro e instalación de push antivandálico para sanitario, suministro e instalación de cielo raso en pvc, esmalte sobre mampostería, vinilo muros interiores 3 manos, vinilo s/pañete - 2 manos, vinilo bajo placa - 2 manos, remoción de pintura suelta manual, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado		

final. incluye transporte de insumos a obra, cerradura SCH Lage o similar entrada a-80 pd, vidrio crudo incoloro 6 mm - tipo peldar o similar, limpieza de canales y bajantes, cubiertas e impermeabilizaciones, carpintería metálica, iluminación, aparatos sanitarios, cielo raso, pintura, cerraduras, vidrios y obras exteriores

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100 %	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
Cielo raso, pintura, cerraduras, vidrios.		
Registro fotográfico		



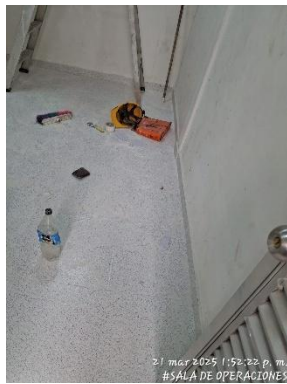
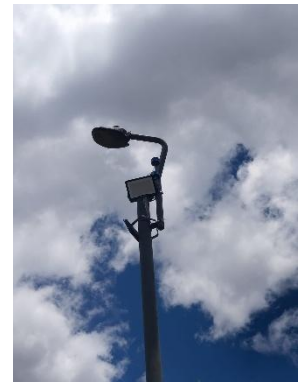


Tabla 16. Frente de Obra – BAACA - BAFLA.

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Tunjuelito	BAACA - BAFLA	BATALLON DE ARTILLERIA 13	21/02/2025	02/05/2025
NOMBRE		LOCALIDAD	DIRECCION	
BAACA - BAFLA		Tunjuelito	BATALLON DE ARTILLERIA 13	
Polígono de intervención:				
				
Descripción de actividades: demolición de pisos en baldosín (inc. retiro de sobr.), desmonte de sifones, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes), desmonte de accesorios sanitarios (tapa registros, pomos, regaderas, incrustaciones, rejillas, etc), mantenimiento de las dos bombas del sistema de presión, incluye instalación de válvula reguladora de presión a 60psi, calibración de los presos tatos a 90 y 85 psi. incluye revisión de conexión de motores y tableros, incluye instalación de dos válvulas desairado ras de 1" con accesorios, accesorios pvc-p ø 1", registro p/d red white ø 1" o equivalente, registro paso directo red white de 1 1/4", cheque p/d red white ø 1" o equivalente, tubería pvcp rde 9 de 1/2", tubería pvcp rde 21 ø 1 1/2", reparaciones hidráulicas pvc de 1/2" - 3/4" y 1", sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), reinstalación de aparatos sanitarios, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 25w, 95-227v, 2320 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, mantenimiento general de tableros de 18 circuitos trifásicos (incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de barrajes de neutros y tierras y limpieza general), limpieza y reemboquille de enchape, suministro e instalación de piso duro piso, suministro e instalación de rejilla metálica de piso de 3" en acero inoxidable, lampara 2x32 t8 bajo placa – hermética, ducha calypso mezclador (sum e instalación), sanitario tipo acuacer blanco corona o similar (sum e instalación), suministro e instalación de sifón en p, para lavamanos, metálico cromado. importado, marca a&a o similar, llave manguera 1/2" (sum e instalación), instalación poma, suministro e instalación de candado tipo alemán yale.				
Estado programado				
Programado		Ejecutado	Avance/Atraso	
100%		100 %	0,00%	
Actividades pendientes por ejecutar				
NA				
Registro fotográfico				



Tabla 17. Frente de Obra – URI DE PUENTE ARANDA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Puente Aranda	URI	Carrera 40#10ª-08	31/01/2025	02/05/2025

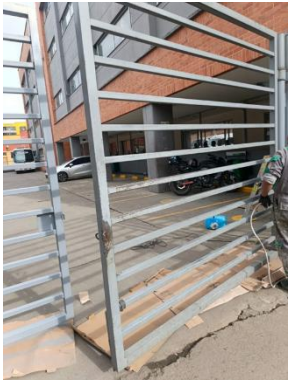
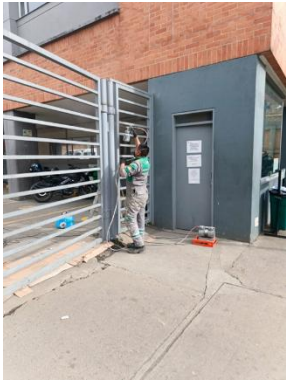
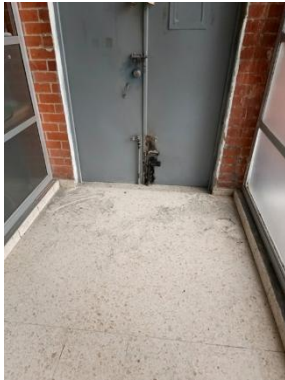
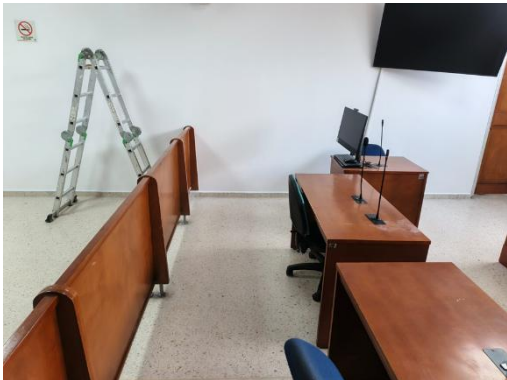
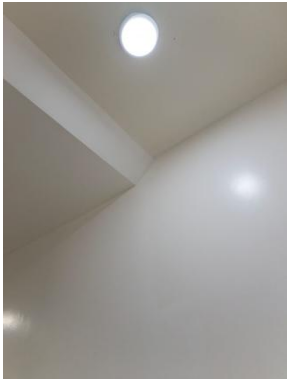
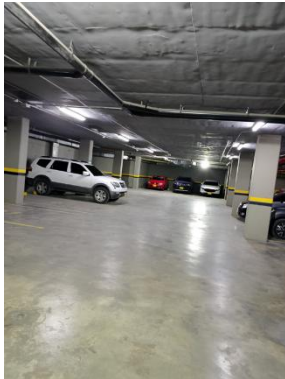
NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
URI DE PUENTE ARANDA	Puente Aranda	Carrera 40#10 ^a -08

Polígono de intervención:

**Descripción de actividades:**

Arreglo pasadores para puerta exterior, incluye cadena y candado, suministro e instalación de extractor de ventana (incluye demolición de vano, adecuación de vano, instalación de extractor y retiro de sobrantes), mantenimiento de portón en lámina cold rolled de 480 x 300 cm(incluye instalación de platinas de 3/16", pasadores, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura en esmalte , duro hueso y soldadura, en cada cara de los tubos de 1 " y en las 2 caras de la lámina), esmalte sobre mampostería, esmalte s/ lámina lineal, remoción de pintura suelta manual., suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, demolición cielo raso falso (inc. retiro de sobr.), desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmontes de tableros eléctricos , suministro e instalación de muro en superboard, doble cara b 9 con espesor de 6 mm (incluye aislamiento acústico, estructura, masilla acrílica y demás elementos para su correcta instalación), reparaciones hidráulicas pvc de 1/2" - 3/4" y 1", suministro e instalación de registro de 2" en PVC, tubería emt 3/4" - suspendida incluye accesorios, mantenimiento general de tableros de 24 circuitos trifásicos (incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de barrajes de neutros y tierras y limpieza general), suministro e instalación de caja metálica de paso, dimensiones 20x20x15, incluye tapa en plástico y adaptador terminal emt 1/2", suministro e instalación de cable no.12 awg thhn/thwn-2 600v 90°C. libre de halógeno, puerta y marco en aluminio anodizado serie 3831/5020 - color mate natural + vidrio cristal templado incoloro 5 mm, suministro e instalación de lámparas herméticas, pantalla led 24w 60x60 de incrustar, taparregistro 20 x 20 (sum e instalación), suministro e instalación de cielo raso en pvc, suministro e instalación de enchape cerámico con medida 30cmx60cm para muros en interiores incluye pegante, boquilla y todos los elementos para su correcta ejecución en alturas inferiores a 3 metros, suministro e instalación de sistema de insonorización mediante aplicación de frescaza, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmonte de accesorios sanitarios (tapa registros, pomos, regaderas, incrustaciones, rejillas, etc....), sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), pantalla led 24w 60x60 de incrustar, llave manguera 1/2" (sum e instalación).

Estado programado

Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
82,90%	83,32%	0,42%
Actividades pendientes por ejecutar		
Pintura esmalte mampostería, vinilo bajo techo, luminarias, interruptores, tomacorriente, cielo raso PVC, puerta de aluminio con vidrio, sondeos, reparaciones hidráulicas y las actividades requeridas por el logístico del equipamiento para un buen funcionamiento de la infraestructura de la edificación y aprobadas por la supervisión del contrato.		
Registro fotográfico		
   		
 		
   		

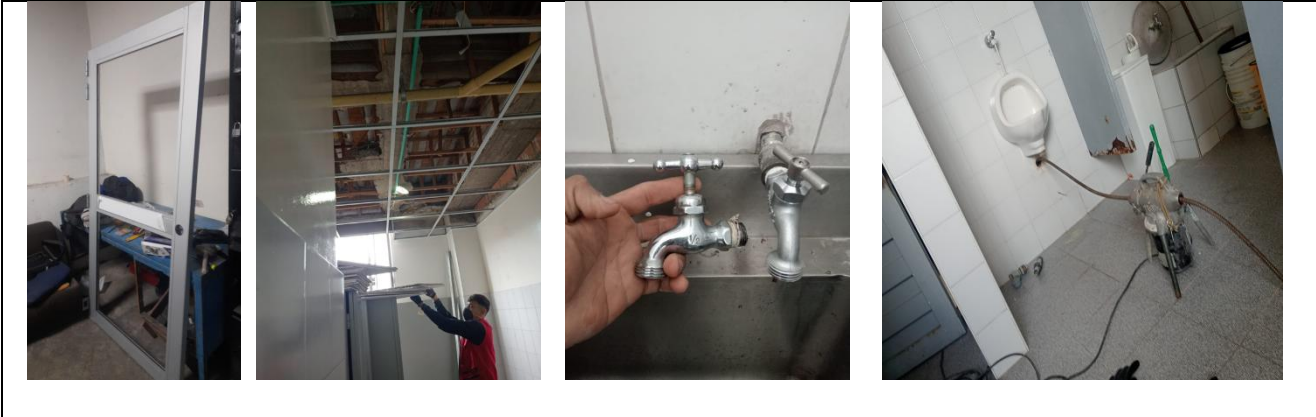


Tabla 18. Frente de Obra – CER – CENTRO DE RECLUSION ESPECIAL

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Puente Aranda	CER	CRA 41ª No. 6 / 343	03/02/2025	02/05/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CER- Centro de reclusión especial	Puente Aranda	CRA 41ª No. 6 / 343
<p>Polígono de intervención:</p>		

Descripción de actividades:

Desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 25w, 95-227v, 2320 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, grifería lavaplatos tipo prisma o similar sobreponer (sum e instalación). desmonte de cerraduras (incluye retiro de sobrantes), cerradura puertas acceso principal.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
78,83	78,83%	0,00%
Actividades pendientes por ejecutar		
Actividades requeridas por el logístico del equipamiento para buen funcionamiento y aprobadas por la supervisión del contrato.		

Registro fotográfico

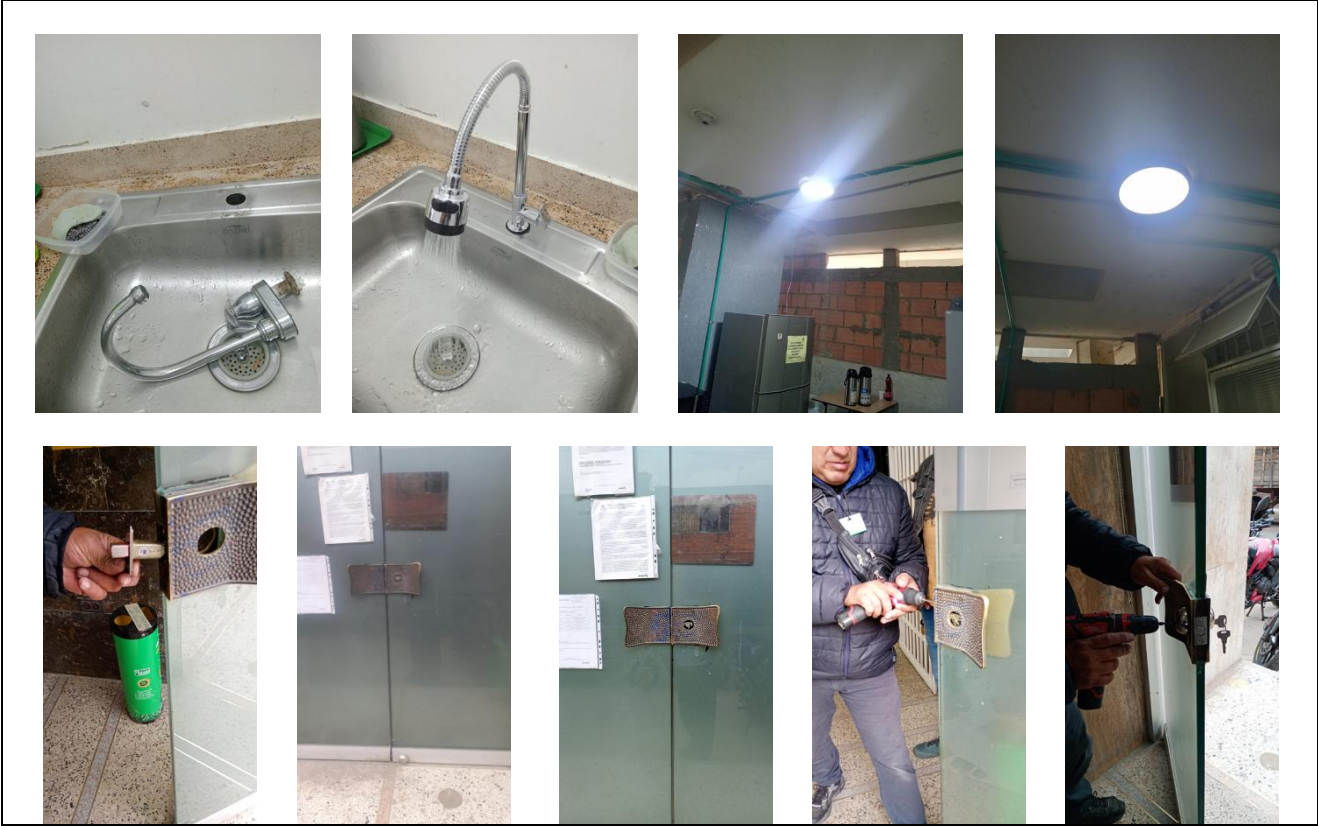


Tabla 19. Frente de Obra – CAI VICTORIA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
San Cristóbal	Caí VICTORIA	Cra 3ª este	07/02/2025	07/04/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí VICTORIA	San Cristóbal	Cra 3ª este
Polígono de intervención:		

Descripción de actividades:
Suministro e instalación de ventana blindada en cold-rolled cal. 14 nivel iii. 1. cristales laminados en caliente incoloro e=30 mm nivel III. pintura electrostática color crudo o natural. pisa vidrio y marco. 4. montaje a través de tornillos de expansión y epóxidos. película de seguridad o anti esquirlas de 4" mls. de espesor.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar
NA

Registro fotográfico











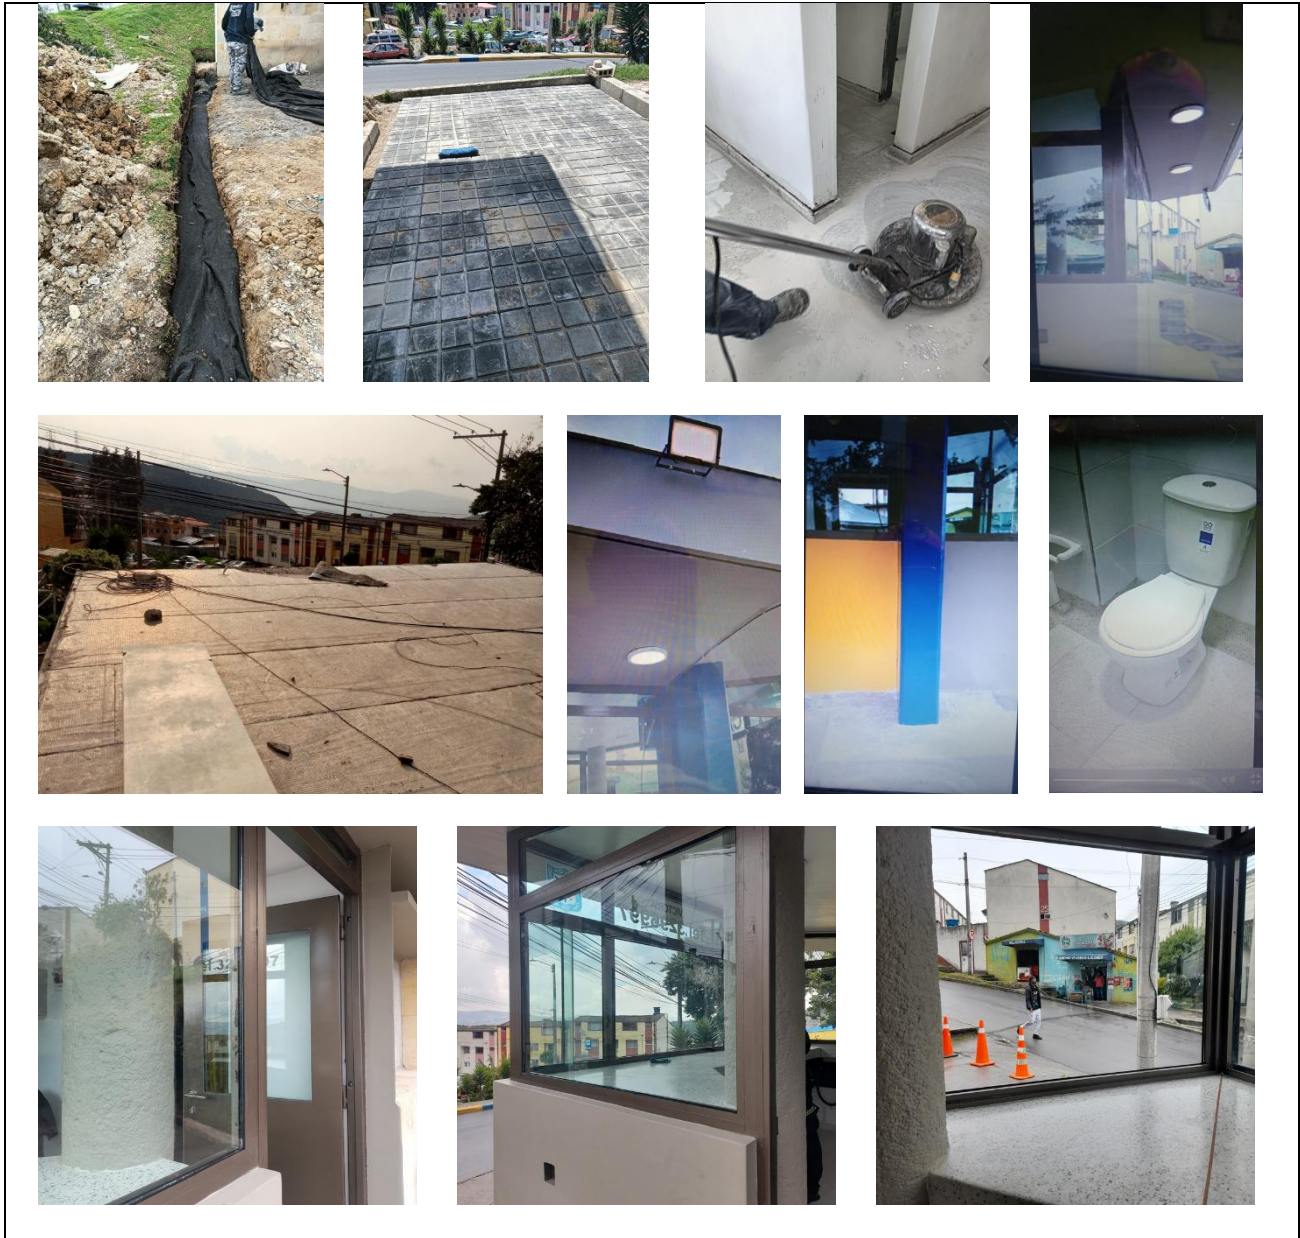
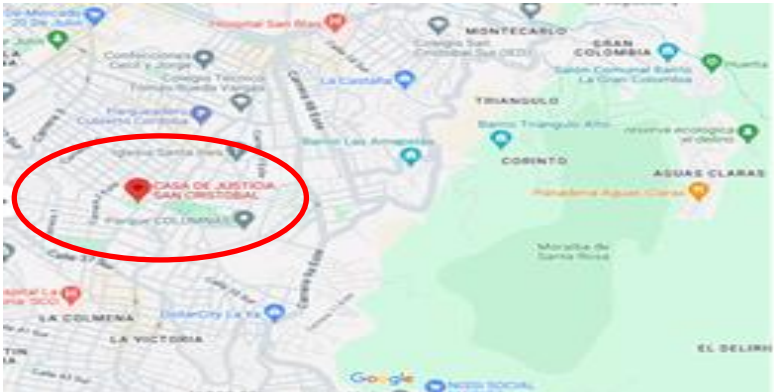


Tabla 20. Frente de Obra – CASA DE JUSTICIA SAN CRISTOBAL

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
San Cristóbal	CJ SAN CRISTOBAL	Dig 31csur # 67 este -3.	11/02/2025	02/05/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CJ SAN CRISTOBAL	San Cristóbal	Dig 31csur # 67 este -3.
Polígono de intervención:		
		
Descripción de actividades: Desmonte de push sanitarios, grifería lavamanos tipo grival ó simil. (sum e instalación), vinilo muros interiores 3 manos, vinilo bajo placa - 2 manos, suministro y aplicación de vinilo lineal para interiores 3 manos para anchos iguales o inferiores a 40 cm, limpieza y desinfección de tanque en concreto para agua potable, suministro e instalación de accesorios, en pvc - p de 2", resanes generales, suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica. ,suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio para anchos iguales o inferiores a 60 cm. incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica., puerta y marco en aluminio anodizado serie 3831/5020 - color mate natural + vidrio cristal templado incoloro 5 mm,suministro e instalación de malla angeo en fibra de vidrio para mosquitos, roedores y aves., pantalla led 24w 60x60 de incrustar, suministro e instalación de sifón en p, para lavamanos, metálico cromado. importado, marca a&a o similar., vinilo muros interiores 3 manos, vidrio crudo incoloro 4 mm - tipo Peldar ó similar, suministro e instalación de sika flex para reparaciones y mantenimientos, poda de césped (incluye retiro de sobrantes), suministro e instalación de sellado de ventanas para fachada exterior en alturas entre 1,5 metros y 12 metros, ventanas aluminio anodizado serie 3831/5020 - color mate natural - incluye vidrio cristal templado incoloro 5 mm.		
Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0 %
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		


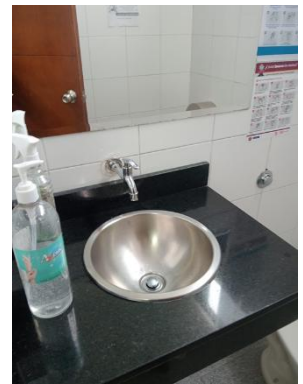

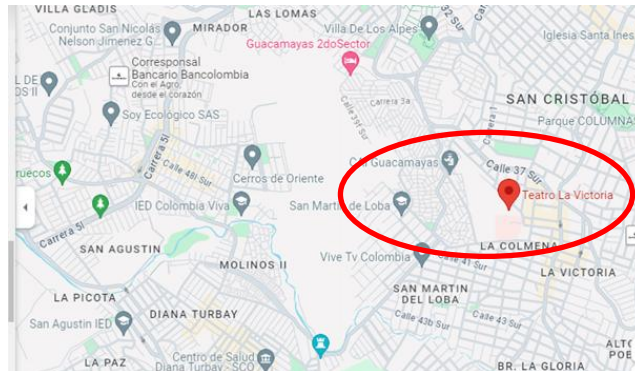


Tabla 21. Frente de Obra – CJR LA VICTORIA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
San Cristóbal	CJR LA VICTORIA	Calle 36 m sur	12/02/2025	02/05/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CJR LA VICTORIA	San Cristóbal	Calle 36 m sur

Polígono de intervención:

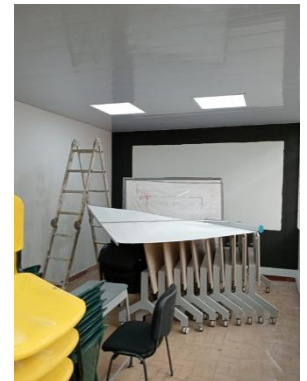
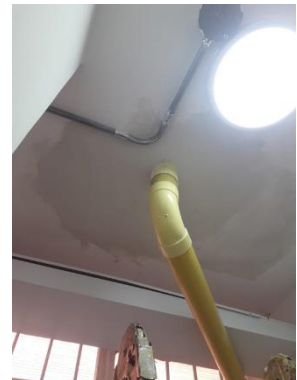


Descripción de actividades:

Desmonte aparatos sanitarios (sólo p´atención de emergencias con reinstalación del mismo aparato sanitario), sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), vinilo muros interiores 3 manos, vinilo bajo placa - 2 manos, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, limpieza profunda de cárcamo, desmonte de sifones, sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), vinilo muros interiores 3 manos, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, desmonte de sifones, reparaciones tubería PVC sanitaria de 3" ,sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"),sellado y emboquillado de pase de tuberías de diámetros entre 2" a 4" sobre elementos de concreto, usando aditivos tipo sikadur 32 y sikatop 121 o similar, sellado y emboquillado de regata en muros y placas para tuberías de diámetros entre 1 1/2" a 4" sobre elementos de concreto, usando aditivos tipo sikadur 32 y sikatop 121 o similar., suministro e instalación de malla angeo en fibra de vidrio para mosquitos, roedores y aves., suministro e instalación de sifón en p, para lavamanos, metálico cromado. importado, marca a&a o similar., grifería anti vandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión $\varnothing$ 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, suministro e instalación de asiento sanitario tipo estándar, cerradura safe o similar entrada 142a aluminio satinado, suministro e instalación de enchape cerámico con medida 30cmx60cm para muros en interiores incluye pegante, boquilla y todos los elementos para su correcta ejecución en alturas inferiores a 3 metros, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes),desmonte de cerraduras (incluye retiro de sobrantes),suministro e instalación de muro en superboard, de una cara, con espesor de 10 mm (incluye, estructura, masilla acrílica y demás elementos para su correcta instalación), en alturas iguales o inferiores a 5 metros, reparaciones tubería pvc sanitaria de 3" ,tubería pvc sanitaria de 3" (incluye atraque en concreto),suministro e instalación de interruptor sencillo, resanes generales, rejillas piso $\varnothing$ 30 cm vinilo muros interiores 3 manos, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, suministro e instalación de cerradura

cilíndrica de pomo metálico grado 2 función aula, (pomo interior siempre activo, pomo exterior se activa con la llave.) con amaestramiento según especificación. referencia yale lf 5308 o equivalente, limpieza de canales y bajantes.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
1,00%	100 %	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		



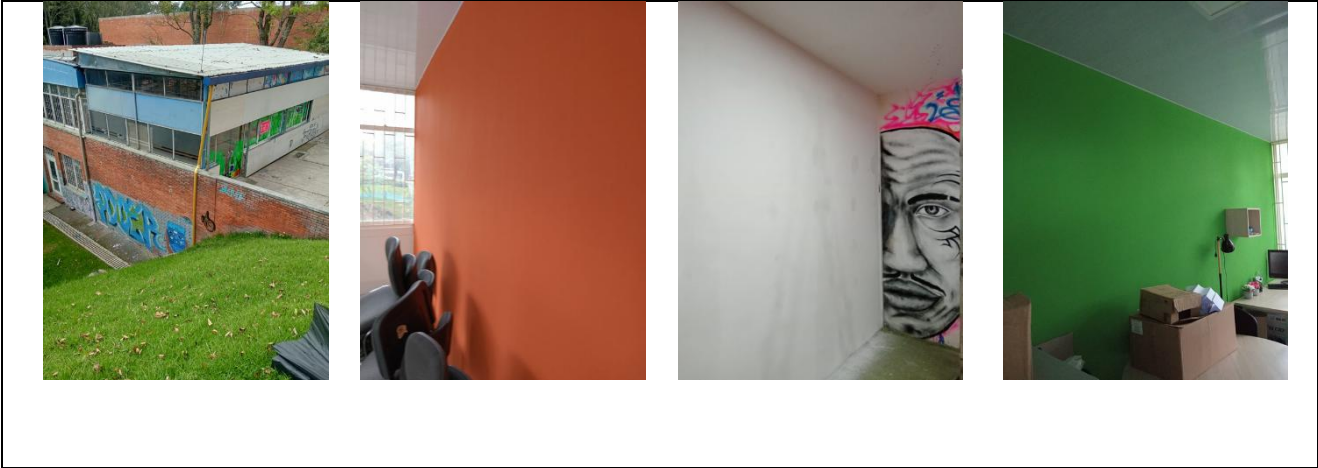


Tabla 22. Frente de Obra – CJR SANTA FE

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Santa Fe	CJR SANTA FE	Cra 4 # 23 - 28	12/02/2025	02/05/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CJR SANTA FE	Santa Fe	Cra 4 # 23 - 28
<p>Polígono de intervención:</p>		

Descripción de actividades:

Demolición pisos en tablón (inc. retiro de sobr.), demolición de guarda escoba (incluye retiro de sobrantes), relleno en recebo b-200, incluye compactación, malla electro soldada estándar 5mm, suministro e instalación de muro en superboard, de una cara, con espesor de 10 mm (incluye, estructura, masilla acrílica y demás elementos para su correcta instalación), en alturas iguales o inferiores a 5 metros, vinilo muros interiores 3 manos, vinilo bajo placa - 2 manos, remoción de pintura suelta manual, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, retiro de mantos asfálticos (inc. retiro de sobr.), desmonte de teja ondulada etérnit, desmonte de flanche en lámina galvanizada. ,desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), suministro e instalación de muro en superboard, de una cara, con espesor de 10 mm (incluye, estructura, masilla acrílica y demás elementos para su correcta instalación), en

alturas iguales o inferiores a 5 metros., punto eléctrico para toma corriente doble., suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, resanes generales, mantenimiento de piso en madera mediante el suministro e instalación de guaradescoba, suministro e instalación de piso laminado spc. incluye superlón reforzado 2mm, pirlán de aluminio, flanche lámina galvanizada cl. 20 - ds=50 cm, suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica, suministro e instalación de cubierta termo acústica tipo upvc e= 2,5mm o similar. incluye elementos de fijación y elementos para trabajo en altura. no incluye caballete, suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio para anchos iguales o inferiores a 60 cm. incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica., pantalla led 24w 60x60 de incrustar, suministro e instalación de sifón en p, para lavamanos, metálico cromado. importado, marca a&a o similar., suministro e instalación de asiento sanitario tipo estándar, vinilo muros interiores 3 manos, remoción de pintura suelta manual, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, limpieza de canales y bajantes, tubería emt 3/4" - suspendida incluye accesorios, cableado 1#10, cableado 2#12, interruptor automático enchufable 2 polo 15/30 a, suministro e instalación de caja de paso de 60x60x20 en lámina cold rolled con recubrimiento en pintura electroestática calibre 20., pantalla led 24w 60x60 de incrustar, aseo en obra incluye implementos para su ejecución dentro de los espacios intervenidos,

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100 %	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		

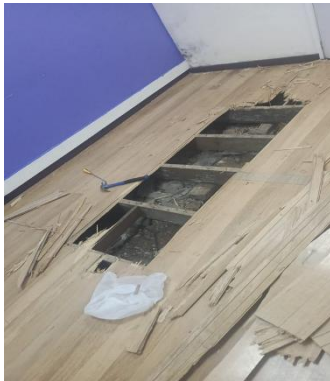




Tabla 23. Frente de Obra – BAMAR

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Sumapaz	BAMAR	Batallón de alta montaña No, 1 - Sumapaz	18/02/2025	02/05/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Bamar	Sumapaz	Batallón de alta montaña No, 1 -Sumapaz

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:

Desmante de teja ondulada eternit ,desmante de flanche en lámina galvanizada, desmante de lámparas (incluye retiro de sobrantes),desmante de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores).,desmante de cableado eléctrico (contempla los cables contenidos dentro de un ducto entre calibres #8, #10 y #14),excavación manual tierra h<2.50 m. (inc. cargue, transporte y disposición final).compactación y relleno con material existente, salida para lámpara fluorescente - pvc, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de interruptor doble, suministro e instalación de toma corriente doble, suministro e instalación de interruptor sencillo, tubería emt 3/4" - suspendida incluye accesorios, tubería emt 1 1/2" - suspendida incluye accesorios, suministro e instalación de caja metálica de paso, dimensiones 20x20x15, incluye tapa en plástico y adaptadores terminal emt 1/2",suministro e instalación de acometida 3#6 + 1#6 neutro + 1#8 tierra en cable thhn 90° c. incluye protector de cableado, suministro e instalación de red eléctrica monofásica de cu 2 x n° 10 awg (1 fase + 1 neutro) + 1 x n° 12 t awg, revisión y organización general de tablero de 12 circuitos (contempla: identificación de circuitos, peinado y limpieza de tablero y marquillado), suministro e instalación de cubierta tipo thermo sky o similar 2.5mm. incluye accesorios de instalación, andamio, herramientas y equipos ,suministro e instalación de caballete tipo thermo sky o similar 2.5mm. incluye accesorios de instalación, andamio, herramientas y equipos, suministro e instalación de lámparas herméticas, suministro e instalación de reflector de 100w,cielo raso en lámina alfajor cal. 14 incluye estructura de soporte metálica con tubería pesada 4*8, platina de 1 1/2"*1/8, con soldadura pesada 70/18 y anclado al concreto con perno y chazo expansivo de 1/2 *2 1/2",suministro e instalación de módulo de cerramiento perimetral en malla eslabonada calibre 10 de 2" con h=2m. incluye marco en ángulo de 1 1/2" x 1/8", platina de 1 1/2"x 3/16", soldadura y aplicación de anticorrosivo y pintura, suministro e instalación de lámina en acrílico de 5mm. incluye aplicación de sikaflex, desmante de lámparas (incluye retiro de sobrantes),desmante de cerraduras (incluye retiro de sobrantes),desmante de policarbonato existente; incluye retiro de sobrantes, desmante de accesorios

eléctricos (tomacorrientes e interruptores),desmante de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes),salida + interruptor sencillo luminex o equivalente - pvc, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de interruptor doble, suministro e instalación de toma corriente doble, tablero de automáticos de 12 circuitos tipo pesado con puerta y cerradura de cierre, cerradura y espacio totalizador industrial ntq-412t y barraje de tierra aislada, interruptor automático enchufable 2 polo 15/30 a, interruptor automático enchufable 2 polo 40/60 a, limpieza y re emboquille de enchape, instalación de grifería sanitarios, suministro e instalación sanitario de tanque tipo avanti o similar ,cambio de acople sanitario, suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio cumple con la Ada. marca toto o similar, juego de incrustar acuacer o similar (sum e instalación), suministro e instalación de desagüe con rejilla para lavamanos, sencillo, con rebose, metálico, cromado, marca a&a o similar, suministro e instalación de sifón en p, para lavamanos, metálico cromado. importado, marca a&a o similar., llave manguera 1/2" (sum e instalación), grifería anti vandámica para lavamanos pico largo tipo push, conexión ø 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, suministro e instalación manija galvanizada para puerta.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100 %	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		



Tabla 24. Frente de Obra – PM13

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Puente Aranda	PM13	Cra 50 # 18-05	19/02/2025	27/04/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
PM13	Puente Aranda	Cra 50 # 18-05

Polígono de intervención:

Descripción de actividades:

Demolición cielo raso falso (inc. retiro de sobr.), regata sobre muros incluye retiro de sobrantes, desmonte aparatos sanitarios (sólo p'atención de emergencias con reinstalación del mismo aparato sanitario), suspensión de salida hidráulica (inc. retiro de sobr.), desmonte de puertas., desmonte de sifones, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmonte de push sanitarios, demolición de acabados cerámicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye trasiego, retiro y disposición final de escombros), desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores)., desmonte de espejo (incluye retiro y disposición final), desmonte de accesorios sanitarios (tapa registros, pomos, regaderas, incrustaciones, rejillas, etc...), demolición de muro liviano con alturas iguales o inferiores a 3 metros. incluye retiro de sobrantes, corte de placa con pulidora. incluye aseo, suministro e instalación de tapa para caja de inspección de 60 a 1 m de ancho, muro en bloque no. 5 e=15cm, accesorios pvc-p ø 2",registro paso directo red white de 1 1/4",reparaciones sanitarias en 2" ,sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"),sellado y emboquillado de pase de tuberías de diámetros entre 2" a 4" sobre elementos de concreto, usando aditivos tipo sikadur 32 y sikatop 121 o similar., sellado y emboquillado de regata en muros y placas para tuberías de diámetros entre 1 1/2" a 4" sobre elementos de concreto, usando aditivos tipo sikadur 32 y sikatop 121 o similar., mantenimiento y limpieza de cajas de inspección . incluye limpieza de la caja, ajuste de marco y/o reparación de marco, mantenimiento general de tableros de 18 circuitos trifásicos (incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de barrajes de neutros y tierras y limpieza general), pañete liso sobre muros 1:4 ,limpieza y reemboquille de enchape, boca puerta en gravilla lavada (incluye dilatación en plástica), suministro e instalación de guaradescoba en duro piso h=8cm, suministro e instalación de marcos en aluminio soporte 60*60. incluye pintura electroestática, suministro e instalación de rejilla metálica de piso de 3" en acero inoxidable, suministro e instalación de pasador de 2". incluye tornillos. , pantalla led 24w 60x60 de incrustar, ducha calypso mezclador (sum e instalación), sanitario institucional fluxómetro (sum e instalación), desmonte y reposición de manija de ducha, incluye retiro de sobrantes., suministro e instalación de desagüe con rejilla para lavamanos, sencillo, con rebose, metálico, cromado, marca a&a o similar., suministro e instalación de sifón en p, para lavamanos, metálico cromado. importado, marca a&a o similar., suministro e instalación de cielo raso en pvc, esmalte sobre mampostería, vinilo muros interiores 3 manos, anticorrosivo s/lámina llena, anticorrosivo s/lámina lineal, esmalte s/ lámina lineal, remoción de pintura suelta manual., suministro y aplicación de esmalte sobre lámina llena (contempla la preparación de la superficie previa aplicación),suministro e instalación de espejo cristal biselado de 4mm,limpieza de canales y bajantes, suministro e instalación de enchape cerámico con medida 30cmx60cm para muros en interiores incluye pegante, boquilla y todos los elementos para su correcta ejecución en alturas inferiores a 3 metros.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100 %	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		

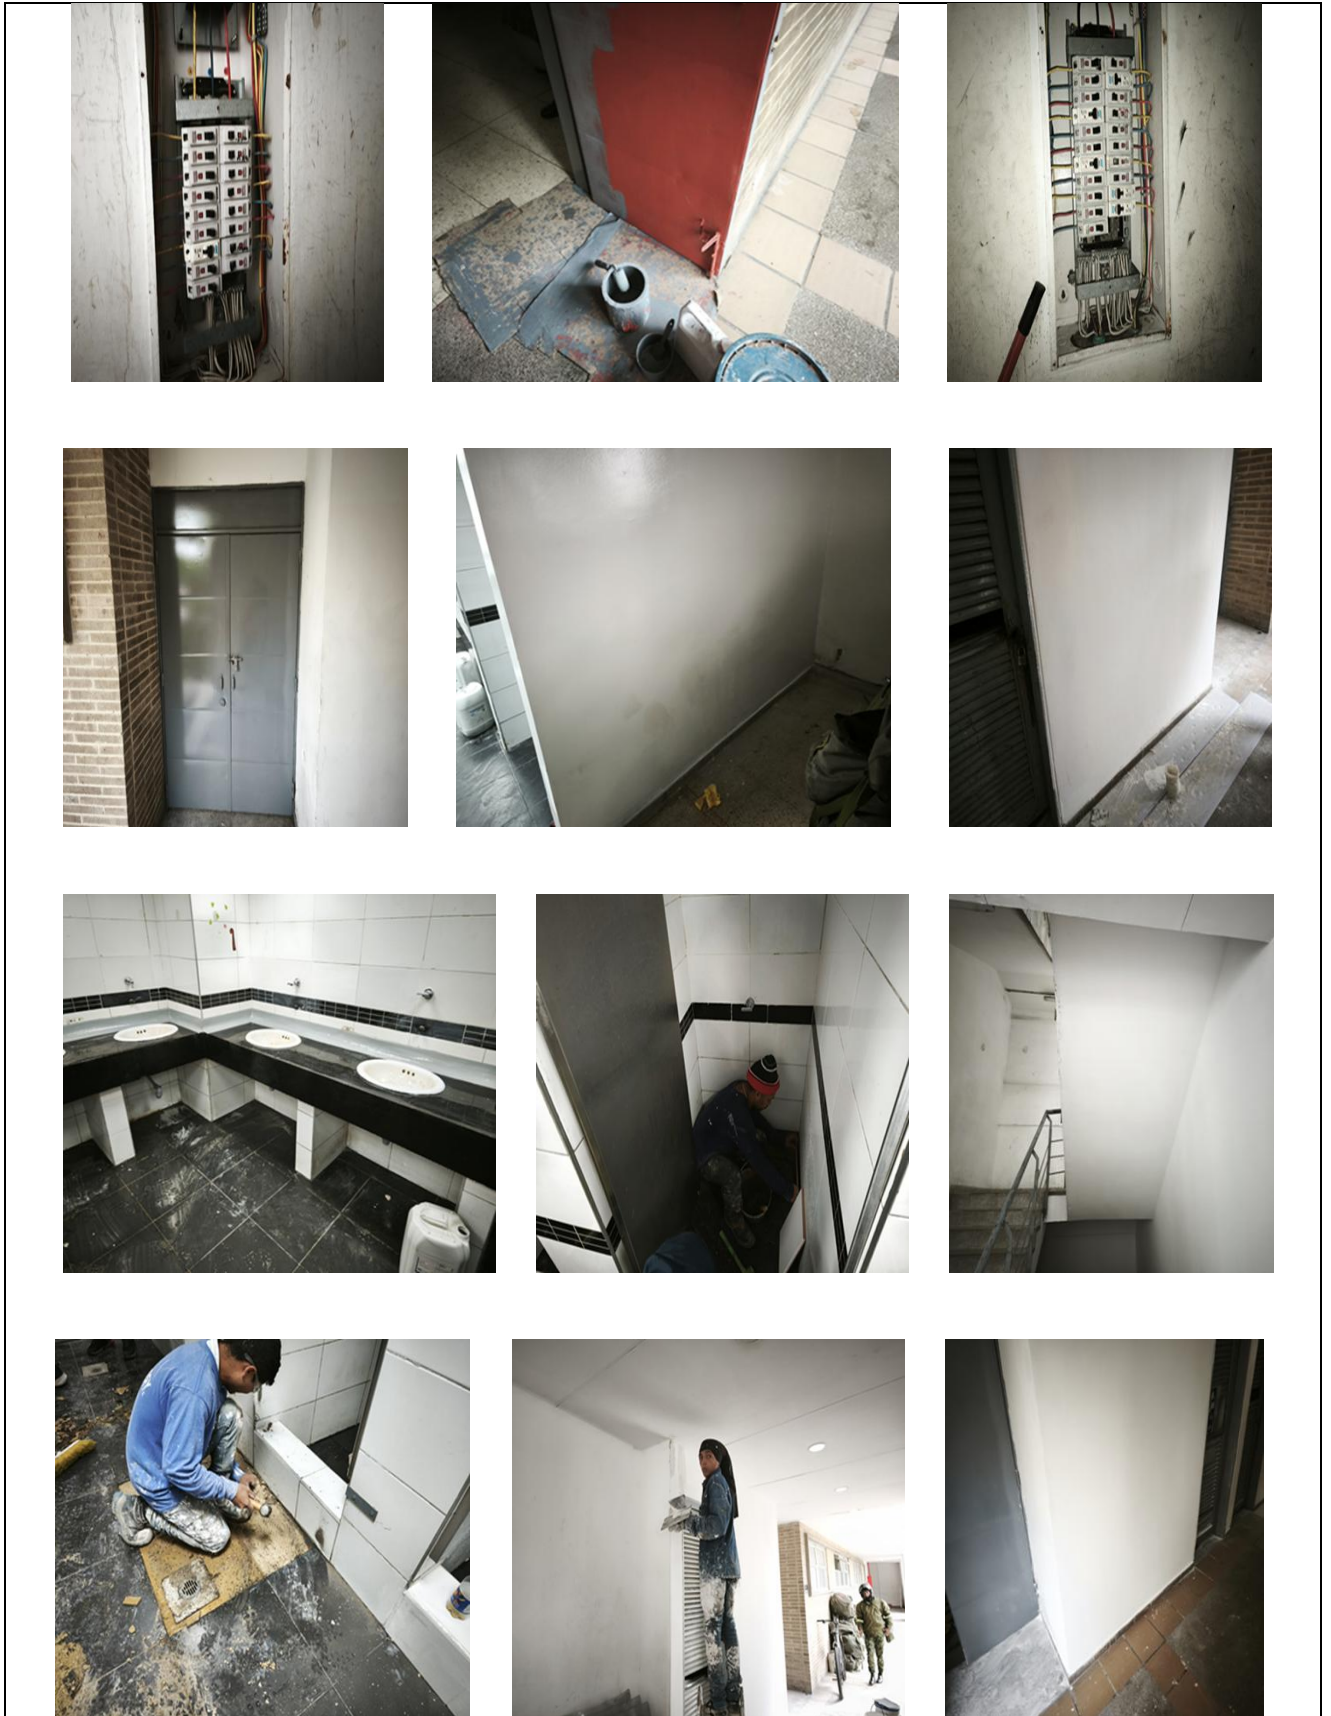
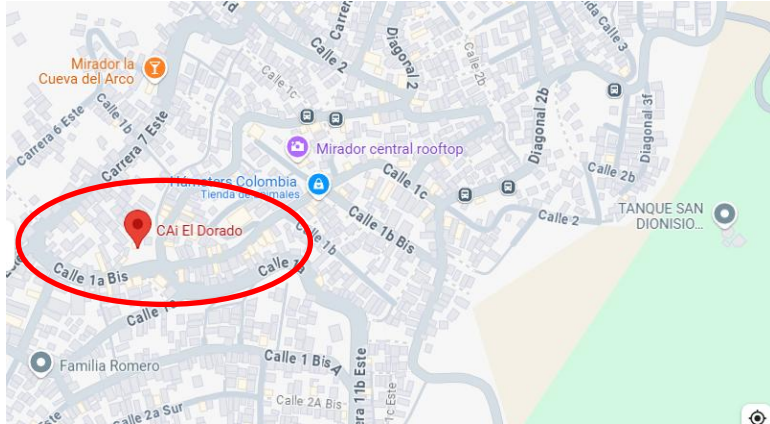


Tabla 25. Frente de Obra – CAI DORADO

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Santa Fe	CAI DORADO	Calle 1Bis A No. 8-82	27/02/2025	27/04/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí DORADO	Santa Fe	Calle 1Bis A No. 8-82

Polígono de intervención:

**Descripción de actividades:**

Regata sobre muros incluye retiro de sobrantes, escarificar pañetes (inc. retiro de sobr.), accesorios pvc-p $\varnothing$ 1/2", registro p/d red White $\varnothing$ 1/2" ó equivalente, tubería pvcp rde 9 de 1/2", suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2" (incluye accesorios), sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), sellado y emboquillado de regata en muros y placas para tuberías de diámetros entre 1 1/2" a 4" sobre elementos de concreto, usando aditivos tipo sikadur 32 y sikatop 121 o similar, mantenimiento de piso en granito mediante resanes, pulida, brillada y sellada, alistado impermeabilizado para pisos con sika-1 en mortero 1:4, suministro e instalación de piso duro piso, guaradescoba en granito h = 0.065, mediacaña en granito h = 0.10 granito pulido mesones b = 60 cm incluye salpicadero y faldón win de aluminio, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, desbaste de filo existente y conformación de filo biselado, con aplicación de mezcla y estuco, mantenimiento y limpieza de cajas de inspección. incluye limpieza de la caja, ajuste de marco y/o reparación de marco, reinstalación de luminaria de incrustar o sobreponer, revisión y organización general de tablero de 12 circuitos (contempla: identificación de circuitos, peinado y limpieza de tablero y marquillado), suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m., dilatadores plásticos para piso., enchapes en piedra muñeca, restauración de piedra muñeca. incluye re emboquillada, instalación de grifería orinal, instalación de grifería sanitarios, orinal mediano de colgar institucional color blanco para conexión $\varnothing$ 5/8" ref. 21-aa-8860 mancesa ó similar + kit válvula de descarga anti vandálica alta presión para orinal, conexión $\varnothing$ 3/4" ó 1/2", 21-aa-950 docol ó similar., suministro e instalación sanitario de tanque tipo avanti o similar, cambio de acople sanitario, suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio cumple con la ada. marca toto o similar., juego de incrustar acuacer o similar (sum e instalación), tapa registro 20 x 20 (sum e instalación), suministro e instalación de desagüe con rejilla para lavamanos, sencillo, con rebose, metálico, cromado, marca a&a o similar. Llave manguera 1/2" (sum e instalación), sistema de accionamiento anti vandálico alta presión p/orinal de colgar, docol ó similar (inc. válvula de descarga, botón de accionamiento anti vandálico y accesorios para conexión posterior), grifería anti

vandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión $\varnothing$ 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, remoción de pintura suelta manual., suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, limpieza de canales y bajantes, limpieza e impermeabilización de fachadas, retiro de mantos asfálticos (inc. retiro de sobr.), desmonte de flanche en lámina galvanizada, loseta prefabricada concreto tipo a50 - 40 x 40 x 6 cm (incluye suministro e instalación. incluye base 4cm mortero 1:5, hecho en obra), cenefas en concreto de 0.30 - 3000 psi, flanche cal. 20 en lámina galvanizada desarrollo 30 cm, suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica, marcos puertas lámina c.r. c18 - b=80 cm (antic - esmalte), mantenimiento, restauración y reparación de mirilla metálica de caí. contempla la reparación de zonas afectadas, masillado y aplicación de pintura de acabado, mantenimiento y restauración de marcos de carpintería en aluminio mediante resane, masillado y aplicación de pintura de acabado tipo anoloc, suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable, medidas de 55x43cm, suministro e instalación de puerta corrediza de dos hojas cada una de 0,675x0,75m en lámina cold rolled calibre 18, incluye: manija, marco, aplicación de anticorrosivo y esmalte por ambas caras, suministro e instalación de puerta entamborada en acero galvanizado calibre 18. incluye bisagras, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte, no incluye marco, grifería lavaplatos tipo prisma o similar sobreponer (sum e instalación), esmalte sobre mampostería, vinilo bajo placa - 2 manos, pintura koraza para fachadas, suministro y aplicación de esmalte sobre lámina llena (contempla la preparación de la superficie previa aplicación), suministro y aplicación de doble mano de pintura bituminosa Texas o similar sobre manto asfáltico.

Estado programado

Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0 %

Actividades pendientes por ejecutar

NA

Registro fotográfico





Tabla 26. Frente de Obra – Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C4)

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Fontibón	C4	Cra. 68b # 20-62	25/02/2025	02/07/2025
NOMBRE		LOCALIDAD	DIRECCION	
Centro de Comando, Control, Comunicaciones y Computo (C4)		Fontibón	Cra. 68b # 20-62	
Polígono de intervención:				
Descripción de actividades:				
<p>demolición de pisos en baldosín (inc. retiro de sobr.), regata sobre muros incluye retiro de sobranes, desmonte de sifones, desmonte de tope llantas, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobranes), desmonte de cerraduras (incluye retiro de sobranes), desmonte de push sanitarios, desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), desmonte de aparatos sanitarios (incluye retiro de sobranes), desmonte de accesorios sanitarios (tapa registros, pomos, regaderas, incrustaciones, rejillas, etc...), marcos cajas tapas de inspección, mantenimiento equipo de presión de agua potable, revisión succión de la bomba, incluye: 1 biching de 2 x 1 1/2", 2 niples de 1 1/2" y 1 coupling de 1 1/2", accesorios pvc-p ø 3/4", accesorios pvc-p ø 1 1/4", sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), reinstalación de aparatos sanitarios, suministro e instalación de sifón tipo acordeón plástico, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 25w, 95-227v, 2320 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de toma corriente doble, suministro e instalación de toma gfci, cableado 1#12, cableado 1#10, cableado 2#12, cableado 2#10, interruptor automático enchufable 2 polo 15/30 a, suministro e instalación de luminaria de emergencia tipo sylvania led r1 2x1,6w o similar en muros inferiores o iguales a 3 metros de altura, reinstalación de luminaria de incrustar o sobreponer, revisión y organización general de tablero de 12 circuitos (contempla: identificación de circuitos, peinado y limpieza de tablero y marquillado), revisión y organización general de tablero de 18 circuitos (contempla: identificación de circuitos, peinado y limpieza de tablero y marquillado), suministro e instalación de reflector solar de 300 w de alta efectividad, limpieza y reemboquille de enchape, afinado pisos mortero 1:4 h=4 cm, vinisol tráfico pesado 3 mm, suministro e instalación de cinta antideslizante pisos ancho 5 cms incluye materiales y mano de obra, piso en gravilla mona, pirlan de aluminio, suministro e instalación de marcos en aluminio soporte 60*60. incluye pintura electroestática, mantenimiento puertas en aluminio y marco, incluye recorte por cambio de nivel de piso, mantenimiento de portón en lámina cold rolled de 480 x 300 cm(incluye instalación de platinas de 3/16", pasadores, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura en esmalte , duro hueso y soldadura, en cada cara de los tubos de 1 " y en las 2 caras de la lámina), mantenimiento y sellado de marco en ventanas con aplicación de sellador plástico de poliuretano en alturas iguales o inferiores a 6 mts, enchape pared egeo 20.5 x 20.5 mesones, suministro e instalación de lámparas herméticas, reflector de piso 250 w, soporte proyectores</p>				

pantalla led 24w 60x60 de incrustar, kit válvula de descarga antivandálica alta presión p'orinal, conexión $\varnothing$ 3/4" ó 1/2", 21-aa-950 docol ó similar, llave manguera 1/2" (sum e instalación), grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión $\varnothing$ 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, suministro e instalación de push antivandálico para sanitario, suministro e instalación de asiento sanitario tipo estándar, divisiones para baños en acero inoxidable, líneas tráfico 0.10, cerradura safe o similar entrada 142a aluminio satinado, mantenimiento de vidrios mediante el suministro e instalación de película sanblasting, suministro e instalación de esquineros plásticos, poda de césped (incluye retiro de sobrantes), instalación de tope llantas, limpieza profunda de cárcamo, suministro e instalación de mesón con barra para cocina en mármol echo a la medida, suministro e instalación de mesón en mármol fino, mantenimiento y reubicación de tubería cubierta helipuerto con anclajes, mantenimiento red nebulizada, sensor de movimiento

Estado programado

Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
79,67%	79,67%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

Poda, instalación de bombas trituradoras y último mantenimiento de red nebulizada

Registro fotográfico



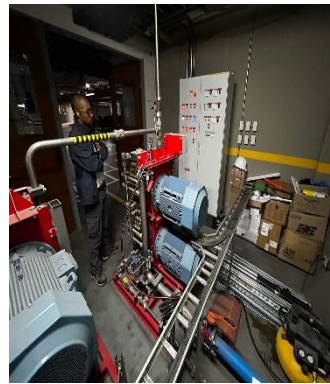
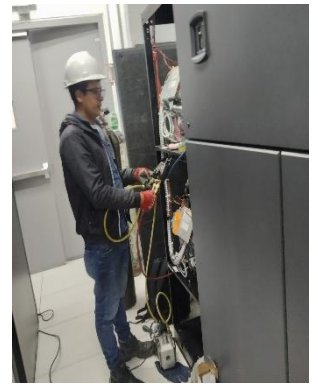
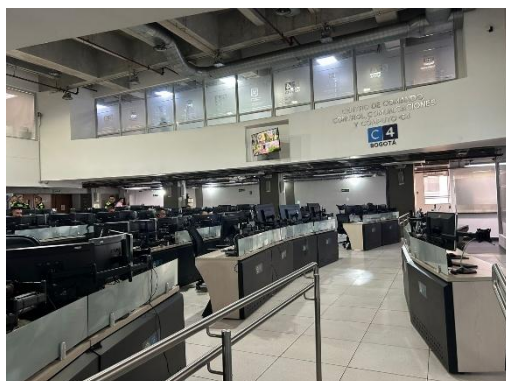
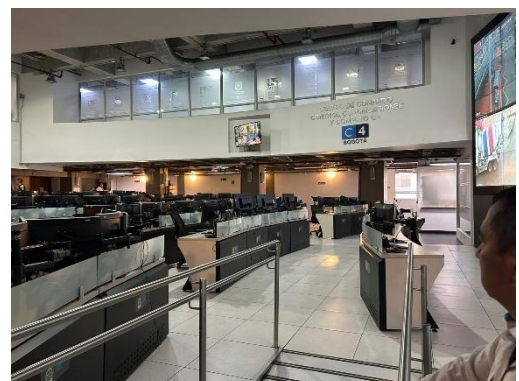


Tabla 27. Frente de Obra – Casa de Justicia Bosa

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Bosa	CASA DE JUSTICIA BOSA	CARRERA 81 D # 59 A 59 Sur	12/03/2025	27/05/2025
NOMBRE		LOCALIDAD	DIRECCION	
CASA DE JUSTICIA BOSA		Bosa	CARRERA 81 D # 59 A 59 Sur	
Polígono de intervención:				
<p>A map of Bosa, Colombia, showing the location of Casa de Justicia Bosa - Centro. The location is marked with a red pin and labeled "Casa de Justicia Bosa - Centro". It is situated near Carrera 81 and Calle 63 Sur. Other nearby streets include Carrera 82A, Carrera 82B, Carrera 82C, Carrera 82D, Carrera 82E, Carrera 82F, Carrera 82G, Carrera 82H, Carrera 82I, Carrera 82J, Carrera 82K, Carrera 82L, Carrera 82M, Carrera 82N, Carrera 82O, Carrera 82P, Carrera 82Q, Carrera 82R, Carrera 82S, Carrera 82T, Carrera 82U, Carrera 82V, Carrera 82W, Carrera 82X, Carrera 82Y, Carrera 82Z, Carrera 83A, Carrera 83B, Carrera 83C, Carrera 83D, Carrera 83E, Carrera 83F, Carrera 83G, Carrera 83H, Carrera 83I, Carrera 83J, Carrera 83K, Carrera 83L, Carrera 83M, Carrera 83N, Carrera 83O, Carrera 83P, Carrera 83Q, Carrera 83R, Carrera 83S, Carrera 83T, Carrera 83U, Carrera 83V, Carrera 83W, Carrera 83X, Carrera 83Y, Carrera 83Z, Carrera 84A, Carrera 84B, Carrera 84C, Carrera 84D, Carrera 84E, Carrera 84F, Carrera 84G, Carrera 84H, Carrera 84I, Carrera 84J, Carrera 84K, Carrera 84L, Carrera 84M, Carrera 84N, Carrera 84O, Carrera 84P, Carrera 84Q, Carrera 84R, Carrera 84S, Carrera 84T, Carrera 84U, Carrera 84V, Carrera 84W, Carrera 84X, Carrera 84Y, Carrera 84Z, Carrera 85A, Carrera 85B, Carrera 85C, Carrera 85D, Carrera 85E, Carrera 85F, Carrera 85G, Carrera 85H, Carrera 85I, Carrera 85J, Carrera 85K, Carrera 85L, Carrera 85M, Carrera 85N, Carrera 85O, Carrera 85P, Carrera 85Q, Carrera 85R, Carrera 85S, Carrera 85T, Carrera 85U, Carrera 85V, Carrera 85W, Carrera 85X, Carrera 85Y, Carrera 85Z, Carrera 86A, Carrera 86B, Carrera 86C, Carrera 86D, Carrera 86E, Carrera 86F, Carrera 86G, Carrera 86H, Carrera 86I, Carrera 86J, Carrera 86K, Carrera 86L, Carrera 86M, Carrera 86N, Carrera 86O, Carrera 86P, Carrera 86Q, Carrera 86R, Carrera 86S, Carrera 86T, Carrera 86U, Carrera 86V, Carrera 86W, Carrera 86X, Carrera 86Y, Carrera 86Z, Carrera 87A, Carrera 87B, Carrera 87C, Carrera 87D, Carrera 87E, Carrera 87F, Carrera 87G, Carrera 87H, Carrera 87I, Carrera 87J, Carrera 87K, Carrera 87L, Carrera 87M, Carrera 87N, Carrera 87O, Carrera 87P, Carrera 87Q, Carrera 87R, Carrera 87S, Carrera 87T, Carrera 87U, Carrera 87V, Carrera 87W, Carrera 87X, Carrera 87Y, Carrera 87Z, Carrera 88A, Carrera 88B, Carrera 88C, Carrera 88D, Carrera 88E, Carrera 88F, Carrera 88G, Carrera 88H, Carrera 88I, Carrera 88J, Carrera 88K, Carrera 88L, Carrera 88M, Carrera 88N, Carrera 88O, Carrera 88P, Carrera 88Q, Carrera 88R, Carrera 88S, Carrera 88T, Carrera 88U, Carrera 88V, Carrera 88W, Carrera 88X, Carrera 88Y, Carrera 88Z, Carrera 89A, Carrera 89B, Carrera 89C, Carrera 89D, Carrera 89E, Carrera 89F, Carrera 89G, Carrera 89H, Carrera 89I, Carrera 89J, Carrera 89K, Carrera 89L, Carrera 89M, Carrera 89N, Carrera 89O, Carrera 89P, Carrera 89Q, Carrera 89R, Carrera 89S, Carrera 89T, Carrera 89U, Carrera 89V, Carrera 89W, Carrera 89X, Carrera 89Y, Carrera 89Z, Carrera 90A, Carrera 90B, Carrera 90C, Carrera 90D, Carrera 90E, Carrera 90F, Carrera 90G, Carrera 90H, Carrera 90I, Carrera 90J, Carrera 90K, Carrera 90L, Carrera 90M, Carrera 90N, Carrera 90O, Carrera 90P, Carrera 90Q, Carrera 90R, Carrera 90S, Carrera 90T, Carrera 90U, Carrera 90V, Carrera 90W, Carrera 90X, Carrera 90Y, Carrera 90Z, Carrera 91A, Carrera 91B, Carrera 91C, Carrera 91D, Carrera 91E, Carrera 91F, Carrera 91G, Carrera 91H, Carrera 91I, Carrera 91J, Carrera 91K, Carrera 91L, Carrera 91M, Carrera 91N, Carrera 91O, Carrera 91P, Carrera 91Q, Carrera 91R, Carrera 91S, Carrera 91T, Carrera 91U, Carrera 91V, Carrera 91W, Carrera 91X, Carrera 91Y, Carrera 91Z, Carrera 92A, Carrera 92B, Carrera 92C, Carrera 92D, Carrera 92E, Carrera 92F, Carrera 92G, Carrera 92H, Carrera 92I, Carrera 92J, Carrera 92K, Carrera 92L, Carrera 92M, Carrera 92N, Carrera 92O, Carrera 92P, Carrera 92Q, Carrera 92R, Carrera 92S, Carrera 92T, Carrera 92U, Carrera 92V, Carrera 92W, Carrera 92X, Carrera 92Y, Carrera 92Z, Carrera 93A, Carrera 93B, Carrera 93C, Carrera 93D, Carrera 93E, Carrera 93F, Carrera 93G, Carrera 93H, Carrera 93I, Carrera 93J, Carrera 93K, Carrera 93L, Carrera 93M, Carrera 93N, Carrera 93O, Carrera 93P, Carrera 93Q, Carrera 93R, Carrera 93S, Carrera 93T, Carrera 93U, Carrera 93V, Carrera 93W, Carrera 93X, Carrera 93Y, Carrera 93Z, Carrera 94A, Carrera 94B, Carrera 94C, Carrera 94D, Carrera 94E, Carrera 94F, Carrera 94G, Carrera 94H, Carrera 94I, Carrera 94J, Carrera 94K, Carrera 94L, Carrera 94M, Carrera 94N, Carrera 94O, Carrera 94P, Carrera 94Q, Carrera 94R, Carrera 94S, Carrera 94T, Carrera 94U, Carrera 94V, Carrera 94W, Carrera 94X, Carrera 94Y, Carrera 94Z, Carrera 95A, Carrera 95B, Carrera 95C, Carrera 95D, Carrera 95E, Carrera 95F, Carrera 95G, Carrera 95H, Carrera 95I, Carrera 95J, Carrera 95K, Carrera 95L, Carrera 95M, Carrera 95N, Carrera 95O, Carrera 95P, Carrera 95Q, Carrera 95R, Carrera 95S, Carrera 95T, Carrera 95U, Carrera 95V, Carrera 95W, Carrera 95X, Carrera 95Y, Carrera 95Z, Carrera 96A, Carrera 96B, Carrera 96C, Carrera 96D, Carrera 96E, Carrera 96F, Carrera 96G, Carrera 96H, Carrera 96I, Carrera 96J, Carrera 96K, Carrera 96L, Carrera 96M, Carrera 96N, Carrera 96O, Carrera 96P, Carrera 96Q, Carrera 96R, Carrera 96S, Carrera 96T, Carrera 96U, Carrera 96V, Carrera 96W, Carrera 96X, Carrera 96Y, Carrera 96Z, Carrera 97A, Carrera 97B, Carrera 97C, Carrera 97D, Carrera 97E, Carrera 97F, Carrera 97G, Carrera 97H, Carrera 97I, Carrera 97J, Carrera 97K, Carrera 97L, Carrera 97M, Carrera 97N, Carrera 97O, Carrera 97P, Carrera 97Q, Carrera 97R, Carrera 97S, Carrera 97T, Carrera 97U, Carrera 97V, Carrera 97W, Carrera 97X, Carrera 97Y, Carrera 97Z, Carrera 98A, Carrera 98B, Carrera 98C, Carrera 98D, Carrera 98E, Carrera 98F, Carrera 98G, Carrera 98H, Carrera 98I, Carrera 98J, Carrera 98K, Carrera 98L, Carrera 98M, Carrera 98N, Carrera 98O, Carrera 98P, Carrera 98Q, Carrera 98R, Carrera 98S, Carrera 98T, Carrera 98U, Carrera 98V, Carrera 98W, Carrera 98X, Carrera 98Y, Carrera 98Z, Carrera 99A, Carrera 99B, Carrera 99C, Carrera 99D, Carrera 99E, Carrera 99F, Carrera 99G, Carrera 99H, Carrera 99I, Carrera 99J, Carrera 99K, Carrera 99L, Carrera 99M, Carrera 99N, Carrera 99O, Carrera 99P, Carrera 99Q, Carrera 99R, Carrera 99S, Carrera 99T, Carrera 99U, Carrera 99V, Carrera 99W, Carrera 99X, Carrera 99Y, Carrera 99Z, Carrera 100A, Carrera 100B, Carrera 100C, Carrera 100D, Carrera 100E, Carrera 100F, Carrera 100G, Carrera 100H, Carrera 100I, Carrera 100J, Carrera 100K, Carrera 100L, Carrera 100M, Carrera 100N, Carrera 100O, Carrera 100P, Carrera 100Q, Carrera 100R, Carrera 100S, Carrera 100T, Carrera 100U, Carrera 100V, Carrera 100W, Carrera 100X, Carrera 100Y, Carrera 100Z.</p>				
Descripción de actividades: desmante canales y bajantes (inc. retiro de sobr.), desmante puertas con marcos (inc. retiro de sobr.), escarificar pañetes (inc. retiro de sobr.), desmante de flanche en lámina galvanizada, desmante de sifones, desmante de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmante de cerraduras (incluye retiro de sobrantes), demolición de acabados cerámicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye trasiego, retiro y disposición final de escombros), desmante de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), desmante de espejo (incluye retiro y disposición final), desmante de accesorios sanitarios (tapa registros, pomos, regaderas, incrustaciones, rejillas, etc...), accesorios pvc-p ø 2", reparaciones hidráulicas pvc de 1/2" - 3/4" y 1", bajante a.n. pvc ø 4" (inc. accesorios), sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de toma corriente doble, suministro e instalación de interruptor sencillo, cableado 1#12, mantenimiento general de tableros de 18 circuitos trifásicos (incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de barrajes de neutros y tierras y limpieza general), suministro e instalación de lampara panel led 40 w de 30 x 120 de incrustar (instalada en alturas de hasta 3 m), suministro e instalación de salida con caja ravel + tomacorriente doble en tubería emt de 3/8" hasta 3/4" sobrepuesta en placa, resanes generales, suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m, suministro e instalación de cinta antideslizante pisos ancho 5 cms incluye materiales y mano de obra, mantenimiento de piso en madera mediante el suministro e instalación de guaradescoba, pirlan de aluminio, canal lámina galvanizada ds = 80 cm - cal 20, flanche lámina galvanizada cl. 20 - ds=50 cm, suministro e instalación de lámina alveolar de 6 mm color cristal, mantenimiento puertas en aluminio y marco, incluye recorte por cambio de nivel de piso, suministro e instalación de canaleta metálica 12x5cm. incluye tapa metálica, suministro e instalación de lavamanos corrido antivandálico en acero inoxidable r 304, suministro e instalación de pie de amigo platina 6" x 10" reforzado con soporte transversal, enchape pared egeo 20.5 x 20.5(inc. win y remate en aluminio), pantalla led 24w 60x60 de incrustar, suministro e instalación de lampara exterior tipo tortuga de 10w con rej				

plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, suministro y aplicación de vinilo lineal para interiores 3 manos para anchos iguales o inferiores a 40 cm, cerradura safe o similar alcoba clasic 141 - aluminio satinado, cerradura safe o similar entrada 142a aluminio satinado, bisagra de vaivén, suministro e instalación de sikaflex para reparaciones y mantenimientos, suministro e instalación de espejo cristal biselado de 4mm, limpieza de canales y bajantes, remoción de cinta antideslizante. incluye retiro de material, lijada, pulida piso en madera, suministro e instalación de puertas en madera trípex (ancho entre 65 a 75 cm altura de 1.95 a 2 metros), con bastidor interno y relleno de madera en pino. incluye pintura en sellador catalizado y laca catalizada semi mate, color miel intenso, no incluye chapa, mantenimiento de divisiones de baño en acero inoxidable, Instalación de flanches, acabados en general, aseo.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		

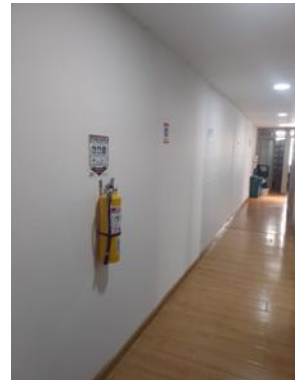
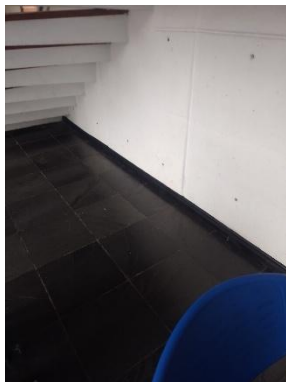
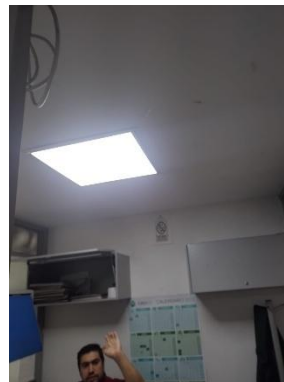


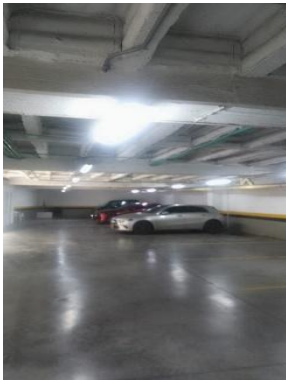
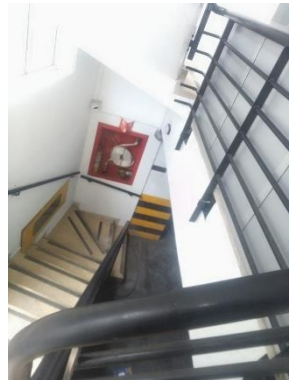
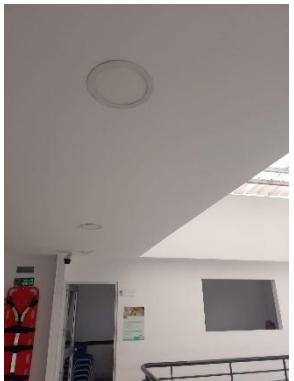


Tabla 28. Frente de Obra – Casa de Justicia Mártires

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Mártires	CASA DE JUSTICIA MARTIRES	Cra. 21 # 14 - 75	12/03/2025	02/05/2025
NOMBRE		LOCALIDAD	DIRECCION	
CASA DE JUSTICIA MARTIRES		Mártires	Cra. 21 # 14 - 75	
Polígono de intervención:				
				
Descripción de actividades:				
<p>retiro de mantos asfálticos (inc. retiro de sobr.), desmonte de sifones, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmonte de cerraduras (incluye retiro de sobrantes), desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), desmonte de accesorios sanitarios (tapa registros, pomos, regaderas, incrustaciones, rejillas, etc...), limpieza y desinfección de tanque en concreto para agua potable, chazos para carpintería, suministro e instalación de muro en superboard, doble cara b 9 con espesor de 6 mm (incluye aislamiento acústico, estructura, masilla acrílica y demás elementos para su correcta instalación), accesorios pvc-p ø 1/2", accesorios pvc-p ø 1", registro p/d red white ø 1" ó equivalente, cheque p/d red white ø 2" ó equivalente, mantenimiento y limpieza de cajas de inspección . incluye limpieza de la caja, ajuste de marco y/o reparación de marco, suministro e instalación de registro de 2" en pvc, suministro e instalación de toma regulada, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de interruptor triple, suministro e instalación de interruptor sencillo, suministro e instalación de tapa ciega, reinstalación de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), resanes generales, limpieza y reemboquille de enchape, suministro e instalación de cinta antideslizante pisos ancho 5 cms incluye materiales y mano de obra, mantenimiento de piso en madera mediante el suministro e instalación de guaradescoba, boca puerta en gravilla lavada (incluye dilatación en plástica), media caña en cemento mortero 1:3, suministro e instalación de media caña en pvc de 6 cm. incluye desmote y retiro de mediacaña existente y tornillo de fijación, montaje/desmonte teja acrílica, flanche lámina galvanizada cl. 20 - cm=50 cm, suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio para anchos iguales o inferiores a 60 cm. incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica, mantenimiento puertas en aluminio y marco, incluye recorte por cambio de nivel de piso, suministro e instalación de malla angeo en fibra de vidrio para mosquitos, roedores y aves, mantenimiento de portón en lámina cold rolled de 480 x 300 cm(incluye instalación de platinas de 3/16", pasadores, lijada, aplicación de anticorrosivo, pintura en esmalte , duro hueso y soldadura, en cada cara de los tubos de 1 " y en las 2 caras de la lámina), suministro e instalación de puerta para closet en lámina melánico rh 15 mm 2,00x0.40 canto termo fundido rígido de 0,2 mm con bisagra tipo convencional y marco, mantenimiento y sellado de marco en ventanas con aplicación de sellador plástico de poliuretano en alturas iguales o inferiores a 6 mts, lampara 2x32 t8 bajo placa – hermética. suministro e instalación de lampara exterior tipo tortuga</p>				

de 10w con rejilla color negro. (incluye bombillo), suministro e instalación de sifón en p, para lavamanos, metálico cromado. importado, marca a&a o similar, llave manguera 1/2" (sum e instalación), grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión ø 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, esmalte sobre mampostería, vinilo muros interiores 3 manos, vinilo bajo placa - 2 manos, esmalte s/ lámina lineal, remoción de pintura suelta manual, pintura koraza para fachadas, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m, producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, suministro y aplicación de esmalte sobre lámina llena (contempla la preparación de la superficie previa aplicación), suministro y aplicación de vinilo lineal para interiores 3 manos para anchos iguales o inferiores a 40 cm, cerradura safe o similar alcoba clasic 141 - aluminio satinado, cerradura puertas acceso principal, vidrio crudo incoloro 6 mm - tipo peldar ó similar, mantenimiento de vidrios mediante el suministro e instalación de película sanblasting, limpieza de canales y bajantes, limpieza profunda de cárcamo, remoción de cinta antideslizante. incluye retiro de material.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		



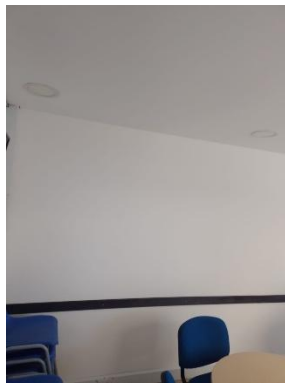
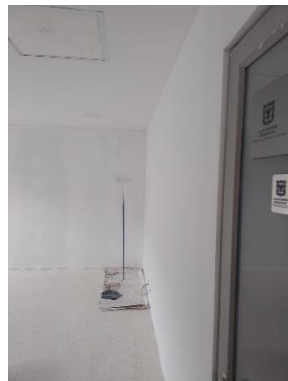
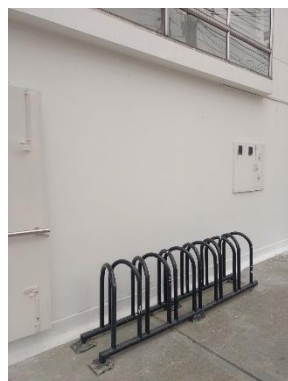
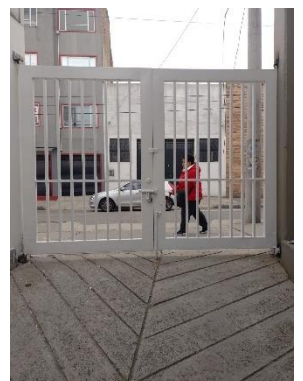


Tabla 29. Frente de Obra – Casa de Justicia Usme

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Usme	CASA DE JUSTICIA USME	CALLE 137 C Sur # 2 A 43	05/03/2025	02/05/2025
NOMBRE		LOCALIDAD	DIRECCION	
CASA DE JUSTICIA USME		Usme	CALLE 137 C Sur # 2 A 43	
Polígono de intervención:				
				
Descripción de actividades: demolición de guaradescoba (incluye retiro de sobrantes), desmonte de sifones, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmonte de cerraduras (incluye retiro de sobrantes), desmonte de push sanitarios, demolición de acabados cerámicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye trasiego, retiro y disposición final de escombros), desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes), chazos para carpintería, muro en lámina de superboard, doble cara b 9 con espesor de 6 mm (incluye estructura, masilla acrílica y demás elementos para su correcta instalación), accesorios pvc-p ø 1/2", tubería pvcp rde 9 de 1/2", reubicación punto hidráulico agua fría, reinstalación de aparatos sanitarios, suministro e instalación de toma regulada, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de toma corriente doble, troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática, cableado 1#12, cableado 2#12, limpieza y reemboquille de enchape, mantenimiento de piso en madera mediante el suministro e instalación de guaradescoba, boca puerta en gravilla lavada (incluye dilatación plástica), media caña en gravilla lavada, afinado endurecido pasos escalera mortero 1:3, gradas en gravilla lavada de 0.30, suministro e instalación de piso tipo tableta de gres 30x30 grafilado. incluye emboquillado con mortero impermeabilizado, suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 2,5mm. incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica, puerta entamborada lámina c.r. c18 (antic - esmalte), suministro e instalación de canaleta metálica 12x5cm. incluye tapa metálica, suministro e instalación de puerta de 0,9 x 2m, con marco de madera maciza con tapa termoacústica ste 53,con poliuretano inyectado para sellos dentro del marco con sellos perimetrales en neopreno. incluye fila de hoja doble, interior con relleno de fibra de vidrio de 1" tipo acústica, lámina de triplex de 4mm y 7mm y aglomeración de 9mm y 12mm, pantalla led 24w 60x60 de incrustar, rejilla plástica 3 x 2" (sum e instalación), grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión ø 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, esmalte sobre mampostería, vinilo muros interiores 3 manos, vinilo bajo placa - 2 manos, remoción de pintura suelta manual, pintura koraza para fachadas, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, suministro y aplicación de estuco plástico lineal a<= 60 cm sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, suministro y aplicación				

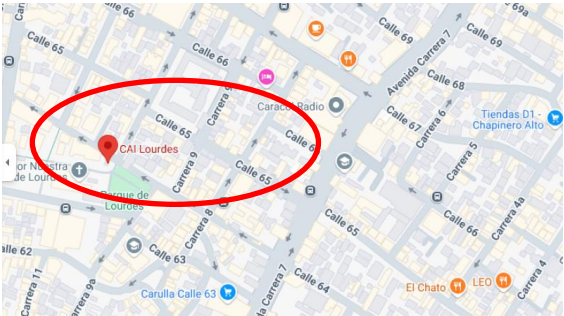
de vinilo lineal para interiores 3 manos para anchos iguales o inferiores a 40 cm, cerradura safe o similar alcoba clasic 141 - aluminio satinado, cerradura safe o similar entrada 142a aluminio satinado, suministro e instalación de cerradura cilíndrica de pomo metálico grado 2 función aula, (pomo interior siempre activo, pomo exterior se activa con la llave.) con amaestramiento según especificación. referencia yale lf 5308 o equivalente

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		



Tabla 30. Frente de Obra – CAI LOURDES

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Chapinero	CAI LOURDES	Calle 64 # 10 .00	28/02/2025	02/05/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí LOURDES	Chapinero	Calle 64 # 10 .00
Polígono de intervención: 		
Descripción de actividades: Mantenimiento de piso en granito mediante resanes, pulida, brillada y sellada, cenefas en concreto de 0.30 - 3000 psi,		
Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		
		

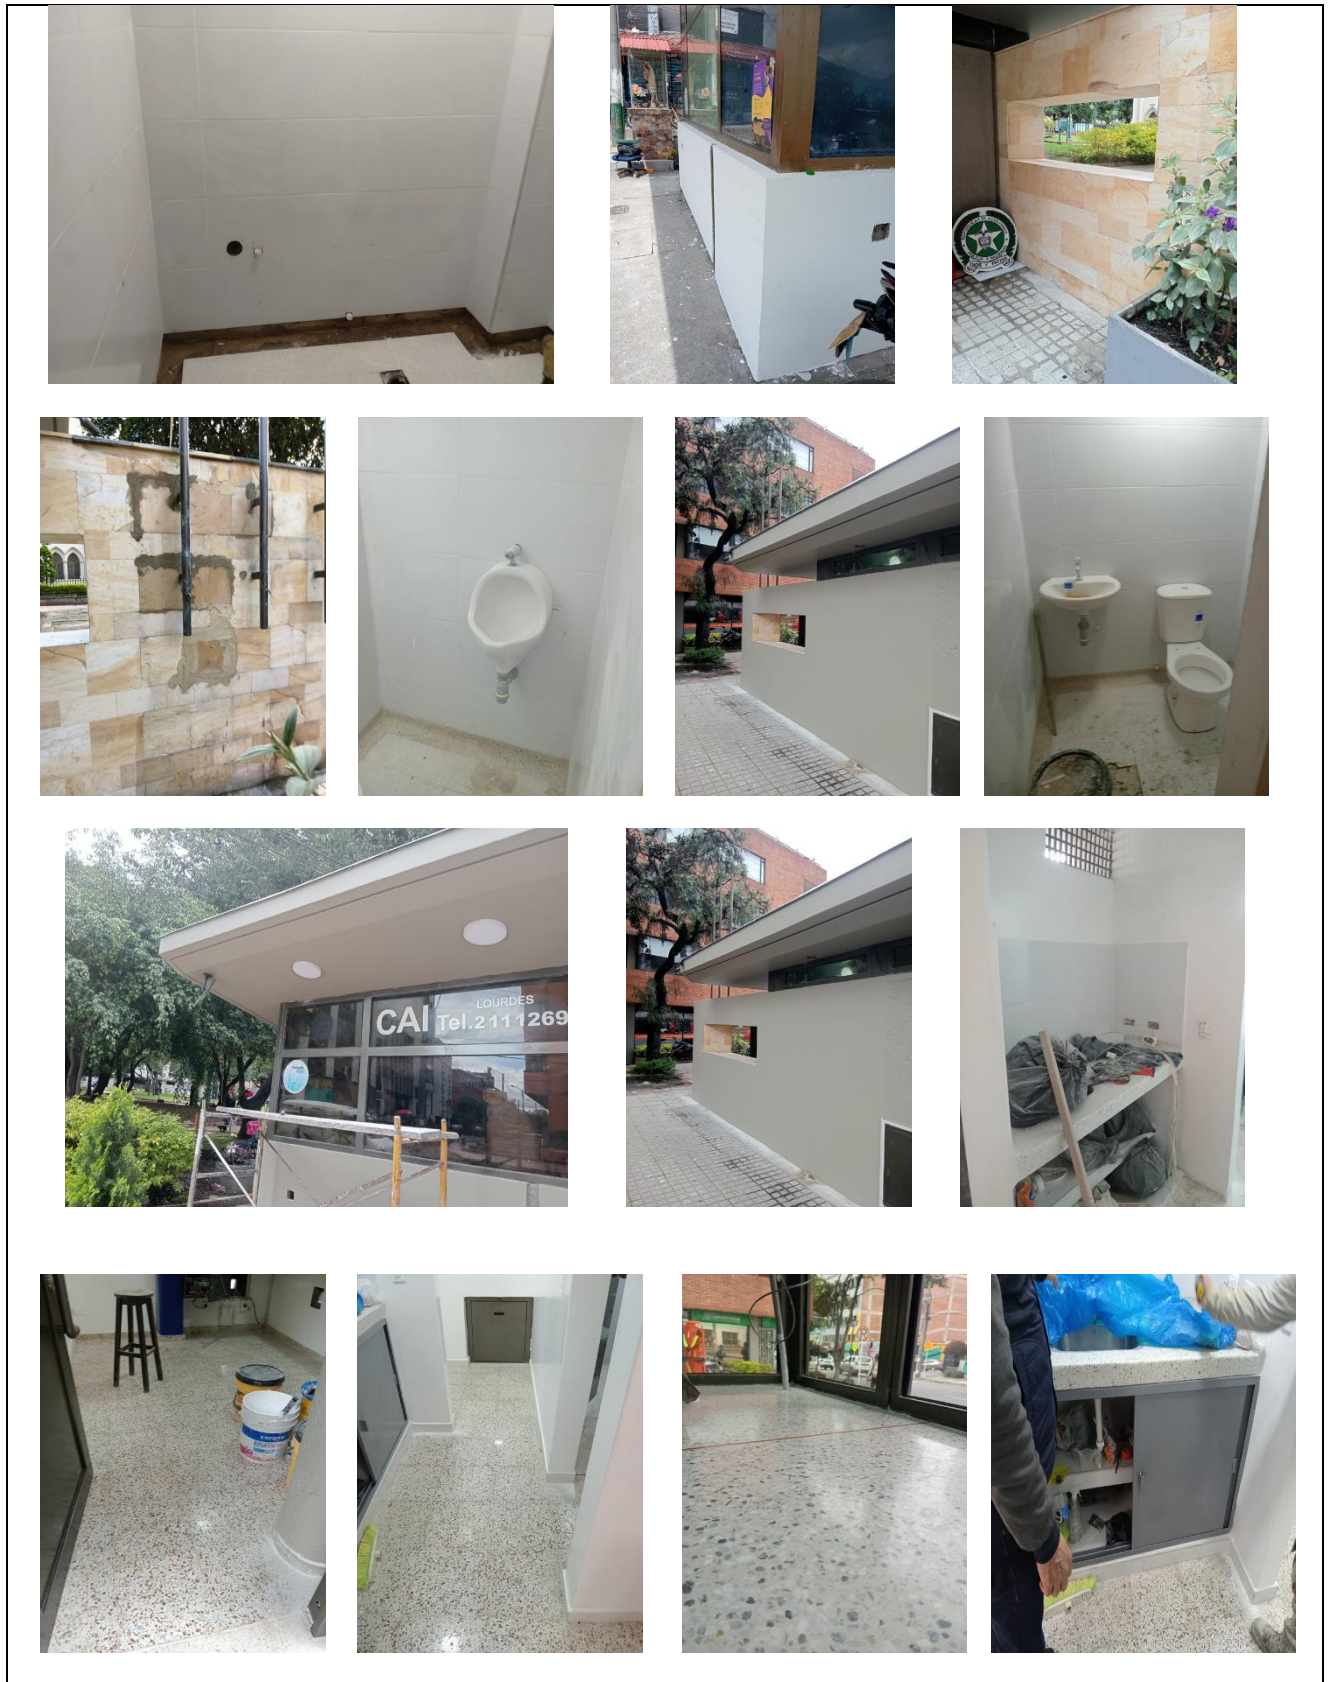
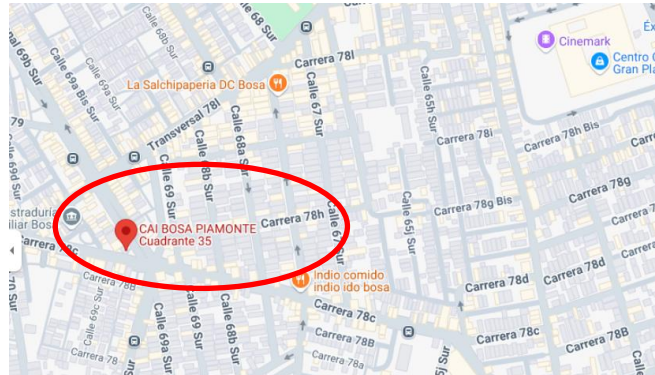


Tabla 31. Frente de Obra – CAI PIAMONTE

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Bosa	CAI PIAMONTE	Cra 78C 3 69BIS SUR	05/03/2025	02/05/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí PIAMONTE	Bosa	Cra 78C 3 69BIS SUR

Polígono de intervención:

**Descripción de actividades:**

Remoción de guarda escoba (incluye retiro de sobrantes), retiro de mantos asfálticos (inc. retiro de sobr.), desmonte de flanche en lámina galvanizada. Suministro e instalación de interruptor doble, suministro e instalación de interruptor triple, suministro e instalación de toma corriente doble, suministro e instalación de toma gfci, suministro e instalación de interruptor sencillo, suministro e instalación de red eléctrica monofásica de cu 2 x n° 12 awg (1 fase + 1 neutro) + 1 x n° 12 t awg, marquillado de puntos eléctrico plastificado de 1x2cm, mantenimiento de piso en granito mediante resanes, pulida, brillada y sellada, guarda escoba en granito h = 0.065, flanche cal. 20 en lámina galvanizada desarrollo 30 cm, suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica, mantenimiento y restauración de marcos de carpintería en aluminio mediante resane, masillado y aplicación de pintura de acabado tipo anoloc, suministro e instalación de puerta corrediza de dos hojas cada una de 0,675x0,75m en lámina cold rolled calibre 18, incluye: manija, marco, aplicación de anticorrosivo y esmalte por ambas caras. Instalación de grifería orinal, instalación de grifería sanitarios, orinal mediano de colgar institucional color blanco para conexión $\varnothing$ 5/8" ref 21-aa-8860 mancesa ó similar + kit válvula de descarga anti vandálica alta presión para orinal, conexión $\varnothing$ 3/4" ó 1/2", 21-aa-950 docol ó similar., suministro e instalación sanitario de tanque tipo avanti o similar, cambio de acople sanitario, suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio marca toto o similar, suministro de punto sanitario d= 3", juego de incrustar acuacer o similar (sum e instalación), tapar registro 20 x 20 (sum e instalación), suministro e instalación de desagüe con rejilla para lavamanos, sencillo, con rebose, metálico, cromado, marca a&a o similar., llave manguera 1/2" (sum e instalación), sistema de accionamiento anti vandálico alta presión p/orinal de colgar, docol ó similar (inc. válvula de descarga, botón de accionamiento anti vandálico y accesorios para conexión posterior), grifería anti vandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión $\varnothing$ 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, suministro y aplicación de esmalte sobre lámina llena (contempla la preparación de la superficie previa aplicación), suministro y aplicación de doble mano de pintura bituminosa texsa o similar sobre manto asfáltico, suministro e instalación de espejo cristal biselado de 4mm, suministro e instalación de espejo convexo de 30cm de diámetro. incluye soporte de fijación, aseo en obra incluye implementos para su ejecución dentro

de los espacios intervenidos, suministro e instalación de tope puerta de piso incluye elementos de fijación.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		

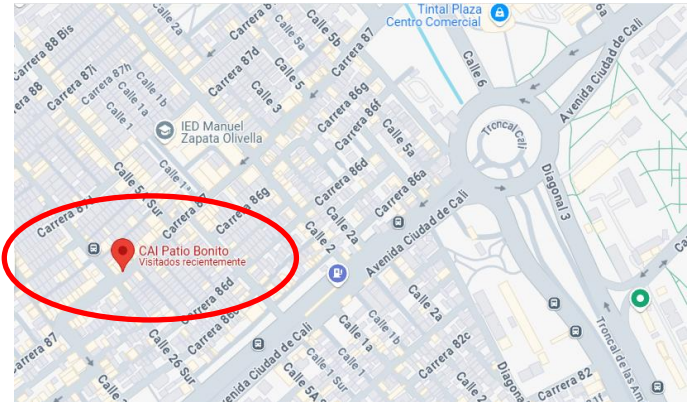


Tabla 32. Frente de Obra – CAI PATIO BONITO

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Kennedy	CAI PATIO BONITO	Calle 26 sur cra 87	11/03/2025	02/05/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí PATIO BONITO	Kennedy	Calle 26 sur cra 87

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:

Reparaciones tubería pvc sanitaria de 4", tubería pvc-I Ø 4" (inc. accesorios), salida para lámpara fluorescente - pvc, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 hora, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 25w, 95-227v, 2320 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas. suministro e instalación de interruptor doble, suministro e instalación de interruptor triple, suministro e instalación de toma corriente doble, suministro e instalación de toma gfci, suministro e instalación de interruptor sencillo, tubería emt 1/2" - suspendida incluye accesorios, suministro e instalación de tapa ciega, suministro e instalación de salida + tomacorriente doble en tubería emt de 1/2" sobrepuesta, (longitud promedio de salida 3 ml), suministro e instalación de caja metálica de paso, dimensiones 20x20x15, incluye tapa en plástico y adtadores terminal emt 1/2", suministro e instalación de red eléctrica monofásica de cu 2 x no 12 awg (1 fase + 1 neutro) + 1 x no 12 t awg, revisión y organización general de tablero de 12 circuitos (contempla: identificación de circuitos, peinado y limpieza de tablero y marquillado), marquillado de puntos eléctrico plastificado de 1x2cm, mantenimiento de piso en granito mediante resanes, pulida, brillada y sellada ,mantenimiento y restauración de marcos de carpintería en aluminio mediante resane, masillado y aplicación de pintura de acabado tipo anoloc. Suministro e instalación de puerta corrediza de dos hojas cada una de 0,675x0,75m en lámina cold rolled calibre 18, incluye: manija, marco, aplicación de anticorrosivo y esmalte por ambas caras., suministro e instalación de mirilla metálica de 9,5x9,5cm, incluye seguro con platina y aplicación de pintura en esmalte, suministro e instalación de reflector de 100w, instalación de grifería orinal, instalación de grifería sanitarios, orinal mediano de colgar institucional color blanco para conexión Ø 5/8" ref. 21-aa-8860 mancesa o similar + kit válvula de descarga anti vandálica alta presión para orinal, conexión Ø 3/4" o 1/2", 21-aa-950 docol o similar., suministro e instalación sanitario de tanque tipo avanti o similar ,cambio de acople sanitario, suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio marca toto o similar, juego de incrustar acuacer o similar (sum e instalación), tapar registro 20 x 20 (sum e instalación), suministro e instalación de desagüe con rejilla para lavamanos, sencillo, con rebose, metálico, cromado, marca a&a o similar, llave manguera 1/2" (sum e instalación), sistema de accionamiento anti vandálico alta presión p/orinal de colgar, docol ó similar (inc. válvula de descarga,

botón de accionamiento anti vandálico y accesorios para conexión posterior),grifería anti vandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión ø 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, suministro y aplicación de esmalte sobre lámina llena (contempla la preparación de la superficie previa aplicación),cerradura safe o similar entrada 142a aluminio satinado, suministro e instalación de espejo cristal biselado de 4mm,suministro e instalación de espejo convexo de 30cm de diámetro. incluye soporte de fijación, aseo en obra incluye implementos para su ejecución dentro de los espacios intervenidos, suministro e instalación de tope puerta de piso incluye elementos de fijación.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
Observaciones en remates de pinturas, sondeos y limpiezas de cajas de inspección, para hacer entrega ante MEBOG.		
Registro fotográfico		

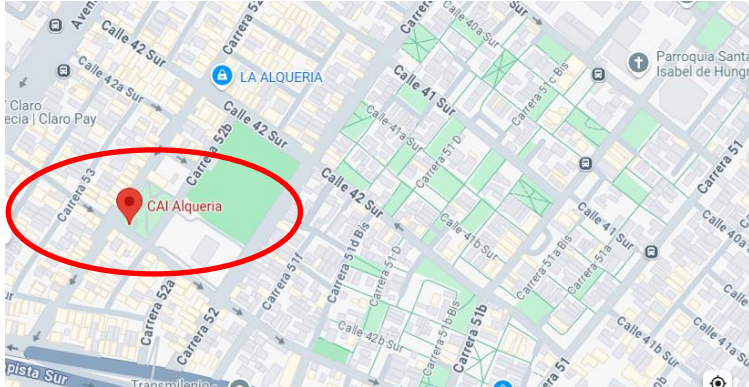


Tabla 33. Frente de Obra – CAI ALQUERIA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Puente Aranda	CAI ALQUERIA	Cra 52C # 43-00 SUR	17/03/2025	03/05/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí ALQUERIA	Puente Aranda	Cra 52C # 43-00 SUR

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:

Retiro de mantos asfálticos (inc. retiro de sobr.), desmonte de flanche en lámina galvanizada, mantenimiento y limpieza de cajas de inspección. incluye limpieza de la caja, ajuste de marco y/o reparación de marco, loseta prefabricada concreto tipo a50 - 40 x 40 x 6 cm (incluye suministro e instalación. incluye base 4cm mortero 1:5, hecho en obra), guarda escoba en granito h = 0.065, cenefas en concreto de 0.30 - 3000 psi, flanche cal. 20 en lámina galvanizada desarrollo 30 cm, suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica, vinilo bajo placa - 2 manos, suministro y aplicación de doble mano de pintura bituminosa texsa o similar sobre manto asfáltico, limpieza de canales y bajantes, mantenimiento, restauración y reparación de mirilla metálica de caí. contempla la reparación de zonas afectadas, masillado y aplicación de pintura de acabado, mantenimiento y restauración de marcos de carpintería en aluminio mediante resane, masillado y aplicación de pintura de acabado tipo anoloc, suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable, medidas de 55x43cm, grifería lavaplatos tipo prisma o similar sobreponer (sum e instalación), instalación de grifería orinal, instalación de grifería sanitarios, orinal mediano de colgar institucional color blanco para conexión $\varnothing$ 5/8" ref 21-aa-8860 mancesa ó similar + kit válvula de descarga anti vandálica alta presión para orinal, conexión $\varnothing$ 3/4" ó 1/2", 21-aa-950 docol ó similar, suministro e instalación sanitario de tanque tipo avanti o similar ,cambio de acople sanitario, suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio cumple con marca toto o similar, juego de incrustar acuacer o similar (sum e instalación), taparregistro 20 x 20 (sum e instalación), suministro e instalación de desagüe con rejilla para lavamanos, sencillo, con rebose, metálico, cromado, marca a&a o similar, llave manguera 1/2" (sum e instalación), sistema de accionamiento anti vandálico alta presión p/orinal de colgar, docol ó similar (inc. válvula de descarga, botón de accionamiento anti vandálico y accesorios para conexión posterior), grifería anti vandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión $\varnothing$ 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, esmalte sobre mampostería, pintura koraza para fachadas, suministro y aplicación de esmalte sobre lámina llena (contempla la preparación de la superficie previa aplicación), suministro y aplicación de esmalte sobre lámina llena (contempla la preparación de la superficie previa aplicación), cerradura

safe o similar entrada 142a aluminio satinado, suministro e instalación de cerradura de seguridad 4 pasadores para puerta de acceso principal en caí's, suministro e instalación de espejo cristal biselado de 4mm, suministro e instalación de espejo convexo de 30cm de diámetro. incluye soporte de fijación, suministro e instalación de tope puerta de piso incluye elementos de fijación, salida para lámpara fluorescente - pvc, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 25w, 95-227v, 2320 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de interruptor doble, suministro e instalación de interruptor triple, suministro e instalación de toma corriente doble, suministro e instalación de toma gfcí, suministro e instalación de interruptor sencillo, tubería emt 1/2" - suspendida incluye accesorios, suministro e instalación de tapa ciega, suministro e instalación de salida + tomacorriente doble en tubería emt de 1/2" sobrepuesta, (longitud promedio de salida 3 ml), suministro e instalación de caja metálica de paso, dimensiones 20x20x15, incluye tapa en plástico y adtadores terminal emt 1/2", suministro e instalación de red eléctrica monofásica de cu 2 x n° 12 awg (1 fase + 1 neutro) + 1 x n° 12 t awg, revisión y organización general de tablero de 12 circuitos (contempla: identificación de circuitos, peinado y limpieza de tablero y marquillado), marquillado de puntos eléctrico plastificado de 1x2cm, suministro e instalación de puerta corrediza de dos hojas cada una de 0,675x0,75m en lámina cold rolled calibre 18, incluye: manija, marco, aplicación de anticorrosivo y esmalte por ambas caras, aseo en obra incluye implementos para su ejecución dentro de los espacios intervenidos , suministro e instalación de ventana blindada en cold-rolled cal. 14 nivel iii. 1. cristales laminados en caliente incoloro e=30 mm nivel III. pintura electrostática color crudo o natural. pisa vidrio y marco. 4. montaje a través de tornillos de expansión y epóxicos. película de seguridad o anti esquirlas de 4" mls. de espesor., suministros e instalación de puerta blindada (0,80x2,05m) con marcos y nave de puerta fabricados en lámina cold- rolled cal. 14 para nivel iii, montaje de marco a través de tornillos de expansión y epóxicos. chapa de seguridad multipuntos con dos (2) pasadores (su. - imc.) ; cuatro (4) al frente incluido el picaporte; sistema de llaves codificadas (5 unidades). bisagras tipo cilindro de alta resistencia en acero cold-rolled de 3/4" de diámetro y 3 1/2" de longitud, sistema de rodamiento interno. manijas de apertura. (exterior-interior). acabados en lámina y pintura electrostática. materiales de fabricación anti - inflamables. cristales laminados en caliente nivel iii . extremo de pasadores de la cerradura en acero inoxidable de 1/2". sistema interno con bujes y empaques en varillas para evitar el ruido de ellas. diseño con cristal blindado en modulo superior y montante similar al diseño de las puertas para caí.

Estado programado

Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

NA

Registro fotográfico

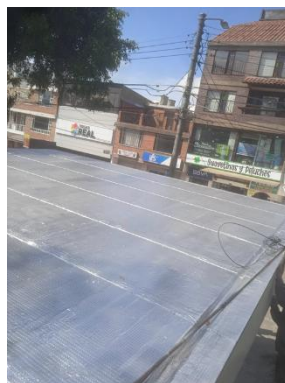




Tabla 34. Frente de Obra – CESPAC – CENTRO ESPECIALIZADOS PARA ADOLESCENTES

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Puente Aranda	CESPA	AV 30 # 11 - 85	12/03/2025	02/05/2025

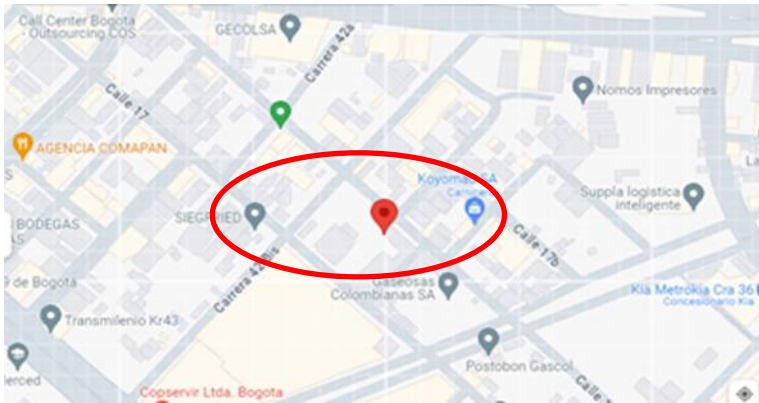
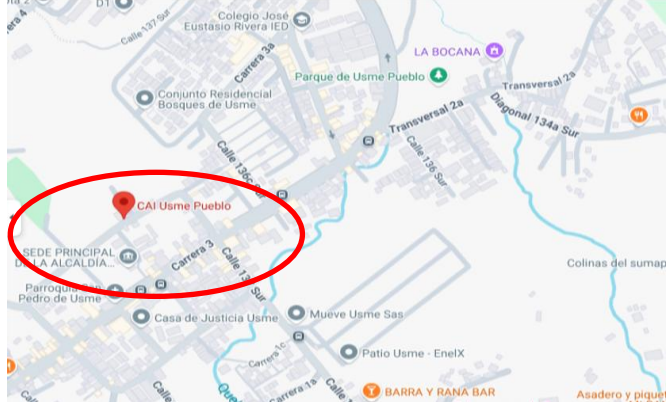
NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CESPA -	Puente Aranda	AV 30 # 11 - 85
<p>Polígono de intervención:</p> 		
<p>Descripción de actividades:</p> <p>Desmante de ventanas y vidrios (inc. retiro de sobr.),desmante de puertas en vidrio templado, desmante de cerraduras (incluye retiro de sobrantes),desmante de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes),flanche cal. 20 en lámina galvanizada desarrollo 30 cm,suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio para anchos iguales o inferiores a 60 cm. incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica., suministro e instalación de marcos en aluminio soporte 60*60. incluye pintura electroestática, grifería lavaplatos tipo prisma o similar sobreponer (sum e instalación), instalación poma, mantenimiento de vidrios mediante el suministro e instalación de película sandblasting, limpieza de fachadas, suministro e instalación de vidrio laminad 3+3. desmante de puertas., suministro e instalación de puerta dimensión de ancho 0,80 metros con altura entre 2,00 m a 2,10 m de puerta en material termo laminado color rívia en, de 5.5 mm en marco de 8 cm, con tapa luz (incluye marco, no incluye chapa), incluye todo para su correcta instalación. (equipamiento estación de policía Usme).</p>		
Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0 %
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		



Tabla 35. Frente de Obra – CAI USME

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Usme	CAI USME	Cra 5 con Calle 6 Usme pueblo	8/04/2025	15/04/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí USME	Usme	Cra 5 con Calle 6 Usme pueblo
<p>Polígono de intervención:</p> 		
<p>Descripción de actividades:</p> <p>Desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes),desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores)..desmontaje de tuberías eléctricas (incluye: etm, conduit, galvanizada en diámetros entre 1/2" y 1 1/2" y alturas hasta de 3 m),salida para lámpara incandescente (incluye roseta) - emt, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 25w, 95-227v, 2320 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de interruptor doble, suministro e instalación de interruptor triple, suministro e instalación de toma corriente doble, suministro e instalación de toma gfci, suministro e instalación de interruptor sencillo, suministro e instalación de tapa ciega, suministro e instalación de caja metálica de paso, dimensiones 20x20x15, incluye tapa en plástico y adtadores terminal emt 1/2",cableado 1#12,cableado 2#12,revisión y organización general de tablero de 12 circuitos (contempla: identificación de circuitos, peinado y limpieza de tablero y marquillado),mantenimiento y restauración de marcos de carpintería en aluminio mediante resane, masillado y aplicación de pintura de acabado tipo anoloc. Suministro e instalación de mesón en acero inox. 304 cal. 18 de largo 5 m y ancho 0,60 m. con dos pocetas de 0,35*0,35*0,15. con entrepaño en acero, grifería lavaplatos tipo prisma o similar sobreponer (sum e instalación), esmalte sobre mampostería, vinilo muros interiores 3 manos, vinilo bajo placa - 2 manos, remoción de pintura suelta manual, pintura koraza para fachadas, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final, suministro y aplicación de esmalte sobre lámina llena (contempla la preparación de la superficie previa aplicación), limpieza de canales y bajantes.</p>		
Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		

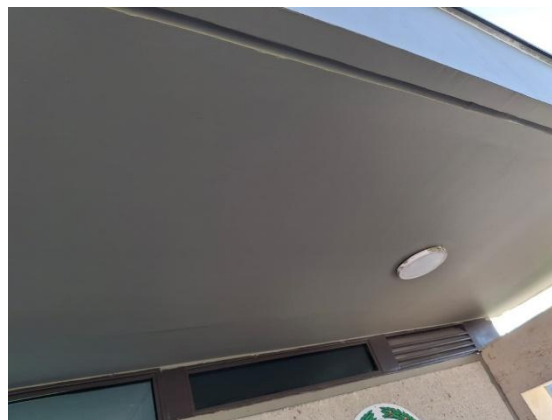
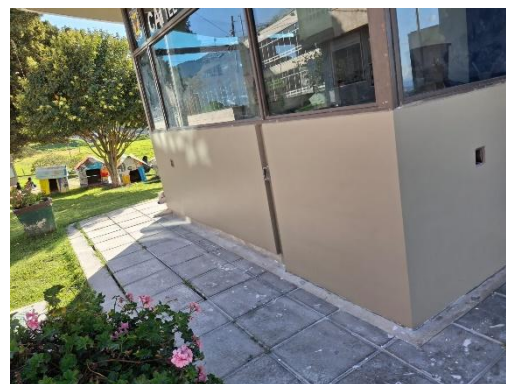
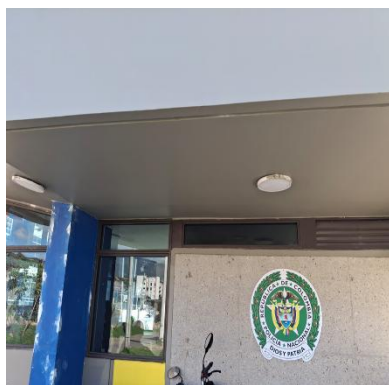


Tabla 36. Frente de Obra – Casa de Justicia Ciudad Bolívar

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Ciudad Bolívar	CASA DE JUSTICIA CIUDAD BOLIVAR	Diagonal 62 sur # 20f - 20	27/03/2025	02/05/2025
NOMBRE		LOCALIDAD	DIRECCION	
CASA DE JUSTICIA CIUDAD BOLIVAR		Ciudad Bolívar	Diagonal 62 sur # 20f - 20	
Polígono de intervención:				
				
Descripción de actividades: desmonte ventanas y vidrios (inc. retiro de sobr.), desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), registro p/d red white ø 1/2" ó equivalente, pantalla led 24w 60x60 de incrustar, grifería lavaplatos tipo prisma o similar sobreponer (sum e instalación), grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión ø 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, divisiones para baños en acero inoxidable, vinilo muros interiores 3 manos, vinilo bajo placa - 2 manos, remoción de pintura suelta manual, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, suministro y aplicación de vinilo lineal para interiores 3 manos para anchos iguales o inferiores a 40 cm, vidrio crudo incoloro 5 mm - tipo peldar ó similar, mantenimiento de vidrios mediante el suministro e instalación de película sanblasting, suministro e instalación de espejo cristal biselado de 4mm, limpieza de canales y bajantes, aseo en obra incluye implementos para su ejecución dentro de los espacios intervenidos				
Estado programado				
Programado	Ejecutado		Avance/Atraso	
100%	100%		0%	
Actividades pendientes por ejecutar				
NA				
Registro fotográfico				

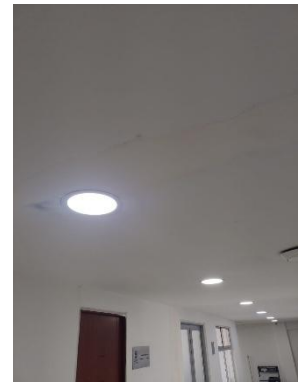
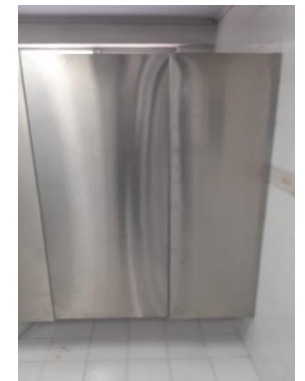


Tabla 37. Frente de Obra – Casa de Justicia Tunjuelito

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Tunjuelito	CASA DE JUSTICIA TUNJUELITO	Calle 51 sur # 7 - 35	13/05/2025	13/06/2025
NOMBRE		LOCALIDAD	DIRECCION	
CASA DE JUSTICIA CIUDAD TUNJUELITO		Tunjuelito	Calle 51 sur # 7 - 35	
Polígono de intervención:				
				
Descripción de actividades: desmante ventanas y vidrios (inc. retiro de sobr.), escarificar pañetes (inc. retiro de sobr.), sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), suministro y aplicación de pañete, impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m, suministro e instalación de malla expandida imt-20 cal. 14 instalada a modo de cielo raso soldada sobre reja de seguridad. incluye platina pisa malla de 1 1/2x3/16" anticorrosivo y esmalte, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, cerradura puertas acceso principal, aseo en obra incluye implementos para su ejecución dentro de los espacios intervenidos, desmante de sifones, desmante de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmante de cerraduras (incluye retiro de sobrantes), desmontes de tableros eléctricos, desmante de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), suministro e instalación de toma regulada, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de toma corriente doble, troqueles eléctricos sencillos, con pintura electrostática, tubería emt 3/4" - suspendida incluye accesorios, suministro e instalación de tapa ciega, interruptor automático enchufable 2 polo 15/30 a, mantenimiento general de tableros de 24 circuitos trifásicos (incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de barrajes de neutros y tierras y limpieza general), suministro e instalación de lampara panel led 40 w de 30 x 120 de incrustar (instalada en alturas de hasta 3 m), suministro e instalación de tablero trifásico de 24 circuitos con espacio para totalizador. no incluye regatas, suministro e instalación de red eléctrica monofásica de cu 2 x nº 12 awg (1 fase + 1 neutro) + 1 x nº 12 t awg, suministro e instalación de red eléctrica monofásica de cu 2 x nº 10 awg (1 fase + 1 neutro) + 1 x nº 12 t awg, suministro e instalación de cable no.12 awg thhn/thwn-2 600v 90°c. libre de halógeno, suministro e instalación de cable no.10 awg thhn/thwn-2 600v 90°c. libre de halógeno, desmante de canaleta metálica de tomas y voz y datos incluye retiro de sobrantes, mantenimiento de impermeabilización manto asfáltico mediante el reselle juntas con aplicación de emulsión asfáltica y calor. no incluye pintura bituminosa, suministro e instalación de marcos en aluminio soporte 60*60. incluye pintura electroestática, suministro e instalación de canaleta metálica 12x5cm. incluye tapa metálica, suministro e instalación de concertina sencilla con diámetro de 45 cm. incluye guaya de 1/8", tubo de fijación cada 5 metros y platina con perforaciones de 0,05x0,05*1/4", pantalla led 24w 60x60 de incrustar, suministro e instalación de sifón en p, para				

lavamanos, metálico cromado. importado, marca a&a o similar, vinilo muros interiores 3 manos, suministro y aplicación de doble mano de pintura bituminosa texsa o similar sobre manto asfaltico, instalación espejos (m.o.), vidrio crudo incoloro 5 mm - tipo peldar ó similar, mantenimiento y ajuste de puerta en vidrio de seguridad, incluye desmonte, ajuste, nivelación, lubricación y reinstalación, limpieza profunda de cárcamo.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%
Actividades pendientes por ejecutar		
NA		
Registro fotográfico		





Tabla 38. Frente de Obra – Estación de Policía Usaquéen

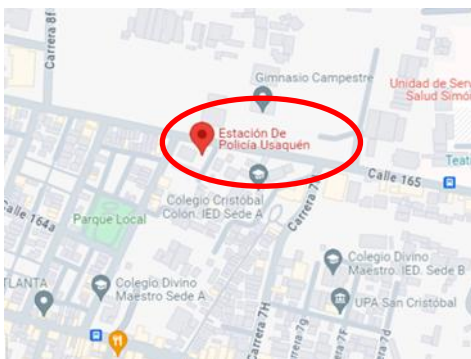
LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Usaquén	ESTACION DE POLICIA USAQUEN	Cl. 165 # 8A-43.	05/05/2025	30/05/2025
NOMBRE		LOCALIDAD	DIRECCION	
ESTACION DE POLICIA USAQUEN		USAQUEN	Cl. 165 # 8A-43.	
Polígono de intervención:				
				
Descripción de actividades:				
Mantenimiento de 3 bombas de agua potable, cambio de flauta, cambio de tubos de succión, cambio de contactores, impulsores y presostato				
Estado programado				
Programado	Ejecutado		Avance/Atraso	
100%	100%		0%	
Actividades pendientes por ejecutar				
NA				
Registro fotográfico				
<div></div>				



Tabla 39. Frente de Obra – Sub - Estación Tres Reyes

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Ciudad Bolívar	SUB- ESTACION TRES REYES	CRA 77ª CON CALLE 64F SUR	22/06/2025	30/06/2025
NOMBRE		LOCALIDAD	DIRECCION	
SUB - ESTACION TRES REYES		CIUDAD BOLIVAR	Cra 77ª con Calle 64F SUR.	
Polígono de intervención:				
				
Descripción de actividades:				
Desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmonte de cerraduras (incluye retiro de sobrantes), desmonte de push sanitarios, desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores)., desmonte de accesorios sanitarios (tapa registros, pomos, regaderas, incrustaciones, rejillas, etc...), suministro e instalación de tapa para caja de inspección de 60 a 1 m de ancho, suministro e instalación de toma corriente doble, mantenimiento puertas en aluminio y marco, incluye recorte por cambio de nivel de piso, arreglo pasadores para puerta exterior, incluye cadena y candado, suministro e instalación de extractor de ventana (incluye demolición de vano, adecuación de vano, instalación de extractor y retiro de sobrantes), mantenimiento de puerta metálica entamborada de 2,1 x 1,30m corrediza. incluye desmonte, ajuste de riel, engrase, manija y montaje, suministro e instalación de concertina sencilla con diámetro de 45 cm. incluye guaya de 1/8", tubo de fijación cada 5 metros y platina con perforaciones de 0,05x0,05*1/4", suministro e instalación de lámparas herméticas, ducha calypso mezclador (sum e instalación), instalación de flotador para sanitarios, desmonte y reposición de manija de ducha, incluye retiro de sobrantes, revisión y reparación tanque sanitario (lavado, cambio flotador y accesorios), grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión ø 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, instalación poma, suministro e instalación de cerradura antipánico tipo Orlando o similar, suministro e instalación de clavija, cerramiento tubo y malla ondulada, poda de césped (incluye retiro de sobrantes), limpieza profunda de cárcamo, sensor de movimiento.				
Estado programado				
Programado		Ejecutado		Avance/Atraso
100%		100%		0%
Actividades pendientes por ejecutar				
NA				
Registro fotográfico				

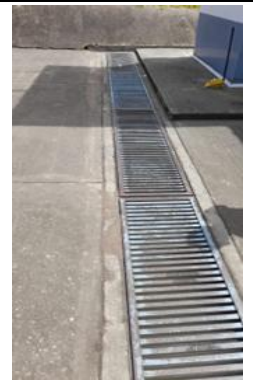
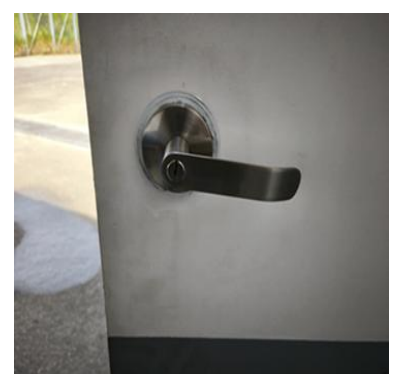
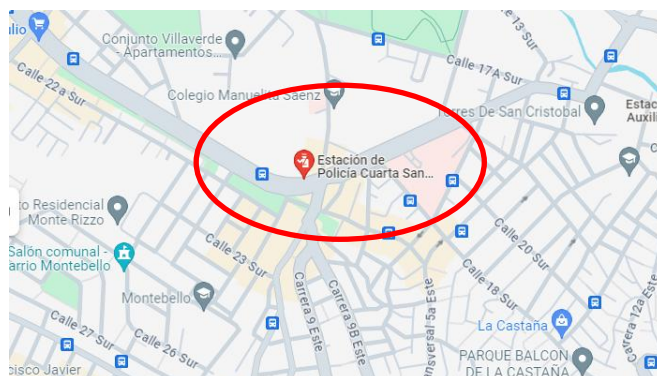


Tabla 40. Frente de Obra – Estación de Policía San Cristóbal

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
San Cristóbal	ESTACION DE POLICIA SAN CRISTOBAL	Avenida 1 de mayo No. 1-40.	20/05/2025	30/06/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
E/SAN CRISTOBAL	SAN CRISTOBAL	AVENIDA 1 DE MAYO NO. 1-40

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:

demolición cielo raso falso (inc. retiro de sobr.), demolición pañetes (inc. retiro de sobr.), demolición de muros (e=0,15) en altura de 17m, incluye cargue y transporte, regata sobre muros incluye retiro de sobrantes, suspensión de salida sanitaria (inc. retiro de sobr.), suspensión de salida hidráulica (inc. retiro de sobr.), desmonte de sifones, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmontes de tableros eléctricos, demolición de acabados cerámicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye trasiego, retiro y disposición final de escombros), desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), desmonte de cableado eléctrico (contempla los cables contenidos dentro de un ducto entre calibres #8, #10 y #14), desmontaje de tuberías eléctricas (incluye: etm, conduit, galvanizada en diámetros entre 1/2" y 1 1/2" y alturas hasta de 3 m), demolición de acabado de texturizado bajo placa. incluye retiro de escombros, malla electrosoldada estándar 5mm, muro en bloque no. 5 e=15 cm, salida + interruptor triple luminex o equivalente- pvc.

salida + tomacorriente doble monofásica – pvc, salida para lampara fluorescente – emt, punto eléctrico para toma corriente doble, tubería emt 3/4" - suspendida incluye accesorios, breaker industrial 3 x 15/60 a, breaker industrial 3 x 75/100 a, mantenimiento general de tableros de 18 circuitos trifásicos (incluye: cambio de breakers que se requieran, cambio de barrajes de neutros y tierras y limpieza general), suministro e instalación de caja metálica de paso, dimensiones 20x20x15, incluye tapa en plástico y adtadores terminal emt 1/2", suministro e instalación de red eléctrica monofásica de cu 2 x no 12 awg (1 fase + 1 neutro) + 1 x n° 12 t awg, suministro e instalación de acometida eléctrica libre de halógeno en cable 3 #4 + 1 #4 neutro y 1 #6 tierra, suministro e instalación de caja metálica galvanizada para protección de reflectores de calibre 18 y malla imt. incluye aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte, suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m, suministro y aplicación de pañete liso 1:3 impermeabilizado lineal, (ancho máximo 0,6m). aplicado en alturas iguales o inferiores a 3m, suministro e instalación de cerramiento de celdas (rejas) elaborados en varilla metálica lisa ø7/8" puesta verticalmente cada 0.10 y platinas 38x4mm (1½"x3/16"). con marcos perimetrales y divisiones verticales modulares en ángulo metálico 50 x 4mm (2"x3/16"). piezas conjuntamente soldadas garantizando la estabilidad y resistencia a vandalismo. fijada con anclajes cada 0.20 en el perímetro. acabado pintura esmalte para metal color gris claro mate aplicada sobre base anticorrosiva. (incluye transporte. equipo y mano de obra), suministro e instalación de reflector de 100w, vinilo muros interiores 3 manos, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, suministro e instalación de lámina en acrílico de 5mm. incluye aplicación de sikaflex, suministro e instalación de candado tipo alemán yale 800 o similar, incluye todo para su correcto funcionamiento (equipamiento celdas), esmalte sobre mamposteria (2 manos), desmonte de estructura en madera de piso existente. (incluye retiro y disposición final de sobrantes). aseo en obra incluye implementos para su ejecución dentro de los espacios intervenidos, suministro e instalación de acero para reforzamiento

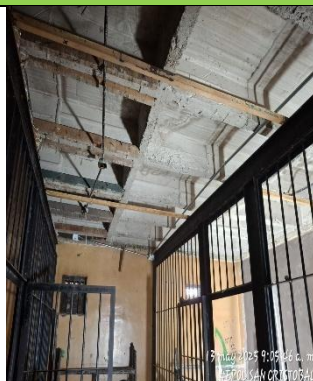
Estado programado

Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
100%	100%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

NA

Registro fotográfico



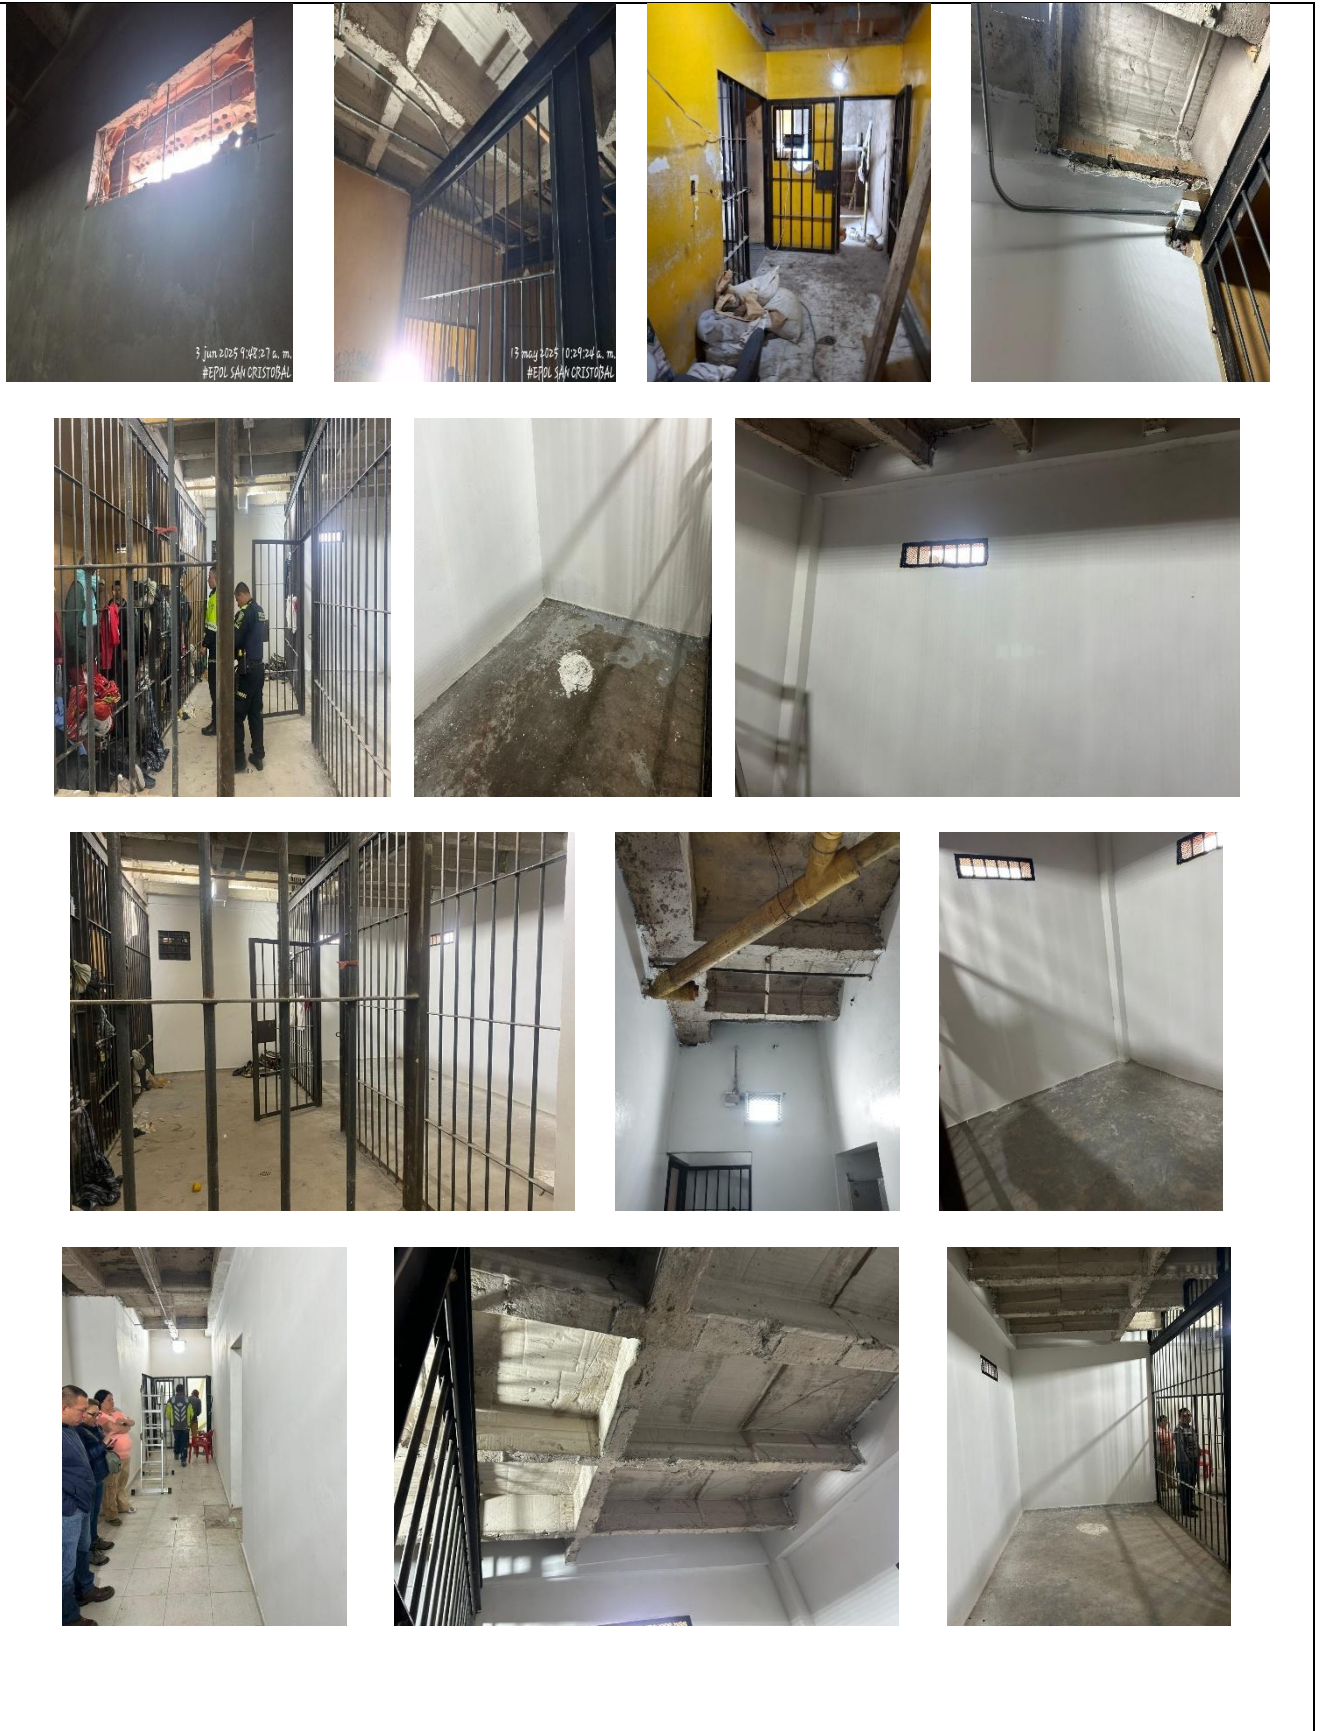
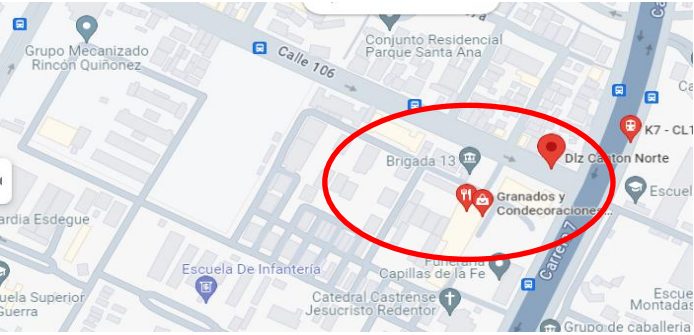


Tabla 41. Frente de Obra – Baser 13

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Usaquén	BASER 13	Calle 106 # 7- 25.	09/06/2025	07/07/2025
NOMBRE		LOCALIDAD	DIRECCION	
BASER 13		USAQUEN	Calle 106 # 7- 25.	
<p>Polígono de intervención:</p> 				
<p>Descripción de actividades:</p> <p>demolición pañetes (inc. retiro de sobr.), regata sobre muros incluye retiro de sobrantes, suspensión de salida sanitaria (inc. retiro de sobr.), suspensión de salida hidráulica (inc. retiro de sobr.) desmonte de sifones, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmonte de push sanitarios, demolición de acabados cerámicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye trasiego, retiro y disposición final de escombros), desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes), desmonte de accesorios sanitarios (tapa registros, pomos, regaderas, incrustaciones rejillas, etc...), limpieza y desinfección de tanque en concreto para agua potable, instalación acometida de 2" (mano de obra), registro p/d red white ø 1/2" ó equivalente, punto suministro galvanizado (inc. accesorios), sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), reinstalación de aparatos sanitarios, suministro e instalación de sifón tipo acordeón plástico, limpieza y reemboquille de enchape, suministro y aplicación de pañete liso 1:3 impermeabilizado lineal, (ancho máximo 0,6m). aplicado en alturas iguales o inferiores a 3m, suministro e instalación de rejilla metálica de piso de 3" en acero inoxidable, suministro e instalación de enchape pared lineal, suministro e instalación de lámparas herméticas, ducha calypso mezclador (sum e instalación), grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión ø 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, kit válvula de descarga antivandálica alta presión p´orinal, conexión ø 3/4" ó 1/2", 21-aa-950 docol ó similar, suministro e instalación de acople para lavamanos, 40 cms de largo, metálico cromado, importado, marca a&a o similar, suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio cumple con la Ada. marca toto o similar, suministro e instalación de push antivandálico para sanitario, mantenimiento preventivo de sistema hidráulico, incluye mto de motobomba de 7hp, tablero de variadores de frecuencia (ajuste de borneras, revisión de contactores, retoque y revisión de voltajes y amperajes) ajuste y calibración de hidro acumulador y presostatos, mto de bombas sumergibles para aguas nivel freático y limpieza de foso - bomba sumergible de 50*50, incluye retiro de cheques antirretorno y limpieza de los mismos. incluye niples descarga hg 2", desde motobomba a flauta de distribución, cheque hidro 2" bronce y válvula cortina 2" bronce.</p>				
Estado programado				
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso		
100%	100%	0%		
Actividades pendientes por ejecutar				
NA				

Registro fotográfico

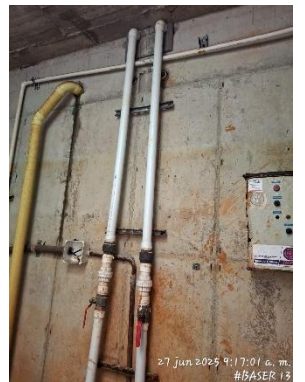
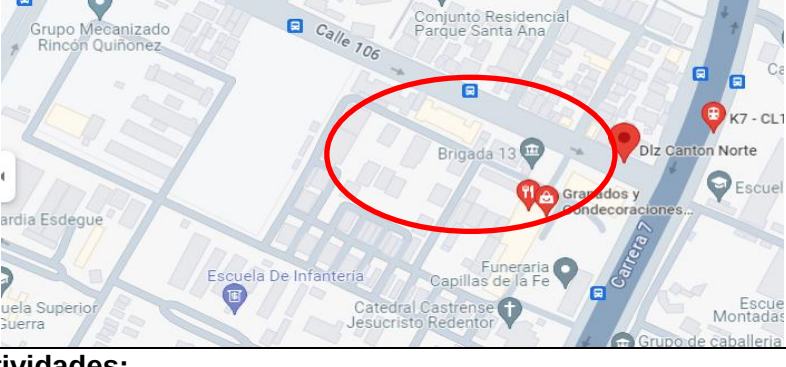


Tabla 42. Frente de Obra – PM 15

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Usaquén	PM15	Calle 106 # 7- 25.	15/06/2025	17/07/2025
NOMBRE		LOCALIDAD	DIRECCION	
PM 15		USAQUEN	Calle 106 # 7- 25.	
<p>Polígono de intervención:</p> 				
<p>Descripción de actividades:</p> <p>limpieza y desinfección de tanque en concreto para agua potable, instalación acometida de 2" (mano de obra), mantenimiento preventivo de sistema hidráulico, incluye mto de motobomba de 7hp, tablero de variadores de frecuencia (ajuste de borneras, revisión de contactores, retoque y revisión de voltajes y amperajes) ajuste y calibración de hidro acumulador y presostatos, mto de bombas sumergibles para aguas nivel freático y limpieza de foso - bomba sumergible de 50*50, incluye retiro de chequeos antirretorno y limpieza de los mismos. incluye niples descarga hg 2", desde motobomba a flauta de distribución, cheque hidro 2" bronce y válvula cortina 2" bronce.</p>				
Estado programado				
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso		
96,75%	53,89%	-42,86%		
Actividades pendientes por ejecutar				
<p>demolición pañetes (inc. retiro de sobr.), regata sobre muros incluye retiro de sobrantes, suspensión de salida sanitaria (inc. retiro de sobr.), suspensión de salida hidráulica (inc. retiro de sobr.), desmonte de sifones, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmonte de push sanitarios, demolición de acabados cerámicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye trasiego, retiro y disposición final de escombros), desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes), desmonte de accesorios sanitarios (tapa registros, pomos, regaderas, incrustaciones, rejillas, etc...), limpieza y desinfección de tanque en concreto para agua potable, instalación acometida de 2" (mano de obra), registro p/d red white ø 1/2" ó equivalente, punto suministro galvanizado (inc. accesorios), sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), reinstalación de aparatos sanitarios, suministro e instalación de sifón tipo acordeón plástico, limpieza y reemboquille de enchape, suministro y aplicación de pañete liso 1:3 impermeabilizado lineal, (ancho máximo 0,6m). aplicado en alturas iguales o inferiores a 3m, suministro e instalación de rejilla metálica de piso de 3" en acero inoxidable, suministro e instalación de enchape pared lineal, suministro e instalación de lámparas herméticas, ducha calypso mezclador (sum e instalación), grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión ø 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, kit válvula de descarga antivandálica alta presión p/orinal, conexión ø 3/4" ó 1/2", 21-aa-950 docol ó similar, suministro e instalación de acople para lavamanos, 40 cms de largo, metálico cromado, importado, marca a&a o similar, suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio cumple con la Ada. marca toto o similar, suministro e instalación de push antivandálico para sanitario, mantenimiento preventivo de sistema</p>				

hidráulico, incluye mto de motobomba de 7hp, tablero de variadores de frecuencia (ajuste de borneras, revisión de contactores, retoque y revisión de voltajes y amperajes)

Registro fotográfico

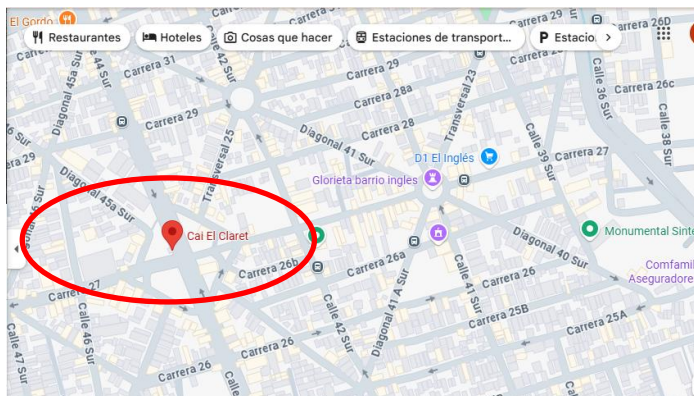


Tabla 43. Frente de Obra – CAI CLARET

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Rafael Uribe	CAI CLARET	Calle 44sur # 27-50	06/07/2025	06/08/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí CLARET	Rafael Uribe	Calle 44sur # 27-50

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:

Demolición de pisos en baldosín (inc. retiro de sobr.), demolición mesón corrido (inc. retiro de sobr.), regata sobre muros incluye retiro de sobrantes, desmonte de sifones, desmonte de push sanitarios, demolición de acabados cerámicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye trasiego, retiro y disposición final de escombros), desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes) sellado y emboquillado de regata en muros y placas para tuberías de diámetros entre 1 1/2" a 4" sobre elementos de concreto, usando aditivos tipo sikadur 32 y sikatop 121 o similar., restauración de piedra muñeca. incluye reemboquillada, desmonte puertas con marcos (inc. retiro de sobr.), escarificar pañetes (inc. retiro de sobr.), retiro de mantos asfálticos (inc. retiro de sobr.),desmonte de flanche en lámina galvanizada , accesorios pvc-p ø 1/2".registro p/d red white ø 1/2" ó equivalente, tubería pvcp rde 9 de 1/2",suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2" (incluye accesorios),sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"),sellado y emboquillado de regata en muros y placas para tuberías de diámetros entre 1 1/2" a 4" sobre elementos de concreto, usando aditivos tipo sikadur 32 y sikatop 121 o similar., mantenimiento y limpieza de cajas de inspección . incluye limpieza de la caja, ajuste de marco y/o reparación de marco,,suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m.,dilatadores plásticos para piso, alistado impermeabilizado para pisos con sika-1 en mortero 1:4 ,suministro e instalación de piso duro piso ,mediacaña en granito h = 0.10 m,flanche cal. 20 en lámina galvanizada desarrollo 30 cm,suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica, granito pulido mesones b = 60 cm incluye salpicadero y faldón, enchapes en piedra muñeca, win de aluminio, remoción de pintura suelta manual, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, desbaste de filo existente y conformación de filo biselado, con aplicación de mezcla y estuco, suministro y aplicación de doble mano de pintura bituminosa texsa o similar sobre manto asfáltico, limpieza de canales y bajantes, limpieza e impermeabilización de fachadas, suministro e instalación de enchape cerámico con medida 30cmx60cm para muros en interiores incluye pegante, boquilla y todos los

elementos para su correcta ejecución en alturas inferiores a 3 metros, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes),desmonte de cerraduras (incluye retiro de sobrantes),desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores).,salida para lampara fluorescente - pvc, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 25w, 95-227v, 2320 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas. ,suministro e instalación de interruptor doble, suministro e instalación de interruptor triple, suministro e instalación de toma corriente doble, suministro e instalación de toma gfci, suministro e instalación de interruptor sencillo, tubería emt 1/2" - suspendida incluye accesorios, suministro e instalación de tapa ciega, suministro e instalación de salida + tomacorriente doble en tubería emt de 1/2" sobrepuesta, (longitud promedio de salida 3 ml),suministro e instalación de caja metálica de paso, dimensiones 20x20x15, incluye tapa en plástico y adaptadores terminal emt 1/2",suministro e instalación de red eléctrica monofásica de cu 2 x n° 12 awg (1 fase + 1 neutro) + 1 x n° 12 t awg, revisión y organización general de tablero de 12 circuitos (contempla: identificación de circuitos, peinado y limpieza de tablero y marquillado),marquillado de puntos eléctrico plastificado de 1x2cm,mantenimiento de piso en granito mediante resanes, pulida, brillada y sellada ,guarda escoba en granito h = 0.065,mantenimiento, restauración y reparación de mirilla metálica de caí. contempla la reparación de zonas afectadas, masillado y aplicación de pintura de acabado., mantenimiento y restauración de marcos de carpintería en aluminio mediante resane, masillado y aplicación de pintura de acabado tipo anoloc. Suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable, medidas de 55x43cm,suministro e instalación de puerta corrediza de dos hojas cada una de 0,675x0,75m en lámina cold rolled calibre 18, incluye: manija, marco, aplicación de anticorrosivo y esmalte por ambas caras., suministro e instalación de reflector de 100w,griferia lavaplatos tipo prisma o similar sobreponer (sum e instalación),instalación de grifería orinal, instalación de grifería sanitarios, orinal mediano de colgar institucional color blanco para conexión ø 5/8" ref 21-aa-8860 mancesa ó similar + kit válvula de descarga antivandálica alta presión para orinal, conexión ø 3/4" ó 1/2", 21-aa-950 docol ó similar, suministro e instalación sanitario de tanque tipo avanti o similar ,cambio de acople sanitario, suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio cumple con la ada. marca toto o similar, juego de incrustar acuacer o similar (sum e instalación),tapa registro 20 x 20 (sum e instalación),suministro e instalación de desagüe con rejilla para lavamanos, sencillo, con rebose, metálico, cromado, marca a&a o similar, llave manguera 1/2" (sum e instalación)sistema de accionamiento antivandálico alta presión p/orinal de colgar, docol ó similar (inc. válvula de descarga, botón de accionamiento antivandálico y accesorios para conexión posterior),,grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión ø 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, esmalte sobre mamposteria,vinilo bajo placa - 2 manos, pintura koraza para fachadas ,suministro y aplicación de esmalte sobre lámina llena (contempla la preparación de la superficie previa aplicación),suministro e instalación de cerradura de seguridad 4 pasadores para puerta de acceso principal en CAIs.

Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
15,63%	89,69%	74,06 %
Actividades pendientes por ejecutar		
cerradura safe o similar entrada 142a aluminio satinado, suministro e instalación de espejo cristal biselado de 4mm, suministro e instalación de espejo convexo de 30cm de diámetro. incluye soporte de fijación, aseo en obra incluye implementos para su ejecución dentro de los espacios intervenidos, suministro e instalación de tope puerta, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.		
Registro fotográfico		

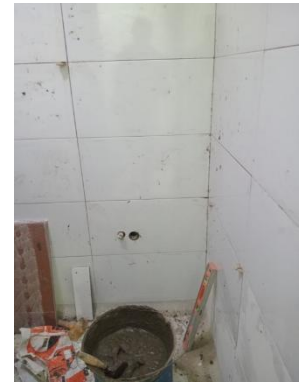
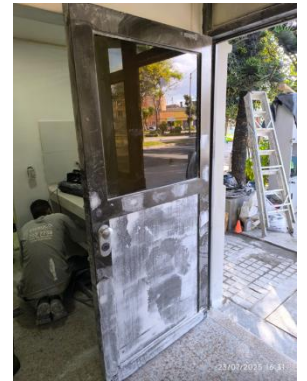
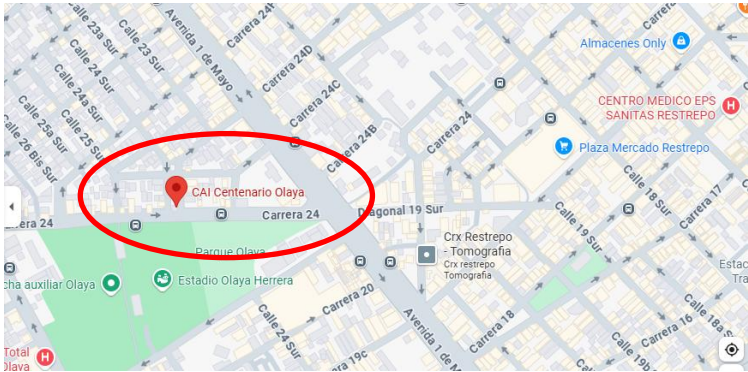


Tabla 44. Frente de Obra – CAI CENTENARIO

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Rafael Uribe	CAI CENTENARIO	Cra 24 # 24 -06 SUR	10/07/2025	07/08/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí CENTENARIO	Rafael Uribe	Cra 24 # 24 -06 SUR

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:

Demolición de pisos en baldosín (inc. retiro de sobr.), demolición mesón corrido (inc. retiro de sobr.), desmonte puertas con marcos (inc. retiro de sobr.), escarificar pañetes (inc. retiro de sobr.), retiro de mantos asfálticos (inc. retiro de sobr.), desmonte de flanche en lámina galvanizada. , desmonte de sifones, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes),desmonte de cerraduras (incluye retiro de sobrantes),desmonte de push sanitarios, demolición de acabados cerámicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye trasiego, retiro y disposición final de escombros), desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores)., desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes), desmonte de espejo (incluye retir y disposición final), suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m., granito pulido mesones b = 60 cm incluye salpicadero y faldón, enchapes en piedra muñeca, restauración de piedra muñeca. incluye reemboquillada, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, accesorios pvc-p ø 1/2", registro p/d red white ø 1/2" ó equivalente, tubería pvcp rde 9 de 1/2", suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2" (incluye accesorios), sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), mantenimiento y limpieza de cajas de inspección. incluye limpieza de la caja, ajuste de marco y/o reparación de marco, salida para lampara fluorescente - pvc, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 25w, 95-227v, 2320 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de interruptor doble, suministro e instalación de interruptor triple, suministro e instalación de toma corriente doble, suministro e instalación de toma gfci,suministro e instalación de interruptor sencillo, tubería emt 1/2" - suspendida incluye accesorios, suministro e instalación de tapa ciega, suministro e instalación de salida + tomacorriente doble en tubería emt de 1/2" sobrepuesta, (longitud promedio de salida 3 ml),suministro e instalación de caja metálica de paso, dimensiones 20x20x15, incluye tapa en plástico y adaptadores terminal emt 1/2",suministro e instalación de red eléctrica monofásica de cu 2 x n° 12 awg (1 fase + 1 neutro) + 1 x n° 12 t awg, revisión y organización general

de tablero de 12 circuitos (contempla: identificación de circuitos, peinado y limpieza de tablero y marquillado),marquillado de puntos eléctrico plastificado de 1x2cm,suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m.,dilatadores plásticos para piso., mantenimiento de piso en granito mediante resanes, pulida, brillada y sellada ,alistado impermeabilizado para pisos con sika-1 en mortero 1:4 ,suministro e instalación de piso duro piso ,guarda escoba en granito h = 0.065,mediacaña en granito h = 0.10 suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica. ,suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable, medidas de 55x43cm,win de aluminio, suministro e instalación de reflector de 100w,grifería lavaplatos tipo prisma o similar sobreponer (sum e instalación),instalación de grifería orinal, instalación de grifería sanitarios, remoción de pintura suelta manual., pintura koraza para fachadas ,desbaste de filo existente y conformación de filo biselado, con aplicación de mezcla y estuco., limpieza de canales y bajantes, limpieza e impermeabilización de fachadas, suministro e instalación de enchape cerámico con medida 30cmx60cm para muros en interiores incluye pegante, boquilla y todos los elementos para su correcta ejecución en alturas inferiores a 3 metros. flanche cal. 20 en lámina galvanizada desarrollo 30 cm, marcos puertas lámina c.r. c18 - b=80 cm (antic - esmalte), mantenimiento, restauración y reparación de mirilla metálica de cai. contemp, la reparación de zonas afectadas, masillado y aplicación de pintura de acabado, mantenimiento y restauración de marcos de carpintería en aluminio mediante resane, masillado y aplicación de pintura de acabado tipo anoloc, suministro e instalación de mirilla metálica de 9,5x9,5cm, incluye seguro con platina y aplicación de pintura en esmalte, suministro e instalación de puerta entamborada en acero galvanizado calibre 18. incluye bisagras, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte, no incluye marco, orinal mediano de colgar institucional color blanco para conexión ø 5/8" ref 21-aa-8860 mancesa ó similar + kit válvula de descarga antivandálica alta presión para orinal, conexión ø 3/4" ó 1/2", 21-aa-950 docol ó similar, suministro e instalación sanitario de tanque tipo avanti o similar, cambio de acople sanitario, suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio cumple con la ada. marca toto o similar, juego de incrustar acuacer o similar (sum e instalación), tapa- registro 20 x 20 (sum e instalación), suministro e instalación de desagüe con rejilla para lavamanos, sencillo, con rebose, metálico, cromado, marca a&a o similar, suministro e instalación de sifón en p, para lavamanos, metálico cromado. importado, marca a&a o similar, llave manguera 1/2" (sum e instalación),sistema de accionamiento antivandálico alta presión p/orinal de colgar, docol ó similar (inc. válvula de descarga, botón de accionamiento antivandálico y accesorios para conexión posterior),grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión ø 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, esmalte sobre mampostería,vinilo bajo placa - 2 manos, suministro y aplicación de esmalte sobre lámina llena (contempla la preparación de la superficie previa aplicación),suministro y aplicación de doble mano de pintura bituminosa texsa o similar sobre manto asfáltico, cerradura safe o similar entrada 142a aluminio satinado, suministro e instalación de cerradura de seguridad 4 pasadores para puerta de acceso principal en caí's.

Estado programado

Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
17,87%	86,66%	68,79%

Actividades pendientes por ejecutar

Suministro e instalación de puerta corrediza de dos hojas cada una de 0,675x0,75m en lámina cold rolled calibre 18, incluye: manija, marco, aplicación de anticorrosivo y esmalte por ambas caras, suministro e instalación de espejo cristal biselado de 4mm, suministro e instalación de espejo convexo de 30cm de diámetro. incluye soporte de fijación, aseo en obra incluye implementos para su ejecución dentro de los espacios intervenidos, suministro e instalación de tope puerta, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

Registro fotográfico



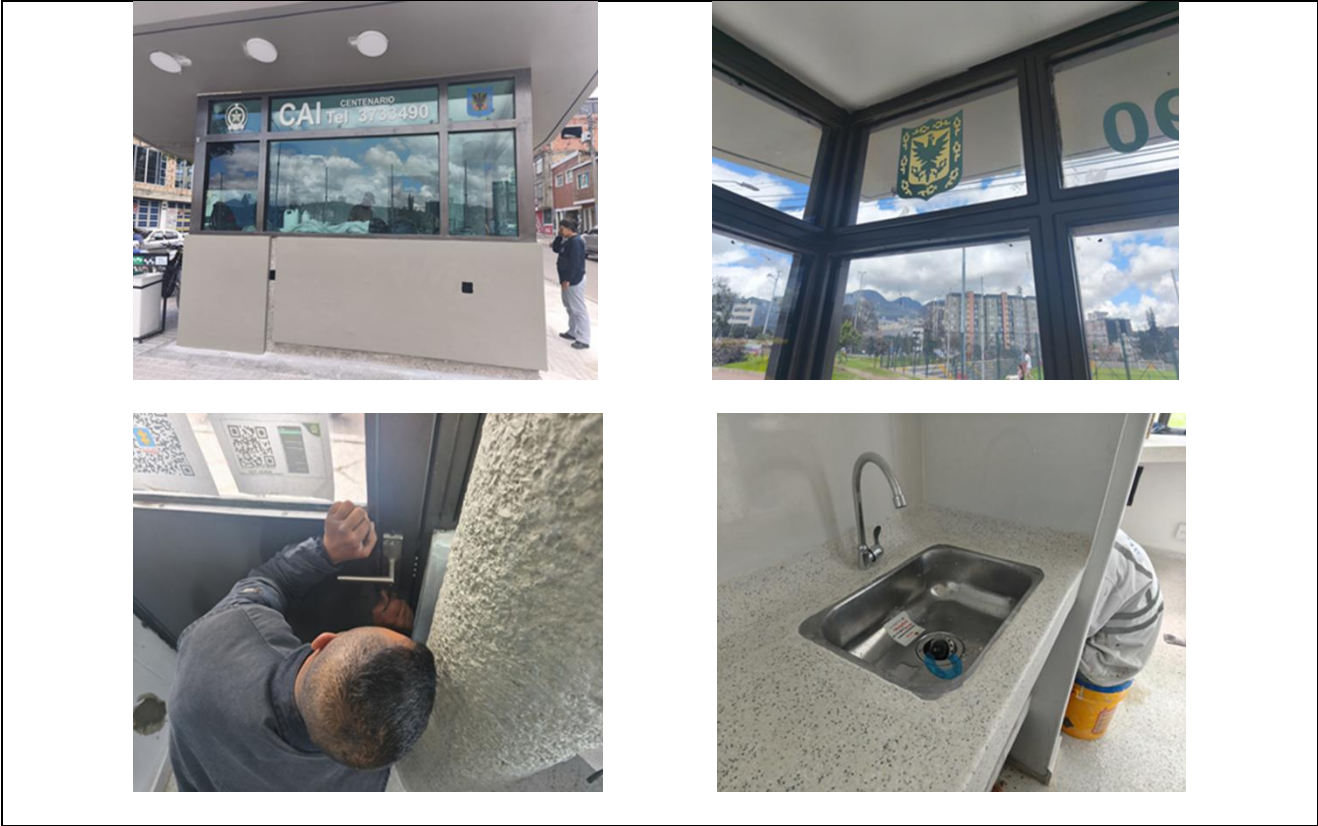


Tabla 45. Frente de Obra – CAI HAYUELOS

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Fontibón	CAI HAYUELOS	Cra 80 con Calle 22	17/07/2025	14/07/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
Caí HAYUELOS	Fontibón	Cra 80 con Calle 22
Polígono de intervención:		

Descripción de actividades:

Demolición de pisos en baldosín (inc. retiro de sobr.), regata sobre muros incluye retiro de sobrantes, desmonte puertas con marcos (inc. retiro de sobr.), desmonte de sifones, desmonte de push sanitario. Desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes), desmonte de espejo (incluye retir y disposición final), accesorios pvc-p ø 1/2", registro p/d red white ø 1/2" ó equivalente, tubería pvcp rde 9 de 1/2", suministro e instalación de punto hidráulico de 1/2" (incluye accesorios), sellado y emboquillado de regata en muros y placas para tuberías de diámetros entre 1 1/2" a 4" sobre elementos de concreto, usando aditivos tipo sikadur 32 y sikatop 121 o similar. demolición mesón corrido (inc. retiro de sobr.), escarificar pañetes (inc. retiro de sobr.), demolición de acabado de texturizado bajo placa. incluye retiro de escombros, corte de placa con pulidora. incluye aseo, regata en placa (incluye retiro de sobrantes), mesones en concreto de a=0,90 m., sondeo de puntos sanitarios (entre 1 1/2" y 4"), suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m., dilatadores plásticos para piso., alistado impermeabilizado para pisos con sika-1 en mortero 1:4, suministro e instalación de piso duro piso, guarda escoba en granito h = 0.065, mediacaña en granito h = 0.10 granito pulido mesones b = 60 cm incluye salpicadero y faldón, win de aluminio, remoción de pintura suelta manual., suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, limpieza de canales y bajantes, suministro e instalación de enchape cerámico con medida 30cmx60cm para muros en interiores incluye pegante, boquilla y todos los elementos para su correcta ejecución en alturas inferiores a 3 metros

Estado programado

Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
6,99%	17,39%	10,40%

Actividades pendientes por ejecutar

Retiro de mantos asfálticos (inc. retiro de sobr.), desmonte de flanche en lámina galvanizada, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmonte de cerraduras (incluye retiro de sobrantes), desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), mantenimiento y limpieza de cajas de inspección. incluye limpieza de la caja, ajuste de marco y/o reparación de marco, salida para lampara incandescente (incluye roseta) – pvc, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 25w, 95-227v, 2320 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de interruptor doble, suministro e instalación de interruptor triple, suministro e instalación de toma corriente doble, suministro e instalación de toma gfci, suministro e instalación de interruptor sencillo, tubería emt 1/2" - suspendida incluye accesorios, suministro e instalación de tapa ciega, suministro e instalación de salida + tomacorriente doble en tubería emt de 1/2" sobrepuesta, (longitud promedio de salida 3 ml), suministro e instalación de caja metálica de paso, dimensiones 20x20x15, incluye tapa en plástico y adaptadores terminal emt 1/2", suministro e instalación de red eléctrica monofásica de cu 2 x n° 12 awg (1 fase + 1 neutro) + 1 x n° 12 t awg, revisión y organización general de tablero de 12 circuitos (contempla: identificación de circuitos, peinado y limpieza de tablero y marquillado), marquillado de puntos eléctrico plastificado de 1x2cm, mantenimiento de piso en granito mediante resanes, pulida, brillada y sellada, mantenimiento de acabados de piso tipo losetas prefabricadas en concreto tipo a50 contemplando la reinstalación de las mismas losetas desmontadas. incluye base de mortero 1:5, cenefas en concreto de 0.30 - 3000 psi, flanche cal. 20 en lámina galvanizada desarrollo 30 cm, suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica, marcos puertas lámina c.r. c18 - b=80 cm (antic - esmalte), suministro e instalación de ventana blindada en cold-rolled cal. 14 nivel iii. 1. cristales laminados en caliente incoloro e=30 mm nivel III. pintura electrostática color crudo o natural. pisa vidrio y marco. 4.montaje a través de tornillos de expansión y epóxicos. película de

seguridad o anti esquirlas de 4" mls. de espesor, suministros e instalación de puerta blindada (0,80x2,05m) con marcos y nave de puerta fabricados en lámina cold- rolled cal. 14 para nivel iii, montaje de marco a través de tornillos de expansión y epóxicos. chapa de seguridad multipuntos con dos (2) pasadores (sup. - inf.) ; cuatro (4) al frente incluido el picaporte; sistema de llaves codificadas (5 unidades). bisagras tipo cilindro de alta resistencia en acero cold-rolled de ¾" de diámetro y 3 ½" de longitud, sistema de rodamiento interno. manijas de apertura. (exterior- interior). acabados en lámina y pintura electrostática. materiales de fabricación anti - inflamables. cristales laminados en caliente nivel iii. extremo de pasadores de la cerradura en acero inoxidable de ½". sistema interno con bujes y empaques en varillas para evitar el ruido de ellas. diseño con cristal blindado en modulo superior y montante similar al diseño de las puertas para caí, mantenimiento, restauración y reparación de mirilla metálica de caí. contempla la reparación de zonas afectadas, masillado y aplicación de pintura de acabado, mantenimiento y restauración de marcos de carpintería en aluminio mediante resane, masillado y aplicación de pintura de acabado tipo anoloc, suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable, medidas de 55x43cm, suministro e instalación de mirilla metálica de 9,5x9,5cm, incluye seguro con platina y aplicación de pintura en esmalte, suministro e instalación de puerta entamborada en acero galvanizado calibre 18. incluye bisagras, aplicación de anticorrosivo y pintura en esmalte, no incluye marco, enchapes en piedra muñeca, restauración de piedra muñeca. incluye reemboquillada, suministro e instalación de reflector de 100w, grifería lavaplatos tipo prisma o similar sobreponer (sum e instalación), instalación de grifería orinal, instalación de grifería sanitarios, orinal mediano de colgar institucional color blanco para conexión ø 5/8" ref 21-aa-8860 mancesca ó similar + kit válvula de descarga antivandálica alta presión para orinal, conexión ø 3/4" ó 1/2", 21-aa-950 docol ó similar, suministro e instalación sanitario de tanque tipo avanti o similar, cambio de acople sanitario, suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio cumple con la ada. marca toto o similar, juego de incrustar acuacer o similar (sum e instalación), tapa registro 20 x 20 (sum e instalación), suministro e instalación de desagüe con rejilla para lavamanos, sencillo, con rebose, metálico, cromado, marca a&a o similar, suministro e instalación de sifón en p, para lavamanos, metálico cromado. importado, marca a&a o similar, llave manguera 1/2" (sum e instalación), sistema de accionamiento antivandálico alta presión p/orinal de colgar, docol ó similar (inc. válvula de descarga, botón de accionamiento antivandálico y accesorios para conexión posterior), grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión ø 3/4" ó 1/2", 24-aa-142006 docol ó similar, esmalte sobre mampostería, vinilo bajo placa - 2 manos, pintura koraza para fachadas, suministro y aplicación de esmalte sobre lámina llena (contempla la preparación de la superficie previa aplicación), desbaste de filo existente y conformación de filo biselado, con aplicación de mezcla y estuco, suministro y aplicación de doble mano de pintura bituminosa texsa o similar sobre manto asfáltico, cerradura safe o similar entrada 142a aluminio satinado, suministro e instalación de espejo cristal biselado de 4mm, suministro e instalación de espejo convexo de 30cm de diámetro. incluye soporte de fijación, limpieza e impermeabilización de fachadas, mantenimiento de bordillo o sardinel en concreto incluye desmonte, limpieza, nivelación y reinstalación, aseo en obra incluye implementos para su ejecución dentro de los espacios intervenidos, suministro e instalación de tope puerta, incluye todo lo necesario para su correcta instalación y funcionamiento.

Registro fotográfico



Tabla 46. Frente de Obra – CAI TIMIZA

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Kennedy	CAI TIMIZA	Carrera 74 con Calle 43 Sur	11/07/2025	08/08/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CAÍ TIMIZA	Kennedy	Carrera 74 con Calle 43 Sur
Polígono de intervención:		

Descripción de actividades:

demolición de pisos en baldosín (inc. retiro de sobr.), demolición mesón corrido (inc. retiro de sobr.), desmonte puertas con marcos (inc. retiro de sobr.), escarificar pañetes (inc. retiro de sobr.), retiro de mantos asfálticos (inc. retiro de sobr.), desmonte de flanche en lámina galvanizada, desmonte de sifones, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmonte de push sanitarios, demolición de acabados cerámicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye trasiego, retiro y disposición final de escombros), desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes), desmonte de espejo (incluye retiro y disposición final), demolición de acabado de texturizado bajo placa. incluye retiro de escombros, corte de placa con pulidora. incluye aseo, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 25w, 95-227v, 2320 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de interruptor doble, suministro e instalación de interruptor triple, suministro e instalación de toma corriente doble, suministro e instalación de toma gfci, suministro e instalación de interruptor sencillo, suministro e instalación de caja metálica de paso, dimensiones 20x20x15, incluye tapa en plástico y adaptadores terminal emt 1/2", suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m, mediacaña en granito h = 0.10 m, mantenimiento de acabados de piso tipo losetas prefabricadas en concreto tipo a50 contemplando la reinstalación de las mismas losetas desmontadas. incluye base de mortero 1:5, suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica, marcos puertas lámina c.r. c18 - b=80 cm (antic - esmalte), mantenimiento, restauración y reparación de mirilla metálica de cai. contempla la reparación de zonas afectadas, masillado y aplicación de pintura de acabado, suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable, medidas de 55x43cm, granito pulido mesones b = 60 cm incluye salpicadero y faldón, win de aluminio, restauración de piedra muñeca. incluye reemboquillada, orinal mediano de colgar institucional color blanco para conexión $\varnothing$ 5/8" ref. 21-aa-8860 mancesa o similar + kit válvula de descarga antivandálica alta presión para orinal, conexión $\varnothing$ 3/4" o 1/2", 21-aa-950 docol o similar, suministro e instalación sanitario de tanque tipo avanti o similar, suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio cumple con la Ada. marca toto o similar, sistema de accionamiento antivandálico alta presión p/orinal de colgar, docol o similar (inc. válvula de descarga, botón de accionamiento antivandálico y accesorios para conexión posterior), grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión $\varnothing$ 3/4" o 1/2", 24-aa-142006 docol o similar, esmalte sobre mampostería, vinilo bajo placa - 2 manos, remoción de pintura suelta manual, pintura koraza para fachadas, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, desbaste de filo existente y conformación de filo biselado, con aplicación de mezcla y estuco, suministro e instalación de espejo convexo de 30cm de diámetro. incluye soporte de fijación, suministro e instalación de enchape cerámico con medida 30cmx60cm para muros en interiores incluye pegante, boquilla y todos los elementos para su correcta ejecución en alturas inferiores a 3 metros.

Estado programado

Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
15,72%	96,99%	81,26%

Actividades pendientes por ejecutar

tope puerta, mantenimiento y limpieza de cajas de inspección, ajuste de marco y/o reparación de marco, revisión y organización general de tablero de 12 circuitos, mantenimiento de piso en granito, guaradescoba en granito h = 0.065, mantenimiento y restauración de marcos de carpintería en aluminio mediante resane, masillado y aplicación de pintura de acabado tipo anoloc, aseo en obra incluye implementos para su ejecución dentro de los espacios intervenidos.

Registro fotográfico

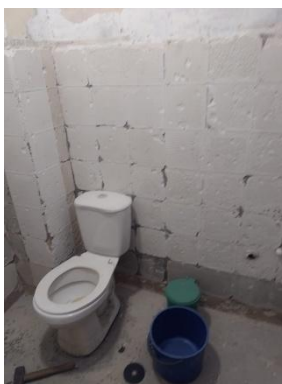


Tabla 47. Frente de Obra – CAI JUAN REY

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
San Cristóbal	CAI JUAN REY	Calle 74 Sur con Carrera 15 Este	25/07/2025	22/08/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CAI JUAN REY	San Cristóbal	Calle 74 Sur con Carrera 15 Este

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:

demolición mesón corrido (inc. retiro de sobr.), desmonte puertas con marcos (inc. retiro de sobr.), retiro de mantos asfálticos (inc. retiro de sobr.), desmonte de flanche en lámina galvanizada, desmonte de push sanitarios, desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes), granito pulido mesones b = 60 cm incluye salpicadero y faldón

Estado programado

Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
1,75%	2,68%	0,93%

Actividades pendientes por ejecutar

demolición de pisos en baldosín (inc. retiro de sobr.), escarificar pañetes (inc. retiro de sobr.), retiro de mantos asfálticos (inc. retiro de sobr.), desmonte de sifones, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmonte de push sanitarios, demolición de acabados cerámicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye trasiego, retiro y disposición final de escombros), desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), desmonte de espejo (incluye retiro y disposición final), demolición de acabado de texturizado bajo placa. incluye retiro de escombros, corte de placa con pulidora. incluye aseo, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 25w, 95-227v, 2320 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de interruptor doble, suministro e instalación de interruptor triple, suministro e instalación de toma corriente doble, suministro e instalación de toma gfci, suministro e instalación de interruptor sencillo, suministro e instalación de caja metálica de paso, dimensiones 20x20x15, incluye tapa en plástico y adtadores terminal emt 1/2", suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m, mediacaña en granito h = 0.10 m, mantenimiento de acabados de piso tipo losetas prefabricadas en concreto tipo a50 contemplando la reinstalación de las mismas losetas desmontadas. incluye base de mortero 1:5, suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico

impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. incluye imprimación de superficie con emulsión asfáltica, marcos puertas lámina c.r. c18 - b=80 cm (antic - esmalte), mantenimiento, restauración y reparación de mirilla metálica de cai. contempla la reparación de zonas afectadas, masillado y aplicación de pintura de acabado, suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable, medidas de 55x43cm, granito pulido mesones b = 60 cm incluye salpicadero y faldón, win de aluminio, restauración de piedra muñeca. incluye reemboquillada, orinal mediano de colgar institucional color blanco para conexión $\varnothing$ 5/8" ref. 21-aa-8860 mancesa o similar + kit válvula de descarga antivandálica alta presión para orinal, conexión $\varnothing$ 3/4" o 1/2", 21-aa-950 docol o similar, suministro e instalación sanitario de tanque tipo avanti o similar, suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio cumple con la Ada. marca toto o similar, sistema de accionamiento antivandálico alta presión p/orinal de colgar, docol o similar (inc. válvula de descarga, botón de accionamiento antivandálico y accesorios para conexión posterior), grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión $\varnothing$ 3/4" o 1/2", 24-aa-142006 docol o similar, esmalte sobre mampostería, vinilo bajo placa - 2 manos, remoción de pintura suelta manual, pintura koraza para fachadas, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, desbaste de filo existente y conformación de filo biselado, con aplicación de mezcla y estuco, suministro e instalación de espejo convexo de 30cm de diámetro. incluye soporte de fijación, suministro e instalación de enchape cerámico con medida 30cmx60cm para muros en interiores incluye pegante, boquilla y todos los elementos para su correcta ejecución en alturas inferiores a 3 metros.

Registro fotográfico



Tabla 48. Frente de Obra – CAI LIBERTADORES

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
San Cristóbal	CAI LIBERTADORES	Cra. 11a Este #52	25/07/2025	22/08/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CAI LIBERTADORES	San Cristóbal	Cra. 11a Este #52

Polígono de intervención:



Descripción de actividades:

demolición mesón corrido (inc. retiro de sobr.), desmonte puertas con marcos (inc. retiro de sobr.), desmonte de sifones, desmonte de push sanitarios, demolición de acabados cerámicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye trasiego, retiro y disposición final de escombros), desmonte de aparatos sanitarios (incluye: retiro de sobrantes).

Estado programado

Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
1,34%	1,34%	0%

Actividades pendientes por ejecutar

demolición de pisos en baldosín (inc. retiro de sobr.), escarificar pañetes (inc. retiro de sobr.), retiro de mantos asfálticos (inc. retiro de sobr.), desmonte de sifones, desmonte de lámparas (incluye retiro de sobrantes), desmonte de push sanitarios, demolición de acabados cerámicos de piso o muros en alturas de hasta 3m. (incluye trasiego, retiro y disposición final de escombros), desmonte de accesorios eléctricos (tomacorrientes e interruptores), desmonte de espejo (incluye retiro y disposición final), demolición de acabado de texturizado bajo placa. incluye retiro de escombros, corte de placa con pulidora. incluye aseo, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 18w, 95-227v, 1620 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de bala panel led de incrustar o sobreponer 25w, 95-227v, 2320 lm, 6.000k, aro blanco, 35.000 horas, suministro e instalación de interruptor doble, suministro e instalación de interruptor triple, suministro e instalación de toma corriente doble, suministro e instalación de toma gfci, suministro e instalación de interruptor sencillo, suministro e instalación de caja metálica de paso, dimensiones 20x20x15, incluye tapa en plástico y adtadores terminal emt 1/2", suministro y aplicación de pañete impermeabilizado liso 1:3 sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m, mediacaña en granito h = 0.10 m, mantenimiento de acabados de piso tipo losetas prefabricadas en concreto tipo a50 contemplando la reinstalación de las mismas losetas desmontadas. incluye base de mortero 1:5, suministro e instalación de impermeabilización de cubierta plana con manto asfáltico impermeabilizante de 3mm con foil de aluminio. incluye imprimación de superficie con emulsión

asfáltica, marcos puertas lámina c.r. c18 - b=80 cm (antic - esmalte), mantenimiento, restauración y reparación de mirilla metálica de cai. contempla la reparación de zonas afectadas, masillado y aplicación de pintura de acabado, suministro e instalación de lavaplatos de sobreponer en acero inoxidable, medidas de 55x43cm, granito pulido mesones b = 60 cm incluye salpicadero y faldón, win de aluminio, restauración de piedra muñeca. incluye reemboquillada, orinal mediano de colgar institucional color blanco para conexión $\varnothing$ 5/8" ref. 21-aa-8860 mancesa o similar + kit válvula de descarga antivandálica alta presión para orinal, conexión $\varnothing$ 3/4" o 1/2", 21-aa-950 docol o similar, suministro e instalación sanitario de tanque tipo avanti o similar, suministro e instalación de lavamanos de colgar con un solo orificio cumple con la Ada. marca toto o similar, sistema de accionamiento antivandálico alta presión p/orinal de colgar, docol o similar (inc. válvula de descarga, botón de accionamiento antivandálico y accesorios para conexión posterior), grifería antivandálica para lavamanos pico largo tipo push, conexión $\varnothing$ 3/4" o 1/2", 24-aa-142006 docol o similar, esmalte sobre mampostería, vinilo bajo placa - 2 manos, remoción de pintura suelta manual, pintura koraza para fachadas, suministro y aplicación de estuco plástico sobre muros en alturas iguales o inferiores a 3m. producto listo para usar, aplicado en tres (3) capas con lijado para acabado final. incluye transporte de insumos a obra, desbaste de filo existente y conformación de filo biselado, con aplicación de mezcla y estuco, suministro e instalación de espejo convexo de 30cm de diámetro. incluye soporte de fijación, suministro e instalación de enchape cerámico con medida 30cmx60cm para muros en interiores incluye pegante, boquilla y todos los elementos para su correcta ejecución en alturas inferiores a 3 metros.

Registro fotográfico

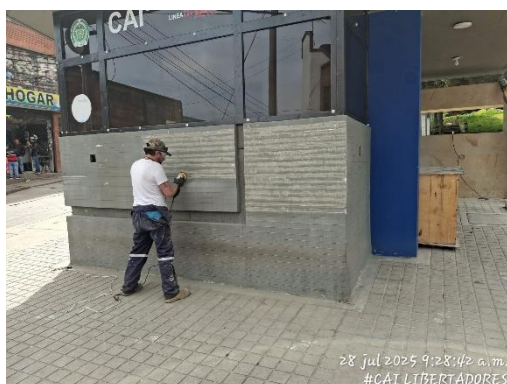
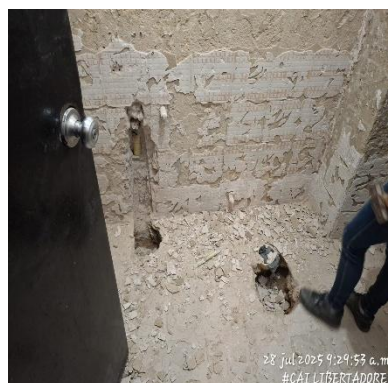


Tabla 49. Frente de Obra – CARCEL DISTRITAL

LOCALIDAD	UNIDAD	DIRECCIÓN	FECHA INICIO	FECHA TERMINACIÓN
Usme	CARCEL DISTRITAL	Kilómetro 5 vía Usme.	25/07/2025	22/08/2025

NOMBRE	LOCALIDAD	DIRECCION
CARCEL DISTRITAL	Usme	Kilómetro 5 vía Usme.
<p>Polígono de intervención:</p> 		
<p>Descripción de actividades: excavación manual tierra h<2.50 m. (inc. cargue, transporte y disposición final), compactación y relleno con material existente, suministro e instalación de pie de amigo platina 6" x 10" reforzado con soporte transversal, suministro e instalación de concertina sencilla con diámetro de 45 cm. incluye guaya de 1/8", tubo de fijación cada 5 metros y platina con perforaciones de 0,05x0,05*1/4", poda de césped (incluye retiro de sobrantes), suministro y fundición de placa de concreto de 3000 psi e=10cm. incluye trasiego de material, transporte y formaleta. no incluye acero de refuerzo.</p>		
Estado programado		
Programado	Ejecutado	Avance/Atraso
93,89%	76,96%	-16,93%
Actividades pendientes por ejecutar		
Instalación de cerramiento metálico, instalación de reflectores		
Registro fotográfico		



Durante el periodo del presente informe, se presentaron varias actividades que precisaban mitigar el impacto negativo al funcionamiento normal de los equipamientos de las diferentes localidades de Bogotá. La cuadrilla y la línea de emergencia atendió la ejecución de estas actividades que se relacionan a continuación, con el seguimiento y acompañamiento por parte de la Interventoría.

Tabla 50. Emergencias atendidas en el periodo.

FRENTE	VALOR EMERGENCIA
E.P RAFAEL URIBE (EMER 108)	\$ 649.028,00
E.P TUNJUELITO (109)	\$ 4.857.464,00
CAI PLAZA AMERICAS (EMER 110)	\$ 1.706.596,00
CAI TOBERIN (EMER 111)	\$ 1.295.677,00
CAI SANTA MARIA DEL LAGO (EMER 112)	\$ 1.064.070,00
CAI SOLEDAD (EMER 113)	\$ 2.937.534,00
CAI SAMPER MENDOZA (EMER 114)	\$ 5.510.413,00
CAI COMPARTIR (EMER 115)	\$ 7.665.984,00
CAI DANUBIO AZUL (EMER 116)	\$ 1.575.602,00
CAI VALVANERA (EMER 120)	\$ 6.818.824,00
CAI PINAR (EMER 121)	\$ 1.188.879,00
EPOL SAN CRISTOBAL (EMER 122)	\$ 903.954,00
EPOL SUBA (EMER 123)	\$ 7.876.961,00
EPOL PUENTE ARANDA (EMER 124)	\$ 1.516.269,00
EPOL SAN CRISTOBAL (EMER 125)	\$ 3.029.454,00
CAI PUENTE ARANDA (EMER) VIDRIOS BLINDADOS - EN FABRICACION	\$ 8.097.096,00
TOTAL EMERGENCIAS MEBOG	\$ 56.693.805,00
25,69%	\$ 14.564.638,50
TOTAL EMERGENCIAS MEBOG	\$ 71.258.443,50
CASA DE JUSTICIA	
CJ SAN CRISTOBAL(EMER 117)	\$ 1.090.960,00
CJ MARTIRES(EMER 119)	\$ 387.235,00
CJ CIUDA BOLIVAR (EMER 126)	\$ 1.199.115,00
CJ SAN CRISTOBAL (EMER 127)	\$ 3.605.284,00
TOTAL CASA DE JUSTICIAS	\$ 6.282.594,00
CASA DE J J RESTURATIVA	
CASA RESTAURATIVA SANTA FE (EMER 118)	\$ 137.245,00
TOTAL CASA RESTAURATIVAS	\$ 137.245,00
TOTAL EMERGENCIAS JUSTICIA	\$ 6.419.839,00
25,69%	\$ 1.649.256,64
TOTAL EMERGENCIAS JUSTICIA	\$ 8.069.095,64
TOTAL DE EMERGENCIAS ATENDIDAS	\$ 79.327.539,14

Tabla 51. Emergencias conciliadas en el periodo.

Las emergencias se concilian en un lapso de tiempo mínimo de 3 días, en el momento que es autorizada por la supervisión del contrato, posteriormente se legalizan para la elaboración del acta de no previsto de emergencias.

Emergencias MEBOG

FRENTE	VALOR EMERGENCIA
E.P RAFAEL URIBE (EMER 108)	\$ 649.028,00
E.P TUNJUELITO (109)	\$ 4.857.464,00
CAI PLAZA AMERICAS (EMER 110)	\$ 1.706.596,00
CAI TOBERIN (EMER 111)	\$ 1.295.677,00
CAI SANTA MARIA DEL LAGO (EMER 112)	\$ 1.064.070,00
CAI SOLEDAD (EMER 113)	\$ 2.937.534,00
CAI SAMPER MENDOZA (EMER 114)	\$ 5.510.413,00
CAI COMPARTIR (EMER 115)	\$ 7.665.984,00
CAI DANUBIO AZUL (EMER 116)	\$ 1.575.602,00
CAI VALVANERA (EMER 120)	\$ 6.818.824,00
CAI PINAR (EMER 121)	\$ 1.188.879,00
EPOL SAN CRISTOBAL (EMER 122)	\$ 903.954,00
EPOL SUBA (EMER 123)	\$ 7.876.961,00
EPOL PUENTE ARANDA (EMER 124)	\$ 1.516.269,00
EPOL SAN CRISTOBAL (EMER 125)	\$ 3.029.454,00
CAI PUENTE ARANDA (EMER) VIDRIOS BLINDADOS - EN FABRICACION	\$ 8.097.096,00
TOTAL EMERGENCIAS MEBOG	\$ 56.693.805,00
25,69%	\$ 14.564.638,50
TOTAL EMERGENCIAS MEBOG	\$ 71.258.443,50

Emergencias JUSTICIA

CASA DE JUSTICIA	
CJ SAN CRISTOBAL(EMER 117)	\$ 1.090.960,00
CJ MARTIRES(EMER 119)	\$ 387.235,00
CJ CIUDA BOLIVAR (EMER 126)	\$ 1.199.115,00
CJ SAN CRISTOBAL (EMER 127)	\$ 3.605.284,00
TOTAL CASA DE JUSTICIAS	\$ 6.282.594,00
CASA DE J J RESTURATIVA	
CASA RESTAURATIVA SANTA FE (EMER 118)	\$ 137.245,00
TOTAL CASA RESTAURATIVAS	\$ 137.245,00
TOTAL EMERGENCIAS JUSTICIA	\$ 6.419.839,00
25,69%	\$ 1.649.256,64
TOTAL EMERGENCIAS JUSTICIA	\$ 8.069.095,64

6. RECURSOS UTILIZADOS

Durante el desarrollo de los Contratos de Obra e Interventoría, cada una de las partes cuenta con el talento humano que se relaciona a continuación:

6.1 PERSONAL AUTORIZADO POR SDSCJ:

Tabla 52. Personal SDSCJ

CARGO	NOMBRE
Apoyo a la Supervisión	EDUIN ANTONIO MORENO SHET
Apoyo a la Supervisión	JUAN CARLOS PINZÓN CORTES
Supervisión	ORLANDO VEGA NAVAS

6.2 PERSONAL DE LA INTERVENTORÍA

Para el desarrollo del compromiso contractual, TOTTAL INC SAS BIC, cuenta con el siguiente personal mínimo. Anexo 11.8

Tabla 53. Personal TOTTAL INC SAS BIC.

CARGO	CANTIDAD	NOMBRE	Nombre
Director de Interventoría	1	ALVARO JIMÉNEZ POLO	ALVARO JIMÉNEZ POLO
Residente de Interventoría 1	1	MAURY JAVIER FERRIGNO RIVAS	MARIA PIEDAD ESPINOSA VIRGÜEZ
Residente de Interventoría 2	1	BENJAMIN ANTONIO HERNANDEZ G	ALEXIS REDONDO PEÑA
Inspector 1	1	DIEGO ALEXIS FORERO BELTRAN	DIEGO ALEXIS FORERO BELTRAN
Inspector 2	1	CRISTIAN CAMILO BAQUERO CORREDOR	CRISTIAN CAMILO BAQUERO CORREDOR

Inspector 3	1	FREDY CORTES	FREDY CORTES
Inspector 4	1	JAIME RODRIGUEZ	JAIME RODRIGUEZ
Inspector 5	1	YEISON DANILO DURAN BARBOSA	YEISON DANILO DURAN BARBOSA
Profesional Seguridad Industrial	1	KATHERINE GUAÑARITA DIAZ	KATHERINE GUAÑARITA DIAZ
Profesional de presupuestos programación y control	1	JUAN CARLOS MORALES RIVERA	JUAN CARLOS MORALES RIVERA
Profesional redes eléctricas	1	JESÚS ALBERTO LÓPEZ VELA	JESÚS ALBERTO LÓPEZ VELA
Profesional redes Hidrosanitarias	1	OMAR ARCHILA MENDOZA	OMAR ARCHILA MENDOZA
Profesional en estructuras	1	CARLOS ALBERTO MAYORGA VELA	CARLOS ALBERTO MAYORGA VELA

	Proceso:	SCJ- SIF-CMA-003-2024	Código:	F-FC-559
			Version:	1
	Documento:	Reporte Estado Equipo Mínimo de Trabajo	Fecha Aprobación:	28/03/2022
			Fecha de Vigencia:	28/03/2022
				Hoja 1 de 1

NÚMERO/AÑO DEL CONTRATO	SCJ-1980-2024	FECHA DILIGENCIAMIENTO	31 JULIO DE 2025
OBJETO DEL CONTRATO	"INTERVENTORIA TÉCNICA ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA AL CONTRATO PARA REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LOS EQUIPAMIENTOS DE INFRAESTRUCTURA A CARGO DE LA SOCJ Y AGENCIAS".	NOMBRE DEL CONTRATISTA	TOTAL INC SAS BIC
PERIODO CERTIFICADO	jul-25	NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL	Edgar Alfredo Salazar Bernal


A continuación se relaciona el listado de personal que ejecutó las labores administrativas y operativas para el contrato, de acuerdo con las obligaciones establecidas en el mismo, en el periodo certificado:


LISTADO DE PERSONAL								
No.	NOMBRE Y APELLIDOS COMPLETOS	CÉDULA	FECHA DE INGRESO (DD/MM/AAAA)	CARGO	ÁREA	FORMACIÓN	DEDICACIÓN	¿APROBADO POR LA SUPERVISIÓN?
1	ASIFAR JIMÉNEZ POND	79.498.079	3/08/2025	Director de Interventoría	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo parcial	SI
2	BENJAMIN HERNANDEZ	92.277.536	3/08/2025	Residente de Interventoría 1	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo completo	SI
3	MAURY JAVIER FERRONDO RIVAS	72.261.222	3/08/2025	Residente de Interventoría 2	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo completo	SI
4	ALEXIS RODRIGO PEÑA	3.759.428	30/01/2025	Residente de Interventoría 1	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo completo	SI
5	MARIA FIDAO ESPINOSA VIRGILIZ	52.227.037	30/01/2025	Residente de Interventoría 2	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo completo	SI
6	JHON ALBERTO LÓPEZ VILANDIA	10.240.108	3/08/2025	Profesional fiscal co interventoria	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo parcial	SI
7	OMAR ARCHILA MENDOZA	7.227.406	3/08/2025	Profesional Redes Hidrosanitarias Interventoria	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo parcial	SI
8	CARLOS ALBERTO MAYORGA VELA	80.020.496	3/08/2025	Profesional en estructuras interventoria	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo parcial	SI
9	FERNANDO JIMENEZ POLO	79.542.134	3/08/2025	Apoyo a la dirección	Administrativa	Profesional	Tiempo completo	SI
10	JUAN CARLOS MORALES RIVERA	79.955.008	3/08/2025	Profesional de presupuesto	Administrativa	Profesional	Tiempo parcial	SI
11	KATHERINE GUAÑARITA DIAZ	1.075.236.249	3/08/2025	Profesional socio	Campo/Administrativa	Profesional	Tiempo parcial	SI
12	DIEGO ALEXIS FORERO BIGURAN	80.076.930	3/08/2025	Inspector 1	Campo	Profesional	Tiempo completo	SI
13	CRISTIAN CAMILO BACURIO CORREDOR	1.055.423.638	3/08/2025	Inspector 2	Campo	Técnico	Tiempo completo	SI
14	JAIME ALBERTO RODRIGUEZ CASERRE	79.205.436	3/08/2025	Inspector 3	Campo	Técnico	Tiempo completo	SI
15	YEISON DURAN BARBOSA	1.084.310.225	3/08/2025	Inspector 4	Administrativo	Profesional	Tiempo completo	SI
16	FREDY ALEXANDER CORTEIS PRUDOMO	80.844.754	3/08/2025	Inspector 5	Campo	Técnico	Tiempo completo	SI
17	BRICK STEVEN RAMIREZ ARENDAÑO	1.084.241.930	3/08/2025	Apoyo SI SOMA	Campo	Técnico	Tiempo completo	SI

OBSERVACIONES:

Dejamos constancia que se han verificado a satisfacción los soportes que avalan la vinculación del personal que ejecutó las labores administrativas y operativas para el contrato en el periodo certificado.

Dado en Bogotá a los 31 días del mes de julio de 2025


ALVARO JIMENEZ POLO
Director de Interventoría
TOTAL INC SAS BIC


EDWIN ANTONIO MORENO SHET
Supervisión Contrato 1904 de 2023
SECRETARÍA DE SEGURIDAD, CONVIVENCIA Y JUSTICIA



6.3 PERSONAL DEL CONTRATISTA

El contratista **CONSORCIO OBRASW**, contó con el siguiente personal para el desarrollo o ejecución de su compromiso contractual.

Tabla 54. Personal DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S.

CARGO	CANTIDAD	NOMBRE
Director de Obra	1	HOSMAN ENRIQUE LECHUGA
Coordinador 1	1	JUAN CAMILO SALAMANCA
Coordinador 2	1	VICTOR HOLMAN FORERO
Inspector 1	1	IVAN ANDRES SANTOS ARROYO
Inspector 2	1	JUAN FERNANDO PEDREROS
Inspector 3	1	JUAN ESTEBAN FORERO
Profesional de presupuesto y programación de obra	1	JUAN MARTIN ROCHA
Supervisor SISOMA	1	JULIAN ANDRES LÓPEZ
Asesor Estructural	1	JUAN CARLOS HERRERA
Asesor Eléctrico	1	CIRO ANTONIO RODRIGUEZ
Asesor Hidrosanitario	1	GLORIA LIZETH PARRA

6.4 RECURSOS DE LA INTERVENTORÍA.

Para el desarrollo del compromiso contractual, **TOTALL INC SAS BIC** contó con la siguiente maquinaria y/o equipos:

Tabla 55. Maquinaria y/o equipos a disponibilidad de interventoría

CANTIDAD	EQUIPO
1	Equipo de oficina (Computadores, celulares, impresora)

6.5 RECURSOS DEL CONTRATISTA.

El **CONSORCIO OBRASW**, cuentan con la siguiente maquinaria y/o equipos, para la ejecución del contrato.

Tabla 56. Maquinaria y/o equipos a disponibilidad del contratista

CANTIDAD	EQUIPO
1	Equipo de oficina (Computadores, celulares, impresora)
2	Camioneta para el transporte de material y personal requerido

7. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES DE ORDEN CONTRACTUAL

El presente informe corresponde a la etapa de diagnósticos, sin embargo, el contratista

inicio 4 frentes de obra que se desarrollaron del 01 de abril al 30 de abril de 2025.

7.1. Actividades de Orden Financiero:

A continuación, se relacionan los presupuestos presentados a la fecha por DIARQCO luego de las visitas realizadas para diagnóstico. Los valores no son definitivos y puede presentar ajustes:

Tabla 57. Presupuestos iniciales.

ESTACIÓN DE POLICIA			\$	1.650.743.501
1	Teusaquillo	NUEVO COMANDO	\$	798.445.760
2	Ciudad Bolívar	ESTACION DE POLICIA CIUDAD BOLIVAR	\$	646.803.818
3	Usme	ESTACION DE POLICIA USME	\$	205.493.923
CAI			\$	380.820.119
1	Usaquén	CAI VERBENAL	\$	52.585.395
2	Chapinero	CAI LOURDES	\$	59.745.248
3	Santafé	CAI DORADO	\$	50.924.411
5	Bosa	CAI PIAMONTE	\$	67.004.516
6	Kennedy	CAI PATIO BONITO	\$	72.357.582
7	Pte. Aranda	CAI ALQUERIA	\$	78.202.966
EQUIPAMIENTOS DE JUSTICIA			\$	75.816.609
1	Pte. Aranda	CESPA	\$	33.594.396
2	Santa Fé	CASA RESTAURATIVA SANTA FE	\$	25.762.005
3	San Cristóbal	CASA RESTAURATIVA LA VICTORIA	\$	16.460.207
CASAS DE JUSTICIA			\$	367.361.906
3	San Cristóbal	CJ SAN CRISTOBAL	\$	78.756.153
4	Bosa	CJ BOSA	\$	91.855.123
6	Tunjuelito	CJ TUNJUELITO	\$	91.809.712
5	Ciudad Bolívar	CJ CIUDAD BOLIVAR	\$	104.940.919

CENTRO DE TRASLADO Y PROTECCIÓN			\$ 236.315.987
1	Pte. Aranda	URI PTE ARANDA	\$ 236.315.987
CENTRO DE TRASLADO Y PROTECCIÓN			\$ 150.038.176
1	Pte. Aranda	CER	\$ 150.038.176
BRIGADA			\$ 1.127.596.864
1	Usaquén	BASER 13	\$ 203.900.131
2	Usaquén	SALA DE OPERACIONES - BACOM 24	\$ 85.522.245
3	Usaquén	PM15	\$ 192.822.051
4	Pte. Aranda	PM13	\$ 214.147.395
5	Tunjuelito	BAFLA	\$ 33.261.559
6	Sumapaz	BITER	\$ 157.589.092
7	Sumapaz	BAMAR	\$ 240.354.391

7.2. Acta de recibo parcial de obra

Por parte del DIARQCO CONSTRUCTORES S.A.S. a la fecha del presente informe presentará acta de pago parcial.

Tabla 58. Actas Parciales Contrato de Obra

CONTRATO DE OBRA			
CONCEPTO	PERIODO FACTURADO	ESTADO	VALOR
ACTA N°1	03/01/2025 al 31/01/2025	PAGADA	\$ 112.389.068,47
ACTA N°2	01/02/2025 al 28/02/2025	PAGADA	\$ 781.284.163,95
ACTA N°3	01/03/2025 al 31/03/2025	PAGADA	\$ 1.415.542.327,46
ACTA N°4	01/04/2025 al 30/04/2025	PAGADA	\$ 692.697.550,58
ACTA N°5	01/05/2025 al 31/05/2025	PAGADA	\$ 838.881.159,53
ACTA N°6	01/06/2025 al 30/06/2025	EN TRAMITE	\$ 380.825.568,39
TOTAL, FACTURADO.			\$ 4.221.619.838,38
VALOR DEL CONTRATO.			\$ 6.165.240.537,00
TOTAL, POR FACTURAR – LIQUIDACION.			\$ 1.943.620.698,62

7.3 Acta de recibo parcial de interventoría

Tabla 59. Actas Parciales Contrato de Interventoría

CONTRATO DE INTERVENTORÍA			
CONCEPTO	PERIODO FACTURADO	ESTADO	VALOR
ACTA N°1	03/01/2025 al 31/01/2025	PAGADA	\$ 112.459.669,52
ACTA N°2	01/02/2025 al 28/02/2025	PAGADA	\$ 120.492.503,06
ACTA N°3	01/03/2025 al 31/03/2025	PAGADA	\$ 120.492.503,06
ACTA N°4	01/04/2025 al 30/04/2025	PAGADA	\$ 120.492.503,06
ACTA N°5	01/05/2025 al 31/05/2025	PAGADA	\$ 120.492.503,06
ACTA N°6	01/06/2025 al 30/06/2025	PAGADA	\$ 120.492.503,06
ACTA N°7	01/07/2025 al 31/07/2025	EN TRAMITE	\$ 89.304.901,19
TOTAL, FACTURADO.			\$ 804.227.086,00
VALOR DEL CONTRATO.			\$ 804.227.086,00
TOTAL, POR FACTURAR – LIQUIDACION.			\$ 0

7.4 Actividades de orden administrativo

Las actividades de orden administrativo se han desarrollado de acuerdo con lo requerido contractualmente.

Tabla 60. Informes mensuales Contrato de obra.

INFORME	PERIODO	ESTADO
Informe mensual No 1	03/01/2025 al 31/01/2025	APROBADO
Informe mensual No 2	01/02/2025 al 28/02/2025	APROBADO
Informe mensual No 3	01/03/2025 al 31/03/2025	APROBADO
Informe mensual No 4	01/04/2025 al 30/04/2025	APROBADO
Informe mensual No 5	01/05/2025 al 31/05/2025	APROBADO
Informe mensual No 6	01/06/2025 al 30/06/2025	APROBADO
Informe mensual No 6	01/07/2025 al 31/07/2025	EN TRAMITE

De igual manera, a la fecha del presente informe, se relaciona el estado de los informes mensuales de interventoría:

Tabla 61. Informes mensuales Contrato de interventoría.

INFORME	PERIODO	ESTADO
Informe mensual No 1	03/01/2025 al 31/01/2025	APROBADO
Informe mensual No 2	01/02/2025 al 28/02/2025	APROBADO
Informe mensual No 3	01/03/2025 al 31/03/2025	APROBADO

Informe mensual No 4	01/04/2025 al 30/04/2025	APROBADO
Informe mensual No 5	01/05/2025 al 31/05/2025	APROBADO
Informe mensual No 6	01/06/2025 al 30/06/2025	APROBADO
Informe mensual No 7	01/07/2025 al 31/07/2025	PRESENTE INFORME

Tabla 62. Comités de obra

No	FECHA	LUGAR
1	21/01/2025	SSCJ
2	27/01/2025	SSCJ
3	06/02/2025	SSCJ
4	12/02/2025	SSCJ
5	20/02/2025	SSCJ
6	28/02/2025	SSCJ
7	17/03/2025	SSCJ
8	28/03/2025	SSCJ
9	03/04/2025	SSCJ
10	15/04/2025	SSCJ
11	25/04/2025	SSCJ
12	08/05/2025	SSCJ
13	13/05/2025	SSCJ
14	26/05/2025	SSCJ
15	04/06/2025	SSCJ
16	19/06/2025	SSCJ
17	03/07/2025	SSCJ
18	11/07/2025	SSCJ
19	21/07/2025	SSCJ

8. ACTIVIDADES DE ORDEN TÉCNICO

8.1 Actividades Realizadas por el contrato de Obra

8.1.1. Administrativo:

- Entrega de presupuestos actualizados de acuerdo a la ejecución en cada frente de obra.
- Envío para aprobación del personal del contratista que estará en los diferentes frentes de obra.
- Entrega de informe manejo ambiental.
- Entrega de correspondencia.
- El contratista solicita revisión y aprobación por parte de la interventoría de varios paquetes de NPs.
- Se radica Acta parcial de obra No. 6 a la Supervisión.

8.1.2. Actividades realizadas por el contrato de Interventoría

Durante la ejecución del contrato de obra la interventoría realizó las siguientes actividades:

- Asistencia a comités y reuniones técnicas
- Revisión, verificación y aval de los presupuestos actualizados en cada equipamiento.
- Control del contrato de obra, y control del balance general.
- Asistencia y acompañamiento de las emergencias presentadas
- Realización de informes diarios, semanales y mensuales técnicos de interventoría e informes del área SSTA.
- Revisión y aprobación de informes mensuales e informes del área SSTA del contratista.
- Revisión de documentación contractual requerida
- Seguimiento a las bitácoras de obra y de emergencias
- Relación de correspondencia enviada y recibida
- Acompañamiento, seguimiento y control a los frentes de obra en donde se realizan actividades
- Revisión y conciliación de ítems no previstos del contrato de obra
- Revisión, aprobación y radicación de la cuenta de cobro No. 6 del contrato de obra.

9. OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES GENERALES

Para efectos del cumplimiento del objeto del contrato, el CONTRATISTA se compromete a cumplir, además de las obligaciones inherentes a la naturaleza del mismo y las derivadas de las disposiciones legales vigentes que regulan la actividad, las siguientes obligaciones generales:

1. Acatar la Constitución Política de Colombia, la Ley, las normas legales y procedimientos establecidos por el Gobierno Nacional y Distrital, y demás disposiciones pertinentes. SE CUMPLE.
2. Cumplir con lo previsto en las disposiciones de las especificaciones esenciales, así como en la propuesta presentada. SE CUMPLE
3. Dar cumplimiento a las obligaciones con los Sistemas de Seguridad Social, Salud, pensión, aportes parafiscales, cuando haya lugar, riesgos laborales y presentar los documentos respectivos que así lo acrediten, conforme lo establecido por el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, la Ley 828 de 2003, la Ley 1122 de 2007, la Ley 1562 de 2012, Decreto 1703 de 2002, Decreto 510 del 5 de marzo de 2003, artículo 23 de la Ley 1150 de 2007, Ley 1562 de 2012 y demás normas que las adicionen, complementen o modifiquen. SE CUMPLE
4. Dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, deberá constituir las garantías pactadas en el mismo. SE CUMPLIO
5. Suscribir el acta de inicio, dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la aprobación de la garantía única previa aprobación del personal que integra el "equipo de trabajo mínimo interventor". SE CUMPLIO

6. Garantizar la calidad de los servicios contratados y responder por ello. SE CUMPLE
7. Colaborar con LA ENTIDAD para que el objeto contratado se cumpla y que éste sea el de mejor calidad. SE CUMPLE
8. Acatar las órdenes que durante el desarrollo del contrato LA ENTIDAD le imparta, y de manera general, obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales evitando las dilaciones y entramamientos que pudieran presentarse. SE CUMPLE
9. Reportar de manera inmediata cualquier novedad o anomalía, al supervisor del contrato, según corresponda. SE CUMPLE
10. Guardar total reserva de la información que por razón del servicio y desarrollo de sus actividades obtenga. Esta es de propiedad de la Secretaría Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia y solo salvo expreso requerimiento de autoridad competente podrá ser divulgada. SE CUMPLE
11. Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato imparta LA ENTIDAD por conducto del supervisor del contrato. SE CUMPLE
12. En cumplimiento de la Directiva Distrital No. 003 del 2012, el contratista se obliga: a). Velar por el respeto de los derechos constitucionales y laborales de los trabajadores que utilice para la ejecución del contrato, para lo cual, eliminará formas de contratación lesivas para los derechos laborales de los trabajadores. b). Velar por el respeto de la legislación laboral vigente e incentivar la mejor oferta laboral y prestacional que garantice el acceso a mejores oportunidades de trabajo. El incumplimiento de las obligaciones contractuales incluidas en el presente numeral, ocasionará el inicio de procesos sancionatorios, conforme con la normatividad vigente, esto es, la imposición de multas o la declaratoria de incumplimiento haciendo efectiva la cláusula penal pecuniaria, si es el caso. SE CUMPLE
13. Dar cumplimiento a lo dispuesto en la Circular No. 1 de 2011 expedida por el alcalde Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de no contratar a menores de edad, en cumplimiento de los pactos, convenios y convenciones internacionales ratificados por Colombia, según lo establece la Constitución Política de Colombia y demás normas vigentes sobre la materia, en particular aquellas que consagran los derechos de los niños. SE CUMPLE.

OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL CONTRATISTA

OBLIGACIONES DE CARÁCTER TÉCNICO

1. Gestionar ante la supervisión del contrato, la aprobación del personal que integra el “equipo de trabajo mínimo interventor”, de acuerdo con los compromisos adquiridos en la propuesta. Para ello deberá remitir dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la suscripción del contrato, todos los documentos que acrediten la formación y experiencia requerida por LA ENTIDAD para cada uno de ellos. Como parte integral de los documentos, la relación, cargo, datos de contacto e incluir las afiliaciones al sistema de seguridad social. SE CUMPLE.
2. Sustituir de forma oportuna, el personal que por fuerza mayor o a solicitud de la supervisión del contrato, sea requerido. Ello deberá adelantarse dentro de los dos (2) días

hábiles siguientes a la novedad o solicitud de cambio y el integrante que ingresa deberá acreditar iguales o superiores condiciones a las requeridas por LA ENTIDAD y aquellas que fueron objeto de ponderación por parte de LA ENTIDAD durante el proceso de adjudicación. SE CUMPLE

3. Cumplir, con lo establecido en el “ANEXO 3 – CONDICIONES TECNICAS”. SE CUMPLE

4. Cumplir con todas las obligaciones que por Ley corresponden a la interventoría, incluyendo aquellas aplicables de la “Guía para el ejercicio de las funciones de supervisión e interventoría de los contratos suscritos por las Entidades Estatales” - G-EFSICE-02 de Colombia Compra Eficiente. SE CUMPLE

5. Recomendar a la supervisión del contrato, los procedimientos, métodos, acciones o cualquier otro tipo de actividad que, según su experiencia, conocimiento y buenas prácticas, puedan beneficiar el desarrollo del contrato de obra desde el punto de vista técnico, administrativo, financiero y jurídico. SE CUMPLE

6. Cumplir durante la totalidad de plazo de ejecución del contrato y de forma taxativa, con los ofrecimientos realizados en su propuesta y los cuales hayan sido objeto de ponderación y asignación de puntaje. SE CUMPLE

7. Verificar y hacer seguimiento a las actividades y obligaciones de carácter técnico, que hacen parte del contrato de obra cuyo objeto es: “Realizar el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de la SDSCJ y Agencias”, incluidos los documentos soportes y demás anexos que hacen parte integral del mismo. SE CUMPLE

8. Revisar, verificar y avalar dentro de los tres (3) días hábiles siguientes a la presentación por parte del contratista de obra, los diagnósticos, actividades, cronogramas y procedimientos necesarios previos al inicio de cualquier actividad de obra. SE CUMPLE

9. Verificar que el personal profesional presentado para la ejecución del contrato por parte del Contratista de obra, cumpla con el porcentaje de dedicación mínima de disponibilidad en tiempo, requerido por LA ENTIDAD para la ejecución del contrato. SE CUMPLE

10. Revisar, verificar y avalar que las cantidades de obra, especificaciones técnicas y actividades correspondan con las realmente ejecutadas, de acuerdo con las necesidades establecidas por la Supervisión. Para ello, deberá estructurar, diligenciar, suscribir y presentar las actas o documentos necesarios, debidamente acompañado del registro fotográfico del antes, durante y después de la ejecución. SE CUMPLE

11. Programar, asistir y liderar los comités de obra ordinarios y extraordinarios que se programen o los que convoque la supervisión del contrato, en los cuales deberá presentar toda la información que le sea requerida por la supervisión con relación a la ejecución del contrato, para hacer el seguimiento a la ejecución contractual y para tomar las acciones que se deriven de su ejecución. SE CUMPLE

12. Levantar las actas de las reuniones o comités de obra que se lleven a cabo, debidamente suscritas y realizando el seguimiento a los compromisos allí adquiridos. Las actas de las reuniones deberán ser entregadas a la supervisión, en un plazo máximo de tres (3) días calendario posterior a la realización de las mismas. SE CUMPLE

13. Llevar una bitácora del desarrollo del contrato, donde se consignarán todas las

instrucciones impartidas, las solicitudes, observaciones y recomendaciones formuladas, los acuerdos y demás determinaciones tomadas en relación con la ejecución del objeto contractual. SE CUMPLE

14. Informar por escrito, de forma oportuna y permanente al Supervisor del Contrato, sobre los aspectos relevantes del desempeño del contrato de obra, su problemática y alternativas de solución, así como el incumplimiento parcial o total del mismo. SE CUMPLE

15. Verificar que las actividades a ejecutar cumplan con las especificaciones técnicas requeridas para cada una de ellas y se adelanten de acuerdo con las fichas técnicas de los productos, recomendaciones de los fabricantes y mediante la aplicación de buenas prácticas. SE CUMPLE

16. Analizar y dar respuesta motivada dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a las sugerencias, solicitudes, reclamaciones y consultas del contratista de obra, resolviendo aquellas que fueren de su competencia, buscando solucionar conjuntamente con el contratista los problemas que puedan afectar la adecuada ejecución de las obras y trasladando a LA ENTIDAD únicamente las reclamaciones y consultas que a esta le competan de acuerdo con el alcance del contrato. SE CUMPLE

17. Verificar que los productos y actividades ejecutadas en el marco del contrato de obra, cumplan con los reglamentos, normas técnicas y de calidad, presentando las certificaciones válidas que acrediten el cumplimiento de reglamentos, normas, entre otras, cuando estas apliquen. SE CUMPLE

18. Gestionar, coordinar y efectuar el seguimiento, a la oportuna atención de requerimientos, que con carácter de "Emergencias", el Contratista de obra deba atender y sean solicitados por la supervisión. SE CUMPLE

19. Responder en un plazo no mayor a tres (3) días hábiles contados desde su presentación, las consultas, conceptos y asesorías que solicite la SECRETARÍA y que sean del alcance de la INTERVENTORÍA. SE CUMPLE

20. Cumplir con los conceptos contemplados en el factor multiplicador indicados en su propuesta, lo cual será verificado en la liquidación del contrato. SE CUMPLE

21. Mantener un archivo organizado de la correspondencia, informes, resúmenes gráficos, fotografías, solicitudes, requerimientos, quejas, planos, cálculos, memorias e inventarios detallados que, sirven de base para efectuar el recibo mensual de las obras ejecutadas. SE CUMPLE

22. Revisar, conceptuar y avalar por personal idóneo en la materia, los informes presentados por el Contratista de obra. SE CUMPLE

23. Revisar, avalar y gestionar dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a su recibo, los informes mensuales, cortes de obra, facturas de pago y demás documentos que le sean radicados por el Contratista de obra. En caso que sea necesario que el contratista de obra realice ajustes o modificaciones al mismo, la interventoría contará con tres (3) días hábiles para adelantar la nueva revisión, contados a partir de la entrega de los documentos por parte del contratista de obra. SE CUMPLE

24. Acreditar en formato establecido por la Supervisión, la disponibilidad del personal de interventoría en obra, de acuerdo con las dedicaciones establecidas por la Entidad. SE CUMPLE

25. Verificar el cumplimiento durante la totalidad de ejecución del contrato, de los ofrecimientos efectuados por el Contratista de obra con el fin de obtener los puntos asignados durante la evaluación de la oferta. SE CUMPLE

26. Mantener en su planta de personal el número mínimo de trabajadores en condición de discapacidad, o el que aplique, con el cual obtuvo el puntaje adicional de la oferta con la que fue seleccionado. En este último caso se deberá verificar la vigencia de la certificación sobre el porcentaje de trabajadores en condición de discapacidad con los cuales cuenta la contratista, expedida por el Ministerio de Trabajo (según aplique). SE CUMPLE

27. Presentar en su informe mensual, el seguimiento efectuado en los aspectos técnico, administrativo, financiero y jurídico, incluyendo desde cada uno de estos componentes, los aspectos de seguridad y salud en el trabajo, salud ocupacional y medio ambiental que por Ley apliquen. SE CUMPLE

28. Dar cumplimiento a lo dispuesto en el Artículo 5° del Decreto 332 de 2020 expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá D.C., en el sentido de prevenir el abuso y el acoso sexual y la obligación de denunciar las violencias basadas en género en el marco de la ejecución del contrato. De igual forma evitar el lenguaje escrito, visual y audiovisual sexista. SE CUMPLE. La interventoría certifica que no se ha presentado por parte del contratista CONSORCIO OBRAS W, temas de abuso y acoso laboral ni sexual, ni ha recepcionado denuncias de violencia basadas en género en el marco de la ejecución del contrato, dando cumplimiento al Artículo 5 del Decreto 332 de 2020, expedido por la Alcaldía Mayor de Bogotá.

29. Dar cumplimiento al Decreto 332 de 2020, garantizando la vinculación de mujeres para la ejecución del objeto contractual en un porcentaje mínimo de 50% teniendo en cuenta factores que acentúan su vulnerabilidad, como la condición de víctima del conflicto armado, las discapacidades, ser mujer jefa de hogar, entre otras. Esta vinculación y su permanencia será verificada a través del supervisor. SE CUMPLE.

La presente interventoría, se permite informar, que según en las hojas de vida presentada por el contratista CONSORCIO OBRAS W, y según la aprobación de ingreso de personal, el contratista NO CUMPLE, con el decreto 333 de 2020, debido a que el porcentaje de contratación de mujeres es del 25%. Por lo anterior, se solicita al contratista, dar cumplimiento a lo establecido en el decreto antes mencionado.

30. Verificar el cumplimiento de la adecuada señalización de los espacios a intervenir a fin de mitigar cualquier tipo de impacto. Para ello, deberá evaluar previo a la intervención los riesgos asociados a la actividad, su impacto, medidas de mitigación, tipo de señalización, etc. Así mismo, deberá velar porque el contratista de obra, informe y comunique de forma oportuna y adecuada a todas las personas que puedan verse afectadas, sobre el tipo de actividad a realizar y las recomendaciones que deben ser tenidas en cuenta. SE CUMPLE

31. Verificar el cumplimiento de adecuadas condiciones para el recibo, acopio y almacenamiento de materiales, sea la adecuada y en concordancia con las normas y recomendaciones de las administradoras de riesgos laborales – ARL. SE CUMPLE

32. Verificar el cumplimiento y hacer seguimiento a las actividades y obligaciones del

contratista en materia ambiental, que hacen parte del contrato de obra cuyo objeto es: “Realizar el mantenimiento y mejoramiento de los equipamientos de infraestructura a cargo de la SDSCJ y Agencias”, incluidos los documentos y demás anexos que hacen parte integral del mismo. SE CUMPLE.

La presente interventoría, ha realizado seguimiento a las actividades ambientales desarrolladas por parte del contratista CONSORCIO OBRAS W, en el cual, ha cumplido en el periodo del presente informe; el contratista presentó el plan de manejo ambiental con su programa de gestión de residuos, en el cual, fue aprobado por la interventoría. Se entregó documentación para apertura del PIN ambiental a la entidad, en el cual, se encuentra en proceso de apertura. Se recomienda al contratista, iniciar con las actividades del plan de manejo ambiental, para dar cumplimiento a la normatividad ambiental.

33. Realizar la verificación, seguimiento y control para el cumplimiento de la legislación vigente que regulan los programas de salud ocupacional, entrega oportuna y adecuada de equipos de protección personal – EPP, protocolos de trabajo seguro en altura – TSA, protocolos para el trabajo seguro en espacios confinados y todos aquellos aplicables a la materia. SE CUMPLE

34. Revisar y aprobar el uso de herramientas y equipos apropiados y certificados (cuando aplique), para la debida ejecución de las actividades programadas: Equipos, andamios, líneas de vida, etc. SE CUMPLE

35. Vigilar que se dé cumplimiento a la legislación vigentes durante la ejecución del contrato, respecto a las adecuadas condiciones de trabajo, seguridad y salud e higiene ocupacional. SE CUMPLE

36. Entregar y verificar que todos los trabajadores a su cargo y a cargo del contratista de obra, estén debidamente uniformados, identificados de forma visible y clara, porten y den uso adecuado de todos los elementos de seguridad industrial, así como de los elementos de protección personal. SE CUMPLE

37. Cumplir con la totalidad de los requisitos legales establecidos en el artículo 2.2.4.6.28 del Decreto 1072 de 2015, en relación con sus dependientes y contratistas durante toda la ejecución contractual. SE CUMPLE

38. Mantener a disposición de LA ENTIDAD, copia del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo actualizado y de acuerdo con lo establecido en la legislación y normatividad vigente, incluidos los Estándares mínimos – Riesgos Laborales del Ministerio del Trabajo. SE CUMPLE

39. Ejecutar sus actividades minimizando los riesgos para la salud, la seguridad y el medio ambiente, dando estricto cumplimiento a las normas nacionales y distritales aplicables. SE CUMPLE

40. Cumplir con todas las demás obligaciones que le correspondan de acuerdo a la de acuerdo con la ley con el “Manual de Contratación, Supervisión e Interventoría” de la secretaria Distrital de Seguridad, Convivencia y Justicia, que se encuentre vigente. SE CUMPLE

41. Las demás actividades de carácter ambiental que ameriten el desarrollo del contrato. SE CUMPLE

OBLIGACIONES DE CARÁCTER ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO

1. Gestionar ante las compañías aseguradoras la ampliación de la cobertura de los amparos a que haya lugar de acuerdo con las prórrogas, adiciones, suspensiones o modificaciones efectuadas durante la vigencia del contrato de interventoría, y aportarlas a LA Entidad dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la aprobación de los modificatorios en SECOP. SE CUMPLE

2. Mantener el personal que hace parte de su equipo de trabajo, bajo las condiciones y el tipo de contratación laboral que corresponda con la exigibilidad de dedicación y condiciones requeridas por LA ENTIDAD, realizando los pagos que legalmente sean exigibles y de acuerdo con la oferta y factor multiplicador presentado. SE CUMPLE

3. Remitir de forma mensual a la Supervisión, certificación suscrita por el Representante Legal y/o el Revisor Fiscal del contratista (según aplique), acompañado de la planilla de pago de aportes al sistema de seguridad social Integral y Parafiscales, del personal vinculado al proyecto. SE CUMPLE

4. Revisar y aprobar dentro de los dos (2) días hábiles siguientes a su presentación, la documentación que acredite la formación, experiencia, idoneidad, afiliaciones al sistema de seguridad social y demás que sean pertinentes, respecto al personal que conforma el equipo de trabajo del Contratista de obra y efectuar el seguimiento a la disponibilidad del mismo durante la totalidad de ejecución del contrato, en las condiciones requeridas por LA ENTIDAD. Así mismo, en caso que el Contratista de obra requiera cambiar algún o algunos miembros de su equipo, la INTERVENTORÍA, verificará el cumplimiento de los perfiles y afiliaciones, garantizando que sea igual o superior al establecido por la Entidad incluyendo aquellas que hayan sido objeto de ponderación según la oferta presentada. SE CUMPLE

5. Verificar y hacer seguimiento a cada una de las obligaciones que con carácter administrativo y financiero estén a cargo del Contratista de obra. SE CUMPLE

6. Revisar y aprobar el Plan de Inversión del Anticipo propuesto por el contratista de obra, vigilando el cumplimiento taxativo del mismo y llevando el registro inequívoco y avalado de los saldos, cargos y conceptos que reflejen la situación financiera del encargo fiduciario constituido. Cualquier diferencia entre los saldos bancarios registrados en el extracto que el contratista debe presentar versus el registro de gastos o el Plan de Inversión, deberá ser informado inmediatamente a la supervisión por parte del CONTRATISTA. El CONTRATISTA es el responsable del seguimiento financiero y contable del mismo. Así mismo, esta información deberá mantenerse actualizada y entregada de forma mensualizada a la supervisión o cuando esta lo solicite. SE CUMPLE.

7. Llevar actualizado el control presupuestal y de ejecución, manteniendo al día la contabilidad de los mismos en términos de recursos invertidos, recursos por invertir y comparación con el presupuesto, registro cronológico de los pagos, ajustes y deducciones realizados durante el desarrollo del objeto contractual. SE CUMPLE

8. Cumplir con las obligaciones que le sean atribuidas por parte del comité fiduciario, cuando así sea establecido por este. SE CUMPLE

9. Aprobar y gestionar o devolver oportunamente y para su modificación, las facturas, cuentas de cobro, actas de avance del contrato, informes y demás estructurados y presentados por el contratista de obra. A LA FECHA NO SE HA INICIADO ESTE TRAMITE

10. Presentar los informes de ejecución contractual, de acuerdo con las especificaciones solicitadas por la supervisión. En este deberá detallarse y conceptuarse el cumplimiento o no, de cada una de las obligaciones a cargo del contratista de obra, acompañado de las evidencias que lo soporten. SE CUMPLE

11. Establecer la línea de base del presupuesto de obra, los indicadores de gestión y la programación, para poder ejercer las funciones de monitoreo y control al desempeño del contrato de obra. SE CUMPLE

12. Gestionar ante la supervisión, de forma oportuna y por lo menos con 24 horas de antelación, los permisos y autorizaciones de ingreso a los diferentes equipamientos y áreas, cumpliendo para ellos los protocolos de seguridad e información que sean requeridos por los diferentes organismos y dependencias. SE CUMPLE

13. Requerir a los contratistas, si a ello hubiere lugar para que tomen medidas para mejorar el rendimiento pactado, mediante el aumento de personal, material, equipo, horas extras, sin costo alguno para LA ENTIDAD y las Entidades Territoriales, cuando a juicio de la INTERVENTORÍA se advierta retrasos en la ejecución, corroborando diariamente la efectividad de las medidas correctivas y de los planes de contingencia adoptados. Lo anterior, implica la revisión y aprobación de planes de choque o planes de contingencia. SE CUMPLE

14. Vigilar permanentemente la ejecución, hasta su puesta en marcha, comunicando por escrito y oportunamente al Contratista, los requerimientos para que se efectúen los respectivos ajustes si hubiere lugar, según corresponda, indicando el plazo para que se adelanten los mismos. SE CUMPLE

OBLIGACIONES DE CARÁCTER JURÍDICO

1. Adoptar las medidas necesarias para que el contrato de obra objeto de la interventoría se desarrolle en condiciones de eficacia, eficiencia y oportunidad. SE CUMPLE

2. Verificar y exigir que se otorguen las garantías establecidas en el contrato de obra, velar por que estas permanezcan vigentes de acuerdo con las condiciones estipuladas en el contrato. SE CUMPLE

3. Requerir al contratista cuando sea necesario modificar las garantías en valor o en plazo. Lo anterior incluye, todo tipo de novedad contractual que se presente durante la ejecución (prorrogas-suspensiones-otrosí etc.). En caso de que el contratista de ejecución de obra no realice las ampliaciones a que haya lugar, el CONTRATISTA deberá informar a la SCJ de este evento, con el fin de que se tomen las medidas respectivas. SE CUMPLE

4. Informar al supervisor los hechos y/o circunstancias que puedan constituir un incumplimiento del contrato de obra objeto de interventoría, o que puedan constituir actos de corrupción. SE CUMPLE

5. Informar y entregar copia al supervisor de los requerimientos realizados al contratista del contrato de obra y remitir una copia de los mismos a la compañía aseguradora. En todos

los requerimientos que se realicen al contratista de la obra se deberá establecer un término para el

cumplimiento de la obligación, y en caso que se incumpla dicho termino se deberá presentar al supervisor un informe desde el punto de vista técnico sobre el incumplimiento del contratista y una tasación de los perjuicios ocasionados. SE CUMPLE

6. Informar, sustentar y avalar de manera oportuna cualquier situación que pueda llegar a implicar una modificación contractual, así como las solicitudes de prórroga, adición, modificación, suspensión o cualquier tipo de novedad o modificación al contrato de obra. El aval se debe presentar debidamente motivado y acompañada de los soportes o evidencias que la justifiquen. SE CUMPLE

7. Velar por el cumplimiento de las obligaciones laborales y aportes parafiscales que se generen con relación al contrato suscrito, en especial verificando que los empleados del contratista de ejecución de obra se encuentren afiliados al Sistema de Seguridad Social (salud, pensiones y riesgos profesionales) y se dé cumplimiento a la Ley 789 de 2002, Ley 797 de 2003 y sus decretos reglamentarios y demás normas concordantes, así como aquellas normas que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. SE CUMPLE

8. Proyectar las actas de recibo a satisfacción, así como el acta el acta de terminación y las demás actas necesarias en el marco del contrato de obra. SE CUMPLE

9. Apoyar a la supervisión de forma oportuna, durante el proceso de liquidación de los contratos de obra e interventoría, estructurando, consolidando y presentado los informes, soportes y documentos que para ello sean requeridos. SE CUMPLE

10. Asistir a la entidad en las audiencias, que se adelanten con fundamento en lo dispuesto en el artículo 86 de la Ley 1474 de 2011 – “IMPOSICIÓN DE MULTAS, SANCIONES Y DECLARATORIAS DE INCUMPLIMIENTO”- y las normas que lo modifiquen, adicionen o complementen -debidos procesos, inclusive cuando se trate de suspensión y reanudación de la misma. Así mismo, deberá acompañar a la Entidad en los procesos a que haya lugar y demás reclamaciones administrativas o contractuales y hasta la vigencia de la garantía. SE CUMPLE

11. Apoyar a la Entidad en la estructuración y consecución de los documentos de respuesta, cuando sea del caso, y respecto de reclamaciones que se deriven de la ejecución de los contratos por parte de órganos de control, autoridad judicial administrativa y/o particular en virtud del derecho de petición. SE CUMPLE

12. Apoyar a la Entidad en la atención y proyección de respuesta a los requerimientos, PQR, derechos de petición y demás solicitudes que se presenten por parte de ciudadanos, entidades, entes de control y en general los diferentes actores que intervienen en el objeto contractual de la presente INTERVENTORÍA ya sea directa o indirectamente. SE CUMPLE

13. Requerir al contratista, si a ello hubiere lugar para que tomen medidas para mejorar el rendimiento pactado, mediante el aumento de personal, material, equipo, horas extras, sin costo alguno para la secretaria y las Entidades Territoriales, cuando a juicio de la INTERVENTORÍA se advierta retrasos en la ejecución, corroborando diariamente la efectividad de las medidas correctivas y de los planes de contingencia adoptados. Lo anterior, implica la revisión y aprobación de planes de choque o planes de contingencia. SE CUMPLE

14. Vigilar permanentemente la ejecución, hasta su puesta en marcha, comunicando por escrito y oportunamente al Contratista, los requerimientos para que se efectúen los respectivos ajustes si hubiere lugar, según corresponda, indicando el plazo para que se adelanten los mismos. SE CUMPLE

15. Las demás que de conformidad con la normatividad vigente y con su naturaleza correspondan a la función de Interventoría en lo que a obligaciones jurídicas y legales se refiere. SE CUMPLE.

10. OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES DE INTERVENTORIA

REPORTE MENSUAL DE ACTIVIDADES RELACIONADAS CON EL MANTENIMIENTO DE INFRAESTRUCTURA (JULIO DE 2025)

- **Equipamientos que finalizaron su mantenimiento JULIO y la descripción breve del tipo de mantenimiento que se realizó**

BASER 13: DEMOLICION PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.), REGATA SOBRE MUROS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, SUSPENSIÓN DE SALIDA SANITARIA (INC. RETIRO DE SOBR.), SUSPENSIÓN DE SALIDA HIDRÁULICA (INC. RETIRO DE SOBR.), DESMONTE DE SIFONES, DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES), DESMONTE DE PUSH SANITARIOS, DEMOLICIÓN DE ACABADOS CERÁMICOS DE PISO O MUROS EN ALTURAS DE HASTA 3M. (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS), DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: RETIRO DE SOBRANTES), DESMONTE DE ACCESORIOS SANITARIOS (TAPA REGISTROS, POMOS, REGADERAS, INCRUSTACIONES, REJILLAS, ETC...), LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE EN CONCRETO PARA AGUA POTABLE, INSTALACIÓN ACOMETIDA DE 2" (MANO DE OBRA), REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" Ó EQUIVALENTE, PUNTO SUMINISTRO GALVANIZADO (INC. ACCESORIOS), SONDEO DE PUNTOS SANITARIOS (ENTRE 1 1/2" Y 4"), REINSTALACIÓN DE APARATOS SANITARIOS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN TIPO ACORDEÓN PLÁSTICO, LIMPIEZA Y REEMBOQUILLE DE ENCHAPE, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE LISO 1:3 IMPERMEABILIZADO LINEAL, (ANCHO MÁXIMO 0,6M). APLICADO EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLA METÁLICA DE PISO DE 3" EN ACERO INOXIDABLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE PARED LINEAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LÁMPARAS HERMÉTICAS, DUCHA CALYPSO MEZCLADOR (SUM E INSTALACIÓN), GRIFERIA ANTIVANDALICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR, KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN P´ORINAL, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ACOPLE PARA LAVAMANOS, 40 CMS DE LARGO, METÁLICO CROMADO, IMPORTADO, MARCA A&A O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR CON UN SOLO ORIFICIO CUMPLE CON LA ADA. MARCA TOTO O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUSH ANTIVANDÁLICO PARA SANITARIO, MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA HIDRÁULICO, INCLUYE MTO DE MOTOBOMBA DE 7HP, TABLERO DE VARIADORES DE FRECUENCIA (AJUSTE DE BORNERAS, REVISIÓN DE CONTACTORES, RETOQUE Y REVISIÓN DE VOLTAJES Y AMPERAJES) AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE HIDRO ACUMULADOR Y PRESOSTATOS, MTO DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NIVEL

FREÁTICO Y LIMPIEZA DE FOSO - BOMBA SUMERGIBLE DE 50*50, INCLUYE RETIRO DE CHEQUES ANTIRRETORNO Y LIMPIEZA DE LOS MISMOS. INCLUYE NIPLES DESCARGA HG 2", DESDE MOTOBOMBA A FLAUTA DE DISTRIBUCIÓN, CHEQUE HIDRO 2" BRONCE Y VÁLVULA CORTINA 2" BRONCE.

- **Equipamientos nuevos a los cuales se les hizo o se inició el mantenimiento en JULIO y también la descripción breve del tipo de mantenimiento.**

URI DE PUENTE ARANDA: ARREGLO PASADORES PARA PUERTA EXTERIOR, INCLUYE CADENA Y CANDADO,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE EXTRACTOR DE VENTANA (INCLUYE DEMOLICIÓN DE VANO, ADECUACIÓN DE VANO, INSTALACIÓN DE EXTRACTOR Y RETIRO DE SOBANTES),MANTENIMIENTO DE PORTON EN LÁMINA COLD ROLLED DE 480 X 300 CM(INCLUYE INSTALACION DE PLATINAS DE 3/16", PASADORES, LIJADA, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO, PINTURA EN ESMALTE , DURO HUESO Y SOLDADURA, EN CADA CARA DE LOS TUBOS DE 1 " Y EN LAS 2 CARAS DE LA LAMINA), ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA,ESMALTE S/ LAMINA LINEAL,REMOCION DE PINTURA SUELTA MANUAL.,SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M. PRODUCTO LISTO PARA USAR, APLICADO EN TRES (3) CAPAS CON LIJADO PARA ACABADO FINAL. INCLUYE TRANSPORTE DE INSUMOS A OBRA, DEMOLICION CIELO RASO FALSO (INC. RETIRO DE SOBR.),DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE RETIRO DE SOBATES),DESMONTES DE TABLEROS ELECTRICOS ,SUMINISTRO E INSTALACION DE MURO EN SUPERBOARD, DOBLE CARA B 9 CON ESPESOR DE 6 MM (INCLUYE AISLAMIENTO ACUSTICO, ESTRUCTURA, MASILLA ACRILICA Y DEMAS ELEMENTOS PARA SU CORRESTA INSTALACIÓN),REPARACIONES HIDRÁULICAS PVC DE 1/2" - 3/4" Y 1",SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REGISTRO DE 2" EN PVC,TUBERIA EMT 3/4" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS,MANTENIMIENTO GENERAL DE TABLEROS DE 24 CIRCUITOS TRIFÁSICOS (INCLUYE: CAMBIO DE BREAKERS QUE SE REQUIERAN, CAMBIO DE BARRAJES DE NEUTROS Y TIERRAS Y LIMPIEZA GENERAL),SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA DE PASO, DIMENSIONES 20X20X15, INCLUYE TAPA EN PLASTICO Y ADTADORES TERMINAL EMT 1/2",SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CABLE NO.12 AWG THHN/THWN-2 600V 90°C. LIBRE DE HALOGENO,PUERTA Y MARCO EN ALUMINIO ANODIZADO SERIE 3831/5020 - COLOR MATE NATURAL + VIDRIO CRISTAL TEMPLADO INCOLORO 5 MM,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAMPARAS HERMETICAS,PANTALLA LED 24W 60X60 DE INCRUSTAR,TAPARREGISTRO 20 X 20 (SUM E INSTALACIÓN),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CIELO RASO EN PVC,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAFE CERAMICO CON MEDIDA 30CMX60CM PARA MUROS EN INTERIORES INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION EN ALTURAS INFERIORES A 3 METROS,SUMINISTRO E INSTALAACION DE SISTEMA DE INSONORIZACION MEDIANTE APLICACIÓN DE FRESCAZA, DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE RETIRO DE SOBATES),DESMONTE DE ACCESORIOS SANITARIOS (TAPA REGISTROS, POMOS, REGADERAS, INCRUSTACIONES, REJILLAS, ETC...),SONDEO DE PUNTOS SANITARIOS (ENTRE 1 1/2" Y 4"),PANTALLA LED 24W 60X60 DE INCRUSTAR,LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACIÓN).

CER: DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE RETIRO DE SOBATES), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS, GRIFERIA LAVAPLATOS TIPO PRISMA O SIMILAR SOBREPONER (SUM E INSTALACIÓN). DESMONTE DE CERRADURAS (INCLUYE RETIRO DE

SOBRATES), CERRADURA PUERTAS ACCESO PRINCIPAL.

NUEVO COMANDO: SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MALLA EXPANDIDA IMT-20 CAL. 14 INSTALADA A MODO DE CIELO RAZO SOLDADA SOBRE REJA DE SEGURIDA. INCLUYE PLATINA PISAMALLA DE 1 1/2X3/16" ANTICORROSIVO Y ESMALTE, DESMONTE PISO FLOTENTE TIPO PORCELANATO 60X60 E=2 CM INCLUYE SISTEMA SUCCION PARA RETIRO DE PIEZAS, TRASIEGO DE PIEZAS A ZONA DE ACOPIO INCLUYE RETIRO PLOTS E INVENTARIO DE IDENTIFICACION. (EQUIPAMIENTO NUEVO COMANDO),LAVADO Y SECADO DE PISO FLOTANTE EN PORCELANATO 60X60 E=2 CM CON SISTEMA DE LAVADO A PRESION INCLUYE TODOS LO ELEMENTOS PARA SU EJECUCION (EQUIPAMIENTO NUEVO COMANDO),REINSTALACION PISO FLOTENTE TIPO PORCELANATO 60X60 E=2 CM INCLUYE SISTEMA SUCCION PARA PUESTA DE PIEZAS, TRASIEGO DE PIEZAS DESDE ZONA DE ACOPIO INCLUYE INSTALACION DE PLOTS.(EQUIPAMIENTO NUEVO COMANDO),SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE CORDON TIPO SILICONA PARA SELLO PERIMETRAL EN ZONAS INTERVENIDAS DE ACUERDO A FICHA TECNICA DEL FABRICANTE (EQUIPAMIENTO NUEVO COMANDO),LAVADO DE MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE DE ACUERDO A FICHA TECNICA DEL PROVEEDOR CON SISITEMA DE PRESION GRADUABLE INCLUYE TODOS LO ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION (EQUIPAMIENTO NUEVO COMANDO),INSPECCIÓN Y MANTENIMIENTO DE TUBERÍA SISTEMA MANUAL HÚMEDO (1 VISITA) EN CUMPLIMIENTO NORMATIVO NFPA 25. INCLUYE HERRAMIENTA MENOR, INSUMOS DE LIMPIEZA Y PINTURA E INFORME DE ACTIVIDADES Y HALLAZGOS. NO INCLUYE REPUESTOS POR ACCIONES CORRECTIVAS QUE SEAN NECESARIAS; EN CASO DE REQUERIRSE SE COTIZARAN POR SEPARADO. (EQUIPAMIENTO NUEVO COMANDO), TARJETA DE CONTROL DE GENERACION AVR, MARCA STAMFORD, CONTROL REGULADOR DE VOLTAJE DEL GENERADOR, INCLUYE (CABLES, AMARRES, CINTA, CONEXIONES, TERMINALES, VALOR MANO DE OBRA: DESMONTE E INSTALACION DE TARJETA DE CONTROL DE GENERACION AVR, MARCA STAMFORD, CONTROL REGULADOR DE VOLTAJE, PROGRAMACION Y SINCRONIZACION DE INFORMACION, PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE LA PLANTA ELECTRICA DE EMERGENCIA. REVISION Y MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE INGRESO DE HUELLA DACTILAR (BIMETRICO) NUEVO COMANDO, DESMONTE DE PUERTAS EN VIDRIO TEMPLADO,DESMONTE DE SIFONES,DESMONTE DE PUSH SANITARIOS,SONDEO DE PUNTOS SANITARIOS (ENTRE 1 1/2" Y 4"),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN TIPO ACORDEÓN PLASTICO,SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL Ó SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR),MANTENIMIENTO Y AJUSTE DE PUERTA EN VIDRIO DE SEGURIDAD, INCLUYE DESMONTE, AJUSTE, NIVELACION, LUBRICACION Y REINSTALACIÓN.

C4: MANTENIMIENTO RED NEBULIZADA, SENSOR DE MOVIMIENTO.

PM 15: LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TANQUE EN CONCRETO PARA AGUA POTABLE, INSTALACIÓN ACOMETIDA DE 2" (MANO DE OBRA), MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SISTEMA HIDRÁULICO, INCLUYE MTO DE MOTOBOMBA DE 7HP, TABLERO DE VARIADORES DE FRECUENCIA (AJUSTE DE BORNERAS, REVISIÓN DE CONTACTORES, RETOQUE Y REVISIÓN DE VOLTAJES Y AMPERAJES) AJUSTE Y CALIBRACIÓN DE HIDRO ACUMULADOR Y PRESOSTATOS, MTO DE BOMBAS SUMERGIBLES PARA AGUAS NIVEL FREÁTICO Y LIMPIEZA DE FOSO - BOMBA SUMERGIBLE DE 50*50, INCLUYE RETIRO DE CHEQUES ANTIRRETORNO Y LIMPIEZA DE LOS MISMOS. INCLUYE NIPLES DESCARGA HG 2", DESDE MOTOBOMBA A

FLAUTA DE DISTRIBUCIÓN, CHEQUE HIDRO 2" BRONCE Y VÁLVULA CORTINA 2" BRONCE.

CAI TIMIZA: DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.), DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.), DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.), ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.), RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.), DESMONTE DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA, DESMONTE DE SIFONES, DESMONTE DE LÁMPARAS (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES), DESMONTE DE PUSH SANITARIOS, DEMOLICIÓN DE ACABADOS CERÁMICOS DE PISO O MUROS EN ALTURAS DE HASTA 3M. (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS), DESMONTE DE ACCESORIOS ELÉCTRICOS (TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES), DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: RETIRO DE SOBRANTES), DESMONTE DE ESPEJO (INCLUYE RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL), DEMOLICIÓN DE ACABADO DE TEXTURIZADO BAJO PLACA. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS, CORTE DE PLACA CON PULIDORA. INCLUYE ASEO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA GFCI, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CAJA METÁLICA DE PASO, DIMENSIONES 20X20X15, INCLUYE TAPA EN PLÁSTICO Y ADTADORES TERMINAL EMT 1/2", SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M, MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M, MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PISO TIPO LOSETAS PREFABRICADAS EN CONCRETO TIPO A50 CONTEMPLANDO LA REINSTALACIÓN DE LAS MISMAS LOSETAS DESMONTADAS. INCLUYE BASE DE MORTERO 1:5, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE DE 3MM CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIE CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 CM (ANTIC - ESMALTE), MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE MIRILLA METÁLICA DE CAI. CONTEMPLA LA REPARACIÓN DE ZONAS AFECTADAS, MASILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS DE 55X43CM, GRANITO PULIDO MESONES B = 60 CM INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN, WIN DE ALUMINIO, RESTAURACIÓN DE PIEDRA MUÑECA. INCLUYE REEMBOQUILLADA, ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA O SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" O 1/2", 21-AA-950 DOCOL O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUETIPO AVANTI O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR CON UN SOLO ORIFICIO CUMPLE CON LA ADA. MARCA TOTO O SIMILAR, SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL O SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR), GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXIÓN Ø 3/4" O 1/2", 24-AA-142006 DOCOL O SIMILAR, ESMALTE SOBRE MAMPOSTERÍA, VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS, REMOCIÓN DE PINTURA SUELTA MANUAL, PINTURA KORAZA PARA FACHADAS, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M. PRODUCTO LISTO PARA USAR, APLICADO EN TRES (3) CAPAS CON LIJADO PARA ACABADO FINAL. INCLUYE

TRANSPORTE DE INSUMOS A OBRA, DESBASTE DE FILO EXISTENTE Y CONFORMACIÓN DE FILO BISELADO, CON APLICACIÓN DE MEZCLA Y ESTUCCO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESPEJO CONVEXO DE 30CM DE DIÁMETRO. INCLUYE SOPORTE DE FIJACIÓN, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAFE CERAMICO CON MEDIDA 30CMX60CM PARA MUROS EN INTERIORES INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION EN ALTURAS INFERIORES A 3 METROS

CAI LIBERTADORES: DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.), DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.), DESMONTE DE SIFONES, DESMONTE DE PUSH SANITARIOS, DEMOLICIÓN DE ACABADOS CERÁMICOS DE PISO O MUROS EN ALTURAS DE HASTA 3M. (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS), DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: RETIRO DE SOBRANTES).

CAI JUAN REY: DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.), DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.), RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.), DESMONTE DE FLANCHE EN LÁMINA GALVANIZADA, DESMONTE DE PUSH SANITARIOS, DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: RETIRO DE SOBRANTES), GRANITO PULIDO MESONES B = 60 CM INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN.

CARCEL DISTRITAL: EXCAVACION MANUAL TIERRA H<2.50 M. (INC. CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICION FINAL), COMPACTACIÓN Y RELLENO CON MATERIAL EXISTENTE, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PIE DE AMIGO PLATIN.A 6" X 10" REFORZADO CON SOPORTE TRANSVERSAL, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCERTINA SENCILLA CON DIÁMETRO DE 45 CM. INCLUYE GUAYA DE 1/8", TUBO DE FIJACIÓN CADA 5 METROS Y PLATINA CON PERFORACIONES DE 0,05X0,05*1/4", PODA DE CÉSPED (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES), SUMINISTRO Y FUNDICIÓN DE PLACA DE CONCRETO DE 3000 PSI E=10CM. INCLUYE TRASIEGO DE MATERIAL, TRANSPORTE Y FORMALETA. NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.

CAI CLARET: DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.), DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.), REGATA SOBRE MUROS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, DESMONTE DE SIFONES, DESMONTE DE PUSH SANITARIOS, DEMOLICIÓN DE ACABADOS CERAMICOS DE PISO O MUROS EN ALTURAS DE HASTA 3M. (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS), DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: RETIRO DE SOBRANTES) SELLADO Y EMBOQUILLADO DE REGATA EN MUROS Y PLACAS PARA TUBERÍAS DE DIAMETROS ENTRE 1 1/2" A 4" SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO, USANDO ADITIVOS TIPO SIKADUR 32 Y SIKATOP 121 O SIMILAR., RESTAURACION DE PIEDRA MUÑECA. INCLUYE REEMBOQUILLADA, DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.), ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.), RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.),DESMONTE DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA , ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2".REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" Ó EQUIVALENTE,TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2",SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS),SONDEO DE PUNTOS SANITARIOS (ENTRE 1 1/2" Y 4"),SELLADO Y EMBOQUILLADO DE REGATA EN MUROS Y PLACAS PARA TUBERÍAS DE DIAMETROS ENTRE 1 1/2" A 4" SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO, USANDO ADITIVOS TIPO SIKADUR 32 Y SIKATOP 121 O SIMILAR.,MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN . INCLUYE LIMPIEZA DE LA CAJA, AJUSTE DE MARCO Y/O REPARACIÓN DE MARCO,,SUMINISTO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO 1:3 SOBRE

MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M.,DILATADORES PLASTICOS PARA PISO.,ALISTADO IMPERMEABILIZADO PARA PISOS CON SIKA-1 EN MORTERO 1:4 ,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DURO PISO ,MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M,FLANCHE CAL. 20 EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO 30 CM,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE DE 3MM CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIE CON EMULSIÓN ASFÁLTICA, GRANITO PULIDO MESONES B = 60 CM INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN, ENCHAPES EN PIEDRA MUÑECA, WIN DE ALUMINIO, REMOCION DE PINTURA SUELTA MANUAL, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M. PRODUCTO LISTO PARA USAR, APLICADO EN TRES (3) CAPAS CON LIJADO PARA ACABADO FINAL. INCLUYE TRANSPORTE DE INSUMOS A OBRA,DESBASTE DE FILO EXISTENTE Y CONFORMACIÓN DE FILO BISELADO, CON APLICACIÓN DE MEZCLA Y ESTUCO,SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOBLE MANO DE PINTURA BITUMINOSA TEXSA O SIMILAR SOBRE MANTO ASFALTICO,LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES,LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAFE CERAMICO CON MEDIDA 30CMX60CM PARA MUROS EN INTERIORES INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION EN ALTURAS INFERIORES A 3 METROS, DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE RETIRO DE SOBRATES),DESMONTE DE CERRADURAS (INCLUYE RETIRO DE SOBRATES),DESMONTE DE ACCESORIOS ELECTRICOS (TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES).,SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS. ,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA GFCI,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO,TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA + TOMACORRIENTE DOBLE EN TUBERIA EMT DE 1/2" SOBREPUESTA, (LONGITUD PROMEDIO DE SALIDA 3 ML),SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA DE PASO, DIMENSIONES 20X20X15, INCLUYE TAPA EN PLASTICO Y ADTADORES TERMINAL EMT 1/2",SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA MONOFÁSICA DE CU 2 X N° 12 AWG (1 FASE + 1 NEUTRO) + 1 X N° 12 T AWG,REVISIÓN Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS (CONTEMPLA: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PEINADO Y LIMPIEZA DE TABLERO Y MARQUILLADO),MARQUILLADO DE PUNTOS ELECTRICO PLASTIFICADO DE 1X2CM,MANTENIMIENTO DE PISO EN GRANITO MEDIANTE RESANES, PULIDA, BRILLADA Y SELLADA ,GUARDAESCOBA EN GRANITO H = 0.065,MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE MIRILLA METÁLICA DE CAI. CONTEMPLA LA REPARACIÓN DE ZONAS AFECTADAS, MASILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO.,MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MARCOS DE CARPINTERIA EN ALUMINIO MEDIANTE RESANE, MASILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO TIPO ANOLOC.,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS DE 55X43CM,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUERTA CORREDIZA DE DOS HOJAS CADA UNA DE 0,675X0,75M EN LAMINA COLD ROLLED CALIBRE 18, INCLUYE: MANIJA, MARCO, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y ESMALTE POR AMBAS CARAS.,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFELCTOR DE 100W,GRIFERIA LAVAPLATOS TIPO PRISMA O SIMILAR SOBREPONER (SUM E INSTALACIÓN),INSTALACIÓN DE GRIFERIA ORINAL,INSTALACIÓN DE GRIFERIA SANITARIOS,ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA

CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR.,SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUETIPO AVANTI O SIMILAR ,CAMBIO DE ACOPLE SANITARIO,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR CON UN SOLO ORIFICIO CUMPLE CON LA ADA. MARCA TOTO O SIMILAR.,JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER O SIMILAR (SUM E INSTALACIÓN),TAPARREGISTRO 20 X 20 (SUM E INSTALACIÓN),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGÜE CON REJILLA PARA LAVAMANOS, SENCILLO, CON REBOSE, METÁLICO, CROMADO, MARCA A&A O SIMILAR.,LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACIÓN)SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL Ó SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA CONEXIÓN POSTERIOR),,GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR,ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA,VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS,PINTURA KORAZA PARA FACHADAS ,SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (CONTEMPLA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PREVIA APLICACIÓN),SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SEGURIDAD 4 PASADORES PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN CAI'S.

CAI CENTENARIO: DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.), DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.), DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.), ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.), RETIRO DE MANTOS ASFALTICOS (INC. RETIRO DE SOBR.), DESMONTE DE FLANCHE EN LAMINA GALVANIZADA. , DESMONTE DE SIFONES,DESMONTE DE LAMPARAS (INCLUYE RETIRO DE SOBRATES),DESMONTE DE CERRADURAS (INCLUYE RETIRO DE SOBRATES),DESMONTE DE PUSH SANITARIOS,DEMOLICIÓN DE ACABADOS CERAMICOS DE PISO O MUROS EN ALTURAS DE HASTA 3M. (INCLUYE TRASIEGO, RETIRO Y DISPOSICIÓN FINAL DE ESCOMBROS), DESMONTE DE ACCESORIOS ELECTRICOS (TOMACORRIENTES E INTERRUPTORES),, DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: RETIRO DE SOBRANTES), DESMONTE DE ESPEJO (INCLUYE RETIR Y DISPOSICIÓN FINAL), SUMINISTO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M., GRANITO PULIDO MESONES B = 60 CM INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN, ENCHAPES EN PIEDRA MUÑECA, RESTAURACION DE PIEDRA MUÑECA. INCLUYE REEMBOQUILLADA, SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M. PRODUCTO LISTO PARA USAR, APLICADO EN TRES (3) CAPAS CON LIJADO PARA ACABADO FINAL. INCLUYE TRANSPORTE DE INSUMOS A OBRA, ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2", REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" Ó EQUIVALENTE, TUBERIA PVC P RDE 9 DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS), SONDEO DE PUNTOS SANITARIOS (ENTRE 1 1/2" Y 4"), MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN. INCLUYE LIMPIEZA DE LA CAJA, AJUSTE DE MARCO Y/O REPARACIÓN DE MARCO,SALIDA PARA LAMPARA FLUORESCENTE - PVC,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 18W, 95-227V, 1620 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BALA PANEL LED DE INCRUSTAR O SOBREPONER 25W, 95-227V, 2320 LM, 6.000K, ARO BLANCO, 35.000 HORAS,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR DOBLE,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TRIPLE,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA CORRIENTE DOBLE,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TOMA GFCI,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR SENCILLO,TUBERIA EMT 1/2" - SUSPENDIDA INCLUYE ACCESORIOS,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TAPA CIEGA,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SALIDA + TOMACORRIENTE

DOBLE EN TUBERIA EMT DE 1/2" SOBREPUESTA, (LONGITUD PROMEDIO DE SALIDA 3 ML),SUMINISTRO E INSTALACION DE CAJA METALICA DE PASO, DIMENSIONES 20X20X15, INCLUYE TAPA EN PLASTICO Y ADAPTADORES TERMINAL EMT 1/2",SUMINISTRO E INSTALACION DE RED ELECTRICA MONOFÁSICA DE CU 2 X N° 12 AWG (1 FASE + 1 NEUTRO) + 1 X N° 12 T AWG,REVISIÓN Y ORGANIZACIÓN GENERAL DE TABLERO DE 12 CIRCUITOS (CONTEMPLA: IDENTIFICACIÓN DE CIRCUITOS, PEINADO Y LIMPIEZA DE TABLERO Y MARQUILLADO),MARQUILLADO DE PUNTOS ELECTRICOS PLASTIFICADO DE 1X2CM,SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M.,DILATADORES PLASTICOS PARA PISO.,MANTENIMIENTO DE PISO EN GRANITO MEDIANTE RESANES, PULIDA, BRILLADA Y SELLADA ,ALISTADO IMPERMEABILIZADO PARA PISOS CON SIK-1 EN MORTERO 1:4 ,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DURO PISO ,GUARDAESCOBA EN GRANITO H = 0.065,MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE IMPERMEABILIZACIÓN DE CUBIERTA PLANA CON MANTO ASFÁLTICO IMPERMEABILIZANTE DE 3MM CON FOIL DE ALUMINIO. INCLUYE IMPRIMACIÓN DE SUPERFICIE CON EMULSIÓN ASFÁLTICA. ,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAPLATOS DE SOBREPONER EN ACERO INOXIDABLE, MEDIDAS DE 55X43CM,WIN DE ALUMINIO,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REFELCTOR DE 100W,GRIFERIA LAVAPLATOS TIPO PRISMA O SIMILAR SOBREPONER (SUM E INSTALACIÓN),INSTALACIÓN DE GRIFERIA ORINAL,INSTALACIÓN DE GRIFERIA SANITARIOS,REMOCION DE PINTURA SUELTA MANUAL.,PINTURA KORAZA PARA FACHADAS ,DESBASTE DE FILO EXISTENTE Y CONFORMACIÓN DE FILO BISELADO, CON APLICACIÓN DE MEZCLA Y ESTUCO.,LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES,LIMPIEZA E IMPERMEABILIZACION DE FACHADAS,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO CON MEDIDA 30CMX60CM PARA MUROS EN INTERIORES INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION EN ALTURAS INFERIORES A 3 METROS. FLANCHE CAL. 20 EN LAMINA GALVANIZADA DESARROLLO 30 CM, MARCOS PUERTAS LAMINA C.R. C18 - B=80 CM (ANTIC - ESMALTE), MANTENIMIENTO, RESTAURACIÓN Y REPARACIÓN DE MIRILLA METÁLICA DE CAL. CONTEMP, LA REPARACIÓN DE ZONAS AFECTADAS, MASILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO, MANTENIMIENTO Y RESTAURACIÓN DE MARCOS DE CARPINTERIA EN ALUMINIO MEDIANTE RESANE, MASILLADO Y APLICACIÓN DE PINTURA DE ACABADO TIPO ANOLOC, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MIRILLA METALICA DE 9,5X9,5CM, INCLUYE SEGURO CON PLATINA Y APLICACIÓN DE PINTURA EN ESMALTE, SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA ENTAMBORADA EN ACERO GALVANIZADO CALIBRE 18. INCLUYE BISAGRAS, APLICACIÓN DE ANTICORROSIVO Y PINTURA EN ESMALTE, NO INCLUYE MARCO, ORINAL MEDIANO DE COLGAR INSTITUCIONAL COLOR BLANCO PARA CONEXION Ø 5/8" REF 21-AA-8860 MANCESA Ó SIMILAR + KIT VÁLVULA DE DESCARGA ANTIVANDÁLICA ALTA PRESIÓN PARA ORINAL, CONEXION Ø 3/4" Ó 1/2", 21-AA-950 DOCOL Ó SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN SANITARIO DE TANQUETIPO AVANTI O SIMILAR, CAMBIO DE ACOPLER SANITARIO, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE LAVAMANOS DE COLGAR CON UN SOLO ORIFICIO CUMPLE CON LA ADA. MARCA TOTO O SIMILAR, JUEGO DE INCRUSTAR ACUACER O SIMILAR (SUM E INSTALACIÓN), TAPARREGISTRO 20 X 20 (SUM E INSTALACIÓN), SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE DESAGÜE CON REJILLA PARA LAVAMANOS, SENCILLO, CON REBOSE, METÁLICO, CROMADO, MARCA A&A O SIMILAR, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE SIFÓN EN P, PARA LAVAMANOS, METÁLICO CROMADO. IMPORTADO, MARCA A&A O SIMILAR,LLAVE MANGUERA 1/2" (SUM E INSTALACIÓN),SISTEMA DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO ALTA PRESION P/ORINAL DE COLGAR, DOCOL Ó SIMILAR (INC. VÁLVULA DE DESCARGA, BOTON DE ACCIONAMIENTO ANTIVANDALICO Y ACCESORIOS PARA

CONEXIÓN POSTERIOR),GRIFERÍA ANTIVANDÁLICA PARA LAVAMANOS PICO LARGO TIPO PUSH, CONEXIÓN Ø 3/4" Ó 1/2", 24-AA-142006 DOCOL Ó SIMILAR,ESMALTE SOBRE MAMPOSTERIA,VINILO BAJO PLACA - 2 MANOS,SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA (CONTEMPLA LA PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE PREVIA APLICACIÓN),SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE DOBLE MANO DE PINTURA BITUMINOSA TEXSA O SIMILAR SOBRE MANTO ASFALTICO,CERRADURA SAFE O SIMILAR ENTRADA 142A ALUMINIO SATINADO,SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CERRADURA DE SEGURIDAD 4 PASADORES PARA PUERTA DE ACCESO PRINCIPAL EN CAÍ'S.

CAI HAYUELOS: DEMOLICIÓN DE PISOS EN BALDOSÍN (INC. RETIRO DE SOBR.), REGATA SOBRE MUROS INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES, DESMONTE PUERTAS CON MARCOS (INC. RETIRO DE SOBR.), DESMONTE DE SIFONES, DESMONTE DE PUSH SANITARIO., DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS (INCLUYE: RETIRO DE SOBRANTES), DESMONTE DE ESPEJO (INCLUYE RETIR Y DISPOSICIÓN FINAL)., ACCESORIOS PVC-P Ø 1/2", REGISTRO P/D RED WHITE Ø 1/2" Ó EQUIVALENTE, TUBERIA PVCP RDE 9 DE 1/2", SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PUNTO HIDRAULICO DE 1/2" (INCLUYE ACCESORIOS), SELLADO Y EMBOQUILLADO DE REGATA EN MUROS Y PLACAS PARA TUBERÍAS DE DIAMETROS ENTRE 1 1/2" A 4" SOBRE ELEMENTOS DE CONCRETO, USANDO ADITIVOS TIPO SIKADUR 32 Y SIKATOP 121 O SIMILAR. DEMOLICION MESÓN CORRIDO (INC. RETIRO DE SOBR.), ESCARIFICAR PAÑETES (INC. RETIRO DE SOBR.), DEMOLICION DE ACABADO DE TEXTURIZADO BAJO PLACA. INCLUYE RETIRO DE ESCOMBROS, CORTE DE PLACA CON PULIDORA. INCLUYE ASEO, REGATA EN PLACA (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES), MESONES EN CONCRETO DE A=0,90 M., SONDEO DE PUNTOS SANITARIOS (ENTRE 1 1/2" Y 4"), SUMINISTO Y APLICACIÓN DE PAÑETE IMPERMEABILIZADO LISO 1:3 SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M., DILATADORES PLASTICOS PARA PISO., ALISTADO IMPERMEABILIZADO PARA PISOS CON SIKA-1 EN MORTERO 1:4 , SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PISO DURO PISO , GUARDAESCOBA EN GRANITO H = 0.065, MEDIACAÑA EN GRANITO H = 0.10 M, GRANITO PULIDO MESONES B = 60 CM INCLUYE SALPICADERO Y FALDÓN, WIN DE ALUMINIO, REMOCION DE PINTURA SUELTA MANUAL., SUMINISTRO Y APLICACIÓN DE ESTUCO PLÁSTICO SOBRE MUROS EN ALTURAS IGUALES O INFERIORES A 3M. PRODUCTO LISTO PARA USAR, APLICADO EN TRES (3) CAPAS CON LIJADO PARA ACABADO FINAL. INCLUYE TRANSPORTE DE INSUMOS A OBRA, LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES, SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE CERAMICO CON MEDIDA 30CMX60CM PARA MUROS EN INTERIORES INCLUYE PEGANTE, BOQUILLA Y TODOS LOS ELEMENTOS PARA SU CORRECTA EJECUCION EN ALTURAS INFERIORES A 3 METROS

Cantidad de emergencias atendidas en JULIO y la descripción breve del tipo de emergencia/mtto atendido.

21 EMERGENCIAS ATENDIDAS, LA MAYORÍA POR REQUERIMIENTO DE FILTRACIONES DE AGUA, FALLAS ELÉCTRICAS Y DAÑOS EN LUMINARIAS, TOMAS CORRIENTES, INTERRUPTORES, MANTENIMIENTO DE TABLEROS, CAMBIO DE REFLECTORES, SONDEOS RED SANITARIA. LIMPIEZA DE CANALES Y BAJANTES, LIMPIEZA DE CAJAS DE INSPECCIÓN Y COLECTOR PRINCIPAL; SONDEOS, RED HIDRÁULICA, PUSH ANTI VANDÁLICO, MANTENIMIENTO DE PUERTAS, CAMBIO DE CERRADURAS.

- **Así mismo, si se adicionan recursos durante el mes al contrato describirlo y el por qué se adicionaron**

N/A

- **También incluir el porcentaje de avance del contrato a JULIO**

*EJECUTADO FÍSICO: 83,02%

*AVANCE EN TIEMPO: 76,47%

*FINANCIERO: 69,48% (COBRADO)

Como recomendaciones y conclusiones, se le solicita al contratista el envío del presupuesto del equipamiento Ep. Fontibón, para que la Supervisión pueda definir las intervenciones, y así el contratista pueda ejecutar las actividades antes que se finalice el contrato.

Durante el presente periodo se continuó con el seguimiento y control de las obligaciones de todas y cada una de las obligaciones derivadas del contrato de obra 1970/24.

11. ANEXOS

- 11.1.** Informes semanales
- 11.2.** Actas de comité
- 11.3.** Relación de correspondencia enviada y recibida
- 11.4.** Registro Fotográfico
- 11.5.** Conceptos Técnicos de los Especialistas
- 11.6.** Reporte Estado Equipo Mínimo de trabajo
- 11.7.** Control General del Contrato
- 11.8.** Actualización Estado Casas de Justicia
- 11.9.** Bitácora de Emergencias
- 11.10.** Informes Quincenales
- 11.11.** Informe SST
- 11.12.** Informe Ambiental
