

 MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

INFORME DE EJECUCIÓN DE CONVENIOS/ CONTRATOS FONSECON
CONVENIO INTERADMINISTRATIVO DE COFINANCIACIÓN NO. 2001 DE 2021, MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA
INFORME PERIODO DE EJECUCIÓN MES DE FEBRERO DE 2023

1. GENERALIDADES CONVENIO / CONTRATO

OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA.		
UBICACIÓN DEL PROYECTO: (Si es urbano: Dirección exacta y barrio Si es rural: Vereda y breve descripción para llegar)	VEREDA TAMBORES – CONTIGUO AL COLISEO		
BENEFICIARIO:	MUNICIPIO DE BALBOA, DEPARTAMENTO DE RISARALDA.		
VALOR TOTAL APORTES DEL PROYECTO	APORTES MIN – FONSECON		\$1.250.000.000
	APORTES ENTIDADES PÚBLICAS		\$ 73.000.000
	TOTAL, APORTES DEL CONVENIO		\$1.323.000.000
FECHA SUSCRIPCIÓN	12-NOVIEMBRE-2021		
FECHA INICIAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	31-MAYO-2022	FECHA ACTUAL DE TERMINACIÓN DEL CONVENIO	30 - JUNIO -2023
SUPERVISOR DEL CONVENIO/ CONTRATO	Ing. YENIER HENAO MEJIA		DESDE: 17-11-2021
SUPERVISORES ANTERIORES (adjuntar casillas si es necesario)	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Ing. YENIER HENAO MEJIA	17-11-2021	ACTUAL
	Arq. _____	DD-MES-AAAA	DD-MES-AAAA
APOYO A LA SUPERVISIÓN	NOMBRE	DESDE	HASTA
	Arq. DANIEL SUAREZ	17-11-2021	31-03-2022
	Ing. KELLY PETRO	01-04-2022	30-09-2022
	Ing. KELLY PETRO	11-11-2022	31-12-2022
	Ing. KELLY PETRO	27-01-2023	Actual
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL MUNICIPIO	No. 58821 No.35222	4-11-2021 19-01-2022	
REGISTRO PRESUPUESTAL MUNICIPIO	N/A	DD-MES-AAAA	
COMPROMISO VIGENCIA FUTURA (si aplica)	N/A		
REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO VIGENCIA 2021	No. 116021	12-11-2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL MINISTERIO VIGENCIA 2022	No. 26522	19-01-2022	
FECHA DE APROBACIÓN DE PÓLIZA INICIAL	No. 5803807931	17-NOVIEMBRE-2021	
FECHA DEL ACTA DE INICIO EJECUCIÓN DEL CONVENIO/ CONTRATO	17-NOVIEMBRE-2021		
FECHA DE MODIFICACIONES, ADICIONES O PRÓRROGAS AL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	PRIMERA PRÓRROGA		FECHA: 26/05/2022
	SEGUNDA PRÓRROGA		FECHA: 30/11/2022
	PRIMERA MODIFICACIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
FECHA DE SUSPENSIONES Y REINICIOS DEL CONVENIO/ CONTRATO (adjuntar casillas si es necesario)	SUSPENSIÓN 01		FECHA: DD/MM/AAAA
	AMPLIACIÓN A LA SUSPENSIÓN		FECHA: DD/MM/AAAA
	REINICIO 01		FECHA: DD/MM/AAAA
PÓLIZA SEGÚN ACTUACIÓN (Vigencia nueva del amparo)	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
	FECHA: DD/MM/AAAA		
VALOR DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$83.333.000		
VALOR DE INTERVENTORÍA ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$41.667.000		
CUOTA DE GERENCIA (Cuando aplique)	\$0		
VALOR DE OBRA	\$1.107.911.892,00		

 MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

VALOR INTERVENTORIA	\$ 88.687.437,00
VALOR ADICIONAL DE OBRA	\$ _____

2. ASPECTOS FINANCIEROS CONVENIO/ CONTRATO

➤ **Convenio interadministrativo/ Contrato** (adjuntar casillas si la cantidad de desembolsos es mayor o el convenio/ contrato tuvo adiciones)

CONCEPTO	REQUISITOS DE CUMPLIMIENTO	PORCENTAJE DE OBRA REQUERIDO	FECHA DE PAGO	VALOR
PRIMER DESEMBOLSO	1) UN PRIMER DESEMBOLSO equivalente a la suma de \$225.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. Suscripción del acta de inicio. B. Designación de la supervisión del convenio por parte del municipio. C. Aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO.	NO APLICA	07/12/2021	\$ 225.000.000,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	2) UN SEGUNDO DESEMBOLSO equivalente a la suma de \$820.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. la certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 40% de ejecución de la obra. B. El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance. C. La respectiva acta parcial de obra avalada por el interventor, y D. Evidencia del inicio en la ejecución del trámite ante la empresa competente para la expedición de las certificaciones RETIE y/o RETILAP.	40%	DD/MM/AAAA	\$ 820.000.000
TERCER DESEMBOLSO	3) UN ÚLTIMO DESEMBOLSO equivalente a la suma de \$205.000.000 PESOS M/L., contra entrega de los siguientes productos: A. La certificación del supervisor del convenio designado por el municipio que acredite el avance del 100% de ejecución de obra, la cual debe incluir: 1) El correspondiente informe de interventoría con registro fotográfico del avance; 2) La respectiva acta final de obra avalada por el interventor. B. Entrega de la certificación RETIE y/o RETILAP. C. Entrega al Ministerio del Interior de “acta de recibo y entrega de bienes proyectos FONSECON” (Anexo 26), debidamente diligenciado.	100%	DD/MM/AAAA	\$ 205.000.000,00
TOTAL, DESEMBOLSOS A LA FECHA DEL INFORME				\$ 225.000.000,00
TOTAL, VALOR LEGALIZADO POR EL MUNICIPIO A LA FECHA DEL INFORME (según información de contratación derivada)				\$ 0,00

3. PÓLIZA ACTUAL CONVENIO/ CONTRATO

Nombre Aseguradora: **ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA**

PÓLIZA No.	AMPAROS	VALORES ASEGURADOS	VIGENCIAS	
			FECHA INICIO	FECHA FINAL
580 47 994000069129	Cumplimiento	\$ 264.600.000,00	12/11/2021	30/12/2023

4. INFORMACIÓN CONTRATACIÓN DERIVADA

➤ **Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción del proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa – Risaralda.**

DESCRIPCIÓN	OBJETO	VALOR
No. del contrato	REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA	\$ 1.124.000.000

 MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

Link de Consulta: LICITACION PÚBLICA NUMERO BLP-OP- 002-2021	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-28797&g-recaptcha-response=03AGdBg27QsGZB842-CKB02uqTV223f38dphd1f4dcxv0gldJy9cdg-4PA20lFKupM2ac3ie37hyRVvEsfFqoUy0pyJUGUA8uSr1pZaW-UE_EeASNSyWcP52mivqeXAdJHSDcRAynMPAVltzBB6eRq8_FL0AeqAAvk5QIDwdAgODEJlNgnLJKrKfKoYrJoh4EQYoyYX3bTN_yZ0j-EKIZgcZ8VdZKcEj05G0s8bFFSDR8jLLYy16pgfruTZ1A5U8-UdsCwugVR4AXPdHdwaQQuuMSP5WEb0btYya_UvR6En1fk9TQLBMN4I3JATXtQhFAcU_PcFwghBkewA7BusKYUGV0ln8WJXAvHdBMKM5kR80UvJ8E_JE1K1B2hz3dUjMhfauxFzEY3E3R1Y9CsyIWAshl_vz62EbfwJBNyRv0veyckZhr1DlvZdmhnr0fZkjdbE8uUfoQ	
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	30/09/ 2022	\$ 67.244.892
	DD/MM/AAAA	\$ 0,00
Nombre contratista	CONSORCIO SACÚDETE BALBOA RL/ JESÚS ENRIQUE RIQUETT RANGEL	NIT 901574342 C.C. 5055765
Fecha de Acta de inicio del contrato	18/06/2022	Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA I	16/12/2022
	SUSPENSIÓN I	12/11/2022
	REINÍCIO I	13/12/2022
Fecha Inicial de terminación del contrato	17/11/2022	Fecha Actual de terminación del contrato 18/5/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO:		\$ 1.191.244.892
COMPANÍA ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADO S.A	
PÓLIZA No.	No. 75-44-101121093	
FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 03/04/2023	
	Calidad del Servicio: 03/10/2027	

➤ *Contrato de Ejecución de Interventoría al Contrato de Ejecución de Estudios, Diseños y Construcción del proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa – Risaralda.*

DESCRIPCIÓN	OBJETO		VALOR
No. del contrato	INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA		\$ 124.971.539
Link de Consulta:	https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=22-15-12937955		
Adicional en valor (adjuntar celdas si es necesario)	30/09/ 2022	\$ 5.382.898	
	DD/MM/AAAA	\$ 0,00	
Nombre contratista	Consortio interventoria Balboa 2022 RL/ Luz Marina Barrios Rodriguez		NIT.901.598.981-5 C.C. 50.901.550
Fecha de Acta de inicio del contrato	17/06/2022		Duración ____ meses
Prórrogas, Suspensiones y Reinicios (adjuntar celdas si es necesario)	PRÓRROGA I	16/12/2022	
	SUSPENSIÓN I	12/11/2022	
	REINÍCIO I	13/12/2022	
Fecha Inicial de terminación del contrato	16/11/2022	Fecha Actual de terminación del contrato	17/05/2023
VALOR TOTAL CONTRATADO:			\$ 130.354.528
COMPANÍA ASEGURADORA	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA		
PÓLIZA No.	No. 440-47-994000026471		

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

FECHA DE LA PÓLIZA	Cumplimiento del Contrato: 10/01/2023
	Calidad del Servicio: 10/11/2027

5. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

Enviado:

FECHA DE ÚLTIMO INFORME DEL MUNICIPIO:	Diciembre 2022	28-02-2023
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA	N/A	DD-MES-AAAA
INFORME FINANCIERO	Mayo 2022	7-06-2022
SALDO DE LA CUENTA BANCARIA	Si	Corte: Mayo - 2022
ACTIVIDADES DEL PROYECTO		x
OTROS		x

6. INFORME DEL SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

DESARROLLO DE LAS ACTIVIDADES DEL CONVENIO/ CONTRATO:	
<i>La información que se registra a continuación debe ser suministrada por la Interventoría:</i>	PORCENTAJE (%)
% PROGRAMADO DE EJECUCIÓN DE OBRA	31,07%
% EJECUTADO DE OBRA	9,82%

PERIODO: febrero de 2023
VIGENCIA: Hasta el 30 de junio de 2023.

Se realizó seguimiento durante el mes de febrero de 2023 mediante vía telefónica y correos electrónicos se requirieron documentos contractuales y que están dentro de las cláusulas que son obligaciones específicas del Municipio.

Se realiza seguimiento de este convenio con fundamento en lo establecido en la CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO: " (...)3) Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR. 4) Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual del Convenio, cumpliendo las normas técnicas necesarias para la correcta ejecución del mismo. 30) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.30) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.33) Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto. 34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: MULTAS. Si EL MUNICIPIO se constituye en mora o incumple, total o parcialmente, las obligaciones que asume en virtud de este Convenio, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del Convenio y sin perjuicio de que EL MINISTERIO pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento. PARÁGRAFO PRIMERO. EL MUNICIPIO autoriza expresamente al MINISTERIO para deducir directamente el valor de las multas causadas, de cualquier suma que se deba desembolsar al MUNICIPIO por razón de este Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. La suma

 MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

de los valores por multas causadas en desarrollo del presente Convenio no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor del mismo.

Las cláusulas anteriormente mencionadas, fueron citadas al municipio en el mes de febrero de 2023.

RESUMEN:

El 14 de diciembre de 2021 al 4 de enero de 2022, se publicó los documentos soporte, estudios previos, como también el proyecto de pliego de condiciones, los anexos requeridos y los riesgos de la LICITACIÓN PUBLICA ALCALDÍA BALBOA BLP OP No. 002 - 2021; que tiene como objeto; REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA.

El 4 de enero de 2022, se realizó el cargue de los pliegos definitivos del proceso contando con fecha de cierre el día 19 de enero de 2022.

El 22 de enero 2022 se suspende el proceso, mediante la resolución No 22 del 2022 y el día 23 de febrero 2022 se reanuda el proceso, mediante la resolución No 077 del 2022.

El 26 de febrero de 2022, se publicó los documentos soportes, estudios previos, como también el proyecto de pliego de condiciones, los anexos requeridos y los riesgos de EL CONCURSO DE MERITOS ALCALDIA BALBOA CMB No 001-CM2022; que tiene como objeto; INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, JURÍDICA, FINANCIERA, CONTABLE Y AMBIENTAL AL CONTRATO QUE TIENE POR OBJETO "REALIZAR LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA DEPARTAMENTO DE RISARALDA".

El 2 de marzo del 2022, se realiza la Audiencia de Adjudicación. Veracidad

El 10 de marzo mediante la resolución 081 del 2022, el municipio realizó la suspensión del proceso, el 29 de abril del 2022, mediante la resolución 086 del 2022, se reanuda el proceso CMB N° 001 del 2022 y se dieron respuestas a las observaciones que llegaron al proceso y se expiden los pliegos definitivos.

El proceso de interventoría fue adjudicado el día 21 de mayo de 2022 mediante resolución número 094.

La obra e interventoría cuentan con acta de inicio la cual tiene fecha de suscripción el día 18 de junio de 2022.

JUSTIFICACIÓN DE AVANCE:

- El día 8 de febrero de 2023, mediante correo electrónico se extiende invitación a reunión virtual de seguimiento al convenio y estado de avance de obra al municipio de Balboa para el día 9 de febrero de 2023.

En la reunión se contó con la participación de la supervisión por parte del municipio, contratista de obra e interventoría, se levanta acta de comité en el se pactaron los siguientes compromisos:

- Reinicio de las actividades en obra -13/2/2023
- Desembolso de anticipo al contratista -22/02/2023
- Presentación de los informes mensuales de supervisión e informes semanales de interventoría-Inmediato.

De acuerdo con lo anterior, el día 13 de febrero mediante correo electrónico se recuerda al municipio el compromiso de dar inicio a las actividades de obra y se solicitó los informes semanales de interventoría.

(...) Cabe mencionar que se debe evidenciar que para la semana del 13 de febrero de 2023 se debe evidenciar trabajos en obra y avances. CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 34) Entregar durante la ejecución dela obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría. (...)

De acuerdo con el compromiso de iniciar las actividades en obra, se recibe correo con fecha de 22 de febrero de 2023 donde manifiestan lo siguiente:

 <div>MINISTERIO DEL INTERIOR</div>	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

(...) Ya se retomaron actividades en el sitio de trabajo, sin embargo, no se ha podido adelantar de la manera esperada por situaciones que afectan directamente la ejecución de los trabajos.

Envío documento explicando las situaciones, para que estén al tanto y sean conscientes de los posibles retrasos que se pueden presentar en estas semanas. (...)

En el presente informe, se adjunta documento que presentó el contratista de obra al supervisor por parte del municipio y a la interventoría.

De acuerdo a los informes de supervisión mensuales por parte del municipio, estos han ido siendo enviados al Ministerio del Interior fuera del tiempo estipulado, el día 21 de febrero de 2023 se envió correo electrónico al municipio manifestando lo siguiente:

(...) Por medio del presente comunico las siguientes observaciones a los informes de supervisión presentados desde el mes de mayo de 2022 hasta diciembre 2022.

En los informes se sigue evidenciando que relacionan información del Ministerio, el municipio debe implementar el logo del municipio no el del Ministerio del Interior.

El supervisor del convenio es el del municipio no el del Ministerio del Interior- favor presentar los certificados de asignación de los supervisores para verificación de los mismos, teniendo en cuenta los cambios internos de personal realizados por el municipio.

Verificar la información relacionada en el informe del mes de octubre, toda vez que el Ministerio del Interior ha realizado los pagos correspondientes y establecidos en la minuta en su totalidad según lo avanzado en el convenio.

Los informes de los meses octubre, noviembre y diciembre deberán ser ajustados con la información propia del municipio y firmados.

Lo anterior se requiere sea presentado a más tardar el día 22 de febrero de 2022. (...)

Los informes no fueron recibidos por parte de esta supervisión.

Con respecto al desembolso del anticipo del contratista de obra, a fecha del presente informe no se evidencia que dicho pago haya sido realizado al contratista de obra.

Se anexan correos enviados y recibidos, acta de comité.

- El día 24 de febrero de 2023, mediante correo electrónico se envía al municipio con copia a la aseguradora un oficio cuyo radicado es 2023-2-003122-005273 Id: 87140 y asunto: Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio 2001 de 2021 Municipio de Balboa -Risaralda, dirigido al alcalde Jefferson Román Herrera.

Temas tratados:

- Cronograma del convenio
- Presentación de informes mensuales de supervisión y los informes semanales de interventoría

Se adjunta al presente informe, el oficio enviado.

- El día 27 de febrero de 2023, mediante correo electrónico se manifestó al municipio lo siguiente:

(...) Por medio del presente, solicito al municipio de Balboa-Risaralda tener en cuenta el tiempo establecido en la minuta del convenio No.2001-21 para el cumplimiento a las obligaciones del convenio, exactamente la CLÁUSULA SEGUNDA. -OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO. 33) Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días

 MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN PARA CONVENIOS/ CONTRATOS SUSCRITOS CON EL MINISTERIO - FONSECON ANEXO 3	Código: BS-P3-F3
		Versión: 5
		Vigente Desde: 17/12/2018

hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto. 34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría.

La cual estipula que los informes mensuales de supervisión deben ser presentados dentro de los primero 5 días hábiles de cada mes, este correo es enviado al municipio precisamente para evitar incumplimientos por la no presentación de lo solicitado en el tiempo establecido, por lo tanto, se espera la presentación del informe correspondiente al mes de febrero dentro de lo estipulado.

De igual manera, se reitera al municipio la presentación de los informes técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio de los meses comprendidos desde octubre hasta enero 2023 suscritos por el supervisor por parte del municipio, informes a los cuales se les volvió a realizar observaciones por medio de correo enviado el día 21 de febrero de 2023.

Se reitera la presentación de todos los informes semanales de interventoría debidamente firmados (...)

A la fecha el municipio no ha presentado los informes de supervisión ajustados.

Se anexa correo enviado al municipio.


Se adelantó formato mensual de ejecución de recursos entregados en administración como trámite interno del Ministerio del Interior para la legalización de recursos, el cual se adjunta al presente informe. Se procederá a radicar mediante memorando en el mes de marzo la documentación.

A fecha del presente informe, el porcentaje de avance es de del 9,82% información suministrada por el municipio mediante informe de interventoría a corte de 24 de febrero de 2023 en el cual anexan registro fotográfico, no se encuentra firmado. Se adjunta de igual manera al presente informe de supervisión. Dicho porcentaje de avance manifestado por parte de la interventoría se procederá a verificar por parte de la supervisión del Ministerio.

7. FECHAS DE VISITAS REALIZADAS AL PROYECTO (orden cronológico)

DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA
DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA	DD/MM/AAAA

8. SUPERVISOR

 Ing. Yenier Henao Mejía Supervisor del Convenio Subdirección de Infraestructura Ministerio – FONSECON	 Ing. Kelly Johana Petro Márquez Elaboró-Apoyo Profesional a la Supervisión Desde 27 de enero de 2023 Subdirección de Infraestructura Ministerio – FONSECON
---	---

REUNION DE SEGUIMIENTO AL CONVENIO 2001-2021

Kelly Johana Petro Marquez <kelly.petro@mininterior.gov.co>

Mié 08/02/2023 11:57

Para: Yenier Henao Mejia <yenier.henao@mininterior.gov.co>; Angie Vannessa Venegas Serrano <angie.venegas@mininterior.gov.co>; Planeacion @balboa-risaralda.gov.co <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>; obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co <obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co>

Cordial saludo,

Por medio del presente, se realiza invitación al municipio de Balboa -Risaralda con el objetivo de realizar seguimiento al convenio y estado de avance de obra.

Favor extender la invitación al contratista de obra y a la interventoría.

Atentamente,

Kelly Johana Petro Márquez

Apoyo a la supervisión del convenio

Reunión de Microsoft Teams

Únase a través de su ordenador, aplicación móvil o dispositivo de sala

[Haga clic aquí para unirse a la reunión](#)

ID de la reunión: 241 161 754 256

Código de acceso: xH5jUn

[Descargar Teams](#) | [Unirse en la web](#)



MINISTERIO DEL INTERIOR

[Infórmese](#) | [Opciones de reunión](#) | [Legal](#)

MUNICIPIO DE BALBOA- SEGUIMIENTO COMPROMISOS

Kelly Johana Petro Marquez <kelly.petro@mininterior.gov.co>

Lun 13/02/2023 15:49

Para: Planeacion @balboa-risaralda.gov.co <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>

CC: Yenier Henao Mejia <yenier.henao@mininterior.gov.co>

Cordial saludo,

Teniendo en cuenta los compromisos pactados en la reunión , quiero recordar al municipio la presentación de los informes semanales de interventoría.

Cabe mencionar que se debe evidenciar que para la semana del 13 de febrero de 2023 se debe evidenciar trabajos en obra y avances.**CLÁUSULA SEGUNDA: OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO 34)** Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría.

Atentamente,

Kelly Johana Petro Márquez

Apoyo a la supervisión- Subdirección para los proyectos de seguridad y convivencia ciudadana.

kelly.petro@mininterior.gov.co

cel.3225179816

PBX: +571 2427400

Carrera 8 N.º 12B -31

Bogotá, D.C., Colombia

<https://www.mininterior.gov.co>



MINISTERIO DEL INTERIOR

 MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7	Código: GC-P3-F7
		Versión: 2
		Vigente desde: 17/12/2018

ACTA No.	
FECHA	9 DE FEBRERO DE 2023
CIUDAD	BOGOTÁ
No. CONTRATO y/o CONVENIO	2001-21
OBJETO:	AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE LAS PARTES PARA PROMOVER LA CONVIVENCIA CIUDADANA, A TRAVÉS DE LA EJECUCIÓN DE UN PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA - RISARALDA
PORCENTAJE DE AVANCE DE LA EJECUCION %	7%
MOTIVO:	SEGUIMIENTO AL CONVENIO Y AVANCE DE OBRA

PARTES

Ministerio del Interior	Municipio
Nombre: Kelly Petro Márquez Celular:3225179816 Cargo: Apoyo a la supervisión del convenio	Nombre : Diego Giraldo Lopez Celular :3136009100 Cargo : Supervisor del convenio
Interventoría (convenio)	Obra (convenio)
Nombre: Carlos Rambal Celular:301386859 Cargo: Interventoria	Nombre: Cristóbal García Celular:3013801401 Cargo: obra

 MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7	Código: GC-P3-F7
		Versión: 2
		Vigente desde: 17/12/2018

DESARROLLO DE LA REUNION

Estado del convenio: en etapa de ejecución de obra- Sacúdete al parque tipo I opción I.

Tema principal:

-Avance de obra

-Documentación convenio.

En cumplimiento a la **CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO:** " (...) 3) *Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO DEL INTERIOR.* 4) *Desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual del Convenio, cumpliendo las normas técnicas necesarias para la correcta ejecución del mismo (...)*

Se hace necesario realizar comité de seguimiento al convenio y verificación e avance en obra en el cual participaran las partes, contratista de obra , interventoría y municipio toda vez que no se evidencia avance % en obra , el municipio no suministra informes semanales de interventoría, registro fotográfico, informes mensuales de supervisión con los debidos ajustes desde el mes de mayo 2022 hasta diciembre 2022 a los cuales se les realizaron observaciones toda vez que no contemplaban la información del municipio y las actividades desarrolladas en cada mes.

Dado a lo anterior, el contratista de obra interviene en el comité mencionando que en obra se ha realizado cerramiento, alistamiento de bodega o campamento de la obra, excavación mecánica para el muro de contención, lo anterior representando un 7% de avance en obra, avance que no ha podido ser verificado por parte el Ministerio del Interior , como bien se menciona anteriormente, el municipio no ha allegado los informes semanales de interventoría y el informe mensual de supervisión del mes de enero 2023.

El contratista de obra manifiesta que se han presentado situaciones con el municipio por la demora en la parte administrativa y financiera , pese a que el alcalde del municipio se comprometió a realizar el desembolso del anticipo en el mes de diciembre 2022, este no fue desembolsado, siendo este fundamental para el buen desarrollo y continuidad de las actividades en obra.

El contratista de obra presentó solicitud de suspensión del contrato al municipio, por lo que el supervisor del convenio por parte del municipio manifestó que el desembolso del anticipo no hace parte como sustento jurídico para dicha solicitud, teniendo claro que el contratista al momento de presentar la licitación debía contar con solvencia financiera, sin embargo , deja claridad que el desembolso del anticipo se encuentra en trámite cuentas por pagar y que el pago el mes de diciembre presentó inconvenientes al cierre del año anterior, pasando a ser reserva presupuestal , dejando como compromiso el pago del mismo el día 22 de febrero de 2023.

Por parte del Ministerio del Interior, recuerda a los participantes del comité que un proyecto se saca adelante en conjunto toda vez que el objetivo es beneficiar a una comunidad entera con la construcción del sacúdete al parque.

A la fecha, el Ministerio del interior ha desembolsado al municipio un valor de \$225.000.000 correspondientes a un primer desembolso, por nuestra parte no existe motivo alguno por el cual no se deba estar trabajando en obra o cumpliendo el cronograma aportado por el municipio y aprobado por las partes.

Cabe aclarar que el Municipio, está incurriendo en un presunto incumplimiento con la programación de obra acordada en el cronograma actualizado al año 2023, conforme con la segunda prorrogas que extiende el plazo del Convenio hasta el 30 de junio de 2023; toda vez Teniendo en cuenta el cronograma aportado por el

 MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7	Código: GC-P3-F7
		Versión: 2
		Vigente desde: 17/12/2018

municipio y avalado por las partes, se evidencia un significativo atraso en las actividades a desarrollar en el convenio toda vez que en el mes de diciembre de 2022 se debió iniciar trámite con la empresa certificadora RETIE/RETILAP y contar con un porcentaje de avance en obra superior al 50% e iniciar las actividades de conexión definitiva de servicios públicos.

Se requiere la presentación inmediata de la subsanación de los informes mensuales de supervisión del mes de mayo 2022 hasta diciembre 2022, la presentación del informe del mes de enero 2023 y los informes semanales de interventoría con registro fotográfico, en cumplimiento a la **CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 33)** *Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto. 34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría.*

CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO: “ (...)30) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.

Se pactan compromisos los cuales se relacionan en la presente acta y deberán ser cumplidas en el tiempo establecido.


COMPROMISOS

RESPONSABLE	ACCIONES	FECHA LÍMITE CUMPLIMIENTO
CONTRATISTA DE OBRA-INTERVENTORIA-MUNICIPIO	REINICIO DE ACTIVIDADES EN OBRA	13-2-2023
MUNICIPIO	DESEMBOLSO DE ANTICIPO A CONTRATISTA	22-2-2023
MUNICIPIO	PRESENTACIÓN DE INFORMES MENSUALES DE SUPERVISIÓN Y LOS INFORMES SEMANALES DE INTERVENTORIA	INMEDIATO

En constancia de lo anterior, firman el presente documento en dos (2) originales,

Anexos: (Relacionar los documentos con el número de folios)
Copia: Subdirección de Gestión Contractual

 MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO ACTA DE REUNIÓN DE SEGUIMIENTO A LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL ANEXO 7	Código: GC-P3-F7
		Versión: 2
		Vigente desde: 17/12/2018

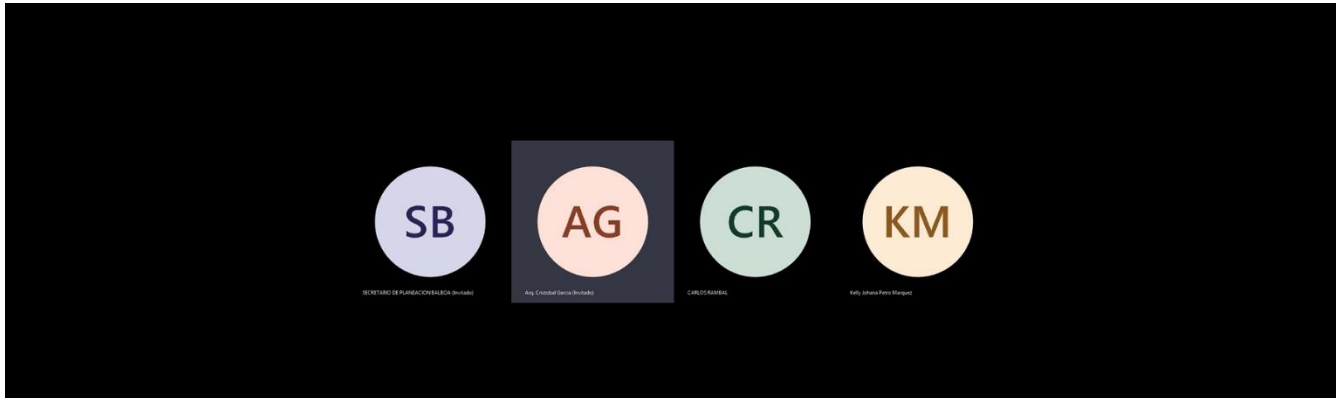

OBSERVACIONES- INFORMES DE SUPERVISIÓN PRESENTADOS POR EL MUNICIPIO DE BALBOA

Kelly Johana Petro Marquez <kelly.petro@mininterior.gov.co>

Mar 21/02/2023 10:44

Para: Planeacion @balboa-risaralda.gov.co <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>

CC: Yenier Henao Mejia <yenier.henao@mininterior.gov.co>


Cordial saludo ,

Por medio del presente comunico las siguientes observaciones a los informes de supervisión presentados desde el mes de mayo de 2022 hasta diciembre 2022.

En los informes se sigue evidenciando que relacionan información del Ministerio, el municipio debe implementar el logo del municipio no el del Ministerio del Interior.

El supervisor del convenio es el del municipio no el del Ministerio del Interior- favor presentar los certificados de asignación de los supervisores para verificación de los mismos, teniendo en cuenta los cambios internos de personal realizados por el municipio.

Verificar la información relacionada en el informe del mes de octubre, toda vez que el Ministerio del Interior ha realizado los pagos correspondientes y establecidos en la minuta en su totalidad según lo avanzado en el convenio.



Los informes de los meses octubre, noviembre y diciembre deberán ser ajustados con la información propia del municipio y firmados.

Lo anterior se requiere sea presentado a más tardar el día 22 de febrero de 2022.

Atentamente,

Kelly Johana Petro Márquez

Apoyo a la supervisión- Subdirección para los proyectos de seguridad y convivencia ciudadana.

kelly.petro@mininterior.gov.co

cel.3225179816

PBX: +571 2427400

Carrera 8 N.º 12B -31

Bogotá, D.C., Colombia

<https://www.mininterior.gov.co>

Reactivación Sacudete Balboa

CONSACUDETE <consorciosacudetebalboa@gmail.com>

Mié 22/02/2023 15:01

Para: Planeacion @balboa-risaralda.gov.co <Planeacion@balboa-risaralda.gov.co>; obraspublicas @balboa-risaralda.gov.co <obraspublicas@balboa-risaralda.gov.co>; coninterventoriabalboa2022@gmail.com <coninterventoriabalboa2022@gmail.com>; ventanilla ventanilla <Ventanilla@balboa-risaralda.gov.co>; Kelly Johana Petro Marquez <kelly.petro@mininterior.gov.co>

buenas tardes,

Ya se retomaron actividades en el sitio de trabajo, sin embargo no se ha podido adelantar de la manera esperada por situaciones que afectan directamente la ejecución de los trabajos.

Envío documento explicando las situaciones, para que estén al tanto y sean conscientes de los posibles retrasos que se pueden presentar en estas semanas.

Agradeciendo de antemano

CONSORCIO SACUDETE BALBOA.

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO MUNICIPIO DE BALBOA-RISARALDA CONV.2001-21

Kelly Johana Petro Marquez <kelly.petro@mininterior.gov.co>

Vie 24/02/2023 13:17

Para: HUBERTO VASQUEZ VASQUEZ <contactenos@balboa-risaralda.gov.co>; Planeacion @balboa-risaralda.gov.co <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>

CC: Yenier Henao Mejia <yenier.henao@mininterior.gov.co>; Remberto Alejandro Martinez Polo <remberto.martinez@mininterior.gov.co>; Angie Vannessa Venegas Serrano <angie.venegas@mininterior.gov.co>; Zulma Andrea Leon Nuñez <zulma.leon@mininterior.gov.co>; Norman Eduardo Ortiz Tovar <norman.ortiz@mininterior.gov.co>; notificacion@solidaria.com.co <notificacion@solidaria.com.co>

Cordial saludo,

Adjunto oficio de presunto incumplimiento al municipio de Balboa-Risaralda.

Atentamente,

Kelly Johana Petro Márquez

Apoyo a la supervisión- Subdirección para los proyectos de seguridad y convivencia ciudadana.

kelly.petro@mininterior.gov.co

cel.3225179816

PBX: +571 2427400

Carrera 8 N.º 12B -31

Bogotá, D.C., Colombia

<https://www.mininterior.gov.co>



MINISTERIO DEL INTERIOR

RECORDATORIO Y REITERACION PRESENTACION DE INFORMES DE SUPERVISIÓN POR PARTE DEL MUNICIPIO DE BALBOA-CALDAS CONV. 2001-2021

Kelly Johana Petro Marquez <kelly.petro@mininterior.gov.co>

Lun 27/02/2023 16:47

Para: Planeacion @balboa-risaralda.gov.co <planeacion@balboa-risaralda.gov.co>

CC: Yenier Henao Mejia <yenier.henao@mininterior.gov.co>

Municipio de Balboa-Risaralda

Cordial saludo,

Por medio del presente, solicito al municipio de Balboa-Risaralda tener en cuenta el tiempo establecido en la minuta del convenio No.2001-21 para el cumplimiento a las obligaciones del convenio, exactamente la **CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO. 33) Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto. 34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría.**

La cual estipula que los informes mensuales de supervisión deben ser presentados dentro de los primero 5 días hábiles de cada mes, este correo es enviado al municipio precisamente para evitar incumplimientos por la no presentación de lo solicitado en el tiempo establecido, por lo tanto, se espera la presentación del informe correspondiente al mes de febrero dentro de lo estipulado.

De igual manera, se reitera al municipio la presentación de los informes técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio de los meses comprendidos desde octubre hasta enero 2023 suscritos por el supervisor por parte del municipio, informes a los cuales se les volvió a realizar observaciones por medio de correo enviado el día 21 de febrero de 2023.

Se reitera la presentación de todos los informes semanales de interventoría debidamente firmados.

Atentamente,

Kelly Johana Petro Márquez

Apoyo a la supervisión- Subdirección para los proyectos de seguridad y convivencia ciudadana.

kelly.petro@mininterior.gov.co

cel.3225179816

PBX: +571 2427400

Carrera 8 N.º 12B -31

Bogotá, D.C., Colombia

<https://www.mininterior.gov.co>



RF. COMUNICADO 04-23

Balboa, Risaralda.
Febrero 21 de 2023

Señor(es).
CARLOS RAMBAL BUENDIA
R.L. INTERVENTORIA BALBOA 2022
DIEGO ALBERTO GIRALDO LOPEZ.
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA.

Asunto: Avance de obra

Cordial saludo,


Después de superar unos percances que tuvo el consorcio internamente, el día lunes 20 de febrero, se retomaron actividades en sitio.

Los trabajos de excavación que se realizaron sufrieron una leve afectación por causa del efecto climático que está atravesando el municipio, con lluvias casi que a diario.

Por esta misma razón, en la vía que comunica las canteras acreditadas y la vereda de Tambores, se presentó un retraso en el material que se esperaba el día de hoy, por una volqueta que se atascó en una zona lodosa. (anexo evidencia)
Por otra parte, el municipio presenta una interrupción del servicio de agua potable, dificultando la producción de concreto, retrasando la fabricación del muro de contención, obra que como sabemos es la primera actividad que realizar para lograr la estabilidad del sitio y esta interrupción según noticias locales, se extenderá hasta el día viernes 24 de febrero.

Con este documento queremos poner en conocimiento a la interventoría y a la secretaria de planeación para que sean conscientes de los posibles atrasos que puede tener la obra

Atentamente.



JESUS ENRIQUE RIQUETT RANGEL.
R.L. CONSORCIO SACUDETE BALBOA.

ANEXO.

Foto en la que se puede observar el carro atazcado en la via de “Cruces”.





Bogotá, 23 de febrero de 2023

Señor

JEFFERSON ROMÁN HERRERA

Alcaldía municipal de Balboa-Risaralda
Balboa-Risaralda

Asunto: Presunto incumplimiento de las obligaciones contractuales del convenio 2001 de 2021 Municipio de Balboa -Risaralda

Cordial saludo,

En mi condición de Supervisor del Convenio Interadministrativo del asunto, por medio del presente, se adelanta el trámite por presunto incumplimiento de las obligaciones por parte del Municipio de Balboa-Caldas, con base en las siguientes generalidades y hechos:

GENERALIDADES

Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2001 de 2021

Conveniente: Balboa -Caldas.

Fecha suscripción: 12-noviembre - 2021

Valor Convenio: \$1.250.000.000

– Aporte total FONSECON

\$ 73.000.000 –

Aporte del municipio

Valor total del Convenio: \$1.323.000.000

CDP: 1215 de 30 de septiembre de 2022

Fecha terminación inicial: 31 de mayo de 2022

Fecha de Finalización actual: 30 de junio de 2023

Adiciones: si

Prórrogas:

- de ejecución al 30 de noviembre de 2022.

Primera Prórroga– ampliando plazo



- Segunda Prórroga, primera adición y modificación – ampliando plazo de ejecución al 30 de junio de 2023.

HECHOS

1. Que el 12 de noviembre de 2021, EL MINISTERIO y EL MUNICIPIO suscribieron el Convenio Interadministrativo de Cofinanciación No. 2001 de 2021, por valor de \$1.250.000.000 ML, el cual inició el 17 de noviembre de 2021.
2. Que el objeto del convenio interadministrativo es: "Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto Sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de Balboa Risaralda.
3. Que el plazo inicial de ejecución del Convenio se pactó hasta el 31 de mayo de 2022.
4. Que EL MUNICIPIO, mediante oficio No. 10000- 081 de fecha 10 de mayo de 2022, solicitó a la supervisión por parte del MINISTERIO la primera prórroga al convenio.
5. Que mediante memorando **MEM2022-12727-SIN-4020** del 17 de mayo de 2022, radicado de conformidad con la Resolución No. 0363 del 19 de marzo de 2020, por correo electrónico en la Subdirección de Gestión Contractual, el supervisor del Convenio solicitó realizar la primera prórroga al Convenio.
6. El día 26 de mayo de 2022 se suscribe la primera prórroga al convenio, estableciendo nueva fecha de terminación del convenio.
7. Que el plazo de terminación del convenio según primera prórroga del convenio es el día 30 de noviembre de 2022.
8. Que EL MUNICIPIO, mediante oficio No. 10300 – 244 de fecha 16 de noviembre de 2022, solicitó a la supervisión por parte del MINISTERIO la segunda prórroga, primera adición y modificación al convenio.
9. mediante memorando 2022-3-003122-028003 Id: 46083 del 29 de noviembre de 2022, radicado de conformidad con la Resolución No. 0363 del 19 de marzo de 2020, por correo electrónico en la Subdirección de Gestión Contractual, el supervisor del Convenio solicitó realizar la segunda prórroga, primera adición y modificación al convenio.
10. El día 30 de noviembre de 2022 se suscribe la segunda prórroga, primera adición y modificación al convenio
11. Que el plazo de terminación del convenio según la segunda prórroga, primera adición y modificación al convenio es el día 30 de junio de 2023.

PRESUNTO INCUMPLIMIENTO



CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 3. “Dar estricto cumplimiento al cronograma aprobado por el supervisor del MINISTERIO 4. “desarrollar las actividades del proyecto dentro del plazo de ejecución contractual”.

El Municipio, está incurriendo en un presunto incumplimiento con la programación de obra acordada en el cronograma actualizado al año 2023, conforme con la segunda prórroga que extiende el plazo del Convenio hasta el 30 de junio de 2023; toda vez Teniendo en cuenta el cronograma aportado por el municipio y avalado por las partes, se evidencia un significativo atraso en las actividades a desarrollar en el convenio toda vez que en el mes de diciembre de 2022 se debió iniciar trámite con la empresa certificadora RETIE/RETILAP y contar con un porcentaje de avance en obra superior al 50% e iniciar las actividades de conexión definitiva de servicios públicos.

Se tiene que, según lo manifestado en la reunión virtual que se desarrolló el día 9 de febrero de 2023 el porcentaje de avance en obra corresponde a un 7% y se han realizado actividades de adecuación de lote y actividades preliminares de muro de contención, se hace necesario que por parte del municipio se presente semanalmente el informe de interventoría y los informes mensuales de supervisión corregidos cada uno desde el mes de mayo de 2022 tal como se encuentra estipulado en la minuta del convenio **CLÁUSULA SEGUNDA. OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS: 33)** *Elaborar, publicar en la plataforma SECOP II y presentar al MINISTERIO-FONSECON, dentro de los primeros cinco (5) días hábiles de cada mes, iniciando en el mes siguiente a la fecha de legalización del convenio, un informe técnico, administrativo y financiero sobre el avance del objeto del convenio, suscrito por el supervisor del MUNICIPIO. En el informe se deberán indicar los porcentajes de avance y ejecución, conforme a lo establecido en el cronograma de convenio previamente presentado, adjuntando: a) Los informes de ejecución tanto del contrato de estudios, diseño y obra como el de interventoría. b) Soportes de cada uno de los pagos realizados por parte del MUNICIPIO, discriminados por contrato y fuente de financiación, anexando las respectivas órdenes de pago, cuando corresponda los comprobantes de egreso y copia de los extractos de la cuenta bancaria registrada ante el MINISTERIO, donde se depositan dichos recursos. c) Certificación en la que conste el cumplimiento de las obligaciones de dichos contratistas frente al Sistema de Seguridad Social en los contratos derivados, de acuerdo con lo exigido en la legislación vigente para el efecto. 34) Entregar durante la ejecución de la obra, junto con el informe mensual: el registro fotográfico en el cual se evidencie el inicio y avances de obra objeto del convenio, discriminado por etapas; así como los informes semanales de avance de ejecución de obra, aprobados por el supervisor del MUNICIPIO y la interventoría.*

Se recalca al municipio de Balboa, que de ninguna manera o motivo esta debe estar suspendida o sin desarrollar actividades en obra. El día 9 de febrero de 2023 en la reunión virtual se solicitó retomar las actividades en obra el día 13 de febrero de 2023, no se evidencia el cumplimiento de lo anteriormente mencionado.


A la fecha, el Ministerio del interior ha desembolsado al municipio un valor de \$225.000.000 correspondientes a un primer desembolso, por nuestra parte no existe motivo alguno por el cual no se deba estar trabajando en obra o cumpliendo el cronograma aportado por el municipio y aprobado por las partes.



CLÁUSULA SEGUNDA. - OBLIGACIONES DEL MUNICIPIO. OBLIGACIONES ESPECÍFICAS DEL MUNICIPIO: “ (...)30) Suministrar oportunamente la información solicitada por el MINISTERIO, a través del supervisor o el apoyo a la supervisión y acompañar el desarrollo de las visitas de seguimiento que se realicen.

De no cumplirse lo precitado predica una serie de circunstancias jurídicas que desprenden una continuidad de sucesos -riesgos para los extremos contractuales como bien se evidencia en las obligaciones; por tal motivo, se insta a la entidad territorial a que cumpla con extremo apego sus obligaciones so pena de las acciones jurídicas que se puedan desprender del no cumplimiento por parte de la entidad territorial y los contratistas derivados de obra e interventoría.

Se recuerda al municipio que el no cumplimiento se efectuará la **CLÁUSULA UNDÉCIMA: MULTAS. Si EL MUNICIPIO** se constituye en mora o incumple, total o parcialmente, las obligaciones que asume en virtud de este Convenio, salvo fuerza mayor o caso fortuito, se causarán multas sucesivas del uno por ciento (1%) del valor del Convenio por cada día de retardo, sin exceder el diez por ciento (10%) del valor del Convenio y sin perjuicio de que EL MINISTERIO pueda hacer efectiva la sanción pecuniaria por incumplimiento. PARÁGRAFO PRIMERO. EL MUNICIPIO autoriza expresamente al MINISTERIO para deducir directamente el valor de las multas causadas, de cualquier suma que se deba desembolsar al MUNICIPIO por razón de este Convenio. PARÁGRAFO SEGUNDO. La suma de los valores por multas causadas en desarrollo del presente Convenio no podrá exceder el diez por ciento (10%) del valor del mismo. (...)

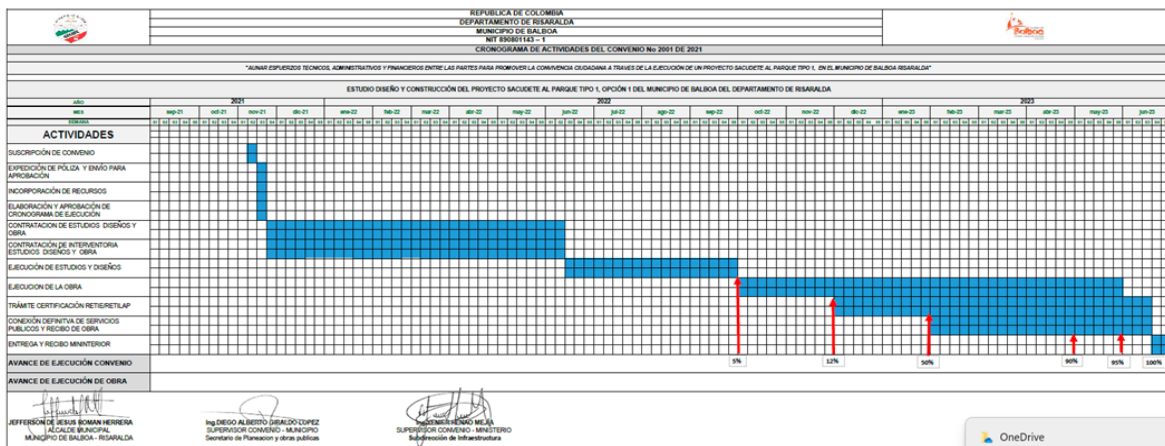

Lo anteriormente expuesto, evidencia **PRESUNTO INCUMPLIMIENTO** por parte del Municipio de Balboa -Risaralda, pese a los requerimientos al Municipio por parte del Ministerio del Interior a través de correos electrónicos y llamadas, suscitando al cumplimiento de lo estipulado en la minuta del convenio y al desarrollo continuo de las actividades del proyecto.

Se le recuerda al Municipio que la sanción por incumplimiento le impedirá acceder a futuro a recursos FONSECON.



Al contestar cite Radicado 2023-2-003122-005273 Id: 87140

Folios: 5 Fecha: 2023-02-24 12:15:05

Anexos: 0

Remitente: GRUPO DE CONTROL Y SEGUIMIENTO DE
PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

Destinatario: HUMBERTO VASQUEZ VASQUEZ

Atentamente,

Yenier Henao Mejía
Supervisor
Subdirección De Seguridad y Convivencia Ciudadana

Supervisor del Convenio 2001-2021

C.c.p. Aseguradora Solidaria de Colombia Póliza de Seguros No.580-47-994000069129, Convenio 2001 de 2021. (Balboa-Caldas)

Elaboró: Kelly Petro– Contratista/Apoyo a la Supervisión SIN

Revisó: Angie Vanessa Venegas Contratista/Apoyo Jurídico SIN

Aprobó: Yenier Henao– Contratista/ Líder Grupo de Supervisión SIN

Balboa, Risaralda.
Febrero 27 de 2023

Señor(es).
DIEGO ALBERTO GIRALDO LOPEZ.
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL
MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA.

Asunto: Información estado actual de obra.

Cordial saludo,


Con el fin de informar a la supervisión del convenio sacúdete balboa 2022, enviamos este documento para expresar lo siguiente:

- El día lunes 20 de enero se retomaron actividades en sitio.
- La semana del 20 de enero al 25 de enero, se empleó para recibir material necesario para la ejecución del muro de contención que representa un 40% del total necesario y limpieza en las excavaciones que fueron afectados por la ola ambiental que atraviesa el municipio.
- En esa semana hubo un atraso en el material por el paro de taxistas en la ciudad de Pereira, situación que ya fue solucionada.
- Por último en los recintos de la alcaldía municipal del Balboa, el día viernes 24 de febrero, tuvimos un comité de obra donde se establecieron unos compromisos para recortar el porcentaje de atraso que tiene actualmente el proyecto, que es aproximadamente del 21% con respecto a la fecha en la que nos encontramos.

Esperamos que después de estos inconvenientes que ya han sido superados, el proyecto pueda transcurrir de la mejor manera y sin más atrasos.

(se anexa evidencia)

Atentamente.



JESUS ENRIQUE RIQUETT RANGEL.
R.L. CONSORCIO SACUDETE BALBOA

ANEXO.









 MINISTERIO DEL INTERIOR	FORMATO INFORME MENSUAL DE EJECUCIÓN RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN				Código: GR-RF-P1-F4
					Versión: 01
					Vigencia desde: 29/12/2017
Entidad Administradora: <u>BALBOA-RISARALDA</u> NIT Entidad Administradora : <u>890801143-1</u> No. Convenio : <u>2001-2021</u> Informe con corte a : <u>31/12/2022</u> Fecha de Elaboración Informe: <u>23/01/2023</u> Valor total Convenio: <u>\$1.250.000.000 M/L</u>					
Fecha de desembolso y/ o ejecución	Valor desembolso Mininterior	Valor ejecutado mensual	Valor ejecutado acumulado	Concepto	Valor pendiente por legalizar
Saldo anterior					\$ -
movimiento del mes					
7/12/2021	\$ 225.000.000,00			Primer Desembolso	\$ 225.000.000
20/10/2022		\$ 83.333.000,00	\$ 83.333.000	comprobante de egreso N° 02198 Pago parcial (01) al Contrato N° 001-2022 Suscripción del acta de inicio,designación de la supervisión del convenio por parte del municipio, aprobación del cronograma del convenio por parte del supervisor del MINISTERIO	\$ 141.667.000
2/11/2022		\$ 41.667.000,00	\$ 125.000.000	Comprobante de egreso N° 02327 Pago parcial (01) al contrato N° 001-2022 Estudios y Diseños a UT Sacudete Bruselas	\$ 100.000.000
Total	\$ 225.000.000	\$ 125.000.000,00	\$ -		100.000.000,00
OBSERVACIONES:					
Firma:  _____ Supervisor Convenio					
Elaboro: Kelly Petro Márquez Reviso: Yenier Henao Mejía					

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

INFORME FINANCIERO DICIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

PROYECTO (S):

SACUDETE TIPO 1

CUENTA (AHORROS) No.457253005106	DEL BANCO:	AGRARIO DE COLOMBIA
VALOR CONVENIO		\$ 1.250.000.000,00
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR		\$ 1.250.000.000,00
VALOR APORTE MUNICIPIO	FECHA DE GIRO	
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	7/12/2021	GIRO 1 \$ 225.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2 \$ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3 \$ 0,00
		GIRO 4 \$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	\$ 225.000.000,00
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)		\$ 225.000.000,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
ADJUDICADO	CONSORCIO SACUDETE BALBOA	\$ 1.124.000.000,00	N/A	\$ 1.124.000.000,00	\$ 1.124.000.000,00
	TOTAL CONTRATADO			\$ 1.124.000.000,00	\$ 1.124.000.000,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

[illegible]

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
1/12/2022	\$ 3 589.00
2/12/2022	\$ 10 767.00
5/12/2022	\$ 3 589.00
6/12/2022	\$ 3 589.00
7/12/2022	\$ 7 179.00
9/12/2022	\$ 10 769.00
12/12/2022	\$ 3 590.00
13/12/2022	\$ 3 590.00
14/12/2022	\$ 3 590.00
15/12/2022	\$ 3 590.00
16/12/2022	\$ 10 772.00
19/12/2022	\$ 3 591.00
20/12/2022	\$ 3 591.00
21/12/2022	\$ 3 591.00
22/12/2022	\$ 3 591.00
23/12/2022	\$ 10 775.00
26/12/2022	\$ 3 592.00
27/12/2022	\$ 3 592.00
28/12/2022	\$ 3 592.00
29/12/2022	\$ 3 592.00
30/12/2022	\$ 10 777.00
TOTAL (3)	\$ 114,898.00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA
(AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. -----

[illegible]

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	\$ 225.000.000,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	\$ 125.015.328,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	\$ 1.540.488,00
Rendimientos financieros noviembre 2021	\$ 0,00
Rendimientos financieros diciembre 2021	\$ 66.450,00
Rendimientos financieros enero 2022	\$ 71.398,00
Rendimientos financieros febrero 2022	\$ 93.827,00
Rendimientos financieros marzo 2022	\$ 109.244,00
Rendimientos financieros abril 2022	\$ 114.517,00
Rendimientos financieros mayo 2022	\$ 110.878,00
Rendimientos financieros junio 2022	\$ 110.933,00
Rendimientos financieros julio 2022	\$ 122.680,00
Rendimientos financieros agosto 2022	\$ 141.496,00
Rendimientos financieros septiembre 2022	\$ 180.002,00
Rendimientos financieros octubre 2022	\$ 186.664,00
Rendimientos financieros noviembre 2022	\$ 117.501,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	\$ 1.425.590,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	\$ 114.898,00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	\$ 101.525.160,00

OBSERVACIONES	El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA PUNTA (1) " fila #22" corresponde a GIROO 1 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de noviembre \$10'526,160
---------------	--

FIRMA

LINA MARIA HENAO HENAO
Secretaria de Hacienda y del Tesoro

PROYECTO (S):

SACUDETE TIPO 1

VALOR CONTRATADO:

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA
(AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. -----

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	\$ 225.000.000,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	\$ 125.015.328,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	\$ 1.425.590,00
Rendimientos financieros noviembre 2021	\$ 0,00
Rendimientos financieros diciembre 2021	\$ 66.450,00
Rendimientos financieros enero 2022	\$ 71.398,00
Rendimientos financieros febrero 2022	\$ 93.827,00
Rendimientos financieros marzo 2022	\$ 109.244,00
Rendimientos financieros abril 2022	\$ 114.517,00
Rendimientos financieros mayo 2022	\$ 110.878,00
Rendimientos financieros junio 2022	\$ 110.933,00
Rendimientos financieros julio 2022	\$ 122.680,00
Rendimientos financieros agosto 2022	\$ 141.496,00
Rendimientos financieros septiembre 2022	\$ 180.002,00
Rendimientos financieros octubre 2022	\$ 186.664,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	\$ 1.308.089,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	\$ 117.501,00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	\$ 101.410.262,00

OBSERVACIONES El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #22" corresponde a GIROO 1 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de noviembre de 2014, 262

FIRMA

LINA MARIA HENAO HENAO
Secretaria de Hacienda y del Tesoro

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

INFORME FINANCIERO OCTUBRE DE 2022
MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

PROYECTO (S):

SACUDETE TIPO 1

CUENTA (AHORROS) No.457253005106	DEL BANCO:	AGRARIO DE COLOMBIA
VALOR CONVENIO		\$ 1.250.000.000,00
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR		\$ 1.250.000.000,00
VALOR APORTE MUNICIPIO		
	FECHA DE GIRO	
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	7/12/2021	GIRO 1 \$ 225.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2 \$ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3 \$ 0,00
		GIRO 4 \$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	\$ 225.000.000,00
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)		\$ 225.000.000,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
ADJUDICADO	CONSORCIO SACUDETE BALBOA	\$ 1,124.000.000,00	N/A	\$ 1.124.000.000,00	\$ 1.124.000.000,00
TOTAL CONTRATADO				\$ 1.124.000.000,00	\$ 1.124.000.000,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
CO No.001	ESTUDIOS Y DISEÑOS	2171	2198	20/10/2022	66708066	N/A	66708066
	COMISION	N/A	N/A	20/10/2022	64440	N/A	6440
	IVA	N/A	N/A	20/10/2022	1224	N/A	1224
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL PAGADO (2)					\$ 66.773.730,00	\$ 0,00	\$ 66.715.730,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO	
1	2
3	4
5	6
7	8
9	10
11	12
13	14
15	16
17	18
19	20
21	22
23	24
25	26
27	28
29	30
31	32
33	34
35	36
37	38
39	40
41	42
43	44
45	46
47	48
49	50
51	52
53	54
55	56
57	58
59	60
61	62
63	64
65	66
67	68
69	70
71	72
73	74
75	76
77	78
79	80
81	82
83	84
85	86
87	88
89	90
91	92
93	94
95	96
97	98
99	100

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
3/10/2022	\$ 5.858,00
4/10/2022	\$ 5.858,00
5/10/2022	\$ 5.858,00
6/10/2022	\$ 5.858,00
7/10/2022	\$ 17.575,00
10/10/2022	\$ 5.859,00
11/10/2022	\$ 8.004,00
12/10/2022	\$ 8.004,00
13/10/2022	\$ 8.004,00
14/10/2022	\$ 32.019,00
18/10/2022	\$ 8.006,00
19/10/2022	\$ 8.006,00
20/10/2022	\$ 5.645,00
21/10/2022	\$ 16.937,00
24/10/2022	\$ 5.646,00
25/10/2022	\$ 5.646,00
26/10/2022	\$ 5.646,00
27/10/2022	\$ 5.647,00
28/10/2022	\$ 16.941,00
31/10/2022	\$ 5.647,00
TOTAL (3)	\$ 186.664,00

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA
(AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. _____[illegible]

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	\$ 225.000.000,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	\$ 66.715.730,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	\$ 1.308.089,00
Rendimientos financieros noviembre 2021	\$ 0,00
Rendimientos financieros diciembre 2021	\$ 66.450,00
Rendimientos financieros enero 2022	\$ 71.398,00
Rendimientos financieros febrero 2022	\$ 93.827,00
Rendimientos financieros marzo 2022	\$ 109.244,00
Rendimientos financieros abril 2022	\$ 114.517,00
Rendimientos financieros mayo 2022	\$ 110.878,00
Rendimientos financieros junio 2022	\$ 110.933,00
Rendimientos financieros julio 2022	\$ 122.680,00
Rendimientos financieros agosto 2022	\$ 141.496,00
Rendimientos financieros septiembre 2022	\$ 180.002,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	\$ 1.121.425,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	\$ 186.664,00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	\$ 159.592.359,00

OBSERVACIONES

El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila "22" corresponde a GIROO 1 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de octubre \$159.582.369

FIRMA

LINA MARIA HENAO HENAO
Secretaria de Hacienda y del Tesoro

OBJETO: Aunar esfuerzos técnicos, administrativos y financieros entre las partes para promover la convivencia ciudadana, a través de la ejecución de un proyecto sacúdete al parque tipo 1 en el municipio de BALBOA RISARALDA.

INFORME FINANCIERO SEPTIEMBRE DE 2022
MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

PROYECTO (S):

SACUDETE TIPO 1

CUENTA (AHORROS) No.457253005106		DEL BANCO:	AGRARIO DE COLOMBIA
VALOR CONVENIO			\$ 1.250.000.000,00
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			\$ 1.250.000.000,00
VALOR APORTE MUNICIPIO			
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	7/12/2021	GIRO 1	\$ 225.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	\$ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	\$ 0,00
		GIRO 4	\$ 0,00
		TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR	\$ 225.000.000,00
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)			\$ 225.000.000,00

VALOR CONTRATADO:

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
ADJUDICADO	CONSORCIO SACUDETE BALBOA	\$ 1.124.000.000,00	N/A	\$ 1.124.000.000,00	\$ 1.124.000.000,00
TOTAL CONTRATADO				\$ 1.124.000.000,00	\$ 1.124.000.000,00

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECCION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECCION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL PAGADO (2)					\$ 0,00	\$ 0,00	£ 0,00

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO	
FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
1/09/2022	\$ 4.625,00
2/09/2022	\$ 13.877,00
5/09/2022	\$ 4.626,00
6/09/2022	\$ 4.626,00
7/09/2022	\$ 5.854,00
8/09/2022	\$ 5.854,00
9/09/2022	\$ 17.562,00
12/09/2022	\$ 5.854,00
13/09/2022	\$ 5.855,00
14/09/2022	\$ 5.855,00
15/09/2022	\$ 5.855,00
16/09/2022	\$ 17.566,00
19/09/2022	\$ 5.856,00
20/09/2022	\$ 5.856,00
21/09/2022	\$ 5.856,00
22/09/2022	\$ 5.856,00
23/09/2022	\$ 17.569,00
26/09/2022	\$ 5.857,00
27/09/2022	\$ 5.857,00
28/09/2022	\$ 5.857,00
29/09/2022	\$ 5.857,00
30/09/2022	\$ 17.572,00
TOTAL (3)	\$ 180.002,00

[illegible]

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	\$ 225.000.000,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	\$ 0,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	\$ 1.121.425,00
Rendimientos financieros noviembre 2021	\$ 0,00
Rendimientos financieros diciembre 2021	\$ 66.450,00
Rendimientos financieros enero 2022	\$ 71.398,00
Rendimientos financieros febrero 2022	\$ 93.827,00
Rendimientos financieros marzo 2022	\$ 109.244,00
Rendimientos financieros abril 2022	\$ 114.517,00
Rendimientos financieros mayo 2022	\$ 110.878,00
Rendimientos financieros junio 2022	\$ 110.933,00
Rendimientos financieros julio 2022	\$ 122.680,00
Rendimientos financieros agosto 2022	\$ 141.496,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	\$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	\$ 0,00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)	\$ 226.121.425,00

OBSERVACIONES

El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #22" corresponde a GIROO 1 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de septiembre de \$226.121.425

FIRMA

LINA MARIA HENAO HENAO
Secretaria de Hacienda y del Tesoro

PROYECTO (S):

CUENTA (AHORROS) No.457253005106		DEL BANCO:	AGRARIO DE COLOMBIA
VALOR CONVENIO			\$ 1.250.000.000,00
VALOR APORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			\$ 1.250.000.000,00
VALOR APORTE MUNICIPIO			
	FECHA DE GIRO		
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	7/12/2021	GIRO 1	\$ 225.000.000,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	\$ 0,00
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	\$ 0,00
		GIRO 4	\$ 0,00
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		\$ 225.000.000,00
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)			\$ 225.000.000,00

CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
ADJUDICADO	CONSORCIO SACUDETE BALBOA	\$ 1.124.000.000,00	N/A	\$ 1.124.000.000,00	\$ 1.124.000.000,00
TOTAL CONTRATADO				\$ 1.124.000.000,00	\$ 1.124.000.000,00

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL PAGADO (2)					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
1/08/2022	\$ 4.008,00
2/08/2022	\$ 4.008,00
3/08/2022	\$ 4.008,00
4/08/2022	\$ 4.623,00
5/08/2022	\$ 13.869,00
8/08/2022	\$ 4.623,00
9/08/2022	\$ 4.623,00
10/08/2022	\$ 4.623,00
11/08/2022	\$ 4.623,00
12/08/2022	\$ 18.494,00
16/08/2022	\$ 4.624,00
17/08/2022	\$ 4.624,00
18/08/2022	\$ 4.624,00
19/08/2022	\$ 13.873,00
22/08/2022	\$ 4.624,00
23/08/2022	\$ 4.625,00
24/08/2022	\$ 4.625,00
25/08/2022	\$ 4.625,00
26/08/2022	\$ 13.875,00
29/08/2022	\$ 4.625,00
30/08/2022	\$ 4.625,00
31/08/2022	\$ 4.625,00
TOTAL (3)	\$ 141.496,00

[illegible]

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)	\$ 225.000.000,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	\$ 0,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)	\$ 941.423,00
Rendimientos financieros noviembre 2021	\$ 0,00
Rendimientos financieros diciembre 2021	\$ 66.450,00
Rendimientos financieros enero 2022	\$ 71.398,00
Rendimientos financieros febrero 2022	\$ 93.827,00
Rendimientos financieros marzo 2022	\$ 109.244,00
Rendimientos financieros abril 2022	\$ 114.517,00
Rendimientos financieros mayo 2022	\$ 110.878,00
Rendimientos financieros junio 2022	\$ 110.933,00
Rendimientos financieros julio 2022	\$ 122.680,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)	\$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)	\$ 0,00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) ÷ (5)	\$ 225.941.423,00

El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #22" corresponde a GIROO 1 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de septiembre \$225,941,423

LINA MARIA HENAO HENAO
Secretaria de Hacienda y del Tesoro

PROYECTO (S):	SACUDETE TIPO 1			
CUENTA (AHORROS) No.457253005106		DEL BANCO:	AGRARIO DE COLOMBIA	
VALOR CONVENIO			\$ 1.250.000.000,00	
VALOR APOORTE MINISTERIO DEL INTERIOR			\$ 1.250.000.000,00	
VALOR APOORTE MUNICIPIO	FECHA DE GIRO			
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:	7/12/2021	GIRO 1	\$ 225.000.000,00	
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 2	\$ 0,00	
VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO DEL INTERIOR:		GIRO 3	\$ 0,00	
		GIRO 4	\$ 0,00	
	TOTAL GIRADO MINISTERIO DEL INTERIOR		\$ 225.000.000,00	
VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1)			\$ 225.000.000,00	

VALOR CONTRATADO:					
CONTRATO No.	NOMBRE CONTRATISTA	VALOR CONTRATO	VALOR ADICION (SI APLICA)	TOTAL CONTRATADO	VALOR FINANCIADO CON ESTE CONVENIO
ADJUDICADO	CONSORCIO SACUDETE BALBOA	\$ 1.124.000.000,00	N/A	\$ 1.124.000.000,00	\$ 1.124.000.000,00
TOTAL CONTRATADO				\$ 1.124.000.000,00	\$ 1.124.000.000,00

CONTRATO No.	OBJETO DEL PAGO	No. DE ORDEN DE PAGO	No. DE COMPROBANTE DE EGRESO	FECHA DE PAGO	AFECTACION RECURSOS MINISTERIO DEL INTERIOR	AFECTACION RECURSOS DEL MUNICIPIO	VALOR DEL PAGO
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
VALOR TOTAL PAGADO (2)					\$ 0,00	\$ 0,00	\$ 0,00

FECHA RENDIMIENTOS GENERADOS	VALOR RENDIMIENTOS GENERADOS
1/07/2022	\$ 14.795,00
5/07/2022	\$ 3.699,00
6/07/2022	\$ 4.006,00
7/07/2022	\$ 4.006,00
8/07/2022	\$ 12.019,00
11/07/2022	\$ 4.007,00
12/07/2022	\$ 4.007,00
13/07/2022	\$ 4.007,00
14/07/2022	\$ 4.007,00
15/07/2022	\$ 12.021,00
18/07/2022	\$ 4.007,00
19/07/2022	\$ 8.014,00
21/07/2022	\$ 4.007,00
22/07/2022	\$ 12.022,00
25/07/2022	\$ 4.008,00
26/07/2022	\$ 4.008,00
27/07/2022	\$ 4.008,00
28/07/2022	\$ 4.008,00
29/07/2022	\$ 12.024,00
TOTAL (3)	\$ 122.680,00

[illegible]

TOTAL (3)	\$ 122,000.00	\$ 225,000.000,00
TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)		\$ 0,00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)		\$ 799,927,00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)		\$ 0,00
Rendimientos financieros noviembre 2021		\$ 66,450,00
Rendimientos financieros diciembre 2021		\$ 71,398,00
Rendimientos financieros enero 2022		\$ 93,827,00
Rendimientos financieros febrero 2022		\$ 109,244,00
Rendimientos financieros marzo 2022		\$ 114,517,00
Rendimientos financieros abril 2022		\$ 110,878,00
Rendimientos financieros mayo 2022		\$ 110,933,00
Rendimientos financieros junio 2022		\$ 0,00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)		\$ 0,00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)		\$ 0,00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)		\$ 225,799,927,00

LINA MARIA HENAO HENAO
Secretaria de Hacienda y del Tesoro

SACUDETE TIPO 1

VALOR CONTRATADO:

VALOR PAGADO A LA FECHA A LOS CONTRATOS:

RENDIMIENTO FINANCIEROS GENERADOS EN LA CUENTA DEL CONVENIO

DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS A LA CUENTA (AHORROS) DEL TESORO NACIONAL No. _____

TOTAL DESEMBOLSOS REALIZADOS (1)		\$ 225,000,000.00
TOTAL PAGOS REALIZADOS (2)	2	\$ 0.00
TOTAL RENDIMIENTOS FINANCIEROS GENERADOS (3)		\$ 455,436.00
Rendimientos financieros noviembre		\$ 0.00
Rendimientos financieros diciembre		\$ 66,450.00
Rendimientos financieros enero		\$ 71,398.00
Rendimientos financieros febrero		\$ 93,827.00
Rendimientos financieros marzo		\$ 109,244.00
TOTAL DEVOLUCION RENDIMIENTOS FINANCIEROS (4)		\$ 0.00
SALDO EN LA CUENTA RENDIMIENTOS FINANCIEROS (3-4)=(5)		\$ 455,436.00
SALDO EN CAJA DEL CONVENIO (1) - (2) + (5)		\$ 225,455,436.00

El valor correspondiente a VALOR TOTAL RECURSOS DESEMBOLSADOS A LA CUENTA A LA FECHA (1) " fila #22" corresponde a GIROO 1 DEL VALOR GIRADO POR EL MINISTERIO mas el rendimiento financiero alcanzado hasta el mes de febrero \$225.455.436

LINA MARIA HENAO HENAO
Secretaria de Hacienda y del Tesoro

MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA**890801143-1****OP 2.247****COMPROBANTE DE EGRESO No. 02327**FECHA miércoles, 2 noviembre, 2022 VALOR OP **41.667.000,00** VALOR NETO **33.683.744,00**

PAGADO A: CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022 901598981

CONCEPTO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORIA No 001 DE 2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIAN CIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA

LA SUMA DE **TREINTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL SETECIENTOS CUARENTA Y CUATR**

PÁGUESE A: CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022

CONTABILIDAD

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CHEQUE	CUENTA	BANCO
11100631	0,00	33.683.744,00		45725300510 - 6	BANCO AGRARIO BALBOA
24010201	33.683.744,00	0,00			
	33.683.744,00	33.683.744,00			

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

10:29:52a. m.

PAG.

1 DE 1

MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

890801143-1

ORDEN DE PAGO

PAG. 1

NRO. 02247

FECHA 2022/10/27

BENEFICIARIO CONSORCIO INTERVENTORIA BALBOA 2022

NIT 901598981

DV 5

VALOR CUARENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y SIETE MIL PESOS MCTE.
\$41.667.000,00

CONCEPTO PAGO CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 001 DE 2022 REALIZAR LA INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURÍDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN CONTRATO, ACTAS DE INICIO Y PAGO No 1 ANEXOS.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	RP	REG	Doc	VALOR
2.3.2.02.02.005.4501040.2 021660750022.53290_133 .4	INVERSION	RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit	1137	2726	CONTRA DE INTERVENTORIA No.001 DE 2022	41.667.000,00
Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo I Opción I del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit						
TOTAL						41.667.000,00

CONTABILIDAD		
CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
13050801	0,00	332.636,00
13058801	0,00	1.400.571,00
13058802	0,00	525.214,00
13110101	0,00	875.357,00
17100501	41.667.000,00	0,00
24010201	0,00	33.683.744,00
24360302	0,00	3.851.571,00
24362502	0,00	997.907,00
TOTAL	41.667.000,00	41.667.000,00

DESCUENTOS	
DESCRIPCIÓN	VALOR
RETFTE HONORARIOS 11%	3.851.571,00
TASA CULTURAL 1.5%	525.214,00
RETFTE IVA SERVICIOS 15%	997.907,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	332.636,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANO 4%	1.400.571,00
TASA PRODEPORTE Y REC 2,5%	875.357,00
TOTAL	7.983.256,00

ANEXOS		
DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS

VALOR ORDEN 41.667.000,00
DESCUENTOS 7.983.256,00
NETO A PAGAR 33.683.744,00

ORDENADOR DEL GASTO

Certificamos que para el pago de la presente orden se han cumplido todas las etapas precontractuales y contractuales, los documentos soportes se encuentran en sus debidas carpetas

Elaboró CONTA

Espacio para
Logo Corporativo

CONSORCIO INTERVENTORIA B
NIT 901.598.981-5
TV 4 ESTE 61 05 TO 3 AP 1303 CONJ
Tel: (605) 3023565755
Bogotá - Colombia
javier01523@hotmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE-2

Señores MUNICIPIO DE BALBOA
NIT 890.801.143-1 Teléfono (601) 3104518143
Dirección CL 8 6 44 Ciudad Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura

Generación 26/10/2022, 10:44
Expedición 26/10/2022, 10:52
Vencimiento 26/10/2022

Item	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	COMPONENTE 1 INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS	1.00	41,667,000.34

Total items: 1

Valor en Letras:

Cuarenta y un millones seiscientos sesenta y siete mil pesos m/cte con treinta y cuatro cent.

Condiciones de Pago:

Otros \$ 41,667,000.34

Observaciones:

COMPONENTE 1 INTERVENTORIA ESTUDIOS Y DISEÑOS

Total Bruto	35,014,286.00
IVA 19%	6,652,714.34
Total a Pagar	41,667,000.34

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.046.145-6

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor, Número Autorización 18764035804816 aprobado en 20220908 prefijo FE desde el número 1 al 100 Vigencia: 12 Meses Meses

- Actividad Económica 7112 Actividades de ingeniería y otras actividades conexas de consultoría técnica Tarifa 0
CUFE: 06fb773a7466f6a27455f6bec0622d03ec2e25ded0280123e6183c075140aaa357a91ff9eca2f116c0f5c56840bd1e86d

4. Secretaría de Hacienda y Tesorería

Balboa Risaralda,

Doctora:

LINA MARÍA HENAO HENAO.
Secretaria de Hacienda Municipal
L.C.

Cordial Saludo:

Por medio del presente me permito solicitarle se sirva efectuar el siguiente traslado:

Cuenta a Debitar	Valor	Cuenta Destino
45725300510 – 6 Proyecto Sacúdete al Parque	33.683.744	027200099094 cuenta de ahorros del Banco Davivienda SA a nombre de Consorcio Interventoría Balboa, Nit: 901.598.981 – 5.
TOTAL		33.683.744

Agradezco su colaboración,

Cordialmente,



JEFFERSON DE JESÚS ROMÁN HERRERA.
Alcalde Municipal



JOSÉ DANIEL AGUIRRE VÉLEZ.
Tesorero General

Proyectó: Janeth M. Herrera Martínez. - Auxiliar Administrativo.
Revisó: Lina María Henao Henao. - Secretaria de Hacienda.
Aprobó: Lina María Henao Henao. - Secretaria de Hacienda.

Francisco Henao

MUNICIPIO DE BALBOA MPIO : JOSE DANIEL AGUIRRE VELEZ

Transferencia

Confirmación de la transferencia

Cuenta Origen:

Cuenta de ahorros
PROYECTO SACUDETE AL
PARQUE

******5106**

MUNICIPIO DE BALBOA

Monto a debitar \$
33.690.184,00

Cuenta Destino:

Producto de terceros
CONSORCIO
INTERVENTORIA BALBOA

******9094**

Monto a acreditar \$
33.683.744,00

Monto \$**33.683.744,00**

Información adicional de la transferencia

Costo de la \$ 6.440,00
transacción:

Número 01
de

factura:

Descripción:

INTERVENTORIA

02/11/2022 - 09:07:09 a.m | IP actual: 191.102.120.230

IC-Banking / Copyright © 2022 Infocorp



La operación solicitada se
realizó correctamente

Número de Cuenta Origen: ****5106
Número de Cuenta Destino: BANCO DAVIVIENDA SA -
****9094
Valor Transferencia: \$ 33.683.744,00
Fecha y Hora: 02/11/2022 10:45:33 a.
m.
Dirección IP: 191.102.120,230
Costo de la transacción: \$ 6.440,00 + IVA
Número de aprobación: 1903933439
Tipo transacción: Transferencia Interbancaria

La transacción esta siendo procesada. Para conocer el estado
de su transacción, ingrese a la opción Consulta de
transferencias interbancarias.

MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

80140143-1

OP 2.171**COMPROBANTE DE EGRESO No. 02198**

FECHA: jueves, 20 octubre, 2022 VALOR OP 83.333.000,00 VALOR NETO 66.708.066,00
PAGADO A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA 901574342

CONCEPTO: PAGO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN CONTRATO, ACTA DE INICIO Y DE PAGO PARCIAL No 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ANEXOS

LA SUMA DE: SESENTA Y SEIS MILLONES SETECIENTOS OCHO MIL SESENTA Y SEIS PESOS

PÁGUESE A: CONSORCIO SACUDETE BALBOA

CONTABILIDAD

CODIGO	DÉBITOS	CRÉDITOS	CUENTA	BANCO
11100631	0,00	66.708.066,00	45725300510 - 6	BANCO AGRARIO BALBOA
24010201	66.708.066,00	0,00		
	66.708.066,00	66.708.066,00		

RECIBÍ

TESORERÍA

C.C./NIT.

8:07:24a. m.

PAG.

1 DE 1

MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA

890801143-1

ORDEN DE PAGO

PAG.

1

NRO.

02171

FECHA

2022/10/07

BENEFICIARIO

CONSORCIO SACUDETE BALBOA

NIT 901574342

DV 5

VALOR OCHENTA Y TRES MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y TRES MIL PESOS MCTE.
\$83.333.000,00

CONCEPTO PAGO CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022 REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA. SE CANCELA SEGÚN CONTRATO, ACTA DE INICIO Y DE PAGO PARCIAL No 1 DE ESTUDIOS Y DISEÑOS ANEXOS.

IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL

RUBRO	DEPEND	RECURSO	RP	REG	Doc	VALOR
2.3.2.02.02.005.4501040.2 021660750022.53290_133 4	Otras obras de ingeniería civil - Infraestructura para la promoción a la cultura de la legalidad y a la convivencia construida - Estudios Diseño y Construcción del Proyecto SRisaraldaCRisaraldaSacudete al Parque Tipo I Opción 1 del Municipio de Balboa Risaralda - Construcción y servicios de la construcción RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit	INVERSION RB - Transferencias del nivel nacional para inversión - Superavit	800	2275	OBRA PÚBLICA No 001 DE 2022	83.333.000,00
					TOTAL	83.333.000,00

CONTABILIDAD

CÓDIGO	DÉBITO	CRÉDITO
13050801	0,00	791.664,00
13058801	0,00	3.333.320,00
13058802	0,00	1.249.995,00
13110101	0,00	2.083.325,00
17100501	83.333.000,00	0,00
24010201	0,00	66.708.066,00
24360302	0,00	9.166.630,00
TOTAL	83.333.000,00	83.333.000,00

DESCUENTOS

DESCRIPCIÓN	VALOR
RETFTE HONORARIOS 11%_	9.166.630,00
TASA CULTURAL 1.5%	1.249.995,00
INDUSTRIA Y COMERCIO	791.664,00
ESTAMPILLA PRO ANCIANO 4%	3.333.320,00
TASA PRODEPORTE Y REC 2,5%	2.083.325,00
TOTAL	16.624.934,00

ANEXOS


DESCRIPCIÓN	NUMERO	FOLIOS
-------------	--------	--------

VALOR ORDEN 83.333.000,00
DESCUENTOS 16.624.934,00
NETO A PAGAR 66.708.066,00

ORDENADOR DEL GASTO

Certificamos que para el pago de la presente orden se han cumplido todas las etapas precontractuales y contractuales, los documentos soportes se encuentran en sus debidas carpetas

Elaboró CONTA



Número de Cuenta Destino: BANCO DAVIVIENDA SA -
Cuenta de Corriente 8955

Fecha y Hora: 20/10/2022 12:29:59 p.
M.

Número de aprobación: 572354033

La transacción está siendo procesada. Para conocer el estado de su transacción, ingrese a la opción Consulta de transferencias interbancarias.



Banco Agrario de Colombia



**ESTADO DE
CUENTAS DE AHORRO
ACTIVO**

Hasta 30 millones,
su dinero está
asegurado

Deposito
seguro
de Fegam
www.fegam.gov.co

NOMBRE MUNICIPIO DE BALBOA ,
DIRECCIÓN CL 8 6 44
CIUDAD RISARALDA, BALBOA

MES DICIEMBRE AÑO 2022

NÚMERO DE CUENTA:
457253005106


OFICINA: 5725 BALBOA

RESUMEN DE MOVIMIENTO

	No. Transacciones	Valor		Valor
SALDO ANTERIOR		101.410.262,00	SALDO ACTUAL	101.525.160,00
TOTAL ABONOS	21	114.898,00	PROMEDIO MES	101.469.553,00
TOTAL CARGOS	0	0,00	INTERESES	114.898,00

INFORMACIÓN IMPORTANTE

**ESTIMADO CLIENTE: PARA SU COMODIDAD,
AHORA USTED PUEDE ACTUALIZAR SUS
DATOS BASICOS COMO TELEFONOS DE
CONTACTO Y DIRECCIONES, A TRAVES DE
NUESTRA LINEA GRATUITA DE CONTACTO
BANAGRARIO 018000 915000 O DESDE
BOGOTA AL 5948500, SERVICIO 24 HORAS.**



www.bancoagrario.gov.co
• Banca Agropecuaria • Banca Personas •
Banca Oficial • Banca Empresarial • Banca
Microfinanzas

DIAS	DESCRIPCIÓN DE LA TRANSACCIÓN	OFICINA	No. DC10	VALOR	SALDO
01/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		3.589,00	101.413.851,00
02/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		10.767,00	101.424.618,00
05/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		3.589,00	101.428.207,00
06/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		3.589,00	101.431.796,00
07/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		7.179,00	101.438.975,00
09/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		10.769,00	101.449.744,00
12/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		3.590,00	101.453.334,00
13/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		3.590,00	101.456.924,00
14/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		3.590,00	101.460.514,00
15/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		3.590,00	101.464.104,00
16/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		10.772,00	101.474.876,00
19/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		3.591,00	101.478.467,00
20/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		3.591,00	101.482.058,00
21/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		3.591,00	101.485.649,00
22/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		3.591,00	101.489.240,00
23/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		10.775,00	101.500.015,00
26/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		3.592,00	101.503.607,00
27/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		3.592,00	101.507.199,00
28/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		3.592,00	101.510.791,00
29/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		3.592,00	101.514.383,00
30/12	INTERESES DE AHORROS	BALBOA (RISARAL		10.777,00	101.525.160,00

N.I.T. 800.037.800-8

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Canal Soluciones de Comunicación S.A.S. NIT. 800.096.812-8 6418

Autorregulado por AMV

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL		
	LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"		
INTERVENTORIA			
FECHA	24/02/2023	PERIODO	10 Del: 17/02/2023 Al: 24/02/2023

1. INFORMACIÓN GENERAL			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CONTRATO DE OBRA	
Contrato N°: CI No. 001 DE 2022		Contrato N°: CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2022	
Objeto: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y JURIDICA A LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACUDETE AL PARQUE TIPO I UBICADO EN EL MUNICIPIO DE BALBOA, RISARALDA"		Objeto: REALIZAR ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"	
Plazo inicial:	152	Plazo inicial:	152
Fecha de inicio:	17-jun-22	Fecha de inicio:	18-jun-22
Fecha de Terminación Inicial:	16-nov-22	Fecha de Terminación Inicial:	17-nov-22
Fecha de terminación:	16-nov-22	Fecha de terminación:	17-nov-22
Plazo actualizado:	105 días calendario	Plazo actualizado:	90 días calendario
Plazo transcurrido	252,00 DIAS	Plazo transcurrido	251,00 días
Valor inicial:	\$ 125.000.000,00	Valor inicial:	\$ 1.124.000.000,00
Valor adición(es):	\$ 5.382.898,00	Valor adición(es):	\$ 67.244.892,00
Valor actualizado:	\$ 130.382.898,00	Valor actualizado:	\$ 1.191.244.892,00
Valor pagado:	\$ 41.667.000,00	Valor pagado:	\$ 83.333.000,00
Valor por pagar:	\$ 88.715.898,00	Valor por pagar:	\$ 1.107.911.892,00
Contratista:	CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	Contratista:	CONSORCIO SACÚDETE BALBOA

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	
El proyecto consiste en la construcción de un sacúdete al parque tipo 1, opción 1, el cual tiene los componentes, AUDITORIO ABIERTO, CAFETERIA, BAÑOS, SALA COMUNITARIA, JUEGOS INFANTILES, CANCHA SINTÉTICA, GRADERIAS, GYM VITAL, CICLO PARQUEO, con un área de 1200 metros cuadrados de área, correspondientes a un lote de 30 x 40 metros, como recomendación. El cual contiene dos etapas la uno y para su puesta en marcha requirió de la elaboración los estudios y diseños y la etapa dos de la construcción de la obra civil como tal	

3. GENERACIÓN DE EMPLEO	
CARGO	CANTIDAD
CONTRATISTA DE OBRA	
Director de obra	1
Residente de obra	1
Asesor Social	1
Asesor Seguridad y Salud en el Trabajo	1
Almacenista	0
Oficiales	1
Ayudantes	1
Equipo diseñador: (Topografo-Ing. Suelos-Arquitecto-Ing. Civil-Ing. Hidraulico-Ing. Electrico-Ing. Estructural)	0




<div>CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022</div>		<div>INFORME SEMANAL</div> <div>LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA”</div> <div>INTERVENTORIA</div>		<div> Consorcio Interventoria Balboa 2022</div>	
INTERVENTORÍA					
Director de interventoría				1	
Residente de interventoría				1	
Inspector de obra				0	
4. ACTIVIDADES EJECUTADAS					
Excavacion manual					
Excavacion mecanica					
Localizacion y replanteo					
Configuracion y nivelacion de terreno					
Relleno compactado con matrial de sitio manualmente					
Retiro de material sobrante					
5. OBSERVACIONES					
Luego de superar las adversidades que presento el contratista, las cuales nos comunicaron, se reiniciaron labores el día lunes 20 de febrero del 2023. Durante el reinicio de las actividades, se observó que por las fuertes lluvias que se presentaron, durante el tiempo que no se pudo avanzar en obra, se habían dañado unos trabajos de excavación que se habían realizado, estos se subsanaron en el trascurso de la semana. Por otra parte el contratista comunico que la vía de Cruces Balboa, se encuentra en mal estado, esto se evidencia ya que esta semana se han estado realizados trabajos de mantenimiento por parte de la alcaldía y de la Gobernación. Esto influye para el suministro de los materiales ya que los volqueteros solo pueden hacer de a dos viajes al día, por el estado de la vía lo cual influye en el rendimiento. El día martes 22 de febrero se presentó un paro de taxistas en la ciudad de Pereira situación que ocasiono inconvenientes con el suministro del cemento. Estas adversidades ya han sido superadas y en obra se encuentran: 40 m3 cúbicos de material, agregado para iniciar los trabajos de fundición del muro en concreto ciclópeo el cual tiene una totalidad de 160m3.					
PROGRAMACIÓN DE LA INVERSIÓN - CONTRATO DE OBRA N° 001 DE 2022 -SACUDETE TIPO 1 BALBOA					
COMPONENTE		VR. INVERSIÓN	ACUM. ANTERIOR	EJECUCIÓN CORTE	EJECUCIÓN TOTAL
COMPONENTE 2					
Excavacion manual		\$ 4.640.580	\$ 4.640.580,00	\$ -	\$ 4.640.580,00
Excavacion mecanica incluye retiro de material sobrante		\$ 797.532	\$ 797.532,00	\$ -	\$ 797.532,00
Localizacion y replanteo		\$ 3.322.800	\$ 3.322.800,00	\$ -	\$ 3.322.800,00
Configuracion y nivelacion de terreno		\$ 3.531.600	\$ 3.531.600,00		\$ 3.531.600,00
Relleno compactado con matrial de sitio manualmente		\$ 1.493.910	\$ 1.493.910,00		\$ 1.493.910,00
Concreto ciclopeo		\$ 48.342.600	\$ 12.000.000,00	\$ 8.000.000,00	\$ 20.000.000,00
</					

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022		INFORME SEMANAL LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA” INTERVENTORIA			
		\$	-		
		\$	-		
		\$	-		
TOTAL	\$ 62.129.022	\$	25.786.422,00	\$	33.786.422,00

<p>CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022</p>	<p>INFORME SEMANAL</p> <p>LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA”</p> <p>INTERVENTORIA</p>	
---	--	---

<p>CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022</p>	<p>INFORME SEMANAL</p> <p>LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA”</p> <p>INTERVENTORIA</p>	
---	--	---

<p>CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022</p>	<p>INFORME SEMANAL</p> <p>LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA”</p> <p>INTERVENTORIA</p>	
---	--	---

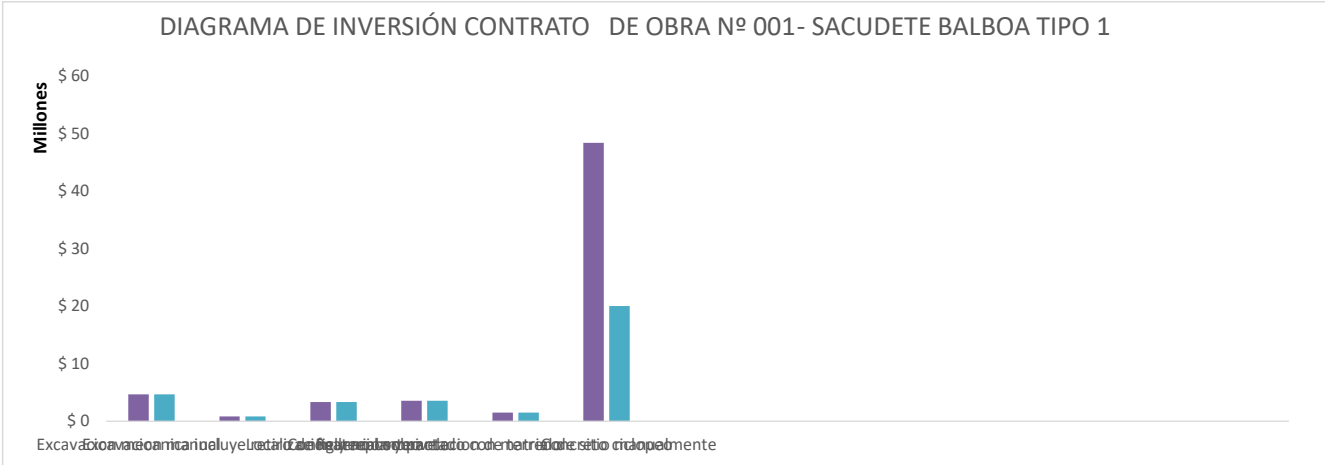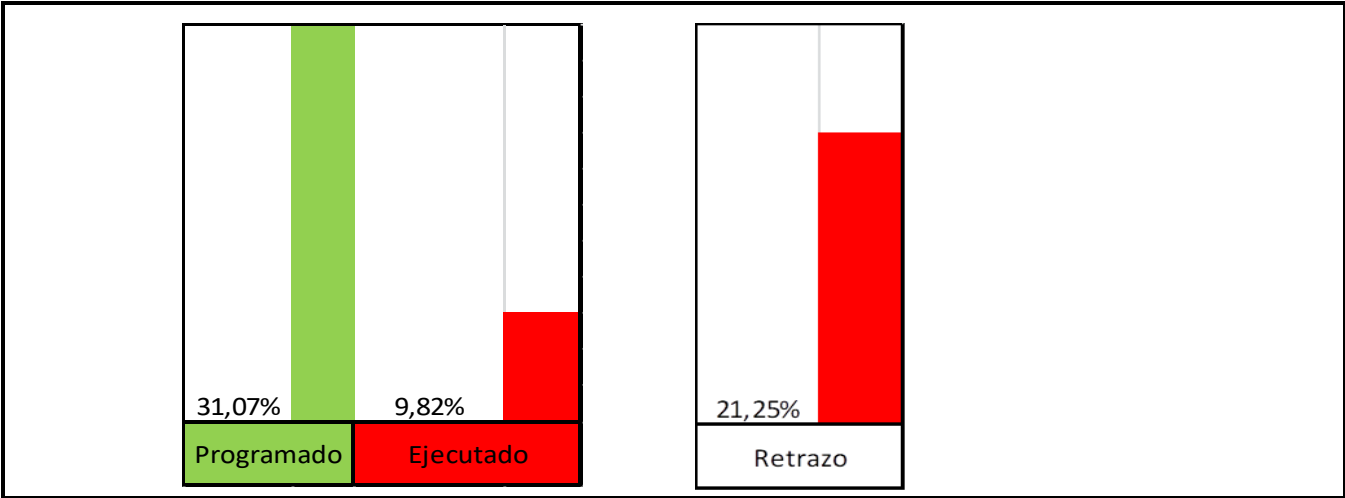[illegible][illegible]

CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022	INFORME SEMANAL						
	LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA”						
INTERVENTORIA							
(+ / -): + = adelanto; - = atraso DUR: Duración (en días calendario)							

<p>CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022</p>	<p align="center">INFORME SEMANAL</p> <p>LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"</p> <p align="center">INTERVENTORIA</p>	
---	--	---

ESTADO ACTUAL DEL PROYECTO			
DESCRIPCIÓN		AVANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL	
		PROGRAMADO	EJECUTADO
ESTA SEMANA	%		
	\$	\$ 64.424.172,00	\$ 8.000.000,00
ACUMULADO ANTERIOR	%		
	\$	\$ 3.701.744.724,00	\$ 25.786.422,00
TOTAL EJECUTADO	%	31,07%	
	\$		\$ 33.786.422,00

BALANCE DE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL		
TOTALES	%	\$
PROGRAMADO	31,07%	\$ -
EJECUTADO	9,82%	\$ 33.786.422,00
TOTAL ADELANTO O ATRASO EJECUCIÓN	-21,25%	\$ 33.786.422,00

Actualmente se tiene un retraso de 21% aproximado debido a que se han teniendo dificultades, con la consecución de los materiales. De igual forma se está coordinando el traslado del personal maestro de obra oficial y ayudantes desde otros lugares, ya que ha sido difícil conseguir mano de obra en el municipio. Esperamos para la próxima semana tener estos inconvenientes solucionados y retomara los trabajos. Y para subsanar estos retrasos se tiene proyectado aumentar el número de cuadrillas en la obra con el personal que se trae de otros municipios

TIEMPO DE EJECUCIÓN		
PLAZO	DÍAS	% TIEMPO
PLAZO EJECUCIÓN EN DÍAS	152,00	100,00%
PLAZO TRANSCURRIDO	251,00	165,13%
TIEMPO ATRASO O ADELANTO	- 32,30	-21,25%
PLAZO REAL TRANSCURRIDO	218,70	143,88%

CARLOS ALBERTO RAMBAL BUENDÍA
 Director de Interventoria

<p>CONSORCIO INTERVENTORÍA BALBOA 2022</p>	<p>INFORME SEMANAL</p> <p>LA OBRA CIVIL TENDIENTE ES PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS, DISEÑOS Y CONSTRUCCIÓN DEL PROYECTO SACÚDETE AL PARQUE TIPO 1 EN EL MUNICIPIO DE BALBOA RISARALDA"</p> <p>INTERVENTORIA</p>	
---	--	---

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO	
	
Movimiento de material	Acopio de material agregado
	
Personal en obra	Personal en obra
	
Adecuacion del terreno de cimentacion para muro en concreto ciclopeo, excavacion manual	Adecuacion del terreno de cimentacion para muro en concreto ciclopeo, excavacion manual
