



CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
TRUJILLO
De La Fuente

INFORME MENSUAL # 02 DE EJECUCION DE OBRA

Contrato de Obra Pública No. SAMC-001-2025

"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÁ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ 2025"

Contratista

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S.

NIT. 901.878.498-0

R/L: DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA

Supervisión

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA

SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PÚBLICAS

**MAYO DE 2025
CUBARA – BOYACA**

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

Nit 901.878.498

ofitrujillodelafuentes@gmail.com

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16ª - 31

Saravena Arauca

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. ASPECTOS PRECONTRACTUALES.....	5
2.1 PROCESO DE SELECCIÓN	5
2.2 CELEBRACION DEL CONTRATO	5
3. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO	6
3.1 DESCRIPCION GENERAL.....	6
3.2 FINALIDAD DEL PROYECTO	6
3.3 LOCALIZACION.....	6
3.4 ALCANCE.....	7
4. ACTOS ADMINISTRATIVOS.....	9
4.1 MODIFICACIONES Y/O ADICIONES AL CONTRATO.....	9
5. ACTOS ADMINISTRATIVOS SUSCRITOS	14
6. RELACION DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA.....	14
6.1 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN.....	14
7. ACTAS DE COMITÉ TÉCNICOS	15
8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA.....	16
9. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA	16
9.1 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO	16
9.2 CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA.....	17
9.3 VALLA INFORMATIVA	17
10. RELACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES.....	18
10.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO	18
10.2 PERSONAL OPERATIVO	18
10.3 PAGOS SALARIALES Y LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL	19
11. BITACORA DIARIA DE OBRA	20
12. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL	20
12.1 DOTACIÓN DEL PERSONAL	20

12.2 ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA	21
12.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)	22
13. IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES	22
14. PERMISOS Y LICENCIAS	22
14.1 LICENCIAS Y PERMISOS PARA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN	22
14.2 OTROS PERMISOS REQUERIDOS.....	22
15. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA.....	22
16. MANEJO DEL ANTICIPO.....	24
<i>Apertura de cuenta bancaria</i>	24
a. Estado de la cuenta bancaria	25
b. Control de la inversión del anticipo.....	25
17. ASPECTOS TECNICOS	25
17.1 CONDICIONES CONTRACTUALES.....	25
18. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA PARA ACTA FINAL	28
19. AVANCE DE LA OBRA	31
19.1 AVANCE FÍSICO DE LA OBRA.....	31
19.2 AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL.....	31
20. PROGRAMACION DE LA OBRA	32
21. DESCRIPCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EJECUTADOS	33
22. CONCLUSIONES.....	40

1. INTRODUCCIÓN

En el siguiente informe de ejecución de obra, se evidencia las actividades ejecutadas en cumplimiento a la minuta contractual por el contratista **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S.** Durante el periodo del 06 de abril del 2025 al 05 de mayo del 2025, un tiempo transcurrido de dos (02) meses de ejecución, teniendo en cuenta los ítems y cantidades referenciadas en el Contrato de Obra Pública No. SAMC-001-2025 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÁ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ 2025"**. Y las especificaciones técnicas, planos y diseños que hacen parte integral del mismo, con el fin de garantizar el buen desarrollo y ejecución del objeto contractual.

El informe contiene la ejecución técnica, administrativa, financiera del contrato de obra mencionado, en el marco del sistema de calidad y las exigencias de la Entidad Contratante contenidas en las especificaciones técnicas, referidas en los siguientes aspectos:

- Trabajos ejecutados: descripción general de las obras ejecutadas evaluadas técnicamente de acuerdo a las especificaciones y diseños para el cumplimiento de los objetivos.
- Aspectos Administrativos: Manejo administrativo de todos los documentos y trámites legales correspondientes, legalización, pólizas, actas, personal y equipo empleado para la ejecución de las obras.
- Aspectos Técnicos: Control sobre la ejecución diaria de las actividades de obra dentro de los parámetros técnicos establecidos, utilizando el equipo y personal idóneo en la realización de los trabajos.
- Aspecto Financiero: Control sobre la ejecución financiera del Contrato de acuerdo con los parámetros establecidos en el mismo.
- Control de Calidad: control diario ejecución de obras, utilizando materiales de calidad y el personal idóneo en la ejecución de los trabajos.

2. ASPECTOS PRECONTRACTUALES

2.1 PROCESO DE SELECCIÓN

La alcaldía de Cubara adelantó el proceso de licitación pública SAMC-001-2025 de conformidad con lo establecido en la Ley 80/93, ley 1150 de 2007, y demás normas aplicables para suscribir contratos, para lo cual la Gerencia de Contratación realizó oportunamente las publicaciones pertinentes en la página WEB www.contratos.gov.co, Departamento de Arauca, llevándose a cabo el cierre del proceso de selección de acuerdo al cronograma y realizando la respectiva evaluación de las ofertas presentadas por los proponentes por parte del Comité Evaluador. Una vez se llevó a cabo las evaluaciones jurídicas, técnica y financiera de las propuestas y se estableció el orden de elegibilidad, se procedió a adjudicar el contrato a la **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S** representada legamente por **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA** mediante Resolución No. 0081 de fecha 04 de marzo de 2025.

2.2 CELEBRACION DEL CONTRATO

Teniendo en cuenta la Resolución de Adjudicación, **No. 0081 de fecha 04 de marzo de 2025** se procedió a la suscripción del contrato de obra (*No. SAMC-001-2025 el día 04 de marzo de 2025*) entre el municipio de Cubara y la firma contratista **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S** representada legalmente por **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**, el cual tiene por objeto **"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÁ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ 2025."**, con un plazo de ejecución de **DOS (02) MESES** y un valor de **DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$217,282,949.87)**.

3. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO

3.1 DESCRIPCION GENERAL

El presente documento contiene las actividades ejecutadas de forma satisfactoria por el contratista de obra durante el periodo comprendido entre el seis (06) de abril del 2025 al cinco (05) de mayo del 2025, del Contrato de Obra Pública SAMC-001-2025 denominado **"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÀ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ 2025"**.

Todas las actividades descritas se desarrollaron de manera integral teniendo como referencia las especificaciones técnicas del proyecto y la normatividad vigente en la ejecución de los procesos constructivos. Durante la ejecución de las actividades se realizó el correcto cumplimiento de los estándares de calidad, procedimientos de ejecución, control, recibo para los trabajos, forma de pago y demás exigencias estipuladas en las especificaciones técnicas del proyecto.

3.2 FINALIDAD DEL PROYECTO

De acuerdo con el objeto del contrato de obra pública SAMC-001-2025, la finalidad de la obra en ejecución es realizar el **"CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÀ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ 2025"**.

3.3 LOCALIZACION

El contrato de obra pública SAMC-001-2025 se realizará en el área rural en la vereda el silencio del municipio de Cubará.

El proyecto se encuentra ubicado en el sector El Silencio, a una distancia aproximada de 24,58 km del casco urbano del municipio de Cubará, en el departamento de Boyacá. Su localización geográfica está definida por las coordenadas 6°53'56.71" de latitud norte y 72°0'45.17" de longitud oeste.

ITEM	DESCRIPCIÓN	UBICACIÓN
1	SEDE SILENCIO (IE KERA SHIKARA)	(6°53'56.71"N- 72° 0'45.17"O)



Ilustración 1. Localización del proyecto.
Fuente: Google Earth

3.4 ALCANCE

El Municipio de Cubará, a través de este proyecto, busca garantizar un entorno educativo seguro y funcional mediante la construcción de un aula escolar de 96,90 m² aproximadamente en la sede El Silencio, perteneciente a la Institución Educativa Kerá Shikará. La intervención incluye las siguientes actividades:

1. Preliminares:

- **Localización y replanteo:** Abarcará un área de 96,90 m² para definir la ubicación exacta del aula.
- **Cerramiento temporal:** Instalación de 193,80 ml de cerramiento en vara rolliza y lona (altura 1,50 m) para seguridad del área de trabajo.
- **Preparación del terreno:** Incluye descapote manual (96,90 m²), excavación de 4,66 m³ en material común y relleno compactado de 31,88 m³.

2. Estructuras en acero:

- **Refuerzo estructural:** Uso de 2.712,04 kg de acero de refuerzo (60.000 PSI) para cimentación y columnas.
- **Malla electrosoldada:** Instalación de 252,69 kg de malla (150x150 mm, Ø6x6 mm) en losas y pisos.

3. Estructuras en concreto:

- **Cimentación y soportes:**
 - Solado de limpieza (9,47 m² en concreto 2000 PSI).

- Construcción de vigas de amarre (**8,12 m³**), columnas (**2,01 m³**) y vigas aéreas (**3,41 m³**) en concreto 3000 PSI.
- **Placa base y elementos complementarios:**
 - Placa de piso de **82,02 m²** (concreto 3000 PSI).
 - Bancas y poyos en concreto (**13,20 m²**).
- 4. **Mampostería:**
 - **Muros en bloque:** Construcción de **76,63 m²** de muros en bloque No. 5 (espesor 0,12 m) para división de espacios.
- 5. **Cubierta:**
 - **Estructura metálica:** Instalación de **548,23 kg** de tubería rectangular para soporte.
 - **Techado termoacústico:** Colocación de **112,00 m²** de teja termoacústica calibre 30, incluyendo caballete de **11,20 ml**.
- 6. **Carpintería metálica:**
 - **Puertas y ventanas:**
 - Suministro e instalación de puerta en lámina calibre 18 (**3,45 m²**).
 - Ventanas corredizas en aluminio con vidrio de seguridad (**25,00 m²**) y mirillas (**1,05 m²**).
 - Rejillas de ventilación en tubería galvanizada (**25,00 m²**).
- 7. **Instalaciones eléctricas:**
 - **Distribución interna:**
 - Conexión desde el medidor al tablero (**30,00 ml**).
 - Tuberías PVC Conduit de 3/4" (**24,00 ml**) y 1/2" (**5,00 ml**), y tubería IMC (**49,75 ml**).
 - Tablero monofásico con 8 circuitos y polo a tierra.
 - Iluminación con paneles LED suspendidos (**14 unidades**).
- 8. **Acabados:**
 - **Revestimientos:**
 - Pañete liso (**169,11 m²**) y estuco (**188,11 m²**) en muros.
 - Enchape cerámico en piso (**93,72 m²**) y carpeta de nivelación (**82,02 m²**).
 - **Pintura:** Aplicación de vinilo en **188,11 m²** para protección y estética.

4. ACTOS ADMINISTRATIVOS

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S, inicio labores el día 06 de marzo de 2025, una vez suministrada, revisada y aprobada la documentación requerida para suscribir acta de inicio. Al acto se presentó, la firma contratista de obra la **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S** representada legalmente por **DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA**.

Tabla 1. Actos Administrativos Contrato de Obra No. SAMC-001-2025

FECHA	ACTO ADMINISTRATIVO	SUSCRITA POR
06 de marzo de 2025	Suscripción De Contrato De Obra No. SAMC-001-2025.	GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde Municipal DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA Contratista
06 de marzo de 2025	Suscripción De Acta De Inicio Del Contrato De Obra No. SAMC-001-2025.	JOSE LEONARDO ARAQUE CONTRERAS Secretario Planeación y Obras Públicas Supervisor. DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA Contratista
02 de mayo de 2025	Suscripción De Acta De Adicional De Plazo Del Contrato De Obra No. SAMC-001-2025. Por UN (01) Mes	GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde Municipal JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretario Planeación y Obras Públicas Supervisor DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA Contratista

4.1 MODIFICACIONES Y/O ADICIONES AL CONTRATO

Afectación por precipitaciones

En el periodo transcurrido fueron presentadas constantes precipitaciones que provocaron un impacto considerable en el proyecto, esto debido a que las lluvias afectan directamente el desarrollo del mismo, ya que gran parte de las actividades se llevan a cabo a cielo abierto, lo que genera que el personal obrero no pueda ejecutar ninguna actividad, generando un atraso significativo en obra.

Cabe resaltar que las lluvias no solo afectan directamente al proyecto, sino que también tiene un impacto considerable en las vías de acceso que conducen al lugar de construcción, lo que dificulta el tránsito de los vehículos que transportan los materiales y el tránsito de los trabajadores para que puedan ingresar a desarrollar sus trabajos, por lo cual, se presentan atrasos debido a la ausencia de mano de obra para la ejecución de las actividades programadas.

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE como ejecutor del contrato de obra SAMC-001-2025, implementa alternativas como la colocación de carpas para dar continuidad a los trabajos en la medida en que el tiempo lo permite.

Es de vital importancia tener en cuenta que la afectación que producen las lluvias va más allá de las horas en las que la precipitación se presenta, sino que, posterior a esta se deben efectuar trabajos no previstos (Limpiezas, adecuaciones de terreno, desagües, entre otros) que generan gastos en tiempo y costos adicionales, por lo tanto, al ser trabajos no previstos, presentan atrasos en las actividades que si están programadas.

Teniendo en cuenta lo anterior, se determina que, debido a las fuertes precipitaciones presentadas en el transcurso de la ejecución del proyecto, el plazo de ejecución de este se ve afectado y para mitigar estas pérdidas será necesario realizar un adicional en tiempo que permita concluir la totalidad del proyecto y cumplir con su objeto principal.

A continuación, se evidencia la afectación en días de las precipitaciones presentadas en el periodo correspondiente.

Cuadro de Lluvias:

25 DE MARZO DEL 2025 AL 05 DE ABRIL DEL 2025						
FECHA	MAÑANA		TARDE		TOTAL HORAS	AFECTACIÓN EN DÍAS
	INICIA	FINALIZA	INICIA	FINALIZA		
25-mar-25			1:00:00 p. m.	4:00:00 p. m.	3	0,38
28-mar-25	7:00:00 a. m.	11:00:00 a. m.			4	0,50
29-mar-25	7:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.			3	0,38
31-mar-25	7:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.			5	0,63
1-abr-25	7:00:00 a. m.	10:00:00 a. m.			3	0,38
2-abr-25			2:00:00 p. m.	5:00:00 p. m.	3	0,38
3-abr-25	11:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:00:00 p. m.	3:00:00 p. m.	3	0,38
4-abr-25	7:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.			5	0,63
5-abr-25	8:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:00:00 p. m.	5:00:00 p. m.	8	1,00
8-abr-25	9:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.			3	0,38
7-abr-25			1:00:00 p. m.	5:00:00 p. m.	4	0,50
8-abr-25	8:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.			4	0,50
9-abr-25	8:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:00:00 p. m.	3:00:00 p. m.	6	0,75
10-abr-25	7:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:00:00 p. m.	2:00:00 p. m.	6	0,75
11-abr-25	7:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:00:00 p. m.	5:00:00 p. m.	9	1,13
14-abr-25	8:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:00:00 p. m.	5:00:00 p. m.	8	1,00
15-abr-25	7:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.	1:00:00 p. m.	5:00:00 p. m.	9	1,13
16-abr-25	8:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.			4	0,50
22-abr-25	8:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.			4	0,50
23-abr-25	7:00:00 a. m.	12:00:00 p. m.			5	0,63
25-abr-25			1:00:00 p. m.	5:00:00 p. m.		
TOTAL					99	12,38

Teniendo en cuenta la tabla se evidencia una afectación de 12,38 días en el periodo, del cual, se contempla un porcentaje correspondiente al 33.45% que abarcan los tiempos de re ejecución de las

actividades y desagües de agua, por lo tanto, se tiene una afectación total de 15 días. A continuación, se presenta la afectación de las lluvias en las áreas del proyecto.

Ilustraciones: Afectación de las lluvias en obra

AFECCIÓN DE LAS LLUVIAS






Del reporte anterior se justifica en el reporte de bitácora anexa al presente comunicado. Se debe tener en cuenta el tiempo en el que se efectúan trabajos no previstos a causa de las lluvias como limpiezas, adecuaciones de terreno, drenado, que, al ser trabajos no previstos, generan costos y atrasos en las actividades programadas.

Considerando lo anterior, las precipitaciones presentadas no permiten el correcto desarrollo de las actividades programadas, de la misma forma, se producen atrasos y retrocesos en las actividades. Como ejecutores del contrato, se toman las medidas necesarias para continuar con lo programado en la medida en que el tiempo lo permita, sin embargo, se deben tener en cuenta las afectaciones mencionadas al momento de evaluar el avance general del proyecto.

De la misma manera es de vital importancia tener en cuenta lo manifestado por el contratista en cuanto a la pluviometría del área del proyecto. Según el "Boletín de predicción climática y recomendación sectorial" en su edición N° 360 de marzo y mayo de 2025, en la zona se proyectan precipitaciones con probabilidad muy por encima de lo normal.

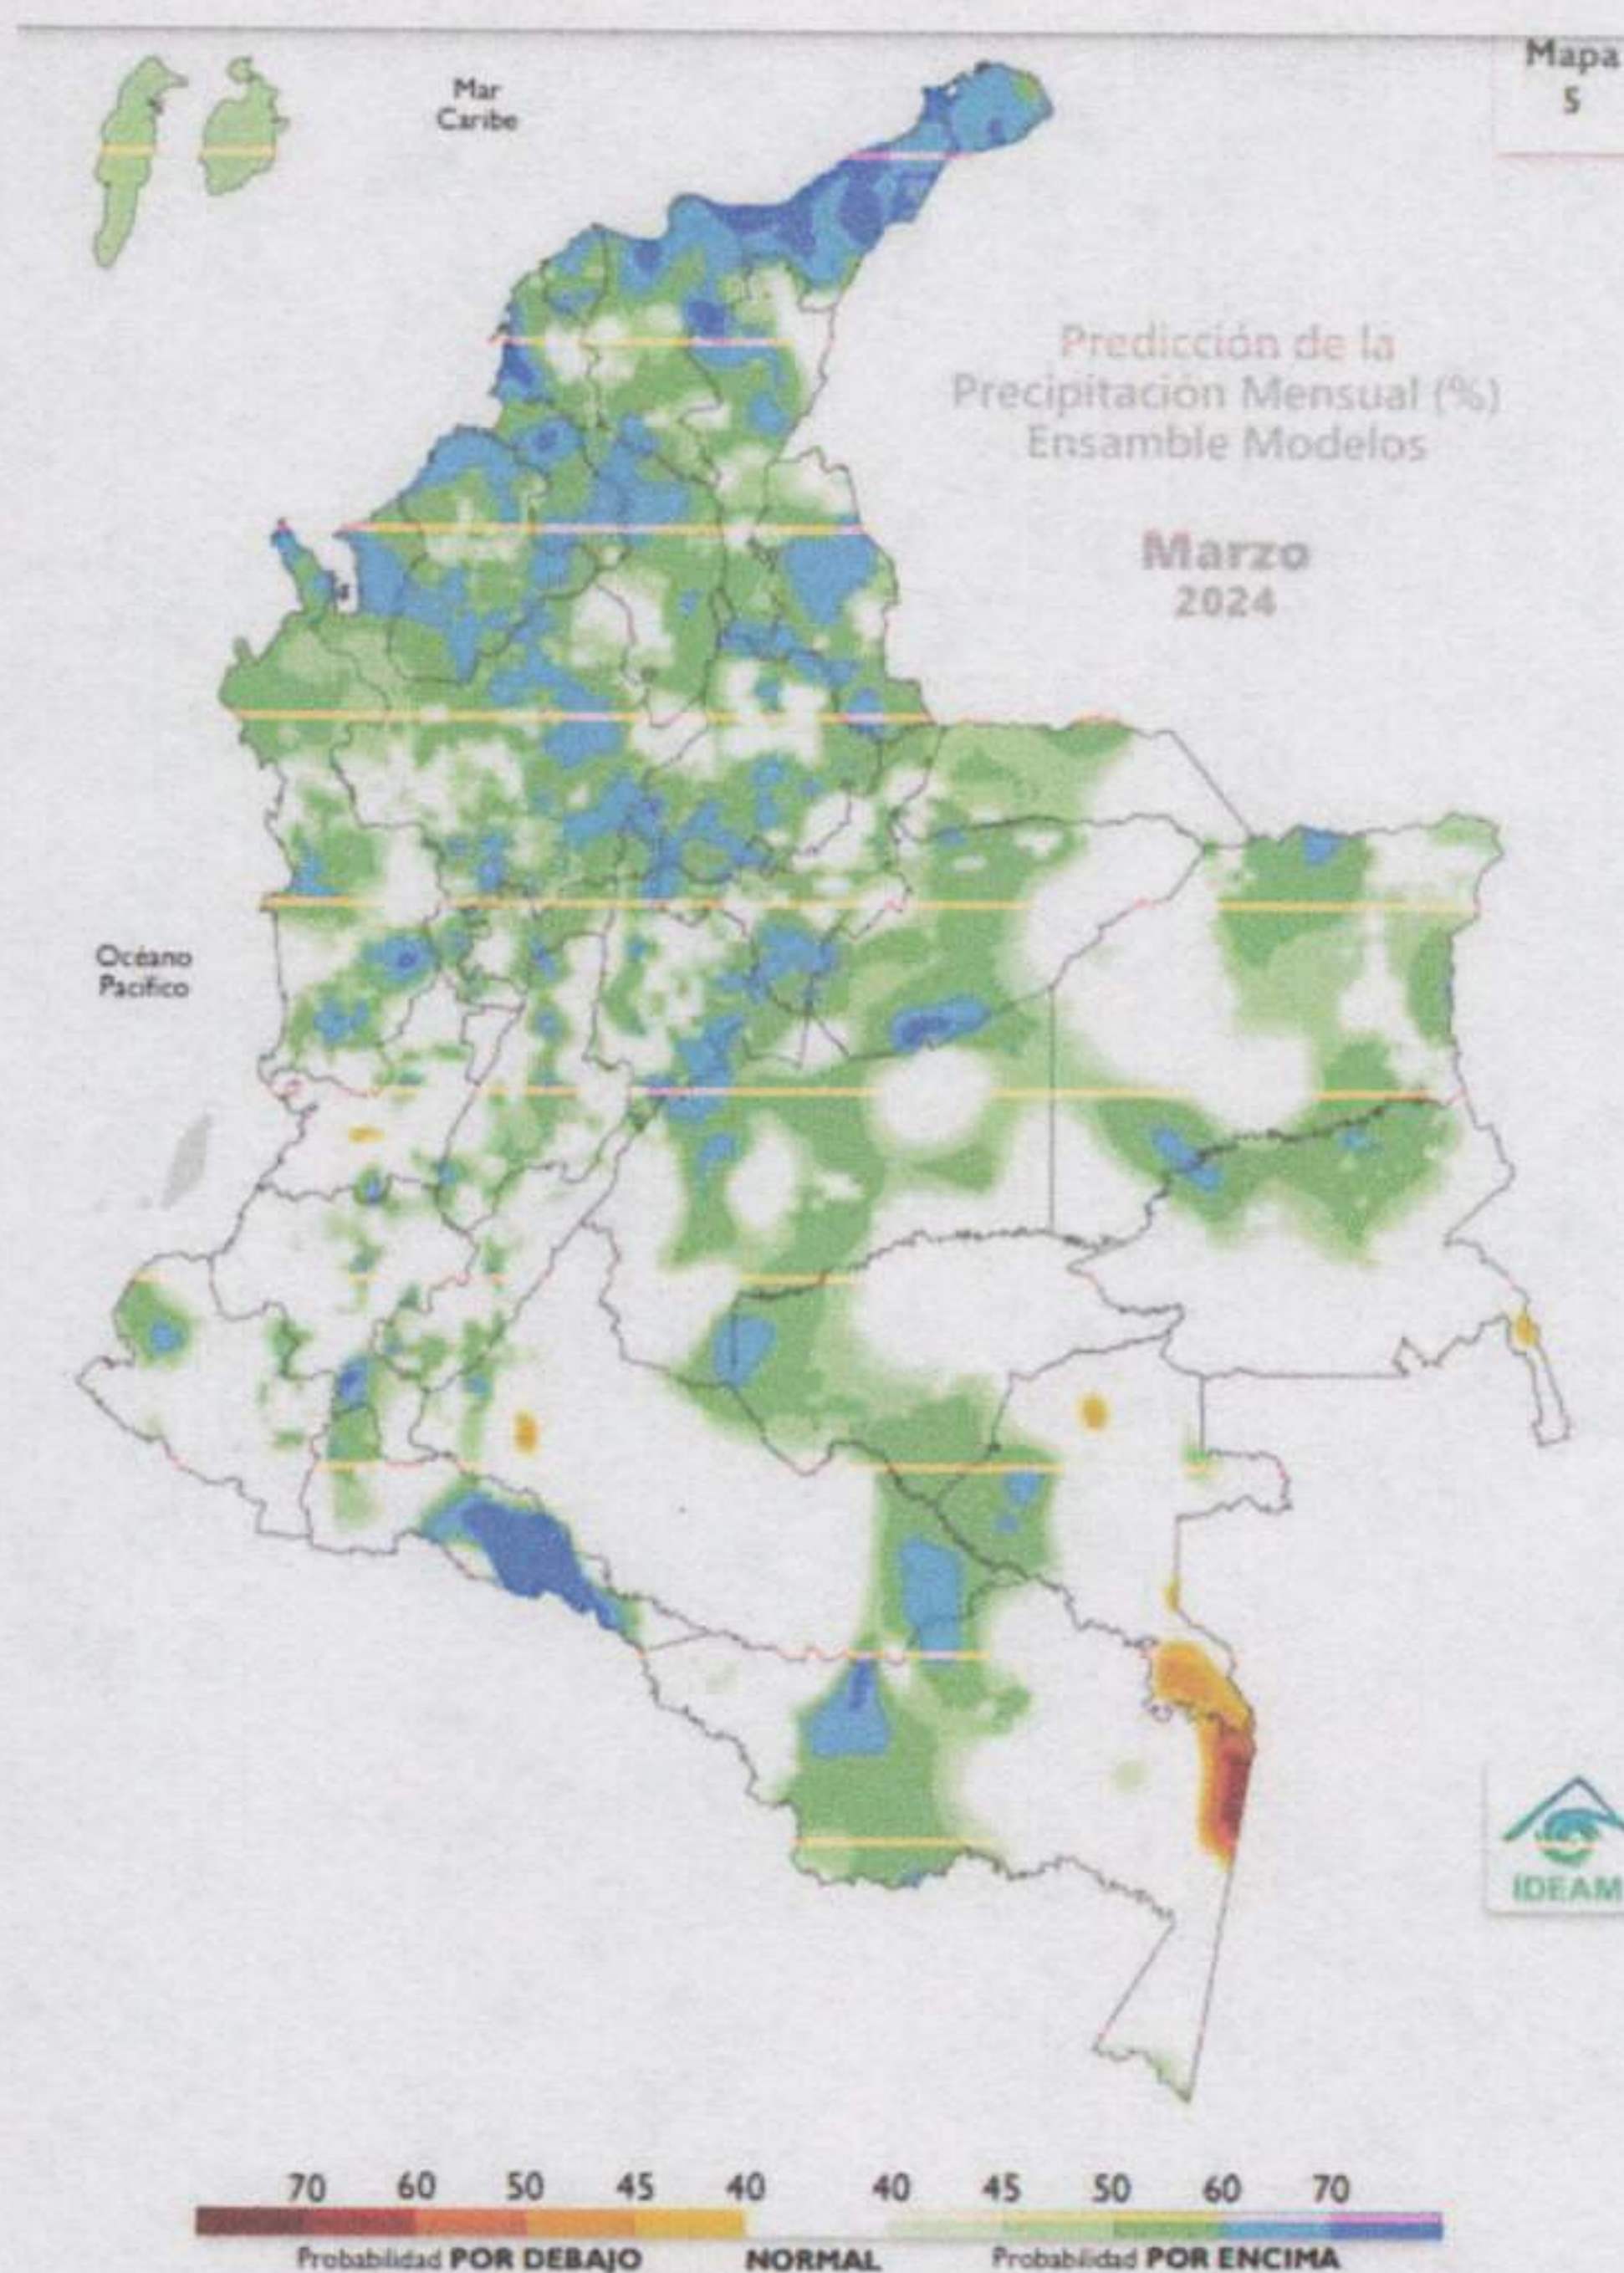

Por lo que se valida una afectación exponencial conforme a la ejecución de las tareas programadas, puesto que este inconveniente genera una afectación constante en el desarrollo de las tareas. Teniendo en cuenta lo anterior, se valida una afectación de 20 días puesto que, si bien es cierto, la afectación se presenta desde el inicio de las actividades, sin embargo, no es una afectación total debido a que si existe mano de obra calificada pero no la suficiente para el desarrollo de las actividades programadas.

5. ACTOS ADMINISTRATIVOS SUSCRITOS

FICHA TECNICA DEL CONTRATO	
CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO	
ENTIDAD CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CUBARA
CONTRATO No:	SAMC-001-2025
OBJETO DEL CONTRATO:	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÁ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ 2025
CONTRATISTA:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S
REPRESENTANTE LEGAL:	DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA
NIT. No:	901.878.498-0
VALOR DEL CONTRATO:	DOSCIENTOS DIECISIETE MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CUARENTA Y NUEVE PESOS CON OCHENTA Y SIETE CENTAVOS (\$217,282,949.87) M/CTE
PLAZO CONTRACTUAL:	DOS (02) MESES
FECHA DE SUSCRIPCION:	06 DE MARZO DE 2025
FECHA INICIO:	06 DE MARZO DE 2025
VALOR ANTICIPO DEL (30%):	SESENTA Y CINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y CUATRO MIL OCHOCIENTOS OCHENTA Y CUATRO PESOS CON NOVENTA Y SEIS CENTAVOS (\$ 65,184,884.96) M/CTE
MODIFICACION No. 01 PRORROGA N° 01:	UN (01) MES – 02 DE MAYO DE 2025
FECHA DE TERMINACION:	04 DE MAYO DE 2025
NUEVA FECHA DE TERMINACION:	04 DE JUNIO DE 2025
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	2025000159 – DEL 17 DE FEBRERO DE 2025
REGISTRO PRESUPUESTAL:	2025000220 – DEL 04 DE MARZO DE 2025
SUPERVISOR:	JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA SECRETARIO DE PLANEACION Y OBRAS PUBLICAS

Tabla 2. Ficha técnica del contrato

6. RELACION DE POLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

De acuerdo con las garantías exigidas por el Municipio de cubara en el Contrato de Obra No. SAMC-001-2025, se suscribe con la compañía aseguradora **SOLIDARIA DE COLOMBIA** las siguientes garantías teniendo en cuenta los amparos en valor y plazo estipulados en la minuta contractual en la **CLÁUSULA DECIMOCTAVA: GARANTIAS** del Contrato así:

6.1 PÓLIZAS DE LEGALIZACIÓN

Las pólizas iniciales fueron expedidas por la aseguradora **SOLIDARIA DE COLOMBIA**, tomada por la **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S**, y con beneficiario el municipio de cubara.

Tabla 3. Pólizas Anexo 0

FECHA EXPEDICION	NOMBRE / TIPO DE POLIZA	ENTIDAD ASEGURADORA	NUMERO DE LA POLIZA	VALOR ASEGURADO	DESDE	HASTA
05/03/2025	Cumplimiento General	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 47 99400007 0088	\$ 21,9728,295.00	05/03/2025	05/09/2025
	Buen Manejo Y Correcta Inversión Del Anticipo			\$ 65,184,885.00	05/03/2025	05/09/2025
	Pago De Salarios, Prestaciones Sociales E Indemnizaciones Laborales			\$ 10,864,148.00	05/03/2025	05/05/2028
	Estabilidad y calidad De las obras			\$ 43,456,590.00	VER NOTA ACLARATORIA	
	Garantía de calidad De los bienes			\$ 21,728,295.00	05/03/2025	05/09/2025
	Predios, Labores Y Operaciones	ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA	475 74 99400001 2181	\$ 284.700.000,00	05/03/2025	06/05/2025
	Contratistas Y Subcontratistas			\$ 284.700.000,00	05/03/2025	06/05/2025
	RCE Patronal			\$ 284.700.000,00	05/03/2025	06/05/2025
	Vehículos Propios Y No Propios			\$ 284.700.000,00	05/03/2025	06/05/2025

7. ACTAS DE COMITÉ TECNICOS

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del informe parcial, se han suscrito actas de comités técnicos desarrollados entre las partes.

Tabla 4. Actas de comité técnico

FECHA	ACTO DE COMITÉ TECNICOS	MOTIVO DEL ACTO DE COMITÉ TECNICOS	SUSCRITA POR
02 de mayo de 2025	Modificatorio No. 01 Prorroga No. 01	Suscripción de acta de adicional de plazo del contrato de obra No. SAMC-001-2025. Por un (01) mes	- GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde Municipal - JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretaria Planeación y obras públicas. Supervisor - DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA Contratista

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

NÚMERO ELECTRÓNICO
PARA PAGOS
4752559767

PÓLIZA No: 475 -74 - 994000012181 ANEXO:0

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA.

COD. AGE: 475

RAMO: 74

PAP:

DIA MES AÑO

05 03 2025

VIGENCIA DE LA PÓLIZA

DIA MES AÑO

05 03 2025

HORAS

23:59

VIGENCIA DESDE

A LAS

DIA MES AÑO

06 05 2025

HORAS

23:59

VIGENCIA HASTA

A LAS

DIAS

FECHA DE IMPRESIÓN

DIA MES AÑO

05 03 2025

TIPO DE IMPRESIÓN: IMPRESION

MODALIDAD FACTURACIÓN: ANUAL

TIPO DE MOVIMIENTO EXPEDICION

VIGENCIA DEL ANEXO

DIA MES AÑO HORAS

05 03 2025 23:59

VIGENCIA DESDE A LAS

DIA MES AÑO HORAS DIAS

06 05 2025 23:59 62

VIGENCIA HASTA A LAS

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE SAS

IDENTIFICACIÓN: NIT 901.878.498-0

DIRECCIÓN: CALLE 22 NO. 16A- 31 BARRIO SIETE DE AGOSTO CIUDAD: ARAUCA, ARAUCA

TELÉFONO: 3115894460

DATOS DEL ASEGURADO Y BENEFICIARIO

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CUBARA

IDENTIFICACIÓN: NIT 800.099.196-2

DIRECCIÓN: CALLE 4 NO 4-43

CIUDAD: CUBARÁ, BOYACÁ

TELÉFONO: 3102574494

BENEFICIARIO: TERCEROS AFECTADOS

IDENTIFICACIÓN: NIT 001-8

DATOS DEL RIESGO Y AMPAROS

ASEGURADO: MUNICIPIO DE CUBARA

NIT : 800099196

ITEM: 1 DEPARTAMENTO: BOYACÁ CIUDAD: CUBARÁ

DIRECCION: CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE

ACTIVIDAD: CONTRATO DE EJECUCION DE OBRA

TIPO EDIFICIO: SI APLICA

TIPO DE RIESGO: SERVICIOS

MANZANA:

DESCRIPCION	AMPAROS	SUMA ASEGURADA	% INVAR	SUBLIMITE
CONTRATO		\$ 284,700,000.00		
	PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	284,700,000.00		
	CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	284,700,000.00		
	RCE PATRONAL	284,700,000.00		
	VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	284,700,000.00		

DEDUCIBLES: 10.00 % DEL VALOR DE LA PERDIDA - Mínimo: 1.00 SMLV en PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES/CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS/RCE PATRONAL/VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS

BENEFICIARIOS
NIT 001 - TERCEROS AFECTADOS

OBJETO DEL CONTRATO**

MEDIANTE LA PRESENTE PÓLIZA SE AMPARAN LOS PERJUICIOS PATRIMONIALES QUE CAUSE DIRECTAMENTE EL ASEGURADO CON MOTIVO DE UNA DETERMINADA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL EN QUE INCURRA DE ACUERDO CON LA LEY COLOMBIANA EN VIRTUD DE LA EJECUCION DEL CONTRATO DE OBRA NO.SAMC-001 DEL 2025, CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÁ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ 2025"

ASEGURADOS: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE SAS NIT:901878498-0 /MUNICIPIO DE CUBARA - BOYACA NIT:800099196-2
BENEFICIARIOS: TERCEROS AFECTADOS/ CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE SAS NIT:901878498-0 /MUNICIPIO DE CUBARA - BOYACA NIT:800099196-2

VALOR ASEGURADO TOTAL: \$ ***284,700,000.00	VALOR PRIMA: \$ *****120,900	GASTOS EXPEDICION: \$ *****5,000.00	IVA: \$ *****23,921	TOTAL A PAGAR: \$ *****149,821
--	---------------------------------	--	------------------------	-----------------------------------

INTERMEDIARIO			COASEGURO CEDIDO		
NOMBRE	CLAVE	%PART	NOMBRE COMPAÑIA	%PART	VALOR ASEGURADO
EVA YOSANI MEDINA TORRES	5079	100.00			

LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARA DERECHO A ASEGURADORA SOLIDARIA DE COLOMBIA ENTIDAD COOPERATIVA, PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS CON OCASIÓN DE LA EXPEDICIÓN DEL CONTRATO.

FIRMA ASEGURADOR

(415)7701861000019(8020)00000000007000475255976

FIRMA TOMADOR

DIRECCIÓN NOTIFICACIÓN ASEGURADORA: Calle 100 No. 9A-45 Piso 12 Bogotá

CADF257A0A0AF57959

CLIENTE



MARMEDINA 0

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRA CONTRACTUAL

DATOS DE LA POLIZA

AGENCIA EXPEDIDORA: SEAS CUCUTA PROMOVEMOS SEGUROS LTDA. COD. AGENCIA: 475 RAMO: 74 No PÓLIZA: 994000012181 ANEXO: 0

DATOS DEL TOMADOR

NOMBRE:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE SAS	IDENTIFICACIÓN:	NIT	901.878.498-0
ASEGURADO:	MUNICIPIO DE CUBARA	IDENTIFICACIÓN:	NIT	800.099.196-2
BENEFICIARIO:	TERCEROS AFECTADOS	IDENTIFICACIÓN:	NIT	001-8

TEXTO ITEM 1

CLIENTE

POLIZA SEGURO DE RESP. CIVIL EXTRACONTRACTUAL
DATOS DE LA PÓLIZA

ANEXO: 0

TIPO DE MOVIMIENTO: 0

PAGINA: 3

TOMADOR: CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE SAS

IDENTIFICACION: 901.878.498-0

ITEM	ASEGURADO	C.C. 6 NIT	UBICACION DEL PREDIO	CIUDAD	VALOR ASEGURADO	PRIMA SIN IVA	PRIMA CON IVA
1	MUNICIPIO DE CUBARA	800099196-2	CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLA	CUBARÁ	284,700,000.00	120,900	144,821
					PRIMA TOTAL SIN IVA	PRIMA TOTAL CON IVA	
					120,900	144,821	

8. CORRESPONDENCIA ENVIADA Y RECIBIDA

Durante la ejecución del contrato de obra con corte a la fecha del presente informe, se ha enviado y recibido correspondencia entre la supervisión, el contratista y la alcaldía municipal de cubara.

Tabla 5. Correspondencia

FECHA	MOTIVO DE CORRESPONDENCIA	ENVIADA POR
20 de marzo de 2025	Solicitud de comité de obra al contrato de obra No. SAMC-001-2025	DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA Contratista
02 de mayo de 2025	Suscripción de acta de adicional de plazo del contrato de obra No. SAMC-001-2025. Por un (01) mes	DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA Contratista

9. CONTROL SOCIAL DE LA OBRA

9.1 SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO

El 10/03/2025, se realizó la socialización del proyecto para la **CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÁ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ 2025**, en las instalaciones de la sala de juntas municipal del Municipio de Cubará, con previa convocatoria realizada por el Municipio de Cubará a través de la Secretaría de Planeación y Obras públicas.

Se le socializa a la comunidad presente, el contrato tiene como objetivo principal la construcción de un aula escolar en la sede educativa El Silencio, ubicada en la Institución Educativa Kerá Shikará del municipio de Cubará, Boyacá. Este proyecto busca fortalecer la infraestructura educativa, brindando un espacio adecuado y seguro para el desarrollo de las actividades académicas de los estudiantes de la comunidad.

El alcance del proyecto incluye:

- Diseño y planificación arquitectónica y estructural del aula, adaptada a las necesidades educativas y a las condiciones del entorno.
- Construcción de un aula moderna y funcional, con los materiales y tecnologías adecuados para promover un ambiente de aprendizaje óptimo.
- Implementación de servicios básicos, incluyendo electricidad, ventilación e iluminación adecuada, para garantizar comodidad y seguridad.
- Mejoras en el entorno, como áreas de circulación y espacios exteriores, que contribuyan a un ambiente escolar integrador y saludable.
- Capacitación y sensibilización a la comunidad educativa sobre el uso y mantenimiento del nuevo espacio.

- Compromiso social y ambiental, asegurando que la construcción se realice de manera responsable, respetando el entorno natural y promoviendo la participación comunitaria.
- Este proyecto pretende beneficiar directamente a los estudiantes, docentes y familias de la comunidad, promoviendo el acceso a una educación de calidad en un entorno digno y adecuado. Además, contribuirá al fortalecimiento del tejido social y al desarrollo integral de la comunidad de Cubará, promoviendo valores de participación, responsabilidad y compromiso con la educación.



Ilustración 2. Socialización del contrato

9.2 CONFORMACIÓN DE LA VEEDURÍA CIUDADANA

Para el presente contrato de obra no se realizó la conformación de la veeduría de obra ante la personería.

9.3 VALLA INFORMATIVA

Al momento de dar inicio con el contrato de obra No. SAMC-001-2025, se reunieron en el sitio de ejecución del proyecto el Secretario de Planeación Ing. José Leonardo Araque contreras y la firma **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLOS DE LA FUENTE R/L** Diana Carolina Fuentes Mojica quien realizo el suministro e instalación de la valla informativa del contrato en referencia cuyo objeto es **CONSTRUCCIÓN DE UN AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÁ DEL MUNICIPIO DE CUBARÁ BOYACÁ 2025.**



Ilustración 3. Valla Informativa

10. RELACION DEL PERSONAL Y CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES LABORALES

Se vinculó el personal requerido para la administración y ejecución de los trabajos de acuerdo al alcance de la obra, realizando previamente la afiliación al sistema de seguridad social integral y riesgos laborales. La supervisión antes del ingreso del personal a la obra verificó las respectivas afiliaciones, así como el pago mensual de los aportes a salud, pensión, riesgos y aportes parafiscales conforme a las planillas de pago entregada.

10.1 PERSONAL ADMINISTRATIVO

El personal profesional y administrativo que laboró en la obra para el periodo del presente informe es el mismo que fue ofertado en el proceso de selección y no ha sido modificado hasta la fecha.

A continuación, se relaciona el personal administrativo y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe final:

Tabla 6. Personal administrativo del contrato de obra No. SAMC-001-2025 periodo de marzo 2025.

No	Nombre	Cédula	Cargo	Salario	Fecha de ingreso	Fecha de retiro	SALUD	PENSION	RIESGO	CCF	PLANILLA
1	Luz Stella Sosa Mojica	1013590049	Profesional SST	\$ 1.423.500	01/03/2025		Nueva EPS	Protección	ARL SURA		9485558178

Tabla 7. Personal administrativo del contrato de obra No. SAMC-001-2025 periodo de abril 2025.

No	Nombre	Cédula	Cargo	Salario	Fecha de ingreso	Fecha de retiro	SALUD	PENSION	RIESGO	CCF	PLANILLA
1	Luz Stella Sosa Mojica	1013590049	Profesional SST	\$ 1.423.500	01/03/2025		Nueva EPS	Protección	ARL SURA		9485558178
2	Tatiana Mercedes Contreras Beltrán	1098652592	Residente de obra	\$ 3.000.000	01/04/2025		Nueva EPS	PORVENIR	ARL SURA	COMFABOY	33636070

Tabla 8. Personal administrativo del contrato de obra No. SAMC-001-2025 periodo de mayo 2025.

No	Nombre	Cédula	Cargo	Salario	Fecha de ingreso	Fecha de retiro	SALUD	PENSION	RIESGO	CCF	PLANILLA
1	Diana Carolina Fuente Mojica	63544298	Profesional SST	\$ 1.423.500	01/03/2025		Nueva EPS	Porvenir	ARL SURA	COMFABOY	33685184
	Tatiana Mercedes Contreras Beltrán	1098652592	Residente de obra	\$ 3.000.000	01/04/2025		Nueva EPS	Porvenir	ARL SURA	COMFABOY	33685184

10.2 PERSONAL OPERATIVO

Se utilizó mano de obra no calificada de la región con lo cual fue posible generar empleo en la zona de influencia del proyecto. Así mismo se vinculó mano de obra calificada para dirigir las actividades de acuerdo con los requerimientos técnicos de la obra.

A continuación, se relaciona el personal operativo y las planillas de pago de cada uno de los meses correspondientes al periodo del presente informe final:

Tabla 9. Personal operativo del contrato de obra No SAMC-001-2025 en el mes de abril 2025.

No	Nombre	Cédula	Cargo	Salario	Fecha de ingreso	Fecha de retiro	SALUD	PENSION	RIESGO	CCF	PLANILLA
1	Bocota Bocota Shikaru	1149192379	Ayudante	\$ 1.916.000	01/04/2025		Nueva Eps	Colpensiones	Arl Sura	Comfaboy	33636070
2	Bocota Bocota Tayakubo	1149192402	Ayudante	\$ 2.555.010	01/04/2025		Nueva Eps	Colpensiones	Arl Sura	Comfaboy	33636070
3	Rocha Gomez Wilder	9467181	Oficial	\$ 1.916.000	01/04/2025		Nueva Eps	Porvenir	Arl Sura	Comfaboy	33636070
4	Rotarbaria Bocota Arturo	9466632	Ayudante	\$ 1.916.000	01/04/2025		Nueva Eps	Porvenir	Arl Sura	Comfaboy	33636070
5	Rotarbaria Rotarbaria Bekusa	1049397042	Ayudante	\$ 1.916.000	01/04/2025		Nueva Eps	Porvenir	Arl Sura	Comfaboy	33636070
6	Rotarbaria Rotarbaria Reusuwia	1149192383	Ayudante	\$ 1.916.000	01/04/2025		Nueva Eps	Porvenir	Arl Sura	Comfaboy	33636070
7	Rotarbaria Rotarbaria Takuakubo	1049392055	Ayudante	\$ 1.916.000	01/04/2025		Eps-Coosalud	Protección	Arl Sura	Comfaboy	33636070
8	Trillos Agustin	96124946	Ayudante	\$ 1.916.000	01/04/2025		Nueva Eps	Porvenir	Arl Sura	Comfaboy	33636070
9	Vera Suarez Luis Edgar	9467051	Ayudante	\$ 1.916.000	01/04/2025		Nueva Eps	Porvenir	Arl Sura	Comfaboy	33636070

Tabla 10. Personal operativo del contrato de obra No SAMC-001-2025 en el mes de mayo 2025.

No	Nombre	Cédula	Cargo	Salario	Fecha de ingreso	Fecha de retiro	SALUD	PENSION	RIESGO	CCF	PLANILLA
1	Bocota Bocota Shikaru	1149192379	Ayudante	\$ 1.916.000	01/04/2025	01/05/2025	Nueva Eps	Colpensiones	Arl Sura	Comfaboy	33636145
2	Bocota Bocota Tayakubo	1149192402	Ayudante	\$ 2.555.010	01/04/2025	01/05/2025	Nueva Eps	Colpensiones	Arl Sura	Comfaboy	33636145
3	Rocha Gomez Wilder	9467181	Oficial	\$ 1.916.000	01/04/2025		Nueva Eps	Porvenir	Arl Sura	Comfaboy	33636145
4	Rotarbaria Bocota Arturo	9466632	Ayudante	\$ 1.916.000	01/04/2025	30/05/2025	Nueva Eps	Porvenir	Arl Sura	Comfaboy	33636145
5	Rotarbaria Rotarbaria Bekusa	1049397042	Ayudante	\$ 1.916.000	01/04/2025	30/05/2025	Nueva Eps	Porvenir	Arl Sura	Comfaboy	33636145
6	Rotarbaria Rotarbaria Reusuwia	1149192383	Ayudante	\$ 1.916.000	01/04/2025	30/05/2025	Nueva Eps	Porvenir	Arl Sura	Comfaboy	33636145
7	Rotarbaria Rotarbaria Takuakubo	1049392055	Ayudante	\$ 1.916.000	01/04/2025	01/05/2025	Eps-Coosalud	Protección	Arl Sura	Comfaboy	33636145
8	Trillos Agustin	96124946	Ayudante	\$ 1.916.000	01/04/2025	01/05/2025	Nueva Eps	Porvenir	Arl Sura	Comfaboy	33636145
9	Vera Suarez Luis Edgar	9467051	Ayudante	\$ 1.916.000	01/04/2025		Nueva Eps	Porvenir	Arl Sura	Comfaboy	33636145

El pago de las planillas de seguridad social integral del periodo del acta final realizados, se presentan en el **ANEXO** con las respectivas planillas de la nómina firmadas por el personal.

Para un mejor control del cumplimiento de las obligaciones que tiene con respecto al personal vinculado a la obra, la supervisión realiza seguimiento a los compromisos laborales verificando los siguientes aspectos:

10.3 PAGOS SALARIALES Y LIQUIDACIÓN DEL PERSONAL

Se realizó los pagos salariales de los trabajadores vinculados a la ejecución de la obra, conforme al contrato laboral (verbal o escrito) para el mes que se relacionan en el presente informe.

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	MES 1		MES 2		
	SI	NO	SI	NO	
Se tiene al día las afiliaciones a seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC de todo el personal.	X		X		
Se ha entregado a la supervisión copia de las afiliaciones del personal.	X		X		
Se presenta oportunamente las planillas de pago de salarios de todo el personal.	X		X		
Los reportes de tiempo de las planillas de pago de salarios corresponden con el tiempo real trabajado en campo.	X		X		
Las liquidaciones del personal retirado cumplen con la reglamentación vigente.	X		X		
Se tiene al día el pago de seguridad social, ICBF, SENA, Cajas de compensación, ARP, FIC, fondos de pensiones, EPS de todo el personal.	X		X		

Tabla 11. Seguimiento a los compromisos laborales del contratista- Contrato de Obra No. SAMC-001-2025

11. BITACORA DIARIA DE OBRA

La bitácora de obra se comienza a llenar los formatos con las actividades que se van ejecutando desde el acta de inicio de la obra que tiene por fecha el día 06 de abril de 2025 hasta el 05 de mayo de 2025, se presenta copia de la Bitácora Diaria de Obra para el periodo del acta final.

12. SEGURIDAD INDUSTRIAL Y SALUD OCUPACIONAL

12.1 DOTACIÓN DEL PERSONAL

Se llevó a cabo la dotación del personal que labora en la obra con los elementos de protección requeridos en el desarrollo de sus labores diarias, de acuerdo a las necesidades de cada trabajador, haciendo entrega de los siguientes elementos:

ELEMENTOS DE PROTECCION	ENTREGADOS		ESTADO			BENEFICIARIOS
	Si	No	Bueno	Regular	Malo	
CASCO	X		X			Ingenieros, ayudantes.
GUANTES	X		X			Ayudantes y oficiales
BOTAS DE CAUCHO	X		X			Ayudantes y oficiales
GAFAS DE PROTECCION	X		X			Ayudantes y oficiales
TAPA BOCAS	X		X			Ayudantes y oficiales

Tabla 12. Dotación del personal en obra de elementos de protección-Contrato de Obra No. SAMC-001-2025



Ilustración 3. Uso de EPP durante ejecución de la obra

El inspector SISO verificó diariamente en campo la utilización de los elementos de protección por parte del personal en obra, haciendo los respectivos requerimientos a los trabajadores que en determinado momento no los estaban usando.

12.2 ACCIDENTALIDAD EN LA OBRA

El inspector SISO (Seguridad y Salud en el Trabajo) mantuvo, durante el periodo objeto del presente informe, un monitoreo riguroso del registro de accidentes laborales y de la atención de los incidentes vinculados al personal vinculado por el contratista, en concordancia con el marco del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) y con el plan de seguridad y salud vigente para la obra. En este periodo, no se reportaron accidentes laborales imputables a la ejecución del contrato No. SAMC-001-2025. Se observó la ausencia de lesionados, de incapacidades derivadas de incidentes laborales y de pérdidas de tiempo asociadas a eventos de esta índole. Adicionalmente, se verificó la efectiva implementación de los controles de riesgo establecidos (perímetros de seguridad, uso correcto de equipos de protección personal, señalización adecuada, gestión de permisos de trabajo y capacitación del personal), y se constató la coherencia entre la documentación de registro de incidentes y la evidencia de campo disponible en la obra.

Por su parte, El inspector SISO (Seguridad y Salud en el Trabajo) llevó a cabo una vigilancia orientada a posibles accidentes que pudiesen afectar a terceros como consecuencia de la ejecución de la obra. En el periodo de referencia no se presentaron accidentes a terceros vinculados a la ejecución del contrato SAMC-001-2025. Las actividades de control incluyeron revisión de planes de manejo de tránsito y flujo de maquinaria, control de accesos y circulación en zonas de obra, condiciones de almacenamiento de materiales y cumplimiento de permisos de trabajo y de protección de peatones. No se identificaron condiciones inseguras que pudieran generar exposición a terceros ni indicios de incidentes cercanos con potencial de impacto, por lo que no fue necesario registrar desviaciones que ameriten acciones correctivas.

En el periodo analizado se mantuvo un desempeño de seguridad y salud en el trabajo conforme a las políticas y procedimientos del SG-SST, con la ausencia de accidentes laborales y de accidentes a terceros derivados de la ejecución del contrato SAMC-001-2025.

12.3 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO (SG-SST)

Teniendo en cuenta la normatividad vigente en materia de seguridad y salud en el trabajo (Decreto 1072 de 2015) establecida por el Ministerio de Trabajo, todos los empleadores deben implementar el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo (SG-SST) el cual "consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua, lo cual incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoría y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en los espacios laborales."

13. IMPOSICION DE MULTAS Y SANCIONES

Durante la ejecución del presente contrato de obra no se aplicaron multas ni sanciones.

14. PERMISOS Y LICENCIAS

14.1 LICENCIAS Y PERMISOS PARA EXPLOTACIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN

Se realizó la adquisición de los materiales de construcción como (arena y triturado), en canteras autorizadas por la Agencia Nacional de Minería que cuentan con los respectivos permisos y licencias de CORPORINOQUIA, vigentes a la fecha de adquisición de los materiales.

Para la ejecución del contrato de obra No. SAMC-001-2025, el contratista adquirió los materiales de construcción en las siguientes canteras (arena y triturado).

TIPO DE MATERIAL	CANTERA	LOCALIZACIÓN DE LA CANTERA	PERMISOS Y LICENCIAS		RESOLUCION DE CORPORINOQUIA	VIGENTE	
			Minero	Ambiental		SI	NO
Arena y Triturado	LUIS HERNANDO VALENCIA MORA	CUBARA	Concesión Minera N° CRM-202412041807-662038 del 04 de diciembre de 2024.		Corporinoquia Resolución N° 500.41.15.1867 del 29 de diciembre de 2015	X	

Tabla 13. Proveedores de materiales de cantera para la obra objeto del contrato No. SAMC-001-2025

En el **ANEXO 4** se presenta copia de las Resoluciones otorgadas por la Autoridad Ambiental competente para la explotación de materiales de construcción de las canteras.


14.2 OTROS PERMISOS REQUERIDOS

No se requieren ningún otro tipo de permisos para la ejecución del contrato de obra SAMC-001-2025.

15. CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPO EN OBRA

La supervisión verificó que el contratista utilizara en la ejecución de las actividades del contrato la maquinaria y equipo requerido según los APU y especificaciones técnicas del proyecto. Así mismo constató el estado físico y de operación de la maquinaria y equipo solicitando al contratista sustituirlo por mal estado o realizarle mantenimiento preventivo y/o correctivo, cada vez que fue necesario.

Por otro lado, la supervisión realizó un seguimiento y control a la maquinaria y equipos propios y/o alquilados por el contratista verificando que los seguros se encuentren vigentes y que se haya realizado la respectiva afiliación de los operarios al sistema de seguridad social y ARL.

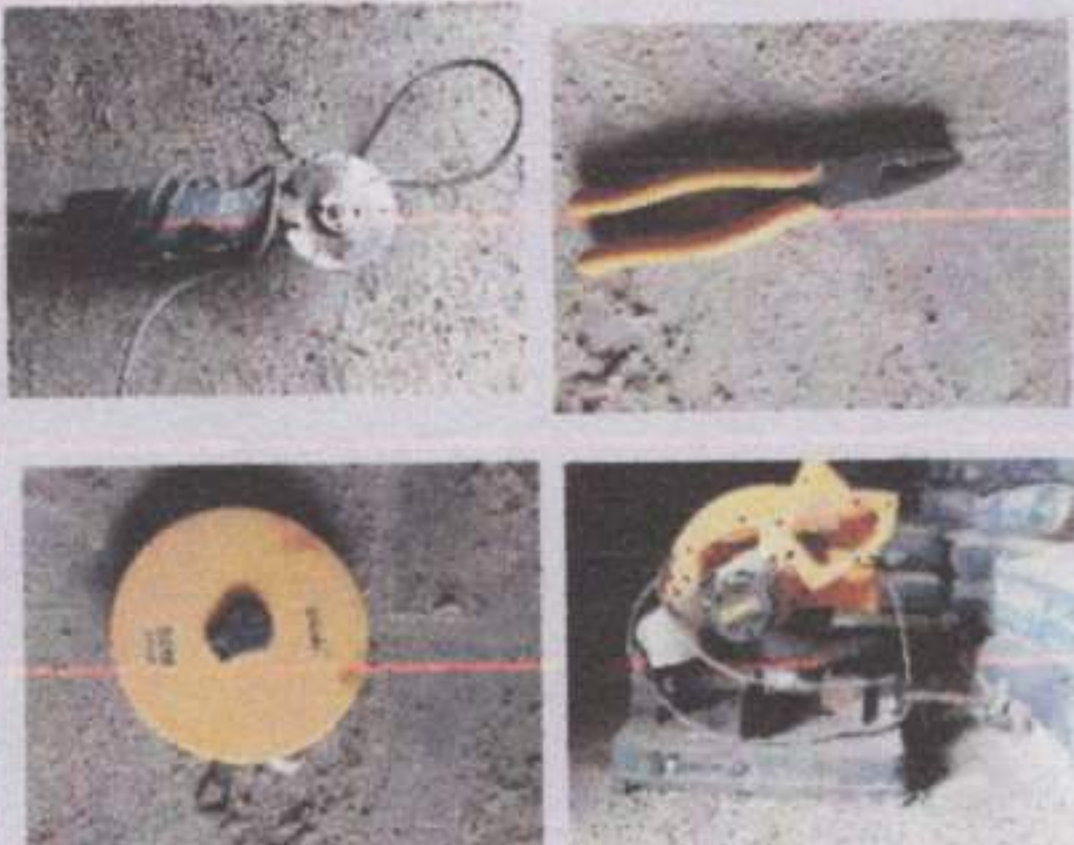DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ESTADO
Herramienta Menor 	GLOBAL	BUENO
Estación Topográfica (Ver certificado de Calibración – Anexo 2) 	1	BUENO
Mezcladora de concreto 	1	bueno

ACTIVIDAD	SEGUIMIENTO				OBSERVACIONES
	MES 1		MES 2		
	SI	NO	SI	NO	
se cuenta con los contratos de alquiler de la maquinaria y equipo que no son de su propiedad debidamente suscritos con terceros.		X		X	
Los operadores de la maquinaria y equipos se encuentran debidamente afiliados al sistema de seguridad social integral y ARL.	X		X		
Los vehículos maquinaria y equipo que el contratista tiene en la obra cumplen con los siguientes requisitos: • SOAT • Seguro contra todo riesgo • Tarjeta de propiedad • Licencia de conducción de la persona responsable	X		X		

Tabla 14. Seguimiento y control de la maquinaria y equipos utilizado en la ejecución del contrato del contrato No. SAMC-001-2025.

16. MANEJO DEL ANTICIPO

De acuerdo a la minuta del contrato en su cláusula sexta, numeral 2, PARÁGRAFO PRIMERO establece: (...) la entidad entregara anticipo del treinta (30%). del valor del contrato. El anticipo se tramitará previa solicitud del contratista y aceptación de las condiciones de la entidad para su entrega. En todo caso el anticipo estar sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado De Caja (PAC).

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS

VALOR DEL CONTRATO:	\$ 217.282.949,87
PORCENTAJE DEL ANTICIPO:	30%
VALOR DEL ANTICIPO PAGADO A LA FECHA:	\$ 65.184.884,96
FECHA DE PAGO:	28 de abril de 2025

Apertura de cuenta bancaria

ENTIDAD BANCARIA:	BBVA COLOMBIA
TITULAR:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO TRUJILLO DE LA FUENTE
CUENTA BANCARIA No.:	0842000200006073
FECHA DE APERTURA:	(21/02/2025)
NOMBRE DE LA CUENTA:	CONSTRUCCIONES Y SUMINISTRO TRUJILLO DE LA FUENTE
VALOR DEL ANTICIPO:	\$ 65.184.884,96
FECHA DE CONSIGNACIÓN DEL ANTICIPO:	28 de abril de 2025
VALOR CONSIGNADO A LA CUENTA:	\$ 65.184.884,96

a. Estado de la cuenta bancaria

Para el periodo del presente informe, la cuenta está cerrada.

ITEM	DESCRIPCIÓN	VALOR	PORCENTAJE
1	Compra de Materiales y Transporte	\$ 55.434.152,22	85%
2	Mano de obra	\$ 9.777.732,74	15%
TOTAL		\$ 65.184.884,96	100%

Tabla 15. Plan de inversión del anticipo inicial del contrato del contrato No. SAMC-001-2025.

b. Control de la inversión del anticipo

La inversión del anticipo se realizó conforme al Plan de Inversión aprobado por la supervisión; los desembolsos se han realizado de acuerdo a la programación de giros presentada por el contratista y los recursos se utilizaron para la ejecución de las actividades propias del contrato. La supervisión ha vigilado y controlado que el contratista utilice los recursos exclusivamente en la ejecución del contrato, conforme a lo estipulado en el plan de inversión del anticipo y ha verificado los soportes entregados por el contratista.

17. ASPECTOS TECNICOS

17.1 CONDICIONES CONTRACTUALES

El contrato de obra suscrito entre la alcaldía del municipio de Cubara y la firma contratista **CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S** contempla las siguientes actividades a desarrollar dentro del plazo contractual establecido de dos (02) meses.

CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)
1	SEDE I.E. SILENCIO- AULA				
1.1	PRELIMINARES				\$ 7,748,742.00
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	96.90	\$ 5,890.35	\$ 570,775.00
1.1.2	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1,50 M	ML	193.80	\$ 18,768.48	\$ 3,637,331.00
1.1.3	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL	M2	96.90	\$ 4,566.35	\$ 442,479.00
1.1.4	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	4.66	\$ 54,796.60	\$ 255,243.00
1.1.5	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA RELLENO	M3	31.88	\$ 89,181.06	\$ 2,842,914.00
1.2	ESTRUCTURAS EN ACERO				\$ 28,868,721.00
1.2.1	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (CORTE, FIGURADA Y AMARRE)	KG	2,712.04	\$ 9,878.46	\$ 26,790,749.00



CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO De La Fuente

CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)
1.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm	KG	252.69	\$ 8,223.56	\$ 2,077,972.00
1.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO				\$ 28,261,740.00
1.3.1	SOLADO DE LIMPIEZA E=0,05 EN CONCRETO DE 2000 PSI	M2	9.47	\$ 44,256.44	\$ 419,020.00
1.3.2	VIGAS DE AMARRE Y BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	8.12	\$ 1,036,954.55	\$ 8,423,182.00
1.3.3	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	2.01	\$ 1,402,798.08	\$ 2,823,833.00
1.3.4	VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3.41	\$ 1,807,644.20	\$ 6,164,790.00
1.3.5	PLACA BASE EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M	M2	82.02	\$ 108,621.67	\$ 8,909,149.00
1.3.6	BANCA, COTERO Y POYO EN CONCRETO DE 3000 PSI E=0.10 M	M2	13.20	\$ 115,285.34	\$ 1,521,766.00
1.4	MAMPOSTERIA				\$ 4,767,881.00
1.4.1	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 M	M2	76.63	\$ 62,220.73	\$ 4,767,881.00
1.5	CUBIERTA				\$ 23,089,761.00
1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA RECTANGULAR	KG	548.23	\$ 19,440.34	\$ 10,657,832.00
1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA CAL. 30	M2	112.00	\$ 99,435.25	\$ 11,136,748.00
1.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA CAL. 30	ML	11.20	\$ 115,641.20	\$ 1,295,181.00
1.6	CARPINTERIA METALICA				\$ 21,986,704.00
1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA CAL. 18	M2	3.45	\$ 484,611.26	\$ 1,671,909.00
1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA CORREDERA EN ALUMINIO NATURAL INCLUYE VIDRIO 5MM CON PELICULA DE SEGURIDAD	M2	25.00	\$ 567,976.61	\$ 14,199,415.00
1.6.3	MIRILLA RECTANGULAR ADYACENTE A PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO 5 MM	M2	1.05	\$ 475,247.23	\$ 499,010.00
1.6.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE REJILLAS DE VENTANAS EN TUBERÍA GALVANIZADA	M2	25.00	\$ 224,654.79	\$ 5,616,370.00
1.7	INSTALACIONES ELECTRICAS				\$ 17,607,084.00
1.7.1	CONEXIÓN MEDIDOR A TABLERO	ML	30.00	\$ 54,263.61	\$ 1,627,908.00
1.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"	ML	24.00	\$ 32,590.65	\$ 782,176.00
1.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CONDUIT DE 1/2"	ML	5.00	\$ 35,337.80	\$ 176,689.00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

Nit 901.878.498

ofitrujillodelafuentes@gmail.com

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16ª - 31

Saravena Arauca

CONDICIONES CONTRACTUALES					
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)
1.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA IMC DE 3/4"	ML	49.75	\$ 60,098.57	\$ 2,989,904.00
1.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MONOFASICO CON 08 CIRCUITOS TIPO ENCHUFABLE CON TOTALIZADOR	UND	1.00	\$ 263,311.16	\$ 263,311.00
1.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLO A TIERRA	UND	1.00	\$ 863,261.37	\$ 863,261.00
1.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER (1X20 A)	UND	3.00	\$ 39,298.29	\$ 117,895.00
1.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER (1X30 A)	UND	1.00	\$ 39,298.29	\$ 39,298.00
1.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED DE 40W - 30X120 CM	UND	6.00	\$ 313,954.94	\$ 1,883,730.00
1.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER RIEL MONOPOLAR 50 AMP (TOTALIZADOR)	UND	1.00	\$ 36,960.99	\$ 36,961.00
1.7.11	PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR TRIPLE CON LUZ PILOTO	UND	1.00	\$ 149,371.69	\$ 149,372.00
1.7.12	PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR CUADRUPLE CON LUZ PILOTO	UND	1.00	\$ 149,203.65	\$ 149,204.00
1.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION LED CONTINUUM SUPENDER 40W 4.000K	UND	8.00	\$ 624,107.30	\$ 4,992,858.00
1.7.14	PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE	UND	8.00	\$ 165,800.17	\$ 1,326,401.00
1.7.15	PUNTO ELECTRICO ILUMINACION	UND	14.00	\$ 157,722.54	\$ 2,208,116.00
1.8	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS				\$ 31,040,006.00
1.8.1	PAÑETE LISO SOBRE MURO E=1.5 CM	M2	169.11	\$ 36,935.39	\$ 6,246,092.00
1.8.2	FILOS Y DILATACIONES PARA VIGAS Y COLUMNAS A DOBLE CARA E=1.5 CM	ML	170.38	\$ 13,851.85	\$ 2,360,106.00
1.8.3	ESTUCO	M2	188.11	\$ 17,941.04	\$ 3,374,864.00
1.8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA 0.57X0.57 M	M2	93.72	\$ 110,460.63	\$ 10,352,568.00
1.8.5	PINTURA EN VINILO	M2	188.11	\$ 16,686.02	\$ 3,138,784.00
1.8.6	EMBONADO	M2	19.00	\$ 91,524.50	\$ 1,738,966.00
1.8.7	CARPETA DE NIVELACION	M3	82.02	\$ 46,679.18	\$ 3,828,626.00
TOTAL COSTO DIRECTO					\$ 163,370,639.00
ADMINISTRACION 24%					\$ 39,208,953.36
IMPREVISTO 2%					\$ 3,267,412.78
UTILIDAD 7%					\$ 11,435,944.73
TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 53,912,310.87
COSTO TOTAL					\$ 217,282,949.87

Tabla 16. Condiciones contractuales iniciales del Contrato de Obra No. Samc-001-2025.

18. CANTIDADES DE OBRA EJECUTADA PARA EL INFORME # 02

Para el periodo de corte acta final de obra, se han ejecutado las siguientes cantidades para cada uno de los ítems del contrato:

CONDICIONES CONTRACTUALES										ACTA DE AVANCE DE OBRA (1)		ACTA DE AVANCE DE OBRA (2)		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)
1.1	PRELIMINARES														
1.1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	96,90	\$ 5.890,35	\$ 570.775,00	96,90	\$ 570.775,00	0,00	\$ 0,00	96,90	\$ 570.774,92				
1.1.2	CERRAMIENTO EN VARA ROLLIZA Y LONA H=1,50 M	ML	193,80	\$ 18.768,48	\$ 3.637.331,00	193,80	\$ 3.637.331,00	0,00	\$ 0,00	193,80	\$ 3.637.331,42				
1.1.3	DESCAPOTE Y LIMPIEZA MANUAL	M2	96,90	\$ 4.566,35	\$ 442.479,00	94,70	\$ 432.433,00	0,00	\$ 0,00	94,70	\$ 432.433,35				
1.1.4	EXCAVACION EN MATERIAL COMUN	M3	4,66	\$ 54.796,60	\$ 255.243,00	0,00	\$ 0,00	4,66	\$ 255.243,00	4,66	\$ 255.242,56				
1.1.5	SUMINISTRO, EXTENDIDA Y COMPACTACION DE MATERIAL PARA RELLENO	M3	31,88	\$ 89.181,06	\$ 2.842.914,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.2	ESTRUCTURAS EN ACERO														
1.2.1	ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (CORTE, FIGURADA Y AMARRE)	KG	2.712,04	\$ 9.878,46	\$ 26.790.749,00	1.000,48	\$ 9.883.202,00	1.711,56	\$ 16.907.547,00	2.712,04	\$ 26.790.748,84				
1.2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE MALLA ELECTROSOLDADA S=150x150mm, Ø=6x6mm	KG	252,69	\$ 8.223,56	\$ 2.077.972,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00				
1.3	ESTRUCTURAS EN CONCRETO														
1.3.1	SOLADO DE LIMPIEZA E=0,05 EN CONCRETO DE 2000 PSI	M2	9,47	\$ 44.256,44	\$ 419.020,00	0,00	\$ 0,00	9,47	\$ 419.020,00	9,47	\$ 419.019,97				
1.3.2	VIGAS DE AMARRE Y BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	8,12	\$ 1.036.954,55	\$ 8.423.182,00	0,00	\$ 0,00	8,12	\$ 8.423.182,00	8,12	\$ 8.423.181,81				
1.3.3	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	2,01	\$ 1.402.798,08	\$ 2.823.833,00	0,00	\$ 0,00	2,01	\$ 2.823.833,00	2,01	\$ 2.823.832,54				
1.3.4	VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3,41	\$ 1.807.644,20	\$ 6.164.790,00	0,00	\$ 0,00	3,41	\$ 6.164.790,00	3,41	\$ 6.164.789,78				

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

NIT 901.878.498

ofitrujillodelafuentes@gmail.com

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16° - 31

Saravena Arauca

CONDICIONES CONTRACTUALES										ACTA DE AVANCE DE OBRA (1)		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)	CANTIDAD	VALOR TOTAL (\$)
1.5	CUBIERTA												
1.5.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA METALICA RECTANGULAR	KG	548,23	\$ 19.440,34	\$ 10.657.832,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.5.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CUBIERTA EN TEJA TERMOACUSTICA CAL. 30	M2	112,00	\$ 99.435,25	\$ 11.136.748,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.5.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CABALLETE EN TEJA TERMOACUSTICA CAL. 30	ML	11,20	\$ 115.641,20	\$ 1.295.181,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.6	CARPINTERIA METALICA												
1.6.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE PUERTA EN LAMINA CAL. 18	M2	3,45	\$ 484.611,26	\$ 1.671.909,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.6.2	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA CORREDERA EN ALUMINIO NATURAL INCLUYE VIDRIO 5MM CON PELICULA DE SEGURIDAD	M2	25,00	\$ 567.976,61	\$ 14.199.415,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.6.3	MIRILLA RECTANGULAR ADYACENTE A PUERTA CON MARCO DE ALUMINIO Y VIDRIO 5 MM	M2	1,05	\$ 475.247,23	\$ 499.010,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE REJILLAS DE VENTANAS EN TUBERIA GALVANIZADA	M2	25,00	\$ 224.654,79	\$ 5.616.370,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.7	INSTALACIONES ELECTRICAS												
1.7.1	CONEXION MEDIDOR A TABLERO	ML	30,00	\$ 54.263,61	\$ 1.627.908,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.7.2	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CONDUIT DE 3/4"	ML	24,00	\$ 32.590,65	\$ 782.176,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.7.3	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC CONDUIT DE 1/2"	ML	5,00	\$ 35.337,80	\$ 176.689,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.7.4	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA IMC DE 3/4"	ML	49,75	\$ 60.098,57	\$ 2.989.904,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.7.5	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO MONOFASICO CON 08 CIRCUITOS TIPO ENCHUFABLE CON TOTALIZADOR	UND	1,00	\$ 263.311,16	\$ 263.311,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.7.6	SUMINISTRO E INSTALACION DE POLO A TIERRA	UND	1,00	\$ 863.261,37	\$ 863.261,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.7.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER (1X20 A)	UND	3,00	\$ 39.298,29	\$ 117.895,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.7.8	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER (1X30 A)	UND	1,00	\$ 39.298,29	\$ 39.298,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00
1.7.9	SUMINISTRO E INSTALACION PANEL LED DE 40W - 30X120 CM	UND	6,00	\$ 313.954,94	\$ 1.883.730,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00	0,00	\$ 0,00

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

NIT 901.878.498

ofitrujillodelafuentes@gmail.com

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16ª - 31

Saravena Arauca

CONDICIONES CONTRACTUALES										ACTA DE AVANCE DE OBRA (1)		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL (\$)	CANTIDAD		VALOR TOTAL (\$)		CANTIDAD		VALOR TOTAL (\$)	
1.7.10	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER RIEL MONOPOLAR 50 AMP (TOTALIZADOR)	UND	1,00	\$ 36.960,99	\$ 36.961,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00	
1.7.11	PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR TRIPLE CON LUZ PILOTO	UND	1,00	\$ 149.371,69	\$ 149.372,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00	
1.7.12	PUNTO ELECTRICO INTERRUPTOR CUADRUPLIE CON LUZ PILOTO	UND	1,00	\$ 149.203,65	\$ 149.204,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00	
1.7.13	SUMINISTRO E INSTALACION LED CONTINUUM SUPENDER 40W 4.000K	UND	8,00	\$ 624.107,30	\$ 4.992.858,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00	
1.7.14	PUNTO ELECTRICO TOMACORRIENTE MONOFASICO DOBLE	UND	8,00	\$ 165.800,17	\$ 1.326.401,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00	
1.7.15	PUNTO ELECTRICO ILUMINACION	UND	14,00	\$ 157.722,54	\$ 2.208.116,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00	
1.8	ACABADOS Y RECUBRIMIENTOS												
1.8.1	PAÑETE LISO SOBRE MURO E=1.5 CM	M2	169,11	\$ 36.935,39	\$ 6.246.092,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00	
1.8.2	FILOS Y DILATACIONES PARA VIGAS Y COLUMNAS A DOBLE CARA E=1.5 CM	ML	170,38	\$ 13.851,85	\$ 2.360.106,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00	
1.8.3	ESTUCO	M2	188,11	\$ 17.941,04	\$ 3.374.864,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00	
1.8.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE DE PISO EN CERAMICA 0.57X0.57 M	M2	93,72	\$ 110.460,63	\$ 10.352.568,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00	
1.8.5	PINTURA EN VINILO	M2	188,11	\$ 16.686,02	\$ 3.138.784,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00	
1.8.6	EMBONADO	M2	19,00	\$ 91.524,50	\$ 1.738.966,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00	
1.8.7	CARPETA DE NIVELACION	M3	82,02	\$ 46.679,18	\$ 3.828.626,00	0,00		\$ 0,00		0,00		\$ 0,00	
COSTO DIRECTO DE LA OBRA					\$ 163.370.639,00			\$ 38.101.629,00				\$ 38.101.629,00	

Tabla 17. Cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No. SAMC-001-2025 en el presente informe

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

Nit 901.878.498

ofitrujillodelafuentes@gmail.com

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16° - 31

Saravena Arauca

19. AVANCE DE LA OBRA

19.1 AVANCE FÍSICO DE LA OBRA

De acuerdo a las cantidades de obra ejecutadas en el periodo, se presenta un avance de obra acumulado del 32.21%, equivalente a la totalidad de las actividades establecidas en la minuta del contrato.



Gráfico 1. Avance Físico del contrato de obra No. SAMC-001-2025

19.2 AVANCE DEL PLAZO CONTRACTUAL

Con respecto al plazo contractual inicial, de dos (02) meses establecidos en la minuta del contrato y un adicional de un (01) mes, han transcurrido dos (02) meses desde la fecha de inicio hasta la fecha

de corte del presente informe, lo cual equivale a un 32.21% del total del plazo ejecutado, ejecutando las actividades del contrato antes del tiempo estipulado para dicha ejecución.

En cuanto al estado del tiempo para el periodo del presente informe el clima presentado durante la ejecución de las actividades fue variable para el desarrollo de las actividades del contrato permitiendo cumplir con la programación establecida.

PLAZO CONTRACTUAL	DOS (02) MESES
TIEMPO SUSPENDIDO	CERO (0) DIAS
PLAZO ADICIONADO	UN (01) MES
PLAZO EJECUTADO	DOS (02) MESES
PLAZO POR EJECUTAR	UN (01) MES
% PLAZO EJECUTADO	67.00%

Tabla 18. Plazo Contractual

20. PROGRAMACION DE LA OBRA

Para el control de la programación, se presentó a la supervisión el respectivo cronograma de trabajo con cada uno de los ítems a ejecutar, con el cual la supervisión hizo seguimiento semanal y mensual al avance en la ejecución de todas las actividades y del contrato en general constatando que se realiza la obra con anticipación de la fecha propuesta por la administración, a continuación, se evidencian las actividades ejecutadas para el presente informe final.

21. DESCRIPCION DE ELEMENTOS ESTRUCTURALES EJECUTADOS

1.1.4 EXCAVACION EN MATERIAL COMUN

la excavación en material de suelo común, siguiendo meticulosamente las líneas y niveles establecidos en el replanteo para garantizar la precisión y exactitud del trabajo. La ejecución se llevó a cabo mediante el uso de maquinaria manual, que permitió una mayor precisión en el retiro del material y facilitó el control en las áreas específicas delimitadas para la excavación. Durante el proceso, se realizaron inspecciones constantes para verificar que las dimensiones y pendientes coincidieran con los planos y especificaciones técnicas previamente diseñadas.

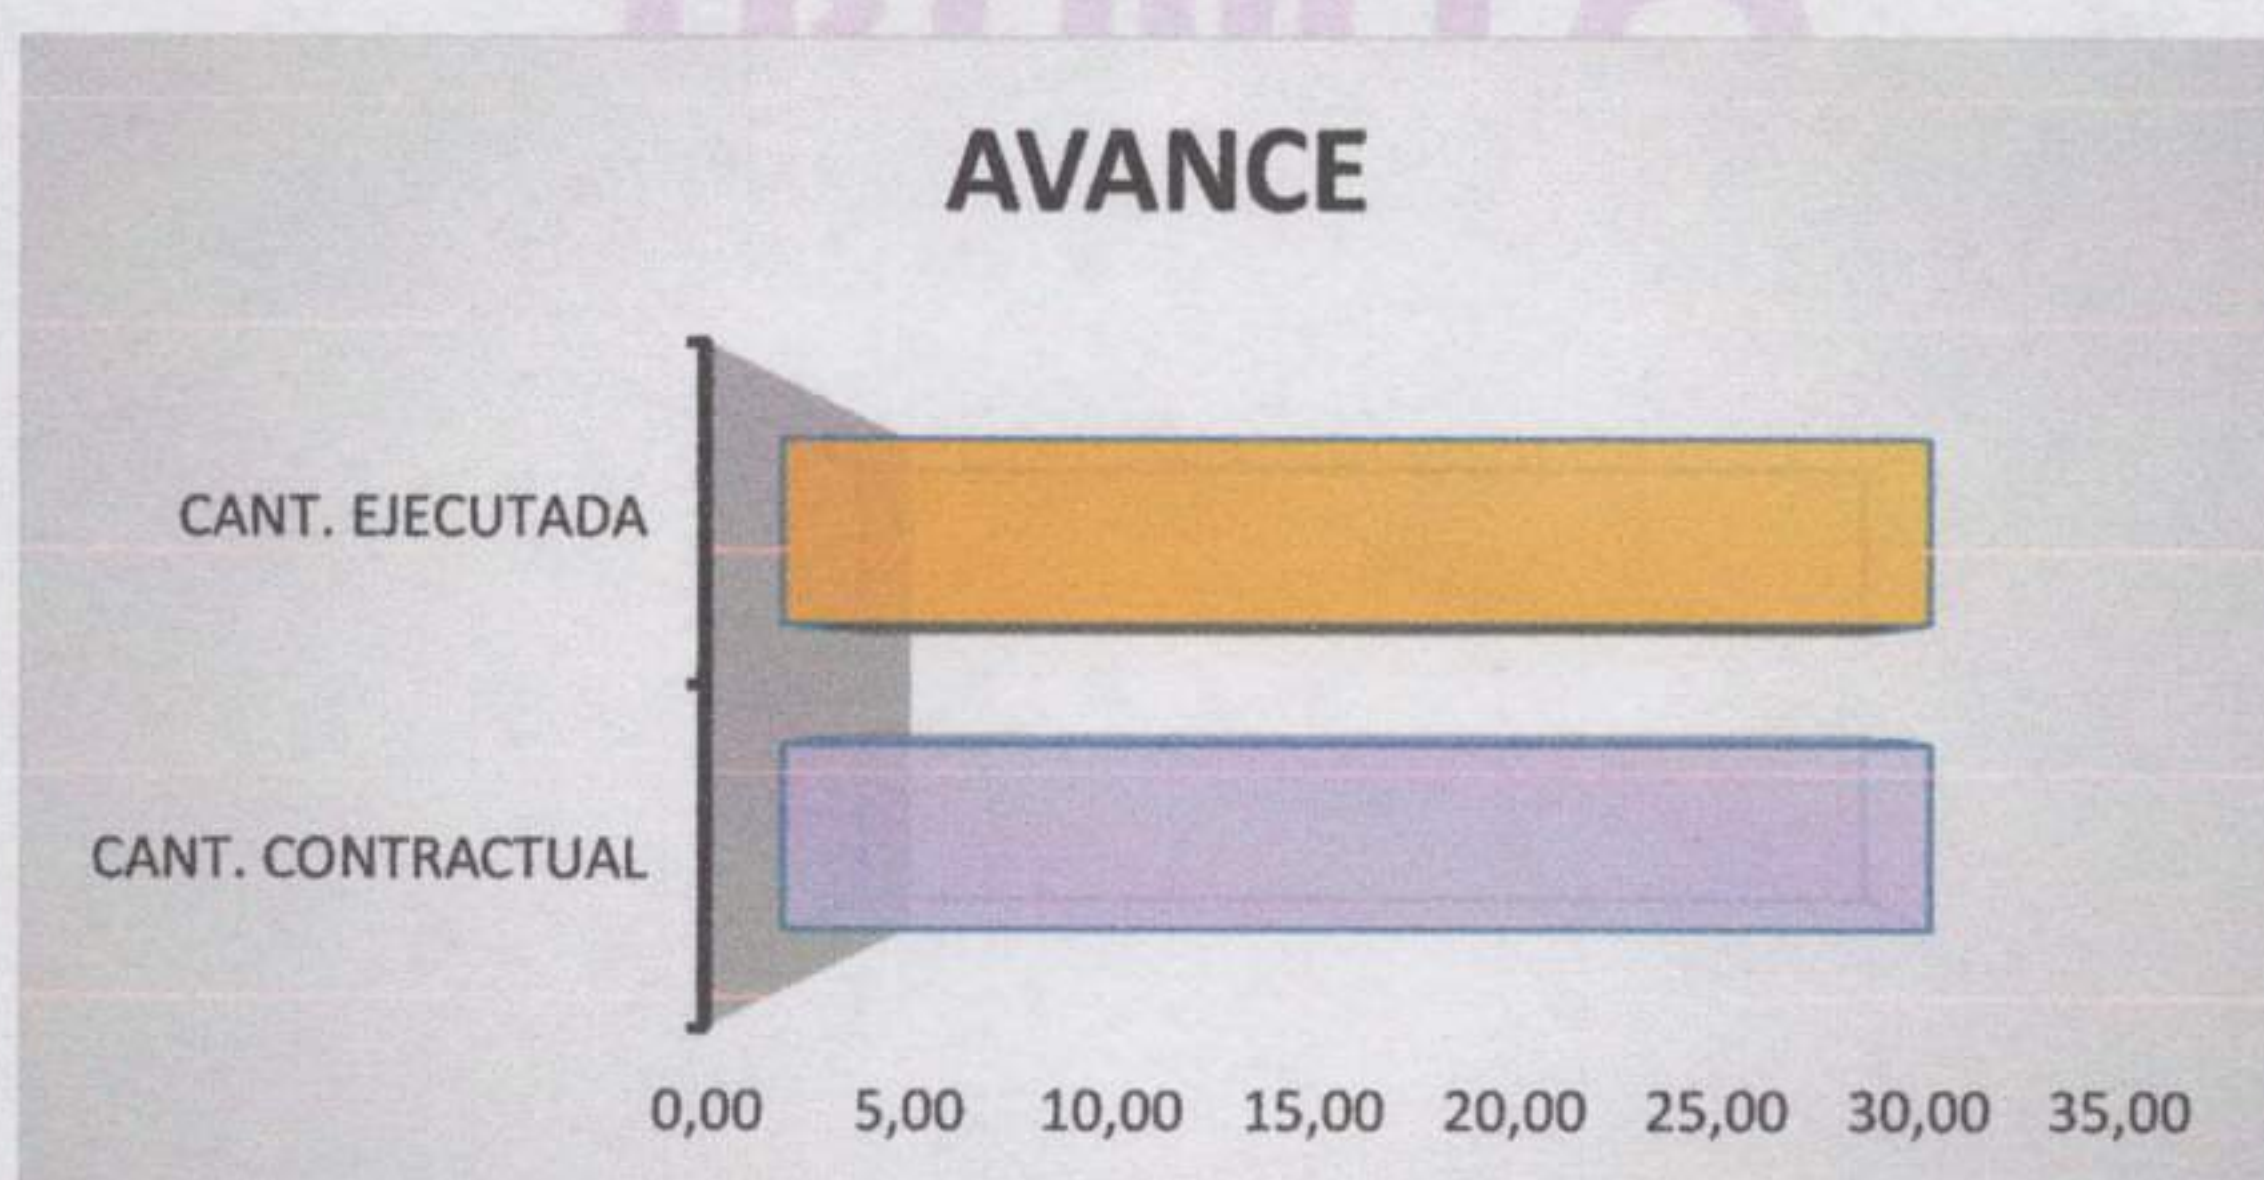


Tabla 19. EXCAVACION EN MATERIAL COMUN.

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. MAYORES Y/O MENORES	(+/-)	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
M3	4,66		=	4,66	100.00%

1.2 ESTRUCTURAS EN ACERO

1.2.1 ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (CORTE, FIGURADA Y AMARRE)

se realizó la recepción del acero de refuerzo, que fue suministrado en forma de varillas de diferentes longitudes, de acuerdo con los planos estructurales previamente aprobados. Una vez recibido el material, se procedió a revisar las especificaciones para verificar que las varillas cumplieran con las características de resistencia y dimensiones requeridas.

Posteriormente, se inició el proceso de corte, en el cual se utilizaron herramientas especializadas como cizallas hidráulicas o, en algunos casos, sopletes, para obtener las longitudes exactas indicadas en los planos. Durante esta etapa, se prestó especial atención a la precisión del corte para evitar errores que pudieran afectar la integridad estructural. Luego, se procedió a la figurada del acero de refuerzo, donde se doblaron y formaron las varillas según las formas requeridas para los diferentes elementos estructurales, como vigas y columnas. Este proceso incluyó el doblado preciso y la conformación de curvas, respetando las curvas y anclajes diseñados, así como las especificaciones para las conexiones y refuerzos internos.

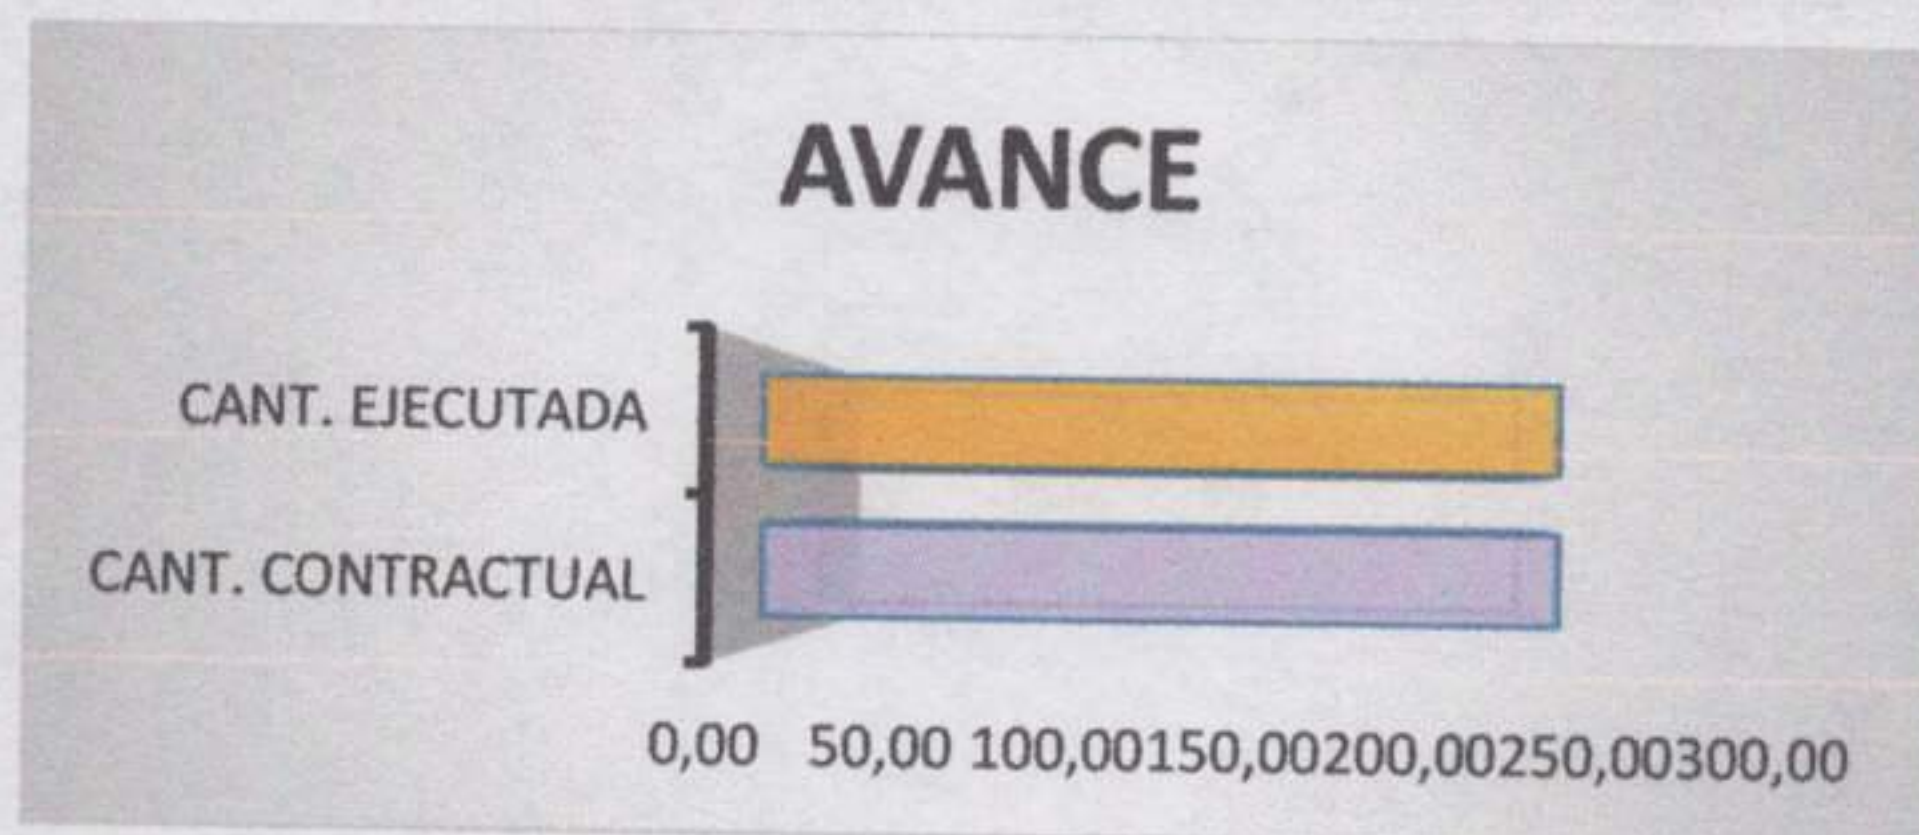


Tabla 20. ACERO DE REFUERZO 60.000 PSI (CORTE, FIGURADA Y AMARRE).

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. MAYORES Y/O MENORES	(+/-)	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
KG	2.712,04		=	1.711,56	63.11%

1.3 ESTRUCTURAS EN CONCRETO

1.3.1 SOLADO DE LIMPIEZA E=0,05 EN CONCRETO DE 2000 PSI

El solado de limpieza se elaboró mediante un proceso cuidadoso y meticuloso que garantizó la durabilidad y resistencia de la estructura. En primer lugar, se realizó la preparación del terreno, la cual consistió en la excavación y nivelación del área destinada al solado, asegurando una superficie uniforme y estable. Posteriormente, se llevó a cabo la compactación del suelo mediante maquinaria, logrando una espesor adecuado que minimizara posibles asentamientos futuros. Para optimizar la estabilidad del solado, se humedeció el suelo de manera controlada, facilitando la adhesión y la compactación efectiva del material. Luego, se colocó una capa de base de nivelación, la cual sirvió como respaldo uniforme para la capa de concreto. La base fue extendida y nivelada cuidadosamente, asegurando que cumpliera con las pendientes y dimensiones requeridas.



AVANCE

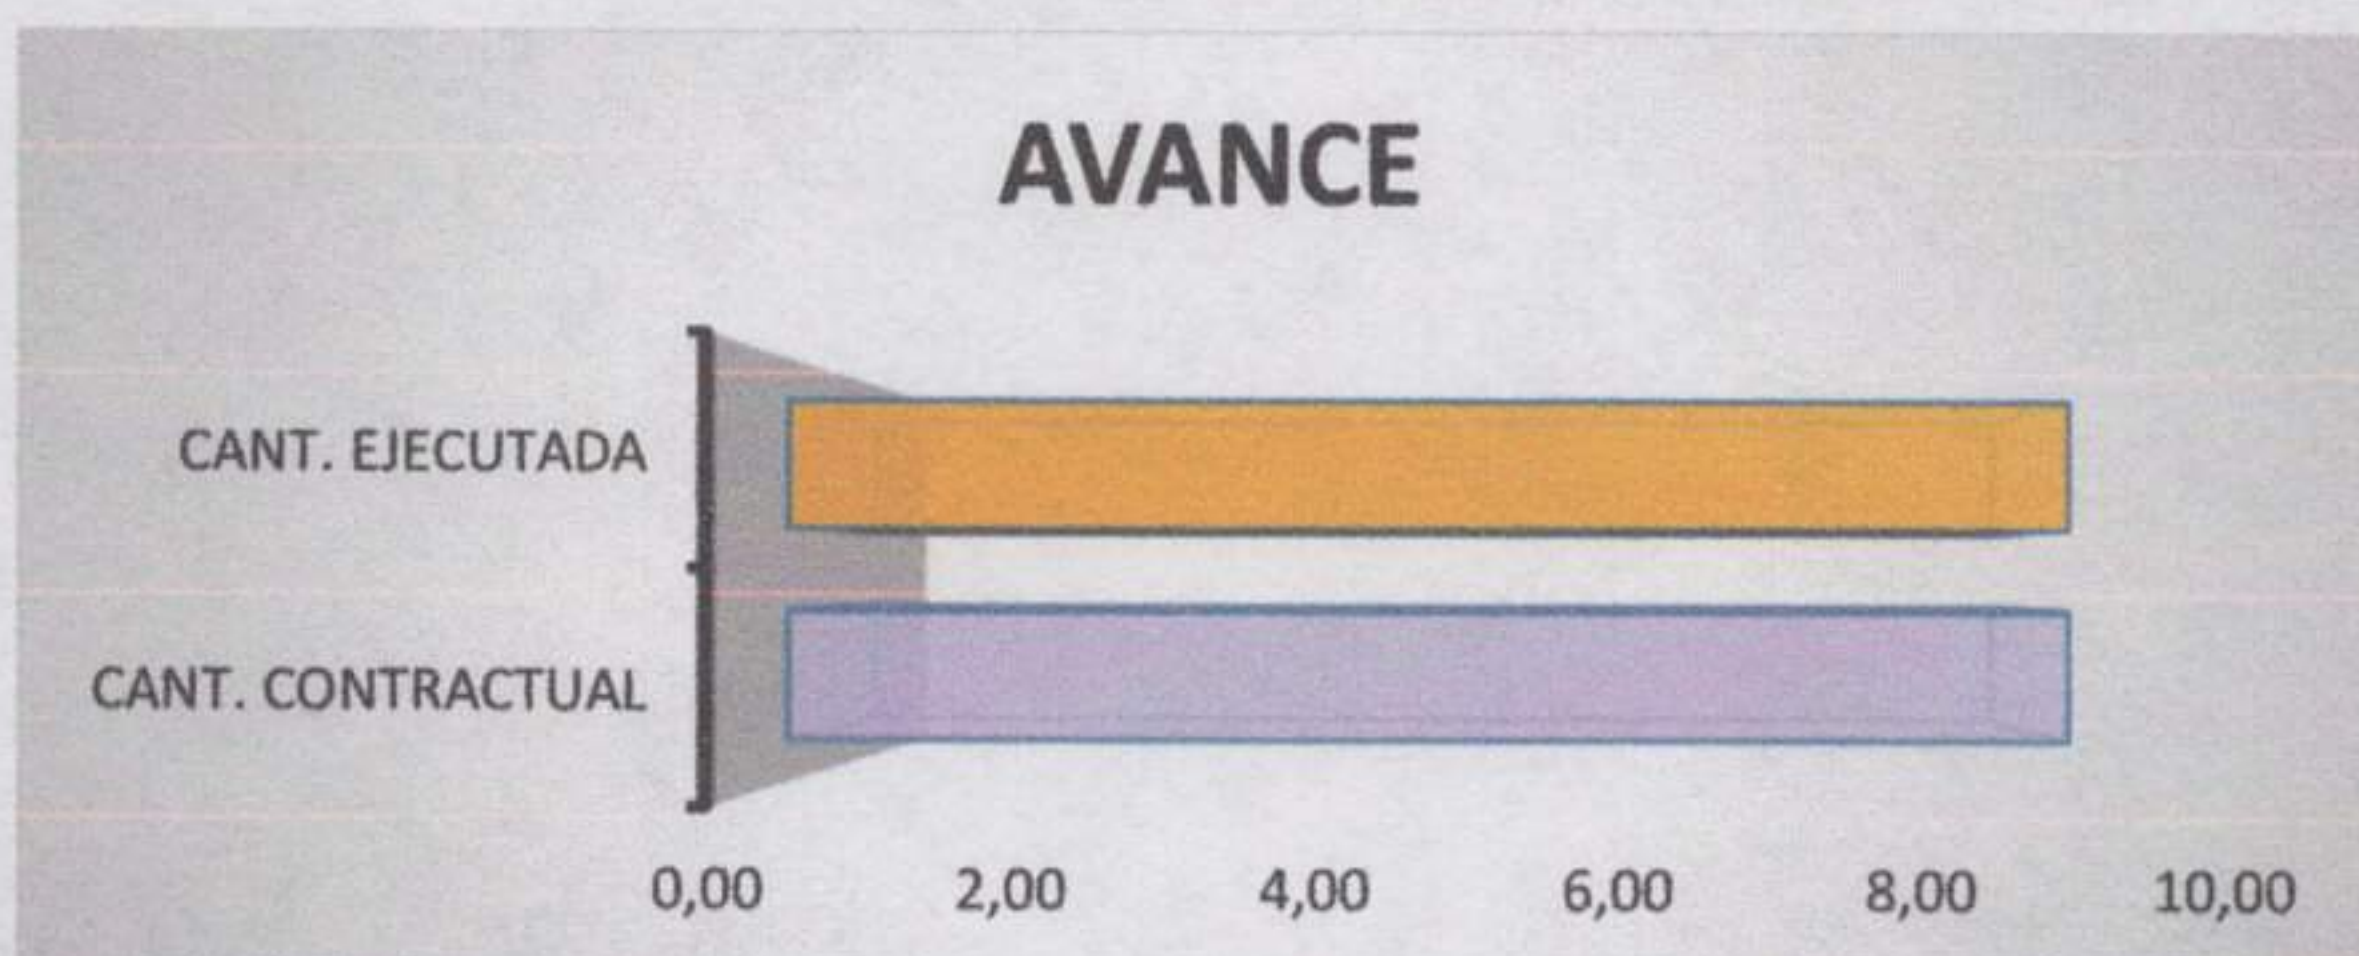


Tabla 21. SOLADO DE LIMPIEZA E=0,05 EN CONCRETO DE 2000 PSI .

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. MAYORES Y/O MENORES	(+/-)	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
M2	9,47		=	9,47	100.00%

1.3.2 VIGAS DE AMARRE Y BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO

Se elaboraron y construyeron las vigas de amarre y los bordillos utilizando concreto de 3000 PSI, siguiendo meticulosamente las dimensiones especificadas en los planos estructurales para garantizar la precisión y la resistencia requerida. La preparación de los encofrados se realizó con madera de alta calidad, cortada y ensamblada con cuidado para asegurar su correcta alineación, nivelación y estabilidad durante el proceso de vertido del concreto. Antes de verter, se verificó minuciosamente la ubicación y las dimensiones, realizando ajustes necesarios para cumplir con las especificaciones del proyecto. La mezcla se vertió cuidadosamente en los encofrados en varias capas, permitiendo que cada una se asentara correctamente antes de añadir la siguiente. Durante el vertido, se utilizó un vibrador de concreto de forma continua para eliminar cualquier aire atrapado y asegurar una consolidación adecuada, logrando una estructura sólida, uniforme y resistente.

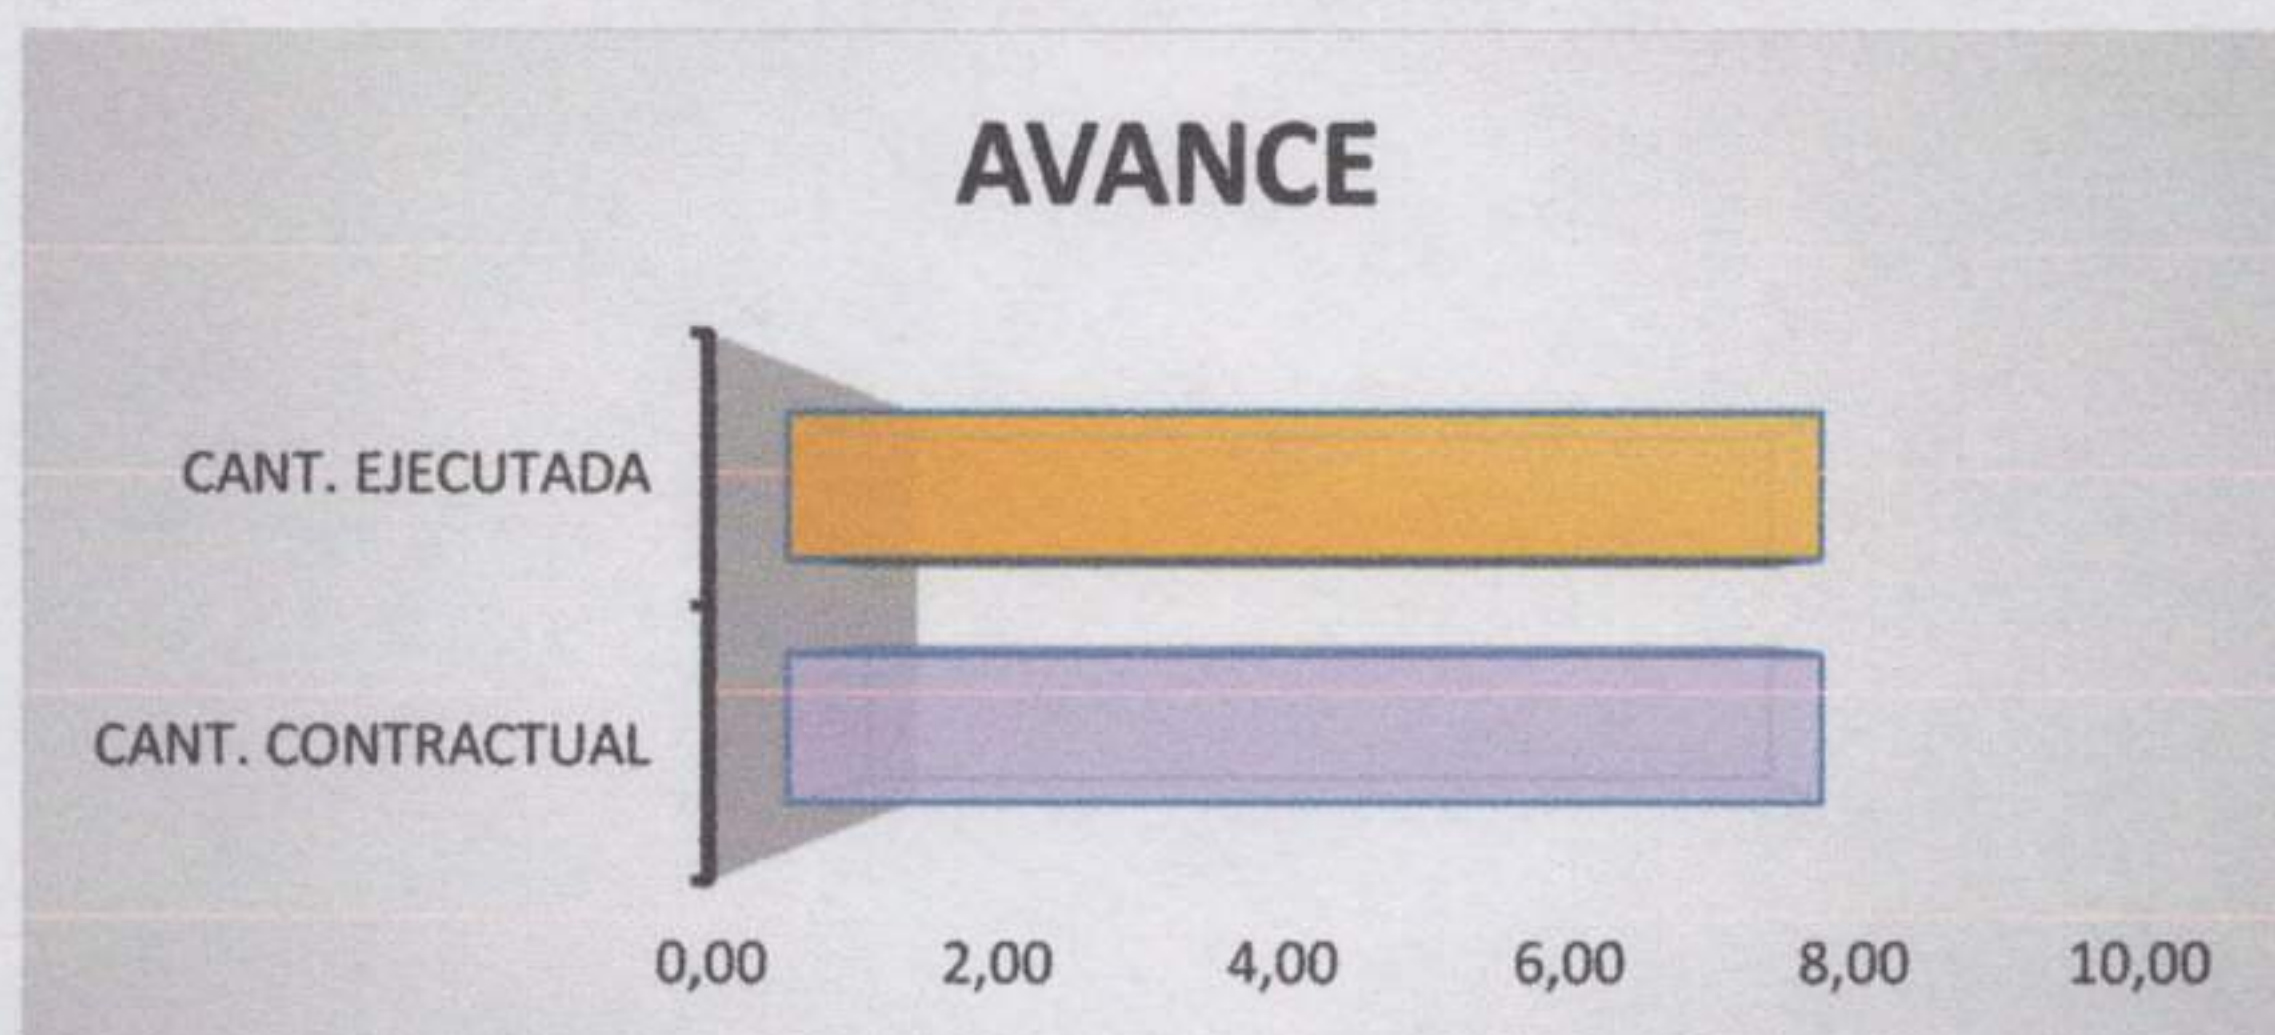


Tabla 22. VIGAS DE AMARRE Y BORDILLOS EN CONCRETO DE 3000 PSI MOVIMIENTO DE TIERRAS Y ESTRUCTURAS EN CONCRETO.

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. MAYORES Y/O MENORES	(+/-)	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
M3	8,12		=	8,12	100.00%

1.3.3 COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

La construcción de las columnas de concreto de 3000 PSI se realizó mediante un proceso meticuloso y controlado, siguiendo estrictamente los planos y especificaciones técnicas del proyecto. Se elaboró y preparó previamente el área de trabajo, asegurando que la superficie estuviera limpia y libre de residuos que pudieran afectar la adherencia del concreto. Se construyeron y colocaron los encofrados en los lugares señalados, los cuales fueron fabricados con materiales resistentes y se ajustaron con precisión para cumplir con la forma y dimensiones establecidas en los planos. Posteriormente, se colocaron las armaduras de refuerzo, verificando su correcta colocación, amarre y separación, conforme a las indicaciones del ingeniero y planos estructurales. Una vez asegurada la correcta ubicación de las armaduras, se procedió a preparar la mezcla de concreto, la cual fue diseñada para alcanzar una resistencia de 3000 PSI. La mezcla se vertió cuidadosamente en los encofrados en varias capas, permitiendo que cada una se asentara correctamente antes de añadir la siguiente. Durante el vertido, se utilizó un vibrador de concreto de forma continua para eliminar cualquier aire atrapado y asegurar una consolidación adecuada, logrando una estructura sólida, uniforme y resistente. Todo el proceso se realizó siguiendo los protocolos de seguridad y calidad establecidos en la obra, garantizando la durabilidad y estabilidad de las columnas construidas.

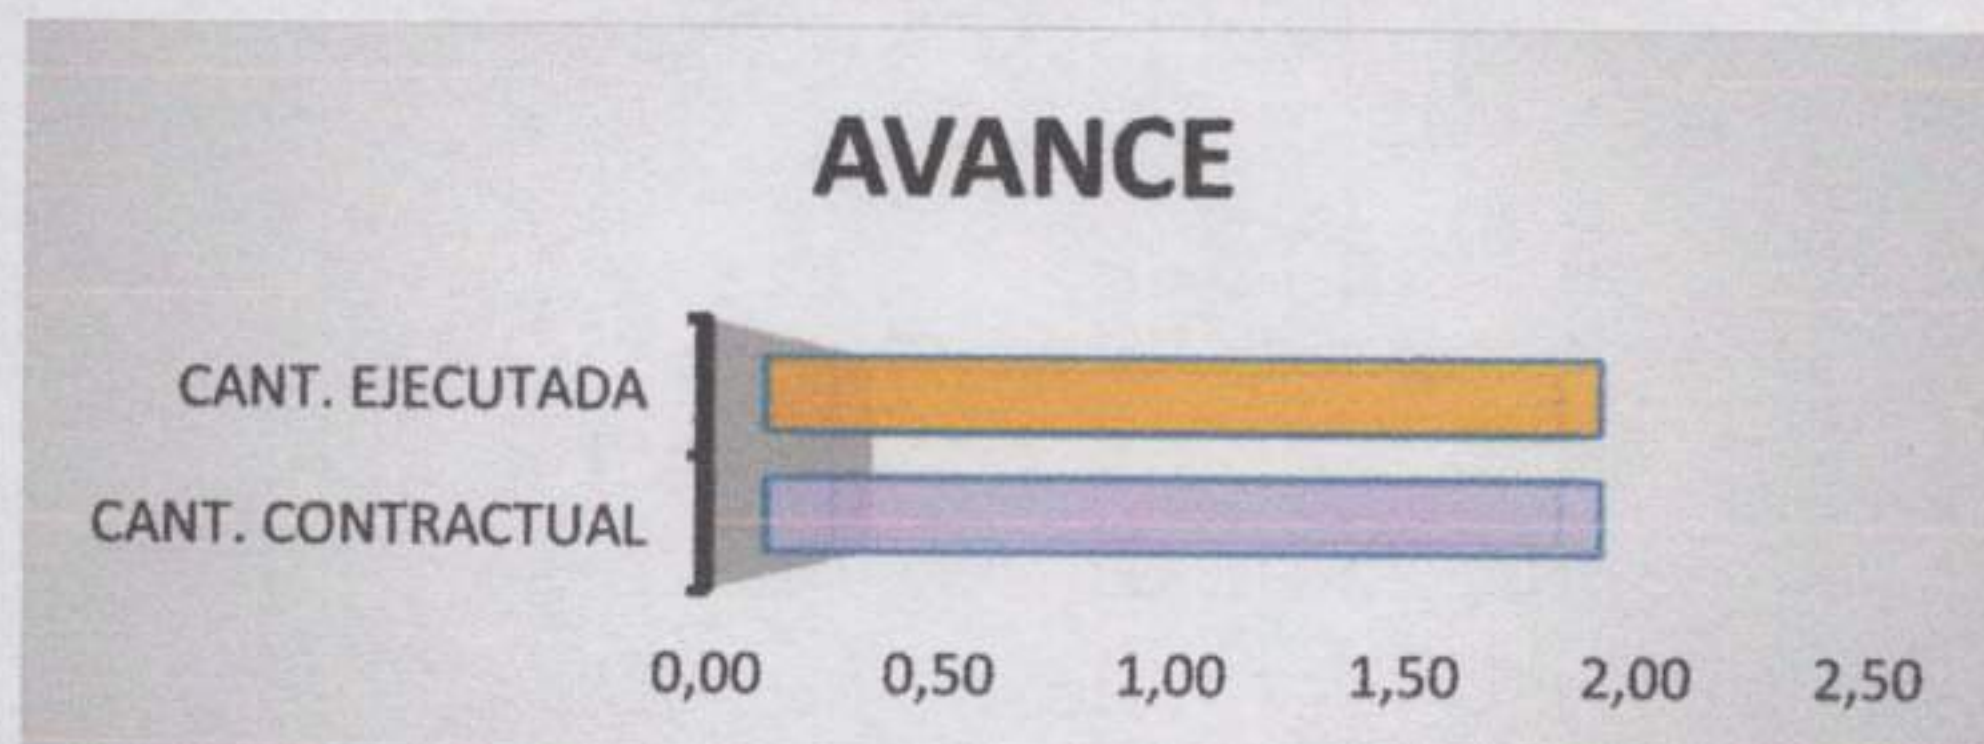


Tabla 23. COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI.

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. MAYORES Y/O MENORES	(+/-)	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
M3	2,01		=	2,01	100.00%

1.3.4 VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI

Se fundieron las vigas aéreas de concreto de 3000 PSI mediante un proceso meticuloso y controlado para garantizar su calidad y precisión. Primero, se fabricaron los moldes específicos que cumplieran con las dimensiones y formas establecidas en los planos estructurales, asegurando así la uniformidad y compatibilidad en toda la estructura. Posteriormente, se colocaron las armaduras de refuerzo en doble capa, cuidando que cada una estuviera correctamente posicionada y sujeta con amarres adecuados, lo que permitió mantenerlas en su lugar durante todo el proceso de vaciado. La mezcla de concreto, diseñada con una resistencia de 3000 PSI, fue preparada en cantidades precisas y vertida con cuidado en los moldes, evitando que se produjeran segregaciones o irregularidades. Durante el vertido, se utilizó un vibrador de acero para consolidar el concreto, eliminando cualquier vacío interno y garantizando una adherencia perfecta entre la mezcla y las armaduras. Finalmente, se permitió que las vigas fraguaran y curaran de manera adecuada, asegurando su resistencia y durabilidad para el uso estructural previsto.

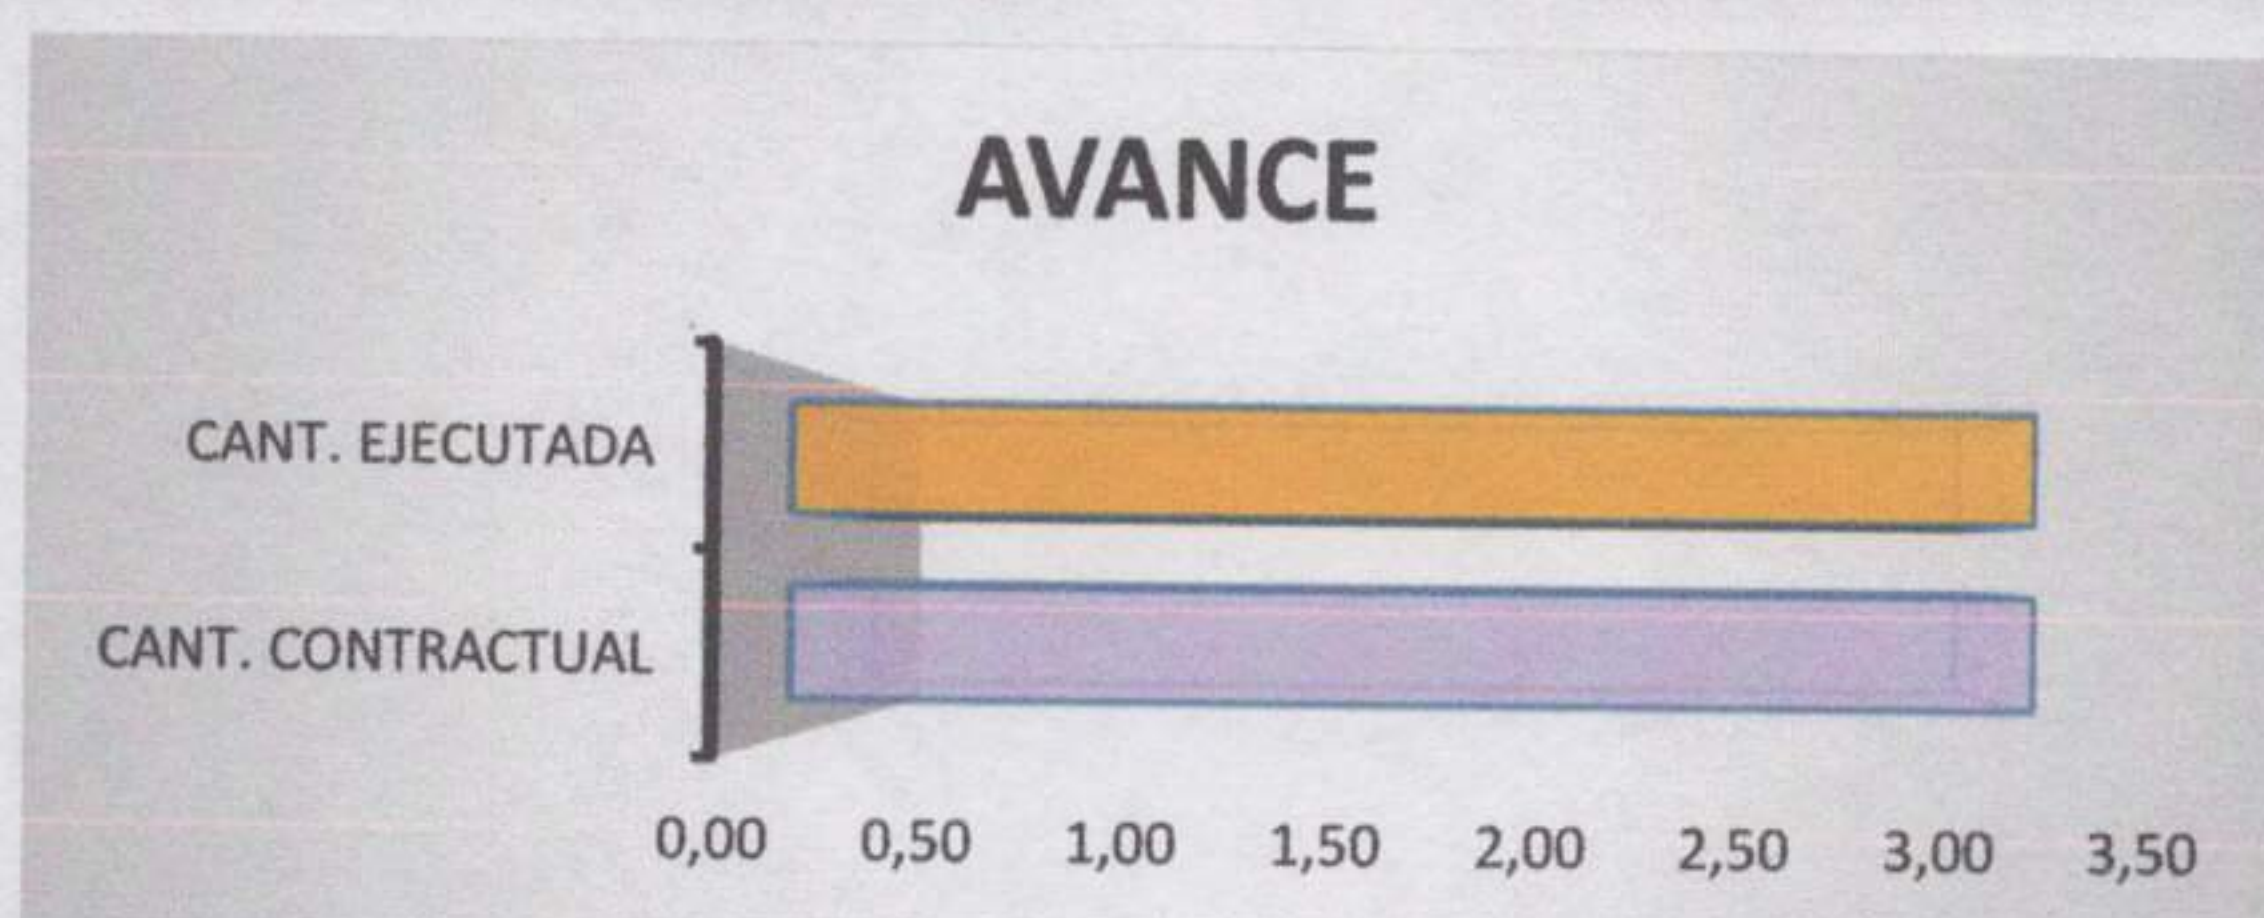


Tabla 24. VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 3000 PSI.

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. MAYORES Y/O MENORES	(+/-)	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
M3	3,41		=	3,41	100.00%

1.4 MAMPOSTERIA

1.4.1 MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 M

la construcción del muro de bloque No. 5 siguiendo estrictamente el diseño estructural y arquitectónico previamente establecido. Para ello, se seleccionaron bloques de concreto con un espesor de 0.12 metros, asegurando su calidad y resistencia conforme a las especificaciones técnicas del proyecto. La colocación de los bloques se realizó en hiladas, utilizando mortero de cemento y arena en proporciones adecuadas para garantizar la adherencia y durabilidad del muro. Durante el proceso, se emplearon niveles y plomadas para verificar en todo momento la correcta alineación vertical y horizontal, logrando así una estructura recta y uniforme. Cada bloque fue asentado con precisión, cuidando que las juntas de mortero quedaran uniformes, completas y sin espacios excesivos, para evitar posibles fisuras o debilidades estructurales. Además, se prestó especial atención a la limpieza de las superficies de contacto y al control de la humedad del mortero para facilitar un mejor asentamiento.

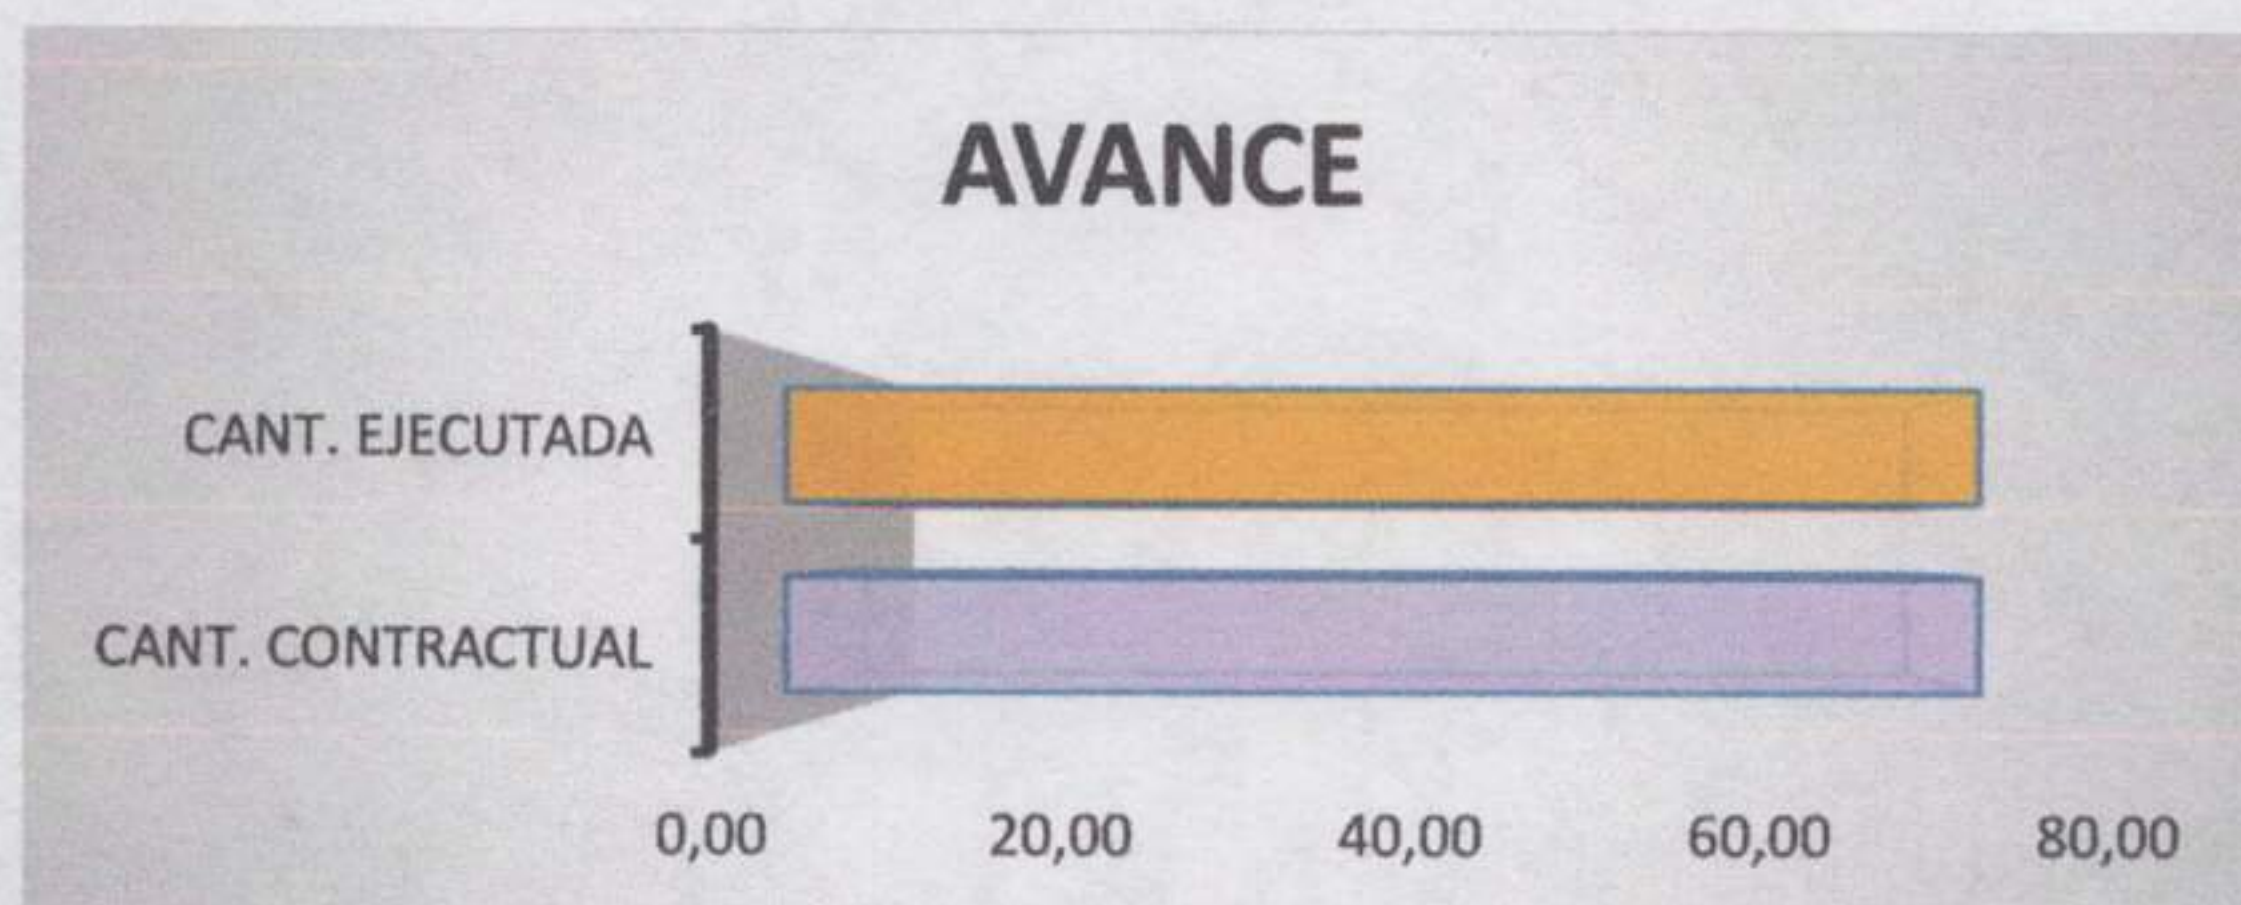




Tabla 25. MURO EN BLOQUE No. 5 E=0.12 M .

UNIDAD	CANTIDAD CONTRACTUAL	CANT. MAYORES Y/O MENORES	(+/-)	CANTIDAD EJECUTADA PRESENTE INFORME	% EJECUTADO
M2	76,63		=	50,00	65.25%

22. CONCLUSIONES

- Hasta la fecha, el avance físico de la obra alcanza un porcentaje del 32.21% respecto al cronograma establecido, demostrando un cumplimiento parcial de las actividades programadas.
- La ejecución de los trabajos cumple con las especificaciones técnicas y normativas aplicables, garantizando la calidad y seguridad de la obra.
- Se proyecta continuar con las actividades programadas, priorizando la coordinación y supervisión para mantener el ritmo de avance y cumplir con los plazos establecidos.

Diana Carolina Fuentes

DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA
CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE S.A.S
Representante Legal

Tatiana Contreras

ING TATIANA MERCEDES CONTRERAS BELTRAN
MP. 68202-334789
RESIDENTE DE OBRA

	SEGUIMIENTO TECNICO	LT-ST-F003
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA CONT. DE OBRA No. SAMC-001-2025	Versión No. 01

ACTA No. 1 COMITÉ DE OBRA
FECHA DE LA REUNION: 21 DE MARZO DE 2025

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA:

PRESENTAR A CONTINUACIÓN LAS OBSERVACIONES TÉCNICAS Y OPERATIVAS CONSTATADAS EN CAMPO, JUNTO CON LAS PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN DE ALCANCE QUE REQUIEREN LA REVISIÓN Y APROBACIÓN DEL COMITÉ DE OBRA PARA LA CORRECTA CONTINUIDAD Y SEGURIDAD DE LA INTERVENCIÓN.

LOCALIZACION DEL PROYECTO: AULA ESCOLAR EN LA SEDE EDUCATIVA EL SILENCIO DE LA INSTITUCIÓN EDUCATIVA KERÁ SHIKARÁ

PLAZO DE EJECUCION: DOS (02) MESES

FECHA DE INICIO: 06 DE MARZO DE 2025

FECHA DE TERMINACION: 04 DE MAYO DE 2025

VALOR DEL CONTRATO: \$ 217,282,949.87

1. ASISTENTES

NOMBRE	CARGO	ENTIDAD
Diana Carolina Fuentes	Representante Legal	C.S. Trujillo de la fuente
Tatiana Contreras	Ing Residente	C.S. Trujillo de la f.

	SEGUIMIENTO TECNICO	LT-ST-F003
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA CONT. DE OBRA No. SAMC-001-2025	Versión No. 01

ACTA No. 1 COMITÉ DE OBRA
FECHA DE LA REUNION: 21 DE MARZO DE 2025

--	--	--

2. INTRODUCCIÓN

Se da apertura a la reunión por parte del contratista de obra, quien presenta el orden del día, centrado en dos aspectos:

- Revisión de antecedentes y hallazgos técnicos en campo.
- Análisis de las propuestas de modificación y alcance.
- Evaluación del impacto en presupuesto y cronograma.
- Aprobación de las modificaciones y adendas correspondientes.
- Revisión de actualización de planos y documentación técnica.
- Conclusiones y próximos pasos

3. DESARROLLO DEL COMITÉ

- **ANTECEDENTES Y HALLAZGOS TÉCNICOS** Se presentaron las observaciones constatadas en campo, destacando:
 - La reducción en la ejecución del ítem 1.1.3 (descapote y limpieza manual), debido a la menor cantidad de material vegetal y residuos en el área intervenida.
 - La solicitud del personal docente para cancelar la instalación del ítem 1.6.3 (mirilla rectangular con marco de aluminio y vidrio de 5 mm), por motivos de seguridad y control de acceso. Se propone ampliar la cantidad del ítem 1.6.1 (puerta en lámina CAL. 18) para mantener la funcionalidad.
 - La dificultad en adquirir el componente 1.7.12 (interruptor cuádruple con luz piloto), que ha salido del mercado. Se propone instalar por dos interruptores dobles que cumplan con la misma función siendo el mismo valor de los dos por el interruptor cuádruple.
 - El ajuste del ítem 1.6.2 (suministro e instalación de ventana corredera en aluminio natural, con vidrio de 5 mm y película de seguridad) se realiza de acuerdo al diseño original. La construcción contempla en cada sección dos ventanas corredizas; sin embargo, debido a la altura y a la garantía del material para mayor rigidez y durabilidad, se propone dejar una sección fija en la parte superior, reduciendo únicamente la altura de las ventanas sin modificar las cantidades iniciales ni el valor total.

4. PROPUESTAS DE MODIFICACIÓN Y RECOMENDACIONES

- Modificación en el alcance del ítem 1.1.3 para reprogramar la limpieza y descapote solo en zonas con material a retirar.
- Cancelación del ítem 1.6.3, con incremento en el alcance del ítem 1.6.1, previa revisión técnica.

	SEGUIMIENTO TECNICO	LT-ST-F003
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA CONT. DE OBRA No. SAMC-001-2025	Versión No. 01

ACTA No. 1 COMITÉ DE OBRA

FECHA DE LA REUNION: 21 DE MARZO DE 2025

- Intercambiar por la instalación de dos interruptores dobles, por el cuádruple sin modificar su valor ni especificaciones técnicas.
- Evaluación del impacto en costos y cronograma, requiriéndose las adendas pertinentes.
- Actualización de planos, memorias de cálculo y especificaciones técnicas, para reflejar las modificaciones aprobadas.

5. CONCLUSIÓN Y ACUERDOS:

El Comité aprueba en forma unánime las propuestas de modificación presentadas, considerando que garantizan la seguridad, funcionalidad y continuidad de la obra, así como la compatibilidad técnica y presupuestal. Se autoriza la expedición de las adendas correspondientes y la actualización de la documentación técnica.


Por otra parte, se concluye que no se requerirá una adición al presupuesto contractual, ni la creación de ítem no previstos al contrato.

6. SOLICITUD DE APROBACIÓN

Se solicita al supervisor y a las instancias correspondientes la aprobación formal de las modificaciones propuestas, para proceder con la revisión, ajuste y ejecución de las actividades en concordancia con los nuevos alcances.


7. FIRMAS

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad de los participantes:



DIANA CAROLINA FUENTES MOJICA

R/L Construcciones Y Suministros Trujillo De La Fuente
Contratista



ING TATIANA MERCEDES CONTRERAS BELTRAN

ARQ. JESUS IVAN QUIÑONEZ RUEDA
Supervisor del Contrato



CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
TRUJILLO
De La Fuente

ANEXO

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS
TRUJILLO
De La Fuente

CONSTRUCCIONES Y SUMINISTROS TRUJILLO DE LA FUENTE

Nit 901.878.498

ofitrujillodelafuentes@gmail.com

Cel 3115894460 Calle 22 No. 16ª - 31

Saravena Arauca

[illegible]

[illegible]

[illegible]
