

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 1 de 40

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CICHM412 de 2023

INFORME DE INTERVENTORIA No. 3


MENSUAL

☒

FINAL

☐

Objeto Contrato: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y ALGECIRAS - DEPARTAMENTO DEL HUILA.

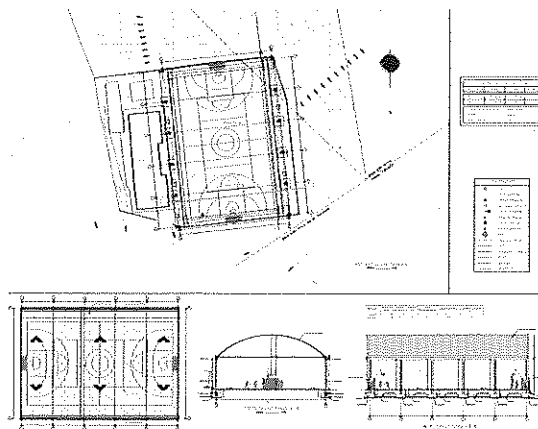

MUNICIPIO: GIGANTE – HUILA.

DEPARTAMENTO: HUILA

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
 Neiva-Huila

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023			Página 2 de 40

CONTRATO DE INTERVENTORIA No. CICHM412 de 2023 CELEBRADO ENTRE EL INSTITUTO DEPARTAMENTAL DEL DEPORTE, LA EDUCACIÓN FÍSICA, LA RECREACIÓN Y EL APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE DEL HUILA - "INDERHUILA" Y WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA

APOYO A LA SUPERVISIÓN		ING. CÉSAR JOAQUÍN VELASQUEZ TIQUE		ENTIDAD		INDERHUILA	
1. INFORMACIÓN DEL CONTRATO INTERVENTORIA							
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.		CICHM412 de 2023					
OBJETO		INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA A DOS (2) CONTRATOS DE OBRA PÚBLICA A NIVEL DEPORTIVO LOCALIZADA EN EL MUNICIPIO DE GIGANTE Y ALGECIRAS - DEPARTAMENTO DEL HUILA.			PERIODO DEL INFORME		Entre 01 al 30 de octubre de 2024
CONTRATISTA		WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA			NIT:		80.926.744-7
REPRESENTANTE LEGAL:		N/A			C.C:		80.926.744
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):			14/11/2023				
FECHA DE INICIO (D/M/A):			05/12/2023				
PLAZO INICIAL			EL PLAZO ESTIMADO PARA LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO SERÁ DE TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES.				
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):			N/A				
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):			UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS (29/10/2024).				
PLAZO TOTAL:			CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.				
VALOR INICIAL:			SETENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$78.095.342,00) M/CTE				
VALOR ADICIONAL (SI APLICA):			N/A				
VALOR TOTAL:			SETENTA Y OCHO MILLONES NOVENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS (\$78.095.342,00) M/CTE				
2. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA							
CONTRATO DE OBRA No.		418 DE 2023					
OBJETO:		CONSTRUCCIÓN DE CUBIERTA AUTOPORTANTE CON ILUMINACION PARA LA INSTITUCION EDUCATIVA JOSE MIGUEL MONTALVO, DEL MUNICIPIO DE GIGANTE - DEPARTAMENTO DEL HUILA					
CONTRATISTA		CONSORCIO GIGANTE C&M			NIT:		901.774.181- 4.
REPRESENTANTE LEGAL:		CARLOS FELIPE DUSSAN NAVARRO			C.C:		7.711.971
FECHA SUSCRIPCIÓN (D/M/A):			22/11/2023				

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2 Página 3 de 40
Fecha Aprobación: 13/02/2023			


FECHA DE INICIO (D/M/A):	05/12/2023
PLAZO INICIAL	TRES (3) MESES, CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIO, PREVIO EL CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCIÓN Y APROBACIÓN DE LOS DOCUMENTOS PREVISTOS EN EL PLIEGO DE CONDICIONES. SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL.
PLAZO ADICIONAL (No.1) (D/M/A):	UN (1) MES Y QUINCE (15) DÍAS (29/10/2024).
PLAZO TOTAL:	CUATRO (4) MESES Y QUINCE (15) DÍAS.
VALOR INICIAL:	CUATROCIENTOS NOVENTA Y CINCO MILLONES SEICIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS OCHENTA PESOS (\$495.688.780,00) M/CTE
VALOR ADICIONAL:	CUARENTA Y CINCO MILLONES CIENTO CUARENTA Y NUEVE MIL OCHOCIENTOS VEINTE PESOS (\$45.149.820,00) M/CTE
VALOR TOTAL:	QUINIENTOS CUARENTA MILLONES OCHOCIENTOS TREINTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS PESOS (\$540.838.600,00) M/CTE

3. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se encuentra ubicado en el Municipio de Gigante, departamento del Huila; Gigante es un municipio ubicado en el departamento de Huila. Esta localizado al centro oriente. Hace parte de la región andina, sobre la margen izquierda del río Magdalena entre la cordillera occidental y el cerro Matambo. Su extensión territorial es de 626 km², su altura es de 860 msnm y su temperatura promedio es de 24 °C. El casco urbano del municipio está localizado en la parte noreste del departamento (Región Sub-centro). Su economía se basa principalmente en el sector agrícola (principalmente café y cacao), la ganadería, piscicultura, la extracción de petróleo y generación de energía eléctrica; ya que es parte del área de influencia de la represa del Quimbo con un 43,91 % (Porcentaje del embalse o cuenta en el área del municipio). Es conocida como «Capital Cacaotera del Huila».


El proyecto es en el Colegio Agrícola; Este colegio está ubicado dentro del casco urbano del municipio de Gigante, para acceder se debe tomar la calle 4 hacia el oriente, hasta llegar a la carrera 15, las vías son pavimentadas, y se considera de fácil acceso.

HUILA EN COLOMBIA

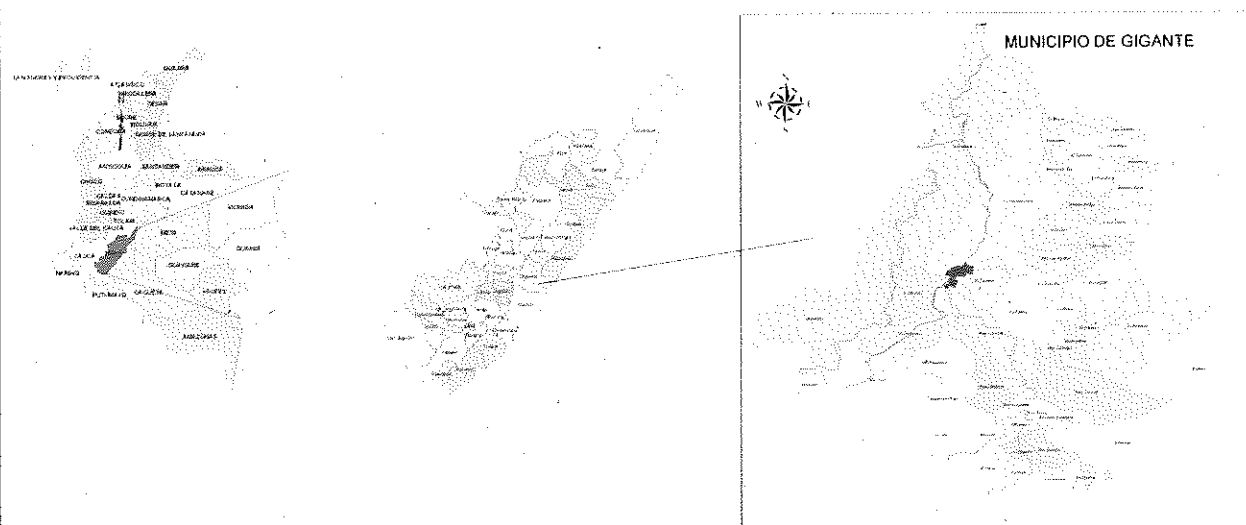

Fuente 1 Gobernación del Huila

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2 Página 4 de 40

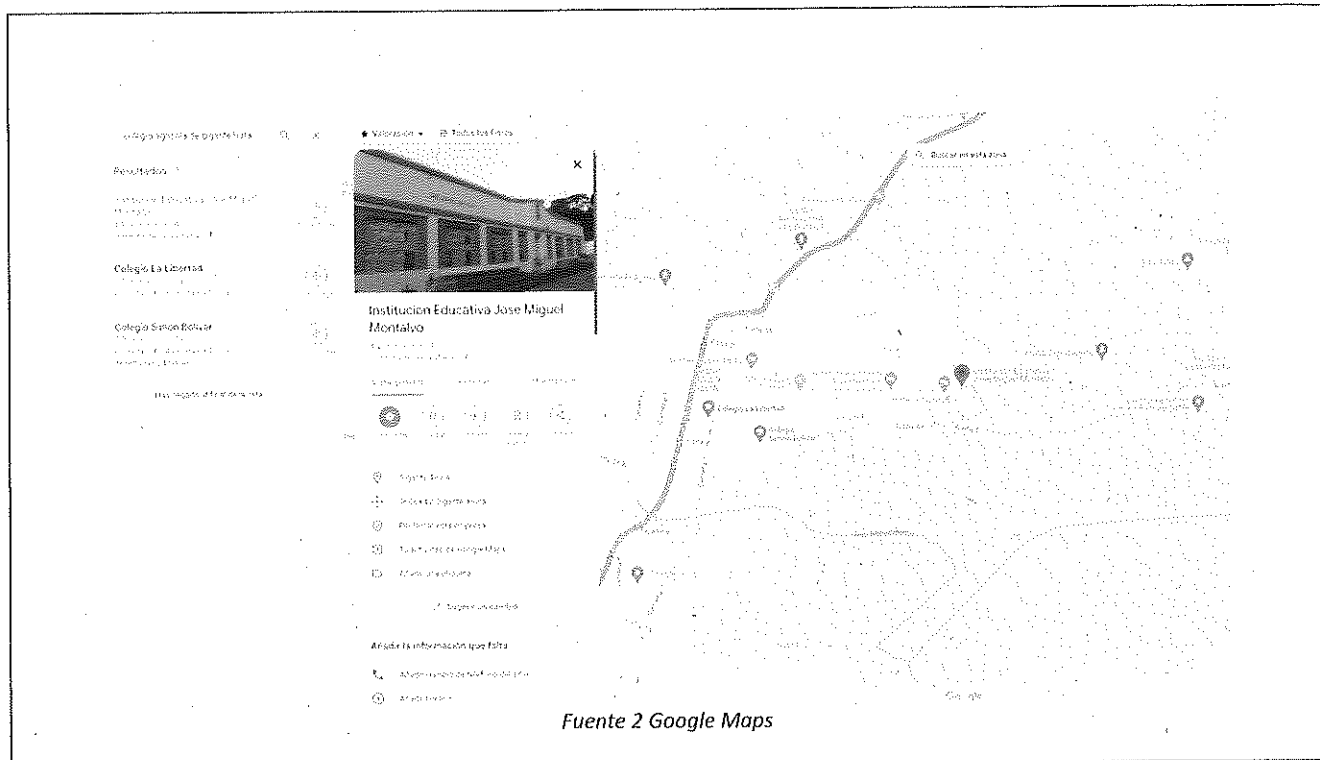

4. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El proyecto al cual se le realizará la interventoría tiene como finalidad la construcción una cubierta para cancha multifuncional, según especificaciones descritas en el anexo técnico del contrato de obra, por el cual se tiene estipulado los siguientes capítulos:

1. ACTIVIDADES PRELIMINARES
2. CONCRETOS
3. ESTRUCTURA METÁLICA - CUBIERTA
4. ACABADOS - PLACA EN CONCRETO
5. INSTALACIONES HIDROSANITARIAS
6. INSTALACIONES ELECTRICAS
7. TRANSPORTE

Los lineamientos generales tienen por objeto describir todos los aspectos que paralelamente con las especificaciones técnicas se deben desarrollar para lograr la calidad exigida por el Inderhuila.

Por lo tanto, los lineamientos generales hacen parte integral del manual de especificaciones y su cumplimiento son de carácter obligatorio.

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 5 de 40
Fecha Aprobación: 13/02/2023		

5. DESCRIPCION DEL AVANCE MENSUAL DE OBRA

Durante el periodo comprendido entre el 01 al 30 de octubre de 2024 se viene realizando la ejecución de la actividad de:

Localización y replanteo ejecutado en el mes de octubre del 2024:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Localización y replanteo	76,05 m2	12,41%

Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante ejecutada en el mes de octubre 2024:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	51,80 m2	11,04%

Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada ejecutada en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	44,42 ml	15,14%

Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente ejecutada en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	44.23 m3	23.82%

Cerramiento provisional en lona verde ejecutada en el mes de octubre:

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE INTERVENTORIA	
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Código: IDH-CGID-F06 Versión: 2 Página 6 de 40

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Cerramiento provisional en lona verde	57.24 m	100%

Retiro trampolín piscina ejecutada en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Retiro trampolín piscina	1 und	100%

Solado en concreto de limpieza 2000 PSI e = 0.05 mts ejecutado en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Solado en concreto de limpieza 2000 PSI e = 0.05 mts	8.00 m2	11.41%

Construcción de zapatas en concreto 3000 PSI ejecutadas en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	20.80 m3	64.10%

Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño ejecutadas en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	12.16 m3	64.30%

Acero de refuerzo $F_y=60.000$ P.S.I. viga de cimentación ejecutadas en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Acero de refuerzo $F_y=60.000$ P.S.I. viga de cimentación.	624.92 kg	48.97%

Acero de refuerzo $F_y=60.000$ P.S.I. columnas ejecutadas en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
-----------	----------	-------------

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 7 de 40
Fecha Aprobación: 13/02/2023		

Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas.	3,009.85 kg	89.18%
--	-------------	--------

Corte de placa en concreto ejecutadas en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas.	3,009.85 kg	89.18%

Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües ejecutadas en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües.	62.30 m	100.00%

Caja de inspección en concreto de F'c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms, con espesores de paredes de 0.10 mts. Según diseño ejecutadas en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Caja de inspección en concreto de F'c=2500 PSI, de sección 0.70*0.70, H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms, con espesores de paredes de 0.10 mts. Según diseño	5.00 und	71.43%

Suministro e instalación de tubería hidráulica 1" presiones ejecutadas en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de tubería hidráulica 1" presión	62.30 m	100.00%

Suministro e instalación de tubería hidráulica 2" presiones ejecutadas en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Desmonte de marcos canchas existentes.	2 und	100,00%

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 8 de 40
Fecha Aprobación: 13/02/2023		

Transporte de materiales pétreos ejecutada en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Transporte de materiales pétreos.	906.51 m3-Km	11.29%

6. HISTORIA CRONOLOGICA DEL PROYECTO

ACTIVIDAD	FECHA (dd/mm/aaaa)	DÍAS DE EJECUCION TRANSCURRIDOS	DÍAS DE SUSPENSION TRANSCURRIDOS	NUEVA FECHA DE TERMINACION (dd/mm/aaaa)
Iniciación	05/12/2023			04/03/2024
Suspensión No. 1	28/12/2023	23		
Reinicio No. 1	26/08/2024		242	02/11/2024
Informe no. 2	30/09/2024	35		02/11/2024
Adición de tiempo No. 1 (1 mes y 15 días)	29/10/2024	29		17/12/2024
Informe no. 3	30/10/2024	1		
TOTAL, DIAS		88	242	

7. ACTAS (Relación de las diferentes actas: acta de Inicio, acta de Suspensión, acta de Reinicio, actas de Modificación, actas de obra ejecutada, actas de modificación y acta de recibo final.)

Tipo de Acta	No.	Fecha
ACTA DE INICIO	01	05/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	01	28/12/2023
ACTA DE SUSPENSIÓN	01	28/12/2023
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	02	28/12/2023
ACTA DE REUNIÓN	02	02/05/2024
ACTA DE REUNIÓN	03	28/05/2024
ACTA DE REUNIÓN	04	12/06/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN DE REINICIO	03	26/08/2024
ACTA DE REINICIO	01	26/08/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN – CAMBIO DE VIGENCIA	04	26/08/2024
ACTA DE JUSTIFICACIÓN	05	29/10/2024

8. ACTIVIDADES TECNICAS Y ADMINISTRATIVAS REALIZADAS PARA EL SEGUIMIENTO AL CONTRATO DE OBRA DURANTE EL PERIODO (Cumplimiento Obligaciones del contrato).

a). Obligaciones de Carácter General.	Durante el periodo se hace la solicitud a la interventoría de parte del contratista y posteriormente al INDERHUILA para suscribir el otro si modificadorio No. 3 para prorroga de contrato de un (1) mes y
---------------------------------------	--

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: IDH-CGID-F06	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	
	Versión: 2 Página 9 de 40	

	<p>quince (15) días, más adición en cuarenta y cinco millones ciento cuarenta y nueve mil ochocientos veinte pesos (\$ 45.149.820).</p> <p>Se hace ajuste de mayores y menores cantidades y se evidencio que se requieren ítems que nos están contemplados en las condiciones iniciales del contrato y que se deben ejecutar para cumplir con las obligaciones técnicas requeridas por el proyecto.</p>												
b). Actividades Administrativas.	<p>El contratista cumplió los requisitos exigidos de los perfiles profesionales del recurso humano y el tiempo de dedicación de estos al contrato, el cual durante la ejecución del presente informe y de acuerdo con las hojas de vida aprobadas por la interventoría los perfiles son los siguientes:</p> <p>HERNAN DARIO RIVERA FLOREZ – director de obra EDUARDO DUSSAN NAVARRO – residente de obra IGNACIO ANTONIO CASTRO CAMARGO – profesional siso</p> <p>Una vez aprobado por interventoría el personal mínimo requerido, el contratista realizo las respectivas afiliaciones afiliación a la EPS, AFP y ARL.</p> <p>Se realizaron reuniones con el contratista y con el INDERHUILA, con el fin de socialización de balance, propuesta de memorias de cálculo para mayores y menores cantidades de obras e ítems nuevos el día 15/10/2024</p> <p>El 29 de octubre, tras la aprobación formal y firma del Acta de Modificación No. 01 y el Otrosí Modificatorio No. 03, se procedió al inicio de la ejecución de los trabajos correspondientes a los ítems adicionales y cantidades no previstas inicialmente, que fueron debidamente aprobados.</p>												
c). Actividades Operativas.	<p>Se realizada vigilancia por parte de la interventoría en el cual las obras se ejecutaron de acuerdo con las especificaciones técnicas, las obras que se ejecutaron en el presente periodo son:</p> <p>Localización y replanteo ejecutado en el mes de octubre del 2024:</p> <table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>% EJECUCIÓN</th></tr><tr><td>Localización y replanteo</td><td>76,05 m2</td><td>12,41%</td></tr></table> <p>Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante ejecutada en el mes de octubre 2024:</p> <table><tr><th>ACTIVIDAD</th><th>CANTIDAD</th><th>% EJECUCIÓN</th></tr><tr><td>Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.</td><td>51,80 m2</td><td>11,04%</td></tr></table>	ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN	Localización y replanteo	76,05 m2	12,41%	ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN	Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	51,80 m2	11,04%
ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN											
Localización y replanteo	76,05 m2	12,41%											
ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN											
Demolición de placa de concreto e= 0,10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	51,80 m2	11,04%											

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 10 de 40

Fecha Aprobación:
13/02/2023

Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada ejecutada en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	44,42 ml	15,14%

Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente ejecutada en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Relleno en recebo seleccionado y compactado mecánicamente.	44.23 m3	23.82%

Cerramiento provisional en lona verde ejecutada en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Cerramiento provisional en lona verde	57.24 m	100%

Retiro trampolín piscina ejecutada en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Retiro trampolín piscina	1 und	100%

Solado en concreto de limpieza 2000 PSI e = 0.05 mts ejecutado en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Solado en concreto de limpieza 2000 PSI e = 0.05 mts	8.00 m2	11.41%

Construcción de zapatas en concreto 3000 PSI ejecutadas en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
-----------	----------	-------------

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023			Página 11 de 40

	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	20.80 m3	64.10%
	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño ejecutadas en el mes de octubre:		
	ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	12.16 m3	64.30%
	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación ejecutadas en el mes de octubre:		
	ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. viga de cimentación.	624.92 kg	48.97%
	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas ejecutadas en el mes de octubre:		
	ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas.	3,009.85 kg	89.18%
	Corte de placa en concreto ejecutadas en el mes de octubre:		
	ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
	Acero de refuerzo Fy=60.000 P.S.I. columnas.	3,009.85 kg	89.18%
	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües ejecutadas en el mes de octubre:		
	ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión; para desagües.	62.30 m	100.00%

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 12 de 40
Fecha Aprobación: 13/02/2023		

Caja de inspección en concreto de $F'c=2500$ PSI, de sección 0.70×0.70 , H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms, con espesores de paredes de 0.10 mts. Según diseño ejecutadas en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Caja de inspección en concreto de $F'c=2500$ PSI, de sección 0.70×0.70 , H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms, con espesores de paredes de 0.10 mts. Según diseño	5.00 und	71.43%

Suministro e instalación de tubería hidráulica 1" presiones ejecutadas en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Suministro e instalación de tubería hidráulica 1" presión	62.30 m	100.00%

Suministro e instalación de tubería hidráulica 2" presiones ejecutadas en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Desmonte de marcos canchas existentes.	2 und	100,00%

Transporte de materiales pétreos ejecutada en el mes de octubre:

ACTIVIDAD	CANTIDAD	% EJECUCIÓN
Transporte de materiales petreos.	906.51 m3-Km	11.29%

se evitó en trabamientos con el contratista de obra y se colaborará en la solución de problemas surgidos en el desarrollo de este a fin de cumplir a satisfacción la ejecución del contrato, en cual paralelo a la ejecución de la obra en actividades contractuales, se adelantaba la elaboración, análisis y revisión de balance de obra con las respectivas actividades no previstas.

Se hace visita y charla con el motivo de velar por la seguridad de los trabajadores asociado a la obra ejecutada, se revisa los instrumentos adecuados para la protección personal y se enfatiza en el proceso adecuado de obra sin riesgo para los trabajadores.

Se Verifico y aprobó la localización de los trabajos y verificar que la implantación del proyecto realizada por el contratista, verificando fundición de vigas de cimentación y zapatas, con concreto elaborado de forma correcta.

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: IDH-CGID-F06 Versión: 2 Página 13 de 40	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	

	<p>Se llevó a cabo un nuevo proceso de localización y replanteo topográfico, y a continuación, se procedió a la instalación de un cerramiento en lona de alta resistencia de color verde, con el fin de delimitar el área de intervención. Posteriormente, se ejecutó el corte de la losa de concreto en todo el perímetro de la zona de intervención, abarcando tanto la cimentación existente como las estructuras adyacentes, con el objetivo de realizar una demolición controlada, asegurando la preservación de las áreas no afectadas.</p> <p>En paralelo, se efectuó el corte de la losa de concreto a lo largo del trayecto planificado para la instalación de la red de tuberías sanitarias, así como para las conducciones a presión de 1" y 2". Finalmente, al concluir la jornada laboral, se retiró el trampolín de la piscina, siguiendo los protocolos establecidos para su desinstalación.</p> <p>Se hace vista y comités de obra para realizar los controles de las actividades programada, así como recomendar lo ajustes que haya lugar en forma oportuna. verificar y garantizar que cumplan las normas y especificaciones técnicas, procedimientos adecuados de construcción y protección.</p> <p>El contratista cumplió con la totalidad del personal mínimo requerido, y con el personal necesario para la correcta ejecución de las obras durante el tiempo de ejecución del presente informe, se constató que el personal contará con la dotación adecuada para la labor desempeñada.</p>
d). Actividades Logísticas.	<p>Se hace entrega de bitácora de obra del periodo comprendido entre el 01 al 30 de octubre de 2024.</p> <p>En el presente informe se presentan las memorias de cálculo de las actividades ejecutadas descritas en las obligaciones - actividades operativas</p> <p>Se realiza comités semanales con fin de demostrar avances en la ejecución de obra.</p> <p>El día 03 de octubre de 2024, el Contratista de obra, Consorcio Gigante C&M, deberá continuar con el avance general de la obra siguiendo las recomendaciones dadas por el Ing. Wilmar Armando Jimenez Marulanda.</p> <p>El día 08 de octubre de 2024, el Contratista de Obra, Consorcio Gigante C&M, deberá presentar el Acta de modificación de mayores y menores cantidades e ítems nuevos.</p> <p>El día 11 de octubre de 2024, el Contratista de obra, Consorcio Gigante C&M, deberá ejecutar el ítem 5.02 según diseño entregado en planos por la Entidad Contratante.</p> <p>El día 17 de octubre de 2024, el Contratista de Interventoría, el Ing. Wilmar Armando Jiménez Marulanda, radicará el Acta de modificación no. 01 de mayores y menores cantidades e ítems nuevos.</p> <p>El día 23 de octubre de 2024, El Contratista de obra, Consorcio Gigante C&M, deberá continuar con el avance general de la obra siguiendo las recomendaciones dadas por el Ing. Wilmar Armando Jiménez Marulanda.</p>

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE INTERVENTORIA	Código: IDH-CGID-F06
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Versión: 2 Página 14 de 40


	<p>El día 30 de octubre se hace entrega mensual de informe de interventoría.</p>
e). Obligaciones de Carácter Ambiental.	<p>Se planifico una adecuada sobre la estimación de las cantidades de materiales que se van a utilizar dentro de cada una de las etapas productivas, donde previamente se realizará una estimación del uso y desperdicio, buscando tener un mayor control desde la generación en la fuente y así minimizar el uso y reducir el exceso de material sobrante debido a que podría llegar a generar una mayor afectación y contaminación.</p> <p>Se implemento las estrategias necesarias para incrementar la cantidad de residuos a reutilizar en procesos dentro de la obra o fuera de ésta, lo cual permitirá desarrollar estrategias de reciclaje por medio de su reutilización o mediante el intercambio o simbiosis industrial con empresas que pueden aprovecharlos y convertirlos en insumos de sus procesos productivos, con la finalidad de impulsar la generación de nuevos mercados.</p> <p>Se verifico que el contratista uso residuos como la madera para optimizar los procesos donde se disminuyan los residuos generados al garantizar mejores cortes y aprovechamiento sin bajar los índices de calidad, estos deberán ser clasificados y almacenados donde puedan estar protegidos de la intemperie y los cambios climáticos evitando su deterioro o daño.</p> <p>El proyecto cuenta con el personal idóneo capaz de desarrollar estrategias que permitan disminuir el posible grado de afectación generado al medio ambiente, a través del inadecuado manejo y disposición final de los residuos de Construcción y Demolición RCD, el cual será el encargado de socializar y sensibilizar al personal sobre las metodologías aplicables al proyecto de acuerdo al tipo de residuos que se puedan generar y aplicando las medidas necesarias para su correspondiente control y seguimiento, además de resaltar la importancia de realizar una adecuada separación en la fuente y buenas prácticas ambientales con el personal operativo y administrativo en pro de generar una mayor conciencia ambiental.</p>
f). Actividades Financieras.	<p>En el periodo de 01 al 30 de octubre se analiza el avance financiero de obra, para prever futuras adiciones al contrato y disponibilidad presupuestal, en el presente informe en el numeral 19, se presenta el balance económico de ejecución del contrato presentando un avance por cada ítem y un avance general del periodo.</p> <p>Control de vinculación del personal por parte del contratista a sistemas generales de seguridad social y que se encuentre a paz y salvo con dichas entidades.</p>
g). Actividades Jurídicos.	<p>Durante el periodo se realizaron todas las actividades de revisión y acompañamiento en pólizas y garantías de reinicio de obra actualizadas y anexos necesarios para el cumplimiento de las obligaciones con respecto al periodo.</p> <p>Velar por el cumplimiento de ejecución de la obra por parte del contratista, respetando del objetivo del contrato.</p>

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2
			Página 15 de 40

Fecha Aprobación:
13/02/2023


9. DESCRIPCIÓN DEL ESTADO DEL TIEMPO

Probabilidad de Precipitación en octubre en Gigante

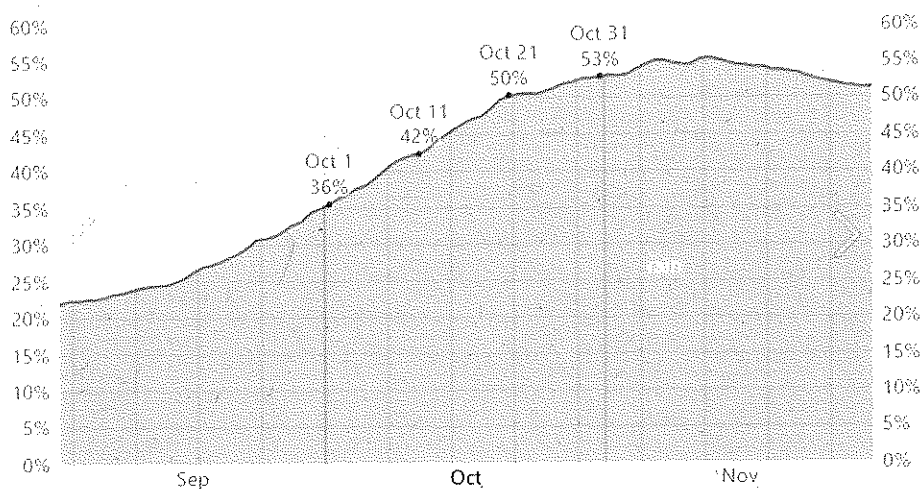

Fuente: Web Weather Spark

Un día lluvioso es aquel con al menos 0,04 pulgadas de precipitación líquida o equivalente a líquido. En Gigante, la probabilidad de un día lluvioso durante el transcurso de octubre está aumentando muy rápidamente, comenzando el mes en 36% y terminándolo en 53%.

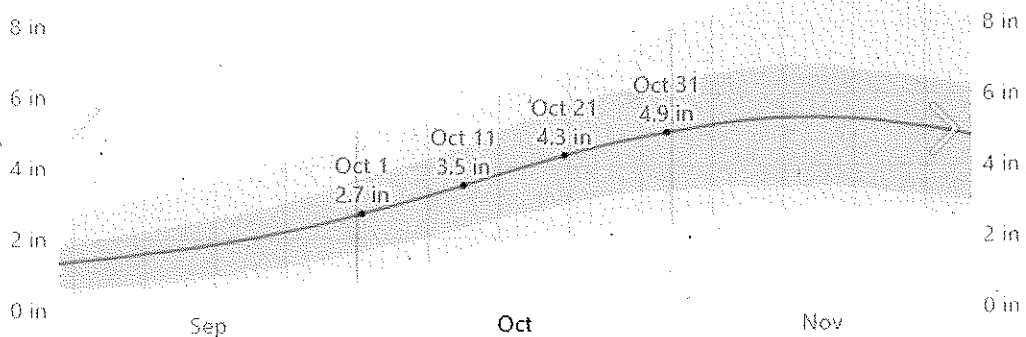

Fuente: Web Weather Spark

La precipitación media móvil de 31 días durante octubre en Gigante aumenta muy rápidamente, comenzando el mes con 2,7 pulgadas, cuando rara vez excede 4,7 pulgadas o cae por debajo de 0,8 pulgadas, y terminando el mes con 4,9 pulgadas, cuando rara vez excede 7,8 pulgadas o cae por debajo de 2,2 pulgadas.

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: IDH-CGID-F06	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	
	Versión: 2	
	Página 16 de 40	

10. CONTROL DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Tipo Prueba de Laboratorio	Resistencia concreto	Relación volumétrica concreto
Diseño de mezcla concreto hidráulico	3000 PSI	1.0:1.7:1.5
Diseño de mezcla concreto hidráulico	2500 PSI	1.0:2.0:1.6
Diseño de mezcla concreto hidráulico	2000 PSI	1.0:2.3:1.8

NOTA: Las obras de concreto ejecutadas se le realiza prueba a la compresión simple, Norma Artículo 630-07 ensayo E-410, cumpliendo con las resistencias exigidas.

Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por la INTERVENTORIA

DESCRIPCIÓN	FECHA TOMA DE MUESTRA	FECHA ROTURA	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
Elemento	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	7	14	28	PSI	PSI	
Zapata eje B	30/09/2024	07/10/2024	X			3000	2168	CUMPLE (72%)
		14/10/2024		X		3000	2718	CUMPLE (91%)
		28/10/2024			X	3000	3222	CUMPLE (107%)
Zapata eje A	02/09/2024	09/10/2024	X			3000	2238	CUMPLE (75%)
		16/10/2024		X		3000	2848	CUMPLE (95%)
		30/10/2024			X	3000	3298	CUMPLE (110%)
viga de cimentación eje B	07/10/2024	07/10/2024	X			3000	2188	CUMPLE (73%)
		14/10/2024		X		3000	2705	CUMPLE (90%)
		28/10/2024			X	3000	3198	CUMPLE (107%)

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG					Código: IDH-CGID-F06		
	INFORME DE INTERVENTORIA					Versión: 2		
Fecha Aprobación: 13/02/2023						Página 17 de 40		

Viga de cimentación eje A	15/10/2024	22/10/2024	X			3000	2186	CUMPLE (73%)
		29/10/2024		X		3000	3051	CUMPLE (102%)
		13/11/2024			X	3000	3112	CUMPLE (104%)

Control Resultado de Ensayo y Pruebas de Laboratorio realizados por el CONTRATISTA

DESCRIPCIÓN	FECHA TOMA DE MUESTRA	FECHA ROTURA	EDAD DEL ENSAYO			RESISTENCIA REQUERIDA	RESISTENCIA FINAL OBTENIDA	CUMPLE/ NO CUMPLE
Elemento	(dd/mm/aaaa)	(dd/mm/aaaa)	7	14	28	PSI	PSI	
Solado	25/09/2024	02/10/2024	X			2000	1823.2	CUMPLE (40%)
		09/10/2024		X		2000	1940.10	CUMPLE (65%)
		23/10/2024			X	2000	2216.62	CUMPLE (100%)
Solado	26/09/2024	03/10/2024	X			2000	1892.89	CUMPLE (40%)
		10/10/2024		X		2000	2061.50	CUMPLE (65%)
		24/10/2024			X	2000	2196.38	CUMPLE (100%)
Zapatas	30/09/2024	07/10/2024	X			3000	2322.28	CUMPLE (40%)
		14/10/2024		X		3000	2868.56	CUMPLE (65%)
		28/10/2024			X	3000	3275.47	CUMPLE (100%)

11. CONTROL DE ANTICIPO

Relación de Pago (Anticipo y/o Acta de Obra Ejecutada)	Fecha (dd/mm/aaaa)	Valor Acta	Amortización	Valor pagado
---	-----------------------	------------	--------------	--------------

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023			Página 18 de 40

Valor Anticipo (25%)	N/A			
Acta Parcial No. 1	N/A			
Acta Recibo Final No.4	N/A			
Valor Contrato Inicial	Valor Adicional	Valor Total	Valor Ejecutado	Valor no Ejecutado
\$ 78.095.342,00	\$	\$ 78.095.342,00	\$	\$ 78.095.342,00

12. COMITES DE OBRA

Fecha de Realización (dd/mm/aaaa)	Lugar	Resultado del Comité (Describir)
03/10/2024	IE José Miguel Montalvo – Municipio de Gigante, Huila	El Contratista de obra, Consorcio Gigante C&M, deberá continuar con el avance general de la obra siguiendo las recomendaciones dadas por el Ing. Wilmar Armando Jimenez Marulanda.
08/10/2024	INDERHUILA	El Contratista de Obra, Consorcio Gigante C&M, deberá presentar el Acta de modificación de mayores y menores cantidades e ítems nuevos.
11/10/2024	INDERHUILA	El Contratista de obra, Consorcio Gigante C&M, deberá ejecutar el ítem 5.02 según diseño entregado en planos por la Entidad Contratante.
17/10/2024	INDERHUILA	El Contratista de Interventoría, el Ing. Wilmar Armando Jiménez Marulanda, radicará el Acta de modificación no. 01 de mayores y menores cantidades e ítems nuevos.
23/10/2024	IE José Miguel Montalvo – Municipio de Gigante, Huila	El Contratista de obra, Consorcio Gigante C&M, deberá continuar con el avance general de la obra siguiendo las recomendaciones dadas por el Ing. Wilmar Armando Jiménez Marulanda.

13. RELACIÓN DE DOCUMENTOS YA ENTREGADOS

TIPO DOCUMENTO	FECHA DE ENTREGA A LA ENTIDAD (dd/mm/aaaa)	No. RADICADO (Emitido por INDERHUILA)	FORMATO (Físico/Digital)
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No. CHU-100010216))	21/11/2023	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas R.C (Endoso (No. CHU-100002056))	21/11/2023	N/A	Digital – Plataforma secop II
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (05/12/2023) al (28/12/2023))	28/12/2023	N/A	Digital
Actas de socialización e inicio de obra	05/12/2023	N/A	Físico

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2 Página 19 de 40
Fecha Aprobación: 13/02/2023			

Actas de conformación de veeduría ciudadana	06/12/2023	N/A	Físico
Actas de comités (periodo del (05/12/2023) al (28/12/2023))	21/12/2023	N/A	Físico
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (05/12/2023) al (28/12/2023))	28/12/2023	N/A	Digital
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No. CHU-100010216)) Anexo No. 2	30/09/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas R.C (Endoso (No. CHU-100002056)) Anexo No. 2	30/09/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No. CHU-100010216)) Anexo No. 3	30/09/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas R.C (Endoso (No. CHU-100002056)) Anexo No. 3	30/09/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No. CHU-100010216)) Anexo No. 4	30/09/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas R.C (Endoso (No. CHU-100002056)) Anexo No. 4	30/09/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas de cumplimiento (Endoso (No. CHU-100010216)) Anexo No. 5	30/09/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Pólizas R.C (Endoso (No. CHU-100002056)) Anexo No. 5	30/09/2024	N/A	Digital – Plataforma secop II
Planillas de aportes a seguridad social integral (EPS-ARP-AFP) (periodo del (01/10/2024) al (30/10/2024))	30/10/2024	N/A	Digital
Copias de Bitácora de Obra (periodo del (01/10/2024) al (30/10/2024))	30/10/2023	N/A	Digital

14. RELACION DE PERSONAL (Profesional Interventoría)

NOMBRE Y APELLIDOS	No. IDENTIFICACIÓN	CARGO	MODALIDAD DE CONTRATACION
GILDARDO SERRATO SERRATO	1.075.598.217	DIRECTOR DE INTERVENTORIA	CONTRATO POR LABOR
WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	80.926.744	RESIDENTE DE INTERVENTORIA	CONTRATO POR LABOR

15. RELACIÓN DE PAGOS

TIPO DE PAGO (Anticipo / Acta No.)	No. COMPROBANTE	FECHA

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2
			Página 20 de 40
Fecha Aprobación: 13/02/2023			

16. RELACIÓN DE PAGOS DURANTE EL PERIODO DE LOS APORTES AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

PERSONAL	PENSIÓN	SALUD	ARL	CCF	PARAFISCALES	N° PLANILLA
GILDARDO SERRATO SERRATO	\$ 299.200	\$ 281.300	\$ 156.600	\$ 45.000	\$ 0	9477856158
WILMAR ARMANDO JIMENEZ MARULANDA	\$ 360.000	\$ 233.800	\$ 130.200	\$ 37.400	\$ 0	9477856158

17. RELACIÓN DE POLIZAS DE GARANTIA

Póliza legalización del CONTRATO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 0	CHU-100010216		10/11/2023	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	08/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo		
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	08/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	08/02/2024	08/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 0	CHU-100002056		10/11/2023	08/11/2023	08/02/2024

Póliza Anulación certificado para actualización ACTA DE INICIO:

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 1	CHU-100010216		06/12/2023	Cumplimiento del contrato	08/11/2023	08/08/2024
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo		
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	08/11/2023	08/02/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	08/02/2024	08/02/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 1	CHU-100002056		06/12/2023	08/11/2023	08/02/2024

Póliza actualizada ACTA DE INICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL	CHU-100010216		06/12/2023	Cumplimiento del contrato	05/12/2023	04/09/2024

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023			Página 21 de 40

ANEXO 2				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo		
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	05/12/2023	07/03/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	06/03/2024	07/03/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL (Relacionar todas las actualizaciones)

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 2	CHU-100002056		06/12/2023	05/12/2023	06/03/2024

Póliza actualizada ACTA DE SUSPENSIÓN Y REINICIO

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 3	CHU-100010216		07/09/2024	Cumplimiento del contrato	26/08/2024	04/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo		
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/08/2024	07/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	06/11/2024	06/11/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	VIGENCIA
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 3	CHU-100002056		07/09/2024	05/12/2023	06/11/2024

Póliza actualizada OTRO SI No. 1

POLIZA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 4	CHU-100010216		07/09/2024	Cumplimiento del contrato	26/08/2024	04/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo		
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/08/2024	07/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	06/11/2024	06/11/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	VIGENCIA
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 4	CHU-100002056		07/09/2024	05/12/2023	06/11/2024

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2 Página 22 de 40

Fecha Aprobación:
13/02/2023

Póliza actualizada OTRO SI No. 2

POLIZA DE CUMPLIMIENTO


ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	AMPARO	VIGENCIA	
					DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 5	CHU-100010216		07/09/2024	Cumplimiento del contrato	26/08/2024	04/05/2025
				Buen Manejo y correcta inversión del anticipo		
				Pago salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales	26/08/2024	07/11/2027
				Estabilidad y Calidad de Obras	06/11/2024	06/11/2029

POLIZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL

ASEGURADORA	No.	ENDOZO	FECHA DE EMISIÓN (dd/mm/aaaa)	VIGENCIA	
				DESDE (dd/mm/aaaa)	DESDE (dd/mm/aaaa)
SEGUROS MUNDIAL ANEXO 5	CHU-100002056		07/09/2024	05/12/2023	06/11/2024




18. PLANO y/o ESQUEMAS RELACIONADOS CON LAS ACTIVIDADES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO
(Describir el contenido del plano)

- Plano general: Contiene levantamiento topográfico que consta de replanteo de puntos en los ejes estructurales de columnas sobre el área de la cubierta autoportante, dentro de la institución educativa José Miguel Montalvo en el municipio de Gigante, departamento del Huila. También relaciona el área de adecuación para movimiento de tierra en la zona de terreno natural a nivel de placa de contrapiso de la cancha múltiple.

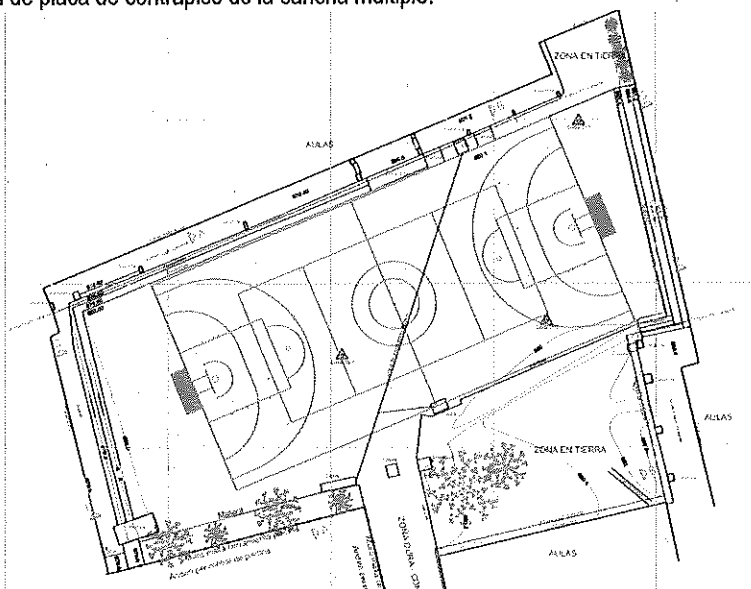

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE INTERVENTORIA	
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Código: IDH-CGID-F06 Versión: 2 Página 23 de 40


- **Plano estructural E-1:** Contiene la vista en planta de la cimentación (zapatas y viga de cimentación) y el despiece de la viga de cimentación.

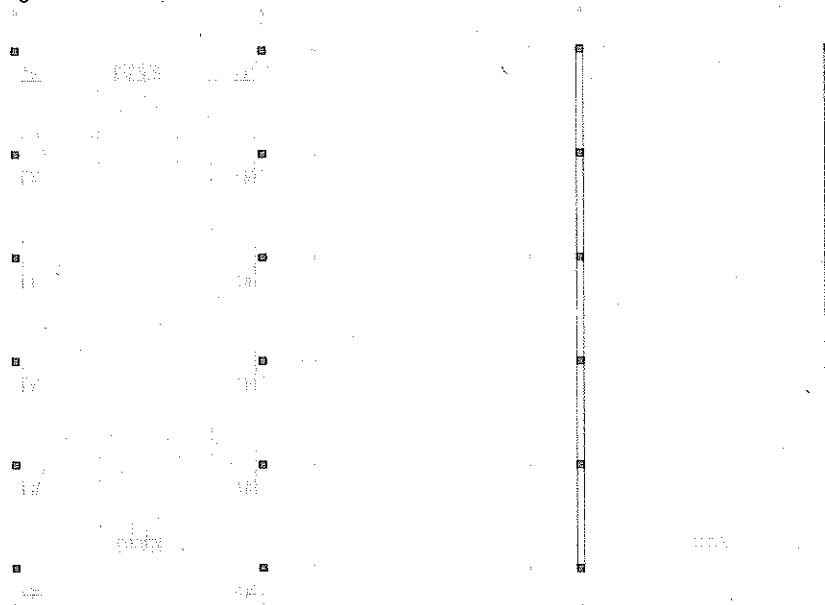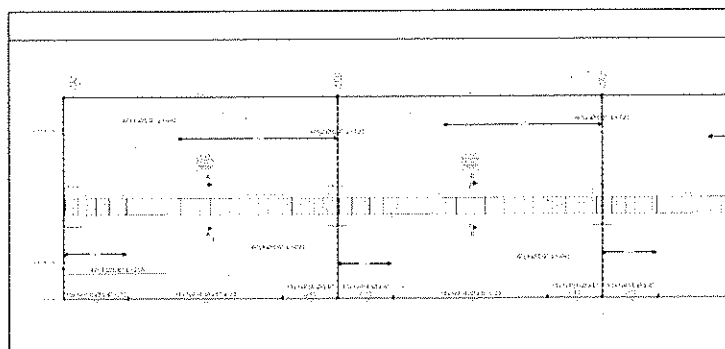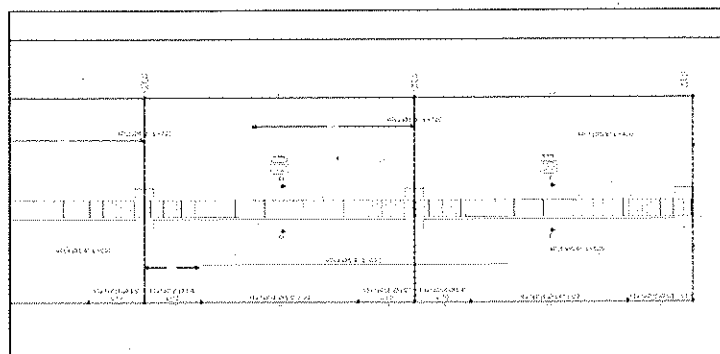

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 24 de 40

Fecha Aprobación:
13/02/2023

- **Plano estructural E-2:** contiene la vista en planta de la viga aérea, el despiece de las zapatas, columnas y viga aérea.

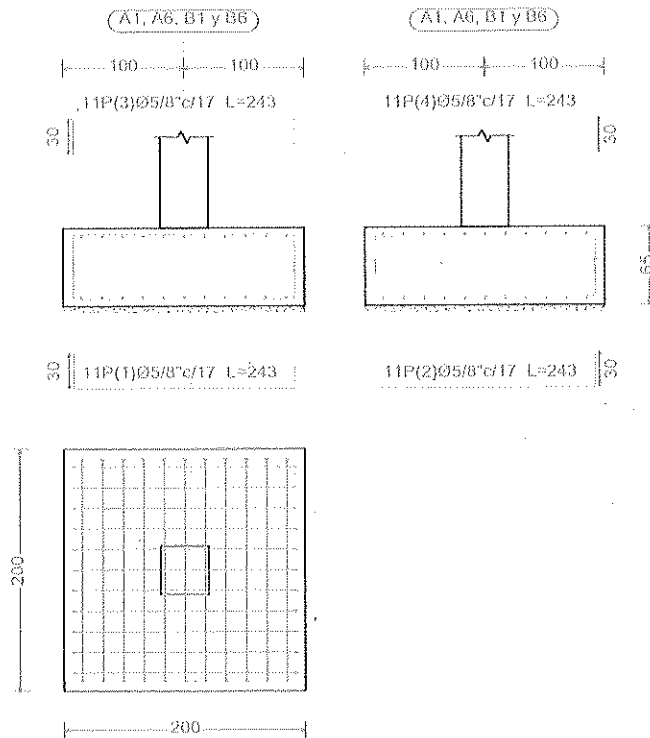



**SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE
PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG**


Código: IDH-CGID-F06

**Fecha Aprobación:
13/02/2023**

INFORME DE INTERVENTORIA


Versión: 2

Página 25 de 40

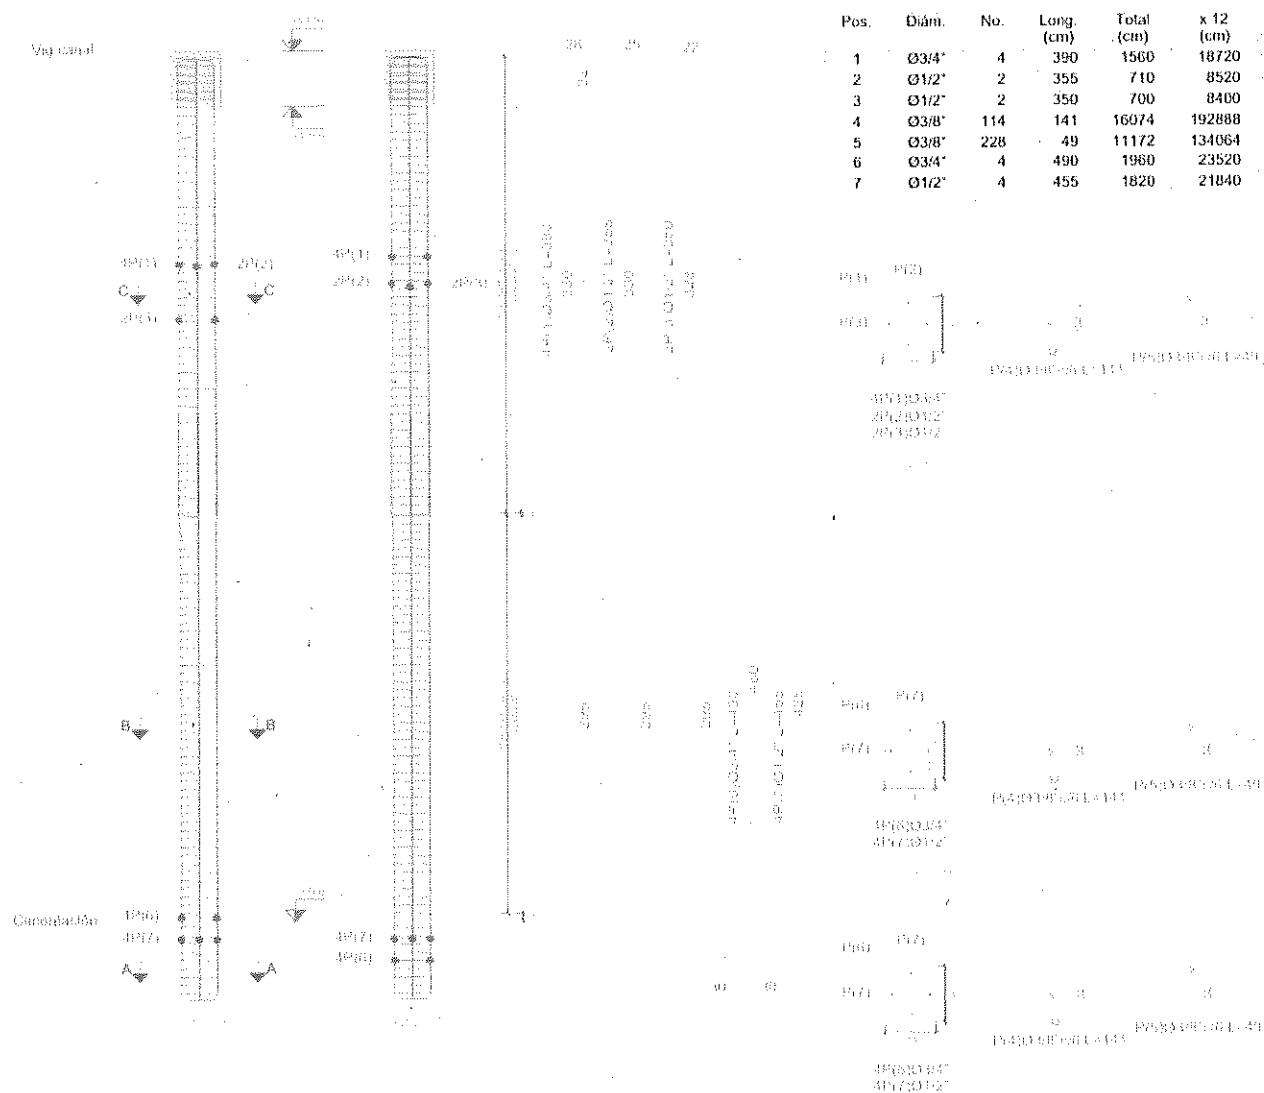


	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Informe de Interventoria	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	Código: IDH-CGID-F06	
	Versión: 2 Página 27 de 40	

- **Esquema corte de placa en concreto:** contiene la delimitación que debe tener el corte de placa en concreto.

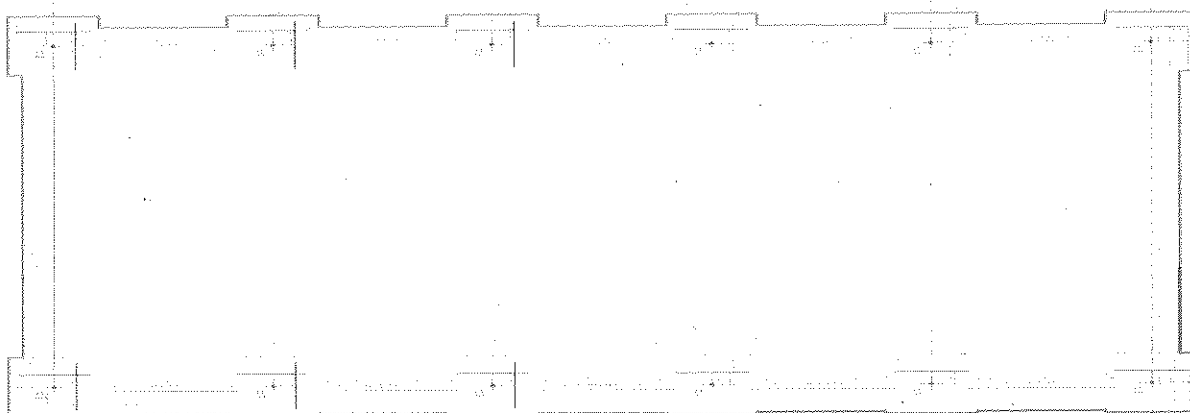

- **Esquema tuberías:** contiene el trazado de la tubería a redireccionar para que no atraviese la placa nueva de concreto.

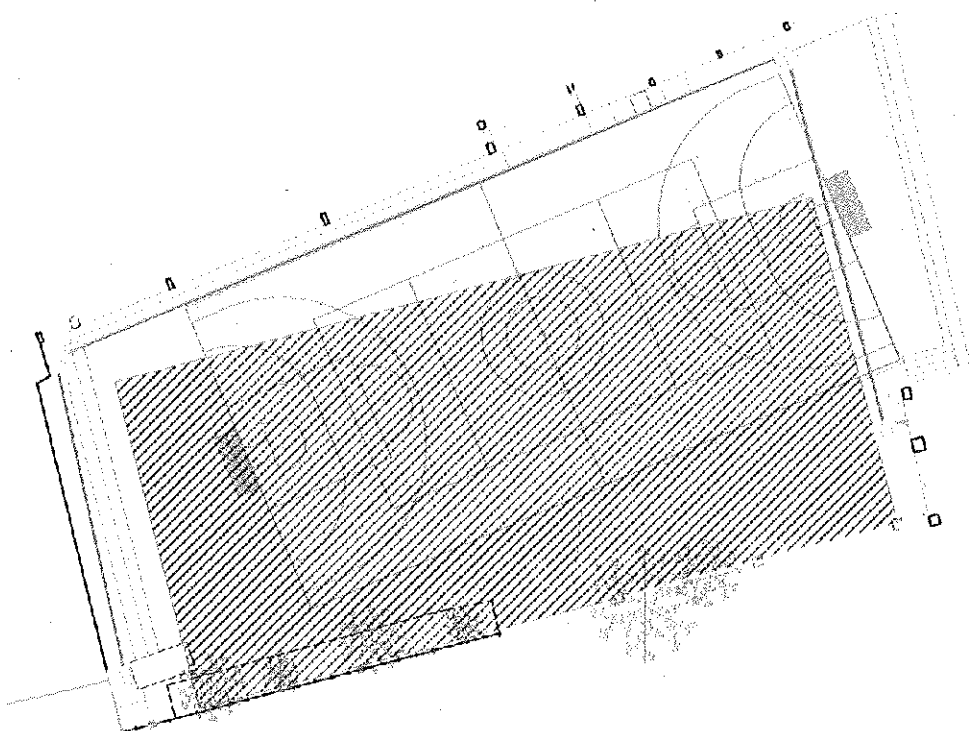



PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Version: 2


INFORME DE INTERVENTORIA

13/02/2023

19. DIAGRAMA DE AVANCE DE ACTIVIDADES Y TRABAJOS

CONDICIONES CONTRACTUALES															CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA MODIFICACIÓN NO. 1 (29/10/2024)			EJECUCIÓN DE OBRA MENSUAL			EJECUCIÓN DE OBRA ACUMULADA	
ITEM	DESCRIPCION	UNID	CANT	VRUNITARIO	VRTOTAL	CANT	VRTOTAL	CANT	VRTOTAL	CANT	VRTOTAL	% EJECCION	CANT	% EJECCION								
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES																					
1.01	Localización y replanteo.	M2	536.56	\$ 3,565.00	\$ 1,912,836.00	612.61	\$ 2,183,955.00	76.05	\$ 271,118.00			12.41%	612.61	100.00%								
1.02	Demolición de placa de concreto e= 0.10 mts. Incluye retiro del material sobrante.	M2	602.21	\$ 26,329.00	\$ 15,855,587.00	469.30	\$ 12,356,200.00	51.80	\$ 1,363,842.00			11.04%	429.09	91.43%								
1.03	Demolición de cerramiento perimetral existente (muro, malla, cimentación) hasta, H= 3 mt. Incluye retiro de material sobrante.	ML	20.74	\$ 20,899.00	\$ 433,445.00	19.22	\$ 401,679.00	0.00	\$ -			0.00%	19.22	100.00%								
1.04	Desmonte marcos canchas existentes.	UND	2.00	\$ 117,116.00	\$ 234,232.00	2.00	\$ 234,232.00	0.00	\$ -			0.00%	2.00	100.00%								
1.05	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	87.57	\$ 46,090.00	\$ 4,036,101.00	293.41	\$ 13,523,267.00	44.42	\$ 2,047,318.00			15.14%	127.12	43.33%								
1.06	Relleno en recebo seleccionado y compactado mecanicamente.	M3	23.53	\$ 84,008.00	\$ 1,976,708.00	185.66	\$ 15,596,925.00	44.23	\$ 3,715,674.00			23.82%	44.23	23.82%								
NP. 1.07	Cerramiento provisional en lona verde	ML	0.00	\$ 36,304.00	\$ -	57.24	\$ 2,192,521.00	57.24	\$ 2,192,521.00			100.00%	57.24	100.00%								
NP. 1.08	Retiro trampolín piscina	UND	0.00	\$ 109,260.00	\$ -	1.00	\$ 109,260.00	1.00	\$ 109,260.00			100.00%	1.00	100.00%								
	SUB-TOTAL CAPITULO				\$ 24,448,909.00		\$ 46,598,039.00		\$ 9,699,733.00			20.82%		55.79%								
2	CIMENTACIÓN																					
2.01	Soldo en concreto de limpieza 2000 PSI. e= 0.05 mts	M2	68.52	\$ 34,077.00	\$ 2,334,956.00	70.12	\$ 2,389,479.00	8.00	\$ 272,616.00			11.41%	64.00	91.27%								
2.02	Construcción zapatas en concreto 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño.	M3	44.24	\$ 620,231.00	\$ 27,439,019.00	32.45	\$ 20,126,496.00	20.80	\$ 12,900,805.00			64.10%	31.20	96.15%								
2.03	Acero de refuerzo Fy=60,000 P.S.I. zapatas	KG	3,207.00	\$ 7,130.00	\$ 22,865,910.00	2030.40	\$ 14,476,762.00	0.00	\$ -			0.00%	1998.98	98.45%								
2.04	Construcción viga de cimentación en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI. Ver diseño	M3	6.61	\$ 743,441.00	\$ 4,914,145.00	18.91	\$ 14,058,469.00	12.16	\$ 9,040,243.00			64.30%	12.16	64.30%								
2.05	Acero de refuerzo Fy=60,000 P.S.I. viga de cimentación	KG	1,276.00	\$ 7,130.00	\$ 9,097,880.00	1347.38	\$ 9,606,819.00	624.92	\$ 4,455,660.00			46.38%	1248.84	92.76%								
NP. 2.06	Construcción de cerramiento perimetral existente (muro, malla) hasta, H= 2 mt.	ML	0.00	\$ 377,008.00	\$ -	18.00	\$ 6,786,144.00	0.00	\$ -			0.00%	0.00	0.00%								
	SUB-TOTAL CAPITULO				\$ 66,651,910.00		\$ 67,444,159.00		\$ 26,669,344.00			39.54%		79.68%								
3	ESTRUCTURA EN CONCRETO																					
3.01	Construcción en columnas en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI	M3	13.00	\$ 922,566.00	\$ 11,993,358.00	10.55	\$ 9,733,071.00	0.00	\$ -			0.00%	0.00	0.00%								

*Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.indemhuila.gov.co - atencionusuario@indemhuila.gov.co
Nerva-Huila*



PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Versión: 2

Página 29 de 40

13/02/2023

3.02	Acero de refuerzo Fy=60,000 P.S.I. columnas	KG	4,720.00	\$	7,130.00	\$	33,653,600.00	3375.03	\$	24,063,964.00	3009.85	\$	21,460,231.00	89.18%	3319.68	98.36%
3.03	Construcción de Viga Canal en concreto de 210 KG/CM2-3000 PSI impermeabilizado.	M3	18.00	\$	1,006,771.00	\$	18,121,878.00	16.09	\$	16,198,945.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
3.04	Acero de refuerzo Fy=60,000 P.S.I. Viga Canal	KG	2,367.00	\$	7,130.00	\$	16,876,710.00	2032.70	\$	14,493,151.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
3.05	Suministro e instalación de manto zetal viga canal.	M2	60.80	\$	40,424.00	\$	2,457,779.00	56.95	\$	2,302,147.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO						\$ 83,103,325.00			\$ 66,791,278.00			\$ 21,460,231.00	32.13%		35.44%
4	CUBIERTA															
4.01	Suministro, fabricación e instalación de cubierta autoportante a base de lámina de acero cal. 22, en paneles engargolados lateralmente de una sola pieza en acabado pñitr políester estándar, fabricado a un 20% de flecha con respecto a la luz.	M2	548.11	\$	211,958.00	\$	116,176,299.00	469.68	\$	99,552,433.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO						\$ 116,176,299.00			\$ 99,552,433.00			\$ -	0.00%		0.00%
5	ACABADOS - PLACA EN CONCRETO															
5.01	Demarcación de cancha en pintura tráfico pesado, para demarcación de las tres actividades básicas: microfútbol, voleibol y baloncesto.	ML	307.11	\$	14,826.00	\$	4,553,212.86	323.82	\$	4,800,955.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
5.02	Suministro e instalación de cancha multifuncional en tubo 3" tipo pesado y tubo AN 2" Cal 16 Fútbol de Salón, Baloncesto, Tablero en fibra de vidrio 20MM de 1.8 * 1.05 M. Incluye: aro, malla, demarcado, logos, antirreflexivo y pintura	UND	2.00	\$	3,717,773.00	\$	7,435,546.00	2.00	\$	7,435,546.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
5.03	Placa de piso en concreto de 3000 PSI, e=0.10 cm.	M2	420.00	\$	84,130.00	\$	35,334,600.00	543.44	\$	45,719,607.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
5.04	Cuneta en concreto de 3000 PSI, según diseño.	ML	60.80	\$	84,010.00	\$	5,107,808.00	30.40	\$	2,553,904.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
NP. 5.05	Cuneta en concreto de 3000 PSI con profundidad de 0.50m	ML	0.00	\$	98,383.00	\$	-	45.19	\$	4,445,928.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
NP. 5.06	Corte de placa en concreto para dilataciones. Incluye suministro e instalación de sellante para junta de dilatación	ML	0.00	\$	28,142.00	\$	-	216.00	\$	6,078,672.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
NP. 5.07	Corte de placa en concreto	ML	0.00	\$	7,591.00	\$	-	276.42	\$	2,098,304.00	269.04	\$	2,042,283.00	97.33%	269.04	97.33%
NP. 5.08	Rejillas prefabricadas para cunetas	ML	0.00	\$	166,020.00	\$	-	75.20	\$	12,484,704.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO						\$ 52,431,166.86			\$ 85,617,620.00			\$ 2,042,283.00	2.39%		2.39%
6	INSTALACIONES HIDROSANITARIAS															
6.01	Bajantes en tubería PVC-S de 4" con accesorios de conexión; para desagües y bajantes de aguas lluvias.	ML	65.00	\$	80,296.00	\$	5,219,240.00	63.00	\$	5,058,648.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa

Despacho 875 04 31-875 04 23 - 875 04 39 www.inderhulla.gov.co - atencionusuario@inderhulla.gov.co

Neiva-Huila



PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Versión: 2

Fecha Aprobación:

13/02/2023

6.02	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 6", con accesorios de conexión, para desagües.	ML	14.56	\$	107,293.00	\$	1,562,186.00	62.30	\$	6,684,354.00	62.30	\$	6,684,354.00	100.00%	62.30	100.00%
6.03	Suministro e instalación de tubería PVC-S de 8", con accesorios de conexión, para salida.	ML	20.00	\$	219,466.00	\$	4,389,320.00	22.00	\$	4,828,252.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
6.04	Caja de inspección en concreto de F'c=2500 PSI, de sección 0.70'x0.70. H: 1M incluye cañuela, tapa en concreto reforzado de 8 cms , con espesores de paredes de 0.10 mts.según diseño	UND	2.00	\$	350,649.00	\$	701,298.00	7.00	\$	2,454,543.00	5.00	\$	1,753,245.00	71.43%	5.00	71.43%
NP. 6.05	Suministro e instalación de tubería hidráulica 1" presión	ML	0.00	\$	26,226.00	\$	-	62.30	\$	1,633,880.00	62.30	\$	1,633,880.00	100.00%	62.30	100.00%
NP. 6.06	Suministro e instalación de tubería hidráulica 2" presión	ML	0.00	\$	42,005.00	\$	-	18.00	\$	756,090.00	18.00	\$	756,090.00	100.00%	18.00	100.00%
	SUB-TOTAL CAPITULO					\$ 11,872,044.00			\$ 21,415,767.00			\$ 10,827,569.00	50.56%			50.56%
7	INSTALACIONES ELECTRICAS															
7.01	Caja de inspección de alumbrado público de 40x40x70 cm, fundida en concreto de 3000 psi y tapa en lamina alaior.	UND	4.00	\$	640,108.00	\$	2,560,432.00	4.00	\$	2,560,432.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
7.02	Excavación manual sin clasificar. Incluye: todo factor y disposición final del material en escombrera autorizada.	M3	6.40	\$	46,090.00	\$	294,976.00	8.94	\$	412,045.00	0.00	\$	-	0.00%	2.05	22.93%
7.03	Canalización en ductos conduit pvc tipo pesado, dos ductos de 1 1/2" para baja tensión. Incluye compactación y tapada de brecha. a=0.40 mts.	ML	40.00	\$	49,435.00	\$	1,977,400.00	32.80	\$	1,621,468.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
7.04	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1 1/2"	UND	2.00	\$	305,078.00	\$	610,156.00	2.00	\$	610,156.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
7.05	Transición aérea-subterránea tubería IMC 1"	UND	2.00	\$	282,809.00	\$	565,618.00	2.00	\$	565,618.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
7.06	Suministro - instalación y cableado de medida directa en poste.	UND	1.00	\$	1,018,745.00	\$	1,018,745.00	0.00	\$	-	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
7.07	Suministro - instalación y cableado de caja de distribución colocada en columna.	UND	1.00	\$	4,710,084.00	\$	4,710,084.00	1.00	\$	4,710,084.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
7.08	Suministro e instalación de cableado para red de distribución principal en ducto subterráneo en conductor 2x6 al ser8000 + 6 al ser8000 + 1x8 cu.	ML	35.00	\$	88,702.00	\$	3,104,570.00	35.00	\$	3,104,570.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
7.09	Instalación brazo sello según diseño de 3.5 mts. Galvanizado y acabado en pintura polvo poliéster, para anclar el reflector.	UND	12.00	\$	369,665.00	\$	4,435,980.00	12.00	\$	4,435,980.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
7.10	Suministro e instalación de cableado para redes internas para montaje de reflectores.	ML	60.00	\$	58,262.00	\$	3,495,720.00	60.00	\$	3,495,720.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
7.11	Suministro e instalación de reflector led de 150 w	UND	12.00	\$	1,020,712.00	\$	12,248,544.00	12.00	\$	12,248,544.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%
7.12	Suministro e instalación de toma corriente a 120 v.	UND	1.00	\$	976,854.00	\$	976,854.00	1.00	\$	976,854.00	0.00	\$	-	0.00%	0.00	0.00%

Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhulla.gov.co - atencionusuuario@inderhulla.gov.co

Página 30 de 40



TEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG

Código: IDH-CGID-F06
Versión: 2
Página 31 de 40

Informe de Interventoría

Fecha Aprobación:
13/02/2023

7.13	Suministro e instalación de tomacorriente a 240v y tomacorriente a 120 v.	UND	1.00	\$ 1,037,321.00	\$ 1,037,321.00	1.00	\$ 1,037,321.00	0.00	\$ -	0.00%	0.00	0.00%
NP. 7.14	Instalación acometida a tablero de circuitos	UND	0.00	\$ 625,694.00	\$	1.00	\$ 625,694.00	0.00	\$ -	0.00%	0.00	0.00%
8	SUB-TOTAL CAPITULO			\$ 37,036,400.00			\$ 36,404,486.00		\$ -	0.00%		0.26%
8.01	TRANSPORTE											
	Transporte de materiales petreos	M3-Km	4,383.82	\$ 1,102.00		8028.22	\$ 8,847,098.00	906.51	\$ 998,974.00	11.29%	2781.64	34.65%
	SUB-TOTAL CAPITULO			\$ 4,830,970.00			\$ 8,847,098.00		\$ 998,974.00	11.29%		34.65%
	TOTAL COSTO DIRECTO			\$ 396,551,024.00			\$ 432,670,880.00		\$ 71,698,134.00			
Administración		20%		\$ 79,310,205.00			\$ 86,534,176.00		\$ 14,339,627.00			
Imprevistos		1%		\$ 3,965,510.00			\$ 4,326,709.00		\$ 716,981.00			
Utilidad		4%		\$ 15,862,041.00			\$ 17,306,835.00		\$ 2,867,925.00			
	TOTAL COSTO			\$ 495,688,780.00			\$ 540,838,600.00		\$ 89,622,667.00	16.57%		27.60%
% AVANCE DE OBRA												

NOTA: Las cantidades y la calidad de las obras consignadas en el presente informe, son netamente responsabilidad del contratista e interventor quienes las cuantificaron y constataron en el terreno.



ING. CESAR JOAQUIN VELASQUEZ TIQUE
Vo.Bo APOYO SUPERVISION



ING. GILDARDO SERRATO SERRATO
DIRECTOR DE INTERVENTORIA

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 32 de 40

20. REGISTRO FOTOGRAFICO


21.

ITEM 1.01. LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO:



Localización y replanteo - 29 al 30 de octubre del 2024.


ITEM 1.02. DEMOLICIÓN DE PLACA DE CONCRETO E=0.10 MTS. INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL SOBRANTE:

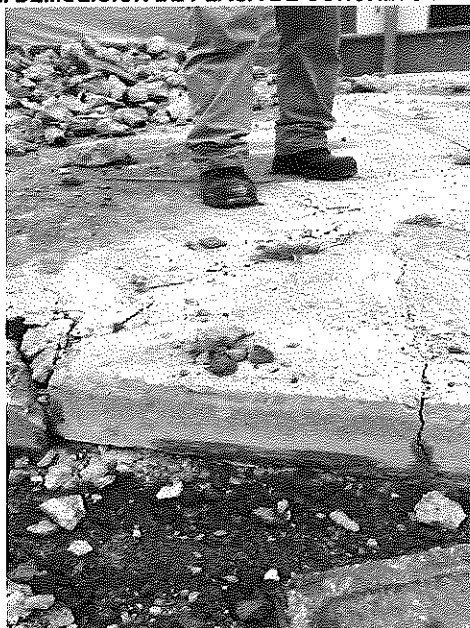

Demolición de placa en concreto - 29 al 31 de octubre del 2024.

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	Código: IDH-CGID-F06	
Fecha Aprobación: 13/02/2023	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2
		Página 33 de 40

ITEM 1.05. EXCAVACIÓN MANUAL SIN CLASIFICAR. INCLUYE: TODO FACTOR Y DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL EN ESCOMBRERA AUTORIZADA

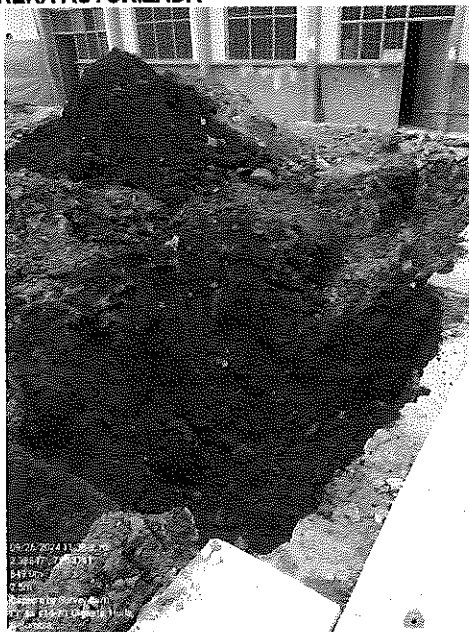

Excavación manual- 01 al 31 de octubre del 2024.

ITEM 1.06. RELLENO EN RECEBO SELECCIONADO Y COMPACTADO MECANICAMENTE.





Relleno en recebo seleccionado y compactado – 01 al 31 de octubre del 2024.

ITEM NP1.07. CERRAMIENTO PROVISIONAL EN LONA VERDE


*Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderrhuila.gov.co - atencionusuario@inderrhuila.gov.co
Neiva-Huila*

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 34 de 40

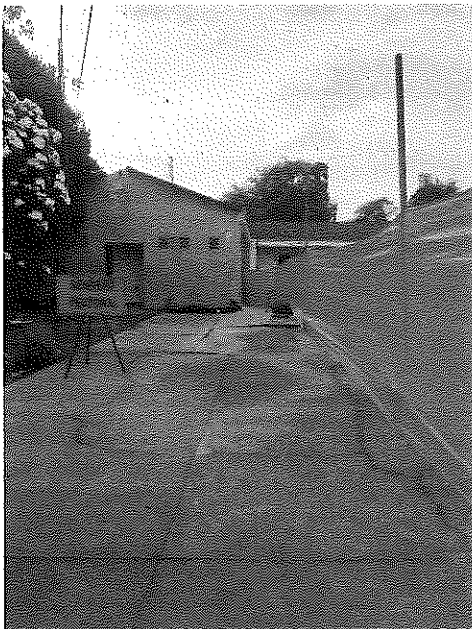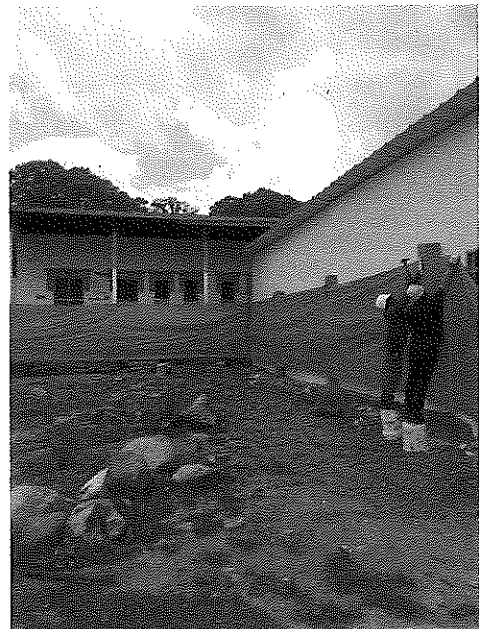

Construcción cerramiento perimetral - 29 de octubre del 2024.

ITEM NP1.08. RETIRO TRAMPOLÍN PISCINA.

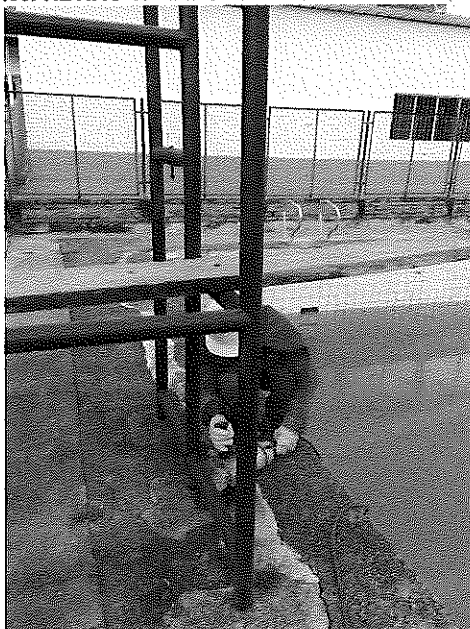


Retiro trampolín - 29 de octubre del 2024.

ITEM 2.01. SOLADO EN CONCRETO DE LIMPIEZA 2000 PSI E = 0.05 MTS.


*Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atenciomusuuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila*

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	
	INFORME DE INTERVENTORIA	Código: IDH-CGID-F06
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Versión: 2 Página 35 de 40

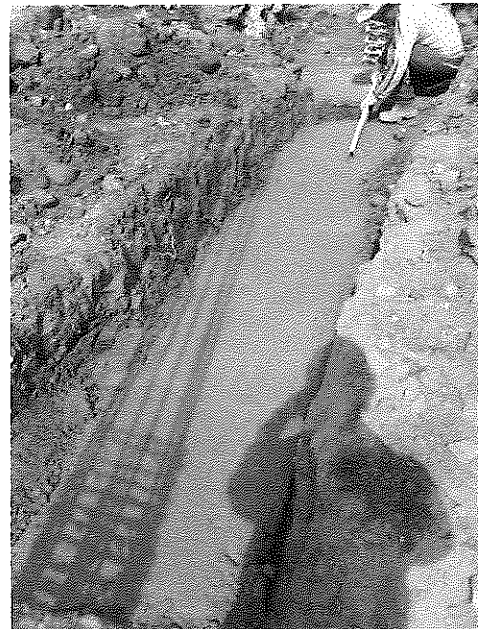

Solado en concreto de limpieza 2000 PSIS – 05 de octubre del 2024.

ITEM 2.02. CONSTRUCCIÓN ZAPATAS EN CONCRETO 210 KG/CM2-3000 PSI. VER DISEÑO.

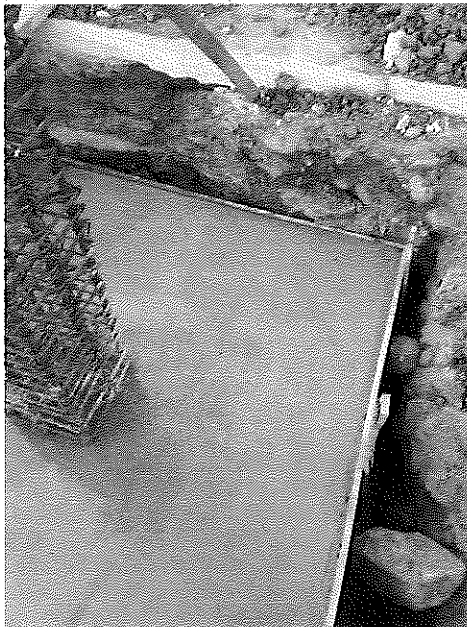

Construcción zapatas en concreto 3000 PSI – 07 al 15 de octubre del 2024.

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 36 de 40

Fecha Aprobación:
13/02/2023

ITEM 2.04. CONSTRUCCIÓN VIGA DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 210 KG/CM2-3000 PSI.



Construcción viga de cimentación - 15 al 25 de octubre del 2024.

ITEM 2.05. ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI VIGA DE CIMENTACIÓN.



Acero de refuerzo viga de cimentación - 10 al 18 de octubre del 2024.

ITEM 3.02. ACERO DE REFUERZO FY = 60000 PSI COLUMNAS:

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG		Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA		Versión: 2 Página 37 de 40



Acero de refuerzo de columnas - 15 al 29 de octubre del 2024.

ITEM NP 5.07. CORTE DE PLACA EN CONCRETO:



Corte de placa en concreto – 29 al 31 de octubre del 2024.

ITEM 6.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC-S DE 6", CON ACCESORIOS DE CONEXIÓN; PARA DESAGÜE:


Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
 Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderrhuila.gov.co - atencionusuario@inderrhuila.gov.co
 Neiva-Huila

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 38 de 40



Suministro e instalación tubería PVC-S de 6" - 29 al 31 de octubre del 2024.

ITEM 6.04. CAJA DE INSPECCION EN CONCRETO DE F'C=2500 PSI, DE SECCION 0.70*0.70, H: 1M INCLUYE CAÑUELA, TAPA EN CONCRETO REFORZADO DE 8 CMS, CON ESPESORES DE PAREDES DE 0.10 MTS. SEGUN DISEÑO:

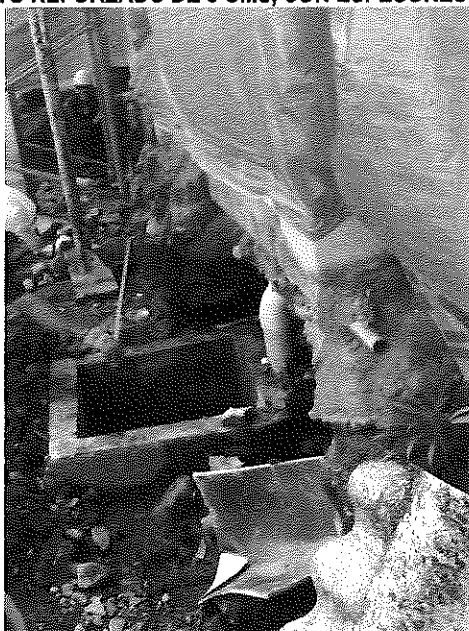

Cajas de inspección de aguas residuales - 29 al 31 de octubre del 2024.

ITEM NP 6.05. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRÁULICA 1" PRESIÓN.

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 39 de 40



Cajas de inspección de aguas residuales - 29 al 31 de octubre del 2024.

ITEM NP 6.06. SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA HIDRÁULICA 2" PRESIÓN.



Suministro e instalación tubería de 2" - 29 al 31 de octubre del 2024.

ITEM 8.01. TRANSPORTE DE MATERIALES PÉTREOS.

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - atencionusuario@inderhuila.gov.co
Neiva-Huila



 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2 Página 40 de 40



Transporte de materiales pétreos - 10 al 29 de octubre del 2024.

22. ANEXOS

- SOPORTES DE PAGO A APORTES A SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL (EPS-ARP-AFP) INTERVENTORIA.
- INFORME No. 3 DEL CONTRATISTA.

 ING. GILDARDO SERRATO SERRATO	 (30/10/2024)	 ING. CESAR JOAQUIN VELASQUEZ TIQUE
FIRMA ORIGINAL DIRECTOR DE INTERVENTORIA	FECHA DE ENTREGA	FIRMA ORIGINAL Vo.Bo APOYO SUPERVISION

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

Sucursal: GIGANTE (2 Afiliados)

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

RESUMEN DE PAGO

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671
672
673
674
675
676
677
678
679
680
681
682
683
684
685
686
687
688
689
690
691
692
693
694
695
696
697
698
699
700
701
702
703
704
705
706
707
708
709
710
711
712
713
714
715
716
717
718
719
720
721
722
723
724
725
726
727
728
729
730
731
732
733
734
735
736
737
738
739
740
741
742
743
744
745
746
747
748
749
750
751
752
753
754
755
756
757
758
759
760
761
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774
775
776
777
778
779
780
781
782
783
784
785
786
787
788
789
790
791
792
793
794
795
796
797
798
799
800
801
802
803
804
805
806
807
808
809
810
811
812
813
814
815
816
817
818
819
820
821
822
823
824
825
826
827
828
829
830
831
832
833
834
835
836
837
838
839
840
84

SALARIO										PENSION										SALUD						
Fecha Inicio vct	Fecha Fin vct	Fecha Inicio ht	Fecha Fin ht	Valor	Integral	Tip de Salario	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Tarifa Alto Riesgo Pension	Valor Cotización	Cotización Voluntaria Empleador	Cotización Voluntaria Afiliado	Fondo Solididad Pensional	Fondo Subsistencia	Valor No retenido	Total	AFP Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Valor UP	
																			\$449,200						\$515,100	
																			\$459,200						\$515,100	
				\$2,250,000	No		PORVENIR	30	\$2,250,000	169 SIN RIESGO		\$360,000	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$360,000	BUENA E.P.S.	30	\$2,250,000	12.5%	\$281,300		
				\$1,870,000	No		PORVENIR	30	\$1,870,000	169 SIN RIESGO		\$299,200	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$299,200	SANITAS	30	\$1,870,000	12.5%	\$233,800		
																			\$699,200						\$515,100	

CCF													RIESGOS				PARAFISCALES									
C	Total	EPS Destino	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Valor Cotización	Administradora	Días	IBC	Tarifa	Clase Riesgo	Valor Cotización	Días	IBC	Tarifa SENA	Valor Cotización SENA	Tarifa ICBF	Valor Cotización ICBF	Tarifa ESAP	Valor Cotización ESAP	Tarifa MEN	Valor Cotización MEN	Reservado SENA e ICBF		
	\$515,100						\$515,100						\$281,300						\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
	\$515,100						\$515,100						\$286,800						\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
	\$515,100						\$515,100						\$286,800						\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
50	\$281,300		CONFAMILIAR HULA	30	\$2,250,000	2%	\$45,000	ARL SURA	30	\$2,250,000	6.96%		\$156,400	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0	No	
50	\$233,800		CONFAMILIAR HULA	30	\$1,870,000	2%	\$37,400	ARL SURA	30	\$1,870,000	6.96%		\$130,200	30	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	0%	\$0	\$0	No	
	\$515,100						\$515,100						\$286,800						\$0	\$0	\$0	\$0	\$0	\$0		
