

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																																				
				VERSIÓN 1																																																																																				
				PÁGINA 1 DE 1																																																																																				
				FECHA 12 / 4 / 2024 (Día / Mes / Año)																																																																																				
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		PERIODO MES: DICIEMBRE 2023 (DEF)																																																																																				
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 31 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 31 (Indique el número del acta)																																																																																				
				VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1,822,783.00																																																																																				
<table><thead><tr><th></th><th>Día/Mes/Año</th><th>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</th><th>ING.</th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>12/04/2024</td><td></td><td>ING. WILSON PARRA</td><td></td><td>AJUSTES FORMATOS DEL ACTA DE AJUSTES 31</td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>15/04/2024</td><td></td><td>ING. RAUL FRANCO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>19/04/2024</td><td></td><td>ING. WILSON PARRA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>19/04/2024</td><td></td><td>ING. WILSON PARRA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>19/04/2024</td><td></td><td>ING. JOSE RICARDO BURBANO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td>25/04/2024</td><td></td><td>ING. JOSE RICARDO BURBANO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>25/04/2024</td><td></td><td>JAIDER DEVIA REY</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td></td><td></td><td>KAROL ROCA PACHECO</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING.	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12/04/2024		ING. WILSON PARRA		AJUSTES FORMATOS DEL ACTA DE AJUSTES 31	FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	15/04/2024		ING. RAUL FRANCO			FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	19/04/2024		ING. WILSON PARRA			FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	19/04/2024		ING. WILSON PARRA			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	19/04/2024		ING. JOSE RICARDO BURBANO			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)						FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL						FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	25/04/2024		ING. JOSE RICARDO BURBANO			FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA						FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	25/04/2024		JAIDER DEVIA REY			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)						FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO						FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO			KAROL ROCA PACHECO		
	Día/Mes/Año	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ING.	FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																																			
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	12/04/2024		ING. WILSON PARRA		AJUSTES FORMATOS DEL ACTA DE AJUSTES 31																																																																																			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	15/04/2024		ING. RAUL FRANCO																																																																																					
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	19/04/2024		ING. WILSON PARRA																																																																																					
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	19/04/2024		ING. WILSON PARRA																																																																																					
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	19/04/2024		ING. JOSE RICARDO BURBANO																																																																																					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																								
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL																																																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	25/04/2024		ING. JOSE RICARDO BURBANO																																																																																					
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA																																																																																								
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	25/04/2024		JAIDER DEVIA REY																																																																																					
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)																																																																																								
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO																																																																																								
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO			KAROL ROCA PACHECO																																																																																					
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																																								
ORDEN DE PAGO																																																																																								
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021																																																																																								
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"																																																																																								
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE NIT. 901.475.034-7																																																																																								
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING. KAROL ROCA PACHECO (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																																																																																								
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 1,836,103.00 VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																																																																																								
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES 31 DEL PERIODO DICIEMBRE DE 2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)																																																																																								
<table><tbody><tr><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Firma Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Matrícula No. 52202-46096 NRR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: 25/04/24 (Suscribe según su competencia)</td><td>Firma Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Matrícula No. 52202-46096 NRR DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: 25/04/24 (Suscribe según su competencia)</td><td>Firma Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Matrícula No. 25202-147800 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 26/04/24 (Suscribe según su competencia)</td><td>Firma Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO Matrícula No. 13202-115547 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:</td></tr></tbody></table>									Firma Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Matrícula No. 52202-46096 NRR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: 25/04/24 (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Matrícula No. 52202-46096 NRR DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: 25/04/24 (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Matrícula No. 25202-147800 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 26/04/24 (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO Matrícula No. 13202-115547 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																												
Firma Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Matrícula No. 52202-46096 NRR SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: 25/04/24 (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS Matrícula No. 52202-46096 NRR DIRECTOR TERRITORIAL Fecha firma: 25/04/24 (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: JAIDER ALEXIS DEVIA REY Matrícula No. 25202-147800 CND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 26/04/24 (Suscribe según su competencia)	Firma Nombre: ING. KAROL ROCA PACHECO Matrícula No. 13202-115547 ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																																					
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE		CÓDIGO MEP-MNL-IN-S-FR-1						
VERSION 1		PÁGINA DE 3							
FECHA 8 4 2024 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO						
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-23	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 31 (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)							
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)						
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)						
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE		FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)						
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00						
DATOS ESPECÍFICOS									
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: \$ 45.032.927.694,00									
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: \$ 42.575.422.338,00									
nov-23									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I ₀	I	I / I ₀	(A)	(B)	P ₀ =A-B	P _i =P ₀ *(I/I ₀)	P _i -P ₀	
1 Obras de Explanación	101.14	103.21	1.02047	\$7.546.657,00	\$188.666,00	\$7.357.991,00	\$7.508.609,00	\$150.618,00	
2 Sub-bases y bases	100.76	102.43	1.01657	\$17.211.256,00	\$430.281,00	\$16.780.975,00	\$17.059.036,00	\$278.061,00	
3 Transporte de materiales	100.39	100.89	1.00498	\$1.275.833,00	\$31.896,00	\$1.243.937,00	\$1.250.132,00	\$6.195,00	
4 Aceros y elementos metálicos	103.72	108.28	1.04396	\$461.024,00	\$11.526,00	\$449.498,00	\$469.258,00	\$19.760,00	
5 Acero Estructural y cables de acero	103.72	108.28	1.04396	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
6 Concretos, maderos y obras varias	101.91	104.30	1.02345	\$3.521.967,00	\$88.049,00	\$3.433.918,00	\$3.514.443,00	\$80.525,00	
7 Concreto para superestructuras	101.21	99.33	0.98142	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.13	104.67	1.04534	\$1.164.186,00	\$29.105,00	\$1.135.081,00	\$1.186.546,00	\$51.465,00	
Insumo Equipo	100.90	102.26	1.01348	\$1.350.845,00	\$33.771,00	\$1.317.074,00	\$1.334.828,00	\$17.754,00	
Insumo Asfalto	1752.87	1893.12	1.08001	\$7.312.543,00	\$182.814,00	\$7.129.729,00	\$7.700.179,00	\$570.450,00	
Insumo Otros Materiales	101.65	105.20	1.03492	\$10.068.053,00	\$251.701,00	\$9.816.352,00	\$10.159.139,00	\$342.787,00	
Insumo Transporte	100.05	100.43	1.00380	\$47.678,00	\$1.192,00	\$46.486,00	\$46.663,00	\$177,00	
Insumo Mano de Obra	101.59	102.56	1.00955	\$169.509,00	\$4.238,00	\$165.271,00	\$166.849,00	\$1.578,00	
TOTALES				\$ 50.128.551,00	\$ 1.253.239,00	\$ 48.876.312,00	\$ 50.395.682,00	\$ 1.519.370,00	\$ -

[Handwritten signature]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE							CÓDIGO MEPI-MN1-IN-5-FR-1	
								VERSIÓN 1	
								PÁGINA DE 3	
								FECHA 8 4 2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-23		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 31 (D)		(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)			
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
				FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 (Indique número y año)				VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00					
CAPÍTULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA NOVIEMBRE 2023	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Ia	I	I / Ia	(A)	(B)	Pa=A-B	Pi=Pa*(I/Ia)	Pi-Pa	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103,28	121,72	1,17859	\$7.546.657,00	\$188.666,00	\$7.357.991,00	\$8.672.055,00	\$1.314.064,00	
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102,44	123,34	1,20405	\$17.211.256,00	\$430.281,00	\$16.780.975,00	\$20.205.133,00	\$3.424.158,00	
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	134,49	1,28884	\$788.164,00	\$19.704,00	\$768.460,00	\$990.422,00	\$221.962,00	
Insumo Maquinaria	102,47	119,52	1,16639	\$1.350.845,00	\$33.771,00	\$1.317.074,00	\$1.536.222,00	\$219.148,00	
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$7.312.543,00	\$182.814,00	\$7.129.729,00	\$11.831.286,00	\$4.701.557,00	
Insumo Otros Materiales	108,63	132,59	1,22057	\$10.068.053,00	\$251.701,00	\$9.816.352,00	\$11.981.545,00	\$2.165.193,00	
Insumo Transporte	100,56	117,01	1,16358	\$47.678,00	\$1.192,00	\$46.486,00	\$54.090,00	\$7.604,00	
Insumo Mano de Obra	102,30	120,51	1,17801	\$169.509,00	\$4.238,00	\$165.271,00	\$194.691,00	\$29.420,00	
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109,42	123,93	1,13257	\$4.073.121,00	\$101.828,00	\$3.971.293,00	\$4.497.767,00	\$526.474,00	
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105,35	125,70	1,19315	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108,95	126,11	1,15751	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102,36	136,62	1,33474	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	100,89	119,68	1,18624	\$1.275.833,00	\$31.896,00	\$1.243.937,00	\$1.475.608,00	\$231.671,00	
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101,97	120,17	1,17847	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102,07	119,83	1,17406	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	123,43	1,19821	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Equipo	102,47	119,52	1,16639	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Otros Materiales	108,63	132,59	1,22057	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Transporte	100,56	117,01	1,16358	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Mano de Obra	102,30	120,51	1,17801	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103,44	123,71	1,19599	\$285.892,00	\$7.147,00	\$278.745,00	\$333.376,00	\$54.631,00	
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106,31	130,90	1,23134	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Transporte elevado Preliminares 14101	101,57	121,73	1,19848	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	102,82	125,52	1,22074	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Transporte elevado Rellenos 14103	107,49	127,66	1,18762	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Transporte elevado Subestructura 14104	102,58	129,75	1,26488	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Transporte elevado Superestructura 14105	112,43	134,45	1,19584	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
TOTALES				\$ 50.129.551,00	\$ 1.253.238,00	\$ 48.876.313,00	\$ 61.772.195,00	\$ 12.895.882,00	

[Handwritten signature]

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE				CÓDIGO MEH-MN1-IN-S-FR-1	
					VERSIÓN 1	
					PÁGINA DE 3	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ				ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)				ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31				MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-23				ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 31 (D)				(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)			

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)				INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030				VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)				VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00			
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00															

dic-23									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I _o	I	I / I _o	(A)	(B)	P _o =A-B	P _i =P _o *(I/I _o)	P _i -P _o	
1 Obras de Explanación	101.14	103.21	1.02047	\$142.495.426,00	\$3.562.386,00	\$138.933.040,00	\$141.776.999,00	\$2.843.959,00	\$95.810.118,00
2 Sub-bases y bases	100.76	102.43	1.01657	\$324.981.694,00	\$8.124.542,00	\$316.857.152,00	\$322.107.475,00	\$5.250.323,00	\$239.917.719,00
3 Transporte de materiales	100.39	100.89	1.00498	\$24.090.185,00	\$602.255,00	\$23.487.930,00	\$23.604.900,00	\$116.970,00	\$6.100.208,00
4 Aceros y elementos metálicos	103.72	108.28	1.04396	\$8.705.024,00	\$217.626,00	\$8.487.398,00	\$8.860.504,00	\$373.106,00	\$58.076.081,00
5 Acero Estructural y cables de acero	103.72	108.28	1.04396	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
6 Concretos, morteros y obras varias	101.91	104.30	1.02345	\$66.501.527,00	\$1.662.538,00	\$64.838.989,00	\$66.359.463,00	\$1.520.474,00	\$117.880.802,00
7 Concreto para superestructuras	101.21	99.33	0.98142	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.13	104.67	1.04534	\$21.982.082,00	\$549.552,00	\$21.432.530,00	\$22.404.281,00	\$971.751,00	\$225.327.215,00
Insuno Equipo	100.90	102.26	1.01348	\$25.506.557,00	\$637.664,00	\$24.868.893,00	\$25.204.126,00	\$335.233,00	\$7.950.066,00
Insuno Asfalto	1752.87	1893.12	1.08001	\$138.074.910,00	\$3.451.873,00	\$134.623.037,00	\$145.394.226,00	\$10.771.189,00	\$312.526.798,00
Insuno Otros Materiales	101.65	105.20	1.03492	\$190.104.255,00	\$4.752.606,00	\$185.351.649,00	\$191.824.129,00	\$6.472.480,00	\$153.485.168,00
Insuno Transporte	100.05	100.43	1.00380	\$900.250,00	\$22.506,00	\$877.744,00	\$881.079,00	\$3.335,00	\$79.095,00
Insuno Mano de Obra	101.59	102.56	1.00955	\$3.200.650,00	\$80.016,00	\$3.120.634,00	\$3.150.436,00	\$29.802,00	\$707.620,00
TOTALES				\$ 946.542.560,00	\$ 23.663.564,00	\$ 922.878.996,00	\$ 951.567.618,00	\$ 28.688.622,00	\$ 1.217.860.890,00
				VALOR AJUSTE		\$ 30.207.992,00		\$ 1.217.860.890,00	
				VALOR IVA		\$ 220.750,00		\$ 8.899.753,00	
				VALOR TOTAL ICOP		\$ 30.428.742,00		\$ 1.226.760.643,00	

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (%) (tres decimales)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE

DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ

ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. (P)

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31

MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-23

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 31 (D)

(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

FECHA

842024

(Día / Mes / Año)

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021

PLAZO INICIAL: 114 MESES

PLAZO ACUMULADO: 114 MESES

(Indique número y año)

(En meses según contrato principal)

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

OBJETO:

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021

FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030

MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”

(Indique día/mes/año)

(Includas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

FECHA DE SUSPENSIÓN:

FECHA DE REANUDACIÓN:

CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021

INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00

VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00

(Indique número y año)

(Según contrato principal)

(Indique día/mes/año)

CAPÍTULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2023	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Ia	I	I / Ia	(A)	(B)	Pa=A-B	Pi=Pa*(I/Ia)	Pi-Pa	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103,28	121,82	1,17956	\$142.495.426,00	\$3.562.386,00	\$138.933.040,00	\$163.879.857,00	\$24.946.817,00	\$445.708.295,00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102,44	122,89	1,19965	\$324.981.694,00	\$8.124.542,00	\$316.857.152,00	\$380.117.682,00	\$63.260.530,00	\$1.584.865.034,00
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	134,76	1,29142	\$14.882.056,00	\$372.051,00	\$14.510.005,00	\$18.738.511,00	\$4.228.506,00	\$700.987.022,00
Insumo Maquinaria	102,47	119,72	1,16834	\$25.506.557,00	\$637.664,00	\$24.868.893,00	\$29.055.322,00	\$4.186.429,00	\$69.683.979,00
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$138.074.910,00	\$3.451.873,00	\$134.623.037,00	\$223.397.506,00	\$88.774.469,00	\$2.347.604.567,00
Insumo Otros Materiales	108,63	132,73	1,22185	\$190.104.255,00	\$4.752.606,00	\$185.351.649,00	\$226.471.912,00	\$41.120.263,00	\$856.159.743,00
Insumo Transporte	100,56	117,03	1,16378	\$900.250,00	\$22.506,00	\$877.744,00	\$1.021.501,00	\$143.757,00	\$2.291.075,00
Insumo Mano de Obra	102,30	120,51	1,17801	\$3.200.650,00	\$80.016,00	\$3.120.634,00	\$3.676.138,00	\$555.504,00	\$10.249.014,00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109,42	123,96	1,13284	\$76.908.387,00	\$1.922.710,00	\$74.985.677,00	\$84.946.774,00	\$9.961.097,00	\$625.780.882,00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105,35	125,75	1,19363	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108,95	126,38	1,15999	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$217.596.239,00
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102,36	134,17	1,31080	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.098.836,00
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608	100,89	119,69	1,18634	\$24.090.185,00	\$602.255,00	\$23.487.930,00	\$27.864.671,00	\$4.376.741,00	\$121.040.477,00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101,97	120,12	1,17798	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.547.648,00
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102,07	119,71	1,17288	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.104.499,00
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	123,25	1,19646	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$56.097.130,00
Insumo Equipo	102,47	119,72	1,16834	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Otros Materiales	108,63	132,73	1,22185	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Transporte	100,56	117,03	1,16378	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Mano de Obra	102,30	120,51	1,17801	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103,44	123,98	1,19860	\$5.398.190,00	\$134.955,00	\$5.263.235,00	\$6.308.513,00	\$1.045.278,00	\$1.706.346,00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106,31	130,70	1,22946	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.192.965,00
Transporte elevado Preliminares 14101	101,57	121,94	1,20055	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	102,82	126,16	1,22696	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Transporte elevado Rellenos 14103	107,49	128,33	1,19386	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Transporte elevado Subestructura 14104	102,58	130,49	1,27209	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$101.617,00
Transporte elevado Superestructura 14105	112,43	132,33	1,17699	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-5-FR-1	
					VERSION	1	
					PÁGINA	8	DE 3

		FECHA	8	4	2024
		(Día / Mes / Año)			

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-23	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. 31 (D)	
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)			

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	FECHA DE SUSPENSIÓN: _____ (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)
	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00
	VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00

	TOTALES	\$	946.542.560,00	\$	23.663.564,00	\$	922.878.996,00	\$	1.165.478.387,00	\$	242.599.391,00	\$	7.088.815.368,00
PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (trecer decimales)											VALOR AJUSTE	\$	255.495.273,00
											VALOR IVA	\$	1.867.081,00
											VALOR TOTAL ICOCIV	\$	257.362.354,00
											VALOR AJUSTE	\$	285.703.265,00
											VALOR IVA	\$	2.087.832,00
											VALOR TOTAL ICCP + ICOCIV	\$	287.791.097,00

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">RESUMEN ACTAS DE AJUSTE PROVISIONAL ACTA DICIEMBRE 2023</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">VALOR AJUSTE Provisional 31 Dic 23</td> <td style="width: 10%;">\$</td> <td style="width: 40%;">283.880.482,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR IVA</td> <td>\$</td> <td>2.074.511,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL AJUSTE</td> <td>\$</td> <td>285.954.993,00</td> </tr> </table>	RESUMEN ACTAS DE AJUSTE PROVISIONAL ACTA DICIEMBRE 2023			VALOR AJUSTE Provisional 31 Dic 23	\$	283.880.482,00	VALOR IVA	\$	2.074.511,00	VALOR TOTAL AJUSTE	\$	285.954.993,00	<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <th colspan="3">RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR DEFINITIVO</th> </tr> <tr> <td style="width: 50%;">VALOR AJUSTE DEFINITIVO</td> <td style="width: 10%;">\$</td> <td style="width: 40%;">1.822.783</td> </tr> <tr> <td>VALOR IVA</td> <td>\$</td> <td>13.320,00</td> </tr> <tr> <td>VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR</td> <td>\$</td> <td>1.836.103,00</td> </tr> </table>	RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR DEFINITIVO			VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	1.822.783	VALOR IVA	\$	13.320,00	VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	1.836.103,00
RESUMEN ACTAS DE AJUSTE PROVISIONAL ACTA DICIEMBRE 2023																									
VALOR AJUSTE Provisional 31 Dic 23	\$	283.880.482,00																							
VALOR IVA	\$	2.074.511,00																							
VALOR TOTAL AJUSTE	\$	285.954.993,00																							
RESUMEN ACTAS DE AJUSTE A COBRAR DEFINITIVO																									
VALOR AJUSTE DEFINITIVO	\$	1.822.783																							
VALOR IVA	\$	13.320,00																							
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	\$	1.836.103,00																							

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: \$ 1.822.783,00	VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 1.836.103,00 (Indicar el valor incluido IVA)
VALOR EN LETRAS: UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS MCTE	

NOTAS:

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.
2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
7. El interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deben estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:  Nombre: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO Representante Legal o Apoderado CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE Matrícula Profesional No.: 25202-57327 CND	Firma:  Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RÍOS Representante Legal o Apoderado CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030 Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND
---	---

Original: Para el trámite de pago de la cuenta, (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO

AFINCO-FR-12

VERSIÓN

1

PÁGINA

1

DE

1

CONTRATO No: 991 DE 2021

%

TIPO PAGO:

NUMERO DE ACTA O CUENTA
DE COBRO

PERIODO

ANTICIPO

2,500%

ACTA DE OBRA

PAGO ANTICIPADO

ACTA DE INTERVENTORIA

DESEMBOLSO

ACTA DE AJUSTE

X

31

DICIEMBRE 2023 DEF

PRESTACION DE SERVICIOS

OTRO

CUAL? _____

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.

(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO

RP 240424

RUBRO No.

C-2401-0600-132-51102D-2401017-02

RECURSO No.

16

VALOR AFECTADO

\$ 225.611,00

No. COMPROMISO

RP 136723

RUBRO No.

C-2401-0600-135-0-2401008-02

RECURSO No.

11

VALOR AFECTADO

\$ 1.610.492,00

TOTAL ACTA

\$ 1.836.103,00

NOTA: Si el recurso es No. 14, favor indicar Entidad Financiadora: _____

(BID, USAID, CAF, Etc...)

Firmado digitalmente
por JOSE RICARDO
BURBANO BARCENAS

JOSE RICARDO BURBANO BARCENAS
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL		CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. 991 DE 2021 Contratista CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

Acta No. Acta de Ajuste Definitivo 31 Dic-23 Valor basico \$ 1,822,783.00 Período: dic-23

Valor incluido el Iva: \$ 1,836,103.00

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1	3001	NEIVA - BALSILLAS	\$ 1,525,034.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 1,525,034.00
2	3002	BALSILLAS - MINA BLANCA	\$ 85,458.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 85,458.00
3	6504	PUERTO RICO - MINA BLANCA	\$ 225,611.00	\$ -	\$ 0.00	\$ 225,611.00
4	6503	FLORENCIA - PUERTO RICO	\$ -	\$ -	\$ 0.00	\$ -
TOTALES			\$ 1,836,103.00	\$ -	\$ -	\$ 1,836,103.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

DEPARTAMENTO 1 - HUILA			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
891180009-1	MUNICIPIO 1	NEIVA	\$ 1,525,034.00	\$ 1,513,970.71
			\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 1 - HUILA			\$ 1,525,034.00	\$ 1,513,971.00
DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800095785-2	MUNICIPIO 1	SAN VICENTE DEL CAGUAN	\$ 311,069.00	\$ 308,812.29
800095775-9	MUNICIPIO 2	PUERTO RICO	\$ -	\$ -
800095770-9	MUNICIPIO 3	EL DONCELLO	\$ -	\$ -
800095763-0	MUNICIPIO 4	EL PAUJIL	\$ -	\$ -
800095770-2	MUNICIPIO 5	MONTAÑITA	\$ -	\$ -
800095728-2	MUNICIPIO 6	FLORENCIA	\$ -	\$ -
TOTAL DEPARTAMENTO 2 - CAQUETÁ			\$ 311,069.00	\$ 308,812.00
TOTAL			\$ 1,836,103.00	\$ 1,822,783.00




ANIBAL OJEDA CARRIAZO
 Representante Legal
 CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
 Matrícula No.: 25202-57327 CND



JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
 Representante Legal
 CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
 Matrícula. No. 25202-44184 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEP1/MN1-IN-4-FR-1							
VERSIÓN 1																	
PÁGINA DE 7																	
FECHA 31 12 2023 (Día / Mes / Año)																	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA No. 31 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 996.672.111,00 MES dic-23 ACTA FINAL ☐																	
CONTRATO No : 991 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código via)										FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.895.528.238,00 (Indique día/mes/año)					
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C)=(A+B): \$ 409.452.964.666,00							
No. DE ORDEN	GPP	GRUPO DE AJUSTE			CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Modificación No. \$		Última Acta de fecha 29/09/2023		OBRA EJECUTADA				
					GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA	ACUMULADO		
EXPLANACIONES																	
1	E	1			201-13		Demolición de Estructuras	m3	3,724.00	\$ 113,387.00	\$ 422,253,188.00	-	\$ -	-	\$ -		
1.1	E	1-11601	1	11,601	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113,387.00	\$ -	2,979.00	\$ 337,779,873.00	\$ 1,239.07	\$ 140,494,110.00		
1.2	E	1-11701	1	11,701	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113,387.00	\$ -	559.00	\$ 63,383,333.00	\$ -	\$ -		
1.3	E	1-14101	1	14,101	201-13		Demolición de Estructuras	m3	-	\$ 113,387.00	\$ -	186.00	\$ 21,089,982.00	\$ -	\$ -		
2	E	1			201-13		Remoción de alcantarillas	m	5,644.00	\$ 69,636.00	\$ 393,025,584.00	-	\$ -	-	\$ -		
2.1	E	1-11601	1	11,601	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	\$ 69,636.00	\$ -	4,515.00	\$ 314,406,540.00	\$ 237.00	\$ 16,503,732.00		
2.2	E	1-11701	1	11,701	201-13		Remoción de alcantarillas	m	-	\$ 69,636.00	\$ -	1,129.00	\$ 78,619,044.00	\$ -	\$ -		
3	E	1			201-13		Remoción de cercas de alambre	m	220,599.00	\$ 4,475.00	\$ 987,180,525.00	-	\$ -	-	\$ -		
3.1	E	1-11601	1	11,601	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	\$ 4,475.00	\$ -	130,000.00	\$ 581,750,000.00	\$ 205.00	\$ 917,375.00		
3.2	E	1-11701	1	11,701	201-13		Remoción de cercas de alambre	m	-	\$ 4,475.00	\$ -	30,000.00	\$ 134,250,000.00	\$ -	\$ -		
4	E	1			210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	1,139,426.00	\$ 10,216.00	\$ 11,640,376,016.00	1,960.51	\$ 20,028,570.00	\$ 1,960.51	\$ 20,028,570.00		
4.1	E	1-11601	1	11,601	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10,216.00	\$ -	454,197.00	\$ 4,640,076,552.00	\$ 55,796.26	\$ 570,014,592.00		
4.2	E	1-11701	1	11,701	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10,216.00	\$ -	113,549.00	\$ 1,160,016,584.00	\$ -	\$ -		
4.3	E	1-14101	1	14,101	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10,216.00	\$ -	113,549.00	\$ 1,160,016,584.00	\$ -	\$ -		
4.4	E	1-11606	1	11,606	210-13		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	m3	-	\$ 10,216.00	\$ -	75,700.49	\$ 773,356,206.00	\$ -	\$ -		
5	E	1			210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	74,655.00	\$ 60,376.00	\$ 4,507,370,280.00	-	\$ -	-	\$ -		
5.1	E	1-11601	1	11,601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60,376.00	\$ -	36,394.00	\$ 2,197,324,144.00	68.48	\$ 4,134,548.00		
5.2	E	1-11701	1	11,701	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60,376.00	\$ -	9,099.00	\$ 549,361,224.00	\$ -	\$ -		
5.3	E	1-14101	1	14,101	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60,376.00	\$ -	9,099.00	\$ 549,361,224.00	\$ -	\$ -		
5.4	E	1-11606	1	11,606	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	-	\$ 60,376.00	\$ -	6,065.00	\$ 366,180,440.00	\$ -	\$ -		
6	E	1			211-13		Remoción de Derrumbes	m3	126,989.00	\$ 9,747.00	\$ 1,237,761,783.00	108,918.32	\$ 1,061,626,865.00	4,072.00	\$ 39,689,784.00		
6.1	E	1-11601	1	11,601	211-13		Remoción de Derrumbes	m3	-	\$ 9,747.00	\$ -	-	\$ -	-	\$ -		
7	E	1			220-13		Terraplenes	m3	680,805.00	\$ 12,594.00	\$ 8,574,058,170.00	-	\$ -	-	\$ -		
7.1	E	1-11601	1	11,601	220-13		Terraplenes	m3	-	\$ 12,594.00	\$ -	160,000.00	\$ 2,015,040,000.00	\$ -	\$ -		
7.2	E	1-11701	1	11,701	220-13		Terraplenes	m3	-	\$ 12,594.00	\$ -	40,000.00	\$ 503,760,000.00	\$ -	\$ -		
8	E	1			230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	550,000.00	\$ 10,300.00	\$ 5,665,000,000.00	-	\$ -	-	\$ -		
8.1	E	1-11601	1	11,601	230-1P		Mejoramiento de la subrasante con adición de materiales	m3	-	\$ 10,300.00	\$ -	300,000.00	\$ 3,090,000,000.00	\$ -	\$ -		
9	E	1			231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	467,519.00	\$ 7,521.00	\$ 3,516,210,399.00	-	\$ -	-	\$ -		
9.1	E	1-11601	1	11,601	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	\$ 7,521.00	\$ -	240,000.00	\$ 1,805,040,000.00	\$ 3,787.67	\$ 28,487,066.00		
9.2	E	1-11701	1	11,701	231-13		Geotextil para separación de suelos de subrasante y capas granulares	m2	-	\$ 7,521.00	\$ -	60,001.00	\$ 451,267,521.00	\$ -	\$ -		
10	E	1					Conformación de taludes existentes	m2	261,070.00	\$ 1,332.00	\$ 347,745,240.00	-	\$ -	-	\$ -		
10.1	E	1-11606	1	11,606			Conformación de taludes existentes	m2	-	\$ 1,332.00	\$ -	261,070.00	\$ 347,745,240.00	\$ -	\$ -		
Subtotal										\$ 37,290,981,185.00		\$ 22,397,614,844.00		\$ 43,824,332.00		\$ 2,852,619,668.00	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																	
11	S	2			310-13		Conformación de la calzada existente	m2	1,100,000.00	\$ 927.00	\$ 1,019,700,000.00	401,211.66	\$ 371,923,209.00	\$ 401,211.66	\$ 371,923,209.00		
11.1	S	2-11602	2	11,602	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	\$ 927.00	\$ -	959,031.00	\$ 889,021,737.00	\$ -	\$ -		
11.2	S	2-11702	2	11,702	310-13		Conformación de la calzada existente	m2	-	\$ 927.00	\$ -	139,757.34	\$ 129,555,054.00	\$ -	\$ -		
12	S	2			320-13		Subbase Granular clase A	m3	164,000.00	\$ 145,000.00	\$ 23,780,000,000.00	1,504.26	\$ 218,117,700.00	\$ 1,504.26	\$ 218,117,700.00		
12.1	S	2-11602	2	11,602	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 145,000.00	\$ -	145,236.00	\$ 21,059,220,000.00	868.83	\$ 125,980,350.00		
12.2	S	2-11702	2	11,702	320-13		Subbase Granular clase A	m3	-	\$ 145,000.00	\$ -	36,308.74	\$ 5,264,767,300.00	\$ -	\$ -		
13	S	2					Sub-base granular para bacheo clase A	m3	12,300.00	\$ 180,245.00	\$ 2,217,013,500.00	-	\$ -	-	\$ -		
13.1	S	2-11602	2	11,602			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 180,245.00	\$ -	9,840.00	\$ 1,773,810,800.00	\$ -	\$ -		
13.2	S	2-11702	2	11,702			Sub-base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 180,245.00	\$ -	2,460.00	\$ 443,402,700.00	\$ -	\$ -		
14	B	2			330-13		Base granular clase A	m3	186,000.00	\$ 155,000.00	\$ 28,830,000,000.00	-	\$ -	-	\$ -		
14.1	B	2-11602	2	11,602	330-13		Base granular clase A	m3	-	\$ 155,000.00	\$ -	155,100.00	\$ 24,040,500,000.00	1,394.92	\$ 216,212,600.00		
14.2	B	2-11702	2	11,702	330-13		Base granular clase A	m3	-	\$ 155,000.00	\$ -	38,775.00	\$ 6,010,125,000.00	\$ -	\$ -		
15	B	2			330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	7,140.00	\$ 190,385.00	\$ 1,359,348,900.00	-	\$ -	-	\$ -		
15.1	B	2-11602	2	11,602	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 190,385.00	\$ -	5,712.00	\$ 1,087,479,120.00	\$ 15.30	\$ 2,912,891.00		
15.2	B	2-11702	2	11,702	330-13		Base granular para bacheo clase A	m3	-	\$ 190,385.00	\$ -	1,428.00	\$ 271,869,780.00	\$ -	\$ -		
Subtotal										\$ 57,206,062,400.00		\$ 61,559,592,400.00		\$ 342,192,950.00		\$ 14,657,806,965.00	
PAVIMENTOS ASFÁLTICOS																	
16	P	8			421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	1,100,000.00	\$ 1,849.00	\$ 2,033,900,000.00	-	\$ -	-	\$ -		
16.1	P	8-11603	8	11,603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1,849.00	\$ -	911,324.00	\$ 1,686,038,076.00	8,474.97	\$ 15,670,220.00		
16.2	P	8-11703	8	11,703	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1,849.00	\$ -	170,873.00	\$ 315,944,177.00	\$ -	\$ -		
16.3	P	8-14104	8	14,104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	-	\$ 1,849.00	\$ -	56,958.00	\$ 105,315,342.00	\$ -	\$ -		
17	P	8			450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	99,000.00	\$ 775,000.00	\$ 76,725,000,000.00	-	\$ -	-	\$ -		
17.1	P	8-11603	8	11,603	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775,000.00	\$ -	66,969.26	\$ 51,901,176,501.00	\$ -	\$ -		
17.2	P	8-11703	8	11,703	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775,000.00	\$ -	12,000.00	\$ 9,300,000,000.00	\$ -	\$ -		
17.3	P	8-14104	8	14,104	450-1P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	-	\$ 775,000.00	\$ -	4,000.00	\$ 3,100,000,000.00	\$ -	\$ -		
18	P	8			450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	86,028.00	\$ 775,000.00	\$ 66,671,700,000.00	-	\$ -	-	\$ -		
18.1	P	8-11603	8	11,603	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775,000.00	\$ -	68,885.00	\$ 53,385,875,000.00	486.11	\$ 376,735,250.00		
18.2	P	8-11703	8	11,703	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775,000.00	\$ -	12,916.00	\$ 10,009,900,000.00	\$ -	\$ -		
18.3	P	8-14104	8	14,104	450-2P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19	m3	-	\$ 775,000.00	\$ -	4,305.00	\$ 3,336,375,000.00	\$ -	\$ -		
19	P	8			450-9P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	3,808.00	\$ 856,527.00	\$ 3,261,654,816.00	-	\$ -	-	\$ -		
19.1	P	8-11603	8	11,603	450-9P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	\$ 856,527.00	\$ -	3,046.00	\$ 2,608,981,242.00	\$ -	\$ -		
19.2	P	8-11703	8	11,703	450-9P		Mezcla densa en caliente tipo MDC-19 para bacheos	m3	-	\$ 856,527.00	\$ -	762.00					

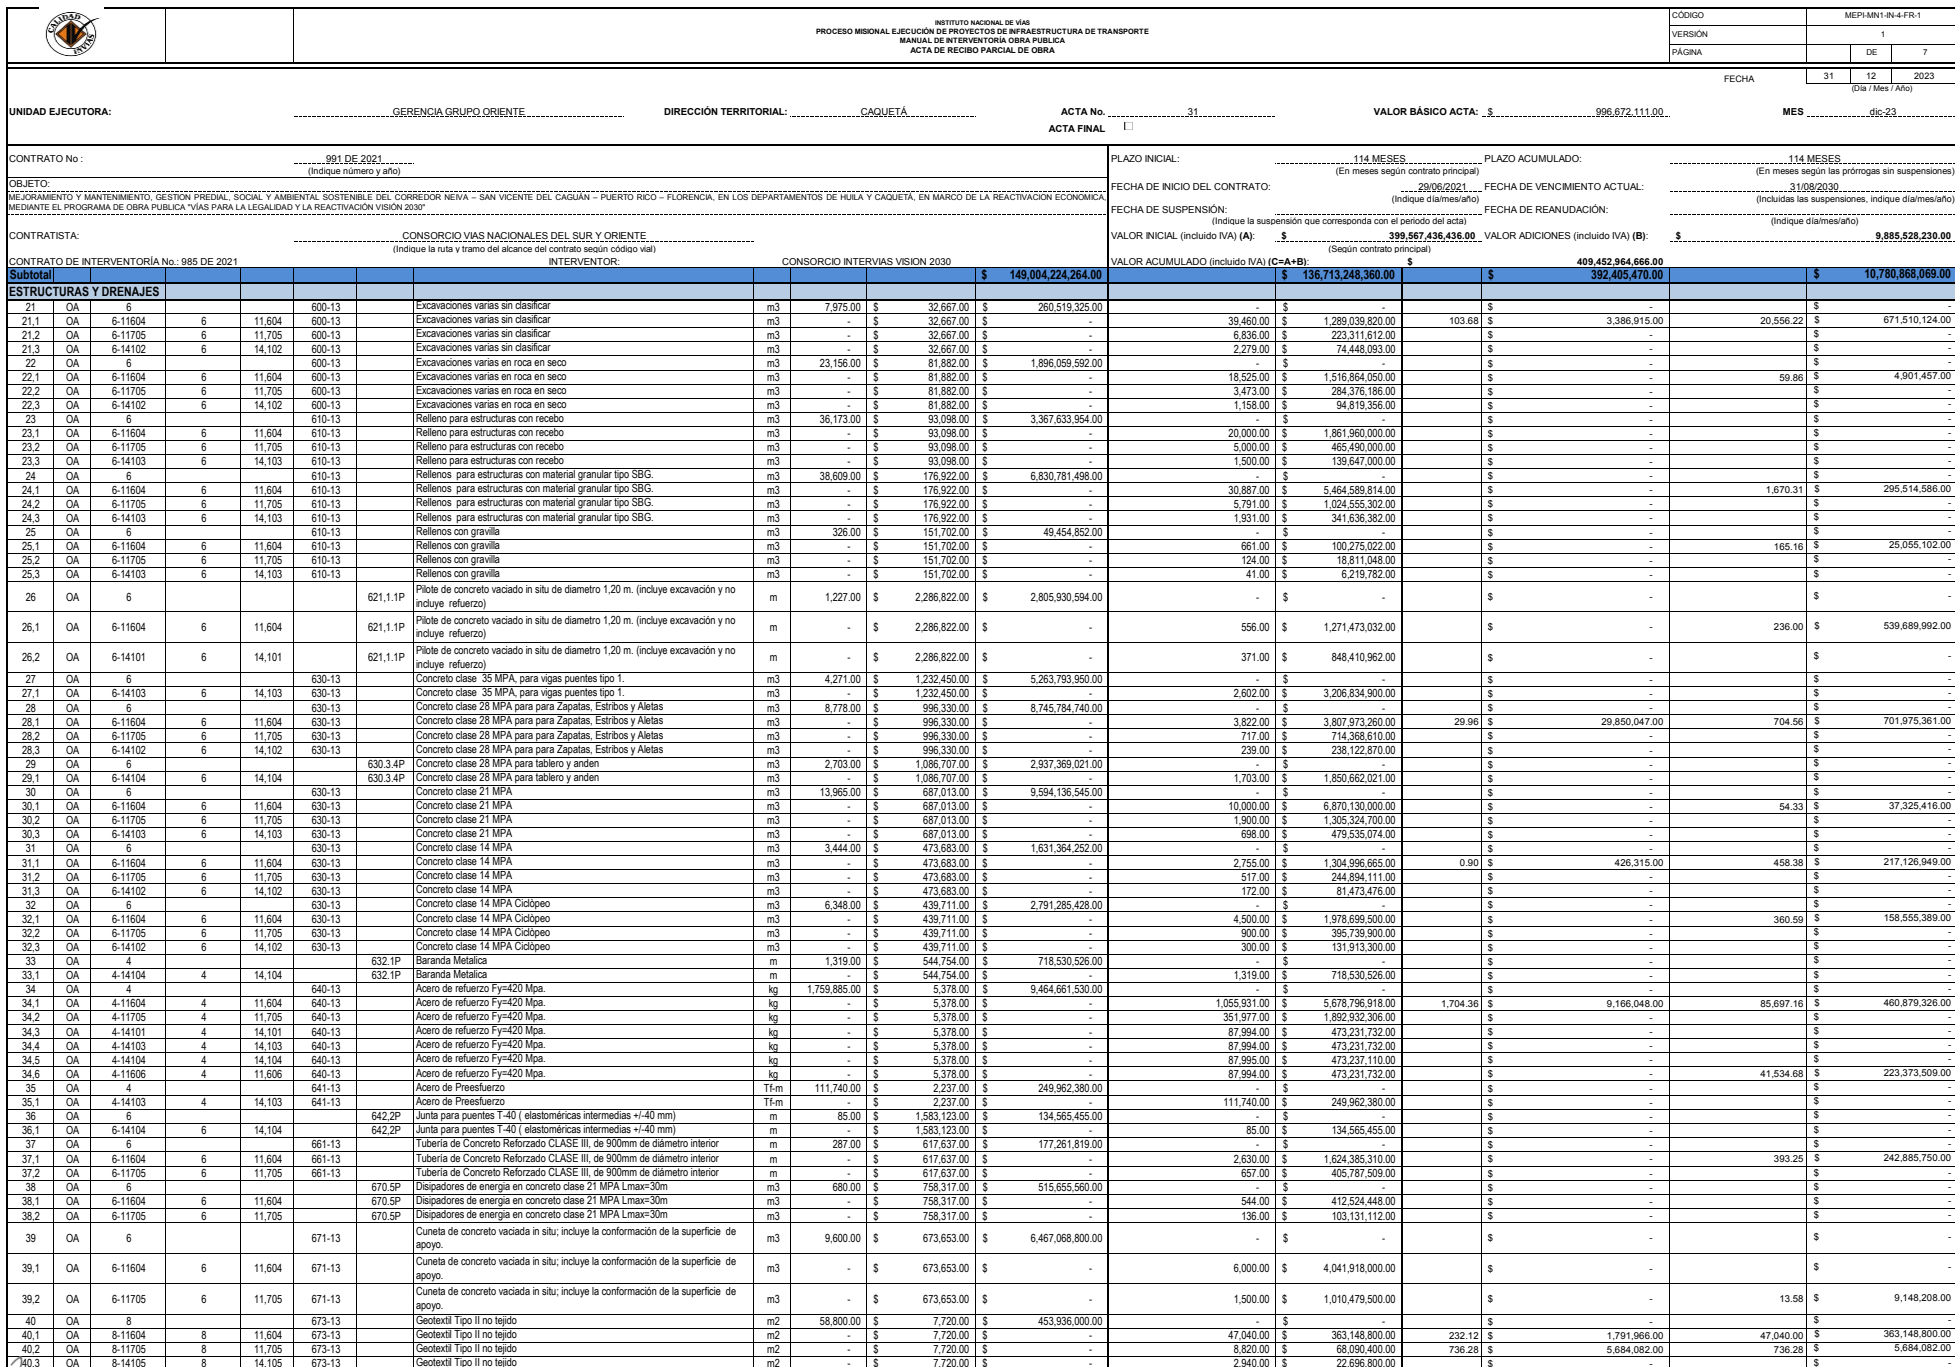

										INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSION PÁGINA		MEPH-M1-IN-4-FR-1 1 7		
										FECHA		31122023 (Día / Mes / Año)												
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE										DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETA		ACTA No. 31		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 996,672,111.00		MES: dic-23								
CONTRATO No.: 091 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)												
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 20090202 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31082030 (Incluya las suspensiones, indique día/mes/año)												
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código viat)										FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:												
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021										VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399,567,436,436.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9,885,528,230.00												
INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409,452,964,666.00														
41	OA	6			673-13	Material granular drenante	m3	6,032.00	\$	136,094.00	\$	1,093,107,008.00												
41.1	OA	6-11604	6	11,604	673-13	Material granular drenante	m3	-	\$	136,094.00	\$	-	16,426.00	\$	2,235,480,044.00	209.92	\$	28,568,852.00	8,279.52	\$	1,126,792,995.00			
41.2	OA	6-11705	6	11,705	673-13	Material granular drenante	m3	-	\$	136,094.00	\$	-	1,205.00	\$	163,993,270.00		\$	-		\$	-			
41.3	OA	6-14105	6	14,105	673-13	Material granular drenante	m3	-	\$	136,094.00	\$	-	401.00	\$	54,573,694.00		\$	-		\$	-			
42	OA	6			681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	11,112.00	\$	237,444.00	\$	2,638,477,728.00	-	\$	-		\$	-		\$	-			
42.1	OA	6-11604	6	11,604	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	\$	237,444.00	\$	-	8,890.00	\$	2,110,877,160.00		\$	-	230.00	\$	54,612,120.00			
42.2	OA	6-11705	6	11,705	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	\$	237,444.00	\$	-	1,667.00	\$	395,819,148.00		\$	-		\$	-			
42.3	OA	6-14105	6	14,105	681-13	Gaviones de malla de alambre de acero entrelazado clase 1: recubrimiento de zinc (galvanizado)	m3	-	\$	237,444.00	\$	-	555.00	\$	131,781,420.00		\$	-		\$	-			
Subtotal												\$ 68,087,340,557.00		\$ 61,349,002,354.00		\$ 78,874,225.00		\$ 5,138,179,166.00						
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																								
43	SCT	8				Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	220,000.00	\$	1,794.00	\$	394,680,000.00	-	\$	-		\$	-		\$	-		
43.1	SCT	8-11607	8	11,607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	\$	1,794.00	\$	-	526,000.00	\$	943,644,000.00		\$	-	166,458.91	\$	298,627,285.00		
43.2	SCT	8-11710	8	11,710		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	\$	1,794.00	\$	-	83,000.00	\$	148,902,000.00		\$	-	33,000.00	\$	59,202,000.00		
43.3	SCT	8-14104	8	14,104		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	-	\$	1,794.00	\$	-	13,000.00	\$	23,322,000.00		\$	-	464.00	\$	832,416.00		
44	SCT	8				Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	110,000.00	\$	22,076.00	\$	2,428,360,000.00	-	\$	-		\$	-		\$	-		
44.1	SCT	8-11607	8	11,607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	\$	22,076.00	\$	-	80,000.00	\$	1,766,080,000.00		\$	-	482.41	\$	10,649,683.00		
44.2	SCT	8-11710	8	11,710		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	\$	22,076.00	\$	-	16,500.00	\$	364,254,000.00		\$	-		\$	-		
44.3	SCT	8-14104	8	14,104		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca Vial con pintura en frío	m2	-	\$	22,076.00	\$	-	5,500.00	\$	121,418,000.00		\$	-		\$	-		
45	SCT	8				Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	375.00	\$	396,630.00	\$	148,736,250.00	-	\$	-		\$	-		\$	-		
45.1	SCT	8-11607	8	11,607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$	396,630.00	\$	-	400.00	\$	158,652,000.00		\$	-	6.00	\$	2,379,780.00		
45.2	SCT	8-11710	8	11,710		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$	396,630.00	\$	-	90.00	\$	35,696,700.00		\$	-		\$	-		
46	SCT	8				Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	222.00	\$	503,621.00	\$	111,803,862.00	-	\$	-		\$	-		\$	-		
46.1	SCT	8-11607	8	11,607		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$	503,621.00	\$	-	178.00	\$	89,644,538.00		\$	-		\$	-		
46.2	SCT	8-11710	8	11,710		Manual de Señalización Vial 2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	-	\$	503,621.00	\$	-	44.00	\$	22,159,324.00		\$	-		\$	-		
47	SCT	4				720-13	Poste de referencia	u	3,500.00	\$	253,536.00	\$	887,376,000.00	-	\$	-		\$	-		\$	-		
47.1	SCT	4-11607	4	11,607		720-13	Poste de referencia	u	-	\$	253,536.00	\$	-	2,300.00	\$	583,132,800.00		\$	-		\$	-		
47.2	SCT	4-11710	4	11,710		720-13	Poste de referencia	u	-	\$	253,536.00	\$	-	700.00	\$	177,475,200.00		\$	-		\$	-		
48	SCT	4				730-13	Defensa metálica	m	8,000.00	\$	230,532.00	\$	1,844,256,000.00	-	\$	-		\$	-		\$	-		
48.1	SCT	4-11607	4	11,607		730-13	Defensa metálica	m	-	\$	230,532.00	\$	-	6,400.00	\$	1,475,404,800.00		\$	-	748.96	\$	172,659,247.00		
48.2	SCT	4-11710	4	11,710		730-13	Defensa metálica	m	-	\$	230,532.00	\$	-	1,600.00	\$	368,851,200.00		\$	-		\$	-		
Subtotal												\$ 5,815,212,112.00		\$ 6,278,636,562.00		\$ -		\$ 544,350,411.00						
OBRAS VARIAS																								
49	OV	6				800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	97,500.00	\$	17,838.00	\$	1,739,205,000.00	-	\$	-		\$	-		\$	-		
49.1	OV	6-11605	6	11,605		800-13	Cerca de Alambre de Púas con postes de madera	m	-	\$	17,838.00	\$	-	97,500.00	\$	1,739,205,000.00		\$	-		\$	-		
50	OV	6				810-13	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	27,500.00	\$	18,835.00	\$	517,962,500.00	-	\$	-		\$	-		\$	-		
50.1	OV	6-11606	6	11,606		810-13	Protección de Taludes con bloques de césped	m2	-	\$	18,835.00	\$	-	27,500.00	\$	517,962,500.00		\$	-	21,224.46	\$	399,762,704.00		
Subtotal												\$ 2,257,167,500.00		\$ 2,257,167,500.00		\$ -		\$ 399,762,704.00						
TRANSPORTES																								
51	T	3				900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	1,183,729.00	\$	1,057.00	\$	1,251,201,553.00	-	\$	-		\$	-		\$	-		
51.1	T	3-11608	3	11,608		900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	\$	1,057.00	\$	-	843,194.00	\$	891,256,058.00		\$	-	15,572.61	\$	16,460,249.00		
51.2	T	3-14102	3	14,102		900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos, entre cien metros(100 m) y mil metros(1.000 m) de distancia.	m3-E	-	\$	1,057.00	\$	-	210,799.00	\$	222,814,543.00		\$	-		\$	-		
52	T	3				900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	11,837,290.00	\$	1,000.00	\$	11,837,290,000.00	27,496.20	\$	27,496,200		\$	-	27,496.20	\$	27,496,200.00		
52.1	T	3-11608	3	11,608		900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	\$	1,000.00	\$	-	7,426,510.54	\$	7,426,510,540.00		\$	-	268,875.96	\$	268,875,957.00		

Handwritten signature

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPHAN1-IN-4-FR-1									
		VERSION 1										PÁGINA DE 7									
		FECHA 31 12 2023 (Día / Mes / Año)										MES dic-23									
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO ORIENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ				ACTA No. 31		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 996.672.111,00		MES							
		ACTA FINAL ☐																			
CONTRATO No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO "GESTIÓN PRECUAL" Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL "CORREDOR NEIVA" "SAN VICENTE DEL CAGLIAN" "PUERTO RICO" "FLORENSA" EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"														FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)														FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)				FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021														VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399.567.436.436,00				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9.885.528.230,00			
INTERVENITOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 499.452.964.666,00							
52,2	T	3-14102	3	14.102	900-13	Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	-	\$ 1.000,00	\$ -	1.857.838,23	\$ 1.857.838.230,00	\$ -	\$ -	\$ -						
53	T	3			900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	1.650.857,00	\$ 1.175,00	\$ 1.939.756.975,00	112.459,00	\$ 132.139.325,00	\$ -	112.458,30	\$ 132.138.503,00						
53,1	T	3-11608	3	11.608	900-13	Transporte de materiales provenientes de derrumbes, medido a partir de cien metros (100m)	m3-km	-	\$ 1.175,00	\$ -	1.538.386,92	\$ 1.807.604.632,00	5.700,80	\$ 6.698.440,00	185.340,42	\$ 217.774.994,00					
Subtotal									\$ 15.028.248.528,00		\$ 12.365.659.528,00		\$ 6.698.440,00		\$ 662.745.903,00						
ITEMS NO PREVISTOS																					
54	NP	3			NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		\$ 1.175,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
54,1	NP	3-11608	3	11.608	NP1	Transporte de Material Granular (suelto) Items NP2 NP3 NP4 NP5	m3-km		\$ 1.175,00		1.734.750,00	\$ 2.038.331.250,00	15.887,30	\$ 18.667.578,00	628.344,80	\$ 738.305.140,00					
55	NP	8			NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522.909,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
55,1	NP	8-11603	8	11.603	NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522.909,00		11.120,00	\$ 5.814.748.080,00	\$ -	3.662,51	\$ 1.915.159.442,00						
55,2	NP	8-11703	8	11.703	NP2	Suministro e Instalación de Asfaltita actividades de mantenimiento - Mina Las Pabas (no incluye transporte)	m3		\$ 522.909,00		2.280,00	\$ 1.192.232.520,00	\$ -	730,35	\$ 381.906.588,00						
56	NP	1			NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118.425,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
56,1	NP	1-11601	1	11.601	NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118.425,00		42.000,00	\$ 4.973.850.000,00	896,92	\$ 106.217.751,00	10.763,97	\$ 1.274.723.147,00					
56,2	NP	1-11701	1	11.701	NP3	Suministro e Instalación de Terraplén - Norma INVIAS 220-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 118.425,00		10.500,00	\$ 1.243.462.500,00	\$ -	\$ -	\$ -						
57	NP	2			NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78.905,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
57,1	NP	2-11602	2	11.602	NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78.905,00		42.000,00	\$ 3.314.010.000,00	\$ -	4.215,59	\$ 332.631.500,00						
57,2	NP	2-11702	2	11.702	NP4	Suministro e Instalación de Afirmado - Norma INVIAS 311-13 (no incluye transporte)	m3		\$ 78.905,00		10.500,00	\$ 828.502.500,00	\$ -	\$ -	\$ -						
58	NP	2			NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99.544,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
58,1	NP	2-11602	2	11.602	NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99.544,00		4.200,00	\$ 418.084.800,00	\$ -	1.492,00	\$ 148.519.648,00						
58,2	NP	2-11702	2	11.702	NP5	Suministro e Instalación de Pedraplén - Norma INVIAS 221-13 (no incluye material de sello, ni transporte)	m3		\$ 99.544,00		1.050,00	\$ 104.521.200,00	\$ -	\$ -	\$ -						
59	NP	1			NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11.303,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
59,1	NP	1-11601	1	11.601	NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11.303,00		300.800,00	\$ 3.399.942.400,00	\$ -	71.126,41	\$ 803.941.812,00						
59,2	NP	1-11701	1	11.701	NP6	Retiro de Asfaltita - Demolición para actividades de pavimentación (incluye transporte)	m2		\$ 11.303,00		75.200,00	\$ 849.985.600,00	\$ -	1.905,76	\$ 21.540.760,00						
60	NP	1			NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150.333,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
60,1	NP	1-11601	1	11.601	NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150.333,00		4.864,00	\$ 731.219.712,00	\$ -	21,08	\$ 3.169.020,00						
60,2	NP	1-11701	1	11.701	NP7	Demolición pavimento natural y asfáltico incluye corte - Norma INVIAS 465-13 (incluye transporte)	m3		\$ 150.333,00		1.216,00	\$ 182.804.928,00	\$ -	\$ -	\$ -						
61	NP	8			NP8	Geomalla Bixial 30 KN/M o similar	m2		\$ 17.917,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
61,1	NP	8-11603	8	11.603	NP8	Geomalla Bixial 30 KN/M o similar	m2		\$ 17.917,00		85.000,00	\$ 1.522.945.000,00	\$ -	\$ -	\$ -						
61,2	NP	8-11703	8	11.703	NP8	Geomalla Bixial 30 KN/M o similar	m2		\$ 17.917,00		20.000,00	\$ 358.340.000,00	\$ -	\$ -	\$ -						
62	NP	8			NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20.929,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
62,1	NP	8-11602	8	11.602	NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20.929,00		170.000,00	\$ 3.557.930.000,00	\$ -	\$ -	\$ -						
62,2	NP	8-11702	8	11.702	NP9	Geotextil NT 4000 o Similar	m2		\$ 20.929,00		46.000,00	\$ 962.734.000,00	\$ -	\$ -	\$ -						
63	NP	6			NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
63,1	NP	6-11604	6	11.604	NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810,00		1.152,00	\$ 105.765.120,00	24,50	\$ 2.249.345,00	275,73	\$ 25.314.771,00					
63,2	NP	6-11705	6	11.705	NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810,00		216,00	\$ 19.830.960,00	\$ -	\$ -	\$ -						
63,3	NP	6-14105	6	14.105	NP10	Cinta PVC Sika O-22 O Similar	m		\$ 91.810,00		72,00	\$ 6.610.320,00	\$ -	\$ -	\$ -						
64	NP	2			NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		\$ 218.221,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
64,1	NP	2-11602	2	11.602	NP11	Suelo de Relleno para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos (no incluye transporte)	m3		\$ 218.221,00		2.219,00	\$ 484.232.399,00	\$ -	893,33	\$ 194.943.366,00						
65	NP	8			NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 43.721,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
65,1	NP	8-11603	8	11.603	NP12	Suministro e Instalación de Geomalla de Refuerzo GUX-49 o similar para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2		\$ 43.721,00		3.540,00	\$ 154.772.340,00	\$ -	2.864,77	\$ 125.250.609,00						
66	NP	8			NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$ 79.973,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
66,1	NP	8-11603	8	11.603	NP13	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 1.0m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$ 79.973,00		268,00	\$ 21.432.764,00	\$ -	124,05	\$ 9.920.651,00						
67	NP	8			NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$ 46.553,00		-	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -						
67,1	NP	8-11603	8	11.603	NP14	Suministro e Instalación de Geodren Planar ancho = 0.5m (Lloraderos) para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m		\$ 46.553,00		273,00	\$ 12.708.969,00	\$ -	247,44	\$ 11.519.074,00						

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEP-MN-IN-4-FR-1 1 7			
														FECHA		31122023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA:		GERENCIA GRUPO ORIENTE				DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ				ACTA No. 31		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 996,672,111.00		MES dic-23			
CONTRATO No. 991 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAJAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISION 2030"														FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)														FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021														VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399,557,436,436.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9,895,528,230.00	
INTERVENIENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030														VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 499,452,964,666.00			
68	NP	8			NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$	122,472.00	-	\$	-	\$	-	\$	-	
68,1	NP	8-11604	8	11,604	NP15	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m	\$	122,472.00	151.00	\$	18,493,272.00	\$	-	150.60	\$ 18,444,283.00	
69	NP	8			NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	un	\$	33,343.00	-	\$	-	\$	-	\$	-	
69,1	NP	8-11603	8	11,603	NP16	Suministro e Instalación de Saco en Polipropileno relleno con suelo-cemento para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	un	\$	33,343.00	1,166.00	\$	38,877,938.00	\$	-	1,085.00	\$ 36,177,155.00	
70	NP	8			NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	\$	42,208.00	-	\$	-	\$	-	\$	-	
70,1	NP	8-11606	8	11,606	NP17	Suministro e Instalación de Manto TRM para fachada de muro en tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	\$	42,208.00	12,590.00	\$	531,398,720.00	\$	-	6,952.26	\$ 293,440,990.00	
71	NP	6			NP18	Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro	m	\$	34,210.00	-	\$	-	\$	-	\$	-	
71,1	NP	6-11604	6	11,604	NP18	Suministro e Instalación de Tubería Perforada 4" para filtro	m	\$	34,210.00	47,000.00	\$	1,607,870,000.00	162.00	\$ 5,542,020.00	12,860.69	\$ 439,964,205.00	
72	NP	4			NP19	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1.2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	\$	4,808,941.00	-	\$	-	\$	-	\$	-	
72,1	NP	4-11606	4	11,606	NP19	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1.2m (NO Recuperable) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	\$	4,808,941.00	103.87	\$	499,504,702.00	\$	-	103.87	\$ 499,504,702.00	
73	NP	6			NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1.20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	\$	4,719,466.00	-	\$	-	\$	-	\$	-	
73,1	NP	6-11604	6	11,604	NP20	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1.20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m	\$	4,719,466.00	45.00	\$	212,375,970.00	\$	-		\$ -	
74	NP	6			NP21	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	\$	1,104,266.00	-	\$	-	\$	-	\$	-	
74,1	NP	6-11604	6	11,604	NP21	Concreto Plástico 28 MPA a/c <0.45 para Viga Cabezal para pantalla pilotes PR12+770 Ruta 3001	m3	\$	1,104,266.00	19.55	\$	21,588,400.00	\$	-	19.55	\$ 21,588,400.00	
75	NP	6			NP22	Dren Horizontal d=3"- Long max=20m altura max = 15m rasante	m	\$	344,857.00	-	\$	-	\$	-	\$	-	
75,1	NP	6-11604	6	11,604	NP22	Dren Horizontal d=3"- Long max=20m altura max = 15m rasante	m	\$	344,857.00	1,570.00	\$	541,425,490.00	\$	-	705.00	\$ 243,124,185.00	
76	NP	6			NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1.20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	\$	5,166,106.00	-	\$	-	\$	-	\$	-	
76,1	NP	6-11604	6	11,604	NP23	Pilote excavado en roca, concreto 28Mpa a/c=0.45 vaciado in situ d= 1.20 m. (no incluye refuerzo, ni transporte de material sobrante) para pantalla pilotes PR52+800 Ruta 6503	m	\$	5,166,106.00	39.00	\$	201,478,134.00	\$	-		\$ -	
77	NP	4			NP24	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1.2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	\$	2,869,478.00	-	\$	-	\$	-	\$	-	
77,1	NP	4-11606	4	11,606	NP24	Suministro e Instalación de camisa metálica e=6mm para pilote de d=1.2m (Recuperable) para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m	\$	2,869,478.00	78.00	\$	223,819,284.00	\$	-		\$ -	
78	NP	6			NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	\$	1,596,514.00	-	\$	-	\$	-	\$	-	
78,1	NP	6-11604	6	11,604	NP25	Concreto clase 28 MPA a/c =0.45, incluye juntas de dilatación y lloraderos para Muro de Contención PR52+800 ruta 6503	m3	\$	1,596,514.00	110.00	\$	175,616,540.00	\$	-		\$ -	
79	NP	6			NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$	129,077.00	-	\$	-	\$	-	\$	-	
79,1	NP	6-11604	6	11,604	NP26	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=1m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$	129,077.00	42.00	\$	5,421,234.00	\$	-		\$ -	
80	NP	6			NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$	192,063.00	-	\$	-	\$	-	\$	-	
80,1	NP	6-11604	6	11,604	NP27	Suministro e Instalación de Filtro en Geodren Vial ancho=2m y Tubería Corrugada 4" para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m	\$	192,063.00	30.00	\$	5,761,890.00	\$	-		\$ -	
81	NP	8			NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	\$	77,947.00	-	\$	-	\$	-	\$	-	
81,1	NP	8-11603	8	11,603	NP28	Suministro e Instalación de Geodren Planar para Muro de Contención PR52+800 Ruta 6503	m2	\$	77,947.00	114.00	\$	8,885,958.00	\$	-		\$ -	
82	NP	8			NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	\$	11,267.00	-	\$	-	\$	-	\$	-	
82,1	NP	8-11607	8	11,607	NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	\$	11,267.00	12,500.00	\$	140,837,500.00	\$	-		\$ -	
82,2	NP	8-11710	8	11,710	NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	\$	11,267.00	1,250.00	\$	14,083,750.00	\$	-		\$ -	
82,3	NP	8-14104	8	14,104	NP29	Suministro e Instalación de tacha reflectiva bidireccional amarilla o blanca/roja sin espigo	un	\$	11,267.00	1,250.00	\$	14,083,750.00	\$	-		\$ -	
Subtotal								\$	-	\$	36,560,519,894.00	\$	132,676,694.00	\$	7,539,089,448.00		

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA No. 31 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 996,672,111.00 MES: dic-23

CONTRATO No.: 001 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEWA - SAN VICENTE DEL CAGUAN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030 (Indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE (Indique la ruta y tramo del contrato según código vía)	FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 399,567,436.00 (Según contrato principal)	VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ 9,895,528,230.00
	VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 409,452,964,666.00	
(A) SUBTOTAL BÁSICO DE OBRAS (A)	\$ 334,689,236,546.00	\$ 42,575,422,334.00
(B) PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)	\$ 49,343,566,111.00	\$ 8,017,667,845.00
AJUSTE POR REDONDEO	\$ -	\$ 5.00
(C) PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	\$ 800,000,000.00	\$ -
(D) VALOR BÁSICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES D=(A+B+C)	\$ 384,832,802,657.00	\$ 50,593,090,184.00
(E) VALOR IVA (OBRA) (E)	\$ 2,812,239,712.00	\$ 369,718,736.00
(F) VALOR OBRAS (INCLUYE IVA) F=(D+E)	\$ 387,645,042,369.00	\$ 50,962,808,920.00
(G) REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (G)	\$ 1,845,000,000.00	\$ 1,473,739,600.00
(H) IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS (H)	\$ 350,550,000.00	\$ 280,010,524.00
(I) TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS H+H	\$ 2,195,550,000.00	\$ 1,753,750,124.00
(J) ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES (J)	\$ 3,183,304,765.00	
(K) IVA - ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES (K)	\$ 604,827,905.00	
(L) TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES, ATÍPICOS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VALES L+J+K	\$ 3,788,132,670.00	
(M) GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (Incluye PAGA e IVA 19%)	\$ 9,226,844,067.00	\$ 12,031,465.00
(N) PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)	\$ 500,000,000.00	\$ 9,908,676.00
(O) VALOR TOTAL (F+H+L+M+N)	\$ 399,567,436,000.00	\$ 52,738,499,185.00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AUI	30	%
Utilidad	5	%
Valor Anticipo Otorgado	\$ 9,885,528,230.00	2.50%
Valor Amortizado Presenta Acta	\$ 25,098,887.00	0.25%
Valor Amortizado Acumulado	\$ 1,083,125,954.00	10.96%
Valor Saldo por Amortizar	\$ 8,802,402,276.00	89.04%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 996,672,111.00	\$ 7,283,373.00	\$ 1,003,955,484.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL SOSTENIBLE (PRACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 996,672,111.00	\$ 7,283,373.00	\$ 1,003,955,484.00


RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 43,824,332.00	\$ 2,852,619,668.00
SB	\$ 125,980,350	\$ 9,491,552,674.00
B	\$ 216,212,600.00	\$ 5,166,254,291.00
P	\$ 392,405,470.00	\$ 10,780,868,069.00
OA	\$ 78,874,225.00	\$ 5,138,179,166.00
SCT	\$ -	\$ 544,350,411.00
OV	\$ -	\$ 399,762,704.00
T	\$ 6,698,440.00	\$ 662,745,903.00
NP	\$ 132,676,694.00	\$ 7,539,089,448.00
TOTAL	\$ 996,672,111.00	\$ 42,575,422,334.00


RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica) ICCP

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Exploración	\$ 150,042,083.00	\$ 196,163,488.00
2 Sub-bases y bases	\$ 342,192,950.00	\$ 590,040,909.00
3 Transporte de materiales	\$ 25,366,018.00	\$ 159,634,703.00
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 9,166,048.00	\$ -
5 Acero Estructural y cables de acero	\$ -	\$ -
6 Concretos, morteros y obras varias	\$ 70,023,494.00	\$ -
7 Concreto para superestructuras	\$ -	\$ -
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 399,881,518.00	\$ -
TOTAL	\$ 996,672,111.00	\$ 945,839,100.00

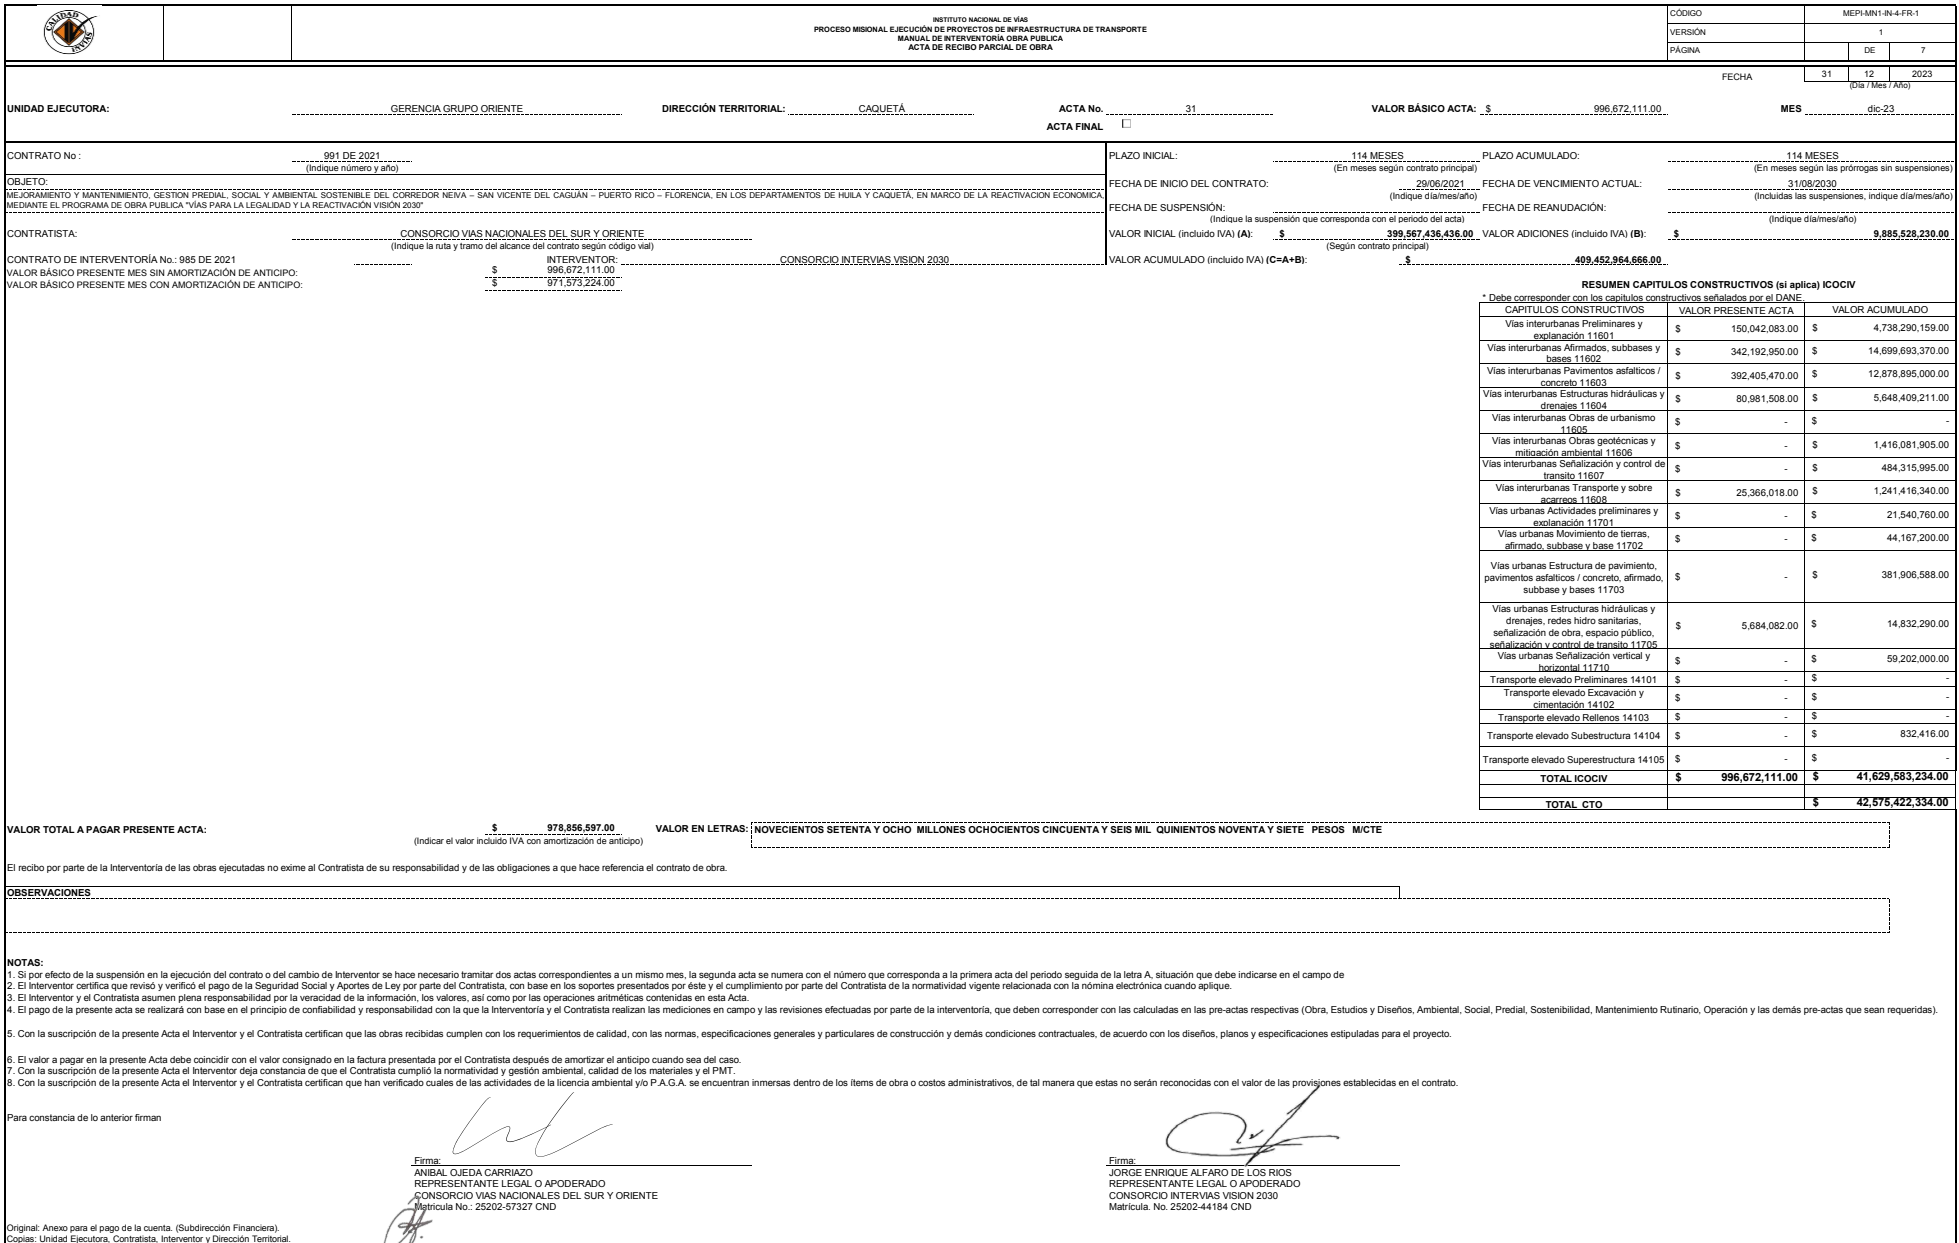

[illegible]

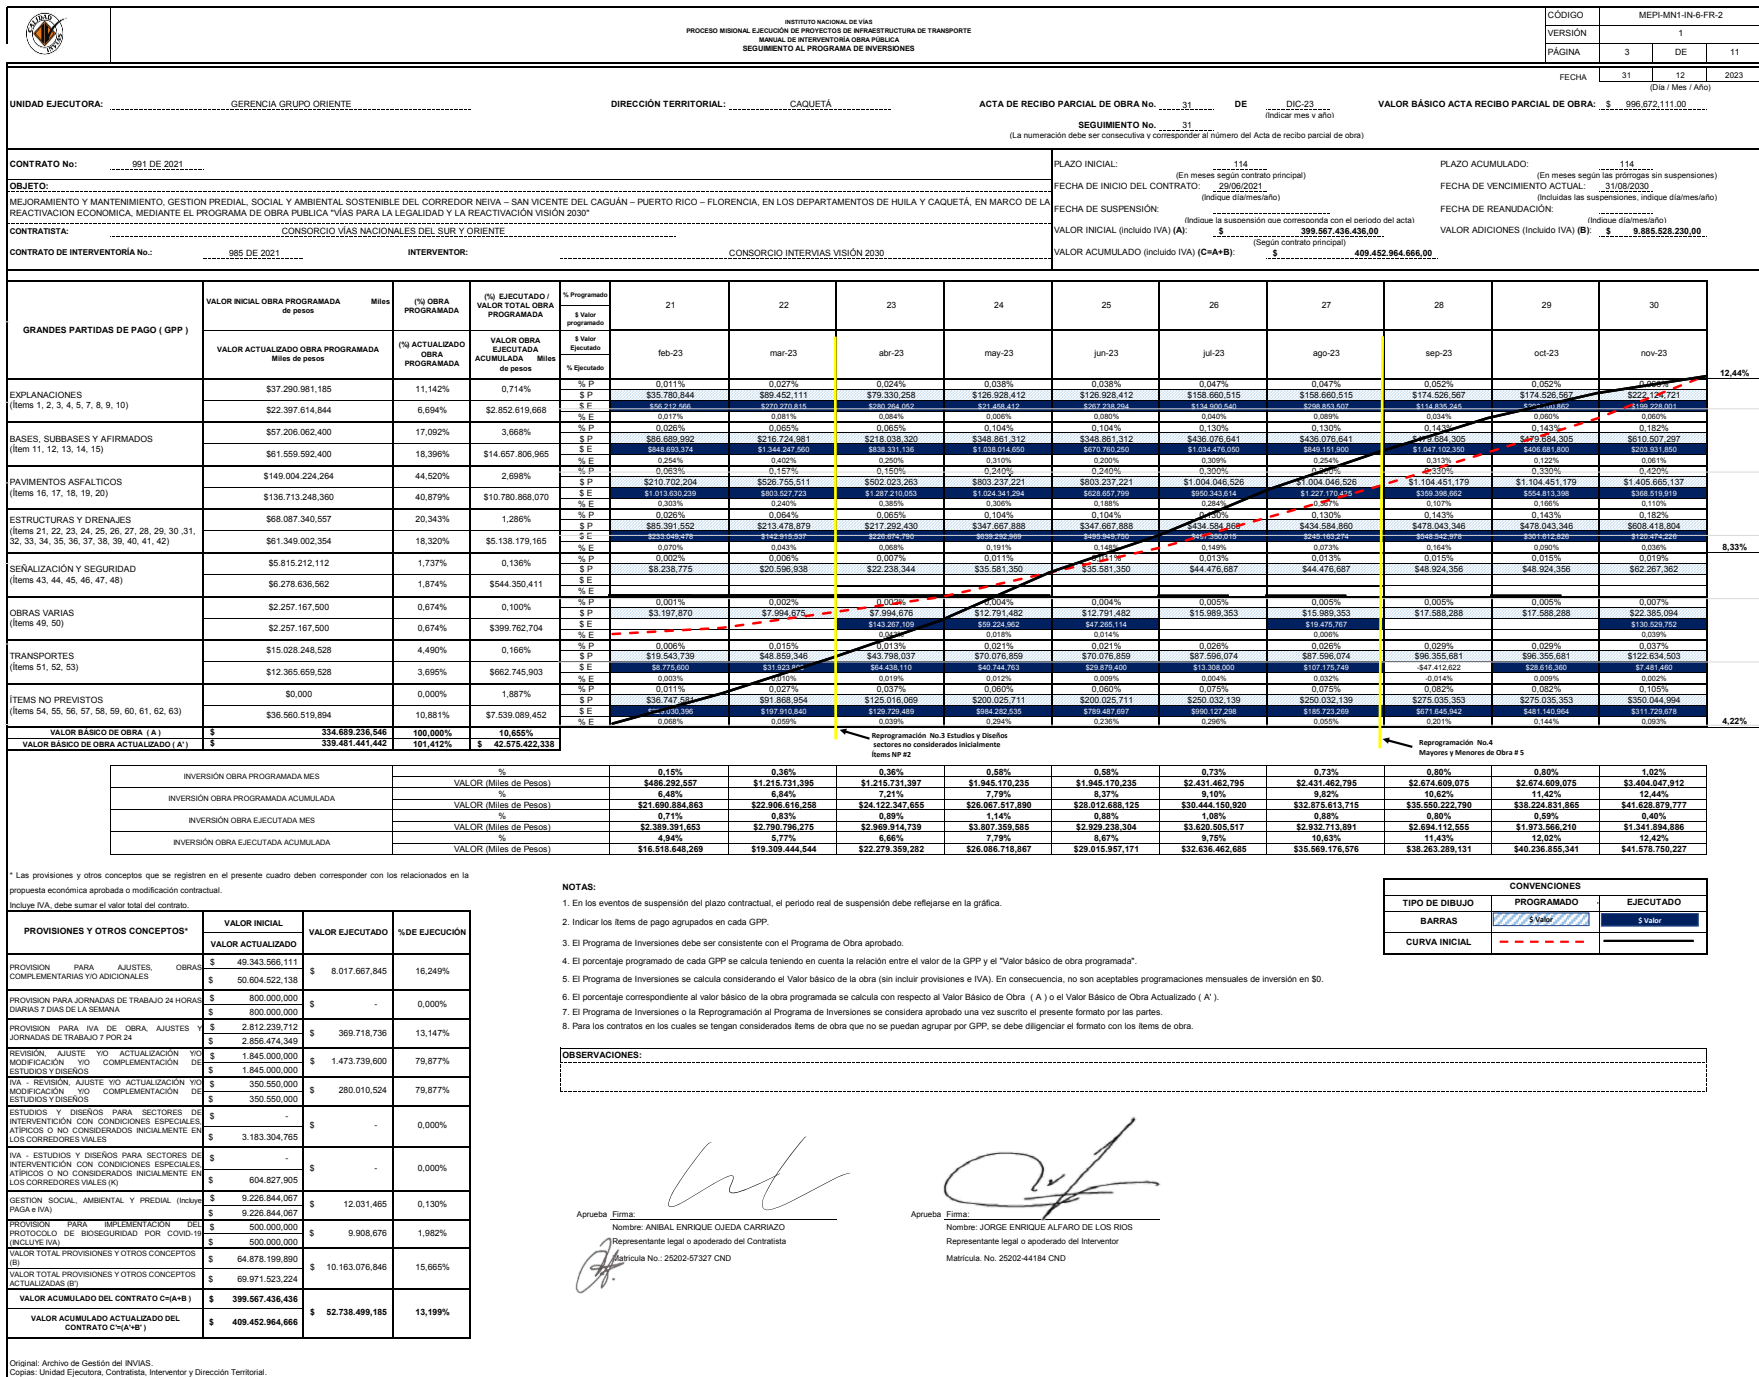

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEPR-MN1-IN-6-FR-2 1 10 DE 11						
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE												DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 DE DIC-23		FECHA: 31 DE 12 DE 2023			
SEGUIMIENTO No. 31												VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 996,672,111.00							
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)																			
CONTRATO No: 991 DE 2021												PLAZO INICIAL: 114		PLAZO ACUMULADO: 114					
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEVA – SAN VICENTE DEL CAQUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/05/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/08/2030					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE												FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021												INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030							
VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles												(%) OBRA PROGRAMADA		(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA					
VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles												(%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA		VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos					
GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)																			
EXPLANACIONES (Ítems 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10)												\$37.290.981,185		11,142%		\$2.852.619,668		71,82%	
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS (Ítem 11, 12, 13, 14, 15)												\$61.559.592,400		18,396%		\$14.657.806,965			
PAVIMENTOS ASFALTICOS (Ítem 16, 17, 18, 19, 20)												\$136.713.248,360		40,875%		\$10.790.868,070			
ESTRUCTURAS Y DRENAJES (Ítem 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42)												\$68.087.340,557		20,343%		\$1.286%			
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD (Ítems 43, 44, 45, 46, 47, 48)												\$6.278.636,562		1,874%		\$544.350,411		84,64%	
OBRAS VARIAS (Ítem 49, 50)												\$2.257.167,500		0,674%		\$399.762.704			
TRANSPORTES (Ítem 51, 52, 53)												\$15.028.248,528		4,490%		\$0.050%			
ÍTEMES NO PREVISTOS												\$36.560.519,894		10,881%		\$7.539.089,452		87,76%	
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)												\$ 334.689.236,548		100,000%		\$ 10.655%			
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')												\$ 338.481.441,442		101,412%		\$ 42.676.422,338			
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES												\$5.501.498,050		1,64%		\$1.328.926,298		0,40%	
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA												\$9.411		0,28%		\$60.20%		0,19%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES												\$2.812.239,712		0,84%		\$369.718,736		13,147%	
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA												\$2.812.239,712		0,84%		\$369.718,736		13,147%	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS												\$1.845.000,000		0,55%		\$1.473.739,600		79,877%	
REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS												\$1.845.000,000		0,55%		\$1.473.739,600		79,877%	
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES ATÍPICAS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES												\$3.183.304,765		0,95%		\$-		0,000%	
ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA SECTORES DE INTERVENCIÓN CON CONDICIONES ESPECIALES ATÍPICAS O NO CONSIDERADOS INICIALMENTE EN LOS CORREDORES VIALES												\$604.827,905		0,18%		\$-		0,000%	
GESTIÓN SOCIAL, AMBIENTAL Y PREDIAL (Incluye PAGA e IVA)												\$2.226.844,067		0,67%		\$12.031,465		0,36%	
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA)												\$500.000,000		0,15%		\$9.908,678		0,30%	
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)												\$64.878.199,890		19,46%		\$10.163.076,846		15,665%	
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADOS (B')												\$69.971.523,224		20,67%		\$-		0,000%	
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)												\$399.567.436,436		118,80%		\$52.738.499,185		13,199%	
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')												\$409.452.964,666		121,14%		\$-		0,000%	
NOTAS:																			
1. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la gráfica.																			
2. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.																			
3. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.																			
4. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".																			
5. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA). En consecuencia, no son aceptables programaciones mensuales de inversión en \$0.																			
6. El porcentaje correspondiente al valor básico de la obra programada se calcula con respecto al Valor Básico de Obra (A) o el Valor Básico de Obra Actualizado (A').																			
7. El Programa de Inversiones o la Reprogramación al Programa de Inversiones se considera aprobado una vez suscrito el presente formato por las partes.																			
8. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.																			
OBSERVACIONES:																			
Aprobada Firma: ANIBAL ENRIQUE OJEDA CARRIAZO																			
Representante legal o apoderado del Contratista																			
Matricula No.: 25202-57327 CND																			
Aprobada Firma: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS																			
Representante legal o apoderado del Interventor																			
Matricula No.: 25202-44184 CND																			
Original: Archivo de Gestión del INVIA.																			
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																			


[illegible]

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14867645953



(415)7707212489984(8020) 0000014867645953

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 4 7 5 0 3 4 7

6. DV

7

12. Dirección seccional

Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico

6

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

3

69. Otras organizaciones no clasificadas

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 2 1 0 2 0 9

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

9 8

76. Fecha de registro

77. No. Matricula mercantil

78. Departamento

1 3

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control



Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1				-
2				-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País


172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14867645953



(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 6. DV 12. Dirección seccional
9 0 1 4 7 5 0 3 4 7 Impuestos de Cartagena

14. Buzón electrónico
6

Representación


1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 8		2 0 2 1 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido AVENDAÑO	106. Primer nombre MENZEL		107. Otros nombres RAFAEL	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
2	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		2 0 2 1 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido OJEDA	105. Segundo apellido CARRIAZO	106. Primer nombre ANIBAL		107. Otros nombres ENRIQUE	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
3	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		2 0 2 1 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido BAJAIRE	106. Primer nombre MENZEL		107. Otros nombres RAFAEL	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
4	98. Representación REPRS LEGAL SUPL		99. Fecha inicio ejercicio representación 1 9		2 0 2 1 0 2 0 9	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadan	101. Número de identificación 1 3	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido AMIN	105. Segundo apellido BAJAIRE	106. Primer nombre EFRAIN		107. Otros nombres FERNANDO	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV		103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre		107. Otros nombres	
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)		109. DV	110. Razón social representante legal		

Espacio reservado para la DIAN



4. Número de formulario

14867645953



(415)7707212489984(8020) 000001486764595 3

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 4 7 5 0 3 4 7	6. DV 7	12. Dirección seccional Impuestos de Cartagena	14. Buzón electrónico 6
---	------------	---	----------------------------

Socios y/o Miembros de Juntas Directivas, Consorcios, Uniones Temporales

1	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 3 0 0 9 4 9 2 0	113. DV 5	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social KMA CONSTRUCCIONES S.A.S					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 9 0 2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro
2	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 9 0 4 0 3 2 3 5	113. DV 3	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CICON SAS					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro
3	111. Tipo de documento NIT	3 1	112. Número de identificación 8 0 6 0 1 4 1 0 8	113. DV 1	114. Nacionalidad COLOMBIA	1 6 9
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social CONSTRUCTORA EMMA LTDA					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso 5 2 0 2 1 0 2 0 9	123. Fecha de retiro
4	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro
5	111. Tipo de documento		112. Número de identificación	113. DV	114. Nacionalidad	
	115. Primer apellido		116. Segundo apellido		117. Primer nombre	118. Otros nombres
	119. Razón social					
	120. Valor capital del socio		121. % Participación		122. Fecha de ingreso	123. Fecha de retiro

ICCP - Índices serie empalme según canasta general y grupos de obra*

Índices 2021

Meses	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Total ICCP	100.93	101.34	101.94	101.93	102.39	102.80	103.50	103.62	103.44	103.30	103.42	103.78
Canasta General												
Equipos	100.61	100.90	101.12	100.99	101.43	101.60	102.01	102.17	102.18	102.19	102.25	102.26
Materiales	101.12	101.65	102.62	102.61	103.23	103.81	104.84	104.98	104.64	104.36	104.57	105.20
Transporte	100.09	100.05	100.05	100.05	100.08	100.31	100.33	100.34	100.34	100.39	100.41	100.43
Mano de obra	101.25	101.59	101.76	101.93	102.03	102.26	102.51	102.56	102.57	102.58	102.56	102.56
Obras de explanación	100.73	101.14	101.40	101.48	101.83	102.06	102.65	102.85	102.91	103.07	103.15	103.21
Subbases y bases	100.71	100.76	101.46	101.61	101.59	101.95	102.22	102.16	102.23	102.20	102.40	102.43
Transporte de materiales	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
Aceros y elementos metálicos	101.59	103.72	104.69	106.46	107.81	108.09	109.17	109.82	109.10	108.16	108.06	108.28
Concretos, morteros y obras varias	101.32	101.91	102.07	102.31	102.62	102.96	103.91	104.07	103.96	103.79	103.90	104.30
Concreto para estructura de puentes	101.39	101.21	99.88	99.41	98.52	98.93	98.95	98.76	98.93	98.80	98.55	99.33
Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100.26	100.13	102.57	101.17	102.71	103.55	104.42	104.48	103.68	103.45	103.81	104.67

Fuente: DANE – Índice de Costos de la Construcción Pesada (ICCP)

Actualizado el 28 de enero de 2022

NOTA: La diferencia en la suma de las variables, obedece al sistema de aproximación en el nivel de dígitos trabajados en el índice. Se sugiere a los usuarios consultar las variaciones difundidas por el DANE, ya que son calculadas con la totalidad de cifras decimales disponibles para el índice.

NOTA 2: Los resultados presentados para los registros ubicados en las filas 433 a 436 del presente archivo, hacen referencia a los grupos de costos, en tanto que los ubicados en las filas 438 a 444 se refieren a los resultados para los grupos de obra, del año 2021

Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2021											
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	100.73	101.15	101.42	101.50	101.86	102.09	102.72	102.92	102.98	103.14	103.21	103.28
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	100.70	100.76	101.46	101.62	101.60	101.96	102.24	102.18	102.24	102.21	102.42	102.44
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	100.90	101.20	102.53	102.02	102.91	103.25	104.31	104.29	103.81	103.50	103.66	104.35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	101.50	103.14	103.95	105.33	106.53	107.48	108.56	109.28	108.78	108.61	109.16	109.42
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	100.69	101.17	101.67	102.42	102.53	102.97	104.54	104.39	104.56	104.88	104.98	105.35
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambie	4.07	101.36	101.84	102.86	104.40	105.05	105.45	107.62	107.99	108.14	108.36	108.49	108.95
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	4.40	100.57	101.94	101.43	102.12	100.42	100.81	101.71	101.20	102.19	101.70	102.00	102.36
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4.22	100.24	100.39	100.42	100.45	100.42	100.77	100.81	100.82	100.84	100.89	100.89	100.89
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares y explanación	13.81	100.34	100.52	100.67	100.81	100.80	101.11	101.67	101.81	101.84	101.86	101.95	101.97
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, afirmado, subb	12.21	100.53	100.66	100.88	101.10	101.13	101.44	101.75	101.84	101.87	101.93	102.04	102.07
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimento, pavimentos	38.21	100.70	100.57	101.58	101.64	101.70	102.20	102.66	102.74	102.65	102.64	102.91	103.01
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, mitigación ambier	21.15	101.32	101.83	102.62	103.66	104.53	104.82	106.50	106.51	106.57	106.72	107.07	107.80
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y drenajes, rede	10.83	101.00	101.20	101.14	101.42	101.48	101.79	102.47	102.66	102.80	102.94	103.03	103.44
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicios, redes hidrc	0.92	100.91	101.62	102.77	104.10	104.73	106.49	110.05	110.63	110.61	111.04	111.64	111.97
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, urbanas de servi	1.25	101.20	101.80	101.80	102.26	102.61	103.45	104.03	103.95	104.26	104.70	105.30	105.74
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicios, señalizació	0.81	101.27	102.65	104.37	106.20	106.61	107.58	109.02	109.12	110.34	112.22	112.87	114.10
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	0.53	100.07	101.07	100.77	101.14	99.79	100.46	102.75	102.64	102.88	102.19	102.39	102.30
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical y horizontal	0.28	100.86	101.30	101.62	102.42	102.86	103.28	104.32	104.58	105.16	105.35	105.73	106.31

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																			
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2022											
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y explanación	22.06	104.36	105.59	106.33	107.22	108.07	108.34	109.12	109.17	109.40	110.04	110.42	110.31
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, subbases y bases	18.69	103.71	104.89	105.19	105.76	106.58	107.02	108.07	107.64	107.83	108.53	108.73	108.89
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos asfálticos / concreto	38.51	106.80	109.36	110.34	113.44	114.11	113.62	116.71	116.86	116.76	118.63	119.18	118.60
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hidráulicas y drenajes	7.09	110.96	111.37	114.95	117.49	118.65	118.22	118.79	118.45	118.42	119.33	119.69	119.27
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbanismo	0.96	107.61	110.00	110.71	111.38	112.36	113.02	113.11	113.07	113.09	113.49	113.64	113.75
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotécnicas y mitigación ambie	4.07	111.12	112.85	113.76	114.86	115.31	115.13	116.29	116.39	116.82	118.44	118.64	118.22
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y control de tránsito	4.40	105.12	106.29	106.98	109.61	110.03	110.83	111.66	113.69	112.65	114.40	116.28	114.26
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sobre acarreo	4.22	101.56	101.84	102.77	103.21	104.21	104.62	105.41	105.48	105.50	105.53	105.53	105.74
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades preliminares y explanación	13.81	103.10	103.92	104.37	104.92	105.80	106.17	107.02	107.08	107.34	108.12	108.23	108.31
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento de tierras, afirmado, subb	12.21	103.19	104.21	104.66	105.02	105.77	106.24	106.97	106.91	107.15	107.55	107.66	107.83
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de pavimento, pavimentos	38.21	104.36	105.61	105.81	106.42	107.17	107.33	108.71	107.99	108.40	109.61	109.83	110.14
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotécnicas, mitigación ambier	21.15	110.33	112.71	113.85	115.72	115.83	115.44	116.92	116.79	117.11	118.71	119.28	118.69
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hidráulicas y drenajes, rede	10.83	105.32	106.97	107.88	108.45	109.03	109.59	110.47	110.85	111.03	111.82	111.98	111.83
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas de servicios, redes hidrc	0.92	113.81	115.46	116.47	117.51	118.50	118.31	119.97	119.47	119.89	123.35	123.23	122.60
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosanitarias, urbanas de servi	1.25	108.01	109.21	111.68	112.61	114.01	114.57	115.07	115.48	115.53	115.98	116.16	116.17
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas de servicios, señalizació	0.81	118.30	119.72	121.41	122.30	120.39	120.98	121.34	122.81	123.17	123.90	124.59	124.76
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización de terreno	0.53	104.77	106.01	105.66	107.47	108.32	108.52	110.25	111.22	110.70	114.17	115.23	113.26
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización vertical y horizontal	0.28	108.81	110.85	111.87	113.30	113.98	114.55	115.39	116.09	116.49	117.56	118.27	118.13

A16.3 ICOCIV - Serie histórica índice por tipología de obra y capítulo constructivo																			
Código grupos de obra CPC V 2.0 A.C.	Código subclases CPC V 2.0 A.C.	Código de tipología de obra	Tipología de obra	Código de agregación a nivel de obra-capítulo	Código Capítulo Constructivo	Capítulo constructivo	Ponderación al tipo de obra (%)	2023											
								Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
								Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
	53211	53211_06	Vías interurbanas	11601	01	Preliminares y	22.06	115.70	118.02	118.78	119.53	119.90	119.90	120.71	121.04	121.17	121.51	121.72	121.82
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11602	02	Afirmados, sul	18.69	114.91	117.90	119.71	120.52	121.03	121.41	121.78	122.44	122.70	122.84	123.34	122.89
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11603	03	Pavimentos as	38.51	126.71	131.73	132.31	132.85	133.11	132.97	134.18	133.42	133.96	133.23	134.49	134.76
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11604	04	Estructuras hid	7.09	123.17	125.08	125.23	125.48	125.47	125.22	124.87	124.32	123.49	123.81	123.93	123.96
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11605	05	Obras de urbar	0.96	121.13	123.23	123.96	124.28	124.99	125.56	125.69	125.51	125.69	125.71	125.70	125.75
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11606	06	Obras geotéc	4.07	123.30	125.51	125.76	126.98	127.02	126.73	127.04	126.46	126.50	126.17	126.11	126.38
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11607	07	Señalización y	4.40	128.39	131.60	130.88	132.24	131.26	129.94	132.76	131.80	132.59	131.40	136.62	134.17
530201	53211	53211_06	Vías interurbanas	11608	08	Transporte y sc	4.22	108.97	111.19	111.67	113.11	115.59	116.31	116.41	117.92	118.35	119.30	119.68	119.69
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11701	01	Actividades pr	13.81	112.38	114.97	115.79	116.83	117.88	118.14	118.34	119.07	119.29	119.85	120.17	120.12
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11702	02	Movimiento d	12.21	112.20	115.00	116.10	117.02	117.88	118.27	118.40	119.06	119.31	119.65	119.83	119.71
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11703	03	Estructura de p	38.21	115.65	118.90	121.10	121.60	122.07	122.98	123.13	123.67	123.86	123.70	123.43	123.25
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11704	04	Obras geotéc	21.15	125.27	128.61	129.15	129.33	129.72	129.74	129.77	129.23	129.65	129.11	129.72	130.01
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11705	05	Estructuras hid	10.83	118.39	121.11	121.82	122.79	123.04	123.27	123.88	123.83	123.99	123.77	123.71	123.98
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11706	06	Redes urbanas	0.92	125.82	128.70	128.54	128.96	129.18	128.86	128.64	128.50	128.40	128.38	127.85	127.36
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11707	07	Redes hidrosar	1.25	122.52	125.28	125.52	125.83	126.20	126.48	125.56	125.24	125.32	124.93	124.83	124.63
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11708	08	Redes urbanas	0.81	128.23	129.86	130.64	130.27	130.06	130.50	130.20	130.19	130.08	129.68	129.50	129.70
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11709	09	Estabilización c	0.53	124.44	128.01	127.27	128.64	127.94	126.82	129.14	128.58	128.98	128.64	132.06	130.12
530201	53211	53211_07	Vías urbanas	11710	10	Señalización ve	0.28	124.66	127.43	128.14	128.58	129.03	128.99	129.58	129.39	130.25	129.98	130.90	130.70

		2021												
Grupos de costos	Ponderación	Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	Abril Índice	Mayo Índice	Junio Índice	Julio Índice	Agosto Índice	Septiembre Índice	Octubre Índice	Noviembre Índice	Diciembre Índice	
Materiales	51,31	101,15	101,82	102,63	103,56	104,47	105,21	107,04	107,39	107,34	107,52	107,86	108,63	
Herramienta	2,14	100,85	101,50	102,12	102,76	102,82	102,87	103,47	103,99	104,15	104,37	104,84	105,40	
Maquinaria	12,71	100,59	100,86	101,06	101,01	101,60	101,72	102,39	102,54	102,53	102,47	102,57	102,47	
Equipos	6,18	100,17	100,23	99,53	99,58	99,88	100,44	100,52	100,65	100,68	100,80	100,72	100,73	
Mano de ot	16,89	101,06	101,37	101,51	101,71	101,79	102,01	102,20	102,28	102,30	102,31	102,30	102,30	
Transporte	8,89	100,07	100,04	100,07	100,25	100,39	100,48	100,51	100,53	100,53	100,64	100,69	100,56	
Equipos esp	1,89	100,46	101,35	101,78	102,18	103,28	105,07	106,60	107,73	108,15	109,40	110,17	111,42	

A16.4 ICOCIV - Serie histórica índice por grupos de costos													
		2022											
Grupos de costos	Ponderación	Enero Índice	Febrero Índice	Marzo Índice	Abril Índice	Mayo Índice	Junio Índice	Julio Índice	Agosto Índice	Septiembre Índice	Octubre Índice	Noviembre Índice	Diciembre Índice
Materiales	51,31	110,87	112,56	114,37	116,63	117,93	117,99	119,84	119,88	119,88	122,00	122,49	122,12
Herramienta	2,14	106,07	107,25	107,82	108,87	109,34	109,72	110,07	110,85	111,57	112,28	113,24	113,81
Maquinaria	12,71	103,86	104,62	104,89	105,43	106,49	106,87	107,85	108,03	108,57	109,04	109,02	108,85
Equipos	6,18	101,32	102,46	102,72	102,49	103,05	103,41	103,93	104,68	104,82	104,91	106,40	106,87
Mano de ot	16,89	104,75	106,81	107,20	107,03	107,29	107,82	108,05	108,07	108,09	108,13	108,17	108,24
Transporte	8,89	101,43	101,81	102,58	103,03	103,88	104,22	104,94	105,00	105,07	105,07	105,07	105,42
Equipos esp	1,89	114,58	115,78	117,88	118,22	120,06	121,72	123,74	129,68	132,16	135,31	138,00	140,35

A16.4 ICOCIV - Serie histórica índice por grupos de costos													
Grupos de costos	Ponderación (%)	2021						2023					
		Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
		Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice	Índice
Materiales	51.31	101.15	101.82	102.63	103.56	104.47	105.21	133.55	132.96	132.98	132.40	132.59	132.73
Herramienta m	2.14	100.85	101.50	102.12	102.76	102.32	102.87	118.40	118.55	118.24	118.24	117.87	118.11
Maquinaria	12.71	100.59	100.86	101.06	101.01	101.60	101.72	118.22	118.60	118.66	119.17	119.52	119.72
Equipos	6.18	100.17	100.23	99.53	99.58	99.88	100.44	112.53	112.64	112.85	112.91	113.16	113.15
Mano de obra	16.89	101.06	101.37	101.51	101.71	101.79	102.01	120.25	120.32	120.42	120.51	120.51	120.51
Transporte	8.89	100.07	100.04	100.07	100.25	100.39	100.48	114.28	115.57	115.93	116.82	117.01	117.03
Equipos especi	1.89	100.46	101.35	101.78	102.18	103.28	105.07	150.24	150.12	151.05	152.56	152.34	152.86



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés, que de acuerdo con la variación que ha experimentado durante el último año el indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto y de acuerdo a la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales, el precio del asfalto vigente a partir del 1° de marzo de 2021 será de UN MILLON CUATROCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRECE PESOS MCTE (\$1.473.013).

Bogotá, 26 de febrero de 2021

DocuSigned by:
Fernando Cubillos
AED93492C9384D3...

FERNANDO CUBILLOS GUZMAN

Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales
Gerencia Productos y Petroquímicos



CIRCULAR INFORMATIVA



Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se ha experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) La tasa de cambio y iii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 22° de octubre de 2021 será de UN MILLON QUINIENTOS NOVENTA MIL OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS MCTE (\$1.590.854) por tonelada métrica.

Bogotá, 21 de octubre 2021

DocuSigned by:

 731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
 Gerente
 Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by:  EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by:  58115413A921434... Alejandro Gómez Bustamante Asesor Jurídico



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en:

i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 01 octubre de 2022 será de DOS MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CUATRO MIL TRESCIENTOS CINCUENTA Y SIETE PESOS CON SETENTA Y NUEVE CENTAVOS MCTE (\$2.444.357,79) por tonelada métrica.

Bogotá, 30 de septiembre 2022

DocuSigned by:
Felipe Trujillo Lopez
731B7604DDA041D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ

Gerente

Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
DocuSigned by: <i>Juan Carlos Palacios G</i> EE4C1ACFF5DD4BD... Juan Carlos Palacios G Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	DocuSigned by: <i>Alexandra Sanchez</i> AC9C813D53C9428... Alexandra Sanchez Franco Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales



CIRCULAR INFORMATIVA

Ecopetrol S.A se permite informar a todos sus clientes y grupos de interés que, de acuerdo con los incrementos que se han experimentado en los últimos meses en: i) El indicador internacional que se utiliza como referente para el cálculo del precio del asfalto, ii) El crudo materia prima a partir del cual se obtiene el asfalto y iii) de acuerdo con la política interna de fijación de precios para los Productos Petroquímicos e Industriales de Ecopetrol S.A, el precio de lista del asfalto vigente a partir del 14 de febrero 2023 será de DOS MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y NUEVE MIL NOVECIENTOS SEIS PESOS CON CUARENTA Y UN CENTAVOS MCTE (\$2.639.906,41) por tonelada métrica.

Bogotá, 14 de febrero 2023

Desubsigned by:
Felipe Trujillo Lopez
73187964DDA347D...

FELIPE TRUJILLO LOPEZ
Gerente
Gerencia de Productos y Petroquímicos

Elaboró:	Revisó:
Desubsigned by: <i>Juan Carlos Palacios</i> EE4C1A0FF5D04B0... Juan Carlos Palacios Desarrollador de Negocios Gerencia Productos y Petroquímicos	Desubsigned by: <i>Alexandra Sanchez</i> AC9CE12D53C942E... Alexandra Sanchez Franco Jefe Departamento Desarrollo de Negocios Petroquímicos e Industriales

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE				CÓDIGO	MEP-MN1-IN-S-FR-1	
					VERSION	1	
					PÁGINA		3

				FECHA		31	12	2023
						(Día / Mes / Año)		

UNIDAD EJECUTORA:	GERENCIA GRUPO ORIENTE	DIRECCION TERRITORIAL:	CAQUETÁ	ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 31 (P)	ACTA DE AJUSTE FINAL: ☐ SI ☒ NO
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.	31	MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:	dic-23	ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)	
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)					

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)	PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)	FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)	FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)	INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030	VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)
	VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00	VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00

DATOS ESPECÍFICOS	
INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA:	\$ 45.032.927.694,00
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA:	\$ 42.575.422.338,00

nov-23									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I ₀	I	I / I ₀	(A)	(B)	P ₀ =A-B	P ₁ =P ₀ *(I/I ₀)	P ₁ -P ₀	
1 Obras de Explanación	101,14	103,21	1,02047	\$7.546.657,00	\$188.666,00	\$7.357.991,00	\$7.508.609,00	\$150.618,00	
2 Sub-bases y bases	100,76	102,43	1,01657	\$17.211.256,00	\$430.281,00	\$16.780.975,00	\$17.059.036,00	\$278.061,00	
3 Transporte de materiales	100,39	100,89	1,00498	\$1.275.833,00	\$31.896,00	\$1.243.937,00	\$1.250.132,00	\$6.195,00	
4 Aceros y elementos metálicos	103,72	108,28	1,04398	\$461.024,00	\$11.526,00	\$449.498,00	\$469.258,00	\$19.760,00	
5 Acero Estructural y cables de acero	103,72	108,28	1,04396	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
6 Concretos, morteros y obras varias	101,91	104,30	1,02345	\$3.521.967,00	\$88.049,00	\$3.433.918,00	\$3.514.443,00	\$80.525,00	
7 Concreto para superestructuras	101,21	99,33	0,98142	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	104,67	1,04534	\$1.164.186,00	\$29.105,00	\$1.135.081,00	\$1.186.546,00	\$51.465,00	
Insumo Equipo	100,90	102,26	1,01348	\$1.350.845,00	\$33.771,00	\$1.317.074,00	\$1.334.828,00	\$17.754,00	
Insumo Asfalto	1752,87	1893,12	1,08001	\$7.312.543,00	\$182.814,00	\$7.129.729,00	\$7.700.179,00	\$570.450,00	
Insumo Otros Materiales	101,65	105,20	1,03492	\$10.068.053,00	\$251.701,00	\$9.816.352,00	\$10.159.139,00	\$342.787,00	
Insumo Transporte	100,05	100,43	1,00380	\$47.678,00	\$1.192,00	\$46.486,00	\$46.663,00	\$177,00	
Insumo Mano de Obra	101,59	102,56	1,00955	\$169.509,00	\$4.238,00	\$165.271,00	\$166.849,00	\$1.578,00	
TOTALES				\$ 50.128.551,00	\$ 1.253.239,00	\$ 48.876.312,00	\$ 50.395.682,00	\$ 1.519.370,00	\$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE							CÓDIGO MEP-MN1-IN-5-FR-1	
								VERSIÓN 1	
								PÁGINA DE 3	
								FECHA 31 DE 12 DE 2023 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 31 (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI NO			
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-23		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D) (Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)					
CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUAN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA “VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030”				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)		INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.438.436,00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00			
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00									
CAPÍTULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA OCTUBRE 2023	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	Ia	I	I / Ia	(A)	(B)	P= A-B	P-Pa*(I/Ia)	Pi-Pa	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103,28	121,51	1,17656	\$7.546.657,00	\$188.666,00	\$7.357.991,00	\$8.657.118,00	\$1.299.127,00	
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102,44	122,84	1,19916	\$17.211.256,00	\$430.281,00	\$16.780.975,00	\$20.123.074,00	\$3.342.099,00	
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	133,23	1,27676	\$788.164,00	\$19.704,00	\$768.460,00	\$981.139,00	\$212.679,00	
Insumo Equipo	102,47	119,17	1,16297	\$1.350.845,00	\$33.771,00	\$1.317.074,00	\$1.531.718,00	\$214.644,00	
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$7.312.543,00	\$182.814,00	\$7.129.729,00	\$11.831.286,00	\$4.701.557,00	
Insumo Otros Materiales	108,63	132,40	1,21882	\$10.068.053,00	\$251.701,00	\$9.816.352,00	\$11.964.366,00	\$2.148.014,00	
Insumo Transporte	100,56	116,82	1,16169	\$47.678,00	\$1.192,00	\$46.486,00	\$54.002,00	\$7.516,00	
Insumo Mano de Obra	102,30	120,51	1,17801	\$169.509,00	\$4.238,00	\$165.271,00	\$194.691,00	\$29.420,00	
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109,42	123,81	1,13147	\$4.073.121,00	\$101.828,00	\$3.971.293,00	\$4.493.399,00	\$522.106,00	
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105,35	125,71	1,19325	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108,95	126,17	1,15806	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102,36	131,40	1,28374	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreo 11608	100,89	119,30	1,18248	\$1.275.833,00	\$31.896,00	\$1.243.937,00	\$1.470.931,00	\$226.994,00	
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101,97	119,85	1,17533	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102,07	119,65	1,17229	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	123,70	1,20083	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Equipo	102,47	119,17	1,16297	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Otros Materiales	108,63	132,40	1,21882	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Transporte	100,56	116,82	1,16169	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Insumo Mano de Obra	102,30	120,51	1,17801	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103,44	123,77	1,19657	\$285.892,00	\$7.147,00	\$278.745,00	\$333.538,00	\$54.793,00	
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106,31	129,98	1,22269	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Transporte elevado Preliminares 14101	101,57	121,62	1,19740	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	102,82	125,26	1,21821	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Transporte elevado Rellenos 14103	107,49	127,48	1,18595	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Transporte elevado Subestructura 14104	102,58	129,85	1,26585	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
Transporte elevado Subestructura 14105	112,43	133,93	1,19122	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	
TOTALES				\$ 50.129.551,00	\$ 1.253.238,00	\$ 48.876.313,00	\$ 61.635.262,00	\$ 12.758.949,00	\$ -

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE AJUSTE				CÓDIGO MEPH-MN1-IN-S-FR-1	
					VERSIÓN 1	
					PÁGINA DE 3	

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE		DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ		ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 31 (P)		ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒	
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31		MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-23		ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)		FECHA: 31 12 2023 (Día / Mes / Año)	

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)				PLAZO INICIAL: 114 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"				FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE				FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 985 DE 2021 (Indique número y año)				INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030		VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.436.436,00 (Según contrato principal)	
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00		VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00	

dic-23									
GRUPO DE AJUSTE	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN FEBRERO 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA DICIEMBRE 2021	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I ₀	I	I / I ₀	(A)	(B)	P ₀ -A-B	P ₀ -P ₀ *(I/I ₀)	P ₀ -P ₀	
1 Obras de Explanación	101,14	103,21	1,02047	\$142.495.426,00	\$3.562.386,00	\$138.933.040,00	\$141.776.999,00	\$2.843.959,00	\$95.810.118,00
2 Sub-bases y bases	100,76	102,43	1,01657	\$324.981.694,00	\$8.124.542,00	\$316.857.152,00	\$322.107.475,00	\$5.250.323,00	\$239.917.719,00
3 Transporte de materiales	100,39	100,89	1,00498	\$24.090.185,00	\$602.255,00	\$23.487.930,00	\$23.604.900,00	\$116.970,00	\$6.100.208,00
4 Aceros y elementos metálicos	103,72	108,28	1,04396	\$8.705.024,00	\$217.626,00	\$8.487.398,00	\$8.860.504,00	\$373.106,00	\$58.076.081,00
5 Acero Estructural y cables de acero	103,72	108,28	1,04396	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
6 Concretos, morteros y obras varias	101,91	104,30	1,02345	\$66.501.527,00	\$1.662.538,00	\$64.838.989,00	\$66.359.463,00	\$1.520.474,00	\$117.880.802,00
7 Concreto para superestructuras	101,21	99,33	0,98142	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
8 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	100,13	104,67	1,04534	\$21.982.082,00	\$549.552,00	\$21.432.530,00	\$22.404.281,00	\$971.751,00	\$225.327.215,00
Insumo Equipo	100,90	102,26	1,01348	\$25.506.557,00	\$637.664,00	\$24.868.893,00	\$25.204.126,00	\$335.233,00	\$7.950.066,00
Insumo Asfalto	1752,87	1893,12	1,08001	\$138.074.910,00	\$3.451.873,00	\$134.623.037,00	\$145.394.226,00	\$10.771.189,00	\$312.526.798,00
Insumo Otros Materiales	101,65	105,20	1,03492	\$190.104.255,00	\$4.752.606,00	\$185.351.649,00	\$191.824.129,00	\$6.472.480,00	\$153.485.168,00
Insumo Transporte	100,05	100,43	1,00380	\$900.250,00	\$22.506,00	\$877.744,00	\$881.079,00	\$3.335,00	\$79.095,00
Insumo Mano de Obra	101,59	102,56	1,00955	\$3.200.650,00	\$80.016,00	\$3.120.634,00	\$3.150.436,00	\$29.802,00	\$707.620,00
TOTALES				\$ 946.542.560,00	\$ 23.663.564,00	\$ 922.878.996,00	\$ 951.567.618,00	\$ 28.688.622,00	\$ 1.217.860.890,00
				VALOR AJUSTE		\$ 30.207.992,00		\$ 1.217.860.890,00	
				VALOR IVA		\$ 220.750,00		\$ 8.899.753,00	
				VALOR TOTAL ICOP		\$ 30.428.742,00		\$ 1.226.760.643,00	

PORCENTAJE AMORTIZADO: 2.500% (t) (tres decimales)



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA
ACTA DE AJUSTE

CÓDIGO
MEP-MN1-IN-5-FR-14
VERSIÓN
1
PÁGINA
DE 3

FECHA
31 12 2023
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No. 31 (P) ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☒
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 31 MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA: dic-23 ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No. (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO DE OBRA No.: 991 DE 2021 (Indique número y año)
OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA - SAN VICENTE DEL CAGUÁN - PUERTO RICO - FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"

PLAZO INICIAL: 114 MESES (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 29/06/2021 (Indique día/mes/año)
PLAZO ACUMULADO: 114 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 31/08/2030 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 985 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISIÓN 2030 (Indique número y año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399.567.438.436,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 409.452.964.666,00

CAPÍTULO CONSTRUCTIVO	ÍNDICE MES DE CIERRE DEL PROCESO DE SELECCIÓN DICIEMBRE 2021	ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA OCTUBRE 2023	FACTOR DE AJUSTE	VALOR BÁSICO DE OBRA	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES DEFINITIVOS ACUMULADOS
	I _o	I	I / I _o	(A)	(B)	P _o =A-B	P _o -P _o *(I/I _o)	P _i -P _o	
Vías interurbanas Preliminares y explanación 11601	103,28	121,51	1,17656	\$142.495.426,00	\$3.562.386,00	\$138.933.040,00	\$163.463.058,00	\$24.530.018,00	\$444.764.685,00
Vías interurbanas Afirmados, subbases y bases 11602	102,44	122,84	1,19916	\$324.981.694,00	\$8.124.542,00	\$316.857.152,00	\$379.962.422,00	\$63.105.270,00	\$1.583.216.987,00
Vías interurbanas Pavimentos asfálticos / concreto 11603	104,35	133,23	1,27676	\$14.882.056,00	\$372.051,00	\$14.510.005,00	\$18.525.794,00	\$4.015.789,00	\$699.902.606,00
Insumo Equipo	102,47	119,17	1,16297	\$25.506.557,00	\$637.664,00	\$24.868.893,00	\$28.921.776,00	\$4.052.883,00	\$69.461.579,00
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$138.074.910,00	\$3.451.873,00	\$134.623.037,00	\$223.397.506,00	\$88.774.469,00	\$2.347.604.567,00
Insumo Otros Materiales	108,63	132,40	1,21882	\$190.104.255,00	\$4.752.606,00	\$185.351.649,00	\$225.910.297,00	\$40.558.648,00	\$855.259.261,00
Insumo Transporte	100,56	116,82	1,16169	\$900.250,00	\$22.506,00	\$877.744,00	\$1.019.666,00	\$141.922,00	\$2.287.507,00
Insumo Mano de Obra	102,30	120,51	1,17801	\$3.200.650,00	\$80.016,00	\$3.120.634,00	\$3.676.138,00	\$555.504,00	\$10.249.014,00
Vías interurbanas Estructuras hidráulicas y drenajes 11604	109,42	123,81	1,13147	\$76.908.387,00	\$1.922.710,00	\$74.985.677,00	\$84.844.044,00	\$9.858.367,00	\$625.519.207,00
Vías interurbanas Obras de urbanismo 11605	105,35	125,71	1,19325	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Vías interurbanas Obras geotécnicas y mitigación ambiental 11606	108,95	126,17	1,15806	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$217.702.290,00
Vías interurbanas Señalización y control de tránsito 11607	102,36	131,40	1,28374	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$37.098.836,00
Vías interurbanas Transporte y sobre acarreos 11608	100,89	119,30	1,18248	\$24.090.185,00	\$602.255,00	\$23.487.930,00	\$27.774.007,00	\$4.286.077,00	\$120.881.216,00
Vías urbanas Actividades preliminares y explanación 11701	101,97	119,85	1,17533	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$3.547.648,00
Vías urbanas Movimiento de tierras, afirmado, subbase y base 11702	102,07	119,65	1,17229	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$2.104.499,00
Vías urbanas Estructura de pavimento, pavimentos asfálticos / concreto, afirmado, subbase y bases 11703	103,01	123,70	1,20083	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$56.097.130,00
Insumo Equipo	102,47	119,17	1,16297	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Asfalto	1893,12	3141,49	1,65943	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Otros Materiales	108,63	132,40	1,21882	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Transporte	100,56	116,82	1,16169	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Insumo Mano de Obra	102,30	120,51	1,17801	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Vías urbanas Estructuras hidráulicas y drenajes, redes hidro sanitarias, señalización de obra, espacio público, señalización y control de tránsito 11705	103,44	123,77	1,19657	\$5.398.190,00	\$134.955,00	\$5.263.235,00	\$6.297.829,00	\$1.034.594,00	\$1.695.824,00
Vías urbanas Señalización vertical y horizontal 11710	106,31	129,98	1,22269	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$6.192.965,00
Transporte elevado Preliminares 14101	101,57	121,62	1,19740	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Transporte elevado Excavación y cimentación 14102	102,82	125,26	1,21821	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Transporte elevado Rellenos 14103	107,49	127,48	1,18595	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00
Transporte elevado Subestructura 14104	102,58	129,85	1,26585	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$101.617,00
Transporte elevado Superestructura 14105	112,43	133,93	1,19122	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00	\$0,00

ACTA DE AJUSTE FINAL: SI ☐ NO ☐

VALOR ADICIONES (incluido IVA): \$ 9.885.528.230,00

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto dentro de los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección. En el evento en que el anticipo autorizado sea girado por el Instituto en varios desembolsos y el primer desembolso sea girado dentro del plazo previsto en el presente numeral y los desembolsos subsiguientes se efectúen por fuera de este plazo, aplica el formato MEPI-MN1-IN-5-FR-2 para los giros subsiguientes.

2. El formato MEPI-MN1-IN-5-FR-1 aplica igualmente para contratos sin anticipo.

3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.

4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoria.

5. El Acta de Ajuste debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.

6. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.


7. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.

8. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento, valores que deberá estar relacionados en la correspondiente factura. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma: _____
Nombre: JORGE ENRIQUE ALFARO DE LOS RIOS
Representante Legal o Apoderado
CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030
Matrícula Profesional No.: 25202 - 44184 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-15-FR-8				
												VERSION 1				
												PÁGINA DE 2				
												FECHA 12 4 2023 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: GERENCIA GRUPO ORIENTE DIRECCIÓN TERRITORIAL: CAQUETÁ																
CONTRATO DE OBRA No.: 991 de 2021 CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE																
MES INFORME MENSUAL: DICIEMBRE PROYECTO: NEIVA - SAN VICENTE DEL CAQUETÁ - PUERTO RICO - FLORENCIA																
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.: 995 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS VISION 2030																
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA																
Vigencia Fiscal		Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto		Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)		Contrato Principal / Adicional No.		Valor		Saldo del Acta Anterior				
2023	136723		C-2401-0600-135-0-2401008-02		11	NACION		Contrato principal		\$	6,074,377,314.00	\$ 133,065,070.66				
2024	240424		C-2401-0600-132-51102D-2401023-02		16	NACION		Contrato principal		\$	218,395,062.00	\$				
2024	240424		C-2401-0600-132-51102D-2401017-02		16	NACION		Contrato principal		\$	1,330,844,608.00	\$ 492,793,759.00				
2024	240424		C-2401-0600-132-51102D-2401008-02		16	NACION		Contrato principal		\$	18,106,315,586.00	\$ 16,616,598,503.00				
2024	166824		C-2401-0600-135-51102D-2401008-02		11	NACION		Contrato principal		\$	6,074,377,315.00	\$ 6,074,377,315.00				
2024	166824		C-2401-0600-135-51102D-2401017-02		11	NACION		Contrato principal		\$	1,901,548,611.00	\$ 1,901,548,611.00				
2024	166824		C-2401-0600-135-51102D-2401023-02		11	NACION		Contrato principal		\$	135,165,185.00	\$ 135,165,185.00				
					TOTAL						\$	27,766,666,667.00	\$ 25,355,568,443.66			
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 409,452,964,666.00																
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA																
Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal No.419721 De (21/05/2021)	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones	
1	OBRA	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00		SI	NO		
1	AJUSTES	jun-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00		X	X		
2	OBRA	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00		X	X		
2	AJUSTES	jul-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,884,103,103.00	\$ 399,567,436,436.00		X	X		
3	OBRA	ago-21	\$ 25,633,813.00	\$ 187,324.00	\$ 25,821,137.00	\$ -	\$ 25,821,134	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,858,281,969.00	\$ 399,541,615,299.00		X	X		
3	AJUSTES	ago-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,858,281,969.00	\$ 399,541,615,299.00		X	X		
4	OBRA	sep-21	\$ 290,414,527.00	\$ 35,828,991.00	\$ 326,243,518.00	\$ -	\$ 326,243,518	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,532,038,451.00	\$ 399,215,371,781.00		X	X		
4	AJUSTES	sep-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,532,038,451.00	\$ 399,215,371,781.00		X	X		
5	OBRA	oct-21	\$ 151,421,024.00	\$ 1,106,538.00	\$ 152,527,562.00	\$ -	\$ 152,527,562	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,379,510,889.00	\$ 399,062,844,219.00		X	X		
5	AJUSTES	oct-21	\$ 2,076,560.00	\$ 15,175.00	\$ 2,091,735.00	\$ -	\$ 2,091,735	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,377,419,154.00	\$ 399,060,752,484.00		X	X		
6	OBRA	nov-21	\$ 373,938,181.00	\$ 2,732,625.00	\$ 376,670,806.00	\$ -	\$ 376,670,806	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,000,748,348.00	\$ 398,684,081,678.00		X	X		
6	AJUSTES	nov-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	92221 11/03/2021	\$ 10,000,748,348.00	\$ 398,684,081,678.00		X	X		
ADICIÓN 1		dic-21						\$ -	9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 10,000,748,348.00	\$ 408,569,609,908.00		X		
7	OBRA	dic-21	\$ 288,931,557.00	\$ 2,111,423.00	\$ 291,042,980.00	\$ -	\$ 291,042,980	\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 9,709,705,368.00	\$ 408,278,566,928.00		X	X		
7	AJUSTES	dic-21	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 9,709,705,368.00	\$ 408,278,566,928.00		X	X		
8	OBRA	ene-22	\$ 162,319,214.00	\$ 1,186,179.00	\$ 163,505,393.00	\$ -	\$ 163,505,393	\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 23,379,533,308.00	\$ 408,115,061,535.00		X	X		
8	AJUSTES	ene-22	\$ 2,725,546.00	\$ 19,917.00	\$ 2,745,463.00	\$ -	\$ 2,745,463	\$ 9,885,528,230.00	245321 18/12/2021	\$ 23,376,787,845.00	\$ 408,112,316,072.00		X	X		
9	OBRA	feb-22	\$ 95,030,846.00	\$ 1,319,010.00	\$ 96,349,856.00	\$ 2,402,243.00	\$ 93,947,613.00	\$ 9,883,125,987.00	245321 18/12/2021	\$ 23,282,840,232.00	\$ 408,015,966,216.00		X	X		
10	OBRA	mar-22	\$ 815,420,772.00	\$ 141,316,899.00	\$ 956,737,671.00	\$ 23,853,865.00	\$ 932,883,806.00	\$ 9,859,272,122.00	245321 18/12/2021	\$ 22,349,956,426.00	\$ 407,059,228,545.00		X	X		
11	OBRA	abr-22	\$ 315,412,481.00	\$ 2,302,160.00	\$ 317,714,641.00	\$ 7,921,421.00	\$ 309,793,220.00	\$ 9,851,350,701.00	245321 18/12/2021	\$ 22,040,163,206.00	\$ 406,741,513,904.00		X	X		
12	OBRA	may-22	\$ 1,319,446,250.00	\$ 95,874,977.00	\$ 1,415,321,227.00	\$ 35,287,500.00	\$ 1,380,033,727.00	\$ 9,816,063,201.00	245321 18/12/2021	\$ 20,660,129,479.00	\$ 405,326,192,677.00		X	X		
13	OBRA	jun-22	\$ 991,701,814.00	\$ 7,243,636.00	\$ 998,945,450.00	\$ 24,906,210.00	\$ 974,039,240.00	\$ 9,791,156,991.00	245321 18/12/2021	\$ 19,686,090,239.00	\$ 404,327,247,227.00		X	X		
REPROGRAMACIÓN # 2		jul-22						\$ 9,791,156,991.00	216522 28/02/2022	\$ 19,686,090,239.00	\$ 404,327,247,227.00		X			
14	OBRA	jul-22	\$ 2,175,716,723.00	\$ 15,895,811.00	\$ 2,191,612,534.00	\$ 54,642,385.00	\$ 2,136,970,149.00	\$ 9,736,514,606.00	216522 28/02/2022	\$ 17,549,120,090.00	\$ 402,135,634,693.00		X	X		
15	OBRA	ago-22	\$ 1,402,740,283.00	\$ 24,188,336.00	\$ 1,426,928,619.00	\$ 35,576,902.00	\$ 1,391,351,717.00	\$ 9,700,937,704.00	216522 28/02/2022	\$ 16,157,768,373.00	\$ 400,708,706,074.00		X	X		
16	OBRA	sep-22	\$ 1,571,877,792.00	\$ 11,486,799.00	\$ 1,583,364,591.00	\$ 39,584,115.00	\$ 1,543,780,476.00	\$ 9,661,353,589.00	216522 28/02/2022	\$ 14,613,987,897.00	\$ 399,125,341,483.00		X	X		
17	OBRA	oct-22	\$ 1,222,379,281.00	\$ 8,932,772.00	\$ 1,231,312,053.00	\$ 30,782,801.00	\$ 1,200,529,252.00	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 13,413,458,645.00	\$ 397,894,029,430.00		X	X		
9	AJUSTES	feb-22	\$ 1,460,286.00	\$ 10,671.00	\$ 1,470,957.00	\$ -	\$ 1,470,957	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 13,411,987,688.00	\$ 397,892,558,473.00		X	X		
10	AJUSTES	mar-22	\$ 1,282,119.00	\$ 9,369.00	\$ 1,291,488.00	\$ -	\$ 1,291,488	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 13,410,686,200.00	\$ 397,891,266,985.00		X	X		
11	AJUSTES	abr-22	\$ 6,390,786.00	\$ 46,702.00	\$ 6,437,488.00	\$ -	\$ 6,437,488	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 13,404,258,712.00	\$ 397,884,829,497.00		X	X		
12	AJUSTES	may-22	\$ 16,753,129.00	\$ 122,427.00	\$ 16,875,556.00	\$ -	\$ 16,875,556	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 13,387,383,156.00	\$ 397,867,953,941.00		X	X		
13	AJUSTES	jun-22	\$ 25,396,818.00	\$ 185,592.00	\$ 25,582,410.00	\$ -	\$ 25,582,410	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 13,361,800,746.00	\$ 397,842,371,531.00		X	X		
14	AJUSTES	jul-22	\$ 170,598,773.00	\$ 1,246,683.00	\$ 171,845,456.00	\$ -	\$ 171,845,456	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 13,189,955,290.00	\$ 397,670,526,075.00		X	X		
15	AJUSTES	ago-22	\$ 158,438,396.00	\$ 1,157,819.00	\$ 159,596,215.00	\$ -	\$ 159,596,215	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 13,030,359,075.00	\$ 397,510,929,860.00		X	X		
16	AJUSTES	sep-22	\$ 225,473,832.00	\$ 1,647,693.00	\$ 227,121,525.00	\$ -	\$ 227,121,525	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 12,803,237,550.00	\$ 397,283,808,335.00		X	X		
17	AJUSTES	oct-22	\$ 174,274,743.00	\$ 1,273,546.00	\$ 175,548,289.00	\$ -	\$ 175,548,289	\$ 9,630,570,788.00	216522 28/02/2022	\$ 12,627,689,261.00	\$ 397,108,260,046.00		X	X		
18	OBRA	nov-22	\$ 1,175,667,282.00	\$ 8,591,415.00	\$ 1,184,258,697.00	\$ 29,606,467.00	\$ 1,154,652,230.00	\$ 9,600,964,321.00	216522 28/02/2022	\$ 11,473,037,031.00	\$ 395,924,001,349.00		X	X		
18	AJUSTES	nov-22	\$ 225,165,931.00	\$ 1,645,443.00	\$ 226,811,374.00	\$ -	\$ 226,811,374	\$ 9,600,964,321.00	216522 28/02/2022	\$ 11,246,225,657.00	\$ 395,697,189,975.00		X	X		
19	OBRA	dic-22	\$ 1,447,896,167.00	\$ 10,580,780.00	\$ 1,458,476,947.00	\$ 36,461,924.00	\$ 1,422,015,023.00	\$ 9,564,502,397.00	216522 28/02/2022	\$ 9,824,210,634.00	\$ 394,238,713,028.00		X	X		
19	AJUSTES	dic-22	\$ 207,314,232.00	\$ 1,514,989.00	\$ 208,829,221.00	\$ -	\$ 208,829,221	\$ 9,564,502,397.00	216522 28/02/2022	\$ 9,615,381,413.00	\$ 394,029,883,807.00		X	X		
20	OBRA	ene-23	\$ 1,786,280,408.00	\$ 13,053,588.00	\$ 1,799,333,996.00	\$ 44,983,350.00	\$ 1,754,350,646.00	\$ 9,519,519,047.00	216522 28/02/2022	\$ 35,627,697,434.00	\$ 392,230,549,811.00	#29625 27/03/2023	X	X		
20	AJUSTES	ene-23	\$ 222,048,195.00	\$ 1,622,660.00	\$ 223,670,855.00	\$ -	\$ 223,670,855	\$ 9,519,519,047.00	216522 28/02/2022	\$ 35,404,026,579.00	\$ 392,006,878,956.00	#29633 27/03/2023	X	X		
21	OBRA	feb-23	\$ 2,389,391,653.00	\$ 17,460,939.00	\$ 2,406,852,592.00	\$ 60,171,315.00	\$ 2,346,681,277.00	\$ 9,459,347,732.00	125123 8/02/2023	\$ 33,057,345,302.00	\$ 389,600,026,364.00		X	X		

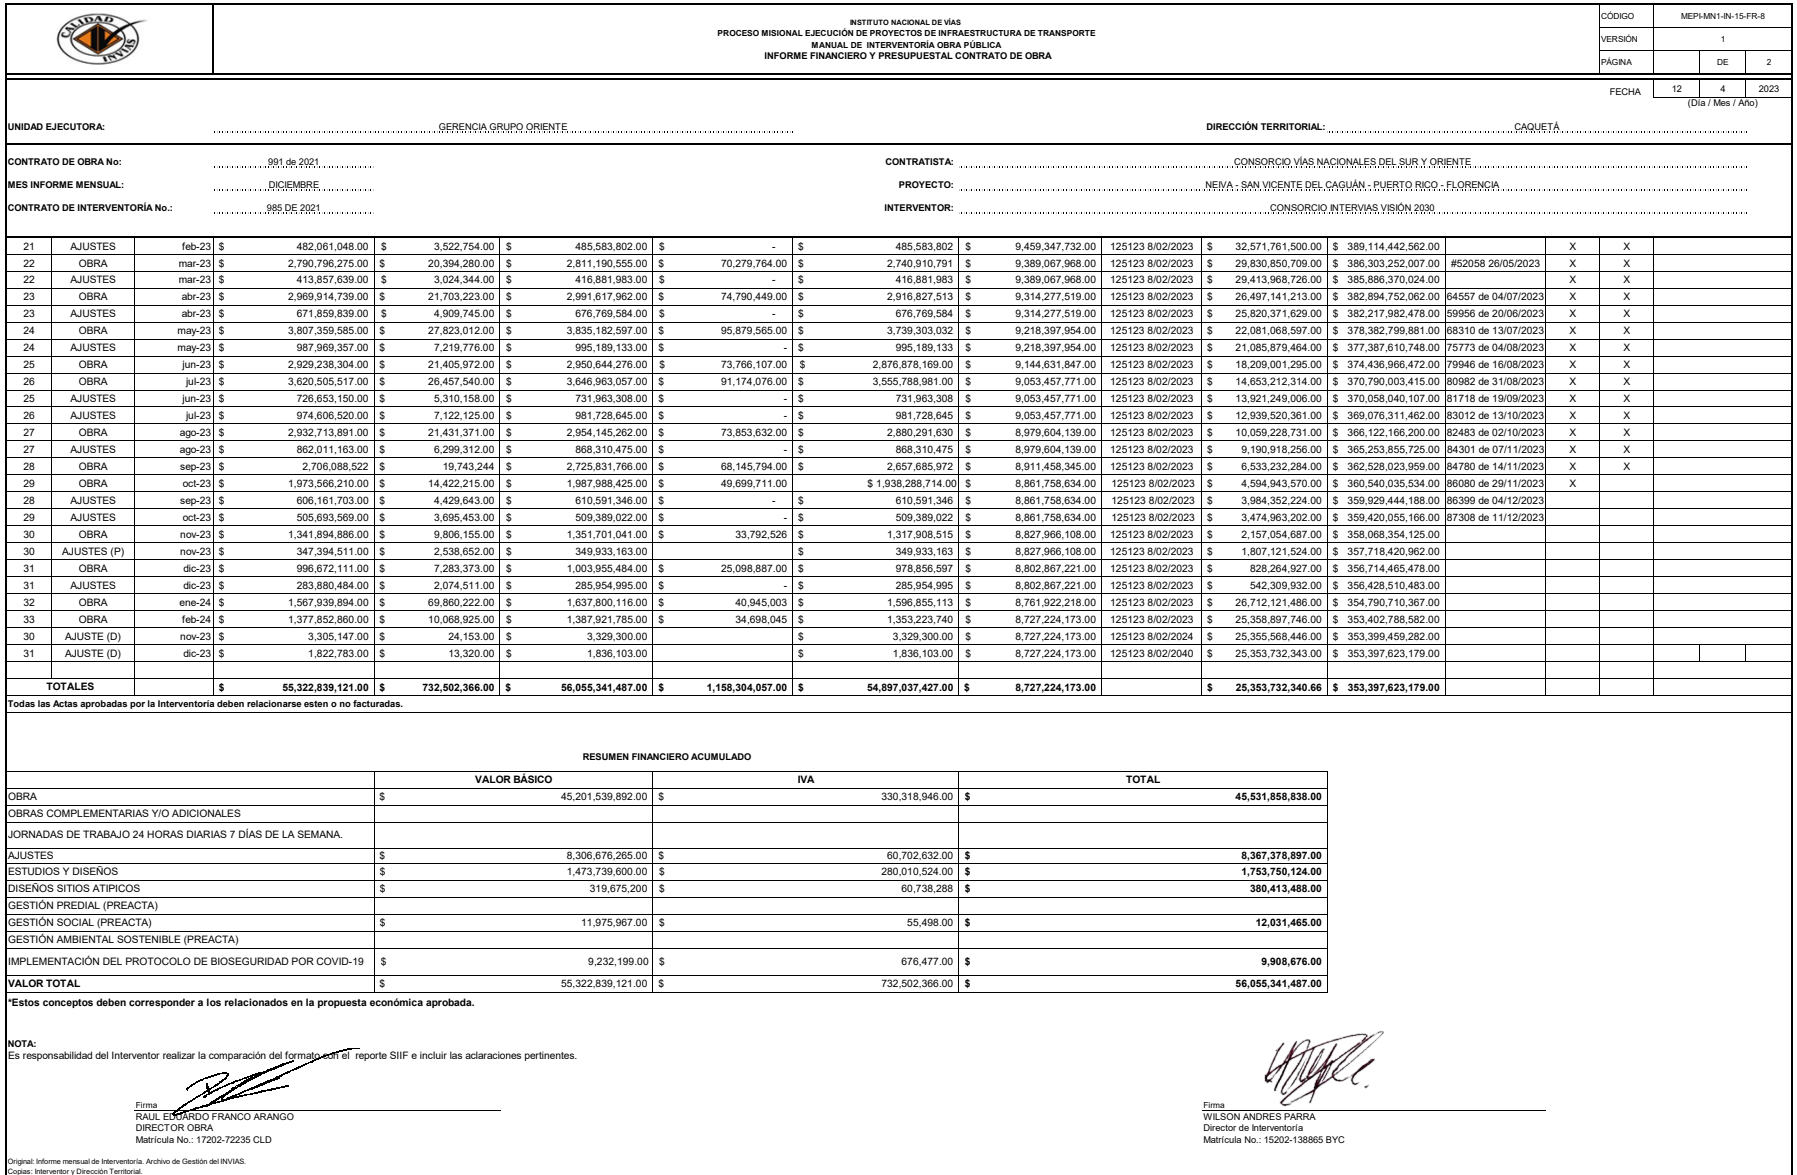



FACTURA PROFORMA
No. 31B

Señor(es) INSTITUTO NACIONAL DE VIAS	Fecha Factura	DIA	MES	AÑO
		11	4	2023
NIT 800,215,807- 2 Tel 377 0600	Fecha de Vencimiento	DIA	MES	AÑO
Direccion: CR 59 26 60		10	5	2024
	Contrato No.	991 DE 2021		
Ciudad BOGOTA D.C	Interventor			

DESCRIPCIÓN	VALOR
ACTA AJUSTES 31 DEFINITIVA - OBRAS DE CONSTRUCCION PARA EL MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DEL CORREDOR NEIVA – SAN VICENTE DEL CAGUÁN – PUERTO RICO – FLORENCIA, EN LOS DEPARTAMENTOS DE HUILA Y CAQUETÁ, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030"	1.402.141
PERIODO: DICIEMBRE 2023 IVA 19% SOBRE UTILIDAD 5% EJECUCIÓN OBRA: \$13.320	

OBSERVACIONES:			
90% KMA CONSTRUCCIONES S.A.S - NIT: 830,094,920-5			
5% CICON S.A.S - NIT: 890,403,235-3			
5% CONSTRUCTORA EMMA LTDA - NIT: 806,014,108-1			
#\$24-02-00;991 DE 2021;kpacheco@invias.gov.co#\$			
VALOR EN LETRAS:			
UN MILLON OCHOCIENTOS TREINTA Y SEIS MIL CIENTO TRES PESOS M/CTE			
FAVOR CONSIGNAR A: NIT: BANCO: CUENTA CORRIENTE:		CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	
		901,475,034-7	
		DAVIVIENDA	
		055969998453	
		TOTAL FACTURA	
		1.836.103,00	
		RETE IVA	
FORMA DE PAGO:		CONTADO	
MEDIO DE PAGO:		ACUERDO MUTUO	
FECHA DE EMISION		AMORT. ANT	
HORA DE EMISION		RETE IVAN	
		OTROS DESCUENTOS	
		TOTAL A PAGAR	
		1.836.103,00	

GIRAR CHEQUE ÚNICAMENTE A CONSORCIO VIAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE CON SELLOS PARA CONSIGNAR AL PRIMER BENEFICIARIO. ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN SUS EFECTOS LEGALES A UN TÍTULO VALOR - (SEGÚN ARTICULO 772 Y SIGUIENTES DEL CÓDIGO DE COMERCIO), EN CONCORDANCIA CON LO ESTABLECIDO POR LA LEY 1231 DE 2008 ESTA FACTURA CAUSARÁ INTERESES DE MORA A LA TASA MÁXIMA LEGAL VIGENTE A PARTIR DE SU VENCIMIENTO.

	ACEPTADA 	ACEPTADA
CONSORCIO VÍAS NACIONALES DEL SUR Y ORIENTE	INTERVENTORIA	FIRMA Y SELLO CC o NIT
