

	<p style="text-align: center;">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p style="text-align: center;">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p style="text-align: center;">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p style="text-align: center;">LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL</p>	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio Solidario No.	2604-2024	OAC JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BOQUERON
Contrato de Interventoría No.	3565-2024	Interventoría: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS

Objeto Convenio Solidario:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No.	1	MES O PERIODO:	nov-24
---------------------	---	----------------	--------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		3
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		3
2.1	Localización		3
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		3
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		3
2.4	Características técnicas del proyecto		3
3	INFORMACION CONTRATO DE OBRA		4
3.1	Información general del contrato		4
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		4
3.3	Seguimiento Items no previstos		4
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		4
4	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	Plan de Inversión de Desembolso Convenios		
	Informe de Inversión y Buen Manejo del Desembolso convenio		
	Auxiliar Detallado Movimientos Buen Manejo del Desembolso		
	Certificado contrapartida Convenios OAC-INVIAS		
	Actas de Comité Operativo		
5	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA		5
5.1	Información general del contrato		5
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		5
5.3	Informes especialistas y profesionales		5
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		5
5.5	Informe matriz de riesgos.		5
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría	N/A	
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.	N/A	
6	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		6
8	Anexos		6
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		6
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		7
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		5 Y 6
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 4674 de fecha 4/10/2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIA.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORIA OBRAS PÚBLICAS
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO
MEP1-MN-RV-15-FR-2
VERSION
1
PAGINA

FECHA
30/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META PERIODO MES: 09-24

CONTRATO DE OBRA No.: 2604-2024 PLAZO INICIAL: HASTA 31-DIC-2024 VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 399,306,276.00
FECHA DE INICIO: 30/09/2024 VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$
FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A
FECHA DE REANUDACIÓN: N/A VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 399,306,276.00
FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024 ANTICIPO CONCEDIDO: \$
PLAZO ACUMULADO: 3 MESES+ 1 DIA ANTICIPO AMORTIZADO: \$

OBJETO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BOQUERON

CONTRATO DE INTERVENTORIA: 3566-2024 INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCONSAS SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO				AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO				
ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD		ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA	
Pavimentación				Construcción				
Mejoramiento				Mejoramiento				
Rehabilitación				Rehabilitación				
Estructuras				Túneles				
Puentes				Puentes				
Pontones				Pontones				
Mantenimiento				Mantenimiento				
Otros (Especificar cuales)	ALCANTARILLAS	UNIDAD	4	Otros (Especificar cuales)	ALCANTARILLAS	UNIDAD	0	0

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES				AVANCE FINANCIERO				
	BÁSICO	IVA	TOTAL		BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	\$ 149,729,822.00		\$ 149,729,822.00	OBRAS	0.00		0.00	0.00
CONTRAPARTIDA JAC	\$ 1,000,000.00		\$ 1,000,000.00	CONTRAPARTIDA JAC	0.00		0.00	0.00
ADMINISTRACION	\$ 44,084,559.00		\$ 44,084,559.00	JORNADA DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0.00		0.00	0.00
PAGA	\$ 4,491,895.00		\$ 4,491,895.00	GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0.00		0.00	0.00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 199,306,276.00		\$ 199,306,276.00	GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0.00		0.00	0.00
				GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0.00		0.00	0.00
				GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0.00		0.00	0.00
				VALOR EJECUTADO	0.00		0.00	0.00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 59,909,940.67
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$
AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0.00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0
MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0
EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0
TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Socialización de actividades del proyecto- San José del Guaviare



Socialización de actividades del proyecto- San José del Guaviare

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma
Nombre: Alejandro Aguilar
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 05202-66512 ANT
Registral: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del PMOAS.
Código: Interventoría, Operación, Verificación

		INFORME MENSUAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL					
						FECHA: 30/11/2024 <small>(Día/Mes/Año)</small>	
1. INTRODUCCIÓN							
PROYECTO: PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META		UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES		INFORME N°: 1	
CONTRATO DE INTERVENTORA N°: 3556-2024		NÚMERO DEL PROCESO: CMA-DEO-SVR-CIPT-047-2024		ID DEL SECTOR: COL. EL CENTRO 13489802		INTERVENIOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - OROUONG SAS	
CONVENIO N°: 2604-2024		ID DEL SECTOR: SPSC-CD-CS-423-2024		OBJETO CONVENIO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOQUERÓN DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORA: ING CARLOS GERMAN CORTO URSIGUI	
						ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL / ORGANIZACIÓN INDÍGENA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BOQUERÓN	
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO							
2.1 LOCALIZACIÓN:							
DEPARTAMENTO: GUAVIARE		MUNICIPIO: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		VEREDA / COMUNIDAD O RESGUARDO INDÍGENA: EL BOQUERÓN		TRAMO DE LA VÍA A INTERVENIR: Corredor vial que comunica "El Boquerón" en el tramo de la Vereda Boquerón que tiene una longitud de atención de 3,40 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 "Tramo vial Caño Blanco 2 - Boquerón", y el punto final de referencia es PR03+000 "Entrada Caño Blanco"	
						LONGITUD DEL TRAMO: 3.4 KM	
						ACTIVIDAD ECONOMICA: Agrícola	
IMÁGENES DE LA LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO							
DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: LOCALIZACIÓN EL BOQUERON - SAN JOSE DEL GUAVIARE				DESCRIPCIÓN DE LA IMAGEN: VÍA EXISTENTE FUENTE: Propia			
2.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA							
MUNICIPIOS DE INFLUENCIA: SAN JOSÉ DEL GUAVIARE		BENEFICIOS DE LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: La ejecución de alcantarillas en vías terciarias es fundamental para garantizar la adecuada evacuación de aguas lluvias, evitando el deterioro prematuro de la estructura vial y mejorando su durabilidad. Además, contribuyen a la estabilidad de los taludes, reducen el riesgo de inundaciones y favorecen la transitableidad en toda época del año.					
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VÍA							
FOTO INICIAL				FOTO AVANCE			
LOCALIZACIÓN:		Municipio de San José del Guaviare		LOCALIZACIÓN:			
DESCRIPCIÓN:		VÍA DESTAPADA, MATERIAL TIPO ARCILLA, TUBO DE ALCANTARILLA SIN ESTRUCTURA EN CONCRETO NO SE EVIDENCIA MANEJO DE AGUAS DE ESCORRENTÍAS CON CUNETAS VIA EN MAL ESTADO		DESCRIPCIÓN:			
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO (parámetros de diseño, parámetros geométricos, sección típica de la vía, estructura del pavimento a construir y tipificación de los diferentes sectores)							
TIPO DE OBRA: ESTRUCTURA HIDRAULICA		DESCRIPCIÓN TÉCNICA:		TIPO DE OBRA: ESTRUCTURA HIDRAULICA		DESCRIPCIÓN TÉCNICA:	
PR01+283 PR01+900 PR02+100 PR03+200							
UBICACIÓN:		CONSTRUCCIÓN DE 4 ALCANTARILLAS		UBICACIÓN:			
ESQUEMA:				ESQUEMA:			

INFORME MENSUAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL												
FECHA: 30/11/2024											30/11/2024	
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO												
3.1 INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO												
ID DEL SECCP: SPSC-CD-C-472-2024 CONVENIO No: 2604-2024 FECHA SUSCRIPCION: 23/08/24 ORGANIZACION DE ACCION COMUNAL / ORGANIZACION INDIGENA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BOQUERON												
OBJETO CONVENIO: ALINEAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL NT: 00162916-4												
REPRESENTANTE LEGAL: FABIO NELSON DUARTE LOPEZ NUMERO DE CONTACTO: 307281247 VALOR INICIAL: \$ 99.306.276,00 ADICION: \$ VALOR ACTUALIZADO: \$ 106.306.276,00												
ORDEN DE INICIO: 30/09/2024 FECHA ORDEN DE INICIO: 30/09/2024 PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2024 FECHA DE TERMINACION INICIAL: 31/12/2024 FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA: 31/12/2024												
ESTADO DEL CONVENIO: EJECUCION												
PROROGAS												
PLAZO	PLAZO	FECHA TERMINACION										
N/A	N/A	N/A										
SUSPENSIONES												
IN	RAZON DE SUSPENSION	PLAZO	FECHA REANIMACION	FECHA TERMINACION								
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A								
3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES												
ITEM	DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUCION DEL MES ANTERIOR		EJECUCION PRESENTE MES		EJECUCION ACUMULADA		PORCENTAJE DE EJECUCION
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	
CONSTRUCCION DE (4) ALCANTARILLAS												
1	Excavaciones Varías Sin Clasificar	M3	218,1	\$ 48.131,00	\$ 10.497.371,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
2	Excavaciones Varías En Roca En Seco	M3	38,5	\$ 82.793,00	\$ 3.187.531,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
3	Relleno Para Estructuras Con Suelo (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	102,9	\$ 264.533,00	\$ 27.220.446,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
4	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	34,3	\$ 1.028.815,00	\$ 35.288.355,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
5	Concreto Liviano Resistencia 14Mpa (F) - Mezcla In Situ	M3	4,7	\$ 619.709,00	\$ 2.912.632,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
6	Tubería De Concreto Reforzado, Clase II De 900Mm De diametro Interior	M	31	\$ 848.419,00	\$ 26.300.989,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
7	Aceiro De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2315,6	\$ 5.120,00	\$ 11.855.872,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
8	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	33,5	\$ 969.153,00	\$ 32.466.626,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
				SUBTOTAL	\$ 126.759.822,00							
				TOTALES	\$ 126.759.822,00		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES, ESTADO Y ACCIONES DE LA INTERVENTORIA FRENTE AL AVANCE DEL MES												
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS												
GRADIENTE DE EJECUCION VS PROGRAMACION												
Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto.												
Sin embargo, la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el adelantamiento y control del convenio. Entre estas actividades se destacan la revisión detallada de la documentación contractual, la validación de los hojas de vida del personal propuesto para el proyecto y la socialización de las actividades planificadas con los partes interesadas. Estas acciones buscan garantizar que, una vez se dispongan los recursos, los labores puedan ejecutarse de manera inmediata y eficiente, cumpliendo con los lineamientos técnicos y contractuales establecidos.												
N/A												
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA												
DESCRIPCION												
FORMATO												
OBSERVACIONES												
4.1	Informes Semanales					ANEXO	SI					
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra				MEPI-MNI-IN-15-FR-4	ANEXO	N/A					
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra				MEPI-MNI-IN-15-FR-6	ANEXO	N/A					
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra				MEPI-MNI-IN-15-FR-8	ANEXO	N/A					
4.5	Estado General del Tiempo				MEPI-MNI-IN-15-FR-10	ANEXO	N/A					
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio				MEPI-MNI-IN-15-FR-11	ANEXO	N/A					
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra				MEPI-MNI-IN-15-FR-12	ANEXO	SI					
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra				MEPI-MN-IN-15-FR-14	ANEXO	N/A					Debido a las características de la obra, no implementa plan de calidad pero se realizará seguimiento y control a las especificaciones de las actividades ejecutadas
4.9	Otros documentos seguimiento mensual											
	Plan de Inversión de Desembolso Convenios					ANEXO	N/A					
	Informe de Inversión y Buen Manejo del Desembolso convenio					ANEXO	N/A					
	Auxiliar Detallado Movimientos Buen Manejo del Desembolso					ANEXO	N/A					
	Certificado contrapartida Convenios OAC-INVIAS					ANEXO	N/A					
	Actas de Comité Operativo					ANEXO	N/A					
	Certificación/oficio/Resolución del municipio respecto al RETEICA					ANEXO	N/A					

INFORME MENSUAL

PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL

FECHA

30/11/2024

5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO

NUMERO DEL PROCESO

CMA-DEO-SVB-CCTP-017-2024

ID DEL SECOF

CO1.SLCNTR.1345

CONTRATO NO.

3965-2024

FECHA SUSCRIPCION

11-09-24

CONTRATISTA

GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCCONG SAS

INTERVENITORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCION COMUNAL O COMUNIDADES ETNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE

INTEGRANTES

% PARTICIPACION

INTEGRANTES

OBJETO CONTRATO:

EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA EZP TOTAL - LOTE 4

NT

030.509.472.9

REPRESENTANTE LEGAL

LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ

NUMERO DE CONTACTO

3176446297

VALOR INICIAL

\$ 2.014.395.039.00

ADICION

\$ -

VALOR ACTUALIZADO

\$ 2.014.395.039.00

ORDEN DE INICIO

17-09-24

FECHA ORDEN DE INICIO

17/10/2024

PLAZO INICIAL

HASTA 31/12/2024

FECHA DE TERMINACION INICIAL

31/12/2024

FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA

31/12/2024

ORDENOS

NO.	PLAZO	FECHA TERMINACION
N.A	N.A	N.A

SUSPENSIONES

NO.	AMPLIACION DE SUSPENSION	PLAZO	FECHA REANUDACION	FECHA TERMINACION
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A

ESTADO DEL CONVENIO

EJECUCION

5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR

DESCRIPCION

1. REVISION DOCUMENTACION DEL PROYECTO SUMINISTRADA POR INVIAS
2. VISITA DE INSPECCION Y RECONOCIMIENTO A LA ZONA DEL PROYECTO
3. REVISION Y APROBACION DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONALES A VINCULAR AL PROYECTO
4. ELABORACION DE INFORMES SEMANALES Y MENSUAL N.1
5. ASISTENCIA A REUNIONES Y CAPACITACIONES CITADAS POR LA REGIONAL META
6. RADICACION HOJAS DE VIDA PERSONAL CLAVE EQUIPO DE INTERVENTORIA PARA APROBACION DE INVIAS
7. RADICACION SOLICITUD CAMBIO DE FIRMA, CUENTA BANCARIA CONSULTA DEL COMEND
8. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO INICIAL.

REGISTRO FOTOGRAFICO



5.3 INFORME DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES

DESCRIPCION ACTIVIDADES GESTION SOCIAL

1. REUNION DE SOCIALIZACION DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD
2. REUNION DE ACABACION DE INQUIETUDES A LA COMUNIDAD SOBRE INICIO DEL PROYECTO

REGISTRO FOTOGRAFICO



DESCRIPCION ACTIVIDADES GESTION AMBIENTAL

1. RECOLECCION DE MATERIAL RETIRO PARA ELABORACION DE ENSAYOS
2. VISITA PLANTA DE AGREGADOS DE LA ZONA.

REGISTRO FOTOGRAFICO



RESPONSABLE

ING. ZAYRA JHANA BAUTISTA VAZELA TP48728-249691 STD

FECHA

30/11/2024

6. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION	FORMATO		OBSERVACIONES
6.1 Equipo y vehiculos Contrato de Interventoria	MEPI-MNI-IN-15-FR-5	ANEXO SI	-----
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoria	MEPI-MNI-IN-15-FR-7	ANEXO SI	-----
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoria	MEPI-MNI-IN-15-FR-9	ANEXO SI	-----
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoria	MEPI-MNI-IN-15-FR-13	ANEXO SI	-----
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoria	MEPI-MNI-IN-15-FR-15	ANEXO N/A	Debido a las características de la obra, no implementa plan de calidad pero se realizará seguimiento y control a las especificaciones de las actividades ejecutadas
6.6 Otros documentos seguimiento mensual	MEPI-MN-IN-3-FR-1	ANEXO N/A	-----
Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-2	ANEXO N/A	-----
Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	SI	-----
Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	ANEXO N/A	-----
Bitácora		ANEXO N/A	-----

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	RELACION DE LA CORRESPONDENCIA			
	No.	FECHA	ACTUACIONES	RESPONSABLE
Durante el periodo del presente informe se realizaron actividades administrativas correspondientes a la etapa previa de alistamiento, como revisión de la documentación e información inicial del proyecto, reuniones y capacitaciones convocadas por la entidad contratante: INVIAS.	OF-INTEP_L0TE4-001	18-sep-24	INDICACION DE PUNTO DE INTERVENTORIA	INVIAS- Ing. Juan Pablo Toro Carvajal
	OF-INTEP_L0TE4-002	1-nov-24	SOLICITUD DE ANTICIPA Y DOCUMENTACION PARA APERTURA DE CUENTA CORRIENTE	INVIAS- Ing. Juan Pablo Toro Carvajal
	OF-INTEP_L0TE4-003	12-nov-24	SOLICITUD DE REVISIÓN Y AVAL DE HORAS DE VIDA PARA INICIO DE ETAPA DE ALISTAMIENTO	INVIAS- Ing. Carlos Corzo
	OF-INTEP_L0TE4-004	18-nov-24	SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES EN CAMPO EN LOS 16 CONVENIOS CON ORDEN DE INICIO	INVIAS- Ing. Carlos Corzo
	Cambio electrónico	19-oct-24	6. Información General y Formatos Convenios 2024	GRUPOING S.A.S
	Cambio electrónico	20-oct-24	Revisión Formato TMS	GRUPOING S.A.S

ELABORÓ

CARGO DIRECTOR DE INTERVENTORIA

PROFESIONAL Ing. Álvaro Solano Aguilar

MATRÍCULA PROFESIONAL 06202-66512 ANT

FIRMA 

APROBÓ

CARGO SUPERVISOR


PROFESIONAL Ing. Carlos Germán Corzo Ureba

MATRÍCULA PROFESIONAL 17202-117788 CLD

FIRMA 

REGISTRO FOTOGRAFICO					
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL					
FECHA: 30/11/2024 (DIA / MES / AÑO)					
PROYECTO:	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	UNIDAD EJECUTORA:	INFORME No.:	PERIODO DEL INFORME:	ULTIMO INFORME MENSUAL:
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	META	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	1	15-30 NOV. 2024	NO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	NUMERO DEL PROCESO:	ID DEL SECOP:	INTERVENTOR:	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
3565-2024	CMA-DEQ-SVR-CCPT-047-2024	CO1 SLCNTR 13459802	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS	ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI	
CONVENIO No.:	ID DEL SECOP:	OBJETO CONVENIO	ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL / ORGANIZACIÓN INDIGENA:		
2604-2024	SPSC-CD-CS-423-2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BOQUERON		

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
DESCRIPCION DE LA IMAGEN: Socialización de actividades del proyecto- San Jose del Guaviare FUENTE: Propia	DESCRIPCION DE LA IMAGEN: Reunión en la regional Meta, aclaraciones inicio de obra FUENTE: Propia
	
DESCRIPCION DE LA IMAGEN: Visita a planta de agregados de la zona FUENTE: Propia	DESCRIPCION DE LA IMAGEN: Reunión de aclaración de inquietudes a la comunidad sobre el inicio del proyecto FUENTE: Propia



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																												
			VERSIÓN	1																												
			PÁGINA																													
			FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)																												
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																													
CONTRATO DE OBRA No: 2604-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BOQUERON																													
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24			PROYECTO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																													
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3565-2024			INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS																													
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	Total
Seco															8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	128
Lluvias moderadas																																
Lluvias intensas																																
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																
OBSERVACIONES:																																
Firma N.A. Nombre: Residente de Obra Matrícula Profesional No.:																																
Firma Nombre: Deyanira Cristancho Residente de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-82693 CND																																
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES							DIRECCIÓN TERRITORIAL: META		
CONTRATO DE OBRA No.: 2604-2024							CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BOQUERON		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24							AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO PROYECTO: VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3565-2024							INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS		
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple Si o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
OBSERVACIONES:									
Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.									
NOTAS:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.									
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.									
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.									
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.									
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.									
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma N.A									
Nombre: Ing. Alvaro Solano Aguilar									
Director de Obra									
Matrícula Profesional No.:									
Firma									
Nombre: Ing. Alvaro Solano Aguilar									
Director de Interventoría									
Matrícula Profesional No.: 05202-66512 ANT									
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.									
Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA		30	11	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	META
-------------------	------------------------------	------------------------	------

CONTRATO DE OBRA No.	2604-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BOQUERON
----------------------	-----------	--------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:	
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL	

FECHA DE INICIO:	30/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 199.306.276,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 199.306.276,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3565-2024	INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS
-------------------------------	-----------	--------------	---

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																																		
<table><tr><td>Amparo</td><td>% Amparo</td><td>Valor Asegurado (\$)</td><td colspan="6">VIGENCIA</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 19.930.627,60</td><td>23</td><td>7</td><td>24</td><td>31</td><td>12</td><td>25</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>5%</td><td>\$ 9.965.313,80</td><td>23</td><td>7</td><td>24</td><td>31</td><td>12</td><td>27</td></tr><tr><td>Calidad de Estudios y Diseños</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>Estabilidad y/o Calidad de Obra</td><td>20%</td><td>\$ 39.861.255,20</td><td>31</td><td>12</td><td>24</td><td>31</td><td>12</td><td>29</td></tr></table>				Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 19.930.627,60	23	7	24	31	12	25	Buen manejo y correcta inversión del anticipo									Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.965.313,80	23	7	24	31	12	27	Calidad de Estudios y Diseños									Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 39.861.255,20	31	12	24	31	12	29
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																															
			Desde			Hasta																																																												
Cumplimiento	10%	\$ 19.930.627,60	23	7	24	31	12	25																																																										
Buen manejo y correcta inversión del anticipo																																																																		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 9.965.313,80	23	7	24	31	12	27																																																										
Calidad de Estudios y Diseños																																																																		
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 39.861.255,20	31	12	24	31	12	29																																																										
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. CV-100043080																																																																		
Certificado de modificación o anexo No.: 0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																																		
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.																																																																		
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:																																																																		

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																							
<table><tr><td>Seguro</td><td>% Asegurado</td><td>Valor Asegurado (\$)</td><td colspan="6">VIGENCIA</td></tr><tr><td></td><td></td><td></td><td colspan="3">Desde</td><td colspan="3">Hasta</td></tr><tr><td>Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)</td><td>10%</td><td>\$ 260.000.000,00</td><td>23</td><td>7</td><td>24</td><td>31</td><td>12</td><td>24</td></tr><tr><td>Otros</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>				Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA									Desde			Hasta			Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 260.000.000,00	23	7	24	31	12	24	Otros								
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																				
			Desde			Hasta																																	
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 260.000.000,00	23	7	24	31	12	24																															
Otros																																							
PÓLIZA DE SEGURO RCE No. CV-100011455																																							
OTRAS PÓLIZAS No.																																							
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																							
Razón Social Compañía Aseguradora: COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.																																							
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:																																							

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		30	11	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.
Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. **OTRAS PÓLIZAS No.**
Certificado de modificación o anexo No.
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)
Razón Social Compañía Aseguradora:
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:
Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 


Nombre: Ing. Alvaro Solano Aguilar
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-66512 ANT

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS					CÓDIGO	
						VERSIÓN	
						PÁGINA	14 de 26
						FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES						DIRECCIÓN TERRITORIAL: META	
PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)							
DATOS GENERALES							
CONVENIO No. 2604-2024 (Indicar número y año)						EJECUTOR: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA BOQUERON	
OBJETO DEL CONVENIO:							
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3565-2024 (Indicar número y año)						INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS	
JUSTIFICACIÓN:							
Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.							
(Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO							
RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA					\$ -	#¡DIV/0!
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)					\$ -	#¡DIV/0!
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$ -	#¡DIV/0!
4							
5							
N							
	TOTAL					\$ -	#¡DIV/0!
NOTAS:							
1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica.							
2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría.							
3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio.							
4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica) . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.							
Firma: N.A		Firma: 					
Nombre: FABIO NELSON DUARTE LÓPEZ		Nombre: LUZ ARGELA XARAMILLO					
Representante Legal o su Apoderado		Representante Legal o su Apoderado					
Ejecutor		Interventor					
		Matrícula Profesional No.: 68202-328617 STD					
Firma: N.A		Firma: N.A					
Nombre:		Nombre:					
Contador de la OAC		Ingeniero Residente del Proyecto					
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica		Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica					
Tarjeta Profesional No.:		Matrícula Profesional No.:					
Contratista							
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.							
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSION Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS					CODIGO				
						VERSION				
						PAGINA				
						FECHA	30/11/2024 (Dia / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES						DIRECCION TERRITORIAL: META				
DATOS GENERALES										
INFORME MENSUAL DE INVERSION DEL DESEMBOLSO No. 1						MES: nov-24				
						INFORME FINAL DE INVERSION DEL DESEMBOLSO ☐				
CONVENIO No. 2604-2024 (Indicar número y año)										
DESEMBOLSO OTORGADO: 0 %										
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ - (MCTE)										
OBJETO DEL CONVENIO:										
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DE LA VEREDA BOQUERON DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL										
ORGANIZACION DE ACCION COMUNAL JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA BOQUERON										
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. 3565-2024 0 (Indicar número y año)										
INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS										
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSION DEL DESEMBOLSO										
DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCION EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCION ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCION DEL RUBRO
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).										
** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.										
NOTA: El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.										
SEGUIMIENTO INVERSION DEL CONVENIO POR RUBRO										
RUBRO No.	DESCRIPCION DEL RUBRO			VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)		SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA				\$ -	\$ -			\$ -	
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL				\$ -	\$ -			\$ -	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
TOTALES				\$ -						
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME										
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)										
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:										
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)										
RESUMEN RELACION DE CONSIGNACIONES										
COMPROBANTE DE CONSIGNACION DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACION			VALOR RECURSOS PROPIOS		PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO		
OBSERVACIONES:										
Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto, por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.										
NOTA:										
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCION DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros <u>indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)</u>										
Firma: N/A Nombre: FABIO NELSON DUARTE LÓPEZ Representante Legal OAC Ejecutor					Firma: Nombre: LUZ ANGELY JARAMILLO Representante Legal o Delegado Interventor Matrícula Profesional No.: 68202-328617 STD					
Firma: N/A Nombre: Contador de la OAC Tarjeta Profesional No.:					Firma: N/A Nombre: Ingeniero Residente del Proyecto Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica Matrícula Profesional No.:					
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.										

[illegible]

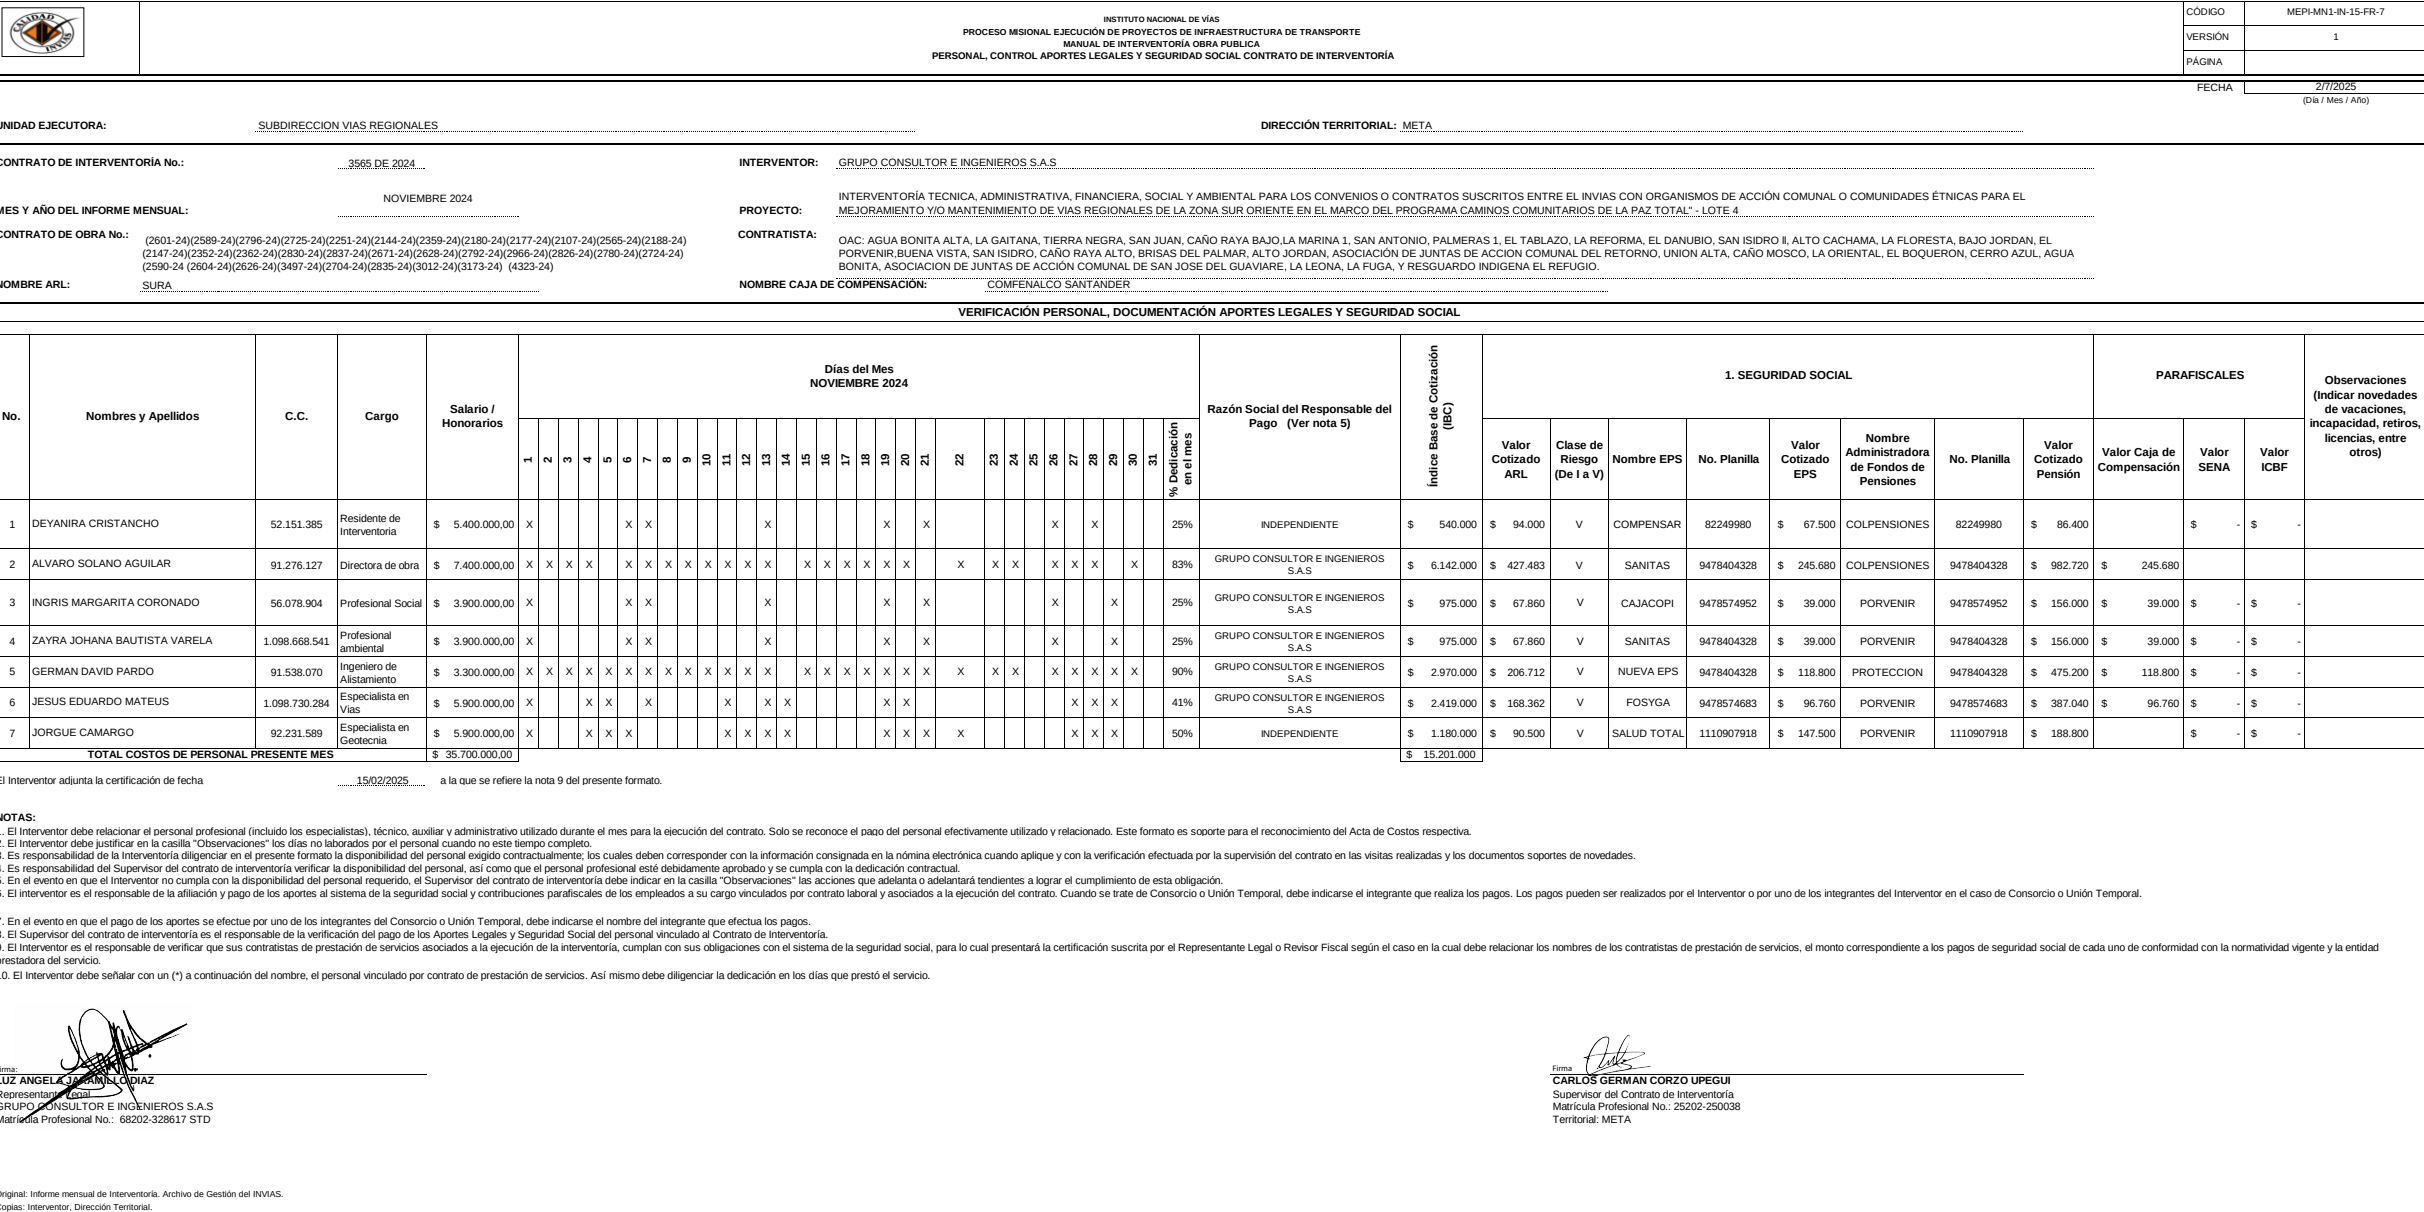

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA										CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9
											VERSIÓN	1
											PÁGINA	

FECHA

2/7/2025
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	META
-------------------	---------------------------------	------------------------	------

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	3565 DE 2024	INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S
--------------------------------	--------------	--------------	------------------------------------

MES INFORME MENSUAL:
CONTRATO DE OBRA No:

NOVIEMBRE 2024
(2601-24)(2589-24)(2796-24)(2725-24)(2251-24)(2144-24)(2359-24)
(2180-24)(2177-24)(2107-24)(2565-24)(2188-24)(2147-24)(2352-24)
(2362-24)(2830-24)(2837-24)(2671-24)(2628-24)(2792-24)(2966-24)
(2826-24)(2780-24)(2724-24)(2590-24 (2604-24)(2626-24)(3497-24)
(2704-24)(2835-24)(3012-24)(3173-24) (4323-24)

PROYECTO: CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL
CONTRATISTA: OAC: AGUA BONITA ALTA, LA GAITANA, TIERRA NEGRA, SAN JUAN, CAÑO RAYA BAJO,LA MARINA 1, SAN ANTONIO, PALMERAS 1, EL TABLAZO, LA REFORMA, EL DANUBIO, SAN ISIDRO II, ALTO CACHAMA, LA FLORESTA, BAJO JORDAN, EL PORVENIR,BUENA VISTA, SAN ISIDRO, CAÑO RAYA ALTO, BRISAS DEL PALMAR, ALTO JORDAN, ASOCIACIÓN DE JUNTAS DE ACCION COMUNAL DEL RETORNO, UNION ALTA, CAÑO MOSCO, LA ORIENTAL, EL BOQUERON, CERRO AZUL, AGUA BONITA, ASOCIACION DE JUNTAS DE ACCIÓN COMUNAL DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, LA LEONA, LA FUGA, Y RESGUARDO INDIGENA EL REFUGIO.

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA							
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	966524	C-2402-0600-14-51102A-2402041-02	10	Nación	Principal	\$ 2.014.395.039,00	\$ 2.014.395.039,00
TOTAL						\$ 2.014.395.039,00	\$ 2.014.395.039,00

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 2.014.395.039,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
ACTA No. 1	NOVIEMBRE/2024	\$ 63.070.357,00	\$ 11.983.368,00	75.053.725,00			-	966524 Septiembre- 26-2024	\$ 1.939.341.314,00	\$ 1.939.341.314,00		ACTA 01
TOTALES		63.070.357,00	11.983.368,00	75.053.725,00		-	-		\$ 1.939.341.314,00	\$ 1.939.341.314,00		

Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO			
	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL	\$ 41.963.160,00	\$ 7.973.000,00	\$ 49.936.160,00
OTROS COSTOS DIRECTOS (Viaticos,Alquiler equipos, Oficina)	\$ 21.107.197,00	\$ 4.010.367,00	\$ 25.117.564,00
VALOR TOTAL	\$ 63.070.357,00	\$ 11.983.367,00	\$ 75.053.724,00

*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

NOTAS:

1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.
2. Este formato se diligencia por año.

Firma:

LUZ ANGELA DIAZ
Representante Legal
GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS S.A.S
Matrícula Profesional No.: 68202-328617 STD

Firma

CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038
Territorial: META

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																					
		VERSIÓN	1																																																					
		PÁGINA																																																						
		FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)																																																					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3565-2024		INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:																																																								
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.																																																								
FECHA DE INICIO: 17/10/2024																																																								
PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/24																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31/12/24 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																								
VALOR INICIAL: \$ 2.014.395.039,00																																																								
VALOR ACUMULADO: \$ 2.014.395.039,00 (Incluye adiciones)																																																								
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																								
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 201.439.503,90</td><td>17</td><td>10</td><td>24</td><td>5</td><td>6</td><td>25</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>20%</td><td>\$ 402.879.007,80</td><td>17</td><td>10</td><td>24</td><td>5</td><td>6</td><td>25</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 402.879.007,80</td><td>17</td><td>10</td><td>24</td><td>5</td><td>2</td><td>28</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 604.318.511,70</td><td>5</td><td>2</td><td>25</td><td>5</td><td>2</td><td>30</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 201.439.503,90	17	10	24	5	6	25	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	\$ 402.879.007,80	17	10	24	5	6	25	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 402.879.007,80	17	10	24	5	2	28	Calidad del servicio	30%	\$ 604.318.511,70	5	2	25	5	2	30
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																					
			Desde			Hasta																																																		
Cumplimiento	10%	\$ 201.439.503,90	17	10	24	5	6	25																																																
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	\$ 402.879.007,80	17	10	24	5	6	25																																																
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 402.879.007,80	17	10	24	5	2	28																																																
Calidad del servicio	30%	\$ 604.318.511,70	5	2	25	5	2	30																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101191894																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:																																																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		30/11/2024		
		(Día / Mes / Año)		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES						
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.						
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA			
			Desde			Hasta
Cumplimiento			Día	Mes	Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día Mes Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma	Firma
Nombre: Ing. Alvaro Solano Aguilar	Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Director de Interventoría	Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-66512 ANT	Matrícula Profesional No.: 25202-250038

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

3565-2024
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4

INTERVENTOR:

GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS

FECHA DE INICIO:

17/10/2024
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL:

HASTA 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO:

HASTA 31/12/24
(Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No:

2604-2024
(Indicar número y año)

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL- VEREDA BOQUERON

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI NO .X.... APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTE DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma

Nombre: Ing. Alvaro Solano Aguilar
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-66512 ANT

Firma

N.A

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma

Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA	24 de 26				
		FECHA	(Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META					
DATOS GENERALES							
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____ (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3565-2024 (Indicar número y año)		INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS					
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4							
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:		ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI					
JUSTIFICACIÓN: Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio. (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
							%
	TOTAL						
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos. 3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico. 4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.							
Firma:		Firma:					
Nombre: LUZ ANGELA JARAMILLO Representante Legal o su Apoderado Interventor Matrícula Profesional No.: 68202-328617 STD		Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Supervisor del contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-250038					
Original: Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	25 de 26

FECHA		30/11/2024 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	META
-------------------	------------------------------	------------------------	------

DATOS GENERALES			
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐	INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐		
(Indique si corresponde) (Indique si corresponde)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:	3565-2024 (Indicar número y año)		
CUENTA BANCARIA No.:	BANCO	SUCURSAL:	
ANTICIPO OTORGADO:	%		
VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO:	\$	-	(M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO						
*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:

El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM						
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (____): \$ _____
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ _____
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES					
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO


(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:

Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.

Firma: 	Firma: 
Nombre: LUZ ANGEL JARAMILLO Representante Legal o Delegado Interventor Matrícula Profesional No.: 68202-328617 STD	Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Supervisor del contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-250038

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

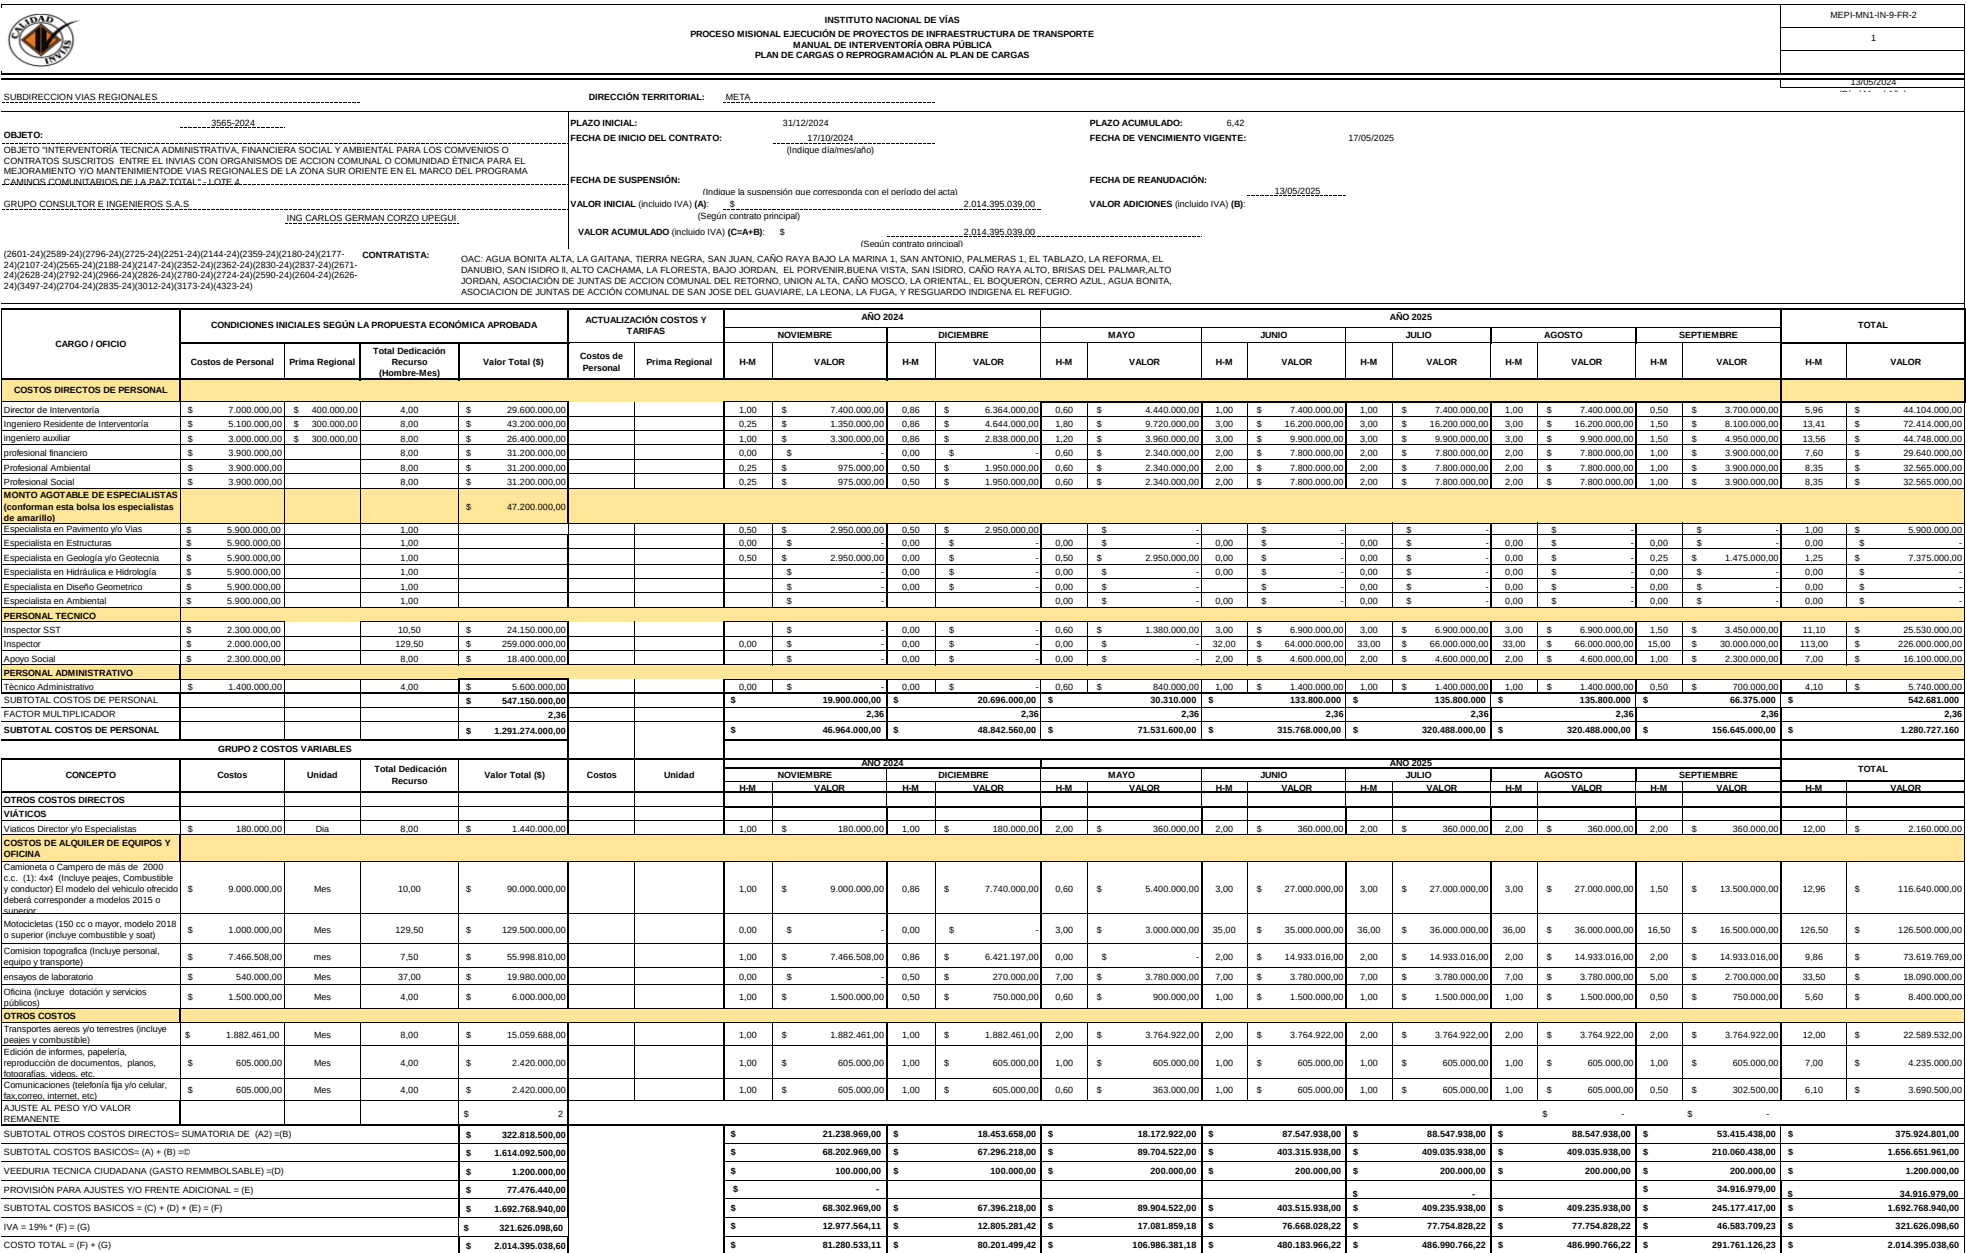

1. Para elaborar el Plan de Cargas inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversión con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de intervención.

4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Firma 

ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 250038 CDN
Territorial: META
