

	<p align="center">INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS</p> <p align="center">PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE</p> <p align="center">MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA</p> <p align="center">LISTA DE CHEQUEO INFORME MENSUAL</p>	CÓDIGO	
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

Convenio Solidario No. 2626-2024	OAC JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CERRO AZUL
Contrato de Interventoría No. 3565-2024	Interventoría: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS

Objeto Convenio Solidario:

AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

INFORME MENSUAL No. 1	MES O PERIODO: nov-24
----------------------------------	----------------------------------

No.	CONTENIDO	FORMATO	PÁGINA
	Lista de Chequeo Informe Mensual de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-1	1
	Resumen Mensual Estado General del Proyecto	MEPI-MN1-IN-15-FR-2	2
1	INTRODUCCIÓN		3
2	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO		3
2.1	Localización		3
2.2	Municipios en la zona de influencia y beneficios de la ejecución del proyecto		3
2.3	Inventario y estado inicial de la vía		3
2.4	Características técnicas del proyecto		3
3	INFORMACION CONTRATO DE OBRA		4
3.1	Información general del contrato		4
3.2	Descripción de las actividades ejecutadas en el mes		4
3.3	Seguimiento Items no previstos		4
3.4	Estado de avance y acciones a seguir por parte de la Interventoría		4
4	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA		
4.1	Informe Semanal	MEPI-MN1-IN-15-FR-3	
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4	
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6	
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8	
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10	
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12	
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN-1IN-15-FR-14	
4.9	Otros documentos seguimiento mensual		
	Plan de Inversión de Desembolso Convenios		
	Informe de Inversión y Buen Manejo del Desembolso convenio		
	Auxiliar Detallado Movimientos Buen Manejo del Desembolso		
	Certificado contrapartida Convenios OAC-INVÍAS		
	Actas de Comité Operativo		
5	INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA		5
5.1	Información general del contrato		5
5.2	Descripción de las actividades realizadas por el Interventor		5
5.3	Informes especialistas y profesionales		5
5.4	Informe del Programa Anual de Caja - PAC		5
5.5	Informe matriz de riesgos.		5
5.6	Información otros programas y aplicativos según pliegos de condiciones Contratos de Obra e Interventoría	N/A	
	• Seguimiento estado del trámite Certificación de compatibilidad de los planos con el sistema de información geográfico (SIG) de la Entidad.	N/A	
6	REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE INTERVENTORIA		
6.1	Equipo y vehículos Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-5	
6.2	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-7	
6.3	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-9	
6.4	Seguimiento Garantías Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-13	
6.5	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoría	MEPI-MN1-IN-15-FR-15	
6.6	Otros documentos seguimiento mensual		
	• Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-1	
		MEPI-MN-IN-3-FR-2	
	• Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	
	• Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	
7	Conclusiones y recomendaciones		6
8	Anexos		6
8.1	Relación de la correspondencia generada entre contratista e interventor incluyendo asunto, referencia, fecha de recibo		6
8.2	Registro fotográfico y video del avance de las obras		7
8.3	Registro fotográfico y video de las actividades ambientales, sociales, prediales y de sostenibilidad adelantadas		5 Y 6
8.4	Copia de la Bitácora del mes correspondiente		

Nota: El Interventor debe diligenciar los folios, conforme al contenido del informe mensual.

Firma: _____

Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Resolución de designación No. 4674 de fecha 4/10/2024

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVÍAS.

Copias: Interventor, Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
RESUMEN MENSUAL ESTADO GENERAL DEL PROYECTO

CÓDIGO	MEP1-MN-IN-15-FR-2
VERSION	1
PÁGINA	

FECHA: 30/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VÍAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

PERIODO MES: 09-24

CONTRATO DE OBRA No.: 2626-2024

PLAZO INICIAL: HASTA 31-DIC-2024

VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 200.692.620,00

OBJETO: ALIAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL

FECHA DE INICIO: 30/09/2024

VALOR ADICIONALES (incluido IVA): \$

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): \$ 200.692.620,00

FECHA DE REANUDACIÓN: N/A

ANTICIPO CONCEDIDO: \$

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/12/2024

ANTICIPO AMORTIZADO: \$

PLAZO ACUMULADO: 3 MESES+ 1 DIA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA: 3566-2024

INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUPOING SAS

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

ALCANCE FÍSICO CONTRATADO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD
Pavimentación		
Construcción	ML	83
Mejoramiento		
Rehabilitación		
Estructuras		
Túneles		
Puentes		
Pontones		
Mantenimiento		
Otros (Especificar cuales)		

AVANCE FÍSICO EJECUTADO DEL CONTRATO

ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD MES	CANTIDAD ACUMULADA
Pavimentación			
Construcción	ML	0	0
Mejoramiento			
Rehabilitación			
Estructuras			
Túneles			
Puentes			
Pontones			
Mantenimiento			
Otros (Especificar cuales)			

AVANCE FINANCIERO

VALOR TOTAL CONTRATADO INCLUIDOS LOS ADICIONALES

	BÁSICO	IVA	TOTAL
OBRAS	\$ 151.070.580,00		\$ 151.070.580,00
CONTRAPARTIDA JAC	\$ 1.000.000,00		\$ 1.000.000,00
ADMINISTRACION	\$ 44.089.922,00		\$ 44.089.922,00
PAGA	\$ 4.532.118,00		\$ 4.532.118,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$ 200.692.620,00		\$ 200.692.620,00

Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

VALOR TOTAL EJECUTADO EN EL MES

	BÁSICO	IVA	TOTAL	ACUMULADO
OBRAS	0,00		0,00	0,00
CONTRAPARTIDA JAC	0,00		0,00	0,00
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
GESTIÓN DE SOSTENIBILIDAD (PREACTA)	0,00		0,00	0,00
VALOR EJECUTADO	0,00		0,00	0,00

INVERSIÓN EN OBRA

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA (A): \$ 50.356.860,00

INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA (B): \$ 0,00%

AVANCE DE OBRA EN % (B/A): 0,00%

EMPLEOS GENERADOS EN EL MES

MANO DE OBRA CALIFICADA: 0

MANO DE OBRA NO CALIFICADA: 0

EMPLEOS INDIRECTOS GENERADOS: 0

TOTAL EMPLEOS GENERADOS: 0

REGISTRO FOTOGRÁFICO






Socialización de actividades del proyecto- San José del Guaviare





Socialización de actividades del proyecto- San José del Guaviare

PROCEDIMIENTOS DE MULTA O SANCIÓN (Indicar el estado en que se encuentre el proceso administrativo de multa o sanción si aplica)

Firma:
Nombre: Alexander Aguilar
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No. 05202-66512 ANT
Registral Interventoría Municipal de Huancabamba, Archivo de Gestión del PM145.
Código: Interventoría, Operación Terrestre

		INFORME MENSUAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL					
						FECHA:	30/11/2024 <small>(Día / Mes / Año)</small>
1. INTRODUCCION							
PROYECTO:	DIRECCION TERRITORIAL:		UNIDAD EJECUTORA:	INFORME No.:	PERIODO DEL INFORME:	ULTIMO INFORME MENSUAL:	
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL		META		SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES		1	
CONTRATO DE INTERVENTORA No.:	NUMERO DEL PROCESO:		ID DEL SECCP:	INTERVENTOR:	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORA:		
3556-2024	CMA-DEO-SVR-CIPT-047-2024		COL-SE-CTR-13488802	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUPO CIVIC VIAS	ING CARLOS GERMAN CORTO URSQUI		
CONVENIO No.:	ID DEL SECCP:	OBJETO CONVENIO			ORGANIZACION DE ACCION COMUNAL / ORGANIZACION INDIGENA		
2626-2024	SPSC-CD-CS-441-2024	ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CERRO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSE DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA CERRO AZUL		
2. DESCRIPCION DEL PROYECTO							
2.1 LOCALIZACION:							
DEPARTAMENTO:	MUNICIPIO:	VEREDA / COMUNIDAD O RESGUARDO INDIGENA:		TRAMO DE LA VIA A INTERVENIR:	LONGITUD DEL TRAMO:	ACTIVIDAD ECONOMICA:	
GUAVIARE	SAN JOSE DEL GUAVIARE	CERRO AZUL		Corredor vial que comunica "la vereda Cerro Azul -Alpes" en el tramo de la Vereda Cerro Azul que tiene una longitud de atencion de 3.10 km, tomando como punto de inicio de referencia el PR00+000 "Yo de Cerro Azul" y el punto final de referencia es PR03+100 "Puente Quemado"	83 ML	Agrícola	
IMAGENES DE LA LOCALIZACION DEL PROYECTO							
							
DESCRIPCION DE LA IMAGEN: LOCALIZACIÓN CERRO AZUL - SAN JOSE DEL GUAVIARE				DESCRIPCION DE LA IMAGEN: LOCALIZACIÓN VIA EXISTENTE			
2.2 MUNICIPIOS DE LA ZONA DE INFLUENCIA							
MUNICIPIOS DE INFLUENCIA		BENEFICIOS DE LA EJECUCION DEL PROYECTO:					
SAN JOSE DEL GUAVIARE		La ejecución de placa huella en vías terciarias mejoran las vías de acceso a las veredas, beneficiando a las comunidades rurales al facilitar el acceso a servicios básicos y el transporte de productos agrícolas. Este tipo de obras también disminuye los costos de mantenimiento y promueve el desarrollo económico en las regiones apartadas.					
2.3 INVENTARIO Y ESTADO INICIAL DE LA VIA							
							
FOTO INICIAL				FOTO AVANCE			
LOCALIZACION:	Municipio de San José del Guaviare			LOCALIZACION:			
DESCRIPCION:	VÍA DESTAPADA, MATERIAL TIPO ARCILLA, SIN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA VIAL			DESCRIPCION:			
2.3 CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO (parámetros de diseño, parámetros geométricos, sección típica de la vía, estructura del pavimento a construir y tipificación de los diferentes sectores)							
TIPO DE OBRA:	PLACA HUELLA	DESCRIPCION TECNICA:		TIPO DE OBRA:	PLACA HUELLA	DESCRIPCION TECNICA:	
UBICACION:	PR01+256 PR01+209	MEJORAMIENTO DE VIA MEDIANTE PLACA HUELLA EN CONCRETO L=43 ML		UBICACION:	PR01+300 PR01+340	MEJORAMIENTO DE VIA MEDIANTE PLACA HUELLA EN CONCRETO L=40 ML	
							

	INFORME MENSUAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL												
FECHA: 30/11/2024													
3. DESCRIPCION DEL PROYECTO													
3.1 INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO													
ID DEL SECTOR:	SPSC-CD-C-441-2024		CONVENIO No:	2626-2024		FECHA SUSCRIPCIÓN:	24 JUL 24		ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMunal / ORGANIZACIÓN INDIGENA:	JUNTA DE ACCIÓN COMunal VEREDA CERRO AZUL			
ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMunal VEREDA CERRO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL													
SUJETO CONVENIO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL													
REPRESENTANTE LEGAL: ANDRES BERTULFO PINTO BELTRAN													
NUMERO DE CONTACTO: 3103168399													
VALOR INICIAL: \$ 200.892.620,00													
ADICIÓN: \$ 200.892.620,00													
VALOR ACTUALIZADO: \$ 200.892.620,00													
ORDEN DE INICIO: 30/09/2024													
FECHA ORDEN DE INICIO: 30/09/2024													
PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/2024													
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: 31/12/2024													
FECHA DE TERMINACIÓN ACTUALIZADA: 31/12/2024													
ESTADO DEL CONVENIO: EJECUCION													
PRORROGAS													
PLAZO	PLAZO	FECHA TERMINACIÓN											
N/A	N/A	N/A											
SUSPENSIONES													
IN	AMPLIACION DE SUSPENSIÓN	PLAZO	FECHA REANIMACIÓN	FECHA TERMINACIÓN									
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A									
3.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL MES													
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	EJECUCION DEL MES ANTERIOR		EJECUCION PRESENTE MES		EJECUCION ACUMULADA		PORCENTAJE DE EJECUCION	
						CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL		
CONSTRUCCIÓN DE PLACA HUELLA EN CONCRETO L=83 M													
1	Conformación De La Calzada Existente	M2	415	\$ 1.731,00	\$ 718.365,00		\$ -		\$ -		\$ -		
2	Subbase Granular Clase C Sbg-50	M3	69,9	\$ 833.563,00	\$ 58.266.054,00		\$ -		\$ -		\$ -		
3	Concreto Reforzado Resistencia 21Mpa (D) - Mezcla In Situ	M3	48,9	\$ 1.023.540,00	\$ 50.051.106,00		\$ -		\$ -		\$ -		
4	Concreto Cidlopeo Resistencia 14Mpa (G)	M3	21,5	\$ 552.241,00	\$ 11.873.182,00		\$ -		\$ -		\$ -		
5	Acero De Refuerzo Fy 4200 Mpa	KG	2265,8	\$ 5.119,00	\$ 11.598.630,00		\$ -		\$ -		\$ -		
6	Excavaciones Varias Sin Clasificar	M3	2,8	\$ 48.131,00	\$ 134.767,00		\$ -		\$ -		\$ -		
7	Relleno Para Estructura Con Material Granular Tipo Sbg-50 (Analizado Sin Preparación De La Superficie Base Del Relleno)	M3	22	\$ 837.658,00	\$ 18.428.476,00		\$ -		\$ -		\$ -		
SUBTOTAL				\$ -									
TOTALES				\$ 151.070.580,00			\$ -		\$ -		\$ -		
DESCRIPCION DE ACTIVIDADES, ESTADO Y ACCIONES DE LA INTERVENTORIA FRENTE AL AVANCE DEL MES													
DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS													
DIAGRAMA DE EJECUCION VS PROGRAMACION													
Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto. Sin embargo, la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio. Entre estas actividades se destacan la revisión detallada de la documentación contractual, la validación de los hojas de vida del personal propuesto para el proyecto y la socialización de las actividades planificadas con las partes interesadas. Estas acciones buscan garantizar que, una vez se dispongan los recursos, los trabajos puedan ejecutarse de manera inmediata y eficiente, cumpliendo con los lineamientos técnicos y contractuales establecidos.													
N/A													
4. REPORTES EJECUCION MENSUAL CONTRATO DE OBRA													
DESCRIPCION	FORMATO					OBSERVACIONES							
4.1	Informes Semanales	ANEXO ... SI ...											
4.2	Maquinaria y Equipo Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-4					ANEXO ... N/A ...						
4.3	Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-6					ANEXO ... N/A ...						
4.4	Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-8					ANEXO ... N/A ...						
4.5	Estado General del Tiempo	MEPI-MN1-IN-15-FR-10					ANEXO ... N/A ...						
4.6	Resumen Ensayos de Laboratorio	MEPI-MN1-IN-15-FR-11					ANEXO ... N/A ...						
4.7	Seguimiento Garantías y Seguros Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-12					ANEXO ... SI ...						
4.8	Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Obra	MEPI-MN1-IN-15-FR-14					ANEXO ... N/A ...						
4.9	Otros documentos seguimiento mensual												
	Plan de Inversión de Desembolso Convenios	ANEXO ... N/A ...											
	Informe de Inversión y Buen Manejo del Desembolso convenio	ANEXO ... N/A ...											
	Auxiliar Detallado Movimientos Buen Manejo del Desembolso	ANEXO ... N/A ...											
	Certificado contrapartida Convenios OAC-INVIAS	ANEXO ... N/A ...											
	Actas de Comité Operativo	ANEXO ... N/A ...											
	Certificacion/oficio/Resolucion del municipio respecto al RETEICA	ANEXO ... N/A ...											

		INFORME MENSUAL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL					
						FECHA	30/11/2024
5. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA							
5.1 INFORMACION GENERAL DEL CONVENIO							
NUMERO DEL PROCESO		CO1.SLCNTR.1345		CONTRATO NO.		GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS	
CMA-DEO-SVB-C-CPPT-017-2024		ID DEL SECOF		3965-2024		SAS - GRUCCING SAS	
		9802		11-09-24		SAS - GRUCCING SAS	
INTERVENCIÓN TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMunal O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VÍAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE		INTEGRANTES		% PARTICIPACIÓN		INTEGRANTES	
OBJETO CONTRATO: EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA ZONA SUR ORIENTE		NT		330.509.472.9		N/A	
REPRESENTANTE LEGAL		LUZ ANGELA JARAMILLO DIAZ		NUMERO DE CONTACTO		3176446297	
				VALOR INICIAL		\$ 2.014.395.039.00	
				ADICION		\$	
				VALOR ACTUALIZADO		\$ 2.014.395.039.00	
ORDEN DE INICIO		17-09-24		FECHA ORDEN DE INICIO		17/10/2024	
				PLAZO INICIAL		HASTA 31/12/2024	
				FECHA DE TERMINACION INICIAL		31/12/2024	
				FECHA DE TERMINACION ACTUALIZADA		31/12/2024	
BORROROS		SUSPENSIONES		ESTADO DEL CONVENIO		EJECUCION	
No		PLAZO		FECHA TERMINACIÓN			
N/A		N/A		N/A			
5.2 DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR EL INTERVENTOR							
DESCRIPCION				REGISTRO FOTOGRAFICO			
1. REVISIÓN DOCUMENTACIÓN DEL PROYECTO SUMINISTRADA POR INVIAS 2. VISITA DE INSPECCIÓN Y RECONOCIMIENTO A LA ZONA DEL PROYECTO 3. REVISIÓN Y APROBACIÓN DE HOJAS DE VIDA DE PROFESIONALES A VINCULAR AL PROYECTO 4. ELABORACIÓN DE INFORMES SEMANALES Y MENSUAL N.º 1 5. ASISTENCIA A REUNIONES Y CAPACITACIONES CITADAS POR LA REGIONAL META 6. RADICACIÓN HOJAS DE VIDA PERSONAL, CLAVE EQUIPO DE INTERVENTORIA PARA APROBACIÓN DE INVIAS 7. RADICACIÓN SOLICITUD CAMBIO DE FIRMA, CUENTA BANCARIA CONSULTA DEL COMEND							
5.3 INFORME DE ESPECIALISTAS Y PROFESIONALES							
DESCRIPCION ACTIVIDADES GESTION SOCIAL				REGISTRO FOTOGRAFICO			
1. REUNIÓN DE SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO CON LA COMUNIDAD 2. REUNIÓN DE ACUJACIÓN DE INQUIETUDES A LA COMUNIDAD SOBRE INICIO DEL PROYECTO							
DESCRIPCION ACTIVIDADES GESTION AMBIENTAL				REGISTRO FOTOGRAFICO			
1. RECOLECCIÓN DE MATERIAL RETIRO PARA ELABORACIÓN DE ENSAYOS 2. VISITA PLANTA DE AGREGADOS DE LA ZONA							
RESPONSABLE		ING. ZAYRA ACHANA BAUTISTA VARELA TP48238-249691 STD		FIRMA		REGISTRO FOTOGRAFICO	
							
DESCRIPCION SEGUIMIENTO SST				REGISTRO FOTOGRAFICO			
1. REVISIÓN ESTUDIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD (GEOTECNA Y TOPOGRAFIA)							
RESPONSABLE		ING. JESUS EDUARDO MATEUS M.P. 68202-333954 STD		FIRMA		REGISTRO FOTOGRAFICO	
							
DESCRIPCION SEGUIMIENTO SST				REGISTRO FOTOGRAFICO			
1. REVISIÓN ESTUDIOS ENTREGADOS POR LA ENTIDAD (GEOTECNA Y TOPOGRAFIA)							
RESPONSABLE		ING. JORGE ALFREDO CAMARGO M.P. 1522346981 BYD		FIRMA		REGISTRO FOTOGRAFICO	
							

6. INFORMACION CONTRATO DE INTERVENTORIA

DESCRIPCION	FORMATO		OBSERVACIONES
6.1 Equipo y vehiculos Contrato de Interventoria	MEPI-MNI-IN-15-FR-5	ANEXO SI	-----
6.2 Personal, Control Aportes Legales y Seguridad Social Contrato de Interventoria	MEPI-MNI-IN-15-FR-7	ANEXO SI	-----
6.3 Informe Financiero y Presupuestal Contrato de Interventoria	MEPI-MNI-IN-15-FR-9	ANEXO SI	-----
6.4 Seguimiento Garantías Contrato de Interventoria	MEPI-MNI-IN-15-FR-13	ANEXO SI	-----
6.5 Seguimiento al Plan de Calidad Contrato de Interventoria	MEPI-MNI-IN-15-FR-15	ANEXO N/A	Debido a las características de la obra, no implementa plan de calidad pero se realizará seguimiento y control a las especificaciones de las actividades ejecutadas
6.6 Otros documentos seguimiento mensual	MEPI-MN-IN-3-FR-1	ANEXO N/A	-----
Seguimiento a la inversión del Anticipo	MEPI-MN-IN-3-FR-2	ANEXO N/A	-----
Plan de Cargas o reprogramación al Plan de Cargas aprobado	MEPI-MN-IN-9-FR-2	SI	-----
Seguimiento al Plan de Cargas	MEPI-MN-IN-9-FR-3	ANEXO N/A	-----
Bitácora		ANEXO N/A	-----

7. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	RELACION DE LA CORRESPONDENCIA			
	No.	FECHA	ACORDADO	INTERVENCION
Durante el periodo del presente informe se realizaron actividades administrativas correspondientes a la etapa previa de alistamiento, como revisión de la documentación e información inicial del proyecto, reuniones y capacitaciones convocadas por la entidad contratante: INVIAS.	OF-INTER_L0TE4-001	18-sep-24	INDICACION DE PUNTO DE INTERVENTORIA	INVIAS- Ing. Juan Pablo Toro Carvajal
	OF-INTER_L0TE4-002	1-nov-24	SOLICITUD DE ANTICIPA Y DOCUMENTACION PARA APTITUDE DE CONTRA CARGAS	INVIAS- Ing. Juan Pablo Toro Carvajal
	OF-INTER_L0TE4-003	12-nov-24	SOLICITUD DE REVISION Y AVAL DE HORAS DE VIDA PARA INICIO DE ETAPA DE ALISTAMIENTO	INVIAS- Ing. Carlos Corzo
	OF-INTER_L0TE4-004	18-nov-24	SOLICITUD DE AUTORIZACION PARA EL INICIO DE ACTIVIDADES EN CAMPO EN LOS SE CONVENIOS CON ORDEN DE INICIO	INVIAS- Ing. Carlos Corzo
	Cambio electrónico	19-oct-24	6. Informacion General y Formatos Convenios 2024	GRUPOING S.A.S
	Cambio electrónico	19-oct-24	6. Informacion General y Formatos Convenios 2024	GRUPOING S.A.S

ELABORO

CARGO

DIRECTOR DE INTERVENTORIA


PROFESIONAL

Ing. Alvaro Solano Aguilar

MATRICULA PROFESIONAL

06202-66512 ANT

FIRMA



APROBO

CARGO

SUPERVISOR

PROFESIONAL

Ing. Carlos Germain Corzo Utrera

MATRICULA PROFESIONAL


25202-250038

FIRMA



REGISTRO FOTOGRAFICO					
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL					
FECHA: 30/11/2024 (DIA / MES / AÑO)					
PROYECTO:	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	UNIDAD EJECUTORA:	INFORME No.:	PERIODO DEL INFORME:	ULTIMO INFORME MENSUAL:
PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS PARA LA PAZ TOTAL	META	SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES	1	15-30 NOV. 2024	NO
CONTRATO DE INTERVENTORIA No.:	NUMERO DEL PROCESO:	ID DEL SECOP:	INTERVENTOR:	SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORIA:	
3565-2024	CMA-DEQ-SVR-CCPT-047-2024	CO1 SLCNTR 13459802	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS	ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI	
CONVENIO No.:	ID DEL SECOP:	OBJETO CONVENIO	ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL / ORGANIZACIÓN INDIGENA:		
2626-2024	SPSC-CD-CS-441-2024	AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL.	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CERRO AZUL		

REGISTRO FOTOGRAFICO	
	
DESCRIPCION DE LA IMAGEN: Socialización de actividades del proyecto- San Jose del Guaviare FUENTE: Propia	DESCRIPCION DE LA IMAGEN: LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO
	
DESCRIPCION DE LA IMAGEN: Visita a planta de agregados de la zona FUENTE: Propia	DESCRIPCION DE LA IMAGEN: FUENTE: Propia



	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA ESTADO GENERAL DEL TIEMPO		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-10																													
			VERSIÓN	1																													
			PÁGINA																														
			FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)																													
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES			DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																														
CONTRATO DE OBRA No: 2626-2024			CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL																														
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24			PROYECTO: MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL																														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No: 3565-2024			INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS																														
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO																																	
Clase de tiempo	DÍAS DEL MES																															Total	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31		
Seco															8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8		128	
Lluvias moderadas																																	
Lluvias intensas																																	
Total horas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8			
EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.																																	
NOTA: Anexar Registro pluviométrico del IDEAM correspondiente a la Estación más cercana al Proyecto.																																	
OBSERVACIONES: Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.																																	
<div><div>Firma N.A</div><div>Nombre:</div><div>Residente de Obra</div><div>Matrícula Profesional No.:</div></div> <div><div></div><div>Firma</div><div>Nombre: Deyanira Cristancho</div><div>Residente de Interventoría</div><div>Matrícula Profesional No.: 25202-82693 CND</div></div>																																	
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor, Dirección Territorial.																																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA DE OBRA PÚBLICA RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-11	
							VERSIÓN	1	
							PAGINA		
							FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)	
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES							DIRECCIÓN TERRITORIAL: META		
CONTRATO DE OBRA No.: 2626-2024							CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL		
MES Y AÑO DEL INFORME MENSUAL: nov-24							PROYECTO: MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3565-2024							INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS		
RESUMEN ENSAYOS DE LABORATORIO EJECUTADOS EN EL PRESENTE MES									
No. Consecutivo del Ensayo	Fecha del Ensayo (Día/Mes/Año)	Descripción/Ensayo	Norma	Procedencia (Sitio donde se tomo la muestra)	No. De Muestras	Rango Cumplimiento del Ensayo	Resultado del Ensayo	Cumple Si o NO	Observación / Acciones
A. ENSAYOS CONTRATO DE OBRA									
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
B. ENSAYOS CONTRATO DE INTERVENTORÍA									
N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A
OBSERVACIONES:									
Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.									
NOTAS:									
1. La columna "No. Consecutivo del Ensayo" corresponde a un número consecutivo único que identifica cada resultado obtenido de laboratorio o prueba de campo.									
2. Es responsabilidad del Interventor verificar el cumplimiento en la realización del número de ensayos requeridos en el periodo y el cumplimiento de las especificaciones generales y particulares de contrucción y normas de ensayo.									
3. Cuando el resultado del ensayo de laboratorio no cumple, el Interventor debe diligenciar en la columna "Observaciones" el procedimiento utilizado para subsanar la no conformidad y generar los reportes con los resultados de laboratorio que evidencien la corrección de la no conformidad.									
4. Ningún reporte de laboratorio se puede presentar con enmendaduras.									
5. Los laboratorios que se usen para los ensayos deben estar certificados según las normas ISO (International Organization for Standardization) vigentes que apliquen y los equipos de laboratorio que se utilicen deben estar debidamente calibrados. Certificaciones y calibraciones que deben adjuntar al informe mensual.									
6. El interventor debe presentar este formato diligenciando los resultados de laboratorio de los ensayos realizados durante el periodo del informe tanto por el contratista como por la interventoría de forma separada, anexando en medio digital los resultados de laboratorio que los soportan.									
Firma N.A					Firma				
Nombre:					Nombre: Ing. Aylaro Solano Aguilar				
Director de Obra					Director de Interventoría				
Matrícula Profesional No.:					Matrícula Profesional No.: 05202-66512 ANT				
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.									
Copias: Interventor, Dirección Territorial.									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA			

FECHA		30	11	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

UNIDAD EJECUTORA:	SUBDIRECCION VIAS REGIONALES	DIRECCIÓN TERRITORIAL:	META
-------------------	------------------------------	------------------------	------

CONTRATO DE OBRA No.	2626-2024	CONTRATISTA:	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL
----------------------	-----------	--------------	---

OBJETO DEL CONTRATO:			
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL			

FECHA DE INICIO:	30/09/2024
PLAZO INICIAL:	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	31/12/2024 (Incluye prórrogas y suspensiones)
VALOR INICIAL:	\$ 200.692.620,00
VALOR ACUMULADO:	\$ 200.692.620,00 (Incluye adiciones)
VALOR INICIAL ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -
VALOR ACUMULADO ÍTEM ESTUDIOS Y DISEÑOS:	\$ -

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.	3565-2024	INTERVENTOR:	GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS
-------------------------------	-----------	--------------	---

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL									
			VIGENCIA						
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	Desde			Hasta			
Cumplimiento	10%	\$ 20.069.262,00	24	7	24	31	12	25	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo									
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	5%	\$ 10.034.631,00	24	7	24	31	12	27	
Calidad de Estudios y Diseños									
Estabilidad y/o Calidad de Obra	20%	\$ 40.138.524,00	31	12	24	31	12	29	

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.	CV-100043079
Certificado de modificación o anexo No.:	0 (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:	

SEGUROS EXIGIDOS SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL									
			VIGENCIA						
Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)	Desde			Hasta			
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)	10%	\$ 260.000.000,00	24	7	24	31	12	24	
Otros									

PÓLIZA DE SEGURO RCE No.	CV-100011454	OTRAS PÓLIZAS No.	
Certificado de modificación o anexo No.:	(Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)		
Razón Social Compañía Aseguradora:	COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.		
Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:			

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		30	11	2024
		(Día)	(Mes)	(Año)

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)
Cumplimiento		
Buen manejo y correcta inversión del anticipo		
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones		
Calidad de Estudios y Diseños		
Estabilidad y/o Calidad de Obra		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año			
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP:

SEGUROS EXIGIDOS INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES

A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.

ADICIONAL No.: PRÓRROGA No.: MODIFICACIÓN No.: SUSPENSIÓN No.:

Seguro	% Asegurado	Valor Asegurado (\$)
Responsabilidad Civil Extracontractual (RCE)		
Otros		

VIGENCIA					
Desde			Hasta		
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año
Día	Mes	Año	Día	Mes	Año

PÓLIZA DE SEGURO RCE No. OTRAS PÓLIZAS No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación del seguro en la plataforma del SECOP:

OBSERVACIONES:

NOTAS:
1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y seguros aprobados por el Instituto.
2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías y/o seguros aprobados por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma 


Nombre: Ing. Alvaro Solano Aguilar
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-66512 ANT


Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE PLAN DE INVERSIÓN DESEMBOLSO CONVENIOS/CONTRATOS					CÓDIGO	
						VERSIÓN	
						PÁGINA	14 de 26
						FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES						DIRECCIÓN TERRITORIAL: META	
PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1 (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)							
DATOS GENERALES							
CONVENIO No. 2626-2024 (Indicar número y año)						EJECUTOR: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL	
OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3565-2024 (Indicar número y año)						INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS	
JUSTIFICACIÓN: Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio. (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO							
RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA					\$ -	#¡DIV/0!
2	GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL (PAGA)					\$ -	#¡DIV/0!
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS					\$ -	#¡DIV/0!
4							
5							
N							
	TOTAL					\$ -	#¡DIV/0!
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del desembolso se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Organismo de Acción Comunal o comunidad étnica. 2. El desembolso otorgado se debe utilizar exclusivamente para la inversión en elementos e insumos básicos para la ejecución del convenio tales como, materiales, alquiler de maquinaria y equipo, transportes y costos de personal, dándole prioridad a los que se encuentren dentro de la ruta crítica del programa de obra. En todo caso, los conceptos de inversión del desembolso deben estar sustentados por el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica, revisados y aprobados por la Interventoría. 3. El Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica deberá programar mes a mes la inversión del desembolso teniendo en cuenta el plazo de ejecución del convenio. 4. Invertida la totalidad del desembolso o terminado el convenio de manera anticipada, el Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica y el Interventor deben cancelar la cuenta conjunta del manejo de los recursos anulando los cheques sobrantes (en los casos que aplique) y deben realizar el reintegro al Instituto del saldo si lo hay en la cuenta que indique la Subdirección Financiera. Copia de la consignación debe ser remitida mediante oficio radicado a la Unidad ejecutora indicando con precisión los valores correspondientes a rendimientos y a saldo de capital, el número, año del convenio y el nombre del ejecutor (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica) . Es responsabilidad de la Interventoría verificar el cumplimiento de esta obligación.							
Firma: N.A		Firma:					
Nombre: ANDRES BERTULFO PINTO BELTRAN		Nombre: LUZ ÁNGELA JARAMILLO					
Representante Legal o su Apoderado		Representante Legal o su Apoderado					
Ejecutor		Interventor					
		Matrícula Profesional No.: 68202-328617 STD					
Firma: N.A		Firma: N.A					
Nombre:		Nombre:					
Contador de la OAC		Ingeniero Residente del Proyecto					
Apoyo Administrativo - Contable del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica		Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica					
Tarjeta Profesional No.:		Matrícula Profesional No.:					
Contratista							
Original: Archivo de Gestión del INVIAS.							
Copias: Unidad Ejecutora, JAC, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL DESEMBOLSO CONVENIOS					CÓDIGO				
						VERSIÓN				
						PÁGINA				
						FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES						DIRECCIÓN TERRITORIAL: META				
DATOS GENERALES										
INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO No. 1						MES: nov-24	INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO ☐			
CONVENIO No. 2626-2024 (Indicar número y año)										
DESEMBOLSO OTORGADO: 0 %										
VALOR DEL DESEMBOLSO OTORGADO: \$ - (MCTE)										
OBJETO DEL CONVENIO:										
AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL										
ORGANIZACIÓN DE ACCIÓN COMUNAL JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3565-2024 0 (Indicar número y año)										
INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS										
DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL DESEMBOLSO										
DOCUMENTO DE EGRESO No.	FECHA	BENEFICIARIO	CONCEPTO	VALOR FACTURA CON IVA	VALOR ANTICIPO	DESCUENTO RETENCIÓN EN LA FUENTE	DESCUENTO RETENCIÓN ICA	VALOR A PAGAR O VALOR GIRADO	RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO
* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por la Interventoría).										
** Indicar el número del rubro según la numeración establecida en el Plan de Inversión del desembolso Mensualizado del convenio.										
NOTA: El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de desembolso y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del desembolso.										
SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL CONVENIO POR RUBRO										
RUBRO No.	DESCRIPCIÓN DEL RUBRO			VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)		SALDO DESEMBOLSO ACTUAL (A-D)	
1	COSTOS DIRECTOS DE OBRA				\$ -	\$ -			\$ -	
2	GASTOS GESTION SOCIAL Y AMBIENTAL				\$ -	\$ -			\$ -	
3	GASTOS ADMINISTRATIVOS				\$ -	\$ -	\$ -		\$ -	
TOTALES				\$ -						
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES DEL INFORME										
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)										
VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS:										
(Según certificación Entidad Financiera o Bancaria según el caso)										
RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES										
COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN			VALOR RECURSOS PROPIOS		PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO		
OBSERVACIONES:										
Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto, por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.										
NOTA:										
Es responsabilidad de la interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica de remitir mensualmente copia a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIA o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros <u>indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del desembolso otorgado, el número, año del convenio y el nombre del contratista (Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica)</u>										
Firma: N/A Nombre: ANDRES BERTULFO PINTO BELTRAN Representante Legal OAC Ejecutor										
Firma: Nombre: LUZ ARCEZA JARAMILLO Representante Legal o Delegado Interventor Matrícula Profesional No.: 68202-328617 STD										
Firma: N/A Nombre: Contador de la OAC Tarjeta Profesional No.:										
Firma: N/A Nombre: Ingeniero Residente del Proyecto Apoyo Técnico del Organismo de Acción Comunal o Comunidad Étnica Matrícula Profesional No.:										
Original: Informe mensual de Interventoría, Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.										



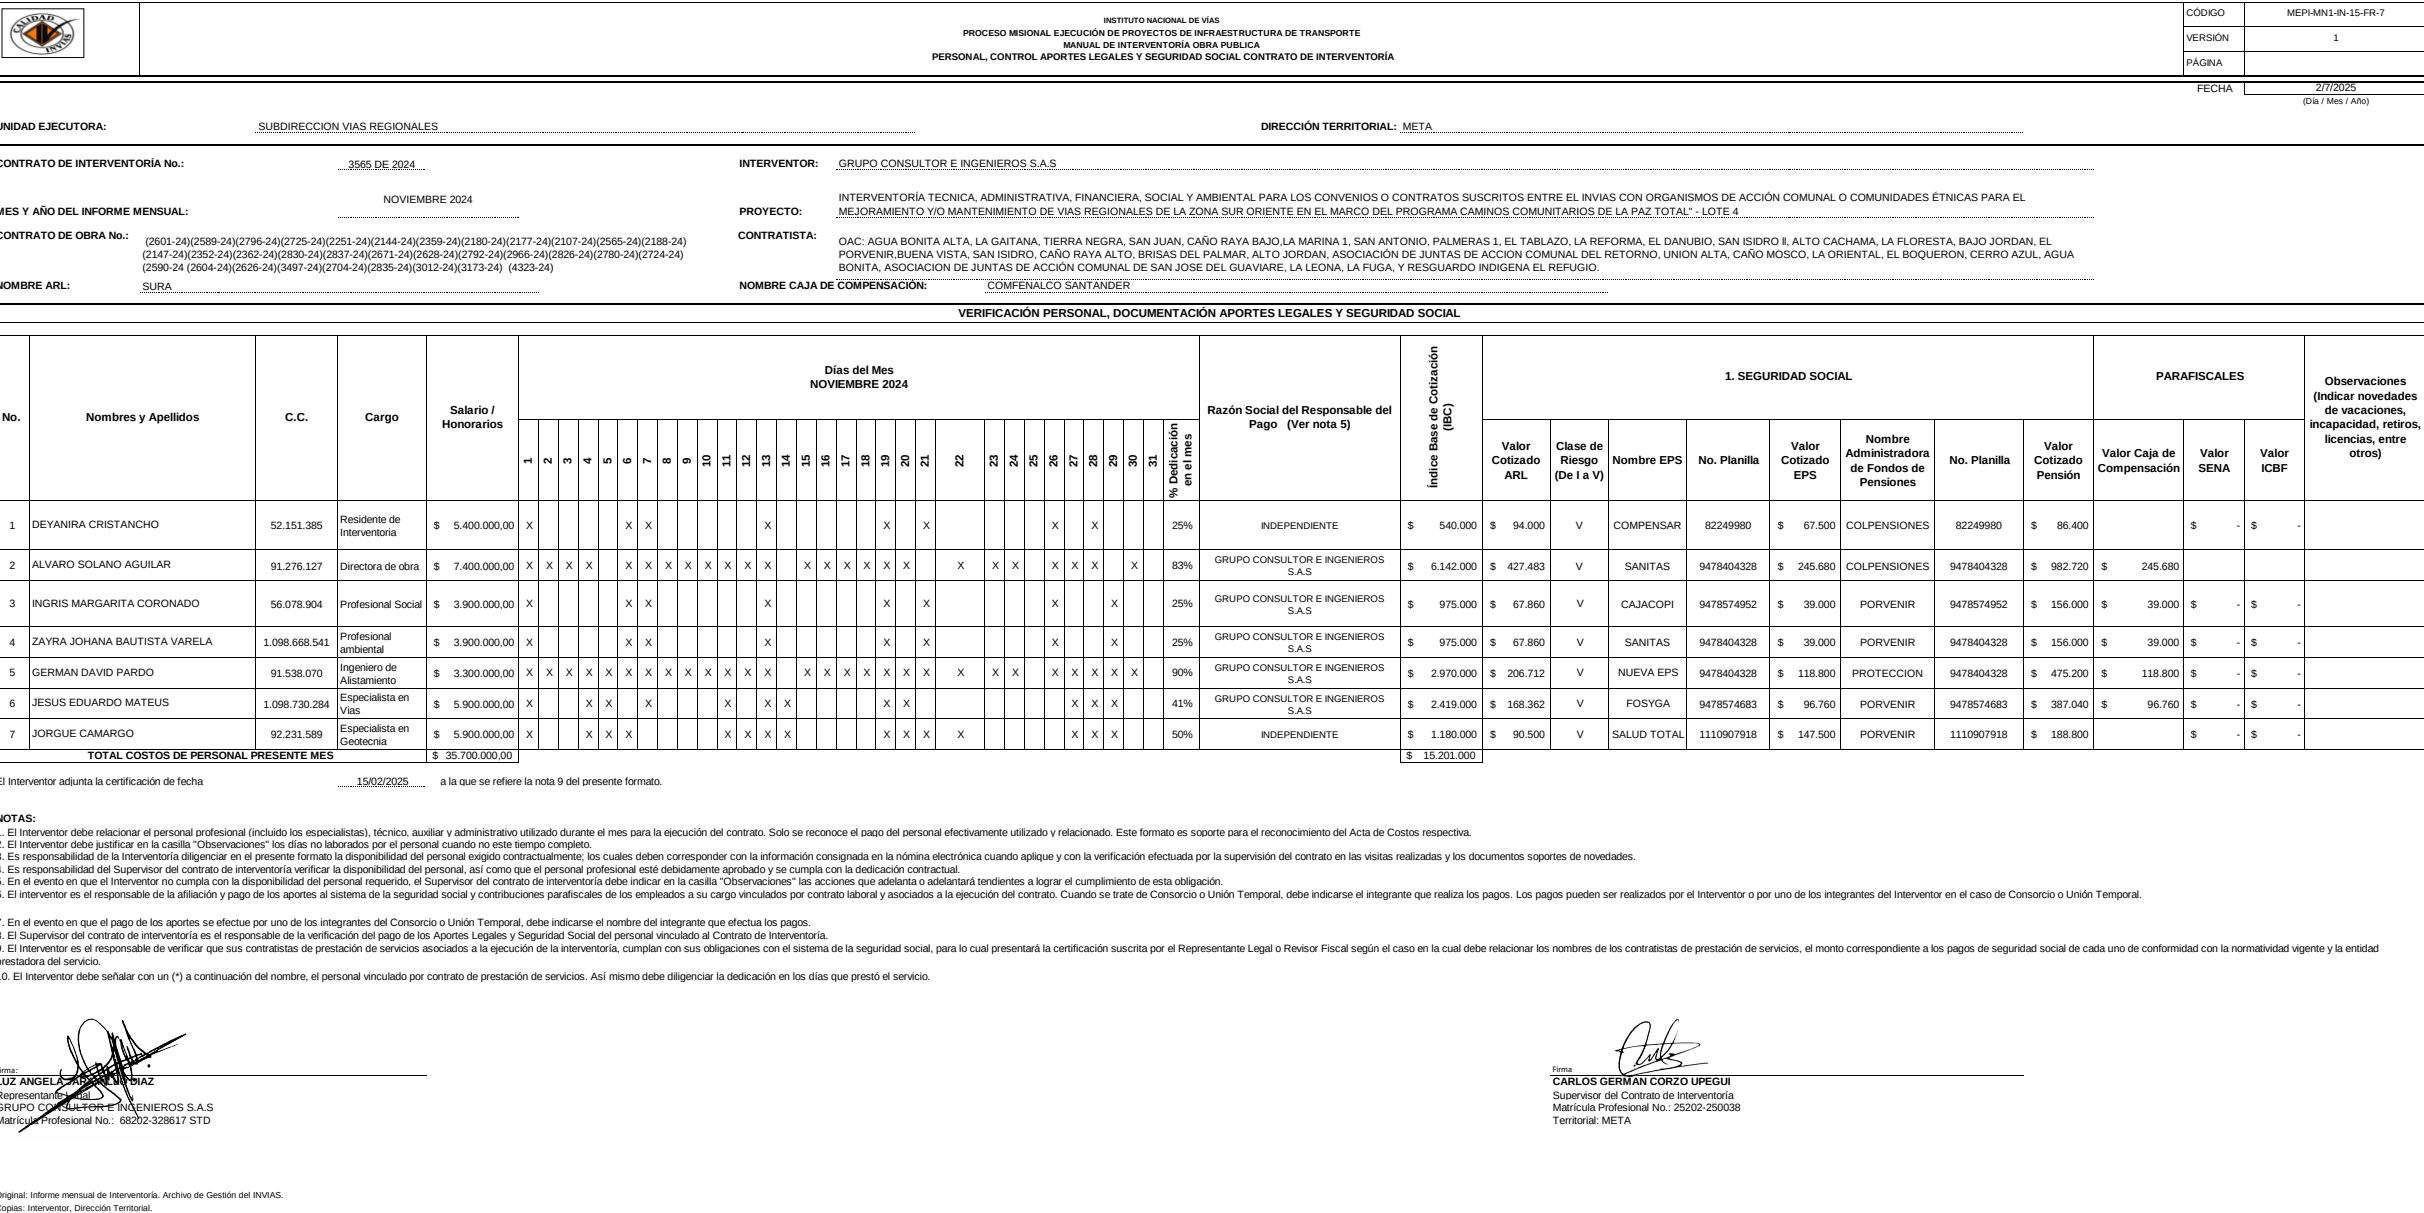

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA						CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-9				
							VERSION	1				
							PÁGINA					
FECHA								30/11/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES						DIRECCIÓN TERRITORIAL: META						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3565-2024						INTERVENIOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS						
MES INFORME MENSUAL: nov-24						PROYECTO: ALINAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL DEL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DEL GUAVIARE, DEL DEPARTAMENTO DEL GUAVIARE PARA EL MEJORAMIENTO VIAL EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL						
CONTRATO DE OBRA No: 2626-2024						CONTRATISTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL VEREDA CERRO AZUL						
RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES CONTRATO INTERVENTORÍA												
Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Indicar si es Contrato Principal o No. De Adicional	Valor	Saldo del Acta Anterior					
2024	966524	34-23 GRUPO GERENCIA PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL - GGVCP	10	Nación	contrato principal	\$ 2.014.395.039	\$ 2.014.395.039					
TOTAL						\$ 2.014.395.039	\$ 2.014.395.039					
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: \$ 2.014.395.039												
SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA												
Acta No.	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Observaciones
1	NOVIEMBRE/2024	\$ 38.058.461,00	\$ 7.231.108,00	\$ 45.289.569,00	0	\$ 45.289.569,00	0	966524 de 26-sep-24	\$ 1.969.105.470	\$ 1.969.105.470		ACTA No.1 DIC
TOTALES		\$ 38.058.461,00	\$ 7.231.108,00	\$ 45.289.569,00					\$ -	\$ -		
Todas las Actas aprobadas por el Supervisor del Contrato de Interventoría deben relacionarse estén o no facturadas.												
RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO												
	VALOR BÁSICO		IVA		TOTAL							
COSTOS DIRECTOS DE PERSONAL		\$ 32.391.000,00	\$ 6.154.290,00	\$ 38.545.290,00								
OTROS COSTOS DIRECTOS (Viáticos, Alquiler equipos, Oficina)		\$ 5.367.461,00	\$ 1.019.817,59	\$ 6.387.278,59								
VEEDURIA TECNICA CIUDADANA (GASTO REMBOLSABLE)		\$ 300.000	\$ 57.000,00	\$ 357.000,00								
VALOR TOTAL		\$ 38.058.461,00	\$ 7.231.108,00	\$ 45.289.569,00								
*Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.												
NOTAS: 1. Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes. 2. Este formato se diligencia por año.												
Firma												
Nombre: Ing. Alvaro Solano Aguilar												
Director de Interventoría												
Matrícula Profesional No.: 05202-66512 ANT												
Firma												
Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI												
Supervisor del Contrato de Interventoría												
Matrícula Profesional No.: 25202-250038												
Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS. Copias: Interventor y Dirección Territorial.												

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13																																																					
		VERSIÓN	1																																																					
		PÁGINA																																																						
		FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)																																																					
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META																																																						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3565-2024		INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS																																																						
OBJETO DEL CONTRATO:																																																								
INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4.																																																								
FECHA DE INICIO: 17/10/2024																																																								
PLAZO INICIAL: HASTA 31/12/24																																																								
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: HASTA 31/12/24 (Incluye prórrogas y suspensiones)																																																								
VALOR INICIAL: \$ 2.014.395.039,00																																																								
VALOR ACUMULADO: \$ 2.014.395.039,00 (Incluye adiciones)																																																								
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI																																																								
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO EXIGIDA SEGÚN CONTRATO PRINCIPAL																																																								
<table><tr><th rowspan="2">Amparo</th><th rowspan="2">% Amparo</th><th rowspan="2">Valor Asegurado (\$)</th><th colspan="6">VIGENCIA</th></tr><tr><th colspan="3">Desde</th><th colspan="3">Hasta</th></tr><tr><td>Cumplimiento</td><td>10%</td><td>\$ 201.439.503,90</td><td>17</td><td>10</td><td>24</td><td>5</td><td>6</td><td>25</td></tr><tr><td>Buen manejo y correcta inversión del anticipo</td><td>20%</td><td>\$ 402.879.007,80</td><td>17</td><td>10</td><td>24</td><td>5</td><td>6</td><td>25</td></tr><tr><td>Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones</td><td>20%</td><td>\$ 402.879.007,80</td><td>17</td><td>10</td><td>24</td><td>5</td><td>2</td><td>28</td></tr><tr><td>Calidad del servicio</td><td>30%</td><td>\$ 604.318.511,70</td><td>5</td><td>2</td><td>25</td><td>5</td><td>2</td><td>30</td></tr></table>						Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA						Desde			Hasta			Cumplimiento	10%	\$ 201.439.503,90	17	10	24	5	6	25	Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	\$ 402.879.007,80	17	10	24	5	6	25	Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 402.879.007,80	17	10	24	5	2	28	Calidad del servicio	30%	\$ 604.318.511,70	5	2	25	5	2	30
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA																																																					
			Desde			Hasta																																																		
Cumplimiento	10%	\$ 201.439.503,90	17	10	24	5	6	25																																																
Buen manejo y correcta inversión del anticipo	20%	\$ 402.879.007,80	17	10	24	5	6	25																																																
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones	20%	\$ 402.879.007,80	17	10	24	5	2	28																																																
Calidad del servicio	30%	\$ 604.318.511,70	5	2	25	5	2	30																																																
GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No. 96-44-101191894																																																								
Certificado de modificación o anexo No.: (Señalar el último certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto correspondiente a las condiciones iniciales del contrato)																																																								
Razón Social Compañía Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO S.A																																																								
Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:																																																								

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO GARANTÍAS CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA			

FECHA		30/11/2024		
		(Día / Mes / Año)		

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO INCLUYENDO ADICIONES, MODIFICACIONES, PRÓRROGAS Y SUSPENSIONES						
A continuación indicar los amparos y vigencias de los certificados de modificación o anexos aprobados por el Instituto en su orden consecutivo.						
Amparo	% Amparo	Valor Asegurado (\$)	VIGENCIA			
			Desde			Hasta
Cumplimiento			Día	Mes	Año	
Buen manejo y correcta inversión del anticipo			Día	Mes	Año	
Pago de Salarios, prestaciones sociales legales e indemnizaciones			Día	Mes	Año	Día Mes Año
Calidad del servicio			Día	Mes	Año	Día Mes Año

GARANTÍA ÚNICA DE CUMPLIMIENTO No.

Certificado de modificación o anexo No.:
(Señalar certificado de modificación o anexo aprobado por el Instituto)

Razón Social Compañía Aseguradora:

Fecha de aprobación de la garantía en la plataforma del SECOP II:

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

NOTAS:

1. El formato debe diligenciarse de manera consecutiva para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto.

2. El Interventor debe incluir en este formato de manera consecutiva la información para cada uno de los certificados o anexos de modificación de las garantías aprobadas por el Instituto (Insertar las casillas que se requieran).

Firma		Firma	
Nombre:	Ing. Alvaro Solano Aguilar	Nombre:	ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Cargo:	Director de Interventoría	Cargo:	Supervisor Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:	05202-66512 ANT	Matrícula Profesional No.:	25202-250038

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA		CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
			VERSIÓN	1
			PÁGINA	

FECHA

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCION VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

META

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.:

3565-2024
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL* – LOTE 4

INTERVENTOR:

GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS

FECHA DE INICIO:

17/10/2024
(Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL:

HASTA 31/12/24

FECHA DE VENCIMIENTO:

HASTA 31/12/24
(Incluye prórrogas y suspensiones)

CONTRATO DE OBRA No:

2626-2024
(Indicar número y año)

CONTRATISTA:

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL- VEREDA CERRO AZUL

1. PLAN DE CALIDAD

PRESENTADO: SI NO .X.... APROBADO: SI NO VERSIÓN No. FECHA DE VERSIÓN:

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

2. AUDITORIAS DE CALIDAD

PROGRAMA AUDITORIA PRESENTADO: SI NO No. DE AUDITORÍAS PROGRAMADAS: FECHA ÚLTIMA AUDITORÍA:
PRESENTO INFORME DE AUDITORÍA: SI NO No. DE AUDITORÍAS REALIZADAS: FECHA PRÓXIMA AUDITORÍA:

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

3. PLAN DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (PIMyE)

PRESENTADO: SI NO APROBADO: SI NO FECHA DE APROBACIÓN:
No. TOTAL DE ENSAYOS PROGRAMADOS EN EL MES: No. TOTAL DE ENSAYOSEJECUTADOS EN EL MES:
CUMPLIDO EL PLAN DE PIMyE EN EL MES: SI NO

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

El plan de Inspección, medición y ensayo de la Interventoría corresponde al control de calidad efectuado de manera independiente al PIMyE desarrollado como autocontrol de calidad por parte del Contratista de Obra.
La cantidad de ensayos que se deben realizar en el mes se define con base en el PIMyE aplicado por el Contratista de obra durante el mes.

4. REPORTE DE NO CONFORMIDADES

No. de No Conformidades reportadas en el mes: No. de No Conformidades pendientes de cierre en el mes:
No. acumulado de No Conformidades identificadas para el contrato: No. acumulado de No Conformidades cerradas para el contrato:
No. acumulado de No Conformidades pendientes de cierre para el contrato:

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

5. QUEJAS Y RECLAMOS

No. De quejas y reclamos recibidas en el mes: No. De quejas y reclamos atendidas en el mes:
No. De quejas y reclamos en el mes pendientes de atención: No. Acumulado de De quejas y reclamos recibidas por el contrato:
No. Acumulado De quejas y reclamos pendientes de atención por el contrato: No. Acumulado de De quejas y reclamos atendidas en el contrato:

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

Las quejas y reclamos tienen como origen fundamental a los usuarios del proyecto y a la comunidad de la zona.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA SEGUIMIENTO AL PLAN DE CALIDAD CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MINFRA-MN1-IN-15-FR-15
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA

30/11/2024
(Día / Mes / Año)

6. ÍNDICES DE GESTIÓN IG (Para cada objetivo de calidad del Plan de Calidad se debe establecer al menos un índice de gestión que permita evaluar su estado de cumplimiento)

Título indicador de Gestión:	Valor del IG mes	Comentarios sobre Indicador de gestión (Aclarar fórmula y consideraciones en la definición del IG)
IG1: Índice de gestión 1 =		
IG2: Índice de gestión 2 =		
IG3: Índice de gestión 3 =		
IG4: Índice de gestión 4 =		
IG5: Índice de gestión 5 =		
IGn: Índice de gestión n =		

Para cada indicador de gestión se debe definir un título representativo del mismo.

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

7. CALIBRACIÓN DE EQUIPOS, INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO (Se debe relacionar todo el equipo que requiera de calibración).

No.	Tipo de Equipo	Marca	Serie	Fecha de Calibración	No. y Fecha Certificado de Calibración	Fecha de Vencimiento Calibración	Comentarios

OBSERVACIONES:

Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio.

NOTA:
Siempre que alguna de las respuestas de este formato sea "NO", el Interventor debe indicar en el espacio de observaciones las acciones tomadas para dar cumplimiento a la obligación.

Firma



Nombre: Ing. Alvaro Solano Aguilar
Director de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 05202-66512 ANT

Firma

N.A

Nombre:
Profesional en Calidad Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.:

Firma



Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.

Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-1				
		VERSIÓN	1				
		PÁGINA	24 de 26				
		FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION VIAS REGIONALES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: META					
DATOS GENERALES							
PLAN DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO No. _____ (Indicar en forma consecutiva el número de la versión siendo el plan Inicial el número 1)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3565-2024 (Indicar número y año)		INTERVENTOR: GRUPO CONSULTOR E INGENIEROS SAS - GRUCOING SAS					
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIA CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4							
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI							
JUSTIFICACIÓN: Durante el mes en curso, el convenio en referencia, a pesar de contar con la orden de inicio, no ha iniciado actividades de obra debido a la falta de desembolsos por parte de la entidad contratante. Este retraso ha impedido la ejecución física del proyecto; por lo tanto la interventoría ha avanzado en tareas esenciales para el alistamiento y control del convenio. (Indicar la justificación cuando se trate de modificación del plan de inversión del anticipo)							
DETALLE DEL PLAN DE INVERSIÓN DE ANTICIPO							
ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VR. MES 1	VR. MES 2	VR. MES 3	VR. MES N	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	%
1							%
2							%
3							%
4							%
5							%
							%
	TOTAL						
NOTAS: 1. El Plan de Inversión Inicial del Anticipo se elabora teniendo en cuenta el valor total otorgado por este concepto. Los porcentajes se toman sobre el 100% del valor otorgado como anticipo. El Plan de Inversión debe ser actualizado de acuerdo con el valor girado al Interventor. 2. El anticipo se debe utilizar exclusivamente para el proyecto en equipos de medición, ensayos de laboratorio y de topografía, repuestos para estos, dotación de oficina, arrendamientos, insumos y suministros, ensayos de laboratorio, honorarios y nómina. No aplica para compra ni alquiler de vehículos. 3. Sólo se permite hasta el quince por ciento (15%) del valor del anticipo para compra de equipo. En el evento en que el interventor solicite y justifique un mayor porcentaje, el Supervisor del contrato de interventoría debe analizar la solicitud y presentar su concepto. La aprobación definitiva del posible mayor porcentaje de anticipo se realiza por medio de resolución motivada, suscrita por el Director General para el contrato de interventoría específico. 4. El Interventor debe programar mes a mes la inversión del anticipo teniendo en cuenta el plazo acordado con el Supervisor del Contrato de Interventoría para su inversión.							
Firma:		Firma: _____					
Nombre: LUZ ANGELA JARAMILLO Representante Legal o su Apoderado Interventor Matrícula Profesional No.: 68202-328617 STD		Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI Supervisor del contrato de Interventoría Matrícula Profesional No.: 25202-250038					
Original: Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.							

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME DE INVERSIÓN Y BUEN MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE INTERVENTORÍA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-3-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	25 de 26

	FECHA	30/11/2024 (Día / Mes / Año)
--	-------	---------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN VIAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: META

DATOS GENERALES

INFORME MENSUAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Indique si corresponde)	INFORME FINAL DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO ☐ (Indique si corresponde)
--	--

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3565-2024
(Indicar número y año)

CUENTA BANCARIA No.: BANCO SUCURSAL:

ANTICIPO OTORGADO: %

VALOR DEL ANTICIPO OTORGADO: \$ - (M/CTE)

OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA:

INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, SOCIAL Y AMBIENTAL PARA LOS CONVENIOS O CONTRATOS SUSCRITOS ENTRE EL INVIAS CON ORGANISMOS DE ACCIÓN COMUNAL O COMUNIDADES ÉTNICAS PARA EL MEJORAMIENTO Y/O MANTENIMIENTO DE VIAS REGIONALES DE LA ZONA SUR ORIENTE EN EL MARCO DEL PROGRAMA CAMINOS COMUNITARIOS DE LA PAZ TOTAL" – LOTE 4

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI

DETALLE MOVIMIENTOS DE INVERSIÓN DEL ANTICIPO

*TIPO DE DOCUMENTO MERCANTIL (FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO)	NÚMERO DE FACTURA, CHEQUE O DOCUMENTO DE EGRESO	FECHA	BENEFICIARIO	VALOR	**ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM

* Comprobantes de movimiento. (Que contengan el número de la cédula de ciudadanía o NIT del beneficiario y concepto de pagos soportados con facturas, cheques o documentos de egreso que cumplan los requisitos de ley, según el caso, situación que es revisada, verificada y aprobada por el Supervisor del contrato de interventoría).

** Indicar el número del ítem según la numeración establecida en el Plan de Inversión del Anticipo Mensualizado del contrato de interventoría Formato MEPI-MN1-IN-3-FR-1.

NOTA:
El Interventor debe adjuntar con este formato los extractos, informes financieros de manejo de anticipo y rendimientos, soportes de transferencias, comprobantes de operación de traslados de fondos de rendimientos financieros y notificación de aplicación del pago expedidos por la Subdirección Financiera, así como todos los documentos que correspondan al manejo de los recursos del anticipo.

SEGUIMIENTO INVERSIÓN DEL ANTICIPO DE INTERVENTORÍA POR ÍTEM

ÍTEM No.	DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM	VALOR PROGRAMA APROBADO (A)	VALOR ACUMULADO MES ANTERIOR (B)	VALOR PRESENTE MES (C)	VALOR ACUMULADO ACTUAL D=(B+C)	SALDO ANTICIPO ACTUAL (A-D)
TOTALES						

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS DEL MES ANTERIOR AL MES DEL INFORME (): \$ -
(Indicar el mes) (Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

VALOR RENDIMIENTOS FINANCIEROS ACUMULADOS: \$ -
(Según certificación Entidad Financiera o bancaria según el caso)

RESUMEN RELACIÓN DE CONSIGNACIONES

COMPROBANTE DE CONSIGNACIÓN DE RENDIMIENTOS FINANCIEROS No.	VALOR RECURSOS NACIÓN	VALOR RECURSOS PROPIOS	PERIODO DE RENDIMIENTO	FECHA	VALOR ACUMULADO

(De conformidad con lo establecido en el instructivo MEPI-MN1-IN-3)

NOTA:
Es responsabilidad del Supervisor del contrato de interventoría verificar el cumplimiento de la obligación a cargo del Interventor de remitir mensualmente copia a la Subdirección Financiera y a la Unidad Ejecutora de la consignación o transacción del reintegro al INVIAS o a la DIRECCIÓN DEL TESORO PÚBLICO según el caso, de los rendimientos financieros indicando con precisión que se trata de recursos por concepto de rendimientos financieros del anticipo otorgado, el número, año del contrato y el nombre del Interventor.


Firma: 

Nombre: LUZ ARCEBA JARAMILLO
Representante Legal o Delegado Interventor
Matrícula Profesional No.: 68202-328617 STD

Firma: 

Nombre: ING CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202-250038

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

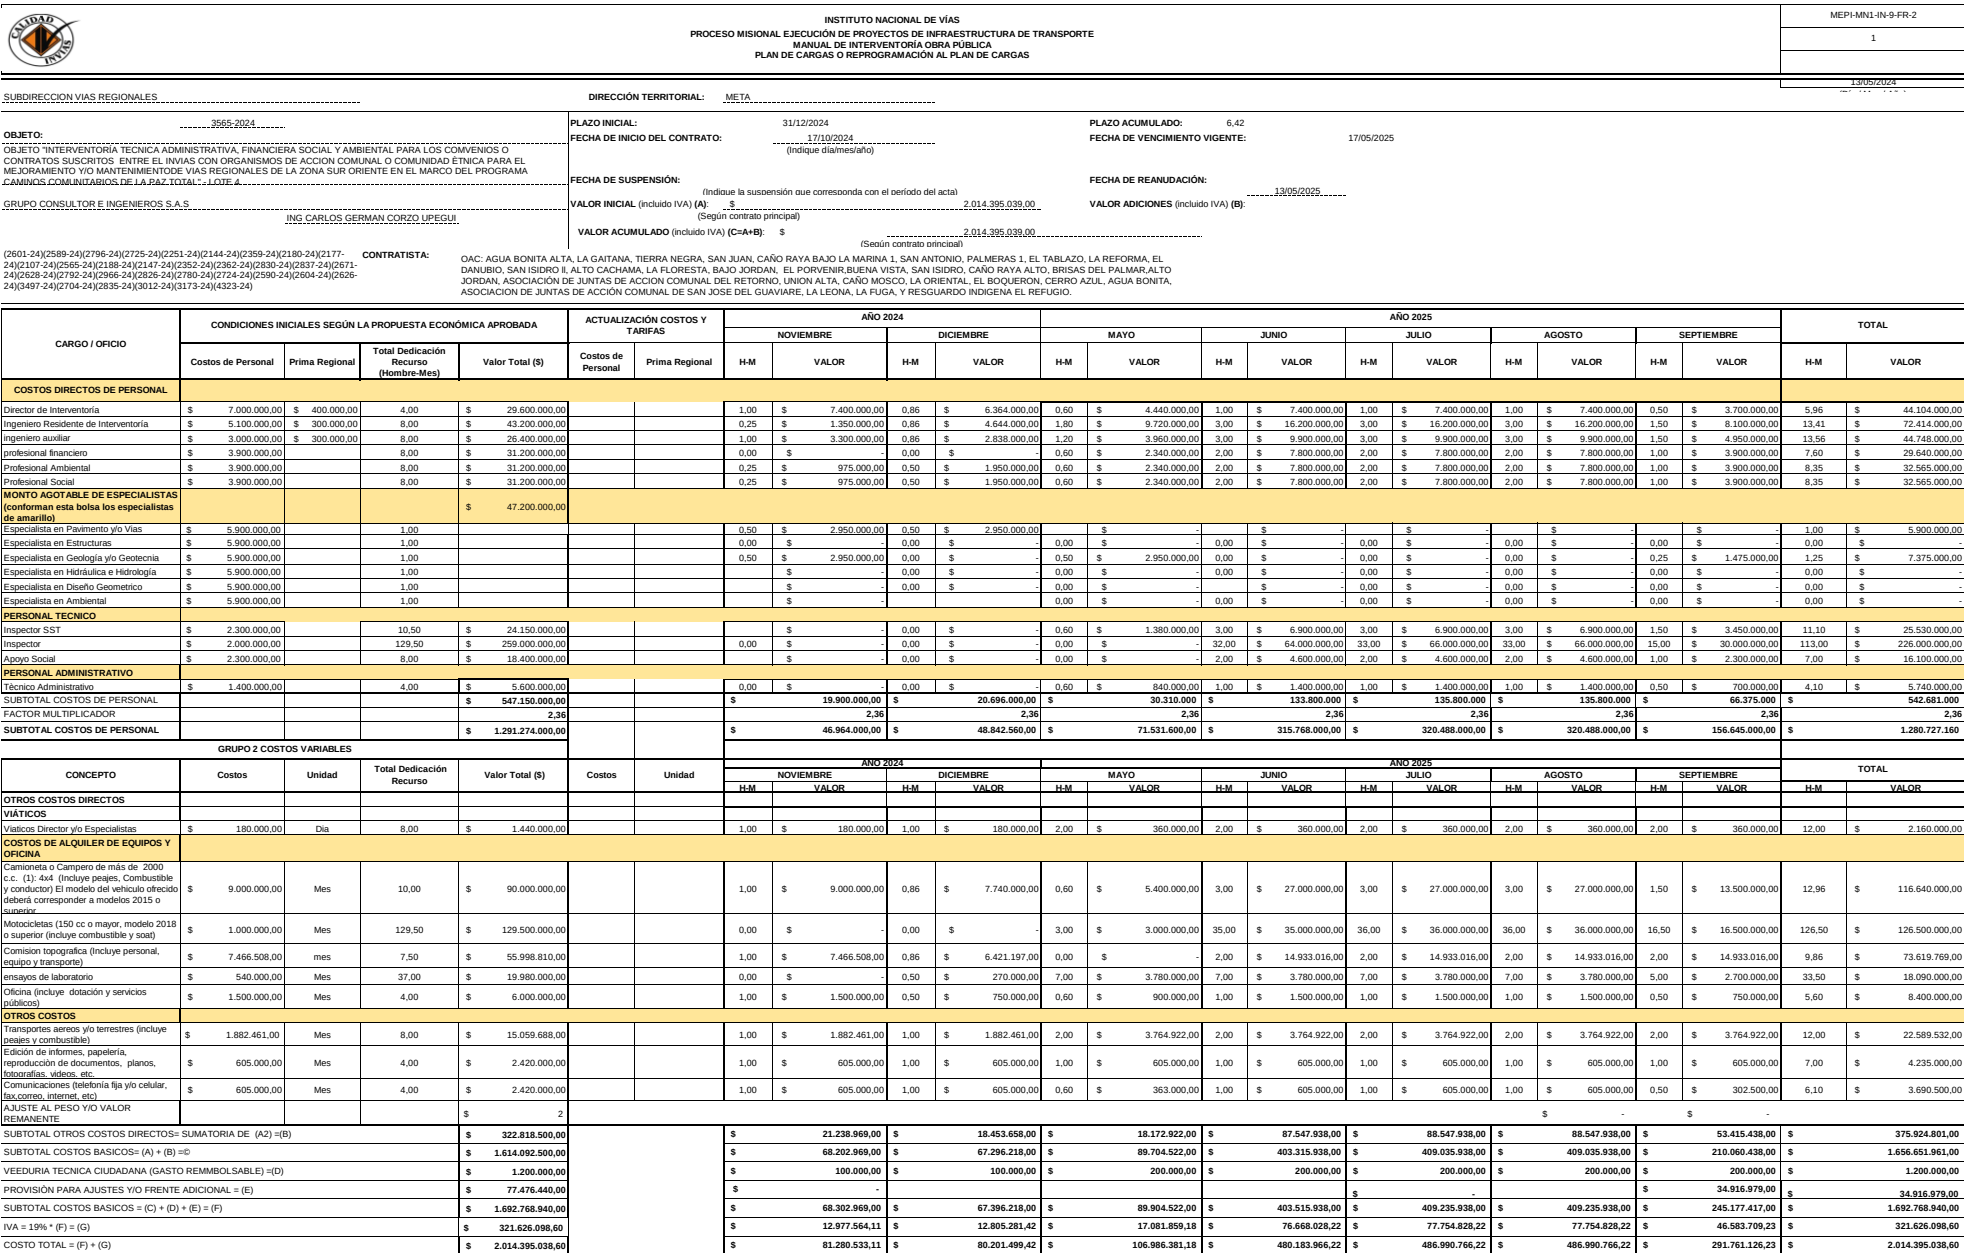

1. Para elaborar el Plan de Cargas Inicial el Interventor debe haber aprobado el Programa de Obra y el Programa de Inversión con base en estos documentos presenta un esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, información que le permite identificar la proyección de la dedicación del personal y otros costos, optimizando sus recursos de acuerdo con la ejecución del proyecto.

2. Para la Reprogramación al Plan de Cargas el Interventor debe presentar actualizado el esquema gráfico que identifique cronograma, puntos de referencia, frentes de obra y tiempos proyectados de intervención, actualizando las dedicaciones y costos de los meses anteriores de acuerdo con las actas de costos tramitadas para cada periodo, e identifica y distribuye su personal y otros costos para los siguientes periodos, optimizando sus recursos de acuerdo con las necesidades de ejecución del proyecto.

3. La utilización del personal y otros costos requeridos es controlado e incorporado al proyecto previa aprobación del Supervisor del contrato de intervención.

4. En los eventos de suspensión del plazo contractual, el periodo real de suspensión debe reflejarse en la reprogramación al plan de cargas.

5. El Plan de Cargas Final debe contener los recursos y valores ejecutados en cada periodo del plazo contractual y debe corresponder con el valor total ejecutado según la última Acta de Costos tramitada.

Firma 

ING. CARLOS GERMAN CORZO UPEGUI
Supervisor del Contrato de Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25202 - 250038 CDN
Territorial: META
