



		ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURÍDICA ACTA DE PAGO No. 87															
		OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCARGA FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN".															
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		VALOR CONTRATO INICIAL:		\$		733.648.671,00		ACTA DE INICIO:		01/12/2023		ACTA PARCIAL No. 7 Y FINAL PERIODO: 30/10/2024-19/12/2024					
		VALOR ADICIONAL:		\$		297.240.090,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		11/12/2023							
		VALOR TOTAL:		\$		1.030.888.761,00		Acta de suspensión No.1:		28/12/2023							
		DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.4741						Acta de Reinicio No.1:		19/03/2024							
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032487 DEL 2023		DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.4740						Prorroga No.1: (3 MESES)		19/03/2024		FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024					
		DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.3899						Prorroga No.2: (1 MES)		20/06/2024							
CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCTORA ALPON SAS REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE		REGISTRO PRESUPUESTAL No.1: 2023.CEN.01.8322						Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090)		19/07/2024							
		REGISTRO PRESUPUESTAL No.1: 2023.CEN.01.8323						PRORROGA No.4(90 DIAS CALENDARIO)		19/09/2024							
		REGISTRO PRESUPUESTAL No.1: 2024.CEN.01.04060						FECHA DE TERMINACION		19/12/2024							
SUPERVISIÓN: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO																	
CONDICIONES ORIGINALES										CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.7		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA	
														ACTA 7		ACTA 7	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
DISIPADOR DE ENERGIA CENTRO DE BIENESTAR ANIMAL DE POPAYAN																	
PRELIMINARES																	
1.1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE ESTRUCTURAS DE CONDUCCION PLUVIAL	M2	724,5	\$ 3.399,00	\$ 2.462.576,00	724,50	\$ 2.462.576,00	724,50	\$ 2.462.576,00	0,00	\$ 0	724,50	\$ 2.462.576				
1.2	ROCERIA MANUAL Y CON GUADAÑA	M2	724,5	\$ 686,00	\$ 497.007,00	1.127,73	\$ 773.623,00	1.354,50	\$ 928.187,00	-227,00	\$ -155.722	1.127,50	\$ 773.465				
1.3	REMOCION DE DUCTOS DE SERVICIOS EXISTENTES	ML	8	\$ 62.290,00	\$ 498.320,00	8,00	\$ 498.320,00	8,00	\$ 498.320,00	0,00	\$ 0	8,00	\$ 498.320				
2	CAPITULO 11 - EXCAVACIONES Y RELLENOS						\$ 3.734.519,00		\$ 3.800.083,00		\$ -155.722,00		\$ 3.734.361,00				
2.1	EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MTS DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN	M3	67,66	\$ 20.498,00	\$ 1.373.232,00	169,22	\$ 3.468.400,00	216,75	\$ 4.442.443,00	-47,53	\$ -974.175	169,22	\$ 3.468.268				
2.2	EXCAVACION A MANO EN SECO A PROFUNDIDAD DE 2,5 A 5 MT EN MATERIAL COMUN	M3	35,00	\$ 25.952,00	\$ 906.670,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0		\$ 0				
2.3	EXCAVACION A MANO BAJO AGUA HASTA 2,5 DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN	M3	12,00	\$ 27.284,00	\$ 327.408,00	0,00	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0		\$ 0				

[Firma]

[Firma]
Camila Ramirez
Javier Montoya



		ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURÍDICA ACTA DE PAGO No. 07															
		OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGÍA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN".										CRONOLOGIA DEL CONTRATO					
		VALOR CONTRATO INICIAL:					\$ 733.648.671,00					ACTA DE INICIO:		01-12-2023			
		VALOR ADICIONAL:					\$ 297.240.090,00					FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		31/12/2023			
		VALOR TOTAL:					\$ 1.030.888.761,00					Acta de suspensión No. 1 :		28/12/2023			
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032467 DEL 2023		DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.4741										Acta de Reinicio No. 1 :		19/03/2024		ACTA PARCIAL No. 7 Y FINAL PERIODO: 30/10/2024-19/12/2024	
		DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.4740										Prorroga No. 1 : (3 MESES)		19/03/2024			
		DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2024.CEN.01.3899										Prorroga No. 2: (1 MES)		20/06/2024			
		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8322										Prorroga No. 3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090		19/07/2024			
		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8323										PRORROGA No. 4(90 DIAS CALENDARIO)		19/09/2024			
CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCTORA ALPON SAS REP. L. JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.04060										FECHA DE TERMINACION		19/12/2024		FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2024	
SUPERVISIÓN: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO		CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No. 7		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA			
												ACTA 7		ACTA 7			
		ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA			UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
		2.4	EXCAVACION A MANO BAJO AGUA A PROFUNDIDAD DE 2,5 A 5 MT EN MATERIAL COMUN			M3	20,00	\$ 42.729,00	\$ 854.580,00	0,00	-	0,00	-	0,00	\$ 0		\$ 0
		2.5	EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN CONGLOMERADO O MATERIAL DE RIO			M3	30,00	\$ 24.844,00	\$ 745.320,00	350,86	\$ 8.716.766,00	493,08	\$ 12.250.080,00	-142,22	\$ 3.533.314	350,86	\$ 8.716.766
		2.6	EXCAVACION A MANO BAJO AGUA HASTA 2,5 DE PROFUNDIDAD EN CONGLOMERADO O MATERIAL DE RIO			M3	21,00	\$ 38.993,00	\$ 818.853,00	0,00	-	0,00	-	0,00	\$ 0		\$ 0
		2.7	RELLENOS TIPO III MECANICO CON MATERIAL DE ROCA MUERTA. INCLUYE TRANSPORTE			M3	69,00	\$ 97.811,00	\$ 6.748.959,00	0,00	-	0,00	-	0,00	\$ 0		\$ 0
		2.8	PROTECCIÓN DE TALUDES CON BLOQUES DE CESPED			M2	90,00	\$ 14.651,00	\$ 1.318.590,00	0,00	-	0,00	-	0,00	\$ 0		\$ 0

CA

Camila Ramirez
Javier Montilla

		ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURIDICA ACTA DE PAGO No. 87											
		OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANTARIA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN".											
		VALOR CONTRATO INICIAL:				\$ 733.848.671,00							
		VALOR ADICIONAL:				\$ 297.240.090,00							
		VALOR TOTAL:				\$ 1.030.888.761,00							
SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA		DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.4741											
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032467 DEL 2023		DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2023.CEN.01.4740											
CONTRATISTA DE OBRA:	CONSTRUCTORA ALPON SAS REP. L. JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE	DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2024.CEN.01.3899											
SUPERVISIÓN:	CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO	REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.8322											
		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.8323											
		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2024.CEN.01.04000											
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.7		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA	
										ACTA 7		ACTA 7	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3	CAPITULO III - ESTRUCTURAS Y DRENAJES						\$ 12.185.166,00		\$ 16.692.523,00		\$ -4.607.484,00		\$ 12.185.034,00
3.1	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 4000 PSI PARA ESTRUCTURAS (Cabezales de salida)	M3	3,81	\$ 590.215,00	\$ 2.248.719,00	\$ 1,31	\$ 772.777,00	1,87	\$ 1.103.702,00	-0,56	\$ -330.925	1,31	\$ 772.777
3.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS (Disipador de energia)	M3	222,00	\$ 543.827,00	\$ 120.729.594,00	\$ 33,02	\$ 17.957.657,00	275,03	\$ 149.567.784,00	-242,01	\$ -131.610.127	33,02	\$ 17.957.657
3.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO (E= 0,05)	M3	3,50	\$ 403.514,00	\$ 1.412.299,00	\$ 30,01	\$ 12.110.852,00	38,85	\$ 15.675.732,00	-8,83	\$ -3.564.880	30,01	\$ 12.110.852
3.4	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 24"	ML	8,00	\$ 588.843,00	\$ 4.710.744,00	\$ 8,91	\$ 5.248.358,00	0,00	\$ -	8,91	\$ 5.248.358	8,91	\$ 5.248.358
3.5	ACERO DE REFUERZO 420 Mpa (60000 psi). INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, AMARRE, CORTE E INSTALACIÓN	KG	17993,00	\$ 6.671,00	\$ 120.031.303,00	\$ 14.635,66	\$ 97.634.506,00	12.125,29	\$ 80.887.810,00	2.510,37	\$ 16.746.696	14.635,66	\$ 97.634.506
3.6	BORDILLOS DE CONFINAMIENTO LATERAL VACIADO IN SITU H= 40 CM INCLUYE SUPERFICIE DE APOYO	M3	98,56	\$ 55.909,00	\$ 5.510.391,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0		\$ 0

Camilo Ramirez

Javier Montilla



SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800932467 DEL 2023

CONTRATISTA DE OBRA:

CONSTRUCTORA ALPON SAS
REP. L. JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE

SUPERVISIÓN:

CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

ALCALDÍA DE POPAYÁN
OFICINA ASESORA JURÍDICA
ACTA DE PAGO No. 87

OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGÍA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELÉCTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN".

VALOR CONTRATO INICIAL:	\$	733.648.671,00
VALOR ADICIONAL:	\$	297.240.090,00
VALOR TOTAL:	\$	1.030.888.761,00

DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2023.CEN.01.4741

DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2023.CEN.01.4740

DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2024.CEN.01.3899

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2013.CEN.01.8322

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2013.CEN.01.8323

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.04060

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

ACTA DE INICIO:	01-12-2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
Acta de suspensión No.1 :	28/12/2023
Acta de Reinicio No.1 :	19/03/2024
Prorroga No.1 : (3 MESES)	19/03/2024
Prorroga No.2: (1 MES)	20/08/2024
Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090)	19/07/2024
PRORROGA No.4(90 DIAS CALENDARIO)	19/09/2024
FECHA DE TERMINACION	19/12/2024

ACTA PARCIAL No. 7 Y FINAL PERIODO: 30/10/2024 -18/12/2024

FECHA:19 DE DICIEMBRE DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.7		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA	
										ACTA 7		ACTA 7	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3.7	ENROCADO EN CONCRETO CICLOPEO 3000 PSI	M3	3,43	\$ 529.135,00	\$ 1.814.933,00	\$ 22,05	\$ 11.667.427,00	0,00	\$ -	22,05	\$ 11.667.427	22,05	\$ 11.667.427
3.8	DREN FRANCES SECCION -1MX0,65 NO INCLUYE EXCAVACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL	ML	47,00	\$ 157.189,00	\$ 7.387.883,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0		\$ 0
4	CAPITULO IV- TRANSPORTES DE MATERIALES						\$ 145.391.577,00		\$ 247.235.028,00		\$ 101.843.451,00		\$ 145.391.577,00
4.1	ACARREO INTERNO MATERIALES PETREOS- VARIOS HASTA 1000M	M3	369,43	\$ 11.841,00	\$ 4.374.421,00	\$ 400,85	\$ 4.746.465,00	164,12	\$ 1.943.345,00	236,73	\$ 2.803.120	400,85	\$ 4.746.465
4.2	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACIÓN SOBANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL	M3-KM	4698	\$ 1.856,00	\$ 8.719.488,00	\$ 7.675,99	\$ 14.246.639,00	3.024,01	\$ 5.612.563,00	4.651,98	\$ 8.634.075	7.675,99	\$ 14.246.638

Camila Romera
Javier Mantilla



ALCALDÍA DE POPAYÁN
OFICINA ASESORA JURÍDICA
ACTA DE PAGO No. 67

OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN".

VALOR CONTRATO INICIAL:	\$	733.648.671,00
VALOR ADICIONAL:	\$	297.240.090,00
VALOR TOTAL:	\$	1.030.888.761,00

DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.4741

DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.4740

DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.3899

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8322

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8323

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2021.CEN.01.04060

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

ACTA DE INICIO:	01-12-2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
Acta de suspensión No.1:	28/12/2023
Acta de Reinicio No.1:	19/03/2024
Prorroga No.1: (3 MESES)	19/03/2024
Prorroga No.2: (1 MES)	20/06/2024
Prorroga No.3: 12 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090	19/07/2024
PRORROGA No.4: (90 DIAS CALENDARIO)	19/09/2024
FECHA DE TERMINACION	19/12/2024

ACTA PARCIAL No. 7 Y FINAL
PERIODO: 30/10/2024-19/12/2024

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2024

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACION No.7

ACUMULADO ACTAS ANTERIORES

OBRA EJECUTADA

OBRA EJECUTADA

ACTA 7

ACTA 7

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1.NP	CAPITULO 1.NP- ITEMS NO PREVISTOS						\$ 18.993.104,00		\$ 7.855.908,00		\$ 11.437.193,00		\$ 18.993.103,00
1.NP-1	POZO DE ABSORCION DE ENERGIA EN CONCRETO DE 4000 PSI. ESPESOR DE MUROS 20 CM. (NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO) ALTURA 4,90 MTRS.	UND	0,00	\$ 12.955.012,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0		\$ 0
1.NP-2	TAPA EN LAMINA DE ALFAJOR 2,5MM INCLUYE MARCO Y CONTRAMARCO EN ANGULO DE 2"X 3,16", ANTICORROSIVO Y PINTURA. SECCION DE 1X1,4 M	UND	0,00	\$ 377.281,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0		\$ 0
1.NP-3	EXCAVACION BJO AGUA DE 2,5 HASTA 5 MT DE PROFUNDIDAD EN ROCA (INCLUYE DEMOLICION)	M3	0,00	\$ 308.293,65	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0		\$ 0
1.NP-4	FILTRO EN MATERIAL GRANULAR-0,8MX0,60 NO INCLUYE EXCAVACION (INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL)	ML	0,00	\$ 97.443,00	\$ -	\$ -	\$ -	35,00	\$ 3.410.505,00	-35,00	\$ -3.410.505		\$ 0

[Firma]

[Firma]
Camila Ramirez
Javier Montaña



		ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURÍDICA ACTA DE PAGO No. 87																			
		OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN".										CRONOLOGIA DEL CONTRATO									
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032467 DEL 2023		VALOR CONTRATO INICIAL:				\$		733.648.671,00		ACTA DE INICIO:		01-12-2023		ACTA PARCIAL No. 7 Y FINAL PERIODO: 30/10/2024-10/12/2024							
		VALOR ADICIONAL:				\$		297.240.090,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		31/12/2023									
		VALOR TOTAL:				\$		1.030.888.761,00		Acta de suspension No.1 :		28/12/2023									
		DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.4741										Acta de Ratificación No.1 :			19/03/2024						
		DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2023.CEN.01.4740										Prorroga No.1 : (3 MESES)			19/03/2024						
CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCTORA ALPON SAS REP. L. JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE		DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2024.CEN.01.3899										Prorroga No.2: (1 MES)			20/06/2024						
		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8322										Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090)			19/07/2024						
		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8323										PRORROGA No.4 (90 DIAS CALENDARIO)			19/09/2024						
		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.04060										FECHA DE TERMINACION			19/12/2024						
SUPERVISIÓN: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO												FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2024									
CONDICIONES ORIGINALES														CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.7		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA	
																		ACTA 7		ACTA 7	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR								
1.NP-5	RELLENOS TIPO I CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0.30m AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	0,00	\$ 20.776,00	\$ -	\$ 56,76	\$ 1.179.246,00	9,60	\$ 199.450,00	47,16	\$ 979.795	56,76	\$ 1.179.246								
1.NP-6	CUNETAS DE CONCRETO VACIADO IN SITU INCLUYE LA CONFORMACION DE LA SUPERFICIE DE APOYO.	M3	0,00	\$ 607.086,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0		\$ 0								
1.NP-7	SUMINISTRO E INSTALACION DE SILLA YEE PVC PARA ALCANTARILLADO 24" X 8"	UND	0,00	\$ 626.758,72	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0		\$ 0								
1.NP-8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 200 (8")	ML	0,00	\$ 78.670,00	\$ -	\$ -	\$ -	12,00	\$ 944.040,00	-12,00	\$ -944.040	0,00	\$ 0								
1.NP-9	FILTRO SECCION (B=0.45 M X H= 0.65 M) INCLUYE TRANSPORTE DE MATERIAL GRANULAR	ML	0,00	\$ 96.651,00	\$ -	\$ 129,20	\$ 12.487.310,00	93,50	\$ 9.035.869,00	35,70	\$ 3.450.441	129,20	\$ 12.487.310								
1.NP-10	ESTRUCTURA SOPORTE PARA CONDUCCION DE MATERIAL DE HORMIGON	UND	0,00	\$ 16.023.272,00	\$ -	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0		\$ 0								
1.NP-10	ESTRUCTURA SOPORTE PARA CONDUCCION DE MATERIAL DE HORMIGON	ML	0,00	\$ 100.145,45	\$ -	\$ -	\$ -	450,00	\$ 45.065.453,00	-450,00	\$ -45.065.453		\$ 0								

[Firma]
Comisario Ramiro
Javier Montaña



		ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURÍDICA ACTA DE PAGO No. 81															
		OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGÍA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN".								CRONOLOGIA DEL CONTRATO				ACTA PARCIAL No. 7 Y FINAL PERIODO: 30/10/2024-10/12/2024			
										ACTA DE INICIO:		01-12-2023					
										FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		31/12/2023					
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.4741								Acta de suspensión No.1 :		28/12/2023					
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032467 DEL 2023		DISP. PRESUPUESTAL Nros. 2023.CEN.01.4740								Acta de Reinicio No.1 :		19/03/2024					
CONTRATISTA DE OBRA:		DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2024.CEN.01.3299								Prorroga No.1 : (3 MESES)		19/03/2024					
SUPERVISIÓN:		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8322 REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8323 REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2021.CEN.01.04060								Prorroga No.2: (1 MES)		20/06/2024					
										Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090)		19/07/2024					
										PRORROGA No.4(90 DIAS CALENDARIO)		19/09/2024					
										FECHA DE TERMINACION		19/12/2024					
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.7				ACUMULADO ACTAS ANTERIORES				OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA	
														ACTA 7		ACTA 7	
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR		
1 NP-11	REMOCION DE ROCA DE ZANJAS DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD MAXMA, CON MEDIOS MANUALES	M3	0,00	\$ 53.812,81	\$ -	\$ 98,23	\$ 5.266.557,00	98,23	\$ 5.266.557,00	0,00	\$ 0	98,23	\$ 5.266.557				
1 NP-12	EXCAVACION BAJO AGUA HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN ROCA (INCLUYE DEMOLICION)	M3	0,00	\$ 265.465,4	\$ -	\$ -	\$ -	17,50	\$ 4.645.644,00	-17,50	\$ -4.645.644		\$ 0				
1NP-13	REVESTIMIENTO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA TUBERIA	M3	0,00	\$ 908.344,2	\$ -	\$ 0,86	\$ 781.176,00			0,86	\$ 781.176	0,86	\$ 781.176				
1 NP-14	DREN FRANCES SECCION 1MX0,65 NO INCLUYE EXCAVACION Y TRANSPORTE DE MATERIAL	ML	0,00	\$ 539.576,50	\$ -	\$ 4,50	\$ 2.428.094,00	0,00	\$ -	4,50	\$ 2.428.094	4,50	\$ 2.428.094				
1NP-15	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNION MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 300 (12")	ML		\$ 114.273,21	\$ -	\$ 12,00	\$ 1.371.279,00			12,00	\$ 1.371.279	12,00	\$ 1.371.279				

[Firma]

[Firma]
Carmelo Remírez
Luis Mandillo



		ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURÍDICA ACTA DE PAGO No. 07										CRONOLOGIA DEL CONTRATO				ACTA PARCIAL No. 7 Y FINAL PERIODO: 30/10/2024-18/12/2024 FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2024
		OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGÍA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN".										ACTA DE INICIO:		01-12-2023		
		VALOR CONTRATO INICIAL:					\$ 733.648.671,00					FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		31/12/2023		
		VALOR ADICIONAL:					\$ 297.240.090,00					Acta de suspensión No. 1 :		28/12/2023		
VALOR TOTAL:					\$ 1.030.888.761,00					Acta de Reinicio No. 1 :		19/03/2024				
DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.4741										Prorroga No. 1 : (3 MESES)		19/03/2024				
DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.4740										Prorroga No.2: (1 MES)		20/06/2024				
DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2024.CEN.01.3899										Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090		19/07/2024				
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.8322										PRORROGA No.4(90 DIAS CALENDARIO)		19/09/2024				
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.8323										FECHA DE TERMINACION		19/12/2024				
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2021.CEN.01.04060																
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.7		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA				
										ACTA 7		ACTA 7				
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
1NP-16	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 3000 PSI PARA ESTRUCTURAS (Disipador de energía) INCLUYE HERRAMIENTA EN ZINC GUADUA Y ALAMBRE PARA CONDUCCION	M3		\$ 879.914,04		\$ 192,89	\$ 159.728.259,00	0,00	\$ -	192,89	\$ 169.728.259	192,89	\$ 169.728.259			
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL DISIPADOR					\$ 293.684.276,00		\$ 193.241.921,00		\$ 68.588.518,00		\$ 124.873.403,00		\$ 183.241.921,00			
DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYAN																
0	PRELIMINARES															
0,1	LOCALIZACIÓN, TRAZADO Y REPLANTEO DE CONDUCCIONES DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO	ML	412,1	\$ 2.853,00	\$ 1.179.842,00	\$ 315,00	\$ 901.845,00	310,00	\$ 887.530,00	5,00	\$ 14.315	315,00	\$ 901.845			
0,2	ROCERÍA MANUAL Y CON GUADAÑA	M2	627	\$ 685,00	\$ 430.122,00	\$ 630,00	\$ 432.180,00	481,72	\$ 330.457,00	148,28	\$ 101.723	630,00	\$ 432.180			
1	CAPÍTULO 1 - EXCAVACIONES Y RELLENOS						\$ 1.334.025,00		\$ 1.217.987,00		\$ 110.038,00		\$ 1.334.025,00			

[Firma]

[Firma]
Comily Romerez
Junior Mandillo



ALCALDÍA DE POPAYÁN
OFICINA ASESORA JURÍDICA
ACTA DE PAGO No. 87

OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN".

VALOR CONTRATO INICIAL:	\$	733.648.671,00
VALOR ADICIONAL:	\$	297.240.090,00
VALOR TOTAL:	\$	1.030.888.761,00

DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.4741

DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.4740

DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.3899

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8322

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8323

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.04060

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

ACTA DE INICIO:	01-12-2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
Acta de suspensión No.1:	28/12/2023
Acta de Relicido No.1:	19/03/2024
Prorroga No.1: (3 MESES)	19/03/2024
Prorroga No.2: (1 MES)	20/06/2024
Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090	19/07/2024
PRORROGA No.4: (90 DÍAS CALENDARIO)	19/09/2024
FECHA DE TERMINACION	19/12/2024

ACTA PARCIAL No. 7 Y FINAL
PERIODO: 30/10/2024-19/12/2024

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2024

SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032467 DEL 2023

CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCTORA ALFON SAS
REP. L. JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE

SUPERVISIÓN: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACION No.7

ACUMULADO ACTAS ANTERIORES

OBRA EJECUTADA

OBRA EJECUTADA

ACTA 7

ACTA 7

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1,10	EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN	M3	159,00	\$ 20.496,00	\$ 3.258.864,00	\$ 111,45	\$ 2.284.279,00	292,74	\$ 5.999.999,00	-181,29	\$ 3.715.720	111,45	\$ 2.284.270
1,20	EXCAVACION A MANO EN SECO A PROFUNDIDAD DE 2,5 A 5 MT EN MATERIAL COMUN	M3	60,00	\$ 25.962,00	\$ 1.557.720,00	\$ 5,21	\$ 135.262,00	5,21	\$ 135.262,00	0,00	\$ 0	5,21	\$ 135.262
1,30	EXCAVACION A MANO BAJO AGUA HASTA 2,5 DE PROFUNDIDAD EN MATERIAL COMUN	M3	100,00	\$ 27.284,00	\$ 2.728.400,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0		\$ 0
1,40	EXCAVACION A MANO BAJO AGUA A PROFUNDIDAD DE 2,5 A 5 MT EN MATERIAL COMUN	M3	60,00	\$ 42.729,00	\$ 2.563.740,00	\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0		\$ 0
1,50	EXCAVACION A MANO EN SECO HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN CONGLOMERADO O MATERIAL DE RIO	M3	90,00	\$ 24.844,00	\$ 2.235.960,00	\$ 295,40	\$ 7.338.918,00	71,77	\$ 1.783.054,00	223,63	\$ 5.555.864	295,40	\$ 7.338.918

[Firma]

[Firma]
Camila Ramirez
Javier Manilla



		ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURÍDICA ACTA DE PAGO No. 07														
		OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN".										CRONOLOGIA DEL CONTRATO				
		VALOR CONTRATO INICIAL:					\$ 733.648.671,00					ACTA DE INICIO:		01-12-2023		
		VALOR ADICIONAL:					\$ 297.240.090,00					FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		31/12/2023		
		VALOR TOTAL:					\$ 1.030.888.761,00					Acta de suspensión No.1 :		28/12/2023		
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.4741										Acta de Reinicién No.1 :		19/03/2024		ACTA PARCIAL No. 7 Y FINAL PERIODO: 30/10/2024-18/12/2024
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032467 DEL 2023		DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.4740										Prorroga No.1: (3 MESES)		19/03/2024		
CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCTORA ALPON SAS REP. L. JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE		DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.3899										Prorroga No.2: (1 MES)		20/06/2024		
SUPERVISIÓN: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8322										Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090)		19/07/2024		
		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8323										PRORROGA No.4:(90 DIAS CALENDARIO)		19/09/2024		
		REGISTRO PRESUPUESTAL No.: 2021.CEN.01.04060										FECHA DE TERMINACION		19/12/2024		FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2024
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.7		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA				
										ACTA 7		ACTA 7				
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
1,60	EXCAVACION A MANO BAJO AGUA HASTA 2,5 DE PROFUNDIDAD EN CONGLOMERADO O MATERIAL DE RIO	M3	90,00	\$ 38.993,00	\$ 3.509.370,00	\$ 284,96	\$ 11.111.332,00	109,99	\$ 4.288.340,00	174,97	\$ 6.822.492	284,96	\$ 11.111.332			
1,70	RELLENOS TIPO I CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA EXCAVACION COMPACTADO CON EQUIPO MECANICO EN CAPAS DE 0,30m AL 90% DEL PROCTOR MODIFICADO	M3	112,84	\$ 20.776,00	\$ 2.344.364,00	\$ 239,52	\$ 4.976.268,00	234,47	\$ 4.871.349,00	5,05	\$ 104.919	239,52	\$ 4.976.268			
1,80	RELLENOS TIPO III MECANICO CON MATERIAL DE ROCA MUERTA. INCLUYE TRANSPORTE	M3	281,60	\$ 97.811,00	\$ 27.543.578,00	\$ 302,24	\$ 29.562.397,00	250,00	\$ 24.452.750,00	52,24	\$ 5.109.647	302,24	\$ 29.562.397			
1,90	SUMINISTRO Y COLOCACION DE MATERIAL GRANULAR PARA CIMENTACION DE TUBERIA PVC. INCLUYE TRANSPORTE	M3	95,94	\$ 122.530,00	\$ 11.755.528,00	\$ 27,06	\$ 3.315.662,00	19,84	\$ 2.430.995,00	7,22	\$ 884.667	27,06	\$ 3.315.662			
2	CAPÍTULO II - ESTRUCTURAS Y DRENAJES						\$ 58.724.118,00		\$ 43.982.249,00		\$ 14.761.869,00		\$ 58.724.118,00			
2,10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA PVC UNIÓN MECANICA PARA ALCANTARILLADO D= 200 (8")	ML	412,10	\$ 78.670,00	\$ 32.419.907,00	\$ 326,98	\$ 25.723.517,00	310,09	\$ 24.394.780,00	16,89	\$ 1.328.736	326,98	\$ 25.723.516			
2,20	CONSTRUCCION CILINDRO CONCRETO DE 4000 PSI HASTA 5M, D int = 1,50, E= 0,15.	ML	10,00	\$ 960.585,00	\$ 9.605.850,00	\$ 18,05	\$ 17.338.560,00	12,55	\$ 12.055.312,00	5,50	\$ 5.283.218	18,05	\$ 17.338.560			

44

Comité Ramírez
García Morilla



ALCALDIA DE POPAYAN

OFICINA ASISTENTE TECNICA

ACTA DE TIPO No. 07

OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCION DE SUBSTACION DE ENERGIA Y DESARROL FINAL, REDES SUBTERRANEAS EN LA CIUDAD DE POPAYAN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYAN"

VALOR CONTRATO INICIAL:	\$	733.046.671,00
VALOR ADICIONAL:	\$	207.240.000,00
VALOR TOTAL:	\$	1.040.286.671,00

DISP. PRESUPUESTAL No. : 2023 CEN 01 4741

DISP. PRESUPUESTAL No. : 2023 CEN 01 4740

DISP. PRESUPUESTAL No. : 2024 CEN 01 3899

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 2023 CEN 01 8322

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 2023 CEN 01 8323

REGISTRO PRESUPUESTAL No. : 2024 CEN 01 04060

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

ACTA DE INICIO:	01-12-2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
Acta de suspension No. 1 :	28/12/2023
Acta de Reanudo No. 1 :	19/01/2024
Promesa No. 1 : (3 MESES)	19/01/2024
Promesa No. 2 : (1 MES)	20/06/2024
Promesa No. 3 : (2 MESES Y ADICIONAL DE 207.240.000)	19/07/2024
PROMESA No. 4: 180 DIAS (CALENDARIO)	19/09/2024
FECHA DE TERMINACION	19/12/2024
FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024	

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No. 2

ACUMULADO ACTAS ANTERIORES

OBRA EJECUTADA ACTA 7

OBRA EJECUTADA ACTA 7

ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL
2.30	CONSTRUCCION DE BROCAL EN CONCRETO DE 4000 PSI D=1,5 MT E=0,30M. CON TAPA. INCLUYE ACERO DE REFUERZO	UND	5,00	\$ 787.439,00	\$ 3.937.195,00	6,00	\$ 4.724.634,00	6,00	\$ 4.724.634,00	0,00	\$ 0	6,00	\$ 4.724.634
2.40	CONSTRUCCION DE LOSA DE FONDO CONCRETO DE 4000 PSI PARA CAMARA DE INSPECCION TIPO B. INCLUYE CANCHUELA D=1,5m, E=0,2M	UND	5,00	\$ 566.275,00	\$ 2.831.375,00	6,00	\$ 3.397.650,00	7,28	\$ 4.179.110,00	-1,38	\$ -781.460	6,00	\$ 3.397.650
2.50	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO DE 2000 PSI PARA SOLADO (E= 0,05)	M3	2,05	\$ 401.486,00	\$ 823.046,00	1,58	\$ 634.348,00	2,12	\$ 850.490,00	-0,54	\$ -216.142	1,58	\$ 634.348
2.60	CONSTRUCCION DE CABEZAL DE SALIDA EN CONCRETO DE 3555 PSI	UND	1,00	\$ 1.090.484,00	\$ 1.090.484,00	-	\$ -	0,00	\$ 0	0,00	\$ 0	-	\$ 0
3	CAPITULO B. TRANSPORTES DE MATERIALE					\$ 61.818.776,89	\$ 61.818.776,89	\$ 46.304.326,49	\$ 46.304.326,49	\$ 5.514.352,40	\$ 5.514.352,40	\$ 61.818.776,40	\$ 61.818.776,40
3.10	RETIRO DE MATERIAL DE EXCAVACION SOBREVANTE Y LIMPIEZA EN GENERAL	M3-M4	5200,00	\$ 1.856,00	\$ 9.657.200,00	\$ 10.518,99	\$ 19.523.246,00	5.786,92	\$ 10.740.524,00	4.732	\$ 8.782.722	10.518,99	\$ 19.523.246

af

comitadame
Alfonso Otobillo C.



ALCALDÍA DE POPAYÁN
OFICINA ASESORA JURÍDICA
ACTA DE PAGO No. 07

OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCORTE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN".

VALOR CONTRATO INICIAL:	\$	733.648.671,00
VALOR ADICIONAL:	\$	297.240.090,00
VALOR TOTAL:	\$	1.030.888.761,00

DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2023.CEN.01.4741

DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2023.CEN.01.4740

DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2024.CEN.01.3899

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8322

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8323

REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.04060

CRONOLOGIA DEL CONTRATO

ACTA DE INICIO:	01-12-2023
FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023
Acta de suspensión No.1:	28/12/2023
Acta de Reinicio No.1:	19/03/2024
Prorroga No.1 (3 MESES)	19/03/2024
Prorroga No.2 (1 MES)	20/06/2024
Prorroga No.3 (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090)	19/07/2024
PRORROGA No.4(90 DIAS CALENDARIO)	19/09/2024
FECHA DE TERMINACION	19/12/2024

ACTA PARCIAL No. 7 Y FINAL
PERIODO: 30/10/2024-19/12/2024

FECHA: 19 DE DICIEMBRE DE 2024

SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032467 DEL 2023

CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCTORA ALPON SAS
REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE

SUPERVISIÓN: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO

CONDICIONES ORIGINALES

CONDICIONES ACTUALIZADAS
ACTA DE MODIFICACION No.7

ACUMULADO ACTAS ANTERIORES

OBRA EJECUTADA

OBRA EJECUTADA

ACTA 7

ACTA 7


ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
3,20	ACARREO INTERNO MATERIALES PETREOS- VARIOS HASTA 1000M	M3	654,94	\$ 11.841,00	\$ 7.755.145,00	\$ 370,89	\$ 4.391.708,00	281,10	\$ 3.328.505,00	89,79	\$ 1.063.203	370,89	\$ 4.391.708
2.NP	CAPITULO II- ITEM NO PREVISTO						\$ 23.914.954,00		\$ 14.069.029,00		\$ 9.845.925,00		\$ 23.914.954,00
2.NP-1	EXCAVACION BAJO AGUA HASTA 2,5 MT DE PROFUNDIDAD EN ROCA (INCLUYE DEMOLICION)	M3	0,00	\$ 265.465,4	\$ -	\$ 46,00	\$ 12.212.468,00	20,51	\$ 5.444.429,00	25,495	\$ 6.768.039	46,00	\$ 12.212.468
2.NP-2	EXCAVACION BJO AGUA DE 2,5 HASTA 5 MT DE PROFUNDIDAD EN ROCA (INCLUYE DEMOLICION)	M3	0,00	\$ 308.293,7	\$ -	\$ 46,90	\$ 14.458.972,00	7,07	\$ 2.179.636,00	39,83	\$ 12.279.336	46,90	\$ 14.458.972
2.NP-3	REMOCION DE ROCA DE ZANJAS DE HASTA 3 M DE PROFUNDIDAD MAXIMA, CON MEDIOS MANUALES	M3	0,00	\$ 53.612,81	\$ -	\$ 62,29	\$ 3.339.697,00	133,63	\$ 7.164.325,00	-71,34	\$ -3.824.628	62,29	\$ 3.339.697
2.NP-4	CAJA DE INSPECCION DE 50 CM X 50 CM EN CONCRETO DE 4000 PSI (NO INCLUYE REFUERZO)	UND	0,00	\$ 341.515,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 341.515,00	-1,00	\$ -341.515		\$ 0
2.NP-5	HUMEDAL ARTIFICIAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, Impermeabilizado con geomembrana, Espesor 1 mm o S+ 15 cm, Espesor 2 bsa de fondo= 20 cm. Incluye instalacion de material granular, plantas acualicas y acero de refuerzo.	UND	0,00	\$ 6.560.809,00	\$ -	\$ 1,00	\$ 6.560.809,00	1,00	\$ 6.560.809,00	0,00	\$ 0	1,00	\$ 6.560.809

[Firma]
Camilo Ramirez
Gustavo Morilla



<div></div> <div>SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA</div> <div>CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032467 DEL 2023</div> <div>CONTRATISTA DE OBRA: CONSTRUCTORA ALPON SAS REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE</div> <div>SUPERVISIÓN: CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO</div>		ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURÍDICA ACTA DE PAGO No. 87												
		OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN".												
		VALOR CONTRATO INICIAL:					\$ 733.648.671,00							
		VALOR ADICIONAL:					\$ 297.240.090,00							
		VALOR TOTAL:					\$ 1.030.888.761,00							
		DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.4741												
		DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.4740												
		DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.3899												
		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8322												
		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8323												
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.04060														
										CRONOLOGIA DEL CONTRATO				ACTA PARCIAL No. 7 Y FINAL PERIODO: 30/10/2024-10/12/2024
										ACTA DE INICIO:		01-12-2023		
										FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		31/12/2023		
										Acta de suspensión No.1:		28/12/2023		
										Acta de Reinicio No.1:		19/03/2024		
										Prorroga No.1: (3 MESES)		19/03/2024		
										Prorroga No.2: (1 MES)		20/06/2024		
										Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090)		19/07/2024		
										PRORROGA No.4(90 DIAS CALENDARIO)		19/09/2024		
										FECHA DE TERMINACIÓN		19/12/2024		

[Firma]
Camila Ramirez
Luisa Morilla



		ALCALDÍA DE POPAYÁN														
		OFICINA ASESORA JURÍDICA														
		ACTA DE PAGO 46, 07														
		OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCORTE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN".														
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA		VALOR CONTRATO INICIAL:								733.648.671,00		ACTA DE INICIO:		01-12-2023		ACTA PARCIAL No. 7 Y FINAL PERIODO: 30/10/2024-19/12/2024
		VALOR ADICIONAL:								297.240.090,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		31/12/2023		
		VALOR TOTAL:								1.030.888.761,00		Acta de suspension No. 1:		28/12/2023		
		DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.4741										Acta de Reinicio No.1:		19/03/2024		
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032467 DEL 2023		DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.4740										Prorroga No.1 (3 MESES)		19/03/2024		FECHA 19 DE DICIEMBRE DE 2024
		DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.3899										Prorroga No.2: (1 MES)		20/06/2024		
		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8322										Prorroga No.3: (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090		19/07/2024		
		REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8323										PRORROGA No.4(90 DIAS CALENDARIO)		19/09/2024		
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUCTORA ALPON SAS REP. L. JUAN CAMILO ALEGRIA PONCE								DISP. PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.04060		FECHA DE TERMINACION		19/12/2024		
SUPERVISIÓN:		CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO														
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.7		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA				
										ACTA 7		ACTA 7				
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR			
3 NP	CAPITULO III- ITEM NO PREVISTO															
3 NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION GENERADOR ELECTRICOCABINADA, MARCA WECHAI, REF AP1002-W, POTENCIA NOMINAL 100kw – 125 KVA, VOLTAJE 220, MOTOR KOREANO, REFERENCIA R6105ZLDS, 1800 RPM, GENERADOR TIPO STAMFORD, TABLERO DE CONTROL DEEP SEA / COMAP.	UND	0,00	\$ 114.467.101,2	\$ -	\$ 1,00	\$ 114.467.101,00	1,00	\$ 114.467.101,00	0,00	\$ 0	1,00	\$ 114.467.101			
3 NP-2	SUMINISTRO E INSTALACIONDE TRANSFERENCIA AUTOMATICA DE 330 AMP A 220 VOLTIOS POR CONTACTORES INDUSTRIALES Y TEMPORIZADORES.	UND	1,00	\$ 20.421.378,8		\$ 1,00	\$ 20.421.379,00	1,00	\$ 20.421.379,00	0,00	\$ 0	1,00	\$ 20.421.379			
3 NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA PLANTA ELECTRICA- SISTEMA DE BOMBAS -TABLERO GENERAL	ML	0,00			\$ -	\$ -	0,00	\$ -	0,00	\$ 0		\$ 0			
	COSTO DIRECTO OBRA CIVIL PLANTA				\$ 134.888.480,00		134.888.480,00		\$ 134.888.480,00				\$ 134.888.480,00			
NP- 4 SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA PREENSAMBLADO DE BOMBEO PARA RED AGUA POTABLE																
4 NP-1	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PRESION CONSTANTE / 3.0 HP Q = 3,5LPS H= 35M 110V/220V INCLUYE TABLERO DE CONTROL, TANQUE HIDROACUMULADOR 60- 100GLN, INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION	UND	0,00	\$ 22.004.885,00	\$ -	\$ -	\$ -	1,00	\$ 22.004.885,00	-1,00	\$ -22.004.885		\$ 0			

94

Camila Ramirez
Luis Matilla




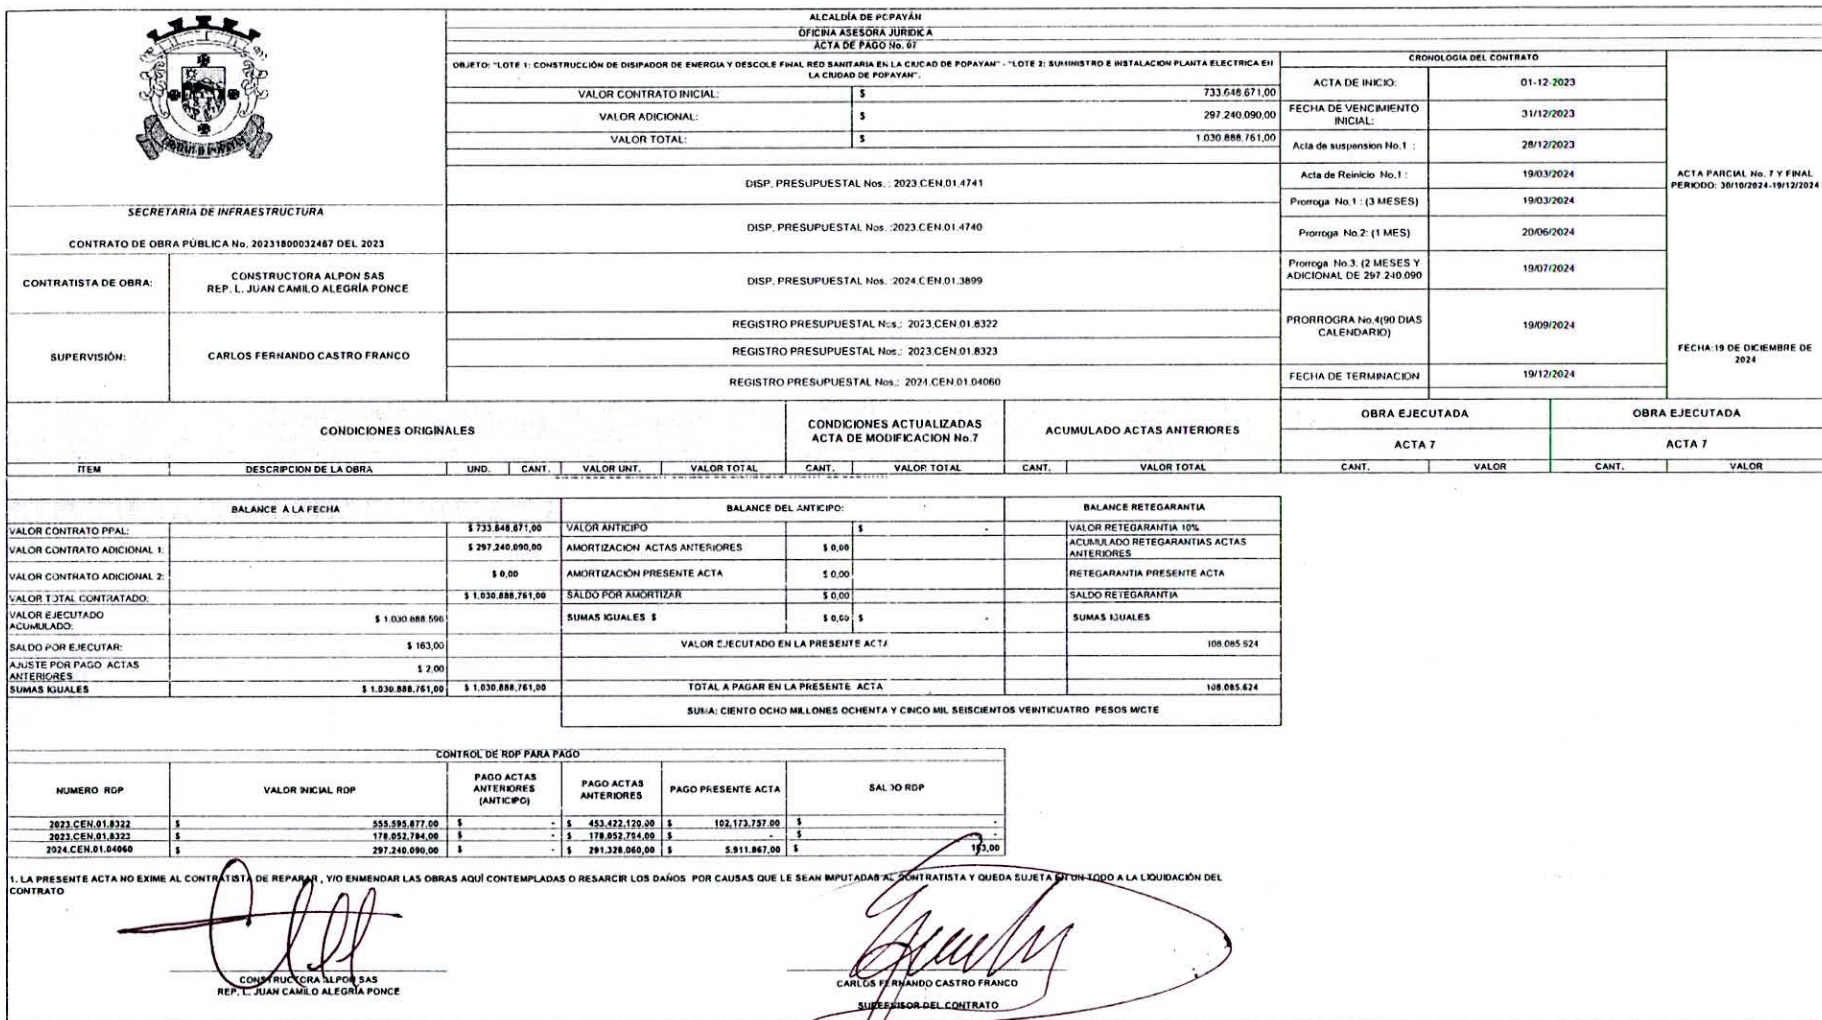
ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURÍDICA ACTA DE PAGO No. 07													
OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGIA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN"										CRONOLOGIA DEL CONTRATO			
VALOR CONTRATO INICIAL:										ACTA DE INICIO:	01-12-2023		
VALOR ADICIONAL:										FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:	31/12/2023		
VALOR TOTAL:										Acta de suspension No.1 :	28/12/2023		
DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2023.CEN.01.4741										Acta de Reinicio No.1 :	19/03/2024		
DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2023.CEN.01.4740										Prorroga No.1 : (3 MESES)	19/03/2024		
DISP. PRESUPUESTAL Nos. 2024.CEN.01.3899										Prorroga No.2 : (1 MES)	20/06/2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8322										Prorroga No.3 : (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090)	19/07/2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2023.CEN.01.8323										PRORROGA No.4(90 DIAS CALENDARIO)	19/09/2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos.: 2024.CEN.01.04060										FECHA DE TERMINACION	19/12/2024		
CONDICIONES ORIGINALES										OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA	
CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.7										ACTA 7		ACTA 7	
ACUMULADO ACTAS ANTERIORES										CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
4 NP-2	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE CILINDRICO HORIZONTAL 12500 LITROS.SEGUN DISEÑO (INCLUYE TRANSPORTE)	UND	0,00	\$ 24.722.498,00	\$ -	\$ 1,00	\$ 24.722.498,00	1,00	\$ 24.722.498,00	0,00	\$ 0	1,00	\$ 24.722.498
4 NP-3	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CHEQUE HD 4" INCLUYE ANCLAJE EN CONCRETO	UND	0,00	\$ 1.867.231,00		\$ 1,00	\$ 1.867.231,00	1,00	\$ 1.867.231,00	0,00	\$ 0	1,00	\$ 1.867.231
4 NP-4	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 2" RDE 21	ML	0,00	\$ 176.776,00		\$ 20,35	\$ 3.597.392,00	28,00	\$ 4.949.728,00	-7,65	-\$ 1.352.336	20,35	\$ 3.597.392
4 NP-5	ANCLAJE DE SOPORTE EN CONCRETO 3000 PSI PARA BOMBAS	UND	0,00	\$ 330.000,00		\$ 1,00	\$ 330.000,00	3,12	\$ 1.029.600,00	-2,12	-\$ 699.600	1,00	\$ 330.000
4 NP- 6	PRUEBA DE PRESION SISTEMA DE BOMBEO PRE ENSAMBLADO	UND	0,00	\$ 981.622,40		\$ -	\$ -	1,00	\$ 981.622,00	-1,00	-\$ 981.622		\$ 0
4 NP- 7	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 4 PULGADAS PVC RDE 21	ML	0,00	\$ 136.526,40		\$ 15,00	\$ 2.047.896,00	3,50	\$ 477.842,00	11,50	\$ 1.570.054	15,00	\$ 2.047.896
4 NP- 8	SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 1/2 PULGADAS PVC RDE 9	ML	0,00	\$ 35.979,00		\$ 26,01	\$ 935.814,00	24,00	\$ 863.496,00	2,01	\$ 72.318	26,01	\$ 935.814

Camila Ramirez
Javier Martillo



						ALCALDÍA DE POPAYÁN OFICINA ASESORA JURÍDICA ACTA DE PAGO No. 07								
OBJETO: "LOTE 1: CONSTRUCCIÓN DE DISIPADOR DE ENERGÍA Y DESCOLE FINAL RED SANITARIA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN" - "LOTE 2: SUMINISTRO E INSTALACION PLANTA ELECTRICA EN LA CIUDAD DE POPAYÁN".										CRONOLOGIA DEL CONTRATO				ACTA PARCIAL No. 7 Y FINAL PERIODO: 30/10/2024-19/12/2024
VALOR CONTRATO INICIAL:						\$		733.648.671,00		ACTA DE INICIO:		01-12-2023		
VALOR ADICIONAL:						\$		297.240.090,00		FECHA DE VENCIMIENTO INICIAL:		31/12/2023		
VALOR TOTAL:						\$		1.030.888.761,00		Acta de suspension No.1 :		28/12/2023		
DISP. PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.4741										Acta de Reinicio No.1 :		19/03/2024		
DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2023.CEN.01.4740										Prorroga No.1 : (3 MESES)		19/03/2024		
DISP. PRESUPUESTAL Nos. :2024.CEN.01.3899										Prorroga No.2: (1 MES)		20/06/2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.8322										Prorroga No.3 (2 MESES Y ADICIONAL DE 297.240.090)		19/07/2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2023.CEN.01.8323										PRORROGA No.4(90 DIAS CALENDARIO)		19/09/2024		
REGISTRO PRESUPUESTAL Nos. : 2024.CEN.01.04060										FECHA DE TERMINACION		19/12/2024		
FECHA:19 DE DICIEMBRE DE 2024														
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA														
CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. 20231800032467 DEL 2023														
CONTRATISTA DE OBRA:		CONSTRUCTORA ALPON SAS REP. L. JUAN CAMILO ALEGRÍA PONCE												
SUPERVISIÓN:		CARLOS FERNANDO CASTRO FRANCO												
CONDICIONES ORIGINALES						CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION No.7		ACUMULADO ACTAS ANTERIORES		OBRA EJECUTADA		OBRA EJECUTADA		
										ACTA 7		ACTA 7		
ITEM	DESCRIPCION DE LA OBRA	UND.	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR TOTAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	
4 NP- 9	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE CIERRE 2 PULG. HD INCLUYE ANCLAJE	UND	0,00	\$ 968.980,88		\$ 1,00	\$ 968.981,00	1,00	\$ 968.981,00	0,00	\$ 0	1,00	\$ 968.981	
4 NP- 10	SUMINISTRO E INSTALACION DE VALVULA DE REDUCCION 4 X2 PULG. HD	UND	0,00	\$ 966.861,88		\$ 1,00	\$ 966.862,00	1,00	\$ 966.862,00	0,00	\$ 0	1,00	\$ 966.862	
4 NP- 11	SUMINISTRO E INSTALACION DE ACOMETIDA ELECTRICA SISTEMA DE BOMBAS -TABLERO GENERAL	ML	0,00	\$ 296.632,0		\$ 55,00	\$ 16.314.760,00	55,00	\$ 16.314.760,00	0,00	\$ 0	55,00	\$ 16.314.760	
4 NP- 12	SUMINISTRO E INSTALACION DE SISTEMA DE PRESION CONSTANTE / 3,0 HP Q = 3,5 LPS H= 35M 110V/220V INCLUYE TABLERO DE CONTROL, TANQUE HIDROACUMULADOR 60-100GLN. INCLUYE TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU INSTALACION Y PRUEBA DE PRESION	UND	0,00	\$ 25.704.121,0		\$ 1,00	\$ 25.704.121,00			1,00	\$ 25.704.121	1,00	\$ 25.704.121	
COSTO DIRECTO OBRA CIVIL SISTEMA DE BOMBEO					\$		\$ 77.458.858,00		\$ 77.458.858,00	\$	2.308.086,80		\$ 77.458.858,00	
AJUSE POR APROXIMACION							\$ -167							
COSTO DIRECTO					\$ 555.794.448,00		\$ 780.976.334		\$ 699.093.159,00		\$ 81.883.049,00		\$ 780.976.208,00	
ADMINISTRACION 25%					\$ 138.948.612,00		\$ 195.244.083,00		\$ 174.773.290,00		\$ 20.470.762,00		\$ 195.244.052,00	
UTILIDAD 5%					\$ 27.789.722,00		\$ 39.048.617,00		\$ 34.954.658,00		\$ 4.094.152,00		\$ 39.048.810,00	
IMPREVISTOS 2%					\$ 11.115.889,00		\$ 15.619.527,00		\$ 13.981.864,00		\$ 1.637.661,00		\$ 15.619.524,00	
TOTAL COSTO INDIRECTO					\$ 177.854.223,00		\$ 249.912.427,00		\$ 223.709.812,00		\$ 26.202.575,00		\$ 249.912.387,00	
COSTO TOTAL					\$ 733.648.671		\$ 1.030.888.761		\$ 922.802.972		\$ 108.085.624		\$ 1.030.888.596,00	


Camila Ramirez

Juan María



Revisó: Ing Javier Montilla
Revisó: Ing. Camila ramirez
