



INFORME 5
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 748 DE 2024



Índice de Tablas

Tabla 1. Datos Generales del Contrato	11
Tabla 2. Datos Generales de interventoría.....	11
Tabla 3. Información segmentos viales objeto de intervención	12
Tabla 4. Datos punto de atención FDLRUU.	13
Tabla 5. Consultas ciudadanas.	13
Tabla 6. Recorridos Urbanos.....	14
Tabla 7. Reuniones de Inicio	15
Tabla 8. Reuniones de finalización.....	16
Tabla 9. Reuniones Extraordinarias.	17
Tabla 10. Comité de Participación.....	20
Tabla 11. Reuniones comités de participación.....	21
Tabla 12. Actas de Vecindad.....	22
Tabla 13. Actas de Cierre Vecindad.....	22
Tabla 14. Actas de Rampas.	22
Tabla 15. Actas de compromiso social.	23
Tabla 16. Registros Fotográficos PMT -	23
Tabla 17. Actas adecuación de bajantes.....	24
Tabla 18. Jornadas de Capacitación:	24
Tabla 19. Mano de Obra no Calificada.....	26
Tabla 20. Tramos abiertos con Vallas	27
Tabla 21. Volantes informativos.	28
Tabla 22. PSI.....	29
Tabla 23. Volantes informativos.	31



INFORME 5
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 748 DE 2024



Índice de Anexos

Anexo 1. Consultas ciudadanas	14
Anexo 2. Actas de reunión de inicio	16
Anexo 3. Actas de reunión extraordinaria.....	20
Anexo 4. Inscripción comité de participación.....	21
Anexo 5. Actas comité de participación.....	21
Anexo 6. Formato asistencia capacitación	25
Anexo 7. MONC.....	26
Anexo 8. Soportes distribución de volantes.....	29
Anexo 9. Soportes instalación PSI	30



INFORME 5
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 748 DE 2024



1. INTRODUCCIÓN.

Para el correcto desarrollo de las actividades constructivas, el contratista CONSORCIO VR RUU, planteó mediante la implementación del Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica aprobado previo al inicio de las obras de mantenimiento y rehabilitación de la malla vial, acciones que incentivan la participación de los ciudadanos en todos los procesos de mejoramiento de calidad de vida desarrollado en la ciudad, más específicamente en la localidad de Rafael Uribe y en los diferentes barrios en los que tendrán lugar las intervenciones.

Con base en lo anterior se describe a lo largo del documento las acciones ejecutadas en cumplimiento del PGS, construido según los lineamientos del anexo técnico del contrato cuyo objeto es "EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C" cuyo principal interés es mitigar los impactos y causar los mínimos traumatismos a la población residente en los ejes viales intervenidos, por tanto se crean escenarios para la comunicación donde la comunidad reconozca a las entidades intervinientes en el desarrollo del proyecto, dando trámite a sus solicitudes y obteniendo la resolución de sus quejas o reclamos.

2. OBJETIVOS

- Mitigar el impacto social causado por la ejecución de obras, a partir de la atención, acompañamiento e inclusión de la comunidad presente en el área de influencia directa del proyecto.
- Evidenciar las actividades desarrolladas por el equipo de gestión social para la mitigación de los impactos generados por las obras.
- Implementar el sistema de servicio a la ciudadanía y establecer canales de comunicación con la comunidad de las localidades del área de influencia del proyecto para suministrar información clara, veraz y oportuna, teniendo en cuenta las particularidades del territorio.
- Promover en los ciudadanos la importancia de la obra, sus beneficios, el buen uso y cuidado del medio ambiente con el fin de mejorar las condiciones de convivencia y seguridad, a través de las acciones y encuentros participativos enfocados a la cultura ciudadana.



INFORME 5
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 748 DE 2024



3. ALCANCE DEL DOCUMENTO

El presente documento dará cuenta de las acciones realizadas por el contratista entre el 1 y el 31 de agosto de 2025, dando cumplimiento al Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, construido para el desarrollo del proyecto 748 de 2024, suscrito entre el CONSORCIO VR RUU y el Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe.

4. ESTRUCTURA DEL INFORME

El Contratista VR RUU, ejecutor del contrato número 748 de 2024, se permite presentar por medio del presente documento las actividades desarrolladas por el equipo social durante el periodo comprendido entre el 1 y el 31 de agosto de 2025.

A continuación, se relacionan las actividades desarrolladas:

- Elaboración y distribución de piezas informativas para inicio de actividades sociales preliminares.
- Recorridos de obra para identificación de condiciones sociales en CIV a intervenir.
- Reuniones de inicio.
- Reuniones extraordinarias
- Atención a la comunidad.
- Socialización PMT
- Recorridos de obra.

5. GENERALIDADES DEL CONTRATO.

Tabla 1. Datos Generales del Contrato.

CONTRATISTA	CONSORCIO VR RUU
Objeto	"EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FÓRMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."
No del contrato	748 de 2024
Valor del contrato	\$ 6.117.748
Plazo de ejecución	Seis (6) meses
Fecha de inicio	25 de marzo de 2025.
Fecha de terminación	09 septiembre de 2025.
Representante legal	Ing. Farley Andrea Larrarte.

Tabla 2. Datos Generales de interventoría.

INTERVENTORIA	CONSORCIO INTER VIAS ARM 2024
Objeto:	REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE DERIVADO DEL CONTRATO DE CONSULTORÍA 281 DE 2019, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C.
No del contrato	745 de 2024
Valor inicial del contrato:	\$ 852.611.456
Duración (meses):	6 meses
Fecha de inicio	10 de marzo de 2025
Fecha de terminación	09 de septiembre de 2025
Representante Legal:	Ing. Juan Pablo Lemus

INFORME 5
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 748 DE 2024

6. LISTADO DE SEGMENTOS VIALES A INTERVENIR.

El proyecto se ubica en la ciudad de Bogotá D.C., en la localidad de Rafael Uribe, en la que se ubican los trece (13) segmentos viales priorizados al corte del presente informe. El alcance del proyecto está orientado a realizar las obras necesarias para la construcción de vías y espacio público de la localidad, así como la atención de emergencias y reparaciones que dé lugar según el desarrollo de las actividades constructivas.

A continuación, se presenta la información de los segmentos objeto de intervención:

Tabla 3. Información segmentos viales objeto de intervención

No.	CIV	ELEMENTO	PK	DIRECCIÓN			
				TRAMO	DESDE	HASTA	BARRIO
1	18003126	CALZADA	418315	KR 13 C BIS	CL 51 C SUR	CL 51 C BIS SUR	LA ESPERANZA
		ANDEN	418316				
		ANDEN	418314				
2	18003182	CALZADA	418401	CL 49B S	KR 13 B	Sin Establecer	LA ESPERANZA
		ANDEN	418400				
		ANDEN	418402				
3	18001971	CALZADA	419779	KR 13	CL 31 F S	CL 32 S	HOSPITAL SAN CARLOS
		ANDEN	419780				
		ANDEN	419778				
4	18005026	CALZADA	20002169	CR 5 P	CL 49 A BIS S.	CL 49 B S	MARRUECOS
5	18005042	CALZADA	20008545	CR 5 P	CL 49 B S	CL 49 B BIS S	MARRUECOS
6	18005057	CALZADA	20003169	CR 5 P	CL 49 B BIS S	CL 49 C S.	MARRUECOS
7	18000313	CALZADA	410973	CL 23 SUR	KR 24D BIS	KR 24F	CENTENARIO
8	18003163	CALZADA	20005253	KR 11	CL 36 A BIS SUR	CL 36 B SUR	PIJAOS
9	18003250	CALZADA		KR 10D	CL 36 A BIS SUR	CL 36 B SUR	PIJAOS
10	18002962	CALZADA	417962	CL 48A S	KR 12H	DG 46 S	MARCO FIDEL SUAREZ
		ANDEN	417963				
		ANDEN	417961				
11	18005161	CALZADA	421473	KR 5P	CL 49H S	DG 50 S	MOLINOS DEL SUR
		ANDEN	421472				
		ANDEN	421474				
ADICIÓN							
12	18005087	CALZADA	20008640	CL 49 B S	CR 5 P	CR 5 N	MARRUECOS
13	18005094	CALZADA	20004100	CL 49 B BIS S	CR 5 P	CR 5 N	MARRUECOS
14	18003049	CALZADA	91030552	TV 13G BIS	DG 46 SUR	DG 49A BIS SUR	MARCO FIDEL SUAREZ

7. PLAN DIALOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.

7.1. LINEA ESTRATEGICA DEL DIALOGO CIUDADANO.

7.1.1. Programa de servicio a la ciudadanía

A través de este programa el CONSORCIO VR RUU realizará todas las actividades necesarias para la atención eficiente y eficaz las cuales se describen a continuación.

7.1.1.1. Punto PAC

El CONSORCIO CONSERVACIÓN VR RUU, ubicó el punto de atención a la comunidad en el barrio Santa Lucía, en la nomenclatura relacionada en la tabla número 4, cumpliendo con las condiciones necesarias relacionadas en el Plan de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica.

A continuación, se presenta el cuadro resumen de las especificaciones en relación al punto de atención a la comunidad:


Tabla 4. Datos punto de atención FDLRUU.

PUNTO DE ATENCIÓN A LA COMUNIDAD - FDLRUU	
Nombre del profesional social	MARTHA CORAL
Horario de atención	Lunes, miércoles y jueves de 7:00 am a 12:00 m.
Dirección	Transversal 19 # 47 A- 52 sur
Teléfono	3112769552
Correo electrónico	pac.cto748conservacionruu@gmail.com


Durante el periodo correspondiente a este informe se no se realizó apertura a consultas ciudadanas, en el periodo correspondiente se realizó el cierre de una (1) consulta la cual se relaciona en el siguiente cuadro.

Tabla 5. Consultas ciudadanas.

ITEM	BARRIO	CIV	PREDIO	FECHA	NOMBRE	TELEFONO	CONCEPTO	ESTADO DEL REQUERIMIENTO
1	MOLINOS DEL SUR	18005161	KR 5P # 49 H 55 SUR	9-jul-25	JUDY REINA	3125353193	Afectación en cableado parabólica.	CERRADA 23/08/2025

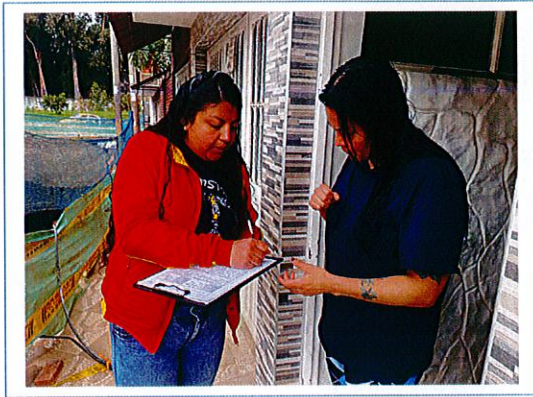

Registro Fotográfico 2. Cierre de Consulta ciudadana Barrio Molinos.

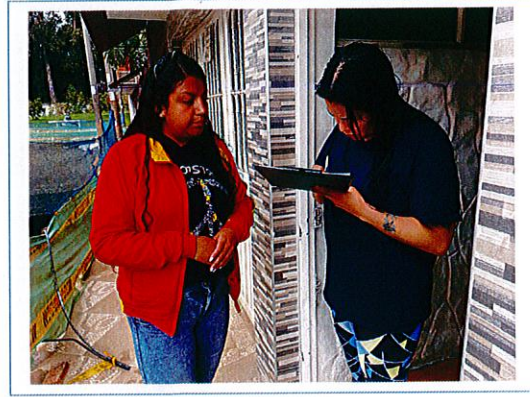

Registro Fotográfico 1. Cierre de Consulta ciudadana Barrio Molinos.

- **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, Consultas ciudadanas cerradas en el mes} * 100}{\text{Total, Consultas ciudadanas abiertas en el mes}} = \frac{1}{1} = 100 \%$$

Anexo 1. Consultas ciudadanas

7.1.1.1.1. Recorridos Urbanos.

El área de gestión social, durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe realizó recorridos de reconocimiento a los segmentos viales objeto de intervención, de manera conjunta entre las partes interesadas (FDLRUU, interventoría y contratista), identificando condiciones o aspectos prioritarios durante la etapa de ejecución.

Tabla 6. Recorridos Urbanos.

RECORRIDOS URBANOS			
Fecha	CIV	Barrio	Objetivo
08/08/2025	18002962	MARCO FIDEL SUÁREZ	Reconocimiento de avance de obra e inquietudes de la comunidad.
13/08/2025	18005161	MOLINOS DEL SUR	Reconocimiento de avance de obra e inquietudes de la comunidad.
11/08/2025	18005026 - 18005042 - 18005057	MARRUECOS	Reconocimiento de avance de obra e inquietudes de la comunidad.
14/08/2025	18000313	CENTENARIO	Reconocimiento de avance de obra e inquietudes de la comunidad.

INFORME 5
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 748 DE 2024

13/08/2025	18003126-18003182	LA ESPERANZA	Reconocimiento de avance de obra e inquietudes de la comunidad.
14/08/2025	18003163	PIJAOS	Reconocimiento de avance de obra e inquietudes de la comunidad.
5/08/2025	18001971	HOSPITAL SAN CARLOS	Reconocimiento de avance de obra e inquietudes de la comunidad.

7.1.1.1.2. Atención a veedurías ciudadanas.

Durante el periodo correspondiente a este informe, no se realizaron actividades correspondientes a estos ítems.

7.1.1.2. Programa de Dialogo y Participación Ciudadana

Este programa es parte de la línea estratégica de Diálogo Ciudadano. También forma parte de los objetivos de mitigación, apropiación y sostenibilidad del apéndice de gestión del Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica para el Desarrollo Urbano.

7.1.1.2.1. Reuniones participativas.

Durante el periodo correspondiente a este informe, no se realizaron actividades correspondientes a estos ítems.

7.1.1.2.2. Reuniones virtuales y semipresenciales.

Durante el periodo correspondiente a este informe, no se realizaron actividades correspondientes a este ítem.


7.1.1.2.3. Reuniones de inicio.

Durante el periodo correspondiente a este informe, se realizó una (1) reunión de inicio, la cual se relaciona en el siguiente cuadro:


Tabla 7. Reuniones de Inicio

Acta No.	CIV	BARRIO	TRAMO	FECHA DE EJECUCIÓN	PARTICIPANTES
1	18001971	HOSPITAL SAN CARLOS	KR 13 ENTRE, CL 31F Y CL 32 SUR	31-jul-25	18

Nota: En el cuadro anterior se relacionan actividades ejecutadas en el mes de julio de 2025, teniendo en cuenta las fechas de corte acordados con interventoría para la presentación de informes mensuales.

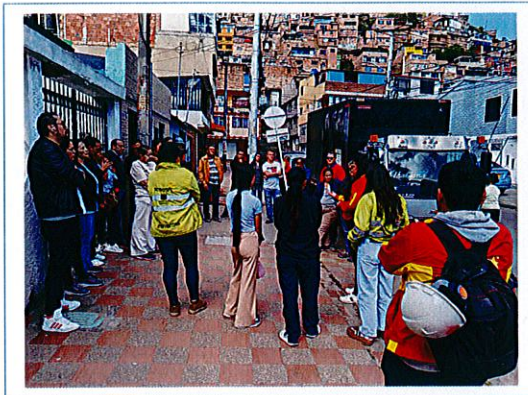

Registro Fotográfico 3. Reunión de inicio frente de obra Hospital san Carlos.

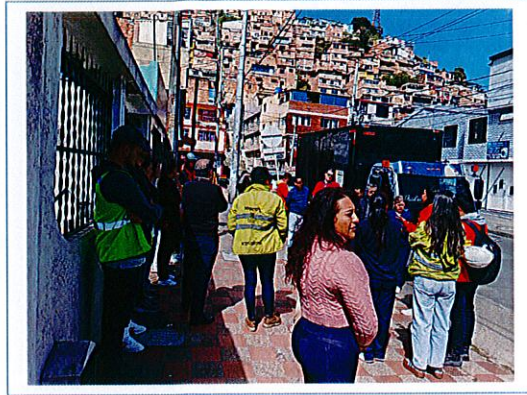

Registro Fotográfico 4. Reunión de inicio frente de obra Hospital san Carlos.

- **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, reuniones de inicio realizadas en el mes} * 100}{\text{Total, reuniones de inicio programadas en el mes}} = \frac{1}{1} = 100\%$$

Anexo 2. Actas de reunión de inicio

7.1.1.2.4. Reuniones de finalización

Durante el periodo correspondiente a este informe, no se realizaron actividades de cumplimiento a este ítem, por lo que no se registra información en el siguiente cuadro.

Tabla 8. Reuniones de finalización

Ítem	CIV	BARRIO	TRAMO	FECHA DE EJECUCIÓN	PARTICIPANTES
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, reuniones de inicio realizadas en el mes} * 100}{\text{Total, reuniones de inicio programadas en el mes}} = \frac{N/A}{N/A} = N/A\%$$

7.1.1.2.5. Reuniones extraordinarias

Durante el periodo correspondiente a este informe se llevaron a cabo treinta y dos (32) reuniones extraordinarias, las cuales se relacionan a continuación:



CONSORCIO VR RUU

**INFORME 5
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 748 DE 2024**



Tabla 9. Reuniones Extraordinarias.

Ítem	CIV	BARRIO	DIRECCIÓN	FECHA	PART.	DESCRIPCIÓN
1	18002962	MARCO FIDEL SUAREZ	CL 48 A SUR # 12H 26	24-jul-2025	2	Seguimiento por daño de domiciliaria de GAS, hecho en ejecución del contrato.
2	18002962	MARCO FIDEL SUAREZ	CL 48 A SUR # 12H 26	24-jul-2025	2	Acuerdo de pago por daños y afectaciones.
3	18003126-18003182	LA ESPERANZA	CL 49B SUR # 13 A 07	25-jul-2025	2	Atención a solicitud referente a instalación de contadores EAAB-ESP
4	18003126-18003182	LA ESPERANZA	CL 49B SUR # 13 A 20	25-jul-2025	2	Atención a solicitud de daño en vidrio en fachada en ocasión de las obras.
5	18003126-18003182	LA ESPERANZA	CL 49B SUR # 13 A 32	25-jul-2025	2	Soporte de entrega de medidor ESP a propietario.
6	18005161	MOLINOS DEL SUR	KR 5P # 49H 61	25-jul-2025	2	Atención a incidente por caída en sendero peatonal.
7	18002962	MARCO FIDEL SUAREZ	CL 48 A SUR # 12H 20	25-jul-2025	2	Recepción de documentos referente a reparaciones hechas por la propietaria.
8	18005026-18005042-18005057	MARRUECOS	CL 49 C SUR # 5P 14	28-jul-25	2	Seguimiento a inconformidad por actividades de acopio en el frente de obra.
9	18000313	CENTENARIO	CL 23 SUR # 24D 32	29-jul-25	2	Evidencia de autorización para ubicación de carpa en EP.
10	18002962	MARCO FIDEL SUAREZ	CL 48 A SUR # 12H 26	29-jul-25	2	Seguimiento a arreglo de domiciliaria de GAS, realizado por el contratista.
11	18003126-18003182	LA ESPERANZA	KR 13 B # 49 B 21 SUR	29-jul-25	4	Atención de solicitud de paso de vehículo, propiedad de un residente en el tramo de intervención.
12	18003126-18003182	LA ESPERANZA	KR 13 # 49B 34	29-jul-25	3	Evidencia de autorización para ubicación de carpa en EP y acopio de material.
13	18003163	PIJAOS	KR 11 # 36A 40	30-jul-25	2	Evidencia de compromiso de reparación de bajante en predio, afectado por actividades constructivas en obra.
14	18002962	MARCO FIDEL SUAREZ	CL 48 A SUR # 12H 26	1-ago-25	2	Seguimiento a arreglo de domiciliaria de GAS, realizado por el contratista (cambio de válvula)
15	18003163	PIJAOS	KR 11 # 36A 57	1-ago-25	2	Recepción de solicitud de construcción de rampa en predio, sustentada por residente en condición de discapacidad.
16	18003163	PIJAOS	KR 11 # 36A 52	1-ago-25	2	Recepción de solicitud de construcción de rampa en predio, sustentada por residente en condición de discapacidad.
17	18003163	PIJAOS	KR 11 # 36A 64	1-ago-25	2	Recepción de solicitud de construcción de rampa en predio, sustentada por residente en condición de discapacidad.
18	18003163	PIJAOS	KR 11 # 36A 70	1-ago-25	2	Evidencia de autorización para ubicación de carpa en EP.

INFORME 5
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 748 DE 2024


19	18003126-18003182	LA ESPERANZA	49 B SUR # 13 A 20	6-ago-25	2	Seguimiento a solicitud de reinstalación de medidor EAAB-ESP, por visitas hechas por a la entidad al predio.
20	18003126-18003182	LA ESPERANZA	49 B SUR # 13 20	6-ago-25	5	Constancia de información acerca de la autorización de construcción de rampa en predio.
21	18005057	MARRUECOS	CL 49C SUR # 5P 02	11-ago-25	2	Recepción de solicitud de atención de afectación hecha en cajilla de medidor.
22	18003163	PIJAOS	KR 11 # 36 A 57	11 -ago-25	2	Constancia de solicitud de documentación al propietario para tramitar la autorización de construcción de rampa.
23	18003126-18003182	LA ESPERANZA	CL 49B SUR ENTRE KR 13C Y 13A CALLE CERRADA	13-ago-25	10	Socialización a residentes de los segmentos viales en intervención a fin de informar el nuevo alcance de las actividades constructivas autorizadas por el FDLRUU
24	18001971	HOSPITAL SAN CARLOS	KR 13 BIS A # 31D 10 SUR	14-ago-25	2	Información a la comunidad sobre zonas de trabajo autorizadas por el PMT.
25	18003163	PIJAOS	KR 11 # 36A 46	14-ago-25	2	Solicitud al residente del predio para adelantar tramite de solicitud de reubicación de medidor.
26	18000313	CENTENARIO	CL 23 SUR # 24D 56	14-agot-25	2	Seguimiento a reporte de corte de servicio de agua, se confirma que este hecho no es atribuible al contratista. Socialización a residente acerca de cierres viales autorizados en ocasión de las obras.
27	18003126	LA ESPERANZA	KR 13B # 49B 21	16-ago-2025	2	
28	18005161	MOLINOS DEL SUR	KR 5P # 49H 45	19-ago-2025	2	Se realiza atención al seguimiento de persona con movilidad reducida.
29	18005161	MOLINOS DEL SUR	KR 5P # 49H 48	19-ago-2025	2	Seguimiento del área social al incidente de caída en sendero peatonal.
30	18005161	MOLINOS DEL SUR	KR 5P # 49H 48	19-ago-2025	3	Seguimiento por daño de cableado que suministra servicios de TV.
31	18003126	LA ESPERANZA	CL 49B SUR # 13B 05	19-ago-2025	2	Solicitud de apoyo a la JAC, para la socialización de retiro de vehículos del CIV a intervenir.
32	18003126	LA ESPERANZA	KR 13B # 49B 21	20-ago-2025	2	Socialización de cierre de vía, para ejecución de actividades de conservación del eje vial.

Nota: En el cuadro anterior se relacionan actividades ejecutadas en el mes de julio de 2025, teniendo en cuenta las fechas de corte acordados con interventoría para la presentación de informes mensuales.


- Indicador de cumplimiento:

INDICADOR EFICIENCIA


$$\frac{\text{Total, reuniones extraordinarias realizadas en el mes} * 100}{\text{Total, reuniones extraordinarias el contrato}} = \frac{32}{32} = 100\%$$

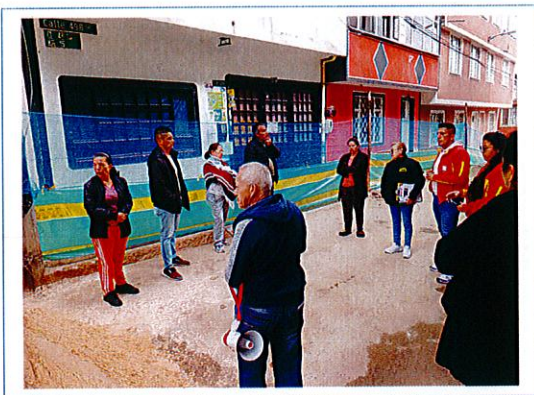


Registro Fotográfico 5. Reunión extraordinaria Frente de Obra La Esperanza.

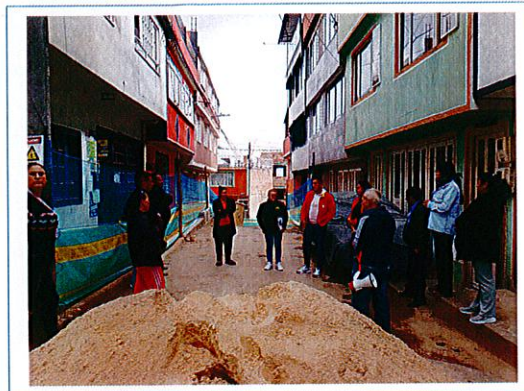

Registro Fotográfico 6. Reunión extraordinaria Frente de Obra La Esperanza.

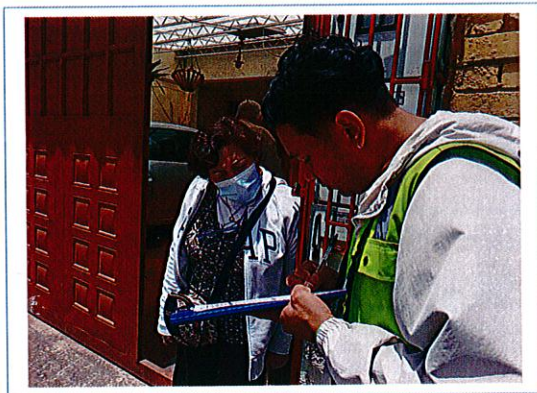


Registro Fotográfico 8. Reunión extraordinaria Frente de Obra Hospital san Carlos.

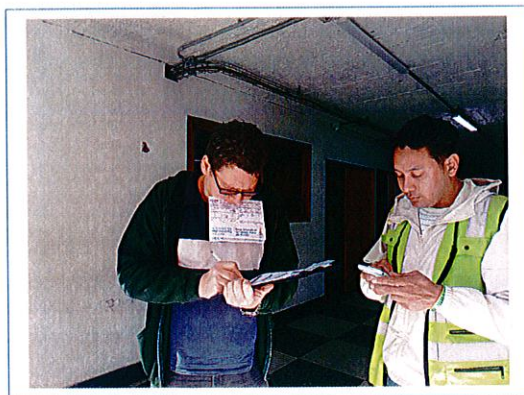

Registro Fotográfico 7. Reunión extraordinaria Frente de Obra Centenario.



Registro Fotográfico 10. Reunión extraordinaria Frente de Obra Pijaos

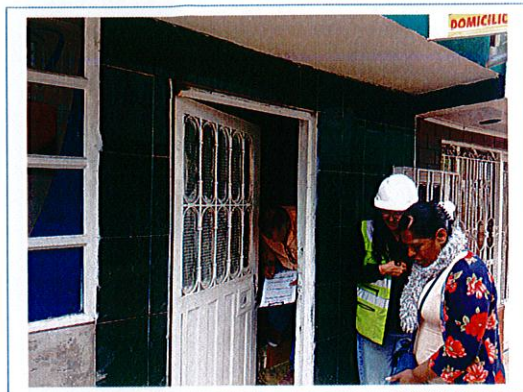

Registro Fotográfico 9. Reunión extraordinaria Frente de Obra Marruecos.

Anexo 3. Actas de reunión extraordinaria.

7.1.1.2.6. Reuniones con comerciantes, empresarios, industriales y servicios.

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, no se realizaron actividades correspondientes a este ítem, dado que el contrato se encuentra en preliminares, la evidencia de estas acciones se verá reflejada en los próximos informes.

7.1.1.2.7. Comité de Participación Ciudadana.

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe se realizó una (1) reunión de inicio, en las que se conformó un comité de participación, el cual se relaciona a continuación:

Tabla 10. Comité de Participación

COMITÉ COD.	CIV	BARRIO	NOMBRES	TELEFONO	FECHA DE CONFORMACIÓN	PARTICIPANTES
07	18001971	HOSPITAL SAN CARLOS	Nataly Herrera	3107559395	31-jul-2025	5
			Jackelin Castillo	3142423743	31-jul-2025	
			Guillermo Uach	3108595078	31-jul-2025	
			Heymer Hernández	3135777527	31-jul-2025	
			Hildebrando Parra	3102729639	31-jul-2025	

Nota: En el cuadro anterior se relacionan actividades ejecutadas en el mes de julio de 2025, teniendo en cuenta las fechas de corte acordados con interventoría para la presentación de informes mensuales.

- **Indicador de cumplimiento:**

INFORME 5
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 748 DE 2024

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, comités de participación conformados en el mes} * 100}{\text{Total, comités de participación proyectados en el mes}} = \frac{01}{01} = 100\%$$

Anexo 4. Inscripción comité de participación

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, se generaron tres (3) reuniones con comités de participación, las cuales se relacionan a continuación en el siguiente cuadro.

Tabla 11. Reuniones comités de participación

Ítem	CIV	BARRIO	TRAMO	FECHA DE EJECUCIÓN	PARTICIPANTES
1	18000313	CENTENARIO	CL 23 SUR DESDE KR 24D BIS HASTA KR 24F	12-ago-25	4
2	18005161	MOLINOS DEL SUR	KR 5P DESDE CL 49 H Y DG 50 SUR	12-ago-25	13
3	18003163- 18003250	PIJAOS	KR 11 ENTRE CL 36 A BIS Y CL 36B SUR- KR 10D ENTRE CL 36 A BIS Y CL 36B SUR	13-ago-25	18

• **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, reuniones comités de participación en el mes} * 100}{\text{Total, reuniones comités de participación proyectados en el mes}} = \frac{3}{3} = 100\%$$

Anexo 5. Actas comité de participación.

7.1.1.3. Programa acompañamiento actividades técnicas

Teniendo en cuenta que existen varias actividades que son responsabilidad del área técnica, las cuales requieren contacto directo con la comunidad, se hace necesaria la intervención de los profesionales sociales para el diálogo ciudadano y comunicación estratégica para las siguientes actividades:

- Actas de vecindad
- Actas de rampas y acceso vehicular a predios (garajes)
- Información por suspensión de acceso a garajes
- Actas de compromiso
- Registro filmico y/o fotográfico de andenes, fachadas y vías de desvío si se requiere.

7.1.1.3.1. Actas de vecindad:

INFORME 5
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 748 DE 2024

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, no se realizó el levantamiento de las actas de vecindad, por lo tanto, no se relaciona esta actividad.

Tabla 12. Actas de Vecindad.

ITEM	CIV	BARRIO	TRAMO	# DE ACTAS DE VECINDAD	FECHA DE REALIZACIÓN (DESDE)	FECHA DE REALIZACIÓN (HASTA)
1	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

• **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, actas de vecindad realizadas en el mes} * 100}{\text{Total, actas de vecindad programadas en el mes}} = \frac{N/A}{N/A} = N/A\%$$

7.1.1.3.2. Actas de vecindad de cierre:

Durante el periodo correspondiente a este informe, se realizaron 13 cierres de actas de vecindad, las cuales se relacionan a continuación en el siguiente cuadro.

Tabla 13. Actas de Cierre Vecindad.

ITEM	CIV	BARRIO	TRAMO	# DE ACTAS DE VECINDAD	FECHA DE REALIZACIÓN (DESDE)	FECHA DE REALIZACIÓN (HASTA)
1	18002962	MARCO FIDEL SUAREZ	CL 48 A SUR ENTRE, KR 12H Y DG 46	13	30-jul-25	30-jul-25

• **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, actas de vecindad realizadas en el mes} * 100}{\text{Total, actas de vecindad programadas en el mes}} = \frac{13}{13} = 100\%$$

Anexo 6. Actas de vecindad de cierre

7.1.1.3.3. Actas de rampas y acceso vehicular a predios (garajes):

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe no se realizaron actividad correspondiente a este ítem, por lo tanto, no se relaciona en el siguiente cuadro.

Tabla 14. Actas de Rampas.

ITEM	CIV	BARRIO	DIRECCION	FECHA DE REALIZACIÓN
1	N/A	N/A	N/A	N/A



INFORME 5
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 748 DE 2024



- **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, actas de rampas levantadas en el mes} * 100}{\text{Total, actas de rampa proyectados en el mes}} = \frac{N/A}{N/A} = N/A\%$$

7.1.1.3.4. Actas de compromiso

Durante el periodo correspondiente a este informe, no se realizó actividad correspondiente a este ítem, por lo tanto, no se relaciona información en el siguiente cuadro.

Tabla 15. Actas de compromiso social.

ITEM	CIV	BARRIO	DIRECCION	FECHA DE REALIZACIÓN
1	N/A	N/A	N/A	N/A

- **Indicador de cumplimiento:**

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, actas de rampas levantadas en el mes} * 100}{\text{Total, actas de rampa proyectados en el mes}} = \frac{N/A}{N/A} = N/A\%$$

7.1.1.3.5. Levantamiento de registro filmico y/o fotográfico de las vías que serán empleadas como desvíos.

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, no se realizaron actividades de cumplimiento a este ítem, por lo que no se relaciona información en el siguiente cuadro.

Tabla 16. Registros Fotográficos PMT -

RECORRIDOS URBANOS			
Fecha	CIV	Barrio	Observaciones
N/A	N/A	N/A	N/A

Los soportes de esta actividad reposan en las oficinas administrativas del Consorcio y se encuentran a disposición y consulta de la interventoría y Fondo de Desarrollo Local de Rafael Uribe Uribe.

7.1.1.3.6. Adecuación de bajantes

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, no se realizaron actividades correspondientes a este ítem, por lo tanto, no se relacionan en el siguiente cuadro:



CONSORCIO VR RUU

**INFORME 5
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 748 DE 2024**



Tabla 17. Actas adecuación de bajantes.

ITEM	CIV	BARRIO	DIRECCION	FECHA DE REALIZACIÓN
1	N/A	N/A	N/A	N/A

- Indicador de cumplimiento:**

$$\frac{\text{Total, actas de bajantes levantadas en el mes} * 100}{\text{Total, actas de bajantes proyectados en el mes}} = \frac{N/A}{N/A} = N/A\%$$

7.1.1.4. Programa de cultura ciudadana.

Durante el periodo correspondiente a este informe, no se realizaron actividades correspondientes a este ítem, dado que el contrato se encuentra en etapa de estudios y diseños, el avance de estas actividades se verá reflejado en los próximos informes.

7.1.1.4.1. Formación en cultura ciudadana y desarrollo urbano

El Contratista CONSORCIO VR RUU, realizará un (1) proceso formativo en Cultura Ciudadana y Desarrollo Urbano, que será previamente aprobado por la Interventoría y aceptado por el FDLRUU, a través de talleres que promueven en los ciudadanos la importancia de los proyectos urbanos y sus beneficios en un contexto de ciudad, el buen uso y cuidado del medio ambiente, motivar el buen comportamiento de los actores viales, cuidado del entorno, sentido y valor de lo público, entre otros temas que contribuyan a la sostenibilidad de las obras.

7.1.1.4.2. Acciones de formación a empleados de obra.


Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, el equipo social del contrato realizó la ejecución de una capacitación al equipo del contratista.

Tabla 18. Jornadas de Capacitación:

ITEM	FECHA	TEMATICA	NUMERO DE PARTICIPANTES
1	15/08/2025	Salud sexual y reproductiva	4

- Indicador de cumplimiento:**

$$\frac{\text{Total, capacitaciones adelantadas en el mes} * 100}{\text{Total, capacitaciones proyectadas en el mes}} = \frac{1}{1} = 100\%$$

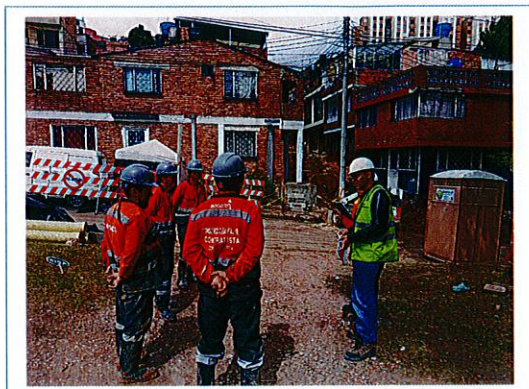

Registro Fotográfico 11. Capacitación a personal de Obra.

Anexo 7. Formato asistencia capacitación

7.1.1.4.3. Acciones académicas y articulación con el sector educativo.

Durante la ejecución del periodo correspondiente, a este informe no se realizaron actividades correspondientes a este ítem, dado que el contrato se encuentra en etapa de estudios y diseños, el avance de estas actividades se verá reflejado en los próximos informes.

7.1.1.5. Programa de gobernanza para la movilidad

Con el desarrollo del programa se estima un proceso de coordinación interinstitucional, con el cual se favorezca la puesta en marcha de todas las acciones de diálogo ciudadano y comunicación estratégica durante el desarrollo del contrato, las cuales contarán con el acompañamiento permanente del FDLRUU y la interventoría al contratista. Es importante precisar que la ejecución del programa será permanente, toda vez que las acciones a desarrollar son de corto, mediano y largo plazo.

7.1.1.5.1. Sector Salud.

Durante la ejecución del periodo correspondiente, no se realizaron actividades correspondientes a este ítem.

7.1.1.5.2. Sector Educativo.

Durante la ejecución del periodo correspondiente, no se realizaron actividades correspondientes a este ítem.

7.1.1.5.3. Sector desarrollo económico.

La coordinación con este sector está encausada en dos (2) grupos a saber: comerciantes o empresarios del sector y vinculación de mano de obra.

- **Comerciantes o empresarios del sector.**

Durante la ejecución del periodo correspondiente, no se realizaron actividades correspondientes a este ítem.

- **Vinculación de mano de obra.**

Mano de Obra no calificada y población vulnerable.

Con el fin de dar cumplimiento al Decreto Distrital 380 del 2015, "Por el cual se formula la Política de Trabajo Decente y Digno de Bogotá, D.C., y se dictan otras disposiciones", el FDLRUU busca generar oportunidades laborales para un porcentaje de la población que conlleve al mejoramiento de las condiciones socio-económicas y, por ende, al mejoramiento de su calidad de vida.

Mano de Obra no calificada de la Localidad.

Durante el periodo correspondiente a este informe, el área de gestión social se encuentra haciendo la convocatoria de MONC, por lo cual el cumplimiento de este ítem se verá reflejada en los siguientes informes.

Tabla 19. Mano de Obra no Calificada.

INFORME	TOTAL CONTRATACIÓN MES	SEXO		% CUMPLIMIENTO CONTRATACIÓN MUJER	TIPO VINCULACIÓN		MANO DE OBRA CALIFICADA	MANO DE OBRA NO CALIFICADA	MONC DE LA LOCALIDAD	% CUMPLIMIENTO MONC LOC	ESTRATO 1/2	JOVENES 18 A 28 AÑOS	ADULTO MAYOR
		F	M		DIRECTO	INDIRECTO							
5	69	12	54	22%	36	30	30	36	6	17%	60	14	1

Nota: La contratista continua con la implementación de estrategias para la convocatoria de contratación de MONC

Anexo 8. MONC

7.1.1.5.4. Manejo de servicios públicos.

El CONSORCIO VR RUU desde el área de gestión social del contrato, se encuentra atento a acompañar los procesos de coordinación, articulación e implementación de las acciones con las empresas públicas, relacionados con la alteración de las actividades cotidianas asociadas al desarrollo del proyecto, respecto a la prestación de servicios públicos.

Durante le ejecución del periodo correspondiente, no se realizaron actividades correspondientes a este ítem.

7.1.1.5.5. Sector Movilidad.

Las acciones para desarrollar con el sector Movilidad están relacionadas con todas las acciones necesarias para los procesos de socialización del Plan de Manejo de Tráfico PMT para cada uno de los tramos a intervenir. Por consiguiente, el CONSORCIO VR RUU garantizará que se informe de manera oportuna a la comunidad afectada por los cambios en el PMT.

Durante la ejecución del periodo correspondiente, no se realizaron actividades correspondientes a este ítem.

7.2. LINEA ESTRATEGICA DE COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA.

7.2.1. Programa de información para el desarrollo del proyecto.

Este programa hace parte de la línea de comunicación estratégica y se enfoca en cumplir las expectativas relacionadas con el suministro de información, así como la socialización del proyecto a los ciudadanos y ciudadanas residentes en el área de influencia directa e indirecta del proyecto.

7.2.1.1.1. Divulgación del proyecto en el área de influencia directa y aferente.

- **Vallas móviles:**

El CONSORCIO VR RUU cuenta con vallas móviles disponibles e instaladas en los frentes de obra en ejecución. Este elemento de divulgación se encuentra ubicado en un punto estratégico de cada CIV en obra, en la que se visualiza la información acerca del contrato.


A continuación, se relaciona los frentes de obra abiertos a la fecha de corte del presente informe, los cuales cuentan con valla móvil.

Tabla 20. Tramos abiertos con Vallas

CONTROL SEGMENTOS ABIERTOS CON VALLA MÓVIL			
ITEM	CIV	BARRIO	OBSERVACIONES
1	18002962	MARCO FIDEL SUÁREZ	Instalación de valla móvil en frente de obra abierto.
2	18005161	MOLINOS DEL SUR	Instalación de valla móvil en frente de obra abierto.
3	18005026-18005042-18005057	MARRUECOS	Instalación de valla móvil en frente de obra abierto.
4	18000313	CENTENARIO	Instalación de valla móvil en frente de obra abierto.
5	18003126-18003182	LA ESPERANZA	Instalación de valla móvil en frente de obra abierto.

INFORME 5 PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA CONTRATO 748 DE 2024

6	18003163	PIJAOS	Instalación de valla móvil en frente de obra abierto.
7	18001971	HOSPITAL SAN CARLOS	Instalación de valla móvil en frente de obra abierto.

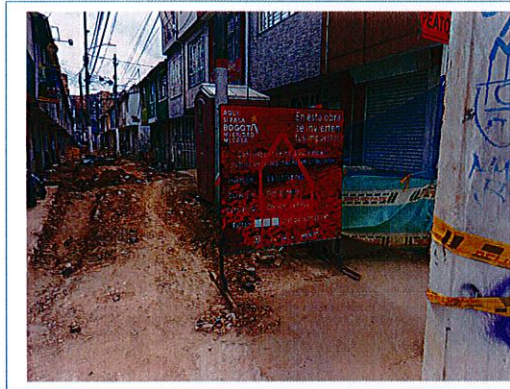

Registro Fotográfico 12. Valla de obra Marruecos.



Registro Fotográfico 13. Valla de obra Centenario

• Volantes informativos:

Durante el periodo correspondiente a este informe, se realizó la distribución de piezas informativas en los siguientes tramos, los cuales buscaron socializar a la comunidad acerca de las actividades preliminares del área social:


Tabla 21. Volantes informativos.

Cod Volante	BARRIO	CIV	TEMA	FECHA DE DISTRIBUCIÓN	TOTAL, DISTRIBUIDOS
45	HOSPITAL SAN CARLOS	18001971	Convocatoria a reunión de inicio	29-jul-25	21
46	PIJAOS	18003163	Volante de inicio de obra	29-jul-25	18
48	PIJAOS	18003250	Volante de inicio de obra	29-jul-25	16
	MARCO FIDEL SUAREZ	18002962	Plegable de sostenibilidad	30-jul-25	14
50	HOSPITAL SAN CARLOS	18001971	Volante de inicio de obra	1-ago-25	24
52	CENTENARIO	18000313	Convocatoria comité participación	11-ago-25	3
53	MOLINOS DEL SUR	18005161	Convocatoria comité participación	11-ago-25	8
54	PIJAOS	18003163-18003250	Convocatoria comité participación	11-ago-25	34


INFORME 5
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 748 DE 2024

55	LA ESPERANZA	18003126- 18003182	Convocatoria reunión Extraordinaria	14-ago-25	24
56	LA ESPERANZA	18003126	Volante de inicio	16-ago-25	10
58	MARRUECOS	18005087	Volante actas de vecindad 1 visita	20-ago-25	49
TOTAL					221

Nota: Se mencionan fechas del mes de julio, incluyendo actividades que se ejecutaron dentro del periodo anterior, los cuales no fueron incluidos en el informe previo.

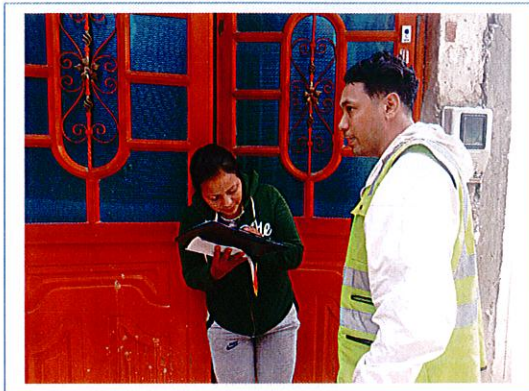

Registro Fotográfico 14. Entrega de volante frente de obra la Esperanza.

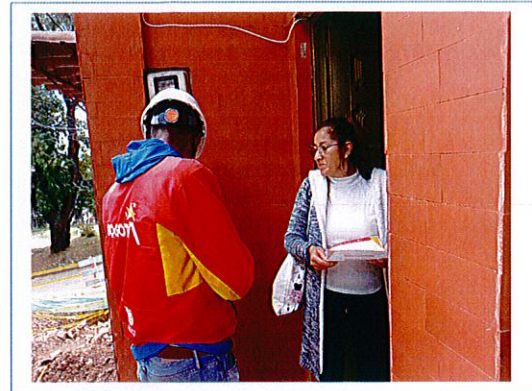

Registro Fotográfico 15. Entrega de volante frente de obra Pijaos.

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, piezas informativas entregadas en el mes} * 100}{\text{Total, piezas informativas proyectadas en el mes}} = \frac{221}{221} = 100\%$$

Anexo 9. Soportes distribución de volantes.

• **Puntos satélites de información - PSI:**

Durante el periodo correspondiente a este informe se mantuvo la publicación de nueve (9) PSI, y la instalación de tres (3) PSI nuevos en los frentes de obra abiertos.


Tabla 22. PSI.

ITEM	BARRIO	CIV	DIRECCIÓN	PERSONA CONTACTO	TELEFONO	FECHA DE INSTALACIÓN/ ACTUALIZACION
01	QUIROGA	ALCALDIA LOCAL	Cl. 32 Sur # 23	N/A	6013660007	15-ago-25 ACTUALIZADO
02	LA ESPERANZA	18003182	Cl 49b sur # 13b – 42	Harol Zarate	3204560592	15-ago-25 ACTUALIZADO
03	LA ESPERANZA	18003182	Cl 49b sur # 13a – 19	Claudia Rojas	3228942593	15-ago-25 ACTUALIZADO
04	MARCO FIDEL SUAREZ	18002962	Dg 46 sur # 13 – 07	Fernan Garcés	3243723539	15-ago-25 ACTUALIZADO
05	MARRUECOS	18005026	Kr 5p # 49 a - 44 sur	Sergio Suspes	3104441888	15-ago-25 ACTUALIZADO


INFORME 5
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 748 DE 2024

06	MARRUECOS	18005042	Kr 5p # 49 b - 18 sur	Ana Felibar Ortiz	3193795310	15-ago-25 ACTUALIZADO
07	MARRUECOS	18005057	Cl 49c sur # 5p - 02	Constanza Velandia	3112547070	15-ago-25 ACTUALIZADO
08	MOLINOS DEL SUR	18005161	Kr 5p # 49 h - 10 sur	Alfonso Jaramillo	3004780991	15-ago-25 ACTUALIZADO
09	CENTENARIO	18000313	CL 23 SUR # 24D 60	José Jiménez	3134456490	15-ago-25 ACTUALIZADO
10	PIJAOS	18003163	KR 11 # 36 A 34	Marisol Laguna	3156066578	30-jul-2025 NUEVO
11	PIJAOS	18003250	KR 10D # 36A 34	María Elena Gil	3144383437	30-jul-2025 NUEVO
12	HOSPITAL SAN CARLOS	18001971	KR 13 # 31 F 03 SUR	Víctor Bustos	3134441529	4-ago-2025 NUEVO

Nota: Se mencionan fechas del mes de julio, incluyendo actividades que se ejecutaron dentro del periodo anterior, los cuales no fueron incluidos en el informe previo.

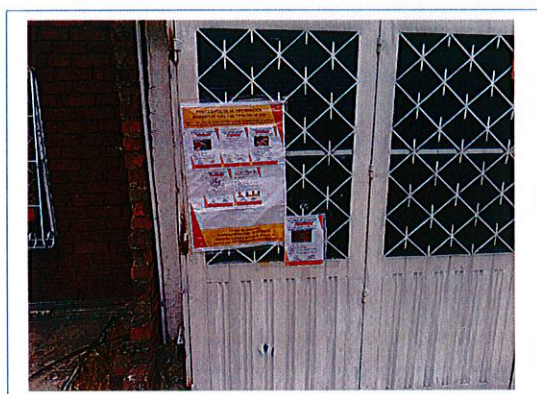

Registro Fotográfico 16. Instalación de PSI frentes de obra Pijaos

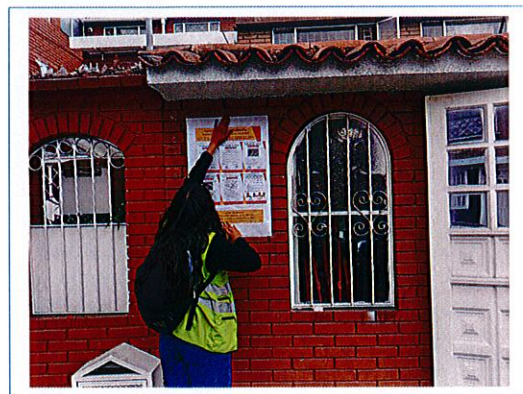

Registro Fotográfico 17. Instalación de PSI frentes de obra Hospital san Carlos

- Indicador de cumplimiento:

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, PSI publicados en el mes} * 100}{\text{Total, PSI proyectados en el mes}} = \frac{12}{12} = 100\%$$

Anexo 10. Soportes instalación PSI

7.2.1.1.2. Divulgación Plan Manejo de Trafico – PMT

- Volante de información PMT



CONSORCIO VR RUU

INFORME 5
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 748 DE 2024




Los volantes del Plan de Manejo de Tránsito (PMT), son piezas para informar sobre el manejo de tránsito, señalización provisional y desvíos que se realizarán antes y durante la ejecución de las obras, permitirán que los usuarios tomen las precauciones respectivas.

Durante el periodo correspondiente a este informe, se realizó la distribución de piezas informativas en los siguientes tramos, los cuales buscaron socializar a la comunidad acerca de las actividades preliminares del área social:

Tabla 23. Volantes informativos.

Cod Volante	BARRIO	CIV	TEMA	FECHA DE DISTRIBUCIÓN	TOTAL, DISTRIBUIDOS
47	PIJAOS	18003163	Volante de PMT	29-jul-25	18
49	PIJAOS	18003250	Volante de PMT	29-jul-25	16
51	HOSPITAL SAN CARLOS	18001971	Volante de PMT	1-ago-25	24
57	LA ESPERANZA	18003126	Volante de PMT	16-ago-25	10
TOTAL					68

Nota: Se mencionan fechas del mes de julio, incluyendo actividades que se ejecutaron dentro del periodo anterior, los cuales no fueron incluidos en el informe previo.

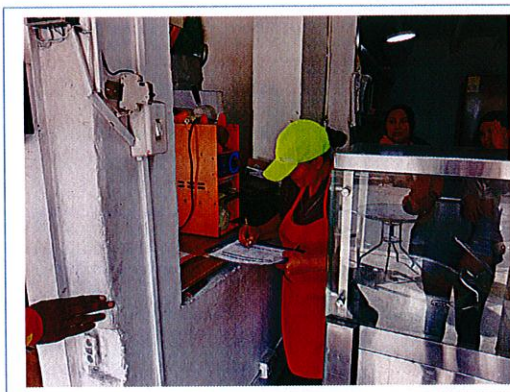

Registro Fotográfico 19. Entrega de volante frente de obra Hospital san Carlos



Registro Fotográfico 18. Entrega de volante frente de obra Pijaos.

• **Indicador de cumplimiento**

INDICADOR EFICIENCIA

$$\frac{\text{Total, piezas informativas entregadas en el mes} * 100}{\text{Total, piezas informativas proyectadas en el mes}} = \frac{68}{68} = 100\%$$

El soporte de esta actividad se encuentra incluida en el anexo 8, correspondiente a la distribución de piezas informativas.

- **Difusión en medio masiva de comunicación local**

Durante la ejecución del periodo correspondiente a este informe, no se realizaron actividades correspondientes a este ítem.

8. REPORTES, SEGUIMIENTO Y COORDINACION DURANTE LA EJECUCION DEL CONTRATO

A continuación, se relacionan los requisitos exigidos para la presentación de informes durante la ejecución del contrato.

8.1. Soportes de gestión

El Contratista contará y dispondrá en el Punto FDLRUU de los soportes de todas las actividades de su gestión, para lo que deberá consignar la información de su gestión en los formatos establecidos en el proceso de Diálogo Ciudadano y Comunicación Estratégica, en sus versiones actualizadas.

El cumplimiento de este ítem se refleja en los anexos adjuntos al presente informe, por con siguiente el contratista se encuentra cumpliendo los requerimientos por la entidad e interventoría.

8.2. Informe mensual

El Contratista entregará un informe mensual de las actividades de gestión realizadas durante el periodo en medio físico y magnético a la Interventoría para su revisión y aprobación, con los respectivos soportes, teniendo en cuenta las fechas de corte establecidas previamente.

Teniendo en cuenta que este informe se presentará mensualmente, el presente documento representa el cumplimiento y gestión de este ítem.

8.3. Informe final de gestión

Durante la ejecución del periodo correspondiente, no se realizaron actividades correspondientes a este ítem, dado que el contrato se encuentra en etapa de ejecución.

8.4. Comités de seguimiento.

Durante el periodo correspondiente a este informe las profesionales sociales de interventoría y contratista asistieron a los comités semanales, en los que se dio seguimiento a las actividades sociales hechas en ocasión a la ejecución del contrato de referencia.

8.5. Índice de cumplimiento.

Teniendo en cuenta que el contrato se encuentra en etapa de inicio, para el periodo correspondiente a este informe no se realiza seguimiento o calificación de las listas de chequeo.



INFORME 5
PLAN DIÁLOGO CIUDADANO Y
COMUNICACIÓN ESTRATÉGICA
CONTRATO 748 DE 2024



9. CONCLUSIONES

- El contratista cumplió con las fechas establecidas y socializadas para la apertura de los frentes de obra abiertos durante el periodo correspondiente a este informe
- En el desarrollo de las actividades comunitarias como actas de vecindad y socialización de comunicados la comunidad afirma que son obras necesarias y pertinentes para toda la comunidad.
- La comunidad a fue receptiva frente a los procesos de socialización, se cuenta con expectativa frente a los procesos técnicos a desarrollar en los ejes viales.

779 CONSORCIO INTER VÍAS ARM 2024

NIT: 901903583-6

CIVA-745-2024-057-O

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2025

Señores

CONSORCIO VR RUU

Farley Andrea Larrarte Barrera
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 745 DE 2024


"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C.". DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA LP 006 2024."

ASUNTO: APROBACIÓN CONSULTAS CIUDADANAS.

Cordial saludo,

Por medio de la presente la interventoría, CONSORCIO INTER VIAS ARM 2024, se permite informar que, una vez revisadas las consultas ciudadanas para el informe de gestión social No. 5 presentado por CONSORCIO VR RUU para el contrato 748 de 2024, se genera la aprobación teniendo en cuenta que cumple con los lineamientos impartidos por el FDLRUU.

Cordialmente,


JUAN PABLO LEMUS ACEVEDO
Representante Legal interventoría

ANEXO 1

Consultas Ciudadanas

FORMATO REQUERIMIENTOS ATENCIÓN AL CIUDADANO			BOGOTÁ
CODIGO FDLRU COP	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSION 2	
ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE FONDO DE DESARROLLO LOCAL RAFAEL URIBE		Requerimiento No: Radicado No: Radicado No:	
Fecha de Radicado: AAAA/MM/DD	2025/julio/09	Canal de Recepción:	Whatsapp
Interesado:	Judy Yemil Reina Chaparro	Documento de Identidad:	52 732 754
Dirección de correspondencia:	Kr 5p # 49h 55 sur	Datos de Contacto:	312 535 3193
Dirección del Requerimiento:	Kr 5p # 49h 55 sur	Barrio / Localidad:	Molinos Sur / Rafael Uribe
N° Contrato de Obra / N° Contrato de Interventoría:	Cto # 748/745	Tipo de Requerimiento:	
Criterio:		Subcriterio:	
Descripción del Requerimiento:			
La Señora Judy Reina Solicita el pago del arreglo de la afección generada al cableado del internet y parabólica ocasionado por la maquinaria de la obra.			
Seguimiento:			
9 julio 2025: Se le solicita a la Ciudadana que por medio de la entidad prestadora del servicio realice la reparación y una vez se realice el cobro en la factura hacerla llegar para iniciar el proceso de pago.			
11 julio 2025: La Ciudadana envía factura del cobro.			
12 julio 2025: por medio de Whatsapp se solicita el envío de los siguientes documentos para iniciar proceso de pago: - Copia de la Cédula Ciudadanía - Certificado Bancario - Cuenta de Cobro.			
14 julio 2025: La Ciudadana envía los documentos solicitados. Se cancela en valor total de \$ 200.000 mil Pesos mte.			
22-07-2025: Se realizó el pago por medio de transferencia a la cuenta bancaria suministrada por la Ciudadana.			
- Se firma cierre de la consulta el 23 de agosto 2025.			
Objeto del Contrato		Datos de Contacto del Punto CREA	
"Ejecutar las obras y actividades para la construcción de la malla vial y espacio público de la localidad rafael uribe en Bogotá D.C."		Residente social: Martha Coral Dirección: TV 19 # 47A - 52 Santa Lucia Telefono: 3112769552 Email: pac.cto748conservacionruu@gmail.com Horario de atención: Lunes, miércoles y jueves de 7:00 am a 12:00 m.	
RECIBIÓ A SATISFACCIÓN:		ATENDIÓ:	
(Firma) Yemil Reina CH		(Firma) MARTHA CORAL	
(Nombre) Yemil Reina CH CIUDADANO/A		Profesional Social - CONTRATISTA	
		APROBÓ:	
		(Firma) ANGELA GUACANE ME	
		Apoyo Social - INTERVENTORÍA	
Al suministrar la información solicitada en este formato, usted está autorizando el manejo de sus datos de acuerdo con la Política de Protección de Datos Personales del IDU que se encuentra publicada en www.idu.gov.co . Para consultas, rectificación, supresión o actualización de datos personales, comuníquese a través del correo electrónico atciudadano@idu.gov.co . Lo anterior en cumplimiento de la Ley 1581 de 2012.			

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA
52732754
NUMERO

REINA CHAPARRO
APELLIDOS

JUDY YEIMIL CHA
NOMBRES

YEIMIL REINA CH.
FIRMA



FECHA DE NACIMIENTO 17-JUN-1981
BOGOTA D.C.
(CUNDINAMARCA)
LUGAR DE NACIMIENTO

1.70 ESTATURA
B+ G.S. RH
F SEXO

17-ABR-2001 BOGOTA D.C.
FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

INDICE DERECHO

REGISTRADOR NACIONAL
IVAN DUQUE ESCOBAR



P-1500104-42093242-F-0052732754-20010814 0185401225A 01 111747311

Certificación Bancaria

Sábado, 12 de julio de 2025

CONSORCIO VR RUU

Bancolombia S.A. se permite informar que JUDY YEIMIL REINA CHAPARRO identificado(a) con CC 52732754, a la fecha de expedición de esta certificación, tiene con el Banco los siguientes productos:

Producto	No. Producto	Fecha Apertura aaaa-mm-dd	Estado	Saldo
Cuenta Ahorros / A la mano	91242572179	2022-09-27	ACTIVO	*****

***Importante:** Esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

*Si desea verificar la veracidad de esta información, puede comunicarse con la Sucursal Telefónica Bancolombia a los siguientes números:
Medellín - Local: (57-4) 510 90 00 - Bogotá - Local: (57-1) 343 00 00 - Barranquilla - Local: (57-5) 361 88 88 - Cali - Local: (57-2) 554 05 05
Resto del país: 01800 09 12345. Sucursales telefónicas en el exterior: España(34) 900 995 717 - Estados Unidos(1) 1 866 379 97 14.



Catalina Cortés Uribe.
Gerente Servicios Contact Center & BPO.

 **Bancolombia**

Bancolombia nunca solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com.co

Fecha: 12/07/2025

CUENTA DE COBRO

CONSORCIO VR RUU

NIT: 901903181-9

DEBE A

JUDY YEIMIL REINA CHAPARRO

NIT: 900548752-8

La suma de: \$ 200.000

Lo anterior por cuenta de los siguientes conceptos: Daños al cableado de la parabólica y del internet por segunda vez. Solicito la colaboración de ustedes para que el daño sea reparado lo antes posible ya que del internet depende mi empleo.

Agradezco de su colaboración quedo atenta.

Adjunto recibo de pago y certificado bancario

Para que sea pagada a la cuenta bancaria que se indica a continuación:

Entidad: Bancolombia

Tipo de cuenta: Ahorros

Número: 912-425721-79

Yeimil Reina CH.

Judy Yeimil Reina Chaparro

Cédula de ciudadanía: 52732754

Contacto: 3144265586





TVCOLOMBIADIGITAL S.A.S

NIT. 900548752-8
CALLE 108#21-10 - Provenza
PBX: 6017702775
Bucaramanga

Nombres: JUDY YEIMIL REINA CHAPARRO
Cédula/Nit: 52732754
Dirección: CR 05 P 49 H S 55, HACIENDA LOS MOLINOS
Teléfonos: 3144265586
Barrio: HACIENDA LOS MOLINOS
Ciudad: BOGOTÁ D.C.
E-mail: HERLINDACHAPARRONINO@GMAIL.COM

ESTADO DE CUENTA

52732754

+	+	+	+	=
Saldo Anterior	Valor Televisión	Valor internet	Vir otros servicios	TOTAL
0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00

FECHA LIMITE DE PAGO

11/07/2025

Resumen Estado de Cuenta	Valor
Último pago efectuado el	0,00
Deuda Anterior *	0,00

Cod.	01	Televisión	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
Total Televisión						0,00

Cod.	02	Internet	Fecha Inicial	Fecha Final	Días	Valor
PTO ADIC @ ESPECIAL						200.000,00
Total Internet						200.000,00

Fecha de Emisión: 2025-07-11
Periodo Facturado:
Fecha de pago oportuno: 11/07/2025
Fecha de Corte: 11/07/2025
Atrasos:

Total a Pagar

\$ 200.000,00

SON: DOSCIENTOS MIL

FIRMA AUTORIZADA

RECIBIMOS A CONFORMIDAD



Nóminas, Proveedores y Libranzas

Empresa: CONSORCIO VR RUU
Tipo Identificación: NIT Persona Jurídica **No. Identificación:** 9019031819
Generado por: SANDRA MILENA MENDOZA PARADA

A continuación el detalle de: Resultado - Crear

No. Autorización N/A **Fecha de Emisión** 2025/07/22

Origen

Tipo Producto Cuenta Ahorros
Nombre Producto Origen AHO0666 **No. Producto** *****0666
Fecha de Pago 2025/07/22

Destino

Tipo Identificación Cédula de Ciudadanía
No. Identificación 52732754
Beneficiario JUDY YEIMIL REINA CHAPARRO
Valor a Pagar \$200,000.00
Entidad Financiera Bancolombia
Tipo Producto Cuenta Ahorros
Producto Destino 91242572179
Tipo Pago PROVEEDORES
Referencia / No. Factura
Información Adicional PQR
Estado En Proceso



Importante: Una vez finalizada esta transacción, por favor verifique el débito en la cuenta origen, antes de intentar realizarla nuevamente.

* La tarifa de esta transacción depende del acuerdo que tenga establecido con el Banco

CONSORCIO INTER VÍAS ARM 2024

NIT: 901903583-6

CIVA-745-2024-057-P

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2025

Señores

CONSORCIO VR RUU

Farley Andrea Larrarte Barrera
Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 745 DE 2024

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C.". DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA LP 006 2024."

ASUNTO: APROBACIÓN ACTAS DE REUNION DE INICIO.

Cordial saludo,

Por medio de la presente la interventoría CONSORCIO INTER VIAS ARM 2024, se permite informar que, una vez revisadas las actas de reunión de inicio para el informe de gestión social No. 5 presentado por CONSORCIO VR RUU para el contrato 748 de 2024, se genera la aprobación teniendo en cuenta que cumple con los lineamientos impartidos por el FDLRUU.

Cordialmente,


JUAN PABLO LEMUS ACEVEDO
Representante Legal interventoría

ANEXO 2

Actas de Reunión de Inicio

FORMATO			
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CÓDIGO	PROCESO	VERSIÓN	
FO-SC-14	GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	2.0	
Contrato No.: 748-2024		HORA INICIO: 9:00 am	Hoja 1 de 3
FECHA: julio 31 de 2025		HORA DE FINALIZACIÓN: 10:00 am	Acta N° _____
PROYECTO: "EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C."			
ORDEN DEL DÍA			
INICIO			
OBJETIVO: SOCIALIZAR EL INICIO DE OBRA			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
INTERVENCIONES DE LA COMUNIDAD			
ACUERDOS Y COMPROMISOS			
CIERRE			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>Se inicia la reunión siendo las 9:00 am del 31 de julio de 2025, a la cual asisten los representantes del contratista CONSORCIO CONSERVACIÓN VR RUU, INTERVENTORIA, representantes de la Alcaldía Local, edil local y la comunidad del barrio Hospital San Carlos, CIV (18001971) a fin de socializar las actividades en marcadas en el contrato 748 de 2024, suscrito en el fondo de Desarrollo Local de la localidad de Rafael Uribe Uribe y el Consorcio anteriormente mencionado.</p> <p>La profesional social del contratista informa el segmento a intervenir, el cual se relaciona a continuación.</p> <p>A) (18001971) KR 13 ENTRE CL 31F SUR Y CL 32 SUR.</p> <p>La profesional social del consorcio contratista presenta los funcionarios y profesionales representantes de cada entidad, así mismo menciona las reglas para las intervenciones y manifiesta la importancia de un buen manejo del lenguaje y los parámetros mínimos de respeto para el buen desarrollo de esta actividad.</p> <ol style="list-style-type: none"> Se inicia la reunión con la intervención del señor edil Carlos Salamanca, manifestando lo gratificante y placentero que es contar con la intervención en el segmento vial, agradece la participación de la comunidad ya que se han presentado problemáticas debido al mal estado de la vía, aclara que los recursos para la intervención, son recursos públicos y de la administración local, de la comunidad, del trabajo mancomunado; solicita a la comunidad que apoyen las actividades constructivas, que ayuden con el mantenimiento de la misma y que sea la comunidad quien realice la veeduría ciudadana para que la ejecución en la intervención sea optimo y del agrado de todos. Para continuar con el desarrollo de la reunión se le brinda el espacio al componente técnico del consorcio contratista, con el fin de socializar las actividades constructivas en el segmento vial, la ingeniera encargada indica que el inicio de las actividades constructivas se realizaría a partir del martes 05 de agosto del presente año, con una duración aproximada de 3 a 6 meses siempre que no se presenten inconvenientes al momento de la intervención actividades de construcción para ejecutarse en vía y espacio público: <p>Intervención en vía:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Espacio público: Construcción de ambos costados del espacio público, con una subbase peatonal, fundida en concreto; aclarando que se dejará el mismo diseño para todo el segmento vial, por lo que si es necesario levantar construcciones de los predios que están en el espacio público se realizará, dejando en claro también que no habrá ingreso para ningún tipo de vehículos en el transcurso de la intervención. - Excavación: de 65 a 70 cm aproximadamente. - Estructura del segmento vial: Estará conformada por ...una capa de agregado reciclado, una capa de jocelda que mide aproximadamente 15 cm, otra capa de agregado reciclado, una geomalla y una subbase estabilizada la cual va con cemento y aditivos, aclarando que adicional a esto, la vía quedará con asfalto. - Redes: Inicialmente inspección de las redes, en caso de encontrar redes en mal estado, se realizará el cambio de toda la red sanitaria, con su respectiva acometida y caja de inspección. - Inicio Obra: 05 de agosto 2025. - Duración de obra: 3 a 6 meses aproximadamente, tiempo sujeto a condiciones climáticas, de orden social o cualquier otra situación que atañe el atraso en las actividades de obra. <ol style="list-style-type: none"> Por parte del componente SST y Ambiental, indican que se instalará unos palos rollizos con una poli sombras, las cuales delimitan el segmento de la intervención, recomendando que el frete de obra contará con un campamento, se contará también con una unidad sanitaria para los trabajadores de la obra, se instalará una vaya informativa donde estará plasmado la información contractual en relación a la intervención. Seguidamente por parte del componente Social, manifiestan que, se han venido realizando todas las actividades preliminares que se tienen en cuenta antes de realizar la actividad constructiva. 			

- Inicialmente se ha venido realizando actas de vecindad en los predios aferentes y que corresponden al segmento vial donde se ejecutará la intervención, aclarando la importancia de dicha actividad, ya que se trata de constatar cómo está el estado físico o estructural del predio.
- Punto Satélite de Información, el cual estará ubicado en el frente de obra, donde está el contenido de cada volante entregado en el segmento vial hasta la fecha, y donde estará la información para la comunicación con el consorcio contratista, como el correo electrónico, la dirección de la oficina principal y el número telefónico donde se atenderá cualquier novedad presentada en el transcurso de la intervención.
- A modo de recomendación, el componente Social, le informa a la comunidad, específicamente para las personas que cuentan con tiendas en el sector, no brindar créditos a los trabajadores, teniendo en cuenta que el personal que se encuentra en los segmentos viales, es rotativo.
- Por otro lado, se le brinda una explicación a la comunidad relacionada con las bajantes de aguas lluvias, ya que se observan predios que cuentan con tejas con caída hacia el andén, la recomendación es la adecuación para dichas bajantes con el fin de no generar afectaciones en la construcción de la vía.
- Se informa a la comunidad todo lo relacionado a los parqueaderos que se tengan que contratar para asegurar sus vehículos, se reitera que el costo de dicho servicio es asumido por el propietario del predio.
- Se indica que todo lo relacionado a los temas sociales, serán atendidos por el componente Social, directamente a los números de teléfono, el cual estará en el sector apoyando todo lo relacionado a la intervención.
- A modo de recomendación, se le informa a la comunidad que en caso se presentar algún inconveniente en temas de seguridad, ya sea por la intervención o hurto de algún material o maquinaria en la obra, se solicita no interceder, sino generar de inmediato el reporte a través de los medios de comunicación ya antes mencionados, con esto se activan las rutas de emergencia de seguridad.
- Se contará con una persona de vigilancia en el segmento vial para la seguridad y cuidado de los materiales de la maquinaria y demás elementos que se encuentren en el frente de obra.
- Se realizará la conformación de un Comité de Participación Ciudadana, desarrollando encuentros de

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

1. **Habitante del sector:** El ciudadano solicita información sobre el proceso de intervención, desea saber sobre cómo es el orden de ejecución en relación al tema constructivo, si será todo al mismo tiempo o primero la vía y después espacio público (andén)

Rta/ La profesional social del consorcio contratista informa que, la intervención iniciará primero en el segmento vial, aclarando que el cerramiento iniciará sobre la vía, dejando adecuado el sendero peatonal, y después se continua con el espacio público.

2. **María Montenegro:** La ciudadana solicita información sobre la intervención sobre el andén, pregunta que si en su predio adecuarán el espacio para el tránsito de personas ya que cuenta con un establecimiento comercial.

Rta/ La profesional social indica que, en vista que es una zona comercial, se realizará en primera instancia la construcción de la vía, y seguidamente se procederá con la intervención sobre el espacio público, por lo que se aclara que mientras se realiza la intervención sobre el segmento vial contarán con total acceso a los establecimientos comerciales, con excepción para los predios que cuenten con garaje, indicando que se garantizará el sendero peatonal, sin embargo, al momento de realizar la intervención en el espacio público se contará con la adecuación necesaria para el ingreso a los establecimientos, dejando en claro que será de forma limitada, ya que se debe intervenir dichos espacios, para lo que se solicita por parte de la comunidad paciencia al momento de dichas intervenciones.

3. **Habitante del sector:** La ciudadana solicita información sobre intervención del segmento vial, manifestando que desea saber de dónde hasta dónde va dicha intervención.

Rta/ La Ingeniera del componente técnico del consorcio contratista aclara la información sobre el segmento vial, indicando que la intervención que se ejecutará estará solo en la cuadra correspondiente a la KR 13 entre la CL 31F SUR y la CL 32 SUR.

4. **Habitante del sector:** El ciudadano solicita información sobre un segmento vial que se encuentra aledaño al segmento de la intervención a ejecutar, pregunta si ese otro segmento vial se va a intervenir.

Rta/ El componente técnico y el componente social del consorcio contratista, le indican al ciudadano que ese otro segmento vial, no se ejecutará, ya que corresponde a otro CIV, y por el momento la directriz está sobre el CIV donde están en ese momento.

Por su parte el señor edil Carlos Salamanca le aclara al ciudadano que, de acuerdo al proyecto que se pasa para la ejecución en relación a las intervenciones viales, ya se había priorizado la vía que se ejecutará, y la vía que el ciudadano indica corresponde a otro proyecto que está en marcha.

5. **Habitante del sector:** El ciudadano solicita información sobre el cierre vehicular que se implementará en la vía debido a la intervención misma.

Rta/ La profesional social indica que, para realizar el proceso del cierre vial en el sector, se debe contar con un Plan de Manejo de Tráfico (PMT), el cual es avalado por la Secretaría Distrital de Movilidad, con la intención de generar la menor afectación posible en el sector, de igual forma se indica a la comunidad que se realizará una entrega a través de una pieza informativa donde estará ilustrado toda la información en relación al PMT que se aplicará para el sector donde se intervendrá.

6. **Habitante del sector:** El ciudadano solicita información sobre el tiempo real de la intervención tanto para el espacio público y para el segmento vial, también solicita información sobre la altura que quedarían los andenes y por último desea saber si la intervención incluirá trabajo nocturno.

Rta/ La ingeniera a cargo del componente técnico le informa al ciudadano que el tiempo de intervención inicialmente está pronosticado para una durabilidad de tres meses, aclara que no se cuenta con un tiempo estimado para cada actividad a ejecutar, ya que estas se podrían cruzar con el fin de agilizar la intervención, por otro lado, la ingeniera encargada le indica al ciudadano que no se generaría actividades constructivas en hora de la noche, ya que se cuenta con unos horarios estipulados de lunes a viernes de 7:00 am a 4:00 pm, los días sábados se trabajaría de 7:00 am a 11:00 am; dejando en claro que en caso de ser necesario la jornada se extendería dependiendo de que tipo de actividad se ejecutaría, como por ejemplo la fundida del concreto, posiblemente ese día la jornada sería más extensa.


Por último, en relación a la altura de los andenes, la ingeniera encargada informa que, sería aproximadamente 30 cm, teniendo en cuenta que se trata de un proyecto de conservación, aclarando que posiblemente quedará de acuerdo al mismo diseño actual de la vía.

7. **Habitante del sector:** El ciudadano solicita información sobre los accesos a los garajes.

Rta/ La ingeniera informa a la comunidad que el acceso a garajes solo quedará para los predios que en este momento cuenten con puerta portón de acceso a garajes.

Por su parte la profesional del componente social realiza una aclaración en relación a los accesos de garajes, indica que se realizará una visita técnica en acompañamiento del equipo social a los predios que cuenten con este acceso, quedando bajo un acta donde se documenta el estado del mismo, ya que se trabajan bajo diseños que son entregados por la Alcaldía Local.

No se presentan más preguntas por parte de la comunidad, se da paso a la conformación del Comité de Participación Ciudadana y se da por finalizada a la reunión siendo las 10:00 am.

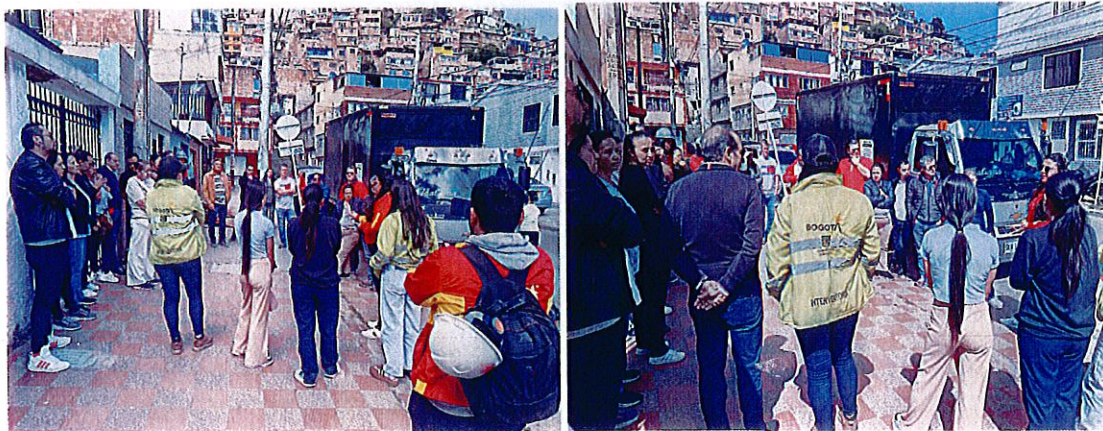

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Programar visitas solicitadas para levantamiento de Actas de Vecindad.	Consortio VR RUU	De acuerdo a la solicitud de los ciudadanos.

FIRMAS

NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA
SE ADJUNTA LISTADO DE ASISTENCIA		
ELABORÓ	RESPONSABLE	APROBÓ
NOMBRE: MARTHA CORAL	MARTHA CORAL	ANGELA GUACANEME
CARGO: PROFESIONAL SOCIAL	PROFESIONAL SOCIAL	APOYO SOCIAL-INTERVENTORIA
FIRMA:		
ANEXOS: SI NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:

CONTRATO No.: FDLRU 748 - 2024

Hoja 1 de 2.

FECHA

2025

DD MM AA

ALCALDÍA LOCAL DE RAFAEL URIBE

FONDO DE DESARROLLO

GESTIÓN SOCIAL

CONSORCIO CONSERVACION VIAL

BOGOTÁ

OBRA

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PÚBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE EN BOGOTÁ D.C."

ACTIVIDAD: Revisión de Tránsito Hospital de San Carlos

PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES

No.	NOMBRE	DIRECCIÓN	BARRIO/ENTIDAD/ ORGANIZACIÓN	TELÉFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Elizaveth Torres	Calle 32 s.e # 13-04	Hospital S. Carlos	3053937729	Elizaveth Torres	
2	Beatriz Suarez P.	Calle 13 # 31 F 33	Hospital S. Carlos	3132475749	Beatriz Suarez P.	
3	Nataly Herrera	Calle 13 # 31 F 23 s.e	Hospital S. Carlos	3102384252	Nataly Herrera	
4	Nataly Herrera	Calle 32 s.e # 13-04	Hospital S. Carlos	3102559375	Nataly Herrera	
5	CLAUDIA PATRICIA SEMINORE	CR 13 # 31 F 17 s.e	Hospital S. Carlos	3133758488	CLAUDIA PATRICIA S.	
6	Maith Rodriguez	CR 13 # 31 F 36 s.e	Hospital S. Carlos	3143191903	Maith Rodriguez	
7	Guillermo Sanchez	CR 13 # 31 F 17 s.e	Hospital S. Carlos	3108555089	Guillermo Sanchez	
8	Guillermo Sanchez	CR 13 # 31 F 17 s.e	Hospital S. Carlos	3102424679	Guillermo Sanchez	
9	Guillermo Sanchez	CR 13 # 31 F 30 s.e	Hospital S. Carlos	3141504588	Guillermo Sanchez	
10	Maith Rodriguez	CR 13 # 31 F 36 s.e	Hospital S. Carlos	3166909414	Maith Rodriguez	
11	Roberto Semadeni	CR 13 # 31 F 26 s	Hospital S. Carlos	3913512516	Roberto Semadeni	
12	Maria Yamilandia	CR 13 # 31 F 03 s.e	Hospital S. Carlos	3115930672	Maria Yamilandia	
13	Diana Arias	CR 13 # 31 F 22 s.e	Hospital S. Carlos	3168073875	Diana Arias	
14	Carlos F. Salcher	ALRUU	Hospital S. Carlos	32259696	Carlos F. Salcher	
15	Guillermo Sanchez	CR 13 # 31 F 36 s.e	Hospital S. Carlos	3046020424	Guillermo Sanchez	
16	Nataly Herrera	CR 13 # 31 F 07	Hospital S. Carlos		Nataly Herrera	

APROBO:
(Firma)

ANGELA GUACANEME

Apoyo Social - Interventoria

MARTHA GORAL

Profesional Social - Contratista

Original: Fondo de Desarrollo Local de RUU

1 era copia: Dependencia ejecutora del contrato

2da copia: Interventoria

3ra copia: Contratista

CONTRATO No.: FDLRU 748 - 2024

Hoja 2 de 2
FECHA
DD JUL 2025
MM AA

ALCALDIA LOCAL DE RAFAEL URIBE
FONDO DE DESARROLLO
GESTION SOCIAL
CONSORCIO CONSERVACION VIAL



OBRA

"EJECUTAR LAS OBRAS Y ACTIVIDADES PARA LA CONSERVACION DE LA MALLA VIAL Y ESPACIO PUBLICO DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE EN BOGOTA D.C."

ACTIVIDAD: Reunion de inicio Hospital de San Carlos

PLANILLA DE ASISTENCIA A REUNIONES

No.	NOMBRE	DIRECCION	BARRIO/ENTIDAD/ ORGANIZACION	TELEFONO	FIRMA	OBSERVACIONES
1	Andrés Camacho	en 12 K F31 F-1850	Hospital S. Carlos	3142423743	Andrés Camacho	
2	Yolanda Posada	CI 325 # 15-03	Hospital S. Carlos		Yolanda Posada	
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						
15						
16						

ELABORÓ:
(Firma)

APROBÓ:
(Firma)

MARTHA CORAL

ANGELA GUACANEME

Profesional Social - Contratista

Apoyo Social - Interventoria

Original: Fondo de Desarrollo Local de RUU
1 era copia: Dependencia ejecutora del contrato
2da copia: Interventoria
3ra copia: Contratista

CONSORCIO INTER VÍAS ARM 2024

NIT: 901903583-6

CIVA-745-2024-057-Q

Bogotá D.C., 31 de agosto de 2025

Señores

CONSORCIO VR RUU

Farley Andrea Larrarte Barrera

Representante Legal

REFERENCIA: CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 745 DE 2024

"REALIZAR LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, JURÍDICA, AMBIENTAL, SOCIAL Y DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA RESULTANTE DEL PROCESO DE LICITACIÓN PÚBLICA CUYO OBJETO ES: "EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C.". DERIVADO DEL PROCESO DE SELECCIÓN DE LICITACIÓN DE OBRA PÚBLICA LP 006 2024."

ASUNTO: APROBACIÓN ACTAS DE REUNION EXTRAORDINARIA.

Cordial saludo,

Por medio de la presente la interventoría CONSORCIO INTER VIAS ARM 2024, se permite informar que, una vez revisadas las actas de reunión de reunión extraordinaria para el informe de gestión social No. 5 presentado por CONSORCIO VR RUU para el contrato 748 de 2024, se genera la aprobación teniendo en cuenta que cumple con los lineamientos impartidos por el FDLRUU.

Cordialmente,


JUAN PABLO LEMUS ACEVEDO
Representante Legal interventoría

ANEXO 3

Actas de Reunión Extraordinaria

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 748-2024		HORA INICIO: 11:30 Am	Hoja 1 de
FECHA: 24-Julio-2025		HORA DE FINALIZACIÓN: 12:15pm	Acta N°
<p>PROYECTO: "EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C"</p>			
ORDEN DEL DÍA			
* Inicio			
* Objeto			
* Desarrollo			
* Cierre			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>* Se inicia reunión con el señor Osvaldo Martínez Propietario del predio Cl 48ª sur #121-26 Con CIO-18002962 del barrio Marco Fidel Suárez, junto al componente social del Consorcio VR Roo Conservación CTO 748-2024 Para tratar los siguientes temas.</p>			
<p>* En la presente acta se dejó constancia que se realizó una llamada a la empresa (vanti, de gas natural) con el fin de gestionar la reinstalación del servicio de gas natural, el cual suspendido el día 24 de julio. Durante la comunicación el personal de la empresa vanti manifestó que la reinstalación del servicio se llevara a cabo el día viernes 25 de julio del 2025, en un horario comprendido entre 7:00 AM y 4:00 PM.</p>			
<p>* Así mismo, se le informa al ciudadano, que en la próxima factura del servicio aparecerá un excedente correspondiente a los costos de la instalación, dicho excedente deberá ser cubierto en su totalidad por el consorcio VR, aumentando la responsabilidad del pago completo derivado del procedimiento de reinstalación.</p>			
<p style="text-align: right;">David U</p>			

FORMATO ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			BOGOTÁ	
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0		
INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD				
COMPROMISO	RESPONSABLE	FECHA DE CUMPLIMIENTO		
Reembolso de dinero corres-	Consortio VR Ruv	una vez se		
pondiente a los gastos de	cto-748-2024	defina. Se		
alimentación en el tiempo		realizará pago		
que aplique				
FIRMAS				
NOMBRE	ENTIDAD/CARGO	FIRMA		
Oswaldo Martinez	Propietario	Oswaldo Martinez		
	cc. 19459869			
	Tel 3136619519			
ELABORÓ		RESPONSABLE	APROBÓ	
NOMBRE	MARTHA CORAL	MARTHA CORAL	ANGELA GUACANEME	
CARGO	PROFESIONAL SOCIAL	PROFESIONAL SOCIAL	APOYO SOCIAL INTERVENTORIA	
FIRMA				
ANEXOS: SI	NO	TIPO DE ANEXO:	CANTIDAD:	

FORMATO			BOGOTÁ
ACTA DE REUNIÓN CON COMUNIDAD			
CÓDIGO FO-SC-14	PROCESO GESTIÓN SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA	VERSIÓN 2.0	
Contrato No.: 748-2024		HORA INICIO: 2:45 p.m.	Hoja 1 de 2
FECHA: 25. Julio. 2025		HORA DE FINALIZACIÓN: 3:00 p.m.	Acta N°
<p>PROYECTO: "EJECUTAR LAS ACCIONES, ACTIVIDADES Y OBRAS NECESARIAS PARA LA CONSERVACIÓN DE LA MALLA VIAL, EL ESPACIO PÚBLICO Y LOS PUENTES DE LA LOCALIDAD DE RAFAEL URIBE URIBE A PRECIOS UNITARIOS FIJOS, SIN FORMULA DE REAJUSTE Y A MONTO AGOTABLE EN LA CIUDAD DE BOGOTÁ, D. C"</p>			
ORDEN DEL DÍA			
Inicio			
Objetivo y desarrollo de la Reunión			
Acuerdos			
Cierre.			
DESARROLLO DE LA REUNIÓN			
<p>Se inicia reunión con la ciudadana Aura María Rios, propietaria del predio ubicado en la dirección CL 49B SUR 13A-07, correspondiente al barrio La Esperanza (civ-18003126), y el componente social del Consorcio VR RUU - CTO 748-2024, a fin de tratar los siguientes temas.</p>			
<p>- La ciudadana Aura María Rios, manifiesta al componente social que, actualmente adelanta un trámite ante la Empresa de Acueducto, agua y alcantarillado de Bogotá, relacionado con la solicitud de instalación de medidores de agua en su predio.</p>			
<p>- En el marco de esta gestión, la ciudadana hace entrega al componente social de la documentación digital que respalda dicha solicitud, incluyendo el radicado emitido por la entidad.</p>			
<p>- Con base en esta información, la ciudadana solicita que se comunique al consorcio constructor responsable de la intervención en el sector, la necesidad de dejar habilitada la acometida para la futura instalación del servicio de agua en su predio, con el propósito de evitar futuras intervenciones en la vía pública, actualmente en proceso de construcción, una vez la solicitud ante la empresa de Acueducto sea aprobada.</p>			
