

Página: 1 de 3

Actividades desarrolladas:
Se desarrolla la adecuada disposición de residuos. Se hace seguimiento a informes mensuales.
Se concepto de aprobación al informe ambiental del período de marzo de 2025.

FORMATO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA


Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3
---------------------------------------	------------------------	-------------	----------------------	----------------

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO:


- Se hace uso de elementos de protección personal.
- Se realizan charlas diarias de cinco minutos en temas de seguridad y salud en el trabajo (riesgos inherentes al trabajo eléctrico, trabajo seguro en alturas, inspecciones de área de trabajo, señalización de áreas).
- Se realiza una capacitación SST cuyo nombre fue enfermedades respiratorias.
- El contratista realiza registro documental a través de formatos de su empresa (ATS para las actividades eléctricas, permisos de trabajo para energías peligrosas, inspecciones preoperacionales a taladro a herramientas menores (alicates, pinzas, cortafrio, destornillador y llaves).
- Se hace recomendación de diligenciar completamente el permiso de trabajo para tareas peligrosas.
- No se hace entrega de documentos para trabajo en alturas (limpieza de tanques elevados), no se registra permiso para trabajos en alturas, análisis de trabajo seguro para trabajos en alturas, inspección de equipo de acceso que se utilizó para la actividad.
- En la semana en curso se envía oficio SST solicitando el cumplimiento total de requisitos para trabajos seguros en alturas según resolución 4272 de 2021.
- En la semana no se reporta accidentes laborales.
- Se emiten observaciones sobre requisitos legales para trabajo seguro en alturas conforme a la Resolución 4272 de 2021.

PERSONAL OBRA E INTERVENTORÍA

Personal de Interventoría	6
Personal del Contratista	7
Total Personal en Obra	13

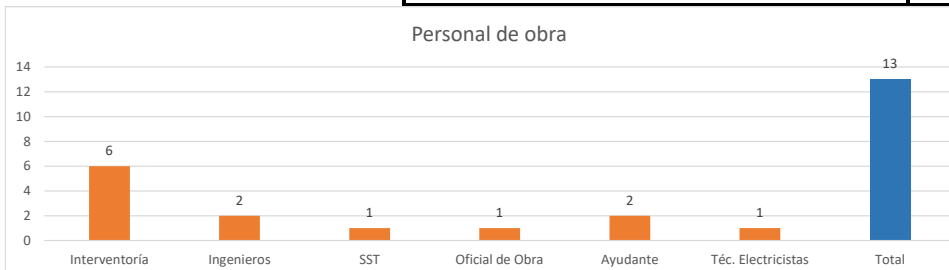

En el **gráfico 1**, se reporta todo el personal que se encuentra presente en obra, incluyendo el número de trabajadores de Interventoría.

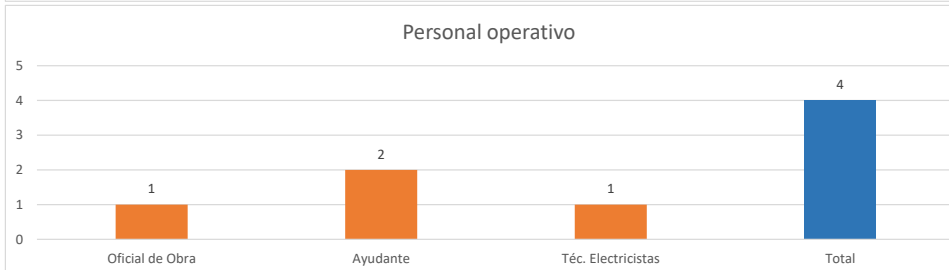

En el **gráfico 2** Los números que se encuentran dentro del gráfico corresponden al personal operativo en obra.

EQUIPOS MENORES

TIPO	CONTRACTUAL	ACTUAL	OBSERVACIONES
GUADANADORA		1	
ESCALERA		2	
ANDAMIOS		4	
HIDRO LAVADORA		1	
PULIDORA		2	
TALADROS		2	
Total Equipos		12	

FORMATO



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

Principio de Procedencia: 4602.375	Clave: GSAP 1.0-12-028	Versión: 01	Fecha: 01/MARZO/2020	Página: 1 de 3
---------------------------------------	------------------------	-------------	----------------------	----------------

AVANCE FINANCIERO DE OBRA

Acta Parcial de Obra No.	Periodo	Costo Total	AVANCE FINANCIERO	
1	05/06/2024 - 04/07/2024	\$ 23.200.454,00		Valor Total Contrato Obra
2	05/07/2024 - 04/08/2024	\$ 47.602.415,00		\$ 1.996.500.065,00
3	05/08/2024 - 04/09/2025	\$ 75.183.934,00		Valor facturado Contrato Obra
4	05/09/2024 - 04/10/2025	\$ 42.348.675,00		\$ 1.498.103.385,00
5	05/10/2024 - 04/11/2025	\$ 64.720.146,00		% Avance facturado Acumulado
6	05/11/2024 - 04/12/2025	\$ 264.538.180,00		75,04%
7	05/12/2024 - 31/12/2025	\$ 610.682.692,00		
8	01/01/2025 - 31/01/2025	\$ 229.391.077,00		
9	01/02/2025 - 28/02/2025	\$ 74.588.067,00		
10	01/03/2025 - 31/03/2025	\$ 65.847.745,00		
Total Acumulado	\$ 1.498.103.385,00			

AVANCE FINANCIERO DE INTERVENTORÍA

Acta Parcial de interventoría No.	Periodo	Costo Total		
1	05/06/2024 - 04/07/2024	\$ 42.800.730,00		Valor Total Contrato interventoría
2	05/07/2024 - 04/08/2024	\$ 37.046.902,00		\$ 1.117.574.559,00
3	05/08/2024 - 04/09/2024	\$ 41.812.759,00		Valor facturado Contrato Interventoría
4	05/09/2024 - 04/10/2024	\$ 45.105.296,00		\$ 524.609.882,00
5	05/10/2024 - 04/11/2024	\$ 50.666.541,00		% Avance facturado Acumulado
6	05/11/2024 - 04/12/2024	\$ 72.106.411,00		46,94%
7	05/12/2024 - 12/31/2024	\$ 114.934.236,00		
8	01/01/2025 - 31/01/2025	\$ 83.367.190,00		
9	01/02/2025 - 28/02/2025	\$ 36.769.817,00		
Total Acumulado	\$ 524.609.882,00			

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ISMAEL MAFIOLY RODRIGUEZ
