



OI-FERREAGRO01

MARINILLA - ANTIOQUIA

INFORME N°01 Y FINAL AVANCE DE OBRA.

OBJETO: "CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." LOGRANDO LA DEFINICIÓN DE ESTÁNDARES, PROCEDIMIENTOS Y RESPONSABILIDADES PARA EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LAS UNIDADES SANITARIAS.

PERÍODO: 09 DE MAYO AL 06 JUNIO DE 2025.

A continuación, se presenta el informe de avance del contrato en objeto; Se da inicio al contrato el día 09 de mayo 2025 de acuerdo al acta de inicio y se cuenta con un plazo de 5 meses a partir de la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 26 de agosto 2025, como se indica en el plazo del contrato de obra.

De acuerdo a reunión realizada en las instalaciones del EDUR se indicó que se tenía viabilidad y aprobación para la instalación de 34 pozos.

A continuación, se relaciona la programación del programado Vs ejecutado, y los sistemas instalados en cada uno de beneficiarios y su ubicación según informe que consolida la verificación de saneamiento rural del Municipio de Marinilla.

INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:

El proyecto consiste en la construcción de 34 unidades para el tratamiento de aguas residuales sanitarias individuales para la recolección y tratamiento de las aguas residuales domésticas de comunidades rurales dispersas (de diferentes veredas) del municipio de Marinilla. Con relación al sistema de tratamiento individual tanque séptico. Para garantizar la sostenibilidad del proyecto se incluye capacitación orientado al acompañamiento a la población rural con el fin de desplegar la estrategia de entornos saludables en el área de influencia del proyecto en el municipio de Marinilla, este componente está encaminado a reducir el descargue de las aguas residuales de manera directa sin tratamiento de tipo alguno.

El proyecto posee las siguientes características:

CONTRATO N° CCO-037-2025

CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA
"EDUR "

FECHA DE INICIO: 09 DE MAYO 2025.

NÚMERO DE SISTEMAS INSTALADOS: 33 UNIDADES.



TABLA DE CONTENIDO

OI-FERREAGRO01	1
INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO:.....	1
INTRODUCCIÓN	3
DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO	3
INFORMACIÓN DE POLIZAS.....	4
TABLA No. 1. INFORMACIÓN PÓLIZA DEL PROYECTO.	4
TABLA No. 2. INFORMACIÓN PÓLIZA DEL PROYECTO.	5
DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES REALIZADAS.....	5
AVANCE DE OBRA.....	10
TABLA No. 3. CUADRO MES DE ABRIL PROGRAMACIÓN GENERAL.	11
DIAGRAMA DE GANTT – PROGRAMACIÓN PROYECTADA DE MANERA INICIAL:	11
GRAFICO No. 1.PROGRAMACIÓN DE OBRA.....	11
INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:	11
TABLA No. 4. INVERSIÓN DEL PROYECTO.....	13
GRAFICO No. 2. PLAN DE INVERSIÓN PREVISTA.	14
GRAFICO No. 3. MAPA DE MARINILLA – ANTIOQUIA.	15
ANEXOS.....	15



INTRODUCCIÓN

El presente informe final tiene como propósito documentar el desarrollo, cumplimiento y resultados del Contrato de Suministro, Transporte, Instalación y Puesta en Funcionamiento de Sistemas de Tratamiento de Aguas Residuales Domésticas (ARD) Prefabricados, en el área rural del municipio de Marinilla. Este proyecto se enmarca en los esfuerzos por mejorar las condiciones sanitarias y ambientales de las comunidades rurales, a través de soluciones sostenibles y técnicamente adecuadas para el tratamiento de aguas residuales.

Durante la ejecución del contrato, se definieron e implementaron estándares técnicos, procedimientos operativos y lineamientos de responsabilidad que permitieran asegurar el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias instaladas. Asimismo, se garantizó que cada una de las etapas –desde el suministro de los equipos hasta su puesta en marcha– cumpliera con los requisitos establecidos en los términos contractuales y en la normatividad vigente.

Este informe presenta de manera detallada las actividades realizadas, los recursos empleados, los resultados obtenidos y las observaciones técnicas pertinentes, como cierre técnico y administrativo del contrato.

DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO

El proyecto consistió en el suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistemas prefabricados para el tratamiento de aguas residuales domésticas (ARD) en distintas zonas del área rural del municipio de Marinilla, Antioquia. Esta iniciativa se orientó a mejorar las condiciones de saneamiento básico en comunidades que no contaban con sistemas adecuados para el manejo de aguas residuales, contribuyendo así a la protección del recurso hídrico y a la mejora de la calidad de vida de la población beneficiaria.

La intervención incluyó la selección y entrega de plantas de tratamiento prefabricadas, su transporte e instalación en los sitios previamente definidos, así como su puesta en operación y verificación de funcionamiento. De forma complementaria, se definieron los estándares técnicos y operativos necesarios para garantizar la eficiencia y sostenibilidad del sistema, además de capacitar a las comunidades y/o responsables en su adecuada operación y mantenimiento.

El proyecto responde a un enfoque integral que articula el componente técnico con el social, asegurando que las soluciones implementadas sean viables, apropiadas al contexto rural y sostenibles en el tiempo.



• SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO DE 2.000 LITROS

Volúmenes y cantidad de material filtrante	
Volumen total del sistema (l)	2090
Volumen total Tanque séptico (l)	1463
Volumen total Filtro Anaerobio (l)	627
Material filtrante (Unidades)	180




GRAFICO No. 1. SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO.

INFORMACIÓN DE POLIZAS

En cumplimiento de lo establecido en el pliego de condiciones y en el marco legal vigente para la contratación pública, el contratista constituyó las pólizas exigidas como garantía del adecuado desarrollo del contrato. Estas pólizas tienen como finalidad respaldar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, así como amparar los posibles riesgos derivados de la ejecución del proyecto.

A continuación, se relacionan las pólizas constituidas, indicando su tipo, número, entidad aseguradora, vigencia, cobertura y los amparos específicos establecidos, con el fin de dejar constancia de su cumplimiento y validez durante la ejecución del contrato.

ASEGURADORA: SEGUROS GENERALES SURAMERICANA S.A.

PRODUCTO	VALOR ASEGURADO	NÚMERO DE PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA VIGENCIA
<u>SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DERIVADO DE CUMPLIMIENTO</u>	\$284.700.000	No 013001009018	SECTOR SERVICIOS	DESDE 28 DE MARZO 2025 HASTA 26 de agosto 2025

TABLA No. 1. INFORMACIÓN PÓLIZA DEL PROYECTO.



PRODUCTO	VALOR ASEGURADO	NÚMERO DE PÓLIZA	DESCRIPCIÓN	FECHA VIGENCIA
<u>SEGURO DE CUMPLIMIENTO A FAVOR DE ENTIDADES ESTATALES (GARANTÍA ÚNICA)</u>	\$77.312.472	No 4240770	SECTOR SERVICIOS	DESDE 28 DE MARZO 2025 HASTA 26 de agosto 2030

TABLA No. 2. INFORMACIÓN PÓLIZA DEL PROYECTO.

DESCRIPCIÓN DETALLADA DE ACTIVIDADES REALIZADAS

A continuación, se relacionan las actividades realizadas en cada uno de los predios.

1. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: AURA ROSA GALLO DUQUE, C.C. 43.470.154.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN LA CEREDA ALTO DE LOS CABUYOS.
2. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: BERTHA OLIVA DUQUE RAMÍREZ, C.C. 21.872.945.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN LA VEREDA ALTO DEL MERCADO.
3. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: BLANCA OLIVA GIRALDO CASTAÑO, C.C. 43.960.567.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA LA ESMERALDA.
4. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: CARLOS EMILIO RAMIREZ, C.C. 3.529.475.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES

	EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA CASCAJO ARRIBA.
5. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: CLAUDIA ARISTIZABAL SOTO, C.C. 21.481.242.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA LA ESPERANZA.
6. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: BLANCA EDILMA GIL VALLEJO, C.C. 43.469.273.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN LA VEREDA ALTO DE LOS CABUYOS.
7. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: ELIGIO DE JESÚS GARCÍA ARBOLEDA, C.C. 15.429.002.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA ALTO DE LOS CABUYOS.
8. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: GERARDO DE JESÚS GÓMEZ GIRALDO, C.C. 70.901.261.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN LA VEREDA CRISTO REY.
9. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: JAIME DE JESÚS DUQUE GARCÍA, C.C 70.903.804.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN SECTOR LA VEREDA ALTO DE LOS CABUYOS.
10. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: JORGE IVAN ECHEVERRY GARCÍA, C.C. 71.118.956.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA CASCAJO ARRIBA.

<p>11. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LEONEL DE JESUS GIRALDO, C.C. 71.187.286.</p>	<p>SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA LLANADAS,</p>
<p>12. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LUIS FERNANDO MUNERA LONDOÑO, C.C. 70.901.194.</p>	<p>SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN SECTOR LA VEREDA ALTO DE LOS CABUYOS.</p>
<p>13. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LUZ AMÉRICA GIRALDO ALZATE, C.C. 43.469.930.</p>	<p>SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA SAN BOSCO.</p>
<p>14. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: MARIA MARGARITA GARCÍA GONZALEZ, C.C. 39.184.518.</p>	<p>SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN LA VEREDA CASCAJO ARRIBA.</p>
<p>15. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: MARTHA ELENA MONTOYA GONZÁLES, C.C. 43.796.199.</p>	<p>SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA CASCAJO ABAJO.</p>
<p>16. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: SERGIO DUQUE RAMIREZ, C.C. 15.464.635.</p>	<p>SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA ALTO DEL MERCADO.</p>
<p>17. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: CARLOS CEBALLOS HINCAPIE, C.C. 70.903.499.</p>	<p>SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES</p>

	EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA LA MILAGROSA.
18. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: DIANA MILENA GOMEZ, C.C. 53.036.502.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA LA MILAGROSA.
19. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LUIS FELIPE BUITRAGO DUQUE, C.C. 1.038.414.887.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA LA MILAGROSA.
20. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: EDWIN ALEXI HINCAPIE GIRALDO, C.C. 70.908.407.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA LA ESPERANZA.
21. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LUZ MARINA QUINTERO CASTRO, C.C. 1.038.409.288.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA CIMARRONAS.
22. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: FRANCISCO JAVIER TORRES OROZCO, C.C. 70.698.032.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA SANTA CRUZ.
23. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: ADRIAN CAMILO HIDALGO MONTOYA, C.C. 98.461.035.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA SANTA CRUZ.

<p>24. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: DONELIA OROZCO MARIN, C.C. 21,963.336.</p>	<p>SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA SANTA CRUZ.</p>
<p>25. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: JONATHAN ALBEIRO GALVIS GIRALDO, C.C. 1.038.411.165.</p>	<p>SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA CAMPO ALEGRE.</p>
<p>26. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: BERTA OLIVA GIRALDO ARISTIZABAL, C.C. 43.795.810.</p>	<p>SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA CAMPO ALEGRE.</p>
<p>27. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ CORREA, C.C. 43.113.038.</p>	<p>SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA MONTAÑITAS.</p>
<p>28. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: JORGE ORLANDO DUQUE RAMIREZ, C.C. 70.904.250.</p>	<p>SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA ALTO DEL MERCADO.</p>
<p>29. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LUZ PIEDAD MARIN OSPINA, C.C. 43.960.251.</p>	<p>SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA SALTO ARRIBA.</p>
<p>30. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: ARGEMIRO MARÍN HENAO, C.C. 70.904.550.</p>	<p>SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES</p>

	EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA EL ROSARIO.
31. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: DEISI PAOLA RAMIREZ BOTERO, C.C. 1.036.960.986.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA YARUMOS.
32. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LUIS ALBERTO GOMEZ BOTERO, C.C. 1.038.406.041.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA YARUMOS.
33. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LINA PATRICIA FLORES MURILLO, C.C. 1.035.225.445.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA SALTO ABAJO.

AVANCE DE OBRA

El avance de obra corresponde al seguimiento técnico y administrativo de las actividades ejecutadas durante el desarrollo del contrato, de acuerdo con el cronograma establecido, los ítems del objeto contractual y los lineamientos técnicos definidos. A través de este apartado se presenta el progreso físico y operativo del proyecto, permitiendo evidenciar el cumplimiento de metas parciales, así como la trazabilidad de las actividades desarrolladas en campo.

La información que se expone a continuación incluye la relación de actividades ejecutadas, fechas clave, porcentajes de avance por etapa y observaciones relevantes, con el fin de documentar de manera detallada y verificable el desarrollo del proyecto hasta su finalización.

A continuación, se relaciona el reporte general de programación del proyecto con fecha de corte al 06 de junio 2025, donde se observa que se generó un adelanto del 70.59% de acuerdo a programación prevista de manera inicial:



Informe de programación:

% Programado	% Avance Real	Fin Línea Base inicial	Fin Línea Base final	Avance en plazo (adelanto)
29.41%	100%	09/05/2025	19/08/2025	70.59%

TABLA No. 3. CUADRO MES DE ABRIL PROGRAMACIÓN GENERAL.

DIAGRAMA DE GANTT – PROGRAMACIÓN PROYECTADA DE MANERA INICIAL:

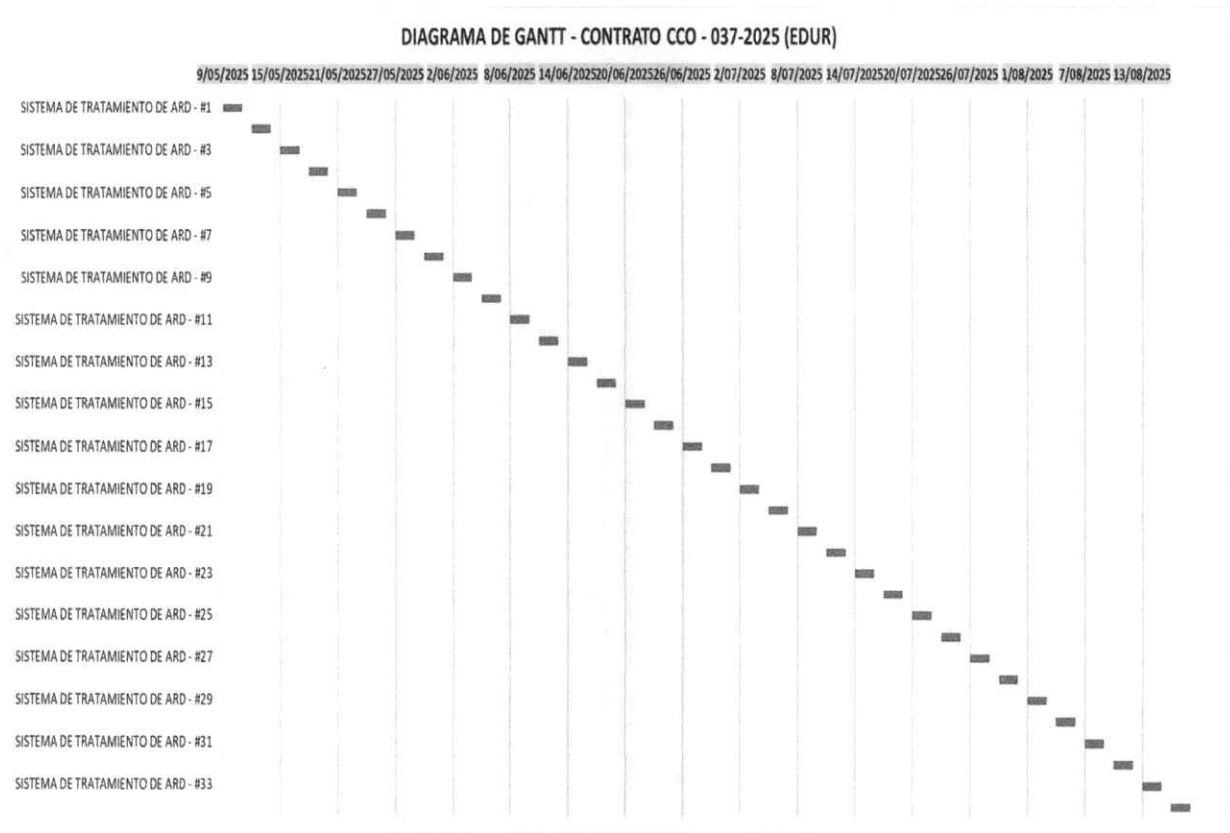


GRAFICO No. 1. PROGRAMACIÓN DE OBRA.

INFORMACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO:

A continuación, se relaciona el presupuesto previsto para la inversión al contrato con base a la programación prevista.

NOMBRE ACTIVIDAD	FECHA INICIO	DURACIÓN EN DÍAS	FECHA FIN	PRESUPUESTO PLAN DE INVERSIÓN
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #1	9/05/2025	2	11/05/2025	\$ 5.663.917,33
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #2	12/05/2025	2	14/05/2025	\$ 11.327.834,66
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #3	15/05/2025	2	17/05/2025	\$ 16.991.751,99
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #4	18/05/2025	2	20/05/2025	\$ 22.655.669,32
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #5	21/05/2025	2	23/05/2025	\$ 28.319.586,65
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #6	24/05/2025	2	26/05/2025	\$ 33.983.503,98
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #7	27/05/2025	2	29/05/2025	\$ 39.647.421,31
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #8	30/05/2025	2	1/06/2025	\$ 45.311.338,63
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #9	2/06/2025	2	4/06/2025	\$ 50.975.255,96
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #10	5/06/2025	2	7/06/2025	\$ 56.639.173,29
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #11	8/06/2025	2	10/06/2025	\$ 62.303.090,62
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #12	11/06/2025	2	13/06/2025	\$ 67.967.007,95
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #13	14/06/2025	2	16/06/2025	\$ 73.630.925,28
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #14	17/06/2025	2	19/06/2025	\$ 79.294.842,61
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #15	20/06/2025	2	22/06/2025	\$ 84.958.759,94
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #16	23/06/2025	2	25/06/2025	\$ 90.622.677,27
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #17	26/06/2025	2	28/06/2025	\$ 96.286.594,60
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #18	29/06/2025	2	1/07/2025	\$ 101.950.511,93
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #19	2/07/2025	2	4/07/2025	\$ 107.614.429,26

SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #20	5/07/2025	2	7/07/2025	\$ 113.278.346,59
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #21	8/07/2025	2	10/07/2025	\$ 118.942.263,92
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #22	11/07/2025	2	13/07/2025	\$ 124.606.181,25
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #23	14/07/2025	2	16/07/2025	\$ 130.270.098,58
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #24	17/07/2025	2	19/07/2025	\$ 135.934.015,90
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #25	20/07/2025	2	22/07/2025	\$ 141.597.933,23
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #26	23/07/2025	2	25/07/2025	\$ 147.261.850,56
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #27	26/07/2025	2	28/07/2025	\$ 152.925.767,89
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #28	29/07/2025	2	31/07/2025	\$ 158.589.685,22
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #29	1/08/2025	2	3/08/2025	\$ 164.253.602,55
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #30	4/08/2025	2	6/08/2025	\$ 169.917.519,88
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #31	7/08/2025	2	9/08/2025	\$ 175.581.437,21
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #32	10/08/2025	2	12/08/2025	\$ 181.245.354,54
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #33	13/08/2025	2	15/08/2025	\$ 186.909.271,87
SISTEMA DE TRATAMIENTO DE ARD - #34	16/08/2025	2	18/08/2025	\$ 192.573.189,20

A continuación, se relaciona la inversión real realizada con base al 100% ejecutado de los 33 sistemas sépticos instalados:

INVERSIÓN A LA FECHA		POR EJECUTAR	
\$187.117.591	100%	\$0,00	0%

TABLA NO. 4. INVERSIÓN DEL PROYECTO.



PLAN DE INVERSIÓN CONTRATO CCO-037-2025 (EDUR)

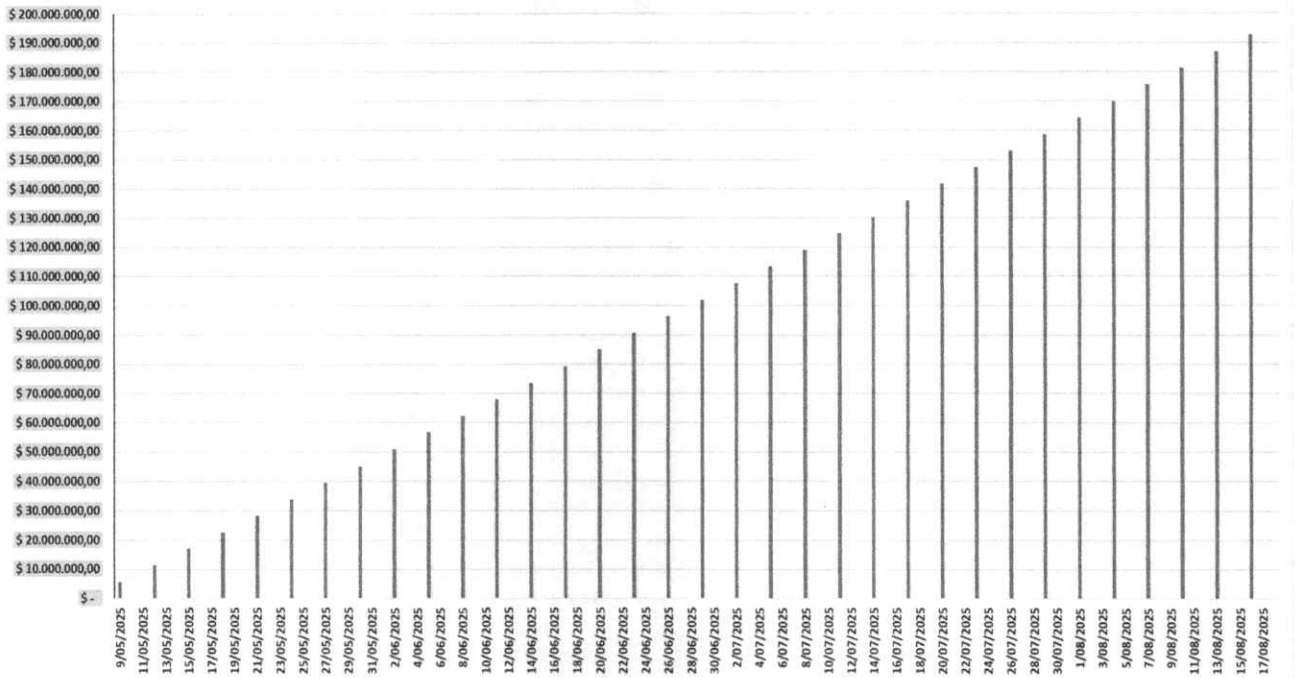


GRAFICO No. 2. PLAN DE INVERSIÓN PREVISTA.

10- CONTROL DE COSTOS						
Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$	%
Directos+AIU+IVA	\$ 220.892.775,48	\$ 220.892.775	\$ 187.117.591	100,00%	\$ 0,00	0,00%
Adiciones	N/A	\$ 0				
Reducciones		\$ 33.775.184				
TOTAL	\$ 220.892.775,48	\$ 187.117.591				

11- CONTROL PAGOS		
DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 220.892.775	NO SE HA REALIZADO NINGÚN COBRO A LA FECHA
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	\$ 33.775.184	
VALOR TOTAL	\$ 187.117.591	VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE PERIODO.



FERREAGRO Marinilla SAS
 NIT 901.157.946-5
 DIRECCIÓN: CALLE 28 N°24-71

FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN OBRA PÚBLICA

Versión 00-1
 Vigencia 01/01/2025

1- INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

FECHA INFORME: 06/06/2025 PERIODO REPORTADO DEL: 09/05/2025 AL: 06/06/2025

CONTRATO N°: CCO-037-2025 CONTRATANTE: EMPRESA DE DESARROLLO TERRITORIAL URBANO Y RURAL DE MARINILLA "EDUR"

OBJETO: "CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.

FECHA DE INICIO: 09/05/2025 FECHA DE TERMINACIÓN: 26/08/2025

VALOR INICIAL: \$ 220,892,775 VALOR ADICIONAL (Si aplica): \$ 0.00 VALOR REDUCCIÓN (Si aplica): \$ 33,775,184 VALOR TOTAL: \$ 187,117,591

2- ESTADO DEL CONTRATO OBSERVACIONES

Se da inicio al contrato el día 09 de mayo 2025 según programación radicada ante entidad contratante y se cuenta con un plazo de 5 meses a partir de la suscripción del acta de inicio sin sobrepasar el 26 de agosto 2025, como se indica en el plazo del contrato de obra.

De acuerdo a reunión realizada en las instalaciones del EDUR se indicó que se tenía viabilidad y aprobación para la instalación de 34 pozos.

A continuación se relaciona la programación del programado Vs ejecutado, y los sistemas instalados en cada uno de beneficiarios y su ubicación según informe que consolida la verificación de saneamiento rural del Municipio de Marinilla.

3- RECURSOS DEL CONTRATISTA

Manuales, Certificados y Otros		Materiales en Obra		Equipos en Obra		Personal en obra y administrativo		Dedicación contractual	Dedicación ejecutada	Cumplio/ No cumplimiento	Observaciones
Detalle	Obs/Resultado	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	Detalle	Cantidad	%	%	SI/ No	Detalle
CERTIFICADO Y MANUAL PARA LA INSTALACIÓN SISTEMAS SEPTICOS ROTOVEL	SE CUENTA CON CERTIFICADO	Sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado integrado	34	PULIDORA	3	RESIDENTE DE OBRA	1	30	30	SI	PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
		Arenilla	10.2	TALADRO	1	ASESOR SISO	1	20	20	SI	PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
		TRITURADO	13.6	PALAS	4	AUXILIAR TÉCNICO	1	100	100	SI	SI CUMPLE CON PRESENCIA EN OBRA.
		LIMPIADOR PVC	34	PICAS	4	MAESTRO	1	100	100	SI	SI CUMPLE CON PRESENCIA EN OBRA.
		Soldadura líquida PVC tubería PVC sanitaria de 4"	34	MANIJAS	2	AYUDANTE ENTENDIDO	1	100	100	SI	SI CUMPLE CON PRESENCIA EN OBRA.
		ACCESORIO S PVC 4"	408			AYUDANTE	1	100	100	SI	SI CUMPLE CON PRESENCIA EN OBRA.
			170			ASESOR ADMINISTRATIVO	1	20	20	SI	PERSONAL TÉCNICO ADMINISTRATIVO
TOTAL							7				

4- CONTROL DE PROGRAMACIÓN (Se lleva control por las 34 unidades indicadas en estudio)

PORCENTAJE PONDERADA EN OBRA
























EJECUCIÓN MENSUAL (MES REPORTADO)		EJECUTADO TOTAL A LA FECHA	PROGRAMADO TOTAL A LA FECHA	ATRASO (-) / ADELANTO (+)
MESES ANTERIOR	0.00%	100.00%	29.41%	70.59%
MES DE MAYO Y JUNIO	100.00%			

GRAFICO DE OBRA PROGRAMADA Vs. EJECUTADA



GRAFICO DE PORCENTAJE PROGRAMADO Vs EJECUTADO POR CAPITULOS DE LA PRESENTE SEMANA

CAPITULOS	AVANCE	GRAFICO DE PORCENTAJE	TOTAL
1. AURA ROSA GALLO DUQUE	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
2. BERTHA OLIVA	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
3. BLANCA OLIVA GIRALDO CASTAÑO	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
4. CARLOS EMILIO RAMIREZ	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
5. CLAUDIA ARISTIZABAL SOTO	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%
6. BLANCA EDILMA GIL VALLEJO	PROGRAMADO		100.00%
	EJECUTADO		100.00%

7. ELIGIO GARCÍA	PROGRAMA DO		100.00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100.00%
8. GERARDO GOMEZ	PROGRAMA DO		100.00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100.00%
9. JAIME DE JESÚS DUQUE GARCÍA	PROGRAMA DO		100.00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100.00%
10. JORGE GARCÍA	PROGRAMA DO		100.00%
	EJECUTADO	90% 95% 100%	100.00%
11. LEONEL GIRALDO	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%
12. LUIS FERNANDO MUNERA	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%
13. LUZ AMÉRICA	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%
14. MARGARITA GARCÍA	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%
15. MARTHA MONTOYA	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%
16. SERGIO DUQUE	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%
17. CARLOS CEBALLOS HINCAPIE	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%
18. DIANA MILENA GOMEZ	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%
19. LUIS FELIPE BUITRAGO DUQUE	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%
20. EDWIN ALEXI HINCAPIE GIRALDO	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%
21. LUZ MARINA QUINTERO CASTRO	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%
22. FRANCISCO JAVIER TORRES OROZCO	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%
23. ADRIAN CAMILO HIDALGO MONTOYA	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%
24. DONELIA OROZCO MARIN	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%
25. JONATHAN ALBEIRO GALVIS GIRALDO	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%
26. BERTA OLIVA GIRALDO ARISTIZABAL.	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%
27. CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ CORREA	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%
28. JORGE ORLANDO DUQUE RAMIREZ	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%
29. LUZ PIEDAD MARIN OSPINA	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO	0% 5% 10% 15% 20% 25% 30% 35% 40% 45% 50% 55% 60% 65% 70% 75% 80% 85% 90% 95% 100%	100.00%

30. ARGEMIRO MARÍN HENAO	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO		100.00%
31. DEISI PAOLA RAMIREZ BOTERO	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO		100.00%
32. LUISA ALBERTO GOMEZ BOTERO	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO		100.00%
33. LINA PATRICIA FLORES MURILLO	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO		100.00%
34. DESISTIMIENTO	PROGRAMA DO		0.00%
	EJECUTADO		0.00%

5- PLAZO (DÍAS)			
Cant. Dias	Total	Transcurrido	Faltantes
Contractual	110	29	81
Proyección	32	29	3

6- ESQUEMA DE PLANO MARINILLA Y SISTEMA SÉPTICO

* SISTEMA SÉPTICO INTEGRADO DE 2.000 LITROS

Material de concreto (m ³)	2000
Material de acero (kg)	1400
Material de fibra de vidrio (m ²)	627
Material de plástico (kg)	100

7- ESTADO DE LA OBRA Y PROYECCIÓN

Días transcurridos de la obra	Días (atraso/adelanto)	Fecha Terminación Obra Proyectada
29	78	09/06/2025

8- DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO	9- ACTIVIDADES REALIZADAS Y PENDIENTES DE INICIO.			
	Actividades ejecutadas y observaciones.		SISTEMA SÉPTICO ENTREGADO A PROPIETARIO	
1. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: AURA ROSA GALLO DUQUE, C.C. 43.470.154.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN ÁREA RURAL, PREDIO UBICADO EN LA CEREDA ALTO DE LOS CABUYOS.	SI	x	NO
2. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: BERTHA OLIVA DUQUE RAMÍREZ, C.C. 21.872.945.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN ÁREA RURAL, PREDIO UBICADO EN LA VEREDA ALTO DEL MERCADO.	SI	x	NO
3. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: BLANCA OLIVA GIRALDO CASTAÑO, C.C. 43.960.567.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN ÁREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA LA ESMERALDA.	SI	x	NO
4. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: CARLOS EMILIO RAMIREZ, C.C. 3.529.475.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN ÁREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA CASCAJO ARRIBA.	SI	x	NO
5. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: CLAUDIA ARISTIZABAL SOTO, C.C. 21.481.242.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN ÁREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA LA ESPERANZA.	SI	x	NO
6. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: BLANCA EDILMA GIL VALLEJO, C.C. 43.489.273.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN ÁREA RURAL, PREDIO UBICADO EN LA VEREDA ALTO DE LOS CABUYOS.	SI	x	NO
7. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: ELIGIO DE JESÚS GARCÍA ARBOLEDA, C.C. 15.429.002.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN ÁREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA ALTO DE LOS CABUYOS.	SI	x	NO
8. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: GERARDO DE JESÚS GÓMEZ GIRALDO, C.C. 70.901.261.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN ÁREA RURAL, PREDIO UBICADO EN LA VEREDA CRISTO REY.	SI	x	NO
9. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: JAIME DE JESÚS DUQUE GARCÍA, C.C. 70.903.804.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN ÁREA RURAL, PREDIO UBICADO EN SECTOR LA VEREDA ALTO DE LOS CABUYOS.	SI	x	NO
10. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: JORGE IVAN ECHEVERRY GARCÍA, C.C. 71.118.956.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN ÁREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA CASCAJO ARRIBA.	SI	x	NO
11. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LEONEL DE JESUS GIRALDO, C.C. 71.187.286.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN ÁREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA LLANADAS.	SI	x	NO
12. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LUIS FERNANDO MUNERA LONDOÑO, C.C. 70.901.194.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN ÁREA RURAL, PREDIO UBICADO EN SECTOR LA VEREDA ALTO DE LOS CABUYOS.	SI	x	NO
13. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LUZ AMÉRICA GIRALDO ALZATE, C.C. 43.469.930.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN ÁREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA SAN BOSCO.	SI	x	NO
14. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: MARIA MARGARITA GARCÍA GONZALEZ, C.C. 39.184.518.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN ÁREA RURAL, PREDIO UBICADO EN LA VEREDA CASCAJO ARRIBA.	SI	x	NO

15. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: MARTHA ELENA MONTOYA GONZÁLES, C.C. 43.796.199.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA CASCAJO ABAJO.	SI	x	NO
16. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: SERGIO DUQUE RAMIREZ, C.C. 15.464.635.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA ALTO DEL MERCADO.	SI	x	NO
17. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: CARLOS CEBALLOS HINCAPIE, C.C. 70.903.499.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA LA MILAGROSA.	SI	x	NO
18. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: DIANA MILENA GOMEZ, C.C. 53.036.502.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA LA MILAGROSA.	SI	x	NO
19. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LUIS FELIPE BUITRAGO DUQUE, C.C. 1.038.414.887.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA LA MILAGROSA.	SI	x	NO
20. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: EDWIN ALEXI HINCAPIE GIRALDO, C.C. 70.908.407.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA LA ESPERANZA.	SI	x	NO
21. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LUZ MARINA QUINTERO CASTRO, C.C. 1.038.409.288.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA CIMARRONAS.	SI	x	NO
22. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: FRANCISCO JAVIER TORRES OROZCO, C.C. 70.698.032.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA SANTA CRUZ.	SI	x	NO
23. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: ADRIAN CAMILO HIDALGO MONTOYA, C.C. 98.461.035.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA SANTA CRUZ.	SI	x	NO
24. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: DONELIA OROZCO MARIN, C.C. 21,963.338.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA SANTA CRUZ.	SI	x	NO
25. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: JONATHAN ALBEIRO GALVIS GIRALDO, C.C. 1.038.411.165.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA CAMPO ALEGRE.	SI	x	NO
26. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: BERTA OLIVA GIRALDO ARISTIZABAL, C.C. 43.795.810.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA CAMPO ALEGRE.	SI	x	NO
27. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ CORREA, C.C. 43.113.038.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA MONTAÑITAS.	SI	x	NO
28. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: JORGE ORLANDO DUQUE RAMIREZ, C.C. 70.904.250.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA ALTO DEL MERCADO.	SI	x	NO
29. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LUZ PIEDAD MARIN OSPINA, C.C. 43.960.251.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA SALTO ARRIBA.	SI	x	NO
30. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: ARGEMIRO MARÍN HENAO, C.C. 70.904.550.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA EL ROSARIO.	SI	x	NO
31. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: DEISI PAOLA RAMIREZ BOTERO, C.C. 1.036.960.986.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA YARUMOS.	SI	x	NO
32. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LUIS ALBERTO GOMEZ BOTERO, C.C. 1.038.406.041.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA YARUMOS.	SI	x	NO
33. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LINA PATRICIA FLORES MURILLO, C.C. 1.035.225.445.	SE REALIZÓ EL SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA DE TRATAMIENTOS DE AGUAS RESIDUALES EN AREA RURAL, PREDIO UBICADO EN VEREDA SALTO ABAJO.	SI	x	NO

OBSERVACIONES: SE INSTALARON 33 SISTEMAS SÉPTICOS, PARA COMPLETAR LOS 34 QUE SE INDICÓ POR PARTE DE LA EDUR, SE HAN DESARROLLADO ACTIVIDADES SIN NOVEDAD. EN LOS CASOS DONDE SE HA PRESENTADO ALGÚN TIPO DE NOVEDAD SE DEJA REGISTRO EN BITÁCORA DE OBRA
 NOTA: EL SISTEMA SÉPTICO #34 DEL SR IVAN ALBERTO HINCAPIE NO SE REALIZARÁ LA INSTALACIÓN.

10- CONTROL DE COSTOS

Detalle	Presupuesto		Inversión a la Fecha		Por Ejecutar	
	INICIAL	ACTUAL (Adiciones y/o reducciones)	\$	%	\$	%
Directos+AIU+IVA	\$ 220,892,775.48	\$ 220,892,775	\$ 187,117,591	100.00%	\$ 0.00	0.00%
Adiciones	N/A	\$ 0				
Reducciones		\$ 33,775,184				
TOTAL	\$ 220,892,775.48	\$ 187,117,591				

11- CONTROL PAGOS

DETALLE DE PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL	\$ 220,892,775	NO SE HA REALIZADO NINGÚN COBRO A LA FECHA
VALOR ADICIONAL (Si aplica)	\$ 0	
VALOR REDUCIDO (Si aplica)	\$ 33,775,184	VALOR A COBRAR EN EL PRESENTE PERIODO.
VALOR TOTAL	\$ 187,117,591	



FERREAGRIO Marínilla SAS
NIT 901.157.946-5

DIRECCIÓN: CALLE 28 N°24-71

PROYECTO: SCONTRAT DE OBRA N° CCO-037-2025: CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD

PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA

ENTIDAD CONTRATANTE: MUNICIPIO DE MARINILLA

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO ENTRE CORNARE Y MUNICIPIO DE MARINILLA: S-CI-726-2024

VALOR TOTAL: \$ 220,892,775

VALOR ADICIONALES: \$ -

VALOR DEDUCCION: \$ 33,775,184

VALOR FINAL: \$ 187,117,591

EJECUCION ACUMULADA: \$ 187,117,591

FECHA DE CORTE: 06/06/2025

FECHA DEL ACTA: 06-jun-25

DIAS DE EJECUCION CONTI: 40

PERCENTAJE ELEC: 100%


ITEM	DESCRIPCION	SUBACTIVIDA D	DESCRIPCION	UNIDA D	CANTIDA D	CONTRATUAL			ACTA N°1 CANTIDAD OBRA ADICIONAL	VALOR EJECUTADO	ACUMULADO DE OBRA		% EJECUCION
						VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD OBRA			CANTIDAD ACUMULADA	VALOR ACUMULADO	
1.10			Tubería PVC sanitaria de 4" dispuesta en una brecha de 0.40 m de profundidad por 0.30 m de ancho con pendiente del 3%.	m	468.0	\$ 24,810	\$ 11,611,080	396.00	0	\$ 9,824,760	396.00	9,824,760	85%
1.20			Unión PVC 4"	un	39.0	\$ 7,640.00	\$ 297,960	33.00	0	\$ 252,120	33.00	252,120	85%
1.30			Codo PVC 4"	un	39.0	\$ 12,929.00	\$ 504,231	33.00	0	\$ 426,657	33.00	426,657	85%
1.40			Buje 3" a 4"	un	39.0	\$ 9,727.00	\$ 379,353	33.00	0	\$ 320,991	33.00	320,991	85%
1.50			Sifón 4"	un	39.0	\$ 23,763.00	\$ 967,557	33.00	0	\$ 784,179	33.00	784,179	85%
1.60			Soldadura líquida PVC	g/4	0.156	\$ 78,339.00	\$ 12,221	0.132	0	\$ 10,341	0.132	10,341	85%
1.70			Limpiador removedor para PVC	g/4	0.156	\$ 45,698.00	\$ 7,129	0.132	0	\$ 6,032	0.132	6,032	85%
1.80			Arenilla	m3	11.700	\$ 32,641.00	\$ 381,900	9.900	0	\$ 323,146	9.900	323,146	85%
1.90	Suministro, instalación, conexión a vivienda y Sistema de tratamiento prefabricado integrado.		Sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado integrado. Séptico con un volumen nominal mínimo de 1500 Litros * y un diámetro en el FAFA de 0.30 m3, para un volumen total del sistema integrado séptico más FAFA de mínimo de 2000 L y los accesorios requeridos para empalmar con las tuberías de PVC de 4 pulgadas de entrada del afluente y de salida del efluente.	un	39.0	\$ 2,789,918.00	\$ 108,806,802	33.0	0	\$ 92,067,294	33.00	92,067,294	85%
1.10			Oficial	un	39.0	\$ 95,141.50	\$ 3,710,519	33.0	0	\$ 3,139,670	33.00	3,139,670	85%
1.11			Excavación manual material común seco 0-2 m	m3	175.5	\$ 37,934.00	\$ 6,657,417	148.5	0	\$ 5,633,199	148.50	5,633,199	85%
1.12			Lleno y apisonamiento de material excavado	m3	39.0	\$ 27,709.00	\$ 1,080,651	33.0	0	\$ 914,397	33.00	914,397	85%
1.13			Ayudante	un	39.0	\$ 68,502.00	\$ 2,671,578	33.0	0	\$ 2,260,566	33.00	2,260,566	85%
1.14			Herramienta menor	un	39.00	\$ 14,482.24	\$ 564,807	33.00	0	\$ 477,914	33.00	477,914	85%
2	Transporte vehicular del sistema séptico y todos los accesorios adecuados para su correcta instalación.		Transporte casco urbano al sitio de la obra.	Vieje	39.0	\$ 236,566	\$ 9,226,074	33.00	0	\$ 7,806,678	33.00	7,806,678	85%
3	Suministro e instalación del sistema de disposición del efluente		Disposición de efluente (cualquiera de las tres opciones)	gl	39.0	\$ 835,188	\$ 32,572,332	33.00	0	\$ 27,561,204	33.00	27,561,204	85%
4	Capacitación (taller) en la operación y mantenimiento del sistema de tratamiento.		Taller	Taller	39.0	\$ 35,123.00	\$ 1,369,797	33.00	0	\$ 1,159,059	33.00	1,159,059	85%
5	Suministro, transporte e instalación de valla acorde lineamientos Cornare		Valla publicitaria del convenio	Unidad	39.0	\$ 7,155,000	\$ 279,045	33.00	0	\$ 236,115	33.00	236,115	85%







SUBTOTAL	\$ 181,059,652	\$ 153,204,321	\$ 153,204,321
VALOR DE ADMINISTRACIÓN - UTILIDAD (22%)	\$ 39,833,123	\$ 33,913,270	\$ 33,913,270
TOTAL	\$ 220,892,775	\$ 187,117,591	\$ 187,117,591


Alberto Esquivel S.
RESIDENTE DE OBRA
FERREAGRIO MARINILLA



















INTERVENTORIA


SUPERVISOR DEL MUNICIPIO

	4. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: CARLOS EMILIO RAMIREZ, C.C. 3.529.475. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	4 de 33

FECHA ELABORACIÓN:	30 5 2025	No. INFORME	1	MES	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		
					
FECHA FOTO: 20/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 20/05/2025 DESCRIPCION:			
					
FECHA FOTO: 20/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 20/05/2025 DESCRIPCION:			
					
FECHA FOTO: 20/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 20/05/2025 DESCRIPCION:			

	5. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: CLAUDIA ARISTIZABAL SOTO, C.C. 21.481.242. CONTRATISTA DE OBRAS	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	5 de 33
<p>Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.</p>			

FECHA ELABORACIÓN:	<input type="text" value="30"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2025"/>	No. INFORME	<input type="text" value="1"/>	MES	<input type="text" value="5"/>												
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	<p>“CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA.” Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.</p>																
LUGAR	<input type="text" value="MARINILLA - ANTIOQUIA"/>																
CONTRATO OBRA No:	<input type="text" value="CCO-037-2025"/>	CONTRATISTA	<input type="text" value="FERREAGRO Marinilla SAS"/>														
CONTRATO INTERVENTORIA No:	<input type="text"/>	INTERVENTORIA	<input type="text" value="UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA"/>														
<table border="1"> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION: </td> <td> FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION: </td> </tr> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION: </td> <td> FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION: </td> </tr> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION: </td> <td> FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION: </td> </tr> </table>								FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION:			FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION:			FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION:
																	
FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION:																
																	
FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION:																
																	
FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION:																

	1. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: AURA ROSA GALLO DUQUE, C.C. 43.470.154. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	1 de 33

FECHA ELABORACIÓN:

30	5	2025
----	---	------

 No. INFORME

1

 MES

5

OBJETO DEL CONTRATO OBRA: "CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.

LUGAR: MARINILLA - ANTIOQUIA

CONTRATO OBRA No:

CCO-037-2025

 CONTRATISTA:

FERREAGRO Marinilla SAS

CONTRATO INTERVENTORIA No:


--

 INTERVENTORIA:

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA




FECHA FOTO: 19/05/2025
DESCRIPCION: EXCAVACIÓN Y FIJACIÓN DE TUBERÍA.

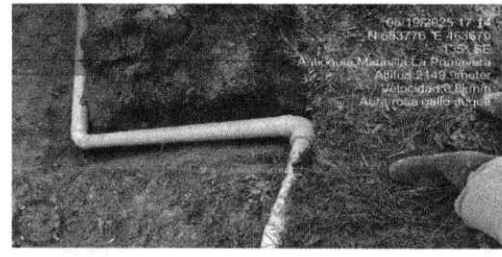


FECHA FOTO: 19/05/2025
DESCRIPCION: BRECHA Y FIJACIÓN DE TUBERÍA SANITARIA.



FECHA FOTO: 19/05/2025
DESCRIPCION: INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN.

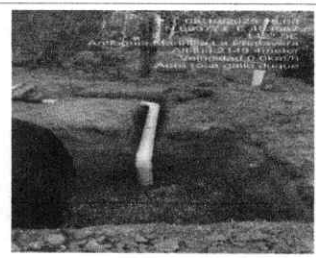



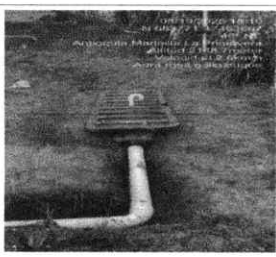




FECHA FOTO: 19/05/2025
DESCRIPCION: LLENO CON MATERIAL GRANULAR.










FECHA FOTO: 19/05/2025
DESCRIPCION: Lleno con material de sitio,

FECHA FOTO: 19/05/2025
DESCRIPCION:

	2. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: BERTHA OLIVA DUQUE RAMÍREZ, C.C. 21.872.945. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	2 de 33

FECHA ELABORACIÓN:	30 5 2025	No. INFORME	1	MES	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		
					
FECHA FOTO: 21/05/2025 DESCRIPCION: RELLENO CON MATERIAL GRANULAR Y GEOTEXTIL		FECHA FOTO: 21/05/2025 DESCRIPCION: BRECHA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA 4".			
					
FECHA FOTO: 21/05/2025 DESCRIPCION: GEOTEXTIL.		FECHA FOTO: 21/05/2025 DESCRIPCION:			
					
FECHA FOTO: 21/05/2025 DESCRIPCION: INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE TANQUE.		FECHA FOTO: 21/05/2025 DESCRIPCION: RELLENO CON MATERIAL DE SITIO.			

	3. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: BLANCA OLIVA GIRALDO CASTAÑO, C.C. 43.960.567.	CODIGO No.	
	CONTRATISTA DE OBRAS	VERSIÓN:	00-1
	Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	3 de 33

FECHA ELABORACIÓN:	30 5 2025	No. INFORME	1	MES	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		
					
FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION: EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO NATURAL.		FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION: INSTALACIÓN DE TUBERÍA Y GEOTEXTIL.			
					
FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION: MATERIAL GRANULAR TRITURADO.		FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION: RELLENO DE EXCAVACIÓN PERIMETRAL A BORDO.			
					
FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 26/05/2025 DESCRIPCION:			

12- CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES CONTRATISTA (Se deben enunciar todas las actividades que deben ser realizadas por el Contratista, registradas en los estudios previos y la minuta del contrato)


ACTIVIDAD	ENTREGADO	APROBADO	CUMPLIÓ	OBSERVACIONES
PRESENTACION HOJAS DE VIDA CONTRATISTA	SI	SI	SI	SE RADICÓ LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN ANTE INTERVENTORÍA, DANDO CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS.
PRESENTACION PROGRAMACION DE OBRA CONTRATISTA	SI	SI	SI	SE RADICÓ LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN ANTE INTERVENTORÍA, DANDO CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS.
PRESENTACION APORTES SEGURIDAD SOCIAL -PARAFISCALES	SI	SI	SI	SE RADICÓ LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN ANTE INTERVENTORÍA, DANDO CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS.
PRESENTACIÓN PROGRAMACIÓN DE OBRA	SI	SI	SI	SE RADICÓ LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN ANTE INTERVENTORÍA, DANDO CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS.
PRESENTACION PLAN DE INVERSION DEL ANTICIPO DE OBRA	SI	SI	SI	SE RADICÓ LA RESPECTIVA DOCUMENTACIÓN ANTE INTERVENTORÍA, DANDO CUMPLIMIENTO DE LOS LINEAMIENTOS.

13- OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES

Se presenta un desistimiento por parte del propietario Ivan Alberto Hincapie Orozco, identificado con cedula 70952731 motivo por el cual no se realiza la instalación.


14- EL TIEMPO EXISTENTE FUE ASI (Condiciones Climaticas):

SEMANA 1: SE PRESENTARON LLUVIAS INTERMITENTES EN HORARIOS DE LA MAÑANA.
 SEMANA 2: SE PRESENTARON LLUVIAS INTERMITENTES EN HORARIOS DE LA TARDE.
 SEMANA 3: SE PRESENTARON DÍAS SOLEADOS
 SEMANA 4: SE PRESENTARON LLUVIAS EN HORAS DE LA MAÑANA
 SEMANA 5: SE PRESENTARON DÍAS SOLEADOS.







<p>ELABORO:</p> <p><i>Alberto Esguerra Serna</i></p> <p>ALBERTO ESGUERRA SERNA Ingeniero Residente de Contratista C.C. 1.070.619.242 De Girardot</p>	<p>REVISO:</p>  <p>JUAN CAMILO GARCÍA ARISTIZÁBAL Representante Legal FERREAGRO S.A.S NIT. 901.757.946-5</p>
--	--


15-ANEXO REGISTRO FOTOGRÁFICO DEL PERÍODO REPORTADO

SE ANEXA REGISTRO FOTOGRÁFICO POR CADA SISTEMA SEPTICO INSTALADO

	6. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: BLANCA EDILMA GIL VALLEJO, C.C. 43.469.273.	CODIGO No.	
	CONTRATISTA DE OBRAS	VERSIÓN:	00-1
	Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	6 de 33


FECHA ELABORACIÓN:	<input type="text" value="30"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2025"/>	No. INFORME	<input type="text" value="1"/>	MES	<input type="text" value="5"/>
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	<input type="text" value="MARINILLA - ANTIOQUIA"/>				
CONTRATO OBRA No:	<input type="text" value="CCO-037-2025"/>	CONTRATISTA	<input type="text" value="FERREAGRO Marinilla SAS"/>		
CONTRATO INTERVENTORIA No:	<input type="text"/>	INTERVENTORIA	<input type="text" value="UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA"/>		

	
FECHA FOTO: 19/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 19/05/2025 DESCRIPCION:
	
FECHA FOTO: 19/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 19/05/2025 DESCRIPCION:
	
FECHA FOTO: 19/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 19/05/2025 DESCRIPCION:

	7. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: ELIGIO DE JESÚS GARCÍA ARBOLEDA, C.C. 15.429.002.		CODIGO No.
	CONTRATISTA DE OBRAS		VERSIÓN: 00-1
	Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.		FECHA: enero-25
			PÁGINA: 7 de 33


FECHA ELABORACIÓN:	<input type="text" value="30"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2025"/>	No. INFORME	<input type="text" value="1"/>	MES	<input type="text" value="5"/>
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	<input type="text" value="MARINILLA - ANTIOQUIA"/>				
CONTRATO OBRA No:	<input type="text" value="CCO-037-2025"/>	CONTRATISTA	<input type="text" value="FERREAGRO Marinilla SAS"/>		
CONTRATO INTERVENTORIA No:	<input type="text"/>	INTERVENTORIA	<input type="text" value="UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA"/>		



	8. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: GERARDO DE JESÚS GÓMEZ GIRALDO, C.C. 70.901.261. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	8 de 33

FECHA ELABORACIÓN:	30 5 2025	No. INFORME	1	MES	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		



	9. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: JAIME DE JESÚS DUQUE GARCÍA, C.C 70.903.804.	CODIGO No.	
	CONTRATISTA DE OBRAS	VERSIÓN:	00-1
	Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	9 de 33

FECHA ELABORACIÓN: No. INFORME MES

OBJETO DEL CONTRATO OBRA: "CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.

LUGAR

CONTRATO OBRA No: CONTRATISTA

CONTRATO INTERVENTORIA No: INTERVENTORIA



FECHA FOTO: 19/05/2025
DESCRIPCION: EXCAVACIÓN MANUAL PARA INSTALACIÓN DEL SISTEMA.



FECHA FOTO: 19/05/2025
DESCRIPCION: LLENO CON MATERIAL GRANULAR TRITURADO.



FECHA FOTO: 19/05/2025
DESCRIPCION: GEOTEXTIL




FECHA FOTO: 19/05/2025
DESCRIPCION: BRECHA E INSTALACIÓN DE TUBERÍA.



FECHA FOTO: 19/05/2025
DESCRIPCION: NIVELACIÓN E INSTALACIÓN DE POZO.



FECHA FOTO: 19/05/2025
DESCRIPCION: RELLENO CON MATERIAL DE SITIO Y CONEXIÓN

	10. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: JORGE IVAN ECHEVERRY GARCÍA, C.C. 71.118.956.	CODIGO No.	
	CONTRATISTA DE OBRAS	VERSIÓN:	00-1
	Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	10 de 33

FECHA ELABORACIÓN:	<input type="text" value="30"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2025"/>	No. INFORME	<input type="text" value="1"/>	MES	<input type="text" value="5"/>
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	<input type="text" value="CCO-037-2025"/>	CONTRATISTA	<input type="text" value="FERREAGRO Marinilla SAS"/>		
CONTRATO INTERVENTORIA No:	<input type="text"/>	INTERVENTORIA	<input type="text" value="UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA"/>		



FECHA FOTO: 23/05/2025
DESCRIPCION: INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL PARA INSTALACIÓN DE FILTRO.



FECHA FOTO: 23/05/2025
DESCRIPCION: CAPA DE TRITURADO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA.



FECHA FOTO: 23/05/2025
DESCRIPCION: FILTRO.




FECHA FOTO: 23/05/2025
DESCRIPCION: INSTALACIÓN Y NIVELACIÓN DE POZO SÉPTICO.



FECHA FOTO: 23/05/2025
DESCRIPCION: LLENO CON MATERIAL DE SITIO.



FECHA FOTO: 23/05/2025
DESCRIPCION: FINALIZACIÓN DE INSTALACIÓN.

	11. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LEONEL DE JESUS GIRALDO, C.C. 71.187.286. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	11 de 33

FECHA ELABORACIÓN: No. INFORME MES


OBJETO DEL CONTRATO OBRA: "CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.

LUGAR

CONTRATO OBRA No: CONTRATISTA

CONTRATO INTERVENTORIA No: INTERVENTORIA



	12. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LUIS FERNANDO MUNERA LONDOÑO, C.C. 70.901.194. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	12 de 33







FECHA ELABORACIÓN: No. INFORME MES


OBJETO DEL CONTRATO OBRA: "CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.

LUGAR



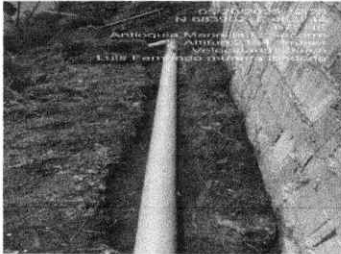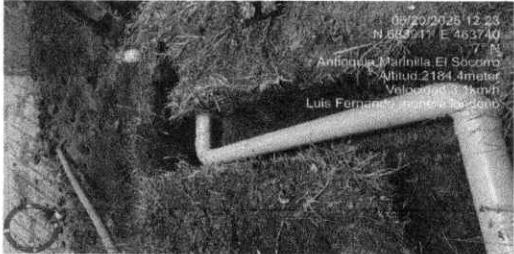



CONTRATO OBRA No: CONTRATISTA


CONTRATO INTERVENTORIA No: INTERVENTORIA



















 <p>20 may 2025 4:56:14 p. m. N. Sin Nombre Marinilla Antioquia Altitud: 199.5m Volc: 0.000000 Luis Fernando Munera Londoño Municipio de Marinilla</p>	
FECHA FOTO: 20/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 20/05/2025 DESCRIPCION:
	 <p>09/20/2025 12:23 N 685717 E 463740 77.7M Antioquia Marinilla El Socorro Altitud: 2184.4meter Volc: 0.000000 Luis Fernando Munera Londoño</p>
FECHA FOTO: 20/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 20/05/2025 DESCRIPCION:
	
FECHA FOTO: 20/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 20/05/2025 DESCRIPCION:


	13. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LUZ AMÉRICA GIRALDO ALZATE, C.C. 43.469.930. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	13 de 33

FECHA ELABORACIÓN:	30 5 2025	No. INFORME	1	MES	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		

	
FECHA FOTO: 22/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 22/05/2025 DESCRIPCION:
	
FECHA FOTO: 22/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 22/05/2025 DESCRIPCION:
	
FECHA FOTO: 22/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 22/05/2025 DESCRIPCION:

	14. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: MARIA MARGARITA GARCÍA GONZALEZ, C.C. 39.184.518.	CODIGO No.	
	CONTRATISTA DE OBRAS	VERSIÓN:	00-1
	Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	14 de 33

FECHA ELABORACIÓN:	<input type="text" value="30"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2025"/>	No. INFORME	<input type="text" value="1"/>	MES	<input type="text" value="5"/>												
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.																
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA																
CONTRATO OBRA No:	<input type="text" value="CCO-037-2025"/>	CONTRATISTA	<input type="text" value="FERREAGRO Marinilla SAS"/>														
CONTRATO INTERVENTORIA No:	<input type="text"/>	INTERVENTORIA	<input type="text" value="UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA"/>														
<table border="1"> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> FECHA FOTO: 23/05/2025 DESCRIPCION: </td> <td> FECHA FOTO: 23/05/2025 DESCRIPCION: </td> </tr> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> FECHA FOTO: 23/05/2025 DESCRIPCION: </td> <td> FECHA FOTO: 23/05/2025 DESCRIPCION: </td> </tr> <tr> <td>  </td> <td>  </td> </tr> <tr> <td> FECHA FOTO: 23/05/2025 DESCRIPCION: </td> <td> FECHA FOTO: 23/05/2025 DESCRIPCION: </td> </tr> </table>								FECHA FOTO: 23/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 23/05/2025 DESCRIPCION:			FECHA FOTO: 23/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 23/05/2025 DESCRIPCION:			FECHA FOTO: 23/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 23/05/2025 DESCRIPCION:
																	
FECHA FOTO: 23/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 23/05/2025 DESCRIPCION:																
																	
FECHA FOTO: 23/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 23/05/2025 DESCRIPCION:																
																	
FECHA FOTO: 23/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 23/05/2025 DESCRIPCION:																

	15. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: MARTHA ELENA MONTOYA GONZÁLES, C.C. 43.796.199.	CODIGO No.	
	CONTRATISTA DE OBRAS	VERSIÓN:	00-1
	Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	15 de 33

FECHA ELABORACIÓN: 30 5 2025 **No. INFORME** 1 **MES** 5


OBJETO DEL CONTRATO OBRA: "CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.



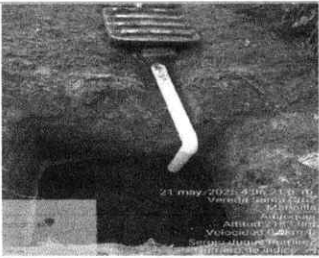



LUGAR MARINILLA - ANTIOQUIA


CONTRATO OBRA No: CCO-037-2025 **CONTRATISTA** FERREAGRO Marinilla SAS

CONTRATO INTERVENTORIA No: **INTERVENTORIA** UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA

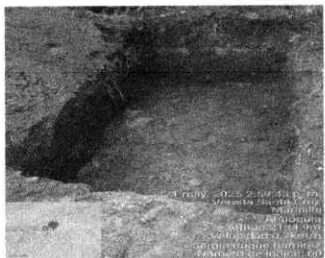

	16. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: SERGIO DUQUE RAMIREZ, C.C. 15.464.635. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	16 de 33

FECHA ELABORACIÓN:	30 5 2025	No. INFORME	1	MES	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		
					
FECHA FOTO: 21/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 21/05/2025 DESCRIPCION:			
					
FECHA FOTO: 21/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 21/05/2025 DESCRIPCION:			
					
FECHA FOTO: 21/05/2025 DESCRIPCION: PUNTOS DE ANCLAJE.		FECHA FOTO: 21/05/2025 DESCRIPCION:			

	17. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: CARLOS CEBALLOS HINCAPIE, C.C. 70.903.499. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	17 de 33

FECHA ELABORACIÓN:	30 5 2025	No. INFORME	1	MES	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		





18. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: DIANA MILENA GOMEZ, C.C. 53.036.502.

CONTRATISTA DE OBRAS

Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.

CODIGO No.	
VERSIÓN:	00-1
FECHA:	enero-25
PÁGINA:	18 de 33

FECHA ELABORACIÓN:

30 5 2025

No. INFORME

1

MES

5

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

“CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA.” Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.

LUGAR

MARINILLA - ANTIOQUIA

CONTRATO OBRA No:

CCO-037-2025

CONTRATISTA

FERREAGRO Marinilla SAS

CONTRATO INTERVENTORIA No:

INTERVENTORIA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA



FECHA FOTO: 27/05/2025
DESCRIPCION:



FECHA FOTO: 27/05/2025
DESCRIPCION:



FECHA FOTO: 27/05/2025
DESCRIPCION:




FECHA FOTO: 27/05/2025
DESCRIPCION:



FECHA FOTO: 27/05/2025
DESCRIPCION: PUNTOS DE ANCLAJE.




FECHA FOTO: 27/05/2025
DESCRIPCION:







	19. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LUIS FELIPE BUITRAGO DUQUE, C.C. 1.038.414.887. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	19 de 33


FECHA ELABORACIÓN:	30 5 2025	No. INFORME	1	MES	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		









	20. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: EDWIN ALEXI HINCAPIE GIRALDO, C.C. 70.908.407. CONTRATISTA DE OBRAS	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	20 de 33
Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.			


FECHA ELABORACIÓN:	<input type="text" value="30"/> <input type="text" value="5"/> <input type="text" value="2025"/>	No. INFORME	<input type="text" value="1"/>	MES	<input type="text" value="5"/>
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	<input type="text" value="MARINILLA - ANTIOQUIA"/>				
CONTRATO OBRA No:	<input type="text" value="CCO-037-2025"/>	CONTRATISTA	<input type="text" value="FERREAGRO Marinilla SAS"/>		
CONTRATO INTERVENTORIA No:	<input type="text"/>	INTERVENTORIA	<input type="text" value="UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA"/>		







	
FECHA FOTO: 24/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 24/05/2025 DESCRIPCION:
	
FECHA FOTO: 24/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 24/05/2025 DESCRIPCION:
	
FECHA FOTO: 24/05/2025 DESCRIPCION: PUNTOS DE ANCLAJE.	FECHA FOTO: 24/05/2025 DESCRIPCION:


	21. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LUZ MARINA QUINTERO CASTRO, C.C. 1.038.409.288. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	21 de 33





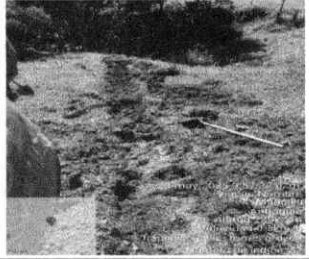

FECHA ELABORACIÓN:	30 5 2025	No. INFORME	1	MES	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	“CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA.” Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		


 <p>FECHA FOTO: 24/05/2025 DESCRIPCION: EXCAVACIÓN MANUAL PARA TENDIDO DE FILTRO Y TUBERÍA.</p>	 <p>FECHA FOTO: 24/05/2025 DESCRIPCION: EXCAVACIÓN MANUAL PARA POZO SÉPTICO.</p>
 <p>FECHA FOTO: 24/05/2025 DESCRIPCION: INSTALACIÓN DE GEOTEXTIL Y TENDIDO DE TUBERÍA.</p>	 <p>FECHA FOTO: 24/05/2025 DESCRIPCION:</p>
 <p>FECHA FOTO: 24/05/2025 DESCRIPCION: PUNTOS DE ANCLAJE.</p>	 <p>FECHA FOTO: 24/05/2025 DESCRIPCION:</p>




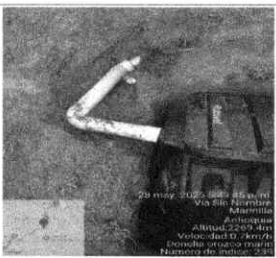


	22. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: FRANCISCO JAVIER TORRES OROZCO, C.C. 70.698.032. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	21 de 33


FECHA ELABORACIÓN:	30 5 2025	No. INFORME	1	MES	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		
					
FECHA FOTO: 28/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 28/05/2025 DESCRIPCION:			
					
FECHA FOTO: 28/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 28/05/2025 DESCRIPCION:			
					
FECHA FOTO: 28/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 28/05/2025 DESCRIPCION:			





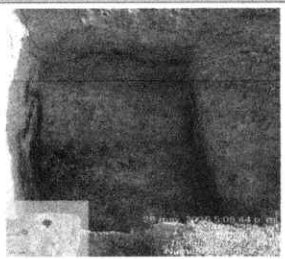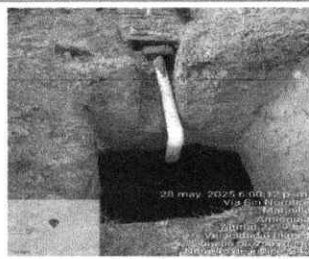

	23. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: ADRIAN CAMILO HIDALGO MONTOYA, C.C. 98.461.035. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	21 de 33


FECHA ELABORACIÓN:	30 5 2025	No. INFORME	1	MES	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		
					
FECHA FOTO: 28/05/2025		FECHA FOTO: 28/05/2025			
DESCRIPCION:		DESCRIPCION:			
					
FECHA FOTO: 28/05/2025		FECHA FOTO: 28/05/2025			
DESCRIPCION:		DESCRIPCION:			
					
FECHA FOTO: 28/05/2025		FECHA FOTO: 28/05/2025			
DESCRIPCION:		DESCRIPCION:			


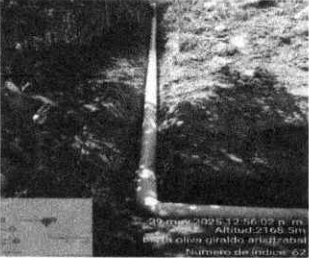




	24. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: DONELIA OROZCO MARIN, C.C. 21,963.336. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	21 de 33


FECHA ELABORACIÓN:	30 5 2025	No. INFORME	1	MES	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		
					
FECHA FOTO: 28/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 28/05/2025 DESCRIPCION:			
					
FECHA FOTO: 28/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 28/05/2025 DESCRIPCION:			
					
FECHA FOTO: 28/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 28/05/2025 DESCRIPCION:			




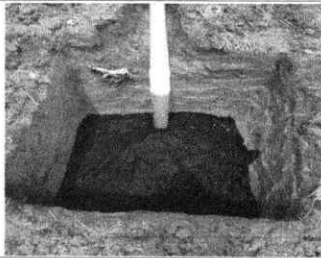


	25. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: JONATHAN ALBEIRO GALVIS GIRALDO, C.C. 1.038.411.165. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	21 de 33


FECHA ELABORACIÓN:	30 5 2025	No. INFORME	1	MES	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		
					
FECHA FOTO: 29/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 29/05/2025 DESCRIPCION:			
					
FECHA FOTO: 29/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 29/05/2025 DESCRIPCION:			
					
FECHA FOTO: 29/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 29/05/2025 DESCRIPCION:			

	26. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: BERTA OLIVA GIRALDO ARISTIZABAL, C.C. 43.795.810. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	21 de 33







FECHA ELABORACIÓN:	30 5 2025	No. INFORME	1	MES	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		
					
FECHA FOTO: 29/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 29/05/2025 DESCRIPCION:			
					
FECHA FOTO: 29/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 29/05/2025 DESCRIPCION:			
					
FECHA FOTO: 29/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 29/05/2025 DESCRIPCION:			

	27. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: CLAUDIA PATRICIA VELASQUEZ CORREA, C.C. 43.113.038. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	21 de 33

FECHA ELABORACIÓN:	30 5 2025	No. INFORME	1	MES	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		
					
FECHA FOTO: 30/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 30/05/2025 DESCRIPCION:			
					
FECHA FOTO: 30/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 30/05/2025 DESCRIPCION:			
					
FECHA FOTO: 30/05/2025 DESCRIPCION:		FECHA FOTO: 30/05/2025 DESCRIPCION:			

	28. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: JORGE ORLANDO DUQUE RAMIREZ, C.C. 70.904.250. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	21 de 33

FECHA ELABORACIÓN:	30 5 2025	No. INFORME	1	MES	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		

	
FECHA FOTO: 30/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 30/05/2025 DESCRIPCION:
	
FECHA FOTO: 30/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 30/05/2025 DESCRIPCION:
	
FECHA FOTO: 30/05/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 30/05/2025 DESCRIPCION:



29. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LUZ PIEDAD MARIN OSPINA, C.C. 43.960.251.

CONTRATISTA DE OBRAS

Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.

CODIGO No.

VERSIÓN:

00-1

FECHA:

enero-25

PÁGINA:

21 de 33

FECHA ELABORACIÓN:

30 5 2025

No. INFORME

1

MES

5

OBJETO DEL CONTRATO OBRA:

"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.

LUGAR

MARINILLA - ANTIOQUIA

CONTRATO OBRA No:

CCO-037-2025

CONTRATISTA

FERREAGRO Marinilla SAS


CONTRATO INTERVENTORIA No:

INTERVENTORIA

UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA



FECHA FOTO: 30/05/2025
DESCRIPCION:

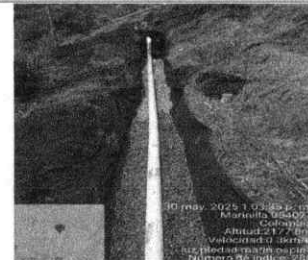

FECHA FOTO: 30/05/2025
DESCRIPCION:



FECHA FOTO: 30/05/2025
DESCRIPCION:




FECHA FOTO: 30/05/2025
DESCRIPCION:


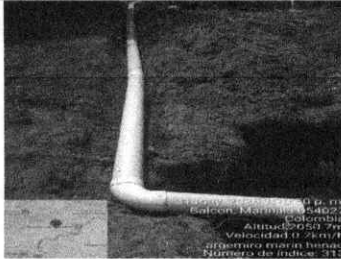







FECHA FOTO: 30/05/2025
DESCRIPCION:









FECHA FOTO: 30/05/2025
DESCRIPCION:


	30. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: ARGEMIRO MARÍN HENAO, C.C. 70.904.550. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	21 de 33


FECHA ELABORACIÓN:	31 5 2025	No. INFORME	1	MES	5
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		
					
FECHA FOTO: 31/05/2025 DESCRIPCION:					
					
FECHA FOTO: 31/05/2025 DESCRIPCION:					
					
FECHA FOTO: 31/05/2025 DESCRIPCION:					
					
FECHA FOTO: 31/05/2025 DESCRIPCION:					
					
FECHA FOTO: 31/05/2025 DESCRIPCION:					
					
FECHA FOTO: 31/05/2025 DESCRIPCION:					


	31. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: DEISI PAOLA RAMIREZ BOTERO, C.C. 1.036.960.986. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	21 de 33





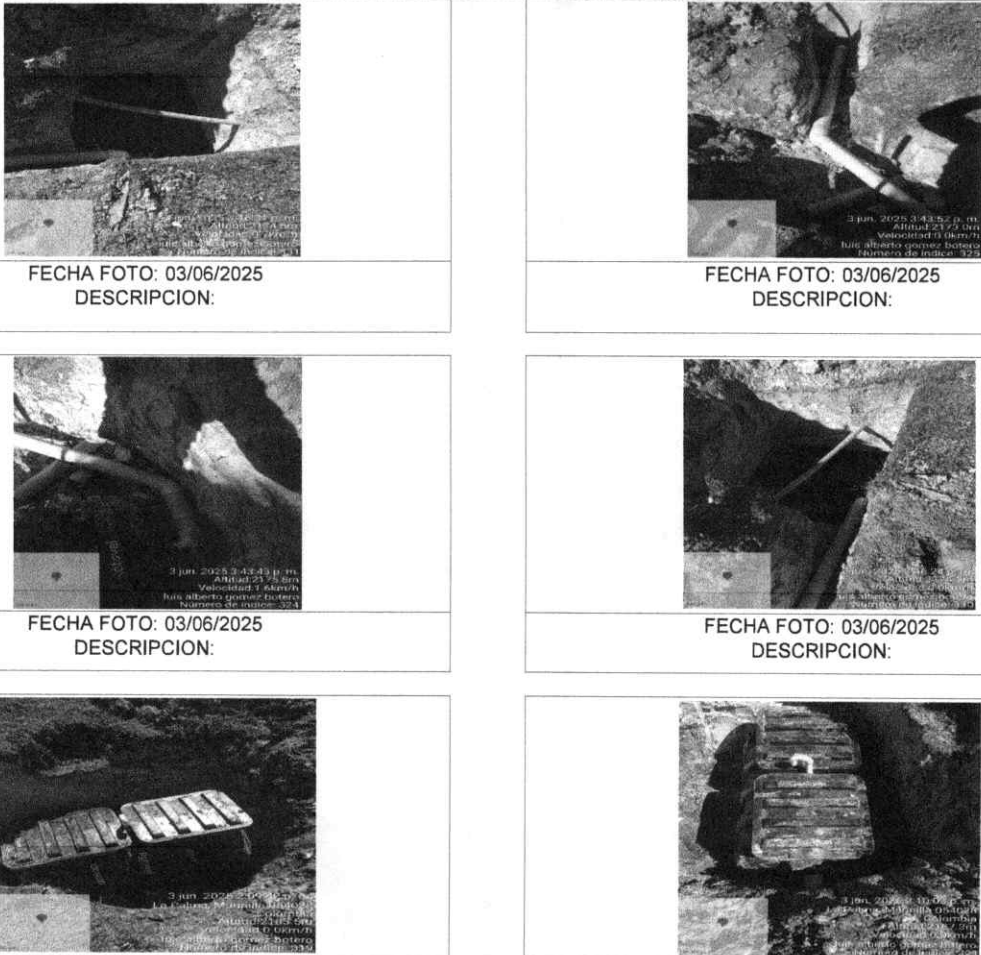

FECHA ELABORACIÓN:	6 6 2025	No. INFORME	1	MES	6
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		

	
FECHA FOTO: 04/06/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 04/06/2025 DESCRIPCION:
	
FECHA FOTO: 04/06/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 04/06/2025 DESCRIPCION:
	
FECHA FOTO: 04/06/2025 DESCRIPCION:	FECHA FOTO: 04/06/2025 DESCRIPCION:

	32. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LUIS ALBERTO GOMEZ BOTERO, C.C. 1.038.406.041. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	21 de 33

FECHA ELABORACIÓN:	6 6 2025	No. INFORME	1	MES	6
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		
					
FECHA FOTO: 03/06/2025		DESCRIPCION:			
FECHA FOTO: 03/06/2025		DESCRIPCION:			
FECHA FOTO: 03/06/2025		DESCRIPCION:			
FECHA FOTO: 03/06/2025		DESCRIPCION:			

	33. INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMA SÉPTICO EN PREDIO DE: LINA PATRICIA FLORES MURILLO, C.C. 1.035.225.445. CONTRATISTA DE OBRAS Suministro, transporte, instalación y puesta en funcionamiento de sistema de tratamiento de aguas residuales prefabricado conformado por tanque séptico más filtro anaerobio de flujo ascendente (FAFA) dispuestos de manera integrada, es decir en una sola unidad, con descarga del efluente al suelo o al agua.	CODIGO No.	
		VERSIÓN:	00-1
		FECHA:	enero-25
		PÁGINA:	21 de 33

FECHA ELABORACIÓN:	6 6 2025	No. INFORME	1	MES	6
OBJETO DEL CONTRATO OBRA:	"CONTRATO DE SUMINISTRO, TRANSPORTE, INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS ARD PREFABRICADOS, EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE MARINILLA." Logrando la definición de estándares, procedimientos y responsabilidades para el correcto funcionamiento de las unidades sanitarias.				
LUGAR	MARINILLA - ANTIOQUIA				
CONTRATO OBRA No:	CCO-037-2025	CONTRATISTA	FERREAGRO Marinilla SAS		
CONTRATO INTERVENTORIA No:		INTERVENTORIA	UNIVERSIDAD DE ANTIOQUIA		
					
FECHA FOTO: 04/01/2025 DESCRIPCION:					
					
FECHA FOTO: 04/06/2025 DESCRIPCION:					
					
FECHA FOTO: 04/06/2025 DESCRIPCION:					
					
FECHA FOTO: 04/06/2025 DESCRIPCION:					
					
FECHA FOTO: 04/06/2025 DESCRIPCION:					
					
FECHA FOTO: 04/06/2025 DESCRIPCION:					
