
	INFORME TÉCNICO CONTRATO DE OBRA No: OPS-160-2025.	VERSIÓN
		FECHA: 21/11/23


INFORME TÉCNICO No.2

APROBACIÓN DE DOCUMENTO CONTRATISTA DE OBRA			
APROBACIÓN	RESPONSABLE	NOMBRE:	ING. WILLIAN ESPINEL
		FIRMA:	
		FECHA:	25 DE AGOSTO DE 2025

	INFORME TÉCNICO CONTRATO DE OBRA No: OPS-160-2025.	VERSIÓN
		FECHA: 21/11/23

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCIÓN.....	4
2. GENERALIDADES.....	5
2.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.....	5
2.2 OBJETO DEL CONTRATO.....	6
2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.....	6
3.LOCALIZACIÓN.....	6
3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO.....	6
5.BALANCE DE OBRA.....	7
5.1 MEMORIA DE CANTIDADES.....	8
6.AVANCE DE LAS ACTIVIDADES.....	13
5. INFORME FINANCIERO.....	14
6. INFORME FINANCIERO.....	15
7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REPORTE DE INCIDENTES.....	15
8. GESTIÓN DE RIESGOS IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS.....	15
9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES PRINCIPALES.....	15
10. PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO.....	16
11. REGISTRO FOTOGRÁFICO.....	17

	INFORME TÉCNICO CONTRATO DE OBRA No: OPS-160-2025.	VERSIÓN
		FECHA: 21/11/23

1. INTRODUCCIÓN.

El presente informe tiene como objetivo principal documentar el estado actual de ejecución del proyecto "CONTRATAR OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA TERRAZA DEL BLOQUE A, CON EL FIN DE ADECUAR ESPACIOS DESTINADOS A ZONAS DE ESTUDIO, ZONA DE TRABAJO, BIENESTAR Y CAFETERÍA, EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA IES CINOC, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PENSILVANIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS". contratado mediante el Proceso de Selección Mínima Cuantía No. MC-034-2025 y ejecutado por VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS actividades realizadas hasta la fecha de corte, localización y replanteo, demolición de enchapes de piso, instalación de anclajes, instalación de platinas, instalación de estructura metálica de cubierta e instalación de canal. Asimismo, se incluyen registros fotográficos que evidencian el progreso y cumplimiento de las especificaciones técnicas del contrato.


Además, se justifica el cobro de la segunda acta parcial de obra por un valor de \$17.484.194,28 COP, correspondiente al avance acumulado de las actividades ejecutadas en las áreas intervenidas, garantizando la transparencia y el cumplimiento de lo estipulado en el contrato y en las normas aplicables.

	INFORME TÉCNICO CONTRATO DE OBRA No: OPS-160-2025.	VERSIÓN
		FECHA: 21/11/23

2. GENERALIDADES.

2.1 INFORMACION GENERAL DEL CONTRATO DE OBRA.

INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO MÍNIMA CUANTÍA No. OPS-160-2025	
OBJETO DEL CONTRATO:	"CONTRATAR OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA TERRAZA DEL BLOQUE A, CON EL FIN DE ADECUAR ESPACIOS DESTINADOS A ZONAS DE ESTUDIO, ZONA DE TRABAJO, BIENESTAR Y CAFETERÍA, EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA IES CINOC, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".
CONTRATISTA:	VEGA INGENIERIA Y COSNTRUCCION SAS
NIT	900.811.229-4
REPRESENTANTE LEGAL	JOSE FERNANDO VEGA PAVA
IDENTIFICACIÓN C.C:	74.271.014
CONTRATO DE OBRA No.:	MÍNIMA CUANTÍA No. OPS-160-2025
CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO	
FECHA DE INICIACIÓN CONTRATO:	JULIO 23 DE 2025
FECHA DE TERMINACIÓN:	AGOSTO 22 DE 2025
PLAZO TOTAL	Un (01) meses
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	\$31.774.655
CONDICIONES FINALES DEL CONTRATO	
ADICION MEDIANTE OTROSI No.	001 de Agosto 21 de 2025
VALOR ADICION MEDIANTE OTROSI No. 001	\$6.896.232,30
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$38.670.887,30
FECHA DE TEMINACION DEL CONTRATO	SEPTIEMBRE 08 DE 2025
VALOR FACTURA No.1	10.391.524,10
FECHA FACTURA No. 1	12 DE AGSOTO DE 2025
VALOR FACTURA No. 2	\$17.484.194,28
FECHA FACTURA No. 2	25 DE AGOSTO DE 2025
PORCENTAJE DE AVANCE	72.08%
VALOR PENDIENTE A RETORNAR	\$10.975.169
SUPERVISOR	GERSON O. TAPASCO
SUPERVISOR TECNICO	JORGE MARIO SOTO ROMAN

	INFORME TÉCNICO CONTRATO DE OBRA No: OPS-160-2025.	VERSIÓN
		FECHA: 21/11/23

2.2 OBJETO DEL CONTRATO.

"CONTRATAR OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA TERRAZA DEL BLOQUE A, CON EL FIN DE ADECUAR ESPACIOS DESTINADOS A ZONAS DE ESTUDIO, ZONA DE TRABAJO, BIENESTAR Y CAFETERÍA, EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA IES CINOC, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".

2.3 DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

El IES CINOC tiene prevista la adecuación y mejoramiento de la infraestructura física en la terraza del bloque A con el fin de atender los requerimientos y necesidades en términos de infraestructura para la prestación del servicio.

3.LOCALIZACIÓN.

El proyecto se ejecuta en el IES CINOC en el municipio de Pensilvania, departamento de Caldas.

3.1 UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL PROYECTO



TOMADO DE: https://www.google.com/maps/place/IES+CINOC/@5.3844618,-75.1597453,664m/data=!3m1!1e2!4m5!1s0x8:47255727dd8727:0x61dd48569:5c45d18m21345.384959144-75.159684716,%2Fg%2F11ckq445z?entry=tt&g_ep=EgoyMDI1MDg6bW46KXkxMDUoAGAFQAv%3D%3D



ACTA PARCIAL No. 2

Table with contract details: OBJETIVO DEL FORNITO, No. DE CONTRATO, CONTRATANTE, CONTRATISTA, OBJETO, SUPERVISOR, ELABORO, NIT, and FECHA ELABORACION.

Main table with columns: ITEM, DESCRIPCION, UNIDAD, CANTIDAD, Y ENTREGA, Y. TOTAL, MAYORES CANTIDADES DE OBRA, MENORES CANTIDADES DE OBRA, CONDICIONES BAJALES DEL CONTRATO, CONDICIONES BAJALES DEL CONTRATO, ACTA PARCIAL No. 1, ACTA PARCIAL No. 2, ACUMULADO EJECUTADO, SALDO POR EJECUTAR.

Para constancia firmo la presente en la presente acta.

Handwritten signatures and names: ING. JOSE EDUARDO SUAREZ SUAREZ, SUPERVISOR.

TABLA RESUMEN FINANCIERO

Summary financial table with columns: ITEM, VALOR DEL CONTRATO, VALOR DE LOS PAGOS, VALOR DE LOS PAGOS, VALOR DE LOS PAGOS, VALOR DE LOS PAGOS.

Handwritten signature at the top right of the page.



INFORME TÉCNICO CONTRATO DE OBRA No: OPS-160-2025.

VERSIÓN
FECHA: 21/11/23

5. BALANCE DE OBRA.




Table with columns: DESCRIPCIÓN, CANTIDAD, VALOR UNITARIO, VALOR TOTAL, etc. Includes sub-sections like 'CONDICIONES DE OBRAS', 'MAYORES CANTIDADES DE OBRAS', 'ACTA FACILITADA N.º 1', 'ACTA FACILITADA N.º 2', 'ACUMULADO DE ESTADO', and 'MAYORES DE OBRAS'.

Este documento es una copia impresa de un archivo electrónico.

VEICCON logo and company name: VEICCON INGENIERIA Y CONSULTORIA S.A.S.

 <p>VEICCON Ingeniería con responsabilidad</p>	<p>INFORME TÉCNICO CONTRATO DE OBRA No: OPS-160-2025.</p>	<p>VERSIÓN</p>
		<p>FECHA: 21/11/23</p>

5.1 MEMORIA DE CANTIDADES.

<p>"CONTRATAR OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA TERRAZA DEL BLOQUE A, CON EL FIN DE ADECUAR ESPACIOS DESTINADOS A ZONAS DE ESTUDIO, ZONA DE TRABAJO, BIENESTAR Y CAFETERIA, EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA IES CINCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS".</p>		<p>MMB-PO-016 EDICIÓN ÚNICA DE OBRA FECHA: 05-11-13</p>													
	<p>FECHA:</p>	<table border="1"> <tr> <th>DD</th> <th>MM</th> <th>AA</th> <th>ITEMS</th> </tr> <tr> <td>25</td> <td>8</td> <td>2025</td> <td>2.01</td> </tr> </table>	DD	MM	AA	ITEMS	25	8	2025	2.01	<p>DESCRIPCION</p>				
DD	MM	AA	ITEMS												
25	8	2025	2.01												
<p>VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S</p>	<p>NIT</p>	<p>900.811.229-4</p>	<p>HOJA</p>												
<p>ACTA PARCIAL No. 1</p>			<p>1 de 1</p>												
<p>SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS LLUVIAS PVC 4" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)</p>		<table border="1"> <tr> <th rowspan="2">ITEMS</th> <th colspan="4">DIMENSIONES</th> <th rowspan="2">No DE VECES</th> <th rowspan="2">UBICACION / DESCRIPCION</th> <th rowspan="2">TOTAL</th> </tr> <tr> <th>ANCHO</th> <th>ALTO</th> <th>LARGO</th> <th>UNID.</th> </tr> </table>	ITEMS	DIMENSIONES				No DE VECES	UBICACION / DESCRIPCION	TOTAL	ANCHO	ALTO	LARGO	UNID.	
ITEMS	DIMENSIONES				No DE VECES	UBICACION / DESCRIPCION	TOTAL								
	ANCHO	ALTO	LARGO	UNID.											
 <p>PLANTA DE CUBIERTA</p>															
															
<p>Elaboró: ING. WILLIAN ESPINEL</p>	<p>Revisó: ING. JORGE MARIO BOTO ROMAN</p>	<p>Revisó:</p>	<p>CANTIDAD TOTAL ACTA No. 2</p>	<p>18.24</p>											

2



INFORME TÉCNICO CONTRATO DE OBRA No:
OPS-160-2025.

VERSIÓN
FECHA: 21/11/23

"CONTRATAR OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA TERRAZA DEL BLOQUE A, CON EL FIN DE ADECUAR ESPACIOS DESTINADOS A ZONAS DE ESTUDIO, ZONA DE TRABAJO, BIENESTAR Y CAFETERIA, EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA ES CINCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"		RMI# FO 816	
		EDICION UNICA DE OBRA	
		FECHA: 25-11-13	
		FECHA:	DD MM AA HH:MM
VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S		NIT	900.811.229-4
ACTA PARCIAL No. 1		HOJA	
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PERFILES (CUADRALOS 100X100 CAL 16) TUBULARES ACERO LAMINADOS ASTM A-500 (INCLUYE SOLDADURA, ANTICORROSIVO Y ESMALTE)		DESCRIPCION	
		ITEMS	DESCRIPCION
		ANCHO	LONG
		KG/M	UNID.
		NO DE VECES	TOTAL
		CANTIDAD TOTAL	
		MENOS CANTIDAD PAGADA EN ACTA No. 1	
		CANTIDAD TOTAL ACTA No. 2	

"CONTRATAR OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA TERRAZA DEL BLOQUE A, CON EL FIN DE ADECUAR ESPACIOS DESTINADOS A ZONAS DE ESTUDIO, ZONA DE TRABAJO, BIENESTAR Y CAFETERIA, EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA ES CINCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"		RMI# FO 816	
		EDICION UNICA DE OBRA	
		FECHA: 25-11-13	
		FECHA:	DD MM AA HH:MM
VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S		NIT	900.811.229-4
ACTA PARCIAL No. 1		HOJA	
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PLATINAS Y ANGULOS DE UNION ACERO A-36 (Incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte e instalacion)		DESCRIPCION	
		ITEMS	DESCRIPCION
		ANCHO	LONG
		KG	UNID.
		NO DE VECES	TOTAL
		CANTIDAD TOTAL	
		MENOS CANTIDAD PAGADA EN ACTA No. 1	
		CANTIDAD TOTAL ACTA No. 2	



INFORME TÉCNICO CONTRATO DE OBRA No:
OPS-160-2025.

VERSIÓN
FECHA: 21/11/23

"CONTRATAR OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA TERRAZA DEL BLOQUE A, CON EL FIN DE ADECUAR ESPACIOS DESTINADOS A ZONAS DE ESTUDIO, ZONA DE TRABAJO, BIENESTAR Y CAFETERIA, EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA IES CINCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PENSVLVANA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"		ITEMS		DESCRIPCION		
VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S		FECHA:		SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA UPVC 2.5 MM según especificaciones técnicas del fabricante. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)		
ACTA PARCIAL No. 1		NIT		HOJA		
SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION TEJA UPVC 2.5 MM según especificaciones técnicas del fabricante. (Incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)		900.811.229-4		HOJA		
ITEMS	DIMENSIONES				UBICACION / DESCRIPCION	TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONG	UNID.		
<p>PLANTA DE CUBIERTA</p>						
1	7.3	15.50	M2	1	CUBIERTA	111.65
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 1						111.65

"CONTRATAR OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FISICA EN LA TERRAZA DEL BLOQUE A, CON EL FIN DE ADECUAR ESPACIOS DESTINADOS A ZONAS DE ESTUDIO, ZONA DE TRABAJO, BIENESTAR Y CAFETERIA, EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA IES CINCO, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PENSVLVANA, DEPARTAMENTO DE CALDAS"		ITEMS		DESCRIPCION		
VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S		FECHA:		SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA DE BARANDAS EXISTENTES. INCLUYE LIJADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO FINAL X2 CARAS X 2 MANOS		
ACTA PARCIAL No. 1		NIT		HOJA		
SUMINISTRO E INSTALACION PINTURA DE BARANDAS EXISTENTES. INCLUYE LIJADO, ANTICORROSIVO Y PINTURA DE ACABADO FINAL X2 CARAS X 2 MANOS		900.811.229-4		HOJA		
ITEMS	DIMENSIONES				UBICACION / DESCRIPCION	TOTAL
	ANCHO	ALTO	LONG	UNID.		
1	0.50	27.00	M2	2	PINTURA GENERAL DE BARANDAS EXISTENTES	26.10
CANTIDAD TOTAL ACTA No. 1						26.10

	INFORME TÉCNICO CONTRATO DE OBRA No: OPS-160-2025.	VERSIÓN
		FECHA: 21/11/23

6. AVANCE DE LAS ACTIVIDADES.

El avance de cada una de las actividades durante el periodo del informe de obra se refleja en el acta de avance No 2 anexo a informe de obra No. 2. De las cuales son actividades representativas:

- Suministro e instalación de bajantes para aguas lluvias
- Suministro, transporte e instalación perfiles (rectangulares 76x38mm cal 16) tubulares acero laminados astm a-500 (incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)
- Suministro, transporte e instalación platinas y ángulos de unión acero a-36 (incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte e instalacion)
- Desmote y retiro de estructura metálica y cubierta existente. incluye traslado a donde la entidad lo indique
- Suministro, transporte e instalación perfiles (rectangulares 76x38mm cal 18) tubulares acero laminados astm a-500 (incluye soldadura, anticorrosivo y esmalte)
- Suministro, transporte e instalación teja upvc 2.5 mm según especificaciones técnicas del fabricante. (incluye instalación, ganchos de fijación y el suministro de todos los accesorios requeridos para el correcto montaje.)
- Suministro e instalación pintura de barandas existentes. incluye lijado, anticorrosivo y pintura de acabado final x2 caras x 2 manos
- Suministro e instalación de flanche en lamina galvanizada desarrollo .15 cm cal. 20

Principales Problemas y Soluciones:

- No se presentaron problemas en la ejecución del presente contrato.

Conclusiones Principales: Ejecución Anticipada del Cronograma:

1. El proyecto presenta un avance físico y financiero del 89.92%. Esto refleja una ejecución eficiente de las actividades planificadas.

2. Cumplimiento de Actividades Certificadas:

Las actividades realizadas, han sido ejecutadas y certificadas conforme a las especificaciones técnicas del contrato, asegurando la calidad en cada etapa del proceso.

3. Avance Sustancial del Proyecto:

Las actividades ejecutadas hasta la fecha corresponden a un valor de \$27.875.171.38 COP, lo que evidencia un avance significativo, cumpliendo con las observaciones técnicas del presente contrato

4. Compromiso con los Objetivos Contractuales:

El contratista ha mantenido un enfoque en la ejecución puntual y la optimización de recursos, demostrando un alto nivel de compromiso con los objetivos del proyecto y los tiempos establecidos.

	INFORME TÉCNICO CONTRATO DE OBRA No: OPS-160-2025.	VERSIÓN
		FECHA: 21/11/23

5. INFORME FINANCIERO.

Durante el periodo del informe No. 2 Se presenta acta de avance de obra No 2. Por valor de \$17.484.194,28

PORCENTAJE DE AVANCE REAL DEL PERIODO Y PORCENTAJE DE AVANCE ACUMULADO AVANCE FÍSICO (PROGRAMADO VS REAL)

AVANCE PROGRAMADO		AVANCE REAL		ESTADO DE LA OBRA
ACTUAL %	ACUMULADO %	ACTUAL %	ACUMULADO %	
72.08%	72.08%	72.08%	72.08%	La obra se encuentra en ejecución de acuerdo a lo programado.

RESUMEN PARCIAL INFORME FINANCIERO

VALOR CONTRATADO	VALOR EJECUTADO
\$ 38.670.887,30	\$ 27.875.717,38

VALORES FACTURADOS Y POR FACTURAR

DESCRIPCIÓN	VALOR FACTURADO
VALOR DE ACTA DE AVANCE DE OBRA No.1	\$ 10.391.524,10
VALOR DE ACTA DE AVANCE DE OBRA No.2	\$ 17.484.194,28
VALOR DEL ACTA No. 3. ACTA PENDIENTE POR FACTURAR	\$6.896.232,42
VALOR DEL ACTA FINAL. ACTA PENDIENTE POR FACTURAR	\$3.898.936,50
TOTAL	\$38.670.887,30

	INFORME TÉCNICO CONTRATO DE OBRA No: OPS-160-2025.	VERSIÓN
		FECHA: 21/11/23

6. INFORME FINANCIERO.

Pruebas de Materiales:

- Durante la ejecución del proyecto, no realizaron pruebas de calidad ni ensayos de materiales

Cumplimiento de Especificaciones Técnicas:

- No hubo problemas en el cumplimiento de las especificaciones técnicas.

7. SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REPORTE DE INCIDENTES

- No hubo incidentes de seguridad durante el mes.

Medidas de Seguridad Implementadas:

- Se usaron los elementos de protección personal de manera correcta.

8. GESTIÓN DE RIESGOS IDENTIFICACIÓN DE RIESGOS

- No se identificaron riesgos significativos durante la ejecución.

9. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES CONCLUSIONES PRINCIPALES

- **Ejecución Eficiente:**
El proyecto ha logrado un avance físico y financiero del 89.92%. Esto demuestra una ejecución eficiente, con cumplimiento anticipado de las actividades planificadas.
- **Alineación Física y Financiera:**

	INFORME TÉCNICO CONTRATO DE OBRA No: OPS-160-2025.	VERSIÓN
		FECHA: 21/11/23

10. PERSONAL DE OBRA Y ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO
Juan Carlos Ramírez	Ornamentador
Leonel Alberto Hernadez	Ayudante de obra



PERSONAL ADMINISTRATIVO

NOMBRE	CARGO
José Fernando Vega Pava	Gerente
Willian Espinel	Residente de obra
Wilmar Alberto Vélez Franco	Director de obra


EQUIPO DE OBRA	
COMPRESOR 110 V	(1) UND
ESCALERA EN ALUMINIO DE 12 PASOS	(1) UND
EXTENSION ELECTRICA	30 M
EQUIPO DE SOLDADURA 220 V	(1) UND
CAJA DE HERRAMIENTAS	(1) UND

11. REGISTRO FOTOGRÁFICO.


INSTALACION DE BAJANTES DE AGUAS LLUVIAS

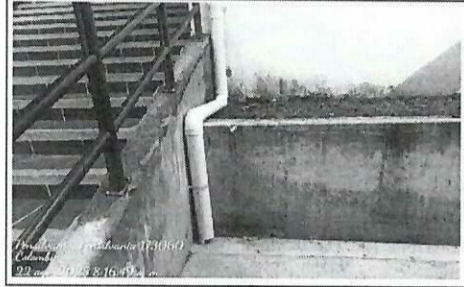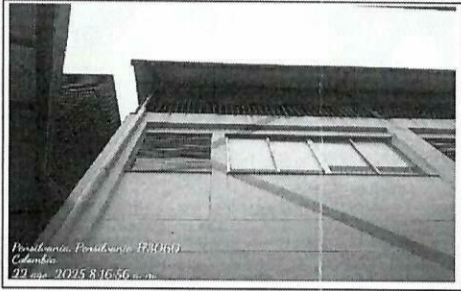


INSTALACION DE PUNTOS DE DESAGUE DE 4"

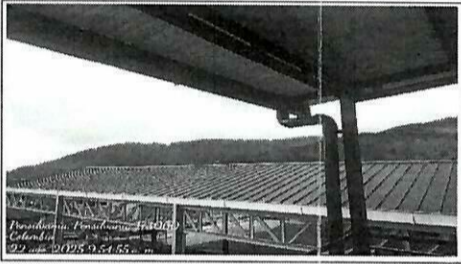


INSTALACION DE PLATINAS

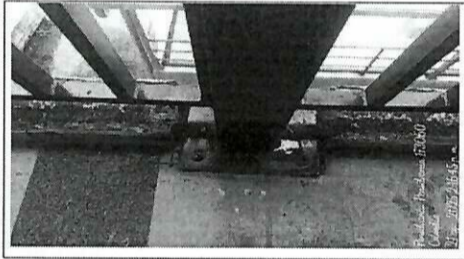


INSTALACION DE CANAL

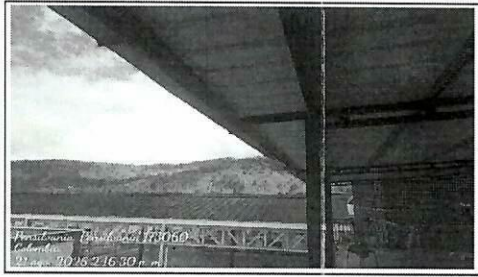


INSTALACION DE PERSIANAS

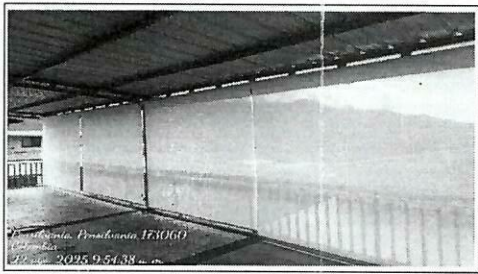

DESMONTE DE ESTRUCTURA EXISTENTE

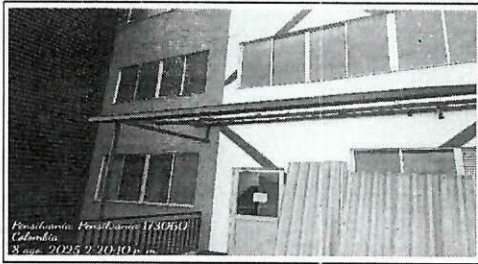

CORREAS DE CUBIERTA 76X38 MM CALIBRE 18

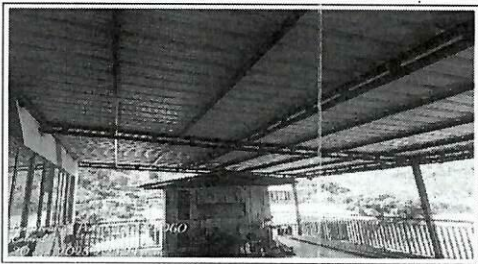

CUBIERTA UMPC 2.5 MM COLOR AZUL-BLANCO



PINTURA BARANDAS EXISTENTES



INSTALACION DE FLANCHE



DECLARACIÓN JURAMENTADA DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 Y LEY 828 DE 2003

Yo, YAIRCINIO BARON GARCIA, identificado con Cédula de Ciudadanía No.74.270.529 de Tasco, y con Tarjeta Profesional No. No. 100887-T de la Junta Central de Contadores de Colombia, en mi condición de contador público de VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S.A.S identificado con Nit 900.811.229-4, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio de BOGOTA, luego de examinar de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, los estados financieros de la compañía, certifico el pago de los aportes realizados por la compañía durante los últimos seis (6) meses calendario legalmente exigibles a la fecha de presentación de la propuesta para el presente proceso de selección, por los conceptos de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (**ICBF**) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA)

Estos pagos, corresponden a los montos contabilizados y pagados por la compañía durante dichos 6 meses. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el Artículo 50 de la Ley 789 de 2002

Dada en Bogotá D.C a los 25 días del mes de agosto de 2025

Cordialmente,



YAIRCINIO BARON GARCIA
CONTADOR PUBLICO
T.P 100887-T
C.C 74.270.529 de Tasco



ING. JOSE FERNANDO VEGA PAVA
REPRESENTANTE LEGAL
VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
C.C No. 74.271.014 de Tasco
M.P. No. 25202-318030 CDM

Adjunto copia de Tarjeta Profesional y Certificado de Vigencia expedido por la JCC.

veicconingenieriasas@gmail.com - fdovega014@gmail.com

Ravisca

Talentos Humanos
2025-08

REPUBLICA DE COLOMBIA
IDENTIFICACION PERSONAL
CEDULA DE CIUDADANIA


NUMERO **74.270.529**
BARON GARCIA

APELLIDOS
YAIRCINIO

NOMBRES

Yair Barón

FIRMA



INDICE DERECHO


FECHA DE NACIMIENTO **11-OCT-1976**
TASCO
(BOYACA)

LUGAR DE NACIMIENTO
1.70 **A+** **M**
ESTATURA G.S. RH SEXO

27-DIC-1994 TASCO

FECHA Y LUGAR DE EXPEDICION

Carlos Abel Sánchez Torres
REGISTRADOR NACIONAL
CARLOS ABEL SÁNCHEZ TORRES



A-1504600-00272198-M-0074270529-20101221

0025275845A 1

34785598

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

2 B 0 1 0 0 B 9 6 1 B F 9 A 8 A

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **YAIRCINIO BARON GARCIA** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 74270529 de TASCO (BOYACÁ) Y Tarjeta Profesional No 100887-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****

EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 11 días del mes de Junio de 2025 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL (E)

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES - COLPENSIONES

CERTIFICA QUE

Verificada la base de datos de afiliados, el/la señor/a **JUAN CARLOS RAMIREZ ORTIZ** identificado/a con documento de identidad **Cédula de Ciudadanía** número **74185503**, se encuentra afiliado/a desde **30/06/2006** al Régimen de Prima Media con Prestación Definida (RPM) administrado por la Administradora Colombiana de Pensiones **COLPENSIONES**.

La presente certificación se expide en Bogotá, el día 30 de julio de 2025.



Rosa Mercedes Nino Amaya
Dirección de Afiliaciones

Nota: Certificado generado desde la página Web. Este documento no es válido para el reconocimiento de prestaciones económicas, está sujeto a verificación y no tiene costo alguno.

CERTIFICADO DE AFILIACIÓN

POSITIVA COMPANÍA DE SEGUROS S.A.

HACE CONSTAR QUE:

Verificada la base de datos de afiliación en el Ramo de Riesgos Laborales se evidenció que JUAN CARLOS RAMIREZ ORTIZ identificado con CC No. 74185503, registra la siguiente información.

Datos del Empleador	Datos de la Relación Laboral
VEICCON SAS - NI 900811229	Fecha de inicio de cobertura: 29/07/2025 Estado Afiliación: ACTIVO Tipo Vinculación: DEPENDIENTE Clase de Riesgo: 5

Esta certificación se expide en la ciudad de Bogotá, a los 30 días del mes de Julio de 2025.





Cordialmente,

**GERENCIA DE AFILIACIONES Y NOVEDADES
POSITIVA COMPANÍA DE SEGUROS S.A.**

Positiva Compañía de Seguros S.A:
Nit. 860.011.153-8 | Línea Gratuita Nacional: (+57) 01-8000-111-170 - Teléfono: +57 (601) 330 7000

Defensor del Consumidor Financiero: Ana María Giraldo (Principal) - Pablo Valencia (Suplente) | defensordelcliente@positiva.gov.co | Carrera 10 #97A - 13, Oficina 502. Bogotá | +57 (601) 610 6164 | Lunes a Viernes 8:00 a. m. - 6:00 p. m. | El Defensor, resolverá las quejas o reclamos, actuará como Conciliador ante Positiva. Más información <https://www.positiva.gov.co/web/guest/defensoria-del-consumidor>. Puedes interponer una queja ante Positiva, o el Defensor, o la SFC u otro organismo de autorregulación.

**LA ASEGURADORA
DE TODOS LOS
COLOMBIANOS**

 Positiva Compañía de Seguros  @PositivaCol  PositivaCol  PositivaSeguros

www.positiva.gov.co



Nombre	Juan Carlos Ramirez Ortiz	Edad	46 Años
Identificación	CC - 74185503	Sexo	Masculino
Entidad	Particular		
Fecha de Atención	02/08/2025 12:38	Fecha de Impresión	02/08/2025

Concepto Ocupacional

Cargo

Técnico operativo en soldador universal

Tipo de Examen

Ingreso

Empresa

Vega ingeniería y construcción sas

Enfasis Específico

Trabajo en alturas

Concepto

Apto para trabajo en alturas

Recomendaciones Médicas

- Realizar actividad fisica constantemente

Recomendaciones Ocupacionales

Otras :

- la condición de salud del paciente, es satisfactoria para el desempeño de sus actividades laborales habituales y para trabajo en alturas. - motricidad fina y gruesa conservada según valoración clínica - no alteraciones sensoriales aparentes - examen neurológico sin déficit aparente - cumplimiento del programa ergonómico, mejorar condiciones musculo esqueléticas, y mantener control postural en actividades laborales - realizar entrenamiento y capacitación en trabajo en alturas - realizar pausas activas durante jornada laboral - utilización de elemento de protección personal de acuerdo a su cargo y estilos de vida saludable - se entrega al paciente copia de certificado médico ocupacional con sus recomendaciones - el paciente entiende y acepta las recomendaciones explicadas al paciente el día de hoy

EN CONCORDANCIA CON EL ARTÍCULO 22 DEL DECRETO 1295 DE 1994 Y LO ESTABLECIDO EN EL CÓDIGO SUTANTIVO DE TRABAJO ARTÍCULO 62 ORDINAL A. PUNTO 1. HAGO CONSTAR QUE LA INFORMACIÓN QUE HE SUMINISTRADO ES FIDELIGNA, CIERTA, VERAZ Y COMPLETA Y QUE A SU VEZ NO HE OMITIDO NINGUN DATO SOBRE MI ESTADO DE SALUD.


MEDICO

Luis Felipe Cardona Mejia
Luis Felipe Cardona Mejia
Médico Especialista GSG
R.M. 4213-2015

PROFESIONAL : LUIS FELIPE CARDONA MEJIA
ESPECIALIDAD : MEDICO SALUD OCUPACIONAL - EPIDEMIOLOGIA
REGISTRO MEDICO : 4213-2015

ASPIRANTE O TRABAJADOR

NOMBRE : JUAN CARLOS RAMIREZ ORTIZ
DOCUMENTO : 74185503



FORMATO ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL Y DOTACIÓN DE TRABAJO

Código: VEM 05-F0-02
VERSIÓN: 01
PÁG. 1 DE 1
04/03

dd	mm	aaaa

DATOS DEL FUNCIONARIO

Nombre: JUAN CARLOS RAMIREZ ORTIZ CC: 74185505
Cargo: Soldador

DOTACIÓN PERSONAL

Botas	<input checked="" type="checkbox"/>	Talla	<u>39</u>
Overol	<input type="checkbox"/>	Talla	<u> </u>
Protector	<input checked="" type="checkbox"/>	Talla	<u>34</u>
Gorro	<input checked="" type="checkbox"/>	Talla	<u>5</u>
Paño	<input type="checkbox"/>	Talla	<u> </u>

ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL

Protector Auditivo Tipo Capote	<input checked="" type="checkbox"/>	Protector Auditivo Tipo Orejera	<input checked="" type="checkbox"/>
Bota de Cuero con Puntera en Acero	<input checked="" type="checkbox"/>	Bota de Cuero con Puntera Dieléctrica	<input type="checkbox"/>
Bota de Seguridad con Puntera en Acero	<input type="checkbox"/>	Botas Impermeables con Puntera Acero	<input type="checkbox"/>
Bota Impermeable con Puntera	<input type="checkbox"/>	Gafas de Seguridad	<input checked="" type="checkbox"/>
Guantes Hilo y PVC	<input checked="" type="checkbox"/>	Guantes en Carroza	<input checked="" type="checkbox"/>
Guante Dieléctrico	<input type="checkbox"/>	Guantes para Soldador	<input type="checkbox"/>
Casco para Entender	<input type="checkbox"/>	Careta para Soldar	<input type="checkbox"/>
Tapabocas Personal	<input type="checkbox"/>	Respirador Contra Gases y Vapores	<input type="checkbox"/>
Gafas	<input checked="" type="checkbox"/>	Barbuquejo	<input type="checkbox"/>
Capucha de Gorrón	<input checked="" type="checkbox"/>	Poncho en PVC con Capucha	<input type="checkbox"/>
OTRO:	<input type="checkbox"/>		<input type="checkbox"/>

FIRMAS

ENTREGA

RECIBO

Una instancia y autorización con sello institucional Espinal

CERTIFICADO

DE CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO PARA
TRABAJO EN ALTURAS Y CONFINADOS

CENTRO DE ENTRENAMIENTO HACE CONSTAR QUE:
JUAN CARLOS RAMIREZ ORTIZ

Identificado con
Cédula de ciudadanía N° 74185503


EMPRESA: VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS
NIT: 900811229-4
R. LEGAL: JOSE FERNANDO VEGA PAVA, con documento 74271014
ARL: POSITIVA

Cursó y aprobó la acción de formación en

TRABAJADOR AUTORIZADO

Realizado en Bogotá del (09) del mes de agosto de 2025 al (12) del mes de agosto de 2025 con
una intensidad de 32 horas.


LINA STEPHANY GIRALDO GARZON
1026279856
Licencia SO N°3745



Edwin Johan Rivera
C.C. 1.023.911.376
Representante Legal
Instituto Educativo RR

10622



En testimonio de lo anterior, se firma en Bogotá a los (12) del mes de agosto de 2025
De conformidad con la AUTORIZACIÓN N° 08SE202422000000051285 del 31 de Octubre de 2024 emitida por el
ministerio de trabajo, con certificación de calidad #30.512-1 emitida por CELAC con acreditación 18-CPR-002
licencia en salud ocupacional LIC. SST N° 17245 DE 7/05/2014 que autoriza a la empresa INSTITUTO RR S.A.S
ubicada en Bogotá D.C en Cr 72D No.38 B Sur 57, con NIT 901807119. Para la capacitación y entrenamiento para trabajo
en alturas en cumplimiento a la resolución 4272 de 2021.
VERIFICACIÓN correo Rr.edusas@gmail.Com



DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900811229-4	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	CRA 113 C NUMERO 192 D 34	6963224	veicoconingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D.C.	BOGOTÁ D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DI/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DI/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
					10	0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR	
2025-07	2025-06	E	08/07/2025	89041943	\$3 365 800	

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1
EPS005	Sanitas EPS	800251440-6	114.000	0	0	0	0	0	0	0	0	114.000	2
EPS010	EPS Sura	800088702-2	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1
EPS017	Famisanar EPS	830003564-7	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1
EPS041	NUÉVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	57.000	0	0	0	0	0	0	0	0	57.000	1
EPS025	Casproca EPS	891856000-7	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	1
ESSC07	EPS S Mutual Ser	806008394-7	3.800	0	0	0	0	0	0	0	0	3.800	1
ESSC24	EPS S Coosalud	900226715-3	28.500	0	0	0	0	0	0	0	0	28.500	1

TOTALES PENSIÓN													
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados	
													230201
230301	Purvenir	800224808-8	812.500	0	0	0	0	0	0	0	812.500	5	
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	227.800	0	0	0	0	0	0	0	227.800	1	
25-14	Colpensiones	900336004-7	243.000	0	0	0	0	0	0	0	243.000	2	

TOTALES RIESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favor	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	756.700				756.700	0	0	756.700		7.567	756.700	10	

TOTALES CAJAS							
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

CF

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900811229-4	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	CRA 113 C NUMERO 152 D 34	6963224	veicozoringenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B = menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10	0
2025-07	2025-06	E	08/07/2025	88041943	TOTAL A PAGAR \$3.365.800	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	0	0	0	0
ICBF				
0	0	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	9	435.100	435.100
Pensión	4	1.738.900	1.738.900
Riesgos Laborales	1	756.700	756.700
CCF	1	435.100	435.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	16	3.365.800	3.365.800

PAGADA

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
N	900811229-4	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS		CRA 113 C NUMERO 152 D 34	6963221	veccoringenierias@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLEADOS 10
					UPC 0
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				TOTAL A PAGAR
2025-08	2025-07	E	14/09/2025	89009040	\$3 032 900

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD													
Código EPS	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad		Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora UPC	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor					
EPS002	Salud Total EPS	800130907-4	45 600	0		0	0	0	2	100	0	45 700	2
EPS005	Santas EPS	800251440-6	114 000	0		0	0	0	2	200	0	114 200	3
EPS010	EPS Suisa	800088702-2	43 700	0		0	0	0	2	100	0	43 800	1
EPS017	Famsanar EPS	830003564-7	57 000	0		0	0	0	2	100	0	57 100	1
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	43 700	0		0	0	0	2	100	0	43 800	1
EPS041	NUJEVA E.P.S. S.A. MOV	900156264-2	43 700	0		0	0	0	2	100	0	43 800	1
ESSC24	EPS-S Coosafud	900226715-3	43 700	0		0	0	0	2	100	0	43 800	1

TOTALES PENSIÓN												
Código AFP	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora Cotización	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Povernit	600224808-8	698 800	0	0	0	0	2	900	0	699 700	4
230901	Skandia Pensiones Obligatorias	800253055-2	227 800	0	0	0	0	2	300	0	228 100	1
25-14	Co pensiones	900339004-7	182 300	0	0	0	0	2	300	0	182 600	2

TOTALES RESGOS LABORALES															
Código ARL	Nombre	NIT	Cotización Obligatoria	Incapacidades		Aportes Otros Sistemas	Valor Neto Cotización	Días Mora	Valor Mora Cotización	Subtotal Cotización	No. Radicado Saldo a Favo.	Valor Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
				No. Autorización	Valor										
14-23	Positiva Seguros	860011153-6	680 800				680 800	3	900	681 700			6 808	681 700	10

TOTALES CAJAS						
Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar
CCF24	Compensar Caja	860068942-7	391 400	2	500	391 900

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
N	900811229-4	VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS	CRA 113 C NUMERO 152 D 34	6963221	vegacor@ingenieriasas@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B -- menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIAMES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAMES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				10	0
2025-08	2025-07	E	14/08/2025	89005040	TOTAL A PAGAR \$3 032 500	

TOTALES PARAFISCALES				
Valor Aporte	Dias Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
SENA				
0	2	0	0	0
ICBF				
0	2	0	0	0
ESAP				
MEN				

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	7	391 400	392 200
Pensión	4	1 564 600	1 566 700
Riesgos Laborales	1	680 800	681 700
CCF	1	391 400	391 900
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	13	3 028 200	3 032 500

PAGADA

**VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**

NIT: 900811229-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CR 113 C 152 D 34, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6802624

Email. veicconingenieriasas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764094251598 válida desde 2025-06-10 hasta 2026-06-10 rango desde FE41 hasta FE50.

Razón Social:	COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS
NIT :	890802678
Dirección:	
Teléfono:	
Email:	rectoria@iescinoc.edu.co
Forma de Pago:	Contado
Medio de Pago:	Consignación bancaria
Fecha de Pago:	29/08/2025
Total de Lineas:	3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA :		FE44			
MONEDA:	COP Colombia, Pesos				
HORA EMISIÓN:	11:15:03-05:00				
FECHA FIRMADO:	26/08/2025 11:15:07				
FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
26	08	2025	29	08	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	un	ACTA PARCIAL DE OBRA No.02. DE ACUERDO CON CONTRATO No. OPS-160-2025, CONTRATAR OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA TERRAZA DEL BLOQUE A, CON EL FIN DE ADECUAR ESPACIOS DESTINADOS A ZONAS DE ESTUDIO, ZONA DE TRABAJO, BIENESTAR Y CAFETERÍA, EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA IES CINOC, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS.	C62	1,00	\$13.850.376,67				0,00	\$13.850.376,67
2	A	ADMINISTRACION 20.29%%	C62	1,00	\$2.809.720,00				0,00	\$2.809.720,00
3	U	UTILIDAD 5%	C62	1,00	\$692.519,00	IVA	19%	\$131.578,61	0,00	\$692.519,00


Notas: OPS-160-2025, ACTA DE OBRA No. 2 PERIODO DEL 13 DE AGOSTO A 18 DE AGOSTO DE 2025, PORCENTAJE DE AVANCE 72.08%	Subtotal:	\$17.352.615,67
	Cargos:	\$0.00
	Descuento:	\$0.00
SON: (diecisiete millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y cuatro pesos veintiocho centavos)	IVA:	\$131.578,61
CUFE: dcd89235ff5ccbbcd8ab464f6675b80f1ee13118403e8d6de1d6f06acb056b83e9645803020082ee9debc68e910d4138	Total:	\$17.484.194,28

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$692.519,00	19,00%	\$131.578,61

Firma Digital: U6p9596pz3ZUvI+cQMnTs9X9JEECY1P7SKWIO89nSRZR255ZYiwWL: f8Q/Thoh76
Zw5TNr0ixT6Oz2OIFJo48ahR75x5XDW874ZYHGJAL657IZb
XWmfUOnS2cWT08 mFDAdcU17dUogbAINJFzJuhOn1JRjkwBKl0ChR6HKyw7+KDah/6RITJ+3g8XFZ +zSPuG5A3gD3M1sfJ1XKVHUBMOhkW2F/WF
QrcxN4rXwypIqUKpokWxotqDaVPIK kOAuzWBVH8RPhrTNSTBclZhpksyxoRedmbfz2b9QaUplSwoF9+NkpovLWLQ83W nXwr531/GN3GcehtIX/s
mw==


Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico: **cadena**. Nit. 890.930.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8



**VEGA INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS**

NIT: 900811229-4

Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas -IVA

Persona Jurídica

CR 113 C 152 D 34, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia

Tel. 6802624

Email. veicconingenieriasas@gmail.com

Autorización factura electrónica de venta No. 18764094251598 válida desde 2025-06-10 hasta 2026-06-10 rango desde FE41 hasta FE50.

Razón Social: COLEGIO INTEGRADO NACIONAL ORIENTE DE CALDAS
NIT : 890802678
Dirección:
Teléfono:
Email: rectoria@iescinoc.edu.co

Forma de Pago: Contado
Medio de Pago: Consignación bancaria
Fecha de Pago: 29/08/2025
Total de Líneas: 3

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : FE44
MONEDA: COP Colombia, Pesos
HORA EMISIÓN: 11:15:03-05:00
FECHA FIRMADO: 26/08/2025 11:15:07

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DÍA	MES	AÑO	DÍA	MES	AÑO
26	08	2025	29	08	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	un	ACTA PARCIAL DE OBRA No.02. DE ACUERDO CON CONTRATO No. OPS-160-2025. CONTRATAR OBRAS CIVILES PARA EL MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA FÍSICA EN LA TERRAZA DEL BLOQUE A, CON EL FIN DE ADECUAR ESPACIOS DESTINADOS A ZONAS DE ESTUDIO, ZONA DE TRABAJO, BIENESTAR Y CAFETERÍA, EN LA SEDE PRINCIPAL DE LA IES CINOC, UBICADA EN EL MUNICIPIO DE PENNSILVANIA, DEPARTAMENTO DE CALDAS.	C62	1,00	\$13.850.376,67				0,00	\$13.850.376,67
2	A	ADMINISTRACION 20.29%%	C62	1,00	\$2.809.720,00				0,00	\$2.809.720,00
3	U	UTILIDAD 5%	C62	1,00	\$692.519,00	IVA	19%	\$131.578,61	0,00	\$692.519,00

Notas:
OPS-160-2025, ACTA DE OBRA No. 2 PERIODO DEL 13 DE AGOSTO A 18 DE AGOSTO DE 2025, PORCENTAJE DE AVANCE 72.08%

Subtotal:	\$17.352.615,67
Cargos:	\$0.00
Descuento:	\$0.00
IVA:	\$131.578,61
Total:	\$17.484.194,28


SON: (diecisiete millones cuatrocientos ochenta y cuatro mil ciento noventa y cuatro pesos veintiocho centavos)
CUFE: dcd9235ff5ccbbcd8ab464f6675b80f1ee13118403e8d6de1d6f06acb056b83e9645803020082ee9debc68e910d4138

IMPUESTO	BASE	TARIFA / VALOR NOMINAL	IMPORTE
IMPUESTOS			
01 IVA	\$692.519,00	19,00%	\$131.578,61

Firma Digital: U6p9596pz3ZUvl+cQMnTs9X9JEECY1P75KWQ89nSRZR255ZYiwWL: f8Q/Thoh76
Zw5TN0ixT6Oz2OIFJo48ahR75x5XrDW87+ZYH6JAL657IZb
XWmfUOnS2cWT08 mFDAdclJ7dUogbAInJFzJuhOn1JRjkwBKlOCihR6HKyw7+KDah6RITJ+3g8XFZ +zSPuG5A3gD3M1sfJ1XKVHUBM0hkW2F/WF
QrcKMrXwypiqUKpKWxogtDdAVPIK kOAuzWBVH8RPhtNSTBcl.ZhpkyxoRedmbfbZzb9QaUpISwO19+NkpovLWLQ83W nXwr531/GN3GCehxIX/s
mw==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.



Software: e-Factura Proveedor tecnológico. **cadena.** Nit. 890.930.534-0

PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8

