

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS TOTAL	FECHA 09/06/2025											
CONTRATO No.	064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024											
FECHA SUSCRIPCIÓN	24/10/2024											
OBJETO DEL CONTRATO	ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6											
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN - MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA–CACOM-6, cancelara al contratista por cumplimiento de las actividades contratadas así:											
	<table><tr><td>No. PAGO</td><td>VALOR PAGO</td><td>PAC MES</td></tr><tr><td>PRIMER PAGO</td><td>SEGÚN FACTURACION A CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2024</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR</td></tr><tr><td>SEGUNDO PAGO</td><td>SEGÚN FACTURACION A CORTE 13 DE DICIEMBRE DE 2024</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR</td></tr></table>			No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES	PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACION A CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACION A CORTE 13 DE DICIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR
	No. PAGO	VALOR PAGO	PAC MES									
	PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACION A CORTE 30 DE NOVIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR									
	SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACION A CORTE 13 DE DICIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR									
La forma de pago establecida no será obstáculo para que, una vez cumplida la entrega a satisfacción, EL MINISTERIO pueda efectuar el pago con anterioridad, si llegare a existir disponibilidad de recursos en el PAC y así lo acepta EL CONTRATISTA. El desembolso se efectuará, previo el cumplimiento de los trámites administrativos, sin necesidad de modificar el presente contrato y mediante decisión unilateral del MINISTERIO. En todo caso, el pago del valor del contrato se subordina a las apropiaciones y disponibilidades presupuestales de la vigencia fiscal del año 2024.												
NOTA 1: Para realizar el pago, se requiere que el proveedor envíe los siguientes documentos:												
<div><div>1.</div><div>Factura en Original por valor total del contrato.</div></div> <div><div>2.</div><div>Planilla de los Pagos Parafiscales.</div></div> <div><div>3.</div><div>Certificación de pago de aportes a seguridad social y parafiscales suscrita por el Revisor Fiscal y/o Representante legal, según corresponda; y/o planillas de pago de seguridad social y parafiscales.</div></div> <div><div>4.</div><div>Suscripción por las partes del acta de recibo a satisfacción.</div></div> <div><div>5.</div><div>Constancia de publicación de la factura en el SECOP II.</div></div> <div><div>6.</div><div>Los demás requisitos y documentos que señale la ley, el reglamento, y en general los documentos del proceso contractual.</div></div>												
NOTA 2: El desembolso de los recursos se efectuará, una vez EL CONTRATISTA presente la factura electrónica, con los paz y salvos de los aportes parafiscales y de los fondos de pensiones y cesantías, de acuerdo con lo establecido en el artículo 23 de la Ley 1150 de 2007 y el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, modificado												

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	<p>por el artículo primero de la Ley 828 de 2003, información que será verificada por la sección Financiera FAC, cuando sean situados los recursos por parte de la Dirección del Tesoro Nacional y previo el trámite administrativo a que haya lugar.</p> <p>NOTA 3: Cuando de conformidad con lo establecido en el Decreto 862 de 2013, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizar los aportes al SENA e ICBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.</p> <p>NOTA 4: El ministerio pagará al contratista el valor de la factura, siempre y cuando se encuentre correctamente publicada en la plataforma SECOP II, así mismo, para efectos del pago, se deberá cumplir lo dispuesto en la circular externa 016 del 09 de marzo de 2021 y la Directiva 020 del 12 de abril de 2021 expedida por SIIF nación y el Ministerio de Hacienda, con respecto a la facturación electrónica.</p> <p>NOTA 5: De acuerdo con lo establecido en la Directiva Presidencial 9 de 2020 y en concordancia con los lineamientos emitidos por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, todos los proveedores obligados a facturar electrónicamente a las entidades que hacen parte del Presupuesto General de la Nación, deberán registrar el siguiente correo: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co como receptor único de las facturas emitidas a nombre de éstas, con el fin de que las envíen automáticamente, junto con el contenedor electrónico - Documento zip (PDF, XML), para efectuar la correspondiente validación ante la DIAN.</p> <p>Por regla general se debe diligenciar en la sección de la factura Notas u Observaciones, entre # \$ el código de identificación de la entidad del Presupuesto General de la Nación (PGN) que está adquiriendo a la cual le va a enviar la factura.</p> <p>Dónde: 15-01-05-000 corresponde al Código SIIF de la Subunidad Ejecutora (UMA) así:</p> <table data-bbox="688 1514 1398 1619"> <tr> <th>CÓDIGO SIIF</th><th>SUBUNIDAD EJECUTORA</th></tr> <tr> <td>15-01-05-008</td><td>CACOM-6 - COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA</td></tr> </table> <p>NOTA 6: Este proceso es de obligatorio cumplimiento para la Fuerza Aérea Colombiana – CACOM N° 6, por ser esta una Entidad Ejecutora del Presupuesto General de la Nación, de tal forma que cuando se asignen contratos a favor de Proveedores o Contratistas (Emisor de la factura) que tengan identificado en el RUT la responsabilidad 52 – Facturador Electrónico, deben entregar en coordinación con el supervisor del contrato para el trámite del pago, la factura electrónica de venta por los bienes y/o</p>	CÓDIGO SIIF	SUBUNIDAD EJECUTORA	15-01-05-008	CACOM-6 - COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA
CÓDIGO SIIF	SUBUNIDAD EJECUTORA				
15-01-05-008	CACOM-6 - COMANDO FUERZA AÉREA COLOMBIANA				

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	<p>servicios, así como también las notas débito y/o notas crédito a que haya lugar, a través del buzón dispuesto para tal efecto por el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, descrito en el punto anterior.</p> <p>NOTA 7: El pago al Contratista se realizará previa presentación de la facturación, el acta de recibo a satisfacción suscrito por el Supervisor del Contrato y demás trámites administrativos a que haya lugar. Por lo tanto, la Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el Contrato.</p> <p>NOTA 8: Para la realización de los pagos por parte del Ministerio de Defensa –Fuerza Aérea Colombiana se requiere la acreditación, por parte del revisor fiscal o del representante legal (según aplique), de que el contratista se encuentra al día en el pago de los aportes al Sistema de Seguridad Social Integral y Parafiscales, cuando a ello haya lugar, dentro de los últimos seis (06) meses.</p> <p>Cuando de conformidad con lo establecido en el artículo 114-1 del Estatuto Tributario, las personas jurídicas o las personas naturales empleadoras se encuentren exentas de realizarlos aportes al SENA e CBF deberán presentar certificación en donde se manifieste dicha situación la cual se entenderá prestada bajo la gravedad del juramento.</p> <p>NOTA 9: La Entidad hará las retenciones a que haya lugar sobre cada pago, de acuerdo con las disposiciones legales vigentes sobre la materia.</p>
CONTRATISTA	INGEBLAR SAS
INTERVENTOR	NO APLICA
SUPERVISOR	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	804.536.926,02
PLAZO DE EJECUCIÓN (DE ENTREGA)	13 de DICIEMBRE de 2024
FECHA DE INICIO	18 DE NOVIEMBRE DE 2024
FECHA DE SUSPENSIÓN	N/A
FECHA DE REINICIACIÓN	N/A
CONTRATO MODIFICATORIO No. 1	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	03 de Diciembre del 2024
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y ANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6 (PRORROGA)
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – CACOM – 6.

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	<table><tr><td>No. PAGO</td><td>VALOR PAGO</td><td>PAC</td></tr><tr><td>PRIMER PAGO</td><td>SEGÚN FACTURACION A CORTE 13 DE DICIEMBRE DE 2024</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR</td></tr><tr><td>SEGUNDO PAGO</td><td>SEGÚN FACTURACION CORTE 27 DE DICIEMBRE</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR</td></tr></table>	No. PAGO	VALOR PAGO	PAC	PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACION A CORTE 13 DE DICIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACION CORTE 27 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR			
No. PAGO	VALOR PAGO	PAC											
PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACION A CORTE 13 DE DICIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR											
SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACION CORTE 27 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR											
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	27 de Diciembre de 2024												
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$804.536.926,02												
CONTRATO MODIFICATORIO No. 2													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	27 de Diciembre del 2024												
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6 (PRORROGA Y CONSTITUCIÓN RESERVA PRESUPUESTAL)												
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – CACOM – 6.												
	<table><tr><td>No. PAGO</td><td>VALOR PAGO</td><td>PAC</td></tr><tr><td>PRIMER PAGO</td><td>SEGÚN FACTURACION A CORTE 13 DE DICIEMBRE DE 2024</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR</td></tr><tr><td>SEGUNDO PAGO</td><td>SEGÚN FACTURACION CORTE 27 DE DICIEMBRE</td><td>DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR</td></tr><tr><td>TERCER PAGO</td><td>SEGÚN FACTURACION CORTE 31 ENERO DE 2025</td><td>PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2025</td></tr></table>	No. PAGO	VALOR PAGO	PAC	PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACION A CORTE 13 DE DICIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACION CORTE 27 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	TERCER PAGO	SEGÚN FACTURACION CORTE 31 ENERO DE 2025	PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2025
	No. PAGO	VALOR PAGO	PAC										
	PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACION A CORTE 13 DE DICIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR										
	SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACION CORTE 27 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR										
TERCER PAGO	SEGÚN FACTURACION CORTE 31 ENERO DE 2025	PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2025											
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	31 de Enero de 2025												
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$804.536.926,02												
CONTRATO MODIFICATORIO No. 3													
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	30 de enero del 2025												
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6 (PRORROGA)												
FORMA DE PAGO	LA NACIÓN – MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AEREA COLOMBIANA – CACOM – 6												

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

	No. PAGO	VALOR PAGO	PAC	
	PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACION A CORTE 13 DE DICIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE CUENTAS PAGAR	Y/O POR
	SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACION CORTE 27 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE CUENTAS PAGAR	Y/O POR
	TERCER PAGO	SEGÚN FACTURACION CORTE 28 FEBRERO DEL 2025	PRIMER TRIMESTRE VIGENCIA 2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	28 de febrero de 2025			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$804.536.926,02			
CONTRATO MODIFICATORIO No. 4				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	28 de febrero del 2025			
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6 (PRORROGA)			
FORMA DE PAGO	No. PAGO	VALOR PAGO	PAC	
	PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACION A CORTE 13 DE DICIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE CUENTAS PAGAR	Y/O POR
	SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACION CORTE 27 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE CUENTAS PAGAR	Y/O POR
	TERCER PAGO	SEGÚN FACTURACION CORTE 15 MARZO DE 2025	PAC ABRIL RESERVA PRESUPUESTAL 2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	15 de marzo de 2025			
VALOR FINAL DEL CONTRATO	\$804.536.926,02			
CONTRATO MODIFICATORIO No. 5				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	14 de marzo del 2025			
OBJETO DEL CONTRATO MODIFICATORIO	ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6 (PRORROGA)			
FORMA DE PAGO	No. PAGO	VALOR PAGO	PAC	
	PRIMER PAGO	SEGÚN FACTURACION A CORTE 13 DE DICIEMBRE DE 2024	DICIEMBRE CUENTAS PAGAR	Y/O POR
	SEGUNDO PAGO	SEGÚN FACTURACION CORTE 27 DE DICIEMBRE	DICIEMBRE CUENTAS PAGAR	Y/O POR
	TERCER PAGO	SEGÚN FACTURACION CORTE 04 ABRIL DEL 2025	PAC MAYO RESERVA PRESUPUESTAL 2025	
PLAZO DE EJECUCIÓN (MODIFICADO) (SI APLICA)	04 de abril de 2025			

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

VALOR FINAL DEL CONTRATO		\$804.536.926,02
En Tres Esquinas, Caquetá, el día 09 del mes de junio de 2025, el señor CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO , en su calidad de Ordenador del Gasto, el señor ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD en su calidad de supervisor por parte del MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL – FUERZA AÉREA COLOMBIANA y el señor JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO en su calidad de Representante Legal de la empresa INGEBLAR S.A.S., Contratista ; efectúan el correspondiente recibo total de los bienes y/o servicios correspondientes al objeto contractual descrito en el citado contrato.		
Luego de adelantar la inspección a los bienes y/o servicios se estableció que estos cumplen con los requerimientos, normas y/o especificaciones técnicas y la entrega se cumplió dentro del plazo contractual establecido. A continuación, se describen pormenorizadamente los bienes entregados y/o servicios prestados, así:		
DESCRIPCIÓN DE OBRAS RECIBIDAS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
Actividades de obra descritas en el contrato principal y recibidas a satisfacción	01	Se anexa cuadro de ejecución de actividades de obra (corte de obra parcial No.7) y documentos que soportan lo referenciado.
DESCRIPCIÓN DE BIENES RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCION DE SERVICIOS RECIBIDOS	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
DESCRIPCIÓN DE OBRAS, BIENES Y SERVICIOS ADICIONALES OFRECIDOS (Ofrecidos por el contratista y que fueron objeto de ponderación y escogencia del contratista, para seguimiento por parte del supervisor)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
ANEXOS O ACTIVIDADES SOPORTE DE LA (S) FACTURA (S) A CANCELAR (cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)	CANTIDAD	OBSERVACIONES GENERALES
N/A	N/A	N/A
PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)		
NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
DIEGO ALEJANDRO ORDONEZ NARVAEZ	RESIDENTE DE OBRA	70202-357836

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

RAQUEL OSORIO AROS	PROFESIONAL EN SALUD OCUPACIONAL Y/O SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO	RESOLUCIÓN 0183 del 18 de junio de 2021
BENJAMIN MACHADO DAVILA	TECNOLOGO EN CONSTRUCCION	05543-049147 ANT
WILLIAM ENRIQUE OROSCO ORDUZ	TÉCNICO ELECTRICISTA	No. 79539088-003445 A1

AUMENTO VIDA ÚTIL DE LOS BIENES, EFECTIVIDAD OPERATIVA, CAPACIDAD PRODUCTIVA Y CALIDAD DE LOS BIENES

El pago de este recibo a satisfacción incrementa el valor y/o la vida útil del bien a intervenir.

Incrementa el valor del bien:

SI: ☒ NO: ☐ Valor del incremento:

Una vez ejecutado el 100% del contrato, incrementa vida útil del bien:

SI: ☒ NO: ☐ Años a incrementar: 3 AÑOS

En caso de ser el pago final de un contrato de obra o mantenimiento mayor sobre un bien inmueble, indique si el bien se encuentra en condiciones de uso, una vez ejecutado el 100% del Contrato:

SI ☐ NO N/A

DESCRIPCIÓN DE ELEMENTO	No DE INVENTARIO	ACTIVO FIJO	VALOR
AD01 COMANDO CACOM6	800405000000000000062052	163600000608	\$ 324,333,992.3
OP02 HANGAR CHARLI CACOM6	8004050000000000000047327	163600000609	\$ 106,273,340.1
TOTAL, AUMENTO VALOR DEL BIEN CORTE 03			\$ 430,607,332.40

SITUACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO

DETALLE DEL PAGO	VALOR	OBSERVACIONES
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	\$ 804,536,926.02	
VALOR ADICIÓN / REDUCCIÓN		
VALOR FINAL CONTRATO		
PAGO ANTICIPADO O ANTICIPO	\$ 0,00	
PRIMER PAGO PARCIAL - CORTE PARCIAL DE OBRA No. 1 PAC (DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR)	\$ 326,642,960.70	Factura No. E50
SEGUNDO PAGO PARCIAL - CORTE PARCIAL DE OBRA No. 2 PAC (DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR)	\$37,052,528.78	Factura No. E57
TECER PAGO PARCIAL - CORTE PARCIAL DE OBRA No. 3 PAC (JUNIO - RESERVA PRESUPUESTAL 2025)	\$ 440,841,436.54	Factura No. E58

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA	Código:	DE-DEAJU-FR-006
	FORMATO ACTA DE RECIBO A SATISFACCIÓN DE BIENES Y SERVICIOS	Versión N°:	07
		Vigencia:	12-12-2024

SALDO	\$0.0
OBSERVACIONES	
N/A	
EN CONSTANCIA, FIRMAN QUIENES INTERVINIERON	
 JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO CONTRATISTA	 ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD SUPERVISOR
 CR. KENNY LEONARDO MORENO DELGADO ORDENADOR DEL GASTO	

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA					Código:	GA-JEADA-FR-132	
	FORMATO DE IMPUTACION DE BIENES Y SERVICIOS POR RUBRO PRESUPUESTAL					Versión No:	4	
						Vigencia:	18/11/2024	

Jefatura o Unidad:	CACOM-6				
Nombre del Supervisor de Contrato	ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD				
Ordenador del Gasto	DILOS				
No. Contrato	064-004-CACOM-6-GRUAL-2024				
Objeto del contrato	ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6				
Valor inicial del contrato	\$ 804,536,926.02				
Adición	\$ 0.00				
Reducción	\$ 0.00				
Valor final del contrato	\$ 804,536,926.02				

IMPUTACIÓN DEL RUBRO A SU MAXIMO NIVEL DE DESAGREGACIÓN (Funcionamiento USO PRESUPUESTAL) (Inversión PROYECTO DE INVERSIÓN)			USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCIÓN USO PRESUPUESTAL	DESCRIPCIÓN	VALOR APROPIACION POR RUBRO
		RECURSO				
02-01-01-001-002-11		10		OTROS EDIFICIOS NO RESIDENCIALES	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALA DE JUNTAS	\$ 402,897,657.73
02-01-01-001-002-10		10		EDIFICIOS Y ESTRUCTURAS PARA FINES MILITARES	PISO HANGAR GRUTE 63 RECUBRIMIENTO EPOXICO 4 CAPAS	\$ 330,539,745.83
02-02-02-005-004-01-2		10		SERVICIOS GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE EDIFICACIONES NO RESIDENCIALES	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SALA DE JUNTAS	\$ 71,099,522.46
TOTAL VIGENCIA 2024						\$ 804,536,926.02
TOTAL VIGENCIAS						\$ 804,536,926.02

					Control - Su contrato se ha modificado en: (En caso de diferencia, modificar valores de rubros de acuerdo a modificatorio y ultimo CPA)			\$ 0.00
--	--	--	--	--	--	--	--	---------

No. PAGO	MES DE PAGO	MES AMORTIZACIÓN O LEGALIZACIÓN	DETALLE DEL PAGO	RUBRO	USO PRESUPUESTAL (solo para recurso 11)	DESCRIPCION	VALOR PARA TRAMITE DE PAGO POR RUBRO	VALOR TOTAL PARA PAGO	SALDOS
1	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11 REC 10	N/A	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALA DE JUNTAS	\$ 78,563,665.43	\$ 326,642,960.70	\$ 324,333,992.30
				02-01-01-001-002-10 REC 10	N/A	PISO HANGAR GRUTE 63 RECUBRIMIENTO EPOXICO 4 CAPAS	\$ 213,436,016.07		\$ 117,103,729.76
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10	N/A	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SALA DE JUNTAS	\$ 34,643,279.20		\$ 36,456,243.26
2	DICIEMBRE Y/O CUENTAS POR PAGAR	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11 REC 10	N/A	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALA DE JUNTAS	\$ 0.00	\$ 37,052,528.78	\$ 324,333,992.30
				02-01-01-001-002-10 REC 10	N/A	PISO HANGAR GRUTE 63 RECUBRIMIENTO EPOXICO 4 CAPAS	\$ 10,830,389.66		\$ 106,273,340.10
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10	N/A	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SALA DE JUNTAS	\$ 26,222,139.12		\$ 10,234,104.14
3	JUNIO - RESERVA PRESUPUESTAL 2025	N/A	PAGO PARCIAL VG ACTUAL	02-01-01-001-002-11 REC 10	N/A	ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA DE SALA DE JUNTAS	\$ 324,333,992.30	\$ 440,841,436.540	\$ 0.00
				02-01-01-001-002-10 REC 10	N/A	PISO HANGAR GRUTE 63 RECUBRIMIENTO EPOXICO 4 CAPAS	\$ 106,273,340.10		\$ 0.00
				02-02-02-005-004-01-2 REC 10	N/A	SERVICIOS DE ADECUACIÓN DE INFRAESTRUCTURA SALA DE JUNTAS	\$ 10,234,104.14		\$ 0.00
TOTALES							\$ 804,536,926.02	\$ 804,536,926.02	\$ 0.00

FIRMA (Supervisor del Contrato)	
POSTFIRMA	ST BAUTISTA GARCIA DIDSON SHWARD
FECHA	9/06/2025

SEÑOR(ES) DIRECCIÓN	MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - FUERZA AEREA COLOMBIANA - COMANDO AEREO DE COMBATE NO 6				FECHA DEL DOCUMENTO (DD/MM/AA)
	Colombia				08/06/2025
TELÉFONO	NIT 800141638-5				FECHA DE VENCIMIENTO
					23/06/2025

ID	Ítem	Unidad	Precio	Cantidad	Descuento	Total
1	ACTA FINAL - CONTRATO 064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 - ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM6	Unidad	\$342.880.482,65	1		\$342.880.482,65
2	ADMINISTRACION	Administración	\$82.291.315,84	1		\$82.291.315,84
3	IMPREVISTO	Unidad	\$3.428.804,83	1		\$3.428.804,83
4	UTILIDAD	Unidad	\$10.286.414,48	1		\$10.286.414,48

Cuatrocientos cuarenta millones ochocientos cuarenta y un mil cuatrocientos treinta y seis pesos con cincuenta y cuatro centavos



Moneda: COP
Generado: 2025-06-08 10:07:59-05:00
Validación DIAN: 2025-06-08 10:09:00-05:00
Tipo de operación: Estándar Forma de pago: Crédito

#\$15-01-05-008;contrato064-00-i-cacom-6-grual-2024;didson.bautista@fae.mil

CUFE: 3eaca2d0f687f49c28bad9a3b4e94b0af7a12b97e667a918411e1202dc1d59198d5a5b5635c110e46ededc0d250e8ec9

Esta factura se asimila en todos sus efectos a una letra de cambio de conformidad con el Art. 774 del código de comercio. Autorizo que en caso de incumplimiento de esta obligación sea reportado a las centrales de riesgo, se cobraran intereses por mora.

Subtotal	\$438.887.017,79
IVA (19.00%)	\$1.954.418,75
Total	\$440.841.436,54

Total de líneas: 4
Cantidad total: 4

ELABORADO POR

ACEPTADA, FIRMA Y/O SELLO Y FECHA

Autorización de numeración de facturación N° 18764083669532 de 2024-11-19 Modalidad Factura Electrónica Desde N° E48 hasta E999 con vigencia hasta 2025-11-19

Representación gráfica de factura de venta electrónica

Proveedor tecnológico: Soluciones Alegria S.A.S - Software: Alegria - NIT 900.559.088-2



INGEBLAR S.A.S
Gerencia, Consultoría & Construcción

PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002 (PERSONAS JURÍDICAS)

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO, identificado con cedula de ciudadanía No. 1.018.429.716, en mi condición de representante legal de **INGEBLAR SAS** identificada con **NIT 901.087.858-4**, bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (*artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983*), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los veintinueve (29) días del mes de mayo del 2025

Atentamente,

Nombre o Razón Social del CONTRATISTA **INGEBLAR SAS**
Nombre del Representante Legal **JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO**
Nit **901.087.858-4**
Dirección **Calle 163 No. 59ª- 10 Bogotá**
Ciudad **Bogotá**
Teléfono **3105814909**
Correo electrónico Gerenciangeblar@gmail.com

JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO
C.C.: 1.018.429.716 de Bogotá

Dirección domicilio principal: CLL 163 No 59a-10 APTO 1504 Bogotá correo: gerenciangeblar@gmail.com cel.: 3105814909

DATOS DE LA PLANILLA						
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD	
					EMPLEADOS	UPC
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				2	0
					TOTAL A PAGAR	
2025-06	2025-05	E	09/06/2025	86996186	\$698.600	

TOTALES POR SUBSISTEMA			
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora	Total a Pagar
Salud	2	114.000	114.000
Pensión	2	455.600	455.600
Riesgos Laborales	1	15.000	15.000
CCF	1	114.000	114.000
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEN	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	6	698.600	698.600


DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE		DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO
NI	901087858-4	INGEBLAR S.A.S		CLL 163 No 59a-10 APTO 1504	3105814909	gerenciaingebлар@gmail.com
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	C – MIPYME			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ, D.C.	
						SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
					EMPLADOS
PERIODO SALUD	PERIODO PENSIONES				UPC
2025-06	2025-05	E	09/06/2025	86996186	\$698.600

DETALLE POR COTIZANTE																																														
INFORMACIÓN COTIZANTE										INFORMACIÓN NOVEDADES						PENSIÓN						SALUD			RIESGOS LABORALES			CCF			PARAFISCALES															
No.	Tipo	No. de identificación	Apellidos y Nombres	Cotizante	Subjugo	Exonerado	Columna exonerada	Exonerado	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	VBP	VBT	SILN	IOE	MAA	VAC	APP	VCT	IRL	CORRECCIÓN	Cód. AFP	IBC AFP	Cotización	Voluntari o Afiliado	Voluntario Aportante	Fondo pensional de solidaridad	Fondo pensional de subsistencia	Cód. EPS	IBC EPS	Cotización / Valor UPC	Cód. ARL	IBC ARL	Clase de Riesgo	Cotización	Código CCF	IBC CCF	Aporte CCF	IBC otros parafiscales	Aporte SENA	Aporte ICBF	Aporte ESAP	Aporte MEN
1	CC	1018429716	ROMERO ARREDONDO JHON BLADIMIRO	1	0			S																231001	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS010	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0
2	CC	1104415337	PALENCIA MENCO KATERINE JHORLEDYS	1	0			S																230301	1.423.500	227.800	0	0	0	0	0	EPS002	1.423.500	57.000	14-11	1.423.500	1	7.500	CCF22	1.423.500	57.000	0	0	0	0	0

PAGADA

PERSONAL ACTIVO DE OBRA CONTRATO 064 ENERO, FEBRERO, MARZO, ABRIL, MAYO 2025			
NOMBRES Y APELLIDOS	CEDULA	CARGO	CEL
JAIRO CUBILLO CORREA	17.653.951	MAESTRO	3223866341
RODRIGUEZ MARTINEZ ANGEL ADRIAN	1.117.546.748	OFICIAL	3107672751
ALMARIO RODRIGUEZ JOAN SEBASTIAN	1.006.502.132	AYUDANTE	3134460262
TREJOS PALENCIA DARLINSON ANDRES	1.117.553.165	AYUDANTE	3228695262
RODRIGUEZ MARTINEZ ANGEL ADRIAN	1117546748	AYUDANTE	3107672751



ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD
SUPERVISOR

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE NIT: 90104990 TIPO DE IDENTIFICACIÓN: C.C. DEPARTAMENTO: FLORENCIA DISTRITO: CALLE 24 N 18 65 BARRIO AMERICAS TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de proyectos de servicio publico. FORMA DE PRESENTACIÓN: SOCIAL APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7951468587 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD: PERIODO COTIZACIÓN OTROS: 2025/02/24 DÍAS DE MORA: 3 MES: febrero AÑO: 2025 E/EMPLADOS: 138884743	
--	--	--	--

TOTAL APORTES A PENSION									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	TOTALES
230301	COFIS-CONFAC	NUEVA EPS CM	1	1	1	\$ 151.000	COTIZACIÓN	\$ 151.000	\$ 151.000
230301	COFIS-CONFAC	EP3007-NEUEVA EPS	2	2	2	\$ 311.400	COTIZACIÓN	\$ 311.400	\$ 311.400
230301	COFIS-CONFAC	EP3005-SANTAS SPA	0	0	0	\$ 0	COTIZACIÓN	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 1.408.300

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERIDAD	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	TOTALES
EP3041	NUEVA EPS CM	NUEVA EPS CM	1	1	1	\$ 38.000	COTIZACIÓN	\$ 38.000	\$ 38.000
EP3037	EP3007-NEUEVA EPS	EP3007-NEUEVA EPS	3	3	3	\$ 81.700	COTIZACIÓN	\$ 81.700	\$ 81.700
EP3005	EP3005-SANTAS SPA	EP3005-SANTAS SPA	0	0	0	\$ 0	COTIZACIÓN	\$ 0	\$ 0
SUB-TOTALES:									\$ 257.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD R/P	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	TOTALES
4-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	9	9	\$ 446.400	COTIZACIÓN	\$ 446.400	\$ 446.400
SUB-TOTALES:									\$ 446.400

TOTAL APORTES A CASA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	No. COTIZANTES	INCAPACIDAD R/P	PAGO A OTROS RIESGOS	SALDO A FAVOR	LIQUIDACIÓN	VALOR	TOTALES
COFIS-CONFAC	COFIS-CONFAC	COFIS-CONFAC	9	9	9	\$ 294.500	COTIZACIÓN	\$ 294.500	\$ 294.500
SUB-TOTALES:									\$ 294.500

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
PENSION									
Nº IDENTIFICACION	NOMBRE	TIPO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO	TIPO DE SALARIO
CC	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO	DEPARTAMENTO
230301-1	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-2	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-3	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-4	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-5	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-6	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-7	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-8	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-9	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-10	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-11	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-12	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-13	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-14	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-15	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-16	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-17	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-18	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-19	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-20	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-21	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-22	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-23	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-24	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-25	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-26	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-27	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-28	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-29	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-30	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-31	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-32	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-33	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-34	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-35	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-36	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-37	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-38	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-39	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-40	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-41	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-42	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-43	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-44	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-45	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-46	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-47	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-48	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-49	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-50	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-51	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-52	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-53	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-54	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-55	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-56	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-57	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-58	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-59	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-60	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-61	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-62	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-63	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-64	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-65	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-66	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-67	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-68	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-69	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-70	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-71	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-72	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-73	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-74	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-75	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-76	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-77	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-78	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-79	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-80	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-81	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-82	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-83	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-84	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-85	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-86	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-87	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-88	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-89	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-90	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-91	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-92	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-93	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-94	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-95	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-96	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-97	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-98	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-99	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI
230301-100	PORVENIR	01-10	SI	SI	SI	SI	SI	SI	SI

TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN SA:
NÚMERO AUTORIZACIÓN:

TOTAL	\$ 2,407.700
--------------	---------------------

DATOS GENERALES DEL APORTANTE				
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:		901604990	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	FLORENCIA DEPARTAMENTO:		SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITARE SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	CALLE 24 N 1 B 65 BARRIO TELÉFONO:		CAQUETA 4379130	
DIRECCIÓN:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:		B-MENOS DE 200 COTIZANTES	
TIPO APORTANTE:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:		Construcción de proyectos de	
TIPO EMPRESA:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:		22 - NUEVO 064	
FORMA DE PRESENTACIÓN:	APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI	

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA				
NÚMERO PLANILLA:	7961468587		TIPO DE PLANILLA:	E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES:	enero	PERIODO COTIZACIÓN:	MES: febrero
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO:	2025	OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	3			
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/02/24		NÚMERO AUTORIZACIÓN:	1288884743

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
900336004	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 312.100
800227940	231001	231001-COLFONDOS	1	\$ 152.300
800224808	230301	230301-PORVENIR	6	\$ 943.800
SUBTOTAL:			9	\$ 1.408.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
800251440	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 38.100
900935126	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	4	\$ 81.900
900156264	EPS041	NUEVA EPS CM	1	\$ 38.100
900156264	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	3	\$ 99.000
SUBTOTAL:			9	\$ 257.100
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
891190047	CCF13	CCF13-COMFACA	9	\$ 295.100
SUBTOTAL:			9	\$ 295.100
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
860011153	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	9	\$ 447.300
SUBTOTAL:			9	\$ 447.300

VALOR SIN MORA:	\$ 2.402.600
VALOR MORA:	\$ 5.100
TOTAL PAGADO:	\$ 2.407.700

nte
n línea

pse Bancolombia

SOI ACH

Pago realizado por: MADITH LORENA SANCHEZ MORENO

Nro. de recibo: 7961468587

Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafiscales

Identificación del contribuyente: 10.80.25.153

Concepto: NI

Razón Social: 901604990

Fecha y hora de la transacción: Lunes 24 de Febrero de 2025 03:21:02 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 2.407.700.00

Cuenta: *****3459

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 310 8000 - Cali 554 0000 - Barranquilla 351 8858 - Cartagena 683 4460 - Bucaramanga 697 2025 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 00 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 896 711 - Estados Unidos 1 866 279 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presente alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le soliciará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguna notificación de emergencia a correo@pse.com.co o correo@bancolombia.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

[illegible]

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN: NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 901604990
 NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITARE SAS
 CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA DEPARTAMENTO: CAQUETA
 DIRECCIÓN: CALLE 24 N 1 B 65 BARRIO TELÉFONO: 4379130
 TIPO APORTANTE: 01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
 TIPO EMPRESA: PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de proyectos de
 FORMA DE PRESENTACIÓN: SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 22 - NUEVO 064
 APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA: 7969201857 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
 PERIODO COTIZACIÓN: MES: febrero PERIODO COTIZACIÓN: MES: marzo
 OTROS SUBSISTEMAS: AÑO: 2025 SALUD: AÑO: 2025
 DÍAS DE MORA: 39
 FECHA PAGO (aaaa/mm/dd): 2025/04/29 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1442028875

LIQUIDACIÓN GENERAL

TOTALES

COTIZANTES	TOTAL PAGADO
------------	--------------

PENSIÓN

ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8002248088	230301	230301-PORVENIR	2
SUBTOTAL:			\$ 467.000

SALUD

ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
9009351267	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS	1
SUBTOTAL:			\$ 58.500

CAJA DE COMPENSACIÓN

ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8911900472	CCF13	CCF13-COMFACA	2
SUBTOTAL:			\$ 116.900

RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA			
NIT	CÓDIGO	NOMBRE	
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2
SUBTOTAL:			\$ 203.200

VALOR SIN MORA:	\$ 881.800
VALOR MORA:	\$ 22.300
TOTAL PAGADO:	\$ 904.100

Comprobante

de pago en línea



Bancolombia

SOI ACH

Pago realizado por: MADITH LORENA SANCHEZ MORENO

Nro. de recibo: 7969201857

Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Identificación del contribuyente: 10.80.25.153

Concepto: NI

Razón Social: 901604990

Fecha y hora de la transacción: Martes 29 de Abril de 2025 11:29:24 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 904,100.00

Cuenta: *****3459

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACIÓN: 80104990 CATEGORIA: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITACIONALES DIRECCIÓN: CALLE 24 N 1 B 89 BARRIO AMERICAS TIPO APORTANTE: EPS037 FORMA DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEÑA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA): SI		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7964501781 PERÍODO COTIZACIÓN: febrero AÑO 2025 FECHA PAGO: 20250317 TIPO DE PLANILLA: PERÍODO COTIZACIÓN SALUD NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20250317		MES: febrero AÑO: 2025 E-EMPLENDOS: 134305512	
--	--	---	--	--	--

TOTAL APORTES A PENSION									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	COTIZACIÓN	EMPLEADOR	SOLIDARIDAD	FSP	SUBSISTENCIA	TOTALES
25-14	25-14 COLPENSIONES		3	\$ 589.300	\$ 589.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 589.300
			1	\$ 227.800	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800
SUB-TOTALES:									\$ 817.100

TOTAL APORTES A SALUD									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACITADO POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	PLANILLA	VALOR	VALOR A FAVOR	TOTALES
25-14	25-14 COLPENSIONES		3	\$ 589.300	\$ 589.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 589.300
			1	\$ 227.800	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800
SUB-TOTALES:									\$ 817.100

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACITADO POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	PLANILLA	VALOR	VALOR A FAVOR	TOTALES
25-14	25-14 COLPENSIONES		3	\$ 589.300	\$ 589.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 589.300
			1	\$ 227.800	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800
SUB-TOTALES:									\$ 817.100

TOTAL APORTES A SALUD DE COMPENSACIÓN FAMILIAR									
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	INCAPACITADO POR ENFERMEDAD	LICENCIA MATERNIDAD	PLANILLA	VALOR	VALOR A FAVOR	TOTALES
25-14	25-14 COLPENSIONES		3	\$ 589.300	\$ 589.300	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 589.300
			1	\$ 227.800	\$ 227.800	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 227.800
SUB-TOTALES:									\$ 817.100

LIQUIDACIÓN DETALLADA APORTES									
SEGURIDAD SOCIAL									
Nº IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	TIPO	SUBTIPO	TIPO DE COTIZACIÓN	TIPO DE SALARIO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	Nº COTIZANTES	TOTALES
25-14	25-14 COLPENSIONES							3	\$ 589.300
								1	\$ 227.800
SUB-TOTALES:									\$ 817.100

TOTAL PAGADO: \$ 1.587.300

Comprobante de pago en línea



Bancolombia

SOI ACH

Pago realizado por: MADITH LORENA SANCHEZ MORENO

Nro. de recibo: 7964501781

Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Identificación del contribuyente: 10.80.25.153

Concepto: NI

Razón Social: 901604990

Fecha y hora de la transacción: Lunes 17 de Marzo de 2025 03:08:42 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 1,587,300.00

Cuenta: *****3459

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL



DATOS GENERALES DEL APORTANTE		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NIT: 901604990		7964504886	
NOMBRE: RAZÓN SOCIAL: SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITARE SAS		TIPO DE PLANILLA: 2025	
CALLE 24 N 18 65 BARRIO AMERICAS TELEFONO: 4379130		PERIODO COTIZACIÓN SALUD: marzo AÑO 2025	
DEPARTAMENTO: BARRIO AMERICAS		MES: 2025/04/28	
CIUDAD: BARRIO AMERICAS		NUMERO AUTORIZACIÓN: 2025/04/28	
TIPO APORTANTE: B-MIENOS DE 200 COTIZANTES			
PRIVADA: ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de proyectos de vivienda			
SUCURSAL: SUCURSAL Y DEFENSIÓN: 22- NUEVO BKA			
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)			
ADMINISTRADORA		ADMINISTRADORA	
CÓDIGO	NOMBRE	CÓDIGO	NOMBRE
25-14	25-14 COI PENSIONES	25-14	25-14 COI PENSIONES
25-14	25-14 COI PENSIONES	25-14	25-14 COI PENSIONES
SUBTOTAL:		SUBTOTAL:	

TOTAL APORTES A SALUD											
ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES		INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		SALDO A FAVOR		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	VALOR ADEMANES	APORTES	DESCUENTO
EPS037	EPS037 NUEVA EPS	3	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.700	\$ 0	\$ 62.700	\$ 0
EPS038	EPS038 SANIT SALUD EPS	2	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 62.700	\$ 0	\$ 62.700	\$ 0
EPS002	EPS002 SANIT SALUD TOTAL	1	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 7.600	\$ 0	\$ 7.600	\$ 0
SUBTOTALES:										\$ 133.000	\$ 700
TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES											
ADMINISTRADORA		Nº. COTIZANTES		INCAPACIDAD IRP		SALDO A FAVOR		MORA		TOTALES	
CÓDIGO	NOMBRE	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-23	14-23-POSTIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.	6	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 231.600	\$ 900	\$ 232.500	\$ 0
SUBTOTALES:								\$ 231.600	\$ 900	\$ 232.500	\$ 0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE	
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 901604990
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITARE SAS
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA DEPARTAMENTO: CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 24 N 1 B 65 BARRIO TELÉFONO: 4379130
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE: B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA: Construcción de proyectos de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA: 22 - NUEVO 064
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):	SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA	
NÚMERO PLANILLA:	7964504886 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo PERIODO COTIZACIÓN MES: abril
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025 SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	6
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/29 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1442065183

LIQUIDACIÓN GENERAL					TOTALES	
				COTIZANTES	TOTAL PAGADO	
PENSIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES		1	\$ 30.600	
8002248088	230301	230301-PORVENIR		5	\$ 503.300	
SUBTOTAL:				6	\$ 533.900	
SALUD						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
9009351267	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS		2	\$ 63.000	
8001309074	EPS002	EPS002-SALUD TOTAL		1	\$ 7.700	
9001562642	EPS037	EPS037-NUEVA EPS		3	\$ 63.000	
SUBTOTAL:				6	\$ 133.700	
CAJA DE COMPENSACIÓN						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8911900472	CCF13	CCF13-COMFACA		6	\$ 133.600	
SUBTOTAL:				6	\$ 133.600	
RIESGOS PROFESIONALES						
ADMINISTRADORA						
NIT	CÓDIGO	NOMBRE				
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑÍA DE SEGUROS S.A.		6	\$ 232.500	
SUBTOTAL:				6	\$ 232.500	

VALOR SIN MORA:	\$ 1.029.300
VALOR MORA:	\$ 4.400
TOTAL PAGADO:	\$ 1.033.700

Comprobante

de pago en línea



Bancolombia

SOI ACH

Pago realizado por: MADITH LORENA SANCHEZ MORENO

Nro. de recibo: 7964504886

Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Identificación del contribuyente: 10.80.25.153

Concepto: NI

Razón Social: 901604990

Fecha y hora de la transacción: Martes 29 de Abril de 2025 11:40:29 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 1,033,700.00

Cuenta: *****3459

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE TIPO IDENTIFICACIÓN: LOCAL CIUDAD/MUNICIPIO: FLORENCIA DEPARTAMENTO: FLORENCIA TELEFONO: 479130 CALLE 24 N 1 B 65 BARRIO AMERICAS CIUDAD/PAIS: COLOMBIA/COLOMBIA TIPO EMPLEADO: O-EMPLEADO AUTOLIQUIDANTE ACTIVIDAD ECONOMICA: PRIVADA SUCURSAL: SUCURSAL FORM DE PRESENTACIÓN: APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA) APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SEMA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA)		DATOS GENERALES DE LA PLANILLA NÚMERO PLANILLA: 7904505051 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD PERIODO COTIZACIÓN: 2025 MES: 20250317 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20250317		NÚMERO PLANILLA: 7904505051 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD PERIODO COTIZACIÓN: 2025 MES: 20250317 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20250317		NÚMERO PLANILLA: 7904505051 TIPO DE PLANILLA: PERIODO COTIZACIÓN SALUD PERIODO COTIZACIÓN: 2025 MES: 20250317 NÚMERO AUTORIZACIÓN: 20250317	
---	--	--	--	---	--	---	--

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A GAMA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NOMBRE	ADMINISTRADORA
25.14	COLPENSIONES		COLPENSIONES		COLPENSIONES		COLPENSIONES
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A GAMA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NOMBRE	ADMINISTRADORA
EP5005	EP5005-SANTAS S.A.		EP5005-SANTAS S.A.		EP5005-SANTAS S.A.		EP5005-SANTAS S.A.
ESS02	ESS02-ASMET SALUD EPS		ESS02-ASMET SALUD EPS		ESS02-ASMET SALUD EPS		ESS02-ASMET SALUD EPS
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A GAMA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NOMBRE	ADMINISTRADORA
14.23	14.23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		14.23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		14.23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.		14.23-POSITIVA COMPANIA DE SEGUROS S.A.
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A GAMA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NOMBRE	ADMINISTRADORA
COF13	COF13-COMFAC		COF13-COMFAC		COF13-COMFAC		COF13-COMFAC
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL APORTES A PENSION		TOTAL APORTES A SALUD		TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES		TOTAL APORTES A GAMA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR	
CÓDIGO	ADMINISTRADORA	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NOMBRE	ADMINISTRADORA	NOMBRE	ADMINISTRADORA
25.14	COLPENSIONES		COLPENSIONES		COLPENSIONES		COLPENSIONES
SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:		SUB-TOTALES:	

TOTAL PAGADO: \$ 44.300

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	901604990
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITARE SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 24 N 1 B 65 BARRIO TELÉFONO:	4379130
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	22 - NUEVO 064
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7964505051	TIPO DE PLANILLA:
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: marzo	PERIODO COTIZACIÓN:
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD:
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/03/17	NÚMERO AUTORIZACIÓN:
		1343543643

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9003360047	25-14	25-14 COLPENSIONES	2	\$ 22.800
SUBTOTAL:			2	\$ 22.800
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002514406	EPS005	EPS005-SANITAS S.A.	1	\$ 3.800
9009351267	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	\$ 1.900
SUBTOTAL:			2	\$ 5.700
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911900472	CCF13	CCF13-COMFACSA	2	\$ 5.700
SUBTOTAL:			2	\$ 5.700
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	2	\$ 10.100
SUBTOTAL:			2	\$ 10.100

VALOR SIN MORA:	\$ 44.300
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 44.300

Comprobante de pago en línea



SOI ACH

Pago realizado por: MADITH LORENA SANCHEZ MORENO

Nro. de recibo: 7964505051

Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Identificación del contribuyente: 10.80.25.153

Concepto: NI

Razón Social: 901604990

Fecha y hora de la transacción: Lunes 17 de Marzo de 2025 03:19:42 PM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 44,300.00

Cuenta: *****3459

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospchoso@bancolombia.com

TOTAL PAGADO:	\$ 29.500
----------------------	------------------

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES COMPROBANTE DE PAGO

DATOS GENERALES DEL APORTANTE		
TIPO IDENTIFICACIÓN:	NIT NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN: 901604990	
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:	SOLUCIONES CONSTRUCTIVAS HABITARE SAS	
CIUDAD/MUNICIPIO:	FLORENCIA DEPARTAMENTO:	CAQUETA
DIRECCIÓN:	CALLE 24 N 1 B 65 BARRIO TELÉFONO:	4379130
TIPO APORTANTE:	01-EMPLEADOR CLASE APORTANTE:	B-MENOS DE 200 COTIZANTES
TIPO EMPRESA:	PRIVADA ACTIVIDAD ECONOMICA:	Construcción de proyectos de
FORMA DE PRESENTACIÓN:	SUCURSAL SUCURSAL / DEPENDENCIA:	22 - NUEVO 064
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):		SI

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA		
NÚMERO PLANILLA:	7969165699 TIPO DE PLANILLA: E-EMPLEADOS	
PERIODO COTIZACIÓN:	MES: abril	PERIODO COTIZACIÓN MES: mayo
OTROS SUBSISTEMAS:	AÑO: 2025	SALUD: AÑO: 2025
DÍAS DE MORA:	0	
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):	2025/04/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN: 1441594250

LIQUIDACIÓN GENERAL				
			TOTALES	
			COTIZANTES	TOTAL PAGADO
PENSIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8002248088	230301	230301-PORVENIR	1	\$ 15.200
SUBTOTAL:			1	\$ 15.200
SALUD				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
9009351267	ESSC62	ESSC62-ASMET SALUD EPS	1	\$ 3.800
SUBTOTAL:			1	\$ 3.800
CAJA DE COMPENSACIÓN				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8911900472	CCF13	CCF13-COMFACA	1	\$ 3.800
SUBTOTAL:			1	\$ 3.800
RIESGOS PROFESIONALES				
ADMINISTRADORA				
NIT	CÓDIGO	NOMBRE		
8600111536	14-23	14-23-POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS S.A.	1	\$ 6.700
SUBTOTAL:			1	\$ 6.700

VALOR SIN MORA:	\$ 29.500
VALOR MORA:	\$ 0
TOTAL PAGADO:	\$ 29.500

Comprobante

de pago en línea



SOI ACH

Pago realizado por: MADITH LORENA SANCHEZ MORENO

Nro. de recibo: 7969165699

Descripción del pago: Pago de la Planilla Integrada de Seguridad Social y Parafisacales

Identificación del contribuyente: 10.80.25.153

Concepto: NI

Razón Social: 901604990

Fecha y hora de la transacción: Martes 29 de Abril de 2025 09:00:31 AM

Nro. de comprobante: 00001

Valor pagado: \$ 29,500.00

Cuenta: *****3459

Bancolombia S.A.

Comuníquese con nuestra Sucursal Telefónica Bancolombia: Bogotá 343 0000 - Medellín 510 9000 - Cali 554 0505 - Barranquilla 361 8888 - Cartagena 693 4400 - Bucaramanga 697 2525 - Pereira 340 1213 - El resto del país 01 800 09 12345 - Sucursales Telefónicas en el exterior: España 900 995 717 - Estados Unidos 1866 379 9714, en caso de recibir una alerta o notificación de una transacción que presenta alguna irregularidad.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico. En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a correosospeschosos@bancolombia.com

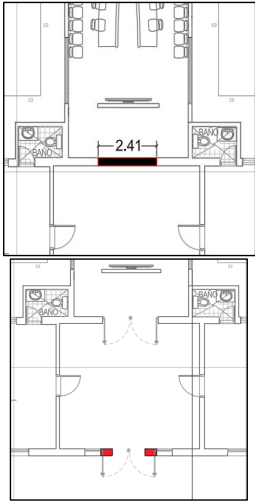
<div></div>		FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA						Código:	GA-JELOG-FR-092
		FORMATO BALANCE DE OBRA						Versión N°:	8
								Vigencia:	30/12/2024
INFORMACION GENERAL									
FECHA DE BALANCE		09 DE JUNIO 2025							
CONTRATO No.		064-00-1-CACOM-6-GRUAL-2024							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA		INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR O SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
		ACTIVIDADES CONTRACTUALES DE OBRA							
No.	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UND	PRESUPUESTO CONTRACTUAL Y/O ULTIMO MODIFICATORIO			BALANCE A LA FECHA			JUSTIFICACIÓN MAYORES Y/O MENORES CANTIDADES
			CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANTIDAD REAL	VALOR PARCIAL REAL	MAYORES Y MENORES CANTIDADES	
1	PRELIMINARES								
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON ELEMENTOS DE PRECISIÓN.	MP	90.00	\$7,168.00	\$645,120.00	90.00	\$ 645,120.00	-	IGUAL
1.2	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL	MP	24.91	\$31,170.00	\$776,444.70	31.79	\$ 990,738.45	6.88	MAYOR
1.3	DESMONTE DE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS METÁLICOS, INCLUYE RETIRO.	M	35.68	\$21,142.00	\$754,346.56	74.40	\$ 1,572,964.80	38.72	MAYOR
1.4	DEMOLICIÓN DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES (mp)	MP	34.50	\$21,685.00	\$748,132.50	55.87	\$ 1,211,595.16	21.37	MAYOR
1.5	DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA	MP	36.70	\$23,152.00	\$849,678.40	54.45	\$ 1,260,684.28	17.75	MAYOR
1.6	DESMONTE CUBIERTAS METÁLICAS	MP	40.37	\$10,494.00	\$423,642.78	83.67	\$ 878,050.82	43.30	MAYOR
1.7	DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES, ANGO Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	MP	4.50	\$18,863.00	\$84,883.50	11.50	\$ 216,924.50	7.00	MAYOR
1.8	DESMONTE DE ELEMENTOS METÁLICOS, INCLUYE RETIRO	MP	7.20	\$19,930.00	\$143,496.00	7.70	\$ 153,461.00	0.50	MAYOR
1.9	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, LAVAPLATOS, ORINALES Y DIVISIONES DE DUCHAS, Y TODOS SUS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO	UND	4.00	\$25,209.00	\$100,836.00	3.00	\$ 75,627.00	(1.00)	MENOR
1.10	DEMOLICIÓN DE MESÓN EN CONCRETO, INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES	M	3.00	\$118,103.00	\$354,309.00	2.52	\$ 297,619.56	(0.48)	MENOR
1.11	TALA DE ARBOLES PORTE MEDIO Y ALTO, INCLUYE PICADO DE MATERIAL, DISPOSICIÓN FINAL DEL MATERIAL Y COMPENSACIÓN.	UND	1.00	\$4,164,451.00	\$4,164,451.00	1.00	\$ 4,164,451.00	-	IGUAL
1.12	TALA Y DESENRAICE ARBOLES MEDIANOS INCLUYE RETIRO DE SOBRESANTES	UND	1.00	\$935,248.00	\$935,248.00	1.00	\$ 935,248.00	-	IGUAL
2	MOVIMIENTO DE TIERRAS								
2.1	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS, INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRESANTES A SITIO AUTORIZADO	MP	90.00	\$199,347.00	\$17,941,230.00	112.59	\$ 22,444,997.03	22.59	MAYOR
2.2	EXTENDIDO Y COMPACTACIÓN COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO	MP	90.00	\$15,912.00	\$1,432,080.00	111.39	\$ 1,772,437.68	21.39	MAYOR
2.3	RELLENO COMPACTADO AL 95% DEL PROCTOR MODIFICADO TIPO SUB-BASE B-200 SEGÚN PLANOS, INCLUYE SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN.	MP	45.00	\$187,194.00	\$8,423,730.00	45.00	\$ 8,423,730.00	-	IGUAL
3	CIMENTACIÓN								
3.1	SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS, INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS	MP	90.00	\$26,573.00	\$2,391,570.00	95.74	\$ 2,544,099.02	5.74	MAYOR
3.2	GEOTEXTIL NT2500 O SIMILAR	MP	90.00	\$9,271.00	\$834,390.00	135.27	\$ 1,254,111.35	45.27	MAYOR
3.3	VIGAS DE CIMENTACIÓN EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.	MP	6.20	\$1,643,871.00	\$10,192,000.20	10.66	\$ 17,521,034.67	4.46	MAYOR
3.4	ZAPATA EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MP	3.20	\$1,598,289.00	\$5,114,524.80	3.20	\$ 5,114,524.80	-	IGUAL
3.5	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MP	90.00	\$186,265.00	\$16,763,850.00	106.34	\$ 19,807,885.76	16.34	MAYOR
4	CONCRETOS								
4.1	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
4.1.1	COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MP	3.2	\$1,796,985.00	\$5,750,352.00	2.44	\$ 4,392,280.59	(0.76)	MENOR
4.1.2	VIGAS AERIAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS, INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO	MP	6.2	\$1,753,596.00	\$10,872,295.20	6.55	\$ 11,485,966.12	0.35	MAYOR
4.1.3	ANDÉN EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI E= 0.13M, INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA	MP	15.0	\$112,618.00	\$1,689,270.00	20.26	\$ 2,281,640.68	5.26	MAYOR
4.2	ACERO DE REFUERZO- ANCLAJES								
4.2.1	ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60- NTC 2298 INCLUYE EPOXICO, ALAMBRE NEGRO, TRASIEGO, MANEJO	Kg	2900	\$8,703.00	\$25,238,700.00	2900.00	\$ 25,238,700.00	-	IGUAL
4.2.2	MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA- NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO	Kg	285.00	\$7,518.00	\$2,142,630.00	233.81	\$ 1,757,796.17	(51.19)	MENOR
5	MAMPOSTERÍA								
5.1	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 PERFORACIÓN HORIZONTAL E=0.12 MTS Ø.33X0.115X0.23 MTS INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MORTERO DE PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.	MP	125.10	\$127,337.00	\$15,929,960.57	95.18	\$ 12,119,935.66	(29.92)	MENOR
5.2	MESÓN EN CONCRETO	MP	2.04	\$166,247.00	\$339,143.88	1.20	\$ 199,496.40	(0.84)	MENOR
6	REDES HIDRO SANITARIAS								
6.1	REDES SANITARIAS								
6.1.1	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4". INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M	10.00	\$42,897.00	\$428,970.00	120.60	\$ 5,173,378.20	110.60	MAYOR
6.1.2	PUNTO SANITARIO Ø 4". INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	3.00	\$75,128.00	\$225,384.00	4.00	\$ 300,512.00	1.00	MAYOR
6.1.3	PUNTO SANITARIO Ø 2". INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	7.00	\$55,801.00	\$390,607.00	2.00	\$ 111,602.00	(5.00)	MENOR
6.1.4	TUBERÍA DE VENTILACIÓN Ø 2"	M	10.00	\$28,557.00	\$285,570.00	0.00	\$ -	(10.00)	MENOR
6.1.5	SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	5.00	\$46,823.00	\$234,115.00	3.00	\$ 140,469.00	(2.00)	MENOR
6.1.6	PRUEBA SANITARIA	UND	1.00	\$129,752.00	\$129,752.00	2.00	\$ 259,504.00	1.00	MAYOR
6.1.7	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 2". INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M	30.00	\$24,060.00	\$721,800.00	6.10	\$ 146,766.00	(23.90)	MENOR
6.1.8	CAJA INSPECCIÓN 60X40X60CM	UND	1.00	\$477,988.00	\$477,988.00	7.00	\$ 3,345,916.00	6.00	MAYOR
6.2	REDES HIDRÁULICAS INTERNAS								
6.2.1	REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 4" (INCLUYE RESANE)	M	30.00	\$29,234.00	\$877,020.00	9.60	\$ 280,646.40	(20.40)	MENOR
6.2.2	TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	M	25.00	\$26,876.00	\$671,900.00	32.40	\$ 870,782.40	7.40	MAYOR
6.2.3	PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN	UND	10.00	\$24,867.00	\$248,670.00	7.00	\$ 174,069.00	(3.00)	MENOR
6.2.4	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3/4"	UND	2.00	\$56,562.00	\$113,124.00	3.00	\$ 169,686.00	1.00	MAYOR
6.2.5	LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA	UND	2.00	\$68,708.00	\$137,416.00	2.00	\$ 137,416.00	-	IGUAL
6.2.6	PRUEBA HIDRÁULICA	UND	1.00	\$132,207.00	\$132,207.00	1.00	\$ 132,207.00	-	IGUAL
6.2.7	DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA	M	20.00	\$5,822.00	\$116,440.00	32.40	\$ 188,632.80	12.40	MAYOR
6.2.8	REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 1"	UND	1.00	\$263,609.00	\$263,609.00	0.00	\$ -	(1.00)	MENOR
6.3	DRENAJE AIRES ACONDICIONADOS								
6.3.1	BAJANTE DRENAJE AIRE ACONDICIONADO TUBERÍA PVC RDE 21 Ø 1"	M	10.00	\$31,862.00	\$318,620.00	8.00	\$ 254,896.00	(2.00)	MENOR
7	INSTALACIONES ELÉCTRICAS								
7.1	BANCO DE DUCTERIAS INTERNAS-EXTERNAS TIPO CONDUIT PVC, EMT, IMC, CAJAS DE PASO Y CANALETA								
7.1.1	DUCTO PVC - DB DE 1XØ3/4" INCLUYE CURVAS, TERMINALES CAJAS Y TAPA CIEGAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	M	150.00	\$15,008.00	\$2,251,200.00	0.00	\$ -	(150.00)	MENOR
7.1.2	DUCTO PVC - DB DE 1X Ø 1". INCLUYE CURVAS, TERMINALES CAJA, TAPA CIEGAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	M	120.00	\$18,734.00	\$2,248,080.00	51.20	\$ 959,180.80	(68.80)	MENOR
7.2	TABLEROS ELÉCTRICOS DE DISTRIBUCIÓN Y CAJAS DE CONTROL								
7.2.1	MANTENIMIENTO DE TABLEROS MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS, TRIFÁSICOS, TABLEROS DE CONTROL DE SALIDAS ESPECIALES Y TABLEROS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN EXISTENTES, INCLUYE LA VERIFICACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN INTERNA DE LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS, BARRAJES Y ELEMENTOS DE FLUJACIÓN CONFORME AL CUADRO DE CARGAS Y/O DIAGRAMA UNIFILAR, ASÍ MISMO DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	UND	1.00	\$2,094,283.00	\$2,094,283.00	1.00	\$ 2,094,283.00	-	IGUAL
7.2.2	TABLERO DE DISTRIBUCIÓN TRIFÁSICO, ENCHUFABLES, DOCE (12) CIRCUITOS, PUERTA CON CHAPA Y LLAVES, INCLUYE PROTECCIONES TERMOMAGNÉTICAS, ESPACIO PARA TOTALIZADOR Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO	UND	1.00	\$1,118,458.00	\$1,118,458.00	1.00	\$ 1,118,458.00	-	IGUAL
7.3	ACOMETIDAS ELÉCTRICAS								
7.3.1	ACOMETIDA EN CABLE 3 X (NO. 8 CUXAWG FASES) + 1 X NO.8 CUXAWG NEUTRO + 1 X NO. 8 CUXESNAXWG TIERRA, EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), INCLUYE DUCTERÍA, CURVAS, UNIONES, RESANE, PÁÑETE, ESTUCO, PINTURA, RECUPERACIÓN DE LA ZONA AFECTADA CON LOS MISMOS ACABADOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.	M	35.00	\$63,442.00	\$2,220,470.00	15.00	\$ 951,630.00	(20.00)	MENOR

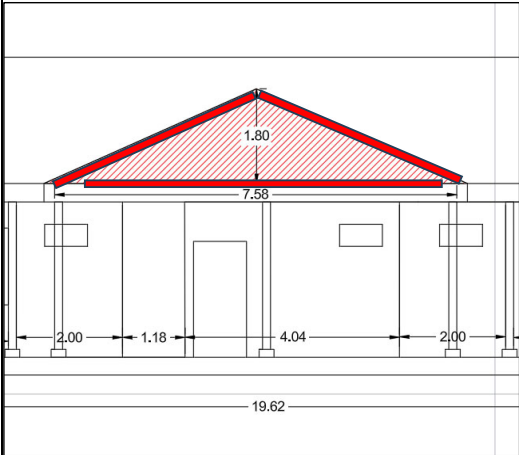
[illegible]


Shogun

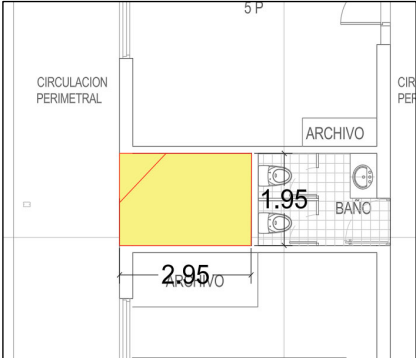
		FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA										Código:		GA-JELOG-FR-101		
		FORMATO CORTE PARCIAL - FINAL DE OBRA										Versión N°:		6		
		Módulo de Cálculo y Control de Costos										Vigencia:		2012/2024		
		ADICUACIÓN DE UNA SALA DE FUEGOS Y MANTENIMIENTO DEL PRD HANGAR GRUPE 41 DEL CACOM 4														
		EST. BAUTISTA GARCIA JORDAN STEWARD														
		09 DE JUNIO 2023														
		TERCER CORTE FINAL DE OBRA														
		OBRA														
NÚMERO	DESCRIPCIÓN ACTIVIDAD	UNO	PRESUPUESTO CONTRACTUAL		BALANCE A LA FECHA		OBRA EJECUTADA				OBRA POR EJECUTAR					
			CANT.	VALOR UNITARIO	VALOR	REMANEJO (V) Y INCREMENTO (C) EN UNIDADES	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CANTIDAD REAL	VALOR REAL				
								CORTE 1 (204 DE Noviembre 21 DE Noviembre del 2020)		CORTE 2 (204 DE 06 de 2021 27 de 2021)		CORTE 3 (204 DE 06 de 2021 27 de 2021)		CORTE 4 (204 DE 06 de 2021 27 de 2021)		
								CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CANTIDAD REAL	VALOR REAL	CANT.	VALOR TOTAL	% EJECUTADO
1	REMOVER EL PAVIMENTO CON ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$7,188.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.1	CONCRETO EN REBANCO CONCRETO (200 MM) PARA REBANCO	M	24.91	\$21,170.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.2	REBANCO DE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.3	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$21,170.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.4	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.5	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.6	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.7	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.8	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.9	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.10	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.11	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
1.12	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.1	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.2	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2.3	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.1	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.2	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.3	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.4	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.5	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.6	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.7	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.8	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.9	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.10	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.11	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.12	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.13	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.14	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.15	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.16	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.17	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.18	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.19	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.20	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.21	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.22	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.23	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.24	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.25	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.26	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.27	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.28	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.29	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.30	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.31	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.32	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.33	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.34	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.35	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.36	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.37	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.38	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.39	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.40	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.41	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.42	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.43	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.44	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.45	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.46	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.47	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.48	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.49	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.50	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3.51	REBANCO DE ESTRUCTURA DE PRESIÓN Y ELEMENTOS DE PRESIÓN.	M	30.00	\$51,142.00	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.0					

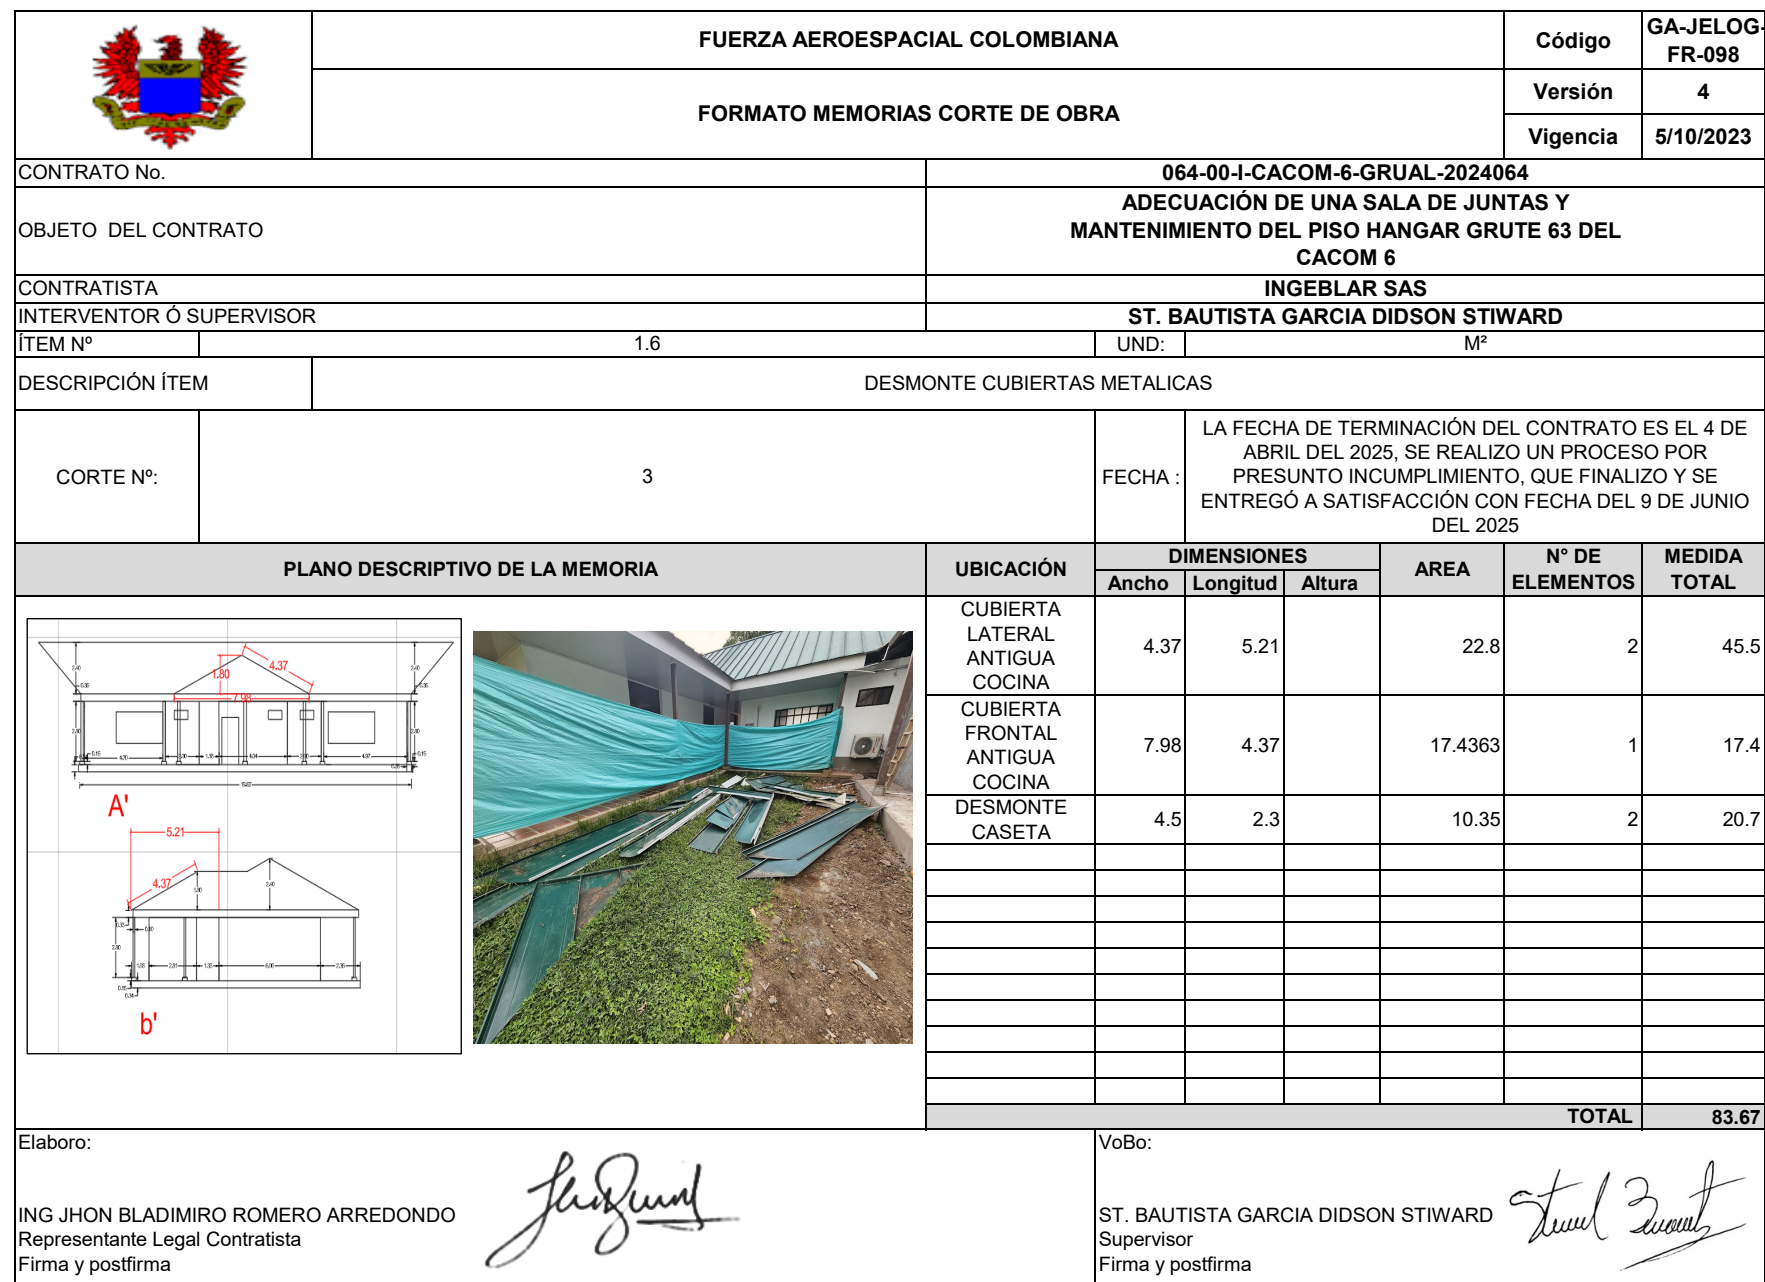
TOTAL TERCEROS UNIDOS DREDA												
ADMINISTRACION	25.00%	1	100,000,000.00		1	100,000,000.00		1	100,000,000.00		1	100,000,000.00
OPERACIONES	1.00%	1	4,000,000.00		1	4,000,000.00		1	4,000,000.00		1	4,000,000.00
OTROS	1.00%	1	4,000,000.00		1	4,000,000.00		1	4,000,000.00		1	4,000,000.00
VALOR TOTAL DREDA	26.00%	3	108,000,000.00		3	108,000,000.00		3	108,000,000.00		3	108,000,000.00
TOTAL DREDA DREDA CONTRACTUAL												
EQUIPOS												
EQUIPOS ENTREGADOS												
EQUIPOS POR ENTREGAR												
BALANCE A LA FECHA												
CORTES 1 (Del 01 de Noviembre al 12 de Diciembre del 2015)												
CORTES 2 (Del 13 de Diciembre del 2015 al 31 de Enero del 2016)												
CORTES 3 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2016)												
CORTES 4 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2016)												
CORTES 5 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2016)												
CORTES 6 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2016)												
CORTES 7 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2016)												
CORTES 8 (Del 01 de Diciembre del 2016 al 31 de Enero del 2017)												
CORTES 9 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2017)												
CORTES 10 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2017)												
CORTES 11 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2017)												
CORTES 12 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2017)												
CORTES 13 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2017)												
CORTES 14 (Del 01 de Diciembre del 2017 al 31 de Enero del 2018)												
CORTES 15 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2018)												
CORTES 16 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2018)												
CORTES 17 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2018)												
CORTES 18 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2018)												
CORTES 19 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2018)												
CORTES 20 (Del 01 de Diciembre del 2018 al 31 de Enero del 2019)												
CORTES 21 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2019)												
CORTES 22 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2019)												
CORTES 23 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2019)												
CORTES 24 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2019)												
CORTES 25 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2019)												
CORTES 26 (Del 01 de Diciembre del 2019 al 31 de Enero del 2020)												
CORTES 27 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2020)												
CORTES 28 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2020)												
CORTES 29 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2020)												
CORTES 30 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2020)												
CORTES 31 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2020)												
CORTES 32 (Del 01 de Diciembre del 2020 al 31 de Enero del 2021)												
CORTES 33 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2021)												
CORTES 34 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2021)												
CORTES 35 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2021)												
CORTES 36 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2021)												
CORTES 37 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2021)												
CORTES 38 (Del 01 de Diciembre del 2021 al 31 de Enero del 2022)												
CORTES 39 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2022)												
CORTES 40 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2022)												
CORTES 41 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2022)												
CORTES 42 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2022)												
CORTES 43 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2022)												
CORTES 44 (Del 01 de Diciembre del 2022 al 31 de Enero del 2023)												
CORTES 45 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2023)												
CORTES 46 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2023)												
CORTES 47 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2023)												
CORTES 48 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2023)												
CORTES 49 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2023)												
CORTES 50 (Del 01 de Diciembre del 2023 al 31 de Enero del 2024)												
CORTES 51 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2024)												
CORTES 52 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2024)												
CORTES 53 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2024)												
CORTES 54 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2024)												
CORTES 55 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2024)												
CORTES 56 (Del 01 de Diciembre del 2024 al 31 de Enero del 2025)												
CORTES 57 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2025)												
CORTES 58 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2025)												
CORTES 59 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2025)												
CORTES 60 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2025)												
CORTES 61 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2025)												
CORTES 62 (Del 01 de Diciembre del 2025 al 31 de Enero del 2026)												
CORTES 63 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2026)												
CORTES 64 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2026)												
CORTES 65 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2026)												
CORTES 66 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2026)												
CORTES 67 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2026)												
CORTES 68 (Del 01 de Diciembre del 2026 al 31 de Enero del 2027)												
CORTES 69 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2027)												
CORTES 70 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2027)												
CORTES 71 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2027)												
CORTES 72 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2027)												
CORTES 73 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2027)												
CORTES 74 (Del 01 de Diciembre del 2027 al 31 de Enero del 2028)												
CORTES 75 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2028)												
CORTES 76 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2028)												
CORTES 77 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2028)												
CORTES 78 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2028)												
CORTES 79 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2028)												
CORTES 80 (Del 01 de Diciembre del 2028 al 31 de Enero del 2029)												
CORTES 81 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2029)												
CORTES 82 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2029)												
CORTES 83 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2029)												
CORTES 84 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2029)												
CORTES 85 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2029)												
CORTES 86 (Del 01 de Diciembre del 2029 al 31 de Enero del 2030)												
CORTES 87 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2030)												
CORTES 88 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2030)												
CORTES 89 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2030)												
CORTES 90 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2030)												
CORTES 91 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2030)												
CORTES 92 (Del 01 de Diciembre del 2030 al 31 de Enero del 2031)												
CORTES 93 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2031)												
CORTES 94 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2031)												
CORTES 95 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2031)												
CORTES 96 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2031)												
CORTES 97 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2031)												
CORTES 98 (Del 01 de Diciembre del 2031 al 31 de Enero del 2032)												
CORTES 99 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2032)												
CORTES 100 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2032)												
CORTES 101 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2032)												
CORTES 102 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2032)												
CORTES 103 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2032)												
CORTES 104 (Del 01 de Diciembre del 2032 al 31 de Enero del 2033)												
CORTES 105 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2033)												
CORTES 106 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2033)												
CORTES 107 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2033)												
CORTES 108 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2033)												
CORTES 109 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2033)												
CORTES 110 (Del 01 de Diciembre del 2033 al 31 de Enero del 2034)												
CORTES 111 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2034)												
CORTES 112 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2034)												
CORTES 113 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2034)												
CORTES 114 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2034)												
CORTES 115 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2034)												
CORTES 116 (Del 01 de Diciembre del 2034 al 31 de Enero del 2035)												
CORTES 117 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2035)												
CORTES 118 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2035)												
CORTES 119 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2035)												
CORTES 120 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2035)												
CORTES 121 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2035)												
CORTES 122 (Del 01 de Diciembre del 2035 al 31 de Enero del 2036)												
CORTES 123 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2036)												
CORTES 124 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2036)												
CORTES 125 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2036)												
CORTES 126 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2036)												
CORTES 127 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2036)												
CORTES 128 (Del 01 de Diciembre del 2036 al 31 de Enero del 2037)												
CORTES 129 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2037)												
CORTES 130 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2037)												
CORTES 131 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2037)												
CORTES 132 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2037)												
CORTES 133 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2037)												
CORTES 134 (Del 01 de Diciembre del 2037 al 31 de Enero del 2038)												
CORTES 135 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2038)												
CORTES 136 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2038)												
CORTES 137 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2038)												
CORTES 138 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2038)												
CORTES 139 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2038)												
CORTES 140 (Del 01 de Diciembre del 2038 al 31 de Enero del 2039)												
CORTES 141 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2039)												
CORTES 142 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2039)												
CORTES 143 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2039)												
CORTES 144 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2039)												
CORTES 145 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2039)												
CORTES 146 (Del 01 de Diciembre del 2039 al 31 de Enero del 2040)												
CORTES 147 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2040)												
CORTES 148 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2040)												
CORTES 149 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2040)												
CORTES 150 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2040)												
CORTES 151 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2040)												
CORTES 152 (Del 01 de Diciembre del 2040 al 31 de Enero del 2041)												
CORTES 153 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2041)												
CORTES 154 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2041)												
CORTES 155 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2041)												
CORTES 156 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2041)												
CORTES 157 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2041)												
CORTES 158 (Del 01 de Diciembre del 2041 al 31 de Enero del 2042)												
CORTES 159 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2042)												
CORTES 160 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2042)												
CORTES 161 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2042)												
CORTES 162 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2042)												
CORTES 163 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2042)												
CORTES 164 (Del 01 de Diciembre del 2042 al 31 de Enero del 2043)												
CORTES 165 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2043)												
CORTES 166 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2043)												
CORTES 167 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2043)												
CORTES 168 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2043)												
CORTES 169 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2043)												
CORTES 170 (Del 01 de Diciembre del 2043 al 31 de Enero del 2044)												
CORTES 171 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2044)												
CORTES 172 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2044)												
CORTES 173 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2044)												
CORTES 174 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2044)												
CORTES 175 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2044)												
CORTES 176 (Del 01 de Diciembre del 2044 al 31 de Enero del 2045)												
CORTES 177 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2045)												
CORTES 178 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2045)												
CORTES 179 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2045)												
CORTES 180 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2045)												
CORTES 181 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2045)												
CORTES 182 (Del 01 de Diciembre del 2045 al 31 de Enero del 2046)												
CORTES 183 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2046)												
CORTES 184 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2046)												
CORTES 185 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2046)												
CORTES 186 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2046)												
CORTES 187 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2046)												
CORTES 188 (Del 01 de Diciembre del 2046 al 31 de Enero del 2047)												
CORTES 189 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2047)												
CORTES 190 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2047)												
CORTES 191 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2047)												
CORTES 192 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2047)												
CORTES 193 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2047)												
CORTES 194 (Del 01 de Diciembre del 2047 al 31 de Enero del 2048)												
CORTES 195 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2048)												
CORTES 196 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2048)												
CORTES 197 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2048)												
CORTES 198 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2048)												
CORTES 199 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2048)												
CORTES 200 (Del 01 de Diciembre del 2048 al 31 de Enero del 2049)												
CORTES 201 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2049)												
CORTES 202 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2049)												
CORTES 203 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2049)												
CORTES 204 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2049)												
CORTES 205 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2049)												
CORTES 206 (Del 01 de Diciembre del 2049 al 31 de Enero del 2050)												
CORTES 207 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2050)												
CORTES 208 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2050)												
CORTES 209 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2050)												
CORTES 210 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2050)												
CORTES 211 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2050)												
CORTES 212 (Del 01 de Diciembre del 2050 al 31 de Enero del 2051)												
CORTES 213 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2051)												
CORTES 214 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2051)												
CORTES 215 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2051)												
CORTES 216 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2051)												
CORTES 217 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2051)												
CORTES 218 (Del 01 de Diciembre del 2051 al 31 de Enero del 2052)												
CORTES 219 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2052)												
CORTES 220 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2052)												
CORTES 221 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2052)												
CORTES 222 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2052)												
CORTES 223 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2052)												
CORTES 224 (Del 01 de Diciembre del 2052 al 31 de Enero del 2053)												
CORTES 225 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2053)												
CORTES 226 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2053)												
CORTES 227 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2053)												
CORTES 228 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2053)												
CORTES 229 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2053)												
CORTES 230 (Del 01 de Diciembre del 2053 al 31 de Enero del 2054)												
CORTES 231 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2054)												
CORTES 232 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2054)												
CORTES 233 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2054)												
CORTES 234 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2054)												
CORTES 235 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2054)												
CORTES 236 (Del 01 de Diciembre del 2054 al 31 de Enero del 2055)												
CORTES 237 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2055)												
CORTES 238 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2055)												
CORTES 239 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2055)												
CORTES 240 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2055)												
CORTES 241 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2055)												
CORTES 242 (Del 01 de Diciembre del 2055 al 31 de Enero del 2056)												
CORTES 243 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2056)												
CORTES 244 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2056)												
CORTES 245 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2056)												
CORTES 246 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2056)												
CORTES 247 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2056)												
CORTES 248 (Del 01 de Diciembre del 2056 al 31 de Enero del 2057)												
CORTES 249 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2057)												
CORTES 250 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2057)												
CORTES 251 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2057)												
CORTES 252 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2057)												
CORTES 253 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2057)												
CORTES 254 (Del 01 de Diciembre del 2057 al 31 de Enero del 2058)												
CORTES 255 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2058)												
CORTES 256 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2058)												
CORTES 257 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2058)												
CORTES 258 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2058)												
CORTES 259 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2058)												
CORTES 260 (Del 01 de Diciembre del 2058 al 31 de Enero del 2059)												
CORTES 261 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2059)												
CORTES 262 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2059)												
CORTES 263 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2059)												
CORTES 264 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2059)												
CORTES 265 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2059)												
CORTES 266 (Del 01 de Diciembre del 2059 al 31 de Enero del 2060)												
CORTES 267 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2060)												
CORTES 268 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2060)												
CORTES 269 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2060)												
CORTES 270 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2060)												
CORTES 271 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2060)												
CORTES 272 (Del 01 de Diciembre del 2060 al 31 de Enero del 2061)												
CORTES 273 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2061)												
CORTES 274 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2061)												
CORTES 275 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2061)												
CORTES 276 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2061)												
CORTES 277 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2061)												
CORTES 278 (Del 01 de Diciembre del 2061 al 31 de Enero del 2062)												
CORTES 279 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2062)												
CORTES 280 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2062)												
CORTES 281 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2062)												
CORTES 282 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2062)												
CORTES 283 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2062)												
CORTES 284 (Del 01 de Diciembre del 2062 al 31 de Enero del 2063)												
CORTES 285 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2063)												
CORTES 286 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2063)												
CORTES 287 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2063)												
CORTES 288 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2063)												
CORTES 289 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2063)												
CORTES 290 (Del 01 de Diciembre del 2063 al 31 de Enero del 2064)												
CORTES 291 (Del 01 de Febrero al 31 de Marzo del 2064)												
CORTES 292 (Del 01 de Abril al 31 de Mayo del 2064)												
CORTES 293 (Del 01 de Junio al 31 de Julio del 2064)												
CORTES 294 (Del 01 de Agosto al 31 de Septiembre del 2064)												
CORTES 295 (Del 01 de Octubre al 31 de Noviembre del 2064)												
CORTES 296 (Del 01 de Diciembre del 2064 al 31 de Enero del 2065)												

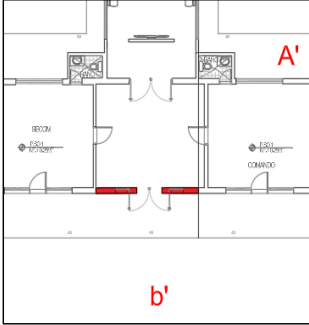
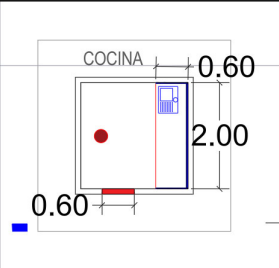
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG- FR-098					
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	4					
				Vigencia	5/10/2023					
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	1.2			UND:	M²					
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DEMOLICIÓN DE MUROS EN BLOQUE / LADRILLO / DRY WALL, INCLUYE RETIRO DEL MATERIAL									
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
				Ancho	Longitud	Altura				
  			MURO DE PUERTA SALA DE JUNTAS		2.41	2.5	6.025	1	6.025	
			ANTEPECHOS DESPACHO		0.5	0.85	0.425	2	0.85	
						TOTAL		6.88		
Elaboro:			VoBo:							
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma							


	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG- FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	1.3			UND:	M					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DESMONTE DE ESTRUCTURA Y ELEMENTOS METÁLICOS, INCLUYE RETIRO.								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
  				COLUMNA CENTRAL		3.3			1	3.3
				VIGAS		6.15			2	12.3
				VIGAS		4.6			1	4.6
				CORREAS		2.3			2	4.6
				CORREAS		3.45			2	6.9
				CORREAS FRONTALES		3.5			2	7
						2.5			4	10
						1.6			2	3.2
				COCINA		4.5			5	22.5
				TOTAL			74.40			
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	4				
				Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.		064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA		INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	1.4		UND:	M²					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DEMOLICION DE ENCHAPE DE PISOS Y PAREDES (m²)							
CORTE N°:	3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				Ancho	Longitud	Altura			
  			BAÑO MUJERES	2.95	1.95		5.8	1	5.8
			ANDEN BAÑO MUJERES	1.95	2.2		4.3	1	4.3
			PISO COCINA	3.6	3.6		13.0	1	13.0
			PARED BAÑO	1.95	0.6		1.2	1	1.2
			SALIDAS HIDRAULICAS BAÑO	1	1		1	1	1
			TOTAL			25.17			
Elaboro:			VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG- FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	1.5			UND:	M²					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DESMONTE DE CIELO RASO, INCLUYE DESMONTE DE ESTRUCTURA								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
				BAÑO MUJERES	2.95	1.95		5.8	1	5.8
				DESMONTE LATERALES A SALA DE JUNTAS	1	5.5		5.5	2	11.0
				INSPECCION TABLERO COMANDO	1	1		1.0	1	1.0
				TOTAL			17.75			
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

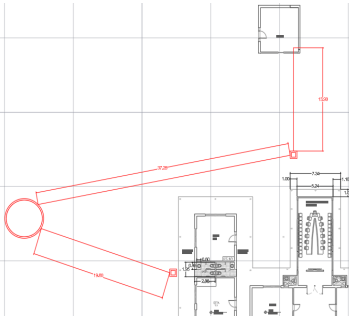


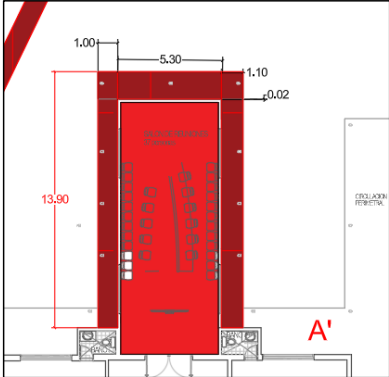
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098								
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4								
					Vigencia	5/10/2023								
CONTRATO No.				064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064										
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6										
CONTRATISTA				INGEBLAR SAS										
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD										
ÍTEM N°	1.7			UND:	M²									
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DESMONTE DE VENTANERÍA INCLUYE MARCOS, VIDRIOS, PERFILES, ANGEOS Y DEMÁS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO												
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZÓ UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZÓ Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025									
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL				
					Ancho	Longitud	Altura							
    				COCINA	1.00		0.60	0.60	1.00	0.60				
				VENTANERIA COMANDO	1.40		2.00	2.80	2.00	5.60				
					0.80		1.00	0.80	1.00	0.80				
				TOTAL						7.00				
Elaboro:					VoBo:									
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma					ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma									

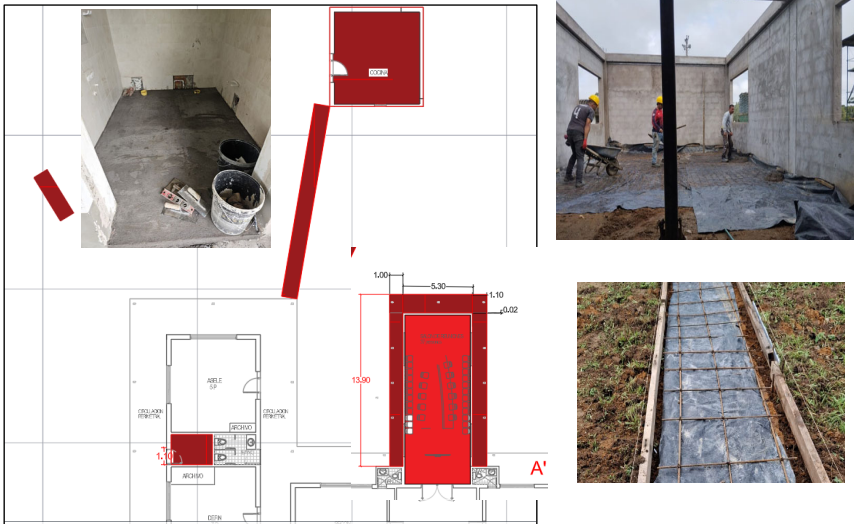
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	1.8			UND:	M²					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DESMONTE DE ELEMENTOS METÁLICOS, INCLUYE RETIRO								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
				PUERTA BAÑO MUJERES	1.20		2.75	3.30	1	3.3
				PUERTA COCINA	1		2	2.00	1	2.0
				PUERTA COMANDO	1.2		2	2.40	1	2.4
										
				TOTAL			7.70			
Elabore: ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma 				VoBo: ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma 						

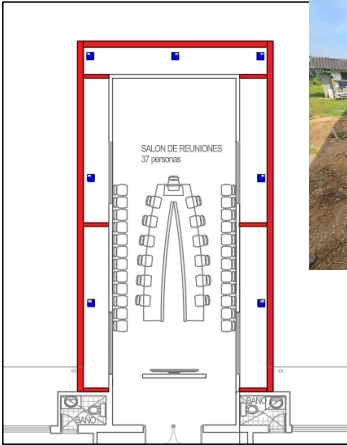
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098		
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4		
					Vigencia	5/10/2023		
CONTRATO No.		064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA		INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	1.9			UND:	UND			
DESCRIPCIÓN ÍTEM	DESMONTE DE APARATOS SANITARIOS, LAVAMANOS, LAVAPLATOS, ORINALES Y DIVISIONES DE DUCHAS, Y TODOS SUS ACCESORIOS, INCLUYE RETIRO							
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025			
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura			
	SANITARIO BAÑO MUJERES					1	1.0	
	LAVAMANOS BAÑO MUJERES					1	1.0	
TOTAL							2.00	
Elaboro:				VoBo:				
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma				

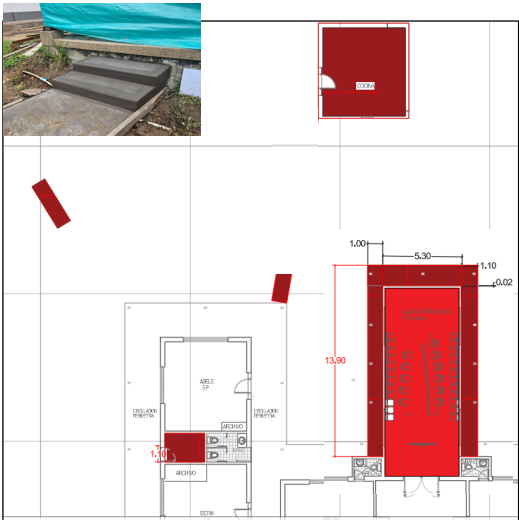
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.				064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA				INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	2.1			UND:	M³					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN SEGÚN PLANOS. INCLUYE CARGUE, TRANSPORTE Y DISPOSICIÓN FINAL DE SOBRANTES A SITIO AUTORIZADO								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
				CAJILLA BAÑO MUJERES A POZO	0.50	19.60	0.7	6.9		6.9
				CAJILLA BAÑO MUJERES	1	1	1	1.0		1.0
				CAJILLA SALA DE JUNTAS A POZO	0.5	37.12	0.6	11.1		11.1
				CAJILLA A COCINA	0.5	12.5	0.7	4.4		4.4
				POSETA A CAJILLA	0.5	9	0.8	3.6		3.6
				TOTAL				26.97		
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

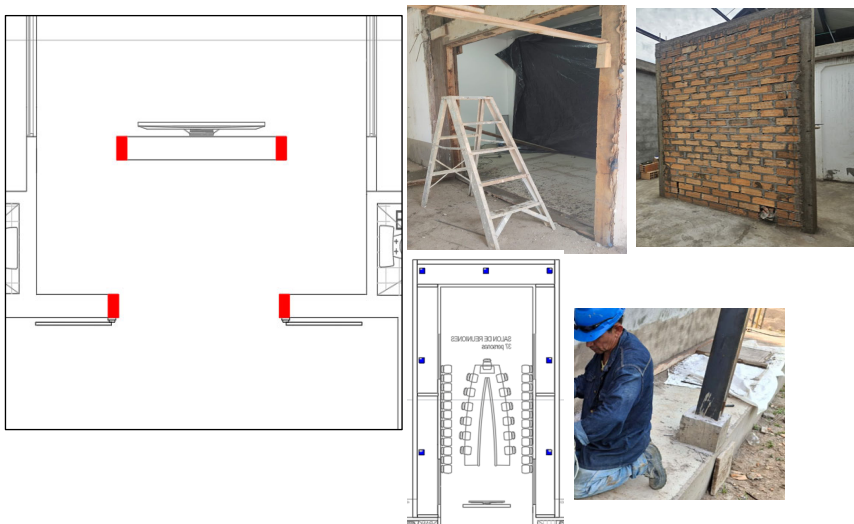
	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4			
					Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	2.2		UND:	M³					
DESCRIPCIÓN ÍTEM	EXTENDIDO Y COMPACTACION COMPACTACIÓN DE CAPA SUBRASANTE HASTA ALCANZAR CBR=95% DEL PROCTOR MODIFICADO								
CORTE N°:	3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA   			UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				Ancho	Longitud	Altura			
			CAJILLA BAÑO MUJERES A POZO	0.40	19.60	0.5	3.9	1	3.9
			CAJILLA SALA DE JUNTAS A POZO	0.4	37.2	0.5	7.4	1	7.4
			CAJILLA A COCINA	0.4	12.5	0.35	1.8	1	1.8
			POSETA A CAJILLA	0.4	9	0.35	1.3	1	1.3
			RELLENO ANDENES	0.40	13.9	0.5	2.8	2	5.6
			RELLENO ANDENES	0.40	7.3	0.5	1.5	1	1.5
			TOTAL 21.39						
Elaboro:			VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

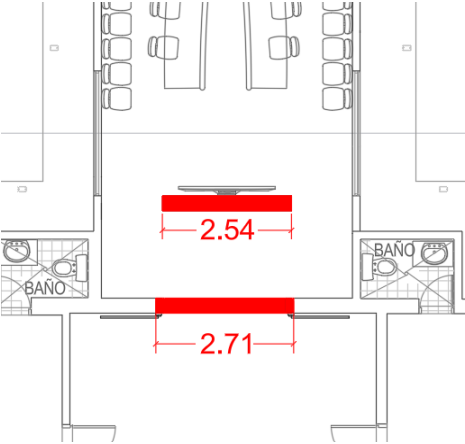
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.				064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA				INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM Nº		3.1		UND:	M²					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		SOLADO DE LIMPIEZA EN CONCRETO DE 2.000 PSI DE E=0.05 M SEGÚN PLANOS. INCLUYE MATERIALES, MANO DE OBRA, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS								
CORTE Nº:		3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
 				SALA DE JUNTAS	5.22	12		62.6		62.64
				ANDENES	1	13.9		13.9	2	27.8
				ANDENES	1	5.3		5.3	1	5.3
				TOTAL					95.74	
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

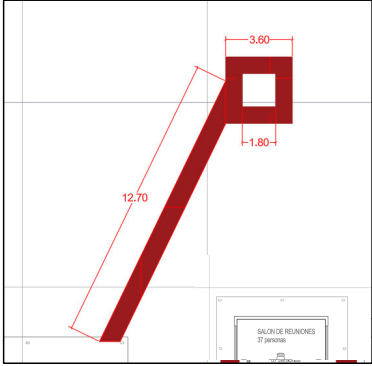
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	3.2			UND:	M²					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		GEOTEXTIL NT2500 O SIMILAR								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
				CAMINO A LAB INGLES	1.00	1.50		1.5	1	1.5
				SALA DE JUNTAS	5.22	12		62.6	1	62.64
				CAMINO A COCINA	1	12.7		12.7	1	12.7
				COCINA	3.6	3.6		13.0	1	12.96
				BAÑOS MUJERES	1.95	2.95		5.75	1	5.7525
				ANDENES	1.2	13.9		16.68	2	33.36
				ANDENES	1.2	5.3		6.36	1	6.36
				TOTAL			135.27			
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

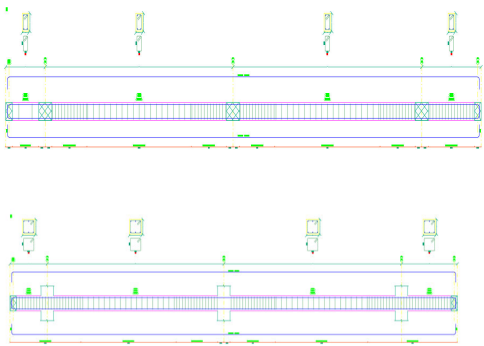
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.				064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA				INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	3.3			UND:	M³					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 4.000 PSI IMPERMEABILIZADO SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO.								
CORTE N°:	1			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
<div></div>				Vigas Riostras	0.2	5.45	0.3	0.327	1	0.327
					0.2	13.2	0.3	0.792	2	1.584
				Sardineles anden	0.2	13.2	0.4	1.056	2	2.112
					0.2	5.45	0.4	0.436	1	0.436
				TOTAL			4.46			
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

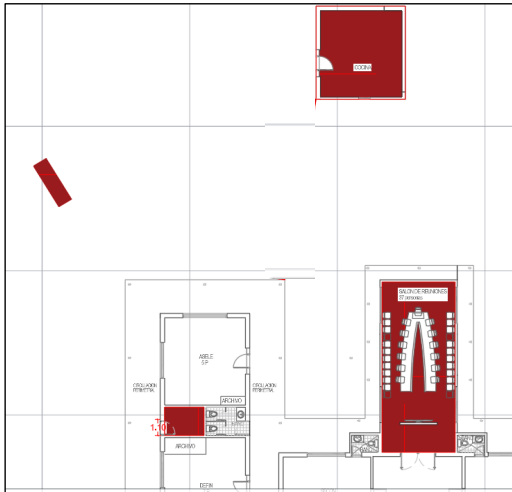
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.				064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA				INGEBLAR SAS						
INTERVENOR Ó SUPERVISOR				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	3.5			UND:	M²					
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO DE 3.000 PSI IMPERMEABILIZADO, SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, E=0.10 M, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO									
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
				PLACA DE CAMINO A LAB INGLES	1.00	1.50		1.50	1.00	1.50
				SALA DE JUNTAS	5.22	12.00		62.64	1.00	62.64
				COCINA	2.00	2.00		4.00	1.00	4.00
				BAÑOS MUJERES	1.95	2.95		5.75	1.00	5.75
				ANDENES SALA DE JUNTAS	1.00	13.20		13.20	2.00	26.40
				ESCALERAS CAMINO A COCINA	1.00	5.45		5.45	1.00	5.45
					0.3	1	0.19	0.3	2	0.6
				TOTAL			106.34			
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098						
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4						
					Vigencia	5/10/2023						
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064									
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6									
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS									
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD									
ÍTEM N°	4.1.1			UND:	M³							
DESCRIPCIÓN ÍTEM	COLUMNA EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO											
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025							
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN			DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
							Ancho	Longitud	Altura			
				MURO TV SALA DE JUNTAS	0.20	0.30	3.15	0.189	2	0.378		
				PUERTAS SAL DE JUNTAS	0.15	0.25	2.5	0.094	2	0.188		
				PEDESTALES CONCRETO PARA COLUMNAS METALICAS	0.25	0.25	0.25	0.016	6	0.094		
TOTAL								0.66				
Elaboro:				VoBo:								
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma								

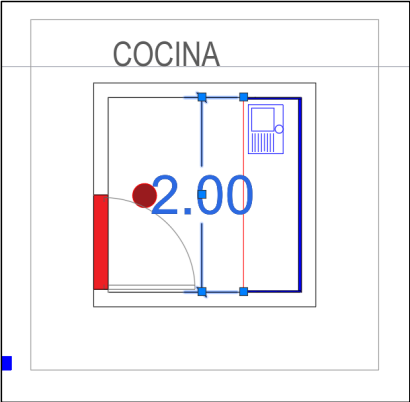
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	4.1.2			UND:	M³					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		VIGAS AEREAS EN CONCRETO DE 4.000 PSI SEGÚN PLANOS. INCLUYE MANO DE OBRA, FORMALETAS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS NECESARIAS, NO INCLUYE ACERO DE REFUERZO								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
<div></div>				MURO TV SALA DE JUNTAS	0.30	2.54	0.3	0.2	1	0.23
				PUERTAS SALA DE JUNTAS	0.15	2.71	0.3	0.1	1	0.12
				TOTAL			0.35			
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

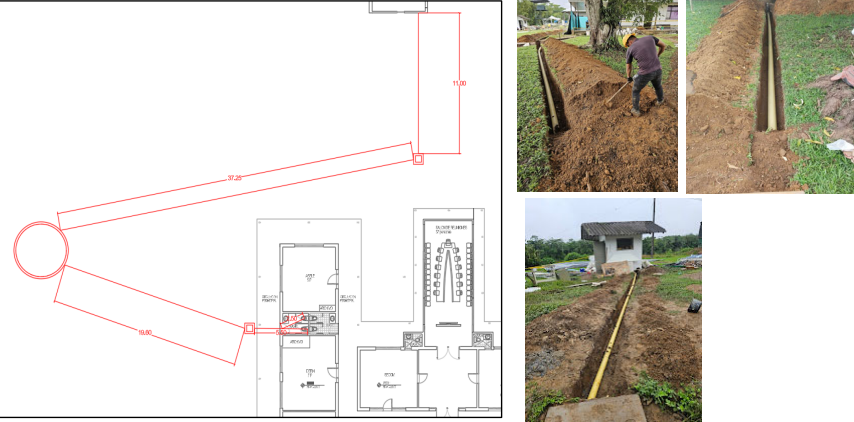
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.				064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA				INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°		4.1.3		UND:	M²					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		ANDEN EN CONCRETO ESTAMPADO DE 3000 PSI E= 0,13M. INCLUYE MATERIALES, FORMALETA, TEXTURIZADO, CURADO Y MALLA ELECTROSOLDADA								
CORTE N°:		3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
  				CAMINO A COCINA	1	12.7		12.7	1	12.7
				ANDEN COCINA	0.7	3.6		2.5	2	5.0
					0.7	1.8		1.3	2	2.5
				TOTAL			20.26			
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

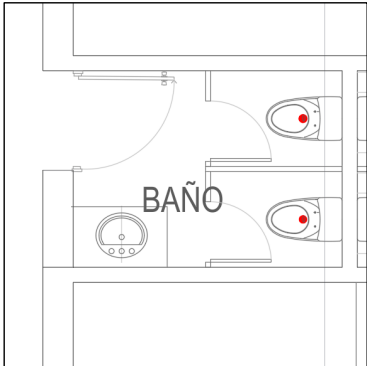
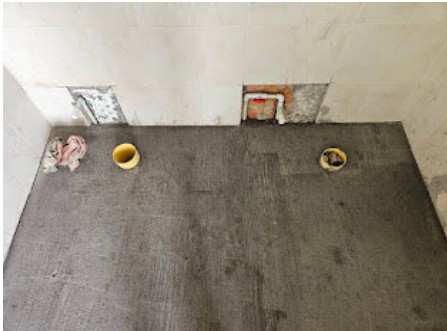
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA					Código					GA-JELOG-FR-098					
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA					Versión					4					
						Vigencia					5/10/2023					
CONTRATO No.					064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064											
OBJETO DEL CONTRATO					ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6											
CONTRATISTA					INGEBLAR SAS											
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR					ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD											
ÍTEM N°	4.2.1				UND:	Kg										
DESCRIPCIÓN ÍTEM		ACERO DE REFUERZO ESTRUCTURAL FY: 420 MPA GR 60 -NTC 2289 INCLUYE EPOXICO, ALAMBRE NEGRO, TRASIEGO, MANEJO														
CORTE N°:	3				FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025										
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA					UBICACIÓN	Pos.	Diám.	No.	Long. (m)	Total (m)	Grado 60 (kg)	Cant. Elementos	Peso Total (kg)			
 					VIGAS CIMENTACION ANDENES	1	1/2"	4.00	13.900	55.60	55.27	2	110.5			
						2	3/8"	103.00	0.950	97.85	54.80	2	109.6			
						3	1/2"	4.00	3.774	15.10	15.01	2	30.0			
						4	3/8"	123.00	0.950	116.85	65.44	2	130.9			
					SUBTOTAL											
TOTAL												381.01				
Elaboro:					VoBo:											
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma					ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma											


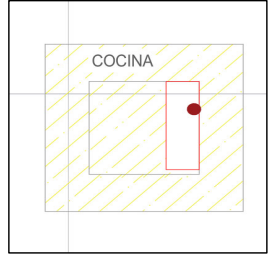
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	4.2.2			UND:	Kg					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		MALLA ELECTROSOLDADA FY 485 MPA -NTC 5806, INCLUYE ALAMBRE NEGRO TRASIEGO, MANEJO								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	PESO (KG)	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
  				PLACA DE CAMINO A LAB INGLES	1.00	7.00		7.00	2.07	14.49
				SALA DE JUNTAS	5.22	12.00		62.64	2.07	129.66
				COCINA	3.60	3.60		12.96	2.07	26.83
				BAÑOS MUJERES	1.95	2.95		5.75	2.07	11.91
				ANDENES SALA DE JUNTAS	1.20	13.20		15.84	2.07	32.79
					1.20	7.30		8.76	2.07	18.13
				TOTAL			233.81			
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						


	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG-FR-098					
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	4					
				Vigencia	5/10/2023					
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	5.1		UND:	M²						
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MURO EN BLOQUE DE ARCILLA NO.5 PERFORACION HORIZONTAL E=0.12 MTS (0.33X0.115X0.23) MTS INCLUYE ACERO DE REFUERZO, MORTERO DE PEGA MAS ANCLAJE A PLACAS CONTRAPISO Y ENTREPISO.									
CORTE N°:	3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
				Ancho	Longitud	Altura				
			BAÑO MUJERES		0.40	2.75	1.1	2	2.2	
			MURO TV SALA DE JUNTAS		2.30	3.05	7.0	2	14.0	
			BAÑO MUEJRES		1.00	1.00	1.0	2	2.0	
			TOTAL			18.23				
Elaboro:			VoBo:							
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma							

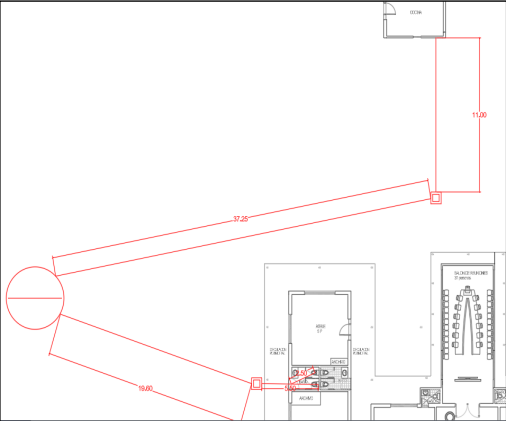
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4			
					Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	5.2		UND:	M²					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		MESÓN EN CONCRETO							
CORTE N°:	3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				Ancho	Longitud	Altura			
<div><div><p>COCINA</p></div><div></div></div>			MESON COCINA	0.60	2.00		1.2		1.2
						TOTAL			
Elaboro:			VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDC Representante Legal Contratista Firma y postfirma			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWAR Supervisor Firma y postfirma						

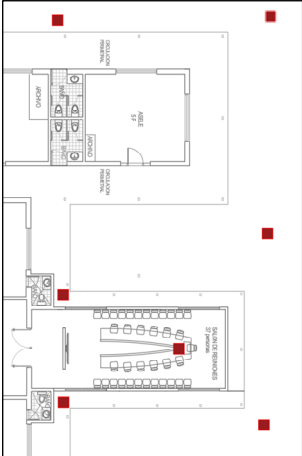
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4			
					Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	6.1.1			UND:	M				
DESCRIPCIÓN ÍTEM	TUBERÍA PVC SANITARIA Ø 4", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA 			UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				Ancho	Longitud	Altura			
			SANITARIO MUJERES		7.00				7.00
			CAJILLA A POZO		19.60				19.60
			POZO A CAJILLA SALA D JUNTAS 6"		37.00				37.00
			POSETA A CAJILLA		9.00				9.00
			PERIMETRO SALA DE JUNTAS		36.00				36.00
			CAJILLA A COCINA		12.00				12.00
			TOTAL					120.60	
Elaboro: ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				VoBo: ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma					

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG- FR-098						
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4						
					Vigencia	5/10/2023						
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064									
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6									
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS									
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD									
ÍTEM N°	6.1.2			UND:	UND							
DESCRIPCIÓN ÍTEM		PUNTO SANITARIO Ø 4" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION										
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025							
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN			DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
							Ancho	Longitud	Altura			
 				BAÑO MUJERES					2	2.0		
				PUNTOS DE EMPALME A POZO					2	2.0		
								TOTAL				
Elaboro: ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				VoBo: ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma								

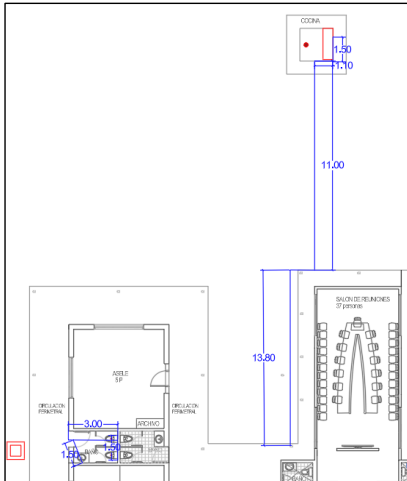
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	4			
				Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064					
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6					
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD					
ÍTEM N°	6.1.3	UND:	UND					
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUNTO SANITARIO Ø 2" , INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION							
CORTE N°:	3	FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura			
 	 	MANOSBAÑO MUJERES					1	1.0
		LAVAPLATOS COCINA					1	1.0
		TOTAL					2.00	
Elaboro:			VoBo:					
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDC Representante Legal Contratista Firma y postfirma			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWAR Supervisor Firma y postfirma					


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.				064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA				INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	6.1.5			UND:	UND					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		SIFÓN Ø 3X2", INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
<div></div>				BAÑO MUJERES					1	1.0
				COCINA					1	1.0
				POSETA					1	1.0
				TOTAL			3.00			
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARE Supervisor Firma y postfirma						






	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG- FR-098					
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4					
					Vigencia	5/10/2023					
CONTRATO No.				064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA				INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	6.1.6			UND:	UND						
DESCRIPCIÓN ÍTEM		PRUEBA SANITARIA									
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
					Ancho	Longitud	Altura				
				baños mujeres					1	1.0	
				desagues comando						1	1.0
								TOTAL			2.00
Elaboro:				VoBo:							
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARE Supervisor Firma y postfirma							


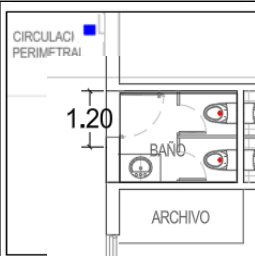

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4			
					Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	6.1.8			UND:	UND				
DESCRIPCIÓN ÍTEM		CAJA INSPECCIÓN 60CMX60CM							
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				Ancho	Longitud	Altura			
   			BAÑOS COMANDO					2	2.0
			CAJILLA TELECOMUNICACIONES					1	1.0
			CAJILLA DESVIACION					2	2.0
			CAJILLA BAÑO MUJERES					1	1.0
			POSETA					1	1
TOTAL								7.00	
Elaboro:				VoBo:					
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma					

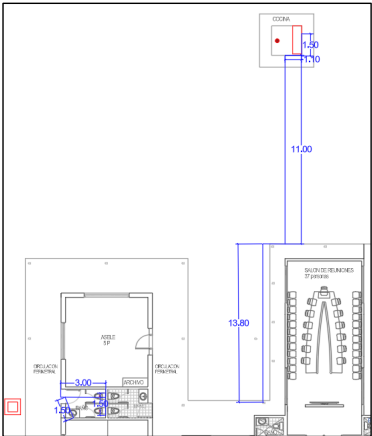

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4			
					Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	6.2.1		UND:	M					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		REGATA PARA INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE Ø 1/2" A Ø 4" (INCLUYE RESANE)							
CORTE N°:	3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				Ancho	Longitud	Altura			
			SANITARIOS 1/2"	5.10				5.1	
			LAVMANOS 1/2"	1.5					1.5
			LAVAMANOS 2"	1					1.0
			LAVAPLATOS 2"	1					1.0
			POSETA	1					1.0
TOTAL							9.60		
Elaboro:			VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

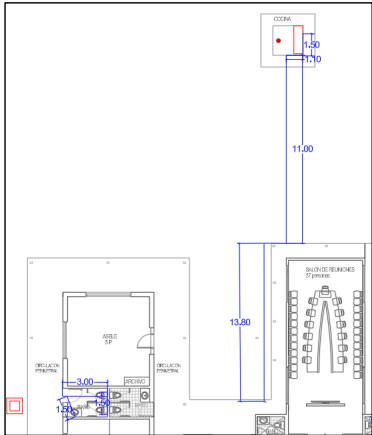
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG- FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	4				
				Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	6.2.2		UND:	M					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		TUBERÍA PVC PRESIÓN RDE 13.5 Ø 1/2" INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN							
CORTE N°:	3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				Ancho	Longitud	Altura			
			SANITARIOS 1/2"	5.10				5.1	
			LAVMANOS 1/2"	1.5				1.5	
			ACOMETIDA LAVAPLATOS 1/ 2"	24.8				24.8	
			POSETA	1				1.0	
			TOTAL					32.40	
Elaboro: ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma			VoBo: ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARE Supervisor Firma y postfirma						



	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098																																																																																																																							
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4																																																																																																																							
					Vigencia	5/10/2023																																																																																																																							
CONTRATO No.				064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064																																																																																																																									
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6																																																																																																																									
CONTRATISTA				INGEBLAR SAS																																																																																																																									
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD																																																																																																																									
ÍTEM N°		6.2.3		UND:	UND																																																																																																																								
DESCRIPCIÓN ÍTEM		PUNTO DE AGUA FRIA Ø 1/2"INCLUYE ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN																																																																																																																											
CORTE N°:		3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025																																																																																																																								
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL																																																																																																																			
					Ancho	Longitud	Altura																																																																																																																						
<div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div><div></div></div> <tr><td>SANITARIOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>LAVAMANOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>LAVAPLATOS</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1.0</td></tr> <tr><td>LLAVE TERMINAL</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>2</td><td>2.0</td></tr> <tr><td>REGISTRO POSETA</td><td></td><td></td><td></td><td></td><td>1</td><td>1</td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr> <tr><td colspan="4"></td><td colspan="3">TOTAL</td><td colspan="2">7.00</td></tr> <tr><td colspan="4">Elaboro:</td><td colspan="7">VoBo:</td></tr> <tr><td colspan="4">ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma</td><td colspan="7">ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARI Supervisor Firma y postfirma</td></tr>				SANITARIOS					2	2.0	LAVAMANOS					1	1.0	LAVAPLATOS					1	1.0	LLAVE TERMINAL					2	2.0	REGISTRO POSETA					1	1																																																													TOTAL			7.00		Elaboro:				VoBo:							ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARI Supervisor Firma y postfirma						
				SANITARIOS					2	2.0																																																																																																																			
				LAVAMANOS					1	1.0																																																																																																																			
				LAVAPLATOS					1	1.0																																																																																																																			
				LLAVE TERMINAL					2	2.0																																																																																																																			
				REGISTRO POSETA					1	1																																																																																																																			
				TOTAL			7.00																																																																																																																						
Elaboro:				VoBo:																																																																																																																									
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARI Supervisor Firma y postfirma																																																																																																																									

	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	6.2.4		UND:	UND						
DESCRIPCIÓN ÍTEM		REGISTRO DE AGUA INCLUYE TAPA Y CAJA Ø 3/4"								
CORTE N°:	3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
				Ancho	Longitud	Altura				
<div></div> <div></div>			COCINA					1	1.0	
			BAÑO MUJERES						1	1.0
			LLAVE CONTROL						1	1.0
			TOTAL							
Elaboro:			VoBo:							
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma							

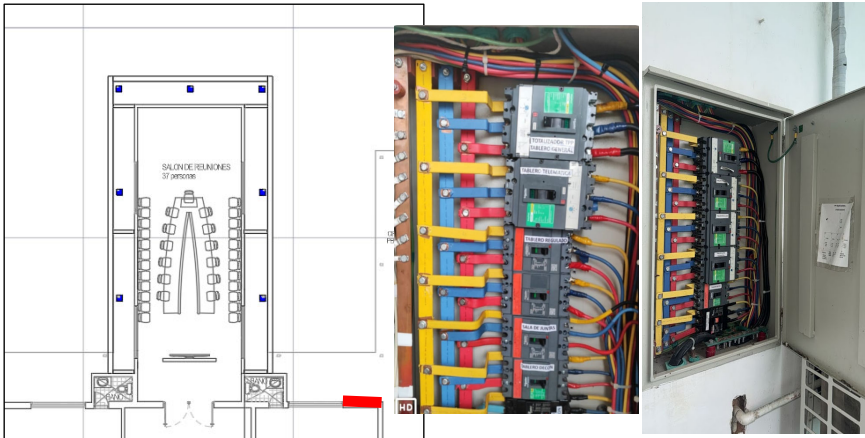
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	4			
				Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.		064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA		INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	6.2.5	UND:	UND					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		LLAVE TERMINAL CON CONEXIÓN PARA MANGUERA						
CORTE N°:	3	FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura			
 	 	LLAVE TERMINAL COCINA POSETA					1	1.0
							1	1.0
		TOTAL					2.00	
Elaboro:		VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWAR Supervisor Firma y postfirma				
								

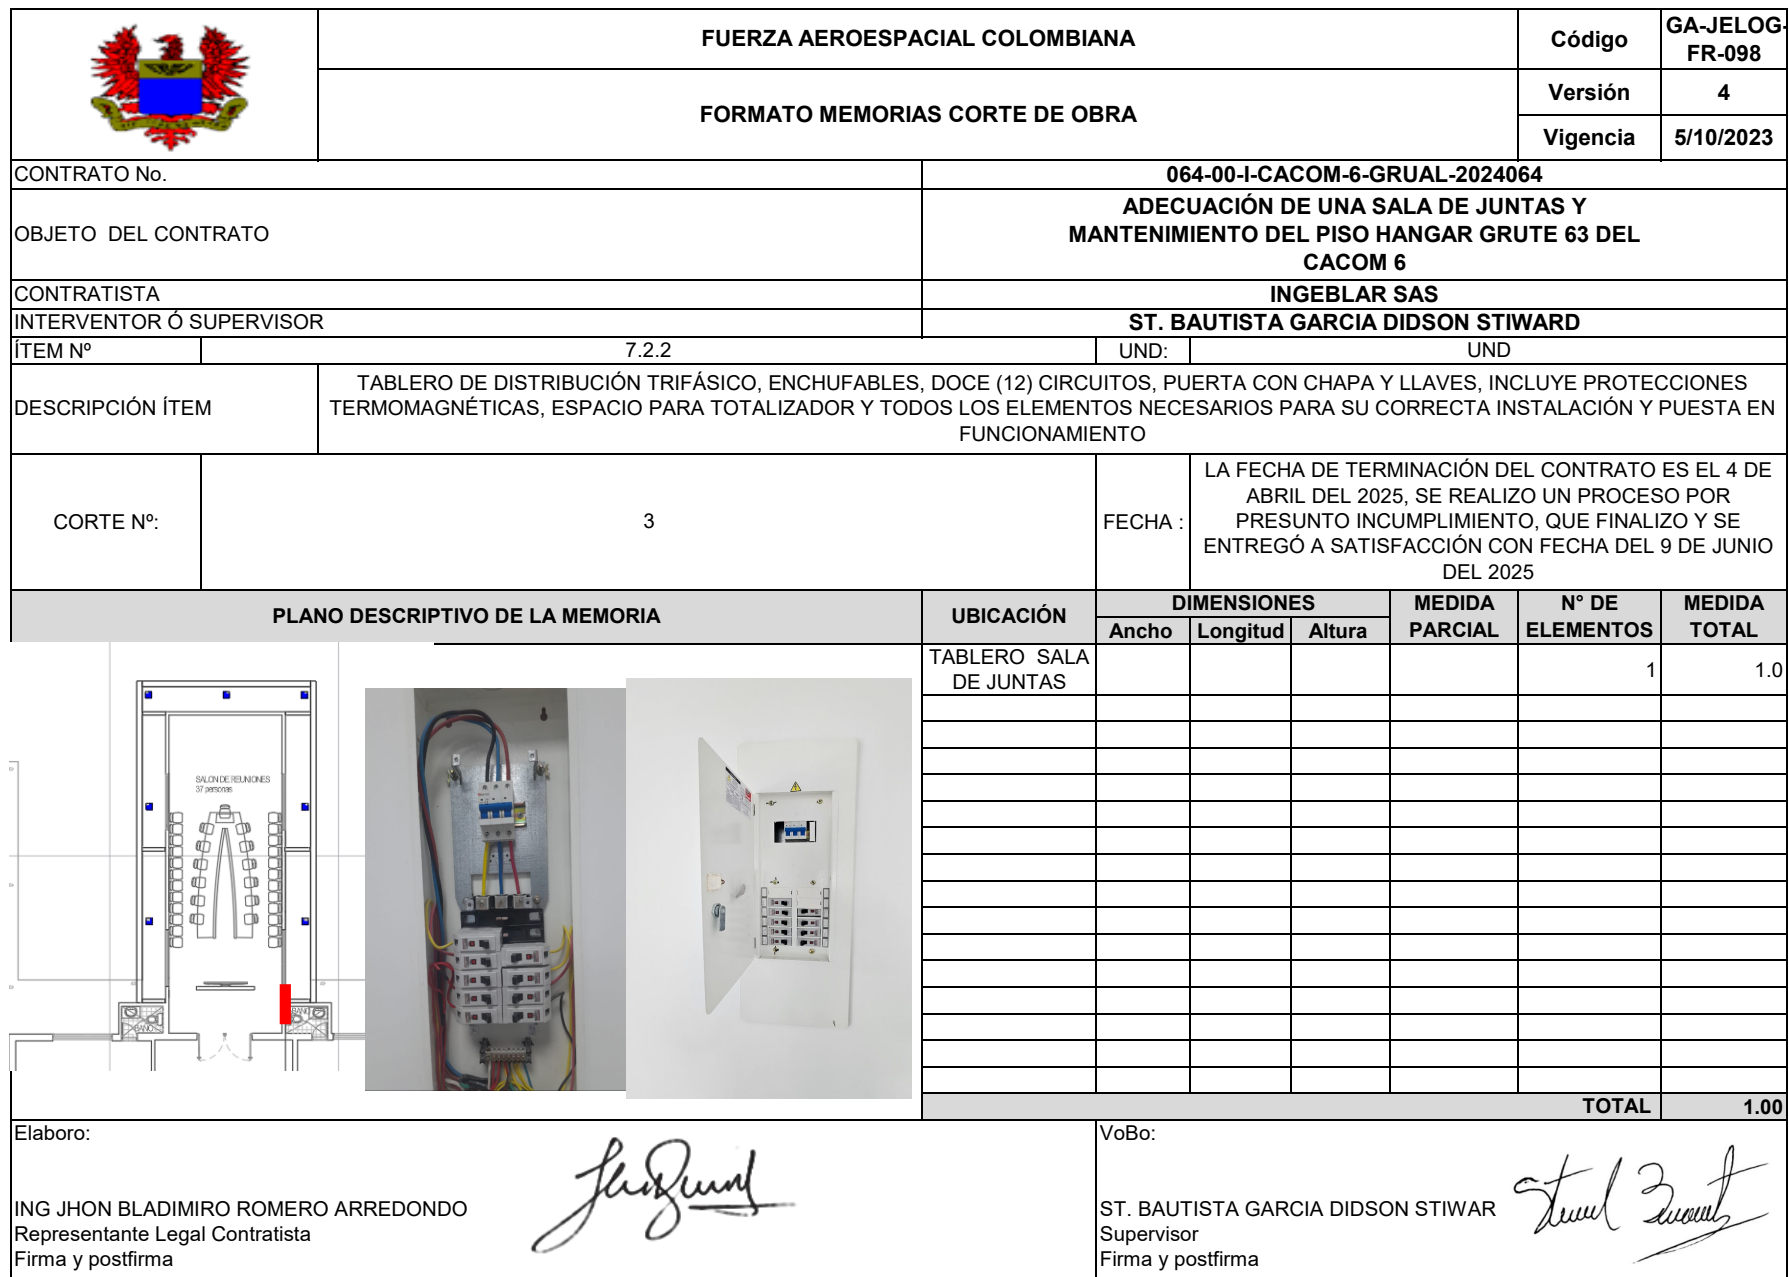
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG- FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	4			
				Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.		064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA		INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	6.2.6	UND:	UND					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		PRUEBA HIDRÁULICA						
CORTE N°:	3	FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura			
		SANITARIOS 1/2"		5.10				5.1
		LAVMANOS 1/2"		1.5				1.5
		REGISTRO 1/2"		2				2.0
		ACOMETIDA LAVAPLATOS 1/ 2"		24.8				24.8
		TOTAL						1.00
Elaboro:		VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

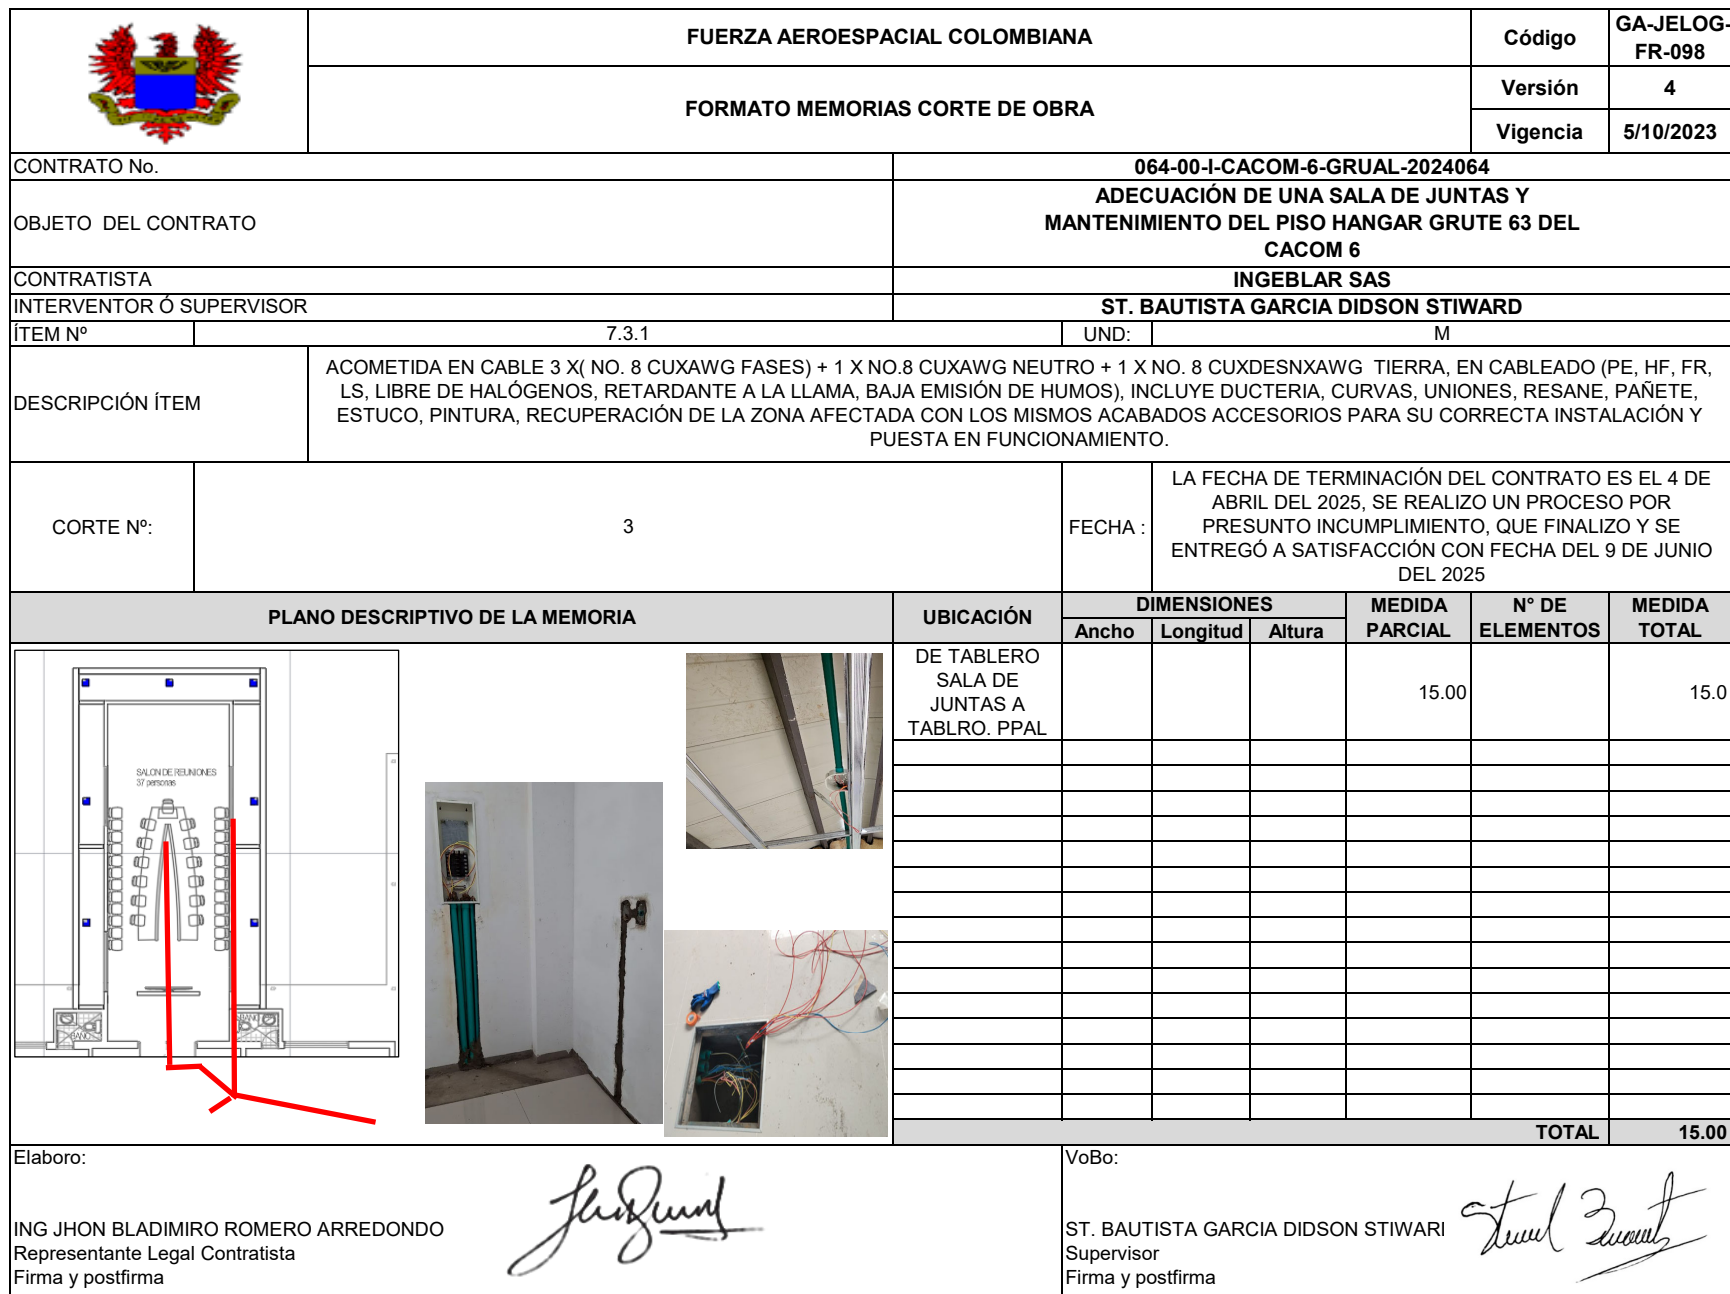
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG- FR-098						
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	4						
				Vigencia	5/10/2023						
CONTRATO No.		064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064									
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6									
CONTRATISTA		INGEBLAR SAS									
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD									
ÍTEM N°	6.2.7		UND:	M							
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DESINFECCIÓN RED HIDRÁULICA									
CORTE N°:	3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025							
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN			DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
						Ancho	Longitud	Altura			
			SANITARIOS 1/2"			5.10				5.1	
			LAVMANOS 1/2"			1.5					1.5
			POSETA			1					1.0
			ACOMETIDA LAVAPLATOS 1/ 2"			24.8					24.8
						TOTAL			32.40		
Elaboro:			VoBo:								
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma								

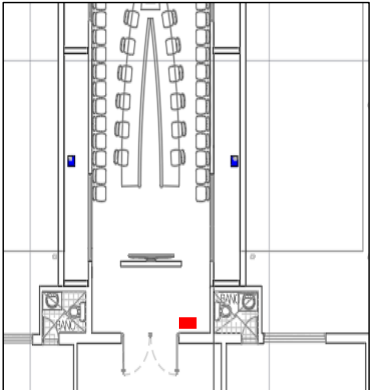
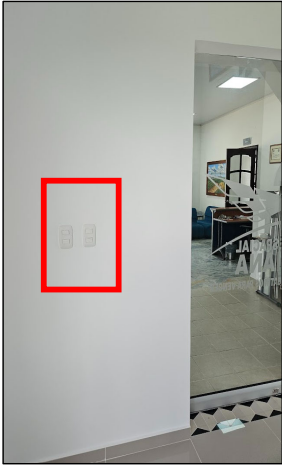
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA		Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA		Versión	4				
			Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.		064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO		ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA		INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	6.3.1	UND:	M					
DESCRIPCIÓN ÍTEM	BAJANTE DRENAJE AIRE ACONDICIONADO TUBERIA PVC RDE 21 Ø 1							
CORTE N°:	3	FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA		UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
			Ancho	Longitud	Altura			
  		SALA DE JUNTAS		8.00		8.0		8.0
		TOTAL					8.00	
Elaboro:		VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma		ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWAR Supervisor Firma y postfirma						

		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA			Código	GA-JELOG- FR-098				
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA			Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.				064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA				INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ITEM N°	7.1.2			UND:	M					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		DUCTO PVC - DB DE 1X Ø 1". INCLUYE CURVAS, TERMINALES CAJA, TAPA CIEGAS Y TODOS LOS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
				DUCTOS TELECOMUN. 2"	25.60		25.6	2	51.2	
								TOTAL		
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

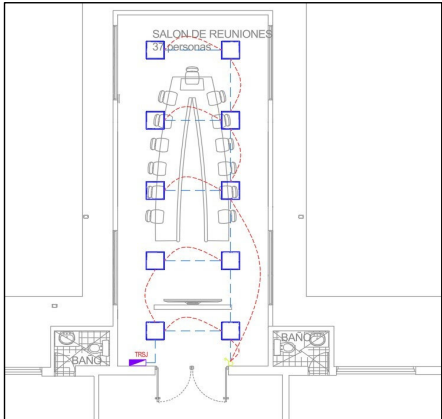
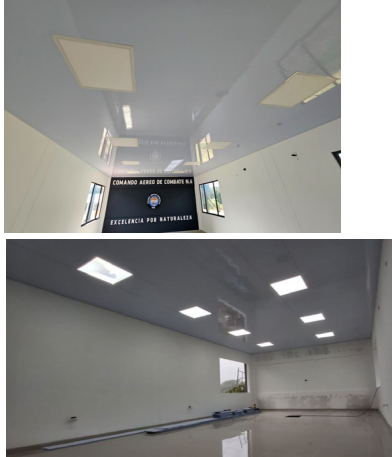
	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG- FR-098					
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4					
					Vigencia	5/10/2023					
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064								
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6								
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS								
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD								
ÍTEM N°	7.2.1			UND:	UND						
DESCRIPCIÓN ÍTEM	MANTENIMIENTO DE TABLEROS MONOFÁSICOS, BIFÁSICOS, TRIFÁSICOS, TABLEROS DE CONTROL DE SALIDAS ESPECIALES Y TABLEROS DE CONTROL DE ILUMINACIÓN EXISTENTES, INCLUYE LA VERIFICACIÓN Y REDISTRIBUCIÓN INTERNA DE LAS PROTECCIONES ELÉCTRICAS, BARRAJES Y ELEMENTOS DE FIJACIÓN CONFORME AL CUADRO DE CARGAS Y/O DIAGRAMA UNIFILAR, ASÍ MISMO DEBE INCLUIR TODOS LOS ELEMENTOS Y/O ACCESORIOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.										
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
					Ancho	Longitud	Altura				
				TABLERO COMANDO					1	1.0	
				TOTAL				1.00			
Elaboro:				VoBo:							
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARI Supervisor Firma y postfirma							

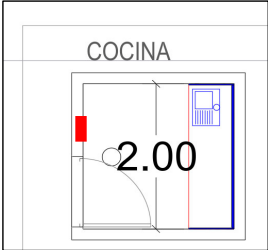
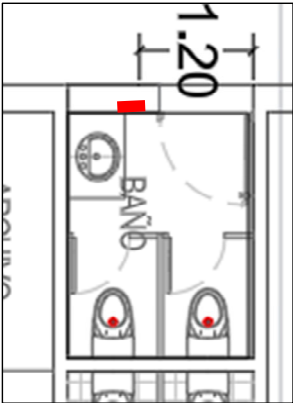


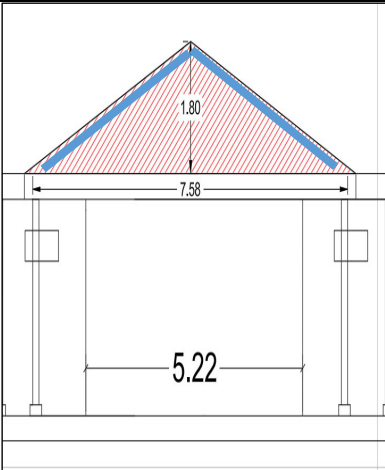



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	7.4.1		UND:	UND						
DESCRIPCIÓN ÍTEM	INTERRUPTOR DOBLE, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , TUBERÍA PVC 3/4", INCLUYE: UNIONES, ACCESORIOS DE FIJACIÓN Y DE CONEXIÓN, FACEPLATE Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS									
CORTE N°:	3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
				Ancho	Longitud	Altura				
  			SALA DE JUNTAS					2	2.0	
			TOTAL 2.00							
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARE Supervisor Firma y postfirma						

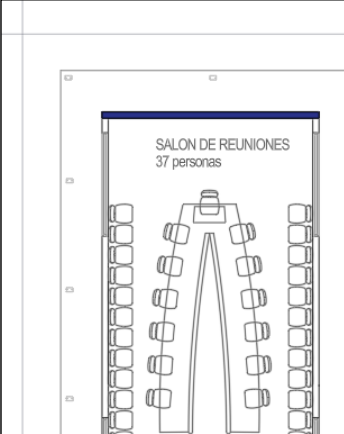
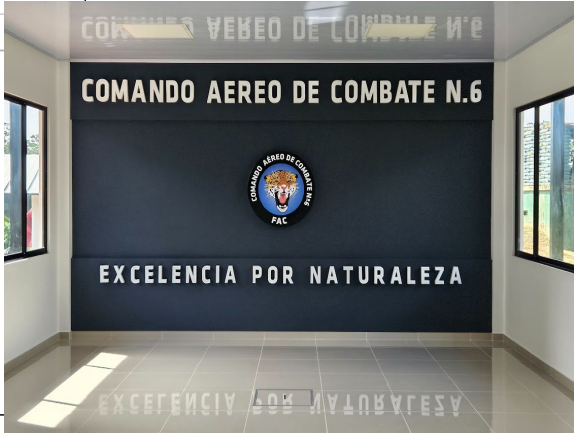
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.				064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA				INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	7.4.2			UND:	UND					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		TOMACORRIENTE BIFÁSICA 20A/220V(2Ø+PT), INCLUYE CLAVIJA, SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA PVC 3/4", Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
				AIRES ACOND. SALA DE JUNTAS					2	2.0
				TOTAL				2.00		
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						


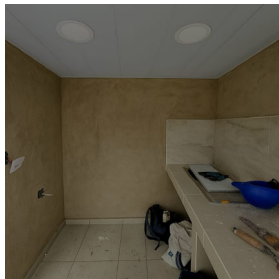
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°		7.4.4		UND:	UND					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		LUMINARIA LED SYLVANIA LED PANEL CUADRADO 60X60 DE 40W DL, 6500K, 100LM, 100-277V, IP20, FP>0.9, THD<20%, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO (PE, HF, FR, LS, LIBRE DE HALÓGENOS, RETARDANTE A LA LLAMA, BAJA EMISIÓN DE HUMOS), TUBERÍA EMT 3/4", CAJA TIPO RAWELT, TORNILLERÍA								
CORTE N°:		3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
<div></div>				SALA DE JUNTAS					10	10.0
				TOTAL				10.00		
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

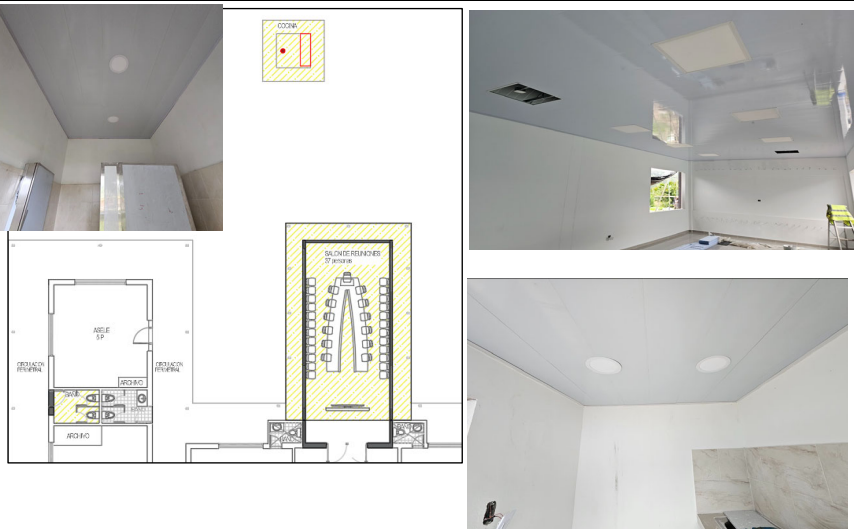
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	7.4.6			UND:	UND					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		INTERRUPTOR SENCILLO, INCLUYE SALIDA EN CABLEADO CU HFFR-LS NO.12 AWG , CAJA PLASTICA UNIVERSAL, TUBERIA PVC 3/4 " Y TODOS LOS ACCESORIOS NECESARIOS PARA GARANTIZAR SU CORRECTA INSTALACIÓN Y PUESTA EN SERVICIO.								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
<div>     </div>				BAÑO					1	1.0
				COCINA					1	1.0
				TOTAL					2.00	
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWAR Supervisor Firma y postfirma						

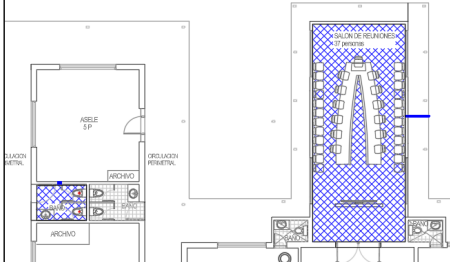

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098					
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4					
					Vigencia	5/10/2023					
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064								
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6								
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS								
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD								
ÍTEM Nº	7.5.1			UND:	UND						
DESCRIPCIÓN ÍTEM	SISTEMA DE APANTALLAMIENTO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS, INCLUYE (4) PUNTAS CAPTADORAS EN ALUMINIO DE 5/8" ALTURA ÚTIL 60 CM, 58 METROS LINEALES DE CONDUCTOR DE INTERCONEXIÓN DE PUNTAS CAPTADORAS EN ALUMINIO TIPO ALAMBRÓN DE 8 MM DE DIÁMETRO, CON SUS RESPECTIVOS AISLADORES, SOPORTES, CONECTOR ES BIMETÁLICOS, ACCESORIOS, Y DEMÁS ELEMENTOS NECESARIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.										
CORTE Nº:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	Nº DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
					Ancho	Longitud	Altura				
<div></div>				SALA DE JUNTAS					1	1.0	
				TOTAL				1.00			
Elaboro:				VoBo:							
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma							

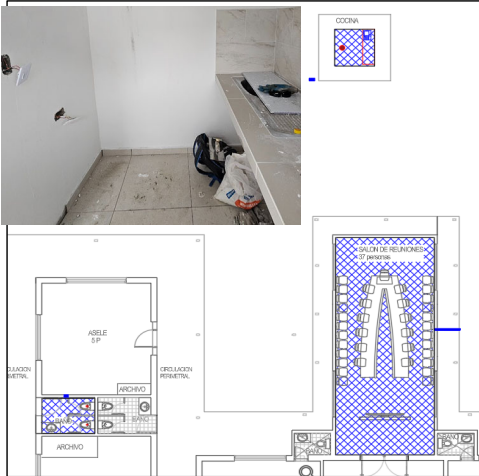
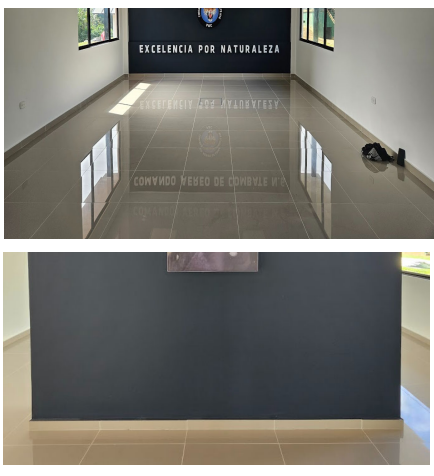
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	8.1		UND:	UND						
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESCUDO FAC/UNIDAD DE 0,80X0,80 ESPESOR 20MM APROX. COLOR LETRA AZUL, EN CUANTO AL ACRÍLICO (FRENTE Y CANTONERA) SE TRABAJARÍA EN 3 MM, LA TAPA POSTERIOR SERIA EN POLIESTILENO CALIBRE 80, LA ILUMINACIÓN ES CON MÓDULO LED ESTILO LUPA.									
CORTE N°:	3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
				Ancho	Longitud	Altura				
  			MURO FONDO S. JUNTAS					2	2.0	
			TOTAL 2.00							
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista 				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor 						
Firma y postfirma				Firma y postfirma						



	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	8.2		UND:	UND						
DESCRIPCIÓN ÍTEM	LETRA TIPO CAJA EN ACRILICO ILUMINADA DE 0,20X0,30X0,05 COLOR AZUL FAC, EN CUANTO AL ACRÍLICO (FRENTE Y CANTONERA) SE TRABAJARÍA EN 3 MM, LA TAPA POSTERIOR SERIA EN POLIESTILENO CALIBRE 80, LA ILUMINACIÓN ES CON MÓDULO LED ESTILO LUPA.									
CORTE N°:	3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025						
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL	
				Ancho	Longitud	Altura				
 			MURO FONDO S. JUNTAS					46	46.0	
			TOTAL					46.00		
Elaboro:			VoBo:							
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma							

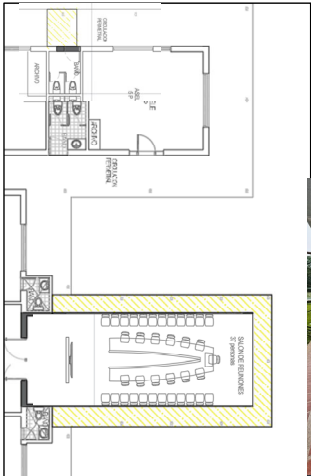
		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG- FR-098							
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4							
						Vigencia	5/10/2023							
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064											
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6											
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS											
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD											
ÍTEM N°	9.1			UND:	M²									
DESCRIPCIÓN ÍTEM		PAÑETE IMPERMEABILIZADO MUROS 1:3 - E= 15 MM. INCLUYE SU APLICACIÓN EN FILOS, CARTERAS Y DILATAACIONES"												
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025									
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL				
					Ancho	Longitud	Altura							
<div></div> <div></div> <div></div> <div></div>				SALA DE JUNTAS		5.55	3.05	16.9	2	33.9				
						5.75	3.05	13.9125	2	27.8				
						5.75	3.05	13.9125	2	27.8				
						5.55	3.05	13.3025	2	26.6				
				MURO TV		5	3.05	11.625	2	23.25				
				COLUMNAS		2.7	3.15	4.88	2	9.76				
				COLUMNAS		1	3.05	3.05	8	24.4				
				COLUMNAS		1	3.05	3.05	19	57.95				
				VIGAS PUERTAS		1	2.5	2.5	2	5				
				PUERTA COMANDO		1	1	1	6	6				
				ANDENES		12.9	0.5	6.45	2	12.9				
						7.3	0.5	3.65	1	3.65				
				BAÑO MUJERES		1	1	1	2	2				
				COCINA		0.4	3.05	1.22	3	3.66				
						2	2.5	5	6	30				
						2	2.5	3.4	2	6.8				

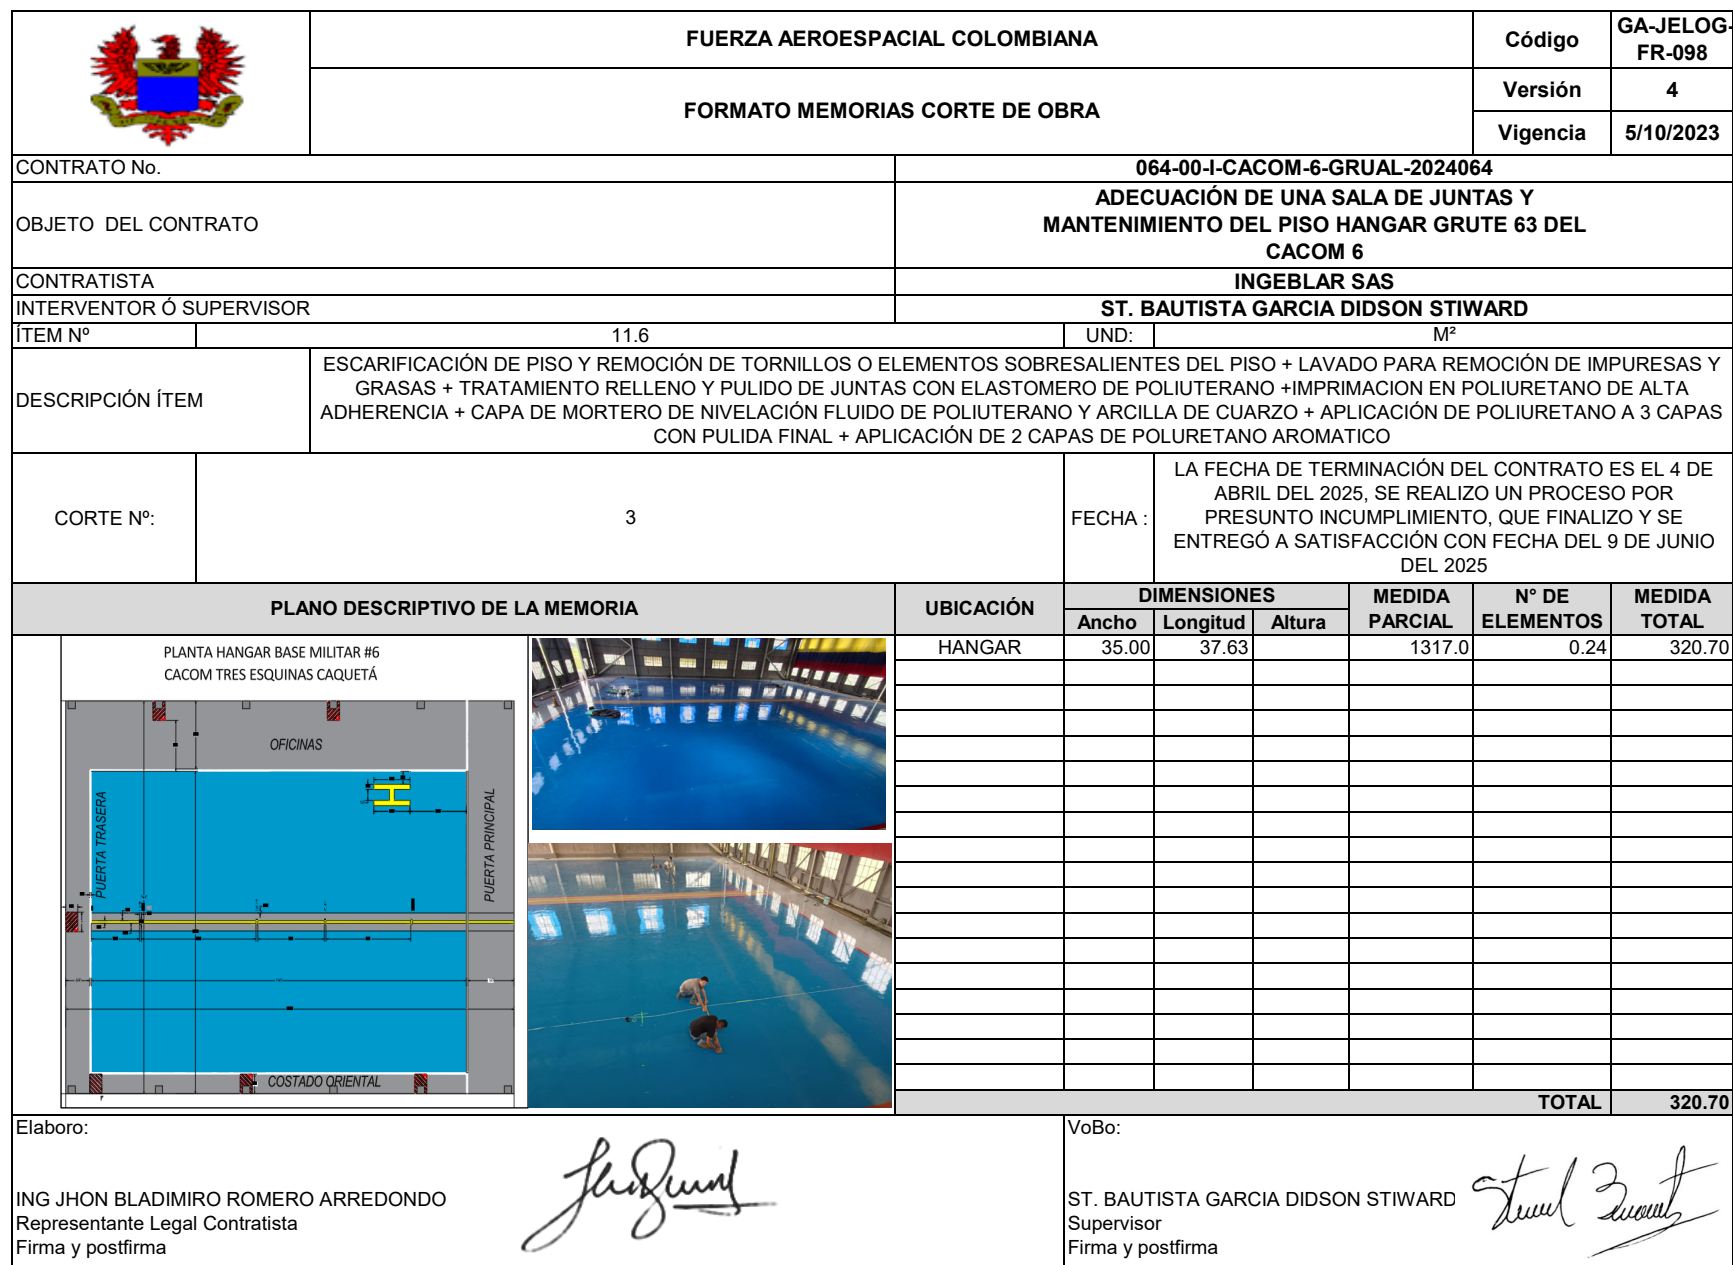
	FUERZA AEREOESPACIAL COLOMBIANA					Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA					Versión	4			
						Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	10.1			UND:	M²					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		CIELO RASO PVC 10 MM (INCLUYE ESTRUCTURA Y COMPUERTAS PARA INSPECCION) Y TODOS LOS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN Y FUNCIONAMIENTO.								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
				SALA DE JUNTAS	5.25	12		63.0		63.0
				COCINA	2	2		4.0		4.0
				BAÑOS MUJERES	1.95	2.95		5.75		5.75
				ANDENES SALA DE JUNTAS	1.4	13.9		19.46		19.46
				ANDENES SALA DE JUNTAS	1.5	7.3		10.95		10.95
				TAPA COSTADO	1	5.5		5.5	2	11
				SUBTOTAL					114.2	
				PORCENTAJE DESPERDICIO 5%					5.708125	
				TOTAL					119.87	
Elaboro:					VoBo:					
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma					ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARI Supervisor Firma y postfirma					

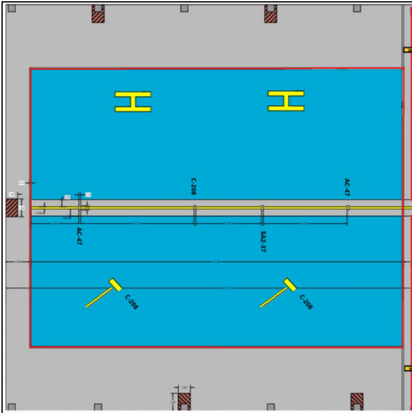
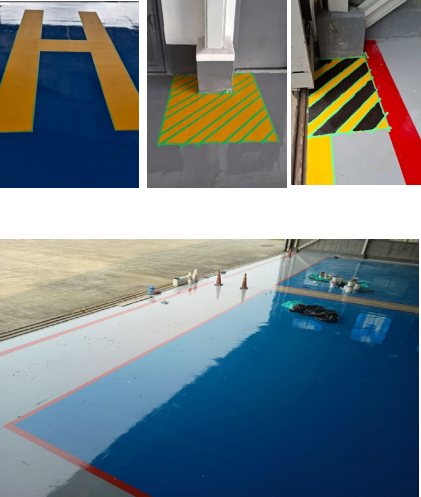
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°		11.1		UND:	M²					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		PISO PORCELANATO 56.6X56.6CM								
CORTE N°:		3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
   				SALA DE JUNTAS	5.25	12		63.0		63.0
				COCINA	2	2		4.0		4.0
				BAÑOS MUJERES	1.95	2.95		5.75		5.75
				ENTRADA COMANDO	1	2		2		2
				MESON COCINA	1.9	0.7		1.33		1.33
				PUERTA EMERG.	1	1		1		1
				SUBTOTAL					77.1	
				PORCENTAJE DESPERDICIO 10%					7.70825	
									84.79	
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

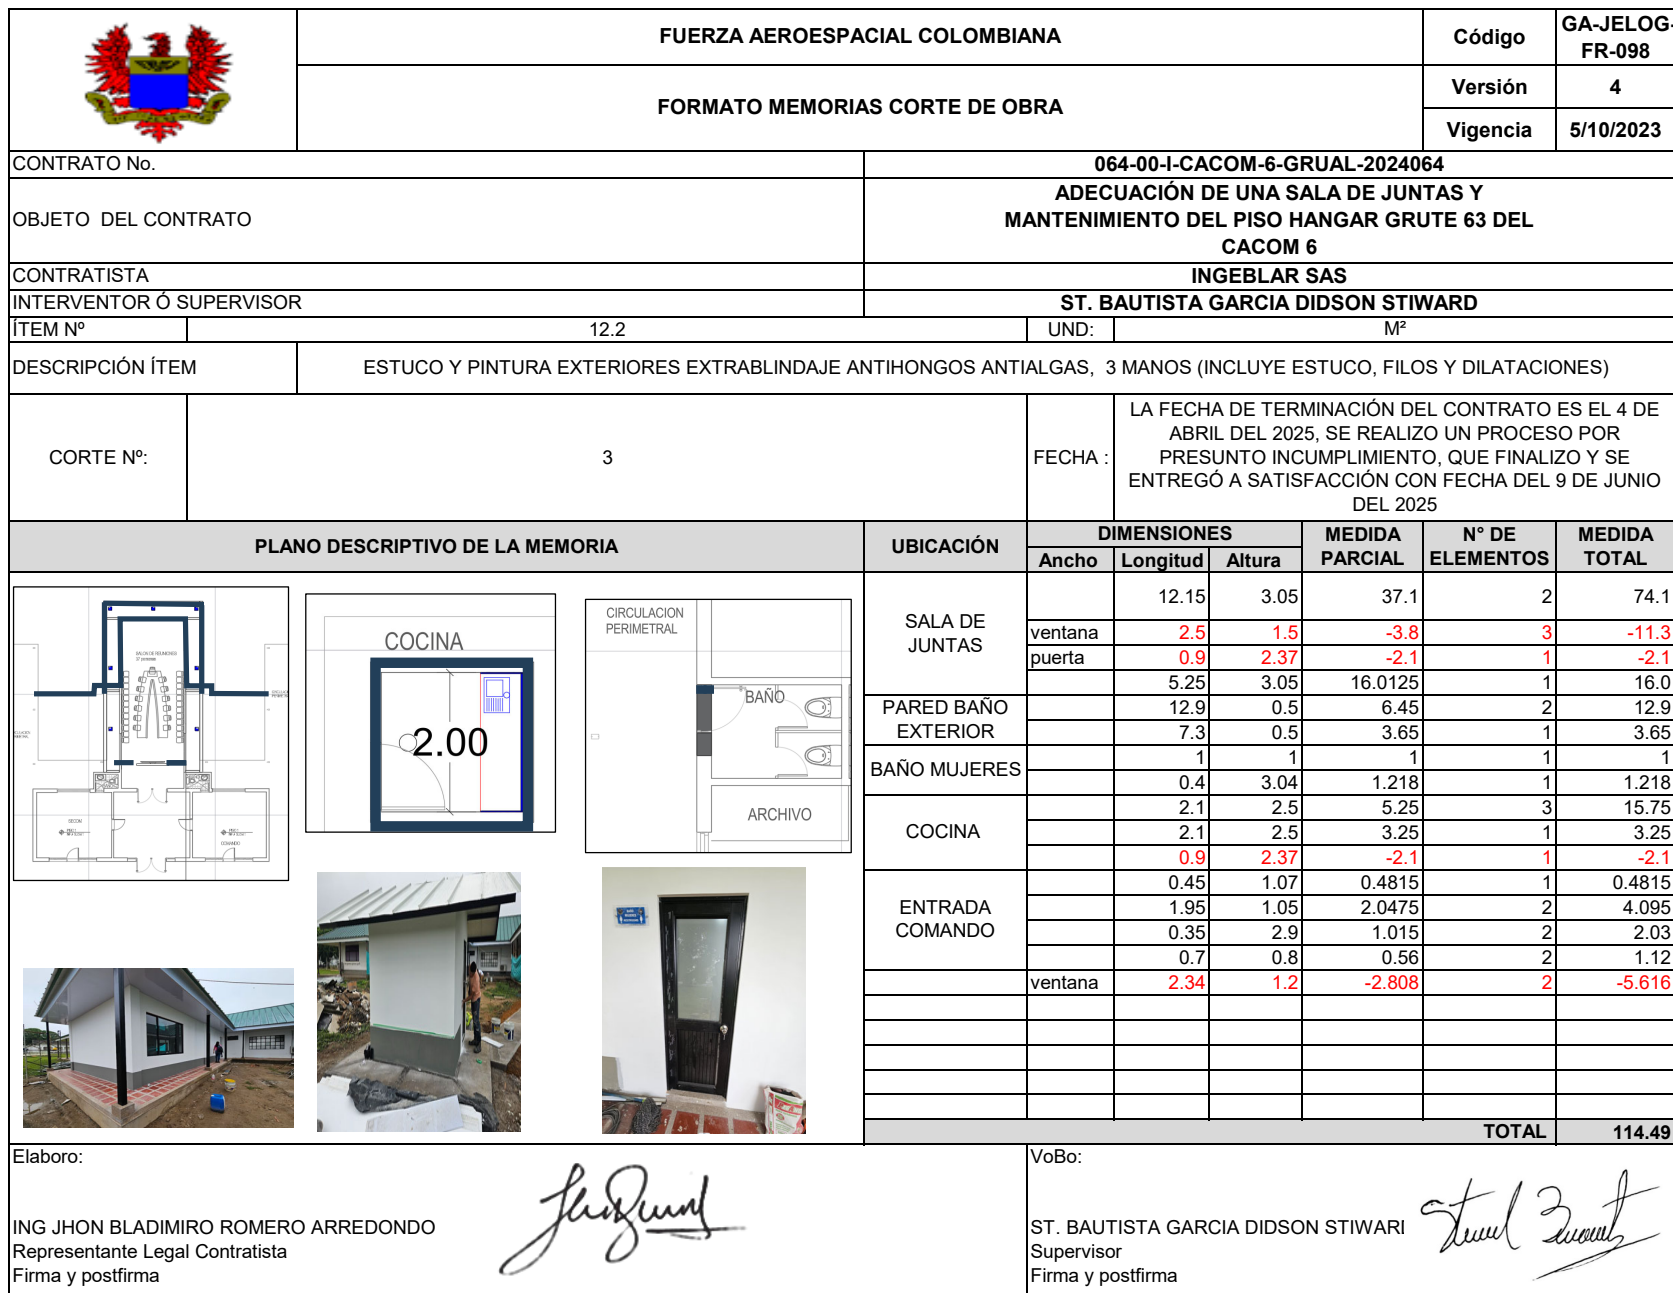
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4			
					Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	11.2		UND:	m					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		GUARDAESCOBA EN PORCELANATO SELLADO DE 56,6 X 56,6 CM H= 8CM (m)							
CORTE N°:	3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	MEDIDA PARCIAL	MEDIDA TOTAL
				Ancho	Longitud	Altura			
 			SALA DE JUNTAS		23		1.0	22.5	22.5
					8.5		1.0	7.5	7.5
			COCINA		3		1.0	3	3.0
					2		2.0	3.2	3.2
			MURO TV		2.8		2	5.6	5.6
SUBTOTAL								41.8	
PORCENTAJE DESPERDICIO 15%								6.27	
TOTAL								48.07	
Elaboro:				VoBo:					
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma					


	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG- FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°		11.3		UND:	M²					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		CERÁMICA PARED ESTRUCTURADA ADARE BEIGE CU 0.30 X 0.60 Cm CORONA O SIMILAR AREA BAÑOS, INCLUYE BOQUILLA Y TODO NECESARIO PARA SU INSTALACION Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO.								
CORTE N°:		3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			N° DE ELEMENTOS	MEDIDA PARCIAL	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
 				COCINA	0.80	3.20		1.0	2.6	2.6
				BAÑOS	0.8	2		1.0	1.6	1.6
				REPOSICION TABLETAS	1	2		1.0	2.0	2.0
				SUBTOTAL			6.2			
				PORCENTAJE DESPERDICIO 10%			0.616			
				TOTAL			6.78			
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARE Supervisor Firma y postfirma						

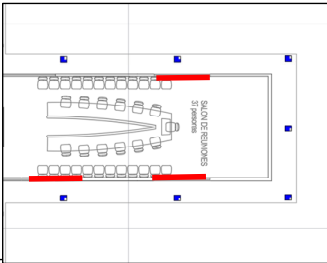
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG- FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	11.4			UND:	M²					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		PISO TABLÓN TRADICIONAL 30X30 ALFA-LISO CON GRANITO RUSTICO								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA  				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
				ANDENES	1.1	13.2		14.52	2	29.04
				ANDENES	1.1	5.3		5.83		5.83
				ANDEN BAÑOS	1.00	2.2		2.2		2.2
					0.6	1		0.6		0.6
				PEDESTALES COLUMNAS	0.5	1		0.5	6	3
SUBTOTAL								40.7		
PORCENTAJE DESPERDICIO 10%								4.067		
TOTAL								44.74		
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

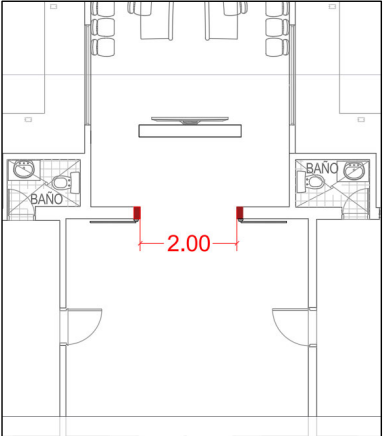


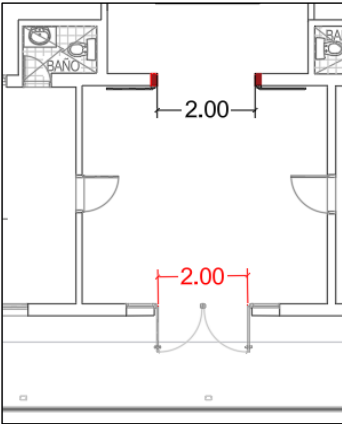
	FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.				064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA				INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	11.6			UND:	M²					
DESCRIPCIÓN ÍTEM	ESCARIFICACIÓN DE PISO Y REMOCIÓN DE TORNILLOS O ELEMENTOS SOBRESALIENTES DEL PISO + LAVADO PARA REMOCIÓN DE IMPURESAS Y GRASAS + TRATAMIENTO RELLENO Y PULIDO DE JUNTAS CON ELASTOMERO DE POLIUTERANO +IMPRIMACION EN POLIURETANO DE ALTA ADHERENCIA + CAPA DE MORTERO DE NIVELACIÓN FLUIDO DE POLIUTERANO Y ARCILLA DE CUARZO + APLICACIÓN DE POLIURETANO A 3 CAPAS CON PULIDA FINAL + APLICACIÓN DE 2 CAPAS DE POLURETANO AROMATICO									
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA  				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
				LINEAS ROJAS		33.05			1	33.05
						29.6			2	59.20
						31.3			4	125.20
				LINEAS AMARILLAS		34.35			1	34.35
						37.5			1	37.50
				CEBRAS NEGRA AMMARILLO		5.77			4	23.08
						11.28			1	11.28
						14.71			1	14.71
						5.76			1	5.76
				LETRAS		3.8			4	15.2
						0.87			2	1.74
								TOTAL		
Elabora: ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				VoBo: ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

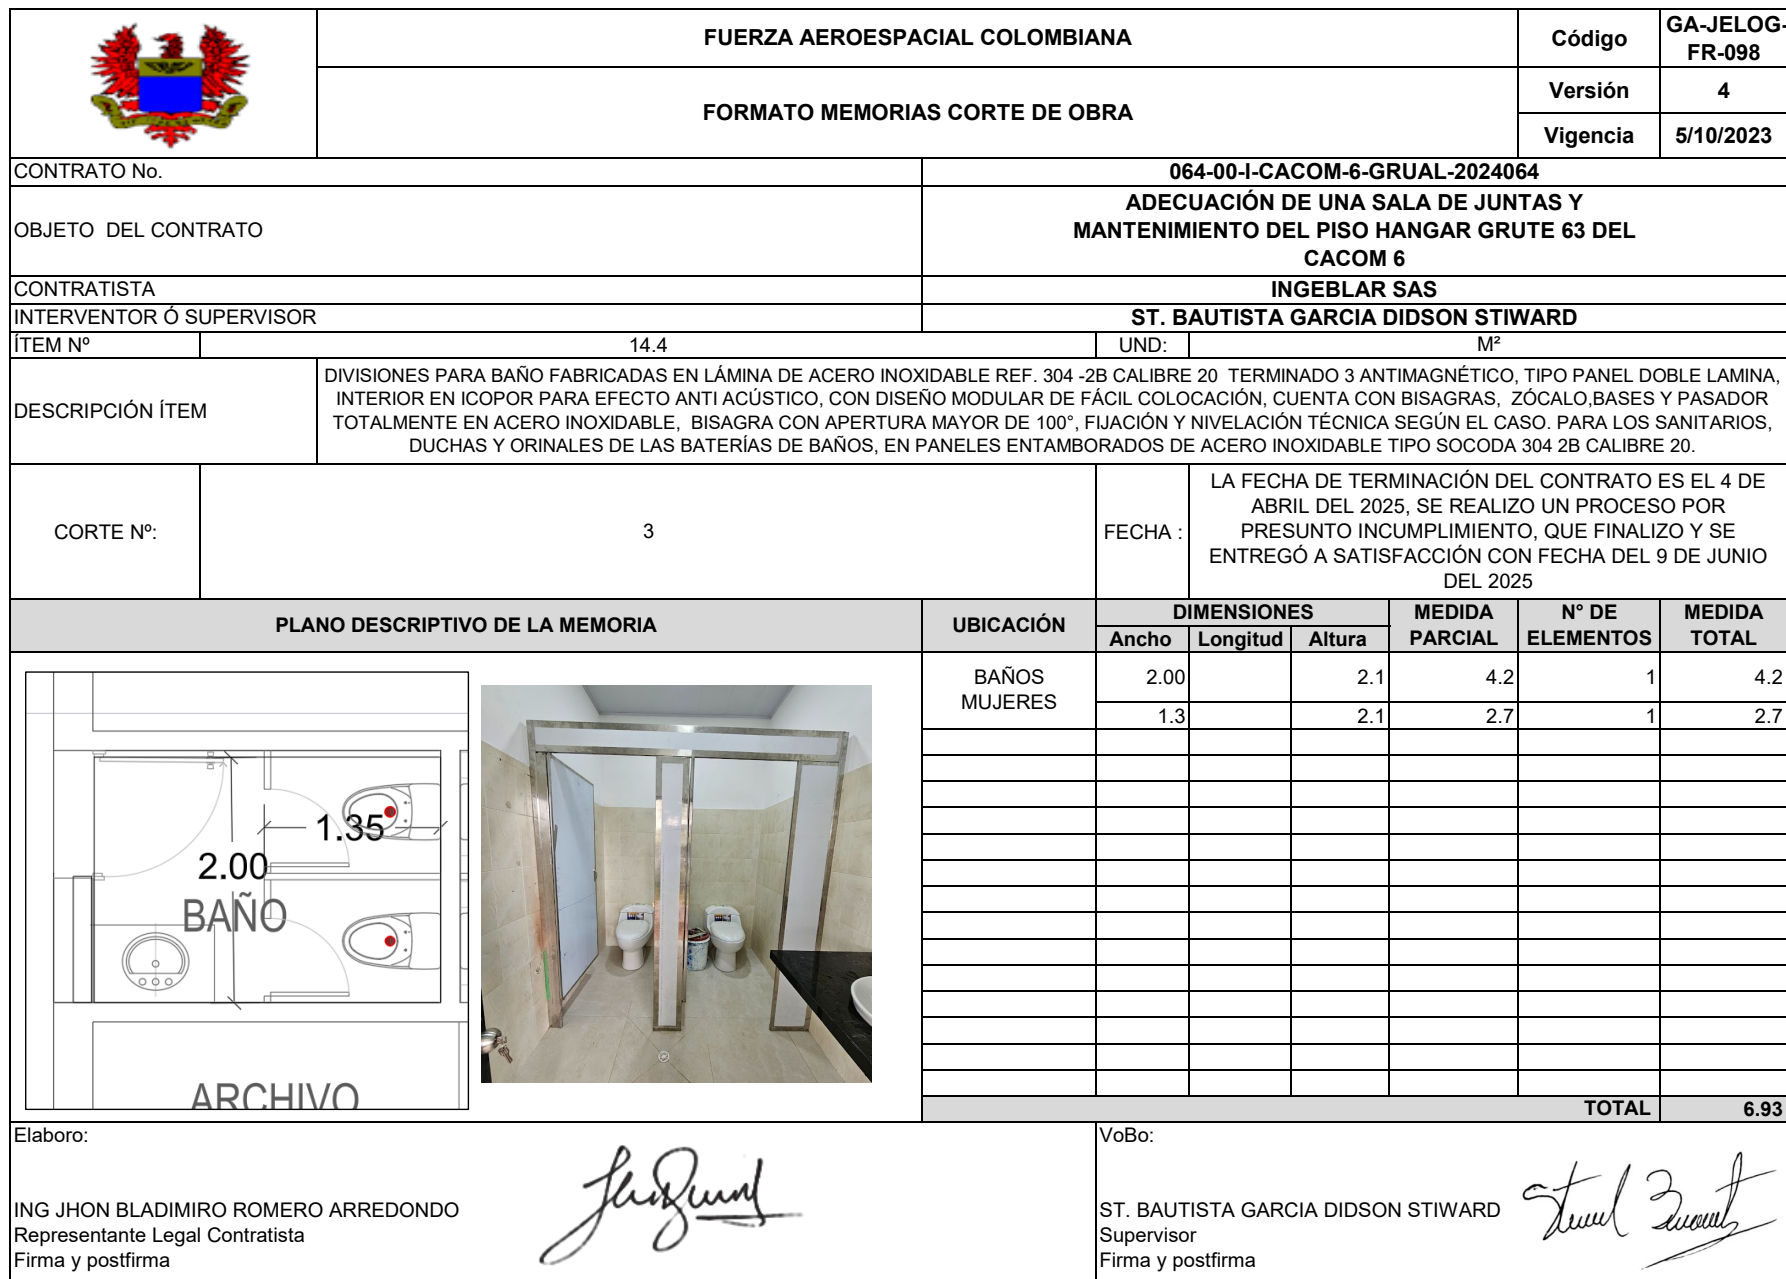


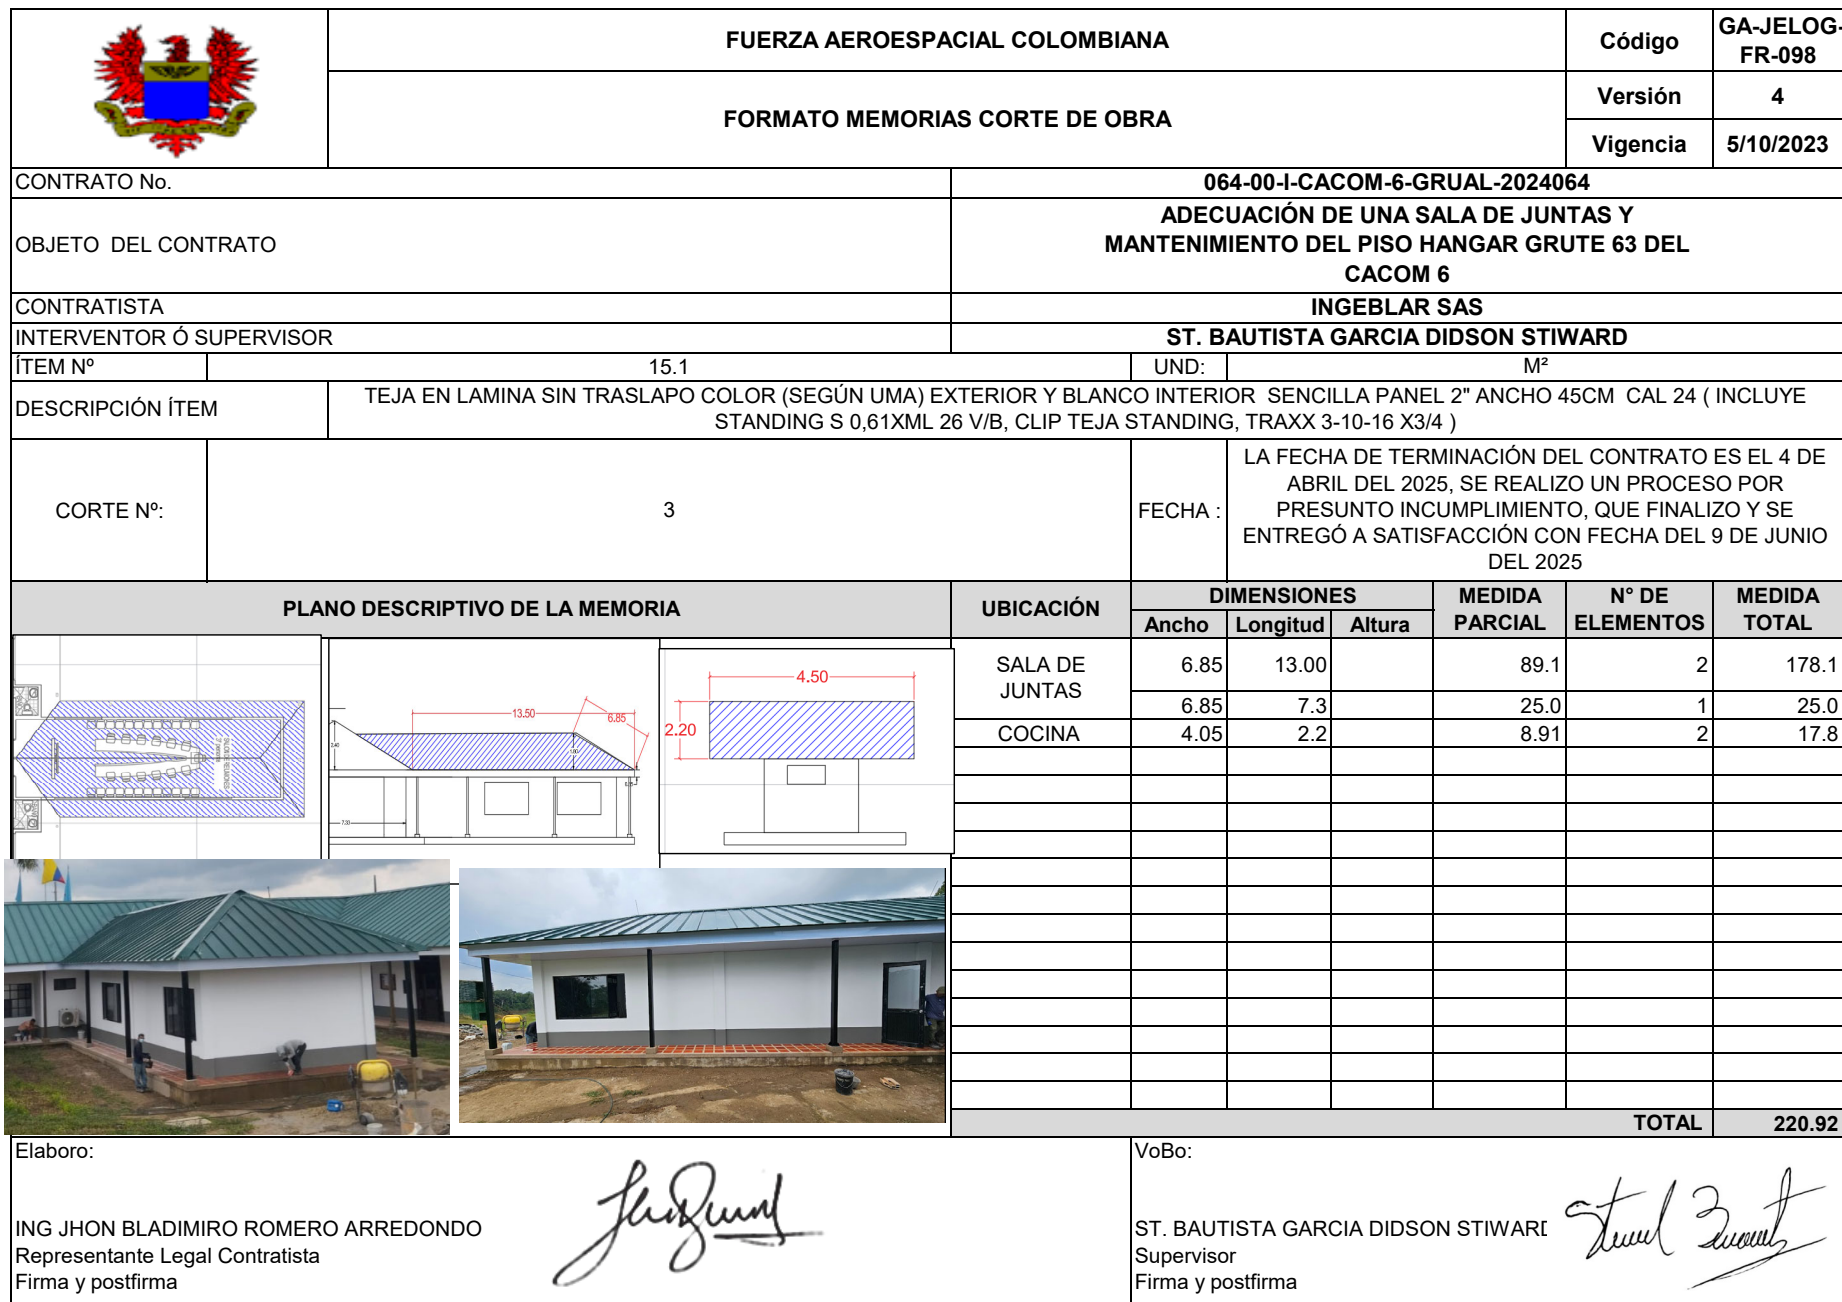
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.				064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA				INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	13.1			UND:	KG					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		ESTRUCTURA METÁLICA SEGUN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO, COMO TAMBIEN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE.								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			PESO ELEMENTO 4.21KG	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Unidad	Longitud	Altura			
 				COLUMNAS SALA DE JUNTAS	2.00		3.30	27.8	6	166.72
				TOTAL			166.72			
Elaboro:					VoBo:					
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma					ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma					

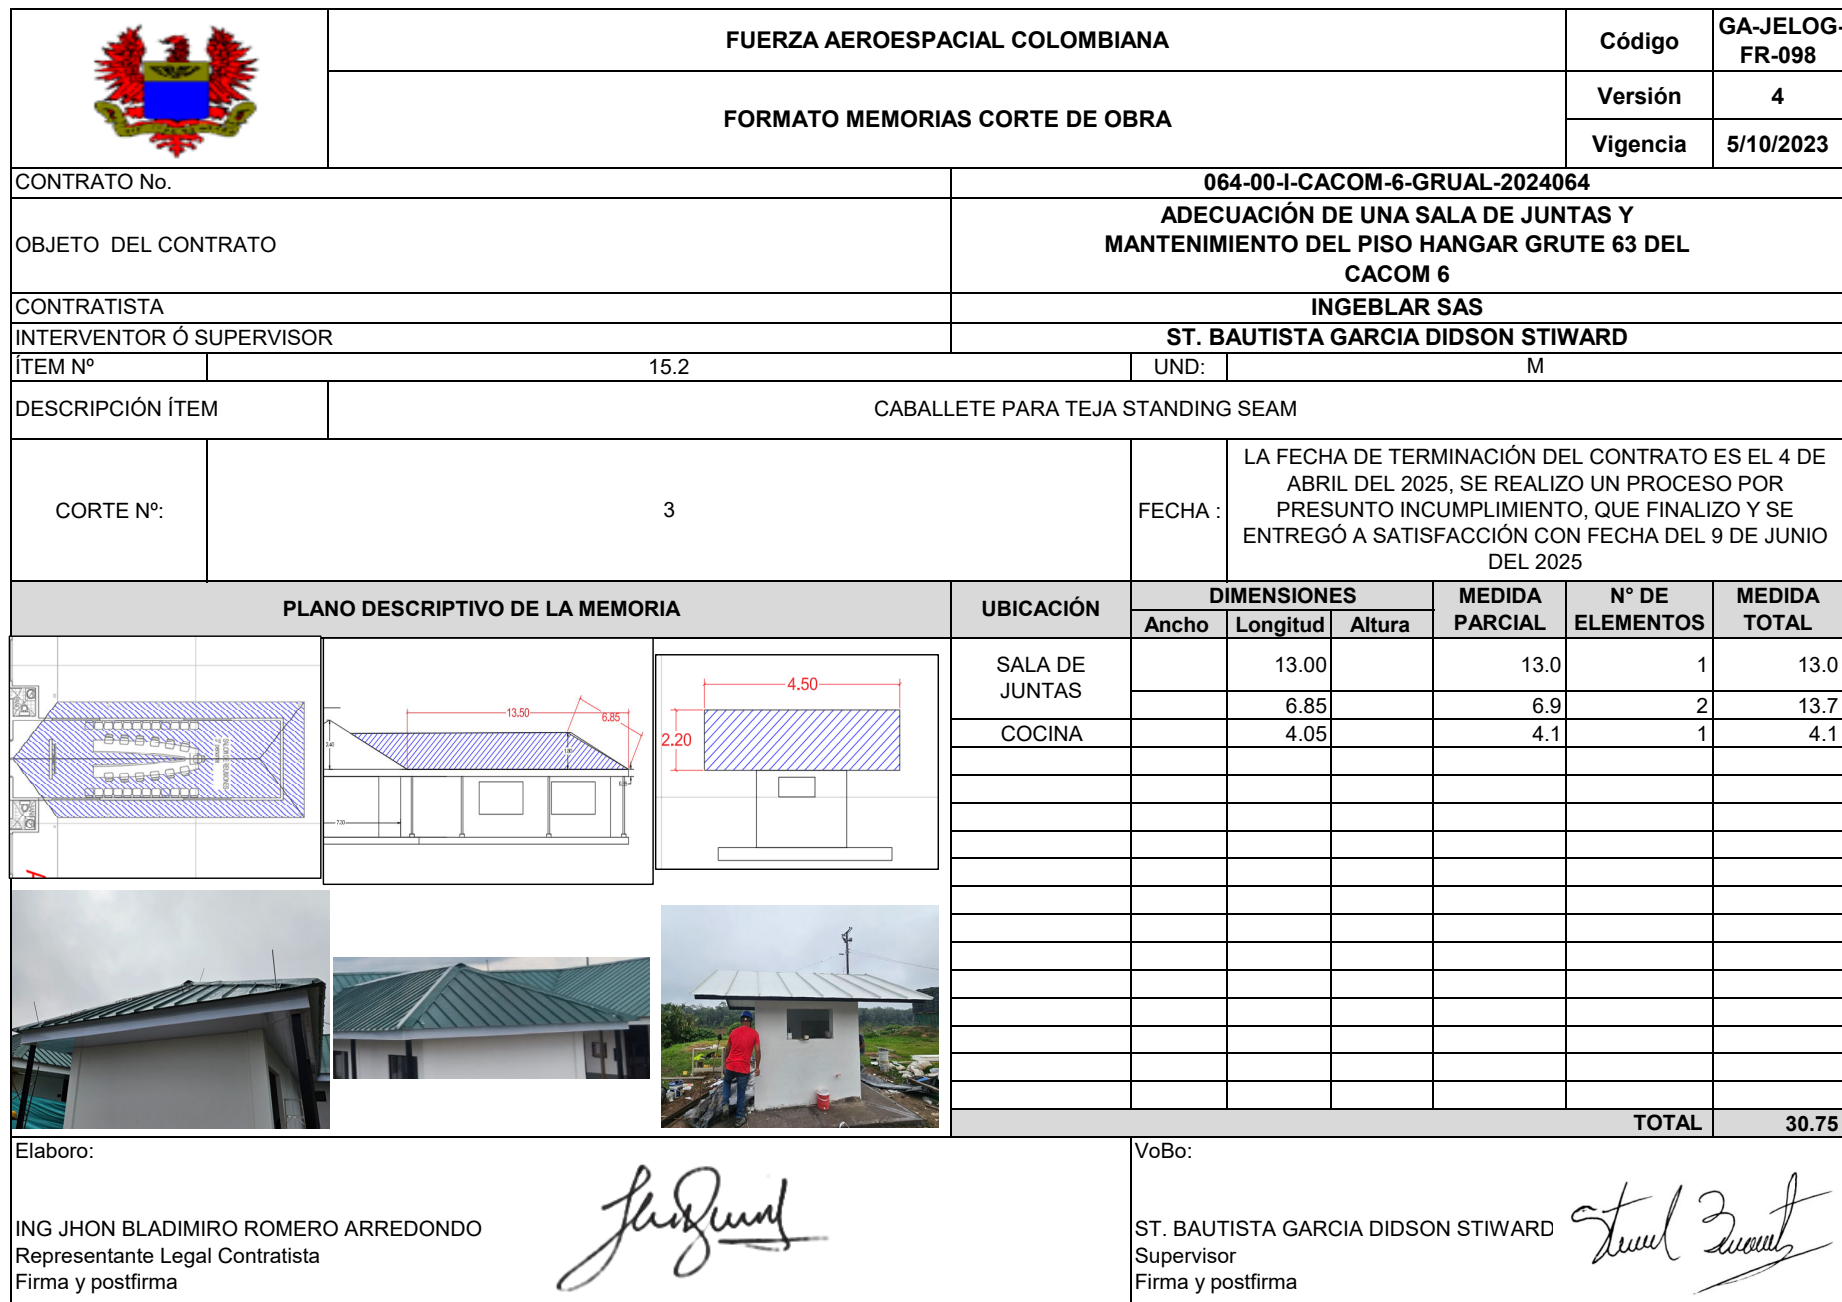
	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.				064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA				INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°		14.1		UND:	M²					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		VENTANAS EN ALUMINIO CORREDIZAS Y VIDRIOS FIJOS CON MARCOS DE 52MM LINEA KONCEPT SERIE 50 ALUMINA ANCHO PERFIL 77/43MM Y VIDRIO DE 5 MM CON PELICULA NANOCERAMICA (CONTROL DE INFRARROJOS) IR 35 100, EN EL ÁREA DE BAÑOS Y COCINA VIDRIO CON PELICULA DECORA, INCLUYE ANGEOS								
CORTE N°:		3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
<div></div>				SALA DE JUNTAS	2.50		1.45	3.6	3	10.9
				COCINA	1		0.6	0.6	1	0.6
				PUERTA COCINA	1		1.9	1.9	1	1.9
				PUERTA BAÑO	1		2.1	2.1	1	2.1
				TOTAL			15.48			
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						


	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4			
					Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	14.2			UND:	M²				
DESCRIPCIÓN ÍTEM	PUERTA EN VIDRIO TEMPLADO LAMINADO PLANILUX (4 mm) COOL-LITE ST 136 + PVB standard (2 x 0,38 mm) + PLANILUX (4 mm) BISAGRA HIDRÁULICA (SPEEDY O SIMILAR) INCLUYE CERRADURA (YALE O SIMILAR) Y PORTA CERRADURA EN ALUMINIO PARA PUERTAS DE VIDRIO, COLOR NEGRO ACERO INOXIDABLE DE 40 CM, CHAPAS ENTRE OTROS.								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025				
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN					
				DIMENSIONES					
 				Ancho	Longitud	Altura	MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				PUERTA SALA DE JUNTAS	2.20	2.35	5.17	1.00	5.17
								TOTAL	5.17
Elaboro:				VoBo:					
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARE Supervisor Firma y postfirma					

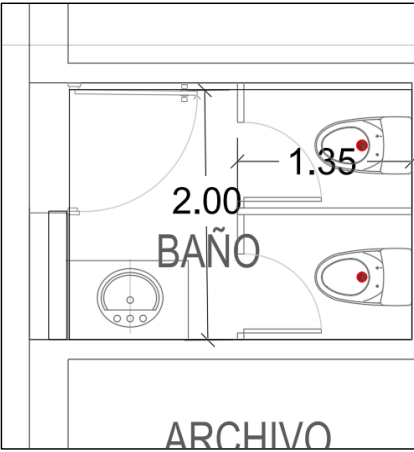
	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	14.3			UND:	M²					
DESCRIPCIÓN ÍTEM	FACHADAS EN VIDRIO TEMPLADO Y/O DIVISIONES INTERNAS DE 10MM CON SANDBLASTING INCLUYE HERRAJES EN ACERO INOXIDABLE TIPO ESTRELLA SEGÚN DETALLE EN PLANOS O HERRAJE SIMILAR QUE APOYE EN PLACA O COLUMNAS CON APOYOS EN TUBERÍA EN ACERO PISO TECHO SEGÚN APL									
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			AREA	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
 				ENTRADA COMANDO		0.88	2	1.8	2	3.5
						2	0.6	1.2	1	1.2
						2	2.2	4.4	1	4.4
				TOTAL			9.12			
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

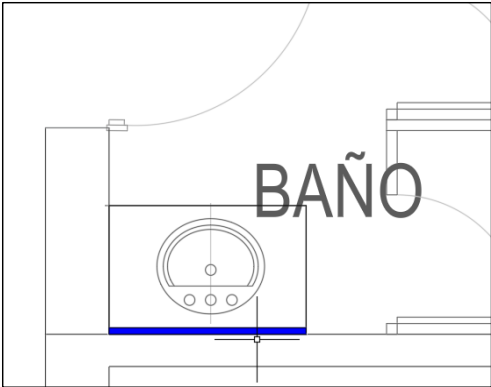


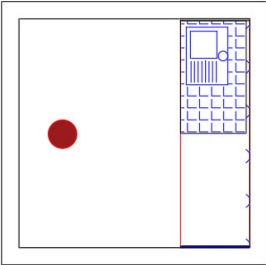


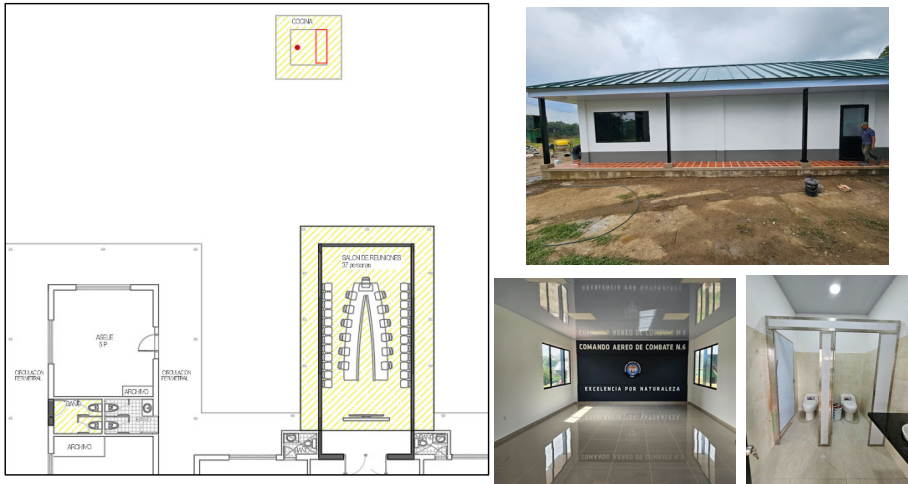


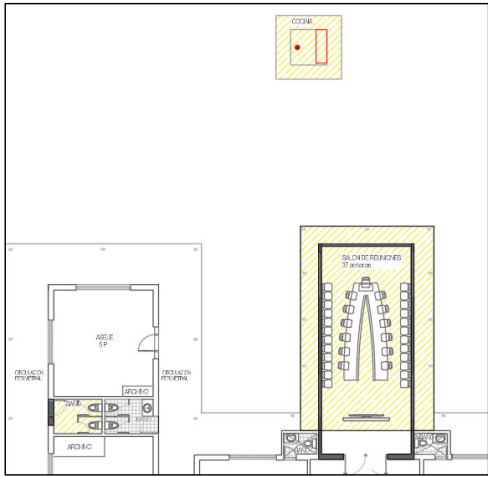
		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG- FR-098			
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4			
						Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	15.3			UND:	kg					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		ESTRUCTURA DE CUBIERTA EN PERFILES METÁLICOS TIPO ACESCO O SIMILAR SEGÚN PLANOS. INCLUYE TODOS LOS ELEMENTOS ESTRUCTURALES PARA SU MONTAJE Y CORRECTO FUNCIONAMIENTO COMO TEMPLETES, CONTRAVIENTOS Y OTROS ACCESORIOS, COMO TAMBIÉN PINTURA EN ANTICORROSIVO Y ESMALTE								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			PESO 4.21KG/M	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	PESO			
<div></div>				SALA DE JUNTAS VIGAS PERIMETRALES	5X15 EN C	13.50	4.21	56.835	2	113.7
					5X15 EN C	7.8	4.21	32.838	2	65.7
					5X15 EN C	13.5	4.21	56.835	2	113.7
					5X15 EN C	5.5	4.21	23.155	2	46.3
					5X15 EN C	13.5	4.21	56.835	2	113.7
				VIGAS CABALLETES	5X15 EN C	2.5	4.21	10.525	2	21.1
					12X6 REC	7	5.58	39.060	2	78.12
					12X6 REC	5	5.58	27.900	4	111.6
				12X6 REC	9	5.58	50.220	4	200.88	
				REYES	5X15 EN C	3.8	4.21	16.060	2	32.1202188
				REY SUPERIOR	5X15 EN C	13.5	4.21	56.835	2	113.67
				REY INFERIOR	5X15 EN C	13.5	4.21	56.835	2	113.67
				PERFILES COCINA	12X6 REC	4.5	5.58	25.110	6	150.66
					12X6 REC	4.5	5.58	25.110	4	100.44
				TOTAL						1375.21
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.				064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA				INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	16.1			UND:	UND					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		SANITARIO MONTECARLO ADVANCE BLANCO CORONA O SIMILAR, INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS.								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
   				BAÑOS MUJERES					2	2.0
				TOTAL			2.00			
Elaboro:					VoBo:					
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma					ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARE Supervisor Firma y postfirma					

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG- FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4			
					Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.				064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064					
OBJETO DEL CONTRATO				ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6					
CONTRATISTA				INGEBLAR SAS					
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD					
ÍTEM N°	16.3		UND:	m²					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		ESPEJO BISELADO E= 4 MM (FLOTADO EN MURO)							
CORTE N°:	3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				Ancho	Longitud	Altura			
 			ESPEJO BAÑOS MUJERES	1.00		0.8	0.8	1	0.80
			TOTAL			0.80			
Elaboro:				VoBo:					
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARE Supervisor Firma y postfirma					

		FUERZA AEROSPAECIAL COLOMBIANA					Código	GA-JELOG- FR-098		
		FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA					Versión	4		
							Vigencia	5/10/2023		
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	16.4			UND:	UND					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		LAVAPLATOS MESON EMPOTRAR ACERO INOXIDABLE 100 X 50CM CON GRIFERÍA								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
<div><div>COCINA</div><div></div><div></div></div>				COCINA					1	1.0
				TOTAL					1.00	
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						


	FUERZA AEROSPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098				
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4				
					Vigencia	5/10/2023				
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064							
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6							
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS							
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD							
ÍTEM N°	17.1			UND:	m²					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		ASEO GENERAL INTERIOR Y EXTERIOR, FINAL DE OBRA								
CORTE N°:	3			FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA				UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
					Ancho	Longitud	Altura			
				SALA DE JUNTAS	5.25	12		63.0		63.0
				COCINA	2	2		4.0		4.0
				BAÑOS MUJERES	1.95	2.93		5.72		5.72
				ANDENES	1	13.9		13.9		13.9
				ANDENES	1	7.3		7.3		7.3
				ENTRADA COMANDO	5.25	1		5.25		5.25
				TOTAL			99.17			
Elaboro:				VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma				ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA				Código	GA-JELOG-FR-098			
	FORMATO MEMORIAS CORTE DE OBRA				Versión	4			
					Vigencia	5/10/2023			
CONTRATO No.			064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024064						
OBJETO DEL CONTRATO			ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6						
CONTRATISTA			INGEBLAR SAS						
INTERVENTOR Ó SUPERVISOR			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD						
ÍTEM N°	17.2		UND:	m³					
DESCRIPCIÓN ÍTEM		RETIRO DE SOBANTES FUERA DE LA UNIDAD							
CORTE N°:	3		FECHA :	LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO ES EL 4 DE ABRIL DEL 2025, SE REALIZO UN PROCESO POR PRESUNTO INCUMPLIMIENTO, QUE FINALIZO Y SE ENTREGÓ A SATISFACCIÓN CON FECHA DEL 9 DE JUNIO DEL 2025					
PLANO DESCRIPTIVO DE LA MEMORIA			UBICACIÓN	DIMENSIONES			MEDIDA PARCIAL	N° DE ELEMENTOS	MEDIDA TOTAL
				Ancho	Longitud	Altura			
<div></div>			SALA DE JUNTAS						1.0
			COCINA						0.5
			BAÑOS						0.70
			MUJERES						0.3
			ANDENES						0.3
			ANDENES						0.2
			ENTRADA COMANDO						
			TOTAL 3.00						
Elaboro:			VoBo:						
ING JHON BLADIMIRO ROMERO ARREDONDO Representante Legal Contratista Firma y postfirma			ST. BAUTISTA GARCIA DIDSON STIWARD Supervisor Firma y postfirma						

2. Concepto Actualización

4. Número de formulario

14837819552



(415)7707212489984(8020) 000001483781955 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 0 8 7 8 5 8 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente Persona jurídica 25. Tipo de documento 1 26. Número de Identificación 27. Fecha expedición

Lugar de expedición 28. País 29. Departamento 30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido 32. Segundo apellido 33. Primer nombre 34. Otros nombres

35. Razón social
INGEBLAR SAS

36. Nombre comercial

37. Sigla
INGEBLAR SAS

UBICACIÓN

38. País COLOMBIA 39. Departamento Bogotá D.C. 40. Ciudad/Municipio Bogotá, D.C.

41. Dirección principal
CL 85 SUR 92 85 IN 19 OF 301

42. Correo electrónico gerenciaingebлар@gmail.com

43. Código postal 5 7 44. Teléfono 1 3 1 0 5 8 1 4 9 0 9 45. Teléfono 2 4 6 5 6 5 8 2

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades	
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	52. Número establecimientos
4 1 1 2	2 0 1 7 0 6 1 2	4 2 9 0	2 0 1 7 0 6 1 2	4 3 3 0 4 2 2 0	

Responsabilidades, Calidades y Atributos

53. Código 5 7 9 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto. renta y compl. régimen ordinario

07- Retención en la fuente a título de renta

09- Retención en la fuente en el impuesto

14- Informante de exógena

42- Obligado a llevar contabilidad

48 - Impuesto sobre las ventas - IVA

52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

54. Código 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55. Forma 56. Tipo Servicio 1 2 3 57. Modo 58. CPC

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI ☐ NO ☒

60. No. de Folios: 0

61. Fecha 2022 - 07 - 14 / 10 : 14: 38

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:


984. Nombre ROMERO ARREDONDO JHON BLADIMIRO

985. Cargo Representante legal Certificado

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14837819552



(415)7707212489984(8020) 000001483781955 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)

9 0 1 0 8 7 8 5 8

6. DV

4

12. Dirección seccional

Impuestos de Bogotá

14. Buzón electrónico

3 2

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza

2

63. Formas asociativas

1 2

64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados

67. Sociedades y organismos extranjeros

70. Beneficio

1

65. Fondos

66. Cooperativas

68. Sin personería jurídica

69. Otras organizaciones no clasificadas

Constitución, Registro y Última Reforma

Composición del Capital

Documento

1. Constitución

2. Reforma

71. Clase

0 4

72. Número

73. Fecha

2 0 1 7 0 3 2 5

74. Número de notaría

75. Entidad de registro

0 3

76. Fecha de registro

2 0 1 7 0 6 1 2

77. No. Matrícula mercantil

0 0 0 2 8 2 7 8 5 5

78. Departamento

1 1

79. Ciudad/Municipio

0 0 1

82. Nacional

1 0 0 %

83. Nacional público

0 . 0 %

84. Nacional privado

1 0 0 . 0 %

85. Extranjero

0 %

86. Extranjero público

0 . 0 %

87. Extranjero privado

0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Superintendencia de Sociedades

5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	4 9	2 0 1 7 0 6 1 2		-
2	8 1	2 0 1 7 0 6 1 2		-
3				-
4				-
5				-

Vinculación económica

93. Vinculación económica

94. Nombre del grupo económico y/o empresarial

95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante

96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior

171. País


172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario

14837819552



(415)7707212489984(8020) 000001483781955 2

5. Número de Identificación Tributaria (NIT) 9 0 1 0 8 7 8 5 8 6. DV 4 12. Dirección seccional Impuestos de Bogotá 14. Buzón electrónico 3 2

Representación

1	98. Representación REPRS LEGAL PRIN		1 8		99. Fecha inicio ejercicio representación 2 0 1 7 0 6 1 2	
	100. Tipo de documento Cédula de Ciudadaní	1 3	101. Número de identificación 1 0 1 8 4 2 9 7 1 6	102. DV	103. Número de tarjeta profesional	
	104. Primer apellido ROMERO	105. Segundo apellido ARREDONDO	106. Primer nombre JHON	107. Otros nombres BLADIMIRO		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
2	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
3	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
4	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			
5	98. Representación		99. Fecha inicio ejercicio representación			
	100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional		
	104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres		
	108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal			

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500526944

CONTRATO: 4600242962



PROVEEDOR DE SERVICIOS	INGEBLAR SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	30.06.2025
CONTRATO No.	064GRUAL24		
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500526944, contrato interno 4600242962 de fecha 08.07.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500526944	00030	1002264031	OP02 HANGAR CHARLI CACOM6 2 +IVA				12.240.833,22
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	12.240.833,22

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRONICA E53
ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6

FIRMAS

AA12 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES
Asistente Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500526944

CONTRATO: 4600242962



PROVEEDOR DE SERVICIOS	INGEBLAR SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	30.06.2025
CONTRATO No.	064GRUAL24		
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500526944, contrato interno 4600242962 de fecha 08.07.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500526944	00020	1002264029	OP02 HANGAR CHARLI CACOM6 2				94.032.506,88
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	94.032.506,88

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRONICA E58
ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6

FIRMAS

AA12 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES
Asistente Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500526944

CONTRATO: 4600242962



PROVEEDOR DE SERVICIOS	INGEBLAR SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	30.06.2025
CONTRATO No.	064GRUAL24		
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500526944, contrato interno 4600242962 de fecha 08.07.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500526944	00010	1002264028	AD01 COMANDO CACOM6 2				324333.992,30
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	324333.992,30

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRONICA E58
ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE
63 DEL CACOM 6

FIRMAS

AA12 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES
Asistente Gestión Contable

ENTRADA RECEPCIÓN DE SERVICIO

PEDIDO: 4500526945

CONTRATO: 4600242962



PROVEEDOR DE SERVICIOS	INGEBLAR SAS	FECHA RECIBO DEL SERVICIO	30.06.2025
CONTRATO No.	064GRUAL24		
UNIDAD RECEPTORA	5006 CACOM 6		
CONCEPTO			
Hace constar que se recibieron a entera satisfacción el / los servicios que a continuación se relacionan y que el proveedor cumplió con las obligaciones contraídas en el / los pedidos 4500526945, contrato interno 4600242962 de fecha 08.07.2025 respectivamente.			

ID	PEDIDO	POS	NUMERO HOJA DE ENTRADA.	DESCRIPCIÓN SERVICIO	COND	P/N	SERIE	VALOR
1	4500526945	00010	1002264032	MTTO PISO HANGA - SALA JUNTAS				10.234.104,14
VALOR TOTAL SERVICIOS							COP	10.234.104,14

OBSERVACIONES

FACTURA ELECTRONICA E53
ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE
63 DEL CACOM 6

FIRMAS

AA12 DIANA MARCELA TIQUE QUIÑONES
Asistente Gestión Contable



Cuenta por pagar Comprobante

Usuario Solicitante:

MHdtique

Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:

15-01-05-008

Fecha y Hora Sistema:

2025-06-10-4:05 p. m.

Diana Marcela Tique Quinones

FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6

Cuentas por pagar							
Número:	78725	Fecha Registro:	2025-06-10	Unidad / Subunidad Ejecutora:	15-01-05-008 FAC COMANDO AEREO DE COMBATE No. 6		
Estado:	Aprobada	Tipo de Cuenta x Pagar:	Adquisicion de Servicios a Personas Declarantes	Nro. Compromiso:	125024	Nro. Cdp:	13924
Caja Menor-Identif.:		Caja Menor-Fecha Registro:		Tipo de Moneda:	COP-Pesos	Tasa de Cambio:	0,00
Valor Antes del Iva:	438.887.017,79	Valor Iva:	1.954.418,75	Valor Total:	440.841.436,54	Valor Total Moneda Original:	0,00
Tercero							
Identificación:	901087858	Razón Social:	INGEBLAR SAS				

Documentos soporte-datos administrativos			
Número:	E58	Tipo	FACTURA
		Fecha:	2025-06-10

Documentos soporte recibidos	
CODIGO	DESCRIPCION
12	CUMPLIDO A SATISFACCION
17	FACTURA

Objeto.:

064-00-I-CACOM-6-GRUAL-2024 RP ADECUACIÓN DE UNA SALA DE JUNTAS Y MANTENIMIENTO DEL PISO HANGAR GRUTE 63 DEL CACOM 6

DIANA MARCELA
TIQUE QUIÑONES

Firmado digitalmente por DIANA
MARCELA TIQUE QUIÑONES

Fecha: 2025.06.10 16:06:26 -05'00'

FIRMA(S) RESPONSABLE(S)
