

	PROCESO						Versión: 1	
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA						CÓDIGO:	
	FORMATO						ATC-FR-003	
INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA						Página _ de _		
INFORME DE AVANCE DE MARZO DE 2025								
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO								
CONVENIO N° 1063 DE 2024 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI								
Objeto del Convenio:		AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR						
Valor del Convenio:	\$	8.034.997.263	Aporte de Mindeportes:	\$	8.034.997.263,00	Aporte del Municipio:	\$ 0,00	
Valor Adición:	\$	-						
Valor Total:	\$	8.034.997.263						
Plazo de Ejecución:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		Suspensión 1		Reinicio:	Prórroga N° 1	Hasta el 31 de marzo de 2025	
Fecha de Inicio:	27/12/2024		Suspensión 2		Reinicio:	Prórroga N° 2		
Vencimiento:	31/03/2025					Plazo Actualizado	3 meses y 3 días	
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)			Valor		Modificación fecha		
SOLIDARIA DE COLOMBIA 320-47-994000030426	Desde	26/12/2024	Hasta	30/09/2025	\$ 1.606.999.452,00	Hasta	9/01/2025	
							\$ 1.606.999.452,00	
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO								
Informe N°	3	Período comprendido entre el 1 de marzo de 2025 y el 31 de marzo de 2025						
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR							
Localización	Municipio de Agustín Codazzi, Cabecera Municipal, Barrio Camilo Torres							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA				CONTRATO DE OBRA				
Objeto:				Objeto:				
Contrato N°:				Contrato N°:				
Contratista:				Contratista:				
Plazo Inicial:				Plazo Inicial:				
Fecha de Inicio:				Fecha de Inicio:				
*Fecha de Suspensión:				*Fecha de Suspensión:				
*Fecha de Reinicio:				*Fecha de Reinicio:				
Fecha de Terminación:				Fecha de Terminación:				
Prórrogas:				Prórrogas:				
Plazo Actualizado:				Plazo Actualizado:				
Valor Inicial:				Valor Inicial:				
Valor Adiciones:				Valor Adiciones:				
Valor Actualizado:				Valor Actualizado:				
Valor pagado:				Valor pagado:				
Valor por pagar:				Valor por pagar:				
Nombre Supervisor:				Nombre Interventor:				

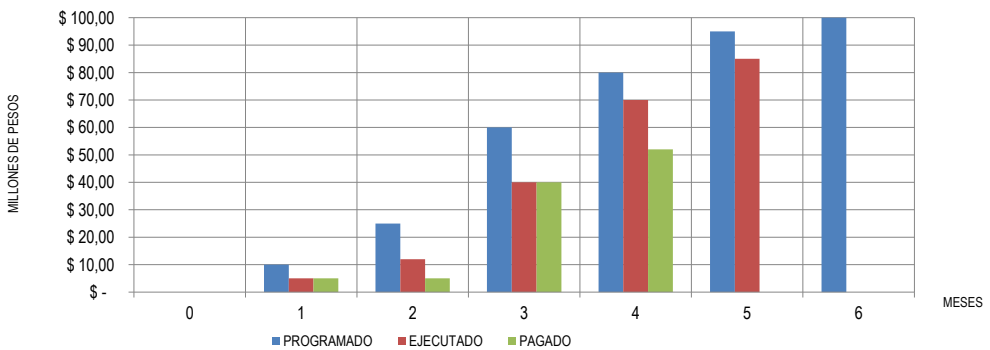
 Deporte	PROCESO	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA						Versión: 1
	FORMATO	INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA						CÓDIGO: ATC-FR-003
							Página _ de _	

ESTADO DE LAS GARANTÍAS							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°				CONTRATO DE OBRA N°			
CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO	VIGENTE (Fechas)		VALOR
	DESDE	HASTA			DESDE	HASTA	
Nombre de la Aseguradora	Póliza N°			Nombre de la Aseguradora	Póliza N°		

RESUMEN DE PAGOS					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°			CONTRATO DE OBRA N°		
CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR	CONCEPTO	FECHA DE PAGO	VALOR

SEGUIMIENTO AL AVANCE								
AVANCE FÍSICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	
% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	
Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	

DESCRIPCIÓN ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERÍODO	
El Municipio de Agustín Codazzi, adelantó el proceso de licitación No. LPO 001 DE 2025, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR, para este periodo, el día 7 de marzo de 2025 se cierra la licitación donde se presentaron 3 proponentes; el día 26 de marzo se publica el informe de avaluacion de las propuestas	
El Municipio de Agustín Codazzi, adelantó el proceso de Concurso de Meritos Abierto No. CMA 002 DE 2025, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR, para este periodo el día 5 de marzo de 2025 se dio apertura al proceso; el día 12 de marzo de 2025 se cierra el proceso.	

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"																																	
 <table><caption>Programmed, Executed, and Paid Data (Millions of Pesos)</caption><thead><tr><th>Month</th><th>Programado</th><th>Ejecutado</th><th>Pagado</th></tr></thead><tbody><tr><td>0</td><td>0</td><td>0</td><td>0</td></tr><tr><td>1</td><td>10,00</td><td>5,00</td><td>5,00</td></tr><tr><td>2</td><td>25,00</td><td>12,00</td><td>5,00</td></tr><tr><td>3</td><td>60,00</td><td>40,00</td><td>40,00</td></tr><tr><td>4</td><td>80,00</td><td>70,00</td><td>50,00</td></tr><tr><td>5</td><td>95,00</td><td>85,00</td><td>0</td></tr><tr><td>6</td><td>100,00</td><td>0</td><td>0</td></tr></tbody></table>	Month	Programado	Ejecutado	Pagado	0	0	0	0	1	10,00	5,00	5,00	2	25,00	12,00	5,00	3	60,00	40,00	40,00	4	80,00	70,00	50,00	5	95,00	85,00	0	6	100,00	0	0	<div>PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.</div> <div>EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.</div> <div>PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).</div> <div>LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS INVERTIDOS DEL CONVENIO</div>
Month	Programado	Ejecutado	Pagado																														
0	0	0	0																														
1	10,00	5,00	5,00																														
2	25,00	12,00	5,00																														
3	60,00	40,00	40,00																														
4	80,00	70,00	50,00																														
5	95,00	85,00	0																														
6	100,00	0	0																														

	PROCESO APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA		Versión: 1	
	FORMATO INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA		CÓDIGO: ATC-FR-003	
			Página _ de _	

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

5. RELACIÓN DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra		0	8.	Copia certificado de pago a contratistas		0
2.	Registro Fotográfico		0	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental		0
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos		0	10.	Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas		0
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta critica		0	11.	Control programa de seguridad industrial		0
5.	Copia último informe de interventoría		0	12.	Control maquinaria y equipo		0
6.	Copia actas de comité de obra		0	13.	Control de calidad / inspecciones / ensayos		0
7.	Copia libro de obra/bitácora		0	14.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio		0

Elaborado por: 	Revisado por: 	Aprobado por: 	
JULIO CESAR MARTINEZ DAZA SECRETARIO DE PLANEACION	JULIO CESAR MARTINEZ DAZA SECRETARIO DE PLANEACION	JULIO CESAR MARTINEZ DAZA SECRETARIO DE PLANEACION	Elaborado: 31/01/2025 Total de Páginas: 3
