

	PROCESO					Versión: 1	
	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA					CÓDIGO:	
	FORMATO					ATC-FR-003	
INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA					Página _ de _		
INFORME DE AVANCE DE JULIO-AGOSTO DE 2025							
1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONVENIO							
CONVENIO N° 1063 DE 2024 SUSCRITO ENTRE MINDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI							
Objeto del Convenio:		AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO DENOMINADO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR					
Valor del Convenio:	\$	8.034.997.263	Aporte de Mindeportes:	\$	8.034.997.263,00	Aporte del Municipio:	\$ 0,00
Valor Adición:	\$	-					
Valor Total:	\$	8.034.997.263					
Plazo de Ejecución:	Hasta el 31 de diciembre de 2024		Suspensión 1		Reinicio:	Prórroga N° 1	Hasta el 31 de marzo de 2025
Fecha de Inicio:	27/12/2024		Suspensión 2		Reinicio:	Prórroga N° 2	
Vencimiento:	31/03/2025					Plazo Actualizado	3 meses y 3 días
Póliza de garantía única:	Vigencia póliza (Fechas)			Valor		Modificación fecha	
SOLIDARIA DE COLOMBIA	Desde	26/12/2024	Hasta	30/09/2025	\$ 1.606.999.452,00	Hasta	9/01/2025
320-47-994000030426							\$ 1.606.999.452,00
2. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO							
Informe N°	7	Período comprendido entre el 8 de julio de 2025 y el 7 de agosto de 2025					
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR						
Localización	Municipio de Agustín Codazzi, Cabecera Municipal, Barrio Camilo Torres						
CONTRATO DE INTERVENTORÍA			CONTRATO DE OBRA				
Objeto:	INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO LA CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR			Objeto:	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES DEL MUNICIPIO AGUSTÍN CODAZZI, DEPARTAMENTO DEL CESAR		
Contrato N°:	CMA-002-2025			Contrato N°:	LP 001 - 2025		
Contratista:	CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25			Contratista:	CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES		
Plazo Inicial:	9 MESES			Plazo Inicial:	9 MESES		
Fecha de Inicio:	8 de julio de 2025			Fecha de Inicio:	8 de julio de 2025		
*Fecha de Suspensión:	N/A			*Fecha de Suspensión:	N/A		
*Fecha de Reinicio:	N/A			*Fecha de Reinicio:	N/A		
Fecha de Terminación:	N/A			Fecha de Terminación:	N/A		
Prórrogas:	N/A			Prórrogas:	N/A		
Plazo Actualizado:	9 MESES			Plazo Actualizado:	9 MESES		
Valor Inicial:	\$	524.518.976		Valor Inicial:	\$	7.509.319.051	
Valor Adiciones:	N/A			Valor Adiciones:	N/A		
Valor Actualizado:	N/A			Valor Actualizado:	N/A		
Valor pagado:	\$			Valor pagado:	\$	-	
Valor por pagar:	\$	524.518.976		Valor por pagar:	\$	7.509.319.051	
Nombre Supervisor:	JULIO CESAR MARTINEZ DAZA			Nombre Interventor:	CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25		

PROCESO	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA	Versión: 1
FORMATO	INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA	CÓDIGO: ATC-FR-003 Página _ de _

ESTADO DE LAS GARANTÍAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA N°				CONTRATO DE OBRA N°					
CONCEPTO		VIGENTE (Fechas)		VALOR	CONCEPTO		VIGENTE (Fechas)		VALOR
		DESDE	HASTA				DESDE	HASTA	
CUMPLIMIENTO		26/05/2025	26/06/2026	\$ 52.451.898	CUMPLIMIENTO		22/05/2025	22/08/2026	\$ 750.931.905,10
BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		26/05/2025	26/06/2026	\$ 262.259.488	BUEN MANEJO DEL ANTICIPO		22/05/2025	22/06/2026	\$ 3.754.659.525,50
PRESTACIONES SOCIALES		26/05/2025	26/06/2029	\$ 52.451.898	PRESTACIONES SOCIALES		22/05/2025	22/02/2029	\$ 375.465.925,55
CALIDAD DEL SERVICIO		26/05/2025	26/02/2031	\$ 52.451.898	ESTABILIDAD Y CALIDAD DEL SERVICIO		SE AMPARA 5 AÑOS, O MESES Y 0 DÍAS		\$ 750.931.905,10
					RESPONSABILIDAD CIVIL No. 21-40-101256022 del 5 de junio de 2025				
					Predios, labores y operaciones		22/05/2025	22/02/2025	\$ 711.750.000,00
					Daño emergent y lucro cesante		22/05/2025	22/02/2025	\$ 711.750.000,00
					Prejuicios extrapatrimoniales		22/05/2025	22/02/2025	\$ 711.750.000,00
Nombre de la Aseguradora	SEGUROS MUNDIAL	Póliza N°		CRC-10002519	Nombre de la Aseguradora: SEGUROS DEL ESTADO		Póliza N°		21-40-101471554

RESUMEN DE PAGOS

[illegible]

SEGUIMIENTO AL AVANCE


AVANCE FISICO (%)				AVANCE FINANCIERO (Miles de pesos)				
CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	CONCEPTO	ACUM. ANTERIOR	AVANCE MENSUAL	TOTAL ACUMULADO	%
% Programado	0,00%	3,04%	3,04%	% Programado	0,00%	0,00%	0,00%	
% Ejecutado	0,00%	5,90%	5,90%	% Ejecutado	0,00%	0,00%	0,00%	
Diferencia	0,00%	-2,86%	-2,86%	Diferencia	0,00%	0,00%	0,00%	

[illegible]

El Municipio de Agustín Codazzi, adelantó el proceso de licitación No. LPO 001 DE 2025, cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR, para este periodo; se realizan las actividades en obra para el normal desarrollo del proyecto

El Municipio de Agustín Codazzi, adelantó el proceso de Concurso de Meritos Abierto No. CMA 002 DE 2025, cuyo objeto es INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, LEGAL Y AMBIENTAL PARA LA OBRA QUE TIENE POR OBJETO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR, para este periodo se la interventoria se encuentra realizando sus labores contractuales.

3. BALANCE EJECUCIÓN PRESUPUESTAL DEL CONVENIO - CURVA "S"

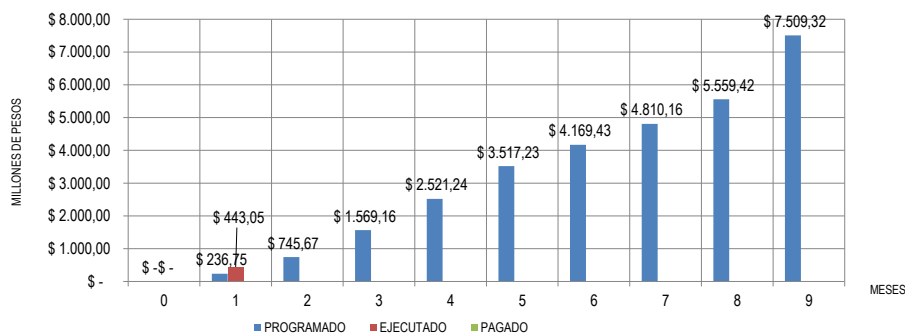

PROGRAMADO: Valor acumulado conforme a la programación vigente.

EJECUTADO: Valor acumulado de las actividades ejecutadas y aprobadas por la Interventoría.

PAGADO: Valor acumulado efectivamente pagado al contratista (Recuerde que el anticipo no es un pago).

LA GRÁFICA CORRESPONDE A LOS RECURSOS
INVERTIDOS DEL CONVENIO

	PROCESO	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA		Versión: 1	
	FORMATO	INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA		CÓDIGO:	
			ATC-FR-003		
		Página _ de _			

4. COMENTARIOS Y RECOMENDACIONES DE LA INTERVENTORÍA

5. RELACIÓN DE ANEXOS

	DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios		DESCRIPCIÓN DOCUMENTO ANEXO	S/N/N.A.	Nº Folios
1.	Balance Presupuestal de la obra		7	8.	Copia certificado de pago a contratistas		0
2.	Registro Fotográfico		1	9.	Seguimiento plan de manejo ambiental		21
3.	Mayores y menores cantidades de obra e ítems no previstos		0	10.	Control programa de seguridad industrial, Control maquinaria y equipo, Control pagos seguridad social y parafiscales contratistas (INFORME SST)		25
4.	Seguimiento ejecución/cronograma/control ruta crítica		0				
5.	Copia último informe de interventoría		0				
6.	Copia actas de comité de obra		0	11.	Control de calidad / inspecciones / ensayos		0
7.	Copia libro de obra/bitácora		0	12.	Extracto bancario de la cuenta de uso exclusivo del convenio		0

Elaborado por:	Revisado por:	Aprobado por:	
JULIO CESAR MARTINEZ DAZA SECRETARIO DE PLANEACION	JULIO CESAR MARTINEZ DAZA SECRETARIO DE PLANEACION	JULIO CESAR MARTINEZ DAZA SECRETARIO DE PLANEACION	Elaborado: 31/01/2025
			Total de Páginas: 3



PROCESO

FORMATO

AYUDA A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA

INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA

VERSIÓN: 1

CÓDIGO: ATC-FR-003


Página ____ de ____

ANEXO N° 1: BALANCE PRESUPUESTAL



CONVENIO NO. COID-1063-2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI													
BALANCE PRESUPUESTAL DE LA OBRA													
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR					Localización	Municipio de Agustín Codazzi, Cabecera Municipal, Barrio Camilo Torres						
Contrato N°:	LP 001 - 2025					Contratista:	CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES						
Periodo:	Del día 08 de julio al día 07 de agosto de 2025					Interventor:	CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25						
Director de obra:	KENTY VEGA					Director Interventoría:	JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS						
1. CONTRATO DE OBRA LP 001 - 2025 - CONTROL AL PRESUPUESTO													
ITEM	DESCRIPCIÓN SEGÚN CONTRATO	UNIDAD	CONTRATO			CANTIDADES			VALORES			SALDOS	
			Cant.	Valor unit.	Valor Total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Acumulado Anterior	Acumulado este mes	Acumulado total	Cantidad	Valor
1	OBRAS PRELIMINARES				\$ 324.251.809,00						\$ 79.281.875,00	\$ 244.968.936,00	
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO CON EQUIPO DE TOPOGRAFIA	M2	12.601,60	\$ 4.632,58	\$ 58.377.866,67	0,00	7.305,65	7.305,65	\$ -	\$ 33.843.977,08	\$ 5.295,95	\$ 24.533.889,58	
1.2	RELLENO CON MATERIAL CLASIFICADO SUB BASE	M3	1.121,42	\$ 194.479,55	\$ 218.093.251,88	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.121,42	
1.3	EXCAVACIÓN MANUAL EN TERRENO COMÚN PARA GRADERÍA Y CAFETERÍA	M3	62,41	\$ 37.525,76	\$ 2.341.794,90	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,41	
1.4	DESCAPOTE A MANUAL EN TERRENO COMÚN, HASTA EXP. 15 MT	M2	7.035,00	\$ 6.433,33	\$ 45.258.500,00	0,00	7.035,00	7.035,00	\$ -	\$ 45.258.500,00	\$ 45.258.500,00	\$ 0,00	
1.5	DESMONTE DE PORTERÍAS EXISTENTES Y DISPOSICIÓN FINAL	UND	2,00	\$ 90.197,73	\$ 180.395,45	0,00	2,00	2,00	\$ -	\$ 180.395,45	\$ 180.395,45	\$ 0,00	
2	EXCAVACION				\$ 77.070.980,00						\$ -	\$ 77.070.980,00	
2.1	RELLENO CON MATERIAL DE PRESTAMO	M3	55,04	\$ 55.228,03	\$ 3.039.971,70	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 55,04	
2.2	EXPLANACION Y CONFORMACION MECANICA CON VIBRO COMPACTADOR	M2	4.847,50	\$ 8.387,88	\$ 40.660.242,42	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.847,50	
2.3	RETIRO DE MATERIAL SOBRIANTE PROVENIENTE DE EXCAVACIONES	M3	776,64	\$ 42.968,18	\$ 33.370.765,76	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 776,64	
3	GRADERIAS				\$ 196.810.907,00						\$ -	\$ 196.810.907,00	
3.1	SOLIDADO EN CONCRETO DE 2500 PSI	M3	1,57	\$ 773.813,64	\$ 1.213.339,78	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,57	
3.2	ZAPATAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	3,53	\$ 1.136.317,42	\$ 4.008.927,87	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,53	
3.3	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3500 PSI	M3	9,80	\$ 1.599.577,27	\$ 15.675.857,27	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 9,80	
3.4	DOBELAS CON GROUTING	M3	0,76	\$ 1.478.137,12	\$ 1.120.664,44	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,76	
3.5	PLACA DE CONCRETO PARA GRADA	M3	3,84	\$ 1.640.943,18	\$ 6.306.144,65	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,84	
3.6	PLANTILLA EN CONCRETO DE 3000PSI E-8CM CON REFUERZO DE MALLA ELECTRO SOLDADA DE 4mm INCLUYE CONFORMACION DE TERRENO	M2	3,07	\$ 103.140,91	\$ 317.096,41	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,07	
3.7	ESCALONES EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	0,58	\$ 1.434.081,82	\$ 826.031,13	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 0,58	
3.8	ESTRUCTURA METALICA PARA ACCESO INCLUYE ISAJE, SOLDADURA, PINTURA Y TODO PARA SU CORRECTO FUNCIONAMIENTO INCLUYE CONTRAVIENTOS	KG	3.909,04	\$ 27.274,24	\$ 106.615.979,14	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.909,04	
3.9	ACERO DE REFUERZO DE 60000 PSI, INCLUYE ALAMBRE NEGRO Y FIGURACION	KG	3.252,25	\$ 9.729,55	\$ 31.642.935,80	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3.252,25	
3.10	CUBIERTA EN LAMINA UPVC INCLUYE MONTEAJE CON CLIPS DE FIJACION Y TODO PARA SU CORRECTA INSTALACION	M2	79,12	\$ 135.847,73	\$ 10.748.272,18	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 79,12	
3.11	LEVANTE EN LADRILLO DE GRES TIPO "ALCANTARA" 24X12X6-8CM CON ACABADO EXPUESTO CON MORTERO DE PEGA 1:4 RANURADO POR UNA CARA	M2	21,84	\$ 233.826,52	\$ 5.106.771,09	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 21,84	
3.12	FLANCHE EN LAMINA DE 1/2", TORNILLOS D 1/2" L=0,25M SEGUN DISEÑO DE 40 X80 CM	UND	7,00	\$ 470.987,73	\$ 3.296.284,09	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,00	
3.13	CANAL METALICA PARA AGUAS LUVIAS (PARA CUBIERTA DE GRADAS)	ML	18,40	\$ 438.925,00	\$ 8.076.220,00	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,40	
3.14	BAIANTE DE AGUAS LUVIAS DE 3" INCLUYE ACCESORIOS Y TODO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO	ML	43,85	\$ 42.334,85	\$ 1.856.383,11	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 43,85	
4	CAFETERIA				\$ 314.741.856,00						\$ -	\$ 314.741.856,00	
4.1	SOLIDADO EN CONCRETO 2.500 PSI	M3	1,17	\$ 773.813,64	\$ 901.879,80	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,17	
4.2	ZAPATA EN CONCRETO DE 3000 PSI, SIN REFUERZO	M3	6,99	\$ 1.167.501,52	\$ 8.164.338,10	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,99	
4.3	VIGA DE CIMENTACION EN CONCRETO DE 3000 PSI (0,25 X ,25)	M3	5,45	\$ 1.287.554,55	\$ 7.017.687,30	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,45	
4.4	COLUMNAS EN CONCRETO DE 3000 PSI	M3	4,93	\$ 1.463.483,31	\$ 7.212.045,76	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,93	
4.5	ACERO DE REFUERZO POR-60 Fy = 420 Mpa. INCLUYE SUMINISTRO.	KG	2.033,96	\$ 9.729,55	\$ 19.789.506,27	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2.033,96	
4.6	FLANCHE EN LAMINA DE 1/2", TORNILLOS D 1/2" L=0,25M SEGUN DISEÑO	UND	4,00	\$ 489.114,39	\$ 1.956.457,58	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,00	
4.7	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURA METALICA IPE 180, 220, 200	KG	5.313,62	\$ 34.567,42	\$ 183.678.087,67	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5.313,62	
4.8	BAIANTE DE AGUAS LUVIAS, TUBERIA PVC 4"	ML	6,00	\$ 44.750,00	\$ 268.500,00	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,00	
4.9	LOSA EN METALDECK CAL 22	M2	86,58	\$ 222.938,64	\$ 19.301.581,26	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,58	
4.10	TUBERIA SANITARIA PVC 4"	ML	48,59	\$ 49.947,73	\$ 2.426.960,07	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 48,59	
4.11	PUNTO SANITARIO PVC 2"	UND	8,00	\$ 36.118,84	\$ 288.951,52	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,00	
4.12	PUNTO SANITARIO PVC 4"	UND	2,00	\$ 70.603,79	\$ 141.207,58	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,00	
4.13	TUBERIA DE PRESION AGUA POTABLE PVC 3/4"	ML	28,10	\$ 18.959,85	\$ 532.771,74	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 28,10	
4.14	TUBERIA DE PRESION AGUA POTABLE PVC 1"	ML	25,07	\$ 20.480,30	\$ 513.441,20	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 25,07	
4.15	PUNTO TUB. DE PRESION AGUA POTABLE 1/2"	UND	87,00	\$ 17.773,48	\$ 1.546.293,18	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 87,00	
4.16	LEVANTE EN LADRILLO DE GRES TIPO "Alcantara" 24x12x6,8cm CON ACABADO	M2	62,50	\$ 233.826,52	\$ 14.614.858,67	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 62,50	
4.17	MESON EN CONCRETO REFORZADO 3.000 PSI E= 10 M	ML	6,50	\$ 142.695,45	\$ 927.520,45	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 6,50	
4.18	SUB BASE (POYO) EN CONCRETO PARA MUEBLES	ML	7,10	\$ 74.084,09	\$ 525.997,05	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,10	
4.19	DESNIVELES DE PLACA, EN MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO	M2	86,58	\$ 54.359,09	\$ 4.706.301,37	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,58	
4.20	IMPERMEABILIZACION EN MANTO ASFALTICO CALIENTE.	M2	86,58	\$ 49.770,45	\$ 4.309.026,42	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 86,58	
4.21	ENCHAPE PISO PARED Y PISO EN CERAMICA .	M2	52,48	\$ 109.421,97	\$ 5.742.464,97	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 52,48	
4.22	APARATO SANITARIO , CORONA O SIMILAR	UND	4,00	\$ 824.023,73	\$ 3.296.090,91	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4,00	
4.23	LAVAMANO SENCILLO, CORONA O SIMILAR	UND	3,00	\$ 283.771,21	\$ 851.313,64	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,00	
4.24	LAVAPLATOS EN ACERO INOXIDABLE, INCLUYE GRIFERIA.	UND	2,00	\$ 678.633,33	\$ 1.357.266,67	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,00	
4.25	MESON EN ACERO INOXIDABLE	ML	3,30	\$ 485.327,27	\$ 1.601.580,00	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 3,30	
4.26	TANQUE ELEVADO DE 2.000 LT	UND	1,00	\$ 974.514,39	\$ 974.514,39	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	
4.27	VENTANA EN ALUMINIO Y VIDRIO, INCLUYE PROTECTOR METALICO	M2	1,50	\$ 562.474,24	\$ 843.711,36	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,50	
4.28	PUERTA Y/O VENTANA METALICA PARA CAFETERIAS CALIBRE 18	M2	16,20	\$ 561.741,67	\$ 9.100.215,00	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 16,20	
4.29	MUEBLES SOBRE Y/O BAJO MESON	ML	7,60	\$ 637.535,61	\$ 4.845.270,61	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7,60	
4.30	PAÑETE SOBRE MURO Y PLACA EN MORTERO 1:4	M2	71,90	\$ 29.603,63	\$ 2.128.457,88	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 71,90	
4.31	PULPLAST SOBRE MURO Y PLACA, INCLUYE PINTURA	M2	64,45	\$ 21.075,76	\$ 1.358.353,65	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,45	
4.32	CIELO RASO EN DRY WALL CON PINTURA	M2	23,56	\$ 82.628,03	\$ 1.946.716,39	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 23,56	
4.33	DIVISION EN ACERO INOXIDABLE PARA HORINAL	UND	1,00	\$ 843.331,06	\$ 843.331,06	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	
4.34	BARRAS PARA BAÑO PMR	UND	1,00	\$ 1.029.156,06	\$ 1.029.156,06	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,00	
5	CANCHA DE FUTBOL				\$ 199.526.402,00						\$ -	\$ 199.526.402,00	
5.1	BORDILLOS PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, (0,12 X0,50) ACI ACERO DE REFUERZO	ML	64,06	\$ 111.593,18	\$ 7.148.659,23	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,06	
5.2	CERRAMIENTO EN MALLA ESLABONADA CON ALTURA DE 5,0MT GALVANIZADA 2"x2" CAL. 12 CON TUBO GALVANIZADO DE 2" E=2,5mm Y MARCO DE FIJACION EN ANGULO DE 1 1/2"x3/16", SEGUN DETALLE. INCLUYE TUBOS ESQUINEROS GALVANIZADOS DE 2 1/2" E=2,5mm	ML	40,00	\$ 1.609.271,97	\$ 64.370.878,79	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 40,00	
5.3	MALLA CONTRA IMPACTO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES,TENSORES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE (2 MANOS) H= 2,50 M	ML	64,08	\$ 1.244.664,39	\$ 79.758.094,36	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 64,08	
5.4	PISO PARA CANCHA Y ENTORNO - E=0.10 m, EN CONCRETO RIGIDO DE 3000 P.S.I., INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA DE 5 MM DE 15 x 15 cm.	M2	640,00	\$ 133.860,61	\$ 85.670.787,88	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 640,00	
5.5	PINTURA DEMARCAÇÃO CANCHA DEPORTIVA, ANCHO 8 cm, CON PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO PESADO, COLORES VARIOS, INDICADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS, INC TRAZADO	ML	245,80	\$ 16.631,06	\$ 4.087.914,70	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 245,80	
5.6	PINTURA DE CANCHA DEPORTIVA CON PINTURA ACRILICA PARA TRAFICO PESADO, COLORES VARIOS, INDICADOS EN LOS PLANOS ARQUITECTONICOS	M2	620,80	\$ 39.253,03	\$ 24.368.281,21	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 620,80	
5.7	PORTERIA POLIUFUNCIONAL EN TUBO GALVANIZADO TIPO PESADO DE 3", SOPORTE DE TABLERO EN TUBO DE 1 1/2" TIPO PESADO TABLERO FIBRA DE VIDRIO DE 1,80' X1,05', CON REFUERZO EN ANGULO 1X 3/16, ARD VARILLA DE 1/2"	UND	2,00	\$ 7.307.739,39	\$ 14.615.478,79	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 2,00	
5.8	PILOTE FUNDIDO EN SITIO H=1.5M D=0.30M EN CONCRETO DE 3000 P.SI, CON REFUERZO	UND	18,00	\$ 331.954,55	\$ 5.975.181,82	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 18,00	
5.9	VIGA DE CONFINAMIENTO (40 X 0,30) PARA PILOTES. EN CONCRETO DE 3,000 PSI INCLUYE EXCAVACION	ML	104,20	\$ 126.395,45	\$ 13.170.406,36	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 104,20	
5.10	CORTE DE PLACA PARA JUNTAS DE DILATACION CON DISCO DIAMANTADO PROF. = 2,5CM. INCLUYE CORDON DE POLIURETANO Y SELADOR DE JUNTAS EPOXICO	ML	373,40	\$ 19.409,09	\$ 7.247.354,55	0,00	0,00	0,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 373,40	
5.11													

<div><div><div><div><div></div><div>Deporte</div></div></div><div></div></div></div>	PROCESO	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA														Versión: 1			
	FORMATO	INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA														CÓDIGO:			
																ATC-FR-003			
																Página	de	...	
6.3	VIGA DE CIMENTACIÓN (0,30 X 0,40) EN CONCRETO DE 3.000 PSI INCLU EXCAVACION	ML	264,20	\$	119.751,52	\$	31.638.350,30	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	264,20	\$	31.638.350,30
6.4	PILOTES D=0,30M PROFUND= 1,5 M PARA CIMENTACION MALLA PERIMETRAL CONTRAIMPACTO INCLUYE EXCAVACION	UND	114,00	\$	331.954,55	\$	37.842.818,18	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	114,00	\$	37.842.818,18
6.5	MALLA CONTRA IMPACTO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES, TENSORES, SOLDADURA, PINTURA MALLA CONTRA IMPACTO SEGUN DISEÑO ESTRUCTURAL, INCLUYE SUMINISTRO E INSTALACION DE ANCLAJES, TENSORES, SOLDADURA, PINTURA ANTICORROSIVA, PINTURA DE ESMALTE (2 MANOS) H= 2,50 M	ML	110,00	\$	1.567.978,03	\$	172.477.583,33	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	110,00	\$	172.477.583,33
6.6	CARCAMO SUMIDERO PARA AGUAS LLUVIAS EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO DE Fc=3.000PSI ,INCLUYE EXCAVACION, ACERO DE REFUERZO Y TAPA, ALTURA PROM. H 0,65 X 0,35 DE ANCHO E=0,05	ML	153,00	\$	1.244.664,39	\$	190.433.652,27	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	153,00	\$	190.433.652,27
6.7	PORTIERA EN TUBO GALVANIZADO TIPO PESADO DE 3" de DIAM. X 2mm, SOPORTE TUBO DE 1 1/2" TIPO PESADO, CON REFUERZO EN ANGULO 1X 3/16, ARO VARILLA DE 1/2"	UND	2,00	\$	5.051.246,97	\$	10.102.493,94	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	2,00	\$	10.102.493,94
6.9	ACERO DE REFUERZO PDR-60 Fy = 420 Mpa. INCLUYE SUMINISTRO, TRANSPORTE, FIGURADO E INSTALACION	KG	4.087,99	\$	9.729,55	\$	39.774.257,28	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	4.087,99	\$	39.774.257,28
6.10	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E 10 CM PARA CANCHA INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADADA DE 5 MM	M2	4.104,00	\$	145.058,33	\$	595.319.400,00	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	4.104,00	\$	595.319.400,00
6.11	JUNTAS DE DILATACION CON DISCO DIAMANTADO PROF. = 2.SCM. INCLUYE CORDON DE POLIURETANO Y SELLADOR DE JUNTAS EPOXICO	ML	2.642,00	\$	14.568,18	\$	38.489.136,36	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	2.642,00	\$	38.489.136,36
6.12	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SHOCKPAD (COLCHON) 20 MM ESPESOR, PARA CANCHA SINTETICA.	M2	4.104,00	\$	87.202,27	\$	357.878.127,27	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	4.104,00	\$	357.878.127,27
6.13	GRAMA SINTETICA DE POLIETILENO FIBRILADO, RETORCIDO, ESTABILIZADO Y RESISTENTE A LOS RAYOS UV DE FIBRA DE THOLON GRASS DE TEN CATE NICLOLON (CERTIFICADO ISO 9001 - ISO 14001) PARA CAMPO RECREATIVO, INSTALAR SEGUN RECOMENDACIONES DEL PROVEEDOR. INCLUYE ARENA DE SILICE, CAUCHO Y DEMARCACIONES.	M2	4.207,50	\$	141.714,39	\$	596.263.312,50	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	4.207,50	\$	596.263.312,50
7	URBANISMO Y MOBILIARIO			\$	946.165.006,45						\$						37.123.840,91	\$	909.041.166,00
7.1	CONSTRUCCION DE PISO ESTAMPADO CONTINUO DE CONCRETO IMPRESO COLOR SEGUN DISEÑO CON APARIENCIA ANTIDESLIZANTE CADA 3 MTS, REALIZADO CON CONCRETO DE 3.000 PSI INCLUYE MALLA ELECTRO SOLDADA, BORDILLOS PERIMETRAL EN CONCRETO DE 3000 PSI, (0,15 X0,50) INC ACERO DE REFUERZO Y EXCAVACION.	M2	805,00	\$	132.034,09	\$	106.287.443,18	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	805,00	\$	106.287.443,18
7.2	PLANTILA EN CONCRETO DE 3000 PSI E 8 CM INCLUYE CONFORMACION DE TERRENO	ML	678,56	\$	130.259,09	\$	88.388.608,73	0,00	285,00	285,00	\$	-	\$	-	\$	-	37.123.840,91	\$	37.123.840,91
7.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE LOSETA EN FORMA HEXAGONAL	M2	825,00	\$	97.794,70	\$	80.680.625,00	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	825,00
7.4	BANCA EN CONCRETO ANTIBANALICA. REFERENCIA MALMO	UND	10,00	\$	3.077.088,18	\$	30.770.681,82	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	10,00
7.6	BANCA EN CONCRETO ANTIBANALICA. REFERENCIA LANDOM	UND	2,00	\$	3.804.806,82	\$	7.609.613,64	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	2,00
7.7	CANCHAS TIPO 403 DE CONCRETO, DE TRES COMPARTAMENTOS	UND	30,00	\$	2.062.664,39	\$	20.626.643,94	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	30,00
7.8	SUMINISTRO Y TRANSPORTE MODULO DE JUEGO DE CUERDA ATI 070 INCLUYE INSTALACION Y TODO PARA SU PERFECTO FUNCIONAMIENTO	UND	1,00	\$	309.824.964,39	\$	309.824.964,39	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	1,00
7.9	SUMINISTRO E INSTALACION DE KIT 6 MAQUINAS BIOSAUDABLE TIPO COLUMPIO UND 1 TIPO BARRAS PARALELAS UND 1, TIPO BANCA ABDOMINAL UND 1, TIPO ELECTICA UND 1, TIPO SURF UND 1, Y 1 CADERA TWISTER	UND	1,00	\$	33.491.917,42	\$	33.491.917,42	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	33.491.917,42
7.10	CONSTRUCCION DE PLACA EN CONCRETO DE 3000 PSI E 10 CM PARA AREA DE JUEGOS BID Y MODULOS DE JUEGO Y CROSSFIT INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADADA DE 5 MM CON ACABADO LISO CON ENDURECEDOR DE PISO	M2	314,00	\$	151.105,30	\$	47.447.065,15	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	314,00
7.11	APLICACION DE TRUFLEX SOBRE PLACA COLORES SEGUN DISEÑO	M2	314,00	\$	72.450,00	\$	22.749.300,00	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	314,00
7.12	SUMINISTRO E INSTALACION DE ESTRUCTURAS CONTENEDORAS PARA LAS RAICES DE LOS ARBOLES. INCLUYE EXCAVACION EN LOS SITIOS DONDE SE PLANTARAN LOS NUEVOS ARBOLES, SE PROCEDERÁ A INSTALAR UN ANILLO	UND	4,00	\$	802.554,55	\$	3.210.218,18	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	4,00
7.13	EMPRIDAZACION CON GRAMA NATURAL	M2	132,00	\$	40.509,85	\$	5.347.300,00	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	132,00
8	CAPITULO ELECTICO			\$	645.740.988,00						\$							\$	645.740.988,00
8.1	TRANSFORMADOR DE DISTRIBUCION MONOFASICO TIPO POSTE 13,2 KV /120-240 V - 25 KVA.	UND	1,00	\$	16.951.171,21	\$	16.951.171,21	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	1,00
8.2	SUMINISTRO, INSTALACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION Y CONTROL DE ILUMINACION. INCLUYE: GABINETE METALICO, TOTALIZADOR, INTERRUPTORES AUTOMATICOS, CONTACTORES, SELECTOR ON-OFF BARRAJES Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. NO INCLUYE OBRA CIVIL.	UND	1,00	\$	5.289.913,64	\$	5.289.913,64	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	5.289.913,64
8.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE METALICO 12 M, INCLUYE CIMENTACION Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. INCLUYE CIMENTACION.	UND	4,00	\$	10.762.464,39	\$	43.049.857,58	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	4,00
8.4	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE METALICO 10 M, INCLUYE CIMENTACION Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. INCLUYE CIMENTACION.	UND	4,00	\$	7.817.340,91	\$	31.269.363,64	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	4,00
8.5	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE POSTE METALICO 5 M, INCLUYE CIMENTACION Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION. INCLUYE CIMENTACION.	UND	61,00	\$	4.109.440,91	\$	250.675.895,45	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	61,00
8.6	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TABLERO BIFASICO PARA BREAKER ENCHUFABLE 6 CIRCUITOS AL/CU PARA LOCALES, INCLUYE BREAKERS Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	2,00	\$	336.281,82	\$	672.563,64	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	2,00
8.7	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE MATERIALES Y MANO DE OBRA PARA PEDESTAL DE TABLERO DE CONTROL DE ILUMINACION.	UND	1,00	\$	479.919,70	\$	479.919,70	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	1,00
8.8	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE MEDIDOR 20 CONFORMADO POR: MEDIDOR, CABLEADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	1,00	\$	534.886,36	\$	534.886,36	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	1,00
8.9	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE BAIJANTE PARA ACOMETIDA EN TUBERIA METALICA GALVANIZADA DE 1 1/2"X6M. INCLUYE ACRILICO DE IDENTIFICACION DE ACOMETIDAS.	UND	1,00	\$	618.901,52	\$	618.901,52	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	1,00
8.10	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA PVC CONDUIT 1X1 1/2". DESDE PUNTO APOYO HASTA GABINETE DE CONTROL DE ILUMINACION.	ML	41,00	\$	35.534,09	\$	1.456.897,73	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	41,00
8.11	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA CU 2BDF+1MBT CU, DESDE BORNES DE TRANSFORMADOR HASTA GABINETE PRINCIPAL. INCLUYE BORNERAS DE CONEXION.	ML	52,00	\$	153.709,85	\$	7.992.912,12	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	52,00
8.12	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 40X40 PARA CONDUCTORES DE SALIDAS DE ILUMINACION.	UND	73,00	\$	483.609,85	\$	35.303.518,94	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	73,00
8.13	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACION DE CAJA DE INSPECCION 60X60 PARA ACOMETIDA DE BAJA TENSION.	UND	6,00	\$	582.087,88	\$	3.492.527,27	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	6,00
8.14	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION PARA CANCHAS. INCLUYE CAJA RAWELT 4"x4", CABLEADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	32,00	\$	665.015,91	\$	21.280.509,09	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	32,00
8.15	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION PARA LUMINARIA LED PARA ILUMINACION GENERAL DEL PARQUE. INCLUYE CABLEADO Y DEMAS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACION.	UND	61,00	\$	534.771,21	\$	32.621.043,94	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	61,00
8.16	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION PARA LOCALES EN CU 1B12F+1B12T+1B12T AWG EN TUBERIA PVC 3/4". INCLUYE BORNAS TERMINALES.	UND	20,00	\$	50.671,21	\$	1.013.424,24	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	20,00
8.17	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA DE INTERRUPTOR SENCILLO PARA LOCALES EN CU 1B12F+1B12T+1B12T AWG EN TUBERIA PVC 3/4". INCLUYE APARATO Y BORNAS TERMINALES.	UND	6,00	\$	59.497,73	\$	356.986,36	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	6,00
8.18	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA DE TOMACORRIENTES PARA LOCALES EN CU 1B12F+1B12T+1B12T AWG EN TUBERIA PVC 3/4". INCLUYE BORNAS TERMINALES.	UND	6,00	\$	100.253,79	\$	601.522,73	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	6,00
8.19	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE SALIDA DE ILUMINACION PARA GRADAS EN CU 1B12F+1B12T+1B12T AWG EN TUBERIA EMT 3/4". INCLUYE BORNAS TERMINALES.	UND	18,00	\$	111.694,70	\$	2.010.504,55	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	18,00
8.20	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA CU 2BDF+1MBT AWG EN TUBERIA PVC 1" PARA ILUMINACION CANCHA. INCLUYE BORNAS TERMINALES.	UND	249,00	\$	73.677,27	\$	18.345.640,91	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	249,00
8.21	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA CU 2BDF+1MBT AWG EN TUBERIA PVC 1" PARA ILUMINACION CANCHA. INCLUYE BORNAS TERMINALES.	UND	288,00	\$	57.892,42	\$	16.673.018,18	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	288,00
8.22	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA CU 2BDF+1MBT AWG EN TUBERIA PVC 3/4" PARA ILUMINACION DEL PARQUE. INCLUYE BORNAS TERMINALES.	UND	412,00	\$	73.261,36	\$	30.183.681,82	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	412,00
8.23	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE ACOMETIDA CU 2BDF+1MBT AWG EN TUBERIA PVC 3/4" PARA TABLEROS DE LOCALES. INCLUYE BORNAS TERMINALES.	UND	215,00	\$	58.517,42	\$	12.581.246,21	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	215,00
8.24	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMACORRIENTE GFCL.	UND	4,00	\$	83.661,36	\$	334.645,45	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	4,00
8.25	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TOMACORRIENTE NORMAL DOBLE.	UND	2,00	\$	36.400,76	\$	72.801,52	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	2,00
8.26	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR LED JETA PRO 500 W O SIMILAR.	UND	24,00	\$	995.484,85	\$	23.891.636,36	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	24,00
8.27	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE PROYECTOR LED JETA PRO 300 W O SIMILAR.	UND	12,00	\$	636.531,82	\$	7.638.381,82	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	12,00
8.28	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED STREET LIGHT 40 W O SIMILAR.	UND	61,00	\$	428.718,18	\$	26.151.809,09	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-		\$	61,00
8.29	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA LED TORTUGA 12 W O SIMILAR.	UND	6,00	\$	72.686,36	\$	436.118,18	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-					



8.1	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED HERMÉTICA 2X18 W O SIMILAR.	UND	12,00	\$	134.468,18	\$	1.613.618,18	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	12,00	\$	1.613.618,18
8.2	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE LUMINARIA LED EMERGENCIA 2X1,6 W O SIMILAR.	UND	2,00	\$	138.661,36	\$	277.322,73	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	2,00	\$	277.322,73
8.3	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PUNTAS CAPTORAS DE 1M. INCLUIR BASE PARA PUNTA CAPTORA.	UND	8,00	\$	160.841,67	\$	1.286.733,33	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	8,00	\$	1.286.733,33
8.34	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BAJANTES. INCLUIR TUBERÍA IMC DE 1/2", CAJA METALICA DOBLE FONDO, CONECTRO BIMETALICO Y CABLE DESNUDO 3/0 PARA CONEXIÓN AL ANILLO INFERIOR.	UND	8,00	\$	268.499,24	\$	2.147.993,94	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	8,00	\$	2.147.993,94
8.35	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CABLE DESNUDO #1/0.	ML	268,00	\$	60.987,12	\$	16.344.548,48	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	268,00	\$	16.344.548,48
8.36	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VARILLA C/U 5/8 X 2,4M. INCLUIR HIDROSOLTA, SOLDADURA EXOTERMICA, GRAPA DE CONEXIÓN.	UND	10,00	\$	409.335,61	\$	4.093.356,06	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	10,00	\$	4.093.356,06
8.37	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE CAJA PREFABRICADA 30X30CM.	UND	8,00	\$	107.209,09	\$	857.672,73	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	8,00	\$	857.672,73
8.38	SUMINISTRO TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE VARILLA C/U 2,4M 5/8 PARA ATERRIZAR POSTES METÁLICOS, CABLE C/U 8 DESNUDO, SOLDADURA EXOTERMICA 115G, CEMENTO CONDUCTIVO Y DEMÁS ACCESORIOS PARA SU CORRECTA INSTALACIÓN.	UND	61,00	\$	421.493,18	\$	25.711.084,09	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	61,00	\$	25.711.084,09
9	INSTALACIONES HIDROANTENARIAS.			\$		\$	77.012.949,90				\$							\$	77.012.949,90
9.1	DESALUCIÓN DE FONDO EXISTENTE. H-VAR.	UND	1,00	\$	423.108,33	\$	423.108,33	0,00	0,00	1,00	\$	-	\$	-	\$	-	1,00	\$	423.108,33
9.2	EXCAVACIÓN MECÁNICA EN MATERIAL COMUN/ COLECTOR H (0-5M).	M3	98,00	\$	48.144,70	\$	4.718.180,30	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	98,00	\$	4.718.180,30
9.3	SOLADO DE FONDO PARA POZOS 2500 PSI. E:0,05	M3	3,00	\$	739.229,55	\$	2.217.688,64	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	3,00	\$	2.217.688,64
9.4	BASE EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA BARRAS 5/8" @ 15 CM DE 2,0M E 0,30M. INCLUIR CAÑUELA EN CONCRETO DE 2000 PSI Y EMBOQUILLADO; PARA POZOS DE INSPECCIÓN DE 1,2-1,2M INTERNO Y 1,2-1,8M EXTERNO.	UND	4,00	\$	545.575,76	\$	2.182.303,03	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	4,00	\$	2.182.303,03
9.5	CUERPO EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA BARRA 5/8" @ 15CM PARA POZO DE INSPECCIÓN 1,5 < H > 3,0M E=0,25 M Ø=1,2M INTERNO Y Ø=1,8M EXTERNO. INCLUIR Peldaño BARRA 3/4 CADA 30 CM. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA CONECTADA DE 100 A 200 MM.	ML	2,00	\$	2.712.276,52	\$	5.424.553,03	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	2,00	\$	5.424.553,03
9.6	CUERPO EN CONCRETO REFORZADO DE 28 MPA BARRA 5/8" @ 15CM PARA POZO DE INSPECCIÓN H > 3,0M E=0,25M Ø=1,2M INTERNO Y Ø=1,8M EXTERNO. INCLUIR Peldaño BARRA 3/4 CADA 30 CM. DIÁMETRO DE LA TUBERÍA CONECTADA DE 100 A 200 MM.	ML	13,00	\$	3.085.349,24	\$	40.109.540,15	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	13,00	\$	40.109.540,15
9.7	CORONA REFORZADA EN CONCRETO DE 28MPA BARRA 5/8" @ 10CM DE Ø=1,6M E=0,2M PARA POZO DE INSPECCIÓN. INCLUIR TAPA Y ARO.	UND	4,00	\$	893.613,64	\$	3.574.454,55	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	4,00	\$	3.574.454,55
9.8	IMPERMEABILIZACIÓN DE PAREDES INTERIORES DE POZOS E=2 CM	M2	14,00	\$	22.010,61	\$	308.148,48	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	14,00	\$	308.148,48
9.9	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI (0,8MX0,8M INT. H VARIABLE) E=0,1M, INCLUIR TAPA REFORZADA Y CAÑUELA.	UND	2,00	\$	825.465,91	\$	1.650.931,82	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	2,00	\$	1.650.931,82
9.10	CONSTRUCCIÓN DE CAJA DE INSPECCIÓN EN CONCRETO DE 3000 PSI (1,0MX1,0M INT. H VARIABLE) E=0,1M, INCLUIR TAPA REFORZADA Y CAÑUELA.	UND	6,00	\$	1.021.877,27	\$	6.131.263,64	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	6,00	\$	6.131.263,64
9.11	INSTALACIÓN DE TUBERÍA PVC ALICANTARILLADO TIPO NOVAFORT 6", CUMPLA A LA RESOLUCIÓN 1127	ML	95,93	\$	107.075,76	\$	10.271.777,42	0,00	0,00	0,00	\$	-	\$	-	\$	-	95,93	\$	10.271.777,42
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$	5.614.125.703,00											327.487.847,00	5.286.637.856,00
	VALOR TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$	1.796.520.224,96											104.796.111,04	1.691.734.113,92
	Administración	27%				\$	1.515.813.339,81											88.421.718,69	1.427.230.221,12
	Imprevistos	1%				\$	96.141.257,03											3.274.878,47	52.866.378,56
	Utilidad	4%				\$	224.565.028,12											13.099.513,88	211.465.514,24
	VALOR TOTAL COSTOS DIRECTOS + INDIRECTOS					\$	7.410.645.928,00											432.283.958,04	6.978.361.969,92
	CERTIFICACIÓN RETIE					\$	8.500.000,00												
	CERTIFICACIÓN RETILAP					\$	14.800.000,00												
	PMA					\$	75.373.123,00												
	VALOR TOTAL DEL CONTRATO DE OBRA					\$	7.509.319.051,00												
	VALOR INTERVENTORIA	7%				\$	524.518.976,00												
	COSTO TOTAL DEL PROYECTO					\$	8.033.838.027,00												
2. RELACIÓN DE PAGOS - CONTRATO DE OBRA N° LP-001 DE 2025																			



	PROCESO	APOYO A LA INFRAESTRUCTURA TÉCNICA Y CIENTÍFICA		Versión: 1
	FORMATO	INFORME DE AVANCE MENSUAL CONVENIOS DE INFRAESTRUCTURA		CÓDIGO: ATC-FR-003
				Página ____ de ____
ANEXO N° 2: REGISTRO FOTOGRÁFICO				
CONVENIO NO. COID-1063-2024 SUSCRITO ENTRE COLDEPORTES Y EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI				
REGISTRO FOTOGRÁFICO - PROYECTO CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR				
Proyecto	CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIO DEPORTIVO EN EL BARRIO CAMILO TORRES EN EL MUNICIPIO DE AGUSTIN CODAZZI, CESAR		Localización	Municipio de Agustín Codazzi, Cabecera Municipal, Barrio Camilo Torres
Contratista:	CONSORCIO PARQUE CAMILO TORRES		Director de obra:	KENY VEGA
Interventor:	CONSORCIO INTER-ESCENARIO CDZ 25		Director Interventoría:	JESUS ARMANDO CERVANTES CEBALLOS
Fecha del registro fotográfico:	7/08/2025			
FOTOGRAFÍA N° 1		FOTOGRAFÍA N° 2		FOTOGRAFÍA N° 3
INSTALACION DE VALLE INFORMATIVA		SOCIALIZACION DEL PROYECTO		SOCIALIZACION DEL PROYECTO
FOTOGRAFÍA N° 4		FOTOGRAFÍA N° 5		FOTOGRAFÍA N° 6
INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL		INSTALACION DE CERRAMIENTO PERIMETRAL		LOCALIZACION Y REPLANTEO
FOTOGRAFÍA N° 7		FOTOGRAFÍA N° 8		FOTOGRAFÍA N° 9
LOCALIZACION Y REPLANTEO		CORTE - EXCAVACIÓN MECANICA SIN CLASIFICAR-INCLUYE RETIRO		CORTE - EXCAVACIÓN MECANICA SIN CLASIFICAR-INCLUYE RETIRO
FOTOGRAFÍA N° 10		FOTOGRAFÍA N° 11		FOTOGRAFÍA N° 12
SUB-BASEGRANULAR, INCL. SUMINISTROYCOMPACTACIONNORMA INVIAS		SUB-BASEGRANULAR, INCL. SUMINISTROYCOMPACTACIONNORMA INVIAS		SUB-BASEGRANULAR, INCL. SUMINISTROYCOMPACTACIONNORMA INVIAS
FOTOGRAFÍA N° 13		FOTOGRAFÍA N° 14		FOTOGRAFÍA N° 15
BORDILLOPERIMETRALENCONCRETOE3000PSI, (0,15X0,50) INC ACERO DE REFUERZO Y EXCAVACION		BORDILLOPERIMETRALENCONCRETOE3000PSI, (0,15X0,50) INC ACERO DE REFUERZO Y EXCAVACION		BORDILLOPERIMETRALENCONCRETOE3000PSI, (0,15X0,50) INC ACERO DE REFUERZO Y EXCAVACION
