

INFORME DE OBRA
CONTRATO 274-2025

OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE
LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA.

INFORME PARCIAL N1
22 DE SEPTIEMBRE 2025

CONTRATISTA: CAB CONSTRUCTORA SAS
NIT:900789383-7

Construyendo Futuro Juntos, COLOMBIA

INFORME DE OBRA

CONTRATO 274-2025

TABLA DE CONTENIDO

1. INTRODUCCION	3
2. DESCRIPCION	4
3. UBICACIÓN	5
4. PERSONAL	7
5. POLIZAS	8
6. PRESUPUESTO	9
7. EJECUCION	11
8. REGISTRO FOTOGRAFICO	13

CAB

Construyendo Futuro Juntos, COLOMBIA

INFORME DE OBRA
CONTRATO 274-2025

1.INTRODUCCIÓN

La Alcaldía del Municipio de Choconta, Cundinamarca, dispone de recursos, con el propósito de dar cumplimiento a la ejecución del contrato de obra OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA. CONTRATO DE OBRA PUBLICA No. 274-2025

CAB

Construyendo Futuro Juntos, COLOMBIA

INFORME DE OBRA
CONTRATO 274-2025

2.DESCRIPCION

El presente documento corresponde al informe parcial de obra No. 1, en donde se hace un recuento de las actividades realizadas durante el periodo de ejecución comprendido del 11 de septiembre al 22 de septiembre en el marco del contrato de obra publica No. 274-2025

En fecha 11 de septiembre de 2025 se da inicio al contrato 274-2025 con objeto “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA.”

Con el presente informe se describe la ejecución del contrato “OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA.” contrato de obra publica No. 274-2025

DESCRIPCION DEL CONTRATO:

CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE CHOCONTÁ, CUNDINAMARCA
CONTRATISTA:	CAB CONSTRUCTORA S.A.S Nit 900789383-7 Representada Legalmente por ANGELYS INGRID BRICEÑO MARTINEZ con C.C No. 35.420.602
OBJETO:	OBRAS DE MANTENIMIENTO Y ADECUACION DEL PALACIO MUNICIPAL Y CASA DE LA CULTURA DEL MUNICIPIO DE CHOCONTA CUNDINAMARCA.
VALOR:	CIENTO CUARENTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CINCO PESOS CON CINCUENTA Y CINCO CENTAVOS (\$ 147.855.395,65) M/CTE
SUPERVISOR:	SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS
PLAZO:	DOS (02) MESES

INFORME DE OBRA CONTRATO 274-2025

3. UBICACIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto se encuentra localizado en Cagua, Cundinamarca.

- El tramo donde se ejecutará la obra se encuentra ubicado en el Palacio municipal con coordenadas $56^{\circ}88'55.23''\text{m N} - 64^{\circ}56'63.20\text{mE}$. carrera 5 No 5 – 19 parque principal Chocontá Cundinamarca.



- Casa de la cultura con coordenadas $56^{\circ}86'92.72''\text{Mn} - 64^{\circ}57'75.39''\text{m E}$



5. POLIZAS:

6

INFORME DE OBRA
CONTRATO 274-2025

7.PRESUPUESTO INICIAL

ITEM		DESCRIPCION	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	V. TOTAL CON AIU
1.	FACHADA PALACIO MUNICIPAL					\$ 93.474.528	
1.1.	APU.01	PINTURA PARA FACHADA 2 MANOS PRIMERA CALIDAD RESISTENTE A LA INTEMPERIE, HIDROREPELENTE, ANTIHONGOS, LAVABLE, INCLUYE RESANE CON ESTUCO PARA EXTERIOR	M2	396,58	\$ 18.025	\$ 7.148.267	\$ 9.507.195,45
1.2.	APU.02	PINTURA PARA FACHADA 2 MANOS PRIMERA CALIDAD RESISTENTE A LA INTEMPERIE, HIDROREPELENTE, ANTIHONGOS, LAVABLE, INCLUYE RESANE CON ESTUCO PARA EXTERIOR (LINEAL)	ML	285,12	\$ 11.166	\$ 3.183.822	\$ 4.234.483,01
1.3.	18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Incluye resane y estuco)	M2	1372	\$ 11.589	\$ 15.900.108	\$ 21.147.143,64
1.4	18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	145,6	\$ 7.472	\$ 1.087.923	\$ 1.446.937,86
1.3.	18,11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	209,23	\$ 23.883	\$ 4.997.040	\$ 6.646.063,32
14.	18,1	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	259	\$ 6.452	\$ 1.671.068	\$ 2.222.520,44
1.5.	18,9	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	22,77	\$ 22.708	\$ 517.061	\$ 687.691,34
1.6.	18,8	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	128	\$ 4.390	\$ 561.920	\$ 747.353,60
1.7	6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3, E=1.5CM	M2	52,5	\$ 33.136	\$ 1.739.640	\$ 2.313.721,20
1.8	6,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3, E=1.5CM (LINEAL)	ML	20	\$ 20.727	\$ 414.540	\$ 551.338,20
1,9	15,9	MALLA CON VENA	M2	52,5	\$ 22.675	\$ 1.190.438	\$ 1.583.281,88

INFORME DE OBRA
CONTRATO 274-2025

1.10	1,13	DEMOLICION PAÑETE MURO	M2	61,5	\$ 12.905	\$ 793.658	\$ 1.055.564,48
1.11	18,14	ESTUCO	M2	52,5	\$ 12.008	\$ 630.420	\$ 838.458,60
1.12	1,14	DEMOLICION CIELO RASO FALSO	M2	46	\$ 15.566	\$ 716.036	\$ 952.327,88
1.13	APU.03	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 6MM (Incluye pintura vinilo tipo coraza para exterior 3 manos, resane de juntas, estructura en omegas y viguetas) altura de trabajo mayor a 10mt	M2	46	\$ 113.086	\$ 5.201.976	\$ 6.918.627,79
1.14	APU.04	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 6MM (Incluye pintura vinilo tipo coraza para exterior 3 manos, resane de juntas, estructura en omegas y viguetas) altura de trabajo mayor a 10mt (Lineal)	ML	46	\$ 67.852	\$ 3.121.186	\$ 4.151.176,79
1.15	APU.05	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE BARRO LA CUAL COMPRENDE LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL VEGETAL Y RESIDUOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTA, LAVADO DE TEJA, CAMBIO DE TEJAS EN MAL ESTADO, ELIMINAR HONGOS Y FUMIGADA DE LA CUBIERTA	M2	724,78	\$ 37.858	\$ 27.438.820	\$ 36.493.631,20
1.16		PROTECCION CON MALLA DE GALLINERO EN CUBIERTA COSTADO LATERAL Y BALCONES	M2	50	\$ 13.125	\$ 656.274	\$ 872.843,76
1.17	APU	LUMINARIA LED 60X60 DE EMPOTRAR	UND	2	\$ 210.000	\$ 420.000	\$ 558.600,00
1.18	1.12	DEMOLICION ENCHAPE MURO	M2	9	\$ 12.107	\$ 108.963	\$ 144.920,79
1.19	1.10	DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02M	M2	3	\$ 11.256	\$ 33.768	\$ 44.911,44
1.21	1.26	DEMOLICION PLACA PISO 0.10M	M2	3	\$ 25.572	\$ 76.716	\$ 102.032,28

INFORME DE OBRA
CONTRATO 274-2025

1.22	1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	2	\$ 35.121	\$ 70.242	\$ 93.421,86
1.23	1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM (INCLUYE CARGUE)	M3	1	\$ 12.143	\$ 12.143	\$ 16.150,19
1.24	6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5CM	M2	9	\$ 28.041	\$ 252.369	\$ 335.650,77
1.25	6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5CM (LINEAL)	ML	7	\$ 17.656	\$ 123.592	\$ 164.377,36
1.26	14.1	BALDOSA CERAMICA PISO PARED 30x60 CALIDAD PRIMERA	M2	12	\$ 84.918	\$ 1.019.016	\$ 1.355.291,28
1.27	14.2	BALDOSA CERAMICA PISO PARED 30x60 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	7	\$ 52.776	\$ 369.432	\$ 491.344,56
1.28	18.16	ESTUCO Y VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS	M2	13	\$ 25.479	\$ 331.227	\$ 440.531,91
1.29	18.17	ESTUCO Y VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS (LINEAL)	ML	4	\$ 16.163	\$ 64.652	\$ 85.987,16
1.30	17.1	SUMINISTRO E ISNTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)	UN	1	\$ 423.837	\$ 423.837	\$ 563.703,21
1.31	17.4	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERIA)	UN	1	\$ 210.731	\$ 210.731	\$ 280.272,23
1.32	17.7	SUMINISTRO E INSTALCION E INSTALACION ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERIA)	UN	1	\$ 554.521	\$ 554.521	\$ 737.512,93
1.33	12.16	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	1	\$ 104.338	\$ 104.338	\$ 138.769,54
1.34	11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	1	\$ 109.109	\$ 109.109	\$ 145.114,97
1.35		LUMANARIA LED 60X60 DE COLGAR	UND	2	\$ 210.000	\$ 420.000	\$ 558.600,00

INFORME DE OBRA
CONTRATO 274-2025

1.36		RETIRO DE PUERTA EXISTENTE E INSTALACION PUERTA METALICA ARQUITECTONICA SIMILAR A LA EXISTENTES DE 3.40X1.20M	UND	1	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000	\$ 3.724.000,00
1.41	15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	44	\$ 77.139	\$ 3.394.116	\$ 4.514.174,28
1.42	5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12M (Incluye vinilo 3 manos)	M2	18,96	\$ 138.184,00	\$ 2.619.969	\$ 3.484.558,29
1.43	5.10.	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12M (incluye vinilo 3 manos) (LINEAL)	ML	11,6	83530	\$ 968.948	\$ 1.288.700,84
1.44	9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0M	UND	2	\$ 633.614	\$ 1.267.228	\$ 1.685.413,24
1.45	9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA X0.20m	UND	2	\$ 374.708	\$ 749.416	\$ 996.723,28
2	CASA DE LA CULTURA					\$ 17.694.942	
2.1	1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARO) incluye retiro material existente que compone la cubierta	M2	30	\$ 18.891	\$ 566.730	\$ 753.750,90
2.2	7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO incluye pintura de laestructura de madera.	M2	30	\$ 68.197	\$ 2.045.910	\$ 2.721.060,30
2.3	7.22	TEJA FIBROCEMENTO N° 6	M2	30	\$ 53.652	\$ 1.609.560	\$ 2.140.714,80
2.4		TEJA DE BARRO	M2	30	\$ 90.160	\$ 2.704.800	\$ 3.597.384,00

INFORME DE OBRA
CONTRATO 274-2025

2.5		CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22;DS=90	ML	30	\$ 80.375	\$ 2.411.250	\$ 3.206.962,50
2.6	16.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0.2.0M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	2,4	\$ 74.321	\$ 178.370	\$ 237.232,63
2.7	2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI	M3	1,2	\$ 812.044	\$ 974.453	\$ 1.296.022,22
2.8	4.3	COLUMNAS 3500PSI	M3	0,864	\$ 1.133.422	\$ 979.277	\$ 1.302.437,89
2.9	4.26	VIGA AEREA 3500PSI	M3	0,6	\$ 1.212.042	\$ 727.225	\$ 967.209,52
2.10	4.21	ACERO FIGURADO 60000PSI	KG	211	\$ 7.692	\$ 1.623.012	\$ 2.158.605,96
2.11	APU	INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS (Incluye tomacorriente, caja plastica, cable N°12 X3, canaleta plastica 1", chazo, tornillos, cinta aislante)	UND	35	\$ 78.363	\$ 2.742.703	\$ 3.647.794,86
2.12	APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPNER INCLUYE CABLE N° 12 X 2,CINTA, CANALETA, TORNILLOS, CHAZOS PLASTICOS	UND	14	\$ 80.832	\$ 1.131.652	\$ 1.505.097,24
							\$ 147.855.395,65

COSTO DIRECTO		\$ 111.169.470
ADMINISTRACION	25%	\$ 27.792.368
IMPREVISTOS	3%	\$ 3.335.084
UTILIDAD	5%	\$ 5.558.474
TOTAL		\$ 147.855.395,65

INFORME DE OBRA
CONTRATO 274-2025

8.. EJECUCION AL 40%

CANTIDADES CONTRATADAS						ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES		PRESENTE ACTA	
ITEM	DESCRIPCION	UND	CANTIDAD	V. UNITARIO	V. TOTAL	(+) MAYORES	(-) MENORES	CANTIDAD	VALOR TOTAL
FACHADA PALACIO MUNICIPAL					\$ 93.474.528				
APU.01	PINTURA PARA FACHADA 2 MANOS PRIMERA CALIDAD RESISTENTE A LA INTEMPERIE, HIDROREPELENTE, ANTIHONGOS, LAVABLE, INCLUYE RESANE CON ESTUCO PARA EXTERIOR	M2	396,58	\$ 18.025	\$ 7.148.267		-	239,34	\$ 4.314.050,85
APU.02	PINTURA PARA FACHADA 2 MANOS PRIMERA CALIDAD RESISTENTE A LA INTEMPERIE, HIDROREPELENTE, ANTIHONGOS, LAVABLE, INCLUYE RESANE CON ESTUCO PARA EXTERIOR (LINEAL)	ML	285,12	\$ 11.166	\$ 3.183.822		-	154,1	\$ 1.720.751,49
18.23	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Incluye resane y estuco)	M2	1372	\$ 11.589	\$ 15.900.108		-	414,19	\$ 4.800.047,91
18.24	VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)	ML	145,6	\$ 7.472	\$ 1.087.923		-	57,99	\$ 433.301,28
18,11	ESMALTE SOBRE MADERA LLENA	M2	209,23	\$ 23.883	\$ 4.997.040		-	65,388	\$ 1.561.664,26
18,1	ESMALTE SOBRE MADERA LINEAL	ML	259	\$ 6.452	\$ 1.671.068				\$ -
18,9	ESMALTE SOBRE LAMINA LLENA	M2	22,77	\$ 22.708	\$ 517.061				\$ -
18,8	ESMALTE SOBRE LAMINA LINEAL	ML	128	\$ 4.390	\$ 561.920				\$ -
6,15	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3, E=1.5CM	M2	52,5	\$ 33.136	\$ 1.739.640				\$ -
6,16	PAÑETE IMPERMEABILIZADO MURO 1:3, E=1.5CM (LINEAL)	ML	20	\$ 20.727	\$ 414.540				\$ -
15,9	MALLA CON VENA	M2	52,5	\$ 22.675	\$ 1.190.438				\$ -
1,13	DEMOLICION PAÑETE MURO	M2	61,5	\$ 12.905	\$ 793.658				\$ -

INFORME DE OBRA
CONTRATO 274-2025

18,14	ESTUCO	M2	52,5	\$ 12.008	\$ 630.420		-		\$ -
1,14	DEMOLICION CIELO RASO FALSO	M2	46	\$ 15.566	\$ 716.036				\$ -
APU.03	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 6MM (Incluye pintura vinilo tipo coraza para exterior 3 manos, resane de juntas, estructura en omegas y viguetas) altura de trabajo mayor a 10mt	M2	46	\$ 113.086	\$ 5.201.976				\$ -
APU.04	CIELO RASO EN LAMINA DE FIBROCEMENTO 6MM (Incluye pintura vinilo tipo coraza para exterior 3 manos, resane de juntas, estructura en omegas y viguetas) altura de trabajo mayor a 10mt (Lineal)	ML	46	\$ 67.852	\$ 3.121.186				\$ -
APU.05	MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE BARRO LA CUAL COMPRENDE LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL VEGETAL Y RESIDUOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTA, LAVADO DE TEJA, CAMBIO DE TEJAS EN MAL ESTADO, ELIMINAR HONGOS Y FUMIGADA DE LA CUBIERTA	M2	724,78	\$ 37.858	\$ 27.438.820	+		835,7	\$ 31.637.972,39
	PROTECCION CON MALLA DE GALLINERO EN CUBIERTA COSTADO LATERAL Y BALCONES	M2	50	\$ 13.125	\$ 656.274				\$ -
APU	LUMINARIA LED 60X60 DE EMPOTRAR	UND	2	\$ 210.000	\$ 420.000				\$ -
1.12	DEMOLICION ENCHAPE MURO	M2	9	\$ 12.107	\$ 108.963				\$ -
1.10	DEMOLICION BALDOSA DE PISO H=0.02M	M2	3	\$ 11.256	\$ 33.768				\$ -
1.26	DEMOLICION PLACA PISO 0.10M	M2	3	\$ 25.572	\$ 76.716				\$ -
1.32	DESMONTE APARATOS SANITARIOS	UN	2	\$ 35.121	\$ 70.242				\$ -
1.45	RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM (INCLUYE CARGUE)	M3	1	\$ 12.143	\$ 12.143				\$ -
6.17	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5CM	M2	9	\$ 28.041	\$ 252.369				\$ -
6.18	PAÑETE LISO MUROS 1:4, E=1.5CM (LINEAL)	ML	7	\$ 17.656	\$ 123.592				\$ -
14.1	BALDOSA CERAMICA PISO PARED 30x60 CALIDAD PRIMERA	M2	12	\$ 84.918	\$ 1.019.016				\$ -
14.2	BALDOSA CERAMICA PISO PARED 30x60 CALIDAD PRIMERA (LINEAL)	ML	7	\$ 52.776	\$ 369.432				\$ -
18.16	ESTUCO Y VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS	M2	13	\$ 25.479	\$ 331.227				\$ -

INFORME DE OBRA
CONTRATO 274-2025

18.17	ESTUCO Y VINILO SOBRE PAÑETE 3 MANOS (LINEAL)	ML	4	\$ 16.163	\$ 64.652				\$ -
17.1	SUMINISTRO E ISNTALACION SANITARIO TANQUE (INCLUYE GRIFERIA)	UN	1	\$ 423.837	\$ 423.837				\$ -
17.4	SUMINISTRO E INSTALACION LAVAMANOS COLGAR (INCLUYE GRIFERIA)	UN	1	\$ 210.731	\$ 210.731				\$ -
17.7	SUMINISTRO E INSTALCION E INSTALACION ORINAL DE LLAVE (INCLUYE GRIFERIA)	UN	1	\$ 554.521	\$ 554.521				\$ -
12.16	PUNTO HIDRAULICO PVC-P/PARAL 1/2"	UN	1	\$ 104.338	\$ 104.338				\$ -
11.19	SALIDA SANITARIA PVC-S/PARAL 2"	UND	1	\$ 109.109	\$ 109.109				\$ -
	LUMANARIA LED 60X60 DE COLGAR	UND	2	\$ 210.000	\$ 420.000				\$ -
	RETIRO DE PUERTA EXISTENTE E INSTALACION PUERTA METALICA ARQUITECTONICA SIMILAR A LA EXISTENTES DE 3.40X1.20M	UND	1	\$ 2.800.000	\$ 2.800.000				\$ -
15.5	CIELO RASO PLANO DRYWALL (INCLUYE PINTURA)	M2	44	\$ 77.139	\$ 3.394.116				\$ -
5.9	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12M (Incluye vinilo 3 manos)	M2	18,96	\$ 138.184,00	\$ 2.619.969				\$ -
5.10.	MURO DRYWALL DOBLE CARA 0.12M (incluye vinilo 3 manos) (LINEAL)	ML	11,6	83530	\$ 968.948				\$ -
9.14	HOJA PUERTA ENTABLERADA MADECOR 0.76-1.0M	UND	2	\$ 633.614	\$ 1.267.228				\$ -
9.6	MARCO PUERTA Y ENCHAPE, TABLA CHAPA X0.20m	UND	2	\$ 374.708	\$ 749.416				\$ -
CASA DE LA CULTURA					\$ 17.694.942				\$ -
1.33	DESMONTE DE CUBIERTAS (TEJA DE BARO) incluye retiro material existente que compone la cubierta	M2	30	\$ 18.891	\$ 566.730				\$ -
7.30	ESTRUCTURA DE MADERA PARA TEJA DE BARRO incluye pintura de laestructura de madera.	M2	30	\$ 68.197	\$ 2.045.910				\$ -
7.22	TEJA FIBROCEMENTO N° 6	M2	30	\$ 53.652	\$ 1.609.560				\$ -

INFORME DE OBRA
CONTRATO 274-2025

	TEJA DE BARRO	M2	30	\$ 90.160	\$ 2.704.800				\$ -
	CANAL EN LAMINA GALVANIZADA CAL. 22;DS=90	ML	30	\$ 80.375	\$ 2.411.250				\$ -
16.4	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H=0.0.2.0M (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5KM)	M3	2,4	\$ 74.321	\$ 178.370				\$ -
2.8	ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI	M3	1,2	\$ 812.044	\$ 974.453				\$ -
4.3	COLUMNAS 3500PSI	M3	0,864	\$ 1.133.422	\$ 979.277				\$ -
4.26	VIGA AEREA 3500PSI	M3	0,6	\$ 1.212.042	\$ 727.225				\$ -
4.21	ACERO FIGURADO 60000PSI	KG	211	\$ 7.692	\$ 1.623.012				\$ -
APU	INSTALACION DE PUNTOS ELECTRICOS (Incluye tomacorriente, caja plastica, cable N°12 X3, canaleta plastica 1", chazo, tornillos, cinta aislante)	UND	35	\$ 78.363	\$ 2.742.703				\$ -
APU	SUMINISTRO E INSTALACION DE PANEL LED REDONDO DE SOBREPNER INCLUYE CABLE N° 12 X 2,CINTA, CANALETA, TORNILLOS, CHAZOS PLASTICOS	UND	14	\$ 80.832	\$ 1.131.652				\$ -
COSTO DIRECTO					\$ 111.169.470				\$ 44.467.788,17
ADMINISTRACION				25%	\$ 27.792.368				\$ 11.116.947,05
IMPREVISTOS				3%	\$ 3.335.084				\$ 1.334.033,64
UTILIDAD				5%	\$ 5.558.474				\$ 2.223.389,41
TOTAL					\$ 147.855.395,65				\$ 59.142.158,27

9. REGISTRO FOTOGRAFICO


1. ITEM: APU.02-PINTURA PARA FACHADA 2 MANOS PRIMERA CALIDAD RESISTENTE A LA INTEMPERIE, HIDROREPELENTE, ANTIHONGOS, LAVABLE, INCLUYE RESANE CON ESTUCO PARA EXTERIOR M2



2. ITEM: APU.02-PINTURA PARA FACHADA 2 MANOS PRIMERA CALIDAD RESISTENTE A LA INTEMPERIE, HIDROREPELENTE, ANTIHONGOS, LAVABLE, INCLUYE RESANE CON ESTUCO PARA EXTERIOR ML



3. ITEM: 18,23-VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (Incluye resane y estuco)

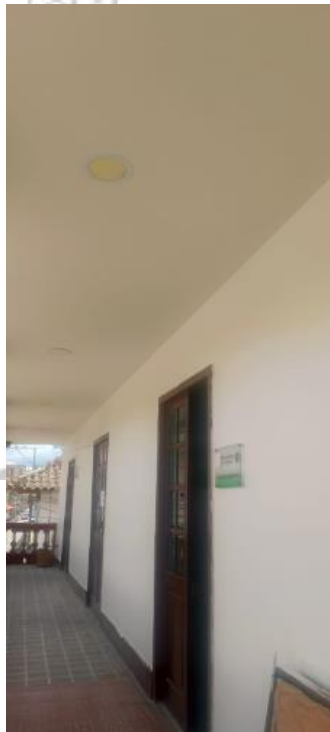

4. ITEM 18,24 - VINILO SOBRE PAÑETE 2 MANOS (LINEAL)




5. ITEM: 18,11 - ESMALTE SOBRE MADERA LLENA



6. ITEM: APU.02 - MANTENIMIENTO DE CUBIERTA DE BARRO LA CUAL COMPRENDE LIMPIEZA, RETIRO DE MATERIAL VEGETAL Y RESIDUOS QUE SE ENCUENTREN EN ESTA, LAVADO DE TEJA, CAMBIO DE TEJAS EN MAL ESTADO, ELIMINAR HONGOS Y FUMIGADA DE LA CUBIERTA



Construyendo Futuro Juntos, COLOMBIA


ANGELYST. BRICEÑO MARTINEZ
NIT:900789383-7
Representante legal
CAB CONSTRUCTORA S.A.S.

CALLE 6 No 3 - 52
TEL: 304 3879893 – 322 90667755
cabconstructorasas@gmail.com
