

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página

ACTAS DE CIERRE DE VEEDURIA CIUDADANA - FORMATO - PM-GID-F05.

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F05
	ACTA DE CIERRE DE VEEDURÍA CIUDADANA	Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página 1 de 1




**REPÚBLICA DE COLOMBIA
DEPARTAMENTO DEL HUILA**

MUNICIPIO DE TIMANA - HUILA

ACTA No.2


Siendo las 10:40 am del día 09 de Julio de 2024, se reunieron los representantes de la comunidad del Centro Poblado Naranjal del municipio de Timaná, con el fin de recibir a satisfacción la veeduría ciudadana del contrato de obra N°CLPIH384 DE 2023, cuyo objeto es "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA" y del contrato de Interventoría N°CIHCM 403 de 2023 cuyo objeto es "INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA".

Para constancia firman los miembros de la comunidad que conformaron el comité de veeduría ciudadana en el Centro Poblado de Naranjal del municipio de Timaná.

NOMBRE	APELLIDOS	CEDULA	TELEFONO	FIRMAS
Luz Elvy	Cano Carvajal	26.452.837	3132023277	
María Esmeralda	Pascuas Arias	36.165.003	3232896427	
Alberto	Bonilla Peralta	12.237.301	3203178365	

Después de haber verificado a cada uno de los firmantes y la aceptación de recibo de comité de Veeduría ciudadana se deja constancia y se adjunta la firma de las personas que verifica la veracidad del hecho.

FIRMA


R. L: CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA
HERNAN JARAMILLO MORERA
 C.C 12.194.810 DE GARZON
 Contrato de obra N°CLPIH384 DE 2023

FIRMA


R.L: INGENIERIA DANISA S.A.S
HERNAN CAMILO CEDEÑO TORRES
 C.C 79.792.360 DE NEIVA
 Contrato de Interventoría N°CIHCM 403 de 2023

 INDERHULLA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página

ACTA DE SOCIALIZACION.

 NARIÑO	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG		Código: DIH-CFLD-F03
	ACTA DE CONCERTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA/CONSULTORIA		Versión: 2
	Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página 1 de 3

FECHA: 15/11/2023	MUNICIPIO: TIMANÁ HUILA	SITIO/UBICACIÓN: CENTRO POBLADO NARANJAL
HORA: 17:30 h.	Nº DEL ACTA: 01	Nº PAG.

OBJETIVO: CONCERTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DEL PROYECTO DE OBRA/CONSULTORIA N° CLPIH 384 DE 2023 CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA" Y CONTRATO DE INTERVENTORIA N° CHCM 403DE 2023 CUYO OBJETO ES "INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES LA "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANÁ DEL DEPARTAMENTO DEL HUILA"

ORDEN DEL DÍA:

ITEMS	TEMA	RESPONSABLE
1	Saludo y control de asistencia	Inderhuila
2	Presentación de las empresas contratistas del Proyecto	Supervisor Inderhuila
3	Socialización de las condiciones técnicas del Proyecto.	Supervisor Inderhuila
4	Socialización de fecha de inicio de obra y el manejo de la mano de Obra no calificada	Contratista de Obra e Interventoría
5	Conformación de Veeduría Ciudadana	Supervisor, contratista de Obra e Interventoría
6	Compromisos por parte del Municipio con la Obra	Supervisor Inderhuila – Representante del Municipio
7	Varios	

ASISTENTES				
Nº	NOMBRE	CEDULA	OCUPACION	DIRRECCION
	Marcada	55020211		
			3217112536	
				FIRMA

Carrera 18 Calle 17 esquina Unidad Deportiva-Sede Administrativa
Despacho 875 04 31- 875 04 23 – 875 04 39 www.inderhuila.gov.co - ciencionasuario@inderhuila.gov.co
Nariño-Huila

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN MIPG		Código: DIN-CFLD-F03
	ACTA DE CONCERTACIÓN Y SOCIALIZACIÓN DE INICIO DE OBRA/CONSULTORIA		Versión: 2
	Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página 2 de 3

Nº	NOMBRE	CEDULA	Ocupacion	TELEFONO	DIRECCION	FIRMA
	José Armando Martínez	8303586	COM. de T	310288188	Alto Naranjal	José Armando Martínez
	Ricardo Rojas	93286242	Indepete	350435740	Alto Naranjal	Ricardo Rojas
	Carlos López	15950451	X	312302703	Alto Naranjal	Carlos López
	Hugo Dolores	8223603	Comerciante	710373191	Centro Naranjal	Hugo Dolores
	Vicente Dolores	2616508	Diente	323289602	Centro Naranjal	Vicente Dolores
	Sharon López	4889274	Portador	312528571	Centro Naranjal	Sharon López
	Mercedes Gascón	2615563	Comerciante	312302703	Centro Naranjal	Mercedes Gascón
	Victor Casanova	8323316	Concejal	312302703	Centro Naranjal	Victor Casanova
	Alfredo Ballesteros	8399008	Comerciante	322451107	Centro Naranjal	Alfredo Ballesteros
	Torres Bonilla	108043102	Independiente	312302703	Centro Naranjal	Torres Bonilla
	Isis C. Valenzuela	1010662	Independiente	312302703	Centro Naranjal	Isis C. Valenzuela
	Hector C. Ballesteros	29450269	Independiente	312302703	Centro Naranjal	Hector C. Ballesteros
	Alfredo Ballesteros	10235721	Independiente	3203179365	Centro Naranjal	Alfredo Ballesteros
	Florencia Ballesteros	2616508	Independiente	312302703	Centro Naranjal	Florencia Ballesteros
	Tulio Ballesteros	2616508	Independiente	312302703	Centro Naranjal	Tulio Ballesteros
	Trinidad Ballesteros	2616508	Independiente	312302703	Centro Naranjal	Trinidad Ballesteros

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página

ACTAS DE COMITÉS.

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION - MIPG		Código: DIH-CMC-F01
Fecha Aprobación: 28/02/2022	ACTA DE RUENIÓN		Versión: 2
			Página 1 de 5

DATOS GENERALES

ASUNTO:	Reunion Declaraciones Obiertas Urayal Tunari	No. ACTA:	01
FECHA:	22 - Noviembre de 2023.	HORA INICIO	11:15.
RESPONSABLE:	DR. Brando A. Cedeño Ochoa, Supervisor	HORA FINAL	11:45.

ORDEN DEL DÍA:

- * Declaraciones Planos
- * Entrega documentación Medio Magnetico.
- * Fecha Para acta de socialización, y oceduria.



Código: DIH-CMC-F01
Versión: 2
Página 2 de 5

PARTICIPANTES:

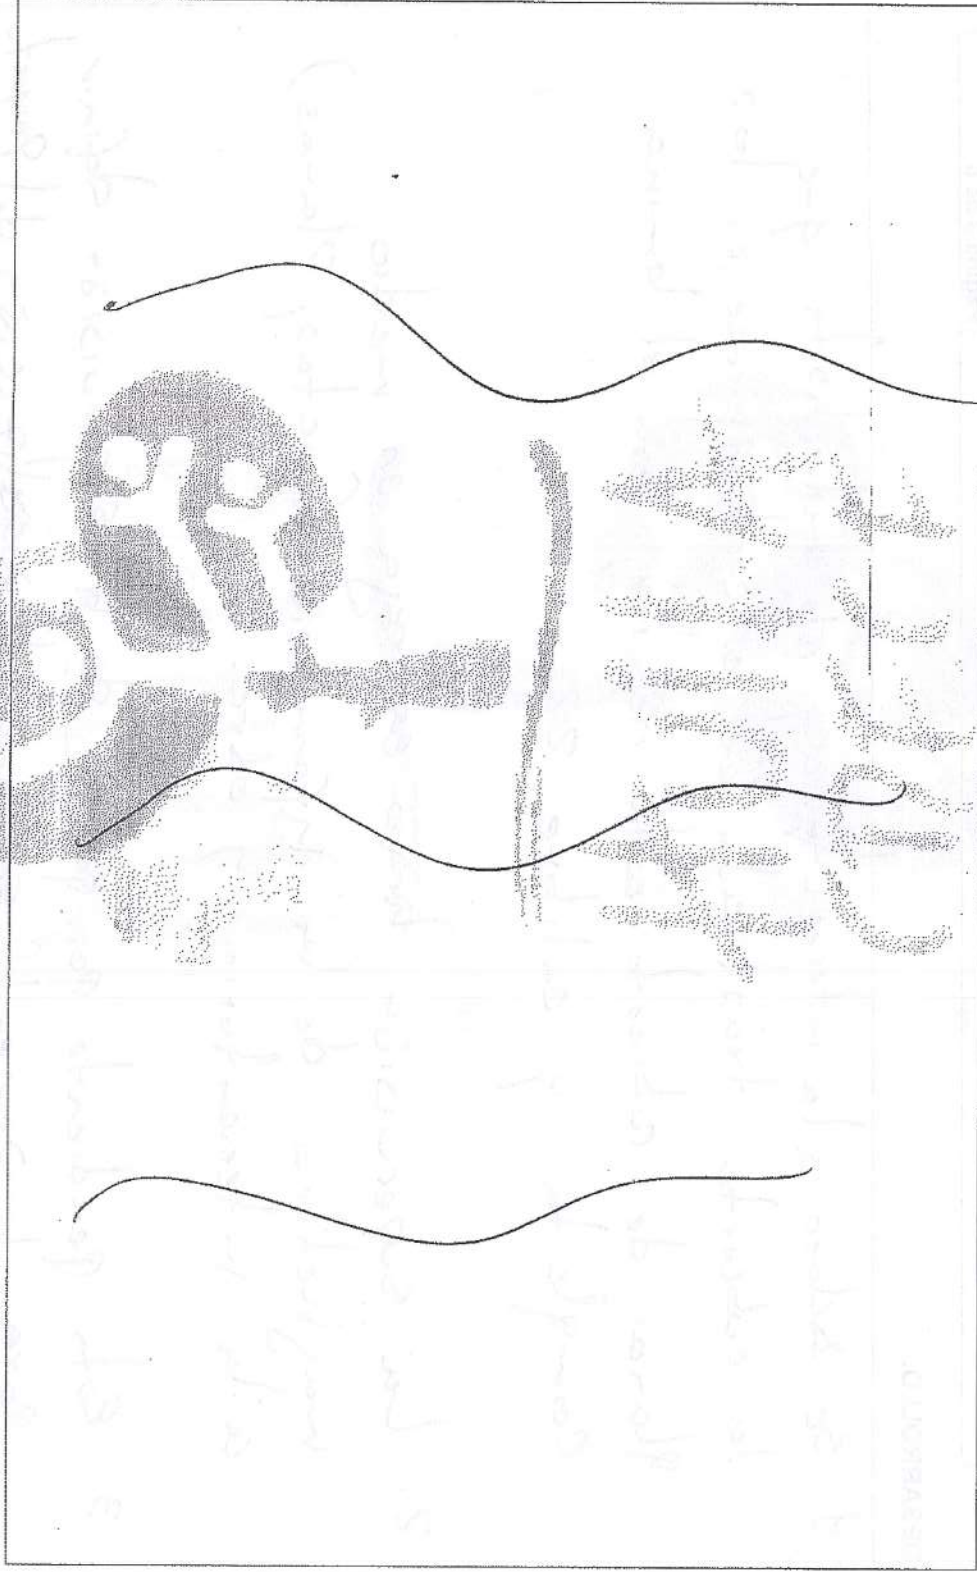
NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
Braulio D Cedeño Ortiz.	Indehivila	
Juan Carlos Garcia Rodriguez	Interventora	
Hernando Insuñillo Montero	Rep legal Contrahista	

 MUNICIPALIDAD DE NEIVA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION - MIPG	
	Fecha Aprobación: 28/02/2022	ACTA DE REUNIÓN
		Código: DIH-CMC-F01 Versión: 2 Página 3 de 5

DESARROLLO:

1. Se aclaro a la interentoria y al contratista que la cubierta traslucida en la cual aparece en los planos de cubierta esta manera, sera el laminar completa y calibre 22.
2. La supervisión hizo entrega en medio magnético de la información (actas, Planos) a la interentoria y obra.
3. Est pendiente por parte de la supervisión definir para la siguiente semana la socialización del proyecto.

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACION Y GESTION - MIPG	
Fecha Aprobación: 28/02/2022	ACTA DE REUNIÓN	Código: DIH-CMC-F01 Versión: 2
		Página 4 de 5



	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTION - MIPG	
	Fecha Aprobación: 28/02/2022	ACTA DE REUNIÓN
	Código: DIH-CMC-F01 Versión: 2 Página 5 de 5	

COMPROMISOS:

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA		
		D	M	A
Definir fecha socialización por parte del supervisor.	Supervisor Dgo. Brando Cedeno	24	11	23

Siendo las _____ se dio por finalizada la sesión de esta reunión

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Versión: 2 Página 1 de 2

Nombre Proyecto	CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA	Acta No.	02
No. De Contrato obra	CLPIH 384-2023	Lugar:	Virtual
No. De Contrato Interventoría	CIHCM 403-2023		
Fecha	02/12/2023	Hora Inicio	8:00 am
Hora Final		8:30 am	

OBJETO DE LA REUNION
Socialización de avance de obra





AGENDA
1. Avance de obra 1 2. Compromisos

DESARROLLO
Se reunió de forma virtual por medio de google meet a las 8:00 am como delegados y/o representantes de la interventoría INGENIERIA DANISA SAS. y representantes del contratista de obra CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA para socializar los siguientes temas: 1. Se solicitó hacer llegar en físico la documentación requerida para el cobro del anticipo. 2. Entrega de informe mensual del mes de noviembre con el avance de obra y cantidades ejecutadas a la fecha. 3. Se continua pendiente definir fecha para visita de socialización del proyecto por parte de la supervisión del contrato 4. Se definió fecha de visita a obra por parte de interventoría y contratista para el día miércoles 06 de diciembre de 2023. 5. Se relacionaron las actividades ejecutadas a la fecha por parte del contratista. 6. El contratista pone en conocimiento la presencia de una acometida hidráulica existente dentro del área de las zapatas y solicita aprobación para reubicar esta acometida con el fin de solucionar y evitar la interferencia en la ejecución del proyecto. Compromisos: 1. Entrega de documentación para cobro de anticipo. 2. Entrega de informe mensual. 3. Planillas de seguridad social de los trabajadores 4. Actas de vecindad 5. Actas de entrega de EPIs (elementos de protección individual) al personal obrero

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Versión: 2 Página 2 de 2

DESARROLLO

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
NELSON VARGAS ALMARIO	INGENIERIA DANISA SAS.	
HERNAN CAMILO CEDEÑO TORRES	INGENIERIA DANISA SAS.	
JUAN CARLOS GARCIA	INGENIERIA DANISA SAS.	
NENCER SERRATO PERDOMO	INGENIERIA DANISA SAS.	
HERNAN JARAMILLO MOREA	CONSORCIO CUBIERTA NARANJAL	
MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON	CONSORCIO CUBIERTA NARANJAL	

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
	Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA

Nombre Proyecto	CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA			Acta No.	03
No. De Contrato obra	CLPIH 384-2023	Lugar:	VIRTUAL		
No. De Contrato Interventoría	CIHCM 403-2023				
Fecha	18/12/2023	Hora Inicio	8:30 am	Hora Final	9:00 am

OBJETO DE LA REUNION					
Socialización de avance de obra					






AGENDA	
1	1. Avance de obra. 2. Programación de socialización. 3. Compromisos.

DESARROLLO	
Se reunieron de forma virtual por medio de google meet siendo las 8:30 am, delegados y/o representantes de la interventoría INGENIERIA DANISA SAS. y representantes del contratista de obra CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA para socializar los siguientes temas:	
- Se ilustra el avance de obra y se relacionan las actividades en ejecución. - Socialización del proyecto: se define fecha para realizarse el día 19/12/2023, a la espera de confirmación de hora por parte de la entidad INDERHUILA. - La interventoría solicita hacer llegar certificados de calidad del acero el cual ya se encuentra en obra. - Se solicita hacer entrega del balance de obra para su revisión y verificación; el contratista manifiesta que se encuentra avanzando en esta actividad y se define fecha para su entrega.	
Compromisos: - Socialización – plazo máximo 20/12/2023 - Certificados de calidad de materiales (acero) – 22/12/2023 - Entrega de informes semanales pendientes - 23/12/2023 - Entrega de balance de obra – 23/12/2023	

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
--------	---------	-------

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Versión: 2 Página 2 de 2

NELSON VARGAS ALMARIO	INGENIERIA DANISA SAS.	
MILDRED BRIYIT BARRERO PALACIOS	INGENIERIA DANISA SAS.	
JUAN CARLOS GARCIA	INGENIERIA DANISA SAS.	
NENCER SERRATO PERDOMO	INGENIERIA DANISA SAS.	
HERNAN JARAMILLO MOREA	CONSROCIO NARANJAL CUBIERTA	
MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON	CONSROCIO NARANJAL CUBIERTA	



Fecha Aprobación:
13/02/2023

SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN - MIPG

ACTA COMITÉ DE OBRA

Código: DIH-CGID-F02

Versión: 2

Página 1 de 2

Nombre Proyecto		CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA			Acta No.	04
No. De Contrato obra		CLPIH 384-2023	Lugar:	VIRTUAL		
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 403-2023				
Fecha	27/12/2023	Hora Inicio	2:00 PM	Hora Final		2:30 PM

OBJETO DE LA REUNION

Verificación de cantidades

AGENDA

- | | |
|---|--|
| 1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Avance de obra. 2. Verificación de cantidades 3. Compromisos. |
|---|--|

DESARROLLO

Se reunieron de forma presencial en instalaciones delINDERHUILA siendo las 2:00 pm, delegados y/o representantes de la interventoría INGENIERIA DANISA SAS. y representantes del contratista de obra CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA, y supervisor del contrato el arquitecto BRAULIO M. CEDEÑO ORTIZ para socializar los siguientes temas:

1. Se ilustra el avance de obra y se relacionan las actividades en ejecución.
2. El contratista de obra informa sobre lo evidenciado al realizar el balance de obra y las cantidades calculadas del ítem "2,2 Concreto para base de estructuras en concreto ciclópeo -2500 PSI (175 kg/cm²) 60% concreto 2500 PSI + 40% piedra media zonga", las cuales se encuentran por debajo de las cantidades necesarias para la ejecución de esta actividad, igualmente se menciona que en los diseños no se evidencia las especificaciones o detalle constructivo del mismo, por su parte la supervisión del contrato por parte delINDERHUILA manifiesta que se calculen y verifiquen las cantidades del ítem líneas arriba mencionado para que se ejecute en su totalidad.
3. También se da a conocer sobre las constantes lluvias durante los últimos días, y que ha afectado el desarrollo de las actividades, en especial las excavaciones por lo tanto la evacuación de aguas ha sido frecuente al igual que la limpieza y nivelación de estas.

Compromisos:

1. Verificación de cantidades del ítem 2,2 Concreto para base de estructuras en concreto ciclópeo -2500 PSI (175 kg/cm²) 60% concreto 2500 PSI + 40% piedra media zonga". 30/12/2023
2. Informe mensual No. 2 correspondiente al mes de diciembre - 6/01/2024



SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN - MIPG

Código: DIH-CGID-F02

Fecha Aprobación:
13/02/2023

ACTA COMITÉ DE OBRA

Versión: 2

Página 2 de 2

DESARROLLO

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
NELSON VARGAS ALMARIO	INGENIERIA DANISA SAS.	
MILDRED BRIYIT BARRERO PALACIOS	INGENIERIA DANISA SAS.	
JUAN CARLOS GARCIA	INGENIERIA DANISA SAS.	
NENCER SERRATO PERDOMO	INGENIERIA DANISA SAS.	
HERNAN JARAMILLO MOREA	CONSROCIO NARANJAL CUBIERTA	
MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON	CONSROCIO NARANJAL CUBIERTA	
BRAULIO M. CEDEÑO ORTIZ	INDERHUILA	

	SISTEMA DE GESTIÓN MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
	Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA

Nombre Proyecto	CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA			Acta No.	05
No. De Contrato obra	CLPIH 384-2023	Lugar:	VIRTUAL		
No. De Contrato Interventoría	CIHCM 403-2023				
Fecha	13/01/2024	Hora Inicio	8:00 AM	Hora Final	8:30 AM







OBJETO DE LA REUNION
Socialización avance de obra

AGENDA
1. Avance de obra. 2. Compromisos.

DESARROLLO
Se reunieron de forma presencial en instalaciones del INDERHUILA siendo las 2:00 pm, delegados y/o representantes de la interventoría INGENIERIA DANISA SAS. y representantes del contratista de obra CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA, y supervisor del contrato el arquitecto BRAULIO M. CEDEÑO ORTIZ para socializar los siguientes temas: - Se ilustra el avance de obra y se relacionan las actividades en ejecución. - La interventoría externa manifiesta su preocupación con respecto al avance de obra ilustrado y el retraso que se presenta a la fecha el cual corresponde al 11.72% a fecha del 30 de diciembre, mediante oficio No 16 se solicita al contratista analizar y realizar un plan de contingencia que permita la ejecución de las actividades en el plazo establecido contractualmente para la ejecución del objeto del contrato. - El contratista manifiesta que dichos retrasos obedecen a diferentes factores involucrados como el estado del clima durante el mes de diciembre y algunos temas financieros que corresponden al retraso en el desembolso del anticipo por parte de la entidad contratante inderhuila, lo que genero inconvenientes en la adquisición de algunos equipos y materiales, también manifiestan que durante finales del mes de diciembre por ser temporada de fiestas, se retraso la compra y suministro de materiales a causa de la no operatividad de los proveedores. Compromisos: - Respuesta formal al oficio No 16 y solicitud remitida por la Interventoría externa.

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Versión: 2 Página 2 de 2

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
NELSON VARGAS ALMARIO	INGENIERIA DANISA SAS.	
MILDRED BRIYIT BARRERO PALACIOS	INGENIERIA DANISA SAS.	
JUAN CARLOS GARCIA	INGENIERIA DANISA SAS.	
NENCER SERRATO PERDOMO	INGENIERIA DANISA SAS.	
HERNAN JARAMILLO MOREA	CONSROCIO NARANJAL CUBIERTA	
MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON	CONSROCIO NARANJAL CUBIERTA	



SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y
GESTIÓN - MIPG

Código: DIH-CGID-F02

Fecha Aprobación:
13/02/2023

ACTA COMITÉ DE OBRA

Versión: 2

Página 1 de 2

Nombre Proyecto	CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA			Acta No.	06
No. De Contrato obra	CLPIH 384-2023	Lugar:	VIRTUAL		
No. De Contrato Interventoría	CIHCM 403-2023				
Fecha	27/01/2024	Hora Inicio	8:00 AM	Hora Final	8:30 AM

OBJETO DE LA REUNION

Socialización avance de obra

AGENDA

1

1. Avance de obra.
2. Compromisos.

DESARROLLO

Se reunieron de forma presencial en instalaciones del INDERHUILA siendo las 2:00 pm, delegados y/o representantes de la interventoría INGENIERIA DANISA SAS. y representantes del contratista de obra CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA, y supervisor del contrato el arquitecto BRAULIO M. CEDEÑO ORTIZ para socializar los siguientes temas:

1. Se ilustra el avance de obra y se relacionan las actividades en ejecución.
2. Se socializa el plan de contingencia presentado por parte del contratista de obra.
3. Interventoría sugiere que al momento de fundir columnas se aplique Sikadur ya que las columnas se fundirán en 2 secciones.





Compromisos:

1. Reprogramación de obra por parte del contratista de obra.
2. Verificación de cantidades en obra, para balance final.

401

 Fecha Aprobación: 13/02/2023	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
	ACTA COMITÉ DE OBRA	Versión: 2
		Página 2 de 2

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
NELSON VARGAS ALMARIO	INGENIERIA DANISA SAS.	
MILDRED BRIYIT BARRERO PALACIOS	INGENIERIA DANISA SAS.	
JUAN CARLOS GARCIA	INGENIERIA DANISA SAS.	
NENCER SERRATO PERDOMO	INGENIERIA DANISA SAS.	
HERNAN JARAMILLO MOREA	CONSROCIO CUBIERTA NARANJAL	
MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON	CONSROCIO CUBIERTA NARANJAL	

	SISTEMA DE GESTIÓN / MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02	
	Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Versión: 2
			Página 1 de 3

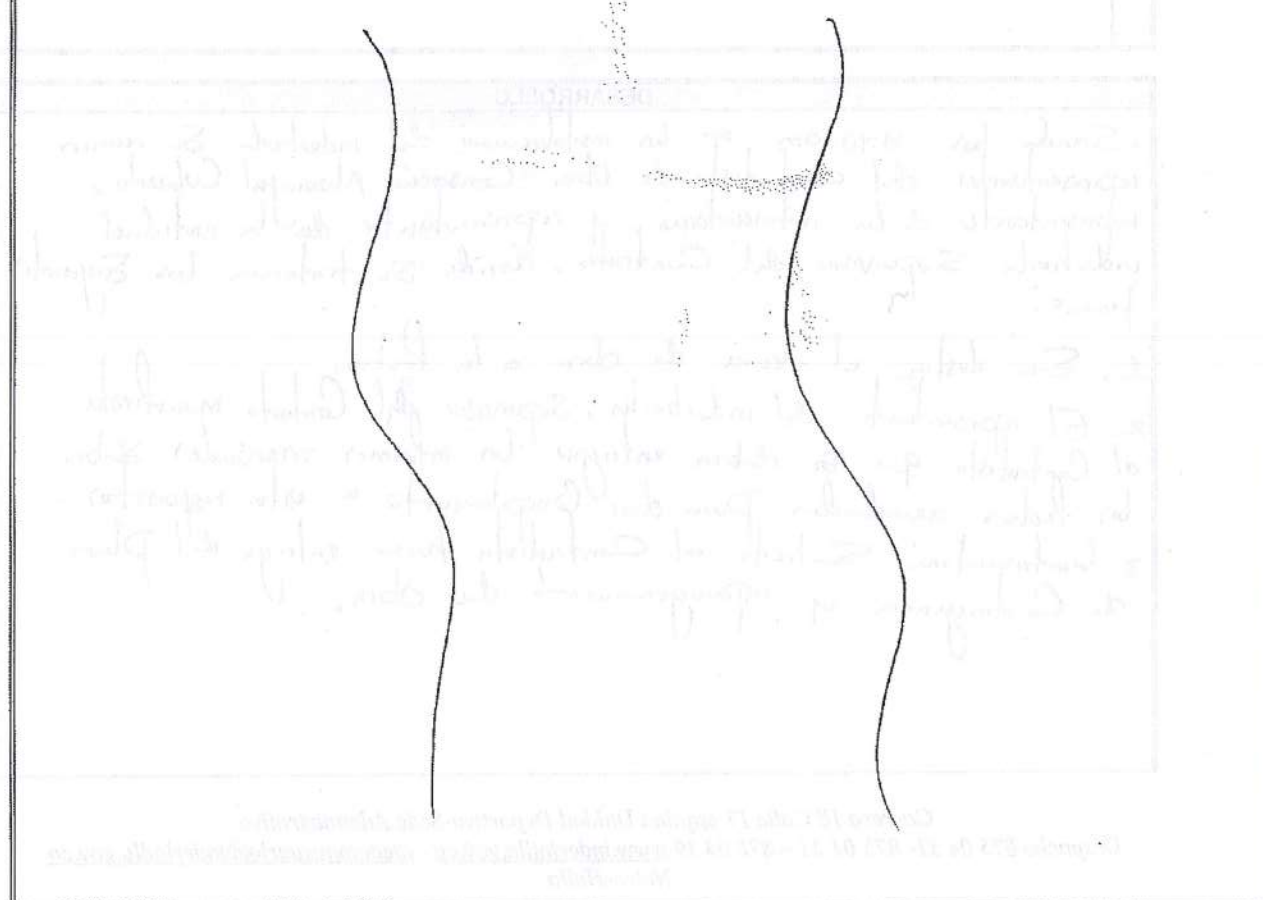
Nombre Proyecto	CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA			Acta No.	07
No. De Contrato obra	CLPIH 384-2023	Lugar:	INDERHUILA		
No. De Contrato Interventoría	CIHCM 403-2023				
Fecha	06 - Febrero - 2024.	Hora Inicio	11:00 Am	Hora Final	11:50 am

OBJETO DE LA REUNION
- Solicitud de Prorroga del Contrato de Obra. - Informe del Mes de Enero - Reprogramación de Obra por Retrasos.

AGENDA
1

DESARROLLO
• Siendo las 11:40 am en las instalaciones del Inderhuila se reúnen representantes del Contratista de Obra Consorcio Naranjal Cubierta, representantes de la interventoría y representante de la entidad Inderhuila Supervisor del Contrato, donde se trataron los siguientes temas: 1. Se ilustra el avance de obra a la fecha. 2. El representante del Inderhuila, Supervisor del Contrato manifiesta al Contratista que se deben entregar los informes mensuales sobre los hechos acordados para dar cumplimiento a estos requisitos. 3. Interventoría solicita al Contratista hacer entrega del plan de Contingencia y reprogramación de obra.

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Versión: 2
		Página 2 de 3

DESARROLLO
<u>Compromisos</u> 1. Entrega de reprogramación de obra (07/02/2024) 2. Entrega de Bitácora de obra (07/02/2024) 3. Registros fotográficos 4. Entrega de Plan de Contingencia (07/02/2024).


	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIRG	Código: DIH-CGID-F02
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Versión: 2 Página 3 de 3

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
NELSON VARGAS ALMARIO	INGENIERIA DANISA SAS.	X
MILDRED BRIYIT BARRERO PALACIOS	INGENIERIA DANISA SAS.	X
JUAN CARLOS GARCIA	INGENIERIA DANISA SAS.	Juan Garcia K
NENCER SERRATO PERDOMO	INGENIERIA DANISA SAS.	X
HERNAN JARAMILLO MOREA	CONSROCIO CUBIERTA NARANJAL	X
MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON	CONSROCIO CUBIERTA NARANJAL	X
BRAULIO A. CEDEÑO ORTIZ	INDERHUILA	X

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Versión: 2 Página 1 de 3

Nombre Proyecto		CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA			Acta No.	09
No. De Contrato obra		CLPIH 384-2023	Lugar:	VIRTUAL		
No. De Contrato Interventoría		CIHCM 403-2023				
Fecha	15/02/2024	Hora Inicio	2:00 PM	Hora Final	3:00 PM	

OBJETO DE LA REUNION	
Socialización avance de obra	

AGENDA	
1	1. Avance de obra. 2. Acta modificatoria. 3. Compromisos.

DESARROLLO	
Se reunieron en la obra de forma presencial siendo las 2:00 pm, delegados y/o representantes de la interventoría INGENIERIA DANISA SAS. y representantes del contratista de obra CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA, para socializar los siguientes temas:	
1. Se ilustra el avance de obra y se relacionan las actividades en ejecución. 2. La residente de obra ilustra el acta modificatoria realizado, con el fin de ser definido y avalado por parte de interventoría, de acuerdo con lo cotejado en el terreno y los planos se puede apreciar que se necesitan ajustar algunas cantidades de obra contratadas, con las cantidades reales en obra, por lo cual se procede junto a la interventoría a realizar y relacionar en un acta de mayores y menores las cantidades de obras ejecutadas. 3. Se coteja lo siguiente: 3.1. Un área menor en la demolición de estructuras en concreto y crear ítem para desmonte malla. 3.2. Solo es necesario desmontar dos postes. 3.3. Se evidencia menor cantidad en actividades de cimentación (vigas y zapatas) e instalaciones hidrosanitarias, de acuerdo con los planos. 3.4. Recebo disminuye descontando el volumen de la tubería a instalar. 3.5. Concreto para base de estructuras Aumenta de acuerdo con los planos. 3.6. Se Cuantifica despiece del acero de acuerdo con planos y se evidencia aumento.	

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Versión: 2 Página 2 de 3

DESARROLLO






- 3.7. Aumenta M2 de cubierta cuantificando el arco de acuerdo a los planos.
- 3.8. No es necesario la restitución de toda la placa de piso cuantificada inicialmente.
- 3.9. No es necesaria la cantidad de pañete para columnas y esta actividad solo se realiza en viga canal
- 3.10. Esgrafiado en graniplast aumenta contemplando todas las caras de la viga canal.
- 3.11. Tubería PVC-S de 6" La distancia de las cajillas es mayor a la planteada inicialmente razón por la cual la cantidad aumenta
- 3.12. Acordado con interventoría y veeduría es necesario aumentar la Tubería PVC-S de 10" " pues la conexión principal establecida inicialmente, puede afectar algunos vecinos.
- 3.13. Transporte de materiales pétreos contractualmente esta cuantificado para actividad de graderías, sin embargo, esta cantidad no se va ejecutar.
4. Se reitera la creación del ítem de demolición y desmonte de malla eslabonada de cerramiento existente, necesaria para incluir las cantidades reales ejecutadas en obra la cual no reflejan ningún incremento en el presupuesto contractual.
5. Que debido a los argumentos que asocian a la presente acta, la Interventoría evidencia la necesidad de un ajuste técnico del contrato de obra CLPIH384 DE 2023 cuyo objeto es **"CONSTRUCCIÓN E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA"**

Compromisos:

6. Entrega de reprogramación de obra – 17/02/2024
7. Entrega de acta modificatoria con memorias de cantidades – 17/02/2024
8. Entrega de corrección y actualización de cantidades ejecutadas para informes mensuales – 17/02/2024
9. Interventoría se compromete a realizar entrega de acta modificatoria y memorias de cantidades revisadas y verificadas al arquitecto Braulio Cedeno, apoyo a la supervisión – 21/02/2024

	SISTEMA DE GESTIÓN: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Versión: 2 Página 3 de 3

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
NELSON VARGAS ALMARIO	INGENIERIA DANISA SAS.	
NENCER SERRATO PERDÓMO	INGENIERIA DANISA SAS.	
ALEX ALBERTO CALVACHE	INGENIERIA DANISA SAS.	
HERNAN JARAMILLO MOREA	CONSROCIO NARANJAL CUBIERTA	
MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON	CONSROCIO NARANJAL CUBIERTA	

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Página 1 de 2

Nombre Proyecto	CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA			Acta No.	10
No. De Contrato obra	CLPIH 384-2023	Lugar:	VIRTUAL		
No. De Contrato Interventoría	CIHCM 403-2023				
Fecha	16/02/2024	Hora Inicio	3:30 PM	Hora Final	4:00 PM

OBJETO DE LA REUNION

Socialización avance de obra

AGENDA

- | | |
|---|---|
| 1 | <ol style="list-style-type: none"> 1. Avance de obra. 2. Acta modificatoria. 3. Compromisos. |
|---|---|

DESARROLLO

Se reunieron de forma virtual siendo las 3:30 pm, delegados y/o representantes de la interventoría INGENIERIA DANISA SAS. y representantes del contratista de obra CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA, y en apoyo a la supervisión del contrato el arquitecto BRAULIO M. CEDEÑO ORTIZ para socializar los siguientes temas:

1. Se ilustra el avance de obra y se relacionan las actividades en ejecución.
2. La residente de obra ilustra el acta modificatoria realizado, con el fin de ser definido y avalado por parte de interventoría e inderhuila, se relacionan mayores y menores cantidades de obra ejecutadas; con respecto al ítem de instalaciones hidrosanitarias, se menciona que es necesario adicionar 18 m de tubería de 10" para realizar un cambio de dirección de la red con el fin de evitar la salida del agua lluvia quede frente a unas viviendas aledañas al polideportivo y causar posibles inconvenientes y daños a estas viviendas.
3. Se ilustra la creación del ítem de demolición y desmonte de malla eslabonada de cerramiento existente, necesaria para incluir las cantidades reales ejecutadas en obra la cual no reflejan ningún incremento en el presupuesto contractual.



Compromisos:

1. Entrega de reprogramación de obra – 17/02/2024
2. Entrega de acta modificatoria con memorias de cantidades – 17/02/2024
3. Entrega de corrección y actualización de cantidades ejecutadas para informes mensuales – 17/02/2024
4. Interventoría se compromete a realizar entrega de acta modificatoria y memorias de cantidades revisadas y verificadas al arquitecto Braulio Cedeño, apoyo a la supervisión – 21/02/2024

	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: DIH-CGID-F02
		Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023	ACTA COMITÉ DE OBRA	Página 2 de 2

DESARROLLO

PARTICIPANTES

NOMBRE	ENTIDAD	FIRMA
JUAN CARLOS GARCIA	INGENIERIA DANISA SAS.	
NENCER SERRATO PERDOMO	INGENIERIA DANISA SAS.	
HERNAN JARAMILLO MOREA	CONSROCIO CUBIERTA NARANJAL	
MARIA ALEJANDRA RAMIREZ CASTRILLON	CONSROCIO CUBIERTA NARANJAL	
BRAULIO A. CEDEÑO ORTIZ	APOYO A LA SUPERVISIÓN INDERHUILS	

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página


RESULTADO DE ENSAYOS Y PRUEBA DE LABORATORIO DEL CONTRATISTA DE OBRA Y DE LA INTERVENTORIA.

 INDERHULLA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página

CONTRATISTA DE OBRA.

 INDERHULLA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página

DISEÑOS DE MEZCLA PARA CONCRETOS.

SEND Servicio de Ensayos No Destructivos		VEL-000
COMUNICACION DE ENTREGA DE INFORME DE ENSAYOS		V:01
Informe No 202312-01		
Garzón, 24 de diciembre de 2023		
Señor (a)		
CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA		
Proyecto: "CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA"		
ENTREGA DEL INFORME DE LABORATORIO No202312-01		
CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA		
Informe No202312-01 contiene 12 paginas		
Nombre del Ensayo	Cant.	
Diseño de Mezcal de Concreto	1	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
-----	-----	
Esta información no intenta suplir los conocimientos, técnicas y criterios profesionales responsables de la construcción de las obras. Los resultados emitidos en este informe no deben ser utilizados en ningún tipo de campaña de información técnica o comercial. SEND SUELOS Y CONCRETOS S.A.S. no se responsabiliza por el muestreo transporte y/o daños que se presenten en el transcurso del mismo. Agradecemos la confianza depositada en nuestro laboratorio y estamos dispuestos a resolver cualquier tipo de inquietud.		
Cordial saludo,		
 Ing. DIANA LORENA MURCIA G. Representante Legal		
(a) El presente informe no puede reproducirse sin la aprobación por parte del laboratorio. (b) Los resultados de los ensayos emitidos en este informe solo son aplicables a las muestras ensayadas. (c) El Informe No202312-01 contiene 12 páginas incluida la carta de entrega de informes de ensayos.		

 Suelos y Concretos S.A.S	GRANULOMETRÍA DE AGREGADOS PARA CONCRETOS		DMC-01
			V.02

PROYECTO:	"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA" / 21Mpa		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA		
LOCALIZACIÓN:	Timana - Huila		
DESCRIPCION DEL MATERIAL:	Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila		
NORMA ASOCIADA:	ARTICULO 630-22	FECHA:	2023/12/04
EQUIPO UTILIZADO:	BALANZA Y TAMICES SEGÚN NORMA		

Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila

Peso inicial muestra:	2998
Peso retenido tamiz No.200:	2974

El agregado va a usarse en concreto con un contenido de cemento mayor de 297 kg/m3

Tamiz mm	TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA Fraccion 1	INVIAS ART-500 / Unica		OBSERVACION
						Inferior	Superior	
50	2"	0,0	0,0%	0%	100%			
37,5	1 1/2"	0,0	0,0%	0%	100%			
24,5	1"	328,2	11%	11%	89%			
19	3/4"	100,5	3,4%	14%	86%			
12,5	1/2"	268,6	9,0%	23%	77%			
9,5	3/8"	90,8	3%	26,3%	74%	100%	100%	NO CUMPLE
4,75	No.4	164,1	5,5%	31,8%	68%	95%	100%	NO CUMPLE
2,36	No.8	141,9	4,7%	36,5%	64%	80%	100%	NO CUMPLE
1,18	No.16	210,0	7%	43,5%	56%	50%	85%	CUMPLE
0,6	No.30	540,0	18%	61,5%	38%	25%	60%	CUMPLE
0,3	No. 50	849,4	28%	89,9%	10%	10%	30%	CUMPLE
0,15	No. 100	239,5	8%	97,8%	2%	2%	10%	CUMPLE
0,075	No. 200	35,8	1%	99%	1%			
0,045	FONDO	28,2	1,0%	100%	0%			
		2997,7	100%					

MODULO DE FINURA (Entre 2,3 y 3,1)

TAMAÑO MÁXIMO (Pulgadas):

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL (Pulgadas):

No Retiene Mas 45% de Material Entre Dos Tamices Consecutivos

4,02 No Cumple

1 1/2"

1"

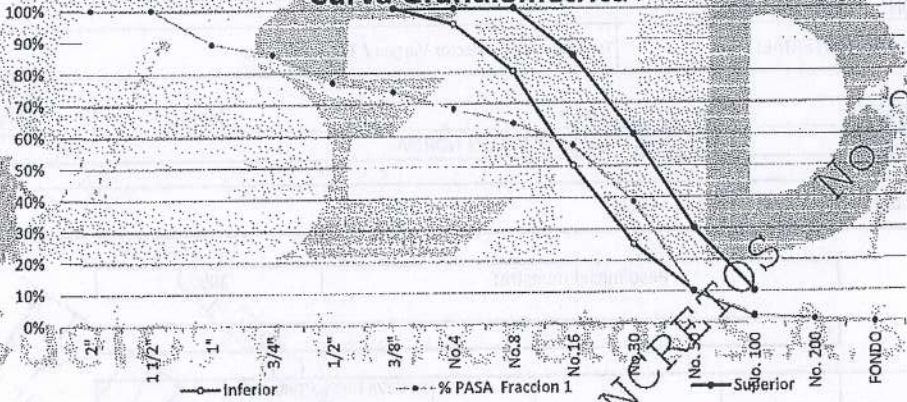
No Cumple

ELABORADO POR
Ing. Juan Carlos Caballero

REVISADO POR
Ing. Diana Murcia Garcia

SEND Servicio de Ensayos
No Destructivos
SUELOS Y CONCRETOS S.A.S
901.680.866-6

Pag. 3 de 12

 SEND Suelos y Concretos S.A.S	GRANULOMETRÍA DE AGREGADOS PARA CONCRETOS	DMC-01 V.02						
	GRADACION INVIAS ART. 500 / Unica							
Curva Granulometrica								
								
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 60%;">Porcentaje De Vacios</td> <td style="width: 40%; text-align: right;">27,57%</td> </tr> <tr> <td>Coefficiente De Curvatura ($1 < C < 3$)</td> <td style="text-align: right;">0,56</td> </tr> <tr> <td>Coefficiente Uniformidad ($C_u > 4$)</td> <td style="text-align: right;">5,97</td> </tr> </table>			Porcentaje De Vacios	27,57%	Coefficiente De Curvatura ($1 < C < 3$)	0,56	Coefficiente Uniformidad ($C_u > 4$)	5,97
Porcentaje De Vacios	27,57%							
Coefficiente De Curvatura ($1 < C < 3$)	0,56							
Coefficiente Uniformidad ($C_u > 4$)	5,97							
OBSERVACIONES:								
ELABORADO POR  Ing. Juan Carlos Caballero		REVISADO POR  Ing. Diana Murcia Garcia						

 Suelos y Concretos S.A.S	GRANULOMETRÍA DE AGREGADOS PARA CONCRETOS	DMC-01
		V.01

PROYECTO:	"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA" / 21Mpa		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA		
LOCALIZACIÓN:	Timana - Huila		
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL:	Triturado Planta Hector Vargas / Timana - Huila		

NORMA ASOCIADA:	ARTICULO 630-22	FECHA:	2023/12/04
EQUIPO UTILIZADO:	BALANZA Y TAMICES SEGÚN NORMA		

Triturado Planta Hector Vargas / Timana - Huila

Peso inicial muestra:

2997

Tamiz mm	TAMIZ	PESO RET. (g.)	% RET.	% RET. ACUM.	% PASA Fraccion 1	NTC 174 No 56 / Tam. Max.		OBSERVACION
						Inferior Fraccion 1	Superior Fraccion 1	
90	3 1/2"	0,0	0,0%	0,0%	100,0%			
75	3"	0,0	0,0%	0,0%	100,0%			
62,5	2 1/2"	0,0	0,0%	0,0%	100,0%			
50	2"	0,0	0,0%	0,0%	100,0%			
37,5	1 1/2"	0,00	0,0%	0,0%	100,0%			
24,5	1"	0,00	0,0%	0,0%	100,0%	90%	100%	CUMPLE
19	3/4"	740,20	24,7%	24,7%	75,3%	40%	85%	CUMPLE
12,5	1/2"	1281,10	42,7%	67,4%	32,6%	10%	40%	CUMPLE
9,5	3/8"	709,50	23,7%	91,1%	8,9%	0%	15%	CUMPLE
4,75	No.4	259,20	8,6%	99,8%	0,2%	0%	5%	CUMPLE
2,36	No.8	0,50	0,0%	99,8%	0,2%			
1,18	No.16	0,00	0,0%	99,8%	0,2%			
0,6	No.30	0,00	0,0%	99,8%	0,2%			
0,3	No. 50	0,40	0,0%	99,8%	0,2%			
0,15	No. 100	2,10	0,1%	99,9%	0,1%			
0,075	No. 200	2,40	0,1%	100,0%	0,0%			
0,045	FONDO	1,2	0,0%	100,0%	0,0%			
		2997,60	100,0%					

TAMAÑO MÁXIMO (Pulgadas):

1"

TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL (Pulgadas):

3/4"

MÓDULO DE FINURA

7,1

ELABORADO POR

Ing. Juan Carlos Caballero

REVISADO POR

Ing. Diana Murcia García

Tel: 311 444 86 64 - 310 297 84 24 / Garzón - Huila

316

SEND Suelos y Concretos S.A.S	GRANULOMETRÍA DE AGREGADOS PARA CONCRETOS	DMC-01
		V.01

GRADACION NTC 174 No 56 / Tam. Max. 1"

Curva Granulometrica Fraccion 1

Tam. (mm)	Inferior Fraccion 1 (%)	% PASA Fraccion 1 (%)	Superior Fraccion 1 (%)
3 1/2"	100	100	100
2"	100	100	100
1 1/2"	100	100	100
1"	90	100	100
3/4"	85	100	100
1/2"	40	100	100
3/8"	10	100	100
No. 20	5	100	100
No. 30	5	100	100
No. 50	5	100	100
No. 100	5	100	100
No. 200	5	100	100

Porcentaje De Vaciado	39,77%
Cofiente De Curvatura ($1 < C < 3$)	0,90
Cofiente Uniformidad ($C_u > 4$)	1,76

OBSERVACIONES:

ELABORADO POR
Ing. Juan Carlos Caballero

REVISADO POR
Ing. Diana Murcia-Garcia

 Suelos y Concretos S.A.S	COMBINACION MATERIALES (FULLER Y BOLOMEY)		DMC-01
			V.01


PROYECTO:	"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA" / 21Mpa	FECHA:	2023/12/04
SOLICITANTE:	CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA		
ESPECIFICACIÓN:			

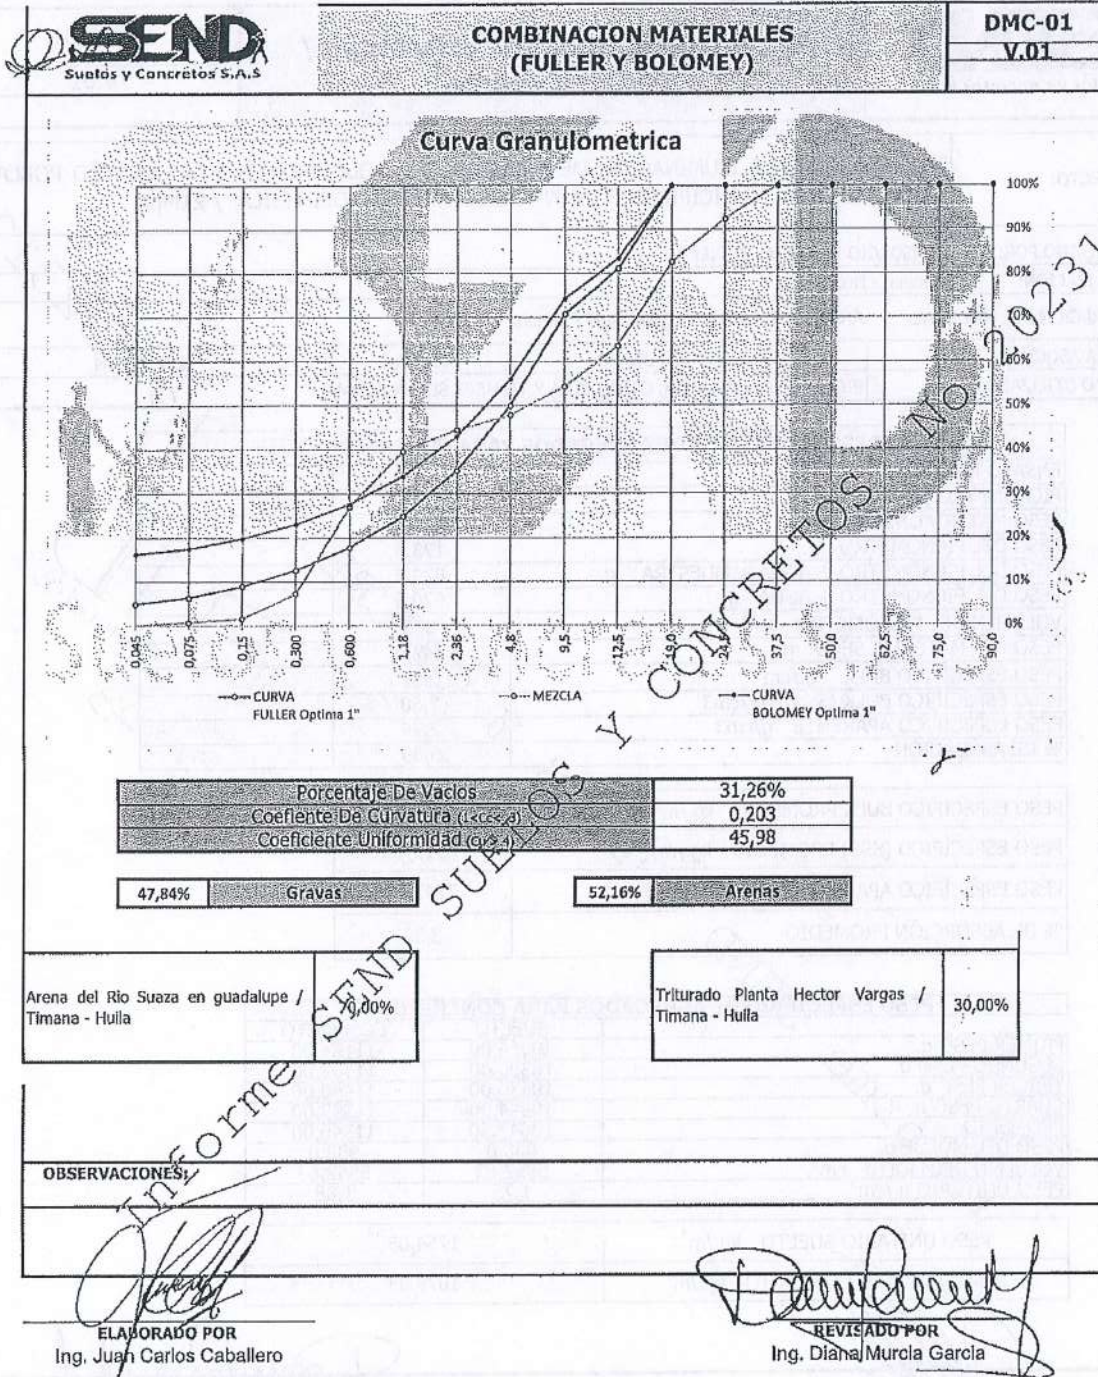
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 01:	Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila
DESCRIPCIÓN DEL MATERIAL 02:	Triturado Planta Hector Vargas / Timana - Huila

FORMA DEL AGREGADO	MIXTA
EL ASENTAMIENTO ESTA EN ESTE RANGO (mm)	50 - 100

ABERTURA / TAMIZ		PORCENTAJE (%)				RESULTADO (%)		CURVA BOLOMEY		NTC 174 No 56 / Tam. Max. 1"	
		70,00 %	30,00 %	Otro	CURVA FULLER	CURVA FULLER	100	CURVA FULLER	CURVA BOLOMEY		
mm	ALTERNOS	Granulometria Agregado Fino 1"	Granulometria Agregado Grueso 3/4"		TRITURADO 1"	ARENA 1"	MEZCLA	Optima 1"	Optima 1"	Límite Inferior	Límite Superior
90,0	3 1/2"	100%	100%		100,00%	100,0%	100%	100%	100%		
75,0	3"	100%	100%		100,00%	100,0%	100%	100%	100%		
62,5	2 1/2"	100%	100%		100,00%	100,0%	100%	100%	100%		
50,0	2"	100%	100%		100,00%	100,0%	100%	100%	100%		
37,5	1 1/2"	100%	100%		100,00%	100,0%	100%	100%	100%		
24,5	1"	89%	100,0%		100,00%	100,0%	92%	100%	100%	90%	100%
19,0	3/4"	86%	75,3%		100,00%	88,1%	82,6%	100%	100%	40%	85%
12,5	1/2"	77%	32,6%		81,1%	71,4%	63,5%	81%	83%	10%	40%
9,5	3/8"	74%	8,9%		70,71%	62,3%	54,3%	71%	74%	0%	15%
4,8	No.4	68%	0,2%		50,00%	44,0%	47,8%	50%	56%	0%	5%
2,36	No.8	63,5%	0,2%		35,24%	31,0%	44,5%	35%	43%		
1,18	No.16	56,5%	0,2%		24,92%	21,9%	39,6%	25%	34%		
0,600	No.30	38,5%	0,2%		17,77%	15,6%	27,0%	18%	28%		
0,300	No.50	10,1%	0,2%		12,57%	11,1%	7,2%	13%	23%		
0,15	No.100	2,7%	0,1%		8,89%	7,8%	1,5%	9%	20%		
0,075	No.200	1%	0,0%		6,28%	5,5%	0,7%	6%	18%		
0,045	FONDO	0%	0,0%		4,87%	4,3%	0%	5%	16%		
MÓDULO DE FINURA FULLER		4,02	7,15		4,80	5,47	5,40				

OBSERVACIONES:

 ELABORADO POR Ing. Juan Carlos Caballero	 REVISADO POR Ing. Diana Murcia Garcia
--	--



 Suelos y Concretos S.A.S	Arena del Río Suaza en guadalupe / Timana - Huila	DMC-01
		V.01

PROYECTO:	"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA" / 21Mpa		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA		
LOCALIZACIÓN:	Timana - Huila		
DESCRIPCION DEL MATERIAL:	Arena del Río Suaza en guadalupe / Timana - Huila		
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E -222-223-13	FECHA:	2023/12/04
EQUIPO UTILIZADO:	PICNOMETRO, BALANZA, CANASTILLA Y TAMICES SEGÚN NORMA		

PESO ESPECÍFICO DE AGREGADOS PARA CONCRETOS		
ENSAYO No.	1	
PICNOMETRO No.	1	
PESO MATERIAL S.S.S. g.	250,2	
PESO DEL PICNOMETRO g.	173,6	
PESO DEL PICNOMETRO + AGUA + MUESTRA g.	824,3	
PESO DEL PICNOMETRO + AGUA g.	670,5	
VOLUMEN DEL PICNOMETRO cm ³ .	590	
PESO DEL MATERIAL SECO g.	242,0	
PESO ESPECÍFICO BULK g./cm ³	2,51	
PESO ESPECÍFICO BULK (SSS) g./cm ³	2,60	
PESO ESPECÍFICO APARENTE g/cm ³	2,74	
% DE ABSORCIÓN	3,39	

PESO ESPECÍFICO BULK PROMEDIO kg./m ³	2510,37
PESO ESPECÍFICO (SSS) PROMEDIO kg./m ³	2595,44
PESO ESPECÍFICO APARENTE PROMEDIO kg./m ³	2743,76
% DE ABSORCIÓN PROMEDIO	3,39

PESO ESPECÍFICO DE AGREGADOS PARA CONCRETOS		
	SUELTO	COMPACTO
PRIMER PESO g.	10964,00	11184,00
SEGUNDO PESO g.	10396,00	11362,00
TERCER PESO g.	10636,00	11440,00
CUARTO PESO g.	10594,00	11398,00
PROMEDIO	10647,50	11346,00
PESO DEL MOLDE g.	908,0	908,0
VOLUMEN DEL MOLDE cm ³ .	5552,63	5552,63
PESO UNITARIO g./cm ³	1,75	1,88

PESO UNITARIO SUELTO kg./m ³	1754,03
PESO UNITARIO COMPACTO kg./m ³	1879,83

ELABORADO POR

Ing. Juan Carlos Caballero A. 42 Barrio Los Samanes . e-mail send@suelosyconcretos.com.co

Tel: 311 444 86 64 - 310 297 84 24 / Garzón - Huila

REVISADO POR

Ing. Diana Murcia García

 Suelos y Concretos S.A.S	Triturado Planta Hector Vargas / Timana - Huila	DMC-01
		V.01

PROYECTO:	"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA"		
	21Mpa		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA		
LOCALIZACIÓN:	Timana - Huila		
DESCRIPCION DEL MATERIAL:	Triturado Planta Hector Vargas / Timana - Huila		
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E 217-13	FECHA:	2023/12/04
EQUIPO UTILIZADO:	BALANZA Y MOLDE PARA PESO UNITARIO		

PESO ESPECIFICO DE AGREGADOS PARA CONCRETOS		
ENSAYO	1	
PESO MATERIAL SECO g.	2322	
PESO MATERIAL S.S.S. g.	2342	
PESO SUMERGIDO g.	1450	
PESO ESPECIFICO BULK g./cm ³	2,60	
PESO ESPECIFICO BULK (SSS) g./cm ³	2,63	
PESO ESPECIFICO APARENTE g./cm ³	2,66	
% DE ABSORCION	0,86	

PESO ESPECIFICO BULK PROMEDIO kg./m ³	2603,14
PESO ESPECIFICO BULK (SSS) PROMEDIO kg./m ³	2625,56
PESO ESPECIFICO APARENTE PROMEDIO kg./m ³	2662,84
% DE ABSORCION PROMEDIO	0,86

PESO UNITARIO DE AGREGADOS PARA CONCRETOS		
	SUELTO	COMPACTO
PRIMER PESO g.	8832,00	9680,00
SEGUNDO PESO g.	8778,00	9668,00
TERCER PESO g.	8982,00	9718,00
CUARTO PESO g.	9938,00	9698,00
PROMEDIO	8864,00	9688,67
PESO DEL MOLDE g.	908,00	908,00
VOLUMEN DEL MOLDE cm ³	5552,63	5552,63
PESO UNITARIO g./cm ³	1,43	1,58

PESO UNITARIO SUELTO kg./m ³	1432,84
PESO UNITARIO COMPACTO kg./m ³	1581,35

ELABORADO POR

Ing. Juan Carlos Caballero A12 Barrio Los Samanes . e-mail sendsuelosyconcretos

Tel: 311 444 86 54 - 310 297 84 24 / Garzón - Huila

REVISADO POR

Ing. Diana Murcia Garcia

 Suelos y Concretos S.A.S	DISEÑO DE CONCRETOS HIDRÁULICOS	DMC-01
	21 MPa	V.01

PROYECTO:	"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA" / 21Mpa		
SOLICITADO POR:	CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA		
LOCALIZACION:	Timana - Huila		
DESCRIPCION DEL MATERIAL:	Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila Y Triturado Planta Hector Vargas / Timana - Huila		
NORMA ASOCIADA:	MÉTODO DE DISEÑO FULLER	FECHA:	2023/12/04

ESPECIFICACIONES DE DISEÑO		MATERIALES	
RESISTENCIA REQUERIDA f'cr :	21	CEMENTO:	CEMENTO ORIENTE ESTRUCTURAL
RESISTENCIA DE DISEÑO f'c :	24	AGREGADO FINO:	Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila
ASENTAMIENTO (mm.):	61,3	AGREGADO GRUESO:	Triturado Planta Hector Vargas / Timana - Huila
		ADITIVO	

CARACTERÍSTICAS DE LOS MATERIALES			
Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila		Triturado Planta Hector Vargas / Timana - Huila	
MODULO DE FINURA (MFF1)	5,47	MODULO DE FINURA (MFF2)	4,80
DENSIDAD APARENTE SECA kg./m³	2510,4	DENSIDAD APARENTE SECA kg./m³	2603,1
MÓDULO DE FINURA (MF1)	4,02	MÓDULO DE FINURA (MF2)	7,15
PESO UNITARIO SUELTO kg./m³	1754,03	PESO UNITARIO SUELTO kg./m³	1432,04
PESO UNITARIO COMPACTO kg./m³	1879,83	PESO UNITARIO COMPACTO kg./m³	1581,35
T1		TAMAÑO MÁXIMO NOMINAL pulg.	3/4"

CÁLCULOS			
CONTENIDO DE AGUA lt.	171,96/1925	% DE ADITIVO EN PESO DE CEMENTO	0,5%
RELACIÓN AGUA-CEMENTO	0,52	CONTENIDO DE CEMENTO kg./m³	331
CONTENIDO AGREGADO FINO %	0,52	CONTENIDO AGREGADO GRUESO %	0,22
CONTENIDO DE AIRE %	1,5%	VOLUMEN DE CEMENTO m³/M³	0,105
VOLUMEN DE AGREGADOS m³/M³	0,75	DENSIDAD APARENTE DE DISEÑO kg./m³	2450,95

CANTIDADES EN PESO POR METRO CÚBICO DE CONCRETO (kg./M³)					
CEMENTO:	331	A. FINO:	1359	A. GRUESO:	589
AGUA:	171,96				0
					1,65 Kg

CANTIDADES EN VOLUMEN POR METRO CÚBICO DE CONCRETO (m³/M³)					
CEMENTO:	0,105	A. FINO:	0,52	A. GRUESO:	0,22
AGUA:	0,1720				0
					1,65 Kg

CANTIDADES EN PESO POR BULTO DE CEMENTO (42,50 Kg)					
CEMENTO:	42,5	A. FINO:	174,7	A. GRUESO:	76
AGUA:	22				0
					212,5 Gramos

CANTIDADES EN VOLUMEN POR BULTO DE CEMENTO (42,50 Kg)					
CEMENTO:	30,4 lts	A. FINO:	99,6 lts	A. GRUESO:	52,8 lts
AGUA:	22,1 lts				0
					212,5 Gramos

PROPORCIONES EN PESO			PROPORCIONES EN VOLUMEN		
1 : 4 : 1,8			1 : 3,3 : 1,7		

PROPORCIONES EN BALDES DE 10 lt.					
Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila	10,0	Triturado Planta Hector Vargas / Timana - Huila	6	AGUA:	2,00
				CEMENTO:	42,50 Kg
					0
					100g - 250g

PROPORCIONES EN BALDES DE 8 lt.					
Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila	12,5	Triturado Planta Hector Vargas / Timana - Huila	7	AGUA:	2,5
				CEMENTO:	42,50 Kg
					0
					100g - 250g

CANTIDADES EN VOLUMEN SUELTO PARA PREPARAR UN METRO CÚBICO DE CONCRETO (M³)				
CEMENTO:	7,78 Kg	Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila	0,8 m3	Triturado Planta Hector Vargas / Timana - Huila
				0,41 m3
				AGUA:
				172 Litros

Se debe **VERIFICAR** en campo, la capacidad de los baldes con los cuales se proporciona la mezcla, en el mercado existen baldes de 10 Litros y de 8 Litros. Verificar las capacidades REALES de la HORMIGONERA

Ing. Juan Carlos Caballero A.

ELABORADO POR

42 Barrio Los Samanes, e-mail: sendasuelosyconcretos@gmail.com
Tel: 311 444 86 54 - 310 297 84 24 / Cañón - Huila

Ing. Diana Murcia García

DIRECTOR DE LABORATORIO

 SUELOS Y CONCRETOS S.A.S	RECOMENDACIONES	DMC-01 V.01
--	------------------------	----------------

PROYECTO:	"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA" / 21Mpa
SOLICITADO POR:	CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA
LOCALIZACIÓN:	Timana - Huila

- Deberá tenerse especial cuidado en la adquisición de los agregados, de tal forma que los tamaños sean los mismos que los traídos al laboratorio, para que se conserven las mismas características físicas y mecánicas en la mezcla final.
- Se recomienda hacer un control de gradación cada semana tanto de la arena como de la gravilla, con el fin de hacer los ajustes necesarios en caso de que existan variaciones significativas en los tamaños de los agregados.
- Deberá tenerse en cuenta la humedad de los agregados con el fin de controlar la cantidad de agua de mezclado; entre mayor sea la humedad, menos cantidad de agua se requiere en la mezcla de concreto.
- La forma más indicada de controlar el agua de mezclado, es midiendo el asentamiento a cada batchada que vaya saliendo.
- Se debe VERIFICAR en campo, la capacidad de los baldes con los cuales se preparara la mezcla, en el mercado mercado es comun encontrar baldes con capacidad de 10 Litros y de 8 Litros.
- Tanto la arena como la gravilla, deberán revolverse independientemente cada uno antes del mezclado, con el fin de evitar segregación del agregado, principalmente del grueso y así lograr una mezcla más homogénea.
- Para el control de calidad del concreto en obra, se recomienda tomar muestras en probetas cilíndricas, las cuales deberán ser sometidas al ensayo de compresión.
- Para la toma de muestras se debe contar con una persona idónea que manipule las probetas cilíndricas de la forma correcta como lo especifican los manuales. Los resultados finales de resistencia del concreto, también dependen del manejo que se le dé a la mezcla desde que es sacada de la batchada, hasta que sean retirados los cilindros del curado para ser fallados.
- NSR10 /C.5.6.2.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos dos probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f_c' .
- Para evitar la evaporación de agua del concreto sin endurecer, se recomienda cubrir cada espécimen inmediatamente después del acabado, preferiblemente con una lámina o bolsa no absorbente y no reactiva, durable e impermeable, hasta que los cilindros de concreto sean removidos de los moldes a las 24h $\pm$ 8h después de fundidos.
- Si existen datos de resistencia que no cumplan con la requerida a los 28 días, o que los datos estén por debajo del 85% de la misma, se deberán hacer los ajustes correspondientes para mejorar la mezcla y hacer las correcciones del diseño después de hacer a su vez el chequeo de los agregados.
- Las distancias de acarreo de la mezcla para los cilindros, deberán ser lo más cortas posibles con el fin de evitar pérdida de humedad y segregación de los agregados dentro de la mezcla.
- Se debe tener mucho cuidado en el manejo de las probetas de concreto, ya que los cilindros que se transportan en vehículos inadecuados, pueden sufrir daños considerables, que se verán reflejados en los resultados de la prueba de resistencia a la compresión.
- Las probetas deberán transportarse en cajas preferiblemente de madera, en donde cada cilindro quede en su propio espacio confinado de tal forma que no vaya a sufrir golpes ni fisuras ocasionadas por la vibración, y además en donde conserven la humedad para que su curado no se vea afectado.

ELABORADO POR

Ing. Juan-Carlos Caballero-A.

REVISADO POR

Ing. Diana-Murcia García

Calle 8 Sur N° 15 - 42 Barrio Los Samanes, e-mail: sendsuelosyconcretos@gmail.com

Tel: 311 444 86 54 - 310 297 84 24 / Garzón - Huila

 Suelos y Concretos S.A.S	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELOS Y AGREGADOS FINOS		VEL 24												
			V.01												
PROYECTO:	"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA"														
SOLICITADO POR:	CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA														
LOCALIZACIÓN:	Timana - Huila														
DESCRIPCION DEL MATERIAL:	Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila														
NORMA ASOCIADA:	INVIAS E -133	FECHA:	2023/12/04												
EQUIPO UTILIZADO:	PICNOMETRO, BALANZA, CANASTILLA Y TAMICES SEGÚN NORMA														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ENSAYO No 1</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descripción</td> <td>Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila</td> </tr> <tr> <td>Abscisa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nivel medido de arcilla en mm</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>Nivel medido de arena en mm</td> <td>77</td> </tr> <tr> <td>Equivalente de arena %</td> <td>88,5%</td> </tr> </tbody> </table>				ENSAYO No 1		Descripción	Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila	Abscisa		Nivel medido de arcilla en mm	87	Nivel medido de arena en mm	77	Equivalente de arena %	88,5%
ENSAYO No 1															
Descripción	Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila														
Abscisa															
Nivel medido de arcilla en mm	87														
Nivel medido de arena en mm	77														
Equivalente de arena %	88,5%														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ENSAYO No 2</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descripción</td> <td>Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila</td> </tr> <tr> <td>Abscisa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nivel medido de arcilla en mm</td> <td>89</td> </tr> <tr> <td>Nivel medido de arena en mm</td> <td>78</td> </tr> <tr> <td>Equivalente de arena %</td> <td>87,6%</td> </tr> </tbody> </table>				ENSAYO No 2		Descripción	Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila	Abscisa		Nivel medido de arcilla en mm	89	Nivel medido de arena en mm	78	Equivalente de arena %	87,6%
ENSAYO No 2															
Descripción	Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila														
Abscisa															
Nivel medido de arcilla en mm	89														
Nivel medido de arena en mm	78														
Equivalente de arena %	87,6%														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">ENSAYO No 3</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Descripción</td> <td>Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila</td> </tr> <tr> <td>Abscisa</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Nivel medido de arcilla en mm</td> <td>87</td> </tr> <tr> <td>Nivel medido de arena en mm</td> <td>75</td> </tr> <tr> <td>Equivalente de arena %</td> <td>86,2%</td> </tr> </tbody> </table>				ENSAYO No 3		Descripción	Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila	Abscisa		Nivel medido de arcilla en mm	87	Nivel medido de arena en mm	75	Equivalente de arena %	86,2%
ENSAYO No 3															
Descripción	Arena del Rio Suaza en guadalupe / Timana - Huila														
Abscisa															
Nivel medido de arcilla en mm	87														
Nivel medido de arena en mm	75														
Equivalente de arena %	86,2%														
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">EQUIVALENTE DE ARENA</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>87,5%</td> </tr> <tr> <td>PORCENTAJE MINIMO INVIAS 500</td> <td>60,0%</td> </tr> </tbody> </table>				EQUIVALENTE DE ARENA			87,5%	PORCENTAJE MINIMO INVIAS 500	60,0%						
EQUIVALENTE DE ARENA															
	87,5%														
PORCENTAJE MINIMO INVIAS 500	60,0%														

ELABORADO POR
Ing. Juan Carlos Caballero A.

REVISADO POR
Ing. Diana L. Murcia G.

Calle 8 Sur N° 15 - 42 Barrio Los Samanes . e-mail sendosuelosyconcretos@gmail.com
Tel: 311 444 86 64 - 310 297 84 24 / Garzón - Huila

 INDERHULLA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página

SOPORTES DE ENSAYOS Y/O PRUEBAS DE LABORATORIOS.



Suelos y Concretos S.A.S

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

VEL-005

V.01

PROYECTO:

Cal

Cal

SOLICITADO POR:

CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA

LOCALIZACIÓN:

Zapatas Concreto 3000 PSI

NORMA ASOCIADA:

ASTM C-31, C-39a, C-143M, INV E 410-22, NTC 673

EQUIPO UTILIZADO:

EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&R, BALANZA, PIE DE REY

FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:

2/01/2024

"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DE CAQUETA"

1.680.866.6

Cilindro N°	N° Interno	Localización	Peso	Altura	Díametro	Area cm ²	Densidad kg/m ³	Fecha Fundido	Fecha Fallado	Edad Fallado	Carga KN	Resistencia PSI	Resistencia MPa	Falla Tipo	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio MPa
17382	144	Zapatas Concreto 3000 PSI	3,78	20,00	10,00	78,54	2406,42	30/12/23	06/01/24	7	98,70 KN	1822,21 PSI	12,57 MPa	2	1886,83 PSI	13,01 MPa
17383	86		3,50	20,00	10,00	78,54	2228,17	30/12/23	06/01/24	7	105,70 KN	1951,45 PSI	13,46 MPa	3		
17384	54		3,99	20,00	10,00	78,54	2536,93	30/12/23	13/01/24	14	144,20 KN	2662,24 PSI	18,36 MPa	4		
17385	110		3,70	20,00	10,00	78,54	2353,58	30/12/23	13/01/24	14	152,90 KN	2822,86 PSI	19,47 MPa	3	2742,55 PSI	18,91 MPa
17386	29		3,56	20,50	10,00	78,54	2209,85	30/12/23	27/01/24	28	165,20 KN	3049,95 PSI	21,03 MPa	3		
17387	84		3,51	20,20	10,00	78,54	2212,41	30/12/23	27/01/24	28	166,70 KN	3077,64 PSI	21,22 MPa	2	3063,79 PSI	21,13 MPa

PROBETAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE / NSR10 - C.5.6.2.4 - Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos tres probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f'c.

Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673

TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6
Como Razonablemente Extremos	Como Bien Formado En Un Extremo Pero No En El Otro. Grietas Verticales Que Llegan A Los Extremos	Agrietamiento Vertical Columnar Que Aparece En Ambos Extremos. No Hay Conos Bien Formados En Ambos Extremos.	Fractura Diagonal Sin Grietas Graves De Los Extremos. Se Deb Golpear Con Martillo Para Romperlo De Tipo 4	Fracturas En Las Esquinas (Usuales En Cilindros Sin Refuerzos)	Similar Al Tipo 5 Pero Las Grietas Tienden A A Unirse En La Superficie Del Cilindro.

ELABORADO POR

Ing. Juan Carlos Caballero

REVISADO POR

Ing. Diana Lorena Murcia

415

Suelos y Concretos S.A.S		COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO		VEL-005											
				V.01											
PROYECTO: "CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DE LA GUAYANA BOLIVIANA"															
SOLICITADO POR: CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA															
LOCALIZACIÓN: Vigas de Cimentación Concreto 3000 PSI															
NORMA ASOCIADA: ASTM C-31, C-39a, C-143M, INV E 410-22, NTC 673															
EQUIPO UTILIZADO: EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&R, BALANZA, PIE DE REY															
FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS: 15/01/2024															
Cilindro No	Localización	Peso	Altura	Diametro	Area	Densidad	Fecha Fundido	Fecha Fallado	Edad Fallado	Carga KN	Resistencia PSI	Resistencia MPa	Falla Tipo	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio MPa
17539	Vigas de Cimentación Concreto 3000 PSI	3,69	20,00	10,00	78,54	2348,49	12/01/24	19/01/24	7	94,70 KN	1748,37 PSI	12,06 MPa	3	1892,37 PSI	13,05 MPa
17540		3,75	20,00	10,00	78,54	2389,87	12/01/24	19/01/24	7	110,30 KN	2036,37 PSI	14,04 MPa	2		
17541		3,36	20,00	10,00	78,54	2137,13	12/01/24	26/01/24	14	135,80 KN	2507,16 PSI	17,29 MPa	4		
17542		3,76	20,00	10,00	78,54	2391,14	12/01/24	26/01/24	14	140,40 KN	2592,09 PSI	17,88 MPa	4		
17543							12/01/24	09/02/24	28						
17544							12/01/24	09/02/24	28						
PROBETAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE / NBR10 - C5.6.2.4 - Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos tres probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f'c.															
Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673															
TIPO 1		TIPO 2		TIPO 3		TIPO 4		TIPO 5		TIPO 6					
Como Razonablemente Extremos	Bien Formados En Ambos	Como Bien Formados En Un Extremo Pero No En El Otro - Aristas Verticales Que Llegan A Los Extremos	Agrietamiento Vertical - Columna Que Abanca Ambos Extremos. No Hay Conos Bien Formados	Fractura Diagonal Sin Ganchos A Traves De Los Extremos. Se Debe Golpear Con Mergullo Para Rompimiento De Tipo 2	Fracturas En Las Esquinas (Usuales En Cilindros Sin Reforzar)	Similar Al Tipo 5 Pero Las Esquinas Tienden A A Unirse En La Superficie Del Cilindro.									
ELABORADO POR: Ing. Juan Carlos Caballero						REVISADO POR: Ing. Diana Lorena Murcia						3 de 4			



Suelos y Concretos S.A.S

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

VEL-005

V.01

PROYECTO:

Cal

SOLICITADO POR:

Informe

LOCALIZACIÓN:

NORMA ASOCIADA:

EQUIPO UTILIZADO:

"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DE HUILA"

CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA

Columnas Concreto 3000 PSI

457M C-31, C-39a, C-143M, INV E 410-22, NTC 673

FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS: 26/01/2024

Cilindro No	No Interno	Localización	Peso	Altura	Diametro	Area cm ²	Densidad kg/m ³	Fecha Fundido	Fecha Fallado	Edad Fallado	Carga KN	Resistencia PSI	Resistencia MPa	Falla Tipo	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio MPa
17545	344	Columnas Concreto 3000 PSI	3,58	20,00	10,00	78,54	2277,93	23/01/24	30/01/24	7	105,60 KN	1949,60 PSI	13,45 MPa	3	2040,07 PSI	14,07 MPa
17546	86		3,48	20,00	10,00	78,54	2214,16	23/01/24	30/01/24	7	115,40 KN	2130,53 PSI	14,69 MPa	5		
17547	54		3,97	20,00	10,00	78,54	2524,20	23/01/24	06/02/24	14	143,80 KN	2654,86 PSI	18,31 MPa	3		
17548	310		3,69	20,00	10,00	78,54	2345,94	23/01/24	06/02/24	14	150,60 KN	2780,40 PSI	19,17 MPa	2	2717,63 PSI	18,74 MPa
17549	297							23/01/24	20/02/24	28						
17550	781							23/01/24	20/02/24	28						

PROBETAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE / NSR10 - C.5.6.2.4 - Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos tres probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f'c.

Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673

TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6
Como Razonablemente Extremos	Como Bien Formado En Un Extremo Pero No En El Otro, Grietas Verticales Que Llegan A Los Extremos	Como Bien Formado En Un Extremo Pero No En El Otro, Grietas Verticales Que Llegan A Los Extremos. No Hay Conos Bien Formados	Fractura Diagonal Sin Grietas A Través De Los Extremos, Se Deb Golpear Con Martillo Para Romperlo De Tipo 4	Fracturas En Las Esquinas (Usuales En Cilindros Sin Refrendar)	Similar Al Tipo 5 Pero Las Grietas Tienden A Unirse En La Superficie Del Cilindro.

ELABORADO POR:

Ing. Juan Carlos Caballero

REVISADO POR:

Ing. Diana Lorena Murcia

4 de 4

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

VEL-005

V.01

PROYECTO:

Calles de la zona de la

"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DE LA GUAYANA BOLIVIANA"

SOLICITADO POR:

CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA

LOCALIZACIÓN:

Zapatas Concreto 3000 PSI

NORMA ASOCIADA:

ASTM C-31, C-39a, C-143M, INV E 410-22, NTC 673

EQUIPO UTILIZADO:

EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&R, BALANZA, PIE DE REY

FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:

2/01/2024

Cilindro No	Localización	Peso	Altura	Diametro	Area	Densidad	Fecha Fundido	Fecha Fallado	Edad Fallado	Carga KN	Resistencia PSI	Resistencia MPa	Falla Tipo	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio MPa	Señal
17382	Zapatas Concreto 3000 PSI	3,78	20,00	10,00	78,54	2406,42	30/12/23	06/01/24	7	98,70 KN	1822,21 PSI	12,57 MPa	2	1886,83 PSI	13,01 MPa	
17383		3,50	20,00	10,00	78,54	2228,17	30/12/23	06/01/24	7	105,70 KN	1951,45 PSI	13,46 MPa	3			
17384		3,99	20,00	10,00	78,54	2536,93	30/12/23	13/01/24	14	144,20 KN	2662,24 PSI	18,56 MPa	4			
17385		3,70	20,00	10,00	78,54	2353,58	30/12/23	13/01/24	14	152,90 KN	2822,86 PSI	19,47 MPa	3	2742,55 PSI	18,91 MPa	
17386		3,56	20,50	10,00	78,54	2209,85	30/12/23	27/01/24	28	165,20 KN	3049,95 PSI	21,03 MPa	3			
17387		3,51	20,20	10,00	78,54	2212,41	30/12/23	27/01/24	28	166,70 KN	3077,64 PSI	21,22 MPa	2	3063,79 PSI	21,13 MPa	

PROBETAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE / MSR10 - C5.6.2.4 - Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos tres probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f'c.

Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673

TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6
Como Razonablemente Extremos	Como Bien Formados En Un Extremo Pero No En El Otro, O En Verticales Que Llegan A Los Extremos	Como Bien Formados En Un Extremo Pero No En El Otro, O En Verticales Que Llegan A Los Extremos. No Hay Conos Bien Formados En Ambos Extremos. Verificar Columnas Que Muestran Agrietamiento Vertical	Fractura Original Sin Grietas A Traves De Los Extremos. Se Deb Golpear Con Martillo Para Romper De Tipo 4	Fracturas En Las Esquinas (Usuales En Cilindros Sin Reforzar)	Similar Al Tipo 5 Pero Las Grietas Tienden A A Unirse En La Superficie Del Cilindro.

ELABORADO POR
Ing. Juan Carlos Caballero

REVISADO POR

Ing. Diana Lorena Murcia



Suelos y Concretos S.A.S

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

VEL-005

V.01

PROYECTO:

Cal

"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DE HUILA"

SOLICITADO POR:

CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA

LOCALIZACIÓN:

Columnas Concreto 3000 PSI

NORMA ASOCIADA:

ASTM C-31, C-39a, C-143M, INV E 410-22, NTC 673

EQUIPO UTILIZADO:

EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&R, BALANZA, PIE DE REY

FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:

26/01/2024


Cilindro No	No. Interno	Localización	Peso	Altura	Diametro	Area cm ²	Densidad kg/m ³	Fecha Fundido	Fecha Fallado	Edad Fallado	Carga KN	Resistencia PSI	Resistencia MPa	Falla Tipo	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio MPa	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio MPa
17545	144	Columnas Concreto 3000 PSI	3,58	20,00	10,00	78,54	2217,83	23/01/24	30/01/24	7	105,60 KN	1949,60 PSI	13,45 MPa	3	2040,07 PSI	14,07 MPa		
17546	86		3,48	20,00	10,00	78,54	2214,16	23/01/24	30/01/24	7	115,40 KN	2130,53 PSI	14,69 MPa	5				
17547	54		3,97	20,00	10,00	78,54	2524,20	23/01/24	06/02/24	14	143,80 KN	2654,86 PSI	18,31 MPa	3				
17548	310		3,69	20,00	10,00	78,54	2345,94	23/01/24	06/02/24	14	150,60 KN	2780,40 PSI	19,17 MPa	2	2717,63 PSI	18,74 MPa		
17604	29	Columnas Concreto 3000 PSI	13,10	30,70	15,30	183,85	2321,27	23/01/24	30/01/24	7	546,20 KN	4307,75 PSI	29,71 MPa	N.F				
17605	83		13,22	30,60	15,40	186,27	2319,42	23/01/24	20/02/24	28	528,70 KN	4115,76 PSI	28,38 MPa	N.F	4211,76 PSI	29,05 MPa		

PROBETAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE / NSR10 - C.5.6.2.4 - Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos tres probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f'c.

Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673

Coro Razonablemente Extremos	Están Formados En Ambos Extremos	Como Bien Formados En Un Extremo Pero No En El Otro, Grietas Verticales Que Llegan A Los Extremos	Agrietamiento Vertical Columnar Que, Abanca Ambos Extremos. No Hay Conos Bien Formados	Fractura Diagonal Sin Grietas O Traves De Los Extremos. Se Deb Colocar Con Habilidad Para el Modelo De Tipo 2	TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6

Elaborado por: 
Ing. Juan Carlos Caballero

Revisado por: 
Ing. Diana Lorena Murcia



Suelos y Concretos S.A.S

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

VEL-005

V.01

PROYECTO: Cal

SOLICITADO POR: CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA

LOCALIZACIÓN: Viga de Cimentación eje 2 Concreto 3000 PSI

NORMA ASOCIADA: ASTM C-31, C-39a, C-143M, INV E 410-22, NTC 673

EQUIPO UTILIZADO: EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&R, BALANZA, PIE DE REY

FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS: 31/01/2024

SEND



SUELOS Y CONCRETOS

1.680.860.000

PROBETAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE / NSR10 - C5.6.2.4 - Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos tres probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de cura establecida para la determinación de f'c.

Cilindro Nº	Nº Interno	Localización	Peso	Alfaca	Dímetro	Area cm ²	Densidad kg/m ³	Fecha Fundido	Fecha Fallado	Edad Fallado	Carga kN	Resistencia PSI	Resistencia MPa	Falla Tipo	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio MPa
17602	144	Viga de Cimentación eje 2 Concreto 3000 PSI	12,59	30,40	15,30	183,85	2251,86	28/01/24	04/02/24	7	432,40 kN	3410,24 PSI	23,52 MPa	3	3829,56 PSI	26,41 MPa
17603	86		13,39	30,50	15,49	186,27	2356,59	28/01/24	25/02/24	28	545,80 kN	4248,88 PSI	29,30 MPa	N.F		
	54															
	310															
	297															
	84															
	24															
	26															
	10															
	8															
	2															

Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673

TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6
					
Como Razonablemente Extremos	Como Bien Formados En Un Extremo Pero No En El Otro, Las Verticales Que Llegan A Los Extremos	Agrietamiento Vertical Columnar Que, Alargado, Se Deb Golpear Con Martillo Para Ambos Extremos. No Hay Conos Bien Formados	Fractura Diagonal Sin Grietas A Traves De Los Extremos. Se Deb Golpear Con Martillo Para el Desarrollo De Tipo 4	Fracturas En Las Esquinas (Usuales En Cilindros Sin Refrendar)	Similar Al Tipo 5 Pero Las Grietas Tienden A A Unirse En La Superficie Del Cilindro.


ELABORADO POR

Ing. Juan Carlos Caballero

REVISADO POR

Ing. Diana Lorena Murcia

SEND Suelos y Concretos S.A.S		COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO										VEL-005					
												V.01					
PROYECTO:		"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DE HUILA"															
SOLICITADO POR:		CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA															
LOCALIZACIÓN:		Zapatas Concreto 3000 PSI															
NORMA ASOCIADA:		ASTM C-31, C-39, C-143M, INV E 410-22, NTC 673															
EQUIPO UTILIZADO:		EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&R, BALANZA, PIE DE REY															
FECHA:		31/12/2023															
Cilindro Nº	Nº Interno	Localización	Peso	Alfuz	Diametro	Area	Densidad	Fecha Fundido	Fecha Fallado	Edad Fallado	Carga KN	Resistencia PSI	Resistencia MPa	Falla Tipo	Resistencia Promedio PSI	Resistencia Promedio MPa	
17606	144	Zapatas Concreto 3000 PSI	13,37	30,60	15,60	191,13	2285,97	28/12/23	25/01/24	28	530,20 KN	4022,28 PSI	27,74 MPa	N.F	4120,79 PSI	28,42 MPa	
17607	146		13,43	30,60	15,60	186,27	2356,26	28/12/23	25/01/24	28	542,00 KN	4219,30 PSI	29,10 MPa	N.F			
PROBETAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE / NSR10 - C.5.6.2.4. - Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos tres probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f'c.																	
Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673																	
TIPO 1		TIPO 2		TIPO 3		TIPO 4		TIPO 5		TIPO 6		TIPO 7		TIPO 8		TIPO 9	
Como Razonablemente Extremos		Como Bien Formado En Un Extremo Pero No En El Otro. Grietas Verticales Que Llegan A Los Extremos		Agritamiento Vertical Columnar Que Abarca Ambos Extremos. No Hay Conos Bien Formados		Fractura Diagonal Sin Grietas A Través De Los Extremos. Se Deb Golpear Con Martillo Para Romperlo De Tipo 4		Fracturas En Las Esquinas (Usuales En Cilindros Sin Refrendar)		Similar Al Tipo 5 Pero Las Grietas Tienden A A Unirse En La Superficie Del Cilindro.							
ELABORADO POR		Ing. Juan Carlos Caballero		REVISADO POR		Ing. Diana Lorena Murcia											



Suelos y Concretos S.A.S.

COMPRESIÓN DE PROBETAS DE CONCRETO HIDRÁULICO

VEL-005

V.01

PROYECTO:

Ca

SOLICITADO POR:

LOCALIZACIÓN

NORMA ASSOCIADA:

EQUIPO UTILIZADO:

"CONSTRUCCION E ILUMINACION DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DE YUCATA"

CONSORCIO NARANJAL CUBIERTA

Vigas de Cimentación Tramo Final Concreto 3000 PSI

~~ASTM C-31, C-39a, C-143M, INV E 410-22, NTC 673~~

EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&B BALANZA PTE DE REV

FECHA RECEPCIÓN DE MUESTRAS:


27/01/2015

EQUIPO PARA ENSAYO DE COMPRESION MARCA R&R, BALANZA, PIE DE REY

[illegible]

PROBETAS SUMINISTRADAS POR EL CLIENTE / NSR-0 - C.5.6.2.4.4 — Un ensayo de resistencia debe ser el promedio de las resistencias de al menos tres probetas de 150 por 300 mm o de al menos tres probetas de 100 por 200 mm, preparadas de la misma muestra de concreto y ensayadas a 28 días o a la edad de ensayo establecida para la determinación de f'_c .

Esquema de los Modelos de Fractura Típicos NTC 673

TIPO 1	TIPO 2	TIPO 3	TIPO 4	TIPO 5	TIPO 6
					
Bien Formados En Ambos Como Bien Formado En Un Extremo Pero No En El Otro, Grutas Verticales Que Llegan A Los Extremos	Agrietamiento Vertical Columnar Que, Alargado, Se Debe Golpear Con Martillo Para Romperlo De Trozos	Fractura Diagonal Sin Grietas Traves De Los Extremos, Se Debe Golpear Con Martillo Para Romperlo De Trozos	Fracturas En Las Esquinas (Usuales En Cilindros Sin Refrendar)	Similar Al Tipo 5 Pero Las Grietas Tienden A A Unirse En La Superficie Del Cilindro.	

REVISÃO POR

Ing. Diana Lorena Murcia

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página

CONTRATISTA DE INTERVENTORÍA.

AOLAB INGENIERIAS SAS

**INFORME DEL ENSAYO COMPRESION DE CILINDROS DE
CONCRETOS**

CLIENTE: INGENIERIA DANISA SAS

PROYECTO

**"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y
FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN E
ILUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO
POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA
DEPARTAMENTO DEL HUILA".**

LOCALIZACION

**CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA
DEPARTAMENTO DEL HUILA**

FEBRERO DEL 2024

REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO												I.N.V. 410-13	
CLIENTE													
INGENIERIA DANISA SAS													
PROYECTO													
"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN E LUMINACIÓN DE CUBIERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA".													
UBICACIÓN													
MUNICIPIO DE TMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA													
FECHA EMISION INFORME:													
FEBRERO DEL 2024													
FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. INTERNO LABORATORIO	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Días)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación	
20/1/2024	30/12/2023	1	Diametro	Longitud	KN	7	6/01/2024	2220	74%	4	3000	CONCRETO ZAPATAS	
	30/12/2023		10,00	20,00	120,2	7	6/01/2024	2277	76%	5	3000		
	30/12/2023		10,00	20,00	155,6	14	13/01/2024	2873	96%	4	3000		
	30/12/2023		10,00	20,00	152,2	14	13/01/2024	2811	94%	3	3000		
	30/12/2023		10,00	20,00	186,0	28	27/01/2024	3435	114%	4	3000		
	30/12/2023		10,00	20,00	182,0	28	27/01/2024	3361	112%	3	3000		
ESQUEMA DE LAS DE FRACTURAS TÍPICAS													
 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6													
OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS HAN SIDO TOMADAS Y TRANSPORTADAS POR EL CLIENTE HASTA EL LABORATORIO. EL COMPORTAMIENTO PARA UN CONCRETO COMBENSIONAL (SIN ADITIVO) SERA: A LOS 1d= 15% 3d= 40% 7d= 70% 14d= 90% 28d= 100% CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%													

AOLAB INGENIERIAS SAS

REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO

I.N.V. 410-13

CLIENTE

INGENIERIA DANISA SAS

PROYECTO

"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA".

UBICACIÓN

MUNICIPIO DE TIMANA DEPARTAMENTO DEL HUILA

FECHA EMISION INFORME

FEBRERO DEL 2024

FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. INTERNO LABORATORIO	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Días)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	%de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación
			Diámetro	Longitud								
14/01/2024	12/01/2024	2	10,00	20,00	115,6	7	19/01/2024	2135	71%	4	3000	CONCRETO VIGA DE CIMENTACION
	12/01/2024		10,00	20,00	119,5	7	19/01/2024	2207	74%	5	3000	
	12/01/2024		10,00	20,00	145,6	14	26/01/2024	2689	90%	4	3000	
	12/01/2024		10,00	20,00	147,5	14	26/01/2024	2724	91%	5	3000	
	12/01/2024		10,00	20,00	171,9	28	9/02/2024	3175	106%	5	3000	
	12/01/2024		10,00	20,00	176,5	28	9/02/2024	3259	109%	3	3000	

ESQUEMA DE LAS DE FRACTURAS TÍPICAS

Tipo 1

Tipo 2

Tipo 3

Tipo 4

Tipo 5

Tipo 6

OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS HAN SIDO TOMADAS Y TRANSPORTADAS POR EL CLIENTE HASTA EL LABORATORIO. EL COMPORTAMIENTO PARA UN CONCRETO COMBENSIONAL (SIN ADITIVO) SERA: A LOS 1d= 15% 3d= 40% 7d= 70% 14d= 90% 28d= 100% CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%

CALCULO

DIRECTOR DE LABORATORIO

ingenieriadessuelosolab@gmail.com / calle 76 # 1ª bis -33 puertas del edén /3223634775

220

AOLAB INGENIERIAS SAS

REPORTE DE ENSAYO RESISTENCIA A LA COMPRESION DE CILINDROS DE CONCRETO												I.N.V. 410-13	
CLIENTE													
INGENIERIA DANISA SAS													
PROYECTO													
"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, LEGAL Y FINANCIERA AL CONTRATO CUYO OBJETO ES "CONSTRUCCIÓN E ILUMINACIÓN DE CUBERTA DEL POLIDEPORTIVO DEL CENTRO POBLADO NARANJAL EN EL MUNICIPIO DE TIANA DEPARTAMENTO DEL HUILA".													
UBICACIÓN													
MUNICIPIO DE TIANA DEPARTAMENTO DEL HUILA													
FECHA EMISION INFORME:													
FEBRERO DEL 2024													
FECHA DE INGRESO DEL CILINDRO	FECHA DE FUNDICION DEL CILINDRO	COD. INTERNO LABORATORIO	DIMENSIONES CILINDRO		Lectura	Edad (Dias)	Fecha de Rotura	Resistencia Obtenida (PSI)	% de Fraguado	Tipo de falla	Especificación Resistencia (PSI)	Observaciones y/o Ubicación	
25/01/2024	23/01/2024	3	Diametro	Longitud	KN	7	30/01/2024	2179	73%	4	3000	CONCRETO COLUMNAS	
	10,00		20,00	118,0	2334			78%	4	3000			
	10,00		20,00	125,4	2794			93%	5	3000			
	10,00		20,00	151,3	2840			95%	2	3000			
	10,00		20,00	182,0	3361			112%	3	3000			
	10,00		20,00	177,5	3278			109%	3	3000			
ESQUEMA DE LAS DE FRACTURAS TÍPICAS													
 Tipo 1 Tipo 2 Tipo 3 Tipo 4 Tipo 5 Tipo 6													
OBSERVACIONES: LAS MUESTRAS HAN SIDO TOMADAS Y TRANSPORTADAS POR EL CLIENTE HASTA EL LABORATORIO. EL COMPORTAMIENTO PARA UN CONCRETO COMBENSIONAL (SIN ADITIVO) SERA: A LOS 1d= 15%, 3d= 40%, 7d= 70%, 14d= 90%, 28d= 100% CON UNA TOLERANCIA DE +/- 5%													
CALCULO DIRECTOR DE LABORATORIO													
ingenieriadesuelosaolab@gmail.com / calle 76 # 1ª bis -33 puertas del edén /3223634775													

 INDERHUILA	SISTEMA DE GESTION: MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG	Código: IDH-CGID-F06
	INFORME DE INTERVENTORIA	Versión: 2
Fecha Aprobación: 13/02/2023		Página

CERTIFICADO CALIDAD MATERIALES.

424



LLC ORGANISMO DE CERTIFICACIÓN S.A.S CERTIFICA QUE:

IMPORTADORES ELÉCTRICOS BOGOTÁ S.A.S

NIT 901497928

Carrera 12 # 17-94 Oficina 301, Bogotá D.C., Colombia.

NIT. 901497928

VALIDO HASTA 25/05/2027

Fue evaluado y obtuvo el certificado de conformidad de producto para **TUBERÍAS Y CAJAS DE ALUMINIO** Productos cubiertos únicamente en la descripción/características/tipo y referencias del documento(s) Anexo(s) Referencias Certificadas. Bajo el Esquema de Certificación 5 - ISO/IEC 17067:2013 y el referente normativo: Resolución 90708 de 2013, Agosto 30 de 2013, **ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETIE)** y sus modificaciones con la Resolución 90907 del 25 de Octubre de 2013, Resolución 90795 de 25 de Julio de 2014, Resolución 40492 del 24 de Abril de 2015, Resolución 40908 del 5 de Septiembre de 2018 del Ministerio de Minas y Energía. Artículo 20 numeral 20.5 y 20.6.1.

Certificado de conformidad de producto No. 2404011531
LLC Organismo de Certificación SAS.
Carrera 12 # 17-94 Oficina 301, Bogotá D.C., Colombia.
Fecha de Emisión: 27/05/2024.
Fecha primer seguimiento: 26/05/2025.
Fecha Segundo seguimiento: 25/05/2026.
Fecha de Vencimiento: 25/05/2027.

Autorizado por
VALERIA VARGAS SANCHEZ
Representante Legal



IMPORTADORES ELÉCTRICOS
BOGOTÁ S.A.S.



ISO/IEC 17065:2012
23-CPR-004



ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2404011531



ANEXO GENERAL REGLAMENTO TÉCNICO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS (RETI) y sus modificaciones con la Resolución 90907 del 25 de octubre de 2013. Artículo 20 numerales 20.5 Y 20.6.1

Ítem	Descripción / Característica / Tipo	Referencia
1	Tubo EMT 1/2	EMT 1/2
2	Tubo EMT 3/4	EMT 3/4
3	Tubo EMT 1	EMT 1
4	Tubo EMT 1-1/4	EMT 1-1/4
5	Tubo EMT 1-1/2	EMT 1-1/2
6	Tubo EMT 2	EMT 2
7	Tubo EMT 2-1/2	EMT 2-1/2
8	Tubo EMT 3	EMT 3
9	Tubo EMT 3-1/2	EMT 3-1/2
10	Tubo EMT 4	EMT 4
11	Tubo EMT 6	EMT 6



ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2404011531



12	Tubo RIGID 4	RIGID 4
13	Tubo RIGID 6	RIGID 6
14	Tubo IMC 1/2	IMC 1/2
15	Tubo IMC 3/4	IMC 3/4
16	Tubo IMC 1	IMC 1
17	Tubo IMC 1-1/4	IMC 1-1/4
18	Tubo IMC 1-1/2	IMC 1-1/2
19	Tubo IMC 2	IMC 2
20	Tubo IMC 2-1/2	IMC 2-1/2
21	Tubo IMC 3	IMC 3
22	Tubo IMC 3-1/2	IMC 3-1/2
23	Tubo IMC 4	IMC 4
24	TUBO IMC 6	IMC 6



IMPORTADORES ELÉCTRICOS
BOGOTÁ S.A.S



ISO/IEC 17065:2012
23-CPR-004



CPR-GC-FR-21 V4
2024-05-07
Página 1 de 1

ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2404011531



25	Conector para EMT Acero H-50S	EMT ACERO H-50S
26	Conector para EMT Acero H-75S	EMT ACERO H-75S
27	Conector para EMT Acero H-100S	EMT ACERO H-100S
28	Conector para EMT Acero H-125S	EMT ACERO H-125S
	Conector para EMT Acero H-150S	EMT ACERO H-150S
30	Conector para EMT Acero H-200S	EMT ACERO H-200S
31	Conector para EMT Acero H-250S	EMT ACERO H-250S
32	Conector para EMT Acero H-300S	EMT ACERO H-300S
33	Conector para EMT Acero H-350S	EMT ACERO H-350S
34	Conector para EMT Acero H-400S	EMT ACERO H-400S
35	Conector para EMT ALUMINIO H-50AL	EMT ALUMINIO H-50AL
36	Conector para EMT Aluminio H-75AL	EMT ALUMINIO H-75AL
37	Conector para EMT Aluminio H-100AL	EMT ALUMINIO H-100AL



ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2404011531



38	Conector para EMT Aluminio H-125AL	EMT ALUMINIO H-125AL
39	Conector para EMT Aluminio H-150AL	EMT ALUMINIO H-150AL
40	Conector para EMT Aluminio H-200AL	EMT ALUMINIO H-200AL
41	Conector para EMT Aluminio H-250AL	EMT ALUMINIO H-250AL
42	Conector para EMT Aluminio H-300AL	EMT ALUMINIO H-300AL
43	Conector para EMT Aluminio H-350AL	EMT ALUMINIO H-350AL
44	Conector para EMT Aluminio H-400AL	EMT ALUMINIO H-400AL
45	Conector recto para coraza SLTC-38	CONECTOR RECTO PARA CORAZA SLTC-38
46	Conector recto para coraza SLTC-50	CONECTOR RECTO PARA CORAZA SLTC-50
47	Conector recto para coraza SLTC-75	CONECTOR RECTO PARA CORAZA SLTC-75
48	Conector recto para coraza SLTC-100	CONECTOR RECTO PARA CORAZA SLTC-100
49	Conector recto para coraza SLTC-125	CONECTOR RECTO PARA CORAZA SLTC-125
50	Conector recto para coraza SLTC-150	CONECTOR RECTO PARA CORAZA SLTC-150



ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2404011531



51	Conector recto para coraza SLTC-200	CONECTOR RECTO PARA CORAZA SLTC- 200
52	Conector recto para coraza SLTC-250	CONECTOR RECTO PARA CORAZA SLTC- 250
53	Conector recto para coraza SLTC-300	CONECTOR RECTO PARA CORAZA SLTC- 300
54	Conector recto para coraza SLTC-350	CONECTOR RECTO PARA CORAZA SLTC- 350
55	Conector recto para coraza SLTC-400	CONECTOR RECTO PARA CORAZA SLTC- 400
56	Conector curvo para coraza LTC-38	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-38
57	Conector curvo para coraza LTC-50	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-50
58	Conector curvo para coraza LTC-75	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-75
59	Conector curvo para coraza LTC-100	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-100
60	Conector curvo para coraza LTC-125	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-125
61	Conector curvo para coraza LTC-150	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-150
62	Conector curvo para coraza LTC-200	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-200
63	Conector curvo para coraza LTC-250	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-250



ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2404011531



64	Conector curvo para coraza LTC-300	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-300
65	Conector curvo para coraza LTC-350	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-350
66	Conector curvo para coraza LTC-400	CONECTOR CURVO PARA CORAZA LTC-400
67	Union EMT Acero Z-50S	EMT ACERO Z-50S
68	Union EMT Acero Z-75S	EMT ACERO Z-75S
69	Union EMT Acero Z-100S	EMT ACERO Z-100S
70	Union EMT Acero Z-125S	EMT ACERO Z-125S
71	Union EMT Acero Z-150S	EMT ACERO Z-150S
72	Union EMT Acero Z-200S	EMT ACERO Z-200S
73	Union EMT Acero Z-250S	EMT ACERO Z-250S
74	Union EMT Acero Z-300S	EMT ACERO Z-300S
75	Union EMT Acero Z-350S	EMT ACERO Z-350S
76	Union EMT Acero Z-400S	EMT ACERO Z-400S



IMPORTADORES ELÉCTRICOS
BOGOTÁ S.A.S



ISO/IEC 17065:2012
23-CPR-004



CPR-GC-FR-21 V4
2024-05-07
Página 1 de 1

ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2404011531



77	Union EMT Aluminio Z-50AL	EMT ALUMINIO Z-50AL
78	Union EMT Aluminio Z-75AL	EMT ALUMINIO Z-75AL
79	Union EMT Aluminio Z-100AL	EMT ALUMINIO Z-100AL
80	Union EMT Aluminio Z-125AL	EMT ALUMINIO Z-125AL
81	Union EMT Aluminio Z-150AL	EMT ALUMINIO Z-150AL
82	Union EMT Aluminio Z-200AL	EMT ALUMINIO Z-200AL
83	Union EMT Aluminio Z-250AL	EMT ALUMINIO Z-250AL
84	Union EMT Aluminio Z-300AL	EMT ALUMINIO Z-300AL
85	Union EMT Aluminio Z-350AL	EMT ALUMINIO Z-350AL
86	Union EMT Aluminio Z-400AL	EMT ALUMINIO Z-400AL
87	Union IMC Galvanizada PF-50	IMC GALVANIZADA PF-50
88	Union IMC Galvanizada PF-75	IMC GALVANIZADA PF-75
89	Union IMC Galvanizada PF-100	IMC GALVANIZADA PF-100



ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
 N° 2404011531



90	Union IMC Galvanizada PF-125	IMC GALVANIZADA PF-125
91	Union IMC Galvanizada PF-150	IMC GALVANIZADA PF-150
92	Union IMC Galvanizada PF-200	IMC GALVANIZADA PF-200
93	Union IMC Galvanizada PF-250	IMC GALVANIZADA PF-250
94	Union IMC Galvanizada PF-300	IMC GALVANIZADA PF-300
95	Union IMC Galvanizada PF-350	IMC GALVANIZADA PF-350
96	Union IMC Galvanizada PF-400	IMC GALVANIZADA PF-400
97	Union IMC Galvanizada PF-500	IMC GALVANIZADA PF-500
98	Union IMC Galvanizada PF-600	IMC GALVANIZADA PF-600
99	Curva EMT PJE-50S	EMT PJE-50S
100	Curva EMT PJE-75S	EMT PJE-75S
101	Curva EMT PJE-100S	EMT PJE-100S
102	Curva EMT PJE-125S	EMT PJE-125S



IMPORTADORES ELÉCTRICOS
BOGOTÁ S.A.S



ISO/IEC 17065:2012
23-CPR-004



CPR-GC-FR-21 V4
2024-05-07
Página 1 de 1

ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
 CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
 N° 2404011531



103	Curva EMT PJE-150S	EMT PJE-150S
104	Curva EMT PJE-200S	EMT PJE-200S
105	Curva EMT PJE-250S	EMT PJE-250S
106	Curva EMT PJE-300S	EMT PJE-300S
107	Curva EMT PJE-350S	EMT PJE-350S
108	Curva EMT PJE-400S	EMT PJE-400S
109	Curva IMC PNE-50	IMC PNE-50
110	Curva IMC PNE-75	IMC PNE-75
111	Curva IMC PNE-100	IMC PNE-100
112	Curva IMC PNE-125	IMC PNE-125
113	Curva IMC PNE-150	IMC PNE-150
114	Curva IMC PNE-200	IMC PNE-200
115	Curva IMC PNE-250	IMC PNE-250



ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2404011531



116	Curva IMC PNE-300	IMC PNE-300
117	Curva IMC PNE-350	IMC PNE-350
118	Curva IMC PNE-400S	IMC PNE-400S
119	Curva IMC PNE-600	IMC PNE-600
120	Capacetes EC1-50	CAPACETES EC1-50
121	Capacetes EC1-75	CAPACETES EC1-75
122	Capacetes EC1-100	CAPACETES EC1-100
123	Capacetes EC1-125	CAPACETES EC1-125
124	Capacetes EC1-150	CAPACETES EC1-150
125	Capacetes EC1-200	CAPACETES EC1-200
126	Capacetes EC1-250	CAPACETES EC1-250
127	Capacetes EC1-300	CAPACETES EC1-300
128	Capacetes EC1-350	CAPACETES EC1-350



IMPORTADORES ELÉCTRICOS
BOGOTÁ S.A.S.



ISO/IEC 17065:2012
23-CPR-004



CPR-GC-FR-21 V4
2024-05-07
Página 1 de 1

ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2404011531



129	Capacetes EC1-400	CAPACETES EC1-400
130	Boquilla IMC MCB-50	IMC MCB-50
131	Boquilla IMC MCB-75	IMC MCB-75
132	Boquilla IMC MCB-100	IMC MCB-100
133	Boquilla IMC MCB-125	IMC MCB-125
134	Boquilla IMC MCB-150	IMC MCB-150
135	Boquilla IMC MCB-200	IMC MCB-200
136	Boquilla IMC MCB-250	IMC MCB-250
137	Boquilla IMC MCB-300	IMC MCB-300
138	Boquilla IMC MCB-350	IMC MCB-350
139	Boquilla IMC MCB-400	IMC MCB-400
140	Boquilla IMC MCB-500	IMC MCB-500
141	Boquilla IMC MCB-600	IMC MCB-600



ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2404011531



142	Caja Aluminio 5800 FSB50-3	CAJA ALUMINIO 5800 FSB50-3
143	Caja Aluminio 5800 FSB75-3	CAJA ALUMINIO 5800 FSB75-3
144	Caja Aluminio 5800 FSB100-3	CAJA ALUMINIO 5800 FSB100-3
145	Caja Aluminio 5800 FSB50-5	CAJA ALUMINIO 5800 FSB50-5
146	Caja Aluminio 5800 FSB75-5	CAJA ALUMINIO 5800 FSB75-5
147	Caja Aluminio 5800 FSB100-5X	CAJA ALUMINIO 5800 FSB100-5X
148	Caja Aluminio 5800 TGB50-5	CAJA ALUMINIO 5800 TGB50-5
149	Caja Aluminio 5800 TGB75-5	CAJA ALUMINIO 5800 TGB75-5
150	Caja Aluminio 5800 TGB100-5X	CAJA ALUMINIO 5800 TGB100-5X
151	Caja Aluminio 5800 DBT-100-5X	CAJA ALUMINIO 5800 DBT- 100-5X
152	Caja Aluminio 5800 DBT-75	CAJA ALUMINIO 5800 DBT- 75
153	Caja Aluminio 5800 DBT-5	CAJA ALUMINIO 5800 DBT- 5
154	Caja Aluminio 5800 T8DB-50	CAJA ALUMINIO 5800 T8DB-50



IMPORTADORES ELÉCTRICOS
BOGOTÁ S.A.S



ISO/IEC 17065:2012
23-CPR-004



CPR-GC-FR-21 V4
2024-05-07
Página 1 de 1

ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2404011531



155	Caja Aluminio 5800 T8DB-75	CAJA ALUMINIO 5800 T8DB-75
156	Caja Aluminio 5800 T8DB-MKO	CAJA ALUMINIO 5800 T8DB-MKO
157	Caja Aluminio Octogonal FSB50-3	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL FSB50-3
158	Caja Aluminio Octogonal FSB75-3	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL FSB75-3
159	Caja Aluminio Octogonal FSB100-3	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL FSB100-3
160	Caja Aluminio Octogonal FSB50-5	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL FSB50-5
161	Caja Aluminio Octogonal FSB75-5	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL FSB75-5
162	Caja Aluminio Octogonal FSB100-5X	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL FSB100-5X
163	Caja Aluminio Octogonal TGB50-5	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL TGB50-5
164	Caja Aluminio Octogonal TGB75-5	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL TGB75-5
165	Caja Aluminio Octogonal TGB100-5X	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL TGB100-5X
166	Caja Aluminio Octogonal DBT-100-5X	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL DBT-100-5X
167	Caja Aluminio Octogonal DBT-100	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL DBT-100



ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2404011531



168	Caja Aluminio Octogonal DBT-75	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL DBT-75
169	Caja Aluminio Octogonal DBT-5	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL DBT-5
170	Caja Aluminio Octogonal T8DB-50	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL T8DB-50
171	Caja Aluminio Octogonal T8DB-75	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL T8DB-75
172	Caja Aluminio Octogonal T8DB-MKO	CAJA ALUMINIO OCTAGONAL T8DB-MKO
173	Caja metálica Acero 2400	CAJA METALICA ACERO 2400
174	Caja metálica Acero 5800	CAJA METALICA ACERO 5800
175	Caja metálica Acero 10X10X10	CAJA METALICA ACERO 10X10X10
176	Caja metálica Acero 12X12	CAJA METALICA ACERO 12X12
177	Caja metálica Acero 12X12X5	CAJA METALICA ACERO 12X12X5
178	Caja metálica Acero Octagonal	CAJA METALICA ACERO OCTAGONAL
179	Caja Aluminio 2400 FSB50-3	CAJA ALUMINIO 2400 FSB50-3
180	Caja Aluminio 2400 FSB75-3	CAJA ALUMINIO 2400 FSB75-3



IMPORTADORES ELÉCTRICOS
BOGOTÁ S.A.S.



ISO/IEC 17065:2012
23-CPR-004



CPR-GC-FR-21 V4
2024-05-07
Página 1 de 1

ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2404011531



181	Caja Aluminio 2400 FSB100-3	CAJA ALUMINIO 2400 FSB100-3
182	Caja Aluminio 2400 FSB50-5	CAJA ALUMINIO 2400 FSB50-5
183	Caja Aluminio 2400 FSB75-5	CAJA ALUMINIO 2400 FSB75-5
184	Caja Aluminio 2400 FSB100-5X	CAJA ALUMINIO 2400 FSB100-5X
185	Caja Aluminio 2400 TGB50-5	CAJA ALUMINIO 2400 TGB50-5
186	Caja Aluminio 2400 TGB75-5	CAJA ALUMINIO 2400 TGB75-5
187	Caja Aluminio 2400 TGB100-5X	CAJA ALUMINIO 2400 TGB100-5X
188	Caja Aluminio 2400 DBT-100	CAJA ALUMINIO 2400 DBT- 100
189	Caja Aluminio 2400 DBT-75	CAJA ALUMINIO 2400 DBT- 75
190	Caja Aluminio 2400 DBT-5	CAJA ALUMINIO 2400 DBT- 5
191	Caja Aluminio 2400 T8DB-50	CAJA ALUMINIO 2400 T8DB-50
192	Caja Aluminio 2400 T8DB-75	CAJA ALUMINIO 2400 T8DB-75
193	Caja Aluminio 2400 T8DB-MKO	CAJA ALUMINIO 2400 T8DB-MKO

** Fin del Anexo 1 **



ANEXO N°1 REFERENCIAS CERTIFICADAS
CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE PRODUCTO
N° 2404011531



NOTAS:

1. La vigencia y validez del presente certificado está sujeta al cumplimiento de los requisitos estipulados en el registro CPR-GV-FR-02 ACUERDO DE CERTIFICACIÓN. TÉRMINOS Y CONDICIONES SERVICIO CERTIFICACIÓN PRODUCTO.
2. LLC realiza vigilancias para verificar la conformidad del producto de acuerdo a lo estipulado en el registro CPR-GV-FR-02 ACUERDO DE CERTIFICACIÓN. TÉRMINOS Y CONDICIONES SERVICIO CERTIFICACIÓN PRODUCTO.
3. Las modificaciones al presente certificado así como su utilización indebida, son inválidas y están sujetas a sanciones legales.
4. Este certificado de producto se firma en fecha de emisión y se atestan los ítems descripción/características/tipo y referencias detalladas en el anexo No 1 que hace parte de este certificado; se evaluaron los requisitos generales y específicos del referente normativo. Cualquier cambio de las materias primas, procesos productivos, sistemas de gestión de calidad, fabricantes, etc. deben ser informados a LLC SAS para su respectiva evaluación complementaria. La no información de estos cambios es responsabilidad única del titular del certificado.
5. Este certificado de producto no implica juicios sobre otros productos distintos a los mencionados en el Anexo ni tampoco sobre otros productos que comercialice o importe el titular del certificado.
5. Para verificar la validez y novedades del presente certificado puede consultar la página www.llccolombia.com o a través de la consulta pública en SIGEPAC.

Autorizado por

Sra. VALERIA VARGAS SANCHEZ
Representante Legal.



IMPORTADORES ELÉCTRICOS
BOGOTÁ S.A.S



ISO/IEC 17065:2012
23-CPR-004



Nº. de Certificado
0393



QCERT

ORGANISMO DE
CERTIFICACIÓN

INDUMA SCA
NIT 890.800.450-3

Certificación tipo marca de conformidad (Esquema 5)

El organismo de certificación QCERT otorga el presente certificado de conformidad de producto, de acuerdo con la siguiente información:

Producto:

Cajas para medidores eléctricos

Referencia:

Ver listado de referencias específicas en anexo.

Referente reglamentario:

Número 20.5 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.

La certificación otorgada está sujeta a los resultados de las evaluaciones de seguimiento anuales tal como se establece en el Reglamento RG-01.

Anexo a este certificado se entrega un documento que contiene 2 hojas donde se describen las especificaciones técnicas de los productos certificados. Este certificado solo puede ser reproducido en su totalidad y la validez del mismo se puede consultar en www.qcert.com.co. Este Certificado es para uso exclusivo del titular.

Fecha de otorgamiento	2012-05-07
Fecha de renovación	2021-11-22
Fecha de vencimiento	2024-11-21

Fechas límite de finalización de auditorías de seguimiento	
Seguimiento 1	2022-11-22
Seguimiento 2	2023-11-22

ISARIN
PINZON
GUEVARA

Firmado
digitalmente por

ISARIN PINZON
GUEVARA

Fecha: 2021.11.22
15:07:42 -05'00'

Gerente

430
**La Calidad es
nuestro sello.**
qcert.com.co

servicioalcliente@qcert.com.co

ANEXO CERTIFICADO



Pagina 1 de 2

No de certificado 0393 Fecha de Renovación 2021-11-22
 Dirección Km 1 Vía Termales El Otoño, Manizales

Aspecto	Descripción
Producto	Cajas para medidores eléctricos
Referente reglamentario	Numeral 20.5 del Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas - RETIE. Resolución 90708 de 30 de agosto de 2013 del Ministerio de Minas y Energías.
Fabricante	INDUMA S.C.A.
Planta de fabricación	Km 1 Vía Termales El Otoño, Manizales
Marca	INDUMA
Material	Lámina Cold Rolled
Espesor de lámina	Calibre 20 comercial
Acabado	Pintura electrostática
Visor	Policarbonato y vidrio
Bornera	Cuadrante en latón
Exclusiones (*)	Ninguna
Usos	Cajas para alojar medidores de energía con marco para sujetar el visor de vidrio



ANEXO CERTIFICADO



Página 2 de 2

No de 0393 Fecha de Renovación 2021-11-22

Direcc Km 1 Vía Termales El Otoño, Manizales

REFERENCIAS PARTICULARES

ITEM	REFERENCIA	DESCRIPCIÓN
1	T7401-019	CC CAJA CONTADOR ET PINT.ELECT C.20 CON STICKER
2	T7401-001	CC CAJA CONTADOR SENCILLA PINT.ELECT CT
3	T7401-005	CC CAJA CONTADOR CON PORTABREAKER PINT.ELECT C.20
4	T7401-006	CC CAJA CONTADOR DOBLE PINT.ELECT C.20
5	T7401-012	CAJA CONTADOR SENCILLA PINT. ELECT SUJECION A POSTE
6	T7401-013	CC CAJA CONTADOR CAJA BREAKER EN TAPA PINT.ELECT C.20
7	T7401-015	CC CAJA CONTADOR CAJA BREAKER ENCHUFABLE PINT.ELECT C.20 CT
8	T7401-017	CAJA CONTADOR PORTABREAKER SUJECION A POSTE C.20
9	T7401-018	CC CAJA CONTADOR DOBLE PINT.ELECT CON BREAKER ENCHUFABLE
10	T7401-022	CC CAJA CONTADOR CIEGA 300X200 C.20 CON KNOCKOUT PLASTICO

ISARIN
PINZON
GUEVARA
Gerente

Firmado digitalmente
por ISARIN PINZON
GUEVARA
Fecha: 2021.11.22
15:08:10 -05'00'



Esquema de certificación 5

Otorga el certificado de conformidad de producto ICONTEC (Esquema de certificación 5 según ISO/IEC 17067) para:
It grants the certificate of conformity product ICONTEC (Certification Scheme 5 according ISO/IEC 17067) for:

**TUBO CONDUIT TIPO LIVIANO, CURVAS CONDUIT, TUBO DUCTO CORRUGADO ELÉCTRICO Y
TELFÓNICO, ACCESORIOS CONDUIT, TUBO DUCTO TELFÓNICO Y ELÉCTRICO (DB Y EB),
CURVAS DUCTO TELFÓNICO Y ELÉCTRICO, ACCESORIOS DUCTO TELFÓNICO Y ELÉCTRICO**

Fabricado por **P.V.C. GERFOR S.A.**, en la Autopista Medellín, kilómetro 2, 600 metros entrada por la vía
parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia, identificada con número de NIT 860.502.509-1

Manufactured by **P.V.C. GERFOR S.A.**, in the Autopista Medellín, kilómetro 2, 600 metros entrada por la vía
parcelas, Cota, Cundinamarca, Colombia, identified with NIT number 860.502.509-1

El derecho del uso del certificado de conformidad de producto se otorga con el referencial:

The right to use the certificate of conformity of product is granted with the Audit Criteria:

**Resolución No. 90708 de 2013 del Ministerio de Minas y Energía RETIE 2013 -
Capítulo 3, Artículo 20.6 y 20.6.1.1**

Reglamento Técnico de Instalaciones Eléctricas RETIE 2013 - Capítulo 3, Artículo 20.6 y 20.6.1.1

Technical Regulations for Electrical Installations RETIE 2013 - Chapter 3, Sections 20.6 y 20.6.1.1

SECTOR ICS 23,040,20

Este certificado de conformidad de producto está sujeto a que la empresa y el producto cumplan permanentemente con los requisitos establecidos en el referencial y en el documento "R-PS-019 Reglamento para la certificación de producto tangible", lo cual será verificado por ICONTEC.

This certificate of conformity of product is subject to the company's and product's permanent fulfillment of the requirements set forth in the audit criteria and the "R-PS-019 Reglamento para la Certificación de producto tangible" document, which will be verified by ICONTEC.

Las referencias autorizadas para ostentar el certificado de conformidad de producto se incluyen en documento anexo que es parte integral del presente certificado.

The references authorized to hold the certificate of conformity of product are included in annexed document and it is integral part of this certificate.

Certificado CSR-CER317106

Certificate

Fecha de Aprobación: 2014-06-18

Approval Date:

Fecha Última Modificación:

Last Modification Date:

Fecha de Renovación: 2023-08-15

Renewal Date:

Fecha de Vencimiento:

Expiration Date:

2026-08-16

La autenticidad del certificado y su alcance se puede consultar al correo electrónico: cliente@icontec.org

ICONTEC es un organismo de Certificación acreditado por:
ICONTEC is a certification body accredited by:



icontec



ISO/IEC 17065:2012
09-CPR-002



ANAB National Accreditation Board
ACCREDITED
PRODUCT CERTIFICATION
BODY
ID # 0677

Roberto Enrique Montoya Villa
Director Ejecutivo

Este certificado es propiedad de ICONTEC y debe ser devuelto cuando sea solicitado.
ICONTEC carrera 37 nro. 52 - 95, Bogotá D.C., Colombia

F-PS-628
Versión 00



CERTIFICADO DE CONFORMIDAD DE
PRODUCTO N° E5-0293-2024

GRUPO VTEK S.A.S

NIT: 901.293.797-6

DIRECCIÓN: Carrera 70A #112-70, Bogotá

Certifica que el producto:

PRODUCTO	DESCRIPCION
LUMINARIAS	Ver hoja N° 2 – Listado de productos certificados

CUMPLE con todos los requerimientos de **RETILAP- Resolución 108540 de 2010** y adicional con todas las actividades requeridas por el esquema de certificación estipulado.

TITULAR DEL CERTIFICADO

Changzhou Gaorui Electric Co.,Ltd

DIRECCIÓN: No.131 Houlu Village, Niutang Twon, Wujin District, Changzhou, Jiangsu, China

NIT: 91320412250942906C

FABRICADO POR:

Changzhou Gaorui Electric Co.,Ltd

DIRECCIÓN: No.131 Houlu Village, Niutang Twon, Wujin District, Changzhou, Jiangsu, China

NIT: N/A

ESQUEMA DE CERTIFICACION N° ISO/IEC 17067

El informe de evaluación GV-FT-04 del proceso E5-0293-2024 detalla de manera específica todas las actividades llevadas a cabo para otorgar cumplimiento

Fecha de otorgamiento: 2024/01/06

Fecha de primer seguimiento: 2025/01/31

Fecha de última modificación: N/A

Fecha de segundo seguimiento: 2026/01/31

Fecha de vencimiento: 2027/01/31

Este certificado es válido por 3 años y está sujeto a las actividades de seguimiento a ser ejecutadas cada 12 meses.

Nota: La validez del presente certificado de conformidad dependerá de la ejecución y conformidad de las respectivas actividades de seguimiento

"Diana Rojas"

REPRESENTANTE LEGAL



N° 1168



77	ALUMBRADO EXTERIOR 50W/60W/90W/100W/120W/150W/180 W/200W, 40-200LM/W, AC85-265V, 50/60HZ, IP65, IK08.	GR1126	N/A
78	ALUMBRADO EXTERIOR 30W/50W/60W/90W/100W/120W/150W /180W/200W, 40-200LM/W, AC85-265V 50-60HZ IP65 IK08	GR1119	N/A
79	ALUMBRADO EXTERIOR 30W/50W/60W/90W/100W/120W/150W /180W, 40-200 LM/W, AC 85-265V, 50- 60HZ, IP65, IK08	GR1119A	N/A
80	ALUMBRADO EXTERIOR 20W/30W/50W/60W/80W/90W/100W/1 20W/150W/180W/200W/250W/300W, 40 -200LM/W, AC85-265V 50-60HZ IP65 IK08	GR1123	N/A
81	REFLECTOR LED MINI10W/20W/30W/50W/40-200LM/ W, AC85-265V 50-60HZ IP65 IK08	GR1046	N/A
82	REFLECTOR LED 10W/20W/30W/50W/100W, 40-200LM/ W, AC85-265V 50-60HZ IP65 IK08	GR1047	N/A
83	REFLECTOR LED 200W/250W/300W/350W, 40-200LM/W, AC85-265V 50-60HZ IP65 IK08	2024	N/A
84	REFLECTOR LED IPAD 400W/450W/500W/550W, 40-200LM/W, AC85-265V 50-60HZ IP65 IK08	2024	N/A
85	REFLECTOR LED KING KONG 10W/20W/30W, 40-200LM/W, AC85-265V 50-60HZ IP65 IK08, SMD/COB	2024	N/A



ISO/IEC 17065:2012
19 CPR-004



N° 1178



Bogotá D.C. 23 de Octubre de 2024

A QUIEN INTERESE:

En nombre de la empresa GYJ FERRETERÍAS S.A. identificada con NIT. 800.130.426 – 3, me permito certificar que el producto vendido al Ing. HERNAN JARAMILLO MORERA identificado con C.C. 12.194.810, con factura de venta N° T105 – 60502843, corresponde a Bobina en lámina metálica prepintada con pintura tipo poliéster de 25 micras, color **BLANCO GRISÁCEO** bajo el código de colores **RAL classic en clasificación RAL 9002, en espesor de 0.75 mm ancho 914 mm**, con protección anticorrosiva Aluzinc AZ50 y categoría rango 9 según norma: (www.coloresral.com.es/ral-classic/ral-9002-blanco-grisaceo).

Rango	Gama / Color	Primero	Último	Cantidad
RAL 9xxx	Blanco/Negro	RAL 9001 Crema	RAL 9023 Gris oscuro perla	14

La información anteriormente descrita puede ser verificada tal y como consta en el certificado de calidad y origen N° HT20211126SAMSXM-01, y de cumplimiento con los requisitos establecidos en la norma técnica ASTM A792 / ASTM A924 y código RAL classic.

Cordialmente:

DAVID DAZA CALDERON
Gerente UNES B60
GYJ Ferreterías S.A.
gerenciab60@gyj.com.co
Cel. 310 7627252



ENTRO

BOGOTÁ CENTRO B-65
Carrera 65B No. 12-93 Tels.: (1) 290 6900 / 7499 / 5602 / 4984
Fax: 419 0304 gerenciab65@gyj.com.co
BOGOTÁ CARRERA 60
Carrera 60 No. 17-86 Tels.: (1) 420 2900 - 261 1270
Fax: 261 8004 gerenciab60@gyj.com.co
BOGOTÁ - CENTRO DE SERVICIOS

Respaldo, seguridad y confianza,
PREFIERA SIEMPRE A G&J EMPRESAS DE ACERO

BOGOTÁ - N. L. TOBERÍN
Carrera 22 No. 166 - 26 Tels.: (1) 214 7211 - 673 7804 / 3800
sucasabogotag@gyj.com.co
BOGOTÁ NORTE B-200
Carrera 7 No. 199-07 Tels.: (1) 679 1129 / 4294 - 669 7343 / 7345
Fax: 679 1129 Ext. 110 gerenciabogotanortes@gyj.com.co
BOGOTÁ PALOQUEMAO



BOGOTÁ SUR
Cra 72P No. 37-23 Sur B Corzaal Tels. (1) 299 5790 - 2451 / 27 -
Fax: 299 5790 Ldx. 108 gerenciabogotasur@gyj.com.co
FUNZA
Km. 3 via Funza-Cota. Parque Industrial Gabeca Barúaga 1 Tel. (1) 299 -
MOSQUERA
Carrera 14 No. 5A-175 Kilómetro 19, Zona Industrial Montañas

产品质量证明书

山东冠县荣达复合材料有限公司

中国山东冠县经济开发区

SHANDONG GUANXIAN RONGDA COMPOSITE MATERIAL CO., Ltd

MILL TEST CERTIFICATE

Economic Development zone, Guanxian,

收货单位 CONSIGNEE: TO WHOM IT MAY CONCERN

产品名称 GOODS: 彩色涂层带钢 PRIME PREPAINTED GALVALUME STEEL COILS

证明书号 CERTIFICATE NO: RFE20211101-1

执行标准 SPECIFICATION: ASTM A 792

日期 DATE OF ISSUE: 2021-11-03

基板 Base Metal	锌层 Zinc Layer	颜色 Color	级别 Grade	规格重量 SIZE AND WEIGHT		涂层结构 Coating Structure	涂料种类 PAINT TYPE	涂层厚度 COATING THICKNESS (um)	光泽 100° LUSTER	涂层性能 COAT PROPERTY				
				规格 SIZE (mm*mm)	重量 WEIGHT (T)					MEK	涂层 弯曲 Coat -Bending	反向 冲击 IMPACT	杯突 CUPPING (mm)	铅笔硬度 PENCIL HARDNESS
Grade 33	AZ100	RAL3001/RAL9010	A	0.28*1220	22.740	2/2	RMP/RMP	5+20/5+10	普通	100/50	3T	9J	6.5mm	2H
Grade 33	AZ100	RAL5005/RAL9010	A	0.28*1220	22.820	2/2	RMP/RMP	5+20/5+10	普通	100/50	3T	9J	6.5mm	2H
Grade 33	AZ100	RAL9002/RAL9010	A	0.30*1000	17.556	2/2	RMP/RMP	5+20/5+10	普通	100/50	3T	9J	6.5mm	2H
Grade 33	AZ100	RAL9002/RAL9010	A	0.30*1220	45.568	2/2	RMP/RMP	5+20/5+10	普通	100/50	3T	9J	6.5mm	2H
Grade 33	AZ100	RAL9002/RAL9010	A	0.38*1000	35.234	2/2	RMP/RMP	5+20/5+10	普通	100/50	3T	9J	6.5mm	2H
Grade 33	AZ100	RAL9002/RAL9010	A	0.38*1220	45.290	2/2	RMP/RMP	5+20/5+10	普通	100/50	3T	9J	6.5mm	2H
Grade 33	AZ100	RAL9002/RAL9010	A	0.43*610	35.642	2/2	RMP/RMP	5+20/5+10	普通	100/50	3T	9J	6.5mm	2H
Grade 33	AZ100	RAL9002/RAL9010	A	0.43*1220	30.580	2/2	RMP/RMP	5+20/5+10	普通	100/50	3T	9J	6.5mm	2H
化 学 成 份 (%)				机 械 性 能										
Chemical composition				Mechanical Propertie										
C	Mn	P	S	Cu	Al	Zn	屈服点 Yield strength(N/mm2)	抗拉强度 Tensile strength	延伸率 Extensibility %	硬度等级 Hardness levels				
<0.20	<1.35	<0.04	<0.04	≥0.25	≥55	≥43	230	310	20	HRB55-65				
合计 TOTAL				总计重 (TOTAL MASS) : 255.43 吨 (TON)										
以上产品符合规定的技术标准, 特此证明。														
PRODUCTS ABOVE ACCORD WITH THE REQUIREMENT, HEREBY PROVED														

达复合材料有限公司

长 沙

5105

5105



检验章

程小光

陆之侠
