



AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL



INFORME MENSUAL DE INTERVENTORÍA

INFORME
No.4

**INTERCONSTRUCCIONES Y
DISEÑOS SAS**
CONTRATO 24001442 H3

➤ **CONTROL DEL DOCUMENTO**

INFORME INTERVENTORÍA No. 4 – PERIODO DEL 1 AGOSTO DE 2025 AL 31 DE AGOSTO DE 2025		
CONTRATO 24001442 H3 DE 2024		
Fecha 1ª edición Junio de 2025		Versión vigente 01
Clasificación	Tipo de documento	Estado
☒ Público ☐ Interno ☐ Confidencial	☐ Técnico ☐ Presentación ☒ Propuesta/Informe ☐ Otros	☐ Borrador ☐ En revisión ☐ Actualizable ☒ Informe Final
Nombre del fichero	Informe de Interventoría No. 4	
Fecha Acta de Inicio	6 de mayo 2025	
Periodo por analizar	1 de Agosto de 2025 al 31 de Agosto de 2025	
Resumen del contenido		
Detalle de todas las acciones adelantadas por la Interventoría en el marco del seguimiento al desarrollo del Mejoramiento de las franjas de seguridad y el suministro e instalación del sistema de iluminación de la plataforma de viraje de la cabecera No. 19 del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena (VF)		

➤ **LISTA DE DISTRIBUCIÓN**

Copia de este documento han sido entregadas a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil. Todas aquellas observaciones que resulten de su revisión y aplicaciones deben ser informadas al Director de Interventoría para proceder a ejecutar sus modificaciones.

ÁREA O DEPENDENCIA		No. DE COPIAS
1.	Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil – Aerocivil	01
2.	Director de Interventoría INTERCONSTRUCCIONES Y DISEÑOS SAS	01

➤ **ÍNDICE DE MODIFICACIONES**

VERSIÓN	MODIFICACIÓN	FECHA	OBSERVACIONES
			-

➤ **ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN**

NUMERO DE REVISIÓN				Versión 1	Versión 2	
APROBACIÓN	ELABORÓ: RESIDENTE INTERVENTORÍA	Firma:				
		Nombre:	Ing. Cesar Isaza Gomez			
		Fecha:		31/08/2025		
	DE APROBÓ: DIRECTOR INTERVENTORÍA	Firma:				
		Nombre:	Ing. Néstor Camilo Artunduaga			
		Fecha:		31/08/2025		

CONTENIDO

➤ CONTROL DEL DOCUMENTO	2
➤ LISTA DE DISTRIBUCIÓN	2
➤ ÍNDICE DE MODIFICACIONES.....	2
➤ ESTADO DE REVISIÓN Y APROBACIÓN	2
CONTENIDO.....	3
1. INTRODUCCIÓN.....	6
Descripción del proyecto	6
Información Contrato de obra	6
Información Contrato de Interventoría.....	7
Conclusiones área ambiental	7
Conclusiones área SST	7
Conclusiones y recomendaciones	7
2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	8
2.1 ANTECEDENTES	8
2.2 LOCALIZACIÓN	9
2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO.....	9
2.3.1 NIVELACION DE LA FRANJA PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19:.....	9
2.3.2 SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19:.....	10
3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA.....	11
3.1 INFORMACIÓN ESTADO LEGAL, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL PROYECTO	12
3.1.1 INFORMACIÓN ESTADO LEGAL	12
3.1.2 REQUERIMIENTOS LEGALES, PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO.....	12
3.1.3 MODIFICACIONES LEGALES REALIZADAS EN EL PERIODO	12
3.2 INFORMACIÓN ESTADO FINANCIERO	12
3.2.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA.....	13
3.2.2 ESTADO FINANCIERO EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA	13
3.2.3 MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA	15
3.2.4 ACTAS PARCIALES DE OBRA	15
3.3 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA.....	16
3.4 INFORMACIÓN TÉCNICA	16
4. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA	19
4.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA	20
4.2 INFORMACIÓN LEGAL INTERVENTORÍA	20
4.2.1 REQUERIMIENTOS LEGALES, PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO.....	21

4.2.2	MODIFICACIONES LEGALES REALIZADAS EN EL PERIODO	21
4.3	INFORMACIÓN FINANCIERA INTERVENTORÍA	21
4.3.1	ESTADO FINANCIERO EJECUCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA	21
4.3.2	MANEJO DEL ANTICIPO.....	21
4.3.3	ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA.....	22
4.4	INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA INTERVENTORÍA	22
4.4.1	NOTAM.....	22
4.4.2	CONTROL DE CORRESPONDENCIA.....	23
4.4.3	INFORMES SEMANALES.....	24
4.4.4	BITÁCORA DE OBRA.....	25
4.4.5	ANÁLISIS DE LLUVIAS	25
4.4.6	PERSONAL INTERVENTORÍA	25
4.5	INFORMACIÓN TÉCNICA INTERVENTORÍA	25
4.5.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO.....	25
4.5.2	COMITÉS TÉCNICO DE SEGUIMIENTO	27
4.5.3	ANÁLISIS DE DISPOSICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES.....	27
4.6	GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL	27
5.	SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA DE PROYECTOS.....	27
6.	INDICADORES DE CUMPLIMIENTO.....	28
7.	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	29
8.	ANEXOS	30

TABLA DE ILUSTRACIONES

Ilustración 1. Localización Aeropuerto Internacional Rafael Núñez	9
Ilustración 2 Estado actual franjas de seguridad,	10
Ilustración 3. Estado actual del sistema de iluminación de plataforma de viraje.	10
Ilustración 4 Valor Programado Vs. Valor Ejecutado	15
Ilustración 5 NOTAM vigentes en el Aeropuerto Rafael Núñez	20
Ilustración 6. Actividades de Topografía.....	26
Ilustración 7. Curva S contrato de obra	29

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Información general contrato obra.....	11
Tabla 2. Pólizas contrato de obra.	14
Tabla 3. Manejo Anticipo obra.....	16
Tabla 4. Relación personal contratista obra	17
Tabla 5. Información general contrato interventoría	17
Tabla 6. Control correspondencia enviada	20
Tabla 7. Control correspondencia recibida.....	22
Tabla 8. Periodos de los informes semanales	24
Tabla 9. Relación personal interventoría	24
Tabla 10. Valores ejecutados para Topografía	25
Tabla 11. Porcentaje de evaluación de los indicadores de cumplimiento	30

1. INTRODUCCIÓN

La Unidad Administrativa Especial – Aeronáutica Civil como responsable de la prestación del servicio a los usuarios y del cumplimiento de los estándares de seguridad operacional aeroportuaria, identifica la necesidad de contratar una figura natural o jurídica mediante licitación pública, que desarrolle las actividades de mejoramiento de las franjas de seguridad y el suministro e instalación del Sistema de Iluminación de la plataforma de viraje cabecera 19 en el Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena. Estas intervenciones abordarán problemáticas relacionadas con los riesgos en la seguridad operacional, mitigación de obstáculos y nivelación del área segura, mejorando así la prestación del servicio a los usuarios.

Por lo anterior la Aeronáutica Civil, formuló el Pliego de Condiciones No. 24001397 H4 de 2024 para la selección del Contratista encargado de ejecutar el contrato de obra pública cuyo objeto es, **“REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF).”**, adjudicada al Contratista **CONSORCIO GYP CARTAGENA** a través del contrato 24001397 H4 DE 2024.

Así mismo la Aeronáutica Civil, formuló concurso de méritos 24001442 H3 de 2024, con el fin de adjudicar la Interventoría al señalado contrato de obra, el objeto de la misma es **REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)**”, adjudicada a **INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑOS S.A.S** a través del contrato 24001442 H3 DE 2024.

El Informe mensual incluye todo lo relacionado con el desarrollo de los contratos de obra e interventoría en los componentes administrativo, técnico, financiero, presupuestal, jurídico y ambiental. Además, se incluye la información pertinente que permita conocer el estado de avance mensual de los contratos, que se desarrollan con la siguiente información:

Descripción del proyecto

- Descripción de la necesidad.
- Localización del proyecto.
- Inventario y estado inicial del contrato.
- Características técnicas del proyecto.

Información Contrato de obra

- Información general del contrato.
- Información de garantías del contrato.
- Se describen las actividades ejecutadas en el periodo, con el avance en la ejecución del mes y el avance acumulado del proyecto; actividades desarrolladas por parte del Contratista, además del resumen ejecutivo de las gestiones.
- Actividades no previstas.
- Solicitudes realizadas por la Aeronáutica.
- Información financiera del contrato de obra.
- Manejo del anticipo del contrato de obra

Información Contrato de Interventoría

- Información general del contrato.
- Información de garantías del contrato
- Descripción de las actividades realizadas por la Interventoría.
- Información financiera del contrato de interventoría

Conclusiones área ambiental

- Conclusiones del informe mensual del área ambiental.

Conclusiones área SST

- Conclusiones del informe mensual SST.

Conclusiones y recomendaciones

- Conclusiones relevantes sobre el estado del contrato de obra y de interventoría.

Se realiza análisis de los componentes descritos en el presente y de acuerdo con las inspecciones diarias realizadas por INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑOS S.A.S, así como la información proporcionada por el Contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, frente a la ejecución de actividades, se detalla cada uno de los componentes discriminados por periodo de ejecución y avances acumulados.

El informe mensual de interventoría No. 4 corresponde al **periodo del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2025**, elaborado según lo establecido en el MANUAL DE INTERVENTORÍA VERSIÓN 2016, cuya aplicación y seguimiento se realiza para el contrato de obra No. 24001397 H4 DE 2024 y Contrato de Interventoría No 24001442 H3 DE 2024.

2. DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

Por medio del presente se informa a la Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil el estado general de los contratos No. 24001397 H4 de 2024 (Obra – CONSORCIO GYP CARTAGENA) y No. 24001442 H3 de 2024 (Interventoría – INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑOS S.A.S), en ejecución, así como el alcance de las actividades desarrolladas por parte del contratista de obra y la interventoría durante el periodo comprendido entre el 01 de Agosto al 31 de Agosto de 2025, orientadas a lograr la ejecución del proyecto cuyo objeto es el MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF), acorde a las especificaciones técnicas establecidas en el contrato y sus anexos técnicos, así como la normatividad vigente en el territorio nacional.

2.1 ANTECEDENTES

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez se encuentra ubicado en la ciudad de Cartagena, en la costa caribeña colombiana. Este aeropuerto es crucial para la conectividad regional y nacional, facilitando el transporte aéreo hacia y desde diversas ciudades del país y el extranjero. El lado tierra del Aeropuerto Rafael Núñez cuenta con un terminal de 20.488 m², 5080 m² de parqueaderos, Torre de control y dispone de dos plataformas de estacionamiento de aeronaves: la Plataforma Primaria o Principal de 80.800 m², situada frente al Edificio del terminal y al oeste de la pista y una secundaria con una superficie aproximada de 25.500 m², se encuentra normalmente cerrada al movimiento de aeronaves.

La zona aire del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena dispone de una pista, denominada 01-19, con una longitud de pista de 2.390 m y una anchura de 45 m. Al norte de la cabecera 19 se encuentra el Mar Caribe y una estructura de control de ingreso de agua a la Ciénaga de la Virgen, la cual queda ubicada al este de la pista, a continuación de unos terrenos fácilmente inundables. Al sur de la cabecera 01 se encuentran unas piscinas de decantación y seguidamente el Caño Juan Angola, mientras que al oeste de la pista se ubica la ciudad, con el Barrio de Crespo y Canapote. La cabecera 01 dispone de un apartadero de espera para aeronaves de letra de clave D, mientras que en la cabecera 19 existe una plataforma de viraje en pista.

En cuanto a las ayudas visuales para la navegación, la pista de vuelo cuenta con indicadores, señalización horizontal y luces aeronáuticas de superficie. El aeropuerto está dotado con dos mangas de viento en las proximidades de ambas cabeceras, las cuales se encuentran iluminadas para su uso nocturno. La señalización horizontal se compone de las siguientes señales: señal designadora de pista, de umbral, de eje de pista, de punto de visada, de zona de toma de contacto, de faja lateral de pista y señal de plataforma de viraje en la pista. La plataforma de viraje también dispone de señal de borde de calle de rodaje.

El 11 de diciembre de 2024 se dio apertura a la licitación pública para la asignación del contrato 24001397 H3 de 2024, el cual tenía por objeto “REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF).”.

Este contrato fue adjudicado mediante la resolución 00439 del 28 de febrero de 2025 al CONSORCIO GYP CARTAGENA, y se dio por finalizado el 05 de marzo de 2025.

2.2 LOCALIZACIÓN

El Aeropuerto Internacional Rafael Núñez se encuentra ubicado en la ciudad de Cartagena, en la costa caribeña colombiana. Este aeropuerto es crucial para la conectividad regional y nacional, facilitando el transporte aéreo hacia y desde diversas ciudades del país y el extranjero.

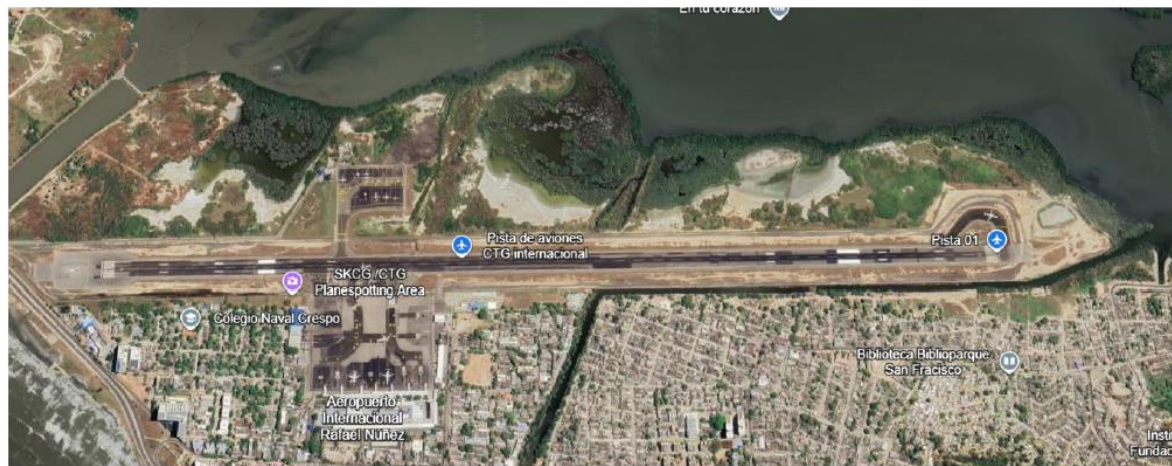


Ilustración 1. Localización Aeropuerto Internacional Rafael Núñez (Tomado del Plan Maestro)

2.3 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO

El alcance de este proyecto estará guiado por el Plan de Mantenimiento Estratégico aeronáutico 2030, con las actividades que se describen a continuación:

2.3.1 NIVELACION DE LA FRANJA PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19:

El estado actual de la zona aire, específicamente en la cabecera 19, costado E y W, se encuentra un desnivel en la franja de la plataforma de viraje de la pista del Aeropuerto Rafael Núñez. Esto debido a la prolongación de la plataforma de viraje con el contrato No. 18001451 04 H4 de 2018 realizado por la Aeronáutica Civil de acuerdo con el “Acuerdo de colaboración para la ejecución de la obra construcción plataforma de viraje en el Aeropuerto Internacional Rafael Núñez de Cartagena”.



Ilustración 2. Estado actual franjas de seguridad, costado E y W cabecera 19 Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena (Tomado del Plan Maestro)

2.3.2 SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19:

Para lograr la operación y puesta en funcionamiento del ILS, se requirió la prolongación de la plataforma de viraje de la cabecera 19 con el fin de proporcionar la protección a los componentes de dicho sistema, tales como las antenas y el sensor de la estela de propulsión de calor, a la hora de despegue de las aeronaves, actividades que fueron ejecutadas a través del contrato No. 18001451 04 H4 de 2018.

Así mismo, el Plan Maestro del Aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena contempló como una de las actuaciones inmediatas de intervención de las instalaciones del área de maniobras, en la cabecera 19, la definición de la RESA obligando a un desplazamiento hacia el interior de la pista del umbral 19 y el extremo 01.

En este sentido, la plataforma de viraje en mención requiere la instalación de un sistema de iluminación que cumpla con lo normatividad aeronáutica, por lo cual deberá apropiarse de los diseños existentes de la Entidad.



Ilustración 3. Estado actual del sistema de iluminación de plataforma de viraje cabecera 19 del aeropuerto Rafael Núñez Cartagena (Tomado del Plan Maestro)

3. INFORMACIÓN DEL CONTRATO DE OBRA

La información contractual del contrato adjudicado al Contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA. Se especifica en la siguiente tabla:

Tabla 1. Información general contrato obra

Número del contrato	24001397 H4 de 2024 del 05 de marzo de 2025
Objeto	REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF).
Contratista	CONSORCIO GYP CARTAGENA
NIT	901.926.046-1
Representante Legal	Oscar Andrés Pereira Garzón
Dirección	Carrera 55 No. 151-69 Torre 4 Apto 701
Teléfono	(601) 4685016
Estado	EN EJECUCIÓN
Valor contrato	\$ 1.298.856.408,00 Vigencia 2024 = \$ 284.373.364,00 Vigencia 2025 = \$ 1.137.493.456,00
Valor anticipo	\$ 284.373.364,00
Valor actualizado	\$ 1.298.856.408,00
Póliza	801045850- CUMPLIMIENTO SEGUROS CONFIANZA 802071857- RCE SEGUROS CONFIANZA
Fecha de aprobación póliza	15 de mayo de 2025
Interventor	Interconstrucciones & diseños SAS
Fecha acta de inicio	6 de mayo de 2025
Plazo inicial	Ocho (8) meses.
Fecha de terminación inicial	06 de Enero de 2026
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP	SIIF No. 102324 de 2024-07-08 y vigencias futuras ordinarias solicitadas a través del SIIF 5924 de 2024-07-08 expedido por el Coordinador del Grupo de Presupuesto de la AEROCIVIL.
Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP	Mil cuatrocientos veintiún millones ochocientos sesenta y seis mil ochocientos veinte pesos M/CTE \$1.421.866.820,00
Registro Presupuestal - RP	No. 102324 del 08 de julio de 2024 y compromiso de vigencia futura No. 5924 del 08 de julio de 2024.
Valor programado en el periodo	\$ 95.668.390,61
Porcentaje de avance físico programado en el periodo	7,37%
Valor ejecutado en el periodo	\$ 100.126.030,94
Porcentaje de avance físico ejecutado en el periodo	7.71%
Valor programado acumulado	\$ 276.828.411,83
Porcentaje de avance físico programado acumulado	21.31%

Valor ejecutado acumulado	\$ 341.029.049,71
Porcentaje de avance físico ejecutado acumulado	26.26%

3.1 INFORMACIÓN ESTADO LEGAL, FINANCIERO, ADMINISTRATIVO Y TÉCNICO DEL PROYECTO

3.1.1 INFORMACIÓN ESTADO LEGAL

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, tiene la necesidad de REALIZAR EL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y LA CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE PLATAFORMA DE VIRAJE CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NÚÑEZ DE CARTAGENA (VF).

Que mediante Resolución No. 03080 del 30 de diciembre de 2024 la Entidad abrió el Proceso de Contratación número 24001397 H4 de 2024, que tiene por objeto: “Realizar el mejoramiento de las franjas de seguridad y el suministro e instalación del sistema de iluminación de la plataforma de viraje de la cabecera 19 del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena (VF)”.

Que mediante Resolución No. 00439 del 28 de febrero de 2025 la Entidad adjudicó el Contrato al Contratista, Consorcio G y P Cartagena, por valor de \$1.298.856.408 incluyendo AIU + IVA y un plazo de ejecución de ocho (08) meses

El 06 de mayo de 2025 se suscribe acta de inicio de obra. Para el Contrato de obra No 24001397 H4 de 2024.

3.1.2 REQUERIMIENTOS LEGALES, PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO

En el presente periodo no se adelantan procesos de incumplimiento.

3.1.3 MODIFICACIONES LEGALES REALIZADAS EN EL PERIODO

En el presente periodo no se realizan modificaciones al contrato.

3.2 INFORMACIÓN ESTADO FINANCIERO

El valor inicial del Contrato 24001397 H4 de 2024 del 05 de marzo de 2025, corresponde a la suma de MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL CUATROCIENTOS OCHO PESOS M/CTE (\$1.298.856.408) incluyendo AIU e IVA sobre la utilidad para los ítems de obra. El cual se pagará mediante actas parciales discriminados por vigencias así:

-Vigencia 2024 = \$ 284.373.364,00

-Vigencia 2025 = \$ 1.137.493.456,00

Es importante indicar que en la Cláusula 6. ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO, se indica que:

“La UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL - AEROCIVIL entregará al CONTRATISTA en calidad de ANTICIPO la suma de DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MILLONES TRESCIENTOS SETENTA Y TRES MIL TRESCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS (\$284.373.364), previo cumplimiento de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución y la constitución de la fiducia o patrimonio autónomo. Dentro de los tres días hábiles siguientes a la legalización del contrato”.

En todo caso, el anticipo estará sujeto a la disponibilidad de cupo en el Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC).”

3.2.1 PÓLIZAS DEL CONTRATO DE OBRA

El contratista realizó actualización de pólizas de acuerdo con el acta de inicio suscrita el día 06 de mayo de 2025.

Tabla 2. Pólizas contrato de obra.

ASEGURADORA		CONFIANZA-NIT 860.070.374-9		
FECHA APROBACIÓN	15 de mayo de 2025		OBJETO ACTUALIZACIÓN	N/A
AMPARO	NUMERO	VALOR (\$)	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
CUMPLIMIENTO DE CONTRATO	81045850	\$ 389.656.922,40	6 de mayo de 2025	6 de mayo de 2026
BUEN MANEJO Y CORRECTA INVERSIÓN DEL ANTICIPO	81045850	\$ 284.373.364,00	6 de mayo de 2025	6 de mayo de 2026
SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	81045850	\$ 129.885.640,80	6 de mayo de 2025	6 de enero de 2029
ESTABILIDAD Y CALIDAD DE LA OBRA	81045850	\$ 389.656.922,40	06 de enero de 2026	06 de enero de 2031
CORRECTO FUNCIONAMIENTO DE LOS EQUIPOS	81045850	\$ 184.175.442,00	06 de enero de 2026	06 de enero de 2028
RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRA CONTRACTUAL	802071857	\$ 284.700.000,00	6 de mayo de 2025	06 de enero de 2026

3.2.2 ESTADO FINANCIERO EJECUCIÓN CONTRATO DE OBRA

Para el corte del presente informe, se establece un avance programado por valor de DOSCIENTOS SETENTA Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL CUATROCIENTOS ONCE PESOS M/CTE (\$ 276.828.411), equivalente al **21.31 %** del valor del contrato. La ejecución de obra se centró en los componentes de Cajas Inspección norma Codensa CS275 (No. 1 al 13 costado E y W), Canalización (4 Ø 4"), norma Codensa CS209, incluye excavación, materiales, nivelación y compactación; estas actividades presentaron un

valor de ejecución en el periodo de DOSCIENTOS OCHENTA MILLONES DOSCIENTOS SETENTA CON SESENTA Y SEIS CENTAVOS M/CTE (\$ 341.029.049), equivale al **26.26 %** del valor del contrato, en la siguiente tabla se presente la inversión por componente:

Tabla 3. Ejecución por componentes periodo

Valor de contrato		\$ 1,298,856,408.00
ACTIVIDAD	PROGRAMADO	EJECUTADO
Levantamiento Topográfico	\$ 25.000.000,00	\$25.000.000
Suministro dados en concreto 3000 PSI de diámetro 20 cm x 30 cm de altura	\$ 3.424.275	\$ 2.282.850
Instalación de cable Cu No.6 desnudo	\$ 8.692.950	\$ 2.350.408
Canalización (4 Ø 4"), norma Condensa CS209, incluye excavación, materiales, nivelación y compactación	\$115.000.000	\$137.425.000,00
Canalización (1 Ø 1" Conduit SCH 40) entre borde pista hasta caja de inspección, incluye excavación, materiales, nivelación y compactación. (eje plataforma de viraje)	\$ 35.445.550	\$2.282.721
Suministro de varillas 2.40 m x 5/8" cobre-cobre	\$ 7.994.259	\$2.664.753
Cajas Inspección norma Codensa CS275 (No. 1 al 13 costado E y W)	\$49.000.000	\$45.500.000
Suministro de cable Cu No.6 desnudo	\$13.652.100,00	\$9.556.470,00
Suministro, instalación, reconfiguración, nivelación, compactación de base granular (incluye materiales, equipos, transporte)	\$194.011.770,00	\$103.887.110

La siguiente grafica se presenta el análisis de inversión mensual neta programada, la inversión programada acumulada y la inversión ejecutada acumulada a la fecha de corte del presente informe.

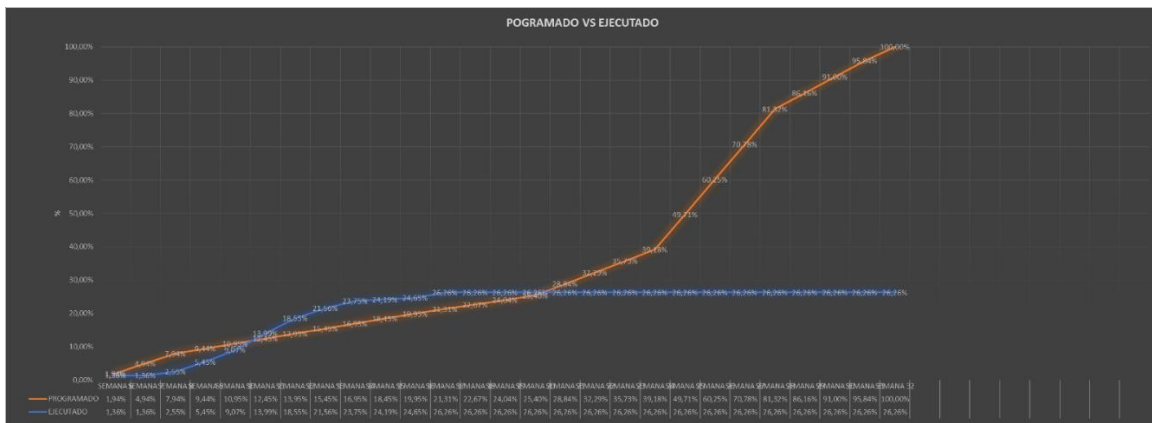


Ilustración 4 Valor Programado Vs. Valor Ejecutado

A corte del presente informe no se presentan movimientos de las vigencias del contrato de obra:

3.2.3 MANEJO DEL ANTICIPO CONTRATO DE OBRA

Para el periodo de análisis el Contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA solicitó el giro del anticipo discriminado de la siguiente forma:

Tabla 3. Manejo Anticipo obra

No.	CONCEPTO	VALOR	FECHA DE APROBACION INTERVENTORIA
1	Obra Civil	\$ 56.874.673	06-05-2025
2	Materiales	\$ 156.405.350	06-05-2025
3	Mano de obra	\$ 42.656.005	06-05-2025
4	Equipos, combustibles y transporte.	\$ 28.437.336	06-05-2025

A la fecha se ha realizado la aprobación de 4 órdenes de desembolso correspondiente al 100% del valor del anticipo como se indica en la siguiente imagen:

ANTICIPO (21,89%)		\$ 284.373.364,00	
ORDEN	PROVEEDOR	VALOR	CONCEPTO
ORDEN No.1	FAA EQUIPO EINGENIERIA	\$ 56.874.673,00	MAQUINARIA
ORDEN No.2	SONEPAR COLOMBIA SAS	\$ 13.839.462,00	CABLE
	MC UNIVERSAL	\$ 150.000.000,00	BALIZAS
ORDEN No.3	SUMINISTRO DE TALADRO Y BROCAS	\$ 18.971.000,00	
	SUMINISTRO PLANTA ELECTRICA 7,5W	\$ 3.499.900,00	
	VIBROCOMPACTADORA (RANA)	\$ 2.332.400,00	
ORDEN No.4	TRANSPORTE PAJATIRA	\$ 4.950.000,00	
ORDEN No. 4	REEMBOLSO DE MATERIALES	\$ 33.905.929,00	
TOTAL		\$ 284.373.364,00	100%
SALDO ANTICIPO		0	0

A la fecha de este informe mensual, el **CONSORCIO GYP CARTAGENA** ha efectuado una amortización por valor de **SETENTA Y DOS MILLONES CIENTO SETENTA Y UN MIL TREINTA Y SIETE PESOS** (\$72.171.037), lo que corresponde al 25,38 % del valor del anticipo

3.2.4 ACTAS PARCIALES DE OBRA

En el presente informe se presenta el acta parcial de obra No.3 por valor de DOSCIENTOS VEINTINUEVE MILLONES CUATROCIENTOS VEINTIÚN MIL SETECIENTOS SESENTA Y DOS CON OCHENTA Y UN CENTAVOS (\$229.421.762,81).

Tabla 6. Relación actas parciales obra

ACTA	COSTO DIRECTO	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	NETO A PAGAR
ACTA No. 1	\$ 14.000.000,00	\$ 3.860.593,00	\$ 13.772.407,00
ACTA No. 2	\$ 82.581.646,00	\$ 18.080.536,00	\$ 64.501.110,00
ACTA No. 3	\$ 229.421.762,81	\$ 50.229.908,00	\$ 179.191.854,81

3.3 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Para la ejecución del contrato se ha establecido un personal técnico mínimo requerido, por lo anterior se hace relación de los profesionales que realizan trabajos:

Tabla 4. Relación personal contratista obra

No.	NOMBRE	CARGO
1	Oscar Andrés Pereira	Director de Obra
2	Oscar Alberto Rojas Vergara	Residente de obra
3	Numa Pompilio Pulido Bulla	Especialista Eléctrico
4	Danilo Meza Contreras	Sisoma
5	Oscar Daniel Oliveros Escobar	Topógrafo
6	Mavily Alejandra Olivero Blanco	Cadenera

4. INFORMACIÓN TÉCNICA

Para el seguimiento técnico de la ejecución se hará de conformidad con los componentes del contrato, como son:

4.1 LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO

Se realizó actividad de levantamiento topográfico de la cabecera 19 de la plataforma de viraje del aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena . El contratista realizo levantamiento en revisión conjunto con la interventoría de la etapa que la nivelación de la franja de seguridad consta ECO




4.2 CANALIZACIÓN (4 Ø 4"), NORMA CODENSA CS209, INCLUYE EXCAVACIÓN, MATERIALES, NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN

Durante el mes de Agosto se terminó la actividad de excavación y canalización de las cajas 1 a la 7 sobre el constado del costado W



4.3 CANALIZACIÓN (1 Ø 1" CONDUIT SCH 40)

Durante el mes de agosto se terminó la actividad de canalización de **1 Ø 1" CONDUIT SCH 40** las cajas 1 a la 13 sobre el constado del costado E y W

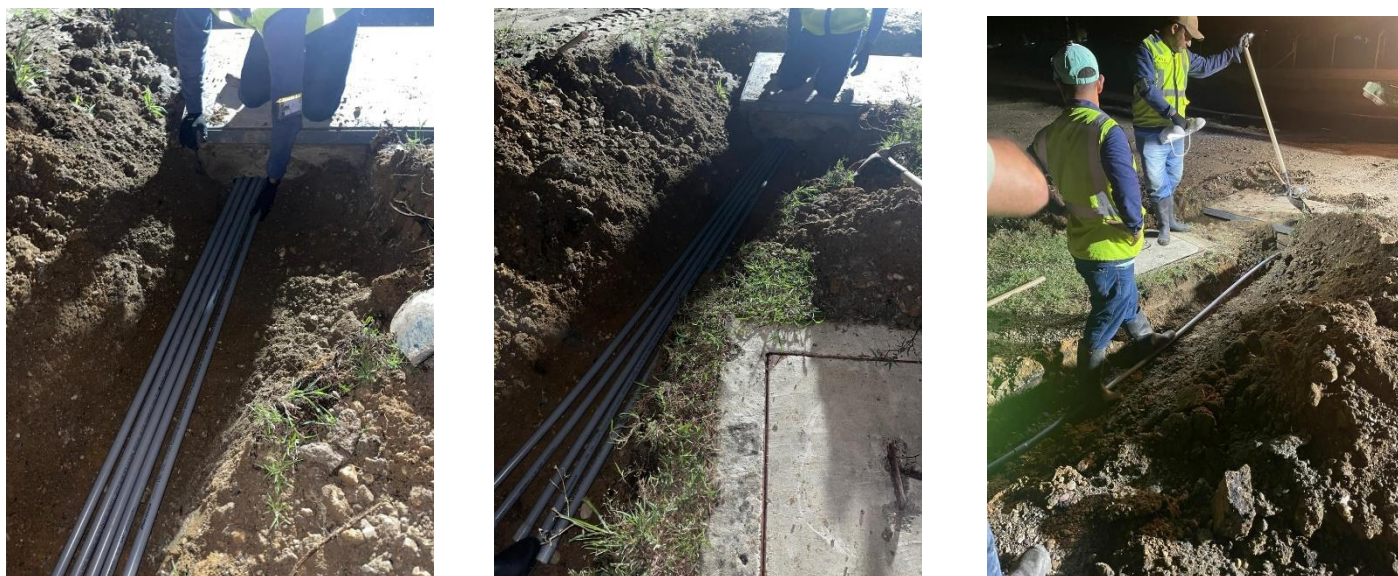

4.4 SUMINISTRO DE CABLE CU NO.6 DESNUDO


Terminación Instalación de cable desnudo sobre la canalización de la caja 1 a la 13 en el costado E Y W



4.5 SUMINISTRO, INSTALACIÓN, RECONFORMACIÓN, NIVELACIÓN, COMPACTACIÓN DE BASE GRANULAR (INCLUYE MATERIALES, EQUIPOS, TRANSPORTE)

Durante del mes de agosto se realizó las actividades de nivelación con base granular costado ECO y se continua con la actividad de compactación y fabricación de viga perimetral de cajas de inspección



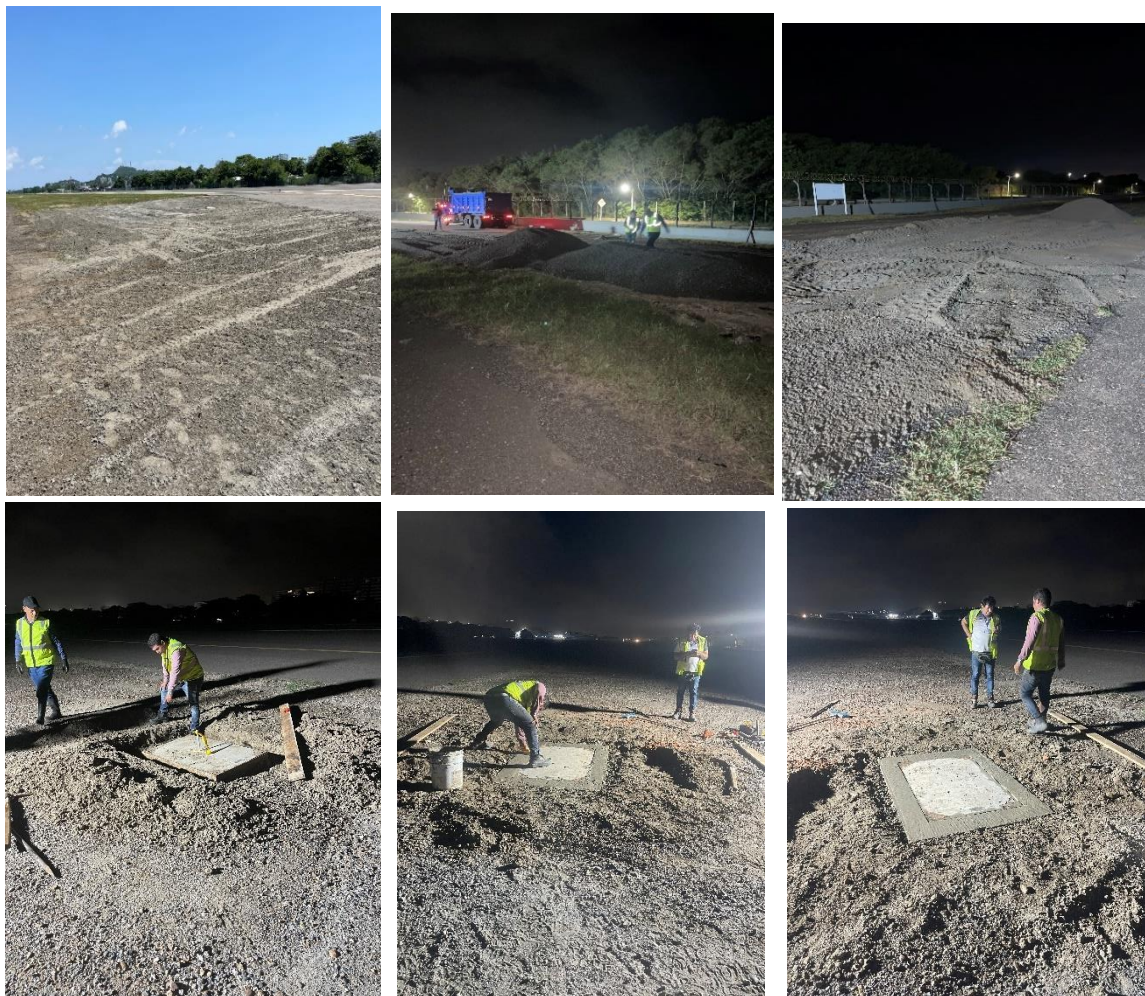

5. INFORMACIÓN CONTRATO DE INTERVENTORÍA

La información contractual del contrato de Interventoría adjudicado a INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑOS SAS se especifica en la siguiente tabla:

Tabla 5. Información general contrato interventoría

Número del contrato	No 24001447 H3 de 2024
Objeto	REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF).
Contratista	INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑOS SAS
NIT	900.235.041-6
Representante Legal	Néstor Camilo Artunduaga Ávila
Dirección	Carrera 13 # 73 – 33 Of 401
Teléfono	(601) 4969423
Estado	EN EJECUCIÓN

Valor contrato	\$ 319.683.453,00 Vigencia 2024 = \$ 53.851.232,00 Vigencia 2025 = \$ 266.252.053,00
Valor anticipo	\$ 0,00
Valor adicional	\$ 0,00
Valor actualizado	\$ 319.683.453,00
Póliza	14-44-101233173 – Seguros del estado
Fecha de aprobación póliza	26 de febrero de 2024
Supervisor	Ing. Omar Estevez
Fecha acta de inicio	6 de mayo de 2025
Plazo inicial	Ocho (8) meses
Fecha de terminación inicial	28 de diciembre de 2025
Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP	No. 5924 expedido 08 de julio de 2024 y compromiso derivado del presente proceso fueron aprobadas vigencias futuras mediante el radicado 5924 del 22 de noviembre de 2024.
Valor Certificado de Disponibilidad Presupuestal – CDP	Cincuenta y tres millones ochocientos cincuenta y un mil doscientos treinta y dos pesos M/CTE(\$53.851.232)
Registro Presupuestal - RP	No. 5924 expedido 08 de julio de 2024
Valor facturado	\$ 51.489.370,00

5.1 INFORMACIÓN GENERAL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Con el objetivo de dar cumplimiento a las especificaciones técnicas del proyecto, se presenta el análisis de los componentes descritos en el presente capítulo de acuerdo con las inspecciones diarias realizadas por Interconstrucciones & Diseños SAS, frente a la ejecución de actividades, se detalla cada uno de los componentes discriminados por periodo de ejecución.

5.2 INFORMACIÓN LEGAL INTERVENTORÍA

La Unidad Administrativa Especial de Aeronáutica Civil, tiene la necesidad de REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)".

Que mediante la Resolución 03079 del 30 de diciembre de 2024 la Entidad abrió el Proceso de Contratación a través del Concurso de Méritos Abierto No. 24001442 H3 de 2024.

Que a través de la Resolución 00515 del 12 de marzo de 2025, la Entidad adjudicó el contrato al oferente INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑO S.A.S., con el objeto de "REALIZAR LA INTERVENTORIA INTEGRAL AL MEJORAMIENTO DE LAS FRANJAS DE SEGURIDAD Y EL

SUMINISTRO E INSTALACIÓN DEL SISTEMA DE ILUMINACIÓN DE LA PLATAFORMA DE VIRAJE DE LA CABECERA 19 DEL AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA (VF)", por un valor total de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$319.683.453) IVA incluido y un plazo de ejecución de OCHO (8) MESES, término contado a partir de los requisitos de ejecución.

Para el presente contrato la entidad no entregará al interventor Anticipo y/o pago anticipado.

El 6 de mayo de 2025 se realiza firma de acta de inicio del contrato No.24001442 H3 de 2024.

5.2.1 REQUERIMIENTOS LEGALES, PROCESOS DE INCUMPLIMIENTO

En el presente periodo no se adelantan procesos de incumplimiento.

5.2.2 MODIFICACIONES LEGALES REALIZADAS EN EL PERIODO

En el presente periodo no se realizan modificaciones legales.

5.3 INFORMACIÓN FINANCIERA INTERVENTORÍA

El valor del Contrato de Interventoría No. 24001442 H3 de 2024, es hasta por la suma de TRESCIENTOS DIECINUEVE MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y TRES MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS (\$319.683.453) IVA incluido y todos los costos directos e indirectos, los impuestos y tasas y contribuciones, el cual se pagará teniendo en cuenta que el precio se pactó mediante actas parciales discriminados por vigencias así:

Vigencia 2024 = \$ 53.851.232,00

Vigencia 2025 = \$ 266.252.053,00

Es importante indicar que en la Cláusula SIETE – APROPIACION PRESUPUESTAL, se indica que:

"El pago de la suma estipulada en este contrato se sujetará al certificado de disponibilidad presupuestal No. 48425 del 29 de enero de 2025, por un valor total de \$320.103.285. Los pagos a que se obliga LA AEROCIVIL por el presente contrato quedan subordinados a la aprobación del Programa Anual Mensualizado de Caja (PAC)"

5.3.1 ESTADO FINANCIERO EJECUCIÓN CONTRATO INTERVENTORÍA

Para el mes de Agosto han radicado acta parcial de interventoria No.1 y 2 por valor de TREINTA MILLONES CIENTO SESENTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO \$ 51.489.370,00

5.3.2 MANEJO DEL ANTICIPO

Para el presente contrato la entidad no entregará al interventor Anticipo y/o pago anticipado.

5.3.3 ACTAS PARCIALES DE INTERVENTORÍA

En el presente periodo se ha radicado el Acta Parcial de Costos No. 1 y 2 .

ACTA	COSTO DIRECTO	IVA	NETO A PAGAR
ACTA No. 1	\$ 17.919.136,00	\$ 3.404.636,00	\$ 21.323.772,00
ACTA No. 2	\$ 25.349.242,02	\$ 4.816.355,98	\$30.165.598,00

5.4 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA INTERVENTORÍA

En el presente periodo se tiene la siguiente información administrativa desarrollada por INTERCONSTRUCCIONES & DISEÑOS SAS

5.4.1 NOTAM

En el periodo se tienen los siguientes NOTAM en desarrollo.

CARTAGENA/CARTAGENA - RAFAEL NUÑEZ (SKCG)

2505150500 / 2507290900 ,
MAY 15 0500-0900
MAY 16 17 23 24 0430-0940
MAY 18 20 21 22 25 0430-0900
JUL 10 13 15 16 17 20 22 23 24 27 29 0430-0900
JUL 11 12 14 18 19 21 25 26 28 0430-0940
RWY 01/19 CLSD

RPLC NOTAM D 1078 /25

N		2506171510	2506190500	JUN 19 20 22 23 25 26 27 29 30 0500-0910	2509160910
D	1434			JUN 24 0630-0910	
A	1584			JUN 21 28 0740-0910	
				JUL 01 0640-0910	
				JUL 02 03 04 06 08 09 30 31 0500-0910	
				JUL 05 07 0740-0910	
				AUG 01 03 05 06 07 08 10 12 13 14 15 17 18 20 21 22 24 26 27 28 29 31 0500-0910	
				AUG 02 09 11 16 23 25 30 0740 -0910	
				AUG 19 0640-0910	
				SEP 01 06 08 13 15 0740-0910	
				SEP 02 03 04 05 07 09 10 11 12 14 16 0500-0910	
				RWY 01/19 CLSD	

Ilustración 5. NOTAM vigentes en el Aeropuerto Rafael Núñez.

5.4.2 CONTROL DE CORRESPONDENCIA

En el siguiente cuadro se hace relación de las comunicaciones remitidas por parte del Contratista a la fecha de corte del presente informe (Anexo B).

Tabla 6. Control correspondencia enviada

FECHA	E-MAIL	OFICIO	OFICIO / CONSECUTIVO	DIRIGIDO A	ASUNTO
08/08/2025		x	INCAR-033-2025	UAEAC Ing. Omar Estévez Supervisión	SOLICITUD DE GESTIÓN PARA OBTENCIÓN DE NOTAM – AEROPUERTO RAFAEL NUÑEZ DE CARTAGENA
24/08/2025		x	INCAR-034-2025	UAEAC Ing. Omar Estévez Supervisión	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.1
24/08/2025		x	INCAR-035-2025	UAEAC Ing. Omar Estévez Supervisión	ACTA PARCIAL DE INTERVENTORIA No.2
01/09/2025		x	INCAR-036-2025	UAEAC Ing. Omar Estévez Supervisión	Información oficio SKCG-D-050
01/06/2025		x	INCAR-037-2025	CONSORCIO GYP CARTAGENA Ing. Oscar Pereira.	Respuesta a oficio SKCG-D-050
29/08/2025		x	INCAR-038-2025	CONSORCIO GYP CARTAGENA Ing. Oscar Pereira.	APROBACIÓN DESEMBOLSO DE ANTICIPO ORDEN 8
01/09/2025		x	INCAR-039-2025	UAEAC Ing. Omar Estévez Supervisión	ACTA PARCIAL DE OBRA No.3
04/08/2025	x			UAEAC Ing. Andres Sanchez Apoyo Supervisión.	Informe semanal de Interventoría No. 13 - Contrato 24001442 H3 de 2024
06/08/2025	x			UAEAC Ing. Andres Sanchez Apoyo Supervisión	Informe Mensual Interventoría No. 3- Contrato 24001442 H3 de 2024
08/08/2025	x			UAEAC Ing. Andres Sanchez Apoyo Supervisión	Presentación de comité
11/08/2025	x			UAEAC Ing. Andres Sanchez Apoyo Supervisión	Informe semanal de Interventoría No. 14 - Contrato 24001442 H3 de 2024
14/8/2025	x			UAEAC Ing. Andres Sanchez Apoyo Supervisión	Informe de Obra No. 3 CONSORCIO G y P CARTAGENA
19/08/2025	x			UAEAC Ing. Andres Sanchez Apoyo Supervisión	Informe Semanal 15 - Aeropuerto Rafael Nuñez Cartagena

25/08/2025	x			UAEAC Ing. Andres Sanchez Apoyo Supervisión	Informe Semanal 16 - Aeropuerto Rafael Nuñez Cartagena
------------	---	--	--	--	---

En el siguiente cuadro se hace relación de las comunicaciones recibidas por parte del Contratista o de la Entidad Contratante a la fecha de corte del presente informe.

Tabla 7. Control correspondencia recibida

FECHA	E-MAIL	OFICIO	OFICIO / CONSECUTIVO	REMITENTE	ASUNTO
01/08/2025		x	SKCG-045	CONSORCIO GYP CARTAGENA Ing. Oscar Pereira Director de Obra	Solicitud Notam
06/08/2025		x	SKCG-0046	CONSORCIO GYP CARTAGENA Ing. Oscar Pereira Director de Obra	Cambio numero de Orden
08/08/2025		x	SKCG-045	CONSORCIO GYP CARTAGENA Ing. Oscar Pereira Director de Obra	Línea de eje
11/08/2025		x	SKCG-046	CONSORCIO GYP CARTAGENA Ing. Oscar Pereira Director de Obra	APU realce cajas
25/08/2025	x			CONSORCIO GYP CARTAGENA Ing. Oscar Pereira Director de Obra	Reprogramación anticipo
26/08/2025		x	SKCG-051	CONSORCIO GYP CARTAGENA Ing. Oscar Pereira Director de Obra	Reembolsos materiales
26/08/2025		x	SKCG-053	CONSORCIO GYP CARTAGENA Ing. Oscar Pereira Director de Obra	Acta No.3 corregida
27/08/2025	x			CONSORCIO GYP CARTAGENA Ing. Oscar Pereira Director de Obra	Respuesta observaciones plano

5.4.3 INFORMES SEMANALES

En el periodo comprendido entre el 1 de Agosto y el 31 de Agosto de 2025 se presentaron los siguientes informes semanales (Anexo C):

Tabla 8. Periodos de los informes semanales

FECHA	INFORME SEMANAL No.
Julio 28 al 03 agosto 2025	13
Agosto 04 al 10- 2025	14
Agosto 11 al 17 - 2025	15
Agosto 18 al 24 - 2025	16
Agosto 25 al 31 - 2025	17

5.4.4 BITÁCORA DE OBRA

Se remite copia de bitácora (Anexo D) con el detalle diario de las actuaciones que se adelantan en la obra durante el periodo comprendido entre 1 de Agosto al 31 de Agosto del 2025.

5.4.5 ANÁLISIS DE LLUVIAS

En (ANEXO E) se incluye el cuadro de frecuencia de lluvias durante el presente periodo.

5.4.6 PERSONAL INTERVENTORÍA

Para la ejecución del contrato de interventoría se ha establecido un personal técnico mínimo requerido, por lo anterior se hace relación de los profesionales que realizan trabajos actualmente

Tabla 9. Relación personal interventoría

No.	NOMBRE	CARGO	PARTICIPACION (%)
1	Néstor Camilo Artunduaga	Director de Interventoría	50%
2	Cesar Augusto Isaza	Residente de Interventoría	100%
3	Daniilsa Navarro Cueto	Inspectora SST	100%
4	Didier Suarez	Especialista Eléctrico	10%
5	Abraham Chávez	Topógrafo	50%

5.5 INFORMACIÓN TÉCNICA INTERVENTORÍA

Para el seguimiento técnico de la ejecución del contrato de mantenimiento lado aire del Aeropuerto Internacional Rafael Núñez, se relaciona las actividades ejecutadas por parte del grupo Interventor, así como la inversión en cada uno de los componentes del contrato, en seguimiento al cronograma (Anexo H).

5.5.1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO

En el aeropuerto Rafael Núñez de Cartagena se adelantaron labores de levantamiento topográfico y replanteo preliminar por un valor de \$ 25.000.000 en el periodo del informe.

Tabla 10. Valores ejecutados para Topografía

Nº	ÍTEM DE PAGO	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD A EJECUTAR	CANTIDAD EJECUTADA (PERIODO)	VALOR EJECUTADO (PERIODO)	CANTIDAD ACUMULADA	CANTIDAD TOTAL ACUMULADA	VALOR TOTAL ACUMULADO	% EJECUTADO ACUMULADO	% POR EJECUTAR
1	6,1	Localización y replanteo. Topografía general: Incluye cartera topográfica, luces de plataforma de	GLB	1	1	\$25.000.000,00	1	1	\$25.000.000,00	100%	0%

viraje, línea eje de plataforma de viraje cabecera19, nivelación, debe entregarse plano en AutoCAD.									
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Reconocimiento del Área de trabajo – Cabecera No. 19- Aeropuerto Rafael Núñez



Levantamiento topográfico y replanteo preliminar – Cabecera No. 19



Descargue de materiales, maquinaria y equipo- inicia Nivelación constado ECO – Cabecera No. 19

19

Ilustración 6 Actividades en el periodo

5.5.2 COMITÉS TÉCNICO DE SEGUIMIENTO

Durante el periodo se realizaron 4 comités técnicos (ANEXO F) con el fin de mostrar las actividades realizadas durante el periodo del informe, así como la iniciación del contrato de mantenimiento para el Aeropuerto Internacional El Edén.

Presentación de comité No.14 del 28 de julio al 3 de agosto de 2025

Presentación de comité No.15 del 4 de agosto al 10 de agosto de 2025

Presentación de comité No.16 del 11 de agosto al 17 de agosto de 2025

Presentación de comité No.17 del 18 de agosto al 24 de agosto de 2025

5.5.3 ANÁLISIS DE DISPOSICIÓN DE EQUIPOS Y MATERIALES

En el presente periodo se realizó el uso de herramienta menor, equipo mínimo requerido para actividades de Levantamiento topográfico, equipo de topografía. Maquinaria para inicio de excavaciones mecánicas en la instalación de banco de ductos de tubería de 4" PVC , volquetas para el suministro de base Granular y compactadora manual.

5.6 GESTIÓN SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO, AMBIENTAL

A través de documento INFORME INTERVENTORÍA SG-SST, se realiza entrega (ANEXO G) del consolidado de las actividades que se llevaron a cabo en las áreas de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, con sus soportes correspondientes, ejecutados en el periodo comprendido entre del 1 de Agosto al 31 de Agosto de 2025.

6. SEGUIMIENTO AL PLAN DE GERENCIA DE PROYECTOS

En el periodo entre el 01 de agosto al 31 de agosto de 2025 se le realizó seguimiento al Plan de Gerencia de Proyectos del Contratista según lo establecido en el pliego de condiciones, dentro de los planes hacemos relevancia al Control del Cronograma y Costos, para el control de los mismos se tienen los siguientes gráficos:



Ilustración 7. Curva S del contrato de obra

En la variación del cronograma (SV) se cuenta con una pendiente positiva lo que quiere decir que el proyecto va por buen camino, esto también se puede concluir debido al resultado que se tiene del progreso real frente al progreso esperado se encuentra con avance.

7. INDICADORES DE CUMPLIMIENTO

Los indicadores de cumplimiento del periodo se presentan a continuación de acuerdo con lo establecido en el Formato 8 con los INDICADORES DE MEDICIÓN PARA EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES.

Tabla 11. Porcentaje de evaluación de los indicadores de cumplimiento

INDICADOR	FORMULA	METRICA	PORCENTAJE OBTENIDO
EVALUACIÓN	(Tiempo de ejecución programado / Tiempo ejecución real) *100	(26/26)*100	100,00%
	(Cantidad de personal contratado / Cantidad de personal mínimo para el periodo) *100	(6/6)*100	100,00%
CUMPLIMIENTO	Solicitudes atendidas satisfactoriamente por el interventor/ total de solicitudes realizadas por la supervisión) *100	(5/5)*100	100,00%
EFICACIA	(Objetivos específicos cumplidos /Objetivos específicos planteados) *100		Medición al finalizar el contrato
RIESGOS	(No riesgos mitigados y/o tratados /No. Riesgos previstos) *100		N/A

Como resultado de la evaluación se considera que para el periodo evaluado se cuentan con indicadores favorables para el desarrollo del Contrato de Obra No. 24001397 H4 de 2024. Respecto al índice de RIESGOS en el periodo evaluado no se presentan.

8. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

- De acuerdo al plan de trabajo presentado por el contratista CONSORCIO GYP CARTAGENA, en el presente periodo evaluado del 1 de agosto de 2025 al 31 de agosto de 2025, se realizaron actividades de terminación de la canalización de tubería de 4" y tubería de 1", Nivelación con base Granular, fabricación de viga perimetral de cajas de inspección de la 13 a la 8.
- El plano eléctrico sigue con observaciones el día 27 de agosto el CONSORCIO GYP CARTAGENA envía subsanación y se encuentra en revisión por el especialista eléctrico de interventoria con el fin de tener una versión definitiva para continuar con la adecuada ejecución del proyecto.
- Al cierre del mes de Agosto, el avance programado del proyecto es del 21.31%, mientras que el avance ejecutado alcanza el 26.26 %, lo que representa un avance positivo del 4,95 % respecto a lo planificado.
- Los comités técnicos desarrollados durante el periodo fueron fundamentales para dar claridad sobre las actividades semanales, así como para resolver problemáticas e inquietudes surgidas en el desarrollo del proyecto.

9. ANEXOS

- 9.1** Anexo A - Registro Fotográfico
- 9.2** Anexo B - Correspondencia enviada y recibida
- 9.3** Anexo C - Informes semanales
- 9.4** Anexo D - Bitácora
- 9.5** Anexo E - Análisis de llluvias
- 9.6** Anexo F - Comités Técnicos
- 9.7** Anexo G – Informe Mensual de Interventoría SG-SST
- 9.8** Anexo H – Cronograma en Project
- 9.9** Anexo I. Certificados de Calidad
