

INFORME MENSUAL No. 1

**ENTIDAD: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA
"CORPAMAG".**

OBJETO: "INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES."



CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No. LP-006-2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ICASM2023

PERIODO: 20 DE MARZO DE 2025 HASTA 31 DE MARZO DE 2025

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	 CONSORCIO ICASM 2023
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

TABLA DE CONTENIDO

1	INTRODUCCIÓN	4
2	ANTECEDENTES DEL PROYECTO	5
2.1	DESCRIPCION GENERAL	5
2.2	LOCALIZACIÓN.....	6
2.2.1	Localización Especifica del Proyecto	7
2.2.2	Inventario y estado inicial del sitio donde se ejecutarán las obras.....	8
2.3	ALCANCE Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO	9
3	ESTADO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS	16
3.1	CONTRATO DE OBRA.....	16
3.1.1	INFORMACION BÁSICA CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023.....	16
4	ACTIVIDADES DE OBRA	16
4.1	ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO	16
4.1.1	INFORME DE REFERENCIAS TOPOGRAFICAS VERIFICADAS DENTRO DEL PERIODO.....	17
4.1.2	INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO.....	17
4.1.3	PERSONAL DE OBRA	18
4.1.4	EQUIPO DE OBRA.....	18
4.1.5	ACTIVIDADES REALIZADAS.....	18
4.1.6	SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA Y LA PROGRAMACION ..	19
4.1.7	BITÁCORA DE OBRA.....	20
4.1.8	CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO	20
4.1.9	CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA	21
4.1.10	CONTROL DE PERSONAL	21
4.2	ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO	21
4.2.1	CONTROL DE PÓLIZAS	21
4.2.2	CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES	22
4.2.3	CORRESPONDENCIA	22
4.2.4	ESTADO DEL TRÁMITE DE LOS PERMISOS.....	22
4.2.5	REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO	22
4.3	ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO	22
5	CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES	23

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	
		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

LISTA DE TABLAS

Tabla 1. Datos generales de contrato de Obra Pública No. LP 006 2023, Periodo 2025.	16
Tabla 2. Informes Semanales.	17
Tabla 3. Personal de Obra.	18
Tabla 4. Relación Maquinara de Obra.....	18
Tabla 5. Relación de Equipos de Topografía.	18
Tabla 6. Resumen del cumplimiento a la programación durante el periodo.	19
Tabla 7. Póliza del Contrato no. LP 006 DE 2023.	22
Tabla 8. Relación de correspondencia durante el periodo.....	22

LISTA DE FIGURAS

Ilustración 1. Localización general del proyecto, Distrito de Santa Marta. Fuente: Propia.	6
Ilustración 2. Ubicación de los cuerpos de agua que se tiene proyectado su intervención. Fuente: Propia.	7
Ilustración 3. Recorrido de campo en Quebrada Bureche. Fuente: Propia.	8
Ilustración 4. Estado de Box en Quebrada Bureche. Fuente Propia.	9
Ilustración 5. Localización de la Cuenca del Río Gaira. Fuente: Propia.	12
Ilustración 6. Figura representativa de muro en Geocontenedor. Fuente: Propia.	13
Ilustración 7 Presupuesto de obra correspondiente al periodo 2025.	15
Ilustración 8. Limpieza del campamento. Fuente: Propia.	17

LISTA DE GRÁFICO

Gráfico 1. Porcentaje Programado vs Ejecutado en las semanas del mes. Fuente: Propia.	19
Gráfico 2. Porcentaje Acumulado de vs Programado vs Ejecutado. Fuente: Propia.	19
Gráfico 3. Porcentaje de Adelanto o Atraso de la Programación del proyecto. Fuente: Propia.	20
Gráfico 4. Estado del Tiempo en el Mes. Fuente: Propia.	20

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	 CONSORCIO ICASM2023
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

1 INTRODUCCIÓN

La Corporación Autónoma Regional del Magdalena (CORPAMAG) dentro de sus funciones propone y articula las políticas, estrategias, planes, programas, proyectos y procedimientos de tipo ambiental, por lo anterior le adjudicó el contrato de obra al CONSORCIO ICASM2023, cuyo objeto es **“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”**.

El presente documento corresponde al informe mensual no. 1, este contiene las actividades desarrolladas en la ejecución de los trabajos relacionados con el contrato de obra en el periodo de tiempo comprendido entre el 20 de marzo de 2025 y 31 de marzo de 2025 de la vigencia 2025, en cumplimiento de las obligaciones contractuales.

Dentro de las funciones de obra se tienen en cuenta la ejecución de las actividades del contrato, con el fin de dar el cumplimiento eficaz de las mismas, acorde a las especificaciones técnicas, diseños estipulados y recomendaciones de Interventoría. El informe mensual está conformado, por un resumen ejecutivo del mes, en el cual se presenta la descripción general del proyecto, el control de la programación, las actividades ejecutadas en el periodo y finalmente un registro fotográfico de las actividades realizadas.

De esta manera, con el presente informe se pretende proporcionar una visión global de las ejecuciones del contrato, dentro del periodo mencionado, en el que se analizan de manera conceptual y gráfica, los rendimientos o avance de la obra.

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	 CONSORCIO ICASM 2023
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

2 ANTECEDENTES DEL PROYECTO

2.1 DESCRIPCION GENERAL

Los cuerpos de agua proveen servicios ambientales que garantizan la disponibilidad del recurso hídrico, la diversidad de la flora y la fauna, la sostenibilidad de los territorios y la calidad de vida de sus habitantes, lo que significa que de su cuidado depende el correcto funcionamiento de cada uno de los ecosistemas terrestres.

En tal sentido, la ejecución de este proyecto es importante no solo para la ciudad, si no para el país en general, debido a que el distrito de Santa Marta representa un turístico, que genera fuentes de empleo a la región y divisas a la ciudad, pero debido a los graves problemas de socavación e inundación no se ha podido desarrollar todo el potencial que tiene. La desembocadura de estos ríos con el mar caribe representa un atractivo sin igual, que atrae casi que naturalmente al turista, que ven en estos parajes un sitio agradable, apacible y donde la calidez del nativo los hace regresar.

Con la ejecución de este proyecto no sólo se está contribuyendo al mejoramiento en la calidad de vida de la comunidad Santa Marta, sino que también contribuye con los procesos de restauración y recuperación de hábitats presentes en los cauces de estos ríos y en la zona costera del Mar Caribe donde la mayoría de ellos desembocan.

Además, con estas obras de mantenimiento en los ríos propuestos en la zona rural y urbana del Distrito de Santa Marta se contribuye que en temporadas de fuertes precipitaciones se mitiguen los riesgos por inundación a las que se encuentran expuestas las comunidades que colindan con las rondas hídricas de estos, así mismo, contribuye a la perduración en el tiempo del proyecto que actualmente se está ejecutando denominado: **“INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”**.

El proyecto busca mantener estos cuerpos de agua en un escenario integral-colectivo sostenible de la ciudad, que resalte a Santa Marta y su carácter transversal. Por consiguiente, este escenario abrirá espacio a todas las personas y los invitará a participar de él y a usarlo permanentemente de manera sostenible.

Además de lo anteriormente expuesto, el presente proyecto se encuentra enmarcado en el enfoque hacia los 500 años buscando la preservación y valorización de la biodiversidad del distrito, con los mantenimientos permanentes en sus cuerpos de agua prestar servicios turísticos de calidad, además con este proyecto se contribuye al desarrollo urbano, social, económico sostenible y adaptado al cambio climático.

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	 CONSORCIO ICASM 2023
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

2.2 LOCALIZACIÓN

El Distrito de Santa Marta está conformado por un mar territorial, un área montañosa correspondiente a la Sierra Nevada, cuerpos de agua interiores, las islas y bahías localizadas en el mar territorial y en los cuerpos de agua, el suelo consolidado constituido por una zona costera y una zona continental, el suelo no consolidado constituido por la zona de Bajamar, el subsuelo y el espacio aéreo asociado.

Limita Por el Norte y el Oeste con el Mar Caribe, al sur los municipios de Ciénaga y Aracataca y por el oriente los departamentos de la Guajira y Cesar. Sus coordenadas geográficas son: 11° 14' 50" de latitud norte y 74° 12' 06" de latitud oeste. Dista de Bogotá 992 Km; de Riohacha 166 Km y de Barranquilla 93 Km. Cuenta con una extensión total de 2,393.35 Km², de los cuales 55.10 Km² pertenecen a zona urbana y 2,338.25 km² a zona rural. La altura promedio de la ciudad es de 2 msnm, pero con una diferencia de altura que va, en el territorio del municipio, desde el nivel del mar hasta los 5.775 msnm en el Pico Cristóbal Colón, que es el más elevado de toda Colombia ubicado en la Sierra Nevada de Santa Marta (PDD Santa Marta, 2023).

Ilustración 1. Localización general del proyecto, Distrito de Santa Marta. Fuente: Propia.



	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	 CONSORCIO ICASM 2023
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

2.2.1 Localización Especifica del Proyecto

Los cuerpos de agua a intervenir serán definidos año a año por la entidad (CORPAMAG), soportado en los informes técnicos, así como en el concepto expedido por la INTERVENTORIA.

El mantenimiento se realizará en los siguientes cuerpos de agua:

- RIO MANZANARES
- RIO GAIRA
- RIO PIEDRAS
- RIO GUACHACA
- RIO MENDIGUACA
- RIO BURITACA
- RIO DON DIEGO

Y otros cuerpos de agua que puedan ser priorizados dentro del Distrito de Santa Marta.

Ilustración 2. Ubicación de los cuerpos de agua que se tiene proyectado su intervención. Fuente: Propia.



Para la vigencia **2025** se realiza recorrido de los distintos cuerpos de agua para identificar cual requiere mayor prioridad y realizar los respectivos estudios y diseño. De igual forma a principio de año se realizó recorrido con personal de Corpamag

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	 CONSORCIO ICASM 2023
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

para la intervención de **Quebrada Bureche** el cual la corporación le hace mantenimiento con frecuencia.

2.2.2 Inventario y estado inicial del sitio donde se ejecutarán las obras

QUEBRADA BURECHE

El cuerpo se encuentra desembocando en el Río Gaira, en el tramo 3 de geocontenedores, esta obra fue planteada con el fin de buscar que las aguas de la quebrada viertan sin formar ningún cambio de margen en el río. Este fue planteado para traer todas las aguas desde la calzada troncal del caribe y después verter de forma segura y se le tiene que hacer mantenimiento periódico para que siga funcionando.

Normalmente los mantenimientos recibidos por la quebrada se limitaban mayormente a limpieza manual y retiro de residuos, pero esta vez se decidió darle un mayor trabajo con el uso de maquinaria amarilla para además de lo anteriormente mencionado retirar el sedimento que ha ido acumulando por años.

Ilustración 3. Recorrido de campo en Quebrada Bureche. Fuente: Propia.



	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Ilustración 4. Estado de Box en Quebrada Bureche. Fuente Propia.



2.3 ALCANCE Y CARACTERISTICAS TECNICAS DEL PROYECTO

El proyecto tiene como alcance, las “**INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES**” para mitigar los fenómenos de inundación debido a las fuertes lluvias recurrentes en el Distrito de Santa Marta, y además del mantenimiento de los cuerpos hídricos, cumpliendo los estándares ambientales de la corporación.

Con motivo de la recuperación de la capacidad hidráulica y la limpieza del cauce, se tienen programadas actividades de: Remoción de sedimentos a máquina, Que busca el retiro de todo material depositado en el cauce, junto con esta actividad se tiene el retiro en volquetas del material removido; Limpieza de vegetación dentro del cauce, este es un trabajo manual y tiene como propósito el despeje del cuerpo de agua de todo tipo de maleza que genere obstrucciones.

Así mismo se construirán obras de protección (Muros en Geocontenedores) en la margen donde se requiera protección, el material proveniente de la excavación será dispuesto como material de relleno de los geocontenedores.

Las estructuras estarán constituidas con Geobolsas relleno con material de sitio con cuatro niveles, cada nivel de 1.25 metros (Altura inicial 1.45m) para una altura total de 5,75 metros. Estos Geocontenedores tendrán en su parte inferior un geomanto antisocavante para evitar la erosión en su base. Adicionalmente, en la parte de

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	 CONSORCIO ICASM 2023
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

contacto con el agua tendrá un geomanto protector generar vegetación a lo largo del tiempo. En la parte posterior del relleno se proveerá de un geotextil no tejido para evitar migración de finos.

Las obras de protección consistirán en un Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil de poliéster; Manto Antisocavación ensamblado en geotextil de poliéster de 89 KN/m; Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50; Geotextil Tejido de Poliéster, resistencia método tira ancha de 40 KN/m y Relleno con Material del Sitio.

Estas obras serán complementadas con la implementación de la Revisión y Ajustes a Estudios y/o Diseños y la Interventoría Técnica, Administrativa, Financiera, Contable, Ambiental, Social y Jurídica.

Para lo cual, se ejecutarán las siguientes actividades:

- Remoción Mecánica De Sedimentos Mediante El Uso De Excavadora Sobre Orugas.
- Dragado Mecánico De Sedimentos Mediante Uso De Excavadora.
- Cargue, Retiro Y Disposición Final De Material Proveniente De La Remoción Y Excavaciones.
- Limpieza Manual De Vegetación.
- Muro En Geocontenedores Ensamblado Con Tensores Internos En Geotextil. Incluye: Relleno Con Material Proveniente De La Excavación, Formaletería Y Costuras.
- Manto Antisocavación Ensamblado En Geotextil. Incluye: Inyección De Arena Proveniente De La Excavación En Lastre Inferior.
- Manto Para El Control De Erosión Permanente, Tipo Trm 50.
- Geotextil Tejido De Poliéster.
- Protocolo De Ahuyentamiento Y Rescate Fauna En El Marco De La Ejecución Del Proyecto.
- Implementación De Estrategia De Sensibilización Y Participación Ambiental Dirigido A La Comunidad En La Zona De Influencia Del Proyecto.
- Diseño De Sistema De Alerta Temprana.
- Implementación De Sistema De Alerta Temprana.

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	 CONSORCIO ICASM 2023
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

A continuación, se describen los componentes analizados para la ejecución del contrato en mención.

- **COMPONENTE TOPOGRÁFICO**

En el informe topográfico contiene los criterios desarrollados en los levantamientos que se realizaron en el distrito de Santa Marta. El estudio topográfico, consta con la descripción topográfica y batimétrica del área propuesta para el proyecto, brindando información a nivel de detalle debidamente geo-referenciada a partir de la colección de datos de la red local geodésica de proyecto. Sin embargo, de este componente se obtiene que:

El máximo error de cierre para las poligonales de los levantamientos de replanteo del eje del canal y estructuras será mínimo de 1:2500 en distancia y $e=10N$, en ángulo, expresado en segundos, siendo “N” el número de vértices de la poligonal. El máximo error de cierre en las nivelaciones para el control de las excavaciones expresado en milímetros será de 50K, siendo “K” la longitud en kilómetros de las líneas de nivelación. En ninguna circunstancia se permitirá utilizar equipo con sistema de posicionamiento global como instrumento de nivel. En la localización de los puntos para sondeos el error máximo admisible es de ± 0.80 m.

- **COMPONENTE ESTUDIO DE SUELO, GEOLÓGICO Y GEOTÉCNICO**

Se presenta el informe de Estudio de suelos, geológico y geotécnico donde se relaciona la evaluación geotécnica inicial y la investigación del subsuelo para identificar la estratigrafía y determinar los parámetros geotécnicos de la zona, además se incluyen registros de la exploración en campo con la información de las muestras de material tomadas.

De igual manera se observa que no se evidencio en ninguno de los sondeos realizados la presencia del nivel freático, así como la examinación de la sismicidad de la zona ante posibles amenazas, además incluye las recomendaciones que deben seguirse durante la ejecución de las obras, teniendo en cuenta la posibilidad de cambio de las condiciones del proyecto. Sin embargo, de este componente se obtiene que:

1. Debido a la homogeneidad de los materiales encontrados en la exploración, no fue necesario hacer zonificaciones geotécnicas, sino que se consideró realizar una sola caracterización geotécnica para todo el lote.
2. Se realizó diseño geotécnico de una estructura de contención para el control de inundaciones generados por una creciente del río. Para todos los casos se encontraron factores de seguridad superiores a los mínimos exigidos en la normatividad colombiana tanto en condiciones estáticas como pseudo estáticas.

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	 CONSORCIO ICASM 2023
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

3. Los materiales producto de las excavaciones a realizar para construir la cimentación podrán ser empleados como material de relleno en razón a su buena capacidad mecánica y su estabilidad volumétrica.

Es importante tener en cuenta la posible variabilidad del perfil estratigráfico en otros sectores del río, lo que genera por ende otras propiedades geomecánicas de los materiales. Lo anterior no indica cambios en los diseños, ya que el trabajo de campo, los resultados de laboratorio y el análisis de éstos, permitieron concluir teniendo en cuenta condiciones desfavorables. De todas formas, se deberá tener presente que, si durante la ejecución de los trabajos se encuentran en la zona condiciones del subsuelo muy diferentes a las descritas como típicas en el informe, o se generan variaciones sustanciales del proyecto que afecten de una u otra manera las recomendaciones emitidas, se deberá informar oportunamente para complementar las conclusiones y recomendaciones consignadas en el informe.

- **COMPONENTE ESTUDIO HIDROLÓGICO – HIDRÁULICO**

La Quebrada Bureche pertenece a la cuenca del Río Gaira, pero debido a que lo que se va a realizar es un mantenimiento rutinario y este tiene una sección definida debido al recubrimiento que posee no se hace necesario una estimación de caudal.

Caracterización de la Cuenca.

Ilustración 5. Localización de la Cuenca del Río Gaira. Fuente: Propia.



La cuenca cuenta con aproximadamente 10.875 hectáreas. La longitud del río Gaira es de 33,95 kilómetros y tiene un caudal promedio anual de 2,7 m³/s a la altura de la estación MINCA ubicada en el centro poblado del mismo nombre.


	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	 CONSORCIO ICASM 2023
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Los principales afluentes del río Gaira son: quebrada El Palmar, quebrada Las Mercedes, quebrada Agua Dulce, quebrada La Macanilla, entre otras. Sus principales centros poblados son Minca, Gaira y el Rodadero.

• COMPONENTE ESTUDIO ESTRUCTURAL

En el estudio estructural fue necesario para determinar el dimensionamiento y el refuerzo necesario para resistir las acciones de las cargas producidos por las acciones de las fuerzas externas. En este orden de ideas, este estudio contiene el diseño de las estructuras de contención con Geobolsas, con el fin de proteger la orilla ante las crecientes que se vienen presentando.

Ilustración 6. Figura representativa de muro en Geocontenedor. Fuente: Propia.

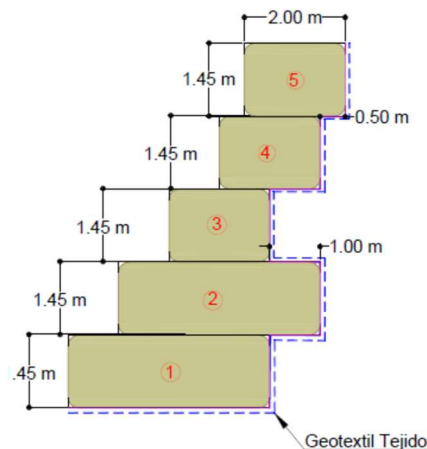

Según el estudio se concluye que:

- El análisis de estabilidad de geobolsas se hace basado con el peso unitario saturado, la cual sería el caso para la condición más crítica.
- Se deben respetar los materiales, las dimensiones, ángulo de inclinación de la estructura, con el fin de garantizar la estabilidad estructural para el cual fue chequeado los geocontenedores,
- Se verificó que la configuración de los Geocontenedores cumple con las condiciones de estabilidad exigidos en la normativa vigente colombiana NSR 2010.
- Las cargas actuantes sobre las estructuras se basaron del estudio de suelos, hipótesis de niveles de agua de acuerdo con el flujo de agua en el río, para lo cual, si existe alguna condición diferente en el sitio, se debe consultar con

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1		
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025		CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

el ingeniero estructural con el fin de revisar cualquier cambio que se pueda presentar.

- Los Geocontenedores se deben llenar mecánicamente, de manera que cuando el primer nivel está semi-sumergido, la medida que se llena con arena y se desplaza el agua, no depende del flujo a través del geotextil, ya que es muy pequeño.
- El sistema de anclaje de cualquier tipo de recubrimiento o geotextil de control de erosión se debe realizar con el mismo peso del elemento, pues ello significa evitar la perforación del geotextil. Son actividades previas para considerar durante la conformación del geocontenedor pues este último es el sistema de anclaje del geotextil o manto de recubrimiento.

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	

CANTIDADES DE OBRA CONTRACTUALES PERIODO VIGENCIA 2025

Ilustración 7 Presupuesto de obra correspondiente al periodo 2025.

		CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA NIT. 800.099.287-4				
FORMATO OFERTA ECONOMICA						
LICITACION DE OBRA PUBLICA No. LP 006 DE 2023						
"INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES"						
AÑO 2025						
ITEM	ESP.	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
I. PRELIMINARES						\$ 31,513,384.00
1.1	P - 1.1	Movilización y Desmovilización de Equipos	und	8.0	\$ 3,939,173.00	\$ 31,513,384.00
II. MANTENIMIENTO HIDRAULICO						\$ 7,480,285,719.18
2.1	P - 2.1	Remoción Mecánica de Sedimentos Mediante el Uso de Excavadora sobre Orugas. Incluye: Seguimiento y Control Topografico	m3	92,648.54	\$ 16,507.00	\$ 1,529,349,449.78
2.3	P - 2.3	Cargue, Retiro y Disposicion Final de Material proveniente de la remoción y Excavaciones. Incluye: Disposicion en Escombrera Certificada	m3	92,648.54	\$ 42,500.00	\$ 3,937,562,950.00
2.4	P - 2.4	Limpieza Manual de vegetación	mes	12.0	\$ 49,385,635.00	\$ 592,627,620.00
2.5	P - 2.5	Muro en Geocontenedores ensamblado con tensores internos en geotextil. Incluye: Relleno con Material Proveniente de la Excavación, Formaletería y Costuras.	m3	6,000.0	\$ 160,377.00	\$ 962,262,000.00
2.6	P - 2.6	Manto Antisocavación ensamblado en geotextil. Incluye: Inyección de Arena proveniente de la excavación en Lastre Inferior	m2	2,250.0	\$ 33,138.00	\$ 74,560,500.00
2.7	P - 2.7	Manto para el Control de Erosión permanente, Tipo TRM 50	m2	7,031.30	\$ 45,978.00	\$ 323,285,111.40
2.8	P - 2.8	Geotextil Tejido de Poliéster	m2	5,156.30	\$ 11,760.00	\$ 60,638,088.00
TOTAL COSTOS DIRECTOS					\$ 7,511,799,103.18	
Aministración (23%)					\$ 1,727,713,794.00	
Imprevistos (2%)					\$ 150,235,982.00	
Utilidad (5%)					\$ 375,589,955.00	
IVA (19%) sobre la Utilidad					\$ 71,362,091.00	
TOTAL COSTOS INDIRECTOS					\$ 2,324,901,822.00	
VALOR TOTAL DE LA OBRA CIVIL					\$ 9,836,700,925.18	
III. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS					\$ 1,134,038,192.00	
3.1	P - 3.1	Rescate de Fauna Acuatica y Terrestre	und	1.0	\$ 237,598,855.00	\$ 237,598,855.00
3.3	P - 3.3	Implementacion de Estrategia de Sensibilización y Participación Ambiental Dirigido a la Comunidad en la Zona de Influencia del Proyecto	und	8.0	\$ 37,443,694.00	\$ 299,549,552.00
3.4	P - 3.4	Diseño de sistema de alerta temprana Río Gaira.	und	1.0	\$ 225,174,735.00	\$ 225,174,735.00
3.4.1	P - 3.4	Implementación del sistema de alerta temprana Río Guachaca.	Glb	1.0	\$ 371,715,050.00	\$ 371,715,050.00
IVA. ACTIVIDADES COMPLEMENTARIA					\$ 215,467,256.48	
VALOR TOTAL OBRA AÑO 2025					\$ 11,186,206,374.00	

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

3 ESTADO DE LOS CONTRATOS SUSCRITOS

3.1 CONTRATO DE OBRA

3.1.1 INFORMACION BÁSICA CONTRATO DE OBRA N° LP-006-2023

DATOS GENERALES DEL CONTRATO DE OBRA	
CONTRATISTA:	CONSORCIO ICASM2023
REPRESENTANTE LEGAL:	DIXON ENRIQUE VALVERDE MARTINEZ
OBJETO:	INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES
FECHA DE SUSCRIPCIÓN DEL CONTRATO:	19 DE DICIEMBRE DE 2023
VALOR DEL CONTRATO:	\$ 330.530.495.016,00
FECHA DE INICIACIÓN:	19 DE MARZO DE 2024
PLAZO DE EJECUCIÓN:	147 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO:	19 DE JUNIO DE 2036
PERIODO ACTUAL:	2025
CUERPO DE AGUA A INTERVENIR:	QUEBRADA BURECHE
VALOR DEL PERIODO:	\$ 11.186.206.374,00
FECHA DE INICIO DE PERIODO:	20 DE MARZO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN:	10 MESES
FECHA DE VENCIMIENTO DEL PERIODO:	31 DIC DE 2025

Tabla 1. Datos generales de contrato de Obra Pública No. LP 006 2023, Periodo 2025.

4 ACTIVIDADES DE OBRA

4.1 ACTIVIDADES DE ORDEN TECNICO

No se realizaron actividades de obra

Semana No. 1 (20/03/2025 - 23/03/2025)

1. No se registraron actividades de obra, solo actividades administrativas.

Semana No. 2 (24/03/2025 - 30/03/2025)

1. No se registraron actividades de obra, solo actividades administrativas.
2. Se realiza limpieza del campamento.

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	 CONSORCIO ICASM 2023
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Ilustración 8. Limpieza del campamento. Fuente: Propia.



4.1.1 INFORME DE REFERENCIAS TOPOGRAFICAS VERIFICADAS DENTRO DEL PERIODO.

No se realizaron actividades de obra en este periodo.

4.1.2 INFORMES TÉCNICOS DESARROLLADOS Y/O APROBADOS EN EL PERIODO.

- Informe Semanal de Obra.

Los informes semanales de obras correspondiente al periodo de ejecución son los siguientes:

SEMANA	ARCHIVO
SEMANA 1	INFORME SEMANAL N°1 (20MAR-23MAR)
SEMANA 2	INFORME SEMANAL N°2 (24MAR-30MAR)

Tabla 2. Informes Semanales.

Los informes se encuentran plasmados en el **“Anexo No.1 Informes Semanales”** del presente Informe.

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

4.1.3 PERSONAL DE OBRA

A continuación, se presenta el personal de obra en el proyecto.

CARGO	NOMBRES
Director de Obra	Luis Fernando Ochoa Marulanda
Especialista Ambiental	Rosa Elvira Villamizar Sierra
Especialista Hidráulico	Danilo Gregorio Rodríguez Correa
Ingeniero Topógrafo	Angela María Fernández Fajardo
Trabajador Social	Andrés Felipe Giraldo Pérez
Profesional SST	Ana Milagro Marengo Caballero
Ingeniero Residente	Jonathan Antonio Caro Escobar
Gerente del Proyecto	Eugenio José Prada Daza

Tabla 3. Personal de Obra.

(Ver Anexo N.o.3 Personal de Obra)

4.1.4 EQUIPO DE OBRA

A continuación, se presenta el equipo y maquinaria de obra mínimo para la ejecución del contrato.

MAQUINARIA:

MAQUINA	MARCA	MODELO	POTENCIA
Excavadora	HYUNDAI	R220LC-9S	143HP
Excavadora	HYUNDAI	R220LC-9S	143HP
Excavadora	HYUNDAI	HX220S	148HP

Tabla 4. Relación Maquinara de Obra.

EQUIPO DE TOPOGRAFIA:

EQUIPO	ESPECIFICACIONES	MARCA
Receptor GNSS Y Rover	REF GALAXY G7	SOUTH
GPS: GNSS RTK	S900A	STONEX

Tabla 5. Relación de Equipos de Topografía.

(Ver Anexo N.o.5 Maquinaria y Equipo de Obra)

4.1.5 ACTIVIDADES REALIZADAS

No se realizaron actividades de obra en este periodo.

4.1.5.1 MEMORIAS DE CALCULO DE CANTIDADES EJECUTADAS

No se realizaron actividades de obra en este periodo.

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	

4.1.6 SEGUIMIENTO AL AVANCE DE OBRA Y LA PROGRAMACION

SEMANA	FECHA		% PROGRAMADO EN LA SEMANA	% PROGRAMADO ACUMULADO	% EJECUTADO EN LA SEMANA	% EJECUTADO ACUMULADO	ADELANTO (+) Ó ATRASO (-)
	DEL	AL					
1	20 DE MARZO DE 2025	23 DE MARZO DE 2025	0.02	0.02	0.00	0.00	-0.02
2	24 DE MARZO DE 2025	30 DE MARZO DE 2025	0.02	0.03	0.00	0.00	-0.03

Tabla 6. Resumen del cumplimiento a la programación durante el periodo.

Gráfico 1. Porcentaje Programado vs Ejecutado en las semanas del mes. Fuente: Propia.



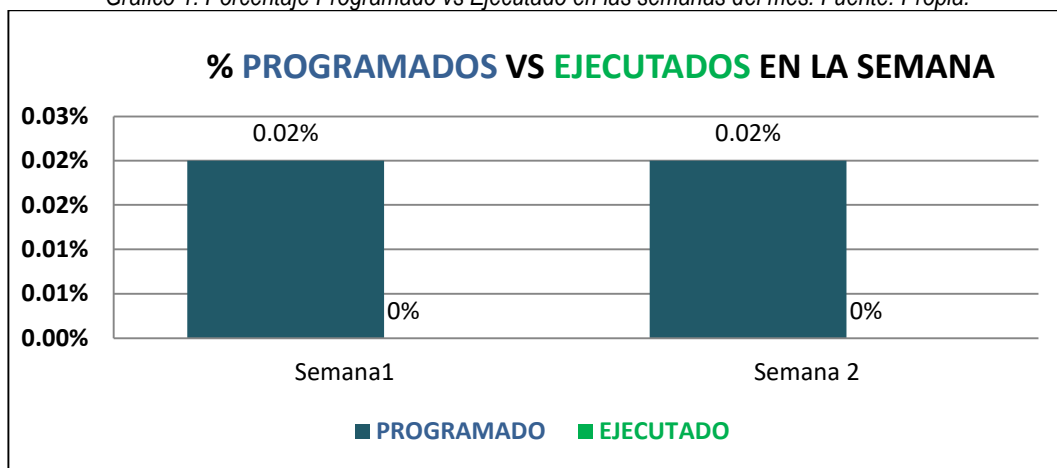


Gráfico 2. Porcentaje Acumulado de vs Programado vs Ejecutado. Fuente: Propia.

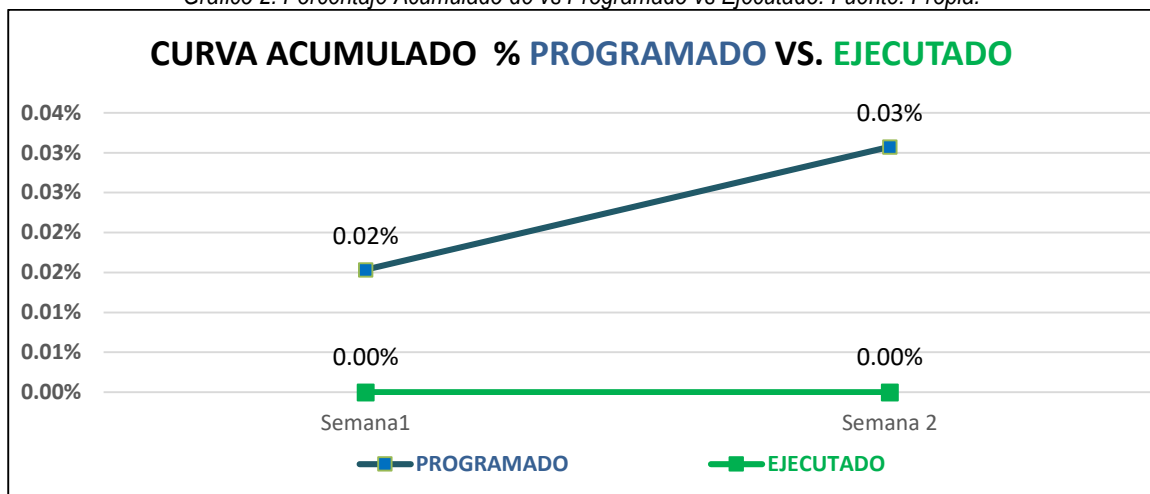

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	 CONSORCIO ICASM 2023
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

Gráfico 3. Porcentaje de Adelanto o Atraso de la Programación del proyecto. Fuente: Propia.

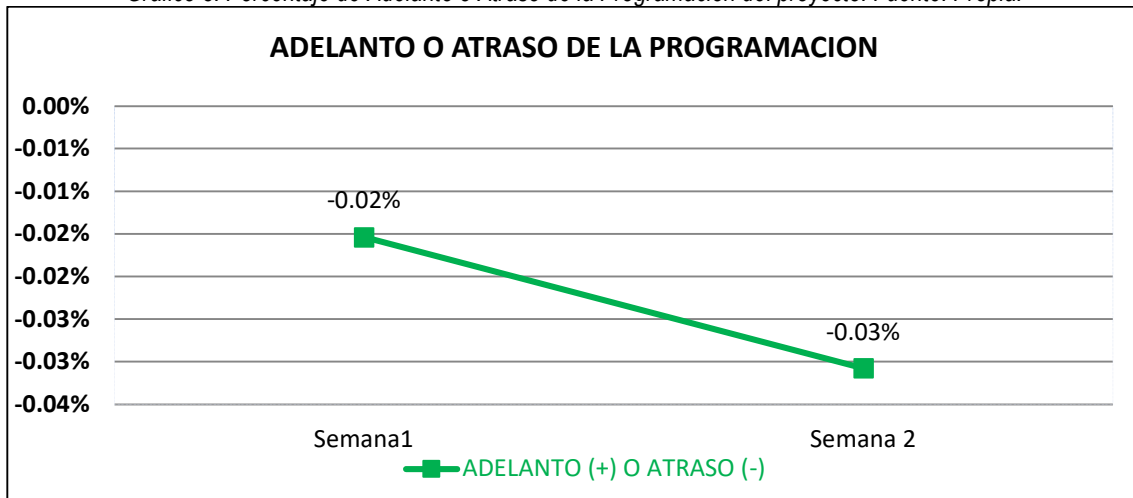

4.1.7 BITÁCORA DE OBRA.

Durante el periodo correspondiente al mes de marzo se realizaron actividades de obra y complementarios. La Bitácora se relaciona en el **“Anexo No.2 Bitácora de Obra”**.

4.1.8 CONTROL DEL ESTADO DEL TIEMPO

El registro del estado del tiempo del periodo comprendido entre el 1 de marzo de 2025 hasta el 31 de marzo de 2025. Se relaciona la información registrada en el **“Anexo No.4 Estado General del Tiempo”**

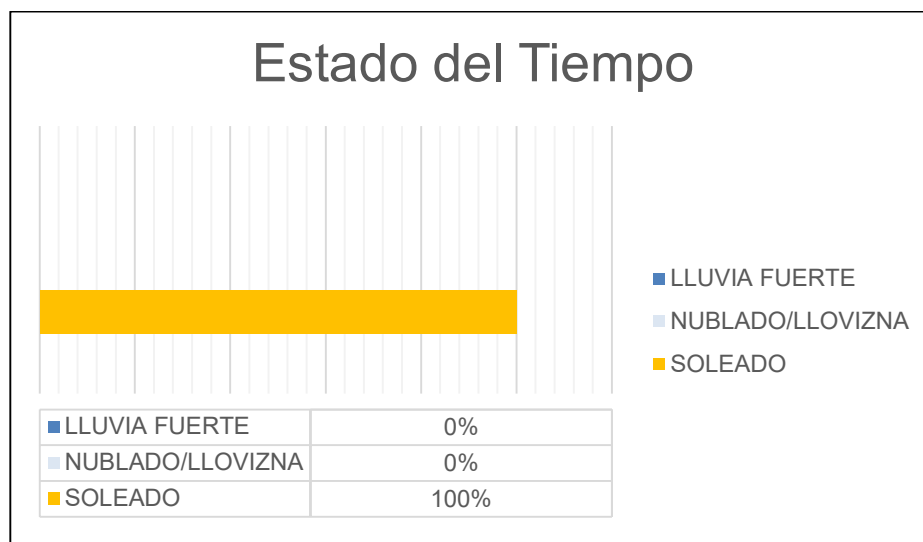


Gráfico 4. Estado del Tiempo en el Mes. Fuente: Propia.

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	 CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	

4.1.9 CONTROL DE MAQUINARIA Y EQUIPOS DE OBRA

El control de los equipos utilizados en obra se relaciona en el **“Anexo No.5 Maquinaria y Equipo de Obra”**, adjunto en los anexos del presente informe.

4.1.10 CONTROL DE PERSONAL

El control del personal en obra se relaciona en el **“Anexo No.6 Seguridad social del personal”** adjunto en los anexos del presente informe.

4.2 ACTIVIDADES DE ORDEN ADMINISTRATIVO

4.2.1 CONTROL DE PÓLIZAS

4.2.1.1 Control de Pólizas Contrato de Obra No. LP-006-2023

A continuación, se relaciona la información de las pólizas vigentes que amparan el contrato de obra de acuerdo con el acta de inicio.

Garantía de cumplimiento según acta de inicio

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. DE POLIZA	CG-1051454		
FECHA DE EXPEDICIÓN	01/04/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO FECHA INICIAL
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	
CUMPLIMIENTO	19/03/2024	30/06/2025	\$ 887.347.736,60
PRESTACIONES SOCIALES	19/03/2024	13/03/2028	\$ 443.673.868,30
ESTABILIDAD DE LA OBRA	13/03/2025	13/03/2027	\$ 175.177.646,00

Garantía de responsabilidad civil extracontractual según acta de inicio

ASEGURADORA	SEGUROS DEL ESTADOS S.A		
No. DE POLIZA	75-40-101050575		
FECHA DE EXPEDICIÓN	01/04/2024		
AMPARO	VIGENCIA		VALOR ASEGURADO
	FECHA INICIAL	FECHA FINAL	

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

PREDIOS OPERACIONES	LABORES Y	19/03/2024	25/03/2025	\$ 650.000.000,00
RESPONSABILIDAD PATRONAL	CIVIL	19/03/2024	25/03/2025	\$ 650.000.000,00
CONTRATISTA SUBCONTRATISTAS	Y	19/03/2024	25/03/2025	\$ 650.000.000,00

Tabla 7. Póliza del Contrato no. LP 006 DE 2023.

4.2.2 CONTROL DE DISPOSICIONES LABORALES

4.2.2.1 CONTRATO DE OBRA

Se relaciona la seguridad social del personal durante el periodo **Anexo No.6**.

4.2.3 CORRESPONDENCIA

OFICIOS ENVIADOS POR EL CONTRATISTA DE OBRA A INTERVENTORIA PERIODO: 20 DE MARZO DE 2025 HASTA 31 DE MARZO DE 2025			
FECHA	REFERENCIA	CONSECUTIVO	ASUNTO
-	-	-	-

Tabla 8. Relación de correspondencia durante el periodo.

4.2.4 ESTADO DEL TRÁMITE DE LOS PERMISOS

No se han transmitido permisos en este periodo.

4.2.5 REUNIONES REALIZADAS DURANTE EL PERIODO

No se han realizado reuniones trascendentales en este periodo.

4.3 ACTIVIDADES DE ORDEN FINANCIERO


No se han realizaron pagos de la vigencia 2025 en este periodo.

	INFORME MENSUAL DE OBRA N°1	
	20 MARZO AL 31 DE MARZO DE 2025	CONTRATO DE OBRA PÚBLICA No LP 006 DE 2023

5 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Durante el periodo correspondiente al mes marzo que hace parte de la vigencia 2025 de ejecución del contrato No. LP 006 DE 2023 que tiene como objeto “INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES”. se concluye: El presente informe comprende el periodo desde el 20 de marzo del 2025 al 31 de marzo de 2025, no se han realizado actividades de obra. Se espera el inicio de las actividades.

Responsable:



LUIS FERNANDO OCHOA
DIRECTOR DE OBRA
CONSORCIO ICASM2023
TP. 13202-33067 BLV



INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA No. 1



INFORMACION DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ICASM2023
INTERVENTORIA: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S
SEMANA No: 1 **Del:** 19 de marzo de 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO: Francisco Jairo Sanchez De la Hoz
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES

CONTRATO No: LP 006 DE 2023
CONTRATO No: CM 007 DE 2023
Al: 23 de marzo de 2025
TIEMPO TRANSCURRIDO DE OBRA: 5 días

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	Consortio ICASM2023	Interventoria:	Interventores e Ingenieria S.A.S
Contrato No:	LP 006 DE 2023	Contrato No:	CM 007 DE 2023
Valor inicial:	\$ 330530495016.00	Valor inicial:	\$ 23163036792
Valor Actualizado:	\$ 330530495016.00	Valor Actualizado:	\$ 23163036792
Plazo inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses
Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses
Fecha de inicio:	19 de marzo de 2024	Fecha de inicio:	19 de marzo de 2024
Fecha de vencimiento:	19 de junio de 2036	Fecha de vencimiento:	19 de junio de 2036
VIGENCIA ACTUAL: 2025			
Valor de vigencia:	\$ 11186206374.00	Valor inicial:	\$ 782829600
Plazo de vigencia:	nueve (9) meses	Plazo inicial:	nueve (9) meses
Fecha de inicio:	19 de marzo de 2025	Plazo Actualizado:	19 de marzo de 2025
Fecha de vencimiento:	31 de diciembre de 2025	Fecha de vencimiento:	31 de diciembre de 2025

ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza gestión y seguimiento para elaboración de estudios y diseños.

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SST, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE RESCATE DE LA SEMANA

ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA

Se hará seguimiento a los levantamientos topobatimetricos


Se hará seguimiento a los estudios hidraulicos y de suelo


PORCENTAJE DE AVANCE

SEMANAL		ACUMULADO		SEMANAL		ACUMULADO	
OBRA PROGRAMADO(%):	0.02%		0.02%	OBRA EJECUTADO(%):	0.00%		0.00%
VALOR BASICO(\$):	\$ 1,719,449.01		\$ 1,719,449.01	VALOR BASICO(\$):	\$ -		\$ -

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Gráfica de Porcentaje de Ejecución Vs Programado - Semanal

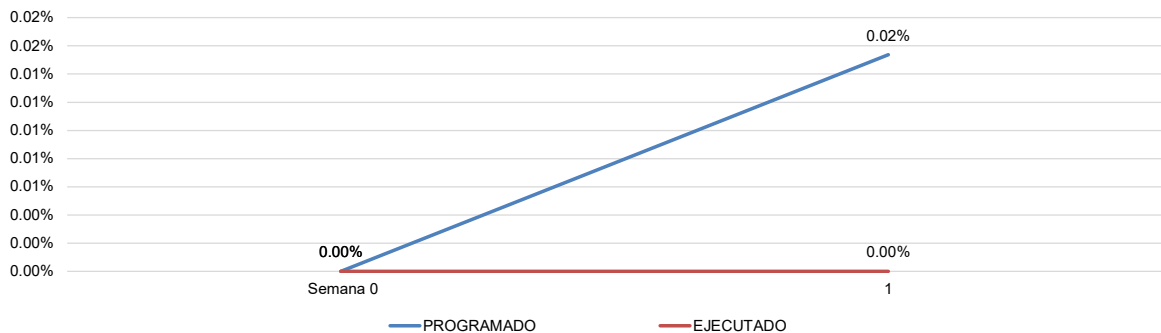

REGISTRO FOTOGRÁFICO	
<div>X</div> <div>XXXXXXXXXX</div>	<div>X</div> <div>XXXXXXXXXXXXXX</div>
<div>OBSERVACIONES</div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div> <div></div>	<div>DIRECTOR DE OBRA</div> <div><div>Firma:</div><div>Nombre: Luis Fernando Ochoa</div><div>Cedula: 73.113.864 de Cartagena</div></div> <div><div></div></div>



INFORME SEMANAL DE AVANCE DE OBRA No. 2



INFORMACION DEL PROYECTO

CONTRATISTA DE OBRA: CONSORCIO ICASM2023
INTERVENTORIA: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S
SEMANA No: 2 **Del:** 24 de marzo de 2025
SUPERVISOR DEL CONTRATO: Francisco Jairo Sanchez De la Hoz
OBJETO DEL CONTRATO: INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES

CONTRATO No: LP 006 DE 2023
CONTRATO No: CM 007 DE 2023
Al: 30 de marzo de 2025
TIEMPO TRANSCURRIDO DE OBRA: 12 días

INFORMACION DEL CONTRATO

CONTRATO DE OBRA		CONTRATO DE INTERVENTORIA	
Contratista:	Consortio ICASM2023	Interventoria:	Interventores e Ingenieria S.A.S
Contrato No:	LP 006 DE 2023	Contrato No:	CM 007 DE 2023
Valor inicial:	\$ 330530495016.00	Valor inicial:	\$ 23163036792
Valor Actualizado:	\$ 330530495016.00	Valor Actualizado:	\$ 23163036792
Plazo inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo inicial:	Ciento cuarenta y siete (147) meses
Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses	Plazo Actualizado:	Ciento cuarenta y siete (147) meses
Fecha de inicio:	19 de marzo de 2024	Fecha de inicio:	19 de marzo de 2024
Fecha de vencimiento:	19 de junio de 2036	Fecha de vencimiento:	19 de junio de 2036

VIGENCIA ACTUAL: 2025

Valor de vigencia:	\$ 11186206374.00	Valor inicial:	\$ 782829600
Plazo de vigencia:	nueve (9) meses	Plazo inicial:	nueve (9) meses
Fecha de inicio:	19 de marzo de 2025	Plazo Actualizado:	19 de marzo de 2025
Fecha de vencimiento:	31 de diciembre de 2025	Fecha de vencimiento:	31 de diciembre de 2025

ACTIVIDADES DE OBRA REALIZADAS EN LA SEMANA

Se realiza gestión y seguimiento para elaboración de estudios y diseños.
Se realizo limpieza del campamento.
Se descargo información de las camaras trampa instaladas la semana pasada.

ACTIVIDADES DEL COMPONENTE SST, SOCIAL, AMBIENTAL Y DE RESCATE DE LA SEMANA

ACTIVIDADES DE OBRA PROGRAMADAS PARA LA PROXIMA SEMANA


Se hará seguimiento a los levantamientos topobatiométricos
Se hará seguimiento a los estudios hidraulicos y de suelo

PORCENTAJE DE AVANCE

SEMANTAL		ACUMULADO		SEMANTAL		ACUMULADO	
OBRA PROGRAMADO(%):	0.02%		0.03%	OBRA EJECUTADO(%):	0.00%		0.00%
VALOR BASICO(\$):	\$ 1,719,449.01		\$ 3,438,898.03	VALOR BASICO(\$):	\$ -		\$ -

RESUMEN GENERAL DEL ESTADO DEL CONTRATO

Gráfica de Porcentaje de Ejecución Vs Programado - Semanal

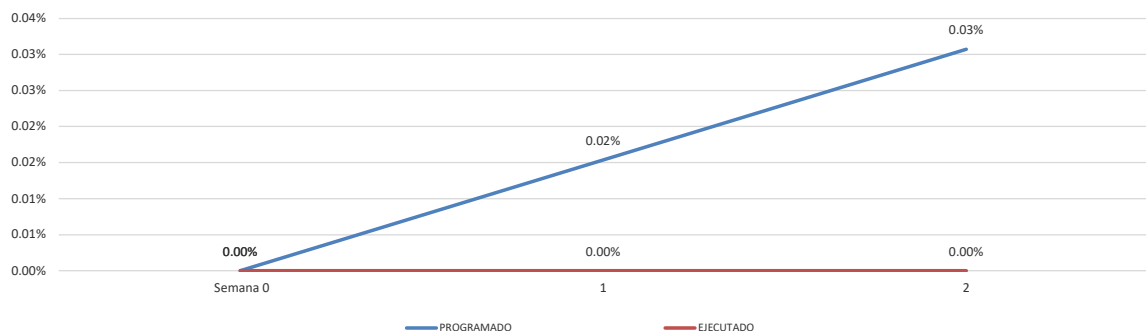

REGISTRO FOTOGRÁFICO



Jornada de limpieza y recolección de residuos - Campamento



Jornada de limpieza y recolección de residuos - Campamento



Jornada de limpieza y recolección de residuos - Campamento



Toma de camaras trampa para el monitoreo de la fauna silvestre - Quebrada Bureche



Toma de camaras trampa para el monitoreo de la fauna silvestre - Quebrada Bureche



Toma de camaras trampa para el monitoreo de la fauna silvestre - Quebrada Bureche

OBSERVACIONES

DIRECTOR DE OBRA

Firma:

Nombre:

Cedula:

Luis Fernando Ochoa

Luis Fernando Ochoa
73.113.864 de Cartagena

Semana No. 1 (20 de marzo 2025- 23 de marzo 2025)

Jueves, 20 de marzo 2025: Clima: Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. Personal: (1) conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. Equipo: Computador portátil, vehículo.

[Signature]

Edilberto Oliveros

Res. Interventoría

[Signature]
Res. Contratista

Viernes, 21 de marzo 2025: Clima: se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. Personal: (1) conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. Equipo: Computador portátil, vehículo.

[Signature]

Edilberto Oliveros

Res. Interventoría

[Signature]
Res. Contratista

Sábado, 22 de marzo 2025: Clima: se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente

Hidráulico y de suelos. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. Equipo: Computador portátil, Vehículo.

~~Equipo~~

Edilberto Olivos.

Res. Interventoría

Jonathan J. Caro E.
Res. Contabilista

Domingo, 23 de marzo 2025: No se realizaron actividades.

~~Equipo~~

Jonathan J. Caro E.

Semana No. 2 (24 de marzo 2025 - 30 de marzo 2025).

Lunes, 24 de marzo: Clima: Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos.

Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. Equipo: Computador portátil, Vehículo.

~~Equipo~~

Edilberto Olivos.

Res. Interventoría

Jonathan J. Caro E.
Res. Contabilista

Martes, 25 de marzo 2025: Clima: Se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra,

(1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. Equipo: computador portátil, vehículo.

Edilberto

Edilberto Oliveros

Jonathan J. L. E.
Res. contratista

Res. Interventoría

Miércoles, 26 de marzo 2025: Clima: se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente Hidráulico y de suelos.

Personal: (1) conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. Equipo: computador portátil, vehículo.

Edilberto

Edilberto Oliveros

Jonathan J. L. E.
Res. contratista

Res. Interventoría

Jueves, 27 de marzo 2025: Clima: se inició el día soleado - seco, sin precipitaciones. Actividades: se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. Personal: (1) conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión Topográfica, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de In-

Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría.

Equipo: Computador portátil, vehículo.

~~Edilberto~~

Edilberto Oliveros

Res. Interventoría

Jonathan J. Lora E.
Res. contratista

Viernes, 28 de marzo 2025: Clima: Se inició el día nublado-húmedo, con precipitaciones leves. Actividades: se realizaron actividades de topo-batimétricas, trámites administrativos de obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. Equipo: Computador portátil, vehículo.

~~Edilberto~~

Edilberto Oliveros

Res. Interventoría

Jonathan J. Lora E.
Res. contratista

Sábado, 29 de marzo 2025: Clima: Se inició el día soleado-seco, sin precipitaciones. Actividades: Se realizaron actividades de Topo-batimétricas, trámites administrativos de Obra, Interventoría y CORPAMAG, se hizo seguimiento a los estudios y diseños del componente hidráulico y de suelos. Personal: (1) Conductor, (1) Coordinador de Obra, (1) Director de Obra, (1) Residente de Obra, (1) Especialista Hidráulico, (1) Comisión de Topografía, (1) Director de Interventoría, (1) Residente de Interventoría, (1) Conductor de Interventoría, (1) Ingeniero Ambiental de Interventoría, (1) Especialista Hidráulico de Interventoría. Equipo: Computador portátil, vehículo.

~~Edilberto~~ Edilberto Oliveros

Res. Interventoría

Jonathan J. Lora E.
Res. contratista



ANEXO No. 3
CONTROL DIARIO DEL PERSONAL DEL CONTRATO DE OBRA



ENTIDAD EJECUTORA: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

MES DEL INFORME: 1

CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ICASM2023

VIGENCIA: 2025


PROYECTO: INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL
MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM 007 DE 2023

INTERVENTOR: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

NOMBRE	CARGO	mar-25																															
		S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
ANA MILAGRO MARENCO CABALLERO	Profesional SST																				X	X	X				X	X	X	X	X		X
LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA	Director de obra																				X	X	X				X	X	X	X	X		X
JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR	Residente de Obra																				X	X	X				X	X	X	X	X		X
ROSA ELVIRA VILLAMIZAR	Especialista Ambiental																				X	X	X				X	X	X	X	X		X
DANILO GREGORIO ROGRIGUEZ CORREA	Especialista Hidraulico																				X	X	X				X	X	X	X	X		X
ANDRES FELIPE GIRALDO PEREZ	Trabajador Social																				X	X	X				X	X	X	X	X		X
ANGELA MARIA FERNANDEZ FAJARDO	Ing. Topografo																				X	X	X				X	X	X	X	X		X
SANTIAGO JOSE OSPINO URUEÑA	Coordinador de Obra																				X	X	X				X	X	X	X	X		X
DAYANA MARCELA CERVANTES GIRALDO	Técnico SST																																
ANDRES FELIPE PONTON ALBOR	Biologo																																
ABDON SEGUNDO PERALTA ATENCIO	Veterinario																																
LEONARDO RAFAEL NOGUERA CONSUEGRA	Topografo																																
JOSE FELIPE VENEZIA MONTENEGRO	Ayudante de topografia																																
RAFAEL EDUARDO PACHECO DE LEON	Inspector de Obra																																
YEISON ATENCIO BARRIOS	Oficial de Obra																																
JOSE FERNANDO PADILLA GUTIERREZ	Oficial de Obra																																
EDGAR ENRIQUE RIVERA JULIO	Ayudante																																
JUAN JOSE CERVANTES ROMERO	Ayudante																																
RICARDO JOSE GUAL ALMARALES	Ayudante																																
RONALD ALBERTO MENDOZA RIVERA	Ayudante																																
UBALDO ANTONIO GAVIRIA LEGUIA	Ayudante																																
OLIVER JOSE BARRIOS CONTRERA	Operador de Maquinaria																																
JOSUE ELI SAN JUAN REYES	Operador de Maquinaria																																
HAIDER URIELES CARRILLO	Operador de Maquinaria																																
GUSTAVO ERNESTO COTES RODRIGUEZ	Conductor																																

OBSERVACIONES: NINGUNA

Firma: 
Nombre: JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR
Residente de Obra
T.P. 08202-242612 ATL

Firma: 
Nombre: EDILBERTO SMITH OLIVEROS ZAMORA
Residente de Interventoría
Matrícula N 08202-181155 ATL



ANEXO No. 4
ESTADO GENERAL DEL TIEMPO



FECHA: 31 MARZO 2025
(Día) (Mes) (Año)

ENTIDAD EJECUTORA: CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

CONTRATO DE OBRA No: LP 006 DE 2023 CONTRATISTA: CONSORCIO ICASM2023
CONTRATO DE INTERVENTORIA No: CM 007 DE 2023 INTERVENTOR: INTERVENTORES E INGENIERIA S.A.S

VIGENCIA: 2025
INFORME MENSUAL No. 1

ESTADO GENERAL DEL TIEMPO

Clase de tiempo	mar-25																												Total
	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31																
Seco	24	24	24	24	24	24	24	24	24	23	24	24	24																311
Nublado / Llovizna										1																			1
Lluvia Fuerte																													0
Total	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24	24																312

NOTA: EN CADA CASILLA SE DEBE INDICAR EL NÚMERO DE HORAS POR DÍA QUE PERMANECE LA CLASE DE TIEMPO LAS 24 HORAS DEL DÍA.

OBSERVACIONES:

Firma: 
Nombre: JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR
Residente de Obra
Matrícula No.: 08202-242612 ATL

Firma: 
Nombre: EDILBERTO SMITH OLIVEROS ZAMORA
Residente de Interventoría
Matrícula No.: 08202-181155 ATL



ANEXO No. 5
MAQUINARIA Y EQUIPOS CONTRATO DE OBRA



ENTIDAD EJECUTORA: CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL MAGDALENA (CORPAMAG)

MES DEL INFORME 1

CONTRATO DE OBRA No. LP 006 DE 2023

CONTRATISTA: CONSORCIO ICASM2023

VIGENCIA: 2025

PROYECTO: INTERVENCIONES A LOS CUERPOS DE AGUA DEL DISTRITO DE SANTA MARTA PARA EL MANTENIMIENTO Y PRESERVACIÓN DE SUS CONDICIONES HIDRÁULICAS Y AMBIENTALES.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. CM 007 DE 2023

INTERVENTOR: INTERVENTORES E INGENIERÍA S.A.S

MAQUINARIA Y EQUIPO

mar-25

	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L	M	M	J	V	S	D	L
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24
EXCAVADORA R220LC-9S																								
EXCAVADORA HYNDAI HX220S 1																								
EXCAVADORA HYNDAI HX220S 2																								
GPS GNSS RTK																								
EQUIPO DE TOPOGRAFÍA																								

OBSERVACIONES:

CONVENCIONES: ACTIVO=A, EN REPARACIÓN=R, INACTIVO=I.

Firma:

Nombre: JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR

Residente de Obra

T.P. 08202-242612 ATL

Firma

Nombre: EDILBERTO SMITH OLIVEROS ZAMORA

Residente de Interventoría

Matrícula No.: 08202-181155 ATL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
NIT 901782970	2	CONSORCIO ICASM 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	PRINCIPAL	CALLE 24 #2-66	SANTA MARTA-MAGDALENA	4229885	Si	

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1431707028	9483864320	E	2025/04/16	2025/04/24	BANCO DE BOGOTA	8	\$7,363,900

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																																									
EMPLEADO			NOVEDADES													PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES									
No.	Identificación	Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Tarifa	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: PRINCIPAL (16 Afiliados)																							\$22,933,000	\$3,669,700			\$24,433,000	\$978,000			\$24,571,395	\$983,500			\$24,433,000	\$1,694,300	\$0	\$0	\$7,325,500		
Centro de Trabajo: Principal (16 Afiliados)																							\$22,933,000	\$3,669,700			\$24,433,000	\$978,000			\$24,571,395	\$983,500			\$24,433,000	\$1,694,300	\$0	\$0	\$7,325,500		
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (16 Afiliados)																							\$22,933,000	\$3,669,700			\$24,433,000	\$978,000			\$24,571,395	\$983,500			\$24,433,000	\$1,694,300	\$0	\$0	\$7,325,500		
1	CC	1192808247	ATENCIO YEISON																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF33	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
2	CC	1129567184	CARO JONATHAN																	230301	30	\$2,300,000	\$368,000	EPS010	30	\$2,300,000	\$92,000	CCF33	30	\$2,300,000	\$92,000	14-11	30	\$2,300,000	6.960%	\$160,100	30	\$0	\$0	Si	\$712,100
3	CC	1004424744	CERVANTES DAYANA																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS002	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF33	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
4	CC	1083018109	CERVANTES JUAN			X													X	25-14	14	\$664,300	\$106,300	CCFC55	14	\$664,300	\$26,600	CCF33	14	\$769,085	\$30,800	14-11	14	\$664,300	6.960%	\$46,300	14	\$0	\$0	Si	\$210,000
5	CC	1083452974	GAVIRIA UBALDO																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC07	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF33	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
6	CC	1082968730	GIRALDO ANDRES																	231001	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF33	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
7	CC	12618745	GUAL RICARDO																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF33	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
8	CC	1082875319	MENDOZA RONALD			X													X	230301	26	\$1,233,700	\$197,400	ESSC07	26	\$1,233,700	\$49,400	CCF33	26	\$1,362,210	\$54,500	14-11	26	\$1,233,700	6.960%	\$85,900	26	\$0	\$0	Si	\$387,200
9	CC	12626312	NOGUERA LEONARDO																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS037	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF33	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
10	CC	1083019606	OSPINO SANTIAGO																	230301	30	\$3,000,000	\$480,000	EPS037	30	\$3,000,000	\$120,000	CCF33	30	\$3,000,000	\$120,000	14-11	30	\$3,000,000	6.960%	\$208,800	30	\$0	\$0	Si	\$928,800
11	CC	12542537	PACHECO RAFAEL																	0	0	\$0	\$0	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF33	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	6.960%	\$104,400	30	\$0	\$0	Si	\$224,400
12	CC	19597805	PADILLA JOSE																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS041	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF33	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
13	CC	72247345	PERALTA ABDON																	230201	30	\$1,423,500	\$227,800	EPS005	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF33	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
14	CC	1083003795	PONTON ANDRES																	230301	30	\$1,500,000	\$240,000	EPS005	30	\$1,500,000	\$60,000	CCF33	30	\$1,500,000	\$60,000	14-11	30	\$1,500,000	6.960%	\$104,400	30	\$0	\$0	Si	\$464,400
15	CC	7593881	RIVERA EDGAR																	230201	28	\$1,328,600	\$212,600	ESSC24	28	\$1,328,600	\$53,200	CCF33	28	\$1,328,600	\$53,200	14-11	28	\$1,328,600	6.960%	\$92,500	28	\$0	\$0	Si	\$411,500
16	CC	7593881	RIVERA EDGAR											X						230201	2	\$94,900	\$15,200	ESSC24	2	\$94,900	\$3,800	CCF33	0	\$0	\$0	14-11	2	\$94,900	0.000%	\$0	0	\$0	\$0	Si	\$19,000
17	CC	1082986414	VENECIA JOSE																	230301	30	\$1,423,500	\$227,800	ESSC24	30	\$1,423,500	\$57,000	CCF33	30	\$1,423,500	\$57,000	14-11	30	\$1,423,500	6.960%	\$99,100	30	\$0	\$0	Si	\$440,900
Total Afiliados (16)																							\$22,933,000	\$3,669,700			\$24,433,000	\$978,000			\$24,571,395	\$983,500			\$24,433,000	\$1,694,300	\$0	\$0	\$7,325,500		

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante		Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 901782970	2	CONSORCIO ICASM 2023	B - MENOS DE 200 COTIZANTES		PRINCIPAL	CALLE 24 #2-66	SANTA MARTA-MAGDALENA	4229885	Si
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1431707028	9483864320	E	2025/04/16	2025/04/24	BANCO DE BOGOTA	8	\$7,363,900
RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				15	\$3,669,700	\$19,100	\$0	\$3,688,800	
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	\$227,800	\$1,200	\$0	\$229,000	
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	\$106,300	\$600	\$0	\$106,900	
PORVENIR	230301	800,224,808	8	10	\$2,652,200	\$13,700	\$0	\$2,665,900	
PROTECCION	230201	800,229,739	0	3	\$683,400	\$3,600	\$0	\$687,000	
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$1,694,300	\$8,800	\$0	\$1,703,100	
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	16	\$1,694,300	\$8,800	\$0	\$1,703,100	
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				16	\$983,500	\$5,100	\$0	\$988,600	
CAJAMAG	CCF33	891,780,093	3	16	\$983,500	\$5,100	\$0	\$988,600	
EPS (ADMINISTRADORAS: 8)				16	\$978,000	\$5,400	\$0	\$983,400	
CAJACOPI	CCFC55	901,543,211	6	1	\$26,600	\$200	\$0	\$26,800	
COOSALUD MOVILIDAD	ESSC24	900,226,715	3	3	\$171,000	\$900	\$0	\$171,900	
EPS SURA (ANTES SUSALUD)	EPS010	800,088,702	2	1	\$92,000	\$500	\$0	\$92,500	
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	2	\$106,400	\$600	\$0	\$107,000	
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	3	\$234,000	\$1,300	\$0	\$235,300	
NUEVA EPS MOVILIDAD	EPS041	900,156,264	2	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300	
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	\$57,000	\$300	\$0	\$57,300	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	4	\$234,000	\$1,300	\$0	\$235,300	
TOTAL				16	\$7,325,500	\$38,400	\$0	\$7,363,900	

Se certifica que ANA MILAGRO MARENCO CABALLERO identificado(a) con CC 1083009348 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

B&P CONSTRUCCIONES SAS NI 900481955

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-03	2025-04	1463174475	9485504301	E	2025-05-07																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$2,600,000						\$416,000										
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$2,600,000						\$181,000										
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$2,600,000						\$104,000										
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$2,600,000						\$104,000										

Este certificado se expide el día 2025-05-07 a las 11:04.

Se certifica que ANDRES FELIPE GIRALDO PEREZ identificado(a) con CC 1082968730 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ICASM 2023 NI 901782970

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-03	2025-04	1431707028	9483864320	E	2025-04-24																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$1,423,500						\$227,800										
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,423,500						\$99,100										
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$1,423,500						\$57,000										
EPS		COOSALUD MOVILIDAD		30	4%	\$1,423,500						\$57,000										

Este certificado se expide el día 2025-04-24 a las 03:11.

Se certifica que JONATHAN ANTONIO CARO ESCOBAR identificado(a) con CC 1129567184 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

CONSORCIO ICASM 2023 NI 901782970

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-03	2025-04	1431707028	9483864320	E	2025-04-24																	
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PORVENIR		30	16%	\$2,300,000						\$368,000										
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$2,300,000						\$160,100										
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$2,300,000						\$92,000										
EPS		EPS SURA (ANTES SUSALUD)		30	4%	\$2,300,000						\$92,000										

Este certificado se expide el día 2025-04-24 a las 03:12.

Certificado de Aportes

Se certifica que LUIS FERNANDO OCHOA MARULANDA identificado(a) con CC 73113864 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social.

APORTANTE: PANAMERICAN DREGING & ENGINEERING S.A.S NI 806003450																													
Clave Planilla	Clave Pago	Tipo Planilla	Fecha Pago	Riesgo	Código	Administradora	Concepto	Periodo	Días	Novedades																IBC	Tarifa	Cotización	
										ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl				vip
9484127370	1401927576	E	2025-04-10	EPS	EPS005	SANITAS	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-04	30																		\$7,194,000	4%	\$287,800
9484127370	1401927576	E	2025-04-10	AFP	25-14	COLPENSIONES	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		\$7,194,000	16%	\$1,151,100
9484127370	1401927576	E	2025-04-10	ARL	14-7	SEGUROS BOLIVAR	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		\$7,194,000	4.35%	\$313,000
9484127370	1401927576	E	2025-04-10	CCF	CCF07	COMFAMILIAR ATLANTICO	COTIZACIÓN OBLIGATORIA	2025-03	30																		\$7,194,000	4%	\$287,800
9484127370	1401927576	E	2025-04-10	FSP	25-14	COLPENSIONES	FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL	2025-03	30																		\$7,194,000		\$36,000
9484127370	1401927576	E	2025-04-10	SUB	25-14	COLPENSIONES	SUBCUENTA DE SUBSISTENCIA	2025-03	30																		\$7,194,000		\$36,000

Este certificado se expide el día 2025-04-22 a las 11:04.

Se certifica que ROSA ELVIRA VILLAMIZAR SIERRA identificado(a) con CC 1082980516 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

B&P CONSTRUCCIONES SAS NI 900481955																			
Periodo		Clave		Planilla		Novedades													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp
2025-03	2025-04	1463174475	9485504301	E	2025-05-07														
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización									
AFP		PORVENIR		30	16%	\$2,000,000				\$320,000									
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$2,000,000				\$139,200									
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$2,000,000				\$80,000									
EPS		SANITAS		30	4%	\$2,000,000				\$80,000									

Este certificado se expide el día 2025-05-07 a las 05:33.

Se certifica que HAIDER FARID URIELES CARRILLO identificado(a) con CC 85372107 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588

Periodo		Clave		Planilla		Novedades																
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip
2025-03	2025-04	1475057578	9484576536	E	2025-05-12									X								
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC						Cotización										
AFP		PROTECCION		30	16%	\$1,755,500						\$280,900										
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,755,500						\$122,200										
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$1,755,500						\$70,300										
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,755,500						\$70,300										

Este certificado se expide el día 2025-08-21 a las 02:41.

Se certifica que JOSUE ELI SANJUAN REYES identificado(a) con CC 1082947445 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588																			
Periodo		Clave		Planilla		Novedades													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp
2025-03	2025-04	1475057578	9484576536	E	2025-05-12									X					
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización									
AFP		COLFONDOS		30	16%	\$1,788,000				\$286,100									
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,788,000				\$124,500									
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$1,788,000				\$71,600									
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,788,000				\$71,600									

Este certificado se expide el día 2025-08-21 a las 02:38.

Se certifica que OLIVER JOSE BARRIOS CONTRERAS identificado(a) con CC 1065574822 realizó los siguientes aportes al Sistema de Seguridad Social:

INVERSIONES B&D S.A.S. NI 901361588																			
Periodo		Clave		Planilla		Novedades													
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Tipo	Fecha Pago	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp
2025-03	2025-04	1475057578	9484576536	E	2025-05-12									X					
Riesgo		Administradora		Días	Tarifa	IBC				Cotización									
AFP		PORVENIR		30	16%	\$1,747,500				\$279,600									
ARL		ARL SURA		30	6.96%	\$1,747,500				\$121,700									
CCF		CAJAMAG		30	4%	\$1,747,500				\$69,900									
EPS		SALUD TOTAL		30	4%	\$1,747,500				\$69,900									

Este certificado se expide el día 2025-08-21 a las 02:36.

PAGADO 03/05/2025 EN HORARIO EXTENDIDO

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	EUGENIO JOSE PRADA DAZA			
Documento	CC19145528	Dirección	CL 76 #54 - 11	
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	6692364	
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO	
Ciudad	BARRANQUILLA, DISTRITO ESP, INDUSTRIAL Y PORTUARIO		Departamento	ATLANTICO
Representante Legal			Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS	

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total						
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	IGE	UMA	UAP	UAT	UOT	IND	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Días AFP	Días EPS	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total
CC 19145528	EUGENIO JOSE PRADA DAZA	57	02																	0	0	30	30	0		(NIN-AF) NINGUNA AFP	\$ 0	\$ 0	(EPS010) EPS SURA	\$ 1.800.000	\$ 225.000	0,522	\$ 1.800.000	\$ 9.400	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 234.400

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 0	\$ 1.800.000	\$ 1.800.000	\$ 0	\$ 0	\$ 225.000	\$ 9.400	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 234.400	\$ 4.300	\$ 238.700

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!

PAGADO 11/04/2025

I. DATOS DEL APORTANTE

Razón Social	DANILO GREGORIO RODRIGUEZ CORREA		
Documento	CC85474247	Dirección	CL 20 #30 - 20
Tipo de Empresa	INDEPENDIENTE	Teléfono	4203020
Tipo Persona	NATURAL	Forma Presentación	ÚNICO
Ciudad	SANTA MARTA, DISTRITO TURISTICO,CULTURAL HISTORICO	Departamento	MAGDALENA
Representante Legal		Identificación	
Total Afiliados	1	ARP	POSITIVA DE SEGUROS

II. DETALLE DEL APORTANTE

Datos del Afiliado				Novedades																Pensiones			Salud			Riesgos			Cajas			Parafiscales				Total					
Identificación	Apellidos y Nombres	Tipo Cotizante	Subtipo Cotizante	ING	RET	RET P	TAE	TDE	TDP	TAP	USP	COR	USI	SGR	IME	UMA	UAP	VCT	IND	Días ARP	Días EPS	Días ARP	Días CCF	Administradora	IBC Pensión	Aporte Pensión	Administradora	IBC Salud	Aporte Salud	Tarifa	IBC Riesgos	Aporte Riesgos	Administradora	IBC Caja	Aporte Caja	Aporte SENA	Aporte ICBF	ESAP	Aporte Ministerio	Total	
CC 85474247	DANILO GREGORIO RODRIGUEZ CORREA	57	00																	0	30	30	30	0	(230301) PORVENIR	\$ 1.423.500	\$ 227.800	(EPS037) NUEVA EPS S.A.	\$ 1.423.500	\$ 178.000	0,522	\$ 1.423.500	\$ 7.500	(NIN-CC) NINGUNA CCF	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300

III.TOTALES

IBC Pensión	IBC Salud	IBC Riesgos	IBC Cajas	Aportes Pensión	Aportes Salud	Aportes Riesgos	Aportes Cajas	Aportes Sena	Aportes ICBF	Aportes ESAP	Aportes Min Educación	(Incapacidades, Licencias, Saldos a Favor) EPS	Incapacidades ARP	SUBTOTAL SIN INTERESES DE MORA	TOTAL INTERESES DE MORA	TOTAL FINAL
\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 1.423.500	\$ 0	\$ 227.800	\$ 178.000	\$ 7.500	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 0	\$ 413.300	\$ 500	\$ 413.800

Líneas de Servicio FonoSIMPLE: Bogotá 601 4446634 - Cali: 602 5540577 - Medellín: 604 5146669 - Bucaramanga: 607 6438000 - Cartagena: 605 6945444 - Pereira: 606 3402582 - Barranquilla: 605 3618850 - Resto del País: 018000 971 971 - ¡Más que Fácil, SIMPLE!

Antes de imprimir, asegúrese que sea realmente necesario. Proteger el medio ambiente está en nuestras manos.

Página 1 de 1

¡El Poder de lo SIMPLE!

DATOS GENERALES DEL APORTANTE									
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF	
CC 12552112		COTES RODRIGUEZ GUSTAVO ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 nO 2a-06 oficina 301	SANTA MARTA-MAGDALENA	4378806	No	
DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-03	08285319	9483517459	I	2025/04/03	2025/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	0	\$178,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES																						
EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES			
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	
Ciudad: SANTA MARTA Depto: MAGDALENA (1 Afiliados)					\$0	\$0			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	
1	CC	12552112	COTES GUSTAVO		0	\$0		\$0	EPS005	30			\$1,423,500	\$178,000		0	\$0	\$0		0	\$0	
Total Afiliados(1)					\$0	\$0			\$1,423,500	\$178,000			\$0	\$0			\$0	\$0			\$0	

DATOS GENERALES DEL APORTANTE								
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 12552112		COTES RODRIGUEZ GUSTAVO ERNESTO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 23 nO 2a-06 oficina 301	SANTA MARTA-MAGDALENA	4378806	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago		Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Valor
2025-03	2025-03	08285319		9483517459	I	2025/04/03	2025/04/01	BANCO DE OCCIDENTE	\$178,000

RESUMEN DE PAGO									
RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR	
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
SANITAS	EPS005	800,251,440	6	1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
TOTAL				1	\$178,000	\$0	\$0	\$178,000	
