
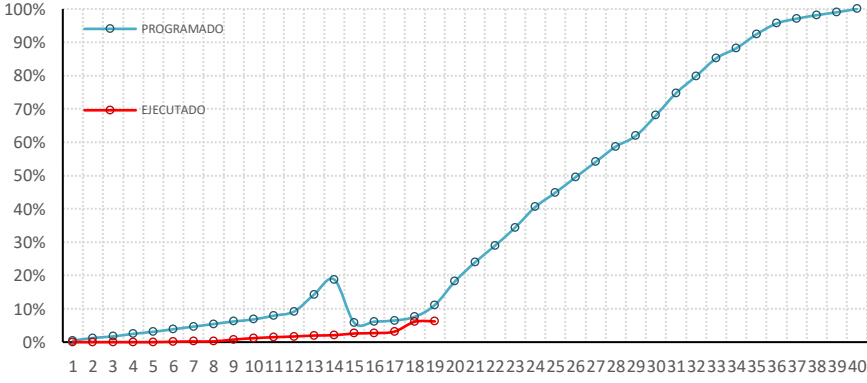
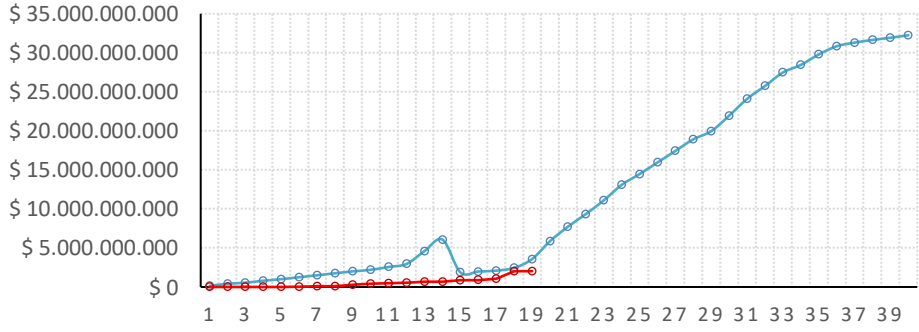


	FORMATO							CÓDIGO	MS-GP-FR-34			
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA							VERSIÓN	0			
	INFORME SEGUIMIENTO SEMANAL INTERVENTORÍA							FECHA	22/02/2023			
PERIODO DE INFORME SEMANAL												
	ECG INGENIERIA SAS	FECHA	lunes, 11 de agosto de 2025	SEMANA No.	19	DEL	4-ago-25	AL	10-ago-25			
1. INFORMACIÓN GENERAL												
OBJETO DEL CONTRATO		INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL PARA LA INTERVENCION DE LAS VIAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE SUMAPAZ, TEQUENDAMA Y ALTO MAGDALENA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA.										
LOCALIZACIÓN PROYECTO		DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA EN LAS PROVINCIAS DEL SUMAPAZ, ALTO MAGDALENA Y TEQUENDAMA.										
CONTRATO DE INTERVENTORÍA					CONTRATO DE OBRA PÚBLICA							
CONTRATO No.:		218 de 2025			CONTRATO No.:		140 de 2025					
PLAZO INICIAL:		Once meses quince días o hasta el 31 de diciembre del 2025			PLAZO INICIAL:		Once meses o hasta 31 de diciembre del 2025					
CONTRATISTA:		ECG INGENIERIA SAS			CONTRATISTA:		CONSORCIO VICGER 2021					
FECHA DE INICIACIÓN:		2 de abril de 2025			FECHA DE INICIACIÓN:		2 de abril de 2025					
*FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A			*FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A					
*FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A			*FECHA DE REINICIACIÓN:		N/A					
FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2025			FECHA DE TERMINACIÓN:		31 de diciembre de 2025					
PLAZO ACTUALIZADO:		274 días			PLAZO ACTUALIZADO:		274 días					
PLAZO TRANSCURRIDO:		131 días			PLAZO TRANSCURRIDO:		131 días					
VALOR INICIAL :		\$ 3.903.576.140			VALOR INICIAL :		\$ 32.246.753.687					
VALOR ADICION:		\$ -			VALOR ADICION:		\$ -					
VALOR ACTUALIZADO:		\$ 3.903.576.140			VALOR ACTUALIZADO:		\$ 32.246.753.687					
VALOR PAGADO:		\$ -			VALOR PAGADO:		\$ -					
VALOR POR PAGAR:		\$ 3.903.576.140			VALOR POR PAGAR:		\$ 32.246.753.687					
VALOR ANTICIPO:		\$ 780.715.228			VALOR ANTICIPO:		\$ -					
SUPERVISOR:		LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ			SUPERVISOR:		INTERVENTORIA ECG					
2. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA												
* Se realizan actividades de procesamiento de información topográfica. * Se entrego información de del componente de caracterización vial (Jerusalén, El colegio, Anapoima, Nariño, Viotá, Anolaima, Pandi Nilo)												
3. CONTROL DE EJECUCIÓN												
3.1. CONTROL DE RUTA CRÍTICA												
No.	Descripción del ítem (Actividades Ruta Crítica)				Programado			Real Ejecutado		Días desfase al inicio de la actividad	Días desfase al final de la actividad	
					Fecha Inicial programad a por actividad	Fecha Final programad a por actividad	Días	**Fecha Inicial por actividad	**Fecha Final por actividad	Días		
1	Caracterización vial y ensayos				2-abr-25	22-jun-25	82	14-abr-25		ejecución	-12	ejecución
2	Explanación y excavaciones, replanteo vial				24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado
3	Mantenimiento Rasante				24-jun-25	31-dic-25	191			no iniciado	no iniciado	no iniciado
Plazo del proyecto: 274 días												
3.2. CONTROL DE PROGRAMACION												
AVANCE FISICO DEL CONTRATO				GRAFICA DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO								
	% PROGRAMADO A LA FECHA	% EJECUTADO HASTA LA FECHA	DIFERENCIA (+ Adelanto - Atraso)									
Acumulado anterior	7,60%	6,11%	-1,49%									
Durante el periodo	3,51%	0,11%	-3,39%									
Acumulado Actual	11,10%	6,22%	4,88%									
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN TIEMPO												
DURACIÓN (DÍAS)	DÍAS TRANSCURRIDOS.	DÍAS QUE FALTAN	DIFERENCIA EN DÍAS									
274 días	131,00	143,00	13,38									
3.3. CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO												
AVANCE CONTROL FINANCIERO DEL CONTRATO				GRAFICA FINANCIERA DEL CONTRATO								
	ACUMULADO PROGRAMADO (\$) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO (\$) MILLONES	INDICADOR (%)									
Acumulado anterior	\$ 2.449.324.487	\$ 1.990.992.973	81,29%									
Durante el periodo	\$ 1.130.804.224	\$ 36.649.667	3,24%									
Acumulado Actual	\$ 3.580.128.711,00	\$ 2.027.642.639,69	56,64%									
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO												
-\$	1.552.486.071											

AVANCE CONTROL AMORTIZACIÓN ANTICIPO				GRAFICA AMORTIZACIÓN ANTICIPO	
	ACUMULADO PROGRAMADO (\$) MILLONES	ACUMULADO EJECUTADO (\$) MILLONES	INDICADOR (%)		
Acumulado anterior			0%		
Durante el periodo			0%		
Acumulado Actual	\$ -	\$ -	0%		
AVANCE O ATRASO DEL CONTRATO EN DINERO					
4. GESTIÓN AMBIENTAL DEL PROYECTO					
Durante la semana evaluada, desde el componente ambiental se realizaron las siguientes actividades:					
1. Teniendo en cuenta que la aprobación del PAGA V5 se realizó el pasado 15 de julio de 2025 por medio del comunicado 25C02_DTO_031, se realizará el seguimiento correspondiente una vez inicien las actividades de obra.					
2. Durante el periodo evaluado se realizó el Informe mensual del mes de julio de 2025 y fue presentado a la Interventoría el 04 de agosto de 2025 para su remisión.					
3. El 06 de agosto de 2025 se realiza acompañamiento al Comité de Socialización desde las 11 am a la 1 pm de manera virtual, donde se menciona el seguimiento de todos los componentes. Desde el área ambiental se precisan algunas consideraciones para la aprobación de la hoja de vida de la especialista ambiental del Contratista. Además, se menciona que se realizará visita desde el componente ambiental a los frentes de obra, una vez se concreten algunos temas técnicos, con el fin de verificar si se requiere o no permisos ambientales de acuerdo a las actividades de obra.					
5. GESTIÓN SOCIAL DEL PROYECTO					
La interventoria se permite informar que, durante el periodo comprendido del 04 de agosto de 2025 al 10 de agosto de 2025, el equipo social del contratista de obra y la interventoria realizaron un despliegue en campo a la provincia del Sumapaz con el objetivo de elaborar el inventario de predios existente en el área de influencia del proyecto y notificar a los propietarios de la visita que se agendará para el levantamiento de actas de vecindad. Esta actividad contó con el acompañamiento de las áreas técnicas.					
La ejecución de la actividad permitió evidenciar que, en el municipio de Cabrera, tramo 2, barrio Simón Bolívar, se encuentran varios predios ubicados en el costado izquierdo de la vía. La interventoría recomienda prestar especial atención durante el levantamiento de las actas de vecindad, ya que, según información suministrada por la comunidad, en actividades realizadas previamente por el acueducto municipal, el uso del vibrocompactador ocasionó fisuras en algunas viviendas.					
Asimismo, se observó que el tubo del acueducto, ubicado a un costado de la carretera, se encuentra expuesto y sin protección. La interventoría también recomendó y reiteró al contratista de obra la elaboración de un registro fílmico y fotográfico del estado de las cercas, así como de los cultivos perennes y transitorios ubicados en el área de influencia. Lo anterior, con el fin de prever y gestionar los cierres viales que puedan presentarse, evitando afectar el transporte de dichos productos y constatar el estado en el que se encuentran los predios y corrales antes del inicio de las obras. En cuanto al municipio de Tibacuy, la interventoría reporta que en la abscisa K20+000 se encuentra expuesta la red de gas y pasa sobre la alcantarilla.					
6. GESTIÓN SST DEL PROYECTO					
En la semana en mencion se ejecuta las siguientes actividades:					
1. Se recibe por parte del contratista respuesta a la solicitud de entrega de seguridad social del mes de junio, del cual se emite nuevas observaciones ya que no se encuentran todas las planillas de pago del personal relacionado en el formato de calculo de aportes.					
2. Se participa en comite de obra dando a conocer al contratista la continuidad de la anomalia por la entrega de la seguridad social del mes de junio y se solicita fecha de compromiso de entrega de la seguridad social del mes de julio a lo cual manifiesta realizar entrega de la documentacion del 12-13 de agosto.					
3. Se realiza informe semanal.					
7. SEGUIMIENTO DEL FACTOR DE CALIDAD					
8. IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES PROBLEMÁTICAS - ANÁLISIS DE CAUSAS					
8.1 PROGRAMACIÓN (CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES)					
El contratista realiza reprogramación de obra para la semana 15, esto basado en las necesidades y eventualidades que se han presentado durante la fase de caracterización y laboratorios expuestas por el contratista según comité de obra con el ICCU.					
* Para la semana 19 el contratista presenta un acumulado ejecutado del 6.22% vs un acumulado programado del 11.10%.					
* Para la presente semana el contratista según programación debió entregar informes finales de la fase de caracterización vial y se debió comenzar con actividades de la fase de ejecución de obra, principalmente con el apartado de alcantarillas por la provincia de Sumapaz					
8.2. DISPONIBILIDAD Y APLICACIÓN DE RECURSOS ECONÓMICOS AL DESARROLLO DEL OBJETO CONTRACTUAL					
* Se ha evidenciado que el contratista tiene disponibilidad y aplicación de recursos para el desarrollo del objeto contractual teniendo en cuenta que se han realizado las actividades de apiques, se han entregado resultados de ensayos de laboratorio, cuneta con personal profesional y de obra.					
8.3. EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO					
Para la semana 19 el contratista presenta un acumulado ejecutado de \$2,027,642,640 vs un acumulado programado de \$3,580,128,711 por lo que el avance financiero presenta un atraso de \$1.552.486.071					
8.4. CALIDAD DE LOS TRABAJOS					
Se han realizado actividades en campo correspondientes a la toma de muestra de suelo " apiques" los cuales el contratista a dado cumplimiento en la calidad de la ejecución de las actividades dando cumplimiento a las especificaciones técnicas componentes SST y componente ambiental.					
8.5. MANEJO AMBIENTAL (Si aplica)					
8.6 SEGURIDAD INDUSTRIAL (Si aplica)					
8.7 PROGRAMA DE SALUD OCUPACIONAL (Si aplica)					
8.8 ASPECTOS SOCIALES (Si aplica)					

9. PLAN DE ACCIÓN RESULTADO DEL ANÁLISIS DE CAUSAS REGISTRADO EN EL NUMERAL ANTERIOR - CON EL OBJETIVO DE ELIMINAR LA CAUSA RAÍZ DE LA SITUACIÓN PROBLEMÁTICA		
ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA PROGRAMADA
Realizar entrega de procesamiento de información correspondiente a la caracterización vial " informes finales "	CONSORCIO VICGER 2021	16/08/2025
Realizar entrega de procesamiento de información correspondiente a laboratorio (informe final).	CONSORCIO VICGER 2021	16/08/2025
10. ACTIVIDADES NO PREVISTAS Y MAYORES CANTIDADES		
<p>*Se presentan mayores cantidades en las actividades correspondientes al Ítem Apiques (incluye por unidad: elaboración, transporte, CBR in situ, CBR laboratorio), esto debido a que se dio cumplimiento a las especificaciones Invias las cuales indican que se deben realizar apiques cada 250m.</p> <p>* Tras la reunión virtual sostenida el día 16 de julio de 2025, realizada en conjunto entre el contratista, la interventoría y los especialistas de cada grupo técnico en el área de geotecnia del proyecto, en donde se revisaron detalladamente los resultados de los apiques y la caracterización de materiales presentados para los tramos de Cabrera (Tramo 1 y Tramo 2), Pandi y Tibacuy, analizando punto por punto los datos entregados por el contratista.</p> <p>Como resultado de esta revisión conjunta, y teniendo en cuenta las condiciones geotécnicas identificadas y los criterios técnicos establecidos en el proyecto, se toma como propuesta y como punto de partida para la formulación de una alternativa técnica de estabilización, mediante el uso de productos químicos y porcentajes variables de cemento, en búsqueda de establecer una fórmula de trabajo representativa por tramo homogéneo.</p>		
11. COMENTARIOS DEL INTERVENTOR		
12. REGISTRO FOTOGRAFICO DEL AVANCE DURANTE LA SEMANA		
<div></div>		

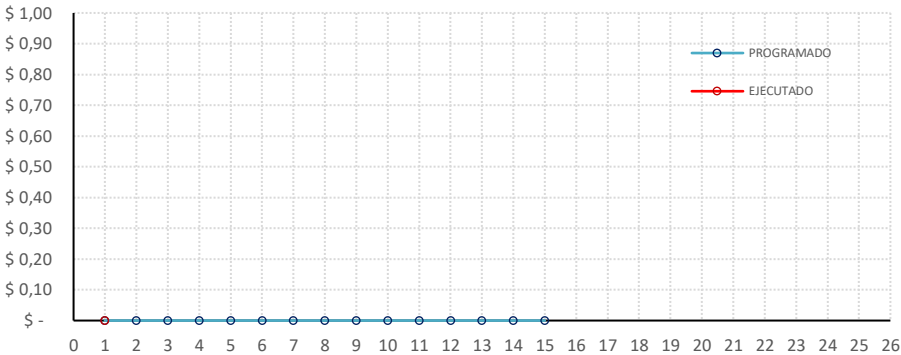

INSPECCION VISUAL OBRAS DE DRENAJE CABRERA

DIRECTOR DE INTERVENTORIA

Nombre: LUIS ALEJANDRO RODRÍGUEZ ROJAS
