

ISSACON
SAS

ISSACON S.A.S


NIT 900.408.874-8

INFORME FINAL DE ACTIVIDADES
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA
INFRAESTRUCTURA DE SALONES COMUNALES EN EL
AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ
JULIO 2025

Celular/Whatsapp 300 163 6465 - 310 790 90 25

Dirección: Carrera 56 # 153 – 15 Int 1 Ofi 202 Bogotá D.C.

Email: contacto.issacon@gmail.com

	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE SALONES COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ	31/07/2025
---	---	------------

1 TABLA DE CONTENIDO

2	INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA.....	4
3	DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO.....	5
4	LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO.....	6
5	INFORMACIÓN TÉCNICA DEL CONTRATO DE OBRA.....	7
6	ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN DEL CONTRATO.....	11
7	ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL CONTRATO.....	16
8	BALANCE FINANCIERO DEL CONTRATO DE OBRA.....	24
9	SEGUIMIENTO Y CONTROL DE POLIZAS.....	24
10	planilla de seguridad social paga / periodo junio - julio.....	27
11	pago fic sena.....	4
12	TABLA DE CANTIDADES.....	7
12	MEMORIAS DE CALCULO.....	41



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA
INFRAESTRUCTURA DE SALONES
COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ

31/07/2025

2 INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA

INFORMACIÓN BÁSICA DEL CONTRATO DE OBRA	
ENTIDAD CONTRATANTE:	ALCALDIA MUNICIPAL DE SANTANA
CONTRATO DE OBRA No:	C-MS-MC-013-2025
FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO:	08 DE MAYO DE 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL:	Un (1) mes y quince (15) días a partir de la suscripción del acta de inicio o hasta agotar el presupuesto oficial
FECHA DE FIRMA DEL ACTA DE INICIO:	14 DE MAYO DEL 2025
PLAZO DE EJECUCIÓN ADICIONAL:	QUINCE (15) DÍAS
FECHA DE SUSPENSIÓN:	N.A.
FECHA DE REINICIO:	N.A.
FECHA DE TERMINACIÓN:	13 DE JULIO DEL 2025
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	\$ 34.743.331,33
VALOR ADICIONAL DEL CONTRATO:	\$ 5.097.899,32
SUPERVISOR:	JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA – SECRETARIO PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL

PBX: (1) 300 163 1415

Dirección: Carrera 56 # 153 – 15 Bogotá D.C.

Email: contacto.issacon@gmail.com



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA
INFRAESTRUCTURA DE SALONES
COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ

31/07/2025

Que conforme a la visita realizada por entes competentes de la Administración Municipal a los respectivos salones comunales con los que se cuenta dentro de la jurisdicción, se encuentra que existe un déficit en diversos aspectos tales como mampostería, pañetes y concretos, pintura, instalaciones eléctricas y sanitarias y sistemas sépticos, limitando la estética y la funcionalidad de mencionados espacios. Por lo anteriormente expuesto, la administración municipal a través de la convocatoria pública PC-MS-MC-015-2025, decide realizar el "MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE SALONES COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ" .

De esta manera se justifica la contratación con la empresa ISSACON SAS con NIT 900.408.874-8, cuyo representante legal es RONALD CAMILO PRADA ULLOA, a través del contrato de obra pública No. C-MS-MC-013-2025.

4 LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se desarrolló en el Municipio de Socotá Boyacá, Mas puntualmente en las Veredas Los Mortiños y Vereda Coscativa



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA
INFRAESTRUCTURA DE SALONES
COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ

31/07/2025

1.02.42	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	74,27	\$ 7.000,00	\$ 7.770,00	\$ 577.077,90
1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 Mpa, SECCIÓN RECTANGULAR	M3	0,24	\$ 730.000,00	\$ 810.300,00	\$ 194.472,00
SUBTOTAL						\$ 1.172.259,90
3	MAMPOSTERÍA					
1.04.15	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0,12 MTS	M2	8,32	\$ 46.000,00	\$ 51.060,00	\$ 424.819,20
SUBTOTAL						\$ 424.819,20
4	PAÑETES					
1.05.13	PAÑETE LISO MURO 1.4	M2	14,44	\$ 23.000,00	\$ 25.530,00	\$ 368.653,20
SUBTOTAL						\$ 368.653,20
5	PINTURA					
1.09.18	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	262,08	\$ 9.200,00	\$ 10.212,00	\$ 2.676.360,96
1.09.17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	#####	\$ 15.600,00	\$ 17.316,00	\$ 4.835.493,00
1.09.04	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	304,76	\$ 6.500,00	\$ 7.215,00	\$ 2.198.843,40
1.09.05	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	37,26	\$ 14.700,00	\$ 16.317,00	\$ 607.971,42
SUBTOTAL						\$ 10.318.668,78
6	VIDRIOS Y CERRADURAS					
1.17.05	VIDRIO 4 MM	M2	9,25	\$ 57.500,00	\$ 63.825,00	\$ 590.381,25
1.17.03	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UND	4,00	\$ 121.000,00	\$ 134.310,00	\$ 537.240,00
SUBTOTAL						\$ 1.127.621,25
7	CUBIERTA					
1.12.19	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	6,00	\$ 57.100,00	\$ 63.381,00	\$ 380.286,00
1.12.25	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NÚMERO 6	M2	13,18	\$ 51.800,00	\$ 57.498,00	\$ 757.823,64
1.12.26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NÚMERO 8	M2	2,16	\$ 49.600,00	\$ 55.056,00	\$ 118.920,96
1.12.03	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BAJANTE AMAZONA	ML	6,00	\$ 63.000,00	\$ 69.930,00	\$ 419.580,00
1.12.04	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CANAL AMAZONA	ML	12,20	\$ 92.600,00	\$ 102.786,00	\$ 1.253.989,20

PBX: (1) 300 163 1415

Dirección: Carrera 56 # 153 – 15 Bogotá D.C.

Email: contacto.issacon@gmail.com



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA
INFRAESTRUCTURA DE SALONES
COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ

31/07/2025

2.05.09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3# Y 4"	UND	1,00	\$ 101.000,00	\$ 112.110,00	\$ 112.110,00
SUBTOTAL						\$ 813.186,00
13	CARPINTERIA METALICA					
1.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	1,00	\$ 114.000,00	\$ 126.540,00	\$ 126.540,00
1.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1,60	\$ 189.000,00	\$ 209.790,00	\$ 335.664,00
1.15.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN VENTANA LAMINA CAL 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	0,24	\$ 212.400,00	\$ 235.764,00	\$ 56.583,36
SUBTOTAL						\$ 518.787,36
14	SISTEMA SEPTICO					
1.02.13	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	6,80	\$ 46.000,00	\$ 51.060,00	\$ 347.208,00
3.03.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE 17,5 Mpa (2500) PARA BASES	M3	0,40	\$ 304.000,00	\$ 337.440,00	\$ 134.976,00
1.02.42	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	29,64	\$ 7.000,00	\$ 7.770,00	\$ 230.302,80
1.04.30	MURO TOLETE COMUN E=0,10 mts.	M2	19,20	\$ 71.600,00	\$ 79.476,00	\$ 1.525.939,20
2.05.50	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TEE SANITARIA D=4"	UND	4,00	\$ 22.500,00	\$ 24.975,00	\$ 99.900,00
1.05.08	PAÑETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	36,15	\$ 27.300,00	\$ 30.303,00	\$ 1.095.453,45
2.05.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CODO PVC SANITARIO D=4"	UND	4,00	\$ 12.600,00	\$ 13.986,00	\$ 55.944,00
1.06.40	TUBERIA DE 4" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACIÓN	ML	5,00	\$ 43.500,00	\$ 48.285,00	\$ 241.425,00
2.07.03	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa - (3000 PSI) PARA TAPAS	M3	0,28	\$ 747.000,00	\$ 829.170,00	\$ 232.167,60
3.03.08	DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4" PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA	ML	10,00	\$ 31.300,00	\$ 34.743,00	\$ 347.430,00
SUBTOTAL						\$ 4.310.746,05
COSTO DIRECTO						\$ 26.725.639,49
ADMINISTRACIÓN					25%	\$ 6.681.409,87
IMPREVISTOS					4%	\$ 1.069.025,58

PBX: (1) 300 163 1415

Dirección: Carrera 56 # 153 – 15 Bogotá D.C.

Email: contacto.issacon@gmail.com



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA
INFRAESTRUCTURA DE SALONES
COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ

31/07/2025

1.01.54	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	M2	17,16	\$ 10.500,00	\$ 10.500,00	71,24		88,40	\$ 928.200,00
1.01.24	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	14,14	\$ 8.400,00	\$ 8.400,00		-10,00	4,14	\$ 34.750,80
1.02.17	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL COMÚN (INCLUYE RETIRO)	M3	0,59	\$ 46.000,00	\$ 46.000,00		-0,59	0,00	\$ 0,00
SUBTOTAL									\$ 962.950,80
2	ESTRUCTURA EN CONCRETO								
1.03.24	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 Mpa - (3000 PSI)	M3	0,12	\$ 950.000,00	\$ 1.054.500,00		-0,02	0,10	\$ 103.762,80
1.03.26	COLUMNAS EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mts- FORMALETA METALICA	M3	0,19	\$ 1.300.000,00	\$ 1.443.000,00		-0,05	0,14	\$ 207.792,00
1.02.42	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	74,27	\$ 7.000,00	\$ 7.770,00		-20,75	53,52	\$ 415.882,72
1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21,1 Mpa, SECCIÓN RECTANGULAR	M3	0,24	\$ 730.000,00	\$ 810.300,00		-0,06	0,19	\$ 149.905,50
SUBTOTAL									\$ 877.343,02
3	MAMPOSTERÍA								
1.04.15	MURO EN BLOQUE No. 5 E=0,12 MTS	M2	8,32	\$ 46.000,00	\$ 51.060,00		-2,62	5,70	\$ 291.042,00
SUBTOTAL									\$ 291.042,00
4	PAÑETES								
1.05.13	PAÑETE LISO MURO 1:4	M2	14,44	\$ 23.000,00	\$ 25.530,00	2,55		16,99	\$ 433.703,64
SUBTOTAL									\$ 433.703,64
5	PINTURA								
1.09.18	VINILO TIPO I SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCO	M2	262,08	\$ 9.200,00	\$ 10.212,00		-9,80	252,28	\$ 2.576.252,72
1.09.17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	279,25	\$ 15.600,00	\$ 17.316,00		-66,41	212,85	\$ 3.685.624,02
1.09.04	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	304,76	\$ 6.500,00	\$ 7.215,00	25,00		329,76	\$ 2.379.218,40
1.09.05	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	37,26	\$ 14.700,00	\$ 16.317,00		-6,47	30,79	\$ 502.335,16
SUBTOTAL									\$ 9.143.430,31
6	VIDRIOS Y CERRADURAS								
1.17.05	VIDRIO 4 MM	M2	9,25	\$ 57.500,00	\$ 63.825,00		-8,09	1,16	\$ 74.037,00

PBX: (1) 300 163 1415

Dirección: Carrera 56 # 153 – 15 Bogotá D.C.

Email: contacto.issacon@gmail.com



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA
INFRAESTRUCTURA DE SALONES
COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ

31/07/2025

	(ACOMETIDA MONOFÁSICA)								
SUBTOTAL									\$ 1.339.770,00
10	ENCHAPE								
1.11.05	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	28,00	\$ 67.900,00	\$ 75.369,00		-20,09	7,91	\$ 595.927,61
1.11.04	ALISTADO PISO E=4 CM - 1:5	M2	1,65	\$ 26.800,00	\$ 29.748,00		-0,46	1,19	\$ 35.304,93
SUBTOTAL									\$ 631.232,54
11	INSTALACIONES HIDRAULICAS								
1.06.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TANQUE ELEVADO PVC 250 LTS. INCLUYE ACCESORIOS	UND	2,00	\$ 275.200,00	\$ 305.472,00			0,00	\$ 0,00
1.06.23	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	32,00	\$ 11.400,00	\$ 12.654,00			12,00	\$ 151.848,00
SUBTOTAL									\$ 151.848,00
12	INSTALACIONES SANITARIAS								
1.02.37	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERIA PVC SANITARIA D=2"	ML	8,00	\$ 21.600,00	\$ 23.976,00			8,00	\$ 191.808,00
1.06.40	TUBERIA DE 4" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACIÓN	ML	8,00	\$ 43.500,00	\$ 48.285,00		-5,00	3,00	\$ 144.855,00
2.05.08	PUNTO DE DESAGUES D=2"	UND	2,00	\$ 55.400,00	\$ 61.494,00			2,00	\$ 122.988,00
2.05.09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3# Y 4"	UND	1,00	\$ 101.000,00	\$ 112.110,00			1,00	\$ 112.110,00
SUBTOTAL									\$ 571.761,00
13	CARPINTERIA METALICA								
1.15.07	SUMINISTRO E INSTALACIÓN MARCO EN LAMINA A=90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	1,00	\$ 114.000,00	\$ 126.540,00			1,00	\$ 126.540,00
1.15.08	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA EN	M2	1,60	\$ 189.000,00	\$ 209.790,00		-0,37	1,24	\$ 259.090,65

PBX: (1) 300 163 1415

Dirección: Carrera 56 # 153 – 15 Bogotá D.C.

Email: contacto.issacon@gmail.com



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA
INFRAESTRUCTURA DE SALONES
COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ

31/07/2025

NP 2.01.48	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA. (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	ML	\$ 7.583,14	\$ 7.583,14	117,00		117,00	\$ 887.227,38
2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGÚN DISEÑO	KG	\$ 22.031,72	\$ 24.455,21	262,56		262,56	\$ 6.420.959,94
SUBTOTAL								\$ 7.308.187,32
							COSTO DIRECTO	\$ 30.647.100,50
							ADMINISTRACIÓN	25% \$ 7.661.775,13
							IMPREVISTOS	4% \$ 1.225.884,02
							UTILIDAD	1% \$ 306.471,01
							VALOR TOTAL	\$ 39.841.230,65

7 ACTIVIDADES DESARROLLADAS DENTRO DEL PERIODO

Las siguiente actividades resumen de manera general todas las actividades realizadas en la obra, para una información más detallada sobre el día a día y como fue el avance de obra se recomienda revisar el documento

ACTIVIDADES REALIZADAS EN EL MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE SALONES COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ – BOYACÁ DURANTE EL PERIODO

6	VIDRIOS Y CERRADURAS			
1.17.05	VIDRIO 4 MM		M2	1,16
1.17.03	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO		UND	2,00

PBX: (1) 300 163 1415
Dirección: Carrera 56 # 153 – 15 Bogotá D.C.
Email: contacto.issacon@gmail.com



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA
INFRAESTRUCTURA DE SALONES
COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ



31/07/2025





MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA
INFRAESTRUCTURA DE SALONES
COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ



31/07/2025

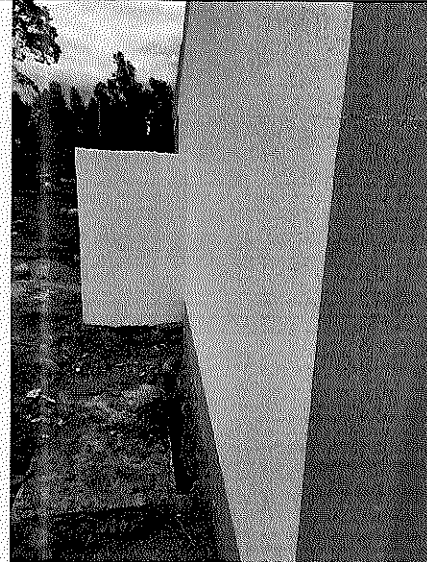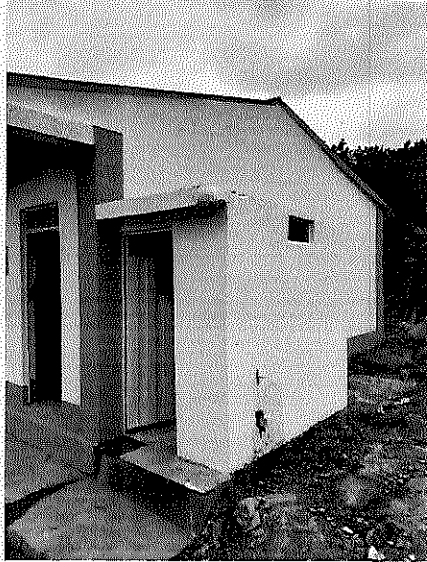



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA
INFRAESTRUCTURA DE SALONES
COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ


31/07/2025

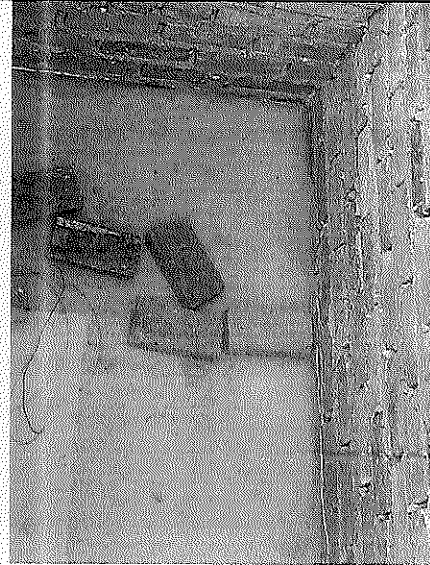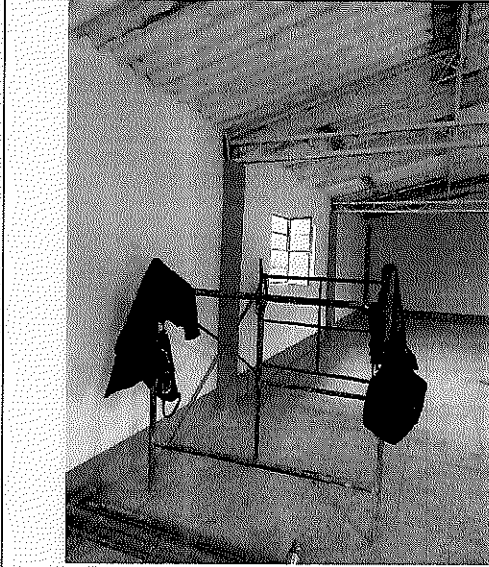



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA
INFRAESTRUCTURA DE SALONES
COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ

31/07/2025

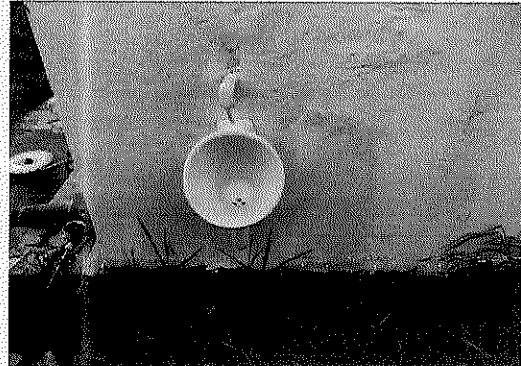



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA
INFRAESTRUCTURA DE SALONES
COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ

31/07/2025

10 ANEXOS

PBX: (1) 300 163 1415
Dirección: Carrera 56 # 153 – 15 Bogotá D.C.
Email: contacto.issacon@gmail.com

DATOS DEL APORTANTE						
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD
NI	900408874-9	ISSACON SAS	CALLE 145 128 41 14 0415	3001658465	issaconsa@gmail.com	
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	CÓDIGO	DEPARTAMENTO	CIUDAD / MUNICIPIO	
ÚNICA	B - menos de 200 c			BOGOTÁ D. C.	BOGOTÁ D. C.	SI

DATOS DE LA PLANILLA					
PLANILLA ASOCIADA	FECHA PAGO ASOCIADA (DÍAS/MES/AÑO)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DÍAS/MES/AÑO)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD
2025-08	2025-07	E	22/09/2025	90670558	\$2.093.800
PERIODO SALUD					EMPLÉADOS
PERIODO PENSIONES					0
					TOTAL A PAGAR
					\$2.093.800

TOTALES POR SUBSISTEMAS

TOTALES SALUD																																																					
Código EPS	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	UPC Adicional	Licencia Maternidad																																																
EPS008	Compensar EPS	860066942-7	114.000	0	Valor																																																
EPS037	Nueva EPS	900156264-2	171.000	0	No. Autorización																																																
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Incapacidades</th> <th colspan="2">Días Mora</th> <th colspan="2">Valor Mora</th> <th colspan="2">Valor Mora UPC</th> <th colspan="2">Total a Pagar</th> <th colspan="2">No. Afiliados</th> </tr> <tr> <th>No. Autorización</th> <th>Valor</th> <th>No. Autorización</th> <th>Valor</th> <th>Valor Mora</th> <th>Colización</th> <th>Valor Mora</th> <th>UPC</th> <th>Total a Pagar</th> <th>No. Afiliados</th> <th>No. Afiliados</th> <th>No. Afiliados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6.100</td> <td>4.100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>118.100</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>6.100</td> <td>4.100</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>177.100</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> </tr> </tbody> </table>						Incapacidades		Días Mora		Valor Mora		Valor Mora UPC		Total a Pagar		No. Afiliados		No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Valor Mora	Colización	Valor Mora	UPC	Total a Pagar	No. Afiliados	No. Afiliados	No. Afiliados	0	0	0	0	6.100	4.100	0	0	118.100	2	2	2	0	0	0	0	6.100	4.100	0	0	177.100	3	3	3
Incapacidades		Días Mora		Valor Mora		Valor Mora UPC		Total a Pagar		No. Afiliados																																											
No. Autorización	Valor	No. Autorización	Valor	Valor Mora	Colización	Valor Mora	UPC	Total a Pagar	No. Afiliados	No. Afiliados	No. Afiliados																																										
0	0	0	0	6.100	4.100	0	0	118.100	2	2	2																																										
0	0	0	0	6.100	4.100	0	0	177.100	3	3	3																																										

TOTALES PENSIÓN

Código AFP	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportante	Aporte FSP - Solidaridad	Aporte FSP - Subsistencia	Días Mora	Valor Mora FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
230301	Porvenir	80024808-8	663.406	0	0	0	0	57	24.400	707.800	3
25-14	Colpensiones	900336004-7	455.600	0	0	0	0	57	16.300	471.900	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	NIT	Colización Obligatoria	Incapacidades No. Autorización	Valor	Días Mora	Valor Mora Colización	Subtotal Colización	No. Radicado Saldo a Favor	Fondo Solidaridad	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Positiva Seguros	860011163-6	312.300		312.300	57	11.200	323.500		3.123	323.500	5

TOTALES CAJAS

Código CCF	Nombre	NIT	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF10	Comibaby	891800213-8	57.000	57	2.100	59.100	1
CCF24	Compensar Caja	860066942-7	57.000	57	2.100	59.100	1
CCF37	Comfenorte	890500516-3	114.000	57	4.100	118.100	2
CCF40	Comfianco Santander	890201518-7	57.000	57	2.100	59.100	1

TOTALES PARAFISCALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados																																																																																								
SENA																																																																																												
0	57	0	0	0																																																																																								
ICBF																																																																																												
0	57	0	0	0																																																																																								
ESAP																																																																																												
0		0	0	0																																																																																								
MEN																																																																																												
0		0	0	0																																																																																								
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">TOTALES</th> <th colspan="2">TOTALES POR SUBSISTEMA</th> <th colspan="2">Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora</th> <th colspan="2">Total a Pagar</th> </tr> <tr> <th>Tipo Administradora</th> <th>No. Administradoras Reportadas</th> <th>Valor</th> <th>No. Afiliados</th> <th>Valor</th> <th>No. Afiliados</th> <th>Valor</th> <th>No. Afiliados</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Salud</td> <td>2</td> <td>285.000</td> <td>2</td> <td>285.000</td> <td>2</td> <td>285.000</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Pensión</td> <td>2</td> <td>1.139.000</td> <td>2</td> <td>1.139.000</td> <td>2</td> <td>1.139.000</td> <td>2</td> </tr> <tr> <td>Riesgos Laborales</td> <td>1</td> <td>312.300</td> <td>1</td> <td>312.300</td> <td>1</td> <td>312.300</td> <td>1</td> </tr> <tr> <td>CCF</td> <td>4</td> <td>285.000</td> <td>4</td> <td>285.000</td> <td>4</td> <td>285.000</td> <td>4</td> </tr> <tr> <td>ESAP</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>ICBF</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>MEN</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>SENA</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>TOTALES</td> <td>9</td> <td>2.021.300</td> <td>9</td> <td>2.021.300</td> <td>9</td> <td>2.021.300</td> <td>9</td> </tr> </tbody> </table>					TOTALES		TOTALES POR SUBSISTEMA		Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora		Total a Pagar		Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Salud	2	285.000	2	285.000	2	285.000	2	Pensión	2	1.139.000	2	1.139.000	2	1.139.000	2	Riesgos Laborales	1	312.300	1	312.300	1	312.300	1	CCF	4	285.000	4	285.000	4	285.000	4	ESAP	0	0	0	0	0	0	0	ICBF	0	0	0	0	0	0	0	MEN	0	0	0	0	0	0	0	SENA	0	0	0	0	0	0	0	TOTALES	9	2.021.300	9	2.021.300	9	2.021.300	9
TOTALES		TOTALES POR SUBSISTEMA		Valor antes de IGE, LMA, IRP y Mora		Total a Pagar																																																																																						
Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados	Valor	No. Afiliados																																																																																					
Salud	2	285.000	2	285.000	2	285.000	2																																																																																					
Pensión	2	1.139.000	2	1.139.000	2	1.139.000	2																																																																																					
Riesgos Laborales	1	312.300	1	312.300	1	312.300	1																																																																																					
CCF	4	285.000	4	285.000	4	285.000	4																																																																																					
ESAP	0	0	0	0	0	0	0																																																																																					
ICBF	0	0	0	0	0	0	0																																																																																					
MEN	0	0	0	0	0	0	0																																																																																					
SENA	0	0	0	0	0	0	0																																																																																					
TOTALES	9	2.021.300	9	2.021.300	9	2.021.300	9																																																																																					

PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES

DATOS DEL APORTANTE				DATOS DE LA PLANILLA			
TIPO	NÚMERO	NOMBRE APORTANTE	DIRECCIÓN	TELÉFONO	CORREO	EXONERADO PAGO PREPAGADOS Y SALUD	SI
RI	90048874-8	ISSACON SAS	CALLE 145 698 4114 CNS	300 1939465	issacson@compensar.com		
FORMA PRESENTACIÓN	CLASE APORTANTE	NOMBRE SUCURSAL	DEPARTAMENTO	CÓDIGO	CUIDAD / MUNICIPIO		
ÚNICA	B - Inactivo 69 200-2		BOGOTÁ D.C.		BOGOTÁ D.C.		

DATOS DE LA PLANILLA				DATOS DEL APORTANTE			
PLANTILLA APLICADA	FECHA PAGO ASOCIADA (MAYÚSCULAS)	TIPO PLANILLA	FECHA PAGO (DIAS/SEMANA)	NÚMERO PLANILLA	CANTIDAD EMPLEADOS	UPC	UPC
2005-07	2025-06	E	22/07/2025	07304578	6	0	0
FRONTO SALUD					TOTAL A PAGAR		
					52,017,800		

TOTALES POR SUBSISTEMAS

Código EPS	Nombre	RT	Cobertura Obligatoria	UPC Adicional	Incapacidades		Licencia Maternidad	Días Mora	Valor Mora	Valor UPD	Total a Pagar	No. Afiliados
					No. Autorización	Valor						
EPS009	Compensar EPS	90048874-8	114.000	0	0	0	0	0	0	0	114.000	2
EPS037	Nueva EPS	900108284-2	154.100	0	0	0	0	0	0	0	154.100	1

TOTALES PENSION

Código AFP	Nombre	RT	Cobertura Obligatoria	UPC Adicional	Aporte Voluntario Afiliado	Aporte Voluntario Aportantes	Aporte FSP Subsolidaria	Días Mora	Valor Mora	Valor FSP	Total a Pagar	No. Afiliados
25-11	Chilembalón	90048874-7	455.000	0	0	0	5	1.500	0	0	1.500	2

TOTALES RIESGOS LABORALES

Código ARL	Nombre	RT	Cobertura Obligatoria	UPC Adicional	Aportes Otros	Valor Neto	Días Mora	Valor Mora	Valor Saldo a Favor	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
14-23	Penalva Seguros	900011153-8	302.000	0	0	302.800	5	1.000	303.800	3.000	303.800	6

TOTALES CAJAS

Código DCF	Nombre	RT	Cobertura Obligatoria	UPC Adicional	Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora	Valor Saldo a Favor	Fondo	Total a Pagar	No. Afiliados
CCF24	Compañías Cajas	90048874-7	57.000	0	57.000	5	200	0	200	57.200	1
CCF37	Chilembalón	90048874-3	198.300	0	198.300	5	400	0	400	198.700	2
CCF40	Compañías Sanibander	800201574-7	57.000	0	57.000	5	200	0	200	57.200	1

TOTALES PARRICIALES

Valor Aporte	Días Mora	Valor Mora Aporte	Total a Pagar	No. Afiliados
0	5	0	0	0
9	5	0	0	0
ESAP				
MEIX				

TOTALES POR SUBSISTEMA

Tipo Administradora	No. Administradoras Reportadas	Valor Aporte de ICE, UPA, RSP y Afijos	Total a Pagar
Salud	2	283.100	284.100
Pensión	2	1.131.400	1.135.800
Riesgos Laborales	1	302.900	303.900
CCF	4	283.100	284.100
ESAP	0	0	0
ICBF	0	0	0
MEIX	0	0	0
SENA	0	0	0
TOTALES	9	2.000.500	2.017.300



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA
INFRAESTRUCTURA DE SALONES
COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ

31/07/2025

12 PAGO FIC

NIT	Medio de Pago	No. Transacción	No. Autorización/CUS	Fecha y Hora
899999034	BANCOLOMBIA	137742868	1687476972	08/08/2025

Número de Identificación
900408874

Primer Nombre ó Razón Social
INGENIEROS CONSTRUCTORES Y

Primer Apellido (si es Persona natural)

Tipo de documento
01

Dígito de Verificación (Si es persona
8

Naturaleza Juridica
01

Departamento
CUNDINAMARCA

Ciudad Capital
BOGOTÁ D.C.

Dirección de Domicilio
CALLE 145 A 45 A 40

Ciudad de Domicilio
BOGOTA

Localización
Nacional

Teléfono de Contacto
+57,3573818

Correo electrónico
ingconstructoresco@gmail.com

Código SIIF
3-2-07-1-02-1-04-43

Regional
Bogota D.C.

Regional Centros SIIF
36-02-00-011-000000

Número Licencia de Obra

Número Contrato de Obra
C-MS-MC-013-2025

Nombre Obra
MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A L

Fecha Inicio Obra
14/05/2025

Fecha Terminación Obra
11/07/2025

Ciudad de Ejecución de la Obra
SOCOTA

Tipo FIC
Costo Total Mano de Obra (Sin Aportes)

Año Periodo a Pagar
2025

Mes Periodo a Pagar
8

Costo Total de Obra a Todo Costo
8000000.00

Costo Total Mano de Obra
8000000.00

Número de Trabajadores en el Periodo
4

Valor Intereses Moratorios
0.00

Aporte FIC
80000.00

Aporte SENA
0.00

Valor del Pago
80000.00



MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA
INFRAESTRUCTURA DE SALONES
COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ

31/07/2025

13 SABANA DE CANTIDADES


ACTA DE LIQUIDACIÓN

		ALCALDE	ADIEL PANQUEBA CHÍA		CONTRATO DE OBRA:		C-MS-MC-013-2025				
		CONTRATISTA	ISSACON SAS R/L. RONALD CAMILO PRADA ULLOA		PLAZO DE EJECUCIÓN: DOS (02) MESES						
		SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL JEFFERSON ARBEY MENDIVIELSO GARCÍA		VALOR INICIAL DEL CONTRATO: \$ 34.743.331.33						
REPUBLICA DE COLOMBIA		FECHA DE INICIO: 14 DE MAYO DE 2025		VALOR ADICIONAL:		\$ 5.097.899,32					
DEPARTAMENTO DE BOYACÁ		FECHA DE TERMINACIÓN: 13 DE JULIO DE 2025		VALOR TOTAL DEL CONTRATO:		\$ 39.841.230,65					
MUNICIPIO DE SOCOTÁ		FECHA PRESENTE ACTA: 11 DE JULIO DE 2025									
CONDICIONES ORIGINALES											
ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR UNITARIO + I.D. 11%	ACTA ANTERIOR		PRESENTE ACTA		OBRA TOTAL EJECUTADA	
						VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL	CANT
PRELIMINARES											
1	DESMONTE CUBIERTAS TEJA DE ASBESTO Y/O ASBESTO CEMENTO	M2	17.16	\$ 10,500.00	\$ 10,500.00	88.40	\$ 928,200.00			88.40	\$ 928,200.00
1.01.24	DEMOLICIÓN ENCHAPE CERAMICO	M2	14.14	\$ 8,400.00	\$ 8,400.00	4.14	\$ 34,750.80			4.14	\$ 34,750.80
1.02.17	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	0.59	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	0.00	\$ 0.00			0.00	\$ 0.00
SUBTOTAL							\$ 962,950.80				\$ 962,950.80
ESTRUCTURA EN CONCRETO											
2	VIGA AMARRE SOBRE MURO 21 Mpa - (3000 PSI)	M3	0.12	\$ 950,000.00	\$ 1,054,500.00	0.10	\$ 103,762.80			0.10	\$ 103,762.80
1.03.26	COLUMNAS EN CONCRETO 21 Mpa (3000 PSI), ALTURA MAYOR A 3 mis- FORMALETA METALICA	M3	0.19	\$ 1,300,000.00	\$ 1,443,000.00	0.14	\$ 207,792.00			0.14	\$ 207,792.00
1.02.42	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	74.27	\$ 7,000.00	\$ 7,770.00	53.52	\$ 415,882.72			53.52	\$ 415,882.72
1.02.13	CONCRETO VIGA DE AMARRE 21.1 Mpa, SECCIÓN RECTANGULAR	M3	0.24	\$ 730,000.00	\$ 810,300.00	0.19	\$ 149,905.50			0.19	\$ 149,905.50
SUBTOTAL							\$ 877,343.02				\$ 877,343.02
MAMPOSTERÍA											
3	MURO EN BLOQUE No. 5 E-0, 12 MTS	M2	8.32	\$ 46,000.00	\$ 51,060.00	5.70	\$ 291,042.00			5.70	\$ 291,042.00
SUBTOTAL							\$ 291,042.00				\$ 291,042.00
PANETES											
4	PAÑETE LISO MURO 1:4	M2	14.44	\$ 23,000.00	\$ 25,530.00	16.99	\$ 433,703.64			16.99	\$ 433,703.64
SUBTOTAL							\$ 433,703.64				\$ 433,703.64
PINTURA											
5	VINILO TIPO 1 SOBRE PAÑETE TRES MANOS SOBRE ESTUCCO	M2	262.08	\$ 9,200.00	\$ 10,212.00	252.28	\$ 2,576,252.72			252.28	\$ 2,576,252.72
1.09.17	PINTURA FACHADA EN VINILO PARA EXTERIORES	M2	279.25	\$ 15,600.00	\$ 17,316.00	212.85	\$ 3,685,624.02			212.85	\$ 3,685,624.02
1.09.04	ESMALTE LAMINA LINEAL 3 MANOS	ML	304.76	\$ 6,500.00	\$ 7,215.00	329.76	\$ 2,379,218.40			329.76	\$ 2,379,218.40
1.09.05	ESMALTE LAMINA LLENA 3 MANOS	M2	37.26	\$ 14,700.00	\$ 16,317.00	30.79	\$ 502,335.16			30.79	\$ 502,335.16
SUBTOTAL							\$ 9,143,430.31				\$ 9,143,430.31

VIDRIOS Y CERRADURAS												
6	1.17.05	VIDRIO 4 MM	M2	9.25	\$ 57,500.00	\$ 63,825.00	0.00	\$ 0.00	1.16	\$ 74,037.00	1.16	\$ 74,037.00
	1.17.03	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UND	4.00	\$ 121,000.00	\$ 134,310.00	0.00	\$ 0.00	2.00	\$ 268,620.00	2.00	\$ 268,620.00
	SUBTOTAL							\$ 0.00		\$ 342,657.00		\$ 342,657.00
CUBIERTA												
7	1.12.19	SUMINISTRO E INSTALACION CABALLETE ONDULADO FIBROCEMENTO	ML	6.00	\$ 57,100.00	\$ 63,381.00	0.00	\$ 0.00	8.00	\$ 507,048.00	8.00	\$ 507,048.00
	1.12.25	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 6	M2	13.18	\$ 51,800.00	\$ 57,498.00	3.16	\$ 181,420.88	4.43	\$ 254,909.27	7.59	\$ 436,330.15
	1.12.26	SUMINISTRO E INSTALACION CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8	M2	2.16	\$ 49,600.00	\$ 55,056.00	0.00	\$ 0.00	25.92	\$ 1,427,051.52	25.92	\$ 1,427,051.52
	1.12.03	SUMINISTRO E INSTALACION DE BAJANTE AMAZONA	ML	6.00	\$ 63,000.00	\$ 69,930.00	0.00	\$ 0.00			0.00	\$ 0.00
	1.12.04	SUMINISTRO E INSTALACION DE CANAL AMAZONA	ML	12.20	\$ 92,600.00	\$ 102,786.00	12.00	\$ 1,233,432.00			12.00	\$ 1,233,432.00
	SUBTOTAL							\$ 1,414,852.88		\$ 2,189,008.79		\$ 3,603,861.67
APARATOS SANITARIOS												
8	1.16.05	SUMINISTRO E INSTALACION COMBO SENSACION LAVAMANOS, SANITARIO, GRIFERIA E INCRUSTACIONES	UND	1.00	\$ 472,860.00	\$ 472,860.00	1.00	\$ 472,860.00			1.00	\$ 472,860.00
	1.16.13	SUMINISTRO E INSTALACION ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO	UND	1.00	\$ 314,700.00	\$ 314,700.00	0.00	\$ 0.00	1.00	\$ 314,700.00	1.00	\$ 314,700.00
	SUBTOTAL							\$ 472,860.00		\$ 314,700.00		\$ 787,560.00
INSTALACION ELECTRICA												
9	1.07.04	SALIDA LAMPARA TOMA PVC COMPLETA	UND	5.00	\$ 86,700.00	\$ 96,237.00	6.00	\$ 577,422.00			6.00	\$ 577,422.00
	7.01.09	SUMINISTRO, INSTALACION Y CONEXIONADO DE CABLE CONCENTRICO (ANTIFRAUDE) No. 1 x 8 + 8 AWG EN COBRE (ACOMETIDA MONOFASICA)	ML	25.00	\$ 20,200.00	\$ 22,422.00	8.00	\$ 179,376.00	26.00	\$ 582,972.00	34.00	\$ 762,348.00
	SUBTOTAL							\$ 756,798.00		\$ 582,972.00		\$ 1,339,770.00
ENCHAPE												
10	1.11.05	SUMINISTRO E INSTALACION DE ENCHAPE EN PORCELANA OLIMPIA 20X20 O SIMILAR	M2	28.00	\$ 67,900.00	\$ 75,369.00	7.91	\$ 595,927.61			7.91	\$ 595,927.61
	1.11.04	ALISTADO PISO E=4 CM - 1.5	M2	1.65	\$ 26,800.00	\$ 29,748.00	1.19	\$ 35,304.93			1.19	\$ 35,304.93
	SUBTOTAL							\$ 631,232.54				\$ 631,232.54
INSTALACIONES HIDRAULICAS												
11	1.06.37	SUMINISTRO E INSTALACION TANQUE ELEVADO PVC 250 LTS. INCLUYE ACCESORIOS	UND	2.00	\$ 275,200.00	\$ 305,472.00	0.00	\$ 0.00			0.00	\$ 0.00
	1.06.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE RED SUMINISTRO TUBERIA PVC-P 1/2" RDE 9	ML	32.00	\$ 11,400.00	\$ 12,654.00	12.00	\$ 151,848.00			12.00	\$ 151,848.00
	SUBTOTAL							\$ 151,848.00				\$ 151,848.00
INSTALACIONES SANITARIAS												
12	1.02.37	SUMINISTRO E INSTALACION TUBERIA PVC SANITARIA D=2"	ML	8.00	\$ 21,600.00	\$ 23,976.00	8.00	\$ 191,808.00			8.00	\$ 191,808.00
	1.06.40	TUBERIA DE 4" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ML	8.00	\$ 43,500.00	\$ 48,285.00	3.00	\$ 144,855.00			3.00	\$ 144,855.00
	2.05.08	PUNTO DE DESAGUES D=2"	UND	2.00	\$ 55,400.00	\$ 61,494.00	2.00	\$ 122,988.00			2.00	\$ 122,988.00
	2.05.09	PUNTO DE DESAGUES PVC 3# Y 4"	UND	1.00	\$ 101,000.00	\$ 112,110.00	1.00	\$ 112,110.00			1.00	\$ 112,110.00
	SUBTOTAL							\$ 571,761.00				\$ 571,761.00

CARPINTERIA METALICA												
13	SUMINISTRO E INSTALACION MARCO EN LAMINA A-90 CM CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	UND	1.00	\$ 114,000.00	\$ 126,540.00	1.00	\$ 126,540.00					\$ 126,540.00
1.15.07												
1.15.08	SUMINISTRO E INSTALACION PUERTA EN LAMINA CAL 18 INC. ANTICORROSIVO	M2	1.60	\$ 189,000.00	\$ 209,790.00	1.24	\$ 259,090.65					\$ 259,090.65
1.15.14	SUMINISTRO E INSTALACION VENTANA LAMINA CAL. 18 CON VIDRIO INC. ANTICORR.	M2	0.24	\$ 212,400.00	\$ 235,764.00	0.00	\$ 0.00					\$ 0.00
SUBTOTAL												
14 SISTEMA SEPTICO												
1.02.13	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN (INCLUYE RETIRO)	M3	6.80	\$ 46,000.00	\$ 46,000.00	7.28	\$ 334,880.00					\$ 334,880.00
3.03.23	SUMINISTRO E INSTALACION DE CONCRETO SIMPLE DE 17.5 Mpa (2500) PARA BASES	M3	0.40	\$ 304,000.00	\$ 337,440.00	0.40	\$ 134,976.00					\$ 134,976.00
1.02.42	SUMINISTRO FIGURADO Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI 420 Mpa	KG	29.64	\$ 7,000.00	\$ 7,770.00	22.34	\$ 173,612.88					\$ 173,612.88
1.04.30	MURO TOLETE COMUN E=0.10 mis.	M2	19.20	\$ 71,600.00	\$ 79,476.00	19.04	\$ 1,513,223.04					\$ 1,513,223.04
2.05.30	SUMINISTRO E INSTALACION TEE SANITARIA D=4"	UND	4.00	\$ 22,500.00	\$ 24,975.00	4.00	\$ 99,900.00					\$ 99,900.00
1.05.08	PANETE IMPERMEABILIZADO 1:3	M2	36.15	\$ 27,300.00	\$ 30,303.00	19.04	\$ 576,969.12					\$ 576,969.12
2.05.33	SUMINISTRO E INSTALACION CODO PVC SANITARIO D=4"	UND	4.00	\$ 12,600.00	\$ 13,986.00	4.00	\$ 55,944.00					\$ 55,944.00
1.06.40	TUBERIA DE 4" PVC SANITARIA, INCLUYE INSTALACION	ML	5.00	\$ 43,500.00	\$ 48,285.00	5.13	\$ 247,519.52					\$ 247,519.52
2.07.03	CONCRETO SIMPLE DE 21 Mpa - (3000 FSI) PARA TAPAS	M3	0.28	\$ 747,000.00	\$ 829,170.00	0.40	\$ 331,668.00					\$ 331,668.00
3.03.08	DRENAJES EN TUBERIA DE PVC 4" PERFORADA INCLUYE GRAVILLA FINA	ML	10.00	\$ 31,300.00	\$ 34,743.00	10.00	\$ 347,430.00					\$ 347,430.00
SUBTOTAL												
ITEM NO PREVISTOS												
NP 2.01.48	DESMONTE DE CORREA - VIGA - COLUMNA EN MADERA, (INCLUYE RETIRO Y ACARREO LIBRE HASTA 5 KM.)	ML		\$ 7,583.14	\$ 7,583.14	117.00	\$ 887,227.38					\$ 887,227.38
2.08.33	SUMINISTRO E INSTALACION PERFILERIA METALICA PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA DE EDIFICACIONES. DIMENSIONES Y CALIBRES SEGUN DISENO	KG		\$ 22,031.72	\$ 24,455.21	262.56	\$ 6,420,959.94					\$ 6,420,959.94
SUBTOTAL												
COSTO DIRECTO												
ADMINISTRACION 25%												
IMPREVISTOS 4%												
UTILIDAD 1%												
VALOR TOTAL												
\$ 7,308,187.32												
\$ 3,429,337.79												
\$ 857,334.45												
\$ 137,173.51												
\$ 34,293.38												
\$ 4,458,139.13												
\$ 30,647,100.80												
\$ 7,661,775.13												
\$ 1,225,884.02												
\$ 308,471.01												
\$ 39,841,230.65												

VALOR TOTAL A PAGAR \$ 4,458,139.13


ISSACON SAS
R/L RONALD CAMILO PRADA ULLOA


SECRETARIO DE PLANEACION Y GESTION TERRITORIAL
INC. JEFFERSON ARBEY MENDIVEISO GARCIA











MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA
INFRAESTRUCTURA DE SALONES
COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL
MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ

31/07/2025

13 MEMORIAS DE CALCULO

MEMORIAS CANTIDADES DE OBRA

	SOCOTÁ, BOYACÁ	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE SALONES COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ						
FECHA	DD: 31 MM: 7 AA: 2025	Inf Avance N°	1	ELABORÓ	Controlista:			
CONTRATISTA	ISSACON SAS	NIT O.C.C.	800.408.874-8	CONTRATO N°	C-MS-MC-013-2025			
CAPÍTULO	8.00 VIDRIOS Y CERRADURAS	ITEM	1.17.05	DESCRIPCIÓN	VIDRIO 4 MM	UNID.	MC	UBICACIÓN
	Localización		Dimensiones			No UND.	Medida Total M2	
	VIDRIO 4 MM		LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO			
			1,00	1,16		1,00	1,16	
Sub-total Acumulado							1,16	
TOTAL							1,16	
CONTRATISTA:	 ISSACON S.A.S. R/L. RONALD CAMILO PRADA ULLOA		SUPERVISOR:	 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL ING. JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA				

	SOCOTÁ, BOYACÁ	MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE SALONES COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ						
FECHA	DD: 31 MM: 7 AA: 2025	Inf Avance N°	1	ELABORÓ	Controlista:			
CONTRATISTA	ISSACON SAS	NIT O.C.C.	800.408.874-8	CONTRATO N°	C-MS-MC-013-2025			
CAPÍTULO	6.00 VIDRIOS Y CERRADURAS	ITEM	1.17.03	DESCRIPCIÓN	CERRADURA ENTRADA DOBLE CILINDRO	UNID.	UND	UBICACIÓN
	Localización		Dimensiones			No UND.	Medida Total UND	
			LARGO (m)	ANCHO (m)	ALTO			
						2,00	2,00	
Sub-total Acumulado							2,00	
TOTAL							2,00	
CONTRATISTA:	 ISSACON S.A.S. R/L. RONALD CAMILO PRADA ULLOA		SUPERVISOR:	 SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL ING. JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA				

		SOCOTÁ, BOYACÁ		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE SALONES COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ				
FECHA DD 31 MM 7 AA 2025		Inf Avance: N° 1		ELABORÓ		Contratista:		
CONTRATISTA ISSACON SAS		NIT O C.C.		900.408.674-8		CONTRATO N° C-MS-MC-013-2025		
CAPITULO 7.00 CUBIERTA		ITEM 1.12.28		DESCRIPCIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA EN TEJA FIBROCEMENTO NUMERO 8		UNID. M2 UBICACIÓN		
		Localización		Dimensiones			No UNID.	Medida Total M2
				LARGO (m)	ANCHO (M)	ALTO		
		COLINAS		2,44	0,92	2,00	6,00	26,94
				Sub-total Acumulado			26,94	
				TOTAL			26,94	
CONTRATISTA:				SUPERVISOR:				
ISSACON S.A.S. R/L. RONALD CAMILO PRADA ULLOA				SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL ING. JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA				

		SOCOTÁ, BOYACÁ		MANTENIMIENTO Y ADECUACIÓN A LA INFRAESTRUCTURA DE SALONES COMUNALES EN EL AREA RURAL DEL MUNICIPIO DE SOCOTÁ - BOYACÁ				
FECHA DD 31 MM 7 AA 2025		Inf Avance: N° 1		ELABORÓ		Contratista:		
CONTRATISTA ISSACON SAS		NIT O C.C.		900.408.674-8		CONTRATO N° C-MS-MC-013-2025		
CAPITULO 8.00 APARATOS SANITARIOS		ITEM 1.16.13		DESCRIPCIÓN SUMINISTRO E INSTALACIÓN ORINAL MEDIANO COMPLETO. GRIF TRADICIONAL CROMO		UNID. UND UBICACIÓN		
		Localización		Dimensiones			No UNID.	Medida Total UNID.
				LARGO (m)	ANCHO (M)	ALTO		
								1,00
				Sub-total Acumulado			1,00	
				TOTAL			1,00	
CONTRATISTA:				SUPERVISOR:				
ISSACON S.A.S. R/L. RONALD CAMILO PRADA ULLOA				SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN TERRITORIAL ING. JEFFERSON ARBEY MENDIVELSO GARCIA				
