

Fecha

11

Mayo

2025

DD

MM

AA

ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA

LA EMPRESA PÚBLICA DE MUNICIPIO DE SOACHA

EPUXUA

TÉCNICA

CONSTRUCCIONES

DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL



CONTRATO No.

075 de 2025

INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA

SEMANA No.

4

DEL

5/05/2025

AL

11/05/2025

TIEMPO TRANSCURRIDO DESDE LA INICIACIÓN DEL CONTRATO

23.00

NOMBRE DEL DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN DE PROYECTOS SUPERVISORES

LUIS CAMILO TORRES HERNANDEZ

OBJETO DEL CONTRATO

ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS PARA PAVIMENTACIÓN DE CORREDORES VIALES EN EL MUNICIPIO DE SOACHA - CUNDINAMARCA EN EL MARCO DEL CONTRATO INTERADMINISTRATIVO No. 3279 - 2024 SUSCRITO ENTRE EL MUNICIPIO DE SOACHA Y LA EMPRESA PÚBLICA DE SOACHA EPUXUA AVANZA E.I.C.E.

SEMANAL

4.00%

ACUMULADO

32.00%

Obra Programada (Físico)

Valor de Proyecto Programado (Financiero \$)

Valor de Proyecto Programado (Financiero %)

\$

25,999,516.56

4.00%

\$

207,996,132.48

32.00%

SEMANAL

4.00%

ACUMULADO

32.00%

Obra Ejecutada (Físico)

Valor de Proyecto Ejecutado (Financiero \$)

Valor de Proyecto Ejecutado (Financiero %)

\$

25,999,516.56

4.00%

\$

207,996,132.48

32.00%

CONTRATO DE OBRA

CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Contratista

Contrato No.

Valor Inicial

Valor Actualizado

Plazo Inicial

Plazo Actualizado

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación

No. de empleos generados

INGENIERIA Y GESTIÓN VÍAL S.A.S. – GEVIAL

075 de 2025

\$ 649,987,914.00

\$ 649,987,914.00

4 meses

4 meses

15/04/2025

14/08/2025

10

Interventor

Contrato No.

Valor Inicial

Valor Actualizado

Plazo Inicial

Plazo Actualizado

Fecha de Iniciación

Fecha de Terminación

No. De empleos generados

GEO INTERVENTORÍAS S.A.S

076 de 2025

\$ 45,500,000.00

\$ 45,500,000.00

4 meses

4 meses

15/04/2025

14/08/2025

3

Generalidades:

El proyecto se encuentra en su fase de Estudios y Diseños, desarrollándose dentro del plazo establecido en el contrato suscrito entre las partes el 15 de abril de 2025, con una duración de cuatro (4) meses, según lo estipulado en el contrato de obra No. 075 de 2025, con el objetivo de garantizar la finalización del mismo.

El presente informe corresponde a la semana número cuatro (4) del proyecto, la cual coincide con la semana correspondiente a la etapa de estudios y diseños.

B. ACTIVIDADES REALIZADAS EN LA SEMANA

Topografía:

Se continua con los trabajos topográficos, los cuales consisten en la ubicación de vértices de control y el levantamiento planimétrico y altimétrico de las zonas de estudio.

Geotecnia:

Se informa que se está llevando a cabo la evaluación de las cantidades de apiques requeridos en la zona de estudio, con el fin de definir la ubicación óptima y el número necesario para garantizar una adecuada caracterización geotécnica del terreno.

Hidráulica:

Se continua con la recopilación de información hidrológica e hidráulica proveniente del IDEAM y la Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB), con el fin de contar con insumos técnicos necesarios para el análisis de las condiciones actuales de escorrentía y drenaje en las zonas de estudio

Tránsito:

Se dio inicio al conteo vehicular correspondiente al componente de tránsito en las zonas de estudio, con el fin de caracterizar la demanda actual y recolectar información clave para el análisis de capacidad vial y diseño del proyecto.

Once

(11)

días del mes de

Mayo

de

2025

(Día en letras)

(Día en números)

(Mes en que se firma el acta)

(Año de firma del acta)

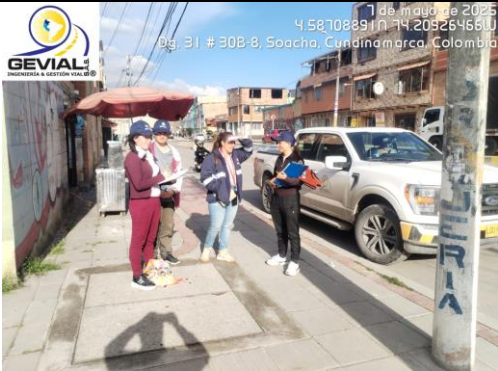
DIRECTOR DE CONSULTORÍA

ING. DONALDO ELIAS CASTILLA RODRIGUEZ

DIRECTOR DE INTERVENTORÍA

ING. JOSE JOAQUIN LARA RUIZ

4-MIN-C-M-39

Fecha 11 Mayo 2025 DD MM AA			ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA LA EMPRESA PÚBLICA DE MUNICIPAL DE SOACHA EPUXUA		TÉCNICA CONSTRUCCIONES DE EJECUCIÓN DEL SUBSISTEMA VIAL		 ALCALDÍA MUNICIPAL DE SOACHA	
CONTRATO No. 075 de 2025								
INFORME SEMANAL DE INTERVENTORÍA								
REGISTRO FOTOGRÁFICO								
								
Fotografía 1.			Fotografía 2.					
								
Fotografía 3.			Fotografía 4.					
								
Fotografía 5.			Fotografía 6.					
								
Fotografía 7.			Fotografía 8.					
