







	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA		CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-2		
			VERSIÓN	1		
			PÁGINA	1	DE	1

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

DIRECCIÓN TERRITORIAL ANTIOQUIA

FECHA 31 día 1 mes 2022 año

ACTA PARCIAL DE OBRA NO. 07 (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)	ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. (Indique el número del acta)	VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1 099 919 993.00	PERIODO MES: ENERO DE 2022
---	--	---	--	----------------------------

	Día	Mes	Año		FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	31	1	22	NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)	28	2	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ		Actualizacion de la informacion del registro presupuestal se debe ajustar formato para la reserva de 2021
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	6	3	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	7	3	2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	7	3	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE MAURICIO HOYOS SIERRA	 MAURICIO HOYOS SIERRA Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	11	3	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE MAURICIO HOYOS SIERRA	 MAURICIO HOYOS SIERRA Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TECNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	30	3	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO		-Acta devuelta mediante el oficio SMC-GGPT-16958 recibido por interventoría el 30 de marzo 2022 para ajuste de acuerdo a las condiciones contractuales y los saldos reportados por el SIIF
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TECNICO DE PROYECTO	5	4	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE LUZ HELENA ARIZA RUIZ		
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11	04	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE CARLOS FELIPE SABOGAL	 CARLOS FELIPE SABOGAL Firmado digitalmente por CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO	
FECHA DE ENTREGA DE LOS DOCUMENTOS AL CONTRATISTA POR LA UNIDAD EJECUTORA PARA RADICACIÓN EN VENTANILLA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE		

Para la autorización de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad

AUTORIZACION DE PAGO

CONTRATO No : 983 DE 2021 NIT. 901.472.786-3

OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

De acuerdo con la facultad otorgada, el ING CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO autoriza el pago a favor del contratista CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 por valor de : \$ 1 053 682 950.00 Letras: UN MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS M/CTE (Indicar el ordenador del pago) (Indicar el nombre del contratista de Obra)

Correspondiente al acta No. 07 del periodo ENERO DE 2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal adjunto.

Firma: MAURICIO HOYOS SIERRA
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No. 05202096971 ANT
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA

Firma: MAURICIO HOYOS SIERRA
Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No. 05202096971 ANT
DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA

Firma: LUZ HELENA ARIZA RUIZ
Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ
Matrícula No.: 63202092415 QND
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO

Firma: CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Nombre : CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO
Matrícula No.: 63202101664 QND
ORDENADOR DEL PAGO

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	6

FECHA	31	01	2022
	día	mes	año

UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES	DIRECCIÓN TERRITORIAL	ANTIOQUIA	ACTA No	07	VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 1 099 919 993.00	MES	ENERO DE 2022
				ACTA FINAL	SI ☐ NO ☒				
				(Indicar con una X)					

CONTRATO No : 983 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2		FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061		LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)		FECHA DE SUSPENSIÓN: FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 967 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ - (Según contrato principal)	
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1			
											VERSIÓN	1			
											PÁGINA	2	DE	6	
											FECHA	31	01	2022	
												día	mes	año	
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES										DIRECCIÓN TERRITORIAL	ANTIOQUIA			
											ACTA No	07			
											ACTA FINAL	SI ☐ NO ☒			
											(Indicar con una X)				
CONTRATO No : 983 DE 2021 (Indique número y año)											PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)				
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2											PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
											FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021				
											FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061											LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 967 DE 2021											INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL				
											FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)				
											FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)				
											VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00				
											VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -				
											(Según contrato principal)				
											VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00				
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS (acta de modificación No. 1 fecha: 7-DIC-21)		OBRA EJECUTADA				
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
									CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	
25	4	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m	36 262.00	\$ 210 000.00	\$ 7 615 020 000.00	36 262.00	\$ 7 615 020 000.00	-	\$ -	-	\$ -	
26	4	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m	32 316.00	\$ 324 690.00	\$ 10 492 682 040.00	32 316.00	\$ 10 492 682 040.00	-	\$ -	-	\$ -	
27	4	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	m	21 103.00	\$ 350 000.00	\$ 7 386 050 000.00	21 103.00	\$ 7 386 050 000.00	-	\$ -	-	\$ -	
28	4	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)	m	25 316.00	\$ 375 000.00	\$ 9 493 500 000.00	25 316.00	\$ 9 493 500 000.00	-	\$ -	-	\$ -	
29	4	623-13		Anclaje tipo tendón	m	18 637.00	\$ 311 825.00	\$ 5 811 482 525.00	18 637.00	\$ 5 811 482 525.00	-	\$ -	-	\$ -	
30	4		PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte abierto	m	86 057.00	\$ 121 647.00	\$ 10 468 575 879.00	86 057.00	\$ 10 468 575 879.00	-	\$ -	-	\$ -	
31	4		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte abierto	m	16 021.00	\$ 99 033.00	\$ 1 586 607 693.00	16 021.00	\$ 1 586 607 693.00	-	\$ -	-	\$ -	
32	6	630.1P		Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	8 762.00	\$ 1 450 000.00	\$ 12 704 900 000.00	8 762.00	\$ 12 704 900 000.00	-	\$ -	-	\$ -	
33	6	630.1.1P		Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes (postensado)	m3	1 388.00	\$ 1 350 000.00	\$ 1 873 800 000.00	1 388.00	\$ 1 873 800 000.00	-	\$ -	-	\$ -	
34	6	630.1.2P		Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	203.00	\$ 1 271 489.00	\$ 258 112 267.00	203.00	\$ 258 112 267.00	-	\$ -	-	\$ -	
35	6	630.3.1P		Concreto clase 28 MPA para Zapatas, Estribos y Aletas, viga base, brocales	m3	6 902.00	\$ 930 000.00	\$ 6 418 860 000.00	6 902.00	\$ 6 418 860 000.00	-	\$ -	-	\$ -	
36	6	630.3.2P		Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	1 306.00	\$ 1 050 000.00	\$ 1 371 300 000.00	1 306.00	\$ 1 371 300 000.00	-	\$ -	-	\$ -	
37	6	630.3.3P		Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	114.00	\$ 1 100 000.00	\$ 125 400 000.00	114.00	\$ 125 400 000.00	-	\$ -	-	\$ -	
38	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	10 188.00	\$ 780 000.00	\$ 7 946 640 000.00	10 188.00	\$ 7 946 640 000.00	-	\$ -	-	\$ -	
39	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	3 761.00	\$ 680 000.00	\$ 2 557 480 000.00	3 761.00	\$ 2 557 480 000.00	-	\$ -	-	\$ -	
40	5	630.4.1P		Concreto lanzado clase 21 Mpa	m3	6 498.00	\$ 950 000.00	\$ 6 173 100 000.00	6 498.00	\$ 6 173 100 000.00	319.50	\$ 303 525 000.00	319.50	\$ 303 525 000.00	
41	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1 140.00	\$ 543 697.00	\$ 619 814 580.00	1 140.00	\$ 619 814 580.00	-	\$ -	-	\$ -	
42	4	632.1P		Baranda Metalica	m	1 372.00	\$ 545 397.00	\$ 748 284 684.00	1 372.00	\$ 748 284 684.00	-	\$ -	-	\$ -	
43	4	640-13		Aceros de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	5 529 845.00	\$ 5 378.00	\$ 29 739 506 410.00	5 529 845.00	\$ 29 739 506 410.00	-	\$ -	-	\$ -	
44	4	641-13		Aceros de Priesfuerzo	tf-m	1 751 321.00	\$ 2 150.00	\$ 3 765 340 150.00	1 751 321.00	\$ 3 765 340 150.00	-	\$ -	-	\$ -	
45	4	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	und	56.00	\$ 2 551 672.00	\$ 142 893 632.00	56.00	\$ 142 893 632.00	-	\$ -	-	\$ -	
46	4	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	und	8.00	\$ 6 524 758.00	\$ 52 198 064.00	8.00	\$ 52 198 064.00	-	\$ -	-	\$ -	
47	4	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	und	24.00	\$ 8 095 360.00	\$ 194 288 640.00	24.00	\$ 194 288 640.00	-	\$ -	-	\$ -	
48	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de diámetro interior	m	37.00	\$ 611 137.00	\$ 22 612 069.00	37.00	\$ 22 612 069.00	-	\$ -	-	\$ -	
49	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de diámetro interior	m	349.00	\$ 1 300 914.00	\$ 454 018 986.00	349.00	\$ 454 018 986.00	-	\$ -	-	\$ -	
50	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de diámetro interior	m	26.00	\$ 1 722 892.00	\$ 44 795 192.00	26.00	\$ 44 795 192.00	-	\$ -	-	\$ -	
51	5	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m	3 628.00	\$ 42 055.00	\$ 152 575 540.00	3 628.00	\$ 152 575 540.00	-	\$ -	-	\$ -	
52	5	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150 mm	m	2 630.00	\$ 69 709.00	\$ 183 334 670.00	2 630.00	\$ 183 334 670.00	-	\$ -	-	\$ -	
53	5	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m	599.00	\$ 80 970.00	\$ 48 501 030.00	599.00	\$ 48 501 030.00	-	\$ -	-	\$ -	
54	5	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	771.00	\$ 202 186.00	\$ 155 885 406.00	771.00	\$ 155 885 406.00	-	\$ -	-	\$ -	
55	5	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	1 435.00	\$ 250 758.00	\$ 359 837 730.00	1 435.00	\$ 359 837 730.00	-	\$ -	-	\$ -	
56	5	670.5P		Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	3 568.00	\$ 780 000.00	\$ 2 783 040 000.00	3 568.00	\$ 2 783 040 000.00	-	\$ -	-	\$ -	
57	5	671.1P		Cuneta de concreto de 21 MPA vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	9 621.00	\$ 643 000.00	\$ 6 186 303 000.00	9 621.00	\$ 6 186 303 000.00	-	\$ -	-	\$ -	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA				CÓDIGO	MINFRA-MN-IN-4-FR-1		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	3	DE	6

				FECHA	31	01	2022
					día	mes	año
UNIDAD EJECUTORA	SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES			DIRECCIÓN TERRITORIAL	ANTIOQUIA		
				ACTA No	07		
				ACTA FINAL	SI ☐ NO ☒		
				(Indicar con una X)			
				VALOR BÁSICO ACTA:	\$ 1 099 919 993.00		
				MES	ENERO DE 2022		

CONTRATO No :	983 DE 2021 (Indique número y año)			PLAZO INICIAL:	37 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:	37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)	
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2			FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO:	2/07/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:	1/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
CONTRATISTA:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061			LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):	TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No	967 DE 2021			INTERVENTOR:	CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL				
				FECHA DE SUSPENSIÓN:			FECHA DE REANUDACIÓN:		
				(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		(Indique día/mes/año)			
				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):	389 978 471 425.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):	\$ -	
				(Según contrato principal)					
				VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$ 389 978 471 425.00				

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS (acta de modificación No. 1 fecha: 7-DIC-21)		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
58	5		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	m	630.00	\$ 137 058.00	\$ 86 346 540.00	630.00	\$ 86 346 540.00	-	\$ -	-	\$ -
59	5		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	1 801.00	\$ 194 649.00	\$ 350 562 849.00	1 801.00	\$ 350 562 849.00	-	\$ -	-	\$ -
60	5		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	4 426.00	\$ 1 050 000.00	\$ 4 647 300 000.00	4 426.00	\$ 4 647 300 000.00	-	\$ -	-	\$ -
61	7	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	28 751.00	\$ 7 005.00	\$ 201 400 755.00	28 751.00	\$ 201 400 755.00	-	\$ -	-	\$ -
62	7	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	78 089.00	\$ 7 720.00	\$ 602 847 080.00	78 089.00	\$ 602 847 080.00	-	\$ -	-	\$ -
63	7		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m	585.00	\$ 28 444.00	\$ 16 639 740.00	585.00	\$ 16 639 740.00	-	\$ -	-	\$ -
64	5	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m	23 684.00	\$ 65 894.00	\$ 1 560 633 496.00	23 684.00	\$ 1 560 633 496.00	-	\$ -	-	\$ -
65	5	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	7 965.00	\$ 190 308.00	\$ 1 515 803 220.00	7 965.00	\$ 1 515 803 220.00	-	\$ -	-	\$ -
66	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	74 901.00	\$ 13 581.00	\$ 1 017 230 481.00	74 901.00	\$ 1 017 230 481.00	-	\$ -	-	\$ -
67	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	82 321.00	\$ 20 637.00	\$ 1 698 858 477.00	82 321.00	\$ 1 698 858 477.00	-	\$ -	-	\$ -
68	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	9 836.00	\$ 32 884.00	\$ 323 447 024.00	9 836.00	\$ 323 447 024.00	-	\$ -	-	\$ -
69	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	11 346.00	\$ 40 763.00	\$ 462 496 998.00	11 346.00	\$ 462 496 998.00	-	\$ -	-	\$ -
70	7	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	11 322.00	\$ 20 969.00	\$ 237 411 018.00	11 322.00	\$ 237 411 018.00	-	\$ -	-	\$ -
Subtotal								\$ 173 395 951 001.00		\$ 173 395 951 001.00		\$ 303 525 000.00		\$ 303 525 000.00

OBRAS SUBTERRÁNEAS														
71	5		PT-1	Perforación exploratoria	m	1 206.00	\$ 231 723.00	\$ 279 457 938.00	1 206.00	\$ 279 457 938.00	-	\$ -	-	\$ -
72	5		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m³	13 426.00	\$ 250 000.00	\$ 3 356 500 000.00	13 426.00	\$ 3 356 500 000.00	-	\$ -	-	\$ -
73	5		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m³	57 279.00	\$ 256 280.00	\$ 14 679 462 120.00	57 279.00	\$ 14 679 462 120.00	-	\$ -	-	\$ -
74	5		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m³	53 444.00	\$ 305 000.00	\$ 16 300 420 000.00	53 444.00	\$ 16 300 420 000.00	-	\$ -	-	\$ -
75	4		PT-3	Permos anclados con lechada para excavaciones subterráneas	m	21 401.00	\$ 98 785.00	\$ 2 114 097 785.00	21 401.00	\$ 2 114 097 785.00	-	\$ -	-	\$ -
76	5		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m³	14 649.00	\$ 1 000 000.00	\$ 14 649 000 000.00	14 649.00	\$ 14 649 000 000.00	-	\$ -	-	\$ -
77	5		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y exc/subterránea)	m³	9 768.00	\$ 1 030 000.00	\$ 10 061 040 000.00	9 768.00	\$ 10 061 040 000.00	-	\$ -	-	\$ -
78	5		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	240.00	\$ 173 926.00	\$ 41 742 240.00	240.00	\$ 41 742 240.00	-	\$ -	-	\$ -
79	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o similar	m2	23 412.00	\$ 24 116.00	\$ 564 603 792.00	23 412.00	\$ 564 603 792.00	-	\$ -	-	\$ -
80	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	29 216.00	\$ 14 391.00	\$ 420 447 456.00	29 216.00	\$ 420 447 456.00	437.20	\$ 6 291 745.00	437.20	\$ 6 291 745.00
81	4		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2	211 151.00	\$ 28 502.00	\$ 6 018 225 802.00	211 151.00	\$ 6 018 225 802.00	-	\$ -	-	\$ -
82	4		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg	708 686.00	\$ 10 584.00	\$ 7 500 732 624.00	708 686.00	\$ 7 500 732 624.00	-	\$ -	-	\$ -
83	4		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg	26 789.00	\$ 8 836.00	\$ 236 707 604.00	26 789.00	\$ 236 707 604.00	-	\$ -	-	\$ -
84	4		PT-6	Fibra de Acero	Kg	244 200.00	\$ 12 365.00	\$ 3 019 533 000.00	244 200.00	\$ 3 019 533 000.00	-	\$ -	-	\$ -
85	7		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m²	40 801.00	\$ 80 000.00	\$ 3 264 080 000.00	40 801.00	\$ 3 264 080 000.00	-	\$ -	-	\$ -
86	5		PT-9	Cámara de inspección Tipo A	u	16.00	\$ 3 514 941.00	\$ 56 239 056.00	16.00	\$ 56 239 056.00	-	\$ -	-	\$ -
87	5		PT10	Tubería para enfilajes: Tubería metálica de 4" de diametro	m	22 379.00	\$ 258 899.00	\$ 5 793 900 721.00	22 379.00	\$ 5 793 900 721.00	-	\$ -	-	\$ -
Subtotal								\$ 88 356 190 138.00		\$ 88 356 190 138.00		\$ 6 291 745.00		\$ 6 291 745.00

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-4-FR-1										
											VERSIÓN		1										
											PÁGINA		4	DE	6								
												FECHA	31	01	2022								
													dia	mes	año								
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES												DIRECCIÓN TERRITORIAL		ANTIOQUIA		ACTA No 07		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1 099 919 993.00		MES		ENERO DE 2022	
												ACTA FINAL		SI ☐ NO ☒		(Indicar con una X)							
CONTRATO No : 983 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL:		37 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO:		37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2												FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:		2/07/2021		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:		1/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061												LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):		TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)		FECHA DE SUSPENSIÓN:		FECHA DE REANUDACIÓN:					
																(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		(Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 967 DE 2021												INTERVENTOR:		CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):		389 978 471 425.00		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):		\$ -	
																(Según contrato principal)							
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):		\$ 389 978 471 425.00									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS (acta de modificación No. 1 fecha: 7-DIC-21)		OBRA EJECUTADA												
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO										
														CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR				
SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD																							
88	7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m	34 789.00	\$ 1 791.00	\$ 62 307 099.00	34 789.00	\$ 62 307 099.00	-	\$ -	-	\$ -									
89	7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	163.00	\$ 59 987.00	\$ 9 777 881.00	163.00	\$ 9 777 881.00	-	\$ -	-	\$ -									
90	5		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	300.00	\$ 8 375.00	\$ 2 512 500.00	300.00	\$ 2 512 500.00	-	\$ -	-	\$ -									
91	4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y si (75cm*75cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	279.00	\$ 396 078.00	\$ 110 505 762.00	279.00	\$ 110 505 762.00	-	\$ -	-	\$ -									
92	4		MSV-2015	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado retroreflectiva	u	143.00	\$ 503 069.00	\$ 71 938 867.00	143.00	\$ 71 938 867.00	-	\$ -	-	\$ -									
93	4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	44.00	\$ 324 103.00	\$ 14 260 532.00	44.00	\$ 14 260 532.00	-	\$ -	-	\$ -									
94	4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	1.00	\$ 11 489 679.00	\$ 11 489 679.00	1.00	\$ 11 489 679.00	-	\$ -	-	\$ -									
95	5	720-13		Poste de referencia	u	9.00	\$ 252 800.00	\$ 2 275 200.00	9.00	\$ 2 275 200.00	-	\$ -	-	\$ -									
96	4	730-13		Defensa metalica	m	166.00	\$ 230 532.00	\$ 38 268 312.00	166.00	\$ 38 268 312.00	-	\$ -	-	\$ -									
97	5	731-13		Defensa de concreto	m	2 794.00	\$ 802 567.00	\$ 2 242 372 198.00	2 794.00	\$ 2 242 372 198.00	-	\$ -	-	\$ -									
98	4	730-13		Sección final	u	6.00	\$ 121 353.00	\$ 728 118.00	6.00	\$ 728 118.00	-	\$ -	-	\$ -									
99	4	730-13		Sección de tope	u	6.00	\$ 95 809.00	\$ 574 854.00	6.00	\$ 574 854.00	-	\$ -	-	\$ -									
100	5	740-13		Captafaros	u	1 149.00	\$ 22 031.00	\$ 25 313 619.00	1 149.00	\$ 25 313 619.00	-	\$ -	-	\$ -									
Subtotal								\$ 2 592 324 621.00		\$ 2 592 324 621.00		\$ -		\$ -									
OBRAS VARIAS																							
101	5	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	2 710.00	\$ 18 835.00	\$ 51 042 850.00	2 710.00	\$ 51 042 850.00	-	\$ -	-	\$ -									
102	5	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	524.00	\$ 22 684.00	\$ 11 886 416.00	524.00	\$ 11 886 416.00	-	\$ -	-	\$ -									
Subtotal								\$ 62 929 266.00		\$ 62 929 266.00		\$ -		\$ -									
TRANSPORTES																							
103	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1000 m), medido a partir de cien metros (100 m)	m3-km	19 865 740.00	\$ 1 000.00	\$ 19 865 740 000.00	18 377 854.00	\$ 18 377 854 000.00	-	\$ -	45 233.00	\$ 45 233 000.00									
Subtotal								\$ 19 865 740 000.00		\$ 18 377 854 000.00		\$ -		\$ 45 233 000.00									
ÍTEM NO PREVISTOS																							
105	1	211-13		REMOCIÓN DE DERRUMBES (No Incluye Transporte)	M3	-	\$ 9 121.00	\$ -	45 182.00	\$ 412 105 022.00	17 696.00	\$ 161 405 216.00	19 040.00	\$ 173 663 840.00									
106	1		310.1P	CONFORMACIÓN DE CALZADA EXISTENTE	M2	-	\$ 1 317.00	\$ -	48 441.00	\$ 63 796 797.00	19 188.00	\$ 25 270 596.00	19 188.00	\$ 25 270 596.00									
107	2		320.1P	MEJORAMIENTO DE VÍA CON MATERIAL DE FRESADO Y SUBBASE GRANULAR (SBG 60%) (Incluye Acopio, Mezcla, Cargue y Transporte)	M3	-	\$ 88 378.00	\$ -	10 163.00	\$ 898 185 614.00	948.00	\$ 83 782 344.00	4 008.00	\$ 354 219 024.00									
108	2		230.1P	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON MATERIAL DE SITIO (No Incluye Transporte)	M3	-	\$ 13 724.00	\$ -	432.00	\$ 5 928 768.00	-	\$ -	-	\$ -									

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MINFRA-MN-IN-4-FR-1												
											VERSIÓN		1												
											PÁGINA		5	DE	6										
FECHA														31	01	2022									
														día	mes	año									
UNIDAD EJECUTORA SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES														DIRECCIÓN TERRITORIAL		ANTIOQUIA		ACTA No 07		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1 099 919 993.00		MES		ENERO DE 2022	
														ACTA FINAL		SI ☐ NO ☒		(Indicar con una X)							
CONTRATO No : 983 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)				PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)											
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2										FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 2/07/2021				FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)											
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061										LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)				FECHA DE SUSPENSIÓN:				FECHA DE REANUDACIÓN:							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No 967 DE 2021										INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL				VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): 389 978 471 425.00				VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -							
														(Según contrato principal)											
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):				389 978 471 425.00											
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS (acta de modificación No. 1 fecha: 7-DIC-21)		OBRA EJECUTADA													
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO												
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR									
109	5		NP-05P	LIMPIEZA DE ESTRUCTURAS DE DRENAJE	UND	-	\$ 646 464.00	\$ -	10.00	\$ 6 464 640.00	-	\$ -	-	\$ -	-	\$ -									
110	3	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO Y/O DERRUMBE PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M)	M3-KM	-	\$ 1 000.00	\$ -	827 116.00	\$ 827 116 000.00	469 671.00	\$ 469 671 000.00	498 175.00	\$ 498 175 000.00											
111	3	900-13		TRANSPORTE DE MATERIAL DE FRESADO PARA DISTANCIAS MAYORES DE MIL METROS (1.000 M) MEDIDO A PARTIR DE CIENTO METROS (100 M) (Incluye Cargue)	M3 -KM	-	\$ 1 182.00	\$ -	48 787.00	\$ 57 666 234.00	21 254.00	\$ 25 122 228.00	21 254.00	\$ 25 122 228.00											
112	5	681-13		GAVIÓN DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO CLASE 1; RECUBRIMIENTO DE ZINC GALVANIZADO	M3	-	\$ 267 346.00	\$ -	444.00	\$ 118 701 624.00	-	\$ -	-	\$ -											
113	1		221.1P	ENROCADO CON MATERIAL PROVENIENTE DE DERRUMBE O EXCAVACIÓN (Incluye Transporte)	M3	-	\$ 18 619.00	\$ -	240.00	\$ 4 468 560.00	-	\$ -	-	\$ -											
114	2		330.1P	INSTALACIÓN DE MATERIAL DE FRESADO (Incluye Acopio, Cargue y Transporte)	M3	-	\$ 21 395.00	\$ -	1.00	\$ 21 395.00	-	\$ -	-	\$ -											
115	2		230.2P	MEJORAMIENTO DE LA SUBRASANTE CON ADICIÓN DE MATERIAL (Incluye Suministro y Transporte)	M3	-	\$ 100 111.00	\$ -	1 741.00	\$ 174 293 251.00	226.00	\$ 22 625 086.00	1 741.00	\$ 174 293 251.00											
Subtotal								\$ -		\$ 2 568 747 905.00		\$ 787 876 470.00		\$ 1 250 743 939.00											
Ajuste al peso										\$ 95.00															
SUBTOTAL OBRAS (A)								\$ 337 627 543 972.00		\$ 337 627 543 972.00		\$ 1 098 767 159.00		\$ 1 894 772 428.00											
* PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES (B)								\$ 26 261 883 970.00		\$ 26 261 883 970.00		\$ -		\$ -											
* PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA (C)								\$ 407 895 168.00		\$ 407 895 168.00		\$ -		\$ -											
* VALOR BASICO DEL CONTRATO INCLUYE OBRAS COMPLEMENTARIAS Y AJUSTES (D) = (A) + (B) + (C)								\$ 364 297 323 110.00		\$ 364 297 323 110.00		\$ 1 098 767 159.00		\$ 1 894 772 428.00											
* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA) (19% de la Utilidad del 5%) (E)								\$ 2 662 172 746.00		\$ 2 662 172 746.00		\$ 8 029 452.00		\$ 13 846 414.00											
* SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA) (F) = (D) + (E)								\$ 366 959 495 856.00		\$ 366 959 495 856.00		\$ 1 106 796 611.00		\$ 1 908 618 842.00											
104	1P		REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (G)	GLB	1.00	\$ 412 000 000	\$ 412 000 000.00	1.00	\$ 412 000 000.00		\$ -	0.4505	\$ 185 606 000.00												
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (H) = (G) * 19%								\$ 78 280 000.00		\$ 78 280 000.00		\$ -		\$ 35 265 140.00											
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL (I) = (G) + (H)								\$ 490 280 000.00		\$ 490 280 000.00		\$ -		\$ 220 871 140.00											
* GESTIÓN SOCIAL, PREDIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE (incluye PMA Licencia ambiental e IVA19%) (J)								\$ 22 222 695 569.00		\$ 22 222 695 569.00		\$ -		\$ -											
* PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (K)								\$ 306 000 000.00		\$ 306 000 000.00		\$ 1 158 176.00		\$ 2 192 108.00											
* VALOR TOTAL (L) = (F) + (I) + (J) + (K)								\$ 389 978 471 425.00		\$ 389 978 471 425.00		\$ 1 107 954 787.00		\$ 2 131 682 090.00											
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.																									

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO

MINFRA-MN-IN-4-FR-1

VERSIÓN

1

PÁGINA

6

DE

6

FECHA

31

01

2022

dia

mes

año

UNIDAD EJECUTORA

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

DIRECCIÓN TERRITORIAL

ANTIOQUIA

ACTA No

07

VALOR BÁSICO ACTA: \$

1 099 919 993.00

MES

ENERO DE 2022

ACTA FINAL

SI

NO

X

(Indicar con una X)

CONTRATO No :

983 DE 2021

(Indique número y año)

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03

(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No

967 DE 2021

INTERVENTOR:

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

PLAZO INICIAL:

37 MESES

(En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO:

37 MESES

(En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO:

2/07/2021

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL:

1/08/2024

(Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN:

(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN:

(Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) (A):

389 978 471 425.00

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):

\$

-

(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):

\$

389 978 471 425.00

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS (acta de modificación No. 1 fecha: 7-dic-21)		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

AIU

30

%

Utilidad

5

%

Valor Anticipo Otorgado

\$

17 978 471 425.00

Valor Amortizado Presenta Acta

\$

54 271 837.00

4.9399%

Valor Amortizado Acumulado

\$

78 180 084.00

0.021%

Registro Presupuestal No.

181622

de Fecha

07-feb-22

Saldo del Registro:

\$

63 946 497 994.00

(Indique el saldo descontando el valor de la presente acta)

VALOR BÁSICO PRESENTE MES EN LETRAS:

UN MIL NOVENTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS DIECINUEVE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES PESOS M/CTE

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 1 098 767 159.00	\$ 8 029 452.00	\$ 1 106 796 611.00
OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O OBRAS ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA E ILUMINACIÓN	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLANTILLA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
PROVISION PARA IMPLEMENTACIÓN DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19 (INCLUYE IVA) (PREACTA)	\$ 1 152 834.00	\$ 5 342.00	\$ 1 158 176.00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 1 099 919 993.00	\$ 8 034 794.00	\$ 1 107 954 787.00

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 187 749 756.00	\$ 487 913 180.00
SB	\$ 106 407 430.00	\$ 528 512 275.00
B	\$ -	\$ -
P	\$ -	\$ -
OA	\$ -	\$ -
SCT	\$ -	\$ -
OV	\$ 309 816 745.00	\$ 309 816 745.00
T	\$ 494 793 228.00	\$ 568 530 228.00

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ 187 749 756.00	\$ 487 913 180.00
2 Sub-bases y bases	\$ 106 407 430.00	\$ 528 512 275.00
3 Transporte de materiales	\$ 494 793 228.00	\$ 568 530 228.00
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 6 291 745.00	\$ 6 291 745.00
5 Concretos, morteros y obras varias	\$ 303 525 000.00	\$ 303 525 000.00
6 Concreto para estructuras de puentes	\$ -	\$ -
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ -	\$ -
(N) Ítems no sujetos a ajuste	\$ 1 152 834.00	\$ 187 631 081.00

NOTAS:

1. El Interventor Certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del contratista, con base en los soportes presentados por éste.

2. Las cantidades y valores consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las preactas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Predial, Social y Ambiental).

3. El % de Amortización debe coincidir con el consignado en la factura.

Para constancia de lo anterior firman

Firma

Nombre :

MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Contratista

Matricula No.:

25202-376479 CND

Firma

Nombre:

JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO

REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO

Interventor

Matricula No.:

25202-32230 CND

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera)

Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECCION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 983 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA ☒	<u>07</u>	<u>ENERO DE 2022</u>
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA ☐	<u> </u>	<u> </u>
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☐	<u> </u>	<u> </u>
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	<u> </u>	<u> </u>
		OTRO ☐	<u> </u>	<u> </u>
		CUAL? <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

NO. COMPROMISO:	<u>426021</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-0-2401017-02</u>	RECURSO NO.:	<u>54</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>180 944.00</u>
NO. COMPROMISO:	<u>181622</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-0-2401009-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>1 053 502 006.00</u>
NO. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO NO.:	<u> </u>	RECURSO NO.:	<u> </u>	VALOR AFECTADO:	<u> </u>
NO. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO NO.:	<u> </u>	RECURSO NO.:	<u> </u>	VALOR AFECTADO:	<u> </u>
NO. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO NO.:	<u> </u>	RECURSO NO.:	<u> </u>	VALOR AFECTADO:	<u> </u>
NO. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO NO.:	<u> </u>	RECURSO NO.:	<u> </u>	VALOR AFECTADO:	<u> </u>
						TOTAL ACTA: \$	<u>1 053 682 950.00</u>

MAURICIO
HOYOS
SIERRA

Firmado
digitalmente
por MAURICIO
HOYOS SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No. 05202096971 ANT



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 983 DE 2021 Contratista: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato: **CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2**

Acta No.: 07 Valor basico: \$ 1 099 919 993.00 Período: ENERO DE 2022
Valor Incluido Iva: \$ 1 107 954 787.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo via)	Denominación (carretera - puente -túnel)	Valor incluido IVA (construcción, rehabilitación, mejoramiento)	Valor incluido IVA Provision para Servicios del Túnel	Valor incluido IVA Estudios y Diseños	Valor incluido IVA (gestion social, predial y ambiental)	Valor incluido IVA Provision implementación protocolo de bioseguridad	Subtotal
1	6203	CARRETERA	\$ 1 106 796 611.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1 106 796 611.00
2	6203	PUENTE	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	6203	TUNEL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
4	6203	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	6203	AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	6203	PROVISION IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1 158 176.00	\$ 1 158 176.00
TOTALES			\$ 1 106 796 611.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1 158 176.00	\$ 1 107 954 787.00


VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890907569-1	MUNICIPIO 1	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	\$ 1 107 954 787.00	\$ 1 099 919 993.00
890983786-7	MUNICIPIO 2	GIRALDO	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 3		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 4		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 5		\$ -	\$ -
TOTAL ANTIOQUIA			\$ 1 107 954 787.00	\$ 1 099 919 993.00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			\$ -
	MUNICIPIO 2			\$ -
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ -	\$ -


MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-376479 CND
Contratista


JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND
Interventor



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Dirección Operativa

CONTRATO NO. 983 DE 2021

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2"

RESUMEN DE GASTOS | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | 1-ene-22 a 31-ene-22

ACTA NO. 7

NO.	DESCRIPCION	VALORES FACTURADOS			
		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES (1-ene-22 al 31-ene-22)	ACUMUALDO ACTUAL	
1	INSUMOS INCLUIDOS DENTRO DE CIRCULAR NO. 3 INVIAS CONSUMIBLES	850 973.00	924 715.65	1 775 688.65	
2	INSUMOS FUERA DE CIRCULAR NO. 3 INVIAS CONSUMIBLES	-	200 000.00	200 000.00	
3	INSUMOS DE COSTOS FIJOS	-	-	-	
TOTAL BÁSICO		850 973.00	1 124 716.00	1 975 689.00	
ADMINISTRACIÓN (2.5%)		21 274.00	28 118.00	49 392.00	
IVA		161 685.00	5 342.00	167 027.00	
TOTAL		1 033 932.00	1 158 176.00	2 192 108.00	

Observaciones: SE APRUEBA POR INTERVENTORÍA LOS CONSUMOS Y VALORES PRESENTADOS, SE VERIFICA LA JUSTIFICACIÓN Y SOPORTES DE TODOS LOS ITEM RELACIONADO PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1-ene-22 AL 31-ene-22.

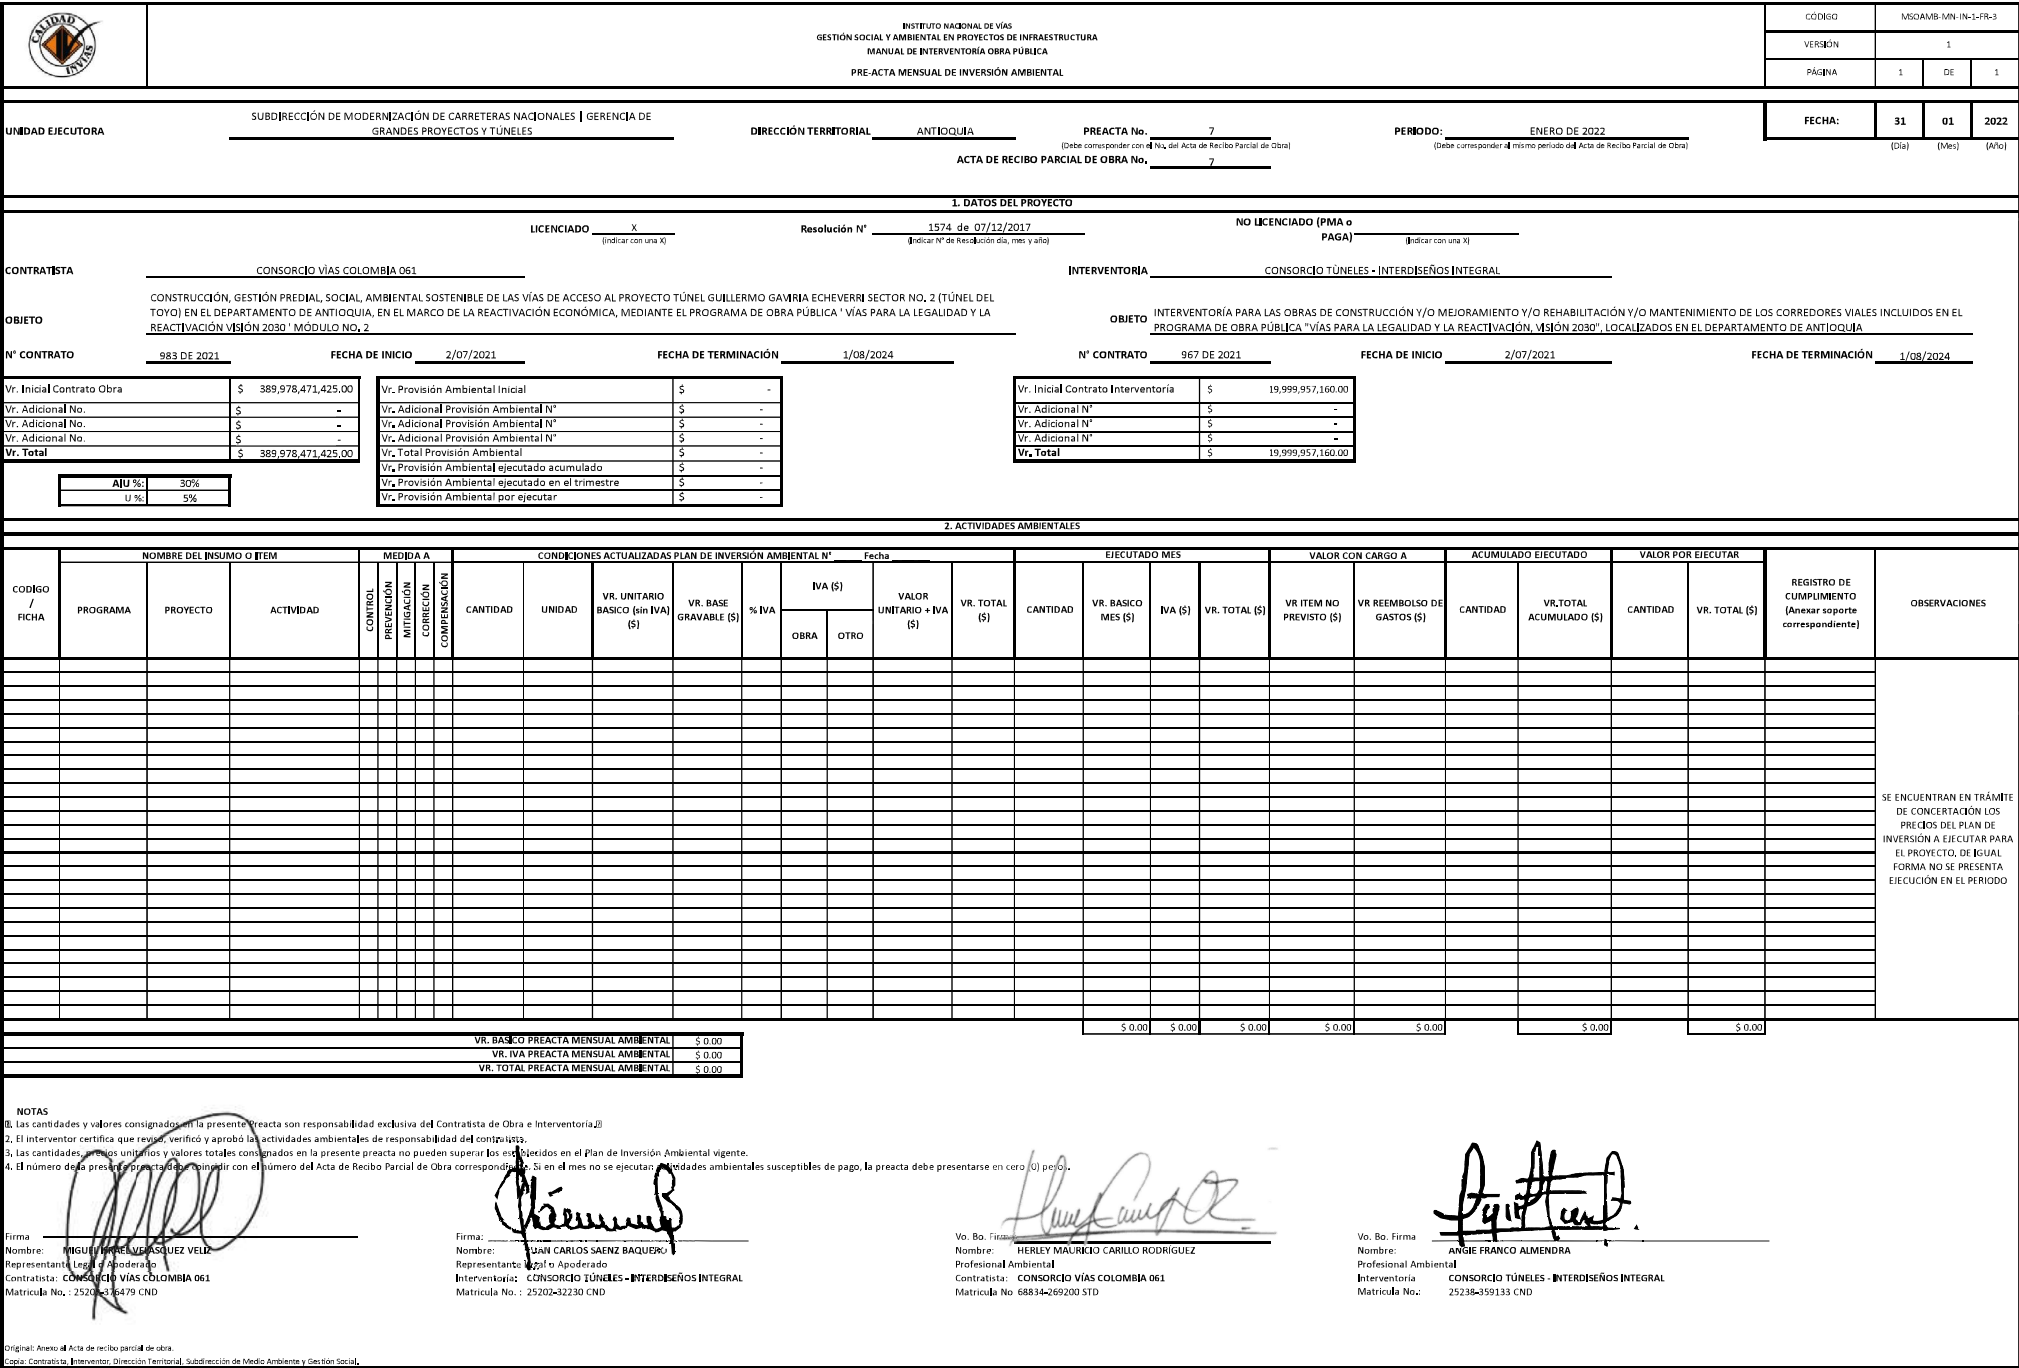
LIQUIDACIÓN PRESENTE MES

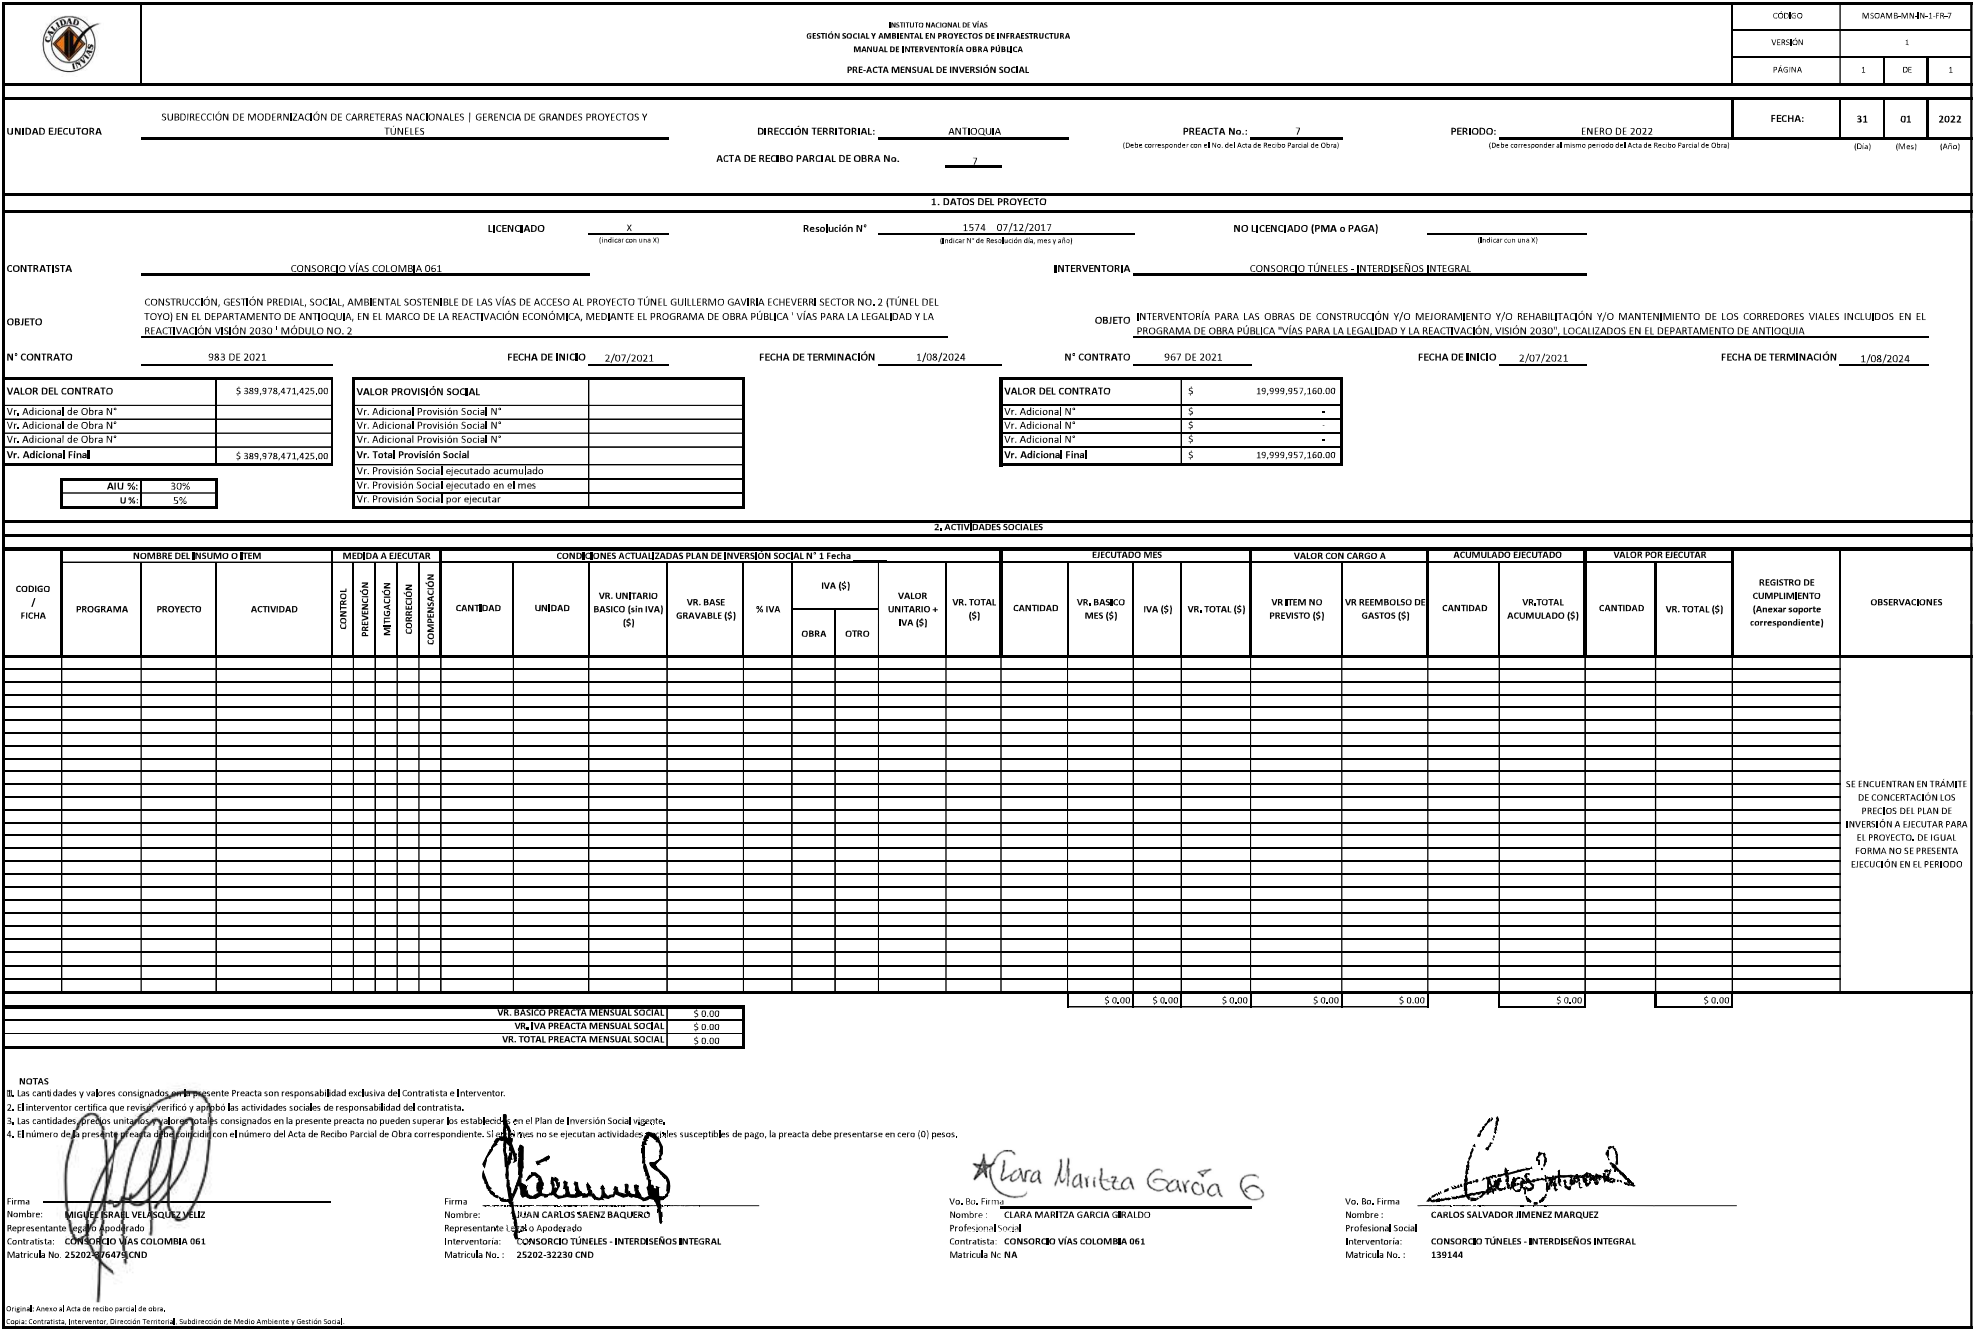
NO.	DESCRIPCION	LIQUIDACIÓN			
		CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE MES (ene-22 Acta No. 7)	ACUMUALDO ACTUAL
1	TOTAL BÁSICO	297 159 507.00	850 973.00	1 124 716.00	1 975 689.00
2	ADMINISTRACIÓN (2.5%)	7 428 986.00	21 274.00	28 118.00	49 392.00
3	IVA	1 411 507.00	161 685.00	5 342.00	167 027.00
TOTAL		306 000 000.00	1 033 932.00	1 158 176.00	2 192 108.00

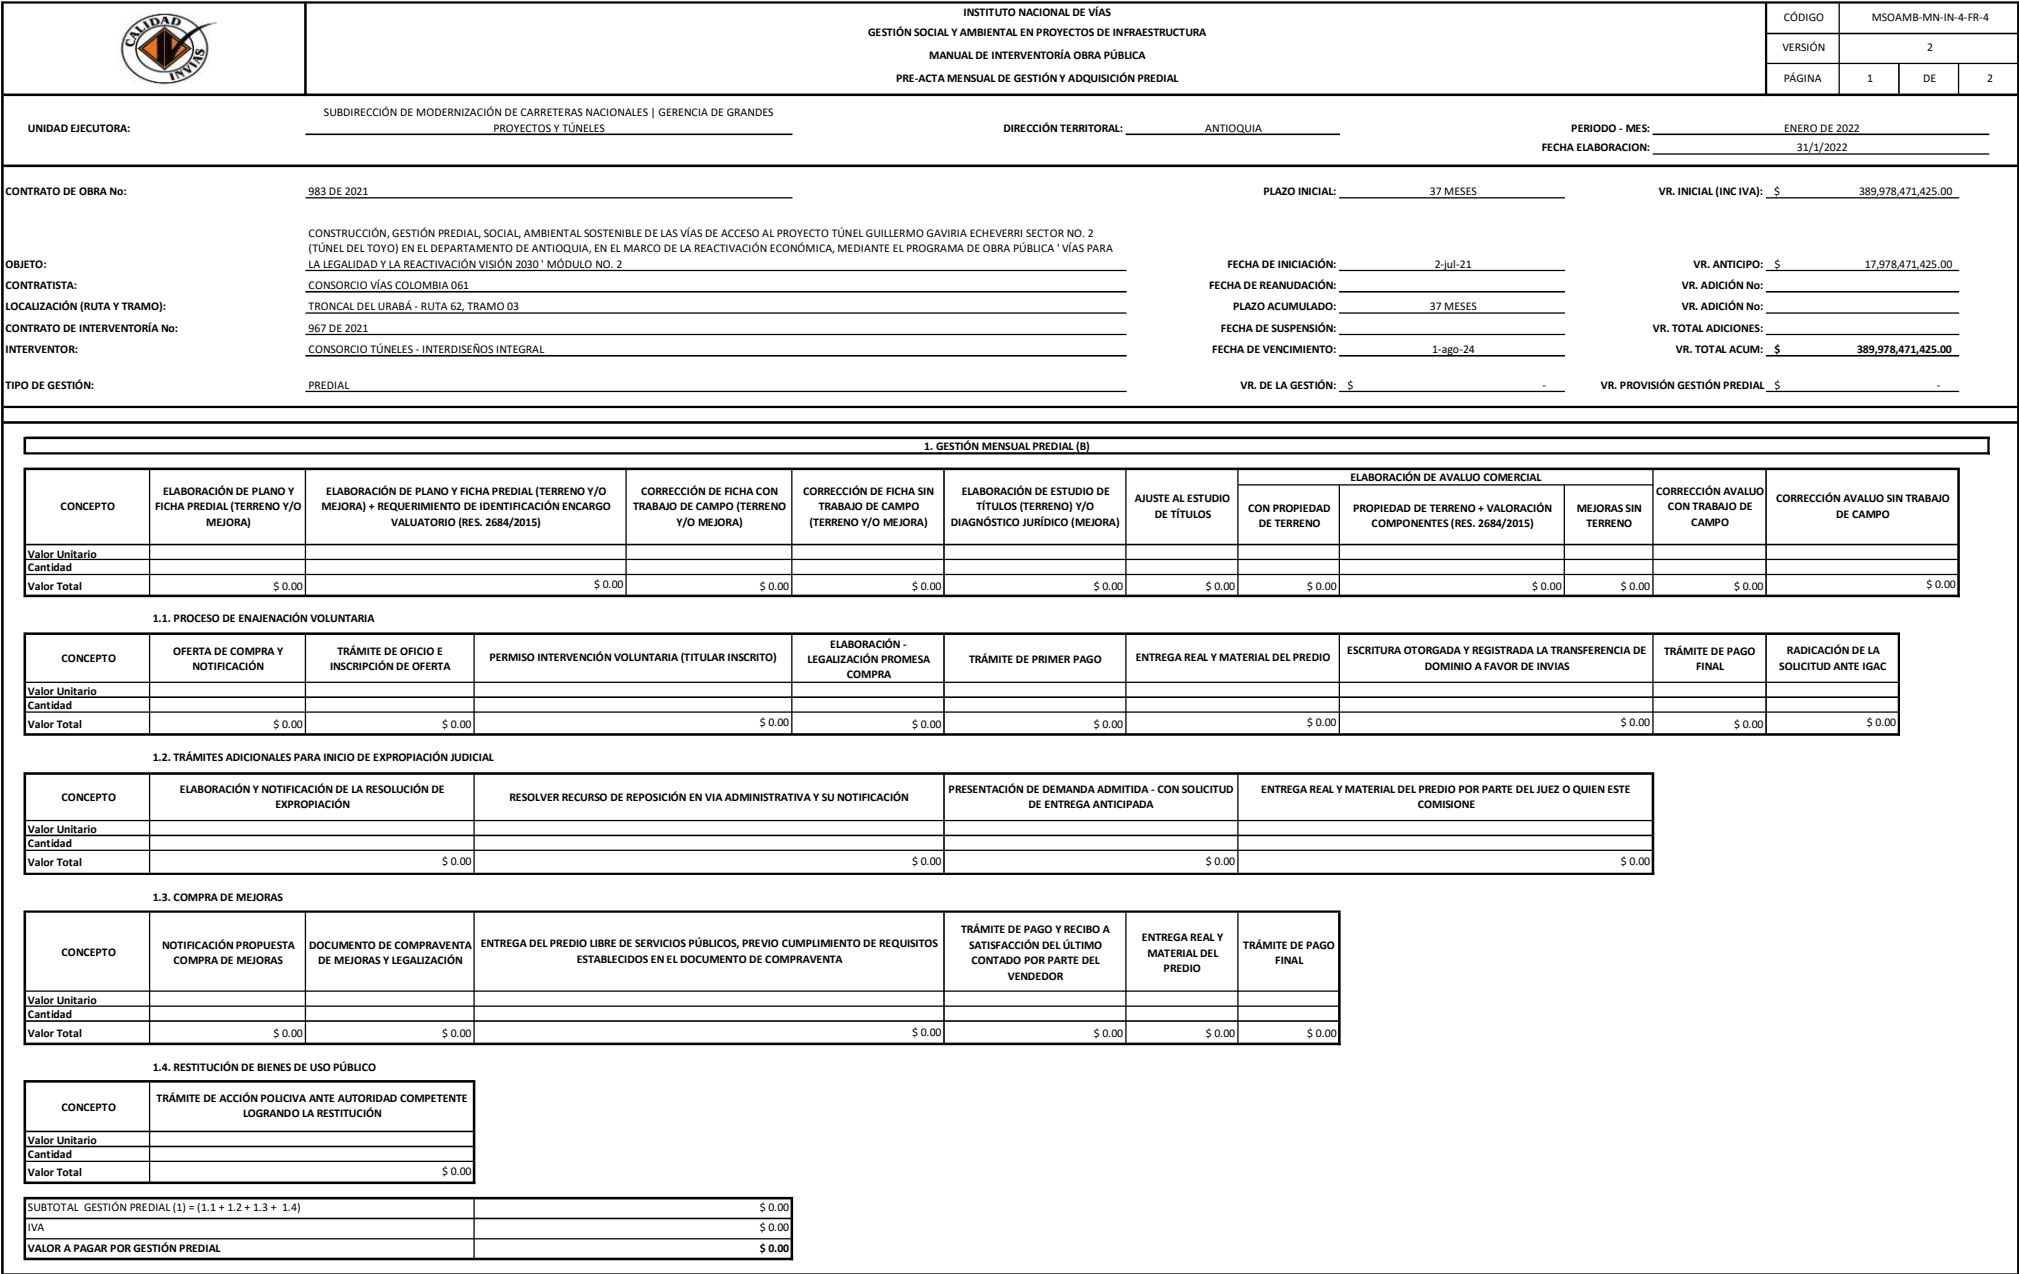
Observaciones: SE LIQUIDA A TRAVÉS DE LA PRESENTE ACTA, LOS COSTOS DERIVADOS DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1-ene-22 al 31-ene-22

Firma
Nombre: ING MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VELIZ
Director de Obra
Contratista

Firma
Nombre: ING JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
Director de Obra
Interventoría









INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS

GESTIÓN SOCIAL Y AMBIENTAL EN PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA

MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA

PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL

CÓDIGO

M5OAMB-MN-IN-4-FR-4

VERSIÓN

2

PÁGINA

1

DE

2

UNIDAD EJECUTORA:

SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

DIRECCIÓN TERRITORIAL:

ANTIOQUIA

PERIODO - MES:

ENERO DE 2022

FECHA ELABORACIÓN:

31/1/2022

CONTRATO DE OBRA No:

983 DE 2021

PLAZO INICIAL:

37 MESES

VR. INICIAL (INC IVA):

\$ 389.978.471.425.00

OBJETO:

CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 MÓDULO NO. 2

FECHA DE INICIACIÓN:

2-jul-21

VR. ANTICIPO:

\$ 17.978.471.425.00

CONTRATISTA:

CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

FECHA DE REANUDACIÓN:

VR. ADICIÓN No:

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO):

TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03

PLAZO ACUMULADO:

37 MESES

VR. ADICIÓN No:

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:

967 DE 2021

FECHA DE SUSPENSIÓN:

VR. TOTAL ADICIONES:

INTERVENTOR:

CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL

FECHA DE VENCIMIENTO:

1-ago-24

VR. TOTAL ACUM:

\$ 389.978.471.425.00

TIPO DE GESTIÓN:

PREDIAL

VR. DE LA GESTIÓN:

\$ -

VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:

\$ -

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

No.	PREDIO No.	ABSCISA INICIAL	ABSCISA FINAL	NOMBRE DEL PROPIETARIO	VALOR PAGADO (SIN IVA)	OBSERVACIONES DEL PAGO
1						
2						
3						
TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS (A)					\$ 0.00	

SUBTOTAL PAGOS PEDIALES (2)	\$ 0.00
OTROS	
IVA	\$ 0.00
VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	\$ 0.00

VR. TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	\$ 0.00
IVA PRESENTE PREACTA	\$ 0.00
VR. TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	\$ 0.00

VR. GESTIÓN PREDIAL	\$ 0.00
---------------------	---------

VR. ACUMULADO ACTIVIDADES PEDIALES	\$ 0.00
GESTION PREDIAL	\$ 0.00
DESEMBOLSOS PEDIALES	\$ 0.00
OTROS	\$ 0.00
IVA	\$ 0.00
VR. TOTAL ACUMULADO	\$ 0.00

SALDO POR EJECUTAR	\$ 0.00
--------------------	---------

NOTAS

Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.

El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.

Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.

El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe presentarse en cero (00) pesos.

Firma

Miguel Israel Velásquez Veliz

Representante Legal o Apoderado Contratista

Matrícula No: 25202-376479 CND

Firma

Juan Carlos Saenz Baquero

Representante Legal o Apoderado Interventor

Matrícula No: 25202-32230 CND

Original: Acta de recibo parcial de obra

Copia: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social.

PERIODO: ENERO DE 2022 CVC061 ACTA DE OBRA NO. 7 CORRESPONDIENTE A OBRA EJECUTADA Contrato: 983 DE 2021			PROFORMA NO. CVC061 - 07
TOTAL ACTA DE OBRA NO. 07	\$ 1 107 954 787.00		
Valor Basico de Obra		\$ 845 205 507.00	\$ 845 205 507.00
Administracion 20.00%		\$ 169 041 102.00	\$ 169 041 102.00
Imprevistos 5.00%		\$ 42 260 275.00	\$ 42 260 275.00
Utilidad 5.00%		\$ 42 260 275.00	\$ 42 260 275.00
IVA de Obra (Sobre Utilidad) 19.00%		\$ 8 029 452.00	
Provisión para Jornadas de Trabajo 24 Horas Diarias 7 Días de la Semana		\$ -	\$ -
Utilidad, Admon y Otros (3%)		\$ -	\$ -
IVA (PST) 19.00%		\$ -	
Valor Estudios y Diseños		\$ -	\$ -
IVA Estudios y Diseños 19.00%		\$ -	
Gestion Social y Ambiental (Item No Previsto)		\$ -	\$ -
Administracion 20.00%		\$ -	\$ -
Imprevistos 5.00%		\$ -	\$ -
Utilidad 5.00%		\$ -	\$ -
IVA (G.S.A) 19.00%		\$ -	
Reembolsables Gestion Social y Ambiental.		\$ -	\$ -
Utilidad, Admon y Otros (4.5%)		\$ -	\$ -
IVA (R.G.S.A) 19.00%		\$ -	
Reembolsables Gestion Predial (Adquisicion)		\$ -	\$ -
Utilidad, Admon y Otros (2.5%)		\$ -	\$ -
IVA (R.G.S.A) 19.00%		\$ -	
Gestion Predial		\$ -	\$ -
IVA (G.P) 19.00%		\$ -	
Reembolsables Provisión implementación protocolo Bioseguridad COVID-19		\$ 1 124 716.00	\$ 1 124 716.00
Utilidad, Admon y Otros (2.5%)		\$ 28 118.00	\$ 28 118.00
IVA (R.P.BC19) (19% de Administración) 19.00%		\$ 5 342.00	
SUBTOTAL BASICO		\$ 1 099 919 993.00	
SUBTOTAL IVA		\$ 8 034 794.00	
AMORTIZACION ANTICIPO		\$ (54 271 837.00)	\$ (54 271 837.00)
NETO A PAGAR		\$ 1 053 682 950.00	
#\$24-02-00;983-2021;csabogal@invias.gov.co#\$			
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061			
ESTA CONFORMADO POR:			
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25% - 900.397.334 - 3)			
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S (75% - 900.354.637 - 5)			
SON:		SUBTOTAL	\$ 1 045 648 156.00
UN MIL CINCUENTA Y TRES MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS Mcte		IVA	\$ 8 034 794.00
		TOTAL	\$ 1 053 682 950.00



CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

EL DIRECTOR DE LA INTERVENTORÍA CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL CERTIFICA:

Que Consorcio Vías Colombia 061- CVC, se encuentra a paz y salvo por concepto de aportes al sistema de seguridad social integral, a la caja de compensación familiar, ICBF y SENA, de los trabajadores a su cargo bajo el contrato de obra No. 983 de 2021 suscrito con el Instituto Nacional de Vías- INVIAS, respecto a los periodos de enero y febrero del año 2022.

Ahora bien, en cuanto al mes de marzo de la anualidad referida, se deja claridad de que las cotizaciones podrá efectuarlas hasta el día 14 de abril de 2022, de acuerdo a los dos últimos dígitos de su NIT, y acorde a lo establecido en el decreto 780 de 2016; por lo cual, estaremos atentos a la verificación de las cotizaciones debidas de éste periodo.

Lo antes expuesto, con el objeto de acreditar nuestro control al correcto cumplimiento de las obligaciones contractuales derivadas del contrato en mención, de la normativa en materia laboral y de seguridad social, y en aportes de parafiscales, que debe acatar el contratista Consorcio Vías Colombia 061- CVC.

La presente se expide a los 07 días del mes de abril de 2022 en Santa Fe Antioquia.

ING. JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
DIRECTOR DE INTERVENTORÍA
CONSORCIO TÚNELES INTERDISEÑOS INTEGRAL

Elaboró: VAV // Aprobó: JCSB

El suscrito JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ, mayor de edad, vecino de la ciudad de Bogotá D.C. identificado con Cedula de ciudadanía N° 1.015.396.432 expedida en Bogotá D.C, actuando en calidad de Representante Legal (\$) del Consorcio Vías Colombia 061, entidad jurídica identificada con Nit. 901.472.786-3 (Integrado por HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S, NIT 900.354.637-5. con un porcentaje de participación del 75% y HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA, con NIT 900.397.334-3 con un porcentaje de participación del 25%).

CERTIFICO:

Que el mencionado Consorcio Vías Colombia 061, se encuentra a paz y salvo por concepto de pago de sus obligaciones con los sistemas de salud, riesgos profesionales, pensión, aportes a las cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje SENA de todo el personal que se encuentra laborando dentro de la misma correspondiente al mes de Marzo de 2022 y que así lo requiere, durante los últimos seis (6) meses.

Lo anterior, para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 50 de la ley 789 de 2002 y la ley 1150 de 2007.

La presente se expide en Bogotá D.C. a los 01 días del mes de Abril de 2022.



JORGE EDUARDO DUARTE RODRIGUEZ
Representante Legal (\$)
Consorcio Vías Colombia 061
