


























	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA			CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-2																																																																																																															
				VERSIÓN 1																																																																																																															
				PÁGINA 1 DE 1																																																																																																															
				FECHA 28/02/2022 (Día / Mes / Año)																																																																																																															
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA		PERIODO MES: FEBRERO DE 2022																																																																																																															
ACTA PARCIAL DE OBRA No. 8 (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. (Indique el número del acta)		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1 592 168 487																																																																																																															
<table><thead><tr><th></th><th colspan="3">Día/Mes/Año</th><th></th><th>FIRMA</th><th>CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:</th></tr></thead><tbody><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td>7</td><td>3</td><td>2022</td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR</td><td></td><td></td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR</td><td>10</td><td>3</td><td>2022</td><td>NOMBRE DE QUIEN APRUEBA</td><td>JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td>10</td><td>3</td><td>2022</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>MAURICIO HOYOS SIERRA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td></td><td></td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td>MAURICIO HOYOS SIERRA</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL</td><td></td><td></td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA</td><td></td><td></td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN RECIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td></td><td></td><td></td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td></td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)</td><td>30</td><td>3</td><td>2022</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO</td><td></td><td>Acta devuelta mediante el oficio SMC-GGPT-16958 recibido por interventoria el 30 de marzo 2022 para ajuste de acuerdo a las condiciones contractuales y los saldos reportados por el SIIF</td></tr><tr><td>FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO</td><td>5</td><td>4</td><td>2022</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>LUZ HELENA ARIZA RUIZ</td><td></td><td></td></tr><tr><td>FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO</td><td>11</td><td>04</td><td>2022</td><td>NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE</td><td>CARLOS FELIPE SABOGAL</td><td></td><td></td></tr></tbody></table>						Día/Mes/Año				FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:	FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	7	3	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE				FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE				FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	10	3	2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10	3	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA			FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA			FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE				FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE				FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE				FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE				FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	30	3	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO		Acta devuelta mediante el oficio SMC-GGPT-16958 recibido por interventoria el 30 de marzo 2022 para ajuste de acuerdo a las condiciones contractuales y los saldos reportados por el SIIF	FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	5	4	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUZ HELENA ARIZA RUIZ			FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11	04	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS FELIPE SABOGAL		
	Día/Mes/Año				FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:																																																																																																													
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	7	3	2022	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO																																																																																																														
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																																															
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																																															
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	10	3	2022	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO																																																																																																														
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	10	3	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA																																																																																																														
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA																																																																																																														
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																																															
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																																															
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE																																																																																																															
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE																																																																																																															
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)	30	3	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO		Acta devuelta mediante el oficio SMC-GGPT-16958 recibido por interventoria el 30 de marzo 2022 para ajuste de acuerdo a las condiciones contractuales y los saldos reportados por el SIIF																																																																																																												
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	5	4	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUZ HELENA ARIZA RUIZ																																																																																																														
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	11	04	2022	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CARLOS FELIPE SABOGAL																																																																																																														
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.																																																																																																																			
ORDEN DE PAGO																																																																																																																			
CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021																																																																																																																			
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2																																																																																																																			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 NIT. 901.472.786-3																																																																																																																			
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061																																																																																																																			
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 1 525 181 790 VALOR EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS M/CTE																																																																																																																			
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE OBRA 8 DEL PERIODO FEBRERO DE 2022 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.																																																																																																																			
<table><tr><td> Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA</td><td> Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA</td><td> Firmado digitalmente por CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO</td><td> Firmado digitalmente por CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO</td></tr><tr><td>Firma: Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Matrícula No. 05202096971 ANT SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td>Firma: Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Matrícula No. 05202-096971 ANT DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td>Firma: Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ Matrícula No.: 63202-092415 QND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)</td><td>Firma: Nombre: CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO Matrícula No.: 63202-101664 QND ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:</td></tr></table>					 Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	 Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	 Firmado digitalmente por CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO	 Firmado digitalmente por CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO	Firma: Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Matrícula No. 05202096971 ANT SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma: Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Matrícula No. 05202-096971 ANT DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma: Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ Matrícula No.: 63202-092415 QND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma: Nombre: CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO Matrícula No.: 63202-101664 QND ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																																																							
 Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	 Firmado digitalmente por MAURICIO HOYOS SIERRA	 Firmado digitalmente por CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO	 Firmado digitalmente por CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO																																																																																																																
Firma: Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Matrícula No. 05202096971 ANT SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma: Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Matrícula No. 05202-096971 ANT DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma: Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ Matrícula No.: 63202-092415 QND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: (Suscribe según su competencia)	Firma: Nombre: CARLOS FELIPE SABOGAL OCAMPO Matrícula No.: 63202-101664 QND ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma:																																																																																																																
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.																																																																																																																			

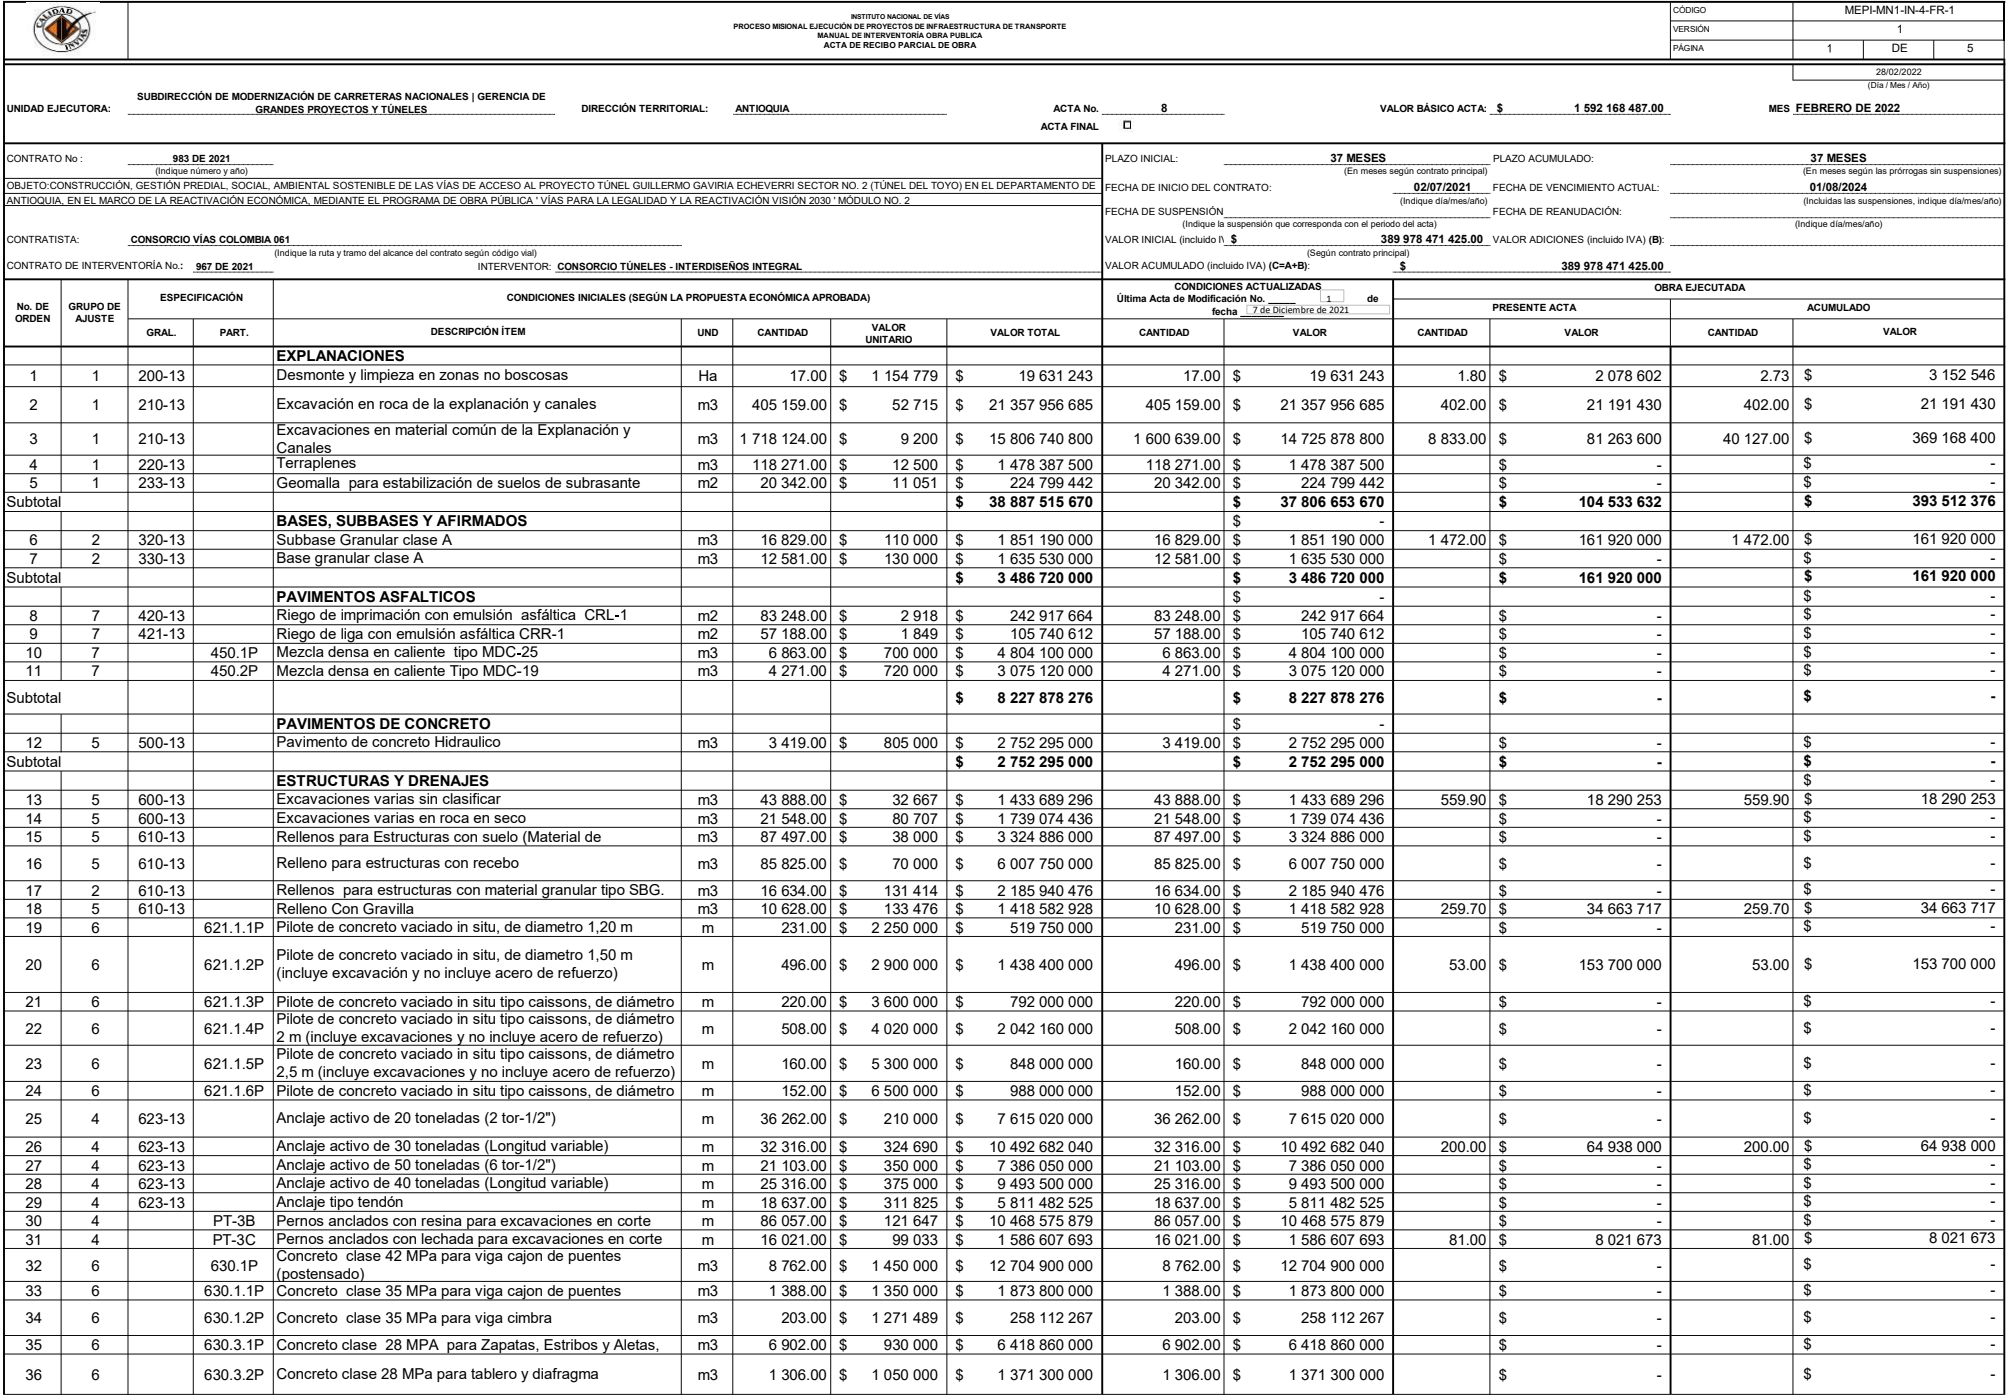


		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1						
												VERSIÓN		1						
												PÁGINA		2 DE 5						
														28/02/2022 (Día / Mes / Año)						
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES				DIRECCIÓN TERRITORIAL:				ANTIOQUIA		ACTA No. 8		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1 592 168 487.00		MES: FEBRERO DE 2022				
										ACTA FINAL ☐										
CONTRATO No.: 983 DE 2021 (Indique número y año)														PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2														FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)														FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021														VALOR INICIAL (Incluido I.V.): \$ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): \$				
INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL														VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00						
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 7 de Diciembre de 2021		OBRA EJECUTADA						
						DESCRIPCIÓN ÍTEM						UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO
		GRAL.	PART.																	
37	6		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	114.00	\$	1 100 000	\$	125 400 000		114.00	\$	125 400 000		\$	-	\$	-	
38	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	10 188.00	\$	780 000	\$	7 946 640 000		10 188.00	\$	7 946 640 000		\$	-	\$	-	
39	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	3 761.00	\$	680 000	\$	2 557 480 000		3 761.00	\$	2 557 480 000		\$	-	\$	-	
40	5		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 Mpa	m3	6 498.00	\$	950 000	\$	6 173 100 000		6 498.00	\$	6 173 100 000	220.10	\$	209 095 000	539.60	\$	512 620 000
41	5	630-13		Concreto clase 14 MPA	m3	1 140.00	\$	543 697	\$	619 814 580		1 140.00	\$	619 814 580		\$	-	\$	-	
42	4		632.1P	Baranda Metalica	m	1 372.00	\$	545 397	\$	748 284 684		1 372.00	\$	748 284 684		\$	-	\$	-	
43	4	640-13		Acero de refuerzo Fy=420 Mpa.	kg	5 529 845.00	\$	5 378	\$	29 739 506 410		5 529 845.00	\$	29 739 506 410	4 967.30	\$	26 714 139	4 967.30	\$	26 714 139
44	4	641-13		Acero de Preesfuerzo	tf-m	1 751 321.00	\$	2 150	\$	3 765 340 150		1 751 321.00	\$	3 765 340 150		\$	-	\$	-	
45	4	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	und	56.00	\$	2 551 672	\$	142 893 632		56.00	\$	142 893 632		\$	-	\$	-	
46	4	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	und	8.00	\$	6 524 758	\$	52 198 064		8.00	\$	52 198 064		\$	-	\$	-	
47	4	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de 3/16"	und	24.00	\$	8 095 360	\$	194 288 640		24.00	\$	194 288 640		\$	-	\$	-	
48	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de	m	37.00	\$	611 137	\$	22 612 069		37.00	\$	22 612 069		\$	-	\$	-	
49	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de	m	349.00	\$	1 300 914	\$	454 018 986		349.00	\$	454 018 986		\$	-	\$	-	
50	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de	m	26.00	\$	1 722 892	\$	44 795 192		26.00	\$	44 795 192		\$	-	\$	-	
51	5	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100 mm	m	3 628.00	\$	42 055	\$	152 575 540		3 628.00	\$	152 575 540		\$	-	\$	-	
52	5	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150	m	2 630.00	\$	69 709	\$	183 334 670		2 630.00	\$	183 334 670	173.10	\$	12 066 628	173.10	\$	12 066 628
53	5	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diametro 150mm	m	599.00	\$	80 970	\$	48 501 030		599.00	\$	48 501 030		\$	-	\$	-	
54	5	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350	m	771.00	\$	202 186	\$	155 885 406		771.00	\$	155 885 406	95.70	\$	19 349 200	95.70	\$	19 349 200
55	5	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	1 435.00	\$	250 758	\$	359 837 730		1 435.00	\$	359 837 730		\$	-	\$	-	
56	5		670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA Lmax=30m	m3	3 568.00	\$	780 000	\$	2 783 040 000		3 568.00	\$	2 783 040 000		\$	-	\$	-	
57	5		671.1P	Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la conformacion de la superficie de apoyo	m3	9 621.00	\$	643 000	\$	6 186 303 000		9 621.00	\$	6 186 303 000		\$	-	\$	-	
58	5		671.4P	Cunetas en sacos de suelo cemento	m	630.00	\$	137 058	\$	86 346 540		630.00	\$	86 346 540		\$	-	\$	-	
59	5		671.5P	Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	1 801.00	\$	194 649	\$	350 562 849		1 801.00	\$	350 562 849		\$	-	\$	-	
60	5		671.7P	Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	4 426.00	\$	1 050 000	\$	4 647 300 000		4 426.00	\$	4 647 300 000		\$	-	\$	-	
61	7	673-13		Geotextil Tipo NT - 1800 o similar no tejido	m2	28 751.00	\$	7 005	\$	201 400 755		28 751.00	\$	201 400 755	791.80	\$	5 546 559	791.80	\$	5 546 559
62	7	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	78 089.00	\$	7 720	\$	602 847 080		78 089.00	\$	602 847 080		\$	-	\$	-	
63	7		673.3P	Geodren planar 0,50 m	m	585.00	\$	28 444	\$	16 639 740		585.00	\$	16 639 740		\$	-	\$	-	
64	5	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10) metros.	m	23 684.00	\$	65 894	\$	1 560 633 496		23 684.00	\$	1 560 633 496		\$	-	\$	-	
65	5	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros.	m	7 965.00	\$	190 308	\$	1 515 803 220		7 965.00	\$	1 515 803 220		\$	-	\$	-	
66	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra	m2	74 901.00	\$	13 581	\$	1 017 230 481		74 901.00	\$	1 017 230 481		\$	-	\$	-	
67	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 110 KN/m para muro de tierra	m2	82 321.00	\$	20 637	\$	1 698 858 477		82 321.00	\$	1 698 858 477		\$	-	\$	-	
68	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra	m2	9 836.00	\$	32 884	\$	323 447 024		9 836.00	\$	323 447 024		\$	-	\$	-	
69	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra estabilizada mecánicamente con geosintéticos	m2	11 346.00	\$	40 763	\$	462 496 998		11 346.00	\$	462 496 998		\$	-	\$	-	
70	7	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra	m2	11 322.00	\$	20 969	\$	237 411 018		11 322.00	\$	237 411 018		\$	-	\$	-	
Subtotal										\$ 173 395 951 001				\$ 173 395 951 001		\$ 552 385 169		\$ 855 910 169		
71	5		PT-1	Perforación exploratoria	m	1 206.00	\$	231 723	\$	279 457 938		1 206.00	\$	279 457 938		\$	-	\$	-	
72	5		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m3	13 426.00	\$	250 000	\$	3 356 500 000		13 426.00	\$	3 356 500 000		\$	-	\$	-	
73	5		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m3	57 279.00	\$	256 280	\$	14 679 462 120		57 279.00	\$	14 679 462 120		\$	-	\$	-	
74	5		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m3	53 444.00	\$	305 000	\$	16 300 420 000		53 444.00	\$	16 300 420 000		\$	-	\$	-	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEPI-MN1-IN-4-FR-1 1 3 DE 5						
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES												DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA		ACTA No. 8		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1 592 168 487.00		MES FEBRERO DE 2022	
CONTRATO No.: 983 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)					
OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)					
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)					
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021												VALOR INICIAL (incluido IVA) \$ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):					
INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00							
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)				CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 7 de Diciembre de 2021		OBRA EJECUTADA									
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO						
75	4		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones subterráneas	m	21 401.00	\$ 98 785	\$ 2 114 097 785	21 401.00	\$ 2 114 097 785		\$ -		\$ -					
76	5		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3	14 649.00	\$ 1 000 000	\$ 14 649 000 000	14 649.00	\$ 14 649 000 000		\$ -		\$ -					
77	5		PT-4	Concreto lanzado clase 28 MPa (portales y	m3	9 768.00	\$ 1 030 000	\$ 10 061 040 000	9 768.00	\$ 10 061 040 000		\$ -		\$ -					
78	5		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	240.00	\$ 173 926	\$ 41 742 240	240.00	\$ 41 742 240		\$ -		\$ -					
79	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o	m2	23 412.00	\$ 24 116	\$ 564 603 792	23 412.00	\$ 564 603 792		\$ -		\$ -					
80	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q5 (6mm-15x15)	m2	29 216.00	\$ 14 391	\$ 420 447 456	29 216.00	\$ 420 447 456	958.30	\$ 13 790 895	1 395.50	\$ 20 082 640					
81	4		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2	211 151.00	\$ 28 502	\$ 6 018 225 802	211 151.00	\$ 6 018 225 802		\$ -		\$ -					
82	4		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg	708 686.00	\$ 10 584	\$ 7 500 732 624	708 686.00	\$ 7 500 732 624		\$ -		\$ -					
83	4		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg	26 789.00	\$ 8 836	\$ 236 707 604	26 789.00	\$ 236 707 604		\$ -		\$ -					
84	4		PT-6	Fibra de Acero	Kg	244 200.00	\$ 12 365	\$ 3 019 533 000	244 200.00	\$ 3 019 533 000		\$ -		\$ -					
85	7		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	40 801.00	\$ 80 000	\$ 3 264 080 000	40 801.00	\$ 3 264 080 000		\$ -		\$ -					
86	5		PT-9	Cámara de inspección Tipo A	u	16.00	\$ 3 514 941	\$ 56 239 056	16.00	\$ 56 239 056		\$ -		\$ -					
87	5		PT10	Tubería para enfijajes: Tubería metálica de 4" de diametro	m	22 379.00	\$ 258 899	\$ 5 793 900 721	22 379.00	\$ 5 793 900 721		\$ -		\$ -					
Subtotal								\$ 88 356 190 138		\$ 88 356 190 138		\$ 13 790 895		\$ 20 082 640					
				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD															
88	7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base	m	34 789.00	\$ 1 791	\$ 62 307 099	34 789.00	\$ 62 307 099		\$ -		\$ -					
89	7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para marca vial con resina termoplástica	m2	163.00	\$ 59 987	\$ 9 777 881	163.00	\$ 9 777 881		\$ -		\$ -					
90	5		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	300.00	\$ 8 375	\$ 2 512 500	300.00	\$ 2 512 500		\$ -		\$ -					
91	4		MSV-2015	Suministro e instalación de señal vertical de tránsito sp, sr y	u	279.00	\$ 396 078	\$ 110 505 762	279.00	\$ 110 505 762		\$ -		\$ -					
92	4		MSV-2015	Suministro e instalación de Señal vertical de tránsito SP,SR	u	143.00	\$ 503 069	\$ 71 938 867	143.00	\$ 71 938 867		\$ -		\$ -					
93	4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con	u	44.00	\$ 324 103	\$ 14 260 532	44.00	\$ 14 260 532		\$ -		\$ -					
94	4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva	u	1.00	\$ 11 489 679	\$ 11 489 679	1.00	\$ 11 489 679		\$ -		\$ -					
95	5	720-13		Poste de referencia	u	9.00	\$ 252 800	\$ 2 275 200	9.00	\$ 2 275 200		\$ -		\$ -					
96	4	730-13		Defensa metálica	m	166.00	\$ 230 532	\$ 38 268 312	166.00	\$ 38 268 312		\$ -		\$ -					
97	5	731-13		Defensa de concreto	m	2 794.00	\$ 802 567	\$ 2 242 372 198	2 794.00	\$ 2 242 372 198		\$ -		\$ -					
98	4	730-13		Sección final	u	6.00	\$ 121 353	\$ 728 118	6.00	\$ 728 118		\$ -		\$ -					
99	4	730-13		Sección de tope	u	6.00	\$ 95 809	\$ 574 854	6.00	\$ 574 854		\$ -		\$ -					
100	5	740-13		Captafaros	u	1 149.00	\$ 22 031	\$ 25 313 619	1 149.00	\$ 25 313 619		\$ -		\$ -					
Subtotal								\$ 2 592 324 621		\$ 2 592 324 621		\$ -		\$ -					
				OBRAS VARIAS															
101	5	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	2710	\$ 18 835	\$ 51 042 850	2 710.00	\$ 51 042 850		\$ -		\$ -					
102	5	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	524	\$ 22 684	\$ 11 886 416	524.00	\$ 11 886 416		\$ -		\$ -					
Subtotal								\$ 62 929 266		\$ 62 929 266		\$ -		\$ -					
				TRANSPORTES															
103	3	900-13		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias	m3-km	19865740	\$ 1 000	\$ 19 865 740 000	18 377 854.00	\$ 18 377 854 000	46 159.00	\$ 46 159 000	91 392.00	\$ 91 392 000					
Subtotal								\$ 19 865 740 000		\$ 18 377 854 000		\$ 46 159 000		\$ 91 392 000					
				ÍTEM NO PREVISTOS															
105	1	211-13		remoción de derrumbes (no incluye transporte)	M3		\$ 9 121	\$ -	45 182.00	\$ 412 105 022	21 938.00	\$ 200 096 498	40 978.00	\$ 373 760 338					
106	1		310.1P	conformación de calzada existente	M2		\$ 1 317	\$ -	48 441.00	\$ 63 796 797	21 960.00	\$ 28 921 320	41 148.00	\$ 54 191 916					
107	2		320.1P	mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)	M3		\$ 88 378	\$ -	10 163.00	\$ 898 185 614	2 093.00	\$ 184 975 154	6 101.00	\$ 539 194 178					
108	2		230.1P	mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)	M3		\$ 13 724	\$ -	432.00	\$ 5 928 768		\$ -		\$ -					
109	5		NP-05P	limpieza de estructuras de drenaje	UND		\$ 646 464	\$ -	10.00	\$ 6 464 640		\$ -		\$ -					

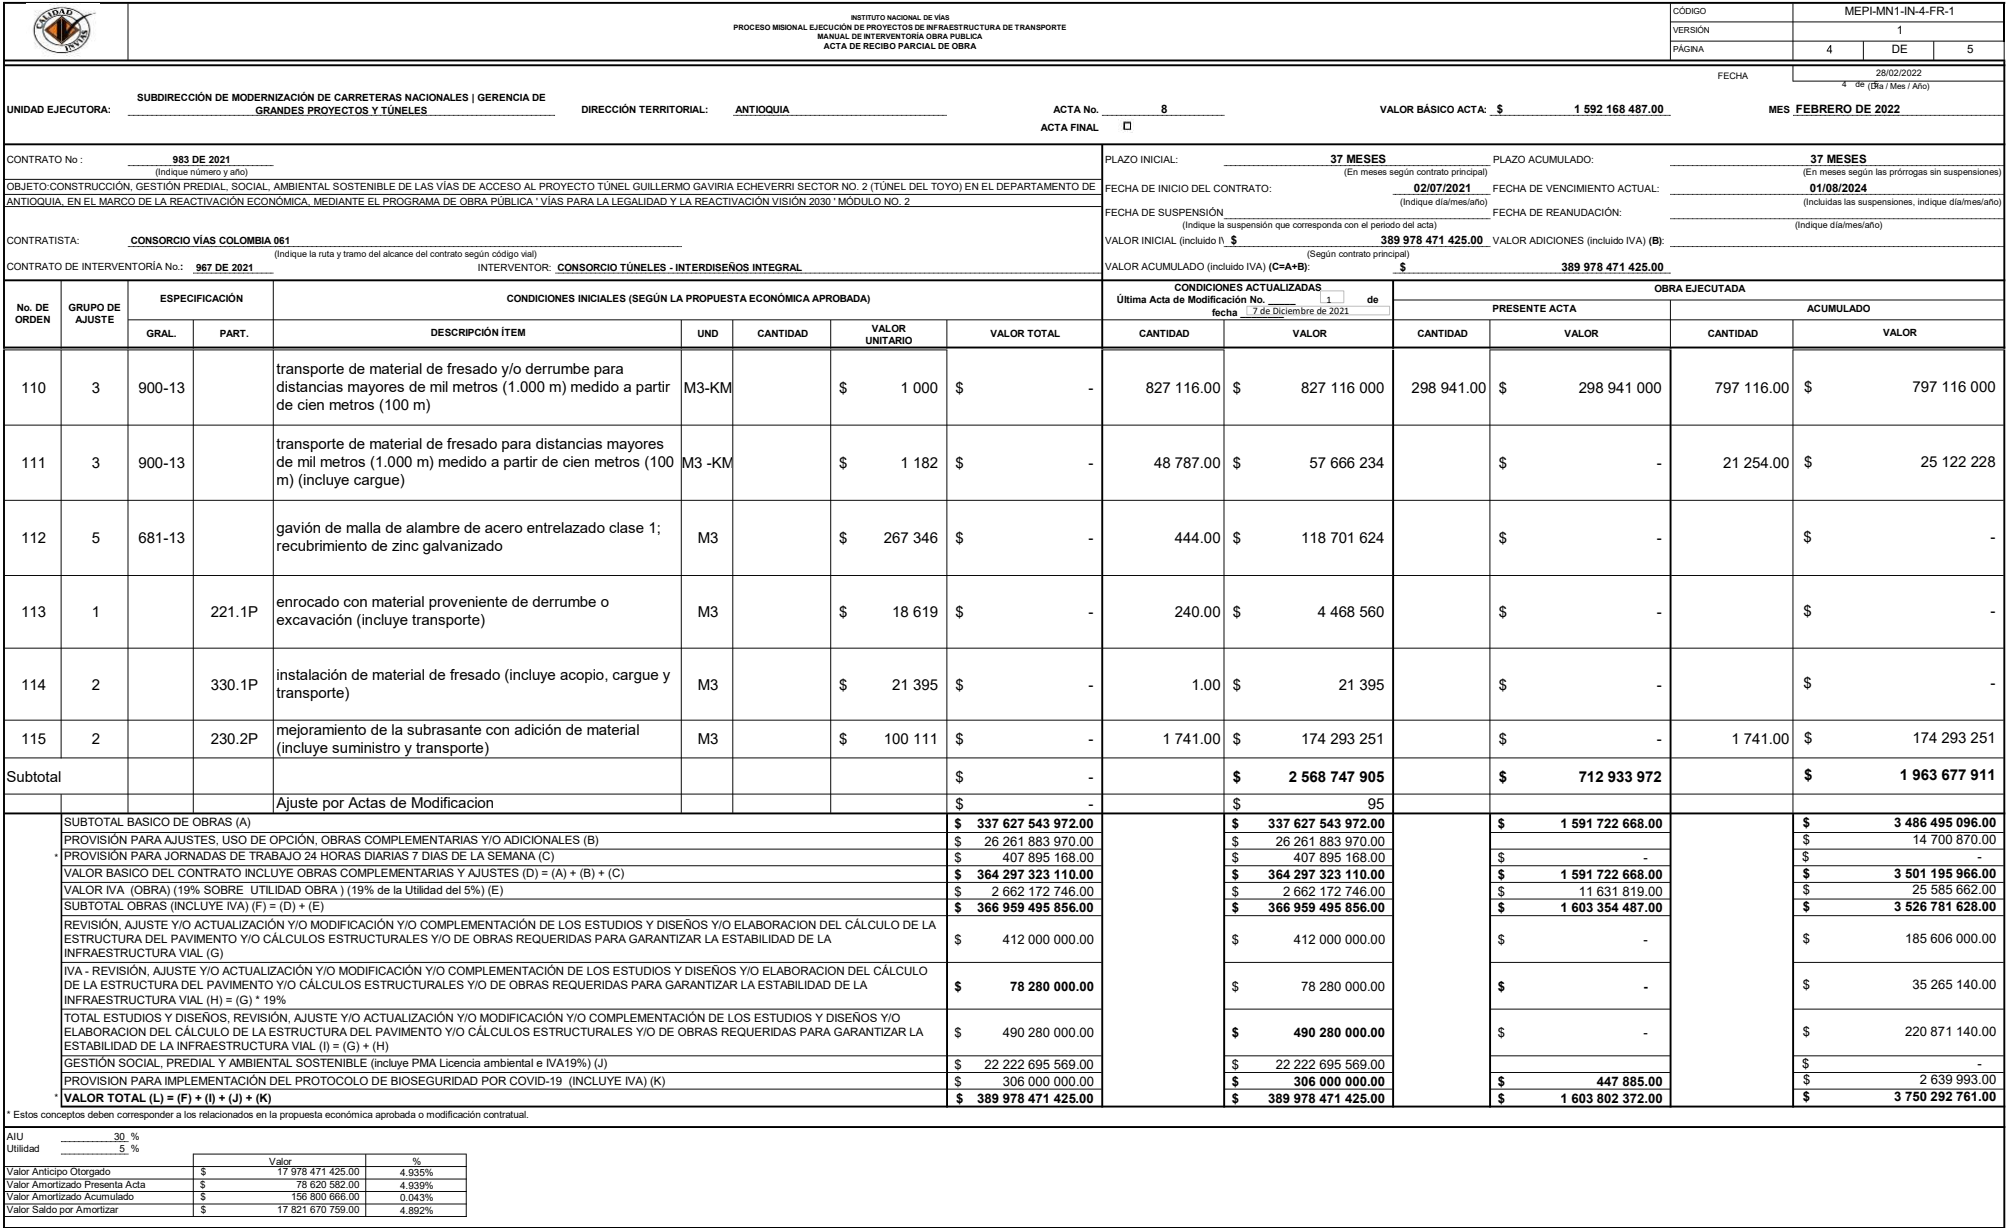

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1							
												VERSIÓN 1							
												PÁGINA 5 DE 5							
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA		ACTA No. 8		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 1 592 168 487.00		FECHA 28/02/2022 5 de (Ene / Mes / Año) MES FEBRERO DE 2022											
CONTRATO No.: 983 DE 2021 (Indique número y año)		PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)										PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)							
OBJETO CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2		FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)							
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vital)		FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)										FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)							
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021		INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL										VALOR INICIAL (incluido IVA): \$ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal)							
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00																	
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS		OBRA EJECUTADA					
						DESCRIPCIÓN ÍTEM						UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 7 de Diciembre de 2021	PRESENTE ACTA		ACUMULADO
		GRAL.	PART.																
RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO																			
* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.																			
		VALOR BÁSICO PRESENTE MES		IVA		TOTAL PRESENTE MES													
OBRA		\$ 1 591 722 668.00		\$ 11 631 819.00		\$ 1 603 354 487													
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES		\$ -		\$ -		\$ -													
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)		\$ -		\$ -		\$ -													
ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLANTILLA)		\$ -		\$ -		\$ -													
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)		\$ -		\$ -		\$ -													
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)		\$ -		\$ -		\$ -													
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)		\$ -		\$ -		\$ -													
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL		\$ 445 819.00		\$ 2 066.00		\$ 447 885													
VALOR TOTAL PRESENTE MES		\$ 1 592 168 487.00		\$ 11 633 885.00		\$ 1 603 802 372													
RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)																			
		G.P.P.		VALOR PRESENTE ACTA		VR. ACUMULADO													
E		\$ 333 551 450		\$ 821 464 630															
SB		\$ 346 895 154		\$ 875 407 429															
B		\$ -		\$ -															
P		\$ -		\$ -															
OA		\$ 54 012 917		\$ 54 012 917															
SCT		\$ -		\$ -															
OV		\$ 512 163 147		\$ 821 979 892															
T		\$ 345 100 000		\$ 913 630 228															
TOTAL		\$ 1 591 722 668		\$ 3 486 495 096															
RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)																			
		GRUPOS		VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO													
1 Obras de Explanación		\$ 333 551 450		\$ 821 464 630															
2 Sub-bases y bases		\$ 346 895 154		\$ 875 407 429															
3 Transporte de materiales		\$ 345 100 000		\$ 913 630 228															
4 Aceros y elementos metálicos		\$ 113 464 707		\$ 119 756 452															
5 Concretos, morteros y obras varias		\$ 293 464 798		\$ 596 989 798															
6 Concreto para estructuras de puentes		\$ 153 700 000		\$ 153 700 000															
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles		\$ 5 546 559		\$ 5 546 559															
(N) Ítems no sujetos a ajuste		\$ 445 819		\$ 202 777 770															
TOTAL		\$ 1 592 168 487		\$ 3 689 272 866															
VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1 592 168 487																			
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: \$ 1 513 547 905																			
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 1 525 181 790																			
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)																			
VALOR EN LETRAS: UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS MCTE																			
El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.																			
OBSERVACIONES																			
NOTAS:																			
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de																			
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.																			
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.																			
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con lo que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).																			
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.																			
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.																			
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumple la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.																			
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cada una de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidos con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.																			
Para constancia de lo anterior firman																			
Firma: 																			
Nombre: MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VELIZ REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Contratista Matrícula Profesional No. 25202-376473 CND																			
Firma: 																			
Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO Interventor Matrícula Profesional No. 25202-32230 CND																			
Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.																			



UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES Y GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES		DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTOQUIA	
CONTRATO No.: 383 DE 2021		ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 8 DE FEBRERO DE 2022 VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: \$ 1.192.168.487,00	
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA E CHEVERRI SECTOR NO. 2 [TÚNEL DEL TOYO] EN EL DEPARTAMENTO DE ANTOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2		REQUIMIENTO No.: 8 (Indicar mes y año) (La numeración debe ser consecutiva y correspondiente al número del Acta de recibo parcial de obra)	
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061		PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según cronograma principal)	
LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03 (Indicar la ruta y tramo del contrato según código vce)		FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO: 2/07/2021 (Indique día/mes/año)	
CONTRATO DE INTERVENCIÓN No.: 367 DE 2021		FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el período del acta)	
INTERVENIOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISERIOS INTEGRAL		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)	
		VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): \$ 389.978.471.425,00 (Según contrato principal)	
		VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389.978.471.425,00	
		PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según los períodos del cronograma)	
		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 1/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)	
		FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)	
		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): \$ -	

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (incluirla provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

[illegible]

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

NOT A:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato

OBSERVACIONES:


 Firmado: _____
 No. de: **MIGUEL ERRAL VELAZQUEZ VELEZ**
 Representante legal de la sociedad de la cual es el Comandante del
 Matrícula No. _____
 CONCORDIA VÍAS COLOMBIALES

Aprobado Firmas: 
 Nombre: **JUAN CARLOS SÁENZ BAQUERO**
 Representante legal o apoderado del interventor
 Matrícula No.: **25202-32230 CND**
 CONSORCIO TÚNELES - INTERDESARROLLO INTEGRAL

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contabilista, Interventor y Dirección Territorial.



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 983 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA ☒	<u>08</u>	<u>FEBRERO DE 2022</u>
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA ☐	<u> </u>	<u> </u>
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☐	<u> </u>	<u> </u>
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	<u> </u>	<u> </u>
		OTRO ☐	<u> </u>	<u> </u>
		CUAL? <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

NO. COMPROMISO:	<u>181622</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-0-2401015-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO:	\$ <u>7 627 696.00</u>
NO. COMPROMISO:	<u>181622</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-0-2401017-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO:	\$ <u>179 874 594.00</u>
NO. COMPROMISO:	<u>181622</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-0-2401009-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO:	\$ <u>1 337 679 500.00</u>
NO. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO NO.:	<u> </u>	RECURSO NO.:	<u> </u>	VALOR AFECTADO:	<u> </u>
NO. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO NO.:	<u> </u>	RECURSO NO.:	<u> </u>	VALOR AFECTADO:	<u> </u>
NO. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO NO.:	<u> </u>	RECURSO NO.:	<u> </u>	VALOR AFECTADO:	<u> </u>
						TOTAL ACTA:	\$ <u>1 525 181 790.00</u>

Firmado
digitalmente por
MAURICIO HOYOS
SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No. 05202096971 ANT



INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL

CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°: 983 DE 2021 Contratista: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061

Objeto del Contrato : **CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2**

Acta No.: 08 Valor basico : \$ 1 592 168 487.00 Período : FEBRERO DE 2022
Valor Incluido Iva : \$ 1 603 802 372.00

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:


Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (carretera - puente -túnel)	Valor incluido IVA (construcción, rehabilitación, mejoramiento)	Valor incluido IVA Provision para Servicios del Túnel	Valor incluido IVA Estudios y Diseños	Valor incluido IVA (gestion social, predial y ambiental)	Valor incluido IVA Provision implementación protocolo de bioseguridad	Subtotal
1	6203	CARRETERA	\$ 1 406 238 806.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1 406 238 806.00
2	6203	PUENTE	\$ 189 094 008.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 189 094 008.00
3	6203	TUNEL	\$ 8 021 673.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8 021 673.00
4	6203	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	6203	AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	6203	PROVISION IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 447 885.00	\$ 447 885.00
TOTALES			\$ 1 603 354 487.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 447 885.00	\$ 1 603 802 372.00


VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890907569-1	MUNICIPIO 1	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	\$ 1 603 802 372.00	\$ 1 592 168 487.00
890983786-7	MUNICIPIO 2	GIRALDO	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 3		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 4		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 5		\$ -	\$ -
TOTAL ANTIOQUIA			\$ 1 603 802 372.00	\$ 1 592 168 487.00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			\$ -
	MUNICIPIO 2			\$ -
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ -	\$ -


MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VELIZ
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-376479 CND
Contratista


JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Matricula No.: 25202-32230 CND
Interventoria

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO												CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-3-FR-6			
													VERSIÓN	1			
													PÁGINA				
TIPO DE DOCUMENTO	PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)				8		FECHA				28 FEBRERO 2022 (Día / Mes / Año)				
1. DATOS DEL PROYECTO																	
UNIDAD EJECUTORA	Gerencia Grandes Proyectos y Túneles				OBJETO DEL CONTRATO				CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL POYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA RACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MODULO No. 2.				No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		983 de 2022		
DIRECCIÓN TERRITORIAL	Dirección Territorial Antioquia												No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		967 de 2021		
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																	
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		1 FEBRERO 2022		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL(\$)	E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)	
																	SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE CONCERTACIÓN LOS PRECIOS DEL PLAN DE INVERSIÓN A EJECUTAR PARA EL PROYECTO. DE IGUAL FORMA NO SE PRESENTA EJECUCIÓN EN EL PERIODO
3. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIO-PREDIAL EN EL CONTRATO DE OBRA																	
NOMBRE DEL INSUMO O ÍTEM		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. FECHA		1 ENERO 2020		INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL			OBSERVACIONES
PROYECTO	ACTIVIDAD	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIO-PREDIAL(\$)	E E M	T E M	VALOR GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. MES	VALOR BÁSICO EJECU. MES (\$)	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$)	VALOR MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL (incluye OTROS*) (\$)	CANTIDAD EJECU. ACUMU. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **	VALOR POR EJECUTAR (\$)	
																	NO APLICA
4. RESUMEN																	
A	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO POR REEMBOLSO DE GASTOS				\$	-	G	VALOR PRE-ACTA TRAMITADO COMO ÍTEM NO PREVISTO				\$	-				
B	VALOR BÁSICO PRE-ACTA				\$	-	H	OTROS COSTOS RELACIONADOS CON REEMBOLSO DE GASTOS EN LA PRE-ACTA				\$	-				
C	VALOR IVA MENSUAL				\$	-	I	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL				\$	-				
D	VALOR TOTAL PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL				\$	-	J	VALOR TOTAL MES GESTIÓN SOCIO-PREDIAL				\$	-				
E	RECURSO REMANENTE (VALOR POR EJECUTAR)				\$	-	K	VALOR TOTAL EJECUTADO ACUMULADO				\$	-				
F	VALOR PROVISIÓN SOCIAL INCLUIDO IVA				\$	-	L	EJECUCIÓN DEL RECURSO SOCIAL ASIGNADO (%)				\$	#DIV/0!				
5. OBSERVACIONES, CONCLUSIONES Y/O RECOMENDACIONES																	
SE ENCUENTRAN EN TRÁMITE DE CONCERTACIÓN LOS PRECIOS DEL PLAN DE INVERSIÓN A EJECUTAR PARA EL PROYECTO. DE IGUAL FORMA NO SE PRESENTA EJECUCIÓN EN EL PERIODO																	
6. FIRMAS																	
Firma Nombre: MIGUEL ISRAEL VELÁSQUEZ VELIZ Representante Legal Contratista Matrícula Profesional No.: 25202-376479 CND ☐ Apoderado ☒ Firma Nombre: CLARA MARTIZA GARCÍA GIRALDO Profesional Social Contratista Matrícula Profesional No.: NO APLICA Firma Nombre: JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO Representante Legal Interventoria Matrícula Profesional No.: 25202-32230 CND ☐ Apoderado ☒ Firma Nombre: CARLOS SALVADOR JIMENEZ MARQUEZ Profesional Social Interventoria Matrícula Profesional No.: 139144																	
NOTAS: 1. Las actividades, cantidades y precios consignados en el presente formato, son responsabilidad del Contratista y del Interventor de acuerdo a sus competencias respectivas, sin superar los valores establecidos en el Plan de Inversión Social vigente. 2. Solo serán reconocidas las pre actas mensuales, una vez el Plan de Inversión Social en su versión 2 o subsiguientes cuente con concepto de no objeción por parte de la Subdirección Sostenibilidad. 3. * En OTROS deben incluirse gravámenes reconocidos contractualmente, como el IVA para actividades sociales tramitadas por ítem no Previsto. 4. ** Todo lo enunciado debe contener información mensual actualizada y relacionada con las pre-actas tramitadas anteriormente. 5. En los numerales 2,3 y 5 es posible modificar el formato incluyendo filas para ampliar el campo de diligenciamiento de la información solicitada. En todo caso se debe conservar la estética y distribución del formato.																	
Original: Archivo de Gestión del INVIA. Copias: Contratista, Interventor, Subdirección Sostenibilidad.																	

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

FECHA		28/02/2022 (Día / Mes / Año)
-------	--	---------------------------------

I. INFORMACION GENERAL													
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES												2. DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA	
1. UNIDAD EJECUTORA:												2. FECHA DE ELABORACIÓN	
3. AÑO : 2022		MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12										28/02/2022	
5. LOCALIZACIÓN:		RUTA: TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03										TRAMO: SECTOR 2	
6. CONTRATO DE OBRA No:		983 DE 2021											
7. OBJETO:		CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2											
8. CONTRATISTA:		CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061										NIT 901.472.786-3	
9. INTERVENTOR:		CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL										NIT	
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:													
11. PLAZO INICIAL:		37 MESES		12. FECHA DE INICIO:		2/07/2021		13. FECHA DE REANUDACIÓN:		N/A			
14. PLAZO ACUMULADO:		37 MESES		15. FECHA DE SUSPENSIÓN:		N/A		16. FECHA DE VENCIMIENTO:		1/08/2024			
17. TIPO DE GESTIÓN:		PREDIAL		18. VR. DE LA GESTIÓN:		0		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:		0			

II. INFORMACION FINANCIERA			
20. VR. INICIAL (INCLUIDO)	\$	-	
21. VR. ANTICIPO:	\$	-	
22. VR. ADICIÓN No:	\$	-	
23. VR. ADICIÓN No:	\$	-	
24. VR. TOTAL ADICIONES:	\$	-	
25. VR. TOTAL	\$	-	

III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN			
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		CANTIDAD	VR UNIDAD.
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	1 394 000
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	2 788 000
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	1 045 000
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	348 500
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	1 074 000
	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL	0	805 500
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	268 500
	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	754 000
	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURÍDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	377 000
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	377 000
	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	320 000
ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	217 000
	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	1 340 000
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	2 680 000
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	860 000
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	640 000
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	640 000
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	640 000
	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	346 500
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	231 000
	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	346 500
1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA	0	231 000
	48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR	0	115 500
	49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS	0	115 500
	50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	231 000
	51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL	0	231 000
	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	321 000
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	321 000
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	107 000
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	749 000
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	642 000
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	150 000
	58. DOCUMENTO DE COMRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	300 000
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMRAVENTA	0	150 000
	60. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	150 000
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	640 000
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)		0	0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61			0
IVA			19%
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		0	0



MINISTERIO DE TRANSPORTE
INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
Dirección Operativa

CONTRATO NO. 983 DE 2021

OBJETO: "CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2"

RESUMEN DE GASTOS | PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD | 1-Feb-22 al 28-Feb-22

ACTA No. 8

NO.	DESCRIPCION	VALORES EJECUTADOS			OBSERVACIONES
		ACUMULADO ANTERIOR	PRESENTE MES (Feb- 2022)	ACUMUALDO ACTUAL	
1	INSUMOS INCLUIDOS DENTRO DE CIRCULAR NO. 3 INVIA CONSUMIBLES	1 775 688.65	234 945.04	2 010 633.69	
2	INSUMOS FUERA DE CIRCULAR NO. 3 INVIA CONSUMIBLES.	200 000.00	200 000.00	400 000.00	
3			-		
TOTAL BÁSICO		1 975 689.00	434 945.00	2 410 634.00	
ADMINISTRACIÓN (2.5%)		49 392.00	10 874.00	60 266.00	
IVA		167 027.00	2 066.00	169 093.00	
TOTAL		2 192 108.00	447 885.00	2 639 993.00	

Observaciones: SE APRUEBA POR INTERVENTORÍA LOS CONSUMOS Y VALORES PRESENTADOS, SE VERIFICA LA JUSTIFICACIÓN Y SOPORTES DE TODOS LOS ITEM RELACIONADOS PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1-Feb-22 al 28-feb-22

LIQUIDACIÓN PRESENTE MES

NO.	DESCRIPCION	LIQUIDACIÓN			
		CONTRACTUAL	ACUMULADO ANTERIOR	VALOR PRESENTE MES (Feb - 2022 Acta No. 8)	ACUMUALDO ACTUAL
1	TOTAL BÁSICO	297 159 507.00	1 975 689.00	434 945.00	2 410 634.00
2	ADMINISTRACIÓN (2.5%)	7 428 986.00	49 392.00	10 874.00	60 266.00
3	IVA	1 411 507.00	167 027.00	2 066.00	169 093.00
TOTAL		306 000 000.00	2 192 108.00	447 885.00	2 639 993.00

Observaciones: SE LIQUIDA A TRAVÉS DE LA PRESENTE ACTA, LOS COSTOS DERIVADOS DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 1/02/2022 al 28/02/2022

Firma

Nombre: ING MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ

Representante Legal o su Apoderado

Contratista

Matrícula No.: 25202-376479 CND

Firma

Nombre: ING JUAN CARLOS SAENZ VAQUERO

Representante Legal o su Apoderado

Interventoría

Matrícula No.: 25202-32230 CND

PERIODO: FEBRERO DE 2022 CVC061 ACTA DE OBRA NO. 8 CORRESPONDIENTE A OBRA EJECUTADA Contrato: 983 DE 2021			PROFORMA NO. CVC061 - 08
TOTAL ACTA DE OBRA NO. 08	\$ 1 603 802 372.00		
Valor Basico de Obra		\$ 1 224 402 052.00	\$ 1 224 402 052.00
Administracion 20.00%		\$ 244 880 410.00	\$ 244 880 410.00
Imprevistos 5.00%		\$ 61 220 103.00	\$ 61 220 103.00
Utilidad 5.00%		\$ 61 220 103.00	\$ 61 220 103.00
IVA de Obra (Sobre Utilidad) 19.00%		\$ 11 631 819.00	
Provisión para Jornadas de Trabajo 24 Horas Diarias 7 Días de la Semana		\$ -	\$ -
Utilidad, Admon y Otros (3%)		\$ -	\$ -
IVA (PST) 19.00%		\$ -	
Valor Estudios y Diseños		\$ -	\$ -
IVA Estudios y Diseños 19.00%		\$ -	
Gestion Social y Ambiental (Item No Previsto)		\$ -	\$ -
Administracion 20.00%		\$ -	\$ -
Imprevistos 5.00%		\$ -	\$ -
Utilidad 5.00%		\$ -	\$ -
IVA (G.S.A) 19.00%		\$ -	
Reembolsables Gestion Social y Ambiental.		\$ -	\$ -
Utilidad, Admon y Otros (4.5%)		\$ -	\$ -
IVA (R.G.S.A) 19.00%		\$ -	
Reembolsables Gestion Predial (Adquisicion)		\$ -	\$ -
Utilidad, Admon y Otros (2.5%)		\$ -	\$ -
IVA (R.G.S.A) 19.00%		\$ -	
Gestion Predial		\$ -	\$ -
IVA (G.P) 19.00%		\$ -	
Reembolsables Provisión implementación protocolo Bioseguridad COVID-19		\$ 434 945.00	\$ 434 945.00
Utilidad, Admon y Otros (2.5%)		\$ 10 874.00	\$ 10 874.00
IVA (R.P.BC19) (19% de Administración) 19.00%		\$ 2 066.00	
SUBTOTAL BASICO		\$ 1 592 168 487.00	
SUBTOTAL IVA		\$ 11 633 885.00	
AMORTIZACION ANTICIPO		\$ (78 620 582.00)	\$ (78 620 582.00)
NETO A PAGAR		\$ 1 525 181 790.00	
#\$24-02-00;983-2021;csabogal@invias.gov.co#\$			
CONSORCIO VIAS COLOMBIA 061			
ESTA CONFORMADO POR:			
HIDALGO E HIDALGO S.A. SUCURSAL COLOMBIA (25% - 900.397.334 - 3)			
HIDALGO E HIDALGO COLOMBIA S.A.S (75% - 900.354.637 - 5)			
SON:		SUBTOTAL	\$ 1 513 547 905.00
UN MIL QUINIENTOS VEINTICINCO MILLONES CIENTO OCHENTA Y UN MIL SETECIENTOS NOVENTA PESOS Mcte		IVA	\$ 11 633 885.00
		TOTAL	\$ 1 525 181 790.00
