

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA				CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2		
					VERSIÓN	1		
					PÁGINA	1	DE	1
					FECHA	26/1/2023 (Día / Mes / Año)		
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES					DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA		PERIODO MES: enero-2023	
UNIDAD EJECUTORA: ACTA PARCIAL DE OBRA No. 19 (Indique el número del acta)					ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. _____ (Indique el número del acta)		ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. _____ (Indique el número del acta)	
					VALOR BÁSICO ACTA: \$ 15 486 830 918			
					CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:			
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	Dia/Mes/Año			NOMBRE DE QUIEN RECIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO	FIRMA		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR				NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	26 01 2023			NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	27 01 2023			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL				NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	03 02 2023			NOMBRE DE QUIEN RECIBE	MAURICIO HOYOS SIERRA			
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA				NOMBRE DE QUIEN RECIBE				
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	06 02 2023			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	LUZ HELENA ARIZA RUIZ			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE				
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO				NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE				
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	09 02 2023			NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	RICARDO BAEZ GARCIA			
Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.								
ORDEN DE PAGO								
CONTRATO DE OBRA No.: 983 DE 2021								
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 " MÓDULO NO. 2								
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 NIT. 901.472.786-3								
DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, ING RICARDO BAEZ GARCIA AUTORIZA EL PAGO A: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indicar el ordenador del pago)								
VALOR TOTAL A PAGAR: \$ 14 979 735 592 VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)								
CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE OBRA 19 DEL PERIODO enero-2023 y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal. (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) (Indicar el periodo del Acta)								
Firma: Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Matrícula N° 05202096971 ANT SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA Fecha firma: 03-02-23 Suscribe según su competencia)		Firma: Nombre: MAURICIO HOYOS SIERRA Matrícula No. 05202-096971 ANT DIRECTOR TERRITORIAL ANTIOQUIA Fecha firma: 03-02-23 (Suscribe según su competencia)		Firma: Nombre: LUZ HELENA ARIZA RUIZ Matrícula No.: 63202-092415 QND GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO Fecha firma: 09/02/2023 (Suscribe según su competencia)		Firma: Nombre: RICARDO BAEZ GARCIA Matrícula No.: 25202-086579 CND ORDENADOR DEL PAGO Fecha de Firma: 09-02-2023		
Original: Anexo para el pago de la cuenta, (Subdirección Financiera). Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.								

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1					
												VERSIÓN		1					
												PÁGINA		1	DE	9			
												FECHA		28/1/2023 (Día / Mes / Año)					
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA				ACTA No. 19		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 15 486 830 918.00			MES enero-2023				
												ACTA FINAL ☐							
CONTRATO No : 983 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)					PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)				
OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 " MÓDULO NO. 2										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)					FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)				
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)					FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)				
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL										VALOR INICIAL (incluido I ¹): \$ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal)					VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):				
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00									
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha 20/12/22		OBRA EJECUTADA								
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR					
Subtotal				EXPLANACIONES				\$ 38 887 515 670		\$ 37 806 653 670		\$ 854 043 825		\$ 5 038 039 251.00					
1	1	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	17.00	\$ 1 154 779	\$ 19 631 243		\$ -		\$ -		\$ -					
1.1	1-11601	200-13		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas			\$ 1 154 779		17.00	\$ 19 631 243		\$ -	2.73	\$ 3 152 546.00					
2	1	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales	m3	405 159.00	\$ 52 715	\$ 21 357 956 685		\$ -		\$ -		\$ -					
2.1	1-11601	210-13		Excavación en roca de la explanación y canales			\$ 52 715		405 159.00	\$ 21 357 956 685	6 955.00	\$ 366 632 825	48 507.00	\$ 2 557 046 505.00					
3	1	210-13		excavación en material común de la explanación y canales	m3	1 718 124.00	\$ 9 200	\$ 15 806 740 800	31 294.00	\$ 287 904 800		\$ -	31 294.00	\$ 287 904 800.00					
3.1	1-11601	210-13		excavación en material común de la explanación y canales			\$ 9 200		1 569 345.00	\$ 14 437 974 000	52 705.00	\$ 484 886 000	237 762.00	\$ 2 187 410 400.00					
4	1	220-13		Terraplenes	m3	118 271.00	\$ 12 500	\$ 1 478 387 500		\$ -		\$ -		\$ -					
4.1	1-11602	220-13		Terraplenes			\$ 12 500		118 271.00	\$ 1 478 387 500	202.00	\$ 2 525 000	202.00	\$ 2 525 000.00					
5	1	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante	m2	20 342.00	\$ 11 051	\$ 224 799 442		\$ -		\$ -		\$ -					
5.1	1-11601	233-13		Geomalla para estabilización de suelos de subrasante			\$ 11 051		20 342.00	\$ 224 799 442		\$ -		\$ -					
Subtotal				BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS				\$ 3 486 720 000		\$ 3 486 720 000		\$ -		\$ 161 920 000.00					
6	2	320-13		Subbase Granular clase A	m3	16 829.00	\$ 110 000	\$ 1 851 190 000		\$ -		\$ -		\$ -					
6.1	2-11602	320-13		Subbase Granular clase A	m3		\$ 110 000		16 829.00	\$ 1 851 190 000		\$ -	1 472.00	\$ 161 920 000.00					
7	2	330-13		Base granular clase A	m3	12 581.00	\$ 130 000	\$ 1 635 530 000		\$ -		\$ -		\$ -					
7.1	2-11602	330-13		Base granular clase A	m3		\$ 130 000		11 071.00	\$ 1 439 230 000		\$ -		\$ -					
7.2	2-15105	330-13		Base granular clase A	m3		\$ 130 000		1 510.00	\$ 196 300 000		\$ -		\$ -					
Subtotal				PAVIMENTOS ASFALTICOS				\$ 8 227 878 276		\$ 8 227 878 276		\$ -		\$ -					
8	7	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	83 248.00	\$ 2 918	\$ 242 917 664		\$ -		\$ -		\$ -					
8.1	7-11603	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		\$ 2 918		68 263.00	\$ 199 191 434		\$ -		\$ -					
8.2	7-14104	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2		\$ 2 918		14 985.00	\$ 43 726 230		\$ -		\$ -					
9	7	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2	57 188.00	\$ 1 849	\$ 105 740 612		\$ -		\$ -		\$ -					
9.1	7-11603	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$ 1 849		46 894.00	\$ 86 707 006		\$ -		\$ -					
9.2	7-14104	421-13		Riego de liga con emulsión asfáltica CRR-1	m2		\$ 1 849		10 294.00	\$ 19 033 606		\$ -		\$ -					
10	7		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3	6 863.00	\$ 700 000	\$ 4 804 100 000		\$ -		\$ -		\$ -					
10.1	7-11603		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		\$ 700 000		5 628.00	\$ 3 939 600 000		\$ -		\$ -					
10.2	7-14104		450.1P	Mezcla densa en caliente tipo MDC-25	m3		\$ 700 000		1 235.00	\$ 864 500 000		\$ -		\$ -					
11	7		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3	4 271.00	\$ 720 000	\$ 3 075 120 000		\$ -		\$ -		\$ -					
11.1	7-11603		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$ 720 000		3 502.00	\$ 2 521 440 000		\$ -		\$ -					
11.2	7-14104		450.2P	Mezcla densa en caliente Tipo MDC-19	m3		\$ 720 000		769.00	\$ 553 680 000		\$ -		\$ -					
Subtotal				PAVIMENTOS DE CONCRETO				\$ 2 752 295 000		\$ 2 752 295 000		\$ -		\$ -					
12	5	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3	3 419.00	\$ 805 000	\$ 2 752 295 000		\$ -		\$ -		\$ -					
12.1	5-11603	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3		\$ 805 000		342.00	\$ 275 310 000		\$ -		\$ -					
12.2	5-15105	500-13		Pavimento de concreto Hidraulico	m3		\$ 805 000		3 077.00	\$ 2 476 985 000		\$ -		\$ -					
Subtotal				ESTRUCTURAS Y DRENAJES				\$ 173 395 951 001		\$ 162 998 717 284		\$ 5 018 992 639		\$ 37 706 803 558.00					
13	5	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3	43 888.00	\$ 32 667	\$ 1 433 689 296		\$ -		\$ -		\$ -					
13.1	5-11604	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		17 555.00	\$ 573 469 185	477.50	\$ 15 598 493	2 147.10	\$ 70 139 316.00					
13.2	5-11605	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		2 194.00	\$ 71 671 398		\$ -		\$ -					
13.3	5-11606	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		6 887.00	\$ 224 977 629	1 008.50	\$ 32 944 670	2 678.50	\$ 87 498 560.00					
13.4	5-14101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		8 778.00	\$ 286 750 926		\$ -	2 132.60	\$ 69 665 645.00					
13.5	5-14102	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		8 778.00	\$ 286 750 926		\$ -	2 995.60	\$ 97 857 265.00					
13.6	5-15101	600-13		Excavaciones varias sin clasificar	m3		\$ 32 667		2 195.00	\$ 71 704 065		\$ -		\$ -					
14	5	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3	21 548.00	\$ 80 707	\$ 1 739 074 436		\$ -		\$ -		\$ -					
14.1	5-11604	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 80 707		8 619.00	\$ 695 613 633		\$ -		\$ -					
14.2	5-11605	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 80 707		1 077.00	\$ 86 921 439		\$ -		\$ -					
14.3	5-11606	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 80 707		2 154.00	\$ 173 842 878		\$ -		\$ -					
14.4	5-14101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 80 707		4 310.00	\$ 347 847 170		\$ -		\$ -					
14.5	5-14102	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 80 707		4 310.00	\$ 347 847 170		\$ -	89.30	\$ 7 207 135.00					
14.6	5-15101	600-13		Excavaciones varias en roca en seco	m3		\$ 80 707		1 078.00	\$ 87 002 146		\$ -		\$ -					
15	5	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3	87 497.00	\$ 38 000	\$ 3 324 886 000		\$ -		\$ -		\$ -					
15.1	5-11604	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3		\$ 38 000		34 998.00	\$ 1 329 924 000	135.20	\$ 5 137 600	135.20	\$ 5 137 600.00					
15.2	5-11605	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3		\$ 38 000		4 374.00	\$ 166 212 000		\$ -		\$ -					
15.3	5-11606	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3		\$ 38 000		8 748.00	\$ 332 424 000	1 020.60	\$ 38 782 800	1 020.60	\$ 38 782 800.00					
15.4	5-14101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3		\$ 38 000		17 500.00	\$ 665 000 000		\$ -	197.20	\$ 7 493 600.00					

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
												VERSIÓN		1		
												PÁGINA		2	DE	9
												FECHA		26/1/2023 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA				ACTA No. 19		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 15 486 830 918.00			MES enero-2023	
		ACTA FINAL ☐														
CONTRATO No.: 983 DE 2021 (Indique número y año)											PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 " MÓDULO NO. 2											FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vital)											FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL											VALOR INICIAL (incluido I ¹): \$ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal)			VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):		
											VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha 20/12/22		OBRA EJECUTADA					
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR		
15.5	5-14102	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de Excavación)	m3		\$ 38 000		17 500.00	\$ 665 000 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
15.6	5-15101	610-13		Rellenos para Estructuras con suelo (Material de	m3		\$ 38 000		4 377.00	\$ 166 326 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
16	5	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3	85 825.00	\$ 70 000	\$ 6 007 750 000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
16.1	5-11604	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 70 000		34 330.00	\$ 2 403 100 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
16.2	5-11605	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 70 000		4 290.00	\$ 300 300 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
16.3	5-11606	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 70 000		8 581.00	\$ 600 670 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
16.4	5-14101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 70 000		17 166.00	\$ 1 201 620 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
16.5	5-14102	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 70 000		17 166.00	\$ 1 201 620 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
16.6	5-15101	610-13		Relleno para estructuras con recebo	m3		\$ 70 000		4 292.00	\$ 300 440 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
17	5	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3	16 634.00	\$ 131 414	\$ 2 185 940 476		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
17.1	5-11604	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 131 414		6 654.00	\$ 874 428 756	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
17.2	5-11605	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 131 414		832.00	\$ 109 336 448	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
17.3	5-11606	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 131 414		1 663.00	\$ 218 541 482	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
17.4	5-14101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 131 414		3 327.00	\$ 437 214 378	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
17.5	5-14102	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 131 414		3 327.00	\$ 437 214 378	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
17.6	5-15101	610-13		Rellenos para estructuras con material granular tipo SBG.	m3		\$ 131 414		831.00	\$ 109 205 034	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
18	5	610-13		Relleno Con Gravilla	m3	10 628.00	\$ 133 476	\$ 1 418 582 928		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
18.1	5-11604	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		\$ 133 476		4 251.00	\$ 567 406 476	\$ -	\$ -	1 470.60	\$ 196 289 805.00		
18.2	5-11605	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		\$ 133 476		531.00	\$ 70 875 756	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
18.3	5-11606	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		\$ 133 476		1 063.00	\$ 141 884 988	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
18.4	5-14101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		\$ 133 476		2 126.00	\$ 283 769 976	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
18.5	5-14102	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		\$ 133 476		2 126.00	\$ 283 769 976	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
18.6	5-15101	610-13		Relleno Con Gravilla	m3		\$ 133 476		531.00	\$ 70 875 756	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
19	6		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m	m	231.00	\$ 2 250 000	\$ 519 750 000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
19.1	6-11606		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 2 250 000		285.00	\$ 641 250 000	\$ -	\$ -	152.90	\$ 344 025 000.00		
19.2	6-14101		621.1.1P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,20 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 2 250 000		26.00	\$ 58 500 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
20	6		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m	496.00	\$ 2 900 000	\$ 1 438 400 000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
20.1	6-11606		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m (incluye excavación y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 2 900 000		25.00	\$ 72 500 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
20.2	6-14101		621.1.2P	Pilote de concreto vaciado in situ, de diametro 1,50 m	m		\$ 2 900 000		471.00	\$ 1 365 900 000	\$ -	\$ -	162.50	\$ 471 250 000.00		
21	6		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro	m	220.00	\$ 3 600 000	\$ 792 000 000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
21.1	6-11606		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 3 600 000		44.00	\$ 158 400 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
21.2	6-14101		621.1.3P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro 1.8 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 3 600 000		176.00	\$ 633 600 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
22	6		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro 2,00 m (incluye excavaciones y no incluye acero de	m	508.00	\$ 4 020 000	\$ 2 042 160 000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
22.1	6-11606		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro	m		\$ 4 020 000		51.00	\$ 205 020 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
22.2	6-14101		621.1.4P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro	m		\$ 4 020 000		457.00	\$ 1 837 140 000	\$ -	\$ -	40.00	\$ 160 800 000.00		
23	6		621.1.5P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro	m	160.00	\$ 5 300 000	\$ 848 000 000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
23.1	6-11606		621.1.5P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro	m		\$ 5 300 000		32.00	\$ 169 600 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
23.2	6-14101		621.1.5P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro 2,5 m (incluye excavaciones y no incluye acero de refuerzo)	m		\$ 5 300 000		128.00	\$ 678 400 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
24	6		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro	m	152.00	\$ 6 500 000	\$ 988 000 000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
24.1	6-11606		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro	m		\$ 6 500 000		10.00	\$ 65 000 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
24.2	6-14101		621.1.6P	Pilote de concreto vaciado in situ tipo caissons, de diametro	m		\$ 6 500 000		202.00	\$ 1 313 000 000	\$ -	\$ -	161.00	\$ 1 046 500 000.00		
25	4	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m	36 262.00	\$ 210 000	\$ 7 615 020 000		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
25.1	4-11606	623-13		Anclaje activo de 20 toneladas (2 tor-1/2")	m		\$ 210 000		1.20	\$ 252 000	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
26	4	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m	32 316.00	\$ 324 690	\$ 10 492 682 040		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -		
26.1	4-11606	623-13		Anclaje activo de 30 toneladas (Longitud variable)	m		\$ 324 690		61 061.00	\$ 19 825 896 090	6 990.00	\$ 2 269 583 100	46 735.00	\$ 15 174 387 150.00		


		INSTITUTO NACIONAL DE VIAS PROCESO MISIONAL EJECUCION DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1			
												VERSIÓN		1			
												PÁGINA		3	DE	9	
												FECHA		26/1/2023 (Día / Mes / Año)			
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA				ACTA No. 19		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 15 486 830 918.00			MES enero-2023		
										ACTA FINAL ☐							
CONTRATO No : 983 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 " MÓDULO NO. 2												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Inclúdas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vital)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL												VALOR INICIAL (incluido I ¹): \$ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal)			VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):		
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00					
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha 20/12/22		OBRA EJECUTADA					
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO				
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR			
27	4	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	m	21 103.00	\$ 350 000	\$ 7 386 050 000		\$ -		\$ -		\$ -			
27.1	4-11606	623-13		Anclaje activo de 50 toneladas (6 tor-1/2")	m		\$ 350 000		21 103.00	\$ 7 386 050 000		\$ -		\$ -			
28	4	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)	m	25 316.00	\$ 375 000	\$ 9 493 500 000		\$ -		\$ -		\$ -			
28.1	4-11606	623-13		Anclaje activo de 40 toneladas (Longitud variable)	m		\$ 375 000		25 316.00	\$ 9 493 500 000	2 175.00	\$ 815 625 000	10 895.00	\$ 4 085 625 000.00			
29	4	623-13		Anclaje tipo tendón	m	18 637.00	\$ 311 825	\$ 5 811 482 525		\$ -		\$ -		\$ -			
29.1	4-11606	623-13		Anclaje tipo tendón	m		\$ 311 825		5 874.90	\$ 1 831 940 692		\$ -		\$ -			
30	4	623-13	PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte	m	86 057.00	\$ 121 647	\$ 10 468 575 879		\$ -		\$ -		\$ -			
30.1	4-11606	623-13	PT-3B	Pernos anclados con resina para excavaciones en corte	m		\$ 121 647		4 471.10	\$ 543 895 901		\$ -		\$ -			
31	4		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte	m	16 021.00	\$ 99 033	\$ 1 586 607 693		\$ -		\$ -		\$ -			
31.1	4-11606		PT-3C	Pernos anclados con lechada para excavaciones en corte	m		\$ 99 033		16 021.00	\$ 1 586 607 693	1 170.00	\$ 115 868 610	4 668.00	\$ 462 286 044.00			
32	6		630.1P	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes	m3	8 762.00	\$ 1 450 000	\$ 12 704 900 000		\$ -		\$ -		\$ -			
32.1	6-14103		630.1P	Concreto clase 42 MPa para viga cajon de puentes	m3		\$ 1 450 000		8 762.00	\$ 12 704 900 000		\$ -	148.20	\$ 214 890 000.00			
33	6		630.1.1P	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes	m3	1 388.00	\$ 1 350 000	\$ 1 873 800 000		\$ -		\$ -		\$ -			
33.1	6-14103		630.1.1P	Concreto clase 35 MPa para viga cajon de puentes	m3		\$ 1 350 000		1 196.60	\$ 1 615 410 000		\$ -		\$ -			
34	6		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3	203.00	\$ 1 271 489	\$ 258 112 267		\$ -		\$ -		\$ -			
34.1	6-14103		630.1.2P	Concreto clase 35 MPa para viga cimbra	m3		\$ 1 271 489		406.20	\$ 516 478 832		\$ -	304.80	\$ 387 549 846.00			
35	6		630.3.1P	concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga	m3	6 902.00	\$ 930 000	\$ 6 418 860 000		\$ -		\$ -		\$ -			
35.1	6-11606		630.3.1P	concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga	m3		\$ 930 000		2 415.00	\$ 2 245 950 000	278.30	\$ 258 819 000	1 306.80	\$ 1 215 324 000.00			
35.2	6-14102		630.3.1P	concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga	m3		\$ 930 000		2 305.00	\$ 2 143 650 000		\$ -	952.60	\$ 885 918 000.00			
35.3	6-15105		630.3.1P	concreto clase 28 mpa para zapatas, estribos y aletas, viga	m3		\$ 930 000		2 692.00	\$ 2 503 560 000		\$ -		\$ -			
36	6		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3	1 306.00	\$ 1 050 000	\$ 1 371 300 000		\$ -		\$ -		\$ -			
36.1	6-14103		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3		\$ 1 050 000		522.00	\$ 548 100 000		\$ -	31.30	\$ 32 865 000.00			
36.2	6-14104		630.3.2P	Concreto clase 28 MPa para tablero y diafragma	m3		\$ 1 050 000		784.00	\$ 823 200 000		\$ -	266.90	\$ 280 245 000.00			
37	6		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3	114.00	\$ 1 100 000	\$ 125 400 000		\$ -		\$ -		\$ -			
37.1	6-14101		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3		\$ 1 100 000		71.40	\$ 78 540 000		\$ -	35.40	\$ 38 940 000.00			
37.2	6-114102		630.3.3P	Concreto clase 28 MPA para pilas de puentes	m3		\$ 1 100 000		78.00	\$ 85 800 000		\$ -		\$ -			
38	5	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3	10 188.00	\$ 780 000	\$ 7 946 640 000		\$ -		\$ -		\$ -			
38.1	5-11604	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 780 000		3 056.00	\$ 2 383 680 000		\$ -		\$ -			
38.2	5-11605	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 780 000		509.00	\$ 397 020 000		\$ -		\$ -			
38.3	5-11606	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 780 000		3 056.00	\$ 2 383 680 000		\$ -		\$ -			
38.4	5-11607	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 780 000		509.00	\$ 397 020 000		\$ -	22.00	\$ 17 160 000.00			
38.5	5-14104	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 780 000		1 528.00	\$ 1 191 840 000		\$ -		\$ -			
38.6	5-15105	630-13		Concreto clase 28 MPA	m3		\$ 780 000		1 530.00	\$ 1 193 400 000		\$ -		\$ -			
39	5	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3	3 761.00	\$ 680 000	\$ 2 557 480 000		\$ -		\$ -		\$ -			
39.1	5-11604	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 680 000		1 128.00	\$ 767 040 000		\$ -		\$ -			
39.2	5-11605	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 680 000		188.00	\$ 127 840 000		\$ -		\$ -			
39.3	5-11606	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 680 000		1 128.00	\$ 767 040 000		\$ -	158.70	\$ 107 916 000.00			
39.4	5-11607	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 680 000		188.00	\$ 127 840 000		\$ -		\$ -			
39.5	5-14104	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 680 000		564.00	\$ 383 520 000		\$ -		\$ -			
39.6	5-15105	630-13		Concreto clase 21 MPA	m3		\$ 680 000		565.00	\$ 384 200 000		\$ -		\$ -			
40	5		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 Mpa	m3	6 498.00	\$ 950 000	\$ 6 173 100 000		\$ -		\$ -		\$ -			
40.1	5-11606		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 Mpa	m3		\$ 950 000		7 705.90	\$ 7 320 605 000	1 033.80	\$ 982 110 000	6 118.82	\$ 5 812 879 000.00			
40.2	5-14102		630.4.1P	Concreto lanzado clase 21 Mpa	m3		\$ 950 000		650.00	\$ 617 500 000		\$ -	51.20	\$ 48 640 000.00			
41	5	630-13		concreto clase 14 mpa	m3	1 140.00	\$ 543 697	\$ 619 814 580		\$ -		\$ -		\$ -			
41.1	5-11604	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		228.00	\$ 123 962 916	0.30	\$ 163 109	6.60	\$ 3 588 400.00			
41.2	5-11605	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		57.00	\$ 30 990 729		\$ -		\$ -			
41.3	5-11606	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		171.00	\$ 92 972 187		\$ -	42.10	\$ 22 889 644.00			
41.4	5-11607	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		57.00	\$ 30 990 729		\$ -		\$ -			
41.5	5-14102	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		228.00	\$ 123 962 916		\$ -	25.10	\$ 13 646 795.00			
41.6	5-14104	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		171.00	\$ 92 972 187		\$ -	1.60	\$ 869 915.00			
41.7	5-15105	630-13		concreto clase 14 mpa	m3		\$ 543 697		228.00	\$ 123 962 916		\$ -		\$ -			
42	4		632.1P	Baranda Metalica	m	1 372.00	\$ 545 397	\$ 748 284 684		\$ -		\$ -		\$ -			
42.1	4-11605		632.1P	Baranda Metalica	m		\$ 545 397		686.00	\$ 374 142 342		\$ -		\$ -			
42.2	4-14104		632.1P	Baranda Metalica	m		\$ 545 397		686.00	\$ 374 142 342		\$ -		\$ -			
43	4	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg	5 529 845.00	\$ 5 378	\$ 29 739 506 410		\$ -		\$ -		\$ -			
43.1	4-11606	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		552 985.00	\$ 2 973 953 330	33 184.60	\$ 178 466 779	182 268.60	\$ 980 240 532.00			
43.2	4-11605	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		276 492.00	\$ 1 486 973 976		\$ -		\$ -			
43.3	4-11604	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		829 477.00	\$ 4 460 927 306		\$ -		\$ -			
43.4	4-14101	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		552 985.00	\$ 2 973 953 330		\$ -	302 302.20	\$ 1 625 781 230.00			
43.5	4-14102	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		552 985.00	\$ 2 973 953 330		\$ -	198 761.20	\$ 1 068 937 733.00			
43.6	4-14103	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378		552 985.00	\$ 2 973 953 330		\$ -	68 755.20	\$ 369 765 467.00			

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO MEPI-MN1-IN-4-FR-1				
												VERSIÓN 1				
												PÁGINA 4 DE 9				
												FECHA 26/1/2023 (Día / Mes / Año)				
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA ACTA No. 19 VALOR BÁSICO ACTA: \$ 15 486 830 918.00 MES enero-2023 ACTA FINAL ☐																
CONTRATO No.: 983 DE 2021 (Indique número y año)												PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)		PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)		
OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR No. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO No. 2												FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)		FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)		
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)												FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)		FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)		
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL												VALOR INICIAL (incluido I ¹): \$ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal)		VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):		
												VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00				
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)							CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha 20/12/22		OBRA EJECUTADA			
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL		CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO		
43.7	4-14104	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378			552 985.00	\$ 2 973 953 330		\$ -	40 026.50	\$ 215 262 516.00	
43.8	4-15102	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378			552 985.00	\$ 2 973 953 330	4 222.60	\$ 22 709 143	18 598.80	\$ 100 024 346.00	
43.9	4-15104	640-13		acero de refuerzo fy = 420 mpa	kg		\$ 5 378			1 105 966.00	\$ 5 947 885 148		\$ -		\$ -	
44	4	641-13		Acero de Prestuerzo	tf-m	1 751 321.00	\$ 2 150	\$ 3 765 340 150			\$ -		\$ -		\$ -	
44.1	4-14103	641-13		Acero de Prestuerzo	tf-m		\$ 2 150			1 751 321.00	\$ 3 765 340 150		\$ -	266 133.80	\$ 572 187 670.00	
45	4	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	und	56.00	\$ 2 551 672	\$ 142 893 632			\$ -		\$ -		\$ -	
45.1	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 50cm x 50cm x 10cm con 3 de 3/16"	und		\$ 2 551 672			56.00	\$ 142 893 632		\$ -	24.00	\$ 61 240 128.00	
46	4	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	und	8.00	\$ 6 524 758	\$ 52 198 064			\$ -		\$ -		\$ -	
46.1	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 80cm x 80cm x 10cm con 8 de 3/16"	und		\$ 6 524 758			8.00	\$ 52 198 064		\$ -		\$ -	
47	4	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de	und	24.00	\$ 8 095 360	\$ 194 288 640			\$ -		\$ -		\$ -	
47.1	4-14103	642-13		Apoyo elastomérico de 70cm x 70cm x 17cm con 10 de	und		\$ 8 095 360			24.00	\$ 194 288 640		\$ -		\$ -	
48	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de	m	37.00	\$ 611 137	\$ 22 612 069			\$ -		\$ -		\$ -	
48.1	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900 mm de	m		\$ 611 137			37.00	\$ 22 612 069		\$ -		\$ -	
49	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de	m	349.00	\$ 1 300 914	\$ 454 018 986			\$ -		\$ -		\$ -	
49.1	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1200 mm de	m		\$ 1 300 914			349.00	\$ 454 018 986		\$ -		\$ -	
50	5	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de	m	26.00	\$ 1 722 892	\$ 44 795 192			\$ -		\$ -		\$ -	
50.1	5-11604	661-13		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 1500 mm de	m		\$ 1 722 892			26.00	\$ 44 795 192		\$ -		\$ -	
51	5	663-13		tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	m	3 628.00	\$ 42 055	\$ 152 575 540			\$ -		\$ -		\$ -	
51.1	5-11604	663-13		tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	m		\$ 42 055			1 814.00	\$ 76 287 770		\$ -	637.70	\$ 26 818 474.00	
51.2	5-11606	663-13		tubería de plástico tipo pvc perforada de diámetro 100 mm	m		\$ 42 055			544.00	\$ 22 877 920	100.00	\$ 4 205 500	100.00	\$ 4 205 500.00	
51.3	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 100	m		\$ 42 055			1 270.00	\$ 53 409 850		\$ -		\$ -	
52	5	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150	m	2 630.00	\$ 69 709	\$ 183 334 670			\$ -		\$ -		\$ -	
52.1	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150	m		\$ 69 709			1 052.00	\$ 73 333 868		\$ -	173.10	\$ 12 066 628.00	
52.2	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150	m		\$ 69 709			789.00	\$ 55 000 401		\$ -		\$ -	
52.3	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 150	m		\$ 69 709			789.00	\$ 55 000 401		\$ -		\$ -	
53	5	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diámetro 150mm	m	599.00	\$ 80 970	\$ 48 501 030			\$ -		\$ -		\$ -	
53.1	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diámetro 150mm	m		\$ 80 970			180.00	\$ 14 574 600		\$ -		\$ -	
53.2	5-11606	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diámetro 150mm	m		\$ 80 970			240.00	\$ 19 432 800	24.00	\$ 1 943 280	77.30	\$ 6 258 981.00	
53.3	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diámetro 150mm	m		\$ 80 970			162.00	\$ 13 117 140		\$ -		\$ -	
53.4	5-14105	663-13		Tubería de plástico tipo PVC sanitaria de diámetro 150mm	m		\$ 80 970			137.00	\$ 11 092 890		\$ -		\$ -	
54	5	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m	771.00	\$ 202 186	\$ 155 885 406			\$ -		\$ -		\$ -	
54.1	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		\$ 202 186			347.00	\$ 70 158 542		\$ -	188.00	\$ 38 010 968.00	
54.2	5-15106	663-13		Tubería de plástico tipo PVC perforada de diámetro 350 mm	m		\$ 202 186			424.00	\$ 85 726 864		\$ -		\$ -	
55	5	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m	1 435.00	\$ 250 758	\$ 359 837 730			\$ -		\$ -		\$ -	
55.1	5-11604	663-13		Tubería de plástico tipo novafort de diámetro 400 mm	m		\$ 250 758			1 435.00	\$ 359 837 730		\$ -		\$ -	
56	5	663-13	670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA	m3	3 568.00	\$ 780 000	\$ 2 783 040 000			\$ -		\$ -		\$ -	
56.1	5-11604	663-13	670.5P	Disipadores de energia en concreto clase 21 MPA	m3		\$ 780 000			3 568.00	\$ 2 783 040 000	38.10	\$ 29 718 000	38.10	\$ 29 718 000.00	
57	5	671.1P		Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la	m3	9 621.00	\$ 643 000	\$ 6 186 303 000			\$ -		\$ -		\$ -	
57.1	5-11604	671.1P		Cuneta de concreto de 21 MPa vaciada insitu, no incluye la	m3		\$ 643 000			9 621.00	\$ 6 186 303 000		\$ -		\$ -	
58	5	671.4P		Cunetas en sacos de suelo cemento	m	630.00	\$ 137 058	\$ 86 346 540			\$ -		\$ -		\$ -	
58.1	5-11604	671.4P		Cunetas en sacos de suelo cemento	m		\$ 137 058			630.00	\$ 86 346 540		\$ -		\$ -	
59	5	671.5P		Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3	1 801.00	\$ 194 649	\$ 350 562 849			\$ -		\$ -		\$ -	
59.1	5-11604	671.5P		Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3		\$ 194 649			900.00	\$ 175 184 100		\$ -		\$ -	
59.2	5-11606	671.5P		Zanja de coronación en sacos de suelo cemento	m3		\$ 194 649			901.00	\$ 175 378 749		\$ -		\$ -	
60	5	671.7P		Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3	4 426.00	\$ 1 050 000	\$ 4 647 300 000			\$ -		\$ -		\$ -	
60.1	5-11604	671.7P		Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3		\$ 1 050 000			1 041.00	\$ 1 093 050 000		\$ -		\$ -	
60.2	5-11606	671.7P		Zanjas de coronación concreto 21 Mpa en sitio	m3		\$ 1 050 000			2 213.00	\$ 2 323 650 000		\$ -		\$ -	
61	7	673-13		geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido)	m2	28 751.00	\$ 7 005	\$ 201 400 755			\$ -		\$ -		\$ -	
61.1	7-11604	673-13		geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido)	m2		\$ 7 005			11 501.00	\$ 80 564 505		\$ -	4 240.20	\$ 29 702 601.00	
61.2	7-11606	673-13		geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido)	m2		\$ 7 005			5 750.00	\$ 40 278 750		\$ -		\$ -	
61.3	7-15106	673-13		geotextil tipo nt - 1800 o similar (no tejido)	m2		\$ 7 005			11 500.00	\$ 80 557 500		\$ -		\$ -	
62	7	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2	78 089.00	\$ 7 720	\$ 602 847 080			\$ -		\$ -		\$ -	
62.1	7-11604	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		\$ 7 720			31 235.00	\$ 241 134 200		\$ -	3.60	\$ 27 792.00	
62.2	7-11606	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		\$ 7 720			15 618.00	\$ 120 570 960		\$ -		\$ -	
62.3	7-15106	673-13		Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		\$ 7 720			31 236.00	\$ 241 141 920		\$ -		\$ -	
63	7	673.3P		Geodren planar 0,50 m	m	585.00	\$ 28 444	\$ 16 639 740			\$ -		\$ -		\$ -	
63.1	7-11604	673.3P		Geodren planar 0,50 m	m		\$ 28 444			3 031.40	\$ 86 225 142	932.60	\$ 26 526 874.0	1 299.10	\$ 36 951 600.00	
63.2	7-11606	673.3P		Geodren planar 0,50 m	m		\$ 28 444			117.00	\$ 3 327 948		\$ -		\$ -	
63.3	7-15106	673.3P		Geodren planar 0,50 m	m		\$ 28 444			234.00	\$ 6 655 896		\$ -		\$ -	
64	5	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10)	m	23 684.00	\$ 65 894	\$ 1 560 633 496			\$ -		\$ -		\$ -	
64.1	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud menor o igual a diez (10)	m		\$ 65 894			23 684.00	\$ 1 560 633 496		\$ -		\$ -	
65	5	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m	7 965.00	\$ 190 308	\$ 1 515 803 220			\$ -		\$ -		\$ -	

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO		MEPI-MN1-IN-4-FR-1		
												VERSIÓN		1		
												PÁGINA		5	DE	9
												FECHA		26/1/2023 (Día / Mes / Año)		
UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES				DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA				ACTA No. 19		VALOR BÁSICO ACTA: \$ 15 486 830 918.00		MES enero-2023		
										ACTA FINAL ☐						
CONTRATO No : 983 DE 2021 (Indique número y año)										PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)			PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)			
OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA " VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 " MÓDULO NO. 2										FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)			FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)										FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)			FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL										VALOR INICIAL (incluido I ¹): \$ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal)			VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):			
										VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00						
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha 20/12/22		OBRA EJECUTADA					
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	PRESENTE ACTA VALOR	ACUMULADO CANTIDAD	VALOR		
65.1	5-11606	674-13		Dren horizontal de longitud mayor a diez (10) metros	m		\$ 190 308		7 965.00	\$ 1 515 803 220	930.00	\$ 176 986 440	2 645.00	\$ 503 364 660.00		
66	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra	m2	74 901.00	\$ 13 581	\$ 1 017 230 481		\$ -		\$ -		\$ -		
66.1	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 58 KN/m para muro de tierra	m2		\$ 13 581		74 901.00	\$ 1 017 230 481		\$ -		\$ -		
67	7	683-13		geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra	m2	82 321.00	\$ 20 637	\$ 1 698 858 477		\$ -		\$ -		\$ -		
67.1	7-11606	683-13		geomalla de refuerzo tipo 110 kn/m para muro de tierra	m2		\$ 20 637		82 321.00	\$ 1 698 858 477		\$ -	25 090.00	\$ 517 782 330.00		
68	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra	m2	9 836.00	\$ 32 884	\$ 323 447 024		\$ -		\$ -		\$ -		
68.1	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 160 KN/m para muro de tierra	m2		\$ 32 884		9 836.00	\$ 323 447 024		\$ -		\$ -		
69	7	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra	m2	11 346.00	\$ 40 763	\$ 462 496 998		\$ -		\$ -		\$ -		
69.1	7-11606	683-13		Geomalla de refuerzo tipo 220 KN/m para muro de tierra	m2		\$ 40 763		11 346.00	\$ 462 496 998		\$ -		\$ -		
70	7	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra	m2	11 322.00	\$ 20 969	\$ 237 411 018		\$ -		\$ -		\$ -		
70.1	7-11606	683-13		Geomalla de fachada tipo TRM 500 para muros de tierra	m2		\$ 20 969		11 322.00	\$ 237 411 018	2 089.00	\$ 43 804 241	4 778.00	\$ 100 189 882.00		
Subtotal				OBRAS SUBTERRÁNEAS			\$ 88 356 190 138			\$ 86 733 078 224		\$ 7 429 869 780		\$ 26 037 053 216.00		
71	5		PT-1	Perforación exploratoria	m	1 206.00	\$ 231 723	\$ 279 457 938		\$ -		\$ -		\$ -		
71.1	5-15103		PT-1	Perforación exploratoria	m		\$ 231 723		1 206.00	\$ 279 457 938		\$ -		\$ -		
72	5		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m3	13 426.00	\$ 250 000	\$ 3 356 500 000		\$ -		\$ -		\$ -		
72.1	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo III	m3		\$ 250 000		13 426.00	\$ 3 356 500 000	1 852.40	\$ 463 100 000	2 510.50	\$ 627 625 000.00		
73	5		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m3	57 279.00	\$ 256 280	\$ 14 679 462 120		\$ -		\$ -		\$ -		
73.1	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo IV	m3		\$ 256 280		57 279.00	\$ 14 679 462 120	5 852.10	\$ 1 499 776 188	29 879.80	\$ 7 657 595 144.00		
74	5		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m3	53 444.00	\$ 305 000	\$ 16 300 420 000		\$ -		\$ -		\$ -		
74.1	5-15102		PT-2	Excavación subterránea en material tipo V	m3		\$ 305 000		53 444.00	\$ 16 300 420 000	1 660.70	\$ 506 513 500	2 955.80	\$ 901 519 000.00		
75	4		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones	m	21 401.00	\$ 98 785	\$ 2 114 097 785		\$ -		\$ -		\$ -		
75.1	4-15104		PT-3	Pernos anclados con lechada para excavaciones	m		\$ 98 785		21 401.00	\$ 2 114 097 785	2 694.00	\$ 266 126 790	9 134.00	\$ 902 302 190.00		
76	5		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3	14 649.00	\$ 1 000 000	\$ 14 649 000 000		\$ -		\$ -		\$ -		
76.1	5-15105		PT-4	Concreto para revestimiento del Túnel - clase 28 Mpa	m3		\$ 1 000 000		11 520.00	\$ 11 520 000 000		\$ -		\$ -		
77	5		PT-4	concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación	m3	9 768.00	\$ 1 030 000	\$ 10 061 040 000		\$ -		\$ -		\$ -		
77.1	5-11606		PT-4	concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación	m3		\$ 1 030 000		3 054.00	\$ 3 145 620 000	549.00	\$ 565 470 000	1 577.67	\$ 1 625 000 100.00		
77.2	5-15103		PT-4	concreto lanzado clase 28 mpa (portales y excavación subterránea)	m3		\$ 1 030 000		8 290.70	\$ 8 539 421 000	2 734.40	\$ 2 816 432 000	6 957.74	\$ 7 166 472 200.00		
78	5		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m	240.00	\$ 173 926	\$ 41 742 240		\$ -		\$ -		\$ -		
78.1	5-15104		PT-5	Inyección de fisuras o grietas con resina epóxica	m		\$ 173 926		240.00	\$ 41 742 240		\$ -		\$ -		
79	4		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o	m2	23 412.00	\$ 24 116	\$ 564 603 792		\$ -		\$ -		\$ -		
79.1	4-11606		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o	m2		\$ 24 116		14 047.00	\$ 338 757 452		\$ -		\$ -		
79.2	4-15104		PT-6	Malla de acero electrosoldada Q10 (8,5mm-10x10) o	m2		\$ 24 116		9 365.00	\$ 225 846 340		\$ -		\$ -		
80	4		PT-6	malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x	m2	29 216.00	\$ 14 391	\$ 420 447 456		\$ -		\$ -		\$ -		
80.1	4-11606		PT-6	malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x	m2		\$ 14 391		69 568.00	\$ 1 001 153 088	20 259.60	\$ 291 555 904	43 580.00	\$ 627 159 781.00		
80.2	4-15104		PT-6	malla de acero electrosoldada q5 (150mm x 150mm x	m2		\$ 14 391		9 865.10	\$ 141 968 654	2 313.60	\$ 33 295 018	6 026.10	\$ 86 721 605.00		
81	4		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2	211 151.00	\$ 28 502	\$ 6 018 225 802		\$ -		\$ -		\$ -		
81.1	4-11606		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2		\$ 28 502		126 691.00	\$ 3 610 946 882		\$ -		\$ -		
81.2	4-15104		PT-6	Malla para contención de roca triple torsión	m2		\$ 28 502		84 460.00	\$ 2 407 278 920		\$ -		\$ -		
82	4		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg	708 686.00	\$ 10 584	\$ 7 500 732 624		\$ -		\$ -		\$ -		
82.1	4-15102		PT-6	Arco de Acero Estructural	Kg		\$ 10 584		708 686.00	\$ 7 500 732 624	45 831.20	\$ 485 077 421	191 815.30	\$ 2 030 173 136.00		
83	4		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg	26 789.00	\$ 8 836	\$ 236 707 604		\$ -		\$ -		\$ -		
83.1	4-15102		PT-6	Cercha reticulada TE 50	Kg		\$ 8 836		26 789.00	\$ 236 707 604		\$ -		\$ -		
84	4		PT-6	Fibra de Acero	Kg	244 200.00	\$ 12 365	\$ 3 019 533 000		\$ -		\$ -		\$ -		
84.1	4-15102		PT-6	Fibra de Acero	Kg		\$ 12 365		244 200.00	\$ 3 019 533 000		\$ -	46 550.90	\$ 575 601 880.00		
85	7		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2	40 801.00	\$ 80 000	\$ 3 264 080 000		\$ -		\$ -		\$ -		
85.1	7-15106		PT-8	Geomembrana impermeabilizante incluye geotextil	m2		\$ 80 000		30 291.16	\$ 2 423 292 800		\$ -		\$ -		
86	5		PT-9	Cámara de inspección Tipo A	u	16.00	\$ 3 514 941	\$ 56 239 056		\$ -		\$ -		\$ -		
86.1	5-15106		PT-9	Cámara de inspección Tipo A	u		\$ 3 514 941		16.00	\$ 56 239 056		\$ -		\$ -		
87	5		PT10	tubería para enfijajes: tubería metálica de 4" de diámetro	m	22 379.00	\$ 258 899	\$ 5 793 900 721		\$ -		\$ -		\$ -		
87.1	5-15102		PT10	tubería para enfijajes: tubería metálica de 4" de diámetro	m		\$ 258 899		22 379.00	\$ 5 793 900 721	1 941.00	\$ 502 522 959	14 820.00	\$ 3 836 883 180.00		
Subtotal				SEÑALIZACIÓN Y SEGURIDAD			\$ 2 592 324 621			\$ 2 592 324 621		\$ -		\$ 134 734 526.00		
88	7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base	m	34 789.00	\$ 1 791	\$ 62 307 099		\$ -		\$ -		\$ -		
88.1	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base agua para líneas de demarcación de pavimentos	m		\$ 1 791		27 831.00	\$ 49 845 321		\$ -		\$ -		
88.2	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base	m		\$ 1 791		6 958.00	\$ 12 461 778		\$ -		\$ -		
89	7		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base	m2	163.00	\$ 59 987	\$ 9 777 881		\$ -		\$ -		\$ -		
89.1	7-11607		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base	m2		\$ 59 987		130.00	\$ 7 798 310		\$ -		\$ -		
89.2	7-15107		MSV-2015	Suministro y aplicación de pintura en frío acrílica pura base	m2		\$ 59 987		33.00	\$ 1 979 571		\$ -		\$ -		
90	5		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u	300.00	\$ 8 375	\$ 2 512 500		\$ -		\$ -		\$ -		

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEPI-MN1-IN-4-FR-1 1 6 DE 9																									
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES															DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA					ACTA No. 19					VALOR BÁSICO ACTA: \$ 15 486 830 918.00					FECHA 26/1/2023 (Día / Mes / Año)					MES enero-2023				
CONTRATO No.: 983 DE 2021 (Indique número y año)															PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)										PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)														
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2															FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)														
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)															FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)										FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)														
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021 INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL															VALOR INICIAL (incluido I*) \$ 389 978 471 425.00 (Según contrato principal)										VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):														
															VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00																								
No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha 20/12/22		OBRA EJECUTADA																											
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	PRESENTE ACTA		ACUMULADO																										
											CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																							
90.1	5-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		\$ 8 375			240.00	\$ 2 010 000		\$ -		\$ -																								
90.2	5-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de tachas reflectiva bidireccionales	u		\$ 8 375			60.00	\$ 502 500		\$ -		\$ -																								
91	4		MSV-2015	suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y	u	279.00	\$ 396 078	\$ 110 505 762		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -																							
91.1	4-11607		MSV-2015	suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y	u		\$ 396 078		223.00	\$ 88 325 394		\$ -	34.00	\$ 13 466 652.00		\$ -																							
91.2	4-15107		MSV-2015	suministro e instalación de señal vertical de transito sp, sr y	u		\$ 396 078		56.00	\$ 22 180 368		\$ -		\$ -		\$ -																							
92	4		MSV-2015	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado	u	143.00	\$ 503 069	\$ 71 938 867		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -																							
92.1	4-11607		MSV-2015	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado	u		\$ 503 069		114.00	\$ 57 349 866		\$ -		\$ -		\$ -																							
92.2	4-15107		MSV-2015	Suministro e instalación de Señal vertical de transito SP,SR y SI (90 cm *90 cm) con lamina acero galvanizado	u		\$ 503 069		29.00	\$ 14 589 001		\$ -		\$ -		\$ -																							
93	4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u	44.00	\$ 324 103	\$ 14 260 532		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -																							
93.1	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u		\$ 324 103		35.00	\$ 11 343 605		\$ -		\$ -		\$ -																							
93.2	4-15107		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo delineador de curva con lámina reflectiva tipo I	u		\$ 324 103		9.00	\$ 2 916 927		\$ -		\$ -		\$ -																							
94	4		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u	1.00	\$ 11 489 679	\$ 11 489 679		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -																							
94.1	4-11607		MSV-2015	Señal vertical de tránsito tipo bandera con lámina reflectiva tipo I	u		\$ 11 489 679		1.00	\$ 11 489 679		\$ -		\$ -		\$ -																							
95	5	720-13		Poste de referencia	u	9.00	\$ 252 800	\$ 2 275 200		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -																							
95.1	5-11607	720-13		Poste de referencia	u		\$ 252 800		7.00	\$ 1 769 600		\$ -		\$ -		\$ -																							
95.2	5-15107	720-13		Poste de referencia	u		\$ 252 800		2.00	\$ 505 600		\$ -		\$ -		\$ -																							
96	4	730-13		Defensa metalica	m	166.00	\$ 230 532	\$ 38 268 312		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -																							
96.1	4-11607	730-13		Defensa metalica	m		\$ 230 532		166.00	\$ 38 268 312		\$ -		\$ -		\$ -																							
97	5	731-13		Defensa de concreto	m	2 794.00	\$ 802 567	\$ 2 242 372 198		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -																							
97.1	5-11607	731-13		Defensa de concreto	m		\$ 802 567		2 794.00	\$ 2 242 372 198		\$ -	151.10	\$ 121 267 874.00		\$ -																							
98	4	730-13		Sección final	u	6.00	\$ 121 353	\$ 728 118		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -																							
98.1	4-11607	730-13		Sección final	u		\$ 121 353		6.00	\$ 728 118		\$ -		\$ -		\$ -																							
99	4	730-13		Sección de tope	u	6.00	\$ 95 809	\$ 574 854		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -																							
99.1	4-11607	730-13		Sección de tope	u		\$ 95 809		6.00	\$ 574 854		\$ -		\$ -		\$ -																							
100	5	740-13		Captafaros	u	1 149.00	\$ 22 031	\$ 25 313 619		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -																							
100.1	5-11607	740-13		Captafaros	u		\$ 22 031		1 149.00	\$ 25 313 619		\$ -		\$ -		\$ -																							
Subtotal				OBRAS VARIAS						\$ 62 929 266		\$ 62 929 266		\$ -		\$ -																							
101	5	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2	2710	\$ 18 835	\$ 51 042 850		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -																							
101.1	5-11606	810-13		Protección de Taludes con bloques de césped	m2		\$ 18 835		2 710.00	\$ 51 042 850		\$ -		\$ -		\$ -																							
102	5	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2	524	\$ 22 684	\$ 11 886 416		\$ -		\$ -		\$ -		\$ -																							
102.1	5-11606	810-13		Protección de Taludes con Hidrosiembra Controlada.	m2		\$ 22 684		524.00	\$ 11 886 416		\$ -		\$ -		\$ -																							
Subtotal				TRANSPORTES						\$ 19 865 740 000		\$ 18 377 854 000		\$ 2 032 825 400	45 233 000.00	\$ 5 134 124 500.00																							
103	3	900-13		transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien metros (100,00 m)	m3-km	19865740	\$ 1 000	\$ 19 865 740 000	45 233.00	\$ 45 233 000		\$ -	45 233.00	\$ 45 233 000.00		\$ -																							
103.1	3-11608	900-13		transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien metros (100,00 m)	m3-km		\$ 1 000		12 819 265.00	\$ 12 819 265 000	1 730 372.50	\$ 1 730 372 500	4 068 906.20	\$ 4 068 906 200.00		\$ -																							
103.2	3-14101	900-13		transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien metros (100,00 m)	m3-km		\$ 1 000		1 837 785.00	\$ 1 837 785 000		\$ -	1 724.00	\$ 1 724 000.00		\$ -																							
103.3	3-15101	900-13		transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores de mil metros (1.000,00 m), medido a partir de cien metros (100,00 m)	m3-km		\$ 1 000		3 675 571.00	\$ 3 675 571 000	302 452.90	\$ 302 452 900	1 018 261.30	\$ 1 018 261 300.00		\$ -																							

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA										CÓDIGO VERSIÓN PÁGINA		MEPI-MN1-IN-4-FR-1 1 7 DE 9																														
UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES															DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA					ACTA No. 19			VALOR BÁSICO ACTA: \$ 15 486 830 918.00			FECHA: 26/1/2023 (Día / Mes / Año)			MES: enero-2023															
CONTRATO No.: 983 DE 2021 (Indique número y año)															PLAZO INICIAL: 37 MESES (En meses según contrato principal)										PLAZO ACUMULADO: 37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)																			
OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO NO. 2															FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 (Indique día/mes/año)										FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)																			
CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vía)															FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)										FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)																			
CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 967 DE 2021															INTERVENTOR: CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL										VALOR INICIAL (incluido I*): \$ 389 978 471 425.00										VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B):									
															VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): \$ 389 978 471 425.00																													
No. DE ORDEN		GRUPO DE AJUSTE		ESPECIFICACIÓN GRAL. PART.		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)						CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 6 de fecha 20/12/22				OBRA EJECUTADA																												
						DESCRIPCIÓN ÍTEM		UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR																									
Subtotal						ÍTEM NO PREVISTOS																																						
105		1		211-13		remoción de derrumbes (no incluye transporte)						M3				\$ 9 121 \$ -				1 344.00 \$ 12 258 624				\$ - 1 344.00 \$ 12 258 624.00																				
105.1		1-11601		211-13		remoción de derrumbes (no incluye transporte)						M3				\$ 9 121 \$ -				68 838.00 \$ 627 871 398 3 066.00				\$ 27 964 986 58 450.00 \$ 533 122 450.00																				
106		1		310.1P		conformación de calzada existente						M2				\$ 1 317 \$ -				\$ - \$ -				\$ - \$ -																				
106.1		1-11601		310.1P		conformación de calzada existente						M2				\$ 1 317 \$ -				48 441.00 \$ 63 796 797				\$ - 41 148.00 \$ 54 191 916.00																				
107		2		320.1P		mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y						M3				\$ 88 378 \$ -				3 060.00 \$ 270 436 680				\$ - 3 060.00 \$ 270 436 680.00																				
107.1		2-11602		320.1P		mejoramiento de vía con material de fresado y subbase granular (sbg 60%) (incluye acopio, mezcla, cargue y transporte)						M3				\$ 88 378 \$ -				7 103.00 \$ 627 748 934				\$ - 3 041.00 \$ 268 757 498.00																				
108		2		230.1P		mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)						M3				\$ 13 724 \$ -				\$ - \$ -				\$ - \$ -																				
108.1		2-11602		230.1P		mejoramiento de la subrasante con material de sitio (no incluye transporte)						M3				\$ 13 724 \$ -				432.00 \$ 5 928 768				\$ - \$ -																				
109.0		5		NP-05P		limpieza de estructuras de drenaje						UND				\$ 646 464 \$ -				\$ - \$ -				\$ - \$ -																				
109.1		5-11604		NP-05P		limpieza de estructuras de drenaje						UND				\$ 646 464 \$ -				10.00 \$ 6 464 640				\$ - \$ -																				
110		3		900-13		transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir						M3-KM				\$ 1 000 \$ -				28 504.00 \$ 28 504 000				\$ - 28 504.00 \$ 28 504 000.00																				
110.1		3-11608		900-13		transporte de material de fresado y/o derrumbe para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir						M3-KM				\$ 1 000 \$ -				1 058 597.30 \$ 1 058 597 300 88 914.00				\$ 88 914 000 959 385.10 \$ 959 385 100.00																				
111.0		3		900-13		transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100						M3 -KM				\$ 1 182 \$ -				\$ - \$ -				\$ - \$ -																				
111.1		3-11608		900-13		transporte de material de fresado para distancias mayores de mil metros (1.000 m) medido a partir de cien metros (100						M3 -KM				\$ 1 182 \$ -				38 139.00 \$ 45 080 298				\$ - 21 254.00 \$ 25 122 228.00																				
112		5		681-13		gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado						M3				\$ 267 346 \$ -				\$ - \$ -				\$ - \$ -																				
112.1		5-11606		681-13		gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado						M3				\$ 267 346 \$ -				196.00 \$ 52 399 816 128.00				\$ 34 220 288 128.00 \$ 34 220 288.00																				
112.2		5-11604		681-13		gavión de malla de alambre de acero entrelazado clase 1; recubrimiento de zinc galvanizado						M3				\$ 267 346 \$ -				1 700.00 \$ 454 488 200				\$ - 882.00 \$ 235 799 172.00																				
113		1		221.1P		enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)						M3				\$ 18 619 \$ -				\$ - \$ -				\$ - \$ -																				
113.1		1-11602		221.1P		enrocado con material proveniente de derrumbe o excavación (incluye transporte)						M3				\$ 18 619 \$ -				240.00 \$ 4 468 560				\$ - \$ -																				
114		2		330.2P		instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)						M3				\$ 21 395 \$ -				\$ - \$ -				\$ - \$ -																				
114.1		2-11602		330.2P		instalación de material de fresado (incluye acopio, cargue y transporte)						M3				\$ 21 395 \$ -				1.00 \$ 21 395				\$ - \$ -																				
115		2		230.2P		mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)						M3				\$ 100 111 \$ -				1 515.00 \$ 151 668 165				\$ - 1 515.00 \$ 151 668 165.00																				
115.1		2-11602		230.2P		mejoramiento de la subrasante con adición de material (incluye suministro y transporte)						M3				\$ 100 111 \$ -				226.00 \$ 22 625 086				\$ - 226.00 \$ 22 625 086.00																				
116		1		200-13		talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)						U				\$ 255 977 \$ -				\$ - \$ -				\$ - \$ -																				
116.1		1-11606		200-13		talado de arboles h<5m (incluye transporte, no incluye elevador)						U				\$ 255 977 \$ -				316.00 \$ 80 888 732				\$ - 137.00 \$ 35 068 849.00																				
117		1		200-13		talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)						U				\$ 427 938 \$ -				\$ - \$ -				\$ - \$ -																				
117.1		1-11606		200-13		talado de arboles 5<h<=10m (incluye transporte, no incluye elevador)						U				\$ 427 938 \$ -				5 071.00 \$ 2 170 073 598				\$ - 3 629.00 \$ 1 552 987 002.00																				
118		1		200-13		talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)						U				\$ 733 607 \$ -				\$ - \$ -				\$ - \$ -																				
118.1		1-11606		200-13		talado de arboles 10<h<=20m (incluye transporte, no incluye elevador)						U				\$ 733 607 \$ -				1 070.00 \$ 784 959 490				\$ - 977.00 \$ 716 734 039.00																				
119		1		200-13		talado de arboles h>20m (incluye transporte, no incluye elevador)						U				\$ 1 118 742 \$ -				\$ - \$ -				\$ - \$ -																				

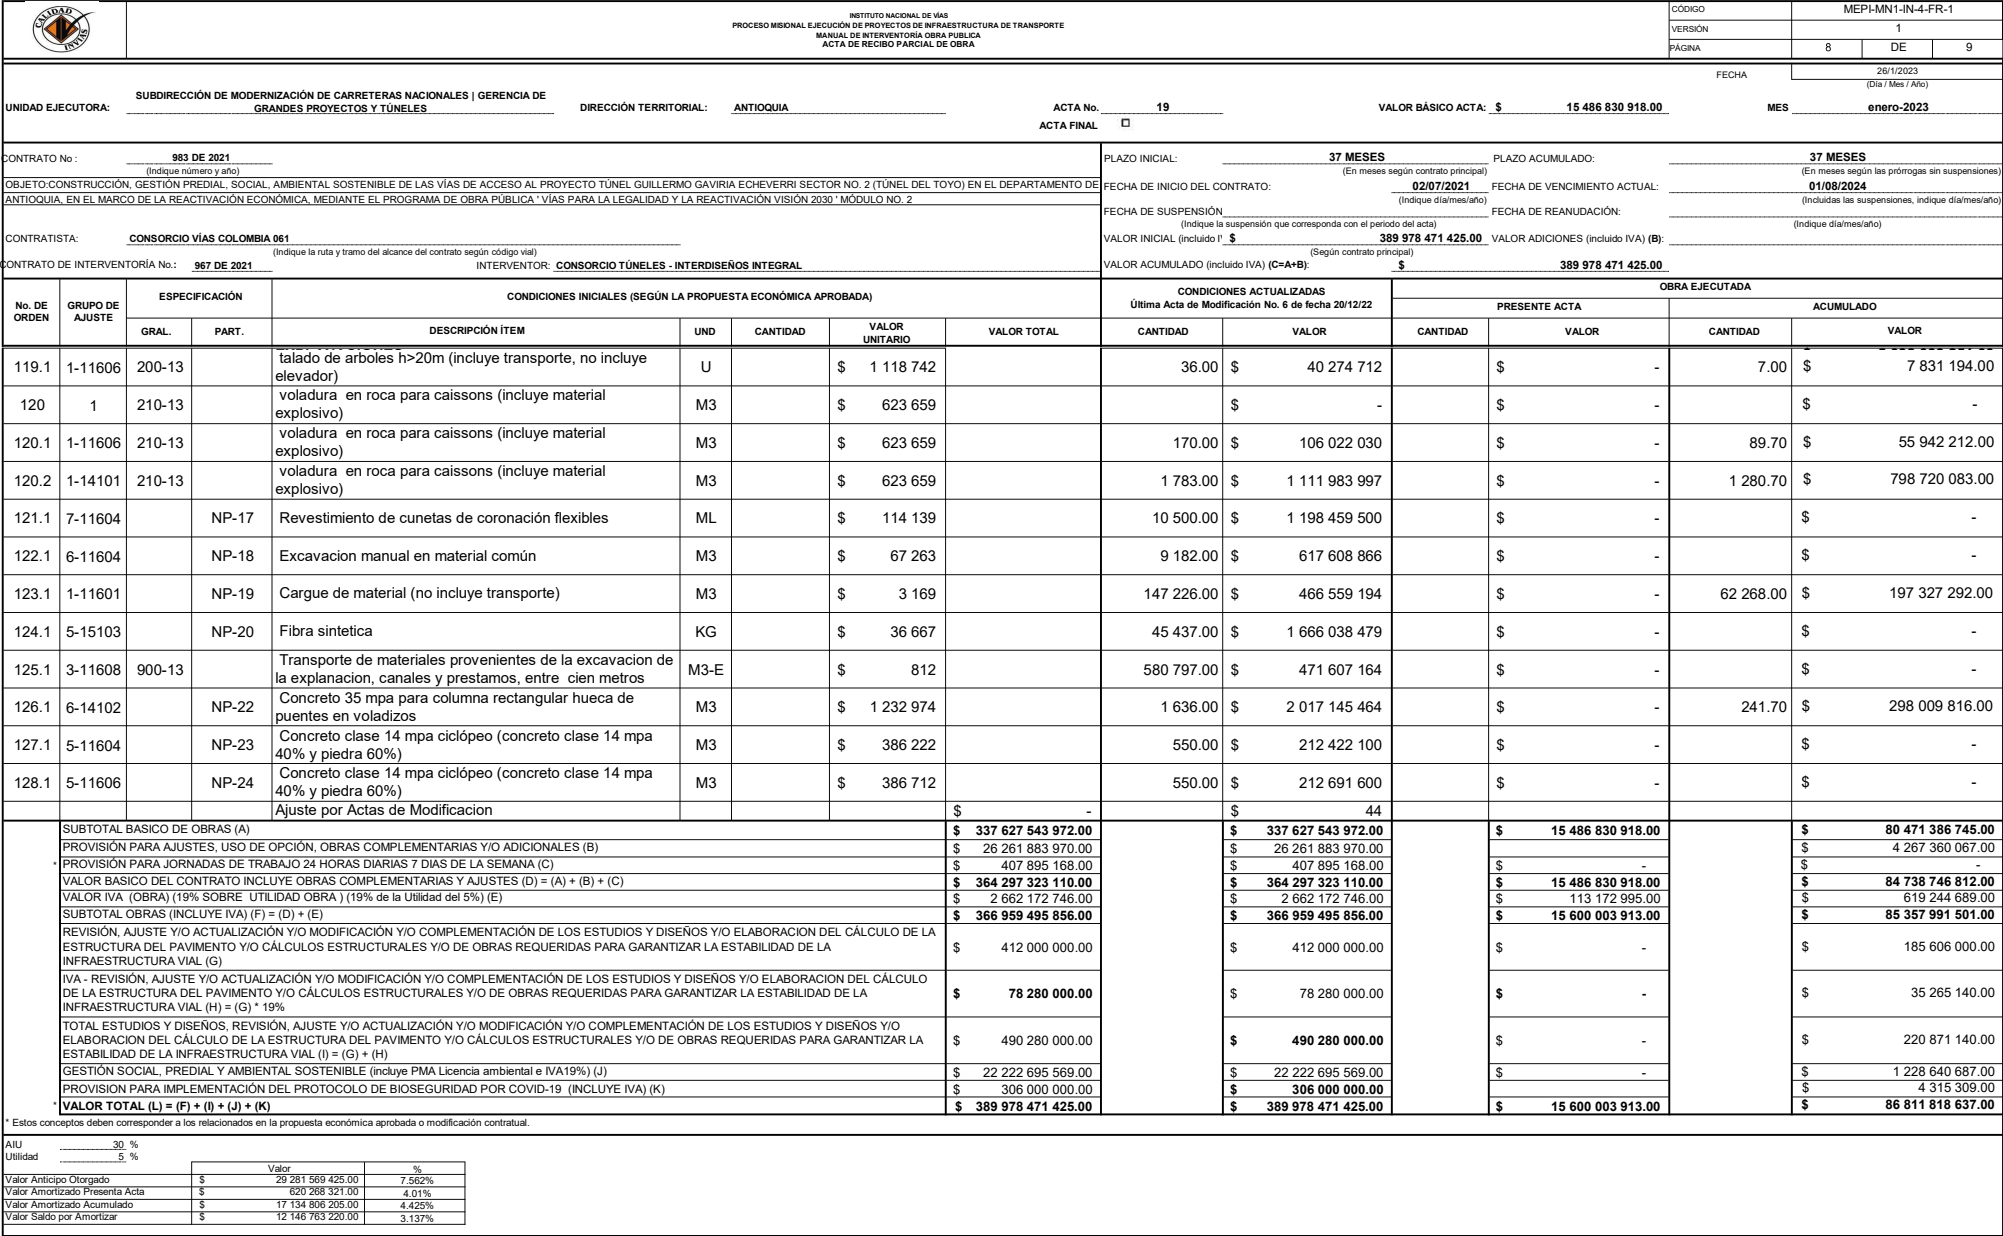

FECHA	26/1/2023 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES | GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA

ACTA No. 19

VALOR BÁSICO ACTA: \$ 15 486 830 918.00

MES enero-2023

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No: 983 DE 2021
(Indique número y año)

OBJETO:CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 'MÓDULO NO. 2

PLAZO INICIAL:	37 MESES (En meses según contrato principal)	PLAZO ACUMULADO:	37 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
----------------	--	------------------	--

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 02/07/2021 FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 01/08/2024
(Indique día/mes/año) (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN _____ FECHA DE REANUDACIÓN: _____
(Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) (Indique día/mes/año)

CONTRATISTA: CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: **967 DE 2021** INTERVENTOR: **CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL**

VALOR INICIAL (incluido I) \$ 389 978 471 425.00 VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): _____
(Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B):	\$	389 978 471 425.00
---	----	--------------------

[illegible]

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	\$ 15 486 830 918.00	\$ 113 172 995.00	\$ 15 600 003 913
PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	\$ -	\$ -	\$ -
PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA (C)	\$ -	\$ -	\$ -
ESTUDIOS Y DISEÑOS (PLANTILLA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN PREDIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN SOCIAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
GESTIÓN AMBIENTAL (PREACTA)	\$ -	\$ -	\$ -
PROVISIÓN PARA IMPLEMENTACIÓN DEL	\$ -	\$ -	\$ -
VALOR TOTAL PRESENTE MES	\$ 15 486 830 918.00	\$ 113 172 995.00	\$ 15 600 003 913

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
E	\$ 882 008 811	\$ 9 002 222 912
B	\$ -	\$ 875 407 429
PA	\$ -	\$ -
PC	\$ -	\$ -
ED	\$ 5 053 212 927	\$ 38 274 832 834
OS	\$ 7 429 869 780	\$ 26 037 053 216
SCT	\$ -	\$ 134 734 526
OV	\$ -	\$ -
T	\$ 2 121 739 400	\$ 6 147 135 828
TOTAL	\$ 15 486 830 918	\$ 80 471 386 745

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)
 * Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
1 Obras de Explanación	\$ 882 008 811	\$ 9 002 222 912
2 Sub-bases y bases	\$ -	\$ 875 407 429
3 Transporte de materiales	\$ 2 121 739 400	\$ 6 147 135 828
4 Aceros y elementos metálicos	\$ 4 478 307 765	\$ 28 951 163 060
5 Concretos, morteros y obras varias	\$ 7 675 624 827	\$ 29 434 486 649
6 Concreto para estructuras de puentes	\$ 258 819 000	\$ 5 376 316 662
7 Pavimentaciones con asfalto, pinturas, geotextiles	\$ 70 331 115	\$ 684 654 205
(N) Ítems no sujetos a ajuste	\$ -	\$ 5 549 285 219
TOTAL	\$ 15 486 830 918	\$ 86 020 671 964

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE ICOCIV (si aplica)			
GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA		VALOR ACUMULADO
11601	\$ 879 483 811.00	\$	5 832 414 533.00
11602	\$ 2 525 000.00	\$	877 932 429.00
11604	\$ 77 144 076.00	\$	684 250 356.00
11606	\$ 5 810 385 612.00	\$	34 118 598 548.00
11607	\$ -	\$	151 894 526.00
11608	\$ 1 819 286 500.00	\$	5 127 150 528.00
14101	\$ -	\$	4 220 874 558.00
14102	\$ -	\$	2 420 216 744.00
14103	\$ -	\$	1 638 498 111.00
14104	\$ -	\$	496 377 431.00
15101	\$ 302 452 900.00	\$	1 018 261 300.00
15102	\$ 3 479 699 211.00	\$	15 729 421 686.00
15103	\$ 2 816 432 000.00	\$	7 166 472 200.00
15104	\$ 299 421 808.00	\$	989 023 795.00
(N) Items no sujetos a ajuste	\$ -	\$	5 549 285 219.00
Total	\$ 15 486 830 918.00	\$	86 020 671 964.00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	15 486 830 918
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO:	\$	14 866 562 597

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: \$ 14 979 735 592
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: CATORCE MIL NOVECIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS TREINTA Y CINCO MIL QUINIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS M/CTE.

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES	
---------------	--

NOTAS:


1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numerará con el número que corresponda a la primera acta del período seguida de la letra A, situación que debe indicarse en el campo de Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los aportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.
3. El Interventor y el Contratista aceptan la plena responsabilidad por la veracidad de los datos que se usen para la verificación de las condiciones en esta Acta, así como, los valores, así como los costos administrativos.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la Interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo a los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea el caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental y el PMU.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma: 
Nombre: MIGUEL SRAEL VELASQUEZ VEL
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25202-376479 CND

Firma: 
Nombre: **JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: **25202-32230 CND**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial

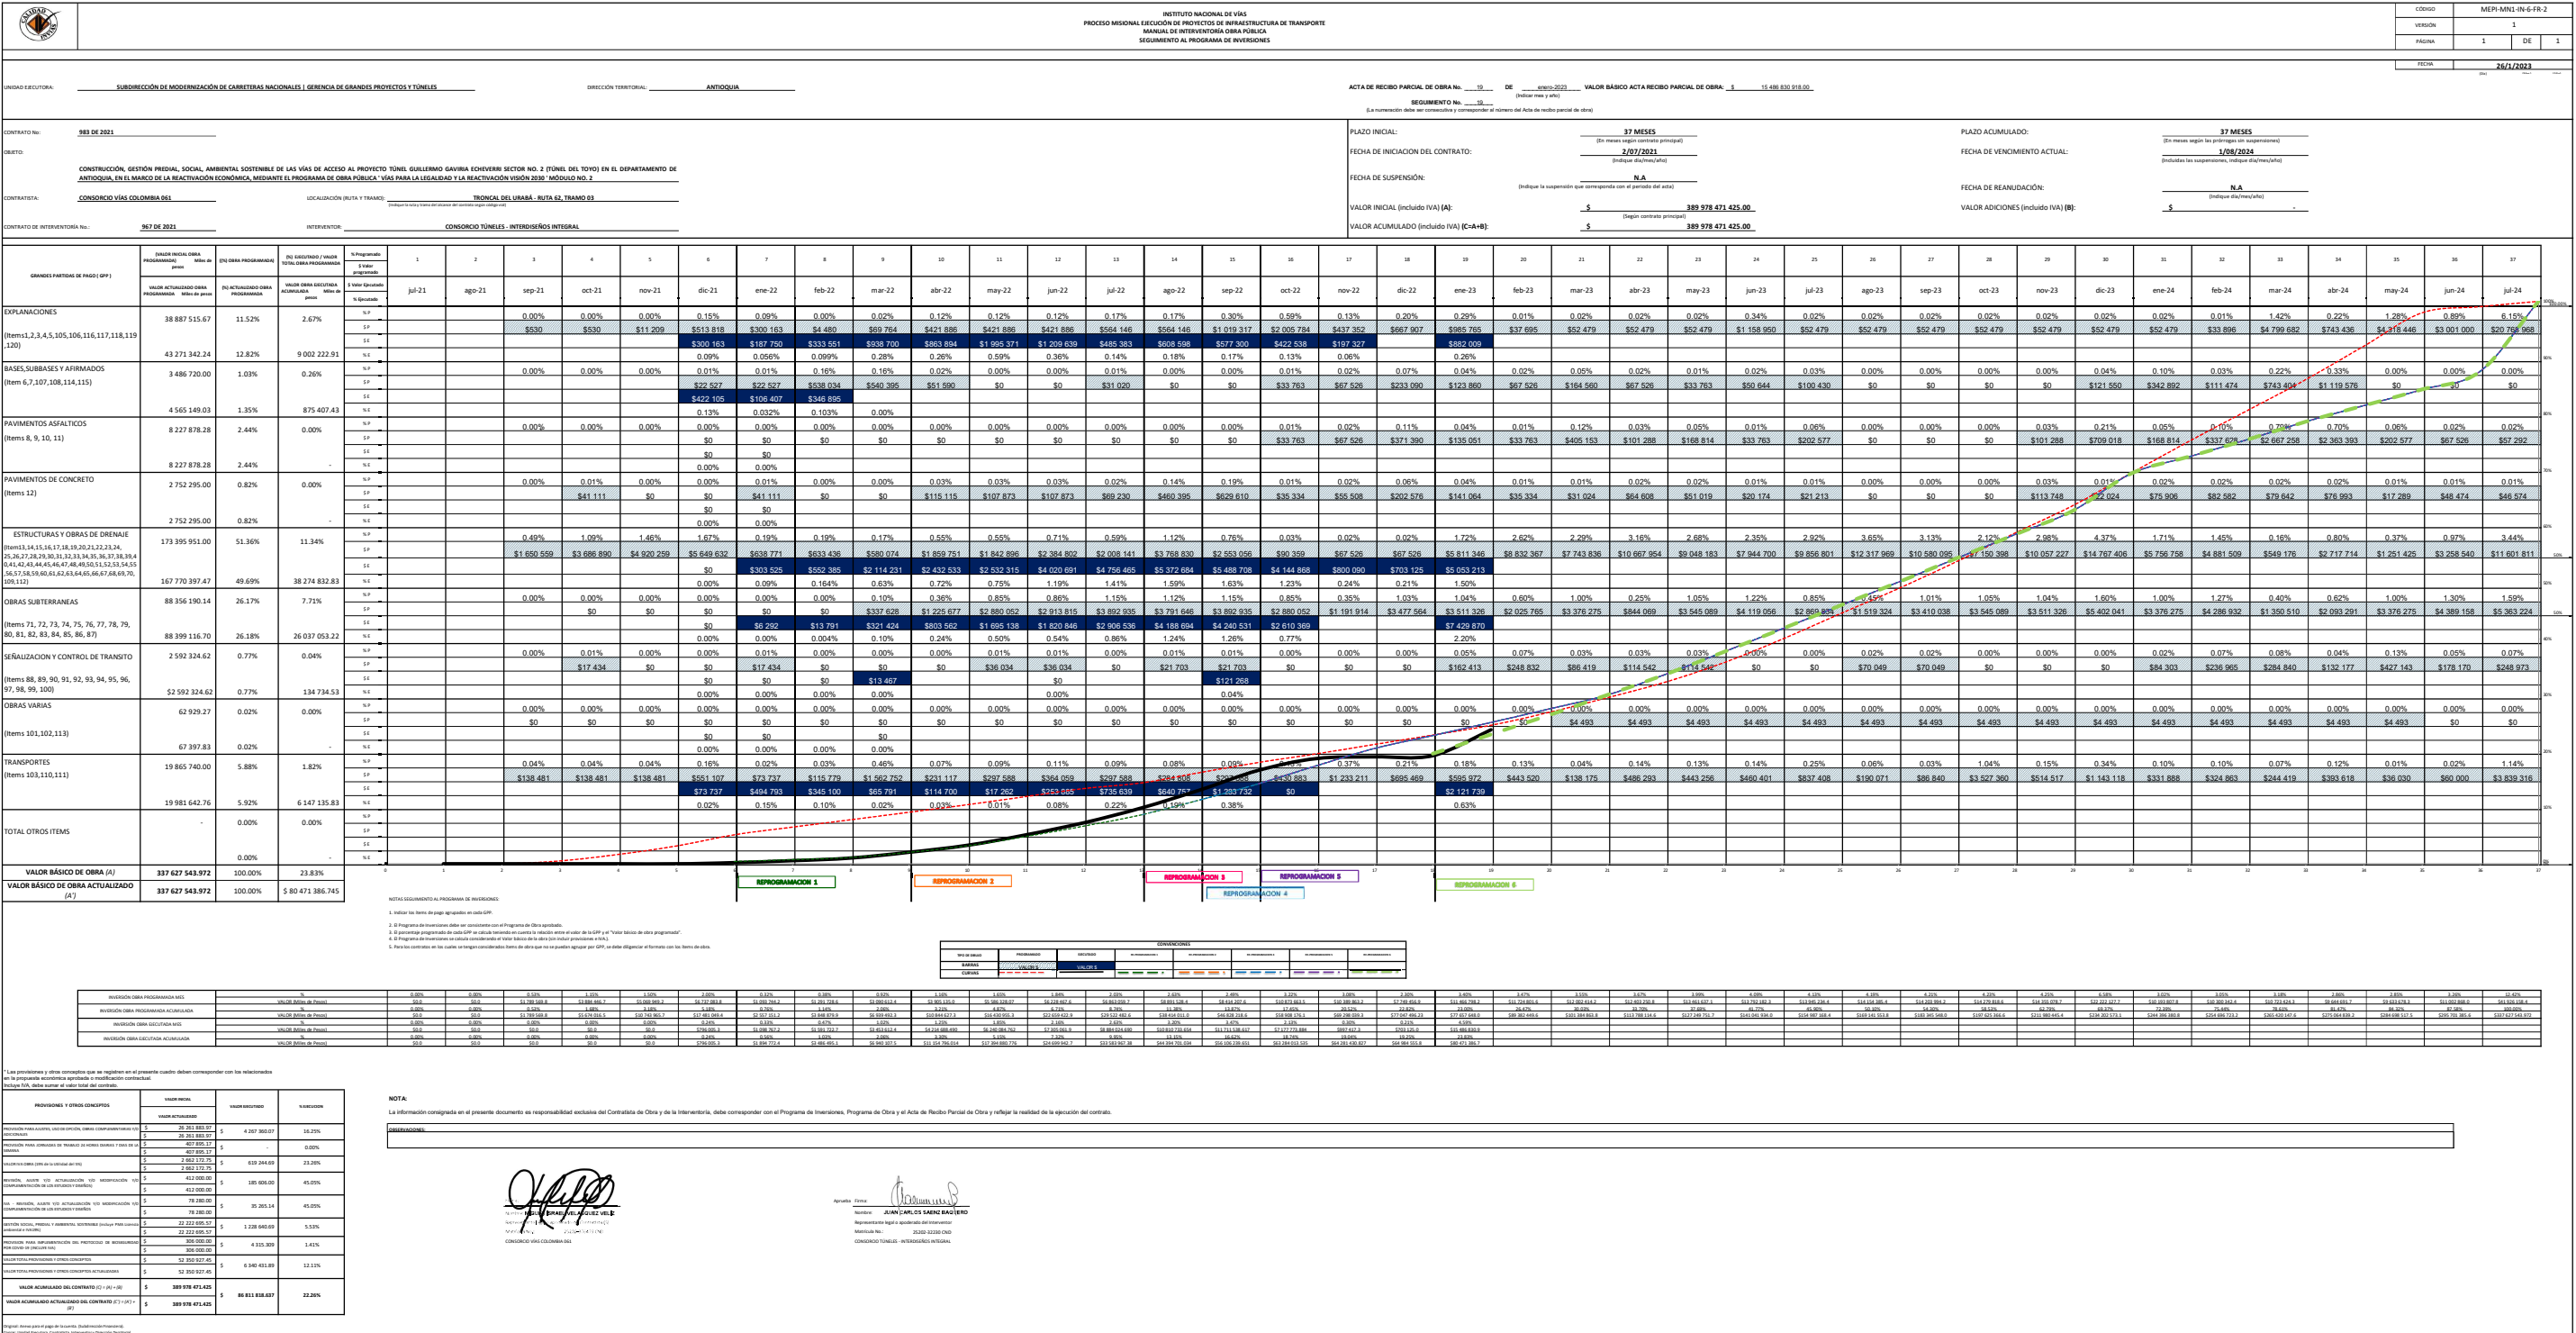



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE
AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES

CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
VERSIÓN	1		
PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: 983 DE 2021

	%	TIPO PAGO:	NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO		ACTA DE OBRA ☒	<u>19</u>	<u>enero-2023</u>
PAGO ANTICIPADO		ACTA DE INTERVENTORIA ☐	<u> </u>	<u> </u>
DESEMBOLSO		ACTA DE AJUSTE ☐	<u> </u>	<u> </u>
		PRESTACION DE SERVICIOS ☐	<u> </u>	<u> </u>
		OTRO ☐	<u> </u>	<u> </u>
		CUAL? <u> </u>	<u> </u>	<u> </u>

NO. COMPROMISO:	<u>96623</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-0-2401009-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>4 486 462 682.00</u>
NO. COMPROMISO:	<u>96623</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-0-2401015-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>9 416 566 026.00</u>
NO. COMPROMISO:	<u>96623</u>	RUBRO NO.:	<u>C-2401-0600-107-0-2401017-02</u>	RECURSO NO.:	<u>11</u>	VALOR AFECTADO: \$	<u>1 076 706 884.00</u>
NO. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO NO.:	<u> </u>	RECURSO NO.:	<u> </u>	VALOR AFECTADO:	<u> </u>
NO. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO NO.:	<u> </u>	RECURSO NO.:	<u> </u>	VALOR AFECTADO:	<u> </u>
NO. COMPROMISO:	<u> </u>	RUBRO NO.:	<u> </u>	RECURSO NO.:	<u> </u>	VALOR AFECTADO:	<u> </u>
						TOTAL ACTA: \$	<u>14 979 735 592.00</u>

Firmado
digitalmente por
MAURICIO HOYOS
SIERRA

SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
MAURICIO HOYOS SIERRA
Matrícula No. 05202096971 ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL					CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
						VERSIÓN	1		
						PÁGINA	1	DE	1

Contrato N°:	983 DE 2021	Contratista:	CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061
--------------	--------------------	--------------	------------------------------------

Objeto del Contrato : **CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2**

Acta No.:	19	Valor basico:	\$ 15 486 830 918.00	Período:	enero-2023
Valor Incluido Iva:		\$	15 600 003 913.00		

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo via)	Denominación (carretera - puente -túnel)	Valor incluido IVA (construcción, rehabilitación, mejoramiento)	Valor incluido IVA Provision para Servicios del Túnel	Valor incluido IVA Estudios y Diseños	Valor incluido IVA (gestion social, predial y ambiental)	Valor incluido IVA Provision implementación protocolo de bioseguridad	Subtotal
1	6203	CARRETERA	\$ 7 420 001 254.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 7 420 001 254.00
2	6203	PUENTE		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
3	6203	TUNEL	\$ 8 180 002 659.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8 180 002 659.00
4	6203	ESTUDIOS Y DISEÑOS	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
5	6203	AMBIENTAL , SOCIAL Y PREDIAL	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
6	6203	PROVISION IMPLEMENTACIÓN PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTALES			\$ 15 600 003 913.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 15 600 003 913.00

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	ANTIOQUIA		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
890907569-1	MUNICIPIO 1	SANTA FÉ DE ANTIOQUIA	\$ 15 600 003 913.00	\$ 15 486 830 918.00
890983786-7	MUNICIPIO 2	GIRALDO	\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 3		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 4		\$ -	\$ -
	MUNICIPIO 5		\$ -	\$ -
TOTAL ANTIOQUIA			\$ 15 600 003 913.00	\$ 15 486 830 918.00

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			\$ -
	MUNICIPIO 2			\$ -
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 2			\$ -	\$ -


NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
TOTAL DEPARTAMENTO 3			\$ -	\$ -





MIGUEL ISRAEL VELASQUEZ VELIZ
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 Matricula No.: 25202-376479 CND
Contratista



JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO
 REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
 Matricula No.: 25202-32230 CND
Interventoria

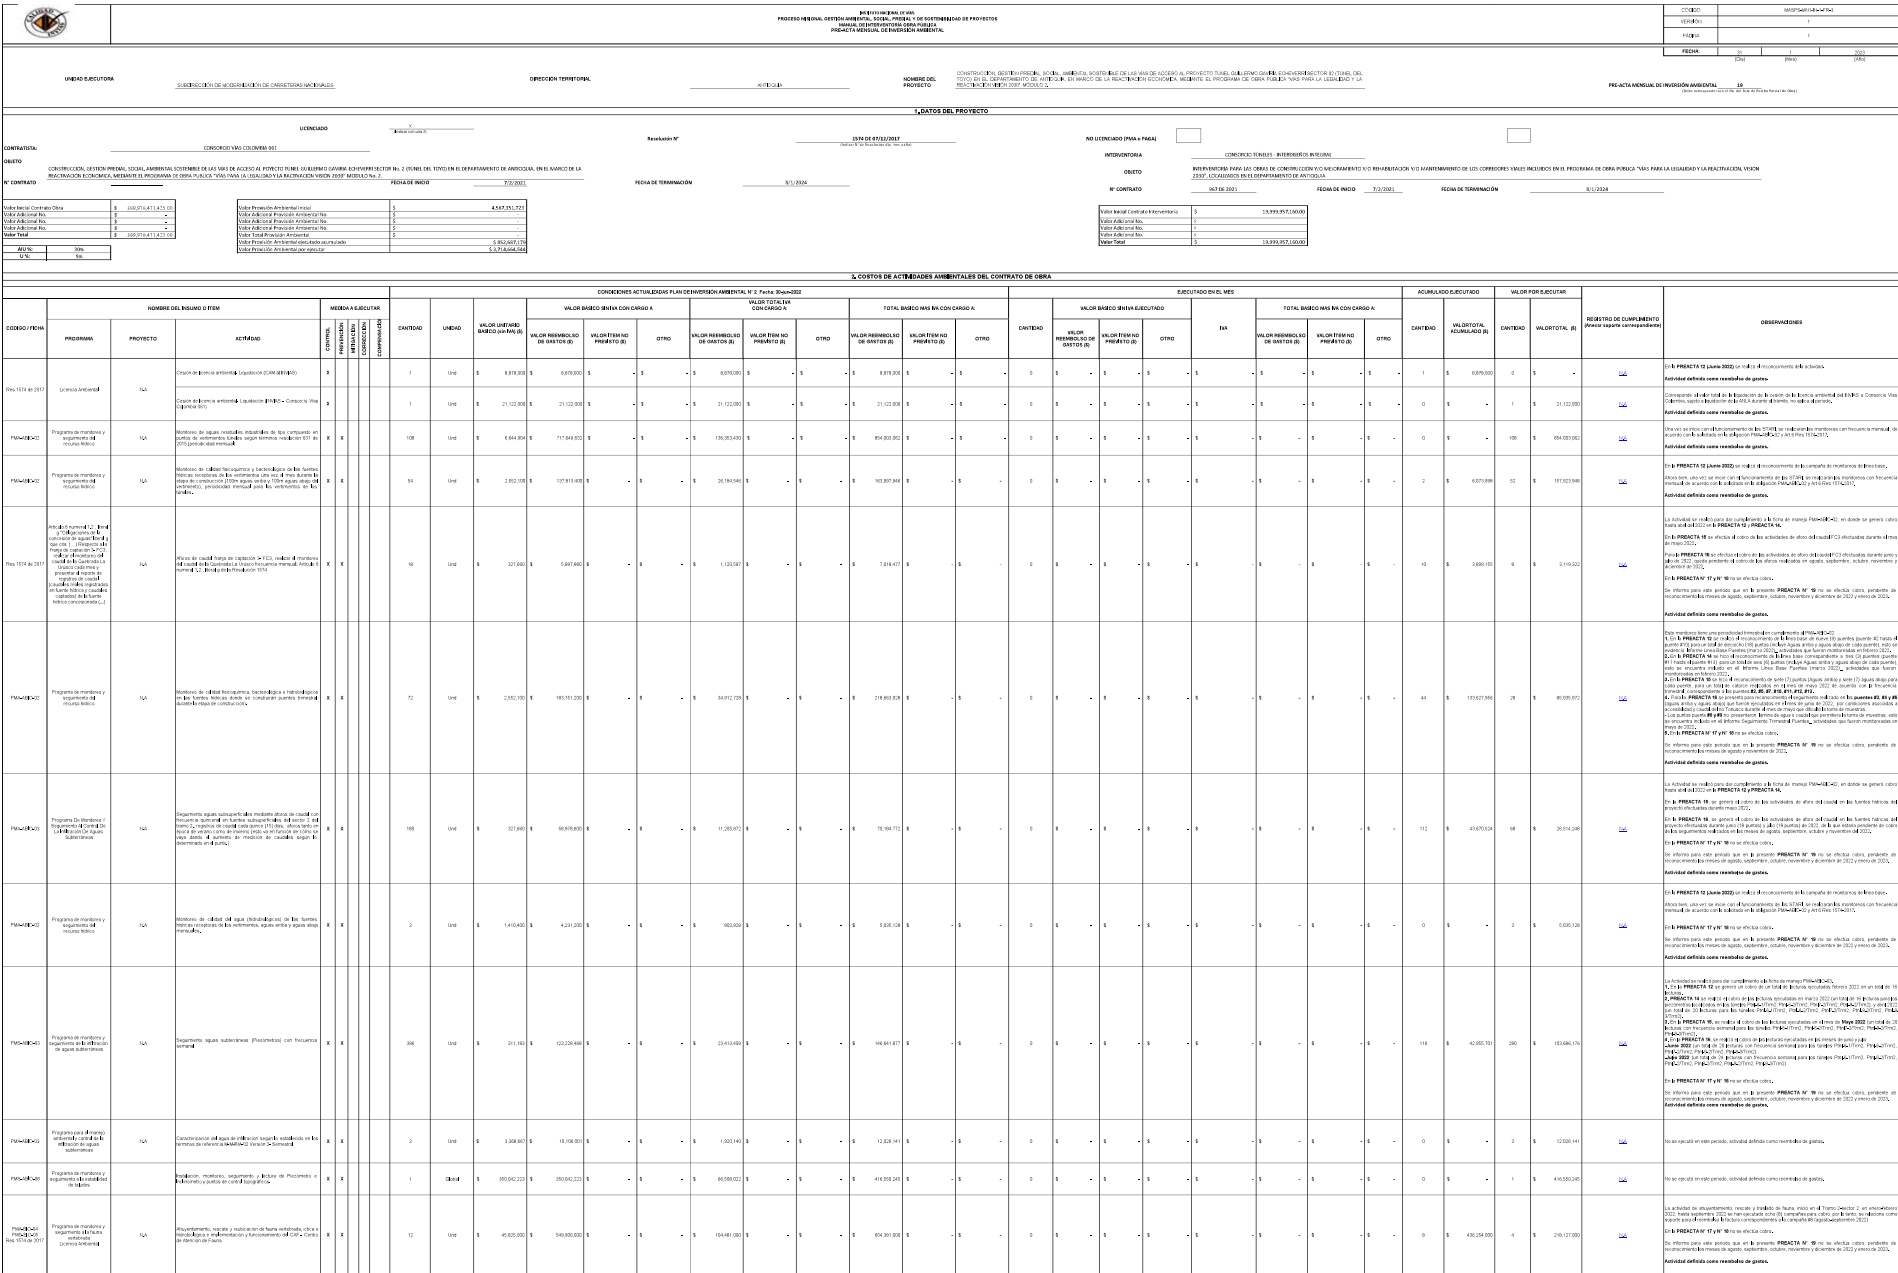


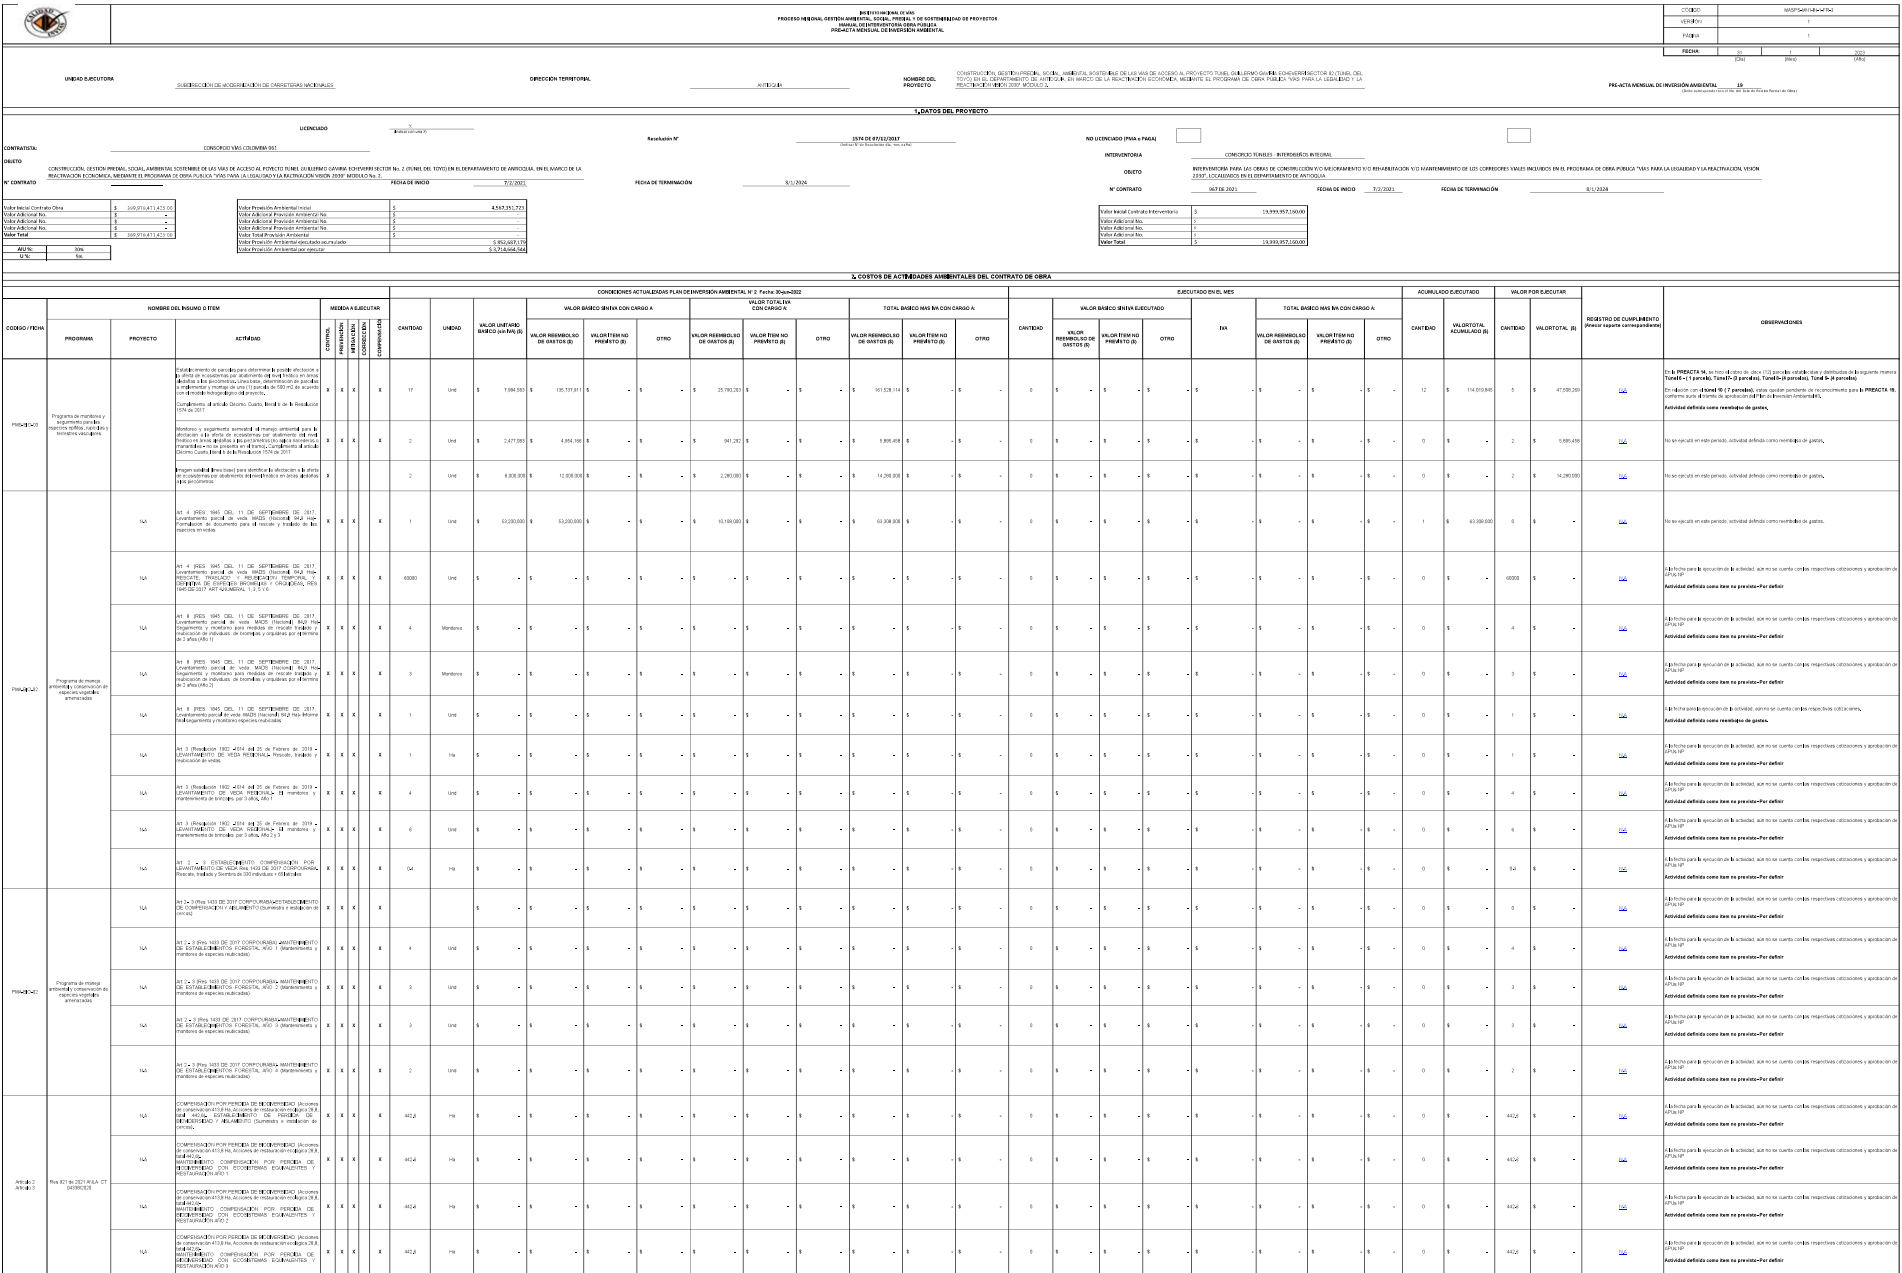

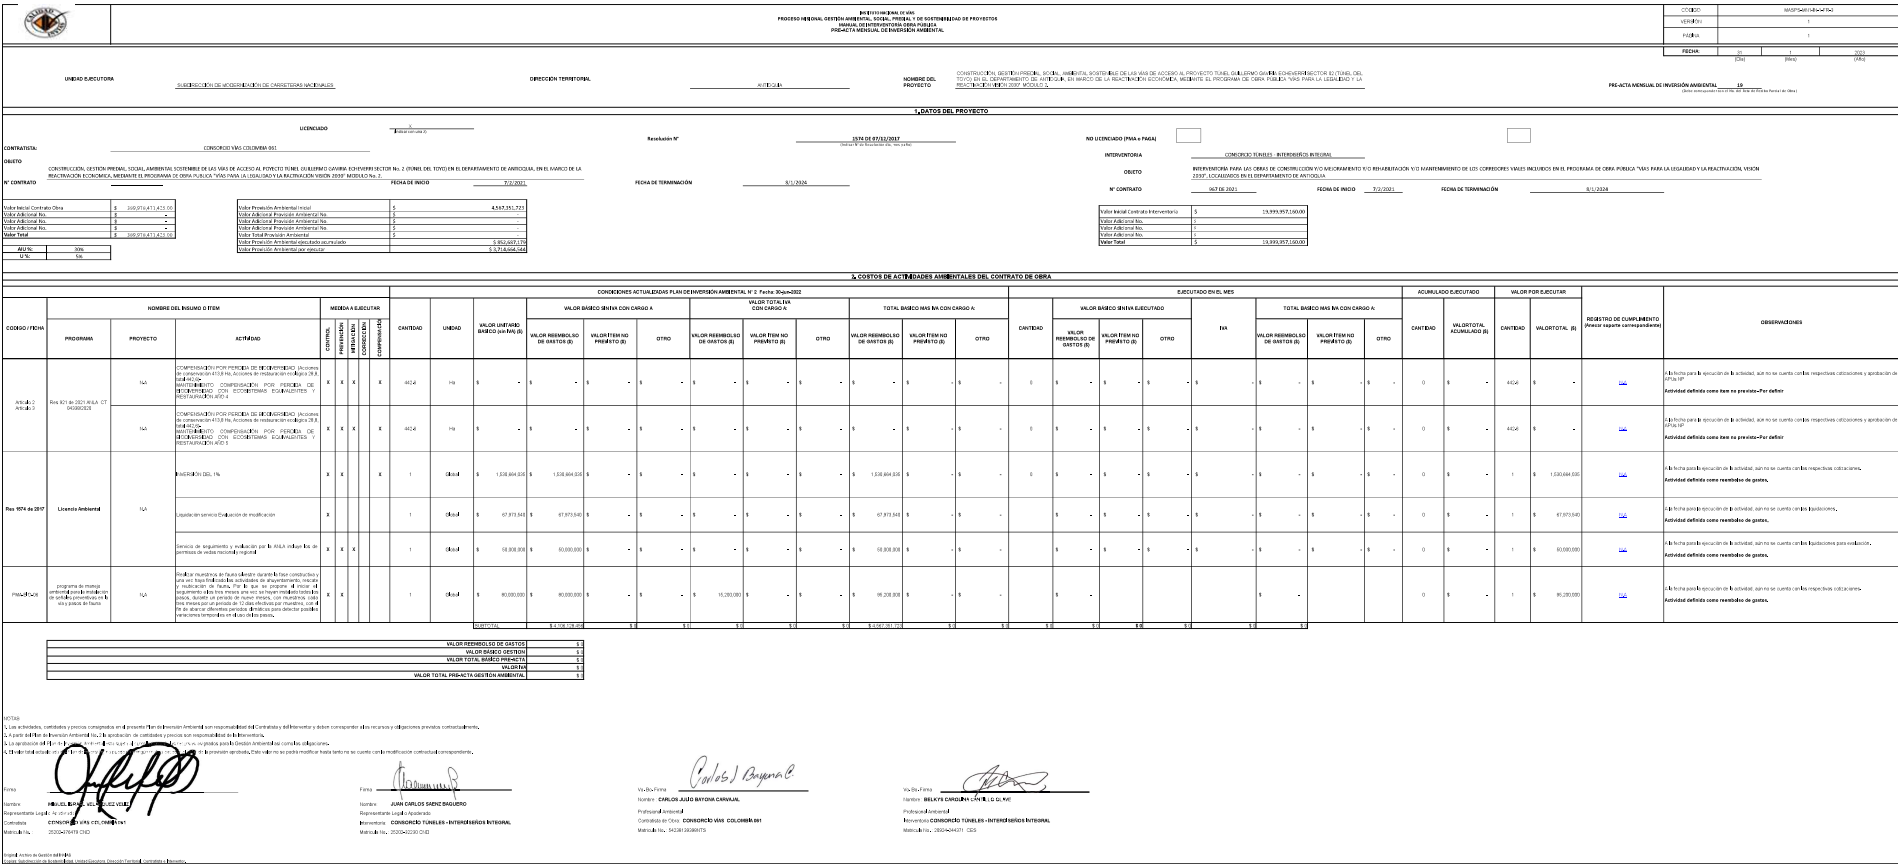

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE GESTIÓN Y ADQUISICIÓN PREDIAL	CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 DE 1

		FECHA		26/1/2023 (Día / Mes / Año)
I. INFORMACION GENERAL				
SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE				
1. UNIDAD EJECUTORA: GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES		2. DIRECCIÓN TERRITORIAL: ANTIOQUIA		
3. AÑO : 2023 MES 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12		4. FECHA DE ELABORACIÓN: 26/1/2023		
5. LOCALIZACIÓN: RUTA: TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03		TRAMO:		SECTOR 2
6. CONTRATO DE OBRA No: 983 DE 2021				
7. OBJETO: CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2				
8. CONTRATISTA:		CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061		NIT 901.472.786-3
9. INTERVENTOR:		CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL		NIT
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:				
11. PLAZO INICIAL: 37 MESES		12. FECHA DE INICIO: 2/07/2021		13. FECHA DE REANUDACIÓN: N/A
14. PLAZO ACUMULADO: 37 MESES		15. FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A		16. FECHA DE VENCIMIENTO: 1/08/2024
17. TIPO DE GESTIÓN: PREDIAL		18. VR. DE LA GESTIÓN: 0		19. VR. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL: 0
II. INFORMACION FINANCIERA				
20. VR. INICIAL (INCLUIDO) \$		-		
21. VR. ANTICIPO: \$		-		
22. VR. ADICIÓN No: \$		-		
23. VR. ADICIÓN No: \$		-		
24. VR. TOTAL ADICIONES: \$		-		
25. VR. TOTAL \$		-		
III. INFORMACION BASE LIQUIDACIÓN				
1. GESTIÓN MENSUAL PREDIAL (B) (Valor / Cantidad)		CANTIDAD	V/R UNIDAD.	TOTAL
ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL	26. ELABORACIÓN FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRÁFICO CON SOPORTES INMUEBLE	0	1 394 000	0
	27. ELABORACIÓN DE FICHA PREDIAL, COMPONENTE TÉCNICO Y TOPOGRAFICO CON SOPORTES DEL INMUEBLE + REQUERIMIENTO DE IDENTIFICACIÓN ENCARGO VALUATORIO (RES. 2684/2015)	0	2 788 000	0
	28. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL PROYECTO, PREVIA AUTORIZACION INVIAS, CON TRABAJO DE CAMPO	0	1 045 000	0
	29. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (TERRENO)	0	348 500	0
	30. ELABORACION DE LA FICHA PREDIAL CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES PARA CONSTRUCCIONES, MEJORAS Y ESPECIES	0	1 074 000	0
ELABORACIÓN DE TÍTULOS	31. MODIFICAR Y/O ACTUALIZAR FICHA PREDIAL POR RAZON INHERENTE AL	0	805 500	0
	32. ELABORACIÓN DE LA FICHA TÉCNICA SIN COMPONENTE TOPOGRÁFICO (MEJORA)	0	268 500	0
	33. ELABORACIÓN DE ESTUDIO DE TÍTULOS PROPIETARIO CON LOS RESPECTIVOS SOPORTES (TERRENO)	0	754 000	0
ACLARACIÓN DE CABIDA Y LINDEROS	34. AJUSTE AL ESTUDIO DE TÍTULOS POR CAMBIOS EN LA SITUACION JURIDICA DEL INMUEBLE POSTERIORES A SU APROBACIÓN	0	377 000	0
	35. ESTUDIO DE TITULOS (DIAGNÓSTICO JURÍDICO) PARA MEJORAS	0	377 000	0
	36. SOLICITUD ANTE IGAC O AUTORIDAD CATASTRAL CORRESPONDIENTE PARA ACTUALIZACIÓN CABIDA Y/O LINDEROS	0	320 000	0
ELABORACIÓN DE AVALUO COMERCIAL	37. LEVANTAMIENTO TOPOGRÁFICO DE ÁREA RESTANTE POR HECTÁREA (INCLUYE PLANO CON COORDENADAS GEOGRÁFICAS)	0	217 000	0
	38. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO	0	1 340 000	0
	39. AVALÚO COMERCIAL PARA INMUEBLES CON PROPIEDAD DEL TERRENO + VALORACIÓN COMPONENTES DE LA RESOLUCIÓN MINISTERIO DE TRANSPORTE 2684 DE 2015, CON LOS COMPONENTES DE DAÑO EMERGENTE Y LUCRO CESANTE LIQUIDADO PARA PAGO.	0	2 680 000	0
	40. ELABORACIÓN DE AVALÚO COMERCIAL PARA MEJORAS SIN TERRENO, CONSTRUCCIONES, ANEXOS Y ESPECIES PARA AVALÚOS CON VALORES SUPERIORES A 2 SMMLV	0	860 000	0
	41. AVALÚOS ENTRE 1,5 HASTA 2 SMMLV	0	640 000	0
	42. AVALÚOS ENTRE 1 HASTA 1,5 SMMLV	0	640 000	0
	43. AVALÚOS ENTRE 0 HASTA 1 SMMLV	0	640 000	0
	44. OFERTA DE COMPRA Y NOTIFICACIÓN	0	346 500	0
	45. INSCRIPCIÓN DE OFERTA DE COMPRA	0	231 000	0
	1.1. ENAJENACIÓN VOLUNTARIA (Valor / Cantidad)	46. PERMISO DE INTERVENCIÓN VOLUNTARIO DEBIDAMENTE SUSCRITO X ENTIDAD Y EL TITULAR INSCRITO EN FOLIO MATRÍC. INMOBILIARIA	0	346 500
47. ELABORACIÓN, LEGALIZACIÓN PROMESA DE COMPRA		0	231 000	0
48. TRÁMITE DE PRIMER PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN POR PARTE DEL VENDEDOR		0	115 500	0
49. ESCRITURA OTORGADA Y REGISTRADA DE DOMINIO A FAVOR DE INVIAS		0	115 500	0
50. TRÁMITE DE PAGO – VERIFICACIÓN DE RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR		0	231 000	0
51. RADICACIÓN SOLICITUD ANTE IGAC O CATASTROS DESCENTRALIZADOS PARA ASIGNACIÓN N° PREDIAL NACIONAL Y/O ACTUALIZ. INFORMACIÓN CATASTRAL		0	231 000	0
1.2. TRÁMITES ADICIONALES PARA INICIO DE EXPROPIACIÓN JUDICIAL (Valor / Cantidad)	52. ELABORACIÓN Y NOTIFICACIÓN DE RESOLUCIÓN DE EXPROPIACIÓN (PREVIO AGOTAMIENTO ETAPA ENAJENACIÓN VOLUNTARIA)	0	321 000	0
	53. CONTESTACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	321 000	0
	54. NOTIFICACIÓN DE RECURSO DE REPOSICIÓN EN VÍA ADMINISTRATIVA	0	107 000	0
	55. PRESENTACIÓN DEMANDA ADMITIDA CON SOLICITUD ENTREGA ANTICIPADA	0	749 000	0
	56. ENTREGA REAL Y MATERIAL DEL INMUEBLE POR PARTE DEL JUEZ O QUIEN ESTE COMISIONE	0	642 000	0
1.3. COMPRA DE MEJORAS PREVIA AUORIZACION DE SMA (Valor / Cantidad)	57. PROPUESTA COMPRA DE MEJORAS	0	150 000	0
	58. DOCUMENTO DE COMPRAVENTA DE MEJORAS Y LEGALIZACIÓN	0	300 000	0
	59. ENTREGA PREDIO LIBRE DE SERVICIOS PÚBLICOS, PREVIO CUMPLIMIENTO REQUISITOS DE DOCUMENTO COMPRAVENTA	0	150 000	0
1.4. RESTITUCIÓN DE BIENES DE USO PÚBLICO (Valor / Cantidad)	60. TRÁMITE DE PAGO Y RECIBO A SATISFACCIÓN DEL ÚLTIMO CONTADO POR PARTE DEL VENDEDOR	0	150 000	0
	61. TRÁMITE DE ACCIÓN POLICIVA ANTE AUTORIDAD COMPETENTE LOGRANDO LA RESTITUCIÓN	0	640 000	0
SUBTOTAL GESTION PREDIAL (1) = Suma casillas 26 a 61				0
IVA				19%
VALOR A PAGAR POR GESTIÓN PREDIAL		0		0



CÓDIGO	MASPS-MN1-IN-5-FR-11
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA	26/1/2023 (Día / Mes / Año)
-------	--------------------------------

I. INFORMACION GENERAL

1. UNIDAD EJECUTORA:		SUBDIRECCIÓN DE MODERNIZACIÓN DE CARRETERAS NACIONALES GERENCIA DE GRANDES PROYECTOS Y TÚNELES										2. DIRECCIÓN TERRITORIAL:		ANTIOQUIA					
3. AÑO : 2023		MES		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	4. FECHA DE ELABORACIÓN		26/1/2023	
5. LOCALIZACIÓN:		RUTA: TRONCAL DEL URABÁ - RUTA 62, TRAMO 03												TRAMO:		SECTOR 2			
6. CONTRATO DE OBRA No:		983 DE 2021																	
7. OBJETO:		CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL, AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TÚNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR NO. 2 (TÚNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN EL MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA ' VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACIÓN VISIÓN 2030 ' MÓDULO NO. 2																	
8. CONTRATISTA:		CONSORCIO VÍAS COLOMBIA 061												NIT		901.472.786-3			
9. INTERVENTOR:		CONSORCIO TÚNELES - INTERDISEÑOS INTEGRAL												NIT					
10. CONTRATO DE INTERVENTORÍA No:																			
11. PLAZO INICIAL:		37 MESES				12. FECHA DE INICIO:				2/07/2021				13. FECHA DE REANUDACIÓN:				N/A	
14. PLAZO ACUMULADO:		37 MESES				15. FECHA DE SUSPENSIÓN:				N/A				16. FECHA DE VENCIMIENTO:				1/08/2024	
17. TIPO DE GESTIÓN:		PREDIAL				18. V.R. DE LA GESTIÓN:				0				19. V.R. PROVISIÓN GESTIÓN PREDIAL:				0	

2. PAGOS MENSUALES POR ADQUISICIÓN PREDIAL (A)

[illegible]

Si la información excede las casillas dispuestas para tal fin, favor utilizar un anexo con la relación completa indicando aquí la cantidad de folios y el anexo parte integral de la pre-acta

62. TOTAL PAGADO POR ADQUISICIÓN DE LOS PREDIOS EN ESTA PRE ACTA (A)	0
63. SUBTOTAL PAGOS PREDIALES (2)	0
64. OTROS	0
65. IVA	0
66. VALOR A PAGAR POR ADQUISICIÓN DE PREDIOS	0

IV. VALORES LIQUIDADOS

67. VALOR TOTAL BASICO PRESENTE PREACTA	0
68. IVA PRESENTE PREACTA	0
69. VALOR TOTAL PRESENTE PREACTA (1+2)	0
70. VALOR GESTIÓN PREDIAL	0

V. CONTROL DE VALORES LIQUIDADOS

71. VALOR ACUMULADO ACTIVIDADES PEDIALES	
72. GESTIÓN PREDIAL	0
73. DESEMBOLSOS PEDIALES	0
74. OTROS	0
75. IVA	0
76. VALOR TOTAL ACUMULADO	0
77. SALDO POR EJECUTAR	

VI. FIRMAS

FIRMA DEL CONTRATISTA				FIRMA DEL INTERVENTOR			
							
NOMBRES Y APELLIDOS		MIGUEL ISMAEL VELÁSQUEZ VELIZ		NOMBRES Y APELLIDOS		JUAN CARLOS SAENZ BAQUERO	
C.C. ____ C.E. X	NÚMERO	459 947		C.C. X C.E. ____	NÚMERO		
MATRÍCULA PROFESIONAL	NÚMERO	25202-376479 CND		MATRÍCULA PROFESIONAL	NÚMERO	25202-32230 CND	
Representante Legal	☐	Apoderado	☒	Representante Legal	☐	Apoderado	☒

NOTAS

1. Las cantidades y valores consignados en la presente Preacta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
2. El Interventor certifica que revisó, verificó y aprobó las actividades de gestión y adquisición predial de responsabilidad del Contratista.
3. Las cantidades, precios unitarios y valores totales consignados en la presente preacta no pueden superar el valor de la provisión predial vigente.
4. El número de la presente preacta debe coincidir con el número del Acta de Recibo Parcial de Obra correspondiente. Si en el mes no se ejecutan actividades de gestión y adquisición predial susceptibles de pago, la preacta debe

ORIGINAL: Acta de recibo parcial de obra Archivo de Gestión del INVIAS
Copias: Contratista, Interventor, Dirección Territorial, Subdirección de Sostenibilidad

		INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD DE PROYECTOS MANUAL DE INTERVENTORIA OBRA PÚBLICA PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL - SEGUIMIENTO FINAL A LA INVERSIÓN SOCIAL DEL PROYECTO										CÓDIGO		MASPS-MN1-IN-3-FR-6							
												VERSION		1							
												PÁGINA		1 DE 1							
TIPO DE DOCUMENTO		PRE-ACTA		PRE-ACTA MENSUAL DE INVERSIÓN SOCIAL No. (coincide con No. Acta de Recibo Parcial de Obra)		19				FECHA		ENERO 2023 (Día / Mes / Año)									
UNIDAD EJECUTORA		Gerencia Grandes Proyectos y Túneles				OBJETO DEL CONTRATO		CONSTRUCCIÓN, GESTIÓN PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LAS VÍAS DE ACCESO AL PROYECTO TUNEL GUILLERMO GAVIRIA ECHEVERRI SECTOR 02 (TUNEL DEL TOYO) EN EL DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA, EN MARCO DE LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PÚBLICA "VÍAS PARA LA LEGALIDAD Y REACTIVACIÓN VISIÓN 2030" MÓDULO 2				No. CONTRATO DE OBRA / AÑO		983 de 2021							
DIRECCIÓN TERRITORIAL		Dirección Territorial Antioquia										No. CONTRATO DE INTERVENTORIA / AÑO		967 de 2021							
2. BALANCE DE LA INVERSIÓN SOCIOAMBIENTAL EN EL CONTRATO DE OBRA																					
PROYECTO		ACTIVIDAD		CONDICIONES ACTUALES PLAN DE INVERSIÓN				No. 3				INFORMACIÓN PRE-ACTA MENSUAL				INFORMACIÓN BALANCE DE INVERSIÓN SOCIAL				OBSERVACIONES	
				UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO (\$)	VALOR BÁSICO GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (\$) **	FECHA	29	AGOSTO	2022	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS) (\$) **	CANTIDAD EJECUT. MES	VALOR BÁSICO EJECUT. MES (\$) **	OTROS * (%)	VALOR OTROS MES (\$) **	VALOR MES GESTIÓN SOCIOAMBIENTAL (incluye OTROS) (\$) **	CANTIDAD EJECUT. ACUMUL. **	VALOR EJECUTADO ACUMULADO (\$) **		
PMA_SOC-01. Programa de manejo de información y participación comunitaria	Impresión de volantes		Unitario	2500	\$ 250.00	\$ 625.000.00	X			\$ 643.593.75	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 643.593.75			
	Pauta de cuñas radiales		Unitario	540	\$ 6.500	\$ 3.510.000.00	X			\$ 3.614.422.50	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 3.614.422.50			
	Refrigerios reuniones con la comunidad (Santa Fe de Antioquia)		Unitario	1700	\$ 10.000	\$ 17.000.000.00	X			\$ 17.505.750.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	59	\$ 607.552.50	\$ 16.898.197.50			
	Refrigerios reuniones con la comunidad (Giraldo)		Unitario	1700	\$ 12.296	\$ 20.903.200.00	X			\$ 21.525.070.20	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 21.525.070.20			
	Impresión de brochure		Unitario	1500	\$ 1.545	\$ 2.317.500.00	X			\$ 2.386.445.63	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.386.445.63			
	Impresión de boletín		Unitario	9000	\$ 1.610	\$ 14.490.000.00	X			\$ 14.921.077.50	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 14.921.077.50			
	Impresión de periódico		Unitario	6000	\$ 846	\$ 5.076.000.00	X			\$ 5.227.011.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 5.227.011.00			
	Impresión de cartillas de finalización de obra		Unitario	1000	\$ 2.030	\$ 2.030.000.00	X			\$ 2.090.392.50	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 2.090.392.50			
PMA_SOC-02. Programa de manejo para la educación socio ambiental al personal y a la comunidad	Video del proyecto		Global	2	\$ 25.000.000	\$ 50.000.000.00	X			\$ 51.487.500.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 51.487.500.00			
	Impresión de cartillas de buenas prácticas socio ambientales para trabajadores		Unitario	700	\$ 2.030	\$ 1.421.000.00	X			\$ 1.463.274.75	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 1.463.274.75			
	Actividades educativas socio ambientales anuales con unidades territoriales menores		Global	1	\$ 50.000.000	\$ 50.000.000.00	X			\$ 51.487.500.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 51.487.500.00			
	Apoyo y fortalecimiento a los PRAE en instituciones educativas oficiales de las unidades territoriales menores		Global	3	\$ 150.000.000	\$ 450.000.000.00	X			\$ 463.387.500.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 463.387.500.00			
	Material con mensajes de seguridad vial para comunidad estudiantil de unidades territoriales menores		Global	1	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000.00	X			\$ 37.071.000.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 37.071.000.00			
PMA_SOC-06. Programa de manejo para la potenciación del sector productivo y empleabilidad	Material con mensajes de seguridad vial para actores viales		Global	1	\$ 36.000.000	\$ 36.000.000.00	X			\$ 37.071.000.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 37.071.000.00			
	Diagnóstico del sector productivo rural y los nuevos emprendimientos en el área de influencia del proyecto		Global	1	\$ 100.000.000	\$ 100.000.000.00	X			\$ 102.975.000.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 102.975.000.00			
	Apoyo técnico y financiero a proyectos productivos en el área de influencia del proyecto		Global	2	\$ 400.000.000	\$ 800.000.000.00	X			\$ 823.800.000.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 823.800.000.00			
PMA_SOC-07. Programa de manejo para el fortalecimiento institucional y comunitario	Capacitaciones para la administración municipal de Santa Fe de Antioquia		Global	1	\$ 60.000.000	\$ 60.000.000.00	X			\$ 61.785.000.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 61.785.000.00			
	Capacitación para organizaciones comunitarias de las unidades territoriales menores		Global	6	\$ 20.000.000	\$ 120.000.000.00	X			\$ 123.570.000.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 123.570.000.00			
	Apoyo a un proyecto de desarrollo local de beneficio colectivo (no individual) en infraestructura o dotación para cada unidad territorial menor		Global	6	\$ 30.000.000	\$ 180.000.000.00	X			\$ 185.355.000.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 185.355.000.00			
Arqueología preventiva	Fase 4 - Implementación del plan de manejo arqueológico		Unitario	25	\$ 47.005.000	\$ 1.175.125.000.00	X			\$ 1.210.084.968.75	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	7	\$ 338.823.792	\$ 871.261.177.00			
	Actividades de rescate de material arqueológico y arqueología pública		Global	1	\$ 300.000.000	\$ 300.000.000.00	X			\$ 308.925.000.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 308.925.000.00			
ra Instituciones de Educación Superior y Estudiantes (Del Aula a la Obra)	Obras con participación comunitaria - Municipio de Santa Fe de Antioquia		Global	1	\$ 140.000.000	\$ 140.000.000.00	X			\$ 144.165.000.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 144.165.000.00			
	Obras con participación comunitaria - Municipio de Giraldo		Global	1	\$ 140.000.000	\$ 140.000.000.00	X			\$ 144.165.000.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	0	\$ -	\$ 144.165.000.00			
	1. Actividad del Aula a la Obra 21/04/2022	Alquiler salón y recursos localivos	Unitario	1	\$ 400.000	\$ 400.000.00	X			\$ 411.900.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 411,900	\$ -			
		Compra de cascos de seguridad	Global	1	\$ 2,169,579.5	\$ 2,169,579.50	X			\$ 2,234,124.49	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,234,124	\$ -			
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios	Global	1	\$ 1,474,000	\$ 1,474.000.00	X			\$ 1,517,851.50	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1,517,852	\$ -			
		Transporte de estudiantes a evento	Unitario	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500.000.00	X			\$ 1,544,625.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1,544,625	\$ -			
	2. Actividad del Aula a la Obra 04/05/2022	Alquiler salón y recursos localivos	Unitario	1	\$ 400.000	\$ 400.000.00	X			\$ 411.900.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 411,900	\$ -			
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios	Global	1	\$ 2,280,000	\$ 2,280.000.00	X			\$ 2,347,830.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 2,347,830	\$ -			
		Transporte de estudiantes a evento	Unitario	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500.000.00	X			\$ 1,544,625.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1,544,625	\$ -			
	3. Actividad del Aula a la Obra 27/05/2022	Alquiler salón y recursos localivos	Unitario	1	\$ 386,000	\$ 386.000.00	X			\$ 397,483.50	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 397,484	\$ -			
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios	Global	1	\$ 1,666,000	\$ 1,666.000.00	X			\$ 1,715,563.50	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1,715,564	\$ -			
		Transporte de estudiantes a evento	Unitario	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500.000.00	X			\$ 1,544,625.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1,544,625	\$ -			
	4. Actividad del Aula a la Obra 17/06/2022	Alquiler salón y recursos localivos	Unitario	1	\$ 550,000	\$ 550.000.00	X			\$ 566,362.50	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 566,363	\$ -			
		Alimentación (desayuno, almuerzo) y refrigerios	Global	1	\$ 1,861,000	\$ 1,861.000.00	X			\$ 1,916,364.75	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1,916,365	\$ -			
		Transporte de estudiantes a evento	Unitario	1	\$ 1,500,000	\$ 1,500.000.00	X			\$ 1,544,625.00	0	\$ -	2.5%	\$ -	\$ -	1	\$ 1,544,625	\$ -			
Compensación social																					

